28/07/2026

se compró señalización y se realizó registro en alquiequipos para alquiler de compresor.

se instaló señalización preventiva de obra correspondiente al PMT.

se capacitó personal operativo en temas de seguridad y salud en el trabajo.

Firma: Raúl E. Ayala G. Residente Interventoría 2

29/07/2026

se realizaron preliminares para la apertura del punto 42. El día fue soleado.

se hicieron las columnas en guadua con base rectangular de concreto.

se hicieron cotizaciones de herramientas de trabajo, se realizaron cotizaciones de maquinaria y equipos, se cotizaron señalizaciones en lámina galvanizada.

se recibió el equipo compresor con martillo, se logró demoler 7mts lineales, aproximadamente a las 04:00pm se suspendió la actividad por requerimiento de interventoría, debido a que la interventora SST no tenía la documentación requerida para iniciar operaciones de esa maquinaria.

Firma: Raúl E. Ayala G. Residente interventoría 2

Powered by CamScanner

30/07/2026

se contó con el acompañamiento de 3 oficiales, 1 maestro, 1 contramaestro, 2 ayudantes, 2 reguladores, 1 residente de obra, 1 residente social, 1 residente ambiental, 1 residente SST, 1 inspector de obra.

se realizó un recorrido por los puntos 42, 41, 40, 51.
se midieron longitudes para calcular cantidades.

se retomó el trabajo con el compresor y los ayudantes, se demolieron varios metros hasta alcanzar 77mts lineales demolidos. de un carril, 3.65 X 77 m.

por el momento se sigue trabajando con el compresor, pero se inició cotización para traer otro equipo.

Firma: Danilo Allerdo
residente de obra.

Residente interventoría.

31/07/2026

se continuó demoliendo el carril con el compresor mientras nos suministran otra maquinaria, Inspeccionando el material demolido, se evidenció que las dovelas del pavimento existente son de 7/8". se habló con supervisión de la alcaldía aclarando el tema de diseño de pavimento y me respondió por mensaje que para losas de 18 cm las dovelas son de 7/8" y losas de 20 cm las dovelas deben ser de 1".

también se recibieron más herramientas para la obra.

Powered by CamScanner

El dra fue despejado y soleado, se conto con el acompañamiento de residente de obra, residente interventor, inspector, residente SST, residente social, residente ambiental y la cuadrilla de obra.

también se solicitó modificación del pmt del punto 42 ya que se presentan muchas problemas de movilidad.

firma: Damin Allerdo
residente de obra. Residente interventoria 2

01/08/2026.

Por parte de la supervisión se recibió un oficio, solicitando una subsanación al pmt implementado.

se llegó a obra aproximadamente a las 10:00 Am, ya que no era dra laboral, se recibieron los reguladores de tránsito a las 11:00 Am, se montó la señalización solicitada, se contó con el acompañamiento del inspector y del contramaestro, residente social y residente de obra.

se pintaron las colombinas solicitadas. y se finalizaron las laboras de subsanación aproximadamente a las 06:30 pm.

firma: Damin Allerdo
Residente de obra.

Residente interventoria 2

03/08/2026

El dra de hoy fue despejado, sin aparente probabilidad de precipitación. se ordenó terminar de pintar las colombinas, se gestionó el alquiler de un retro (pajarita) con martillo, o en su defecto, un minicargador con martillo.

minerva 50:02A Diseñada y actualizada según la Ley © por los

Powered by CamScanner

del cual solo había disponibilidad de un minicargador con martillo en toda la ciudad, quedando programado para el siguiente día en horas de la mañana.

también se están gestionando otros equipos como el bentin y rana.

se cotizó en laboratorio ensayos de densidades con cono de arena.

se trabajó con el compresor hasta el final del día.

también se cotizó y mandó a fabricar señales preventivas de obra.

firma: Darlin Allerdo
residente de obra.

Residente Interventoría 2

04/08/2026

se visitó el punto 51, se midió todos los anclajes que están para intervenir entre los direcciones dadas en la Propuesta económica. Nos percatamos de los puntos exactos a intervenir, los cuales se dejaron marcados.

se realizó comité de obra a las 09:00 AM, se discutieron temas presupuestarios, administrativos, operativos y se hablaron de los compromisos de todas las áreas.

Alrededor de la 01:00 pm ocurrió un corto evento de precipitación, lo que obligó a suspender operaciones momentáneamente.

Se hizo otro pedido de señalización, colombinas plásticas y se está gestionando más personal.

firma: Darlin Allerdo

Residente Interventoría 2

Powered by CamScanner

05/08/2026

Día nublado, hubo un pequeño evento de precipitación entre las 08:00 AM y 08:20 AM en el barrio Aranjuez.

se inició el día con la incorporación de 4 nuevas ayudantes, la llegada de una volqueta más para el retiro de material y el minicargador opera con normalidad.

se planea abrir los puntos 51 y 49 que corresponden a reposición de andén y pavimento en concreto rígido, respectivamente.


se visitaron los puntos 50 y 43 y en ambos puntos no coincide la medición en campo con las medidas de la propuesta económica. se solicitó más claridad de la información a la supervisión.

se solicitó por medio de la supervisión unas visitas de aguas de manizales, para la evaluación de 2 puntos críticos donde se debe reponer el pavimento y hay mH en la zona a intervenir.

En el punto 50 (cr 42 entre calles 72 y 73) está estipulado un tramo de 6,92m de largo y 6m de ancho, pero en campo la losa completa mide L= 7,12 y A= 6m para ambos carriles

minerva 50-02A Diseñada y actualizada según la Ley © por WS

Powered by CamScanner

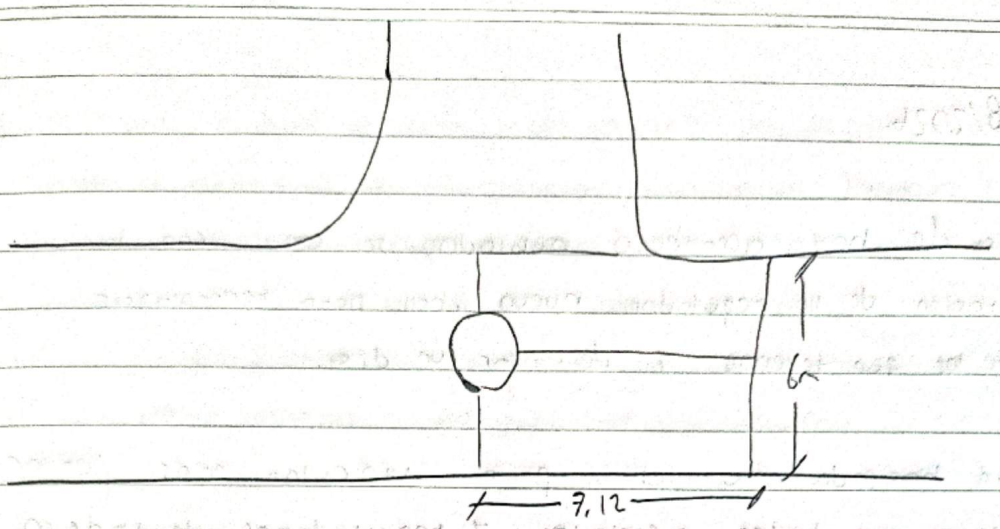

Los otros 3X3m de la propuesta económica no se van a realizar con supervisión.

En el punto 42 descarpotamos la capa de pavimento, se retiró todo y se encontró una capa de afirmado bastante compacta, el residente de interventoría propone dejar esa capa de afirmado y vacear la losa sobre esa capa, aun que ya se han retirado 20 m lineales de 20cm, propone hacer ensayos correspondientes para comparar CBR de diseño y CBR de campo.

se avanzó en el frente de obra del punto 51, se demolieron aproximadamente 28m lineales de un costado del andén.

en compañía con el ingeniero Adrian, supervisor de la alcaldía se hizo un recorrido de unos puntos correspondientes al barrio naranjuez, exactamente se visitaron los siguientes puntos: 49, 48, 50, 54, 46, 47, 44.

firma: Danilo Allerdo

Residente de obra | Residente interventoría | supervisión

minerva 50-02A Diseñada y actualizada según la Ley © por ...

Powered by CamScanner

06/08/2026

El día de hoy amaneció nublado, se contó con la incorporación de un regulador nuevo, ideal para reemplazar uno de los que tenemos y descansar un día.

Se está haciendo convocatoria para vincular más personal operativo, ayudantes, oficiales y reguladores de tráfico.

Se trabajó con residente de interventoría en las correcciones de unos informes, se solicitó a supervisión el envío de una información crucial en cuanto a espesores de pavimento, estructura de diseño de pavimento, andenes, diseños de escaleras y barandas.

Se despachó el minicargador en horas de la tarde, se programó la rana para el lunes, se mandaron a hacer unas señales y quedó para entrega el lunes.

Aproximadamente a las 04:00 pm llegó el ingeniero del laboratorio a realizar unos ensayos de densidades, toma de muestras de la capa de afirmado existente para realizar ensayos de CBR y proctor modificado, para luego comparar con los diseños de la supervisión.

También llovió alrededor de las 04:00, en el punto S7 se dejó descapotado y se recibió un viaje de afirmado para conformación de andenes.

Se reventó una manguera de agua e inmediatamente se reparó mientras viene la empresa de aguas a revisar el daño.

minerva SO-02A Diseñada y actualizada según la Ley © por IICE

Powered by CamScanner

Por parte de la residencia de interventoría se sostiene que la capa de afirmado es competente para vaciar las losas de concreto, de igual manera se esperan los reportes de laboratorio y verificar la capacidad portante del afirmado existente.

Firma: Danilo Allerdo
Residente obra

Residente interventor 2

07/08/2026

Se hizo recorrido con residente de interventoría e inspector de interventoría a los puntos que se pretenden abrir la próxima semana, se visitó el punto 43, 44, 45, 47, 30, 31, 31 y 27.

Los puntos intervenidos se dejaron debidamente señalizados, también se reportó el hurto de una señal de trabajador en la vía

Firma: Danilo Allerdo
Residente de obra

Residente Interv 3

08/08/2026

Este día no se trabajó, al ser sábado es día de descanso.

Firma: Danilo Allerdo
Residente de obra.

Residente Interventor 3

09/08/2026

Este día al ser festivo o dominical no se laboró.
se dejó los puntos intervenidos bien señalizados.

Firma: Danilo Allerdo
Danilo Allerdo residente de obra

Residente Interv 3

minerva 50-02A Diseñada y actualizada según la Ley © por ICS

Powered by CamScanner

10/08/2026

Cerca de las 07:30 AM se presentó un sismo de 7.1 grados con epicentro en Chocó.
Lo que obligó a suspender actividades durante el día para que los colaboradores pudieran estar con sus familias.

De igual manera se adelantaron labores administrativas desde los hogares de cada uno del personal técnico-administrativo.
también se deja señalizado debidamente de acuerdo al PMT en los puntos de intervención.

firma: Danin Allende
Residente de obra

Residente interventoría 3

11/08/2026

Día despejado, se contó con el apoyo de personal operativo y administrativo. se incorporó el residente SST nuevo, en reemplazo de Diego Armando.

se recibió el minicargador de nuevo y se recibió la rana para compactar el afirmado de los anclajes y el compresor con martillo percutor para iniciar el punto 43.

se autorizó por interventoría (residente interventoría 2) la apertura del punto 43, se demolió la losa con martillo percutor debido a el debilitamiento de las estructuras contiguas analizadas la semana anterior.

minerva 20-02A Diseñada y actualizada según la Ley © por ICA

Powered by CamScanner

se recibieron 16m³ de subbase, se terminó de excavar material común, dejando para conformar 20cm de subbase y 20cm de Losa de concreto, autorizado por supervisión e interventoría.

se adelantaron afiliaciones y se comenzó a montar el plan SG-SST del nuevo residente SST, ya que el profesional anterior encargado de l área no implementó adecuadamente una estructura SG-SST y no dejó una relación del personal vinculado al proyecto.

se hizo un recorrido por el punto 4, levantando información de las materas que se van a reponer en ese punto.

se reclamaron 34 señales y se dejó listo para implementar inicio de operaciones en el punto 40.

firma: Danilo Alfaro. Residente de obra

Residente interventoría 3

12/08/2026

El día de hoy fue despejado, se contó con el apoyo de personal operativo, ayudantes, oficiales, reguladores, maestro y contramaestro.

Personal de oficina administrativa y técnica, con la compañía de residente de interventoría e inspector.

hoy se recibieron 2 viajes de subbase, se terminó de mandar el botadero el material demolido del punto 43, se regó la subbase y se recibió de berma para completar la subbase.

minerva 50-02A Diseñada y actualizada según la Ley © por ITCR

Powered by CamScanner

se recibieron los resultados de laboratorio de las densidades con arimado, de igual manera se retiró una capa de arimado y se llenó de subbase, se está compactando con subbase y el bentin.

se compactó con tam los 28m de arcén del punto 57.

se pidió material mixto, acero y cemento para vaciar las tapas del punto 47. se vació una tapa.

se dejan los puntos intervenidos bien señalizados.

Las reguladoras trabajan hasta las 6pm.

firma: Danilo Allerdo
Residente de obra

residente interventoría.

13/08/2026

El día de hoy se hizo capacitación del área ambiental, social y de seguridad ocupacional. se contó con la incorporación de un ayudante.

La reguladora Luisa Fernanda no se presentó debido a una emergencia familiar.

se hizo un recorrido en el punto 42 se compactó a la capa de 20cm con el compactador bentin.
se formaleteó para el bordillo de ese punto y se tiraron niveles.

En el punto 43 se recogió el escombro el día de ayer y se está rompiendo la capa de material común a un espesor de 20 cm para su posterior retiro.

minerva 50-02A Diseñada y actualizada según la Ley © por TDS

Powered by CamScanner

En el punto 51 se está excavando la capa de 10 cm de material común para luego regar y compactar el afirmado con rana.

En el punto 44 (por el cal) se está esperando a recibir el material mixto en costales que se pidió a suma, el acero y el cono slump para hacer el ensayo de asentamiento cuando se vaya a vaciar las tapas faltantes.

se recibió el mixto en costales, el cemento y el acero.

se trajo el cono slump para el ensayo de asentamiento. se hizo la prueba de asentamiento del cono y dio 5", dentro del rango tolerable.

se dejó todo debidamente señalizado.

firma: Danilo Allerdo
residente de obra.

Residente Interventor 3

14/08/2026

hoy el día fue despejado, contamos con buen tiempo para operar. contamos con la incorporación de 2 reguladores, 2 ayudantes y 1 oficial.

se terminó de suministrar subbase en el punto 43, se dejó compactado el punto 42, con el perfil y el bombeo correcto.

se incorporó un frente de trabajo nuevo, el punto 40, en la entrada del barrio Arangüez, son 28m lineales de pavimento rígido, se inició con el cierre perimetral de lo que se va a demoler.

minerva 50-02A Diseñada y actualizada según la Ley © por UGS

Powered by CamScanner

En ese punto 40 se incorporaron los reguladores nuevos y 1 oficial, la operación avanzó con normalidad.

Las tapas del punto 47, en el polideportivo, se están humedeciendo periódicamente para el curado correcto.

En el punto 51 se está terminando de excavar los 10cm de tierra para conformación de andén. Estamos a la espera de 8m³ de subbase

Danib Allerdo
Residente de obra.

Residente de Interventor 3

15/08/2026

Día sábado de descanso. se dejó bien señalizado.

Danib Allerdo
Residente de obra.

Residente Interventor 3

16/08/2026

Día de descanso, domingo, se dejó bien señalizado.

Danib Allerdo
Residente de obra.

Residente Interventor 3

17/08/2026

Día de descanso festivo, se dejó bien señalizado.

Danib Allerdo
Residente de obra.

Residente Interventor 3

18/08/2026

El día de hoy amaneció nublado con probabilidad de lluvia, hoy se terminó de demoler el pavimento del punto 40, Uno la volqueta a recoger escombros, salieron 6 viajes de escombros.

se compactó más el punto 43 con el bentin, el 42 y en horas de la tarde se hizo ensayo de densidades.

Se tenía programado hacer ensayos en el punto 42, 43 y 57, pero

Powered by CamScanner

solo se logró hacer ensayos en el punto 42 y 43 debido a que en el punto 57 estaba mojado el afirmado.

se demolió otra losa del punto 43 en donde se hizo con el martillo del excavador, para rendimiento.

se compactó con rana el afirmado del andén y se mandó a recoger la rana de alquiequipos, se compró una rana para la obra.

también se recibió el acero de las varillas para la conformación de las dovelas. se dejó bien señalizado.

Pavin Alfredo
Residente de obra.

Residente Interventor 3

19/08/2016

se está instalando la estacada para pasar los cables, llegó el ensayo de densidades del punto 43 y 42 y dio 94,6 para el punto 42 y 93,5 para el punto 43. lo que no aprobó interventoría. se ordenó compactar más la subbase con el equipo Benitin y agua.

En el punto 57 se terminó de compactar con afirmado la capa de 10cm del andén y se comenzó a formaletear para el vaciado de el andén.

En el punto 40 se está instalando la señalización para comenzar a demoler la vía. En horas de la tarde se inició con la demolición del pavimento del punto 40.

la interventoría ve con preocupación el avance físico de las actividades contempladas ya que se modificaron los puntos de inicio de la programación inicial partiendo que se deben almenos ejecutar en un valor similar

minerva 50-02A Diseñada y actualizada según la Ley © por UCE

Powered by CamScanner

pero dicho avance ejecutado no alcanza ni al 55% de lo programado, dejando casi nulo el avance de la semana 6, a lo cual se reitera implementar un plan de contingencia encaminado a igualar la programación. al finalizar el día se evidencia el abandono de los puestos de trabajo por parte del personal operativo motivados por la falta de pago.

Danilo Allerdo
Residente de obra.

Residente Interventor 3

20/08/2026

El día de hoy amaneció despejado, contando con el apoyo de 3 oficiales, 6 ayudantes, 4 reguladores y el personal técnico-administrativo.

se está compactando el punto 40 con Benith para alcanzar como mínimo el 95% del proctor modificado, igualmente en el punto 42 y 43. En el punto 42 se están instalando las vigas riostras para los cabezales.

En el punto 43 se autorizó por supervisión e interventoría la demolición de un cuadro de 2,8 x 3,0 m que es el lugar donde habría un hundimiento del pavimento 43, el cual se demolió y se espera que en el transcurso del día se boten los escombros.

En el punto del andén (punto 57) se está terminando de conformar la capa de espesor de afirmado de 20cm con el sardinel. el minicargador con martillo terminó de demoler el sardinel y se avanza en el formaleteo de la estructura de andén.

se visitó el punto donde va el muro de contención

Powered by CamScanner

y se toma las medidas.

se dejó todos los puntos debidamente senalizados.

Danilo Allerdo
Residente de obra.

Residente de laboratorio 3

21/08/2026.

hoy se contó con la visita de aguas de manizales para visitar 4 puntos donde están tapas de MH, se hizo la visita para verificar los puntos, la red de acueducto y alcantarillado y confirmar la profundidad de las redes.

hoy se adelantaron labores de compactación en los puntos 42 y 40 con equipo compactador bentin.

se contó con el apoyo de 4 oficiales, 4 ayudantes, maestro, contramaestro y personal administrativo.

se hizo capacitación de control de derrames por parte de la profesional ambiental, capacitación de seguridad y salud en el trabajo por parte del profesional SST y se dejó las tramos de andén formaletedos para vaciar el día lunes.

el día fue despejado y se dejaron todos los puntos debidamente senalizados.

Danilo Allerdo
Residente de obra.

Residente laboratorio 3

24/08/2026

el día de hoy amaneció despejado, se contó con la colaboración de 4 oficiales, 4 ayudantes, 1 maestro y 1 contramaestro, 1 personal administrativo.

hoy se recibió un concretadora de medio bulto, 1 vibrador y el concreto,

minerva 50-02A Diseñada y actualizada según la Ley © por ICA

Powered by CamScanner

700 bultos, según el dueño de mezcla.

también se recibió material mixto para el concreto.

El inspector de la Alcaldía llegó al punto donde se iba a vaciar el andén y recomendó compactar más el afirmado y se indicó donde se va a poner tapas nuevas, por lo cual se suspende el vaciado hasta subsanar esa parte.

se deja todo el tramo a vaciar compactado con afirmado y formaleteado.

se deja todo el material cubierto y los puntos señalizados.

Danilo Allerdo
Residente de obra.

24/08/2026, continuación de apunte interventor.

A la fecha del punto 42 No se libera por No cumplir con las diligencias realizadas, también se evidencia disgregado de grano muy grueso sin uniformidad para recibo de la capa superior: realizar procedimiento:
1- Escarificar el material, mezclarlo homogeneamente INVIAS INV E-141, recompactar la interventoría realizará siguiente contacto.

Danilo Allerdo
Residente de obra

Carlos Interventoría 3.

25/08/2026

minerva Diseñada y actualizada según la Ley © por

Powered by CamScanner

Agosto 25 de 2026 hora 8:45 AM.

Personal disponible actualmente en la obra: Del contratista.
un ingeniero residente de obra.
una Profesional SST.
una ingeniera ambiental
una profesional en trabajo social
un maestro de obra
un contramaestro de obra
cuatro oficiales.
Siete Ayudantes.
tres controladores de tráfico
un operario de benitin.

Equipo disponible en obra:
Planchas vibrocompactadoras:
Cilindro compactador:
mezcladora.
Herramienta menor.

Puntos y o frentes en ejecución

Punto #1: Andm	Activo
Punto #2: Sin personal	inactivo
Punto #3: Sin personal	inactivo
Punto #4: Sin personal	inactivo

Importantísimo: No hay suficiente personal para avanzar con la obra.
Contrato actualmente se debe tener como mínimo seis puntos en ejecución.
La supervisión observa con mucha preocupación el poco avance de obra, ya que esto repercute en la programación e inversión mensual presentada según programación presentada a la interventoría y a la Secretaría

minerva2 SO-024 Diseñada y actualizada según la Ley © por

Powered by CamScanner

de ingeniería vial.
Para la instalación de concretos tanto asfálticos, como hidráulicos se deben muy presente las siguientes recomendaciones las cuales deben cumplir con las especificaciones viales.

Los materiales granulares y su colocación en cada sitio de trabajo deben estar sujetos a las siguientes Normas:
Afirmado: Artículo 311-22.
Subbase: Artículo 320-22.
Base: Artículo 330-22.
La anterior es de obligatorio cumplimiento por parte del contratista y la interventoría.
Inspector de obra
Supervisor, Secretaria infraestructura

Contado mañana

Agosto 25 de 2026 hora 11:15 am

Se solicita a la interventoría y contratista el favor de informar la fecha y hora, también el punto donde se tiene programado colocar concreto para andenes y pavimento, con el único propósito de realizar el acompañamiento y supervisión por parte de la Secretaría de Infraestructura del municipio.
Es necesario todos los elementos para realizar cada una de las actividades programadas.

minerva 2 Obra diseñada y actualizada según la Ley © por

Powered by CamScanner

Esto con el fin de no tener inconvenientes en la ejecución de cada tarea.
Para instalar concreto mr se debe tener en el sitio los siguientes elementos:

La superficie donde se colocará el cto debe cumplir con los siguientes ítems
Espesor del material granular o base por la interventoría o la administración
cotas y o niveles de acuerdo a cada punto.
Ensayos de densidad.
La superficie deberá estar totalmente sellada y compactada. "Sellada"
No se deben observar áreas con material granular suelto
El material granular colocado debe estar bien graduado cumpliendo segregación
No se permitirán áreas a pavimentar donde se observen ~~áreas~~ solo material grueso y ausente de material fino.

Elementos de obligatorio cumplimiento

Personal suficiente y competente, que cada uno sepa cuales son sus roles.
Todos deben conocer sus funciones.
Equipo:
Retroexcavadora.
Vibrador de punta.
Flota canal.
Rastrillo metálico
Cordeles y o boquilleras.
Instalar debidamente las castillas si es necesario.

minerva 50-02A Diseñada y actualizada según la Ley © por


Powered by CamScanner

Teodolito, según instrucciones de la interventoría.
Aspersora para instalar antisol.
Antisol.
Vibrador o similar
Canastillas para dovelas debidamente revisadas por la interventoría para confirmar que su fabricación sea la correcta, con sus respectivas dovelas en acero liso de acuerdo al diseño dependiendo del espesor del pavimento.
Grasa.
Formaleta para toma de vigas, debidamente lubricadas.
Cono Slump.
Varilla que cumpla con especificaciones para toma de muestras.
Pica o similar para cortar y alizadores.
Formaletas y espesores debidamente revisadas por la interventoría.
Recebo de sitio o el cortado de para conectores si es el caso cerrando se construyen ambos carriles.
Herramientas menores.
Bastones o para sardinel donde sigue su construcción.
Todo lo anterior debe ser revisado por la interventoría mediante una visita de chequeo previo a la preparación y colocación del concreto.
Antes de proceder a la instalación del concreto la superficie deberá estar libre de material suelto, y debidamente humedecida.

minerva 150-DZA Diseñada y actualizada según la Ley © por DZA

Powered by CamScanner

Es necesario asegurar las canastillas para evitar su desplazamiento durante la colocación del concreto.
No pararse sobre la canastilla para evitar su deformación.
En los platos que requieran acero de refuerzo es necesario instalar este elemento con tiempo suficiente, para evitar contratiempos y demoras en el descargue del mixer cuando se trata de concretos especiales FAST TRACK y o similares.
Por último proteger el acero para evitar posibles daños al pavimento ~~recien~~ recién construido.
Todo lo anterior debe ser Avalado por la interventoría.



El día de hoy se contó con la incorporación de 3 nuevos ayudantes 1 1 reguiador, una reguladora renunció el día de ayer, por lo cual contamos con el acompañamiento de 4 oficiales, 7 (~~regulatores~~) ayudantes 1 4 reguiadores, más el personal administrativo.

El día de hoy se vaciará el tramo de andén de 20m, correspondiente al punto 51, también se está avanzando en regar material en el punto 40.

En la visita del inspector de la alcaldía se llegaron a acuerdos en cuanto a la instalación de la malla electro soldada que deben ser en los accesos vehiculares de doble malla y en los puntos donde hay cajas de inspección colocar malla rodeando

minerva 50-02A Diseñada y actualizada según la Ley © por

Powered by CamScanner

la casa de inspección. para el vaciado de hoy
se instaló la malla electrosoldada en toda la longitud
del andén de los primeros 28m de cimdér del
punto 51, y la ingeniera natalia por intermedio de don
conrado autorizó la puesta de la malla en toda la
longitud del andén, porque cuando llegó el señor conrado
a decirnos esa información, ya estaba instalada la malla
y no se nos había suministrado esa información anteriormente.

El vaciado inicio aproximadamente a las 10:00. Am
finaliza a las 4:40 pm, solo se fue del un oficial
y 1 ayudante quedando el restante.

se gastaron 52 bultos de concreto, casi 8m3 cubicos
de mixto y 4 mallas electrosoldadas.

se sacaron 4 cilindros para ensayo de laboratorio,
se instaló el acero longitudinal para el sardinel
y el vaciado transcurrió sin novedad alguna, hubo tiempo
nublado pero no llovió.

se dejó instrucciones de dejar el andén vaciado tapado,
y las señalizaciones bien instaladas.

Danilo Alvarado
Residente obra.

Residente Interventoria 3

26/08/2026
Se inicia el dia, la interventoria solicita el preoperacional de la pulidora a lo cual no se encuentra profesional SST de obra en el punto y de la misma manera se solicita al maestro de obra la guarda o traer el equipo de Corteduria de disco, se realiza el reporte al profesional de Obra competente.
Sobre las 10:20am el Contramaestro Jaiver sufre un accidente laboral en el dedo indice izquierdo por corte con pulidora.

minerva SO-02A Diseñada y actualizada según la Ley ... por ...

Powered by CamScanner

El día de hoy se contó con la compañía de 7 auxiliares, 4 oficiales, 1 maestro y 1 contramaestre. y personal técnico-Administrativo. El clima estuvo en óptimas condiciones, no se presentaron inconvenientes en cuanto a lluvias.

En el punto 42 se levantó la viga trinistra a petición de la interventoría y de la supervisión, se subsanó el tema del material granular grueso fue se apreciaba, se revolvió el material grueso con material fino y se compactó con agua.

de igual manera en el punto 40 se revolvió el material grueso con el material fino y se compactó con el bantin y con la rana por los codos.

Se hizo ensayo de densidades en ambos puntos y dió de 99,7%. del proctor modificado.

En el punto 51 se cortó la dilatación del andén y en el proceso el contramaestre se cortó un dedo, se mandó a ARL inmediatamente y le dieron 2 días de incapacidad.

Quedó todo listo para el vaciado mañana, los puntos debidamente señalizados.

Daniela Allende
Residente de obra.

Residente Interventoría 3

27/08/2026

El día de hoy contamos con un buen clima, con la ayuda de 9 ayudantes y 4 oficiales, el maestro, contramaestra y el personal técnico.

El día de hoy estuvimos citados a una reunión en la alcaldía con la secretaria de infraestructura. Allí todos temas de avance de obra, presupuestarios y de rendimiento en el contrato, se llegaron a acuerdos de subsanación y avance en la ejecución del contrato.

A las 11:00 Am se tenía programada la mixer, llegó exacto al tiempo, se comenzó el proceso de vaciado, con la compañía de interventoría y la supervisión de la alcaldía. Aproximadamente a las 12:30 del medio día el ingeniero Rodman, residente de interventoría da orden de suspender el vaciado, debido a que no se tenían las condiciones, técnicas, operativas y logísticas suplidas al momento del vaciado, por tal razón se decidió suspender el proceso y obedecer la orden de interventoría. se logró tener contacto con Argos a tiempo y se logró suspender una mixer que venía en camino. se reprogramó para el lunes, para suplir todas las garantías técnicas y operativas para el momento del vaciado.

Aprovechando que teníamos una mixer y no perder ese concreto, se vació el concreto en un tramo de andén que se tenía de 28m X 1,57m. El concreto vaciado nos quedamos cortando y pulliendo e instalando los pelos para el sardinel.

Danin Allerdo
Residente de obra

Residente Interventoría 3

28/08/2026

El día de hoy contamos con un buen clima, contamos con la colaboración de 9 ayudantes, 4 oficiales, maestro

Powered by CamScanner
