INFORME DE SUPERVISIÓN DE OBRA

INFORME DE SUPERVISIÓN No:	3		FECHA:	31	de	AGOSTO	de	2026			
PERIODO: DEL	1	de	AGOSTO	de	2026	AL	31	de	AGOSTO	de	2026

CONTRATO No:	**IPVO-017-2026**	DE		RECURSOS:	N/A

OBJETO:

Suministro e instalación de la señalización vial horizontal y vertical requerida para el cumplimiento de la ejecución de los diferentes contratos o convenios suscritos por Tierrasua S.A.S.

LOCALIZACIÓN:

Tunja y Oicatá (Departamento de Boyacá)

NOMBRE DEL CONTRATISTA:	REPRESENTANTE LEGAL:
ICC Ingeniería y Consultoría de Colombia S.A.S. – NIT 901.021.317-8	**Belén Zoraida García Tuta – C.C. 46.682.288**

NOMBRE DEL SUPERVISOR:

Julián Edgardo Guerrero Rincón

ADICIONALES Y PRORROGAS


No.	DESCRIPCIÓN	VALOR	PLAZO
	No se suscribieron adicionales ni prórrogas.		
VALOR ADICIONALES Y PLAZO TOTAL		$ 0,00	

VALOR INICIAL:	$ 1.506.313.999,94	VALOR ADICIONALES:	$ 0,00	VALOR TOTAL:	$ 1.506.313.999,94

FECHA DE TERMINACIÓN REAL (Según prorrogas y suspensiones)	26	de	DICIEMBRE	de	**2026**
FECHA DE TERMINACIÓN REAL (Según prorrogas y suspensiones)		de		de	

AVANCE DE EJECUCIÓN

% DE TIEMPO TRANSCURRIDO	**45%**	% DE AVANCE DE OBRA EJECUTADO	**11,2%**	% DE AVANCE DE OBRA PROGRAMADO	**N.A.**



INFORME DE SUPERVISIÓN DE OBRA	

PÓLIZAS VIGENTES CONTRATO DE OBRA

No PÓLIZA	51-44-101033160	ANEXO No.	0	ASEGURADORA	Seguros del Estado S.A.	FECHA APROB. DIRECCIÓN CONTRATACIÓN	dd	mm	aa
							4	5	2026

DESCRIPCIÓN DE AMPAROS	VIG. DESDE			VIG. HASTA			SUMA ASEGURADA
	dd	mm	aaaa	dd	mm	aaaa	
Cumplimiento del contrato	27	4	2026	2	6	2026	$ 150.631.399,99
Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	27	4	2026	1	12	2029	$ 150.631.399,99
Estabilidad y calidad de las obras	27	12	2026	27	12	2027	$ 301.262.799,99

ESTADO DEL TIEMPO

BUENO	X	REGULAR		MALO		PÉSIMO	

Descripción: Durante el periodo (agosto de 2026) no se ejecutaron actividades de campo relacionadas con el contrato.

RELACIÓN DE ACTAS GENERADAS (Inicio, suspensión, reinicio, etc.)

DESCRIPCIÓN	FECHA		
	dd	mm	aaaa
Acta de inicio	27	5	2026

ACTIVIDADES DESARROLLADAS CONTRATISTA DE OBRA

DESCRIPCIÓN	LOCALIZACIÓN (ABSCISAS)
Durante el periodo (agosto de 2026) no se ejecutaron actividades de campo, por cuanto no se suministraron nuevos tramos para la ejecución de las actividades del contrato.	N/A

INFORME DE SUPERVISIÓN DE OBRA	

EQUIPO UTILIZADO CONTRATISTA DE OBRA			
DESCRIPCIÓN	ACTIVIDAD EJECUTADA	% UTILIZACIÓN	OBSERVACIONES
No se utilizó equipo durante el periodo (mes sin ejecución).			

MATERIALES UTILIZADOS CONTRATISTA DE OBRA		
DESCRIPCIÓN	SUMINISTRADO POR	OBSERVACIONES
No se emplearon materiales durante el periodo (mes sin ejecución).		

SEGUIMIENTO FINANCIERO CONTRATO DE OBRA		
DESCRIPCIÓN	FECHA	VALOR
ANTICIPO		N/A
Acta parcial No. 1	28/08/2026	$ 109.513.972,06
TOTAL PAGOS AUTORIZADOS		**$ 109.513.972,06**

INFORME DE SUPERVISIÓN DE OBRA	

CORRESPONDENCIA PRESENTADA			
FECHA RADICADO	INTERESADO	ASUNTO	RESPUESTA O TRÁMITE
—	—	No se presentó correspondencia enviada ni recibida durante el periodo del informe.	—

VERIFICACIÓN DEL PAGO A SEGURIDAD SOCIAL											
NOBRES Y APELLIDOS	No DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN	SALUD	PENSIÓN	RIESGOS	PERIODO						
					DESDE			HASTA			
					dd	mm	aaaa	dd	mm	aaaa	
N/A											
Durante el periodo no se ejecutaron actividades; en lugar de planillas de seguridad social, el contratista aportó la carta de disponibilidad de profesionales (Anexo C).											

PERSONAL MÍNIMO EXIGIDO EN EL CONTRATO DE OBRA						
CARGO	NOMBRES Y APELLIDOS	DOC. IDENTIFICACIÓN				
Director de Obra	Ing. Elkin Fabián Rincón	C.C. 1.050.200.837				
Residente de Obra	Ing. Joan Daniel Orduz	C.C. 1052406065				
SST	Libin Yesenia Rodríguez Ladino	C.C. 1.002.537.459				
Se verificó que el personal cumple con los requerimientos del contrato?			SI	X	NO	

* Si se incluyó personal nuevo en el periodo se debe radicar al supervisor la hoja de vida y la aprobación de supervisión

INFORME DE SUPERVISIÓN DE OBRA	

ACTIVIDADES DESARROLLADAS PARA EL CONTROL, MANEJO AMBIENTAL Y SEGURIDAD INDUSTRIAL

CONTRATO DE OBRA

DESCRIPCIÓN	LOCALIZACIÓN
Durante el periodo (agosto de 2026) no se ejecutaron actividades de campo, por cuanto no se suministraron nuevos tramos para la ejecución de las actividades del contrato.	N/A

RELACIÓN DE LABORATORIOS PRUEBAS Y ENSAYOS REALIZADAS

POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

DESCRIPCIÓN	FECHA			OBSERVACIÓN
	dd	mm	aaaa	
No se realizaron ensayos de laboratorio en obra durante el periodo; los materiales cuentan con certificados de calidad de fábrica (anexos).				

INFORME DE SUPERVISIÓN DE OBRA	

RELACIÓN Y UBICACIÓN DE FUENTES DE MATERIALES

DESCRIPCIÓN	FUENTE	DISTANCIA A LA OBRA (Km)	OBSERVACIÓN
		—	
		—	
		—	

RELACIÓN DE COMITÉS DE OBRA REALIZADOS

DESCRIPCIÓN	FECHA			OBSERVACIÓN
	dd	mm	aaaa	

RELACIÓN DE INFORMES DE SUPERVISIÓN

DESCRIPCIÓN	PERIODO						OBSERVACIÓN
	DESDE			HASTA			
	dd	mm	aaaa	dd	mm	aaaa	
Informe de Supervisión No. 3	1	8	2026	31	8	2026	Presente informe

OBSERVACIONES:

Durante el periodo (agosto de 2026) no se ejecutaron actividades de campo relacionadas con el contrato, por cuanto no se suministraron nuevos tramos para su ejecución. En consecuencia, en lugar de planillas de seguridad social el contratista aportó la carta de disponibilidad de profesionales.

El avance acumulado en costo directo se mantiene en $140.394.324,40 (11,18%), correspondiente a los periodos anteriores. Durante agosto se tramitó el pago de la primera acta parcial por $109.513.972,06 (incluido AIU), correspondiente a las actividades de demarcación ejecutadas en el tramo de Tunja.

A la fecha de corte (31/08/2026) el contrato registra un pago autorizado (Acta Parcial No. 1 del 28/08/2026) por $109.513.972,06. El contrato no contempla anticipo.

El contrato cuenta además con póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual No. 51-40-101011226 (27/04/2026 a 02/12/2026, $350.181.000).


INFORME DE SUPERVISIÓN DE OBRA	

CONTENIDO MÍNIMO DEL INFORME*	VERIFICACIÓN	FOLIOS No.
Seguimiento Administrativo del Contrato de Obra		
Control y verificación de pagos de seguridad social y parafiscales del personal de obra	N.A.	
Control de pólizas y garantías (Acta de aprobación Sec. De Contratación)	YA SE RADICO	
Actas Generadas (inicio, suspensión , reinicio, etc.)	YA SE RADICO	
El personal de obra cumple con los requisitos exigidos de los perfiles profesionales (para personal nuevo)	N.A.	
Bitácora de obra diligenciada por los residentes con visto bueno de los directores de obra e supervisión	N.A.	
Seguimiento Financiero del Contrato de Obra		
Soportes de seguimiento a la Inversión del Anticipo	N.A.	
Amortización del anticipo	N.A.	
Flujograma de actividades e inversión del contrato de obra	N.A.	
Copia de actas de pago generadas en el periodo	SI	
Seguimiento Técnico del Contrato de Obra		
Certificación de cumplimiento de especificaciones técnicas de materiales y procesos constructivos de las obras ejecutadas	N.A.	
Certificado de recibo de estudios y diseños: Control de planos, diseños, licencias y autorizaciones, estudios cálculos y especificaciones.	N.A.	
Memorias y planos de diseño aprobados	N.A.	
Actas Generadas (Visitas ,comités de obra, vecindad, socialización, etc.)	N.A.	
Cronograma de ejecución de actividades "Actualizado"	N.A.	
Informes de laboratorio y pruebas y ensayos realizadas para verificar que se cumplan las normas, especificaciones técnicas	N.A.	
Seguimiento Seguridad industrial, salud ocupacional y medio ambiente		
Certificación de cumplimiento de pagos a seguridad social y parafiscales del contratista de obra expedida por el director de la supervisión	N.A.	
Registro de cumplimiento de todas las normas vigentes sobre seguridad industrial, salud ocupacional y medio ambiente. (señalización de obra, vertimientos, mantenimientos de maquinaria, etc.)	N.A.	
Copia de licencias y permisos ambientales y de construcción	N.A.	
Registro de uso correcto de los elementos de protección personal (entrega de dotaciones,planillas, fotos, etc.)	N.A.	
Registro de cumplimiento de la normatividad ambiental y plan de manejo ambiental (Seguimiento de fichas ambientales)	N.A.	
Análisis de riesgos de las actividades, identificando los peligros, y formulando los controles correspondientes	N.A.	
Generales		
Registro fotográfico	N.A.	
Soportes de Correspondencia enviada y recibida	N.A.	

* Se refiere a requisitos mínimos del informe de supervisión al cual se le pueden incluir todos los demás documentos que el supervisor considere necesarios.

Verificación: Indica si se entregan documentos soporte (Completar con SI, NO, N.A., YA SE RADICÓ)

Folios No.: Indica en qué folio del informe se encuentran los soportes indicados

FIRMA:	
Supervisor	
NOMBRE:	Julián Edgardo Guerrero Rincón



Vo.Bo. Daniel Camilo Sepúlveda Ramírez

Contratista: Apoyo a la supervisión

AGOSTO DE 2026

INFORME DE AVANCE MENSUAL N°3 V2.0

CONTRATO N° IPVO- 017-2026

ICC INGENIERÍA Y CONSULTORÍA DE COLOMBIA S.A.S.

CONTROL DE CAMBIOS

VERSIÓN	CAMBIO/MODIFICACIÓN	FECHA	NUEVA VERSIÓN
1	VERSIÓN INICIAL	14/09/2026	2
2	ATENCIÓN DE OBSERVACIONES SEGÚN EL CORREO ELECTRÓNICO ENVIADO EL	30/09/2026	


ELABORADO POR:	REVISADO POR:	APROBADO POR:
FECHA: 30/09/26	FECHA: 30/09/26	
 ING. ELKIN FABIAN RINCÓN RINCÓN DIRECTOR DE OBRA ICC INGENIERÍA Y CONSULTORÍA DE COLOMBIA SAS	 BELÉN ZORAIDA GARCÍA TUTA REPRESENTANTE LEGAL ICC INGENIERÍA Y CONSULTORÍA DE COLOMBIA SAS	 ING. JULIÁN EDGARDO GUERRERO RINCON SUPERVISOR TIERRASUA SAS

TABLA DE CONTENIDO

PÁG.

1. INTRODUCCIÓN 6
2. OBJETIVOS 7
2.1 OBJETIVO GENERAL 7
2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 7
3. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 8
3.1 LOCALIZACIÓN GENERAL 8
3.2 ALCANCE 8
3.3 INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO 10
3.4 PERSONAL PROFESIONAL Y EQUIPOS DISPONIBLE PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE ACUERDO CON LA OFERTA PRESENTADA 12
4. SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO DEL CONTRATO 13
4.1 CONTROL DE GARANTIAS Y APROBACIÓN DE LAS MISMAS 13
4.2 ACTAS GENERADAS (INICIO, SOCIALIZACION, SUSPENSION, REINICIO, TERMINACION, RECIBO) 13
4.3 ACTOS ADMINISTRATIVOS, MODIFICACIONES, PRORROGAS, ADICIONES 14
4.4. SOPORTE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL (PLANILLAS POR CADA MES) Y CERTIFICADO POR REVISOR FISCAL ANEXANDO LOS RESPECTIVOS DOCUMENTOS DEL PROFESIONAL 14
5. SEGUIMIENTO TÉCNICO DEL CONTRATO (EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES) POR MES 15
5.1 CONTROL DE CANTIDADES EJECUTADAS POR PERIODO Y ACUMULADO, DE ACUERDO CON EL PRESUPUESTO 15
5.2 EJECUTADOS, SABANA GENERAL DE EJECUCIÓN 16
5.3 BITACORA DE TRABAJO 16
6. SEGUIMIENTO FINANCIERO 17
6.1 SOPORTES DE SEGUIMIENTO INVERSION DEL ANTICIPO DE ACUERDO CON PLAN PRESENTADO 17
6.2 PAGOS REALIZADOS EN EL PERIODO Y ACUMULADO 17
7. SEGUIMIENTO AMBIENTAL, SEGURIDAD Y CONTROL DE CALIDAD 18

7.1 MANEJO Y DISPOSICIÓN FINAL DE LOS RESIDUOS PRODUCTO DE LAS ACTIVIDAES EJECUTADAS 18
7.2 REGISTRO DE CUMPLIMIENTO SEGURIDAD VIAL EN LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES 18
7.2.1 FORTALECIMIENTO DE CONOCIMIENTOS MEDIANTE CAPACITACIÓN 18
7.2.2 COMUNICACIÓN PREVENTIVA Y ACOMPAÑAMIENTO AL PERSONAL 19
7.2.3 ACCIONES ORIENTADAS AL CUIDADO DE LA SALUD 19
7.2.4 VERIFICACIÓN DE CONDICIONES PARA EMERGENCIAS Y CONTROL DE SEÑALIZACIÓN 19
7.2.5 GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL 20
7.2.6 SEGUIMIENTO A EVENTOS DE SEGURIDAD Y SALUD 20
7.2.7 COMPORTAMIENTO DE LOS INDICADORES SST 21
8. GENERALES 28
8.1 CORRESPONDENCIA ENVIADA 28
8.2 CORRESPONDENCIA RECIBIDA 28
9. CONCLUSIONES 29
10. ANEXOS 30

LISTA DE TABLAS

PÁG.

Tabla 1. Alcance del proyecto 9
Tabla 2. Información general del contrato 10
Tabla 3. Personal disponible en la ejecución del proyecto 12
Tabla 4. Relación de Equipos y maquinaria del contratista 12
Tabla 5. Control de garantías 13
Tabla 6. Actas generadas 13
Tabla 9. Indicadores de seguridad 22
Tabla 11. correspondencia enviada 28
Tabla 12. Correspondencia recibida 28

LISTA DE ILUSTRACIONES

PAG.

Ilustración 1. Mapa departamento de Boyacá 8

Ilustración 2. Comparación de presupuesto entre, proyectado, sin ejecutar y ejecutado acumulado en costo directo.....15

Ilustración 3. Pagos Realizados hasta la fecha.....17

1. INTRODUCCIÓN

MEDIANTE EL CONTRATO NO. IPVO-017-2026 CUYO OBJETO ES "SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LA SEÑALIZACIÓN VIAL HORIZONTAL Y VERTICAL REQUERIDA PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUCIÓN DE LOS DIFERENTES CONTRATOS O CONVENIOS SUSCRITOS POR TIERRASUA S.A.S", SUSCRITO ENTRE TIERRASUA S.A.S. E ICC INGENIERÍA Y CONSULTORÍA DE COLOMBIA S.A.S., Y CONFORME CON LO DISPUESTO CONTRACTUALMENTE, SE PRESENTA EL INFORME MENSUAL DE AVANCE DE OBRA CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01 DE AGOSTO HASTA EL 31 DE AGOSTO DE 2026.

EL PRESENTE DOCUMENTO CONTIENE EL AVANCE DE EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DEL CONTRATO DURANTE EL TERCER MES DE OBRA, TRANSCURRIDO DESDE LA FIRMA DEL ACTA DE INICIO EL 27 DE MAYO DE 2026. ASIMISMO, INCLUYE LA DISTRIBUCIÓN DEL PRESUPUESTO POR ACTIVIDAD, LA MAQUINARIA Y LOS EQUIPOS UTILIZADOS, Y EL PERSONAL DISPUESTO POR EL CONTRATISTA, TODO DE ACUERDO CON LO ESTIPULADO EN LOS PLIEGOS DE CONDICIONES DEL CONTRATO.

2. OBJETIVOS

2.1 OBJETIVO GENERAL

PRESENTAR EL AVANCE DE LAS OBRAS Y ACTIVIDADES SUSCRITAS EN EL CONTRATO, ADEMÁS DE DAR UN BALANCE EN LOS COSTOS INCURRIDOS DURANTE ESTA EJECUCIÓN.

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- ENUMERAR Y DESCRIBIR LAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL CONTRATO EN EJECUCIÓN REALIZADAS EN EL PRESENTE MES
- PRESENTAR REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS, ASÍ COMO LAS CANTIDADES EJECUTADAS
- PRESENTAR UN BALANCE GENERAL DE LAS ACTIVIDADES QUE SE HAN REALIZADO EN EL PRESENTE MES.

3. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

3.1 LOCALIZACIÓN GENERAL

EL PROYECTO SE DESARROLLARÁ EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, INTERVINIENDO DIFERENTES SECTORES DE LA RED VIAL SECUNDARIA Y TERCIARIA DE JURISDICCIÓN DEPARTAMENTAL. LAS ACTIVIDADES ESTARÁN ORIENTADAS AL MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE CORREDORES VIALES PRIORIZADOS.

ILUSTRACIÓN 1. MAPA DEPARTAMENTO DE BOYACÁ



FUENTE HTTPS://WWW.TRIVIANTES.COM/DEPARTAMENTO-DE-BOYACA/

3.2 ALCANCE

EL PROYECTO COMPRENDE EL SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y APLICACIÓN DE ELEMENTOS DE SEÑALIZACIÓN Y DEMARCACIÓN VIAL, INCLUYENDO DEMARCACIÓN HORIZONTAL, SEÑALES VERTICALES, TACHAS REFLECTIVAS, ESTOPEROLES Y DELINEADORES DE CURVA. ASIMISMO, CONTEMPLA LA INSTALACIÓN DE DISPOSITIVOS DE CANALIZACIÓN PARA ZONAS DE OBRA Y EL

DESMONTE Y REINSTALACIÓN DE SEÑALES EXISTENTES, CONFORME A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y NORMATIVAS DEL INVIAS.

TABLA 1. ALCANCE DEL PROYECTO

NO.	DESCRIPCIÓN	UN	CANT.
1	**REALIZAR SEÑALIZACION Y DEMARCACION**		
1.01	SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA ACRILICA CON MICROESFERAS, LINEAS CONTINUAS Y DISCONTINUAS DE 12 CMS SEGUN NORMA INVIAS	ML	115281.26
1.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MARCAS VIALES CON PINTURA DE TRÁFICO SEGÚN NORMA INVIAS. (INCLUYE MICROESFERAS)	M2	3178.66
1.03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑAL DE TRANSITO PREVENTIVA, REGLAMENTARIA O INFORMATIVA DE 60 x 60 CM.	UND	123.00
1.04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TACHAS REFLECTIVAS UNIDIRECCIONALES Y BIDIRECCIONALES	UND	12110.00
1.05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DELINEADORES DE CURVA HORIZONTAL DE TAMAÑO 0.40M X 0.50 M. SEGUN NORMA INVIAS. (INCLUYE POSTE METÁLICO).	UND	91.00
1.06	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DEFENSAS VIALES TRAMO RECTO, CAL. 12. 2 POSTES DE 1.50M. Y TERMINALES INCLUYENDO TORNILLERIA, CAPTAFAROS EN LÁMINA GALVANIZADA CAL. 22 EN CINTA REFLECTIVA GRADO INGENIERIA SEGUN NORMA INVIAS	ML	355.00

NO.	DESCRIPCIÓN	UN	CANT.
1.07	SUMINISTRO EE INSTALACIÓN DE ESTOPEROLES D = 10 CM. H = 25 CM. (INCLUYE ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y/O ANCLAJE).	UND	1080.00
1.08	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑAL DE TRANSITO DE 0.90 X 1.13 M. (INFORMATIVAS) SEGUN NORMA INVIAS.	UND	60.00
1.09	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑAL DE TRANSITO PREVENTIVA, REGLAMENTARIA O INFORMATIVA DE 75 x 75 CM.	UND	60.00
1.10	DISPOSITIVO DE CANALIZACIÓN EN OBRAS - DELINEADORES TUBULARES	UND	60.00
1.11	DISPOSITIVO DE CANALIZACIÓN EN OBRAS- BARRERAS PLÁSTICAS (MALETINES)	UND	60.00
1.12	DESMONTE Y REINSTALACIÓN DE SEÑALES VIALES (INCLUYE DADO DE ANCLAJE)	UND	60.00

3.3 INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO

TABLA 2. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

NO. DE ORDEN DE SERVICIOS:	IPVO- 017-2026
OBJETO:	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LA SEÑALIZACIÓN VIAL HORIZONTAL Y VERTICAL REQUERIDA PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA

	EJECUCIÓN DE LOS DIFERENTES CONTRATOS O CONVENIOS SUSCRITOS POR TIERRASUA S.A.S
CONTRATANTE	NOMBRE: TIERRA SUA SAS NIT: 901.285.377-2. REPRESENTANTE LEGAL: JOHN ERNESTO CARRERO VILLAMIL DIRECCIÓN: CL. 19 # 9-35, PISO 10, OFICINA 01. TUNJA, BOYACÁ EMAIL: GERENCIA@TIERRASUA.COM CEL. 3168174458 SUPERVISOR: JULIÁN EDGARDO GUERRERO RINCÓN
CONTRATISTA	NOMBRE: ICC INGENIERIA Y CONSULTORIA DE COLOMBIA SAS NIT: 901.021.317-8 REPRESENTANTE LEGAL: BELÉN ZORAIDA GARCÍA TUTA DIRECCIÓN: CRA 28 # 12A-20 OF 114 DUITAMA – BOYACÁ EMAIL: INGCONSULTORIADECOLOMBIA.SAS@GMAIL.COM CEL: 314 2618527
VALOR INICIAL:	MIL QUINIENTOS SEIS MILLONES TRESCIENTOS TRECE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS CON NOVENTA Y CUATRO CENTAVOS M/CTES ($1.506.313.999,94)
VALOR TOTAL CON ADICIONES:	MIL QUINIENTOS SEIS MILLONES TRESCIENTOS TRECE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS CON NOVENTA Y CUATRO CENTAVOS M/CTES ($1.506.313.999,94)
PLAZO INICIAL:	SIETE (07) MESES
PLAZO TOTAL:	SIETE (07) MESES
FECHA DE INICIO:	27 DE MAYO DE 2026
FECHA DE TERMINACIÓN REAL:	26 DE DICIEMBRE DE 2026
ESTADO ACTUAL	EN EJECUCIÓN

3.4 PERSONAL PROFESIONAL Y EQUIPOS DISPONIBLE PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE ACUERDO CON LA OFERTA PRESENTADA

TABLA 3. PERSONAL DISPONIBLE EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO

NOMBRE	CARGO
ING. ELKIN FABIAN RINCÓN	DIRECTOR DE OBRA
LIBIN YESENIA RODRÍGUEZ LADINO	SST
PERSONAL OPERATIVO	PERSONAL OPERATIVO

TABLA 4. RELACIÓN DE EQUIPOS Y MAQUINARIA DEL CONTRATISTA

MAQUINARIA/EQUIPO	CANTIDAD	USO EN EL PERIODO	ACTIVIDAD
CAMIÓN NHR DOBLE CABINA	2	NO	PINTURA M2
CAMIÓN NKR REWARD EURO IV ABS	2	NO	PINTURA ML
TRAZADORA DE LÍNEAS LINELAZER V 5900 STANDARD 2 PISTOLAS	2	NO	PINTURA M2
TRAZADORA DE LINEAS ROADLAZER ROADPAK	2	NO	PINTURA ML
ROTOMARTILLO	2	NO	
TALADRO PERCUTOR	2	NO	INTALACIÓN DE ESTOPEROLES
PULIDORA	2	NO	

4. SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO DEL CONTRATO

4.1 CONTROL DE GARANTIAS Y APROBACIÓN DE LAS MISMAS

TABLA 5. CONTROL DE GARANTÍAS

CUADRO RESUMEN DE GARANTÍAS				
NO.	**GARANTÍA / AMPARO**	**PÓLIZA**	**VIGENCIA**	**VALOR ASEGURADO**
1	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	51-44-101033160	27/05/2026 AL 02/08/2027	$150.631.399,99
2	PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	51-44-101033160	27/05/2026 AL 01/01/2030	$150.631.399,99
3	ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LAS OBRAS	51-44-101033160	27/12/2026 AL 27/12/2027	$301.262.799,99
4	RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL – PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	51-40-101011226	27/05/2026 AL 01/01/2027	$350.181.000

LAS PÓLIZAS Y APROBACIÓN DE LAS MISMAS SE ADJUNTAN EN EL ANEXO A.

4.2 ACTAS GENERADAS (INICIO, SOCIALIZACION, SUSPENSION, REINICIO, TERMINACION, RECIBO)

TABLA 6. ACTAS GENERADAS

CUADRO RESUMEN DE ACTAS GENERADAS		
NO.	**TIPO DE ACTA**	**FECHA**
1	ACTA DE INICIO	27-MAY-26

EL ACTA DE INICIO SE ADJUNTA EN EL ANEXO B.

4.3 ACTOS ADMINISTRATIVOS, MODIFICACIONES, PRORROGAS, ADICIONES

NO EXISTEN ACTOS ADMINISTRATIVOS DURANTE EL PERIODO DEL INFORME.

4.4. SOPORTE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL (PLANILLAS POR CADA MES) Y CERTIFICADO POR REVISOR FISCAL ANEXANDO LOS RESPECTIVOS DOCUMENTOS DEL PROFESIONAL

PARA EL PRESENTE INFORME NO SE DESARROLLARON ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL CONTRATO, POR TAL MOTIVO NO SE ADJUNTA PLANILLAS DE SEGURIDAD SOCIAL DEL PRESENTE MES, NO OBSTANTE, SE ADJUNTA EN EL ANEXO C LA CARTA DE DISPONIBILIDAD DE PROFESIONALES.


5. SEGUIMIENTO TÉCNICO DEL CONTRATO (EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES) POR MES

EN EL MES DE AGOSTO NO SE EJECUTARON ACTIVIDADES DE CAMPO RELACIONADAS AL CONTRATO, ESTO A RAZÓN DE QUE NO SE HAN SUMINISTRADO TRAMOS PARA EJECUCIÓN DE DICHAS ACTIVIDADES.

5.1 CONTROL DE CANTIDADES EJECUTADAS POR PERIODO Y ACUMULADO, DE ACUERDO CON EL PRESUPUESTO

TENIENDO EN CUENTA LAS ACTIVIDADES QUE SE DESARROLLARON EN EL PRESENTE INFORME SE PRESENTA UN ANÁLISIS FINANCIERO Y DE AVANCE DE LA DESTINACIÓN DE RECURSOS DISPUESTOS EN EL PROYECTO:

ILUSTRACIÓN 2. COMPARACIÓN DE PRESUPUESTO ENTRE, PROYECTADO, SIN EJECUTAR Y EJECUTADO ACUMULADO EN COSTO DIRECTO

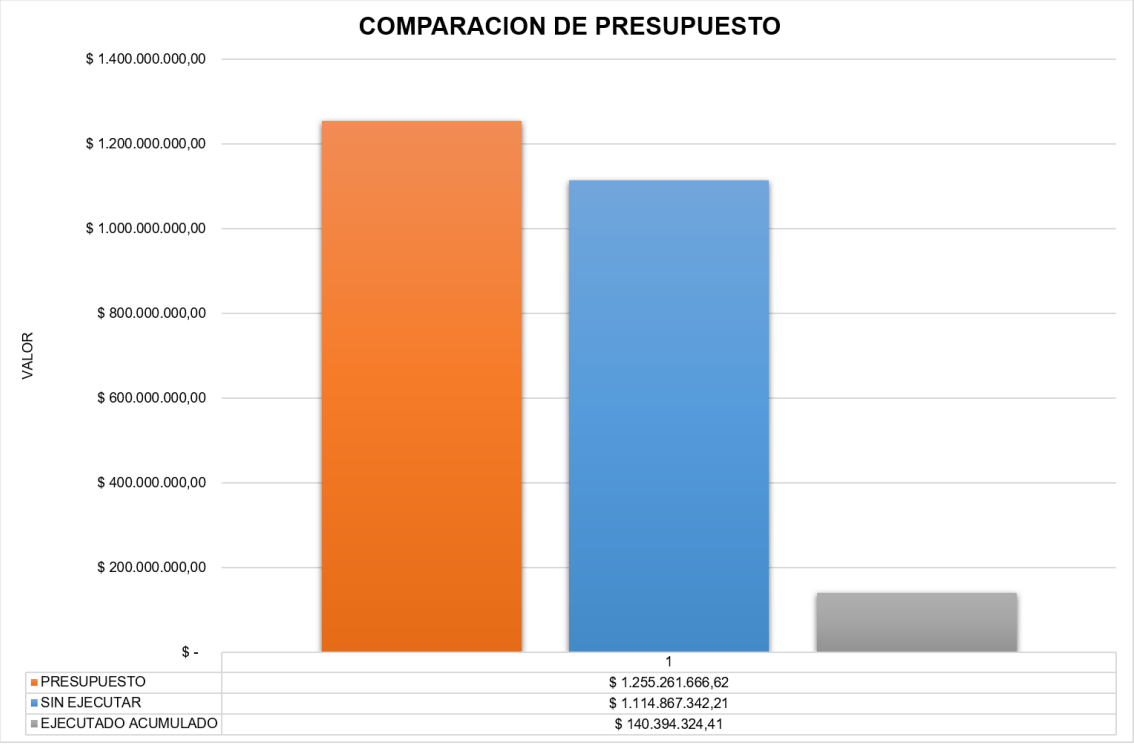

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA

TENIENDO EN CUENTA LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL PROYECTO, SE TIENE QUE HASTA LA FECHA SE TIENE UN PORCENTAJE DE AVANCE ECONÓMICO EN COSTO DIRECTO DEL 11,18% EL CUAL SE ENCUENTRA DISTRIBUIDO DE LA SIGUIENTE MANERA:

5.2 EJECUTADOS, SABANA GENERAL DE EJECUCIÓN

LA SABANA GENERAL DE EJECUCIÓN SE ADJUNTA EN EL ANEXO D.

5.3 BITACORA DE TRABAJO

EL FORMATO DE BITÁCORA SE ADJUNTA EN EL ANEXO E.

6. SEGUIMIENTO FINANCIERO

6.1 SOPORTES DE SEGUIMIENTO INVERSION DEL ANTICIPO DE ACUERDO CON PLAN PRESENTADO

EL CONTRATO NO PRESENTA ANTICIPO

6.2 PAGOS REALIZADOS EN EL PERIODO Y ACUMULADO

EN EL PRESENTE MES SE A REALIZADO UN PAGO PARCIAL DE UN VALOR CON AIU DE $ 109.513.972,06 M/CTE, EL CUAL CORRESPONDE AL 7,27% DEL VALOR TOTAL DEL CONTRATO.

ILUSTRACIÓN 3. PAGOS REALIZADOS HASTA LA FECHA



	PRESUPUESTO	SALDO POR EJECUTAR	PAGOS REALIZADOS
VALOR	$ 1.506.313.999,94	$ 1.396.800.027,88	$ 109.513.972,06

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA

7. SEGUIMIENTO AMBIENTAL, SEGURIDAD Y CONTROL DE CALIDAD

7.1 MANEJO Y DISPOSICIÓN FINAL DE LOS RESIDUOS PRODUCTO DE LAS ACTIVIDAES EJECUTADAS

EN EL PERIODO QUE COMPRENDE ESTE INFORME NO SE REALIZARON ACTIVIDADES.

7.2 REGISTRO DE CUMPLIMIENTO SEGURIDAD VIAL EN LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES

A CONTINUACIÓN, SE PRESENTAN LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (SST) DESARROLLADAS DURANTE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO, CORRESPONDIENTES AL PERÍODO DEL INFORME MENSUAL MES DE AGOSTO. ESTAS ACTIVIDADES ESTUVIERON ENCAMINADAS A LA PREVENCIÓN DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES LABORALES, EL CONTROL DE LOS RIESGOS IDENTIFICADOS Y EL FORTALECIMIENTO DE LAS CONDICIONES SEGURAS DE TRABAJO, MEDIANTE CAPACITACIONES, INSPECCIONES, SEGUIMIENTO Y ACOMPAÑAMIENTO AL PERSONAL DURANTE EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES.

DURANTE EL PERÍODO EVALUADO SE BRINDÓ ORIENTACIÓN AL PERSONAL QUE INGRESÓ A ICC INGENIERÍA Y CONSULTORÍA DE COLOMBIA, TANTO TRABAJADORES DIRECTOS COMO CONTRATISTAS.

COMO PARTE DE ESTE PROCESO SE DIERON A CONOCER LAS DISPOSICIONES GENERALES DE LA ORGANIZACIÓN EN MATERIA DE SST, LAS RESPONSABILIDADES DE LOS TRABAJADORES, NORMAS DE COMPORTAMIENTO SEGURO Y PRINCIPALES MEDIDAS PREVENTIVAS APLICABLES A LAS ACTIVIDADES DEL PROYECTO. TAMBIÉN SE REALIZÓ LA IDENTIFICACIÓN INICIAL DE LOS RIESGOS ASOCIADOS A LAS LABORES Y SE EXPLICARON LOS CONTROLES QUE DEBEN SER CONSIDERADOS ANTES Y DURANTE LA EJECUCIÓN DE CADA ACTIVIDAD.

7.2.1 FORTALECIMIENTO DE CONOCIMIENTOS MEDIANTE CAPACITACIÓN

DURANTE AGOSTO SE DESARROLLARON ACTIVIDADES DE FORMACIÓN ENFOCADAS EN MEJORAR LAS PRÁCTICAS DE SEGURIDAD ADOPTADAS POR EL PERSONAL DURANTE LA EJECUCIÓN DE SUS FUNCIONES.

LOS ESPACIOS DE CAPACITACIÓN PERMITIERON ABORDAR ASPECTOS RELACIONADOS CON LA PREVENCIÓN DE ACCIDENTES, VELOCIDAD SEGURA, HIGIENE DEL SUEÑO, HABITOS SALUDABLES, CONTROL DE PESO, ACOSO LABORAL, UTILIZACIÓN DE EPP, IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS Y SOCIALIZACIÓN DE MEDIDAS PREVENTIVAS FRENTE A EMERGENCIAS NATURALES.

LA FORMACIÓN ESTUVO ORIENTADA A QUE LOS TRABAJADORES RECONOCIERAN LOS RIESGOS PRESENTES EN SU ENTORNO Y APLICARAN DE MANERA ADECUADA LAS MEDIDAS DE CONTROL DEFINIDAS PARA CADA LABOR.

7.2.2 COMUNICACIÓN PREVENTIVA Y ACOMPAÑAMIENTO AL PERSONAL

COMO MECANISMO DE PREVENCIÓN SE REALIZARON ESPACIOS CORTOS DE COMUNICACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN CON LOS TRABAJADORES ANTES Y DURANTE EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES.

EN ESTOS ESPACIOS SE ABORDARON DIFERENTES ASPECTOS RELACIONADOS CON LA PREVENCIÓN Y EL CUIDADO EN EL ENTORNO LABORAL, TALES COMO ORDEN Y ASEO EN LOS PUESTOS DE TRABAJO, PREVENCIÓN DEL RIESGO ELÉCTRICO, MANEJO ADECUADO DE SUSTANCIAS QUÍMICAS, IMPORTANCIA DE MANTENER UNA ADECUADA HIDRATACIÓN, PREVENCIÓN DE INCENDIOS, ACTUACIÓN FRENTE A SITUACIONES DE EMERGENCIA, REPORTE OPORTUNO DE INCIDENTES Y CONDICIONES DE RIESGO, TRABAJO EN EQUIPO Y RESPONSABILIDAD INDIVIDUAL FRENTE A LA SEGURIDAD. ESTOS ESPACIOS FACILITARON EL INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN ENTRE EL PERSONAL Y EL ÁREA DE SST, PERMITIENDO REFORZAR RECOMENDACIONES DE ACUERDO CON LAS CONDICIONES OBSERVADAS DURANTE LAS LABORES.

7.2.3 ACCIONES ORIENTADAS AL CUIDADO DE LA SALUD

DURANTE EL MES SE PROMOVIERON PRÁCTICAS ENCAMINADAS AL MANTENIMIENTO DE CONDICIONES ADECUADAS DE SALUD Y BIENESTAR ENTRE LOS TRABAJADORES.

SE DESARROLLARON EJERCICIOS DE PAUSAS ACTIVAS, MOVILIDAD Y ESTIRAMIENTO COMO ESTRATEGIA PARA DISMINUIR LOS EFECTOS ASOCIADOS A POSTURAS PROLONGADAS, MOVIMIENTOS REPETITIVOS Y EXIGENCIAS FÍSICAS PROPIAS DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS.

DE IGUAL MANERA, SE SOCIALIZARON RECOMENDACIONES RELACIONADAS CON CONSUMO ADECUADO DE AGUA, ALIMENTACIÓN BALANCEADA, DESCANSO Y ADOPCIÓN DE HÁBITOS SALUDABLES. SE EFECTUÓ ADEMÁS SEGUIMIENTO A LAS RECOMENDACIONES DERIVADAS DE LAS VALORACIONES MÉDICAS OCUPACIONALES, BUSCANDO QUE LAS MEDIDAS INDICADAS FUERAN CONSIDERADAS DENTRO DE LAS ACTIVIDADES LABORALES.

7.2.4 VERIFICACIÓN DE CONDICIONES PARA EMERGENCIAS Y CONTROL DE SEÑALIZACIÓN

DURANTE AGOSTO SE REALIZARON VERIFICACIONES EN LOS DIFERENTES PUNTOS DE TRABAJO CON EL PROPÓSITO DE REVISAR QUE LA SEÑALIZACIÓN PREVENTIVA Y DE SEGURIDAD ESTUVIERA INSTALADA DE ACUERDO CON LAS CONDICIONES DEL FRENTE DE TRABAJO.

SE PRESTÓ ESPECIAL ATENCIÓN A LA SEÑALIZACIÓN REQUERIDA PARA ADVERTIR SOBRE LA PRESENCIA DE PERSONAL, EQUIPOS, VEHÍCULOS Y ACTIVIDADES EN EJECUCIÓN, CONTRIBUYENDO A MANTENER CONDICIONES DE CIRCULACIÓN Y OPERACIÓN MÁS SEGURAS.

TAMBIÉN SE REVISÓ LA EXISTENCIA Y DISPONIBILIDAD DE LOS RECURSOS DESTINADOS A LA ATENCIÓN DE SITUACIONES DE EMERGENCIA, INCLUYENDO CAMILLA, BOTIQUÍN, EXTINTORES, KIT DE CARRETERA Y ELEMENTOS PARA CONTROL DE DERRAMES, PROCURANDO QUE ESTOS PERMANECIERAN EN CONDICIONES ADECUADAS Y UBICADOS EN LUGARES DE FÁCIL ACCESO.

7.2.5 GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL

EN EL PERÍODO CORRESPONDIENTE A AGOSTO SE EFECTUÓ CONTROL SOBRE LOS ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL REQUERIDOS PARA LAS DIFERENTES ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL PROYECTO.

SE VERIFICÓ LA DISPONIBILIDAD DE LOS EPP Y SE EFECTUARON ENTREGAS O REPOSICIONES CUANDO FUE NECESARIO, DE ACUERDO CON LAS CARACTERÍSTICAS DE LAS TAREAS Y LOS RIESGOS IDENTIFICADOS.

DENTRO DE LOS ELEMENTOS UTILIZADOS POR EL PERSONAL SE CONTEMPLARON CASCO DE SEGURIDAD, PROTECCIÓN VISUAL, GUANTES, PROTECCIÓN AUDITIVA, PROTECCIÓN RESPIRATORIA, CHALECO REFLECTIVO Y CALZADO DE SEGURIDAD.

DURANTE EL ACOMPAÑAMIENTO EN CAMPO SE REFORZÓ LA NECESIDAD DE UTILIZAR LOS ELEMENTOS DE MANERA PERMANENTE Y ADECUADA, CONSERVARLOS EN BUENAS CONDICIONES Y COMUNICAR OPORTUNAMENTE CUALQUIER DETERIORO, PÉRDIDA O SITUACIÓN QUE PUDIERA AFECTAR SU CAPACIDAD DE PROTECCIÓN.

7.2.6 SEGUIMIENTO A EVENTOS DE SEGURIDAD Y SALUD

CON RESPECTO A LA ACCIDENTALIDAD REGISTRADA DURANTE AGOSTO, NO SE PRESENTARON ACCIDENTES DE TRABAJO CON LESIÓN NI EVENTOS MORTALES RELACIONADOS CON LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL PROYECTO.

DE IGUAL MANERA, DURANTE EL PERÍODO EVALUADO NO SE REPORTARON CASOS DE ENFERMEDAD LABORAL. SE MANTUVO EL SEGUIMIENTO A LAS CONDICIONES DE TRABAJO Y SE PROMOVIÓ ENTRE EL PERSONAL LA COMUNICACIÓN INMEDIATA DE INCIDENTES, ACTOS INSEGUROS, CONDICIONES PELIGROSAS O CUALQUIER SITUACIÓN QUE PUDIERA GENERAR AFECTACIONES A LA SALUD O SEGURIDAD.

7.2.7 COMPORTAMIENTO DE LOS INDICADORES SST

COMO RESULTADO DEL SEGUIMIENTO EFECTUADO DURANTE EL MES DE AGOSTO, LOS PRINCIPALES INDICADORES DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO PRESENTARON LOS SIGUIENTES RESULTADOS:

1. FRECUENCIA DE ACCIDENTALIDAD: 0.
2. SEVERIDAD DE ACCIDENTALIDAD: 0.
3. ACCIDENTES DE TRABAJO MORTALES: 0.
4. PREVALENCIA DE ENFERMEDAD LABORAL: 0.
5. INCIDENCIA DE ENFERMEDAD LABORAL: 0.

LOS RESULTADOS OBTENIDOS DURANTE EL PERÍODO REFLEJAN QUE NO SE PRESENTARON ACCIDENTES DE TRABAJO MORTALES NI CASOS DE ENFERMEDAD LABORAL. ASIMISMO, SE MANTUVO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES PREVENTIVAS Y DE SEGUIMIENTO DESTINADAS A CONSERVAR CONDICIONES ADECUADAS DE SEGURIDAD EN LOS DIFERENTES FRENTES DE TRABAJO.

EN TÉRMINOS GENERALES, DURANTE AGOSTO SE DIO CONTINUIDAD A LAS ACCIONES DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO, FORTALECIENDO LA PREVENCIÓN, EL AUTOCUIDADO, EL USO ADECUADO DE LOS ELEMENTOS DE PROTECCIÓN Y EL CONTROL DE LOS RIESGOS IDENTIFICADOS EN LAS ACTIVIDADES DEL PROYECTO.

TABLA 7. INDICADORES DE SEGURIDAD

INGENIERÍA Y CONSULTORIA DE COLOMBIA S.A.S	**HOJA DE VIDA DE INDICADOR**	**VERSION 01** **FECHA: 31/03/2026** **SG-SST-MTZ-004**


1. INFORMACIÓN DEL INDICADOR

Número de indicador:	3
Nombre del Indicador:	Ausentismo Salud (AS)
Tipo de indicador:	Resultado
Definición del indicador:	Conocer la proporción de días pérdidos por causa médica relacionados con los días programados para laborar.
Variables:	DAM = Dias de ausencia por causa médica DPM = Días de trabajo programados en el mes NT = Número de trabajadores del mes
Método de Cálculo:	AS = (DAM / (DPM X NT)) X 100
Periodicidad:	Mensual
Meta:	N/A
Límite inferior meta:	N/A

2. DATOS

Variables	2026											
	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
DAN Dias de ausencia por causa médica	0	0	0	0	3	0	1	0				
DPM Dias de trabajo programados en el mes	12	20	20	19	20	23	23	20				
NT Número Trabajadores en el mes	5	5	5	5	5	5	5	5				
Seguimiento mensual	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,87	0,00				
Resultado indicador		0,00			1,00							
Indice Anual	3%											

3. GRÁFICA

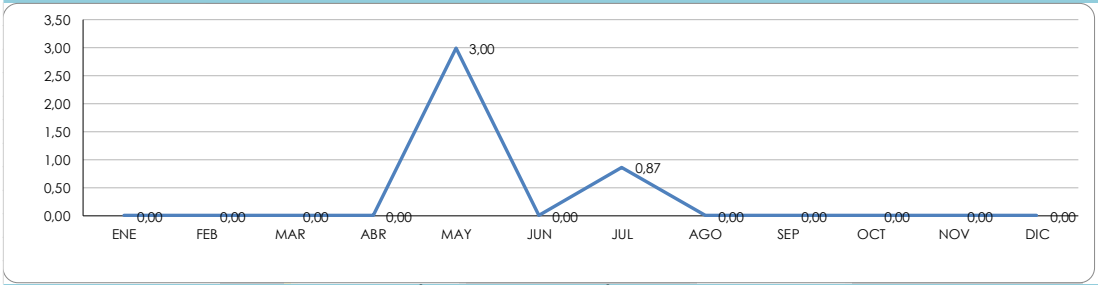

4. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DEL INDICADOR

ENERO	Durante el período evaluado, la empresa presentó un índice de ausentismo laboral bajo, lo cual evidencia que la continuidad operativa se mantuvo sin afectaciones significativas y que las condiciones de trabajo favorecen la asistencia regular de los trabajadores.
FEBRERO	
MARZO	
ABRIL	Las pocas ausencias registradas correspondieron principalmente a incapacidades de origen común, de corta duración, las cuales fueron debidamente justificadas y gestionadas sin generar impactos relevantes en la productividad ni en la planificación de las actividades.
MAYO	
JUNIO	
JULIO	Durante el período evaluado se presentó una ausencia laboral, correspondiente a un trabajador, la cual fue registrada y objeto de seguimiento por parte de la empresa. Esta situación representó un nivel de ausentismo puntual durante el período, sin generar afectaciones significativas en la continuidad de las actividades programadas.
AGOSTO	Durante el período evaluado, no se registraron ausencias laborales asociadas a enfermedades o condiciones de salud, por lo cual el indicador de ausentismo por causa de salud se mantuvo en 0%. Esto evidencia que no se presentaron eventos de incapacidad o ausencias por motivos de salud que afectaran la jornada laboral durante el período.
SEPTIEMBRE	
OCTUBRE	
NOVIEMBRE	
DICIEMBRE	

	HOJA DE VIDA DE INDICADOR	VERSION 01 FECHA: 31/03/2026 SG-SST-MTZ-004


1. INFORMACIÓN DEL INDICADOR

Número de indicador:	4
Nombre del Indicador:	Frecuencia de accidentalidad (IF)
Tipo de indicador:	Resultado
Definición del indicador:	Conocer el número de eventos de accidentes laborales presentados durante el periodo.
Variables:	AT = Número de accidentes de trabajo NT = Número de trabajadores del mes
Método de Cálculo:	IF = (AT / NT) X 100
Periodicidad:	Mensual
Meta:	< = 5
Límite inferior meta:	Entre 5 y 7

2. DATOS

Variables	2026											
	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
AT Número de Accidentes	0	0	0	0	0	0	0	0				
NT Número Trabajadores en el mes	5	5	5	5	5	5	5	5				
Seguimiento mensual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#iDIV/0!	#iDIV/0!	#iDIV/0!	#iDIV/0!
Resultado indicador	0,00			0,00			#iDIV/0!			#iDIV/0!		
Indice Anual	0%											

3. GRÁFICA



4. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DEL INDICADOR

ENERO	Durante el período evaluado no se registraron accidentes de trabajo, lo que evidencia la efectividad de las medidas de prevención implementadas y el compromiso de los trabajadores con la seguridad y el autocuidado.
FEBRERO	
MARZO	
ABRIL	Durante el período evaluado, la accidentalidad se mantuvo en CERO
MAYO	
JUNIO	
JULIO	Durante el período evaluado no se presentaron accidentes de trabajo ni eventos que generaran lesiones a los trabajadores. Se mantuvieron las actividades de prevención, inspección y seguimiento a las condiciones de seguridad, contribuyendo al desarrollo de las labores bajo condiciones seguras.
AGOSTO	Durante el período evaluado, no se presentaron accidentes de trabajo entre los trabajadores de la empresa. Por lo tanto, el indicador de accidentalidad se mantuvo en 0%, evidenciando la ausencia de eventos laborales que generaran lesiones durante el período reportado.
SEPTIEMBRE	
OCTUBRE	
NOVIEMBRE	
DICIEMBRE	

INGENIERÍA Y CONSULTORIA DE COLOMBIA S.A.S	**HOJA DE VIDA DE INDICADOR**	**VERSION 01** **FECHA: 31/03/2026** **SG-SST-MTZ-004**


1. INFORMACIÓN DEL INDICADOR

Número de indicador:	5
Nombre del Indicador:	Severidad de accidentalidad (IS)
Tipo de indicador:	Resultado
Definición del indicador:	Conocer el número de días de ausencia por incapacidad laboral o cargados por la ARL debido a los accidentes de trabajo.
Variables:	DIAT = Días Incapacitantes por Accidentes de Trabajo en el mes DCAT = Días Cargados por Accidentes de Trabajo NT = Número de trabajadores del mes
Método de Cálculo:	IS = ((DIAT + DCAT) / NT) X 100
Periodicidad:	Mensual
Meta:	N/A
Límite inferior meta:	N/A

2. DATOS

Variables	2026											
	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
DIAT Dias incapacitantes AT Mes	0	0	0	4	0	0	0	0				
DCAT Dias cargados AT Mes	0	0	0	0	0	0	0	0				
NT Número Trabajadores en el mes	5	5	5	5	5	5	5	5				
Seguimiento mensual	0,00%	0,00%	0,00%	80,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	#iDIV/0!	#iDIV/0!	#iDIV/0!	#iDIV/0!
Resultado indicador	0,00%			26,67%			#iDIV/0!			#iDIV/0!		
Indice Anual	10%											

3. GRÁFICA

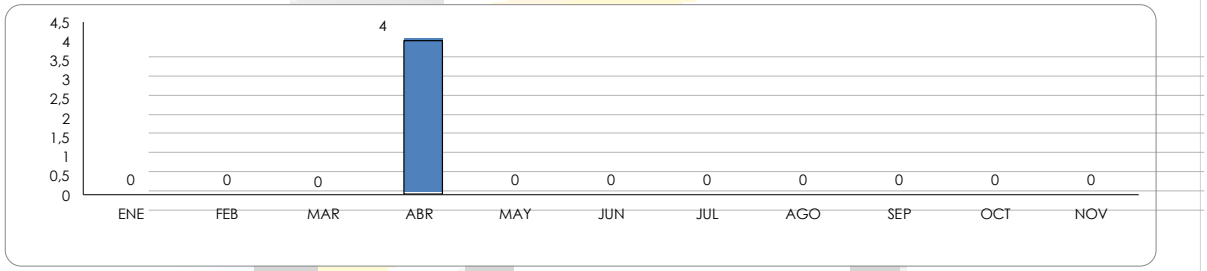

4. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DEL INDICADOR

ENERO	Durante el periodo evaluado no se presentaron accidentes de trabajo, por lo tanto, el índice de severidad se mantiene en cero, evidenciando un control efectivo de los riesgos laborales.
FEBRERO	
MARZO	
ABRIL	De acuerdo con la evaluación realizada, la severidad del accidente se clasificó como baja, al no generar incapacidades médicas prolongadas ni daños graves a la salud del trabajador.
MAYO	
JUNIO	
JULIO	Durante el período evaluado no se presentaron accidentes de trabajo que generaran días de incapacidad o pérdida de tiempo laboral, por lo cual el indicador de severidad presentó un resultado de 0. Esto refleja la ausencia de eventos laborales con consecuencias que afectaran la jornada de trabajo.
AGOSTO	Durante el período evaluado, no se presentaron accidentes de trabajo ni días perdidos por lesiones laborales, por lo cual el indicador de severidad se mantuvo en 0%.
SEPTIEMBRE	
OCTUBRE	
NOVIEMBRE	
DICIEMBRE	

INGENIERÍA Y CONSULTORIA DE COLOMBIA S.A.S	**HOJA DE VIDA DE INDICADOR**	**VERSION 01** **FECHA: 31/03/2026** **SG-SST-MTZ-004**


1. INFORMACIÓN DEL INDICADOR

Número de indicador:	6
Nombre del Indicador:	Proporción de accidentes de trabajo mortales (PATM)
Tipo de indicador:	Resultado
Definición del indicador:	Conocer el número de eventos de accidentes laborales que originaron la muerte del funcionario ocurrido durante el periodo.
Variables:	ATM = Número de accidentes de trabajo Mortal AT = Número de accidentes de trabajo del año
Método de Cálculo:	PATM= (ATM / AT) X 100
Periodicidad:	Anual
Meta:	0%
Límite inferior meta:	0%

2. DATOS

Variables	2026											
	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
ATM Num Accidentes mortales	0	0	0	0	0	0	0	0				
AT Num Accidentes al año	0	0	0	0	0	0	0	0				
Resultado indicador	0,00%			0,00%			0,00%			0,00%		
Indice Anual	%											

3. GRÁFICA



4. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DEL INDICADOR

ENERO	No se presentaron accidentes mortales en la empresa, lo que evidencia la efectividad de las medidas de prevención implementadas y el control de los riesgos críticos.
FEBRERO	
MARZO	
ABRIL	Durante el período evaluado no se registraron accidentes de trabajo con resultado mortal, manteniéndose el indicador de mortalidad en cero (0).
MAYO	
JUNIO	
JULIO	Durante el período evaluado no se presentaron accidentes de trabajo con consecuencias mortales, por lo cual el indicador de mortalidad se mantuvo en 0 casos, evidenciando que no se registraron eventos fatales asociados a las actividades laborales.
AGOSTO	Durante el período evaluado, no se presentaron accidentes de trabajo mortales, por lo cual el indicador de mortalidad se mantuvo en 0%.
SEPTIEMBRE	
OCTUBRE	
NOVIEMBRE	
DICIEMBRE	

INGENIERÍA Y CONSULTORIA DE COLOMBIA S.A.S	**HOJA DE VIDA DE INDICADOR**	**VERSION 01** **FECHA: 31/03/2026** **SG-SST-MTZ-004**


1. INFORMACIÓN DEL INDICADOR

Número de indicador:	7
Nombre del Indicador:	Prevalencia de la enfermedad laboral (PEL)
Tipo de indicador:	Resultado
Definición del indicador:	Número de enfermedades laborales calificadas y en reconocimiento durante el periodo
Variables:	ER = Número de funcionarios con enfermedad laboral reconocida. EC = Número de funcionarios con enfermedad laboral en reconocimiento. PT = Promedio de trabajadores del periodo K = 100.000 La constante 100.000 para los indicadores de enfermedad laboral es la utilizada por la Organización Mundial de Salud (OMS) para la estadística internacional, permitiendo comparación estandarizada.
Método de Cálculo:	PEL = (ER + EP)/ PT X 100.000
Periodicidad:	Anual
Meta:	0
Límite inferior meta:	1

2. DATOS

Variables	2026											
	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
ER Funcionarios con EL	0	0	0	0	0	0	0	0				
EC Funcionarios con EL en reconocimiento	0	0	0	0	0	0	0	0				
NT Número Trabajadores en el mes	5	5	5	5	5	5	5	5				
Seguimiento Mensual PEL	0	0	0	0	0	0	0	0	#iDIV/0!	#iDIV/0!	#iDIV/0!	#iDIV/0!
Resultado indicador	0,00%			0,00%			#iDIV/0!			#iDIV/0!		
Indice Anual	0%											

3. GRÁFICA



4. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DEL INDICADOR

ENERO	La empresa no registró enfermedades laborales en el periodo analizado, reflejando la efectividad de las acciones preventivas y de vigilancia en salud ocupacional.
FEBRERO	
MARZO	
ABRIL	Durante el periodo evaluado no se reportaron diagnósticos de enfermedad laboral, manteniéndose un resultado favorable en el indicador de prevalencia.
MAYO	
JUNIO	
JULIO	Durante el período evaluado no se presentaron casos de enfermedad laboral, por lo cual el indicador de prevalencia se mantuvo en 0 %. No se registraron trabajadores con enfermedad laboral diagnosticada durante el período objeto de seguimiento.
AGOSTO	Durante el período evaluado, no se presentaron nuevos casos de enfermedad laboral entre los trabajadores, por lo cual el indicador de incidencia de enfermedad laboral se mantuvo en 0%.
SEPTIEMBRE	
OCTUBRE	
NOVIEMBRE	
DICIEMBRE	

INGENIERÍA Y CONSULTORIA DE COLOMBIA S.A.S	**HOJA DE VIDA DE INDICADOR**	**VERSION 01** **FECHA: 31/03/2026** **SG-SST-MTZ-004**

1. INFORMACIÓN DEL INDICADOR

Número de indicador:	8
Nombre del Indicador:	Incidencia de la enfermedad laboral (IEL)
Tipo de indicador:	Resultado
Definición del indicador:	Número de enfermedades laborales en reconocimiento durante el periodo
Variables:	EC = Número de funcionarios con enfermedad laboral en reconocimiento. PT = Promedio de trabajadores del periodo K = 100.000
Método de Cálculo:	IEL = (EC / PT) X 100.000
Periodicidad:	Anual
Meta:	0
Límite inferior meta:	0%

2. DATOS

Variables	2026											
	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
EC Funcionarios con EL en reconocimiento	0	0	0	0	0	0	0	0				
NT Número Trabajadores en el mes	5	5	5	5	5	5	5	5				
Seguimiento Mensual PEL	0	0	0	0	0	0	0	0	#iDIV/0!	#iDIV/0!	#iDIV/0!	#iDIV/0!
Resultado indicador	0,00%			0,00%			#iDIV/0!			#iDIV/0!		
Indice Anual	0%											

3. GRÁFICA



4. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DEL INDICADOR

ENERO	Durante el período evaluado no se presentaron casos nuevos de enfermedad laboral, por lo cual el indicador de incidencia se mantuvo en cero.
FEBRERO	
MARZO	
ABRIL	La evaluación refleja un desempeño óptimo, logrando la totalidad de los criterios establecidos.
MAYO	
JUNIO	
JULIO	Durante el período evaluado no se presentaron nuevos casos de enfermedad laboral, por lo cual el indicador de incidencia se mantuvo en 0 %. No se registraron diagnósticos nuevos relacionados con enfermedades laborales durante el período objeto de seguimiento
AGOSTO	Durante el período evaluado, no se reportaron nuevos casos de enfermedad laboral, por lo que la incidencia de enfermedad laboral se mantuvo en 0%.
SEPTIEMBRE	
OCTUBRE	
NOVIEMBRE	
DICIEMBRE	

8. GENERALES

8.1 CORRESPONDENCIA ENVIADA

A CONTINUACIÓN, SE RELACIONA LA CORRESPONDENCIA ENVIADA EN EL PERIODO QUE CORRESPONDE EL PRESENTE INFORME

TABLA 8. CORRESPONDENCIA ENVIADA

ASUNTO	FECHA
INFORME 1 - ICC S.A.S.-CONTRATO IPVO 017 DE 2026	18/08/2026
Oficio 01 contrato IPVO-017-2026	21/08/2026
FORMATOS ICC SAS	28/08/2026
INFORME MENSUAL JULIO - ICC S.A.S.-CONTRATO IPVO 017 DE 2026	29/08/2026

8.2 CORRESPONDENCIA RECIBIDA

A CONTINUACIÓN, SE RELACIONA LA CORRESPONDENCIA RECIBIDA EN EL PERIODO QUE CORRESPONDE EL PRESENTE INFORME

TABLA 9. CORRESPONDENCIA RECIBIDA

ASUNTO	FECHA
RESPUESTA INFORME 1 - ICC S.A.S.-CONTRATO IPVO 017 DE 2026	19/08/2026
RESPUESTA INFORME MENSUAL JULIO - ICC S.A.S.-CONTRATO IPVO 017 DE 2026	31/08/2026

9. CONCLUSIONES

- EN EL MES QUE COMPRENDE EL PRESENTE INFORME NO SE REALIZARON ACTIVIDADES DE CAMPO RELACIONADAS AL CONTRATO.
- LAS ACTIVIDADES DE DEMARCACIÓN QUE SE HAN VENIDO REALIZANDO EN EL MARCO DEL CONTRATO NO- IPVO-017-2026 SUSCRITO ENTRE LAS EMPRESAS DE TIERRASUA SAS E ICC INGENIERIA Y CONSULTORIA DE COLOMBIA SAS, SE HA VENIDO CUMPLIENDO CON ALTOS ESTÁNDARES DE CALIDAD, SIGUIENDO LOS DISEÑOS SUMINISTRADOS POR TIERRASUA SAS Y CUMPLIENDO A CABALIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LA RESOLUCIÓN 20243040045005 DE 2024, EMITIDA POR EL MINISTERIO DE TRANSPORTE, POR LA CUAL SE ADOPTA EL MANUAL DE SEÑALIZACIÓN VIAL DE COLOMBIA. DISPOSITIVOS UNIFORMES EN LA INFRAESTRUCTURA VIAL, PARA LA REGULACIÓN DEL TRÁNSITO Y LA SEGURIDAD VIAL.

10. ANEXOS

ANEXO A. GARANTÍAS DEL CONTRATO

ANEXO B. ACTA DE INICIO

ANEXO C. DISPONIBILIDAD DEL PERSONAL

ANEXO D. SABANA DE CANTIDADES

ANEXO E. BITÁCORA DE OBRA

ACTA DE APROBACIÓN PÓLIZA

CONTRATO No. IPVO	**No. 017-2026**	
OBJETO	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LA SEÑALIZACIÓN VIAL HORIZONTAL Y VERTICAL REQUERIDA PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUCIÓN DE LOS DIFERENTES CONTRATO O CONVENIOS POR TIERRASUA S.A.S.	
CONTRATISTA / TOMADOR	ICC INGENIERÍA Y CONSULTORÍA DE COLOMBIA S.A.S.	
NIT	901.021.317-8	
REPRESENTANTE LEGAL	BELÉN ZORAIDA GARCÍA TUTA CC. No. 46.682.288	
COMPAÑÍA ASEGURADORA	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	
PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO NÚMERO	51-44-101033160	**ANEXO:** 0
FECHA DE EXPEDICIÓN DE LA PÓLIZA	28/04/2026	
AMPARO	**VIGENCIA**	**VALOR ASEGURADO**
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	27/04/2026 A 02/06/2026	$ 150.631.399,99
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES.	27/04/2026 A 01/12/2029	$ 150.631.399,99
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LAS OBRAS	EL AMPARO DE ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA TENDRÁ UNA VIGENCIA DE UN	$ 301.262.799,99

	(01) AÑO A PARTIR DE LA FECHA DE RECIBO FINAL A SATISFACCIÓN DESDE EL 27/11/2026 A 27/11/2027	
COMPAÑÍA ASEGURADORA	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	
PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	51-40-101011226	**ANEXO:** 0
FECHA DE EXPEDICIÓN DE LA PÓLIZA	28/04/2026	
AMPARO	**VIGENCIA**	**VALOR ASEGURADO**
PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	27/04/2026 A 02/12/2026	$ 350.181.000

Por lo anterior se aprueba la póliza allegada por el contratista, contra fecha de suscripción del contrato 27 de abril de 2026; teniendo en cuenta que reúne las condiciones establecidas en este.

La presente se firma en Tunja a los cuatro (04) días del mes de mayo de 2026.

JOHN ERNESTO CARRERO VILLAMIL
Representante Legal

Nombres y Apellidos		Cargo	Firma
Revisó	Laura Catherine Rivera Echenique	Directora Jurídica y de Contratación	
Elaboró	Adriana Menjura Rodríguez	Profesional Contratista	
Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las disposiciones legales y/o técnicas vigentes y, por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para la firma del remitente.			

Datos de la póliza

Estado:
Vigente

Número de póliza:
51-40-101011226
Número de anexo:
0

Fecha de expedición:
martes, 28 de abril de 2026
Ramo:
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPL

Asegurado:
TIERRASUA S.A.S.
Tomador:
ICC INGENIERIA Y CONSULTORIA DE COLOMBIA SAS

Inicio de vigencia:
lunes, 27 de abril de 2026
Fin vigencia:
miércoles, 2 de diciembre de 2026

Valor total asegurado:
$ 350.181.000,00

Consultar de nuevo

Datos de la póliza

Estado:
Vigente

Número de póliza:
51-44-101033160
Número de anexo:
0

Fecha de expedición:
martes, 28 de abril de 2026
Ramo:
CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

Asegurado:
TIERRASUA S.A.S.
Tomador:
ICC INGENIERIA Y CONSULTORIA DE COLOMBIA SAS

Inicio de vigencia:
lunes, 27 de abril de 2026
Fin vigencia:
domingo, 2 de diciembre de 2029

Valor total asegurado:
$ 602.525.599,97

Consultar de nuevo

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

RCE CONTRATOS

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
SOGAMOSO	AGENCIA SOGAMOSO	51	51-40-101011226	0

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
28	04	2026	27	04	2026	00:00	02	12	2026	23:59	EMISION ORIGINAL

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL	IDENTIFICACIÓN
ICC INGENIERIA Y CONSULTORIA DE COLOMBIA SAS	NIT: 901.021.317-8

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
CL 14 NRO. 42 - 70	DUITAMA, BOYACA	3003027865

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO	IDENTIFICACIÓN
TIERRASUA S.A.S.	NIT: 901.285.377-2

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
CL 19 NRO. 9 - 35 PISO 10	TUNJA, BOYACA	3108808902

BENEFICIARIO: 901285377 - TIERRASUA S.A.S.

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN 15-05-2020 - 1329-P-06-00000-E-RCE-002A-D00I / 31-03-22 -1329-P-06-00000-E-RCE-001P-D00I, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUCIOS CAUSADOS A TERCEROS DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO No. IPVO-017-2026, CUYO OBJETO ES: SUMINISTRO E INSTALACION DE LA SEÑALIZACION VIAL HORIZONTAL Y VERTICAL REQUERIDA PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUCION DE LOS DIFERENTES CONTRATOS O CONVENIOS SUSCRITOS POR TIERRASUA S.A.S.

ASEGURADO/ BENEFICIARIO: ICC INGENIERIA Y CONSULTORIA DE COLOMBIA S.A.S. NIT 901.021.317-8, TIERRASUA S.A.S NIT No. 901.285.377-2 Y/O TERCEROS AFECTADOS

AMPAROS

RIESGO: CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES

AMPAROS	DEDUCIBLE	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG ACTUAL
PREDIOS LABORES Y OPERACIONES	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV	27/04/2026	02/12/2026	$350,181,000.00
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV	27/04/2026	02/12/2026	$350,181,000.00
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV	27/04/2026	02/12/2026	$350,181,000.00

ACLARACIONES

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ *****420,217.00	$ *******3,000.00	$ ******80,411.00	$ **********503,628.00	$ ******350,181,000.00	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
SANDRA CONSUELO PATIÑO ALBA	153578	100.00			

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO.

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 10 NO. 14-130 L104 - TELEFONO: 7731957 - SOGAMOSO

51-40-101011226

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

Belen Garcia T

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

RCE CONTRATOS

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
SOGAMOSO	AGENCIA SOGAMOSO	51	51-40-101011226	0

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
28	04	2026	27	04	2026	00:00	02	12	2026	23:59	EMISION ORIGINAL

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIÓN	
	ICC INGENIERIA Y CONSULTORIA DE COLOMBIA SAS		NIT: 901.021.317-8
DIRECCIÓN: CL 14 NRO. 42 - 70	**CIUDAD:** DUITAMA, BOYACA	**TELÉFONO:**	3003027865

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO:		IDENTIFICACIÓN	
	TIERRASUA S.A.S.		NIT: 901.285.377-2
DIRECCIÓN: CL 19 NRO. 9 - 35 PISO 10	**CIUDAD:** TUNJA, BOYACA	**TELÉFONO**	3108808902

BENEFICIARIO: 901285377 - TIERRASUA S.A.S.

AMPAROS	DEDUCIBLE	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG ACTUAL
RESPONSABILIDAD CIVIL PATRONAL	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV	27/04/2026	02/12/2026	$350,181,000.00
RESPONSABILIDAD CIVIL CRUZADA	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV	27/04/2026	02/12/2026	$350,181,000.00
BIENES BAJO CUIDADO TENENCIA Y CONTROL	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV	27/04/2026	02/12/2026	$350,181,000.00
DAÑO EMERGENTE Y LUCRO CESANTE	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV	27/04/2026	02/12/2026	$350,181,000.00
PERJUICIOS EXTRAPATRIMONIALES	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV	27/04/2026	02/12/2026	$350,181,000.00

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO. QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 10 NO. 14-130 L104 - TELEFONO: 7731957 - SOGAMOSO

51-40-101011226

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

Belen Garcia T.

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
SOGAMOSO	AGENCIA SOGAMOSO	51	51-44-101033160	0

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
28	04	2026	27	04	2026	00:00	02	12	2029	23:59	EMISION ORIGINAL

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL	IDENTIFICACIÓN
ICC INGENIERIA Y CONSULTORIA DE COLOMBIA SAS	NIT: 901.021.317-8

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
CL 14 NRO. 42 - 70	DUITAMA, BOYACA	3003027865

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:	IDENTIFICACIÓN
TIERRASUA S.A.S.	NIT: 901.285.377-2

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
CL 19 NRO. 9 - 35 PISO 10	TUNJA, BOYACA	3108808902

ADICIONAL:

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN ECU010B, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No. IPVO-017-2026, CUYO OBJETO ES: SUMINISTRO E INSTALACION DE LA SEÑALIZACION VIAL HORIZONTAL Y VERTICAL REQUERIDA PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUCION DE LOS DIFERENTES CONTRATOS O CONVENIOS SUSCRITOS POR TIERRASUA S.A.S.

EL AMPARO DE ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA TENDRA UNA VIGENCIA DE UN (01) AÑO A PARTIR DE LA FECHA DE RECIBIDO FINAL A SATISFACCIN

AMPAROS

RIESGO: CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG/ACTUAL
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	27/04/2026	02/06/2026	$150,631,399.99
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	27/04/2026	02/12/2029	$150,631,399.99
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	27/11/2026	27/11/2027	$301,262,799.99

ACLARACIONES

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ ***1,545,849.00	$ ******20,000.00	$ *****297,511.00	$ *********1,863,361.00	$ ******602,525,599.97	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
SANDRA CONSUELO PATIÑO ALBA	153578	100.00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 10 NO. 14-130 L104 - TELEFONO: 7731957 - SOGAMOSO


51-44-101033160

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

Belen Garcia T

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

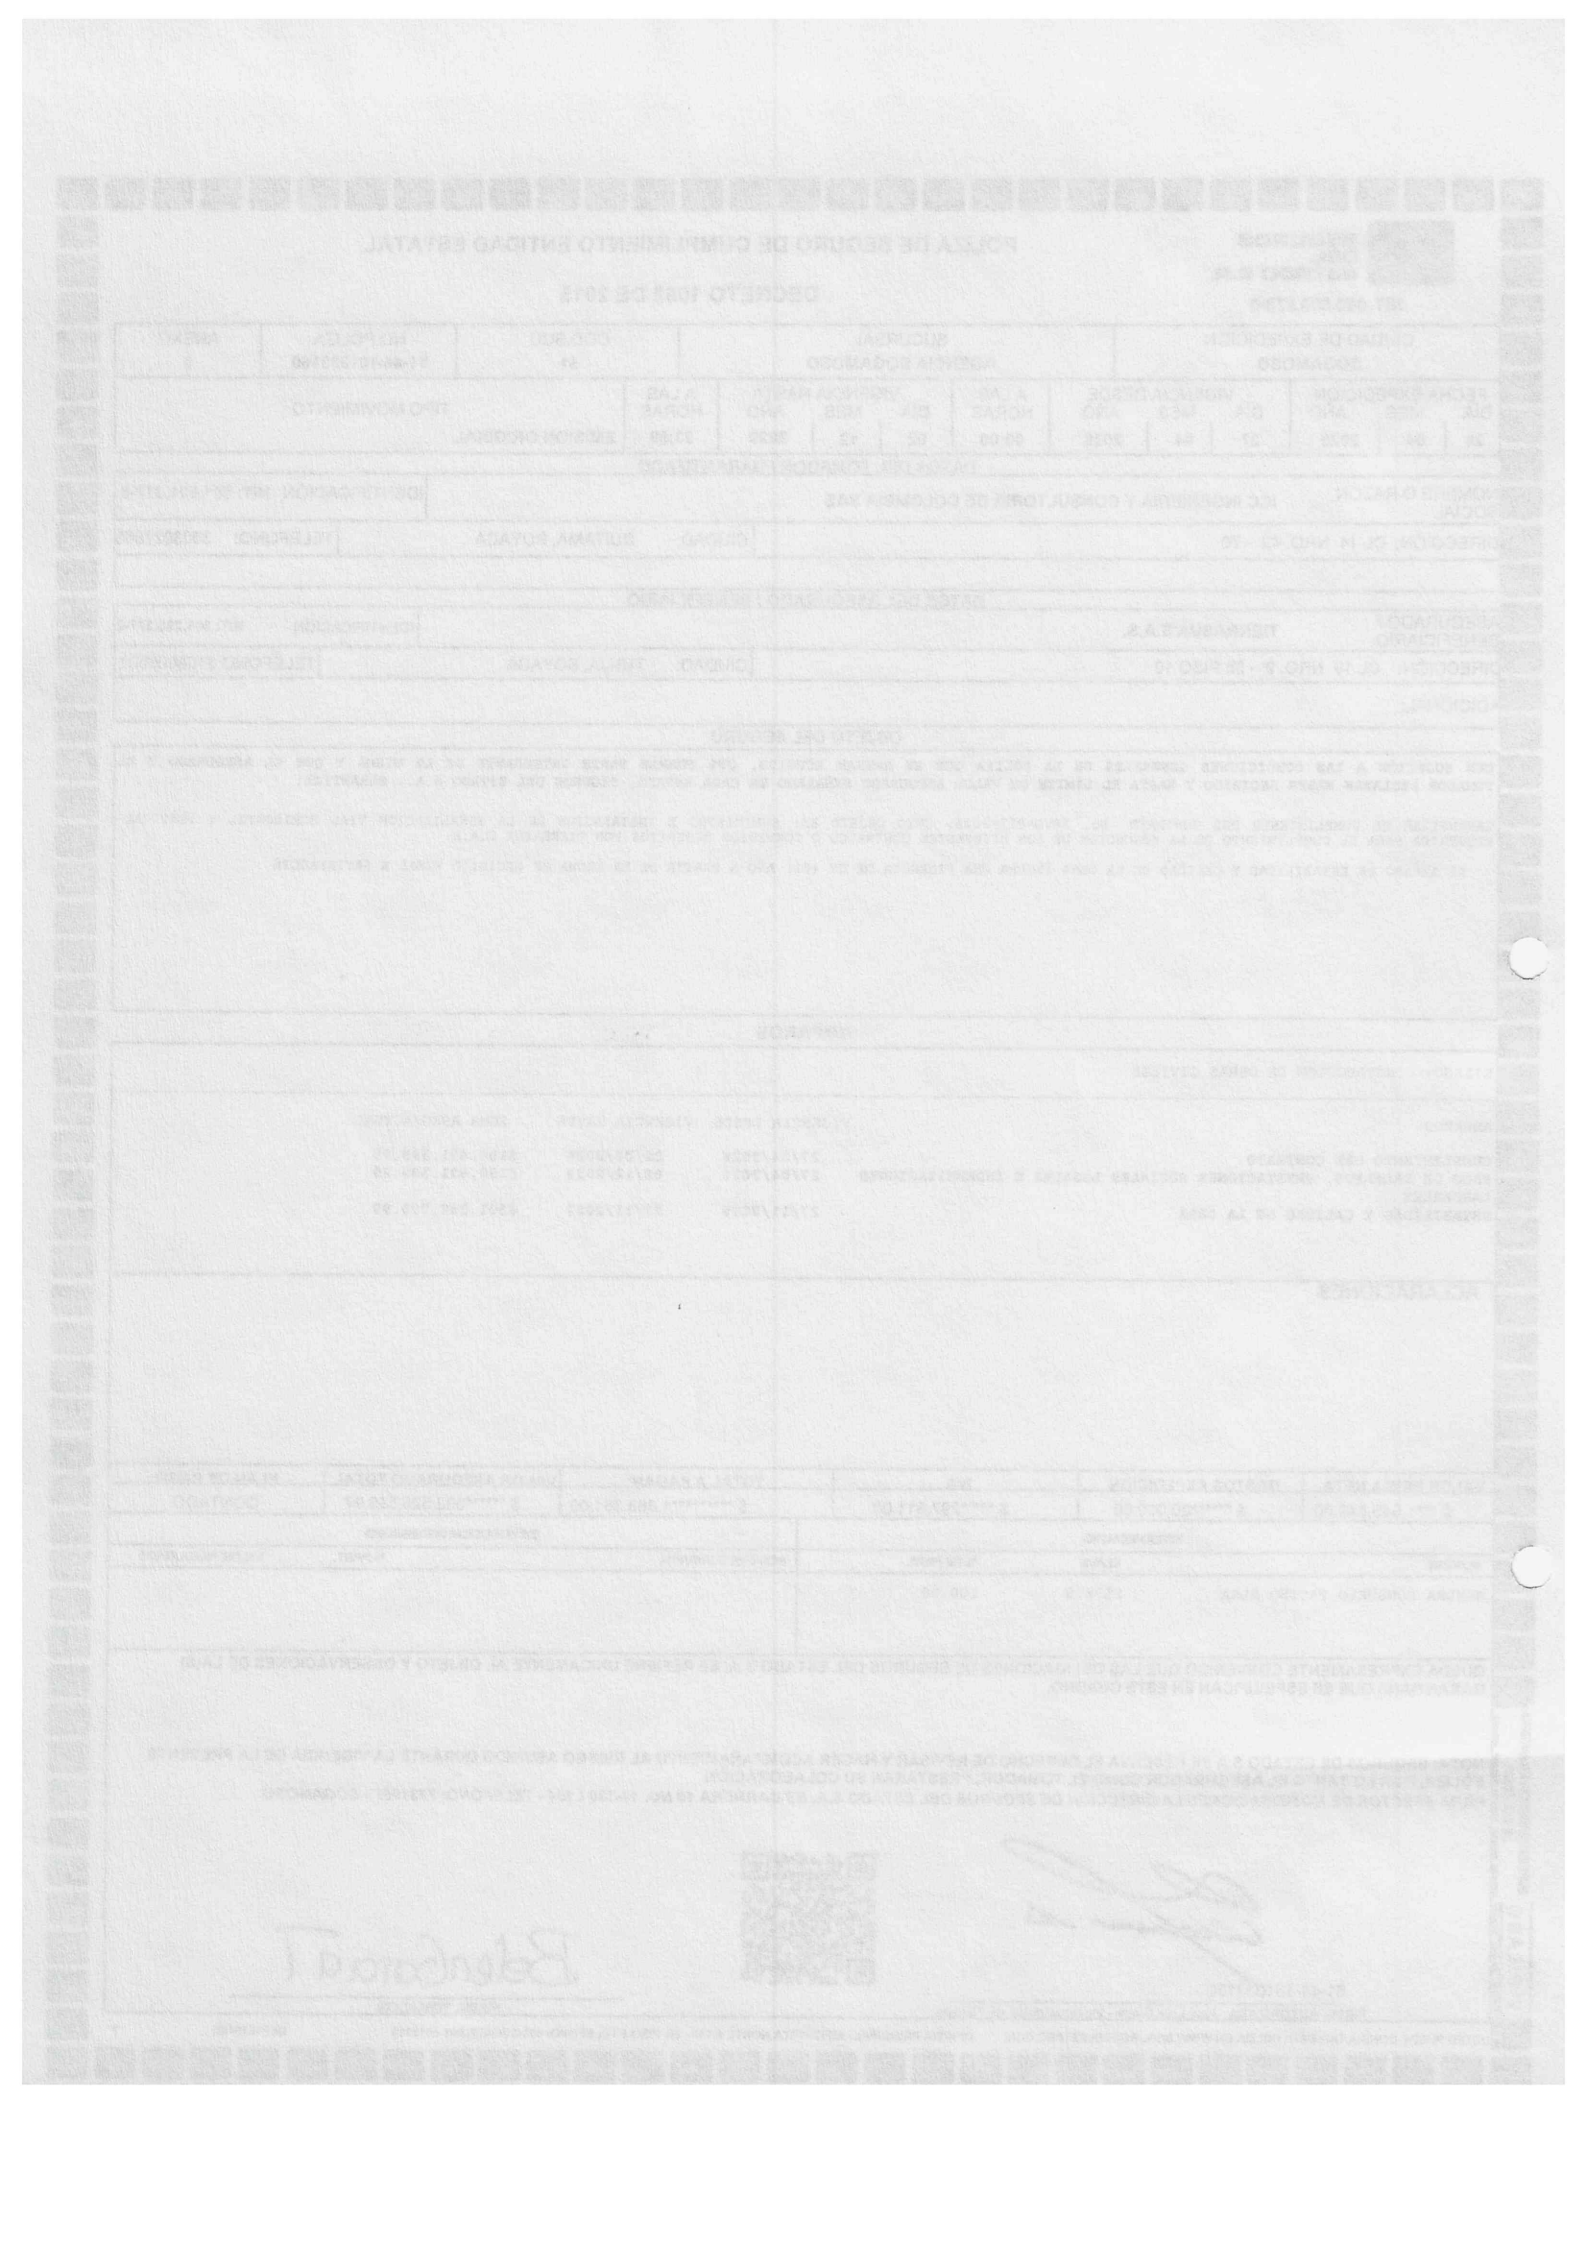

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

CONSTANCIA DE NO REVOCATORIA NI CANCELACION POR FALTA DE PAGO DE LA PRIMA

Hacemos constar, que la póliza Nº 101033160, anexo 0, no expirara por falta de pago de la prima, ni por revocatoria unilateral del tomador de la póliza o de la aseguradora.

Lo anterior de conformidad con lo establecido en el decreto 1082 de 2015 el cual regula las garantías ante entidades estatales

Dado en SOGAMOSO a los 28 días del mes de ABRIL de 2026

51-44-101033160

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

ACTA DE APROBACIÓN PÓLIZA

CONTRATO No. IPVO	**No. 017-2026**	
OBJETO	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LA SEÑALIZACIÓN VIAL HORIZONTAL Y VERTICAL REQUERIDA PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUCIÓN DE LOS DIFERENTES CONTRATO O CONVENIOS POR TIERRASUA S.A.S.	
CONTRATISTA / TOMADOR	ICC INGENIERÍA Y CONSULTORÍA DE COLOMBIA S.A.S.	
NIT	901.021.317-8	
REPRESENTANTE LEGAL	BELÉN ZORAIDA GARCÍA TUTA CC. No. 46.682.288	
COMPAÑÍA ASEGURADORA	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	
PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO NÚMERO	51-44-101033160	**ANEXO:** 3
FECHA DE EXPEDICIÓN DE LA PÓLIZA	12/06/2026	
AMPARO	**VIGENCIA**	**VALOR ASEGURADO**
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	27/05/2026 A 02/08/2027	$ 150.631.399,99
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES.	27/05/2026 A 01/01/2030	$ 150.631.399,99
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LAS OBRAS	EL AMPARO DE ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA TENDRÁ UNA VIGENCIA DE UN	$ 301.262.799,99

	(01) AÑO A PARTIR DE LA FECHA DE RECIBO FINAL A SATISFACCIÓN DESDE EL 27/12/2026 A 27/12/2027	
COMPAÑÍA ASEGURADORA	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	
PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	51-40-101011226	**ANEXO:** 2
FECHA DE EXPEDICIÓN DE LA PÓLIZA	11/06/2026	
AMPARO	**VIGENCIA**	**VALOR ASEGURADO**
PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	27/05/2026 A 01/01/2027	$ 350.181.000

Por lo anterior se aprueba la póliza allegada por el contratista, contra acta de inicio del 27 de mayo de 2026; teniendo en cuenta que reúne las condiciones establecidas en este.

La presente se firma en Tunja a los dieciséis (16) días del mes de junio de 2026.

JOHN ERNESTO CARRERO VILLAMIL
Representante Legal

Nombres y Apellidos		Cargo	Firma
Revisó	Laura Catherine Rivera Echenique	Directora Jurídica y de Contratación	
Elaboró	Adriana Menjura Rodríguez	Profesional Contratista	
Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las disposiciones legales y/o técnicas vigentes y, por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para la firma del remitente.			

Datos de la póliza

Estado:
Vigente

Número de póliza:
51-44-101033160
Número de anexo:
3

Fecha de expedición:
viernes, 12 de junio de 2026
Ramo:
CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

Asegurado:
TIERRASUA S.A.S.
Tomador:
ICC INGENIERIA Y CONSULTORIA DE COLOMBIA SAS

Inicio de vigencia:
miércoles, 27 de mayo de 2026
Fin vigencia:
martes, 1 de enero de 2030

Valor total asegurado:
$ 602.525.599,97

Consultar de nuevo

Datos de la póliza

Estado:
Vigente

Número de póliza:
51-40-101011226
Número de anexo:
2

Fecha de expedición:
jueves, 11 de junio de 2026
Ramo:
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPL

Asegurado:
TIERRASUA S.A.S.
Tomador:
ICC INGENIERIA Y CONSULTORIA DE COLOMBIA SAS

Inicio de vigencia:
miércoles, 27 de mayo de 2026
Fin vigencia:
viernes, 1 de enero de 2027

Valor total asegurado:
$ 350.181.000,00

Consultar de nuevo

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

RCE CONTRATOS

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
SOGAMOSO	AGENCIA SOGAMOSO	51	51-40-101011226	2

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
11	06	2026	27	05	2026	00:00	01	01	2027	23:59	ANEXO DE TRASLADO DE VIGENCIA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL	IDENTIFICACIÓN
ICC INGENIERIA Y CONSULTORIA DE COLOMBIA SAS	NIT: 901.021.317-8

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
CL 14 NRO. 42 - 70	DUITAMA, BOYACA	3003027865

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO	IDENTIFICACIÓN
TIERRASUA S.A.S.	NIT: 901.285.377-2

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
CL 19 NRO. 9 - 35 PISO 10	TUNJA, BOYACA	3108808902

BENEFICIARIO: 901285377 - TIERRASUA S.A.S.

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN 15-05-2020 - 1329-P-06-00000-E-RCE-002A-D00I / 31-03-22 -1329-P-06-00000-E-RCE-001P-D00I, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS CAUSADOS A TERCEROS DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO No. IPVO-017-2026, CUYO OBJETO ES: SUMINISTRO E INSTALACION DE LA SEÑALIZACION VIAL HORIZONTAL Y VERTICAL REQUERIDA PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUCION DE LOS DIFERENTES CONTRATOS O CONVENIOS SUSCRITOS POR TIERRASUA S.A.S.

ASEGURADO/ BENEFICIARIO: ICC INGENIERIA Y CONSULTORIA DE COLOMBIA S.A.S. NIT 901.021.317-8, TIERRASUA S.A.S NIT No. 901.285.377-2 Y/O TERCEROS AFECTADOS

AMPAROS

RIESGO: CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES

AMPAROS	DEDUCIBLE	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG ACTUAL	SUMA ASEG ANTERIOR
PREDIOS LABORES Y OPERACIONES	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV	27/05/2026	01/01/2027	$350,181,000.00	
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV	27/05/2026	01/01/2027	$350,181,000.00	
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV	27/05/2026	01/01/2027	$350,181,000.00	

ACLARACIONES

MEDIANTE EL PRESENTE ANEXO SE HACE MODIFICACION A LA VIGENCIA DE LAS GARANTIAS SEGUN ACTA DE INICIO DE FECHA 27/05/2026

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ *****420,217.00	$ *******3,000.00	$ ******80,411.00	$ **********503,628.00	$ ******350,181,000.00	CONTADO

INTERMEDIARIO

NOMBRE	CLAVE	% DE PART.
SANDRA CONSUELO PATIÑO ALBA	153578	100.00

DISTRIBUCION COASEGURO

NOMBRE COMPAÑÍA	% PART.	VALOR ASEGURADO

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO.

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 10 NO. 14-130 L104 - TELEFONO: 7731957 - SOGAMOSO

51-40-101011226

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

Belen Garcia T

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

RCE CONTRATOS

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
SOGAMOSO	AGENCIA SOGAMOSO	51	51-40-101011226	2

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
11	06	2026	27	05	2026	00:00	01	01	2027	23:59	ANEXO DE TRASLADO DE VIGENCIA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIÓN	
	ICC INGENIERIA Y CONSULTORIA DE COLOMBIA SAS		NIT: 901.021.317-8
DIRECCIÓN: CL 14 NRO. 42 - 70	**CIUDAD:** DUITAMA, BOYACA	**TELÉFONO:**	3003027865

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO:		IDENTIFICACIÓN	
	TIERRASUA S.A.S.		NIT: 901.285.377-2
DIRECCIÓN: CL 19 NRO. 9 - 35 PISO 10	**CIUDAD:** TUNJA, BOYACA	**TELÉFONO:**	3108808902

BENEFICIARIO: 901285377 - TIERRASUA S.A.S.

AMPAROS	DEDUCIBLE	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG ACTUAL	SUMA ASEG ANTERIOR
RESPONSABILIDAD CIVIL PATRONAL	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV	27/05/2026	01/01/2027	$350,181,000.00	
RESPONSABILIDAD CIVIL CRUZADA	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV	27/05/2026	01/01/2027	$350,181,000.00	
BIENES BAJO CUIDADO TENENCIA Y CONTROL	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV	27/05/2026	01/01/2027	$350,181,000.00	
DAÑO EMERGENTE Y LUCRO CESANTE	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV	27/05/2026	01/01/2027	$350,181,000.00	
PERJUICIOS EXTRAPATRIMONIALES	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV	27/05/2026	01/01/2027	$350,181,000.00	

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO. QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 10 NO. 14-130 L104 - TELEFONO: 7731957 - SOGAMOSO

51-40-101011226

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

Belen Garcia T

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

RCE CONTRATOS

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
SOGAMOSO	AGENCIA SOGAMOSO	51	51-40-101011226	2

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
11	06	2026	27	05	2026	00:00	01	01	2027	23:59	ANEXO DE TRASLADO DE VIGENCIA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIÓN	
	ICC INGENIERIA Y CONSULTORIA DE COLOMBIA SAS		**NIT: 901.021.317-8**
DIRECCIÓN: CL 14 NRO. 42 - 70	**CIUDAD:** DUITAMA, BOYACA	**TELÉFONO:**	3003027865

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO:	TIERRASUA S.A.S.	IDENTIFICACIÓN	**NIT: 901.285.377-2**
DIRECCIÓN: CL 19 NRO. 9 - 35 PISO 10	**CIUDAD:** TUNJA, BOYACA	**TELÉFONO:**	3108808902

BENEFICIARIO: 901285377 - TIERRASUA S.A.S.

TEXTO ACLARATORIO

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO. QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 10 NO. 14-130 L104 - TELEFONO: 7731957 - SOGAMOSO

51-40-101011226

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

Belen Garcia T

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

DLF153578B

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
SOGAMOSO	AGENCIA SOGAMOSO	51	51-44-101033160	3

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
12	06	2026	27	05	2026	00:00	01	01	2030	23:59	ANEXO DE PRORROGA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL	IDENTIFICACIÓN
ICC INGENIERIA Y CONSULTORIA DE COLOMBIA SAS	NIT: 901.021.317-8

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
CL 14 NRO. 42 - 70	DUITAMA, BOYACA	3003027865

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:	IDENTIFICACIÓN
TIERRASUA S.A.S.	NIT: 901.285.377-2

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
CL 19 NRO. 9 - 35 PISO 10	TUNJA, BOYACA	3108808902

ADICIONAL:

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN ECU010B, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No. IPVO-017-2026, CUYO OBJETO ES: SUMINISTRO E INSTALACION DE LA SEÑALIZACION VIAL HORIZONTAL Y VERTICAL REQUERIDA PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUCION DE LOS DIFERENTES CONTRATOS O CONVENIOS SUSCRITOS POR TIERRASUA S.A.S.

EL AMPARO DE ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA TENDRA UNA VIGENCIA DE UN (01) AÑO A PARTIR DE LA FECHA DE RECIBIDO FINAL A SATISFACCIN

AMPAROS

RIESGO: CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG/ACTUAL	SUMA ASEG/ANTERIOR
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	27/05/2026	02/08/2027	$150,631,399.99	$150,631,399.99
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	27/05/2026	01/01/2030	$150,631,399.99	
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	27/12/2026	27/12/2027	$301,262,799.99	

ACLARACIONES

MEDIANTE EL PRESENTE ANEXO SE HACE MODIFICACION A LA VIGENCIA DEL AMPARO DE CUMPLIMIENTO SEGUN CONTRATO INICIAL

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ **********0.00	$ **********0.00	$ **********0.00	$ **********0.00	$ ******602,525,599.97	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
SANDRA CONSUELO PATIÑO ALBA	153578	100.00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN


51-44-101033160

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

Belen Garcia T.

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

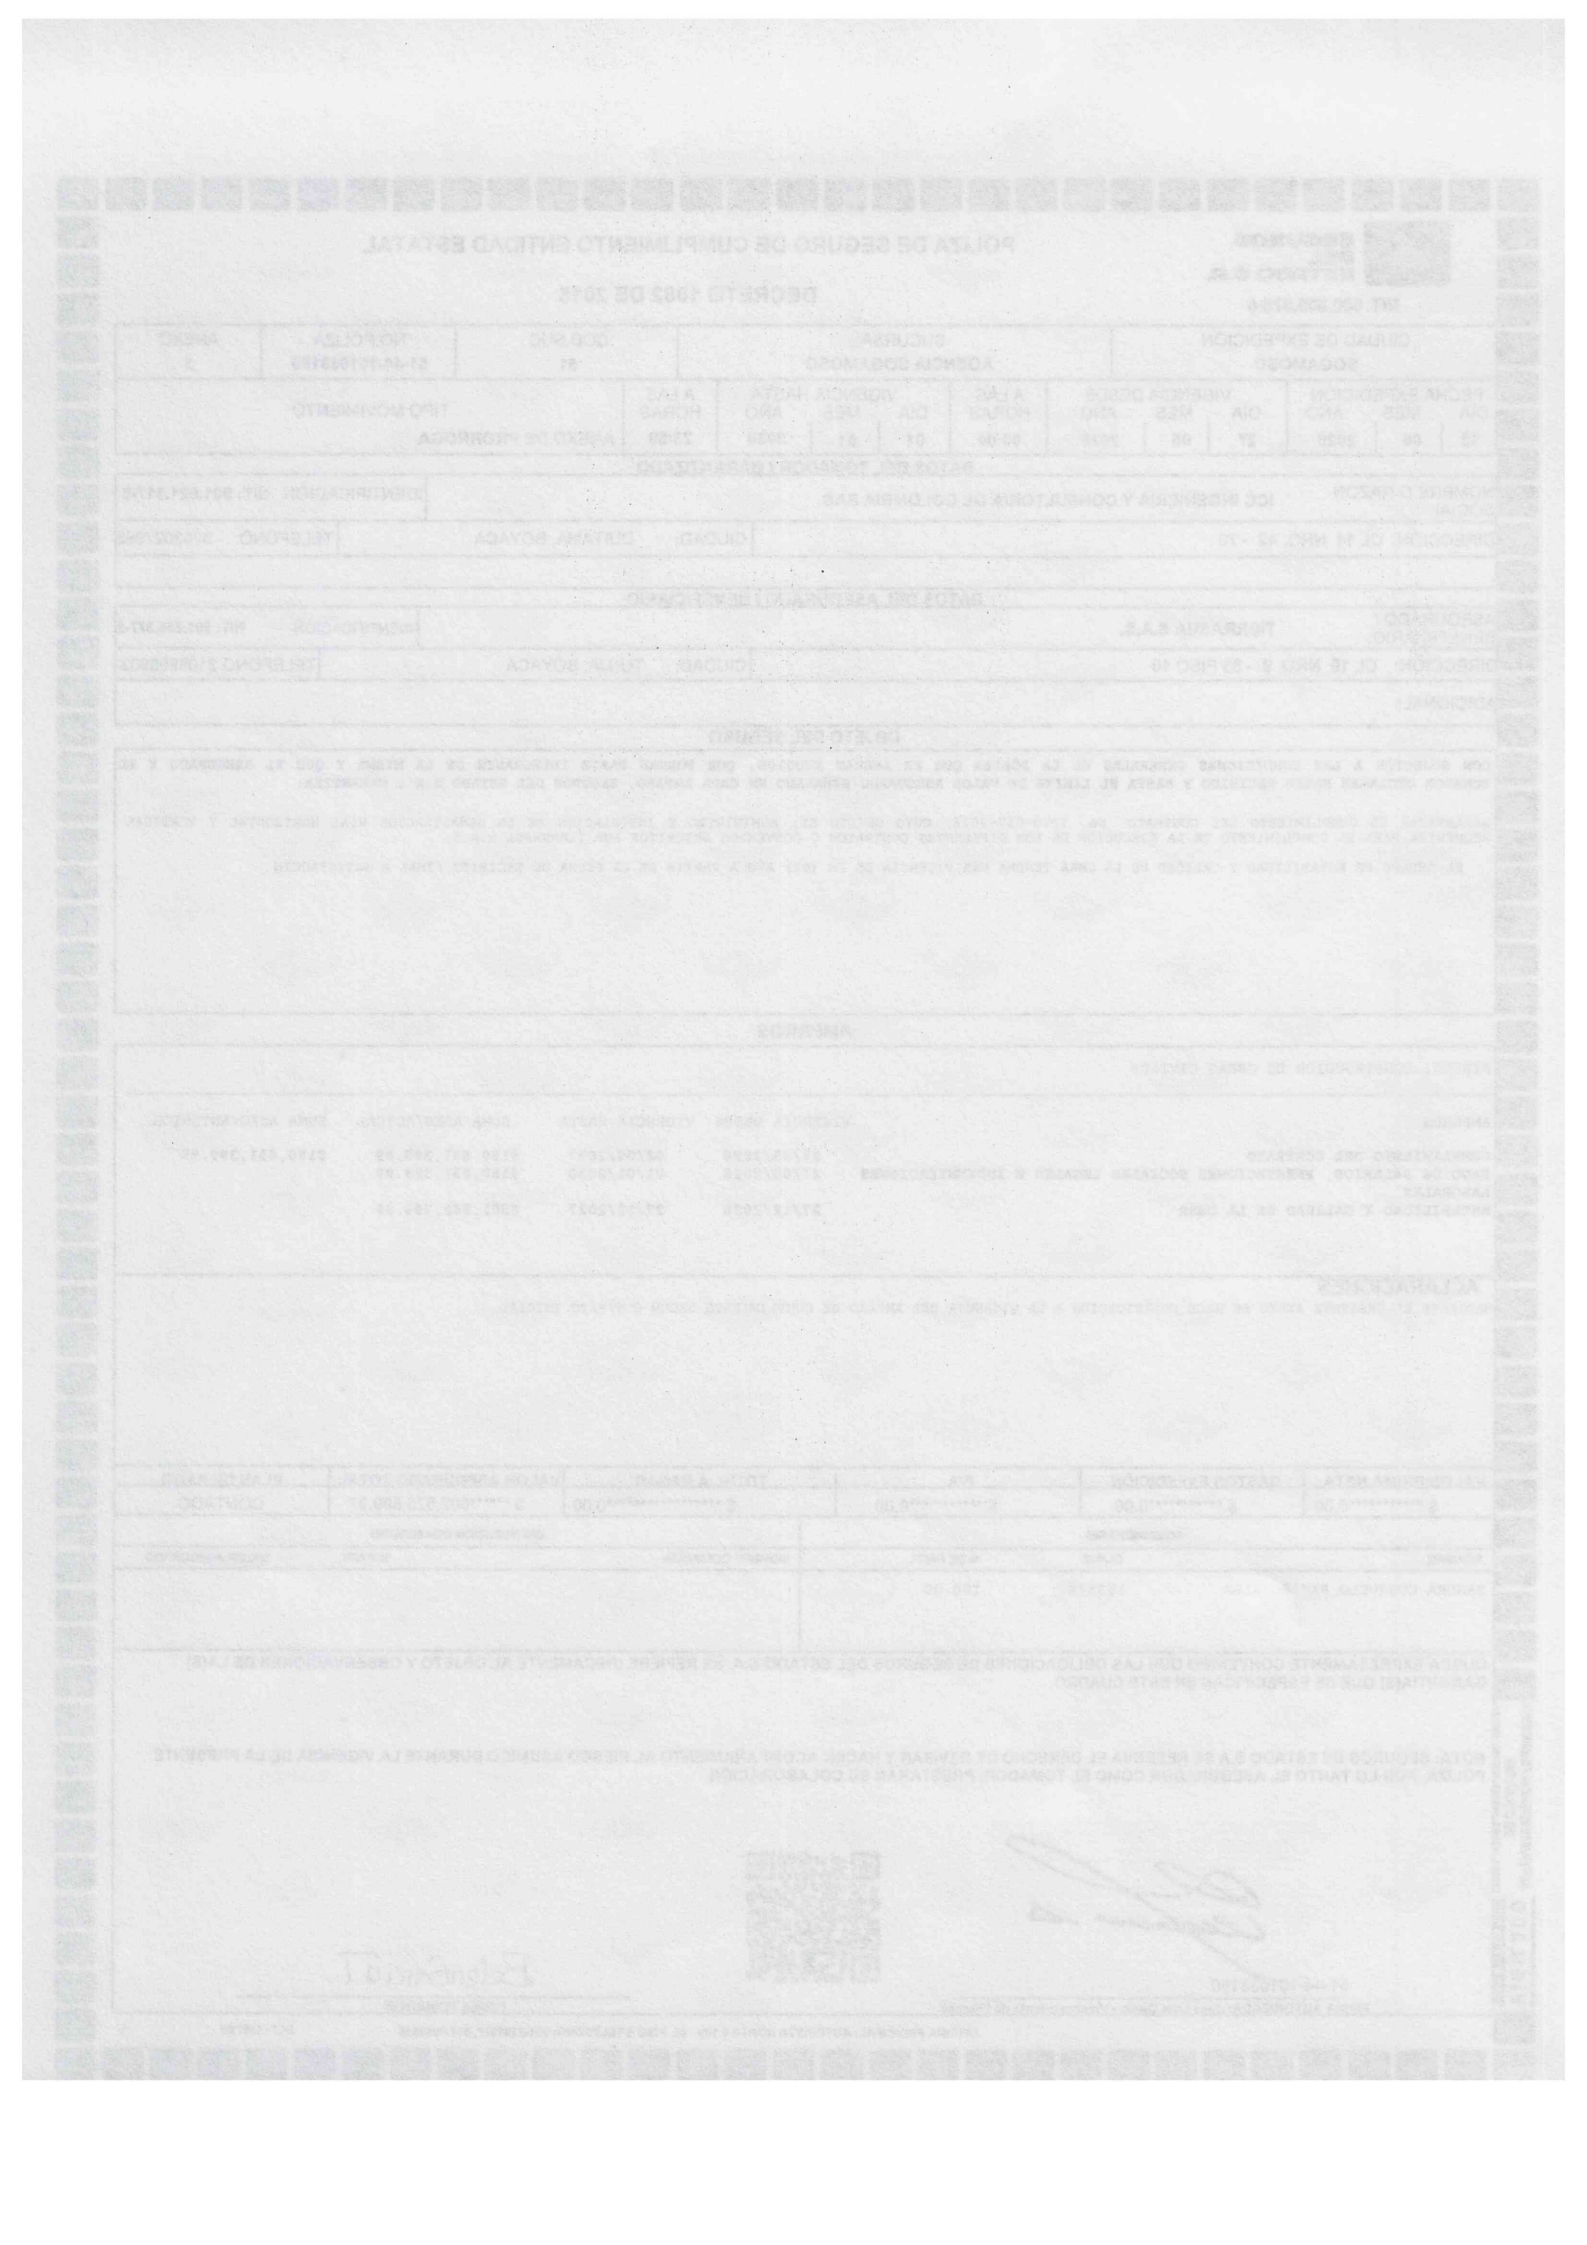

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
SOGAMOSO	AGENCIA SOGAMOSO	51	51-44-101033160	3

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
12	06	2026	27	05	2026	00:00	01	01	2030	23:59	ANEXO DE PRORROGA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIÓN	
	ICC INGENIERIA Y CONSULTORIA DE COLOMBIA SAS		NIT: 901.021.317-8
DIRECCIÓN: CL 14 NRO. 42 - 70	**CIUDAD:** DUITAMA, BOYACA	**TELÉFONO:**	3003027865

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:		IDENTIFICACIÓN	
	TIERRASUA S.A.S.		NIT: 901.285.377-2
DIRECCIÓN: CL 19 NRO. 9 - 35 PISO 10	**CIUDAD:** TUNJA, BOYACA	**TELÉFONO:**	3108808902

ADICIONAL:

TEXTO ACLARATORIO

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 10 NO. 14-130 L104 - TELEFONO: 7731957 - SOGAMOSO

51-44-101033160

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

Belen Garcia T

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

CONSTANCIA DE NO REVOCATORIA NI CANCELACION POR FALTA DE PAGO DE LA PRIMA

Hacemos constar, que la póliza Nº 101033160, anexo 3, no expirara por falta de pago de la prima, ni por revocatoria unilateral del tomador de la póliza o de la aseguradora.

Lo anterior de conformidad con lo establecido en el decreto 1082 de 2015 el cual regula las garantías ante entidades estatales

Dado en SOGAMOSO a los 12 días del mes de JUNIO de 2026

51-44-101033160

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

ACTA DE INICIO

CONTRATO N° IPVO 017-2026

OBJETO	"SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LA SEÑALIZACIÓN VIAL HORIZONTAL Y VERTICAL REQUERIDA PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUCIÓN DE LOS DIFERENTES CONTRATOS O CONVENIOS POR TIERRASUA S.A.S."
VALOR:	MIL QUINIENTOS SEIS MILLONES TRESCIENTOS TRECE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS CON NOVENTA Y CUATRO CENTAVOS ($ 1,506,313,999.94)
PLAZO:	SIETE (07) MESES contados a partir de la suscripción del acta de inicio, en todo caso no podrá exceder el plazo de ejecución al treinta y uno (31) de diciembre de 2026 y/o hasta agotar recursos asignados.
FECHA DE INICIO:	27 DE MAYO DE 2026
CONTRATANTE:	**TIERRASUA S.A.S** NIT. 901.285.377-2 R/L: JOHN ERNESTO CARRERO VILLAMIL
CONTRATISTA:	**ICC INGENIERÍA Y CONSULTORÍA DE COLOMBIA S.A.S.** **NIT:** 901.021.317-8 R/L. BELÉN ZORAIDA GARCÍA TUTA
SUPERVISOR:	**JULIÁN EDGARDO GUERRERO RINCÓN** C.C. 7.173.877

En constancia firman los intervinientes, en el municipio de Tunja, a los veintisiete (27) días del mes de mayo de 2026.

JULIAN EDGARDO GUERRERO RINCON
SUPERVISOR
TIERRASUA S.A.S.

ICC INGENIERÍA Y CONSULTORÍA DE COLOMBIA S.A.S.
R/L. BELÉN ZORAIDA GARCÍA TUTA
CONTRATISTA

Nombres y Apellidos		Cargo	Firma
Proyectó:	Diana Lorena Sierra	Contratista	
Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las disposiciones legales y/o técnicas vigentes y, por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para la firma del remitente.			

INGENIERÍA Y CONSULTORIA
DE COLOMBIA S.A.S

CARTA DE DISPONIBILIDAD DE PROFESIONALES

La empresa **ICC INGENIERIA Y CONSULTORIA DE COLOMBIA.** En calidad de contratista y **BELEN ZORAIDA GARCIA TUTA** en calidad de representante de la empresa, certifica que los profesionales relacionados en el presente documento cuentan con la disponibilidad y disposición necesarias para participar en la ejecución del **CONTRATO IPVO -017 - 2026**, cuyo objeto es: **"SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LA SEÑALIZACIÓN VIAL HORIZONTAL Y VERTICAL REQUERIDA PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUCIÓN DE LOS DIFERENTES CONTRATOS O CONVENIOS SUSCRITOS POR TIERRASUA S.A.S"**

En virtud de lo anterior, se hace constar lo siguiente:

1. Los profesionales relacionados manifiestan su disponibilidad para participar en la ejecución del convenio y desarrollar las actividades que les sean asignadas, de conformidad con el perfil profesional, funciones y responsabilidades establecidas para cada cargo.
2. El personal contará con la disponibilidad requerida para dar inicio a las actividades correspondientes, de acuerdo con el cronograma y la programación establecida para la ejecución del convenio, procurando el cumplimiento de las obligaciones dentro de los plazos previstos.
3. Durante el periodo en que los profesionales desarrollen actividades relacionadas con el convenio, TIERRASUA S.A.S. garantizará el cumplimiento de las obligaciones correspondientes al Sistema de Seguridad Social Integral, incluyendo los aportes a salud, pensión y riesgos laborales (ARL), así como los

NOMBRE COMPLETO	CEDULA	CARGO
Libin Yesenia Rodríguez Ladino	1002537459	Supervisora SST
Elkin Fabian Rincon Rincon	1050200837	Director de obra
Erika Natalia Niño Chaparro	1052378672	Aux Contable
Juan Diego Garay Pérez	1053444133	Aux Administrativo
Ahida Luz Pesca Diaz	46457456	Aux Operativa

Atentamente

Belen Garcia T.

BELEN ZORAIDA GARCIA TUTA
REPRESENTANTE LEGAL DE ICC SAS

INGENIERÍA Y CONSULTORIA DE COLOMBIA S.A.S	**FORMATO**	**VERSIÓN: 0**
		CÓDIGO:
SABANA - CUADRO DE CANTIDADES CONTRATADAS Y EJECUTADAS		**FECHA: 01/01/2025**

FECHA: 30/09/2026

CONTRATO N°:	IPVO- 017-2026
OBJETO:	"SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LA SEÑALIZACIÓN VIAL HORIZONTAL Y VERTICAL REQUERIDA PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUCIÓN DE LOS DIFERENTES CONTRATOS O CONVENIOS SUSCRITOS POR TIERRASUA S.A.S"
CONTRATISTA:	ICC INGENIERÍA Y CONSULTORÍA DE COLOMBIA S.A.S.
SUPERVISOR:	JULIAN EDGARDO GUERRERO RINCON
V. INICIAL	$ 1,506,313,999.94
V. ADICIONAL	$ 0.00
VALOR TOTAL	$ 1,506,313,999.94

FECHA DE INICIACIÓN REAL	27/5/2026
FECHA TERMINACIÓN / CONTRATO:	26/12/2026
FECHA DE TERMINACIÓN REAL:	26/12/2026

ACTA PARCIAL:__

ACTA FINAL: _____

ACTA No. _____

FECHA: 30/09/2026

PERIODO: 01 DE AGOSTO DE 2026 AL 31 DE AGOSTO DE 2026

CONDICIONES ORIGINALES						**OBRA EJECUTADA**						
						PRESENTE INFORME		**ACUM. ACTA ANTERIOR**		**ACUMULADO**	
No.	**Descripción**	**Un**	**Cant.**	**Valor. Unit.**	**Valor. Total**	**Cantidad**	**Valor**	**Cantidad**	**Valor**	**Cantidad**	**Valor**
1	**REALIZAR SEÑALIZACION Y DEMARCACION**										
1.01	SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA ACRILICA CON MICROESFERAS, LINEAS CONTINUAS Y DISCONTINUAS DE 12 CMS SEGUN NORMA INVIAS	ML	115281.26	$ 4,674.150	$ 538,841,901.43	0.00	$ -	14,653.350	$ 68,491,955.90	14,653.350	$ 68,491,955.90
1.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MARCAS VIALES CON PINTURA DE TRÁFICO SEGÚN NORMA INVIAS. (INCLUYE MICROESFERAS)	M2	3178.66	$ 66,332.650	$ 210,848,941.25	0.00	$ -	779.32	$ 51,694,360.80	779.32	$ 51,694,360.80
1.03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑAL DE TRANSITO PREVENTIVA, REGLAMENTARIA O INFORMATIVA DE 60 x 60 CM.	UND	123.00	$ 391,513.020	$ 48,156,101.46	0.000	$ -	0.000	$ -	0.000	$ -
1.04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TACHAS REFLECTIVAS UNIDIRECCIONALES Y BIDIRECCIONALES	UND	12110.00	$ 15,574.350	$ 188,605,378.50	0.000	$ -	603.000	$ 9,391,333.05	603.000	$ 9,391,333.05
1.05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DELINEADORES DE CURVA HORIZONTAL DE TAMAÑO 0.40M X 0.50 M. SEGUN NORMA INVIAS. (INCLUYE POSTE METÁLICO).	UND	91.00	$ 368,159.230	$ 33,502,489.93	0.0000	$ -	0.0000	$ -	0.0000	$ -
1.06	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DEFENSAS VIALES TRAMO RECTO, CAL. 12. 2 POSTES DE 1.50M. Y TERMINALES INCLUYENDO TORNILLERIA, CAPTAFAROS EN LÁMINA GALVANIZADA CAL. 22 EN CINTA REFLECTIVA GRADO INGENIERIA SEGUN NORMA INVIAS	ML	355.00	$ 289,588.670	$ 102,803,977.85	0.0000	$ -	0.0000	$ -	0.0000	$ -
1.07	SUMINISTRO EE INSTALACIÓN DE ESTOPEROLES D = 10 CM. H = 25 CM. (INCLUYE ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y/O ANCLAJE).	UND	1080.00	$ 18,209.890	$ 19,666,681.20	0.000	$ -	594.00	$ 10,816,674.66	594.00	$ 10,816,674.66

CONDICIONES ORIGINALES							OBRA EJECUTADA					
							PRESENTE INFORME		ACUM. ACTA ANTERIOR		ACUMULADO	
No.	**Descripción**	**Un**	**Cant.**	**Valor. Unit.**	**Valor. Total**		**Cantidad**	**Valor**	**Cantidad**	**Valor**	**Cantidad**	**Valor**
1.08	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑAL DE TRANSITO DE 0.90 X 1.13 M. (INFORMATIVAS) SEGUN NORMA INVIAS.	UND	60.00	$ 820,514.010	$ 49,230,840.60	-	0.000	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
1.09	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑAL DE TRANSITO PREVENTIVA, REGLAMENTARIA O INFORMATIVA DE 75 x 75 CM.	UND	60.00	$ 468,679.690	$ 28,120,781.40		0.000	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
1.10	DISPOSITIVO DE CANALIZACIÓN EN OBRAS - DELINEADORES TUBULARES	UND	60.00	$ 65,000.000	$ 3,900,000.00		0.000	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
1.11	DISPOSITIVO DE CANALIZACIÓN EN OBRAS- BARRERAS PLÁSTICAS (MALETINES)	UND	60.00	$ 460,000.000	$ 27,600,000.00		0.000	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
1.12	DESMONTE Y REINSTALACIÓN DE SEÑALES VIALES (INCLUYE DADO DE ANCLAJE)	UND	60.00	$ 66,409.550	$ 3,984,573.00		0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
	COSTO DIRECTO				**$ 1,255,261,666.62**			**$ -**		**$ 140,394,324.41**		**$ 140,394,324.41**
	TOTAL COSTOS DIRECTOS				**$ 1,255,261,666.62**			**$ -**		**$ 140,394,324.41**		**$ 140,394,324.41**
	A.I. 20 %				$ 251,052,333.32			$ -		$ 28,078,864.88		$ 28,078,864.88
	COSTO TOTAL				**$ 1,506,313,999.94**			**$ -**		**$ 168,473,189.3**		**$ 168,473,189.3**
VALOR OBRAS EJECUTADAS												**$ -**
VALOR EJECUTADO EN EL PRESENTE INFORME												**$ -**
SON:												

Belen Garcia T

BELÉN ZORAIDA GARCÍA TUTA
CONTRATISTA
R/L ICC INGENIERÍA Y CONSULTORÍA DE COLOMBIA S.A.S.

JULIAN EDGARDO GUERRERO RINCON
SUPERVISOR
TIERRASUA S.A.S.

TIERRASUA (Conectamos región)	**BITÁCORA DIARIA DE ACTIVIDADES**
Fecha	01/08/2026 al 31/08/2026
Hora	07:30 a 12:00 - 13:30 a 17:30
Clima	Dia soleado
Municipio / Sector	Duitama
Personal	Residente de Obra, Director de Obra
Maquinaria y equipos permanente	**Máquinaria:** No se utiliza maquinaria **Equipos:** No se utiliza equipos
Actividades ejecutadas	Se hace revision documental
Componente de Seguridad y Salud en el Trabajo	Durante la jornada iniciando las actividades con la charla diaria de seguridad y la socialización de los procedimientos seguros de trabajo. La jornada se desarrolló sin incidentes ni accidentes laborales.
Observaciones	Sin novedad

DANIEL CAMILO SEPÚLVEDA RAMÍREZ
Apoyo a la supervisión

ELKIN FABIAN RINCÓN RINCÓN
Director de obra
