**MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL**
**COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES**
**EJÉRCITO NACIONAL**
**LICEOS DEL EJERCITO**

**Radicado No. 2026923017026536: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COPER DIFAB-CELIC**

LUGAR Y FECHA: Bogotá D.C. 10 de noviembre de 2026.

INTERVIENEN: **Teniente Coronel VICTOR HUGO QUINTERO MARULANDA**
Subdirector y Ordenador del Gasto de los Liceos del Ejército.
**Capitán WILMAN JOSE NIEVES CAMAÑO**
Coordinador Administrativo Liceos del Ejército y Supervisor de Contrato.
**ANDREA DEL PILAR MATALLANA SANDOVAL**
Arquitecta Asesora de Infraestructura Liceos del Ejército.
**NESTOR GILBERTO RODRIGUEZ ALVARADO**
Contratista, NIT.79351368-8 CC.79351368 Persona Natural.

ASUNTO: Trata el recibo parcial del contrato de la referencia N.º 273-CELIC-2026 cuyo objeto es, el mantenimiento, y/o remodelación de las instalaciones de los Liceos: Liceo Santa Barbara ubicado en la ciudad de Bogotá, Francisco José De Caldas ubicado en la Base Militar de Tolemaida Nilo Cundinamarca, Liceo General Gustavo Matamoros León ubicado en la ciudad de Yopal, Liceo General Serviez ubicado en la ciudad de Villavicencio y Liceo Pichincha ubicado en la ciudad De Cali. Celebrado entre el Ministerio de Defensa Nacional – Ejército Nacional – Liceos del Ejército y Néstor Gilberto Rodríguez Alvarado.

| ACTA DE RECIBO PARCIAL (ACTA DE OBRA 002) DE LOS SERVICIOS DE OBRA. | |
|---|---|
| CONTRATO No. | N°273-CELIC-2026. |
| CDP. No. | 2426 27/ENE/2026. |
| CRP. No. | 37926 27/AGO/2026. |
| OBJETO | "MANTENIMIENTO, Y/O REMODELACIÓN DE LAS INSTALACIONES DE LOS LICEOS: LICEO SANTA BARBARA UBICADO EN LA CIUDAD DE BOGOTA, FRANCISCO JOSE DE CALDAS UBICADO EN LA BASE MILITAR DE TOLEMAIDA NILO CUNDINAMARCA, LICEO GENERAL GUSTAVO MATOMOROS LEON UBICADO EN LA CIUDAD DE YOPAL, LICEO GENERAL SERVIEZ UBICADO EN LA CIUDAD DE VILLAVICENCIO y LICEO PICHINCHA UBICADO EN LA CIDAD DE CALI". |
| NOMBRE DEL CONTRATISTA | NESTOR GILBERTO RODRIGUEZ ALVARADO<br>NIT.79351368-8<br>CC.79351368 PERSONA NATURAL |
| FECHA DE SUSCRIPCIÓN | 26 de agosto de 2026. |
| VALOR INICIAL DEL CONTRATO | $1.731.444.852,00 (mil setecientos treinta y un millones cuatrocientos cuarenta y cuatro mil ochocientos cincuenta y dos pesos MC/TE). |

CONTINUACIÓN ACTA RADICADO No. 2026923017026536/ (ACTA DE OBRA N. 002) DE RECIBO PARCIAL CORRESPONDIENTE AL CONTRATO 273-CELIC-2026, CUYO OBJETO ES, MANTENIMIENTO, Y/O REMODELACIÓN DE LAS INSTALACIONES DE LOS LICEOS: LICEO SANTA BARBARA UBICADO EN LA CIUDAD DE BOGOTA, FRANCISCO JOSE DE CALDAS UBICADO EN LA BASE MILITAR DE TOLEMAIDA NILO CUNDINAMARCA, LICEO GENERAL GUSTAVO MATAMOROS LEON UBICADO EN LA CIUDAD DE YOPAL, LICEO GENERAL SERVIEZ UBICADO EN LA CIUDAD DE VILLAVICENCIO Y LICEO PICHINCHA UBICADO EN LA CIUDAD DE CALI.

<table>
<tr><td>FORMA DE PAGO</td><td>ABONO EN CUENTA DEL PROVEEDOR.</td></tr>
<tr><td>FECHA DE ENTREGA</td><td>10 de noviembre de 2026.</td></tr>
<tr><td>LUGAR DE ENTREGA</td><td>La ejecución, mejoramientos, mantenimientos y puesta en funcionamiento se realizarán en las siguientes sedes:<br><br><table><tr><th>LICEO</th><th>DIRECCIÓN</th><th>CIUDAD</th></tr><tr><td>Liceo Santa Barbara</td><td>Escuela De Artillería, Km 3 Vía, Bogotá, D.C</td><td>Bogotá, D.C</td></tr><tr><td>Liceo Francisco José de Caldas</td><td>Nilo Cundinamarca en las instalaciones de la Base Militar de Tolemaida</td><td>Nilo -Cundinamarca</td></tr><tr><td>Liceo Gustavo Matamoros León</td><td>Avenida marginal de la selva Octava División</td><td>Yopal - Casanare</td></tr><tr><td>Liceo General Serviez</td><td>kilómetro 12 vía Puerto López Cantón Militar APIAY</td><td>Villavicencio - Meta</td></tr><tr><td>Liceo Pichincha</td><td>Vías Internas Tercera Brigada</td><td>Cali<br>Valle del Cauca</td></tr></table><br>NOTA 1: Se da por entendido que todos los costos de desplazamiento, entrega, imprevistos y demás que se generen correrán por parte del contratista.</td></tr>
<tr><td>CONTRATO ADICIONAL No. 1</td><td>OMITIDO</td></tr>
<tr><td>VALOR CONTRATO ADICIONAL No. 1</td><td>$0</td></tr>
<tr><td>SUPERVISOR DEL CONTRATO</td><td>Capitán WILMAN JOSE NIEVES CAMAÑO identificado con cedula de ciudadanía 1.067.095.872 de Buenavista y/o quien haga sus veces debidamente encargado, Nombrado mediante Resolución N°049 del 14 de julio de 2026.</td></tr>
</table>

En Bogotá D.C, el día 10 de noviembre de 2026, se reunieron: el Señor teniente coronel VICTOR HUGO QUINTERO MARULANDA, por parte del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – EJÉRCITO NACIONAL – LICEOS DEL EJÉRCITO, en su calidad de contratante; el señor Capitán WILMAN JOSE NIEVES CAMAÑO como Coordinador Administrativo de los Liceos del Ejército y supervisor del contrato No. 273-CELIC-2026; y el señor NESTOR GILBERTO RODRIGUEZ ALVARADO, en su calidad de contratista.

Con el objeto de efectuar el correspondiente recibo parcial, de los bienes relativos al objeto contractual descrito en la cláusula PRIMERA del citado contrato.

Luego de adelantar la inspección a los bienes prestados, se estableció que estos cumplen con los requerimientos, normas y/o especificaciones técnicas y la adquisición del suministro de bienes se cumplió dentro del plazo contractual establecido. A continuación, se describen pormenorizadamente los bienes prestados, así:

| DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES RECIBIDOS | OBSERVACIONES GENERALES |
|---|---|

CONTINUACIÓN ACTA RADICADO No. 2026923017026536/ (ACTA DE OBRA N. 002) DE RECIBO PARCIAL CORRESPONDIENTE AL CONTRATO 273-CELIC-2026, CUYO OBJETO ES, MANTENIMIENTO, Y/O REMODELACIÓN DE LAS INSTALACIONES DE LOS LICEOS: LICEO SANTA BARBARA UBICADO EN LA CIUDAD DE BOGOTA, FRANCISCO JOSE DE CALDAS UBICADO EN LA BASE MILITAR DE TOLEMAIDA NILO CUNDINAMARCA, LICEO GENERAL GUSTAVO MATAMOROS LEON UBICADO EN LA CIUDAD DE YOPAL, LICEO GENERAL SERVIEZ UBICADO EN LA CIUDAD DE VILLAVICENCIO Y LICEO PICHINCHA UBICADO EN LA CIUDAD DE CALI.

| | |
|---|---|
| ES EL "MANTENIMIENTO, Y/O REMODELACIÓN DE LAS INSTALACIONES DE LOS LICEOS: LICEO SANTA BARBARA UBICADO EN LA CIUDAD DE BOGOTA, FRANCISCO JOSE DE CALDAS UBICADO EN LA BASE MILITAR DE TOLEMAIDA NILO CUNDINAMARCA, LICEO GENERAL GUSTAVO MATAMOROS LEON UBICADO EN LA CIUDAD DE YOPAL, LICEO GENERAL SERVIEZ UBICADO EN LA CIUDAD DE VILLAVICENCIO y LICEO PICHINCHA UBICADO EN LA CIDAD DE CALI"<br><br>Mediante el acta que a continuación se relaciona, se entregó dentro del plazo establecido en el Contrato No. 273-CELIC-2026, AL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – EJÉRCITO NACIONAL – LICEOS DEL EJÉRCITO los servicios del Contrato los cuales corresponden a lo ejecutado en el periodo comprendido entre el 22 de septiembre y el 09 de noviembre de 2026, así: | Ninguna |

| | | | ACTA ANTERIOR (ACTA 001) | | | ACTA 002 (PRESENTE ACTA) | | | CONSOLIDADO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ITEM | | DESCRIPCION | + ; - ; | CANTIDAD EJECUTADA | VALOR EJECUTADO | + ; - ; | CANTIDAD EJECUTADA | VALOR EJECUTADO | CANTIDAD TOTAL EJECUTADA | VALOR TOTAL |
| **A- LICEO SANTA BÁRBARA - BOGOTÁ (CAMBIO DE CUBIERTA Y ACTUALIZACIÓN REDES DE ILUMINACIÓN SALONES DE BLOQUE BACHILLERATO BAJO)** | | | | | | | | | | |
| **A1C** | **PRELIMINARES** | | | | | | | | | |
| 1 | A1C.1 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERRAMIENTO PROVISIONAL EN TELA EN POLIPROPILENO VERDE DE 2,10 M DE ALTURA, SOPORTADA MEDIANTE POSTES PARA CERCA DE 2,50 M DE LONGITUD, DISPUESTOS CADA 2,50 M. INCLUYE POSTES O ELEMENTOS DE SOPORTE, TENSADO, AMARRES, SUMINISTRO DE MATERIALES, TRANSPORTE, INSTALACIÓN Y TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y ESTABILIDAD. ASIMISMO, INCLUYE EL DESMONTAJE, RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL DEL CERRAMIENTO UNA VEZ FINALIZADOS LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO OBJETO DEL CONTRATO. | 0.00 | 60.00 | $ 1,740,000.00 | 0.00 | 60.00 | $ 1,740,000.00 | 120.00 | $ 3,480,000.00 |
| 2 | A1C.2 | DESMONTE DE CUBIERTA EN FIBROCEMENTO, (INCLUYE PROTECCIÓN DE ÁREAS INFERIORES, ACOPIOS TEMPORALES, ENLONADO, CARGUE Y RETIRO DE MATERIAL DESMONTADO CON DISPOSICIÓN FINAL FUERA DE LAS INSTALACIONES EN SITIO AUTORIZADO). | 0.00 | 700.00 | $ 10,990,000.00 | 0.00 | 643.00 | $ 10,095,100.00 | 1,343.00 | $ 21,085,100.00 |

CONTINUACIÓN ACTA RADICADO No. 2026923017026536/ (ACTA DE OBRA N. 002) DE RECIBO PARCIAL CORRESPONDIENTE AL CONTRATO 273-CELIC-2026, CUYO OBJETO ES, MANTENIMIENTO, Y/O REMODELACIÓN DE LAS INSTALACIONES DE LOS LICEOS: LICEO SANTA BARBARA UBICADO EN LA CIUDAD DE BOGOTA, FRANCISCO JOSE DE CALDAS UBICADO EN LA BASE MILITAR DE TOLEMAIDA NILO CUNDINAMARCA, LICEO GENERAL GUSTAVO MATAMOROS LEON UBICADO EN LA CIUDAD DE YOPAL, LICEO GENERAL SERVIEZ UBICADO EN LA CIUDAD DE VILLAVICENCIO Y LICEO PICHINCHA UBICADO EN LA CIUDAD DE CALI.

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | A1C.3 | RETIRO DE CIELO RASO EXISTENTE, PERFILERÍA Y LÁMINAS (INCLUYE PROTECCIÓN DE ÁREAS INFERIORES, ACOPIOS TEMPORALES, ENLONADO, CARGUE Y RETIRO DE MATERIAL DESMONTADO CON DISPOSICIÓN FINAL FUERA DE LAS INSTALACIONES EN SITIO AUTORIZADO). | 0.00 | 70.00 | $ 840,000.00 | 0.00 | 74.00 | $ 888,000.00 | 144.00 | $ 1,728,000.00 |
| 4 | A1C.4 | DESMONTE ESTRUCTURA CUBIERTA EXISTENTE (CERCHAS Y DEMAS ELEMENTOS ESTRUCTURALES PRINCIPALES). | 0.00 | 450.00 | $ 4,725,000.00 | 0.00 | 222.00 | $ 2,331,000.00 | 672.00 | $ 7,056,000.00 |
| Subtotal | | | | | **$ 18,295,000.00** | | | **$ 15,054,100.00** | | **$ 33,349,100.00** |
| **A2C** | **CUBIERTA** | | | | | | | | | |
| 5 | A2C.1 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN TEJA SIN TRASLAPO - TST STANDING SEAM 450MM DE 2", FABRICADA EN LÁMINA DE ACERO GALVANIZADO Z 180 PREPINTADO SUPER POLIÉSTER . INCLUYE REMATES, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, SELLANTES, (TORNILLERIA OCULTA Y SISTEMA DE FIJACIÓN, SELLANTES Y REMATES, CUMBRERAS, BABEROS Y TAPAJUNTAS, INSTALACIÓN Y TRANSPORTE) INCLUYE REMATES, FILOS, CANTOS Y ELEMENTOS LINEALES, SIN PAGO ADICIONAL. | -192.00 | 751.00 | $ 62,708,500.00 | -192.00 | 400.00 | $ 33,400,000.00 | 1,151.00 | $ 96,108,500.00 |
| 6 | A2C.2 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CIELO RASO EN LÁMINA PVC 7 MM (INCLUYE PERFILERÍA DE SOPORTE, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, REMATE PERIMETRAL TIPO CORNISA, NIVELACIÓN Y ACABADO FINAL) INCLUYE REMATES, FILOS, CANTOS Y ELEMENTOS LINEALES, SIN PAGO ADICIONAL. | -848.00 | | $ 0.00 | -848.00 | | $ 0.00 | 0.00 | $ 0.00 |
| Subtotal | | | | | **$ 62,708,500.00** | | | **$ 33,400,000.00** | | **$ 96,108,500.00** |
| **A3C** | **ELECTRICO** | | | | | | | | | |
| 7 | A3C.1 | DESMONTE DE ELEMENTOS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS EXISTENTES (LUMINARIAS, CÁMARAS, SENSORES Y EQUIPOS SIMILARES). (INCLUYE DESCONEXIÓN SEGURA, CARGUE, RETIRO Y DISPOSICIÓN). | -43.00 | 60.00 | $ 945,900.00 | -43.00 | | $ 0.00 | 60.00 | $ 945,900.00 |
| 8 | A3C.2 | SALIDA ILUMINACIÓN DESCOLGADA EN TUBERÍA PVC CONDUIT 1/2", ALAMBRE NO 12 AWG PROM 3 M" (INCLUYE CAJAS, ACCESORIOS E INSTALACIÓN COMPLETA OPERATIVA, PARA INTERIOR Y PARA EXTERIOR). | -103.00 | | $ 0.00 | -103.00 | | $ 0.00 | 0.00 | $ 0.00 |
| 9 | A3C.3 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR ENCHUFABLE 1X30A. CALIDAD LEGRAND, SIEMENS, SQARE D O SUPERIOR DE MARCA RECONOCIDA Y HOMOLOGADA POR EL CIDET (INCLUYE CAJA, CONEXIÓN Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO). | -23.00 | | $ 0.00 | -23.00 | | $ 0.00 | 0.00 | $ 0.00 |
| 10 | A3C.4 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN PANEL LED CUADRADO 60 X 60 52W, INCLUYE GUAYAS DE COLGAR Y DEMÁS ELEMENTOS PARA SU PERFECTA INSTALACIÓN. | -91.00 | | $ 0.00 | -91.00 | | $ 0.00 | 0.00 | $ 0.00 |
| 11 | A3C.5 | SALIDA TOMA ELÉCTRICA, INCLUYE REGATA, APARATO, CAJA 5800, TUBERÍA, ALAMBRE DE COBRE THW 12 AWG. ADAPTADORES. L HASTA 4,5 ML | -23.00 | | $ 0.00 | -23.00 | | $ 0.00 | 0.00 | $ 0.00 |

CONTINUACIÓN ACTA RADICADO No. 2026923017026536/ (ACTA DE OBRA N. 002) DE RECIBO PARCIAL CORRESPONDIENTE AL CONTRATO 273-CELIC-2026, CUYO OBJETO ES, MANTENIMIENTO, Y/O REMODELACIÓN DE LAS INSTALACIONES DE LOS LICEOS: LICEO SANTA BARBARA UBICADO EN LA CIUDAD DE BOGOTA, FRANCISCO JOSE DE CALDAS UBICADO EN LA BASE MILITAR DE TOLEMAIDA NILO CUNDINAMARCA, LICEO GENERAL GUSTAVO MATAMOROS LEON UBICADO EN LA CIUDAD DE YOPAL, LICEO GENERAL SERVIEZ UBICADO EN LA CIUDAD DE VILLAVICENCIO Y LICEO PICHINCHA UBICADO EN LA CIUDAD DE CALI.

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | A3C.6 | LUMINARIA PARA EXTERIOR. | -12.00 | | $ 0.00 | -12.00 | | $ 0.00 | 0.00 | $ 0.00 |
| 13 | A3C.7 | REINSTALACIÓN DE EQUIPOS ELÉCTRICOS, ELECTRÓNICOS Y DE COMUNICACIONES EXISTENTES, INCLUYENDO DESMONTE TEMPORAL CUANDO APLIQUE, ALMACENAMIENTO, REUBICACIÓN, INSTALACIÓN, CONEXIÓN, FIJACIÓN, CONFIGURACIÓN BÁSICA Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO. | -5.00 | | $ 0.00 | -5.00 | | $ 0.00 | 0.00 | $ 0.00 |
| Subtotal | | | | | **$ 945,900.00** | | | **$ 0.00** | | **$ 945,900.00** |
| **A4C** | **CARPINTERÍA METÁLICA Y/O ESTRUCTURA METÁLICA** | | | | | | | | | |
| 14 | A4C.1 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REFUERZO EN PERFIL METÁLICO CAL 14 Y/O 16 (ELABORACIÓN DE CERCHAS CUANDO APLIQUE DISEÑO ESTRUCTURAL Y PLANOS, INSTALACIÓN DE CORREAS, INCLUYE FABRICACIÓN, TRANSPORTE, MONTAJE, SOLDADURA, TRATAMIENTO ANTICORROSIVO, PINTURA EN ESMALTE, PERNOS Y ANCLAJES DE ELEMENTOS DE FIJACIÓN). | 0.00 | 4,852.00 | $ 103,774,576.00 | 0.00 | 3,148.00 | $ 67,329,424.00 | 8,000.00 | $ 171,104,000.00 |
| Subtotal | | | | | **$ 103,774,576.00** | | | **$ 67,329,424.00** | | **$ 171,104,000.00** |
| **A5C** | **MUROS** | | | | | | | | | |
| 15 | A5C.1 | MURO EN BLOQUE Nº 4 E = 0.10 m (NIVELACIÓN DE CUBIERTAS) INCLUYE FILOS, ENCUENTROS, REMATES Y AJUSTES PROPIOS DE LA MODULACIÓN DEL MURO, SIN PAGO ADICIONAL. | -95.00 | | $ 0.00 | -95.00 | 30.00 | $ 1,800,000.00 | 30.00 | $ 1,800,000.00 |
| 16 | A5C.2 | PAÑETE LISO MUROS 1:3 INTERIOR INCLUYE REMATES, FILOS, CANTOS Y ELEMENTOS LINEALES, DILATACIONES SIN PAGO ADICIONAL. | -24.00 | | $ 0.00 | -24.00 | 20.00 | $ 640,000.00 | 20.00 | $ 640,000.00 |
| 17 | A5C.3 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN. MURO EN DRYWALL DOBLE CARA E: 10CM, (INCLUYE ESTRUCTURA (CANALES Y PARALES) GALVANIZADA BASE 9, CALIBRE 24, CINTA DE PAPEL, MASILLADO, LIJADO Y SELLADO DE UNIONES Y CABEZAS DE TORNILLOS, INCLUYE REFUERZO EN MADERA PARA MARCO DE PUERTA ). INCLUYE REMATES, FILOS, CANTOS Y ELEMENTOS LINEALES, SIN PAGO ADICIONAL. | -30.00 | | $ 0.00 | -30.00 | | $ 0.00 | 0.00 | $ 0.00 |
| 18 | A5C.4 | PINTURA EN VINILO TIPO 2 SOBRE MURO EN DRYWALL INCLUYE REMATES, FILOS, CANTOS Y ELEMENTOS LINEALES, SIN PAGO ADICIONAL. | -59.00 | | $ 0.00 | -59.00 | | $ 0.00 | 0.00 | $ 0.00 |
| 19 | A5C.5 | ESTUCO PLASTICO SOBRE MURO PAÑETADO INCLUYE REMATES, FILOS, CANTOS Y ELEMENTOS LINEALES, SIN PAGO ADICIONAL. | -20.00 | | $ 0.00 | -20.00 | | $ 0.00 | 0.00 | $ 0.00 |
| 20 | A5C.6 | PINTURA EN VINILO TIPO 2 SOBRE MURO ESTUCADO INCLUYE REMATES, FILOS, CANTOS Y ELEMENTOS LINEALES, SIN PAGO ADICIONAL. | -20.00 | | $ 0.00 | -20.00 | | $ 0.00 | 0.00 | $ 0.00 |
| Subtotal | | | | | **$ 0.00** | | | **$ 2,440,000.00** | | **$ 2,440,000.00** |
| **A6C** | **AGUAS LLUVIAS** | | | | | | | | | |

CONTINUACIÓN ACTA RADICADO No. 2026923017026536/ (ACTA DE OBRA N. 002) DE RECIBO PARCIAL CORRESPONDIENTE AL CONTRATO 273-CELIC-2026, CUYO OBJETO ES, MANTENIMIENTO, Y/O REMODELACIÓN DE LAS INSTALACIONES DE LOS LICEOS: LICEO SANTA BARBARA UBICADO EN LA CIUDAD DE BOGOTA, FRANCISCO JOSE DE CALDAS UBICADO EN LA BASE MILITAR DE TOLEMAIDA NILO CUNDINAMARCA, LICEO GENERAL GUSTAVO MATAMOROS LEON UBICADO EN LA CIUDAD DE YOPAL, LICEO GENERAL SERVIEZ UBICADO EN LA CIUDAD DE VILLAVICENCIO Y LICEO PICHINCHA UBICADO EN LA CIUDAD DE CALI.

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | A6C.1 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANAL EN LÁMINA GALVANIZADA CAL. 22; DS=70 CON ELEMENTOS DE FIJACIÓN (INCLUYE FABRICACIÓN, SOPORTES METÁLICOS CADA 1.20m, PENDIENTE MÍNIMA DEL 1%, UNIONES SELLADAS, FIJACIÓN A ESTRUCTURA, INSTALACIÓN COMPLETA, TAPAS Y SOSCOS). | -150.00 | | $ 0.00 | -150.00 | | $ 0.00 | 0.00 | $ 0.00 |
| 22 | A6C.2 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BAJANTES EN PVC AGUAS LLUVIAS D=6" (INCLUYE ACCESORIOS COMO CODOS Y UNIONES, ANCLAJES Y CONEXIÓN A RED EXISTENTE). | -60.00 | | $ 0.00 | -60.00 | | $ 0.00 | 0.00 | $ 0.00 |
| 23 | A6C.3 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN FLANCHE EN LÁMINA GALVANIZADA, D: 30CM CAIBRE 26. INCLUYE PINTURA Y SELLOS. | -20.00 | | $ 0.00 | -20.00 | | $ 0.00 | 0.00 | $ 0.00 |
| Subtotal | | | | | **$ 0.00** | | | **$ 0.00** | | **$ 0.00** |
| **A7** | **ASEO** | | | | | | | | | |
| 24 | A7C.1 | ASEO GENERAL | -1,343.00 | | $ 0.00 | | | $ 0.00 | 0.00 | $ 0.00 |
| Subtotal | | | | | **$ 0.00** | | | **$ 0.00** | | **$ 0.00** |
| **Subtotal LICEO SANTA BÁRBARA - BOGOTÁ** | | | | | **$ 185,723,976.00** | | | **$ 118,223,524.00** | | **$ 303,947,500.00** |
| **B -LICEO FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS -TOLEMAIDA (REMODELACIÓN BAÑOS PRIMARIA)** | | | | | | | | | | |
| **B1B** | **PRELIMINARES** | | | | | | | | | |
| 24 | B1B.1 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERRAMIENTO PROVISIONAL EN TELA EN POLIPROPILENO VERDE DE 2,10 M DE ALTURA, SOPORTADA MEDIANTE POSTES PARA CERCA DE 2,50 M DE LONGITUD, DISPUESTOS CADA 2,50 M. INCLUYE POSTES O ELEMENTOS DE SOPORTE, TENSADO, AMARRES, SUMINISTRO DE MATERIALES, TRANSPORTE, INSTALACIÓN Y TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y ESTABILIDAD. ASIMISMO, INCLUYE EL DESMONTAJE, RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL DEL CERRAMIENTO UNA VEZ FINALIZADOS LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO OBJETO DEL CONTRATO. | 0.00 | 15.00 | $ 450,000.00 | 0.00 | | $ 0.00 | 15.00 | $ 450,000.00 |
| 25 | B1B.2 | DEMOLICIÓN MUROS EN MAMPOSTERÍA 0.15 M (INCLUYE CARGUE, ENLONADO Y RETIRO DE MATERIAL FUERA DE LAS INSTALACIONES). | -13.00 | | $ 0.00 | -13.00 | 12.00 | $ 290,076.00 | 12.00 | $ 290,076.00 |
| 26 | B1B.3 | DEMOLICIÓN PLACA PISO 0.20 M (INCLUYE CARGUE, ENLONADO Y RETIRO DE MATERIAL FUERA DE LAS INSTALACIONES). | -13.00 | | $ 0.00 | -13.00 | 25.00 | $ 1,024,725.00 | 25.00 | $ 1,024,725.00 |
| 27 | B1B.4 | DEMOLICIÓN ENCHAPE DE PISOS (INCLUYE DEMOLICIÓN DE GUARDAESCOBA, INCLUYE CARGUE, ENLONADO Y RETIRO DE MATERIAL FUERA DE LAS INSTALACIONES). | 0.00 | 38.00 | $ 718,884.00 | 0.00 | | $ 0.00 | 38.00 | $ 718,884.00 |
| 28 | B1B.5 | DEMOLICIÓN ENCHAPE DE PARED (INCLUYE CARGUE, ENLONADO Y RETIRO DE MATERIAL FUERA DE LAS INSTALACIONES). | -8.98 | 96.02 | $ 1,917,423.38 | -8.98 | | $ 0.00 | 96.02 | $ 1,917,423.38 |
| 29 | B1B.6 | DESMONTE DIVISIONES EXISTENTES (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE MATERIAL FUERA DE LAS INSTALACIONES). | -3.05 | 26.95 | $ 424,866.75 | -3.05 | | $ 0.00 | 26.95 | $ 424,866.75 |

CONTINUACIÓN ACTA RADICADO No. 2026923017026536/ (ACTA DE OBRA N. 002) DE RECIBO PARCIAL CORRESPONDIENTE AL CONTRATO 273-CELIC-2026, CUYO OBJETO ES, MANTENIMIENTO, Y/O REMODELACIÓN DE LAS INSTALACIONES DE LOS LICEOS: LICEO SANTA BARBARA UBICADO EN LA CIUDAD DE BOGOTA, FRANCISCO JOSE DE CALDAS UBICADO EN LA BASE MILITAR DE TOLEMAIDA NILO CUNDINAMARCA, LICEO GENERAL GUSTAVO MATAMOROS LEON UBICADO EN LA CIUDAD DE YOPAL, LICEO GENERAL SERVIEZ UBICADO EN LA CIUDAD DE VILLAVICENCIO Y LICEO PICHINCHA UBICADO EN LA CIUDAD DE CALI.

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | B1B.7 | DESMONTE APARATOS SANITARIOS Y LAVAMANOS (INCLUYE CARGUE Y RETIRO FUERA DE LAS INSTALACIONES). | -1.00 | 19.00 | $ 698,915.00 | -1.00 | | $ 0.00 | 19.00 | $ 698,915.00 |
| 31 | B1B.8 | DESMONTE ESPEJO EXISTENTE (INCLUYE CARGUE Y RETIRO FUERA DE LAS INSTALACIONES). | -0.69 | 7.31 | $ 87,720.00 | -0.69 | | $ 0.00 | 7.31 | $ 87,720.00 |
| 32 | B1B.9 | DEMOLICIÓN MESÓN EXISTENTE (INCLUYE CARGUE Y RETIRO FUERA DE LAS INSTALACIONES). | -435.88 | 8.12 | $ 121,800.00 | -435.88 | | $ 0.00 | 8.12 | $ 121,800.00 |
| 33 | B1B.10 | PAÑETE LISO MUROS 1:3 INTERIOR INCLUYE REMATES, FILOS, CANTOS Y ELEMENTOS LINEALES, DILATACIONES SIN PAGO ADICIONAL. | 0.00 | | $ 0.00 | 0.00 | 45.98 | $ 1,471,400.00 | 45.98 | $ 1,471,400.00 |
| Subtotal | | | | | **$ 4,419,609.13** | | | **$ 2,786,201.00** | | **$ 7,205,810.13** |
| **B2B** | **PISOS Y ENCHAPES** | | | | | | | | | |
| 34 | B2B.1 | ALISTADO ENDURECIDO 1:3, E=0.04 | 0.00 | | $ 0.00 | 0.00 | 38.00 | $ 2,166,000.00 | 38.00 | $ 2,166,000.00 |
| 35 | B2B.2 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN CERÁMICA PISO TRÁFICO 5, CALIDAD PRIMERA (FORMATO 45X45). | 0.00 | | $ 0.00 | 0.00 | 38.00 | $ 3,714,234.00 | 38.00 | $ 3,714,234.00 |
| 36 | B2B.3 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN BALDOSA CERÁMICA PARED CALIDAD PRIMERA (FORMATO 30X45 COLOR BLANCO MATE, INCLUYE CORTES, FILOS, BORDES, REMATES Y LA EJECUCIÓN DE FRANJAS O ÁREAS CON DIMENSIÓN MENOR A 0.50 m, INCLUYE DESPERDICIOS, CORTES ESPECIALES Y AJUSTES NECESARIOS SIN RECONOCIMIENTO ADICIONAL). | -5.67 | | $ 0.00 | -5.67 | 99.33 | $ 8,873,645.55 | 99.33 | $ 8,873,645.55 |
| 37 | B2B.4 | PLACA BASE CONCRETO 0.10 2500 PSI. | 9.00 | | $ 0.00 | 9.00 | 24.00 | $ 1,891,800.00 | 24.00 | $ 1,891,800.00 |
| 38 | B2B.5 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MESÓN EN QUARZTONE. | -8.00 | | $ 0.00 | -8.00 | | $ 0.00 | 0.00 | $ 0.00 |
| Subtotal | | | | | **$ 0.00** | | | **$ 16,645,679.55** | | **$ 16,645,679.55** |
| **B3B** | **CARPINTERÍA METÁLICA Y/O ESTRUCTURA METÁLICA** | | | | | | | | | |
| 39 | B3B.1 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DIVISIÓN PARA BAÑO EN ACERO INOXIDABLE 304 CAL.20 (INCLUYE PUERTAS Y ACCESORIOS). | -24.00 | | $ 0.00 | -24.00 | | $ 0.00 | 0.00 | $ 0.00 |
| 40 | B3B.2 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN VIDRIO DE 4MM SANDBLASTING. | -24.00 | | $ 0.00 | -24.00 | | $ 0.00 | 0.00 | $ 0.00 |
| 41 | B3B.3 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN ESPEJO INCOLORO 4 MM . | -7.00 | | $ 0.00 | -7.00 | | $ 0.00 | 0.00 | $ 0.00 |
| 42 | B3B.4 | LIJADA Y PINTADA MARCO DE VENTANA EXISTENTE INCLUYENDO PARALES (PINTURA ANTICORROSIVA). | -10.00 | | $ 0.00 | -10.00 | | $ 0.00 | 0.00 | $ 0.00 |
| Subtotal | | | | | **$ 0.00** | | | **$ 0.00** | | **$ 0.00** |
| **B4B** | **CIELO RASO** | | | | | | | | | |
| 43 | B4B.1 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CIELO RASO EN LÁMINA PVC 7 MM (INCLUYE PERFILERÍA DE SOPORTE, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, REMATE PERIMETRAL TIPO CORNISA, NIVELACIÓN Y ACABADO FINAL) INCLUYE REMATES, FILOS, CANTOS Y ELEMENTOS LINEALES, SIN PAGO ADICIONAL. | 0.00 | | $ 0.00 | 0.00 | 38.00 | $ 2,795,660.00 | 38.00 | $ 2,795,660.00 |
| Subtotal | | | | | **$ 0.00** | | | **$ 2,795,660.00** | | **$ 2,795,660.00** |
| **B5B** | **ELECTRICO** | | | | | | | | | |

CONTINUACIÓN ACTA RADICADO No. 2026923017026536/ (ACTA DE OBRA N. 002) DE RECIBO PARCIAL CORRESPONDIENTE AL CONTRATO 273-CELIC-2026, CUYO OBJETO ES, MANTENIMIENTO, Y/O REMODELACIÓN DE LAS INSTALACIONES DE LOS LICEOS: LICEO SANTA BARBARA UBICADO EN LA CIUDAD DE BOGOTA, FRANCISCO JOSE DE CALDAS UBICADO EN LA BASE MILITAR DE TOLEMAIDA NILO CUNDINAMARCA, LICEO GENERAL GUSTAVO MATAMOROS LEON UBICADO EN LA CIUDAD DE YOPAL, LICEO GENERAL SERVIEZ UBICADO EN LA CIUDAD DE VILLAVICENCIO Y LICEO PICHINCHA UBICADO EN LA CIUDAD DE CALI.

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | B5B.1 | DESMONTE DE ELEMENTOS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS EXISTENTES (LUMINARIAS, CÁMARAS, SENSORES Y EQUIPOS SIMILARES). (INCLUYE DESCONEXIÓN SEGURA, CARGUE, RETIRO Y DISPOSICIÓN). | -7.00 | | $ 0.00 | -7.00 | | $ 0.00 | 0.00 | $ 0.00 |
| 45 | B5B.2 | SALIDA ILUMINACIÓN DESCOLGADA EN TUBERÍA PVC CONDUIT 1/2", ALAMBRE NO 12 AWG PROM 3 M" (INCLUYE CASIAS, ACCESORIOS E INSTALACIÓN COMPLETA OPERATIVA). | -7.00 | | $ 0.00 | -7.00 | | $ 0.00 | 0.00 | $ 0.00 |
| 46 | B5B.3 | SALIDA TOMA ELÉCTRICA, INCLUYE REGATA, APARATO, CAJA 5800, TUBERÍA, ALAMBRE DE COBRE THW 12 AWG. ADAPTADORES. L HASTA 4,5 ML. | -6.00 | | $ 0.00 | -6.00 | | $ 0.00 | 0.00 | $ 0.00 |
| 47 | B5B.4 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIAS BALA LED ( INCLUYE APERTURA DE CIELO RASO Y CONEXIÓN ELECTRICA) . | -7.00 | | $ 0.00 | -7.00 | | $ 0.00 | 0.00 | $ 0.00 |
| Subtotal | | | | | **$ 0.00** | | | **$ 0.00** | | **$ 0.00** |
| **B6B** | **INSTALACIONES HIDRAULICAS Y SANITARIAS** | | | | | | | | | |
| 48 | B6B.1 | PUNTO HIDRÁULICO PVC-P/PARAL 1/2". | 0.00 | | $ 0.00 | 0.00 | 12.00 | $ 1,299,036.00 | 12.00 | $ 1,299,036.00 |
| 49 | B6B.2 | SALIDA SANITARIA PVC-S/PARAL 4". | -2.00 | | $ 0.00 | -2.00 | 4.00 | $ 580,152.00 | 4.00 | $ 580,152.00 |
| 50 | B6B.3 | REGISTRO 1/2". | -2.00 | | $ 0.00 | -2.00 | 2.00 | $ 180,772.00 | 2.00 | $ 180,772.00 |
| 51 | B6B.4 | SALIDA SANITARIA PVC-S/PARAL 2". | 8.00 | | $ 0.00 | 8.00 | 14.00 | $ 1,589,112.00 | 14.00 | $ 1,589,112.00 |
| 52 | B6B.5 | RED SANITARIA PVC-S 4". | 0.00 | | $ 0.00 | 0.00 | 25.00 | $ 1,812,975.00 | 25.00 | $ 1,812,975.00 |
| 53 | B6B.6 | RED SUMINISTRO PVC 1/2". | 0.00 | | $ 0.00 | 0.00 | 25.00 | $ 367,850.00 | 25.00 | $ 367,850.00 |
| 54 | B6B.7 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN SANITARIO TANQUE (INCLUYE GRIFERÍA TIPO PUSH). | -6.00 | | $ 0.00 | -6.00 | 0.00 | $ 0.00 | 0.00 | $ 0.00 |
| 55 | B6B.8 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN LAVAMANOS DE EMPOTRAR(INCLUYE GRIFERÍA INSTITUCIONAL). | -10.00 | | $ 0.00 | -10.00 | 0.00 | $ 0.00 | 0.00 | $ 0.00 |
| 56 | B6B.9 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN ORINAL DE LLAVE (INCLUYE GRIFERÍA TIPO PUCH) . | -4.00 | | $ 0.00 | -4.00 | 0.00 | $ 0.00 | 0.00 | $ 0.00 |
| 57 | B6B.10 | CAJA DE INSPECCIÓN DE 60X60. | -1.00 | | $ 0.00 | -1.00 | 1.00 | $ 404,635.00 | 1.00 | $ 404,635.00 |
| 58 | B6B.11 | SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURA EN CONCRETO REFORZADO PARA SOPORTE DE TANQUE ELEVADO (INCLUYE EXCAVACIÓN, CIMENTACIÓN, COLUMNAS, VIGAS, PLACA DE APOYO, ACERO DE REFUERZO, CONCRETO, FORMALETA, TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE 1.000 LITROS, BOMBA ELÉCTRICA DE 0,5 HP, ACCESORIOS, CONEXIONES HIDRÁULICAS Y ELÉCTRICAS NECESARIAS, PRUEBAS Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO). | -1.00 | | $ 0.00 | -1.00 | | $ 0.00 | 0.00 | $ 0.00 |
| Subtotal | | | | | **$ 0.00** | | | **$ 6,234,532.00** | | **$ 6,234,532.00** |
| **B7B** | **ASEO BAÑOS** | | | | | | | | | |
| 59 | B7B.1 | ASEO GENERAL | -38.00 | | $ 0.00 | -38.00 | | $ 0.00 | 0.00 | $ 0.00 |
| Subtotal | | | | | **$ 0.00** | | | **$ 0.00** | | **$ 0.00** |
| Subtotal LICEO FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS - TOLEMAIDA | | | | | $ 4,419,609.13 | | | $ 28,462,072.55 | | $ 32,881,681.68 |
| **C- LICEO GUSTAVO MATAMOROS LEÓN - YOPAL (CAMBIO CUBIERTAS Y ACTUALIZACIÓN REDES DE ILUMINACIÓN BLOQUE SALÓN DE SISTEMAS)** | | | | | | | | | | |
| **C1C** | **PRELIMINARES** | | | | | | | | | |

CONTINUACIÓN ACTA RADICADO No. 2026923017026536/ (ACTA DE OBRA N. 002) DE RECIBO PARCIAL CORRESPONDIENTE AL CONTRATO 273-CELIC-2026, CUYO OBJETO ES, MANTENIMIENTO, Y/O REMODELACIÓN DE LAS INSTALACIONES DE LOS LICEOS: LICEO SANTA BARBARA UBICADO EN LA CIUDAD DE BOGOTA, FRANCISCO JOSE DE CALDAS UBICADO EN LA BASE MILITAR DE TOLEMAIDA NILO CUNDINAMARCA, LICEO GENERAL GUSTAVO MATAMOROS LEON UBICADO EN LA CIUDAD DE YOPAL, LICEO GENERAL SERVIEZ UBICADO EN LA CIUDAD DE VILLAVICENCIO Y LICEO PICHINCHA UBICADO EN LA CIUDAD DE CALI.

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60 | C1C.1 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERRAMIENTO PROVISIONAL EN TELA EN POLIPROPILENO VERDE DE 2,10 M DE ALTURA, SOPORTADA MEDIANTE POSTES PARA CERCA DE 2,50 M DE LONGITUD, DISPUESTOS CADA 2,50 M. INCLUYE POSTES O ELEMENTOS DE SOPORTE, TENSADO, AMARRES, SUMINISTRO DE MATERIALES, TRANSPORTE, INSTALACIÓN Y TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y ESTABILIDAD. ASIMISMO, INCLUYE EL DESMONTAJE, RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL DEL CERRAMIENTO UNA VEZ FINALIZADOS LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO OBJETO DEL CONTRATO. | 0.00 | 60.00 | $ 1,800,000.00 | 0.00 | 60.00 | $ 1,800,000.00 | 120.00 | $ 3,600,000.00 |
| 61 | C1C.2 | DESMONTE DE CUBIERTA EN FIBROCEMENTO, (INCLUYE PROTECCIÓN DE ÁREAS INFERIORES, ACOPIOS TEMPORALES, ENLONADO, CARGUE Y RETIRO DE MATERIAL DESMONTADO CON DISPOSICIÓN FINAL FUERA DE LAS INSTALACIONES EN SITIO AUTORIZADO). | 0.00 | 550.80 | $ 8,647,560.00 | 0.00 | 505.20 | $ 7,931,640.00 | 1,056.00 | $ 16,579,200.00 |
| 62 | C1C.3 | RETIRO DE CIELO RASO EXISTENTE, PERFILERÍA Y LÁMINAS (INCLUYE PROTECCIÓN DE ÁREAS INFERIORES, ACOPIOS TEMPORALES, ENLONADO, CARGUE Y RETIRO DE MATERIAL DESMONTADO CON DISPOSICIÓN FINAL FUERA DE LAS INSTALACIONES EN SITIO AUTORIZADO). | 0.00 | 550.80 | $ 6,609,600.00 | 0.00 | 591.20 | $ 7,094,400.00 | 1,142.00 | $ 13,704,000.00 |
| 63 | C1C.4 | DESMONTE ESTRUCTURA CUBIERTA EXISTENTE (CERCHAS Y DEMAS ELEMENTOS ESTRUCTURALES PRINCIPALES). | -984.31 | | $ 0.00 | -984.31 | 71.69 | $ 752,745.00 | 71.69 | $ 752,745.00 |
| Subtotal | | | | | **$ 17,057,160.00** | | | **$ 17,578,785.00** | | **$ 34,635,945.00** |
| **C2C** | **CUBIERTA** | | | | | | | | | |
| 64 | C2C.1 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN TEJA SIN TRASLAPO - TST STANDING SEAM 450MM DE 2", FABRICADA EN LÁMINA DE ACERO GALVANIZADO Z 180 PREPINTADO SUPER POLIÉSTER . INCLUYE REMATES, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, SELLANTES, (TORNILLERIA OCULTA Y SISTEMA DE FIJACIÓN, SELLANTES Y REMATES, CUMBRERAS, BABEROS Y TAPAJUNTAS, INSTALACIÓN Y TRANSPORTE) INCLUYE REMATES, FILOS, CANTOS Y ELEMENTOS LINEALES, SIN PAGO ADICIONAL. | 0.00 | | $ 0.00 | 0.00 | 1,056.00 | $ 88,176,000.00 | 1,056.00 | $ 88,176,000.00 |
| 65 | C2C.2 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CIELO RASO EN LÁMINA PVC 7 MM (INCLUYE PERFILERÍA DE SOPORTE, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, REMATE PERIMETRAL TIPO CORNISA, NIVELACIÓN Y ACABADO FINAL) INCLUYE REMATES, FILOS, CANTOS Y ELEMENTOS LINEALES, SIN PAGO ADICIONAL. | 0.00 | | $ 0.00 | 0.00 | 511.00 | $ 37,594,270.00 | 511.00 | $ 37,594,270.00 |
| Subtotal | | | | | **$ 0.00** | | | **$ 125,770,270.00** | | **$ 125,770,270.00** |
| **C3C** | **ELECTRICO** | | | | | | | | | |
| 66 | C3C.1 | DESMONTE DE ELEMENTOS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS EXISTENTES (LUMINARIAS, CÁMARAS, SENSORES Y EQUIPOS SIMILARES). (INCLUYE DESCONEXIÓN SEGURA, CARGUE, RETIRO Y DISPOSICIÓN). | 0.00 | 35.00 | $ 551,775.00 | 0.00 | 35.00 | $ 551,775.00 | 70.00 | $ 1,103,550.00 |

CONTINUACIÓN ACTA RADICADO No. 2026923017026536/ (ACTA DE OBRA N. 002) DE RECIBO PARCIAL CORRESPONDIENTE AL CONTRATO 273-CELIC-2026, CUYO OBJETO ES, MANTENIMIENTO, Y/O REMODELACIÓN DE LAS INSTALACIONES DE LOS LICEOS: LICEO SANTA BARBARA UBICADO EN LA CIUDAD DE BOGOTA, FRANCISCO JOSE DE CALDAS UBICADO EN LA BASE MILITAR DE TOLEMAIDA NILO CUNDINAMARCA, LICEO GENERAL GUSTAVO MATAMOROS LEON UBICADO EN LA CIUDAD DE YOPAL, LICEO GENERAL SERVIEZ UBICADO EN LA CIUDAD DE VILLAVICENCIO Y LICEO PICHINCHA UBICADO EN LA CIUDAD DE CALI.

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 67 | C3C.2 | SALIDA ILUMINACIÓN DESCOLGADA EN TUBERÍA PVC CONDUIT 1/2", ALAMBRE NO 12 AWG PROM 3 M" (INCLUYE CAJAS, ACCESORIOS E INSTALACIÓN COMPLETA OPERATIVA, PARA INTERIOR Y PARA EXTERIOR). | 0.00 | | $ 0.00 | 0.00 | 59.00 | $ 5,890,855.00 | 59.00 | $ 5,890,855.00 |
| 68 | C3C.3 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR ENCHUFABLE 1X30A. CALIDAD LEGRAND, SIEMENS, SQARE D O SUPERIOR DE MARCA RECONOCIDA Y HOMOLOGADA POR EL CIDET (INCLUYE CAJA, CONEXIÓN Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO). | 0.00 | | $ 0.00 | 0.00 | 13.00 | $ 888,095.00 | 13.00 | $ 888,095.00 |
| 69 | C3C.4 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN PANEL LED CUADRADO 60 X 60 52W, INCLUYE GUAYAS DE COLGAR Y DEMÁS ELEMENTOS PARA SU PERFECTA INSTALACIÓN. | 0.00 | | $ 0.00 | 0.00 | 22.00 | $ 3,352,690.00 | 22.00 | $ 3,352,690.00 |
| 70 | C3C.5 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIAS BALA LED ( INCLUYE APERTURA DE CIELO RASO Y CONEXIÓN ELECTRICA) - | -15.00 | | $ 0.00 | -15.00 | 12.00 | $ 540,000.00 | 12.00 | $ 540,000.00 |
| 71 | C3C.6 | SALIDA TOMA ELÉCTRICA, INCLUYE REGATA, APARATO, CAJA 5800, TUBERÍA, ALAMBRE DE COBRE THW 12 AWG. ADAPTADORES. L HASTA 4,5 ML | 0.00 | | $ 0.00 | 0.00 | 13.00 | $ 2,186,080.00 | 13.00 | $ 2,186,080.00 |
| 72 | C3C.7 | LUMINARIA PARA EXTERIOR. | 0.00 | | $ 0.00 | 0.00 | 7.00 | $ 700,000.00 | 7.00 | $ 700,000.00 |
| 73 | C3C.8 | REINSTALACIÓN DE EQUIPOS ELÉCTRICOS, ELECTRÓNICOS Y DE COMUNICACIONES EXISTENTES, INCLUYENDO DESMONTE TEMPORAL CUANDO APLIQUE, ALMACENAMIENTO, REUBICACIÓN, INSTALACIÓN, CONEXIÓN, FIJACIÓN, CONFIGURACIÓN BÁSICA Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO. | 0.00 | | $ 0.00 | 0.00 | 10.00 | $ 520,000.00 | 10.00 | $ 520,000.00 |
| Subtotal | | | | | **$ 551,775.00** | | | **$ 14,629,495.00** | | **$ 15,181,270.00** |
| **C4C** | **CARPINTERÍA METÁLICA Y/O ESTRUCTURA METÁLICA** | | | | | | | | | |
| 74 | C4C.1 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REFUERZO EN PERFIL METÁLICO CAL 14 Y/O 16 (ELABORACIÓN DE CERCHAS CUANDO APLIQUE DISEÑO ESTRUCTURAL Y PLANOS, INSTALACIÓN DE CORREAS, INCLUYE FABRICACIÓN, TRANSPORTE, MONTAJE, SOLDADURA, TRATAMIENTO ANTICORROSIVO, PINTURA EN ESMALTE, PERNOS Y ANCLAJES DE ELEMENTOS DE FIJACIÓN). | 0.00 | 3,882.24 | $ 83,033,349.12 | 0.00 | 3,580.76 | $ 76,585,294.88 | 7,463.00 | $ 159,618,644.00 |
| Subtotal | | | | | **$ 83,033,349.12** | | | **$ 76,585,294.88** | | **$ 159,618,644.00** |
| **C5C** | **AGUAS LLUVIAS** | | | | | | | | | |
| 75 | C5C.1 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANAL EN LÁMINA GALVANIZADA CAL. 22; DS=70 CON ELEMENTOS DE FIJACIÓN (INCLUYE FABRICACIÓN, SOPORTES METÁLICOS CADA 1.20m, PENDIENTE MÍNIMA DEL 1%, UNIONES SELLADAS, FIJACIÓN A ESTRUCTURA, INSTALACIÓN COMPLETA, TAPAS Y SOSCOS). | -186.00 | | $ 0.00 | -186.00 | | $ 0.00 | 0.00 | $ 0.00 |
| 76 | C5C.2 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BAJANTES EN PVC AGUAS LLUVIAS D=6" (INCLUYE ACCESORIOS COMO CODOS Y UNIONES, ANCLAJES Y CONEXIÓN A RED EXISTENTE). | -39.00 | | $ 0.00 | -39.00 | | $ 0.00 | 0.00 | $ 0.00 |
| Subtotal | | | | | **$ 0.00** | | | | | **$ 0.00** |
| **C6C** | **NIVELACIÓN CUBIERTA** | | | | | | | | | |

CONTINUACIÓN ACTA RADICADO No. 2026923017026536/ (ACTA DE OBRA N. 002) DE RECIBO PARCIAL CORRESPONDIENTE AL CONTRATO 273-CELIC-2026, CUYO OBJETO ES, MANTENIMIENTO, Y/O REMODELACIÓN DE LAS INSTALACIONES DE LOS LICEOS: LICEO SANTA BARBARA UBICADO EN LA CIUDAD DE BOGOTA, FRANCISCO JOSE DE CALDAS UBICADO EN LA BASE MILITAR DE TOLEMAIDA NILO CUNDINAMARCA, LICEO GENERAL GUSTAVO MATAMOROS LEON UBICADO EN LA CIUDAD DE YOPAL, LICEO GENERAL SERVIEZ UBICADO EN LA CIUDAD DE VILLAVICENCIO Y LICEO PICHINCHA UBICADO EN LA CIUDAD DE CALI.

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 77 | C6C.1 | MURO EN BLOQUE Nº 4 E = 0.10 m (NIVELACIÓN DE CUBIERTAS) INCLUYE FILOS, ENCUENTROS, REMATES Y AJUSTES PROPIOS DE LA MODULACIÓN DEL MURO, SIN PAGO ADICIONAL. | 0.00 | | $ 0.00 | 0.00 | 20.00 | $ 1,200,000.00 | 20.00 | $ 1,200,000.00 |
| 78 | C6C.2 | PAÑETE LISO MUROS 1:3 INTERIOR INCLUYE REMATES, FILOS, CANTOS Y ELEMENTOS LINEALES, DILATACIONES SIN PAGO ADICIONAL. | -36.00 | | $ 0.00 | -36.00 | 4.00 | $ 128,000.00 | 4.00 | $ 128,000.00 |
| 79 | C6C.3 | ESTUCO PLASTICO SOBRE MURO PAÑETADO INCLUYE REMATES, FILOS, CANTOS Y ELEMENTOS LINEALES, SIN PAGO ADICIONAL. | 0.00 | | $ 0.00 | 0.00 | 20.00 | $ 560,000.00 | 20.00 | $ 560,000.00 |
| 80 | C6C.4 | PINTURA EN VINILO TIPO 2 SOBRE MURO ESTUCADO INCLUYE REMATES, FILOS, CANTOS Y ELEMENTOS LINEALES, SIN PAGO ADICIONAL. | 0.00 | | $ 0.00 | 0.00 | 20.00 | $ 360,000.00 | 20.00 | $ 360,000.00 |
| | | | | | **$ 0.00** | | | **$ 2,248,000.00** | | **$ 2,248,000.00** |
| **C7C** | **ASEO** | | | | | | | | | |
| 81 | C7C.1 | ASEO GENERAL | 0.00 | | $ 0.00 | 0.00 | 1,056.00 | $ 4,118,400.00 | 1,056.00 | $ 4,118,400.00 |
| Subtotal | | | | | **$ 0.00** | | | **$ 4,118,400.00** | | **$ 4,118,400.00** |
| Subtotal LICEO GUSTAVO MATAMOROS LEÓN - YOPAL | | | | | **$ 100,642,284.12** | | | **$ 240,930,244.88** | | **$ 341,572,529.00** |
| **D- LICEO GENERAL SERVIEZ - VILLAVICENCIO (CAMBIO CUBIERTA POLICARBONATO PASARELAS EXTERIOR / REMODELACIÓN BAÑOS PREESCOLAR)** | | | | | | | | | | |
| **D- CAMBIO CUBIERTAS POLICARBONATO** | | | | | | | | | | |
| **D1C** | **PRELIMINARES** | | | | | | | | | |
| 82 | D1C.1 | DESMONTE CUBIERTA EN POLICARBONATO EXISTENTE, (INCLUYE ESTRUCTURA EXISTENTE (CORREAS), PROTECCIÓN DE ÁREAS INFERIORES, ACOPIOS TEMPORALES, ENLONADO, CARGUE Y RETIRO DE MATERIAL DESMONTADO CON DISPOSICIÓN FINAL FUERA DE LAS INSTALACIONES EN SITIO AUTORIZADO). | 0.00 | 494.00 | $ 8,398,000.00 | 0.00 | | $ 0.00 | 494.00 | $ 8,398,000.00 |
| Subtotal | | | | | **$ 8,398,000.00** | | | | | **$ 8,398,000.00** |
| **D2C** | **CUBIERTA PASARELAS** | | | | | | | | | |
| 83 | D2C.1 | LIJADA Y PINTADA ESTRUCTURA EXISTENTE INCLUYENDO PARALES (PINTURA ANTICORRSOCIVA). | -494.00 | | $ 0.00 | -494.00 | | $ 0.00 | 0.00 | $ 0.00 |
| 84 | D2C.2 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN TEJA SIN TRASLAPO - TST STANDING SEAM 450MM DE 2", FABRICADA EN LÁMINA DE ACERO GALVANIZADO Z 180 PREPINTADO SUPER POLIÉSTER . INCLUYE REMATES, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, SELLANTES, (TORNILLERIA OCULTA Y SISTEMA DE FIJACIÓN, SELLANTES Y REMATES, CUMBRERAS, BABEROS Y TAPAJUNTAS, INSTALACIÓN Y TRANSPORTE) INCLUYE REMATES, FILOS, CANTOS Y ELEMENTOS LINEALES, SIN PAGO ADICIONAL. | -494.00 | | $ 0.00 | -494.00 | | $ 0.00 | 0.00 | $ 0.00 |
| 85 | D2C.3 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANAL EN LÁMINA GALVANIZADA CAL. 22; DS=70 CON ELEMENTOS DE FIJACIÓN (INCLUYE FABRICACIÓN, SOPORTES METÁLICOS CADA 1.20m, PENDIENTE MÍNIMA DEL 1%, UNIONES SELLADAS, FIJACIÓN A ESTRUCTURA, INSTALACIÓN COMPLETA, TAPAS Y SOSCOS). | -309.00 | | $ 0.00 | -309.00 | | $ 0.00 | 0.00 | $ 0.00 |
| 86 | D2C.4 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN FLANCHE EN LÁMINA GALVANIZADA, D: 30CM CAIBRE 26. INCLUYE PINTURA Y SELLOS. | -48.00 | | $ 0.00 | -48.00 | | $ 0.00 | 0.00 | $ 0.00 |

CONTINUACIÓN ACTA RADICADO No. 2026923017026536/ (ACTA DE OBRA N. 002) DE RECIBO PARCIAL CORRESPONDIENTE AL CONTRATO 273-CELIC-2026, CUYO OBJETO ES, MANTENIMIENTO, Y/O REMODELACIÓN DE LAS INSTALACIONES DE LOS LICEOS: LICEO SANTA BARBARA UBICADO EN LA CIUDAD DE BOGOTA, FRANCISCO JOSE DE CALDAS UBICADO EN LA BASE MILITAR DE TOLEMAIDA NILO CUNDINAMARCA, LICEO GENERAL GUSTAVO MATAMOROS LEON UBICADO EN LA CIUDAD DE YOPAL, LICEO GENERAL SERVIEZ UBICADO EN LA CIUDAD DE VILLAVICENCIO Y LICEO PICHINCHA UBICADO EN LA CIUDAD DE CALI.

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 87 | D2C.5 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN BAJANTES METÁLICAS INCLUYE PINTURA. | -168.00 | | $ 0.00 | -168.00 | | $ 0.00 | 0.00 | $ 0.00 |
| Subtotal | | | | | **$ 0.00** | | | **$ 0.00** | | **$ 0.00** |
| **D3C** | **CARPINTERÍA METÁLICA Y/O ESTRUCTURA METÁLICA** | | | | | | | | | |
| 88 | D3C.1 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REFUERZO EN PERFIL METÁLICO CAL 14 Y/O 16 (ELABORACIÓN DE CERCHAS CUANDO APLIQUE DISEÑO ESTRUCTURAL Y PLANOS, INSTALACIÓN DE CORREAS, INCLUYE FABRICACIÓN, TRANSPORTE, MONTAJE, SOLDADURA, TRATAMIENTO ANTICORROSIVO, PINTURA EN ESMALTE, PERNOS Y ANCLAJES DE ELEMENTOS DE FIJACIÓN). | 0.00 | 1,617.60 | $ 34,597,228.80 | 0.00 | 1,841.40 | $ 39,383,863.20 | 3,459.00 | $ 73,981,092.00 |
| Subtotal | | | | | **$ 34,597,228.80** | | | **$ 39,383,863.20** | | **$ 73,981,092.00** |
| **D-REMODELACIÓN BAÑOS PRIMARIA** | | | | | | | | | | |
| **D1B** | **PRELIMINARES** | | | | | | | | | |
| 89 | D1B.1 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERRAMIENTO PROVISIONAL EN TELA EN POLIPROPILENO VERDE DE 2,10 M DE ALTURA, SOPORTADA MEDIANTE POSTES PARA CERCA DE 2,50 M DE LONGITUD, DISPUESTOS CADA 2,50 M. INCLUYE POSTES O ELEMENTOS DE SOPORTE, TENSADO, AMARRES, SUMINISTRO DE MATERIALES, TRANSPORTE, INSTALACIÓN Y TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y ESTABILIDAD. ASIMISMO, INCLUYE EL DESMONTAJE, RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL DEL CERRAMIENTO UNA VEZ FINALIZADOS LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO OBJETO DEL CONTRATO. | 0.00 | 15.00 | $ 450,000.00 | 0.00 | | $ 0.00 | 15.00 | $ 450,000.00 |
| 90 | D1B.2 | DEMOLICIÓN MUROS EN MAMPOSTERÍA 0.15 M (INCLUYE CARGUE, ENLONADO Y RETIRO DE MATERIAL FUERA DE LAS INSTALACIONES). | 0.00 | 2.00 | $ 48,346.00 | 0.00 | | $ 0.00 | 2.00 | $ 48,346.00 |
| 91 | D1B.3 | DEMOLICIÓN PLACA PISO 0.20 M (INCLUYE CARGUE, ENLONADO Y RETIRO DE MATERIAL FUERA DE LAS INSTALACIONES). | 0.00 | 1.00 | $ 40,989.00 | 0.00 | | $ 0.00 | 1.00 | $ 40,989.00 |
| 92 | D1B.4 | DEMOLICIÓN ENCHAPE DE PISOS (INCLUYE DEMOLICIÓN DE GUARDAESCOBA, INCLUYE CARGUE, ENLONADO Y RETIRO DE MATERIAL FUERA DE LAS INSTALACIONES). | 0.00 | 26.00 | $ 491,868.00 | 0.00 | | $ 0.00 | 26.00 | $ 491,868.00 |
| 93 | D1B.5 | DEMOLICIÓN ENCHAPE DE PARED (INCLUYE CARGUE, ENLONADO Y RETIRO DE MATERIAL FUERA DE LAS INSTALACIONES). | -0.94 | 53.06 | $ 1,059,555.14 | -0.94 | | $ 0.00 | 53.06 | $ 1,059,555.14 |
| 94 | D1B.6 | DESMONTE DIVISIONES EXISTENTES (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE MATERIAL FUERA DE LAS INSTALACIONES). | -0.94 | 12.06 | $ 190,125.90 | -0.94 | | $ 0.00 | 12.06 | $ 190,125.90 |
| 95 | D1B.7 | DESMONTE PUERTAS Y MARCOS EXISTENTES (INCLUYE CARGUE Y RETIRO FUERA DE LAS INSTALACIONES). | -11.00 | 1.00 | $ 36,750.00 | -11.00 | | $ 0.00 | 1.00 | $ 36,750.00 |
| 96 | D1B.8 | DESMONTE APARATOS SANITARIOS Y LAVAMANOS (INCLUYE CARGUE Y RETIRO FUERA DE LAS INSTALACIONES). | -3.00 | 12.00 | $ 441,420.00 | -3.00 | | $ 0.00 | 12.00 | $ 441,420.00 |
| 97 | D1B.9 | PAÑETE LISO MUROS 1:3 INTERIOR INCLUYE REMATES, FILOS, CANTOS Y ELEMENTOS LINEALES, DILATACIONES SIN PAGO ADICIONAL. | 0.00 | 18.39 | $ 588,480.00 | 0.00 | | $ 0.00 | 18.39 | $ 588,480.00 |
| Subtotal | | | | | **$ 3,347,534.04** | | | **$ 0.00** | | **$ 3,347,534.04** |

CONTINUACIÓN ACTA RADICADO No. 2026923017026536/ (ACTA DE OBRA N. 002) DE RECIBO PARCIAL CORRESPONDIENTE AL CONTRATO 273-CELIC-2026, CUYO OBJETO ES, MANTENIMIENTO, Y/O REMODELACIÓN DE LAS INSTALACIONES DE LOS LICEOS: LICEO SANTA BARBARA UBICADO EN LA CIUDAD DE BOGOTA, FRANCISCO JOSE DE CALDAS UBICADO EN LA BASE MILITAR DE TOLEMAIDA NILO CUNDINAMARCA, LICEO GENERAL GUSTAVO MATAMOROS LEON UBICADO EN LA CIUDAD DE YOPAL, LICEO GENERAL SERVIEZ UBICADO EN LA CIUDAD DE VILLAVICENCIO Y LICEO PICHINCHA UBICADO EN LA CIUDAD DE CALI.

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **D2B** | **PISOS Y ENCHAPES** | | | | | | | | | |
| 98 | D2B.1 | ALISTADO ENDURECIDO 1:3, E=0.04 | 0.00 | 26.00 | $ 1,502,930.00 | 0.00 | | $ 0.00 | 26.00 | $ 1,502,930.00 |
| 99 | D2B.2 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN CERÁMICA PISO TRÁFICO 5, CALIDAD PRIMERA (FORMATO 45X45). | 0.00 | | $ 0.00 | 0.00 | 26.00 | $ 2,541,318.00 | 26.00 | $ 2,541,318.00 |
| 100 | D2B.3 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN BALDOSA CERÁMICA PARED CALIDAD PRIMERA (FORMATO 30X45 COLOR BLANCO MATE, INCLUYE CORTES, FILOS, BORDES, REMATES Y LA EJECUCIÓN DE FRANJAS O ÁREAS CON DIMENSIÓN MENOR A 0.50 m, INCLUYE DESPERDICIOS, CORTES ESPECIALES Y AJUSTES NECESARIOS SIN RECONOCIMIENTO ADICIONAL). | -0.32 | | $ 0.00 | -0.32 | 59.68 | $ 5,331,512.80 | 59.68 | $ 5,331,512.80 |
| 101 | D2B.4 | PLACA BASE CONCRETO 0.10 2500 PSI. | -1.50 | | $ 0.00 | -1.50 | 0.50 | $ 39,412.50 | 0.50 | $ 39,412.50 |
| 102 | D2B.5 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MESÓN EN QUARZTONE. | -7.00 | | $ 0.00 | -7.00 | | $ 0.00 | 0.00 | $ 0.00 |
| 103 | D2B.6 | MURO EN BLOQUE Nº 4 E = 0.10 m INCLUYE FILOS, ENCUENTROS, REMATES Y AJUSTES PROPIOS DE LA MODULACIÓN DEL MURO, SIN PAGO ADICIONAL. | -5.00 | | $ 0.00 | -5.00 | 4.00 | $ 240,000.00 | 4.00 | $ 240,000.00 |
| 104 | D2B.7 | VINILO SOBRE PAÑETE DOS MANOS. | 0.00 | | $ 0.00 | 0.00 | 11.00 | $ 132,957.00 | 11.00 | $ 132,957.00 |
| Subtotal | | | | | **$ 1,502,930.00** | | | **$ 8,285,200.30** | | **$ 9,788,130.30** |
| **D3B** | **CARPINTERÍA METÁLICA Y/O ESTRUCTURA METÁLICA** | | | | | | | | | |
| 105 | D3B.1 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DIVISIÓN PARA BAÑO EN ACERO INOXIDABLE 304 CAL.20 (INCLUYE PUERTAS Y ACCESORIOS). | -19.00 | | $ 0.00 | -19.00 | | $ 0.00 | 0.00 | $ 0.00 |
| 106 | D3B.2 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN ESPEJO INCOLORO 4 MM . | -2.00 | | $ 0.00 | -2.00 | | $ 0.00 | 0.00 | $ 0.00 |
| 107 | D3B.3 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN MARCO PARA PUERTA EN LÁMINA CAL 18 -0.8 INCLUYE RESANE FINAL DEL VANO. | -1.00 | | $ 0.00 | -1.00 | | $ 0.00 | 0.00 | $ 0.00 |
| 108 | D3B.4 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUERTA EN LÁMINA CAL 18 INC. ANTICORROSIVO. | -3.00 | | $ 0.00 | -3.00 | | $ 0.00 | 0.00 | $ 0.00 |
| 109 | D3B.5 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN VENTANA REJILLA EN ALUMINIO. | 0.00 | | $ 0.00 | 0.00 | 1.00 | $ 406,000.00 | 1.00 | $ 406,000.00 |
| Subtotal | | | | | **$ 0.00** | | | **$ 406,000.00** | | **$ 406,000.00** |
| **D4B** | **CIELO RASO** | | | | | | | | | |
| 110 | D4B.1 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CIELO RASO EN LÁMINA PVC 7 MM (INCLUYE PERFILERÍA DE SOPORTE, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, REMATE PERIMETRAL TIPO CORNISA, NIVELACIÓN Y ACABADO FINAL) INCLUYE REMATES, FILOS, CANTOS Y ELEMENTOS LINEALES, SIN PAGO ADICIONAL. | -0.74 | | $ 0.00 | -0.74 | 26.27 | $ 1,932,683.90 | 26.27 | $ 1,932,683.90 |
| Subtotal | | | | | **$ 0.00** | | | **$ 1,932,683.90** | | **$ 1,932,683.90** |
| **D5B** | **ELECTRICO** | | | | | | | | | |
| 111 | D5B.1 | DESMONTE DE ELEMENTOS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS EXISTENTES (LUMINARIAS, CÁMARAS, SENSORES Y EQUIPOS SIMILARES). (INCLUYE DESCONEXIÓN SEGURA, CARGUE, RETIRO Y DISPOSICIÓN). | 0.00 | | $ 0.00 | 0.00 | 4.00 | $ 63,060.00 | 4.00 | $ 63,060.00 |

CONTINUACIÓN ACTA RADICADO No. 2026923017026536/ (ACTA DE OBRA N. 002) DE RECIBO PARCIAL CORRESPONDIENTE AL CONTRATO 273-CELIC-2026, CUYO OBJETO ES, MANTENIMIENTO, Y/O REMODELACIÓN DE LAS INSTALACIONES DE LOS LICEOS: LICEO SANTA BARBARA UBICADO EN LA CIUDAD DE BOGOTA, FRANCISCO JOSE DE CALDAS UBICADO EN LA BASE MILITAR DE TOLEMAIDA NILO CUNDINAMARCA, LICEO GENERAL GUSTAVO MATAMOROS LEON UBICADO EN LA CIUDAD DE YOPAL, LICEO GENERAL SERVIEZ UBICADO EN LA CIUDAD DE VILLAVICENCIO Y LICEO PICHINCHA UBICADO EN LA CIUDAD DE CALI.

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | D5B.2 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN PANEL LED CUADRADO 60 X 60 52W, INCLUYE GUAYAS DE COLGAR Y DEMÁS ELEMENTOS PARA SU PERFECTA INSTALACIÓN. | 0.00 | | $ 0.00 | 0.00 | 6.00 | $ 914,370.00 | 6.00 | $ 914,370.00 |
| Subtotal | | | | | **$ 0.00** | | | **$ 977,430.00** | | **$ 977,430.00** |
| **B6B** | **INSTALACIONES HIDRAULICAS Y SANITARIAS** | | | | | | | | | |
| 113 | D6B.1 | PUNTO HIDRÁULICO PVC-P/PARAL 1/2" | -2.00 | 14.00 | $ 1,515,542.00 | -2.00 | | $ 0.00 | 14.00 | $ 1,515,542.00 |
| 114 | D6B.2 | SALIDA SANITARIA PVC-S/PARAL 2" | 0.00 | 9.00 | $ 1,021,572.00 | 0.00 | | $ 0.00 | 9.00 | $ 1,021,572.00 |
| 115 | D6B.3 | RED SANITARIA PVC-S 4" | -7.00 | | $ 0.00 | -7.00 | | $ 0.00 | 0.00 | $ 0.00 |
| 116 | D6B.4 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN SANITARIO TANQUE (INCLUYE GRIFERÍA) | -1.00 | | $ 0.00 | -1.00 | | $ 0.00 | 0.00 | $ 0.00 |
| 117 | D6B.5 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN SANITARIO INFANTIL (INCLUYE GRIFERÍA) | -6.00 | | $ 0.00 | -6.00 | | $ 0.00 | 0.00 | $ 0.00 |
| 118 | D6B.6 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN LAVAMANOS INFANTILES (INCLUYE GRIFERÍA) | -4.00 | | $ 0.00 | -4.00 | | $ 0.00 | 0.00 | $ 0.00 |
| 119 | D6B.7 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN ORINAL INFANTIL (INCLUYE GRIFERÍA) | -4.00 | | $ 0.00 | -4.00 | | $ 0.00 | 0.00 | $ 0.00 |
| Subtotal | | | | | **$ 2,537,114.00** | | | **$ 0.00** | | **$ 2,537,114.00** |
| **D7B** | **ASEO** | | | | | | | | | |
| 120 | D7B.1 | ASEO GENERAL | -520.00 | | $ 0.00 | -520.00 | | $ 0.00 | 0.00 | $ 0.00 |
| Subtotal | | | | | **$ 0.00** | | | **$ 0.00** | | **$ 0.00** |
| Subtotal LICEO GENERAL SERVIEZ - VILLAVICENCIO | | | | | **$ 50,382,806.84** | | | **$ 50,985,177.40** | | **$ 101,367,984.24** |
| **E- LICEO PICHINCHA - CALI (CAMBIO CUBIERTA AULAS BLOQUE PRIMARIA Y ACTUALIZACIÓN REDES DE ILUMINACIÓN)** | | | | | | | | | | |
| **E1C** | **PRELIMINARES** | | | | | | | | | |
| 121 | E1C.1 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERRAMIENTO PROVISIONAL EN TELA EN POLIPROPILENO VERDE DE 2,10 M DE ALTURA, SOPORTADA MEDIANTE POSTES PARA CERCA DE 2,50 M DE LONGITUD, DISPUESTOS CADA 2,50 M. INCLUYE POSTES O ELEMENTOS DE SOPORTE, TENSADO, AMARRES, SUMINISTRO DE MATERIALES, TRANSPORTE, INSTALACIÓN Y TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y ESTABILIDAD. ASIMISMO, INCLUYE EL DESMONTAJE, RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL DEL CERRAMIENTO UNA VEZ FINALIZADOS LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO OBJETO DEL CONTRATO. | 0.00 | 120.00 | $ 3,600,000.00 | 0.00 | | $ 0.00 | 120.00 | $ 3,600,000.00 |
| 122 | E1C.2 | DESMONTE DE CUBIERTA EN FIBROCEMENTO, (INCLUYE PROTECCIÓN DE ÁREAS INFERIORES, ACOPIOS TEMPORALES, ENLONADO, CARGUE Y RETIRO DE MATERIAL DESMONTADO CON DISPOSICIÓN FINAL FUERA DE LAS INSTALACIONES EN SITIO AUTORIZADO). | -47.57 | 502.43 | $ 7,888,151.00 | -47.57 | | $ 0.00 | 502.43 | $ 7,888,151.00 |
| 123 | E1C.3 | RETIRO DE CIELO RASO EXISTENTE, PERFILERÍA Y LÁMINAS (INCLUYE PROTECCIÓN DE ÁREAS INFERIORES, ACOPIOS TEMPORALES, ENLONADO, CARGUE Y RETIRO DE MATERIAL DESMONTADO CON DISPOSICIÓN FINAL FUERA DE LAS INSTALACIONES EN SITIO AUTORIZADO). | 0.00 | 450.00 | $ 5,400,000.00 | 0.00 | | $ 0.00 | 450.00 | $ 5,400,000.00 |
| 124 | E1C.4 | DESMONTE ESTRUCTURA CUBIERTA EXISTENTE (CERCHAS Y DEMAS ELEMENTOS ESTRUCTURALES PRINCIPALES). | -47.57 | 502.43 | $ 5,275,515.00 | -47.57 | | $ 0.00 | 502.43 | $ 5,275,515.00 |

CONTINUACIÓN ACTA RADICADO No. 2026923017026536/ (ACTA DE OBRA N. 002) DE RECIBO PARCIAL CORRESPONDIENTE AL CONTRATO 273-CELIC-2026, CUYO OBJETO ES, MANTENIMIENTO, Y/O REMODELACIÓN DE LAS INSTALACIONES DE LOS LICEOS: LICEO SANTA BARBARA UBICADO EN LA CIUDAD DE BOGOTA, FRANCISCO JOSE DE CALDAS UBICADO EN LA BASE MILITAR DE TOLEMAIDA NILO CUNDINAMARCA, LICEO GENERAL GUSTAVO MATAMOROS LEON UBICADO EN LA CIUDAD DE YOPAL, LICEO GENERAL SERVIEZ UBICADO EN LA CIUDAD DE VILLAVICENCIO Y LICEO PICHINCHA UBICADO EN LA CIUDAD DE CALI.

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Subtotal | | | | | **$ 22,163,666.00** | | | **$ 0.00** | | **$ 22,163,666.00** |
| **E2C** | **CUBIERTA** | | | | | | | | | |
| 125 | E2C.1 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN TEJA SIN TRASLAPO - TST STANDING SEAM 450MM DE 2", FABRICADA EN LÁMINA DE ACERO GALVANIZADO Z 180 PREPINTADO SUPER POLIÉSTER . INCLUYE REMATES, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, SELLANTES, (TORNILLERIA OCULTA Y SISTEMA DE FIJACIÓN, SELLANTES Y REMATES, CUMBRERAS, BABEROS Y TAPAJUNTAS, INSTALACIÓN Y TRANSPORTE) INCLUYE REMATES, FILOS, CANTOS Y ELEMENTOS LINEALES, SIN PAGO ADICIONAL. | -98.60 | | $ 0.00 | -98.60 | 451.40 | $ 37,691,900.00 | 451.40 | $ 37,691,900.00 |
| 126 | E2C.2 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CIELO RASO EN LÁMINA PVC 7 MM (INCLUYE PERFILERÍA DE SOPORTE, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, REMATE PERIMETRAL TIPO CORNISA, NIVELACIÓN Y ACABADO FINAL) INCLUYE REMATES, FILOS, CANTOS Y ELEMENTOS LINEALES, SIN PAGO ADICIONAL. | -179.70 | | $ 0.00 | -179.70 | 220.30 | $ 16,207,471.00 | 220.30 | $ 16,207,471.00 |
| Subtotal | | | | | **$ 0.00** | | | **$ 53,899,371.00** | | **$ 53,899,371.00** |
| **E3C** | **ELECTRICO** | | | | | | | | | |
| 127 | E3C.1 | DESMONTE DE ELEMENTOS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS EXISTENTES (LUMINARIAS, CÁMARAS, SENSORES Y EQUIPOS SIMILARES). (INCLUYE DESCONEXIÓN SEGURA, CARGUE, RETIRO Y DISPOSICIÓN). | -7.00 | 33.00 | $ 520,245.00 | -7.00 | | $ 0.00 | 33.00 | $ 520,245.00 |
| 128 | E3C.2 | SALIDA ILUMINACIÓN DESCOLGADA EN TUBERÍA PVC CONDUIT 1/2", ALAMBRE NO 12 AWG PROM 3 M" (INCLUYE CAJAS, ACCESORIOS E INSTALACIÓN COMPLETA OPERATIVA, PARA INTERIOR Y PARA EXTERIOR). | -35.00 | | $ 0.00 | -35.00 | | $ 0.00 | 0.00 | $ 0.00 |
| 129 | E3C.3 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR ENCHUFABLE 1X30A. CALIDAD LEGRAND, SIEMENS, SQARE D O SUPERIOR DE MARCA RECONOCIDA Y HOMOLOGADA POR EL CIDET (INCLUYE CAJA, CONEXIÓN Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO). | -9.00 | | $ 0.00 | -9.00 | | $ 0.00 | 0.00 | $ 0.00 |
| 130 | E3C.4 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN PANEL LED CUADRADO 60 X 60 52W, INCLUYE GUAYAS DE COLGAR Y DEMÁS ELEMENTOS PARA SU PERFECTA INSTALACIÓN. | -35.00 | | $ 0.00 | -35.00 | | $ 0.00 | 0.00 | $ 0.00 |
| 131 | E3C.5 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIAS BALA LED ( INCLUYE APERTURA DE CIELO RASO Y CONEXIÓN ELECTRICA) - | -2.00 | | $ 0.00 | -2.00 | | $ 0.00 | 0.00 | $ 0.00 |
| 132 | E3C.6 | SALIDA TOMA ELÉCTRICA, INCLUYE REGATA, APARATO, CAJA 5800, TUBERÍA, ALAMBRE DE COBRE THW 12 AWG. ADAPTADORES. L HASTA 4,5 ML | -9.00 | | $ 0.00 | -9.00 | | $ 0.00 | 0.00 | $ 0.00 |
| 133 | E3C.7 | LUMINARIA PARA EXTERIOR. | -4.00 | | $ 0.00 | -4.00 | | $ 0.00 | 0.00 | $ 0.00 |
| 134 | E3C.8 | REINSTALACIÓN DE EQUIPOS ELÉCTRICOS, ELECTRÓNICOS Y DE COMUNICACIONES EXISTENTES, INCLUYENDO DESMONTE TEMPORAL CUANDO APLIQUE, ALMACENAMIENTO, REUBICACIÓN, INSTALACIÓN, CONEXIÓN, FIJACIÓN, CONFIGURACIÓN BÁSICA Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO. | -2.00 | | $ 0.00 | -2.00 | | $ 0.00 | 0.00 | $ 0.00 |
| Subtotal | | | | | **$ 520,245.00** | | | **$ 0.00** | | **$ 520,245.00** |

CONTINUACIÓN ACTA RADICADO No. 2026923017026536/ (ACTA DE OBRA N. 002) DE RECIBO PARCIAL CORRESPONDIENTE AL CONTRATO 273-CELIC-2026, CUYO OBJETO ES, MANTENIMIENTO, Y/O REMODELACIÓN DE LAS INSTALACIONES DE LOS LICEOS: LICEO SANTA BARBARA UBICADO EN LA CIUDAD DE BOGOTA, FRANCISCO JOSE DE CALDAS UBICADO EN LA BASE MILITAR DE TOLEMAIDA NILO CUNDINAMARCA, LICEO GENERAL GUSTAVO MATAMOROS LEON UBICADO EN LA CIUDAD DE YOPAL, LICEO GENERAL SERVIEZ UBICADO EN LA CIUDAD DE VILLAVICENCIO Y LICEO PICHINCHA UBICADO EN LA CIUDAD DE CALI.

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **E4C** | **CARPINTERÍA METÁLICA Y/O ESTRUCTURA METÁLICA** | | | | | | | | | |
| 135 | E4C.1 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REFUERZO EN PERFIL METÁLICO CAL 14 Y/O 16 (ELABORACIÓN DE CERCHAS CUANDO APLIQUE DISEÑO ESTRUCTURAL Y PLANOS, INSTALACIÓN DE CORREAS, INCLUYE FABRICACIÓN, TRANSPORTE, MONTAJE, SOLDADURA, TRATAMIENTO ANTICORROSIVO, PINTURA EN ESMALTE, PERNOS Y ANCLAJES DE ELEMENTOS DE FIJACIÓN). | 0.00 | 4,800.00 | $ 102,662,400.00 | 0.00 | | $ 0.00 | 4,800.00 | $ 102,662,400.00 |
| Subtotal | | | | | **$ 102,662,400.00** | 0.00 | | $ 0.00 | 0.00 | **$ 102,662,400.00** |
| **E5C** | **AGUAS LLUVIAS** | | | | | | | | | |
| 136 | E5C.1 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANAL EN LÁMINA GALVANIZADA CAL. 22; DS=70 CON ELEMENTOS DE FIJACIÓN (INCLUYE FABRICACIÓN, SOPORTES METÁLICOS CADA 1.20m, PENDIENTE MÍNIMA DEL 1%, UNIONES SELLADAS, FIJACIÓN A ESTRUCTURA, INSTALACIÓN COMPLETA, TAPAS Y SOSCOS). | -130.00 | | $ 0.00 | -130.00 | | $ 0.00 | 0.00 | $ 0.00 |
| 137 | E5C.2 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BAJANTES EN PVC AGUAS LLUVIAS D=6" (INCLUYE ACCESORIOS COMO CODOS Y UNIONES, ANCLAJES Y CONEXIÓN A RED EXISTENTE). | -39.00 | | $ 0.00 | -39.00 | | $ 0.00 | 0.00 | $ 0.00 |
| 138 | E5C.3 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN FLANCHE EN LÁMINA GALVANIZADA, D: 30CM CAIBRE 26. INCLUYE PINTURA Y SELLOS. | -20.00 | | $ 0.00 | -20.00 | | $ 0.00 | 0.00 | $ 0.00 |
| Subtotal | | | | | **$ 0.00** | | | **$ 0.00** | | **$ 0.00** |
| **E6C** | **NIVELACIÓN CUBIERTA** | | | | | | | | | |
| 139 | E6C.1 | MURO EN BLOQUE Nº 4 E = 0.10 m (NIVELACIÓN DE CUBIERTAS) INCLUYE FILOS, ENCUENTROS, REMATES Y AJUSTES PROPIOS DE LA MODULACIÓN DEL MURO, SIN PAGO ADICIONAL. | -15.00 | | $ 0.00 | -15.00 | | $ 0.00 | 0.00 | $ 0.00 |
| 140 | E6C.2 | PAÑETE LISO MUROS 1:3 INTERIOR INCLUYE REMATES, FILOS, CANTOS Y ELEMENTOS LINEALES, DILATACIONES SIN PAGO ADICIONAL. | -30.00 | | $ 0.00 | -30.00 | | $ 0.00 | 0.00 | $ 0.00 |
| Subtotal | | | | | **$ 0.00** | | | **$ 0.00** | | **$ 0.00** |
| **E7C** | **ASEO** | | | | | | | | | |
| 141 | E7C.1 | ASEO GENERAL | -500.00 | | $ 0.00 | -500.00 | | $ 0.00 | 0.00 | |
| Subtotal | | | | | **$ 0.00** | | | **$ 0.00** | | **$ 0.00** |
| Subtotal LICEO PICHINCHA - CALI | | | | | **$ 125,346,311.00** | | | **$ 53,899,371.00** | | **$ 179,245,682.00** |
| **SUBTOTAL OBRAS** | | | | | **$ 466,514,987.00** | | | **$ 492,500,390.00** | | **$ 959,015,377.00** |
| | | ADMINISTRACION | | | **$ 107,298,447.00** | | | **$ 113,275,090.00** | | **$ 220,573,537.00** |
| | | IMPREVISTOS | | | **$ 4,665,150.00** | | | **$ 4,925,004.00** | | **$ 9,590,154.00** |
| | | UTILIDAD | | | **$ 9,330,300.00** | | | **$ 9,850,008.00** | | **$ 19,180,308.00** |
| | | IVA SOBRE UTILIDAD | | | **$ 1,772,757.00** | | | **$ 1,871,502.00** | | **$ 3,644,259.00** |
| | | **VALOR TOTAL** | | | **$ 589,581,641.00** | | | **$ 622,421,994.00** | | **$ 1,212,003,635.00** |

CONTINUACIÓN ACTA RADICADO No. 2026923017026536/ (ACTA DE OBRA N. 002) DE RECIBO PARCIAL CORRESPONDIENTE AL CONTRATO 273-CELIC-2026, CUYO OBJETO ES, MANTENIMIENTO, Y/O REMODELACIÓN DE LAS INSTALACIONES DE LOS LICEOS: LICEO SANTA BARBARA UBICADO EN LA CIUDAD DE BOGOTA, FRANCISCO JOSE DE CALDAS UBICADO EN LA BASE MILITAR DE TOLEMAIDA NILO CUNDINAMARCA, LICEO GENERAL GUSTAVO MATAMOROS LEON UBICADO EN LA CIUDAD DE YOPAL, LICEO GENERAL SERVIEZ UBICADO EN LA CIUDAD DE VILLAVICENCIO Y LICEO PICHINCHA UBICADO EN LA CIUDAD DE CALI.

**NESTOR GILBERTO RODRIGUEZ ALVARADO**

NIT: 79351368- 8
Régimen: Responsable del impuesto sobre las ventas - IVA
Tipo de persona: Persona Natural
CR 46 #152-46 LC 276 CC MAZUREN, BOGOTÁ, D.C., Bogotá, Colombia
Tel. 3102447629
Email. nesrro@hotmail.com

| FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA | |
|---|---|
| No de Factura | FENR - 100 |
| Fecha Emisión | 11/11/2026 - 11:37:11 |
| Fecha Vencimiento | 11/12/2026 |
| Moneda | COP Peso colombiano |
| Fecha Firmado | 11/11/2026 11:37:12 |

**Autorización factura electrónica de venta No: 18764115196917 válida desde 2026-09-04 hasta 2027-03-04 rango desde FENR- 94 hasta FENR- 100**

| DATOS DEL RECEPTOR | |
|---|---|
| NIT: | 800130640-3 |
| Nombre/Razón Social: | LICEOS DEL EJERCITO NACIONAL |
| Dirección: | CL 100 11 00, BOGOTÁ, D.C., Bogotá, Colombia, CP 110221 |
| Teléfono: | 3104417670 |
| Email: | victorhugoquinterom@gmail.com |
| Forma de Pago: | Crédito |
| Medio de pago: | Transferencia Débito Bancaria |
| Fecha de Pago: | 11/12/2026 |
| Total de Lineas: | 4 |

| # | CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | U.M | CANTIDAD | PRECIO U. | IMPUESTOS | | | DCTO. | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | NOM. | % o VAL | MONTO | | |
| 1 | 45220000-5 | Obras de ingeniería y trabajos de construcción<br>Acta parcial N° 2 CONTRATO DE OBRA PÚBLICA N° 273-CELIC-2026cuyo objeto es MANTENIMIENTO, Y/O REMODELACIÓN DE LAS INSTALACIONES DE LOS LICEOS: LICEO SANTA BARBARA UBICADO EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ, FRANCISCO JOSE DE CALDAS UBICADO EN LA BASE MILITAR DE TOLEMAIDA NILO CUNDINAMARCA, LICEO GENERAL GUSTAVO MATAMOROS LEON UBICADO EN LA CIUDAD DE YOPAL, LICEO GENERAL SERVIEZ UBICADO EN LA CIUDAD DE VILLAVICENCIO Y LICEO PICHINCHA UBICADO EN LA CIUDAD DE CALI. | WSD | 1,00 | $492.500.390,00 | | | | $0,00 | $492.500.390,00 |
| 2 | AIU 1 | Administración<br>23 % | EA | 1,00 | $113.275.090,00 | | | | $0,00 | $113.275.090,00 |
| 3 | AIU 2 | Imprevistos<br>1 % | EA | 1,00 | $4.925.004,00 | | | | $0,00 | $4.925.004,00 |
| 4 | AIU 3 | Utilidad<br>2 % | EA | 1,00 | $9.850.008,00 | IVA | 19,00% | $1.871.502,00 | $0,00 | $9.850.008,00 |

| IMPUESTO | BASE | TARIFA / VALOR NOMINAL | IMPORTE |
|---|---|---|---|
| IMPUESTOS | | | |
| 01 IVA | $9.850.008,00 | 19,00% | $1.871.502,00 |

| | |
|---|---|
| Subtotal: | $620.550.492,00 |
| Cargos: | $0,00 |
| Descuentos: | $0,00 |
| IVA: | $1.871.502,00 |
| Total: | $622.421.994,00 |

Firma Digital: Z8v87eKetYJrTyude+e5daxy4eXbx0n5SdDRyiF5xidmsWCyApi3CelcHEVVmwG
IM6jqxx4ScaGILJg1TkTCdcTa45YHeYQ1fVgGtSZypCDKGcTjBrr9EMs6mZqjBX
Hu3NOnFJrFByJD/bdQQcCMxiBnh2fCTZ/IVjULdbJhLrHbqxDsahz70OISipgKH
RZtpv8JW7i30Dftt9vYV1Z/fosIrdqHB8Trrf6tQkWS+lplem+bBjbyj6H9rN8VQm
pkJ9dHduJiwg4MZUtoVFU3W1BiQjrvzlahvfTdf9erwMrUpQgGyspv83ZCV9O/bL
fHS4GY26lnWkCAEp54Oh6g==

Esta factura es un titulo valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.

Software: e-Factura Proveedor tecnológico: cadena. Nit. 830.930.534-0 PLATAFORMA: Facturatech Nit. 901.143.311-8

facturatech

CONTINUACIÓN ACTA RADICADO No. 2026923017026536/ (ACTA DE OBRA N. 002) DE RECIBO PARCIAL CORRESPONDIENTE AL CONTRATO 273-CELIC-2026, CUYO OBJETO ES, MANTENIMIENTO, Y/O REMODELACIÓN DE LAS INSTALACIONES DE LOS LICEOS: LICEO SANTA BARBARA UBICADO EN LA CIUDAD DE BOGOTA, FRANCISCO JOSE DE CALDAS UBICADO EN LA BASE MILITAR DE TOLEMAIDA NILO CUNDINAMARCA, LICEO GENERAL GUSTAVO MATAMOROS LEON UBICADO EN LA CIUDAD DE YOPAL, LICEO GENERAL SERVIEZ UBICADO EN LA CIUDAD DE VILLAVICENCIO Y LICEO PICHINCHA UBICADO EN LA CIUDAD DE CALI.

| | |
|---|---|
| Son: | (seiscientos veintidós millones cuatrocientos veintiún mil novecientos noventa y cuatro pesos con cero centavos) |
| CUFE: | 35b4f8261b1df4ff4ba7ac413d535417c4e0eefb0acc202d388f4e8a622d1ee8eb7ad01ce02dccbcce2b568128d51295 |
| Notas: | |

Firma Digital: Z8v87eKetYJrTyude+e5daxy4eXbx0n5SdDRyiF5xidmsWCyAipi3CelcHEVVmwG
lM6jqxx4ScaGILJg1TkTCdcTa45YHeYQ1fVgGtSZypCDKGcTj8rr9EMs6mZqjBX
Hu3NOn1FJrF8yJD/bdQQCcMxi8nh2fCTZ/IVjULdbJhLrHbqxDsahz70DISipgKH
RZtpv8JW7i30Dftt9vYV1Z/fosIrdqHB8Trrf6tQkWS+Iplem+bBjby6H9rN8VQm
pkJ9dHduJiwg4M2UtoVFU3W1BiQjrvzlahvfTdf9erwMrUpQgGyspv83ZCV9OYbL
fHS4GY26lnWkCAEp54Oh6g==

Esta factura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.


Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.

CONTINUACIÓN ACTA RADICADO No. 2026923017026536/ (ACTA DE OBRA N. 002) DE RECIBO PARCIAL CORRESPONDIENTE AL CONTRATO 273-CELIC-2026, CUYO OBJETO ES, MANTENIMIENTO, Y/O REMODELACIÓN DE LAS INSTALACIONES DE LOS LICEOS: LICEO SANTA BARBARA UBICADO EN LA CIUDAD DE BOGOTA, FRANCISCO JOSE DE CALDAS UBICADO EN LA BASE MILITAR DE TOLEMAIDA NILO CUNDINAMARCA, LICEO GENERAL GUSTAVO MATAMOROS LEON UBICADO EN LA CIUDAD DE YOPAL, LICEO GENERAL SERVIEZ UBICADO EN LA CIUDAD DE VILLAVICENCIO Y LICEO PICHINCHA UBICADO EN LA CIUDAD DE CALI.

Durante el periodo de avance comprendido entre el el 22 de septiembre de 2026 y el 09 de noviembre de 2026, se desarrollaron las labores de mantenimiento y adecuación en las instalaciones de los Liceos del Ejército, de acuerdo con lo establecido en el contrato.
A continuación, se detallan las actividades desarrolladas por cada Liceo intervenido, así:


**Liceo Santa Barbara – Bogotá D.C.:**

Suministro e instalación de cerramiento provisional.

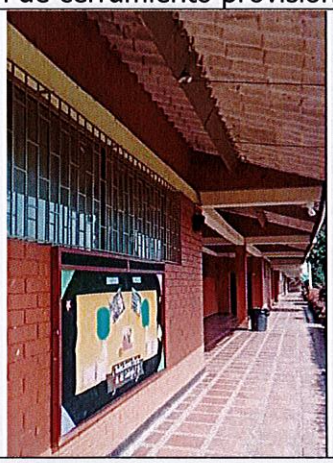




Desmonte de cubierta existente.

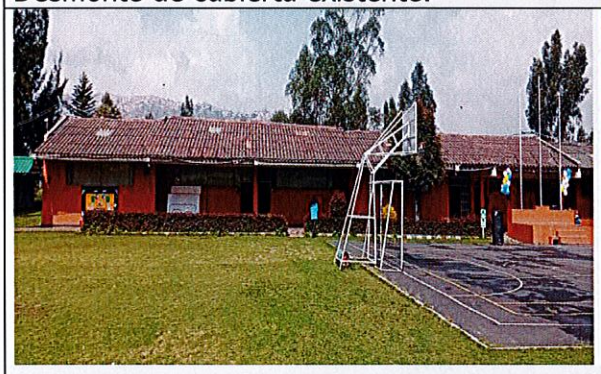






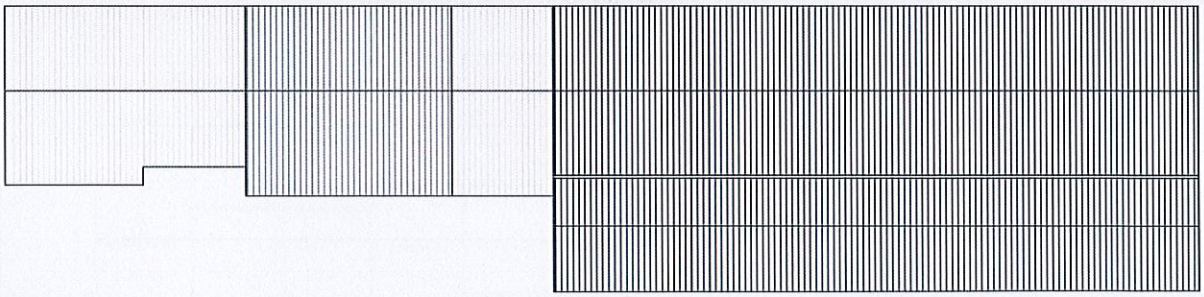


CONTINUACIÓN ACTA RADICADO No. 2026923017026536/ (ACTA DE OBRA N. 002) DE RECIBO PARCIAL CORRESPONDIENTE AL CONTRATO 273-CELIC-2026, CUYO OBJETO ES, MANTENIMIENTO, Y/O REMODELACIÓN DE LAS INSTALACIONES DE LOS LICEOS: LICEO SANTA BARBARA UBICADO EN LA CIUDAD DE BOGOTA, FRANCISCO JOSE DE CALDAS UBICADO EN LA BASE MILITAR DE TOLEMAIDA NILO CUNDINAMARCA, LICEO GENERAL GUSTAVO MATAMOROS LEON UBICADO EN LA CIUDAD DE YOPAL, LICEO GENERAL SERVIEZ UBICADO EN LA CIUDAD DE VILLAVICENCIO Y LICEO PICHINCHA UBICADO EN LA CIUDAD DE CALI.


Desmonte de cielo raso existente.




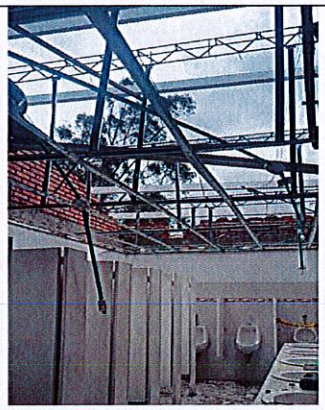





Desmonte de estructura cubierta existente.

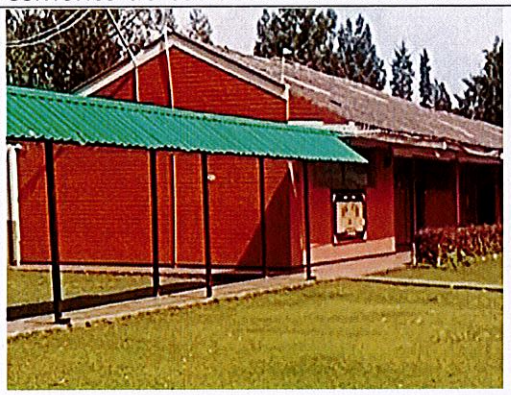

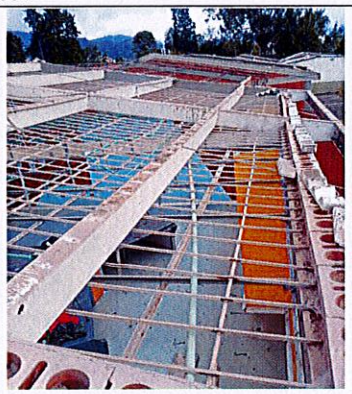




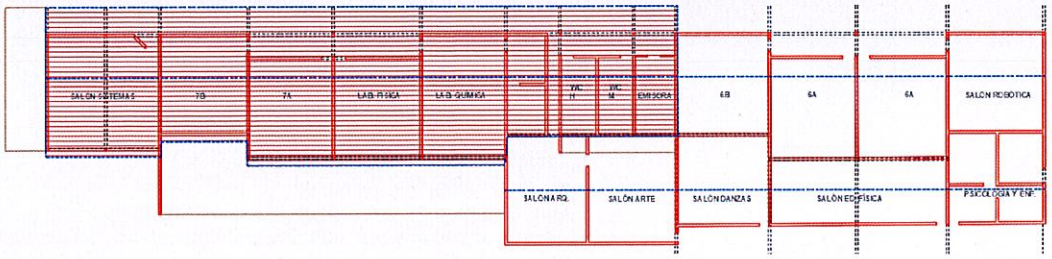


CONTINUACIÓN ACTA RADICADO No. 2026923017026536/ (ACTA DE OBRA N. 002) DE RECIBO PARCIAL CORRESPONDIENTE AL CONTRATO 273-CELIC-2026, CUYO OBJETO ES, MANTENIMIENTO, Y/O REMODELACIÓN DE LAS INSTALACIONES DE LOS LICEOS: LICEO SANTA BARBARA UBICADO EN LA CIUDAD DE BOGOTA, FRANCISCO JOSE DE CALDAS UBICADO EN LA BASE MILITAR DE TOLEMAIDA NILO CUNDINAMARCA, LICEO GENERAL GUSTAVO MATAMOROS LEON UBICADO EN LA CIUDAD DE YOPAL, LICEO GENERAL SERVIEZ UBICADO EN LA CIUDAD DE VILLAVICENCIO Y LICEO PICHINCHA UBICADO EN LA CIUDAD DE CALI.


Suministro e instalación teja sin traslapo - TST standing sean.



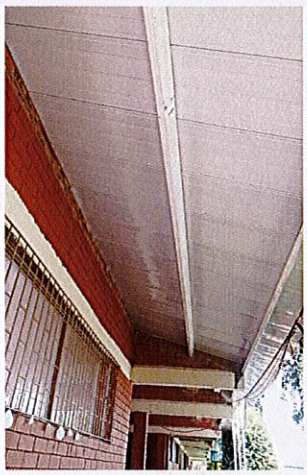

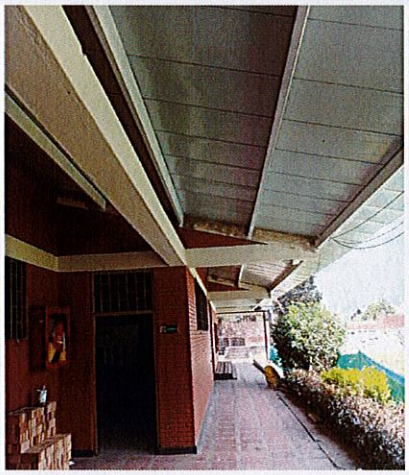





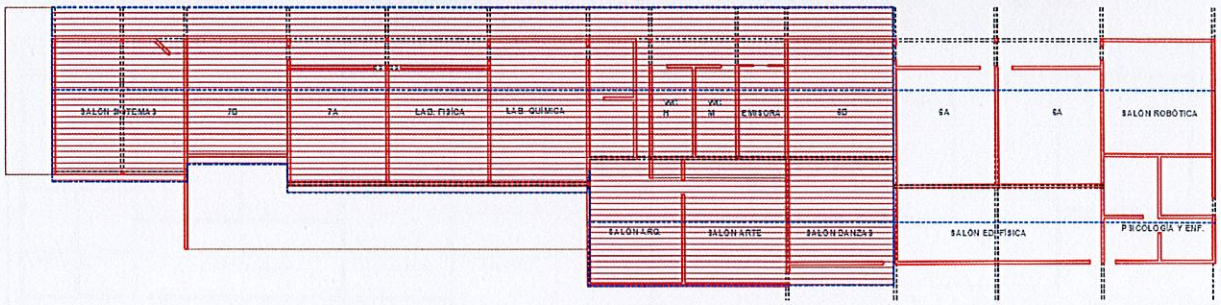


CONTINUACIÓN ACTA RADICADO No. 2026923017026536/ (ACTA DE OBRA N. 002) DE RECIBO PARCIAL CORRESPONDIENTE AL CONTRATO 273-CELIC-2026, CUYO OBJETO ES, MANTENIMIENTO, Y/O REMODELACIÓN DE LAS INSTALACIONES DE LOS LICEOS: LICEO SANTA BARBARA UBICADO EN LA CIUDAD DE BOGOTA, FRANCISCO JOSE DE CALDAS UBICADO EN LA BASE MILITAR DE TOLEMAIDA NILO CUNDINAMARCA, LICEO GENERAL GUSTAVO MATAMOROS LEON UBICADO EN LA CIUDAD DE YOPAL, LICEO GENERAL SERVIEZ UBICADO EN LA CIUDAD DE VILLAVICENCIO Y LICEO PICHINCHA UBICADO EN LA CIUDAD DE CALI.


Suministro e instalación de perfil de refuerzo.

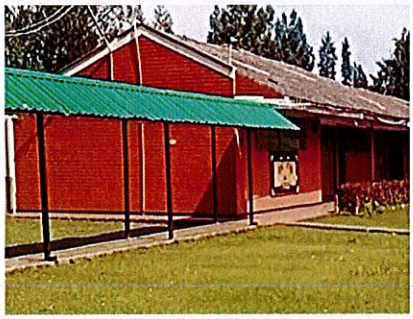


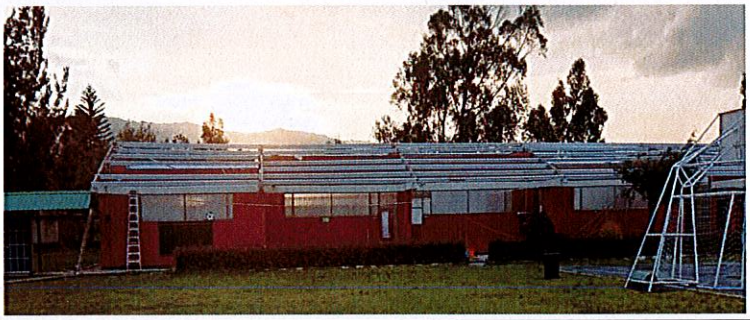

Muro en bloque Nº 4 E = 0.10 m

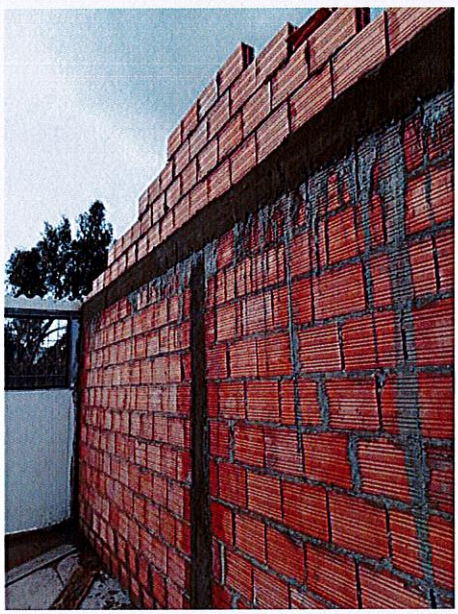


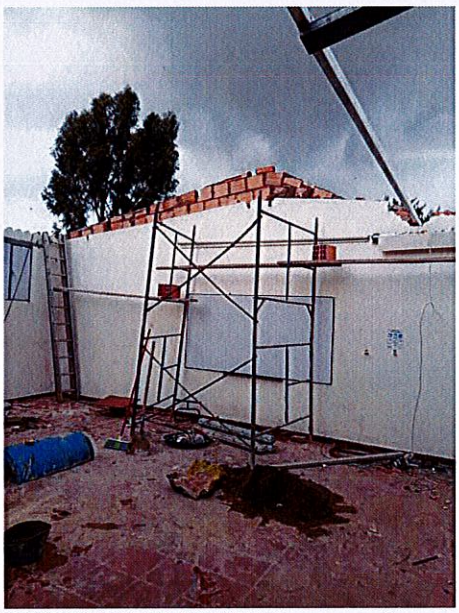


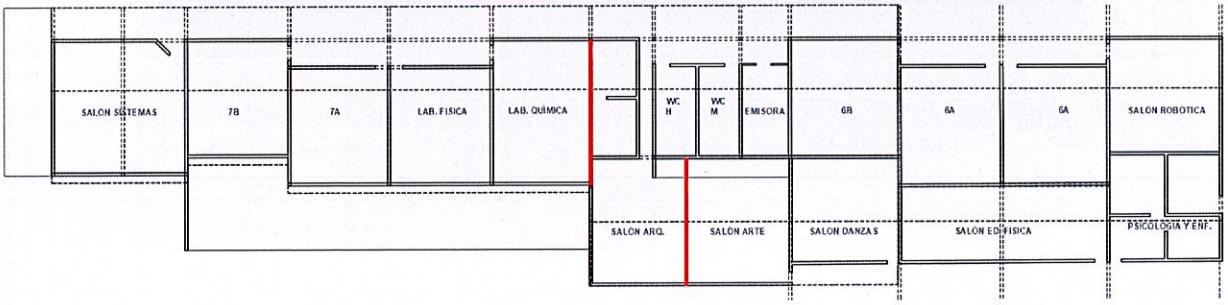


CONTINUACIÓN ACTA RADICADO No. 2026923017026536/ (ACTA DE OBRA N. 002) DE RECIBO PARCIAL CORRESPONDIENTE AL CONTRATO 273-CELIC-2026, CUYO OBJETO ES, MANTENIMIENTO, Y/O REMODELACIÓN DE LAS INSTALACIONES DE LOS LICEOS: LICEO SANTA BARBARA UBICADO EN LA CIUDAD DE BOGOTA, FRANCISCO JOSE DE CALDAS UBICADO EN LA BASE MILITAR DE TOLEMAIDA NILO CUNDINAMARCA, LICEO GENERAL GUSTAVO MATAMOROS LEON UBICADO EN LA CIUDAD DE YOPAL, LICEO GENERAL SERVIEZ UBICADO EN LA CIUDAD DE VILLAVICENCIO Y LICEO PICHINCHA UBICADO EN LA CIUDAD DE CALI.

Pañete liso muros 1:3

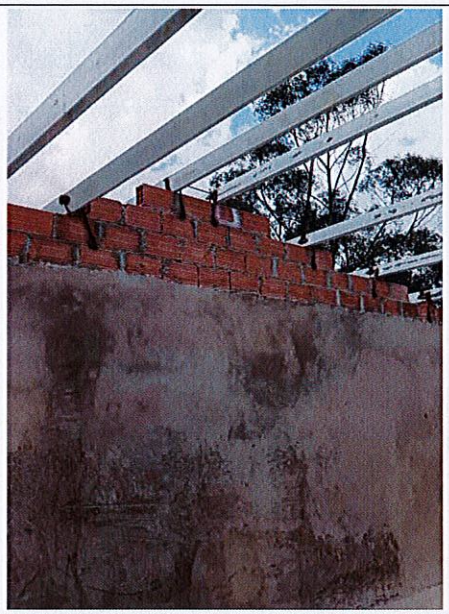

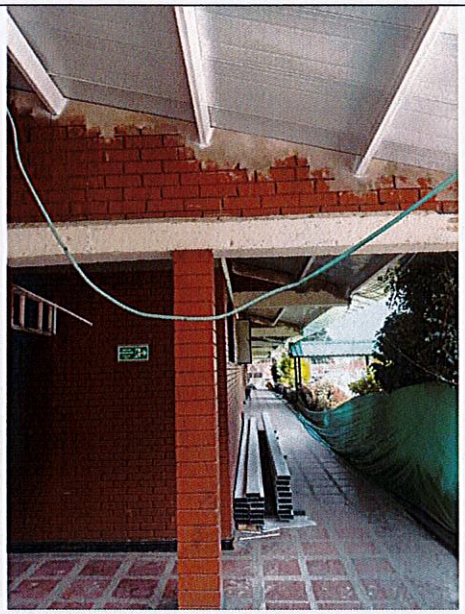

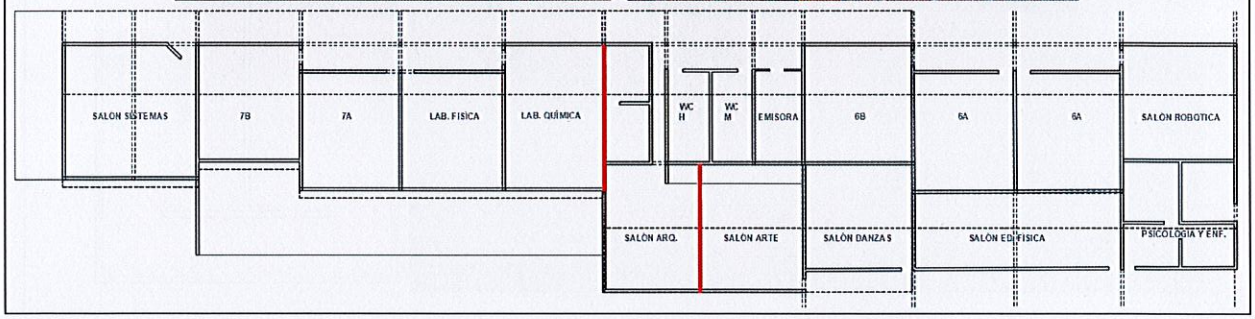



**Liceo Francisco José de Caldas – Tolemaida, Nilo Cundinamarca:**

Demolición muros en mampostería.












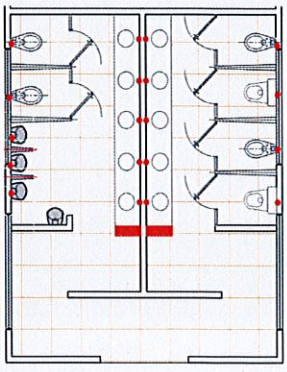


CONTINUACIÓN ACTA RADICADO No. 2026923017026536/ (ACTA DE OBRA N. 002) DE RECIBO PARCIAL CORRESPONDIENTE AL CONTRATO 273-CELIC-2026, CUYO OBJETO ES, MANTENIMIENTO, Y/O REMODELACIÓN DE LAS INSTALACIONES DE LOS LICEOS: LICEO SANTA BARBARA UBICADO EN LA CIUDAD DE BOGOTA, FRANCISCO JOSE DE CALDAS UBICADO EN LA BASE MILITAR DE TOLEMAIDA NILO CUNDINAMARCA, LICEO GENERAL GUSTAVO MATAMOROS LEON UBICADO EN LA CIUDAD DE YOPAL, LICEO GENERAL SERVIEZ UBICADO EN LA CIUDAD DE VILLAVICENCIO Y LICEO PICHINCHA UBICADO EN LA CIUDAD DE CALI.


Demolición placa piso.

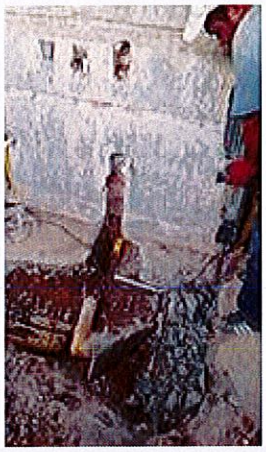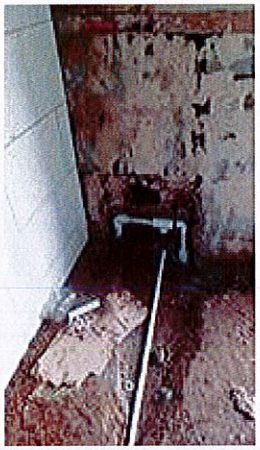
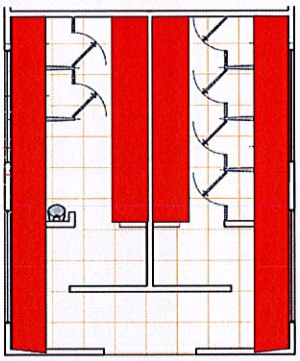


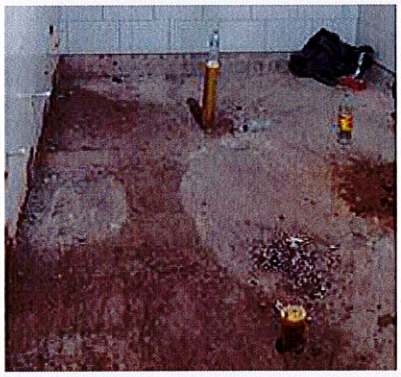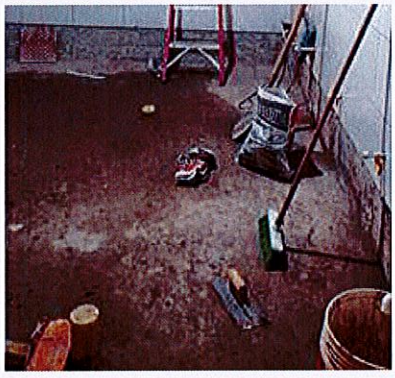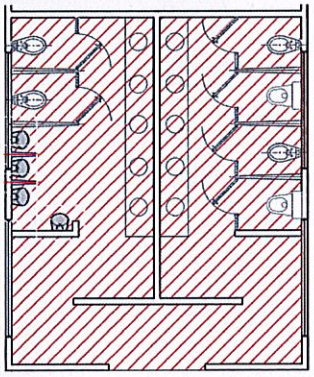


Alistado endurecido.


Suministro e instalación cerámica piso.

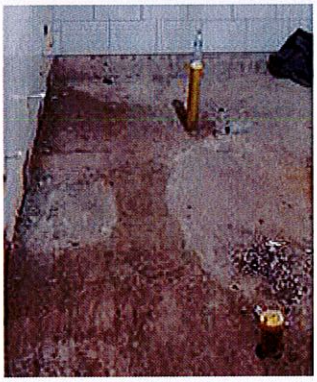


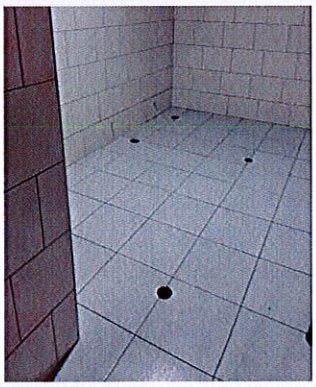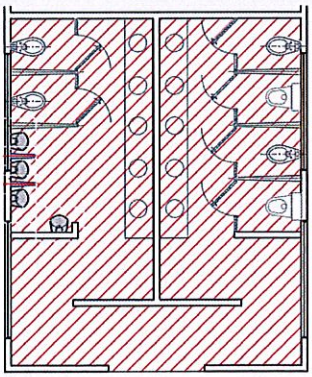



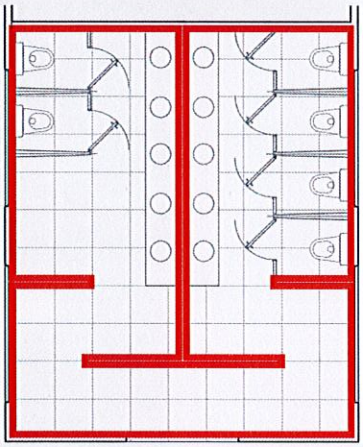
CONTINUACIÓN ACTA RADICADO No. 2026923017026536/ (ACTA DE OBRA N. 002) DE RECIBO PARCIAL CORRESPONDIENTE AL CONTRATO 273-CELIC-2026, CUYO OBJETO ES, MANTENIMIENTO, Y/O REMODELACIÓN DE LAS INSTALACIONES DE LOS LICEOS: LICEO SANTA BARBARA UBICADO EN LA CIUDAD DE BOGOTA, FRANCISCO JOSE DE CALDAS UBICADO EN LA BASE MILITAR DE TOLEMAIDA NILO CUNDINAMARCA, LICEO GENERAL GUSTAVO MATAMOROS LEON UBICADO EN LA CIUDAD DE YOPAL, LICEO GENERAL SERVIEZ UBICADO EN LA CIUDAD DE VILLAVICENCIO Y LICEO PICHINCHA UBICADO EN LA CIUDAD DE CALI.

Suministro e instalación baldosa cerámica pared.

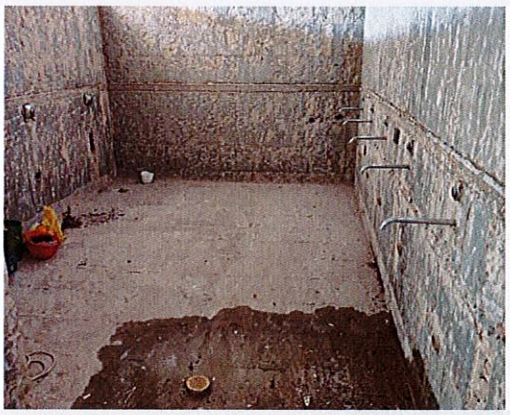

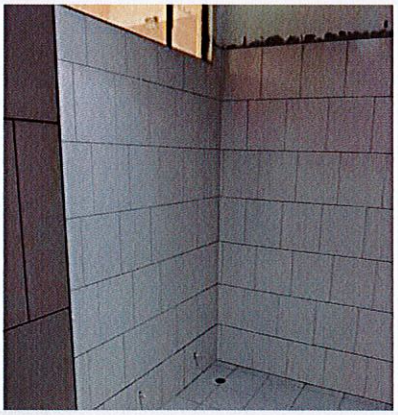

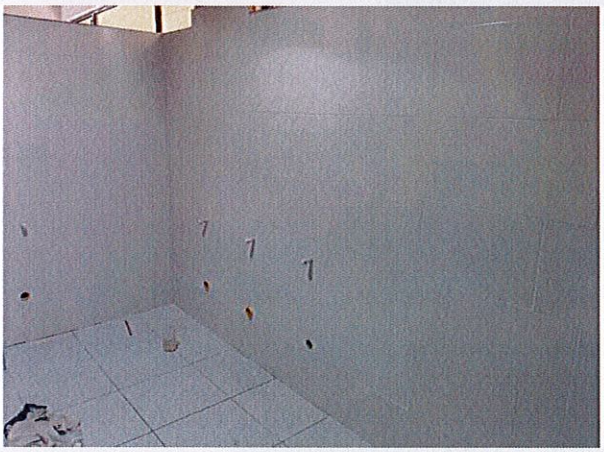




Placa base concreto.







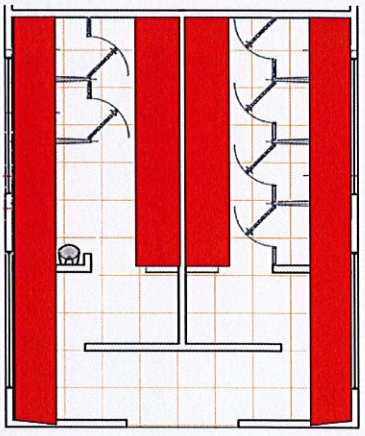


CONTINUACIÓN ACTA RADICADO No. 2026923017026536/ (ACTA DE OBRA N. 002) DE RECIBO PARCIAL CORRESPONDIENTE AL CONTRATO 273-CELIC-2026, CUYO OBJETO ES, MANTENIMIENTO, Y/O REMODELACIÓN DE LAS INSTALACIONES DE LOS LICEOS: LICEO SANTA BARBARA UBICADO EN LA CIUDAD DE BOGOTA, FRANCISCO JOSE DE CALDAS UBICADO EN LA BASE MILITAR DE TOLEMAIDA NILO CUNDINAMARCA, LICEO GENERAL GUSTAVO MATAMOROS LEON UBICADO EN LA CIUDAD DE YOPAL, LICEO GENERAL SERVIEZ UBICADO EN LA CIUDAD DE VILLAVICENCIO Y LICEO PICHINCHA UBICADO EN LA CIUDAD DE CALI.

Suministro e instalación de cielo raso en lámina PVC 7 mm.

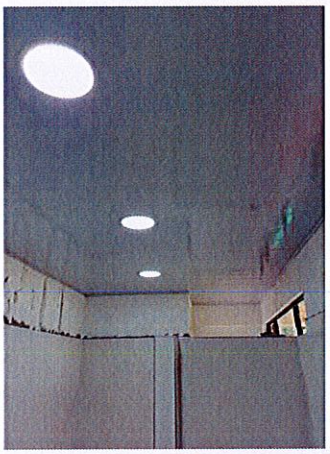

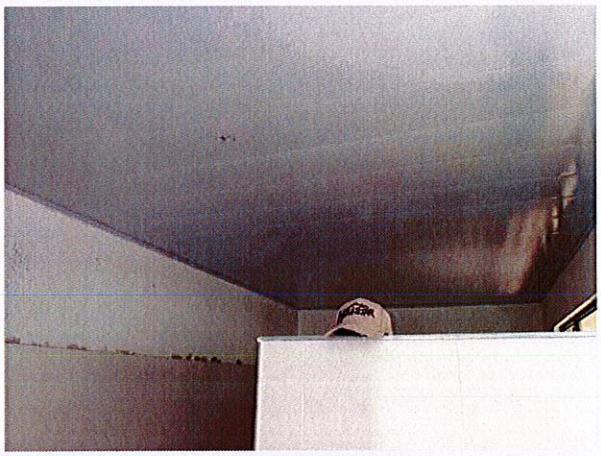

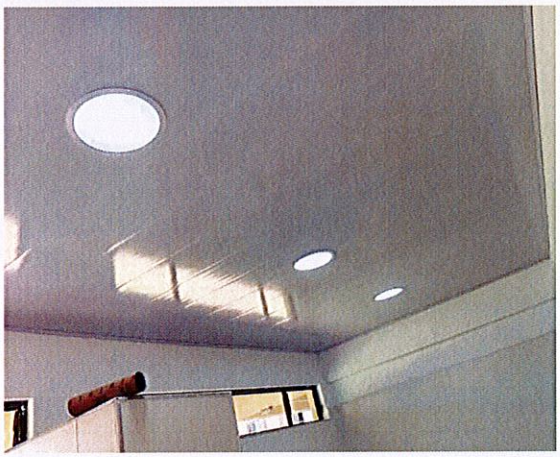


Punto hidráulico PVC-P/PARAL 1/2".







CONTINUACIÓN ACTA RADICADO No. 2026923017026536/ (ACTA DE OBRA N. 002) DE RECIBO PARCIAL CORRESPONDIENTE AL CONTRATO 273-CELIC-2026, CUYO OBJETO ES, MANTENIMIENTO, Y/O REMODELACIÓN DE LAS INSTALACIONES DE LOS LICEOS: LICEO SANTA BARBARA UBICADO EN LA CIUDAD DE BOGOTA, FRANCISCO JOSE DE CALDAS UBICADO EN LA BASE MILITAR DE TOLEMAIDA NILO CUNDINAMARCA, LICEO GENERAL GUSTAVO MATAMOROS LEON UBICADO EN LA CIUDAD DE YOPAL, LICEO GENERAL SERVIEZ UBICADO EN LA CIUDAD DE VILLAVICENCIO Y LICEO PICHINCHA UBICADO EN LA CIUDAD DE CALI.



Salida sanitaria PVC-S/PARAL 4".

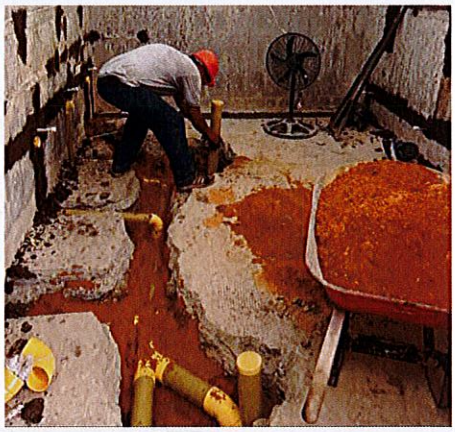Registro 1/2".

Salida sanitaria PVC-S/PARAL 2".

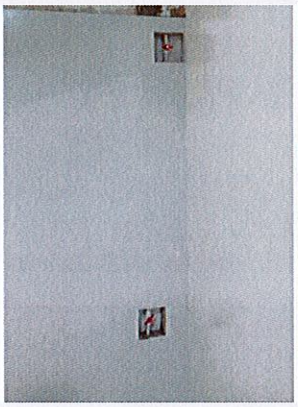
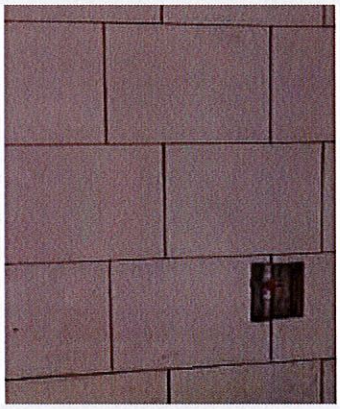



CONTINUACIÓN ACTA RADICADO No. 2026923017026536/ (ACTA DE OBRA N. 002) DE RECIBO PARCIAL CORRESPONDIENTE AL CONTRATO 273-CELIC-2026, CUYO OBJETO ES, MANTENIMIENTO, Y/O REMODELACIÓN DE LAS INSTALACIONES DE LOS LICEOS: LICEO SANTA BARBARA UBICADO EN LA CIUDAD DE BOGOTA, FRANCISCO JOSE DE CALDAS UBICADO EN LA BASE MILITAR DE TOLEMAIDA NILO CUNDINAMARCA, LICEO GENERAL GUSTAVO MATAMOROS LEON UBICADO EN LA CIUDAD DE YOPAL, LICEO GENERAL SERVIEZ UBICADO EN LA CIUDAD DE VILLAVICENCIO Y LICEO PICHINCHA UBICADO EN LA CIUDAD DE CALI.

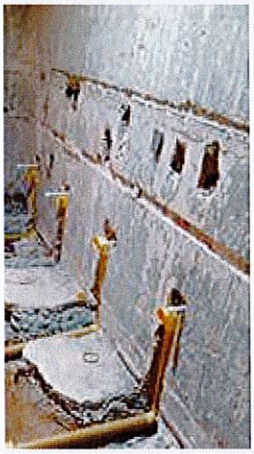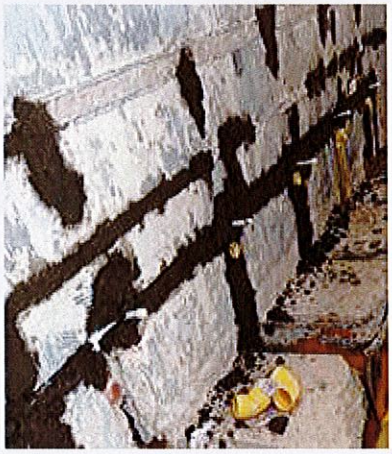
Red sanitaria PVC-S 4".




Red suministro PVC 1/2".

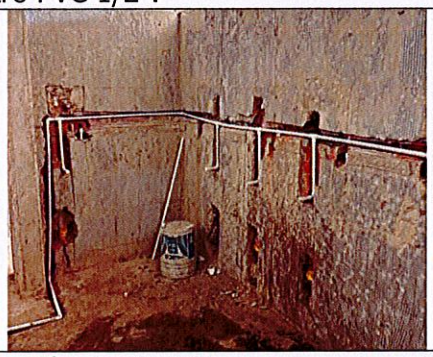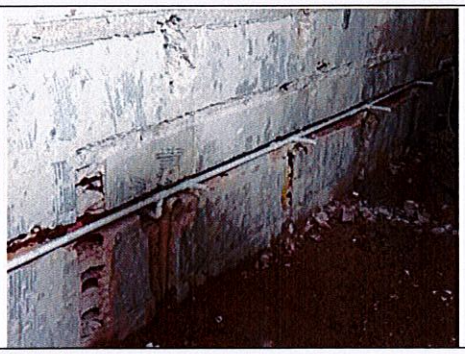Caja de inspección de 60X60.

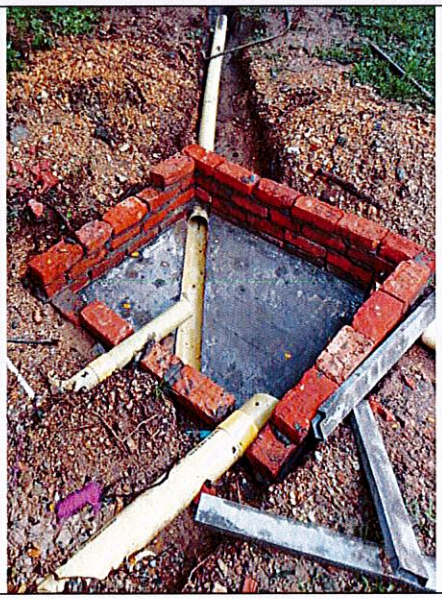

CONTINUACIÓN ACTA RADICADO No. 2026923017026536/ (ACTA DE OBRA N. 002) DE RECIBO PARCIAL CORRESPONDIENTE AL CONTRATO 273-CELIC-2026, CUYO OBJETO ES, MANTENIMIENTO, Y/O REMODELACIÓN DE LAS INSTALACIONES DE LOS LICEOS: LICEO SANTA BARBARA UBICADO EN LA CIUDAD DE BOGOTA, FRANCISCO JOSE DE CALDAS UBICADO EN LA BASE MILITAR DE TOLEMAIDA NILO CUNDINAMARCA, LICEO GENERAL GUSTAVO MATAMOROS LEON UBICADO EN LA CIUDAD DE YOPAL, LICEO GENERAL SERVIEZ UBICADO EN LA CIUDAD DE VILLAVICENCIO Y LICEO PICHINCHA UBICADO EN LA CIUDAD DE CALI.

**Liceo Gustavo Matamoros León – Yopal, Casanare:**


Suministro e instalación de cerramiento provisional.






Desmonte de cubierta existente



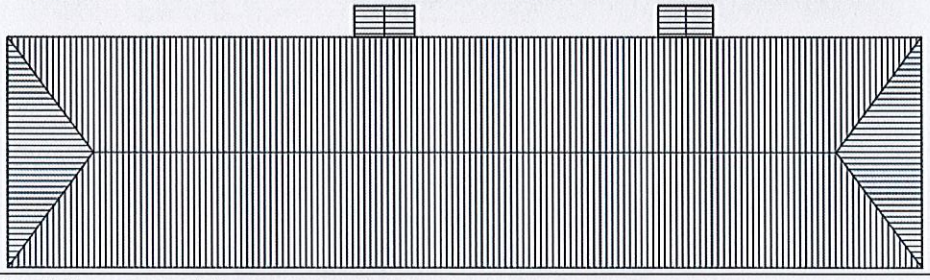


Desmonte de cielo raso existente.

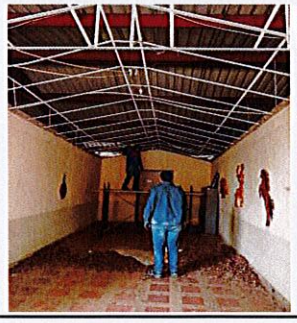



CONTINUACIÓN ACTA RADICADO No. 2026923017026536/ (ACTA DE OBRA N. 002) DE RECIBO PARCIAL CORRESPONDIENTE AL CONTRATO 273-CELIC-2026, CUYO OBJETO ES, MANTENIMIENTO, Y/O REMODELACIÓN DE LAS INSTALACIONES DE LOS LICEOS: LICEO SANTA BARBARA UBICADO EN LA CIUDAD DE BOGOTA, FRANCISCO JOSE DE CALDAS UBICADO EN LA BASE MILITAR DE TOLEMAIDA NILO CUNDINAMARCA, LICEO GENERAL GUSTAVO MATAMOROS LEON UBICADO EN LA CIUDAD DE YOPAL, LICEO GENERAL SERVIEZ UBICADO EN LA CIUDAD DE VILLAVICENCIO Y LICEO PICHINCHA UBICADO EN LA CIUDAD DE CALI.

Desmonte estructura cubierta existente.

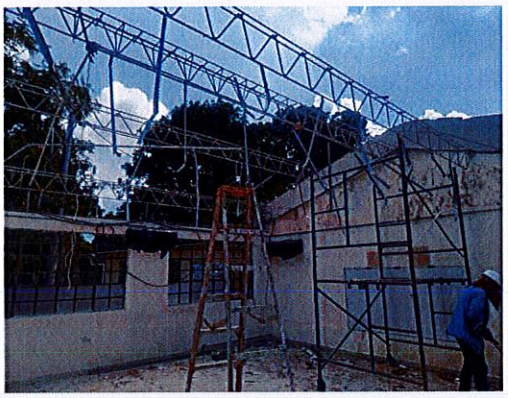






Suministro e instalación de teja sin traslapo TST Standing seam.

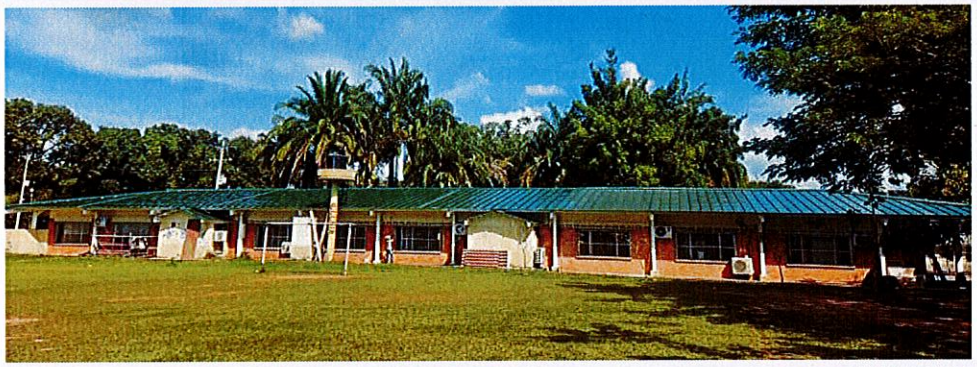




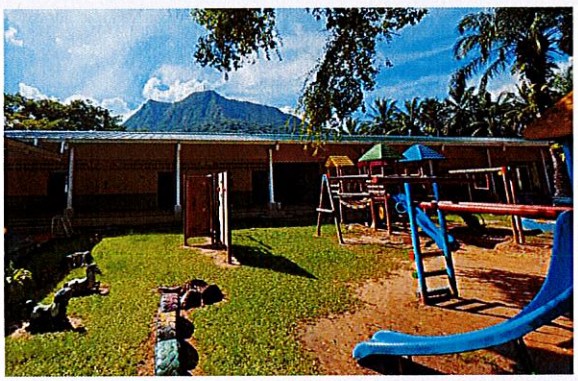

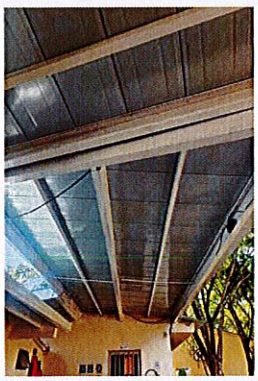


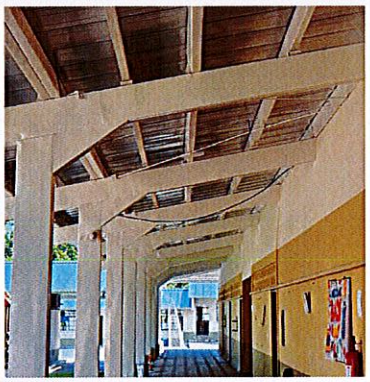




CONTINUACIÓN ACTA RADICADO No. 2026923017026536/ (ACTA DE OBRA N. 002) DE RECIBO PARCIAL CORRESPONDIENTE AL CONTRATO 273-CELIC-2026, CUYO OBJETO ES, MANTENIMIENTO, Y/O REMODELACIÓN DE LAS INSTALACIONES DE LOS LICEOS: LICEO SANTA BARBARA UBICADO EN LA CIUDAD DE BOGOTA, FRANCISCO JOSE DE CALDAS UBICADO EN LA BASE MILITAR DE TOLEMAIDA NILO CUNDINAMARCA, LICEO GENERAL GUSTAVO MATAMOROS LEON UBICADO EN LA CIUDAD DE YOPAL, LICEO GENERAL SERVIEZ UBICADO EN LA CIUDAD DE VILLAVICENCIO Y LICEO PICHINCHA UBICADO EN LA CIUDAD DE CALI.

Suministro e instalación de cielo raso en lámina PVC 7 mm.

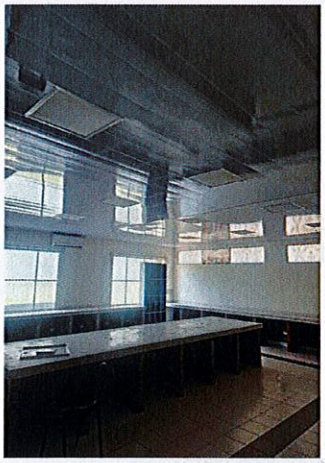



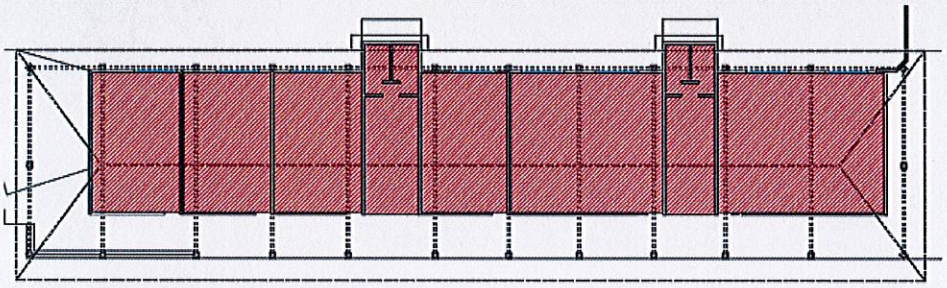


Desmonte de elementos eléctricos y electrónicos existentes.







CONTINUACIÓN ACTA RADICADO No. 2026923017026536/ (ACTA DE OBRA N. 002) DE RECIBO PARCIAL CORRESPONDIENTE AL CONTRATO 273-CELIC-2026, CUYO OBJETO ES, MANTENIMIENTO, Y/O REMODELACIÓN DE LAS INSTALACIONES DE LOS LICEOS: LICEO SANTA BARBARA UBICADO EN LA CIUDAD DE BOGOTA, FRANCISCO JOSE DE CALDAS UBICADO EN LA BASE MILITAR DE TOLEMAIDA NILO CUNDINAMARCA, LICEO GENERAL GUSTAVO MATAMOROS LEON UBICADO EN LA CIUDAD DE YOPAL, LICEO GENERAL SERVIEZ UBICADO EN LA CIUDAD DE VILLAVICENCIO Y LICEO PICHINCHA UBICADO EN LA CIUDAD DE CALI.

Salida iluminación descolgada.





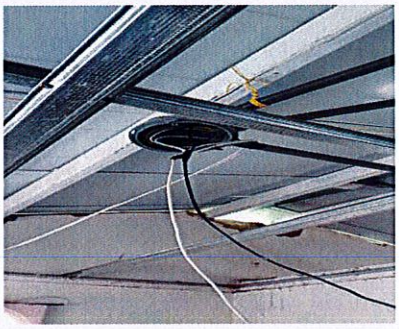

Suministro e instalación panel led cuadrado 60 X 60.

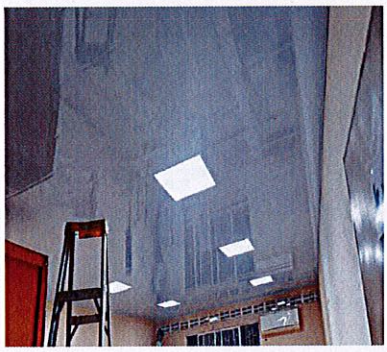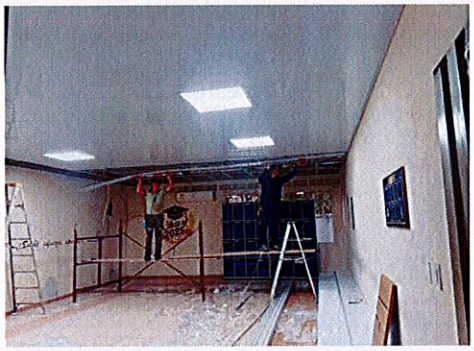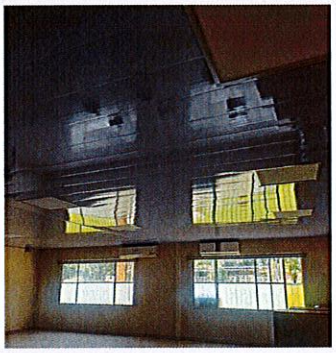


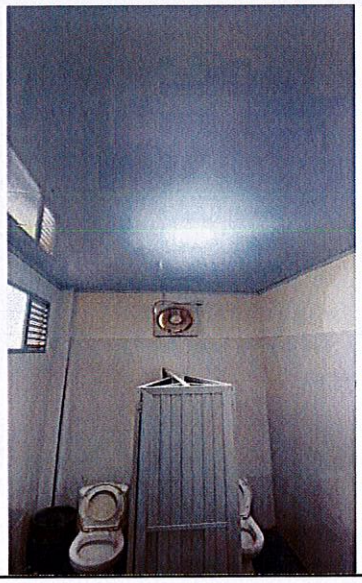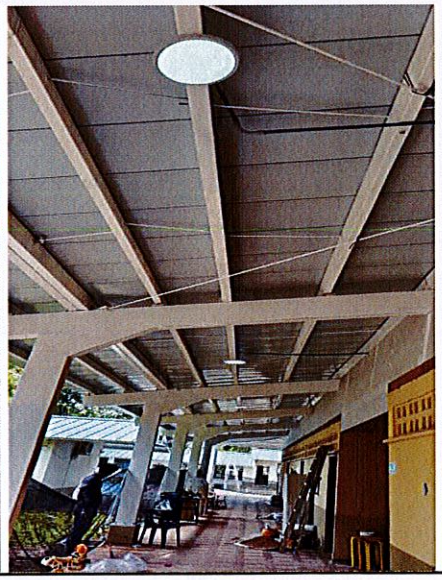


Suministro e instalación de luminarias bala led.


CONTINUACIÓN ACTA RADICADO No. 2026923017026536/ (ACTA DE OBRA N. 002) DE RECIBO PARCIAL CORRESPONDIENTE AL CONTRATO 273-CELIC-2026, CUYO OBJETO ES, MANTENIMIENTO, Y/O REMODELACIÓN DE LAS INSTALACIONES DE LOS LICEOS: LICEO SANTA BARBARA UBICADO EN LA CIUDAD DE BOGOTA, FRANCISCO JOSE DE CALDAS UBICADO EN LA BASE MILITAR DE TOLEMAIDA NILO CUNDINAMARCA, LICEO GENERAL GUSTAVO MATAMOROS LEON UBICADO EN LA CIUDAD DE YOPAL, LICEO GENERAL SERVIEZ UBICADO EN LA CIUDAD DE VILLAVICENCIO Y LICEO PICHINCHA UBICADO EN LA CIUDAD DE CALI.

Luminaria para exterior.

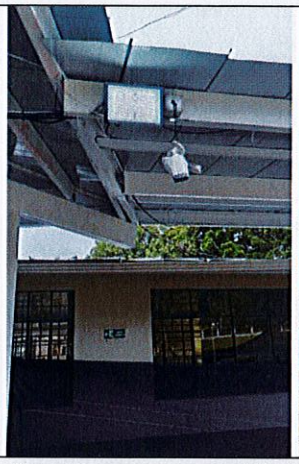

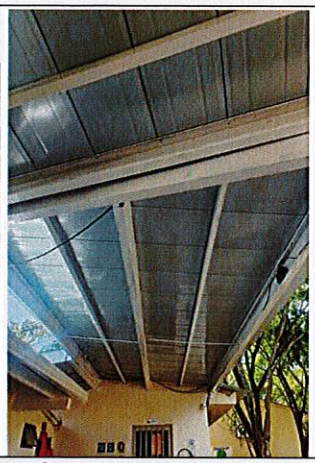

Suministro e instalación de refuerzo en perfil metálico CAL 14 Y/O 16.

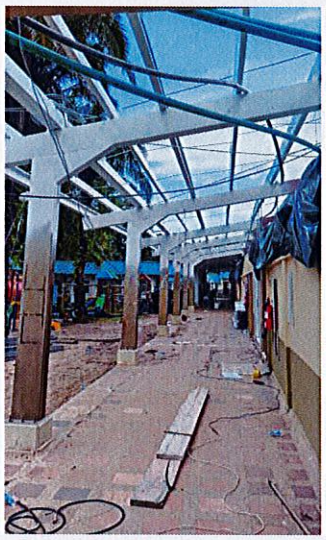




Pañete liso muros 1:3 interior.




CONTINUACIÓN ACTA RADICADO No. 2026923017026536/ (ACTA DE OBRA N. 002) DE RECIBO PARCIAL CORRESPONDIENTE AL CONTRATO 273-CELIC-2026, CUYO OBJETO ES, MANTENIMIENTO, Y/O REMODELACIÓN DE LAS INSTALACIONES DE LOS LICEOS: LICEO SANTA BARBARA UBICADO EN LA CIUDAD DE BOGOTA, FRANCISCO JOSE DE CALDAS UBICADO EN LA BASE MILITAR DE TOLEMAIDA NILO CUNDINAMARCA, LICEO GENERAL GUSTAVO MATAMOROS LEON UBICADO EN LA CIUDAD DE YOPAL, LICEO GENERAL SERVIEZ UBICADO EN LA CIUDAD DE VILLAVICENCIO Y LICEO PICHINCHA UBICADO EN LA CIUDAD DE CALI.

Pintura en vinilo tipo 2 sobre muro estucado.

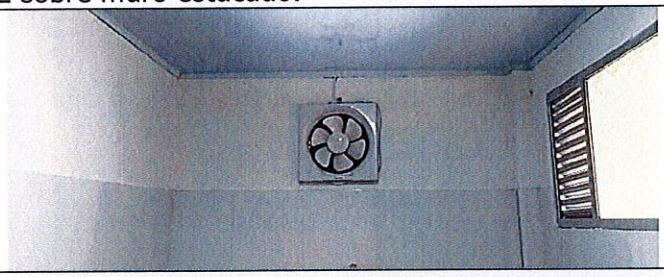

Aseo general.



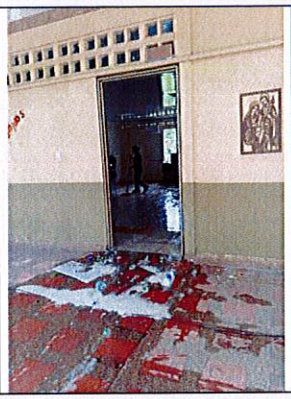




**Liceo General Serviez – Villavicencio, Meta:**

(Cambio cubiertas policarbonato).


Suministro e instalación de refuerzo en perfil metálico.

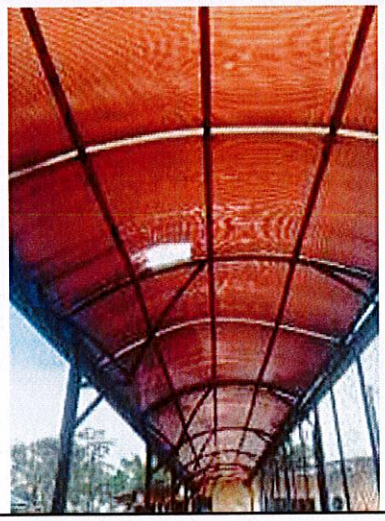





CONTINUACIÓN ACTA RADICADO No. 2026923017026536/ (ACTA DE OBRA N. 002) DE RECIBO PARCIAL CORRESPONDIENTE AL CONTRATO 273-CELIC-2026, CUYO OBJETO ES, MANTENIMIENTO, Y/O REMODELACIÓN DE LAS INSTALACIONES DE LOS LICEOS: LICEO SANTA BARBARA UBICADO EN LA CIUDAD DE BOGOTA, FRANCISCO JOSE DE CALDAS UBICADO EN LA BASE MILITAR DE TOLEMAIDA NILO CUNDINAMARCA, LICEO GENERAL GUSTAVO MATAMOROS LEON UBICADO EN LA CIUDAD DE YOPAL, LICEO GENERAL SERVIEZ UBICADO EN LA CIUDAD DE VILLAVICENCIO Y LICEO PICHINCHA UBICADO EN LA CIUDAD DE CALI.

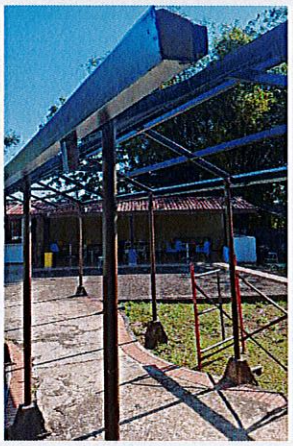




(Remodelación baños preescolar)

Suministro e instalación cerámica piso.

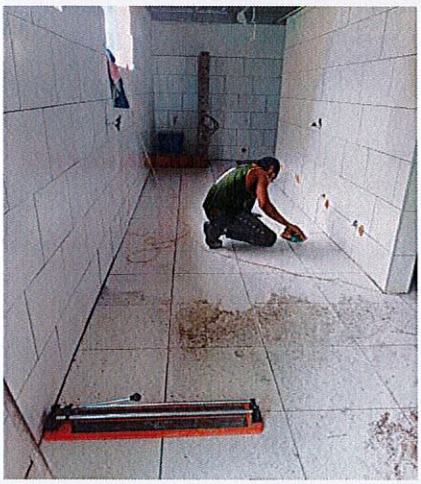
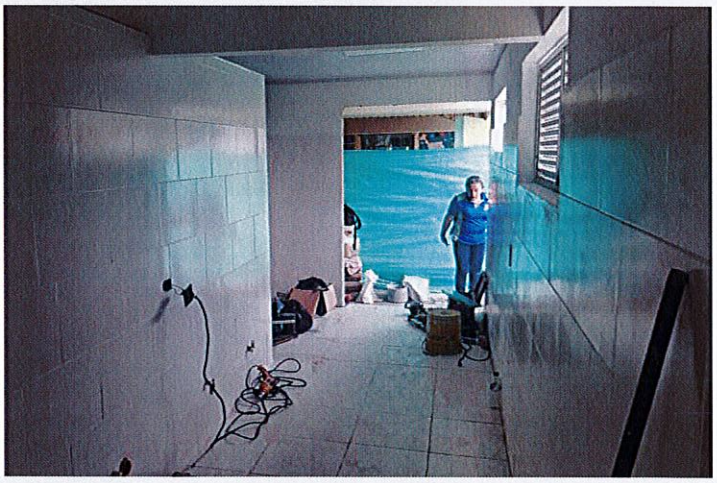



CONTINUACIÓN ACTA RADICADO No. 2026923017026536/ (ACTA DE OBRA N. 002) DE RECIBO PARCIAL CORRESPONDIENTE AL CONTRATO 273-CELIC-2026, CUYO OBJETO ES, MANTENIMIENTO, Y/O REMODELACIÓN DE LAS INSTALACIONES DE LOS LICEOS: LICEO SANTA BARBARA UBICADO EN LA CIUDAD DE BOGOTA, FRANCISCO JOSE DE CALDAS UBICADO EN LA BASE MILITAR DE TOLEMAIDA NILO CUNDINAMARCA, LICEO GENERAL GUSTAVO MATAMOROS LEON UBICADO EN LA CIUDAD DE YOPAL, LICEO GENERAL SERVIEZ UBICADO EN LA CIUDAD DE VILLAVICENCIO Y LICEO PICHINCHA UBICADO EN LA CIUDAD DE CALI.

Suministro e instalación baldosa cerámica pared.

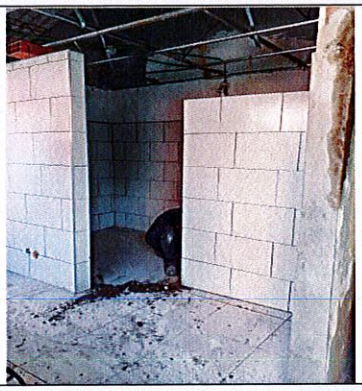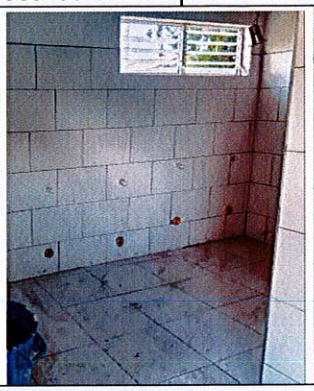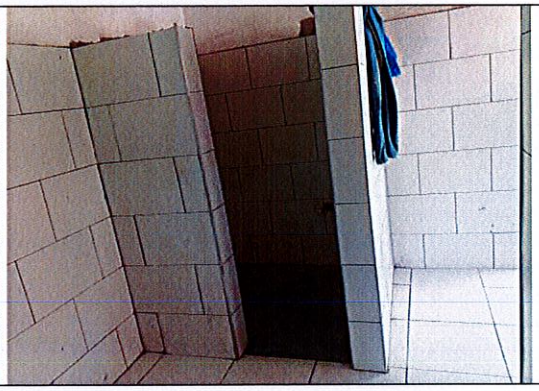Placa base concreto.

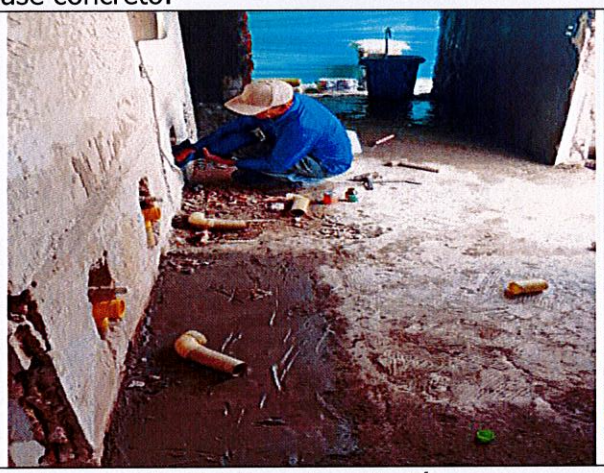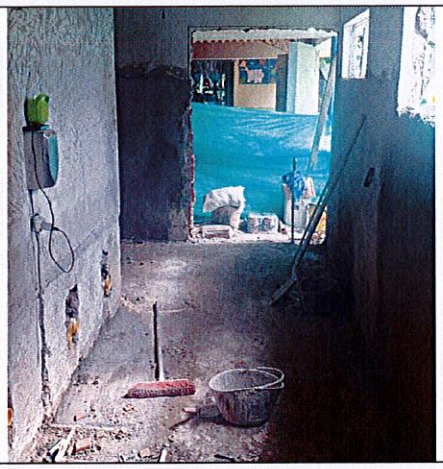



Muro en bloque y Suministro e instalación ventana rejilla en aluminio.




CONTINUACIÓN ACTA RADICADO No. 2026923017026536/ (ACTA DE OBRA N. 002) DE RECIBO PARCIAL CORRESPONDIENTE AL CONTRATO 273-CELIC-2026, CUYO OBJETO ES, MANTENIMIENTO, Y/O REMODELACIÓN DE LAS INSTALACIONES DE LOS LICEOS: LICEO SANTA BARBARA UBICADO EN LA CIUDAD DE BOGOTA, FRANCISCO JOSE DE CALDAS UBICADO EN LA BASE MILITAR DE TOLEMAIDA NILO CUNDINAMARCA, LICEO GENERAL GUSTAVO MATAMOROS LEON UBICADO EN LA CIUDAD DE YOPAL, LICEO GENERAL SERVIEZ UBICADO EN LA CIUDAD DE VILLAVICENCIO Y LICEO PICHINCHA UBICADO EN LA CIUDAD DE CALI.


Vinilo sobre pañete.






Suministro e instalación de cielo raso en lámina PVC 7 mm.



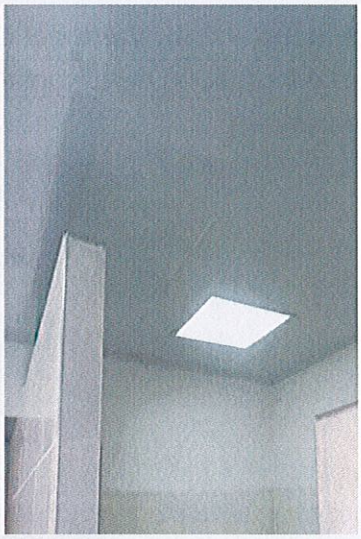

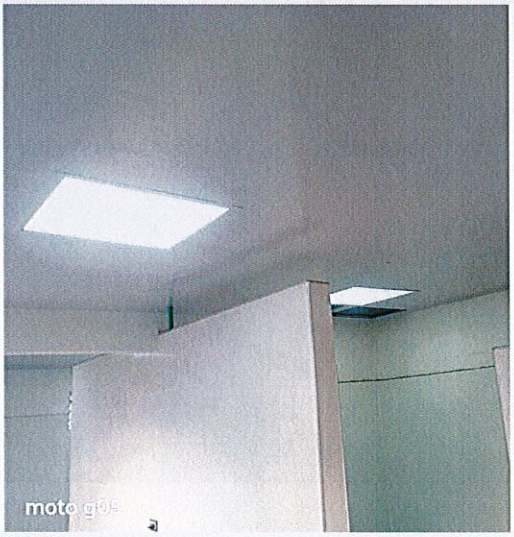

CONTINUACIÓN ACTA RADICADO No. 2026923017026536/ (ACTA DE OBRA N. 002) DE RECIBO PARCIAL CORRESPONDIENTE AL CONTRATO 273-CELIC-2026, CUYO OBJETO ES, MANTENIMIENTO, Y/O REMODELACIÓN DE LAS INSTALACIONES DE LOS LICEOS: LICEO SANTA BARBARA UBICADO EN LA CIUDAD DE BOGOTA, FRANCISCO JOSE DE CALDAS UBICADO EN LA BASE MILITAR DE TOLEMAIDA NILO CUNDINAMARCA, LICEO GENERAL GUSTAVO MATAMOROS LEON UBICADO EN LA CIUDAD DE YOPAL, LICEO GENERAL SERVIEZ UBICADO EN LA CIUDAD DE VILLAVICENCIO Y LICEO PICHINCHA UBICADO EN LA CIUDAD DE CALI.

Desmonte elementos electricos.







**Liceo Pichincha – Cali, Valle del Cauca:**

Suministro e instalación de cerramiento provisional.






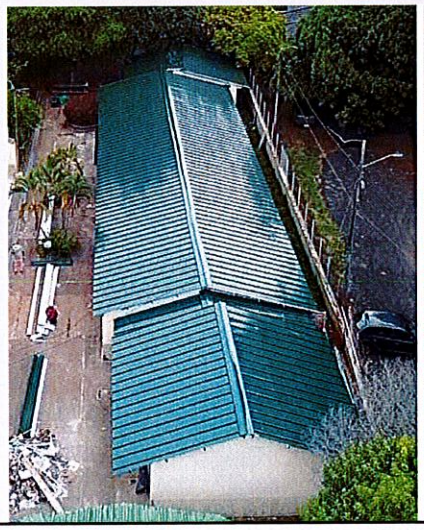

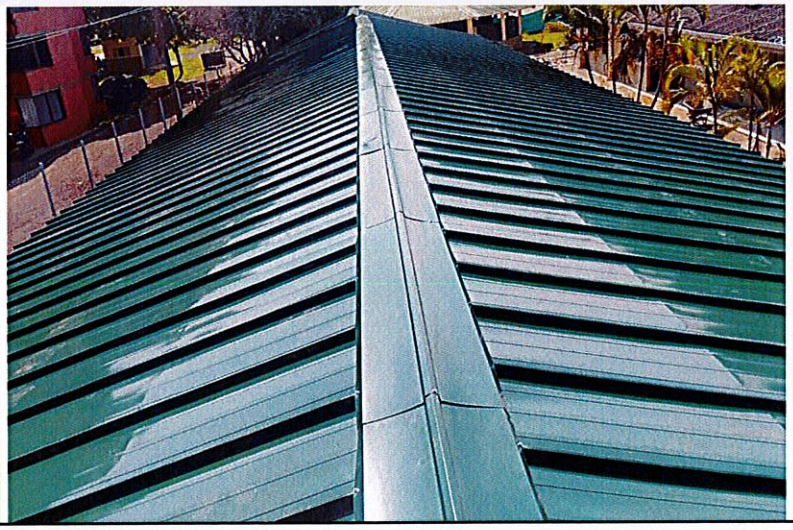

CONTINUACIÓN ACTA RADICADO No. 20269230170265367 (ACTA DE OBRA N. 002) DE RECIBO PARCIAL CORRESPONDIENTE AL CONTRATO 273-CELIC-2026, CUYO OBJETO ES, MANTENIMIENTO, Y/O REMODELACIÓN DE LAS INSTALACIONES DE LOS LICEOS: LICEO SANTA BARBARA UBICADO EN LA CIUDAD DE BOGOTA, FRANCISCO JOSE DE CALDAS UBICADO EN LA BASE MILITAR DE TOLEMAIDA NILO CUNDINAMARCA, LICEO GENERAL GUSTAVO MATAMOROS LEON UBICADO EN LA CIUDAD DE YOPAL, LICEO GENERAL SERVIEZ UBICADO EN LA CIUDAD DE VILLAVICENCIO Y LICEO PICHINCHA UBICADO EN LA CIUDAD DE CALI.




Suministro e instalación de cielo raso en lámina PVC 7 mm.











CONTINUACIÓN ACTA RADICADO No. 2026923017026536/ (ACTA DE OBRA N. 002) DE RECIBO PARCIAL CORRESPONDIENTE AL CONTRATO 273-CELIC-2026, CUYO OBJETO ES, MANTENIMIENTO, Y/O REMODELACIÓN DE LAS INSTALACIONES DE LOS LICEOS: LICEO SANTA BARBARA UBICADO EN LA CIUDAD DE BOGOTA, FRANCISCO JOSE DE CALDAS UBICADO EN LA BASE MILITAR DE TOLEMAIDA NILO CUNDINAMARCA, LICEO GENERAL GUSTAVO MATAMOROS LEON UBICADO EN LA CIUDAD DE YOPAL, LICEO GENERAL SERVIEZ UBICADO EN LA CIUDAD DE VILLAVICENCIO Y LICEO PICHINCHA UBICADO EN LA CIUDAD DE CALI.

Se presenta el informe de avance correspondiente al período comprendido entre el 22 de septiembre y el 09 de noviembre de 2026, durante el cual se registra un progreso acumulado del 70,00%, ejecutado dentro de los parámetros técnicos y contractuales establecidos.
En este periodo se aprueba un valor total de SEISCIENTOS VEINTIDÓS MILLONES CUATROCIENTOS VEINTIÚN MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS M/CTE ($622,421,994), correspondiente a las actividades anteriormente descritas, las cuales fueron debidamente verificadas y validadas.

EN CONSTANCIA FIRMAN QUIENES INTERVINIERON:

**NESTOR GILBERTO RODRIGUEZ ALVARADO**
Contratista.

**Capitán WILMAN JOSE NIEVES CAMAÑO**
Coordinador Administrativo Liceos del Ejército, y Supervisor de Contrato.

**ANDREA DEL PILAR MATALLANA SANDOVAL**
Arquitecta Asesora Infraestructura Liceos del Ejército.

**Teniente Coronel VICTOR HUGO QUINTERO MARULANDA**
Subdirector y Ordenador del Gasto de los Liceos del Ejército.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
EJÉRCITO NACIONAL
COMANDO DE PERSONAL
LICEOS DEL EJÉRCITO

EJÉRCITO NACIONAL

Bogotá D.C. 10 de noviembre de 2026

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 002 DEL CONTRATO No. 273-CELIC-2026.

## *I. DATOS GENERALES DEL CONTRATO*

| | |
|---|---|
| CONTRATO No. | N°273-CELIC-2026. |
| CDP. No. | 2426 27/ENE/2026. |
| CRP. No. | 37926 27/AGO/2026. |
| OBJETO | **"MANTENIMIENTO, Y/O REMODELACIÓN DE LAS INSTALACIONES DE LOS LICEOS: LICEO SANTA BARBARA UBICADO EN LA CIUDAD DE BOGOTA, FRANCISCO JOSE DE CALDAS UBICADO EN LA BASE MILITAR DE TOLEMAIDA NILO CUNDINAMARCA, LICEO GENERAL GUSTAVO MATOMOROS LEON UBICADO EN LA CIUDAD DE YOPAL, LICEO GENERAL SERVIEZ UBICADO EN LA CIUDAD DE VILLAVICENCIO y LICEO PICHINCHA UBICADO EN LA CIDAD DE CALI".** |
| NOMBRE DEL CONTRATISTA | **NESTOR GILBERTO RODRIGUEZ ALVARADO**<br>NIT.79351368-8<br>CC.79351368 PERSONA NATURAL |
| FECHA DE SUSCRIPCIÓN | 26 de agosto de 2026. |
| VALOR INICIAL DEL CONTRATO | $1.731.444.852,00 (mil setecientos treinta y un millones cuatrocientos cuarenta y cuatro mil ochocientos cincuenta y dos pesos MC/TE). |
| FORMA DE PAGO | ABONO EN CUENTA DEL PROVEEDOR. |
| FECHA DE ENTREGA | 10 de noviembre de 2026. |
| LUGAR DE ENTREGA | La ejecución, mejoramientos, mantenimientos y puesta en funcionamiento se realizarán en las siguientes sedes: |

| LICEO | DIRECCIÓN | CIUDAD |
|---|---|---|
| Liceo Santa Barbara | Escuela De Artillería, Km 3 Vía, Bogotá, D.C | Bogotá, D.C |
| Liceo Francisco José de Caldas | Nilo Cundinamarca en las instalaciones de la Base Militar de Tolemaida | Nilo -Cundinamarca |
| Liceo Gustavo Matamoros León | Avenida marginal de la selva Octava División | Yopal - Casanare |
| Liceo General Serviez | kilómetro 12 vía Puerto López Cantón Militar APIAY | Villavicencio - Meta |
| Liceo Pichincha | Vías Internas Tercera Brigada | Cali<br>Valle del Cauca |

Continuación Informe Supervisión No. 002 del Contrato 273-CELIC-2026, cuyo objeto es el mantenimiento, y/o remodelación de las instalaciones de los Liceos: Liceo Santa Barbara ubicado en la ciudad de Bogotá, Francisco José De Caldas ubicado en la Base Militar de Tolemaida Nilo Cundinamarca, Liceo General Gustavo Matamoros León ubicado en la ciudad de Yopal, Liceo General Serviez ubicado en la ciudad de Villavicencio y Liceo Pichincha ubicado en la ciudad De Cali.

| | |
|---|---|
| | NOTA 1: Se da por entendido que todos los costos de desplazamiento, entrega, imprevistos y demás que se generen correrán por parte del contratista. |
| CONTRATO ADICIONAL No. 1 | OMITIDO |
| AUTORIZACIÓN VIGENCIAS FUTURAS | OMITIDO |
| NOMBRE INTERVENTOR | OMITIDO |
| SUPERVISOR DEL CONTRATO | **Capitán WILMAN JOSE NIEVES CAMAÑO** identificado con cedula de ciudadanía 1.067.095.872 de Buenavista y/o quien haga sus veces debidamente encargado, Nombrado mediante Resolución N°049 del 14 de julio de 2026. |

## *II. APROBACIÓN PÓLIZA*

Por encontrarse la Garantía Única de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 7º de la Ley 1150 de 2007 y en los artículos 5.1.11º y 5.1.12º del Decreto 0734 de 2012, fue aprobada póliza de SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL N° 21-44-1015055828 de fecha 28 de agosto de 2026 y póliza CIVIL EXTRACONTRACTUAL N° 21-40-101280283 de fecha 28 de agosto de 2026 expedida por SEGUROS DEL ESTADO que cubre los riesgos de:

| VIGENCIAS Y AMPAROS CONSTITUIDOS | |
|---|---|
| **A. CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO** | |
| VALOR ASEGURADO: | $173,144,485.20 |
| VIGENCIA: | 27/08/2026 hasta 31/07/2027<br>Vigente por el plazo de ejecución del contrato y seis (8) meses más. |
| **B. ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA** | |
| VALOR ASEGURADO: | $346,288,970.40 |
| VIGENCIA: | 27/08/2026 hasta 31/07/2031<br>SI AMPARA 5 AÑOS, 0 MESES Y 0 DÍAS* |
| **C. PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES** | |
| VALOR ASEGURADO: | $86,572,242.60 |
| VIGENCIA: | 27/08/2026 hasta 31/11/2029<br>Vigente por el plazo de ejecución del contrato y tres (3) años más. |
| **D. CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES** | |
| VALOR ASEGURADO: | $346,288,970.40 |

Continuación Informe Supervisión No. 002 del Contrato 273-CELIC-2026, cuyo objeto es el mantenimiento, y/o remodelación de las instalaciones de los Liceos: Liceo Santa Barbara ubicado en la ciudad de Bogotá, Francisco José De Caldas ubicado en la Base Militar de Tolemaida Nilo Cundinamarca, Liceo General Gustavo Matamoros León ubicado en la ciudad de Yopal, Liceo General Serviez ubicado en la ciudad de Villavicencio y Liceo Pichincha ubicado en la ciudad De Cali.

| | |
|---|---|
| VIGENCIA: | 27/08/2026 hasta 31/11/2027<br>Un (1) año contando a partir del recibo a satisfacción de la obra. |

| POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL | |
|---|---|
| **A. CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO** | |
| VALOR ASEGURADO: | $350,181,000.00 |
| VIGENCIA: | El valor No debe ser inferior a : Doscientos (200) SMMLV, el plazo Igual al periodo de ejecución del Contrato. |

Aprobada por el ordenador del gasto según acta No. 1275 folio 39 del 31 de agosto de 2026.

## *III. MODIFICATORIOS Y/O ADICIONALES*

Omitido.

## *IV. SERVICIOS RECIBIDOS*

Cuyo objeto es, el mantenimiento, y/o remodelación de las instalaciones de los Liceos: Liceo Santa Barbara ubicado en la ciudad de Bogotá, Francisco José De Caldas ubicado en la Base Militar de Tolemaida Nilo Cundinamarca, Liceo General Gustavo Matamoros León ubicado en la ciudad de Yopal, Liceo General Serviez ubicado en la ciudad de Villavicencio y Liceo Pichincha ubicado en la ciudad De Cali. Celebrado entre el Ministerio de Defensa Nacional – Ejército Nacional – Liceos del Ejército y NESTOR GILBERTO RODRIGUEZ ALVARADO, los servicios del Contrato los cuales corresponden a lo ejecutado en el periodo del 22 de septiembre al 09 de noviembre de 2026, periodo de ejecución del presente informe, como avance, así:

| | | | ACTA ANTERIOR (ACTA 001) | | | ACTA 002 (PRESENTE ACTA) | | | CONSOLIDADO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ITEM | | DESCRIPCION | +;-; | CANTIDAD EJECUTADA | VALOR EJECUTADO | +;-; | CANTIDAD EJECUTADA | VALOR EJECUTADO | CANTIDAD TOTAL EJECUTADA | VALOR TOTAL |
| | | | | | | | | | | |
| **A- LICEO SANTA BÁRBARA - BOGOTÁ (CAMBIO DE CUBIERTA Y ACTUALIZACIÓN REDES DE ILUMINACIÓN SALONES DE BLOQUE BACHILLERATO BAJO)** | | | | | | | | | | |
| **A1C** | **PRELIMINARES** | | | | | | | | | |
| 1 | A1C.1 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERRAMIENTO PROVISIONAL EN TELA EN POLIPROPILENO VERDE DE 2,10 M DE ALTURA, SOPORTADA MEDIANTE POSTES PARA CERCA DE 2,50 M DE LONGITUD, DISPUESTOS CADA 2,50 M. INCLUYE POSTES O ELEMENTOS DE SOPORTE, TENSADO, AMARRES, SUMINISTRO DE MATERIALES, TRANSPORTE, INSTALACIÓN Y TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y ESTABILIDAD. ASIMISMO, INCLUYE EL DESMONTAJE, RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL DEL CERRAMIENTO UNA VEZ FINALIZADOS LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO OBJETO DEL CONTRATO. | 0.00 | 60.00 | $ 1,740,000.00 | 0.00 | 60.00 | $ 1,740,000.00 | 120.00 | $ 3,480,000.00 |



Calle 100 # 11 - 00
Tel 6019157054 Ext. 2006 Bogotá, D.C
precontractual@liceosejercito.edu.co

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | A1C.2 | DESMONTE DE CUBIERTA EN FIBROCEMENTO, (INCLUYE PROTECCIÓN DE ÁREAS INFERIORES, ACOPIOS TEMPORALES, ENLONADO, CARGUE Y RETIRO DE MATERIAL DESMONTADO CON DISPOSICIÓN FINAL FUERA DE LAS INSTALACIONES EN SITIO AUTORIZADO). | 0.00 | 700.00 | $ 10,990,000.00 | 0.00 | 643.00 | $ 10,095,100.00 | 1,343.00 | $ 21,085,100.00 |
| 3 | A1C.3 | RETIRO DE CIELO RASO EXISTENTE, PERFILERÍA Y LÁMINAS (INCLUYE PROTECCIÓN DE ÁREAS INFERIORES, ACOPIOS TEMPORALES, ENLONADO, CARGUE Y RETIRO DE MATERIAL DESMONTADO CON DISPOSICIÓN FINAL FUERA DE LAS INSTALACIONES EN SITIO AUTORIZADO). | 0.00 | 70.00 | $ 840,000.00 | 0.00 | 74.00 | $ 888,000.00 | 144.00 | $ 1,728,000.00 |
| 4 | A1C.4 | DESMONTE ESTRUCTURA CUBIERTA EXISTENTE (CERCHAS Y DEMAS ELEMENTOS ESTRUCTURALES PRINCIPALES). | 0.00 | 450.00 | $ 4,725,000.00 | 0.00 | 222.00 | $ 2,331,000.00 | 672.00 | $ 7,056,000.00 |
| Subtotal | | | | | **$ 18,295,000.00** | | | **$ 15,054,100.00** | | **$ 33,349,100.00** |
| **A2C** | **CUBIERTA** | | | | | | | | | |
| 5 | A2C.1 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN TEJA SIN TRASLAPO - TST STANDING SEAM 450MM DE 2", FABRICADA EN LÁMINA DE ACERO GALVANIZADO Z 180 PREPINTADO SUPER POLIÉSTER . INCLUYE REMATES, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, SELLANTES, (TORNILLERIA OCULTA Y SISTEMA DE FIJACIÓN, SELLANTES Y REMATES, CUMBRERAS, BABEROS Y TAPAJUNTAS, INSTALACIÓN Y TRANSPORTE) INCLUYE REMATES, FILOS, CANTOS Y ELEMENTOS LINEALES, SIN PAGO ADICIONAL. | -192.00 | 751.00 | $ 62,708,500.00 | -192.00 | 400.00 | $ 33,400,000.00 | 1,151.00 | $ 96,108,500.00 |
| 6 | A2C.2 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CIELO RASO EN LÁMINA PVC 7 MM (INCLUYE PERFILERÍA DE SOPORTE, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, REMATE PERIMETRAL TIPO CORNISA, NIVELACIÓN Y ACABADO FINAL) INCLUYE REMATES, FILOS, CANTOS Y ELEMENTOS LINEALES, SIN PAGO ADICIONAL. | -848.00 | | $ 0.00 | -848.00 | | $ 0.00 | 0.00 | $ 0.00 |
| Subtotal | | | | | **$ 62,708,500.00** | | | **$ 33,400,000.00** | | **$ 96,108,500.00** |
| **A3C** | **ELECTRICO** | | | | | | | | | |
| 7 | A3C.1 | DESMONTE DE ELEMENTOS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS EXISTENTES (LUMINARIAS, CÁMARAS, SENSORES Y EQUIPOS SIMILARES). (INCLUYE DESCONEXIÓN SEGURA, CARGUE, RETIRO Y DISPOSICIÓN). | -43.00 | 60.00 | $ 945,900.00 | -43.00 | | $ 0.00 | 60.00 | $ 945,900.00 |
| 8 | A3C.2 | SALIDA ILUMINACIÓN DESCOLGADA EN TUBERÍA PVC CONDUIT 1/2", ALAMBRE NO 12 AWG PROM 3 M" (INCLUYE CAJAS, ACCESORIOS E INSTALACIÓN COMPLETA OPERATIVA, PARA INTERIOR Y PARA EXTERIOR). | -103.00 | | $ 0.00 | -103.00 | | $ 0.00 | 0.00 | $ 0.00 |
| 9 | A3C.3 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR ENCHUFABLE 1X30A. CALIDAD LEGRAND, SIEMENS, SQARE D O SUPERIOR DE MARCA RECONOCIDA Y HOMOLOGADA POR EL CIDET (INCLUYE CAJA, CONEXIÓN Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO). | -23.00 | | $ 0.00 | -23.00 | | $ 0.00 | 0.00 | $ 0.00 |
| 10 | A3C.4 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN PANEL LED CUADRADO 60 X 60 52W, INCLUYE GUAYAS DE COLGAR Y DEMÁS ELEMENTOS PARA SU PERFECTA INSTALACIÓN. | -91.00 | | $ 0.00 | -91.00 | | $ 0.00 | 0.00 | $ 0.00 |
| 11 | A3C.5 | SALIDA TOMA ELÉCTRICA, INCLUYE REGATA, APARATO, CAJA 5800, TUBERÍA, ALAMBRE DE COBRE THW 12 AWG. ADAPTADORES. L HASTA 4,5 ML | -23.00 | | $ 0.00 | -23.00 | | $ 0.00 | 0.00 | $ 0.00 |
| 12 | A3C.6 | LUMINARIA PARA EXTERIOR. | -12.00 | | $ 0.00 | -12.00 | | $ 0.00 | 0.00 | $ 0.00 |
| 13 | A3C.7 | REINSTALACIÓN DE EQUIPOS ELÉCTRICOS, ELECTRÓNICOS Y DE COMUNICACIONES EXISTENTES, INCLUYENDO DESMONTE TEMPORAL CUANDO APLIQUE, ALMACENAMIENTO, REUBICACIÓN, INSTALACIÓN, CONEXIÓN, FIJACIÓN, CONFIGURACIÓN BÁSICA Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO. | -5.00 | | $ 0.00 | -5.00 | | $ 0.00 | 0.00 | $ 0.00 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Subtotal | | | | | **$ 945,900.00** | | | **$ 0.00** | | **$ 945,900.00** |
| **A4C** | **CARPINTERÍA METÁLICA Y/O ESTRUCTURA METÁLICA** | | | | | | | | | |
| 14 | A4C.1 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REFUERZO EN PERFIL METÁLICO CAL 14 Y/O 16 (ELABORACIÓN DE CERCHAS CUANDO APLIQUE DISEÑO ESTRUCTURAL Y PLANOS, INSTALACIÓN DE CORREAS, INCLUYE FABRICACIÓN, TRANSPORTE, MONTAJE, SOLDADURA, TRATAMIENTO ANTICORROSIVO, PINTURA EN ESMALTE, PERNOS Y ANCLAJES DE ELEMENTOS DE FIJACIÓN). | 0.00 | 4,852.00 | $ 103,774,576.00 | 0.00 | 3,148.00 | $ 67,329,424.00 | 8,000.00 | $ 171,104,000.00 |
| Subtotal | | | | | **$ 103,774,576.00** | | | **$ 67,329,424.00** | | **$ 171,104,000.00** |
| **A5C** | **MUROS** | | | | | | | | | |
| 15 | A5C.1 | MURO EN BLOQUE Nº 4 E = 0.10 m (NIVELACIÓN DE CUBIERTAS) INCLUYE FILOS, ENCUENTROS, REMATES Y AJUSTES PROPIOS DE LA MODULACIÓN DEL MURO, SIN PAGO ADICIONAL. | -95.00 | | $ 0.00 | -95.00 | 30.00 | $ 1,800,000.00 | 30.00 | $ 1,800,000.00 |
| 16 | A5C.2 | PAÑETE LISO MUROS 1:3 INTERIOR INCLUYE REMATES, FILOS, CANTOS Y ELEMENTOS LINEALES, DILATACIONES SIN PAGO ADICIONAL. | -24.00 | | $ 0.00 | -24.00 | 20.00 | $ 640,000.00 | 20.00 | $ 640,000.00 |
| 17 | A5C.3 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN. MURO EN DRYWALL DOBLE CARA E: 10CM, (INCLUYE ESTRUCTURA (CANALES Y PARALES) GALVANIZADA BASE 9, CALIBRE 24, CINTA DE PAPEL, MASILLADO, LIJADO Y SELLADO DE UNIONES Y CABEZAS DE TORNILLOS, INCLUYE REFUERZO EN MADERA PARA MARCO DE PUERTA ). INCLUYE REMATES, FILOS, CANTOS Y ELEMENTOS LINEALES, SIN PAGO ADICIONAL. | -30.00 | | $ 0.00 | -30.00 | | $ 0.00 | 0.00 | $ 0.00 |
| 18 | A5C.4 | PINTURA EN VINILO TIPO 2 SOBRE MURO EN DRYWALL INCLUYE REMATES, FILOS, CANTOS Y ELEMENTOS LINEALES, SIN PAGO ADICIONAL. | -59.00 | | $ 0.00 | -59.00 | | $ 0.00 | 0.00 | $ 0.00 |
| 19 | A5C.5 | ESTUCO PLASTICO SOBRE MURO PAÑETADO INCLUYE REMATES, FILOS, CANTOS Y ELEMENTOS LINEALES, SIN PAGO ADICIONAL. | -20.00 | | $ 0.00 | -20.00 | | $ 0.00 | 0.00 | $ 0.00 |
| 20 | A5C.6 | PINTURA EN VINILO TIPO 2 SOBRE MURO ESTUCADO INCLUYE REMATES, FILOS, CANTOS Y ELEMENTOS LINEALES, SIN PAGO ADICIONAL. | -20.00 | | $ 0.00 | -20.00 | | $ 0.00 | 0.00 | $ 0.00 |
| Subtotal | | | | | **$ 0.00** | | | **$ 2,440,000.00** | | **$ 2,440,000.00** |
| **A6C** | **AGUAS LLUVIAS** | | | | | | | | | |
| 21 | A6C.1 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANAL EN LÁMINA GALVANIZADA CAL. 22; DS=70 CON ELEMENTOS DE FIJACIÓN (INCLUYE FABRICACIÓN, SOPORTES METÁLICOS CADA 1.20m, PENDIENTE MÍNIMA DEL 1%, UNIONES SELLADAS, FIJACIÓN A ESTRUCTURA, INSTALACIÓN COMPLETA, TAPAS Y SOSCOS). | -150.00 | | $ 0.00 | -150.00 | | $ 0.00 | 0.00 | $ 0.00 |
| 22 | A6C.2 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BAJANTES EN PVC AGUAS LLUVIAS D=6" (INCLUYE ACCESORIOS COMO CODOS Y UNIONES, ANCLAJES Y CONEXIÓN A RED EXISTENTE). | -60.00 | | $ 0.00 | -60.00 | | $ 0.00 | 0.00 | $ 0.00 |
| 23 | A6C.3 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN FLANCHE EN LÁMINA GALVANIZADA, D: 30CM CAIBRE 26. INCLUYE PINTURA Y SELLOS. | -20.00 | | $ 0.00 | -20.00 | | $ 0.00 | 0.00 | $ 0.00 |
| Subtotal | | | | | **$ 0.00** | | | **$ 0.00** | | **$ 0.00** |
| **A7** | **ASEO** | | | | | | | | | |
| 24 | A7C.1 | ASEO GENERAL | -1,343.00 | | $ 0.00 | | | $ 0.00 | 0.00 | $ 0.00 |
| Subtotal | | | | | **$ 0.00** | | | **$ 0.00** | | **$ 0.00** |
| **Subtotal LICEO SANTA BÁRBARA - BOGOTÁ** | | | | | **$ 185,723,976.00** | | | **$ 118,223,524.00** | | **$ 303,947,500.00** |

| B -LICEO FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS -TOLEMAIDA (REMODELACIÓN BAÑOS PRIMARIA) | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **B1B** | **PRELIMINARES** | | | | | | | | | |
| 24 | B1B.1 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERRAMIENTO PROVISIONAL EN TELA EN POLIPROPILENO VERDE DE 2,10 M DE ALTURA, SOPORTADA MEDIANTE POSTES PARA CERCA DE 2,50 M DE LONGITUD, DISPUESTOS CADA 2,50 M. INCLUYE POSTES O ELEMENTOS DE SOPORTE, TENSADO, AMARRES, SUMINISTRO DE MATERIALES, TRANSPORTE, INSTALACIÓN Y TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y ESTABILIDAD. ASIMISMO, INCLUYE EL DESMONTAJE, RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL DEL CERRAMIENTO UNA VEZ FINALIZADOS LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO OBJETO DEL CONTRATO. | 0.00 | 15.00 | $ 450,000.00 | 0.00 | | $ 0.00 | 15.00 | $ 450,000.00 |
| 25 | B1B.2 | DEMOLICIÓN MUROS EN MAMPOSTERÍA 0.15 M (INCLUYE CARGUE, ENLONADO Y RETIRO DE MATERIAL FUERA DE LAS INSTALACIONES). | -13.00 | | $ 0.00 | -13.00 | 12.00 | $ 290,076.00 | 12.00 | $ 290,076.00 |
| 26 | B1B.3 | DEMOLICIÓN PLACA PISO 0.20 M (INCLUYE CARGUE, ENLONADO Y RETIRO DE MATERIAL FUERA DE LAS INSTALACIONES). | -13.00 | | $ 0.00 | -13.00 | 25.00 | $ 1,024,725.00 | 25.00 | $ 1,024,725.00 |
| 27 | B1B.4 | DEMOLICIÓN ENCHAPE DE PISOS (INCLUYE DEMOLICIÓN DE GUARDAESCOBA, INCLUYE CARGUE, ENLONADO Y RETIRO DE MATERIAL FUERA DE LAS INSTALACIONES). | 0.00 | 38.00 | $ 718,884.00 | 0.00 | | $ 0.00 | 38.00 | $ 718,884.00 |
| 28 | B1B.5 | DEMOLICIÓN ENCHAPE DE PARED (INCLUYE CARGUE, ENLONADO Y RETIRO DE MATERIAL FUERA DE LAS INSTALACIONES). | -8.98 | 96.02 | $ 1,917,423.38 | -8.98 | | $ 0.00 | 96.02 | $ 1,917,423.38 |
| 29 | B1B.6 | DESMONTE DIVISIONES EXISTENTES (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE MATERIAL FUERA DE LAS INSTALACIONES). | -3.05 | 26.95 | $ 424,866.75 | -3.05 | | $ 0.00 | 26.95 | $ 424,866.75 |
| 30 | B1B.7 | DESMONTE APARATOS SANITARIOS Y LAVAMANOS (INCLUYE CARGUE Y RETIRO FUERA DE LAS INSTALACIONES). | -1.00 | 19.00 | $ 698,915.00 | -1.00 | | $ 0.00 | 19.00 | $ 698,915.00 |
| 31 | B1B.8 | DESMONTE ESPEJO EXISTENTE (INCLUYE CARGUE Y RETIRO FUERA DE LAS INSTALACIONES). | -0.69 | 7.31 | $ 87,720.00 | -0.69 | | $ 0.00 | 7.31 | $ 87,720.00 |
| 32 | B1B.9 | DEMOLICIÓN MESÓN EXISTENTE (INCLUYE CARGUE Y RETIRO FUERA DE LAS INSTALACIONES). | -435.88 | 8.12 | $ 121,800.00 | -435.88 | | $ 0.00 | 8.12 | $ 121,800.00 |
| 33 | B1B.10 | PAÑETE LISO MUROS 1:3 INTERIOR INCLUYE REMATES, FILOS, CANTOS Y ELEMENTOS LINEALES, DILATACIONES SIN PAGO ADICIONAL. | 0.00 | | $ 0.00 | 0.00 | 45.98 | $ 1,471,400.00 | 45.98 | $ 1,471,400.00 |
| Subtotal | | | | | **$ 4,419,609.13** | | | **$ 2,786,201.00** | | **$ 7,205,810.13** |
| **B2B** | **PISOS Y ENCHAPES** | | | | | | | | | |
| 34 | B2B.1 | ALISTADO ENDURECIDO 1:3, E=0.04 | 0.00 | | $ 0.00 | 0.00 | 38.00 | $ 2,166,000.00 | 38.00 | $ 2,166,000.00 |
| 35 | B2B.2 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN CERÁMICA PISO TRÁFICO 5, CALIDAD PRIMERA (FORMATO 45X45). | 0.00 | | $ 0.00 | 0.00 | 38.00 | $ 3,714,234.00 | 38.00 | $ 3,714,234.00 |
| 36 | B2B.3 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN BALDOSA CERÁMICA PARED CALIDAD PRIMERA (FORMATO 30X45 COLOR BLANCO MATE, INCLUYE CORTES, FILOS, BORDES, REMATES Y LA EJECUCIÓN DE FRANJAS O ÁREAS CON DIMENSIÓN MENOR A 0.50 m, INCLUYE DESPERDICIOS, CORTES ESPECIALES Y AJUSTES NECESARIOS SIN RECONOCIMIENTO ADICIONAL). | -5.67 | | $ 0.00 | -5.67 | 99.33 | $ 8,873,645.55 | 99.33 | $ 8,873,645.55 |
| 37 | B2B.4 | PLACA BASE CONCRETO 0.10 2500 PSI. | 9.00 | | $ 0.00 | 9.00 | 24.00 | $ 1,891,800.00 | 24.00 | $ 1,891,800.00 |
| 38 | B2B.5 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MESÓN EN QUARZTONE. | -8.00 | | $ 0.00 | -8.00 | | $ 0.00 | 0.00 | $ 0.00 |
| Subtotal | | | | | **$ 0.00** | | | **$ 16,645,679.55** | | **$ 16,645,679.55** |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **B3B** | **CARPINTERÍA METÁLICA Y/O ESTRUCTURA METÁLICA** | | | | | | | | | |
| 39 | B3B.1 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DIVISIÓN PARA BAÑO EN ACERO INOXIDABLE 304 CAL.20 (INCLUYE PUERTAS Y ACCESORIOS). | -24.00 | | $ 0.00 | -24.00 | | $ 0.00 | 0.00 | $ 0.00 |
| 40 | B3B.2 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN VIDRIO DE 4MM SANDBLASTING. | -24.00 | | $ 0.00 | -24.00 | | $ 0.00 | 0.00 | $ 0.00 |
| 41 | B3B.3 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN ESPEJO INCOLORO 4 MM . | -7.00 | | $ 0.00 | -7.00 | | $ 0.00 | 0.00 | $ 0.00 |
| 42 | B3B.4 | LIJADA Y PINTADA MARCO DE VENTANA EXISTENTE INCLUYENDO PARALES (PINTURA ANTICORROSIVA). | -10.00 | | $ 0.00 | -10.00 | | $ 0.00 | 0.00 | $ 0.00 |
| Subtotal | | | | | **$ 0.00** | | | **$ 0.00** | | **$ 0.00** |
| **B4B** | **CIELO RASO** | | | | | | | | | |
| 43 | B4B.1 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CIELO RASO EN LÁMINA PVC 7 MM (INCLUYE PERFILERÍA DE SOPORTE, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, REMATE PERIMETRAL TIPO CORNISA, NIVELACIÓN Y ACABADO FINAL) INCLUYE REMATES, FILOS, CANTOS Y ELEMENTOS LINEALES, SIN PAGO ADICIONAL. | 0.00 | | $ 0.00 | 0.00 | 38.00 | $ 2,795,660.00 | 38.00 | $ 2,795,660.00 |
| Subtotal | | | | | **$ 0.00** | | | **$ 2,795,660.00** | | **$ 2,795,660.00** |
| **B5B** | **ELECTRICO** | | | | | | | | | |
| 44 | B5B.1 | DESMONTE DE ELEMENTOS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS EXISTENTES (LUMINARIAS, CÁMARAS, SENSORES Y EQUIPOS SIMILARES). (INCLUYE DESCONEXIÓN SEGURA, CARGUE, RETIRO Y DISPOSICIÓN). | -7.00 | | $ 0.00 | -7.00 | | $ 0.00 | 0.00 | $ 0.00 |
| 45 | B5B.2 | SALIDA ILUMINACIÓN DESCOLGADA EN TUBERÍA PVC CONDUIT 1/2", ALAMBRE NO 12 AWG PROM 3 M" (INCLUYE CASIAS, ACCESORIOS E INSTALACIÓN COMPLETA OPERATIVA). | -7.00 | | $ 0.00 | -7.00 | | $ 0.00 | 0.00 | $ 0.00 |
| 46 | B5B.3 | SALIDA TOMA ELÉCTRICA, INCLUYE REGATA, APARATO, CAJA 5800, TUBERÍA, ALAMBRE DE COBRE THW 12 AWG. ADAPTADORES. L HASTA 4,5 ML. | -6.00 | | $ 0.00 | -6.00 | | $ 0.00 | 0.00 | $ 0.00 |
| 47 | B5B.4 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIAS BALA LED ( INCLUYE APERTURA DE CIELO RASO Y CONEXIÓN ELECTRICA) . | -7.00 | | $ 0.00 | -7.00 | | $ 0.00 | 0.00 | $ 0.00 |
| Subtotal | | | | | **$ 0.00** | | | **$ 0.00** | | **$ 0.00** |
| **B6B** | **INSTALACIONES HIDRAULICAS Y SANITARIAS** | | | | | | | | | |
| 48 | B6B.1 | PUNTO HIDRÁULICO PVC-P/PARAL 1/2". | 0.00 | | $ 0.00 | 0.00 | 12.00 | $ 1,299,036.00 | 12.00 | $ 1,299,036.00 |
| 49 | B6B.2 | SALIDA SANITARIA PVC-S/PARAL 4". | -2.00 | | $ 0.00 | -2.00 | 4.00 | $ 580,152.00 | 4.00 | $ 580,152.00 |
| 50 | B6B.3 | REGISTRO 1/2". | -2.00 | | $ 0.00 | -2.00 | 2.00 | $ 180,772.00 | 2.00 | $ 180,772.00 |
| 51 | B6B.4 | SALIDA SANITARIA PVC-S/PARAL 2". | 8.00 | | $ 0.00 | 8.00 | 14.00 | $ 1,589,112.00 | 14.00 | $ 1,589,112.00 |
| 52 | B6B.5 | RED SANITARIA PVC-S 4". | 0.00 | | $ 0.00 | 0.00 | 25.00 | $ 1,812,975.00 | 25.00 | $ 1,812,975.00 |
| 53 | B6B.6 | RED SUMINISTRO PVC 1/2". | 0.00 | | $ 0.00 | 0.00 | 25.00 | $ 367,850.00 | 25.00 | $ 367,850.00 |
| 54 | B6B.7 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN SANITARIO TANQUE (INCLUYE GRIFERÍA TIPO PUSH). | -6.00 | | $ 0.00 | -6.00 | 0.00 | $ 0.00 | 0.00 | $ 0.00 |
| 55 | B6B.8 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN LAVAMANOS DE EMPOTRAR(INCLUYE GRIFERÍA INSTITUCIONAL). | -10.00 | | $ 0.00 | -10.00 | 0.00 | $ 0.00 | 0.00 | $ 0.00 |
| 56 | B6B.9 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN ORINAL DE LLAVE (INCLUYE GRIFERÍA TIPO PUCH) . | -4.00 | | $ 0.00 | -4.00 | 0.00 | $ 0.00 | 0.00 | $ 0.00 |
| 57 | B6B.10 | CAJA DE INSPECCIÓN DE 60X60. | -1.00 | | $ 0.00 | -1.00 | 1.00 | $ 404,635.00 | 1.00 | $ 404,635.00 |
| 58 | B6B.11 | SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURA EN CONCRETO REFORZADO PARA SOPORTE DE TANQUE ELEVADO (INCLUYE EXCAVACIÓN, CIMENTACIÓN, COLUMNAS, VIGAS, PLACA DE APOYO, ACERO DE REFUERZO, CONCRETO, FORMALETA, TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE 1.000 LITROS, BOMBA ELÉCTRICA DE 0,5 HP, ACCESORIOS, CONEXIONES HIDRÁULICAS Y ELÉCTRICAS NECESARIAS, PRUEBAS Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO). | -1.00 | | $ 0.00 | -1.00 | | $ 0.00 | 0.00 | $ 0.00 |
| Subtotal | | | | | **$ 0.00** | | | **$ 6,234,532.00** | | **$ 6,234,532.00** |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **B7B** | **ASEO BAÑOS** | | | | | | | | | |
| 59 | B7B.1 | ASEO GENERAL | -38.00 | | $ 0.00 | -38.00 | | $ 0.00 | 0.00 | $ 0.00 |
| Subtotal | | | | | **$ 0.00** | | | **$ 0.00** | | **$ 0.00** |
| Subtotal LICEO FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS - TOLEMAIDA | | | | | **$ 4,419,609.13** | | | **$ 28,462,072.55** | | **$ 32,881,681.68** |
| **C- LICEO GUSTAVO MATAMOROS LEÓN - YOPAL (CAMBIO CUBIERTAS Y ACTUALIZACIÓN REDES DE ILUMINACIÓN BLOQUE SALÓN DE SISTEMAS)** | | | | | | | | | | |
| **C1C** | **PRELIMINARES** | | | | | | | | | |
| 60 | C1C.1 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERRAMIENTO PROVISIONAL EN TELA EN POLIPROPILENO VERDE DE 2,10 M DE ALTURA, SOPORTADA MEDIANTE POSTES PARA CERCA DE 2,50 M DE LONGITUD, DISPUESTOS CADA 2,50 M. INCLUYE POSTES O ELEMENTOS DE SOPORTE, TENSADO, AMARRES, SUMINISTRO DE MATERIALES, TRANSPORTE, INSTALACIÓN Y TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y ESTABILIDAD. ASIMISMO, INCLUYE EL DESMONTAJE, RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL DEL CERRAMIENTO UNA VEZ FINALIZADOS LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO OBJETO DEL CONTRATO. | 0.00 | 60.00 | $ 1,800,000.00 | 0.00 | 60.00 | $ 1,800,000.00 | 120.00 | $ 3,600,000.00 |
| 61 | C1C.2 | DESMONTE DE CUBIERTA EN FIBROCEMENTO, (INCLUYE PROTECCIÓN DE ÁREAS INFERIORES, ACOPIOS TEMPORALES, ENLONADO, CARGUE Y RETIRO DE MATERIAL DESMONTADO CON DISPOSICIÓN FINAL FUERA DE LAS INSTALACIONES EN SITIO AUTORIZADO). | 0.00 | 550.80 | $ 8,647,560.00 | 0.00 | 505.20 | $ 7,931,640.00 | 1,056.00 | $ 16,579,200.00 |
| 62 | C1C.3 | RETIRO DE CIELO RASO EXISTENTE, PERFILERÍA Y LÁMINAS (INCLUYE PROTECCIÓN DE ÁREAS INFERIORES, ACOPIOS TEMPORALES, ENLONADO, CARGUE Y RETIRO DE MATERIAL DESMONTADO CON DISPOSICIÓN FINAL FUERA DE LAS INSTALACIONES EN SITIO AUTORIZADO). | 0.00 | 550.80 | $ 6,609,600.00 | 0.00 | 591.20 | $ 7,094,400.00 | 1,142.00 | $ 13,704,000.00 |
| 63 | C1C.4 | DESMONTE ESTRUCTURA CUBIERTA EXISTENTE (CERCHAS Y DEMAS ELEMENTOS ESTRUCTURALES PRINCIPALES). | -984.31 | | $ 0.00 | -984.31 | 71.69 | $ 752,745.00 | 71.69 | $ 752,745.00 |
| Subtotal | | | | | **$ 17,057,160.00** | | | **$ 17,578,785.00** | | **$ 34,635,945.00** |
| **C2C** | **CUBIERTA** | | | | | | | | | |
| 64 | C2C.1 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN TEJA SIN TRASLAPO - TST STANDING SEAM 450MM DE 2", FABRICADA EN LÁMINA DE ACERO GALVANIZADO Z 180 PREPINTADO SUPER POLIÉSTER . INCLUYE REMATES, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, SELLANTES, (TORNILLERIA OCULTA Y SISTEMA DE FIJACIÓN, SELLANTES Y REMATES, CUMBRERAS, BABEROS Y TAPAJUNTAS, INSTALACIÓN Y TRANSPORTE) INCLUYE REMATES, FILOS, CANTOS Y ELEMENTOS LINEALES, SIN PAGO ADICIONAL. | 0.00 | | $ 0.00 | 0.00 | 1,056.00 | $ 88,176,000.00 | 1,056.00 | $ 88,176,000.00 |
| 65 | C2C.2 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CIELO RASO EN LÁMINA PVC 7 MM (INCLUYE PERFILERÍA DE SOPORTE, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, REMATE PERIMETRAL TIPO CORNISA, NIVELACIÓN Y ACABADO FINAL) INCLUYE REMATES, FILOS, CANTOS Y ELEMENTOS LINEALES, SIN PAGO ADICIONAL. | 0.00 | | $ 0.00 | 0.00 | 511.00 | $ 37,594,270.00 | 511.00 | $ 37,594,270.00 |
| Subtotal | | | | | **$ 0.00** | | | **$ 125,770,270.00** | | **$ 125,770,270.00** |
| **C3C** | **ELECTRICO** | | | | | | | | | |
| 66 | C3C.1 | DESMONTE DE ELEMENTOS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS EXISTENTES (LUMINARIAS, CÁMARAS, SENSORES Y EQUIPOS SIMILARES). (INCLUYE DESCONEXIÓN SEGURA, CARGUE, RETIRO Y DISPOSICIÓN). | 0.00 | 35.00 | $ 551,775.00 | 0.00 | 35.00 | $ 551,775.00 | 70.00 | $ 1,103,550.00 |
| 67 | C3C.2 | SALIDA ILUMINACIÓN DESCOLGADA EN TUBERÍA PVC CONDUIT 1/2", ALAMBRE NO 12 AWG PROM 3 M" (INCLUYE CAJAS, ACCESORIOS E INSTALACIÓN COMPLETA OPERATIVA, PARA INTERIOR Y PARA EXTERIOR). | 0.00 | | $ 0.00 | 0.00 | 59.00 | $ 5,890,855.00 | 59.00 | $ 5,890,855.00 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 68 | C3C.3 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR ENCHUFABLE 1X30A. CALIDAD LEGRAND, SIEMENS, SQARE D O SUPERIOR DE MARCA RECONOCIDA Y HOMOLOGADA POR EL CIDET (INCLUYE CAJA, CONEXIÓN Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO). | 0.00 | | $ 0.00 | 0.00 | 13.00 | $ 888,095.00 | 13.00 | $ 888,095.00 |
| 69 | C3C.4 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN PANEL LED CUADRADO 60 X 60 52W, INCLUYE GUAYAS DE COLGAR Y DEMÁS ELEMENTOS PARA SU PERFECTA INSTALACIÓN. | 0.00 | | $ 0.00 | 0.00 | 22.00 | $ 3,352,690.00 | 22.00 | $ 3,352,690.00 |
| 70 | C3C.5 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIAS BALA LED ( INCLUYE APERTURA DE CIELO RASO Y CONEXIÓN ELECTRICA) - | -15.00 | | $ 0.00 | -15.00 | 12.00 | $ 540,000.00 | 12.00 | $ 540,000.00 |
| 71 | C3C.6 | SALIDA TOMA ELÉCTRICA, INCLUYE REGATA, APARATO, CAJA 5800, TUBERÍA, ALAMBRE DE COBRE THW 12 AWG. ADAPTADORES. L HASTA 4,5 ML | 0.00 | | $ 0.00 | 0.00 | 13.00 | $ 2,186,080.00 | 13.00 | $ 2,186,080.00 |
| 72 | C3C.7 | LUMINARIA PARA EXTERIOR. | 0.00 | | $ 0.00 | 0.00 | 7.00 | $ 700,000.00 | 7.00 | $ 700,000.00 |
| 73 | C3C.8 | REINSTALACIÓN DE EQUIPOS ELÉCTRICOS, ELECTRÓNICOS Y DE COMUNICACIONES EXISTENTES, INCLUYENDO DESMONTE TEMPORAL CUANDO APLIQUE, ALMACENAMIENTO, REUBICACIÓN, INSTALACIÓN, CONEXIÓN, FIJACIÓN, CONFIGURACIÓN BÁSICA Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO. | 0.00 | | $ 0.00 | 0.00 | 10.00 | $ 520,000.00 | 10.00 | $ 520,000.00 |
| Subtotal | | | | | **$ 551,775.00** | | | **$ 14,629,495.00** | | **$ 15,181,270.00** |
| **C4C** | **CARPINTERÍA METÁLICA Y/O ESTRUCTURA METÁLICA** | | | | | | | | | |
| 74 | C4C.1 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REFUERZO EN PERFIL METÁLICO CAL 14 Y/O 16 (ELABORACIÓN DE CERCHAS CUANDO APLIQUE DISEÑO ESTRUCTURAL Y PLANOS, INSTALACIÓN DE CORREAS, INCLUYE FABRICACIÓN, TRANSPORTE, MONTAJE, SOLDADURA, TRATAMIENTO ANTICORROSIVO, PINTURA EN ESMALTE, PERNOS Y ANCLAJES DE ELEMENTOS DE FIJACIÓN). | 0.00 | 3,882.24 | $ 83,033,349.12 | 0.00 | 3,580.76 | $ 76,585,294.88 | 7,463.00 | $ 159,618,644.00 |
| Subtotal | | | | | **$ 83,033,349.12** | | | **$ 76,585,294.88** | | **$ 159,618,644.00** |
| **C5C** | **AGUAS LLUVIAS** | | | | | | | | | |
| 75 | C5C.1 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANAL EN LÁMINA GALVANIZADA CAL. 22; DS=70 CON ELEMENTOS DE FIJACIÓN (INCLUYE FABRICACIÓN, SOPORTES METÁLICOS CADA 1.20m, PENDIENTE MÍNIMA DEL 1%, UNIONES SELLADAS, FIJACIÓN A ESTRUCTURA, INSTALACIÓN COMPLETA, TAPAS Y SOSCOS). | -186.00 | | $ 0.00 | -186.00 | | $ 0.00 | 0.00 | $ 0.00 |
| 76 | C5C.2 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BAJANTES EN PVC AGUAS LLUVIAS D=6" (INCLUYE ACCESORIOS COMO CODOS Y UNIONES, ANCLAJES Y CONEXIÓN A RED EXISTENTE). | -39.00 | | $ 0.00 | -39.00 | | $ 0.00 | 0.00 | $ 0.00 |
| Subtotal | | | | | **$ 0.00** | | | | | **$ 0.00** |
| **C6C** | **NIVELACIÓN CUBIERTA** | | | | | | | | | |
| 77 | C6C.1 | MURO EN BLOQUE Nº 4 E = 0.10 m (NIVELACIÓN DE CUBIERTAS) INCLUYE FILOS, ENCUENTROS, REMATES Y AJUSTES PROPIOS DE LA MODULACIÓN DEL MURO, SIN PAGO ADICIONAL. | 0.00 | | $ 0.00 | 0.00 | 20.00 | $ 1,200,000.00 | 20.00 | $ 1,200,000.00 |
| 78 | C6C.2 | PAÑETE LISO MUROS 1:3 INTERIOR INCLUYE REMATES, FILOS, CANTOS Y ELEMENTOS LINEALES, DILATACIONES SIN PAGO ADICIONAL. | -36.00 | | $ 0.00 | -36.00 | 4.00 | $ 128,000.00 | 4.00 | $ 128,000.00 |
| 79 | C6C.3 | ESTUCO PLASTICO SOBRE MURO PAÑETADO INCLUYE REMATES, FILOS, CANTOS Y ELEMENTOS LINEALES, SIN PAGO ADICIONAL. | 0.00 | | $ 0.00 | 0.00 | 20.00 | $ 560,000.00 | 20.00 | $ 560,000.00 |
| 80 | C6C.4 | PINTURA EN VINILO TIPO 2 SOBRE MURO ESTUCADO INCLUYE REMATES, FILOS, CANTOS Y ELEMENTOS LINEALES, SIN PAGO ADICIONAL. | 0.00 | | $ 0.00 | 0.00 | 20.00 | $ 360,000.00 | 20.00 | $ 360,000.00 |
| | | | | | **$ 0.00** | | | **$ 2,248,000.00** | | **$ 2,248,000.00** |
| **C7C** | **ASEO** | | | | | | | | | |
| 81 | C7C.1 | ASEO GENERAL | 0.00 | | $ 0.00 | 0.00 | 1,056.00 | $ 4,118,400.00 | 1,056.00 | $ 4,118,400.00 |
| Subtotal | | | | | **$ 0.00** | | | **$ 4,118,400.00** | | **$ 4,118,400.00** |
| Subtotal LICEO GUSTAVO MATAMOROS LEÓN - YOPAL | | | | | **$ 100,642,284.12** | | | **$ 240,930,244.88** | | **$ 341,572,529.00** |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **D- LICEO GENERAL SERVIEZ - VILLAVICENCIO (CAMBIO CUBIERTA POLICARBONATO PASARELAS EXTERIOR / REMODELACIÓN BAÑOS PREESCOLAR)** | | | | | | | | | | |
| **D- CAMBIO CUBIERTAS POLICARBONATO** | | | | | | | | | | |
| **D1C** | **PRELIMINARES** | | | | | | | | | |
| 82 | D1C.1 | DESMONTE CUBIERTA EN POLICARBONATO EXISTENTE, (INCLUYE ESTRUCTURA EXISTENTE (CORREAS), PROTECCIÓN DE ÁREAS INFERIORES, ACOPIOS TEMPORALES, ENLONADO, CARGUE Y RETIRO DE MATERIAL DESMONTADO CON DISPOSICIÓN FINAL FUERA DE LAS INSTALACIONES EN SITIO AUTORIZADO). | 0.00 | 494.00 | $ 8,398,000.00 | 0.00 | | $ 0.00 | 494.00 | $ 8,398,000.00 |
| Subtotal | | | | | **$ 8,398,000.00** | | | | | **$ 8,398,000.00** |
| **D2C** | **CUBIERTA PASARELAS** | | | | | | | | | |
| 83 | D2C.1 | LIJADA Y PINTADA ESTRUCTURA EXISTENTE INCLUYENDO PARALES (PINTURA ANTICORRSOCIVA). | -494.00 | | $ 0.00 | -494.00 | | $ 0.00 | 0.00 | $ 0.00 |
| 84 | D2C.2 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN TEJA SIN TRASLAPO - TST STANDING SEAM 450MM DE 2", FABRICADA EN LÁMINA DE ACERO GALVANIZADO Z 180 PREPINTADO SUPER POLIÉSTER . INCLUYE REMATES, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, SELLANTES, (TORNILLERIA OCULTA Y SISTEMA DE FIJACIÓN, SELLANTES Y REMATES, CUMBRERAS, BABEROS Y TAPAJUNTAS, INSTALACIÓN Y TRANSPORTE) INCLUYE REMATES, FILOS, CANTOS Y ELEMENTOS LINEALES, SIN PAGO ADICIONAL. | -494.00 | | $ 0.00 | -494.00 | | $ 0.00 | 0.00 | $ 0.00 |
| 85 | D2C.3 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANAL EN LÁMINA GALVANIZADA CAL. 22; DS=70 CON ELEMENTOS DE FIJACIÓN (INCLUYE FABRICACIÓN, SOPORTES METÁLICOS CADA 1.20m, PENDIENTE MÍNIMA DEL 1%, UNIONES SELLADAS, FIJACIÓN A ESTRUCTURA, INSTALACIÓN COMPLETA, TAPAS Y SOSCOS). | -309.00 | | $ 0.00 | -309.00 | | $ 0.00 | 0.00 | $ 0.00 |
| 86 | D2C.4 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN FLANCHE EN LÁMINA GALVANIZADA, D: 30CM CAIBRE 26. INCLUYE PINTURA Y SELLOS. | -48.00 | | $ 0.00 | -48.00 | | $ 0.00 | 0.00 | $ 0.00 |
| 87 | D2C.5 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN BAJANTES METÁLICAS INCLUYE PINTURA. | -168.00 | | $ 0.00 | -168.00 | | $ 0.00 | 0.00 | $ 0.00 |
| Subtotal | | | | | **$ 0.00** | | | **$ 0.00** | | **$ 0.00** |
| **D3C** | **CARPINTERÍA METÁLICA Y/O ESTRUCTURA METÁLICA** | | | | | | | | | |
| 88 | D3C.1 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REFUERZO EN PERFIL METÁLICO CAL 14 Y/O 16 (ELABORACIÓN DE CERCHAS CUANDO APLIQUE DISEÑO ESTRUCTURAL Y PLANOS, INSTALACIÓN DE CORREAS, INCLUYE FABRICACIÓN, TRANSPORTE, MONTAJE, SOLDADURA, TRATAMIENTO ANTICORROSIVO, PINTURA EN ESMALTE, PERNOS Y ANCLAJES DE ELEMENTOS DE FIJACIÓN). | 0.00 | 1,617.60 | $ 34,597,228.80 | 0.00 | 1,841.40 | $ 39,383,863.20 | 3,459.00 | $ 73,981,092.00 |
| Subtotal | | | | | **$ 34,597,228.80** | | | **$ 39,383,863.20** | | **$ 73,981,092.00** |
| **D-REMODELACIÓN BAÑOS PRIMARIA** | | | | | | | | | | |
| **D1B** | **PRELIMINARES** | | | | | | | | | |
| 89 | D1B.1 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERRAMIENTO PROVISIONAL EN TELA EN POLIPROPILENO VERDE DE 2,10 M DE ALTURA, SOPORTADA MEDIANTE POSTES PARA CERCA DE 2,50 M DE LONGITUD, DISPUESTOS CADA 2,50 M. INCLUYE POSTES O ELEMENTOS DE SOPORTE, TENSADO, AMARRES, SUMINISTRO DE MATERIALES, TRANSPORTE, INSTALACIÓN Y TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y ESTABILIDAD. ASIMISMO, INCLUYE EL DESMONTAJE, RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL DEL CERRAMIENTO UNA VEZ FINALIZADOS LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO OBJETO DEL CONTRATO. | 0.00 | 15.00 | $ 450,000.00 | 0.00 | | $ 0.00 | 15.00 | $ 450,000.00 |
| 90 | D1B.2 | DEMOLICIÓN MUROS EN MAMPOSTERÍA 0.15 M (INCLUYE CARGUE, ENLONADO Y RETIRO DE MATERIAL FUERA DE LAS INSTALACIONES). | 0.00 | 2.00 | $ 48,346.00 | 0.00 | | $ 0.00 | 2.00 | $ 48,346.00 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 91 | D1B.3 | DEMOLICIÓN PLACA PISO 0.20 M (INCLUYE CARGUE, ENLONADO Y RETIRO DE MATERIAL FUERA DE LAS INSTALACIONES). | 0.00 | 1.00 | $ 40,989.00 | 0.00 | | $ 0.00 | 1.00 | $ 40,989.00 |
| 92 | D1B.4 | DEMOLICIÓN ENCHAPE DE PISOS (INCLUYE DEMOLICIÓN DE GUARDAESCOBA, INCLUYE CARGUE, ENLONADO Y RETIRO DE MATERIAL FUERA DE LAS INSTALACIONES). | 0.00 | 26.00 | $ 491,868.00 | 0.00 | | $ 0.00 | 26.00 | $ 491,868.00 |
| 93 | D1B.5 | DEMOLICIÓN ENCHAPE DE PARED (INCLUYE CARGUE, ENLONADO Y RETIRO DE MATERIAL FUERA DE LAS INSTALACIONES). | -0.94 | 53.06 | $ 1,059,555.14 | -0.94 | | $ 0.00 | 53.06 | $ 1,059,555.14 |
| 94 | D1B.6 | DESMONTE DIVISIONES EXISTENTES (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE MATERIAL FUERA DE LAS INSTALACIONES). | -0.94 | 12.06 | $ 190,125.90 | -0.94 | | $ 0.00 | 12.06 | $ 190,125.90 |
| 95 | D1B.7 | DESMONTE PUERTAS Y MARCOS EXISTENTES (INCLUYE CARGUE Y RETIRO FUERA DE LAS INSTALACIONES). | -11.00 | 1.00 | $ 36,750.00 | -11.00 | | $ 0.00 | 1.00 | $ 36,750.00 |
| 96 | D1B.8 | DESMONTE APARATOS SANITARIOS Y LAVAMANOS (INCLUYE CARGUE Y RETIRO FUERA DE LAS INSTALACIONES). | -3.00 | 12.00 | $ 441,420.00 | -3.00 | | $ 0.00 | 12.00 | $ 441,420.00 |
| 97 | D1B.9 | PAÑETE LISO MUROS 1:3 INTERIOR INCLUYE REMATES, FILOS, CANTOS Y ELEMENTOS LINEALES, DILATACIONES SIN PAGO ADICIONAL. | 0.00 | 18.39 | $ 588,480.00 | 0.00 | | $ 0.00 | 18.39 | $ 588,480.00 |
| Subtotal | | | | | **$ 3,347,534.04** | | | **$ 0.00** | | **$ 3,347,534.04** |
| **D2B** | **PISOS Y ENCHAPES** | | | | | | | | | |
| 98 | D2B.1 | ALISTADO ENDURECIDO 1:3, E=0.04 | 0.00 | 26.00 | $ 1,502,930.00 | 0.00 | | $ 0.00 | 26.00 | $ 1,502,930.00 |
| 99 | D2B.2 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN CERÁMICA PISO TRÁFICO 5, CALIDAD PRIMERA (FORMATO 45X45). | 0.00 | | $ 0.00 | 0.00 | 26.00 | $ 2,541,318.00 | 26.00 | $ 2,541,318.00 |
| 100 | D2B.3 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN BALDOSA CERÁMICA PARED CALIDAD PRIMERA (FORMATO 30X45 COLOR BLANCO MATE, INCLUYE CORTES, FILOS, BORDES, REMATES Y LA EJECUCIÓN DE FRANJAS O ÁREAS CON DIMENSIÓN MENOR A 0.50 m, INCLUYE DESPERDICIOS, CORTES ESPECIALES Y AJUSTES NECESARIOS SIN RECONOCIMIENTO ADICIONAL). | -0.32 | | $ 0.00 | -0.32 | 59.68 | $ 5,331,512.80 | 59.68 | $ 5,331,512.80 |
| 101 | D2B.4 | PLACA BASE CONCRETO 0.10 2500 PSI. | -1.50 | | $ 0.00 | -1.50 | 0.50 | $ 39,412.50 | 0.50 | $ 39,412.50 |
| 102 | D2B.5 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MESÓN EN QUARZTONE. | -7.00 | | $ 0.00 | -7.00 | | $ 0.00 | 0.00 | $ 0.00 |
| 103 | D2B.6 | MURO EN BLOQUE Nº 4 E = 0.10 m INCLUYE FILOS, ENCUENTROS, REMATES Y AJUSTES PROPIOS DE LA MODULACIÓN DEL MURO, SIN PAGO ADICIONAL. | -5.00 | | $ 0.00 | -5.00 | 4.00 | $ 240,000.00 | 4.00 | $ 240,000.00 |
| 104 | D2B.7 | VINILO SOBRE PAÑETE DOS MANOS. | 0.00 | | $ 0.00 | 0.00 | 11.00 | $ 132,957.00 | 11.00 | $ 132,957.00 |
| Subtotal | | | | | **$ 1,502,930.00** | | | **$ 8,285,200.30** | | **$ 9,788,130.30** |
| **D3B** | **CARPINTERÍA METÁLICA Y/O ESTRUCTURA METÁLICA** | | | | | | | | | |
| 105 | D3B.1 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DIVISIÓN PARA BAÑO EN ACERO INOXIDABLE 304 CAL.20 (INCLUYE PUERTAS Y ACCESORIOS). | -19.00 | | $ 0.00 | -19.00 | | $ 0.00 | 0.00 | $ 0.00 |
| 106 | D3B.2 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN ESPEJO INCOLORO 4 MM . | -2.00 | | $ 0.00 | -2.00 | | $ 0.00 | 0.00 | $ 0.00 |
| 107 | D3B.3 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN MARCO PARA PUERTA EN LÁMINA CAL 18 -0.8 INCLUYE RESANE FINAL DEL VANO. | -1.00 | | $ 0.00 | -1.00 | | $ 0.00 | 0.00 | $ 0.00 |
| 108 | D3B.4 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUERTA EN LÁMINA CAL 18 INC. ANTICORROSIVO. | -3.00 | | $ 0.00 | -3.00 | | $ 0.00 | 0.00 | $ 0.00 |
| 109 | D3B.5 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN VENTANA REJILLA EN ALUMINIO. | 0.00 | | $ 0.00 | 0.00 | 1.00 | $ 406,000.00 | 1.00 | $ 406,000.00 |
| Subtotal | | | | | **$ 0.00** | | | **$ 406,000.00** | | **$ 406,000.00** |
| **D4B** | **CIELO RASO** | | | | | | | | | |
| 110 | D4B.1 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CIELO RASO EN LÁMINA PVC 7 MM (INCLUYE PERFILERÍA DE SOPORTE, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, REMATE PERIMETRAL TIPO CORNISA, NIVELACIÓN Y ACABADO FINAL) INCLUYE REMATES, FILOS, CANTOS Y ELEMENTOS LINEALES, SIN PAGO ADICIONAL. | -0.74 | | $ 0.00 | -0.74 | 26.27 | $ 1,932,683.90 | 26.27 | $ 1,932,683.90 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Subtotal | | | | | $ 0.00 | | | $ 1,932,683.90 | | $ 1,932,683.90 |
| **D5B** | **ELECTRICO** | | | | | | | | | |
| 111 | D5B.1 | DESMONTE DE ELEMENTOS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS EXISTENTES (LUMINARIAS, CÁMARAS, SENSORES Y EQUIPOS SIMILARES). (INCLUYE DESCONEXIÓN SEGURA, CARGUE, RETIRO Y DISPOSICIÓN). | 0.00 | | $ 0.00 | 0.00 | 4.00 | $ 63,060.00 | 4.00 | $ 63,060.00 |
| 112 | D5B.2 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN PANEL LED CUADRADO 60 X 60 52W, INCLUYE GUAYAS DE COLGAR Y DEMÁS ELEMENTOS PARA SU PERFECTA INSTALACIÓN. | 0.00 | | $ 0.00 | 0.00 | 6.00 | $ 914,370.00 | 6.00 | $ 914,370.00 |
| Subtotal | | | | | $ 0.00 | | | $ 977,430.00 | | $ 977,430.00 |
| **B6B** | **INSTALACIONES HIDRAULICAS Y SANITARIAS** | | | | | | | | | |
| 113 | D6B.1 | PUNTO HIDRÁULICO PVC-P/PARAL 1/2" | -2.00 | 14.00 | $ 1,515,542.00 | -2.00 | | $ 0.00 | 14.00 | $ 1,515,542.00 |
| 114 | D6B.2 | SALIDA SANITARIA PVC-S/PARAL 2" | 0.00 | 9.00 | $ 1,021,572.00 | 0.00 | | $ 0.00 | 9.00 | $ 1,021,572.00 |
| 115 | D6B.3 | RED SANITARIA PVC-S 4" | -7.00 | | $ 0.00 | -7.00 | | $ 0.00 | 0.00 | $ 0.00 |
| 116 | D6B.4 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN SANITARIO TANQUE (INCLUYE GRIFERÍA) | -1.00 | | $ 0.00 | -1.00 | | $ 0.00 | 0.00 | $ 0.00 |
| 117 | D6B.5 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN SANITARIO INFANTIL (INCLUYE GRIFERÍA) | -6.00 | | $ 0.00 | -6.00 | | $ 0.00 | 0.00 | $ 0.00 |
| 118 | D6B.6 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN LAVAMANOS INFANTILES (INCLUYE GRIFERÍA) | -4.00 | | $ 0.00 | -4.00 | | $ 0.00 | 0.00 | $ 0.00 |
| 119 | D6B.7 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN ORINAL INFANTIL (INCLUYE GRIFERÍA) | -4.00 | | $ 0.00 | -4.00 | | $ 0.00 | 0.00 | $ 0.00 |
| Subtotal | | | | | $ 2,537,114.00 | | | $ 0.00 | | $ 2,537,114.00 |
| **D7B** | **ASEO** | | | | | | | | | |
| 120 | D7B.1 | ASEO GENERAL | -520.00 | | $ 0.00 | -520.00 | | $ 0.00 | 0.00 | $ 0.00 |
| Subtotal | | | | | $ 0.00 | | | $ 0.00 | | $ 0.00 |
| Subtotal LICEO GENERAL SERVIEZ - VILLAVICENCIO | | | | | $ 50,382,806.84 | | | $ 50,985,177.40 | | $ 101,367,984.24 |
| **E- LICEO PICHINCHA - CALI (CAMBIO CUBIERTA AULAS BLOQUE PRIMARIA Y ACTUALIZACIÓN REDES DE ILUMINACIÓN)** | | | | | | | | | | |
| **E1C** | **PRELIMINARES** | | | | | | | | | |
| 121 | E1C.1 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERRAMIENTO PROVISIONAL EN TELA EN POLIPROPILENO VERDE DE 2,10 M DE ALTURA, SOPORTADA MEDIANTE POSTES PARA CERCA DE 2,50 M DE LONGITUD, DISPUESTOS CADA 2,50 M. INCLUYE POSTES O ELEMENTOS DE SOPORTE, TENSADO, AMARRES, SUMINISTRO DE MATERIALES, TRANSPORTE, INSTALACIÓN Y TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y ESTABILIDAD. ASIMISMO, INCLUYE EL DESMONTAJE, RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL DEL CERRAMIENTO UNA VEZ FINALIZADOS LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO OBJETO DEL CONTRATO. | 0.00 | 120.00 | $ 3,600,000.00 | 0.00 | | $ 0.00 | 120.00 | $ 3,600,000.00 |
| 122 | E1C.2 | DESMONTE DE CUBIERTA EN FIBROCEMENTO, (INCLUYE PROTECCIÓN DE ÁREAS INFERIORES, ACOPIOS TEMPORALES, ENLONADO, CARGUE Y RETIRO DE MATERIAL DESMONTADO CON DISPOSICIÓN FINAL FUERA DE LAS INSTALACIONES EN SITIO AUTORIZADO). | -47.57 | 502.43 | $ 7,888,151.00 | -47.57 | | $ 0.00 | 502.43 | $ 7,888,151.00 |
| 123 | E1C.3 | RETIRO DE CIELO RASO EXISTENTE, PERFILERÍA Y LÁMINAS (INCLUYE PROTECCIÓN DE ÁREAS INFERIORES, ACOPIOS TEMPORALES, ENLONADO, CARGUE Y RETIRO DE MATERIAL DESMONTADO CON DISPOSICIÓN FINAL FUERA DE LAS INSTALACIONES EN SITIO AUTORIZADO). | 0.00 | 450.00 | $ 5,400,000.00 | 0.00 | | $ 0.00 | 450.00 | $ 5,400,000.00 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 124 | E1C.4 | DESMONTE ESTRUCTURA CUBIERTA EXISTENTE (CERCHAS Y DEMAS ELEMENTOS ESTRUCTURALES PRINCIPALES). | -47.57 | 502.43 | $ 5,275,515.00 | -47.57 | | $ 0.00 | 502.43 | $ 5,275,515.00 |
| Subtotal | | | | | **$ 22,163,666.00** | | | **$ 0.00** | | **$ 22,163,666.00** |
| **E2C** | **CUBIERTA** | | | | | | | | | |
| 125 | E2C.1 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN TEJA SIN TRASLAPO - TST STANDING SEAM 450MM DE 2", FABRICADA EN LÁMINA DE ACERO GALVANIZADO Z 180 PREPINTADO SUPER POLIÉSTER . INCLUYE REMATES, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, SELLANTES, (TORNILLERIA OCULTA Y SISTEMA DE FIJACIÓN, SELLANTES Y REMATES, CUMBRERAS, BABEROS Y TAPAJUNTAS, INSTALACIÓN Y TRANSPORTE) INCLUYE REMATES, FILOS, CANTOS Y ELEMENTOS LINEALES, SIN PAGO ADICIONAL. | -98.60 | | $ 0.00 | -98.60 | 451.40 | $ 37,691,900.00 | 451.40 | $ 37,691,900.00 |
| 126 | E2C.2 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CIELO RASO EN LÁMINA PVC 7 MM (INCLUYE PERFILERÍA DE SOPORTE, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, REMATE PERIMETRAL TIPO CORNISA, NIVELACIÓN Y ACABADO FINAL) INCLUYE REMATES, FILOS, CANTOS Y ELEMENTOS LINEALES, SIN PAGO ADICIONAL. | -179.70 | | $ 0.00 | -179.70 | 220.30 | $ 16,207,471.00 | 220.30 | $ 16,207,471.00 |
| Subtotal | | | | | **$ 0.00** | | | **$ 53,899,371.00** | | **$ 53,899,371.00** |
| **E3C** | **ELECTRICO** | | | | | | | | | |
| 127 | E3C.1 | DESMONTE DE ELEMENTOS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS EXISTENTES (LUMINARIAS, CÁMARAS, SENSORES Y EQUIPOS SIMILARES). (INCLUYE DESCONEXIÓN SEGURA, CARGUE, RETIRO Y DISPOSICIÓN). | -7.00 | 33.00 | $ 520,245.00 | -7.00 | | $ 0.00 | 33.00 | $ 520,245.00 |
| 128 | E3C.2 | SALIDA ILUMINACIÓN DESCOLGADA EN TUBERÍA PVC CONDUIT 1/2", ALAMBRE NO 12 AWG PROM 3 M" (INCLUYE CAJAS, ACCESORIOS E INSTALACIÓN COMPLETA OPERATIVA, PARA INTERIOR Y PARA EXTERIOR). | -35.00 | | $ 0.00 | -35.00 | | $ 0.00 | 0.00 | $ 0.00 |
| 129 | E3C.3 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR ENCHUFABLE 1X30A. CALIDAD LEGRAND, SIEMENS, SQARE D O SUPERIOR DE MARCA RECONOCIDA Y HOMOLOGADA POR EL CIDET (INCLUYE CAJA, CONEXIÓN Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO). | -9.00 | | $ 0.00 | -9.00 | | $ 0.00 | 0.00 | $ 0.00 |
| 130 | E3C.4 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN PANEL LED CUADRADO 60 X 60 52W, INCLUYE GUAYAS DE COLGAR Y DEMÁS ELEMENTOS PARA SU PERFECTA INSTALACIÓN. | -35.00 | | $ 0.00 | -35.00 | | $ 0.00 | 0.00 | $ 0.00 |
| 131 | E3C.5 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIAS BALA LED ( INCLUYE APERTURA DE CIELO RASO Y CONEXIÓN ELECTRICA) - | -2.00 | | $ 0.00 | -2.00 | | $ 0.00 | 0.00 | $ 0.00 |
| 132 | E3C.6 | SALIDA TOMA ELÉCTRICA, INCLUYE REGATA, APARATO, CAJA 5800, TUBERÍA, ALAMBRE DE COBRE THW 12 AWG. ADAPTADORES. L HASTA 4,5 ML | -9.00 | | $ 0.00 | -9.00 | | $ 0.00 | 0.00 | $ 0.00 |
| 133 | E3C.7 | LUMINARIA PARA EXTERIOR. | -4.00 | | $ 0.00 | -4.00 | | $ 0.00 | 0.00 | $ 0.00 |
| 134 | E3C.8 | REINSTALACIÓN DE EQUIPOS ELÉCTRICOS, ELECTRÓNICOS Y DE COMUNICACIONES EXISTENTES, INCLUYENDO DESMONTE TEMPORAL CUANDO APLIQUE, ALMACENAMIENTO, REUBICACIÓN, INSTALACIÓN, CONEXIÓN, FIJACIÓN, CONFIGURACIÓN BÁSICA Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO. | -2.00 | | $ 0.00 | -2.00 | | $ 0.00 | 0.00 | $ 0.00 |
| Subtotal | | | | | **$ 520,245.00** | | | **$ 0.00** | | **$ 520,245.00** |
| **E4C** | **CARPINTERÍA METÁLICA Y/O ESTRUCTURA METÁLICA** | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 135 | E4C.1 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REFUERZO EN PERFIL METÁLICO CAL 14 Y/O 16 (ELABORACIÓN DE CERCHAS CUANDO APLIQUE DISEÑO ESTRUCTURAL Y PLANOS, INSTALACIÓN DE CORREAS, INCLUYE FABRICACIÓN, TRANSPORTE, MONTAJE, SOLDADURA, TRATAMIENTO ANTICORROSIVO, PINTURA EN ESMALTE, PERNOS Y ANCLAJES DE ELEMENTOS DE FIJACIÓN). | 0.00 | 4,800.00 | $ 102,662,400.00 | 0.00 | | $ 0.00 | 4,800.00 | $ 102,662,400.00 |
| Subtotal | | | | | **$ 102,662,400.00** | 0.00 | | $ 0.00 | 0.00 | **$ 102,662,400.00** |
| **E5C** | **AGUAS LLUVIAS** | | | | | | | | | |
| 136 | E5C.1 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANAL EN LÁMINA GALVANIZADA CAL. 22; DS=70 CON ELEMENTOS DE FIJACIÓN (INCLUYE FABRICACIÓN, SOPORTES METÁLICOS CADA 1.20m, PENDIENTE MÍNIMA DEL 1%, UNIONES SELLADAS, FIJACIÓN A ESTRUCTURA, INSTALACIÓN COMPLETA, TAPAS Y SOSCOS). | -130.00 | | $ 0.00 | -130.00 | | $ 0.00 | 0.00 | $ 0.00 |
| 137 | E5C.2 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BAJANTES EN PVC AGUAS LLUVIAS D=6" (INCLUYE ACCESORIOS COMO CODOS Y UNIONES, ANCLAJES Y CONEXIÓN A RED EXISTENTE). | -39.00 | | $ 0.00 | -39.00 | | $ 0.00 | 0.00 | $ 0.00 |
| 138 | E5C.3 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN FLANCHE EN LÁMINA GALVANIZADA, D: 30CM CAIBRE 26. INCLUYE PINTURA Y SELLOS. | -20.00 | | $ 0.00 | -20.00 | | $ 0.00 | 0.00 | $ 0.00 |
| Subtotal | | | | | **$ 0.00** | | | **$ 0.00** | | **$ 0.00** |
| **E6C** | **NIVELACIÓN CUBIERTA** | | | | | | | | | |
| 139 | E6C.1 | MURO EN BLOQUE Nº 4 E = 0.10 m (NIVELACIÓN DE CUBIERTAS) INCLUYE FILOS, ENCUENTROS, REMATES Y AJUSTES PROPIOS DE LA MODULACIÓN DEL MURO, SIN PAGO ADICIONAL. | -15.00 | | $ 0.00 | -15.00 | | $ 0.00 | 0.00 | $ 0.00 |
| 140 | E6C.2 | PAÑETE LISO MUROS 1:3 INTERIOR INCLUYE REMATES, FILOS, CANTOS Y ELEMENTOS LINEALES, DILATACIONES SIN PAGO ADICIONAL. | -30.00 | | $ 0.00 | -30.00 | | $ 0.00 | 0.00 | $ 0.00 |
| Subtotal | | | | | **$ 0.00** | | | **$ 0.00** | | **$ 0.00** |
| **E7C** | **ASEO** | | | | | | | | | |
| 141 | E7C.1 | ASEO GENERAL | -500.00 | | $ 0.00 | -500.00 | | $ 0.00 | 0.00 | |
| Subtotal | | | | | **$ 0.00** | | | **$ 0.00** | | **$ 0.00** |
| Subtotal LICEO PICHINCHA - CALI | | | | | **$ 125,346,311.00** | | | **$ 53,899,371.00** | | **$ 179,245,682.00** |
| **SUBTOTAL OBRAS** | | | | | **$ 466,514,987.00** | | | **$ 492,500,390.00** | | **$ 959,015,377.00** |
| | | ADMINISTRACION | | | **$ 107,298,447.00** | | | **$ 113,275,090.00** | | **$ 220,573,537.00** |
| | | IMPREVISTOS | | | **$ 4,665,150.00** | | | **$ 4,925,004.00** | | **$ 9,590,154.00** |
| | | UTILIDAD | | | **$ 9,330,300.00** | | | **$ 9,850,008.00** | | **$ 19,180,308.00** |
| | | IVA SOBRE UTILIDAD | | | **$ 1,772,757.00** | | | **$ 1,871,502.00** | | **$ 3,644,259.00** |
| | | **VALOR TOTAL** | | | **$ 589,581,641.00** | | | **$ 622,421,994.00** | | **$ 1,212,003,635.00** |



Calle 100 # 11 - 00
Tel 6019157054 Ext. 2006 Bogotá, D.C
precontractual@liceosejercito.edu.co

Continuación Informe Supervisión No. 002 del Contrato 273-CELIC-2026, cuyo objeto es el mantenimiento, y/o remodelación de las instalaciones de los Liceos: Liceo Santa Barbara ubicado en la ciudad de Bogotá, Francisco José De Caldas ubicado en la Base Militar de Tolemaida Nilo Cundinamarca, Liceo General Gustavo Matamoros León ubicado en la ciudad de Yopal, Liceo General Serviez ubicado en la ciudad de Villavicencio y Liceo Pichincha ubicado en la ciudad De Cali.

**NESTOR GILBERTO RODRIGUEZ ALVARADO**

NIT: 79351368- 8
Régimen: Responsable del impuesto sobre las ventas - IVA
Tipo de persona: Persona Natural
CR 46 #152-46 LC 276 CC MAZUREN, BOGOTÁ, D.C., Bogotá, Colombia
Tel. 3102447629
Email. nesrro@hotmail.com

| FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA | |
|---|---|
| No de Factura | FENR - 100 |
| Fecha Emisión | 11/11/2026 - 11:37:11 |
| Fecha Vencimiento | 11/12/2026 |
| Moneda | COP Peso colombiano |
| Fecha Firmado | 11/11/2026 11:37:12 |

**Autorización factura electrónica de venta No: 18764115196917 válida desde 2026-09-04 hasta 2027-03-04 rango desde FENR- 94 hasta FENR- 100**

| DATOS DEL RECEPTOR | |
|---|---|
| NIT: | 800130640-3 |
| Nombre/Razón Social: | LICEOS DEL EJERCITO NACIONAL |
| Dirección: | CL 100 11 00, BOGOTÁ, D.C., Bogotá, Colombia, CP 110221 |
| Teléfono: | 3104417670 |
| Email: | victorhugoquinterom@gmail.com |
| Forma de Pago: | Crédito |
| Medio de pago: | Transferencia Débito Bancaria |
| Fecha de Pago: | 11/12/2026 |
| Total de Lineas: | 4 |

| # | CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | U.M | CANTIDAD | PRECIO U. | IMPUESTOS | | | DCTO. | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | NOM. | % o VAL. | MONTO | | |
| 1 | 45220000-5 | Obras de ingeniería y trabajos de construcción<br>Acta parcial N° 2 CONTRATO DE OBRA PÚBLICA N° 273 CELIC-2026cuyo objeto es MANTENIMIENTO, Y/O REMODELACIÓN DE LAS INSTALACIONES DE LOS LICEOS: LICEO SANTA BARBARA UBICADO EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ, FRANCISCO JOSE DE CALDAS UBICADO EN LA BASE MILITAR DE TOLEMAIDA NILO CUNDINAMARCA, LICEO GENERAL GUSTAVO MATAMOROS LEON UBICADO EN LA CIUDAD DE YOPAL, LICEO GENERAL SERVIEZ UBICADO EN LA CIUDAD DE VILLAVICENCIO Y LICEO PICHINCHA UBICADO EN LA CIUDAD DE CALI. | WSD | 1,00 | $492.500.390,00 | | | | $0,00 | $492.500.390,00 |
| 2 | AIU 1 | Administración<br>23 % | EA | 1,00 | $113.275.090,00 | | | | $0,00 | $113.275.090,00 |
| 3 | AIU 2 | Imprevistos<br>1 % | EA | 1,00 | $4.925.004,00 | | | | $0,00 | $4.925.004,00 |
| 4 | AIU 3 | Utilidad<br>2 % | EA | 1,00 | $9.850.008,00 | IVA | 19,00% | $1.871.502,00 | $0,00 | $9.850.008,00 |

| IMPUESTO | BASE | TARIFA / VALOR NOMINAL | IMPORTE |
|---|---|---|---|
| IMPUESTOS | | | |
| 01 IVA | $9.850.008,00 | 19,00% | $1.871.502,00 |

| | |
|---|---|
| Subtotal: | $620.550.492,00 |
| Cargos: | $0,00 |
| Descuentos: | $0,00 |
| IVA: | $1.871.502,00 |
| Total: | $622.421.994,00 |

Firma Digital: Z8v87eKetYJrTyude+e5daxy4eXbx0n5SdDRyiF5xidmsWCyAipi3CekHEVVmwG
lM5jqxr4ScaGlLJg1TkTCdcTa45YHeYQ1fVgGtSZypCDKGcTjBr9EMs6mZqjBX
Hu3NOi1FJrF8yJD/bdQQCcMxi8nh2fCTZ/IVjULdbJhLrHbqxDsahz70OISipgKH
RZtpv8JW7i30Dfit9vYV1Z/fosIrdqHB8Trrf6tQkWS+lplem+bBjby6H9rN8VQm
pkJ9dHduJiwg4M2UtoVFU3W1BiQjrvzlahvfTdf9erwMrUpQgGyspv83ZCV90/bL
fHS4GY26lnWkCAEp54Oh6g==
Esta factura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.

**Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.**

Software: e-Factura Proveedor tecnológico: cadena. Nit. 830.930.534-0 PLATAFORMA: Facturatech Nit. 901.143.311-8

facturatech

Continuación Informe Supervisión No. 002 del Contrato 273-CELIC-2026, cuyo objeto es el mantenimiento, y/o remodelación de las instalaciones de los Liceos: Liceo Santa Barbara ubicado en la ciudad de Bogotá, Francisco José De Caldas ubicado en la Base Militar de Tolemaida Nilo Cundinamarca, Liceo General Gustavo Matamoros León ubicado en la ciudad de Yopal, Liceo General Serviez ubicado en la ciudad de Villavicencio y Liceo Pichincha ubicado en la ciudad De Cali.

| | |
|---|---|
| Son: | (seiscientos veintidós millones cuatrocientos veintiún mil novecientos noventa y cuatro pesos con cero centavos) |
| CUFE: | 35b4f8261b1df4ff4ba7ac413d535417c4e0eefb0acc202d388f4e8a622d1ee8eb7ad01ce02dccbcce2b568128d51295 |
| Notas: | |

Firma Digital: Z8v87eKetYJrTyude+e5daxy4eXbx0n5SdDRykF5xidmsWCyAipi3CekHEVVmwG
IM6jqxx4ScaGILJg1TkTCdcTa45YHeYQ1fVgGtSZypCDKGcTj8rr9EMs6mZqiBX
Hu3NDn1FJrF8yJD/bdQQCcMxi8nh2fCTZ/IVjULdbJhLrHbqxDsahz70DISipgKH
RZtpv8JW7i30Dftt9vYV1Z/fosIndqHB8Tmf6tQkWS+IpIem+bBjby6H9rN8VQm
pkJ9dHduJiwg4M2UtoVFU3W1BiQjrvzlahvfTdf9erwMrUpQgGyspv83ZCV9O/bL
fHS4GY26InWkCAEp54Oh6g==
Esta factura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.

Continuación Informe Supervisión No. 002 del Contrato 273-CELIC-2026, cuyo objeto es el mantenimiento, y/o remodelación de las instalaciones de los Liceos: Liceo Santa Barbara ubicado en la ciudad de Bogotá, Francisco José De Caldas ubicado en la Base Militar de Tolemaida Nilo Cundinamarca, Liceo General Gustavo Matamoros León ubicado en la ciudad de Yopal, Liceo General Serviez ubicado en la ciudad de Villavicencio y Liceo Pichincha ubicado en la ciudad De Cali.

Así mismo el contratista presento la justificación técnica, económica y documental de los gastos imprevistos generados durante la ejecución del presente corte, a continuación, se adjunta el documento de justificación, así como los soportes que lo respaldan:



NESTOR GILBERTO RODRIGUEZ ALVARADO
NIT: 79.351.368

Bogota; 9 de septiembre de 2026

Señores
CT Wilmán José Nieves Camaño
Supervisor
**LICEOS DEL EJERCITO**
Calle 100 No 11-00
Bogotá D.C

**Referencia: Justificacion imprevistos Contrato ; 273-CELIC-2026.**

Objeto: **"MANTENIMIENTO, Y/O REMODELACIÓN DE LAS INSTALACIONES DE LOS LICEOS: LICEO SANTA BARBARA UBICADO EN LA CIUDAD DE BOGOTA, FRANCISCO JOSE DE CALDAS UBICADO EN LA BASE MILITAR DE TOLEMAIDA NILO CUNDINAMARCA, LICEO GENERAL GUSTAVO MATOMOROS LEON UBICADO EN LA CIUDAD DE YOPAL, LICEO GENERAL SERVIEZ UBICADO EN LA CIUDAD DE VILLAVICENCIO y LICEO PICHINCHA UBICADO EN LA CIDAD DE CALI."**

Reciban un cordial saludo,

Por medio de la presente me dirijo a ustedes con el fin de justificar los imprevistos del acta parcial No.2

En el Liceo Serviez de la ciudad de Villavicencio, no estaba el ítem de pañete sobre muros, motivo por el cual se vio la necesidad de realizar dicha actividad con el presupuesto de los imprevistos.



Av. Carrera 46 No. 152-46, Centro Comercial Mazurén, oficina 2-76-Tel: 216 3906-3212522001



NESTOR GILBERTO RODRIGUEZ ALVARADO
NIT: 79.351.368



En el liceo Gustavo Matamoros de la ciudad de Yopal, se vio la necesidad de cubrir unos cables que quedaban expuestos, motivo por el cual se requirió hacer una canaleta en Dry Wall, pero dicha actividad no estaba dentro de los ítems contractuales, motivo por el cual se tomó la determinación de realizarlos con el presupuesto de los imprevistos.


Antes



Después



Av. Carrera 46 No. 152-46, Centro Comercial Mazurén, oficina 2-76-Tel: 216 3906-3212522001

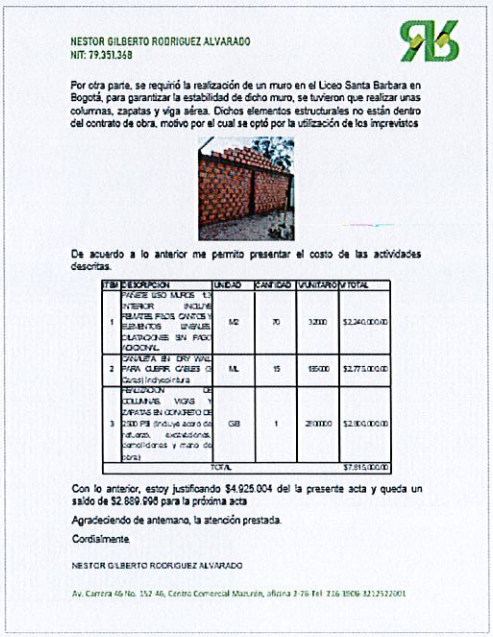

NESTOR GILBERTO RODRIGUEZ ALVARADO
NIT: 79.351.368

Por otra parte, se requirió la realización de un muro en el Liceo Santa Barbara en Bogotá, para garantizar la estabilidad de dicho muro, se tuvieron que realizar unas columnas, zapatas y viga aérea. Dichos elementos estructurales no están dentro del contrato de obra, motivo por el cual se optó por la utilización de los imprevistos



De acuerdo a lo anterior me permito presentar el costo de las actividades descritas.

| ITEM | DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD | V/UNITARIO | V/TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PAÑETE LISO MUROS INTERIOR INCLUYE REMATES, FILOS, CANTOS Y ELEMENTOS UNIFILAR, DILATACIONES SIN PASO ADICIONAL | M2 | 70 | 32000 | $2.240.000,00 |
| 2 | CANALETA EN DRY WALL PARA OCULTAR CABLES (Incluye instalación) | ML | 15 | 185000 | $2.775.000,00 |
| 3 | REALIZACION DE COLUMNAS, VIGAS Y ZAPATAS EN CONCRETO DE 3000 PSI (Incluye acero de refuerzo, excavaciones, cimentaciones y mano de obra) | GB | 1 | 2160000 | $2.160.000,00 |
| | | TOTAL | | | $7.175.000,00 |

Con lo anterior, estoy justificando $4.925.004 del la presente acta y queda un saldo de $2.889.996 para la próxima acta

Agradeciendo de antemano, la atención prestada.

Cordialmente.

NESTOR GILBERTO RODRIGUEZ ALVARADO

Av. Carrera 46 No. 152-46, Centro Comercial Mazurén, oficina 2-76-Tel: 216 3906-3212522001

Continuación Informe Supervisión No. 002 del Contrato 273-CELIC-2026, cuyo objeto es el mantenimiento, y/o remodelación de las instalaciones de los Liceos: Liceo Santa Barbara ubicado en la ciudad de Bogotá, Francisco José De Caldas ubicado en la Base Militar de Tolemaida Nilo Cundinamarca, Liceo General Gustavo Matamoros León ubicado en la ciudad de Yopal, Liceo General Serviez ubicado en la ciudad de Villavicencio y Liceo Pichincha ubicado en la ciudad De Cali.

Durante el periodo de avance comprendido entre el el 22 de septiembre de 2026 y el 09 de noviembre de 2026, se desarrollaron las labores de mantenimiento y adecuación en las instalaciones de los Liceos del Ejército, de acuerdo con lo establecido en el contrato.
A continuación, se detallan las actividades desarrolladas por cada Liceo intervenido, así:


**Liceo Santa Barbara – Bogotá D.C.:**

Suministro e instalación de cerramiento provisional.




Desmonte de cubierta existente.







Desmonte de cielo raso existente.










Desmonte de estructura cubierta existente.

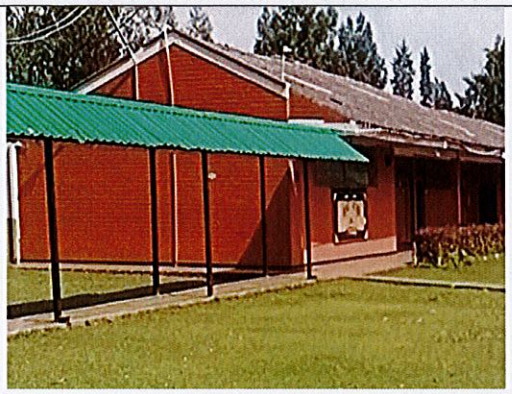

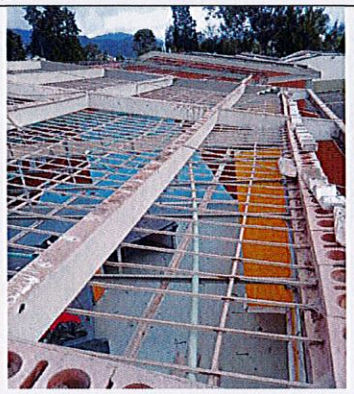





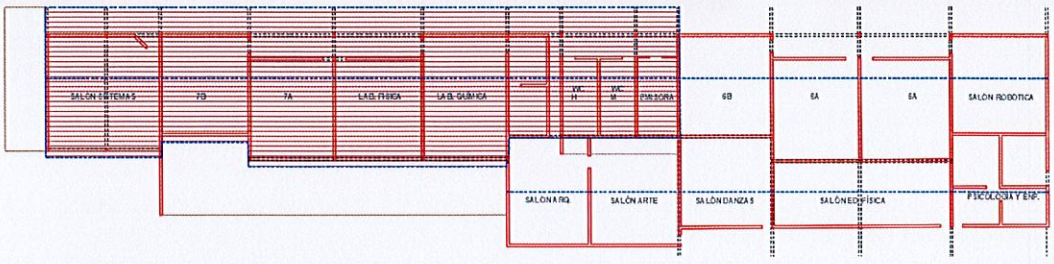


Suministro e instalación teja sin traslapo - TST standing sean.



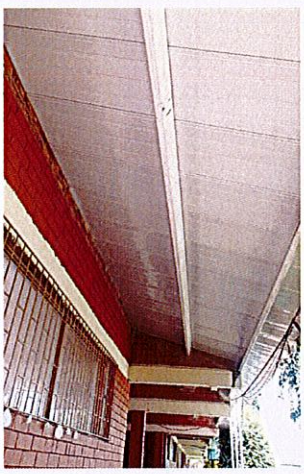

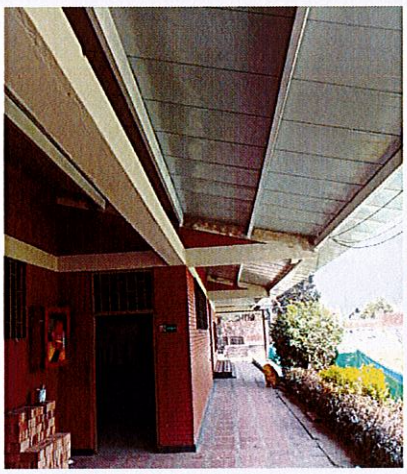




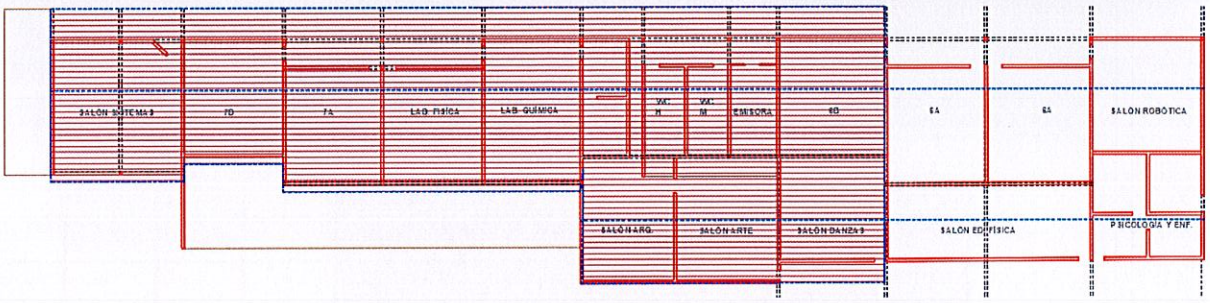





Calle 100 # 11 - 00
Tel 6019157054 Ext. 2006 Bogotá, D.C
precontractual@liceosejercito.edu.co

Suministro e instalación de perfil de refuerzo.

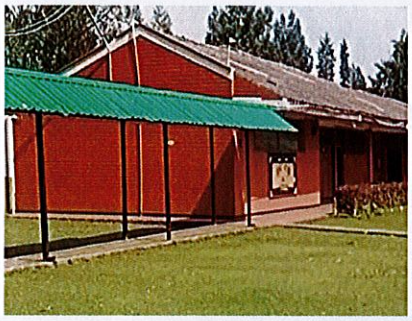





Muro en bloque Nº 4 E = 0.10 m

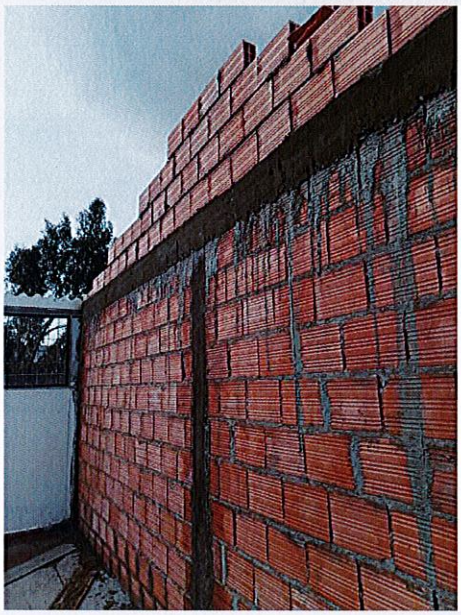





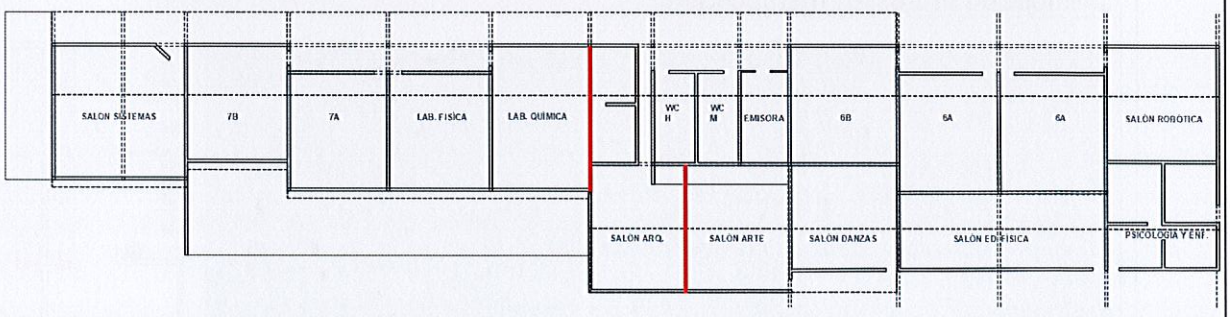

Pañete liso muros 1:3

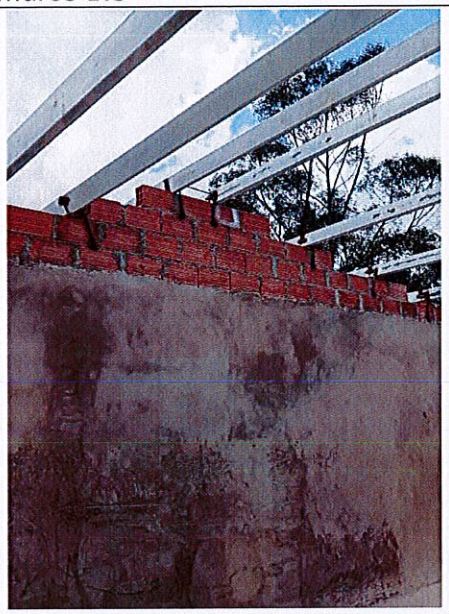


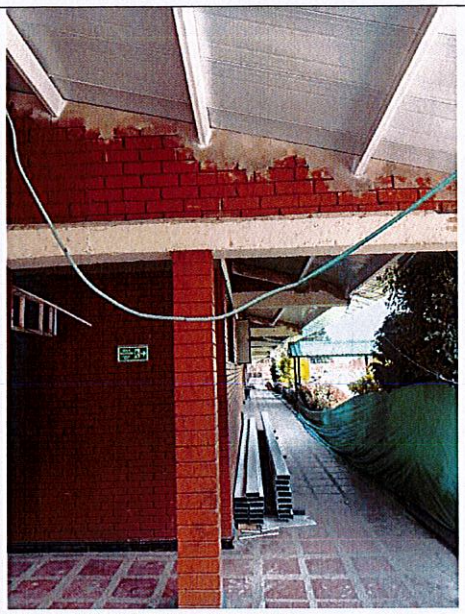

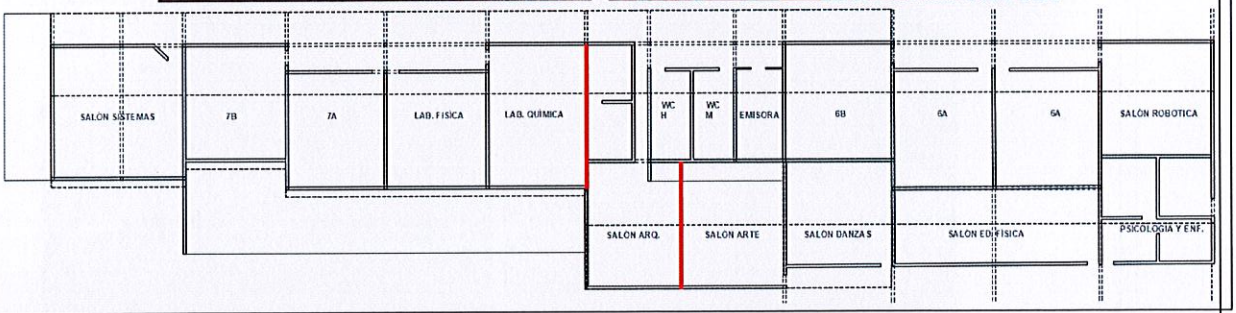



**Liceo Francisco José de Caldas – Tolemaida, Nilo Cundinamarca:**

Demolición muros en mampostería.

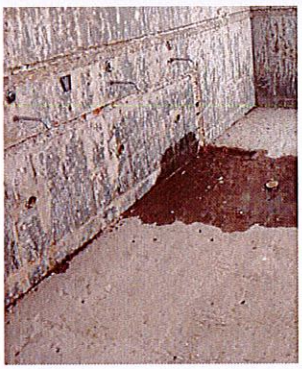






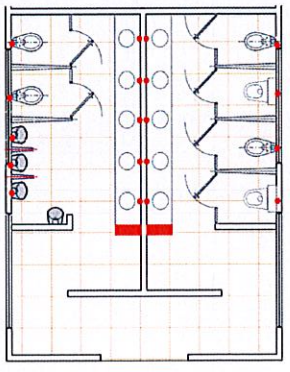


Demolición placa piso.



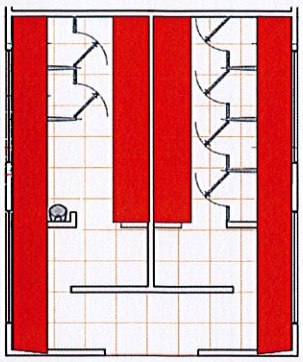



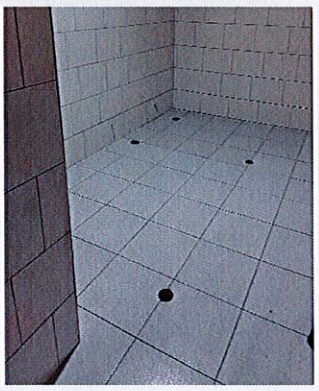
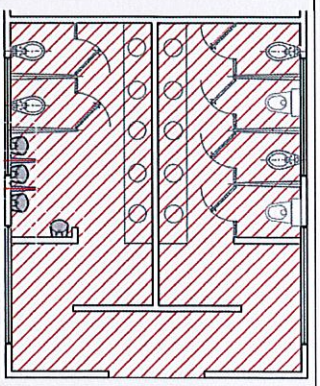
Alistado endurecido.



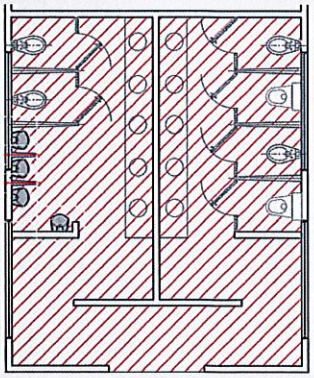



Suministro e instalación cerámica piso.

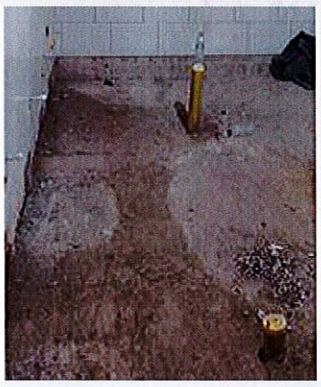






Suministro e instalación baldosa cerámica pared.

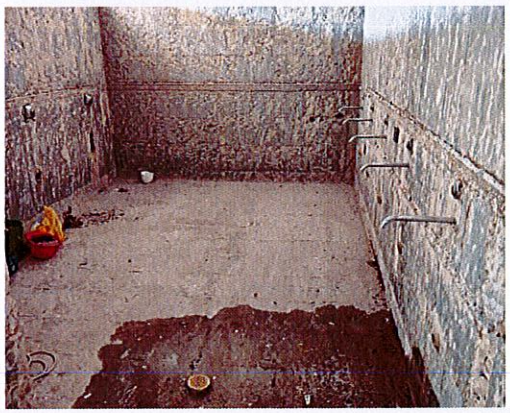

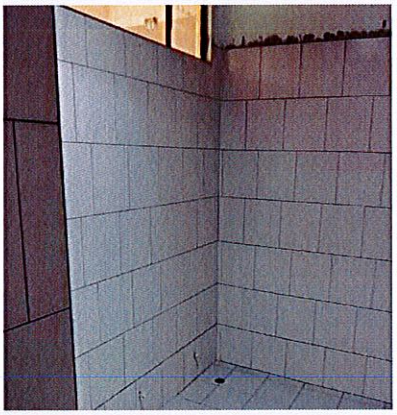

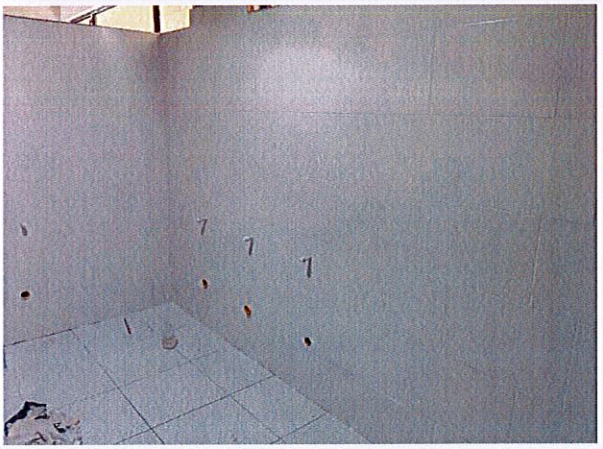


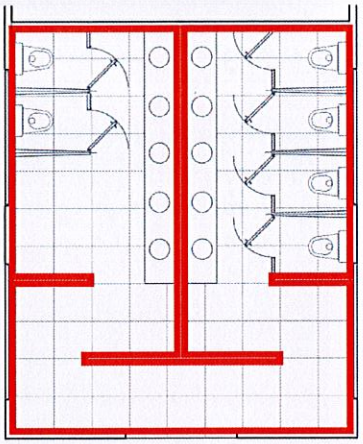

Placa base concreto.









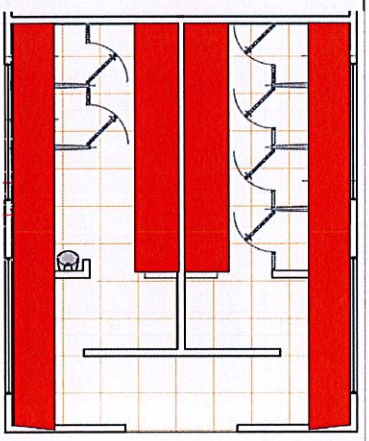




Calle 100 # 11 - 00
Tel 6019157054 Ext. 2006 Bogotá, D.C
precontractual@liceosejercito.edu.co

Continuación Informe Supervisión No. 002 del Contrato 273-CELIC-2026, cuyo objeto es el mantenimiento, y/o remodelación de las instalaciones de los Liceos: Liceo Santa Barbara ubicado en la ciudad de Bogotá, Francisco José De Caldas ubicado en la Base Militar de Tolemaida Nilo Cundinamarca, Liceo General Gustavo Matamoros León ubicado en la ciudad de Yopal, Liceo General Serviez ubicado en la ciudad de Villavicencio y Liceo Pichincha ubicado en la ciudad De Cali.
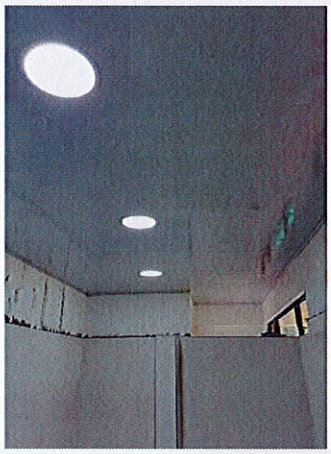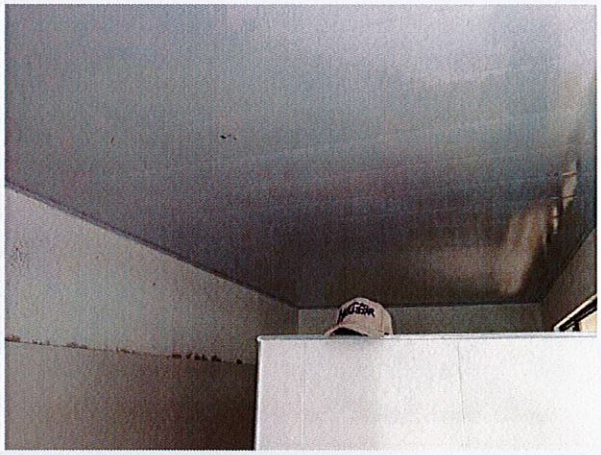
| Suministro e instalación de cielo raso en lámina PVC 7 mm. |
|---|
|    |
| Punto hidráulico PVC-P/PARAL 1/2". |
|   |
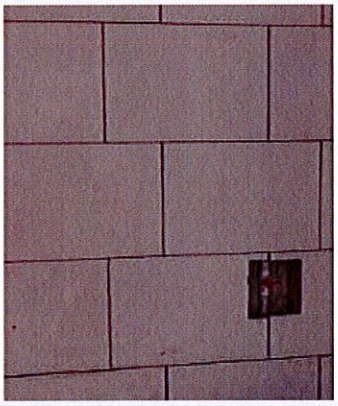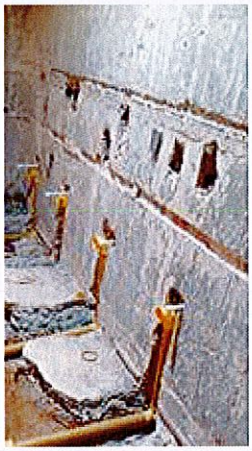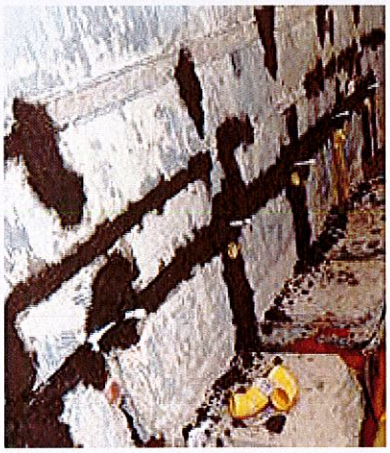
| |
|---|
| Salida sanitaria PVC-S/PARAL 4". |
|   |
| Registro 1/2". |
|   |
| Salida sanitaria PVC-S/PARAL 2". |
|   |




Calle 100 # 11 - 00
Tel 6019157054 Ext. 2006 Bogotá, D.C
precontractual@liceosejercito.edu.co

Red sanitaria PVC-S 4".






Red suministro PVC 1/2".

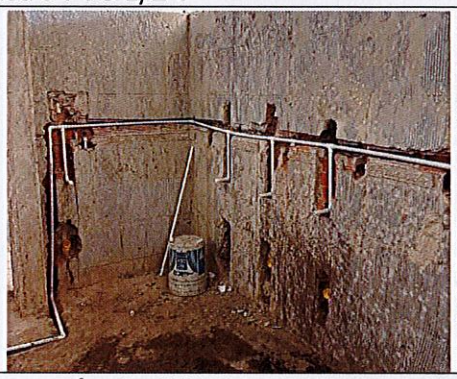



Caja de inspección de 60X60.

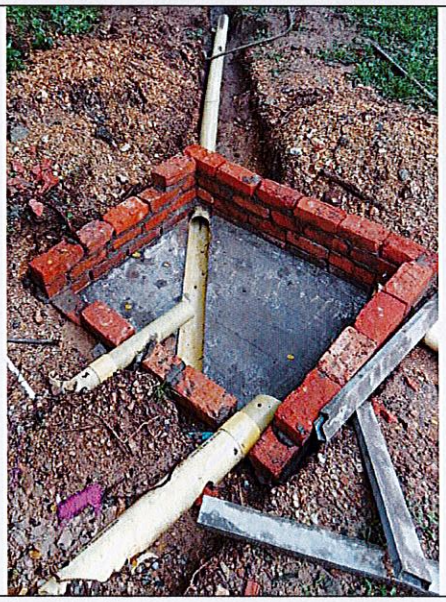



Calle 100 # 11 - 00
Tel 6019157054 Ext. 2006 Bogotá, D.C
precontractual@liceosejercito.edu.co

Continuación Informe Supervisión No. 002 del Contrato 273-CELIC-2026, cuyo objeto es el mantenimiento, y/o remodelación de las instalaciones de los Liceos: Liceo Santa Barbara ubicado en la ciudad de Bogotá, Francisco José De Caldas ubicado en la Base Militar de Tolemaida Nilo Cundinamarca, Liceo General Gustavo Matamoros León ubicado en la ciudad de Yopal, Liceo General Serviez ubicado en la ciudad de Villavicencio y Liceo Pichincha ubicado en la ciudad De Cali.


**Liceo Gustavo Matamoros León – Yopal, Casanare:**


Suministro e instalación de cerramiento provisional.






Desmonte de cubierta existente

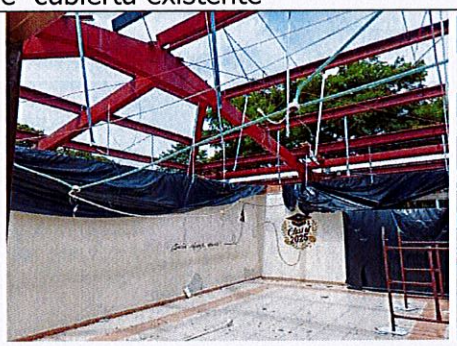

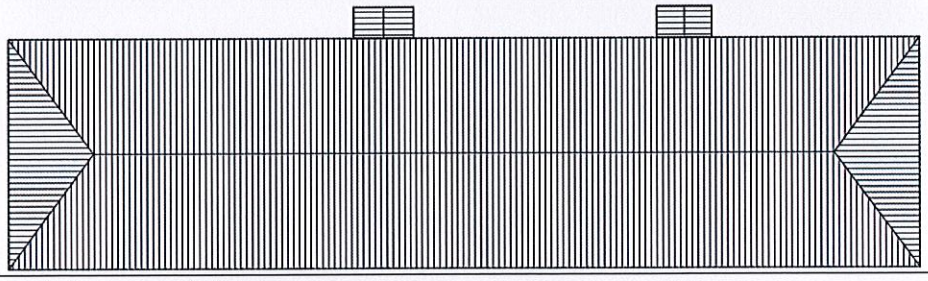

Desmonte de cielo raso existente.

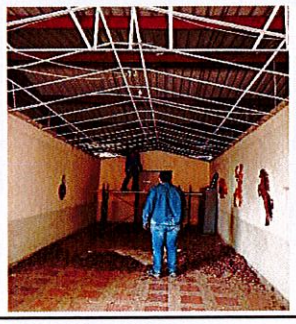





Calle 100 # 11 - 00
Tel 6019157054 Ext. 2006 Bogotá, D.C
precontractual@liceosejercito.edu.co

Desmonte estructura cubierta existente.








Suministro e instalación de teja sin traslapo TST Standing seam.

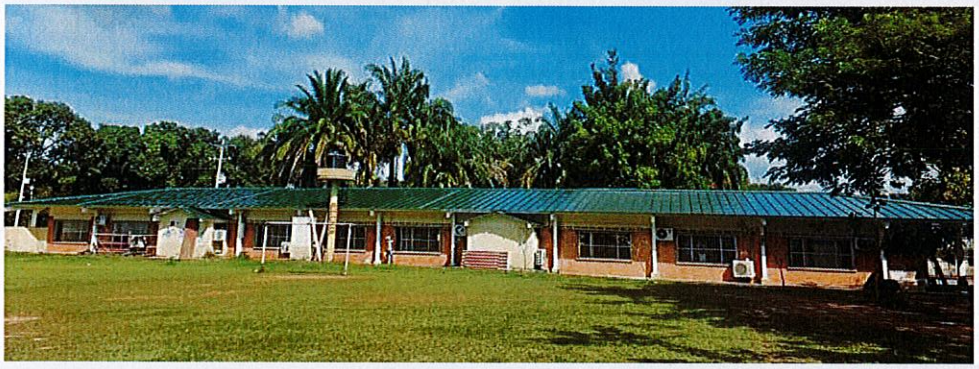




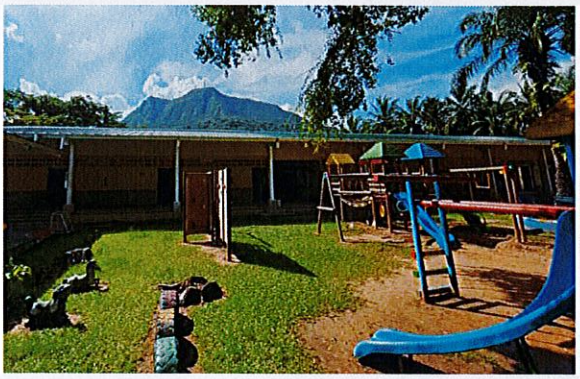

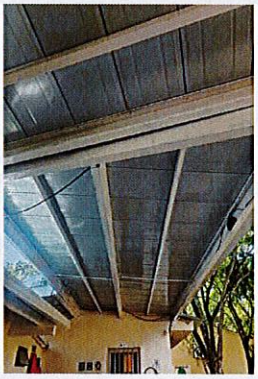

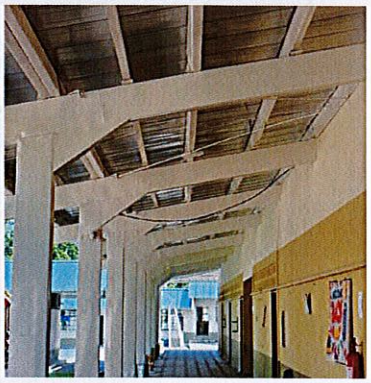






Continuación Informe Supervisión No. 002 del Contrato 273-CELIC-2026, cuyo objeto es el mantenimiento, y/o remodelación de las instalaciones de los Liceos: Liceo Santa Barbara ubicado en la ciudad de Bogotá, Francisco José De Caldas ubicado en la Base Militar de Tolemaida Nilo Cundinamarca, Liceo General Gustavo Matamoros León ubicado en la ciudad de Yopal, Liceo General Serviez ubicado en la ciudad de Villavicencio y Liceo Pichincha ubicado en la ciudad De Cali.

Suministro e instalación de cielo raso en lámina PVC 7 mm.



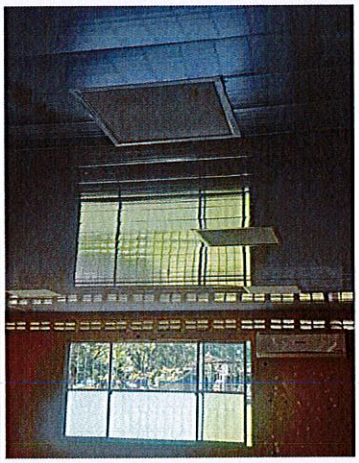

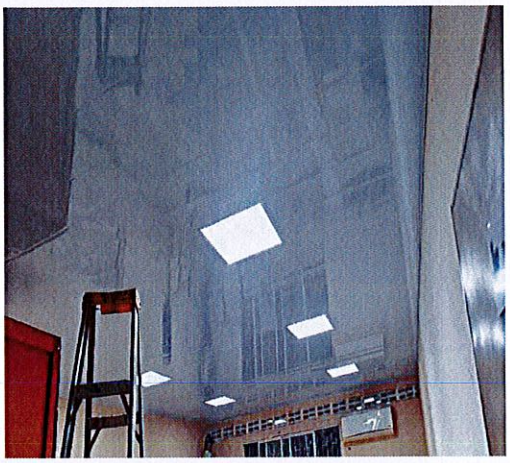

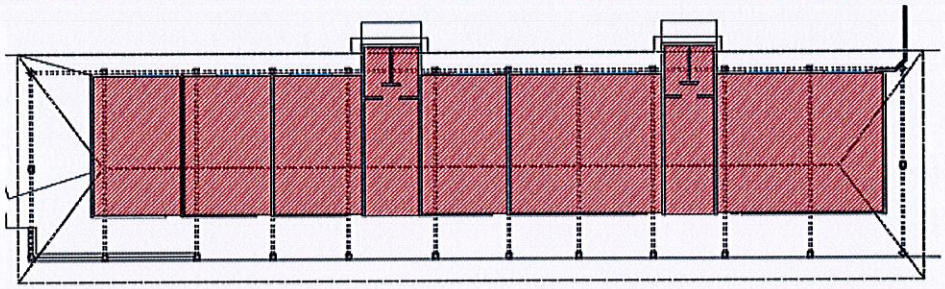

Desmonte de elementos eléctricos y electrónicos existentes.








Calle 100 # 11 - 00
Tel 6019157054 Ext. 2006 Bogotá, D.C
precontractual@liceosejercito.edu.co

Salida iluminación descolgada.



Suministro e instalación panel led cuadrado 60 X 60.

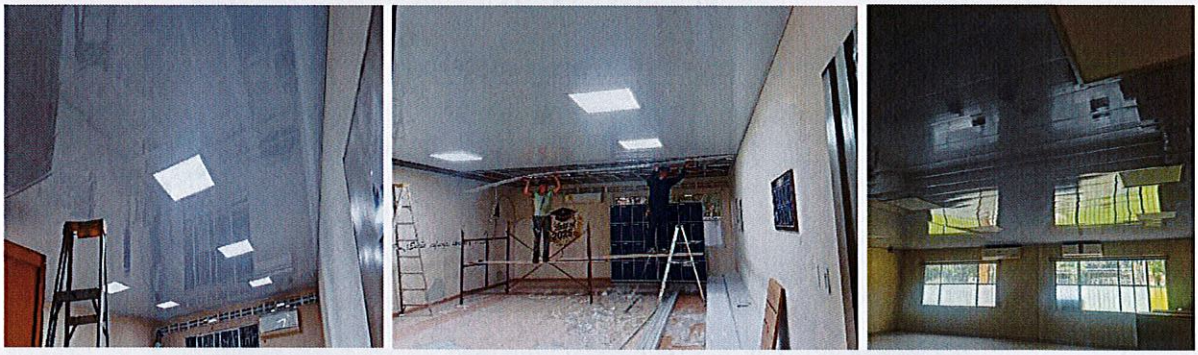


Suministro e instalación de luminarias bala led.







Calle 100 # 11 - 00
Tel 6019157054 Ext. 2006 Bogotá, D.C
precontractual@liceosejercito.edu.co

Luminaria para exterior.

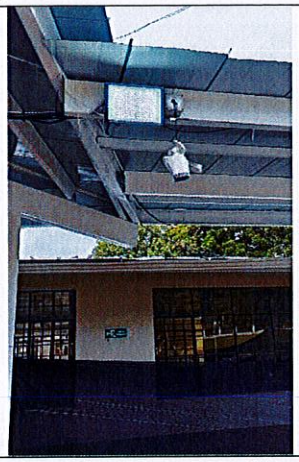

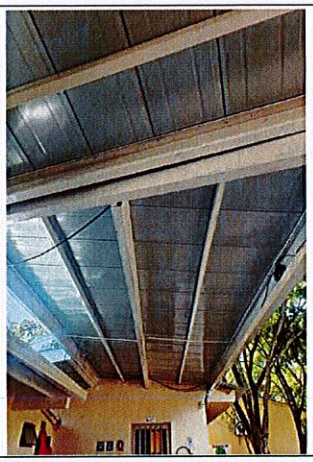

Suministro e instalación de refuerzo en perfil metálico CAL 14 Y/O 16.

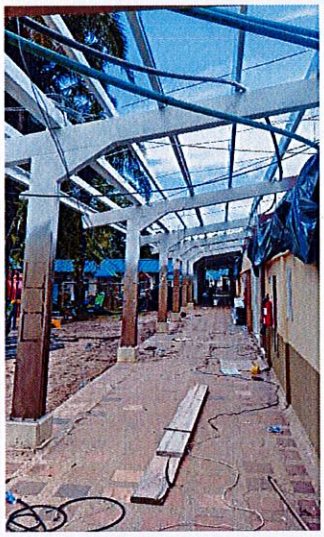



Pañete liso muros 1:3 interior.



| Pintura en vinilo tipo 2 sobre muro estucado. |
|---|
|  |
| Aseo general. |
|  |

**Liceo General Serviez – Villavicencio, Meta:**

(Cambio cubiertas policarbonato).



| Suministro e instalación de refuerzo en perfil metálico. |
|---|
|  |






(Remodelación baños preescolar)

Suministro e instalación cerámica piso.

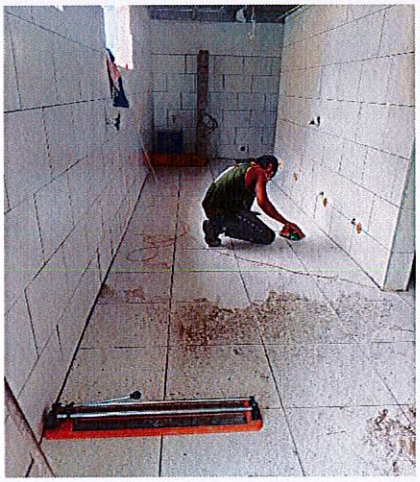
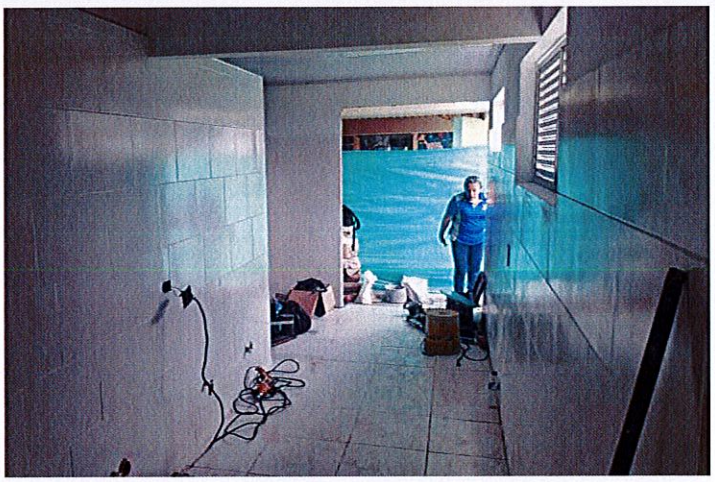





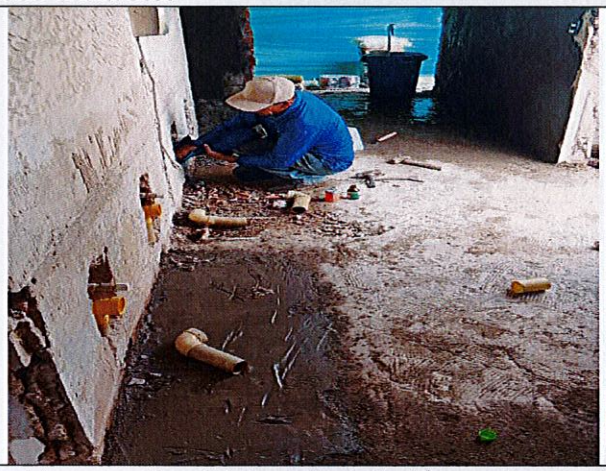
Calle 100 # 11 - 00
Tel 6019157054 Ext. 2006 Bogotá, D.C
precontractual@liceosejercito.edu.co

Continuación Informe Supervisión No. 002 del Contrato 273-CELIC-2026, cuyo objeto es el mantenimiento, y/o remodelación de las instalaciones de los Liceos: Liceo Santa Barbara ubicado en la ciudad de Bogotá, Francisco José De Caldas ubicado en la Base Militar de Tolemaida Nilo Cundinamarca, Liceo General Gustavo Matamoros León ubicado en la ciudad de Yopal, Liceo General Serviez ubicado en la ciudad de Villavicencio y Liceo Pichincha ubicado en la ciudad De Cali.

Suministro e instalación baldosa cerámica pared.

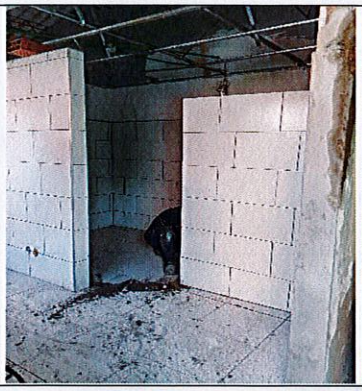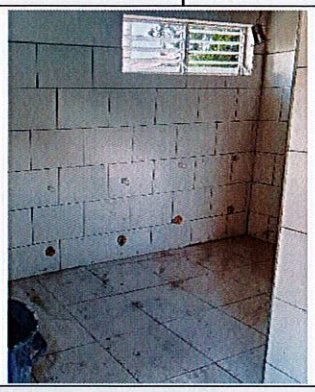

Placa base concreto.





Muro en bloque y Suministro e instalación ventana rejilla en aluminio.






Vinilo sobre pañete.



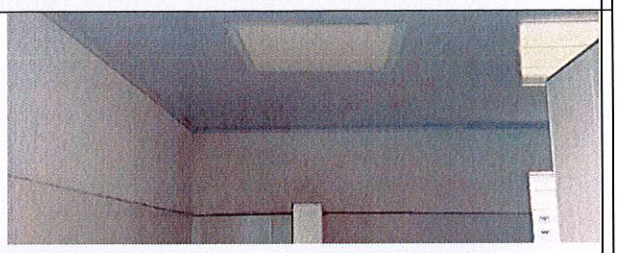


Suministro e instalación de cielo raso en lámina PVC 7 mm.

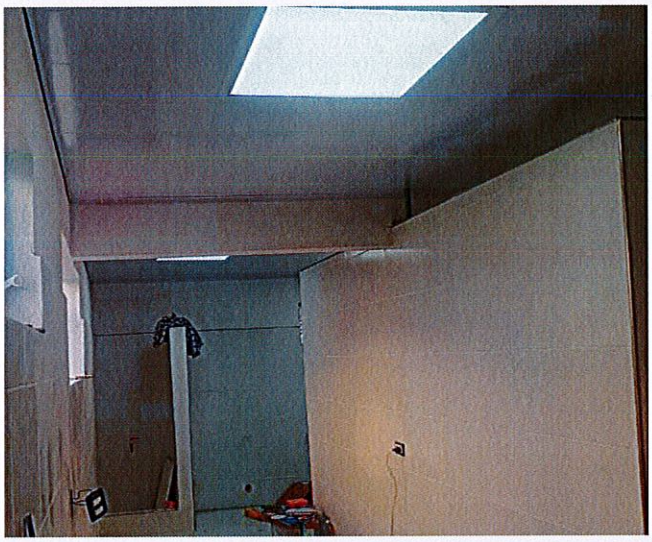

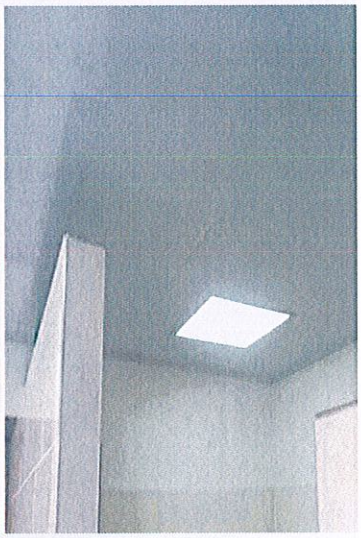







Desmonte elementos electricos.

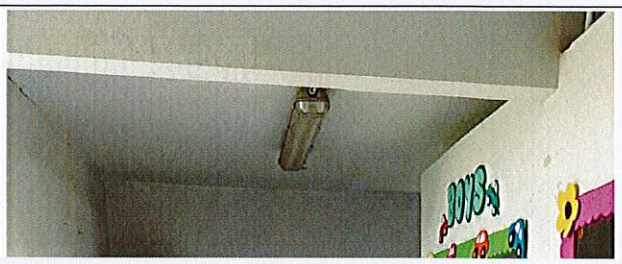**Liceo Pichincha – Cali, Valle del Cauca:**


Suministro e instalación de cerramiento provisional.




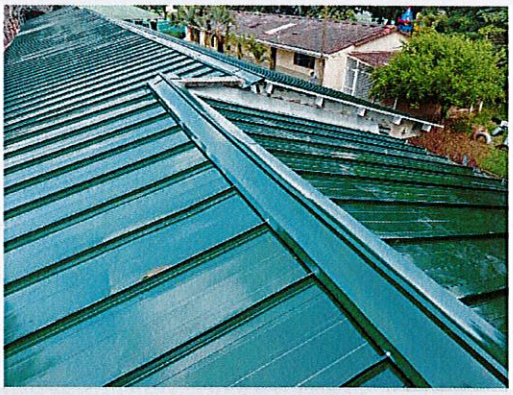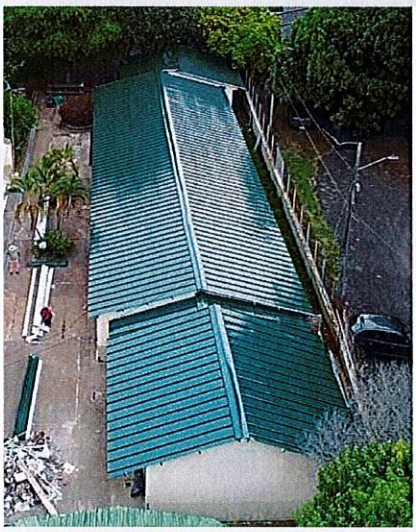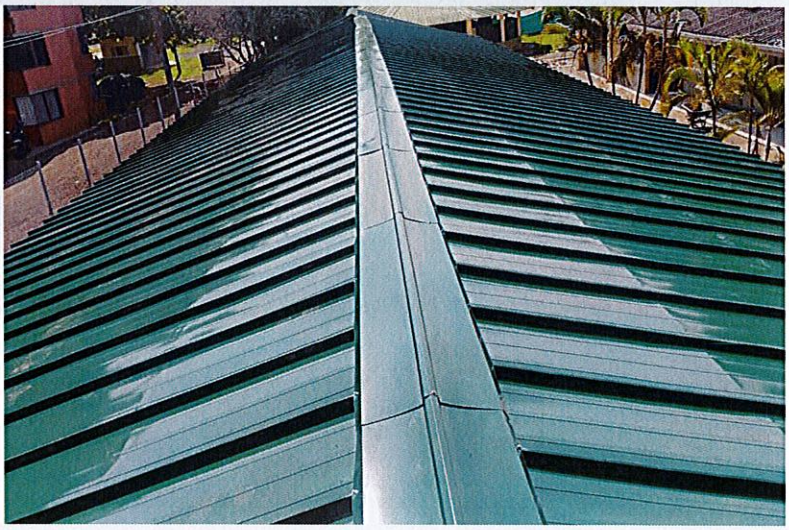





Suministro e instalación de cielo raso en lámina PVC 7 mm.

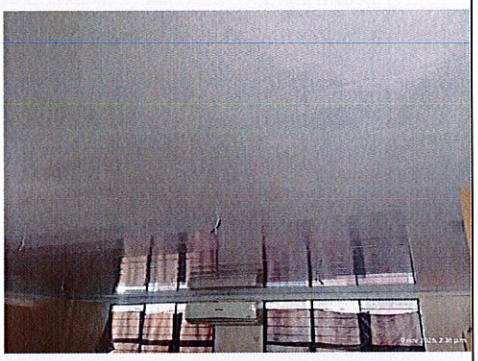

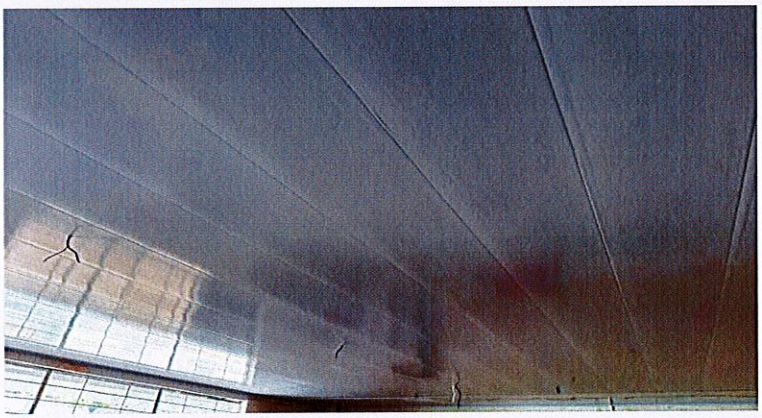









Calle 100 # 11 - 00
Tel 6019157054 Ext. 2006 Bogotá, D.C
precontractual@liceosejercito.edu.co

Continuación Informe Supervisión No. 002 del Contrato 273-CELIC-2026, cuyo objeto es el mantenimiento, y/o remodelación de las instalaciones de los Liceos: Liceo Santa Barbara ubicado en la ciudad de Bogotá, Francisco José De Caldas ubicado en la Base Militar de Tolemaida Nilo Cundinamarca, Liceo General Gustavo Matamoros León ubicado en la ciudad de Yopal, Liceo General Serviez ubicado en la ciudad de Villavicencio y Liceo Pichincha ubicado en la ciudad De Cali.

## *V. PAGOS EFECTUADOS*

Corte 001: $ 589,581,641.00

**BALANCE DEL CONTRATO**

| | | |
|---|---|---|
| Valor Total Contrato Vigencia 2026 | $1.731.444.852,00 | |
| Valor cancelado a la fecha | | $ 589,581,641.00 |
| Valor Total presupuestado a cancelar | | $ 622,421,994.00 |
| Valor Total Pendiente por Cancelar | | $ 519,441,217.00 |
| VALOR TOTAL CONTRATO | $1.731.444.852,00 | $ 1.731.444.852,00 |

## *VI. NIVEL DE EJECUCIÓN Y AVANCE DEL CONTRATO PRINCIPAL.*

| % de Ejecución Financiera Cancelado a la fecha | % Ejecución Física / servicio | % servicio Amortizado |
|---|---|---|
| 34.13% | 70% | 0 |

## *VII. OTRAS ACTIVIDADES*

Se adjunta acta parcial de obra (002) correspondiente al periodo del presente informe.

## *VIII. CONCLUSIONES*

Se presenta el informe de avance correspondiente al período comprendido entre el 22 de septiembre y el 9 de noviembre de 2026, durante el cual se alcanza una ejecución acumulada del 70 %, dentro de los parámetros técnicos y contractuales establecidos.

Por sede, el avance acumulado de ejecución de obra, según las Actas Parciales No. 001 y No. 002, es el siguiente: Liceo Santa Bárbara (68,21 %), Francisco José de Caldas (34,37 %), Gustavo Matamoros León (92,90 %), General Serviez (43,62 %) y Pichincha (78,37 %).

En el presente corte se aprueba un valor de SEISCIENTOS VEINTIDÓS MILLONES CUATROCIENTOS VEINTIÚN MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS M/CTE ($622.421.994), correspondiente al avance ejecutado en el periodo del presente informe.

Pilar Matallana S.

**C.T. WILMAN JOSE NIEVES CAMAÑO**
Supervisor de Contrato.
Liceos del Ejército.

**ANDREA DEL PILAR MATALLANA SANDOVAL**
Arquitecta Asesora Infraestructura.
Liceos del Ejército.
