INPLAYCO S.A.S.
INGENIEROS CONSTRUCTORES E INTERVENTORES

ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE HÁBITAT

# INFORME SEMANAL 7

## GRUPO No. 1

## CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 701-2020 CUYO OBJETO ES REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, JURÍDICA, SOCIAL, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA MODALIDAD DE HABITABILIDAD EN LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT.

ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE HÁBITAT




## SEMANA 7 DEL 14 AL 20 DE DICIEMBRE DE 2020

INPLAYCO S.A.S.
INGENIEROS CONSTRUCTORES E INTERVENTORES

ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE HÁBITAT

# CONTRATO DE INTERVENTORÍA
# NÚMERO: 701-2020

| | | |
|---|---|---|
| **CONTRATANTE:** | **SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT** | |
| **CONTRATISTA:** | **INPLAYCO S.A.S** | |
| **IDENTIFICACIÓN:** | N.I.T.: **860.524.168- 8** | |
| **REPRESENTANTE LEGAL:** | **GONZALO LIÉVANO HOYOS** | |
| **IDENTIFICACIÓN:** | C.C. Nº 19.100.962 | |
| **DIRECCIÓN:** | Carrera 16 A No 82-13 Oficina 201 | |
| **TELÉFONOS:** | 6181167 | inplayco@yahoo.com.mx |
| **SUPERVISOR** | JUAN CARLOS ARBELÁEZ MURILLO | |
| **FECHA DE INICIO** | 4 DE NOVIEMBRE DE 2020 | |
| **FECHA DE FINALIZACIÓN** | 3 DE MAYO DE 2021 | |
| **TIEMPO EJECUCIÓN DEL** | 6 MESES | |
| **VALOR CONTRATO** | $894.285.952 | |
| **FECHA ADICIÓN No. 1** | ------ | |
| **VALOR ADICIÓN No. 1** | $0 | |
| **VALOR TOTAL CONTRATO** | $894.285.952 | |
| **FECHA PRÓRROGA No. 1** | ------ | |
| **VALOR PRÓRROGA No. 1** | $0 | |
| **VALOR TOTAL CONTRATO** | $894.285.952 | |
| | | |

INPLAYCO S.A.S.
INGENIEROS CONSTRUCTORES E INTERVENTORES

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE HÁBITAT

# CONTRATO DE OBRA
# NÚMERO: 694-2020

| | | |
|---|---|---|
| **CONTRATANTE:** | **SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT** | |
| **CONTRATISTA:** | CONSORCIO MEJORAMIENTO EP 2020 | |
| **REPRESENTANTE LEGAL** | LUIS FERNANDO CARRILLO JIMÉNEZ | |
| **OBJETO CONTRACTUAL** | "CONTRATAR LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA MODALIDAD DE HABITABILIDAD DE LOS PROYECTOS ESTRUCTURADOS EN LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT.". | |
| **APROPIACIÓN PRESUPUESTAL** | CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL NO. 914 DEL 14 DE JULIO DE 2020 | |
| **FIDUCIA No.** | | |
| **DIRECCIÓN:** | Calle 31 No. 4 -47 oficina 501 MONTERÍA | |
| **TELÉFONOS:** | 3212231771 | Mejoramientoconsorcio2020@gmail.com |
| **Consorciado No. 1.** | CORPORACIÓN MULTIACTIVA EMPRENDER ONG | |
| **NIT** | 900.164.714-9 | |
| **REPRESENTANTE LEGAL** | JUAN CARLOS NOBLES NAVARRO | |
| **C.C. R.L.** | 10.894.408 | |
| **Consorciado No. 2.** | PROJECT CENTER LIMITADA | |
| **NIT** | 900.236.613-3 | |
| **REPRESENTANTE LEGAL** | LUIS FERNANDO CARRILLO JIMENEZ | |
| **C.C. R.L.** | 72.097.065 | |
| **PARTICIPACIÓN** | | |
| **CORPORACIÓN MULTIACTIVA EMPRENDER** | 60% / MANEJO TÉCNICO, CONTABLE Y ADMINISTRATIVO | |
| **PROJECT CENTER LIMITADA** | 40% / MANEJO TÉCNICO y ADMINISTRATIVO | |
| **SUPERVISOR** | JUAN CARLOS ARBELÁEZ MURILLO | |
| **FECHA DE INICIO** | 4 DE NOVIEMBRE DE 2020 | |
| **FECHA DE FINALIZACIÓN** | 3 DE ABRIL DE 2021 | |
| **TIEMPO EJECUCIÓN DEL CONTRATO** | 5 MESES | |
| **VALOR CONTRATO** | $3.728.543.252 | |
| **FECHA ADICIÓN No. 1** | ------ | |
| **VALOR ADICIÓN No. 1** | $0 | |
| **VALOR TOTAL CONTRATO** | $3.728.543.252 | |
| **FECHA PRÓRROGA No. 1** | ------ | |
| **VALOR PRÓRROGA No. 1** | $0 | |
| **VALOR TOTAL CONTRATO** | $3.728.543.252 | |

INPLAYCO S.A.S.
INGENIEROS CONSTRUCTORES E INTERVENTORES

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE HÁBITAT

## INTRODUCCION

Por intermedio de la Secretaria Distrital del Hábitat, se busca adelantar las obras de mejoramiento de vivienda en la modalidad de habitabilidad en los territorios de Ciudad Bolívar, Usme, Bosa; atendiendo a la Política Nacional y Distrital de Construcción Sostenible, ofreciendo a las familias favorecidas la mejora de sus ambientes habitacionales y de vida., para lograr este alcance del objeto contractual, la Secretaria Distrital del Hábitat celebró el contrato de Interventoría con el No 701 de 2020 con la empresa INPLAYCO S.A.S, para su correcta ejecución con el fin de desarrollar las actividades de mejoramiento de las viviendas de los territorios mencionados anteriormente.

## ETAPA DE VALIDACIÓN

Este informe ejecutivo se desarrolla en su quinta semana, comprendida del 14 de diciembre al 20 de diciembre la presente anualidad, periodo en el cual después de la firma del acta de inicio el CONSORCIO MEJORAMIENTO EP 2020, comenzó con las validaciones y ejecución.

Durante la fase de validación se definió por parte el contratista **CONSORCIO MEJORAMIENTO EP 2020,** un punto de atención a la comunidad (PAC) por localidad y/o Territorio, con el fin de garantizar y resolver las dudas, inquietudes, quejas o reclamos de los beneficiarios las cuales son atendidas de manera oportuna; Ubicado en la Kr 18K Bis con Cll 69T Sur a una cuadra de la estación de Trasmicable de Manitas.

Estas reuniones se realizaron bajo los protocolos de Bioseguridad cumpliendo las exigencias del gobierno nacional.

## SEMANA 7 DEL 14 DE NOVIEMBRE AL 20 DE DICIEMBRE – VALIDACION Y APERTURAS PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS

Para esta semana el consorcio continuo con las validaciones y procede a realizar aperturas de viviendas en diferentes zonas, continuando con lo descrito en la programación entregada, a continuación, se relaciona los MV validados y en ejecución.

INPLAYCO S.A.S.
INGENIEROS CONSTRUCTORES E INTERVENTORES

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE HÁBITAT

| No. | ID_DMV | Dirección | Nombres y apellidos |
|---|---|---|---|
| **NUEVA COLOMBIA** | | | |
| 1 | MVCB_1437 | KR 18L 70H 09 SUR | FLOR ELISA PARRA ROJAS |
| 2 | MVCB_1441 | CL 70H SUR 18L 22 | LUZMILA TORRES BERMUDEZ |
| 3 | MVCB_1440 | CL 70H SUR 18L 16 | ALBA CARMEN ARDILA MATEUS |
| 4 | MVCB_1421 | CL 70I SUR 18L 54 | MARIA ESTER ZORRO GUERRERO |
| 5 | MVCB_1124 | DG 69D SUR 18J 15 | MARIA ANTONIA SANTOS CORREDOR DE RAMIREZ |
| 6 | MVCB_1120 | DG 69D SUR 18J 31 | QUERUBIN CHAGUALA |
| 7 | MVCB_1091 | DG 69D BIS SUR 18J 32 | LIGIA TEJADA DE BARRERO |
| 8 | MVCB_1286 | CL 70 SUR 18L 61 | LUZ MINDA CASTRO PEÑA |
| **JUAN PABLO II** | | | |
| 9 | MVCB_2996 | DG 69A BIS B SUR 18M 23 | MARIA TERESA ANTOLINEZ Y OTRO |
| 10\| | MVCB_2993 | DG 69A BIS B SUR 18M 35 | CARLOS JULIO CARDENAS TRIANA<br>**Beneficiario renuncia subsidio** |
| 11 | MVCB_2999 | DG 69A BIS B SUR 18M 15 | MARIA LEONOR FRAILE SUAREZ |
| 12 | MVCB_2991 | DG 69A BIS B SUR 18M 43 | BRISNELDA CONSTANZA MACIAS MARTINEZ |
| 13 | MVCB_2967 | DG 69A BIS D SUR 18M 36 | MARIA OLGA FARFAN GALEON |
| 14 | MVCB_2960 | DG 69A BIS D SUR 18M 06 | MARIA NURY QUINTERO CARDONA |
| 15 | MVCB_2434 | KR 18M BIS 69A 64 SUR | MARGARITA MARIA MORALES OROZCO |
| 16 | MVCB_2432 | KR 18M BIS 69A 72 SUR | AGUSTÍN VILLANUEVA GUZMÁN |
| 17 | MVCB_3030 | KR 18M BIS 69A 81 SUR | TEODOSIA GALICIA DE GARCIA |
| 18 | MVCB_3020 | KR 18M BIS A 69A 70 SUR | PEDRO PABLO IBAÑEZ |
| **MIRADOR NUTIVARA** | | | |
| 19 | MVCB_1914 | CL70M BIS SUR 18N 33 | BLANCA ODILLIA PATIÑO DE MARTINEZ |
| 20 | MVCB_1843 | CL70M BIS SUR 18N 34 | FLORALBA GUTIERREZ BELTRAN |
| 21 | MVCB_1866 | CL70L SUR 18P 21 | LUIS ALBERTO ALONSO CASTIBLANCO |
| 22 | MVCB_1818 | KR 18P 70K 03 SUR | MERQUECIDE MONTAÑEZ UYOA |
| 23 | MVCB_1811 | CL70K SUR 18Q 09 | ROSA ELVIRAGONZALEZ |
| 24 | MVCB_1726 | CL70K SUR 18P 10 | EMPERATRIZ ACOSTA MARTINEZ |
| 25 | MVCB_1867 | CL70L SUR 18P 15 | JOSE ALBER LUGO |
| 26 | MVCB_1766 | CL70K SUR 18N 46 | CARMEN QUIQUE MARTINEZ |
| 27 | MVCB_1574 | CL 70F SUR 18R 27 | JOSE HIPOLITO GUTIERREZ LUCERO |
| 28 | MVCB_1588 | CL 70F SUR 18P 33 | LUZ NELLY RODRIGUEZ |
| 29 | MV_1608 | KR 18P 70F 06 SUR | ROSALBINA HERNANDEZ PIRACHICAN |
| 30 | MV_0252 | CL 61D SUR 18N 30 MJ | JESUS ANTONIO ORTIZ CASTRO |

INPLAYCO S.A.S.
INGENIEROS CONSTRUCTORES E INTERVENTORES

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE HÁBITAT

| No. | ID_DMV | Dirección | Nombres y apellidos |
|---|---|---|---|
| **JUAN PABLO II** | | | |
| 1 | MVCB_4919 | KR 18M BIS 68B 50 SUR MJ | URIEL PATIÑO RINCON |
| 2 | MVCB_4923 | KR 18M BIS 68B 26 SUR | SIERVO MATIAS FIGUEROA CHAPARRO |
| 3 | MVCB_2932 | TV 18N 69A 97 SUR | MARIA TERESA PIÑEROS PIÑEROS |
| 4 | MVCB_2926 | TV 18N 69A 71 SUR | CORADO TORO DE TORRES Y OTRO |
| 5 | MVCB_3646 | TV 18N BIS 69A 95 SUR | LUIS ANTONIO CABRERA LOPEZ Y OTRA |
| 6 | MVCB_3643 | TV 18N BIS 69A 83 SUR | JOSE ARISTOBULO MENJURA LEITON Y OTRA |
| 7 | MVCB_2925 | TV 18N 69A 67 SUR | MARTHA LUZ CAMPIÑO |
| 8 | MVCB_2917 | DG 69A BIS B SUR 18M 30 | CLAUDIA PATRICIA VARGAS GÓMEZ |
| 9 | MVCB_3642 | TV 18N BIS 69A 77 SUR | JULIO CESAR FICHAS AVILA |
| 10 | MVCB_3641 | TV 18N BIS 69A 75 SUR | CECILIA MENDEZ MORENO |
| 11 | MVCB_3640 | TV 18N BIS 69A 71 SUR | OCTAVIO TELLEZ PINEDA |
| 12 | MVCB_3635 | TV 18N BIS 69A 51 SUR | JUAN CARLOS MAZO CASTRO Y OTRA |
| 13 | MVCB_3634 | TV 18N BIS 69A 47 SUR | AYDE NIÑO Y OTRO |
| 14 | MVCB_2939 | TV 18N BIS 69A 84 SUR | MARIEYE LOAISA |
| 15 | MVCB_4918 | KR 18M BIS 68B 56 SUR | ALVARO DIAZ AVILA |
| 16 | MVCB_3633 | TV 18N BIS 69A 43 SUR | FRANCISCO JAVIER MENDIVELSO GUERRERO |
| 17 | MVCB_4917 | KR 18M BIS 68B 62 SUR | ALVARO ALONSO MORENO |
| **DESARROLLO NUEVA COLOMBIA** | | | |
| 18 | MVCB_1320 | CL70K SUR 18L 65 | ISMINIA BARRETO ARIAS |
| 19 | MVCB_1383 | CL70J SUR 18L 34 | EDGAR FERNANDO CAMARCO ANGEL |
| 20 | MVCB_1380 | CL 70J SUR 18L 22 | ROSALBA MONTES DE CARDONA |
| 21 | MVCB_1382 | CL 70J SUR 18L 30 | MARIA CECILIA RINCON RINCON |
| 22 | MVCB_1381 | CL 70J SUR 18L 26 | NOHORA NOHEMI MAYORGA IBAGUE |
| 23 | MVCB_1374 | CL 70J SUR 18L 11 | OBED OSPINA RESTREPO |
| 24 | MVCB_1371 | CL 70J SUR 18L 23 | CONSUELO NAVARRO |
| 25 | MVCB_1328 | CL 70K SUR 18L 29 | EDILBERTO CARDENAS PAEZ |
| 26 | MVCB_1352 | CL 70K SUR 18L 64 | MARIA RAMOS ORTIZ |
| 27 | MVCB_1341 | CL 70K SUR 18L 20 | JOSE GABRIEL HERRERA MEDINA |
| 28 | MVCB_1344 | CL 70K SUR 18L 32 | ALBEIRO RUIZ SANABRIA |
| 29 | MVCB_1310 | CL 70L SUR 18L 70 | DORA ALICIA LÓPEZ SANABRIA |
| 30 | MVCB_1314 | KR 18M 70K 16 SUR | MARTHA LUCIA OSPINA PEÑA |
| **VILLAS DEL DIAMANTE** | | | |
| 31 | MVCB_5128 | CL 69N SUR 18N 52 | DIEGO MARIO VANEGAS VILLAMIL |
| 32 | MVCB_5156 | CL 69N SUR 18N 58 MJ | FRANCISCO JAVIER ARANGO GUTIERREZ |
| 33 | MVCB_5127 | CL 69N SUR 18N 59 MJ | VICTOR MANUEL MUÑOZ VERGARA |

| No. | ID_DMV | Dirección | Nombres y apellidos |
|---|---|---|---|
| **MIRADOR NUTIVARA** | | | |
| 1 | MVCB_1873 | CL 70L BIS SUR 18N 14 | BLANCA FABIOLA LANDAZURI MESA |
| 2 | MVCB_1886 | KR 18N 70K 31 SUR | LUZ MARIA ARIZA ARIZA |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3 | MVCB_1836 | KR 18N 70K 09 SUR | DELIA MARÍA MATEUS ESCAMILLA |
| 4 | MVCB_1829 | CL 70K SUR 18N 45 | DIANA PATRICIA PÁEZ FINO |
| 5 | MVCB_1684 | CL 70I SUR 18N 56 | MIRYAM MANRIQUE URUEÑA |
| 6 | MVCB_1692 | CL 70 H SUR 18 N 51 | BEATRIZ ADIELA MARTINEZ JARAMILLO |
| 7 | MVCB_1681 | CL 70 I SUR 18 N 36 MJ | ALVARO ELIECER VERDUGO RODRIGUEZ |
| 8 | MVCB_1638 | KR 18R 70H 09 SUR | MAURICIO ENRIQUE MUÑOZ RIAÑO |
| 9 | MVCB_1664 | KR 18P 70G 08 SUR | MARINA CLEMENCIA RAMOS |
| 10 | MVCB_1748 | KR 18P 70I 04 SUR | OLGA LUZ BETANCOURT LEON |
| 11 | MVCB_1704 | KR 18R 70H 08 SUR | ALBA LUCIA VALENCIA OCAMPO |
| 12 | MVCB_1631 | CL 70G SUR 18R15 | ELOISA LAVERDE RIOS |
| **NUEVA COLOMBIA** | | | |
| 13 | MVCB_1130 | DG 69F SUR 18J 18 | CARMEN JULIA SUAREZ PARADA |
| 14 | MVCB_1180 | DG 69F SUR 18J 15 | BLANCA TERESA CALVO DE GARZON |
| 15 | MVCB_1181 | DG 69F SUR 18J 11 | ALBERTO ULLOA ULLOA |
| 16 | MVCB_1161 | DG 69F SUR 18J 03 | MARIA ROSA ELENA BECERRA SEGURA |
| 17 | MVCB_1212 | DG 69G SUR 18J 43 | HERNAN LOPEZ |
| 18 | MVCB_1194 | DG 69H SUR 18J 20 | VICTOR HUGO WILCHES BERNAL |
| 19 | MVCB_1467 | CL 70H SUR 18J 70 | TERESA DE JESUS OLIVOS DE BLANCO |
| 20 | MVCB_1469 | CL 70H SUR 18J 82 | JORGE SANCHEZ FORERO |
| 21 | MVCB_1470 | KR 18L 70G 24 SUR | ANA SILVIA CHACON |
| 22 | MVCB_1495 | KR 18L 70H 10 SUR | YACQUELINE RADA MOJICA |
| 23 | MVCB_1493 | CL 70I SUR 18J 86 | MARIA ELENA ALCIRA GARZON CASALLAS |
| 24 | MVCB_1516 | KR 18L 70I 10 SUR | BERTHA CECILIA MOJICA RUIZ |
| 25 | MVCB_1417 | CL 70I SUR 18L 30 | DIANA MARCELA PARRA BALLESTEROS |
| 26 | MVCB_1416 | CL 70I SUR 18L 22 | ANA CENETH TORRES ROJAS |
| 27 | MVCB_1407 | CL 70I SUR 18L 33 | MARIA ELSA TORRES |
| 28 | MVCB_1409 | CL 70I SUR 18L 21 | FRAN EDILBERTO CRUZ CANO Y OTRA |
| **VILLAS DEL DIAMANTE** | | | |
| 29 | MVCB_5118 | TV 18P BIS 69N 17 SUR | CARLOS ALFREDO CLAVIJO ROZO |
| 30 | MVCB_5464 | KR 19D BIS 70C 25 SUR (KR 19B 70C 25 SUR) | IRMA ROJAS ROJAS |

| No. | ID_DMV | Dirección | Nombres y apellidos |
|---|---|---|---|
| **DOMINGO LAIN II SECTOR Y CONDOMINIO DEL BOSQUE** | | | |
| 1 | MVJA_0723 | CL 63 SUR 18K 14 | VICTOR MANUEL SAMORA HERNANDEZ |
| **DOMINGO LAIN I** | | | |
| 2 | MVJA_0898 | CL 63B SUR 18L 53 | EFIGENIA GUIZA DE SANCHEZ |
| 3 | MVJA_0899 | CL 63B SUR 18L 61 | DORIS AYDEE HERRERA OTALORA |
| 4 | MVJA_0970 | CL 63D SUR 18L 02 | DORIS CUESTA DE RODRIGUEZ |
| **ALTOS DE JALISCO** | | | |
| 5 | MVJA_2741 | KR 18M 62ª 44 SUR | CARLOS ALBERTO MUÑETON FRANCO |
| 6 | MVJA_2729 | KR 18M 62ª 07 SUR | JOSE IGNACIO TAO IBARRA |
| 7 | MVJA_0544 | CL 62ª SUR 18M 09 | MERCEDES RIAÑO PARRA |
| 8 | MVJA_0567 | CL 62ª SUR 18M 41 IN 9 | MARIA DEL ROSARIO RODRIGUEZ |
| 9 | MVJA_3309 | KR 18P BIS B 61D 25 SUR | TEOFILO MORALES TURGA Y OTRA |
| 10 | MVJA_3366 | KR 18Q 61C 34 SUR | EDILMA ALCIRA CASTILLO |
| 11 | MVJA_4350 | TV 18Q BIS C 61B 87 SUR | MARÍA BENDITA REDONDO CASTIBLANCO |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 12 | MVJA_2660 | KR 18L BIS A 62ª 39 SUR | MANUEL EDUARDO RODRIGUEZ PRIETO |
| 13 | MVJA_4333 | TV 18Q BIS C 61B 45 SUR | BEATRIZ CABRALES ACERO |
| 14 | MVJA_0890 | CL 63B SUR 18K 56 | HERNAN HUMBERTO PARRACORREDOR DE RAMIREZ |
| **LA ESCALA 3ER SECTOR** | | | |
| 15 | MVJA_0530 | CL 62ª SUR 18L 07 | LUIS ALIRIO LÓPEZ DÍAZ |
| **GIBRALTAR I Y II** | | | |
| 16 | MVJA_4375 | TV 18R 61B 41 SUR | FERNANDO TORRES Y OTRA |
| **GIBRALTAR I Y II** | | | |
| 17 | MVJA_0598 | CL 62ª SUR 18R 15 | RODULFO BEJARANO |
| 18 | MVJA_0608 | CL 62ª SUR 18T 10 | MARIA LUIDINA VARGAS AGUIRRE |
| 19 | MVJA_3670 | KR 18Z 62 30 SUR | CRISTOBAL PITA CAMARGO |
| **LA ESPERANZA** | | | |
| 20 | MVJA_3607 | KR 18T 62ª 21 SUR | LUIS ENRIQUE JIMENEZ VEGA |
| **MIRADOR (NUTIVARA)** | | | |
| 21 | MVCB_1574 | CL 70F SUR 18R 27 | JOSE HIPOLITO GUTIERREZ LUCERO |
| 22 | MVCB_1585 | CL 70F SUR 18P 51 | ELIECER RONCANCIO MARTINEZ |
| 23 | MVCB_1586 | CL 70F SUR 18P 45 | MARIA DEL CARMEN RINCON |
| 24 | MVCB_1588 | CL 70F SUR 18P 33 | LUZ NELLY RODRIGUEZ |
| 25 | MVCB_1608 | KR 18P 70F 06 SUR | ROSALBINA HERNANDEZ PIRACHICAN |
| 26 | MVCB_1592 | CL 70F SUR 18N 28 | HOBER FABIAN BARRERA GUTIERREZ |
| 27 | MVCB_1708 | TV 18R 70H 57 SUR | MARIA EUGENIA TRUJILLO QUIMBAYO |

| No. | ID_DMV | Dirección | Nombres y apellidos |
|---|---|---|---|
| **ALTOS DE JALISCO** | | | |
| 1 | MVJA_2992 | KR 18 N BIS 61C 21 SUR | TEODOSIA GALICIA DE GARCIA |
| 2 | MVJA_3141 | KR 18P 62 A 30 SUR MJ | MARIA LEONOR FRAILE SUAREZ |
| 3 | MVJA_3146 | KR 18P 62ª 45 SUR MJ | MARIA ESTER ZORRO GUERRERO |
| 4 | MVJA_3335 | KR 18P BIS B 62A 48 SUR MJ | CARLOS JULIO CARDENAS TRIANA |
| 5 | MVJA_3314 | KR 18P BIS B 61D 36 SUR | BRISNELDA CONSTANZA MACIAS MARTINEZ |
| 6 | MVJA_3239 | KR 18P BIS A 61C 22 SUR MJ | NATIVIDAD SILDANA CELYS VIUDA DE GARCIA |
| 7 | MVJA_0259 | CL 70H SUR 18L 16 | ALBA CARMEN ARDILA MATEUS |
| 8 | MVJA_3223 | DG 69A BIS D SUR 18M 36 | MARIA OLGA FARFAN GALEON |
| 9 | MVJA_3231 | DG 69D SUR 18J 15 | MARIA ANTONIA SANTOS CORREDOR DE RAMIREZ |
| 10 | MVJA_3119 | CL 70H SUR 18L 22 | LUZMILA TORRES BERMUDEZ |
| 11 | MVJA_3125 | KR 18L 70H 09 SUR | FLOR ELISA PARRA ROJAS |
| 12 | MVJA_0252 | CL 61D SUR 18N 30 MJ | JESUS ANTONIO ORTIZ CASTRO |
| 13 | MVJA_2996 | KR 18N BIS 61D 18 SUR | MARIA DEL SOCORRO CUPITRA CACAIS |
| 14 | MVJA_2712 | KR 18M 62 29 SUR | JOSE ALIRIO ORTIZ CABRERA Y OTRA |
| 15 | MVJA_2707 | KR 18M 62 12 SUR | ANA LUISA BERNAL PULIDO |
| 16 | MVJA_2640 | KR18L BIS A 61D 47 SUR | PAOLA ANDREA BARRERA PELAEZ |
| **MIRADOR NUTIVARA** | | | |
| 17 | MVCB_1774 | CL 70J SUR 18N 23 | JOSE WILSON MARULANDA GIRALDO |
| 18 | MVCB_1742 | CL 70J SUR 18N 34 | ANA ELVIA MENDOZA DE HERNANDEZ |
| 19 | MVCB_1907 | CL 70N SUR 18N 22 | ANA ROSA LLANOS DE GARCIA |
| 20 | MVCB_1661 | CL 70H SUR 18N 46 MJ | MARICIELO ARIAS CERQUERA |
| 21 | MVCB_1698 | CL 70I SUR 18P 22 | LUZ AMALFI GUTIERREZ FRANCO |

INPLAYCO S.A.S.
INGENIEROS CONSTRUCTORES E INTERVENTORES

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE HÁBITAT

| | | | |
|---|---|---|---|
| **ROCIO ALTOS DEL SUR** | | | |
| 22 | MVJA_2981 | DG 69A BIS D SUR 18M 06 | LEONOR TOVAR BARRERO |
| 23 | MVJA_2812 | KR 18M BIS 69A 64 SUR | MARGARITA MARIA MORALES OROZCO |
| 24 | MVJA_2909 | KR 18M BIS 69A 72 SUR | AGUSTÍN VILLANUEVA GUZMÁN |
| 25 | MVJA_0186 | KR 18M BIS A 69A 70 SUR | PEDRO PABLO IBAÑEZ |
| **LA ESCALA** | | | |
| 26 | MVJA_2672 | DG 69A BIS B SUR 18M 23 | MARIA TERESA ANTOLINEZ Y OTRO |
| **ACACIAS SUR** | | | |
| 27 | MVJA_0598 | CL 62A SUR 18R 15 | RODULFO BEJARANO |
| **BARRIO GIBRALTAR I Y II** | | | |
| 28 | MVJA_0834 | CL 63A SUR 18Q 05 | CLARA INES OCHOA GUTIERREZ |
| 29 | MVJA_3011 | CL 63A SUR 18Q 05 | RITA DEL CARMEN FONSECA CAMARGO |
| 30 | MVJA_3157 | KR 18N BIS 63 27 SUR | IRIA ESTHER SILVA |
| 31 | MVJA_3397 | KR 18P 63 16 SUR | LUZ MARINA ROBAYO ALVARADO |
| **LA ESCALA 3ER SECTOR** | | | |
| 32 | MVJA_0502 | CL 62A SUR 18J 20 | ROSALBA JARA DE ROJAS |
| 33 | MVJA_0519 | CL 62A SUR 18K 20 | NESTOR JAVIER VALENZUELA PEÑA |
| **CIUDAD MILAGRO** | | | |
| 34 | MVJA_0395 | CL 62 SUR 18K 78 | JOSE ORVEY ORTIZ |

| CIUDAD BOLIVAR SEMANA 7 | OBSERVACION | PQR | |
|---|---|---|---|
| | | SI | NO |
| NUEVA COLOMBIA | | | X |
| JUAN PABLO II | MVCB_2917, MVCB_4917, MVCB_2993 | | X |
| MIRADOR NUTIVARA | | | X |
| DESARROLLO NUEVA COLOMBIA | | | X |
| DOMINGO LAIN II SECTOR Y CONDOMINIO DEL BOSQUE | | | X |
| DOMINGO LAIN I | | | X |
| ALTOS DE JALISCO | | | X |
| LA ESCALA 3ER SECTOR | | | X |
| GIBRALTAR I Y II | | | X |
| ROCIO ALTOS DEL SUR | | | X |
| LA ESCALA | | | X |

| RESULTADOS- OBSERVACIÓN | |
|---|---|
| **MVCB_2917** | La Beneficiaria CLAUDIA PATRICIA VARGAS GÓMEZ, confirma contagio covid 19. |
| **MVCB_2993** | Beneficiario de la vivienda decide renunciar al beneficio, ya que la vivienda en buenas condiciones de habitabilidad. |
| **MVCB_4917** | Se le presenta al beneficiario planos de distribución socialización de presupuesto, se le comunica al señor Álvaro Moreno que el consorcio aportara actividades que no se contemplan en el presupuesto. |

INPLAYCO S.A.S.
INGENIEROS CONSTRUCTORES E INTERVENTORES

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE HÁBITAT

**PQR** - A la fecha no se recibieron PQR




**Avance de Validaciones.**








Para la semana 7 el Consorcio Mejoramiento EP 2020, se encuentra en periodo de Validación y continúa ejecutando las adecuaciones de las viviendas.

INPLAYCO S.A.S.
INGENIEROS CONSTRUCTORES E INTERVENTORES


ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE HÁBITAT

## PORCENTAJE EJECUTADO ACUMULADO A LA SEMANA DEL 7 AL 13 DE DICIEMBRE 2020

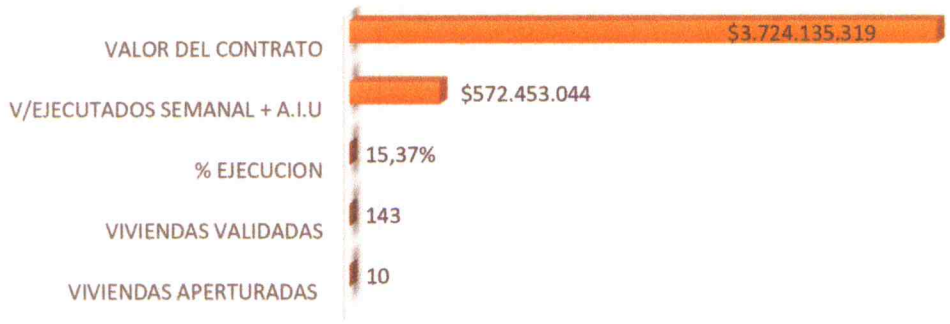


INPLAYCO S.A.S.
INGENIEROS CONSTRUCTORES E INTERVENTORES

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE HÁBITAT

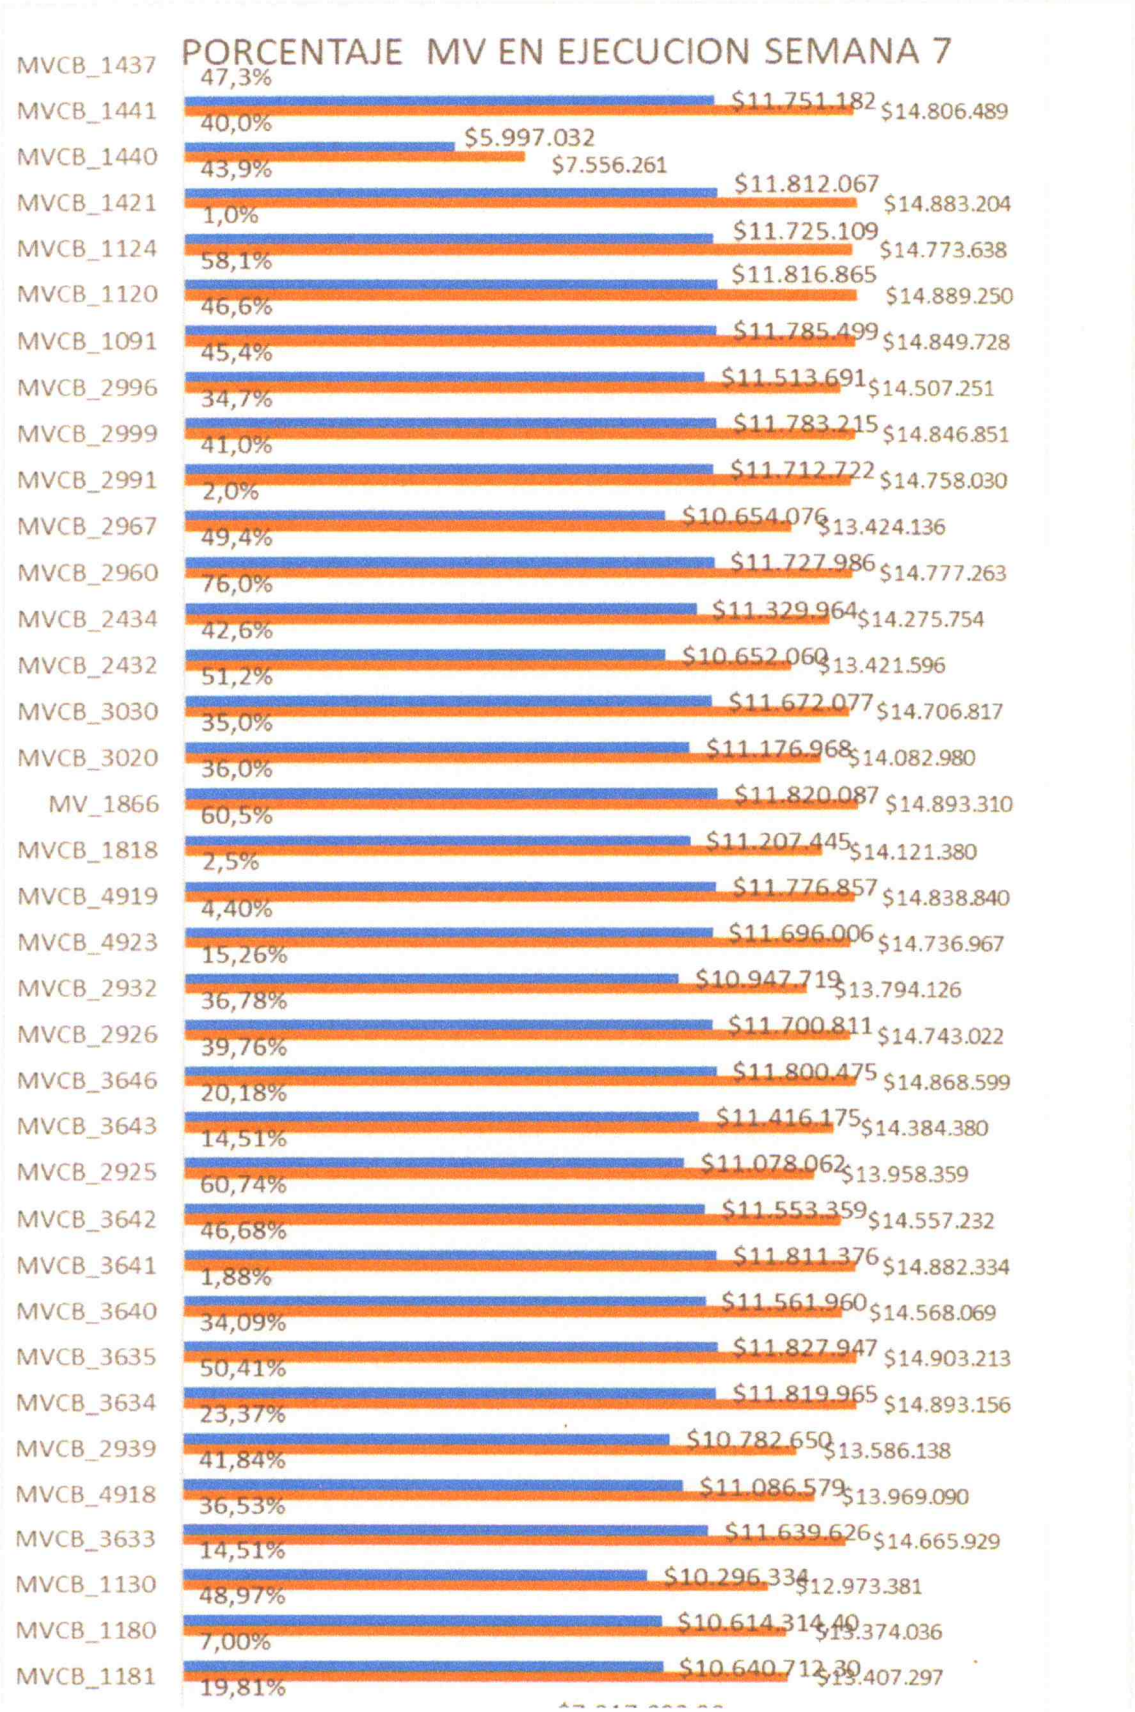

INPLAYCO S.A.S.
INGENIEROS CONSTRUCTORES E INTERVENTORES

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE HÁBITAT

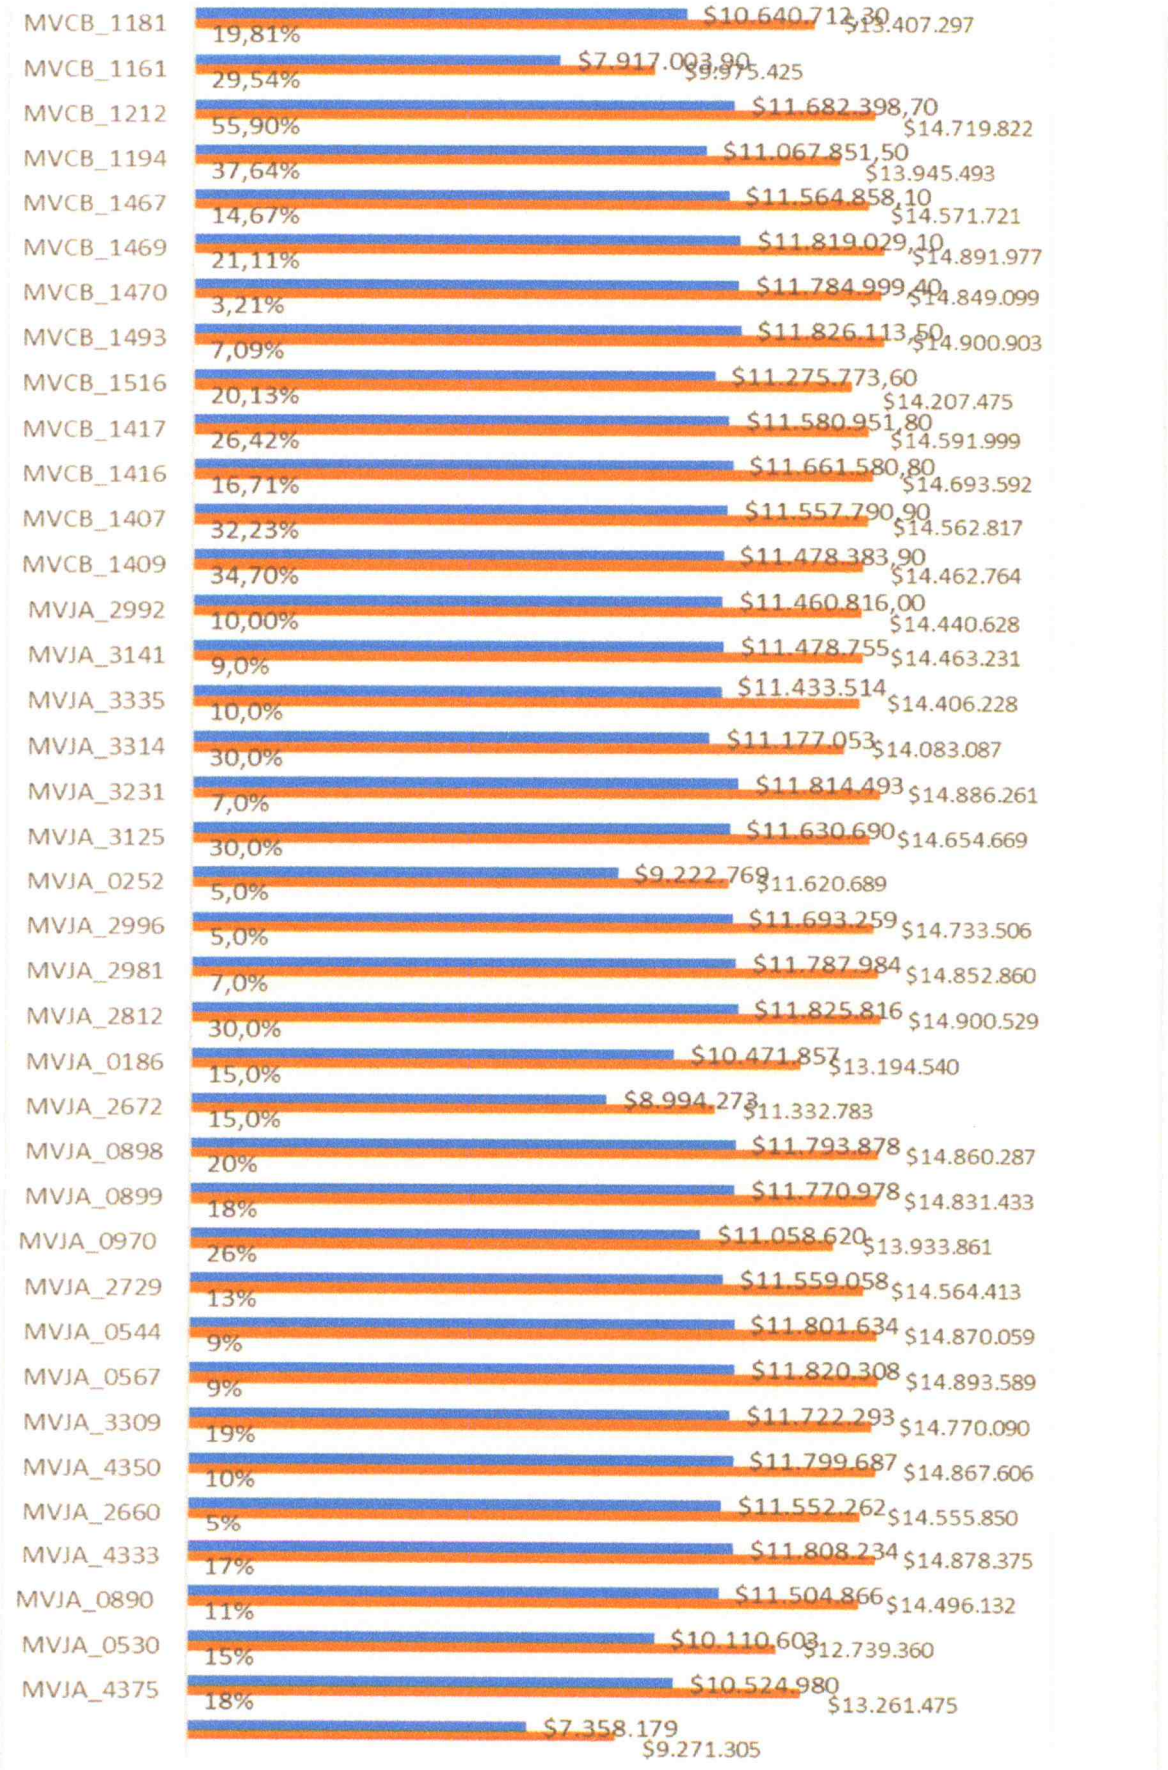

INPLAYCO S.A.S.
INGENIEROS CONSTRUCTORES E INTERVENTORES

ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE HÁBITAT

# INFORME TECNICO SEMANAL 7

**Subsecretaria de Coordinacion Operativa**
**Subdireccion de Barrios**
Seguimiento ejecución proyectos de Mejoramiento de Vivienda - Habitabilidad

## Proyecto mejoramiento de vivienda - AVANCE EJECUCIÓN SEMANAL

Fecha: **20-dic-20**

### Consorcio mejoramiento EP 2020 - Contratista de obra

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Contratato de obra | 694-2020 | | | | Plazo | Cinco (5) meses |
| Objeto | Contratar la ejecución de las obras de mejoramiento de vivienda en la modalidad de habitabilidad de los proyectos estructurados en los territorios priorizados por la Secretaria Distrital de Habitat. Grupo I | | | | Acta de inicio | 4 de noviembre de 2020 |
| CDP No. | No. 914 del 14 de Julio de 2020 | CRP No. | | | Valor del contrato | TRES MIL SETECIENTOS VEINTICUATRO MILLONES CIENTO TREINTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS DIEZ Y NUEVE PESOS ($3.724.135.319) M/Cte |

### Gonzalo Lievano Hoyos -INPLAYCO S.A.S.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Contratato de interventoría | 701-2020 | | | | Plazo | Seis (6) meses |
| Objeto | Realizar la interventorias técnica, jurídica, social, administrativa y financiera, para la ejecución de las obras de mejoramiento de vivienda en la modalidad de habitablidad en los territorios priorizados por la secretaría distrital de hábitat. | | | | Acta de inicio | 04 de noviembre 2020 |
| CDP No | No. 892 del 14 de Julio de 2020 | CRP No. | | | Valor del contrato | OCHOCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS M/CTE ($894.285.952), |

| Fase 1: Validación de la información entregada por el la SDHT | | | | | | | | | Fase 2: Ejecución de obras | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Validación | | | | Ejecución | | | | |
| Territorio o barrio a intervenir | CIUDAD BOLIVAR | Barrios | Predios | Total Predios | Validada | V/Por Validar | Renuncia | V/Modificada | En Ejecución | Terminadas | Por Ejecutar | % de Avance | Acta de Entrega a Satisfacción |
| Arq o Ing. Responsable | ARQ. WILLIAM FDO GARZÓN | NUEVA COLOMBIA | 8 | 30 | 8 | 0 | | 0 | 5 | 2 | 1 | 2.14% | 2 |
| | | JAUN PABLO II | 10 | | 10 | 0 | 1 | 0 | 5 | 4 | 0 | 3.24% | 4 |
| Técnico Responsable | | MIRADOR NUTIVARA | 11 | | 11 | 0 | | 0 | 2 | 0 | 9 | 0.25% | 0 |
| | | ALTOS DE JALISCO | 1 | | 1 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00% | 0 |
| Subtotal | | | 30 | | 30 | 0 | 1 | 0 | 12 | 6 | 11 | 5.63% | 6 |

| AVANCE DE EJECUCIÓN SEMANAL | | | | | | | | | | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Proyecto | | | | FASE I | | | Tiempo Programacion | | | SEMANA DEL 23 AL 29 | SEMANA DEL 30 AL 06 | SEMANA DEL 7 AL 13 | SEMANA DEL 14 AL 20 | SEMANA DEL 21 AL 27 |
| No. | ID_DMV | Dirección | Nombres y apellidos | V/ Validada | V/ Modificada | V/Inicial | Fecha inicio | Fecha terminada | F. Inicio | 4 semana | 5 semana | 6 semana | 7 semana | 8 semana |
| | | NUEVA COLOMBIA | | | | | | | | | | | | |
| 1 | MVCB_1437 | KR 18L 70H 09 SUR | FLOR ELISA PARRA ROJAS | SI | | $11,751,182 | 24/11/2020 | 24/12/2020 | 24/11/2020 | 10% | 23% | 18% | 47.3% | 0% |
| | | | | NO | | | | | | | | | | |
| 2 | MVCB_1441 | CL 70H SUR 18L 22 | LUZMILA TORRES BERMUDEZ | SI | | $5,997,032 | 24/11/2020 | 24/12/2020 | 24/11/2020 | 8% | 42% | 10% | 40.0% | 0% |
| | | | | NO | | | | | | | | | | |
| 3 | MVCB_1440 | CL 70H SUR 18L 16 | ALBA CARMEN ARDILA MATEUS | SI | | $11,812,067 | 24/11/2020 | 24/12/2020 | 24/11/2020 | 7% | 20% | 28% | 43.9% | 0% |
| | | | | NO | | | | | | | | | | |
| 4 | MVCB_1421 | CL 70I SUR 18L 54 | MARIA ESTER ZORRO GUERRERO | SI | | $11,725,109 | 24/11/2020 | 24/12/2020 | 24/11/2020 | 12% | 29% | 58% | 1.0% | 0% |
| | | | | NO | | | | | | | | | | |
| 5 | MVCB_1124 | DG 69D SUR 18J 15 | MARIA ANTONIA SANTOS CORREDOR DE RAMIREZ | SI | | $11,816,865 | 27/11/2020 | 27/12/2020 | 27/11/2020 | 0% | 0% | 5% | 58.1% | 0% |
| | | | | NO | | | | | | | | | | |
| 6 | MVCB_1120 | DG 69D SUR 18J 31 | QUERUBIN CHAGUALA | SI | | $11,785,499 | 27/11/2020 | 27/12/2020 | 27/11/2020 | 0% | 0% | 20% | 46.6% | 0% |
| | | | | NO | | | | | | | | | | |
| 7 | MVCB_1091 | DG 69D BIS SUR 18J 32 | LIGIA TEJADA DE BARRERO | SI | | $11,513,691 | 27/11/2020 | 27/12/2020 | 27/11/2020 | 0% | 0% | 15% | 45.4% | 0% |
| | | | | NO | | | | | | | | | | |
| 8 | MVCB_1286 | CL 70L SUR 18L 61 | LUZ MINDA CASTRO PEÑA | SI | | $11,176,968 | EN FASE DE VALIDACION | EN FASE DE VALIDACION | EN FASE DE VALIDACION | 0% | 0% | 0% | 0.0% | 0% |
| | | | | NO | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | **JUAN PABLO II** | | | | | | | | | | | |
| 9 | MVCB_2998 | DG 69A BIS B SUR 18M 23 | MARIA TERESA ANTOLINEZ Y OTRO | SI | | $11,738,882 | 23/11/2020 | 23/12/2020 | 23/11/2020 | 10% | 26% | 28% | 34.7% | 0% |
| | | | | NO | | | | | | | | | | |
| 10 | MVCB_2993 | DG 69A BIS B SUR 18M 35 | CARLOS JULIO CARDENAS TRIANA | SI | | $11,820,087 | RENUNCIA | RENUNCIA | RENUNCIA | | | 0% | | |
| | | | | NO | | | | | | | | | | |
| 11 | MVCB_2999 | DG 69A BIS B SUR 18M 15 | MARIA LEONOR FRAILE SUAREZ | SI | | $11,783,215 | 23/11/2020 | 23/12/2020 | 23/11/2020 | 8% | 23% | 28% | 41.0% | 0% |
| | | | | NO | | | | | | | | | | |
| 12 | MVCB_2991 | DG 69A BIS B SUR 18M 43 | BRISNELDA CONSTANZA MACIAS MARTINEZ | SI | | $11,757,101 | 23/11/2020 | 23/12/2020 | 23/11/2020 | 10% | 38% | 50% | 2.0% | 0% |
| | | | | NO | | | | | | | | | | |
| 13 | MVCB_2967 | DG 69A BIS D SUR 18M 36 | MARIA OLGA FARFAN GALEON | SI | | $11,712,722 | 27/11/2020 | 27/12/2020 | 27/11/2020 | 0% | 13% | 36% | 49.4% | 0% |
| | | | | NO | | | | | | | | | | |
| 14 | MVCB_2960 | DG 69A BIS D SUR 18M 06 | MARIA NURY QUINTERO CARDONA | SI | | $10,654,076 | 27/11/2020 | 27/12/2020 | 27/11/2020 | 0% | 9% | 15% | 76.0% | 0% |
| | | | | NO | | | | | | | | | | |
| 15 | MVCB_2434 | KR 18M BIS 69A 64 SUR | MARGARITA MARIA MORALES OROZCO | SI | | $11,727,986 | 30/11/2020 | 30/12/2020 | 30/11/2020 | 0% | 12% | 32% | 42.6% | 0% |
| | | | | NO | | | | | | | | | | |
| 16 | MVCB_2432 | KR 18M BIS 69A 72 SUR | AGUSTÍN VILLANUEVA GUZMÁN | SI | | $11,329,964 | 27/11/2020 | 27/12/2020 | 27/11/2020 | 0% | 9% | 10% | 51.2% | 0% |
| | | | | NO | | | | | | | | | | |
| 17 | MVCB_3030 | KR 18M BIS 69A 81 SUR | TEODOSIA GALICIA DE GARCIA | SI | | $10,652,060 | 26/11/2020 | 26/12/2020 | 26/11/2020 | 0% | 20% | 45% | 35.0% | 0% |
| | | | | NO | | | | | | | | | | |
| 18 | MVCB_3020 | KR 18M BIS A 69A 70 SUR | PEDRO PABLO IBAÑEZ | SI | | $11,672,077 | 27/11/2020 | 27/12/2020 | 27/11/2020 | 0% | 9% | 38% | 36.0% | 0% |
| | | | | NO | | | | | | | | | | |
| | | | **MIRADOR NUTIVARA** | | | | | | | | | | | |
| 19 | MV_1914 | CL 70M BIS SUR 18N 33 | BLANCA ODILIA PATIÑO DE MARTINEZ | SI | | $11,424,632 | EN FASE DE VALIDACION | EN FASE DE VALIDACION | EN FASE DE VALIDACION | 0% | 0% | 0% | 0.0% | 0% |
| | | | | NO | | | | | | | | | | |
| 20 | MV_1843 | CL 70M BIS SUR 18N 34 | FLORALBA GUTIERREZ BELTRAN | SI | | $11,752,564 | EN FASE DE VALIDACION | EN FASE DE VALIDACION | EN FASE DE VALIDACION | 0% | 0% | 0% | 0.0% | 0% |
| | | | | NO | | | | | | | | | | |
| 21 | MV_1866 | CL 70L SUR 18P 21 | LUIS ALBERTO ALONSO CASTIBLANCO | SI | | $11,207,445 | 2/12/2020 | 2/01/2021 | 2/12/2020 | 0% | 0% | 0% | 60.5% | 0% |
| | | | | NO | | | | | | | | | | |
| 22 | MV_1818 | KR 18P 70K 03 SUR | MERQUECIDE MONTANEZ UYOA | SI | | $11,776,857 | 2/12/2020 | 2/01/2021 | 2/12/2020 | 0% | 2% | 0% | 2.5% | 0% |
| | | | | NO | | | | | | | | | | |
| 23 | MV_1811 | CL 70K SUR 18Q 09 | ROSA ELVIRA GONZALEZ | SI | | $11,826,704 | EN FASE DE VALIDACION | EN FASE DE VALIDACION | EN FASE DE VALIDACION | 0% | 0% | 0% | 0.0% | 0% |
| | | | | NO | | | | | | | | | | |
| 24 | MV_1726 | CL 70K SUR 18P 10 | EMPERATRIZ ACOSTA MARTINEZ | SI | | $11,736,989 | EN FASE DE VALIDACION | EN FASE DE VALIDACION | EN FASE DE VALIDACION | 0% | 0% | 0% | 0.0% | 0% |
| | | | | NO | | | | | | | | | | |
| 25 | MV_1867 | CL 70L SUR 18P 15 | JOSE ALBER LUGO | SI | | $11,317,334 | EN FASE DE VALIDACION | EN FASE DE VALIDACION | EN FASE DE VALIDACION | 0% | 0% | 0% | 0.0% | 0% |
| | | | | NO | | | | | | | | | | |
| 26 | MV_1766 | CL 70K SUR 18N 46 | CARMEN QUIQUE MARTINEZ | SI | | $10,332,118 | EN FASE DE VALIDACION | EN FASE DE VALIDACION | EN FASE DE VALIDACION | 0% | 0% | 0% | 0.0% | 0% |
| | | | | NO | | | | | | | | | | |
| 27 | MV_1574 | CL 70F SUR 18R 27 | JOSE HIPOLITO GUTIERREZ LUCERO | SI | | $11,646,455 | EN FASE DE VALIDACION | EN FASE DE VALIDACION | EN FASE DE VALIDACION | 0% | 0% | 0% | 0.0% | 0% |
| | | | | NO | | | | | | | | | | |
| 28 | MV_1588 | CL 70F SUR 18P 33 | LUZ NELLY RODRIGUEZ | SI | | $10,983,242 | EN FASE DE VALIDACION | EN FASE DE VALIDACION | EN FASE DE VALIDACION | 0% | 0% | 0% | 0.0% | 0% |
| | | | | NO | | | | | | | | | | |
| 29 | MV_1608 | KR 18P 70F 06 SUR | ROSALBINA HERNANDEZ PIRACHICAN | SI | | $11,804,701 | EN FASE DE VALIDACION | EN FASE DE VALIDACION | EN FASE DE VALIDACION | 0% | 0% | 0% | 0.0% | 0% |
| | | | | NO | | | | | | | | | | |
| | | | **ALTOS DE JALISCO** | | | | | | | | | | | |
| 30 | MV_0252 | CL 61D SUR 18N 30 MJ | JESUS ANTONIO ORTIZ CASTRO | SI | | $11,693,259 | EN FASE DE VALIDACION | EN FASE DE VALIDACION | EN FASE DE VALIDACION | 0% | 0% | 0% | 0.0% | 0% |
| | | | | NO | | | | | | | | | | |

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DEL HÁBITAT

# INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

## PROYECTOS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA

INPLAYCO S.A.S.
INGENIEROS CONSTRUCTORES E INTERVENTORES

| FECHA | 20/12/2020 | PERIODO No. | 2 | DEL | 14/12/2020 | AL | 20/12/2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

### 1. INFORMACIÓN GENERAL

| | |
|---|---|
| OBJETO DEL CONTRATO | Realizar la interventorias técnica, jurídica, social, administrativa y financiera, para la ejecución de las obras de mejoramiento de vivienda en la modalidad de habitabilidad en los territorios priorizados por la secretaría distrital de hábitat. |
| LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO | Corresponde al Grupo 1 a la ejecución de 254 mejoramientos de vivienda, localizados en 3 localidades: Bosa, Usme y Ciudad Bolivar, esta última localidad incluye cuatro (4) intervenciones de Mejoramientointegral. |

| CONTRATO DE INTERVENTORÍA | | CONTRATO DE OBRA | |
|---|---|---|---|
| CONTRATO No.: | 701-2020 | CONTRATO No.: | 694--2020 |
| PLAZO INICIAL: | 6 meses | PLAZO INICIAL: | 5 meses |
| FECHA DE INICIACIÓN: | 4 de noviembre de 2020 | FECHA DE INICIACIÓN: | 4 de noviembre de 2020 |
| **FECHA DE SUSPENSIÓN: | 0 | **FECHA DE SUSPENSIÓN: | 0 |
| **FECHA DE REINICIACIÓN: | 0 | **FECHA DE REINICIACIÓN: | 0 |
| FECHA DE TERMINACIÓN: | 3 de mayo de 2021 | FECHA DE TERMINACIÓN: | 3 de abril 2021 |
| PLAZO ACTUALIZADO: | 0 | PLAZO ACTUALIZADO: | 0 |
| PLAZO TRANSCURRIDO: | 0 | PLAZO TRANSCURRIDO: | 0 |
| VALOR INICIAL : | $ 894,285,952 | VALOR INICIAL : | $ 3,724,135,319 |
| VALOR ADICION(ES): | 0 | VALOR ADICION(ES): | $ - |
| VALOR ACTUALIZADO: | $ - | VALOR ACTUALIZADO: | $ - |
| VALOR ANTICIPO: | 0 | VALOR ANTICIPO: | $ - |
| VALOR POR PAGAR: | $ - | VALOR POR PAGAR: | $ - |
| SUPERVISOR: | JUAN CARLOS ARBELAEZ MURILLO | INTERVENTOR: | Gonzalo Llevano Hoyos -INPLAYCO S.A.S. |

** Inserte las filas que requiera según el número de suspensiones y reinicios.

### 2. CONTROL DE HITOS.

| No. | *** DESCRIPCIÓN DEL HITO | FECHA PROGRAMADA | FECHA REAL DE CUMPLIMIENTO | DÍAS DE RETRASO |
|---|---|---|---|---|
| | SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO (HITO OBLIGATORIO) | 4/11/2020 | 3/04/2021 | |
| 1 | Validación | | | |
| 2 | Entrega de informe de validación | | | |
| 3 | Ejecución | | | |
| | ENTREGA A LA INTERVENTORIA DE LOS PRODUCTOS Y/O ACTIVIDADES CONTRATADAS (HITO OBLIGATORIO) | | | |


*** Inserte las filas que requiera según el número de hitos; teniendo en cuenta que como mínimo se deberán establecer 5 hitos adicionales a los obligatorios de inicio y terminación. Los hitos aprobados por la interventoria se socializarán con el supervisor del contrato para su Vo. Bo. Los Hitos aprobados por la interventoria y SDHT solo se podrán modificar previa novedad contractual que así lo requiera. La matriz del seguimiento hace parte del presente documento.


| No. | INDICADORES BARRIO O TERRITORIO | VALORES CD + AIU | PORCENTAJE SOBRE EL VALOR TOTAL DEL CONTRATO | DIFERENCIA (+) ADELANTO (-) ATRASO |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Valor acumulado de las actividades o productos conforme a la programación vigente. | $200,803,581.72 | 5.39% | |
| 2 | Valor acumulado de las actividades o productos ejecutados y aprobados por la Interventoría. | $209,515,250.70 | 5.63% | |

### 3. ASPECTOS GENERALES INFORME TÉCNICO

**Registre los avances y novedades técnicas, sociales, administrativas, contables y financieras, acompañadas por gráficos, cuadros, fotografías, análisis y comentarios sobre el estado de los trabajos, en todos sus aspectos en la fase de validación y ejecución de obra.**

## CIUDAD BOLIVAR

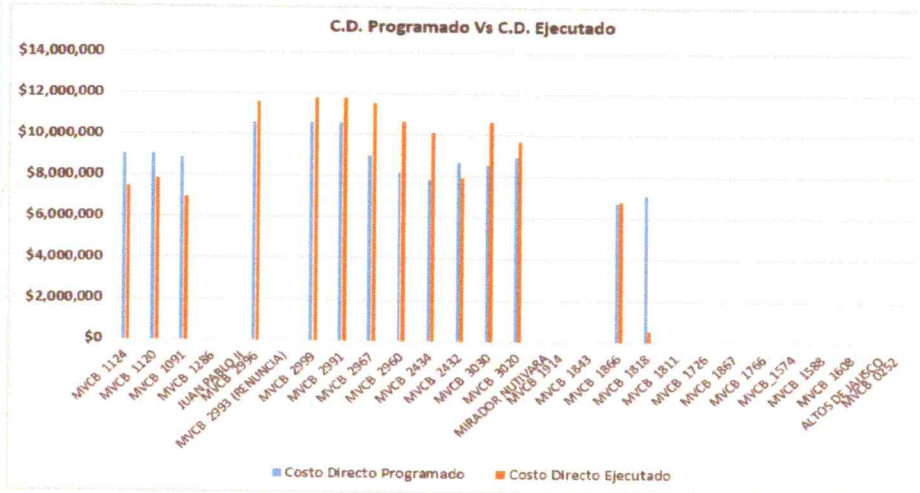
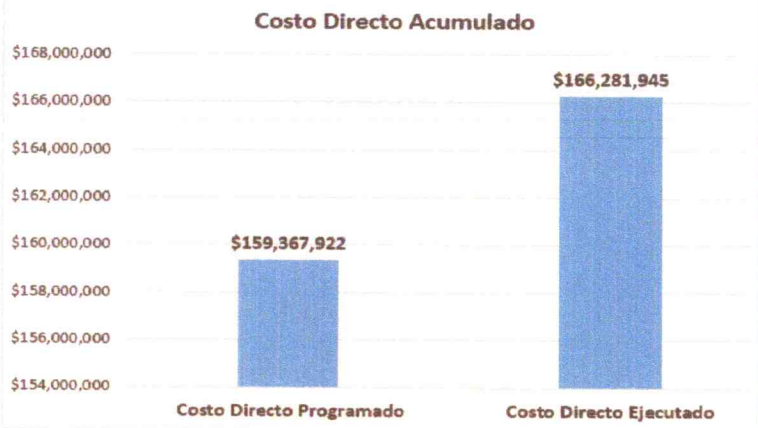
| 4- COMPONENTE TECNICO BARRIO O TERRITORIO | | | |
|---|---|---|---|
| ACTIVIDADES EJECUTADAS EN LA SEMANA. - ESTADO DE AVANCE SEMANAL POR VIVIENDA | | | |
| BARRIO O TERRITORIO - CIUDAD BOLIVAR- BARRIO NUEVA COLOMBIA | | | |
| FECHA: 20- DIC -2020 | | | |
| 1 | MVCB_1437 | FLOR ELISA PARRA ROJAS | Se termina instalación de pisos en alcobas, sala, patio y corredor, se inicia instalacion de enchape de pared en la cocinay en el baño, beneficiaria manifiesta estar satisfecha con las obras |
| 2 | MVCB_1441 | LUZMILA TORRES BERMUDEZ | **Se recibe la vivienda con las actividades acordadas y terminadas a satisfacción, fecha de entrega 15 de diciembre 2020** |
| 3 | MVCB_1440 | ALBA CARMEN ARDILA MATEUS | Se termina la instalación de enchapes en cocina y baño, pendiente la puerta de baño y de combo sanitario del mismo, propietaria debe instalar las luminarias en el cielo raso, beneficiaria manifiesta estar satisfecha con las obras |
| 4 | MVCB_1421 | MARIA ESTER ZORRO GUERRERO | **Se recibe la vivienda con las actividades acordadas y terminadas a satisfacción, fecha de entrega 14 de diciembre 2020** |
| 5 | MVCB_1124 | MARIA ANTONIA SANTOS CORREDOR DE RAMIREZ | Se realiza la instalación de enchape de paredes y de piso en el baño, se inicia instalación de enchape de paredes en la cocina, tambien se realiza el retiro de la cubierta antigua y se instala la cubierta nueva, pendiente hacer el remate de las cuchillas y concluir actividades de baño y cocina, beneficiario manifiesta estar satisfecho con las obras |
| 6 | MVCB_1120 | QUERUBIN CHAGUALA | Se terminan actividades de pintura y enchape de pisos en las dos alcobas, se inicia instalacion de enchape de piso en la sala, pendiente terminar actividades en baño y cocina del piso 01, beneficiario manifiesta estar satisfecho con las obras |
| 7 | MVCB_1091 | LIGIA TEJADA DE BARRERO | Se termina la instalación de enchape en la zona de lavado, se instala enchape de piso en una alcoba y se continua con enchape de paredes y piso en la cocina, beneficiario manifiesta estar satisfecho con las obras |
| 8 | MVCB_1286 | LUZ MINDA CASTRO PEÑA | Pendiente hacer apertura de vivienda para inicio de obras |
| BARRIO O TERRITORIO - CIUDAD BOLIVAR- JUAN PABLO II | | | |
| 9 | MVCB_2996 | MARIA TERESA ANTOLINEZ Y OTRO | Se continua con actividades de estuco y pintura en las alcobas del piso 02 y 01, se hace instalación de cielo raso en PVC en sala, corredor y alcoba piso 01, tambien se termina la isntalación de enchape en piso del nivel 01, pendiente treminar de construir el meson de cocina y pintar en el piso 01, beneficiaria manifiesta estar satisfecha con las obras |
| 10 | MVCB_2993 | **CARLOS JULIO CARDENAS TRIANA** | **El beneficiario de la vivienda decide voluntariamente renunciar al beneficio, ya que la vivienda se encuentra en optimas condiciones de habitabilidad** |
| 11 | MVCB2999 | MARIA LEONOR FRAILE SUAREZ | **Se recibe la vivienda con las actividades acordadas y terminadas a satisfacción, fecha de entrega 15 de diciembre 2020** |
| 12 | MVCB_2991 | BRISNELDA CONSTANZA MACIAS MARTINEZ | **Se recibe la vivienda con las actividades acordadas y terminadas a satisfacción, fecha de entrega 15 de diciembre 2020** |
| 13 | MVCB_2967 | MARIA OLGA FARFAN GALEON | Se inicia la intervencion en la cocina y se terminan los arreglos en el baño, tambien se termina la intervencion en alcobas y en sala, beneficiario manifiesta estar satisfecho con las obras |
| 14 | MVCB_2960 | MARIA NURY QUINTERO CARDONA | **Se recibe la vivienda con las actividades acordadas y terminadas a satisfacción, fecha de entrega 15 de diciembre 2020** |
| 15 | MVCB2434 | MARGARITA MARIA MORALES OROZCO | Se termina la instalación de enchape de paredes en cocina y baño, se inicia la intervencion en pañetes, alistado de pisos y enchape de pisos en el nivel 02 de la casa, beneficiaria manifiesta estar satisfecha con las obras. |
| 16 | MVCB_2432 | AGUSTÍN VILLANUEVA GUZMÁN | Se terminan actividades de estuco en las alcobas, se instala enchape de piso en la sala, se inicia alistado de piso en las alcobas, se construye meson de cocina y se inicia la intervencion en el baño, tambien se levanta el muro para ubicar la nevera, beneficiario manifiesta estar satisfecho con las obras |
| 17 | MVCB_3030 | TEODOSIA GALICIA DE GARCIA | **Se recibe la vivienda con las actividades acordadas y terminadas a satisfacción, fecha de entrega 15 de diciembre 2020** |
| 18 | MVCB_3020 | PEDRO PABLO IBAÑEZ | Se terminan actividad de estuco y pintura en alcoba y patio de la casa, se hace instalación de piso en alcobas, patio y cocina de la casa, el beneficiario no permite que se haga el retiro del enchape anterior de la pared, por lo que en la pared de la cocina quedan dos enchapes de colores diferentes, beneficiario manifiesta estar satisfecho con las obras |
| BARRIO O TERRITORIO - CIUDAD BOLIVAR- MIRADOR NUTIVARA | | | |
| 19 | MV_1914 | BLANCA ODILIA PATIÑO DE MARTINEZ | Pendiente hacer apertura de vivienda para inicio de obras |
| 20 | MV_1843 | FLORALBA GUTIERREZ BELTRAN | Pendiente hacer apertura de vivienda para inicio de obras |
| 21 | MV_1866 | LUIS ALBERTO ALONSO CASTIBLANCO | Se realizan actividades de enchape de paredes en la cocina y se demuele enchape del baño, tambien se inicia el alistado y enchape de piso en la alcoba principal, tambien se alista piso del patio, beneficiario manifiesta estar satisfecho con las obras |
| 22 | MV_1818 | MERQUECIDE MONTANEZ UYOA | Se inician actividades de pañete en la vivienda, se inicia con atrasos en este frente ya que el beneficario no estaba de acuerdo con la calidad del trabajo realizado por el maestro del contratista, ya que el beneficiario es maestro de construcción tambien; la parte social dialoga con el beneficiario para que autorice el ingreso del otro maestro |
| 23 | MV_1811 | ROSA ELVIRA GONZALEZ | Pendiente hacer apertura de vivienda para inicio de obras |
| 24 | MV_1726 | EMPERATRIZ ACOSTA MARTINEZ | Pendiente hacer apertura de vivienda para inicio de obras |
| 25 | MV_1867 | JOSE ALBER LUGO | Pendiente hacer apertura de vivienda para inicio de obras |
| 26 | MV_1766 | CARMEN QUIQUE MARTINEZ | Pendiente hacer apertura de vivienda para inicio de obras |
| 27 | MV_1574 | JOSE HIPOLITO GUTIERREZ LUCERO | Se hace validación en la vivienda y registro fotográfico |
| 28 | MV_1588 | LUZ NELLY RODRIGUEZ | Se hace validación en la vivienda y registro fotográfico |
| 29 | MV_1608 | ROSALBINA HERNANDEZ PIRACHICAN | Se hace validación en la vivienda y registro fotográfico |
| BARRIO O TERRITORIO - CIUDAD BOLIVAR- ALTOS DE JALISCO | | | |
| 30 | MV_0252 | JESUS ANTONIO ORTIZ CASTRO | Se hace validación en la vivienda y registro fotográfico |

| 5. PLAN DE ACCION RESULTADO DEL ANALISIS DE CAUSAS REGISTRADO EN EL NUMERAL ANTERIOR - CON EL OBJETIVO DE ELIMINAR LA CAUSA RAÍZ DE LA SITUACIÓN PROBLEMÁTICA - PLAN DE MEJORA | | |
|---|---|---|
| ACTIVIDAD | RESPONSABLE | FECHA |
| En conjunto con el contratista y esta interventoría se continua[illegible] supervisión a cada uno de los presupuestos, en la mayoria de frentes que[illegible]s hizo seguimiento se encontro personal trabajando y ejecutando actividades, en el frente 1124 se evidencia acumulacion de escombros, por lo que se le informa al contratista realizar el retiro inmediato de esos escombros del frente de la casa, ademas se informa que una vez retirado el cielo raso en sala y alcoba, se encontro la existencia de unos planchones en madera que sostenian la cubierta, dichos planchones no se retiran ya que el retiro pone en riesgo la estabilidad de los muros laterales y central, se propone incremento de presupuesto para la instalación de cielo raso en PVC en esas dos zonas | Arq. William Fdo Garzón | |
| se le solicita al contratista hacer entrega de una programación acertada, donde se indique las fechas de aperturas y conclusión de las validaciones y aperturas | | |

**6. ACTIVIDADES NO PREVISTAS Y MAYORES CANTIDADES**

Se informa que en algunas de las viviendas se presentan mejoras en los acabados finales realizadas por los beneficiarios, por lo tanto se deside intervenir otros espacios en conjunto con el contratista garantizando una adecuada habitabilidad y dignificación de las viviendas

**7. COMENTARIOS DEL INTERVENTOR: Por favor realice la descripción general del estado del contrato y según aplique informe sobre: actividades realizadas en la semana, control de lluvias, compra y suministro de materiales, mano de obra, subcontratos y tramites ante las diferentes empresas prestadoras de servicios, entre otros. Anexe las actas de seguimiento realizadas en la semana correspondiente al periodo del informe.**

**Barrio o Territorio: CIUDAD BOLIVAR**

En el presente periodo el contratista hace entrega de 6 viviendas, se hace validacion en otras 4 viviendas y el seguimiento de obra a otras 10 viviendas, donde se hacen las respectivas observaciones encontradas y se registran en la bitacora de obra


En la presente semana no se han registrado lluvias, tiempo soleado y seco

En algunos de los frentes el contratista no es constante con el acopio de materiales, lo que genera atrasos a los maestros de obra, dicha observación es oficiada al contratista


**8. REGISTRO FOTOGRAFICO DEL AVANCE DURANTE LA SEMANA**

**SE ADJUNTA REGISTRO FOTOGRÁFICO**

# REGISTRO FOTOGRÁFICO

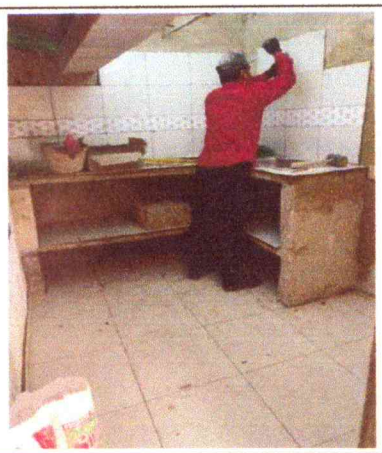

| FECHA | miércoles, 16 de diciembre de 2020 |
|---|---|
| **DESCRIPCION MVCB 1437** | |
| Avance de obra | |

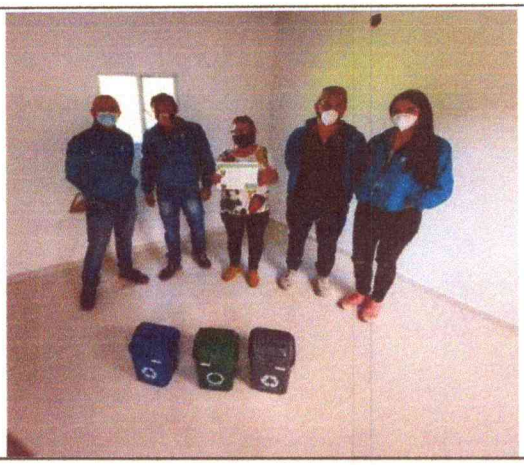

| FECHA | martes, 15 de diciembre de 2020 |
|---|---|
| **DESCRIPCION MVCB 1441** | |
| Entrega de vivienda | |



| FECHA | viernes, 18 de diciembre de 2020 |
|---|---|
| **DESCRIPCION MVCB 1440** | |
| Avance obra | |



| FECHA | jueves, 17 de diciembre de 2020 |
|---|---|
| **DESCRIPCION MVCB 1421** | |
| Entrega de vivienda | |



| FECHA | lunes, 14 de diciembre de 2020 |
|---|---|
| **DESCRIPCION MVCB 2960** | |
| Avance de obra | |




| FECHA | martes, 15 de diciembre de 2020 |
|---|---|
| **DESCRIPCION MVCB 2991** | |
| Avance de obra | |

# REGISTRO FOTOGRÁFICO



| FECHA | jueves, 17 de diciembre de 2020 |
|---|---|
| **DESCRIPCION MVCB 2967** | |
| Avance de obra | |

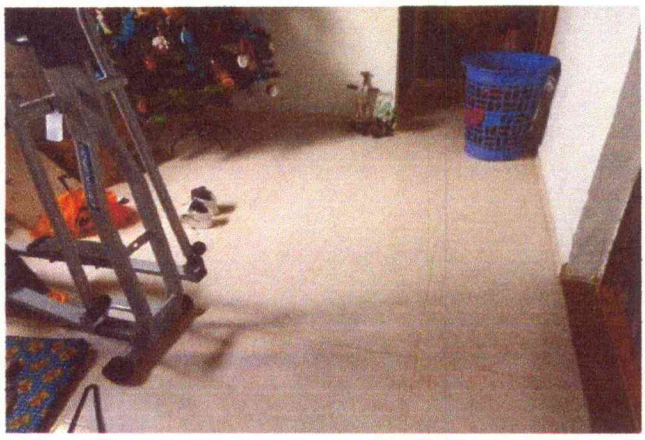


| FECHA | martes, 15 de diciembre de 2020 |
|---|---|
| **DESCRIPCION MVCB 3030** | |
| Avance de obra | |




| FECHA | sábado, 19 de diciembre de 2020 |
|---|---|
| **DESCRIPCION MVCB 1608** | |
| Validación vivienda estado actual | |



| FECHA | miércoles, 16 de diciembre de 2020 |
|---|---|
| **DESCRIPCION MVCB 1091** | |
| Avance de obra | |

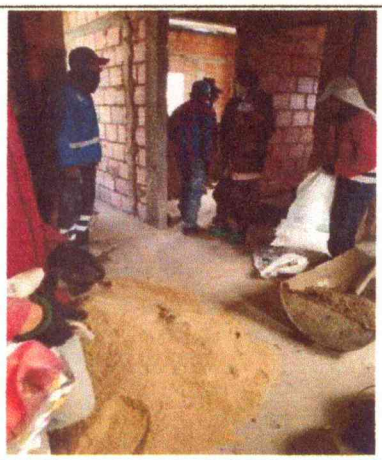

| FECHA | martes, 15 de diciembre de 2020 |
|---|---|
| **DESCRIPCION MVCB 1818** | |
| Avance de obra | |

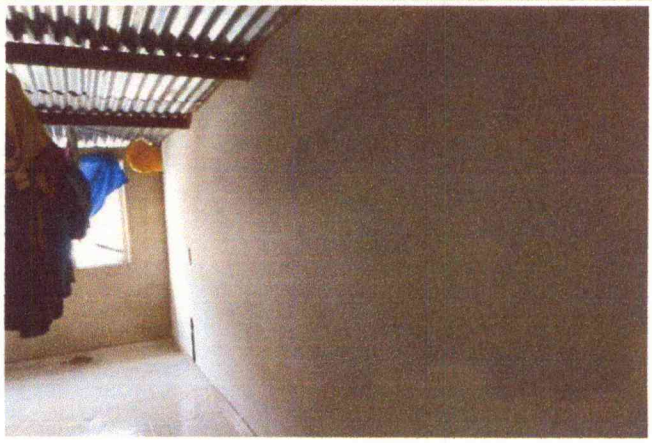

| FECHA | jueves, 17 de diciembre de 2020 |
|---|---|
| **DESCRIPCION MVCB 2996** | |
| Avance de obra | |

**Subsecretaria de Coordinacion Operativa**

**Subdireccion de Barrios**

Seguimiento ejecución proyectos de Mejoramiento de Vivienda - Habitabilidad

## Proyecto mejoramiento de vivienda - AVANCE EJECUCIÓN SEMANAL

Fecha: **20-dic-20**

### Consorcio mejoramiento EP 2020 - Contratista de obra

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Contratato de obra | 694-2020 | | | Plazo | Cinco (5) meses |
| Objeto | Contratar la ejecución de las obras de mejoramiento de vivienda en la modalidad de habitabilidad de los proyectos estructurados en los territorios priorizados por la Secretaria Distrital de Habitat. Grupo I | | | Acta de inicio | 4 de noviembre de 2020 |
| CDP No. | No. 914 del 14 de julio de 2020 | CRP No. | | Valor del contrato | TRES MIL SETECIENTOS VEINTICUATRO MILLONES CIENTO TREINTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS DIEZ Y NUEVE PESOS ($3.724.135.319) M/Cte |

### Gonzalo Llevano Hoyos -INPLAYCO S.A.S.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Contratato de interventoría | 701-2020 | | | Plazo | Seis (6) meses |
| Objeto | Realizar la interventorias técn ca, jurídica, social, administrativa y financiera, para la ejecución de las obras de mejoramiento de vivienda en la modalidad de habitabilidad en los territorios priorizados por la secretar a distrital de hábitat. | | | Acta de inicio | 04 de noviembre 2020 |
| CDP No | No. 892 del 14 de julio de 2020 | CRP No. | | Valor del contrato | OCHOCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS M/CTE ($894.285.952), |

| Fase 1: Validación de la información entregada por el la SDHT | | | | | | | | | Fase 2: Ejecución de obras | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Validación | | | | Ejecución | | | | |
| Territorio o barrio a intervenir | CIUDAD BOLIVAR | Barrios | Predios | Total Predios | Validada | V/Por Validar | | V/Modificada | En Ejecución | Terminadas | Por Ejecutar | % de Avance | Acta de Entrega a Satisfacción |
| Arq o Ing. Responsable | ARQ. LEONARDO SOLANO SOLANO | JUAN PABLOII | 17 | 33 | 17 | 0 | | 0 | 12 | 5 | 0 | 3.83% | 5 |
| | | NUEVA COLOMBIA | 13 | | 13 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 13 | 0.00% | 0 |
| Técnico Responsable | | VILLAS DEL DIAMANTE | 3 | | 3 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.00% | 0 |
| | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
| Subtotal | | | 33 | 33 | 33 | 0 | | 0 | 12 | 5 | 16 | 3.83% | 5 |

| AVANCE DE EJECUCIÓN SEMANAL | | | | | | | | | | DICIEMBRE | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Proyecto | | | | FASE I | | | Tiempo Programacion | | | SEMANA DEL 7 AL 13 | SEMANA DEL 14 AL 20 | SEMANA DEL 21 AL 27 | SEMANA DEL 28 AL 3 | SEMANA DEL 4 AL 10 |
| No. | ID_DMV | Dirección | Nombres y apellidos | V/ Validada | V/ Modificada | V/inicial | Fecha inicio | Fecha terminada | F. Inicio | 6 semana | 7 semana | 8 semana | 9 semana | 10 semana |
| | | | | JUAN PABLO II | | | | | | | | | | |
| 1 | MVCB_4919 | KR 18M BIS 68B 50 SUR MJ | URIEL PATIÑO RINCON | SI / NO | | $11,696,006 | 17/11/2020 | 1/12/2020 | 3/12/2020 | 0% | 15.26% | 0% | 0% | 0% |
| 2 | MVCB_4923 | KR 18M BIS 68B 26 SUR | SIERVO MATIAS FIGUEROA CHAPARRO | SI / NO | | $10,947,719 | 17/11/2020 | 1/12/2020 | 23/11/2020 | 0% | 14.05% | 0% | 0% | 0% |
| 3 | MVCB_2932 | TV 18N 69A 97 SUR | MARIA TERESA PIÑEROS PIÑEROS | SI / NO | | $11,700,811 | 17/11/2020 | 1/12/2020 | 23/11/2020 | 0% | 36.78% | 0% | 0% | 0% |
| 4 | MVCB_2926 | TV 18N 69A 71 SUR | CORADO TORO DE TORRES Y OTRO | SI / NO | | $11,800,475 | 17/11/2020 | 1/12/2020 | 23/11/2020 | 0% | 39.76% | 0% | 0% | 0% |
| 5 | MVCB_3646 | TV 18N BIS 69A 95 SUR | LUIS ANTONIO CABRERA LOPEZ Y OTRA | SI / NO | | $11,416,175 | 2/12/2020 | 16/12/2020 | 24/11/2020 | 0% | 20.18% | 0% | 0% | 0% |
| 6 | MVCB_3643 | TV 18N BIS 69A 83 SUR | JOSE ARISTOBULO MENJURA LEITON Y OTRA | SI / NO | | $11,078,062 | 2/12/2020 | 16/12/2020 | 24/11/2020 | 0% | 14.51% | 0% | 0% | 0% |
| 7 | MVCB_2925 | TV 18N 69A 67 SUR | MARTHA LUZ CAMPIÑO | SI / NO | | $11,553,359 | 2/12/2020 | 16/12/2020 | 24/11/2020 | 0% | 60.74% | 0% | 0% | 0% |
| 8 | MVCB_2917 | DG 69A BIS B SUR 18M 30 | CLAUDIA PATRICIA VARGAS GÓMEZ | SI / NO | | $11,229,192 | 18/11/2020 | 2/12/2020 | 24/11/2020 | 0% | 0.00% | 0% | 0% | 0% |
| 9 | MVCB_3642 | TV 18N BIS 69A 77 SUR | JULIO CESAR FICHAS AVILA | SI / NO | | $11,811,376 | 2/12/2020 | 16/12/2020 | 25/11/2020 | 0% | 46.68% | 0% | 0% | 0% |
| 10 | MVCB_3641 | TV 18N BIS 69A 75 SUR | CECILIA MENDEZ MORENO | SI / NO | | $11,561,960 | 2/12/2020 | 16/12/2020 | 25/11/2020 | 0% | 51.88% | 0% | 0% | 0% |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | MVCB_3640 | TV 18N BIS 69A 71 SUR | OCTAVIO TELLEZ PINEDA | SI / NO | | $11,827,947 | 3/12/2020 | 17/12/2020 | 25/11/2020 | 0% | 34.09% | 0% | 0% | 0% |
| 12 | MVCB_3635 | TV 18N BIS 69A 51 SUR | JUAN CAR[illegible]ZO CASTRO Y OTRA | SI / NO | | $11,819,965 | 3/12/2[illegible] | 17/12/2020 | 25/11/2020 | 0% | 50.41% | 0% | 0% | 0% |
| 13 | MVCB_3634 | TV 18N BIS 69A 47 SUR | AYDE NIÑO Y OTRO | SI / NO | | $10,782,650 | 3/12/2020 | 17/12/2020 | 23/11/2020 | 0% | 23.37% | 0% | 0% | 0% |
| 14 | MVCB_2939 | TV 18N BIS 69A 84 SUR | MARIEYE LOAISA | SI / NO | | $11,086,579 | 4/12/2020 | 18/12/2020 | 30/11/2020 | 0% | 41.84% | 0% | 0% | 0% |
| 15 | MVCB_4918 | KR 18M BIS 68B 56 SUR | ALVARO DIAZ AVILA | SI / NO | | $11,639,626 | 4/12/2020 | 18/12/2020 | 23/11/2020 | 0% | 36.53% | 0% | 0% | 0% |
| 16 | MVCB_3633 | TV 18N BIS 69A 43 SUR | FRANCISCO JAVIER MENDIVELSO GUERRERO | SI / NO | | $10,296,334 | 3/12/2020 | 17/12/2020 | 30/11/2020 | 0% | 14.51% | 0% | 0% | 0% |
| 17 | MVCB_4917 | KR 18M BIS 68B 62 SUR | ALVARO ALONSO MORENO | SI / NO | | $10,136,993 | 4/12/2020 | 18/12/2020 | 3/12/2020 | 0% | 0.00% | 0% | 0% | 0% |
| | | | | | | **NUEVA COLOMBIA** | | | | | | | | |
| 18 | MVCB_1320 | CL 70K SUR 18L 65 | ISMENIA BARRETO ARIAS | SI / NO | | $11,707,337 | EN FASE DE VALIDACION | EN FASE DE VALIDACION | EN FASE DE VALIDACION | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 19 | MVCB_1383 | CL 70J SUR 18L 34 | EDGAR FERNANDO CAMARCO ANGEL | SI / NO | | $10,129,674 | EN FASE DE VALIDACION | EN FASE DE VALIDACION | EN FASE DE VALIDACION | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 20 | MVCB_1380 | CL 70J SUR 18L 22 | ROSALBA MONTES DE CARDONA | SI / NO | | $11,330,297 | EN FASE DE VALIDACION | EN FASE DE VALIDACION | EN FASE DE VALIDACION | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 21 | MVCB_1382 | CL 70J SUR 18L 30 | MARIA CECILIA RINCON RINCON | SI / NO | | $11,818,990 | EN FASE DE VALIDACION | EN FASE DE VALIDACION | EN FASE DE VALIDACION | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 22 | MVCB_1381 | CL 70J SUR 18L 26 | NOHORA NOHEMI MAYORGA IBAGUE | SI / NO | | $8,886,491 | EN FASE DE VALIDACION | EN FASE DE VALIDACION | EN FASE DE VALIDACION | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 23 | MVCB_1374 | CL 70J SUR 18L 11 | OBED OSPINA RESTREPO | SI / NO | | $10,320,364 | EN FASE DE VALIDACION | EN FASE DE VALIDACION | EN FASE DE VALIDACION | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 24 | MVCB_1371 | CL 70J SUR 18L 23 | CONSUELO NAVARRO | SI / NO | | $11,808,362 | EN FASE DE VALIDACION | EN FASE DE VALIDACION | EN FASE DE VALIDACION | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 25 | MVCB_1328 | CL 70K SUR 18L 29 | EDILBERTO CARDENAS PAEZ | SI / NO | | $10,521,578 | EN FASE DE VALIDACION | EN FASE DE VALIDACION | EN FASE DE VALIDACION | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 26 | MVCB_1352 | CL 70K SUR 18L 64 | MARIA RAMOS ORTIZ | SI / NO | | $11,766,783 | EN FASE DE VALIDACION | EN FASE DE VALIDACION | EN FASE DE VALIDACION | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 27 | MVCB_1341 | CL 70K SUR 18L 20 | JOSE GABRIEL HERRERA MEDINA | SI / NO | | $11,783,941 | EN FASE DE VALIDACION | EN FASE DE VALIDACION | EN FASE DE VALIDACION | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 28 | MVCB_1344 | CL 70K SUR 18L 32 | ALBEIRO RUIZ SANABRIA | SI / NO | | $11,778,217 | EN FASE DE VALIDACION | EN FASE DE VALIDACION | EN FASE DE VALIDACION | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 29 | MVCB_1310 | CL 70L SUR 18L 70 | DORA ALICIA LÓPEZ SANABRIA | SI / NO | | $11,826,158 | EN FASE DE VALIDACION | EN FASE DE VALIDACION | EN FASE DE VALIDACION | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 30 | MVCB_1314 | KR 18M 70K 16 SUR | MARTHA LUCIA OSPINA PEÑA | SI / NO | | $11,714,974 | EN FASE DE VALIDACION | EN FASE DE VALIDACION | EN FASE DE VALIDACION | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| | | | | | | **VILLAS DEL DIAMANTE** | | | | | | | | |
| 31 | MVCB_5128 | CL 69N SUR 18N 52 | DIEGO MARIO VANEGAS VILLAVIL | SI / NO | | $8,215,904 | EN FASE DE VALIDACION | EN FASE DE VALIDACION | EN FASE DE VALIDACION | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 32 | MVCB_5156 | CL 69N SUR 18N 58 MJ | FRANCISCO JAVIER ARANGO GUTIERREZ | SI / NO | | $9,918,506 | EN FASE DE VALIDACION | EN FASE DE VALIDACION | EN FASE DE VALIDACION | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 33 | MVCB_5127 | CL 69N SUR 18N 59 MJ | VICTOR MANUEL MUÑOZ VERGARA | SI / NO | | $11,788,586 | EN FASE DE VALIDACION | EN FASE DE VALIDACION | EN FASE DE VALIDACION | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DEL HÁBITAT

# INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

## PROYECTOS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA

INPLAYCO S.A.S.
INGENIEROS CONSTRUCTORES & INTERVENTORES

| FECHA | 20/12/2021 | PERICDO No. | 7 | DEL | 14/12/2020 | AL | 20/12/2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

### 1. INFORMACIÓN GENERAL

| | |
|---|---|
| OBJETO DEL CONTRATO | Realizar la interventorias técnica, jurídica, social, administrativa y financiera, para la ejecución de las obras de mejoramiento de vivienda en la modalidad de habitabilidad en los territorios priorizados por la secretaría distrital de hábitat. |
| LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO | Corresponde al Grupo 1 a la ejecución de 254 mejoramientos de vivienda, localizados en 3 localidades: Bosa, Usme y Ciudad Bolívar, esta última localidad incluye cuatro (4) intervenciones de Mejoramiento integral. |

| CONTRATO DE INTERVENTORÍA | | CONTRATO DE OBRA | |
|---|---|---|---|
| CONTRATO No.: | 701-2020 | CONTRATO No.: | 694--2020 |
| PLAZO INICIAL: | 6 meses | PLAZO INICIAL: | 5 meses |
| FECHA DE INICIACIÓN: | 4 de noviembre de 2020 | FECHA DE INICIACIÓN: | 4 de noviembre de 2020 |
| **FECHA DE SUSPENSIÓN: | 0 | **FECHA DE SUSPENSIÓN: | 0 |
| **FECHA DE REINICIACIÓN: | 0 | **FECHA DE REINICIACIÓN: | 0 |
| FECHA DE TERMINACIÓN: | 3 de mayo de 2021 | FECHA DE TERMINACIÓN: | 3 de abril 2021 |
| PLAZO ACTUALIZADO: | 0 | PLAZO ACTUALIZADO: | 0 |
| PLAZO TRANSCURRIDO: | 0 | PLAZO TRANSCURRIDO: | 0 |
| VALOR INICIAL : | $ 894,235,952 | VALOR INICIAL : | $ 3,724,135,319 |
| VALOR ADICION(ES): | 0 | VALOR ADICION(ES): | $ - |
| VALOR ACTUALIZADO: | $ - | VALOR ACTUALIZADO: | $ - |
| VALOR ANTICIPO: | 0 | VALOR ANTICIPO: | $ - |
| VALOR POR PAGAR: | $ - | VALOR POR PAGAR: | $ - |
| SUPERVISOR: | JUAN CARLOS AREVALEZ MURILLO | INTERVENTOR: | Gonzalo Jovano Hoyos -INPLAYCO S.A.S. |

** Inserte las filas que requiera según el número de suspensiones y reinicios.

### 2. CONTROL DE HITOS

| No. | *** DESCRIPCIÓN DEL HITO | FECHA PROGRAMADA | FECHA REAL DE CUMPLIMIENTO | DÍAS DE RETRASO |
|---|---|---|---|---|
| | SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO (HITO OBLIGATORIO) | 4/11/2020 | 3/04/2021 | |
| 1 | Validación | | | |
| 2 | Entrega de informe de validación | | | |
| 3 | Ejecución | | | |
| | ENTREGA A LA INTERVENTORIA DE LOS PRODUCTOS Y/O ACTIVIDADES CONTRATADAS (HITO OBLIGATORIO) | | | |

*** Inserte las filas que requiera según el número de hitos; teniendo en cuenta que como mínimo se deberán establecer 5 hitos adicionales a los obligatorios de Inicio y terminación. Los hitos aprobados por la interventoría se socializarán con el supervisor del contrato para su Vo. Bo. Los Hitos aprobados por la interventoría y SDHT solo se podrán modificar previa novedad contractual que así lo requiera. La matriz del seguimiento hace parte del presente documento.


| No. | INDICADORES BARRIO O TERRITORIO | VALORES | PORCENTAJE SOBRE EL VALOR TOTAL DE CONTRATO | DIFERENCIA (+) ADELANTO (-) ATRASO |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Valor acumulado de las actividades o productos conforme a la programación vigente | $ 163,341,722 | 4.39% | |
| 2 | Valor acumulado de las actividades o productos ejecutados y aprobados por la Interventoría. | $ 142,670,776 | 3.83% | |


### 3. ASPECTOS GENERALES INFORME TÉCNICO

Registre los avances y novedades técnicas, sociales, administrativas, contables y financieras, acompañadas por gráficos, cuadros, fotografías, análisis y comentarios sobre el estado de los trabajos, en todos sus aspectos en la fase de validación y ejecución de obra.

Fase de validación y aprobación.

## Juan Pablo II

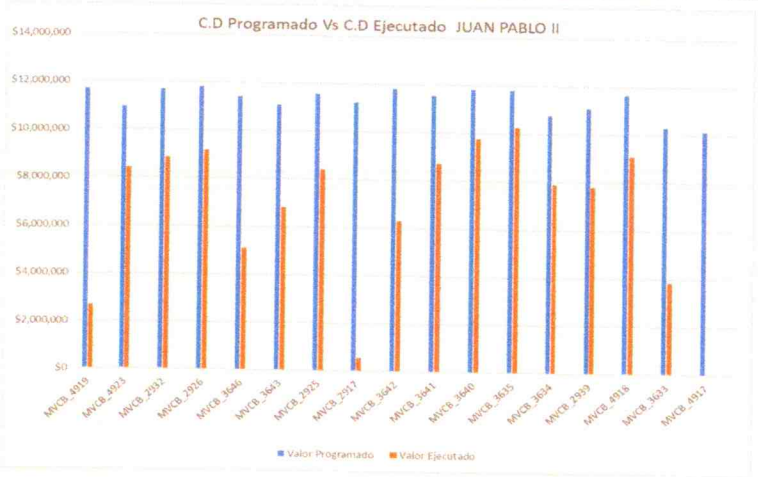
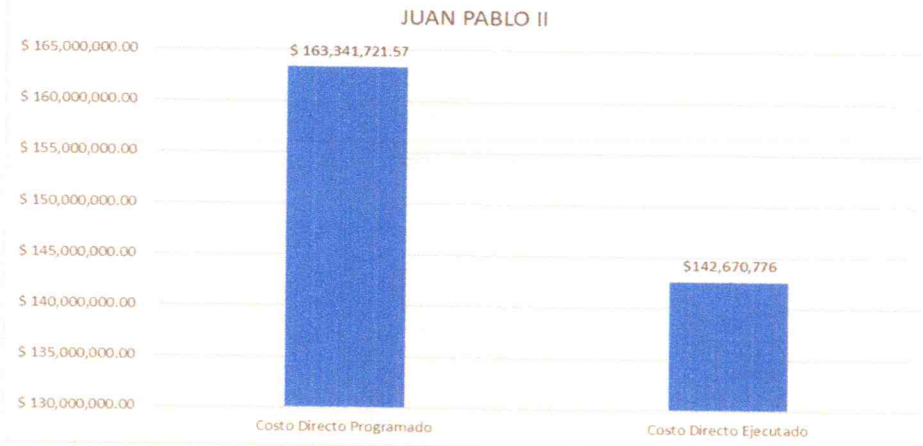
| 4- COMPONENTE TECNICO BARRIO O TERRITORIO | | |
|---|---|---|
| ACTIVIDADES EJECUTADAS EN LA SEMANA. - ESTADO DE AVANCE SEMANAL POR VIVI | | |
| JUAN PABLO II - NUEVA COLOMBIA | | |
| FECHA: 06 DE DICIEMBRE 2020 | | |
| **BARRIO JUAN PABLO II** | | |
| MVCB_4919 | URIEL PATIÑO RINCON | Se realiza visita Técnica-Social al Beneficiario Evidenciando actividad de Pañete liso Habitaciones y Hall ,Alistado de Pisos en Habitaciones,Demoliciones de Pisos y enchape Muro |
| **MVCB_4923** | **SIERVO MATIAS FIGUEROA CHAPARRO** | **Se realiza visita Técnica-Social Realizando Entrega Oficial de la vivienda Fecha de Entrega 18 de Diciembre de 2020** |
| MVCB_2932 | MARIA TERESA PIÑEROS PIÑEROS | Se realiza visita Técnica-Social al Beneficiario Evidenciando actividad de Instalación Cielo raso,aplicación de Estuco,enchape ceramico zona de ropas |
| MVCB_2926 | CORADO TORO DE TORRES Y OTRO | Se realiza visita Técnica-Social al Beneficiario Evidenciando actividad de Instalación Enchape ceramico Cocina e Instalacion de Cielo raso Area Sala |
| MVCB_3646 | LUIS ANTONIO CABRERA LOPEZ Y OTRA | Se realiza visita Técnica-Social al Beneficiario Evidenciando actividad de instalación enchape cerámica pared cocina, mesón y Patio de ropas , Instalación piso cerámico zona de ropas. |
| MVCB_3643 | JOSE ARISTOBULO MENJURA LEITON Y OTRA | Se realiza visita Técnica-Social al Beneficiario Evidenciando actividad de instalación enchape cerámico mesón y Patio de ropas , Instalación piso cerámico zona de ropas. Aplicación estuco área sala. Fundición en granito boca puertas habitaciones. |
| MVCB_2925 | MARTHA LUZ CAMPIÑO | Se realiza visita Técnica-Social al Beneficiario Evidenciando actividad de aplicación de pañete liso en áreas de cocina, habitaciones y hall. Instalación piso cerámico habitación principal. Se hace el llamado a aumentar el personal operativo para dar termino optimo a las actividades. |
| MVCB_2917 | CLAUDIA PATRICIA VARGAS GÓMEZ | En el MVCB-2917 Se mantiene detenidas la ejecucion hasta el alta medica del beneficiario,No se realiza ni seguimiento ni ejecucion hasta no presentar el documento oficial de la EPS |
| MVCB_3642 | JULIO CESAR FICHAS AVILA | Se realiza visita Técnica-Social al Beneficiario Evidenciando actividad de piso cerámico Área sala-comedor y preparación de superficie para aplicación de nuevas pinturas, así como la instalación de enchape cerámico área cocina. Se culmina Instalación de Cubierta. |
| MVCB_3641 | CECILIA MENDEZ MORENO | Se realiza visita Técnica-Social al Beneficiario Evidenciando actividad de piso cerámico Área sala-comedor y preparación de superficie para aplicación de nuevas pinturas, así como la instalación de enchape cerámico área cocina. Instalación de Cielo rasos Hall de acceso. |
| MVCB_3640 | OCTAVIO TELLEZ PINEDA | Se realiza visita Técnica-Social al Beneficiario Evidenciando actividad de aplicación de estuco área sala y habitaciones y aplicación pintura área habitaciones. Fundición en granito boca puertas habitaciones. |
| MVCB_3635 | JUAN CARLOS MAZO CASTRO Y OTRA | **Se realiza visita Técnica-Social Realizando Entrega Oficial de la vivienda Fecha de Entrega 18 de Diciembre de 2020** |
| MVCB_3634 | AYDE NIÑO Y OTRO | **Se realiza visita Técnica-Social Realizando Entrega Oficial de la vivienda Fecha de Entrega 18 de Diciembre de 2020** |
| MVCB_3633 | FRANCISCO JAVIER MENDIVELSO GUERRERO | Se realiza visita Técnica-Social al Beneficiario Evidenciando actividad de demoliciones de piso en áreas de Sala y Habitación principal ,Instalación de cubierta. Fundición de alistados de piso en áreas de Sala y Habitación principal. |
| MVCB_2939 | MARIEYE LOAISA | Se realiza visita Técnica-Social al Beneficiario Evidenciando actividad de enchape cerámico área cocina y baño, Instalación de cielo raso Habitación Principal. Aplicación de estuco y pintura área sala comedor. |
| **MVCB_4917** | **ALVARO ALONSO MORENO** | **Se presenta presupuesto y plano de distribución de la vivienda con la especificación de actividades a ejecutar ante la Secretaria de Habitat, para su revisión y aprobación de dicho presupuesto estructurado por el contratista y la interventoría.** |
| MVCB_4918 | ALVARO DIAZ AVILA | **Se realiza visita Técnica-Social Realizando Entrega Oficial de la vivienda Fecha de Entrega 18 de Diciembre de 2020** |
| **BARRIO NUEVA COLOMBIA** | | |
| MVCB_1320 | ISMENIA BARRETO ARIAS | Se realiza Estructuracion de Presupuesto para apertura de Ejecucion de actividades |
| MVCB_1383 | EDGAR FERNANDO CAMARGO ANGEL | Se realiza Estructuracion de Presupuesto para apertura de Ejecucion de actividades |
| MVCB_1380 | ROSALBA MONTES DE CARDONA | Se realiza Estructuracion de Presupuesto para apertura de Ejecucion de actividades |
| MVCB_1382 | MARIA CECILIA RINCON RINCON | Se realiza Estructuracion de Presupuesto para apertura de Ejecucion de actividades |
| MVCB_1381 | NOHORA NOHEMI MAYORGA IBAGUE | Se realiza Estructuracion de Presupuesto para apertura de Ejecucion de actividades |
| MVCB_1374 | OBED OSPINA RESTREPO | Se realiza Estructuracion de Presupuesto para apertura de Ejecucion de actividades |
| MVCB_1371 | CONSUELO NAVARRO | Se realiza Estructuracion de Presupuesto para apertura de Ejecucion de actividades |
| MVCB_1328 | EDILBERTO CARDENAS PAEZ | Se realiza Estructuracion de Presupuesto para apertura de Ejecucion de actividades |
| MVCB_1352 | MARIA RAMOS ORTIZ | Se realiza Estructuracion de Presupuesto para apertura de Ejecucion de actividades |
| MVCB_1341 | JOSE GABRIEL HERRERA MEDINA | Se realiza Estructuracion de Presupuesto para apertura de Ejecucion de actividades |
| MVCB_1344 | ALBEIRO RUIZ SANABRIA | Se realiza Estructuracion de Presupuesto para apertura de Ejecucion de actividades |
| MVCB_1310 | DORA ALICIA LÓPEZ SANABRIA | Se realiza Estructuracion de Presupuesto para apertura de Ejecucion de actividades |
| MVCB_1314 | MARTHA LUCIA OSPINA PEÑA | Se realiza Estructuracion de Presupuesto para apertura de Ejecucion de actividades |
| **VILLAS DEL DIAMANTE** | | |
| MVCB_5128 | DIEGO MARIO VANEGAS VILLAMIL | Se realiza Estructuracion de Presupuesto para apertura de Ejecucion de actividades |
| MVCB_5129 | FRANCISCO JAVIER ARANGO GUTIERREZ | Se realiza Estructuracion de Presupuesto para apertura de Ejecucion de actividades |
| MVCB_5156 | VICTOR MANUEL MUÑOZ VERGARA | Se realiza Estructuracion de Presupuesto para apertura de Ejecucion de actividades |


| 5. PLAN DE ACCION RESULTADO DEL ANALISIS DE CAUSAS REGISTRADO EN EL NUMERAL ANTERIOR - CON EL OBJETIVO DE ELIMINAR LA CAUSA RAÍZ DE LA SITUACIÓN PROBLEMÁTICA - PLAN DE MEJORA | | | |
|---|---|---|---|
| | **ACTIVIDAD** | **RESPONSABLE** | **FECHA** |
| Se presenta presupuesto y plano de distribución de la vivienda MVCB- 4917 , d | pecificación de actividades a ejecutar ante la Secretaria de Habitat, para su rev | Arq.Leonardo Solano | |
| | | | |

| 6. ACTIVIDADES NO PREVISTAS Y MAYORES CANTIDADES |
|---|
| En el MVCB-2917 Se mantiene detenidas la ejecucion hasta el alta medica del beneficiario.No se real za ni seguimiento ni ejecucion hasta no presentar el documento oficial de la EPS |
| Se a determinado en conjunto con el Contratista cada una de las actividades priorizando areas terminadas y v abilitazando areas Primarias |

| **7. COMENTARIOS DEL INTERVENTOR: Por favor realice la descripción general del estado del contrato y según aplique informe sobre: actividades realizadas en la semana, control de lluvias, compra y suministro de materiales, mano de obra, subcontratos y tramites ante las diferentes empresas prestadoras de servicios, entre otros. Anexe las actas de seguimiento realizadas en la semana correspondiente al periodo del informe.** |
|---|
| **Barrio o Territorio: JUAN PABLO II**<br><br>En cada validación ejecutada en la semana es de vital importancia determinar condiciones de vulnerabilidad como hacinamiento, ausencia de servicios públicos, problemas de salud asociados a carencias en saneamiento básico, carencias de pisos, cubiertas, deficiencias construct vas, entre otras que permitan justificar y fijar una línea base del problema a abordar a través del proyecto de Mejoramiento de Vivienda |

| 8. REGISTRO FOTOGRAFICO DEL AVANCE DURANTE LA SEMANA |
|---|
| SE ADJUNTA REGISTRO FOTOGRÁFICO |

| REGISTRO FOTOGRAFICO |
|---|
| MV -4923 |

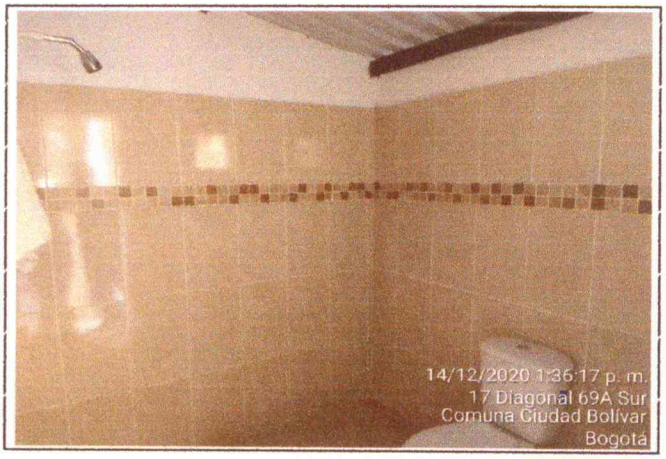


| FECHA | sábado, 19 de diciembre de 2020 |
|---|---|
| DESCRIPCION | |
| Estado Area Baño | |




| FECHA | sábado, 19 de diciembre de 2020 |
|---|---|
| DESCRIPCION | |
| Estado Area Lavadero | |




| FECHA | sábado, 19 de diciembre de 2020 |
|---|---|
| DESCRIPCION | |
| Estado Area Baño | |




| FECHA | sábado, 19 de diciembre de 2020 |
|---|---|
| DESCRIPCION | |
| Estado Actual Area Cocina | |




| FECHA | sábado, 19 de diciembre de 2020 |
|---|---|
| DESCRIPCION | |
| Estado Actual Cubierta | |




| FECHA | sábado, 19 de diciembre de 2020 |
|---|---|
| DESCRIPCION | |
| Estado Actual Area Habitacion | |

**Subsecretaria de Coordinación Operativa**
**Subdirección de Barrios**
Seguimiento ejecución proyectos de Mejoramiento de Vivienda - Habitabilidad

## Proyecto mejoramiento de vivienda - AVANCE EJECUCIÓN SEMANAL

| Fecha | 20-dic-20 |
|---|---|

**Consorcio Mejoramiento EP 2020**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Contrato de obra** | 694-2020 | | | **Plazo** | Cinco (5) meses |
| **Objeto** | Contratar la ejecución de las obras de mejoramiento de vivienda en la modalidad de habitabilidad de los proyectos estructurados en los territorios priorizados por la Secretaria Distrital de Habitat. Grupo I | | | **Acta de inicio** | 4 de noviembre de 2020 |
| **CDP No.** | No. 914 del 14 de julio de 2020 | **CRP No.** | | **Valor del contrato** | TRES MIL SETECIENTOS VEINTICUATRO MILLONES CIENTO TREINTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS DIEZ Y NUEVE PESOS ($3.724.135.319) M/Cte |

**Gonzalo Liévano Hoyos -INPLAYCO S.A.S.**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Contrato de interventoría** | 701-2020 | | | **Plazo** | Seis (6) meses |
| **Objeto** | Realizar la interventorías técnica, jurídica, social, administrativa y financiera, para la ejecución de las obras de mejoramiento de vivienda en la modalidad de habitabilidad en los territorios priorizados por la secretaría distrital de hábitat. | | | **Acta de inicio** | 04 de noviembre 2020 |
| **CDP No** | No. 892 del 14 de julio de 2020 | **CRP No.** | | **Valor del contrato** | OCHOCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS M/CTE ($894.285.952), |

| **Fase 1: Validación de la información entregada por el la SDHT** | | | | | | | | | **Fase 2: Ejecución de obras** | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Territorio o barrio a intervenir** | **Ciudad Bolivar** | **Barrios** | **Predios** | **Total Predios** | **Validación** | | | | **Ejecución** | | | | |
| | | | | | Validada | V/Por Validar | | V/Modificada | En Ejecución | Terminadas | Por Ejecutar | % de Avance | Acta de Entrega a Satisfacción |
| **Arq. o Ing. Responsable** | Ing. Humberto Blanco González | MIRADOR (NUTIVARA) | 12 | 30 | 12 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 12 | 0.00% | 0 |
| | | NUEVA COLOMBIA | 16 | | 16 | 0 | | 0 | 16 | 0 | 0 | 3.84% | 0 |
| **Técnico Responsable** | | VILLAS EL DIAMANTE | 2 | | 2 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00% | 0 |
| | | | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
| **Subtotal** | | | 30 | 30 | 30 | 0 | | 0 | 16 | 0 | 14 | 3.84% | 0 |

| **AVANCE DE EJECUCIÓN SEMANAL** | | | | | | | | | | | NOVIEMBRE | | | | DICIEMBRE | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Proyecto Ciudad Bolivar** | | | | **FASE I** | | | **Tiempo Programación** | | | | SEMANA DEL 4 AL 8 | SEMANA DEL 9 AL 15 | SEMANA DEL 16AL 22 | SEMANA DEL 23 AL 29 | SEMANA DEL 30 AL 06 | SEMANA DEL 7 AL 13 | SEMANA DEL 14 AL 20 |
| **No.** | **ID_DMV** | **Dirección** | **Nombres y apellidos** | **V/ Validada** | **V/ Modificada** | **V/inicial** | **Fecha inicio** | **Fecha terminada** | **F. Inicio** | | **1 semana** | **2 semana** | **3 semana** | **4 semana** | **5 semana** | **6 semana** | **7 semana** |
| **MIRADOR (NUTIVARA)** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | MVCB_1873 | CL 70L BIS SUR 18N 14 | BLANCA FABIOLA LANDAZURI MESA | SI / NO | | $11,828,247.60 | EN FASE DE VALIDACION | EN FASE DE VALIDACION | EN FASE DE VALIDACION | | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 2 | MVCB_1886 | KR 18N 70K 31 SUR | LUZ MARIA ARIZA ARIZA | SI / NO | | $11,168,015.60 | EN FASE DE VALIDACION | EN FASE DE VALIDACION | EN FASE DE VALIDACION | | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 3 | MVCB_1836 | KR 18N 70K 09 SUR | DELIA MARÍA MATEUS ESCAMILLA | SI / NO | | $11,789,726.10 | EN FASE DE VALIDACION | EN FASE DE VALIDACION | EN FASE DE VALIDACION | | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 4 | MVCB_1829 | CL 70K SUR 18N 45 | DIANA PATRICIA PÁEZ FINO | SI / NO | | $11,105,245.60 | EN FASE DE VALIDACION | EN FASE DE VALIDACION | EN FASE DE VALIDACION | | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 5 | MVCB_1684 | CL 70I SUR 18N 56 | MIRYAM MANRIQUE URUEÑA | SI / NO | | $11,749,188.70 | EN FASE DE VALIDACION | EN FASE DE VALIDACION | EN FASE DE VALIDACION | | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 6 | MVCB_1892 | CL 70 H SUR 18 N 51 | BEATRIZ ADIELA MARTINEZ JARAMILLO | SI / NO | | $10,114,021.80 | EN FASE DE VALIDACION | EN FASE DE VALIDACION | EN FASE DE VALIDACION | | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 7 | MVCB_1681 | CL 70 I SUR 18 N 36 MI | ALVARO ELIECER VERDUGO RODRIGUEZ | SI / NO | | $10,278,758.80 | EN FASE DE VALIDACION | EN FASE DE VALIDACION | EN FASE DE VALIDACION | | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 8 | MVCB_1638 | KR 18R 70H 09 SUR | MAURICIO ENRIQUE MUÑOZ RIAÑO | SI / NO | | $9,580,888.90 | EN FASE DE VALIDACION | EN FASE DE VALIDACION | EN FASE DE VALIDACION | | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 9 | MVCB_1664 | KR 18P 70G 08 SUR | MARINA CLEMENCIA RAMOS | SI / NO | | $9,223,968.20 | EN FASE DE VALIDACION | EN FASE DE VALIDACION | EN FASE DE VALIDACION | | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 10 | MVCB_1748 | KR 18P 70I 04 SUR | OLGA LUZ BETANCOURT LEON | SI / NO | | $11,750,274.10 | EN FASE DE VALIDACION | EN FASE DE VALIDACION | EN FASE DE VALIDACION | | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 11 | MVCB_1704 | KR 18R 70H 08 SUR | ALBA LUCIA VALENCIA OCAMPO | SI / NO | | $11,612,063.20 | EN FASE DE VALIDACION | EN FASE DE VALIDACION | EN FASE DE VALIDACION | | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 12 | MVCB_1631 | CL 70G SUR 18R 15 | ELOISA LAVERDE RIOS | SI / NO | | $11,276,851.40 | EN FASE DE VALIDACION | EN FASE DE VALIDACION | EN FASE DE VALIDACION | | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **NUEVA COLOMBIA** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | MVCB_1130 | DG 69F SUR 18J 18 | CARMEN JULIA SUAREZ PARADA | SI / NO | | $10,614,314.40 | 26/11/2020 | EN EJECUCION | 26/11/2020 | 0% | 0% | 0% | 0% | 15.48% | 14.91% | 48.97% |
| 14 | MVCB_1180 | DG 69F SUR 18J 15 | BLANCA TERESA CALVO DE GARZON | SI / NO | | $10,640,712.30 | 26/11/2020 | EN EJECUCION | 26/11/2020 | 0% | 0% | 0% | 0% | 35.00% | 33.13% | 7.00% |
| 15 | MVCB_1181 | DG 69F SUR 18J 11 | ALBERTO ULLOA ULLOA | SI / NO | | $7,917,003.90 | 27/11/2020 | EN EJECUCION | 27/11/2020 | 0% | 0% | 0% | 0% | 38.70% | 39.82% | 19.81% |
| 16 | MVCB_1161 | DG 69F SUR 18J 03 | MARIA ROSA ELENA BECERRA SEGURA | SI / NO | | $11,682,398.70 | 30/11/2020 | EN EJECUCION | 30/11/2020 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.00% | 52.68% | 29.54% |
| 17 | MVCB_1212 | DG 69G SUR 18J 43 | HERNAN LOPEZ | SI / NO | | $11,067,851.50 | 2/12/2020 | EN EJECUCION | 2/12/2020 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.00% | 30.63% | 55.90% |
| 18 | MVCB_1194 | DG 69H SUR 18J 20 | VICTOR HUGO WILCHES BERNAL | SI / NO | | $11,564,858.10 | 25/11/2020 | EN EJECUCION | 25/11/2020 | 0% | 0% | 0% | 0% | 8.57% | 5.00% | 37.64% |
| 19 | MVCB_1467 | CL 70H SUR 18J 70 | TERESA DE JESUS OLIVOS DE BLANCO | SI / NO | | $11,819,029.10 | 2/12/2020 | EN EJECUCION | 2/12/2020 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.00% | 0.50% | 16.43% |
| 20 | MVCB_1469 | CL 70H SUR 18J 82 | JORGE SANCHEZ FORERO | SI / NO | | $11,784,999.40 | 26/11/2020 | EN EJECUCION | 26/11/2020 | 0% | 0% | 0% | 0% | 16.71% | 12.18% | 21.11% |
| 21 | MVCB_1470 | KR 18L 70G 24 SUR | ANA SILVIA CHACON | SI / NO | | $11,826,113.50 | 25/11/2020 | EN EJECUCION | 25/11/2020 | 0% | 0% | 0% | 0% | 21.80% | 19.99% | 3.21% |
| 22 | MVCB_1495 | KR 18L 70H 10 SUR | YACQUELINE RADA MOJICA | SI / NO | | $11,751,135.80 | 25/11/2020 | EN EJECUCION | 25/11/2020 | 0% | 0% | 0% | 0.05% | 62.25% | 37.24% | 0.46% |
| 23 | MVCB_1493 | CL 70I SUR 18J 86 | MARIA ELENA ALCIRA GARZON CASALLAS | SI / NO | | $11,275,773.60 | 30/11/2020 | EN EJECUCION | 30/11/2020 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.00% | 4.86% | 7.09% |
| 24 | MVCB_1516 | KR 18L 70I 10 SUR | BERTHA CECILIA MOJICA RUIZ | SI / NO | | $11,580,951.80 | 25/11/2020 | EN EJECUCION | 25/11/2020 | 0% | 0% | 0% | 0.05% | 43.70% | 10.47% | 20.13% |
| 25 | MVCB_1417 | CL 70I SUR 18L 30 | DIANA MARCELA PARRA BALLESTEROS | SI / NO | | $11,661,580.80 | 30/11/2020 | EN EJECUCION | 30/11/2020 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.00% | 50.36% | 26.42% |
| 26 | MVCB_1416 | CL 70I SUR 18L 22 | ANA CENETH TORRES ROJAS | SI / NO | | $11,557,790.90 | 27/11/2020 | EN EJECUCION | 27/11/2020 | 0% | 0% | 0% | 0% | 13.28% | 13.36% | 16.71% |
| 27 | MVCB_1407 | CL 70I SUR 18L 33 | MARIA ELSA TORRES | SI / NO | | $11,478,383.90 | 28/11/2020 | EN EJECUCION | 28/11/2020 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.00% | 27.15% | 32.23% |
| 28 | MVCB_1409 | CL 70I SUR 18L 21 | FRAN EDILBERTO CRUZ CANO Y OTRA | SI / NO | | $11,460,816.00 | 27/11/2020 | EN EJECUCION | 27/11/2020 | 0% | 0% | 0% | 0% | 35.00% | 5.01% | 34.70% |
| **VILLAS EL DIAMANTE** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 29 | MVCB_5118 | TV 18P BIS 69N 17 SUR | CARLOS ALFREDO CLAVIJO ROZO | SI / NO | | $11,761,810.50 | EN FASE DE VALIDACION | EN FASE DE VALIDACION | EN FASE DE VALIDACION | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.00% | 0.00% | 0% |
| 30 | MVCB_5464 | KR 19D BIS 70C 25 SUR (KR 19B 70C 25 SUR) | IRMA ROJAS ROJAS | SI / NO | | $11,428,943.80 | EN FASE DE VALIDACION | EN FASE DE VALIDACION | EN FASE DE VALIDACION | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.00% | 0.00% | 0% |

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DEL HÁBITAT

# INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

## PROYECTOS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA

INPLAYCO S.A.S.
INGENIEROS CONSTRUCTORES E INTERVENTORES

| FECHA | 20/12/2021 | PERIODO No. | 7 | DEL | 14/12/2020 | AL | 20/12/2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

### 1. INFORMACIÓN GENERAL

| | |
|---|---|
| OBJETO DEL CONTRATO | Realizar la interventorías técnica, jurídica, social, administrativa y financiera, para la ejecución de las obras de mejoramiento de vivienda en la modalidad de habitabilidad en los territorios priorizados por la secretaría distrital de hábitat. |
| LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO | Corresponde al Grupo 1 a la ejecución de 254 mejoramientos de vivienda, localizados en 3 localidades: Bosa, Usme y Ciudad Bolívar, esta última localidad incluye cuatro (4) Intervenciones de Mejoramientointegral. |

| CONTRATO DE INTERVENTORÍA | | CONTRATO DE OBRA | |
|---|---|---|---|
| CONTRATO No.: | 701-2020 | CONTRATO No.: | 694--2020 |
| PLAZO INICIAL: | 6 meses | PLAZO INICIAL: | 5 meses |
| FECHA DE INICIACIÓN: | 4 de noviembre de 2020 | FECHA DE INICIACIÓN: | 4 de noviembre de 2020 |
| **FECHA DE SUSPENSIÓN: | 0 | **FECHA DE SUSPENSIÓN: | 0 |
| **FECHA DE REINICIACIÓN: | 0 | **FECHA DE REINICIACIÓN: | 0 |
| FECHA DE TERMINACIÓN: | 3 de mayo de 2021 | FECHA DE TERMINACIÓN: | 3 de abril 2021 |
| PLAZO ACTUALIZADO: | 0 | PLAZO ACTUALIZADO: | 0 |
| PLAZO TRANSCURRIDO: | 0 | PLAZO TRANSCURRIDO: | 0 |
| VALOR INICIAL : | $ 894,285,952 | VALOR INICIAL : | $ 3,724,135,319 |
| VALOR ADICION(ES): | 0 | VALOR ADICION(ES): | $ - |
| VALOR ACTUALIZADO: | $ - | VALOR ACTUALIZADO: | $ - |
| VALOR ANTICIPO: | 0 | VALOR ANTICIPO: | $ - |
| VALOR POR PAGAR: | $ - | VALOR POR PAGAR: | $ - |
| SUPERVISOR: | JUAN CARLOS ARBELAEZ MURILLO | INTERVENTOR: | Gonzalo Liévano Hoyos -INPLAYCO S.A.S. |

** Inserte las filas que requiera según el número de suspensiones y reinicios.

### 2. CONTROL DE HITOS.

| No. | *** DESCRIPCIÓN DEL HITO | FECHA PROGRAMADA | FECHA REAL DE CUMPLIMIENTO | DÍAS DE RETRASO |
|---|---|---|---|---|
| | SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO (HITO OBLIGATORIO) | 4/11/2020 | 3/04/2021 | |
| 1 | Validación | | | |
| 2 | Entrega de informe de validación | | | |
| 3 | Ejecución | | | |
| | ENTREGA A LA INTERVENTORIA DE LOS PRODUCTOS Y/O ACTIMIDADES CONTRATADAS (HITO OBLIGATORIO) | | | |

*** Inserte las filas que requiera según el número de hitos; teniendo en cuenta que como mínimo se deberán establecer 5 hitos adicionales a los obligatorios de inicio y terminación. Los hitos aprobados por la interventoría se socializarán con el supervisor del contrato para su Vo. Bo. Los Hitos aprobados por la interventoría y SDHT solo se podrán modificar previa novedad contractual que así lo requiera. La matriz de seguimiento hace parte del presente documento.


| No. | INDICADORES BARRIO O TERRITORIO | VALORES CD + AIU | PORCENTAJE SOBRE EL VALOR TOTAL DEL CONTRATO | DIFERENCIA (+) ADELANTO (-) ATRASO |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Valor acumulado de las actividades o productos conforme a la programación vigente. | $176,783,176.00 | 4.75% | |
| 2 | Valor acumulado de las actividades o productos ejecutados y aprobados por la Interventoría. | $143,102,833.00 | 3.84% | |

### 3. ASPECTOS GENERALES INFORME TÉCNICO

Registre los avances y novedades técnicas, sociales, administrativas, contables y financieras, acompañadas por gráficos, cuadros, fotografías, análisis y comentarios sobre el estado de los trabajos, en todos sus aspectos en la fase de validación y ejecución de obra.

Fase de validación y apropiación.

## Ciudad Bolívar

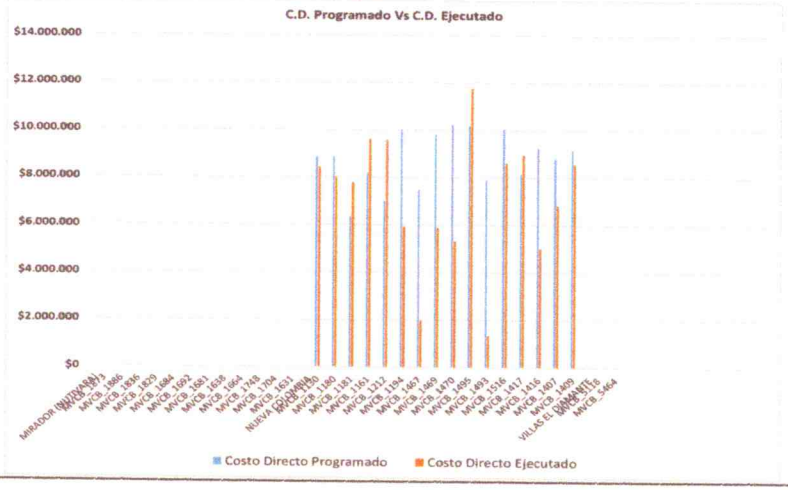




## 4- COMPONENTE TECNICO BARRIO O TERRITORIO

### ACTIVIDADES EJECUTADAS EN LA SEMANA. - ESTADO DE AVANCE SEMANAL POR VIVIENDA

### BARRIO O TERRITORIO: CIUDAD BOLIVAR

Personal técnico de la interventoría y contratista realizaron visitas a las viviendas aperturadas para verificar avances y calidad de las obras. Se dieron directrices respecto de actividades que se están ejecutando. Se revisan presupuestos proyectados y se ajustan cantidades teniendo en cuenta que hay actividades avanzadas en algunas de las viviendas.

### BARRIO O TERRITORIO: CIUDAD BOLIVAR - MIRADOR (NUTIVARA)

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 | MVCB_1873 | BLANCA FABIOLA LANDAZURI MESA | Vivienda **validada**. Sin aperturar. |
| 2 | MVCB_1886 | LUZ MARIA ARIZA ARIZA | Vivienda **validada**. Sin aperturar. |
| 3 | MVCB_1836 | DELIA MARÍA MATEUS ESCAMILLA | Vivienda **validada**. Sin aperturar. |
| 4 | MVCB_1829 | DIANA PATRICIA PÁEZ FINO | Vivienda **validada**. Sin aperturar. |
| 5 | MVCB_1684 | MIRYAM MANRIQUE URUEÑA | Vivienda **validada**. Sin aperturar. |
| 6 | MVCB_1692 | BEATRIZ ADIELA MARTINEZ JARAMILLO | Vivienda **validada**. Sin aperturar. |
| 7 | MVCB_1681 | ALVARO ELIECER VERDUGO RODRIGUEZ | Vivienda **validada**. Sin aperturar. |
| 8 | MVCB_1638 | MAURICIO ENRIQUE MUÑOZ RIAÑO | Vivienda **validada**. Sin aperturar. |
| 9 | MVCB_1664 | MARINA CLEMENCIA RAMOS | Vivienda **validada**. Sin aperturar. |
| 10 | MVCB_1748 | OLGA LUZ BETANCOURT LEON | Vivienda **validada**. Sin aperturar. |
| 11 | MVCB_1704 | ALBA LUCIA VALENCIA OCAMPO | Vivienda **validada**. Sin aperturar. |
| 12 | MVCB_1631 | ELOISA LAVERDE RIOS | Vivienda **validada**. Sin aperturar. |

### BARRIO O TERRITORIO: CIUDAD BOLIVAR - BARRIO NUEVA COLOMBIA

| | | | |
|---|---|---|---|
| 13 | MVCB_1130 | CARMEN JULIA SUAREZ PARADA | Se terminó el alistado de pisos en alcobas, sala comedor y hall de alcobas, a los cuales se les instaló la cerámica y guardaescoba. Se enchapó mesón y muros de cocina, y se dio inicio a enchapes de zona de lavandería. Se instaló cielo rasos en las dos alcobas y se inicio el cielo raso en la sala. |
| 14 | MVCB_1180 | BLANCA TERESA CALVO DE GARZON | Falta guardaescoba en comedor. Se instaló cielo raso pvc en cocina, baño y alcoba. Se instaló sanitario y lavamanos en el baño, al igual que la papelera, jabonera y gancho. Se inicia pintura de muros con vinilo. |
| 15 | MVCB_1181 | ALBERTO ULLOA ULLOA | Se dejaron observaciones en cuanto a detalle de enchapes en cocina, y faltantes de guardaescoba y remates de enchape de piso. En el área de baño se encuentra pendiente la elaboración del bordillo de poceta. Se ejecutó pintura con vinilo en muros de zona de lavandería, hall de cocina, alcoba principal, comedor y hall de acceso; se instaló guardaescoba y enchape cerámico en la alcoba principal. |
| 16 | MVCB_1161 | MARIA ROSA ELENA BECERRA SEGURA | Se enchaparon el mesón y muros de cocina. Se iniciaron actividades para instalación de cielo raso. |
| 17 | MVCB_1212 | HERNAN LOPEZ | Se instalaron perfiles metálicos para soporte de correa y se terminó la instalación de la teja arquitectónica en toda el área de cubierta y de las dos canales metálicas contempladas. Se alistaron con mortero los pisos de dos alcobas y del patio, queda pendiente el enchape de estas áreas. |
| 18 | MVCB_1194 | VICTOR HUGO WILCHES BERNA | En el segundo piso, en alcoba principal, se instaló el guardaescoba, se terminó de estucar muros y se pintaron con vinilo. En el baño se terminó el enchape de muros y pisos, se instalaron aparatos sanitarios, accesorios y cielo raso. En el primer piso, en el área de cocina del 1 piso, se avanzó en el enchape de mesón y muros. Se enchapó el piso del corredor de entrada y de la sala comedor. |
| 19 | MVCB_1467 | TERESA DE JESUS OLIVOS DE BLANCO | Se enchaparon el mesón y muros de cocina. En el área del baño se enchaparon los muros y piso, se instalaron el sanitario, lavamanos y accesorios. No hay inicio de nuevas actividades. |
| 20 | MVCB_1469 | JORGE SANCHEZ FORERO | Se instala cielo raso en baño del 2 piso. Se enchaparon el mesón y muros de la cocina. Quedó enchapado el piso de la sala con su correspondiente guardaescoba. En la zona de lavandería se alistaron los pisos y se inició la instalación de enchapes de muros. |
| 21 | MVCB_1470 | ANA SILVIA CHACON | En esta vivienda prácticamente no hubo avance, tan sólo un 3,21%, representado en el estucado de muros de hall de entrada, y el inicio de instalación de estructura para cielo raso pvc en el área de comedor y alcobas. |
| 22 | MVCB_1495 | YACQUELINE RADA MOJICA | Quedaron terminadas todas las actividades de acuerdo con el presupuesto proyectado. Se espera entregarla la próxima semana. |
| 23 | MVCB_1493 | MARIA ELENA ALCIRA GARZON CASALLAS | Se afinaron pañetes de muros en áreas de cocina, lavandería y comedor. Se terminó de levantar la mampostería de hall de entrada para mejorar la alineación de muro existente. Se pañetó el muro derecho del corredor de acceso. Se levantan mochetas en cocina para fundir mesón. |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 24 | MVCB_1516 | BERTHA CECILIA MOJICA RUIZ | En el área de cocina quedan pendientes detalles de emboquillado. Se pintaron muros de las zonas de comedor y sala. En la sala se terminó el enchape cerámico de piso con su correspondiente guardaescoba. |
| 25 | MVCB_1417 | DIANA MARCELA PARRA BALLESTEROS | Se emboquilló el enchape de piso de las áreas de sala, estudio, comedor y cocina. Se termi... el enchape de piso de la alcoba contigua a fachada, se inició el enchape de piso de la alcoba principal. Se terminó el enchape cerámico del piso y muro de la zona de lavandería. En el área del baño se terminó el enchape de muros y piso, se instaló el sanitario y accesorios. Se terminó la instalación de cielo raso en la sala, comedor y cocina. Se encuentran pintados con vinilo los muros de sala, comedor, estudio, se inicia pintura de muros de alcobas. |
| 26 | MVCB_1416 | ANA CENETH TORRES ROJAS | Area de cocina: se fundió el mesón y se enchapó; igualmente se enchaparon los muros. En la zona de lavandería se terminó el enchape de muros y pisos. Se enchapó el piso del corredor de alcobas. En la alcoba 3 quedó terminado el enchape de piso y la pintura de muros. Se aplica estuco en áreas de muros de lavandería y corredor de alcobas. |
| 27 | MVCB_1407 | MARIA ELSA TORRES | En la zona de cocina se demolió el enchape de mesón y muros; se terminó la instalación de cielo raso en tablilla de pvc en las áreas del 3er. piso; Se demolieron los enchapes de piso y muros del baño, se inició la instalación de enchapes en las paredes del baño. |
| 28 | MVCB_1409 | FRAN EDILBERTO CRUZ CANO Y OTRA | Continuó la instalación de enchape cerámico en los pisos de alcobas y sala. Se inician trabajos de enchapes en la zona del baño; se desmonta mesón de acero en cocina. |

**BARRIO O TERRITORIO: CIUDAD BOLIVAR - BARRIO VILLAS EL DIAMANTE**

**FECHA: 19/12/2020**

El día 19 de diciembre de 2020, personal tanto técnico como social de la interventoría y del contratista, realizaron visitas a las viviendas identificadas como MVCB_5118 y MVCB_5464, ubicadas en el barrio Villas El Diamante, con el fin de validar y/o priorización las actividades de mejoramiento a ejecutar en dichos inmuebles. Se efectuaron mediciones de las diferentes áreas a priorizar y se dejó registro fotográfico del estado inicial de las posibles áreas a intervenir. Se espera el presupuesto de acuerdo con las actividades priorizadas.

| | | | |
|---|---|---|---|
| 29 | MVCB_5118 | CARLOS ALFREDO CLAVIJO ROZO | La mayor parte de la vivienda presenta pisos con acabados en mortero esmaltado, excepto baños y cocina; el área de lavandería cuenta con mampostería en bloque de arcilla sin pañetar y pisos en mortero esmaltado. La cocina tiene mesón y muros de salpicadero en enchape con diferentes formatos; faltan muros por enchapar. Algunos áreas de muros de zona social se encuentran sin pañete. Los aparatos sanitarios están en mal estado. |
| 30 | MVCB_5464 | IRMA ROJAS ROJAS | Todos los pisos de la vivienda (2 piso) se encuentran con acabado en mortero afinado. La cocina tiene muros con pañete, los pisos y muros no tienen ningún tipo de acabado. El baño carece de enchapes tanto de piso como de muros, y no cuenta con aparatos sanitarios. La vivienda no tiene cielo rasos en ninguna de las áreas. |

**5. PLAN DE ACCIÓN RESULTADO DEL ANÁLISIS DE CAUSAS REGISTRADO EN EL NUMERAL ANTERIOR - CON EL OBJETIVO DE ELIMINAR LA CAUSA RAÍZ DE LA SITUACIÓN PROBLEMÁTICA - PLAN DE MEJORA**

| ACTIVIDAD | RESPONSABLE | FECHA |
|---|---|---|
| En conjunto con el contratista y la interventoría se realizaran y supervisaran los respectivos presupuestos iniciales de obra, también se definirán posibles ajustes a las áreas establecidas e indicadas inicialmente en cada uno de los expedientes de los beneficiarios del programa de mejoramiento de vivienda | Residente de interventoría | 27/12/2020 |

**6. ACTIVIDADES NO PREVISTAS Y MAYORES CANTIDADES**

Se ajustarán, en caso de ser necesario, las cantidades de obra de las diferentes actividades que se desarrollan en las viviendas, velando porque se invierta el presupuesto proyectado.

**7. COMENTARIOS DEL INTERVENTOR: Por favor realice la descripción general del estado del contrato y según aplique informe sobre: actividades realizadas en la semana, control de lluvias, compra y suministro de materiales, mano de obra, subcontratos y tramites ante las diferentes empresas prestadoras de servicios, entre otros. Anexe las actas de seguimiento realizadas en la semana correspondiente al periodo del informe.**

**Barrio o Territorio: Ciudad Bolivar**

A la fecha del informe se han validado un total de 30 viviendas, de las cuales se han aperturado e iniciado actividades en dieciséis (16) viviendas del barrio Nueva Colombia; quedan por aperturar doce (12) viviendas en el barrio Mirador (Nutivara) y dos (2) en el barrio Villas El Diamante. Se avanza en actividades como demolición de enchapes de piso y pared, alistado de pisos y pañete de muro; enchapes de piso y pared de cocinas y baños, instalación aparatos sanitarios, cielo raso en pvc, pintura de muros en vinilo y de carpintería metálica.


Durante la semana se presentó tiempo seco.

Se avanza en las actividades proyectadas. Se continúa el acopio de materiales para alistado y pañete (arena y cemento), baldosas para enchape de piso y pared, soportes metálicos y tablillas de pvc para cielo raso y combos sanitarios.


**8. REGISTRO FOTOGRAFICO DEL AVANCE DURANTE LA SEMANA**

**(SE ADJUNTA REGISTRO FOTOGRAFICO)**


# REGISTRO FOTOGRÁFICO

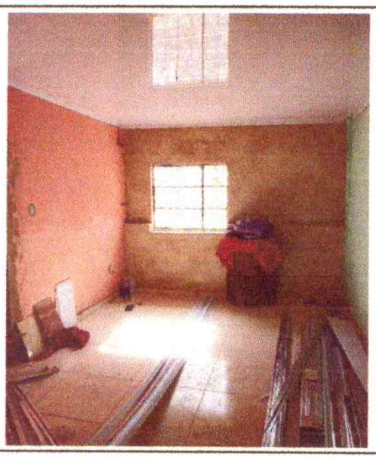

| FECHA | martes, 15 de diciembre de 2020 |
|---|---|
| **DESCRIPCION MVCB 1130** | |
| Avance de obra en alcoba principal | |

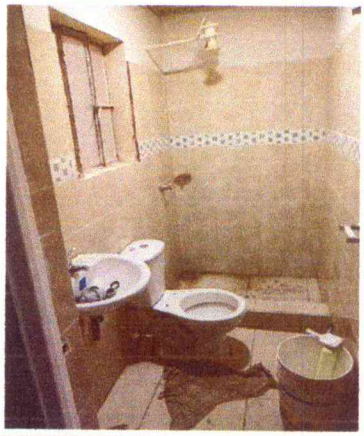


| FECHA | miércoles, 16 de diciembre de 2020 |
|---|---|
| **DESCRIPCION MVCB 1180** | |
| Avance de obra en baño | |

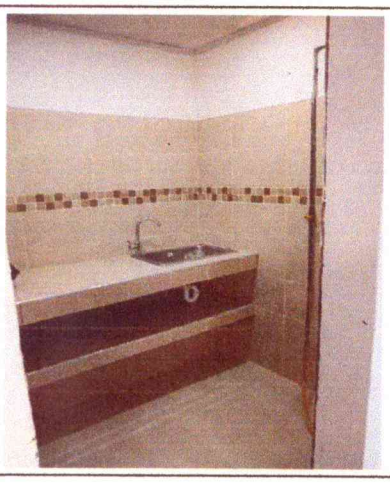


| FECHA | jueves, 17 de diciembre de 2020 |
|---|---|
| **DESCRIPCION MVCB 1181** | |
| Avance de obra en cocina | |



| FECHA | jueves, 17 de diciembre de 2020 |
|---|---|
| **DESCRIPCION MVCB 1194** | |
| Avance de obra en baño del 2 piso | |

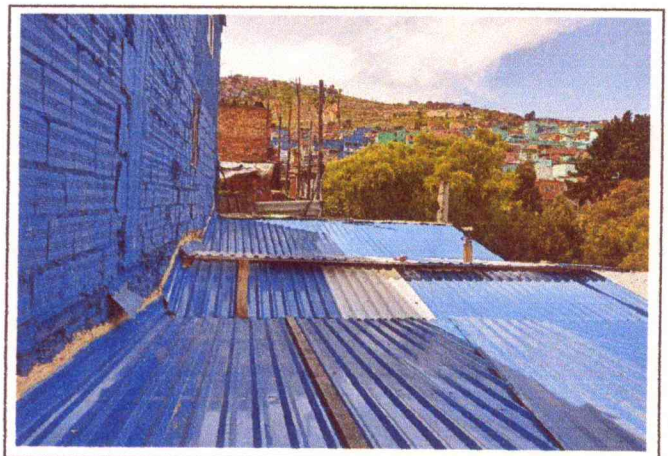

| FECHA | jueves, 17 de diciembre de 2020 |
|---|---|
| **DESCRIPCION MVCB 1212** | |
| Avance de obra de la cubierta instalada en teja arquitectónica | |

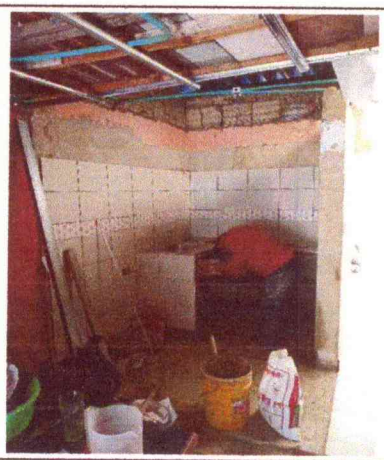

| FECHA | miércoles, 16 de diciembre de 2020 |
|---|---|
| **DESCRIPCION MVCB 1416** | |
| Estado de avance en cocina | |


# REGISTRO FOTOGRÁFICO




| FECHA | martes, 15 de diciembre de 2020 |
|---|---|
| **DESCRIPCION MVCB 1493** | |
| Avance de actividades en área de cocina | |




| FECHA | miércoles, 16 de diciembre de 2020 |
|---|---|
| **DESCRIPCION MVCB 1417** | |
| Avance de obra en área de la sala | |

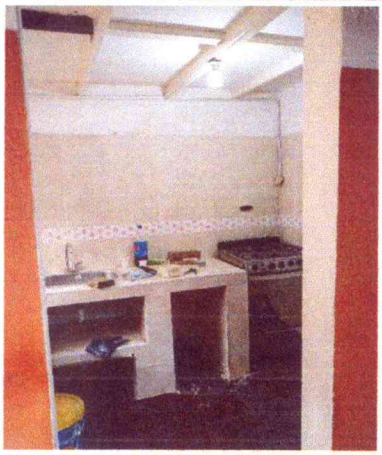


| FECHA | viernes, 18 de diciembre de 2020 |
|---|---|
| **DESCRIPCION MVCB 1467** | |
| Avance de obra en área de cocina | |

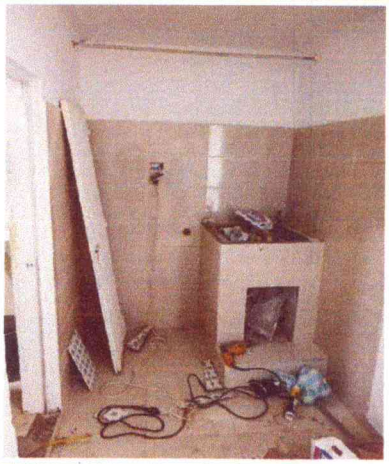

| FECHA | martes, 15 de diciembre de 2020 |
|---|---|
| **DESCRIPCION MVCB 1516** | |
| Avance de obra en área de lavandería | |

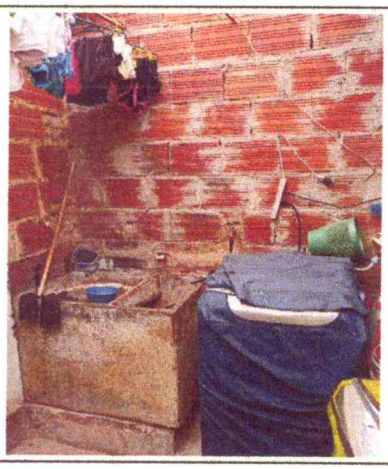

| FECHA | sábado, 19 de diciembre de 2020 |
|---|---|
| **DESCRIPCION MVCB 5118** | |
| Validación de la vivienda | |

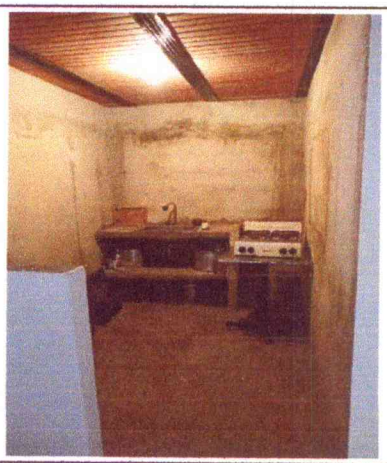

| FECHA | sábado, 19 de diciembre de 2020 |
|---|---|
| **DESCRIPCION MVCB 5464** | |
| Validación de la vivienda | |

**Subsecretaria de Coordinacion Operativa**
**Subdireccion de Barrios**
Seguimiento ejecución proyectos de Mejoramiento de Vivienda - Habitabilidad

## Proyecto mejoramiento de vivienda - AVANCE EJECUCIÓN SEMANAL

Fecha: **20-dic-20**

### Consorcio mejoramiento EP 2020 - Contratista de obra

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Contratato de obra | 694-2020 | | | Plazo | Cinco (5) meses |
| Objeto | Contratar la ejecución de las obras de mejoramiento de vivienda en la modalidad de habitabilidad de los proyectos estructurados en los territorios priorizados por la Secretaria Distrital de Habitat. Grupo I | | | Acta de inicio | 4 de noviembre de 2020 |
| CDP No. | No. 914 del 14 de julio de 2020 | CRP No. | | Valor del contrato | TRES MIL SETECIENTOS VEINTICUATRO MILLONES CIENTO TREINTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS DIEZ Y NUEVE PESOS ($3.724.135.319) M/Cte |

### Gonzalo Llevano Hoyos -INPLAYCO S.A.S.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Contratato de interventoria | 701-2020 | | | Plazo | Seis (6) meses |
| Objeto | Realizar la interventorias técnica, juridica, social, administrativa y financiera, para la ejecución de las obras de mejoramiento de vivienda en la modalidad de habitablidad en los territorios priorizados por la secretaría distrital de hábitat. | | | Acta de inicio | 04 de noviembre 2020 |
| CDP No | No. 892 del 14 de julio de 2020 | CRP No. | | Valor del contrato | OCHOCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS M/CTE ($894.285.952), |

| Fase 1: Validación de la información entregada por el la SDHT | | | | | | | | | Fase 2: Ejecución de obras | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Validación | | | | Ejecución | | | | |
| Territorio o barrio a intervenir | CIUDAD BOLIVAR | Barrios | Predios | Total Predios | Validada | V/Por Validar | | V/Modificada | En Ejecución | Terminadas | Por Ejecutar | % de Avance | Acta de Entrega a Satisfacción |
| Arq o Ing. Responsable | | ALTOS DE JALISCO | 16 | 34 | 16 | 0 | | 0 | 10 | 0 | 6 | 0.61% | 0 |
| | | MIRADOR NUTIVARA | 5 | | 5 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.00% | 0 |
| Técnico Responsable | INSP. CRISTIAN VELASCO | ROCIO ALTOS DEL SUR | 4 | | 4 | 0 | | 0 | 3 | 0 | 1 | 0.26% | 0 |
| | | LA ESCALA | 1 | | 1 | 0 | | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.06% | 0 |
| | | ACACIAS SUR | 1 | | 1 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00% | 0 |
| | | BARRIO GIBRALTAR I Y II | 4 | | 4 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.00% | 0 |
| | | LA ESCALA 3ER SECTOR | 2 | | 2 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00% | 0 |
| | | CIUDAD MILAGRO | 1 | | 1 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00% | 0 |
| Subtotal | | | 34 | 34 | 34 | 0 | | 0 | 14 | 0 | 20 | 0.93% | 0 |

| AVANCE DE EJECUCIÓN SEMANAL | | | | | | | | | | DICIEMBRE | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Proyecto | | | | FASE I | | | Tiempo Programacion | | | SEMANA DEL 30 AL 06 | SEMANA DEL 7 AL 13 | SEMANA DEL 14 AL 20 | SEMANA DEL 21 AL 27 | SEMANA DEL 28 AL 3 |
| No. | ID_DMV | Dirección | Nombres y apellidos | V/ Validada | V/ Modificada | V/Inicial | Fecha inicio | Fecha terminada | F. Inicio | 5 semana | 6 semana | 7 semana | 8 semana | 9 semana |
| | | | | | | ALTOS DE JALISCO | | | | | | | | |
| 1 | MVJA_2992 | KR 18M BIS 69A 81 SUR | TEODOSIA GALICIA DE GARCIA | SI / NO | | $11,478,755 | 27/11/2020 | 26/12/2020 | 27/11/2020 | 8% | 27% | 10% | 0% | 0% |
| 2 | MVJA_3141 | DG 69A BIS B SUR 18M 15 | MARIA LEONOR FRAILE SUAREZ | SI / NO | | $11,433,514 | 26/11/2020 | 23/12/2020 | 26/11/2020 | 0% | 6% | 9% | 0% | 0% |
| 3 | MVJA_3146 | CL 70I SUR 18L 54 | MARIA ESTER ZORRO GUERRERO | SI / NO | | $11,428,313 | 26/11/2020 | 24/12/2020 | 26/11/2020 | 3% | 4% | 0% | 0% | 0% |
| 4 | MVJA_3335 | DG 69A BIS B SUR 18M 35 | CARLOS JULIO CARDENAS TRIANA | SI / NO | | $11,177,053 | 26/11/2020 | 24/12/2020 | 26/11/2020 | 0% | 0% | 10% | 0% | 0% |
| 5 | MVJA_3314 | DG 69A BIS B SUR 18M 43 | BRISNELDA CONSTANZA MACIAS MARTINEZ | SI / NO | | $11,814,493 | 26/11/2020 | 23/12/2020 | 26/11/2020 | 0% | 5% | 30% | 0% | 0% |
| 6 | MVJA_3239 | KR 18P BIS A 61C 22 SUR MJ | NATIVIDAD SILDANA CELYS VIUDA DE GARCIA | SI | | $11,459,853 | EN FASE DE VALIDACION | EN FASE DE VALIDACION | EN FASE DE VALIDACION | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 7 | MVJA_0259 | CL 70H SUR 18L 16 | ALBA CARMEN ARDILA MATEUS | SI / NO | | $11,264,898 | 24/11/2020 | 24/12/2020 | 24/11/2020 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 8 | MVJA_3223 | DG 69A BIS D SUR 18M 36 | MARIA OLGA FARFAN GALEON | SI / NO | | $11,811,986 | 27/11/2020 | 27/12/2020 | 27/11/2020 | 0% | 4% | 0% | 0% | 0% |
| 9 | MVJA_3231 | DG 69D SUR 18J 15 | MARIA ANTONIA SANTOS CORREDOR DE RAMIREZ | SI / NO | | $11,630,690 | 24/11/2020 | 27/12/2020 | 24/11/2020 | 0% | 0% | 7% | 0% | 0% |
| 10 | MVJA_3119 | CL 70H SUR 18L 22 | LUZMILA TORRES BERMUDEZ | SI / NO | | $7,121,160 | 24/11/2020 | 24/12/2020 | 24/11/2020 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 11 | MVJA_3125 | KR 18L 70H 09 SUR | FLOR ELISA PARRA ROJAS | SI / NO | | $9,222,769 | 24/11/2020 | 24/12/2020 | 24/11/2020 | 0% | 0% | 30% | 0% | 0% |
| 12 | MVJA_0252 | CL 61D SUR 18N 30 MJ | JESUS ANTONIO ORTIZ CASTRO | SI | | $11,693,259 | EN FASE DE VALIDACION | EN FASE DE VALIDACION | EN FASE DE VALIDACION | 0% | 0% | 5% | 0% | 0% |
| 13 | MVJA_2996 | KR 18N BIS 61D 18 SUR | MARIA DEL SOCORRO CUPITRA CACAIS | SI | | $11,787,984 | EN FASE DE VALIDACION | EN FASE DE VALIDACION | EN FASE DE VALIDACION | 0% | 0% | 5% | 0% | 0% |
| 14 | MVJA_2712 | KR 18M 62 29 SUR | JOSE ALIRIO ORTIZ CABRERA Y OTRA | SI | | $11,813,746 | EN FASE DE VALIDACION | EN FASE DE VALIDACION | EN FASE DE VALIDACION | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 15 | MVJA_2707 | KR 18M 62 12 SUR | ANA LUISA BERNAL PULIDO | SI | | $6,092,091 | EN FASE DE VALIDACION | EN FASE DE VALIDACION | EN FASE DE VALIDACION | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 16 | MVJA_2640 | KR 18L BIS A 61D 47 SUR | PAOLA ANDREA BARRERA PELAEZ | SI / NO | | $11,440,930 | FASE DE VALIDACION | FASE DE VALIDACION | FASE DE VALIDACION | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **MIRADOR NUTIVARA** | | | | | | | | | | | | | | |
| 17 | MVCB_1774 | CL 70J SUR 18N 23 | JOSE W[illegible]RULANDA GIRALDO | SI | | $11,815,916 | EN FASE DE VALIDACION | EN FASE DE VALIDACION | EN FASE DE VALIDACION | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 18 | MVCB_1742 | CL 70J SUR 18N 34 | ANA ELV[illegible]OZA DE HERNANDEZ | SI | | $11,779,533 | EN FASE DE VALIDACION | EN FASE DE VALIDACION | EN FASE DE VALIDACION | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 19 | MVCB_1907 | CL 70N SUR 18N 22 | ANA ROSA LLANOS DE GARCIA | SI | | $11,042,205 | EN FASE DE VALIDACION | EN FASE DE VALIDACION | EN FASE DE VALIDACION | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 20 | MVCB_1661 | CL 70H SUR 18N 46 MJ | MARICIELO ARIAS CERQUERA | SI | | $11,651,309 | EN FASE DE VALIDACION | EN FASE DE VALIDACION | EN FASE DE VALIDACION | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 21 | MVCB_1698 | CL 70I SUR 18P 22 | LUZ AMALFI GUTIERREZ FRANCO | SI | | $9,465,986 | EN FASE DE VALIDACION | EN FASE DE VALIDACION | EN FASE DE VALIDACION | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| **ROCIO ALTOS DEL SUR** | | | | | | | | | | | | | | |
| 22 | MVJA_2981 | DG 69A BIS D SUR 18M 06 | LEONOR TOVAR BARRERO | SI<br>NO | | $11,825,816 | 27/11/2020 | 27/12/2020 | 27/11/2020 | 0% | 10% | 7% | 0% | 0% |
| 23 | MVJA_2812 | KR 18M BIS 69A 64 SUR | MARGARITA MARIA MORALES OROZCO | SI<br>NO | | $10,471,857 | 27/11/2020 | 30/12/2020 | 27/11/2020 | 3% | 7% | 30% | 0% | 0% |
| 24 | MVJA_2909 | KR 18M BIS 69A 72 SUR | AGUSTÍN VILLANUEVA GUZMÁN | SI<br>NO | | $11,742,586 | 27/11/2020 | 27/12/2020 | 27/11/2020 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 25 | MVJA_0186 | KR 18M BIS A 69A 70 SUR | PEDRO PABLO IBAÑEZ | SI<br>NO | | $8,994,273 | 27/11/2020 | 27/12/2020 | 27/11/2020 | 0% | 0% | 15% | 0% | 0% |
| **LA ESCALA** | | | | | | | | | | | | | | |
| 26 | MVJA_2672 | DG 69A BIS B SUR 18M 23 | MARIA TERESA ANTOLINEZ Y OTRO | SI<br>NO | | $11,793,878 | 26/11/2020 | 23/12/2020 | 26/11/2020 | 0% | 0% | 15% | 0% | 0% |
| **ACACIAS SUR** | | | | | | | | | | | | | | |
| 27 | MVJA_0598 | CL 62A SUR 18R 15 | RODULFO BEJARANO | SI<br>NO | | $11,813,894 | FASE DE VALIDACION | FASE DE VALIDACION | FASE DE VALIDACION | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| **BARRIO GIBRALTAR I Y II** | | | | | | | | | | | | | | |
| 28 | MVJA_0834 | CL 63A SUR 18Q 05 | CLARA INES OCHOA GUTIERREZ | SI<br>NO | | $9,526,817 | FASE DE VALIDACION | FASE DE VALIDACION | FASE DE VALIDACION | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 29 | MVJA_3011 | KR 18N BIS 63 27 SUR | RITA DEL CARMEN FONSECA CAMARGO | | | $11,511,935 | FASE DE VALIDACION | FASE DE VALIDACION | FASE DE VALIDACION | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 30 | MVJA_3157 | KR 18P 63 16 SUR | IRIA ESTHER SILVA | | | $11,683,822 | FASE DE VALIDACION | FASE DE VALIDACION | FASE DE VALIDACION | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 31 | MVJA_3397 | KR 18Q 63D 10 SUR | LUZ MARINA ROBAYO ALVARADO | | | $11,795,938 | FASE DE VALIDACION | FASE DE VALIDACION | FASE DE VALIDACION | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| **LA ESCALA 3ER SECTOR** | | | | | | | | | | | | | | |
| 32 | MVJA_0502 | CL 62A SUR 18J 20 | ROSALBA JARA DE ROJAS | SI<br>NO | | $10,438,708 | FASE DE VALIDACION | FASE DE VALIDACION | FASE DE VALIDACION | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 33 | MVJA_0519 | CL 62A SUR 18K 20 | NESTOR JAVIER VALENZUELA PEÑA | | | $11,823,991 | FASE DE VALIDACION | FASE DE VALIDACION | FASE DE VALIDACION | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| **CIUDAD MILAGRO** | | | | | | | | | | | | | | |
| 34 | MVJA_0395 | CL 62 SUR 18K 78 | JOSE ORVEY ORTIZ | SI<br>NO | | $9,076,503 | FASE DE VALIDACION | FASE DE VALIDACION | FASE DE VALIDACION | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DEL HÁBITAT

# INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

## PROYECTOS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA

INPLAYCO S.A.S.
Ingenieros Constructores e Interventores

| FECHA | 20/12/2020 | PERIODO No. | 7 | DEL | 14/12/2020 | AL | 20/12/2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

### 1. INFORMACIÓN GENERAL

| | |
|---|---|
| OBJETO DEL CONTRATO | Realizar la interventorias técnica, jurídica, social, administrativa y financiera, para la ejecución de las obras de mejoramiento de vivienda en la modalidad de habitabilidad en los territorios priorizados por la secretaría distrital de hábitat. |
| LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO | Corresponde al Grupo 1 a la ejecución de 254 mejoramientos de vivienda, localizados en 3 localidades: Bosa, Usme y Ciudad Bolivar, esta última localidad incluye cuatro (4) Intervenciones de MejoramientoIntegral. |

| CONTRATO DE INTERVENTORÍA | | CONTRATO DE OBRA | |
|---|---|---|---|
| CONTRATO No.: | 701-2020 | CONTRATO No.: | 694--2020 |
| PLAZO INICIAL: | 6 meses | PLAZO INICIAL: | 5 meses |
| FECHA DE INICIACIÓN: | 4 de noviembre de 2020 | FECHA DE INICIACIÓN: | 4 de noviembre de 2020 |
| **FECHA DE SUSPENSIÓN: | 0 | **FECHA DE SUSPENSIÓN: | 0 |
| **FECHA DE REINICIACIÓN: | 0 | **FECHA DE REINICIACIÓN: | 0 |
| FECHA DE TERMINACIÓN: | 3 de mayo de 2021 | FECHA DE TERMINACIÓN: | 3 de abril 2021 |
| PLAZO ACTUALIZADO: | 0 | PLAZO ACTUALIZADO: | 0 |
| PLAZO TRANSCURRIDO: | 0 | PLAZO TRANSCURRIDO: | 0 |
| VALOR INICIAL : | $ 894,285,952 | VALOR INICIAL : | $ 3,724,135,319 |
| VALOR ADICION(ES): | 0 | VALOR ADICION(ES): | $ - |
| VALOR ACTUALIZADO: | $ - | VALOR ACTUALIZADO: | $ - |
| VALOR ANTICIPO: | 0 | VALOR ANTICIPO: | $ - |
| VALOR POR PAGAR: | $ - | VALOR POR PAGAR: | $ - |
| SUPERVISOR: | JUAN CARLOS ARBELAEZ MURILLO | INTERVENTOR: | Gonzalo Llevano Hoyos -INPLAYCO S.A.S. |

** Inserte las filas que requiera según el número de suspensiones y reinicios.

### 2. CONTROL DE HITOS.

| No. | *** DESCRIPCIÓN DEL HITO | FECHA PROGRAMADA | FECHA REAL DE CUMPLIMIENTO | DÍAS DE RETRASO |
|---|---|---|---|---|
| | SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO (HITO OBLIGATORIO) | 4/11/2020 | 3/04/2021 | |
| 1 | Validación | | | |
| 2 | Entrega de informe de validación | | | |
| 3 | Ejecución | | | |
| | ENTREGA A LA INTERVENTORIA DE LOS PRODUCTOS Y/O ACTIVIDADES CONTRATADAS (HITO OBLIGATORIO) | | | |

*** Inserte las filas que requiera según el número de hitos; teniendo en cuenta que como mínimo se deberán establecer 5 hitos adicionales a los obligatorios de inicio y terminación. Los hitos aprobados por la interventoria se socializarán con el supervisor del contrato para su Vo. Bo. Los Hitos aprobados por la interventoria y SDHT solo se podrán modificar previa novedad contractual que así lo requiera. La matriz del seguimiento hace parte del presente documento.


| No. | INDICADORES BARRIO O TERRITORIO | VALORES | PORCENTAJE SOBRE EL VALOR TOTAL DEL CONTRATO | DIFERENCIA (+) ADELANTO (-) ATRASO |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Valor acumulado de las actividades o productos conforme a la programación vigente. | $50,331,330.00 | 1.35% | |
| 2 | Valor acumulado de las actividades o productos ejecutados y aprobados por la Interventoría. | $13,219,184.16 | 0.35% | |


### 3. ASPECTOS GENERALES INFORME TÉCNICO

**Registre los avances y novedades técnicas, sociales, administrativas, contables y financieras, acompañadas por gráficos, cuadros, fotografías, análisis y comentarios sobre el estado de los trabajos, en todos sus aspectos en la fase de validación y ejecución de obra.**

**Fase de validación y apropiación.**

## CIUDAD BOLIVAR

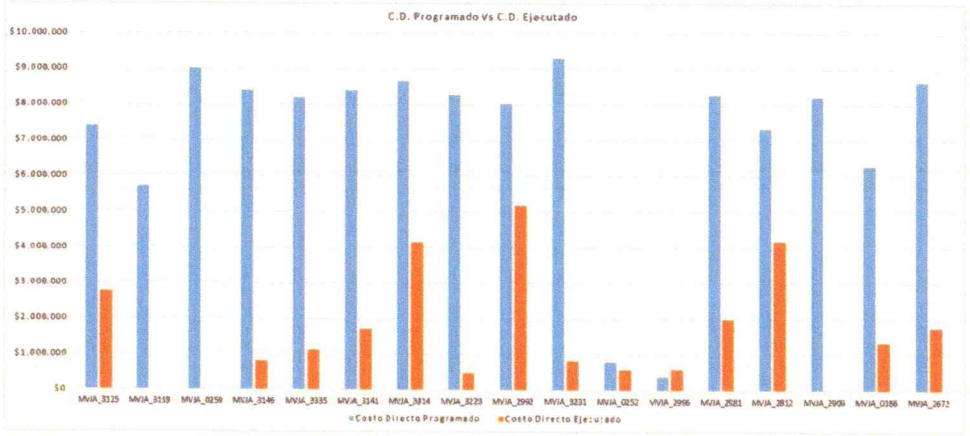
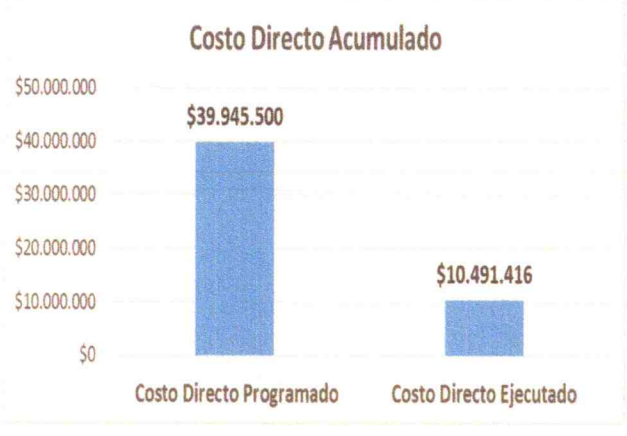
| | | | |
|---|---|---|---|
| | 4- COMPONENTE TECNICO BARRIO O TERRITORIO | | |
| | ACTIVIDADES EJECUTADAS EN LA SEMANA. - ESTADO DE AVANCE SEMANAL POR VIVIEN[illegible] | | |
| | BARRIO O TERRITORIO - CIUDAD BOLIVAR | | |
| | FECHA: 20- DIC -2020 | | |
| | ALTOS DE JALISCO | | |
| 1 | MVJA_2992 | TEODOSIA GALICIA DE GARCIA | SE REALIZA VISITA DE SEGUIMIENTO, EN LA CUAL SE EVIDENCIA AVANCE EN ACTIVIDADES DE ENCHAPE EN HABITACIONES, EN COCINA, EN BAÑO Y PINTURA |
| 2 | MVJA_3141 | MARIA LEONOR FRAILE SUAREZ | SE REALIZA VISITA DE SEGUIMIENTO, EN LA CUAL SE EVIDENCIA AVANCE EN ACTIVIDADES DE DEMOLICION Y PAÑETES |
| 3 | MVJA_3146 | MARIA ESTER ZORRO GUERRERO | SE REALIZA VISITA DE SEGUIMIENTO TECNICO, EN LA CUAL SE EVIDENCIA QUE NO HAY AVANCE DESDE EL SEGUIMIENTO ANTERIOR. LA BENEFICIARA MANIFIESTA INCONFORMIDAD PORQUE LAS ACTIVIDADES ESTAN MUY DEMORADAS Y LOS TRABAJADORES CUANDO VAN SOLO ESTAN POR UN PAR DE HORAS Y SE VAN |
| 4 | MVJA_3335 | CARLOS JULIO CARDENAS TRIANA | SE REALIZA VISITA DE SEGUIMIENTO, EN LA CUAL SE EVIDENCIA AVANCE EN ACTIVIDAD DE PAÑETE |
| 5 | MVJA_3314 | BRISNELDA CONSTANZA MACIAS MARTINEZ | SE REALIZA VISITA DE SEGUIMIENTO, EN LA CUAL SE EVIDENCIA AVANCE SIGNIFICATIVO EN ACTIVIDADES DE ENCHAPE DE PISOS Y PAÑETES DEL ENCOROSE |
| 6 | MVJA_3239 | NATIVIDAD SILDANA CELYS VIUDA DE GARCIA | Se hace validación en la vivienda, se definen espacios a intervenir, se hace levantamiento arquitectonico para calculo de cantidades de obra |
| 7 | MVJA_0259 | ALBA CARMEN ARDILA MATEUS | SE REALIZA VISITA DE SEGUIMIENTO, EN LA CUAL SE EVIDENCIA SUMINISTRO DE MATERIALES EN UNA MINIMA CANTIDAD. AUN NO INICIAN LABORES DE EJECUCION |
| 8 | MVJA_3223 | MARIA OLGA FARFAN GALEON | SE REALIZA VISITA DE SEGUIMIENTO, NO SE EVIDENCIA PRESENCIA DE TRABAJADORES |
| 9 | MVJA_3231 | MARIA ANTONIA SANTOS CORREDOR DE RAMIREZ | SE REALIZA VISITA DE SEGUIMIENTO, EN LA CUAL SE EVIDENCIA SUMINISTRO DE MATERIALES Y EJECUCION. CON UN AVANCE EN DEMOLICIONES EN COCINA Y PAÑETES |
| 10 | MVJA_3119 | LUZMILA TORRES BERMUDEZ | Se realiza visita de seguimiento tecnico, en la cual no se evidencia ni suministro de materiales ni ejecución. La beneficiaria manifiesta inconformidad porque ella desocupo su casa y hasta la fecha no inician labores. |
| 11 | MVJA_3125 | FLOR ELISA PARRA ROJAS | SE REALIZA VISITA DE SEGUINMIENTO TECNICO. EN EL CUAL SE EVIDENCIA LA INSTALACION DE LA CUBIERTA, QUEDAN ALGUNOS PENDIENTES Y FALTA INTERVENCION EN INTERIORES. |
| 12 | MVJA_0252 | JESUS ANTONIO ORTIZ CASTRO | SE REALIZA APERTURA DEL MV, SE SOCIALIZA EL PRESUPUESTO Y QUEDAN ACORDADAS LAS AREAS A INTERVENIR. SE REALIZA SEGUIMIENTO TECNICO EN EL CUAL SE EVIDENCIA AGILIDAD EN LOS PROCESOS DE EJECUCION. |
| 13 | MVJA_2996 | MARIA DEL SOCORRO CUPITRA CACAIS | SE REALIZA APERTURA DEL MV, SE SOCIALIZA EL PRESUPUESTO Y QUEDAN ACORDADAS LAS AREAS A INTERVENIR. SE REALIZA SEGUIMIENTO TECNICO EN EL CUAL SE EVIDENCIA AGILIDAD EN LOS PROCESOS DE EJECUCION. |
| 14 | MVJA_2712 | JOSE ALIRIO ORTIZ CABRERA Y OTRA | Se hace validación en la vivienda, se definen espacios a intervenir, se hace levantamiento arquitectonico para calculo de cantidades de obra |
| 15 | MVJA_2707 | ANA LUISA BERNAL PULIDO | Se hace validación en la vivienda, se definen espacios a intervenir, se hace levantamiento arquitectonico para calculo de cantidades de obra |
| 16 | MVJA_2640 | PAOLA ANDREA BARRERA PELAEZ | Se realiza validación técnica, para cálculo de cantidades y elaboración de presupuesto. |
| | MIRADOR NUTIVARA | | |
| 17 | MVCB_1774 | JOSE WILSON MARULANDA GIRALDO | Se hace validación en la vivienda, se definen espacios a intervenir, se hace levantamiento arquitectonico para calculo de cantidades de obra |
| 18 | MVCB_1742 | ANA ELVIA MENDOZA DE HERNANDEZ | Se hace validación en la vivienda, se definen espacios a intervenir, se hace levantamiento arquitectonico para calculo de cantidades de obra |
| 19 | MVCB_1907 | ANA ROSA LLANOS DE GARCIA | Se hace validación en la vivienda, se definen espacios a intervenir, se hace levantamiento arquitectonico para calculo de cantidades de obra. Cubierta en pesimas condiciones se solicita aprobacion para intervencion de cubierta con estructura en su totalidad |
| 20 | MVCB_1661 | MARICIELO ARIAS CERQUERA | Se hace validación en la vivienda, se definen espacios a intervenir, se hace levantamiento arquitectonico para calculo de cantidades de obra |
| 21 | MVCB_1698 | LUZ AMALFI GUTIERREZ FRANCO | Se hace validación en la vivienda, se definen espacios a intervenir, se hace levantamiento arquitectonico para calculo de cantidades de obra |
| | ROCIO ALTOS DEL SUR | | |
| 22 | MVJA_2981 | LEONOR TOVAR BARRERO | SE REALIZA VISITA DE SEGUIMIENTO, EN LA CUAL SE EVIDENCIA AVANCE EN ACTIVIDADES DE PAÑETE. BENEFICIARIO MANIFIESTA QUE HAY MUCHA DEMORA EN EL SUMINISTRO DE LOS MATERTIALES. |
| 23 | MVJA_2812 | MARGARITA MARIA MORALES OROZCO | SE REALIZA VISITA DE SEGUIMIENTO, EN LA CUAL SE EVIDENCIA AVANCE EN ACTIVIDADES DE PAÑETE. ALISTADO DE PISO, CONSTRUCCION DE MOCHETA EN COCINA, ENCHAPE MESON Y ENCHAPE ZONA DE LAVANDERIA |
| 24 | MVJA_2909 | AGUSTÍN VILLANUEVA GUZMÁN | SE REALIZA VISITA DE SEGUIMIENTO, EN LA CUAL SEV EVIDENCIA QUE NO HAY SUMINISTRO DE MATERIALES NI EJECUCION. LA BENEFICIARIA MANIFIESTA QUE HA MUCHA DEMORA EN EL INICIO DE LAS ACTIVIDADES DE EJECUCION Y SUMISTRO DE MATERIALES. |
| 25 | MVJA_0186 | PEDRO PABLO IBAÑEZ | SE REALIZA VISITA DE SEGUIMIENTO, EN LA CUAL SE EVIDENCIA AVANCE EN ACTIVIDADES DE DESMONTE DE CUBIERTA, ALISTADO DE PISOS Y PAÑETE EN COCINA. LA BENEFICIARIA MANIFIESTA QUE LOS TRABAJADORES DESTECHARON EL DIA 16/12/2020 Y A LA FECHA DEL SEGUIMIENTO (18/12/2020) NO HAN EMPEZADO CON EL MONTQAJE DE LA CUBIERTA |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | **LA ESCALA** | |
| 26 | MVJA_2672 | MARIA TERESA ANTOLINEZ Y OTRO | REALIZA VISITA DE SEGUIMIENTO, EN LA CUAL SE EVIDENCIA AVANCE EN ACTIVIDAD DE [illegible]L BENEFICIARIO MANIFIESTA QUE EL SUBCONTRATISTA PRESENTA BASTANTE MORA EN EL SUMINISTRO DE MATERIALES. |
| | | **ACACIAS SUR** | |
| 27 | MVJA_0598 | RODULFO BEJARANO | Se hace validación en la vivienda, se definen espacios a intervenir, se hace levantamiento arquitectonico para calculo de cantidades de obra |
| | | **BARRIO GIBRALTAR I Y II** | |
| 28 | MVJA_0834 | CLARA INES OCHOA GUTIERREZ | Se hace validación en la vivienda, se definen espacios a intervenir, se hace levantamiento arquitectonico para calculo de cantidades de obra |
| 29 | MVJA_3011 | RITA DEL CARMEN FONSECA CAMARGO | Se hace validación en la vivienda, se definen espacios a intervenir, se hace levantamiento arquitectonico para calculo de cantidades de obra |
| 30 | MVJA_3157 | IRIA ESTHER SILVA | Se hace validación en la vivienda, se definen espacios a intervenir, se hace levantamiento arquitectonico para calculo de cantidades de obra |
| 31 | MVJA_3397 | LUZ MARINA ROBAYO ALVARADO | Se hace validación en la vivienda, se definen espacios a intervenir, se hace levantamiento arquitectonico para calculo de cantidades de obra |
| | | **LA ESCALA 3ER SECTOR** | |
| 32 | MVJA_0502 | ROSALBA JARA DE ROJAS | Se hace validación en la vivienda, se definen espacios a intervenir, se hace levantamiento arquitectonico para calculo de cantidades de obra |
| 33 | MVJA_0519 | NESTOR JAVIER VALENZUELA PEÑA | Se hace validación en la vivienda, se definen espacios a intervenir, se hace levantamiento arquitectonico para calculo de cantidades de obra |
| | | **CIUDAD MILAGRO** | |
| 34 | MVJA_0395 | JOSE ORVEY ORTIZ | Se hace validación en la vivienda, se definen espacios a intervenir, se hace levantamiento arquitectonico para calculo de cantidades de obra |

**5. PLAN DE ACCIÓN RESULTADO DEL ANÁLISIS DE CAUSAS REGISTRADO EN EL NUMERAL ANTERIOR - CON EL OBJETIVO DE ELIMINAR LA CAUSA RAÍZ DE LA SITUACIÓN PROBLEMÁTICA - PLAN DE MEJORA**

| ACTIVIDAD | RESPONSABLE | FECHA |
|---|---|---|
| Se realizan seguimientos tecnicos a los mv aperturados, en los cuales se evidenció un gran número de inconformidades por las fechas de inicio de ejecucion por parte del contratista siendo que estos se aperturaron con bastante anterioridad y aun hay viviendas que no han sido intervenidas. los beneficirios manifiestan que los maestros no estan trabajando de turno completo sino que se presentan un durante un par de horas y luego se van sin volver en el resto del día. | CRISTIAN VELASCO | |
| se le solicita al contratista hacer entrega de una programación acertada, donde se indique las fechas de aperturas y conclusión de las validaciones y aperturas | | |

**6. ACTIVIDADES NO PREVISTAS Y MAYORES CANTIDADES**

Se informa que en algunas de las viviendas se presentan mejoras en los acabados finales realizadas por los beneficiarios, por lo tanto se deside intervenir otros espacios en conjunto con el contratista garantizando una adecuada habitabilidad y dignificación de las viviendas

**7. COMENTARIOS DEL INTERVENTOR: Por favor realice la descripción general del estado del contrato y según aplique informe sobre: actividades realizadas en la semana, control de lluvias, compra y suministro de materiales, mano de obra, subcontratos y tramites ante las diferentes empresas prestadoras de servicios, entre otros. Anexe las actas de seguimiento realizadas en la semana correspondiente al periodo del informe.**

**Barrio o Territorio: CIUDAD BOLIVAR**

En el presente periodo se hace la validación en 8 MV y el seguimiento de obra a los 17 mv aperturados. se le informa al contratista de obra y al beneficiario sobre los espacios a intervenir

**8. REGISTRO FOTOGRAFICO DEL AVANCE DURANTE LA SEMANA**

**SE ADJUNTA REGISTRO FOTOGRAFICO**


# REGISTRO FOTOGRÁFICO




| FECHA | jueves, 17 de diciembre de 2020 |
|---|---|
| DESCRIPCION MVJA_0519 | |
| estado actual baño | |




| FECHA | jueves, 17 de diciembre de 2020 |
|---|---|
| DESCRIPCION MVJA_0519 | |
| estado actual cocina | |




| FECHA | jueves, 17 de diciembre de 2020 |
|---|---|
| DESCRIPCION MVJA_0395 | |
| estado actual cocina | |



| FECHA | jueves, 17 de diciembre de 2020 |
|---|---|
| DESCRIPCION MVJA_0395 | |
| estado actual sala | |

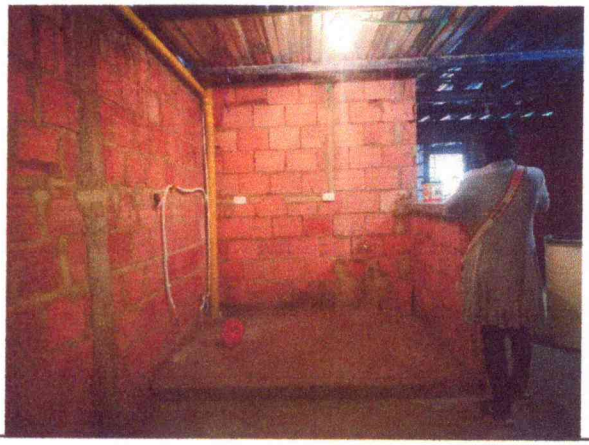

| FECHA | miércoles, 16 de diciembre de 2020 |
|---|---|
| DESCRIPCION MVJA_3397 | |
| estado actual cocina | |

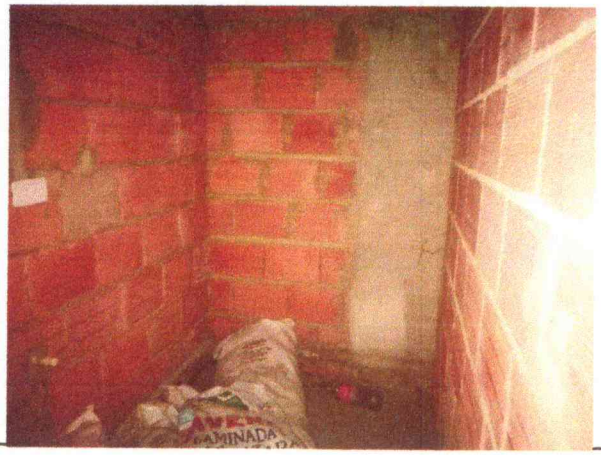

| FECHA | miércoles, 16 de diciembre de 2020 |
|---|---|
| DESCRIPCION MVJA_3397 | |
| estado actual baño | |

**Subsecretaria de Coordinacion Operativa**

**Subdireccion de Barrios**

Seguimiento ejecución proyectos de Mejoramiento de Vivienda - Habitabilidad

## Proyecto mejoramiento de vivienda - AVANCE EJECUCIÓN SEMANAL

**Fecha** 20-dic-20

### Consorcio mejoramiento EP 2020 - Contratista de obra

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Contratato de obra | 694-2020 | | | Plazo | Cinco (5) meses |
| Objeto | Contratar la ejecución de las obras de mejoramiento de vivienda en la modalidad de habitabilidad de los proyectos estructurados en los territorios priorizados por la Secretaría Distrital de Habitat. Grupo I | | | Acta de inicio | 4 de noviembre de 2020 |
| CDP No. | No. 914 del 14 de julio de 2020 | CRP No. | | Valor del contrato | TRES MIL SETECIENTOS VEINTICUATRO MILLONES CIENTO TREINTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS DIEZ Y NUEVE PESOS ($3.724.135.319) M/Cte |

### Gonzalo Llevano Hoyos -INPLAYCO S.A.S.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Contratato de interventoría | 701-2020 | | | Plazo | Seis (6) meses |
| Objeto | Realizar la interventorias técnica, jurídica, social, administrativa y financiera, para la ejecución de las obras de mejoramiento de vivienda en la modalidad de habitablidad en los territorios priorizados por la secretaría distrital de hábitat. | | | Acta de inicio | 04 de noviembre 2020 |
| CDP No | No. 892 del 14 de julio de 2020 | CRP No. | | Valor del contrato | OCHOCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS M/CTE ($894.285.952), |

| Fase 1: Validación de la información entregada por el la SDHT | | | | | | | | Fase 2: Ejecución de obras | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Validación | | | Ejecución | | | | |
| Territorio o barrio a intervenir | CIUDAD BOLIVAR | Barrios | Predios | Total Predios | Validada | V/Por Validar | V/Modificada | En Ejecución | Terminadas | Por Ejecutar | % de Avance | Acta de Entrega a Satisfacción |
| Arq o Ing. Responsable | ARQ. WILLIAM GARZON | LA ESCALA 3ER SECTOR | 1 | 27 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.05% | 0 |
| | | DOMINGO LAIN II | 1 | | 1 | | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
| | | ACACIAS SUR | 3 | | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.00% | 0 |
| | | DOMINGO LAIN I | 3 | | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.50% | 0 |
| Técnico Responsable | ERICK ALVAREZ CADAVID | ALTOS DE JALISCO | 10 | | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0.66% | 0 |
| | | MIRADOR (NUEVARA) | 7 | | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0.00% | 0 |
| | | LA ESPERANZA | 1 | | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00% | 0 |
| | | GIBRALTAR I Y II | 1 | | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.16% | 0 |
| Subtotal | | | 27 | 27 | 16 | 11 | 0 | 16 | 0 | 11 | 1.37% | 0 |

### AVANCE DE EJECUCIÓN SEMANAL

| Proyecto | | | | FASE I | | | Tiempo Programacion | | | NOVIEMBRE | | | | DICIEMBRE | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | SEMANA DEL 4 AL 8 | SEMANA DEL 9 AL 15 | SEMANA DEL 16AL 22 | SEMANA DEL 23 AL 29 | SEMANA DEL 30 AL 06 | SEMANA DEL 7 AL 13 | SEMANA DEL 14 AL 20 |
| No. | ID_DMV | Dirección | Nombres y apellidos | V/ Validada | V/ Modificada | V/Inicial | Fecha inicio | Fecha terminada | F. Inicio | 1 semana | 2 semana | 3 semana | 4 semana | 5 semana | 6 semana | 7 semana |
| **DOMINGO LAIN II SECTOR Y CONDOMINIO DEL BOSQUE** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | MVJA_0723 | CL 63 SUR 18K 14 | VICTOR MANUEL SAMORA HERNANDEZ | SI | | $11,82[illegible],595 | 26/11/2020 | EN EJECUCION | 26/11/2020 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| | | | | NO | | | | | | | | | | | | |
| **DOMINGO LAIN I** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | MVJA_0898 | CL 63B SUR 18L 53 | EFIGENIA GUIZA DE SANCHEZ | SI | | $11,770,978 | 24/11/2020 | EN EJECUCION | 24/11/2020 | 0% | 0% | 0% | 0% | 21% | 20% | 20% |
| | | | | NO | | | | | | | | | | | | |
| 3 | MVJA_0899 | CL 63B SUR 18L 61 | DORIS AYDEE HERRERA OTALORA | SI | | $11,058,620 | 24/11/2020 | EN EJECUCION | 24/11/2020 | 0% | 0% | 0% | 0% | 34% | 8% | 18% |
| | | | | NO | | | | | | | | | | | | |
| 4 | MVJA_0970 | CL 63D SUR 18L 02 | DORIS CUESTA DE RODRIGUEZ | SI | | $11,559,058 | 25/11/2020 | EN EJECUCION | 25/11/2020 | 0% | 0% | 0% | 0% | 15% | 2% | 26% |
| | | | | NO | | | | | | | | | | | | |
| **ALTOS DE JALISCO** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | MVJA_2741 | KR 18M 62A 44 SUR | CARLOS ALBERTO MUÑETON FRANCO | SI | | $11,816,187 | 27/11/2020 | EN EJECUCION | 27/11/2020 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| | | | | NO | | | | | | | | | | | | |
| 6 | MVJA_2729 | KR 18M 62A 07 SUR | JOSE IGNACIO TAO IBARRA | SI | | $11,80[illegible],634 | 25/11/2020 | EN EJECUCION | 25/11/2020 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 13% |
| | | | | NO | | | | | | | | | | | | |
| 7 | MVJA_0544 | CL 62A SUR 18M 09 | MERCEDES RIAÑO PARRA | SI | | $11,82[illegible],308 | 24/11/2020 | EN EJECUCION | 24/11/2020 | 0% | 0% | 0% | 0% | 31% | 10% | 9% |
| | | | | NO | | | | | | | | | | | | |
| 8 | MVJA_0567 | CL 62A SUR 18M 41 IN 9 | MARIA DEL ROSARIO RODRIGUEZ | SI | | $11,722,293 | 25/11/2020 | EN EJECUCION | 25/11/2020 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 10% | 9% |
| | | | | NO | | | | | | | | | | | | |
| 9 | MVJA_3309 | KR 18P BIS B 61D 25 SUR | TEOFILO MORALES TURGA Y OTRA | SI | | $11,799,687 | 24/11/2020 | EN EJECUCION | 24/11/2020 | 0% | 0% | 0% | 0% | 19% | 8% | 19% |
| | | | | NO | | | | | | | | | | | | |
| 10 | MVJA_3366 | KR 18Q 61C 34 SUR | EDILMA A.CIRA CASTILLO | SI | | $11,764,716 | 26/11/2020 | EN EJECUCION | 26/11/2020 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| | | | | NO | | | | | | | | | | | | |
| 11 | MVJA_4350 | TV 18Q BIS C 61B 87 SUR | MARÍA BENDITA REDONDO CASTIBLANCO | SI | | $11,552,262 | 26/11/2020 | EN EJECUCION | 26/11/2020 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 10% |
| | | | | NO | | | | | | | | | | | | |
| 12 | MVJA_2660 | KR 18L BIS A 62A 39 SUR | MANUEL EDUARDO RODRIGUEZ PRIETO | SI | | $11,808,234 | 25/11/2020 | EN EJECUCION | 25/11/2020 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% |
| | | | | NO | | | | | | | | | | | | |
| 13 | MVJA_4333 | TV 18Q BIS C 61B 45 SUR | BEATRIZ CABRALES ACERO | SI | | $11,504,866 | 27/11/2020 | EN EJECUCION | 27/11/2020 | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 23% | 17% |
| | | | | NO | | | | | | | | | | | | |
| 14 | MVJA_0890 | CL 63B SUR 18K 56 | HERNAN HUMBERTO PARRA | SI | | $10,110,603 | 25/11/2020 | EN EJECUCION | 25/11/2020 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 11% |
| | | | | NO | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **LA ESCALA 3ER SECTOR** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | MVJA_0530 | CL 62A SUR 18L 07 | LUIS [redacted] LÓPEZ DÍAZ | SI<br>NO | | $10,524,980 | 26/11/2020 | EN E[redacted] | 26/11/2020 | 0% | 0% | 0% | 0% | 2% | 0% | 15% |
| **GIBRALTAR I Y II** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16 | MVJA_4375 | TV 18R 61B 41 SUR | FERNANDO TORRES Y OTRA | SI<br>NO | | $7,358,179 | 26/11/2020 | EN EJECUCION | 26/11/2020 | 0% | 0% | 0% | 0% | 25% | 27% | 18% |
| **ACACIAS SUR** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17 | MVJA_0598 | CL 62A SUR 18R 15 | RODULFO BEJARANO | SI<br>NO | | $11,813,894 | EN FASE DE VALIDAC ON | EN FASE DE VALIDACION | EN FASE DE VALIDACION | 0% | 0% | 0% | 0% | C% | 0% | 0% |
| 18 | MVJA_0608 | CL 62A SUR 18T 10 | MARIA LUIDINA VARGAS AGUIRRE | SI<br>NO | | $11,762,856 | EN FASE DE VALIDAC ON | EN FASE DE VALIDACION | EN FASE DE VALIDACION | 0% | 0% | 0% | 0% | C% | 0% | 0% |
| 19 | MVJA_3670 | KR 18Z 62 30 SUR | CRISTOBAL PITA CAMARGO | SI<br>NO | | $11,79[redacted],446 | EN FASE DE VALIDAC ON | EN FASE DE VALIDACION | EN FASE DE VALIDACION | 0% | 0% | 0% | 0% | C% | 0% | 0% |
| **LA ESPERANZA** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20 | MVJA_3607 | KR 18T 62A 21 SUR | LUIS ENRIQUE JIMENEZ VEGA | SI<br>NO | | $11,760,814 | EN FASE DE VALIDAC ON | EN FASE DE VALIDACION | EN FASE DE VALIDACION | 0% | 0% | 0% | 0% | C% | 0% | 0% |
| **MIRADOR (NUTIVARA)** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21 | MVCB_1574 | CL 70F SUR 18R 27 | JOSE HIPOLITO GUTIERREZ LUCERO | SI<br>NO | | $11,646,455 | EN FASE DE VALIDAC ON | EN FASE DE VALIDACION | EN FASE DE VALIDACION | 0% | 0% | 0% | 0% | C% | 0% | 0% |
| 22 | MVCB_1585 | CL 70F SUR 18P 51 | ELIECER RONCANCIO MARTINEZ | SI<br>NO | | $11,805,655 | EN FASE DE VALIDAC ON | EN FASE DE VALIDACION | EN FASE DE VALIDACION | 0% | 0% | 0% | 0% | C% | 0% | 0% |
| 23 | MVCB_1586 | CL 70F SUR 18P 45 | MARIA DEL CARMEN RINCON | SI<br>NO | | $11,816,419 | EN FASE DE VALIDAC ON | EN FASE DE VALIDACION | EN FASE DE VALIDACION | 0% | 0% | 0% | 0% | C% | 0% | 0% |
| 24 | MVCB_1588 | CL 70F SUR 18P 33 | LUZ NELLY RODRIGUEZ | SI<br>NO | | $10,983,242 | EN FASE DE VALIDAC ON | EN FASE DE VALIDACION | EN FASE DE VALIDACION | 0% | 0% | 0% | 0% | C% | 0% | 0% |
| 25 | MVCB_1608 | KR 18P 70F 06 SUR | ROSALBINA HERNANDEZ PIRACHICANI | SI<br>NO | | $11,804,701 | EN FASE DE VALIDAC ON | EN FASE DE VALIDACION | EN FASE DE VALIDACION | 0% | 0% | 0% | 0% | C% | 0% | 0% |
| 26 | MVCB_1592 | CL 70F SUR 18N 28 | HOBER FABIAN BARRERA GUTIERREZ | SI<br>NO | | $11,822,174 | EN FASE DE VALIDAC ON | EN FASE DE VALIDACION | EN FASE DE VALIDACION | 0% | 0% | 0% | 0% | C% | 0% | 0% |
| 27 | MVCB_1708 | TV 18R 7CH 57 SUR | MARIA EUGENIA TRUJILLO QU MBAYO | SI<br>NO | | $11,760,814 | EN FASE DE VALIDAC ON | EN FASE DE VALIDACION | EN FASE DE VALIDACION | 0% | 0% | 0% | 0% | C% | 0% | 0% |

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DEL HÁBITAT

# INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

## PROYECTOS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA

INPLAYCO S.A.S.
INGENIERÍAS CONSTRUCTORES E INTERVENTORES

| FECHA | 20/12/2021 | PERIODO No. | 7 | DEL | 14/12/2020 | AL | 20/12/2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

### 1. INFORMACIÓN GENERAL

| | |
|---|---|
| OBJETO DEL CONTRATO | Realizar la interventorías técnica, jurídica, social, administrativa y financiera, para la ejecución de las obras de mejoramiento de vivienda en la modalidad de habitabilidad en los territorios priorizados por la secretaría distrital de hábitat. |
| LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO | Corresponde al Grupo 1 a la ejecución de 254 mejoramientos de vivienda, localizados en 3 localidades: Bosa, Usme y Ciudad Bolívar, esta última localidad incluye cuatro (4) Intervenciones de MejoramientoIntegral. |

| CONTRATO DE INTERVENTORÍA | | CONTRATO DE OBRA | |
|---|---|---|---|
| CONTRATO No.: | 701-2020 | CONTRATO No.: | 694--2020 |
| PLAZO INICIAL: | 6 meses | PLAZO INICIAL: | 5 meses |
| FECHA DE INICIACIÓN: | 4 de noviembre de 2020 | FECHA DE INICIACIÓN: | 4 de noviembre de 2020 |
| **FECHA DE SUSPENSIÓN: | 0 | **FECHA DE SUSPENSIÓN: | 0 |
| **FECHA DE REINICIACIÓN: | 0 | **FECHA DE REINICIACIÓN: | 0 |
| FECHA DE TERMINACIÓN: | 3 de mayo de 2021 | FECHA DE TERMINACIÓN: | 3 de abril 2021 |
| PLAZO ACTUALIZADO: | 0 | PLAZO ACTUALIZADO: | 0 |
| PLAZO TRANSCURRIDO: | 0 | PLAZO TRANSCURRIDO: | 0 |
| VALOR INICIAL : | $ 894,285,952 | VALOR INICIAL : | $ 3,724,135,319 |
| VALOR ADICION(ES): | 0 | VALOR ADICION(ES): | $ - |
| VALOR ACTUALIZADO: | $ - | VALOR ACTUALIZADO: | $ - |
| VALOR ANTICIPO: | 0 | VALOR ANTICIPO: | $ - |
| VALOR POR PAGAR: | $ - | VALOR POR PAGAR: | $ - |
| SUPERVISOR: | JUAN CARLOS ARBELAEZ MURILLO | INTERVENTOR: | Gonzalo Llevano Hoyos -INPLAYCO S.A.S |

** Inserte las filas que requiera según el número de suspensiones y reinicios.

### 2. CONTROL DE HITOS.

| No. | *** DESCRIPCIÓN DEL HITO | FECHA PROGRAMADA | FECHA REAL DE CUMPLIMIENTO | DÍAS DE RETRASO |
|---|---|---|---|---|
| | SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO (HITO OBLIGATORIO) | 4/11/2020 | 3/04/2021 | |
| 1 | Validación | | | |
| 2 | Entrega de informe de validación | | | |
| 3 | Ejecución | | | |
| | ENTREGA A LA INTERVENTORIA DE LOS PRODUCTOS Y/O ACTIVIDADES CONTRATADAS (HITO OBLIGATORIO) | | | |


*** Inserte las filas que requiera según el número de hitos; teniendo en cuenta que como mínimo se deberán establecer 5 hitos adicionales a los obligatorios de inicio y terminación. Los hitos aprobados por la interventoría se socializarán con el supervisor del contrato para su Vo. Bo. Los Hitos aprobados por la interventoría y SDHT solo se podrán modificar previa novedad contractual que así lo requiera. La matriz ded seguimiento hace parte del presente documento.


| No. | INDICADORES BARRIO O TERRITORIO | VALORES CD + AIU | PORCENTAJE SOBRE EL VALOR TOTAL DEL CONTRATO | DIFERENCIA (+) ADELANTO (-) ATRASO |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Valor acumulado de las actividades o productos conforme a la programación vigente. | $186,548,913.00 | 5.01% | |
| 2 | Valor acumulado de las actividades o productos ejecutados y aprobados por la Interventoría. | $63,945,000.00 | 1.72% | |

### 3. ASPECTOS GENERALES INFORME TÉCNICO

**Registre los avances y novedades técnicas, sociales, administrativas, contables y financieras, acompañadas por gráficos, cuadros, fotografías, análisis y comentarios sobre el estado de los trabajos, en todos sus aspectos en la fase de validación y ejecución de obra.**

## CIUDAD BOLIVAR

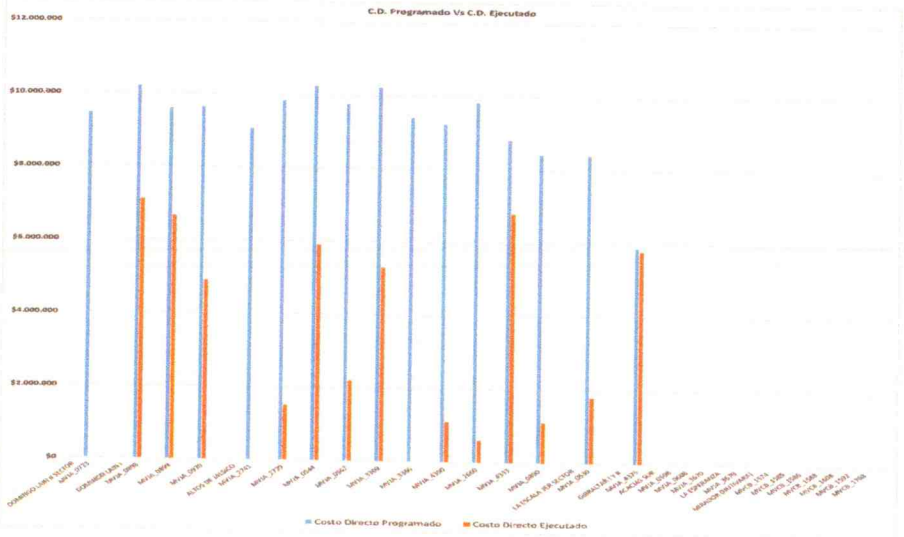
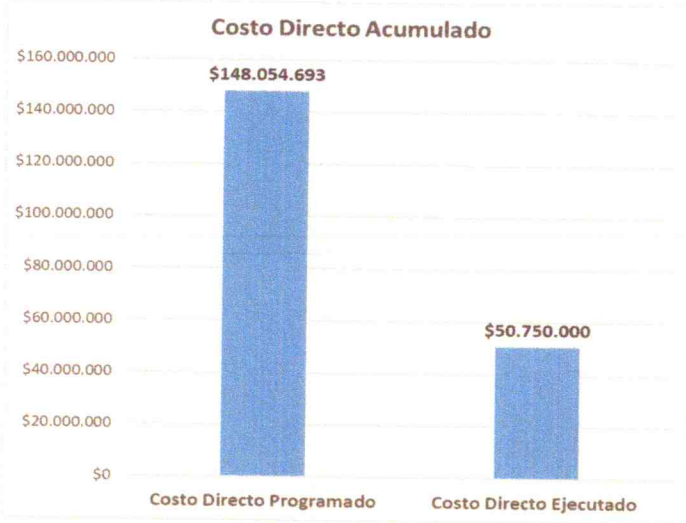
| 4- COMPONENTE TECNICO BARRIO O TERRITORIO | | | |
|---|---|---|---|
| ACTIVIDADES EJECUTADAS EN LA SEMANA. - ESTADO DE AVANCE SEMANAL POR VIVIE | | | |
| FECHA: 29- NOV -2020 | | | |
| BARRIO O TERRITORIO - CIUDAD BOLIVAR - DOMINGO LAIN II SECTOR Y CONDOMINIO DEL BOSQUE | | | |
| 1 | MVJA_0723 | VICTOR MANUEL SAMORA HERNANDEZ | Se hace seguimiento, no se evidencia materiales ni actividades en ejecución. |
| BARRIO O TERRITORIO - CIUDAD BOLIVAR - DOMINGO LAIN I | | | |
| 2 | MVJA_0898 | EFIGENIA GUIZA DE SANCHEZ | Se hace seguimiento, se evidencia materiales y maestro ejecutando actividades de instalación de enchape en baño e instalación de meson de cocina, pendiente emboquillar. Beneficiaria se encuentra conforme. |
| 3 | MVJA_0899 | DORIS AYDEE HERRERA OTALORA | Se hace seguimiento, se evidencia materiales y maestro ejecutando actividades de instalación de enchape en baño. Beneficiaria se encuentra conforme. |
| 4 | MVJA_0970 | DORIS CUESTA DE RODRIGUEZ | Se hace seguimiento, Se evidencia actividades de instalación de enchape de piso y meson de cocina. Beneficiaria se encuentra conforme. |
| BARRIO O TERRITORIO - CIUDAD BOLIVAR - ALTOS DE JALISCO | | | |
| 5 | MVJA_2741 | CARLOS ALBERTO MUÑETON FRANCO | Beneficiario no se encuentra hasta el mes de enero; se debe validar nuevamente una vez beneficiario termine adecuaciones por su cuenta. |
| 6 | MVJA_2729 | JOSE IGNACIO TAO IBARRA | Se hace seguimiento, Beneficiario se encuentra pagando arriendo en otra vivienda para poder realizar las mejoras por lo cual se le debe dar prioridad para entregar. Se evidencia materiales y maestro ejecutando actividad de alistado de piso. |
| 7 | MVJA_0544 | MERCEDES RIAÑO PARRA | Se hace seguimiento, se evidencia materiales y maestro ejecutando actividades de enchape en muro y meson de cocina. Beneficiaria se encuentra conforme. |
| 8 | MVJA_0567 | MARIA DEL ROSARIO RODRIGUEZ | Se hace seguimiento, se evidencia materiales se ejecuta actividades de enchape en cocina y pañete en muro. Bebeficiaria se encuentra conforme. |
| 9 | MVJA_3309 | TEOFILO MORALES TURGA | Se hace seguimiento; se evidencia materiales, maestro ejecutando actividades de instalacion de enchape en cocina y aplicación de vinilo en habitacion. Beneficiaria se encuentra conforme. |
| 10 | MVJA_3366 | EDILMA ALCIRA CASTILLO | Se hace seguimiento, Beneficiaria se encuentra pagando arriendo en otra vivienda para poder realizar las mejoras por lo cual se le debe dar prioridad para entregar. Se evidencia materiales pero no inicio de actividades. Beneficiaria inconforme. |
| 11 | MVJA_4350 | MARÍA BENDITA REDONDO CASTIBLANCO | Se hace seguimiento, se evidencia materiales y maestro ejecutando actividades de alistado de piso y pañete en muro. |
| 12 | MVJA_2660 | MANUEL EDUARDO RODRIGUEZ PRIETO | Se hace seguimiento, se evidencia maestro ejecutando actividades de pañete sobre muros. Beneficiario se encuentra inconforme con la demora en el inicio de actividades. |
| 13 | MVJA_4333 | BEATRIZ CABRALES ACERO | Se hace seguimiento, se evidencia materiales y maestro ejecutando actividades instalacion de enchape en piso. Beneficiario se encuentra conforme. |
| 14 | MVJA_0890 | HERNAN HUMBERTO PARRA | Se hace seguimiento, se evidencia materiales y maestro ejecutando actividades de alistado de piso y desmonte de ventana. |
| BARRIO O TERRITORIO - CIUDAD BOLIVAR - LA ESCALA 3ER SECTOR | | | |
| 15 | MVJA_0530 | LUIS ALIRIO LÓPEZ DÍAZ | Se hace seguimiento, Esposa de Beneficiario tiene bajo custodia 3 niños y recibe visitas del ICBF por lo cual se le debe dar prioridad para entregar, se evidencia materiales y maestro ejecutando actividades de alistado de piso y pañete en muro. Beneficiario se encuentra inconforme por la demora en la ejecucion de actividades. |
| BARRIO O TERRITORIO - CIUDAD BOLIVAR - GIBRALTAR I Y II | | | |
| 16 | MVJA_4375 | FERNANDO TORRES Y OTRA | Se hace seguimiento, se evidencia materiales y maestro ejecutando actividades de instalacion de sanitario y perfileria para cielo raso. Beneficiario se encuentra conforme. |

| 5. PLAN DE ACCIÓN RESULTADO DEL ANÁLISIS DE CAUSAS REGISTRADO EN EL NUMERAL ANTERIOR - CON EL OBJETIVO DE ELIMINAR LA CAUSA RAÍZ DE LA SITUACIÓN PROBLEMÁTICA - PLAN DE MEJORA | | |
|---|---|---|
| ACTIVIDAD | RESPONSABLE | FECHA |
| En conjunto con el contratista y esta interventoría se realizaran y supervisaran los respectivos presupuestos iniciales de obra, tambien se definiran posibles ajustes a las areas establecidas e indicadas inicialmente en cada uno de los expedientes de los beneficiaros del programa de mejoramiento de vivienda | ERICK ALVAREZ CADAVID | |
| | | |

| 6. ACTIVIDADES NO PREVISTAS Y MAYORES CANTIDADES |
|---|
| Se informa que en algunas de las viviendas se presentan mejoras en los acabados finales realizadas por los beneficiarios, por lo tanto se deside intervenir otros espacios en conjunto con el contratista garantizando una adecuada habitabilidad |
| |

**7. COMENTARIOS DEL INTERVENTOR: Por favor realice la descripción general del estado del contrato y según aplique informe sobre: actividades realizadas en la semana, control de lluvias, compra y suministro de materiales, mano de obra, subcontratos y tramites ante las diferentes empresas prestadoras de servicios, entre otros. Anexe las actas de seguimiento realizadas en la semana correspondiente al periodo del informe.**

**Barrio o Territorio: CIUDAD BOLIVAR**

En el presente periodo se hace seguimiento en 16 viviendas beneficiadas, se explica en cada vivienda los espacios a intervenir, se le informa a cada propietario sobre las intervenciones que se realizaran por consecuente se realiza apertura de Bitacoras en dode se redacta toda la informacion del MV a intervenir.


Se debe dar prioridad de entrega a los MV: 0530, 2729 y 3366.

En el MV 3309 se solicita una visita adicional para estudio de cubierta .Para dar solución de mejoramiento se decide intervenir áreas partes principales como lo son habitación, cocina y baño de esta manera se baja el cielo raso existente y se identifican posibles daños en cubierta y se procede a reparar la parte afectada, de esta manera garantizando que la mejora de vivienda realizada sea efectiva.


**8. REGISTRO FOTOGRAFICO DEL AVANCE DURANTE LA SEMANA**

**SE ADJUNTA REGISTRO FOTOGRAFICO**


# REGISTRO FOTOGRÁFICO

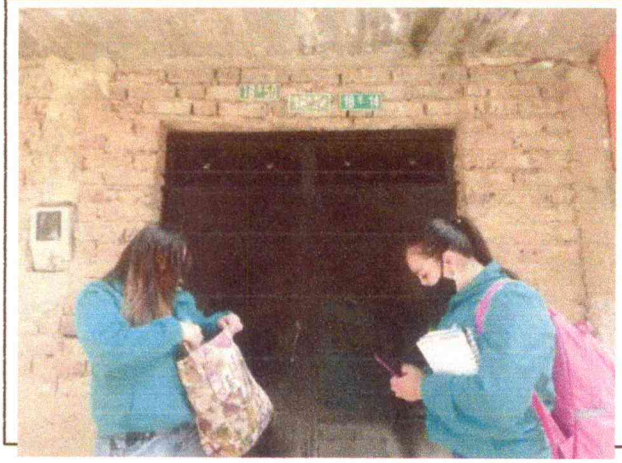


| FECHA | Sabado, 19 de Diciembre 2020 |
|---|---|
| **DESCRIPCION MVJA_0723** | |
| Seguimiento | |

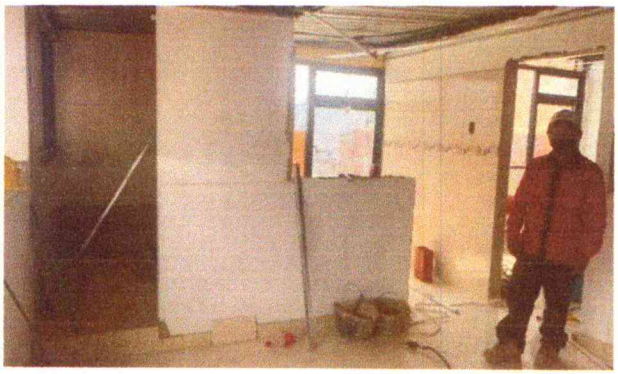

| FECHA | Jueves, 17 de Diciembre 2020 |
|---|---|
| **DESCRIPCION MVJA_0898** | |
| Seguimiento | |

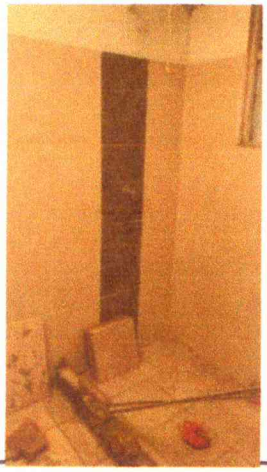

| FECHA | Jueves, 17 de Diciembre 2020 |
|---|---|
| **DESCRIPCION MVJA_0899** | |
| Seguimiento | |

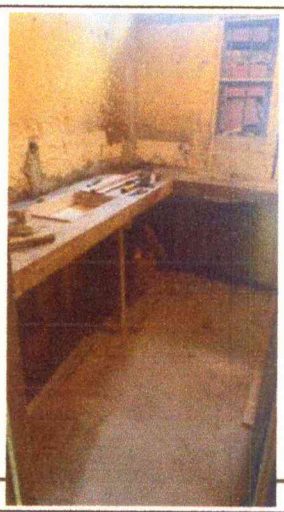

| FECHA | Sabado, 19 de Diciembre 2020 |
|---|---|
| **DESCRIPCION MVJA_0970** | |
| Seguimiento | |




| FECHA | Miercoles, 16 de Diciembre 2020 |
|---|---|
| **DESCRIPCION MVJA_2729** | |
| Seguimiento | |



| FECHA | Miercoles, 16 de Diciembre 2020 |
|---|---|
| **DESCRIPCION MVJA_0544** | |
| Seguimiento | |

# REGISTRO FOTOGRÁFICO

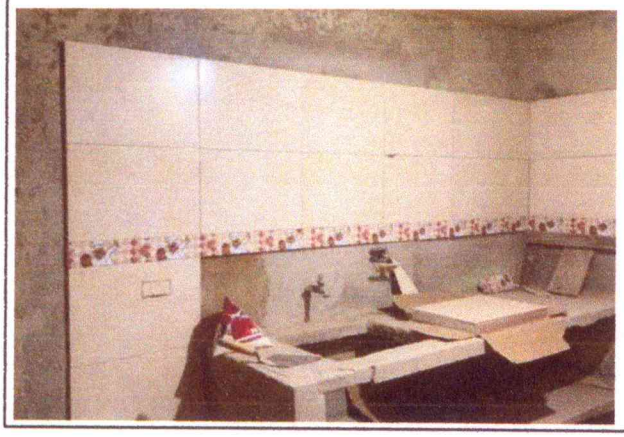


| FECHA | jueves, 17 de diciembre de 2020 |
|---|---|
| **DESCRIPCION MVJA_0567** | |
| Seguimiento | |



| FECHA | jueves, 17 de diciembre de 2020 |
|---|---|
| **DESCRIPCION MVJA_3309** | |
| Seguimiento | |



| FECHA | jueves, 17 de diciembre de 2020 |
|---|---|
| **DESCRIPCION MVJA_3366** | |
| Seguimiento | |

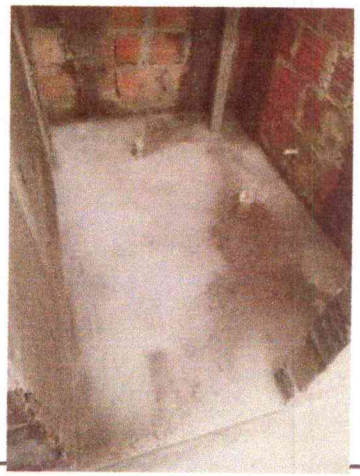

| FECHA | jueves, 10 de diciembre de 2020 |
|---|---|
| **DESCRIPCION MVJA_4350** | |
| Seguimiento | |



| FECHA | jueves, 17 de diciembre de 2020 |
|---|---|
| **DESCRIPCION MVJA_2660** | |
| Seguimiento | |



| FECHA | jueves, 17 de diciembre de 2020 |
|---|---|
| **DESCRIPCION MVJA_4333** | |
| Seguimiento | |

INPLAYCO S.A.S.
INGENIEROS CONSTRUCTORES E INTERVENTORES

ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE HÁBITAT

# INFORME SOCIAL SEMANAL 7

INFORME SEMANAL 7
SEMANA 7

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DEL HÁBITAT

# INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

## PROYECTOS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA
## GRUPO 1

INPLAYCO S.A.S.
INGENIEROS CONSTRUCTORES E INTERVENTORES

| FECHA | 19/12/2020 | PERIODO No. | 7 | DEL | 14/12/2020 | AL | 19/12/2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

### 1. INFORMACIÓN GENERAL

| | |
|---|---|
| OBJETO DEL CONTRATO | Realizar la interventorías técnica, jurídica, social, administrativa y financiera, para la ejecución de las obras de mejoramiento de vivienda en la modalidad de habitabilidad en los territorios priorizados por la secretaría distrital de hábitat. |
| LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO | Corresponde al Grupo 1 a la ejecución de 254 mejoramientos de vivienda, localizados en 3localidades: Bosa, Usme y Ciudad Bolívar, esta última localidad incluye cuatro (4) intervenciones de MejoramientoIntegral. |

| CONTRATO DE INTERVENTORÍA | | CONTRATO DE OBRA | |
|---|---|---|---|
| CONTRATO No.: | 701-2020 | CONTRATO No.: | 894--2020 |
| PLAZO INICIAL: | 6 meses | PLAZO INICIAL: | 5 meses |
| FECHA DE INICIACIÓN: | 4 de noviembre de 2020 | FECHA DE INICIACIÓN: | 4 de noviembre de 2020 |
| **FECHA DE SUSPENSIÓN: | 0 | **FECHA DE SUSPENSIÓN: | 0 |
| **FECHA DE REINICIACIÓN: | 0 | **FECHA DE REINICIACIÓN: | 0 |
| FECHA DE TERMINACIÓN: | 3 de mayo de 2021 | FECHA DE TERMINACIÓN: | 3 de abril 2021 |
| PLAZO ACTUALIZADO: | 0 | PLAZO ACTUALIZADO: | 0 |
| PLAZO TRANSCURRIDO: | 0 | PLAZO TRANSCURRIDO: | 0 |
| VALOR INICIAL : | $ 894.285.952,00 | VALOR INICIAL : | $ 3.724.135.319,00 |
| VALOR ADICIÓN(ES): | $ - | VALOR ADICIÓN(ES): | $ - |
| VALOR ACTUALIZADO: | $ - | VALOR ACTUALIZADO: | $ - |
| VALOR ANTICIPO: | $ - | VALOR ANTICIPO: | $ - |
| VALOR POR PAGAR: | $ - | VALOR POR PAGAR: | $ - |
| SUPERVISOR: | JUAN CARLOS ARBELÁEZ MURILLO | INTERVENTOR: | Gonzalo Liévano Hoyos -INPLAYCO S.A.S. |

** Inserte las filas que requiera según el número de suspensiones y reinicios.

### 2. CONTROL DE HITOS.

| No. | *** DESCRIPCIÓN DEL HITO | FECHA PROGRAMADA | FECHA REAL DE CUMPLIMIENTO | DÍAS DE RETRASO |
|---|---|---|---|---|
| | **SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO (HITO OBLIGATORIO)** | 04/11/2020 | 03/04/2021 | |
| 1 | Validación | | | |
| 2 | Entrega de informe de validación | | | |
| 3 | Ejecución | | | |
| | **ENTREGA A LA INTERVENTORÍA DE LOS PRODUCTOS Y/O ACTIVIDADES CONTRATADAS (HITO OBLIGATORIO)** | | | |

*** Inserte las filas que requiera según el número de hitos; teniendo en cuenta que como mínimo se deberán establecer 5 hitos adicionales a los obligatorios de inicio y terminación. Los hitos aprobados por la interventoría se socializarán con el supervisor del contrato para su Vo. Bo. Los Hitos aprobados por la interventoría y SDHT solo se podrán modificar previa novedad contractual que así lo requiera. La matriz de seguimiento hace parte del presente documento.

| No. | INDICADORES | VALORES | PORCENTAJE SOBRE EL VALOR TOTAL DEL CONTRATO | DIFERENCIA (+) ADELANTO (-) ATRASO |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Valor acumulado de las actividades o productos conforme a la programación vigente. | | | |
| 2 | Valor acumulado de las actividades o productos ejecutados y aprobados por la Interventoría. | | | |

### 3. ASPECTOS GENERALES INFORME SOCIAL

## COMPONENTE SOCIAL - AVANCE SOCIAL DE CADA UNIDAD DE VIVIENDA

**LOCALIDAD: CIUDAD BOLÍVAR**

**BARRIO O TERRITORIO: JUAN PABLO II**

15/12/2020 - **MVCB_3633: FRANCISCO JAVIER MENDIVELSO GUERRERO,** entrega de la vivienda, en la que se firman actas finales, se socializa el presupuesto final, manual de uso y conservación y entrega kit ecológico.

14/12/2020 - **MVCB_3030: TEODOSIA GALICIA,** visita de seguimiento en el que se encuentra conforme a la beneficiaria.

14/12/2020 - **MVCB_2960: MARÍA NURY QUINTERO CARDONA,** visita de seguimiento en la que se encuentra conforme a la beneficiaria.

15/12/2020 - **MVCB_2967: MARÍA OLGA FARFÁN GALEÓN,** entrega de la vivienda, en la que se firman actas finales, se socializa el presupuesto final, manual de uso y conservación y entrega kit ecológico.

| |
|---|
| 14/12/2020 - **MVCB_2999 : MARÍALEONOR FRAILE SUÁREZ,** visita de seguimiento en la cual se encuentra conforme a la beneficiaria. |
| 15/12/2020 - **MVCB_2991: BRISNELDA CONSTANZA MACIAS MARTÍNEZ,** entrega de la vivienda, en la que se firman actas finales. se socializa el presupuesto final, manual de uso y conservación y entrega kit ecológico. |
| 15/12/2020 - **MVCB_3020: PEDRO PABLO IBÁÑEZ,** entrega de la vivienda, en la que se firman actas finales, se socializa el presupuesto final, manual de uso y conservación y entrega kit ecológico. |
| 15/12/2020 - **MVCB_2917: MARÍA OLGA FARFÁN GALEÓN,** entrega de la vivienda, en la que se firman actas finales, se socializa el presupuesto final, manual de uso y conservación y entrega kit ecológico. |
| 15/12/2020 - **MVCB_2960: MARÍA NURY QUINTERO CARDONA,** entrega de la vivienda a conformidad de la beneficiaria, se socializa presupuesto final, manual de uso y mantenimiento y se entrega kit ecológico. |
| 15/12/2020 - **MVCB_3030: TEODOSIA GALICIA DE GARCIA Y OTRO,** entrega de vivienda a conformidad con la beneficiaria, se socializa presupuesto final de la obra, manual de uso y mantenimiento y se entrega kit ecológico. |
| 15/12/2020 - **MVCB_2434: MARGARITA MORALES,** entrega de la vivienda, en la que se firman actas finales, se socializa el presupuesto final, manual de uso y conservación y entrega kit ecológico. |
| 15/12/2020 - **MVCB_2991: BRISNELDA CONSTANZA MACIAS MARTINEZ,** entrega de vivienda a conformidad con la familia, recibe el autorizado JULIAN RICARDO URBIBA; se socializa presupuesto final de la obra, manual de uso y mantenimiento y se entrega kit ecológico. |
| 15/12/2020 - **MVCB_2999: MARÍA LEONOR FRAILE SUÁREZ,** entrega de vivienda a conformidad con la beneficiaria, se socializa presupuesto final de la obra, manual de uso y mantenimiento y se entrega kit ecológico. |
| 15/12/2020 - **MVCB_2925: MARTHA LUZ CAMPIÑO,** entrega de la vivienda, en la que se firman actas finales, se socializa el presupuesto final, manual de uso y conservación y entrega kit ecológico. |
| 15/12/2020 - **MVCB_4919: URIEL PATIÑO,** entrega de la vivienda, en la que se firman actas finales, se socializa el presupuesto final, manual de uso y conservación y entrega kit ecológico. |
| 15/12/2020 - **MVCB_2926: CORADO TORO DE TORRES,** entrega de la vivienda, en la que se firman actas finales, se socializa el presupuesto final, manual de uso y conservación y entrega kit ecológico. |
| 15/12/2020 -**MVCB_2932: MARÍA TERESA PIÑEROS PIÑEROS ,** entrega de la vivienda, en la que se firman actas finales, se socializa el presupuesto final, manual de uso y conservación y entrega kit ecológico. |
| 14/12/2020 - **MVCB_3646: LUIS ANTONIO CABRERA LOPEZ,** seguimiento de obra |
| 15/12/2020 - **MVCB_3646: LUIS ANTONIO CABRERA LÓPEZ,** entrega de la vivienda, en la que se firman actas finales, se socializa el presupuesto final, manual de uso y conservación y entrega kit ecológico. |
| 15/12/2020 - **MVCB_3635: JUAN CARLOS MOZO CASTRO,** entrega de la vivienda, en la que se firman actas finales, se socializa el presupuesto final, manual de uso y conservación y entrega kit ecológico. |
| 18/12/2020 - **MVCB_3635: JUAN CARLOS MOZO CASTRO,** entrega de vivienda |
| 15/12/2020- **MVCB_4923: SIERVO MATIAS FIGUEROA,** entrega de la vivienda, en la que se firman actas finales, se socializa el presupuesto final, manual de uso y conservación y entrega kit ecológico. |
| 15/12/2020 - **MVCB_2939: MARIEYE LOAISA,** entrega de la vivienda, en la que se firman actas finales, se socializa el presupuesto final, manual de uso y conservación y entrega kit ecológico. |
| 15/12/2020 - **MVCB_4917: ALVARO ALONSO MORENO,** entrega de la vivienda, en la que se firman actas finales, se socializa el presupuesto final, manual de uso y conservación y entrega kit ecológico. |
| 15/121/2020 -**MVCB_3634: AYDE PATIÑO,** entrega de la vivienda, en la que se firman actas finales, se socializa el presupuesto final, manual de uso y conservación y entrega kit ecológico. |
| 15/12/2020 - **MVCB_4918: ÁLVARO DÍAZ ÁVILA,** entrega de la vivienda, en la que se firman actas finales, se socializa el presupuesto final, manual de uso y conservación y entrega kit ecológico. |
| 16/12 /2020 - **MVCB_3641: CECILIA MENDEZ MORENO,** seguimiento de obra |
| 15/12 /2020 - **MVCB_3640: OCTAVIO TELLEZ PINEDA,** entrega de la vivienda, en la que se firman actas finales, se socializa el presupuesto final, manual de uso y conservación y entrega kit ecológico. |

| |
|---|
| 18/12 /2020 - **MVCB_3640: OCTAVIO TELLEZ PINEDA,** seguimiento de obra |
| 15/12/2020 - **MVCB_3642: JULIO CESAR FICHAS,** entrega de la vivienda, en la que se firman actas finales, se socializa el presupuesto final, manual de uso y conservación y entrega kit ecológico. |
| 15/121/2020 -**MVCB_3643: JOSÉ ARISTÓBULO MENJURA LEITION ,** entrega de la vivienda, en la que se firman actas finales, se socializa el presupuesto final, manual de uso y conservación y entrega kit ecológico. |
| 15/12/2020 - **MVCB_2917: CLAUDIA PATRICIA VARGAS GOMEZ,** entrega de la vivienda, en la que se firman actas finales, se socializa el presupuesto final, manual de uso y conservación y entrega kit ecológico. |
| **HISTORIAS DE VIDA** |
| 15/12/2020 - **MVCB_4918: ÁLVARO DÍAZ ÁVILA,** entrega de la vivienda, en la que se firman actas finales, se socializa el presupuesto final, manual de uso y conservación y entrega kit ecológico. |
| **BARRIO O TERRITORIO - LUCERO BAJO** |
| 17/12/2020 - **MVCB_2324- ARMANDO QUIROGA BARRIGA,** validación |
| 17/12/2020 - **MVCB_2617- QUINTANILLOCASTILLO DOMINGUEZ,** validación |
| 17/12/2020 - **MVCB_2628- MARÍA ALICIA POVEDA,** validación |
| 17/12/2020 - **MVCB_2418 - BETILDA URREGO ,** validación |
| 17/12/2020 - **MVCB_ 2414 - MARÍA HELENA RINCÓN RINCÓN ,** validación |
| **BARRIO O TERRITORIO: MIRADOR NUTIBARA** |
| 15/12/2020 - **MVCB_1866: LUIS ALBERTO ALONSO CASTIBLANCO,** entrega de la vivienda, en la que se firman actas finales, se socializa el presupuesto final, manual de uso y conservación y entrega kit ecológico. |
| 15/12/2020 - **MVCB_1818: MERQUECIDE MONTANEZ UYOA,** entrega de la vivienda, en la que se firman actas finales, se socializa el presupuesto final, manual de uso y conservación y entrega kit ecológico. |
| 18/12/2020 - **MVCB_1866: LUIS ALBERTO ALONSO CASTIBLANCO,** seguimiento. Atiende la autorizada MARÍA VILLAMIL. Se observa personal de obra . La señora MARÍA no refiere dudas e inquietudes |
| 19/12/2020 - **MVCB_1574: JOSÉ HIPOLITO GUTIERREZ LUCERO,** validación. Atiende la visita su hija autorizada ARIANE GUTIERREZ, MORA. |
| 19/12/2020 - **MVCB_1588: LUZ NELLY RODRIGUEZ,** validación. |
| 19/12/2020 - **MVCB_1608: ROSALBINA HERNANDEZ PIRACHICAN,** validación. |
| 19/12/2020 - **MVCB_1585: ELIECER RONCANCIO MARTINEZ,** validación **NO EFECTIVA.** El número de teléfono esta errado. No atienden a la puerta, se deja notificación con el número de la social. |
| **BARRIO O TERRITORIO: ALTOS DE JALISCO** |
| 17/12/2020 - **MVJA_2660: MANUEL RODRÍGUEZ,** visita en la cual se genera inquietud por parte del beneficiario quien refiere que no han traído materiales completos para la ejecución de obra. |
| 17/12/2020 - **MVJA_0539: LUIS ALIRIO LÓPEZ,** visita de seguimiento en la cual se encuentra al beneficiario con inquietud por la falta de personal de obra, hay materiales para la intervención pero no se ha avanzado. |
| 17/12/2020 - **MVJA_2729: JOSÉ IGNACIO TAO IBARRA,** visita de seguimiento en la cual se encuentra bastante inquieto al beneficiario ya que hay personal de obra pero no material para trabajar y continúan pagando arriendo por su salud y comodidad. |
| 14/12/2020 - **MVJA_3314: MARÍA OLMA MOLANO.** Seguimiento de obra donde se la beneficiaria manifiesta estar angustiada ya que no ve mayor avance en los mejoramientos. |
| 14/12/2020 - **MVJA_3335: MYRIAM PATRICIA SARMIENTO APONTE.** Seguimiento de obra, donde se evidencia que no han iniciado actividades en la vivienda, la beneficiaria se muestra molesta. |

| |
|---|
| 14/12/2020 - **MVJA_3146: CLARA INES GIL BAÉZ**. Seguimiento de obra donde los beneficiarios manifiestan que los maestron no van a trabajar de corrido, son intermitentes y por eso no se ve el avance de obra. |
| 14/12/2020 - **MVJA_3141: GLORIA CRISTINA GUTIERREZ GARZON.** Seguimiento de obra donde no se presenta novedad. |
| 14/12/2020 - **MVJA_2830: MVJA_MARÍA LUISA CONTRERAS SANABRIA.** Se realiza visita a la vivienda con el fin de dialogar con los beneficiario, a lo cual se encuenra el esposo de señora y el muy groseramente dice que si no le van a dar los materiales, no quiere nada. |
| 14/12/2020 - **MVJA_2909: BLANCA CECILIA ALFONSO BOHORQUEZ**. Seguimiento de obra donde se evidencia que no han iniciado actividades en la vivienda, tambien se acuerda con la beneficiaria que el dia siguiente se le aclarará el presupuesto ajustado y cerrado. |
| 14/12/2020 - **MVJA_3119: LUZ YANID PADUA.** Seguimiento de obra donde se evidencia que no se ha iniciado actividades de mejoramiento en la vivienda. |
| 14/12/2020 -**MVJA_0259: ALBA ROSA HURTADO CAICEDO.** Seguimiento de obra donde se evidencia que no han iniciado actividades en la vivienda. |
| 15/12/2020 - **MVJA_2909: BLANCA CECILIA ALFONSO BOHORQUEZ.** Se visita la vivienda con el fin de aclarar el presupuesto ajustado y aprobado por la interventoria tecnica; a esto se levanta acta de seguimiento donde la beneficiaria acepta el presupuesto establecido. |
| 16/12/2020 - **MVJA_0252: JESÚS ANTONIO ORTIZ CASTRO.** A pertura de la vivienda, queda pendiente las actas de inicio social y tecnica. |
| 17/12/2020 - **MVJA_2996: MARÍA DEL SOCORRO CUPITRA CACAIS.** Apertura |
| 18/12/2020 - **MVJA_2992: ISAURA AREVALO MALAGÓN.** Seguimiento de obra donde la beneficiaria manifiesta estar inconforme ya que no le alcanza el presupuesto para una canal; así mismo se le resuelven inquietudes frente a otras actividades. |
| 18/12/2020 - **MVJA_0252: JESUS ANTONIO ORTIZ CASTRO.** Seguimiento de obra donde no se presenta novedad y el beneficiario se muestra agusto. |
| 18/12/2020 - **MVJA_2996: MARÍA DEL SOCORRO CUPITRA CACAIS**. Seguimiento de obra donde la beneficiaria no muestra novedad y esta a gusto con las obras realizadas hasta el momento. |
| 18/12/2020 - **MVJA_3335: MYRIAM PATRICIA SARMIENTO APONTE**. Seguimiento de obra donde se resuelven dudas frente a las actividades del mejoramiento. |
| 18/12/2020 - **MVJA_3146: CLARA INES GIL BAEZ**. Seguimiento de obra donde la beneficiaria manifiesta que los maestron no van a trabajar, son intermitentes; asi mismo se evidencia que en el momento no estan. |
| 18/12/2020 - **MVJA_3141: GLORIA CRISTINA GUTIERREZ GARZON**. Seguimiento de obra donde no se presenta novedad alguna. |
| 18/12/2020 - **MVJA_3314: MARÍA OLMA MOLANO ROMERO.** Seguimiento de obra donde se resuelven dudas frente a las actividades de mejoramiento. |
| 18/12/2020 - **MVJA_0259: ALBA ROSA HURTADO CAICEDO.** Seguimiento de obra donde se evidencia que no han iniciado actividades en la vivienda; la beneficiaria ya desocupo las areas. |
| 18/12/2020 - **MVJA_3125: MARÍA AURORA RENGIFO.** Seguimiento de obra, donde se evidencia que la vivienda ya tiene avance, pero no se encuentra la bitacora, se llama a la beneficiaria y se le indica que la bitacora siempre debe permanecer en la vivienda. |
| 18/12/2020 - **MVJA_3119: LUZ YANID PADUA**. Seguimiento de obra, donde se evidencia que no han iniciado actividades de mejoras en la vivienda; no se puede dialogar con la beneficiaria. |
| 18/12/2020 - **MVJA_3231: SOFIA MORENO.** Seguimiento de obra donde se evidencia que no hay personal trabajando, la beneficiaria manifiesta no tener inconformidad y estar a gusto con las obras hasta el momento. |
| 18/12/2020 - **MVJA_3223: MYRIAM AMPARO GOMEZ GALVIS.** Seguimiento de obra donde se evidencia que no hay personal de obra trabajando. |
| **HISTORIA DE VIDA** |
| 18/12/2020 - **MVJA_3314 MARÍA OLMA MOLANO.** Se evidencia preocupación por parte de la beneficiaria ya que las obran van muy lento y no se ve mayor avance, manifiesta que las personas que tiene a su cargo (adultos mayores) se encuentran delicados de salud ya que los tiene viviendo en el primer piso de la vivienda y este es bastante humedo. |
| 17/12/2020 - **MVJA_0544: MERCEDES RIAÑO PARRA,** Visita de seguimiento historia de vida, en la que se encuentra conforme a la beneficiaria pero refiere inquietud de la intermitencia del material. |

| BARRIO O TERRITORIO NUEVA COLOMBIA |
| --- |
| 14/12/2020 - **MVCB_1421: MARÍA ESTER ZORRO GUERRERO,** entrega de vivienda a conformidad con la beneficiaria, se socializa presupuesto final de la obra, manual de uso y mantenimiento y se entrega kit ecológico. |
| 15/12/2020 - **MVCB_1440: ALBA CARMEN ARDILA MATEUS,** entrega de la vivienda, en la que se firman actas finales, se socializa el presupuesto final, manual de uso y conservación y entrega kit ecológico. |
| 16/12/2020 - **MVCB_1437: FLOR ELISA PARRA ROJAS,** visita de seguimiento en la que se encuentra en la vivienda solo personal de obra. Se deja anotación en bitácora. |
| 16/12/2020 - **MVCB_1091: LIGIA TEJADA DE BARRERO,** visita de seguimiento en la que se encuentra a la hija de la beneficiaria, quien es la encargada mediante carta. Manifiesta conformidad con la ejecución de obra. |
| 15/12/2020 - **MVCB_1124: MARÍA ANTONIA SANTOS DE RAMÍREZ,** entrega de la vivienda, en la que se firman actas finales, se socializa el presupuesto final, manual de uso y conservación y entrega kit ecológico. |
| 15/12/2020 - **MVCB_1120: QUERUBÍN CHAGUALA,** entrega de la vivienda, en la que se firman actas finales, se socializa el presupuesto final, manual de uso y conservación y entrega kit ecológico. |
| 15/12/2020 - **MVCB_2432: AGUSTÍN VILLANUEVA,** entrega de la vivienda, en la que se firman actas finales, se socializa el presupuesto final, manual de uso y conservación y entrega kit ecológico. |
| 14/12/2020 - **MVCB_1194: VÍCTOR WILCHES,** seguimiento. El beneficiario no se encuentra en la vivienda. Sin embargo el inquilino manifiesta que trajeron material y llegarán al medio día. Se observa avance de la obra. Se trata de hacer contacto telefónico con el señor Victor pero no es posible. |
| 14/12/2020 - **MVCB_1212: HERNAN LOPEZ** seguimiento. La familia manifiesta conformidad ya que el dia de ayer empezaron obras y se evidencia levantamiento de cubierta. El señor Hernan se encuentra colaborando y recibiendo las tejas que están desmontando. Se le indica que no puede hacer dicha acción. Se le sugiere al contratista traer el personal necesario para las actividades ya que el beneficiario al buscar prontitud en los trabajos constructivos colabora en las actividades. Vivienda aperturada el 2 de diciembre |
| 14/12/2020 - **MVCB_1161: MARÍA ROSA ELENA BECERRA SEGURA,** seguimiento. La beneficiaria refiere conformidad con los avances de obra. Se observa personal de obra. |
| 14/12/2020 - **MVCB_1181: ALBERTO ULLOA ULLOA,** seguimiento. La familia manifiesta que han avanzado la obra. No se observa personal de obra. Manifiesta la autorizada que los maestros le indicaron que pasaran más tarde. |
| 14/12/2020 - **MVCB_1130: CARMEN JULIA SUÁREZ,** seguimiento. La familia manifiesta conformidad con los avances de obra. Hay presencia de personal de obra en el predio. Se le sugiere a la parte técnica resolver inquietudes de la señora Carmen. Se le recuerda a la beneficiaria no preguntar nada sobre la obra a los maestros. |
| 14/12/2020 - **MVCB_1516: BERTHA MOJICA RUÍZ,** seguimiento. Se observa personal de obra. La familia manifiesta conformidad con el avance constructivo y relaciones adecuadas con los maestros. |
| 14/12/2020 - **MVCB_1416: ANA TORRES ROJAS,** seguimiento. Se observa personal de obra. La familia manifiesta conformidad con el avance constructivo y relaciones adecuadas con los maestros. Sin embargo refiere inquietudes ya que no ha llegado la canal |
| 14/12/2020 - **MVCB_1417: DIANA PARRA BALLESTEROS,** seguimiento. Atiente la autorizada ALICIA BALLESTEROS. La señora Alicia manifiesta que Diana se encuentra muy conforme con los avances de obra. |
| 14/12/2020 - **MVCB_1441: LUZMILA TORRES BERMÚDEZ,** seguimiento. La familia manifiesta conformidad con el avance constructivo. La vivienda se iba a entregar pero aun faltaban pendientes técnicos |
| 15/12/2020 - **MVCB_1441: LUZMILA TORRES BERMÚDEZ,** Entrega de vivienda a conformidad con la beneficiaria. se socializa presupuesto final de la obra, manual d euso y mantenimiento y se entrega kit ecológico. |
| 15/12/2020 - **MVCB_1470: ANA SILVIA CHACON,** seguimiento. La beneficiaria manifiesta que desde el viernes 11 no se ha acercado el personal de obra |
| 15/12/2020 - **MVCB_1467: TERESA DE JESUS OLIVOS DE BLANCO,** seguimiento. La familia manifiesta conformidad con el avance de obra. Se refuerza uso de tapabocas al personal de obra. |
| 15/12/2020 - **MVCB_1493: MARÍA GARZON CASALLAS,** seguimiento. Se observa personal de obra. Refieren inquietudes técnicas se le sugiere al contratista que las resuelva. |
| 16/12/2020 - **MVCB_1416: ANA TORRES ROJAS,** seguimiento. Se observa personal de obra. La familia manifiesta conformidad con el avance constructivo y relaciones adecuadas con los maestros. Se evidencia alegria por la llegada de la canal esperada. |
| 16/12/2020 - **MVCB_1409: FRAN CRUZ CANO Y OTRA,** seguimiento. Atiente la autorizada YENY BERNAL. La familia manifiesta inquietud ya que los trabajadores no se presentan desde el dia lunes 14 de diciembre. Se le solicita al contratista retomar labores. Se le recuerda a la señora Yeny que existe un número telefónico de atención a la comunidad en caso de ausencia de personal. Se le sugiere si el día de mañana no retoman labores llame al PAC |
| 16/12/2020 - **MVCB_1407: MARÍA ELSA TORRES,** seguimiento. La familia manifiesta conformidad con el avance de la obra . Se observa personal en el predio. |
| 16/12/2020 - **MVCB_1417: DIANA PARRA BALLESTEROS,** seguimiento. Atiente la autorizada ALICIA BALLESTEROS. La señora Alicia refiere conformida con los avances de la obra. En el predio se encuentran más familiares los cuales indican que el cambio que ha tenido la casa es evidente. |
| 16/12/2020 - **MVCB_1495: YACQUELINE RADA MOJICA,** seguimiento. Atiende la autorizada Heidi Bocanegra. La familia manifiesta conformidad con el avance de obra. No se observa personal de obra. Se le sugiere al contratista retomar labores ya que los pendientes técr |

| |
|---|
| 16/12/2020 - **MVCB_1194: VICTOR WILCHES,** seguimiento. El beneficiario refiere conformidad con el avance de obra. Se observa personal de obra en el predio |
| 16/12/2020 - **MVCB_1212: HERNAN LOPEZ** seguimiento. La familia manifiesta conformidad con el avance de la obra. Se observa personal de obra |
| 16/12/2020 - **MVCB_1161: MARÍA ROSA ELENA BECERRA SEGURA,** seguimiento. La beneficiaria refiere conformidad con los avances de obra. Se observa personal de obra. |
| 16/12/2020 - **MVCB_1180: BLANCA CALVO DE GARZON,** seguimiento. La beneficiaria refiere conformidad con los avances de obra. Se observa personal de obra. |
| 17/12/2020 - **MVCB_1469: JORGE SANCHEZ FORERO,** seguimiento. Se observa personal de obra. No se observa personal de obra. La familia manifiesta inquietudes por el monto del presupuesto, área técnica las resuelve. |
| 18/12/2020 - **MVCB_1469: JORGE SANCHEZ FORERO,** seguimiento. Se observa personal de obra. La familia refiere conformidad con el avance de la obra ya que pronto finalizarán el mejoramientos de vivienda. |
| 18/12/2020 - **MVCB_1467: TERESA DE JESUS OLIVOS DE BLANCO,** seguimiento. La familia manifiesta conformidad con el avance de obra. La señora Teresa manifiesta que los maestros se encuentran en hora de almuerzo. |
| 19/12/2020 - **MVCB_1470: ANA SILVIA CHACON,** seguimiento. La beneficiaria manifiesta que desde hace tres dias no hay personal. Se le solicita al contratista retomar labores constructivas. |
| **DESARROLLO: ROCÍO ALTOS DEL SUR** |
| 14/12/2020 - **MVJA_2812: ANDREA JENNIFFER ACOSTA MEDIVELSO**. Seguimiento de obra donde se evidencia que no hay personal trabajando, se dialoga con la beneficia y se resuelven dudas frente a las actividades de obra. |
| 14/12/2020 - **MVJA_0186: ISABEL ARDILA VARGAS.** Seguimiento de obra donde se aclara los canales de comunicación dentro de la ejecuicion de los mejoramientos. |
| 14/12/20202 - **MVJA_2981: LEONOR TOVAR BARRERO.** Seguimiento de obra donde se evidencia que las obras estan suspendidas ya que el beneficiario se encuentra haciendo la placa de una habitación. |
| 18/12/2020 - **MVJA_2981: LEONOR TOVAR BARRERO**. Seguimiento de obra donde se presentan molestas por el polvo a personas ajenas al mismo, se cita a la beneficiaria y al apoderado para el dia martes 22 de diciembre, con el fin de aclarar las inconformidades. |
| 18/12/2020 - **MVJA_2812: ANDREA JENNIFFER ACOSTA MEDIVELSO.** Seguimiento de obra donde la beneficiaria manifiesta estar contenta con los maestros aunque dice que el material no les llega a tiempo ni completo para trabajar de corrido. |
| 18/12/2020 - **MVJA_0186: ISABEL ARDILA VARGAS.** Seguimiento de obra donde se evidencia que no hay personal en la vivienda y la apoderada dice que desentecharon hace dos dias. |
| 18/12/2020 - **MVJA_2909: BLANCA CECILIA ALFONSO BOHORQUEZ**. Seguimiento de obra donde se evidencia que no han iniciado actividades en la vivienda y la beneficiaria se muestra molesta ante la situacion ya que van mas de 15 dias sin empezar la obra. |
| **BARRIO O TERRITORIO: LA ESCALA** |
| 18/12/2020 **MVJA_2672 CARLOS OLIMPO SEGURA GUERRERO**. Seguimiento de obra donde el beneficiario manifiesta estar conforme con las obras. |
| **BARRIO O TERRITORIO: LA ESCALA III SECTOR** |
| 17/12/2020 - **MVJA_0519 NESTOR JAVIER VALENZUELA PEÑA.** Validación donde nos atiende la esposa del beneficiario, la señora Deyanira Tovar |
| 19/12/2020 - **MVJA_0502 ROSALBA JARA DE ROJAS**. Validación |
| **BARRIO O TERRITORIO: GIBRALTAR I Y II** |
| 16/12/2020 - **MVJA_3011: RITA DEL CARMEN FONSECA CAMARGO**. Validación |
| 16/12/2020 - **MVJA_3157: IRIA ESTER SILVIA**. Validación |
| 16/12/2020 - **MVJA_3397: LUZ MARINA ROBAYO**. Validación |
| 19/12/2020 - **MVJA_0834: CLARA INES OCHOA**. Validación |
| **BARRIO O TERRITORIO:CIUDAD MILAGRO** |
| 17/12/2020 - **MVJA_0395: JOSE ORVEY ORTÍZ**. Validación |

| |
|---|
| **BARRIO O TERRITORIO: ACACIAS SUR** |
| 19/12/2020 - **MVJA_0598 RODULFO BEJARANO.** Validación |
| **BARRIO O TERRITORIO: DOMINGO LAIN I** |
| 17/12/2020 - **MVJA_0970: DORIS CUESTA RAMÍREZ,** visita de seguimiento en la cual se encuentra conforme a la beneficiaria. |
| 17/12/2020- **MVJA_0898: EFIGENIA GUIZA,** visita de seguimiento en la cual se encuentra conforme a la beneficiaria |
| **HISTORIA DE VIDA** |
| 17/12/2020 - **MVCB_0899: DORIS HERRERA**, visita de seguimiento en la cual se encuentra conforme a la beneficiaria, manifiesta inquietud de instalación de cielo raso y si pierde luminosidad el pasillo. |
| **BARRIO O TERRITORIO: VILLAS EL DIAMANTE** |
| 18/12/2020 - **MVCB_5464: IRMA ROJAS ROJAS,** validación atendida por el esposo de la beneficiaria Fortunato Rojas, quien está autorizado mediante carta. |
| 18/12/2020 - **MVCB_5118: CARLOS ALFREDO CLAVIJO,** validación. |
| 19 /12/2020 - **MVCB_5129 :FRANCISCO JAVIER ARANGO GUTIERREZ,** validación |
| 19 /12/2020 - **MVCB_5156 : VICTOR MANUEL TELLEZ ,** validación |
| 19/12/2020 - **MVCB_5128 : DIEGO MARIO VANEGAS ,** validación |
| **4. CASOS ESPECIALES COMPONENTE SOCIAL - CONFLICTOS Y ANÓMALIAS** |
| |
| **5. PLAN DE ACCIÓN RESULTADO DEL ANÁLISIS DE CAUSAS REGISTRADO EN EL NUMERAL ANTERIOR - CON EL OBJETIVO DE ELIMINAR LA CAUSA RAÍZ DE LA SITUACIÓN PROBLEMÁTICA - PLAN DE MEJORA** |

| ACTIVIDAD | RESPONSABLE | FECHA PROGRAMADA |
|---|---|---|
| | | |

| |
|---|
| **6. Actas de reunión con la comunidad y listados de asistencia o soporte de las diferentes acciones según corresponda (cuando aplique).** |
| **7. COMENTARIOS DEL INTERVENTOR: Por favor realice la descripción general del estado del contrato y según aplique informe sobre: actividades realizadas en la semana, control de lluvias, compra y suministro de materiales, mano de obra, subcontratos y tramites ante las diferentes empresas prestadoras de servicios, entre otros. Anexe las actas de seguimiento realizadas en la semana correspondiente al periodo del informe.** |
| |
| * Durante este semana no se presentaron lluvias<br>*Se continúan evidenciando ausencias de material y personal de obra en el sector de Jalisco |
| **8. REGISTRO FOTOGRÁFICO DEL AVANCE DURANTE LA SEMANA** |
| |

INPLAYCO S.A.S.
INGENIEROS CONSTRUCTORES E INTERVENTORES

# REGISTRO FOTOGRÁFICO

## GRUPO 1



15/12 /2020 - MVCB_3635: JUAN CARLOS MOZO CASTRO, entrega de vivienda



15/12/2020- MVCB_4923: SIERVO MATIAS FIGUEROA, entrega de vivienda




15/12/2020 -MVCB_3634: AYDE PATIÑO, entrega de vivienda



15/12/2020 - MVCB_4918: ÁLVARO DÍAZ ÁVILA, entrega de vivienda



17/12/2020 - MVCB_2324- ARMANDO QUIROGA BARRIGA, validación

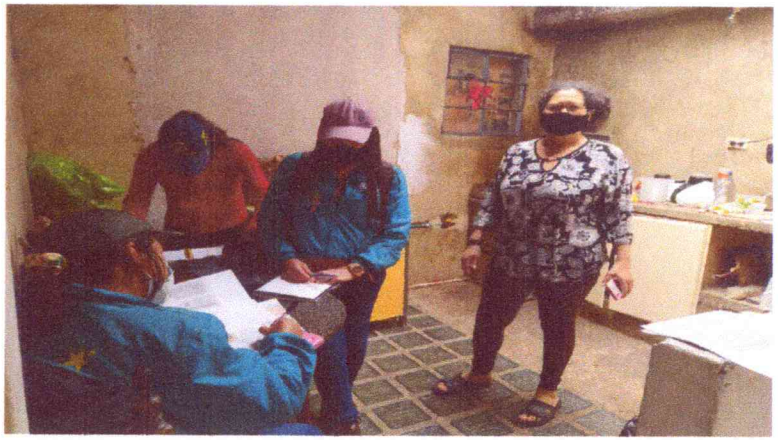

17/12/2020 - MVCB_2617- QUINTANILLOCASTILLO DOMINGUEZ, validación



14/12/2020 MVJA_2830: MARÍA LUISA CONTRERAS SANABRIA. VISITA CASO ESPECIAL



16/12/2020 MVJA_3397 LUZ MARINA ROBAYO. VALIDACIÓN



14/12/2020 - MVCB_1421: MARIA ESTER ZORRO Guerrero, entrega de vivienda a conformidad con la beneficiaria, se socializa presupuesto final de la obra, manual de uso y mantenimiento y se entrega kit ecológico.



15/12/2020 - MVCB_2960: MARIA NURY QUINTERO CARDONA, entrega de la vivienda a conformidad de la beneficiaria, se socializa presupuesto final, manual de uso y mantenimiento y se entrega kit ecológico.



15/12/2020 - MVCB_1441: LUZMILA TORRES BERMUDEZ, Entrega de vivienda



15/12/2020 - MVCB_3030: TEODOSIA GALICIA DE GARCIA Y OTRO, entrega de vivienda




15/12/2020 - MVCB_2991: BRISNELDA CONSTANZA MACIAS MARTINEZ, entrega de vivienda a conformidad



18/12/2020 - MVCB_5464: IRMA ROJAS ROJAS, validación atendida por el esposo de la beneficiaria Fortunato Rojas, quien está autorizado mediante carta.



15/12/2020 - MVCB_2999: MARÍA LEONOR FRAILE SUAREZ, entrega de vivienda a conformidad

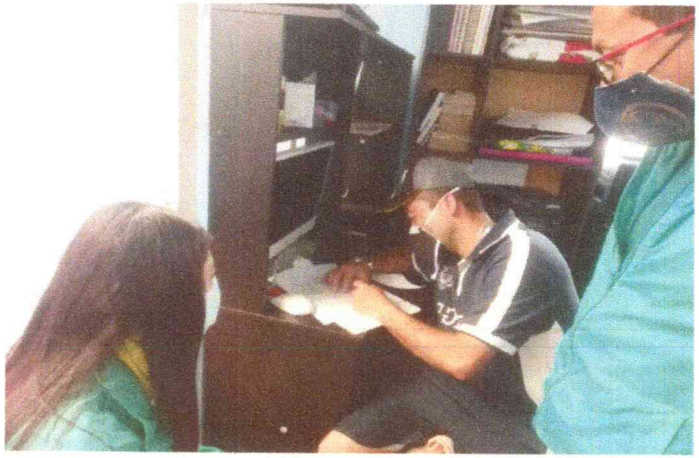

18/12/2020 - MVCB_5118: CARLOS ALFREDO CLAVIJO, validación.

INPLAYCO S.A.S.
INGENIEROS CONSTRUCTORES E INTERVENTORES

ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE HÁBITAT

# INFORME SISO SEMANAL 7

| INPLAYCO S.A.S. | INFORME HSE | ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARIA DEL HÁBITAT |
|---|---|---|

**INFORME INTERVENTORÍA SISO**

| FECHA DEL INFORME | | OBJETO DEL CONTRATO | INFORME |
|---|---|---|---|
| DESDE | 14/12/2020 | " Ejecución de las obras de mejoramiento de vivienda en la modalidad de habitabilidad en los territorios priorizados por la Secretaría Distrital del Hábitat." | 7 |
| HASTA | 20/12/2020 | | |

**1. Descripción de las Actividades Realizadas durante la semana**

**Contratista :** Acompañamiento a las actividades de Seguimiento a las mejoras en las vivienda por parte del equipo técnico, divulgación del protocolo de seguridad y bioseguridad para ingreso a las viviendas; Se hace seguimiento a las actividades que vienen desarrollando en las viviendas asignadas a los diferentes grupos de trabajo en compañía de interventoría. Se verificó uso correcto de herramientas, autocuidado, trabajo seguro durante las visitas.

Charla de Autocuidado Ante la prevención del COVID-19 dirigida al personal operativo, debido al incremento de casos a nivel nacional.

En la vivienda MV: 2917 cuya beneficiaria es Claudia Patricia Vargas, se recibe notificación de resultado positivo para COVID 19, por lo tanto se suspendieron actividades en la vivienda. En seguimiento a este caso, se realiza visita dada la situación presentada con la beneficiaria de retorno inesperado en su vivienda después de la hospitalización a causa del covid-19, es de aclarar que desde el área SST ya estaba programada la desinfección de la vivienda con una empresa certificada, y es cancelada debido a que la hija informa que a la beneficiaria le dan de alta en la clínica y será llevada a su vivienda, se les informa a las personas que habitan la vivienda que por protocolos de Bioseguridad no se realizaran actividades en la vivienda mientras la Sra. Claudia Patricia Vargas y demás familiares se encuentra en habitando en ella. Se diligencia acta especificando que las actividades se reanudaran el próximo año.

**Interventoría:** Continuando con el acompañamiento y verificación del cumplimiento del protocolo de Bioseguridad entregado por parte del contratista, proceso que se cumple durante los recorridos realizados. Se realizan actividades administrativas referente a informe semanal y revisión de documentos del personal contratado.

Recorrido por diferentes sectores en compañía de profesional SISO del contratista, tomando temperatura, reforzando tema de autocuidado y prevención, tomando de referencia el incremento de los casos COVID 19 a nivel nacional, se propone realizar charla a cada casa visitada sobre el tema; además se revisan los contenido del kit de bioseguridad, encontrando que algunos recipientes deben ser recargados, se dan indicaciones a los maestros para realizar la recarga del kit con el encargado de bodega.

**CAPACITACION**

| | | |
|---|---|---|
| Jornadas de Inducción y divulgación del Protocolo de Bioseguridad, Capacitación autocuidado ante la prevención del covid-19, por aumento de casos a Nivel Nacional | si | 100% |
| | Durante las visitas de seguimiento se refuerza el tema y se verifica su aplicación | |

**2. Gestión Ambiental**

Se hace disposición de escombros en Cemex sitio autorizado por la autoridad ambiental.

El contratista Acuarela en Jalisco ha realizado la recolección de los escombros generados en las obras realizadas en la vivienda y cuenta con acopio provisional de escombros en su bodega, para luego realizar la respectiva disposición final.

## 2.1. Generación y Disposición de Residuos Sólidos

| Tipo de Residuo | Cantidad m3 | Acumulado | Sitio de Disposición | Observaciones |
|---|---|---|---|---|
| Escombro | 8 | 32 | Cemex | Se recibe copias del vale de disposición |

## 3. Gestión en Salud Ocupacional (Seguridad e Higiene Industrial)

Se revisa el pago de la seguridad social de uno de los subcontratistas cotejando contra listado de personal activo.

Se sigue verificando la aplicación del protocolo de Bioseguridad, se dan recomendaciones a los trabajadores como parte de las medidas de prevención de accidentes, se verifican los contenidos de los kit entregados en las viviendas intervenidas.

Se nota mayor cubrimiento en la entrega de EPP en las cuadrillas.

### 3.1. Índices

| Valor | Horas Hombre Trabajadas Contratista | Horas Hombre Capacitación | Horas Hombre Trabajadas Interventoría | Días Ausentismo por Enfermedad General | Ausentismo por Accidentes de Trabajo |
|---|---|---|---|---|---|
| **Total Semanales** | **5376** | 37 | **528** | **0** | **0** |
| **Total Acumulado** | **16656** | 140 | **2640** | **10** | **0** |

### 3.1.1.Incidendentalidad

| | Fatalidades | Casos Con Daños A propiedad | Incidente Ambiental | Incidente Vehicular | Casi Accidentes | Casos Con días Perdidos | Casos con Trabajo restringido | Casos Con Días de Incapacidad (tratamiento medico) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Total** | **0** | **0** | **0** | **0** | **1** | **0** | **0** | **0** |

### 3.2. Capacitaciones y Charlas

| | |
|---|---|
| **16/12/2020** | Se realizó charla en los diferentes puestos de trabajo sobre Autocuidado Ante la Prevención del COVID-19, debido al incremento de casos a nivel nacional<br><br>Se reafirma el protocolo de Bioseguridad en las viviendas aperturadas |

### 3.3. Condiciones y Acciones Subsanar

#### 3.3.1 Condición Substandar

| No | Descripción | Acción Tomada | La Condición Continua? |
|---|---|---|---|
| 1 | Personal con dotación incompleta | Se informa a SST del contratista para tomar las acciones correspondientes | **si** |
| 2 | Escombro acumulado en viviendas | Se recoge en lonas de fibra | Ha sido corregida paulatinamente, se solicita aumentar la periodicidad de recolección |
| 3 | Entrega y uso de EPP, personal realizando corte de baldosa sin protección ocular | Se solicita el uso o reposición de los EPP faltantes | No, Se reponen los EPP para continuar con la actividad |

## 4. Registro Fotográfico

### Toma de temperatura a beneficiarios



MV 3632



MV 2926



MV 3634

### Toma de temperatura a Personal y charla de Seguridad



MV 2925



MV 3643



MV 3646



Recogido



MV 2992



Recogido



MV 3146

INPLAYCO S.A.S.
INGENIEROS CONSTRUCTORES E INTERVENTORES

# INFORME SISO
# INPLAYCO SAS
## Fecha: 14 al 20 de Diciembre de 2020

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DEL HÁBITAT

## META DE CUMPLIMIENTO AL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO, MEDIO AMBIENTE Y CALIDAD: 100%

| ACTIVIDADES | | | | | | GESTIÓN AMBIENTAL | | | No. HORAS HOMBRE CAPACITACIONES | | | | | Reportes de incidentes en el componente social y técnico. | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PROYECTO / DEPARTAMENTO | CONTRATO | CONTRATISTA | OBJETO CONTRATO | NUMERO DE TRABAJADORES | HORAS HOMBRE TRABAJADAS | ESCOMBROS (Cantidad m3) | RESIDUOS PELIGROSOS (Kgs) | CONSUMO DE AGUA (m3), para las ictividades de mejoramiento de Vivienda | PROFESIONALES | TECNICOS | OPERATIVOS (Subcontratistas, maestros y auxiliares) | PROVEEDOR | TOTAL | LUGAR O ÁREA DE TRABAJO | FECHA DEL ACCIDENTE | No. DÍAS INCAPACIDAD | No. ACCIDENTE REGISTRABLE | FECHA DE INVESTIGACIÓN | DESCRIPCION DEL ACCIDENTE | RELACION DE EQUIPO DE INVESTIGACIÓN | LECCIÓN APRENDIDA | PLAN DE ACCIÓN Y FECHA |
| | CONTRATO 694 - 2020<br>CONTRATISTA: CONSORCIO MEJORAMIENTO EP 2020 | | Contratar la ejecución de las obras de mejoramiento de vivienda en la modalidad de habitabilidad de los proyectos estructurados en los territorios priorizados por la Secretaria Distrital de Hábitat. Grupo I | 112 | 5376 | 8.0 | 0.0 | | 14.00 | 0.00 | 98.00 | 0.00 | 112 | | | 0 | 0 | | | | | | |
| | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | | | | | |
| | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | | | | | |
| | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | | | | | |
| | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | | | | | |
| | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | | | | | |
| | | | | 112 | 5376 | 8 | 0 | 0.0 | 14.00 | 0.00 | 98.00 | 0.00 | 112.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | |

ELABORO: ROBERT ROJAS TORRES -PROFESIONAL SISO


| INDICADORES SST- CONTRATO No. 694 2020 | |
|---|---|
| META AL PLAN AMBIENTAL 100% | % |
| META AL PLAN DE CALIDAD 100% | % |
| HORAS HOMBRE SEMANAL | 5,904 |
| HORAS HOMBRE ACUMULADAS MES | 19,296 |
| No. INCIDENTES REGISTRABLES | 0 |
| No. DÍAS DE INCAPACIDAD | 0 |
| No. DÍAS DE INCAPACIDAD ACUMULADOS MES | 7 |
| HORAS CAPACITACIONES SEMANAL | 37.00 |
| HORAS CAPACITACIONES ACOMULADA MENSUAL | 140.00 |

No laboral

| GESTIÓN AMBIENTAL | | |
|---|---|---|
| ESCOMBROS (Cantidad m3) Semanal | 8 | Se realiza disposición de escombros en CEMEX |
| ESCOMBROS (Cantidad acumuladas mes) | 32 | |
| RESIDUOS PELIGROSOS (Cantidad Kg semanal) | 0 | |
| RESIDUOS PELIGROSOS (Cantidad acumuladas mes) | 0 | |
| CONSUMO DE AGUA (m3) Semanal | 0 | Uso de agua de cada vivienda, incluyendo agua lluvia, no se ha adquirido agua adicional |
| CONSUMO DE AGUA (m3), Mensual | 0 | |

**INFORME SISO**
**INPLAYCO SAS**
**Fecha: 14 al 20 de Diciembre de 2020**

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DEL HÁBITAT

| RELACIÓN DE: CHARLAS DIARIAS CAPACITACIONES SIMULACROS LECCIONES APRENDIAS (Fechas) | OBSERVACION POR PARTE DE INTERVENTORÍA | REGISTRO FOTOGRÁFICO | | |
|---|---|---|---|---|
| Se realizó charla en los diferentes puestos de trabajo sobre divulgación de casi accidente, importancia del orden y aseo en las viviendas. | Por la distancia entre los diferentes áreas de trabajo, se realiza la charla en cada una de las viviendas visitadas, diligenciando el respectivo registro |  MV 2925 |  MV 2925 |  MV 3640 |

# INFORME SISO

**Fecha: 14 al 20 de Diciembre de 2020**

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DEL HÁBITAT

**CONTRATO: 694 - 2020**
**CONTRATISTA: CONSORCIO MEJORAMIENTO EP 2020**

## CONDICIONES Y ACCIONES SUBESTÁNDAR

| No. | DESCRIPCIÓN | HALLAZGOS | ACCIÓN CONTINUA | | FECHAS | | RESPONSABLE | REGISTRO FOTOGRÁFICO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | ABIERTA | CERRADA | FECHA DE APERTURA | FECHA DE CIERRE | | |
| 1 | Suministro de dotación | Personal con dotación incompleta | 1 | 0 | 2/12/2020 | | LEDA LAMBIS - SISO<br>LUIS FERNANDO CARRILLO |  |
| 2 | Uso indebido espacio publico | Arena descargada en vía, obstaculizando el paso | 1 | 1 | 4/12/2020 | 5/12/2020 | LEDA LAMBIS - SISO |  |
| 3 | Acumulación Escombros | Escombros acumulados en las viviendas o fuera de ellas | 1 | 1 | 9/12/2020 | 11/12/2020 | LEDA LAMBIS - SISO |  |
| 4 | Uso de EPP | Acto inseguro, ayudante no usa gafas durante el corte de baldosa con pulidora. MVJA 2812 | 1 | 1 | 18/12/2020 | 18/12/2020 | LEDA LAMBIS - SISO |  |
| 5 | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | |
| | | | 4 | 3 | | | | |

| | |
|---|---|
| TOTAL ACCIONES ABIERTAS | 4 |
| TOTAL ACCIONES CERRADAS | 3 |

INPLAYCO S.A.S.

# INFORME SISO

## Fecha: 14 al 20 de Diciembre de 2020

ALCALDIA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

CONTRATO: 694-2020
CONTRATISTA: CONSORCIO MEJORAMIENTO EP 2020

**RELACIÓN DE TRABAJADORES ADMINISTRATIVOS Y OPERATIVOS AFILIADOS A SEGURIDAD SOCIAL**

| No. | NOMBRES Y APELLIDOS | C.C. | Fecha de afiliación | Personal afiliado Administrativos | Personal afiliado (operativo: maestros y auxiliares) | EPS | PENSION | ARL | ESTADO ACTUAL | | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | ACTIVO | RETIRADO | |
| 1 | CARLOS JOSE HERNADEZ JIMENEZ | 78,717,000 | 17/11/2020 | 1 | | NUEVA EPS | PORVENIR | POSITIVA | SI | | |
| 2 | DIANA CAROLINA NAVARRO JIMENEZ | 52,233,027 | 20/11/2020 | 1 | | COMPENSAR | PORVENIR | POSITIVA | SI | | |
| 3 | LEDA LUZ LAMBIS CASTRO | 22,732,637 | 19/11/2020 | 1 | | SURA | PORVENIR | POSITIVA | SI | | |
| 4 | LUIS FERNANDOI CARRILLO JIMENEZ | 72,097,065 | 19/11/2020 | 1 | | CAJACOPI | COLFONDOS | POSITIVA | SI | | |
| 5 | RICARDO JAIMES RUIZ | 19,144,052 | 19/11/2020 | 1 | | NUEVA EPS | NO APLICA | POSITIVA | SI | | |
| 6 | SHIRLEY AMELI VITOLA SERRANO | 64,583,890 | 19/11/2020 | 1 | | COMPENSAR | PORVENIR | POSITIVA | SI | | |
| 7 | YESENIA VIVIANA GAMEZ SALAS | 1,120,745,285 | 19/11/2020 | 1 | | NUEVA EPS | COLFONDOS | POSITIVA | SI | | |
| 8 | MARCO AUGUSTO HAMON RODRIGUEZ | 1,070,955,988 | 19/11/2020 | 1 | | FAMISANAR | PORVENIR | POSITIVA | SI | | |
| 9 | LINA MARCELA COLORADO CASTRO | 1,019,022,812 | 19/11/2020 | 1 | | SALUD TOTAL | PORVENIR | POSITIVA | SI | | |
| 10 | DANIELA CASTAÑO CASTAÑO | 1,032,447,818 | 19/11/2020 | 1 | | FAMISANAR | PROTECCION | POSITIVA | SI | | |
| 11 | LIBYS PADILLA URUETA | 1,073,822,532 | 2/10/2020 | 1 | | SALUD TOTAL | PORVENIR | POSITIVA | SI | | |
| 12 | JUAN ADRES CORREDOR MAYORGA | 1,022,401,358 | 19/11/2020 | 1 | | FAMISANAR | PORVENIR | POSITIVA | SI | | |
| 13 | GERSON ASPRILLA LOPEZ | 11,797,192 | 19/11/2020 | 1 | | SANITAS | COLPENSIONES | POSITIVA | SI | | |
| 14 | WILFRED BENAVIDEZ SANCHEZ | 79,851,515 | 19/11/2020 | 1 | | ALIANSA SALUD | PORVENIR | POSITIVA | | SI | RETIRADO |
| 15 | GREGORY FERNEY MOSQUERA | 1,105,305,250 | 29/11/2020 | 1 | | SALUD TOTAL | PROTECCION | POSITIVA | SI | | |
| 16 | ANDAIR MONTIEL VAQUIRO | 1,007,535,425 | 25/11/2020 | | 1 | SALUD TOTAL | COLPENSIONES | SURA | | SI | RETIRADO |
| 17 | CARLOS COLORADO BANDO | 13,107,585 | 24/11/2020 | | 1 | SALUD TOTAL | PORVENIR | SURA | SI | | |
| 18 | EDGAR MARTINEZ CRUZ | 79,296,107 | 25/11/2020 | | 1 | SALUD TOTAL | PROTECCION | SURA | SI | | |
| 19 | EDWIN HARVEY DE LA CRUZ TORO | 10,307,972 | 25/11/2020 | | 1 | SALUD TOTAL | COLPENSIONES | SURA | | SI | RETIRADO |
| 20 | FERNANDO VIDAL ORTIZ | 5,887,718 | 25/11/2020 | | 1 | FAMISANAR | COLPENSIONES | SURA | | SI | RETIRADO |
| 21 | IDELFONSO CIFUENTES | 19,232,722 | 25/11/2020 | | 1 | SURA | PORVENIR | SURA | | SI | RETIRADO |
| 22 | MARLON HUMBERTO MARTINEZ VAZQUEZ | 1,031,152,755 | 25/11/2020 | | 1 | FAMISANAR | PORVENIR | SURA | | SI | RETIRADO |
| 23 | WILMER ANDRES ROJAS SOLANO | 1,118,534,846 | 25/11/2020 | | 1 | SALUD TOTAL | PORVENIR | SURA | SI | | |
| 24 | OSCAR ARMANDO CALVACHE PAZ | 12,977,717 | 24/11/2020 | | 1 | SALUD TOTAL | PORVENIR | SURA | SI | | |
| 25 | VICTOR RUIZ GARCIA | 1,002,597,213 | 25/11/2020 | | 1 | CAPITAL SALUD | PORVENIR | SURA | | SI | RETIRADO |
| 26 | CARLOS ALBERTO CAICEDO HINOJOSA | 1,111,817,731 | 24/11/2020 | | 1 | SALUD TOTAL | PORVENIR | SURA | SI | | |
| 27 | YARLI COLORADO PAZ | 1,085,549,452 | 24/11/2020 | | 1 | CAPITAL SALUD | PORVENIR | SURA | SI | | |
| 28 | ILDELFONSO RAMIREZ ESQUIVEL | 96,361,399 | 1/12/2020 | | 1 | FAMISANAR | COLPENSIONES | SURA | SI | | |
| 29 | JUAN PABLO CORREA MURCIA | 1,116,920,538 | 1/12/2020 | | 1 | SALUD TOTAL | PORVENIR | SURA | SI | | |
| 30 | KEVIN FABIAN HOYOS YEPEZ | 1,083,043,276 | 1/12/2020 | | 1 | SALUD TOTAL | PROTECCION | SURA | SI | | |
| 31 | LAMBERTO GABRIEL DORIA SANCHEZ | 72,147,586 | 1/12/2020 | | 1 | SALUD TOTAL | PROTECCION | SURA | SI | | |
| 32 | ARLEY GIOVANNI CAICEDO RAMIREZ | 1,117,511,256 | 3/12/2020 | | 1 | SALUD TOTAL | PORVENIR | SURA | SI | | |
| 33 | ALBERT JOSE LEON GOMEZ | 828,089,416,111,997 | 3/12/2020 | | 1 | SALUD TOTAL | COLFONDOS | SURA | SI | | |

| No. | NOMBRES Y APELLIDOS | C.C. | Fecha de afiliación | Personal afiliado Administrativos | Personal afiliado (operativo: maestros y auxiliares) | EPS | PENSION | ARL | ESTADO ACTUAL | | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | ACTIVO | RETIRADO | |
| 34 | JHON WILLIAM BALLESTEROS MARTINEZ | 1,033,761,449 | 8/12/2020 | | 1 | COMPENSAR | PORVENIR | SURA | SI | | |
| 35 | CARLOS ENRIQUE REDONDO | 80,373,803 | 13/12/2020 | | 1 | SALUD TOTAL | COLPENSIONES | SURA | SI | | |
| 36 | JULIO FERNEY BENAVIDES MENDEZ | 80,256,134 | 13/12/2020 | | 1 | SALUD TOTAL | COLFONDOS | SURA | SI | | |
| 37 | FREDY EDINSON FORERO NIÑO | 1,024,489,116 | 15/12/2020 | | 1 | SALUD TOTAL | PORVENIR | SURA | SI | | |
| 38 | JUAN AGUSTIN LIZARAZO | 4,103,403 | 15/12/2020 | | 1 | SANITAS | 65 AÑOS LIQUIDADO | SURA | SI | | |
| 39 | JOSE IGNACIO CANO NOVOA | 7,330,323 | 15/12/2020 | | 1 | CAPITAL SALUD | 64 AÑOS LIQUIDADO | SURA | SI | | |
| 40 | BRAYAN ESTIVEN LOPEZ MOLINA | 1,024,602,801 | 17/11/2020 | | 1 | FAMISANAR | PROTECCION | POSITIVA | SI | | |
| 41 | EDWIN JIMMY ESPINEL CHACON | 80,064,358 | 17/11/2020 | | 1 | NUEVA EPS | COLPENSIONES | POSITIVA | SI | | |
| 42 | EDGAR VELANDIA | 80,090,780 | 26/11/2020 | | 1 | ALIANSA SALUD | PORVENIR | POSITIVA | SI | | |
| 43 | EMITZO JOSE FANDIÑO FLOREZ | 85,469,924 | 18/11/2020 | | 1 | NUEVA EPS | PORVENIR | POSITIVA | SI | | |
| 44 | EVANGELISTA BRINEZ BURGOS | 6,030,390 | 17/11/2020 | | 1 | SALUD TOTAL | COLPENSIONES | POSITIVA | SI | | |
| 45 | FABIO NELSON LOPEZ DIAZ | 80,124,048 | 17/11/2020 | | 1 | SALUD TOTAL | PROTECCION | POSITIVA | SI | | |
| 46 | JULIO CESAR NEIRA BENAVIDEZ | 79,903,950 | 18/11/2020 | | 1 | COMPENSAR | PROTECCION | POSITIVA | SI | | |
| 47 | RAFAEL CASTRO VILLA | 8,815,936 | 17/11/2020 | | 1 | SALUD TOTAL | PORVENIR | POSITIVA | SI | | |
| 48 | LEYDY PATRICIA SUAREZ VELAZQUEZ | 1,033,693,495 | 18/11/2020 | | 1 | CAPITAL SALUD | PROTECCION | POSITIVA | SI | | |
| 49 | MICHEL LEONARDO SALAS CELIS | 1,033,766,212 | 17/11/2020 | | 1 | FAMISANAR | PORVENIR | POSITIVA | SI | | |
| 50 | VLADIMIR BRIÑEZ MAHECHA | 1,033,682,982 | 17/11/2020 | | 1 | FAMISANAR | COLFONDOS | POSITIVA | SI | | |
| 51 | CARLOS ANDRES SUAREZ VELAZQUEZ | 1,033,693,493 | 18/11/2020 | | 1 | FAMISANAR | PORVENIR | POSITIVA | SI | | |
| 52 | LUIS FERNANDO CUPITRA DUCUARA | 1,022,939,409 | 18/11/2020 | | 1 | SURA | COLFONDOS | POSITIVA | SI | | |
| 53 | LUIS ALEJANDRO ZAMBRANO | 79,770,115 | 18/11/2020 | | 1 | CAPITAL SALUD | COLPENSIONES | POSITIVA | | SI | RETIRADO |
| 54 | OSBAR RENE BERNAL PAEZ | 80,778,371 | 20/11/2020 | | 1 | SALUD TOTAL | PROTECCION | POSITIVA | SI | | |
| 55 | ALBEIRO GUERRERO MACANA | 5,996,412 | 25/11/2020 | | 1 | NUEVA EPS | PORVENIR | POSITIVA | SI | | |
| 56 | EDWIN RODRIGUEZ VIDAL | 93,394,589 | 25/11/2020 | | 1 | MEDIMAS | PORVENIR | POSITIVA | SI | | |
| 57 | JOSE ANTONIO SILVA ORTEGA | 19,458,840 | 25/11/2020 | | 1 | COMFACUNDI | PORVENIR | POSITIVA | SI | | |
| 58 | SAURITH REALES DELGADO | 91,431,492 | 25/11/2020 | | 1 | NUEVA EPS | COLPENSIONES | POSITIVA | SI | | |
| 59 | CARLOS PAEZ PULIDO | 1,049,630,871 | 17/11/2020 | | 1 | MEDIMAS | PROTECCION | POSITIVA | SI | | |
| 60 | RAUL OSORIO RINCON | 79,689,250 | 17/11/2020 | | 1 | SALUD TOTAL | PORVENIR | POSITIVA | SI | | |
| 61 | MISAEL PERDOMO VILLAMIL | 1,033,784,477 | 24/11/2020 | | 1 | NUEVA EPS | PORVENIR | POSITIVA | SI | | |
| 62 | JOSE GUILLERMO MARTINEZ VARGAS | 79,666,136 | 27/11/2020 | | 1 | SALUD TOTAL | COLPENSIONES | POSITIVA | SI | | |
| 63 | OMAR MARTINEZ ZULETA | 4,946,584 | 27/11/2020 | | 1 | NUEVA EPS | COLPENSIONES | POSITIVA | SI | | |
| 64 | VICTOR MANUEL GUERRERO PACHECO | 80,126,593 | 26/11/2020 | | 1 | CAPITAL SALUD | PORVENIR | POSITIVA | SI | | |
| 65 | QUEVIN FABIAN LESMES LINARES | 1,000,003,268 | 27/11/2020 | | 1 | CAPITAL SALUD | PORVENIR | POSITIVA | SI | | |
| 66 | EDISON JOSE VENECIA SARABIA | 72,120,789 | 25/11/2020 | | 1 | FAMISANAR | PORVENIR | POSITIVA | SI | | |
| 67 | YOENDISON JOSE VENECIA MORENO | 1,101,879,446 | 25/11/2020 | | 1 | COMPARTA | PORVENIR | POSITIVA | SI | | |
| 68 | RUBEN PINEDA MAHECHA | 1,031,151,104 | 25/11/2020 | | 1 | SALUD TOTAL | PORVENIR | POSITIVA | SI | | |
| 69 | RAUL ALEXANDER SALAMANCA SALGADO | 80,749,213 | 26/11/2020 | | 1 | CAPITAL SALUD | PORVENIR | POSITIVA | SI | | |
| 70 | LEONARDO SOLANO CELY | 1,024,511,017 | 26/11/2020 | | 1 | FAMISANAR | PORVENIR | POSITIVA | SI | | |
| 71 | LUIS FRANCISCO GOMEZ SANCHEZ | 80857562 | 25/11/2020 | | 1 | FAMISANAR | COLPENSIONES | POSITIVA | SI | | |
| 72 | HAYDER CAMILO GALVIZ | 1,033,762,528 | 17/11/2020 | | 1 | FAMISANAR | PROTECCION | POSITIVA | SI | | |
| 73 | CAMILO HERNANDEZ SANCHEZ | 1,049,639,642 | 17/11/2020 | | 1 | FAMISANAR | COLFONDOS | POSITIVA | SI | | |
| 74 | CESAR JULIO BENAVIDEZ | 1,193,036,484 | 27/11/2020 | | 1 | COOSALUD | PORVENIR | POSITIVA | SI | | |
| 75 | FERNANDO MORENO HUERTAS | 3,199,429 | 26/11/2020 | | 1 | CAPITAL SALUD | PORVENIR | POSITIVA | SI | | |

| No. | NOMBRES Y APELLIDOS | C.C. | Fecha de afiliación | Personal afiliado Administrativos | Personal afiliado (operativo: maestros y auxiliares) | EPS | PENSION | ARL | ESTADO ACTUAL | | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | ACTIVO | RETIRADO | |
| 76 | JHON EDISON PALACIO MORENO | 1,077,435,835 | 26/11/2020 | | 1 | SALUD TOTAL | PROTECCION | POSITIVA | SI | | |
| 77 | LUIS HERNANDEZ BARRETO | 80,858,697 | 25/11/2020 | | 1 | SANITAS | PROTECCION | POSITIVA | SI | | |
| 78 | LUZ ADRIANA SILVA MUÑOZ | 53,094,514 | 26/11/2020 | | 1 | CAPITAL SALUD | PORVENIR | POSITIVA | SI | | |
| 79 | JEISON ACERO | 1,044,391,694 | 25/11/2020 | | 1 | MUTUAL SER | PORVENIR | POSITIVA | SI | | |
| 80 | ANDRES FERNANDO PEREZ DIAZ | 1,063,625,214 | 1/12/2020 | | 1 | NUEVA EPS | PORVENIR | POSITIVA | SI | | |
| 81 | ANGEL IVAN DIAZ | 79,924,351 | 1/12/2020 | | 1 | FAMISANAR | PORVENIR | POSITIVA | SI | | |
| 82 | CARLOS ALBERTO SUAREZ BARRERA | 9,527,688 | 1/12/2020 | | 1 | CAPITAL SALUD | PORVENIR | POSITIVA | SI | | |
| 83 | CIRO ARTURO NIÑO | 4,255,303 | 1/12/2020 | | 1 | SALUD TOTAL | COLPENSIONES | POSITIVA | SI | | |
| 84 | EDGAR HERNANDO NIÑO | 4,225,078 | 1/12/2020 | | 1 | CAPITAL SALUD | PORVENIR | POSITIVA | SI | | |
| 85 | EDWAR ARLEY RODRIGUEZ MAYORGA | 1,033,754,705 | 1/12/2020 | | 1 | SALUD TOTAL | PORVENIR | POSITIVA | SI | | |
| 86 | EMILIANO MUÑOZ PALACIO | 80,265,681 | 1/12/2020 | | 1 | SALUD TOTAL | PORVENIR | POSITIVA | SI | | |
| 87 | CAMILO ERNESTO RAMIREZ ROA | 1,033,735,370 | 1/12/2020 | | 1 | COMPENSAR | PROTECCION | POSITIVA | SI | | |
| 88 | CARLOS SEBASTIAN LOPEZ CASTELLANO | 1,031,170,297 | 1/12/2020 | | 1 | FAMISANAR | PROTECCION | POSITIVA | SI | | |
| 89 | IDELFONSO DE JESUS PEÑARANDA | 1,118,873,986 | 1/12/2020 | | 1 | SALUD TOTAL | PORVENIR | POSITIVA | SI | | |
| 90 | CARLOS ALBERTO PULIDO YATE | 1,033,683,233 | 1/12/2020 | | 1 | FAMISANAR | PROTECCION | POSITIVA | SI | | |
| 91 | CIPRIANO PIÑEROS | 79,703,764 | 1/12/2020 | | 1 | FAMISANAR | COLFONDOS | POSITIVA | SI | | |
| 92 | DAGOBERTO PAREJO AREVALO | 8,668,649 | 1/12/2020 | | 1 | MUTUAL SER | PORVENIR | POSITIVA | SI | | |
| 93 | DANIEL ARTURO NIÑO ROJAS | 1,024,469,352 | 1/12/2020 | | 1 | SALUD TOTAL | COLPENSIONES | POSITIVA | SI | | |
| 94 | EDER GONZALEZ GASTELBLONDO | 84,062,070 | 1/12/2020 | | 1 | NUEVA EPS | PORVENIR | POSITIVA | SI | | |
| 95 | GLORIA JIMENEZ | 28,155,523 | 2/12/2020 | | 1 | NUEVA EPS | PROTECCION | POSITIVA | SI | | |
| 96 | JESUS DAVID LOPEZ GALVIZ | 13,860,790 | 2/12/2020 | | 1 | NUEVA EPS | COLPENSIONES | POSITIVA | SI | | |
| 97 | JHON RIVER MAYORGA BENAVIDES | 1,033,721,955 | 1/12/2020 | | 1 | CAPITAL SALUD | PORVENIR | POSITIVA | SI | | |
| 98 | SAMIR ZIAD PINEDA YAHMURE | 79,920,337 | 1/12/2020 | | 1 | COMPENSAR | PROTECCION | POSITIVA | SI | | |
| 99 | SIMON LOPEZ PALACIOS | 94,418,910 | 1/12/2020 | | 1 | SALUD TOTAL | COLPENSIONES | POSITIVA | SI | | |
| 100 | WILSON FERNEY BERNAL GUASCA | 1,033,707,175 | 1/12/2020 | | 1 | FAMISANAR | PORVENIR | POSITIVA | SI | | |
| 101 | YOISEN HAIDIN CHIBUQUE CAICEDO | 1,007,413,403 | 1/12/2020 | | 1 | MEDIMAS | PROTECCION | POSITIVA | SI | | |
| 102 | LUIS HERNANDEZ GRANADA | 19,219,713 | 1/12/2020 | | 1 | SANITAS | COLPENSIONES | POSITIVA | SI | | |
| 103 | ANDRES GARCIA ROJAS | 80,895,628 | 15/12/2020 | | 1 | SALUD TOTAL | PROTECCION | POSITIVA | SI | | |
| 104 | EDGAR HERNANDO NIÑO | 4,225,078 | 1/12/2020 | | 1 | CAPITAL SALUD | PORVENIR | POSITIVA | SI | | |
| 105 | HELI RAMIREZ PERALTA | 79,734,766 | 12/12/2020 | | 1 | SALUD TOTAL | PROTECCION | POSITIVA | SI | | |
| 106 | JAVIER FRANCO RODRIGUEZ | 731054127121978 | 1/12/2020 | | 1 | SALUD TOTAL | PROTECCION | POSITIVA | SI | | |
| 107 | JEISON LOPEZ MEJIA | 1,033,816,388 | 15/12/2020 | | 1 | SALUD TOTAL | PORVENIR | POSITIVA | SI | | |
| 108 | JOSE RODRIGUEZ GARCIA | 1,031,176,991 | 1/12/2020 | | 1 | CAPITAL SALUD | PORVENIR | POSITIVA | SI | | |
| 109 | JULIAN ANDRES ARAGON DEVIA | 1,030,628,205 | 15/12/2020 | | 1 | CONVIDA | PORVENIR | POSITIVA | SI | | |
| 110 | KEVIN SEBASTIAN APARACIO | 1,000,064,803 | 10/12/2020 | | 1 | FAMISANAR | PORVENIR | POSITIVA | SI | | |
| 111 | LUIS CARLOS MENDOZA GAMEZ | 17,971,346 | 4/12/2020 | | 1 | ALIANSA SALUD | PORVENIR | POSITIVA | SI | | |
| 112 | LUIS MUÑOZ GRAJALES | 80,774,495 | 1/12/2020 | | 1 | COOSALUD | PROTECCION | POSITIVA | SI | | |
| RESULTADOS: | | | | 15 | 97 | | | | 104 | 8 | |

# INFORME SISO

**Fecha: 14 al 20 de Diciembre de 2020**

INPLAYCO S.A.S.
INGENIEROS CONSTRUCTORES E INTERVENTORES

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DEL HÁBITAT

**CONTRATO: 694-2020**
**CONTRATISTA: CONSORCIO MEJORAMIENTO EP 2020**

## RELACIÓN PERSONAL CON EXÁMENES MÉDICOS

| No. | NOMBRES Y APELLIDOS | C.C. | FECHA DE INGRESO | FECHA DE EXAMEN MÉDICO DE INGRESO/ PERIODICO | PERSONAL | | Personal Trabajos en Alturas | | ESTADOL ACTUAL | | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Administrativo | Operativo: maestros y auxiliares | APTO | NO APTO | ACTIVO | RETIRADO | |
| 1 | CARLOS JOSE HERNANDEZ JIMENEZ | 78,717,000 | 17/11/2020 | 20/11/2020 | 1 | | SI | | SI | | |
| 2 | DIANA CAROLINA NAVARRO JIMENEZ | 52,233,027 | 20/11/2020 | 10/11/2020 | 1 | | SI | | SI | | |
| 3 | LEDA LUZ LAMBIS CASTRO | 22,732,637 | 19/11/2020 | 10/11/2020 | 1 | | SI | | SI | | |
| 4 | LUIS FERNANDOI CARRILLO JIMENEZ | 72,097,065 | 19/11/2020 | 11/11/2020 | 1 | | SI | | SI | | |
| 5 | RICARDO JAIMES RUIZ | 19,144,052 | 19/11/2020 | 10/11/2020 | 1 | | SI | | SI | | |
| 6 | SHIRLEY AMELI VITOLA SERRANO | 64,583,890 | 19/11/2020 | 10/11/2020 | 1 | | SI | | SI | | |
| 7 | YESENIA VIVIANA GAMEZ SALAS | 1,120,745,285 | 19/11/2020 | 12/11/2020 | 1 | | SI | | SI | | |
| 8 | MARCO AUGUSTO HAMON RODRIGUEZ | 1,070,955,988 | 19/11/2020 | 10/11/2020 | 1 | | SI | | SI | | |
| 9 | LINA MARCELA COLORADO CASTRO | 1,019,022,812 | 19/11/2020 | 10/11/2020 | 1 | | SI | | SI | | |
| 10 | DANIELA CASTAÑO CASTAÑO | 1,032,447,818 | 19/11/2020 | 14/11/2020 | 1 | | SI | | SI | | |
| 11 | LIBYS PADILLA URUETA | 1,073,822,532 | 2/10/2020 | 20/8/2020 | 1 | | SI | | SI | | |
| 12 | JUAN ANDRES CORREDOR MAYORGA | 1,022,401,358 | 19/11/2020 | 24/11/2020 | 1 | | SI | | SI | | |
| 13 | GERSON ASPRILLA LOPEZ | 11,797,192 | 19/11/2020 | 11/11/2020 | 1 | | SI | | SI | | |
| 14 | WILFRED BENAVIDEZ SANCHEZ | 79,851,515 | 19/11/2020 | 13/11/2020 | 1 | | SI | | | SI | |
| 15 | GREGORY FERNEY MOSQUERA | 1,105,305,250 | 29/11/2020 | 25/11/2020 | 1 | | SI | | SI | | |
| 16 | ALBEIRO GUERRERO MACANA | 5,996,412 | 25/11/2020 | 2/12/2020 | | 1 | SI | | SI | | |
| 17 | CAMILO HERNANDEZ SANCHEZ | 1,049,639,642 | 17/11/2020 | 2/12/2020 | | 1 | SI | | SI | | |
| 18 | EVAGELISTA BRINEZ BURGOS | 6,030,390 | 17/11/2020 | 2/12/2020 | | 1 | SI | | SI | | |
| 19 | FABIO NELSON LOPEZ DIAZ | 80,124,048 | 17/11/2020 | 2/12/2020 | | 1 | SI | | SI | | |
| 20 | JEISON ACERO | 1,044,391,694 | 25/11/2020 | 2/12/2020 | | 1 | SI | | SI | | |
| 21 | JOSE ANTONIO SILVA ORTEGA | 19,458,840 | 25/11/2020 | 2/12/2020 | | 1 | SI | | SI | | |
| 22 | JULIO CESAR NEIRA BENAVIDEZ | 79,903,950 | 18/11/2020 | 2/12/2020 | | 1 | SI | | SI | | |
| 23 | QUEVIN FABIAN LESMES LINARES | 1,000,003,268 | 27/11/2020 | 2/12/2020 | | 1 | SI | | SI | | |
| 24 | LEYDY PATRICIA SUAREZ VELAZQUEZ | 1,033,693,495 | 18/11/2020 | 2/12/2020 | | 1 | SI | | SI | | |

| No. | NOMBRES Y APELLIDOS | C.C. | FECHA DE INGRESO | FECHA DE EXAMEN MÉDICO DE INGRESO/ PERIODICO | PERSONAL | | Personal Trabajos en Alturas | | ESTADOL ACTUAL | | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Administrativo | Operativo: maestros y auxiliares | APTO | NO APTO | ACTIVO | RETIRADO | |
| 25 | LUIS FERNANDO CUPITRA DUCUARA | 1,022,939,409 | 18/11/2020 | 2/12/2020 | | 1 | SI | | SI | | |
| 26 | LUIS FRANCISCO GOMEZ SANCHEZ | 80,857,562 | 25/11/2020 | 2/12/2020 | | 1 | SI | | SI | | |
| 27 | LUZ ADRIANA SILVA MUÑOZ | 53,094,514 | 26/11/2020 | 2/12/2020 | | 1 | SI | | SI | | |
| 28 | MICHEL LEONARDO SALAS CELIS | 1,033,766,212 | 17/11/2020 | 2/12/2020 | | 1 | SI | | SI | | |
| 29 | MISAEL PERDOMO VILLAMIL | 1,033,784,477 | 24/11/2020 | 2/12/2020 | | 1 | SI | | SI | | |
| 30 | OSBAR RENE BERNAL PAEZ | 80,778,371 | 20/11/2020 | 2/12/2020 | | 1 | SI | | SI | | |
| 31 | RAUL OSORIO RINCON | 79,669,250 | 17/11/2020 | 2/12/2020 | | 1 | SI | | SI | | |
| 32 | RUBEN PINEDA MAHECHA | 1,031,151,104 | 25/11/2020 | 2/12/2020 | | 1 | SI | | SI | | |
| 33 | SAURITH REALES DELGADO | 91,431,492 | 25/11/2020 | 2/12/2020 | | 1 | SI | | SI | | |
| 34 | VICTOR MANUEL GUERRERO PACHECO | 80,126,593 | 26/11/2020 | 2/12/2020 | | 1 | SI | | SI | | |
| 35 | VLADIMIR BRIÑEZ MAHECHA | 1,033,682,982 | 17/11/2020 | 2/12/2020 | | 1 | SI | | SI | | |
| 36 | CARLOS ALBERTO SUAREZ BARRERA | 9,527,688 | 1/12/2020 | 2/12/2020 | | 1 | SI | | SI | | |
| 37 | YOENDISON JOSE VENECIA MORENO | 1,101,879,446 | 25/11/2020 | 2/12/2020 | | 1 | SI | | SI | | |
| 38 | CIPRIANO PIÑEROS | 79,703,764 | 1/12/2020 | 2/12/2020 | | 1 | SI | | SI | | |
| 39 | JOSE RODRIGUEZ GARCIA | 1,031,176,991 | 1/12/2020 | 2/12/2020 | | 1 | SI | | SI | | |
| 40 | | | | | | | | | | | |
| 41 | | | | | | | | | | | |
| 42 | | | | | | | | | | | |
| 43 | | | | | | | | | | | |
| 44 | | | | | | | | | | | |
| 45 | | | | | | | | | | | |
| 121 | | | | | | | | | | | |
| RESULTADOS: | | | | | 15 | 24 | 39 | 0 | 38 | 1 | |

# INFORME SISO

**Fecha: 14 al 20 de Diciembre de 2020**

**CONTRATO: 694-2020**
**CONTRATISTA: CONSORCIO MEJORAMIENTO EP 2020**

**RELACIÓN PERSONAL 7. Relación de actividades generales en donde se evidencie el cumplimiento de la implementación del Protocolo de Bioseguridad, así mismo, el interventor deberá informar sobre el cumplimiento o incumplimiento de este.**

| No. | NOMBRES Y APELLIDOS | C.C. | FECHA DE INGRESO | FECHA DE EXAMEN MÉDICO DE INGRESO/ PERIODICO | PERSONAL | | IMPLEMENTACIÓN PROTOCÓLO | | ESTADO ACTUAL | | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Administrativo | Operativo: maestros y auxiliares | SI | NO | ACTIVO | RETIRADO | |
| 1 | CARLOS JOSE HERNADEZ JIMENEZ | 78,717,000 | 17/11/2020 | 20/11/2020 | 1 | | SI | | SI | | |
| 2 | DIANA CAROLINA NAVARRO JIMENEZ | 52,233,027 | 20/11/2020 | 10/11/2020 | 1 | | SI | | SI | | |
| 3 | LEDA LUZ LAMBIS CASTRO | 22,732,637 | 19/11/2020 | 10/11/2020 | 1 | | SI | | SI | | |
| 4 | LUIS FERNANDOI CARRILLO JIMENEZ | 72,097,065 | 19/11/2020 | 11/11/2020 | 1 | | SI | | SI | | |
| 5 | RICARDO JAIMES RUIZ | 19,144,052 | 19/11/2020 | 10/11/2020 | 1 | | SI | | SI | | |
| 6 | SHIRLEY AMELI VITOLA SERRANO | 64,583,890 | 19/11/2020 | 10/11/2020 | 1 | | SI | | SI | | |
| 7 | YESENIA VIVIANA GAMEZ SALAS | 1,120,745,285 | 19/11/2020 | 12/11/2020 | 1 | | SI | | SI | | |
| 8 | MARCO AUGUSTO HAMON RODRIGUEZ | 1,070,955,988 | 19/11/2020 | 10/11/2020 | 1 | | SI | | SI | | |
| 9 | LINA MARCELA COLORADO CASTRO | 1,019,022,812 | 19/11/2020 | 10/11/2020 | 1 | | SI | | SI | | |
| 10 | DANIELA CASTAÑO CASTAÑO | 1,032,447,818 | 19/11/2020 | 14/11/2020 | 1 | | SI | | SI | | |
| 11 | LIBYS PADILLA URUETA | 1,073,822,532 | 2/10/2020 | 20/8/2020 | 1 | | SI | | SI | | |
| 12 | JUAN ADRES CORREDOR MAYORGA | 1,022,401,358 | 19/11/2020 | 24/11/2020 | 1 | | SI | | SI | | |
| 13 | GERSON ASPRILLA LOPEZ | 11,797,192 | 19/11/2020 | 11/11/2020 | 1 | | SI | | SI | | |
| 14 | WILFRED BENAVIDEZ SANCHEZ | 79,851,515 | 19/11/2020 | 13/11/2020 | 1 | | SI | | SI | | |
| 15 | GREGORY FERNEY MOSQUERA | 1,105,305,250 | 29/11/2020 | 25/11/2020 | 1 | | SI | | | SI | |
| 16 | ANDAIR MONTIEL VAQUIRO | 1,007,535,425 | 25/11/2020 | | | 1 | si | | SI | | |
| 17 | CARLOS COLORADO BANDO | 13,107,585 | 24/11/2020 | | | 1 | SI | | | SI | |
| 18 | EDGAR MARTINEZ CRUZ | 79,296,107 | 25/11/2020 | | | 1 | SI | | SI | | |
| 19 | EDWIN HARVEY DE LA CRUZ TORO | 10,307,972 | 25/11/2020 | | | 1 | SI | | SI | | |
| 20 | FERNANDO VIDAL ORTIZ | 5,887,718 | 25/11/2020 | | | 1 | SI | | | SI | |
| 21 | IDELFONSO CIFUENTES | 19,232,722 | 25/11/2020 | | | 1 | SI | | | SI | |
| 22 | MARLON HUMBERTO MARTINEZ VAZQUEZ | 1,031,152,755 | 25/11/2020 | | | 1 | SI | | | SI | |
| 23 | WILMER ANDRES ROJAS SOLANO | 1,118,534,846 | 25/11/2020 | | | 1 | SI | | SI | | |

| No. | NOMBRES Y APELLIDOS | C.C. | FECHA DE INGRESO | FECHA DE EXAMEN MÉDICO DE INGRESO/ PERIODICO | PERSONAL | | IMPLEMENTACIÓN PROTOCÓLO | | ESTADO ACTUAL | | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Administrativo | Operativo: maestros y auxiliares | SI | NO | ACTIVO | RETIRADO | |
| 24 | OSCAR ARMANDO CALVACHE PAZ | 12,977,717 | 24/11/2020 | | | 1 | SI | | SI | | |
| 25 | VICTOR RUIZ GARCIA | 1,002,597,213 | 25/11/2020 | | | 1 | SI | | | SI | |
| 26 | CARLOS ALBERTO CAICEDO HINOJOSA | 1,111,817,731 | 24/11/2020 | | | 1 | SI | | SI | | |
| 27 | YARLI COLORADO PAZ | 1,085,549,452 | 24/11/2020 | | | 1 | SI | | SI | | |
| 28 | ILDELFONSO RAMIREZ ESQUIVEL | 96,361,399 | 17/11/2020 | | | 1 | SI | | SI | | |
| 29 | JUAN PABLO CORREA MURCIA | 1,116,920,538 | 17/11/2020 | | | 1 | SI | | SI | | |
| 30 | KEVIN FABIAN HOYOS YEPEZ | 1,083,043,276 | 18/11/2020 | | | 1 | SI | | SI | | |
| 31 | LAMBERTO GABRIEL DORIA SANCHEZ | 72,147,586 | 17/11/2020 | | | 1 | SI | | SI | | |
| 32 | ARLEY GIOVANNI CAICEDO RAMIREZ | 1,117,511,256 | 3/12/2020 | | | 1 | SI | | SI | | |
| 33 | ALBERT JOSE LEON GOMEZ | 828089416111997 | 3/12/2020 | | | 1 | SI | | SI | | |
| 34 | JHON WILLIAM BALLESTEROS MARTINEZ | 1,033,761,449 | 8/12/2020 | | | 1 | SI | | SI | | |
| 35 | CARLOS ENRIQUE REDONDO | 80,373,803 | 13/12/2020 | | | 1 | SI | | SI | | |
| 36 | JULIO FERNEY BENAVIDES MENDEZ | 80,256,134 | 13/12/2020 | | | 1 | SI | | SI | | |
| 37 | FREDY EDINSON FORERO NIÑO | 1,024,489,116 | 15/12/2020 | | | 1 | SI | | SI | | |
| 38 | JUAN AGUSTIN LIZARAZO | 4,103,403 | 15/12/2020 | | | 1 | SI | | SI | | |
| 39 | JOSE IGNACIO CANO NOVOA | 7,330,323 | 15/12/2020 | | | 1 | SI | | SI | | |
| 40 | BRAYAN ESTIVEN LOPEZ MOLINA | 1,024,602,801 | 17/11/2020 | | | 1 | SI | | SI | | |
| 41 | EDWIN JIMMY ESPINEL CHACON | 80,064,358 | 17/11/2020 | | | 1 | SI | | SI | | |
| 42 | EDGAR VELANDIA | 80,090,780 | 26/11/2020 | | | 1 | SI | | SI | | |
| 43 | EMITZO JOSE FANDIÑO FLOREZ | 85,469,924 | 18/11/2020 | | | 1 | SI | | SI | | |
| 44 | EVANGELISTA BRINEZ BURGOS | 6,030,390 | 17/11/2020 | 2/12/2020 | | 1 | SI | | SI | | |
| 45 | FABIO NELSON LOPEZ DIAZ | 80,124,048 | 17/11/2020 | 2/12/2020 | | 1 | SI | | SI | | |
| 46 | JULIO CESAR NEIRA BENAVIDEZ | 79,903,950 | 18/11/2020 | 2/12/2020 | | 1 | SI | | SI | | |
| 47 | RAFAEL CASTRO VILLA | 8,815,936 | 17/11/2020 | | | 1 | SI | | SI | | |
| 48 | LEYDY PATRICIA SUAREZ VELAZQUEZ | 1,033,693,495 | 18/11/2020 | 2/12/2020 | | 1 | SI | | SI | | |
| 49 | MICHEL LEONARDO SALAS CELIS | 1,033,766,212 | 17/11/2020 | 2/12/2020 | | 1 | SI | | SI | | |
| 50 | VLADIMIR BRIÑEZ MAHECHA | 1,033,682,982 | 17/11/2020 | 2/12/2020 | | 1 | SI | | SI | | |
| 51 | CARLOS ANDRES SUAREZ VELAZQUEZ | 1,033,693,493 | 18/11/2020 | | | 1 | SI | | SI | | |
| 52 | LUIS FERNANDO CUPITRA DUCUARA | 1,022,939,409 | 18/11/2020 | 2/12/2020 | | 1 | SI | | SI | | |
| 53 | LUIS ALEJANDRO ZAMBRANO | 79,770,115 | 18/11/2020 | | | 1 | SI | | SI | | |
| 54 | OSBAR RENE BERNAL PAEZ | 80,778,371 | 20/11/2020 | 2/12/2020 | | 1 | SI | | SI | | |
| 55 | ALBEIRO GUERRERO MACANA | 5,996,412 | 25/11/2020 | 2/12/2020 | | 1 | SI | | SI | | |

| No. | NOMBRES Y APELLIDOS | C.C. | FECHA DE INGRESO | FECHA DE EXAMEN MÉDICO DE INGRESO/ PERIODICO | PERSONAL | | IMPLEMENTACIÓN PROTOCÓLO | | ESTADO ACTUAL | | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Administrativo | Operativo: maestros y auxiliares | SI | NO | ACTIVO | RETIRADO | |
| 56 | EDWIN RODRIGUEZ VIDAL | 93,394,589 | 25/11/2020 | | | 1 | SI | | SI | | |
| 57 | JOSE ANTONIO SILVA ORTEGA | 19,458,840 | 25/11/2020 | 2/12/2020 | | 1 | SI | | SI | | |
| 58 | SAURITH REALES DELGADO | 91,431,492 | 25/11/2020 | 2/12/2020 | | 1 | SI | | SI | | |
| 59 | CARLOS PAEZ PULIDO | 1,049,630,871 | 17/11/2020 | | | 1 | SI | | SI | | |
| 60 | RAUL OSORIO RINCON | 79,669,250 | 17/11/2020 | 2/12/2020 | | 1 | SI | | SI | | |
| 61 | MISAEL PERDOMO VILLAMIL | 1,033,784,477 | 24/11/2020 | 2/12/2020 | | 1 | SI | | SI | | |
| 62 | JOSE GUILLERMO MARTINEZ VARGAS | 79,666,136 | 27/11/2020 | | | 1 | SI | | SI | | |
| 63 | OMAR MARTINEZ ZULETA | 4,946,584 | 27/11/2020 | | | 1 | SI | | SI | | |
| 64 | VICTOR MANUEL GUERRERO PACHECO | 80,126,593 | 26/11/2020 | 2/12/2020 | | 1 | SI | | SI | | |
| 65 | QUEVIN FABIAN LESMES LINARES | 1,000,003,268 | 27/11/2020 | 2/12/2020 | | 1 | SI | | SI | | |
| 66 | EDISON JOSE VENECIA SARABIA | 72,120,789 | 25/11/2020 | | | 1 | SI | | SI | | |
| 67 | YOENDISON JOSE VENECIA MORENO | 1,101,879,446 | 25/11/2020 | 2/12/2020 | | 1 | SI | | SI | | |
| 68 | RUBEN PINEDA MAHECHA | 1,031,151,104 | 25/11/2020 | 2/12/2020 | | 1 | SI | | SI | | |
| 69 | RAUL ALEXANDER SALAMANCA SALGADO | 80,749,213 | 26/11/2020 | | | 1 | SI | | SI | | |
| 70 | LEONARDO SOLANO CELY | 1,024,511,017 | 26/11/2020 | | | 1 | SI | | SI | | |
| 71 | LUIS FRANCISCO GOMEZ SANCHEZ | 80857562 | 25/11/2020 | 2/12/2020 | | 1 | SI | | SI | | |
| 72 | HAYDER CAMILO GALVIZ | 1,033,762,528 | 17/11/2020 | | | 1 | SI | | SI | | |
| 73 | CAMILO HERNANDEZ SANCHEZ | 1,049,639,642 | 17/11/2020 | 2/12/2020 | | 1 | SI | | SI | | |
| 74 | CESAR JULIO BENAVIDEZ | 1,193,036,484 | 27/11/2020 | | | 1 | SI | | SI | | |
| 75 | FERNANDO MORENO HUERTAS | 3,199,429 | 26/11/2020 | | | 1 | SI | | SI | | |
| 76 | JHON EDISON PALACIO MORENO | 1,077,435,835 | 26/11/2020 | | | 1 | SI | | SI | | |
| 77 | LUIS HERNANDEZ BARRETO | 80,858,697 | 25/11/2020 | | | 1 | SI | | SI | | |
| 78 | LUZ ADRIANA SILVA MUÑOZ | 53,094,514 | 26/11/2020 | 2/12/2020 | | 1 | SI | | SI | | |
| 79 | JEISON ACERO | 1,044,391,694 | 25/11/2020 | 2/12/2020 | | 1 | SI | | SI | | |
| 80 | ANDRES FERNANDO PEREZ DIAZ | 1,063,625,214 | 1/12/2020 | | | 1 | SI | | SI | | |
| 81 | ANGEL IVAN DIAZ | 79,924,351 | 1/12/2020 | | | 1 | SI | | SI | | |
| 82 | CARLOS ALBERTO SUAREZ BARRERA | 9,527,688 | 1/12/2020 | 2/12/2020 | | 1 | SI | | SI | | |
| 83 | CIRO ARTURO NIÑO | 4,255,303 | 1/12/2020 | | | 1 | SI | | SI | | |
| 84 | EDGAR HERNANDO NIÑO | 4,225,078 | 1/12/2020 | | | 1 | SI | | SI | | |
| 85 | EDWAR ARLEY RODRIGUEZ MAYORGA | 1,033,754,705 | 1/12/2020 | | | 1 | SI | | SI | | |
| 86 | EMILIANO MUÑOZ PALACIO | 80,265,681 | 1/12/2020 | | | 1 | SI | | SI | | |


| No. | NOMBRES Y APELLIDOS | C.C. | FECHA DE INGRESO | FECHA DE EXAMEN MÉDICO DE INGRESO/ PERIODICO | PERSONAL | | IMPLEMENTACIÓN PROTOCÓLO | | ESTADO ACTUAL | | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Administrativo | Operativo: maestros y auxiliares | SI | NO | ACTIVO | RETIRADO | |
| 87 | CAMILO ERNESTO RAMIREZ ROA | 1,033,735,370 | 1/12/2020 | | | 1 | SI | | SI | | |
| 88 | CARLOS SEBASTIAN LOPEZ CASTELLANO | 1,031,170,297 | 1/12/2020 | | | 1 | SI | | SI | | |
| 89 | IDELFONSO DE JESUS PEÑARANDA | 1,118,873,986 | 1/12/2020 | | | 1 | SI | | SI | | |
| 90 | CARLOS ALBERTO PULIDO YATE | 1,033,683,233 | 1/12/2020 | | | 1 | SI | | SI | | |
| 91 | CIPRIANO PIÑEROS | 79,703,764 | 1/12/2020 | 2/12/2020 | | 1 | SI | | SI | | |
| 92 | DAGOBERTO PAREJO AREVALO | 8,668,649 | 1/12/2020 | | | 1 | SI | | SI | | |
| 93 | DANIEL ARTURO NIÑO ROJAS | 1,024,469,352 | 1/12/2020 | | | 1 | SI | | SI | | |
| 94 | EDER GONZALEZ GASTELBLONDO | 84,062,070 | 1/12/2020 | | | 1 | SI | | SI | | |
| 95 | GLORIA JIMENEZ | 28,155,523 | 2/12/2020 | | | 1 | SI | | SI | | |
| 96 | JESUS DAVID LOPEZ GALVIZ | 13,860,790 | 2/12/2020 | | | 1 | SI | | SI | | |
| 97 | JHON RIVER MAYORGA BENAVIDEZ | 1,033,721,955 | 1/12/2020 | | | 1 | SI | | SI | | |
| 98 | SAMIR ZIAD PINEDA YAHMURE | 79,920,337 | 1/12/2020 | | | 1 | SI | | SI | | |
| 99 | SIMON LOPEZ PALACIOS | 94,418,910 | 1/12/2020 | | | 1 | SI | | SI | | |
| 100 | WILSON FERNEY BERNAL GUASCA | 1,033,707,175 | 1/12/2020 | | | 1 | SI | | SI | | |
| 101 | YOISEN HAIDIN CHIBUQUE CAICEDO | 1,007,413,403 | 1/12/2020 | | | 1 | SI | | SI | | |
| 102 | LUIS HERNANDEZ GRANADA | 19,219,713 | 1/12/2020 | | | 1 | SI | | SI | | |
| 103 | ANDRES GARCIA ROJAS | 80,895,628 | 15/12/2020 | | | 1 | SI | | SI | | |
| 104 | EDGAR HERNANDO NIÑO | 4,225,078 | 1/12/2020 | | | 1 | SI | | SI | | |
| 105 | HELI RAMIREZ PERALTA | 79,734,766 | 12/12/2020 | | | 1 | SI | | SI | | |
| 106 | JAVIER FRANCO RODRIGUEZ | 731,054,127,121,978 | 1/12/2020 | | | 1 | SI | | SI | | PERMISO DE TRABAJO MINISTERIO |
| 107 | JEISON LOPEZ MEJIA | 1,033,816,388 | 15/12/2020 | | | 1 | SI | | SI | | |
| 108 | JOSE RODRIGUEZ GARCIA | 1,031,176,991 | 1/12/2020 | 2/12/2020 | | 1 | SI | | SI | | |
| 109 | JULIAN ANDRES ARAGON DEVIA | 1,030,628,205 | 15/12/2020 | | | 1 | SI | | SI | | |
| 110 | KEVINN SEBASTIAN APARACIO | 1,000,064,803 | 10/12/2020 | | | 1 | SI | | SI | | |
| 111 | LUIS CARLOS MENDOZA GAMEZ | 17,971,346 | 4/12/2020 | | | 1 | SI | | SI | | |
| 112 | LUIS MUÑOZ GRAJALES | 80,774,495 | 1/12/2020 | | | 1 | SI | | SI | | |
| 113 | | | | | | | | | | | |
| 201 | | | | | | | | | | | |
| RESULTADOS: | | | | | 15 | 97 | 112 | 0 | 105 | 7 | |

# REGISTRO FOTOGRAFICO

**MV 3146**



DESCRIPCIÓN Y FECHA: Acopio temporal de Escombro - para retiro
Semana 14 al 20 de Diciembre

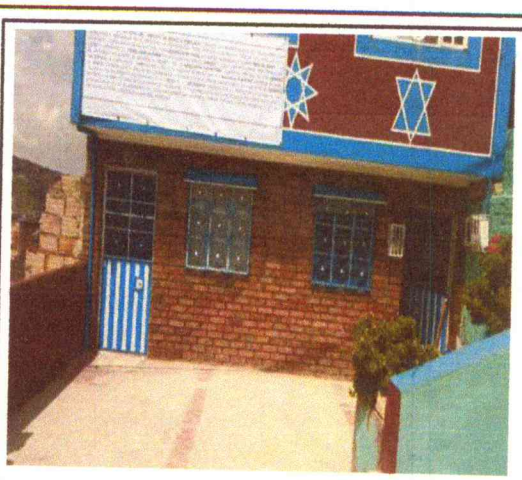


DESCRIPCIÓN Y FECHA: Estado de la vivienda posterior a la recogida de escombros
Semana 14 al 20 de Diciembre

**MV 2992**




DESCRIPCIÓN Y FECHA: Acopio temporal de Escombro - para retiro
Semana 14 al 20 de Diciembre

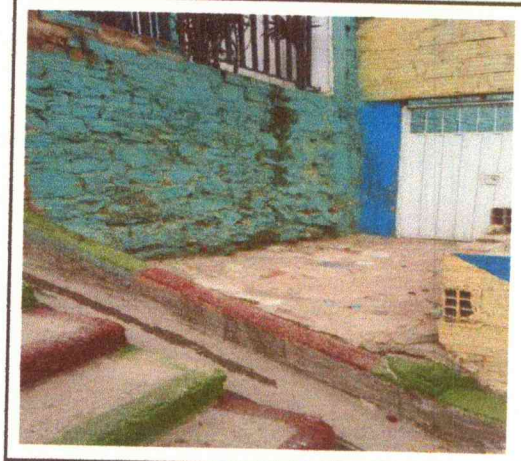

DESCRIPCIÓN Y FECHA: Estado de la vivienda posterior a la recogida de escombros
Semana 14 al 20 de Diciembre

**MVJA - 2812**

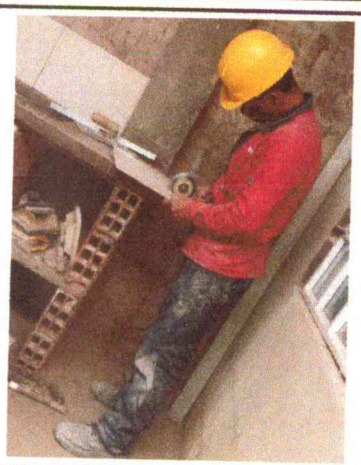

DESCRIPCIÓN Y FECHA: Acto inseguro - no uso de EPP de protección ocular, por ausencia del mismo
Semana 14 al 20 de Diciembre de 2020


**MVJA - 2812**



DESCRIPCIÓN Y FECHA: Reposición de EPP, para poder continuar la actividad
Semana 14 al 20 de Diciembre de 2020

# REGISTRO FOTOGRAFICO

**MV 2926**

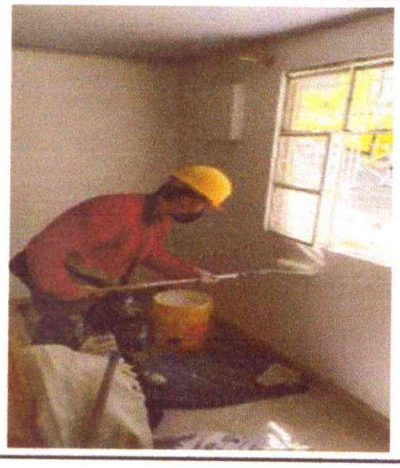

DESCRIPCIÓN Y FECHA: Trabajo en actividades de pintura
Semana 14 al 20 de Diciembre de 2020

**MV 4918**



DESCRIPCIÓN Y FECHA: Actividades de trabajo sin novedad para SST
Semana 14 al 20 de Diciembre de 2020

**MV - 2932**




DESCRIPCIÓN Y FECHA: Toma de temperatura a trabajador
Semana 14 al 20 de Diciembre de 2020

**MV - 2932**



DESCRIPCIÓN Y FECHA: Toma de temperatura a beneficiario
Semana 14 al 20 de Diciembre de 2020

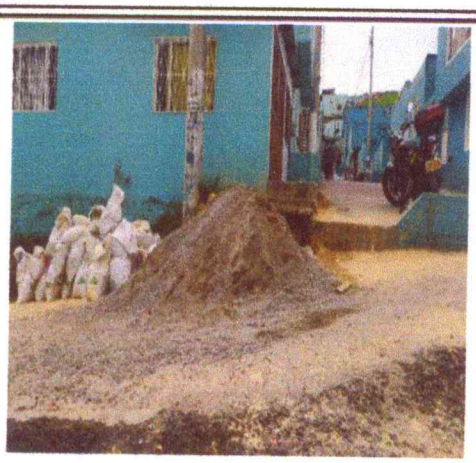

DESCRIPCIÓN Y FECHA: descargue provisional de Material en vía, se solicitó recolección para distribución
Semana 14 al 20 de Diciembre de 2020





DESCRIPCIÓN Y FECHA: Se recolecta material en lonas y es distribuido, despejando la vía
Semana 14 al 20 de Diciembre de 2020
