INPLAYCO S.A.S.
INGENIEROS CONSTRUCTORES E INTERVENTORES


ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE HÁBITAT


INFORME SEMANAL 9

GRUPO No. 1

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 701-2020 CUYO OBJETO ES REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, JURÍDICA, SOCIAL, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA MODALIDAD DE HABITABILIDAD EN LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT.

ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE HÁBITAT

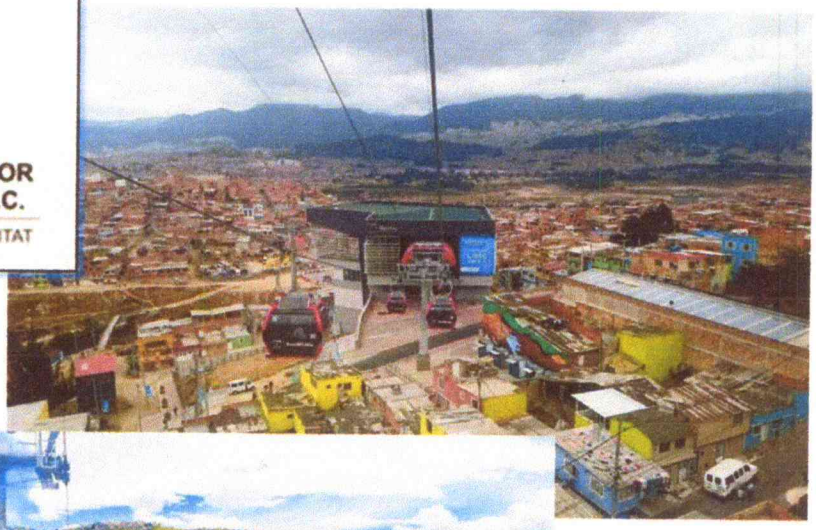

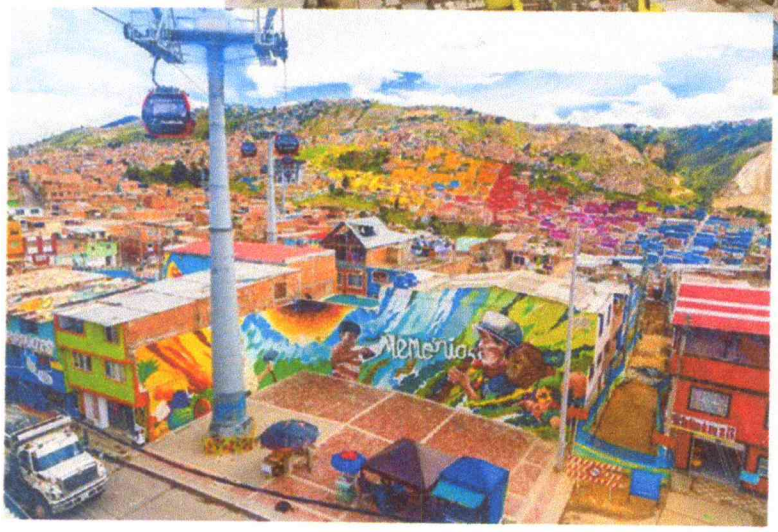

SEMANA 9 DEL 28 AL 3 DE ENERO DE 2021

INPLAYCO S.A.S.
INGENIEROS CONSTRUCTORES E INTERVENTORES

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE HÁBITAT

CONTRATO DE INTERVENTORÍA
NÚMERO: 701-2020

CONTRATANTE:	**SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT**	
CONTRATISTA:	**INPLAYCO S.A.S**	
IDENTIFICACIÓN:	N.I.T.: **860.524.168- 8**	
REPRESENTANTE LEGAL:	**GONZALO LIÉVANO HOYOS**	
IDENTIFICACIÓN:	C.C. Nº 19.100.962	
DIRECCIÓN:	Carrera 16 A No 82-13 Oficina 201	
TELÉFONOS:	6181167	inplayco@yahoo.com.mx
SUPERVISOR	JUAN CARLOS ARBELÁEZ MURILLO	
FECHA DE INICIO	4 DE NOVIEMBRE DE 2020	
FECHA DE FINALIZACIÓN	3 DE MAYO DE 2021	
TIEMPO EJECUCIÓN DEL	6 MESES	
VALOR CONTRATO	$894.285.952	
FECHA ADICIÓN No. 1	------	
VALOR ADICIÓN No. 1	$0	
VALOR TOTAL CONTRATO	$894.285.952	
FECHA PRÓRROGA No. 1	------	
VALOR PRÓRROGA No. 1	$0	
VALOR TOTAL CONTRATO	$894.285.952	

INPLAYCO S.A.S.
INGENIEROS CONSTRUCTORES E INTERVENTORES

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE HÁBITAT

CONTRATO DE OBRA
NÚMERO: 694-2020

CONTRATANTE:	**SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT**	
CONTRATISTA:	CONSORCIO MEJORAMIENTO EP 2020	
REPRESENTANTE LEGAL	LUIS FERNANDO CARRILLO JIMÉNEZ	
OBJETO CONTRACTUAL	"CONTRATAR LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA MODALIDAD DE HABITABILIDAD DE LOS PROYECTOS ESTRUCTURADOS EN LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT.".	
APROPIACIÓN PRESUPUESTAL	CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL NO. 914 DEL 14 DE JULIO DE 2020	
FIDUCIA No.		
DIRECCIÓN:	Calle 31 No. 4 -47 oficina 501 MONTERÍA	
TELÉFONOS:	3212231771	Mejoramientoconsorcio2020@gmail.com
Consorciado No. 1.	CORPORACIÓN MULTIACTIVA EMPRENDER ONG	
NIT	900.164.714-9	
REPRESENTANTE LEGAL	JUAN CARLOS NOBLES NAVARRO	
C.C. R.L.	10.894.408	
Consorciado No. 2.	PROJECT CENTER LIMITADA	
NIT	900.236.613-3	
REPRESENTANTE LEGAL	LUIS FERNANDO CARRILLO JIMENEZ	
C.C. R.L.	72.097.065	
PARTICIPACIÓN		
CORPORACIÓN MULTIACTIVA EMPRENDER	60% / MANEJO TÉCNICO, CONTABLE Y ADMINISTRATIVO	
PROJECT CENTER LIMITADA	40% / MANEJO TÉCNICO y ADMINISTRATIVO	
SUPERVISOR	JUAN CARLOS ARBELÁEZ MURILLO	
FECHA DE INICIO	4 DE NOVIEMBRE DE 2020	
FECHA DE FINALIZACIÓN	3 DE ABRIL DE 2021	
TIEMPO EJECUCIÓN DEL CONTRATO	5 MESES	
VALOR CONTRATO	$3.728.543.252	
FECHA ADICIÓN No. 1	------	
VALOR ADICIÓN No. 1	$0	
VALOR TOTAL CONTRATO	$3.728.543.252	
FECHA PRÓRROGA No. 1	------	
VALOR PRÓRROGA No. 1	$0	
VALOR TOTAL CONTRATO	$3.728.543.252	

INPLAYCO S.A.S.
INGENIEROS CONSTRUCTORES E INTERVENTORES

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE HÁBITAT

INTRODUCCION

Por intermedio de la Secretaria Distrital del Hábitat, se busca adelantar las obras de mejoramiento de vivienda en la modalidad de habitabilidad en los territorios de Ciudad Bolívar, Usme, Bosa; atendiendo a la Política Nacional y Distrital de Construcción Sostenible, ofreciendo a las familias favorecidas la mejora de sus ambientes habitacionales y de vida., para lograr este alcance del objeto contractual, la Secretaria Distrital del Hábitat celebró el contrato de Interventoría con el No 701 de 2020 con la empresa INPLAYCO S.A.S, para su correcta ejecución con el fin de desarrollar las actividades de mejoramiento de las viviendas de los territorios mencionados anteriormente.

ETAPA DE EJECUCION

Este informe ejecutivo se desarrolla en su quinta semana, comprendida del 28 de diciembre al 3 de enero la presente anualidad, periodo en el cual después de la firma del acta de inicio el CONSORCIO MEJORAMIENTO EP 2020, comenzó con las validaciones y ejecución para este periodo el consorcio remite dos cortes ya cumple con 60 casa entregadas al 100%.

Durante la fase de validación se definió por parte el contratista **CONSORCIO MEJORAMIENTO EP 2020,** un punto de atención a la comunidad (PAC) por localidad y/o Territorio, con el fin de garantizar y resolver las dudas, inquietudes, quejas o reclamos de los beneficiarios las cuales son atendidas de manera oportuna; Ubicado en la Kr 18K Bis con Cll 69T Sur a una cuadra de la estación de Trasmicable de Manitas.

Estas reuniones se realizaron bajo los protocolos de Bioseguridad cumpliendo las exigencias del gobierno nacional.

SEMANA 7 DEL 28 DE NOVIEMBRE AL 3 DE ENERO –APERTURAS PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS

Para esta semana el consorcio realiza entregas a los beneficiarios y procede a realizar aperturas de viviendas en diferentes zonas, continuando con lo descrito en la programación entregada, a continuación, se relaciona los MV validados para ejecución de obra.

INPLAYCO S.A.S.
INGENIEROS CONSTRUCTORES E INTERVENTORES

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE HÁBITAT

No.	ID_DMV	Dirección	Nombres y apellidos
NUEVA COLOMBIA			
1	MVCB_1437	KR 18L 70H 09 SUR	FLOR ELISA PARRA ROJAS
2	MVCB_1441	CL 70H SUR 18L 22	LUZMILA TORRES BERMUDEZ
3	MVCB_1440	CL 70H SUR 18L 16	ALBA CARMEN ARDILA MATEUS
4	MVCB_1421	CL 70I SUR 18L 54	MARIA ESTER ZORRO GUERRERO
5	MVCB_1124	DG 69D SUR 18J 15	MARIA ANTONIA SANTOS CORREDOR DE RAMIREZ
6	MVCB_1120	DG 69D SUR 18J 31	QUERUBIN CHAGUALA
7	MVCB_1091	DG 69D BIS SUR 18J 32	LIGIA TEJADA DE BARRERO
8	MVCB_1286	CL 70 SUR 18L 61	LUZ MINDA CASTRO PEÑA
JUAN PABLO II			
9	MVCB_2996	DG 69A BIS B SUR 18M 23	MARIA TERESA ANTOLINEZ Y OTRO
10	MVCB_2993	DG 69A BIS B SUR 18M 35	CARLOS JULIO CARDENAS TRIANA **Beneficiario renuncia subsidio**
11	MVCB_2999	DG 69A BIS B SUR 18M 15	MARIA LEONOR FRAILE SUAREZ
12	MVCB_2991	DG 69A BIS B SUR 18M 43	BRISNELDA CONSTANZA MACIAS MARTINEZ
13	MVCB_2967	DG 69A BIS D SUR 18M 36	MARIA OLGA FARFAN GALEON
14	MVCB_2960	DG 69A BIS D SUR 18M 06	MARIA NURY QUINTERO CARDONA
15	MVCB_2434	KR 18M BIS 69A 64 SUR	MARGARITA MARIA MORALES OROZCO
16	MVCB_2432	KR 18M BIS 69A 72 SUR	AGUSTÍN VILLANUEVA GUZMÁN
17	MVCB_3030	KR 18M BIS 69A 81 SUR	TEODOSIA GALICIA DE GARCIA
18	MVCB_3020	KR 18M BIS A 69A 70 SUR	PEDRO PABLO IBAÑEZ
MIRADOR NUTIVARA			
19	MVCB_1914	CL70M BIS SUR 18N 33	BLANCA ODILLIA PATIÑO DE MARTINEZ
20	MVCB_1843	CL70M BIS SUR 18N 34	FLORALBA GUTIERREZ BELTRAN
21	MVCB_1866	CL70L SUR 18P 21	LUIS ALBERTO ALONSO CASTIBLANCO
22	MVCB_1818	KR 18P 70K 03 SUR	MERQUECIDE MONTAÑEZ UYOA
23	MVCB_1811	CL70K SUR 18Q 09	ROSA ELVIRAGONZALEZ
24	MVCB_1726	CL70K SUR 18P 10	EMPERATRIZ ACOSTA MARTINEZ
25	MVCB_1867	CL70L SUR 18P 15	JOSE ALBER LUGO
26	MVCB_1766	CL70K SUR 18N 46	CARMEN QUIQUE MARTINEZ
27	MVCB_1574	CL 70F SUR 18R 27	JOSE HIPOLITO GUTIERREZ LUCERO
28	MVCB_1588	CL 70F SUR 18P 33	LUZ NELLY RODRIGUEZ
29	MV_1608	KR 18P 70F 06 SUR	ROSALBINA HERNANDEZ PIRACHICAN
ALTOS DE JALISCO			
30	MV_0252	CL 61D SUR 18N 30 MJ	JESUS ANTONIO ORTIZ CASTRO
VISTA HERMOSA			
31	MV SH-005	TV 18I 71 35 SUR	MARIA CUSTODIA SANCHEZ SANCHEZ

INPLAYCO S.A.S.
INGENIEROS CONSTRUCTORES E INTERVENTORES

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARIA DE HÁBITAT

No.	ID_DMV	Dirección	Nombres y apellidos
JUAN PABLO II			
1	MVCB_4919	KR 18M BIS 68B 50 SUR MJ	URIEL PATIÑO RINCON
2	MVCB_4923	KR 18M BIS 68B 26 SUR	SIERVO MATIAS FIGUEROA CHAPARRO
3	MVCB_2932	TV 18N 69A 97 SUR	MARIA TERESA PIÑEROS PIÑEROS
4	MVCB_2926	TV 18N 69A 71 SUR	CORADO TORO DE TORRES Y OTRO
5	MVCB_3646	TV 18N BIS 69A 95 SUR	LUIS ANTONIO CABRERA LOPEZ Y OTRA
6	MVCB_3643	TV 18N BIS 69A 83 SUR	JOSE ARISTOBULO MENJURA LEITON Y OTRA
7	MVCB_2925	TV 18N 69A 67 SUR	MARTHA LUZ CAMPIÑO
8	MVCB_2917	DG 69A BIS B SUR 18M 30	CLAUDIA PATRICIA VARGAS GÓMEZ
9	MVCB_3642	TV 18N BIS 69A 77 SUR	JULIO CESAR FICHAS AVILA
10	MVCB_3641	TV 18N BIS 69A 75 SUR	CECILIA MENDEZ MORENO
11	MVCB_3640	TV 18N BIS 69A 71 SUR	OCTAVIO TELLEZ PINEDA
12	MVCB_3635	TV 18N BIS 69A 51 SUR	JUAN CARLOS MAZO CASTRO Y OTRA
13	MVCB_3634	TV 18N BIS 69A 47 SUR	AYDE NIÑO Y OTRO
14	MVCB_2939	TV 18N BIS 69A 84 SUR	MARIEYE LOAISA
15	MVCB_4918	KR 18M BIS 68B 56 SUR	ALVARO DIAZ AVILA
16	MVCB_3633	TV 18N BIS 69A 43 SUR	FRANCISCO JAVIER MENDIVELSO GUERRERO
17	MVCB_4917	KR 18M BIS 68B 62 SUR	ALVARO ALONSO MORENO
DESARROLLO NUEVA COLOMBIA			
18	MVCB_1320	CL70K SUR 18L 65	ISMINIA BARRETO ARIAS
19	MVCB_1383	CL70J SUR 18L 34	EDGAR FERNANDO CAMARCO ANGEL
20	MVCB_1380	CL 70J SUR 18L 22	ROSALBA MONTES DE CARDONA
21	MVCB_1382	CL 70J SUR 18L 30	MARIA CECILIA RINCON RINCON
22	MVCB_1381	CL 70J SUR 18L 26	NOHORA NOHEMI MAYORGA IBAGUE
23	MVCB_1374	CL 70J SUR 18L 11	OBED OSPINA RESTREPO
24	MVCB_1371	CL 70J SUR 18L 23	CONSUELO NAVARRO
25	MVCB_1328	CL 70K SUR 18L 29	EDILBERTO CARDENAS PAEZ
26	MVCB_1352	CL 70K SUR 18L 64	MARIA RAMOS ORTIZ
27	MVCB_1341	CL 70K SUR 18L 20	JOSE GABRIEL HERRERA MEDINA
28	MVCB_1344	CL 70K SUR 18L 32	ALBEIRO RUIZ SANABRIA
29	MVCB_1310	CL 70L SUR 18L 70	DORA ALICIA LÓPEZ SANABRIA
30	MVCB_1314	KR 18M 70K 16 SUR	MARTHA LUCIA OSPINA PEÑA
VILLAS DEL DIAMANTE			
31	MVCB_5128	CL 69N SUR 18N 52	DIEGO MARIO VANEGAS VILLAMIL
32	MVCB_5156	CL 69N SUR 18N 58 MJ	FRANCISCO JAVIER ARANGO GUTIERREZ
33	MVCB_5127	CL 69N SUR 18N 59 MJ	VICTOR MANUEL MUÑOZ VERGARA

No.	ID_DMV	Dirección	Nombres y apellidos
MIRADOR NUTIVARA			
1	MVCB_1873	CL 70L BIS SUR 18N 14	BLANCA FABIOLA LANDAZURI MESA
2	MVCB_1886	KR 18N 70K 31 SUR	LUZ MARIA ARIZA ARIZA
3	MVCB_1836	KR 18N 70K 09 SUR	DELIA MARÍA MATEUS ESCAMILLA
4	MVCB_1829	CL 70K SUR 18N 45	DIANA PATRICIA PÁEZ FINO
5	MVCB_1684	CL 70I SUR 18N 56	MIRYAM MANRIQUE URUEÑA
6	MVCB_1692	CL 70 H SUR 18 N 51	BEATRIZ ADIELA MARTINEZ JARAMILLO
7	MVCB_1681	CL 70 I SUR 18 N 36 MJ	ALVARO ELIECER VERDUGO RODRIGUEZ
8	MVCB_1638	KR 18R 70H 09 SUR	MAURICIO ENRIQUE MUÑOZ RIAÑO
9	MVCB_1664	KR 18P 70G 08 SUR	MARINA CLEMENCIA RAMOS
10	MVCB_1748	KR 18P 70I 04 SUR	OLGA LUZ BETANCOURT LEON
11	MVCB_1704	KR 18R 70H 08 SUR	ALBA LUCIA VALENCIA OCAMPO
12	MVCB_1631	CL 70G SUR 18R15	ELOISA LAVERDE RIOS
13	MVCB_1592	CL 70F SUR 18N 28	HOBER FABIAN BARRERA GUTIERREZ
NUEVA COLOMBIA			
14	MVCB_1130	DG 69F SUR 18J 18	CARMEN JULIA SUAREZ PARADA
15	MVCB_1180	DG 69F SUR 18J 15	BLANCA TERESA CALVO DE GARZON
16	MVCB_1181	DG 69F SUR 18J 11	ALBERTO ULLOA ULLOA
17	MVCB_1161	DG 69F SUR 18J 03	MARIA ROSA ELENA BECERRA SEGURA
18	MVCB_1212	DG 69G SUR 18J 43	HERNAN LOPEZ
19	MVCB_1194	DG 69H SUR 18J 20	VICTOR HUGO WILCHES BERNAL
20	MVCB_1467	CL 70H SUR 18J 70	TERESA DE JESUS OLIVOS DE BLANCO
21	MVCB_1469	CL 70H SUR 18J 82	JORGE SANCHEZ FORERO
22	MVCB_1470	KR 18L 70G 24 SUR	ANA SILVIA CHACON
23	MVCB_1495	KR 18L 70H 10 SUR	YACQUELINE RADA MOJICA
24	MVCB_1493	CL 70I SUR 18J 86	MARIA ELENA ALCIRA GARZON CASALLAS
25	MVCB_1516	KR 18L 70I 10 SUR	BERTHA CECILIA MOJICA RUIZ
26	MVCB_1417	CL 70I SUR 18L 30	DIANA MARCELA PARRA BALLESTEROS
27	MVCB_1416	CL 70I SUR 18L 22	ANA CENETH TORRES ROJAS
28	MVCB_1407	CL 70I SUR 18L 33	MARIA ELSA TORRES
29	MVCB_1409	CL 70I SUR 18L 21	FRAN EDILBERTO CRUZ CANO Y OTRA
VILLAS DEL DIAMANTE			
30	MVCB_5118	TV 18P BIS 69N 17 SUR	CARLOS ALFREDO CLAVIJO ROZO
31	MVCB_5464	KR 19D BIS 70C 25 SUR (KR 19B 70C 25 SUR)	IRMA ROJAS ROJAS
32	MVCB_5491	KR 19F 70C 41 SUR MJ	LEONILDE BUITRAGO MORENO

INPLAYCO S.A.S.
INGENIEROS CONSTRUCTORES E INTERVENTORES

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE HÁBITAT

No.	ID_DMV	Dirección	Nombres y apellidos
ALTOS DE JALISCO			
1	MVJA_2992	KR 18 N BIS 61C 21 SUR	TEODOSIA GALICIA DE GARCIA
2	MVJA_3141	KR 18P 62 A 30 SUR MJ	MARIA LEONOR FRAILE SUAREZ
3	MVJA_3146	KR 18P 62ª 45 SUR MJ	MARIA ESTER ZORRO GUERRERO
4	MVJA_3335	KR 18P BIS B 62A 48 SUR MJ	CARLOS JULIO CARDENAS TRIANA
5	MVJA_3314	KR 18P BIS B 61D 36 SUR	BRISNELDA CONSTANZA MACIAS MARTINEZ
6	MVJA_3239	KR 18P BIS A 61C 22 SUR MJ	NATIVIDAD SILDANA CELYS VIUDA DE GARCIA
7	MVJA_0259	CL 70H SUR 18L 16	ALBA CARMEN ARDILA MATEUS
8	MVJA_3223	DG 69A BIS D SUR 18M 36	MARIA OLGA FARFAN GALEON
9	MVJA_3231	DG 69D SUR 18J 15	MARIA ANTONIA SANTOS CORREDOR DE RAMIREZ
10	MVJA_3119	CL 70H SUR 18L 22	LUZMILA TORRES BERMUDEZ
11	MVJA_3125	KR 18L 70H 09 SUR	FLOR ELISA PARRA ROJAS
12	MVJA_0252	CL 61D SUR 18N 30 MJ	JESUS ANTONIO ORTIZ CASTRO
13	MVJA_2996	KR 18N BIS 61D 18 SUR	MARIA DEL SOCORRO CUPITRA CACAIS
14	MVJA_2712	KR 18M 62 29 SUR	JOSE ALIRIO ORTIZ CABRERA Y OTRA
15	MVJA_2707	KR 18M 62 12 SUR	ANA LUISA BERNAL PULIDO
16	MVJA_2640	KR18L BIS A 61D 47 SUR	PAOLA ANDREA BARRERA PELAEZ
MIRADOR NUTIVARA			
17	MVCB_1774	CL 70J SUR 18N 23	JOSE WILSON MARULANDA GIRALDO
18	MVCB_1742	CL 70J SUR 18N 34	ANA ELVIA MENDOZA DE HERNANDEZ
19	MVCB_1907	CL 70N SUR 18N 22	ANA ROSA LLANOS DE GARCIA
20	MVCB_1661	CL 70H SUR 18N 46 MJ	MARICIELO ARIAS CERQUERA
21	MVCB_1698	CL 70I SUR 18P 22	LUZ AMALFI GUTIERREZ FRANCO
22	MVCB_1708	TV 18R 70H 57 SUR	MARIA EUGENIA TRUJILLO QUIMBAYO
ROCIO ALTOS DEL SUR			
23	MVJA_2981	DG 69A BIS D SUR 18M 06	LEONOR TOVAR BARRERO
24	MVJA_2812	KR 18M BIS 69A 64 SUR	MARGARITA MARIA MORALES OROZCO
25	MVJA_2909	KR 18M BIS 69A 72 SUR	AGUSTÍN VILLANUEVA GUZMÁN
26	MVJA_0186	KR 18M BIS A 69A 70 SUR	PEDRO PABLO IBAÑEZ
LA ESCALA			
27	MVJA_2672	DG 69A BIS B SUR 18M 23	MARIA TERESA ANTOLINEZ Y OTRO
ACACIAS SUR			
28	MVJA_0598	CL 62A SUR 18R 15	RODULFO BEJARANO
BARRIO GIBRALTAR I Y II			
29	MVJA_0834	CL 63A SUR 18Q 05	CLARA INES OCHOA GUTIERREZ
30	MVJA_3011	CL 63A SUR 18Q 05	RITA DEL CARMEN FONSECA CAMARGO
31	MVJA_3157	KR 18N BIS 63 27 SUR	IRIA ESTHER SILVA
32	MVJA_3397	KR 18P 63 16 SUR	LUZ MARINA ROBAYO ALVARADO
LA ESCALA 3ER SECTOR			
33	MVJA_0502	CL 62A SUR 18J 20	ROSALBA JARA DE ROJAS
34	MVJA_0519	CL 62A SUR 18K 20	NESTOR JAVIER VALENZUELA PEÑA
CIUDAD MILAGRO			
35	MVJA_0395	CL 62 SUR 18K 78	JOSE ORVEY ORTIZ
VILLAS DEL DIAMANTE			
36	MVCB_5474	CL 70F SUR 19F 18 MJ	OLIVIA RIVERA
37	MVCB_5395	CL 70B SUR 18R 29	MARÍA CRISTINA GONZALEZ GARCÍA
38	MVCB_5388	CL 70C SUR 18R 48	DUBERNEY ARIAS BETANCUR

INPLAYCO S.A.S.
INGENIEROS CONSTRUCTORES E INTERVENTORES

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE HÁBITAT

No.	ID_DMV	Dirección	Nombres y apellidos
DOMINGO LAIN II SECTOR Y CONDOMINIO DEL BOSQUE			
1	MVJA_0723	CL 63 SUR 18K 14	VICTOR MANUEL SAMORA HERNANDEZ
DOMINGO LAIN I			
2	MVJA_0898	CL 63B SUR 18L 53	EFIGENIA GUIZA DE SANCHEZ
3	MVJA_0899	CL 63B SUR 18L 61	DORIS AYDEE HERRERA OTALORA
4	MVJA_0970	CL 63D SUR 18L 02	DORIS CUESTA DE RODRIGUEZ
ALTOS DE JALISCO			
5	MVJA_2741	KR 18M 62ª 44 SUR	CARLOS ALBERTO MUÑETON FRANCO
6	MVJA_2729	KR 18M 62ª 07 SUR	JOSE IGNACIO TAO IBARRA
7	MVJA_0544	CL 62ª SUR 18M 09	MERCEDES RIAÑO PARRA
8	MVJA_0567	CL 62ª SUR 18M 41 IN 9	MARIA DEL ROSARIO RODRIGUEZ
9	MVJA_3309	KR 18P BIS B 61D 25 SUR	TEOFILO MORALES TURGA Y OTRA
10	MVJA_3366	KR 18Q 61C 34 SUR	EDILMA ALCIRA CASTILLO
11	MVJA_4350	TV 18Q BIS C 61B 87 SUR	MARÍA BENDITA REDONDO CASTIBLANCO
12	MVJA_2660	KR 18L BIS A 62ª 39 SUR	MANUEL EDUARDO RODRIGUEZ PRIETO
13	MVJA_4333	TV 18Q BIS C 61B 45 SUR	BEATRIZ CABRALES ACERO
14	MVJA_0890	CL 63B SUR 18K 56	HERNAN HUMBERTO PARRACORREDOR DE RAMIREZ
LA ESCALA 3ER SECTOR			
15	MVJA_0530	CL 62ª SUR 18L 07	LUIS ALIRIO LÓPEZ DÍAZ
GIBRALTAR I Y II			
16	MVJA_4375	TV 18R 61B 41 SUR	FERNANDO TORRES Y OTRA
ACACIAS SUR			
17	MVJA_0598	CL 62A SUR 18R 15	RODULFO BEJARANO
18	MVJA_0608	CL 62A SUR 18T 10	MARIA LUIDINA VARGAS AGUIRRE
19	MVJA_3670		
LA ESPERANZA			
20	MVJA_3607	KR 18T 62A 21 SUR	LUIS ENRIQUE JIMENEZ VEGA
21	MVCB_1574	CL 70F SUR 18R 27	JOSE HIPOLITO GUTIERREZ LUCERO

INPLAYCO S.A.S.
INGENIEROS CONSTRUCTORES E INTERVENTORES

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARIA DE HÁBITAT

PQR - A la fecha se recibió 1 PQR



OBSERVACIONES Y PQRS

CIUDAD BOLIVAR SEMANA 9	OBSERVACION	PQR	
		SI	NO
NUEVA COLOMBIA			X
JUAN PABLO II			X
MIRADOR NUTIVARA			X
DESARROLLO NUEVA COLOMBIA			X
DOMINGO LAIN II SECTOR Y CONDOMINIO DEL BOSQUE			X
DOMINGO LAIN I			X
ALTOS DE JALISCO	MVJA_3314 – MVJA_2812-MVJA_0286-MVJA_3670	X	
LA ESCALA 3ER SECTOR			X
GIBRALTAR I Y II			X
ROCIO ALTOS DEL SUR			X
LA ESCALA			X

		APERTURA	CIERRE
MVJA_3314	Se presenta por retrasos en la ejecución de obra, se recomienda darle celeridad a la ejecución y entregar obra.	21-12-2020	30-12-2020
MVJA_2812	Beneficiaria manifiesta inconformidad con respecto a los tiempos de ejecución y de intervención del personal de obra. Se recomienda dar celeridad al avance constructivo, posteriormente se entrega la vivienda y queda cerrada.	23-12-2020	28-12-2020
MVJA_3670	Solicitud comunicada a través de la SDHT indicando inquietudes por el subsidio e inicio de actividades,	28 -12-2020	
MVJA_0286	Solicitud comunicada a través de la SDHT indicando inquietudes por el subsidio e inicio de actividades,	28 -12-2020	


INPLAYCO S.A.S.
INGENIEROS CONSTRUCTORES E INTERVENTORES

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARIA DE HÁBITAT

Avance de Validaciones.





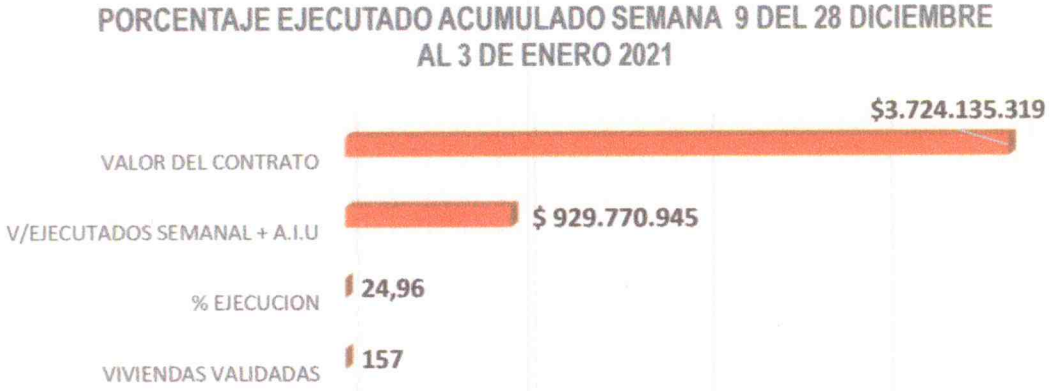


Para la **semana 9 DEL 28 DICIEMBRE AL 3 DE ENERO 2021** el CONSORCIO MEJORAMIENTO EP 2020, facturadas 60 viviendas ejecutadas 62 MV.

INPLAYCO S.A.S.
INGENIEROS CONSTRUCTORES E INTERVENTORES

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE HÁBITAT


PORCENTAJE DE MV EN EJECUCION SEMANA 9

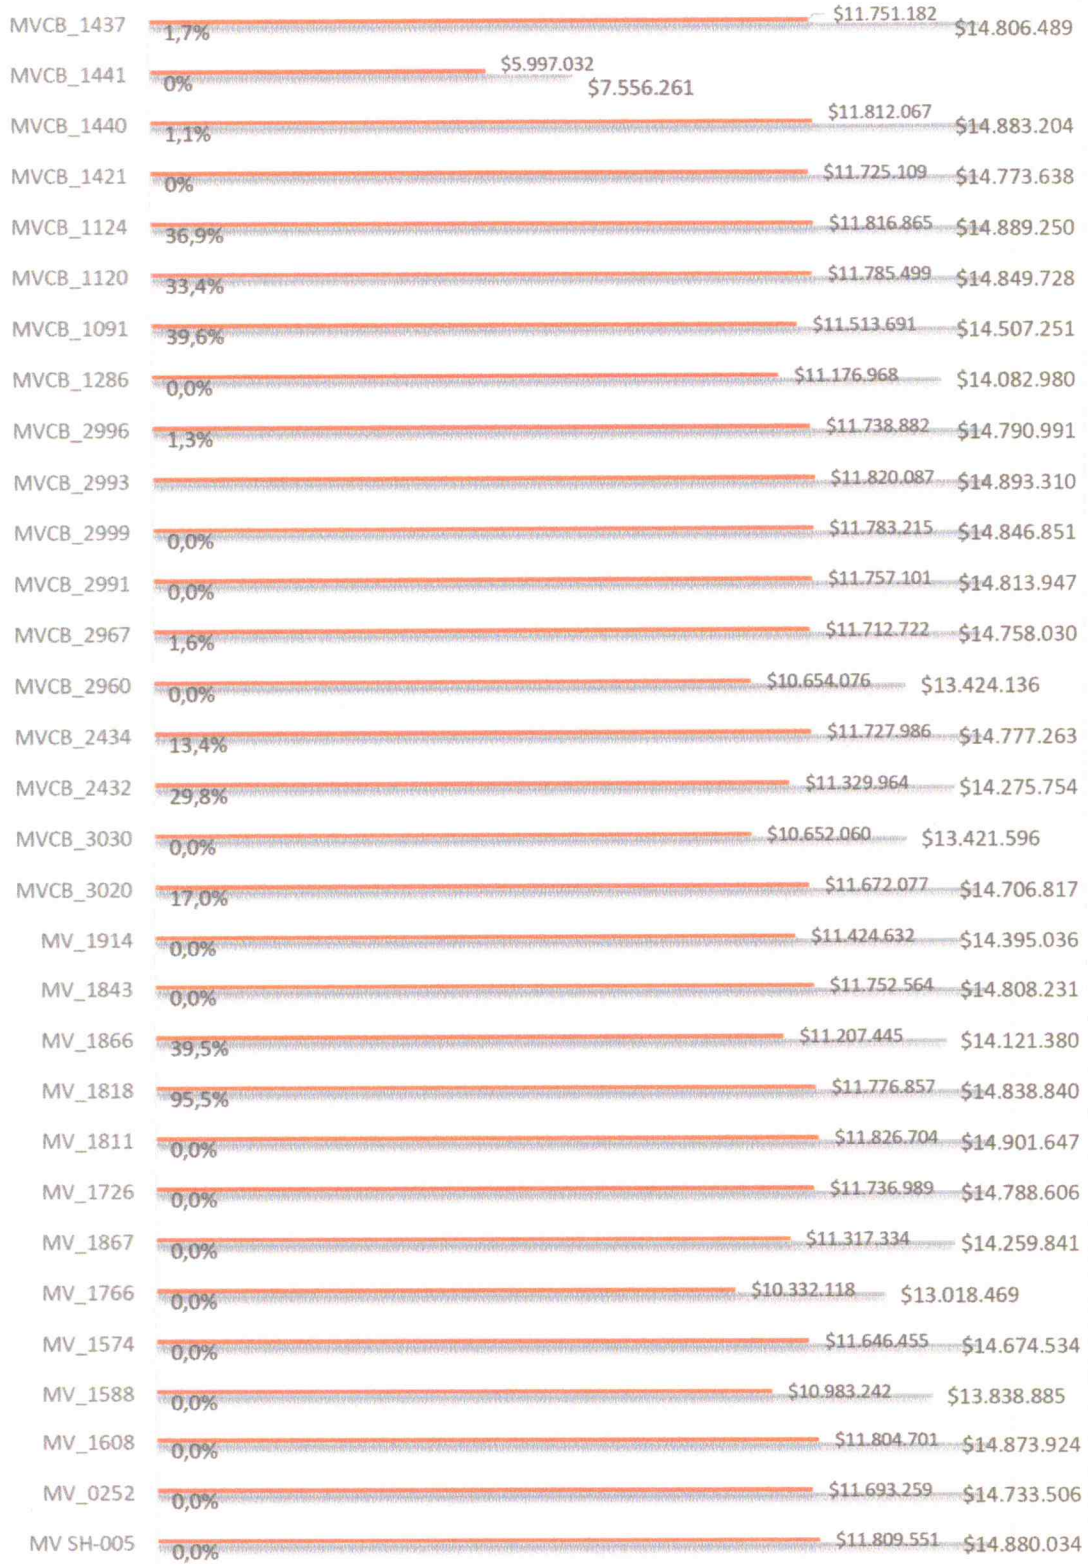

INPLAYCO S.A.S.
INGENIEROS CONSTRUCTORES E INTERVENTORES

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARIA DE HÁBITAT


PORCENTAJE DE MV EN EJECUCION SEMANA 3

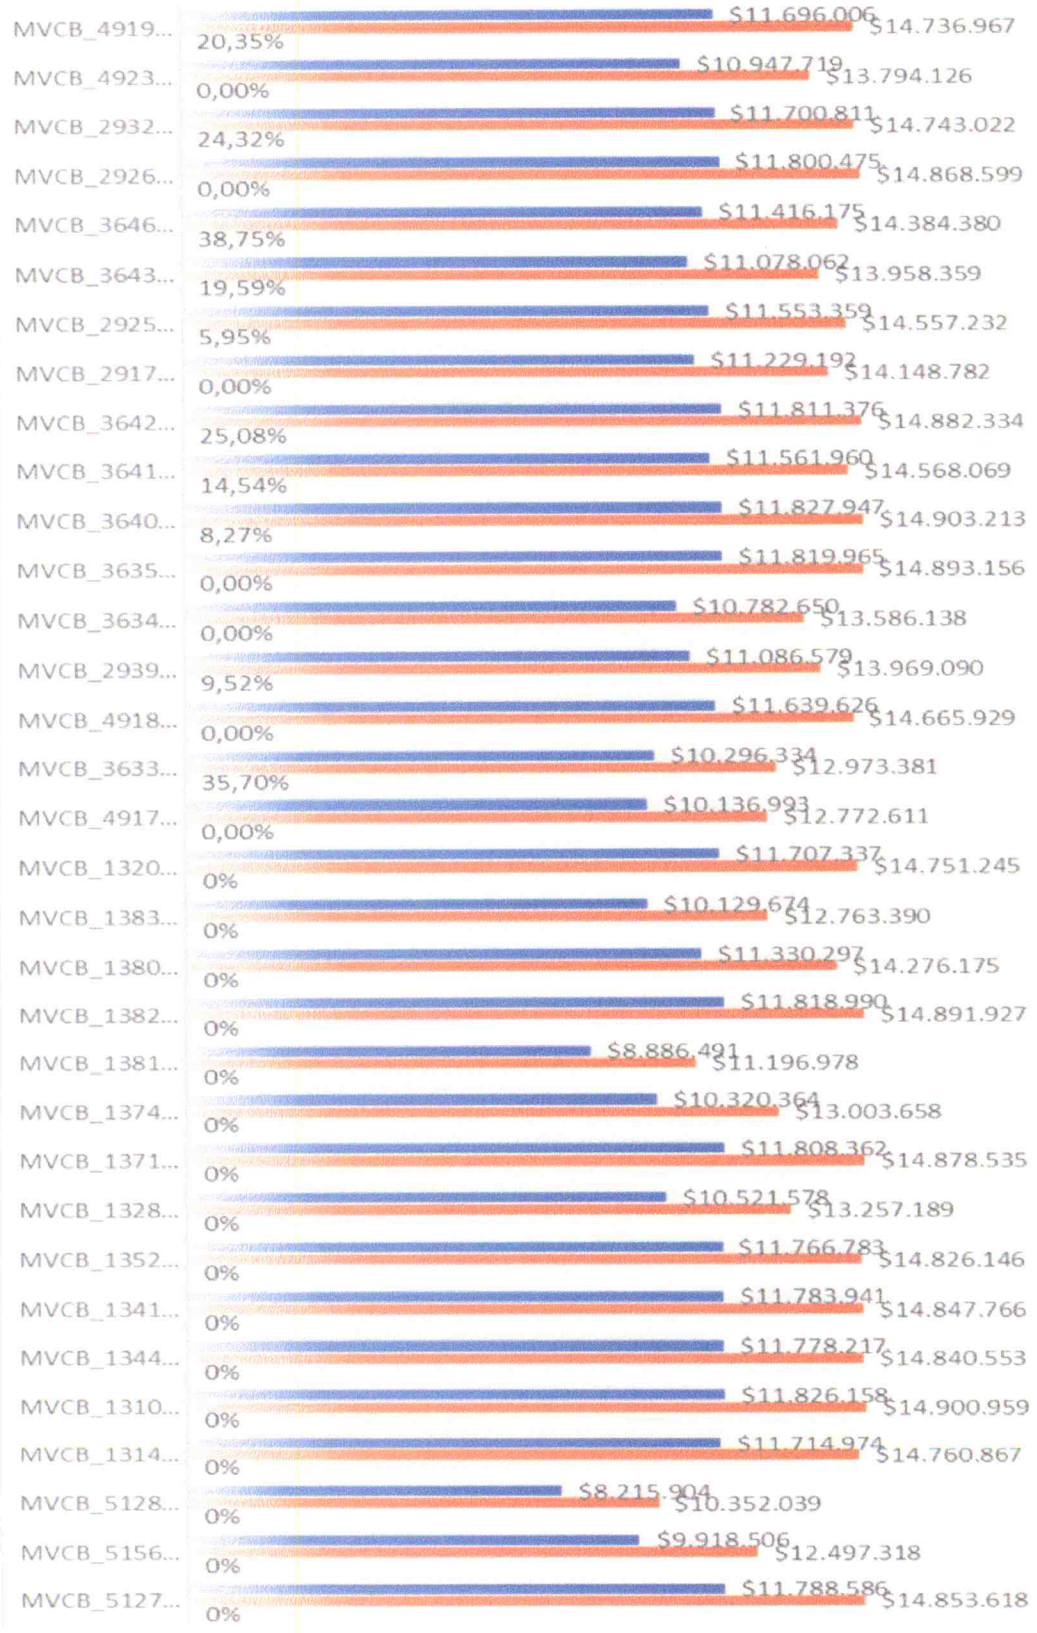

INPLAYCO S.A.S.
INGENIEROS CONSTRUCTORES E INTERVENTORES

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARIA DE HÁBITAT


PORCENTAJE DE MV EN EJECUCION SEMANA 9

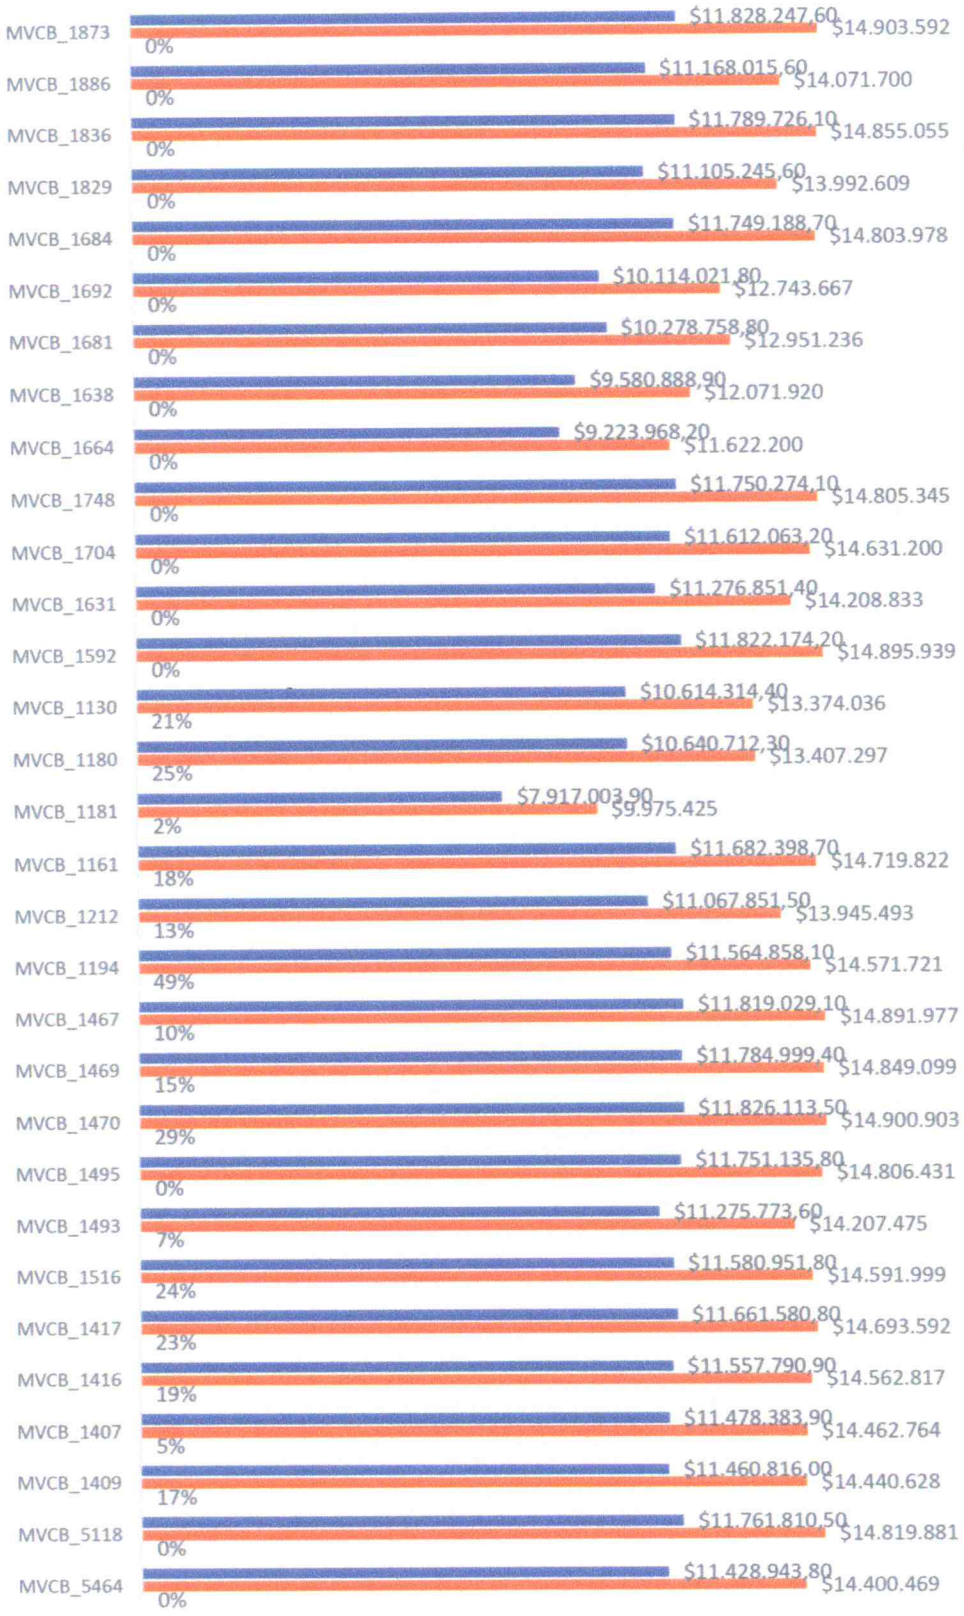

INPLAYCO S.A.S.
INGENIEROS CONSTRUCTORES E INTERVENTORES


ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE HÁBITAT

PORCENTAJE DE MV EN EJECUCION SEMANA 9

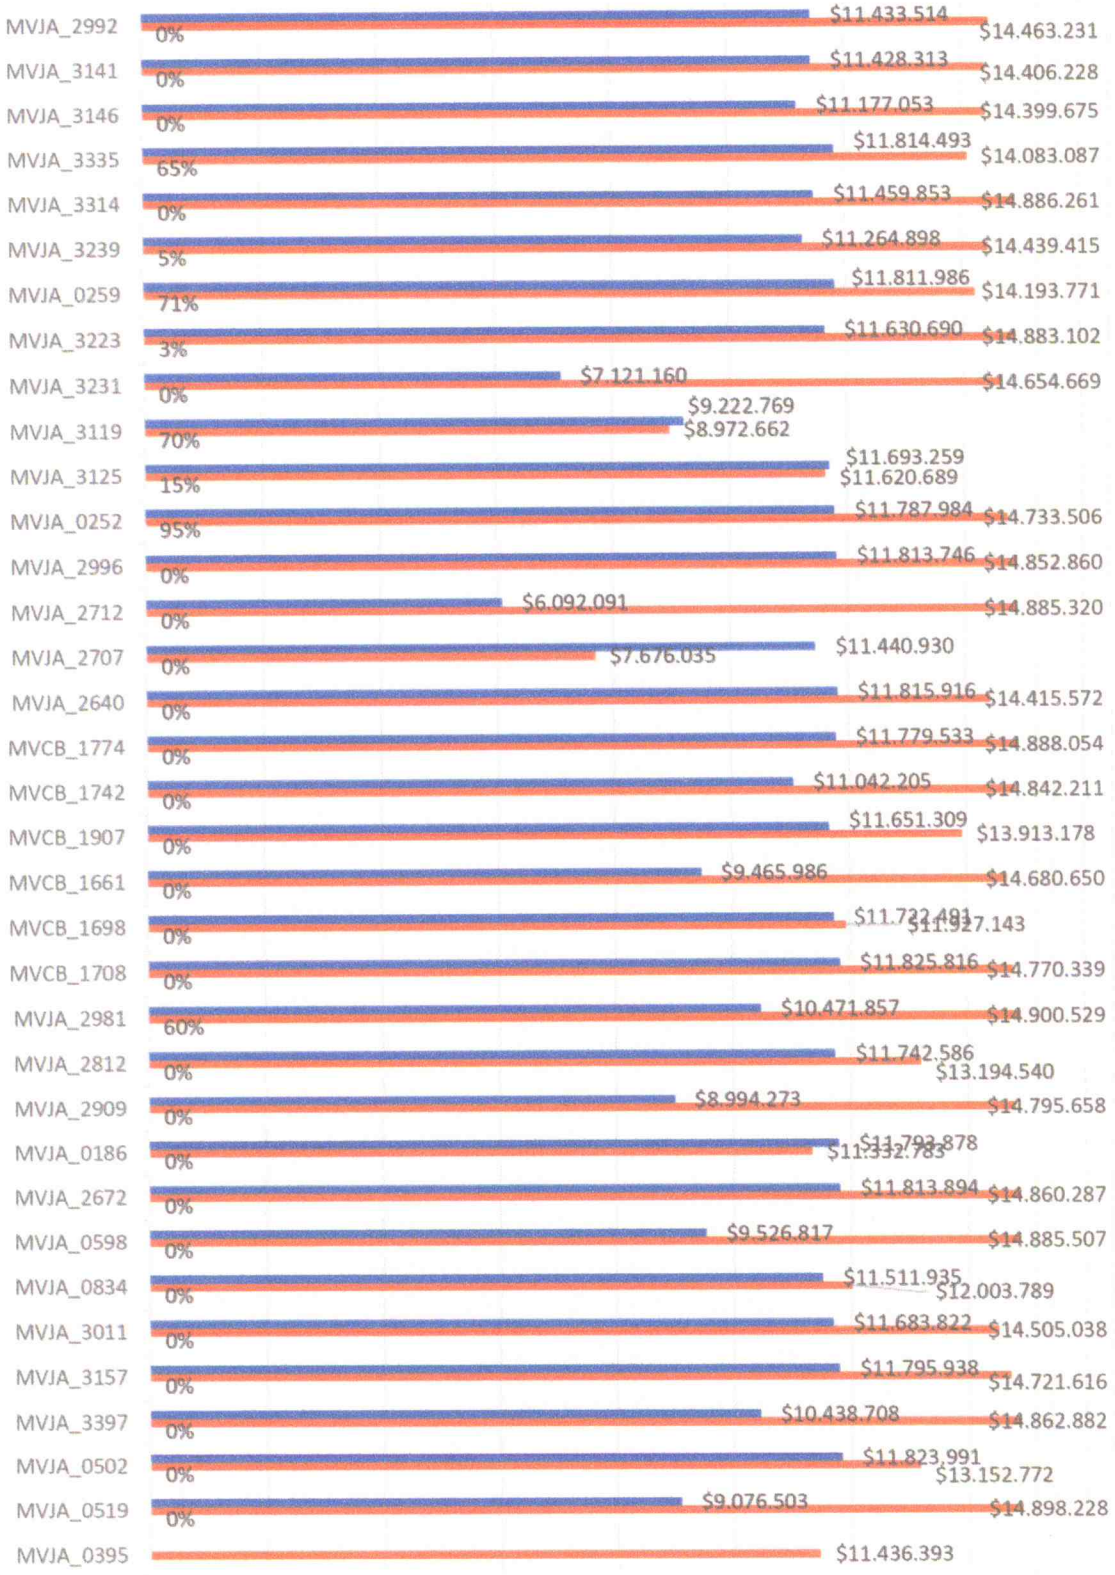

INPLAYCO S.A.S.
INGENIEROS CONSTRUCTORES E INTERVENTORES

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE HÁBITAT

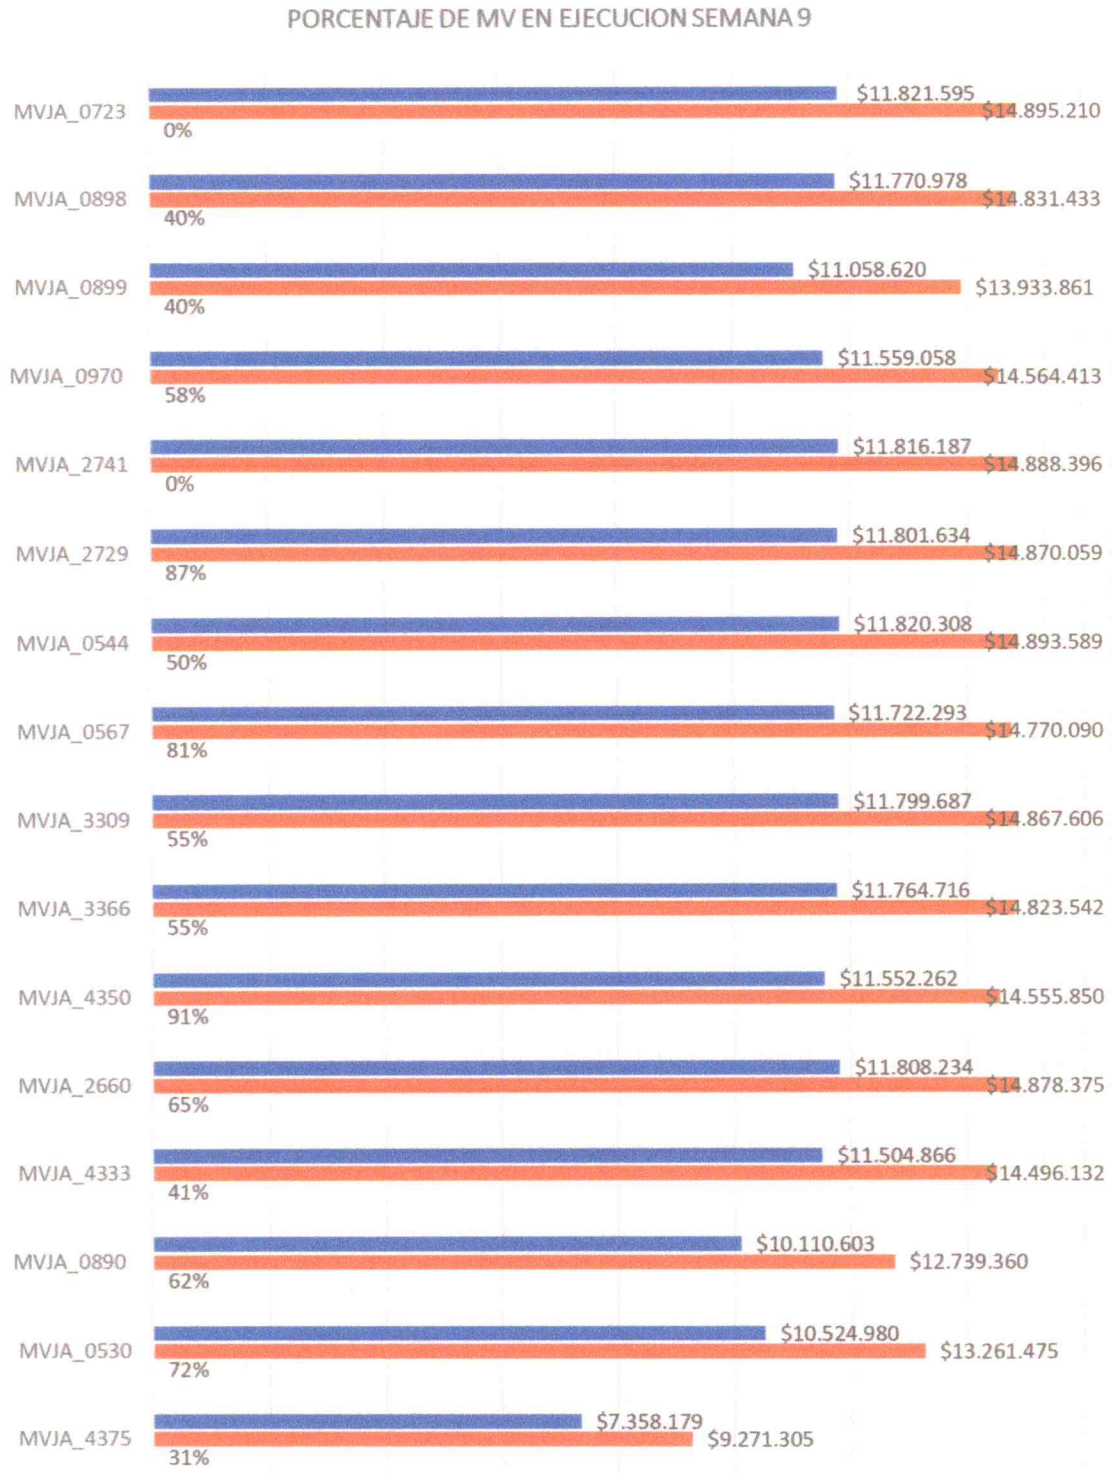

Para esta semana el CONSORCIO MEJORAMIENTO EP 2020, continua con 24 viviendas en ejecucion las cuales 2 que aperturaron pero solo se llevo material.

INPLAYCO S.A.S.
INGENIEROS CONSTRUCTORES E INTERVENTORES

ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE HÁBITAT

INFORME TECNICO SEMANAL 9

INPLAYCO S.A.S.
INGENIEROS CONSTRUCTORES E INTERVENTORES

ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE HÁBITAT

No.	ID_DMV	Dirección	Nombres y apellidos
NUEVA COLOMBIA			
1	MVCB_1437	KR 18L 70H 09 SUR	FLOR ELISA PARRA ROJAS
2	MVCB_1441	CL 70H SUR 18L 22	LUZMILA TORRES BERMUDEZ
3	MVCB_1440	CL 70H SUR 18L 16	ALBA CARMEN ARDILA MATEUS
4	MVCB_1421	CL 70I SUR 18L 54	MARIA ESTER ZORRO GUERRERO
5	MVCB_1124	DG 69D SUR 18J 15	MARIA ANTONIA SANTOS CORREDOR DE RAMIREZ
6	MVCB_1120	DG 69D SUR 18J 31	QUERUBIN CHAGUALA
7	MVCB_1091	DG 69D BIS SUR 18J 32	LIGIA TEJADA DE BARRERO
8	MVCB_1286	CL 70 SUR 18L 61	LUZ MINDA CASTRO PEÑA
JUAN PABLO II			
9	MVCB_2996	DG 69A BIS B SUR 18M 23	MARIA TERESA ANTOLINEZ Y OTRO
10	MVCB_2993	DG 69A BIS B SUR 18M 35	CARLOS JULIO CARDENAS TRIANA **Beneficiario renuncia subsidio**
11	MVCB_2999	DG 69A BIS B SUR 18M 15	MARIA LEONOR FRAILE SUAREZ
12	MVCB_2991	DG 69A BIS B SUR 18M 43	BRISNELDA CONSTANZA MACIAS MARTINEZ
13	MVCB_2967	DG 69A BIS D SUR 18M 36	MARIA OLGA FARFAN GALEON
14	MVCB_2960	DG 69A BIS D SUR 18M 06	MARIA NURY QUINTERO CARDONA
15	MVCB_2434	KR 18M BIS 69A 64 SUR	MARGARITA MARIA MORALES OROZCO
16	MVCB_2432	KR 18M BIS 69A 72 SUR	AGUSTÍN VILLANUEVA GUZMÁN
17	MVCB_3030	KR 18M BIS 69A 81 SUR	TEODOSIA GALICIA DE GARCIA
18	MVCB_3020	KR 18M BIS A 69A 70 SUR	PEDRO PABLO IBAÑEZ
MIRADOR NUTIVARA			
19	MVCB_1914	CL70M BIS SUR 18N 33	BLANCA ODILLIA PATIÑO DE MARTINEZ
20	MVCB_1843	CL70M BIS SUR 18N 34	FLORALBA GUTIERREZ BELTRAN
21	MVCB_1866	CL70L SUR 18P 21	LUIS ALBERTO ALONSO CASTIBLANCO
22	MVCB_1818	KR 18P 70K 03 SUR	MERQUECIDE MONTAÑEZ UYOA
23	MVCB_1811	CL70K SUR 18Q 09	ROSA ELVIRAGONZALEZ
24	MVCB_1726	CL70K SUR 18P 10	EMPERATRIZ ACOSTA MARTINEZ
25	MVCB_1867	CL70L SUR 18P 15	JOSE ALBER LUGO
26	MVCB_1766	CL70K SUR 18N 46	CARMEN QUIQUE MARTINEZ
27	MVCB_1574	CL 70F SUR 18R 27	JOSE HIPOLITO GUTIERREZ LUCERO
28	MVCB_1588	CL 70F SUR 18P 33	LUZ NELLY RODRIGUEZ
29	MV_1608	KR 18P 70F 06 SUR	ROSALBINA HERNANDEZ PIRACHICAN
ALTOS DE JALISCO			
30	MV_0252	CL 61D SUR 18N 30 MJ	JESUS ANTONIO ORTIZ CASTRO
VISTA HERMOSA			
31	MV SH-005	TV 18I 71 35 SUR	MARIA CUSTODIA SANCHEZ SANCHEZ

Subsecretaria de Coordinacion Operativa

Subdireccion de Barrios

Seguimiento ejecución proyectos de Mejoramiento de Vivienda - Habitabilidad

Proyecto mejoramiento de vivienda - AVANCE EJECUCIÓN SEMANAL

Fecha	3-ene-21

Consorcio mejoramiento EP 2020 - Contratista de obra

Contratato de obra	694-2020				Plazo	Cinco (5) meses
Objeto	Contratar la ejecución de las obras de mejoramiento de vivienda en la modalidad de habitabilidad de los proyectos estructurados en los territorios priorizados por la Secretaria Distrital de Habitat. Grupo I				Acta de inicio	4 de noviembre de 2020
CDP No.	No. 914 del 14 de julio de 2020	CRP No.			Valor del contrato	TRES MIL SETECIENTOS VEINTICUATRO MILLONES CIENTO TREINTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS DIEZ Y NUEVE PESOS ($3.724.135.319) M/Cte

Gonzalo Llevano Hoyos -INPLAYCO S.A.S.

Contratato de interventoría	701-2020				Plazo	Seis (6) meses
Objeto	Realizar la interventorias técnica, jurídica, social, administrativa y financiera, para la ejecución de las obras de mejoramiento de vivienda en la modalidad de habitablidad en los territorios priorizados por la secretaria distrital de hábitat.				Acta de inicio	04 de noviembre 2020
CDP No	No. 892 del 14 de julio de 2020	CRP No.			Valor del contrato	OCHOCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS M/CTE ($894.285.952),

Fase 1: Validación de la información entregada por el la SDHT									Fase 2: Ejecución de obras				
					Validación				Ejecución				
Territorio o barrio a intervenir	CIUDAD BOLIVAR	Barrios	Predios	Total Predios	Validada	V/Por Validar	Renuncia	V/Modificada	En Ejecución	Terminadas	Por Ejecutar	% de Avance	Acta de Entrega a Satisfacción
Arq o Ing. Responsable	ARQ. WILLIAM FDO GARZÓN	NUEVA COLOMBIA	8	31	8	0		0	0	7	1	2,58%	7
		JAUN PABLO II	10		10	0	1	0	0	9	0	3,49%	9
Técnico Responsable		MIRADOR NUTIVARA	11		11	0		0	0	2	9	0,78%	2
		ALTOS DE JALISCO	1		1	0		0	0	0	1	0,00%	0
		VISTA HERMOSA	1		1			0	0	0	1	0,00%	0
Subtotal			31		31	0	1	0	0	18	12	6,85%	18

AVANCE DE EJECUCIÓN SEMANAL										DICIEMBRE				ENERO
Proyecto				FASE I			Tiempo Programacion			SEMANA DEL 30 AL 06	SEMANA DEL 7 AL 13	SEMANA DEL 14 AL 20	SEMANA DEL 21 AL 27	SEMANA DEL 28 AL 03
No.	ID_DMV	Dirección	Nombres y apellidos	V/ Validada	V/ Modificada	V/Inicial	Fecha inicio	Fecha terminada	P. inicio	5 semana	6 semana	7 semana	8 semana	9 semana
		NUEVA COLOMBIA												
1	MVCB_1437	KR 18L 70H 09 SUR	FLOR ELISA PARRA ROJAS	SI / NO		$11.751.182	24/11/2020	21/12/2020	24/11/2020	23%	18%	47,3%	1,7%	100,0%
2	MVCB_1441	CL 70H SUR 18L 22	LUZMILA TORRES BERMUDEZ	SI / NO		$5.997.032	24/11/2020	15/12/2020	24/11/2020	42%	10%	40,0%	0%	100,0%
3	MVCB_1440	CL 70H SUR 18L 16	ALBA CARMEN ARDILA MATEUS	SI / NO		$11.812.067	24/11/2020	29/12/2020	24/11/2020	20%	28%	43,9%	0,0%	100,0%
4	MVCB_1421	CL 70I SUR 18L 54	MARIA ESTER ZORRO GUERRERO	SI / NO		$11.725.109	24/11/2020	14/12/2020	24/11/2020	29%	58%	1,0%	0%	100,0%
5	MVCB_1124	DG 69D SUR 18J 15	MARIA ANTONIA SANTOS CORREDOR DE RAMIREZ	SI / NO		$11.816.865	27/11/2020	23/12/2020	27/11/2020	0%	5%	58,1%	36,9%	100,0%
6	MVCB_1120	DG 69D SUR 18J 31	QUERUBIN CHAGUALA	SI / NO		$11.785.499	27/11/2020	26/12/2020	27/11/2020	0%	20%	46,6%	26,3%	100,0%
7	MVCB_1091	DG 69D BIS SUR 18J 32	LIGIA TEJADA DE BARRERO	SI / NO		$11.513.691	27/11/2020	26/12/2020	27/11/2020	0%	15%	45,4%	34,7%	100,0%
8	MVCB_1286	CL 70L SUR 18L 61	LUZ MINDA CASTRO PEÑA	SI / NO		$11.176.968	EN FASE DE VALIDACION	EN FASE DE VALIDACION	EN FASE DE VALIDACION	0%	0%	0,0%	0,0%	0,0%

	JUAN PABLO II														
9	MVCB_2996	DG 69A BIS B SUR 18M 23	MARIA TERESA ANTOLINEZ Y OTRO	SI NO		$11.738.882	23/11/2020	21/12/2020	23/11/2020	26%	28%	34,7%	1,3%	100,0%
10	MVCB_2993	DG 69A BIS B SUR 18M 35	CARLOS JULIO CARDENAS TRIANA	SI NO		$11.820.087	RENUNCIA	RENUNCIA	RENUNCIA					
11	MVCB_2999	DG 69A BIS B SUR 18M 15	MARIA LEONOR FRAILE SUAREZ	SI NO		$11.783.215	23/11/2020	15/12/2020	23/11/2020	23%	28%	41,0%	0,0%	100,0%
12	MVCB_2991	DG 69A BIS B SUR 18M 43	BRISNELDA CONSTANZA MACIAS MARTINEZ	SI NO		$11.757.101	23/11/2020	15/12/2020	23/11/2020	38%	50%	2,0%	0,0%	100,0%
13	MVCB_2967	DG 69A BIS D SUR 18M 36	MARIA OLGA FARFAN GALEON	SI NO		$11.712.722	27/11/2020	21/12/2020	27/11/2020	13%	36%	49,4%	1,6%	100,0%
14	MVCB_2960	DG 69A BIS D SUR 18M 06	MARIA NURY QUINTERO CARDONA	SI NO		$10.654.076	27/11/2020	17/12/2020	27/11/2020	9%	15%	76,0%	0,0%	100,0%
15	MVCB_2434	KR 18M BIS 69A 64 SUR	MARGARITA MARIA MORALES OROZCO	SI NO		$11.727.986	30/11/2020	23/12/2020	30/11/2020	12%	32%	42,6%	13,4%	100,0%
16	MVCB_2432	KR 18M BIS 69A 72 SUR	AGUSTÍN VILLANUEVA GUZMÁN	SI NO		$11.329.964	27/11/2020	26/12/2020	27/11/2020	9%	10%	51,1%	14,1%	100,0%
17	MVCB_3036	KR 18M BIS 69A 81 SUR	TEODOSIA GALICIA DE GARCIA	SI NO		$10.652.060	26/11/2020	15/12/2020	26/11/2020	20%	45%	35,0%	0,0%	100,0%
18	MVCB_3029	KR 18M BIS A 69A 70 SUR	PEDRO PABLO IBAÑEZ	SI NO		$11.672.077	27/11/2020	23/12/2020	27/11/2020	9%	38%	36,0%	17,0%	100,0%
	MIRADOR NUTIVARA														
19	MV_1914	CL 70M BIS SUR 18N 33	BLANCA ODILIA PATIÑO DE MARTINEZ	SI NO		$11.424.632	EN FASE DE VALIDACION	EN FASE DE VALIDACION	EN FASE DE VALIDACION	0%	0%	0,0%	0,0%	0,0%
20	MV_1843	CL 70M BIS SUR 18N 34	FLORALBA GUTIERREZ BELTRAN	SI NO		$11.752.564	EN FASE DE VALIDACION	EN FASE DE VALIDACION	EN FASE DE VALIDACION	0%	0%	0,0%	0,0%	0,0%
21	MV_1866	CL 70L SUR 18P 21	LUIS ALBERTO ALONSO CASTIBLANCO	SI NO		$11.207.445	2/12/2020	21/12/2020	2/12/2020	0%	0%	60,5%	39,5%	100,0%
22	MV_1818	KR 18P 70K 03 SUR	MERQUECIDE MONTAÑEZ UYOA	SI NO		$11.776.857	2/12/2020	26/12/2020	2/12/2020	2%	0%	2,5%	95,5%	100,0%
23	MV_1811	CL 70K SUR 18Q 09	ROSA ELVIRA GONZALEZ	SI NO		$11.826.704	EN FASE DE VALIDACION	EN FASE DE VALIDACION	EN FASE DE VALIDACION	0%	0%	0,0%	0,0%	0,0%
24	MV_1726	CL 70K SUR 18P 10	EMPERATRIZ ACOSTA MARTINEZ	SI NO		$11.736.989	EN FASE DE VALIDACION	EN FASE DE VALIDACION	EN FASE DE VALIDACION	0%	0%	0,0%	0,0%	0,0%
25	MV_1867	CL 70L SUR 18P 15	JOSE ALBER LUGO	SI NO		$11.317.334	EN FASE DE VALIDACION	EN FASE DE VALIDACION	EN FASE DE VALIDACION	0%	0%	0,0%	0,0%	0,0%
26	MV_1766	CL 70K SUR 18N 46	CARMEN QUIQUE MARTINEZ	SI NO		$10.332.118	EN FASE DE VALIDACION	EN FASE DE VALIDACION	EN FASE DE VALIDACION	0%	0%	0,0%	0,0%	0,0%
27	MV_1574	CL 70F SUR 18R 27	JOSE HIPOLITO GUTIERREZ LUCERO	SI NO		$11.646.455	EN FASE DE VALIDACION	EN FASE DE VALIDACION	EN FASE DE VALIDACION	0%	0%	0,0%	0,0%	0,0%
28	MV_1588	CL 70F SUR 18P 33	LUZ NELLY RODRIGUEZ	SI NO		$10.983.242	EN FASE DE VALIDACION	EN FASE DE VALIDACION	EN FASE DE VALIDACION	0%	0%	0,0%	0,0%	0,0%
29	MV_1608	KR 18P 70F 06 SUR	ROSALBINA HERNANDEZ PIRACHICAN	SI NO		$11.804.701	EN FASE DE VALIDACION	EN FASE DE VALIDACION	EN FASE DE VALIDACION	0%	0%	0,0%	0,0%	0,0%
	URBANIZACION COMPARTIR														
30	MVCB_0252	TV 18P BIS 65D 04 SUR	JESUS ANTONIO BARRERA FANDIÑO	SI NO		$11.829.606	EN FASE DE VALIDACION	EN FASE DE VALIDACION	EN FASE DE VALIDACION	0%	0%	0,0%	0,0%	0,0%
	VISTA HERMOSA														
31	MV SH-005	TV 18I 71 35 SUR	MARIA CUSTODIA SANCHEZ SANCHEZ	SI NO		$11.809.551	EN FASE DE VALIDACION	EN FASE DE VALIDACION	EN FASE DE VALIDACION	0%	0%	0,0%	0,0%	0,0%

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DEL HÁBITAT

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

PROYECTOS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA

INPLAYCO S.A.S.
INGENIEROS CONSTRUCTORES E INTERVENTORES

FECHA	3/01/2021	PERIODO No.	9	DEL	28/12/2020	AL	3/01/2021

1. INFORMACIÓN GENERAL

OBJETO DEL CONTRATO	Realizar la interventorías técnica, jurídica, social, administrativa y financiera, para la ejecución de las obras de mejoramiento de vivienda en la modalidad de habitabilidad en los territorios priorizados por la secretaría distrital de hábitat.
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO	Corresponde al Grupo 1 a la ejecución de 254 mejoramientos de vivienda, localizados en 3 localidades: Bosa, Usme y Ciudad Bolívar, esta última localidad incluye cuatro (4) intervenciones de Mejoramientointegral.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA		CONTRATO DE OBRA	
CONTRATO No.:	701-2020	CONTRATO No.:	694--2020
PLAZO INICIAL:	6 meses	PLAZO INICIAL:	5 meses
FECHA DE INICIACIÓN:	4 de noviembre de 2020	FECHA DE INICIACIÓN:	4 de noviembre de 2020
**FECHA DE SUSPENSIÓN:	0	**FECHA DE SUSPENSIÓN:	0
**FECHA DE REINICIACIÓN:	0	**FECHA DE REINICIACIÓN:	0
FECHA DE TERMINACIÓN:	3 de mayo de 2021	FECHA DE TERMINACIÓN:	3 de abril 2021
PLAZO ACTUALIZADO:	0	PLAZO ACTUALIZADO:	0
PLAZO TRANSCURRIDO:	0	PLAZO TRANSCURRIDO:	0
VALOR INICIAL :	$ 894,285,952	VALOR INICIAL :	$ 3,724,135,319
VALOR ADICION(ES):	0	VALOR ADICION(ES):	$ -
VALOR ACTUALIZADO:	$ -	VALOR ACTUALIZADO:	$ -
VALOR ANTICIPO:	0	VALOR ANTICIPO:	$ -
VALOR POR PAGAR:	$ -	VALOR POR PAGAR:	$ -
SUPERVISOR:	JUAN CARLOS ARBELAEZ MURILLO	INTERVENTOR:	Gonzalo Llevano Hoyos -INPLAYCO S.A.S.

** Inserte las filas que requiera según el número de suspensiones y reinicios.

2. CONTROL DE HITOS.

No.	*** DESCRIPCIÓN DEL HITO	FECHA PROGRAMADA	FECHA REAL DE CUMPLIMIENTO	DÍAS DE RETRASO
	SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO (HITO OBLIGATORIO)	4/11/2020	3/04/2021	
1	Validación			
2	Entrega de informe de validación			
3	Ejecución			
	ENTREGA A LA INTERVENTORIA DE LOS PRODUCTOS Y/O ACTIVIDADES CONTRATADAS (HITO OBLIGATORIO)			


***** Inserte las filas que requiera según el número de hitos; teniendo en cuenta que como mínimo se deberán establecer 5 hitos adicionales a los obligatorios de inicio y terminación. Los hitos aprobados por la interventoría se socializarán con el supervisor del contrato para su Vo. Bo. Los Hitos aprobados por la interventoría y SDHT solo se podrán modificar previa novedad contractual que así lo requiera. La matriz ded segimiento hace parte del presente documento.**


No.	INDICADORES BARRIO O TERRITORIO	VALORES CD + AIU	PORCENTAJE SOBRE EL VALOR TOTAL DEL CONTRATO	DIFERENCIA (+) ADELANTO (-) ATRASO
1	Valor acumulado de las actividades o productos conforme a la programación vigente.	$248,736,996.90	6.68%	
2	Valor acumulado de las actividades o productos ejecutados y aprobados por la Interventoría.	$255,041,427.06	6.85%	

3. ASPECTOS GENERALES INFORME TÉCNICO

Registre los avances y novedades técnicas, sociales, administrativas, contables y financieras, acompañadas por gráficos, cuadros, fotografías, análisis y comentarios sobre el estado de los trabajos, en todos sus aspectos en la fase de validación y ejecución de obra.

CIUDAD BOLIVAR

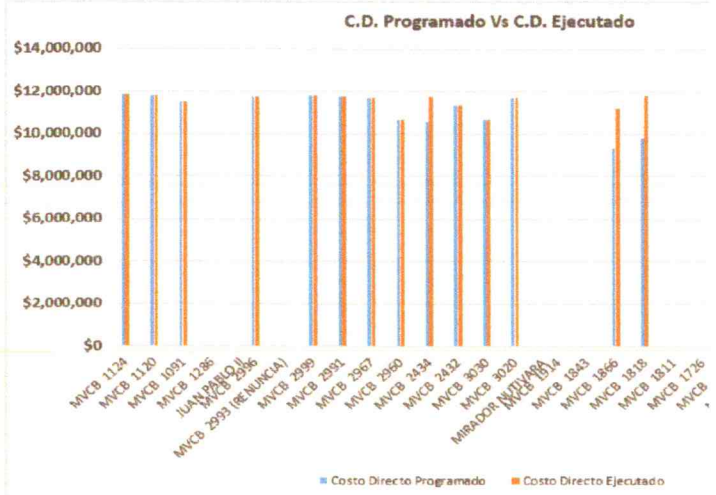

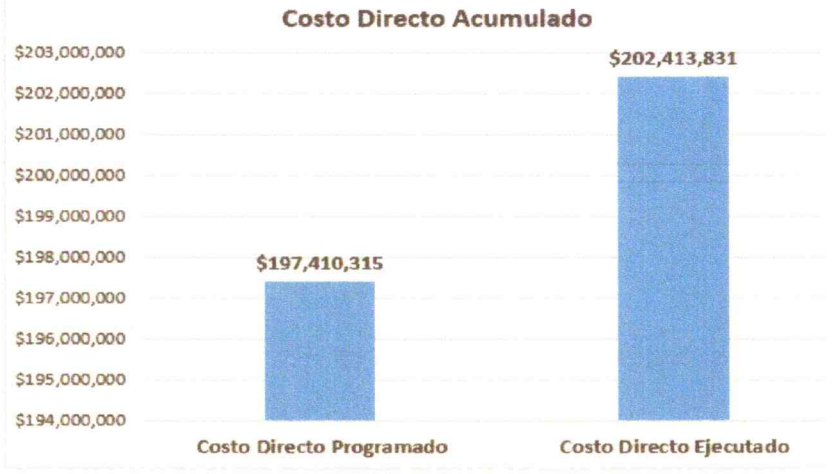

4- COMPONENTE TECNICO BARRIO O TERRITORIO			
ACTIVIDADES EJECUTADAS EN LA SEMANA. - ESTADO DE AVANCE SEMANAL POR VIVI			
BARRIO O TERRITORIO - CIUDAD BOLIVAR- BARRIO NUEVA COLOMBIA			
FECHA: 03- ENERO -2021			
1	MVCB_1437	FLOR ELISA PARRA ROJAS	**Se recibe la vivienda con las actividades acordadas y terminadas a satisfacción, fecha de entrega 21 de diciembre 2020**
2	MVCB_1441	LUZMILA TORRES BERMUDEZ	**Se recibe la vivienda con las actividades acordadas y terminadas a satisfacción, fecha de entrega 15 de diciembre 2020**
3	MVCB_1440	ALBA CARMEN ARDILA MATEUS	**Se recibe la vivienda con las actividades acordadas y terminadas a satisfacción, fecha de entrega 29 de diciembre 2020**
4	MVCB_1421	MARIA ESTER ZORRO GUERRERO	**Se recibe la vivienda con las actividades acordadas y terminadas a satisfacción, fecha de entrega 15 de diciembre 2020**
5	MVCB_1124	MARIA ANTONIA SANTOS CORREDOR DE RAMIREZ	**Se recibe la vivienda con las actividades acordadas y terminadas a satisfacción, fecha de entrega 23 de diciembre 2020**
6	MVCB_1120	QUERUBIN CHAGUALA	**Se recibe la vivienda con las actividades acordadas y terminadas a satisfacción, fecha de entrega 29 de diciembre 2020**
7	MVCB_1091	LIGIA TEJADA DE BARRERO	**Se recibe la vivienda con las actividades acordadas y terminadas a satisfacción, fecha de entrega 29 de diciembre 2020**
8	MVCB_1286	LUZ MINDA CASTRO PEÑA	Pendiente hacer apertura de vivienda para inicio de obras
BARRIO O TERRITORIO - CIUDAD BOLIVAR- JUAN PABLO II			
9	MVCB_2996	MARIA TERESA ANTOLINEZ Y OTRO	**Se recibe la vivienda con las actividades acordadas y terminadas a satisfacción, fecha de entrega 21 de diciembre 2020**
10	MVCB_2993	**CARLOS JULIO CARDENAS TRIANA**	**El beneficiario de la vivienda decide voluntariamente renunciar al beneficio, ya que la vivienda se encuentra en optimas condiciones de habitabilidad**
11	MVCB2999	MARIA LEONOR FRAILE SUAREZ	**Se recibe la vivienda con las actividades acordadas y terminadas a satisfacción, fecha de entrega 15 de diciembre 2020**
12	MVCB_2991	BRISNELDA CONSTANZA MACIAS MARTINEZ	**Se recibe la vivienda con las actividades acordadas y terminadas a satisfacción, fecha de entrega 15 de diciembre 2020**
13	MVCB_2967	MARIA OLGA FARFAN GALEON	**Se recibe la vivienda con las actividades acordadas y terminadas a satisfacción, fecha de entrega 21 de diciembre 2020**
14	MVCB_2960	MARIA NURY QUINTERO CARDONA	**Se recibe la vivienda con las actividades acordadas y terminadas a satisfacción, fecha de entrega 17 de diciembre 2020**
15	MVCB2434	MARGARITA MARIA MORALES OROZCO	**Se recibe la vivienda con las actividades acordadas y terminadas a satisfacción, fecha de entrega 23 de diciembre 2020**
16	MVCB_2432	AGUSTÍN VILLANUEVA GUZMÁN	**Se recibe la vivienda con las actividades acordadas y terminadas a satisfacción, fecha de entrega 30 de diciembre 2020**
17	MVCB_3030	TEODOSIA GALICIA DE GARCIA	**Se recibe la vivienda con las actividades acordadas y terminadas a satisfacción, fecha de entrega 15 de diciembre 2020**
18	MVCB_3020	PEDRO PABLO IBAÑEZ	**Se recibe la vivienda con las actividades acordadas y terminadas a satisfacción, fecha de entrega 23 de diciembre 2020**
BARRIO O TERRITORIO - CIUDAD BOLIVAR- MIRADOR NUTIVARA			
19	MV_1914	BLANCA ODILIA PATIÑO DE MARTINEZ	Pendiente hacer apertura de vivienda para inicio de obras
20	MV_1843	FLORALBA GUTIERREZ BELTRAN	Pendiente hacer apertura de vivienda para inicio de obras
21	MV_1866	LUIS ALBERTO ALONSO CASTIBLANCO	**Se recibe la vivienda con las actividades acordadas y terminadas a satisfacción, fecha de entrega 21 de diciembre 2020**
22	MV_1818	MERQUECIDE MONTANEZ UYOA	**Se recibe la vivienda con las actividades acordadas y terminadas a satisfacción, fecha de entrega 26 de diciembre 2020**
23	MV_1811	ROSA ELVIRA GONZALEZ	Pendiente hacer apertura de vivienda para inicio de obras
24	MV_1726	EMPERATRIZ ACOSTA MARTINEZ	Pendiente hacer apertura de vivienda para inicio de obras
25	MV_1867	JOSE ALBER LUGO	Pendiente hacer apertura de vivienda para inicio de obras
26	MV_1766	CARMEN QUIQUE MARTINEZ	Pendiente hacer apertura de vivienda para inicio de obras
27	MV_1574	JOSE HIPOLITO GUTIERREZ LUCERO	Se hace validación en la vivienda y registro fotográfico
28	MV_1588	LUZ NELLY RODRIGUEZ	Se hace validación en la vivienda y registro fotográfico
29	MV_1608	ROSALBINA HERNANDEZ PIRACHICAN	Se hace validación en la vivienda y registro fotográfico
BARRIO O TERRITORIO - CIUDAD BOLIVAR- ALTOS DE JALISCO			
30	MV_0252	JESUS ANTONIO ORTIZ CASTRO	Se hace validación en la vivienda y registro fotográfico
BARRIO O TERRITORIO - CIUDAD BOLIVAR- VISTA HERMOSA			
31	MV SH-005	MARIA CUSTODIA SANCHEZ SANCHEZ	Se hace validación en la vivienda y registro fotográfico

5. PLAN DE ACCION RESULTADO DEL ANALISIS DE CAUSAS REGISTRADO EN EL NUMERAL ANTERIOR - CON EL OBJETIVO DE ELIMINAR LA CAUSA RAÍZ DE LA SITUACIÓN PROBLEMÁTICA - PLAN DE MEJORA

ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA
En conjunto con el contratista y esta interventoría se continua con la supervisión a cada uno de los presupuestos, en la mayoria de frentes que se les hizo seguimiento se encontro personal trabajando y ejecutando actividades.	Arq. William Fdo Garzón	
se le solicita al contratista hacer entrega de una programación acertada, donde se indique las fechas de aperturas y conclusión de las validaciones y aperturas		

6. ACTIVIDADES NO PREVISTAS Y MAYORES CANTIDADES

Se informa que en algunas de las viviendas se presentan mejoras en los acabados finales realizadas por los beneficiarios, por lo tanto se deside intervenir otros espacios en conjunto con el contratista garantizando una adecuada habitabilidad y dignificación de las viviendas

7. COMENTARIOS DEL INTERVENTOR: Por favor realice la descripción general del estado del contrato y según aplique informe sobre: actividades realizadas en la semana, control de lluvias, compra y suministro de materiales, mano de obra, subcontratos y tramites ante las diferentes empresas prestadoras de servicios, entre otros. Anexe las actas de seguimiento realizadas en la semana correspondiente al periodo del informe.

Barrio o Territorio: CIUDAD BOLIVAR

En el presente periodo el contratista hace entrega de 4 viviendas, completando así un total de 17 viviendas enregadas a la fecha, no se hace validacion de viviendas, pero se hace el seguimiento de obra una (01) vivienda, donde se hacen las respectivas observaciones encontradas y se registran en la bitacora de obra

En la presente semana no se han registrado lluvias, tiempo soleado y seco

En algunos de los frentes el contratista no es constante con el acopio de materiales, lo que genera atrasos a los maestros de obra, dicha observación es oficiada al contratista

8. REGISTRO FOTOGRAFICO DEL AVANCE DURANTE LA SEMANA

SE ADJUNTA REGISTRO FOTOGRÁFICO


REGISTRO FOTOGRÁFICO



FECHA	martes, 29 de diciembre de 2020
DESCRIPCION MVCB 1440	
Entrega de vivienda	



FECHA	martes, 29 de diciembre de 2020
DESCRIPCION MVCB 1120	
Entrega de vivienda	

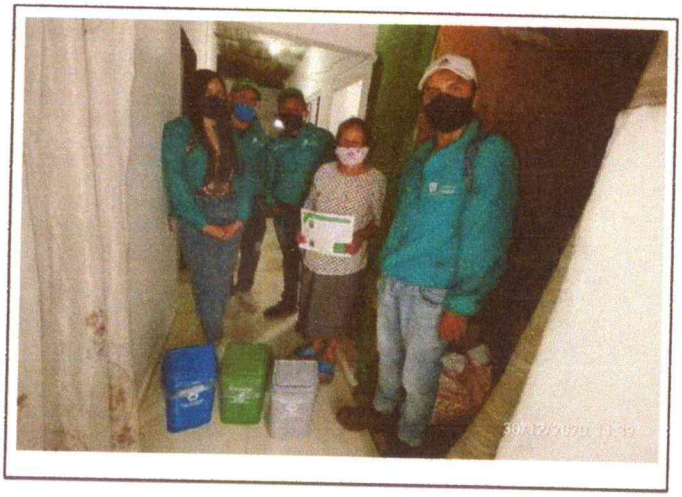


FECHA	martes, 29 de diciembre de 2020
DESCRIPCION MVCB 1091	
Entrega de vivienda	



FECHA	miércoles, 30 de diciembre de 2020
DESCRIPCION MVCB 2432	
Entrega de vivienda	



FECHA	martes, 29 de diciembre de 2020
DESCRIPCION MVCB 1818	
Avance de obra	

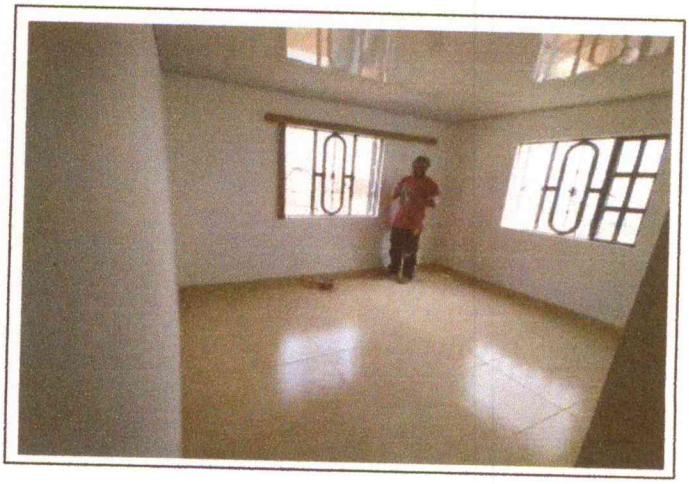

FECHA	martes, 29 de diciembre de 2020
DESCRIPCION MVCB 1818	
Avance de obra	

INPLAYCO S.A.S.

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE HÁBITAT

No.	ID_DMV	Dirección	Nombres y apellidos
JUAN PABLO II			
1	MVCB_4919	KR 18M BIS 68B 50 SUR MJ	URIEL PATIÑO RINCON
2	MVCB_4923	KR 18M BIS 68B 26 SUR	SIERVO MATIAS FIGUEROA CHAPARRO
3	MVCB_2932	TV 18N 69A 97 SUR	MARIA TERESA PIÑEROS PIÑEROS
4	MVCB_2926	TV 18N 69A 71 SUR	CORADO TORO DE TORRES Y OTRO
5	MVCB_3646	TV 18N BIS 69A 95 SUR	LUIS ANTONIO CABRERA LOPEZ Y OTRA
6	MVCB_3643	TV 18N BIS 69A 83 SUR	JOSE ARISTOBULO MENJURA LEITON Y OTRA
7	MVCB_2925	TV 18N 69A 67 SUR	MARTHA LUZ CAMPIÑO
8	MVCB_2917	DG 69A BIS B SUR 18M 30	CLAUDIA PATRICIA VARGAS GÓMEZ
9	MVCB_3642	TV 18N BIS 69A 77 SUR	JULIO CESAR FICHAS AVILA
10	MVCB_3641	TV 18N BIS 69A 75 SUR	CECILIA MENDEZ MORENO
11	MVCB_3640	TV 18N BIS 69A 71 SUR	OCTAVIO TELLEZ PINEDA
12	MVCB_3635	TV 18N BIS 69A 51 SUR	JUAN CARLOS MAZO CASTRO Y OTRA
13	MVCB_3634	TV 18N BIS 69A 47 SUR	AYDE NIÑO Y OTRO
14	MVCB_2939	TV 18N BIS 69A 84 SUR	MARIEYE LOAISA
15	MVCB_4918	KR 18M BIS 68B 56 SUR	ALVARO DIAZ AVILA
16	MVCB_3633	TV 18N BIS 69A 43 SUR	FRANCISCO JAVIER MENDIVELSO GUERRERO
17	MVCB_4917	KR 18M BIS 68B 62 SUR	ALVARO ALONSO MORENO
DESARROLLO NUEVA COLOMBIA			
18	MVCB_1320	CL70K SUR 18L 65	ISMINIA BARRETO ARIAS
19	MVCB_1383	CL70J SUR 18L 34	EDGAR FERNANDO CAMARCO ANGEL
20	MVCB_1380	CL 70J SUR 18L 22	ROSALBA MONTES DE CARDONA
21	MVCB_1382	CL 70J SUR 18L 30	MARIA CECILIA RINCON RINCON
22	MVCB_1381	CL 70J SUR 18L 26	NOHORA NOHEMI MAYORGA IBAGUE
23	MVCB_1374	CL 70J SUR 18L 11	OBED OSPINA RESTREPO
24	MVCB_1371	CL 70J SUR 18L 23	CONSUELO NAVARRO
25	MVCB_1328	CL 70K SUR 18L 29	EDILBERTO CARDENAS PAEZ
26	MVCB_1352	CL 70K SUR 18L 64	MARIA RAMOS ORTIZ
27	MVCB_1341	CL 70K SUR 18L 20	JOSE GABRIEL HERRERA MEDINA
28	MVCB_1344	CL 70K SUR 18L 32	ALBEIRO RUIZ SANABRIA
29	MVCB_1310	CL 70L SUR 18L 70	DORA ALICIA LÓPEZ SANABRIA
30	MVCB_1314	KR 18M 70K 16 SUR	MARTHA LUCIA OSPINA PEÑA
VILLAS DEL DIAMANTE			
31	MVCB_5128	CL 69N SUR 18N 52	DIEGO MARIO VANEGAS VILLAMIL
32	MVCB_5156	CL 69N SUR 18N 58 MJ	FRANCISCO JAVIER ARANGO GUTIERREZ
33	MVCB_5127	CL 69N SUR 18N 59 MJ	VICTOR MANUEL MUÑOZ VERGARA

Subsecretaria de Coordinacion Operativa
Subdireccion de Barrios
Seguimiento ejecución proyectos de Mejoramiento de Vivienda - Habitabilidad

Proyecto mejoramiento de vivienda - AVANCE EJECUCIÓN SEMANAL

Fecha: **3-ene-21**

Consorcio mejoramiento EP 2020 - Contratista de obra

Contratato de obra	694-2020			Plazo	Cinco (5) meses
Objeto	Contratar la ejecución de las obras de mejoramiento de vivienda en la modalidad de habitabilidad de los proyectos estructurados en los territorios priorizados por la Secretaria Distrital de Habitat. Grupo I			Acta de inicio	4 de noviembre de 2020
CDP No.	No. 914 del 14 de julio de 2020	CRP No.		Valor del contrato	TRES MIL SETECIENTOS VEINTICUATRO MILLONES CIENTO TREINTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS DIEZ Y NUEVE PESOS ($3.724.135.319) M/Cte

Gonzalo Llevano Hoyos -INPLAYCO S.A.S.

Contratato de interventoría	701-2020			Plazo	Seis (6) meses
Objeto	Realizar la interventorias técnica, jurídica, social, administrativa y financiera, para la ejecución de las obras de mejoramiento de vivienda en la modalidad de habitablidad en los territorios priorizados por la secretaría distrital de hábitat.			Acta de inicio	04 de noviembre 2020
CDP No	No. 892 del 14 de julio de 2020	CRP No.		Valor del contrato	OCHOCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS M/CTE ($894.285.952),

Fase 1: Validación de la información entregada por el la SDHT									Fase 2: Ejecución de obras				
Territorio o barrio a intervenir	CIUDAD BOLIVAR	Barrios	Predios	Total Predios	Validación				Ejecución				
					Validada	V/Por Validar		V/Modificada	En Ejecución	Terminadas	Por Ejecutar	% de Avance	Acta de Entrega a Satisfacción
Arq o Ing. Responsable	ARQ. LEONARDO SOLANO SOLANO	JUAN PABLO II	17	33	33	0		0	6	11	0	5,31%	11
		NUEVA COLOMBIA	13		0	0		13	0	0	13	0,00%	0
Técnico Responsable		VILLAS DEL DIAMANTI	3		0	0		3	0	0	3	0,00%	0
		0	0		0	0		0	0	0	0	0,00%	0
Subtotal			33	33	33	0		0	6	11	16	5,31%	11

AVANCE DE EJECUCIÓN SEMANAL										DIC - ENE	ENERO			
Proyecto				FASE I			Tiempo Programacion			SEMANA DEL 28 AL 3	SEMANA DEL 4 AL 10	SEMANA DEL 11 AL 17	SEMANA DEL 18 AL 24	SEMANA DEL 25 AL 31
No.	ID_DMV	Dirección	Nombres y apellidos	V/ Validada	V/ Modificada	V/inicial	Fecha inicio	Fecha terminada	F. inicio	9 semana	10 semana	11 semana	12 semana	13 semana
JUAN PABLO II														
1	MVCB_4919	KR 18M BIS 68B 50 SUR MJ	URIEL PATIÑO RINCON	SI / NO		$11.696.006	17/11/2020	1/12/2020	3/12/2020	100,00%	0%	0%	0%	0%
2	MVCB_4923	KR 18M BIS 68B 26 SUR	SIERVO MATIAS FIGUEROA CHAPARRO	SI / NO		$10.947.719	17/11/2020	1/12/2020	23/11/2020	0,00%	0%	0%	0%	0%
3	MVCB_2932	TV 18N 69A 97 SUR	MARIA TERESA PIÑEROS PIÑEROS	SI / NO		$11.700.811	17/11/2020	1/12/2020	23/11/2020	100,00%	0%	0%	0%	0%
4	MVCB_2926	TV 18N 69A 71 SUR	CORADO TORO DE TORRES Y OTRO	SI / NO		$11.800.475	17/11/2020	1/12/2020	23/11/2020	0,00%	0%	0%	0%	0%

5	MVCB_3646	TV 18N BIS 69A 95 SUR	LUIS ANTONIO CABRERA LOPEZ Y OTRA	SI NO		$11.416.175	2/12/2020	16/12/2020	24/11/2020	100,00%	0%	0%	0%	0%
6	MVCB_3643	TV 18N BIS 69A 83 SUR	JOSE ARISTOBULO MENJURA LEITON Y OTRA	SI NO		$11.078.062	2/12/2020	16/12/2020	24/11/2020	100,00%	0%	0%	0%	0%
7	MVCB_2925	TV 18N 69A 67 SUR	MARTHA LUZ CAMPIÑO	SI NO		$11.553.359	2/12/2020	16/12/2020	24/11/2020	100,00%	0%	0%	0%	0%
8	MVCB_2917	DG 69A BIS B SUR 18M 30	CLAUDIA PATRICIA VARGAS GÓMEZ	SI NO		$11.229.192	18/11/2020	2/12/2020	24/11/2020	0,00%	0%	0%	0%	0%
9	MVCB_3642	TV 18N BIS 69A 77 SUR	JULIO CESAR FICHAS AVILA	SI NO		$11.811.376	2/12/2020	16/12/2020	25/11/2020	100,00%	0%	0%	0%	0%
10	MVCB_3641	TV 18N BIS 69A 75 SUR	CECILIA MENDEZ MORENO	SI NO		$11.561.960	2/12/2020	16/12/2020	25/11/2020	100,00%	0%	0%	0%	0%
11	MVCB_3640	TV 18N BIS 69A 71 SUR	OCTAVIO TELLEZ PINEDA	SI NO		$11.827.947	3/12/2020	17/12/2020	25/11/2020	100,00%	0%	0%	0%	0%
12	MVCB_3635	TV 18N BIS 69A 51 SUR	JUAN CARLOS MAZO CASTRO Y OTRA	SI NO		$11.819.965	3/12/2020	17/12/2020	25/11/2020	0,00%	0%	0%	0%	0%
13	MVCB_3634	TV 18N BIS 69A 47 SUR	AYDE NIÑO Y OTRO	SI NO		$10.782.650	3/12/2020	17/12/2020	23/11/2020	0,00%	0%	0%	0%	0%
14	MVCB_2939	TV 18N BIS 69A 84 SUR	MARIEYE LOAISA	SI NO		$11.086.579	4/12/2020	18/12/2020	30/11/2020	100,00%	0%	0%	0%	0%
15	MVCB_4918	KR 18M BIS 68B 56 SUR	ALVARO DIAZ AVILA	SI NO		$11.639.626	4/12/2020	18/12/2020	23/11/2020	0,00%	0%	0%	0%	0%
16	MVCB_3633	TV 18N BIS 69A 43 SUR	FRANCISCO JAVIER MENDIVELSO GUERRERO	SI NO		$10.296.334	3/12/2020	17/12/2020	30/11/2020	100,00%	0%	0%	0%	0%
17	MVCB_4917	KR 18M BIS 68B 62 SUR	ALVARO ALONSO MORENO	SI NO		$10.136.993	4/12/2020	18/12/2020	3/12/2020	100,00%	0%	0%	0%	0%
NUEVA COLOMBIA														
18	MVCB_1320	CL 70K SUR 18L 65	ISMENIA BARRETO ARIAS	SI NO		$11.707.337	EN FASE DE VALIDACION	EN FASE DE VALIDACION	EN FASE DE VALIDACION	0%	0%	0%	0%	0%
19	MVCB_1383	CL 70J SUR 18L 34	EDGAR FERNANDO CAMARCO ANGEL	SI NO		$10.129.674	EN FASE DE VALIDACION	EN FASE DE VALIDACION	EN FASE DE VALIDACION	0%	0%	0%	0%	0%
20	MVCB_1380	CL 70J SUR 18L 22	ROSALBA MONTES DE CARDONA	SI NO		$11.330.297	EN FASE DE VALIDACION	EN FASE DE VALIDACION	EN FASE DE VALIDACION	0%	0%	0%	0%	0%
21	MVCB_1382	CL 70J SUR 18L 30	MARIA CECILIA RINCON RINCON	SI NO		$11.818.990	EN FASE DE VALIDACION	EN FASE DE VALIDACION	EN FASE DE VALIDACION	0%	0%	0%	0%	0%
22	MVCB_1381	CL 70J SUR 18L 26	NOHORA NOHEMI MAYORGA IBAGUE	SI NO		$8.886.491	EN FASE DE VALIDACION	EN FASE DE VALIDACION	EN FASE DE VALIDACION	0%	0%	0%	0%	0%
23	MVCB_1374	CL 70J SUR 18L 11	OBED OSPINA RESTREPO	SI NO		$10.320.364	EN FASE DE VALIDACION	EN FASE DE VALIDACION	EN FASE DE VALIDACION	0%	0%	0%	0%	0%
24	MVCB_1371	CL 70J SUR 18L 23	CONSUELO NAVARRO	SI NO		$11.808.362	EN FASE DE VALIDACION	EN FASE DE VALIDACION	EN FASE DE VALIDACION	0%	0%	0%	0%	0%
25	MVCB_1328	CL 70K SUR 18L 29	EDILBERTO CARDENAS PAEZ	SI NO		$10.521.578	EN FASE DE VALIDACION	EN FASE DE VALIDACION	EN FASE DE VALIDACION	0%	0%	0%	0%	0%
26	MVCB_1352	CL 70K SUR 18L 64	MARIA RAMOS ORTIZ	SI NO		$11.766.783	EN FASE DE VALIDACION	EN FASE DE VALIDACION	EN FASE DE VALIDACION	0%	0%	0%	0%	0%
27	MVCB_1341	CL 70K SUR 18L 20	JOSE GABRIEL HERRERA MEDINA	SI NO		$11.783.941	EN FASE DE VALIDACION	EN FASE DE VALIDACION	EN FASE DE VALIDACION	0%	0%	0%	0%	0%
28	MVCB_1344	CL 70K SUR 18L 32	ALBEIRO RUIZ SANABRIA	SI NO		$11.778.217	EN FASE DE VALIDACION	EN FASE DE VALIDACION	EN FASE DE VALIDACION	0%	0%	0%	0%	0%
29	MVCB_1310	CL 70L SUR 18L 70	DORA ALICIA LÓPEZ SANABRIA	SI NO		$11.826.158	EN FASE DE VALIDACION	EN FASE DE VALIDACION	EN FASE DE VALIDACION	0%	0%	0%	0%	0%
30	MVCB_1314	KR 18M 70K 16 SUR	MARTHA LUCIA OSPINA PEÑA	SI NO		$11.714.974	EN FASE DE VALIDACION	EN FASE DE VALIDACION	EN FASE DE VALIDACION	0%	0%	0%	0%	0%
VILLAS DEL DIAMANTE														
31	MVCB_5128	CL 69N SUR 18N 52	DIEGO MARIO VANEGAS VILLAMIL	SI NO		$8.215.904	EN FASE DE VALIDACION	EN FASE DE VALIDACION	EN FASE DE VALIDACION	0%	0%	0%	0%	0%
32	MVCB_5156	CL 69N SUR 18N 58 MJ	FRANCISCO JAVIER ARANGO GUTIERREZ	SI NO		$9.918.506	EN FASE DE VALIDACION	EN FASE DE VALIDACION	EN FASE DE VALIDACION	0%	0%	0%	0%	0%
33	MVCB_5127	CL 69N SUR 18N 59 MJ	VICTOR MANUEL MUÑOZ VERGARA	SI NO		$11.788.586	EN FASE DE VALIDACION	EN FASE DE VALIDACION	EN FASE DE VALIDACION	0%	0%	0%	0%	0%

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DEL HÁBITAT

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

PROYECTOS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA

INPLAYCO S.A.S.
INGENIEROS CONSTRUCTORES E INTERVENTORES

FECHA	3/01/2021	PERIODO No.	9	DEL	28/12/2020	AL	3/01/2021

1. INFORMACIÓN GENERAL

OBJETO DEL CONTRATO	Realizar la interventorias técnica, jurídica, social, administrativa y financiera, para la ejecución de las obras de mejoramiento de vivienda en la modalidad de habitabilidad en los territorios priorizados por la secretaría distrital de hábitat.
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO	Corresponde al Grupo 1 a la ejecución de 254 mejoramientos de vivienda, localizados en 3 localidades: Bosa, Usme y Ciudad Bolivar, esta última localidad incluye cuatro (4) Intervenciones de MejoramientoIntegral.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA		CONTRATO DE OBRA	
CONTRATO No.:	701-2020	CONTRATO No.:	694--2020
PLAZO INICIAL:	6 meses	PLAZO INICIAL:	5 meses
FECHA DE INICIACIÓN:	4 de noviembre de 2020	FECHA DE INICIACIÓN:	4 de noviembre de 2020
**FECHA DE SUSPENSIÓN:	0	**FECHA DE SUSPENSIÓN:	0
**FECHA DE REINICIACIÓN:	0	**FECHA DE REINICIACIÓN:	0
FECHA DE TERMINACIÓN:	3 de mayo de 2021	FECHA DE TERMINACIÓN:	3 de abril 2021
PLAZO ACTUALIZADO:	0	PLAZO ACTUALIZADO:	0
PLAZO TRANSCURRIDO:	0	PLAZO TRANSCURRIDO:	0
VALOR INICIAL :	$ 894,285,952	VALOR INICIAL :	$ 3,724,135,319
VALOR ADICION(ES):	0	VALOR ADICION(ES):	$ -
VALOR ACTUALIZADO:	$ -	VALOR ACTUALIZADO:	$ -
VALOR ANTICIPO:	0	VALOR ANTICIPO:	$ -
VALOR POR PAGAR:	$ -	VALOR POR PAGAR:	$ -
SUPERVISOR:	JUAN CARLOS ARBELAEZ MURILLO	INTERVENTOR:	Gonzalo Llevano Hoyos -INPLAYCO S.A.S.

** Inserte las filas que requiera según el número de suspensiones y reinicios.

2. CONTROL DE HITOS.

No.	*** DESCRIPCIÓN DEL HITO	FECHA PROGRAMADA	FECHA REAL DE CUMPLIMIENTO	DÍAS DE RETRASO
	SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO (HITO OBLIGATORIO)	4/11/2020	3/04/2021	
1	Validación			
2	Entrega de informe de validación			
3	Ejecución			
	ENTREGA A LA INTERVENTORIA DE LOS PRODUCTOS Y/O ACTIVIDADES CONTRATADAS (HITO OBLIGATORIO)			


***** Inserte las filas que requiera según el número de hitos; teniendo en cuenta que como mínimo se deberán establecer 5 hitos adicionales a los obligatorios de inicio y terminación. Los hitos aprobados por la interventoría se socializarán con el supervisor del contrato para su Vo. Bo. Los Hitos aprobados por la interventoría y SDHT solo se podrán modificar previa novedad contractual que así lo requiera. La matriz del segimiento hace parte del presente documento.**


No.	INDICADORES BARRIO O TERRITORIO	VALORES	PORCENTAJE SOBRE EL VALOR TOTAL DEL CONTRATO	DIFERENCIA (+) ADELANTO (-) ATRASO
1	Valor acumulado de las actividades o productos conforme a la programación vigente.	$220,546,249	5.92%	
2	Valor acumulado de las actividades o productos ejecutados y aprobados por la Interventoría.	$197,932,445	5.31%	

3. ASPECTOS GENERALES INFORME TÉCNICO

Registre los avances y novedades técnicas, sociales, administrativas, contables y financieras, acompañadas por gráficos, cuadros, fotografías, análisis y comentarios sobre el estado de los trabajos, en todos sus aspectos en la fase de validación y ejecución de obra.

Fase de validación y apropiación.

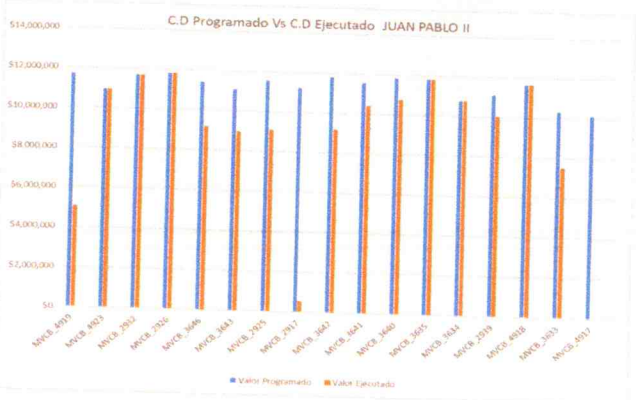

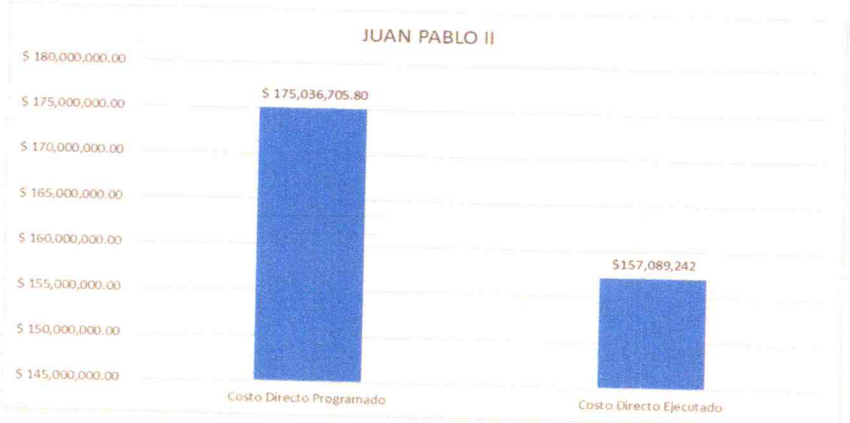

4- COMPONENTE TECNICO BARRIO O TERRITORIO		
ACTIVIDADES EJECUTADAS EN LA SEMANA. - ESTADO DE AVANCE SEMANAL POR VIVIENDA		
JUAN PABLO II - NUEVA COLOMBIA		
FECHA: 03 DE ENERO 2020		
		BARRIO JUAN PABLO II
MVCB_4919	URIEL PATIÑO RINCON	Se realiza visita Técnica-Social al Beneficiario Evidenciando actividad de instalacion Piso ceramico Habitacion,Enchape ceramico muro Baño y Meson de Cocina.
MVCB_4923	**SIERVO MATIAS FIGUEROA CHAPARRO**	**Se realiza visita Técnica-Social Realizando Entrega Oficial de la vivienda Fecha de Entrega 18 de Diciembre de 2020**
MVCB_2932	**MARIA TERESA PIÑEROS PIÑEROS**	**Se realiza visita Técnica-Social Realizando Entrega Oficial de la vivienda Fecha de Entrega 21 de Diciembre de 2020**
MVCB_2926	**CORADO TORO DE TORRES Y OTRO**	**Se realiza visita Técnica-Social Realizando Entrega Oficial de la vivienda Fecha de Entrega 21 de Diciembre de 2021**
MVCB_3646	**LUIS ANTONIO CABRERA LOPEZ Y OTRA**	**Se realiza visita Técnica-Social Realizando Entrega Oficial de la vivienda Fecha de Entrega 23 de Diciembre de 2021**
MVCB_3643	**JOSE ARISTOBULO MENJURA LEITON Y OTRA**	**Se realiza visita Técnica-Social Realizando Entrega Oficial de la vivienda Fecha de Entrega 21 de Diciembre de 2021**
MVCB_2925	MARTHA LUZ CAMPIÑO	Se realiza visita Técnica-Social al Beneficiario Evidenciando actividad de aplicación de pañete liso en áreas de habitaciones y hall.Instalacion enchape muro cocina y en area de baño . Se hace el llamado a aumentar el personal operativo para dar termino optimo a las actividades.
MVCB_2917	CLAUDIA PATRICIA VARGAS GÓMEZ	En el MVCB-2917 Se mantiene detenidas la ejecucion hasta el alta medica del beneficiario.No se realiza ni seguimiento ni ejecucion hasta no presentar el documento oficial de la EPS
MVCB_3642	JULIO CESAR FICHAS AVILA	Se realiza visita Técnica-Social al Beneficiario Evidenciando actividad de piso cerámico Área sala-comedor y preparación de superficie para aplicación de nuevas pinturas, así como la instalación de enchape cerámico área cocina.
MVCB_3641	**CECILIA MENDEZ MORENO**	**Se realiza visita Técnica-Social Realizando Entrega Oficial de la vivienda Fecha de Entrega 21 de Diciembre de 2021**
MVCB_3640	**OCTAVIO TELLEZ PINEDA**	**Se realiza visita Técnica-Social Realizando Entrega Oficial de la vivienda Fecha de Entrega 21 de Diciembre de 2021**
MVCB_3635	**JUAN CARLOS MAZO CASTRO Y OTRA**	**Se realiza visita Técnica-Social Realizando Entrega Oficial de la vivienda Fecha de Entrega 18 de Diciembre de 2020**
MVCB_3634	**AYDE NIÑO Y OTRO**	**Se realiza visita Técnica-Social Realizando Entrega Oficial de la vivienda Fecha de Entrega 18 de Diciembre de 2020**
MVCB_3633	FRANCISCO JAVIER MENDIVELSO GUERRERO	Se realiza visita Técnica-Social al Beneficiario Evidenciando actividad de instalación de piso cerámico área sala y habitación principal así como en área de cocina.
MVCB_2939	**MARIEYE LOAISA**	**Se realiza visita Técnica-Social Realizando Entrega Oficial de la vivienda Fecha de Entrega 23 de Diciembre de 2021**
MVCB_4917	ALVARO ALONSO MORENO	**Se presenta presupuesto y plano de distribución de la vivienda con la especificación de actividades a ejecutar ante la Secretaria de Habitat, para su revisión y aprobación de dicho presupuesto estructurado por el contratista y la interventoria.**
MVCB_4918	**ALVARO DIAZ AVILA**	**Se realiza visita Técnica-Social Realizando Entrega Oficial de la vivienda Fecha de Entrega 18 de Diciembre de 2020**
		BARRIO NUEVA COLOMBIA
MVCB_1320	ISMENIA BARRETO ARIAS	Se realiza Estructuracion de Presupuesto para apertura de Ejecucion de actividades
MVCB_1383	EDGAR FERNANDO CAMARCO ANGEL	Se realiza Estructuracion de Presupuesto para apertura de Ejecucion de actividades
MVCB_1380	ROSALBA MONTES DE CARDONA	Se realiza Estructuracion de Presupuesto para apertura de Ejecucion de actividades
MVCB_1382	MARIA CECILIA RINCON RINCON	Se realiza Estructuracion de Presupuesto para apertura de Ejecucion de actividades
MVCB_1381	NOHORA NOHEMI MAYORGA IBAGUE	Se realiza Estructuracion de Presupuesto para apertura de Ejecucion de actividades
MVCB_1374	OBED OSPINA RESTREPO	Se realiza Estructuracion de Presupuesto para apertura de Ejecucion de actividades
MVCB_1371	CONSUELO NAVARRO	Se realiza Estructuracion de Presupuesto para apertura de Ejecucion de actividades
MVCB_1328	EDILBERTO CARDENAS PAEZ	Se realiza Estructuracion de Presupuesto para apertura de Ejecucion de actividades
MVCB_1352	MARIA RAMOS ORTIZ	Se realiza Estructuracion de Presupuesto para apertura de Ejecucion de actividades
MVCB_1341	JOSE GABRIEL HERRERA MEDINA	Se realiza Estructuracion de Presupuesto para apertura de Ejecucion de actividades
MVCB_1344	ALBEIRO RUIZ SANABRIA	Se realiza Estructuracion de Presupuesto para apertura de Ejecucion de actividades
MVCB_1310	DORA ALICIA LÓPEZ SANABRIA	Se realiza Estructuracion de Presupuesto para apertura de Ejecucion de actividades
MVCB_1314	MARTHA LUCIA OSPINA PEÑA	Se realiza Estructuracion de Presupuesto para apertura de Ejecucion de actividades
		VILLAS DEL DAIAMANTE
MVCB_5128	DIEGO MARIO VANEGAS VILLAMIL	Se realiza Estructuracion de Presupuesto para apertura de Ejecucion de actividades
MVCB_5129	FRANCISCO JAVIER ARANGO GUTIERREZ	Se realiza Estructuracion de Presupuesto para apertura de Ejecucion de actividades
MVCB_5156	VICTOR MANUEL MUÑOZ VERGARA	Se realiza Estructuracion de Presupuesto para apertura de Ejecucion de actividades

5. PLAN DE ACCIÓN RESULTADO D... ÁLISIS DE CAUSAS REGISTRADO EN EL NUMERAL ANTERIOR - CON EL OBJETIVO DE ELIMINAR LA CAUSA RAÍZ DE LA SITUACIÓN PROBLEMÁTICA - PLAN DE MEJORA		
ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA
Se presenta presupuesto y plano de distribución de la vivienda MVCB- 4917 , con la especificación de actividades a ejecutar ante la Secretaria de Habitat, para su revisión y aprobación de dicho presupuesto estructurado por el contratista y la interventoría.	Arq.Leonardo Solano	

6. ACTIVIDADES NO PREVISTAS Y MAYORES CANTIDADES
En el MVCB-2917 Se mantiene detenidas la ejecucion hasta el alta medica del beneficiario,No se realiza ni seguimiento ni ejecucion hasta no presentar el documento oficial de la EPS
Se a determinado en conjunto con el Contratista cada una de las actividades priorizando areas terminadas y viabiliazando areas Primarias

7. COMENTARIOS DEL INTERVENTOR: Por favor realice la descripción general del estado del contrato y según aplique informe sobre: actividades realizadas en la semana, control de lluvias, compra y suministro de materiales, mano de obra, subcontratos y tramites ante las diferentes empresas prestadoras de servicios, entre otros. Anexe las actas de seguimiento realizadas en la semana correspondiente al periodo del informe.

Barrio o Territorio: JUAN PABLO II

En cada validación ejecutada en la semana es de vital importancia determinar condiciones de vulnerabilidad como hacinamiento, ausencia de servicios públicos, problemas de salud asociados a carencias en saneamiento básico, carencias de pisos, cubiertas, deficiencias constructivas, entre otras que permitan justificar y fijar una linea base del problema a abordar a través del proyecto de Mejoramiento de Vivienda

8. REGISTRO FOTOGRAFICO DEL AVANCE DURANTE LA SEMANA
SE ADJUNTA REGISTRO FOTOGRAFICO


REGISTRO FOTOGRAFICO




FECHA	domingo, 27 de diciembre de 2020
DESCRIPCION	
Estado Actual Pisos ceramicos	



FECHA	domingo, 27 de diciembre de 2020
DESCRIPCION	
Estado Actual Muro area baño	

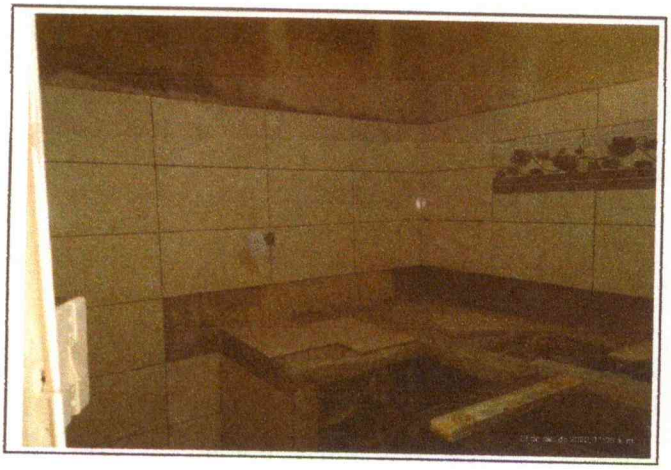


FECHA	domingo, 27 de diciembre de 2020
DESCRIPCION	
Estado Actual Avance Area Cocina	

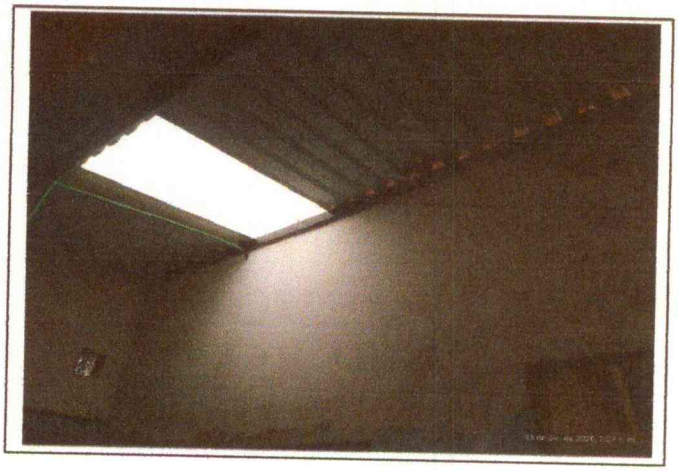

FECHA	domingo, 27 de diciembre de 2020
DESCRIPCION	
Estado Actual Habitaciones	



FECHA	sábado, 19 de diciembre de 2020
DESCRIPCION	
Estado Actual Area Patio de Ropas	

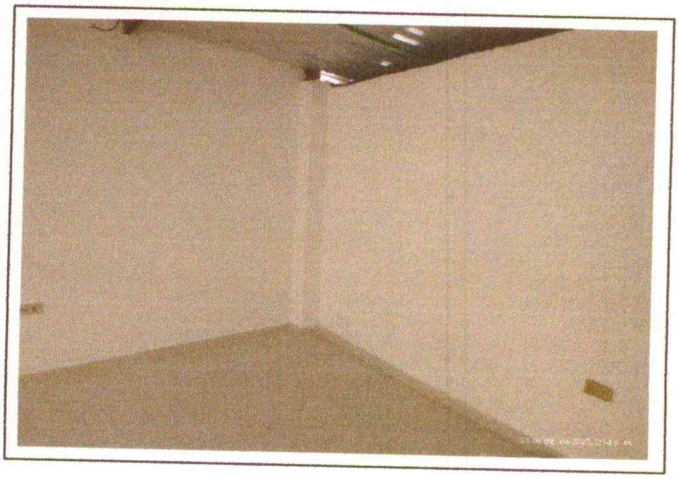

FECHA	sábado, 19 de diciembre de 2020
DESCRIPCION	
Estado Actual Area Hall	

INPLAYCO S.A.S.

ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C.
SECRETARIA DE HABITAT

No.	ID_DMV	Dirección	Nombres y apellidos
MIRADOR NUTIVARA			
1	MVCB_1873	CL 70L BIS SUR 18N 14	BLANCA FABIOLA LANDAZURI MESA
2	MVCB_1886	KR 18N 70K 31 SUR	LUZ MARIA ARIZA ARIZA
3	MVCB_1836	KR 18N 70K 09 SUR	DELIA MARÍA MATEUS ESCAMILLA
4	MVCB_1829	CL 70K SUR 18N 45	DIANA PATRICIA PÁEZ FINO
5	MVCB_1684	CL 70I SUR 18N 56	MIRYAM MANRIQUE URUEÑA
6	MVCB_1692	CL 70 H SUR 18 N 51	BEATRIZ ADIELA MARTINEZ JARAMILLO
7	MVCB_1681	CL 70 I SUR 18 N 36 MJ	ALVARO ELIECER VERDUGO RODRIGUEZ
8	MVCB_1638	KR 18R 70H 09 SUR	MAURICIO ENRIQUE MUÑOZ RIAÑO
9	MVCB_1664	KR 18P 70G 08 SUR	MARINA CLEMENCIA RAMOS
10	MVCB_1748	KR 18P 70I 04 SUR	OLGA LUZ BETANCOURT LEON
11	MVCB_1704	KR 18R 70H 08 SUR	ALBA LUCIA VALENCIA OCAMPO
12	MVCB_1631	CL 70G SUR 18R15	ELOISA LAVERDE RIOS
13	MVCB_1592	CL 70F SUR 18N 28	HOBER FABIAN BARRERA GUTIERREZ
NUEVA COLOMBIA			
14	MVCB_1130	DG 69F SUR 18J 18	CARMEN JULIA SUAREZ PARADA
15	MVCB_1180	DG 69F SUR 18J 15	BLANCA TERESA CALVO DE GARZON
16	MVCB_1181	DG 69F SUR 18J 11	ALBERTO ULLOA ULLOA
17	MVCB_1161	DG 69F SUR 18J 03	MARIA ROSA ELENA BECERRA SEGURA
18	MVCB_1212	DG 69G SUR 18J 43	HERNAN LOPEZ
19	MVCB_1194	DG 69H SUR 18J 20	VICTOR HUGO WILCHES BERNAL
20	MVCB_1467	CL 70H SUR 18J 70	TERESA DE JESUS OLIVOS DE BLANCO
21	MVCB_1469	CL 70H SUR 18J 82	JORGE SANCHEZ FORERO
22	MVCB_1470	KR 18L 70G 24 SUR	ANA SILVIA CHACON
23	MVCB_1495	KR 18L 70H 10 SUR	YACQUELINE RADA MOJICA
24	MVCB_1493	CL 70I SUR 18J 86	MARIA ELENA ALCIRA GARZON CASALLAS
25	MVCB_1516	KR 18L 70I 10 SUR	BERTHA CECILIA MOJICA RUIZ
26	MVCB_1417	CL 70I SUR 18L 30	DIANA MARCELA PARRA BALLESTEROS
27	MVCB_1416	CL 70I SUR 18L 22	ANA CENETH TORRES ROJAS
28	MVCB_1407	CL 70I SUR 18L 33	MARIA ELSA TORRES
29	MVCB_1409	CL 70I SUR 18L 21	FRAN EDILBERTO CRUZ CANO Y OTRA
VILLAS DEL DIAMANTE			
30	MVCB_5118	TV 18P BIS 69N 17 SUR	CARLOS ALFREDO CLAVIJO ROZO
31	MVCB_5464	KR 19D BIS 70C 25 SUR (KR 19B 70C 25 SUR)	IRMA ROJAS ROJAS
32	MVCB_5491	KR 19F 70C 41 SUR MJ	LEONILDE BUITRAGO MORENO

Subsecretaria de Coordinación Operativa
Subdirección de Barrios
Seguimiento ejecución proyectos de Mejoramiento de Vivienda - Habitabilidad

Proyecto mejoramiento de vivienda - AVANCE EJECUCIÓN SEMANAL

Fecha: **3-ene-21**

Consorcio Mejoramiento EP 2020

Contrato de obra	694-2020			Plazo	Cinco (5) meses
Objeto	Contratar la ejecución de las obras de mejoramiento de vivienda en la modalidad de habitabilidad de los proyectos estructurados en los territorios priorizados por la Secretaría Distrital de Habitat. Grupo I			Acta de inicio	4 de noviembre de 2020
CDP No.	No. 914 del 14 de julio de 2020	CRP No.		Valor del contrato	TRES MIL SETECIENTOS VEINTICUATRO MILLONES CIENTO TREINTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS DIEZ Y NUEVE PESOS ($3.724.135.319) M/Cte

Gonzalo Liévano Hoyos -INPLAYCO S.A.S.

Contrato de interventoria	701-2020			Plazo	Seis (6) meses
Objeto	Realizar la interventorías técnica, jurídica, social, administrativa y financiera, para la ejecución de las obras de mejoramiento de vivienda en la modalidad de habitabilidad en los territorios priorizados por la secretaría distrital de hábitat.			Acta de inicio	04 de noviembre 2020
CDP No	No. 892 del 14 de julio de 2020	CRP No.		Valor del contrato	OCHOCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS M/CTE ($894.285.952),

Fase 1: Validación de la información entregada por el la SDHT								Fase 2: Ejecución de obras				
					Validación			Ejecución				
Territorio o barrio a intervenir	Ciudad Bolivar	Barrios	Predios	Total Predios	Validada	V/Por Validar	V/Modificada	En Ejecución	Terminadas	Por Ejecutar	% de Avance	Acta de Entrega a Satisfacción
Arq. o Ing. Responsable	Ing. Humberto Blanco González	MIRADOR (NUTIVARA)	13	32	13	0	0	0	0	13	0,00%	0
		NUEVA COLOMBIA	16		16	0	0	16	15	1	5,96%	15
Técnico Responsable		VILLAS EL DIAMANTE	3		3	0	0	0	0	3	0,00%	0
			0		0	0	0	0	0	0	0,00%	0
Subtotal			32	32	32	0	0	16	15	17	5,96%	15

AVANCE DE EJECUCIÓN SEMANAL

Proyecto Ciudad Bolivar				FASE I			Tiempo Programación			DICIEMBRE				
No.	ID_DMV	Dirección	Nombres y apellidos	V/ Validada	V/ Modificada	V/inicial	Fecha inicio	Fecha entrega MV	F. Inicio	SEMANA DEL 30 AL 06	SEMANA DEL 7 AL 13	SEMANA DEL 14 AL 20	SEMANA DEL 21 AL 27	SEMANA DEL 28 AL 3
										5 semana	6 semana	7 semana	8 semana	9 semana
MIRADOR (NUTIVARA)														
1	MVCB_1873	CL 70L BIS SUR 18N 14	BLANCA FABIOLA LANDAZURI MESA	SI / NO		$11.828.247,60	EN FASE DE VALIDACION	EN FASE DE VALIDACION	EN FASE DE VALIDACION	0%	0%	0%	0%	0%
2	MVCB_1886	KR 18N 70K 31 SUR	LUZ MARIA ARIZA ARIZA	SI / NO		$11.168.015,60	EN FASE DE VALIDACION	EN FASE DE VALIDACION	EN FASE DE VALIDACION	0%	0%	0%	0%	0%
3	MVCB_1836	KR 18N 70K 09 SUR	DELIA MARÍA MATEUS ESCAMILLA	SI / NO		$11.789.726,10	EN FASE DE VALIDACION	EN FASE DE VALIDACION	EN FASE DE VALIDACION	0%	0%	0%	0%	0%
4	MVCB_1829	CL 70K SUR 18N 45	DIANA PATRICIA PÁEZ FINO	SI / NO		$11.105.245,60	EN FASE DE VALIDACION	EN FASE DE VALIDACION	EN FASE DE VALIDACION	0%	0%	0%	0%	0%
5	MVCB_1884	CL 70I SUR 18N 56	MIRYAM MANRIQUE URUEÑA	SI / NO		$11.749.188,70	EN FASE DE VALIDACION	EN FASE DE VALIDACION	EN FASE DE VALIDACION	0%	0%	0%	0%	0%
6	MVCB_1692	CL 70 H SUR 18 N 51	BEATRIZ ADIELA MARTINEZ JARAMILLO	SI / NO		$10.114.021,80	EN FASE DE VALIDACION	EN FASE DE VALIDACION	EN FASE DE VALIDACION	0%	0%	0%	0%	0%
7	MVCB_1881	CL 70 I SUR 18 N 36 MJ	ALVARO ELIECER VERDUGO RODRIGUEZ	SI / NO		$10.278.758,80	EN FASE DE VALIDACION	EN FASE DE VALIDACION	EN FASE DE VALIDACION	0%	0%	0%	0%	0%
8	MVCB_1638	KR 18R 70H 09 SUR	MAURICIO ENRIQUE MUÑOZ RIAÑO	SI / NO		$9.580.888,90	EN FASE DE VALIDACION	EN FASE DE VALIDACION	EN FASE DE VALIDACION	0%	0%	0%	0%	0%
9	MVCB_1864	KR 18P 70G 08 SUR	MARINA CLEMENCIA RAMOS	SI / NO		$9.223.968,20	EN FASE DE VALIDACION	EN FASE DE VALIDACION	EN FASE DE VALIDACION	0%	0%	0%	0%	0%
10	MVCB_1748	KR 18P 70I 04 SUR	OLGA LUZ BETANCOURT LEON	SI / NO		$11.750.274,10	EN FASE DE VALIDACION	EN FASE DE VALIDACION	EN FASE DE VALIDACION	0%	0%	0%	0%	0%
11	MVCB_1704	KR 18R 70H 08 SUR	ALBA LUCIA VALENCIA OCAMPO	SI / NO		$11.612.063,20	EN FASE DE VALIDACION	EN FASE DE VALIDACION	EN FASE DE VALIDACION	0%	0%	0%	0%	0%
12	MVCB_1631	CL 70G SUR 18R 15	ELOISA LAVERDE RIOS	SI / NO		$11.276.851,40	EN FASE DE VALIDACION	EN FASE DE VALIDACION	EN FASE DE VALIDACION	0%	0%	0%	0%	0%
13	MVCB_1592	CL 70F SUR 18N 28	HOBER FABIAN BARRERA GUTIERREZ	SI / NO		$11.822.174,20	EN FASE DE VALIDACION	EN FASE DE VALIDACION	EN FASE DE VALIDACION	0%	0%	0%	0,00%	0%

NUEVA COLOMBIA														
14	MVCB_1130	DG 69F SUR 18J 18	CARMEN JULIA SUAREZ PARADA	SI / NO		$10.614.314,40	26/11/2020	22/12/2020	26/11/2020	15,48%	14,91%	48,97%	20,64%	0,00%
15	MVCB_1180	DG 69F SUR 18J 15	BLANCA TERESA CALVO DE GARZON	SI / NO		$10.640.712,30	26/11/2020	22/12/2020	26/11/2020	35,00%	33,13%	7,00%	24,87%	0,00%
16	MVCB_1181	DG 69F SUR 18J 11	ALBERTO ULLOA ULLOA	SI / NO		$7.917.003,90	27/11/2020	21/12/2020	27/11/2020	38,70%	39,82%	19,81%	1,67%	0,00%
17	MVCB_1161	DG 69F SUR 18J 03	MARIA ROSA ELENA BECERRA SEGURA	SI / NO		$11.682.388,70	30/11/2020	21/12/2020	30/11/2020	0,00%	52,68%	29,54%	17,78%	0,00%
18	MVCB_1212	DG 69G SUR 18J 43	HERNAN LOPEZ	SI / NO		$11.067.851,50	2/12/2020	22/12/2020	1/12/2020	0,00%	30,63%	55,90%	13,47%	0,00%
19	MVCB_1194	DG 69H SUR 18J 20	VICTOR HUGO WILCHES BERNAL	SI / NO		$11.564.858,10	25/11/2020	30/12/2020	25/11/2020	8,57%	5,00%	37,64%	48,79%	0,00%
20	MVCB_1467	CL 70H SUR 18J 70	TERESA DE JESUS OLIVOS DE BLANCO	SI / NO		$11.819.029,10	2/12/2020	EN EJECUCION	1/12/2020	0,00%	0,50%	16,43%	10,30%	42,39%
21	MVCB_1469	CL 70H SUR 18J 82	JORGE SANCHEZ FORERO	SI / NO		$11.784.999,40	26/11/2020	28/12/2020	26/11/2020	16,71%	12,18%	21,11%	15,21%	34,79%
22	MVCB_1470	KR 18L 70G 24 SUR	ANA SILVIA CHACON	SI / NO		$11.826.113,50	25/11/2020	30/12/2020	25/11/2020	21,80%	19,99%	3,21%	29,31%	25,69%
23	MVCB_1496	KR 18L 70H 10 SUR	YACQUELINE RADA MOJICA	SI / NO		$11.751.135,80	25/11/2020	22/12/2020	25/11/2020	62,25%	37,24%	0,46%	0,00%	0,00%
24	MVCB_1493	CL 70I SUR 18J 86	MARIA ELENA ALCIRA GARZON CASALLAS	SI / NO		$11.275.773,60	30/11/2020	30/12/2020	30/11/2020	0,00%	4,86%	7,09%	7,41%	80,64%
25	MVCB_1516	KR 18L 70I 10 SUR	BERTHA CECILIA MOJICA RUIZ	SI / NO		$11.580.951,80	25/11/2020	30/12/2020	25/11/2020	43,70%	10,47%	20,13%	23,91%	1,74%
26	MVCB_1417	CL 70I SUR 18L 30	DIANA MARCELA PARRA BALLESTEROS	SI / NO		$11.661.580,80	30/11/2020	21/12/2020	30/11/2020	0,00%	50,36%	26,42%	23,22%	0,32%
27	MVCB_1418	CL 70I SUR 18L 22	ANA CENETH TORRES ROJAS	SI / NO		$11.557.790,90	27/11/2020	30/12/2020	27/11/2020	13,28%	13,36%	16,71%	19,32%	37,33%
28	MVCB_1407	CL 70I SUR 18L 33	MARIA ELSA TORRES	SI / NO		$11.478.383,90	28/11/2020	28/12/2020	28/11/2020	0,00%	27,15%	32,23%	5,47%	35,15%
29	MVCB_1409	CL 70I SUR 18L 21	FRAN EDILBERTO CRUZ CANO Y OTRA	SI / NO		$11.460.816,00	27/11/2020	30/12/2020	27/11/2020	35,00%	5,01%	34,70%	17,13%	8,16%
VILLAS EL DIAMANTE														
30	MVCB_5118	TV 18P BIS 69N 17 SUR	CARLOS ALFREDO CLAVIJO ROZO	SI / NO		$11.761.810,50	EN FASE DE VALIDACION	EN FASE DE VALIDACION	EN FASE DE VALIDACION	0,00%	0,00%	0%	0%	0%
31	MVCB_5464	KR 19D BIS 70C 25 SUR (KR 19B 70C 25 SUR)	IRMA ROJAS ROJAS	SI / NO		$11.428.943,80	EN FASE DE VALIDACION	EN FASE DE VALIDACION	EN FASE DE VALIDACION	0,00%	0,00%	0%	0%	0%
32	MVCB_5491	KR 19F 70C 41 SUR MI	LEONILDE BUITRAGO MORENO	SI / NO		$9.461.874,70	EN FASE DE VALIDACION	EN FASE DE VALIDACION	EN FASE DE VALIDACION	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DEL HÁBITAT

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

PROYECTOS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA

INPLAYCO S.A.S. INGENIEROS CONSTRUCTORES E INTERVENTORES

FECHA	3/01/2021	PERIODO No.	9	DEL	28/12/2020	AL	3/01/2021

1. INFORMACIÓN GENERAL

OBJETO DEL CONTRATO	Realizar la interventorías técnica, jurídica, social, administrativa y financiera, para la ejecución de las obras de mejoramiento de vivienda en la modalidad de habitabilidad en los territorios priorizados por la secretaría distrital de hábitat.
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO	Corresponde al Grupo 1 a la ejecución de 254 mejoramientos de vivienda, localizados en 3 localidades: Bosa, Usme y Ciudad Bolívar, esta última localidad incluye cuatro (4) Intervenciones de MejoramientoIntegral.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA		CONTRATO DE OBRA	
CONTRATO No.:	701-2020	CONTRATO No.:	694--2020
PLAZO INICIAL:	6 meses	PLAZO INICIAL:	5 meses
FECHA DE INICIACIÓN:	4 de noviembre de 2020	FECHA DE INICIACIÓN:	4 de noviembre de 2020
**FECHA DE SUSPENSIÓN:	0	**FECHA DE SUSPENSIÓN:	0
**FECHA DE REINICIACIÓN:	0	**FECHA DE REINICIACIÓN:	0
FECHA DE TERMINACIÓN:	3 de mayo de 2021	FECHA DE TERMINACIÓN:	3 de abril 2021
PLAZO ACTUALIZADO:	0	PLAZO ACTUALIZADO:	0
PLAZO TRANSCURRIDO:	0	PLAZO TRANSCURRIDO:	0
VALOR INICIAL :	$ 894,285,952	VALOR INICIAL :	$ 3,724,135,319
VALOR ADICION(ES):	0	VALOR ADICION(ES):	$ -
VALOR ACTUALIZADO:	$ -	VALOR ACTUALIZADO:	$ -
VALOR ANTICIPO:	0	VALOR ANTICIPO:	$ -
VALOR POR PAGAR:	$ -	VALOR POR PAGAR:	$ -
SUPERVISOR:	JUAN CARLOS ARBELAEZ MURILLO	INTERVENTOR:	Gonzalo Liévano Hoyos -INPLAYCO S.A.S.

** Inserte las filas que requiera según el número de suspensiones y reinicios.

2. CONTROL DE HITOS.

No.	*** DESCRIPCIÓN DEL HITO	FECHA PROGRAMADA	FECHA REAL DE CUMPLIMIENTO	DÍAS DE RETRASO
	SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO (HITO OBLIGATORIO)	4/11/2020	3/04/2021	
1	Validación	17/11/2020	20/12/2020	
2	Entrega de informe de validación	17/11/2020	20/12/2020	
3	Ejecución	21/12/2020	3/04/2021	
	ENTREGA A LA INTERVENTORIA DE LOS PRODUCTOS Y/O ACTIVIDADES CONTRATADAS (HITO OBLIGATORIO)			


***** Inserte las filas que requiera según el número de hitos; teniendo en cuenta que como mínimo se deberán establecer 5 hitos adicionales a los obligatorios de inicio y terminación. Los hitos aprobados por la interventoría se socializarán con el supervisor del contrato para su Vo. Bo. Los Hitos aprobados por la interventoría y SDHT solo se podrán modificar previa novedad contractual que así lo requiera. La matriz de seguimiento hace parte del presente documento.**


No.	INDICADORES BARRIO O TERRITORIO	VALORES	PORCENTAJE SOBRE EL VALOR TOTAL DEL CONTRATO	DIFERENCIA (+) ADELANTO (-) ATRASO
1	Valor acumulado de las actividades o productos conforme a la programación vigente.	$226,401,479.00	6.08%	
2	Valor acumulado de las actividades o productos ejecutados y aprobados por la Interventoría.	$221,877,297.00	5.96%	

3. ASPECTOS GENERALES INFORME TÉCNICO

Registre los avances y novedades técnicas, sociales, administrativas, contables y financieras, acompañadas por gráficos, cuadros, fotografías, análisis y comentarios sobre el estado de los trabajos, en todos sus aspectos en la fase de validación y ejecución de obra.

Ciudad Bolívar

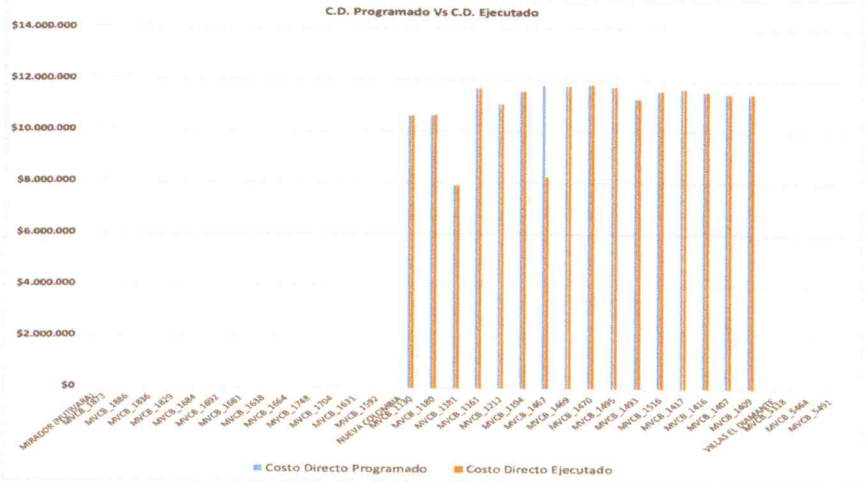

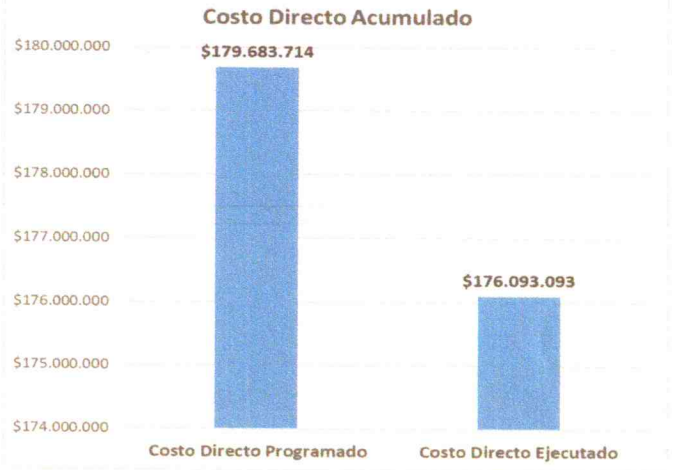

4- COMPONENTE TECNICO BARRIO O TERRITORIO			
ACTIVIDADES EJECUTADAS EN LA SEMANA. - ESTADO DE AVANCE SEMANAL POR VIVIENDA			
BARRIO O TERRITORIO: CIUDAD BOLIVAR			
Personal técnico de la interventoría y contratista realizaron visitas a las viviendas aperturadas para verificar avances y calidad de las obras. Se dieron directrices respecto de actividades que se están ejecutando. Se revisan presupuestos proyectados y se ajustan cantidades teniendo en cuenta que hay actividades avanzadas en algunas de las viviendas.			
BARRIO O TERRITORIO: CIUDAD BOLIVAR - MIRADOR (NUTIVARA)			
1	MVCB_1873	BLANCA FABIOLA LANDAZURI MESA	Vivienda **validada**. Sin aperturar.
2	MVCB_1886	LUZ MARIA ARIZA ARIZA	Vivienda **validada**. Sin aperturar.
3	MVCB_1836	DELIA MARÍA MATEUS ESCAMILLA	Vivienda **validada**. Sin aperturar.
4	MVCB_1829	DIANA PATRICIA PÁEZ FINO	Vivienda **validada**. Sin aperturar.
5	MVCB_1684	MIRYAM MANRIQUE URUEÑA	Vivienda **validada**. Sin aperturar.
6	MVCB_1692	BEATRIZ ADIELA MARTINEZ JARAMILLO	Vivienda **validada**. Sin aperturar.
7	MVCB_1681	ALVARO ELIECER VERDUGO RODRIGUEZ	Vivienda **validada**. Sin aperturar.
8	MVCB_1638	MAURICIO ENRIQUE MUÑOZ RIAÑO	Vivienda **validada**. Sin aperturar.
9	MVCB_1664	MARINA CLEMENCIA RAMOS	Vivienda **validada**. Sin aperturar.
10	MVCB_1748	OLGA LUZ BETANCOURT LEON	Vivienda **validada**. Sin aperturar.
11	MVCB_1704	ALBA LUCIA VALENCIA OCAMPO	Vivienda **validada**. Sin aperturar.
12	MVCB_1631	ELOISA LAVERDE RIOS	Vivienda **validada**. Sin aperturar.
13	MVCB_1592	HOBER FABIAN BARRERA GUTIERREZ	Vivienda **validada**. Sin aperturar.
BARRIO O TERRITORIO: CIUDAD BOLIVAR - BARRIO NUEVA COLOMBIA			
Personal técnico de la interventoría y contratista realizaron visitas a las viviendas para verificar terminación de actividades y proceder a la entrega de viviendas. Durante esta semana se entregaron ocho (8) viviendas más para llegar a quince (15) viviendas terminadas y entregadas a satisfacción a los beneficiarios del barrio Nueva Colombia; en dichas viviendas se socializó el presupuesto final de la obra, el manual de uso y mantenimiento, y se entregó "kit" ecológico. Queda pendiente una vivienda por entregar de las dieciséis aperturadas en el barrio Nueva Colombia.			
14	MVCB_1130	CARMEN JULIA SUAREZ PARADA	Se terminaron las actividades proyectadas en esta vivienda. El día 22 de diciembre de 2020 se entregaron las obras a la beneficiaria.
15	MVCB_1180	BLANCA TERESA CALVO DE GARZON	Se terminaron las actividades proyectadas en esta vivienda. El día 22 de diciembre de 2020 se entregaron las obras a la beneficiaria.
16	MVCB_1181	ALBERTO ULLOA ULLOA	Se terminaron las actividades proyectadas en esta vivienda. El día 21 de diciembre de 2020 se entregaron las obras al beneficiario.
17	MVCB_1161	MARIA ROSA ELENA BECERRA SEGURA	Se terminaron las actividades proyectadas en esta vivienda. El día 21 de diciembre de 2020 se entregaron las obras a la beneficiaria.
18	MVCB_1212	HERNAN LOPEZ	Se terminaron las actividades proyectadas en esta vivienda. El día 22 de diciembre de 2020 se entregaron las obras al beneficiario.
19	MVCB_1194	VICTOR HUGO WILCHES BERNA	Se terminaron las actividades proyectadas en esta vivienda. El día 30 de diciembre de 2020 se entregaron las obras al beneficiario.
20	MVCB_1467	TERESA DE JESUS OLIVOS DE BLANCO	Se terminó la limpieza y aplicación de anticorrosivo sobre perfiles metálicos de cielo raso, que se encontraban con trazas de oxidación. Se terminó la instalación de la teja arquitectónica. Se enchaparon pisos de la zona de comedor, patio, corredor y alcoba de la entrada. Se realizó media caña en mortero, el perímetro de la terraza para preparar dicha zona para la impermeabilización con manto asfáltico.
21	MVCB_1469	JORGE SANCHEZ FORERO	Se terminaron las actividades proyectadas en esta vivienda. El día 28 de diciembre de 2020 se entregaron las obras al beneficiario.
22	MVCB_1470	ANA SILVIA CHACON	Se terminaron las actividades proyectadas en esta vivienda. El día 30 de diciembre de 2020 se entregaron las obras a la beneficiaria.
23	MVCB_1495	YACQUELINE RADA MOJICA	Se terminaron las actividades proyectadas en esta vivienda. El día 22 de diciembre de 2020 se entregaron las obras a la beneficiaria.
24	MVCB_1493	MARIA ELENA ALCIRA GARZON CASALLAS	Se terminaron las actividades proyectadas en esta vivienda. El día 30 de diciembre de 2020 se entregaron las obras a la beneficiaria.
25	MVCB_1516	BERTHA CECILIA MOJICA RUIZ	Se terminaron las actividades proyectadas en esta vivienda. El día 30 de diciembre de 2020 se entregaron las obras a la beneficiaria.
26	MVCB_1417	DIANA MARCELA PARRA BALLESTEROS	Se terminaron las actividades proyectadas en esta vivienda. El día 21 de diciembre de 2020 se entregaron las obras a la beneficiaria.
27	MVCB_1416	ANA CENETH TORRES ROJAS	Se terminaron las actividades proyectadas en esta vivienda. El día 30 de diciembre de 2020 se entregaron las obras a la beneficiaria.
28	MVCB_1407	MARIA ELSA TORRES	Se terminaron las actividades proyectadas en esta vivienda. El día 28 de diciembre de 2020 se entregaron las obras a la beneficiaria.
29	MVCB_1409	FRAN EDILBERTO CRUZ CANO Y OTRA	Se terminaron las actividades proyectadas en esta vivienda. El día 30 de diciembre de 2020 se entregaron las obras a la beneficiaria.

BARRIO O TERRITORIO: CIUDAD BOLIVAR - BARRIO VILLAS EL DIAMANTE			
30	MVCB_5118	CARLOS ALFREDO CLAVIJO ROZO	Vivienda **validada**. Sin aperturar.
31	MVCB_5464	IRMA ROJAS ROJAS	Vivienda **validada**. Sin aperturar.
32	MVCB_5491	LEONILDE BUITRAGO MORENO	El día 28 de diciembre de 2020, personal tanto técnico como social de la interventoría y del contratista, realizó **visita a la vivienda con el fin de validar** y/o priorizar las actividades de mejoramiento a ejecutar en dicho inmueble. Se efectuaron mediciones de las diferentes áreas a priorizar y se dejó registro fotográfico del estado inicial de las posibles áreas a intervenir. Se elaborará el presupuesto de acuerdo con las actividades priorizadas. La vivienda consta de dos pisos. En el primer piso se encuentra la sala con acabados de piso en tableta de granito y pintura de muros en buen estado; la cocina cuenta con mesón acabado en baldosín, los cuales se encuentran en pésimo estado, los muros tienen acabado con pintura vinilo. El baño tiene pisos y muros enchapados con baldosín antiguo, los cuales presentan deterioro y suciedad avanzada. La alcoba tiene pisos en diferentes formatos y muros acabados en vinilo. En el segundo piso de la vivienda se encuentran tres alcobas, corredor con pisos acabados en mortero, muros en pañete; en la zona de lavandería los muros son en bloque sin pañete, y lavadero en mal estado. La vivienda en segundo piso carece de cielo raso.

5. PLAN DE ACCIÓN RESULTADO DEL ANÁLISIS DE CAUSAS REGISTRADO EN EL NUMERAL ANTERIOR - CON EL OBJETIVO DE ELIMINAR LA CAUSA RAÍZ DE LA SITUACIÓN PROBLEMÁTICA - PLAN DE MEJORA

ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA
En conjunto con el contratista y la interventoría se elaborarán los respectivos presupuestos iniciales de obra de las viviendas validadas. A medida que se vayan aperturando las viviendas faltantes se harán visitas de seguimiento, para verificar avance y calidad de las obras proyectadas en cada vivienda.	Residente de interventoría	4/01/2021

6. ACTIVIDADES NO PREVISTAS Y MAYORES CANTIDADES

Se ajustarán, en caso de ser necesario, las cantidades de obra de las diferentes actividades que se desarrollan en las viviendas, velando porque se invierta el presupuesto proyectado.

7. COMENTARIOS DEL INTERVENTOR: Por favor realice la descripción general del estado del contrato y según aplique informe sobre: actividades realizadas en la semana, control de lluvias, compra y suministro de materiales, mano de obra, subcontratos y tramites ante las diferentes empresas prestadoras de servicios, entre otros. Anexe las actas de seguimiento realizadas en la semana correspondiente al periodo del informe.

Barrio o Territorio: Ciudad Bolivar

A la fecha del informe se han validado un total de 32 viviendas, de las cuales se aperturaron dieciséis (16) viviendas en el barrio Nueva Colombia; quedan por aperturar trece (13) viviendas en el barrio Mirador (Nutivara) y tres (3) en el barrio Villas El Diamante. De las 16 viviendas aperturadas en el barrio Nueva Colombia, se han terminado y entregado quince (15). En la vivienda del barrio Nueva Colombia que falta por entregar, quedan pendiente las actividades de impermeabilización de la terraza.

Durante la semana se presentó tiempo seco.

Se avanza en las actividades proyectadas. Hay demoras en la instalación de materiales de impermeabilización para adecuar la terraza del MVCB_1467.

8. REGISTRO FOTOGRAFICO DEL AVANCE DURANTE LA SEMANA

(SE ADJUNTA REGISTRO FOTOGRAFICO)

REGISTRO FOTOGRÁFICO



FECHA	lunes, 28 de diciembre de 2020
DESCRIPCION MVCB 1407	
Vivienda entregada. Vista final de obras terminadas en la zona de cocina	




FECHA	lunes, 28 de diciembre de 2020
DESCRIPCION MVCB 1407	
Vivienda entregada. Vista final del área de comedor	




FECHA	lunes, 28 de diciembre de 2020
DESCRIPCION MVCB 1469	
Vivienda entregada. Vista final de la cocina	



FECHA	miércoles, 30 de diciembre de 2020
DESCRIPCION MVCB 1194	
Vivienda entregada. Vista final del corredor de acceso	

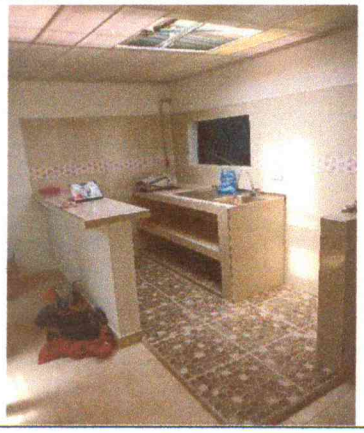


FECHA	miércoles, 30 de diciembre de 2020
DESCRIPCION MVCB 1409	
Vivienda entregada. Vista final de la cocina	

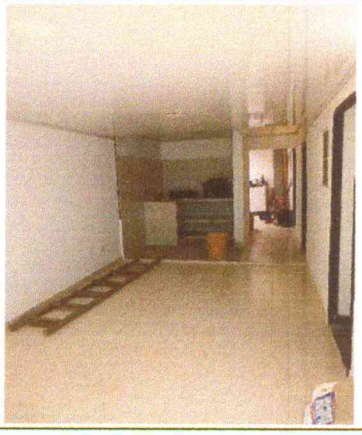


FECHA	miércoles, 30 de diciembre de 2020
DESCRIPCION MVCB 1416	
Vivienda entregada. Vista final de sala comedor y cocina	


REGISTRO FOTOGRÁFICO

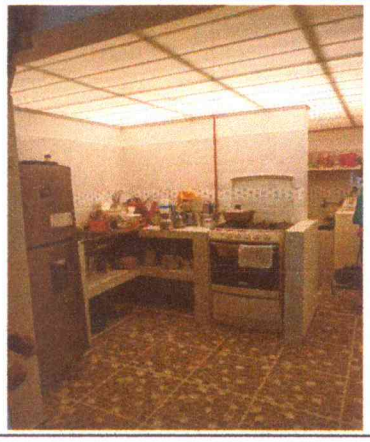


FECHA	miércoles, 30 de diciembre de 2020
DESCRIPCION MVCB 1493	
Vivienda entregada. Vista final cocina	

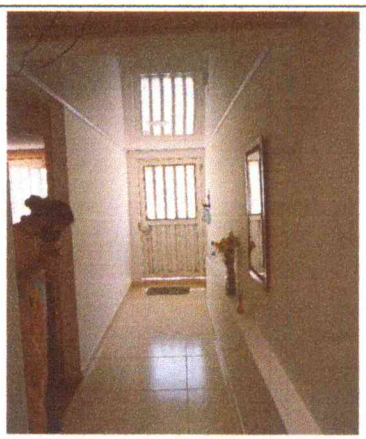

FECHA	miércoles, 30 de diciembre de 2020
DESCRIPCION MVCB 1493	
Vivienda entregada. Vista final del corredor de acceso	

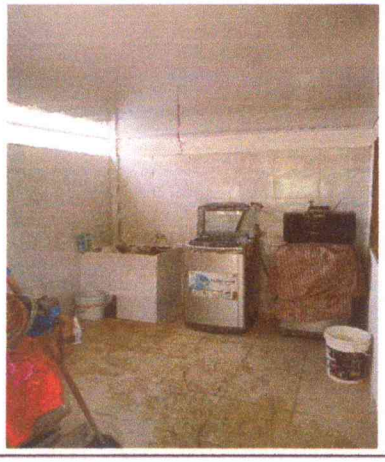


FECHA	miércoles, 30 de diciembre de 2020
DESCRIPCION MVCB 1470	
Vivienda entregada. Vista final de lavandería	

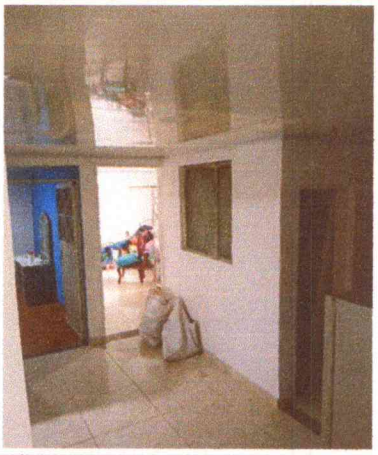

FECHA	miércoles, 30 de diciembre de 2020
DESCRIPCION MVCB 1516	
Vivienda entregada. Vista final comedor	



FECHA	martes, 29 de diciembre de 2020
DESCRIPCION MVCB 1467	
Avance de obra. Elaboración de media caña en mortero, en el perímetro de la terraza	

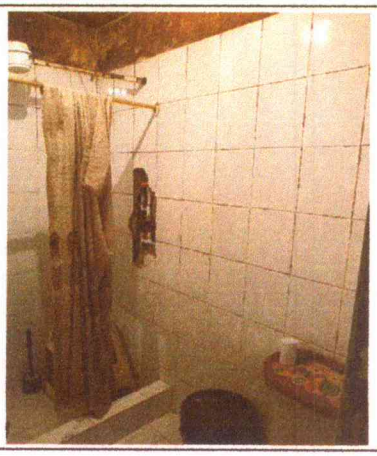

FECHA	lunes, 28 de diciembre de 2020
DESCRIPCION MVCB 5491	
Validación de la vivienda. Estado actual del baño	

INPLAYCO S.A.S.
INGENIEROS CONSTRUCTORES E INTERVENTORES

ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE HÁBITAT

No.	ID_DMV	Dirección	Nombres y apellidos
ALTOS DE JALISCO			
1	MVJA_2992	KR 18 N BIS 61C 21 SUR	TEODOSIA GALICIA DE GARCIA
2	MVJA_3141	KR 18P 62 A 30 SUR MJ	MARIA LEONOR FRAILE SUAREZ
3	MVJA_3146	KR 18P 62ª 45 SUR MJ	MARIA ESTER ZORRO GUERRERO
4	MVJA_3335	KR 18P BIS B 62A 48 SUR MJ	CARLOS JULIO CARDENAS TRIANA
5	MVJA_3314	KR 18P BIS B 61D 36 SUR	BRISNELDA CONSTANZA MACIAS MARTINEZ
6	MVJA_3239	KR 18P BIS A 61C 22 SUR MJ	NATIVIDAD SILDANA CELYS VIUDA DE GARCIA
7	MVJA_0259	CL 70H SUR 18L 16	ALBA CARMEN ARDILA MATEUS
8	MVJA_3223	DG 69A BIS D SUR 18M 36	MARIA OLGA FARFAN GALEON
9	MVJA_3231	DG 69D SUR 18J 15	MARIA ANTONIA SANTOS CORREDOR DE RAMIREZ
10	MVJA_3119	CL 70H SUR 18L 22	LUZMILA TORRES BERMUDEZ
11	MVJA_3125	KR 18L 70H 09 SUR	FLOR ELISA PARRA ROJAS
12	MVJA_0252	CL 61D SUR 18N 30 MJ	JESUS ANTONIO ORTIZ CASTRO
13	MVJA_2996	KR 18N BIS 61D 18 SUR	MARIA DEL SOCORRO CUPITRA CACAIS
14	MVJA_2712	KR 18M 62 29 SUR	JOSE ALIRIO ORTIZ CABRERA Y OTRA
15	MVJA_2707	KR 18M 62 12 SUR	ANA LUISA BERNAL PULIDO
16	MVJA_2640	KR18L BIS A 61D 47 SUR	PAOLA ANDREA BARRERA PELAEZ
MIRADOR NUTIVARA			
17	MVCB_1774	CL 70J SUR 18N 23	JOSE WILSON MARULANDA GIRALDO
18	MVCB_1742	CL 70J SUR 18N 34	ANA ELVIA MENDOZA DE HERNANDEZ
19	MVCB_1907	CL 70N SUR 18N 22	ANA ROSA LLANOS DE GARCIA
20	MVCB_1661	CL 70H SUR 18N 46 MJ	MARICIELO ARIAS CERQUERA
21	MVCB_1698	CL 70I SUR 18P 22	LUZ AMALFI GUTIERREZ FRANCO
22	MVCB_1708	TV 18R 70H 57 SUR	MARIA EUGENIA TRUJILLO QUIMBAYO
ROCIO ALTOS DEL SUR			
23	MVJA_2981	DG 69A BIS D SUR 18M 06	LEONOR TOVAR BARRERO
24	MVJA_2812	KR 18M BIS 69A 64 SUR	MARGARITA MARIA MORALES OROZCO
25	MVJA_2909	KR 18M BIS 69A 72 SUR	AGUSTÍN VILLANUEVA GUZMÁN
26	MVJA_0186	KR 18M BIS A 69A 70 SUR	PEDRO PABLO IBAÑEZ
LA ESCALA			
27	MVJA_2672	DG 69A BIS B SUR 18M 23	MARIA TERESA ANTOLINEZ Y OTRO
ACACIAS SUR			
28	MVJA_0598	CL 62A SUR 18R 15	RODULFO BEJARANO
BARRIO GIBRALTAR I Y II			
29	MVJA_0834	CL 63A SUR 18Q 05	CLARA INES OCHOA GUTIERREZ
30	MVJA_3011	CL 63A SUR 18Q 05	RITA DEL CARMEN FONSECA CAMARGO
31	MVJA_3157	KR 18N BIS 63 27 SUR	IRIA ESTHER SILVA
32	MVJA_3397	KR 18P 63 16 SUR	LUZ MARINA ROBAYO ALVARADO
LA ESCALA 3ER SECTOR			
33	MVJA_0502	CL 62A SUR 18J 20	ROSALBA JARA DE ROJAS
34	MVJA_0519	CL 62A SUR 18K 20	NESTOR JAVIER VALENZUELA PEÑA
CIUDAD MILAGRO			
35	MVJA_0395	CL 62 SUR 18K 78	JOSE ORVEY ORTIZ
VILLAS DEL DIAMANTE			
36	MVCB_5474	CL 70F SUR 19F 18 MJ	OLIVIA RIVERA
37	MVCB_5395	CL 70B SUR 18R 29	MARÍA CRISTINA GONZALEZ GARCÍA
38	MVCB_5388	CL 70C SUR 18R 48	DUBERNEY ARIAS BETANCUR

Subsecretaria de Coordinacion Operativa

Subdireccion de Barrios

Seguimiento ejecución proyectos de Mejoramiento de Vivienda - Habitabilidad

Proyecto mejoramiento de vivienda - AVANCE EJECUCIÓN SEMANAL

Fecha: **3-ene-21**

Consorcio mejoramiento EP 2020 - Contratista de obra

Contratato de obra	694-2020			Plazo	Cinco (5) meses
Objeto	Contratar la ejecución de las obras de mejoramiento de vivienda en la modalidad de habitabilidad de los proyectos estructurados en los territorios priorizados por la Secretaria Distrital de Habitat. Grupo I			Acta de inicio	4 de noviembre de 2020
CDP No.	No. 914 de 14 de julio de 2020	CRP No.		Valor del contrato	TRES MIL SETECIENTOS VEINTICUATRO MILLONES CIENTO TREINTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS DIEZ Y NUEVE PESOS ($3.724.135.319) M/Cte

Gonzalo Llevano Hoyos -INPLAYCO S.A.S.

Contratato de Interventoría	701-2020			Plazo	Seis (6) meses
Objeto	Realizar la interventorias técnica, jurídica, social, administrativa y financiera, para la ejecución de las obras de mejoramiento de vivienda en la modalidad de habitabilidad en los territorios priorizados por la secretaria distrital de hábitat.			Acta de inicio	04 de noviembre 2020
CDP No	No. 892 de 14 de julio de 2020	CRP No.		Valor del contrato	OCHOCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS M/CTE ($894.285.952),

Fase 1: Validación de la información entregada por el la SDHT

Territorio o barrio a intervenir		Barrios	Predios	Total Predios	Validación				Fase 2: Ejecución de obras				
					Validada	V/Por Validar		V/Mocificada	Ejecución: En Ejecución	Terminadas	Por Ejecutar	% de Avance	Acta de Entrega a Satisfacción
Arq o Ing. Responsable		ALTOS DE JALISCO	16		16	0		0	7	5	4	2,55%	5
		MIRADOR NUTIVARA	6		6	0		0	0	0	6	0,00%	0
Técnico Responsable	CRISTIAN VELASCO	ROCIO ALTOS DEL SUR	4		4	0		0	2	1	1	0,47%	1
		LA ESCALA	1		1	0		0	1	0	0	0,16%	0
		ACACIAS SUR	1	38	1	0		0	0	0	1	0,00%	0
		BARRIO GIBRALTAR I Y II	4		4	0		0	0	0	4	0,00%	0
		LA ESCALA 3ER SECTOR	2		2	0		0	0	0	2	0,00%	0
		CIUDAD MILAGRO	1		1	0		0	0	0	1	0,00%	0
		VILLAS DEL DIAMANTE	3		3	0		0	0	0	3	0,00%	0
Subtotal			38	38	38	0		0	10	6	22	3,18%	6

AVANCE DE EJECUCIÓN SEMANAL

Proyecto				FASE I			Tiempo Programacion			DICIEMBRE				
No.	ID_DMV	Dirección	Nombres y apellidos	V/ Validada	V/ Modificada	V/Inicial	Fecha inicio	Fecha terminada	F. Inicio	SEMANA DEL 02 AL 06	SEMANA DEL 7 AL 13	SEMANA DEL 14 AL 20	SEMANA DEL 21 AL 27	SEMANA DEL 28 AL 3
										5 semana	6 semana	7 semana	8 semana	9 semana
		ALTOS DE JALISCO												
1	MVJA_2992	KR 18N BIS 61C 21 SUR	ISAURA AREVALO MALAGON	SI		$11.478.755	27/11/2020	26/12/2020	27/11/2020	8%	27%	10%	55%	100%
2	MVJA_3141	KR 18P 62 A 30 SUR MJ	GLORIA CRISTINA GUTIERREZ GARZON	SI		$11.433.514	26/11/2020	23/12/2020	26/11/2020	0%	6%	9%	0%	10%
3	MVJA_3146	KR 18P 62A 45 SUR MJ	CLARA INES GIL BAEZ	SI		$11.428.313	26/11/2020	24/12/2020	26/11/2020	3%	4%	0%	0%	8%
4	MVJA_3335	KR 18P B S B 62A 48 SUR MJ	MYRIAM PATRICIA SARMIENTO APONTE	SI		$11.177.053	26/11/2020	24/12/2020	26/11/2020	0%	0%	10%	0%	35%
5	MVJA_3314	KR 18P BIS B 61D 36 SUR	MARIA OLMA MOLANO ROMERO	SI		$11.814.493	26/11/2020	26/12/2020	26/11/2020	0%	5%	30%	65%	100%
6	MVJA_3239	KR 18P BIS A 61C 22 SUR MJ	NATIVIDAD SILDANA CELYS VIUDA DE GARCIA	SI		$11.459.853	EN FASE DE VALIDACION	EN FASE DE VALIDACION	EN FASE DE VALIDACION	0%	0%	0%	0%	0%
7	MVJA_0259	CL 70H SUR 18L 15	ALBA CARMEN ARDILA MATEUS	SI		$11.264.898	24/11/2020	24/12/2020	24/11/2020	0%	0%	0%	5%	15%
8	MVJA_3223	KR 18P BIS A 61A 55 SUR	MYRIAM AMPARO GÓMEZ DE GALVIS	SI		$11.811.986	27/11/2020	26/12/2020	27/11/2020	0%	4%	25%	71%	100%
9	MVJA_3231	KR 18P BIS A 61B 12 SUR MJ	SOFIA MORENO	SI		$11.630.690	24/11/2020	27/12/2020	24/11/2020	0%	0%	7%	3%	20%
10	MVJA_3119	KR 18P 61A 67 SUR MJ	LUZ YANID PADUA	SI		$7.121.160	24/11/2020	24/12/2020	24/11/2020	0%	0%	0%	0%	5%
11	MVJA_3125	KR 18P 61 A 76 SUR MJ	MARIA AURORA RENGIFO	SI		$9.222.769	24/11/2020	26/12/2020	24/11/2020	0%	0%	30%	70%	100%
12	MVJA_0252	CL 61D SUR 18N 30 MJ	JESUS ANTONIO ORTIZ CASTRO	SI		$11.693.259	16/12/2020	16/01/2021	16/12/2020	0%	0%	5%	15%	10%
13	MVJA_2996	KR 18N BIS 61D 18 SUR	MARIA DEL SOCORRO CUPITRA CACAIS	SI		$11.787.984	24/11/2020	26/12/2020	24/11/2020	0%	0%	5%	95%	100%
14	MVJA_2712	KR 18M 62 29 SUR	JOSE ALIRIO ORTIZ CABRERA Y OTRA	SI		$11.813.746	EN FASE DE VALIDACION	EN FASE DE VALIDACION	EN FASE DE VALIDACION	0%	0%	0%	0%	0%
15	MVJA_2707	KR 18M 62 12 SUR	ANA LUISA BERNAL PULIDO	SI		$6.092.091	EN FASE DE VALIDACION	EN FASE DE VALIDACION	EN FASE DE VALIDACION	0%	0%	0%	0%	0%
16	MVJA_2640	KR 18L BIS A 61D 47 SUR	PAOLA ANDREA BARRERA PELAEZ	SI		$11.440.930	FASE DE VALIDACION	FASE DE VALIDACION	FASE DE VALIDACION	0%	0%	0%	0%	0%
		MIRADOR NUTIVARA												
17	MVCB_1774	CL 70I SUR 18N 23	JOSE WILSON MARULANDA GIRALDO	SI		$11.815.916	EN FASE DE VALIDACION	EN FASE DE VALIDACION	EN FASE DE VALIDACION	0%	0%	0%	0%	0%

18	MVCB_1742	CL 70J SUR 18N 34	ANA ELVIA MENDOZA DE HERNANDEZ	SI		$11.779.533	EN FASE DE VALIDACION	EN FASE DE VALIDACION	EN FASE DE VALIDACION	0%	0%	0%	0%	0%
19	MVCB_1907	CL 70N SUR 18N 22	ANA ROSA LLANOS DE GARCIA	SI		$11.062.205	EN FASE DE VALIDACION	EN FASE DE VALIDACION	EN FASE DE VALIDACION	0%	0%	0%	0%	0%
20	MVCB_1661	CL 70H SUR 18N 46 MJ	MARICIELO ARIAS CERQUERA	SI		$11.651.309	EN FASE DE VALIDACION	EN FASE DE VALIDACION	EN FASE DE VALIDACION	0%	0%	0%	0%	0%
21	MVCB_1698	CL 70I SUR 18P 22	LUZ AMALFI GUTIERREZ FRANCO	SI		$9.465.986	EN FASE DE VALIDACION	EN FASE DE VALIDACION	EN FASE DE VALIDACION	0%	0%	0%	0%	0%
22	MVCB_1706	TV 18R 70H 57 SUR	MARIA EUGENIA TRUJILLO QUIMBAYO	SI		$11.722.491	FASE DE VALIDACION	FASE DE VALIDACION	FASE DE VALIDACION	0%	0%	0%	0%	0%
		ROCIO ALTOS DEL SUR												
23	MVJA_2981	DG 69A BIS D SUR 18M 06	LEONOR TOVAR BARRERO	SI NO		$11.825.816	27/11/2020	27/12/2020	27/11/2020	0%	10%	7%	0%	0%
24	MVJA_2812	KR 18M BIS 61C 29 SUR	ANDREA JENNIFFER ACOSTA MENDIVELSO	SI NO		$10.471.857	27/11/2020	26/12/2020	27/11/2020	3%	7%	30%	60%	100%
25	MVJA_2909	KR 18N 61C 27 SUR	BLANCA CECILIA ALFONSO BOHORQUEZ	SI NO		$11.742.586	27/11/2020	27/12/2020	27/11/2020	0%	0%	0%	0%	0%
26	MVJA_0188	CL 61C SUR 18N 03	ISABEL ARDILA VARGAS	SI NO		$8.994.273	27/11/2020	27/12/2020	27/11/2020	0%	0%	15%	0%	0%
		LA ESCALA												
27	MVJA_2672	KR 18M 61 15 SUR MJ	CARLOS OLIMPO SEGURA GUERRERO	SI NO		$11.793.878	26/11/2020	23/12/2020	26/11/2020	0%	0%	15%	0%	25%
		ACACIAS SUR												
28	MVJA_0598	CL 62A SUR 18R 15	RODULFO BEJARANO	SI NO		$11.813.894	FASE DE VALIDACION	FASE DE VALIDACION	FASE DE VALIDACION	0%	0%	0%	0%	0%
		BARRIO GIBRALTAR I Y II												
29	MVJA_0834	CL 63A SUR 18Q 05	CLARA INES OCHOA GUTIERREZ	SI NO		$9.526.817	FASE DE VALIDACION	FASE DE VALIDACION	FASE DE VALIDACION	0%	0%	0%	0%	0%
30	MVJA_3011	KR 18N BIS 63 27 SUR	RITA DEL CARMEN FONSECA CAMARGO	SI NO		$11.511.935	FASE DE VALIDACION	FASE DE VALIDACION	FASE DE VALIDACION	0%	0%	0%	0%	0%
31	MVJA_3157	KR 18P 63 16 SUR	IRIA ESTHER SILVA	SI NO		$11.683.822	FASE DE VALIDACION	FASE DE VALIDACION	FASE DE VALIDACION	0%	0%	0%	0%	0%
32	MVJA_3397	KR 18Q 63D 10 SUR	LUZ MARINA ROBAYO ALVARADO	SI NO		$11.795.938	FASE DE VALIDACION	FASE DE VALIDACION	FASE DE VALIDACION	0%	0%	0%	0%	0%
		LA ESCALA 3ER SECTOR												
33	MVJA_0502	CL 62A SUR 18J 20	ROSALBA JARA DE ROJAS	SI NO		$10.438.708	FASE DE VALIDACION	FASE DE VALIDACION	FASE DE VALIDACION	0%	0%	0%	0%	0%
34	MVJA_0519	CL 62A SUR 18K 20	NESTOR JAVIER VALENZUELA PEÑA			$11.823.991	FASE DE VALIDACION	FASE DE VALIDACION	FASE DE VALIDACION	0%	0%	0%	0%	0%
		CIUDAD MILAGRO												
35	MVJA_0395	CL 62 SUR 18K 78	JOSE ORVEY ORTIZ	SI NO		$9.076.503	FASE DE VALIDACION	FASE DE VALIDACION	FASE DE VALIDACION	0%	0%	0%	0%	0%
		VILLAS DEL DIAMANTE												
36	MVCB_5474	CL 70F SUR 19F 18 MJ	OLIVIA RIVERA	SI NO		$11.783.640	FASE DE VALIDACION	FASE DE VALIDACION	FASE DE VALIDACION	0%	0%	0%	0%	0%
37	MVCB_5395	CL 70B SUR 18R 29	MARÍA CRISTINA GONZALEZ GARCÍA	SI NO		$10.807.904	FASE DE VALIDACION	FASE DE VALIDACION	FASE DE VALIDACION	0%	0%	0%	0%	0%
38	MVCB_5388	CL 70C SUR 18R 48	DUBERNEY ARIAS BETANCUR	SI NO		$11.480.264	FASE DE VALIDACION	FASE DE VALIDACION	FASE DE VALIDACION	0%	0%	0%	0%	0%

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DEL HÁBITAT

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

PROYECTOS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA

INPLAYCO S.A.S.
INGENIEROS CONSTRUCTORES E INTERVENTORES

FECHA	3/01/2021	PERIODO No.	9	DEL	28/12/2020	AL	3/01/2021

1. INFORMACIÓN GENERAL

OBJETO DEL CONTRATO	Realizar la interventorias técnica, jurídica, social, administrativa y financiera, para la ejecución de las obras de mejoramiento de vivienda en la modalidad de habitabilidad en los territorios priorizados por la secretaría distrital de hábitat.
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO	Corresponde al Grupo 1 a la ejecución de 254 mejoramientos de vivienda, localizados en 3 localidades: Bosa, Usme y Ciudad Bolívar, esta última localidad incluye cuatro (4) intervenciones de Mejoramientointegral.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA		CONTRATO DE OBRA	
CONTRATO No.:	701-2020	CONTRATO No.:	694--2020
PLAZO INICIAL:	6 meses	PLAZO INICIAL:	5 meses
FECHA DE INICIACIÓN:	4 de noviembre de 2020	FECHA DE INICIACIÓN:	4 de noviembre de 2020
**FECHA DE SUSPENSIÓN:	0	**FECHA DE SUSPENSIÓN:	0
**FECHA DE REINICIACIÓN:	0	**FECHA DE REINICIACIÓN:	0
FECHA DE TERMINACIÓN:	3 de mayo de 2021	FECHA DE TERMINACIÓN:	3 de abril 2021
PLAZO ACTUALIZADO:	0	PLAZO ACTUALIZADO:	0
PLAZO TRANSCURRIDO:	0	PLAZO TRANSCURRIDO:	0
VALOR INICIAL :	$ 894,285,952	VALOR INICIAL :	$ 3,724,135,319
VALOR ADICION(ES):	0	VALOR ADICION(ES):	$ -
VALOR ACTUALIZADO:	$ -	VALOR ACTUALIZADO:	$ -
VALOR ANTICIPO:	0	VALOR ANTICIPO:	$ -
VALOR POR PAGAR:	$ -	VALOR POR PAGAR:	$ -
SUPERVISOR:	JUAN CARLOS ARBELAEZ MURILLO	INTERVENTOR:	Gonzalo Llevano Hoyos -INPLAYCO S.A.S.

** Inserte las filas que requiera según el número de suspensiones y reinicios.

2. CONTROL DE HITOS.

No.	*** DESCRIPCIÓN DEL HITO	FECHA PROGRAMADA	FECHA REAL DE CUMPLIMIENTO	DÍAS DE RETRASO
	SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO (HITO OBLIGATORIO)			
1	Validación			
2	Entrega de informe de validación			
3	Ejecución			
	ENTREGA A LA INTERVENTORIA DE LOS PRODUCTOS Y/O ACTIVIDADES CONTRATADAS (HITO OBLIGATORIO)			

***** Inserte las filas que requiera según el número de hitos; teniendo en cuenta que como mínimo se deberán establecer 5 hitos adicionales a los obligatorios de inicio y terminación. Los hitos aprobados por la interventoría se socializarán con el supervisor del contrato para su Vo. Bo. Los Hitos aprobados por la interventoría y SDHT solo se podrán modificar previa novedad contractual que así lo requiera. La matriz ded segimiento hace parte del presente documento.**


No.	INDICADORES BARRIO O TERRITORIO	VALORES	PORCENTAJE SOBRE EL VALOR TOTAL DEL CONTRATO	DIFERENCIA (+) ADELANTO (-) ATRASO
1	Valor acumulado de las actividades o productos conforme a la programación vigente.	$214,572,999.06	5.76%	
2	Valor acumulado de las actividades o productos ejecutados y aprobados por la Interventoría.	$118,280,541.96	3.18%	

3. ASPECTOS GENERALES INFORME TÉCNICO

Registre los avances y novedades técnicas, sociales, administrativas, contables y financieras, acompañadas por gráficos, cuadros, fotografías, análisis y comentarios sobre el estado de los trabajos, en todos sus aspectos en la fase de validación y ejecución de obra.

Fase de validación y apropiación.

CIUDAD BOLIVAR

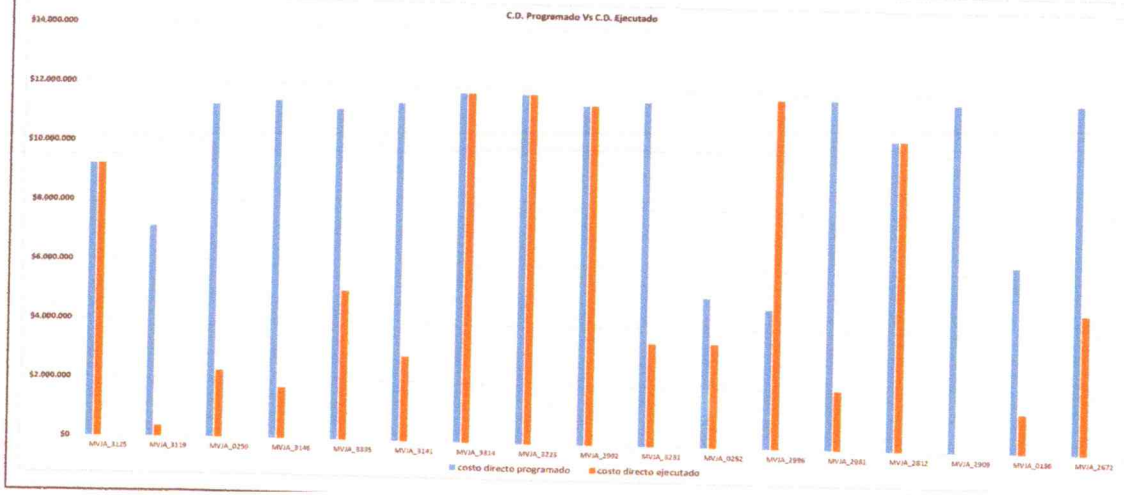



	4- COMPONENTE TECNICO BARRIO O TERRITORIO		
	TIVIDADES EJECUTADAS EN LA SEMANA. - ESTADO DE AVANCE SEMANAL POR VIV		
	BARRIO O TERRITORIO - CIUDAD BOLIVAR		
	FECHA: 27- DIC -2020		
		ALTOS DE JALISCO	
1	MVJA_2992	TEODOSIA GALICIA DE GARCIA	SE REALIZA ENTREGA A CONFORMIDAD DE LA BENEFICIARIA, SE SOCIALIZA PRESUPUESTO FINAL Y MANUAL DE USO Y MANTENIMIENTO. DE IGUAL MANERA SE HACE ENTREGA DE KIT
2	MVJA_3141	MARIA LEONOR FRAILE SUAREZ	SE REALIZA VISITA DE SEGUIMIENTO TECNICO EN LA CUAL SE EVIDENCVIA AVANCE EN ACTIVIDADES DE PAÑETE, ALISTADO DE PISOS Y ENCHAPE EN BAÑO.
3	MVJA_3146	MARIA ESTER ZORRO GUERRERO	SE REALIZA VISITA DE SEGUIMIENTO TECNICO, EN LA CUAL SE EVIDENCIA AVANCE EN CONSTRUCCION DE MESON COCINA. LA BENEFICIARIA MANIFIESTA INCONFORMIDAD POR DI
4	MVJA_3335	CARLOS JULIO CARDENAS TRIANA	SE REALIZA VISITA DE SEGUIMIENTO TECNICO EN LA CUAL SE EVIDENCIA AVANCE EN ACTIVIDADES DE PAÑETE A NIVEL GENERAL, ALISTADO DE PISOS Y ENCHAPE EN HABITACION 1.
5	MVJA_3314	BRISNELDA CONSTANZA MACIAS MARTINEZ	SE REALIZA ENTREGA A CONFORMIDAD DE LA BENEFICIARIA, SE SOCIALIZA PRESUPUESTO FINAL Y MANUAL DE USO Y MANTENIMIENTO. DE IGUAL MANERA SE HACE ENTREGA DE KIT
6	MVJA_3239	NATIVIDAD SILDANA CELYS VIUDA DE GARCIA	Se hace validación en la vivienda, se definen espacios a intervenir, se hace levantamiento arquitectonico para calculo de cantidades de obra
7	MVJA_0259	ALBA CARMEN ARDILA MATEUS	SE REALIZA VISITA DE SEGUIMNIENTO TECNICO, EN LA CUAL SE EVIDENCIA AVANCE EN ACTIVIDADES DE ALISTADO DE PISO A NIVEL GENERAL Y DEMOLICION DE ENCHAPE EN BAÑO
8	MVJA_3223	MARIA OLGA FARFAN GALEON	SE REALIZA ENTREGA A CONFORMIDAD DE LA BENEFICIARIA, SE SOCIALIZA PRESUPUESTO FINAL Y MANUAL DE USO Y MANTENIMIENTO. DE IGUAL MANERA SE HACE ENTREGA DE KIT
9	MVJA_3231	MARIA ANTONIA SANTOS CORREDOR DE RAMIREZ	SE REALIZA VISITA DE SEGUIMIENTO TECNICO, EN LA CUAL SE EVIDENCIA AVANCE EN CONSTRUCCION DE MESON COCINA Y ENCHAPE EN BAÑO.
10	MVJA_3119	LUZMILA TORRES BERMUDEZ	SE REALIZA VISITA DE SEGUIMIENTO TECNICO, EN LA CUAL SE EVIDENCIA ATRASOS EN LA EJECUCION. SE INICIAN ACTIVIDADES EL DIA 29 DE DICIEMBRE UN MES DESPUES DE LA FECH
11	MVJA_3125	MARIA AURORA RENGIFO	SE REALIZA ENTREGA A CONFORMIDAD DE LA BENEFICIARIA, SE SOCIALIZA PRESUPUESTO FINAL Y MANUAL DE USO Y MANTENIMIENTO. DE IGUAL MANERA SE HACE ENTREGA DE KIT
12	MVJA_0252	JESUS ANTONIO ORTIZ CASTRO	SE REALIZA VISITA DE SEGUIMIENTO TECNICO EN LA CUAL SE EVIDENCIA AVANCE EN ACTIVIDAD DE PAÑETE A NIVEL GENERAL.
13	MVJA_2998	MARIA DEL SOCORRO CUPITRA CACAIS	SE REALIZA ENTREGA A CONFORMIDAD DE LA BENEFICIARIA, SE SOCIALIZA PRESUPUESTO FINAL Y MANUAL DE USO Y MANTENIMIENTO. DE IGUAL MANERA SE HACE ENTREGA DE KIT
14	MVJA_2712	JOSE ALIRIO ORTIZ CABRERA Y OTRA	Se hace validación en la vivienda, se definen espacios a intervenir, se hace levantamiento arquitectonico para calculo de cantidades de obra
15	MVJA_2707	ANA LUISA BERNAL PULIDO	Se hace validación en la vivienda, se definen espacios a intervenir, se hace levantamiento arquitectonico para calculo de cantidades de obra
16	MVJA_2640	PAOLA ANDREA BARRERA PELAEZ	Se realiza validación técnica, para cálculo de cantidades y elaboración de presupuesto.
		MIRADOR NUTIVARA	
17	MVCB_1774	JOSE WILSON MARULANDA GIRALDO	Se hace validación en la vivienda, se definen espacios a intervenir, se hace levantamiento arquitectonico para calculo de cantidades de obra
18	MVCB_1742	ANA ELVIA MENDOZA DE HERNANDEZ	Se hace validación en la vivienda, se definen espacios a intervenir, se hace levantamiento arquitectonico para calculo de cantidades de obra
19	MVCB_1907	ANA ROSA LLANOS DE GARCIA	Se hace validación en la vivienda, se definen espacios a intervenir, se hace levantamiento arquitectonico para calculo de cantidades de obra. Cubierta en pesimas condici
20	MVCB_1661	MARICIELO ARIAS CERQUERA	Se hace validación en la vivienda, se definen espacios a intervenir, se hace levantamiento arquitectonico para calculo de cantidades de obra
21	MVCB_1698	LUZ AMALFI GUTIERREZ FRANCO	Se hace validación en la vivienda, se definen espacios a intervenir, se hace levantamiento arquitectonico para calculo de cantidades de obra
22	MVCB_1708	MARIA EUGENIA TRUJILLO QUIMBAYO	Se hace validación en la vivienda, se definen espacios a intervenir, se hace levantamiento arquitectonico para calculo de cantidades de obra
		ROCIO ALTOS DEL SUR	
23	MVJA_2981	LEONOR TOVAR BARRERO	SE REALIZA VISITA DE SEGUIMIENTO TECNICO, EN LA CUAL NO SE EVIDENCIA AVANCE A LA ANTERIOR VISITA. LA BENEFICIARIA MANIEFIESTA INCONFORMIDAD DEBIDO A LAS DEMO
24	MVJA_2812	MARGARITA MARIA MORALES OROZCO	SE REALIZA ENTREGA A CONFORMIDAD DE LA BENEFICIARIA, SE SOCIALIZA PRESUPUESTO FINAL Y MANUAL DE USO Y MANTENIMIENTO. DE IGUAL MANERA SE HACE ENTREGA DE KIT
25	MVJA_2909	AGUSTÍN VILLANUEVA GUZMÁN	SE REALIZA VISITA DE SEGUIMIENTO, EN LA CUAL SE EVIDENCIA QUE NO HAY SUMINISTRO DE MATERIALES NI EJECUCION. LA BENEFICIARIA MANIFIESTA QUE HAY MUCHA DEMORA E
26	MVJA_0186	PEDRO PABLO IBAÑEZ	SE REALIZA VISITA DE SEGUIMIENTO, EN LA CUAL SE EVIDENCIA AVANCE EN ACTIVIDADES DE DESMONTE DE CUBIERTA, ALISTADO DE PISOS Y PAÑETE EN COCINA. LA BENEFICIARIA M
		LA ESCALA	
27	MVJA_2672	MARIA TERESA ANTOLINEZ Y OTRO	SE REALIZA VISITA DE SEGUIMIENTO TECNICO EN LA CUAL SE EVIDENCIA AVANCE EN ACTIVIDADES DE PAÑETE A NIVEL GENERAL Y ALISTADO DE PISOS. EL BENEFICIARIO MANIFIESTA
		ACACIAS SUR	
28	MVJA_0598	RODULFO BEJARANO	Se hace validación en la vivienda, se definen espacios a intervenir, se hace levantamiento arquitectonico para calculo de cantidades de obra

		BARRIO GIBRALTAR I Y II	
29	MVJA_0634	CLARA INES OCHOA GUTIERREZ	hace validación en la vivienda, se definen espacios a intervenir, se hace levantam arquitectonico para calculo de cantidades de obra
30	MVJA_3011	RITA DEL CARMEN FONSECA CAMARGO	hace validación en la vivienda, se definen espacios a intervenir, se hace levantamiento arquitectonico para calculo de cantidades de obra
31	MVJA_3157	IRIA ESTHER SILVA	Se hace validación en la vivienda, se definen espacios a intervenir, se hace levantamiento arquitectonico para calculo de cantidades de obra
32	MVJA_3397	LUZ MARINA ROBAYO ALVARADO	Se hace validación en la vivienda, se definen espacios a intervenir, se hace levantamiento arquitectonico para calculo de cantidades de obra
		LA ESCALA 3ER SECTOR	
33	MVJA_0502	ROSALBA JARA DE ROJAS	Se hace validación en la vivienda, se definen espacios a intervenir, se hace levantamiento arquitectonico para calculo de cantidades de obra
34	MVJA_0519	NESTOR JAVIER VALENZUELA PEÑA	Se hace validación en la vivienda, se definen espacios a intervenir, se hace levantamiento arquitectonico para calculo de cantidades de obra
		CIUDAD MILAGRO	
35	MVJA_0396	JOSE ORVEY ORTIZ	Se hace validación en la vivienda, se definen espacios a intervenir, se hace levantamiento arquitectonico para calculo de cantidades de obra
		VILLAS DEL DIAMANTE	
36	MVCB-5474	OLIVIA RIVERA	SE REALIZA VISITA DE VALIDACION. SE TOMAN MEDIDAS PARA REALIZACION DE PRESUPUESTOS Y POSTERIORMENTE DEFINIR AREAS A INTERVENIR
37	MVCB-5395	MARÍA CRISTINA GONZALEZ GARCÍA	SE REALIZA VISITA DE VALIDACION. SE TOMAN MEDIDAS PARA REALIZACION DE PRESUPUESTOS Y POSTERIORMENTE DEFINIR AREAS A INTERVENIR
38	MVCB-5388	DUBERNEY ARIAS BETANCUR	SE REALIZA VISITA DE VALIDACION. SE TOMAN MEDIDAS PARA REALIZACION DE PRESUPUESTOS Y POSTERIORMENTE DEFINIR AREAS A INTERVENIR

5. PLAN DE ACCIÓN RESULTADO DEL ANÁLISIS DE CAUSAS REGISTRADO EN EL NUMERAL ANTERIOR - CON EL OBJETIVO DE ELIMINAR LA CAUSA RAÍZ DE LA SITUACIÓN PROBLEMÁTICA - PLAN DE MEJORA

ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA
Se realizan 3 validaciones y seguimientos tecnicos, en los cuales se evidenció un gran número de inconformidades por las fechas de inicio de ejecucion por parte del contratista siendo que estos se aperturaron con bastante anterioridad y aun hay viviendas que no han sido intervenidas. los beneficirios manifiestan que los maestros no estan trabajando de turno completo sino que se presentan un durante un par de horas y luego se van sin volver en el resto del día.	CRISTIAN VELASCO	
se le solicita al contratista hacer entrega de una programación acertada, donde se indique las fechas de aperturas y conclusión de las validaciones y aperturas		

6. ACTIVIDADES NO PREVISTAS Y MAYORES CANTIDADES

Se informa que en algunas de las viviendas se presentan mejoras en los acabados finales realizadas por los beneficiarios, por lo tanto se deside intervenir otros espacios en conjunto con el contratista garantizando una adecuada habitabilidad y dignificación de las viviendas

7. COMENTARIOS DEL INTERVENTOR: Por favor realice la descripción general del estado del contrato y según aplique informe sobre: actividades realizadas en la semana, control de lluvias, compra y suministro de materiales, mano de obra, subcontratos y tramites ante las diferentes empresas prestadoras de servicios, entre otros. Anexe las actas de seguimiento realizadas en la semana correspondiente al periodo del informe.

Barrio o Territorio: CIUDAD BOLIVAR

8. REGISTRO FOTOGRAFICO DEL AVANCE DURANTE LA SEMANA

SE ADJUNTA REGISTRO FOTOGRAFICO


REGISTRO FOTOGRÁFICO




FECHA	martes, 29 de diciembre de 2020
DESCRIPCION	MVCB_5395
VALIDACION	




FECHA	martes, 29 de diciembre de 2020
DESCRIPCION	MVCB_5395
VALIDACION	

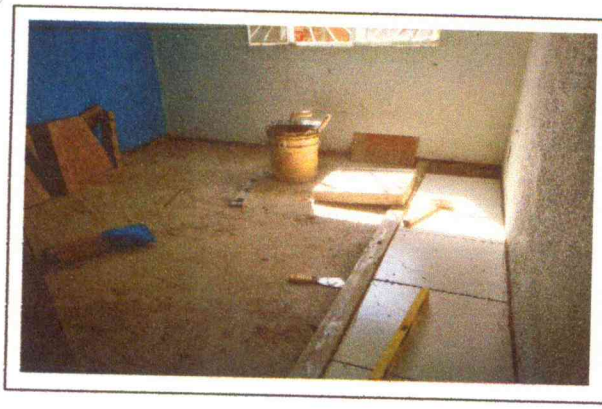


FECHA	lunes, 28 de diciembre de 2020
DESCRIPCION	MVJA_0259
SEGUIMIENTO	

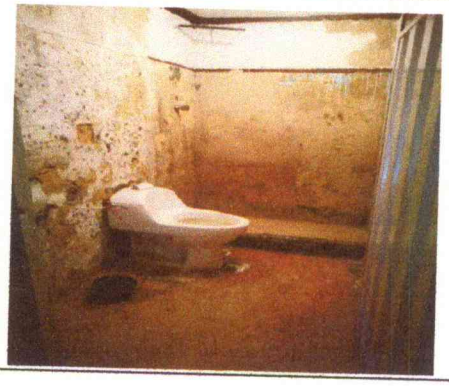

FECHA	lunes, 28 de diciembre de 2020
DESCRIPCION	MVJA_0259
SEGUIMIENTO	

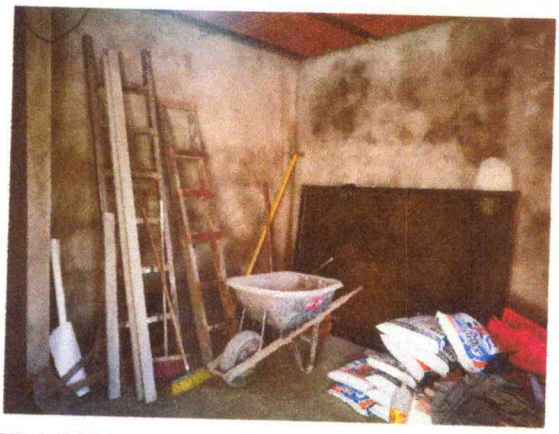


FECHA	miércoles, 30 de diciembre de 2020
DESCRIPCION	MVJA_2672
SEGUIMIENTO	

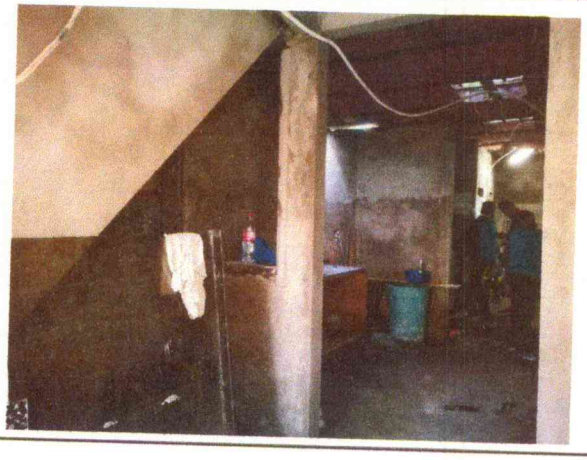

FECHA	miércoles, 30 de diciembre de 2020
DESCRIPCION	MVJA_2672
SEGUIMIENTO	

REGISTRO FOTOGRÁFICO

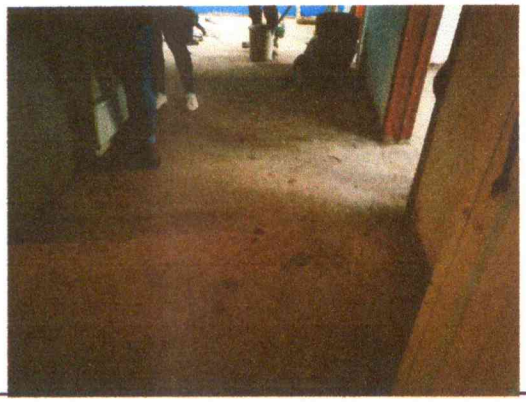

FECHA	lunes, 28 de diciembre de 2020
DESCRIPCION MVJA_0259	
SEGUIMIENTO	



FECHA	lunes, 28 de diciembre de 2020
DESCRIPCION MVJA_0259	
SEGUIMIENTO	




FECHA	miércoles, 30 de diciembre de 2020
DESCRIPCION MVJA_2981	
SEGUIMIENTO	



FECHA	miércoles, 30 de diciembre de 2020
DESCRIPCION MVJA_2981	
SEGUIMIENTO	



FECHA	martes, 29 de diciembre de 2020
DESCRIPCION MVJA_5388	
VALIDACIÓN	

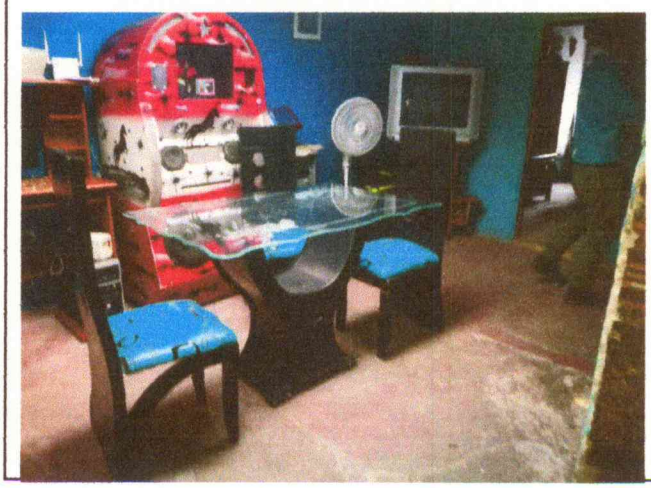

FECHA	martes, 29 de diciembre de 2020
DESCRIPCION MVJA_5388	
VALIDACIÓN	

INPLAYCO S.A.S.
INGENIEROS CONSTRUCTORES E INTERVENTORES

ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C
SECRETARÍA DE HÁBITAT

No.	ID_DMV	Dirección	Nombres y apellidos
DOMINGO LAIN II SECTOR Y CONDOMINIO DEL BOSQUE			
1	MVJA_0723	CL 63 SUR 18K 14	VICTOR MANUEL SAMORA HERNANDEZ
DOMINGO LAIN I			
2	MVJA_0898	CL 63B SUR 18L 53	EFIGENIA GUIZA DE SANCHEZ
3	MVJA_0899	CL 63B SUR 18L 61	DORIS AYDEE HERRERA OTALORA
4	MVJA_0970	CL 63D SUR 18L 02	DORIS CUESTA DE RODRIGUEZ
ALTOS DE JALISCO			
5	MVJA_2741	KR 18M 62ª 44 SUR	CARLOS ALBERTO MUÑETON FRANCO
6	MVJA_2729	KR 18M 62ª 07 SUR	JOSE IGNACIO TAO IBARRA
7	MVJA_0544	CL 62ª SUR 18M 09	MERCEDES RIAÑO PARRA
8	MVJA_0567	CL 62ª SUR 18M 41 IN 9	MARIA DEL ROSARIO RODRIGUEZ
9	MVJA_3309	KR 18P BIS B 61D 25 SUR	TEOFILO MORALES TURGA Y OTRA
10	MVJA_3366	KR 18Q 61C 34 SUR	EDILMA ALCIRA CASTILLO
11	MVJA_4350	TV 18Q BIS C 61B 87 SUR	MARÍA BENDITA REDONDO CASTIBLANCO
12	MVJA_2660	KR 18L BIS A 62ª 39 SUR	MANUEL EDUARDO RODRIGUEZ PRIETO
13	MVJA_4333	TV 18Q BIS C 61B 45 SUR	BEATRIZ CABRALES ACERO
14	MVJA_0890	CL 63B SUR 18K 56	HERNAN HUMBERTO PARRACORREDOR DE RAMIREZ
LA ESCALA 3ER SECTOR			
15	MVJA_0530	CL 62ª SUR 18L 07	LUIS ALIRIO LÓPEZ DÍAZ
GIBRALTAR I Y II			
16	MVJA_4375	TV 18R 61B 41 SUR	FERNANDO TORRES Y OTRA
ACACIAS SUR			
17	MVJA_0598	CL 62A SUR 18R 15	RODULFO BEJARANO
18	MVJA_0608	CL 62A SUR 18T 10	MARIA LUIDINA VARGAS AGUIRRE
19	MVJA_3670		
LA ESPERANZA			
20	MVJA_3607	KR 18T 62A 21 SUR	LUIS ENRIQUE JIMENEZ VEGA
21	MVCB_1574	CL 70F SUR 18R 27	JOSE HIPOLITO GUTIERREZ LUCERO

Subsecretaria de Coordinacion Operativa
Subdireccion de Barrios
Seguimiento ejecución proyectos de Mejoramiento de Vivienda - Habitabilidad

Proyecto mejoramiento de vivienda - AVANCE EJECUCIÓN SEMANAL

Fecha: **3-ene-21**

Consorcio mejoramiento EP 2020 - Contratista de obra

Contratato de obra	694-2020			Plazo	Cinco (5) meses
Objeto	Contratar la ejecución de las obras de mejoramiento de vivienda en la modalidad de habitabilidad de los proyectos estructurados en los territorios priorizados por la Secretaria Distrital de Habitat. Grupo I			Acta de inicio	4 de noviembre de 2020
CDP No.	No. 914 del 14 de julio de 2020	CRP No.		Valor del contrato	TRES MIL SETECIENTOS VEINTICUATRO MILLONES CIENTO TREINTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS DIEZ Y NUEVE PESOS ($3.724.135.319) M/Cte

Gonzalo Llevano Hoyos -INPLAYCO S.A.S.

Contratato de interventoria	701-2020			Plazo	Seis (6) meses
Objeto	Realizar la interventorias técnica, juridica, social, administrativa y financiera, para la ejecución de las obras de mejoramiento de vivienda en la modalidad de habitablidad en los territorios priorizados por la secretaria distrital de hábitat.			Acta de inicio	04 de noviembre 2020
CDP No	No. 892 del 14 de julio de 2020	CRP No.		Valor del contrato	OCHOCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS M/CTE ($894.285.952),

Fase 1: Validación de la información entregada por el la SDHT									Fase 2: Ejecución de obras				
					Validación				Ejecución				
Territorio o barrio a intervenir	CIUDAD BOLIVAR	Barrios	Predios	Total Predios	Validada	V/Por Validar		V/Modificada	En Ejecución	Terminadas	Por Ejecutar	% de Avance	Acta de Entrega a Satisfacción
Arq o Ing. Responsable	ARQ. WILLIAM GARZON	LA ESCALA 3ER SECTOR	1	21	1	0		0	0	1	0	0,36%	1
		DOMINGO LAIN II	1		1	0		0	1	0	0	0,00%	0
		LUCERO MEDIO	5		0	5		0	0	0	5	0,00%	0
		DOMINGO LAIN I	3		3	0		0	0	3	0	1,16%	3
Técnico Responsable	ERICK ALVAREZ CADAVID	ALTOS DE JALISCO	10		15	0		-5	1	9	0	3,51%	9
		GIBRALTAR I Y II	1		1	0		0	0	1	0	0,29%	1
Subtotal			21	21	21	5		0	2	14	5	5,32%	14

AVANCE DE EJECUCIÓN SEMANAL										DICIEMBRE				ENERO
Proyecto				FASE I			Tiempo Programacion			SEMANA DEL 30 AL 06	SEMANA DEL 7 AL 13	SEMANA DEL 14 AL 20	SEMANA DEL 21 AL 27	SEMANA DEL 28 AL 3
No.	ID_DMV	Dirección	Nombres y apellidos	V/ Validada	V/ Modificada	V/Inicial	Fecha inicio	Fecha terminación MV	F. Inicio	5 semana	6 semana	7 semana	8 semana	9 semana
DOMINGO LAIN II SECTOR Y CONDOMINIO DEL BOSQUE														
1	MVJA_0723	CL 63 SUR 18K 14	VICTOR MANUEL SAMORA HERNANDEZ	SI / NO		$11.821.595	26/11/2020	EN EJECUCION	26/11/2020	0%	0%	0%	0%	0%
DOMINGO LAIN I														
2	MVJA_0898	CL 63B SUR 18L 53	EFIGENIA GUIZA DE SANCHEZ	SI / NO		$11.770.978	24/11/2020	26/12/2020	24/11/2020	21%	19,6%	19,5%	39,7%	100%
3	MVJA_0899	CL 63B SUR 18L 61	DORIS AYDEE HERRERA OTALORA	SI / NO		$11.058.620	24/11/2020	26/12/2020	24/11/2020	34%	8%	18%	40%	100%
4	MVJA_0970	CL 63D SUR 18L 02	DORIS CUESTA DE RODRIGUEZ	SI / NO		$11.559.058	25/11/2020	26/12/2020	25/11/2020	15%	2%	26%	58%	100%

ALTOS DE JALISCO														
5	MVJA_2741	KR 18M 62A 44 SUR	CARLOS ALBERTO MUÑETON FRANCO	SI / NO		$11.816.187	27/11/2020	EN EJECUCION	27/11/2020	0%	0%	0%	0%	0%
6	MVJA_2728	KR 18M 62A 07 SUR	JOSE IGNACIO TAO IBARRA	SI / NO		$11.801.634	25/11/2020	26/12/2020	25/11/2020	0%	0%	13%	87%	100%
7	MVJA_0544	CL 62A SUR 18M 09	MERCEDES RIAÑO PARRA	SI / NO		$11.820.308	24/11/2020	26/12/2020	24/11/2020	31%	10%	9%	50%	100%
8	MVJA_0567	CL 62A SUR 18M 41 IN 9	MARIA DEL ROSARIO RODRIGUEZ	SI / NO		$11.722.293	25/11/2020	26/12/2020	25/11/2020	0%	10%	9%	81%	100%
9	MVJA_3309	KR 18P BIS B 61D 25 SUR	TEOFILO MORALES TURGA Y OTRA	SI / NO		$11.799.687	24/11/2020	22/12/2020	24/11/2020	19%	8%	19%	55%	100%
10	MVJA_3366	KR 18Q 61C 34 SUR	EDILMA ALCIRA CASTILLO	SI / NO		$11.764.716	26/11/2020	22/12/2020	26/11/2020	0%	0%	45%	55%	100%
11	MVJA_4350	TV 18Q BIS C 61B 87 SUR	MARÍA BENDITA REDONDO CASTIBLANCO	SI / NO		$11.552.262	26/11/2020	22/12/2020	26/11/2020	0%	0%	10%	91%	100%
12	MVJA_2660	KR 18L BIS A 62A 39 SUR	MANUEL EDUARDO RODRIGUEZ PRIETO	SI / NO		$11.808.234	25/11/2020	22/12/2020	25/11/2020	0%	0%	35%	65%	100%
13	MVJA_4333	TV 18Q BIS C 61B 45 SUR	BEATRIZ CABRALES ACERO	SI / NO		$11.504.866	27/11/2020	19/12/2020	27/11/2020	20%	23%	17%	41%	100%
14	MVJA_0690	CL 63B SUR 18K 56	HERNAN HUMBERTO PARRA	SI / NO		$10.110.603	25/11/2020	19/12/2020	25/11/2020	0%	0%	38%	62%	100%
LA ESCALA 3ER SECTOR														
15	MVJA_0530	CL 62A SUR 18L 07	LUIS AURIO LÓPEZ DÍAZ	SI / NO		$10.524.980	26/11/2020	17/12/2020	26/11/2020	2%	0%	26%	72%	100%
GIBRALTAR I Y II														
16	MVJA_0598	TV 18R 61B 41 SUR	FERNANDO TORRES Y OTRA	SI / NO		$7.358.179	26/11/2020	17/12/2020	26/11/2020	25%	27%	18%	31%	100%
ACACIAS SUR														
17	MVJA_0598	CL 62A SUR 18R 15	RODULFO BEJARANO	SI / NO		$7.358.180	26/11/2020	17/12/2020		0%	0%	0%	0%	0%
18	MVJA_0608	CL 62A SUR 18T 10	MARIA LUDINA VARGAS AGUIRRE	SI / NO		$7.358.181	26/11/2020	17/12/2020		0%	0%	0%	0%	0%
19	MVJA_3670	KR 18Z 62 30 SUR	CRISTOBAL PITA CAMARGO	SI		11791446,1	EN FASE DE VALIDACION	EN FASE DE VALIDACION	EN FASE DE VALIDACION	0%	0%	0%	0%	0%
LA ESPERANZA														
20	MVJA_3607	KR 18T 62A 21 SUR	LUIS ENRIQUE JIMENEZ VEGA	SI / NO		11760813,7	EN FASE DE VALIDACION	EN FASE DE VALIDACION	EN FASE DE VALIDACION	0%	0%	0%	0%	0%
MIRADOR (HUTIVARA)														
21	MVCB_1574	CL 70F SUR 18R 27	JOSE HIPOLITO GUTIERREZ LUCERO	SI		11646455,4	EN FASE DE VALIDACION	EN FASE DE VALIDACION	EN FASE DE VALIDACION	0%	0%	0%	0%	0%
22	MVCB_1585	CL 70F SUR 18P 51	ELIECER RONCANCIO MARTINEZ	SI / NO		$11.805.655	EN FASE DE VALIDACION	EN FASE DE VALIDACION	EN FASE DE VALIDACION	0%	0%	0%	0%	0%
23	MVCB_1586	CL 70F SUR 18P 45	MARIA DEL CARMEN RINCON	SI / NO		$11.816.419	EN FASE DE VALIDACION	EN FASE DE VALIDACION	EN FASE DE VALIDACION	0%	0%	0%	0%	0%

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DEL HÁBITAT

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

PROYECTOS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA

INPLAYCO S.A.S.
INGENIEROS CONSTRUCTORES E INTERVENTORES

FECHA	3/01/2021	PERIODO No.	9	DEL	28/12/2020	AL	3/01/2021

1. INFORMACIÓN GENERAL

OBJETO DEL CONTRATO	Realizar la interventorías técnica, jurídica, social, administrativa y financiera, para la ejecución de las obras de mejoramiento de vivienda en la modalidad de habitabilidad en los territorios priorizados por la secretaría distrital de hábitat.
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO	Corresponde al Grupo 1 a la ejecución de 254 mejoramientos de vivienda, localizados en 3 localidades: Bosa, Usme y Ciudad Bolívar, esta última localidad incluye cuatro (4) Intervenciones de Mejoramientotntegral.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA		CONTRATO DE OBRA	
CONTRATO No.:	701-2020	CONTRATO No.:	694--2020
PLAZO INICIAL:	6 meses	PLAZO INICIAL:	5 meses
FECHA DE INICIACIÓN:	4 de noviembre de 2020	FECHA DE INICIACIÓN:	4 de noviembre de 2020
**FECHA DE SUSPENSIÓN:	0	**FECHA DE SUSPENSIÓN:	0
**FECHA DE REINICIACIÓN:	0	**FECHA DE REINICIACIÓN:	0
FECHA DE TERMINACIÓN:	3 de mayo de 2021	FECHA DE TERMINACIÓN:	3 de abril 2021
PLAZO ACTUALIZADO:	0	PLAZO ACTUALIZADO:	0
PLAZO TRANSCURRIDO:	0	PLAZO TRANSCURRIDO:	0
VALOR INICIAL :	$ 894,285,952	VALOR INICIAL :	0
VALOR ADICION(ES):	0	VALOR ADICION(ES):	$ 3,724,135,319
VALOR ACTUALIZADO:	$ -	VALOR ACTUALIZADO:	$ -
VALOR ANTICIPO:	0	VALOR ANTICIPO:	$ -
VALOR POR PAGAR:	$ -	VALOR POR PAGAR:	$ -
SUPERVISOR:	JUAN CARLOS ARBELAEZ MURILLO	INTERVENTOR:	Gonzalo Llevano Hoyos -INPLAYCO S.A.S.

** Inserte las filas que requiera según el número de suspensiones y reinicios.

2. CONTROL DE HITOS.

No.	*** DESCRIPCIÓN DEL HITO	FECHA PROGRAMADA	FECHA REAL DE CUMPLIMIENTO	DÍAS DE RETRASO
	SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO (HITO OBLIGATORIO)	4/11/2020	3/04/2021	
1	Validación			
2	Entrega de informe de validación			
3	Ejecución			
	ENTREGA A LA INTERVENTORIA DE LOS PRODUCTOS Y/O ACTIVIDADES CONTRATADAS (HITO OBLIGATORIO)			


*** Inserte las filas que requiera según el número de hitos; teniendo en cuenta que como mínimo se deberán establecer 5 hitos adicionales a los obligatorios de inicio y terminación. Los hitos aprobados por la interventoría se socializarán con el supervisor del contrato para su Vo. Bo. Los Hitos aprobados por la interventoría y SDHT solo se podrán modificar previa novedad contractual que así lo requiera. La matriz ded seglmiento hace parte del presente documento.


No.	INDICADORES BARRIO O TERRITORIO	VALORES	PORCENTAJE SOBRE EL VALOR TOTAL DEL CONTRATO	DIFERENCIA (+) ADELANTO (-) ATRASO
1	Valor acumulado de las actividades o productos conforme a la programación vigente.	$227,800,693.26	6.12%	
2	Valor acumulado de las actividades o productos ejecutados y aprobados por la Interventoría.	$198,017,086.68	5.32%	

3. ASPECTOS GENERALES INFORME TÉCNICO

Registre los avances y novedades técnicas, sociales, administrativas, contables y financieras, acompañadas por gráficos, cuadros, fotografías, análisis y comentarios sobre el estado de los trabajos, en todos sus aspectos en la fase de validación y ejecución de obra.

CIUDAD BOLIVAR

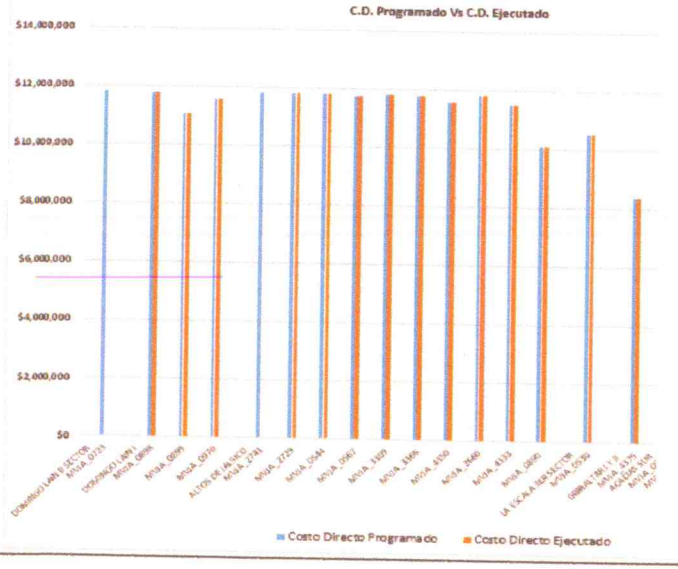

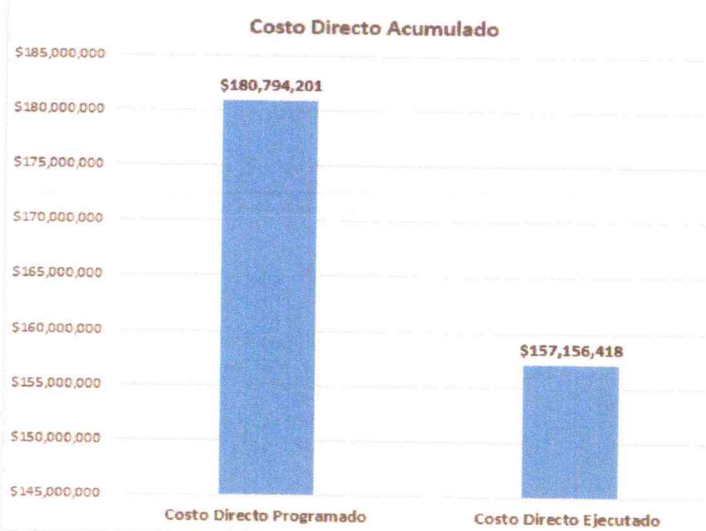

4- COMPONENTE TECNICO BARRIO O TERRITORIO			
ACTIVIDADES EJECUTADAS EN LA SEMANA. - ESTADO DE AVANCE SEMANAL POR VIVIEN			
FECHA: 27-12 -2020			
BARRIO O TERRITORIO - CIUDAD BOLIVAR - DOMINGO LAIN II SECTOR Y CONDOMINIO DEL BOSQUE			
1	MVJA_0723	VICTOR MANUEL SAMORA HERNANDEZ	Se hace seguimiento, la vivienda no cuenta con ningun servicio publico (agua, luz y gas) por tal motivo aun no se inician actividades; se suscribe acta en la cual el beneficiario se compromete a realizar la gestion necesaria para contar con el suministro de luz y agua para poder dar comienzo a la ejecución de la mejora.
BARRIO O TERRITORIO - CIUDAD BOLIVAR - DOMINGO LAIN I			
2	MVJA_0898	EFIGENIA GUIZA DE SANCHEZ	Se hace entrega de vivienda a conformidad del beneficiario, se socializa presupuesto final, manual de uso y mantenimiento; se entrega kit ecologico.
3	MVJA_0899	DORIS AYDEE HERRERA OTALORA	Se hace entrega de vivienda a conformidad del beneficiario, se socializa presupuesto final, manual de uso y mantenimiento; se entrega kit ecologico.
4	MVJA_0970	DORIS CUESTA DE RODRIGUEZ	Se hace entrega de vivienda a conformidad del beneficiario, se socializa presupuesto final, manual de uso y mantenimiento; se entrega kit ecologico.
BARRIO O TERRITORIO - CIUDAD BOLIVAR - ALTOS DE JALISCO			
5	MVJA_2741	CARLOS ALBERTO MUÑETON FRANCO	Beneficiario no se encuentra hasta el mes de enero; se debe validar nuevamente una vez beneficiario termine adecuaciones por su cuenta.
6	MVJA_2729	JOSE IGNACIO TAO IBARRA	Se hace entrega de vivienda a conformidad del beneficiario, se socializa presupuesto final, manual de uso y mantenimiento; se entrega kit ecologico.
7	MVJA_0544	MERCEDES RIAÑO PARRA	Se hace entrega de vivienda a conformidad del beneficiario, se socializa presupuesto final, manual de uso y mantenimiento; se entrega kit ecologico.
8	MVJA_0567	MARIA DEL ROSARIO RODRIGUEZ	Se hace entrega de vivienda a conformidad del beneficiario, se socializa presupuesto final, manual de uso y mantenimiento; se entrega kit ecologico.
9	MVJA_3309	TEOFILO MORALES TURGA	Se hace entrega de vivienda a conformidad del beneficiario, se socializa presupuesto final, manual de uso y mantenimiento; se entrega kit ecologico.
10	MVJA_3366	EDILMA ALCIRA CASTILLO	Se hace entrega de vivienda a conformidad del beneficiario, se socializa presupuesto final, manual de uso y mantenimiento; se entrega kit ecologico.
11	MVJA_4350	MARÍA BENDITA REDONDO CASTIBLANCO	Se hace entrega de vivienda a conformidad del beneficiario, se socializa presupuesto final, manual de uso y mantenimiento; se entrega kit ecologico.
12	MVJA_2660	MANUEL EDUARDO RODRIGUEZ PRIETO	Se hace entrega de vivienda a conformidad del beneficiario, se socializa presupuesto final, manual de uso y mantenimiento; se entrega kit ecologico.
13	MVJA_4333	BEATRIZ CABRALES ACERO	Se hace entrega de vivienda a conformidad del beneficiario, se socializa presupuesto final, manual de uso y mantenimiento; se entrega kit ecologico.
14	MVJA_0890	HERNAN HUMBERTO PARRA	Se hace entrega de vivienda a conformidad del beneficiario, se socializa presupuesto final, manual de uso y mantenimiento; se entrega kit ecologico.
BARRIO O TERRITORIO - CIUDAD BOLIVAR - LA ESCALA 3ER SECTOR			
15	MVJA_0530	LUIS ALIRIO LÓPEZ DÍAZ	Se hace entrega de vivienda a conformidad del beneficiario, se socializa presupuesto final, manual de uso y mantenimiento; se entrega kit ecologico.
BARRIO O TERRITORIO - CIUDAD BOLIVAR - GIBRALTAR I Y II			
16	MVJA_4375	FERNANDO TORRES Y OTRA	Se hace entrega de vivienda a conformidad del beneficiario, se socializa presupuesto final, manual de uso y mantenimiento; se entrega kit ecologico.
BARRIO O TERRITORIO - CIUDAD BOLIVAR - LUCERO MEDIO			
17	MVJA_2324	ARMANDO QUIROGA BARRIGA Y OTRA	Se hace validación en la vivienda, se definen espacios a intervenir y se realiza levantamiento arquitectonico para calculo de cantidades de obra.
18	MVJA_2617	QUINTILIANO CASTILLO DOMÍNGUEZ Y OTRA	Se hace validación en la vivienda, se definen espacios a intervenir y se realiza levantamiento arquitectonico para calculo de cantidades de obra.
19	MVJA_2628	MARIA ALICIA MAHECHA POVEDA	Se hace validación en la vivienda, se definen espacios a intervenir y se realiza levantamiento arquitectonico para calculo de cantidades de obra.
20	MVJA_2418	BERTILDA URREGO	Se hace validación en la vivienda, se definen espacios a intervenir y se realiza levantamiento arquitectonico para calculo de cantidades de obra.
21	MVJA_2414	MARIA ELENA RINCON RINCON	Se hace validación en la vivienda, se definen espacios a intervenir y se realiza levantamiento arquitectonico para calculo de cantidades de obra.

5. PLAN DE ACCIÓN RESULTADO DEL ANÁLISIS DE CAUSAS REGISTRADO EN EL NUMERAL ANTERIOR - CON EL OBJETIVO DE ELIMINAR LA CAUSA RAÍZ DE LA SITUACIÓN PROBLEMÁTICA - PLAN DE MEJORA		
ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA
En conjunto con el contratista y esta interventoría se realizaran y supervisaran los respectivos presupuestos iniciales de obra y seguimiento a la ejecución de actividades, tambien se definiran posibles ajustes a las areas establecidas e indicadas inicialmente en cada uno de los expedientes de los beneficiaros del programa de mejoramiento de vivienda.	ERICK ALVAREZ CADAVID	

6. ACTIVIDADES NO PREVISTAS Y MAYORES CANTIDADES

Se informa que en algunas de las viviendas se presentan mejoras en los acabados finales realizadas por los beneficiarios, por lo tanto se deside intervenir otros espacios en conjunto con el contratista garantizando una adecuada habitabilidad y dignificación de las viviendas

7. COMENTARIOS DEL INTERVENTOR: Por favor realice la descripción general del estado del contrato y según aplique informe sobre: actividades realizadas en la semana, control de lluvias, compra y suministro de materiales, mano de obra, subcontratos y tramites ante las diferentes empresas prestadoras de servicios, entre otros. Anexe las actas de seguimiento realizadas en la semana correspondiente al periodo del informe.

Barrio o Territorio: CIUDAD BOLIVAR


En el presente periodo se hace seguimiento de obra a 16 viviendas beneficiadas, se le informa al contratista de obra y al beneficiario sobre los espacios a intervenir.

Se debe dar prioridad de entrega a los MV: 0530, 2729 y 3366.

8. REGISTRO FOTOGRAFICO DEL AVANCE DURANTE LA SEMANA

SE ADJUNTA REGISTRO FOTOGRAFICO

REGISTRO FOTOGRÁFICO

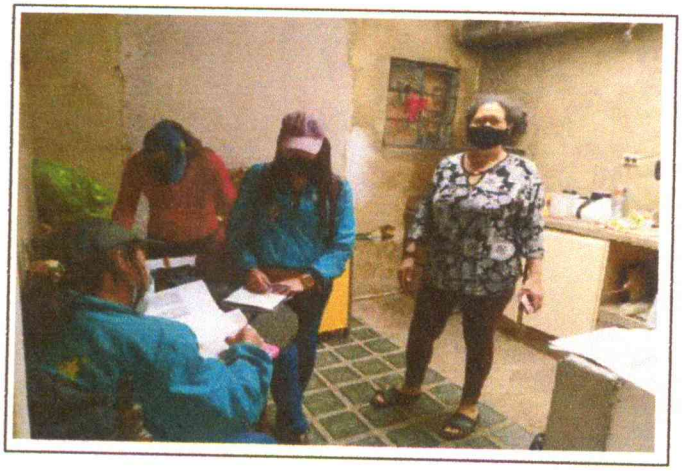

FECHA	jueves, 17 de diciembre de 2020
DESCRIPCION MVJA_2617	
Validacion	




FECHA	jueves, 17 de diciembre de 2020
DESCRIPCION MVJA_2628	
Validacion	



FECHA	jueves, 17 de diciembre de 2020
DESCRIPCION MVJA_2418	
Validacion	



FECHA	jueves, 17 de diciembre de 2020
DESCRIPCION MVJA_2414	
Validacion	

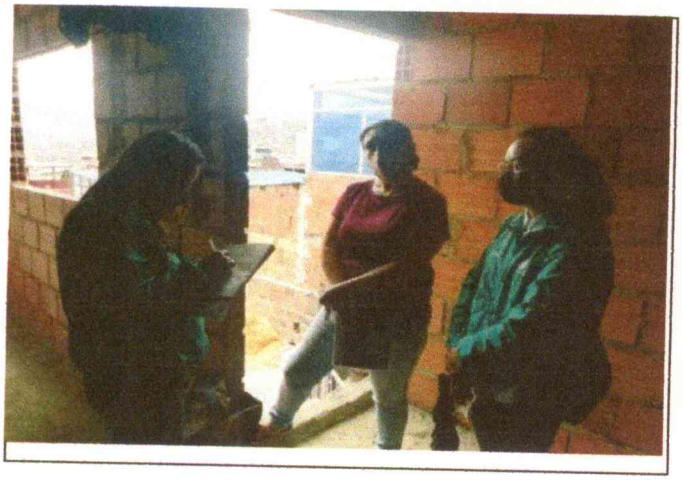


FECHA	jueves, 17 de diciembre de 2020
DESCRIPCION MVJA_2324	
Validacion	




FECHA	martes, 22 de diciembre de 2020
DESCRIPCION MVJA_4350	
Entrega	


REGISTRO FOTOGRÁFICO

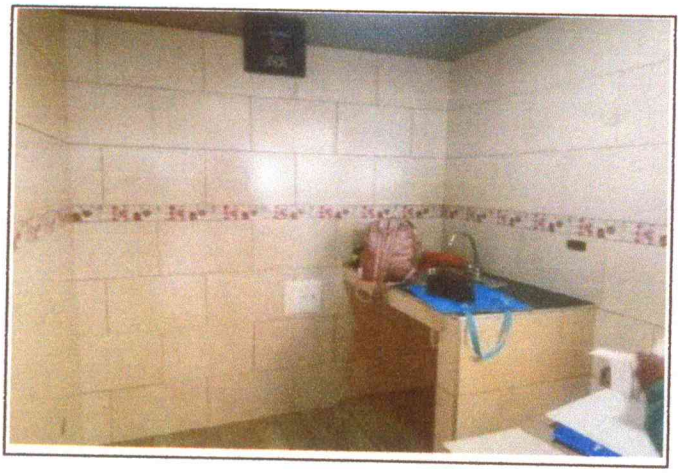

FECHA	martes, 22 de diciembre de 2020
DESCRIPCION MVJA_4350	
Entrega - cocina	

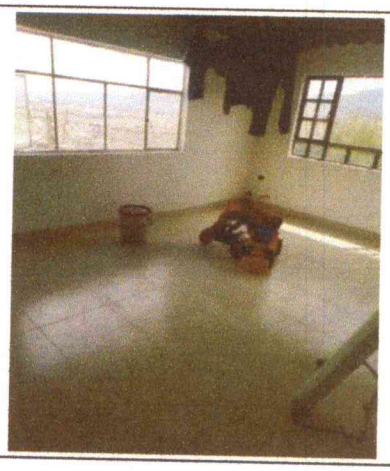

FECHA	martes, 22 de diciembre de 2020
DESCRIPCION MVJA_4350	
Entrega - Habitacion 1	

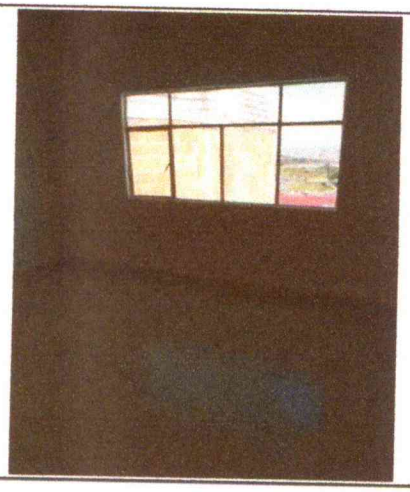

FECHA	martes, 22 de diciembre de 2020
DESCRIPCION MVJA_4350	
Entrega - Habitacion 2	

FECHA	sábado, 19 de diciembre de 2020
DESCRIPCION MVJA_4333	
Entrega	

FECHA	jueves, 17 de diciembre de 2020
DESCRIPCION MVJA_0530	
Entrega - Habitacion	

FECHA	jueves, 17 de diciembre de 2020
DESCRIPCION MVJA_4375	
Entrega - Habitacion	

INPLAYCO S.A.S.
INGENIEROS CONSTRUCTORES E INTERVENTORES

ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE HÁBITAT

INFORME SOCIAL SEMANAL 9

ULTIMA SEMANA DICIEM
28 - 3 ENERO.

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DEL HÁBITAT

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

PROYECTOS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA
GRUPO 1

INPLAYCO S.A.S.
INGENIEROS CONSTRUCTORES E INTERVENTORES

FECHA	02/01/2020	PERIODO No.	9	DEL	28/12/2020	AL	03/01/2021

1. INFORMACIÓN GENERAL

OBJETO DEL CONTRATO	Realizar la interventorías técnica, jurídica, social, administrativa y financiera, para la ejecución de las obras de mejoramiento de vivienda en la modalidad de habitabilidad en los territorios priorizados por la secretaría distrital de hábitat.
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO	Corresponde al Grupo 1 a la ejecución de 254 mejoramientos de vivienda, localizados en 3localidades: Bosa, Usme y Ciudad Bolívar, esta última localidad incluye cuatro (4) Intervenciones de Mejoramientointegral.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA		CONTRATO DE OBRA	
CONTRATO No.:	701-2020	CONTRATO No.:	694--2020
PLAZO INICIAL:	6 meses	PLAZO INICIAL:	5 meses
FECHA DE INICIACIÓN:	4 de noviembre de 2020	FECHA DE INICIACIÓN:	4 de noviembre de 2020
**FECHA DE SUSPENSIÓN:	0	**FECHA DE SUSPENSIÓN:	0
**FECHA DE REINICIACIÓN:	0	**FECHA DE REINICIACIÓN:	0
FECHA DE TERMINACIÓN:	3 de mayo de 2021	FECHA DE TERMINACIÓN:	3 de abril 2021
PLAZO ACTUALIZADO:	0	PLAZO ACTUALIZADO:	0
PLAZO TRANSCURRIDO:	0	PLAZO TRANSCURRIDO:	0
VALOR INICIAL :	$ 894.285.952,00	VALOR INICIAL :	$ 3.724.135.319,00
VALOR ADICIÓN(ES):	$ -	VALOR ADICIÓN(ES):	$ -
VALOR ACTUALIZADO:	$ -	VALOR ACTUALIZADO:	$ -
VALOR ANTICIPO:	$ -	VALOR ANTICIPO:	$ -
VALOR POR PAGAR:	$ -	VALOR POR PAGAR:	$ -
SUPERVISOR:	JUAN CARLOS ARBELÁEZ MURILLO	INTERVENTOR:	Gonzalo Liévano Hoyos -INPLAYCO S.A.S.

** Inserte las filas que requiera según el número de suspensiones y reinicios.

2. CONTROL DE HITOS.

No.	*** DESCRIPCIÓN DEL HITO	FECHA PROGRAMADA	FECHA REAL DE CUMPLIMIENTO	DÍAS DE RETRASO
	SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO (HITO OBLIGATORIO)	04/11/2020	03/04/2021	
1	Validación			
2	Entrega de informe de validación			
3	Ejecución			
	ENTREGA A LA INTERVENTORÍA DE LOS PRODUCTOS Y/O ACTIVIDADES CONTRATADAS (HITO OBLIGATORIO)			

*** Inserte las filas que requiera según el número de hitos; teniendo en cuenta que como mínimo se deberán establecer 5 hitos adicionales a los obligatorios de inicio y terminación. Los hitos aprobados por la interventoría se socializarán con el supervisor del contrato para su Vo. Bo. Los Hitos aprobados por la interventoría y SDHT solo se podrán modificar previa novedad contractual que así lo requiera. La matriz de seguimiento hace parte del presente documento.

No.	INDICADORES	VALORES	PORCENTAJE SOBRE EL VALOR TOTAL DEL CONTRATO	DIFERENCIA (+) ADELANTO (-) ATRASO
1	Valor acumulado de las actividades o productos conforme a la programación vigente.			
2	Valor acumulado de las actividades o productos ejecutados y aprobados por la Interventoría.			

3. ASPECTOS GENERALES INFORME SOCIAL

COMPONENTE SOCIAL - AVANCE SOCIAL DE CADA UNIDAD DE VIVIENDA

LOCALIDAD: CIUDAD BOLÍVAR

BARRIO O TERRITORIO: MIRADOR NUTIBARA

29/12/2020 - **MVCB_1585: ELIECER RONCANCIO MARTÍNEZ,** validación.

29/12/2020 - **MVCB_1357: MARTHA LILIA AGUDELO SANTOS,** validación.

BARRIO O TERRITORIO: ALTOS DE JALISCO

28/12/2020 - **MVJA_3314: MARÍA OLMA MOLANO ROMERO, cierre de la queja,** se finalizan actividades constructivas en la vivienda a conformidad de la señora y de acuerdo al presupuesto estipulado, se socializa presupuesto final, manual de uso y conservación y se entrega kit ecológico.

28/12/2020 - **MVJA_3223: MYRIAM AMPARO GÓMEZ DE GALVIS,** se finalizan actividades constructivas en la vivienda a conformidad de la señora y de acuerdo al presupuesto estipulado, se socializa presupuesto final, manual de uso y conservación y se entrega kit ecológico.

28/12/2020 - **MVJA_3125: MARÍA AURORA RENGIFO,** se finalizan actividades cosntructivas en la vivienda a conformidad de la señora y de acuerdo al presupuesto estipulado, se socializa presupuesto final, manual de uso y conservación y se entrega kit ecológico.

28/12/2020 - **MVJA_2992: ISAURA ARÉVALO MALAGÓN,** se finalizan actividades constructivas en la vivienda a conformidad de la señora y de acuerdo al presupuesto estipulado, se socializa presupuesto final, manual de uso y conservación y se entrega kit ecológico.
28/12/2020 - **MVJA_0890: HERNÁN HUMBERTO PARRA,** se finalizan actividades constructivas en la vivienda, sin embargo, no se recibe a conformidad por el beneficiario a pesar de socializar en repetidas ocasiones las actividads de obra teniendo en cuenta que cambiaron por condiciones estructurales, se socializa presupuesto final, manual de uso y conservación, se hace acta en la cual reposa información de lo sucedido y se firma por los profesionales y beenficiario.
28/12/2020 - **MVJA_2660: MANUEL EDUARDO RODRIGUEZ PRIETO,** se finalizan actividades constructivas en la vivienda a conformidad del beneficiario y de acuerdo al presupuesto estipulado, se socializa presupuesto final, manual de uso y conservación y se entrega kit ecológico.
28/12/2020 - **MVJA_2729: JOSÉ IGNACIO TAO IBARRA,** se finalizan actividades constructivas en la vivienda a conformidad del beneficiario y de acuerdo al presupuesto estipulado, se socializa presupuesto final, manual de uso y conservación y se entrega kit ecológico.
28/12/2020 - **MVJA_0544: MERCEDES RIAÑO PARRA,** se finalizan actividades constructivas en la vivienda a conformidad del beneficiario y de acuerdo al presupuesto estipulado, se socializa presupuesto final, manual de uso y conservación y se entrega kit ecológico.
28/12/2020 - **MVJA_0567: MARÍA DEL ROSARIO RODRÍGUEZ,** se finalizan actividades constructivas en la vivienda a conformidad del beneficiario y de acuerdo al presupuesto estipulado, se socializa presupuesto final, manual de uso y conservación y se entrega kit ecológico.
28/12/2020 - **MVJA_3309: TEÓFILO MORALES TURGA Y OTRA,** se finalizan actividades constructivas en la vivienda a conformidad del beneficiario y de acuerdo al presupuesto estipulado, se socializa presupuesto final, manual de uso y conservación y se entrega kit ecológico.
28/12/2020 - **MVJA_3366: EDILMA ALCIRA CASTILLO,** se finalizan actividades constructivas en la vivienda a conformidad del beneficiario y de acuerdo al presupuesto estipulado, se socializa presupuesto final, manual de uso y conservación y se entrega kit ecológico.
28/12/2020 - **MVJA_4350: MARÍA BENDITA REDONDO CASTIBLANCO,** se finalizan actividades constructivas en la vivienda a conformidad del beneficiario y de acuerdo al presupuesto estipulado, se socializa presupuesto final, manual de uso y conservación y se entrega kit ecológico.
28/12/2020 - **MVJA_4333: BEATRIZ CABRALES ACERO,** se finalizan actividades constructivas en la vivienda a conformidad del beneficiario y de acuerdo al presupuesto estipulado, se socializa presupuesto final, manual de uso y conservación y se entrega kit ecológico.
28/12/2020 - **MVJA_4375: FERNANDO TORRES Y OTRA,** se finalizan actividades constructivas en la vivienda a conformidad del beneficiario y de acuerdo al presupuesto estipulado, se socializa presupuesto final, manual de uso y conservación y se entrega kit ecológico.
28/12/2020 - **MVJA_3119: LUZ YANID PADUA.** Seguimiento. Se hace acercamiento al predio para cumplir cita programada con la beneficiaria en compañia del contratista y subcontratista ya que la vivienda se encuentra aperturada desde el 24 de noviembre y la familia desocupó la vivienda. La señora Luz no se encuentra en el predio porque debia ir a trabajar. Se regresará nuevamente el dia de mañana para levantar acta con la beneficiaria y con el contratista. Ya que se comprometieron a iniciar labores constructivas el dia de mañana
28/12/2020 - **MVJA_2909: BLANCA CECILIA ALFONSO BOHÓRQUEZ.** Seguimiento. Se hace acercamiento al predio. La beneficiaria manifiesta conformidad con el avance de la obra. Manifiesta dudas las cuales son resueltas por el área pertinente. Se observa personal de obra en el predio.
28/12/2020 - **MVJA_0252: JESÚS ANTONIO ORTÍZ CASTRO.** Seguimiento. Se hace acercamiento al predio el beneficiario manifiesta conformidad con el avance de obra. Se observa personal de obra
28/12/2020 - **MVJA_2996: MARÍA DEL SOCORRO CUPITRA CACAIS.** Seguimiento. Se hace acercamiento al predio el beneficiario manifiesta conformidad con el avance de obra. Se observa personal de obra
28/12/2020 - **MVJA_2909: BLANCA CECILIA ALFONSO BOHÓRQUEZ**. Seguimiento. La beneficiaria se encuentra inconforme ya que la vivienda de aperturo el 27 de noviembre y adecuaron los espacios cumpliendo compromisos técnicos para el inicio de la obra. El contratista indica que el 2 de enero inician se iniciarán las labores. Solicita que el dia de inicio entren todo el material si no, no deja iniciar labores. Se le indica a la señora Rocio que si el dia de 2 de enero no inician labores tiene el derecho de interponer PQR.
28/12/2020 - **MVJA_3141: GLORIA CRISTINA GUTIÉRREZ GARZÓN**. Seguimiento. Se hace acercamiento al predio. La beneficiaria refiere conformidad con el avance de la obra. Se observa personal en el predio. Manifiestan inquietudes técnicas las cuales son resueltas.
28/12/2020 - **MVJA_3146: CLARA INÉS GIL BAEZ.** Seguimiento. Se hace acercamiento al predio. La beneficiaria refiere conformidad con el avance de la obra; sin embargo solicita mayor presencia de los maestros ya que en ocasiones el personal de obra no asiste al predio. Se observa personal de obra en la casa. Manifiesta inquietudes técnicas las cuales son resueltas.
29/12/2020 - **MVJA_3119: LUZ YANID PADUA.** Seguimiento. Se hace acercamiento al predio para cumplir cita programada con la beneficiaria en compañia del contratista. Se hace levantamiento de acta en la cual se estipulan compromisos para darle continuidad a la obra. Se observa personal de obra y material en la vivienda.
30/12/2020 - **MVJA_3231: SOFÍA MORENO.** Seguimiento. Se observa personal de obra en el predio. La beneficiaria manifesta conformidad por la obra
30/12/20202 - **MVJA_2981: LEONOR TOVAR BARRERO.** Seguimiento. Se observa inconformidad por parte de la familia ya que que el personal de obra no ha ido al predio hace 8 dias. Se le recomienda a la familia llamar a la social si se repite nuevamente. El contratista refiere que hará cambio de personal y hoy retomarán labores en dos horas.
30/12/2020 - **MVJA_3335: MYRIAM PATRICIA SARMIENTO APONTE**. Seguimiento.Se hace acercamiento al predio. Se observa personal de obra y conformidad por parte del autorizado Anderson Castro.

BARRIO O TERRITORIO NUEVA COLOMBIA
28/12/2020 - **MVCB_1469: JORGE SÁNCHEZ FORERO,** se firman los documentos de entrega de la vivienda a satisfacción de la beneficiaria.
28/12/2020 - **MVCB_1194: VÍCTOR HUGO WILCHES BERNAL,** se firman los documentos de entrega de la vivienda a satisfacción de la beneficiaria.
28/12/2020 - **MVCB_1212: HERNÁN LÓPEZ,** se firman los documentos de entrega de la vivienda a satisfacción de la beneficiaria.
28/12/2020 - **MVCB_1161: MARÍA ROSA ELENA BECERRA SEGURA,** se firman los documentos de entrega de la vivienda a satisfacción de la beneficiaria.
28/12/2020 - **MVCB_1180: BLANCA TERESA CALVO DE GARZÓN,** se firman los documentos de entrega de la vivienda a satisfacción de la beneficiaria.
28/12/2020 - **MVCB_1181: ALBERTO ULLOA ULLOA,** se firman los documentos de entrega de la vivienda a satisfacción de la beneficiaria.
30/12/2020 - **MVCB_1470: ANA SILVIA CHACÓN ,** Entrega de vivienda
30/12/2020 - **MVCB_1416: ANA CENETH TORRES ROJAS ,** Entrega de vivienda
30/12/2020 - **MVCB_1409: JENNY CAROLINA BERNAL ,** Entrega de vivienda
30/12/2020 - **MVCB_1493 : MARIA ELENA ALCIRA GARZÓN CASALLAS,** Entrega de vivienda
30/12/2020 - **MVCB_1516: BERTA CECILIA MOJICA RUIZ ,** Entrega de vivienda
28/12/2020 - **MVCB_1407: MARÍA ELSA TORRES,** se firman los documentos de entrega de la vivienda a satisfacción de la beneficiaria.
BARRIO O TERRITORIO: LA ESCALA III SECTOR
30/12/2020 - **MVJA_2672: CARLOS OLIMPO SEGURA GUERRERO,** seguimiento. La familia manifiesta inquietudes porque los trabajadores no tienen material. Sin embargo hay presencia de personal de obra en el predio.
28/12/2020 - **MVJA_0530: LUIS ALIRIO LÓPEZ DÍAZ,** entrega de la vivienda, socialización de presupuesto final, de manual de uso y mantenimiento y se entrega kit ecológico.
BARRIO O TERRITORIO: ROCÍO ALTOS DEL SUR
28/12/2020 - **MVJA_2812: ANDREA JENNIFFER ACOSTA MENDIVELSO,** entrega de la vivienda, socialización de presupuesto final, de manual de uso y mantenimiento y se entrega kit ecológico, cierre de queja.
BARRIO O TERRITORIO: VILLAS EL DIAMANTE
29/12/2020 - **MVCB_5474: OLIVA RIVERA,** Validación.
29/12/2020 - **MVCB_5395: MARÍA CRISTINA GONZALEZ GARCÍA,** Validación.
29/12/2020 - **MVCB_5388: DUBERNEY ARIAS BETANCUR,** Validación.
29/12/2020 - **MVCB_5489: GLORIA INES PEÑA BELTRAN,** Validación
29/12/2020 - **MVCB_5491 LEONILDE BUITRAGO MORENO,** Validación

BARRIO O TERRITORIO: DOMINGO LAIN I		
28/12/2020 - **MVJA_0970: DORIS CUESTA DE RODRÍGUEZ,** entrega de la vivienda, socialización de presupuesto final, de manual de uso y mantenimiento y se entrega kit ecológico, cierre de queja.		
28/12/2020 - **MJVA_0898: EFIGENIA GUIZA DE SÁNCHEZ,** entrega de la vivienda, socialización de presupuesto final, de manual de uso y mantenimiento y se entrega kit ecológico		
28/12/2020 - **MVJA_0899: DORIS AYDEE HERRERA OTÁLORA,** entrega de la vivienda, socialización de presupuesto final, de manual de uso y mantenimiento y se entrega kit ecológico		
4. CASOS ESPECIALES COMPONENTE SOCIAL - CONFLICTOS Y ANOMALÍAS		
CIERRE DE QUEJA: **28/12/2020 - MVJA_3314: MARÍA OLMA MOLANO ROMERO,** se finalizan actividades cosntructivas en la vivienda a conformidad de la señora y de acuerdo al presupuesto estipulado, se socializa presupuesto final, manual de uso y conservación y se entrega kit ecológico.		
PETICIÓN: **30/12/2020 - MVJA_3670: CRISTÓBAL PITA CAMARGO,** se comunica telefónicamente la P. Social María Isabel Serrano informando petición con radicado SDHT 1-2020-37091 Bajo derecho de peticion tramitado a la Personeria Distrital solicita "(…) se dé respuesta de fondo sobre el subsidio distrital de mejoramiento de vivienda según resolución 848 de 30 de diciembre de 2019 (…)"		
PETICIÓN: 30**/12/2020 - MVJA_0286: HASBLEIDY GINA ROJAS ESCOBAR,** se comunica telefónicamente la P. Social María Isabel Serrano informando petición con radicado SDHT 1-2020-37710 – MVJA_0286 – IIM Jalisco "(…) estoy muy inquieta porque habian quedado de venir a visitarme el dia 3 de diciembre para revisar el presupuesto e iniciar la obra (…)"		
5. PLAN DE ACCIÓN RESULTADO DEL ANÁLISIS DE CAUSAS REGISTRADO EN EL NUMERAL ANTERIOR - CON EL OBJETIVO DE ELIMINAR LA CAUSA RAÍZ DE LA SITUACIÓN PROBLEMÁTICA - PLAN DE MEJORA		
ACTIVIDAD	**RESPONSABLE**	**FECHA PROGRAMADA**
Para las dos peticiones instaurades ante la Personería y SDHT respectivamente, se envian por parte del contratista notificaciones por correo certificado, en la cuales se establece dia de visita de validación, a las mismas se tienen programados equipos técnicos y sociales de la interventoria y contratista.	CONSORCIO MEJORAMIENTO EP2020	30/12/2020 NOTIFICACIÓN
6. Actas de reunión con la comunidad y listados de asistencia o soporte de las diferentes acciones según corresponda (cuando aplique).		
CIERRE DE QUEJA: 28/12/2020 MVJA_3314: MARÍA OLMA MOLANO ROMERO, se finalizan actividades cosntructivas en la vivienda a conformidad de la señora y de acuerdo al presupuesto estipulado, se socializa presupuesto final, manual de uso y conservación y se entrega kit ecológico.		
7. COMENTARIOS DEL INTERVENTOR: Por favor realice la descripción general del estado del contrato y según aplique informe sobre: actividades realizadas en la semana, control de lluvias, compra y suministro de materiales, mano de obra, subcontratos y tramites ante las diferentes empresas prestadoras de servicios, entre otros. Anexe las actas de seguimiento realizadas en la semana correspondiente al periodo del informe.		
* Se continúan evidenciando demoras en la ejecución de algunas viviendas lo que genera inconformidades en los beneficiarios, sobre todo en el sector de Jalisco, dado que eventualmente el contratista no cuenta con material ni personal de obra. * Se cierra la queja instaurada por la beneficiaria de la vivienda MVJA_3314.		
8. REGISTRO FOTOGRÁFICO DEL AVANCE DURANTE LA SEMANA		


INPLAYCO S.A.S.

REGISTRO FOTOGRÁFICO


GRUPO 1



28/12/2020 - MVJA_0899: DORIS HERRERA, entrega de vivienda a conformidad de la beneficiaria, se socializa presupuesto final de obras, manual de uso y mantenimiento y se entrega kit ecológico.

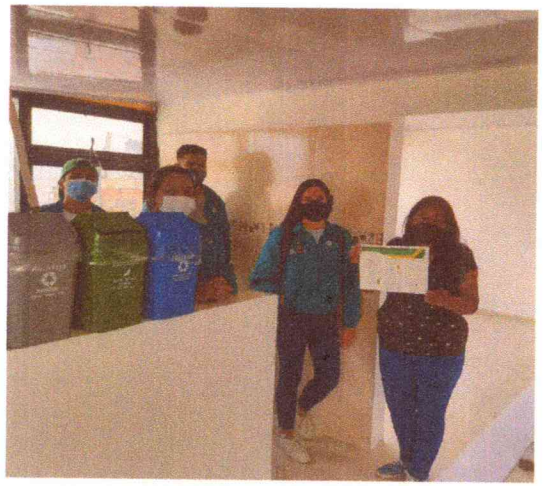

28/12/2020 - MVJA_0898: EFIGENIA GUIZA, entrega de vivienda, se socializa presupuesto final de obras, manual de uso y mantenimiento y se entrega kit ecológico.

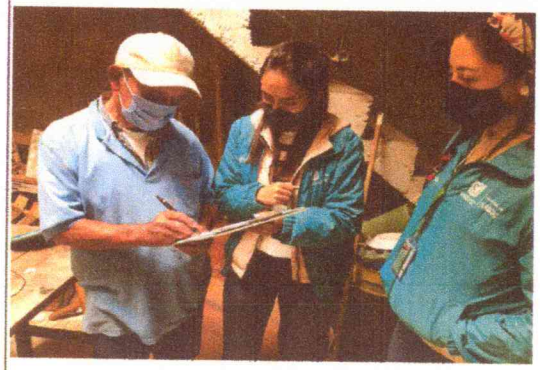

29/12/2020 - MVCB_1585: ELIECER RONCANCIO MARTÍNEZ, validación.




29/12/2020 - MVCB_1357: MARTHA LILIA AGUDELO SANTOS, validación.



29/12/2020 - MVCB_5489: GLORIA INES PEÑA BELTRAN, Validación



29/12/2020 MVCB_5474: OLIVA RIVERA. Validación.

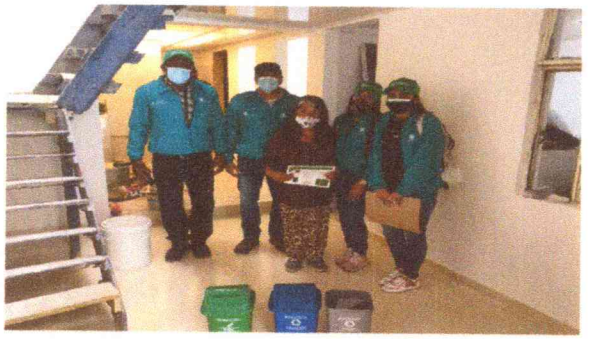

30/12/2020 - MVCB_1493 : MARÍA ELENA ALCIRA GARZÓN CASALLAS, Entrega de vivienda



29/12/2020 MVCB_5388: DUBERNEY ARIAS BETANCUR. Validación.

BASE DE DATOS SEGUIMIENTO DE PETICIONES QUEJAS Y RECLAMOS EJECUCION DE OBRAS
SUBDIRECCIÓN DE BARRIOS
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA

Nº	Nº CONSECUTIVO TOTAL DEL MES	MV - ID	FECHA APERTURA	FECHA CIERRE	NOMBRE DE LA PERSONA SOLICITANTE	LOCALIDAD	TOD	BARRIO	DIRECCIÓN	TELÉFONO DE CONTACTO	TIPO DE SOLICITUD				DESCRIPCIÓN DEL ASUNTO Y/O SITUACIÓN	RECOMENDACIÓN Y TRAMITE Y/O RESPUESTA	SEGUIMIENTO OBRA	SEGUIMIENTO INTERVENTORÍA	RESPUESTA DE CIERRE Y SOPORTE O TRAMITE APLICATIVO	ESTADO	
											P	Q	R	S						ABIERTO	CERRADO
1	1	MVJA_3314	21/12/2020	29/12/2020	MARÍA OLMA MOLANO ROMERO	CIUDAD BOLÍVAR	JALISCO	ALTOS DE JALISCO	CARRERA 18 P BIS B N 61 D 86 SUR	7912832-3222121138		X			La beneficiaria quien se encuentra vinculada como Historia de vida, manifiesta inconformidad con el atraso de obra ya que reside con su progenitora, quien está en seguimiento por parte de la Secretaría de Salud y debido a la incomodidad generada por la intervención se cayó, por lo expuesto anteriormente el contratista se compromete a a darle celeridad a la ejecución de obra en esta vivienda.	La interventoria recomienda al contratista darle celeridad a la ejecución de obras en la vivienda. dados los factores de salud, seguimiento institucional de salud los adultos mayores y la edad de quienes residen allí.	29/12/2020	29/12/2020	Se realiza visita para cierre y entrega de la residencia. En dicha visita se observa que los compromisos hechos por el contratista están totalmente ejecutados de la mejor manera, dándole cierre a la queja y reclamo interpuesto por la beneficiaria en el desarrollo del mejoramiento de vivienda. Este cierre es firmado a satisfacción, por la beneficiaria.		X
2	1	MVJA_3670	28/12/2020	06/01/2021	CRISTÓBAL PITA CAMARGO	CIUDAD BOLÍVAR	JALISCO	ACACIAS SUR	KR 18Z 62 30 SUR	3118666083-3134655773		X			Radicado SDHT 1-2020-37091 Bajo derecho de peticion tramitado a la Personeria Distrital solicita "(...) se dé respuesta de fondo sobre el subsidio distrital de mejoramiento de vivienda según resolución 648 de 30 de diciembre de 2019 (...)"	Se remite respuesta por la SDHT informando ... "(...) contrato de obra No. 694 de 2020, cuya fecha de inicio fue el 4 de noviembre de 2020 cuenta con un grupo de 254 viviendas las cuales deben ser ejecutadas conforme al contrato de este, en un término de 5 meses, en su caso especifico de tiene programada la visita de validación el día 6 enero de 2021 a las 10:00 am, en donde se le brindará la información correspondiente y se verificará las obras a realizar.(...)"	6/1/2020	6/1/2020	Se remite respuesta por la SDHT informando ... "(...) contrato de obra No. 694 de 2020, cuya fecha de inicio fue el 4 de noviembre de 2020 cuenta con un grupo de 254 viviendas las cuales deben ser ejecutadas conforme al contrato de este, en un término de 5 meses, en su caso especifico de tiene programada la visita de validación el día 6 enero de 2021 a las 10:00 am, en donde se le brindará la información correspondiente y se verificará las obras a realizar.(...)"		X
3	1	MVJA_0286	28/12/2020	06/01/2021	HASBLEIDY GINA ROJAS ESCOBAR	CIUDAD BOLÍVAR	JALISCO	CIUDAD MILAGRO	CL 62 BIS SUR 18J 12	3123501086 - 3115812468		X			Radicado SDHT 1-2020-37710 – IM MVJA_0286 – IM Jalisco "(...) estoy muy inquieta porque habian quedado de venir a visitarme el día 3 de diciembre para revisar el presupuesto e iniciar la obra (...)"	Se remite respuesta por la SDHT informando ... "(...) contrato de obra No. 694 de 2020, cuya fecha de inicio fue el 4 de noviembre de 2020 cuenta con un grupo de 254 viviendas las cuales deben ser ejecutadas conforme al contrato de este, en un término de 5 meses, en su caso especifico de tiene programada la visita de validación el día 6 enero de 2021 a las 2:00 pm, en donde se le brindará la información correspondiente y se verificará las obras a realizar.(...)"	6/1/2020	6/1/2020	Se remite respuesta por la SDHT informando ... "(...) contrato de obra No. 694 de 2020, cuya fecha de inicio fue el 4 de noviembre de 2020 cuenta con un grupo de 254 viviendas las cuales deben ser ejecutadas conforme al contrato de este, en un término de 5 meses, en su caso especifico de tiene programada la visita de validación el día 6 enero de 2021 a las 2:00 pm, en donde se le brindará la información correspondiente y se verificará las obras a realizar.(...)"		X

INPLAYCO S.A.S.
INGENIEROS CONSTRUCTORES E INTERVENTORES

ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE HÁBITAT

INFORME SISO SEMANAL 9

INPLAYCO S.A.S.	INFORME HSE	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DEL HÁBITAT

INFORME INTERVENTORÍA SISO

FECHA DEL INFORME		OBJETO DEL CONTRATO	INFORME
DESDE	28/12/2020	" Ejecución de las obras de mejoramiento de vivienda en la modalidad de habitabilidad en los territorios priorizados por la Secretaría Distrital del Hábitat."	9
HASTA	3/1/2021		

1. Descripción de las Actividades Realizadas durante la semana

Contratista : Acompañamiento a las actividades de Seguimiento a las mejoras en las vivienda por parte del equipo técnico, divulgación del protocolo de seguridad y bioseguridad para ingreso a las viviendas; Se hace seguimiento a las actividades que vienen desarrollando en las viviendas asignadas a los diferentes grupos de trabajo en compañía de interventoría. Se verificó uso correcto de herramientas, autocuidado, trabajo seguro durante las visitas. Se realiza jornada de aseo y recogida de escombro en las viviendas.

Charla **"USO CORRECTO DE LOS EPP"** dirigida al personal operativo, con recomendaciones aplicables en el trabajo.

Interventoría: Recorrido por diferentes sectores en compañía de profesional SISO del contratista, tomando temperatura, reforzando tema de Bioseguridad. Se revisa el contenido de los kit de bioseguridad. Se verifica en las entregas los aspectos SST aplicables.

CAPACITACION

Capacitación USO CORRECTO DE LOS EPP.	si	100%
	La charla se hace durante las visitas de seguimiento, se refuerza el tema de bioseguridad y se verifica su aplicación	

2. Gestión Ambiental

El contratista en Jalisco ha realizado la recolección de los escombros generados en las obras realizadas en la vivienda y cuenta con acopio provisional de escombros en su bodega, para luego realizar la respectiva disposición final.
Se recibieron soportes de esta disposición en Cemex.

2.1. Generación y Disposición de Residuos Sólidos

Tipo de Residuo	Cantidad m3	Acumulado	Sitio de Disposición	Observaciones
Escombro	48	80	Cemex	Se recibe copia de la remisión

3. Gestión en Salud Ocupacional (Seguridad e Higiene Industrial)

Se sigue verificando la aplicación del protocolo de Bioseguridad, dando recomendaciones a los trabajadores como parte de las medidas de prevención de accidentes. Se nota mayor cubrimiento en la entrega de EPP en las cuadrillas.

Se recibe notificación que el Ingeniero **JUAN SEBASTIAN GONZALEZ ORTIZ** perteneciente al Consorcio Mejoramiento EP 2020, recibe resultado de la prueba realizada, siendo este Negativo, se dan recomendaciones para el retorno a las actividades.

3.1. Índices

Valor	Horas Hombre Trabajadas Contratista	Horas Hombre Capacitación	Horas Hombre Trabajadas Interventoria	Dias Ausentismo por Enfermedad General	Ausentismo por Accidentes de Trabajo
Total Semanales	**2688**	28	**264**	**0**	**0**
Total Acumulado	**22032**	196	**3168**	**10**	**0**

3.1.1.Incidendentalidad

	Fatalidades	Casos Con Daños A propiedad	Incidente Ambiental	Incidente Vehicular	Casi Accidentes	Casos Con dias Perdidos	Casos con Trabajo restringido	Casos Con Días de Incapacidad (tratamiento medico)
Total	**0**	**0**	**0**	**0**	**1**	**0**	**0**	**0**

3.2. Capacitaciones y Charlas

22/12/2020	Charla "USO CORRECTO DE LOS EPP" dirigida al personal operativo, con recomendaciones aplicables en el trabajo.

3.3. Condiciones y Acciones Subsanar

3.3.1 Condición Substandar


No	Descripción	Acción Tomada	La Condición Continua?
1	Personal No usa dotación entregada	Se informa a SST del contratista para tomar las acciones correspondientes	**si**

4. Registro Fotográfico


Toma de temperatura a beneficiarios



MV 0252

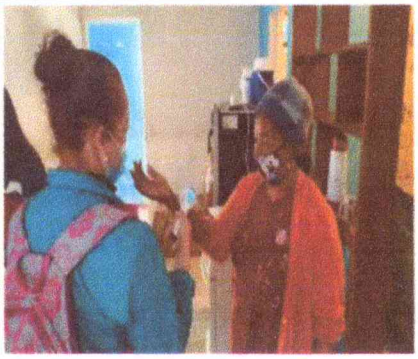


MV 0259

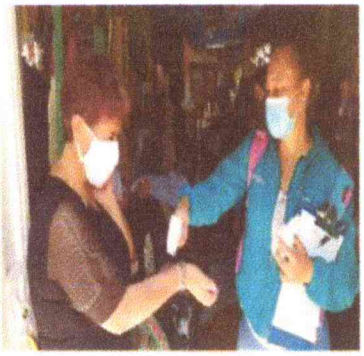


MV 2992

Toma de temperatura a Personal y charla de Seguridad

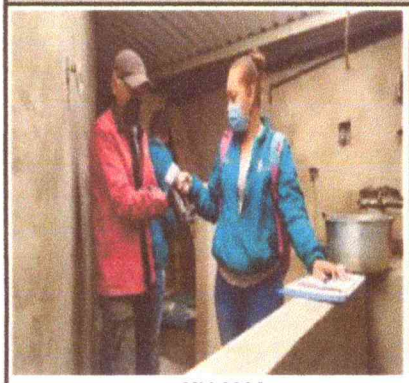

MV 2996

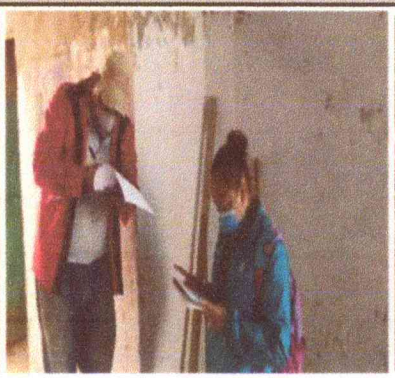

MV 3125



MV 3146

Protocolo ingreso a viviendas - kit bioseguridad



MV 3314



MV 3146



MV 0530

INPLAYCO S.A.S.
INGENIEROS CONSTRUCTORES E INTERVENTORES

INFORME SISO
INPLAYCO SAS
Fecha: 28 de Diciembre de 2020 al 3 de Enero de 2021

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DEL HÁBITAT

META DE CUMPLIMIENTO AL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO, MEDIO AMBIENTE Y CALIDAD: 100%

ACTIVIDADES						GESTIÓN AMBIENTAL			No. HORAS HOMBRE CAPACITACIONES					Reportes de incidentes en el componente social y técnico.							
PROYECTO / DEPARTAMENTO	CONTRATO	CONTRATISTA	OBJETO CONTRATO	NUMERO DE TRABAJADORES	HORAS HOMBRE TRABAJADAS	ESCOMBROS (Cantidad m3)	RESIDUOS PELIGROSOS (Kgs)	CONSUMO DE AGUA (m3), para las actividades de mejoramiento de vivienda	PROFESIONALES	TECNICOS	OPERATIVOS (Subcontratistas, maestros y auxiliares)	PROVEEDOR	TOTAL	LUGAR O ÁREA DE TRABAJO	FECHA DEL ACCIDENTE	No. DÍAS INCAPACIDAD	No. ACCIDENTE REGISTRABLE	FECHA DE INVESTIGACIÓN	DESCRIPCION DEL ACCIDENTE	RELACION DE EQUIPO DE INVESTIGACIÓN	LECCIÓN APRENDIDA	PLAN DE ACCIÓN Y FECHA
	CONTRATO 594 - 2020 CONTRATISTA: CONSORCIO MEJORAMIENTO EP 2020		Contratar la ejecución de las obras de mejoramiento de vivienda en la modalidad de habitabilidad de los proyectos estructurados en los territorios priorizados por la Secretaria Distrital de Hábitat. Grupo I	112	2668	16.0	0.0		14.00	0.00	98.00	0.00	112			0	0					
									0	0	0	0	0			0	0				
									0	0	0	0	0			0	0				
									0	0	0	0	0			0	0				
									0	0	0	0	0			0	0				
									0	0	0	0	0			0	0				
				112	2668	16	0	0.0	14.00	0.00	98.00	0.00	112.00	0	0	0	0		0			

ELABORO: ROBERT ROJAS TORRES -PROFESIONAL SISO


INDICADORES SST- CONTRATO No. 594 2020	
HORAS HOMBRE SEMANAL	2,952
HORAS HOMBRE ACUMULADAS MES	21,312
HORAS HOMBRE ACUMULADAS TOTAL	25,200
No. INCIDENTES REGISTRABLES	0
No. DÍAS DE INCAPACIDAD	0
No. DÍAS DE INCAPACIDAD ACUMULADOS MES	7
HORAS CAPACITACIONES SEMANAL	28.00
HORAS CAPACITACIONES ACOMULADO MENSUAL	137.00
HORAS CAPACITACIONES ACOMULADO TOTAL	196.00

No laboral

GESTIÓN AMBIENTAL		
ESCOMBROS (Cantidad m3) Semanal	16	
ESCOMBROS (Cantidad acumuladas mes)	40	
ESCOMBROS (Cantidad acumuladas mes)	48	
RESIDUOS PELIGROSOS (Cantidad Kg semanal)	0	
RESIDUOS PELIGROSOS (Cantidad acumuladas mes)	0	
CONSUMO DE AGUA (m3) Semanal	0	Uso de agua de cada vivienda, incluyendo agua lluvia, no se ha adquirido agua adicional
CONSUMO DE AGUA (m3), Mensual	0	

INFORME SISO
INPLAYCO SAS
Fecha: 28 de Diciembre de 2020 al 3 de enero 2021

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DEL HÁBITAT

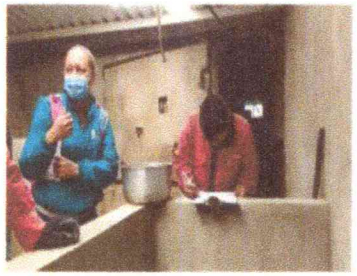RELACIÓN DE: CHARLAS DIARIAS CAPACITACIONES SIMULACROS LECCIONES APRENDIAS (Fechas)	OBSERVACION POR PARTE DE INTERVENTORÍA	REGISTRO FOTOGRÁFICO		
Se realizó charla en los diferentes puestos de trabajo TEMA: "USO CORRECTO DE LOS EPP"	Por la distancia entre los diferentes áreas de trabajo, se realiza la charla en cada una de las viviendas visitadas, diligenciando el respectivo registro			
		MV 3146	MV 2996	MV 0259

INPLAYCO S.A.S

INFORME SISO

Fecha: 28 de Diciembre de 2020 al 3 de enero 2021

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DEL HÁBITAT

CONTRATO: 694-2020
CONTRATISTA: CONSORCIO MEJORAMIENTO EP 2020

RELACIÓN DE TRABAJADORES ADMINISTRATIVOS Y OPERATIVOS AFILIADOS A SEGURIDAD SOCIAL

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	C.C.	Fecha de afiliación	Personal afiliado Administrativos	Personal afiliado (operativo: maestros y auxiliares)	EPS	PENSION	ARL	ESTADO ACTUAL		OBSERVACIONES
									ACTIVO	RETIRADO	
1	CARLOS JOSE HERNADEZ JIMENEZ	78,717,000	17/11/2020	1		NUEVA EPS	PORVENIR	POSITIVA	SI		
2	DIANA CAROLINA NAVARRO JIMENEZ	52,233,027	20/11/2020	1		COMPENSAR	PORVENIR	POSITIVA	SI		
3	LEDA LUZ LAMBIS CASTRO	22,732,637	19/11/2020	1		SURA	PORVENIR	POSITIVA	SI		
4	LUIS FERNANDOI CARRILLO JIMENEZ	72,097,065	19/11/2020	1		CAJACOPI	COLFONDOS	POSITIVA	SI		
5	RICARDO JAIMES RUIZ	19,144,052	19/11/2020	1		NUEVA EPS	NO APLICA	POSITIVA	SI		
6	SHIRLEY AMELI VITOLA SERRANO	64,583,890	19/11/2020	1		COMPENSAR	PORVENIR	POSITIVA	SI		
7	YESENIA VIVIANA GAMEZ SALAS	1,120,745,285	19/11/2020	1		NUEVA EPS	COLFONDOS	POSITIVA	SI		
8	MARCO AUGUSTO HAMON RODRIGUEZ	1,070,955,988	19/11/2020	1		FAMISANAR	PORVENIR	POSITIVA	SI		
9	LINA MARCELA COLORADO CASTRO	1,019,022,812	19/11/2020	1		SALUD TOTAL	PORVENIR	POSITIVA	SI		
10	DANIELA CASTAÑO CASTAÑO	1,032,447,818	19/11/2020	1		FAMISANAR	PROTECCION	POSITIVA	SI		
11	LIBYS PADILLA URUETA	1,073,822,532	2/10/2020	1		SALUD TOTAL	PORVENIR	POSITIVA	SI		
12	JUAN ADRES CORREDOR MAYORGA	1,022,401,356	19/11/2020	1		FAMISANAR	PORVENIR	POSITIVA	SI		
13	GERSON ASPRILLA LOPEZ	11,797,192	19/11/2020	1		SANITAS	COLPENSIONES	POSITIVA	SI		
14	WILFRED BENAVIDEZ SANCHEZ	79,851,515	19/11/2020	1		ALIANSA SALUD	PORVENIR	POSITIVA		SI	RETIRADO
15	GREGORY FERNEY MOSQUERA	1,105,305,250	29/11/2020	1		SALUD TOTAL	PROTECCION	POSITIVA	SI		
16	ANDAIR MONTIEL VAQUIRO	1,007,535,425	25/11/2020		1	SALUD TOTAL	COLPENSIONES	SURA		SI	RETIRADO
17	CARLOS COLORADO BANDO	13,107,585	24/11/2020		1	SALUD TOTAL	PORVENIR	SURA	SI		
18	EDGAR MARTINEZ CRUZ	79,286,107	25/11/2020		1	SALUD TOTAL	PROTECCION	SURA	SI		
19	EDWIN HARVEY DE LA CRUZ TORO	10,307,972	25/11/2020		1	SALUD TOTAL	COLPENSIONES	SURA		SI	RETIRADO
20	FERNANDO VIDAL ORTIZ	5,887,718	25/11/2020		1	FAMISANAR	COLPENSIONES	SURA		SI	RETIRADO
21	IDELFONSO CIFUENTES	19,232,722	25/11/2020		1	SURA	PORVENIR	SURA		SI	RETIRADO
22	MARLON HUMBERTO MARTINEZ VAZQUEZ	1,031,152,755	25/11/2020		1	FAMISANAR	PORVENIR	SURA		SI	RETIRADO
23	WILMER ANDRES ROJAS SOLANO	1,118,534,846	25/11/2020		1	SALUD TOTAL	PORVENIR	SURA	SI		
24	OSCAR ARMANDO CALVACHE PAZ	12,977,717	24/11/2020		1	SALUD TOTAL	PORVENIR	SURA	SI		
25	VICTOR RUIZ GARCIA	1,002,597,213	25/11/2020		1	CAPITAL SALUD	PORVENIR	SURA		SI	RETIRADO
26	CARLOS ALBERTO CAICEDO HINOJOSA	1,111,817,731	24/11/2020		1	SALUD TOTAL	PORVENIR	SURA	SI		
27	YARLI COLORADO PAZ	1,085,549,452	24/11/2020		1	CAPITAL SALUD	PORVENIR	SURA	SI		
28	ILDELFONSO RAMIREZ ESQUIVEL	96,361,399	1/12/2020		1	FAMISANAR	COLPENSIONES	SURA	SI		
29	JUAN PABLO CORREA MURCIA	1,116,920,538	1/12/2020		1	SALUD TOTAL	PORVENIR	SURA	SI		
30	KEVIN FABIAN HOYOS YEPEZ	1,083,043,276	1/12/2020		1	SALUD TOTAL	PROTECCION	SURA	SI		
31	LAMBERTO GABRIEL DORIA SANCHEZ	72,147,586	1/12/2020		1	SALUD TOTAL	PROTECCION	SURA	SI		
32	ARLEY GIOVANNI CAICEDO RAMIREZ	1,117,511,256	3/12/2020		1	SALUD TOTAL	PORVENIR	SURA	SI		
33	ALBERT JOSE LEON GOMEZ	828,089,416,111,997	3/12/2020		1	SALUD TOTAL	COLFONDOS	SURA	SI		
34	JHON WILLIAM BALLESTEROS MARTINEZ	1,033,761,449	8/12/2020		1	COMPENSAR	PORVENIR	SURA	SI		
35	CARLOS ENRIQUE REDONDO	80,373,803	13/12/2020		1	SALUD TOTAL	COLPENSIONES	SURA	SI		
36	JULIO FERNEY BENAVIDES MENDEZ	80,256,134	13/12/2020		1	SALUD TOTAL	COLFONDOS	SURA	SI		

RELACIÓN DE TRABAJADORES ADMINISTRATIVOS Y OPERATIVOS AFILIADOS A SEGURIDAD SOCIAL											
No.	NOMBRES Y APELLIDOS	C.C.	Fecha de afiliación	Personal afiliado Administrativos	Personal afiliado (operativo: maestros y auxiliares)	EPS	PENSION	ARL	ESTADO ACTUAL		OBSERVACIONES
									ACTIVO	RETIRADO	
37	FREDY EDINSON FORERO NIÑO	1,024,489,116	15/12/2020		1	SALUD TOTAL	PORVENIR	SURA	SI		
38	JUAN AGUSTIN LIZARAZO	4,103,403	15/12/2020		1	SANITAS	65 AÑOS LIQUIDADO	SURA	SI		
39	JOSE IGNACIO CANO NOVOA	7,330,323	15/12/2020		1	CAPITAL SALUD	64 AÑOS LIQUIDADO	SURA	SI		
40	BRAYAN ESTIVEN LOPEZ MOLINA	1,024,802,801	17/11/2020		1	FAMISANAR	PROTECCION	POSITIVA	SI		
41	EDWIN JIMMY ESPINEL CHACON	80,084,356	17/11/2020		1	NUEVA EPS	COLPENSIONES	POSITIVA	SI		
42	EDGAR VELANDIA	80,090,760	26/11/2020		1	ALIANSA SALUD	PORVENIR	POSITIVA	SI		
43	EMITZO JOSE FANDIÑO FLOREZ	85,469,924	18/11/2020		1	NUEVA EPS	PORVENIR	POSITIVA	SI		
44	EVANGELISTA BRINEZ BURGOS	6,030,390	17/11/2020		1	SALUD TOTAL	COLPENSIONES	POSITIVA	SI		
45	FABIO NELSON LOPEZ DIAZ	80,124,048	17/11/2020		1	SALUD TOTAL	PROTECCION	POSITIVA	SI		
46	JULIO CESAR NEIRA BENAVIDEZ	79,903,950	18/11/2020		1	COMPENSAR	PROTECCION	POSITIVA	SI		
47	RAFAEL CASTRO VILLA	8,815,936	17/11/2020		1	SALUD TOTAL	PORVENIR	POSITIVA	SI		
48	LEYDY PATRICIA SUAREZ VELAZQUEZ	1,033,693,495	18/11/2020		1	CAPITAL SALUD	PROTECCION	POSITIVA	SI		
49	MICHEL LEONARDO SALAS CELIS	1,033,786,212	17/11/2020		1	FAMISANAR	PORVENIR	POSITIVA	SI		
50	VLADIMIR BRIÑEZ MAHECHA	1,033,682,982	17/11/2020		1	FAMISANAR	COLFONDOS	POSITIVA	SI		
51	CARLOS ANDRES SUAREZ VELAZQUEZ	1,033,695,493	18/11/2020		1	FAMISANAR	PORVENIR	POSITIVA	SI		
52	LUIS FERNANDO CUPITRA DUCUARA	1,022,939,409	18/11/2020		1	SURA	COLFONDOS	POSITIVA	SI		
53	LUIS ALEJANDRO ZAMBRANO	79,770,115	18/11/2020		1	CAPITAL SALUD	COLPENSIONES	POSITIVA		SI	RETIRADO
54	OSBAR RENE BERNAL PAEZ	80,776,571	20/11/2020		1	SALUD TOTAL	PROTECCION	POSITIVA	SI		
55	ALBEIRO GUERRERO MACANA	5,996,412	26/11/2020		1	NUEVA EPS	PORVENIR	POSITIVA	SI		
56	EDWIN RODRIGUEZ VIDAL	93,394,589	26/11/2020		1	MEDIMAS	PORVENIR	POSITIVA	SI		
57	JOSE ANTONIO SILVA ORTEGA	19,458,640	25/11/2020		1	COMFACUNDI	PORVENIR	POSITIVA	SI		
58	SAURITH REALES DELGADO	91,431,492	25/11/2020		1	NUEVA EPS	COLPENSIONES	POSITIVA	SI		
59	CARLOS PAEZ PULIDO	1,049,630,871	17/11/2020		1	MEDIMAS	PROTECCION	POSITIVA	SI		
60	RAUL OSORIO RINCON	79,699,250	17/11/2020		1	SALUD TOTAL	PORVENIR	POSITIVA	SI		
61	MISAEL PERDOMO VILLAMIL	1,033,784,477	24/11/2020		1	NUEVA EPS	PORVENIR	POSITIVA	SI		
62	JOSE GUILLERMO MARTINEZ VARGAS	79,696,136	27/11/2020		1	SALUD TOTAL	COLPENSIONES	POSITIVA	SI		
63	OMAR MARTINEZ ZULETA	4,046,564	27/11/2020		1	NUEVA EPS	COLPENSIONES	POSITIVA	SI		
64	VICTOR MANUEL GUERRERO PACHECO	80,126,593	26/11/2020		1	CAPITAL SALUD	PORVENIR	POSITIVA	SI		
65	QUEVIN FABIAN LESMES LINARES	1,000,003,268	27/11/2020		1	CAPITAL SALUD	PORVENIR	POSITIVA	SI		
66	EDISON JOSE VENECIA SARABIA	72,120,789	25/11/2020		1	FAMISANAR	PORVENIR	POSITIVA	SI		
67	YOENDISON JOSE VENECIA MORENO	1,101,879,446	26/11/2020		1	COMPARTA	PORVENIR	POSITIVA	SI		
68	RUBEN PINEDA MAHECHA	1,031,151,104	25/11/2020		1	SALUD TOTAL	PORVENIR	POSITIVA	SI		
69	RAUL ALEXANDER SALAMANCA SALGADO	80,749,213	28/11/2020		1	CAPITAL SALUD	PORVENIR	POSITIVA	SI		
70	LEONARDO SOLANO CELY	1,024,511,017	26/11/2020		1	FAMISANAR	PORVENIR	POSITIVA	SI		
71	LUIS FRANCISCO GOMEZ SANCHEZ	80857562	28/11/2020		1	FAMISANAR	COLPENSIONES	POSITIVA	SI		
72	HAYDER CAMILO GALVIZ	1,033,762,528	17/11/2020		1	FAMISANAR	PROTECCION	POSITIVA	SI		
73	CAMILO HERNANDEZ SANCHEZ	1,049,639,842	17/11/2020		1	FAMISANAR	COLFONDOS	POSITIVA	SI		
74	CESAR JULIO BENAVIDEZ	1,193,035,484	27/11/2020		1	COOSALUD	PORVENIR	POSITIVA	SI		
75	FERNANDO MORENO HUERTAS	3,199,429	26/11/2020		1	CAPITAL SALUD	PORVENIR	POSITIVA	SI		
76	JHON EDISON PALACIO MORENO	1,077,455,895	26/11/2020		1	SALUD TOTAL	PROTECCION	POSITIVA	SI		
77	LUIS HERNANDEZ BARRETO	80,858,697	25/11/2020		1	SANITAS	PROTECCION	POSITIVA	SI		
78	LUZ ADRIANA SILVA MUÑOZ	53,094,514	26/11/2020		1	CAPITAL SALUD	PORVENIR	POSITIVA	SI		
79	JEISON ACERO	1,044,391,694	25/11/2020		1	MUTUAL SER	PORVENIR	POSITIVA	SI		

RELACIÓN DE TRABAJADORES ADMINISTRATIVOS Y OPERATIVOS AFILIADOS A SEGURIDAD SOCIAL											
No.	NOMBRES Y APELLIDOS	C.C.	Fecha de afiliación	Personal afiliado Administrativos	Personal afiliado (operativo: maestros y auxiliares)	EPS	PENSION	ARL	ESTADO ACTUAL		OBSERVACIONES
									ACTIVO	RETIRADO	
80	ANDRES FERNANDO PEREZ DIAZ	1,063,625,214	1/12/2020		1	NUEVA EPS	PORVENIR	POSITIVA	SI		
81	ANGEL IVAN DIAZ	79,924,351	1/12/2020		1	FAMISANAR	PORVENIR	POSITIVA	SI		
82	CARLOS ALBERTO SUAREZ BARRERA	9,527,688	1/12/2020		1	CAPITAL SALUD	PORVENIR	POSITIVA	SI		
83	CIRO ARTURO NIÑO	4,255,303	1/12/2020		1	SALUD TOTAL	COLPENSIONES	POSITIVA	SI		
84	EDGAR HERNANDO NIÑO	4,225,078	1/12/2020		1	CAPITAL SALUD	PORVENIR	POSITIVA	SI		
85	EDWAR ARLEY RODRIGUEZ MAYORGA	1,033,754,705	1/12/2020		1	SALUD TOTAL	PORVENIR	POSITIVA	SI		
86	EMILIANO MUÑOZ PALACIO	80,265,681	1/12/2020		1	SALUD TOTAL	PORVENIR	POSITIVA	SI		
87	CAMILO ERNESTO RAMIREZ ROA	1,033,735,370	1/12/2020		1	COMPENSAR	PROTECCION	POSITIVA	SI		
88	CARLOS SEBASTIAN LOPEZ CASTELLANO	1,031,170,297	1/12/2020		1	FAMISANAR	PROTECCION	POSITIVA	SI		
89	IDELFONSO DE JESUS PEÑARANDA	1,118,873,986	1/12/2020		1	SALUD TOTAL	PORVENIR	POSITIVA	SI		
90	CARLOS ALBERTO PULIDO YATE	1,033,689,233	1/12/2020		1	FAMISANAR	PROTECCION	POSITIVA	SI		
91	CIPRIANO PIÑEROS	79,703,764	1/12/2020		1	FAMISANAR	COLFONDOS	POSITIVA	SI		
92	DAGOBERTO PAREJO AREVALO	8,668,649	1/12/2020		1	MUTUAL SER	PORVENIR	POSITIVA	SI		
93	DANIEL ARTURO NIÑO ROJAS	1,024,469,352	1/12/2020		1	SALUD TOTAL	COLPENSIONES	POSITIVA	SI		
94	EDER GONZALEZ GASTELBLONDO	84,082,070	1/12/2020		1	NUEVA EPS	PORVENIR	POSITIVA	SI		
95	GLORIA JIMENEZ	28,155,523	2/12/2020		1	NUEVA EPS	PROTECCION	POSITIVA	SI		
96	JESUS DAVID LOPEZ GALVIZ	13,860,790	2/12/2020		1	NUEVA EPS	COLPENSIONES	POSITIVA	SI		
97	JHON RIVER MAYORGA BENAVIDES	1,033,721,955	1/12/2020		1	CAPITAL SALUD	PORVENIR	POSITIVA	SI		
98	SAMIR ZIAD PINEDA YAHMURE	79,920,337	1/12/2020		1	COMPENSAR	PROTECCION	POSITIVA	SI		
99	SIMON LOPEZ PALACIOS	94,418,910	1/12/2020		1	SALUD TOTAL	COLPENSIONES	POSITIVA	SI		
100	WILSON FERNEY BERNAL GUASCA	1,033,707,175	1/12/2020		1	FAMISANAR	PORVENIR	POSITIVA	SI		
101	YOISEN HAIDIN CHIBUQUE CAICEDO	1,007,413,403	1/12/2020		1	MEDIMAS	PROTECCION	POSITIVA	SI		
102	LUIS HERNANDEZ GRANADA	19,219,713	1/12/2020		1	SANITAS	COLPENSIONES	POSITIVA	SI		
103	ANDRES GARCIA ROJAS	80,895,628	15/12/2020		1	SALUD TOTAL	PROTECCION	POSITIVA	SI		
104	EDGAR HERNANDO NIÑO	4,225,078	1/12/2020		1	CAPITAL SALUD	PORVENIR	POSITIVA	SI		
105	HELI RAMIREZ PERALTA	79,734,766	12/12/2020		1	SALUD TOTAL	PROTECCION	POSITIVA	SI		
106	JAVIER FRANCO RODRIGUEZ	731054127121978	1/12/2020		1	SALUD TOTAL	PROTECCION	POSITIVA	SI		
107	JEISON LOPEZ MEJIA	1,033,816,386	15/12/2020		1	SALUD TOTAL	PORVENIR	POSITIVA	SI		
108	JOSE RODRIGUEZ GARCIA	1,031,176,991	1/12/2020		1	CAPITAL SALUD	PORVENIR	POSITIVA	SI		
109	JULIAN ANDRES ARAGON DEVIA	1,030,626,205	15/12/2020		1	CONVIDA	PORVENIR	POSITIVA	SI		
110	KEVIN SEBASTIAN APARACIO	1,000,064,803	10/12/2020		1	FAMISANAR	PORVENIR	POSITIVA	SI		
111	LUIS CARLOS MENDOZA GAMEZ	17,971,346	4/12/2020		1	ALIANSA SALUD	PORVENIR	POSITIVA	SI		
112	LUIS MUÑOZ GRAJALES	80,774,495	1/12/2020		1	COOSALUD	PROTECCION	POSITIVA	SI		
113											
114											
115											
116											
RESULTADOS:				15	97				104	8	

INFORME SISO

Fecha: 28 de Diciembre de 2020 al 3 de enero 2021

CONTRATO: 694-2020
CONTRATISTA: CONSORCIO MEJORAMIENTO EP 2020

RELACIÓN PERSONAL CON EXÁMENES MÉDICOS

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	C.C.	FECHA DE INGRESO	FECHA DE EXAMEN MÉDICO DE INGRESO/ PERIODICO	PERSONAL		Personal Trabajos en Alturas		ESTADOL ACTUAL		OBSERVACIONES
					Administrativo	Operativo: maestros y auxiliares	APTO	NO APTO	ACTIVO	RETIRADO	
1	CARLOS JOSE HERNANDEZ JIMENEZ	78,717,000	17/11/2020	20/11/2020	1		SI		SI		
2	DIANA CAROLINA NAVARRO JIMENEZ	52,233,027	20/11/2020	10/11/2020	1		SI		SI		
3	LEDA LUZ LAMBIS CASTRO	22,732,637	19/11/2020	10/11/2020	1		SI		SI		
4	LUIS FERNANDOI CARRILLO JIMENEZ	72,097,065	19/11/2020	11/11/2020	1		SI		SI		
5	RICARDO JAIMES RUIZ	19,144,052	19/11/2020	10/11/2020	1		SI		SI		
6	SHIRLEY AMELI VITOLA SERRANO	64,583,890	19/11/2020	10/11/2020	1		SI		SI		
7	YESENIA VIVIANA GAMEZ SALAS	1,120,745,285	19/11/2020	12/11/2020	1		SI		SI		
8	MARCO AUGUSTO HAMON RODRIGUEZ	1,070,955,988	19/11/2020	10/11/2020	1		SI		SI		
9	LINA MARCELA COLORADO CASTRO	1,019,022,812	19/11/2020	10/11/2020	1		SI		SI		
10	DANIELA CASTAÑO CASTAÑO	1,032,447,818	19/11/2020	14/11/2020	1		SI		SI		
11	LIBYS PADILLA URUETA	1,073,822,532	2/10/2020	20/8/2020	1		SI		SI		
12	JUAN ANDRES CORREDOR MAYORGA	1,022,401,358	19/11/2020	24/11/2020	1		SI		SI		
13	GERSON ASPRILLA LOPEZ	11,797,192	19/11/2020	11/11/2020	1		SI		SI		
14	WILFRED BENAVIDEZ SANCHEZ	79,851,515	19/11/2020	13/11/2020	1		SI			SI	
15	GREGORY FERNEY MOSQUERA	1,105,305,250	29/11/2020	25/11/2020	1		SI		SI		
16	ALBEIRO GUERRERO MACANA	5,996,412	25/11/2020	2/12/2020		1	SI		SI		
17	CAMILO HERNANDEZ SANCHEZ	1,049,639,642	17/11/2020	2/12/2020		1	SI		SI		
18	EVAGELISTA BRINEZ BURGOS	6,030,390	17/11/2020	2/12/2020		1	SI		SI		
19	FABIO NELSON LOPEZ DIAZ	80,124,048	17/11/2020	2/12/2020		1	SI		SI		
20	JEISON ACERO	1,044,391,694	25/11/2020	2/12/2020		1	SI		SI		
21	JOSE ANTONIO SILVA ORTEGA	19,458,840	25/11/2020	2/12/2020		1	SI		SI		
22	JULIO CESAR NEIRA BENAVIDEZ	79,903,950	18/11/2020	2/12/2020		1	SI		SI		
23	QUEVIN FABIAN LESMES LINARES	1,000,003,268	27/11/2020	2/12/2020		1	SI		SI		
24	LEYDY PATRICIA SUAREZ VELAZQUEZ	1,033,693,495	18/11/2020	2/12/2020		1	SI		SI		
25	LUIS FERNANDO CUPITRA DUCUARA	1,022,939,409	18/11/2020	2/12/2020		1	SI		SI		

RELACIÓN PERSONAL CON EXÁMENES MÉDICOS

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	C.C.	FECHA DE INGRESO	FECHA DE EXAMEN MÉDICO DE INGRESO/ PERIODICO	PERSONAL		Personal Trabajos en Alturas		ESTADOL ACTUAL		OBSERVACIONES
					Administrativo	Operativo: maestros y auxiliares	APTO	NO APTO	ACTIVO	RETIRADO	
26	LUIS FRANCISCO GOMEZ SANCHEZ	80,857,562	25/11/2020	2/12/2020		1	SI		SI		
27	LUZ ADRIANA SILVA MUÑOZ	53,094,514	26/11/2020	2/12/2020		1	SI		SI		
28	MICHEL LEONARDO SALAS CELIS	1,033,766,212	17/11/2020	2/12/2020		1	SI		SI		
29	MISAEL PERDOMO VILLAMIL	1,033,784,477	24/11/2020	2/12/2020		1	SI		SI		
30	OSBAR RENE BERNAL PAEZ	80,778,371	20/11/2020	2/12/2020		1	SI		SI		
31	RAUL OSORIO RINCON	79,669,250	17/11/2020	2/12/2020		1	SI		SI		
32	RUBEN PINEDA MAHECHA	1,031,151,104	25/11/2020	2/12/2020		1	SI		SI		
33	SAURITH REALES DELGADO	91,431,492	25/11/2020	2/12/2020		1	SI		SI		
34	VICTOR MANUEL GUERRERO PACHECO	80,126,593	26/11/2020	2/12/2020		1	SI		SI		
35	VLADIMIR BRIÑEZ MAHECHA	1,033,682,982	17/11/2020	2/12/2020		1	SI		SI		
36	CARLOS ALBERTO SUAREZ BARRERA	9,527,688	1/12/2020	2/12/2020		1	SI		SI		
37	YOENDISON JOSE VENECIA MORENO	1,101,879,446	25/11/2020	2/12/2020		1	SI		SI		
38	CIPRIANO PIÑEROS	79,703,764	1/12/2020	2/12/2020		1	SI		SI		
39	JOSE RODRIGUEZ GARCIA	1,031,176,991	1/12/2020	2/12/2020		1	SI		SI		
40											
41											
42											
43											
44											
45											
121											
RESULTADOS:					15	24	39	0	38	1	

INFORME SISO

Fecha: 28 de Diciembre de 2020 al 3 de enero 2021

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DEL HÁBITAT

CONTRATO: 694-2020
CONTRATISTA: CONSORCIO MEJORAMIENTO EP 2020

RELACIÓN PERSONAL 7. Relación de actividades generales en donde se evidencie el cumplimiento de la implementación del Protocolo de Bioseguridad, así mismo, el interventor deberá informar sobre el cumplimiento o incumplimiento de este.

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	C.C.	FECHA DE INGRESO	FECHA DE EXAMEN MÉDICO DE INGRESO/ PERIODICO	PERSONAL		IMPLEMENTACIÓN PROTOCÓLO		ESTADO ACTUAL		OBSERVACIONES
					Administrativo	Operativo: maestros y auxiliares	SI	NO	ACTIVO	RETIRADO	
1	CARLOS JOSE HERNADEZ JIMENEZ	78,717,000	17/11/2020	20/11/2020	1		SI		SI		
2	DIANA CAROLINA NAVARRO JIMENEZ	52,233,027	20/11/2020	10/11/2020	1		SI		SI		
3	LEDA LUZ LAMBIS CASTRO	22,732,637	19/11/2020	10/11/2020	1		SI		SI		
4	LUIS FERNANDOI CARRILLO JIMENEZ	72,097,065	19/11/2020	11/11/2020	1		SI		SI		
5	RICARDO JAIMES RUIZ	19,144,052	19/11/2020	10/11/2020	1		SI		SI		
6	SHIRLEY AMELI VITOLA SERRANO	64,583,890	19/11/2020	10/11/2020	1		SI		SI		
7	YESENIA VIVIANA GAMEZ SALAS	1,120,745,285	19/11/2020	12/11/2020	1		SI		SI		
8	MARCO AUGUSTO HAMON RODRIGUEZ	1,070,955,988	19/11/2020	10/11/2020	1		SI		SI		
9	LINA MARCELA COLORADO CASTRO	1,019,022,812	19/11/2020	10/11/2020	1		SI		SI		
10	DANIELA CASTAÑO CASTAÑO	1,032,447,818	19/11/2020	14/11/2020	1		SI		SI		
11	LIBYS PADILLA URUETA	1,073,822,532	2/10/2020	20/8/2020	1		SI		SI		
12	JUAN ADRES CORREDOR MAYORGA	1,022,401,358	19/11/2020	24/11/2020	1		SI		SI		
13	GERSON ASPRILLA LOPEZ	11,797,192	19/11/2020	11/11/2020	1		SI		SI		
14	WILFRED BENAVIDEZ SANCHEZ	79,851,515	19/11/2020	13/11/2020	1		SI			SI	
15	GREGORY FERNEY MOSQUERA	1,105,305,250	29/11/2020	25/11/2020	1		si		SI		
16	ANDAIR MONTIEL VAQUIRO	1,007,535,425	25/11/2020			1	SI			SI	
17	CARLOS COLORADO BANDO	13,107,585	24/11/2020			1	SI		SI		
18	EDGAR MARTINEZ CRUZ	79,296,107	25/11/2020			1	SI		SI		
19	EDWIN HARVEY DE LA CRUZ TORO	10,307,972	25/11/2020			1	SI			SI	
20	FERNANDO VIDAL ORTIZ	5,887,718	25/11/2020			1	SI			SI	
21	IDELFONSO CIFUENTES	19,232,722	25/11/2020			1	SI			SI	
22	MARLON HUMBERTO MARTINEZ VAZQUEZ	1,031,152,755	25/11/2020			1	SI			SI	
23	WILMER ANDRES ROJAS SOLANO	1,118,534,846	25/11/2020			1	SI		SI		

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	C.C.	FECHA DE INGRESO	FECHA DE EXAMEN MÉDICO DE INGRESO/ PERIODICO	PERSONAL		IMPLEMENTACIÓN PROTOCÓLO		ESTADO ACTUAL		OBSERVACIONES
					Administrativo	Operativo: maestros y auxiliares	SI	NO	ACTIVO	RETIRADO	
24	OSCAR ARMANDO CALVACHE PAZ	12.977.717	24/11/2020			1	SI		SI		
25	VICTOR RUIZ GARCIA	1.002.597.213	25/11/2020			1	SI			SI	
26	CARLOS ALBERTO CAICEDO HINOJOSA	1.111.817.731	24/11/2020			1	SI		SI		
27	YARLI COLORADO PAZ	1.085.549.452	24/11/2020			1	SI		SI		
28	ILDELFONSO RAMIREZ ESQUIVEL	96.361.399	17/11/2020			1	SI		SI		
29	JUAN PABLO CORREA MURCIA	1.116.920.538	17/11/2020			1	SI		SI		
30	KEVIN FABIAN HOYOS YEPEZ	1.083.043.276	18/11/2020			1	SI		SI		
31	LAMBERTO GABRIEL DORIA SANCHEZ	72.147.586	17/11/2020			1	SI		SI		
32	ARLEY GIOVANNI CAICEDO RAMIREZ	1,117,511,256	3/12/2020			1	SI		SI		
33	ALBERT JOSE LEON GOMEZ	826089416111997	3/12/2020			1	SI		SI		
34	JHON WILLIAM BALLESTEROS MARTINEZ	1,033,761,449	8/12/2020			1	SI		SI		
35	CARLOS ENRIQUE REDONDO	80,373,803	13/12/2020			1	SI		SI		
36	JULIO FERNEY BENAVIDES MENDEZ	80,256,134	13/12/2020			1	SI		SI		
37	FREDY EDINSON FORERO NIÑO	1,024,489,116	15/12/2020			1	SI		SI		
38	JUAN AGUSTIN LIZARAZO	4,103,403	15/12/2020			1	SI		SI		
39	JOSE IGNACIO CANO NOVOA	7,330,323	15/12/2020			1	SI		SI		
40	BRAYAN ESTIVEN LOPEZ MOLINA	1.024.602.801	17/11/2020			1	SI		SI		
41	EDWIN JIMMY ESPINEL CHACON	80.064.358	17/11/2020			1	SI		SI		
42	EDGAR VELANDIA	80.090.780	26/11/2020			1	SI		SI		
43	EMITZO JOSE FANDIÑO FLOREZ	85.469.924	18/11/2020			1	SI		SI		
44	EVANGELISTA BRINEZ BURGOS	6.030.390	17/11/2020	2/12/2020		1	SI		SI		
45	FABIO NELSON LOPEZ DIAZ	80.124.048	17/11/2020	2/12/2020		1	SI		SI		
46	JULIO CESAR NEIRA BENAVIDEZ	79.903.950	18/11/2020	2/12/2020		1	SI		SI		
47	RAFAEL CASTRO VILLA	8.815.936	17/11/2020			1	SI		SI		
48	LEYDY PATRICIA SUAREZ VELAZQUEZ	1.033.693.495	18/11/2020	2/12/2020		1	SI		SI		
49	MICHEL LEONARDO SALAS CELIS	1.033.766.212	17/11/2020	2/12/2020		1	SI		SI		
50	VLADIMIR BRINEZ MAHECHA	1.033.682.982	17/11/2020	2/12/2020		1	SI		SI		
51	CARLOS ANDRES SUAREZ VELAZQUEZ	1.033.693.493	18/11/2020			1	SI		SI		
52	LUIS FERNANDO CUPITRA DUCUARA	1.022.939.409	18/11/2020	2/12/2020		1	SI		SI		
53	LUIS ALEJANDRO ZAMBRANO	79.770.115	18/11/2020			1	SI		SI		
54	OSBAR RENE BERNAL PAEZ	80.778.371	20/11/2020	2/12/2020		1	SI		SI		
55	ALBEIRO GUERRERO MACANA	5.996.412	25/11/2020	2/12/2020		1	SI		SI		

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	C.C.	FECHA DE INGRESO	FECHA DE EXAMEN MÉDICO DE INGRESO/ PERIODICO	PERSONAL		IMPLEMENTACIÓN PROTOCÓLO		ESTADO ACTUAL		OBSERVACIONES
					Administrativo	Operativo: maestros y auxiliares	SI	NO	ACTIVO	RETIRADO	
56	EDWIN RODRIGUEZ VIDAL	93.394.589	25/11/2020			1	SI		SI		
57	JOSE ANTONIO SILVA ORTEGA	19.458.840	25/11/2020	2/12/2020		1	SI		SI		
58	SAURITH REALES DELGADO	91.431.492	25/11/2020	2/12/2020		1	SI		SI		
59	CARLOS PAEZ PULIDO	1,049.630.871	17/11/2020			1	SI		SI		
60	RAUL OSORIO RINCON	79.669.250	17/11/2020	2/12/2020		1	SI		SI		
61	MISAEL PERDOMO VILLAMIL	1,033,784,477	24/11/2020	2/12/2020		1	SI		SI		
62	JOSE GUILLERMO MARTINEZ VARGAS	79.666.136	27/11/2020			1	SI		SI		
63	OMAR MARTINEZ ZULETA	4.946.584	27/11/2020			1	SI		SI		
64	VICTOR MANUEL GUERRERO PACHECO	80.126.593	26/11/2020	2/12/2020		1	SI		SI		
65	QUEVIN FABIAN LESMES LINARES	1,000,003,268	27/11/2020	2/12/2020		1	SI		SI		
66	EDISON JOSE VENECIA SARABIA	72.120.789	25/11/2020			1	SI		SI		
67	YOENDISON JOSE VENECIA MORENO	1,101,879,446	25/11/2020	2/12/2020		1	SI		SI		
68	RUBEN PINEDA MAHECHA	1,031,151,104	25/11/2020	2/12/2020		1	SI		SI		
69	RAUL ALEXANDER SALAMANCA SALGADO	80.749.213	26/11/2020			1	SI		SI		
70	LEONARDO SOLANO CELY	1,024,511,017	26/11/2020			1	SI		SI		
71	LUIS FRANCISCO GOMEZ SANCHEZ	80857562	25/11/2020	2/12/2020		1	SI		SI		
72	HAYDER CAMILO GALVIZ	1,033,762,528	17/11/2020			1	SI		SI		
73	CAMILO HERNANDEZ SANCHEZ	1,049,639,642	17/11/2020	2/12/2020		1	SI		SI		
74	CESAR JULIO BENAVIDEZ	1,193,036,484	27/11/2020			1	SI		SI		
75	FERNANDO MORENO HUERTAS	3.199.429	26/11/2020			1	SI		SI		
76	JHON EDISON PALACIO MORENO	1,077,435,835	26/11/2020			1	SI		SI		
77	LUIS HERNANDEZ BARRETO	80.858.697	25/11/2020			1	SI		SI		
78	LUZ ADRIANA SILVA MUÑOZ	53.094.514	26/11/2020	2/12/2020		1	SI		SI		
79	JEISON ACERO	1.044.391.694	25/11/2020	2/12/2020		1	SI		SI		
80	ANDRES FERNANDO PEREZ DIAZ	1,063,625,214	1/12/2020			1	SI		SI		
81	ANGEL IVAN DIAZ	79,924,351	1/12/2020			1	SI		SI		
82	CARLOS ALBERTO SUAREZ BARRERA	9,527,688	1/12/2020	2/12/2020		1	SI		SI		
83	CIRO ARTURO NIÑO	4,255,303	1/12/2020			1	SI		SI		
84	EDGAR HERNANDO NIÑO	4,225,078	1/12/2020			1	SI		SI		
85	EDWAR ARLEY RODRIGUEZ MAYORGA	1,033,754,705	1/12/2020			1	SI		SI		
86	EMILIANO MUÑOZ PALACIO	80,265,681	1/12/2020			1	SI		SI		
87	CAMILO ERNESTO RAMIREZ ROA	1,033,735,370	1/12/2020			1	SI		SI		

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	C.C.	FECHA DE INGRESO	FECHA DE EXAMEN MÉDICO DE INGRESO/ PERIODICO	PERSONAL		IMPLEMENTACIÓN PROTOCÓLO		ESTADO ACTUAL		OBSERVACIONES
					Administrativo	Operativo: maestros y auxiliares	SI	NO	ACTIVO	RETIRADO	
88	CARLOS SEBASTIAN LOPEZ CASTELLANO	1,031,170,297	1/12/2020			1	SI		SI		
89	IDELFONSO DE JESUS PEÑARANDA	1,118,873,986	1/12/2020			1	SI		SI		
90	CARLOS ALBERTO PULIDO YATE	1,033,683,233	1/12/2020			1	SI		SI		
91	CIPRIANO PIÑEROS	79,703,764	1/12/2020	2/12/2020		1	SI		SI		
92	DAGOBERTO PAREJO AREVALO	8,668,649	1/12/2020			1	SI		SI		
93	DANIEL ARTURO NIÑO ROJAS	1,024,469,352	1/12/2020			1	SI		SI		
94	EDER GONZALEZ GASTELBLONDO	84,062,070	1/12/2020			1	SI		SI		
95	GLORIA JIMENEZ	28,155,523	2/12/2020			1	SI		SI		
96	JESUS DAVID LOPEZ GALVIZ	13,860,790	2/12/2020			1	SI		SI		
97	JHON RIVER MAYORGA BENAVIDEZ	1,033,721,955	1/12/2020			1	SI		SI		
98	SAMIR ZIAD PINEDA YAHMURE	79,920,337	1/12/2020			1	SI		SI		
99	SIMON LOPEZ PALACIOS	94,418,910	1/12/2020			1	SI		SI		
100	WILSON FERNEY BERNAL GUASCA	1,033,707,175	1/12/2020			1	SI		SI		
101	YOISEN HAIDIN CHIBUQUE CAICEDO	1,007,413,403	1/12/2020			1	SI		SI		
102	LUIS HERNANDEZ GRANADA	19,219,713	1/12/2020			1	SI		SI		
103	ANDRES GARCIA ROJAS	80,895,628	15/12/2020			1	SI		SI		
104	EDGAR HERNANDO NIÑO	4,225,078	1/12/2020			1	SI		SI		
105	HELI RAMIREZ PERALTA	79,734,766	12/12/2020			1	SI		SI		
106	JAVIER FRANCO RODRIGUEZ	731,054,127,121,978	1/12/2020			1	SI		SI		PERMISO DE TRABAJO MINISTERIO
107	JEISON LOPEZ MEJIA	1,033,816,388	15/12/2020			1	SI		SI		
108	JOSE RODRIGUEZ GARCIA	1,031,176,991	1/12/2020	2/12/2020		1	SI		SI		
109	JULIAN ANDRES ARAGON DEVIA	1,030,628,205	15/12/2020			1	SI		SI		
110	KEVINN SEBASTIAN APARACIO	1,000,064,803	10/12/2020			1	SI		SI		
111	LUIS CARLOS MENDOZA GAMEZ	17,971,346	4/12/2020			1	SI		SI		
112	LUIS MUÑOZ GRAJALES	80,774,495	1/12/2020			1	SI		SI		
113											
201											
RESULTADOS:					15	97	112	0	105	7	

REGISTRO FOTOGRAFICO


MV 0252






DESCRIPCIÓN Y FECHA: Implementación de protocolo de bioseguridad
Semana 28 de Diciembre de 2020 al 3 de enero 2021

MV 0252

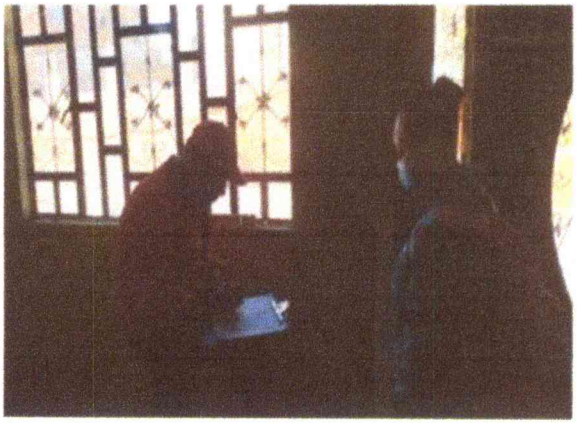

DESCRIPCIÓN Y FECHA: charla de Seguridad
Semana 28 de Diciembre de 2020 al 3 de enero 2021

MV 0259

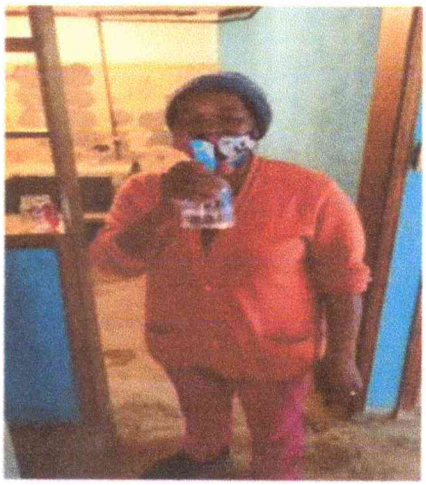

DESCRIPCIÓN Y FECHA: Implementación de protocolo de bioseguridad
Semana 28 de Diciembre de 2020 al 3 de enero 2021

MV 0259





DESCRIPCIÓN Y FECHA: Implementación de protocolo de bioseguridad y charla de Seguridad
Semana 28 de Diciembre de 2020 al 3 de enero 2021

REGISTRO FOTOGRAFICO


MV 0530



DESCRIPCIÓN Y FECHA: charla de Seguridad
Semana 28 de Diciembre de 2020 al 3 de enero 2021

MV 0530



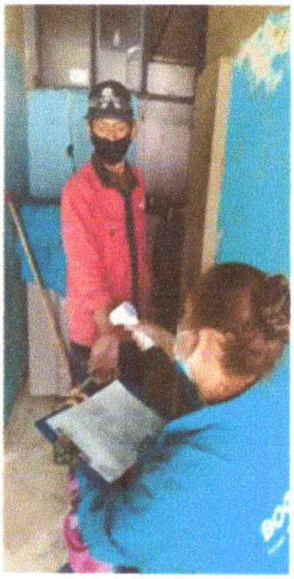

DESCRIPCIÓN Y FECHA: Implementación de protocolo de bioseguridad
Semana 28 de Diciembre de 2020 al 3 de enero 2021

MV - 3309



DESCRIPCIÓN Y FECHA: Implementación de protocolo de bioseguridad
Semana 28 de Diciembre de 2020 al 3 de enero 2021

MV - 0530





DESCRIPCIÓN Y FECHA: Implementación de protocolo de bioseguridad
Semana 28 de Diciembre de 2020 al 3 de enero 2021


REGISTRO FOTOGRAFICO

MV - 3125



DESCRIPCIÓN Y FECHA: Implementación de protocolo de bioseguridad
Semana 28 de Diciembre de 2020 al 3 de enero 2021

MV - 3125

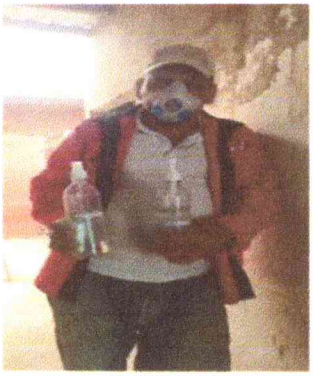

DESCRIPCIÓN Y FECHA: Implementación de protocolo de bioseguridad
Semana 28 de Diciembre de 2020 al 3 de enero 2021

MV 3146





DESCRIPCIÓN Y FECHA: Implementación de protocolo de bioseguridad
Semana 28 de Diciembre de 2020 al 3 de enero 2021

MV 3146



DESCRIPCIÓN Y FECHA: Implementación de protocolo de bioseguridad
Semana 28 de Diciembre de 2020 al 3 de enero 2021
