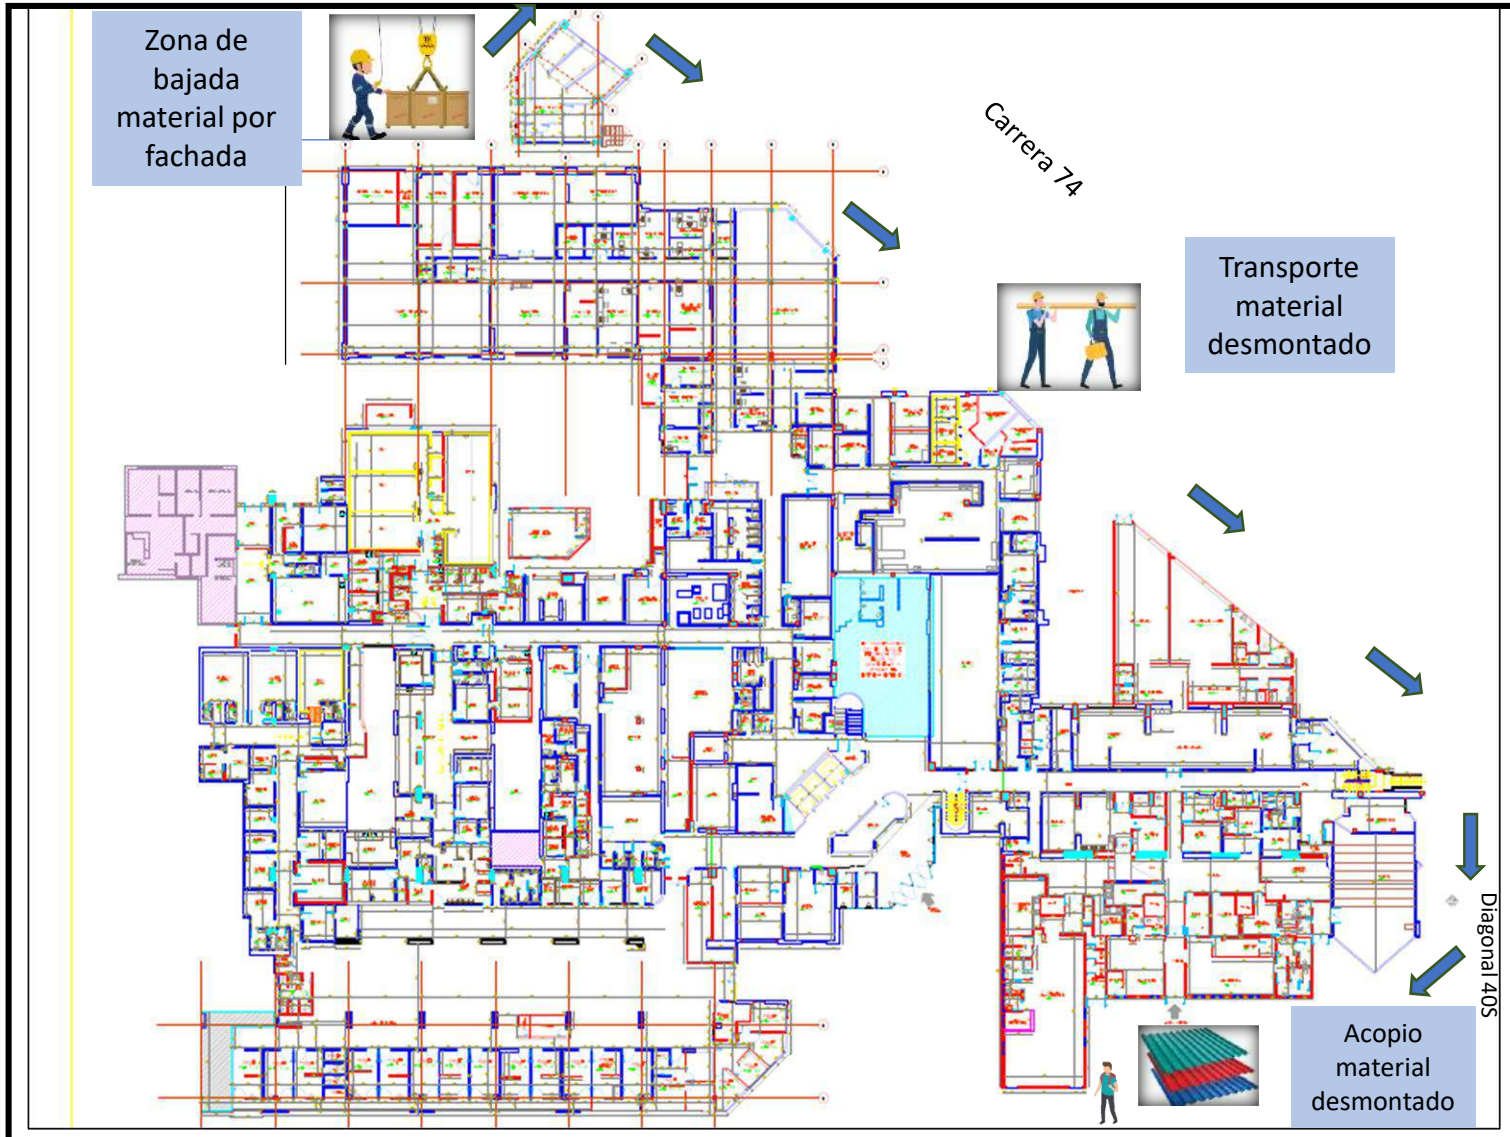


CONTIENE: *PLANTA PRIMER PISO ACOPIO MATERIAL DESMONTE DE CUBIERTA PISO 3 HOSPITAL OCCIDENTE DE KENNEDY DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUROCCIDENTE E.S.E*

Contratante: *La Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E.*

Contratista: *Exeo Ingenieria y Servicios SAS*

DESCRIPCIÓN

- Siendo la fachada de la UCI 2 que da a la zona de retiro de residuos del Hospital; se procede a bajar los materiales por la fachada de la cubierta intervenida como son: Teja ondulada, aislante en fibra de vidrio y malla gallinero.
- Se continua a trasladar de esta zona de residuos a la zona de acopio dada por el Hospital
- El traslado se hace por la parte externa del Hospital saliendo de la zona de retiro de residuos dirigiéndose por la Carrera 74, posterior a la Diagonal 40S y se ingresa por esa portería donde se tiene la zona de acopio de material para ser retirado una vez se tenga la capacidad de la carga del carro que lo trasportara para llevarla a la disposición final de cada uno de ellos.


CONVENCIONES

Ruta Recorrido del Desmonte material y llevada a zona de acopio dada por el Hospital

Zona de bajada material por fachada

Transporte material desmontado

Acopio material desmontado

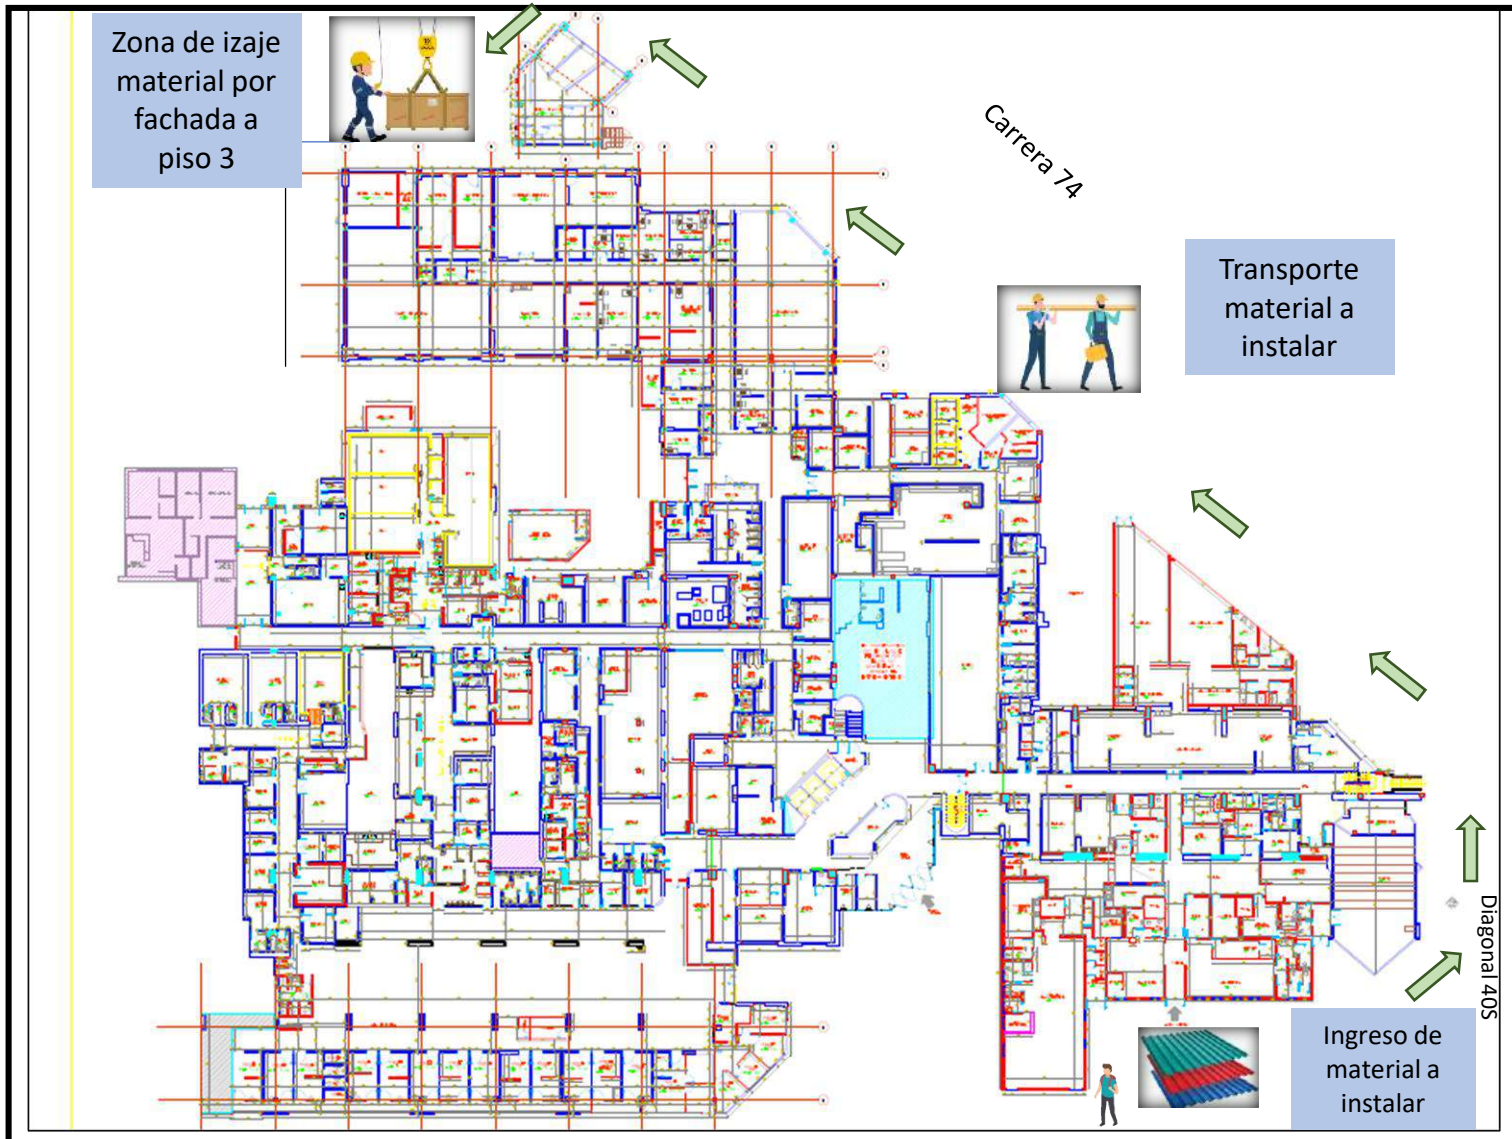

CONTIENE: *PLANTA PRIMER PISO INGRESO DE MATERIAL A MONTAR EN CUBIERTA PISO 3 HOSPITAL OCCIDENTE DE KENNEDY DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUROCCIDENTE E.S.E*

Contratante*: La Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E.*

Contratista: *Exeo Ingenieria y Servicios SAS*

DESCRIPCIÓN

- Se ingresa por la portería que es la zona de acopio asignada por el Hospital dejando el carro que fabrica la teja y se ingresa a la portería donde se tiene la zona de acopio de material.
- Una vez fabricada la teja se realiza el traslado por la parte externa del Hospital saliendo por la Diagonal 40S posterior por la Carrera 74 y se llega a la zona de retiro de residuos del Hospital,
- Se procede a realizar el izaje de la teja por la fachada hasta la cubierta del piso 3 que la que se realizara la intervención.

CONVENCIONES

Ruta Recorrido del Desmonte material y llevada a zona de acopio dada por el Hospital

Zona de bajada material por fachada

Transporte material desmontado

Acopio material desmontado
