ALCALDÍA DE FUSAGASUGÁ

ESTUDIO DE MERCADO

ADQUISICIÓN DE ESTRUCTURAS METÁLICAS DESTINADAS AL ALMACENAMIENTO Y RESGUARDO DE BIENES DE LAS JUNTAS DE ACCIÓN COMUNAL DEL MUNICIPIO DE FUSAGASUGÁ.

1. OBJETO DEL ESTUDIO

El presente estudio de mercado tiene como finalidad identificar y analizar las condiciones económicas y comerciales para la adquisición de catorce (14) estructuras metálicas destinadas al almacenamiento y resguardo de bienes de las juntas de acción comunal del municipio de Fusagasugá,

El análisis permite establecer un valor unitario y un valor total estimado a partir de cotizaciones directas comparables, antecedentes de contratación pública y referencias comerciales disponibles. Para la comparación se consideran los componentes integrales del suministro, particularmente el transporte hasta Fusagasugá, la entrega y el descargue en los sitios determinados por el Municipio.

2. DESCRIPCIÓN DEL BIEN

El Municipio requiere adquirir catorce (14) estructuras metálicas modulares destinadas al almacenamiento y resguardo de bienes. Para efectos de identificación comercial, corresponden a unidades de aproximadamente veinte (20) pies, usadas o restauradas, siempre que se encuentren en condiciones estructurales, funcionales y de conservación aptas para el uso previsto.

Las características dimensionales inicialmente requeridas son:

Característica	Requerimiento
Cantidad	14 unidades
Largo exterior	6,10 metros aprox.
Ancho exterior	2,44 metros aprox.
Alto exterior	2,59 metros aprox.
Volumen útil	Aproximadamente 32 m^3
Tipo	Estructura metálica modular para almacenamiento
Uso	Almacenamiento y resguardo de bienes
Estado	Usado/restaurado, apto para el uso previsto
Material principal	Acero / estructura metálica

Las dimensiones indicadas son aproximadas y corresponden a las utilizadas comercialmente en estructuras metálicas modulares de veinte (20) pies. La aceptación del bien estará sujeta al cumplimiento de las especificaciones técnicas y condiciones de funcionamiento exigidas por la Entidad.

3. ALCANCE ECONÓMICO

La comparación económica se realiza sobre el valor integral de las catorce (14) unidades, incluyendo transporte hasta Fusagasugá, entrega y descargue en los lugares establecidos por el Municipio.

El precio integral deberá comprender:

- Entrega de 14 estructuras metálicas modulares destinadas al almacenamiento.
- Transporte hasta los sitios determinados por el supervisor del contrato.
- Entrega en sitio.
- Descargue en sitio.
- No se incluyen obras civiles, adecuación del terreno, conexiones eléctricas, mobiliario ni modificaciones posteriores que no estén expresamente requeridas. Los costos necesarios para el transporte, la entrega y el descargue sí deben estar incorporados en la cotización.

Las cotizaciones directas fueron analizadas bajo condiciones técnicas y logísticas homogéneas, verificando que los valores incluyeran los componentes requeridos para la entrega integral de las unidades.

4. METODOLOGÍA DEL ESTUDIO DE MERCADO

Para la identificación de las condiciones económicas del mercado se acudió a las siguientes fuentes:

a) Antecedentes de contratación pública relacionados con la adquisición, suministro, transporte o instalación de estructuras metálicas modulares y contenedores.

b) Información pública de procesos publicados en SECOP y plataformas de consulta de contratación estatal.

c) Referencias comerciales de bienes de dimensiones y usos similares.

d) Cotizaciones solicitadas directamente a potenciales proveedores del mercado.

e) Comparación de las ofertas bajo condiciones de cantidad, características, transporte, entrega y descargue equivalentes.

La información se examinó teniendo en cuenta las diferencias de cantidad, dimensiones, estado del bien, adaptaciones, instalación, logística, impuestos y alcance de cada adquisición. Los antecedentes públicos se utilizan como referencias de comportamiento de la demanda y no como precios unitarios directamente equivalentes cuando sus condiciones difieren.

5. ANTECEDENTES DE CONTRATACIÓN PÚBLICA

5.1. Instituto Universitario de la Paz -- UNIPAZ – 2026

Se identificó el proceso "SUBASTA INVERSA 010-2026", identificado en SECOP II como CO1.REQ.11286252, cuyo objeto corresponde a la adquisición e instalación de contenedores marítimos adaptados como solución modular para el fortalecimiento del proceso misional de la entidad.

El valor estimado publicado asciende a $403.536.000, bajo la modalidad de selección abreviada mediante subasta inversa. El proceso contempla contenedores adaptados e instalación, por lo que su alcance técnico no es idéntico al suministro de unidades usadas/restauradas para almacenamiento requerido por el Municipio.

Este antecedente es relevante por su actualidad y por evidenciar la existencia de demanda pública de estructuras modulares metálicas mediante un procedimiento de selección abreviada con subasta inversa. Su valor global no se toma como precio unitario comparable, debido a las diferencias de alcance y adaptación.

5.2. Corporación Autónoma Regional para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga – CDMB – 2026

Se identificó el proceso SA-SI-012-2026, cuyo objeto comprende la adquisición, transporte e instalación de una unidad modular tipo contenedor de veinte (20) pies, adaptada para el secado ambiental de suelos, lodos y sedimentos.

El valor publicado del proceso asciende a $65.525.000 y corresponde a una unidad con adaptación especializada para una finalidad técnica y ambiental específica.

Por tratarse de una sola unidad y de una solución adaptada, su valor no es directamente comparable con el precio de catorce (14) estructuras destinadas al almacenamiento general. No obstante, constituye un antecedente pertinente sobre adquisición pública de unidades modulares de veinte (20) pies e inclusión de transporte e instalación.

El antecedente permite advertir que las adaptaciones y la destinación especializada pueden incidir de manera importante en el precio, por lo cual no debe trasladarse directamente su valor al presente análisis.

5.3. CENAC Aviación – 2026

Se identificó el proceso MC-152-CENACAVIACIÓN-2026, cuyo objeto corresponde a la adquisición de contenedores de cuarenta (40) pies para la División de Aviación Asalto Aéreo y sus unidades.

El valor publicado asciende a $145.672.000, bajo la modalidad de mínima cuantía y con objeto de compraventa. La dimensión de cuarenta (40) pies y la cantidad del proceso son diferentes a las condiciones requeridas por el Municipio.

Este proceso se incorpora como antecedente de demanda institucional de contenedores metálicos para almacenamiento y resguardo, sin utilizar su valor como referencia unitaria directa por las diferencias de dimensión, cantidad y alcance.

La comparación confirma la presencia de necesidades de almacenamiento mediante estructuras metálicas en entidades públicas, pero exige considerar las especificaciones y condiciones logísticas particulares de cada adquisición.

5.4. Instituto para la Investigación y la Preservación del Patrimonio Cultural y Natural del Valle del Cauca – INCIVA – 2023

En la información pública de contratación de INCIVA se identificó el contrato 040.10.05.23.2926, celebrado para la compra de un (1) contenedor de veinte (20) pies, por valor de $16.954.000.

El antecedente guarda relación con la adquisición de una unidad de veinte (20) pies para almacenamiento. Sin embargo, la información consultada no permite establecer con certeza que el precio incluyera transporte y descargue en sitio.

Por lo anterior, se considera un referente histórico de demanda y de precio publicado, pero no un comparable económico directo para determinar el valor integral de catorce (14) unidades con transporte, entrega y descargue.

6. REFERENCIAS COMERCIALES Y PRECIOS DE MERCADO

Se identificó una referencia comercial publicada de una unidad metálica de veinte (20) pies, con dimensiones aproximadas de 6,02 m × 2,40 m × 2,59 m y fabricada en acero.

El precio publicado para dicha referencia es de $20.467.900 por unidad.

Aunque las dimensiones y el uso anunciado guardan relación con la necesidad institucional, la información disponible no acredita de manera suficiente que el precio incluya transporte hasta Fusagasugá, entrega y descargue, ni permite confirmar que el estado, garantía y demás condiciones sean equivalentes a las cotizaciones directas.

En consecuencia, esta referencia se conserva como dato indicativo de mercado, pero no se incorpora al cálculo del promedio ni sustituye las cotizaciones directas homologadas.

7. CUADRO COMPARATIVO PRELIMINAR

Entidad / proceso	Año	Objeto o bien	Dimensión / alcance	Valor publicado	Uso en el análisis
UNIPAZ – SUBASTA INVERSA 010-2026	2026	Adquisición e instalación de contenedores marítimos adaptados	Contenedores adaptados; alcance modular	$403.536.000	Antecedente reciente de demanda pública; no comparable directo por adaptación e instalación.
CDMB – SA-SI-012-2026	2026	Adquisición, transporte e instalación de unidad modular adaptada para secado ambiental	1 unidad de 20 pies, adaptación especializada	$65.525.000	Referencia de demanda y logística; no comparable directo por unidad única y adaptación técnica.
CENAC Aviación – MC-152-CENACAVIACIÓN-2026	2026	Adquisición de contenedores para División de Aviación Asalto Aéreo	Contenedores de 40 pies	$145.672.000	Antecedente de almacenamiento institucional; dimensiones y alcance diferentes.
INCIVA – contrato 040.10.05.23.2926	2023	Compra de un contenedor de 20 pies	1 unidad de 20 pies	$16.954.000	Referencia histórica; no se verificó que incluyera transporte y descargue.

8. ANÁLISIS DE LOS PRECIOS

La información recopilada evidencia que las entidades públicas han adquirido estructuras metálicas y contenedores de diferentes dimensiones, cantidades y niveles de adaptación. Los valores publicados no son directamente homologables entre sí debido a diferencias en:

Las diferencias entre los antecedentes públicos y las cotizaciones directas obedecen, entre otros, a los siguientes factores:

- Dimensiones.
- Estado del contenedor.
- Si es nuevo o usado.
- Nacionalización.
- Adecuaciones especiales.
- Tratamientos anticorrosivos.
- Tipo de piso.
- Tipo de puerta.
- Sistemas de seguridad.
- Transporte.
- Instalación.
- Destinación específica.
- Garantía.
- Impuestos.

Por estas razones, los antecedentes de contratación pública se utilizan para contextualizar la demanda y reconocer factores que inciden en los precios, mientras que la determinación del valor estimado se fundamenta en las tres cotizaciones directas que fueron solicitadas para catorce (14) unidades y que contemplan condiciones técnicas y logísticas comparables. No se promedian valores de procesos públicos con objetos, cantidades o alcances diferentes.

La comparación directa considera exclusivamente las cotizaciones de proveedores que informaron valores para las catorce (14) unidades, incluyendo transporte, entrega y descargue en los lugares establecidos por el supervisor.

9. COTIZACIONES DIRECTAS

Se analizaron tres (3) cotizaciones directas de proveedores del sector: Econtainers S.A.S., Shiptainer S.A.S. y Atlas Box S.A.S.

Las solicitudes y ofertas consideraron las siguientes condiciones:

Cantidad: catorce (14) unidades.

Bien: estructura metálica modular destinada al almacenamiento, de dimensiones aproximadas a veinte (20) pies.

Dimensiones exteriores aproximadas:

- 6,10 m de largo.
- 2,44 m de ancho.
- 2,59 m de alto.

Volumen útil: aproximadamente 32 m³.

El proveedor deberá informar y asumir en el valor ofertado:

1. Precio unitario integral.
2. Precio total por catorce (14) unidades.
3. IVA, si aplica.
4. Características técnicas y estado del bien.
5. Material y condiciones de restauración.
6. Sistema de cierre.

7. Tipo de piso.
8. Tratamiento anticorrosivo.
9. Transporte, entrega y descargue.
10. Garantía.
11. Vigencia de la cotización.

La información económica que se presenta corresponde a los precios unitarios informados por los proveedores y a su aplicación para catorce (14) unidades, manteniendo incluidos los componentes de transporte, entrega y descargue.

10. HOMOLOGACIÓN DE LAS COTIZACIONES

Para garantizar la comparabilidad económica se verificó que las tres cotizaciones correspondieran a catorce (14) unidades de dimensiones aproximadas de veinte (20) pies y que contemplaran el transporte hasta Fusagasugá, entrega y descargue en sitio.

- Econtainers S.A.S. incluye transporte y descargue en auto descargable.
- Shiptainer S.A.S. incluye transporte y descargue en auto descargable.
- Atlas Box S.A.S. incluye transporte y descargue a piso mediante vehículo autodescargable.

Las obras civiles, el mobiliario y la adecuación del terreno no hacen parte del precio comparado.

Los proveedores discriminaron el IVA, lo que permite comparar los valores unitarios y totales antes de IVA y calcular separadamente el impuesto aplicable.

Proveedor	Valor unitario antes de IVA	Subtotal 14 unidades antes de IVA	IVA 19%	Total 14 unidades IVA incluido
Econtainers S.A.S.	$18.600.000	$260.400.000	$49.476.000	$309.876.000
Shiptainer S.A.S.	$21.300.000	$298.200.000	$56.658.000	$354.858.000
Atlas Box S.A.S.	$22.520.000	$315.280.000	$59.903.200	$375.183.200

11. DETERMINACIÓN DEL PRECIO DE REFERENCIA

Para determinar el valor estimado se toman como base los valores unitarios antes de IVA de las tres (3) cotizaciones directas homologadas. Se aplica el promedio aritmético simple, asignando igual incidencia a cada cotización, dado que las tres corresponden a la misma cantidad de unidades y contemplan los componentes integrales requeridos.

Econtainers S.A.S.: $260.400.000 para 14 unidades.

Shiptainer S.A.S.: $298.200.000 para 14 unidades.

Atlas Box S.A.S.: $315.280.000 para 14 unidades.

La diferencia entre el menor y el mayor valor total antes de IVA es de $54.880.000. Esta variación se considera al analizar el comportamiento de las ofertas, sin que por sí sola desvirtúe su comparabilidad, pues las tres cotizaciones fueron presentadas para la misma cantidad y alcance logístico.

CÁLCULO DEL PROMEDIO ARITMÉTICO SIMPLE

El promedio se calcula sumando los tres valores unitarios antes de IVA y dividiendo el resultado entre tres (3), sin aplicar ponderaciones diferenciadas:

Econtainers S.A.S.: $18.600.000 por unidad antes de IVA.

Shiptainer S.A.S.: $21.300.000 por unidad antes de IVA.

Atlas Box S.A.S.: $22.520.000 por unidad antes de IVA. Este valor corresponde al valor unitario utilizado para el cálculo comparativo; debe conservarse la cotización original como soporte de la cifra.

($18.600.000 + $21.300.000 + $22.520.000) / 3 = $20.806.666,67.

El promedio unitario de $20.806.666,67 se multiplica por catorce (14) unidades para obtener un valor estimado antes de IVA de $291.293.333,33. Sobre este subtotal se calcula el IVA del diecinueve por ciento (19 %), equivalente a $55.345.733,33. El valor total estimado, incluido IVA, es de $346.639.066,67, aproximado al peso a $346.639.067.

Concepto	Operación	Valor
Promedio del valor unitario	($18.600.000 + $21.300.000 + $22.520.000) / 3	$20.806.666,67
Valor de catorce (14) unidades antes de IVA	$20.806.666,67 × 14	$291.293.333,33
IVA (19 %)	$291.293.333,33 × 19 %	$55.345.733,33
Valor total estimado incluido IVA	$291.293.333,33 + $55.345.733,33	$346.639.066,67
Valor total aproximado al peso	Redondeo al peso	$346.639.067

12. VALOR ESTIMADO DEL MERCADO

El valor estimado se determina a partir del promedio aritmético simple de los valores unitarios antes de IVA de las tres cotizaciones directas homologadas. Esta metodología permite incorporar en igualdad de condiciones las tres referencias obtenidas para la misma cantidad de bienes y alcance logístico.

Valor unitario promedio antes de IVA: $20.806.666,67.

Valor de catorce (14) unidades antes de IVA: $291.293.333,33. IVA (19 %): $55.345.733,33. VALOR TOTAL ESTIMADO: $346.639.066,67, aproximado al peso a $346.639.067. El valor comprende el transporte, entrega y descargue de las catorce (14) unidades.

13. CONSIDERACIONES PARA LA ESTRUCTURACIÓN DEL PROCESO

La descripción técnica y económica del bien debe permitir identificar características objetivas y verificables, así como comparar las ofertas bajo condiciones equivalentes. Para ello, deben precisarse, entre otros aspectos, la cantidad, dimensiones aproximadas, estado admisible, estructura, cerramiento, piso, puertas, sistema de cierre, tratamiento anticorrosivo, transporte, entrega y descargue.

La verificación de las condiciones técnicas y comerciales debe garantizar que las unidades ofrecidas sean aptas para el almacenamiento y que los costos de transporte, entrega y descargue estén incluidos en el valor ofertado.

La estructuración del procedimiento de selección deberá atender la naturaleza de los bienes, su eventual clasificación como bienes de características técnicas uniformes y de común utilización, la cuantía y las reglas legales aplicables. El presente estudio de mercado aporta información económica y comercial para esa evaluación, sin anticipar la selección de un proveedor.

Nota metodológica: el valor estimado se obtiene del promedio aritmético simple de las tres cotizaciones directas homologadas. El cálculo arroja un valor unitario promedio de $20.806.666,67 antes de IVA y un valor total para catorce (14) unidades de $346.639.066,67, que se aproxima al peso a $346.639.067, IVA incluido.

CONDICIÓN DE PLAZO: La ejecución contractual se proyecta hasta el treinta (30) de diciembre de 2026. La entrega podrá coordinarse con la supervisión, de acuerdo con los lugares establecidos por el Municipio, hasta completar las catorce (14) unidades, con transporte y descargue incluidos.

FUENTES DE LOS ANTECEDENTES DE CONTRATACIÓN PÚBLICA

UNIPAZ, proceso SUBASTA INVERSA 010-2026, SECOP II, referencia CO1.REQ.11286252: https://www.temploapp.co/procesos/adquisicion-e-instalacion-de-contenedores-maritimos-adaptados-como-solucion/21038535-8b2c-4f43-8ead-62ec763354a6.

CDMB, proceso SA-SI-012-2026: https://www.temploapp.co/procesos/adquisicion-transporte-e-instalacion-de-una-unidad-modular-tipo-contenedor-de/abf2f7f0-8ee7-4721-a429-2de94d96ce5e.

CENAC Aviación, proceso MC-152-CENACAVIACIÓN-2026: https://www.temploapp.co/procesos/adquisicion-de-contenedores-de-40-ft-para-la-division-de-aviacion-asalto-aereo/ff72aa15-1abd-44e3-819e-afa305a9b3b7.

INCIVA, relación pública de contratación vigencia 2023, contrato 040.10.05.23.2926: https://inciva.gov.co/storage/Clientes/INCIVA/Principal/imagenes/contenidos/120150-base%20ley%20de%20transparencia%20-%20contratacion%20inciva%20vigencia%202023.pdf.

DANIEL ALBERTO PARRADO DIAZ
Director de Recursos Físicos
Alcaldía de Fusagasugá.

ATLAS
BOX CAPITAL

COTIZACION | CONTENEDORES MARÍTIMOS

ALCALDÍA MUNICIPAL DE FUSAGASUGÁ

Referencia: Oferta para suministro de unidades de almacenamiento

Bogotá, 7 de octubre de 2026

OBJETO

ADQUISICIÓN DE ESPACIOS DESTINADOS AL ALMACENAMIENTO Y RESGUARDO DE BIENES PARA LAS JUNTAS DE ACCIÓN COMUNAL DEL MUNICIPIO DE FUSAGASUGÁ

1. ALCANCE TÉCNICO DEL SUMINISTRO

Atlas Box presenta la siguiente configuración técnica para el suministro solicitado, correspondiente a unidades marítimas de 20 pies sometidas a un proceso de recuperación funcional y protección superficial para uso como espacio de almacenamiento.

- Contenedor marítimo de 20 pies en condición original, apto para intervención y puesta en servicio.
- Puertas y herrajes originales conservados, operativos y habilitados para el uso previsto.
- Piso original del contenedor con acabado en pintura de color negro.
- Restauración parcial de superficies internas y externas, sin proceso de detallado integral.
- Corrección parcial de abolladuras propias del uso previo de la unidad.
- Remoción completa de corrosión y óxido presentes en las áreas intervenidas.
- Aplicación de protección anticorrosiva en superficies internas y externas.

2. PROPUESTA ECONÓMICA

Los valores ofertados contemplan el suministro de las unidades descritas y su transporte hasta el área urbana de Fusagasugá, de acuerdo con las condiciones indicadas a continuación.

Ítem	Descripción	Cant.	Valor unitario	Valor total
1	Suministro de contenedor marítimo usado de 20 pies, restaurado y pintado, en condiciones originales de estructura.	16	$ 19.990.000	$ 319.840.000
2	Transporte de las unidades al municipio de Fusagasugá.	16	$ 2.530.000	$ 40.480.000
			Subtotal	**$ 360.320.000**
			IVA (19%)	**$ 68.460.800**
			TOTAL OFERTA	**$ 428.780.800**

3. CONDICIONES COMERCIALES Y DE ENTREGA

- El valor de transporte aplica para entregas dentro del área urbana de Fusagasugá.
- El descargue de los contenedores está contemplado a piso en auto descargable, para lo cual deben garantizar 28 metros lineales para maniobrar
- El cliente deberá asegurar condiciones adecuadas de acceso para los vehículos de transporte hasta el punto de entrega.
- Plazo estimado de entrega: cuarenta (30) días hábiles


Atentamente,


LORENA MUÑOZ
ÁREA COMERCIAL
ATLAS BOX SAS
NIT 901.019.148-7

La información técnica e imágenes contenidas en esta oferta son de carácter referencial.

COTIZACION TECNICA Y ECONOMICA
ALCALDIA MUNICIPAL DE FUSAGASUGA
ESTUDIO DE MERCADO


OBJETO: ADQUISICIÓN DE ESPACIOS DESTINADOS AL ALMACENAMIENTO Y RESGUARDO DE BIENES PARA LAS JUNTAS DE ACCIÓN COMUNAL DEL MUNICIPIO DE FUSAGASUGÁ

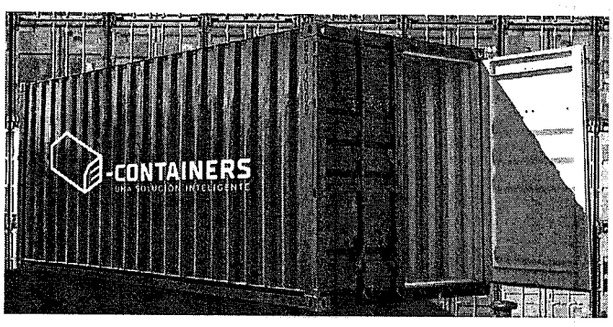

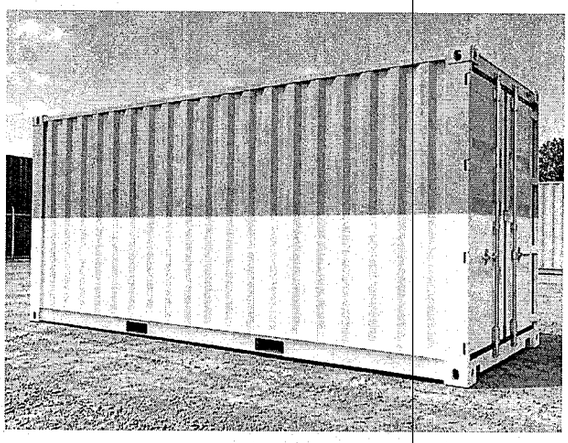

IMAGENES DE REFENCIA

→ **Estructura y Acabados Generales:**

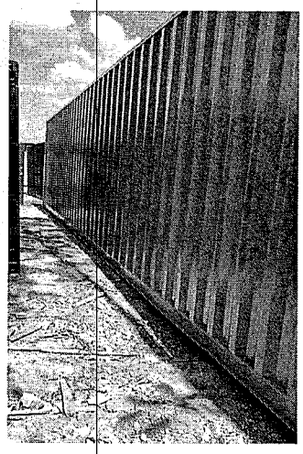

- Unidad conformada por un contenedor marítimo de 20 pies, en condiciones originales, usado. Nacionalizado
- Puertas y herrajes operativos y originales del contenedor
- Piso original del contenedor, pintado color negro
- Cross member original del contenedor


→ **Restauracion:**

- Restauración interna y externa parcial sin detallado
- Eliminación parcial de abolladuras
- Eliminación de corrosión y óxido completo
- Puertas originales del contenedor habilitadas
- Acabado externo e interno en anticorrosivo

- Incluye transporte en el área urbana de Fusagasugá.
- Incluye descargue en auto descargable, para lo cual el cliente debe garantizar 20 metros lineales para maniobrar y descargar.

Encuentranos en:
Bogotá (1) 7462065
Medellín (4) 6049461
Manizales (6) 8918650
Cali (2) 4850401
Cartagena (5) 6939833
Barranquilla (5) 3852330
+(57) 311 639 4356
info@econtainers.co
WWW.ECONTAINERS.CO


CONTENEDOR DE 20 PIES

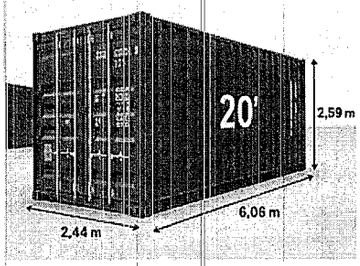


MEDIDAS EXTERIORES	
Largo:	6,06 m
Ancho:	2,44 m
Alto:	2,59 m

MEDIDAS INTERIORES	
Largo:	5,90 m
Ancho:	2,35 m
Alto:	2,39 m


SUPERFICIE APROX.	PESO VACÍO	CARGA MÁXIMA
13 - 15 m²	2.200 - 2.400 kg	28.000 kg




FACHADA LATERAL





FACHADA FRONTAL




FACHADA POSTERIOR

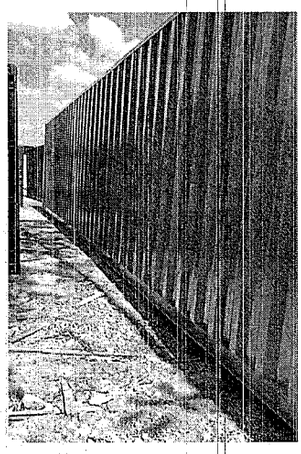

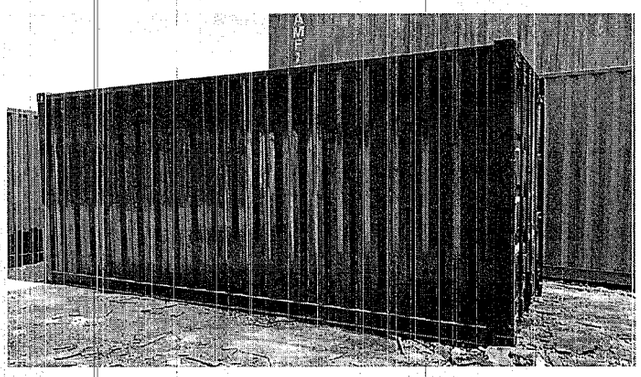

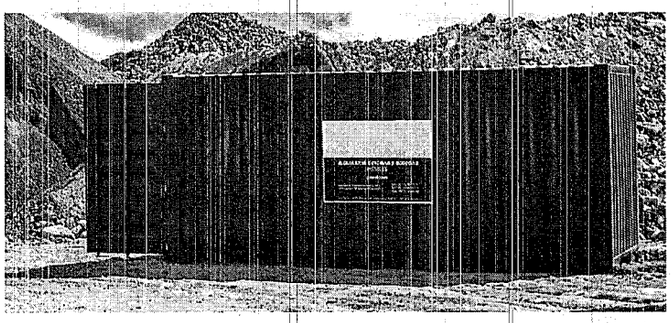

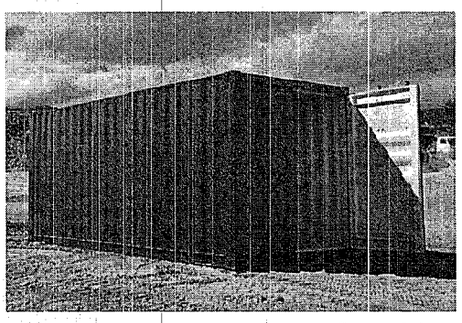

s en:
2065
9441
3650
3401
7855
Barranquilla (5) 3852330
+(57) 311 639 4356
info@econtainers.co
WWW.ECONTAINERS.CO

E-CONTAINERS

COSTO DE LA ADQUISICION

ITEM	PRODUCTO	CANT	VALOR UNIT	TOTAL
1	SUMINISTRO DE CONTENEDOR EN CONDICIONES ORIGINALES USADO RESTAURADO Y PINTADO DE 20 PIES	14	$ 17.200.000	$ 240.800.000
3	TRANSPORTE A FUSAGASUGA	14	$ 1.400.000	$ 19.600.000
	SUBTOTAL			$ 260.400.000
	IVA			$ 49.476.000
	TOTAL			$ 309.876.000

CONDICIONES COMERCIAL:

- Las imágenes son de referencia.
- Incluye transporte en el área urbana de Fusagasugá.
- Incluye descargue en auto descargable, para lo cual el cliente debe garantizar 20 metros lineales para maniobrar y descargar.
- El cliente debe garantizar vías de acceso óptimas para el transporte al sitio de entrega.
- El cliente debe garantizar las siguientes condiciones de terreno: compactado, nivelado y debidamente cimentado.
- No se incluye mobiliario.
- No se incluye trabajos de obra civil.
- El precio incluye suministro de plano de planta general. En caso de requerir algún plano se cotizará como un adicional.
- La oferta incluye certificado emitido por el contratista, en caso de requerir certificaciones o constancias normativas por alguna entidad especial se cotizará como un adicional
- Garantía de 3 meses por defectos de fabricación.
- Tiempo de entrega: 3 entregas semanales para un total de 30 días calendario.

PAULA VALENCIA Q.
Sales Manager B2G
ECONTAINERS SAS
900.641.692-1
Cel 3108331305
pvalencia@econtainers.co

JOHN JAIRO VALENCIA HINCAPIE
Representante Legal
ECONTAINERS SAS
900.641.692-1
