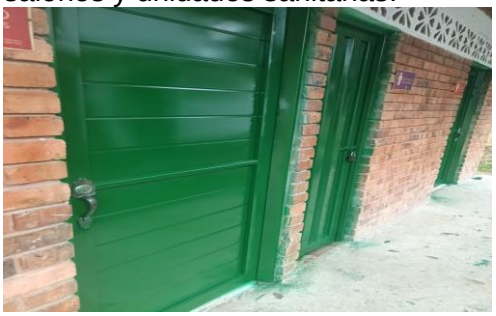
INFORME DEL CONTRATISTA
REPORTE DE LA GESTION DEL CUMPLIMIENTO Y EJECUCION DE ACTIVIDADES AL CONTRATO No.14 DE 2026

Número del Contrato:	IERS-CRE-14-2026
Objeto del Contrato:	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANALES Y BAJANTES EN LA SEDE BARÓN GALLERO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA RURAL DEL SUR Y PINTURA DE CARPINTERÍA METÁLICA, CON EL FIN DE MANTENER Y MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA DE LA SEDE Y FORTALECER LOS AMBIENTES DE APRENDIZAJE
Contratista:	JOSE MANUEL PINEDA FONSECA, identificado con CC. No 6.767.031 de Tunja
Contratante:	**INSTITUCIÒN EDUCATIVA RURAL DEL SUR**
Valor del contrato	NUEVE MILLONES QUINENTOS MIL PESOS ($9.500.000) MCTE
Fecha de suscripción	11 de agosto de 2026
Fecha Inicio del Contrato	11 de agosto de 2026
Fecha de Terminación:	28 de agosto de 2026
Forma de Pago:	Único pago 100%

En cumplimiento de las obligaciones establecidas en la cláusula TERCERA del contrato No.14-2026, me permito dar informe de las actividades ejecutadas durante el periodo del objeto contractual, conforme a lo siguiente:

	OBLIGACIONES DIRECTAS DEL CONTRATISTA	
Fecha	**Actividades- Obligaciones del Contrato**	**EVIDENCIA**
DEL 11 AL 28 DE AGOSTO DE 2026	A) se realiza el Suministro e instalación de canales tipo “pecho de paloma”, en lámina galvanizada, calibre 18. Incluye base anticorrosivo y pintura tipo esmalte a 2 manos. Tramos: 1-. Parte delantera de sala de profesores, salones de clase y cocina. 2-. Cajilla de cilindros y aguas lluvias. 3-. Parte posterior restaurante. 4-. Parte posterior salones de clase. 52 MTS B). Instalación de cubierta en POLICARBONATO Y ESTRUCTURA METALICA CUADRADA DE 1.1/2 PULGADA CALIBRE 18 ELABORACION CACHUCHA O CUBIERTA, frente de sala de profesores y salón de clase. Incluye MANO DE OBRA. Materiales suministrados por el Contratante. IERS Rural del Sur. 7 MTS 2 C) Se hace la Instalación de Bajantes, en tubería plástica de 3 “de diámetro, codos, uniones y demás accesorios, en inicio y	 Instalación canaleta tipo pecho paloma calibre 18 material galvanizado.

	terminación de tramos de canal. Incluye excavación e instalación de tramo de tubería de 3 m., en parte posterior de salones. Incluye MANO DE OBRA. Materiales suministrados por el Contratante. IERS Rural 10 UND D) se realiza la limpieza, empaste en zonas deterioradas, lijada y pintura general por ambas caras, tipo esmalte a 2 manos, en marcos y puertas metálicas de salones y unidades sanitarias. 18 UND E) Se hace la soldadura de puertas, bisagras, rejillas y otros elementos metálicos 10 UND	 Instalación de canales tipo “pecho de paloma”, en lámina galvanizada, calibre 18. Incluye base anticorrosivo y pintura tipo esmalte a 2 manos.  Instalación de Bajantes, en tubería plástica de 3 “de diámetro, codos, uniones y demás accesorios, en inicio y terminación de tramos de canal. Incluye excavación e instalación de tramo de tubería de 3 m., en parte posterior de salones. 

		 Instalación de Bajantes, en tubería plástica PVC tipo sanitaria de 3 “de diámetro  Limpieza, lijada y pintura general por ambas caras, tipo esmalte a 2 manos, en marcos y puertas metálicas de salones y unidades sanitarias.   Limpieza, lijada y pintura general por ambas caras, tipo esmalte a 2 manos, en marcos y puertas metálicas.

		 Limpieza, lijada y pintura general PUERTAS SALONES Y UNIDADES SANITARIAS SEDE BARON GALLERO

El presente informe se efectúa con el ánimo de sustentar el cumplimiento del contrato y como soporte para el cobro del mismo.

Fecha de Presentación: 28 de agosto de 2026

NOMBRE DEL PROPONENTE: JOSE MANUEL PINEDA FONSECA
NIT o C.C.: 6.767.031
DIRECCIÓN: TUNJA- CRA 8ª-12-25 BARRIO SAN LAUREANO
TELÉFONO: 3224184978
Atentamente,

