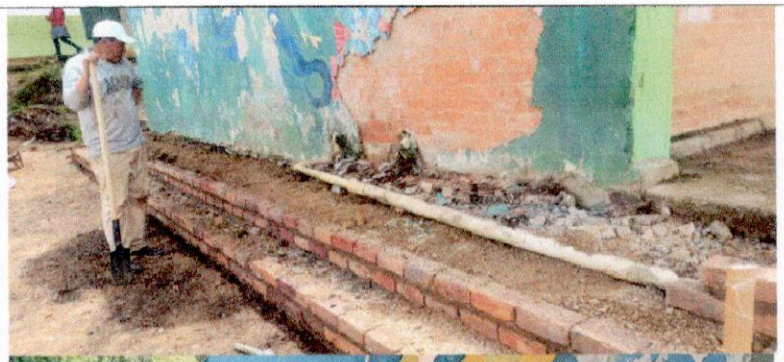
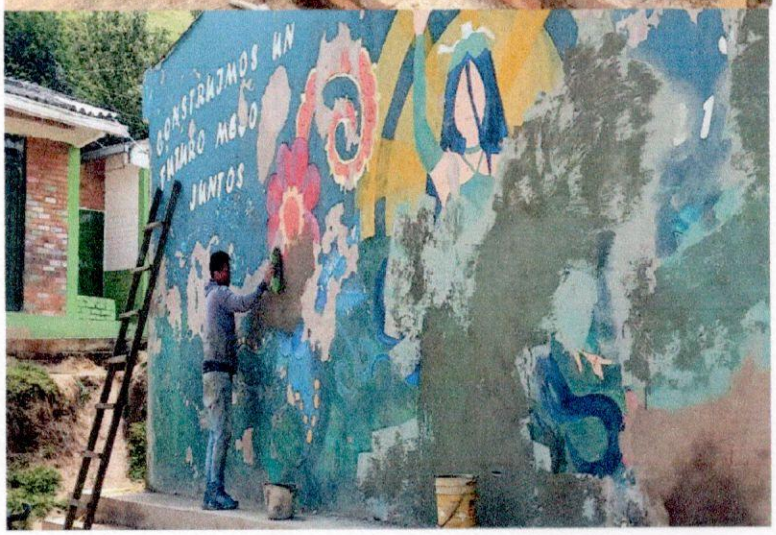
INFORME DEL CONTRATISTA
REPORTE DE LA GESTION DEL CUMPLIMIENTO Y EJECUCION DE ACTIVIDADES AL CONTRATO No.18 DE 2026

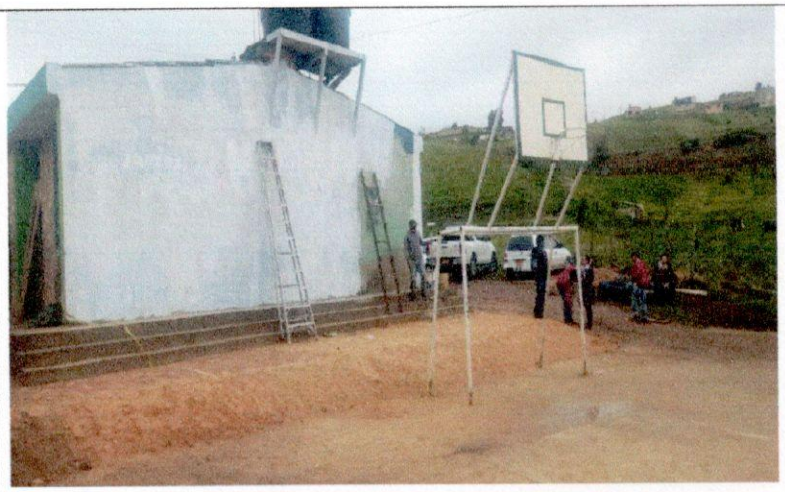
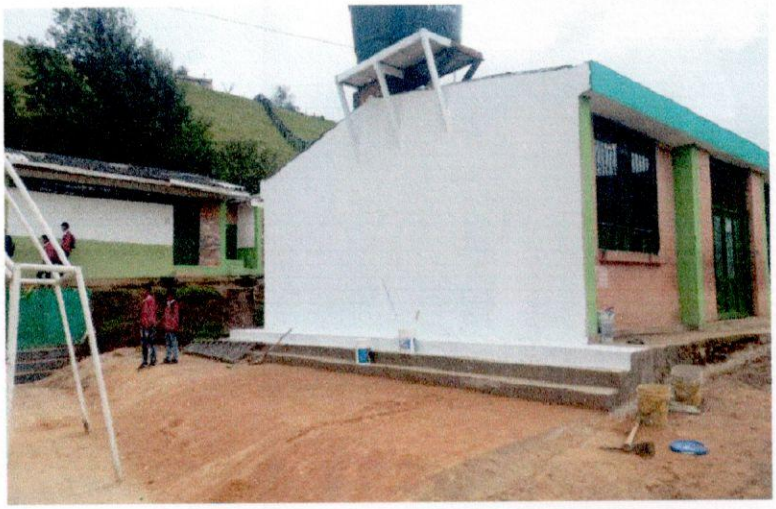
Número del Contrato:	IERS-CRE-18-2026
Objeto del Contrato:	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE LA SEDE CENTRAL DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA RURAL DEL SUR DE TUNJA, INCLUYE MANO DE OBRA Y SUMINISTRO DE MATERIALES, A TODO COSTO
Contratista:	**JOSE MANUEL GONZALEZ GONZALEZ, identificado con CC. # 7.170.695. de Tunja**
Contratante:	**INSTITUCIÒN EDUCATIVA RURAL DEL SUR**
Valor del contrato	**OCHO MILLONES CIENTO NOVENTA Y DOS MIL QUINIENTOS PESOS ($8.192.500) MCTE**
Fecha de suscripción	13 de octubre de 2026
Fecha Inicio del Contrato	13 de octubre de 2026
Fecha de Terminación:	26 de octubre de 2026
Forma de Pago:	Único pago 100%

En cumplimiento de las obligaciones establecidas en la cláusula TERCERA del contrato No.18-2026, me permito dar informe de las actividades ejecutadas durante el periodo del objeto contractual, conforme a lo siguiente:

	OBLIGACIONES DIRECTAS DEL CONTRATISTA	
Fecha	**Actividades-Obligaciones del Contrato**	**EVIDENCIA**
Del 13 al 22 de octubre de 2026	1. Raspar, resanar, impermeabilizar y pintar con base de pegacor e impermeabilizante y vinilo Tipo 1 para exteriores, pared del costado norte del restaurante escolar, incluye el suministro de materiales como: Pintura vinilo Tipo 1, Bultos de pegacort, galones de impermeabilizante, cemento, equipos y accesorios como andamio y demás necesarios. Instalar adoquín en aproximadamente 44m2, en superficie entre muro y cancha deportiva, peldaños en zona oriental del restaurante	

	escolar y rampa en zona occidental, en proyección de andenes existentes. Incluye, incluye mano de obra y materiales; 2000 unidades de adoquín aproximadamente, 6m3 arena lavada, 6 bulto de cemento fortificado, 6m3 de recebo, para alistamiento de superficie, compactación con uso de rana e instalación de adoquín. Suministro e Instalación de 6 m., de tubería PVC corrugada tipo alcantarillado, de 4" de diámetro, en paso vehicular de cancha deportiva a zona de restaurante escolar, incluye construcción de canal para recibir aguas del restaurante escolar.	   Instalación canaleta tipo pecho paloma calibre 18 material galvanizado.

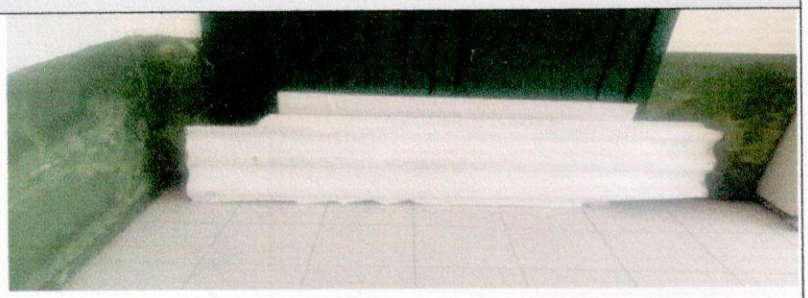
		  

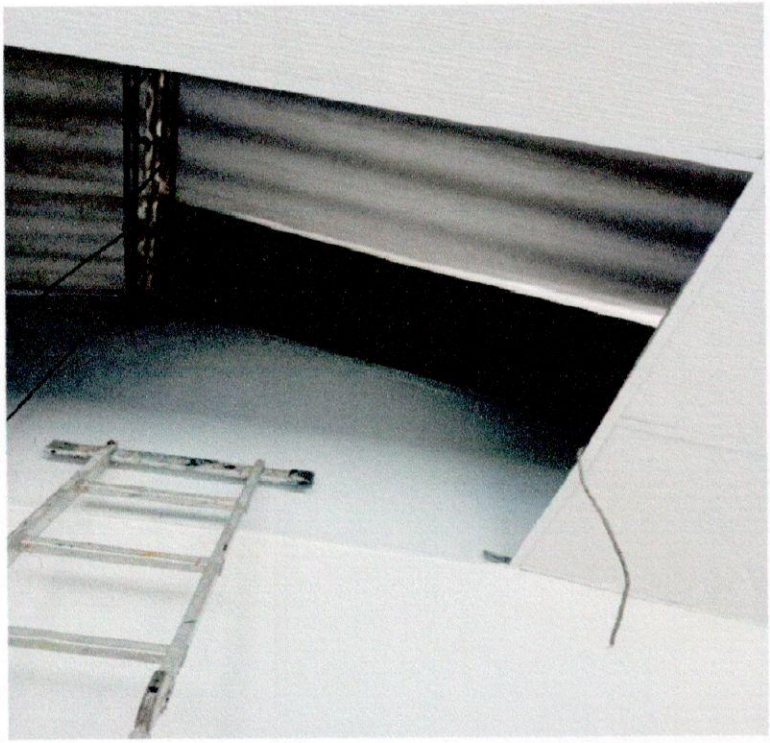
		 

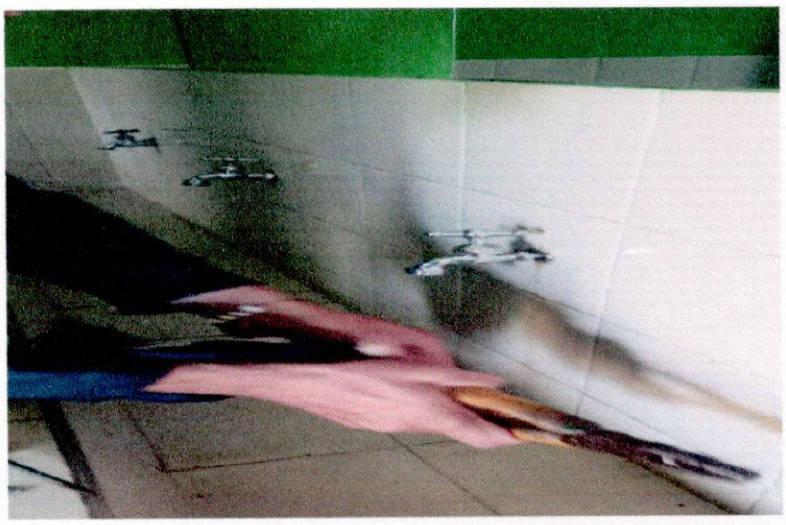
	OBLIGACIONES DIRECTAS DEL CONTRATISTA	
Fecha	**Actividades-Obligaciones del Contrato**	**EVIDENCIA**

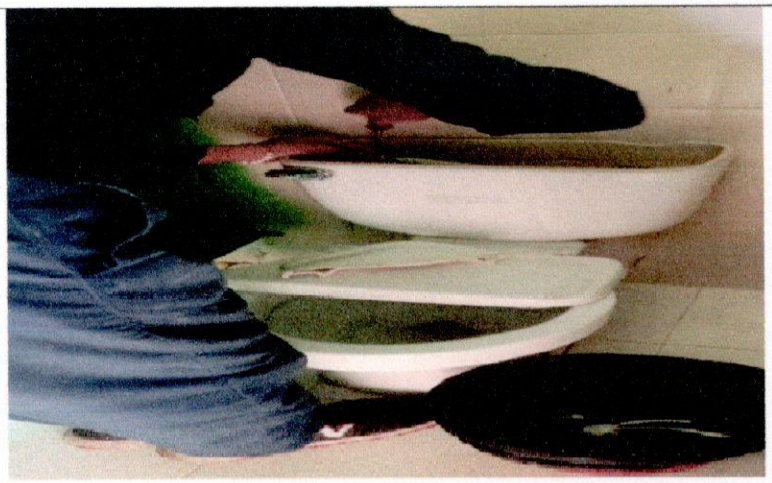
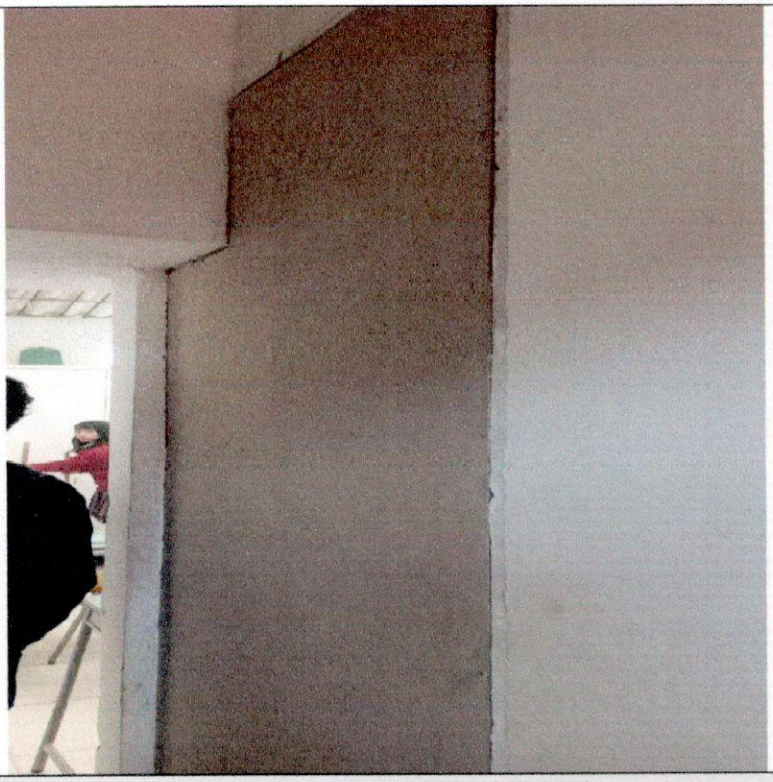
Del 13 al 22 de octubre de 2026	2. Suministro, instalación y mano de obra para el retiro de canaletas metálicas, adecuación de cableado y toma corrientes en el salón de bilingüismo sede central, incluye materiales como: 11 canaleta plástica de 5cm x 2.5 metros 1 rollo de cable #12 200 tornillo autoperforante de 1” 1 un rollo de cinta aislante 12 toma corriente doble de sobreponer .	 

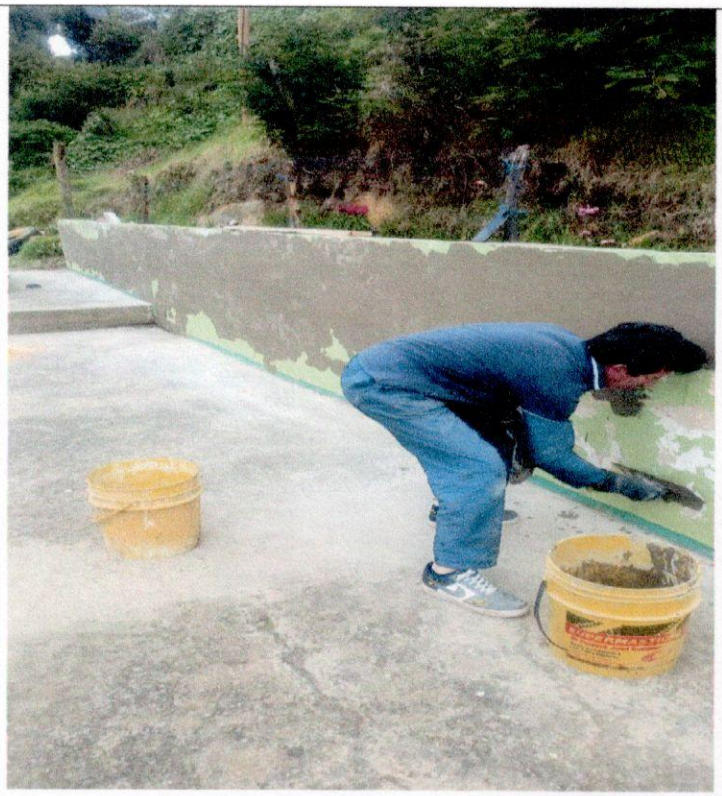
		    

	OBLIGACIONES DIRECTAS DEL CONTRATISTA	
Fecha	**Actividades- Obligaciones del Contrato**	**EVIDENCIA**
Del 13 al 22 de octubre de 2026	3. Mano de obra y transporte para el montaje de teja de Eternit y arreglo de falso techo salón- sede central	

	OBLIGACIONES DIRECTAS DEL CONTRATISTA	
Fecha	**Actividades-Obligaciones del Contrato**	**EVIDENCIA**
Del 13 al 22 de octubre de 2026	4. Mano de obra, arreglo de baños niños y niñas, cambio de accesorios, flotadores tanques de reserva.	

		
	Mano de obra para cambiar lámina de superboard. Incluye materiales-(Salón de laboratorio sede central) 1 una lámina de superboard calibre 6 7 metros de cinta malla 1 estuco plástico ½ galón ½ galón de pintura vinilo tipo 1	
	OBLIGACIONES DIRECTAS DEL CONTRATISTA	
Fecha	**Actividades-Obligaciones del Contrato**	**EVIDENCIA**
Del 13 al 22 de octubre de 2026	5. Mano de obra para picar, pañetar, y pintar muro izada de bandera sede central. Incluye materiales:	

El presente informe se efectúa con el ánimo de sustentar el cumplimiento del contrato y como soporte para el cobro del mismo.

Fecha de Presentación: 22 de octubre de 2026

JOSE MANUEL GONZALEZ GONZALEZ
NIT o C.C.: 7.170.695
DIRECCIÓN: VEREDA RUNTA ABAJO TUNJA
TELÉFONO: 3132773416
IMAIL; manuelitogg0503@gmail.com

Atentamente,

FIRMA José Manuel González González
7.170.695
