FECHA	06 de Septiembre de 2026
DESTINATARIO	Dirección Técnica de Medio Ambiente – Gobernación de Casanare
FUNCIONARIO (s)	Arnulfo Bohórquez Páez – Profesional de Apoyo
ASUNTO	Visita técnica de verificación de estado físico de la Infraestructura del Bioparque Wisirare
MUNICIPIO	Orocué - Casanare

ACTA DE VISITA	**SI**	**X**	**NO**	
FECHA DE VISITA	06 de Junio de 2026			

1. ESTADO ACTUAL

El Bioparque cuenta con áreas verdes, cerramientos y estructuras existentes para manejo y conservación de fauna. El registro fotográfico evidencia recorridos peatonales en terreno natural y tramos con superficie granular, además de estructuras existentes asociadas al manejo de fauna. Se identifican condiciones que requieren adecuación de accesos, superficies de circulación y elementos constructivos para mejorar la funcionalidad de las áreas intervenidas.

2. OBRAS REQUERIDAS

De acuerdo con las condiciones físicas y operativas observadas durante la visita, se identifica la necesidad de mejorar las condiciones de acceso, circulación y funcionamiento de las áreas destinadas al manejo y conservación del caimán llanero dentro del Bioparque Wisirare.

En particular, se identifica la necesidad de conformar una nueva vía de acceso interna que permita comunicar la vía existente con el sector donde se encuentran ubicadas las tanquillas destinadas al manejo de los especímenes. La ausencia de este tramo de circulación dificulta el acceso directo a dichas instalaciones y genera limitaciones durante las actividades de manejo y traslado de caimanes, debido a que los desplazamientos deben realizarse sin contar con una conexión interna adecuada hasta el área de las tanquillas.

De igual manera, durante la inspección se evidencia que dos de las tanquillas o piscinas destinadas al manejo de los caimanes presentan fisuras en sus elementos constructivos, condición que afecta su funcionalidad y genera restricciones para su utilización. De acuerdo con las condiciones observadas, dichas estructuras no se encuentran actualmente en condiciones adecuadas para ser utilizadas de manera normal, situación que limita la capacidad disponible para las actividades de manejo, atención y traslado de los especímenes.

En consecuencia, se identifica la necesidad de intervenir las tanquillas afectadas, con el propósito de recuperar sus condiciones de funcionalidad y garantizar que puedan ser utilizadas de manera segura y adecuada, así como de mejorar la conexión mediante la nueva vía de acceso interna hasta este sector.

Adicionalmente, se identifica la necesidad de mejorar los senderos y recorridos internos existentes, considerando las condiciones actuales de las superficies de circulación y la importancia de garantizar el desplazamiento adecuado del personal hacia las diferentes áreas del Bioparque.

Las intervenciones identificadas deberán ser definidas técnicamente de acuerdo con las condiciones encontradas en campo, las necesidades de operación del Bioparque y las especificaciones técnicas que correspondan.

3. INVENTARIO

Durante la visita se identificaron los siguientes elementos de infraestructura existentes en el área inspeccionada:

- Vía interna existente: se identifica una vía de circulación al interior del Bioparque, la cual presenta una discontinuidad en el sector que conduce hacia las tanquillas destinadas al manejo de los caimanes, generando una interrupción en la conexión directa con dicha área.
- Tanquillas o piscinas para manejo de caimanes: se identifican estructuras destinadas al alojamiento temporal y manejo de los especímenes. Durante la inspección visual se evidenció que dos de estas estructuras presentan fisuras, condición que afecta su estado físico y limita actualmente su utilización.
- Senderos internos: se identifican recorridos peatonales que permiten la circulación hacia diferentes sectores del Bioparque. Algunos tramos presentan superficies conformadas con material granular y se encuentran integrados al entorno natural del predio.
- Estructuras de cerramiento: se identifican cerramientos en malla destinados al aislamiento y manejo de las áreas donde permanecen los especímenes, los cuales hacen parte de la infraestructura funcional del Bioparque.
- Construcciones e instalaciones existentes: se identifican estructuras complementarias asociadas a la operación del Bioparque y al manejo de los animales, incluyendo áreas de apoyo y elementos destinados al suministro de agua.
- Áreas verdes y zonas naturales: el área inspeccionada se encuentra predominantemente rodeada de cobertura vegetal, árboles y zonas verdes, las cuales conforman el entorno inmediato de las instalaciones existentes.

En términos generales, el inventario evidencia la existencia de infraestructura destinada al manejo, conservación y atención de los especímenes, así como elementos de circulación y acceso que requieren adecuaciones para mejorar las condiciones de funcionamiento del Bioparque.

4. PERMISOS Y SERVIDUMBRE

Las intervenciones identificadas se encuentran localizadas dentro de las instalaciones del Bioparque Wisirare, por lo que no se evidencian requerimientos asociados a servidumbres sobre predios de terceros para el desarrollo de las obras.

En caso de ejecutarse actividades de mantenimiento, reparación o adecuación sobre la infraestructura existente, se deberá coordinar previamente con los administradores del Bioparque Wisirare la programación y ejecución de los trabajos, con el fin de garantizar el acceso a las áreas de intervención y evitar interferencias con las actividades de manejo, conservación y traslado de los especímenes.

5. REQUERIMIENTOS AMBIENTALES

Teniendo en cuenta que las intervenciones se desarrollan al interior del Bioparque Wisirare y se encuentran relacionadas con infraestructura destinada al manejo y conservación del caimán llanero, las actividades de mantenimiento, reparación y adecuación deberán ejecutarse procurando minimizar cualquier afectación sobre los especímenes, la vegetación y las condiciones naturales existentes en el área.

La ejecución de los trabajos deberá coordinarse previamente con los administradores del Bioparque, especialmente cuando las actividades se desarrollen en áreas próximas a las tanquillas, cerramientos o espacios destinados al manejo de los animales, con el fin de establecer las condiciones de acceso, horarios y medidas necesarias para evitar interferencias con las actividades de manejo y conservación.

Así mismo, durante la ejecución deberán implementarse las medidas correspondientes para el manejo adecuado de residuos, materiales de construcción, escombros, excavaciones y demás elementos generados por las actividades, evitando su disposición inadecuada dentro de las instalaciones o en las áreas naturales del Bioparque.

6. SOLICITUD DE LA COMUNIDAD

Durante la visita, los administradores del Bioparque Wisirare manifestaron las necesidades relacionadas con el mejoramiento y adecuación de la infraestructura existente, especialmente aquellas asociadas con las condiciones de acceso, circulación y funcionamiento de las áreas destinadas al manejo y conservación del caimán llanero. De manera particular, manifestaron la necesidad de contar con una conexión adecuada entre la vía interna existente y el sector de las tanquillas, debido a las dificultades que actualmente se presentan durante las actividades de manejo y traslado de los especímenes. Así mismo, señalaron la condición de las tanquillas que presentan fisuras, las cuales actualmente no se encuentran en condiciones adecuadas para su utilización. Durante la visita también fueron manifestadas otras necesidades de mantenimiento y adecuación de la infraestructura del Bioparque; sin embargo, estas no se encuentran contempladas dentro de las intervenciones objeto de la presente actuación, debido a la disponibilidad limitada de recursos para su atención. Las necesidades expuestas por los administradores fueron consideradas durante la inspección y contrastadas con las condiciones físicas observadas en el sitio.

7. ANEXO FOTOGRAFICO



Fotografía 1. Proyección de vía nueva




Fotografía 2. Senderos Peatonales



Fotografía 3. Piscina o Tanquilla

8. GRAFICO DE UBICACIÓN

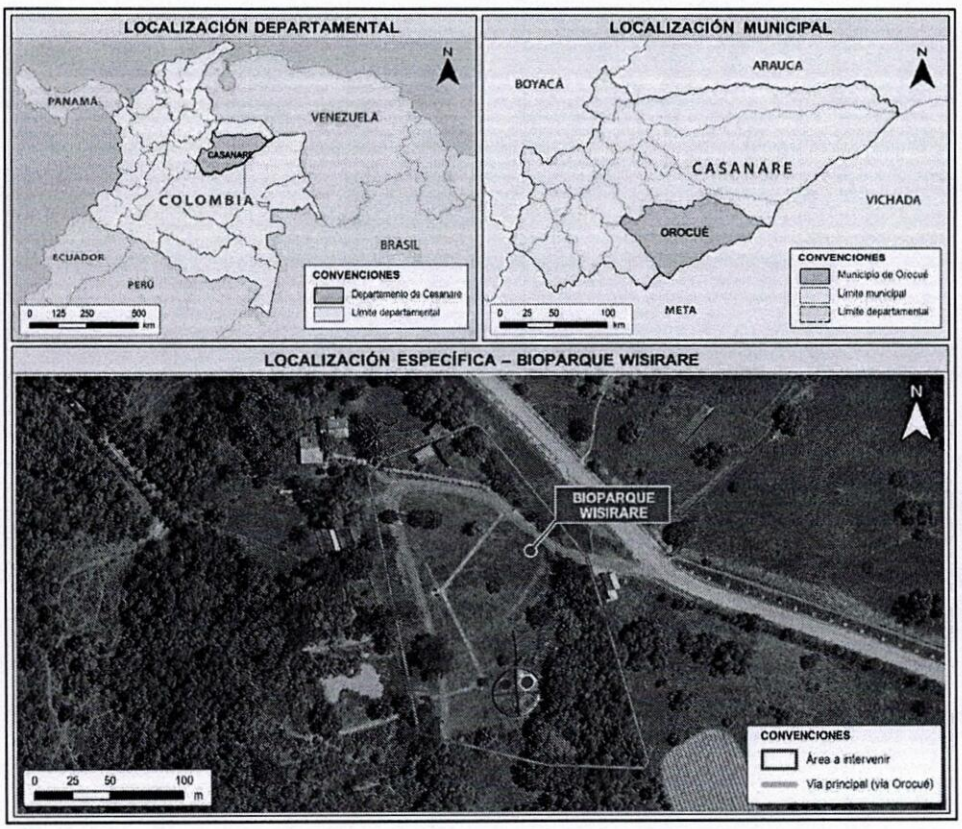

NOMBRE Y FIRMA DEL PROFESIONAL DE APOYO

ARNULFO BOHÓRQUEZ PÁEZ
