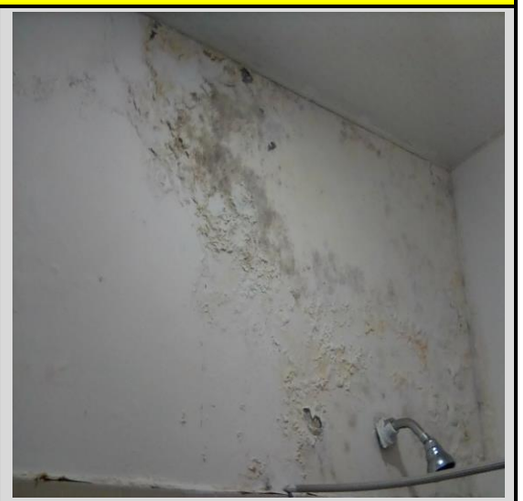
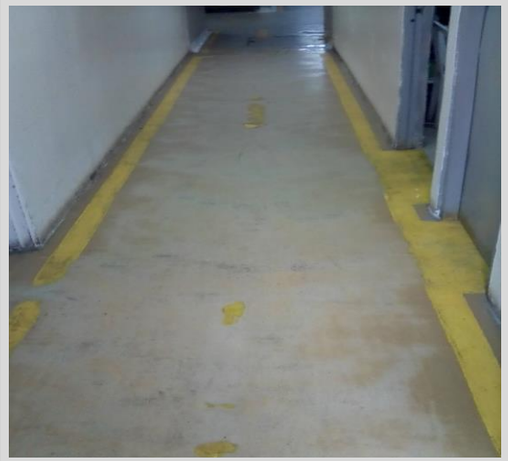
A N E X O N° 4

N°	Unidad de Servicio	Item	Actividad Planeada	DESCRIPCION DEL ITEM PROPUESTA	Registro Fotografico
1		1	Mantenimiento de puerta, cambio y instalacion chapa de seguridad cuarto frio de congelacion	Retiro de chapa existente, suministro e instalacion de chapa de seguridad para cuarto frio de congelacion (incluye mantenimiento,revision, y ajuste de puerta)	
2		2	Mantenimiento de puerta, cambio y instalacion chapa de seguridad cuarto frio de refrigeracion	Retiro de chapa existente, suministro e instalacion de chapa de seguridad para cuarto frio de congelacion (incluye mantenimiento,revision, y ajuste de puerta)	

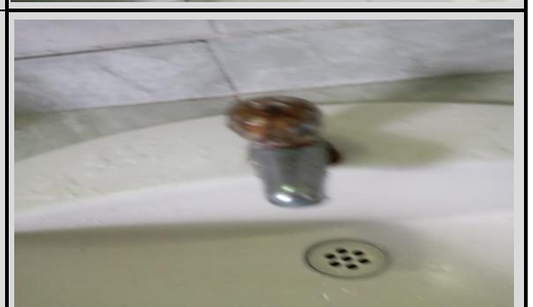
3	COMEDOR No. 2 BASPC-13 (Bogota)	3	Mantenimiento de puerta, cambio y instalacion chapa de seguridad cuarto de conservacion	Retiro de chapa tipo cerrojo existente con suministro e instalacion de cerrojo doble acabado niquelado (llave multipunto) pintura esmalte tipo 1 a dos manos, sobre puerta y/o rejas metalicas, incluye lijado, suavizado de pintura existente y preparacion de superficie	
4		4	Mantenimiento de puerta, cambio y instalacion chapa de seguridad bodega de viveres secos	Retiro de chapa tipo cerrojo existente con suministro e instalacion de cerrojo doble acabado niquelado (llave multipunto), pintura esmalte tipo 1 a dos manos,sobre puerta y/o rejas metalicas, incluye lijado, suavizado de pintura existente y preparacion de superficie	
5		5	Mantenimiento de puerta, cambio y instalacion chapa de seguridad puerta principal ingreso comedor	Retiro de chapa tipo cerrojo existente con suministro e instalacion de cerrojo doble acabado niquelado (llave multipunto)	
6		6	Mantenimiento de puerta, cambio y instalacion chapa de seguridad puerta oficina administrador	Retiro de chapa tipo cerrojo existente con suministro e instalacion de cerrojo doble acabado niquelado (llave multipunto)	

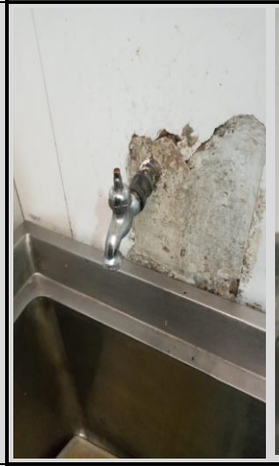
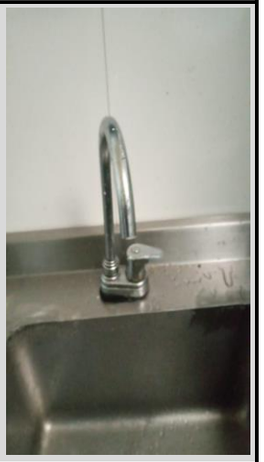
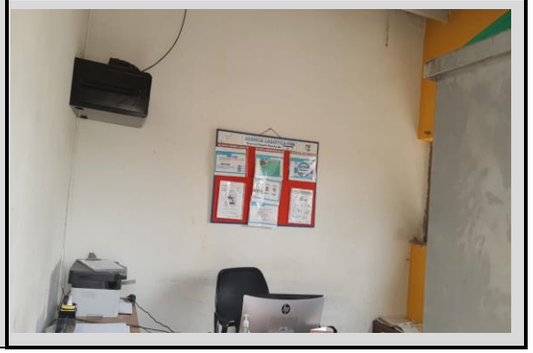
7		7	Instalacion de con sus respectivas chapas de seguridad para Bodega de menaje de la cocina de 1 metro por 2 metros de alto	Retiro de chapa tipo cerrojo existente con suministro e instalacion de cerrojo doble acabado niquelado (llave multipunto)	
8		8	Demarcacion del comedor 50 metros lineales	Suministro e instalacion de pintura demarcacion franja de ancho de 10 a 15 cm, en pintura demarcacion trafico pesado a 2 manos (color por definir)	
9		9	SE INCLUYE ITEM 9	Suministro e instalacion de pintura esmalte tipo 1 a dos manos, sobre puerta y/o rejas metalicas, incluye lijado, suavizado de pintura existente y preparacion de superficie	
	SUBTOTAL COMEDOR No. 2 BASPC-13 (Bogota)				
10		1	Arreglo de humedad de baño y aplicación de pintura por 3 mts de alto por 2 metros de ancho	Correccion de humedad por posible escape de agua en baño incluye demolicion, reparacion de tuberia, resane y rcuperacion de superficies en acabado igual y/o simiilar al existente	

11	COMEDOR No. 3 TEQUENDAMA (Bogota)	2	Mantenimiento puerta oficina administrador, pintura y resane de golpes, instalación de chapa de seguridad.	Retiro de chapa tipo cerrojo existente con suministro e instalacion de cerrojo doble acabado niquelado (llave multipunto)	
12		3	Mantenimieto puerta ingreso comedor, pintura y resane golpes, instalación de chapa de seguridad.	Retiro de chapa existente, suministro e instalacion de chapa de seguridad para cuarto frio de congelacion (incluye mantenimiento,revision, y ajuste de puerta)	

13		4	Demarcación área del comedor pintura amarilla, azul y roja, área 37 metros de largo por 18 metros de ancho.(Pintura Epoxica Para Pisos)	Suministro e instalacion de pintura demarcacion franja de ancho de 10 a 15 cm, en pintura demarcacion trafico pesado a 2 manos (color por definir)	
14		5	SE INCLUYE ITEM 5	Suministro e instalacion de pintura esmalte tipo 1 a dos manos, sobre puerta y/o rejas metalicas, incluye masillado, lijado, suavizado de pintura existente y preparacion de superficie	
	SUBTOTAL COMEDOR No. 3 TEQUENDAMA (Bogota)				
15		1	Resane y Pintura paredes comedor de tropa con Pinturas esmalte al agua	Suministro e instalacion de pintura tipo 1 en esmalte a base de agua a dos manos. (incluye resane y preparacion de superficies)	

16	COMEDOR No. 4 POLICIA MILITAR No. 13 (Bogota)	2	Demarcación total comedor y bodega (Pintura azul-amarilla), Pintura Epoxica Para Pisos	Suministro e instalacion de pintura demarcacion franja de ancho de 10 a 15 cm, en pintura demarcacion trafico pesado a 2 manos (color por definir)	
17		3	Mantenimiento puerta e Instalación chapa de seguridad oficina administrador	Retiro de chapa tipo cerrojo existente con suministro e instalacion de cerrojo doble acabado niquelado (llave multipunto)	
18		4	Mantenimiento e Instalación chapa de seguridad puerta principal comedor	Retiro de chapa tipo cerrojo existente con suministro e instalacion de cerrojo doble acabado niquelado (llave multipunto). Incluye revision y ajuste de cierre de puerta (puerta principal comedor)	

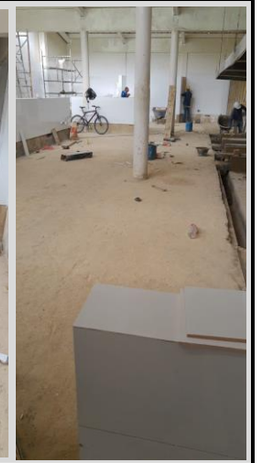
19		5	Mantenimiento puerta e Instalación chapa de seguridad Bodega	Retiro de chapa tipo cerrojo existente con suministro e instalacion de cerrojo doble acabado niquelado (llave multipunto). Incluye revision y ajuste de cierre de puerta (bodega)	
20		6	Mantenimiento puerta y Cambio de chapa baño auxiliares (femeninas)	Retiro de chapa tipo cerrojo existente con suministro e instalacion de cerrojo doble acabado niquelado (llave multipunto). Incluye revision y ajuste de cierre de puerta.(baño auxiliares femeninas)	
	SUBTOTAL COMEDOR No. 4 POLICIA MILITAR No. 13 (Bogota)				
21		1	Pintura puertas y rejas metalicas del rancho(6 puertas y 1 reja)	Suministro e instalacion de pintura esmalte tipo 1 a dos manos, sobre puerta y/o rejas metalicas, incluye masillado, lijado, suavizado de pintura existente y preparacion de superficie.	
22		2	Retiro de dos (2) sanitarios dañados e instalacion de dos (2) Sanitarios nuevos con sus sisterna, instalacion de 2 llaves para lavamanos, un registro de bola de 1 1/4,Dos Bujes de 1 1/4, a 1/2, 6 codos de 1/2, 1 Tubo PVC de 1/2, 6 Adaptadores de 1/2, 4 adaptadores machos de 1 1/4, Cemento, 1/2 bulto. arena amarilla 1 carretillada, 2 metros de enchape 20 x 30; Baños Auxiliares y Soldados	Retiro sanitario dañado, suministro e instalacion de sanitarios nuevo de dos piezas de doble descarga.	
23				Retiro, suministro e instalacion de griferia institucional de mesa tipo push para lavamanos	

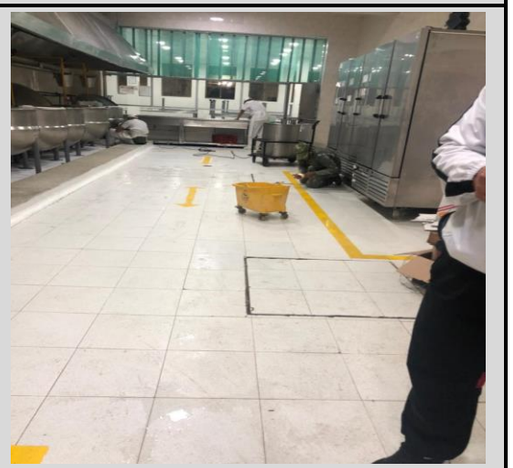
24	COMEDOR No. 6 GUARDIA PRESIDENCIAL (Bogota)			Retiro, suministro e instalacion de registro de bola Ø entre 1" a 1 1/2, con sus respectivos accesorio y tuberia necesarios para el cambio del registro. Incuye demolicion, resane en mortero y resuperacion de superficie en badosin igual y/o similar al existente.	
25		5	Retirar e instalar en la Cocina, 3 Griferias, 1 llave Jardinera	Retiro, suministro e instalacion de grifera para lavaplatos 8" Altura de 28 cms incluye conectores Aireador incorporado para un bajo consumo de agua Cromado resistente al desgaste y la corrosión	 
26		6	Resane y Pintura paredes Oficina administracion y bodega 150 m2 con Pinturas esmalte al agua	Suministro e instalacion de pintura tipo 1 en esmalte a base de agua a dos manos. (incluye resane y preparacion de superficies)	

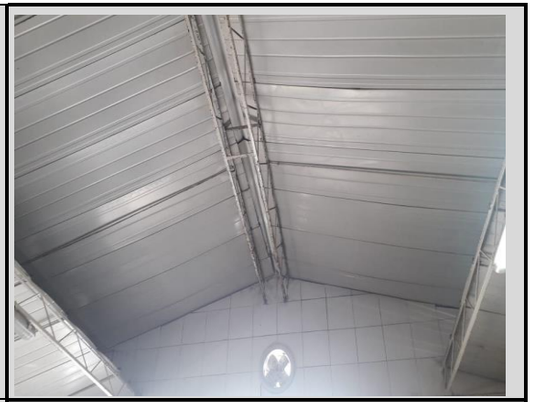
27		7	Demarcacion Total de la Bodega y Rancho Pintura Epoxica Para Pisos color amarillo (220 Metros)	Suministro e instalacion de pintura demarcacion franja de ancho de 10 a 15 cm, en pintura demarcacion trafico pesado a 2 manos (color por definir);	
	SUBTOTAL COMEDOR No. 6 GUARDIA PRESIDENCIAL (Bogota)				
28	COMEDOR No. 7 BATALLÓN DE MANTENIMIENTO (Bogota)	1	Resane de humedad oficina administrador, 3 m2	Correccion de gotera en oficina administrador, area de trabajo 3 m2	
29		2	Pintura oficina del administrador, 3 m X 3 m Pinturas esmalte al agua	Suministro e instalacion de pintura tipo 1 en esmalte a base de agua a dos manos. (incluye resane y preparacion de superficies)	
30		3	Mantenimiento puerta oficina administrador e instalación de chapa de seguridad	Retiro de chapa tipo cerrojo existente con suministro e instalacion de cerrojo doble acabado niquelado (llave multipunto). Incluye revision y ajuste de cierre de puerta. (oficina administrador)	
31		4	Mantenimiento de dos (2) puertas e instalación de chapas de seguridad para la bodega de víveres	Retiro de chapa tipo cerrojo existente con suministro e instalacion de cerrojo doble acabado niquelado (llave multipunto). Incluye revision y ajuste de cierre de puerta (bodega de viveres)	
32		5	Demarcación total comedor y bodega (Pintura azul-amarilla), Pintura Epoxica Para Pisos	Suministro e instalacion de pintura demarcacion franja de ancho de 10 a 15 cm, en pintura demarcacion trafico pesado a 2 manos (color por definir)	

33		6		Suministro e instalacion de pintura esmalte tipo 1 a dos manos, sobre puerta y/o rejas metalicas, incluye masillado, lijado, suavizado de pintura existente y preparacion de superficie.	
	SUBTOTAL COMEDOR No. 7 BATALLÓN DE MANTENIMIENTO (Bogota)				
34		1	Resane, estuco y pintura de paredes 37,8 m2, Pinturas esmalte al agua	Suministro e instalacion de pintura tipo 1 en esmalte a base de agua a dos manos. (incluye resane y preparacion de superficies)	
35		2	Mantenimiento techo, presenta una gotera	gotera en oficina administrador, area de trabajo 3 m2	

36	COMEDOR No. 8 ESCUELA ARTILLERÍA (Bogota)	3	Mantenimiento puerta oficina adaminitrador con Cambio de chapa	Retiro de chapa tipo cerrojo existente con suministro e instalacion de cerrojo doble acabado niquelado (llave multipunto). Incluye revision y ajuste de cierre de puerta. (oficina administrador)	
37		4	Mantenimiento de 2 Lampara con cambio de Tubos Fluorescente T8 32 W 865	Mantenimiento de lampara, incluye limpieza de mueble metalico, cambio de sockets (si se requiere) cambi de balasto(si se requiere) suministro e instalacion de 2 tubos flurescentes T8 32 Watios	
38		5	cambio de 04 tomacorrientes dobles	Retiro suministro e instalacion de tomacorriente doble 110V	

39		6	Mantenimiento y pintura de una (1) puerta y dos (2) ventanas 7m	Suministro e instalacion de pintura esmalte tipo 1 a dos manos, sobre puerta y/o rejas metalicas, incluye masillado, lijado, suavizado de pintura existente y preparacion de superficie.	
40		7	Cambio de un interruptor sencillo	Retiro suministro e instalacion de interruptor sencillo	
41		8	Demarcación total comedor y bodega (Pintura azul-amarilla), Pintura Epoxica Para Pisos	Suministro e instalacion de pintura demarcacion franja de ancho de 10 a 15 cm, en pintura demarcacion trafico pesado a 2 manos (color por definir) en comedor y bodega; actualmente se encuentra en mantenimiento de cambio de piso.	 
	SUBTOTAL COMEDOR No. 8 ESCUELA ARTILLERÍA (Bogota)				

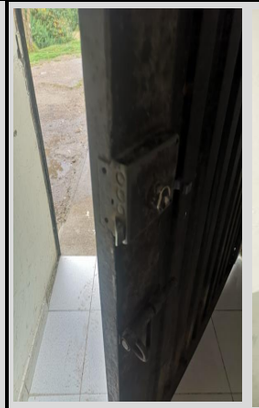
42	COMEDOR No. 10 ESCUELA LOGÍSTICA (Bogota)	1	Compra e instalación de piso para el área de la caldera, 6 X 6	Retiro de baldosin existente, sobrepiso en mortero 1:3, suministro e instalacion de piso baldosa de gres antideslizante formato y diseño por definir, junta antiacida ancho de 10 a 20 mm	
43		2	Demarcación total comedor y bodega (Pintura azul-amarilla), Pintura Epoxica Para Pisos	Suministro e instalacion de pintura demarcacion franja de ancho de 10 a 15 cm, en pintura demarcacion trafico pesado a 2 manos (color por definir) en comedor y bodega	
	SUBTOTAL COMEDOR No. 10 ESCUELA LOGÍSTICA (Bogota)				
44		1	Cambio de 30 mts de cercha en angulo y varilla	Cambio suministro e instalacion de cerca de cubierta en angulo de 1" x 1/8" y varilla No 5	

45	COMEDOR No. 12 CAMAN - MADRID (Cundinamarca)	2	Resane y Pinturas esmalte al agua blanco 110 mts	Suministro e instalacion de pintura tipo 1 en esmalte a base de agua a dos manos. (incluye resane y preparacion de superficies)	
46		3	demarcacion cocina 80 mts, Pintura Epoxica Para Pisos	Suministro e instalacion de pintura demarcacion franja de ancho de 10 a 15 cm, en pintura demarcacion trafico pesado a 2 manos (color por definir) en comedor y bodega	
47		4	Cambio de 4 tomacorrientes	Retiro suministro e instalacion de tomacorriente doble 110V	
	SUBTOTAL COMEDOR No. 12 CAMAN - MADRID (Cundinamarca)				

48		1	Mantenimiento de puerta enrollable que separa la línea de servicio con el área de comedor de los soldados; 6 metros de largo por 4 de alto.	Mantenimiento de puerta cortina enrollable que separa la línea de servicio con el área de comedor de los soldados; 6 metros de largo por 4 de alto.(incluye cambio de pieza dañadas ajuste y verificaciond de cierre)	
49		2	Mantenimiento del granito del cárcamo del área de las marmitas; mide 20 metros lineales.	CARCAMO AREA DE MARMITAS: Retiro de granito existente, sobrepiso en mortero 1:3, suministro e instalacion de granito lavado tamaño de grano por definir	
50		3	Mantenimiento y pintura de paredes de la cocina del comedor; debe ser lavable y resistente al calor; aproximadamente 15 metros cuadrados.	COCINA DE COMEDOR: Suministro e instalacion de pintura tipo 1 en esmalte a base de agua a dos manos. (incluye resane y preparacion de superficies)	

51	COMEDOR No. 13 ESCOM - FACATATIVA (Cundinamarca)	4	Mantenimiento piso área de marmitas y remplazo de algunas baldosas en todo el comedor; aproximadamente 10 metros cuadrados.	PISO AREA DE MARMITAS: mantenimiento de piso, recuperacion de piezas dañadas reemboquillado	
52		5		PISO AREA DE COMEDOR: Remplazo de piezas similares y/o iguales a las existentes	
53		6	Mantenimiento y pintura de ventanas del área total de la cocina; aproximadamente 12 metros lineales.	COCINA: Suministro e instalacion de pintura esmalte tipo 1 a dos manos, sobre puerta y/o rejas metalicas, incluye masillado, lijado, suavizado de pintura existente y preparacion de superficie.	
54		7	Construcción de muro en el área de la línea de servicio para prevenir el ingreso de roedores al área de cocina del comedor; 7 metros de largo por 1 metro de alto, enchapado.	AREA DE SERVICIO: Construccion de muro en bloque de arcilla No 4 pañetado ambas caras, estucado, y acabado final en pintura esmallte a base de agua a dos manos. Altura de muro h= 1 mt	

55		8	demarcacion cocina, Pintura Epoxica Para Pisos	COCINA: Suministro e instalacion de pintura demarcacion franja de ancho de 10 a 15 cm, en pintura demarcacion trafico pesado a 2 manos (color por definir) en comedor y bodega	
	SUBTOTAL COMEDOR No. 13 ESCOM - FACATATIVA (Cundinamarca)				
56	COMEDOR No. 14 BAEEV 13 - UBALÁ (Cundinamarca)	1	Demarcación en la zona de producción, largo 23 metros X 7 metros de ancho	AREA DE PRODUCCION: Suministro e instalacion de pintura demarcacion franja de ancho de 10 a 15 cm, en pintura demarcacion trafico pesado a 2 manos (color por definir) en comedor y bodega	
57		2	Instalación baldosas área lavado de loza.5 m de ancho X 4 m de largo	AREA DE LAVADO: Retiro de baldosin existente, sobrepiso en mortero 1:3, suministro e instalacion de piso baldosa de gres antideslizante formato y diseño por definir.	


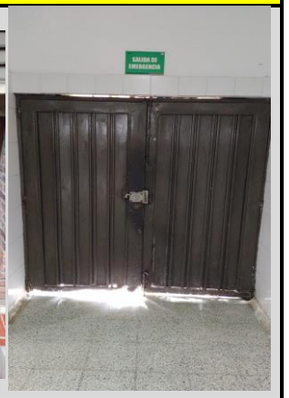
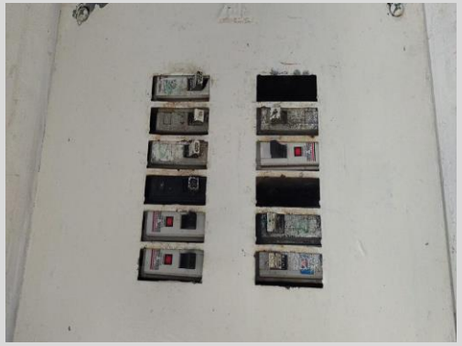
58		3	Cambiar malla en zona de producción y Bodega.30 metros	AREA DE PRODUCCION: Cambio suministro e instalacion de malla eslabonada calibre 10 hueco 2 - 1/4" x 2-1/4"	
	SUBTOTAL COMEDOR No. 14 BAEEV 13 - UBALÁ (Cundinamarca)				
59		1	Demarcación en la zona de producción y bodegas. Largo 35 metros X 15 centimetros de ancho pintura epoxica	AREA DE PRODUCCION Y BODEGAS:Suministro e instalacion de pintura demarcacion franja de ancho de 10 a 15 cm, en pintura demarcacion trafico pesado a 2 manos (color por definir)	
60		2	Pintura puerta entrada principal color CAOBA. 1,60 x 2,10	Suministro e instalacion de pintura esmalte tipo 1 a dos manos, sobre puerta y/o rejas metalicas, incluye masillado, lijado, suavizado de pintura existente y preparacion de superfiicie COLOR CAOBA	 

61	COMEDOR No. 16 BITER AUSTRALIA - USME (BOGOTA)	3	Pintura General interna instalaciones comedor de tropa incluido oficina en color BLANCO pintura en aceite.	Suministro e instalacion de pintura tipo 1 en esmalte a base de agua a dos manos. (incluye resane y preparacion de superficies) comedor de tropa y oficina	 
62		4	Pintura puertas internas bodegas y oficina color blanco (11 puertas)	Suministro e instalacion de pintura esmalte tipo 1 a dos manos, sobre puerta y/o rejas metalicas, incluye masillado, lijado, suavizado de pintura existente y preparacion de superficie	
63		5	Mantenimiento de las lámparas 20 unidades y cambio de 16 tubos luz blanca	Mantenimiento de lampara, incluye limpieza de mueble metalico, cambio de sockets (si se requiere) cambio de balasto(si se requiere) suministro e instalacion de 2 tubos flurescentes T8 32 Watios	

64		6	Cambio lamparas tipo led redonda luz blanca 20 unidades	Retiro suministro e instalacion de panel led redondo 18 watios	
65		7	Cambio chapa para puerta principal 1	Retiro de chapa tipo cerrojo existente con suministro e instalacion de cerrojo doble acabado niquelado (llave multipunto). Incluye revision y ajuste de cierre de puerta. PUERTA PRINCIPAL	
	SUBTOTAL COMEDOR No. 16 BITER AUSTRALIA - USME (BOGOTA)				

66	COMEDOR No. 17 B.A.S.P.C. No 1 TUNJA (BOYACA)	1	Desengrasar tejado comedor 265 m2	Suministro e instalacion de pintura tipo 1 esmalte a dos manos de cara inferior de tejas de cubierta comedor (incluye desengrasado y preparacion de superficie)	
67		2	Desengrasar cerchas 230 ml	Suministro e instalacion de pintura tipo 1 esmalte a dos manos de cerchas de cubierta comedor (incluye desengrasado y preparacion de superficie)	
68		3	Pintura tejado dos manos 265 m2	Suministro e instalacion de pintura tipo 1en esmalte a base de agua a dos manos (incluye resane y preparacion de superficies)	

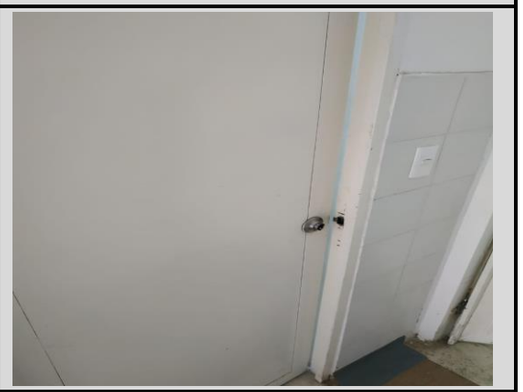
69		4	Pintura sobre estuco dos manos techo 20 m2	Suministro e instalacion de pintura esmalte tipo 1 a dos manos, sobre puerta y/o rejas metalicas, incluye masillado, lijado, suavizado de pintura existente y preparacion de superficie	
	SUBTOTAL COMEDOR No. 17 B.A.S.P.C. No 1 TUNJA (BOYACA)				
70	COMEDOR No. 18 GMSIL - DUITAMA (BOYACA)	1	Resane de 20 mts de paredes	Suministro e instalacion de pintura tipo 1 en esmalte a base de agua a dos manos. (incluye resane y preparacion de superficies)	
71		2	demarcacion cocina con pintura epóxica 33 mts	Suministro e instalacion de pintura demarcacion franja de ancho de 10 a 15 cm, en pintura demarcacion trafico pesado a 2 manos (color por definir)	

72		3	pintura al interior de la cocina 50 mts	Suministro e instalacion pinura acrilica interior a dos manos (incluye resane y preparacion de superficiie) color por definir en la obra	
	SUBTOTAL COMEDOR No. 18 GMSIL -DUITAMA (BOYACA)				
73		1	Mantenimiento y cambio de puerta entrada principal al comedor presenta deterioro por tiempo de uso incluyendo la chapa.	PUERTA ENTRADA COMEDOR PRINCIPAL: Retiro suministro e instalacion de puerta en lamina calibre 18 con suministro e instalacion de cerrojo doble acabado niquelado (llave multipunto).	 
74		2	Mantenimiento de 18 tacos en las cajas de control de energía, los que tiene son de 20 amperios y se requieren de 40 amperios para que soporte la carga de energía y no se salten	Mantenimiento revision y ajuste de tablero de tacos	

75				Retiro suministro e instalacion de taco 1 polo entre 20 a 50 amp	
76	COMEDOR No. 19 TARQUI - SOGAMOSO (BOYACA)	3	Mantenimiento de 6 tomacorriente de 110 voltios	Retiro suministro e instalacion de tomacorriente doble 110V	
77		4	Mantenimiento de 3 tomacorriente de 220 voltios.	Retiro suministro e instalacion de tomacorriente doble 220V	

78		5	Mantenimiento de la malla para protección contra invasores en el área de cocina. 10 m	AREA DE COCINA: Cambio suministro e instalacion de malla eslabonada calibre 10 hueco 2 - 1/4" x 2-1/4"	
79		6	Mantenimiento de 4 lámparas en el área de cocina	Mantenimiento de lampara, incluye limpieza de mueble metalico, cambio de sockets (si se requiere) cambi de balasto(si se requiere) suministro e instalacion de 2 tubos flurescentes T8 32 Watios	
80		7	Mantenimiento de la línea de servicio específicamente remachado de las piezas sueltas	Area de servicio: suministro e instalacion de remache pop en lamina metalica	
	SUBTOTAL COMEDOR No. 19 TARQUI - SOGAMOSO (BOYACA)				
81		1	Resanar y pintar oficina administrador 14.5 m2	OFICINA ADMINISTRADOR: Suministro e instalacion de pintura tipo 1 vinilo interior a dos manos. (incluye resane y preparacion de superficies)	

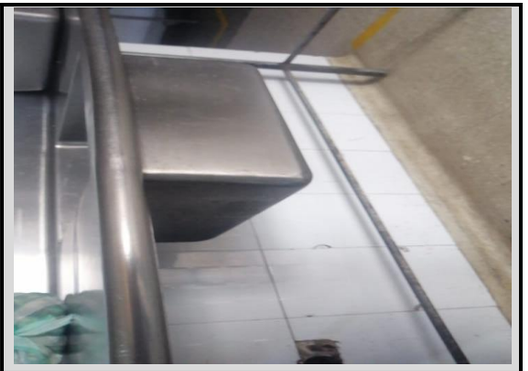
82	COMEDOR No. 20 BISUC - CHIQUINQUIRÁ (BOYACA)	2	:cambio de tubos de lamparas T12 (1.20 cm) 28 unidades	Suministro e instalacion de tubos flurescentes T12 39 watios	
83		3	Resane y pintura area de cocina 12.6 m2	AREA DE COCINA: Suministro e instalacion de pintura tipo 1 en esmalte a base de agua a dos manos. (incluye resane y preparacion de superficies)	
	SUBTOTAL OMEDOR No. 20 BISUC - CHIQUINQUIRÁ (BOYACA)				
84		1	Resane y pintura de paredes oficina administrador	OFICINA ADMINISTRADOR: Suministro e instalacion de pintura tipo 1 vinilo interior a dos manos. (incluye resane y preparacion de superficies)	

85		2	Ajuste, soldadura, pintura puerta ingreso oficina administrador	Retiro de chapa tipo cerrojo existente con suministro e instalacion de cerrojo doble acabado niquelado (llave multipunto). Incluye revision, SOLDLADURA y ajuste de cierre de puerta. (oficina administrador)	
86		3	instalacion chapa oficina de administrador		

87	COMEDOR No. 23 BATALLÓN DE SANIDAD (BOGOTA)	4	resane y pintura paredes area de cocina	AREA COCINA Y DE SERVICIO: : Suministro e instalacion de pintura tipo 1 en esmalte a base de agua a dos manos. (incluye resane y preparacion de superficies)	
88		5	ajuste y pintura de puerta area de cocina	AREA DE ALMACENAMIENTO: Suministro e instalacion de pintura tipo 1 vinilo interior a dos manos. (incluye resane y preparacion de superficies)	

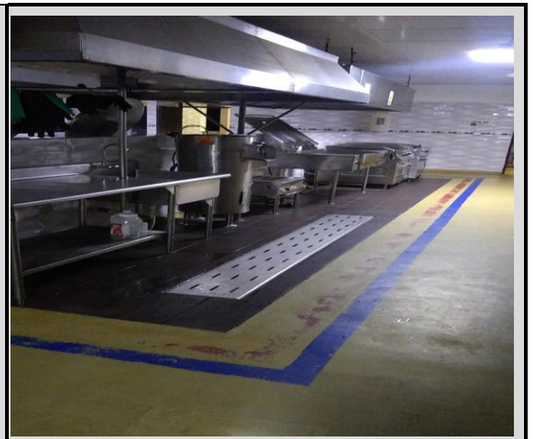
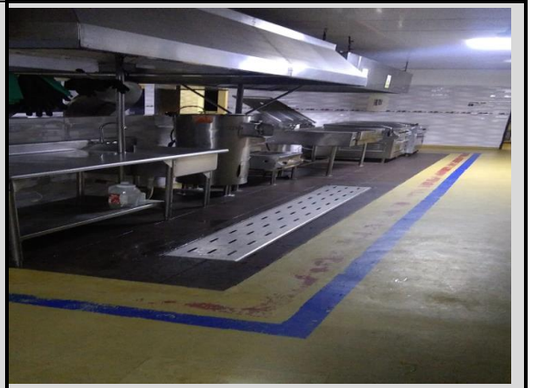
89		6	instalacion de chapa puerta de acceso linea de servicio	PUERTA COCINA Y PUERTA AREA ALMACENAMIENTO: Suministro e instalacion de pintura esmalte tipo 1 a dos manos, sobre puerta y/o rejas metalicas, incluye masillado, lijado, suavizado de pintura existente y preparacion de superficie.	
90		7	pintura demarcacion area de cocina	Suministro e instalacion de pintura demarcacion franja de ancho de 10 a 15 cm, en pintura demarcacion trafico pesado a 2 manos (color por definir)	
91		8	resane y pintura de paredes area de linea de servicio	PUERTA ACCESO LINEA DE SERVICIO: Retiro de chapa tipo cerrojo existente con suministro e instalacion de cerrojo doble acabado niquelado (llave multipunto). Incluye revision, y ajuste de cierre de puerta.	

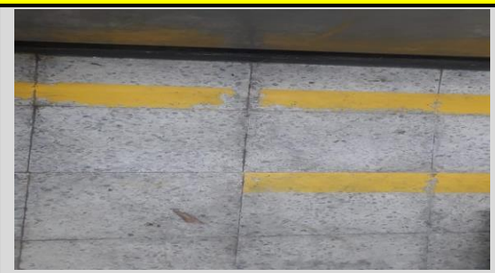
92		9	ajuste y pintura de la puerta area linea de servcio	PUERTA AREA DE ALMACENAMIENTO: Retiro de chapa tipo cerrojo existente con suministro e instalacion de cerrojo doble acabado niquelado (llave multipunto). Incluye revision, y ajuste de cierre de puerta.	
	SUBTOTAL COMEDOR No. 23 BATALLÓN DE SANIDAD (BOGOTA)				
93		1	Mantenimiento de las puertas entrada al comedor de tropa, las dos (2) bodegas y de la Oficina, presentan deterioro por tiempo de uso; con cambio de chapas	PUERTA ENTRADA A COMEDOR, BODEGAS Y OFICINA: Retiro de chapa tipo cerrojo existente con suministro e instalacion de cerrojo doble acabado niquelado (llave multipunto). Incluye revision, y ajuste de cierre de puerta.	

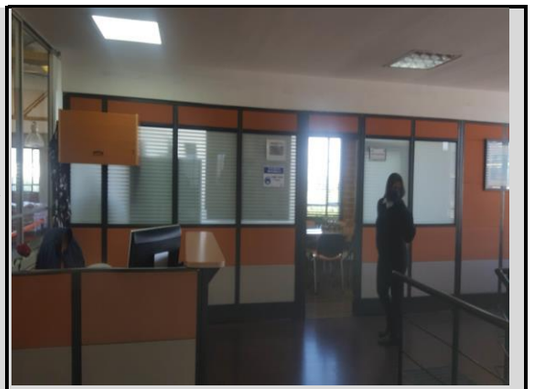
94		2	Mantenimiento e instalacion tuberia del Lavaplatos con cambio de griferia	Sondeo de tuberia desague de lavaplatos	
95				Retiro, suministro e instalacion de grifera para lavaplatos 8" Altura de 28 cms incluye conectores Aireador incorporado para un bajo consumo de agua, cromado resistente al desgaste y la corrosión.	
96		3	Mantenimiento de tomacorriente de 110 voltios	Retiro suministro e instalacion de tomacorriente doble 110V	

97	COMEDOR No. 25 SAMACA (BOYACA)	4	Mantenimiento de interruptor de encendido de lampara	Retiro suministro e instalacion de interruptor sencillo	
98		6	Arreglo y adecuacion de la poceta de lavado de traperos	Poceta lavado traperos: Retiro de enchape, pañete dosificacion 1:3 suministro e instalacion de ceramica (formato y color por definir) incluye filos, esquinero en aluminio y rejilla sifon ente 2" a 4"	
99		7	Mantenimiento de la línea de servicio específicamente remache de las piezas sueltas y conecion de la tubería de gas	Linea de servicio y meson acero inoxidable: suministro e instalacion de remache pop en lamina metalica	

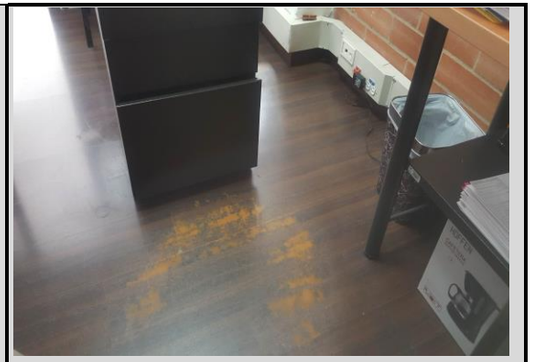
100		8	Pintura de trafico pesado para demarcación piso	Suministro e instalacion de pintura demarcacion franja de ancho de 10 a 15 cm, en pintura demarcacion trafico pesado a 2 manos (color por definir)	
	SUBTOTAL COMEDOR No. 25 SAMACA (BOYACA)				
101		1	Demarcacion pintura epoxica corlor amarillo 20 metros area de cocina marmitas y estufas industriales	Suministro e instalacion de pintura demarcacion franja de ancho de 10 a 15 cm, en pintura demarcacion trafico pesado a 2 manos (diferentes colores a aplicar según la ubicación, por definir en obra)	
102		2	Demarcacion pintura epoxica corlor azul 20 metros area de cocina marmitas y estufas industriales	COCINA, PAREDES PASILLOS, FRENTES COMEDOR DE TROPA: Suministro e instalacion de pintura tipo 1 en esmalte a base de agua a dos manos. (incluye resane y preparacion de superficies) color blanco almendra	

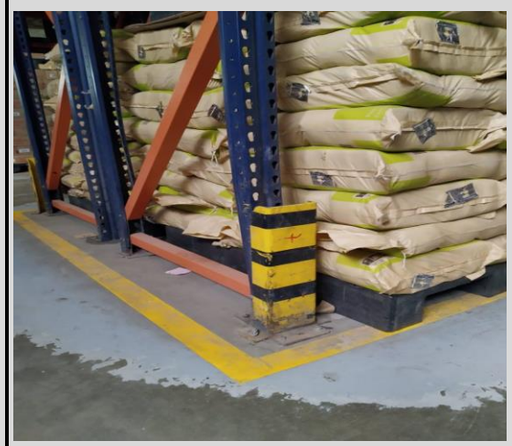
103	COMEDOR No. 26 GAORI - MARANDUA VICHADA	3	Demarcacion pintura epoxica corlor rojo 20 metros area de cocina marmitas y estufas industriales	Resane y acabado con pegacor, estuco plastico y tabletas 40 metros para la oficina problemas de humedad	
104		4	Demarcacion pintura epoxica corlor amarillo 15 metros area de calderas	Sondeo de tuberia de desague diametro de 2" a 3", retiro suministro e instalacion de rejilla en aluminio para Sifón de 3" con sosco de 2" pulgadas	
105		5	Demarcacion pintura epoxica corlor azul 15 metros area de calderas	Suministro de empaque diametro 1 1/2"	

106		6	Mantenimiento Puerta entrada al area de la bodega	Retiro de chapa tipo cerrojo existente con suministro e instalacion de cerrojo doble acabado niquelado (llave multipunto). Incluye revision, y ajuste de cierre de puerta.	
	SUBTOTAL COMEDOR No. 26 GAORI - MARANDUA VICHADA				
107	COMEDOR No. 27 CATAM (BOGOTA)		Remosion y instalacion Baldosa de trafico pesado para la bodega 150 m2	Retiro de baldosin existente, sobrepiso en mortero 1:3, suministro e instalacion de piso baldosa trafico pesado	 
	SUBTOTAL COMEDOR No. 27 CATAM (BOGOTA)				

108			Correr pared oficina de la Direcion de la Regional largo 8,20 m; altura 2,53 m; traslado Drywall 35 cm ancho y 8,20 mts	DIRECCION REGIONAL: Reubicacion de division modular piso techo en aluminio con paneles en madera forrados, h= altura 2,53 mts, incluye trabajo de Drywall en un area de 35 cm ancho x 8,20 mts.	
109			ampliacion en 2.5 m2 oficina del area financiera y reubicacion puestos de trabajo (2.50 largo X 2.10 ancho y 2.20 de alto)	Ampliacion en 2.5 m2 oficina del area financiera y reubicacion puestos de trabajo (2.50 largo X 2.10 ancho y 2.20 de alto), incluye reubicacion de division modular piso techo en aluminio con paneles en madera forrados	
110			Pintura salon lanceros y area cafeteria 140 m2	PINTURA SALON LANCEROS Y AREA CAFETERIA: Suministro e instalacion en muros y techo de pintura vinilo tipo 1 a dos manos (incluye resanes, filos, y preparacion de superficies)	 

111	Instalaciones Cede Administrativa Cota (CUNDINAMARCA)		Cambio de 10 lamparas de Tubo Fluorescente por lámparas led para techo	Retiro de lampara 60 x 60 suministro e instalacion de panel led 60 x 60	
112			cambio de 3 toma corrientes	Retiro, suministro e instalacion de tomacorriente 110 v	 
113			Mantenimeto puerta y cambio de chapa oficina de SST	Retiro de chapa tipo cerrojo existente con suministro e instalacion de cerrojo doble acabado niquelado (llave multipunto). Incluye revision, y ajuste de cierre de puerta. (oficina SST)	

114			Reemplazo de piso laminado en mal estado oficina Direccion 6 mts	Reemplazo de piso laminado en mal estado oficina Direccion 6 mts	
	Instalaciones Cede Administrativa Cota (CUNDINAMARCA)				
115		1	Resane pintura oficina y bodega 35 m2	OFICINA Y BODEGA: Suministro e instalacion en muros y techo de pintura vinilo tipo 1 a dos manos (incluye resanes, filos, y preparacion de superficies)	
116		2	Mantenimieto puerta ingreso bodega	PUERTA INGRESO A BODEGA:Revision y ajsute puerta metalica dimensiones (2 x 1) mts.	

117	CAD Cota (CUNDINAMARCA)	3	Mantenimiento portones ingreso CAD (oxidados)	Portones ingreso CAD (oxidados): Mantenimiento consistente en lijado de superficies oxidadas, suministro e instalacion de anticorrosivo en area oxidada y suministro e instalacion de esmalte tipo 1 a dos manos	 
118		4	Suministra e instalacion persiana en politileno de 4mts de ancho por 20 mts de largo	Suministro e instalacion de cortina tipo cuarto frio para porton de cargue y descargue de bodegas tiras de 20 cm de ancho traslapadas 5 cm en ambos lados en material resistente a los rayos solares , fijacion a viga en parte superior con platina metalica de 1 1/2" x 1/8" . Altura de porton 5 ml x 4 ml de ancho	
119		5	mantenimiento 15 protectores de estanteria	Mantenimiento 15 protectores de estanteria	

120		6	Cambio de parales en mal estado estanteria (10 und)	Cambio de parales en mal estado estanteria (10 und)	
121		7	Demarcacion piso bodega 20 metros lineales	Suministro e instalacion de pintura demarcacion franja de ancho de 10 a 15 cm, en pintura demarcacion trafico pesado a 2 manos.	
	SUBTOTAL CAD Cota (CUNDINAMARCA)				
