SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE – SENA

SEDES GUAJIRA

Contrato de Interventoría No. CO1.PCCNTR.1636309.

"Realizar la interventoría técnica, administrativa, financiera, jurídica, contable y ambiental, para el mantenimiento predictivo, preventivo, correctivo, reparaciones y mejoras locativas a las instalaciones del servicio nacional de aprendizaje SENA a Nivel Nacional, mediante el sistema de precios unitarios fijos, sin fórmula de reajuste y a monto agotable".



INFORME MENSUAL No. 06

PERÍODO: 12 DE ENERO DE 2021 AL 11 DE FEBRERO DE 2021

ELABORÓ: Firma:	APROBÓ: Firma:
Nombre: Ing. Soraya Navarro Bolaño	Nombre: Ing. Pedro Gutiérrez Bustillo
Cargo: Residente de Interventoría	Cargo: Director de interventoría

TABLA DE CONTENIDO

1. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 5

1.1. DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD QUE SE PRETENDE SATISFACER CON LA CONTRATACIÓN: 5
1.2. OBJETO A CONTRATAR 6
1.3. CONTRATO DE OBRA No. CO1.PCCNTR. 1552323 DE 2020 7
1.4. LOCALIZACIÓN 7

2. INFORMACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA 9

2.1. FORMA DE PAGO 10
2.2. ANTICIPO DE OBRA 10
2.3. ESTADO LEGAL DEL CONTRATO DE OBRA 10
2.4. ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL PERIODO 11
2.4.1 ACTIVIDADES EJECUTADAS POR EL CONTRATISTA CONSORCIO CONSTRUCTOR ALFA 11
2.5. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO DE OBRA 11
2.5.1. SEDE COMERCIO Y SERVICIO – RIOHACHA: 12
2.5.2. CENTRO INDUSTRIAL Y DE ENERGÍAS ALTERNATIVAS - MAICAO: 12
2.5.3. CENTRO INDUSTRIAL Y DE ENERGÍAS ALTERNATIVAS - RIOHACHA: 12
2.5.4. CENTRO AGRO EMPRESARIAL Y ACUÍCOLA - FONSECA: 13
2.6. PERSONAL DEL CONTRATISTA 14
2.7. EQUIPOS DEL CONTRATISTA. 14
2.8. ESTADO DEL TIEMPO 14

3. CONTRATO DE INTERVENTORÍA 16

3.1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA 16
3.2. FORMA DE PAGO 16
3.3. ESTADO LEGAL DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA 17
3.4. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA 17
3.5. PERSONAL DE LA INTERVENTORÍA 18
3.6. EQUIPOS DE LA INTERVENTORÍA 18
3.7. RESUMEN ACTAS DE SEGUIMIENTO DEL CONTRATO 19
3.8. PLAN DE INVERSIÓN DE ANTICIPO DE LA INTERVENTORÍA 19
3.9. ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR LA INTERVENTORÍA 19
3.10. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN A LOS ENSAYOS DE LABORATORIO 20

4. RELACIÓN DE CORRESPONDENCIA 20

5. VALOR TOTAL DEL PROYECTO OBSERVACIONES 20

6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 21

6.1 CONCLUSIONES: 21
6.2 RECOMENDACIONES: 23

LISTA DE GRÁFICOS:

Grafica 1. Localización de la zona del proyecto 7
Grafica 2. Localización geográfica del proyecto CENTRO AGRO EMPRESARIAL Y ACUÍCOLA - FONSECA 7
Grafica 3. Localización geográfica del proyecto CENTRO INDUSTRIAL Y ENERGÍAS ALTERNATIVAS - MAICAO 8
Grafica 4. Localización geográfica del proyecto SEDE COMERCIO Y SERVICIO - RIOHACHA 8

Grafica 5. Localización geográfica del proyecto CENTRO INDUSTRIAL Y ENERGÍAS ALTERNATIVAS - RIOHACHA 8

LISTA DE TABLAS:

Tabla 1. Información general del Contrato de Obra CO1.PCCNTR. 1552323 de 2020 9
Tabla 2. Estado legal del Contrato de Obra CO1.PCCNTR. 1552323 de 2020 11
Tabla 3. Control financiero contratista Sede Comercio y Servicio - Riohacha 12
Tabla 4. Control financiero contratista Centro Industrial y de Energías Alternativas - Maicao ...12
Tabla 5. Control financiero contratista Centro Industrial y de Energías Alternativas - Riohacha 12
Tabla 6. Control financiero contratista Centro Agro empresarial y Acuícola – Fonseca.....13
Tabla 7 Control financiero Contratista.....13
Tabla 8. Relación del personal Contrato 14
Tabla 9. Información general del contrato de interventoría 16
Tabla 10. Estado legal del Contrato de Interventoría No. CO1.PCCNTR.1636309 de 2020 17
Tabla 11 Control financiero Interventoría 18
Tabla 12. Relación del personal de Interventoría 18
Tabla 13. Relación de equipos del interventor 18
Tabla 14 Presupuesto sedes Atlántico.....21

ANEXOS:

Anexo No. 01: Control Financiero Contratista.
Anexo No. 02: Control Personal Contratista.
Anexo No. 03: Control Maquinaria y equipos Contratista.
Anexo No. 04: Certificados de calibración y mantenimiento de equipos.
Anexo No. 05: Control e inspección de ensayos.
Anexo No. 06: Control general del estado del tiempo.
Anexo No. 07: Control Financiero Interventoría.
Anexo No. 08: Control Personal Interventoría.
Anexo No. 09: Planilla de afiliaciones personal Interventoría.
Anexo No. 10: Control Maquinaria y equipos Interventoría.
Anexo No. 11: Actas de seguimiento del Contrato.
Anexo No. 12: Relación de correspondencia.
Anexo No. 13: Informes semanales.
Anexo No. 14: Registro fotográfico.
Anexo No. 15: Bitácora de Obra.
Anexo No. 16: Programación actualizada

INTRODUCCIÓN

En cumplimiento del Contrato de Interventoría No. CO1.PCCNTR.1636309, CONSORCIO INTER INGECO - GNG, presenta al Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA, el Informe Mensual de Interventoría No. 6, cuyo principal objetivo es informar a la entidad sobre el avance del contrato de obra en cuanto al desarrollo técnico, administrativo, financiero, social y jurídico, así como las acciones de seguimiento y control sobre las actividades del siguiente contrato:

- Contrato de Obra CO1.PCCNTR. 1552323, el cual fue adjudicado a la empresa CONSORCIO CONSTRUCTOR ALFA, y cuyo objeto es*: “MANTENIMIENTO PREDICTIVO, PREVENTIVO, CORRECTIVO, REPARACIONES Y MEJORAS LOCATIVAS A LAS INSTALACIONES DEL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA A NIVEL NACIONAL, MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE.”,* Contrato suscrito el 15 de mayo de 2020 y con Acta de inicio suscrita el 21 de agosto de 2020.

En el contenido del presente informe se detallan las actividades desarrolladas por el Contratista y la Interventoría durante el periodo comprendido entre el 12 de enero de 2021 y el 11 de febrero de 201 correspondiente al sexto mes de ejecución del Contrato de Interventoría.

En este informe se presentan los procedimientos y acciones realizadas para asegurar, controlar y vigilar el desarrollo idóneo del Contrato en el ámbito técnico, administrativo, financiero, social, ambiental, contable y jurídico con el fin de garantizar la calidad de las obras a ejecutar. De la misma manera, tiene el objeto de garantizar el cumplimiento de las normas técnicas ambientales y de seguridad industrial exigidas por la Entidad y la legislación vigente.

El contrato fue adjudicado el 16 de junio de 2020 tras un proceso de concurso de méritos CM-DG-0001-2020 para el LOTE No. 1 al **CONSORCIO INTER INGECO -GNG por la suma de SEISCIENTOS NOVENTA Y UN MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS PESOS M/CTE ($691.547.900)** incluido IVA y demás erogaciones que correspondan.

1. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

1.1. DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD QUE SE PRETENDE SATISFACER CON LA CONTRATACIÓN:

El Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, es un establecimiento público del orden nacional, con personería jurídica, patrimonio propio e independiente, y autonomía administrativa; adscrito al Ministerio del Trabajo de Colombia, facultada por el Estado para invertir en el desarrollo social y técnico de los trabajadores colombianos, ofreciendo y ejecutando la formación profesional integral, para la incorporación y el desarrollo de las personas en actividades productivas que contribuyan al desarrollo social, económico y tecnológico del país.

En la actualidad, el Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), cuenta con 33 regionales y 117 centros de formación, que prestan un servicio permanente a la comunidad. Estos inmuebles tienen en su mayoría entre 35 y 70 años de antigüedad, que sumada al tipo de uso que tienen (educativo), genera que presenten un grado de deterioro considerable, razón por la cual es necesario mantener las instalaciones en óptimas condiciones físicas desde el punto de vista operativo y funcional, siendo requerido contratar el **MANTENIMIENTO PREDICTIVO, PREVENTIVO, CORRECTIVO, REPARACIONES Y MEJORAS LOCATIVAS A LAS INSTALACIONES DEL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA A NIVEL NACIONAL, MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE.**

En consideración a lo expuesto, la Dirección General del SENA celebró con el Consorcio Constructor ALFA, el Contrato No. CO1.PCCNTR. 1552323 suscrito el 15 de mayo de 2020, para las intervenciones del Lote 1, correspondiente a los Departamentos de Magdalena, Guajira, Atlántico, Cesar, Córdoba, Sucre, Bolívar, San Andrés y Providencia.

A partir del análisis del Diagnóstico Integral de la infraestructura de las Regionales y Centros de Formación del Sena, se deben realizar mantenimientos como son: impermeabilizaciones, sistemas eléctricos, jardinería, equipos de bombeo, lavado de tanques, sistemas contraincendios, fumigación, aires acondicionados, mantenimientos generales, mantenimientos hidrosanitarios, entre otros. Los mantenimientos a realizar están categorizados como recurrentes, preventivos, correctivos y predictivos y su periodicidad depende del tipo de intervención que se realice.

El Servicio Nacional de Aprendizaje SENA estableció el uso del Manual de Mantenimiento, como una guía práctica para realizar con eficiencia las labores requeridas para el uso, conservación y mantenimiento de los predios, edificios e instalaciones que integran las diferentes sedes a nivel nacional, necesarias para mejorar y conservar los aspectos importantes de los establecimientos, tales como: funcionalidad, seguridad, productividad, confort, imagen institucional, salubridad e higiene. Adicionalmente, le permitirán a la Entidad, reducir costos mayores, en atención

a que un mantenimiento preventivo adecuado retrasa la inversión en mantenimiento correctivo.

1.2. OBJETO A CONTRATAR

Realizar obras de MANTENIMIENTO PREDICTIVO, PREVENTIVO, CORRECTIVO, REPARACIONES Y MEJORAS LOCATIVAS A LAS INSTALACIONES DEL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA A NIVEL NACIONAL, MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE en los Departamentos de Magdalena, Guajira, Atlántico, Cesar, Córdoba, Sucre, Bolívar, San Andrés y Providencia.

Las especificaciones y requerimientos de orden técnico que definen el alcance del objeto contractual, se encuentran desarrolladas en el Manual de Mantenimiento del SENA, el listado de unitarios y requisitos habilitantes y/o ponderables que derivan en obligaciones a cargo del contratista.

1.3. CONTRATO DE OBRA No. CO1.PCCNTR. 1552323 de 2020

El objeto “REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREDICTIVO, PREVENTIVO, CORRECTIVO, REPARACIONES Y MEJORAS LOCATIVAS A LAS INSTALACIONES DEL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA A NIVEL NACIONAL, MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE”

1.4. LOCALIZACIÓN

Las obras a ejecutar se encuentran ubicadas en el Departamento de la Guajira, en los Municipios de Riohacha (CENTRO INDUSTRIAL Y ENERGÍAS ALTERNATIVAS Kilómetro 5 troncal del Caribe Riohacha – Maicao), Riohacha (SEDE COMERCIO Y SERVICIO Cra 15 No 19 – 40), Maicao (CENTRO INDUSTRIAL Y ENERGÍAS ALTERNATIVAS Kra 42 y 45 troncal del Caribe) y Fonseca (CENTRO AGRO EMPRESARIAL Y ACUÍCOLA Kilómetro 1 vía Fonseca – Barrancas).



Grafica 1. Localización de la zona del proyecto



Grafica 2. Localización geográfica del proyecto CENTRO AGRO EMPRESARIAL Y ACUÍCOLA - FONSECA



Grafica 3. Localización geográfica del proyecto CENTRO INDUSTRIAL Y ENERGÍAS ALTERNATIVAS - MAICAO



Grafica 4. Localización geográfica del proyecto SEDE COMERCIO Y SERVICIO - RIOHACHA



Grafica 5. Localización geográfica del proyecto CENTRO INDUSTRIAL Y ENERGÍAS ALTERNATIVAS - RIOHACHA

2. INFORMACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA

En la siguiente tabla se encuentra la información general del Contrato de Obra No. CO1.PCCNTR. 1552323 DE 2020

Tabla 1. Información general del Contrato de Obra CO1.PCCNTR. 1552323 de 2020

CONTRATISTA:	CONSORCIO CONSTRUCTOR ALFA
CONTRATO No:	CO1.PCCNTR. 1552323 DE 2020
CONTRATANTE:	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE – SENA
OBJETO:	MANTENIMIENTO PREDICTIVO, PREVENTIVO, CORRECTIVO, REPARACIONES Y MEJORAS LOCATIVAS A LAS INSTALACIONES DEL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA A NIVEL NACIONAL, MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE
LOCALIZACIÓN:	Riohacha (CENTRO INDUSTRIAL Y ENERGÍAS ALTERNATIVAS Kilómetro 5 troncal del Caribe Riohacha – Maicao), Riohacha (SEDE COMERCIO Y SERVICIO Cra 15 No 19 – 40), Maicao (CENTRO INDUSTRIAL Y ENERGÍAS ALTERNATIVAS Kra 42 y 45 troncal del Caribe) y Fonseca (CENTRO AGRO EMPRESARIAL Y ACUÍCOLA Kilómetro 1 vía Fonseca – Barrancas)
VALOR DEL CONTRATO:	OCHO MIL SETECIENTOS SETENTA Y SIETE MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS M/CTE ($ 8.777.298.757), incluido AU, costos directos e indirectos, gastos, IVA sobre la utilidad y demás erogaciones en que deba incurrir el contratista para la adecuada ejecución del objeto contractual.
VALOR ADICIÓN No. 01	QUINIENTOS UN MILLONES NOVECIENTOS VEINTICINCO MIL CUATROCIENTOS VEINTISÉIS $ 501.925.456
VALOR DEL ANTICIPO:	NO APLICA – SIN ANTICIPO
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	NUEVE MIL DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE MILLONES DOSCIENTOS VEINTICUATRO MIL DOSCIENTO TRECE $ 9.279.224.213
FECHA DE INICIO:	21 DE AGOSTO DE 2020
DURACIÓN O PLAZO INICIAL:	01 DICIEMBRE DE 2020
PRORROGA No. 01:	30 DÍAS
PRÓRROGA No. 02	3 MESES
FECHA DE TERMINACIÓN:	31 DE MARZO DE 2021

2.1. FORMA DE PAGO

El Servicio Nacional de Aprendizaje SENA se compromete a pagar el valor del contrato subordinado a las apropiaciones que del mismo se hagan del presupuesto, de acuerdo a actas de avance de obra, hasta el 100% del valor efectivamente recibido a satisfacción, de la siguiente manera:

1. **PAGOS PARCIALES**: El Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, pagará al contratista el valor del contrato acuerdo programación del PAC (Plan Anual de Caja) autorizado por el Ministerio de Hacienda y Crédito Publico mensualmente a la Institución, en la cuenta que para los efectos acredite el Contratista, conforme el avance de obra efectivamente recibido a satisfacción por parte de la Interventoría del Contrato, sin que los mismos superen el noventa por ciento (90%), dentro de los treinta (30) días siguientes a la radicación de la documentación en forma y al cumplimiento de los trámites administrativos que correspondan, así:

   El contratista facturará mensualmente el porcentaje de la obra ejecutada en el respectivo periodo, soportado en las actas de recibo parcial de obra ejecutada, revisada, aceptada y recibida a entera satisfacción por la interventoría.

2. **UN ÚLTIMO PAGO**: Correspondiente al diez (10%) final de las actividades de obra efectivamente recibidas a satisfacción por parte de la interventoría del contrato, acuerdo programación del PAC (Plan Anual de Caja) autorizado por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, en la cuenta que para los efectos acredite el Contratista, dentro de los treinta (30) días siguientes a la radicación de la documentación en debida forma.

2.2. ANTICIPO DE OBRA

El contrato de obra CO1.PCCNTR. 1552323 DE 2020no contempla disposición de anticipo por ningún concepto.

2.3. ESTADO LEGAL DEL CONTRATO DE OBRA

A fecha de corte del presente informe el contrato se encuentra vigente en cumplimiento de su sexto mes de ejecución.

A partir del 21 de agosto de 2020 fecha en la cual se suscribió el acta de inicio se da inicio al contrato una vez que el contratista presenta la documentación inicial y ésta es aprobada por interventoría conforme a las condiciones establecidas en el contrato y en el pliego de condiciones.

A continuación, se relacionan las garantías actualizadas según el nuevo plazo contractual de acuerdo a la prorroga No. 2

Tabla 2. Estado legal del Contrato de Obra CO1.PCCNTR. 1552323 de 2020

PÓLIZAS PRESENTADAS					
AMPAROS	**COMPAÑÍA**	**VALOR ASEGURADO**	**NÚMERO PÓLIZA**	**VIGENCIAS**	
				DESDE	**HASTA**
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	SEGUROS MUNDIAL	$1.855.844.842	M-100115506	30/12/2020	30/09/2021
PAGOS DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES, LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES		$463.961.210		30/12/2020	31/03/2024
ESTABILIDAD DE OBRA		$1.855.844.842		31/03/2021	31/03/2022
CALIDAD DEL SERVICIO		$1.855.844.842		30/12/2020	30/09/2021
CALIDAD		$1.855.844.842		30/12/2020	30/09/2021
RESPONSABILIDAD EXTRACONTRACTUAL		$463.961.210	M-100019446	07/05/2020	31/03/2021

2.4. ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL PERIODO

2.4.1 Actividades ejecutadas por el Contratista **CONSORCIO CONSTRUCTOR ALFA**

En el periodo comprendido entre el 12 de enero de 2021 y el 11 de febrero de 2021 el Contratista ejecutó las siguientes actividades:

Programado:
- Sede Comercio y Servicio – Riohacha: 100%
- Centro Industrial y De Energías Alternativas – Maicao: 100%
- Centro Industrial y De Energías Alternativas – Riohacha: 100%
- Centro Agro empresarial y Acuícola – Fonseca: 100%

Ejecutado: 0,00%
- Sede Comercio y Servicio – Riohacha: 40,37%
- Centro Industrial y De Energías Alternativas – Maicao: 13,84%
- Centro Industrial y De Energías Alternativas – Riohacha: 26,52%
- Centro Agro empresarial y Acuícola – Fonseca: 0,00%

2.5. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO DE OBRA

El control de avance financiero del contrato de obra para el departamento de la Guajira se relaciona en el siguiente cuadro:

2.5.1. SEDE COMERCIO Y SERVICIO – RIOHACHA:

Tabla 3. Control financiero contratista Sede Comercio y Servicio - Riohacha

CONTROL FINANCIERO -						
No acta	**Mes**	**Ejecutado**	**Ejecutado acumulado**	**Programado**	**Programado acumulado**	**Saldo**
	1	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
	2	$ 0	$ 0	$ 56.536.388	$ 56.536.388	$ 179.765.940
	3	$ 72.570.665	$ 72.570.665	$ 112.066.087	$ 168.602.475	$ 107.195.275
	4	$ 0	$ 72.570.665	$ 11.163.465	$ 179.765.940	$ 107.195.275
	5	$ 0	$ 72.570.665		$ 179.765.940	$ 107.195.275
	6	$ 0	$ 72.570.665		$ 179.765.940	$ 107.195.275
TOTALES			$ 72.570.665		$ 179.765.940	$ 107.195.275

2.5.2. CENTRO INDUSTRIAL Y DE ENERGÍAS ALTERNATIVAS - MAICAO:

Tabla 4. Control financiero contratista Centro Industrial y de Energías Alternativas - Maicao

CONTROL FINANCIERO -						
No acta	**Mes**	**Ejecutado**	**Ejecutado acumulado**	**Programado**	**Programado acumulado**	**Saldo**
	1	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
	2	$ 0	$ 0	$ 23.603.463	$ 23.603.463	$ 50.771.054
	3	$ 7.026.713	$ 7.026.713	$ 25.903.391	$ 49.506.855	$ 43.744.339
	4	$ 0	$ 7.026.713	$ 1.264.199	$ 50.771.054	$ 43.744.339
	5	$ 0	$ 7.026.713		$ 50.771.054	$ 43.744.339
	6	$ 0	$ 7.026.713		$ 50.771.054	$ 43.744.339
TOTALES			$ 7.026.713		$ 50.771.054	$ 43.744.339

2.5.3. CENTRO INDUSTRIAL Y DE ENERGÍAS ALTERNATIVAS - RIOHACHA:

Tabla 5. Control financiero contratista Centro Industrial y de Energías Alternativas - Riohacha

CONTROL FINANCIERO -						
No acta	**Mes**	**Ejecutado**	**Ejecutado acumulado**	**Programado**	**Programado acumulado**	**Saldo**
	1	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
	2	$ 0	$ 0	$ 50.864.762	$ 50.864.762	$ 80.076.766
	3	$ 21.232.354	$ 21.232.354	$ 29.212.004	$ 80.076.766	$ 58.844.411
	4	$ 0	$ 21.232.354	$ 0	$ 80.076.766	$ 58.844.411
	5	$ 0	$ 21.232.354	$ 0	$ 80.076.766	$ 58.844.411
	6	$ 0	$ 21.232.354	$ 0	$ 80.076.766	$ 58.844.411

CONTROL FINANCIERO -						
No acta	**Mes**	**Ejecutado**	**Ejecutado acumulado**	**Programado**	**Programado acumulado**	**Saldo**
TOTALES			$ 21.232.354		$ 80.076.766	$ 58.844.411

2.5.4. CENTRO AGRO EMPRESARIAL Y ACUÍCOLA - FONSECA:

Tabla 6. Control financiero contratista Centro Agro empresarial y Acuícola – Fonseca

CONTROL FINANCIERO -						
No acta	**Mes**	**Ejecutado**	**Ejecutado acumulado**	**Programado**	**Programado acumulado**	**Saldo**
	1	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
	2	$ 0	$ 0	$ 27.364.346	$ 27.364.346	$ 27.364.346
	3	$ 0	$ 0	$ 0	$ 27.364.346	$ 27.364.346
	4	$ 0	$ 0	$ 0	$ 27.364.346	$ 27.364.346
	5	$ 0	$ 0	$ 0	$ 27.364.346	$ 27.364.346
	6	$ 0	$ 0	$ 0	$ 27.364.346	$ 27.364.346
TOTALES			$ 0		$ 27.364.346	$ 27.364.346

En el periodo del presente informe el Contratista CONSORCIO CONSTRUCTOR ALFA En el periodo del presente informe la Entidad realiza observaciones al corte de obra No. 1, remitidas al contratista mediante comunicados *“CINP-BTA-023-0490-0005; OFICIO 92020066740 NIS 2020-02-320649 OBSERVACIONES ACTA PARCIAL DE PAGO No. 1 CONTRATO DE OBRA”.* Se diligencia formato “Control Financiero Contratista” y se encuentra en el Anexo No.01.

Tabla 7 Control financiero Contratista

CONTROL FINANCIERO						
No. Acta	**Mes**	**Ejecutado**	**Ejecutado acumulado**	**Programado**	**Programado acumulado**	**Saldo**
	21/08/20 – 11/09/20	$0	$0	$0	$0	$0
	12/09/20 – 11/10/20	$0	$0	$0	$0	$0
	12/10/20 – 11/11/20	$0	$0	$0	$0	$0
	11/11/20 – 12/12/20	$0	$0	$0	$0	$0
	11/12/20 – 12/01/21	$0	$0	$0	$0	$0
TOTALES		**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**

2.6. PERSONAL DEL CONTRATISTA

El contratista CONSORCIO CONSTRUCTOR ALFA, cuenta con el siguiente personal profesional durante el periodo del presente informe, se diligencia el Formato “Control de Personal Contratista”, en el Anexo No. 02, adicionales los trabajadores contratados para la ejecución de actividades y en resumen con el siguiente cuadro:

Tabla 8. Relación del personal Contrato

PERSONAL PROFESIONAL Y OPERATIVO		
No.	**DESCRIPCIÓN**	**NOMBRE**
1	Representante Legal	SERGIO MOLINA SAAVEDRA
2	Director de Obra	RICARDO ARTURO MOLINA GARCIA
3	Coordinador de Obra	LUIS ALFREDO GRANADOS DONADO
4	Profesional SST	SERGIO FERNANDO ALONSO CARVAJAL
5	Inspector de seguridad	DUBYS VALENZUELA SANCHEZ
6	Encargado Eléctrico	HELLMAN DAVID DIAZ BOLAÑO
7	Encargado Hidrosanitario	JOSE DANIEL CASTAÑEDA
8	Encargado Ambiental	JAIRO ANDRES CORDOBA HERNANDEZ

2.7. Equipos del contratista.


En el presente período el contratista CONSORCIO CONSTRUCTOR ALFA, NO ha presentado la relación de maquinaria y equipos a utilizar.

Se diligencia el Formato “Control de Maquinaria y Equipos” y se encuentra en el Anexo No. 03.

2.8. ESTADO DEL TIEMPO

A continuación, se relaciona el estado del tiempo comprendido entre el 12 de enero de 2021 y el 11 de febrero de 2021, se diligencia formato “Control general del estado del tiempo y se encuentra en el Anexo No. 06.

ESTADO GENERAL DEL TIEMPO																														
	DICIEMBRE																			ENERO										
DIA	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	TOTAL HORAS
Clase de tiempo																																
Seco o Soleado	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	248
Nublado																																0
Lluvias intensas																																0
Lluvias moderadas																																0
TOTAL HORAS DE LLUVIA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

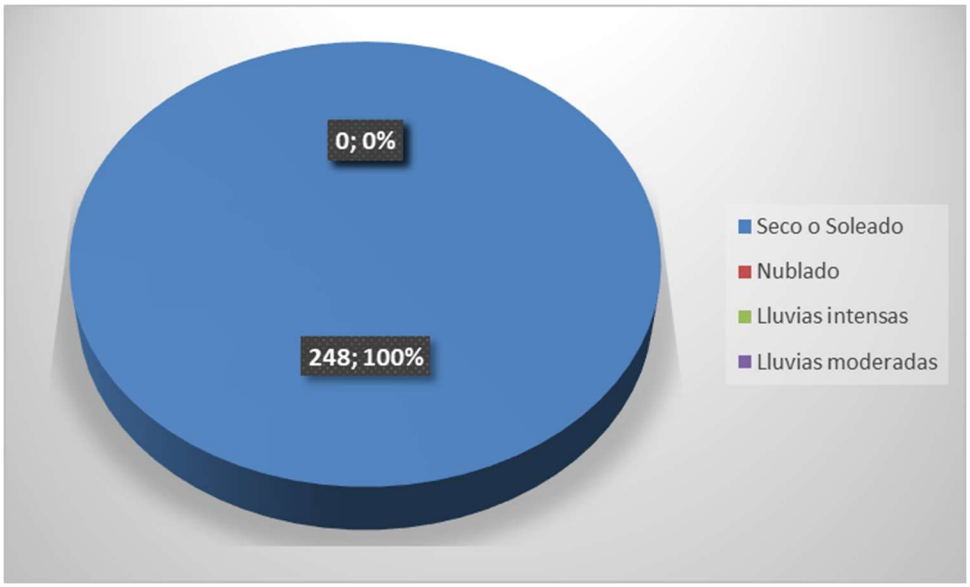
0; 0%
248; 100%
Seco o Soleado
Nublado
Lluvias intensas
Lluvias moderadas

3. CONTRATO DE INTERVENTORÍA

3.1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Tabla 9. Información general del contrato de interventoría

INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTER INGECO - GNG
CONTRATO No.:	CO1.PCCNTR.1636309 DE 2020
CONTRATANTE	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA
OBJETO:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA, CONTABLE Y AMBIENTAL, PARA EL MANTENIMIENTO PREDICTIVO, PREVENTIVO, CORRECTIVO, REPARACIONES Y MEJORAS LOCATIVAS A LAS INSTALACIONES DEL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA A NIVEL NACIONAL, MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE.
LOCALIZACIÓN:	Riohacha (CENTRO INDUSTRIAL Y ENERGÍAS ALTERNATIVAS Kilómetro 5 troncal del Caribe Riohacha – Maicao), Riohacha (SEDE COMERCIO Y SERVICIO Cra 15 No 19 – 40), Maicao (CENTRO INDUSTRIAL Y ENERGÍAS ALTERNATIVAS Kra 42 y 45 troncal del Caribe) y Fonseca (CENTRO AGRO EMPRESARIAL Y ACUÍCOLA Kilómetro 1 vía Fonseca – Barrancas)
VALOR DEL CONTRATO:	SEISCIENTOS NOVENTA Y UN MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS PESOS M/CTE ($691.547.900) incluido IVA
VALOR ADICIONES:	NO APLICA
VALOR DEL ANTICIPO:	NO APLICA
DURACIÓN O PLAZO PRORROGA No 01:	30 DÍAS
DURACIÓN O PLAZO PRORROGA No 02:	3 MESES
FECHA DE INICIO:	12 DE AGOSTO DE 2020
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:	15 DE DICIEMBRE DE 2020
DURACIÓN O PLAZO TOTAL:	31 DE MARZO DE 2021

3.2. FORMA DE PAGO

El Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, pagará al contratista el valor del contrato de ***INTERVENTORÍA*** de acuerdo con la programación del PAC (Plan Anual de Caja) autorizado por el Ministerio de Hacienda y Crédito Publico mensualmente a la

Institución, en la cuenta que para los efectos acredite el Contratista, de la siguiente manera:

1. **PAGOS PARCIALES**: Pagos parciales mensuales de interventoría equivalentes al porcentaje de avance mensual de obra ejecutada y recibida a satisfacción, hasta completar el noventa (90%) del valor del contrato de interventoría. Soportado con el informe de interventoría, la respectiva factura, aprobación del Supervisor de Interventoría designado por el SENA y el Coordinador del Grupo de Construcciones del SENA.

2. **UN ÚLTIMO PAGO**: Pago final equivalente al Diez (10%) del valor ejecutado de la interventoría, contra la entrega final del informe de interventoría y las actas de liquidación suscritas de los contratos de interventoría y del contrato de obra.

3.3. ESTADO LEGAL DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

A la fecha de corte del presente informe el contrato de interventoría CO1.PCCNTR.1636309 de 2020 se encuentra vigente en cumplimiento del sexto mes de ejecución. El estado legal del contrato de Interventoría se encuentra registrado en el Formato “Control Legal Interventoría”:

Tabla 10. Estado legal del Contrato de Interventoría No. CO1.PCCNTR.1636309 de 2020

PÓLIZAS PRESENTADAS					
TIPO DE PÓLIZA	COMPAÑÍA ASEGURADORA	VALOR ASEGURADO	NUMERO PÓLIZA	VIGENCIAS	
				Iniciación	Terminación
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	SEGUROS DEL ESTADO	$138.309.580,00	15-44-101228786	12/08/2020	29/11/2021
CALIDAD DEL SERVICIO		$138.309.580,00		12/08/2020	14/04/2022
SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES		$34.577.395,00		12/08/2020	30/05/2024
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL		$351.121.200,00	15-40-101064985	12/08/2020	28/05/2021

3.4. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Debido a que los pagos parciales mensuales de interventoría equivalen al porcentaje de avance mensual de obra ejecutada y recibida a satisfacción y a la fecha de este informe el Contratista no ha ejecutado actividades a completa satisfacción del cliente, se relaciona el estado financiero del contrato de interventoría relacionando valores en cero pagados a la Interventoría, valor ejecutado y valor programado a la fecha del presente informe. Se diligencia formato “Control Financiero Interventoría” y se encuentra en el Anexo No. 07.

Tabla 11 Control financiero Interventoría

CONTROL FINANCIERO						
No acta	**Mes**	**COSTO DIRECTO**	**IVA**	**Ejecutado**	**Ejecutado acumulado**	**Saldo**
						$ 691.547.950,00
	1	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
	2	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
	3	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
	4	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
	5	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
	6	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
TOTALES		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	**$ 691.547.950,00**

3.5. PERSONAL DE LA INTERVENTORÍA

Para el buen desarrollo del contrato, la Interventoría contó con el siguiente personal para la ejecución del sexto mes comprendido entre el 12 de enero de 2021 y el 11 de febrero de 2021. Se diligencia formato “Control de Personal Interventoría”, se encuentra en el Anexo No. 8:

Tabla 12. Relación del personal de Interventoría

PERSONAL PROFESIONAL Y OPERATIVO		
No.	**DESCRIPCIÓN**	**NOMBRE**
1	Representante legal	CARLOS ROLÓN AMAYA
2	Director de Interventoría	PEDRO GUTIÉRREZ BUSTILLO
3	Residente de interventoría	SORAYA NAVARRO
4	Residente SST	ANREA XIOMARA PEREZ
5	Inspector	CATHERINE BORJA MEJÍA
6	Inspector	SANDRA MILENA RÓDRIGUEZ
7	Secretaria	DAMARIS MOSQUERA

3.6. EQUIPOS DE LA INTERVENTORÍA

La relación de los equipos de la Interventoría se diligenciará en el Formato “Control de Maquinaria y Equipos Interventoría”. Anexo No. 16. A continuación se presenta en resumen la relación.

Tabla 13. Relación de equipos del interventor

EQUIPOS	CANTIDAD
COMPUTADORES	1
CÁMARAS FOTOGRÁFICAS	1
IMPRESORAS	1
ESCÁNER	1

3.7. RESUMEN ACTAS DE SEGUIMIENTO DEL CONTRATO

En el periodo del presente informe no se realizaron reuniones de comité.

3.8. PLAN DE INVERSIÓN DE ANTICIPO DE LA INTERVENTORÍA

En el contrato de interventoría CO1.PCCNTR.1636309 de 2020 no se estipula pagos de anticipo por ningún concepto.

3.9. ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR LA INTERVENTORÍA

Durante el período comprendido entre el 12 de enero de 2021 al 11 de febrero de 2021, la Interventoría realizó las siguientes actividades:

ADMINISTRATIVAS.

- Gestionar toda la documentación presentada por el contratista, recibo, respuesta y redirección al SENA.
- Elaboración de correspondencia referente al proyecto.
- Requerimientos escritos al contratista para el cumplimiento de obligaciones contractuales conforme a lo establecido en el pliego de condiciones.
- Suscripción de actas de comité registradas en el período.
- Elaboración de informes semanales de interventoría y remisión al SENA informando el estado actual del contrato y las novedades presentadas.
- Dar respuesta a la correspondencia remitida por el contratista y el SENA.

TÉCNICAS:

- Seguimiento y control de los procesos constructivos conforme a la programación de obra presentada por el contratista y avalada por interventoría.
- Participación en comités de seguimiento al contrato y suscripción de las correspondientes actas.
- Seguimiento al avance de obra registrado en el período
- Registro fotográfico de los avances de obra registrados en el periodo.
- Seguimiento y verificación a la implementación de los Protocolos de Bioseguridad presentados por el Contratista y su cumplimiento en el período.

- Seguimiento y control a la disposición de personal para el desarrollo de las obras.
- Seguimiento y control de calidad a la disposición de herramienta y equipo utilizado en el período.
- Seguimiento y control de los procesos ejecutados en los frentes de trabajo.
- Registro de recomendaciones y requerimientos realizados en campo al contratista, suscritos en el libro de obra.
- Cuantificación de obras ejecutadas en el período.
- Control y seguimiento a las no conformidades en cada uno de los frentes de trabajo.
- Revisión y verificación de la aplicación del plan ambiental, presentado por el contratista.
- Revisión y verificación al cumplimiento del programa de seguridad industrial presentado por el contratista.
- Revisión del cumplimiento del programa de calidad presentado por el contratista.
- Seguimiento al cumplimiento de normas de seguridad industrial, control de señalización y demarcación de frentes de trabajo, control de suministro y uso de dotación de obra y elementos de seguridad.

3.10. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN A LOS ENSAYOS DE LABORATORIO

En el período no se ejecutaron obras que requieran ensayos de laboratorio

4. RELACIÓN DE CORRESPONDENCIA

Se diligencian los formatos: “Control de entrada de correspondencia” y “Control de salida de correspondencia”, en el Anexo No. 12.

5. VALOR TOTAL DEL PROYECTO OBSERVACIONES

Como lo contemplan los documentos contractuales el valor del contrato equivale a OCHO MIL SETENCIENTOS SETENTA Y SIETE MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS CINCENTA Y SIETE PESOS M(CTE ($ 8.777.298.757), incluido AU, costos directos e indirectos, gastos, IVA sobre la utilidad y demás erogaciones en que deba incurrir el contratista para la adecuada ejecución del objeto contractual.

Con un valor contractual designado para la regional de Guajira de $763.321.793.

Según presupuesto entregado por el Contratista en el periodo del presente informe, se tienen los siguientes valores presupuestales por sede:

Tabla 14 Presupuesto sedes Atlántico

SEDE	DIRECCIÓN	VALOR
SEDE COMERCIO Y SERVICIO	RIOHACHA	*$ 77,069,296
CENTRO INDUSTRIAL Y DE ENERGIAS ALTERNATIVAS	MAICAO	*$ 108,876,003
CENTRO INDUSTRIAL Y DE ENERGÍAS ALTERNATIVAS	RIOHACHA	$ 77,069,296
CENTRO AGRO EMPRESARIAL Y ACUÍCOLA	FONSECA	$ 31,625,735

*Diagnostico pendiente entrega definitiva

6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.

6.1 CONCLUSIONES:

El contratista a la fecha no ha presentado completamente los respectivos informes de diagnósticos para las diferentes sedes del Departamento de la Guajira. Mediante oficio DCS-233-CO1. 2323 del 03 de noviembre remitió el Diagnóstico consolidado del Departamento de la Guajira, sin embargo, el documento solo contenía el diagnóstico del SEDE COMERCIO Y SERVICIO RIOHACHA. Esta interventoría mediante comunicado CINP-BTA-023-0378-6523 de Noviembre 12 de 2020 remitió observaciones respecto al contenido del mismo. Además se recuerda, que el contenido de los mismos debe ajustarse a lo descrito en su contrato de obra, Capítulo 2.3 ítem 3.2 el cual indica que debe contener un consolidado final del estado actual de las instalaciones a intervenir (con sugerencias de intervención, evaluación programación, detalles de ejecución en los casos que aplique), presentar un cronograma de intervenciones por instalación de la Entidad, presentar el Programa de Calidad específico para el proyecto, el cual debe contener los lineamientos de calidad e indiciadores que deben tenerse en cuenta en cuanto a procesos constructivos, calidad de materiales a emplear acabados y demás aspectos contemplados en el Manual de Mantenimiento de la Entidad. Dicha obligación fue solicitada mediante comunicados CINP-BTA-023-0071-4700 del 7 de septiembre, CINP-BTA-023-0122-5009 del 17 de septiembre, CINP-BTA-023-0142-5186 del 23 de septiembre.

A fecha de corte del presente informe el contrato de obra CO1.PCCNTR.1636309 de 2020 no presenta adelanto en su programación, teniendo en cuenta que para el sexto mes NO se realizaron actividades en ninguna de las sedes:

- Sede Comercio y Servicio – Riohacha:

  De acuerdo a programación presentada inicialmente mediante oficio DCS-069-CO1.6309 del 14 de septiembre y posteriormente ajustada mediante oficio DCS-

118-CO1. 6309 del 01 de octubre presenta un atraso del 59,63% debido a que a fecha de corte del presente informe se ejecutó un 40,37% y presentaba un programado de 100%. Debido a la falta de actividades mencionada anteriormente, se requirió mediante oficio CINP-BTA-023-0183-5426 del 02 de octubre la entrega de un Plan de Contingencia y mediante oficio CINP-BTA-023-0290-5953 del 21 de octubre se evidenció la falta de aplicación del mismo teniendo en cuenta que de acuerdo a las programaciones presentadas por el Contratista ya debía haber dado inicio a todas las sedes a intervenir.

- Centro Industrial y De Energías Alternativas – Maicao:

  De acuerdo a programación presentada inicialmente mediante oficio DCS-069-CO1.6309 del 14 de septiembre y posteriormente ajustada mediante oficio DCS-118-CO1. 6309 del 01 de octubre presenta un atraso del 86,16% debido a que a fecha de corte del presente informe se ejecutó un 13,84% y presentaba un programado de 100%. Debido a la falta de actividades mencionada anteriormente, se requirió mediante oficio CINP-BTA-023-0183-5426 del 02 de octubre la entrega de un Plan de Contingencia y mediante oficio CINP-BTA-023-0290-5953 del 21 de octubre se evidenció la falta de aplicación del mismo teniendo en cuenta que de acuerdo a las programaciones presentadas por el Contratista ya debía haber dado inicio a todas las sedes a intervenir.

- Centro Industrial y De Energías Alternativas – Riohacha:

  De acuerdo a programación presentada inicialmente mediante oficio DCS-069-CO1.6309 del 14 de septiembre y posteriormente ajustada mediante oficio DCS-118-CO1. 6309 del 01 de octubre presenta un atraso del 73,48% debido a que a fecha de corte del presente informe se ejecutó un 26,52% y presentaba un programado de 100%. Debido a la falta de actividades mencionada anteriormente, se requirió mediante oficio CINP-BTA-023-0183-5426 del 02 de octubre la entrega de un Plan de Contingencia y mediante oficio CINP-BTA-023-0290-5953 del 21 de octubre se evidenció la falta de aplicación del mismo teniendo en cuenta que de acuerdo a las programaciones presentadas por el Contratista ya debía haber dado inicio a todas las sedes a intervenir.

- Centro Agro empresarial y Acuícola – Fonseca:

  De acuerdo a programación presentada inicialmente mediante oficios DCS-103-CO1. 6309 del 29 de septiembre y DCS-115-CO1. 6309 del 30 de septiembre que posteriormente fueron ajustadas mediante oficio DCS-117-CO1. 6309 del 01 de octubre presenta un atraso del 100% debido a que a fecha de corte del presente informe no se habían ejecutado actividades constructivas. Debido a la falta de actividades mencionada anteriormente, se requirió mediante oficio CINP-BTA-023-0183-5426 del 02 de octubre la entrega de un Plan de Contingencia y mediante oficio CINP-BTA-023-0290-5953 del 21 de octubre se evidenció la falta de aplicación del mismo teniendo en cuenta que de acuerdo a las programaciones

presentadas por el Contratista ya debía haber dado inicio a todas las sedes a intervenir.

6.2 RECOMENDACIONES:

Se recomienda al contratista disponer de los recursos para el desarrollo de las obras de manera oportuna y de primera calidad según lo dispuesto en el contrato. Dar cumplimiento oportuno a las actividades administrativas que hacen parte del contrato como son la presentación de APU´s, Presupuestos definitivos, Programación de Obra de las actividades a realizar, Programa de Inversiones semana por semana, Afiliaciones del personal que va a ejecutar las actividades, Implementación del Protocolo de Bioseguridad por la persona encargada.

A la fecha no se ha presentado de manera completa y en debida forma la documentación requerida de ningún trabajador, por lo que se debe realizar la respectiva subsanación.

Si bien es cierto se presentaron reprogramaciones para las sedes a intervenir, a la fecha ya se presentan atrasos en todas las sedes y se requiere iniciar actividades cuanto antes para revertir el atraso presentado en las mismas.

ANEXOS

Anexo No. 01: Control Financiero Contratista.

INGECO
INGENIERIA DE CONSTRUCCIONES S.A.S.

CONTROL FINANCIERO CONTRATISTA

CONSORCIO INTERINGECO GNG

GNG Ingeniería S.A.S.

OBRA [X]
INTERVENTORIA [ ]

CONTRATO DE OBRA: CO1.PCCNTR.1552323
CONTRATO DE INTERVENTORIA: CO1.PCCNTR.1636309

ENTIDAD CONTRATANTE: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA
CONTRATISTA CONSORCIO CONSTRUCTOR ALFA
INTERVENTORIA CONSORCIO INTERINGECO-GNG

OBJETO DEL CONTRATO: "REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA, CONTABLE Y AMBIENTAL, PARA EL MANTENIMIENTO PREDICTIVO, PREVENTIVO, CORRECTIVO, REPARACIONES Y MEJORAS LOCATIVAS A LAS INSTALACIONES DEL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA A NIVEL NACIONAL, MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE."

SUPERVISOR: EDGAR JOSÉ DE LA HOZ HERNANDEZ **PERIODO** 12 DE ENERO AL 11 FEBRERO 2021

INFORMACION FINANCIERA

Acta	MES	Costo Directo	Valor AIU + IVA	PAGADO	Saldo Contrato	PROGRAMADO	PROGRAMADO ACUMULADO	EJECUTADO ACUMULADO
	0			-	$ 8,777,298,757	$ 0	$ -	$ 0
1	Agos Sep	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
2	Sep Oct	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
3	Oct Nov	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
4	Nov Dic	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
5	Dic Ene	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
6	Ene Feb	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
TOTALES		$ -	$ -	$ -	$ 0	-	$ -	$ 0

Firma
Nombre: **PEDRO ANTONIO GUTIERREZ BUSTILLO**
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

Anexo No. 02: Control Personal Contratista.

INGECO INGENIERIA DE CONSTRUCCIONES S.A.S. GNG Ingeniería S.A.S.

CONSORCIO INTERINGECO GNG

CONTROL PERSONAL CONTRATISTA

CONTRATO DE OBRA: CO1.PCCNTR.1552323
CONTRATO DE INTERVENTORIA: CO1.PCCNTR.1636309

OBRA X
INTERVENTORIA

ENTIDAD CONTRATANTE: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA **CONTRATISTA:** CONSORCIO CONSTRUCTOR ALFA **INTERVENTORIA:**

OBJETO DEL CONTRATO: MANTENIMIENTO PREDICTIVO, PREVENTIVO, CORRECTIVO, REPARACIONES Y MEJORAS LOCATIVAS A LAS INSTALACIONES DEL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA A NIVEL NACIONAL, MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE

SUPERVISOR: EDGAR DE LA HOZ HERNANDEZ **PERIODO:** 12-ene-21 al 11-feb-21

FECHA / CARGO	ENERO																			FEBRERO										OBSERVACIONES
	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
DIRECTOR DE OBRA - **RICARDO MOLINA**	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	
RESIDENTE TÉCNICO - **LUIS ALFREDO GRANADOS**	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	
PROFESIONAL SST - **SERGIO ALONSO**	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	
PROFESIONAL AMBIENTAL -																																
PROFESIONAL SOCIAL -																																
OFICIALES Y MAESTROS DE OBRA																																
AYUDANTES																																
OPERADORES DE MAQUINARIA																																
CONDUCTORES DE VOLQUETAS																																
PERSONAL DEL CONTRATISTA	**3**	**3**	**3**	**3**	**3**	**0**	**3**	**3**	**3**	**3**	**3**	**3**	**0**	**3**	**3**	**3**	**3**	**3**	**3**	**0**	**3**	**3**	**3**	**3**	**3**	**3**	**0**	**3**	**3**	**3**	**3**	**TOTAL PERIODO** **81**

DOMINGOS Y FESTIVOS

OBSERVACIONES:

Firma:

PEDRO GUTIERREZ BUSTILLO
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

Anexo No. 03: Control Maquinaría y Equipos Contratista.

INGECO INGENIERIA DE CONSTRUCCIONES S.A.S. GNG Ingeniería S.A.S. CONSORCIO INTER INGECO GNG

CONTROL DE MAQUINARIA Y EQUIPOS CONTRATISTA

OBRA X
INTERVENTORIA

CONTRATO DE OBRA: CO1.PCCNTR.1552323
CONTRATO DE INTERVENTORIA: CO1.PCCNTR.1636309

CONTRATISTA CONSORCIO CONSTRUCTOR ALFA **INTERVENTORIA** CONSORCIO INTER INGECO-GNG

ENTIDAD CONTRATANTE: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA

OBJETO DEL CONTRATO: "REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA, CONTABLE Y AMBIENTAL, PARA EL MANTENIMIENTO PREDICTIVO, PREVENTIVO, CORRECTIVO, REPARACIONES Y MEJORAS LOCATIVAS A LAS INSTALACIONES DEL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA A NIVEL NACIONAL, MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE."

SUPERVISOR ENCARGADO: EDGAR JOSÉ DE LA HOZ HERNANDEZ **PERIODO:** 12 DE ENERO AL 11 DE FEBRERO DE 2021

EQUIPO	PROGRAMADO	UTILIZADO	PROPIO	ALQUILADO	LOCALIZACIÓN	CANTIDAD	OBSERVACIONES
			A LA FECHA DE CORTE EL CONTRATISTA NO HA PRESENTADO LA RELACIÓN DE MAQUINARÍA Y EQUIPOS				

OBSERVACIONES:

Firma:

PEDRO GUTIERREZ BUSTILLO
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

Anexo No. 04: Certificados de Calibración y Mantenimiento de Equipos.

EL CONTRATISTA NO HA PRESENTADO LOS CERTIFICADOS DE LA MAQUINARIA A LA FECHA

Anexo No. 05 Control e Inspección de Ensayos.

NO APLICA

Anexo No. 06: Control General del Estado del Tiempo.

INGECO INGENIERIA DE CONSTRUCCIONES S.A.S. GNG Ingeniería S.A.S. CONSORCIO INTERINGECO GNG

CONTROL GENERAL DE ESTADO DEL TIEMPO

CONTRATO DE OBRA: CO1.PCCNTR.1552323

CONTRATO DE INTERVENTORIA: CO1.PCCNTR.1636309

ENTIDAD CONTRATANTE: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA

CONTRATISTA: CONSORCIO CONSTRUCTOR ALFA

INTERVENTOR: CONSORCIO INTER INGECO-GNG

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA MANTENIMIENTO PREDICTIVO, PREVENTIVO, CORRECTIVO, REPARACIONES Y MEJORAS LOCATIVAS A LAS INSTALACIONES DEL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA A NIVEL NACIONAL, MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA, CONTABLE Y AMBIENTAL, PARA EL MANTENIMIENTO PREDICTIVO, PREVENTIVO, CORRECTIVO, REPARACIONES Y MEJORAS LOCATIVAS A LAS INSTALACIONES DEL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA A NIVEL NACIONAL, MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE

SUPERVISOR DESIGNADO: EDGAR JOSÉ DE LA HOZ HERNANDEZ **PERIODO:** 12-ene-21 al 11-feb-21

ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

	ENERO																			FEBRERO										
DIA	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**24**	**25**	**26**	**27**	**28**	**29**	**30**	**31**	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**TOTAL HORAS**
Clase de tiempo																																
Seco o Soleado	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	248
Nublado																																0
Lluvias intensas																																0
Lluvias moderadas																																0
TOTAL HORAS DE LLUVIA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

DOMINGO - DÍA FESTIVO

NOTA: EN CADA CASILLA DE LLUVIAS SE INDICA EL NÚMERO DE HORAS POR DIA QUE PERMANECE LA CLASE DE TIEMPO

OBSERVACIONES:

DOMINGOS Y FESTIVOS

Firma

Nombre: Ing.Pedro Antonio Gutierrez Bustillo

DIRECTOR DE INTERVENTORIA

Anexo No. 7: Estado Financiero de la Interventoría

CONSORCIO INTERINGECO GNG

CONTROL FINANCIERO INTERVENTORÍA

OBRA INTERVENTORIA X

CONTRATO DE OBRA: CO1.PCCNTR.1552323
CONTRATO DE INTERVENTORIA: CO1.PCCNTR.1636309
ENTIDAD CONTRATANTE: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA

CONTRATISTA CONSORCIO CONSTRUCTOR ALFA **INTERVENTORIA** CONSORCIO INTERINGECO-GNG

OBJETO DEL CONTRATO: "REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA, CONTABLE Y AMBIENTAL, PARA EL MANTENIMIENTO PREDICTIVO, PREVENTIVO, CORRECTIVO, REPARACIONES Y MEJORAS LOCATIVAS A LAS INSTALACIONES DEL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA A NIVEL NACIONAL, MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE."

SUPERVISOR DELEGADO: EDGAR JOSÉ DE LA HOZ HERNANDEZ **PERIODO** 12 DE ENERO AL 11 FEBRERO 2021

INFORMACION FINANCIERA

Acta	MES	Costo Directo	Valor AIU + IVA	PAGADO	Amrot.Anticipo	Saldo Anticipo	Saldo Contrato	PROGRAMADO	PROGRAMADO ACUMULADO	EJECUTADO ACUMULADO
	0	0.00	0.00	0.00	N/A	N/A		$ -	$ -	$ -
1	Agos Sep	$ -	$ -	$ -			$ -	$	$	$
2	Sep Oct	$ -	$ -	$ -			$ -	$	$	$
3	Oct Nov	$ -	$ -	$ -			$ -	$	$	$
4	Nov Dic	$ -	$ -	$ -			$ -	$	$	$
5	Dic Ene	$ -	$ -	$ -			$ -	$	$	$
6	Ene Feb	$ -	$ -	$ -			$ -	$	$	$
TOTALES		**$ -**	**$ -**	**$ -**			**$ -**			

	CALCULO DE CORTE DE INTERVENTORIA No.06	
	CONTRATO DE INTERVENTORIA	
VCI=	Valor inicial del contrato de Interventoria	$ 691,547,900.00
VACI 1=	Valor adiciones	$ -
VACT=	Valor total contrato de Interventoria	$ 691,547,900.00
	FORMA DE PAGO CONTRATO INTERVENTORIA	
	Costo variable (90%)	$ 622,393,110.00
	Liquidacion (10%)	$ 69,154,790.00
	TOTAL	$ 691,547,900.00
	CONTRATO DE OBRA	
VICO=	Valor inicial contrato de obra	$ 8,777,298,757.00
VACO 1=	Valor adiciones	$ -
VTCO=	Valor Total contrato de obra	$ 8,777,298,757.00
VAO=	Valor acta de obra No.01	$ -
%AO=	(VAO/VTCO)*100=($0/$8.777.298.757)*100=	0.00%
%AO=	Porcentaje de avance de obra	**0.00%**
	CALCULO VALOR VARIABLE PRESENTE ACTA	
VAI=	(%AO*VTCI)/100 = (0,0%*$691.547.900) =	$ -
VAI=	Valor acta de Interventoria	**$** -
	VALOR A FACTURAR	**$ -**

Firma
Nombre: **PEDRO ANTONIO GUTIERREZ BUSTILLO**
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

Anexo No 8.: Personal de Interventoría

INGECO INGENIERIA DE CONSTRUCCIONES S.A.S. GNG Ingeniería S.A.S.

CONSORCIO INTERINGECO GNG

CONTROL PERSONAL INTERVENTORÍA

CONTRATO DE OBRA: CO1.PCCNTR.1552323
CONTRATO DE INTERVENTORIA: CO1.PCCNTR.1636309

OBRA | **INTERVENTORIA** [X]

ENTIDAD CONTRATANTE: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA
CONTRATISTA: CONSORCIO CONSTRUCTOR ALFA
INTERVENTORIA: CONSORCIO INTERINGECO-GNG

OBJETO DEL CONTRATO: "REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA, CONTABLE Y AMBIENTAL, PARA EL MANTENIMIENTO PREDICTIVO, PREVENTIVO, CORRECTIVO, REPARACIONES Y MEJORAS LOCATIVAS A LAS INSTALACIONES DEL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA A NIVEL NACIONAL, MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE."

SUPERVISOR: EDGAR JOSÉ DE LA HOZ HERNANDEZ
PERIODO: 12 ENERO AL 11 FEBRERO 2021

FECHA / CARGO	DICIEMBRE																				ENERO											OBSERVACIONES
	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
DIRECTOR DE OBRA - **PEDRO GUTIERREZ BUSTILLO**	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	
RESIDENTE TÉCNICO - **SORAYA NAVARRO**	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	
PROFESIONAL SST - **XIOMARA ANDREA PEREZ**	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	
INSPECTOR 1 - **CATHERINE BORJA**	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	
INSPECTOR 2- **SANDRA RODRIGUEZ**	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	
SECRETARIA - **DAMARIS MOSQUERA**	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	

DOMINGOS Y FESTIVOS

OBSERVACIONES:

Firma:

PEDRO GUTIERREZ BUSTILLO
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

Anexo No 9: Planilla de Afiliación Personal Interventoría.

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

DATOS GENERALES DEL APORTANTE			
TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	901388644
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			CONSORCIO INTER INGECO GNG
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	DEPARTAMENTO:	BOGOTA - DISTRITO CAPITAL
DIRECCIÓN:	AV 19 120 71 OF 104	TELÉFONO:	3562690
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades de arquitectura e ingeniería y otras
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA							
NÚMERO PLANILLA:	**7778680970**			TIPO DE PLANILLA:			E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES enero	AÑO	2021	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES febrero	AÑO	2021
DÍAS DE MORA:	0						
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2021/02/05			NÚMERO AUTORIZACIÓN:	884092751		

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
230301	230301-PORVENIR	4	$ 2.192.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2.192.000	$ 0	$ 2.192.000
25-14	25-14 COLPENSIONES	2	$ 1.120.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.120.000	$ 0	$ 1.120.000
SUBTOTALES:										**$ 3.312.000**	**$ 0**	**$ 3.312.000**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	UPC	COTIZACIÓN	UPC	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	4		$ 0		$ 0		$ 0	$ 548.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 548.000	$ 0	$ 0	$ 548.000
EPS037	EPS037-NUEVA EPS	2		$ 0		$ 0		$ 0	$ 280.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 280.000	$ 0	$ 0	$ 280.000
SUBTOTALES:													**$ 828.000**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 828.000**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-7	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	6		$ 0	$ 0		$ 0	$ 1.440.800	$ 1.440.800	$ 0	$ 0	$ 1.440.800
SUBTOTALES:									**$ 1.440.800**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 1.440.800**

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE		APORTES	MORA	VALOR PAGADO
CCF16	CCF16-COMFACOR	1	$ 140.000	$ 0	$ 140.000
CCF41	CCF41-CCF DEL SUCRE	1	$ 128.000	$ 0	$ 128.000
CCF64	CCF64-CAJASAI	1	$ 140.000	$ 0	$ 140.000
CCF15	CCF15-COMFACESAR	1	$ 140.000	$ 0	$ 140.000
CCF33	CCF33-CCF DEL MAGDALENA	1	$ 140.000	$ 0	$ 140.000
CCF07	CCF07-COMFAMILIAR ATLÁNTICO	1	$ 140.000	$ 0	$ 140.000
SUBTOTALES:			**$ 828.000**	**$ 0**	**$ 828.000**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE									NOVEDADES															SEGURIDAD SOCIAL																				PARAFISCALES							
																								PENSIÓN								SALUD						ARP									CCF		SENA	ICBF	ESAP	MINEDU
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	Vr UPC	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DIAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
1	CC 1140836813	BARROS MENA ANDRES RAFAEL	DEPEND		$ 3.500.000	FIJO			SI																	230301-PORVENIR	30	$ 3.500.000	$ 560.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 560.000	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 3.500.000	$ 140.000	$ 0	$ 140.000	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	30	$ 3.500.000		$ 243.600	30	$ 3.500.000	CCF07-COMFAMILIAR ATLÁNTICO	$ 140.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
2	CC 39141822	NAVARRO BOLAÑO SORAYA ALEJANDRA	DEPEND		$ 3.500.000	FIJO			SI																	230301-PORVENIR	30	$ 3.500.000	$ 560.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 560.000	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 3.500.000	$ 140.000	$ 0	$ 140.000	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	30	$ 3.500.000		$ 243.600	30	$ 3.500.000	CCF33-CCF DEL MAGDALENA	$ 140.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
3	CC 72180405	DE AVILA GOMEZ JULIO	DEPEND		$ 3.500.000	FIJO			SI																	25-14 COLPENSIONES	30	$ 3.500.000	$ 560.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 560.000	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 3.500.000	$ 140.000	$ 0	$ 140.000	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	30	$ 3.500.000		$ 243.600	30	$ 3.500.000	CCF64-CAJASAI	$ 140.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
4	CC 77106298	MORALES GALINDO JOSE FIDEL	DEPEND		$ 3.500.000	FIJO			SI																	25-14 COLPENSIONES	30	$ 3.500.000	$ 560.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 560.000	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 3.500.000	$ 140.000	$ 0	$ 140.000	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	30	$ 3.500.000		$ 243.600	30	$ 3.500.000	CCF15-COMFACESAR	$ 140.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
5	CC 78760291	SOLANO ALMANZA SERGIO JAVIER	DEPEND		$ 3.500.000	FIJO			SI																	230301-PORVENIR	30	$ 3.500.000	$ 560.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 560.000	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 3.500.000	$ 140.000	$ 0	$ 140.000	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	30	$ 3.500.000		$ 243.600	30	$ 3.500.000	CCF16-COMFACOR	$ 140.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
6	CC 92535392	SIERRA HERNANDEZ JAIR ERITH	DEPEND		$ 3.200.000	FIJO			SI																	230301-PORVENIR	30	$ 3.200.000	$ 512.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 512.000	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 3.200.000	$ 128.000	$ 0	$ 128.000	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	30	$ 3.200.000		$ 222.800	30	$ 3.200.000	CCF41-CCF DEL SUCRE	$ 128.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL	**$ 6.408.800**

Anexo No. 10: Control Maquinaria y equipos Interventoría.

INGECO INGENIERIA DE CONSTRUCCIONES S.A.S. GNG Ingeniería S.A.S. CONSORCIO INTER INGECO GNG

CONTROL DE MAQUINARIA Y EQUIPOS INTERVENTORIA

OBRA [ ]
INTERVENTORIA [X]

CONTRATO DE OBRA: CO1.PCCNTR.1552323
CONTRATO DE INTERVENTORIA: CO1.PCCNTR.1636309

CONTRATISTA CONSORCIO CONSTRUCTOR ALFA **INTERVENTORIA** CONSORCIO INTER INGECO-GNG

ENTIDAD CONTRATANTE: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA

OBJETO DEL CONTRATO: "REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA, CONTABLE Y AMBIENTAL, PARA EL MANTENIMIENTO PREDICTIVO, PREVENTIVO, CORRECTIVO, REPARACIONES Y MEJORAS LOCATIVAS A LAS INSTALACIONES DEL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA A NIVEL NACIONAL, MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE."

SUPERVISOR DELEGADO: EDGAR JOSÉ DE LA HOZ HERNANDEZ **PERIODO:** 12 DE ENEROAL 11 DE FEBRERO DE 2021

EQUIPO	PROGRAMADO	UTILIZADO	PROPIO	ALQUILADO	LOCALIZACIÓN	CANTIDAD	OBSERVACIONES
Computador			x		Oficina	1	
Cámaras fotográficas			x		Obra	1	
Impresoras			x		Oficina	1	
Escaner			x		Oficina	1	

OBSERVACIONES:

Firma:

PEDRO GUTIERREZ BUSTILLO
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

Anexo No. 11: Actas de seguimiento del Contrato.

NO APLICA

Anexo No. 12: Relación de correspondencia.

CONSORCIO INTERINGECO GNG

RELACIÓN DE CORRESPONDENCIA ENVIADA Y RECIBIDA

CONTRATO DE OBRA: CO1.PCCNTR.1552323
CONTRATO DE INTERVENTORIA: CO1.PCCNTR.1636309
ENTIDAD CONTRATANTE: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA **CONTRATISTA** CONSORCIO CONSTRUCTOR ALFA **INTERVENTORIA** CONSORCIO INTERINGECO-GNG

OBJETO DEL CONTRATO: Realizar la interventoría técnica, administrativa, financiera, jurídica, contable y ambiental, para el mantenimiento predictivo, preventivo, correctivo, reparaciones y mejoras locativas a las instalaciones del servicio nacional de aprendizaje SENA a Nivel Nacional, mediante el sistema de precios unitarios fijos, sin fórmula de reajuste y a monto agotable.

SUPERVISOR DELEGADO: EDGAR JOSE DE LA HOZ HERNANDEZ **PERIODO** 12 DE ENERO AL 11 DE FEBRERO DE 2021

FECHA	REFERENCIA / RADICADO	ASUNTO	ENVÍA	RECIBE
12/01/2021	CINP-BTA-023-0503-0159	Solicitud información pago al señor Emiro Domínguez Arroyo.	CONSORCIO INTERINGECO-GNG	CONSORCIO CONSTRUCTOR ALFA
12/01/2021	CINP-BTA-023-0504-0160	Retraso en la entre en la reprogramación y en el reinicio de las actividades en las sedes del departamento de Córdoba en 2021.	CONSORCIO INTERINGECO-GNG	CONSORCIO CONSTRUCTOR ALFA
12/01/2021	CINP-BTA-023-0505-0163	Comunicado DCS-352-CO11.2323; Cambio profesional SST.	CONSORCIO INTERINGECO-GNG	CONSORCIO CONSTRUCTOR ALFA
12/01/2021	CINP-BTA-023-0506-0175	Informes semanales No. 16 Contrato de Interventoría.	CONSORCIO INTERINGECO-GNG	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA
12/01/2021	CINP-BTA-023-0507-0176	Informes semanales No. 17 Contrato de Interventoría.	CONSORCIO INTERINGECO-GNG	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA
13/01/2021	CINP-BTA-023-0508-0182	Informes semanales No. 18 Contrato de Interventoría.	CONSORCIO INTERINGECO-GNG	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA
13/01/2021	CINP-BTA-023-0509-0183	Solicitud programaciones actualizadas.	CONSORCIO INTERINGECO-GNG	CONSORCIO CONSTRUCTOR ALFA
13/01/2021	CINP-BTA-023-0510-0184	Remisión de garantías contra otrosí No. 2, Contrato de Obra.	CONSORCIO INTERINGECO-GNG	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA
13/01/2021	CINP-BTA-023-0511-0193	Requerimiento por no ejecución de actividades sede San Andrés.	CONSORCIO INTERINGECO-GNG	CONSORCIO CONSTRUCTOR ALFA
13/01/2021	CINP-BTA-023-0512-0221	Informes mensuales No. 3 Contrato de Interventoría.	CONSORCIO INTERINGECO-GNG	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA
15/01/2021	CINP-BTA-023-0513-0266	Comunicado DCS-347-CO1.2323; Diagnóstico sede San Andrés y Providencia.	CONSORCIO INTERINGECO-GNG	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA
15/01/2021	CINP-BTA-023-0514-0270	Comunicado DCS-328-CO1.2323; Relación y documentos del personal del departamento de Bolívar.	CONSORCIO INTERINGECO-GNG	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA
15/01/2021	CINP-BTA-023-0515-0271	Contrato de Obra No. CO1.PCCNTR.155232 Solicitud de inicio de procedimiento de imposición de multa por incumplimiento de obligaciones contractuales SST-MA.	CONSORCIO INTERINGECO-GNG	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA
15/01/2021	CINP-BTA-023-0516-0281	Correo electrónico, Reporte Mantenimiento Aires Acondicionado Sede San Jorge Sedes Córdoba.	CONSORCIO INTERINGECO-GNG	CONSORCIO CONSTRUCTOR ALFA
18/01/2021	CINP-BTA-023-0517-0291	Informes semanales No. 19 Contrato de Interventoría.	CONSORCIO INTERINGECO-GNG	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA
18/01/2021	CINP-BTA-023-0518-0292	Informes semanales No. 20 Contrato de Interventoría.	CONSORCIO INTERINGECO-GNG	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA
18/01/2021	CINP-BTA-023-0519-0295	Comunicado DCS-343-CO1. 2323, Alcance al oficio DCS-339-CO1. 2323 donde se remitió los APU's de Protocolo de Bioseguridad.	CONSORCIO INTERINGECO-GNG	CONSORCIO CONSTRUCTOR ALFA
18/01/2021	CINP-BTA-023-0520-0296	Comunicado DCS-370-CO1.2323; Relación y documentos del personal del departamento de Bolívar.	CONSORCIO INTERINGECO-GNG	CONSORCIO CONSTRUCTOR ALFA
18/01/2021	CINP-BTA-023-0521-0297	Comunicado DCS-369-CO1.2323; Relación y documentos del personal del departamento de Atlántico.	CONSORCIO INTERINGECO-GNG	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA
18/01/2021	CINP-BTA-023-0522-0298	Comunicado DCS-369-CO1.2323; Relación y documentos del personal del departamento de Atlántico.	CONSORCIO INTERINGECO-GNG	CONSORCIO CONSTRUCTOR ALFA
18/01/2021	CINP-BTA-023-0523-0307	Informes mensuales No. 3 Contrato de Interventoría.	CONSORCIO INTERINGECO-GNG	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA
18/01/2021	CINP-BTA-023-0524-0309	Comunicado DCS-349-CO1. 2323; pagos pendientes a MADAK INGENIERIA SAS.	CONSORCIO INTERINGECO-GNG	MADAK INGENIERIA SAS
18/01/2021	CINP-BTA-023-0525-0326	Informe mensual No. 4, Componente SST, Contrato de Interventoría.	CONSORCIO INTERINGECO-GNG	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA
19/01/2021	CINP-BTA-023-0526-0339	Solicitud pago y paz y salvos del señor Danny B Carrillo Delgado.	CONSORCIO INTERINGECO-GNG	CONSORCIO CONSTRUCTOR ALFA
19/01/2021	CINP-BTA-023-0527-0340	Comunicado DCS-372-CO1.2323; Solicitud de ingreso a las Sedes del SENA de San Andrés.	CONSORCIO INTERINGECO-GNG	CONSORCIO CONSTRUCTOR ALFA
19/01/2021	CINP-BTA-023-0528-0341	Comunicado DCS-369-CO1.2323 y DCS-371-CO1. 2323; Relación y documentos del personal del departamento de Atlántico.	CONSORCIO INTERINGECO-GNG	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA
19/01/2021	CINP-BTA-023-0529-0342	Comunicado DCS-371-CO1. 2323; trabajos en tanques de almacenamiento.	CONSORCIO INTERINGECO-GNG	CONSORCIO CONSTRUCTOR ALFA
19/01/2021	CINP-BTA-023-0530-0343	Inicio actividades de impermeabilización, departamento del Cesar.	CONSORCIO INTERINGECO-GNG	CONSORCIO CONSTRUCTOR ALFA
19/01/2021	CINP-BTA-023-0531-0344	Comunicado DCS-362-CO1.2323; Solicitud de ingreso a todas las Sedes del SENA del Departamento de Magdalena.	CONSORCIO INTERINGECO-GNG	CONSORCIO CONSTRUCTOR ALFA
20/01/2021	CINP-BTA-023-0532-0371	Solicitud de entrega de procedimientos para la limpieza y desinfección de tanques en todas las sedes del Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA.	CONSORCIO INTERINGECO-GNG	CONSORCIO CONSTRUCTOR ALFA

CONSORCIO INTERINGECO GNG

RELACIÓN DE CORRESPONDENCIA ENVIADA Y RECIBIDA

CONTRATO DE OBRA: CO1.PCCNTR.1552323
CONTRATO DE INTERVENTORIA: CO1.PCCNTR.1636309
ENTIDAD CONTRATANTE: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA **CONTRATISTA** CONSORCIO CONSTRUCTOR ALFA **INTERVENTORIA** CONSORCIO INTERINGECO-GNG

OBJETO DEL CONTRATO: Realizar la interventoría técnica, administrativa, financiera, jurídica, contable y ambiental, para el mantenimiento predictivo, preventivo, correctivo, reparaciones y mejoras locativas a las instalaciones del servicio nacional de aprendizaje SENA a Nivel Nacional, mediante el sistema de precios unitarios fijos, sin fórmula de reajuste y a monto agotable.

SUPERVISOR DELEGADO: EDGAR JOSE DE LA HOZ HERNANDEZ **PERIODO** 12 DE ENERO AL 11 DE FEBRERO DE 2021

FECHA	REFERENCIA / RADICADO	ASUNTO	ENVÍA	RECIBE
20/01/2021	CINP-BTA-023-0533-0372	Comunicado DCS-368-CO11.2323; Cambio profesional SST.	CONSORCIO INTERINGECO-GNG	CONSORCIO CONSTRUCTOR ALFA
21/01/2021	CINP-BTA-023-0534-0412	Comunicado DCS-332-CO1. 2323 Ajuste Diagnóstico Cesar.	CONSORCIO INTERINGECO-GNG	CONSORCIO CONSTRUCTOR ALFA
21/01/2021	CINP-BTA-023-0535-0414	Comunicado DCS-374-CO1.2323; Relación y documentos del personal del departamento de Atlántico.	CONSORCIO INTERINGECO-GNG	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA
21/01/2021	CINP-BTA-023-0536-0415	Comunicado DCS-355-CO1.2323; Corte de obra No.1.	CONSORCIO INTERINGECO-GNG	CONSORCIO CONSTRUCTOR ALFA
21/01/2021	CINP-BTA-023-0537-0416	Solicitud directriz recursos contrato de obra.	CONSORCIO INTERINGECO-GNG	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA
21/01/2021	CINP-BTA-023-0538-0417	Comunicado DCS-348-CO1.2323. Correcciones diagnóstico consolidado Atlántico.	CONSORCIO INTERINGECO-GNG	CONSORCIO CONSTRUCTOR ALFA
21/01/2021	CINP-BTA-023-0539-0420	Solicitud documentos pendientes contrato de obra.	CONSORCIO INTERINGECO-GNG	CONSORCIO CONSTRUCTOR ALFA
22/01/2021	CINP-BTA-023-0540-0441	Comunicado DCS-373-CO1.2323. Diseño cuneta del Centro Colombo Alemán – Atlántico.	CONSORCIO INTERINGECO-GNG	CONSORCIO CONSTRUCTOR ALFA
22/01/2021	CINP-BTA-023-0541-0457	Informes semanales No. 19 Contrato de Interventoría.	CONSORCIO INTERINGECO-GNG	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA
22/01/2021	CINP-BTA-023-0542-0458	Informes semanales No. 20 Contrato de Interventoría.	CONSORCIO INTERINGECO-GNG	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA
22/01/2021	CINP-BTA-023-0543-0459	Comunicado DCS-378-CO1.2323. Certificado concepto sanitario y protocolo de lavado de tanques.	CONSORCIO INTERINGECO-GNG	CONSORCIO CONSTRUCTOR ALFA
22/01/2021	CINP-BTA-023-0544-0460	Comunicados DCS-376-CO1.2323, DCS-379-CO1.2323, DCS-379-CO1.2323, DCS-380-CO1.2323 y DCS-381-CO1.2323; Lavado de tanques Sedes Guajira, Magdalena, Cesar, Bolívar y Sucre.	CONSORCIO INTERINGECO-GNG	CONSORCIO CONSTRUCTOR ALFA
22/01/2021	CINP-BTA-023-0545-0466	Comunicado DCS-383-CO1.2323; Solicitud de ampliación de horario laboral a cuadrilla de refrigeración en las sedes de la Regional del departamento de Bolívar.	CONSORCIO INTERINGECO-GNG	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA
25/01/2021	CINP-BTA-023-0546-0485	Comunicado DCS-384-CO1.2323; Ajuste APU NP 10.208.	CONSORCIO INTERINGECO-GNG	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA
25/01/2021	CINP-BTA-023-0547-0486	Comunicado DCS-310-CO1.2323; Relación y documentos del personal, impermeabilización departamento de Cesar.	CONSORCIO INTERINGECO-GNG	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA
26/01/2021	CINP-BTA-023-0548-0541	Comunicado DCS-311-CO1.2323; Relación y documentos del personal, impermeabilización departamento de Bolívar.	CONSORCIO INTERINGECO-GNG	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA
27/01/2021	CINP-BTA-023-0549-0550	Remisión de garantías contra otrosí No. 1, Prórroga No. 1, Contrato de Obra.	CONSORCIO INTERINGECO-GNG	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA
27/01/2021	CINP-BTA-023-0550-0558	Comunicado DCS-320-CO1.2323; Relación y documentos del personal, pintura departamento de Atlántico.	CONSORCIO INTERINGECO-GNG	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA
27/01/2021	CINP-BTA-023-0551-0563	Actividades suspendidas sede Comercio y Servicios, Barranquilla, Atlántico.	CONSORCIO INTERINGECO-GNG	CONSORCIO CONSTRUCTOR ALFA
28/01/2021	CINP-BTA-023-0552-0580	Comunicado DCS-322-CO1.2323; APUs Contractuales.	CONSORCIO INTERINGECO-GNG	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA
28/01/2021	CINP-BTA-023-0553-0595	Comunicado DCS-323-CO1.2323; Solicitud prorroga Contrato de Obra.	CONSORCIO INTERINGECO-GNG	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA
29/01/2021	CINP-BTA-023-0554-0620	Comunicado DCS-321-CO1.2323; APUs actividades no previstas.	CONSORCIO INTERINGECO-GNG	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA
29/01/2021	CINP-BTA-023-0555-0621	Informes semanales No. 13, Bolívar y Sucre Contrato de Interventoría.	CONSORCIO INTERINGECO-GNG	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA
29/01/2021	CINP-BTA-023-0556-0622	Comunicado DCS-319-CO1.2323; APUs No Previstos.	CONSORCIO INTERINGECO-GNG	CONSORCIO CONSTRUCTOR ALFA
29/01/2021	CINP-BTA-023-0557-0623	Comunicado DCS-327-CO1.2323; Relación y documentos del personal del departamento de Córdoba.	CONSORCIO INTERINGECO-GNG	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA
29/01/2021	CINP-BTA-023-0558-0624	Comunicado DCS-327-CO1.2323; Relación y documentos del personal del departamento de Córdoba.	CONSORCIO INTERINGECO-GNG	CONSORCIO CONSTRUCTOR ALFA
1/02/2021	CINP-BTA-023-0559-0652	Comunicado DCS-328-CO1.2323; Relación y documentos del personal del departamento de Bolívar.	CONSORCIO INTERINGECO-GNG	CONSORCIO CONSTRUCTOR ALFA
1/02/2021	CINP-BTA-023-0560-0653	Comunicado DCS-324-CO1.2323; Remisión acta de pago parcial No. 1, Contrato de Obra.	CONSORCIO INTERINGECO-GNG	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA
1/02/2021	CINP-BTA-023-0561-0655	Informes semanales No. 14 Contrato de Interventoría.	CONSORCIO INTERINGECO-GNG	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA
1/02/2021	CINP-BTA-023-0562-0657	Comunicado DCS-326-CO1.2323; Programaciones actualizadas contrato de obra.	CONSORCIO INTERINGECO-GNG	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA

CONSORCIO INTERINGECO GNG

RELACIÓN DE CORRESPONDENCIA ENVIADA Y RECIBIDA

CONTRATO DE OBRA: CO1.PCCNTR.1552323
CONTRATO DE INTERVENTORIA: CO1.PCCNTR.1636309
ENTIDAD CONTRATANTE: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA **CONTRATISTA** CONSORCIO CONSTRUCTOR ALFA **INTERVENTORIA** CONSORCIO INTERINGECO-GNG

OBJETO DEL CONTRATO: Realizar la interventoría técnica, administrativa, financiera, jurídica, contable y ambiental, para el mantenimiento predictivo, preventivo, correctivo, reparaciones y mejoras locativas a las instalaciones del servicio nacional de aprendizaje SENA a Nivel Nacional, mediante el sistema de precios unitarios fijos, sin fórmula de reajuste y a monto agotable.

SUPERVISOR DELEGADO: EDGAR JOSE DE LA HOZ HERNANDEZ **PERIODO** 12 DE ENERO AL 11 DE FEBRERO DE 2021

FECHA	REFERENCIA / RADICADO	ASUNTO	ENVÍA	RECIBE
1/02/2021	CINP-BTA-023-0563-0658	Comunicado DCS-326-CO1-2323; Programación actualizada.	CONSORCIO INTERINGECO-GNG	CONSORCIO CONSTRUCTOR ALFA
3/02/2021	CINP-BTA-023-0564-0718	Comunicado DCS-330-CO1-2323; Legalización del contrato y cobro de actividades.	CONSORCIO INTERINGECO-GNG	CONSORCIO CONSTRUCTOR ALFA
3/02/2021	CINP-BTA-023-0565-0719	Comunicado DCS-334-CO1.2323; Factura corte No.01 contrato de obra.	CONSORCIO INTERINGECO-GNG	SENA
3/02/2021	CINP-BTA-023-0564-0729	Informes semanales No. 15 Contrato de Interventoría.	CONSORCIO INTERINGECO-GNG	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA
3/02/2021	CINP-BTA-023-0565-0730	Comunicado DCS-324-CO1.2323; Observaciones Informe Mensual No. 1.	CONSORCIO INTERINGECO-GNG	CONSORCIO CONSTRUCTOR ALFA
3/02/2021	CINP-BTA-023-0566-0731	Comunicado DCS-324-CO1.2323; Observaciones Informe Mensual No. 3 Ambiental y SST.	CONSORCIO INTERINGECO-GNG	CONSORCIO CONSTRUCTOR ALFA
3/02/2021	CINP-BTA-023-0569-0740	Comunicado DCS-324-CO1.2323; Observaciones Informe Mensual No. 2 Ambiental y SST.	CONSORCIO INTERINGECO-GNG	CONSORCIO CONSTRUCTOR ALFA
5/02/2021	CINP-BTA-023-0569-0781	Comunicado DCS-331-CO1.2323; Relación y documentos del personal del departamento se Atlántico.	CONSORCIO INTERINGECO-GNG	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA
5/02/2021	CINP-BTA-023-0571-0802	Comunicado DCS-339-CO1.2323; APUS de implementación protocolo de bioseguridad.	CONSORCIO INTERINGECO-GNG	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA
5/02/2021	CINP-BTA-023-0572-0803	Solicitud de prorroga contrato de interventoría.	CONSORCIO INTERINGECO-GNG	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA
5/02/2021	CINP-BTA-023-0573-0804	Alcance comunicado CINP-BTA-023-0487-7577; Comunicado DCS-CO1.2323; APU´s implementación protocolo de Bioseguridad del contrato de obra No. CO1.PCCNTR.1552323.	CONSORCIO INTERINGECO-GNG	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA
5/02/2021	CINP-BTA-023-0574-0812	Oficio 9-2020-066742, NIS 2020-02-320656, Devolución factura Acta parcial de pago No. 1, Contrato de Obra.	CONSORCIO INTERINGECO-GNG	CONSORCIO CONSTRUCTOR ALFA
8/02/2021	CINP-BTA-023-0575-0855	Solicitud información pago a MADAK INGENIERIA SAS e Ingeniera Katherine Cruz.	CONSORCIO INTERINGECO-GNG	CONSORCIO CONSTRUCTOR ALFA
8/02/2021	CINP-BTA-023-0576-0856	Correo electrónico, Actividades de Lavado y Desinfección de Tanques Sedes Departamento de Córdoba.	CONSORCIO INTERINGECO-GNG	CONSORCIO CONSTRUCTOR ALFA
8/02/2021	CINP-BTA-023-0577-0857	Ingreso personal eléctrico sedes Departamento Sucre.	CONSORCIO INTERINGECO-GNG	CONSORCIO CONSTRUCTOR ALFA
8/02/2021	CINP-BTA-023-0578-0858	Comunicado DCS-340-CO1. 2323; Programación actualizada Departamento del Magdalena.	CONSORCIO INTERINGECO-GNG	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA
10/02/2021	CINP-BTA-023-0579-0901	Comunicado DCS-337-CO1. 2323 - Correcciones a Diagnóstico consolidado Atlántico.	CONSORCIO INTERINGECO-GNG	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA
10/02/2021	CINP-BTA-023-0580-0902	Comunicado DCS-329-CO1. 2323-Ajuste Diagnóstico consolidado Córdoba.	CONSORCIO INTERINGECO-GNG	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA
10/02/2021	CINP-BTA-023-0581-0912	Solicitud de información de personal regional Sucre.	CONSORCIO INTERINGECO-GNG	CONSORCIO CONSTRUCTOR ALFA
10/02/2021	CINP-BTA-023-0582-0914	Presunto incumplimiento de las obligaciones SST-MA.	CONSORCIO INTERINGECO-GNG	CONSORCIO CONSTRUCTOR ALFA
10/02/2021	CINP-BTA-023-0583-0922	Remisión de garantías contra otrosí No. 2, Prórroga No. 2, Contrato de Interventoría.	CONSORCIO INTERINGECO-GNG	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA
11/02/2021	CINP-BTA-023-0584-0972	Informe semanal No. 14 – San Andrés, Contrato de Interventoría.	CONSORCIO INTERINGECO-GNG	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA
11/02/2021	CINP-BTA-023-0585-0973	Informes semanales No. 15 Contrato de Interventoría.	CONSORCIO INTERINGECO-GNG	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA

Firma:
Nombre: PEDRO ANTONIO GUTIERREZ BUSTILLO
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

Anexo No. 13: Informes semanales.

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
GRUPO CONSTRUCCIONES

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA ETAPA CONSTRUCCIÓN

SEMANA No.	21	DEL	11 de enero de 2021	AL	17 de enero de 2021
			(dd-mm-aaaa)		(dd-mm-aaaa)

INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO

CONTRATISTA		INTERVENTOR	
Contratista	CONSORCIO CONSTRUCTOR ALFA	Interventor	CONSORCIO INTER INGECO-GNG
Contrato No.	CO1.PCCNTR.1552323	Contrato No.	CO1.PCCNTR.1636309
Fecha de Iniciación	21 de agosto de 2020	Fecha de Iniciación	12 de agosto de 2020
Fecha de Terminación	HASTA EL 31 DE MARZO DE 2021	Fecha de Terminación	HASTA EL 31 DE MARZO DE 2021
Valor Inicial	$ 8,777,298,757	Valor Inicial	$691,547,950
Adición:	$ 501,925,456	Adición:	N/A
Valor Etapa Construccion	$ 9,279,224,213	Valor Etapa Construccion	$691,547,950
Valor Actualizado Contrato	**$ 9,279,224,213**	Valor Actualizado Contrato	**$691,547,950**
Plazo Inicial	HASTA EL 1 DE DICIEMBRE DE 2020	Plazo Inicial	HASTA EL 15 DE DICIEMBRE DE 2020
Suspensión:	N/A	Suspensión:	N/A
Prórroga 1:	1 MES	Prórroga 1:	15 DÍAS
Prórroga 2:	3 MESES	Prórroga 2:	3 MESES
Plazo Actualizado	HASTA EL 31 DE MARZO DE 2021	Plazo Actualizado	HASTA EL 31 DE MARZO DE 2021

(Diligenciar los campos correspondientes al proyecto, en los campos que no aplique se debe colocar N/A)

OBJETO DEL CONTRATO DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y OBRA :

MANTENIMIENTO PREDICTIVO, PREVENTIVO, CORRECTIVO, REPARACIONES Y MEJORAS LOCATIVAS A LAS INSTALACIONES DEL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA A NIVEL NACIONAL, MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA, CONTABLE Y AMBIENTAL, PARA EL MANTENIMIENTO PREDICTIVO, PREVENTIVO, CORRECTIVO, REPARACIONES Y MEJORAS LOCATIVAS A LAS INSTALACIONES DEL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA A NIVEL NACIONAL, MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE.


PERSONAL QUE INTERVIENE EN EL PROYECTO

CARGO	NOMBRE
DIRECTOR DE OBRA CONTRATISTA:	RICARDO ARTURO MOLINA GARCIA
DIRECTOR DE OBRA INTERVENTORÍA:	PEDRO ANTONIO GUTIERREZ BUSTILLO
ARQUITECTO/INGENIERO RESIDENTE DE OBRA:	GIAN CARLOS ZARUR TORRALVO
INGENIERO/ARQUITECTO RESIDENTE DE INTERVENTORÍA:	SERGIO JAVIER SOLANO ALMANZA
RESIDENTE SISO OBRA	SERGIO FERNAN ALONSO CARVAJAL
RESIDENTE SISO INTERVENTORÍA	XIOMARA PEREZ

SEGUIMIENTO FÍSICO CONTRATO


GRAFICO AVANCE FÍSICO CONTRATO

SEDE COMERCIO Y SERVICIO - RIOHACHA

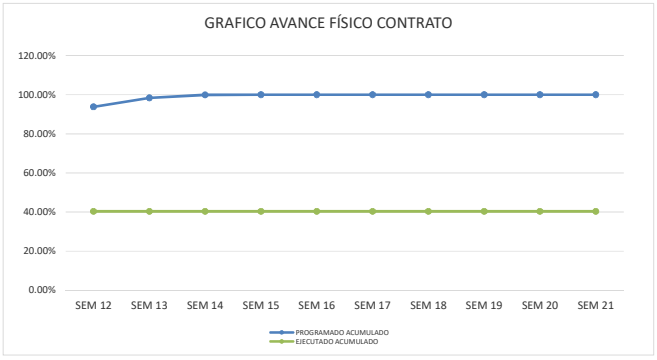

% AVANCE SEMANAL ACUMULADO	PROGRAMADO ACUMULADO	EJECUTADO ACUMULADO	DIFERENCIA
SEM 12	93.79%	40.37%	**-53.42%**
SEM 13	98.34%	40.37%	**-57.97%**
SEM 14	99.89%	40.37%	**-59.52%**
SEM 15	100.00%	40.37%	**-59.63%**
SEM 16	100.00%	40.37%	**-59.63%**
SEM 17	100.00%	40.37%	**-59.63%**
SEM 18	100.00%	40.37%	**-59.63%**
SEM 19	100.00%	40.37%	**-59.63%**
SEM 20	100.00%	40.37%	**-59.63%**
SEM 21	100.00%	40.37%	**-59.63%**
ALERTAS			**-59.63%**
INICIAR PROCESO POR POSIBLE INCUMPLIMIENTO			

CENTRO INDUSTRIAL Y DE ENERGÍAS ALTERNATIVAS - MAICAO

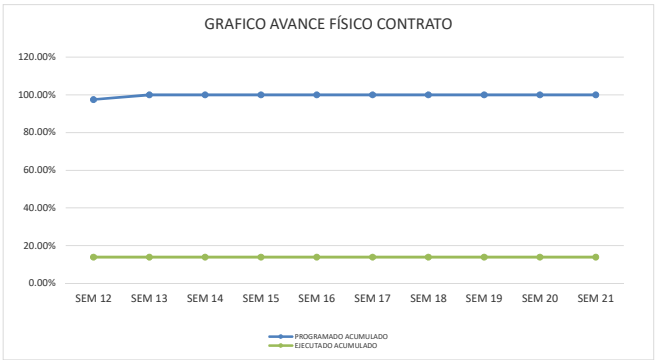


% AVANCE SEMANAL ACUMULADO	PROGRAMADO ACUMULADO	EJECUTADO ACUMULADO	DIFERENCIA
SEM 12	97.51%	13.84%	**-83.67%**
SEM 13	100.00%	13.84%	**-86.16%**
SEM 14	100.00%	13.84%	**-86.16%**
SEM 15	100.00%	13.84%	**-86.16%**
SEM 16	100.00%	13.84%	**-86.16%**
SEM 17	100.00%	13.84%	**-86.16%**
SEM 18	100.00%	13.84%	**-86.16%**
SEM 19	100.00%	13.84%	**-86.16%**
SEM 20	100.00%	13.84%	**-86.16%**
SEM 21	100.00%	13.84%	**-86.16%**
ALERTAS			**-86.16%**
INICIAR PROCESO POR POSIBLE INCUMPLIMIENTO			

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
GRUPO CONSTRUCCIONES

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA ETAPA CONSTRUCCIÓN

SEMANA No.	21	DEL	11 de enero de 2021	AL	17 de enero de 2021


CENTRO INDUSTRIAL Y DE ENERGÍAS ALTERNATIVAS - RIOHACHA

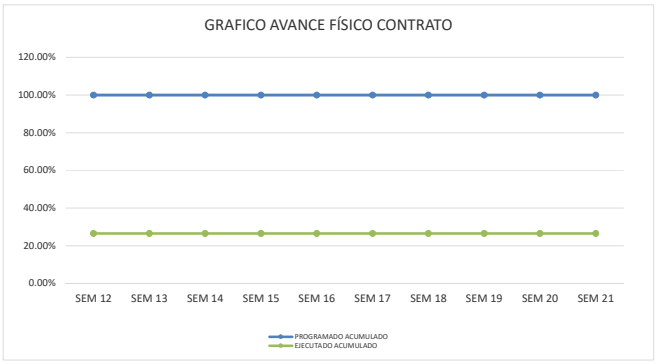

% AVANCE SEMANAL ACUMULADO	PROGRAMADO ACUMULADO	EJECUTADO ACUMULADO	DIFERENCIA
SEM 12	100.00%	26.52%	-73.48%
SEM 13	100.00%	26.52%	-73.48%
SEM 14	100.00%	26.52%	-73.48%
SEM 15	100.00%	26.52%	-73.48%
SEM 16	100.00%	26.52%	-73.48%
SEM 17	100.00%	26.52%	-73.48%
SEM 18	100.00%	26.52%	-73.48%
SEM 19	100.00%	26.52%	-73.48%
SEM 20	100.00%	26.52%	-73.48%
SEM 21	100.00%	26.52%	-73.48%
ALERTAS			-73.48%

INICIAR PROCESO POR POSIBLE INCUMPLIMIENTO


CENTRO AGRO EMPRESARIAL Y ACUÍCOLA - FONSECA

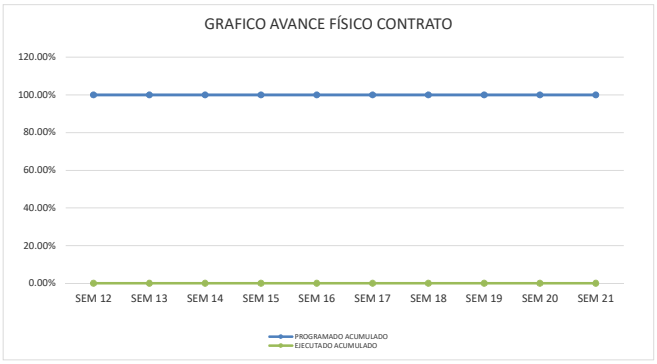

% AVANCE SEMANAL ACUMULADO	PROGRAMADO ACUMULADO	EJECUTADO ACUMULADO	DIFERENCIA
SEM 12	100.00%	0.00%	-100.00%
SEM 13	100.00%	0.00%	-100.00%
SEM 14	100.00%	0.00%	-100.00%
SEM 15	100.00%	0.00%	-100.00%
SEM 16	100.00%	0.00%	-100.00%
SEM 17	100.00%	0.00%	-100.00%
SEM 18	100.00%	0.00%	-100.00%
SEM 19	100.00%	0.00%	-100.00%
SEM 20	100.00%	0.00%	-100.00%
SEM 21	100.00%	0.00%	-100.00%
ALERTAS			-100.00%

INICIAR PROCESO POR POSIBLE INCUMPLIMIENTO

CENTRO ACUÍCOLA Y AGROINDUSTRIAL DE GAIRA - EL BANCO

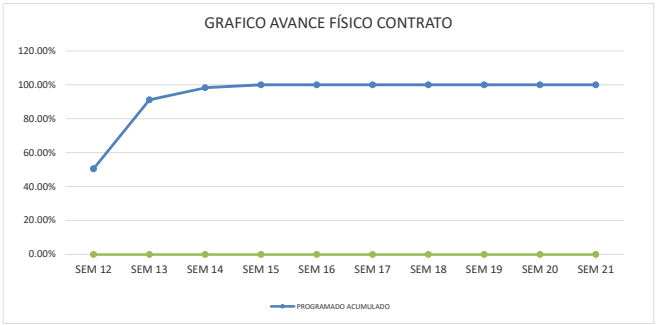

% AVANCE SEMANAL ACUMULADO	PROGRAMADO ACUMULADO	EJECUTADO ACUMULADO	DIFERENCIA
SEM 12	50.52%	0.00%	-50.52%
SEM 13	91.19%	0.00%	-91.19%
SEM 14	98.27%	0.00%	-98.27%
SEM 15	100.00%	0.00%	-100.00%
SEM 16	100.00%	0.00%	-100.00%
SEM 17	100.00%	0.00%	-100.00%
SEM 18	100.00%	0.00%	-100.00%
SEM 19	100.00%	0.00%	-100.00%
SEM 20	100.00%	0.00%	-100.00%
SEM 21	100.00%	0.00%	-100.00%
ALERTAS			-100.00%


INICIAR PROCESO POR POSIBLE INCUMPLIMIENTO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
GRUPO CONSTRUCCIONES

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA ETAPA CONSTRUCCIÓN


SEMANA No.	21	DEL	11 de enero de 2021	AL	17 de enero de 2021

CENTRO ACUÍCOLA Y AGROINDUSTRIAL DE GAIRA - GAIRA

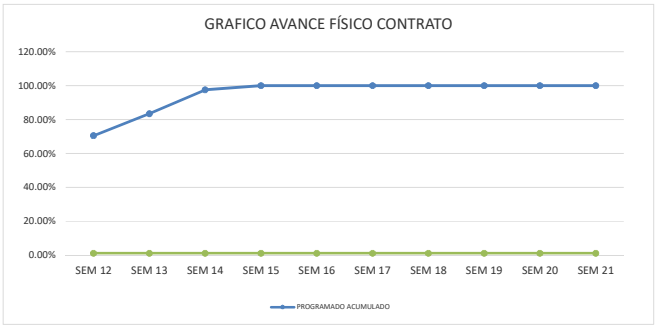


% AVANCE SEMANAL ACUMULADO	PROGRAMADO ACUMULADO	EJECUTADO ACUMULADO	DIFERENCIA
SEM 12	70.58%	1.25%	-69.33%
SEM 13	83.44%	1.25%	-82.19%
SEM 14	97.57%	1.25%	-96.32%
SEM 15	100.00%	1.25%	-98.75%
SEM 16	100.00%	1.25%	-98.75%
SEM 17	100.00%	1.25%	-98.75%
SEM 18	100.00%	1.25%	-98.75%
SEM 19	100.00%	1.25%	-98.75%
SEM 20	100.00%	1.25%	-98.75%
SEM 21	100.00%	1.25%	-98.75%
ALERTAS			-98.75%
INICIAR PROCESO POR POSIBLE INCUMPLIMIENTO			

CENTRO DE LOGÍSTICA Y PROMOCIÓN ECOTURÍSTICA DEL MAGDALENA - CIÉNAGA

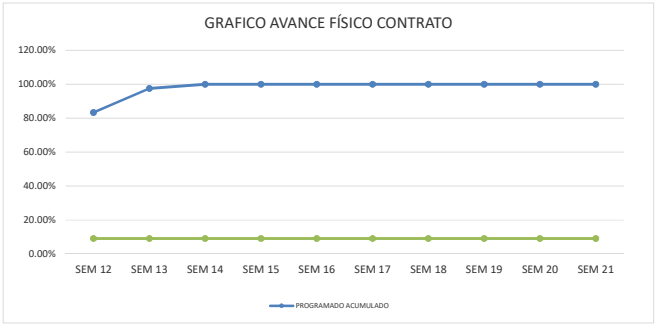


% AVANCE SEMANAL ACUMULADO	PROGRAMADO ACUMULADO	EJECUTADO ACUMULADO	DIFERENCIA
SEM 12	83.41%	9.13%	-74.28%
SEM 13	97.54%	9.13%	-88.41%
SEM 14	100.00%	9.13%	-90.87%
SEM 15	100.00%	9.13%	-90.87%
SEM 16	100.00%	9.13%	-90.87%
SEM 17	100.00%	9.13%	-90.87%
SEM 18	100.00%	9.13%	-90.87%
SEM 19	100.00%	9.13%	-90.87%
SEM 20	100.00%	9.13%	-90.87%
SEM 21	100.00%	9.13%	-90.87%
ALERTAS			-90.87%
INICIAR PROCESO POR POSIBLE INCUMPLIMIENTO			

CENTRO ACUÍCOLA Y AGROINDUSTRIAL DE GAIRA - FUNDACIÓN

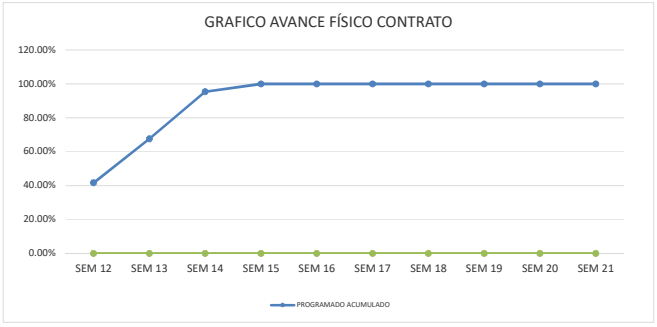

% AVANCE SEMANAL ACUMULADO	PROGRAMADO ACUMULADO	EJECUTADO ACUMULADO	DIFERENCIA
SEM 12	41.65%	0.00%	-41.65%
SEM 13	67.58%	0.00%	-67.58%
SEM 14	95.38%	0.00%	-95.38%
SEM 15	100.00%	0.00%	-100.00%
SEM 16	100.00%	0.00%	-100.00%
SEM 17	100.00%	0.00%	-100.00%
SEM 18	100.00%	0.00%	-100.00%
SEM 19	100.00%	0.00%	-100.00%
SEM 20	100.00%	0.00%	-100.00%
SEM 21	100.00%	0.00%	-100.00%
ALERTAS			-100.00%
INICIAR PROCESO POR POSIBLE INCUMPLIMIENTO			

CENTRO DE LOGÍSTICA Y PROMOCIÓN ECOTURÍSTICA DEL MAGDALENA - IPC MARÍA EUGENIA

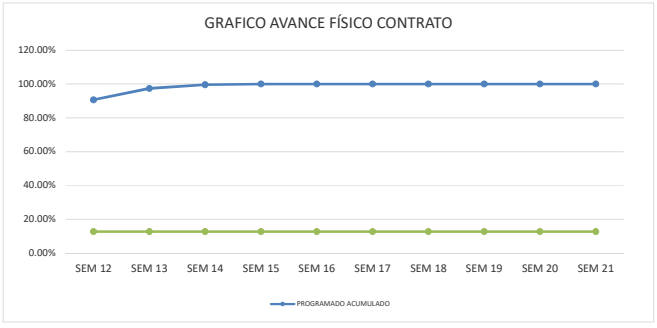


% AVANCE SEMANAL ACUMULADO	PROGRAMADO ACUMULADO	EJECUTADO ACUMULADO	DIFERENCIA
SEM 12	90.69%	12.81%	-77.88%
SEM 13	97.40%	12.81%	-84.59%
SEM 14	99.57%	12.81%	-86.76%
SEM 15	100.00%	12.81%	-87.19%
SEM 16	100.00%	12.81%	-87.19%
SEM 17	100.00%	12.81%	-87.19%
SEM 18	100.00%	12.81%	-87.19%
SEM 19	100.00%	12.81%	-87.19%
SEM 20	100.00%	12.81%	-87.19%
SEM 21	100.00%	12.81%	-87.19%
ALERTAS			-87.19%
INICIAR PROCESO POR POSIBLE INCUMPLIMIENTO			

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
GRUPO CONSTRUCCIONES

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA ETAPA CONSTRUCCIÓN

SEMANA No.	21	DEL	11 de enero de 2021	AL	17 de enero de 2021


CENTRO DE LOGÍSTICA Y PROMOCIÓN ECOTURÍSTICA DEL MAGDALENA - SANTA MARTA

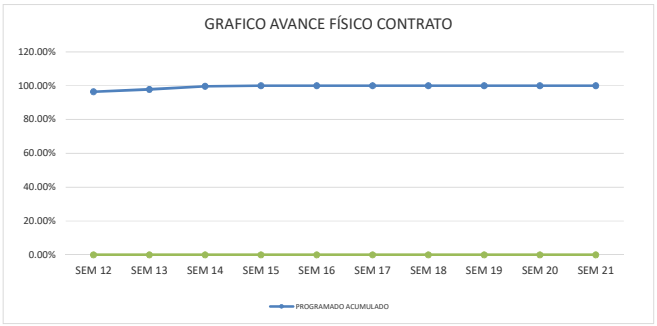

% AVANCE SEMANAL ACUMULADO	PROGRAMADO ACUMULADO	EJECUTADO ACUMULADO	DIFERENCIA
SEM 12	96.41%	0.00%	-96.41%
SEM 13	97.78%	0.00%	-97.78%
SEM 14	99.67%	0.00%	-99.67%
SEM 15	100.00%	0.00%	-100.00%
SEM 16	100.00%	0.00%	-100.00%
SEM 17	100.00%	0.00%	-100.00%
SEM 18	100.00%	0.00%	-100.00%
SEM 19	100.00%	0.00%	-100.00%
SEM 20	100.00%	0.00%	-100.00%
SEM 21	100.00%	0.00%	-100.00%
ALERTAS			-100.00%

INICIAR PROCESO POR POSIBLE INCUMPLIMIENTO

CENTRO DE LOGÍSTICA Y PROMOCIÓN ECOTURÍSTICA DEL MAGDALENA - APE Y SERVICIO MÉDICO

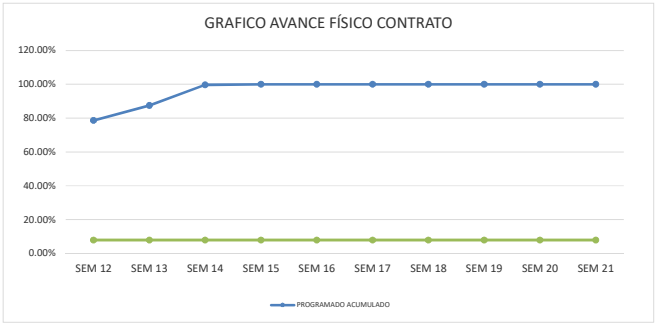


% AVANCE SEMANAL ACUMULADO	PROGRAMADO ACUMULADO	EJECUTADO ACUMULADO	DIFERENCIA
SEM 12	78.62%	7.94%	-70.68%
SEM 13	87.55%	7.94%	-79.61%
SEM 14	99.65%	7.94%	-91.71%
SEM 15	100.00%	7.94%	-92.06%
SEM 16	100.00%	7.94%	-92.06%
SEM 17	100.00%	7.94%	-92.06%
SEM 18	100.00%	7.94%	-92.06%
SEM 19	100.00%	7.94%	-92.06%
SEM 20	100.00%	7.94%	-92.06%
SEM 21	100.00%	7.94%	-92.06%
ALERTAS			-92.06%

INICIAR PROCESO POR POSIBLE INCUMPLIMIENTO

SEGUIMIENTO FINANCIERO CONTRATO DE OBRA (Millones de $) (ETAPA DE OBRA)

GRAFICO AVANCE FINANCIERO CONTRATO ETAPA DE OBRA


SEDE COMERCIO Y SERVICIO - RIOHACHA

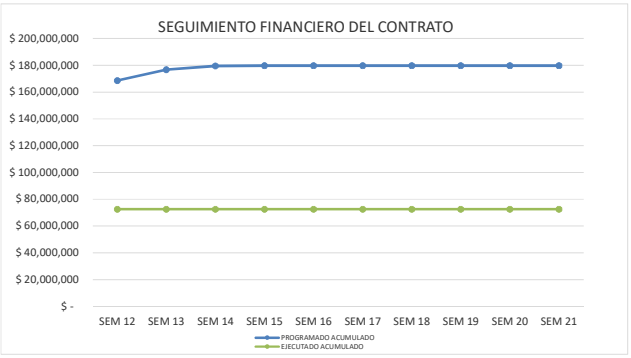

VALOR SEMANAL ACUMULADO	PROGRAMADO ACUMULADO	EJECUTADO ACUMULADO	DIFERENCIA
SEM 12	$ 168,602,475	$ 72,570,665	$ -96,031,810.29
SEM 13	$ 176,781,825	$ 72,570,665	$ -104,211,160.56
SEM 14	$ 179,568,198	$ 72,570,665	$ -106,997,532.64
SEM 15	$ 179,765,940	$ 72,570,665	$ -107,195,275.17
SEM 16	$ 179,765,940	$ 72,570,665	$ -107,195,275.17
SEM 17	$ 179,765,940	$ 72,570,665	$ -107,195,275.17
SEM 18	$ 179,765,940	$ 72,570,665	$ -107,195,275.17
SEM 19	$ 179,765,940	$ 72,570,665	$ -107,195,275.17
SEM 20	$ 179,765,940	$ 72,570,665	$ -107,195,275.17
SEM 21	$ 179,765,940	$ 72,570,665	$ -107,195,275.17

Nota : incluir el avance las ultimas 8 semanas (en Millones)

CENTRO INDUSTRIAL Y DE ENERGÍAS ALTERNATIVAS - MAICAO

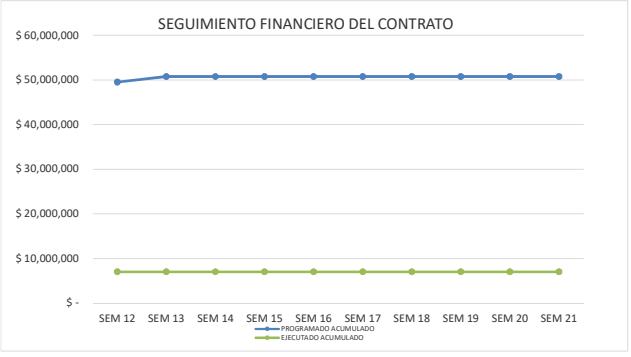

VALOR SEMANAL ACUMULADO	PROGRAMADO ACUMULADO	EJECUTADO ACUMULADO	DIFERENCIA
SEM 12	$ 49,506,855	$ 7,026,713.84	$ -42,480,140.69
SEM 13	$ 50,771,054	$ 7,026,713.84	$ -43,744,339.93
SEM 14	$ 50,771,054	$ 7,026,713.84	$ -43,744,339.93
SEM 15	$ 50,771,054	$ 7,026,713.84	$ -43,744,339.93
SEM 16	$ 50,771,054	$ 7,026,713.84	$ -43,744,339.93
SEM 17	$ 50,771,054	$ 7,026,713.84	$ -43,744,339.93
SEM 18	$ 50,771,054	$ 7,026,713.84	$ -43,744,339.93
SEM 19	$ 50,771,054	$ 7,026,713.84	$ -43,744,339.93
SEM 20	$ 50,771,054	$ 7,026,713.84	$ -43,744,339.93
SEM 21	$ 50,771,054	$ 7,026,713.84	$ -43,744,339.93


Nota : incluir el avance las ultimas 8 semanas (en Millones)

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
GRUPO CONSTRUCCIONES

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA ETAPA CONSTRUCCIÓN

SEMANA No.	21	DEL	11 de enero de 2021	AL	17 de enero de 2021


CENTRO INDUSTRIAL Y DE ENERGÍAS ALTERNATIVAS - RIOHACHA

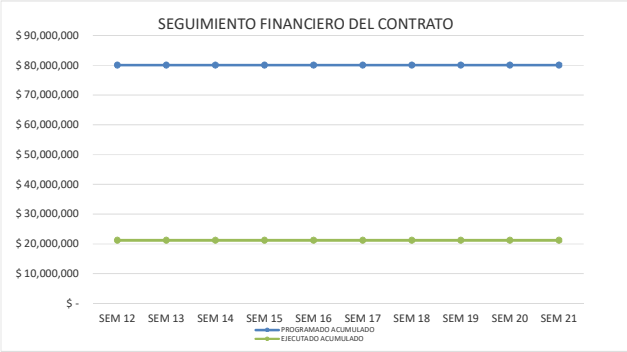

VALOR SEMANAL ACUMULADO	PROGRAMADO ACUMULADO	EJECUTADO ACUMULADO	DIFERENCIA
SEM 12	$ 80,076,766	$ 21,232,354.65	$ -58,844,411.80
SEM 13	$ 80,076,766	$ 21,232,354.65	$ -58,844,411.80
SEM 14	$ 80,076,766	$ 21,232,354.65	$ -58,844,411.80
SEM 15	$ 80,076,766	$ 21,232,354.65	$ -58,844,411.80
SEM 16	$ 80,076,766	$ 21,232,354.65	$ -58,844,411.80
SEM 17	$ 80,076,766	$ 21,232,354.65	$ -58,844,411.80
SEM 18	$ 80,076,766	$ 21,232,354.65	$ -58,844,411.80
SEM 19	$ 80,076,766	$ 21,232,354.65	$ -58,844,411.80
SEM 20	$ 80,076,766	$ 21,232,354.65	$ -58,844,411.80
SEM 21	$ 80,076,766	$ 21,232,354.65	$ -58,844,411.80

Nota : incluir el avance las ultimas 8 semanas (en Millones)


CENTRO AGRO EMPRESARIAL Y ACUÍCOLA - FONSECA

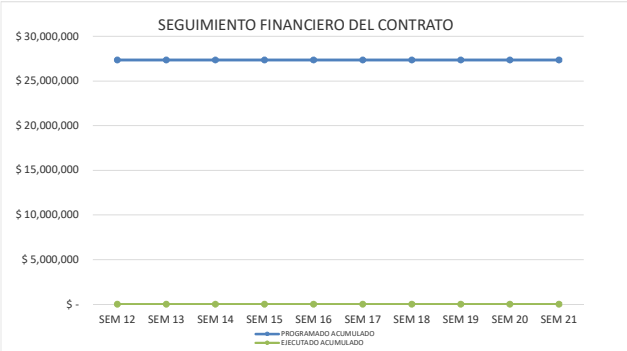

VALOR SEMANAL ACUMULADO	PROGRAMADO ACUMULADO	EJECUTADO ACUMULADO	DIFERENCIA
SEM 12	$ 27,364,346	$ -	$ -27,364,345.78
SEM 13	$ 27,364,346	$ -	$ -27,364,345.78
SEM 14	$ 27,364,346	$ -	$ -27,364,345.78
SEM 15	$ 27,364,346	$ -	$ -27,364,345.78
SEM 16	$ 27,364,346	$ -	$ -27,364,345.78
SEM 17	$ 27,364,346	$ -	$ -27,364,345.78
SEM 18	$ 27,364,346	$ -	$ -27,364,345.78
SEM 19	$ 27,364,346	$ -	$ -27,364,345.78
SEM 20	$ 27,364,346	$ -	$ -27,364,345.78
SEM 21	$ 27,364,346	$ -	$ -27,364,345.78

Nota : incluir el avance las ultimas 8 semanas (en Millones)


CENTRO ACUÍCOLA Y AGROINDUSTRIAL DE GAIRA - EL BANCO

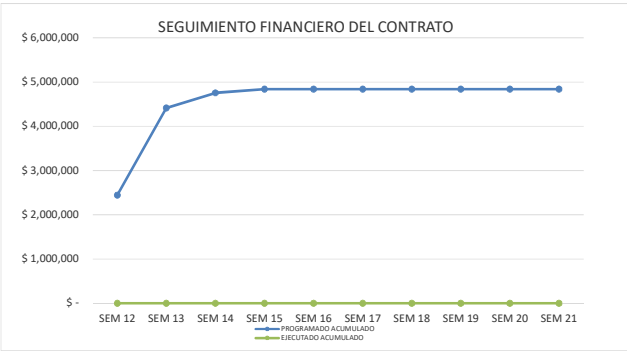

VALOR SEMANAL ACUMULADO	PROGRAMADO ACUMULADO	EJECUTADO ACUMULADO	DIFERENCIA
SEM 12	$ 2,445,343	$ -	$ -2,445,343.37
SEM 13	$ 4,413,913	$ -	$ -4,413,912.54
SEM 14	$ 4,756,609	$ -	$ -4,756,609.12
SEM 15	$ 4,840,347	$ -	$ -4,840,347.12
SEM 16	$ 4,840,347	$ -	$ -4,840,347.12
SEM 17	$ 4,840,347	$ -	$ -4,840,347.12
SEM 18	$ 4,840,347	$ -	$ -4,840,347.12
SEM 19	$ 4,840,347	$ -	$ -4,840,347.12
SEM 20	$ 4,840,347	$ -	$ -4,840,347.12
SEM 21	$ 4,840,347	$ -	$ -4,840,347.12

Nota : incluir el avance las ultimas 8 semanas (en Millones)

CENTRO ACUÍCOLA Y AGROINDUSTRIAL DE GAIRA - GAIRA

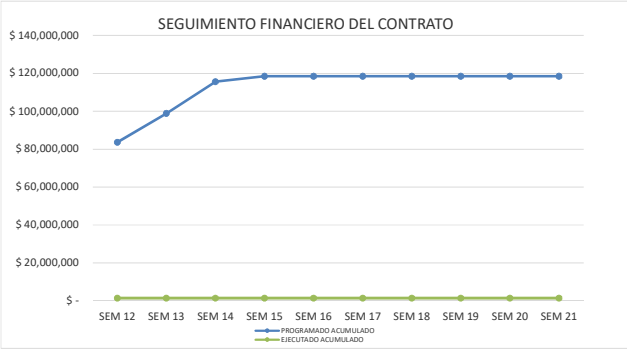

VALOR SEMANAL ACUMULADO	PROGRAMADO ACUMULADO	EJECUTADO ACUMULADO	DIFERENCIA
SEM 12	$ 83,653,639	$ 1,481,539.38	$ -82,172,099.97
SEM 13	$ 98,895,716	$ 1,481,539.38	$ -97,414,177.07
SEM 14	$ 115,643,038	$ 1,481,539.38	$ -114,161,498.18
SEM 15	$ 118,523,150	$ 1,481,539.38	$ -117,041,610.73
SEM 16	$ 118,523,150	$ 1,481,539.38	$ -117,041,610.73
SEM 17	$ 118,523,150	$ 1,481,539.38	$ -117,041,610.73
SEM 18	$ 118,523,150	$ 1,481,539.38	$ -117,041,610.73
SEM 19	$ 118,523,150	$ 1,481,539.38	$ -117,041,610.73
SEM 20	$ 118,523,150	$ 1,481,539.38	$ -117,041,610.73
SEM 21	$ 118,523,150	$ 1,481,539.38	$ -117,041,610.73


Nota : incluir el avance las ultimas 8 semanas (en Millones)

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
GRUPO CONSTRUCCIONES

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA ETAPA CONSTRUCCIÓN

SEMANA No.	21	DEL	11 de enero de 2021	AL	17 de enero de 2021


CENTRO DE LOGÍSTICA Y PROMOCIÓN ECOTURÍSTICA DEL MAGDALENA - CIÉNAGA

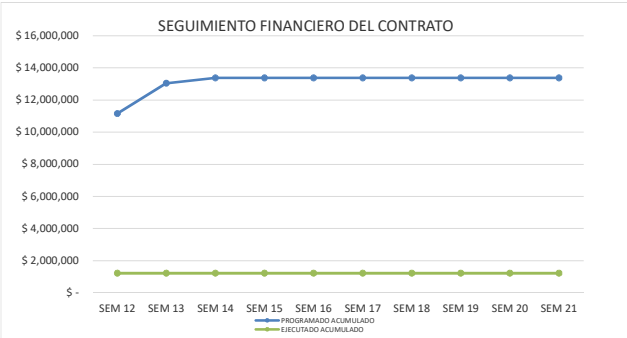

VALOR SEMANAL ACUMULADO	PROGRAMADO ACUMULADO	EJECUTADO ACUMULADO	DIFERENCIA
SEM 12	$ 11,155,550	$ 1,221,078.70	$ -9,934,471.58
SEM 13	$ 13,045,347	$ 1,221,078.70	$ -11,824,268.08
SEM 14	$ 13,374,356	$ 1,221,078.70	$ -12,153,277.23
SEM 15	$ 13,374,356	$ 1,221,078.70	$ -12,153,277.23
SEM 16	$ 13,374,356	$ 1,221,078.70	$ -12,153,277.23
SEM 17	$ 13,374,356	$ 1,221,078.70	$ -12,153,277.23
SEM 18	$ 13,374,356	$ 1,221,078.70	$ -12,153,277.23
SEM 19	$ 13,374,356	$ 1,221,078.70	$ -12,153,277.23
SEM 20	$ 13,374,356	$ 1,221,078.70	$ -12,153,277.23
SEM 21	$ 13,374,356	$ 1,221,078.70	$ -12,153,277.23

Nota : incluir el avance las ultimas 8 semanas (en Millones)


CENTRO ACUÍCOLA Y AGROINDUSTRIAL DE GAIRA - FUNDACIÓN

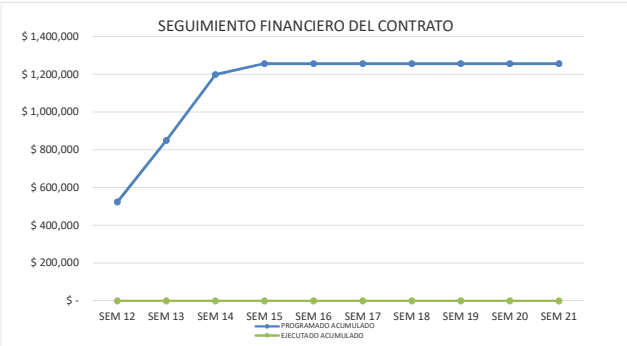

VALOR SEMANAL ACUMULADO	PROGRAMADO ACUMULADO	EJECUTADO ACUMULADO	DIFERENCIA
SEM 12	$ 523,170	$ -	$ -523,170.27
SEM 13	$ 848,880	$ -	$ -848,879.87
SEM 14	$ 1,198,079	$ -	$ -1,198,078.76
SEM 15	$ 1,256,111	$ -	$ -1,256,111.09
SEM 16	$ 1,256,111	$ -	$ -1,256,111.09
SEM 17	$ 1,256,111	$ -	$ -1,256,111.09
SEM 18	$ 1,256,111	$ -	$ -1,256,111.09
SEM 19	$ 1,256,111	$ -	$ -1,256,111.09
SEM 20	$ 1,256,111	$ -	$ -1,256,111.09
SEM 21	$ 1,256,111	$ -	$ -1,256,111.09

Nota : incluir el avance las ultimas 8 semanas (en Millones)


CENTRO DE LOGÍSTICA Y PROMOCIÓN ECOTURÍSTICA DEL MAGDALENA - IPC MARÍA EUGENIA

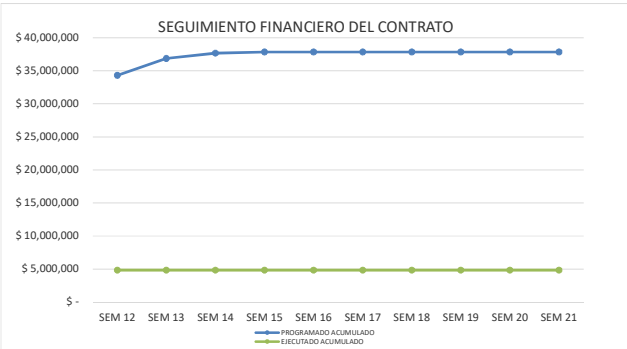

VALOR SEMANAL ACUMULADO	PROGRAMADO ACUMULADO	EJECUTADO ACUMULADO	DIFERENCIA
SEM 12	$ 34,322,418	$ 4,848,055.77	$ -29,474,362.45
SEM 13	$ 36,861,876	$ 4,848,055.77	$ -32,013,820.23
SEM 14	$ 37,683,131	$ 4,848,055.77	$ -32,835,075.58
SEM 15	$ 37,845,869	$ 4,848,055.77	$ -32,997,812.81
SEM 16	$ 37,845,869	$ 4,848,055.77	$ -32,997,812.81
SEM 17	$ 37,845,869	$ 4,848,055.77	$ -32,997,812.81
SEM 18	$ 37,845,869	$ 4,848,055.77	$ -32,997,812.81
SEM 19	$ 37,845,869	$ 4,848,055.77	$ -32,997,812.81
SEM 20	$ 37,845,869	$ 4,848,055.77	$ -32,997,812.81
SEM 21	$ 37,845,869	$ 4,848,055.77	$ -32,997,812.81

Nota : incluir el avance las ultimas 8 semanas (en Millones)

CENTRO DE LOGÍSTICA Y PROMOCIÓN ECOTURÍSTICA DEL MAGDALENA - SANTA MARTA

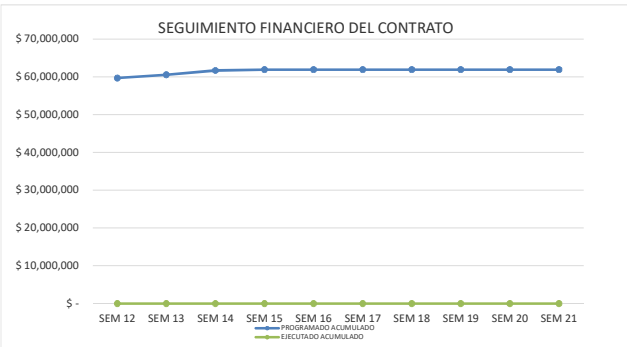

VALOR SEMANAL ACUMULADO	PROGRAMADO ACUMULADO	EJECUTADO ACUMULADO	DIFERENCIA
SEM 12	$ 59,694,501	$ -	$ -59,694,500.89
SEM 13	$ 60,542,768	$ -	$ -60,542,768.36
SEM 14	$ 61,713,006	$ -	$ -61,713,005.95
SEM 15	$ 61,917,333	$ -	$ -61,917,333.15
SEM 16	$ 61,917,333	$ -	$ -61,917,333.15
SEM 17	$ 61,917,333	$ -	$ -61,917,333.15
SEM 18	$ 61,917,333	$ -	$ -61,917,333.15
SEM 19	$ 61,917,333	$ -	$ -61,917,333.15
SEM 20	$ 61,917,333	$ -	$ -61,917,333.15
SEM 21	$ 61,917,333	$ -	$ -61,917,333.15


Nota : incluir el avance las ultimas 8 semanas (en Millones)

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
GRUPO CONSTRUCCIONES

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA ETAPA CONSTRUCCIÓN

SEMANA No.	21	DEL	11 de enero de 2021	AL	17 de enero de 2021

CENTRO DE LOGÍSTICA Y PROMOCIÓN ECOTURÍSTICA DEL MAGDALENA - APE Y SERVICIO MÉDICO

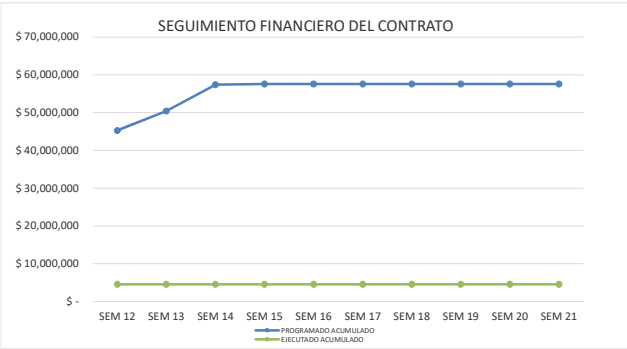

VALOR SEMANAL ACUMULADO	PROGRAMADO ACUMULADO	EJECUTADO ACUMULADO	DIFERENCIA
SEM 12	$ 45,270,870	$ 4,572,000.84	$ -40,698,868.90
SEM 13	$ 50,412,931	$ 4,572,000.84	$ -45,840,930.29
SEM 14	$ 57,380,338	$ 4,572,000.84	$ -52,808,337.11
SEM 15	$ 57,581,875	$ 4,572,000.84	$ -53,009,873.67
SEM 16	$ 57,581,875	$ 4,572,000.84	$ -53,009,873.67
SEM 17	$ 57,581,875	$ 4,572,000.84	$ -53,009,873.67
SEM 18	$ 57,581,875	$ 4,572,000.84	$ -53,009,873.67
SEM 19	$ 57,581,875	$ 4,572,000.84	$ -53,009,873.67
SEM 20	$ 57,581,875	$ 4,572,000.84	$ -53,009,873.67
SEM 21	$ 57,581,875	$ 4,572,000.84	$ -53,009,873.67

Nota : incluir el avance las ultimas 8 semanas (en Millones)

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
GRUPO CONSTRUCCIONES

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA ETAPA CONSTRUCCIÓN

SEMANA No.	21	DEL	11 de enero de 2021	AL	17 de enero de 2021

CONTROL DE HITOS ETAPA DE CONSTRUCCIÓN

SEDE COMERCIO Y SERVICIO - RIOHACHA

No.	*** DESCRIPCIÓN DEL HITO	INICIO PROGR.	INICIO REAL	FIN PROGR.	FIN REAL	DÍAS DE ATRASO INICIO ATRASO (-) AVANCE (+)	DÍAS DE ATRASO FIN ATRASO (-) AVANCE (+)
	SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO (HITO OBLIGATORIO)					0.00	0.00
	PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD Y PRELIMINARES	19/10/2020	6/10/2020	19/10/2020		13.00	
1	IMPERMEABILIZACIONES	20/10/2020	3/11/2020	31/12/2020		-14.00	
2	SISTEMA ELÉCTRICO	20/10/2020		31/12/2020		-89.00	
3	SERVICIO DE JARDINERÍA	11/12/2020	3/11/2020	31/12/2020	13/11/2020	38.00	48.00
5	LAVADO DE TANQUES	22/12/2020		30/12/2020		-26.00	
7	SISTEMAS DE REFRIGERACIÓN	20/10/2020	13/10/2020	31/12/2020	19/10/2020	7.00	
10	NO PREVISTOS	5/11/2020	6/10/2020	31/12/2020		30.00	
	ENTREGA A LA INTERVENTORÍA DE LOS PRODUCTOS Y/O ACTIVIDADES CONTRATADAS (HITO OBLIGATORIO)						

CENTRO INDUSTRIAL Y DE ENERGÍAS ALTERNATIVAS - MAICAO

No.	*** DESCRIPCIÓN DEL HITO	INICIO PROGR.	INICIO REAL	FIN PROGR.	FIN REAL	DÍAS DE ATRASO INICIO ATRASO (-) AVANCE (+)	DÍAS DE ATRASO FIN ATRASO (-) AVANCE (+)
	SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO (HITO OBLIGATORIO)					0.00	0.00
	PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD Y PRELIMINARES	31/10/2020		3/11/2020		-78.00	
3	SERVICIO DE JARDINERÍA	12/12/2020		31/12/2020		-36.00	
5	LAVADO DE TANQUES	3/11/2020		4/11/2020		-75.00	
7	SISTEMAS DE REFRIGERACIÓN	21/11/2020	13/10/2021	31/12/2020	19/10/2020	-326.00	
8	MANTENIMIENTOS GENERALES (limpieza, demoliciones, pinturas, estructuras, etc.)	3/11/2020		17/11/2020		-75.00	
10	NO PREVISTOS	3/11/2020		31/12/2020		-75.00	
	ENTREGA A LA INTERVENTORÍA DE LOS PRODUCTOS Y/O ACTIVIDADES CONTRATADAS (HITO OBLIGATORIO)						

CENTRO INDUSTRIAL Y DE ENERGÍAS ALTERNATIVAS - RIOHACHA

No.	*** DESCRIPCIÓN DEL HITO	INICIO PROGR.	INICIO REAL	FIN PROGR.	FIN REAL	DÍAS DE ATRASO INICIO ATRASO (-) AVANCE (+)	DÍAS DE ATRASO FIN ATRASO (-) AVANCE (+)
	SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO (HITO OBLIGATORIO)					0.00	0.00
	PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD Y PRELIMINARES	31/10/2020		3/11/2020		-78.00	
2	SISTEMA ELÉCTRICO	3/11/2020		31/12/2020		-75.00	
3	SERVICIO DE JARDINERÍA	2/12/2020		31/12/2020		-46.00	
5	LAVADO DE TANQUES	28/11/2020		21/12/2020		-50.00	
7	SISTEMAS DE REFRIGERACIÓN	23/11/2020	14/10/2020	1/12/2020	25/10/2020	40.00	37.00
10	NO PREVISTOS	9/11/2020		31/12/2020		-69.00	
	ENTREGA A LA INTERVENTORÍA DE LOS PRODUCTOS Y/O ACTIVIDADES CONTRATADAS (HITO OBLIGATORIO)						

CENTRO AGRO EMPRESARIAL Y ACUÍCOLA - FONSECA

No.	*** DESCRIPCIÓN DEL HITO	INICIO PROGR.	INICIO REAL	FIN PROGR.	FIN REAL	DÍAS DE ATRASO INICIO ATRASO (-) AVANCE (+)	DÍAS DE ATRASO FIN ATRASO (-) AVANCE (+)
	SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO (HITO OBLIGATORIO)					0.00	0.00
	PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD Y PRELIMINARES	18/09/2020		18/09/2020		-121.00	
3	SERVICIO DE JARDINERÍA	19/09/2020		1/12/2020		-120.00	
5	LAVADO DE TANQUES	19/09/2020		5/10/2020		-120.00	
10	NO PREVISTOS	21/09/2020		25/11/2020		-118.00	
	ENTREGA A LA INTERVENTORÍA DE LOS PRODUCTOS Y/O ACTIVIDADES CONTRATADAS (HITO OBLIGATORIO)						

CENTRO ACUÍCOLA Y AGROINDUSTRIAL DE GAIRA - EL BANCO

No.	*** DESCRIPCIÓN DEL HITO	INICIO PROGR.	INICIO REAL	FIN PROGR.	FIN REAL	DÍAS DE ATRASO INICIO ATRASO (-) AVANCE (+)	DÍAS DE ATRASO FIN ATRASO (-) AVANCE (+)
	SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO (HITO OBLIGATORIO)					0.00	0.00
	PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD Y PRELIMINARES	3/11/2020		3/11/2020		-75.00	
3	SERVICIO DE JARDINERÍA	30/11/2020		31/12/2020		-48.00	
5	LAVADO DE TANQUES	4/11/2020		1/12/2020		-74.00	
7	SISTEMAS DE REFRIGERACIÓN	1/12/2020		15/12/2020		-47.00	
10	NO PREVISTOS	4/11/2020		31/12/2020		-74.00	
	ENTREGA A LA INTERVENTORÍA DE LOS PRODUCTOS Y/O ACTIVIDADES CONTRATADAS (HITO OBLIGATORIO)						

CENTRO ACUÍCOLA Y AGROINDUSTRIAL DE GAIRA - GAIRA

No.	*** DESCRIPCIÓN DEL HITO	INICIO PROGR.	INICIO REAL	FIN PROGR.	FIN REAL	DÍAS DE ATRASO INICIO ATRASO (-) AVANCE (+)	DÍAS DE ATRASO FIN ATRASO (-) AVANCE (+)
	SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO (HITO OBLIGATORIO)					0.00	0.00
	PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD Y PRELIMINARES	3/11/2020		3/11/2020		-75.00	
2	SISTEMA ELÉCTRICO	14/10/2020		1/12/2020		-95.00	
4	EQUIPOS DE BOMBEO	30/11/2020		19/12/2020		-48.00	
5	LAVADO DE TANQUES	4/11/2020		4/12/2020		-74.00	
7	SISTEMAS DE REFRIGERACIÓN	4/11/2020	26/10/2020	31/12/2020		9.00	
8	MANTENIMIENTOS GENERALES (limpieza, demoliciones, pinturas, estructuras, etc.)	4/11/2020		31/12/2020		-74.00	
9	UNIDADES SANITARIAS, REDES HIDRÁULICAS, HIDROSANITARIAS Y PLUVIALES	13/11/2020		23/12/2020		-65.00	
10	NO PREVISTOS	4/11/2020		31/12/2020		-74.00	

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
GRUPO CONSTRUCCIONES

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA ETAPA CONSTRUCCIÓN

SEMANA No.	21	DEL	11 de enero de 2021	AL	17 de enero de 2021

CENTRO DE LOGÍSTICA Y PROMOCIÓN ECOTURÍSTICA DEL MAGDALENA - CIÉNAGA

No.	*** DESCRIPCIÓN DEL HITO	INICIO PROGR.	INICIO REAL	FIN PROGR.	FIN REAL	DÍAS DE ATRASO INICIO ATRASO (-) AVANCE (+)	DÍAS DE ATRASO FIN ATRASO (-) AVANCE (+)
	ENTREGA A LA INTERVENTORÍA DE LOS PRODUCTOS Y/O ACTIVIDADES CONTRATADAS (HITO OBLIGATORIO)						
	SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO (HITO OBLIGATORIO)					**0.00**	**0.00**
	PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD Y PRELIMINARES	30/11/2020		30/11/2020		**-48.00**	
1	IMPERMEABILIZACIONES	1/12/2020		31/12/2020		**-47.00**	
5	LAVADO DE TANQUES	15/12/2020		23/12/2020		**-33.00**	
7	SISTEMAS DE REFRIGERACIÓN	4/12/2020		31/12/2020		**-44.00**	
8	MANTENIMIENTOS GENERALES (limpieza, demoliciones, pinturas, estructuras, etc.)	1/12/2020		29/12/2020		**-47.00**	
9	UNIDADES SANITARIAS, REDES HIDRÁULICAS, HIDROSANITARIAS Y PLUVIALES	1/12/2020		11/12/2020		**-47.00**	
10	NO PREVISTOS	1/12/2020		31/12/2020		**-47.00**	
	ENTREGA A LA INTERVENTORÍA DE LOS PRODUCTOS Y/O ACTIVIDADES CONTRATADAS (HITO OBLIGATORIO)						

CENTRO ACUÍCOLA Y AGROINDUSTRIAL DE GAIRA - FUNDACIÓN

No.	*** DESCRIPCIÓN DEL HITO	INICIO PROGR.	INICIO REAL	FIN PROGR.	FIN REAL	DÍAS DE ATRASO INICIO ATRASO (-) AVANCE (+)	DÍAS DE ATRASO FIN ATRASO (-) AVANCE (+)
	SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO (HITO OBLIGATORIO)					**0.00**	**0.00**
	PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD Y PRELIMINARES	30/11/2020		30/11/2020		**-48.00**	
5	LAVADO DE TANQUES	1/12/2020		12/12/2020		**-47.00**	
7	SISTEMAS DE REFRIGERACIÓN	14/12/2020		31/12/2020		**-34.00**	
10	NO PREVISTOS	1/12/2020		31/12/2020		**-47.00**	
	ENTREGA A LA INTERVENTORÍA DE LOS PRODUCTOS Y/O ACTIVIDADES CONTRATADAS (HITO OBLIGATORIO)						

CENTRO DE LOGÍSTICA Y PROMOCIÓN ECOTURÍSTICA DEL MAGDALENA - IPC MARÍA EUGENIA

No.	*** DESCRIPCIÓN DEL HITO	INICIO PROGR.	INICIO REAL	FIN PROGR.	FIN REAL	DÍAS DE ATRASO INICIO ATRASO (-) AVANCE (+)	DÍAS DE ATRASO FIN ATRASO (-) AVANCE (+)
	SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO (HITO OBLIGATORIO)					**0.00**	**0.00**
	PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD Y PRELIMINARES	30/11/2020		30/11/2020		**-48.00**	
1	IMPERMEABILIZACIONES	17/12/2020		31/12/2020		**-31.00**	
3	SERVICIO DE JARDINERÍA	1/12/2020		31/12/2020		**-47.00**	
4	EQUIPOS DE BOMBEO	14/12/2020		31/12/2020		**-34.00**	
5	LAVADO DE TANQUES	1/12/2020		26/12/2020		**-47.00**	
7	SISTEMAS DE REFRIGERACIÓN	11/12/2020	16/10/2020	31/12/2020	20/10/2020	**56.00**	**72.00**
8	MANTENIMIENTOS GENERALES (limpieza, demoliciones, pinturas, estructuras, etc.)	1/12/2020		31/12/2020		**-47.00**	
9	UNIDADES SANITARIAS, REDES HIDRÁULICAS, HIDROSANITARIAS Y PLUVIALES	11/12/2020		31/12/2020		**-37.00**	
10	NO PREVISTOS	11/12/2020		31/12/2020		**-37.00**	
	ENTREGA A LA INTERVENTORÍA DE LOS PRODUCTOS Y/O ACTIVIDADES CONTRATADAS (HITO OBLIGATORIO)						

CENTRO DE LOGÍSTICA Y PROMOCIÓN ECOTURÍSTICA DEL MAGDALENA - SANTA MARTA

No.	*** DESCRIPCIÓN DEL HITO	INICIO PROGR.	INICIO REAL	FIN PROGR.	FIN REAL	DÍAS DE ATRASO INICIO ATRASO (-) AVANCE (+)	DÍAS DE ATRASO FIN ATRASO (-) AVANCE (+)
	SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO (HITO OBLIGATORIO)					**0.00**	**0.00**
	PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD Y PRELIMINARES	30/11/2020		30/11/2020		**-48.00**	
1	IMPERMEABILIZACIONES	1/12/2020		28/12/2020		**-47.00**	
2	SISTEMA ELÉCTRICO	11/12/2020		31/12/2020		**-37.00**	
3	SERVICIO DE JARDINERÍA	11/12/2020		31/12/2020		**-37.00**	
4	EQUIPOS DE BOMBEO	10/12/2020		31/12/2020		**-38.00**	
5	LAVADO DE TANQUES	3/12/2020		22/12/2020		**-45.00**	
7	SISTEMAS DE REFRIGERACIÓN	11/12/2020		31/12/2020		**-37.00**	
10	NO PREVISTOS	1/12/2020		31/12/2020		**-47.00**	
	ENTREGA A LA INTERVENTORÍA DE LOS PRODUCTOS Y/O ACTIVIDADES CONTRATADAS (HITO OBLIGATORIO)						

CENTRO DE LOGÍSTICA Y PROMOCIÓN ECOTURÍSTICA DEL MAGDALENA - APE Y SERVICIO MÉDICO

No.	*** DESCRIPCIÓN DEL HITO	INICIO PROGR.	INICIO REAL	FIN PROGR.	FIN REAL	DÍAS DE ATRASO INICIO ATRASO (-) AVANCE (+)	DÍAS DE ATRASO FIN ATRASO (-) AVANCE (+)
	SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO (HITO OBLIGATORIO)					**0.00**	**0.00**
	PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD Y PRELIMINARES	30/11/2020		30/11/2020		**-48.00**	
1	IMPERMEABILIZACIONES	1/12/2020		2/12/2020		**-47.00**	
2	SISTEMA ELÉCTRICO	14/12/2020		22/12/2020		**-34.00**	
3	SERVICIO DE JARDINERÍA	1/12/2020		30/12/2020		**-47.00**	
4	EQUIPOS DE BOMBEO	21/12/2020		31/12/2020		**-27.00**	
5	LAVADO DE TANQUES	1/12/2020		22/12/2020		**-47.00**	
7	SISTEMAS DE REFRIGERACIÓN	16/12/2020	30/09/2020	30/12/2020	14/10/2020	**77.00**	**77.00**
8	MANTENIMIENTOS GENERALES (limpieza, demoliciones, pinturas, estructuras, etc.)	1/12/2020		31/12/2020		**-47.00**	
9	UNIDADES SANITARIAS, REDES HIDRÁULICAS, HIDROSANITARIAS Y PLUVIALES	30/11/2020		31/12/2020		**-48.00**	
10	NO PREVISTOS	1/12/2020		31/12/2020		**-47.00**	
	ENTREGA A LA INTERVENTORÍA DE LOS PRODUCTOS Y/O ACTIVIDADES CONTRATADAS (HITO OBLIGATORIO)						

Plazo total del Proyecto en Días	**222**
Plazo faltante del Proyecto en Días	**73**

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
GRUPO CONSTRUCCIONES

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA ETAPA CONSTRUCCIÓN

SEMANA No.	21	DEL	11 de enero de 2021	AL	17 de enero de 2021

ALERTA — CUALQUIER MODIFICACION CONTRACTUAL DEBERA TRAMITARSE CON ALMENOS 15 DIAS DE ANTICIPACION A LA TERMINACIÓN

DESARROLLO Y DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES MENSUALES - REPORTE DE CUMPLIMIENTO A LAS OBLIGACIONES DEL INTERVENTOR

TEMAS TÉCNICOS

CONDICIONES GENERALES DE EJECUCIÓN TÉCNICA DE OBRA	Cumple
El contratista cuenta con el personal capacitado para desarrollo del proyecto y su dedicación cumple con lo estipulado en el contrato	NO
En la obra se cuenta con copia completa de los diseños y licencia de construcción debidamente firmados y aprobados por Curaduría o Planeación Municipal	N/A
La obra cuenta con Valla informativa y la instalación y el diseño debe cumplen con las especificaciones definidos por el SENA	N/A
El campamento de obra cumple con los requisitos mínimos de resistencia, equilibrio y rigidez, que garantice las condiciones de funcionamiento	N/A
El perfil estratigráfico del terreno excavado corresponder al definido en el estudio geotécnico del proyecto.	N/A
Las canteras de donde proviene el material han sido previamente autorizadas por la Interventoría y cuentan con los debidos permisos ambientales y legales.	N/A
Los materiales suministrados, han sido aprobados previo a su instalación por la interventoría, cuentan con certificación de calidad y cumplen con las especificaciones técnicas requeridas	NO
Todos los procedimientos que se usados para la instalación de equipos y materiales eléctricos se ajustan a los establecidos en el reglamento vigente en la empresa de energía, a las demás normas aplicables.	N/A
Todos los procedimientos que se usados para la instalación de equipos y materiales hidrosanitarios se ajustan a los establecidos en la NTC 1500 Código Colombiano de Fontanería y demás normas aplicables.	N/A
La interventoría ha solicitado oportunamente los ensayos y pruebas necesarias a los elementos instalados en obra	SI

Observaciones

TEMAS SISO

CONDICIONES GENERALES SISO	Cumple
En la ejecución de la obra se da cumplimiento a los planes de manejo ambiental, gestión social, salud en el trabajo da cumplimento al plan ambiental aprobados	SI
La totalidad del personal que ha laborado en el proyecto se encuentra esta afiliado y al día con los aportes de seguridad social y parafiscales.	SI
En obra se cuenta con el Plan de manejo Ambiental aprobado por la Interventoría	SI

Observaciones: El Contratista entregó las observaciones al Plan de Manejo Ambiental a la Interventoría, quien se encuentra en revisión del documento.

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

NO HUBO ACTIVIDADES EN NINGUNA DE LAS SEDES DE LOS DEPARTAMENTOS DE GUAJIRA Y MAGDALENA

PERSONAL DE LA OBRA

PERSONAL CONSORCIO	CANT.	PERSONAL CONTRATISTA OBRA CIVIL	CANT.	CONTRATISTA OBRA ELÉCTRICA	CANT.	CONTRATISTA OBRA HIDROSANITARIA	CANT.
DIRECTOR DE OBRA	1	INGENIEROS/ARQUITECTOS		INGENIEROS		INGENIEROS	
RESIDENTES (INGENIERO, ARQUITECTO, SISO)	1	PROFESIONAL SISO		PROFESIONAL SISO		PROFESIONAL SISO	
COMISIÓN TOPOGRÁFICA		MAESTROS DE OBRA		MAESTROS DE OBRA		MAESTROS DE OBRA	
PERSONAL ADMINISTRATIVO		OFICIALES DE OBRA		OFICIALES DE OBRA		OFICIALES DE OBRA	
AYUDANTES DE OBRA		SOLDADORES		AYUDANTES DE OBRA		AYUDANTES DE OBRA	
TOPÓGRAFO		AYUDANTES DE OBRA				AUXILIAR SISOMA	
CADENEROS		INSPECTOR DE OBRA					
INSPECTOR DE OBRA		OPERADORES					
		ASEADORAS					
		ALMACENISTA					
		AUXILIAR SISOMA					
TOTAL	2	TOTAL	0	TOTAL	0	TOTAL	0

PERSONAL DEL CONTRATISTA

n°	ESPECIALIDAD/CARGO	NOMBRE	PLANILLA N°	OBSERVACIONES
1	DIRECTOR DE OBRA	RICARDO ARTURO MOLINA		
2	COORDINADOR REGIONAL	LUIS ALFREDO GRANADOS		
3	RESIDENTE SISO DE OBRA	SERGIO FERNAN ALONSO		

PERSONAL DE INTERVENTORÍA

n°	ESPECIALIDAD/CARGO	NOMBRE	PLANILLA N°	OBSERVACIONES
1	DIRECTOR INTERVENTORÍA	PEDRO GUTIERREZ BUSTILLO	7771855090	
2	ING RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	SORAYA NAVARRO BOLAÑO	7771863931	
3	RESIDENTE SISO INTERVENTORÍA	XIOMARA PEREZ	7771858782	

INFORMES SEMANALES DE INTERVENTORÍA

PERIODO				
Desde	Hasta	No. Informe	Fecha entrega	Observaciones y Contenido del Informe RELEVANTES
11/01/2021	17/01/2021	SEMANA No. 21	18-ene-21	Se reciben oficios de parte del contratista y se les da el respectivo trámite ante la entidad

DIECIOCHO	18	días del mes de	ENERO	de	2021
(Día en letras)	(Día en números)				(Año en que se firma el acta)

DIRECTOR O RESIDENTE DEL PROYECTO ETAPA DE OBRA:

NOMBRES Y APELLIDOS	PEDRO GUTIÉRREZ BUSTILLO	FIRMA	

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
GRUPO CONSTRUCCIONES

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA ETAPA CONSTRUCCIÓN

SEMANA No.	22	DEL	18 de enero de 2021	AL	24 de enero de 2021
			(dd-mm-aaaa)		(dd-mm-aaaa)

INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO

CONTRATISTA		INTERVENTOR	
Contratista	CONSORCIO CONSTRUCTOR ALFA	Interventor	CONSORCIO INTER INGECO-GNG
Contrato No.	CO1.PCCNTR.1552323	Contrato No.	CO1.PCCNTR.1636309
Fecha de Iniciación	21 de agosto de 2020	Fecha de Iniciación	12 de agosto de 2020
Fecha de Terminación	HASTA EL 31 DE MARZO DE 2021	Fecha de Terminación	HASTA EL 31 DE MARZO DE 2021
Valor Inicial	$ 8,777,298,757	Valor Inicial	$691,547,950
Adición:	$ 501,925,456	Adición:	N/A
Valor Etapa Construccion	$ 9,279,224,213	Valor Etapa Construccion	$691,547,950
Valor Actualizado Contrato	**$ 9,279,224,213**	Valor Actualizado Contrato	**$691,547,950**
Plazo Inicial	HASTA EL 1 DE DICIEMBRE DE 2020	Plazo Inicial	HASTA EL 15 DE DICIEMBRE DE 2020
Suspensión:	N/A	Suspensión:	N/A
Prórroga 1:	1 MES	Prórroga 1:	15 DÍAS
Prórroga 2:	3 MESES	Prórroga 2:	3 MESES
Plazo Actualizado	HASTA EL 31 DE MARZO DE 2021	Plazo Actualizado	HASTA EL 31 DE MARZO DE 2021

(Diligenciar los campos correspondientes al proyecto, en los campos que no aplique se debe colocar N/A)

OBJETO DEL CONTRATO DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y OBRA :

MANTENIMIENTO PREDICTIVO, PREVENTIVO, CORRECTIVO, REPARACIONES Y MEJORAS LOCATIVAS A LAS INSTALACIONES DEL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA A NIVEL NACIONAL, MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA, CONTABLE Y AMBIENTAL, PARA EL MANTENIMIENTO PREDICTIVO, PREVENTIVO, CORRECTIVO, REPARACIONES Y MEJORAS LOCATIVAS A LAS INSTALACIONES DEL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA A NIVEL NACIONAL, MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE.


PERSONAL QUE INTERVIENE EN EL PROYECTO

CARGO	NOMBRE
DIRECTOR DE OBRA CONTRATISTA:	RICARDO ARTURO MOLINA GARCIA
DIRECTOR DE OBRA INTERVENTORÍA:	PEDRO ANTONIO GUTIERREZ BUSTILLO
ARQUITECTO/INGENIERO RESIDENTE DE OBRA:	GIAN CARLOS ZARUR TORRALVO
INGENIERO/ARQUITECTO RESIDENTE DE INTERVENTORÍA:	SERGIO JAVIER SOLANO ALMANZA
RESIDENTE SISO OBRA	SERGIO FERNAN ALONSO CARVAJAL
RESIDENTE SISO INTERVENTORÍA	XIOMARA PEREZ

SEGUIMIENTO FÍSICO CONTRATO

GRAFICO AVANCE FÍSICO CONTRATO


SEDE COMERCIO Y SERVICIO - RIOHACHA

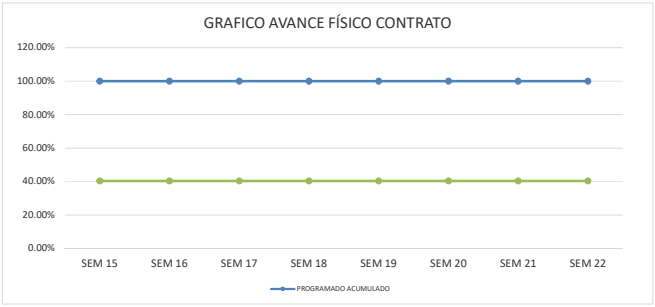

% AVANCE SEMANAL ACUMULADO	PROGRAMADO ACUMULADO	EJECUTADO ACUMULADO	DIFERENCIA
SEM 15	100.00%	40.37%	**-59.63%**
SEM 16	100.00%	40.37%	**-59.63%**
SEM 17	100.00%	40.37%	**-59.63%**
SEM 18	100.00%	40.37%	**-59.63%**
SEM 19	100.00%	40.37%	**-59.63%**
SEM 20	100.00%	40.37%	**-59.63%**
SEM 21	100.00%	40.37%	**-59.63%**
SEM 22	100.00%	40.37%	**-59.63%**
ALERTAS			**-59.63%**

INICIAR PROCESO POR POSIBLE INCUMPLIMIENTO

CENTRO INDUSTRIAL Y DE ENERGÍAS ALTERNATIVAS - MAICAO

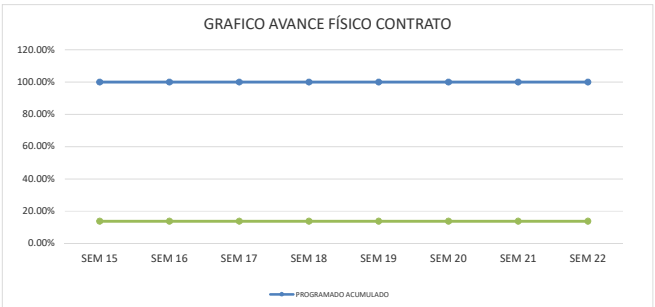

% AVANCE SEMANAL ACUMULADO	PROGRAMADO ACUMULADO	EJECUTADO ACUMULADO	DIFERENCIA
SEM 15	100.00%	13.84%	**-86.16%**
SEM 16	100.00%	13.84%	**-86.16%**
SEM 17	100.00%	13.84%	**-86.16%**
SEM 18	100.00%	13.84%	**-86.16%**
SEM 19	100.00%	13.84%	**-86.16%**
SEM 20	100.00%	13.84%	**-86.16%**
SEM 21	100.00%	13.84%	**-86.16%**
SEM 22	100.00%	13.84%	**-86.16%**
ALERTAS			**-86.16%**


INICIAR PROCESO POR POSIBLE INCUMPLIMIENTO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
GRUPO CONSTRUCCIONES

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA ETAPA CONSTRUCCIÓN


SEMANA No.	22	DEL	18 de enero de 2021	AL	24 de enero de 2021

CENTRO INDUSTRIAL Y DE ENERGÍAS ALTERNATIVAS - RIOHACHA

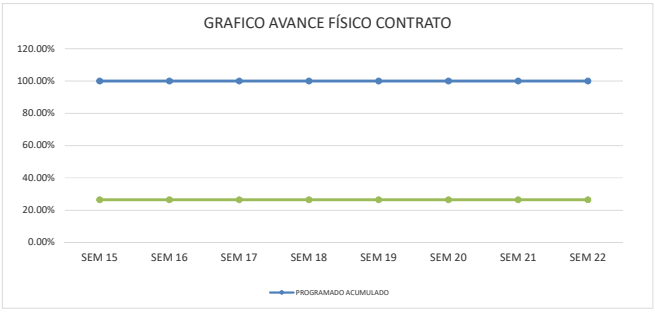


% AVANCE SEMANAL ACUMULADO	PROGRAMADO ACUMULADO	EJECUTADO ACUMULADO	DIFERENCIA
SEM 15	100.00%	26.52%	-73.48%
SEM 16	100.00%	26.52%	-73.48%
SEM 17	100.00%	26.52%	-73.48%
SEM 18	100.00%	26.52%	-73.48%
SEM 19	100.00%	26.52%	-73.48%
SEM 20	100.00%	26.52%	-73.48%
SEM 21	100.00%	26.52%	-73.48%
SEM 22	100.00%	26.52%	-73.48%
ALERTAS			-73.48%
INICIAR PROCESO POR POSIBLE INCUMPLIMIENTO			

CENTRO AGRO EMPRESARIAL Y ACUÍCOLA - FONSECA

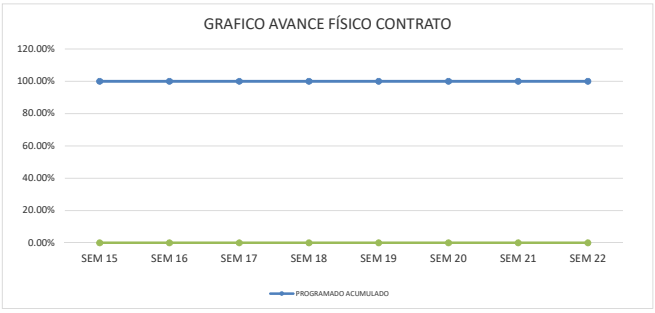


% AVANCE SEMANAL ACUMULADO	PROGRAMADO ACUMULADO	EJECUTADO ACUMULADO	DIFERENCIA
SEM 15	100.00%	0.00%	-100.00%
SEM 16	100.00%	0.00%	-100.00%
SEM 17	100.00%	0.00%	-100.00%
SEM 18	100.00%	0.00%	-100.00%
SEM 19	100.00%	0.00%	-100.00%
SEM 20	100.00%	0.00%	-100.00%
SEM 21	100.00%	0.00%	-100.00%
SEM 22	100.00%	0.00%	-100.00%
ALERTAS			-100.00%
INICIAR PROCESO POR POSIBLE INCUMPLIMIENTO			

CENTRO ACUÍCOLA Y AGROINDUSTRIAL DE GAIRA - EL BANCO

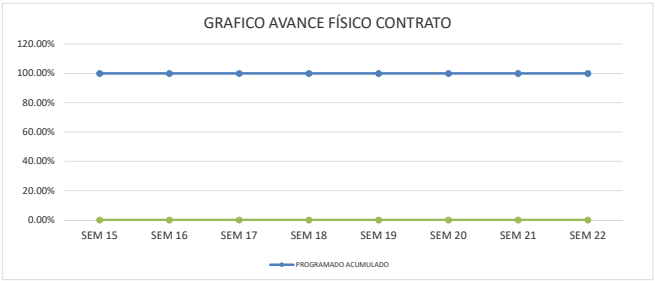

% AVANCE SEMANAL ACUMULADO	PROGRAMADO ACUMULADO	EJECUTADO ACUMULADO	DIFERENCIA
SEM 15	100.00%	0.00%	-100.00%
SEM 16	100.00%	0.00%	-100.00%
SEM 17	100.00%	0.00%	-100.00%
SEM 18	100.00%	0.00%	-100.00%
SEM 19	100.00%	0.00%	-100.00%
SEM 20	100.00%	0.00%	-100.00%
SEM 21	100.00%	0.00%	-100.00%
SEM 22	100.00%	0.00%	-100.00%
ALERTAS			-100.00%
INICIAR PROCESO POR POSIBLE INCUMPLIMIENTO			

CENTRO ACUÍCOLA Y AGROINDUSTRIAL DE GAIRA - GAIRA

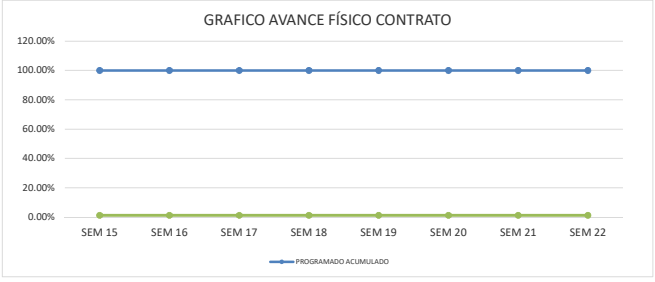


% AVANCE SEMANAL ACUMULADO	PROGRAMADO ACUMULADO	EJECUTADO ACUMULADO	DIFERENCIA
SEM 15	100.00%	1.25%	-98.75%
SEM 16	100.00%	1.25%	-98.75%
SEM 17	100.00%	1.25%	-98.75%
SEM 18	100.00%	1.25%	-98.75%
SEM 19	100.00%	1.25%	-98.75%
SEM 20	100.00%	1.25%	-98.75%
SEM 21	100.00%	1.25%	-98.75%
SEM 22	100.00%	1.25%	-98.75%
ALERTAS			-98.75%
INICIAR PROCESO POR POSIBLE INCUMPLIMIENTO			

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
GRUPO CONSTRUCCIONES

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA ETAPA CONSTRUCCIÓN


SEMANA No.	22	DEL	18 de enero de 2021	AL	24 de enero de 2021

CENTRO DE LOGÍSTICA Y PROMOCIÓN ECOTURÍSTICA DEL MAGDALENA - CIÉNAGA

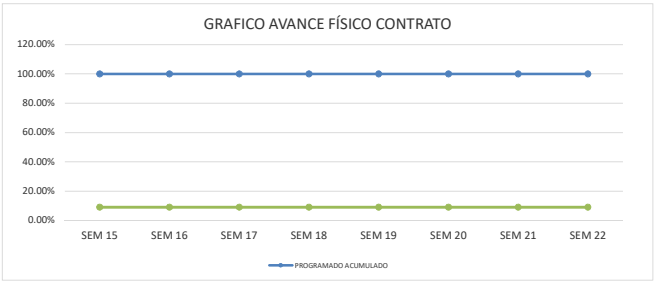


% AVANCE SEMANAL ACUMULADO	PROGRAMADO ACUMULADO	EJECUTADO ACUMULADO	DIFERENCIA
SEM 15	100.00%	9.13%	-90.87%
SEM 16	100.00%	9.13%	-90.87%
SEM 17	100.00%	9.13%	-90.87%
SEM 18	100.00%	9.13%	-90.87%
SEM 19	100.00%	9.13%	-90.87%
SEM 20	100.00%	9.13%	-90.87%
SEM 21	100.00%	9.13%	-90.87%
SEM 22	100.00%	9.13%	-90.87%
ALERTAS			-90.87%
INICIAR PROCESO POR POSIBLE INCUMPLIMIENTO			

CENTRO ACUÍCOLA Y AGROINDUSTRIAL DE GAIRA - FUNDACIÓN

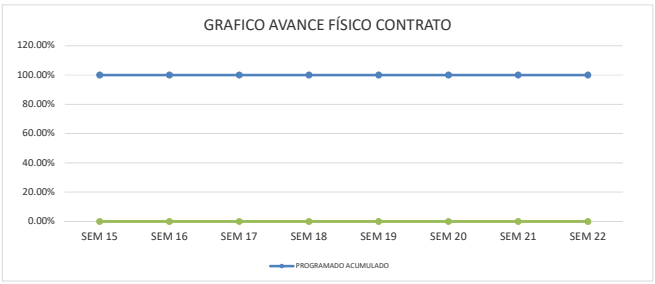


% AVANCE SEMANAL ACUMULADO	PROGRAMADO ACUMULADO	EJECUTADO ACUMULADO	DIFERENCIA
SEM 15	100.00%	0.00%	-100.00%
SEM 16	100.00%	0.00%	-100.00%
SEM 17	100.00%	0.00%	-100.00%
SEM 18	100.00%	0.00%	-100.00%
SEM 19	100.00%	0.00%	-100.00%
SEM 20	100.00%	0.00%	-100.00%
SEM 21	100.00%	0.00%	-100.00%
SEM 22	100.00%	0.00%	-100.00%
ALERTAS			-100.00%
INICIAR PROCESO POR POSIBLE INCUMPLIMIENTO			

CENTRO DE LOGÍSTICA Y PROMOCIÓN ECOTURÍSTICA DEL MAGDALENA - IPC MARÍA EUGENIA

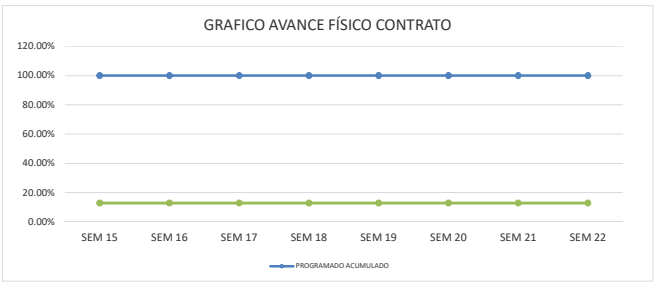

% AVANCE SEMANAL ACUMULADO	PROGRAMADO ACUMULADO	EJECUTADO ACUMULADO	DIFERENCIA
SEM 15	100.00%	12.81%	-87.19%
SEM 16	100.00%	12.81%	-87.19%
SEM 17	100.00%	12.81%	-87.19%
SEM 18	100.00%	12.81%	-87.19%
SEM 19	100.00%	12.81%	-87.19%
SEM 20	100.00%	12.81%	-87.19%
SEM 21	100.00%	12.81%	-87.19%
SEM 22	100.00%	12.81%	-87.19%
ALERTAS			-87.19%
INICIAR PROCESO POR POSIBLE INCUMPLIMIENTO			

CENTRO DE LOGÍSTICA Y PROMOCIÓN ECOTURÍSTICA DEL MAGDALENA - SANTA MARTA

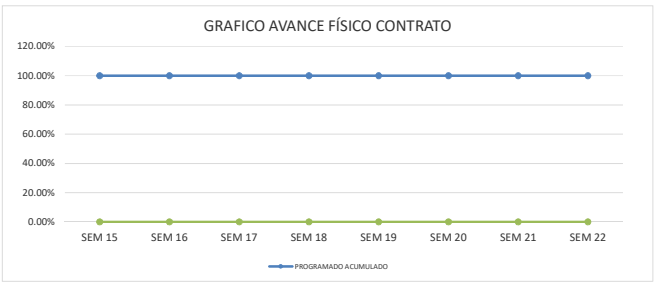


% AVANCE SEMANAL ACUMULADO	PROGRAMADO ACUMULADO	EJECUTADO ACUMULADO	DIFERENCIA
SEM 15	100.00%	0.00%	-100.00%
SEM 16	100.00%	0.00%	-100.00%
SEM 17	100.00%	0.00%	-100.00%
SEM 18	100.00%	0.00%	-100.00%
SEM 19	100.00%	0.00%	-100.00%
SEM 20	100.00%	0.00%	-100.00%
SEM 21	100.00%	0.00%	-100.00%
SEM 22	100.00%	0.00%	-100.00%
ALERTAS			-100.00%
INICIAR PROCESO POR POSIBLE INCUMPLIMIENTO			

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
GRUPO CONSTRUCCIONES

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA ETAPA CONSTRUCCIÓN

SEMANA No.	22	DEL	18 de enero de 2021	AL	24 de enero de 2021

CENTRO DE LOGÍSTICA Y PROMOCIÓN ECOTURÍSTICA DEL MAGDALENA - APE Y SERVICIO MÉDICO

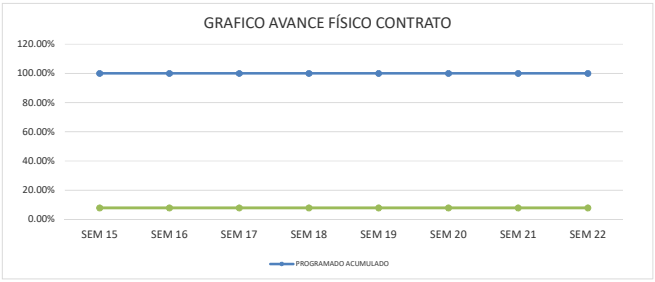


% AVANCE SEMANAL ACUMULADO	PROGRAMADO ACUMULADO	EJECUTADO ACUMULADO	DIFERENCIA
SEM 15	100.00%	7.94%	-92.06%
SEM 16	100.00%	7.94%	-92.06%
SEM 17	100.00%	7.94%	-92.06%
SEM 18	100.00%	7.94%	-92.06%
SEM 19	100.00%	7.94%	-92.06%
SEM 20	100.00%	7.94%	-92.06%
SEM 21	100.00%	7.94%	-92.06%
SEM 22	100.00%	7.94%	-92.06%
ALERTAS			-92.06%

INICIAR PROCESO POR POSIBLE INCUMPLIMIENTO

SEGUIMIENTO FINANCIERO CONTRATO DE OBRA (Millones de $) (ETAPA DE OBRA)

GRAFICO AVANCE FINANCIERO CONTRATO ETAPA DE OBRA


SEDE COMERCIO Y SERVICIO - RIOHACHA

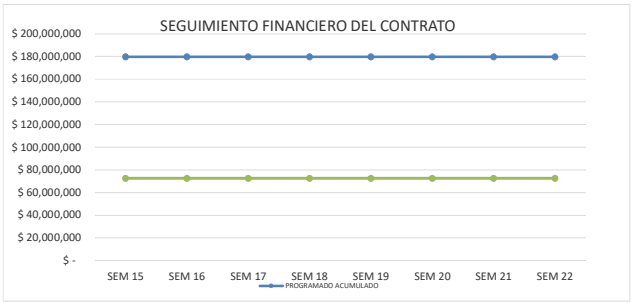

VALOR SEMANAL ACUMULADO	PROGRAMADO ACUMULADO	EJECUTADO ACUMULADO	DIFERENCIA
SEM 15	$ 179,765,940	$ 72,570,665	$ -107,195,275.17
SEM 16	$ 179,765,940	$ 72,570,665	$ -107,195,275.17
SEM 17	$ 179,765,940	$ 72,570,665	$ -107,195,275.17
SEM 18	$ 179,765,940	$ 72,570,665	$ -107,195,275.17
SEM 19	$ 179,765,940	$ 72,570,665	$ -107,195,275.17
SEM 20	$ 179,765,940	$ 72,570,665	$ -107,195,275.17
SEM 21	$ 179,765,940	$ 72,570,665	$ -107,195,275.17
SEM 22	$ 179,765,940	$ 72,570,665	$ -107,195,275.17

Nota : incluir el avance las ultimas 8 semanas (en Millones)


CENTRO INDUSTRIAL Y DE ENERGÍAS ALTERNATIVAS - MAICAO

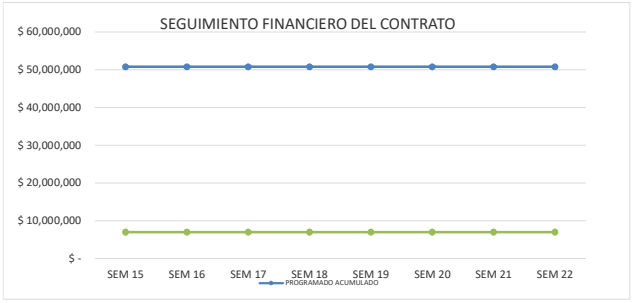

VALOR SEMANAL ACUMULADO	PROGRAMADO ACUMULADO	EJECUTADO ACUMULADO	DIFERENCIA
SEM 15	$ 50,771,054	$ 7,026,713.84	$ -43,744,339.93
SEM 16	$ 50,771,054	$ 7,026,713.84	$ -43,744,339.93
SEM 17	$ 50,771,054	$ 7,026,713.84	$ -43,744,339.93
SEM 18	$ 50,771,054	$ 7,026,713.84	$ -43,744,339.93
SEM 19	$ 50,771,054	$ 7,026,713.84	$ -43,744,339.93
SEM 20	$ 50,771,054	$ 7,026,713.84	$ -43,744,339.93
SEM 21	$ 50,771,054	$ 7,026,713.84	$ -43,744,339.93
SEM 22	$ 50,771,054	$ 7,026,713.84	$ -43,744,339.93

Nota : incluir el avance las ultimas 8 semanas (en Millones)

CENTRO INDUSTRIAL Y DE ENERGÍAS ALTERNATIVAS - RIOHACHA

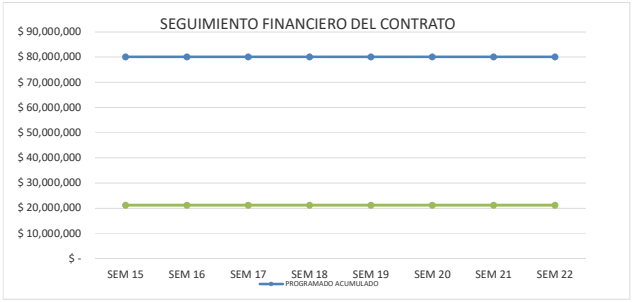

VALOR SEMANAL ACUMULADO	PROGRAMADO ACUMULADO	EJECUTADO ACUMULADO	DIFERENCIA
SEM 15	$ 80,076,766	$ 21,232,354.65	$ -58,844,411.80
SEM 16	$ 80,076,766	$ 21,232,354.65	$ -58,844,411.80
SEM 17	$ 80,076,766	$ 21,232,354.65	$ -58,844,411.80
SEM 18	$ 80,076,766	$ 21,232,354.65	$ -58,844,411.80
SEM 19	$ 80,076,766	$ 21,232,354.65	$ -58,844,411.80
SEM 20	$ 80,076,766	$ 21,232,354.65	$ -58,844,411.80
SEM 21	$ 80,076,766	$ 21,232,354.65	$ -58,844,411.80
SEM 22	$ 80,076,766	$ 21,232,354.65	$ -58,844,411.80


Nota : incluir el avance las ultimas 8 semanas (en Millones)

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
GRUPO CONSTRUCCIONES

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA ETAPA CONSTRUCCIÓN


SEMANA No.	22	DEL	18 de enero de 2021	AL	24 de enero de 2021

CENTRO AGRO EMPRESARIAL Y ACUÍCOLA - FONSECA

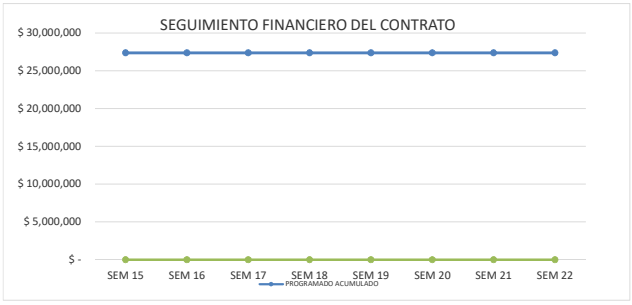


VALOR SEMANAL ACUMULADO	PROGRAMADO ACUMULADO	EJECUTADO ACUMULADO	DIFERENCIA
SEM 15	$ 27,364,346	$ -	$ -27,364,345.78
SEM 16	$ 27,364,346	$ -	$ -27,364,345.78
SEM 17	$ 27,364,346	$ -	$ -27,364,345.78
SEM 18	$ 27,364,346	$ -	$ -27,364,345.78
SEM 19	$ 27,364,346	$ -	$ -27,364,345.78
SEM 20	$ 27,364,346	$ -	$ -27,364,345.78
SEM 21	$ 27,364,346	$ -	$ -27,364,345.78
SEM 22	$ 27,364,346	$ -	$ -27,364,345.78
Nota : incluir el avance las ultimas 8 semanas (en Millones)			

CENTRO ACUÍCOLA Y AGROINDUSTRIAL DE GAIRA - EL BANCO

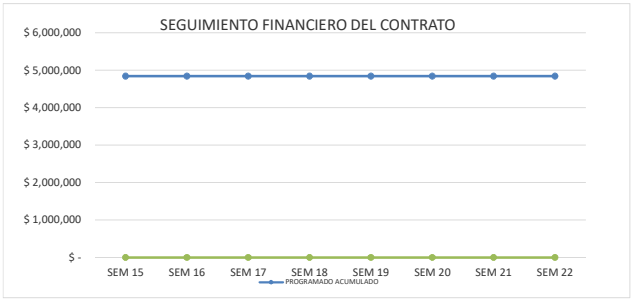


VALOR SEMANAL ACUMULADO	PROGRAMADO ACUMULADO	EJECUTADO ACUMULADO	DIFERENCIA
SEM 15	$ 4,840,347	$ -	$ -4,840,347.12
SEM 16	$ 4,840,347	$ -	$ -4,840,347.12
SEM 17	$ 4,840,347	$ -	$ -4,840,347.12
SEM 18	$ 4,840,347	$ -	$ -4,840,347.12
SEM 19	$ 4,840,347	$ -	$ -4,840,347.12
SEM 20	$ 4,840,347	$ -	$ -4,840,347.12
SEM 21	$ 4,840,347	$ -	$ -4,840,347.12
SEM 22	$ 4,840,347	$ -	$ -4,840,347.12
Nota : incluir el avance las ultimas 8 semanas (en Millones)			

CENTRO ACUÍCOLA Y AGROINDUSTRIAL DE GAIRA - GAIRA

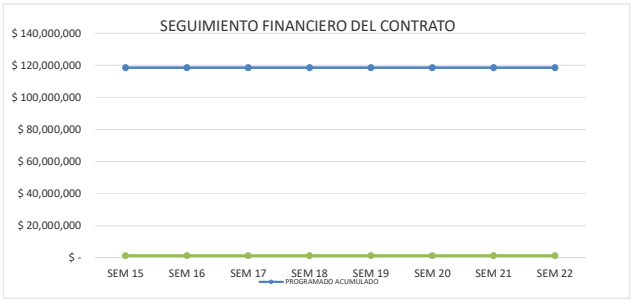

VALOR SEMANAL ACUMULADO	PROGRAMADO ACUMULADO	EJECUTADO ACUMULADO	DIFERENCIA
SEM 15	$ 118,523,150	$ 1,481,539.38	$ -117,041,610.73
SEM 16	$ 118,523,150	$ 1,481,539.38	$ -117,041,610.73
SEM 17	$ 118,523,150	$ 1,481,539.38	$ -117,041,610.73
SEM 18	$ 118,523,150	$ 1,481,539.38	$ -117,041,610.73
SEM 19	$ 118,523,150	$ 1,481,539.38	$ -117,041,610.73
SEM 20	$ 118,523,150	$ 1,481,539.38	$ -117,041,610.73
SEM 21	$ 118,523,150	$ 1,481,539.38	$ -117,041,610.73
SEM 22	$ 118,523,150	$ 1,481,539.38	$ -117,041,610.73
Nota : incluir el avance las ultimas 8 semanas (en Millones)			

CENTRO DE LOGÍSTICA Y PROMOCIÓN ECOTURÍSTICA DEL MAGDALENA - CIÉNAGA

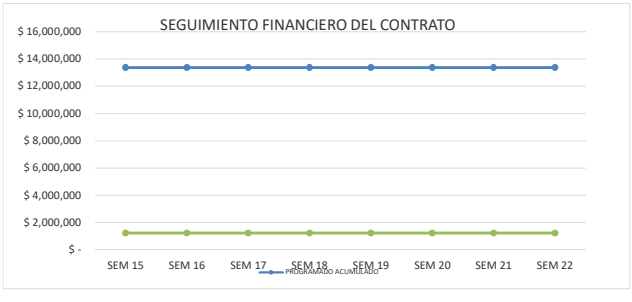


VALOR SEMANAL ACUMULADO	PROGRAMADO ACUMULADO	EJECUTADO ACUMULADO	DIFERENCIA
SEM 15	$ 13,374,356	$ 1,221,078.70	$ -12,153,277.23
SEM 16	$ 13,374,356	$ 1,221,078.70	$ -12,153,277.23
SEM 17	$ 13,374,356	$ 1,221,078.70	$ -12,153,277.23
SEM 18	$ 13,374,356	$ 1,221,078.70	$ -12,153,277.23
SEM 19	$ 13,374,356	$ 1,221,078.70	$ -12,153,277.23
SEM 20	$ 13,374,356	$ 1,221,078.70	$ -12,153,277.23
SEM 21	$ 13,374,356	$ 1,221,078.70	$ -12,153,277.23
SEM 22	$ 13,374,356	$ 1,221,078.70	$ -12,153,277.23
Nota : incluir el avance las ultimas 8 semanas (en Millones)			

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
GRUPO CONSTRUCCIONES

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA ETAPA CONSTRUCCIÓN

SEMANA No.	22	DEL	18 de enero de 2021	AL	24 de enero de 2021


CENTRO ACUÍCOLA Y AGROINDUSTRIAL DE GAIRA - FUNDACIÓN

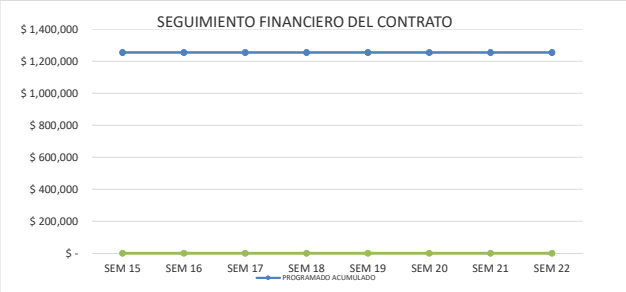

VALOR SEMANAL ACUMULADO	PROGRAMADO ACUMULADO	EJECUTADO ACUMULADO	DIFERENCIA
SEM 15	$ 1,256,111	$ -	$ -1,256,111.09
SEM 16	$ 1,256,111	$ -	$ -1,256,111.09
SEM 17	$ 1,256,111	$ -	$ -1,256,111.09
SEM 18	$ 1,256,111	$ -	$ -1,256,111.09
SEM 19	$ 1,256,111	$ -	$ -1,256,111.09
SEM 20	$ 1,256,111	$ -	$ -1,256,111.09
SEM 21	$ 1,256,111	$ -	$ -1,256,111.09
SEM 22	$ 1,256,111	$ -	$ -1,256,111.09

Nota : incluir el avance las ultimas 8 semanas (en Millones)


CENTRO DE LOGÍSTICA Y PROMOCIÓN ECOTURÍSTICA DEL MAGDALENA - IPC MARÍA EUGENIA

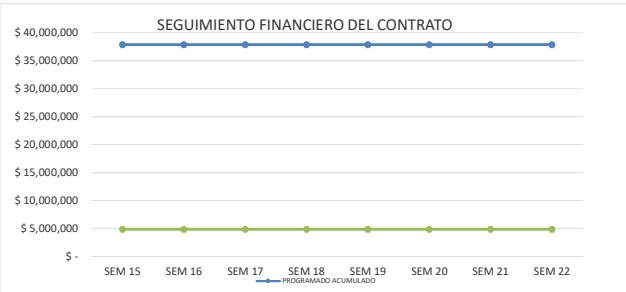

VALOR SEMANAL ACUMULADO	PROGRAMADO ACUMULADO	EJECUTADO ACUMULADO	DIFERENCIA
SEM 15	$ 37,845,869	$ 4,848,055.77	$ -32,997,812.81
SEM 16	$ 37,845,869	$ 4,848,055.77	$ -32,997,812.81
SEM 17	$ 37,845,869	$ 4,848,055.77	$ -32,997,812.81
SEM 18	$ 37,845,869	$ 4,848,055.77	$ -32,997,812.81
SEM 19	$ 37,845,869	$ 4,848,055.77	$ -32,997,812.81
SEM 20	$ 37,845,869	$ 4,848,055.77	$ -32,997,812.81
SEM 21	$ 37,845,869	$ 4,848,055.77	$ -32,997,812.81
SEM 22	$ 37,845,869	$ 4,848,055.77	$ -32,997,812.81

Nota : incluir el avance las ultimas 8 semanas (en Millones)


CENTRO DE LOGÍSTICA Y PROMOCIÓN ECOTURÍSTICA DEL MAGDALENA - SANTA MARTA

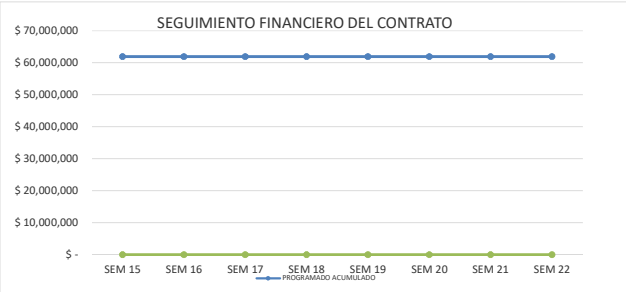

VALOR SEMANAL ACUMULADO	PROGRAMADO ACUMULADO	EJECUTADO ACUMULADO	DIFERENCIA
SEM 15	$ 61,917,333	$ -	$ -61,917,333.15
SEM 16	$ 61,917,333	$ -	$ -61,917,333.15
SEM 17	$ 61,917,333	$ -	$ -61,917,333.15
SEM 18	$ 61,917,333	$ -	$ -61,917,333.15
SEM 19	$ 61,917,333	$ -	$ -61,917,333.15
SEM 20	$ 61,917,333	$ -	$ -61,917,333.15
SEM 21	$ 61,917,333	$ -	$ -61,917,333.15
SEM 22	$ 61,917,333	$ -	$ -61,917,333.15

Nota : incluir el avance las ultimas 8 semanas (en Millones)

CENTRO DE LOGÍSTICA Y PROMOCIÓN ECOTURÍSTICA DEL MAGDALENA - APE Y SERVICIO MÉDICO

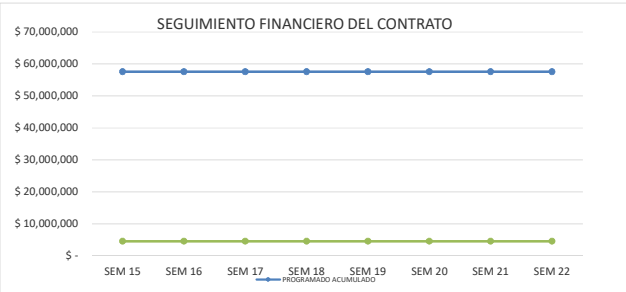

VALOR SEMANAL ACUMULADO	PROGRAMADO ACUMULADO	EJECUTADO ACUMULADO	DIFERENCIA
SEM 15	$ 57,581,875	$ 4,572,000.84	$ -53,009,873.67
SEM 16	$ 57,581,875	$ 4,572,000.84	$ -53,009,873.67
SEM 17	$ 57,581,875	$ 4,572,000.84	$ -53,009,873.67
SEM 18	$ 57,581,875	$ 4,572,000.84	$ -53,009,873.67
SEM 19	$ 57,581,875	$ 4,572,000.84	$ -53,009,873.67
SEM 20	$ 57,581,875	$ 4,572,000.84	$ -53,009,873.67
SEM 21	$ 57,581,875	$ 4,572,000.84	$ -53,009,873.67
SEM 22	$ 57,581,875	$ 4,572,000.84	$ -53,009,873.67

Nota : incluir el avance las ultimas 8 semanas (en Millones)

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
GRUPO CONSTRUCCIONES

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA ETAPA CONSTRUCCIÓN

SEMANA No.	22	DEL	18 de enero de 2021	AL	24 de enero de 2021

CONTROL DE HITOS ETAPA DE CONSTRUCCIÓN

SEDE COMERCIO Y SERVICIO - RIOHACHA

No.	*** DESCRIPCIÓN DEL HITO	INICIO PROGR.	INICIO REAL	FIN PROGR.	FIN REAL	DÍAS DE ATRASO INICIO ATRASO (-) AVANCE (+)	DÍAS DE ATRASO FIN ATRASO (-) AVANCE (+)
	SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO (HITO OBLIGATORIO)					**0.00**	**0.00**
	PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD Y PRELIMINARES	19/10/2020	6/10/2020	19/10/2020		**13.00**	
1	IMPERMEABILIZACIONES	20/10/2020	3/11/2020	31/12/2020		**-14.00**	
2	SISTEMA ELÉCTRICO	20/10/2020		31/12/2020		**-96.00**	
3	SERVICIO DE JARDINERÍA	11/12/2020	3/11/2020	31/12/2020	13/11/2020	**38.00**	**48.00**
5	LAVADO DE TANQUES	22/12/2020		30/12/2020		**-33.00**	
7	SISTEMAS DE REFRIGERACIÓN	20/10/2020	13/10/2020	31/12/2020	19/10/2020	**7.00**	
10	NO PREVISTOS	5/11/2020	6/10/2020	31/12/2020		**30.00**	
	ENTREGA A LA INTERVENTORÍA DE LOS PRODUCTOS Y/O ACTIVIDADES CONTRATADAS (HITO OBLIGATORIO)						

CENTRO INDUSTRIAL Y DE ENERGÍAS ALTERNATIVAS - MAICAO

No.	*** DESCRIPCIÓN DEL HITO	INICIO PROGR.	INICIO REAL	FIN PROGR.	FIN REAL	DÍAS DE ATRASO INICIO ATRASO (-) AVANCE (+)	DÍAS DE ATRASO FIN ATRASO (-) AVANCE (+)
	SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO (HITO OBLIGATORIO)					**0.00**	**0.00**
	PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD Y PRELIMINARES	31/10/2020		3/11/2020		**-85.00**	
3	SERVICIO DE JARDINERÍA	12/12/2020		31/12/2020		**-43.00**	
5	LAVADO DE TANQUES	3/11/2020		4/11/2020		**-82.00**	
7	SISTEMAS DE REFRIGERACIÓN	21/11/2020	13/10/2021	31/12/2020	19/10/2020	**-326.00**	
8	MANTENIMIENTOS GENERALES (limpieza, demoliciones, pinturas, estructuras, etc.)	3/11/2020		17/11/2020		**-82.00**	
10	NO PREVISTOS	3/11/2020		31/12/2020		**-82.00**	
	ENTREGA A LA INTERVENTORÍA DE LOS PRODUCTOS Y/O ACTIVIDADES CONTRATADAS (HITO OBLIGATORIO)						

CENTRO INDUSTRIAL Y DE ENERGÍAS ALTERNATIVAS - RIOHACHA

No.	*** DESCRIPCIÓN DEL HITO	INICIO PROGR.	INICIO REAL	FIN PROGR.	FIN REAL	DÍAS DE ATRASO INICIO ATRASO (-) AVANCE (+)	DÍAS DE ATRASO FIN ATRASO (-) AVANCE (+)
	SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO (HITO OBLIGATORIO)					**0.00**	**0.00**
	PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD Y PRELIMINARES	31/10/2020		3/11/2020		**-85.00**	
2	SISTEMA ELÉCTRICO	3/11/2020		31/12/2020		**-82.00**	
3	SERVICIO DE JARDINERÍA	2/12/2020		31/12/2020		**-53.00**	
5	LAVADO DE TANQUES	28/11/2020		21/12/2020		**-57.00**	
7	SISTEMAS DE REFRIGERACIÓN	23/11/2020	14/10/2020	1/12/2020	25/10/2020	**40.00**	**37.00**
10	NO PREVISTOS	9/11/2020		31/12/2020		**-76.00**	
	ENTREGA A LA INTERVENTORÍA DE LOS PRODUCTOS Y/O ACTIVIDADES CONTRATADAS (HITO OBLIGATORIO)						

CENTRO AGRO EMPRESARIAL Y ACUÍCOLA - FONSECA

No.	*** DESCRIPCIÓN DEL HITO	INICIO PROGR.	INICIO REAL	FIN PROGR.	FIN REAL	DÍAS DE ATRASO INICIO ATRASO (-) AVANCE (+)	DÍAS DE ATRASO FIN ATRASO (-) AVANCE (+)
	SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO (HITO OBLIGATORIO)					**0.00**	**0.00**
	PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD Y PRELIMINARES	18/09/2020		18/09/2020		**-128.00**	
3	SERVICIO DE JARDINERÍA	19/09/2020		1/12/2020		**-127.00**	
5	LAVADO DE TANQUES	19/09/2020		5/10/2020		**-127.00**	
10	NO PREVISTOS	21/09/2020		25/11/2020		**-125.00**	
	ENTREGA A LA INTERVENTORÍA DE LOS PRODUCTOS Y/O ACTIVIDADES CONTRATADAS (HITO OBLIGATORIO)						

CENTRO ACUÍCOLA Y AGROINDUSTRIAL DE GAIRA - EL BANCO

No.	*** DESCRIPCIÓN DEL HITO	INICIO PROGR.	INICIO REAL	FIN PROGR.	FIN REAL	DÍAS DE ATRASO INICIO ATRASO (-) AVANCE (+)	DÍAS DE ATRASO FIN ATRASO (-) AVANCE (+)
	SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO (HITO OBLIGATORIO)					**0.00**	**0.00**
	PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD Y PRELIMINARES	3/11/2020		3/11/2020		**-82.00**	
3	SERVICIO DE JARDINERÍA	30/11/2020		31/12/2020		**-55.00**	
5	LAVADO DE TANQUES	4/11/2020		1/12/2020		**-81.00**	
7	SISTEMAS DE REFRIGERACIÓN	1/12/2020		15/12/2020		**-54.00**	
10	NO PREVISTOS	4/11/2020		31/12/2020		**-81.00**	

CENTRO ACUÍCOLA Y AGROINDUSTRIAL DE GAIRA - GAIRA

No.	*** DESCRIPCIÓN DEL HITO	INICIO PROGR.	INICIO REAL	FIN PROGR.	FIN REAL	DÍAS DE ATRASO INICIO ATRASO (-) AVANCE (+)	DÍAS DE ATRASO FIN ATRASO (-) AVANCE (+)
	SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO (HITO OBLIGATORIO)					**0.00**	**0.00**
	PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD Y PRELIMINARES	3/11/2020		3/11/2020		**-82.00**	
2	SISTEMA ELÉCTRICO						
4	EQUIPOS DE BOMBEO	30/11/2020		19/12/2020		**-55.00**	
5	LAVADO DE TANQUES	4/11/2020		4/12/2020		**-81.00**	
7	SISTEMAS DE REFRIGERACIÓN	4/11/2020	26/10/2020	31/12/2020		**9.00**	
8	MANTENIMIENTOS GENERALES (limpieza, demoliciones, pinturas, estructuras, etc.)	4/11/2020		31/12/2020		**-81.00**	
9	UNIDADES SANITARIAS, REDES HIDRÁULICAS, HIDROSANITARIAS Y PLUVIALES	13/11/2020		23/12/2020		**-72.00**	
10	NO PREVISTOS	4/11/2020		31/12/2020		**-81.00**	
	ENTREGA A LA INTERVENTORÍA DE LOS PRODUCTOS Y/O ACTIVIDADES CONTRATADAS (HITO OBLIGATORIO)						

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
GRUPO CONSTRUCCIONES

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA ETAPA CONSTRUCCIÓN

SEMANA No.	22	DEL	18 de enero de 2021	AL	24 de enero de 2021

CENTRO DE LOGÍSTICA Y PROMOCIÓN ECOTURÍSTICA DEL MAGDALENA - CIÉNAGA

No.	*** DESCRIPCIÓN DEL HITO	INICIO PROGR.	INICIO REAL	FIN PROGR.	FIN REAL	DÍAS DE ATRASO INICIO ATRASO (-) AVANCE (+)	DÍAS DE ATRASO FIN ATRASO (-) AVANCE (+)
	SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO (HITO OBLIGATORIO)					**0.00**	**0.00**
	PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD Y PRELIMINARES	30/11/2020		30/11/2020		**-55.00**	
1	IMPERMEABILIZACIONES	1/12/2020		31/12/2020		**-54.00**	
5	LAVADO DE TANQUES	15/12/2020		23/12/2020		**-40.00**	
7	SISTEMAS DE REFRIGERACIÓN	4/12/2020		31/12/2020		**-51.00**	
8	MANTENIMIENTOS GENERALES (limpieza, demoliciones, pinturas, estructuras, etc.)	1/12/2020		29/12/2020		**-54.00**	
9	UNIDADES SANITARIAS, REDES HIDRÁULICAS, HIDROSANITARIAS Y PLUVIALES	1/12/2020		11/12/2020		**-54.00**	
10	NO PREVISTOS	1/12/2020		31/12/2020		**-54.00**	
	ENTREGA A LA INTERVENTORÍA DE LOS PRODUCTOS Y/O ACTIVIDADES CONTRATADAS (HITO OBLIGATORIO)						

CENTRO ACUÍCOLA Y AGROINDUSTRIAL DE GAIRA - FUNDACIÓN

No.	*** DESCRIPCIÓN DEL HITO	INICIO PROGR.	INICIO REAL	FIN PROGR.	FIN REAL	DÍAS DE ATRASO INICIO ATRASO (-) AVANCE (+)	DÍAS DE ATRASO FIN ATRASO (-) AVANCE (+)
	SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO (HITO OBLIGATORIO)					**0.00**	**0.00**
	PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD Y PRELIMINARES	30/11/2020		30/11/2020		**-55.00**	
5	LAVADO DE TANQUES	1/12/2020		12/12/2020		**-54.00**	
7	SISTEMAS DE REFRIGERACIÓN	14/12/2020		31/12/2020		**-41.00**	
10	NO PREVISTOS	1/12/2020		31/12/2020		**-54.00**	
	ENTREGA A LA INTERVENTORÍA DE LOS PRODUCTOS Y/O ACTIVIDADES CONTRATADAS (HITO OBLIGATORIO)						

CENTRO DE LOGÍSTICA Y PROMOCIÓN ECOTURÍSTICA DEL MAGDALENA - IPC MARÍA EUGENIA

No.	*** DESCRIPCIÓN DEL HITO	INICIO PROGR.	INICIO REAL	FIN PROGR.	FIN REAL	DÍAS DE ATRASO INICIO ATRASO (-) AVANCE (+)	DÍAS DE ATRASO FIN ATRASO (-) AVANCE (+)
	SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO (HITO OBLIGATORIO)					**0.00**	**0.00**
	PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD Y PRELIMINARES	30/11/2020		30/11/2020		**-55.00**	
1	IMPERMEABILIZACIONES	17/12/2020		31/12/2020		**-38.00**	
3	SERVICIO DE JARDINERÍA	1/12/2020		31/12/2020		**-54.00**	
4	EQUIPOS DE BOMBEO	14/12/2020		31/12/2020		**-41.00**	
5	LAVADO DE TANQUES	1/12/2020		26/12/2020		**-54.00**	
7	SISTEMAS DE REFRIGERACIÓN	11/12/2020	16/10/2020	31/12/2020	20/10/2020	**56.00**	**72.00**
8	MANTENIMIENTOS GENERALES (limpieza, demoliciones, pinturas, estructuras, etc.)	1/12/2020		31/12/2020		**-54.00**	
9	UNIDADES SANITARIAS, REDES HIDRÁULICAS, HIDROSANITARIAS Y PLUVIALES	11/12/2020		31/12/2020		**-44.00**	
10	NO PREVISTOS	11/12/2020		31/12/2020		**-44.00**	
	ENTREGA A LA INTERVENTORÍA DE LOS PRODUCTOS Y/O ACTIVIDADES CONTRATADAS (HITO OBLIGATORIO)						

CENTRO DE LOGÍSTICA Y PROMOCIÓN ECOTURÍSTICA DEL MAGDALENA - SANTA MARTA

No.	*** DESCRIPCIÓN DEL HITO	INICIO PROGR.	INICIO REAL	FIN PROGR.	FIN REAL	DÍAS DE ATRASO INICIO ATRASO (-) AVANCE (+)	DÍAS DE ATRASO FIN ATRASO (-) AVANCE (+)
	SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO (HITO OBLIGATORIO)					**0.00**	**0.00**
	PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD Y PRELIMINARES	30/11/2020		30/11/2020		**-55.00**	
1	IMPERMEABILIZACIONES	1/12/2020		28/12/2020		**-54.00**	
2	SISTEMA ELÉCTRICO	11/12/2020		31/12/2020		**-44.00**	
3	SERVICIO DE JARDINERÍA	11/12/2020		31/12/2020		**-44.00**	
4	EQUIPOS DE BOMBEO	10/12/2020		31/12/2020		**-45.00**	
5	LAVADO DE TANQUES	3/12/2020		22/12/2020		**-52.00**	
7	SISTEMAS DE REFRIGERACIÓN	11/12/2020		31/12/2020		**-44.00**	
10	NO PREVISTOS	1/12/2020		31/12/2020		**-54.00**	
	ENTREGA A LA INTERVENTORÍA DE LOS PRODUCTOS Y/O ACTIVIDADES CONTRATADAS (HITO OBLIGATORIO)						

CENTRO DE LOGÍSTICA Y PROMOCIÓN ECOTURÍSTICA DEL MAGDALENA - APE Y SERVICIO MÉDICO

No.	*** DESCRIPCIÓN DEL HITO	INICIO PROGR.	INICIO REAL	FIN PROGR.	FIN REAL	DÍAS DE ATRASO INICIO ATRASO (-) AVANCE (+)	DÍAS DE ATRASO FIN ATRASO (-) AVANCE (+)
	SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO (HITO OBLIGATORIO)					**0.00**	**0.00**
	PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD Y PRELIMINARES	30/11/2020		30/11/2020		**-55.00**	
1	IMPERMEABILIZACIONES	1/12/2020		2/12/2020		**-54.00**	
2	SISTEMA ELÉCTRICO	14/12/2020		22/12/2020		**-41.00**	
3	SERVICIO DE JARDINERÍA	1/12/2020		30/12/2020		**-54.00**	
4	EQUIPOS DE BOMBEO	21/12/2020		31/12/2020		**-34.00**	
5	LAVADO DE TANQUES	1/12/2020		22/12/2020		**-54.00**	
7	SISTEMAS DE REFRIGERACIÓN	16/12/2020	30/09/2020	30/12/2020	14/10/2020	**77.00**	**77.00**
8	MANTENIMIENTOS GENERALES (limpieza, demoliciones, pinturas, estructuras, etc.)	1/12/2020		31/12/2020		**-54.00**	
9	UNIDADES SANITARIAS, REDES HIDRÁULICAS, HIDROSANITARIAS Y PLUVIALES	30/11/2020		31/12/2020		**-55.00**	
10	NO PREVISTOS	1/12/2020		31/12/2020		**-54.00**	
	ENTREGA A LA INTERVENTORÍA DE LOS PRODUCTOS Y/O ACTIVIDADES CONTRATADAS (HITO OBLIGATORIO)						

Plazo total del Proyecto en Días	**222**
Plazo faltante del Proyecto en Días	**66**

ALERTA — **CUALQUIER MODIFICACION CONTRACTUAL DEBERA TRAMITARSE CON ALMENOS 15 DIAS DE ANTICIPACION A LA TERMINACIÓN**

DESARROLLO Y DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES MENSUALES - REPORTE DE CUMPLIMIENTO A LAS OBLIGACIONES DEL INTERVENTOR

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
GRUPO CONSTRUCCIONES

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA ETAPA CONSTRUCCIÓN

SEMANA No.	22	DEL	18 de enero de 2021	AL	24 de enero de 2021

TEMAS TÉCNICOS

CONDICIONES GENERALES DE EJECUCIÓN TÉCNICA DE OBRA	Cumple
El contratista cuenta con el personal capacitado para desarrollo del proyecto y su dedicación cumple con lo estipulado en el contrato	NO
En la obra se cuenta con copia completa de los diseños y licencia de construcción debidamente firmados y aprobados por Curaduría o Planeación Municipal	N/A
La obra cuenta con Valla informativa y la instalación y el diseño debe cumplen con las especificaciones definidos por el SENA	N/A
El campamento de obra cumple con los requisitos mínimos de resistencia, equilibrio y rigidez, que garantice las condiciones de funcionamiento	N/A
El perfil estratigráfico del terreno excavado corresponder al definido en el estudio geotécnico del proyecto.	N/A
Las canteras de donde proviene el material han sido previamente autorizadas por la Interventoría y cuentan con los debidos permisos ambientales y legales.	N/A
Los materiales suministrados, han sido aprobados previo a su instalación por la interventoría, cuentan con certificación de calidad y cumplen con las especificaciones técnicas requeridas	NO
Todos los procedimientos que se usados para la instalación de equipos y materiales eléctricos se ajustan a los establecidos en el reglamento vigente en la empresa de energía, a las demás normas aplicables.	N/A
Todos los procedimientos que se usados para la instalación de equipos y materiales hidrosanitarios se ajustan a los establecidos en la NTC 1500 Código Colombiano de Fontanería y demás normas aplicables.	N/A
La interventoría ha solicitado oportunamente los ensayos y pruebas necesarias a los elementos instalados en obra	SI

Observaciones

TEMAS SISO

CONDICIONES GENERALES SISO	Cumple
En la ejecución de la obra se da cumplimiento a los planes de manejo ambiental, gestión social, salud en el trabajo da cumplimento al plan ambiental aprobados	SI
La totalidad del personal que ha laborado en el proyecto se encuentra esta afiliado y al día con los aportes de seguridad social y parafiscales.	SI
En obra se cuenta con el Plan de manejo Ambiental aprobado por la Interventoría	SI

Observaciones: El Contratista entregó las observaciones al Plan de Manejo Ambiental a la Interventoría, quien se encuentra en revisión del documento.

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

NO HUBO ACTIVIDADES EN NINGUNA DE LAS SEDES DE LOS DEPARTAMENTOS DE GUAJIRA Y MAGDALENA

PERSONAL DE LA OBRA

PERSONAL CONSORCIO	CANT.	PERSONAL CONTRATISTA OBRA CIVIL	CANT.	CONTRATISTA OBRA ELÉCTRICA	CANT.	CONTRATISTA OBRA HIDROSANITARIA	CANT.
DIRECTOR DE OBRA	1	INGENIEROS/ARQUITECTOS		INGENIEROS		INGENIEROS	
RESIDENTES (INGENIERO, ARQUITECTO, SISO)	1	PROFESIONAL SISO		PROFESIONAL SISO		PROFESIONAL SISO	
COMISIÓN TOPOGRÁFICA		MAESTROS DE OBRA		MAESTROS DE OBRA		MAESTROS DE OBRA	
PERSONAL ADMINISTRATIVO		OFICIALES DE OBRA		OFICIALES DE OBRA		OFICIALES DE OBRA	
AYUDANTES DE OBRA		SOLDADORES		AYUDANTES DE OBRA		AYUDANTES DE OBRA	
TOPÓGRAFO		AYUDANTES DE OBRA				AUXILIAR SISOMA	
CADENEROS		INSPECTOR DE OBRA					
INSPECTOR DE OBRA		OPERADORES					
		ASEADORAS					
		ALMACENISTA					
		AUXILIAR SISOMA					
TOTAL	2	TOTAL	0	TOTAL	0	TOTAL	0

PERSONAL DEL CONTRATISTA

n°	ESPECIALIDAD/CARGO	NOMBRE	PLANILLA N°	OBSERVACIONES
1	DIRECTOR DE OBRA	RICARDO ARTURO MOLINA		
2	COORDINADOR REGIONAL	LUIS ALFREDO GRANADOS		
3	RESIDENTE SISO DE OBRA	SERGIO FERNAN ALONSO		

PERSONAL DE INTERVENTORÍA

n°	ESPECIALIDAD/CARGO	NOMBRE	PLANILLA N°	OBSERVACIONES
1	DIRECTOR INTERVENTORÍA	PEDRO GUTIERREZ BUSTILLO	7771855090	
2	ING RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	SORAYA NAVARRO BOLAÑO	7771863931	

INFORMES SEMANALES DE INTERVENTORÍA

PERIODO				
Desde	Hasta	No. Informe	Fecha entrega	Observaciones y Contenido del Informe RELEVANTES
18/01/2021	24/01/2021	SEMANA No. 22	25-ene-21	Se reciben oficios de parte del contratista y se les da el respectivo trámite ante la entidad

VEINTICINCO	25	días del mes de	ENERO	de	2021
(Día en letras)	(Día en números)				(Año en que se firma el acta)

DIRECTOR O RESIDENTE DEL PROYECTO ETAPA DE OBRA:

NOMBRES Y APELLIDOS	PEDRO GUTIÉRREZ BUSTILLO	FIRMA	

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
GRUPO CONSTRUCCIONES

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA ETAPA CONSTRUCCIÓN

SEMANA No.	23	DEL	25 de enero de 2021	AL	31 de enero de 2021
			(dd-mm-aaaa)		(dd-mm-aaaa)

INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO

CONTRATISTA		INTERVENTOR	
Contratista	CONSORCIO CONSTRUCTOR ALFA	Interventor	CONSORCIO INTER INGECO-GNG
Contrato No.	CO1.PCCNTR.1552323	Contrato No.	CO1.PCCNTR.1636309
Fecha de Iniciación	21 de agosto de 2020	Fecha de Iniciación	12 de agosto de 2020
Fecha de Terminación	HASTA EL 31 DE MARZO DE 2021	Fecha de Terminación	HASTA EL 31 DE MARZO DE 2021
Valor Inicial	$ 8,777,298,757	Valor Inicial	$691,547,950
Adición:	$ 501,925,456	Adición:	N/A
Valor Etapa Construccion	$ 9,279,224,213	Valor Etapa Construccion	$691,547,950
Valor Actualizado Contrato	**$ 9,279,224,213**	Valor Actualizado Contrato	**$691,547,950**
Plazo Inicial	HASTA EL 1 DE DICIEMBRE DE 2020	Plazo Inicial	HASTA EL 15 DE DICIEMBRE DE 2020
Suspensión:	N/A	Suspensión:	N/A
Prórroga 1:	1 MES	Prórroga 1:	15 DÍAS
Prórroga 2:	3 MESES	Prórroga 2:	3 MESES
Plazo Actualizado	HASTA EL 31 DE MARZO DE 2021	Plazo Actualizado	HASTA EL 31 DE MARZO DE 2021

(Diligenciar los campos correspondientes al proyecto, en los campos que no aplique se debe colocar N/A)

OBJETO DEL CONTRATO DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y OBRA :

MANTENIMIENTO PREDICTIVO, PREVENTIVO, CORRECTIVO, REPARACIONES Y MEJORAS LOCATIVAS A LAS INSTALACIONES DEL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA A NIVEL NACIONAL, MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA, CONTABLE Y AMBIENTAL, PARA EL MANTENIMIENTO PREDICTIVO, PREVENTIVO, CORRECTIVO, REPARACIONES Y MEJORAS LOCATIVAS A LAS INSTALACIONES DEL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA A NIVEL NACIONAL, MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE.


PERSONAL QUE INTERVIENE EN EL PROYECTO

CARGO	NOMBRE
DIRECTOR DE OBRA CONTRATISTA:	RICARDO ARTURO MOLINA GARCIA
DIRECTOR DE OBRA INTERVENTORÍA:	PEDRO ANTONIO GUTIERREZ BUSTILLO
ARQUITECTO/INGENIERO RESIDENTE DE OBRA:	GIAN CARLOS ZARUR TORRALVO
INGENIERO/ARQUITECTO RESIDENTE DE INTERVENTORÍA:	SERGIO JAVIER SOLANO ALMANZA
RESIDENTE SISO OBRA	SERGIO FERNAN ALONSO CARVAJAL
RESIDENTE SISO INTERVENTORÍA	XIOMARA PEREZ

SEGUIMIENTO FÍSICO CONTRATO

GRAFICO AVANCE FÍSICO CONTRATO


SEDE COMERCIO Y SERVICIO - RIOHACHA

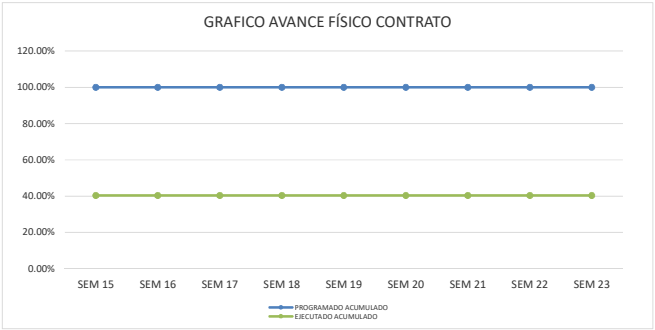

% AVANCE SEMANAL ACUMULADO	PROGRAMADO ACUMULADO	EJECUTADO ACUMULADO	DIFERENCIA
SEM 15	100.00%	40.37%	**-59.63%**
SEM 16	100.00%	40.37%	**-59.63%**
SEM 17	100.00%	40.37%	**-59.63%**
SEM 18	100.00%	40.37%	**-59.63%**
SEM 19	100.00%	40.37%	**-59.63%**
SEM 20	100.00%	40.37%	**-59.63%**
SEM 21	100.00%	40.37%	**-59.63%**
SEM 22	100.00%	40.37%	**-59.63%**
SEM 23	100.00%	40.37%	**-59.63%**
ALERTAS			**-59.63%**

INICIAR PROCESO POR POSIBLE INCUMPLIMIENTO

CENTRO INDUSTRIAL Y DE ENERGÍAS ALTERNATIVAS - MAICAO

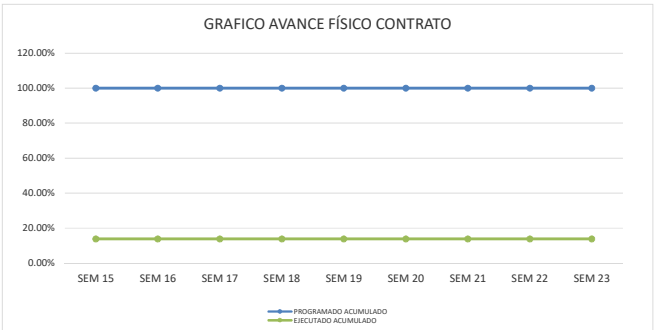

% AVANCE SEMANAL ACUMULADO	PROGRAMADO ACUMULADO	EJECUTADO ACUMULADO	DIFERENCIA
SEM 15	100.00%	13.84%	**-86.16%**
SEM 16	100.00%	13.84%	**-86.16%**
SEM 17	100.00%	13.84%	**-86.16%**
SEM 18	100.00%	13.84%	**-86.16%**
SEM 19	100.00%	13.84%	**-86.16%**
SEM 20	100.00%	13.84%	**-86.16%**
SEM 21	100.00%	13.84%	**-86.16%**
SEM 22	100.00%	13.84%	**-86.16%**
SEM 23	100.00%	13.84%	**-86.16%**
ALERTAS			**-86.16%**


INICIAR PROCESO POR POSIBLE INCUMPLIMIENTO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
GRUPO CONSTRUCCIONES

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA ETAPA CONSTRUCCIÓN


SEMANA No.	23	DEL	25 de enero de 2021	AL	31 de enero de 2021

CENTRO INDUSTRIAL Y DE ENERGÍAS ALTERNATIVAS - RIOHACHA

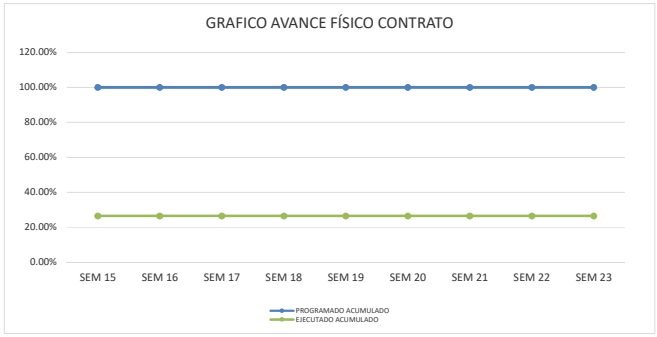


% AVANCE SEMANAL ACUMULADO	PROGRAMADO ACUMULADO	EJECUTADO ACUMULADO	DIFERENCIA
SEM 15	100.00%	26.52%	-73.48%
SEM 16	100.00%	26.52%	-73.48%
SEM 17	100.00%	26.52%	-73.48%
SEM 18	100.00%	26.52%	-73.48%
SEM 19	100.00%	26.52%	-73.48%
SEM 20	100.00%	26.52%	-73.48%
SEM 21	100.00%	26.52%	-73.48%
SEM 22	100.00%	26.52%	-73.48%
SEM 23	100.00%	26.52%	-73.48%
ALERTAS			-73.48%
INICIAR PROCESO POR POSIBLE INCUMPLIMIENTO			

CENTRO AGRO EMPRESARIAL Y ACUÍCOLA - FONSECA

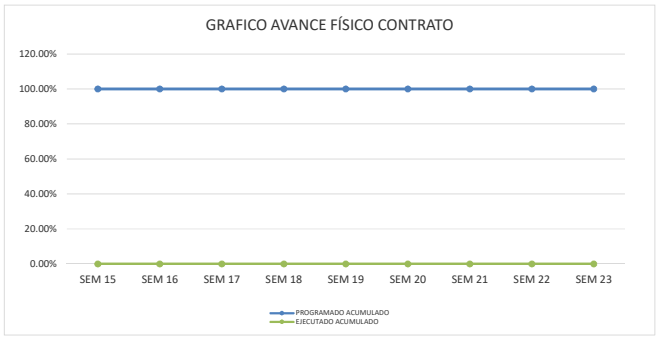


% AVANCE SEMANAL ACUMULADO	PROGRAMADO ACUMULADO	EJECUTADO ACUMULADO	DIFERENCIA
SEM 15	100.00%	0.00%	-100.00%
SEM 16	100.00%	0.00%	-100.00%
SEM 17	100.00%	0.00%	-100.00%
SEM 18	100.00%	0.00%	-100.00%
SEM 19	100.00%	0.00%	-100.00%
SEM 20	100.00%	0.00%	-100.00%
SEM 21	100.00%	0.00%	-100.00%
SEM 22	100.00%	0.00%	-100.00%
SEM 23	100.00%	0.00%	-100.00%
ALERTAS			-100.00%
INICIAR PROCESO POR POSIBLE INCUMPLIMIENTO			

CENTRO ACUÍCOLA Y AGROINDUSTRIAL DE GAIRA - EL BANCO

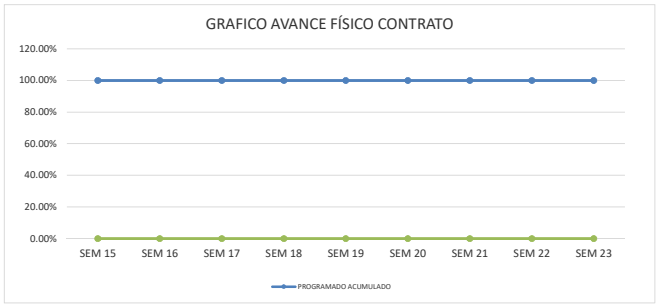

% AVANCE SEMANAL ACUMULADO	PROGRAMADO ACUMULADO	EJECUTADO ACUMULADO	DIFERENCIA
SEM 15	100.00%	0.00%	-100.00%
SEM 16	100.00%	0.00%	-100.00%
SEM 17	100.00%	0.00%	-100.00%
SEM 18	100.00%	0.00%	-100.00%
SEM 19	100.00%	0.00%	-100.00%
SEM 20	100.00%	0.00%	-100.00%
SEM 21	100.00%	0.00%	-100.00%
SEM 22	100.00%	0.00%	-100.00%
SEM 23	100.00%	0.00%	-100.00%
ALERTAS			-100.00%
INICIAR PROCESO POR POSIBLE INCUMPLIMIENTO			

CENTRO ACUÍCOLA Y AGROINDUSTRIAL DE GAIRA - GAIRA

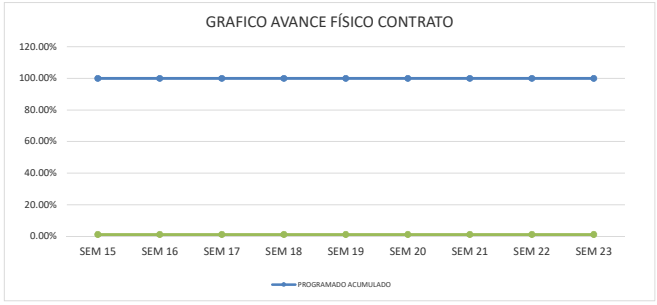


% AVANCE SEMANAL ACUMULADO	PROGRAMADO ACUMULADO	EJECUTADO ACUMULADO	DIFERENCIA
SEM 15	100.00%	1.25%	-98.75%
SEM 16	100.00%	1.25%	-98.75%
SEM 17	100.00%	1.25%	-98.75%
SEM 18	100.00%	1.25%	-98.75%
SEM 19	100.00%	1.25%	-98.75%
SEM 20	100.00%	1.25%	-98.75%
SEM 21	100.00%	1.25%	-98.75%
SEM 22	100.00%	1.25%	-98.75%
SEM 23	100.00%	1.25%	-98.75%
ALERTAS			-98.75%
INICIAR PROCESO POR POSIBLE INCUMPLIMIENTO			

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
GRUPO CONSTRUCCIONES

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA ETAPA CONSTRUCCIÓN


SEMANA No.	23	DEL	25 de enero de 2021	AL	31 de enero de 2021

CENTRO DE LOGÍSTICA Y PROMOCIÓN ECOTURÍSTICA DEL MAGDALENA - CIÉNAGA

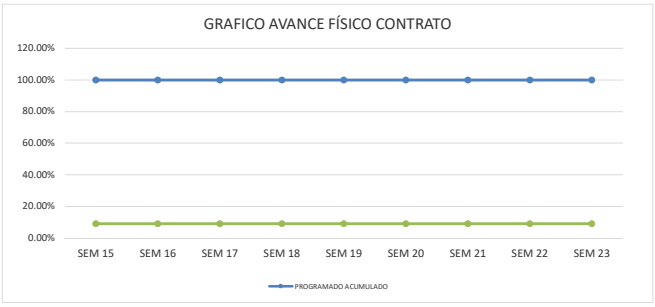


% AVANCE SEMANAL ACUMULADO	PROGRAMADO ACUMULADO	EJECUTADO ACUMULADO	DIFERENCIA
SEM 15	100.00%	9.13%	-90.87%
SEM 16	100.00%	9.13%	-90.87%
SEM 17	100.00%	9.13%	-90.87%
SEM 18	100.00%	9.13%	-90.87%
SEM 19	100.00%	9.13%	-90.87%
SEM 20	100.00%	9.13%	-90.87%
SEM 21	100.00%	9.13%	-90.87%
SEM 22	100.00%	9.13%	-90.87%
SEM 23	100.00%	9.13%	-90.87%
ALERTAS			-90.87%
INICIAR PROCESO POR POSIBLE INCUMPLIMIENTO			

CENTRO ACUÍCOLA Y AGROINDUSTRIAL DE GAIRA - FUNDACIÓN

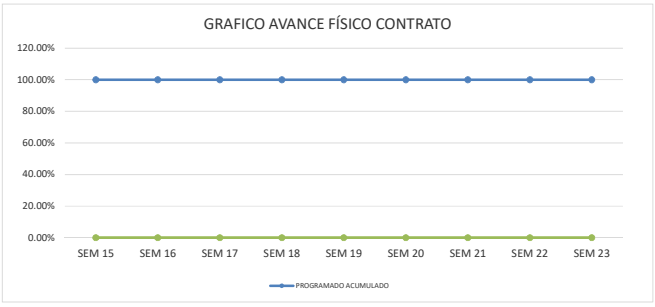


% AVANCE SEMANAL ACUMULADO	PROGRAMADO ACUMULADO	EJECUTADO ACUMULADO	DIFERENCIA
SEM 15	100.00%	0.00%	-100.00%
SEM 16	100.00%	0.00%	-100.00%
SEM 17	100.00%	0.00%	-100.00%
SEM 18	100.00%	0.00%	-100.00%
SEM 19	100.00%	0.00%	-100.00%
SEM 20	100.00%	0.00%	-100.00%
SEM 21	100.00%	0.00%	-100.00%
SEM 22	100.00%	0.00%	-100.00%
SEM 23	100.00%	0.00%	-100.00%
ALERTAS			-100.00%
INICIAR PROCESO POR POSIBLE INCUMPLIMIENTO			

CENTRO DE LOGÍSTICA Y PROMOCIÓN ECOTURÍSTICA DEL MAGDALENA - IPC MARÍA EUGENIA

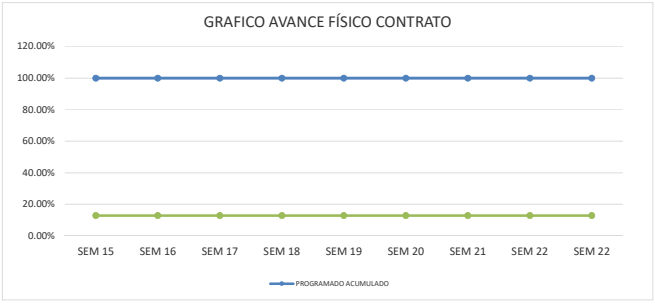

% AVANCE SEMANAL ACUMULADO	PROGRAMADO ACUMULADO	EJECUTADO ACUMULADO	DIFERENCIA
SEM 15	100.00%	12.81%	-87.19%
SEM 16	100.00%	12.81%	-87.19%
SEM 17	100.00%	12.81%	-87.19%
SEM 18	100.00%	12.81%	-87.19%
SEM 19	100.00%	12.81%	-87.19%
SEM 20	100.00%	12.81%	-87.19%
SEM 21	100.00%	12.81%	-87.19%
SEM 22	100.00%	12.81%	-87.19%
SEM 22	100.00%	12.81%	-87.19%
ALERTAS			-87.19%
INICIAR PROCESO POR POSIBLE INCUMPLIMIENTO			

CENTRO DE LOGÍSTICA Y PROMOCIÓN ECOTURÍSTICA DEL MAGDALENA - SANTA MARTA

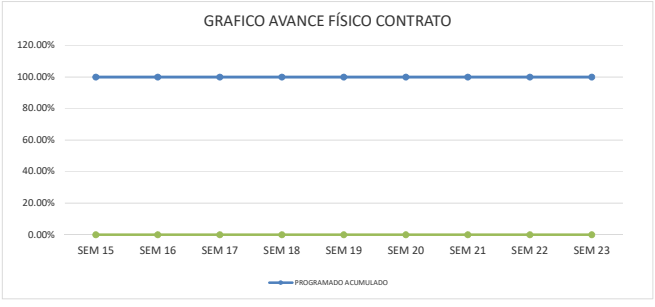


% AVANCE SEMANAL ACUMULADO	PROGRAMADO ACUMULADO	EJECUTADO ACUMULADO	DIFERENCIA
SEM 15	100.00%	0.00%	-100.00%
SEM 16	100.00%	0.00%	-100.00%
SEM 17	100.00%	0.00%	-100.00%
SEM 18	100.00%	0.00%	-100.00%
SEM 19	100.00%	0.00%	-100.00%
SEM 20	100.00%	0.00%	-100.00%
SEM 21	100.00%	0.00%	-100.00%
SEM 22	100.00%	0.00%	-100.00%
SEM 23	100.00%	0.00%	-100.00%
ALERTAS			-100.00%
INICIAR PROCESO POR POSIBLE INCUMPLIMIENTO			

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
GRUPO CONSTRUCCIONES

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA ETAPA CONSTRUCCIÓN

SEMANA No.	23	DEL	25 de enero de 2021	AL	31 de enero de 2021

CENTRO DE LOGÍSTICA Y PROMOCIÓN ECOTURÍSTICA DEL MAGDALENA - APE Y SERVICIO MÉDICO

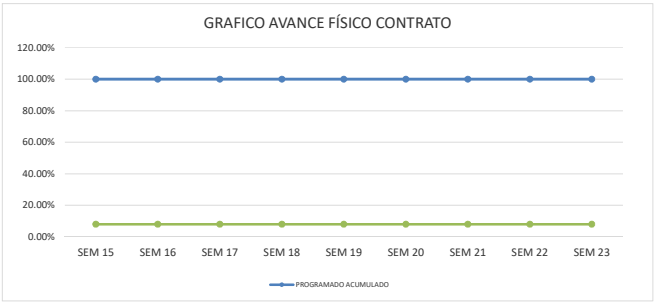


% AVANCE SEMANAL ACUMULADO	PROGRAMADO ACUMULADO	EJECUTADO ACUMULADO	DIFERENCIA
SEM 15	100.00%	7.94%	-92.06%
SEM 16	100.00%	7.94%	-92.06%
SEM 17	100.00%	7.94%	-92.06%
SEM 18	100.00%	7.94%	-92.06%
SEM 19	100.00%	7.94%	-92.06%
SEM 20	100.00%	7.94%	-92.06%
SEM 21	100.00%	7.94%	-92.06%
SEM 22	100.00%	7.94%	-92.06%
SEM 23	100.00%	7.94%	-92.06%
ALERTAS			-92.06%

INICIAR PROCESO POR POSIBLE INCUMPLIMIENTO

SEGUIMIENTO FINANCIERO CONTRATO DE OBRA (Millones de $) (ETAPA DE OBRA)

GRAFICO AVANCE FINANCIERO CONTRATO ETAPA DE OBRA


SEDE COMERCIO Y SERVICIO - RIOHACHA

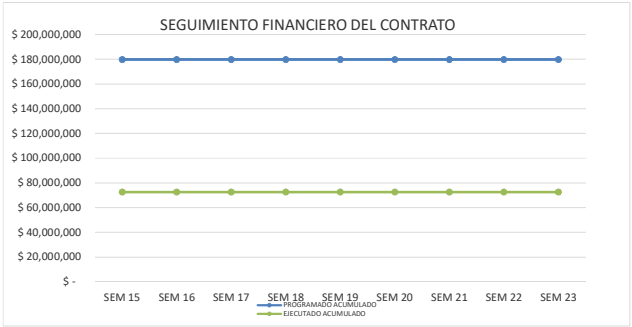

VALOR SEMANAL ACUMULADO	PROGRAMADO ACUMULADO	EJECUTADO ACUMULADO	DIFERENCIA
SEM 15	$ 179,765,940	$ 72,570,665	$ -107,195,275.17
SEM 16	$ 179,765,940	$ 72,570,665	$ -107,195,275.17
SEM 17	$ 179,765,940	$ 72,570,665	$ -107,195,275.17
SEM 18	$ 179,765,940	$ 72,570,665	$ -107,195,275.17
SEM 19	$ 179,765,940	$ 72,570,665	$ -107,195,275.17
SEM 20	$ 179,765,940	$ 72,570,665	$ -107,195,275.17
SEM 21	$ 179,765,940	$ 72,570,665	$ -107,195,275.17
SEM 22	$ 179,765,940	$ 72,570,665	$ -107,195,275.17
SEM 23	$ 179,765,940	$ 72,570,665	$ -107,195,275.17

Nota : incluir el avance las ultimas 8 semanas (en Millones)


CENTRO INDUSTRIAL Y DE ENERGÍAS ALTERNATIVAS - MAICAO

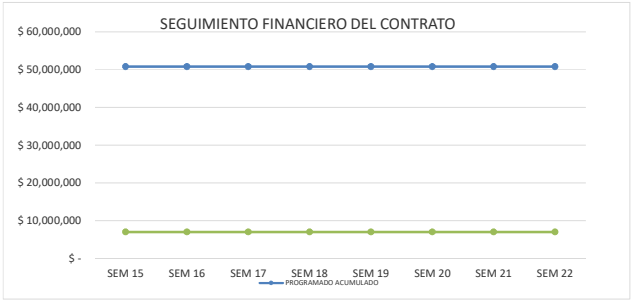

VALOR SEMANAL ACUMULADO	PROGRAMADO ACUMULADO	EJECUTADO ACUMULADO	DIFERENCIA
SEM 15	$ 50,771,054	$ 7,026,713.84	$ -43,744,339.93
SEM 16	$ 50,771,054	$ 7,026,713.84	$ -43,744,339.93
SEM 17	$ 50,771,054	$ 7,026,713.84	$ -43,744,339.93
SEM 18	$ 50,771,054	$ 7,026,713.84	$ -43,744,339.93
SEM 19	$ 50,771,054	$ 7,026,713.84	$ -43,744,339.93
SEM 20	$ 50,771,054	$ 7,026,713.84	$ -43,744,339.93
SEM 21	$ 50,771,054	$ 7,026,713.84	$ -43,744,339.93
SEM 22	$ 50,771,054	$ 7,026,713.84	$ -43,744,339.93

Nota : incluir el avance las ultimas 8 semanas (en Millones)

CENTRO INDUSTRIAL Y DE ENERGÍAS ALTERNATIVAS - RIOHACHA

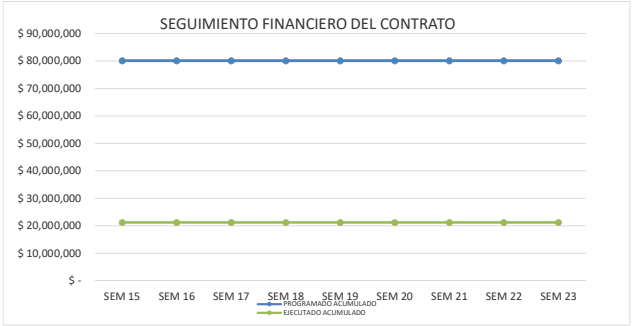

VALOR SEMANAL ACUMULADO	PROGRAMADO ACUMULADO	EJECUTADO ACUMULADO	DIFERENCIA
SEM 15	$ 80,076,766	$ 21,232,354.65	$ -58,844,411.80
SEM 16	$ 80,076,766	$ 21,232,354.65	$ -58,844,411.80
SEM 17	$ 80,076,766	$ 21,232,354.65	$ -58,844,411.80
SEM 18	$ 80,076,766	$ 21,232,354.65	$ -58,844,411.80
SEM 19	$ 80,076,766	$ 21,232,354.65	$ -58,844,411.80
SEM 20	$ 80,076,766	$ 21,232,354.65	$ -58,844,411.80
SEM 21	$ 80,076,766	$ 21,232,354.65	$ -58,844,411.80
SEM 22	$ 80,076,766	$ 21,232,354.65	$ -58,844,411.80
SEM 23	$ 80,076,766	$ 21,232,354.65	$ -58,844,411.80


Nota : incluir el avance las ultimas 8 semanas (en Millones)

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
GRUPO CONSTRUCCIONES

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA ETAPA CONSTRUCCIÓN


SEMANA No.	23	DEL	25 de enero de 2021	AL	31 de enero de 2021

CENTRO AGRO EMPRESARIAL Y ACUÍCOLA - FONSECA

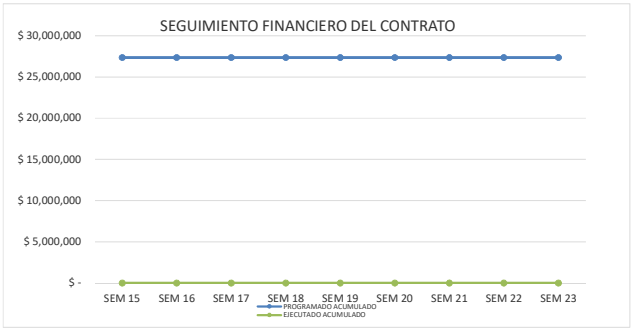


VALOR SEMANAL ACUMULADO	PROGRAMADO ACUMULADO	EJECUTADO ACUMULADO	DIFERENCIA
SEM 15	$ 27,364,346	$ -	$ -27,364,345.78
SEM 16	$ 27,364,346	$ -	$ -27,364,345.78
SEM 17	$ 27,364,346	$ -	$ -27,364,345.78
SEM 18	$ 27,364,346	$ -	$ -27,364,345.78
SEM 19	$ 27,364,346	$ -	$ -27,364,345.78
SEM 20	$ 27,364,346	$ -	$ -27,364,345.78
SEM 21	$ 27,364,346	$ -	$ -27,364,345.78
SEM 22	$ 27,364,346	$ -	$ -27,364,345.78
SEM 23	$ 27,364,346	$ -	$ -27,364,345.78
Nota : incluir el avance las ultimas 8 semanas (en Millones)			

CENTRO ACUÍCOLA Y AGROINDUSTRIAL DE GAIRA - EL BANCO

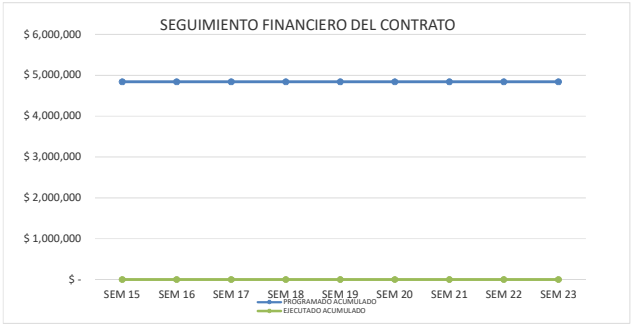


VALOR SEMANAL ACUMULADO	PROGRAMADO ACUMULADO	EJECUTADO ACUMULADO	DIFERENCIA
SEM 15	$ 4,840,347	$ -	$ -4,840,347.12
SEM 16	$ 4,840,347	$ -	$ -4,840,347.12
SEM 17	$ 4,840,347	$ -	$ -4,840,347.12
SEM 18	$ 4,840,347	$ -	$ -4,840,347.12
SEM 19	$ 4,840,347	$ -	$ -4,840,347.12
SEM 20	$ 4,840,347	$ -	$ -4,840,347.12
SEM 21	$ 4,840,347	$ -	$ -4,840,347.12
SEM 22	$ 4,840,347	$ -	$ -4,840,347.12
SEM 23	$ 4,840,347	$ -	$ -4,840,347.12
Nota : incluir el avance las ultimas 8 semanas (en Millones)			

CENTRO ACUÍCOLA Y AGROINDUSTRIAL DE GAIRA - GAIRA

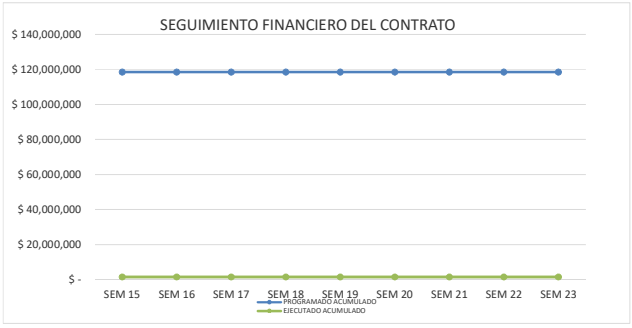

VALOR SEMANAL ACUMULADO	PROGRAMADO ACUMULADO	EJECUTADO ACUMULADO	DIFERENCIA
SEM 15	$ 118,523,150	$ 1,481,539.38	$ -117,041,610.73
SEM 16	$ 118,523,150	$ 1,481,539.38	$ -117,041,610.73
SEM 17	$ 118,523,150	$ 1,481,539.38	$ -117,041,610.73
SEM 18	$ 118,523,150	$ 1,481,539.38	$ -117,041,610.73
SEM 19	$ 118,523,150	$ 1,481,539.38	$ -117,041,610.73
SEM 20	$ 118,523,150	$ 1,481,539.38	$ -117,041,610.73
SEM 21	$ 118,523,150	$ 1,481,539.38	$ -117,041,610.73
SEM 22	$ 118,523,150	$ 1,481,539.38	$ -117,041,610.73
SEM 23	$ 118,523,150	$ 1,481,539.38	$ -117,041,610.73
Nota : incluir el avance las ultimas 8 semanas (en Millones)			

CENTRO DE LOGÍSTICA Y PROMOCIÓN ECOTURÍSTICA DEL MAGDALENA - CIÉNAGA

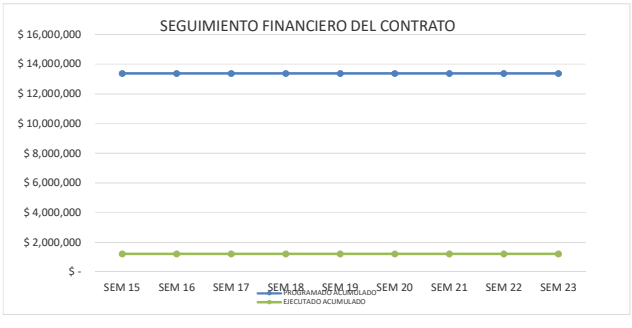


VALOR SEMANAL ACUMULADO	PROGRAMADO ACUMULADO	EJECUTADO ACUMULADO	DIFERENCIA
SEM 15	$ 13,374,356	$ 1,221,078.70	$ -12,153,277.23
SEM 16	$ 13,374,356	$ 1,221,078.70	$ -12,153,277.23
SEM 17	$ 13,374,356	$ 1,221,078.70	$ -12,153,277.23
SEM 18	$ 13,374,356	$ 1,221,078.70	$ -12,153,277.23
SEM 19	$ 13,374,356	$ 1,221,078.70	$ -12,153,277.23
SEM 20	$ 13,374,356	$ 1,221,078.70	$ -12,153,277.23
SEM 21	$ 13,374,356	$ 1,221,078.70	$ -12,153,277.23
SEM 22	$ 13,374,356	$ 1,221,078.70	$ -12,153,277.23
SEM 23	$ 13,374,356	$ 1,221,078.70	$ -12,153,277.23
Nota : incluir el avance las ultimas 8 semanas (en Millones)			

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
GRUPO CONSTRUCCIONES

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA ETAPA CONSTRUCCIÓN

SEMANA No.	23	DEL	25 de enero de 2021	AL	31 de enero de 2021


CENTRO ACUÍCOLA Y AGROINDUSTRIAL DE GAIRA - FUNDACIÓN

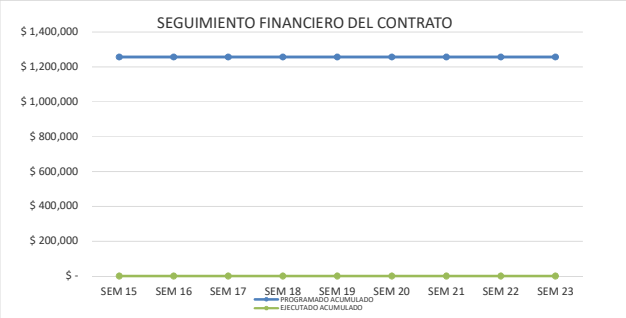

VALOR SEMANAL ACUMULADO	PROGRAMADO ACUMULADO	EJECUTADO ACUMULADO	DIFERENCIA
SEM 15	$ 1,256,111	$ -	$ -1,256,111.09
SEM 16	$ 1,256,111	$ -	$ -1,256,111.09
SEM 17	$ 1,256,111	$ -	$ -1,256,111.09
SEM 18	$ 1,256,111	$ -	$ -1,256,111.09
SEM 19	$ 1,256,111	$ -	$ -1,256,111.09
SEM 20	$ 1,256,111	$ -	$ -1,256,111.09
SEM 21	$ 1,256,111	$ -	$ -1,256,111.09
SEM 22	$ 1,256,111	$ -	$ -1,256,111.09
SEM 23	$ 1,256,111	$ -	$ -1,256,111.09

Nota : incluir el avance las ultimas 8 semanas (en Millones)


CENTRO DE LOGÍSTICA Y PROMOCIÓN ECOTURÍSTICA DEL MAGDALENA - IPC MARÍA EUGENIA

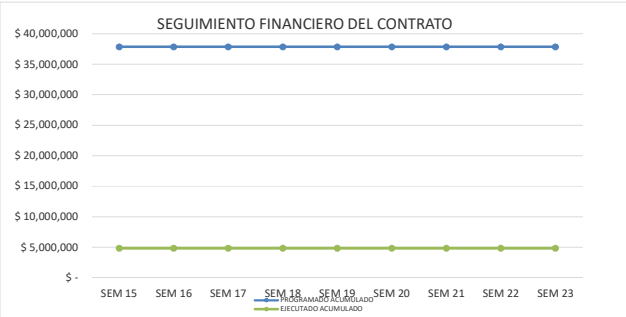

VALOR SEMANAL ACUMULADO	PROGRAMADO ACUMULADO	EJECUTADO ACUMULADO	DIFERENCIA
SEM 15	$ 37,845,869	$ 4,848,055.77	$ -32,997,812.81
SEM 16	$ 37,845,869	$ 4,848,055.77	$ -32,997,812.81
SEM 17	$ 37,845,869	$ 4,848,055.77	$ -32,997,812.81
SEM 18	$ 37,845,869	$ 4,848,055.77	$ -32,997,812.81
SEM 19	$ 37,845,869	$ 4,848,055.77	$ -32,997,812.81
SEM 20	$ 37,845,869	$ 4,848,055.77	$ -32,997,812.81
SEM 21	$ 37,845,869	$ 4,848,055.77	$ -32,997,812.81
SEM 22	$ 37,845,869	$ 4,848,055.77	$ -32,997,812.81
SEM 23	$ 37,845,869	$ 4,848,055.77	$ -32,997,812.81

Nota : incluir el avance las ultimas 8 semanas (en Millones)


CENTRO DE LOGÍSTICA Y PROMOCIÓN ECOTURÍSTICA DEL MAGDALENA - SANTA MARTA

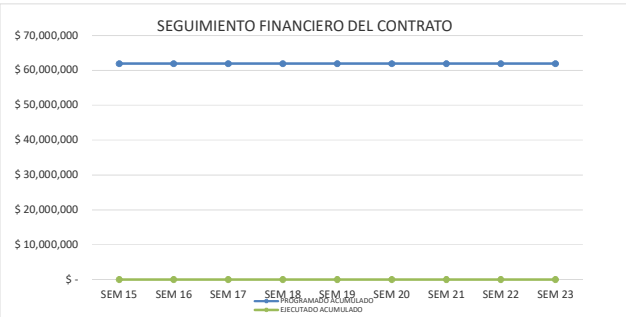

VALOR SEMANAL ACUMULADO	PROGRAMADO ACUMULADO	EJECUTADO ACUMULADO	DIFERENCIA
SEM 15	$ 61,917,333	$ -	$ -61,917,333.15
SEM 16	$ 61,917,333	$ -	$ -61,917,333.15
SEM 17	$ 61,917,333	$ -	$ -61,917,333.15
SEM 18	$ 61,917,333	$ -	$ -61,917,333.15
SEM 19	$ 61,917,333	$ -	$ -61,917,333.15
SEM 20	$ 61,917,333	$ -	$ -61,917,333.15
SEM 21	$ 61,917,333	$ -	$ -61,917,333.15
SEM 22	$ 61,917,333	$ -	$ -61,917,333.15
SEM 23	$ 61,917,333	$ -	$ -61,917,333.15

Nota : incluir el avance las ultimas 8 semanas (en Millones)

CENTRO DE LOGÍSTICA Y PROMOCIÓN ECOTURÍSTICA DEL MAGDALENA - APE Y SERVICIO MÉDICO

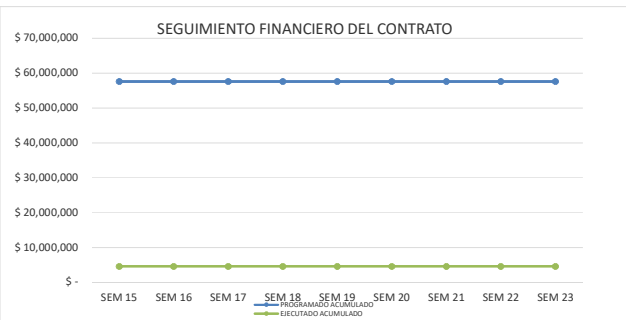

VALOR SEMANAL ACUMULADO	PROGRAMADO ACUMULADO	EJECUTADO ACUMULADO	DIFERENCIA
SEM 15	$ 57,581,875	$ 4,572,000.84	$ -53,009,873.67
SEM 16	$ 57,581,875	$ 4,572,000.84	$ -53,009,873.67
SEM 17	$ 57,581,875	$ 4,572,000.84	$ -53,009,873.67
SEM 18	$ 57,581,875	$ 4,572,000.84	$ -53,009,873.67
SEM 19	$ 57,581,875	$ 4,572,000.84	$ -53,009,873.67
SEM 20	$ 57,581,875	$ 4,572,000.84	$ -53,009,873.67
SEM 21	$ 57,581,875	$ 4,572,000.84	$ -53,009,873.67
SEM 22	$ 57,581,875	$ 4,572,000.84	$ -53,009,873.67
SEM 23	$ 57,581,875	$ 4,572,000.84	$ -53,009,873.67

Nota : incluir el avance las ultimas 8 semanas (en Millones)

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
GRUPO CONSTRUCCIONES

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA ETAPA CONSTRUCCIÓN

SEMANA No.	23	DEL	25 de enero de 2021	AL	31 de enero de 2021

CONTROL DE HITOS ETAPA DE CONSTRUCCIÓN

SEDE COMERCIO Y SERVICIO - RIOHACHA

No.	*** DESCRIPCIÓN DEL HITO	INICIO PROGR.	INICIO REAL	FIN PROGR.	FIN REAL	DÍAS DE ATRASO INICIO ATRASO (-) AVANCE (+)	DÍAS DE ATRASO FIN ATRASO (-) AVANCE (+)
	SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO (HITO OBLIGATORIO)					**0.00**	**0.00**
	PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD Y PRELIMINARES	19/10/2020	6/10/2020	19/10/2020		**13.00**	
1	IMPERMEABILIZACIONES	16/02/2021		4/03/2021		**16.00**	
2	SISTEMA ELÉCTRICO	20/01/2021		31/03/2021		**-11.00**	
3	SERVICIO DE JARDINERÍA	11/12/2020	3/11/2020	31/12/2020	13/11/2020	**38.00**	**48.00**
5	LAVADO DE TANQUES	5/01/2021		26/02/2021		**-26.00**	
7	SISTEMAS DE REFRIGERACIÓN	20/10/2020	13/10/2020	31/12/2020	19/10/2020	**7.00**	
10	NO PREVISTOS	11/12/2020	6/10/2020	31/03/2021		**66.00**	
	ENTREGA A LA INTERVENTORÍA DE LOS PRODUCTOS Y/O ACTIVIDADES CONTRATADAS (HITO OBLIGATORIO)						

CENTRO INDUSTRIAL Y DE ENERGÍAS ALTERNATIVAS - MAICAO

No.	*** DESCRIPCIÓN DEL HITO	INICIO PROGR.	INICIO REAL	FIN PROGR.	FIN REAL	DÍAS DE ATRASO INICIO ATRASO (-) AVANCE (+)	DÍAS DE ATRASO FIN ATRASO (-) AVANCE (+)
	SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO (HITO OBLIGATORIO)					**0.00**	**0.00**
	PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD Y PRELIMINARES	31/10/2020		3/11/2020		**-92.00**	
3	SERVICIO DE JARDINERÍA	13/03/2021		31/03/2021		**41.00**	
7	SISTEMAS DE REFRIGERACIÓN	21/11/2020	13/10/2021	31/12/2020	19/10/2020	**-326.00**	
8	MANTENIMIENTOS GENERALES (limpieza, demoliciones, pinturas, estructuras, etc.)	1/03/2021		13/03/2021		**29.00**	
10	NO PREVISTOS	21/12/2020		31/03/2021		**-41.00**	
	ENTREGA A LA INTERVENTORÍA DE LOS PRODUCTOS Y/O ACTIVIDADES CONTRATADAS (HITO OBLIGATORIO)						

CENTRO INDUSTRIAL Y DE ENERGÍAS ALTERNATIVAS - RIOHACHA

No.	*** DESCRIPCIÓN DEL HITO	INICIO PROGR.	INICIO REAL	FIN PROGR.	FIN REAL	DÍAS DE ATRASO INICIO ATRASO (-) AVANCE (+)	DÍAS DE ATRASO FIN ATRASO (-) AVANCE (+)
	SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO (HITO OBLIGATORIO)					**0.00**	**0.00**
	PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD Y PRELIMINARES	31/10/2020		3/11/2020		**-92.00**	
2	SISTEMA ELÉCTRICO	15/01/2021		31/03/2021		**-16.00**	
3	SERVICIO DE JARDINERÍA	20/02/2021		31/03/2021		**20.00**	
7	SISTEMAS DE REFRIGERACIÓN	17/11/2020	14/10/2020	7/12/2020	25/10/2020	**34.00**	**43.00**
10	NO PREVISTOS	17/11/2020		3/03/2021		**-75.00**	
	ENTREGA A LA INTERVENTORÍA DE LOS PRODUCTOS Y/O ACTIVIDADES CONTRATADAS (HITO OBLIGATORIO)						

CENTRO AGRO EMPRESARIAL Y ACUÍCOLA - FONSECA

No.	*** DESCRIPCIÓN DEL HITO	INICIO PROGR.	INICIO REAL	FIN PROGR.	FIN REAL	DÍAS DE ATRASO INICIO ATRASO (-) AVANCE (+)	DÍAS DE ATRASO FIN ATRASO (-) AVANCE (+)
	SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO (HITO OBLIGATORIO)					**0.00**	**0.00**
	PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD Y PRELIMINARES	3/11/2020		3/11/2020		**-89.00**	
3	SERVICIO DE JARDINERÍA	2/03/2021		31/03/2021		**30.00**	
5	LAVADO DE TANQUES	5/01/2021		23/02/2021		**-26.00**	
7	SISTEMAS DE REFRIGERACIÓN	24/02/2021		8/03/2021		**24.00**	
10	NO PREVISTOS	17/02/2021		31/03/2021		**17.00**	
	ENTREGA A LA INTERVENTORÍA DE LOS PRODUCTOS Y/O ACTIVIDADES CONTRATADAS (HITO OBLIGATORIO)						

CENTRO ACUÍCOLA Y AGROINDUSTRIAL DE GAIRA - EL BANCO

No.	*** DESCRIPCIÓN DEL HITO	INICIO PROGR.	INICIO REAL	FIN PROGR.	FIN REAL	DÍAS DE ATRASO INICIO ATRASO (-) AVANCE (+)	DÍAS DE ATRASO FIN ATRASO (-) AVANCE (+)
	SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO (HITO OBLIGATORIO)					**0.00**	**0.00**
	PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD Y PRELIMINARES	30/11/2020		30/11/2020		**-62.00**	
3	SERVICIO DE JARDINERÍA	2/03/2021		31/03/2021		**30.00**	
5	LAVADO DE TANQUES	5/01/2021		1/02/2021		**-26.00**	
7	SISTEMAS DE REFRIGERACIÓN	1/12/2020		31/12/2020		**-61.00**	
8	MANTENIMIENTOS GENERALES (limpieza, demoliciones, pinturas, estructuras, etc.)	2/03/2021		31/03/2021		**30.00**	
9	UNIDADES SANITARIAS, REDES HIDRÁULICAS, HIDROSANITARIAS Y PLUVIALES	25/01/2021		12/02/2021		**-6.00**	
10	NO PREVISTOS	8/02/2021		31/03/2021		**8.00**	
	ENTREGA A LA INTERVENTORÍA DE LOS PRODUCTOS Y/O ACTIVIDADES CONTRATADAS (HITO OBLIGATORIO)						

CENTRO ACUÍCOLA Y AGROINDUSTRIAL DE GAIRA - GAIRA

No.	*** DESCRIPCIÓN DEL HITO	INICIO PROGR.	INICIO REAL	FIN PROGR.	FIN REAL	DÍAS DE ATRASO INICIO ATRASO (-) AVANCE (+)	DÍAS DE ATRASO FIN ATRASO (-) AVANCE (+)
	SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO (HITO OBLIGATORIO)					**0.00**	**0.00**
	PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD Y PRELIMINARES	3/11/2020		3/11/2020		**-89.00**	
4	EQUIPOS DE BOMBEO	11/03/2021		31/03/2021		**39.00**	
5	LAVADO DE TANQUES	5/01/2021		30/01/2021		**-26.00**	
7	SISTEMAS DE REFRIGERACIÓN	4/11/2020	26/10/2020	9/03/2021		**9.00**	
8	MANTENIMIENTOS GENERALES (limpieza, demoliciones, pinturas, estructuras, etc.)	21/01/2021		31/03/2021		**-10.00**	
9	UNIDADES SANITARIAS, REDES HIDRÁULICAS, HIDROSANITARIAS Y PLUVIALES	13/02/2021		31/03/2021		**13.00**	
10	NO PREVISTOS	4/02/2021		31/03/2021		**4.00**	

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
GRUPO CONSTRUCCIONES

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA ETAPA CONSTRUCCIÓN

SEMANA No.	23	DEL	25 de enero de 2021	AL	31 de enero de 2021

CENTRO DE LOGÍSTICA Y PROMOCIÓN ECOTURÍSTICA DEL MAGDALENA - CIÉNAGA

No.	*** DESCRIPCIÓN DEL HITO	INICIO PROGR.	INICIO REAL	FIN PROGR.	FIN REAL	DÍAS DE ATRASO INICIO ATRASO (-) AVANCE (+)	DÍAS DE ATRASO FIN ATRASO (-) AVANCE (+)
	SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO (HITO OBLIGATORIO)					**0.00**	**0.00**
	PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD Y PRELIMINARES	30/11/2020		30/11/2020		**-62.00**	
1	IMPERMEABILIZACIONES	15/03/2021		31/03/2021		**43.00**	
5	LAVADO DE TANQUES	5/01/2021		1/02/2021		**-26.00**	
7	SISTEMAS DE REFRIGERACIÓN	4/12/2020		31/12/2020		**-58.00**	
8	MANTENIMIENTOS GENERALES (limpieza, demoliciones, pinturas, estructuras, etc.)	12/01/2021		31/03/2021		**-19.00**	
9	UNIDADES SANITARIAS, REDES HIDRÁULICAS, HIDROSANITARIAS Y PLUVIALES	15/03/2021		25/03/2021		**43.00**	
10	NO PREVISTOS	28/12/2020		31/03/2021		**-34.00**	
	ENTREGA A LA INTERVENTORÍA DE LOS PRODUCTOS Y/O ACTIVIDADES CONTRATADAS (HITO OBLIGATORIO)						

CENTRO ACUÍCOLA Y AGROINDUSTRIAL DE GAIRA - FUNDACIÓN

No.	*** DESCRIPCIÓN DEL HITO	INICIO PROGR.	INICIO REAL	FIN PROGR.	FIN REAL	DÍAS DE ATRASO INICIO ATRASO (-) AVANCE (+)	DÍAS DE ATRASO FIN ATRASO (-) AVANCE (+)
	SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO (HITO OBLIGATORIO)					**0.00**	**0.00**
	PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD Y PRELIMINARES	30/11/2020		30/11/2020		**-62.00**	
5	LAVADO DE TANQUES	5/01/2021		1/02/2021		**-26.00**	
7	SISTEMAS DE REFRIGERACIÓN	14/12/2020		31/12/2020		**-48.00**	
10	NO PREVISTOS	1/02/2021		31/03/2021		**1.00**	
	ENTREGA A LA INTERVENTORÍA DE LOS PRODUCTOS Y/O ACTIVIDADES CONTRATADAS (HITO OBLIGATORIO)						

CENTRO DE LOGÍSTICA Y PROMOCIÓN ECOTURÍSTICA DEL MAGDALENA - IPC MARÍA EUGENIA

No.	*** DESCRIPCIÓN DEL HITO	INICIO PROGR.	INICIO REAL	FIN PROGR.	FIN REAL	DÍAS DE ATRASO INICIO ATRASO (-) AVANCE (+)	DÍAS DE ATRASO FIN ATRASO (-) AVANCE (+)
	SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO (HITO OBLIGATORIO)					**0.00**	**0.00**
	PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD Y PRELIMINARES	30/11/2020		30/11/2020		**-62.00**	
1	IMPERMEABILIZACIONES	10/03/2021		23/03/2021		**38.00**	
3	SERVICIO DE JARDINERÍA	2/03/2021		31/03/2021		**30.00**	
4	EQUIPOS DE BOMBEO	18/02/2021		29/03/2021		**18.00**	
5	LAVADO DE TANQUES	5/01/2021		10/03/2021		**-26.00**	
7	SISTEMAS DE REFRIGERACIÓN	11/12/2020	16/10/2020	31/12/2020	20/10/2020	**56.00**	**72.00**
8	MANTENIMIENTOS GENERALES (limpieza, demoliciones, pinturas, estructuras, etc.)	18/02/2021		31/03/2021		**18.00**	
9	UNIDADES SANITARIAS, REDES HIDRÁULICAS, HIDROSANITARIAS Y PLUVIALES	21/12/2020		31/03/2021		**-41.00**	
10	NO PREVISTOS	28/12/2020		31/03/2021		**-34.00**	
	ENTREGA A LA INTERVENTORÍA DE LOS PRODUCTOS Y/O ACTIVIDADES CONTRATADAS (HITO OBLIGATORIO)						

CENTRO DE LOGÍSTICA Y PROMOCIÓN ECOTURÍSTICA DEL MAGDALENA - SANTA MARTA

No.	*** DESCRIPCIÓN DEL HITO	INICIO PROGR.	INICIO REAL	FIN PROGR.	FIN REAL	DÍAS DE ATRASO INICIO ATRASO (-) AVANCE (+)	DÍAS DE ATRASO FIN ATRASO (-) AVANCE (+)
	SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO (HITO OBLIGATORIO)					**0.00**	**0.00**
	PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD Y PRELIMINARES	30/11/2020		30/11/2020		**-62.00**	
1	IMPERMEABILIZACIONES	18/02/2021		15/03/2021		**18.00**	
2	SISTEMA ELÉCTRICO	15/02/2021		31/03/2021		**15.00**	
3	SERVICIO DE JARDINERÍA	18/02/2021		31/03/2021		**18.00**	
4	EQUIPOS DE BOMBEO	2/03/2021		23/03/2021		**30.00**	
5	LAVADO DE TANQUES	25/01/2021		23/02/2021		**-6.00**	
7	SISTEMAS DE REFRIGERACIÓN	11/12/2020		31/12/2020		**-51.00**	
10	NO PREVISTOS	2/03/2021		31/03/2021		**30.00**	
	ENTREGA A LA INTERVENTORÍA DE LOS PRODUCTOS Y/O ACTIVIDADES CONTRATADAS (HITO OBLIGATORIO)						

CENTRO DE LOGÍSTICA Y PROMOCIÓN ECOTURÍSTICA DEL MAGDALENA - APE Y SERVICIO MÉDICO

No.	*** DESCRIPCIÓN DEL HITO	INICIO PROGR.	INICIO REAL	FIN PROGR.	FIN REAL	DÍAS DE ATRASO INICIO ATRASO (-) AVANCE (+)	DÍAS DE ATRASO FIN ATRASO (-) AVANCE (+)
	SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO (HITO OBLIGATORIO)					**0.00**	**0.00**
	PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD Y PRELIMINARES	30/11/2020		30/11/2020		**-62.00**	
1	IMPERMEABILIZACIONES	29/03/2021		31/03/2021		**57.00**	
2	SISTEMA ELÉCTRICO	23/03/2021		31/03/2021		**51.00**	
3	SERVICIO DE JARDINERÍA	2/03/2021		31/03/2021		**30.00**	
4	EQUIPOS DE BOMBEO	2/03/2021		29/03/2021		**30.00**	
5	LAVADO DE TANQUES	5/01/2021		12/02/2021		**-26.00**	
7	SISTEMAS DE REFRIGERACIÓN	16/12/2020	30/09/2020	30/12/2020	14/10/2020	**77.00**	**77.00**
8	MANTENIMIENTOS GENERALES (limpieza, demoliciones, pinturas, estructuras, etc.)	18/01/2021		31/03/2021		**-13.00**	
9	UNIDADES SANITARIAS, REDES HIDRÁULICAS, HIDROSANITARIAS Y PLUVIALES	2/03/2021		31/03/2021		**30.00**	
10	NO PREVISTOS	23/12/2020		31/03/2021		**-39.00**	
	ENTREGA A LA INTERVENTORÍA DE LOS PRODUCTOS Y/O ACTIVIDADES CONTRATADAS (HITO OBLIGATORIO)						

Plazo total del Proyecto en Días	**222**
Plazo faltante del Proyecto en Días	**59**

ALERTA — CUALQUIER MODIFICACION CONTRACTUAL DEBERA TRAMITARSE CON ALMENOS 15 DIAS DE ANTICIPACION A LA TERMINACIÓN

DESARROLLO Y DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES MENSUALES - REPORTE DE CUMPLIMIENTO A LAS OBLIGACIONES DEL INTERVENTOR

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
GRUPO CONSTRUCCIONES

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA ETAPA CONSTRUCCIÓN

SEMANA No.	23	DEL	25 de enero de 2021	AL	31 de enero de 2021

TEMAS TÉCNICOS

CONDICIONES GENERALES DE EJECUCIÓN TÉCNICA DE OBRA	Cumple
El contratista cuenta con el personal capacitado para desarrollo del proyecto y su dedicación cumple con lo estipulado en el contrato	NO
En la obra se cuenta con copia completa de los diseños y licencia de construcción debidamente firmados y aprobados por Curaduría o Planeación Municipal	N/A
La obra cuenta con Valla informativa y la instalación y el diseño debe cumplen con las especificaciones definidos por el SENA	N/A
El campamento de obra cumple con los requisitos mínimos de resistencia, equilibrio y rigidez, que garantice las condiciones de funcionamiento	N/A
El perfil estratigráfico del terreno excavado corresponder al definido en el estudio geotécnico del proyecto.	N/A
Las canteras de donde proviene el material han sido previamente autorizadas por la Interventoría y cuentan con los debidos permisos ambientales y legales.	N/A
Los materiales suministrados, han sido aprobados previo a su instalación por la interventoría, cuentan con certificación de calidad y cumplen con las especificaciones técnicas requeridas	NO
Todos los procedimientos que se usados para la instalación de equipos y materiales eléctricos se ajustan a los establecidos en el reglamento vigente en la empresa de energía, a las demás normas aplicables.	N/A
Todos los procedimientos que se usados para la instalación de equipos y materiales hidrosanitarios se ajustan a los establecidos en la NTC 1500 Código Colombiano de Fontanería y demás normas aplicables.	N/A
La interventoría ha solicitado oportunamente los ensayos y pruebas necesarias a los elementos instalados en obra	SI

Observaciones

TEMAS SISO

CONDICIONES GENERALES SISO	Cumple
En la ejecución de la obra se da cumplimiento a los planes de manejo ambiental, gestión social, salud en el trabajo da cumplimento al plan ambiental aprobados	SI
La totalidad del personal que ha laborado en el proyecto se encuentra esta afiliado y al día con los aportes de seguridad social y parafiscales.	SI
En obra se cuenta con el Plan de manejo Ambiental aprobado por la Interventoría	SI

Observaciones: El Contratista entregó las observaciones al Plan de Manejo Ambiental a la Interventoría, quien se encuentra en revisión del documento.

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

NO HUBO ACTIVIDADES EN NINGUNA DE LAS SEDES DE LOS DEPARTAMENTOS DE GUAJIRA Y MAGDALENA

PERSONAL DE LA OBRA

PERSONAL CONSORCIO	CANT.	PERSONAL CONTRATISTA OBRA CIVIL	CANT.	CONTRATISTA OBRA ELÉCTRICA	CANT.	CONTRATISTA OBRA HIDROSANITARIA	CANT.
DIRECTOR DE OBRA	1	INGENIEROS/ARQUITECTOS		INGENIEROS		INGENIEROS	
RESIDENTES (INGENIERO, ARQUITECTO, SISO)	1	PROFESIONAL SISO		PROFESIONAL SISO		PROFESIONAL SISO	
COMISIÓN TOPOGRÁFICA		MAESTROS DE OBRA		MAESTROS DE OBRA		MAESTROS DE OBRA	
PERSONAL ADMINISTRATIVO		OFICIALES DE OBRA		OFICIALES DE OBRA		OFICIALES DE OBRA	
AYUDANTES DE OBRA		SOLDADORES		AYUDANTES DE OBRA		AYUDANTES DE OBRA	
TOPÓGRAFO		AYUDANTES DE OBRA				AUXILIAR SISOMA	
CADENEROS		INSPECTOR DE OBRA					
INSPECTOR DE OBRA		OPERADORES					
		ASEADORAS					
		ALMACENISTA					
		AUXILIAR SISOMA					
TOTAL	2	TOTAL	0	TOTAL	0	TOTAL	0

PERSONAL DEL CONTRATISTA

n°	ESPECIALIDAD/CARGO	NOMBRE	PLANILLA N°	OBSERVACIONES
1	DIRECTOR DE OBRA	RICARDO ARTURO MOLINA		
2	COORDINADOR REGIONAL	LUIS ALFREDO GRANADOS		
3	RESIDENTE SISO DE OBRA	SERGIO FERNAN ALONSO		

PERSONAL DE INTERVENTORÍA

n°	ESPECIALIDAD/CARGO	NOMBRE	PLANILLA N°	OBSERVACIONES
1	DIRECTOR INTERVENTORÍA	PEDRO GUTIERREZ BUSTILLO	7771855090	
2	ING RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	SORAYA NAVARRO BOLAÑO	7771863931	
4	RESIDENTE SISO INTERVENTORÍA	XIOMARA PEREZ	7775239122	
5	INSPECTOR DE OBRA			

INFORMES SEMANALES DE INTERVENTORÍA

PERIODO				
Desde	Hasta	No. Informe	Fecha entrega	Observaciones y Contenido del Informe RELEVANTES
25/01/2021	31/01/2021	SEMANA No. 23	1-feb-21	Se reciben oficios de parte del contratista y se les da el respectivo trámite ante la entidad

UNO	1	días del mes de	FEBRERO	de	2021
(Día en letras)	(Día en números)				(Año en que se firma el acta)

DIRECTOR O RESIDENTE DEL PROYECTO ETAPA DE OBRA:

NOMBRES Y APELLIDOS	PEDRO GUTIÉRREZ BUSTILLO	FIRMA	

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
GRUPO CONSTRUCCIONES

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA ETAPA CONSTRUCCIÓN

SEMANA No.	24	DEL	1 de febrero de 2021	AL	7 de febrero de 2021
			(dd-mm-aaaa)		(dd-mm-aaaa)

INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO

CONTRATISTA		INTERVENTOR	
Contratista	CONSORCIO CONSTRUCTOR ALFA	Interventor	CONSORCIO INTER INGECO-GNG
Contrato No.	CO1.PCCNTR.1552323	Contrato No.	CO1.PCCNTR.1636309
Fecha de Iniciación	21 de agosto de 2020	Fecha de Iniciación	12 de agosto de 2020
Fecha de Terminación	HASTA EL 31 DE MARZO DE 2021	Fecha de Terminación	HASTA EL 31 DE MARZO DE 2021
Valor Inicial	$ 8,777,298,757	Valor Inicial	$691,547,950
Adición:	$ 501,925,456	Adición:	N/A
Valor Etapa Construccion	$ 9,279,224,213	Valor Etapa Construccion	$691,547,950
Valor Actualizado Contrato	**$ 9,279,224,213**	Valor Actualizado Contrato	**$691,547,950**
Plazo Inicial	HASTA EL 1 DE DICIEMBRE DE 2020	Plazo Inicial	HASTA EL 15 DE DICIEMBRE DE 2020
Suspensión:	N/A	Suspensión:	N/A
Prórroga 1:	1 MES	Prórroga 1:	15 DÍAS
Prórroga 2:	3 MESES	Prórroga 2:	3 MESES
Plazo Actualizado	HASTA EL 31 DE MARZO DE 2021	Plazo Actualizado	HASTA EL 31 DE MARZO DE 2021

(Diligenciar los campos correspondientes al proyecto, en los campos que no aplique se debe colocar N/A)

OBJETO DEL CONTRATO DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y OBRA :

MANTENIMIENTO PREDICTIVO, PREVENTIVO, CORRECTIVO, REPARACIONES Y MEJORAS LOCATIVAS A LAS INSTALACIONES DEL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA A NIVEL NACIONAL, MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA, CONTABLE Y AMBIENTAL, PARA EL MANTENIMIENTO PREDICTIVO, PREVENTIVO, CORRECTIVO, REPARACIONES Y MEJORAS LOCATIVAS A LAS INSTALACIONES DEL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA A NIVEL NACIONAL, MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE.


PERSONAL QUE INTERVIENE EN EL PROYECTO

CARGO	NOMBRE
DIRECTOR DE OBRA CONTRATISTA:	RICARDO ARTURO MOLINA GARCIA
DIRECTOR DE OBRA INTERVENTORÍA:	PEDRO ANTONIO GUTIERREZ BUSTILLO
ARQUITECTO/INGENIERO RESIDENTE DE OBRA:	GIAN CARLOS ZARUR TORRALVO
INGENIERO/ARQUITECTO RESIDENTE DE INTERVENTORÍA:	SERGIO JAVIER SOLANO ALMANZA
RESIDENTE SISO OBRA	SERGIO FERNAN ALONSO CARVAJAL
RESIDENTE SISO INTERVENTORÍA	XIOMARA PEREZ

SEGUIMIENTO FÍSICO CONTRATO

GRAFICO AVANCE FÍSICO CONTRATO


SEDE COMERCIO Y SERVICIO - RIOHACHA

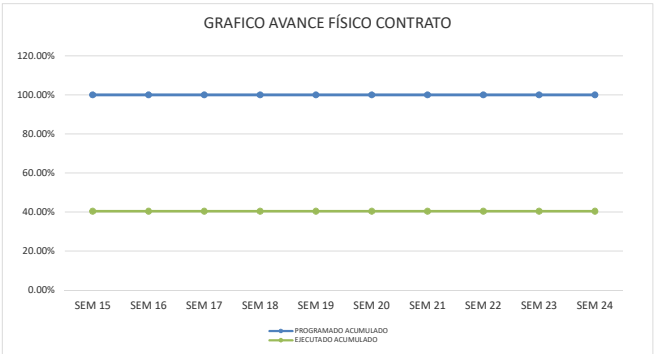

% AVANCE SEMANAL ACUMULADO	PROGRAMADO ACUMULADO	EJECUTADO ACUMULADO	DIFERENCIA
SEM 15	100.00%	40.37%	**-59.63%**
SEM 16	100.00%	40.37%	**-59.63%**
SEM 17	100.00%	40.37%	**-59.63%**
SEM 18	100.00%	40.37%	**-59.63%**
SEM 19	100.00%	40.37%	**-59.63%**
SEM 20	100.00%	40.37%	**-59.63%**
SEM 21	100.00%	40.37%	**-59.63%**
SEM 22	100.00%	40.37%	**-59.63%**
SEM 23	100.00%	40.37%	**-59.63%**
SEM 24	100.00%	40.37%	**-59.63%**
ALERTAS			**-59.63%**

INICIAR PROCESO POR POSIBLE INCUMPLIMIENTO

CENTRO INDUSTRIAL Y DE ENERGÍAS ALTERNATIVAS - MAICAO

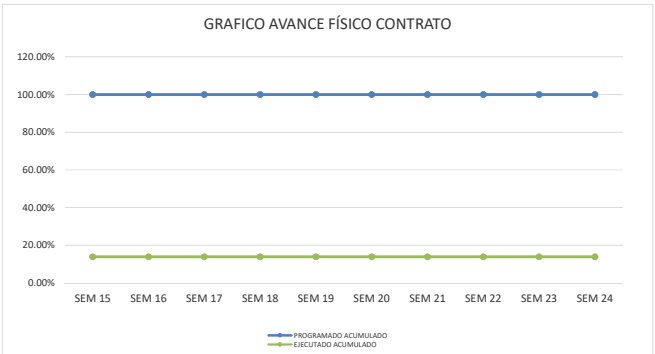

% AVANCE SEMANAL ACUMULADO	PROGRAMADO ACUMULADO	EJECUTADO ACUMULADO	DIFERENCIA
SEM 15	100.00%	13.84%	**-86.16%**
SEM 16	100.00%	13.84%	**-86.16%**
SEM 17	100.00%	13.84%	**-86.16%**
SEM 18	100.00%	13.84%	**-86.16%**
SEM 19	100.00%	13.84%	**-86.16%**
SEM 20	100.00%	13.84%	**-86.16%**
SEM 21	100.00%	13.84%	**-86.16%**
SEM 22	100.00%	13.84%	**-86.16%**
SEM 23	100.00%	13.84%	**-86.16%**
SEM 24	100.00%	13.84%	**-86.16%**
ALERTAS			**-86.16%**


INICIAR PROCESO POR POSIBLE INCUMPLIMIENTO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
GRUPO CONSTRUCCIONES

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA ETAPA CONSTRUCCIÓN


SEMANA No.	24	DEL	1 de febrero de 2021	AL	7 de febrero de 2021

CENTRO INDUSTRIAL Y DE ENERGÍAS ALTERNATIVAS - RIOHACHA

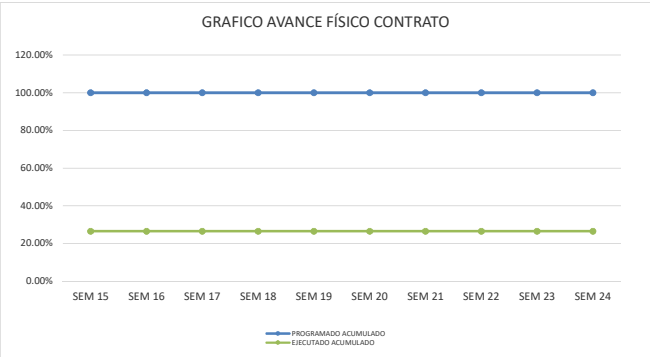


% AVANCE SEMANAL ACUMULADO	PROGRAMADO ACUMULADO	EJECUTADO ACUMULADO	DIFERENCIA
SEM 15	100.00%	26.52%	-73.48%
SEM 16	100.00%	26.52%	-73.48%
SEM 17	100.00%	26.52%	-73.48%
SEM 18	100.00%	26.52%	-73.48%
SEM 19	100.00%	26.52%	-73.48%
SEM 20	100.00%	26.52%	-73.48%
SEM 21	100.00%	26.52%	-73.48%
SEM 22	100.00%	26.52%	-73.48%
SEM 23	100.00%	26.52%	-73.48%
SEM 24	100.00%	26.52%	-73.48%
ALERTAS			-73.48%
INICIAR PROCESO POR POSIBLE INCUMPLIMIENTO			

CENTRO AGRO EMPRESARIAL Y ACUÍCOLA - FONSECA

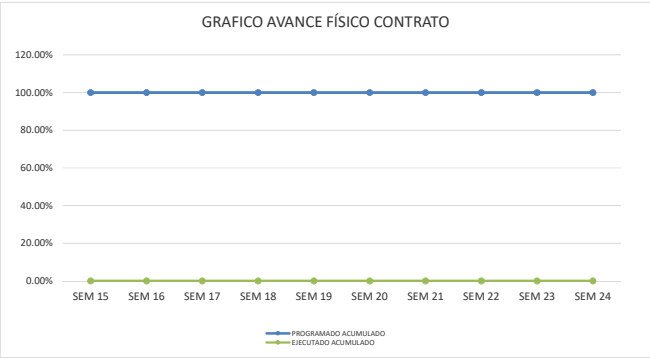


% AVANCE SEMANAL ACUMULADO	PROGRAMADO ACUMULADO	EJECUTADO ACUMULADO	DIFERENCIA
SEM 15	100.00%	0.00%	-100.00%
SEM 16	100.00%	0.00%	-100.00%
SEM 17	100.00%	0.00%	-100.00%
SEM 18	100.00%	0.00%	-100.00%
SEM 19	100.00%	0.00%	-100.00%
SEM 20	100.00%	0.00%	-100.00%
SEM 21	100.00%	0.00%	-100.00%
SEM 22	100.00%	0.00%	-100.00%
SEM 23	100.00%	0.00%	-100.00%
SEM 24	100.00%	0.00%	-100.00%
ALERTAS			-100.00%
INICIAR PROCESO POR POSIBLE INCUMPLIMIENTO			

CENTRO ACUÍCOLA Y AGROINDUSTRIAL DE GAIRA - EL BANCO

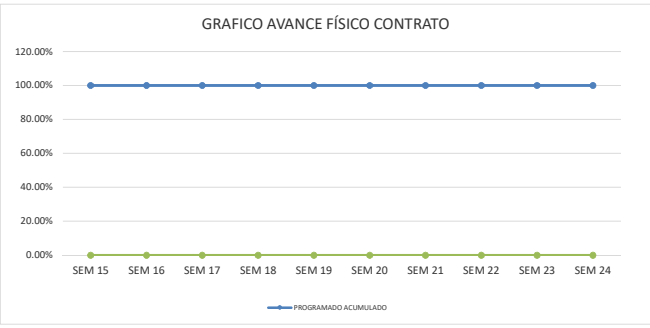

% AVANCE SEMANAL ACUMULADO	PROGRAMADO ACUMULADO	EJECUTADO ACUMULADO	DIFERENCIA
SEM 15	100.00%	0.00%	-100.00%
SEM 16	100.00%	0.00%	-100.00%
SEM 17	100.00%	0.00%	-100.00%
SEM 18	100.00%	0.00%	-100.00%
SEM 19	100.00%	0.00%	-100.00%
SEM 20	100.00%	0.00%	-100.00%
SEM 21	100.00%	0.00%	-100.00%
SEM 22	100.00%	0.00%	-100.00%
SEM 23	100.00%	0.00%	-100.00%
SEM 24	100.00%	0.00%	-100.00%
ALERTAS			-100.00%
INICIAR PROCESO POR POSIBLE INCUMPLIMIENTO			

CENTRO ACUÍCOLA Y AGROINDUSTRIAL DE GAIRA - GAIRA

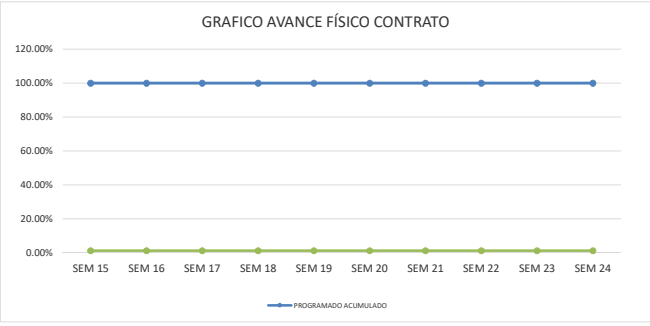


% AVANCE SEMANAL ACUMULADO	PROGRAMADO ACUMULADO	EJECUTADO ACUMULADO	DIFERENCIA
SEM 15	100.00%	1.25%	-98.75%
SEM 16	100.00%	1.25%	-98.75%
SEM 17	100.00%	1.25%	-98.75%
SEM 18	100.00%	1.25%	-98.75%
SEM 19	100.00%	1.25%	-98.75%
SEM 20	100.00%	1.25%	-98.75%
SEM 21	100.00%	1.25%	-98.75%
SEM 22	100.00%	1.25%	-98.75%
SEM 23	100.00%	1.25%	-98.75%
SEM 24	100.00%	1.25%	-98.75%
ALERTAS			-98.75%
INICIAR PROCESO POR POSIBLE INCUMPLIMIENTO			

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
GRUPO CONSTRUCCIONES

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA ETAPA CONSTRUCCIÓN


SEMANA No.	24	DEL	1 de febrero de 2021	AL	7 de febrero de 2021

CENTRO DE LOGÍSTICA Y PROMOCIÓN ECOTURÍSTICA DEL MAGDALENA - CIÉNAGA

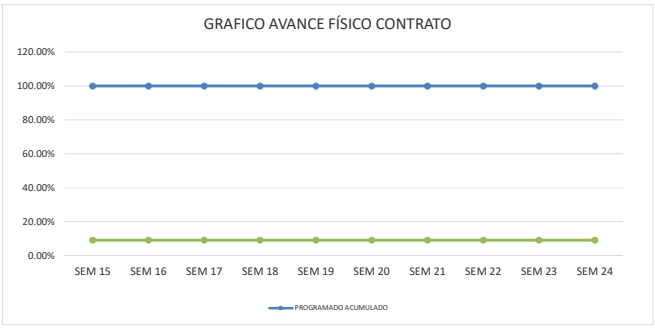


% AVANCE SEMANAL ACUMULADO	PROGRAMADO ACUMULADO	EJECUTADO ACUMULADO	DIFERENCIA
SEM 15	100.00%	9.13%	-90.87%
SEM 16	100.00%	9.13%	-90.87%
SEM 17	100.00%	9.13%	-90.87%
SEM 18	100.00%	9.13%	-90.87%
SEM 19	100.00%	9.13%	-90.87%
SEM 20	100.00%	9.13%	-90.87%
SEM 21	100.00%	9.13%	-90.87%
SEM 22	100.00%	9.13%	-90.87%
SEM 23	100.00%	9.13%	-90.87%
SEM 24	100.00%	9.13%	-90.87%
ALERTAS			-90.87%
INICIAR PROCESO POR POSIBLE INCUMPLIMIENTO			

CENTRO ACUÍCOLA Y AGROINDUSTRIAL DE GAIRA - FUNDACIÓN

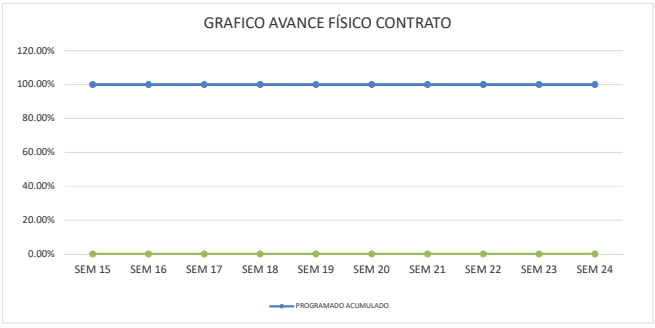


% AVANCE SEMANAL ACUMULADO	PROGRAMADO ACUMULADO	EJECUTADO ACUMULADO	DIFERENCIA
SEM 15	100.00%	0.00%	-100.00%
SEM 16	100.00%	0.00%	-100.00%
SEM 17	100.00%	0.00%	-100.00%
SEM 18	100.00%	0.00%	-100.00%
SEM 19	100.00%	0.00%	-100.00%
SEM 20	100.00%	0.00%	-100.00%
SEM 21	100.00%	0.00%	-100.00%
SEM 22	100.00%	0.00%	-100.00%
SEM 23	100.00%	0.00%	-100.00%
SEM 24	100.00%	0.00%	-100.00%
ALERTAS			-100.00%
INICIAR PROCESO POR POSIBLE INCUMPLIMIENTO			

CENTRO DE LOGÍSTICA Y PROMOCIÓN ECOTURÍSTICA DEL MAGDALENA - IPC MARÍA EUGENIA

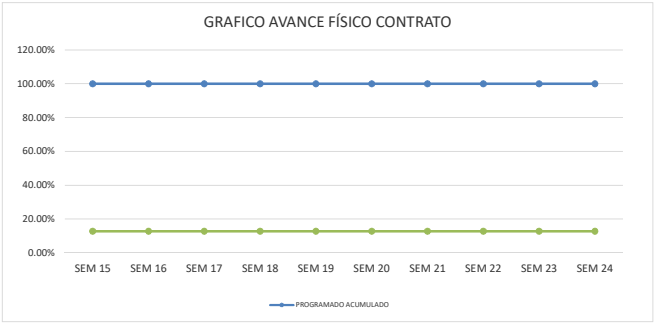

% AVANCE SEMANAL ACUMULADO	PROGRAMADO ACUMULADO	EJECUTADO ACUMULADO	DIFERENCIA
SEM 15	100.00%	12.81%	-87.19%
SEM 16	100.00%	12.81%	-87.19%
SEM 17	100.00%	12.81%	-87.19%
SEM 18	100.00%	12.81%	-87.19%
SEM 19	100.00%	12.81%	-87.19%
SEM 20	100.00%	12.81%	-87.19%
SEM 21	100.00%	12.81%	-87.19%
SEM 22	100.00%	12.81%	-87.19%
SEM 23	100.00%	12.81%	-87.19%
SEM 24	100.00%	12.81%	-87.19%
ALERTAS			-87.19%
INICIAR PROCESO POR POSIBLE INCUMPLIMIENTO			

CENTRO DE LOGÍSTICA Y PROMOCIÓN ECOTURÍSTICA DEL MAGDALENA - SANTA MARTA

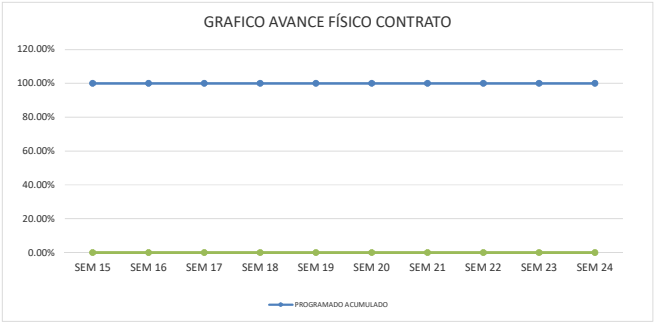


% AVANCE SEMANAL ACUMULADO	PROGRAMADO ACUMULADO	EJECUTADO ACUMULADO	DIFERENCIA
SEM 15	100.00%	0.00%	-100.00%
SEM 16	100.00%	0.00%	-100.00%
SEM 17	100.00%	0.00%	-100.00%
SEM 18	100.00%	0.00%	-100.00%
SEM 19	100.00%	0.00%	-100.00%
SEM 20	100.00%	0.00%	-100.00%
SEM 21	100.00%	0.00%	-100.00%
SEM 22	100.00%	0.00%	-100.00%
SEM 23	100.00%	0.00%	-100.00%
SEM 24	100.00%	0.00%	-100.00%
ALERTAS			-100.00%
INICIAR PROCESO POR POSIBLE INCUMPLIMIENTO			

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
GRUPO CONSTRUCCIONES

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA ETAPA CONSTRUCCIÓN

SEMANA No.	24	DEL	1 de febrero de 2021	AL	7 de febrero de 2021

CENTRO DE LOGÍSTICA Y PROMOCIÓN ECOTURÍSTICA DEL MAGDALENA - APE Y SERVICIO MÉDICO

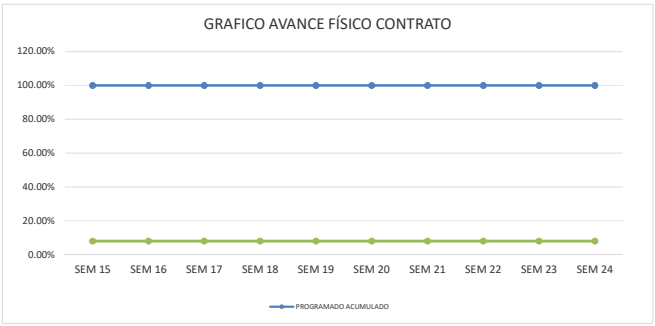


% AVANCE SEMANAL ACUMULADO	PROGRAMADO ACUMULADO	EJECUTADO ACUMULADO	DIFERENCIA
SEM 15	100.00%	7.94%	-92.06%
SEM 16	100.00%	7.94%	-92.06%
SEM 17	100.00%	7.94%	-92.06%
SEM 18	100.00%	7.94%	-92.06%
SEM 19	100.00%	7.94%	-92.06%
SEM 20	100.00%	7.94%	-92.06%
SEM 21	100.00%	7.94%	-92.06%
SEM 22	100.00%	7.94%	-92.06%
SEM 23	100.00%	7.94%	-92.06%
SEM 24	100.00%	7.94%	-92.06%
ALERTAS			-92.06%
INICIAR PROCESO POR POSIBLE INCUMPLIMIENTO			

SEGUIMIENTO FINANCIERO CONTRATO DE OBRA (Millones de $) (ETAPA DE OBRA)


GRAFICO AVANCE FINANCIERO CONTRATO ETAPA DE OBRA

SEDE COMERCIO Y SERVICIO - RIOHACHA

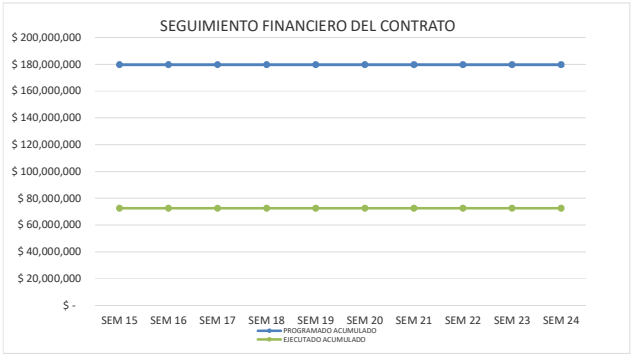


VALOR SEMANAL ACUMULADO	PROGRAMADO ACUMULADO	EJECUTADO ACUMULADO	DIFERENCIA
SEM 15	$ 179,765,940	$ 72,570,665	$ -107,195,275.17
SEM 16	$ 179,765,940	$ 72,570,665	$ -107,195,275.17
SEM 17	$ 179,765,940	$ 72,570,665	$ -107,195,275.17
SEM 18	$ 179,765,940	$ 72,570,665	$ -107,195,275.17
SEM 19	$ 179,765,940	$ 72,570,665	$ -107,195,275.17
SEM 20	$ 179,765,940	$ 72,570,665	$ -107,195,275.17
SEM 21	$ 179,765,940	$ 72,570,665	$ -107,195,275.17
SEM 22	$ 179,765,940	$ 72,570,665	$ -107,195,275.17
SEM 23	$ 179,765,940	$ 72,570,665	$ -107,195,275.17
SEM 24	$ 179,765,940	$ 72,570,665	$ -107,195,275.17
Nota : incluir el avance las ultimas 8 semanas (en Millones)			

CENTRO INDUSTRIAL Y DE ENERGÍAS ALTERNATIVAS - MAICAO

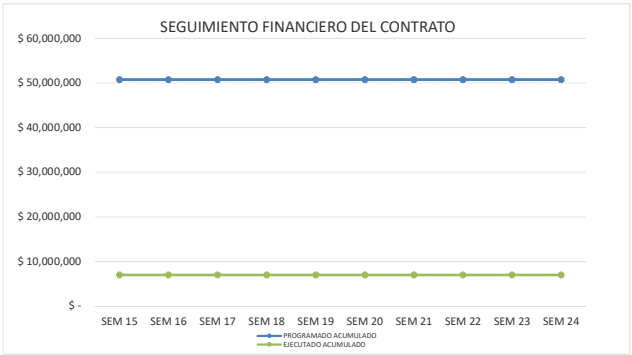

VALOR SEMANAL ACUMULADO	PROGRAMADO ACUMULADO	EJECUTADO ACUMULADO	DIFERENCIA
SEM 15	$ 50,771,054	$ 7,026,713.84	$ -43,744,339.93
SEM 16	$ 50,771,054	$ 7,026,713.84	$ -43,744,339.93
SEM 17	$ 50,771,054	$ 7,026,713.84	$ -43,744,339.93
SEM 18	$ 50,771,054	$ 7,026,713.84	$ -43,744,339.93
SEM 19	$ 50,771,054	$ 7,026,713.84	$ -43,744,339.93
SEM 20	$ 50,771,054	$ 7,026,713.84	$ -43,744,339.93
SEM 21	$ 50,771,054	$ 7,026,713.84	$ -43,744,339.93
SEM 22	$ 50,771,054	$ 7,026,713.84	$ -43,744,339.93
SEM 23	$ 50,771,054	$ 7,026,713.84	$ -43,744,339.93
SEM 24	$ 50,771,054	$ 7,026,713.84	$ -43,744,339.93
Nota : incluir el avance las ultimas 8 semanas (en Millones)			

CENTRO INDUSTRIAL Y DE ENERGÍAS ALTERNATIVAS - RIOHACHA

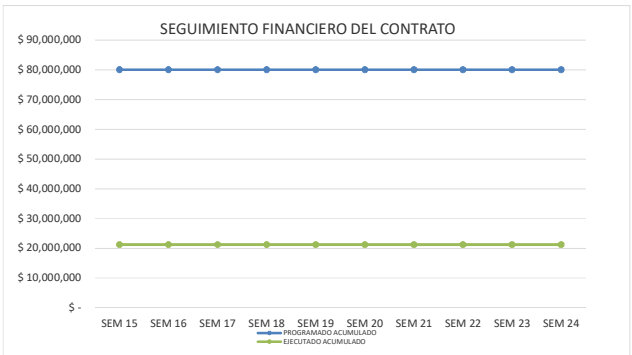


VALOR SEMANAL ACUMULADO	PROGRAMADO ACUMULADO	EJECUTADO ACUMULADO	DIFERENCIA
SEM 15	$ 80,076,766	$ 21,232,354.65	$ -58,844,411.80
SEM 16	$ 80,076,766	$ 21,232,354.65	$ -58,844,411.80
SEM 17	$ 80,076,766	$ 21,232,354.65	$ -58,844,411.80
SEM 18	$ 80,076,766	$ 21,232,354.65	$ -58,844,411.80
SEM 19	$ 80,076,766	$ 21,232,354.65	$ -58,844,411.80
SEM 20	$ 80,076,766	$ 21,232,354.65	$ -58,844,411.80
SEM 21	$ 80,076,766	$ 21,232,354.65	$ -58,844,411.80
SEM 22	$ 80,076,766	$ 21,232,354.65	$ -58,844,411.80
SEM 23	$ 80,076,766	$ 21,232,354.65	$ -58,844,411.80
SEM 24	$ 80,076,766	$ 21,232,354.65	$ -58,844,411.80
Nota : incluir el avance las ultimas 8 semanas (en Millones)			

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
GRUPO CONSTRUCCIONES

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA ETAPA CONSTRUCCIÓN

SEMANA No.	24	DEL	1 de febrero de 2021	AL	7 de febrero de 2021


CENTRO AGRO EMPRESARIAL Y ACUÍCOLA - FONSECA

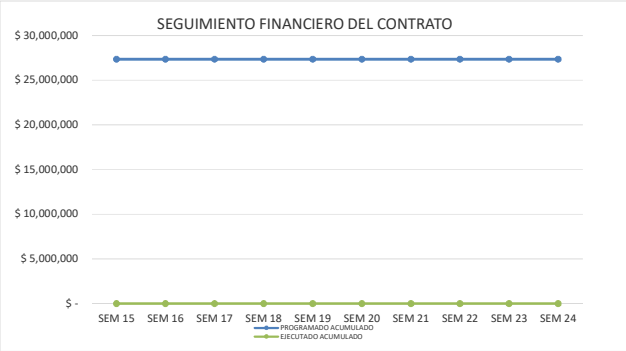

VALOR SEMANAL ACUMULADO	PROGRAMADO ACUMULADO	EJECUTADO ACUMULADO	DIFERENCIA
SEM 15	$ 27,364,346	$ -	$ -27,364,345.78
SEM 16	$ 27,364,346	$ -	$ -27,364,345.78
SEM 17	$ 27,364,346	$ -	$ -27,364,345.78
SEM 18	$ 27,364,346	$ -	$ -27,364,345.78
SEM 19	$ 27,364,346	$ -	$ -27,364,345.78
SEM 20	$ 27,364,346	$ -	$ -27,364,345.78
SEM 21	$ 27,364,346	$ -	$ -27,364,345.78
SEM 22	$ 27,364,346	$ -	$ -27,364,345.78
SEM 23	$ 27,364,346	$ -	$ -27,364,345.78
SEM 24	$ 27,364,346	$ -	$ -27,364,345.78

Nota : incluir el avance las ultimas 8 semanas (en Millones)


CENTRO ACUÍCOLA Y AGROINDUSTRIAL DE GAIRA - EL BANCO

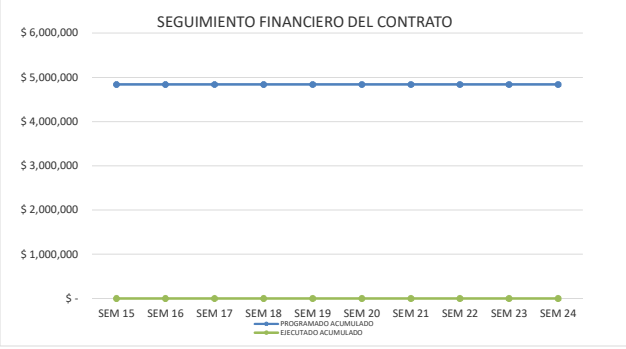

VALOR SEMANAL ACUMULADO	PROGRAMADO ACUMULADO	EJECUTADO ACUMULADO	DIFERENCIA
SEM 15	$ 4,840,347	$ -	$ -4,840,347.12
SEM 16	$ 4,840,347	$ -	$ -4,840,347.12
SEM 17	$ 4,840,347	$ -	$ -4,840,347.12
SEM 18	$ 4,840,347	$ -	$ -4,840,347.12
SEM 19	$ 4,840,347	$ -	$ -4,840,347.12
SEM 20	$ 4,840,347	$ -	$ -4,840,347.12
SEM 21	$ 4,840,347	$ -	$ -4,840,347.12
SEM 22	$ 4,840,347	$ -	$ -4,840,347.12
SEM 23	$ 4,840,347	$ -	$ -4,840,347.12
SEM 24	$ 4,840,347	$ -	$ -4,840,347.12

Nota : incluir el avance las ultimas 8 semanas (en Millones)


CENTRO ACUÍCOLA Y AGROINDUSTRIAL DE GAIRA - GAIRA

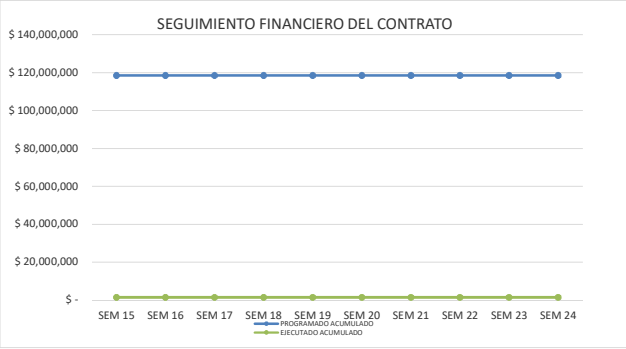

VALOR SEMANAL ACUMULADO	PROGRAMADO ACUMULADO	EJECUTADO ACUMULADO	DIFERENCIA
SEM 15	$ 118,523,150	$ 1,481,539.38	$ -117,041,610.73
SEM 16	$ 118,523,150	$ 1,481,539.38	$ -117,041,610.73
SEM 17	$ 118,523,150	$ 1,481,539.38	$ -117,041,610.73
SEM 18	$ 118,523,150	$ 1,481,539.38	$ -117,041,610.73
SEM 19	$ 118,523,150	$ 1,481,539.38	$ -117,041,610.73
SEM 20	$ 118,523,150	$ 1,481,539.38	$ -117,041,610.73
SEM 21	$ 118,523,150	$ 1,481,539.38	$ -117,041,610.73
SEM 22	$ 118,523,150	$ 1,481,539.38	$ -117,041,610.73
SEM 23	$ 118,523,150	$ 1,481,539.38	$ -117,041,610.73
SEM 24	$ 118,523,150	$ 1,481,539.38	$ -117,041,610.73

Nota : incluir el avance las ultimas 8 semanas (en Millones)

CENTRO DE LOGÍSTICA Y PROMOCIÓN ECOTURÍSTICA DEL MAGDALENA - CIÉNAGA

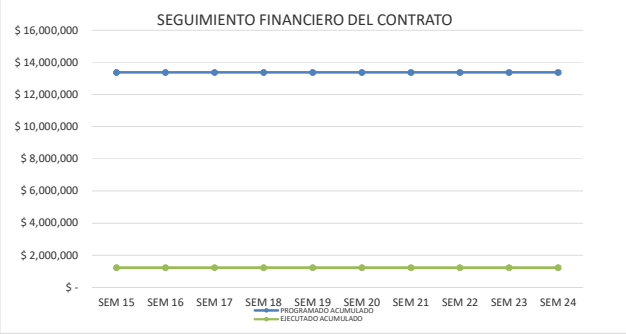

VALOR SEMANAL ACUMULADO	PROGRAMADO ACUMULADO	EJECUTADO ACUMULADO	DIFERENCIA
SEM 15	$ 13,374,356	$ 1,221,078.70	$ -12,153,277.23
SEM 16	$ 13,374,356	$ 1,221,078.70	$ -12,153,277.23
SEM 17	$ 13,374,356	$ 1,221,078.70	$ -12,153,277.23
SEM 18	$ 13,374,356	$ 1,221,078.70	$ -12,153,277.23
SEM 19	$ 13,374,356	$ 1,221,078.70	$ -12,153,277.23
SEM 20	$ 13,374,356	$ 1,221,078.70	$ -12,153,277.23
SEM 21	$ 13,374,356	$ 1,221,078.70	$ -12,153,277.23
SEM 22	$ 13,374,356	$ 1,221,078.70	$ -12,153,277.23
SEM 23	$ 13,374,356	$ 1,221,078.70	$ -12,153,277.23
SEM 24	$ 13,374,356	$ 1,221,078.70	$ -12,153,277.23


Nota : incluir el avance las ultimas 8 semanas (en Millones)

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
GRUPO CONSTRUCCIONES

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA ETAPA CONSTRUCCIÓN

SEMANA No.	24	DEL	1 de febrero de 2021	AL	7 de febrero de 2021


CENTRO ACUÍCOLA Y AGROINDUSTRIAL DE GAIRA - FUNDACIÓN

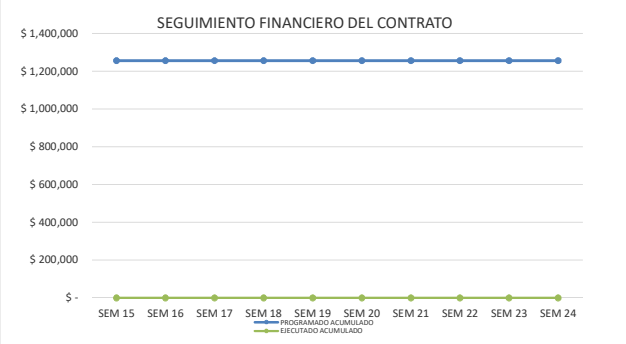

VALOR SEMANAL ACUMULADO	PROGRAMADO ACUMULADO	EJECUTADO ACUMULADO	DIFERENCIA
SEM 15	$ 1,256,111	$ -	$ -1,256,111.09
SEM 16	$ 1,256,111	$ -	$ -1,256,111.09
SEM 17	$ 1,256,111	$ -	$ -1,256,111.09
SEM 18	$ 1,256,111	$ -	$ -1,256,111.09
SEM 19	$ 1,256,111	$ -	$ -1,256,111.09
SEM 20	$ 1,256,111	$ -	$ -1,256,111.09
SEM 21	$ 1,256,111	$ -	$ -1,256,111.09
SEM 22	$ 1,256,111	$ -	$ -1,256,111.09
SEM 23	$ 1,256,111	$ -	$ -1,256,111.09
SEM 24	$ 1,256,111	$ -	$ -1,256,111.09

Nota : incluir el avance las ultimas 8 semanas (en Millones)


CENTRO DE LOGÍSTICA Y PROMOCIÓN ECOTURÍSTICA DEL MAGDALENA - IPC MARÍA EUGENIA

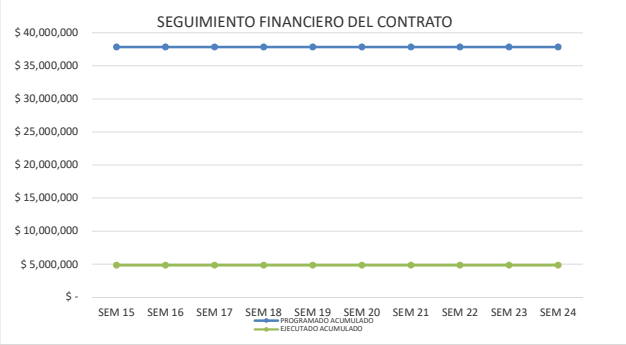

VALOR SEMANAL ACUMULADO	PROGRAMADO ACUMULADO	EJECUTADO ACUMULADO	DIFERENCIA
SEM 15	$ 37,845,869	$ 4,848,055.77	$ -32,997,812.81
SEM 16	$ 37,845,869	$ 4,848,055.77	$ -32,997,812.81
SEM 17	$ 37,845,869	$ 4,848,055.77	$ -32,997,812.81
SEM 18	$ 37,845,869	$ 4,848,055.77	$ -32,997,812.81
SEM 19	$ 37,845,869	$ 4,848,055.77	$ -32,997,812.81
SEM 20	$ 37,845,869	$ 4,848,055.77	$ -32,997,812.81
SEM 21	$ 37,845,869	$ 4,848,055.77	$ -32,997,812.81
SEM 22	$ 37,845,869	$ 4,848,055.77	$ -32,997,812.81
SEM 23	$ 37,845,869	$ 4,848,055.77	$ -32,997,812.81
SEM 24	$ 37,845,869	$ 4,848,055.77	$ -32,997,812.81

Nota : incluir el avance las ultimas 8 semanas (en Millones)


CENTRO DE LOGÍSTICA Y PROMOCIÓN ECOTURÍSTICA DEL MAGDALENA - SANTA MARTA

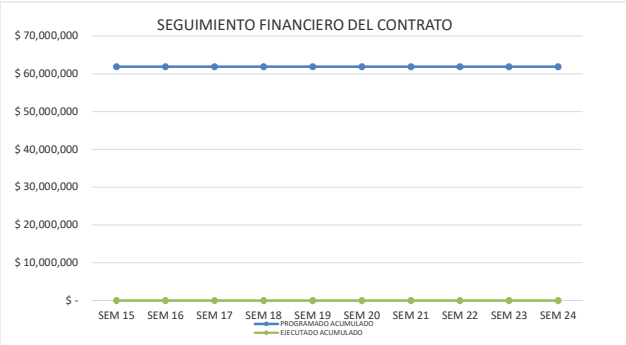

VALOR SEMANAL ACUMULADO	PROGRAMADO ACUMULADO	EJECUTADO ACUMULADO	DIFERENCIA
SEM 15	$ 61,917,333	$ -	$ -61,917,333.15
SEM 16	$ 61,917,333	$ -	$ -61,917,333.15
SEM 17	$ 61,917,333	$ -	$ -61,917,333.15
SEM 18	$ 61,917,333	$ -	$ -61,917,333.15
SEM 19	$ 61,917,333	$ -	$ -61,917,333.15
SEM 20	$ 61,917,333	$ -	$ -61,917,333.15
SEM 21	$ 61,917,333	$ -	$ -61,917,333.15
SEM 22	$ 61,917,333	$ -	$ -61,917,333.15
SEM 23	$ 61,917,333	$ -	$ -61,917,333.15
SEM 24	$ 61,917,333	$ -	$ -61,917,333.15

Nota : incluir el avance las ultimas 8 semanas (en Millones)

CENTRO DE LOGÍSTICA Y PROMOCIÓN ECOTURÍSTICA DEL MAGDALENA - APE Y SERVICIO MÉDICO

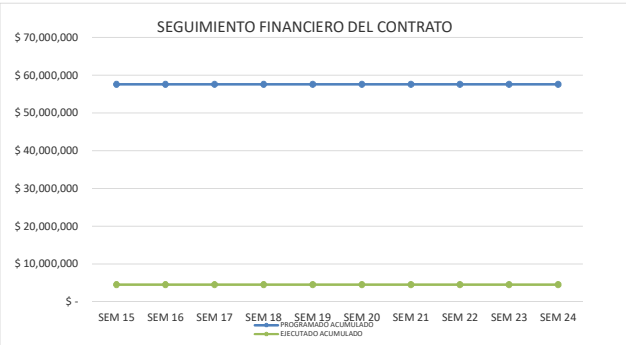

VALOR SEMANAL ACUMULADO	PROGRAMADO ACUMULADO	EJECUTADO ACUMULADO	DIFERENCIA
SEM 15	$ 57,581,875	$ 4,572,000.84	$ -53,009,873.67
SEM 16	$ 57,581,875	$ 4,572,000.84	$ -53,009,873.67
SEM 17	$ 57,581,875	$ 4,572,000.84	$ -53,009,873.67
SEM 18	$ 57,581,875	$ 4,572,000.84	$ -53,009,873.67
SEM 19	$ 57,581,875	$ 4,572,000.84	$ -53,009,873.67
SEM 20	$ 57,581,875	$ 4,572,000.84	$ -53,009,873.67
SEM 21	$ 57,581,875	$ 4,572,000.84	$ -53,009,873.67
SEM 22	$ 57,581,875	$ 4,572,000.84	$ -53,009,873.67
SEM 23	$ 57,581,875	$ 4,572,000.84	$ -53,009,873.67
SEM 24	$ 57,581,875	$ 4,572,000.84	$ -53,009,873.67

Nota : incluir el avance las ultimas 8 semanas (en Millones)

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
GRUPO CONSTRUCCIONES

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA ETAPA CONSTRUCCIÓN

SEMANA No.	24	DEL	1 de febrero de 2021	AL	7 de febrero de 2021

CONTROL DE HITOS ETAPA DE CONSTRUCCIÓN

SEDE COMERCIO Y SERVICIO - RIOHACHA

No.	*** DESCRIPCIÓN DEL HITO	INICIO PROGR.	INICIO REAL	FIN PROGR.	FIN REAL	DÍAS DE ATRASO INICIO ATRASO (-) AVANCE (+)	DÍAS DE ATRASO FIN ATRASO (-) AVANCE (+)
	SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO (HITO OBLIGATORIO)					**0.00**	**0.00**
	PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD Y PRELIMINARES	19/10/2020	6/10/2020	19/10/2020		**13.00**	
1	IMPERMEABILIZACIONES	16/02/2021		4/03/2021		**-16.00**	
2	SISTEMA ELÉCTRICO	20/01/2021		31/03/2021		**-18.00**	
3	SERVICIO DE JARDINERÍA	11/12/2020	3/11/2020	31/12/2020	13/11/2020	**38.00**	**48.00**
5	LAVADO DE TANQUES	5/01/2021		26/02/2021		**-33.00**	
7	SISTEMAS DE REFRIGERACIÓN	20/10/2020	13/10/2020	31/12/2020	19/10/2020	**7.00**	**73.00**
10	NO PREVISTOS	11/12/2020	6/10/2020	31/03/2021		**66.00**	
	ENTREGA A LA INTERVENTORÍA DE LOS PRODUCTOS Y/O ACTIVIDADES CONTRATADAS (HITO OBLIGATORIO)						

CENTRO INDUSTRIAL Y DE ENERGÍAS ALTERNATIVAS - MAICAO

No.	*** DESCRIPCIÓN DEL HITO	INICIO PROGR.	INICIO REAL	FIN PROGR.	FIN REAL	DÍAS DE ATRASO INICIO ATRASO (-) AVANCE (+)	DÍAS DE ATRASO FIN ATRASO (-) AVANCE (+)
	SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO (HITO OBLIGATORIO)					**0.00**	**0.00**
	PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD Y PRELIMINARES	31/10/2020		3/11/2020		**-99.00**	
3	SERVICIO DE JARDINERÍA	13/03/2021		31/03/2021		**34.00**	
7	SISTEMAS DE REFRIGERACIÓN	21/11/2020	13/10/2021	31/12/2020	19/10/2020	**-326.00**	**73.00**
8	MANTENIMIENTOS GENERALES (limpieza, demoliciones, pinturas, estructuras, etc.)	1/03/2021		13/03/2021		**22.00**	
10	NO PREVISTOS	21/12/2020		31/03/2021		**-48.00**	
	ENTREGA A LA INTERVENTORÍA DE LOS PRODUCTOS Y/O ACTIVIDADES CONTRATADAS (HITO OBLIGATORIO)						

CENTRO INDUSTRIAL Y DE ENERGÍAS ALTERNATIVAS - RIOHACHA

No.	*** DESCRIPCIÓN DEL HITO	INICIO PROGR.	INICIO REAL	FIN PROGR.	FIN REAL	DÍAS DE ATRASO INICIO ATRASO (-) AVANCE (+)	DÍAS DE ATRASO FIN ATRASO (-) AVANCE (+)
	SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO (HITO OBLIGATORIO)					**0.00**	**0.00**
	PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD Y PRELIMINARES	31/10/2020		3/11/2020		**-99.00**	
2	SISTEMA ELÉCTRICO	15/01/2021		31/03/2021		**-23.00**	
3	SERVICIO DE JARDINERÍA	20/02/2021		31/03/2021		**13.00**	
7	SISTEMAS DE REFRIGERACIÓN	17/11/2020	14/10/2020	7/12/2020	25/10/2020	**34.00**	**43.00**
10	NO PREVISTOS	17/11/2020		3/03/2021		**-82.00**	
	ENTREGA A LA INTERVENTORÍA DE LOS PRODUCTOS Y/O ACTIVIDADES CONTRATADAS (HITO OBLIGATORIO)						

CENTRO AGRO EMPRESARIAL Y ACUÍCOLA - FONSECA

No.	*** DESCRIPCIÓN DEL HITO	INICIO PROGR.	INICIO REAL	FIN PROGR.	FIN REAL	DÍAS DE ATRASO INICIO ATRASO (-) AVANCE (+)	DÍAS DE ATRASO FIN ATRASO (-) AVANCE (+)
	SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO (HITO OBLIGATORIO)					**0.00**	**0.00**
	PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD Y PRELIMINARES	3/11/2020		3/11/2020		**-96.00**	
3	SERVICIO DE JARDINERÍA	2/03/2021		31/03/2021		**23.00**	
5	LAVADO DE TANQUES	5/01/2021		23/02/2021		**-33.00**	
7	SISTEMAS DE REFRIGERACIÓN	24/02/2021		8/03/2021		**17.00**	
10	NO PREVISTOS	17/02/2021		31/03/2021		**10.00**	
	ENTREGA A LA INTERVENTORÍA DE LOS PRODUCTOS Y/O ACTIVIDADES CONTRATADAS (HITO OBLIGATORIO)						

CENTRO ACUÍCOLA Y AGROINDUSTRIAL DE GAIRA - EL BANCO

No.	*** DESCRIPCIÓN DEL HITO	INICIO PROGR.	INICIO REAL	FIN PROGR.	FIN REAL	DÍAS DE ATRASO INICIO ATRASO (-) AVANCE (+)	DÍAS DE ATRASO FIN ATRASO (-) AVANCE (+)
	SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO (HITO OBLIGATORIO)					**0.00**	**0.00**
	PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD Y PRELIMINARES	30/11/2020		30/11/2020		**-69.00**	
3	SERVICIO DE JARDINERÍA	2/03/2021		31/03/2021		**23.00**	
5	LAVADO DE TANQUES	5/01/2021		1/02/2021		**-33.00**	
7	SISTEMAS DE REFRIGERACIÓN	1/12/2020		31/12/2020		**-68.00**	
8	MANTENIMIENTOS GENERALES (limpieza, demoliciones, pinturas, estructuras, etc.)	2/03/2021		31/03/2021		**23.00**	
9	UNIDADES SANITARIAS, REDES HIDRÁULICAS, HIDROSANITARIAS Y PLUVIALES	25/01/2021		12/02/2021		**-13.00**	
10	NO PREVISTOS	8/02/2021		31/03/2021		**1.00**	
	ENTREGA A LA INTERVENTORÍA DE LOS PRODUCTOS Y/O ACTIVIDADES CONTRATADAS (HITO OBLIGATORIO)						

CENTRO ACUÍCOLA Y AGROINDUSTRIAL DE GAIRA - GAIRA

No.	*** DESCRIPCIÓN DEL HITO	INICIO PROGR.	INICIO REAL	FIN PROGR.	FIN REAL	DÍAS DE ATRASO INICIO ATRASO (-) AVANCE (+)	DÍAS DE ATRASO FIN ATRASO (-) AVANCE (+)
	SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO (HITO OBLIGATORIO)					**0.00**	**0.00**
	PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD Y PRELIMINARES	3/11/2020		3/11/2020		**-96.00**	
4	EQUIPOS DE BOMBEO	11/03/2021		31/03/2021		**32.00**	
5	LAVADO DE TANQUES	5/01/2021		30/01/2021		**-33.00**	
7	SISTEMAS DE REFRIGERACIÓN	4/11/2020	26/10/2020	9/03/2021		**9.00**	
8	MANTENIMIENTOS GENERALES (limpieza, demoliciones, pinturas, estructuras, etc.)	21/01/2021		31/03/2021		**-17.00**	
9	UNIDADES SANITARIAS, REDES HIDRÁULICAS, HIDROSANITARIAS Y PLUVIALES	13/02/2021		31/03/2021		**6.00**	
10	NO PREVISTOS	4/02/2021		31/03/2021		**-3.00**	

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
GRUPO CONSTRUCCIONES

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA ETAPA CONSTRUCCIÓN

SEMANA No.	24	DEL	1 de febrero de 2021	AL	7 de febrero de 2021

CENTRO DE LOGÍSTICA Y PROMOCIÓN ECOTURÍSTICA DEL MAGDALENA - CIÉNAGA

No.	*** DESCRIPCIÓN DEL HITO	INICIO PROGR.	INICIO REAL	FIN PROGR.	FIN REAL	DÍAS DE ATRASO INICIO ATRASO (-) AVANCE (+)	DÍAS DE ATRASO FIN ATRASO (-) AVANCE (+)
	SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO (HITO OBLIGATORIO)					**0.00**	**0.00**
	PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD Y PRELIMINARES	30/11/2020		30/11/2020		**-69.00**	
1	IMPERMEABILIZACIONES	15/03/2021		31/03/2021		**36.00**	
5	LAVADO DE TANQUES	5/01/2021		1/02/2021		**-33.00**	
7	SISTEMAS DE REFRIGERACIÓN	4/12/2020		31/12/2020		**-65.00**	
8	MANTENIMIENTOS GENERALES (limpieza, demoliciones, pinturas, estructuras, etc.)	12/01/2021		31/03/2021		**-26.00**	
9	UNIDADES SANITARIAS, REDES HIDRÁULICAS, HIDROSANITARIAS Y PLUVIALES	15/03/2021		25/03/2021		**36.00**	
10	NO PREVISTOS	28/12/2020		31/03/2021		**-41.00**	
	ENTREGA A LA INTERVENTORÍA DE LOS PRODUCTOS Y/O ACTIVIDADES CONTRATADAS (HITO OBLIGATORIO)						

CENTRO ACUÍCOLA Y AGROINDUSTRIAL DE GAIRA - FUNDACIÓN

No.	*** DESCRIPCIÓN DEL HITO	INICIO PROGR.	INICIO REAL	FIN PROGR.	FIN REAL	DÍAS DE ATRASO INICIO ATRASO (-) AVANCE (+)	DÍAS DE ATRASO FIN ATRASO (-) AVANCE (+)
	SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO (HITO OBLIGATORIO)					**0.00**	**0.00**
	PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD Y PRELIMINARES	30/11/2020		30/11/2020		**-69.00**	
5	LAVADO DE TANQUES	5/01/2021		1/02/2021		**-33.00**	
7	SISTEMAS DE REFRIGERACIÓN	14/12/2020		31/12/2020		**-55.00**	
10	NO PREVISTOS	1/02/2021		31/03/2021		**-6.00**	
	ENTREGA A LA INTERVENTORÍA DE LOS PRODUCTOS Y/O ACTIVIDADES CONTRATADAS (HITO OBLIGATORIO)						

CENTRO DE LOGÍSTICA Y PROMOCIÓN ECOTURÍSTICA DEL MAGDALENA - IPC MARÍA EUGENIA

No.	*** DESCRIPCIÓN DEL HITO	INICIO PROGR.	INICIO REAL	FIN PROGR.	FIN REAL	DÍAS DE ATRASO INICIO ATRASO (-) AVANCE (+)	DÍAS DE ATRASO FIN ATRASO (-) AVANCE (+)
	SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO (HITO OBLIGATORIO)					**0.00**	**0.00**
	PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD Y PRELIMINARES	30/11/2020		30/11/2020		**-69.00**	
1	IMPERMEABILIZACIONES	10/03/2021		23/03/2021		**31.00**	
3	SERVICIO DE JARDINERÍA	2/03/2021		31/03/2021		**23.00**	
4	EQUIPOS DE BOMBEO	18/02/2021		29/03/2021		**11.00**	
5	LAVADO DE TANQUES	5/01/2021		10/03/2021		**-33.00**	
7	SISTEMAS DE REFRIGERACIÓN	11/12/2020	16/10/2020	31/12/2020	20/10/2020	**56.00**	**72.00**
8	MANTENIMIENTOS GENERALES (limpieza, demoliciones, pinturas, estructuras, etc.)	18/02/2021		31/03/2021		**11.00**	
9	UNIDADES SANITARIAS, REDES HIDRÁULICAS, HIDROSANITARIAS Y PLUVIALES	21/12/2020		31/03/2021		**-48.00**	
10	NO PREVISTOS	28/12/2020		31/03/2021		**-41.00**	
	ENTREGA A LA INTERVENTORÍA DE LOS PRODUCTOS Y/O ACTIVIDADES CONTRATADAS (HITO OBLIGATORIO)						

CENTRO DE LOGÍSTICA Y PROMOCIÓN ECOTURÍSTICA DEL MAGDALENA - SANTA MARTA

No.	*** DESCRIPCIÓN DEL HITO	INICIO PROGR.	INICIO REAL	FIN PROGR.	FIN REAL	DÍAS DE ATRASO INICIO ATRASO (-) AVANCE (+)	DÍAS DE ATRASO FIN ATRASO (-) AVANCE (+)
	SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO (HITO OBLIGATORIO)					**0.00**	**0.00**
	PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD Y PRELIMINARES	30/11/2020		30/11/2020		**-69.00**	
1	IMPERMEABILIZACIONES	18/02/2021		15/03/2021		**11.00**	
2	SISTEMA ELÉCTRICO	15/02/2021		31/03/2021		**8.00**	
3	SERVICIO DE JARDINERÍA	18/02/2021		31/03/2021		**11.00**	
4	EQUIPOS DE BOMBEO	2/03/2021		23/03/2021		**23.00**	
5	LAVADO DE TANQUES	25/01/2021		23/02/2021		**-13.00**	
7	SISTEMAS DE REFRIGERACIÓN	11/12/2020		31/12/2020		**-58.00**	
10	NO PREVISTOS	2/03/2021		31/03/2021		**23.00**	
	ENTREGA A LA INTERVENTORÍA DE LOS PRODUCTOS Y/O ACTIVIDADES CONTRATADAS (HITO OBLIGATORIO)						

CENTRO DE LOGÍSTICA Y PROMOCIÓN ECOTURÍSTICA DEL MAGDALENA - APE Y SERVICIO MÉDICO

No.	*** DESCRIPCIÓN DEL HITO	INICIO PROGR.	INICIO REAL	FIN PROGR.	FIN REAL	DÍAS DE ATRASO INICIO ATRASO (-) AVANCE (+)	DÍAS DE ATRASO FIN ATRASO (-) AVANCE (+)
	SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO (HITO OBLIGATORIO)					**0.00**	**0.00**
	PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD Y PRELIMINARES	30/11/2020		30/11/2020		**-69.00**	
1	IMPERMEABILIZACIONES	29/03/2021		31/03/2021		**50.00**	
2	SISTEMA ELÉCTRICO	23/03/2021		31/03/2021		**44.00**	
3	SERVICIO DE JARDINERÍA	2/03/2021		31/03/2021		**23.00**	
4	EQUIPOS DE BOMBEO	2/03/2021		29/03/2021		**23.00**	
5	LAVADO DE TANQUES	5/01/2021		12/02/2021		**-33.00**	
7	SISTEMAS DE REFRIGERACIÓN	16/12/2020	30/09/2020	30/12/2020	14/10/2020	**77.00**	**77.00**
8	MANTENIMIENTOS GENERALES (limpieza, demoliciones, pinturas, estructuras, etc.)	18/01/2021		31/03/2021		**-20.00**	
9	UNIDADES SANITARIAS, REDES HIDRÁULICAS, HIDROSANITARIAS Y PLUVIALES	2/03/2021		31/03/2021		**23.00**	
10	NO PREVISTOS	23/12/2020		31/03/2021		**-46.00**	
	ENTREGA A LA INTERVENTORÍA DE LOS PRODUCTOS Y/O ACTIVIDADES CONTRATADAS (HITO OBLIGATORIO)						

Plazo total del Proyecto en Días	**222**
Plazo faltante del Proyecto en Días	**52**

ALERTA — **CUALQUIER MODIFICACION CONTRACTUAL DEBERA TRAMITARSE CON ALMENOS 15 DIAS DE ANTICIPACION A LA TERMINACIÓN**

DESARROLLO Y DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES MENSUALES - REPORTE DE CUMPLIMIENTO A LAS OBLIGACIONES DEL INTERVENTOR

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
GRUPO CONSTRUCCIONES

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA ETAPA CONSTRUCCIÓN

SEMANA No.	24	DEL	1 de febrero de 2021	AL	7 de febrero de 2021

TEMAS TÉCNICOS

CONDICIONES GENERALES DE EJECUCIÓN TÉCNICA DE OBRA	Cumple
El contratista cuenta con el personal capacitado para desarrollo del proyecto y su dedicación cumple con lo estipulado en el contrato	NO
En la obra se cuenta con copia completa de los diseños y licencia de construcción debidamente firmados y aprobados por Curaduría o Planeación Municipal	N/A
La obra cuenta con Valla informativa y la instalación y el diseño debe cumplen con las especificaciones definidos por el SENA	N/A
El campamento de obra cumple con los requisitos mínimos de resistencia, equilibrio y rigidez, que garantice las condiciones de funcionamiento	N/A
El perfil estratigráfico del terreno excavado corresponder al definido en el estudio geotécnico del proyecto.	N/A
Las canteras de donde proviene el material han sido previamente autorizadas por la Interventoría y cuentan con los debidos permisos ambientales y legales.	N/A
Los materiales suministrados, han sido aprobados previo a su instalación por la interventoría, cuentan con certificación de calidad y cumplen con las especificaciones técnicas requeridas	NO
Todos los procedimientos que se usados para la instalación de equipos y materiales eléctricos se ajustan a los establecidos en el reglamento vigente en la empresa de energía, a las demás normas aplicables.	N/A
Todos los procedimientos que se usados para la instalación de equipos y materiales hidrosanitarios se ajustan a los establecidos en la NTC 1500 Código Colombiano de Fontanería y demás normas aplicables.	N/A
La interventoría ha solicitado oportunamente los ensayos y pruebas necesarias a los elementos instalados en obra	SI

Observaciones

TEMAS SISO

CONDICIONES GENERALES SISO	Cumple
En la ejecución de la obra se da cumplimiento a los planes de manejo ambiental, gestión social, salud en el trabajo da cumplimento al plan ambiental aprobados	SI
La totalidad del personal que ha laborado en el proyecto se encuentra esta afiliado y al día con los aportes de seguridad social y parafiscales.	SI
En obra se cuenta con el Plan de manejo Ambiental aprobado por la Interventoría	SI

Observaciones: El Contratista entregó las observaciones al Plan de Manejo Ambiental a la Interventoría, quien se encuentra en revisión del documento.

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

NO HUBO ACTIVIDADES EN NINGUNA DE LAS SEDES DE LOS DEPARTAMENTOS DE GUAJIRA Y MAGDALENA

PERSONAL DE LA OBRA

PERSONAL CONSORCIO	CANT.	PERSONAL CONTRATISTA OBRA CIVIL	CANT.	CONTRATISTA OBRA ELÉCTRICA	CANT.	CONTRATISTA OBRA HIDROSANITARIA	CANT.
DIRECTOR DE OBRA	0	INGENIEROS/ARQUITECTOS		INGENIEROS		INGENIEROS	
RESIDENTES (INGENIERO, ARQUITECTO, SISO)	0	PROFESIONAL SISO		PROFESIONAL SISO		PROFESIONAL SISO	
COMISIÓN TOPOGRÁFICA		MAESTROS DE OBRA		MAESTROS DE OBRA		MAESTROS DE OBRA	
PERSONAL ADMINISTRATIVO		OFICIALES DE OBRA		OFICIALES DE OBRA		OFICIALES DE OBRA	
AYUDANTES DE OBRA		SOLDADORES		AYUDANTES DE OBRA		AYUDANTES DE OBRA	
TOPÓGRAFO		AYUDANTES DE OBRA				AUXILIAR SISOMA	
CADENEROS		INSPECTOR DE OBRA					
INSPECTOR DE OBRA		OPERADORES					
		ASEADORAS					
		ALMACENISTA					
		AUXILIAR SISOMA					
TOTAL	0	TOTAL	0	TOTAL	0	TOTAL	0

PERSONAL DEL CONTRATISTA

nº	ESPECIALIDAD/CARGO	NOMBRE	PLANILLA N°	OBSERVACIONES
1	DIRECTOR DE OBRA	RICARDO ARTURO MOLINA		
2	COORDINADOR REGIONAL	LUIS ALFREDO GRANADOS		
3	RESIDENTE SISO DE OBRA	SERGIO FERNAN ALONSO		

PERSONAL DE INTERVENTORÍA

nº	ESPECIALIDAD/CARGO	NOMBRE	PLANILLA N°	OBSERVACIONES
1	DIRECTOR INTERVENTORÍA	PEDRO GUTIERREZ BUSTILLO	7778672439	
2	ING RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	SORAYA NAVARRO BOLAÑO	7778680970	
4	RESIDENTE SISO INTERVENTORÍA	XIOMARA PEREZ	7778673656	

INFORMES SEMANALES DE INTERVENTORÍA

PERIODO				
Desde	Hasta	No. Informe	Fecha entrega	Observaciones y Contenido del Informe RELEVANTES
1/02/2021	7/02/2021	SEMANA No. 24	8-feb-21	Se reciben oficios de parte del contratista y se les da el respectivo trámite ante la entidad

OCHO	8	días del mes de	FEBRERO	de	2021
(Día en letras)	(Día en números)				(Año en que se firma el acta)

DIRECTOR O RESIDENTE DEL PROYECTO ETAPA DE OBRA:

NOMBRES Y APELLIDOS	PEDRO GUTIÉRREZ BUSTILLO	FIRMA	

Anexo No. 14: Registro fotográfico.


NO APLICA

Anexo No. 15: Bitácora de Obra.

NO APLICA

Anexo No. 16: Programación actualizada.


FLUJO DE CAJA

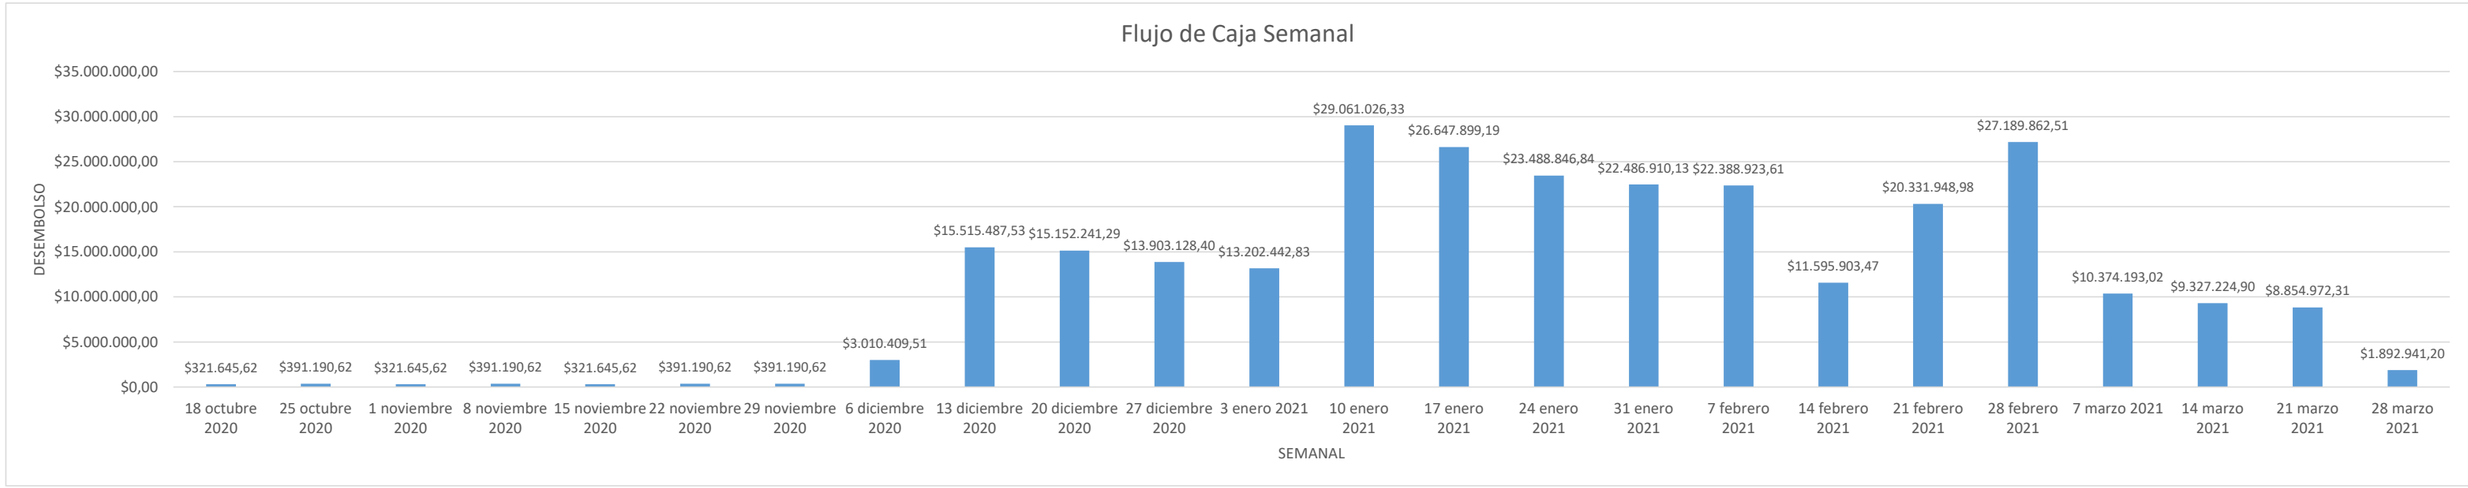

Capitulo:	Costo:
NP.PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD Y PRELIMINARES	$0,00
IMPERMEABILIZACIONES	$442.912,00
SISTEMA ELÉCTRICO	$63.422.461,00
SERVICIO DE JARDINERIA	$22.632.980,00
LAVADO DE TANQUES	$506.872,67
SISTEMAS DE REFRIGERACIÓN	$3.824.975,00
NO PREVISTOS	$186.123.860,72

01. Comercio y Servicios-Cll 21 Av. Aeropuerto Esquina-Riohacha

Id	Modo de tarea	ID APU	Task Name	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	Sucesoras
1			**Comercio y Servicios-Cll 21 Av. Aeropuerto Esquina-RIOHACHA**	**125 días**	**lun 19/10/20**	**mié 31/03/21**		
2			NP.PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD Y PRELIMINARES	1 día	lun 19/10/20	lun 19/10/20		4FC+90 días;20FC+40
3		**1**	**IMPERMEABILIZACIONES**	**13 días**	**mar 16/02/21**	**jue 4/03/21**		
4		1.5	CORRECCION FILTRACION BAJO PLACA CON CEMENTO HIDRAULICO	13 días	mar 16/02/21	jue 4/03/21	2FC+90 días	
5		1.7	IMPERMEABILIZACION CUBIERTA CON MORTER PLASTICO PREPARADO	12 días	mar 16/02/21	mié 3/03/21	34	
6		**2**	**SISTEMA ELÉCTRICO**	**55 días**	**mié 20/01/21**	**mié 31/03/21**		
7		2.1	ORGANIZACIÓN DE CIRCUITOS, DIAGRAMA UNIFILAR DE LA INSTALACION, CUADRO DE CARGAS,IDENTIFICACIÓN Y MARCACIÓN DE CIRCUITOS DE ACUERDO AL CODIGO DE COLORES EXIGIDO EN EL RETIE, ACTUALIZACIÓN DE DIRECTORIO.	10 días	mié 20/01/21	mar 2/02/21	2FC+69 días	8
8		2.2	TRASLADO O CAMBIO DE TABLERO EXISTENTE POR TABLERO TRIFASICO DE 18 CIRCUITOS CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR. INCLUYE BREAKER INDUSTRIAL DE 3X60 HASTA 3X100 AMP.	4 días	mar 2/02/21	sáb 6/02/21	7	9
9		2.6	TRASLADO O CAMBIO DE TABLERO EXISTENTE POR TABLERO TRIFASICO DE 24 CIRCUITOS CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR. INCLUYE BREAKER INDUSTRIAL DE 3X60 HASTA 3X100 AMP.	4 días	lun 8/02/21	jue 11/02/21	8	10
10		2.9	TRASLADO O CAMBIO DE TABLERO EXISTENTE POR TABLERO TRIFASICO DE 36 CIRCUITOS CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR. INCLUYE BREAKER INDUSTRIAL DE 3X60 HASTA 3X100 AMP.	4 días	vie 12/02/21	mié 17/02/21	9	11
11		2.11	CODIFICACION POR CODIGO DE COLORES DE ACUERDO AL "RETIE"; MEDIANTE CINTAS, PREFORMADOS EN CONDUCTORES E IDENTIFICACIÓN DE CADA ACOMETIDA.	1 día	mié 17/02/21	jue 18/02/21	10	12
12		2.12	CAMBIO DE DUCTO PVC A DUCTO METÁLICO EMT DE ACOMETIDAS. DESDE 1" HASTA 2"; INCLUYE ACCESORIOS Y ELEMENTOS DE FIJACION	4 días	jue 18/02/21	mar 23/02/21	11	13

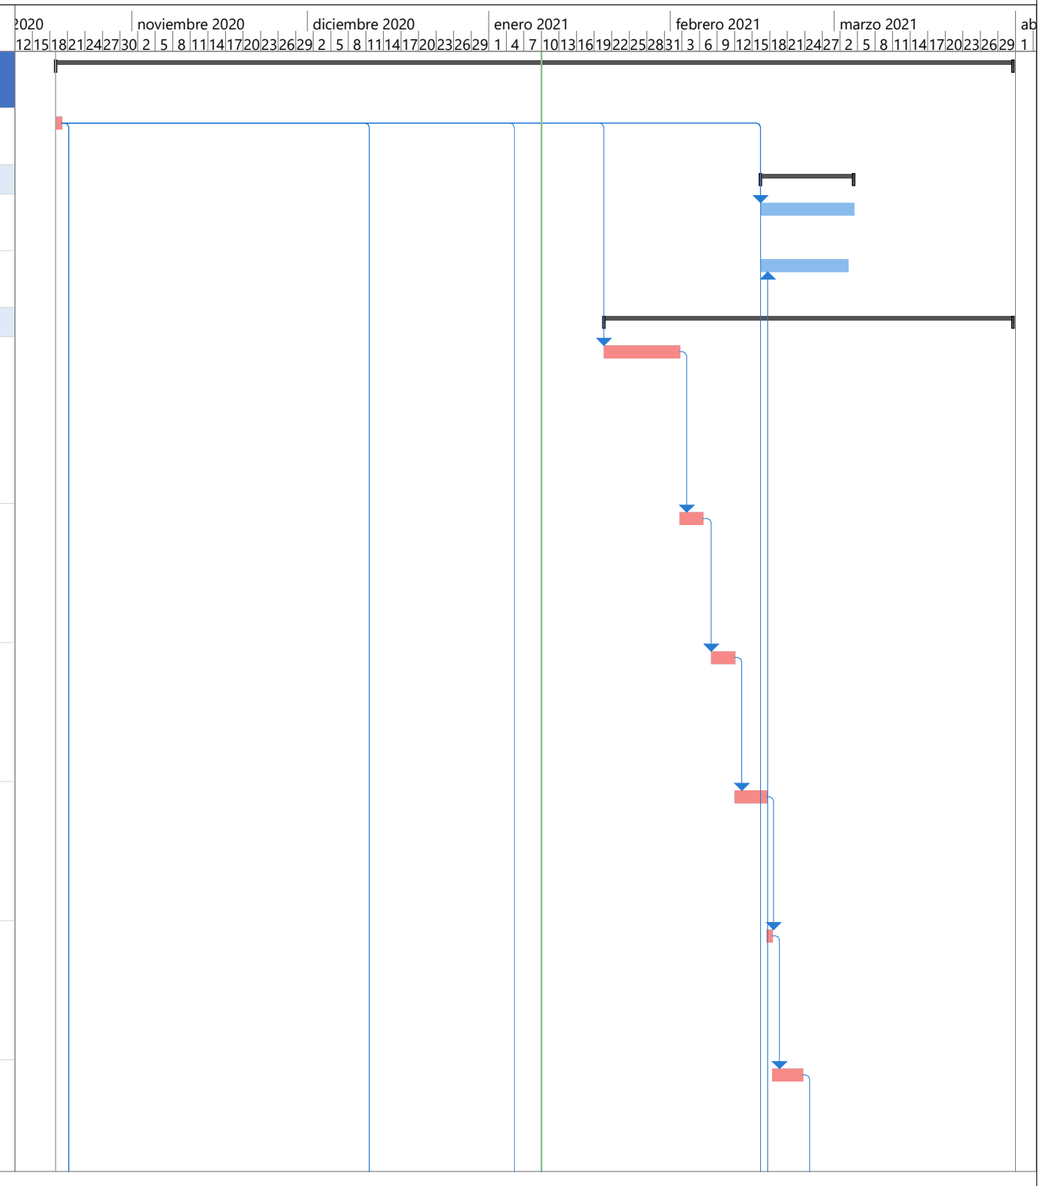


Project: Comercioervicio Riohac

División crítica
Task
Split
Milestone
Summary
Project Summary
Inactive Task
Inactive Milestone
Inactive Summary
Manual Task
Duration-only
Manual Summary Rollup
Manual Summary
Start-only
Finish-only
External Tasks
External Milestone
Deadline
Progress
Manual Progress
Tareas críticas

Aprobó:

Id	Modo de tarea	ID APU	Task Name	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	Sucesoras
13		2.13	CAMBIO DE CONDUCTORES ACOMETIDAS TRIFASICAS DESDE CALIBRE 3X8 HASTA ACOMETIDAS EN CALIBRE 3X1/0	10 días	mar 23/02/21	lun 8/03/21	12	14
14		2.16	PLANTA ELÉCTRICA: MANTENIMIENTO PREVENTIVO CADA 12 MESES O 150 HORAS DE OPERACIÓN.	5 días	lun 8/03/21	sáb 13/03/21	13	15
15		2.17	TRANSFERENCIA AUTOMATICA MANTENIMIENTO, LIMPIEZA, REQUINTADA DE CONEXIONADO DE CONDUCTORES.	2 días	sáb 13/03/21	mar 16/03/21	14	16
16		2.20	MANTENIMIENTO, CAMBIO DE TRAMOS, COLOCACIÓN DE TAPAS A CANALETA METÁLICA DOBLE COMPARTIMENTO 12X5 CM.	5 días	mar 16/03/21	mié 24/03/21	15	17
17		2.21	MEDICIÓN DE RESISTENCIA DE PUESTA A TIERRA UNA VEZ AL AÑO. SE DEBE OBTENER UNA LECTURA DE 3 OHMIOS O MENOR.	5 días	mié 24/03/21	mar 30/03/21	16	18
18		2.22	MEJORAMIENTO DE PUESTA A TIERRA POR MEDIO DE GELES QUIMICOS. BULTO DE 25 KILOS.	1 día	mar 30/03/21	mié 31/03/21	17	
19		**3**	**SERVICIO DE JARDINERIA**	**15 días**	**vie 11/12/20**	**jue 31/12/20**		
20		3.2	PRADIZACION jardines (Incluye 0.05 m de TIERRA NEGRA)	15 días	vie 11/12/20	jue 31/12/20	2FC+40 días	21CC
21		3.3	PODA DE CESPED CON GUADAÑA (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES) cada dos meses	8 días	vie 11/12/20	mar 22/12/20	20CC	22CC
22		3.4	PODA DE ÁRBOLES DE 1.00 m. A 5.00 m. (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES) Para cada sede dos veces al año	8 días	vie 11/12/20	mar 22/12/20	21CC	23CC
23		3.5	PODA DE PASTO ALTO (Incluye retiro pasto cortado) cada dos meses, incluye las sedes Maicao, Industrial y Fonseca	8 días	vie 11/12/20	mar 22/12/20	22CC	
24		**5**	**LAVADO DE TANQUES**	**42 días**	**mar 5/01/21**	**vie 26/02/21**		
25		5.3.1	LAVADO Y DESINFECCIÓN DEL TANQUE ELEVADO (NO INCLUYE REPARACION DE ENCHAPE E IMPERMEABILIZACION)	20 días	mar 5/01/21	sáb 30/01/21	2FC+57 días	27FC+20 días;26FC+20 días;40FC+20 días
26		5.3.5	INSTALACION DE ESCALERA TIPO GATO EN TUBERÍA GALVANIZADA	2 días	mié 24/02/21	vie 26/02/21	25FC+20 días	
27		5.3.6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VALVULA DE GLOBO D=1"	2 días	mié 24/02/21	vie 26/02/21	25FC+20 días	

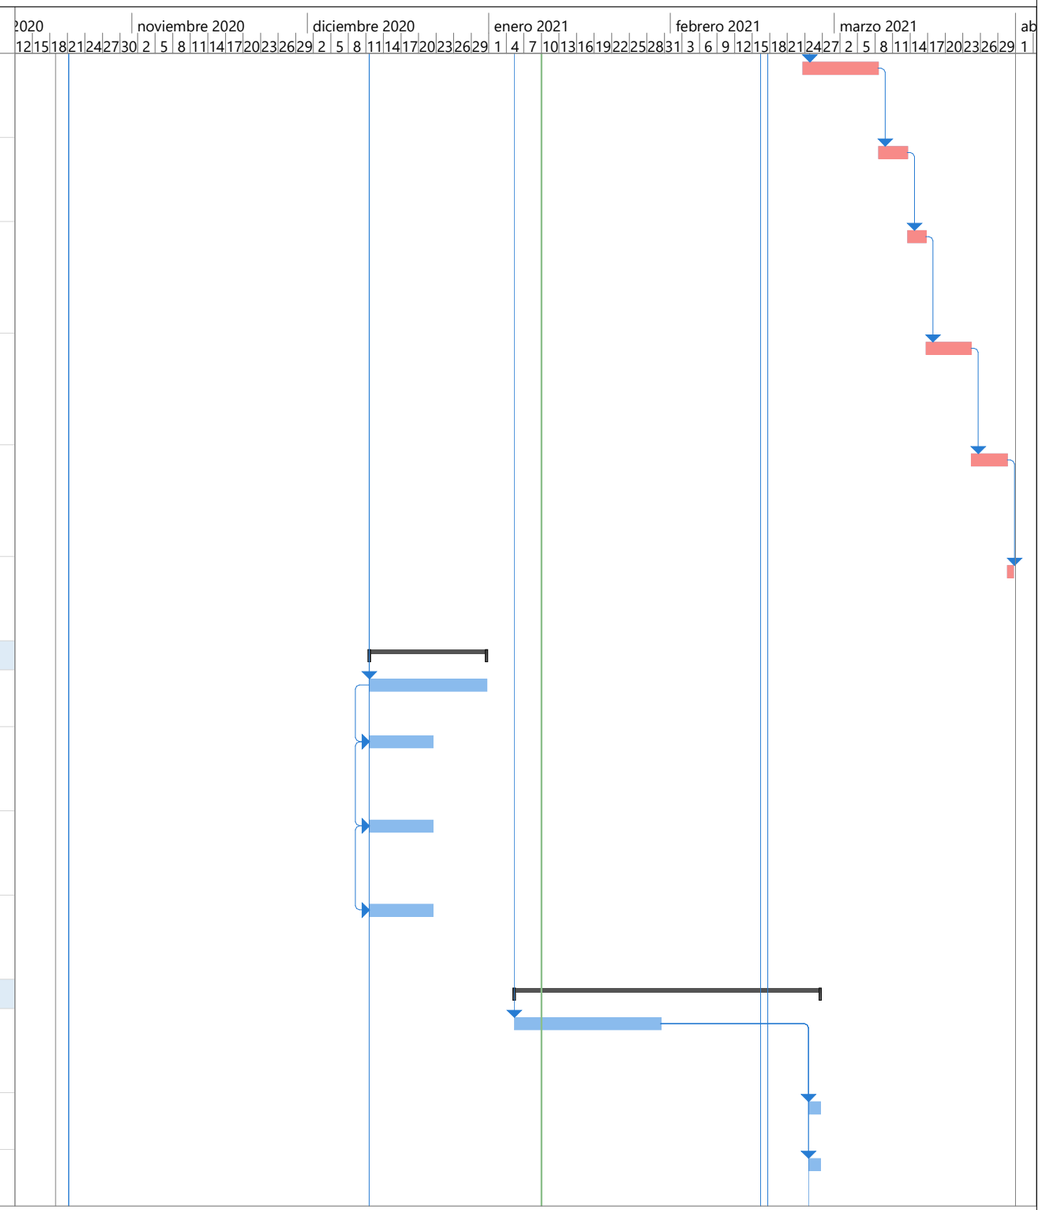


Project: Comercioervicio Riohac

División crítica	Summary	Inactive Summary	Manual Summary	External Milestone	Tareas críticas
Task	Project Summary	Manual Task	Start-only	Deadline	
Split	Inactive Task	Duration-only	Finish-only	Progress	
Milestone	Inactive Milestone	Manual Summary Rollup	External Tasks	Manual Progress	

Aprobó:

Id	Modo de tarea	ID APU	Task Name	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	Sucesoras
28		**7**	**SISTEMAS DE REFRIGERACIÓN**	**55 días**	**mar 20/10/20**	**jue 31/12/20**		
29		7.1	REVISIÓN, CALIBRACIÓN DE EQUIPO CONDENSADORA Y MANEJADORA, MINISPLIT. MENSUALMENTE. VER: Anexo al Pliego electronico para ampliar descripción	55 días	mar 20/10/20	jue 31/12/20	2	
30		7.2	REVISIÓN, CALIBRACIÓN DE EQUIPO CONDENSADORA Y MANEJADORA, SISTEMA CENTRAL CADA 3 MESES. VER: Anexo al Pliego electronico para ampliar descripción	55 días	mar 20/10/20	jue 31/12/20	2	32FC-7 días
31		**NP**	**NO PREVISTOS**	**84 días**	**vie 11/12/20**	**mié 31/03/21**		
32		NP-10.121	REVISIÓN, CALIBRACIÓN DE EQUIPO CONDENSADORA Y MANEJADORA, PISO TECHO.	7 días	mar 22/12/20	jue 31/12/20	30FC-7 días	
33		NP-10.298	DESMONTE DE MANTO EXISTENTE	20 días	vie 11/12/20	vie 8/01/21	2FC+40 días	34;35
34		NP-10.297	SUMINISTRO E INSTALACION DE MANTO ASFALTICO: MANTO POLIESTER ALUMINIO DE 3MM DE ESPESOR (INCLUYE APLICACIÓN PIGMENTO REFLECTIVO DE ALUMINIO)	30 días	vie 8/01/21	mar 16/02/21	33	5;38FC+10 días
35		NP-10.299	TRASIEGO Y DISPOSICIÓN FINAL EN BOTADERO AUTORIZADO DE MANTO ASFÁLTICO EXISTENTE	8 días	vie 8/01/21	mar 19/01/21	33	
36		NP-10.347	Mantenimiento de subestacion electrica Sede Comercio y Servicio	8 días	mar 16/02/21	jue 25/02/21	2FC+90 días	
37		NP-10.348	Mantenimiento de Estructura de Kiosko incluye inmunizacion	34 días	mar 16/02/21	mié 31/03/21	2FC+90 días	
38		NP-10.349	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLETA DE 10 X 10	20 días	lun 1/03/21	vie 26/03/21	34FC+10 días	
39		NP-10.350	SUMINISTRO DE ESCALERA TIPO GATO EN TUBERÍA GALVANIZADA	3 días	mar 23/03/21	vie 26/03/21	40	
40		NP-10.207	IMPERMEABILIZACION DE TANQUE SUBTERRÁNEO	20 días	mié 24/02/21	mar 23/03/21	25FC+20 días	39

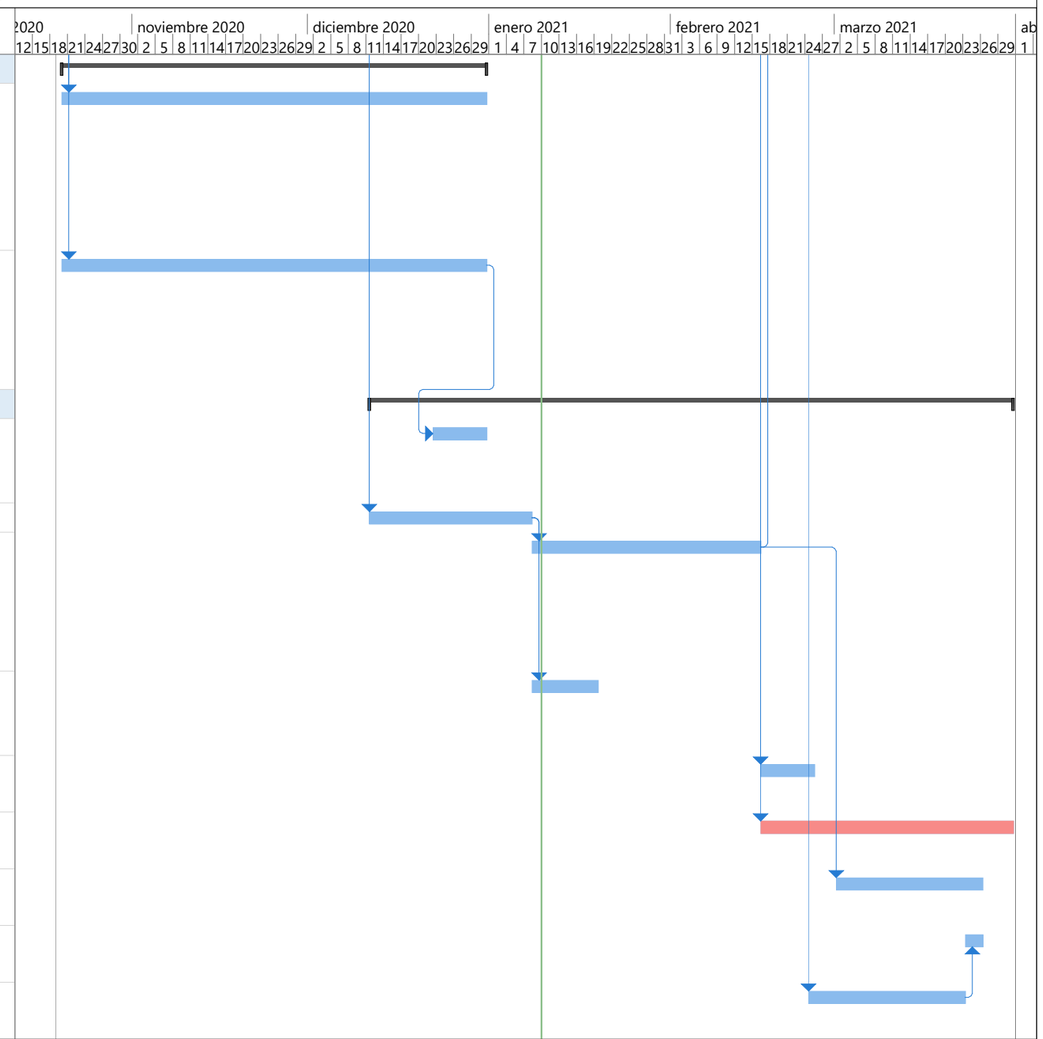


Project: Comercioervicio Riohac

División crítica
Task
Split
Milestone
Summary
Project Summary
Inactive Task
Inactive Milestone
Inactive Summary
Manual Task
Duration-only
Manual Summary Rollup
Manual Summary
Start-only
Finish-only
External Tasks
External Milestone
Deadline
Progress
Manual Progress
Tareas críticas

Aprobó:

ING. RICARDO ARTURO MOLINA GARCÍA
Directora de Obra


FLUJO DE CAJA

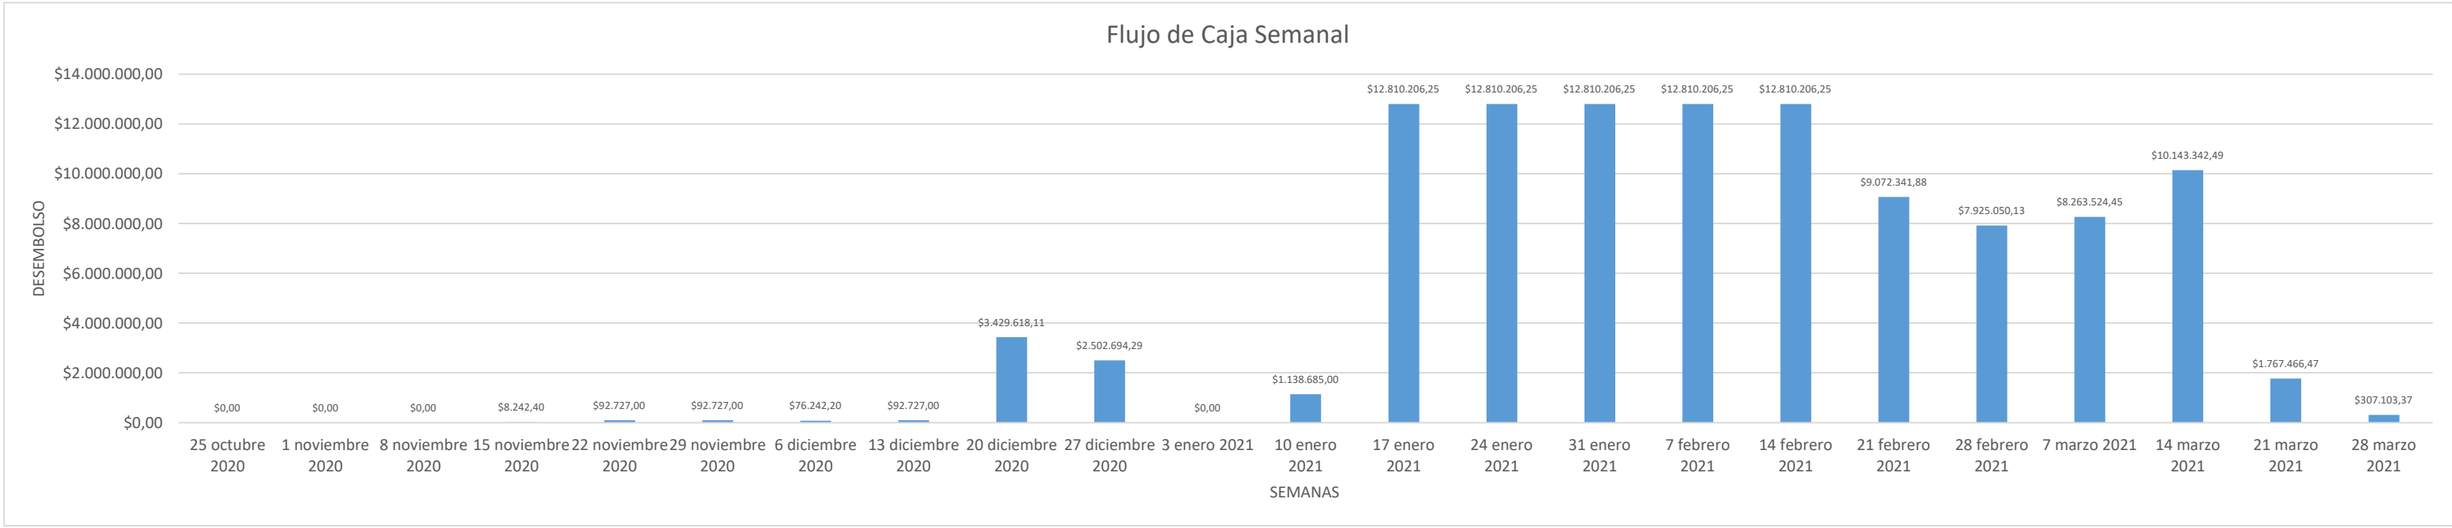

Capitulo:	Costo:
NP.PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD Y PRELIMINARES	$0,00
SERVICIO DE JARDINERIA	$5.687.780,00
SISTEMAS DE REFRIGERACION	$494.544,00
MANTENIMIENTOS GENERALES (limpieza, demoliciones, pinturas, estructuras, etc.)	$127.215,00
NO PREVISTO	$102.653.984,00

02. CIEA MAICAO

Id	Modo de tarea	ID APU	Task Name	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	Sucesoras
1			**CENTRO INDUSTRIAL Y DE ENERGIAS ALTERNATIVAS-MAICAO**	**114 días**	**sáb 31/10/20**	**mié 31/03/21**		
2			NP.PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD Y PRELIMINARES	1 día	sáb 31/10/20	mar 3/11/20		14FC+55 días;9FC+14 días;11FC+90
3		**3**	**SERVICIO DE JARDINERIA**	**13 días**	**sáb 13/03/21**	**mié 31/03/21**		
4		3.2	PRADIZACION jardines (Incluye 0.05 m de TIERRA NEGRA)	13 días	sáb 13/03/21	mié 31/03/21	2FC+100 días	5CC
5		3.3	PODA DE CESPED CON GUADAÑA (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES) cada dos meses	8 días	sáb 13/03/21	mié 24/03/21	4CC	6CC
6		3.4	PODA DE ÁRBOLES DE 1.00 m. A 5.00 m. (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES) Para cada sede dos veces al año	8 días	sáb 13/03/21	mié 24/03/21	5CC	7CC
7		3.5	PODA DE PASTO ALTO (Incluye retiro pasto cortado) cada dos meses, incluye las sedes Maicao, Industrial y Fonseca	8 días	sáb 13/03/21	mié 24/03/21	6CC	
8		**7**	**SISTEMAS DE REFRIGERACION**	**30 días**	**sáb 21/11/20**	**jue 31/12/20**		
9		7.1	REVISIÓN, CALIBRACIÓN DE EQUIPO CONDENSADORA Y MANEJADORA, MINISPLIT. MENSUALMENTE. VER: Anexo al Pliego electronico para ampliar descripción	30 días	sáb 21/11/20	jue 31/12/20	2FC+14 días	13FC-8 días
10		**8**	**MANTENIMIENTOS GENERALES (limpieza, demoliciones, pinturas, estructuras, etc.)**	**10 días**	**lun 1/03/21**	**sáb 13/03/21**		
11		8.15	DESMONTE DE CUBIERTAS ASBESTO CEMENTO. TERMO ACUSTICA. CUBIERTA MODULAR TIPO SANDWICH (Incluye retiro de escombros)	10 días	lun 1/03/21	sáb 13/03/21	2FC+90 días	17

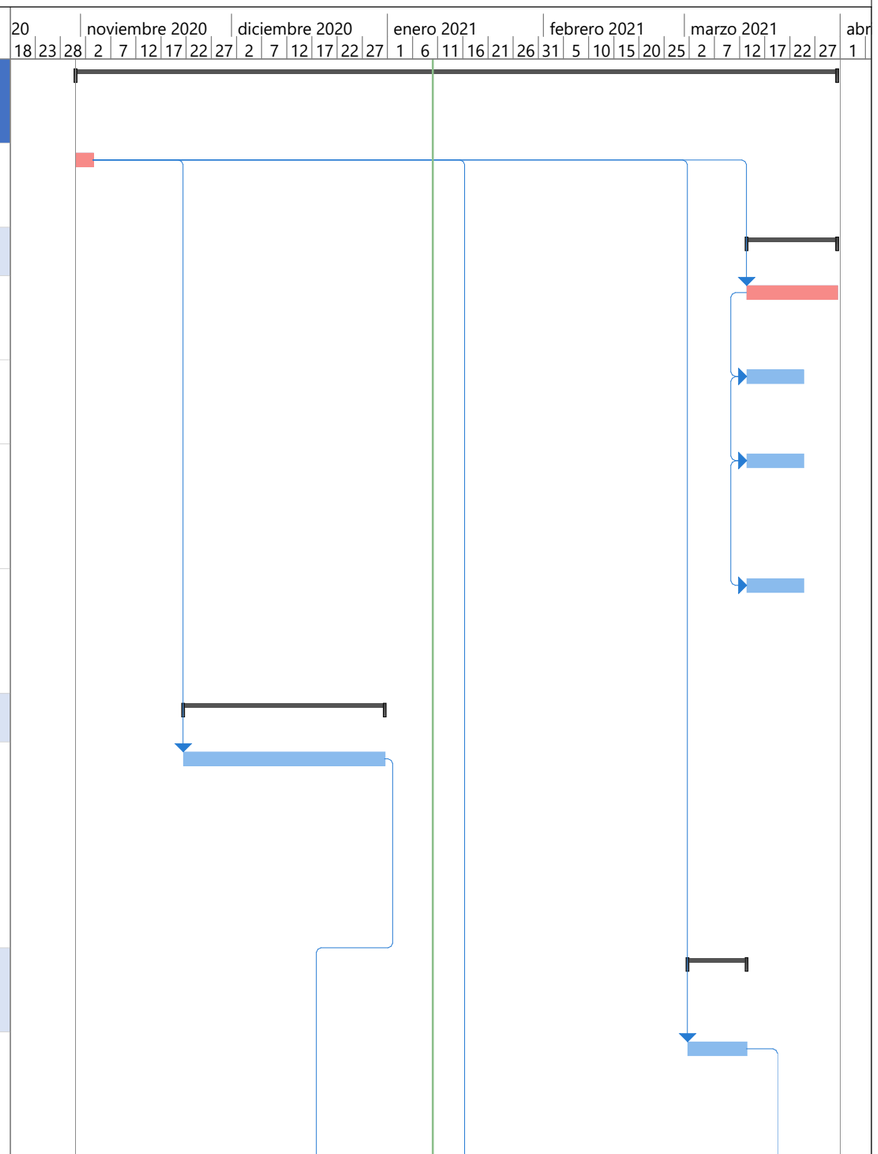


Project: Maicao

División crítica	Project Summary	Duration-only	External Tasks	Tareas críticas			
Task	Inactive Task	Manual Summary Rollup	External Milestone				
Split	Inactive Milestone	Manual Summary	Deadline				
Milestone	Inactive Summary	Start-only	Progress				
Summary	Manual Task	Finish-only	Manual Progress				

Aprobó:

02. CIEA MAICAO

Id	Modo de tarea	ID APU	Task Name	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	Sucesoras
12		**NP**	**NO PREVISTO**	**77 días**	**lun 21/12/20**	**mié 31/03/21**		
13		NP-10.121	REVISIÓN, CALIBRACIÓN DE EQUIPO CONDENSADORA Y MANEJADORA, PISO TECHO.	8 días	lun 21/12/20	jue 31/12/20	9FC-8 días	
14		NP-10.298	DESMONTE DE MANTO EXISTENTE	30 días	sáb 16/01/21	mar 23/02/21	2FC+55 días	15;16
15		NP-10.297	SUMINISTRO E INSTALACION DE MANTO ASFALTICO: Manto Poliester de 3mm de espesor. Aplicación de 3 capas de pintura de base asfaltica formulada con asfalto de penetración, resina hidrocarbúrica solvente asfáltico y pigmento reflectivo de ALUMINIO.	20 días	mar 23/02/21	vie 19/03/21	14	
16		NP-10.299	TRASIEGO Y DISPOSICIÓN DE MANTO RETIRADO (INCLUYE DISPOSICION FINAL ENCAPSULADO EN BOTADERO AUTORIZADO)	20 días	mar 23/02/21	vie 19/03/21	14	17
17		NP-10.330	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TEJA TIPO CANALETA 90 - ETERNIT	8 días	vie 19/03/21	mié 31/03/21	11;16	

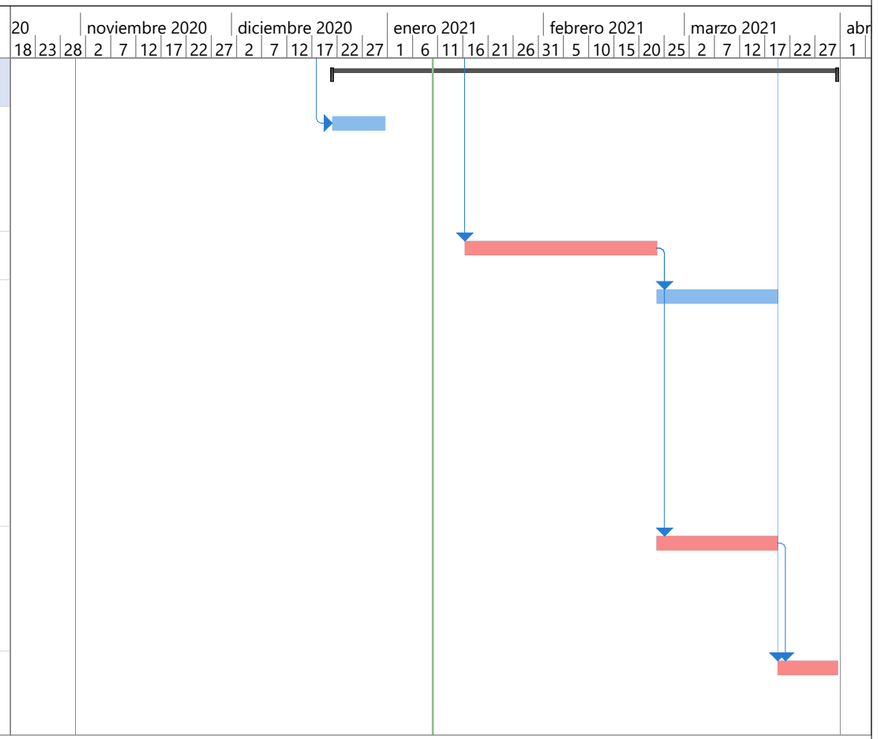


Project: Maicao

División crítica	Project Summary	Duration-only	External Tasks	Tareas críticas			
Task	Inactive Task	Manual Summary Rollup	External Milestone				
Split	Inactive Milestone	Manual Summary	Deadline				
Milestone	Inactive Summary	Start-only	Progress				
Summary	Manual Task	Finish-only	Manual Progress				

Aprobó:

ING. RICARDO ARTURO MOLINA GARCÍA
Directora de Obra


FLUJO DE CAJA

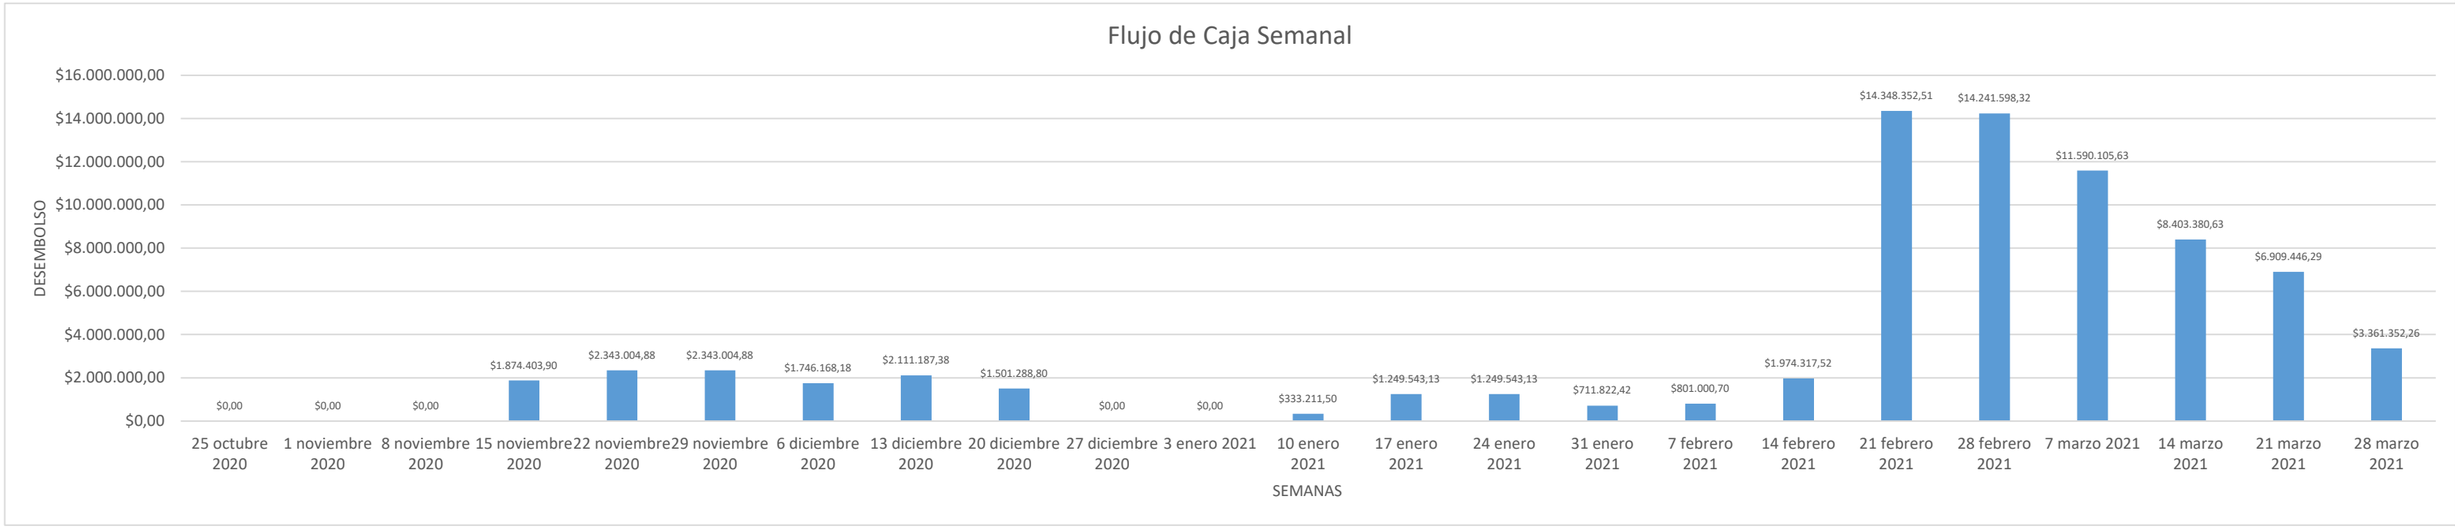

Capitulo:	Costo:
PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD Y PRELIMINARES	$0,00
SISTEMAS ELECTRICOS	$37.543.207,00
SERVICIO JARDINERIA	$27.296.280,00
SISTEMAS DE REFRIGERACIÓN	$659.392,00
NO PREVISTOS	$11.593.853,00

03. CIEA RIOACHA

Id	Modo de tarea	ID APU	Task Name	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	Sucesoras
1			**Centro Industrial y de Energias Alternativas -Troncal del Caribe- RIOHACHA**	**114 días**	**sáb 31/10/20**	**mié 31/03/21**		
2			PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD Y PRELIMINARES	1 día	sáb 31/10/20	mar 3/11/20		4FC+54 días;12FC+83 días;17FC+10
3		**2**	**SISTEMAS ELECTRICOS**	**59 días**	**vie 15/01/21**	**mié 31/03/21**		
4		2.2	TRASLADO O CAMBIO DE TABLERO EXISTENTE POR TABLERO TRIFASICO DE 18 CIRCUITOS CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR. INCLUYE BREAKER INDUSTRIAL DE 3X60 HASTA 3X100 AMP.	15 días	vie 15/01/21	mié 3/02/21	2FC+54 días	5
5		2.3	MARCACIÓN DE TUBERÍA EMT CON COLOR ANARANJADO.	2 días	mié 3/02/21	vie 5/02/21	4	6
6		2.6	TRASLADO O CAMBIO DE TABLERO EXISTENTE POR TABLERO TRIFASICO DE 24 CIRCUITOS CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR. INCLUYE BREAKER INDUSTRIAL DE 3X60 HASTA 3X100 AMP.	8 días	vie 5/02/21	lun 15/02/21	5	7
7		2.7	TRASLADO O CAMBIO DE TABLERO EXISTENTE POR TABLERO MONOFASICO DE 8 CIRCUITOS.	2 días	mar 16/02/21	mié 17/02/21	6	8
8		2.11	CODIFICACION POR CODIGO DE COLORES DE ACUERDO AL "RETIE"; MEDIANTE CINTAS, PREFORMADOS EN CONDUCTORES E IDENTIFICACIÓN DE CADA ACOMETIDA.	2 días	jue 18/02/21	vie 19/02/21	7	9;19
9		2.12	CAMBIO DE DUCTO PVC A DUCTO METÁLICO EMT DE ACOMETIDAS. DESDE 1" HASTA 2"; INCLUYE ACCESORIOS Y ELEMENTOS DE FIJACION	30 días	sáb 20/02/21	mié 31/03/21	8	10CC
10		2.13	CAMBIO DE CONDUCTORES ACOMETIDAS TRIFASICAS DESDE CALIBRE 3X8 HASTA ACOMETIDAS EN CALIBRE 3X1/0	30 días	sáb 20/02/21	mié 31/03/21	9CC	

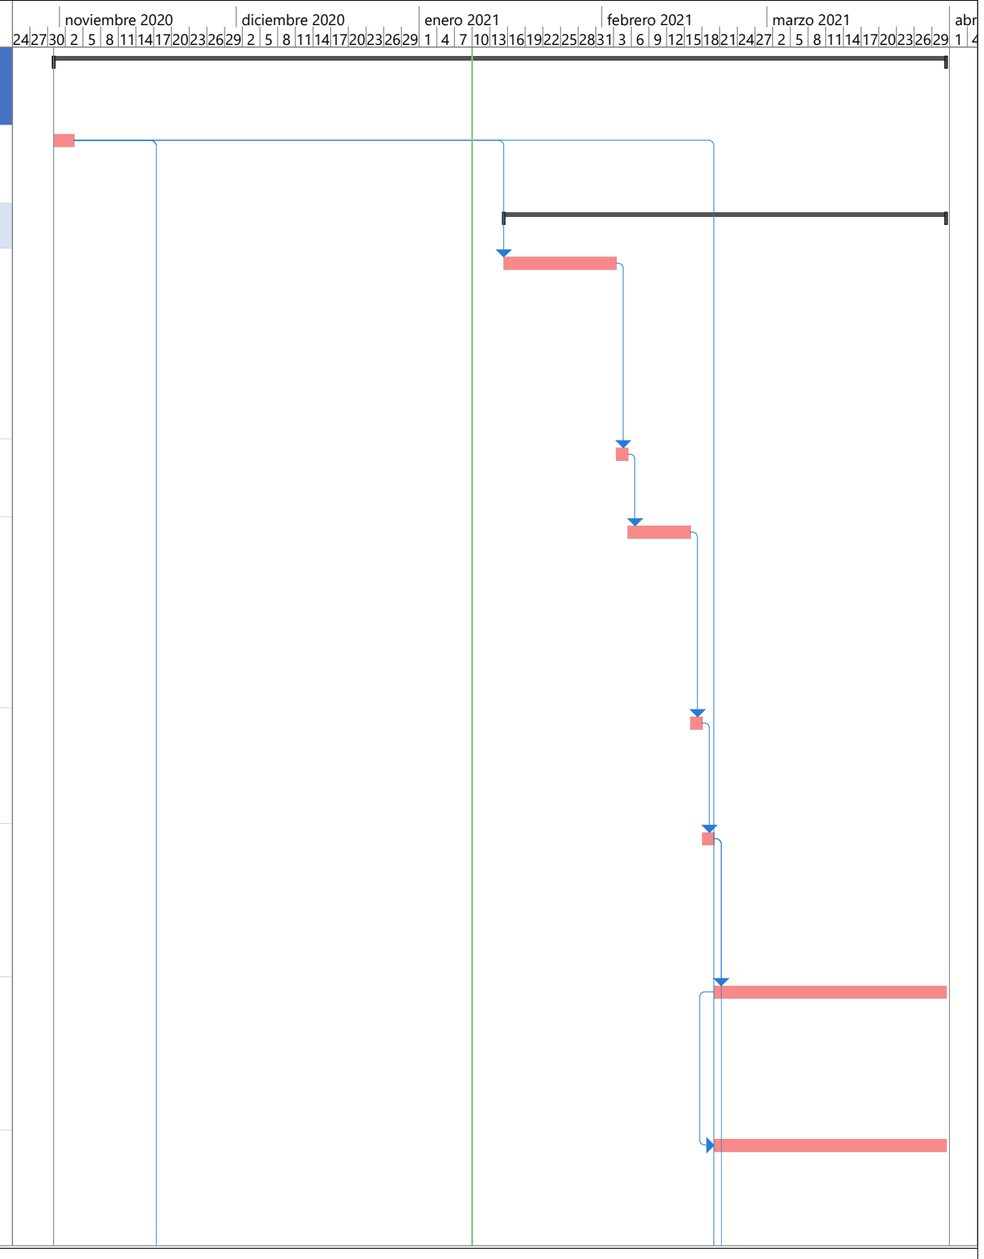


Project: CIEA Riohacha

División crítica	Summary	Inactive Summary	Manual Summary	External Milestone	Tareas críticas
Task	Project Summary	Manual Task	Start-only	Deadline	
Split	Inactive Task	Duration-only	Finish-only	Progress	
Milestone	Inactive Milestone	Manual Summary Rollup	External Tasks	Manual Progress	

Aprobó:

Id	Modo de tarea	ID APU	Task Name	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	Sucesoras
11		**3**	**SERVICIO JARDINERIA**	**30 días**	**sáb 20/02/21**	**mié 31/03/21**		
12		3.2	PRADIZACION jardines (Incluye 0.05 m de TIERRA NEGRA)	30 días	sáb 20/02/21	mié 31/03/21	2FC+83 días	13CC
13		3.3	PODA DE CESPED CON GUADAÑA (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES) cada dos meses	15 días	sáb 20/02/21	jue 11/03/21	12CC	14CC
14		3.4	PODA DE ÁRBOLES DE 1.00 m. A 5.00 m. (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES) Para cada sede dos veces al año	15 días	sáb 20/02/21	jue 11/03/21	13CC	15CC
15		3.5	PODA DE PASTO ALTO (Incluye retiro pasto cortado) cada dos meses, incluye las sedes Maicao, Industrial y Fonseca	15 días	sáb 20/02/21	jue 11/03/21	14CC	
16		**7**	**SISTEMAS DE REFRIGERACIÓN**	**16 días**	**mar 17/11/20**	**lun 7/12/20**		
17		7.2	REVISIÓN, CALIBRACIÓN DE EQUIPO CONDENSADORA Y MANEJADORA, SISTEMA CENTRAL CADA 3 MESES. VER: Anexo al Pliego electronico para ampliar descripción	16 días	mar 17/11/20	lun 7/12/20	2FC+10 días	
18		**NP**	**NO PREVISTOS**	**82 días**	**mar 17/11/20**	**mié 3/03/21**		
19		NP-10.43	MANTENIMIENTOS DE PLANTAS ELECTRICAS	9 días	sáb 20/02/21	mié 3/03/21	8	
20		NP-10.121	REVISIÓN, CALIBRACIÓN DE EQUIPO CONDENSADORA Y MANEJADORA, PISO TECHO.	30 días	mar 17/11/20	jue 24/12/20	2FC+10 días	

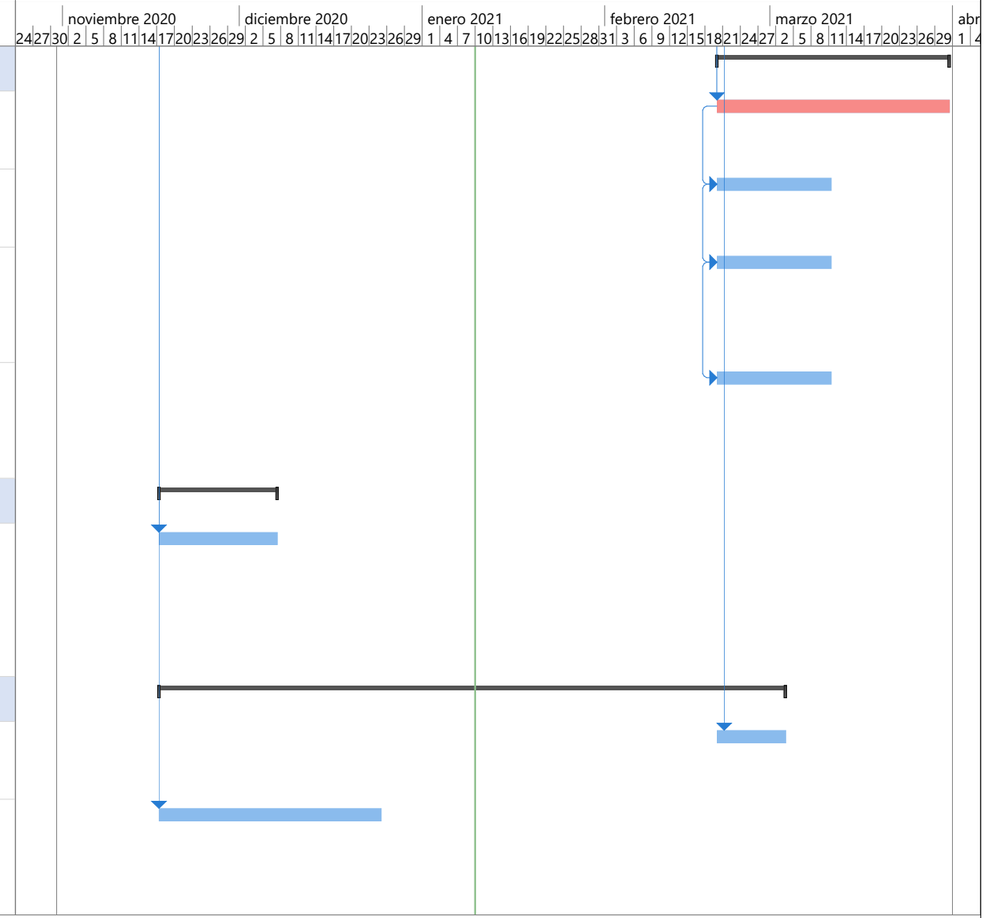


Project: CIEA Riohacha

División crítica	Summary	Inactive Summary	Manual Summary	External Milestone	Tareas críticas
Task	Project Summary	Manual Task	Start-only	Deadline	
Split	Inactive Task	Duration-only	Finish-only	Progress	
Milestone	Inactive Milestone	Manual Summary Rollup	External Tasks	Manual Progress	

Aprobó:

ING. RICARDO ARTURO MOLINA GARCÍA
Directora de Obra


FLUJO DE CAJA

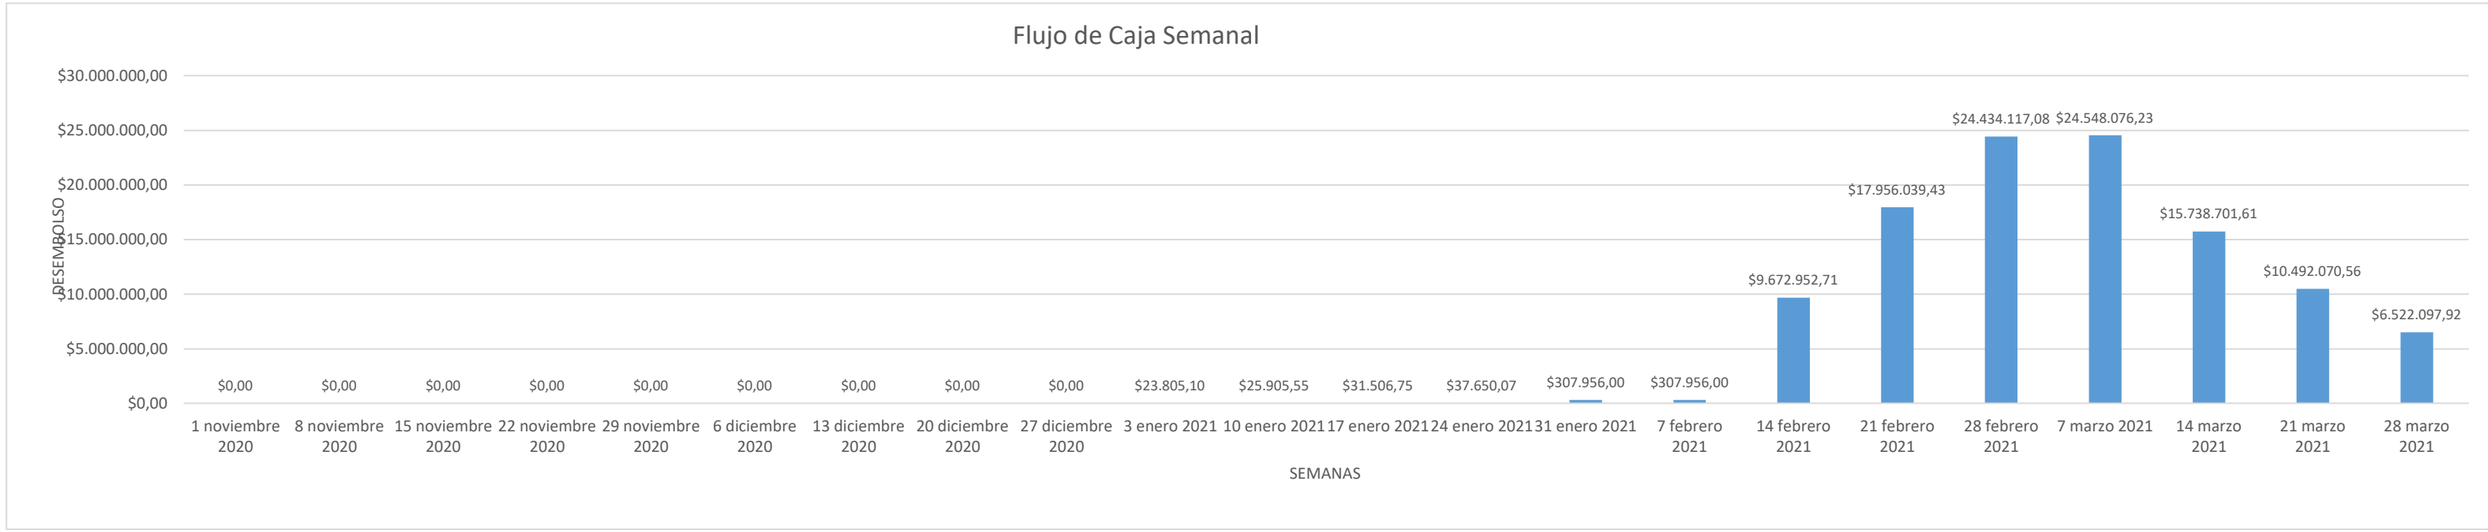

Capitulo:	Costo:
NP.PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD Y PRELIMINARES	$0,00
SERVICIO DE JARDINERIA	$20.379.640,00
LAVADO TANQUES	$1.273.617,00
SISTEMAS DE REFRIGERACIÓN	$299.153,00
NO PREVISTOS	$88.146.425,00

04. Centro Agroempresarial y Acuicola-Km 1 Via Barrancas-Fonseca

Id	Modo de tarea	ID APU	Task Name	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	Sucesoras
1			**CENTRO AGROEMPRESARIAL Y ACUICOLA-Km 1 Via Barrancas FONSECA-GUAJIRA**	**114 días**	**mar 3/11/20**	**mié 31/03/21**		
2			NP.PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD Y PRELIMINARES	1 día	mar 3/11/20	mar 3/11/20		17FC+80 días;4FC+90 días;9FC+46 días;18FC+80 días
3		**3**	**SERVICIO DE JARDINERIA**	**23 días**	**mar 2/03/21**	**mié 31/03/21**		
4		3.2	PRADIZACION jardines (Incluye 0.05 m de TIERRA NEGRA)	23 días	mar 2/03/21	mié 31/03/21	2FC+90 días	5CC
5		3.3	PODA DE CESPED CON GUADAÑA (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES) cada dos meses	8 días	mar 2/03/21	jue 11/03/21	4CC	6CC
6		3.4	PODA DE ÁRBOLES DE 1.00 m. A 5.00 m. (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES) Para cada sede dos veces al año	8 días	mar 2/03/21	jue 11/03/21	5CC	7CC
7		3.5	PODA DE PASTO ALTO (Incluye retiro pasto cortado) cada dos meses, incluye las sedes Maicao, Industrial y Fonseca	8 días	mar 2/03/21	jue 11/03/21	6CC	
8		**5**	**LAVADO TANQUES**	**39 días**	**mar 5/01/21**	**mar 23/02/21**		
9		5.3.1	LAVADO Y DESINFECCIÓN DEL TANQUE ELEVADO (NO INCLUYE REPARACION DE ENCHAPE E IMPERMEABILIZACION)	20 días	mar 5/01/21	sáb 30/01/21	2FC+46 días	10
10		5.3.4	IMPERMEABILIZACION DE TANQUE ELEVADO EN CONCRETO CON SIKA MONOTOP - 107	15 días	sáb 30/01/21	jue 18/02/21	9	11
11		5.3.5	INSTALACION DE ESCALERA TIPO GATO EN TUBERÍA GALVANIZADA	2 días	jue 18/02/21	sáb 20/02/21	10	12
12		5.3.6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VALVULA DE GLOBO D=1"	2 días	lun 22/02/21	mar 23/02/21	11	14
13		**7**	**SISTEMAS DE REFRIGERACIÓN**	**10 días**	**mié 24/02/21**	**lun 8/03/21**		
14		7.2	REVISIÓN, CALIBRACIÓN DE EQUIPO CONDENSADORA Y MANEJADORA, SISTEMA CENTRAL CADA 3 MESES. VER: Anexo al Pliego electronico para ampliar descripción	10 días	mié 24/02/21	lun 8/03/21	12	16

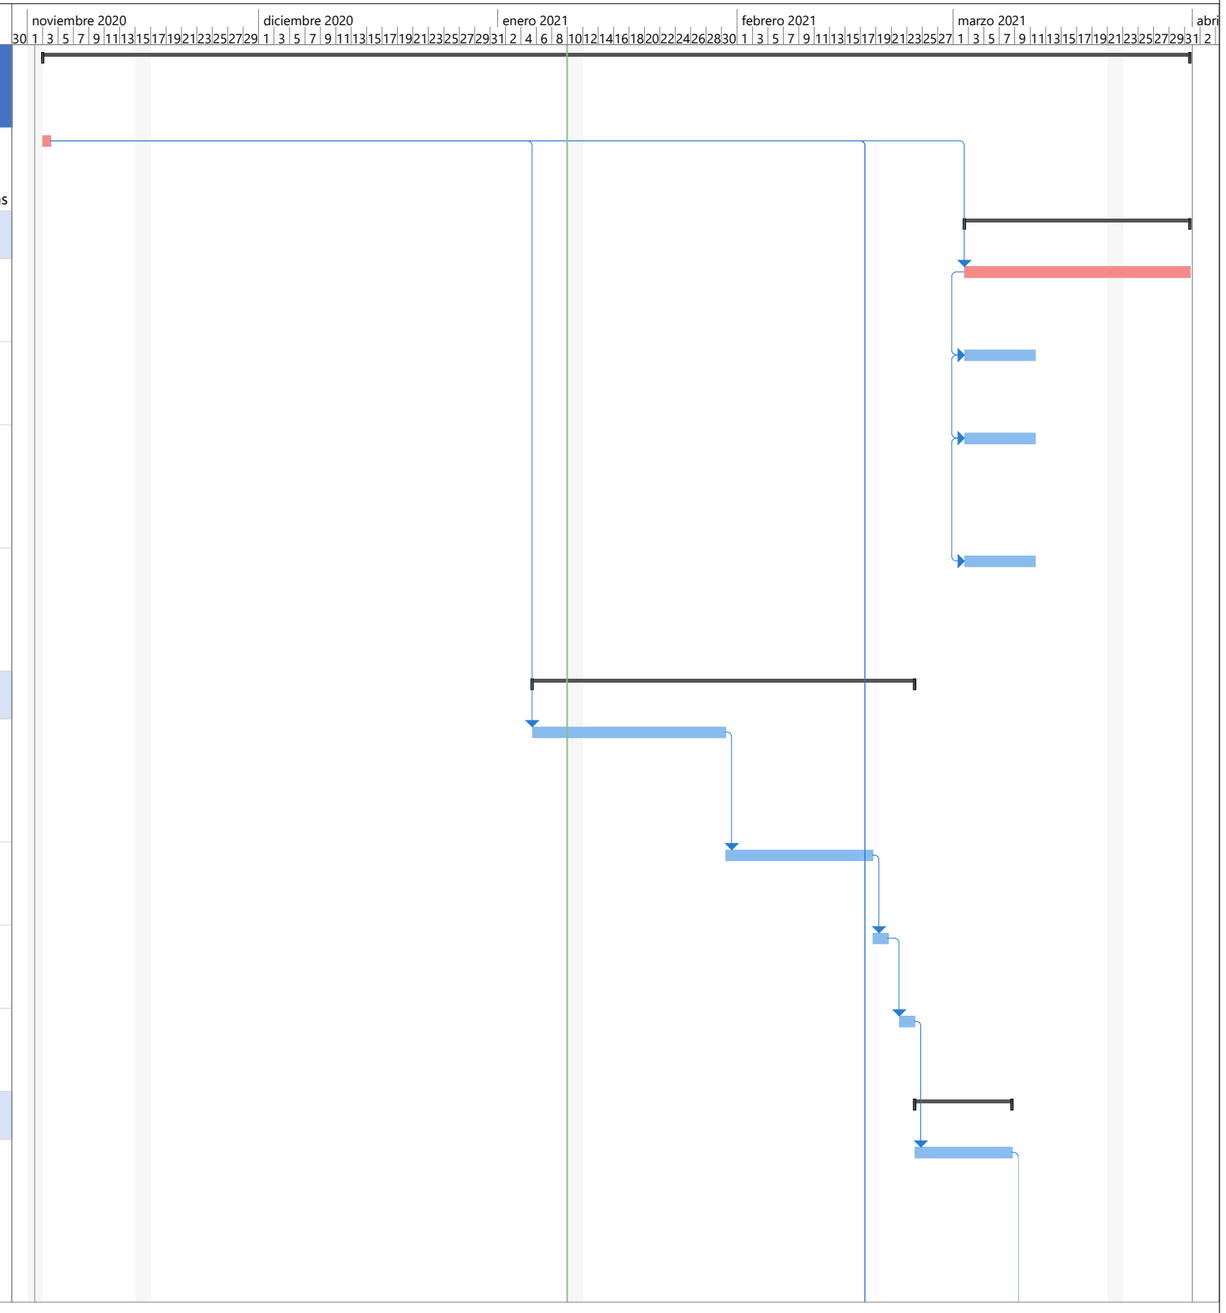


Projecto: Fonseca

División crítica	Milestone	Inactive Task	Manual Task	Manual Summary	External Tasks	Progress
Task	Summary	Inactive Milestone	Duration-only	Start-only	External Milestone	Manual Progress
Split	Project Summary	Inactive Summary	Manual Summary Rollup	Finish-only	Deadline	Tareas críticas

Aprobó:

Id	Modo de tarea	ID APU	Task Name	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	Sucesoras
15		**NP**	**NO PREVISTOS**	**33 días**	**mié 17/02/21**	**mié 31/03/21**		
16		NP-10.337	ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS DE AIRES ACONDICIONADOS	8 días	lun 8/03/21	jue 18/03/21	14	
17		NP-10.338	Suministro e Instalación de valvulas Fluxometro en Baño mujeres, 4 sanitarios y 3 en Lavamanos	22 días	mié 17/02/21	mié 17/03/21	2FC+80 días	
18		NP-10.339	Suministro e Instalación de valvulas Fluxometro en Baño Hombres, 3 en Lavamanos, 5 en orinales y 3 en Sanitarios.	33 días	mié 17/02/21	mié 31/03/21	2FC+80 días	

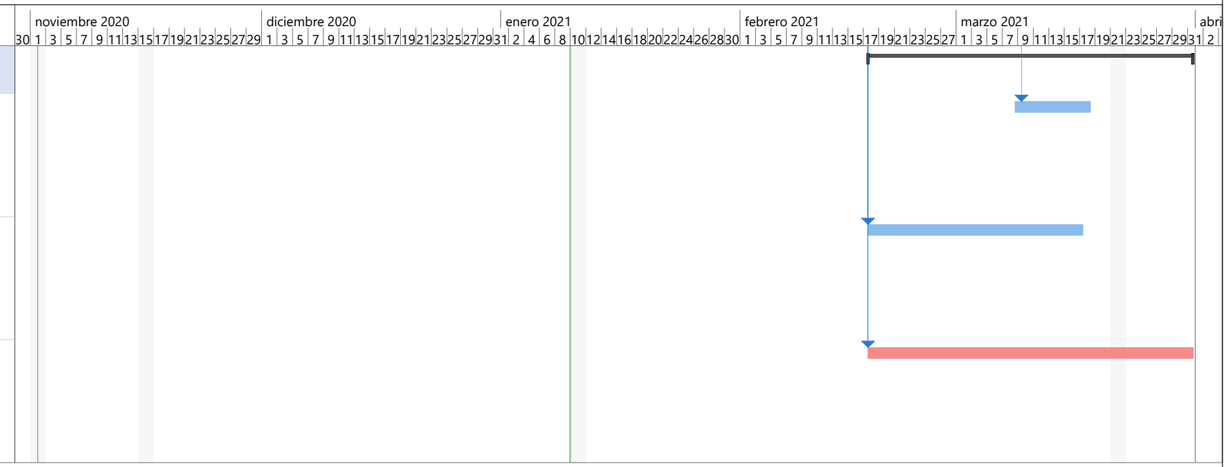

Projecto: Fonseca

División crítica	Milestone	Inactive Task	Manual Task	Manual Summary	External Tasks	Progress
Task	Summary	Inactive Milestone	Duration-only	Start-only	External Milestone	Manual Progress
Split	Project Summary	Inactive Summary	Manual Summary Rollup	Finish-only	Deadline	Tareas críticas

Aprobó: ING. RICARDO ANTONIO MOLINA GARCÍA
Directora de Obra
