INPLAYCO S.A.S.
INGENIEROS CONSTRUCTORES & INTERVENTORES


ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE HÁBITAT


INFORME SEMANAL 13

GRUPO No. 1

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 701-2020 CUYO OBJETO ES REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, JURÍDICA, SOCIAL, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA MODALIDAD DE HABITABILIDAD EN LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT.

ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE HÁBITAT

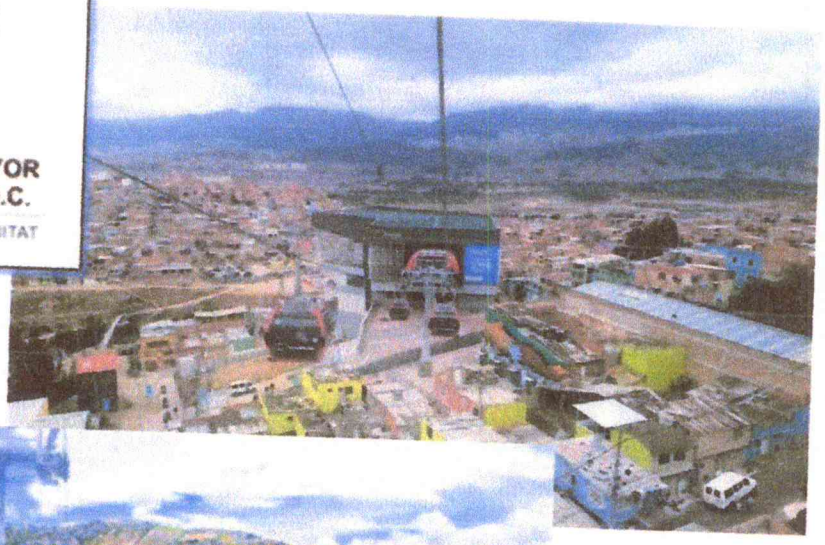

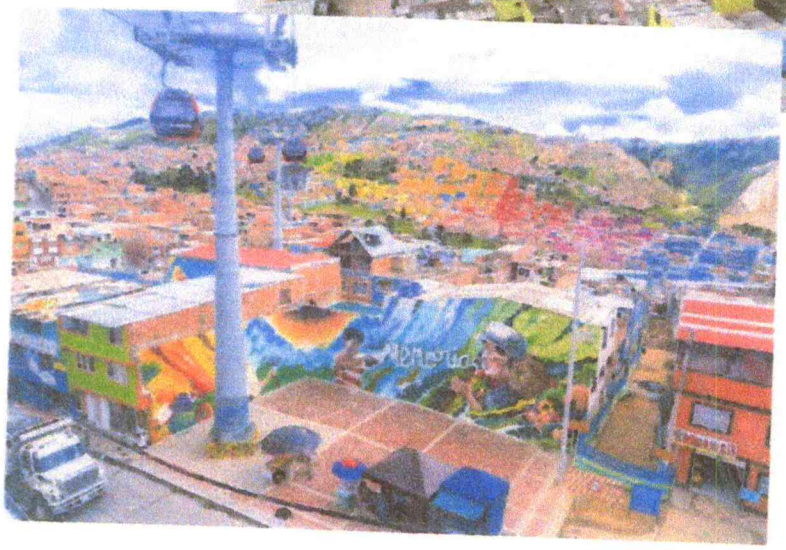

SEMANA 13 DEL 25 AL 31 DE ENERO DE 2021

INPLAYCO S.A.S.
INGENIEROS CONSTRUCTORES E INTERVENTORES

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE HÁBITAT

CONTRATO DE INTERVENTORÍA
NÚMERO: 701-2020

CONTRATANTE:	**SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT**	
CONTRATISTA:	**INPLAYCO S.A.S**	
IDENTIFICACIÓN:	N.I.T.: **860.524.168- 8**	
REPRESENTANTE LEGAL:	**GONZALO LIÉVANO HOYOS**	
IDENTIFICACIÓN:	C.C. Nº 19.100.962	
DIRECCIÓN:	Carrera 16 A No 82-13 Oficina 201	
TELÉFONOS:	6181167	inplayco@yahoo.com.mx
SUPERVISOR	JUAN CARLOS ARBELÁEZ MURILLO	
FECHA DE INICIO	4 DE NOVIEMBRE DE 2020	
FECHA DE FINALIZACIÓN	3 DE MAYO DE 2021	
TIEMPO EJECUCIÓN DEL	6 MESES	
VALOR CONTRATO	$894.285.952	
FECHA ADICIÓN No. 1	------	
VALOR ADICIÓN No. 1	$0	
VALOR TOTAL CONTRATO	$894.285.952	
FECHA PRÓRROGA No. 1	------	
VALOR PRÓRROGA No. 1	$0	
VALOR TOTAL CONTRATO	$894.285.952	

INPLAYCO S.A.S.
INGENIEROS CONSTRUCTORES E INTERVENTORES

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE HÁBITAT

CONTRATO DE OBRA
NÚMERO: 694-2020

CONTRATANTE:	**SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT**	
CONTRATISTA:	CONSORCIO MEJORAMIENTO EP 2020	
REPRESENTANTE LEGAL	LUIS FERNANDO CARRILLO JIMÉNEZ	
OBJETO CONTRACTUAL	"CONTRATAR LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA MODALIDAD DE HABITABILIDAD DE LOS PROYECTOS ESTRUCTURADOS EN LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT.".	
APROPIACIÓN PRESUPUESTAL	CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL NO. 914 DEL 14 DE JULIO DE 2020	
FIDUCIA No.		
DIRECCIÓN:	Calle 31 No. 4 -47 oficina 501 MONTERÍA	
TELÉFONOS:	3212231771	Mejoramientoconsorcio2020@gmail.com
Consorciado No. 1.	CORPORACIÓN MULTIACTIVA EMPRENDER ONG	
NIT	900.164.714-9	
REPRESENTANTE LEGAL	JUAN CARLOS NOBLES NAVARRO	
C.C. R.L.	10.894.408	
Consorciado No. 2.	PROJECT CENTER LIMITADA	
NIT	900.236.613-3	
REPRESENTANTE LEGAL	LUIS FERNANDO CARRILLO JIMENEZ	
C.C. R.L.	72.097.065	
PARTICIPACIÓN		
CORPORACIÓN MULTIACTIVA EMPRENDER	60% / MANEJO TÉCNICO, CONTABLE Y ADMINISTRATIVO	
PROJECT CENTER LIMITADA	40% / MANEJO TÉCNICO y ADMINISTRATIVO	
SUPERVISOR	JUAN CARLOS ARBELÁEZ MURILLO	
FECHA DE INICIO	4 DE NOVIEMBRE DE 2020	
FECHA DE FINALIZACIÓN	3 DE ABRIL DE 2021	
TIEMPO EJECUCIÓN DEL CONTRATO	5 MESES	
VALOR CONTRATO	$3.728.543.252	
FECHA ADICIÓN No. 1	------	
VALOR ADICIÓN No. 1	$0	
VALOR TOTAL CONTRATO	$3.728.543.252	
FECHA PRÓRROGA No. 1	------	
VALOR PRÓRROGA No. 1	$0	
VALOR TOTAL CONTRATO	$3.728.543.252	

INPLAYCO S.A.S.
INGENIEROS CONSTRUCTORES E INTERVENTORES

ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARIA DE HÁBITAT

INTRODUCCION

Por intermedio de la Secretaria Distrital del Hábitat, se busca adelantar las obras de mejoramiento de vivienda en la modalidad de habitabilidad en los territorios de Ciudad Bolívar, Usme, Bosa; atendiendo a la Política Nacional y Distrital de Construcción Sostenible, ofreciendo a las familias favorecidas la mejora de sus ambientes habitacionales y de vida., para lograr este alcance del objeto contractual, la Secretaria Distrital del Hábitat celebró el contrato de Interventoría con el No 701 de 2020 con la empresa INPLAYCO S.A.S, para su correcta ejecución con el fin de desarrollar las actividades de mejoramiento de las viviendas de los territorios mencionados anteriormente.

ETAPA DE EJECUCION

Este informe ejecutivo se desarrolla en la semana 13, comprendida del 25 de enero al 31 de enero del 2021, periodo en el cual después de la firma del acta de inicio el CONSORCIO MEJORAMIENTO EP 2020, continua con la ejecución de viviendas ya aperturadas.

Durante la fase de validación se definió por parte el contratista **CONSORCIO MEJORAMIENTO EP 2020,** un punto de atención a la comunidad (PAC) por localidad y/o Territorio, con el fin de garantizar y resolver las dudas, inquietudes, quejas o reclamos de los beneficiarios las cuales son atendidas de manera oportuna; Ubicado en la Kr 18K Bis con Cll 69T Sur a una cuadra de la estación de Trasmicable de Manitas.

Estas reuniones se realizaron bajo los protocolos de Bioseguridad cumpliendo las exigencias del gobierno nacional.

SEMANA 13 DEL 25 AL 31 DE ENERO –ENTREGAS Y EJECUCION PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS

Para esta semana el consorcio realiza entregas a los beneficiarios y procede a realizar aperturas de viviendas en diferentes zonas, continuando con lo descrito en la programación entregada, a continuación, se relaciona los MV validados para ejecución de obra.

INPLAYCO S.A.S.
INGENIEROS CONSTRUCTORES E INTERVENTORES

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARIA DE HÁBITAT

ARQ. WILLIAM GARZON

No.	ID_DMV	Dirección	Nombres y apellidos
NUEVA COLOMBIA			
1	MVCB_1437	KR 18L 70H 09 SUR	FLOR ELISA PARRA ROJAS
2	MVCB_1441	CL 70H SUR 18L 22	LUZMILA TORRES BERMUDEZ
3	MVCB_1440	CL 70H SUR 18L 16	ALBA CARMEN ARDILA MATEUS
4	MVCB_1421	CL 70I SUR 18L 54	MARIA ESTER ZORRO GUERRERO
5	MVCB_1124	DG 69D SUR 18J 15	MARIA ANTONIA SANTOS CORREDOR DE RAMIREZ
6	MVCB_1120	DG 69D SUR 18J 31	QUERUBIN CHAGUALA
7	MVCB_1091	DG 69D BIS SUR 18J 32	LIGIA TEJADA DE BARRERO
JUAN PABLO II			
8	MVCB_2996	DG 69A BIS B SUR 18M 23	MARIA TERESA ANTOLINEZ Y OTRO
9	MVCB_2993	DG 69A BIS B SUR 18M 35	CARLOS JULIO CARDENAS TRIANA **Beneficiario renuncia subsidio**
10	MVCB_2999	DG 69A BIS B SUR 18M 15	MARIA LEONOR FRAILE SUAREZ
11	MVCB_2991	DG 69A BIS B SUR 18M 43	BRISNELDA CONSTANZA MACIAS MARTINEZ
12	MVCB_2967	DG 69A BIS D SUR 18M 36	MARIA OLGA FARFAN GALEON
13	MVCB_2960	DG 69A BIS D SUR 18M 06	MARIA NURY QUINTERO CARDONA
14	MVCB_2434	KR 18M BIS 69A 64 SUR	MARGARITA MARIA MORALES OROZCO
15	MVCB_2432	KR 18M BIS 69A 72 SUR	AGUSTÍN VILLANUEVA GUZMÁN
16	MVCB_3030	KR 18M BIS 69A 81 SUR	TEODOSIA GALICIA DE GARCIA
17	MVCB_3020	KR 18M BIS A 69A 70 SUR	PEDRO PABLO IBAÑEZ
MIRADOR NUTIVARA			
18	MV_1866	CL 70L SUR 18P 21	LUIS ALBERTO ALONSO CASTIBLANCO
19	MV_1818	KR 18P 70K 03 SUR	MERQUECIDE MONTANEZ UYOA
20	MV_1811	CL 70K SUR 18Q 09	ROSA ELVIRA GONZALEZ
21	MV_1726	CL 70K SUR 18P 10	EMPERATRIZ ACOSTA MARTINEZ
22	MV_1766	CL 70K SUR 18N 46	CARMEN QUIQUE MARTINEZ
23	MV_1574	CL 70F SUR 18R 27	JOSE HIPOLITO GUTIERREZ LUCERO
24	MV_1588	CL 70F SUR 18P 33	LUZ NELLY RODRIGUEZ
25	MV_1608	KR 18P 70F 06 SUR	ROSALBINA HERNANDEZ PIRACHICAN
URBANIZACION COMPARTIR			
26	MV_0252	TV 18P BIS 65D 04 SUR	JESUS ANTONIO BARRERA FANDIÑO
VISTA HERMOSA			
27	MV SH005	TV 18I 71 35 SUR	MARIA CUSTODIA SANCHEZ SANCHEZ
ANTONIO JOSE DE SUCRE III (USMINIA)			
28	MV 21341	KR 7 116 15 SUR	ERMELINDA HERNANDEZ
NUEVO SAN LUIS (USMINIA)			
29	MVUS 0795	KR 5A 112A 24 SUR	AIDA MARIA RUEDA NIETO
EL BRILLANTE (USMINIA)			
30	MV 22203	KR 3 100F 06 SUR MJ	YENY ZURLEY LOPEZ ULLOA
31	MV 22728	DG 101A SUR 2B 37	ECCEHOMO RIVERA RONCANCIO
LA COLMENA III SECTOR (CIUDAD BOLIVAR)			
32	MVJA 2062	DG 64A SUR 19 26	MERCEDES WALTEROS JOANIAS
33	MVJA 2077	DG 64A SUR 19 57	SOFIA PORRAS DE CAJAMARCA
34	MVJA 1896	DG 64BIS A SUR 19A 19	HERNANDO TIQUE GUZMAN
SANTA INES (BOSA LA LIBERTAD)			
35	MVBL 2134	KR 89A BIS 70 19 SUR CA 2	HERMELINA LOSADA CAICEDO
SAN ANTONIO (BOSA LA LIBERTAD)			
36	MVBL 2838	KR 88J 69A 19 SUR CA 1	ALVARO BARRERA ARIZA

INPLAYCO S.A.S.
INGENIEROS CONSTRUCTORES E INTERVENTORES

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARIA DE HÁBITAT

ARQ. LEONARDO SOLANO			
No.	**ID_DMV**	**Dirección**	**Nombres y apellidos**
JUAN PABLO II			
1	MVCB_4919	KR 18M BIS 68B 50 SUR MJ	URIEL PATIÑO RINCON
2	MVCB_4923	KR 18M BIS 68B 26 SUR	SIERVO MATIAS FIGUEROA CHAPARRO
3	MVCB_2932	TV 18N 69A 97 SUR	MARIA TERESA PIÑEROS PIÑEROS
4	MVCB_2926	TV 18N 69A 71 SUR	CORADO TORO DE TORRES Y OTRO
5	MVCB_3646	TV 18N BIS 69A 95 SUR	LUIS ANTONIO CABRERA LOPEZ Y OTRA
6	MVCB_3643	TV 18N BIS 69A 83 SUR	JOSE ARISTOBULO MENJURA LEITON Y OTRA
7	MVCB_2925	TV 18N 69A 67 SUR	MARTHA LUZ CAMPIÑO
8	MVCB_2917	DG 69A BIS B SUR 18M 30	CLAUDIA PATRICIA VARGAS GÓMEZ
9	MVCB_3642	TV 18N BIS 69A 77 SUR	JULIO CESAR FICHAS AVILA
10	MVCB_3641	TV 18N BIS 69A 75 SUR	CECILIA MENDEZ MORENO
11	MVCB_3640	TV 18N BIS 69A 71 SUR	OCTAVIO TELLEZ PINEDA
12	MVCB_3635	TV 18N BIS 69A 51 SUR	JUAN CARLOS MAZO CASTRO Y OTRA
13	MVCB_3634	TV 18N BIS 69A 47 SUR	AYDE NIÑO Y OTRO
14	MVCB_2939	TV 18N BIS 69A 84 SUR	MARIEYE LOAISA
15	MVCB_4918	KR 18M BIS 68B 56 SUR	ALVARO DIAZ AVILA
16	MVCB_3633	TV 18N BIS 69A 43 SUR	FRANCISCO JAVIER MENDIVELSO GUERRERO
17	MVCB_4917	KR 18M BIS 68B 62 SUR	ALVARO ALONSO MORENO
DESARROLLO NUEVA COLOMBIA			
18	MVCB_1320	CL70K SUR 18L 65	ISMINIA BARRETO ARIAS
19	MVCB_1383	CL70J SUR 18L 34	EDGAR FERNANDO CAMARCO ANGEL
20	MVCB_1380	CL 70J SUR 18L 22	ROSALBA MONTES DE CARDONA
21	MVCB_1382	CL 70J SUR 18L 30	MARIA CECILIA RINCON RINCON
22	MVCB_1381	CL 70J SUR 18L 26	NOHORA NOHEMI MAYORGA IBAGUE
23	MVCB_1374	CL 70J SUR 18L 11	OBED OSPINA RESTREPO
24	MVCB_1371	CL 70J SUR 18L 23	CONSUELO NAVARRO
25	MVCB_1328	CL 70K SUR 18L 29	EDILBERTO CARDENAS PAEZ
26	MVCB_1352	CL 70K SUR 18L 64	MARIA RAMOS ORTIZ
27	MVCB_1341	CL 70K SUR 18L 20	JOSE GABRIEL HERRERA MEDINA
28	MVCB_1344	CL 70K SUR 18L 32	ALBEIRO RUIZ SANABRIA
29	MVCB_1310	CL 70L SUR 18L 70	DORA ALICIA LÓPEZ SANABRIA
30	MVCB_1314	KR 18M 70K 16 SUR	MARTHA LUCIA OSPINA PEÑA **Beneficiario renuncia subsidio**
31	MVCB_1357	KR 18M 70J 16 SUR	MARTHA LILIA AGUDELO SANTOS
VILLAS DEL DIAMANTE			
32	MVCB_5128	CL 69N SUR 18N 52	DIEGO MARIO VANEGAS VILLAMIL
33	MVCB_5156	CL 69N SUR 18N 58 MJ	FRANCISCO JAVIER ARANGO GUTIERREZ
34	MVCB_5127	CL 69N SUR 18N 59 MJ	VICTOR MANUEL MUÑOZ VERGARA
35	MVCB_5489	KR 19F 70C 29 SUR MJ	GLORIA INES PEÑA BELTRAN
36	MVCB_5482	KR 19G 70C 18 SUR	LUIS HERNANDO MESA
37	MVCB_5486	CL 70C SUR 19F 07 MJ	MARIA DEL CARMEN ALONSO POSADA
38	MVCB_5314	TV 18N BIS A 69R 17 SUR MJ	ANA OTILIA GUACANEME CUESTA
39	MVCB_5295	CL 69R SUR 18P 45 MJ	MARIA YOLANDA LOZANO VERGARA
40	MVCB_5122	CL 69P SUR 18P 15	HERNAN LOPEZ GIRALDO

41	MVCB_5157	CL 69N SUR 18N 57	ANA TERESA PEÑA ROJAS
MIRADOR (NUTIVARA)			
42	MVCB_1586	CL 70F SUR 18P 45	MARIA DEL CARMEN RINCON
43	MVCB_1907	CL 70N SUR 18N 22	ANA ROSA LLANAOS DE GARCIA
USMINIA			
44	MV_21184	CL 112A SUR 7 48	AMALIA MERCHAN SOSA
45	MV_21368	CL 116 SUR 5 73	ALEJANDRO PAVA
46	MV_21240	CL 114 SUR 7 42	ALFONSO GUERRERO
47	MV_21212	CL 112A SUR 7 31	ERNESTINA CAICEDO

ING. HUMBERTO BLANCO			
No.	**ID_DMV**	**Direcciòn**	**Nombres y apellidos**
MIRADOR NUTIVARA			
1	MVCB_1873	CL 70L BIS SUR 18N 14	BLANCA FABIOLA LANDAZURI MESA
2	MVCB_1886	KR 18N 70K 31 SUR	LUZ MARIA ARIZA ARIZA
3	MVCB_1836	KR 18N 70K 09 SUR	DELIA MARÍA MATEUS ESCAMILLA
4	MVCB_1829	CL 70K SUR 18N 45	DIANA PATRICIA PÁEZ FINO
5	MVCB_1684	CL 70I SUR 18N 56	MIRYAM MANRIQUE URUEÑA
6	MVCB_1692	CL 70 H SUR 18 N 51	BEATRIZ ADIELA MARTINEZ JARAMILLO
7	MVCB_1681	CL 70 I SUR 18 N 36 MJ	ALVARO ELIECER VERDUGO RODRIGUEZ
8	MVCB_1638	KR 18R 70H 09 SUR	MAURICIO ENRIQUE MUÑOZ RIAÑO
9	MVCB_1664	KR 18P 70G 08 SUR	MARINA CLEMENCIA RAMOS
10	MVCB_1748	KR 18P 70I 04 SUR	OLGA LUZ BETANCOURT LEON
11	MVCB_1704	KR 18R 70H 08 SUR	ALBA LUCIA VALENCIA OCAMPO
12	MVCB_1631	CL 70G SUR 18R15	ELOISA LAVERDE RIOS
13	MVCB_1592	CL 70F SUR 18N 28	HOBER FABIAN BARRERA GUTIERREZ
NUEVA COLOMBIA			
14	MVCB_1130	DG 69F SUR 18J 18	CARMEN JULIA SUAREZ PARADA
15	MVCB_1180	DG 69F SUR 18J 15	BLANCA TERESA CALVO DE GARZON
16	MVCB_1181	DG 69F SUR 18J 11	ALBERTO ULLOA ULLOA
17	MVCB_1161	DG 69F SUR 18J 03	MARIA ROSA ELENA BECERRA SEGURA
18	MVCB_1212	DG 69G SUR 18J 43	HERNAN LOPEZ
19	MVCB_1194	DG 69H SUR 18J 20	VICTOR HUGO WILCHES BERNAL
20	MVCB_1467	CL 70H SUR 18J 70	TERESA DE JESUS OLIVOS DE BLANCO
21	MVCB_1469	CL 70H SUR 18J 82	JORGE SANCHEZ FORERO
22	MVCB_1470	KR 18L 70G 24 SUR	ANA SILVIA CHACON
23	MVCB_1495	KR 18L 70H 10 SUR	YACQUELINE RADA MOJICA
24	MVCB_1493	CL 70I SUR 18J 86	MARIA ELENA ALCIRA GARZON CASALLAS
25	MVCB_1516	KR 18L 70I 10 SUR	BERTHA CECILIA MOJICA RUIZ
26	MVCB_1417	CL 70I SUR 18L 30	DIANA MARCELA PARRA BALLESTEROS
27	MVCB_1416	CL 70I SUR 18L 22	ANA CENETH TORRES ROJAS
28	MVCB_1407	CL 70I SUR 18L 33	MARIA ELSA TORRES
29	MVCB_1409	CL 70I SUR 18L 21	FRAN EDILBERTO CRUZ CANO Y OTRA
VILLAS DEL DIAMANTE			
30	MVCB_5118	TV 18P BIS 69N 17 SUR	CARLOS ALFREDO CLAVIJO ROZO
31	MVCB_5464	KR 19D BIS 70C 25 SUR (KR 19B 70C 25 SUR)	IRMA ROJAS ROJAS
32	MVCB_5491	KR 19F 70C 41 SUR MJ	LEONILDE BUITRAGO MORENO
ARBORIZADORA ALTA			
33	MV_14629	CL 75C SUR 34 51	HILDA MIRYAM NIÑO

INPLAYCO S.A.S.
INGENIEROS CONSTRUCTORES E INTERVENTORES

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARIA DE HÁBITAT

34	MV_08564	KR 37A 75 55 SUR	ELSY CARDENAS MONROY
35	MV_09494	TV 35C 72F 31 SUR	GLADYS CASALLAS SUAREZ
SANTA VIVIANA			
36	MV_14485	KR 74D 75C 41 SUR MJ	PLINIO SANABRIA SANDOVAL
37	MV_09083	CL 75C BIS 75 39 SUR	RUTH GORDONS CASTAÑEDA
VILLA ALEMANA II SECTOR - USMINIA			
38	MVUS_0638	CL 115 SUR 3 36	EDWIN ARLEY QUINMBAYO QUINTERO
39	MVUS_0682	CL 113A SUR 4 25	JOSE DEL CARMEN SANCHEZ PAEZ
40	MVUS_0707	KR 4 115 21 SUR	LUZ MERY YARA MATOMA
ANTONIO JOSE DE SUCRE III - USMINIA			
41	MV_21283	KR 7 115 15 SUR	TERESA DE JESUS OSORIO ORTIZ

INSP. ERICK ALVAREZ CADAVID			
No.	**ID_DMV**	**Dirección**	**Nombres y apellidos**
DOMINGO LAIN II SECTOR Y CONDOMINIO DEL BOSQUE			
1	MVJA_0723	CL 63 SUR 18K 14	VICTOR MANUEL SAMORA HERNANDEZ
2	MVJA_1085	CL 64 BIS SUR 18N 42	MARIA NERY ECHEVERRY DE RESTREPO
3	MVJA_2598	KR 18L BIS 64A 22 SUR	FLOR ANGELA MORANTES LOPEZ
4	MVJA_2476	KR 18K BIS 64A 12 SUR	JAIME HUMBERTO BORDA LIBERATO
5	MVJA_2763	KR 18M 64 21 SUR	CARLOS JESÚS BECERRA PEREZ
6	MVJA_1194	CL 64B SUR 18N 81	MOISES RODRÍGUEZ BETANCOURT
7	MVJA_1129	CL 64 SUR 18P 07	ANA BERTILDE GAMBOA VELANDIA
8	MVJA_2479	KR 18K BIS 64A 20 SUR	CRISTOBAL VALBUENA
DOMINGO LAIN I			
9	MVJA_0898	CL 63B SUR 18L 53	EFIGENIA GUIZA DE SANCHEZ
10	MVJA_0899	CL 63B SUR 18L 61	
11	MVJA_0970	CL 63D SUR 18L 02	DORIS CUESTA DE RODRIGUEZ
12	MVJA_2756	KR 18M 63D 08 SUR	ESTHER AROCA YARA
13	MVJA_2469	KR 18K BIS 63D 19 SUR	CARMEN LIBIA GÓMEZ DE CASTAÑEDA
14	MVJA_2342	KR 18J BIS 63D 25 SUR	MARIA DOLORES CASTILLO DE SANCHEZ
15	MVJA_2343	KR 18J BIS 63D 25 SUR	ERNESTO VERGARA NIETO
16	MVJA_1096	CL 64 SUR 18J 46	GONZALO OÑATE BONILLA
ALTOS DE JALISCO			
17	MVJA_2741	KR 18M 62ª 44 SUR	CARLOS ALBERTO MUÑETON FRANCO
18	MVJA_2729	KR 18M 62ª 07 SUR	
19	MVJA_0544	CL 62ª SUR 18M 09	MERCEDES RIAÑO PARRA
20	MVJA_0567	CL 62ª SUR 18M 41 IN 9	MARIA DEL ROSARIO RODRIGUEZ
21	MVJA_3309	KR 18P BIS B 61D 25 SUR	TEOFILO MORALES TURGA Y OTRA
22	MVJA_3366	KR 18Q 61C 34 SUR	EDILMA ALCIRA CASTILLO
23	MVJA_4350	TV 18Q BIS C 61B 87 SUR	MARÍA BENDITA REDONDO CASTIBLANCO
24	MVJA_2660	KR 18L BIS A 62ª 39 SUR	MANUEL EDUARDO RODRIGUEZ PRIETO
25	MVJA_4333	TV 18Q BIS C 61B 45 SUR	BEATRIZ CABRALES ACERO
26	MVJA_0890	CL 63B SUR 18K 56	HERNAN HUMBERTO PARRA CORREDOR DE RAMIREZ
LA ESCALA 3ER SECTOR			
27	MVJA_0530	CL 62ª SUR 18L 07	LUIS ALIRIO LÓPEZ DÍAZ

28	MVJA_4375	TV 18R 61B 41 SUR	FERNANDO TORRES Y OTRA
29	MVJA_3081	KR 18N BIS A 63 26 SUR	JOSE UNILCIO CIFUENTES QUINTERO Y OTRA
30	MVJA_3086	KR 18N BIS A 63C 23 SUR	LUIS ALFREDO CARPINTERO Y OTRA
31	MVJA_3168	KR 18P 63B 16 SUR	OLIVIA BOLAÑOS
32	MVJA_2395	KR 18K 64A 22 SUR	DELIO MARTINEZ GAMBA
33	MVJA_0922	CL 63C SUR 18P 22	FRANCISCO PIAMBA ANACONA
ACACIAS SUR			
34	MVJA_3670	KR 18Z 62 30 SUR	CRISTOBAL PITA CAMARGO
35	MVJA_0439	CL 62 SUR 18Z 04	GAVI ROZO RODRIGUEZ
LA ESPERANZA			
36	MVJA_3607	KR 18T 62A 21 SUR	LUIS ENRIQUE JIMENEZ VEGA
CIUDAD MILAGRO			
37	MVJA_0286	CL 62 BIS SUR 18J 12	HASBLEIDY GINA ROJAS ESCOBAR
38	MVJA_0235	CL 61D SUR 18K 58	LUZ NELLY RODRIGUEZ
39	MVCB_1608	CL 62 BIS SUR 18K 55	VICTOR MANUEL URREA ACOSTA
SAN LUIS			
40	MVJA_2051	DG 64A SUR 18V 14	FABIO VELASQUEZ CABALLERO
41	MVJA_1776	DG 64 BIS SUR 18V-15	UVA ESTHER BAQUERO DE GIL
SAN FERNANDO			
42	MVJA_2139	DG 64B SUR 19 76	MARIA ELIUD ORTEGON DE ALARCON
43	MVJA_2119	DG 64B SUR 19 36	MARIA CONCEPCION RIAÑO
LAS DELICIAS DEL SUR ZONA 19			
44	MVJA_1386	CL 65 SUR 18N 73	CRISTOBAL SUA ALBARRACÍN
LUCERO MEDIO			
45	MVJA_2324	KR 18J 64F 39 SUR	ARMANDO QUIROGA BARRIGA Y OTRA
46	MVJA_2617	KR 18L BIS 64F 07 SUR	QUINTILIANO CASTILLO DOMÍNGUEZ Y OTRA
47	MVJA_2628	KR 18L BIS 64F 47 SUR	MARIA ALICIA MAHECHA POVEDA
48	MVJA_2418	KR 18K 65A 15 SUR	BERTILDA URREGO
49	MVJA_2414	KR 18K 64F 29 SUR	MARIA ELENA RINCON RINCON
USMINIA - ANTONIO JOSE DE SUCRE I SECTOR			
50	MV_18353	CL 109 SUR 9 64	LUZ DAMARIS CASTRO PULGARIN
51	MV_18951	CL 104A SUR 6 37 MJ	LUIS ANTONIO RINCON
52	MV_19285	CL 108 SUR 3A 36	JAIRO ANTONIO ESPINOSA
53	MV_21820	CL 106 B SUR 4 11	JUAN EUDES OREJUELA GARZON
USMINIA - LORENZO ALCANTUZ			
54	MV_17421	CL 102 SUR 5 49	OLGA BARRETO

ING. CRITIAN VELASCO			
No.	**ID_DMV**	**Dirección**	**Nombres y apellidos**
ALTOS DE JALISCO			
1	MVJA_2992	KR 18N BIS 61C 21 SUR	ISAURA AREVALO MALAGON
2	MVJA_3141	KR 18P 62 A 30 SUR MJ	GLORIA CRISTINA GUTIERREZ GARZON
3	MVJA_3146	KR 18P 62A 45 SUR MJ	CLARA INES GIL BAEZ
4	MVJA_3335	KR 18P BIS B 62A 48 SUR MJ	MYRIAM PATRICIA SARMIENTO APONTE
5	MVJA_3314	KR 18P BIS B 61D 36 SUR	MARIA OLMA MOLANO ROMERO
6	MVJA_3239	KR 18P BIS A 61C 22 SUR MJ	NATIVIDAD SILDANA CELYS VIUDA DE GARCIA
7	MVJA_0259	CL 70H SUR 18L 16	ALBA CARMEN ARDILA MATEUS
8	MVJA_3223	KR 18P BIS A 61A 55 SUR	MYRIAM AMPARO GÓMEZ DE GALVIS
9	MVJA_3231	KR 18P BIS A 61B 12 SUR MJ	SOFIA MORENO

INPLAYCO S.A.S.
INGENIEROS CONSTRUCTORES E INTERVENTORES

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE HÁBITAT

10	MVJA_3119	KR 18P 61A 67 SUR MJ	LUZ YANID PADUA
11	MVJA_3125	KR 18P 61 A 76 SUR MJ	MARIA AURORA RENGIFO
12	MVJA_0252	CL 61D SUR 18N 30 MJ	JESUS ANTONIO ORTIZ CASTRO
13	MVJA_2996	KR 18N BIS 61D 18 SUR	MARIA DEL SOCORRO CUPITRA CACAIS
14	MVJA_2712	KR 18M 62 29 SUR	JOSE ALIRIO ORTIZ CABRERA Y OTRA
15	MVJA_2707	KR 18M 62 12 SUR	ANA LUISA BERNAL PULIDO
16	MVJA_2640	KR 18L BIS A 61D 47 SUR	PAOLA ANDREA BARRERA PELAEZ
17	MVJA_2371	KR 18K 61B 02 SUR	ANA EDELMIRA ATARA ESPITIA
18	MVJA_2976	KR 18N BIS 61A 53 SUR	BLANCA LEONOR RIOS CHAPARRO
MIRADOR NUTIVARA			
19	MVCB_1774	CL 70J SUR 18N 23	JOSE WILSON MARULANDA GIRALDO
20	MVCB_1742	CL 70J SUR 18N 34	ANA ELVIA MENDOZA DE HERNANDEZ
21	MVCB_1661	CL 70H SUR 18N 46 MJ	MARICIELO ARIAS CERQUERA
22	MVCB_1698	CL 70I SUR 18P 22	LUZ AMALFI GUTIERREZ FRANCO
23	MVCB_1708	TV 18R 70H 57 SUR	MARIA EUGENIA TRUJILLO QUIMBAYO
ROCIO ALTOS DEL SUR			
24	MVJA_2981	DG 69A BIS D SUR 18M 06	LEONOR TOVAR BARRERO
25	MVJA_2812	KR 18M BIS 61C 29 SUR	ANDREA JENNIFFER ACOSTA MENDIVELSO
27	MVJA_2909	KR 18N 61C 27 SUR	BLANCA CECILIA ALFONSO BOHORQUEZ
28	MVJA_0186	CL 61C SUR 18N 03	ISABEL ARDILA VARGAS
LA ESCALA			
29	MVJA_2672	KR 18M 61 15 SUR MJ	CARLOS OLIMPO SEGURA GUERRERO
ACACIAS SUR			
30	MVJA_0598	CL 62A SUR 18R 15	RODULFO BEJARANO
BARRIO GIBRALTAR I Y II			
31	MVJA_0834	CL 63A SUR 18Q 05	CLARA INES OCHOA GUTIERREZ
32	MVJA_3011	KR 18N BIS 63 27 SUR	RITA DEL CARMEN FONSECA CAMARGO
33	MVJA_3157	KR 18P 63 16 SUR	IRIA ESTHER SILVA
34	MVJA_3397	KR 18Q 63D 10 SUR	LUZ MARINA ROBAYO ALVARADO
LA ESCALA 3ER SECTOR			
35	MVJA_0502	CL 62A SUR 18J 20	ROSALBA JARA DE ROJAS
36	MVJA_0519	CL 62A SUR 18K 20	NESTOR JAVIER VALENZUELA PEÑA
CIUDAD MILAGRO			
37	MVJA_0395	CL 62 SUR 18K 78	JOSE ORVEY ORTIZ
VILLAS DEL DIAMANTE			
38	MVCB_5474	CL 70F SUR 19F 18 MJ	OLIVIA RIVERA
39	MVCB_5395	CL 70B SUR 18R 29	MARÍA CRISTINA GONZALEZ GARCÍA
40	MVCB_5388	CL 70C SUR 18R 48	DUBERNEY ARIAS BETANCUR
ARBORIZADORA ALTA			
41	MV_15742	KR 38 75 54 SUR	DONELIA PATIÑO MURILLO
JERUSALEN			
42	MV_17151	KR 38 79A 38 SUR	GUSTAVO VILLAREAL BERMUDEZ
EL MIRADOR			
43	MV_05324	CL 71C SUR 27B 15	ALDEMAR DUARTE LOPEZ
VILLA ISRAEL			
44	MVUS_0036	KR 5A BIS 110 34 SUR	EMPERATRIZ RODRIGUEZ LOPEZ
VILLA ANITA SUR			
45	MV_21059	KR 8 115B 11 SUR	ALEXANDER BERNAL AVENDAÑO
EL ESPINO			
46	MVUS_0230	CL 115B SUR 3B 11	JORGE GABRIEL BUITRAGO INFANTE
EL VIRREY			
47	MV_20306	KR 4A 97 15 SUR	JUAN FRANCISCO MEDINA SALAZAR
SAN LUIS			
48	MVJA_1876	DG 64 BIS A SUR 18V 15	JOSE OMAR CAMACHO TELLEZ
LAS DELICIAS DEL SUR			
49	MVJA_3257	KR 18P BIS A 65 10 SUR MJ	NELLY PIZA BUITRAGO

INPLAYCO S.A.S.
INGENIEROS CONSTRUCTORES E INTERVENTORES

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE HÁBITAT

SEMANA 13	OBSERVACION	PQR	
		SI	NO
NUEVA COLOMBIA			X
JUAN PABLO II	MVCB_4917	X	
MIRADOR NUTIVARA			X
DESARROLLO NUEVA COLOMBIA			X
URBANIIZACION COMPARTIR			X
EL BRILLANTE			X
LA COLMENA II SECTOR (CIUDAD BOLIVAR)			X
SANTA INES (BOSA LA LIBERTAD)			X
NUEVO SAN LUIS	MVUS_0795	X	
DOMINGO LAIN II SECTOR Y CONDOMINIO DEL BOSQUE			X
DOMINGO LAIN I			X
ALTOS DE JALISCO	**MVJA_3146**		X
LA ESCALA 3ER SECTOR			X
GIBRALTAR I Y II			X
ROCIO ALTOS DEL SUR			X
LA ESCALA			X
ACACIAS SUR			X
VILLAS DEL DIAMANTE			X
VILLA ISRAEL			X
EL ESPINO			X
JERUSALEN			X
EL MIRADOR			X
CIUDAD MILAGRO			X

RESULTADOS- OBSERVACIÓN	
MVJA_3146 **KR 18P 62A 45 SUR MJ** CLARA INES GIL BAEZ	La beneficiaria manifiesta inconformidad por el atraso de obras, además que las actividades iniciales son diferentes a las actuales. Se recomienda al beneficiario ar celeridad a la obra y socializar nuevo presupuesto.

INPLAYCO S.A.S.
INGENIEROS CONSTRUCTORES E INTERVENTORES


ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARIA DE HÁBITAT

PQR - A la fecha se recibió 1 PQR



RENUNCIAS				
MV	**NOMBRE**	**FECHA**	**DESARROLLO**	**OBSERVACIONES**
MVCB_2993	CARLOS JULIO CARDENAS TRIANA Y OTRO	NOVIEMBRE 18	JUAN PABLO II	Por motivos de salud tiene planeado trasladarse de ciudad
MVCB_1314	MARTHA LUCIA OSPINA PEÑA	ENERO 15	NUEVA COLOMBIA	Pleito juridico familiar
MVCB_1119	GERARDO FONSECA ARIAS	ENERO 27	DOMINGO LAIN II SECTOR Y CONDOMINIO DEL BOSQUE	Se trasladó de ciudad y envía renuncia por Whatsapp

Avance de Validaciones.

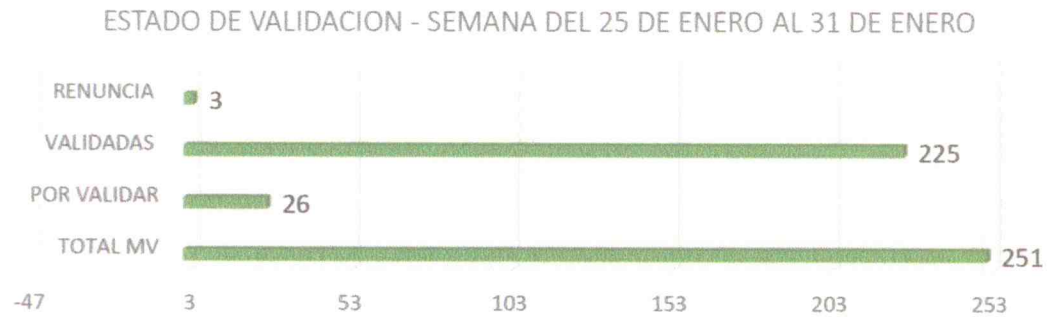




INPLAYCO S.A.S.
INGENIEROS CONSTRUCTORES E INTERVENTORES

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE HÁBITAT

Para la semana 13 el Consorcio Mejoramiento EP 2020, se encuentra en periodo de Validación y continúa ejecutando las adecuaciones de las viviendas.

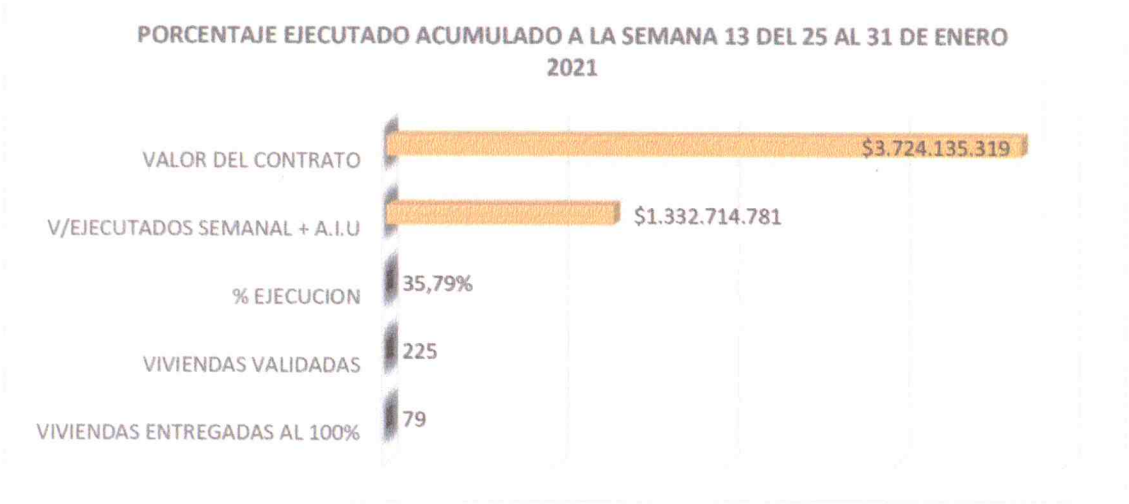



RENUNCIAS A LA FECHA


MVCB 2993 CARLOS JULIO CARDENAS 28 DE NOVIEMBRE

MVCV 1314 MARTHA LUCIA OSPINO PEÑA 15 DE ENERO

MVCB_1119 GERARDO FONSECA ARIAS ENERO 27

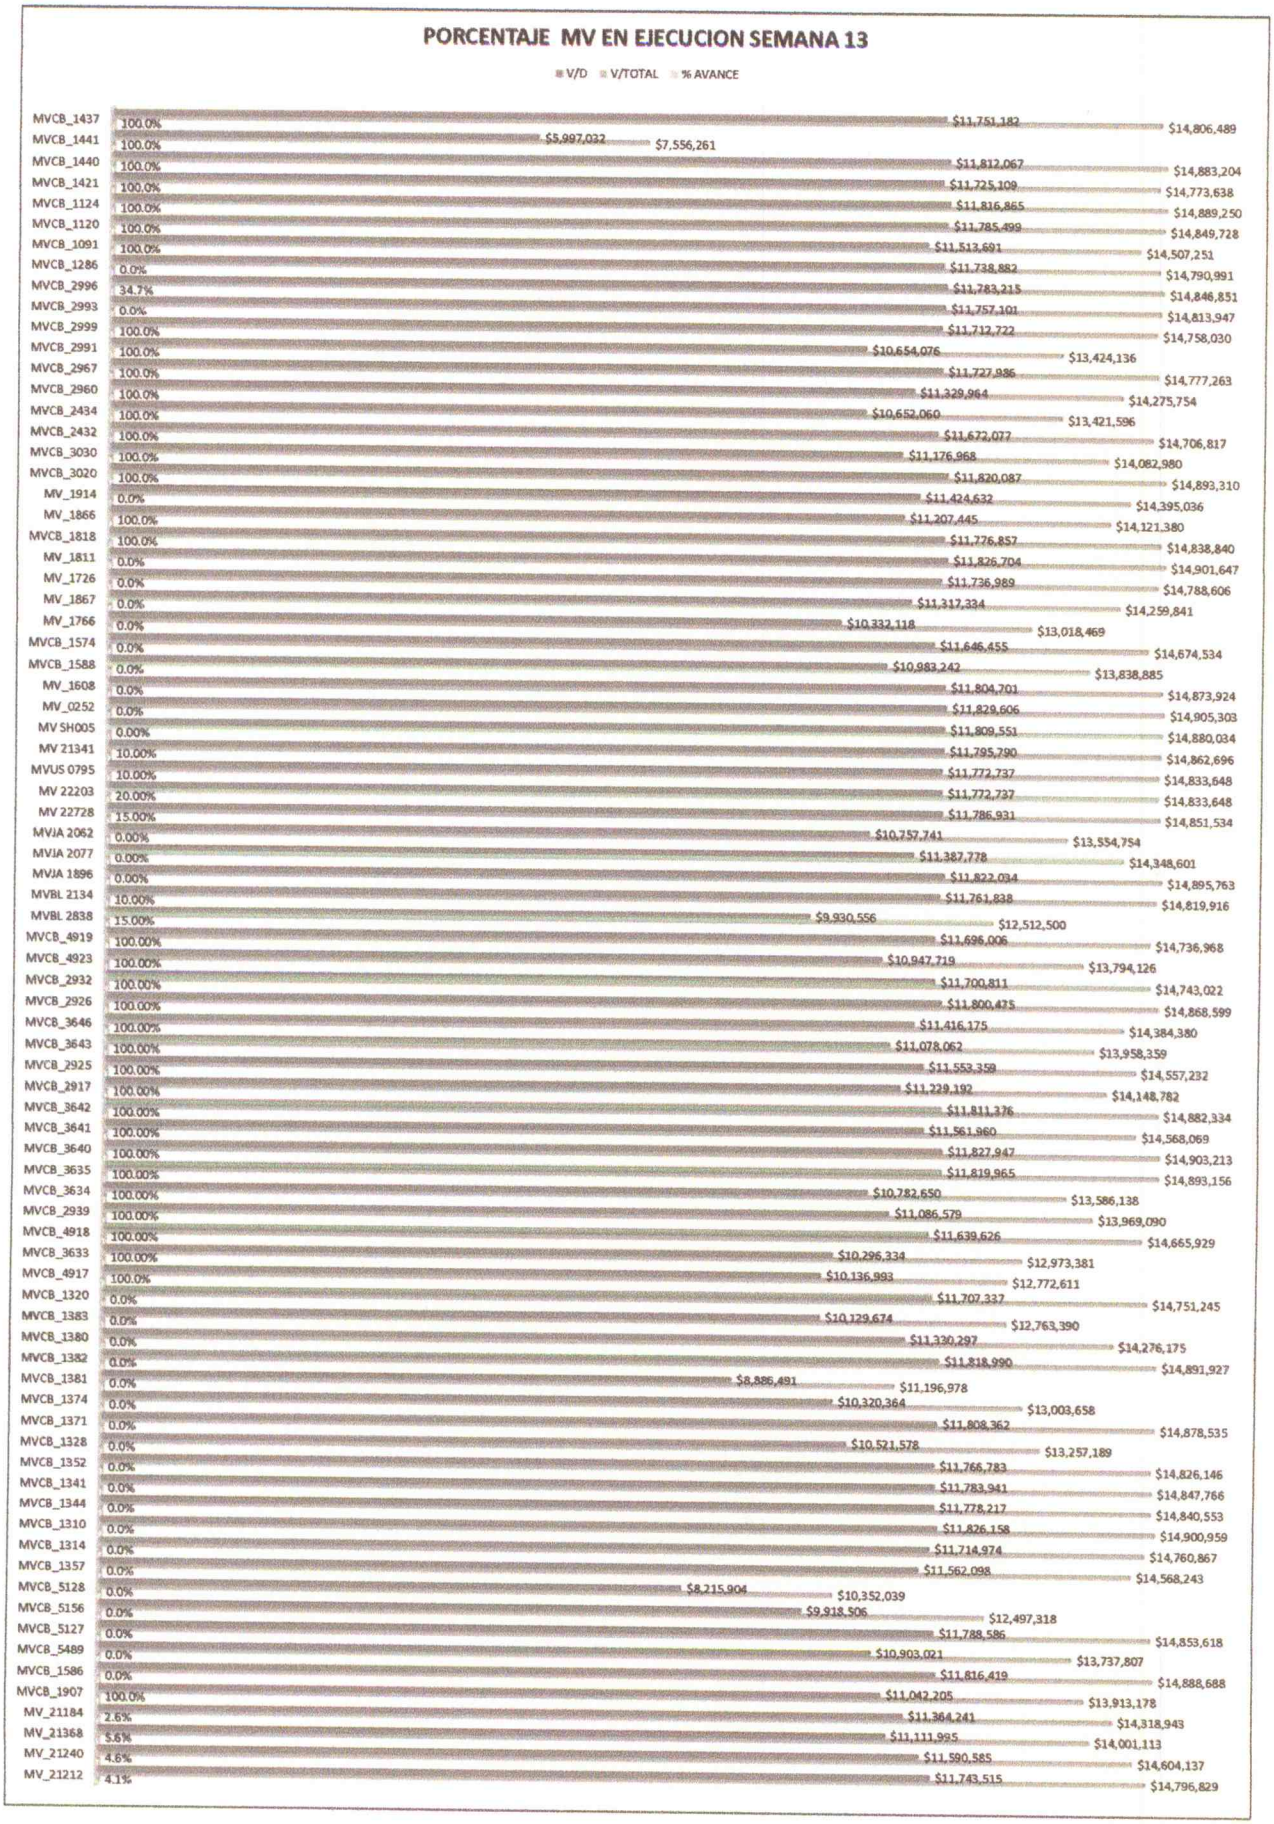
PORCENTAJE MV EN EJECUCION SEMANA 13
V/D
V/TOTAL
% AVANCE
MVCB_1437 100.0% $11,751,182 $14,806,489
MVCB_1441 100.0% $5,997,032 $7,556,261
MVCB_1440 100.0% $11,812,067 $14,883,204
MVCB_1421 100.0% $11,725,109 $14,773,638
MVCB_1124 100.0% $11,816,865 $14,889,250
MVCB_1120 100.0% $11,785,499 $14,849,728
MVCB_1091 100.0% $11,513,691 $14,507,251
MVCB_1286 0.0% $11,738,882 $14,790,991
MVCB_2996 34.7% $11,783,215 $14,846,851
MVCB_2993 0.0% $11,757,101 $14,813,947
MVCB_2999 100.0% $11,712,722 $14,758,030
MVCB_2991 100.0% $10,654,076 $13,424,136
MVCB_2967 100.0% $11,727,986 $14,777,263
MVCB_2960 100.0% $11,329,964 $14,275,754
MVCB_2434 100.0% $10,652,060 $13,421,596
MVCB_2432 100.0% $11,672,077 $14,706,817
MVCB_3030 100.0% $11,176,968 $14,082,980
MVCB_3020 100.0% $11,820,087 $14,893,310
MV_1914 0.0% $11,424,632 $14,395,036
MV_1866 100.0% $11,207,445 $14,121,380
MVCB_1818 100.0% $11,776,857 $14,838,840
MV_1811 0.0% $11,826,704 $14,901,647
MV_1726 0.0% $11,736,989 $14,788,606
MV_1867 0.0% $11,317,334 $14,259,841
MV_1766 0.0% $10,332,118 $13,018,469
MVCB_1574 0.0% $11,646,455 $14,674,534
MVCB_1588 0.0% $10,983,242 $13,838,885
MV_1608 0.0% $11,804,701 $14,873,924
MV_0252 0.0% $11,829,606 $14,905,303
MV SH005 0.00% $11,809,551 $14,880,034
MV 21341 10.00% $11,795,790 $14,862,696
MVUS 0795 10.00% $11,772,737 $14,833,648
MV 22203 20.00% $11,772,737 $14,833,648
MV 22728 15.00% $11,786,931 $14,851,534
MVJA 2062 0.00% $10,757,741 $13,554,754
MVJA 2077 0.00% $11,387,778 $14,348,601
MVJA 1896 0.00% $11,822,034 $14,895,763
MVBL 2134 10.00% $11,761,838 $14,819,916
MVBL 2838 15.00% $9,930,556 $12,512,500
MVCB_4919 100.00% $11,696,006 $14,736,968
MVCB_4923 100.00% $10,947,719 $13,794,126
MVCB_2932 100.00% $11,700,811 $14,743,022
MVCB_2926 100.00% $11,800,475 $14,868,599
MVCB_3646 100.00% $11,416,175 $14,384,380
MVCB_3643 100.00% $11,078,062 $13,958,359
MVCB_2925 100.00% $11,553,359 $14,557,232
MVCB_2917 100.00% $11,229,192 $14,148,782
MVCB_3642 100.00% $11,811,376 $14,882,334
MVCB_3641 100.00% $11,561,960 $14,568,069
MVCB_3640 100.00% $11,827,947 $14,903,213
MVCB_3635 100.00% $11,819,965 $14,893,156
MVCB_3634 100.00% $10,782,650 $13,586,138
MVCB_2939 100.00% $11,086,579 $13,969,090
MVCB_4918 100.00% $11,639,626 $14,665,929
MVCB_3633 100.00% $10,296,334 $12,973,381
MVCB_4917 100.0% $10,136,993 $12,772,611
MVCB_1320 0.0% $11,707,337 $14,751,245
MVCB_1383 0.0% $10,129,674 $12,763,390
MVCB_1380 0.0% $11,330,297 $14,276,175
MVCB_1382 0.0% $11,818,990 $14,891,927
MVCB_1381 0.0% $8,886,491 $11,196,978
MVCB_1374 0.0% $10,320,364 $13,003,658
MVCB_1371 0.0% $11,808,362 $14,878,535
MVCB_1328 0.0% $10,521,578 $13,257,189
MVCB_1352 0.0% $11,766,783 $14,826,146
MVCB_1341 0.0% $11,783,941 $14,847,766
MVCB_1344 0.0% $11,778,217 $14,840,553
MVCB_1310 0.0% $11,826,158 $14,900,959
MVCB_1314 0.0% $11,714,974 $14,760,867
MVCB_1357 0.0% $11,562,098 $14,568,243
MVCB_5128 0.0% $8,215,904 $10,352,039
MVCB_5156 0.0% $9,918,506 $12,497,318
MVCB_5127 0.0% $11,788,586 $14,853,618
MVCB_5489 0.0% $10,903,021 $13,737,807
MVCB_1586 0.0% $11,816,419 $14,888,688
MVCB_1907 100.0% $11,042,205 $13,913,178
MV_21184 2.6% $11,364,241 $14,318,943
MV_21368 5.6% $11,111,995 $14,001,113
MV_21240 4.6% $11,590,585 $14,604,137
MV_21212 4.1% $11,743,515 $14,796,829

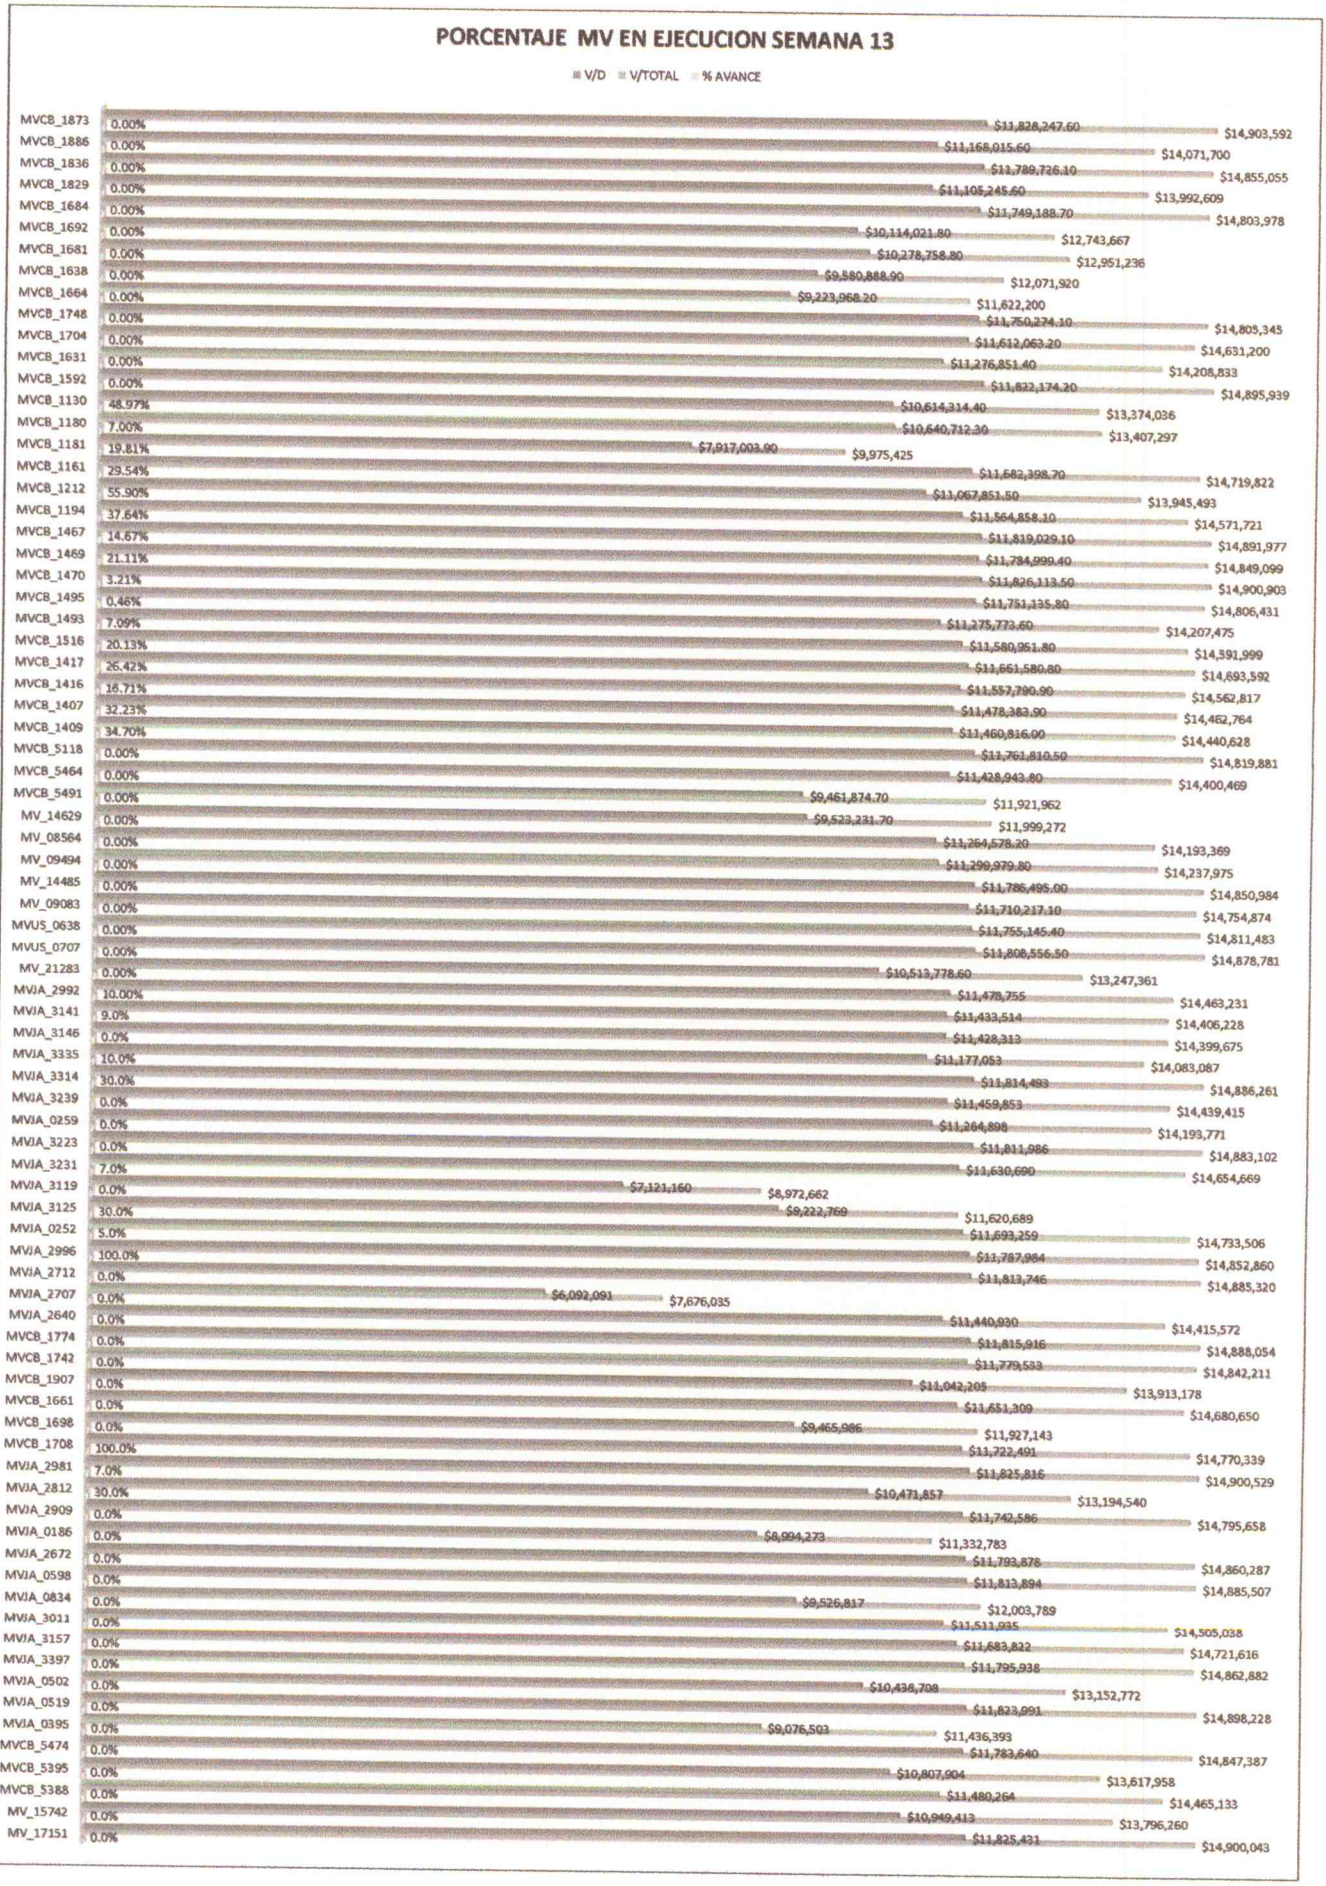
PORCENTAJE MV EN EJECUCION SEMANA 13
V/D
V/TOTAL
% AVANCE
MVCB_1873 0.00% $11,828,247.60 $14,903,592
MVCB_1886 0.00% $11,168,015.60 $14,071,700
MVCB_1836 0.00% $11,789,726.10 $14,855,055
MVCB_1829 0.00% $11,105,245.60 $13,992,609
MVCB_1684 0.00% $11,749,188.70 $14,803,978
MVCB_1692 0.00% $10,114,021.80 $12,743,667
MVCB_1681 0.00% $10,278,758.80 $12,951,236
MVCB_1638 0.00% $9,580,888.90 $12,071,920
MVCB_1664 0.00% $9,223,968.20 $11,622,200
MVCB_1748 0.00% $11,750,274.10 $14,805,345
MVCB_1704 0.00% $11,612,063.20 $14,631,200
MVCB_1631 0.00% $11,276,851.40 $14,208,833
MVCB_1592 0.00% $11,822,174.20 $14,895,939
MVCB_1130 48.97% $10,614,314.40 $13,374,036
MVCB_1180 7.00% $10,640,712.30 $13,407,297
MVCB_1181 19.81% $7,917,003.90 $9,975,425
MVCB_1161 29.54% $11,682,398.70 $14,719,822
MVCB_1212 55.90% $11,067,851.50 $13,945,493
MVCB_1194 37.64% $11,564,858.10 $14,571,721
MVCB_1467 14.67% $11,819,029.10 $14,891,977
MVCB_1469 21.11% $11,784,999.40 $14,849,099
MVCB_1470 3.21% $11,826,113.50 $14,900,903
MVCB_1495 0.46% $11,751,135.80 $14,806,431
MVCB_1493 7.09% $11,275,773.60 $14,207,475
MVCB_1516 20.13% $11,580,951.80 $14,591,999
MVCB_1417 26.42% $11,661,580.80 $14,693,592
MVCB_1416 16.71% $11,557,790.90 $14,562,817
MVCB_1407 32.23% $11,478,383.90 $14,462,764
MVCB_1409 34.70% $11,460,816.00 $14,440,628
MVCB_5118 0.00% $11,761,810.50 $14,819,881
MVCB_5464 0.00% $11,428,943.80 $14,400,469
MVCB_5491 0.00% $9,461,874.70 $11,921,962
MV_14629 0.00% $9,523,231.70 $11,999,272
MV_08564 0.00% $11,264,578.20 $14,193,369
MV_09494 0.00% $11,299,979.80 $14,237,975
MV_14485 0.00% $11,786,495.00 $14,850,984
MV_09083 0.00% $11,710,217.10 $14,754,874
MVUS_0638 0.00% $11,755,145.40 $14,811,483
MVUS_0707 0.00% $11,808,556.50 $14,878,781
MV_21283 0.00% $10,513,778.60 $13,247,361
MVJA_2992 10.00% $11,478,755 $14,463,231
MVJA_3141 9.0% $11,433,514 $14,406,228
MVJA_3146 0.0% $11,428,313 $14,399,675
MVJA_3335 10.0% $11,177,053 $14,083,087
MVJA_3314 30.0% $11,814,493 $14,886,261
MVJA_3239 0.0% $11,459,853 $14,439,415
MVJA_0259 0.0% $11,264,898 $14,193,771
MVJA_3223 0.0% $11,811,986 $14,883,102
MVJA_3231 7.0% $11,630,690 $14,654,669
MVJA_3119 0.0% $7,121,160 $8,972,662
MVJA_3125 30.0% $9,222,769 $11,620,689
MVJA_0252 5.0% $11,693,259 $14,733,506
MVJA_2996 100.0% $11,787,984 $14,852,860
MVJA_2712 0.0% $11,813,746 $14,885,320
MVJA_2707 0.0% $6,092,091 $7,676,035
MVJA_2640 0.0% $11,440,930 $14,415,572
MVCB_1774 0.0% $11,815,916 $14,888,054
MVCB_1742 0.0% $11,779,533 $14,842,211
MVCB_1907 0.0% $11,042,205 $13,913,178
MVCB_1661 0.0% $11,651,309 $14,680,650
MVCB_1698 0.0% $9,465,986 $11,927,143
MVCB_1708 100.0% $11,722,491 $14,770,339
MVJA_2981 7.0% $11,825,816 $14,900,529
MVJA_2812 30.0% $10,471,857 $13,194,540
MVJA_2909 0.0% $11,742,586 $14,795,658
MVJA_0186 0.0% $8,994,273 $11,332,783
MVJA_2672 0.0% $11,793,878 $14,860,287
MVJA_0598 0.0% $11,813,894 $14,885,507
MVJA_0834 0.0% $9,526,817 $12,003,789
MVJA_3011 0.0% $11,511,935 $14,505,038
MVJA_3157 0.0% $11,683,822 $14,721,616
MVJA_3397 0.0% $11,795,938 $14,862,882
MVJA_0502 0.0% $10,436,708 $13,152,772
MVJA_0519 0.0% $11,823,991 $14,898,228
MVJA_0395 0.0% $9,076,503 $11,436,393
MVCB_5474 0.0% $11,783,640 $14,847,387
MVCB_5395 0.0% $10,807,904 $13,617,958
MVCB_5388 0.0% $11,480,264 $14,465,133
MV_15742 0.0% $10,949,413 $13,796,260
MV_17151 0.0% $11,825,431 $14,900,043

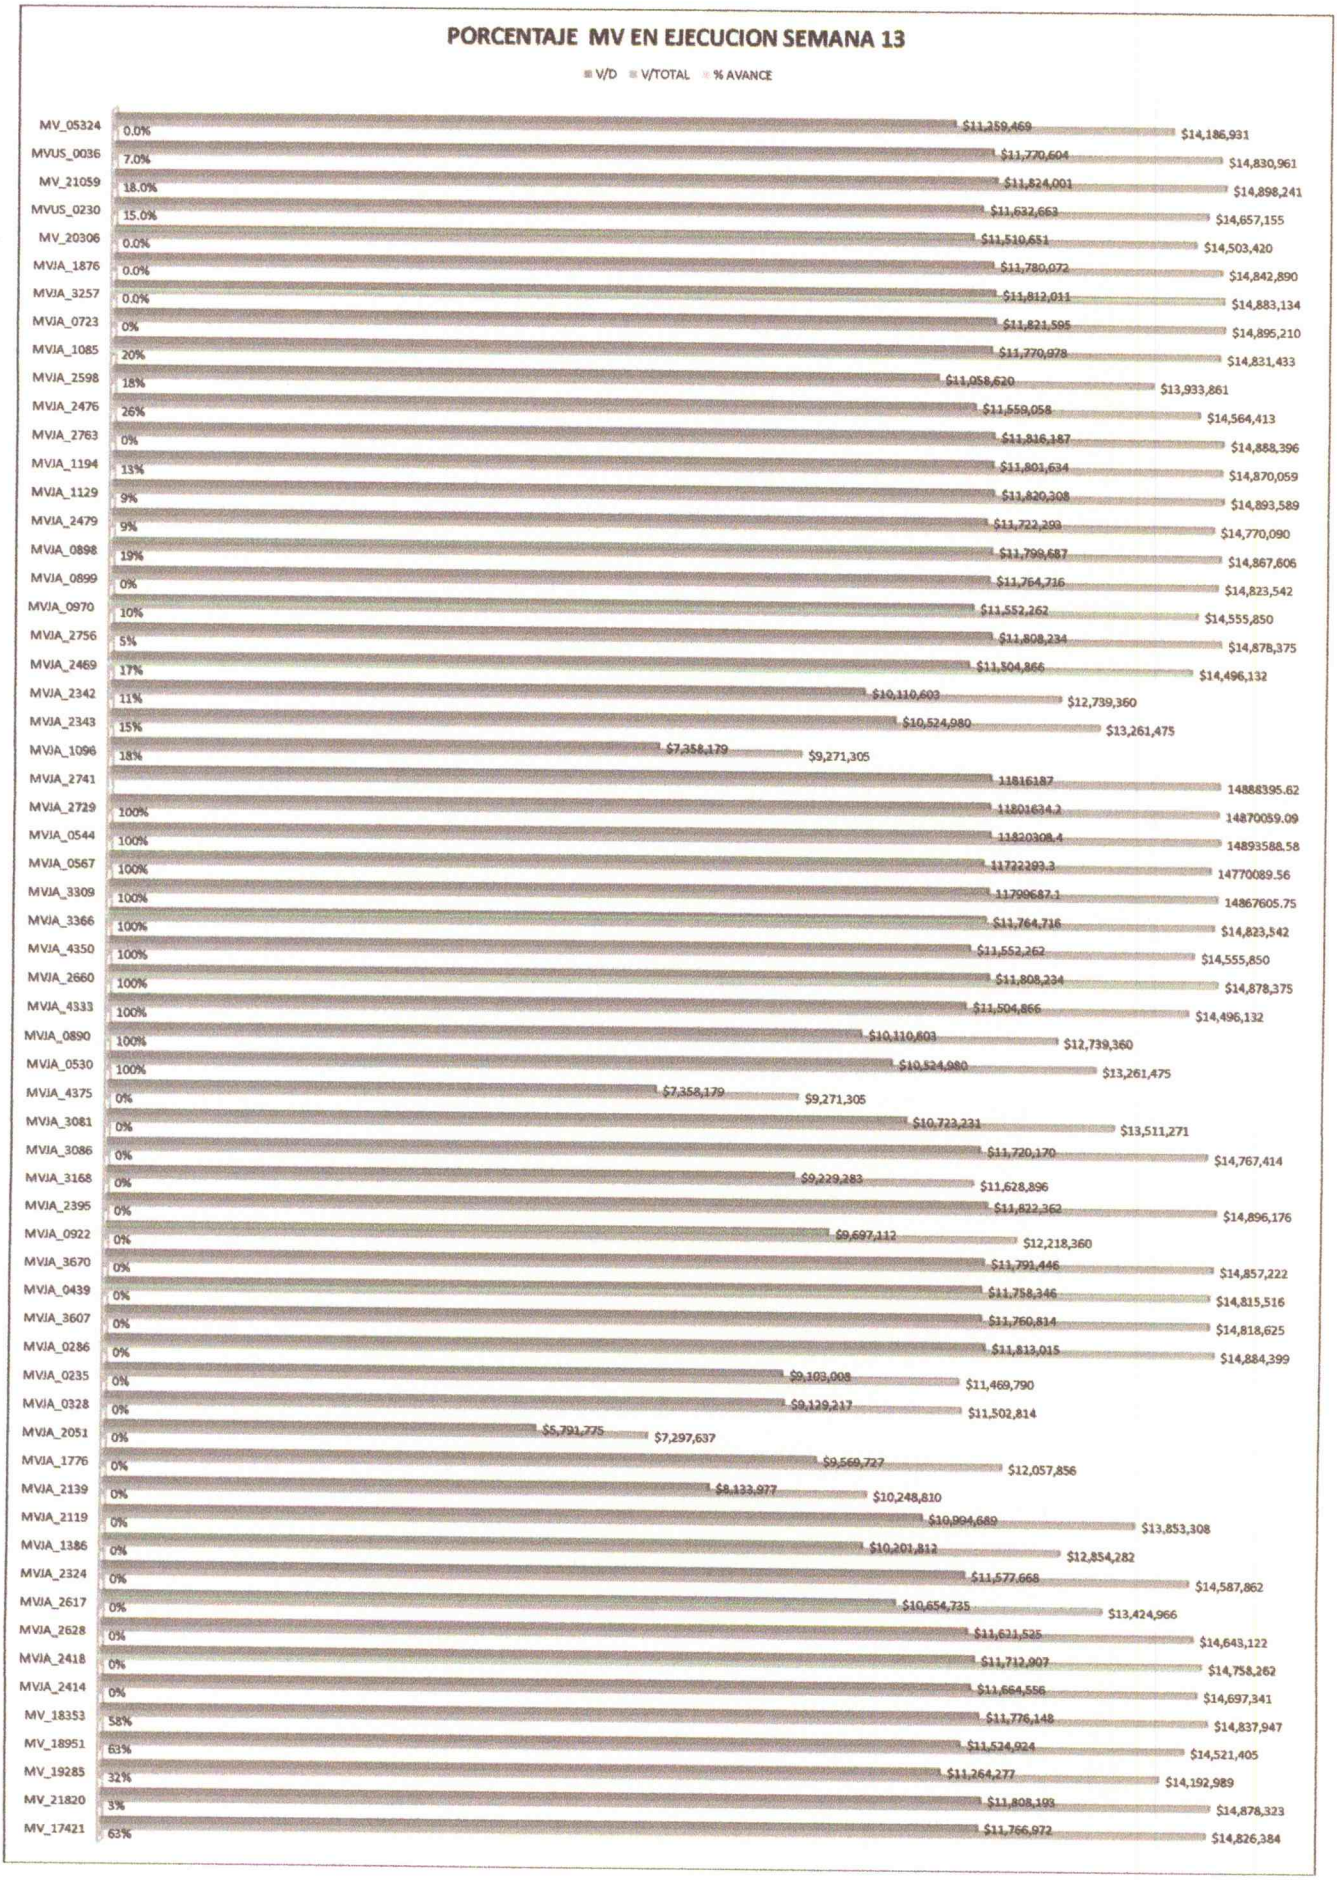
PORCENTAJE MV EN EJECUCION SEMANA 13
V/D
V/TOTAL
% AVANCE
MV_05324 0.0% $11,259,469 $14,186,931
MVUS_0036 7.0% $11,770,604 $14,830,961
MV_21059 18.0% $11,824,001 $14,898,241
MVUS_0230 15.0% $11,632,663 $14,657,155
MV_20306 0.0% $11,510,651 $14,503,420
MVJA_1876 0.0% $11,780,072 $14,842,890
MVJA_3257 0.0% $11,812,011 $14,883,134
MVJA_0723 0% $11,821,595 $14,895,210
MVJA_1085 20% $11,770,978 $14,831,433
MVJA_2598 18% $11,058,620 $13,933,861
MVJA_2476 26% $11,559,058 $14,564,413
MVJA_2763 0% $11,816,187 $14,888,396
MVJA_1194 13% $11,801,634 $14,870,059
MVJA_1129 9% $11,820,308 $14,893,589
MVJA_2479 9% $11,722,293 $14,770,090
MVJA_0898 19% $11,799,687 $14,867,606
MVJA_0899 0% $11,764,716 $14,823,542
MVJA_0970 10% $11,552,262 $14,555,850
MVJA_2756 5% $11,808,234 $14,878,375
MVJA_2469 17% $11,504,866 $14,496,132
MVJA_2342 11% $10,110,603 $12,739,360
MVJA_2343 15% $10,524,980 $13,261,475
MVJA_1096 18% $7,358,179 $9,271,305
MVJA_2741 11816187 14888395.62
MVJA_2729 100% 11801634.2 14870059.09
MVJA_0544 100% 11820308.4 14893588.58
MVJA_0567 100% 11722293.3 14770089.56
MVJA_3309 100% 11799687.1 14867605.75
MVJA_3366 100% $11,764,716 $14,823,542
MVJA_4350 100% $11,552,262 $14,555,850
MVJA_2660 100% $11,808,234 $14,878,375
MVJA_4333 100% $11,504,866 $14,496,132
MVJA_0890 100% $10,110,603 $12,739,360
MVJA_0530 100% $10,524,980 $13,261,475
MVJA_4375 0% $7,358,179 $9,271,305
MVJA_3081 0% $10,723,231 $13,511,271
MVJA_3086 0% $11,720,170 $14,767,414
MVJA_3168 0% $9,229,283 $11,628,896
MVJA_2395 0% $11,822,362 $14,896,176
MVJA_0922 0% $9,697,112 $12,218,360
MVJA_3670 0% $11,791,446 $14,857,222
MVJA_0439 0% $11,758,346 $14,815,516
MVJA_3607 0% $11,760,814 $14,818,625
MVJA_0286 0% $11,813,015 $14,884,399
MVJA_0235 0% $9,103,008 $11,469,790
MVJA_0328 0% $9,129,217 $11,502,814
MVJA_2051 0% $5,791,775 $7,297,637
MVJA_1776 0% $9,569,727 $12,057,856
MVJA_2139 0% $8,133,977 $10,248,810
MVJA_2119 0% $10,994,689 $13,853,308
MVJA_1386 0% $10,201,812 $12,854,282
MVJA_2324 0% $11,577,668 $14,587,862
MVJA_2617 0% $10,654,735 $13,424,966
MVJA_2628 0% $11,621,525 $14,643,122
MVJA_2418 0% $11,712,907 $14,758,262
MVJA_2414 0% $11,664,556 $14,697,341
MV_18353 58% $11,776,148 $14,837,947
MV_18951 63% $11,524,924 $14,521,405
MV_19285 32% $11,264,277 $14,192,989
MV_21820 3% $11,808,193 $14,878,323
MV_17421 63% $11,766,972 $14,826,384

INPLAYCO S.A.S.
INGENIEROS CONSTRUCTORES E INTERVENTORES

ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE HÁBITAT

INFORME TECNICO SEMANAL 13

Subsecretaria de Coordinacion Operativa
Subdireccion de Barrios
Seguimiento ejecución proyectos de Mejoramiento de Vivienda - Habitabilidad

Proyecto mejoramiento de vivienda - AVANCE EJECUCIÓN SEMANAL

Fecha: **31-ene-21**

Consorcio mejoramiento EP 2020 - Contratista de obra

Contratato de obra	694-2020			Plazo	Cinco (5) meses
Objeto	Contratar la ejecución de las obras de mejoramiento de vivienda en la modalidad de habitabilidad de los proyectos estructurados en los territorios priorizados por la Secretaria Distrital de Habitat. Grupo I			Acta de inicio	4 de noviembre de 2020
CDP No.	No. 914 del 14 de julio de 2020	CRP No.		Valor del contrato	TRES MIL SETECIENTOS VEINTICUATRO MILLONES CIENTO TREINTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS DIEZ Y NUEVE PESOS ($3.724.135.319) M/Cte

Gonzalo Llevano Hoyos -INPLAYCO S.A.S.

Contratato de Interventoría	701-2020			Plazo	Seis (6) meses
Objeto	Realizar la interventorias técnica, jurídica, social, administrativa y financiera, para la ejecución de las obras de mejoramiento de vivienda en la modalidad de habitablidad en los territorios priorizados por la secretaria distrital de hábitat.			Acta de inicio	04 de noviembre 2020
CDP No	No. 892 del 14 de julio de 2020	CRP No.		Valor del contrato	OCHOCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS M/CTE ($894.285.952),

Fase 1: Validación de la información entregada por el la SDHT									Fase 2: Ejecución de obras				
					Validación				Ejecución				
Territorio o barrio a intervenir	CIUDAD BOLIVAR - USME - BOSA	Barrios	Predios	Total Predios	Validada	V/Por Validar	Renuncia	V/Modificada	En Ejecución	Terminadas	Por Ejecutar	% de Avance	Acta de Entrega a Satisfacción
Arq o Ing. Responsable	ARQ. WILLIAM FDO GARZÓN	NUEVA COLOMBIA	7		7	0		0	0	7	0	2,58%	7
		JAUN PABLO II	10		10	0	1	0	0	9	0	3,49%	9
Técnico Responsable	ARQ. WILLIAM FDO GARZÓN	MIRADOR NUTIVARA	8		8	0		0	0	2	6	0,78%	2
		URBANIZACION COMPARTIR	1		1	0		0	0	0	1	0,00%	0
		VISTA HERMOSA	1		1	0		0	0	0	1	0,00%	0
		ANTONIO JOSE DE SUCRE III SECTOR (USMINIA)	1		1	0		0	1	0	0	0,04%	0
		NUEVO SAN LUIS (USMINIA)	1	36	1	0		0	1	0	0	0,00%	0
		EL BRILLANTE (USMINIA)	2		2	0		0	2	0	0	0,14%	0
		LA COLMENA III SECTOR (CIUDAD BOLIVAR)	3		3	0		0	0	0	3	0,00%	0
		SANTA INES (BOSA LA LIBERTAD)	1		1	0		0	0	0	1	0,00%	0
		SAN ANTONIO (BOSA LA LIBERTAD)	1		1	0		0	0	0	1	0,00%	0
Subtotal			36		36	0	1	0	4	18	13	7,03%	18

AVANCE DE EJECUCIÓN SEMANAL											ENERO				
Proyecto				FASE I			Tiempo Programacion				SEMANA DEL 28 AL 03	SEMANA DEL 04 AL 10	SEMANA DEL 11 AL 17	SEMANA DEL 18 AL 24	SEMANA DEL 25 AL 31
No.	ID_DMV	Dirección	Nombres y apellidos	V/ Validada	V/ Modificada	V/inicial	Fecha inicio	Fecha terminada	F. inicio		9 semana	10 semana	11 semana	12 semana	13 semana
	NUEVA COLOMBIA														
1	MVCB_1437	KR 18L 70H 09 SUR	FLOR ELISA PARRA ROJAS	SI / NO		$11.751.182	24/11/2020	21/12/2020	24/11/2020		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	100,0%
2	MVCB_1441	CL 70H SUR 18L 22	LUZMILA TORRES BERMUDEZ	SI / NO		$5.997.032	24/11/2020	15/12/2020	24/11/2020		0%	0%	0%	0%	100%
3	MVCB_1440	CL 70H SUR 18L 16	ALBA CARMEN ARDILA MATEUS	SI / NO		$11.812.067	24/11/2020	29/12/2020	24/11/2020		1,1%	0%	0%	0%	100%
4	MVCB_1421	CL 70I SUR 18L 54	MARIA ESTER ZORRO GUERRERO	SI / NO		$11.725.109	24/11/2020	14/12/2020	24/11/2020		0%	0%	0%	0%	100%
5	MVCB_1124	DG 69D SUR 18J 15	MARIA ANTONIA SANTOS CORREDOR DE RAMIREZ	SI / NO		$11.816.865	27/11/2020	23/12/2020	27/11/2020		0,0%	0%	0%	0%	100%
6	MVCB_1120	DG 69D SUR 18J 31	QUERUBIN CHAGUALA	SI / NO		$11.785.499	27/11/2020	29/12/2020	27/11/2020		7,1%	0%	0%	0%	100%
7	MVCB_1091	DG 69D BIS SUR 18J 32	LIGIA TEJADA DE BARRERO	SI / NO		$11.513.691	27/11/2020	29/12/2020	27/11/2020		4,9%	0%	0%	0%	100%

JUAN PABLO II															
8	MVCB_2996	DG 69A BIS B SUR 18M 23	MARIA TERESA ANTOLINEZ Y OTRO	SI / NO		$11.738.882	23/11/2020	21/12/2020	23/11/2020	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	100,0%
9	MVCB_2993	DG 69A BIS B SUR 18M 35	CARLOS JULIO CARDENAS TRIANA	SI / NO		$11.820.087	RENUNCIA	RENUNCIA	RENUNCIA					
10	MVCB_2999	DG 69A BIS B SUR 18M 15	MARIA LEONOR FRAILE SUAREZ	SI / NO		$11.783.215	23/11/2020	15/12/2020	23/11/2020	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	100,0%
11	MVCB_2991	DG 69A BIS B SUR 18M 43	BRISNELDA CONSTANZA MACIAS MARTINEZ	SI / NO		$11.757.101	23/11/2020	15/12/2020	23/11/2020	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	100,0%
12	MVCB_2987	DG 69A BIS D SUR 18M 36	MARIA OLGA FARFAN GALEON	SI / NO		$11.712.722	27/11/2020	21/12/2020	27/11/2020	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	100,0%
13	MVCB_2980	DG 69A BIS D SUR 18M 06	MARIA NURY QUINTERO CARDONA	SI / NO		$10.654.076	27/11/2020	17/12/2020	27/11/2020	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	100,0%
14	MVCB_2434	KR 18M BIS 69A 64 SUR	MARGARITA MARIA MORALES OROZCO	SI / NO		$11.727.986	30/11/2020	23/12/2020	30/11/2020	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	100,0%
15	MVCB_2432	KR 18M BIS 69A 72 SUR	AGUSTIN VILLANUEVA GUZMAN	SI / NO		$11.329.964	27/11/2020	30/12/2020	27/11/2020	15,7%	0,0%	0,0%	0,0%	100,0%
16	MVCB_3030	KR 18M BIS 69A 81 SUR	TEODOSIA GALICIA DE GARCIA	SI / NO		$10.652.960	26/11/2020	15/12/2020	26/11/2020	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	100,0%
17	MVCB_3020	KR 18M BIS A 69A 79 SUR	PEDRO PABLO IBAÑEZ	SI / NO		$11.672.077	27/11/2020	23/12/2020	27/11/2020	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	100,0%
MIRADOR NUTIVARA															
18	MV_1806	CL 79L SUR 18P 21	LUIS ALBERTO ALONSO CASTIBLANCO	SI / NO		$11.207.445	2/12/2020	21/12/2020	2/12/2020	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	100,0%
19	MV_1818	KR 18P 70K 03 SUR	MERQUECIDE MONTANEZ UYOA	SI / NO		$11.776.857	2/12/2020	26/12/2020	2/12/2020	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	100,0%
20	MV_1811	CL 70K SUR 18Q 99	ROSA ELVIRA GONZALEZ	SI / NO		$11.826.704	EN FASE DE VALIDACION	EN FASE DE VALIDACION	EN FASE DE VALIDACION	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
21	MV_1726	CL 70K SUR 18P 10	EMPERATRIZ ACOSTA MARTINEZ	SI / NO		$11.736.989	EN FASE DE VALIDACION	EN FASE DE VALIDACION	EN FASE DE VALIDACION	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
22	MV_1786	CL 70K SUR 18N 46	CARMEN QUIQUE MARTINEZ	SI / NO		$10.332.118	EN FASE DE VALIDACION	EN FASE DE VALIDACION	EN FASE DE VALIDACION	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
23	MV_1574	CL 70F SUR 18R 27	JOSE HIPOLITO GUTIERREZ LUCERO	SI / NO		$11.646.455	EN FASE DE VALIDACION	EN FASE DE VALIDACION	EN FASE DE VALIDACION	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
24	MV_1588	CL 70F SUR 18P 33	LUZ NELLY RODRIGUEZ	SI / NO		$10.983.242	EN FASE DE VALIDACION	EN FASE DE VALIDACION	EN FASE DE VALIDACION	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
25	MV_1808	KR 18P 70F 06 SUR	ROSALBINA HERNANDEZ PIRACHICAN	SI / NO		$11.804.701	EN FASE DE VALIDACION	EN FASE DE VALIDACION	EN FASE DE VALIDACION	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
URBANIZACION COMPARTIR															
26	MVCB_9252	TV 18P BIS 65D 04 SUR	JESUS ANTONIO BARRERA FANDIÑO	SI / NO		$11.829.606	EN FASE DE VALIDACION	EN FASE DE VALIDACION	EN FASE DE VALIDACION	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
VISTA HERMOSA															
27	MV SH005	TV 18I 71 35 SUR	MARIA CUSTODIA SANCHEZ SANCHEZ	SI / NO		$11.809.551	EN FASE DE VALIDACION	EN FASE DE VALIDACION	EN FASE DE VALIDACION	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
ANTONIO JOSE DE SUCRE III SECTOR (USMINIA)															
28	MV 21341	KR 7 116 15 SUR	ERMELINDA HERNANDEZ	SI / NO		$11.795.790	23/01/2021	EN EJECUCIÓN	23/01/2021	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	10,0%
NUEVO SAN LUIS (USMINIA)															
29	MVUS 0795	KR 5A 112A 24 SUR	AIDA MARIA RUEDA NIETO	SI / NO		$11.772.737	23/01/2021	EN EJECUCIÓN	23/01/2021	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	10,0%
EL BRILLANTE (USMINIA)															
30	MV 22203	KR 3 108F 06 SUR MJ	YENY ZURLEY LOPEZ ULLOA	SI / NO		$11.385.925	23/01/2021	EN EJECUCIÓN	23/01/2021	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	20,0%
31	MV 22728	DG 101A SUR 2B 37	ECCEHOMO RIVERA BONCANCIO	SI / NO		$11.786.931	23/01/2021	EN EJECUCIÓN	23/01/2021	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	15,0%
LA COLMENA III SECTOR (CIUDAD BOLIVAR)															
32	MVJA 2962	DG 64A SUR 19 26	MERCEDES WALTEROS JOANIAS	SI / NO		$10.757.741	EN FASE DE VALIDACION	EN FASE DE VALIDACION	EN FASE DE VALIDACION	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
33	MVJA 2977	DG 64A SUR 19 57	SOFIA PORRAS DE CAJAMARCA	SI / NO		$11.387.778	EN FASE DE VALIDACION	EN FASE DE VALIDACION	EN FASE DE VALIDACION	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
34	MVJA 1896	DG 64BIS A SUR 19A 19	HERNANDO TIQUE GUZMAN	SI / NO		$11.822.934	EN FASE DE VALIDACION	EN FASE DE VALIDACION	EN FASE DE VALIDACION	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
SANTA INES (BOSA LA LIBERTAD)															
35	MVBL 2134	KR 89A BIS 70 19 SUR CA 2	HERMELINA LOSADA CAICEDO	SI / NO		$11.761.838	EN FASE DE VALIDACION	EN FASE DE VALIDACION	EN FASE DE VALIDACION	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
SAN ANTONIO (BOSA LA LIBERTAD)															
36	MVBL 2838	KR 88J 69A 19 SUR CA 1	ALVARO BARRERA ARIZA	SI / NO		$9.930.556	EN FASE DE VALIDACION	EN FASE DE VALIDACION	EN FASE DE VALIDACION	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DEL HÁBITAT

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

PROYECTOS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA

INPLAYCO S.A.S.
INGENIEROS CONSTRUCTORES E INTERVENTORES

FECHA	31/01/2021	PERIODO No.	13	DEL	25/01/2021	AL	31/01/2021

1. INFORMACIÓN GENERAL

OBJETO DEL CONTRATO	Realizar la interventorías técnica, jurídica, social, administrativa y financiera, para la ejecución de las obras de mejoramiento de vivienda en la modalidad de habitabilidad en los territorios priorizados por la secretaría distrital de hábitat.
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO	Corresponde al Grupo 1 a la ejecución de 254 mejoramientos de vivienda, localizados en 3 localidades: Bosa, Usme y Ciudad Bolívar, esta última localidad incluye cuatro (4) Intervenciones de MejoramientoIntegral.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA		CONTRATO DE OBRA	
CONTRATO No.:	701-2020	CONTRATO No.:	694--2020
PLAZO INICIAL:	6 meses	PLAZO INICIAL:	5 meses
FECHA DE INICIACIÓN:	4 de noviembre de 2020	FECHA DE INICIACIÓN:	4 de noviembre de 2020
**FECHA DE SUSPENSIÓN:	0	**FECHA DE SUSPENSIÓN:	0
**FECHA DE REINICIACIÓN:	0	**FECHA DE REINICIACIÓN:	0
FECHA DE TERMINACIÓN:	3 de mayo de 2021	FECHA DE TERMINACIÓN:	3 de abril 2021
PLAZO ACTUALIZADO:	0	PLAZO ACTUALIZADO:	0
PLAZO TRANSCURRIDO:	0	PLAZO TRANSCURRIDO:	0
VALOR INICIAL :	$ 894,285,952	VALOR INICIAL :	$ 3,724,135,319
VALOR ADICION(ES):	0	VALOR ADICION(ES):	$ -
VALOR ACTUALIZADO:	$ -	VALOR ACTUALIZADO:	$ -
VALOR ANTICIPO:	0	VALOR ANTICIPO:	$ -
VALOR POR PAGAR:	$ -	VALOR POR PAGAR:	$ -
SUPERVISOR:	JUAN CARLOS ARBELAEZ MURILLO	INTERVENTOR:	Gonzalo Llevano Hoyos -INPLAYCO S.A.S.

** Inserte las filas que requiera según el número de suspensiones y reinicios.

2. CONTROL DE HITOS.

No.	*** DESCRIPCIÓN DEL HITO	FECHA PROGRAMADA	FECHA REAL DE CUMPLIMIENTO	DÍAS DE RETRASO
	SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO (HITO OBLIGATORIO)			
1	Validación	4/11/2020	3/04/2021	
2	Entrega de informe de validación			
3	Ejecución			
	ENTREGA A LA INTERVENTORIA DE LOS PRODUCTOS Y/O ACTIVIDADES CONTRATADAS (HITO OBLIGATORIO)			


***** Inserte las filas que requiera según el número de hitos; teniendo en cuenta que como mínimo se deberán establecer 5 hitos adicionales a los obligatorios de inicio y terminación. Los hitos aprobados por la interventoría se socializarán con el supervisor del contrato para su Vo. Bo. Los Hitos aprobados por la interventoría y SDHT solo se podrán modificar previa novedad contractual que así lo requiera. La matriz del seguimiento hace parte del presente documento.**


No.	INDICADORES BARRIO O TERRITORIO	VALORES CD + AIU	PORCENTAJE SOBRE EL VALOR TOTAL DEL CONTRATO	DIFERENCIA (+) ADELANTO (-) ATRASO
1	Valor acumulado de las actividades o productos conforme a la programación vigente.	$270,746,228.34	7.27%	
2	Valor acumulado de las actividades o productos ejecutados y aprobados por la Interventoría.	$261,624,452.04	7.03%	

3. ASPECTOS GENERALES INFORME TÉCNICO

Registre los avances y novedades técnicas, sociales, administrativas, contables y financieras, acompañadas por gráficos, cuadros, fotografías, análisis y comentarios sobre el estado de los trabajos, en todos sus aspectos en la fase de validación y ejecución de obra.

CIUDAD BOLIVAR - USME

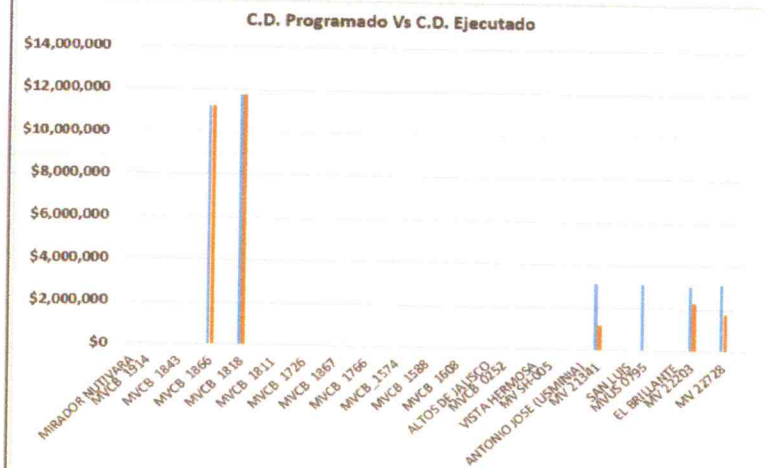

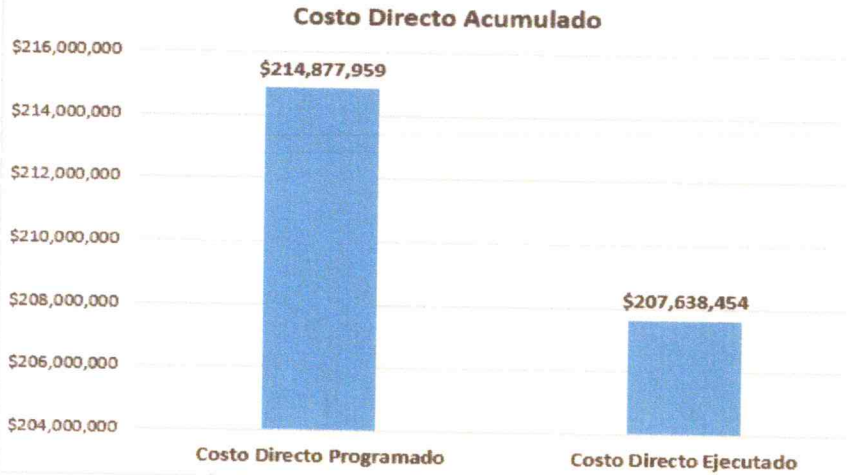

4- COMPONENTE TECNICO BARRIO O TERRITORIO			
ACTIVIDADES EJECUTADAS EN LA SEMANA. - ESTADO DE AVANCE SEMANAL POR VIVIENDA			
BARRIO O TERRITORIO - CIUDAD BOLIVAR- BARRIO NUEVA COLOMBIA			
FECHA: 31- ENERO -2021			
1	MVCB_1437	FLOR ELISA PARRA ROJAS	**Se recibe la vivienda con las actividades acordadas y terminadas a satisfacción, fecha de entrega 21 de diciembre 2020**
2	MVCB_1441	LUZMILA TORRES BERMUDEZ	**Se recibe la vivienda con las actividades acordadas y terminadas a satisfacción, fecha de entrega 15 de diciembre 2020**
3	MVCB_1440	ALBA CARMEN ARDILA MATEUS	**Se recibe la vivienda con las actividades acordadas y terminadas a satisfacción, fecha de entrega 29 de diciembre 2020**
4	MVCB_1421	MARIA ESTER ZORRO GUERRERO	**Se recibe la vivienda con las actividades acordadas y terminadas a satisfacción, fecha de entrega 15 de diciembre 2020**
5	MVCB_1124	MARIA ANTONIA SANTOS CORREDOR DE RAMIREZ	**Se recibe la vivienda con las actividades acordadas y terminadas a satisfacción, fecha de entrega 23 de diciembre 2020**
6	MVCB_1120	QUERUBIN CHAGUALA	**Se recibe la vivienda con las actividades acordadas y terminadas a satisfacción, fecha de entrega 29 de diciembre 2020**
7	MVCB_1091	LIGIA TEJADA DE BARRERO	**Se recibe la vivienda con las actividades acordadas y terminadas a satisfacción, fecha de entrega 29 de diciembre 2020**
BARRIO O TERRITORIO - CIUDAD BOLIVAR- JUAN PABLO II			
8	MVCB_2996	MARIA TERESA ANTOLINEZ Y OTRO	**Se recibe la vivienda con las actividades acordadas y terminadas a satisfacción, fecha de entrega 21 de diciembre 2020**
9	MVCB_2993	**CARLOS JULIO CARDENAS TRIANA**	**El beneficiario de la vivienda decide voluntariamente renunciar al beneficio, ya que la vivienda se encuentra en optimas condiciones de habitabilidad**
10	MVCB2999	MARIA LEONOR FRAILE SUAREZ	**Se recibe la vivienda con las actividades acordadas y terminadas a satisfacción, fecha de entrega 15 de diciembre 2020**
11	MVCB_2991	BRISNELDA CONSTANZA MACIAS MARTINEZ	**Se recibe la vivienda con las actividades acordadas y terminadas a satisfacción, fecha de entrega 15 de diciembre 2020**
12	MVCB_2967	MARIA OLGA FARFAN GALEON	**Se recibe la vivienda con las actividades acordadas y terminadas a satisfacción, fecha de entrega 21 de diciembre 2020**
13	MVCB_2960	MARIA NURY QUINTERO CARDONA	**Se recibe la vivienda con las actividades acordadas y terminadas a satisfacción, fecha de entrega 17 de diciembre 2020**
14	MVCB2434	MARGARITA MARIA MORALES OROZCO	**Se recibe la vivienda con las actividades acordadas y terminadas a satisfacción, fecha de entrega 23 de diciembre 2020**
15	MVCB_2432	AGUSTÍN VILLANUEVA GUZMÁN	**Se recibe la vivienda con las actividades acordadas y terminadas a satisfacción, fecha de entrega 30 de diciembre 2020**
16	MVCB_3030	TEODOSIA GALICIA DE GARCIA	**Se recibe la vivienda con las actividades acordadas y terminadas a satisfacción, fecha de entrega 15 de diciembre 2020**
17	MVCB_3020	PEDRO PABLO IBAÑEZ	**Se recibe la vivienda con las actividades acordadas y terminadas a satisfacción, fecha de entrega 23 de diciembre 2020**
BARRIO O TERRITORIO - CIUDAD BOLIVAR- MIRADOR NUTIVARA			
18	MV_1866	LUIS ALBERTO ALONSO CASTIBLANCO	**Se recibe la vivienda con las actividades acordadas y terminadas a satisfacción, fecha de entrega 21 de diciembre 2020**
19	MV_1818	MERQUECIDE MONTANEZ UYOA	**Se recibe la vivienda con las actividades acordadas y terminadas a satisfacción, fecha de entrega 20 de enero 2021**
20	MV_1811	ROSA ELVIRA GONZALEZ	Pendiente hacer apertura de vivienda para inicio de obras
21	MV_1726	EMPERATRIZ ACOSTA MARTINEZ	Pendiente hacer apertura de vivienda para inicio de obras
22	MV_1766	CARMEN QUIQUE MARTINEZ	Pendiente hacer apertura de vivienda para inicio de obras
23	MV_1574	JOSE HIPOLITO GUTIERREZ LUCERO	Se hace validación en la vivienda y registro fotográfico
24	MV_1588	LUZ NELLY RODRIGUEZ	Se hace validación en la vivienda y registro fotográfico
25	MV_1608	ROSALBINA HERNANDEZ PIRACHICAN	Se hace validación en la vivienda y registro fotográfico
BARRIO O TERRITORIO - CIUDAD BOLIVAR- URBANIZACIÓN COMPARTIR			
26	MVCB_0252	JESUS ANTONIO BARRERA FANDIÑO	Se hace validación en la vivienda y registro fotográfico
BARRIO O TERRITORIO - CIUDAD BOLIVAR- VISTA HERMOSA			
27	MV SH-005	MARIA CUSTODIA SANCHEZ SANCHEZ	Se hace validación en la vivienda y registro fotográfico

REGISTRO FOTOGRÁFICO



FECHA	viernes, 29 de enero de 2021
DESCRIPCION MV 21341	
Avance de obra	



FECHA	viernes, 29 de enero de 2021
DESCRIPCION MV 22203	
Avance de obra	



FECHA	viernes, 29 de enero de 2021
DESCRIPCION MV 22728	
Avance de obra	

FECHA	

Subsecretaria de Coordinacion Operativa
Subdireccion de Barrios
Seguimiento ejecución proyectos de Mejoramiento de Vivienda - Habitabilidad

Proyecto mejoramiento de vivienda - AVANCE EJECUCIÓN SEMANAL

Fecha: **31-ene-21**

Consorcio mejoramiento EP 2020 - Contratista de obra

Contratato de obra	694-2020			Plazo	Cinco (5) meses
Objeto	Contratar la ejecución de las obras de mejoramiento de vivienda en la modalidad de habitabilidad de los proyectos estructurados en los territorios priorizados por la Secretaria Distrital de Habitat. Grupo I			Acta de inicio	4 de noviembre de 2020
CDP No.	No. 914 del 14 de julio de 2020	CRP No.		Valor del contrato	TRES MIL SETECIENTOS VEINTICUATRO MILLONES CIENTO TREINTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS DIEZ Y NUEVE PESOS ($3.724.135.319) M/Cte

Gonzalo Lievano Hoyos -INPLAYCO S.A.S.

Contratato de interventoría	701-2020			Plazo	Seis (6) meses
Objeto	Realizar la interventorias técnica, jurídica, social, administrativa y financiera, para la ejecución de las obras de mejoramiento de vivienda en la modalidad de habitablidad en los territorios priorizados por la secretaría distrital de hábitat.			Acta de inicio	04 de noviembre 2020
CDP No	No. 892 del 14 de julio de 2020	CRP No.		Valor del contrato	OCHOCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS M/CTE ($894.285.952),

Fase 1: Validación de la información entregada por el la SDHT									Fase 2: Ejecución de obras				
					Validación				Ejecución				
Territorio o barrio a intervenir	JUAN PÁBLO II NUEVA COLOMBIA	Barrios	Predios	Total Predios	Validada	V/Por Validar	Renuncias	V/Modificada	En Ejecución	Terminadas	Por Ejecutar	% de Avance	Acta de Entrega a Satisfacción
Arq o Ing. Responsable	Arq.Leonardo Solano	JUAN PABLO II	17		17	0	0	0	0	17	0	6,50%	17
		NUEVA COLOMB.	14		13	0	1	0	13	0	0	2,88%	0
Técnico Responsable		VILLAS DIAMANTE	10		10	0	0	0	0	0	10	0,00%	0
		MIRADOR (NUTIVARA)	2		2	0	0	0	0	0	2	0,00%	0
		USMINIA	4		4	0	0		4	0	0	0,07%	0
Subtotal			47	47	46	0	1	0	17	17	12	9,45%	17

AVANCE DE EJECUCIÓN SEMANAL

				FASE I			Tiempo Programacion			ENERO				
										SEMANA DEL 4 AL 10	SEMANA DEL 11 AL 17	SEMANA DEL 18 AL 24	SEMANA DEL 25 AL 31	
No.	ID_DMV	Dirección	Nombres y apellidos	V/ Validada	V/ Modificada	V/Inicial	Fecha inicio	Fecha terminada	F. Inicio	10 semana	11 semana	12 semana	13 semana	
			JUAN PABLO II											
1	MVCB_4919	KR 18M BIS 68B 50 SUR MJ	URIEL PATIÑO RINCON	SI / NO		$11.696.006	17/11/2020	15/12/2020	3/12/2020	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%
2	MVCB_4923	KR 18M BIS 68B 26 SUR	SIERVO MATIAS FIGUEROA CHAPARRO	SI / NO		$10.947.719	17/11/2020	18/12/2020	23/11/2020	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%
3	MVCB_2932	TV 18N 69A 97 SUR	MARIA TERESA PIÑEROS PIÑEROS	SI / NO		$11.700.811	17/11/2020	21/12/2020	23/11/2020	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%
4	MVCB_2926	TV 18N 69A 71 SUR	CORADO TORO DE TORRES Y OTRO	SI / NO		$11.800.475	17/11/2020	21/12/2020	23/11/2020	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%
5	MVCB_3646	TV 18N BIS 69A 95 SUR	LUIS ANTONIO CABRERA LOPEZ Y OTRA	SI / NO		$11.416.175	2/12/2020	23/12/2020	24/11/2020	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%
6	MVCB_3643	TV 18N BIS 69A 83 SUR	JOSE ARISTOBULO MENJURA LEITON Y OTRA	SI / NO		$11.078.062	2/12/2020	21/12/2020	24/11/2020	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%
7	MVCB_2925	TV 18N 69A 67 SUR	MARTHA LUZ CAMPIÑO	SI / NO		$11.553.359	2/12/2020	30/12/2020	24/11/2020	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%
8	MVCB_2917	DG 69A BIS B SUR 18M 30	CLAUDIA PATRICIA VARGAS GÓMEZ	SI / NO		$11.229.192	18/11/2020	15/12/2020	24/11/2020	41,87%	33,30%	19,92%	100,00%	0,00%
9	MVCB_3642	TV 18N BIS 69A 77 SUR	JULIO CESAR FICHAS AVILA	SI / NO		$11.811.376	2/12/2020	30/12/2020	25/11/2020	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%
10	MVCB_3641	TV 18N BIS 69A 75 SUR	CECILIA MENDEZ MORENO	SI / NO		$11.561.960	2/12/2020	21/12/2020	25/11/2020	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%
11	MVCB_3640	TV 18N BIS 69A 71 SUR	OCTAVIO TELLEZ PINEDA	SI / NO		$11.827.947	3/12/2020	21/12/2020	25/11/2020	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%
12	MVCB_3635	TV 18N BIS 69A 51 SUR	JUAN CARLOS MAZO CASTRO Y OTRA	SI / NO		$11.819.965	3/12/2020	18/12/2020	25/11/2020	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%
13	MVCB_3634	TV 18N BIS 69A 47 SUR	AYDE NIÑO Y OTRO	SI / NO		$10.782.650	3/12/2020	18/12/2020	23/11/2020	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%
14	MVCB_2939	TV 18N BIS 69A 84 SUR	MARIEYE LOAISA	SI / NO		$11.086.579	4/12/2020	23/12/2020	30/11/2020	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%

15	MVCB_4918	KR 18M BIS 68B 56 SUR	ALVARO D[illegible]AVILA	SI NO		$11,639,626	4/12/2020	3/12/2020	23/11/2020	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	0.00%
16	MVCB_3633	TV 18N BIS 69A 43 SUR	FRANCISCO JAVIER MENDIVELSO GUERRERO	SI NO		$10,296,334	3/12/2020	30/12/2020	30/11/2020	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	0.00%
17	MVCB_4917	KR 18M BIS 68B 62 SUR	ALVARO ALONSO MORENO	SI NO		$10,136,993	4/12/2020	EN EJECUCION	3/12/2020	0.00%	0.00%	0.00%	10.00%	0.00%
			DESARROLLO NUEVA COLOMBIA											
18	MVCB_1320	CL 70K SUR 18L 65	ISMENIA BARRETO ARIAS	SI NO		$11,707,337	15/01/2021	EN EJECUCION	15/01/2021	0%	0%	11.02%	33.18%	0%
19	MVCB_1383	CL 70J SUR 18L 34	EDGAR FERNANDO CAMARCO ANGEL	SI NO		$10,129,674	11/01/2021	EN EJECUCION	11/01/2021	0%	0%	25.75%	32.19%	0%
20	MVCB_1380	CL 70J SUR 18L 22	ROSALBA MONTES DE CARDONA	SI NO		$11,330,297	11/01/2021	EN EJECUCION	11/01/2021	0%	0%	27.17%	48.75%	0%
21	MVCB_1382	CL 70J SUR 18L 30	MARIA CECILIA RINCON RINCON	SI NO		$11,818,990	11/01/2021	EN EJECUCION	11/01/2021	0%	0%	13.22%	20.84%	0%
22	MVCB_1381	CL 70J SUR 18L 26	NOHORA NOHEMI MAYORGA IBAGUE	SI NO		$8,886,491	11/01/2021	EN EJECUCION	11/01/2021	0%	0%	24.14%	71.94%	0%
23	MVCB_1374	CL 70J SUR 18L 11	OBED OSPINA RESTREPO	SI NO		$10,320,364	11/01/2021	EN EJECUCION	11/01/2021	0%	0%	21.33%	58.57%	0%
24	MVCB_1371	CL 70J SUR 18L 23	CONSUELO NAVARRO	SI NO		$11,808,362	11/01/2021	EN EJECUCION	11/01/2021	0%	0%	20.91%	53.80%	0%
25	MVCB_1328	CL 70K SUR 18L 29	EDILBERTO CARDENAS PAEZ	SI NO		$10,521,578	11/01/2021	EN EJECUCION	11/01/2021	0%	0%	18.60%	56.45%	0%
26	MVCB_1352	CL 70K SUR 18L 64	MARIA RAMOS ORTIZ	SI NO		$11,766,783	EN FASE DE VALIDACION	EN FASE DE VALIDACION	EN FASE DE VALIDACION	0%	0%	8.94%	31.29%	0%
27	MVCB_1341	CL 70K SUR 18L 20	JOSE GABRIEL HERRERA MEDINA	SI NO		$11,783,941	11/01/2021	EN EJECUCION	11/01/2021	0%	0%	17.92%	65.91%	0%
28	MVCB_1344	CL 70K SUR 18L 32	ALBEIRO RUIZ SANABRIA	SI NO		$11,778,217	15/01/2021	EN EJECUCION	15/01/2021	0%	0%	15.88%	47.68%	0%
29	MVCB_1310	CL 70L SUR 18L 70	DORA ALICIA LÓPEZ SANABRIA	SI NO		$11,826,158	15/01/2021	EN EJECUCION	15/01/2021	0%	0%	15.82%	11.63%	0%
30	MVCB_1314	KR 18M 70K 16 SUR	MARTHA LUCIA OSPINA PEÑA	SI NO		$11,714,974	RENUNCIA	RENUNCIA	RENUNCIA	RENUNCIA	RENUNCIA	RENUNCIA	RENUNCIA	RENUNCIA
31	MVCB_1357	KR 18M 70J 16 SUR	MARTHA LILIA AGUDELO SANTOS	SI NO		$11,562,098	15/01/2021	EN EJECUCION	15/01/2021	0%	0%	10.72%	57.56%	0%
			VILLAS DEL DIAMANTE											
32	MVCB_5128	CL 69N SUR 18N 52	DIEGO MARIO VANEGAS VILLAMIL	SI NO		$8,215,904	EN FASE DE VALIDACION	EN FASE DE VALIDACION	EN FASE DE VALIDACION	0%	0%	0.00%	0%	0%
33	MVCB_5156	CL 69N SUR 18N 58 MJ	FRANCISCO JAVIER ARANGO GUTIERREZ	SI NO		$9,918,506	EN FASE DE VALIDACION	EN FASE DE VALIDACION	EN FASE DE VALIDACION	0%	0%	0.00%	0%	0%
34	MVCB_5127	CL 69N SUR 18N 59 MJ	VICTOR MANUEL MUÑOZ VERGARA	SI NO		$11,788,586	EN FASE DE VALIDACION	EN FASE DE VALIDACION	EN FASE DE VALIDACION	0%	0%	0.00%	0%	0%
35	MVCB_5489	KR 19F 70C 29 SUR MJ	GLORIA INES PEÑA BELTRAN	SI NO		$10,903,021	EN FASE DE VALIDACION	EN FASE DE VALIDACION	EN FASE DE VALIDACION	0%	0%	0.00%	0%	0%
36	MVCB_5482	KR 19G 70C 18 SUR	LUIS HERNANDO MESA	SI NO		$11,726,936	EN FASE DE VALIDACION	EN FASE DE VALIDACION	EN FASE DE VALIDACION	0%	0%	0.00%	0%	0%
37	MVCB_5486	CL 70C SUR 19F 07 MJ	MARIA DEL CARMEN ALONSO POSADA	SI NO		$11,648,943	EN FASE DE VALIDACION	EN FASE DE VALIDACION	EN FASE DE VALIDACION	0%	0%	0.00%	0%	0%
38	MVCB_5314	TV 18N BIS A 69R 17 SUR MJ	ANA OTILIA GUACANEME CUESTA	SI NO		$11,762,842	EN FASE DE VALIDACION	EN FASE DE VALIDACION	EN FASE DE VALIDACION	0%	0%	0.00%	0%	0%
39	MVCB_5295	CL 69R SUR 18P 45 MJ	MARIA YOLANDA LOZANO VERGARA	SI NO		$10,666,717	EN FASE DE VALIDACION	EN FASE DE VALIDACION	EN FASE DE VALIDACION	0%	0%	0.00%	0%	0%
40	MVCB_5122	CL 69P SUR 18P 15	HERNAN LOPEZ GIRALDO	SI NO		$9,464,066	EN FASE DE VALIDACION	EN FASE DE VALIDACION	EN FASE DE VALIDACION	0%	0%	0.00%	0%	0%
41	MVCB_5157	CL 69N SUR 18N 57	ANA TERESA PEÑA ROJAS	SI NO		$11,827,785	EN FASE DE VALIDACION	EN FASE DE VALIDACION	EN FASE DE VALIDACION	0%	0%	0.00%	0%	0%
			MIRADOR (NUTIVARA)											
42	MVCB_1586	CL 70F SUR 18P 45	MARIA DEL CARMEN RINCON	SI NO		$11,816,419	EN FASE DE VALIDACION	EN FASE DE VALIDACION	EN FASE DE VALIDACION	0%	0%	0.00%	0%	0%
43	MVCB_1907	CL 70N SUR 18N 22	ANA ROSA LLANOS DE GARCIA	SI NO		$11,042,205	EN FASE DE VALIDACION	EN FASE DE VALIDACION	EN FASE DE VALIDACION	0%	0%	0.00%	0%	0%
			USMINIA											
44	MV_21184	CL 112A SUR 7 48	AMALIA MERCHAN SOSA	SI NO		$11,364,241	EN FASE DE VALIDACION	EN FASE DE VALIDACION	EN FASE DE VALIDACION	0%	0%	0.00%	2.58%	0%
45	MV_21368	CL 116 SUR 5 73	ALEJANDRO PAVA	SI NO		$11,111,995	EN FASE DE VALIDACION	EN FASE DE VALIDACION	EN FASE DE VALIDACION	0%	0%	0.00%	5.63%	0%
46	MV_21240	CL 114 SUR 7 42	ALFONSO GUERRERO	SI NO		$11,590,585	EN FASE DE VALIDACION	EN FASE DE VALIDACION	EN FASE DE VALIDACION	0%	0%	0.00%	4.56%	0%
47	MV_21212	CL 112A SUR 7 31	ERNESTINA CAICEDO	SI NO		$11,743,515	EN FASE DE VALIDACION	EN FASE DE VALIDACION	EN FASE DE VALIDACION	0%	0%	0.00%	4.08%	0%

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA PROYECTOS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	INPLAYCO S.A.S.

FECHA		PERIODO No.	13	DEL	25/01/2021	AL	31/01/2021

1. INFORMACIÓN GENERAL

OBJETO DEL CONTRATO	Realizar la interventorías técnica, jurídica, social, administrativa y financiera, para la ejecución de las obras de mejoramiento de vivienda en la modalidad de habitabilidad en los territorios priorizados por la secretaría distrital de hábitat
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO	Corresponde al Grupo 1 a la ejecución de 254 mejoramientos de vivienda, localizados en 3 localidades: Bosa, Usme y Ciudad Bolívar, esta última localidad incluye cuatro (4) Intervenciones de Mejoramientointegral.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA		CONTRATO DE OBRA	
CONTRATO No.:	701-2020	CONTRATO No.:	694--2020
PLAZO INICIAL:	6 meses	PLAZO INICIAL:	5 meses
FECHA DE INICIACIÓN:	4 de noviembre de 2020	FECHA DE INICIACIÓN:	4 de noviembre de 2020
**FECHA DE SUSPENSIÓN:	0	**FECHA DE SUSPENSIÓN:	0
**FECHA DE REINICIACIÓN:	0	**FECHA DE REINICIACIÓN:	0
FECHA DE TERMINACIÓN:	3 de mayo de 2021	FECHA DE TERMINACIÓN:	3 de abril 2021
PLAZO ACTUALIZADO:	0	PLAZO ACTUALIZADO:	0
PLAZO TRANSCURRIDO:	0	PLAZO TRANSCURRIDO:	0
VALOR INICIAL :	$ 894.285.952	VALOR INICIAL :	$ 3.724.135.319
VALOR ADICION(ES):	0	VALOR ADICION(ES):	$ -
VALOR ACTUALIZADO:	$ -	VALOR ACTUALIZADO:	$ -
VALOR ANTICIPO:	0	VALOR ANTICIPO:	$ -
VALOR POR PAGAR:	$ -	VALOR POR PAGAR:	$ -
SUPERVISOR:	JUAN CARLOS ARBELAEZ MURILLO	INTERVENTOR:	Gonzalo Llevano Hoyos -INPLAYCO S.A.S.

** Inserte las filas que requiera según el número de suspensiones y reinicios.


2. CONTROL DE HITOS.


No.	*** DESCRIPCIÓN DEL HITO	FECHA PROGRAMADA	FECHA REAL DE CUMPLIMIENTO	DÍAS DE RETRASO
	SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO (HITO OBLIGATORIO)	4/11/2020	3/04/2021	
1	Validación			
2	Entrega de informe de validación			
3	Ejecución			
	ENTREGA A LA INTERVENTORIA DE LOS PRODUCTOS Y/O ACTIVIDADES CONTRATADAS (HITO OBLIGATORIO)			


***** Inserte las filas que requiera según el número de hitos; teniendo en cuenta que como mínimo se deberán establecer 5 hitos adicionales a los obligatorios de inicio y terminación. Los hitos aprobados por la interventoría se socializarán con el supervisor del contrato para su Vo. Bo. Los Hitos aprobados por la interventoría y SDHT solo se podrán modificar previa novedad contractual que así lo requiera. La matriz ded seguimiento hace parte del presente documento.**

No.	INDICADORES BARRIO O TERRITORIO	VALORES	PORCENTAJE SOBRE EL VALOR TOTAL DEL CONTRATO	DIFERENCIA (+) ADELANTO (-) ATRASO
1	Valor acumulado de las actividades o productos conforme a la programación vigente.	$ 356.684.214,03	9,58%	
2	Valor acumulado de las actividades o productos ejecutados y aprobados por la Interventoría.	$ 352.018.055,97	9,45%	

3. ASPECTOS GENERALES INFORME TÉCNICO

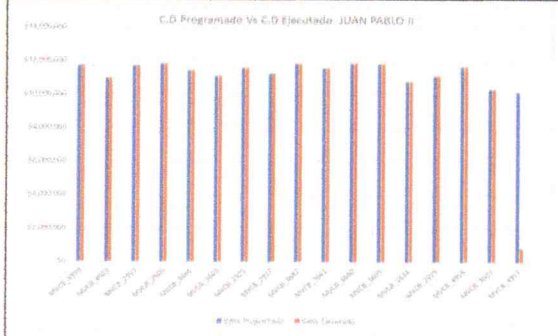

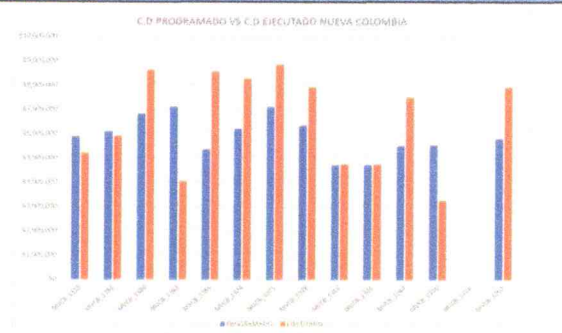

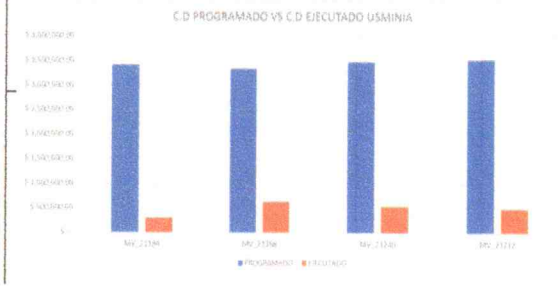



		4- COMPONENTE TECNICO BARRIO O TERRITORIO	
		ACTIVIDADES EJECUTADAS EN LA SEMANA. - ESTADO DE AVANCE SEMANAL POR VIVIENDA	
		JUAN PABLO II - NUEVA COLOMBIA	
		FECHA: 31 de Enero 2021	
		BARRIO JUAN PABLO II	
1	MVCB_4919	URIEL PATIÑO RINCON	Se realiza visita Técnica-Social Realizando Entrega Oficial de la vivienda Fecha de Entrega 11 de enero de 2021
2	MVCB_4923	SIERVO MATIAS FIGUEROA CHAPARRO	Se realiza visita Técnica-Social Realizando Entrega Oficial de la vivienda Fecha de Entrega 18 de Diciembre de 2020
3	MVCB_2932	MARIA TERESA PIÑEROS PIÑEROS	Se realiza visita Técnica-Social Realizando Entrega Oficial de la vivienda Fecha de Entrega 21 de Diciembre de 2020
4	MVCB_2926	CORADO TORO DE TORRES Y OTRO	Se realiza visita Técnica-Social Realizando Entrega Oficial de la vivienda Fecha de Entrega 21 de Diciembre de 2021
5	MVCB_3646	LUIS ANTONIO CABRERA LOPEZ Y OTRA	Se realiza visita Técnica-Social Realizando Entrega Oficial de la vivienda Fecha de Entrega 23 de Diciembre de 2021
6	MVCB_3643	JOSE ARISTOBULO MENJURA LEITON Y OTRA	Se realiza visita Técnica-Social Realizando Entrega Oficial de la vivienda Fecha de Entrega 21 de Diciembre de 2021
7	MVCB_2925	MARTHA LUZ CAMPIÑO	Se realiza visita Técnica-Social Realizando Entrega Oficial de la vivienda Fecha de Entrega 30 de Diciembre de 2020
8	MVCB_2917	CLAUDIA PATRICIA VARGAS GÓMEZ	Se realiza visita Técnica-Social Realizando Entrega Oficial de la vivienda Fecha de Entrega 23 DE ENERO DE 2021
9	MVCB_3642	JULIO CESAR FICHAS AVILA	Se realiza visita Técnica-Social Realizando Entrega Oficial de la vivienda Fecha de Entrega 30 de Diciembre de 2020
10	MVCB_3641	CECILIA MENDEZ MORENO	Se realiza visita Técnica-Social Realizando Entrega Oficial de la vivienda Fecha de Entrega 21 de Diciembre de 2021
11	MVCB_3640	OCTAVIO TELLEZ PINEDA	Se realiza visita Técnica-Social Realizando Entrega Oficial de la vivienda Fecha de Entrega 21 de Diciembre de 2020
12	MVCB_3635	JUAN CARLOS MAZO CASTRO Y OTRA	Se realiza visita Técnica-Social Realizando Entrega Oficial de la vivienda Fecha de Entrega 18 de Diciembre de 2020
13	MVCB_3634	AYDE NIÑO Y OTRO	Se realiza visita Técnica-Social Realizando Entrega Oficial de la vivienda Fecha de Entrega 18 de Diciembre de 2020
14	MVCB_3633	FRANCISCO JAVIER MENDIVELSO GUERRERO	Se realiza visita Técnica-Social Realizando Entrega Oficial de la vivienda Fecha de Entrega 30 de Diciembre de 2022
15	MVCB_2939	MARIEYE LOAISA	Se realiza visita Técnica-Social Realizando Entrega Oficial de la vivienda Fecha de Entrega 23 de Diciembre de 2021
16	MVCB_4917	ALVARO ALONSO MORENO	Se realiza visita Técnica-Social Presentando el personal Operativo y se socializa el Presupuesto estructurado, sé da por inicio la ejecución de cada una de las
17	MVCB_4918	ALVARO DIAZ AVILA	Se realiza visita Técnica-Social Realizando Entrega Oficial de la vivienda Fecha de Entrega 18 de Diciembre de 2020
		BARRIO NUEVA COLOMBIA	
18	MVCB_1320	ISMENIA BARRETO ARIAS	Se realiza visita Técnica-Social Evidenciando actividades : Enchape pared en cerámica para baños , cocina y patio de ropas formato 60 x 30 o similar , Pintura interior tres manos sobre pañete muros, Enchape piso Cerámico Antideslizante baños, Guardaescobas en cerámica e=0,08 m.
19	MVCB_1383	EDGAR FERNANDO CAMARCO ANGEL	Se realiza visita Técnica-Social Evidenciando actividades : Estuco sobre pañete muros, Pintura interior tres manos, Enchape piso Cerámico Antideslizante Patio de Ropas Y Cocina , Enchape de piso Cerámico Habitaciones, Hall Y Sala Comedor. Enchape pared en cerámica para cocina y patio de ropas formato 60 x 30 o similar.
20	MVCB_1380	ROSALBA MONTES DE CARDONA	Se realiza visita Técnica-Social Evidenciando actividades: Sanitario COMBO LINEA ACUAPLUS ULTRA SANITARIO, Estuco sobre pañete muros, Pintura interior tres manos, Enchape piso Cerámico Antideslizante Patio de Ropas Y Cocina.
21	MVCB_1382	MARIA CECILIA RINCON RINCON	Se realiza visita Técnica-Social Evidenciando actividades : Enchape pared en cerámica para baños , cocina y patio de ropas formato 60 x 30 o similar , Pintura interior tres manos sobre pañete muros, Enchape piso Cerámico Antideslizante baños, Guardaescobas en cerámica e=0,08 m
22	MVCB_1381	NOHORA NOHEMI MAYORGA IBAGUE	Se realiza visita Técnica-Social Evidenciando actividades : Enchape de piso Cerámico Habitaciones, Estuco sobre pañete muros, Pintura interior tres manos, Puerta de Madera Área Baño.
23	MVCB_1374	OBED OSPINA RESTREPO	Se realiza visita Técnica-Social Evidenciando actividades : Enchape pared en cerámica para baños , cocina y patio de ropas formato 60 x 30 o similar , Pintura interior tres manos sobre pañete muros, Enchape piso Cerámico Antideslizante baños, Guardaescobas en cerámica e=0,08 m.
24	MVCB_1371	CONSUELO NAVARRO	Se realiza visita Técnica-Social Evidenciando actividades : Se realiza visita Técnica-Social Evidenciando actividades : Enchape pared en cerámica para baños , cocina y patio de ropas formato 60 x 30 o similar , Pintura interior tres manos sobre pañete muros, Enchape piso Cerámico Antideslizante baños, Guardaescobas en cerámica e=0,08 m.
25	MVCB_1328	EDILBERTO CARDENAS PAEZ	Se realiza visita Técnica-Social Evidenciando actividades : Se realiza visita Técnica-Social Evidenciando actividades : Enchape pared en cerámica para baños , cocina y patio de ropas formato 60 x 30 o similar , Pintura interior tres manos sobre pañete muros, Enchape piso Cerámico Antideslizante baños, Guardaescobas en cerámica e=0,08 m.
26	MVCB_1352	MARIA RAMOS ORTIZ	Se realiza visita Técnica-Social Evidenciando actividades : Estuco sobre pañete muros, Enchape piso Cerámico , Cocina , Enchape de piso Cerámico Habitaciones, Hall Y Sala Comedor. Enchape pared en cerámica para cocina y patio de ropas formato 60 x 30 o similar.
27	MVCB_1341	JOSE GABRIEL HERRERA MEDINA	Se realiza visita Técnica-Social Evidenciando actividades : Se realiza visita Técnica-Social Evidenciando actividades : Enchape pared en cerámica para baños , cocina y patio de ropas formato 60 x 30 o similar , Pintura interior tres manos sobre pañete muros, Enchape piso Cerámico Antideslizante baños, Guardaescobas en cerámica e=0,08 m.
28	MVCB_1344	ALBEIRO RUIZ SANABRIA	Se realiza visita Técnica-Social Evidenciando actividades : Estuco sobre pañete muros, Pintura interior tres manos, Enchape piso Cerámico Antideslizante Patio de Ropas Y Cocina , Enchape de piso Cerámico Habitaciones, Hall Y Sala Comedor. Enchape pared en cerámica para cocina y patio de ropas formato 60 x 30 o similar.
29	MVCB_1310	DORA ALICIA LÓPEZ SANABRIA	Se realiza visita Técnica-Social Evidenciando actividades : Alistado de piso en mortero 1:4 Enchape de Piso Ceramico Formato 50*50 o similar.
30	MVCB_1314	MARTHA LUCIA OSPINA PEÑA	Por temas juridicos se termina dando renuncia al programa de Mejoramiento
31	MVCB_1357	MARTHA LILIA AGUDELO SANTOS	Se realiza visita Técnica-Social Evidenciando actividades : Estuco sobre pañete muros, Enchape piso Cerámico , Cocina , Enchape de piso Cerámico Habitaciones, Hall Y Sala Comedor. Enchape pared en cerámica para cocina y patio de ropas formato 60 x 30 o similar.

		VILLAS DEL DIAMANTE	
32	MVCB_5128	DIEGO MARIO VANEGAS VILLAMIL	Se realiza Estructuracion de Presupuesto para apertura de Ejecucion de actividades
33	MVCB_5129	FRANCISCO JAVIER ARANGO GUTIERREZ	Se realiza Estructuracion de Presupuesto para apertura de Ejecucion de actividades
34	MVCB_5156	VICTOR MANUEL MUÑOZ VERGARA	Se realiza Estructuracion de Presupuesto para apertura de Ejecucion de actividades
35	MVCB_5489	GLORIA INES PEÑA BELTRAN	Se realiza Estructuracion de Presupuesto para apertura de Ejecucion de actividades
36	MVCB_5482	LUIS HERNANDO MESA	Se realiza Estructuracion de Presupuesto para apertura de Ejecucion de actividades
37	MVCB_5486	MARIA DEL CARMEN ALONSO POSADA	Se realiza Estructuracion de Presupuesto para apertura de Ejecucion de actividades
38	MVCB_5314	ANA OTILIA GUACANEME CUESTA	Se realiza Estructuracion de Presupuesto para apertura de Ejecucion de actividades
39	MVCB_5295	MARIA YOLANDA LOZANO VERGARA	Se realiza Estructuracion de Presupuesto para apertura de Ejecucion de actividades
40	MVCB_5122	HERNAN LOPEZ GIRALDO	Se realiza Estructuracion de Presupuesto para apertura de Ejecucion de actividades
41	MVCB_5157	ANA TERESA PEÑA ROJAS	Se realiza Estructuracion de Presupuesto para apertura de Ejecucion de actividades
		MIRADOR (NUTIVARA)	
42	MVCB_1586	MARIA DEL CARMEN RINCON	Se realiza Estructuracion de Presupuesto para apertura de Ejecucion de actividades
43	MVCB_1907	ANA ROSA LLANOS DE GARCIA	Se realiza Estructuracion de Presupuesto para apertura de Ejecucion de actividades
		USMINIA	
44	MV_21184	AMALIA MERCHAN SOSA	Se realiza visita Técnica-Social Evidenciando actividades : Demolición Piso Cerámico Existente, Alistado de piso en mortero 1:4, Demolición Enchape Muro Baño y Cocina Existente.
45	MV_21368	ALEJANDRO PAVA	Se realiza visita Técnica-Social Evidenciando actividades : Demolición Piso en Concreto Endurecido Existente, Alistado de piso en mortero 1:4.
46	MV_21240	ALFONSO GUERRERO	Se realiza visita Técnica-Social Evidenciando actividades : Alistado de piso en mortero 1:4, Demolición Enchape Muro Baño Existente.
47	MV_21212	ERNESTINA CAICEDO	Se realiza visita Técnica-Social Evidenciando actividades : Demolición Piso Cerámico Existente, Alistado de piso en mortero 1:4, Demolición Enchape Muro Baño y Cocina Existente.

5. PLAN DE ACCIÓN RESULTADO DEL ANÁLISIS DE CAUSAS REGISTRADO EN EL NUMERAL ANTERIOR - CON EL OBJETIVO DE ELIMINAR LA CAUSA RAÍZ DE LA SITUACIÓN PROBLEMÁTICA - PLAN DE MEJORA

ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA
Se realiza visita Técnica-Social Presentando el personal Operativo y se socializa el Presupuesto estructurado, sé da por inicio la ejecución de cada una de las actividades dadas en el PPTO en la vivienda MVCB-4917		

6. ACTIVIDADES NO PREVISTAS Y MAYORES CANTIDADES

Se a determinado en conjunto con el Contratista cada una de las actividades priorizando areas terminadas y viabiliazando areas Primarias

7. COMENTARIOS DEL INTERVENTOR: Por favor realice la descripción general del estado del contrato y según aplique informe sobre: actividades realizadas en la semana, control de lluvias, compra y suministro de materiales, mano de obra, subcontratos y tramites ante las diferentes empresas prestadoras de servicios, entre otros. Anexe las actas de seguimiento realizadas en la semana correspondiente al periodo del informe.


Barrio o Territorio: JUAN PABLO II

En cada validación ejecutada en la semana es de vital importancia determinar condiciones de vulnerabilidad como hacinamiento, ausencia de servicios públicos, problemas de salud asociados a carencias en saneamiento básico, carencias de pisos, cubiertas, deficiencias constructivas, entre otras que permitan justificar y fijar una línea base del problema a abordar a través del proyecto de Mejoramiento de Vivienda


8. REGISTRO FOTOGRAFICO DEL AVANCE DURANTE LA SEMANA

SE ADJUNTA REGISTRO FOTOGRAFICO


REGISTRO FOTOGRAFICO

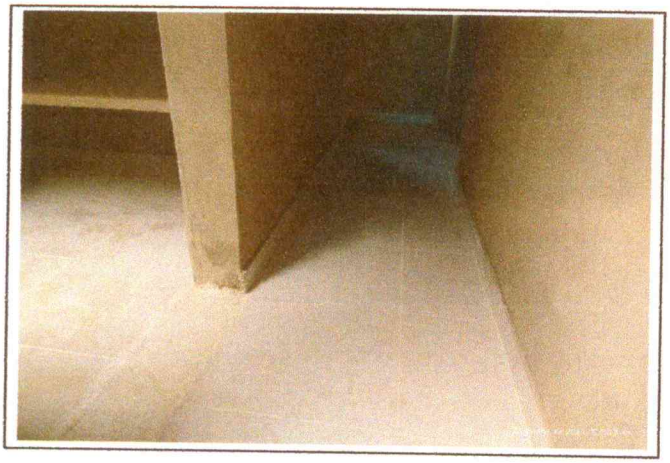

FECHA	domingo, 31 de enero de 2021
DESCRIPCION	

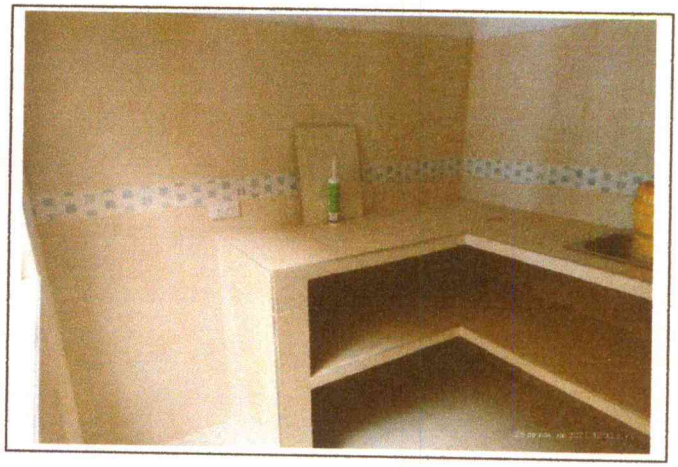


FECHA	domingo, 31 de enero de 2021
DESCRIPCION	

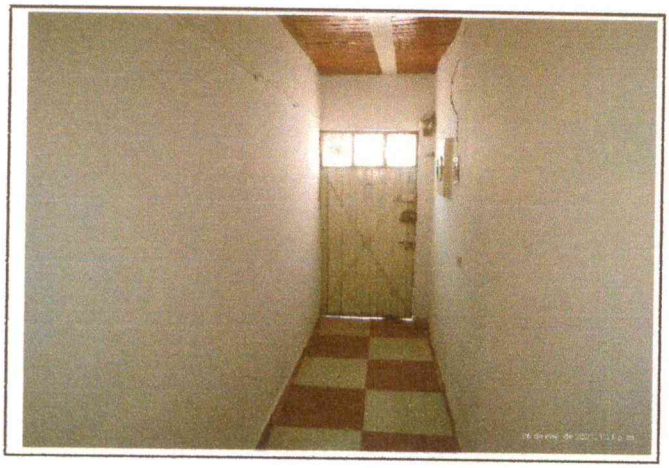


FECHA	domingo, 31 de enero de 2021
DESCRIPCION	



FECHA	domingo, 31 de enero de 2021
DESCRIPCION	

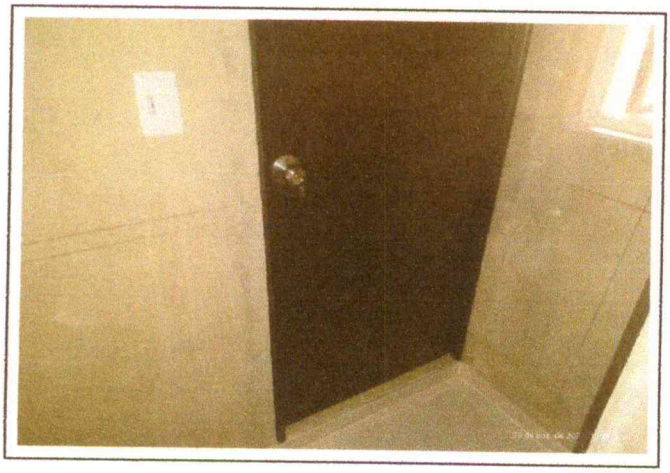

FECHA	domingo, 31 de enero de 2021
DESCRIPCION	

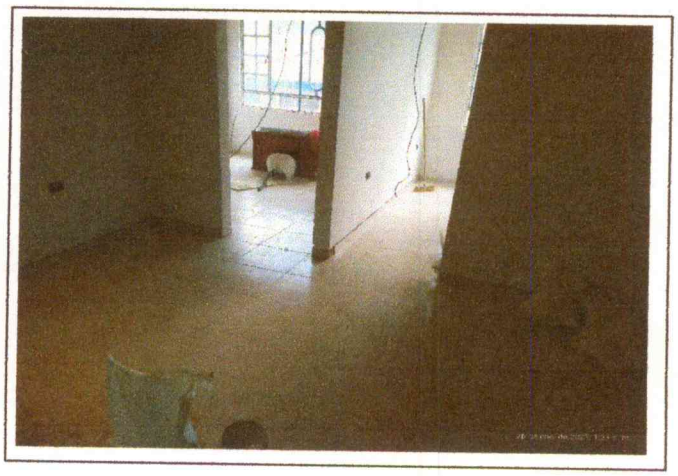

FECHA	domingo, 31 de enero de 2021
DESCRIPCION	

Subsecretaria de Coordinación Operativa
Subdirección de Barrios
Seguimiento ejecución proyectos de Mejoramiento de Vivienda - Habitabilidad

Proyecto mejoramiento de vivienda - AVANCE EJECUCIÓN SEMANAL

Fecha	31-ene-21

Consorcio Mejoramiento EP 2020

Contrato de obra	694-2020			Plazo	Cinco (5) meses
Objeto	Contratar la ejecución de las obras de mejoramiento de vivienda en la modalidad de habitabilidad de los proyectos estructurados en los territorios priorizados por la Secretaria Distrital de Habitat. Grupo I			Acta de inicio	4 de noviembre de 2020
CDP No.	No. 914 del 14 de julio de 2020	CRP No.		Valor del contrato	TRES MIL SETECIENTOS VEINTICUATRO MILLONES CIENTO TREINTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS DIEZ Y NUEVE PESOS ($3.724.135.319) M/Cte

Gonzalo Liévano Hoyos -INPLAYCO S.A.S.

Contrato de interventoría	701-2020			Plazo	Seis (6) meses
Objeto	Realizar la interventorías técnica, jurídica, social, administrativa y financiera, para la ejecución de las obras de mejoramiento de vivienda en la modalidad de habitabilidad en los territorios priorizados por la secretaría distrital de hábitat.			Acta de inicio	04 de noviembre 2020
CDP No	No. 892 del 14 de julio de 2020	CRP No.		Valor del contrato	OCHOCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS M/CTE ($894.285.952),

Fase 1: Validación de la información entregada por el la SDHT									Fase 2: Ejecución de obras				
					Validación				Ejecución				
Territorio o barrio a intervenir	Ciudad Bolivar	Barrios	Predios	Total Predios	Validada	V/Por Validar		V/Modificada	En Ejecución	Terminadas	Por Ejecutar	% de Avance	Acta de Entrega a Satisfacción
Arq. o ing. Responsable	Ing. Humberto Blanco González	MIRADOR (NUTIVARA)	13	41	13	0		0	5	0	5	0.68%	0
		NUEVA COLOMBIA	16		16	0		0	16	16	0	6.08%	16
Técnico Responsable		VILLAS EL DIAMANTE	3		3	0		0	0	0	0	0.00%	0
		ARBORIZADORA ALTA	3		3	0			0	0	0	0.00%	0
		SANTA VIVIANA	2		2	0		0	0	0	0	0.00%	0
		VILLA ALEMANA II SECTOR	3		3	0			3		3	0.18%	0
		ANTONIO JOSE DE SUCRE III	1		1	0		0	1	0	1	0.05%	0
Subtotal			41	41	41	0		0	25	16	9	6.99%	16

AVANCE DE EJECUCIÓN SEMANAL

Proyecto Ciudad Bolivar				FASE I			Tiempo Programación			SEMANA DEL 28 AL 3	ENERO			
No.	ID_DMV	Dirección	Nombres y apellidos	V/ Validada	V/ Modificada	Vinicial	Fecha inicio	Fecha terminada	F. Inicio	9 semana	SEMANA DEL 4 AL 10	SEMANA DEL 11 AL 17	SEMANA DEL 18 AL 24	SEMANA DEL 25 AL 31
											10 semana	11 semana	12 semana	13 semana
MIRADOR (NUTIVARA)														
1	MVCB_1873	CL 70L BIS SUR 18N 14	BLANCA FABIOLA LANDAZURI MESA	SI / NO		$11,828,247.60	20/01/2021	EN EJECUCION	20/01/2021	0%	0%	0.00%	0%	5.00%
2	MVCB_1886	KR 18N 70K 31 SUR	LUZ MARIA ARIZA ARIZA	SI / NO		$11,168,015.60	18/01/2021	EN EJECUCION	18/01/2021	0%	0%	0.00%	7.00%	62.05%
3	MVCB_1836	KR 18N 70K 09 SUR	DELIA MARÍA MATEUS ESCAMILLA	SI / NO		$11,769,726.10	18/01/2021	EN EJECUCION	18/01/2021	0%	0%	0.00%	5.72%	19.69%
4	MVCB_1829	CL 70K SUR 18N 45	DIANA PATRICIA PÁEZ FINO	SI / NO		$11,105,245.60	18/01/2021	EN EJECUCION	18/01/2021	0%	0%	0.00%	0%	36.91%
5	MVCB_1684	CL 70I SUR 18N 56	MIRYAM MANRIQUE URUEÑA	SI / NO		$11,749,188.70	20/01/2021	EN EJECUCION	20/01/2021	0%	0%	0.00%	0%	40.98%
6	MVCB_1692	CL 70 H SUR 18 N 51	BEATRIZ ADIELA MARTINEZ JARAMILLO	SI / NO		$10,114,021.80	EN FASE DE VALIDACION	EN FASE DE VALIDACION	EN FASE DE VALIDACION	0%	0%	0.00%	0%	0.00%
7	MVCB_1681	CL 70 I SUR 18 N 36 MJ	ALVARO ELIECER VERDUGO RODRIGUEZ	SI / NO		$10,278,758.80	EN FASE DE VALIDACION	EN FASE DE VALIDACION	EN FASE DE VALIDACION	0%	0%	0.00%	0%	0.00%
8	MVCB_1638	KR 18R 70H 09 SUR	MAURICIO ENRIQUE MUÑOZ RIAÑO	SI / NO		$9,580,888.90	EN FASE DE VALIDACION	EN FASE DE VALIDACION	EN FASE DE VALIDACION	0%	0%	0.00%	0%	0.00%
9	MVCB_1664	KR 18P 70G 08 SUR	MARINA CLEMENCIA RAMOS	SI / NO		$9,223,968.20	EN FASE DE VALIDACION	EN FASE DE VALIDACION	EN FASE DE VALIDACION	0%	0%	0.00%	0%	0.00%
10	MVCB_1748	KR 18P 70I 04 SUR	OLGA LUZ BETANCOURT LEON	SI / NO		$11,750,274.10	EN FASE DE VALIDACION	EN FASE DE VALIDACION	EN FASE DE VALIDACION	0%	0%	0.00%	0%	0.00%
11	MVCB_1704	KR 18R 70H 08 SUR	ALBA LUCIA VALENCIA OCAMPO	SI / NO		$11,612,063.20	EN FASE DE VALIDACION	EN FASE DE VALIDACION	EN FASE DE VALIDACION	0%	0%	0.00%	0%	0.00%
12	MVCB_1631	CL 70G SUR 18R 15	ELOISA LAVERDE RIOS	SI / NO		$11,276,851.40	EN FASE DE VALIDACION	EN FASE DE VALIDACION	EN FASE DE VALIDACION	0%	0%	0.00%	0%	0.00%
13	MVCB_1592	CL 70F SUR 18N 28	HOBER FABIAN BARRERA GUTIERREZ	SI / NO		$11,822,174.20	EN FASE DE VALIDACION	EN FASE DE VALIDACION	EN FASE DE VALIDACION	0.00%	0.00%	0.00%	0%	0.00%

NUEVA COLOMBIA														
14	MVCB_1130	DG 69F SUR 18J 18	CARMEN JULIA SUAREZ PARADA	SI / NO		$10,614,314.40	26/11/2020	22/12/2020	26/11/2020	1.65%	0.00%	0.00%	0%	0%
15	MVCB_1180	DG 69F SUR 18J 15	BLANCA TERESA CALVO DE GARZON	SI / NO		$10,640,712.30	26/11/2020	22/12/2020	26/11/2020	2.54%	0.00%	0.00%	0%	0%
16	MVCB_1181	DG 69F SUR 18J 11	ALBERTO ULLOA ULLOA	SI / NO		$7,917,003.90	27/11/2020	21/12/2020	27/11/2020	0.83%	0.00%	0.00%	0%	0%
17	MVCB_1161	DG 69F SUR 18J 03	MARIA ROSA ELENA BECERRA SEGURA	SI / NO		$11,682,398.70	30/11/2020	21/12/2020	30/11/2020	0.00%	0.00%	0.00%	0%	0%
18	MVCB_1212	DG 69G SUR 18J 43	HERNAN LOPEZ	SI / NO		$11,067,851.50	2/12/2020	22/12/2020	2/12/2020	0.00%	0.00%	0.00%	0%	0%
19	MVCB_1194	DG 69H SUR 18J 20	VICTOR HUGO WILCHES BERNAL	SI / NO		$11,564,858.10	25/11/2020	30/12/2020	25/11/2020	2.65%	0.00%	0.00%	0%	0%
20	MVCB_1467	CL 70H SUR 18J 70	TERESA DE JESUS OLIVOS DE BLANCO	SI / NO		$11,819,029.10	2/12/2020	16/01/2021	2/12/2020	42.39%	12.73%	17.65%	0%	0%
21	MVCB_1469	CL 70H SUR 18J 82	JORGE SANCHEZ FORERO	SI / NO		$11,784,999.40	26/11/2020	28/12/2020	26/11/2020	34.79%	0.00%	0.00%	0%	0%
22	MVCB_1470	KR 18L 70G 24 SUR	ANA SILVIA CHACON	SI / NO		$11,826,113.50	25/11/2020	30/12/2020	25/11/2020	25.69%	0.00%	0.00%	0%	0%
23	MVCB_1495	KR 18L 70H 10 SUR	YACQUELINE RADA MOJICA	SI / NO		$11,751,135.80	25/11/2020	22/12/2020	25/11/2020	0.00%	0.00%	0.00%	0%	0%
24	MVCB_1493	CL 70I SUR 18J 86	MARIA ELENA ALCIRA GARZON CASALLAS	SI / NO		$11,275,773.60	30/11/2020	30/12/2020	30/11/2020	80.64%	0.00%	0.00%	0%	0%
25	MVCB_1516	KR 18L 70I 10 SUR	BERTHA CECILIA MOJICA RUIZ	SI / NO		$11,580,951.80	25/11/2020	30/12/2020	25/11/2020	1.74%	0.00%	0.00%	0%	0%
26	MVCB_1417	CL 70I SUR 18L 30	DIANA MARCELA PARRA BALLESTEROS	SI / NO		$11,661,580.80	30/11/2020	21/12/2020	30/11/2020	0.32%	0.00%	0.00%	0%	0%
27	MVCB_1416	CL 70I SUR 18L 22	ANA CENETH TORRES ROJAS	SI / NO		$11,557,790.90	27/11/2020	30/12/2020	27/11/2020	37.38%	0.00%	0.00%	0%	0%
28	MVCB_1407	CL 70I SUR 18L 33	MARIA ELSA TORRES	SI / NO		$11,478,383.90	28/11/2020	28/12/2020	28/11/2020	35.15%	0.00%	0.00%	0%	0%
29	MVCB_1409	CL 70I SUR 18L 21	FRAN EDILBERTO CRUZ CANO Y OTRA	SI / NO		$11,460,816.00	27/11/2020	30/12/2020	27/11/2020	8.16%	0.00%	0.00%	0%	0%
VILLAS EL DIAMANTE														
30	MVCB_5118	TV 18P BIS 69N 17 SUR	CARLOS ALFREDO CLAVIJO ROZO	SI / NO		$11,761,810.50	EN FASE DE VALIDACION	EN FASE DE VALIDACION	EN FASE DE VALIDACION	0.00%	0.00%	0.00%	0%	0%
31	MVCB_5464	KR 19D BIS 70C 25 SUR (KR 19B 70C 25 SUR)	IRMA ROJAS ROJAS	SI / NO		$11,428,943.80	EN FASE DE VALIDACION	EN FASE DE VALIDACION	EN FASE DE VALIDACION	0.00%	0.00%	0.00%	0%	0%
32	MVCB_5491	KR 19F 70C 41 SUR MJ	LEONILDE BUITRAGO MORENO	SI / NO		$9,461,874.70	EN FASE DE VALIDACION	EN FASE DE VALIDACION	EN FASE DE VALIDACION	0.00%	0.00%	0.00%	0%	0%
ARBORIZADORA ALTA														
33	MV_14629	CL 75C SUR 34 51	HILDA MIRYAM NIÑO	SI / NO		$9,523,231.70	EN FASE DE VALIDACION	EN FASE DE VALIDACION	EN FASE DE VALIDACION	0.00%	0.00%	0.00%	0%	0%
34	MV_08564	KR 37A 75 55 SUR	ELSY CARDENAS MONROY	SI / NO		$11,264,578.20	EN FASE DE VALIDACION	EN FASE DE VALIDACION	EN FASE DE VALIDACION	0.00%	0.00%	0.00%	0%	0%
35	MV_09494	TV 35C 72F 31 SUR	GLADYS CASALLAS SUAREZ	SI / NO		$11,299,979.80	EN FASE DE VALIDACION	EN FASE DE VALIDACION	EN FASE DE VALIDACION	0.00%	0.00%	0.00%	0%	0%
SANTA VIVIANA														
36	MV_14485	KR 74D 75C 41 SUR MJ	PLINIO SANABRIA SANDOVAL	SI / NO		$11,786,495.00	EN FASE DE VALIDACION	EN FASE DE VALIDACION	EN FASE DE VALIDACION	0.00%	0.00%	0.00%	0%	0%
37	MV_09083	CL 75C BIS 75 39 SUR	RUTH GORDONS CASTAÑEDA	SI / NO		$11,800,204.20	EN FASE DE VALIDACION	EN FASE DE VALIDACION	EN FASE DE VALIDACION	0.00%	0.00%	0.00%	0%	0%
VILLA ALEMANA II SECTOR - USMINIA														
38	MVUS_0638	CL 115 SUR 3 36	EDWIN ARLEY QUINMBAYO QUINTERO	SI / NO		$11,710,217.10	21/01/2021	EN EJECUCION	21/01/2021	0.00%	0.00%	0.00%	0%	21.86%
39	MVUS_0682	CL 113A SUR 4 25	JOSE DEL CARMEN SANCHEZ PAEZ	SI / NO		$11,755,145.40	21/01/2021	EN EJECUCION	21/01/2021	0.00%	0.00%	0.00%	0%	19.56%
40	MVUS_0707	KR 4 115 21 SUR	LUZ MERY YARA MATOMA	SI / NO		$11,808,556.50	21/01/2021	EN EJECUCION	21/01/2021	0.00%	0.00%	0.00%	0%	11.73%
ANTONIO JOSE DE SUCRE III - USMINIA														
41	MV_21283	KR 7 115 15 SUR	TERESA DE JESUS OSORIO ORTIZ	SI / NO		$10,513,778.60	21/01/2021	EN EJECUCION	21/01/2021	0.00%	0.00%	0.00%	0%	14.35%

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DEL HÁBITAT

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

PROYECTOS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA

INPLAYCO S.A.S.
INGENIEROS CONSTRUCTORES E INTERVENTORES

FECHA	31/01/2021	PERIODO No.	13	DEL	25/01/2021	AL	31/01/2021

1. INFORMACIÓN GENERAL

OBJETO DEL CONTRATO	Realizar la interventorías técnica, jurídica, social, administrativa y financiera, para la ejecución de las obras de mejoramiento de vivienda en la modalidad de habitabilidad en los territorios priorizados por la secretaría distrital de hábitat.
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO	Corresponde al Grupo 1 a la ejecución de 254 mejoramientos de vivienda, localizados en 3 localidades: Bosa, Usme y Ciudad Bolívar, esta última localidad incluye cuatro (4) Intervenciones de MejoramientoIntegral.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA		CONTRATO DE OBRA	
CONTRATO No.:	701-2020	CONTRATO No.:	694--2020
PLAZO INICIAL:	6 meses	PLAZO INICIAL:	5 meses
FECHA DE INICIACIÓN:	4 de noviembre de 2020	FECHA DE INICIACIÓN:	4 de noviembre de 2020
**FECHA DE SUSPENSIÓN:	0	**FECHA DE SUSPENSIÓN:	0
**FECHA DE REINICIACIÓN:	0	**FECHA DE REINICIACIÓN:	0
FECHA DE TERMINACIÓN:	3 de mayo de 2021	FECHA DE TERMINACIÓN:	3 de abril 2021
PLAZO ACTUALIZADO:	0	PLAZO ACTUALIZADO:	0
PLAZO TRANSCURRIDO:	0	PLAZO TRANSCURRIDO:	0
VALOR INICIAL :	$ 894,285,952	VALOR INICIAL :	$ 3,724,135,319
VALOR ADICION(ES):	0	VALOR ADICION(ES):	$ -
VALOR ACTUALIZADO:	$ -	VALOR ACTUALIZADO:	$ -
VALOR ANTICIPO:	0	VALOR ANTICIPO:	$ -
VALOR POR PAGAR:	$ -	VALOR POR PAGAR:	$ -
SUPERVISOR:	JUAN CARLOS ARBELAEZ MURILLO	INTERVENTOR:	Gonzalo Liévano Hoyos -INPLAYCO S.A.S.

** Inserte las filas que requiera según el número de suspensiones y reinicios.

2. CONTROL DE HITOS.

No.	*** DESCRIPCIÓN DEL HITO	FECHA PROGRAMADA	FECHA REAL DE CUMPLIMIENTO	DÍAS DE RETRASO
	SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO (HITO OBLIGATORIO)	4/11/2020	3/04/2021	
1	Validación			
2	Entrega de informe de validación			
3	Ejecución			
	ENTREGA A LA INTERVENTORIA DE LOS PRODUCTOS Y/O ACTIVIDADES CONTRATADAS (HITO OBLIGATORIO)			

*** Inserte las filas que requiera según el número de hitos; teniendo en cuenta que como mínimo se deberán establecer 5 hitos adicionales a los obligatorios de inicio y terminación. Los hitos aprobados por la interventoría se socializarán con el supervisor del contrato para su Vo. Bo. Los Hitos aprobados por la interventoría y SDHT solo se podrán modificar previa novedad contractual que así lo requiera. La matriz de seguimiento hace parte del presente documento.


No.	INDICADORES BARRIO O TERRITORIO	VALORES	PORCENTAJE SOBRE EL VALOR TOTAL DEL CONTRATO	DIFERENCIA (+) ADELANTO (-) ATRASO
1	Valor acumulado de las actividades o productos conforme a la programación vigente.	$279,467,460.00	7.50%	
2	Valor acumulado de las actividades o productos ejecutados y aprobados por la Interventoría.	$260,302,002.00	6.99%	


3. ASPECTOS GENERALES INFORME TÉCNICO

Registre los avances y novedades técnicas, sociales, administrativas, contables y financieras, acompañadas por gráficos, cuadros, fotografías, análisis y comentarios sobre el estado de los trabajos, en todos sus aspectos en la fase de validación y ejecución de obra.

Fase de validación y apropiación.

Ciudad Bolívar

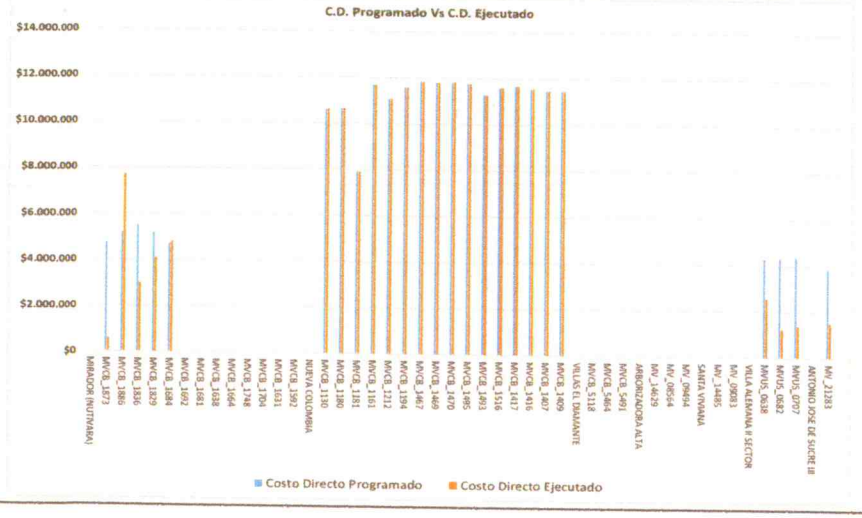

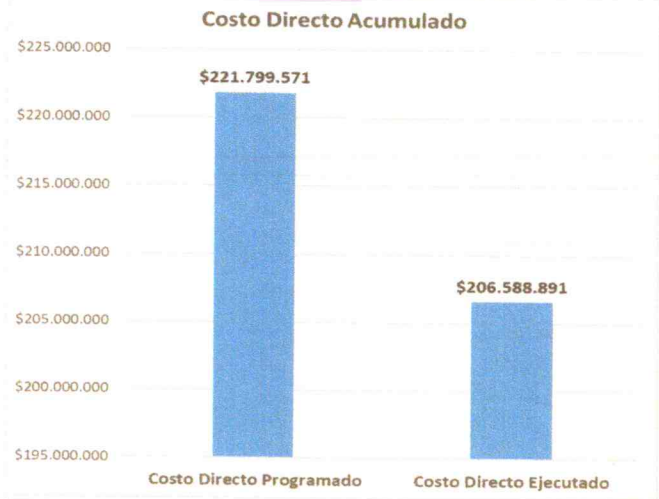

4- COMPONENTE TECNICO BARRIO O TERRITORIO

ACTIVIDADES EJECUTADAS EN LA SEMANA. - ESTADO DE AVANCE SEMANAL POR VIVIENDA

BARRIO O TERRITORIO: CIUDAD BOLIVAR - MIRADOR (NUTIVARA)

1	MVCB_1873	BLANCA FABIOLA LANDAZURI MESA	Personal técnico y social de la interventoría y el contratista realizaron visitas de seguimiento al avance de obras, evidenciando inicio de actividades. Se dieron aclaraciones al personal de obra respecto de las actividades a ejecutar en la vivienda. Se avanza en pañete de muros de la alcoba principal; se alistó el piso del baño; se elaboró el poyo de la zona de lavandería. Se registró en bitácora el avance de las diferentes actividades. Se efectuó registro fotográfico del avance de obra.
2	MVCB_1886	LUZ MARIA ARIZA ARIZA	Se realizó visita de seguimiento evidenciando lo siguiente: A nivel del 3er. piso se terminó el pañete de muros del estar de alcobas, el alistado de pisos del estar de alcobas y se terminó, igualmente, el enchape de los pisos de las alcobas 4 y 5. A nivel del 2 piso, se terminó la preparación de la superficie y se instaló el enchape cerámico de los pisos de la sala y de las alcobas. Se registró en bitácora el avance de las diferentes actividades. Se efectuó registro fotográfico del avance de obra.
3	MVCB_1836	DELIA MARÍA MATEUS ESCAMILLA	Se hizo visita de seguimiento, evidenciando el siguiente avance de actividades: Se terminó el pañete de muros de sala comedor, hall de alcobas y lavandería. Se inicio y terminó el pañete de muros de la cocina, alcoba principal. Se requirió fundir mesón de la cocina. Se registró en bitácora el avance de las diferentes actividades. Se efectuó registro fotográfico del avance de obra.
4	MVCB_1829	DIANA PATRICIA PÁEZ FINO	Personal técnico y social de la interventoría y el contratista realizaron visitas de seguimiento al avance de obras, evidenciando inicio de actividades. Se demolieron enchapes de muros y pisos de la cocina y el baño. Se fundieron mesones y poyo de cocina. Se alistaron pisos cocina, baño, sala comedor, alcobas y pasillo. Se enchapó con cerámica los pisos de sala comedor, alcobas y pasillo de alcobas. Se efectuaron los puntos hidráulicos y sanitarios en las áreas de cocina y baño. Se registró en bitácora el avance de las diferentes actividades. Se efectuó registro fotográfico del avance de obra.
5	MVCB_1684	MIRYAM MANRIQUE URUEÑA	Personal técnico y social de la interventoría y el contratista realizaron visitas de seguimiento al avance de obras, evidenciando inicio de actividades. Se adecuaron los puntos hidráulicos para la lavadora y el lavamanos. Se inició y terminó la instalación de cielo raso en la alcoba principal y la alcoba 2. Se terminó el pañete del muro alto ubicado sobre el patio central. Se efectuó el enchape cerámico de los pisos de alcobas y hall de llegada. Se registró en bitácora el avance de las diferentes actividades. Se efectuó registro fotográfico del avance de obra.
6	MVCB_1692	BEATRIZ ADIELA MARTINEZ JARAMILLO	VIVIENDA VALIDADA. SIN APERTURAR..
7	MVCB_1681	ALVARO ELIECER VERDUGO RODRIGUEZ	VIVIENDA VALIDADA. SIN APERTURAR..
8	MVCB_1638	MAURICIO ENRIQUE MUÑOZ RIAÑO	VIVIENDA VALIDADA. SIN APERTURAR..
9	MVCB_1664	MARINA CLEMENCIA RAMOS	VIVIENDA VALIDADA. SIN APERTURAR..
10	MVCB_1748	OLGA LUZ BETANCOURT LEON	VIVIENDA VALIDADA. SIN APERTURAR..
11	MVCB_1704	ALBA LUCIA VALENCIA OCAMPO	VIVIENDA VALIDADA. SIN APERTURAR..
12	MVCB_1631	ELOISA LAVERDE RIOS	VIVIENDA VALIDADA. SIN APERTURAR..
13	MVCB_1592	HOBER FABIAN BARRERA GUTIERREZ	VIVIENDA VALIDADA. SIN APERTURAR..

BARRIO O TERRITORIO: CIUDAD BOLIVAR - BARRIO NUEVA COLOMBIA

14	MVCB_1130	CARMEN JULIA SUAREZ PARADA	VIVIENDA TERMINADA. ENTREGADA
15	MVCB_1180	BLANCA TERESA CALVO DE GARZON	VIVIENDA TERMINADA. ENTREGADA
16	MVCB_1181	ALBERTO ULLOA ULLOA	VIVIENDA TERMINADA. ENTREGADA
17	MVCB_1161	MARIA ROSA ELENA BECERRA SEGURA	VIVIENDA TERMINADA. ENTREGADA
18	MVCB_1212	HERNAN LOPEZ	VIVIENDA TERMINADA. ENTREGADA
19	MVCB_1194	VICTOR HUGO WILCHES BERNA	VIVIENDA TERMINADA. ENTREGADA
20	MVCB_1467	TERESA DE JESUS OLIVOS DE BLANCO	VIVIENDA TERMINADA. ENTREGADA
21	MVCB_1469	JORGE SANCHEZ FORERO	VIVIENDA TERMINADA. ENTREGADA
22	MVCB_1470	ANA SILVIA CHACON	VIVIENDA TERMINADA. ENTREGADA
23	MVCB_1495	YACQUELINE RADA MOJICA	VIVIENDA TERMINADA. ENTREGADA
24	MVCB_1493	MARIA ELENA ALCIRA GARZON CASALLAS	VIVIENDA TERMINADA. ENTREGADA
25	MVCB_1516	BERTHA CECILIA MOJICA RUIZ	VIVIENDA TERMINADA. ENTREGADA
26	MVCB_1417	DIANA MARCELA PARRA BALLESTEROS	VIVIENDA TERMINADA. ENTREGADA
27	MVCB_1416	ANA CENETH TORRES ROJAS	VIVIENDA TERMINADA. ENTREGADA
28	MVCB_1407	MARIA ELSA TORRES	VIVIENDA TERMINADA. ENTREGADA
29	MVCB_1409	FRAN EDILBERTO CRUZ CANO Y OTRA	VIVIENDA TERMINADA. ENTREGADA

BARRIO O TERRITORIO: CIUDAD BOLIVAR - BARRIO VILLAS EL DIAMANTE			
30	MVCB_5118	CARLOS ALFREDO CLAVIJO ROZO	VIVIENDA VALIDADA. SIN APERTURAR
31	MVCB_5464	IRMA ROJAS ROJAS	VIVIENDA VALIDADA. SIN APERTURAR
32	MVCB_5491	LEONILDE BUITRAGO MORENO	VIVIENDA VALIDADA. SIN APERTURAR
BARRIO O TERRITORIO: CIUDAD BOLIVAR - BARRIO ARBORIZADORA ALTA			
33	MV_14629	HILDA MIRYAM NIÑO	VIVIENDA VALIDADA. SIN APERTURAR
34	MV_08564	ELSY CARDENAS MONROY	VIVIENDA VALIDADA. SIN APERTURAR
35	MV_09494	GLADYS CASALLAS SUAREZ	VIVIENDA VALIDADA. SIN APERTURAR
BARRIO O TERRITORIO: CIUDAD BOLIVAR - BARRIO SANTA VIVIANA			
36	MV_14485	PLINIO SANABRIA SANDOVAL	VIVIENDA VALIDADA. SIN APERTURAR
37	MV_09083	RUTH GORDONS CASTAÑEDA	El día 25 de enero de 2021, personal tanto técnico como social de la interventoría y del contratista, realizó visita a la vivienda ubicada en el barrio Santa Viviana, con el fin de efectuar la **validación** y/o priorización de las actividades de mejoramiento a ejecutar en dicho inmueble. Se efectuaron mediciones de las diferentes áreas a priorizar y se dejó registro fotográfico del estado inicial de las posibles áreas a intervenir. Se elaborará el presupuesto de acuerdo con las actividades priorizadas:
BARRIO O TERRITORIO: USMINIA - BARRIO VILLA ALEMANA II SECTOR FECHA: 28/01/2021			
38	MVUS_0638	EDWIN ARLEY QUINMBAYO QUINTERO	Personal técnico y social de la interventoría y el contratista realizaron visitas de seguimiento al avance de obras, evidenciando inicio de actividades. Se demolió el enchape de piso de la zona de la lavandería, y el enchape del mesón de cocina. Se alistaron los pisos de cocina, comedor, lavandería y pasillo. Se enchaparon con cerámica los pisos de las alcobas 2 y 3, área de cocina y comedor. Se registró en bitácora el avance de las diferentes actividades. Se efectuó registro fotográfico del avance de obra.
39	MVUS_0682	JOSE DEL CARMEN SANCHEZ PAEZ	Personal técnico y social de la interventoría y el contratista realizaron visitas de seguimiento al avance de obras, evidenciando inicio de actividades. A nivel del 2° piso se pañetaron los muros de la alcoba 2, estar de alcobas, pasillo, cocina, baño, y se inició el pañete de muros de la sala comedor. Se registró en bitácora el avance de las diferentes actividades. Se efectuó registro fotográfico del avance de obra.
40	MVUS_0707	LUZ MERY YARA MATOMA	Personal técnico y social de la interventoría y el contratista realizaron visitas de seguimiento al avance de obras, evidenciando inicio de actividades. Se demolió la baldosa de piso del baño y cocina de la sala. Se levantó hilada de bloque en alcoba principal y alcobas 2, 3 y 4, los cuales quedan pañetados. Se pañetaron los muros de la alcoba principal y del hall de llegada. Se alistaron pisos de la alcoba principal. Se registró en bitácora el avance de las diferentes actividades. Se efectuó registro fotográfico del avance de obra.
BARRIO O TERRITORIO: USMINIA - BARRIO ANTONIO JOSE DE SUCRE III FECHA: 28/01/2021			
41	MV_21283	TERESA DE JESUS OSORIO ORTIZ	Personal técnico y social de la interventoría y el contratista realizaron visitas de seguimiento al avance de obras, evidenciando inicio de actividades. En el área dela entrada 1, se demolió la baldosa de piso y pared del baño, se alistó el piso de la sala comedor, cocina, lavandería, baño y se inició el enchape de piso de la sala comedor. En la entrada 2, se demolió el enchape de piso de la alcoba 2. Se registró en bitácora el avance de las diferentes actividades. Se efectuó registro fotográfico del avance de obra.

5. PLAN DE ACCIÓN RESULTADO DEL ANÁLISIS DE CAUSAS REGISTRADO EN EL NUMERAL ANTERIOR - CON EL OBJETIVO DE ELIMINAR LA CAUSA RAÍZ DE LA SITUACIÓN PROBLEMÁTICA - PLAN DE MEJORA

ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA
En conjunto con el contratista y la interventoría se elaborarán los respectivos presupuestos iniciales de obra de las viviendas validadas. Se harán visitas de seguimiento en las viviendas aperturadas, para verificar avance y calidad de las obras proyectadas en cada vivienda.	Residentes de interventoría y de contratista	31/01/2021

6. ACTIVIDADES NO PREVISTAS Y MAYORES CANTIDADES

Se ajustarán, en caso de ser necesario, las cantidades de obra de las diferentes actividades que se desarrollan en las viviendas, velando porque se invierta el presupuesto proyectado.

7. COMENTARIOS DEL INTERVENTOR: Por favor realice la descripción general del estado del contrato y según aplique informe sobre: actividades realizadas en la semana, control de lluvias, compra y suministro de materiales, mano de obra, subcontratos y tramites ante las diferentes empresas prestadoras de servicios, entre otros. Anexe las actas de seguimiento realizadas en la semana correspondiente al periodo del informe.

Barrio o Territorio: Ciudad Bolivar y Usminia

Durante la presente semana se validó una (1) vivienda en el barrio Santa Viviana.

Durante la presente semana se validó una (1) vivienda en el barrio Santa Viviana. Se avanza en las actividades proyectadas. Se continúa el acopio de materiales para alistado y pañete (arena y cemento), baldosas para enchape de piso y pared, tablillas de pvc para cielo raso.


A la fecha del informe se han validado un total de 41 viviendas, de las cuales se han terminado y entregado, dieciséis (16) viviendas en el barrio Nueva Colombia. Se iniciaron obras en cinco (5) viviendas del barrio Mirador (Nutivara); tres (3) en Villa Alemana II sector y una (1) en el barrio Antonio José de Sucre III, de la localidad de Usminia. Quedan por aperturar ocho (8) viviendas en el barrio Mirador (Nutivara); tres (3) en el barrio Villas El Diamante; tres (3) en Arborizadora Alta; dos (2) en Santa Viviana.

Durante la semana se presentó tiempo seco.


8. REGISTRO FOTOGRAFICO DEL AVANCE DURANTE LA SEMANA


(SE ADJUNTA REGISTRO FOTOGRAFICO)

REGISTRO FOTOGRÁFICO

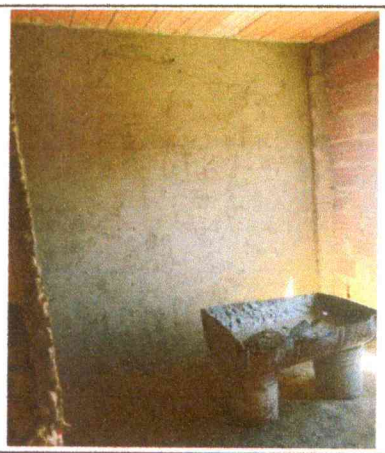


FECHA	sábado, 30 de enero de 2021
DESCRIPCION MVCB 1873	
Avance pañete de muros alcoba posterior 2° piso	

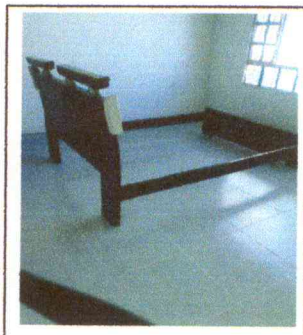





FECHA	sábado, 30 de enero de 2021
DESCRIPCION MVCB 1886	
Enchape cerámico de pisos de sala y alcobas 2° piso	

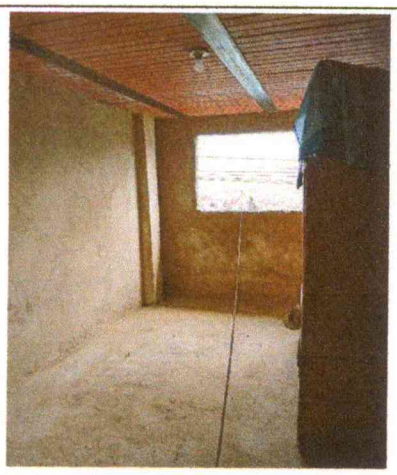

FECHA	miércoles, 27 de enero de 2021
DESCRIPCION MVCB 1836	
Avance pañete de muros en alcoba principal	

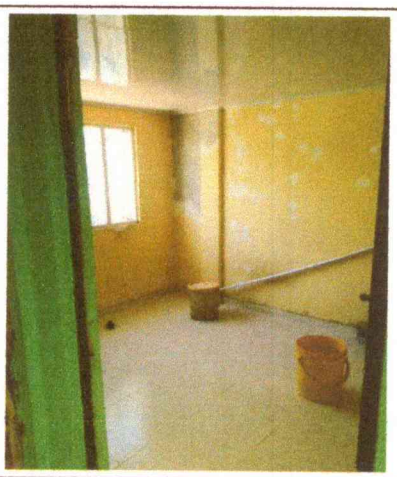

FECHA	sábado, 30 de enero de 2021
DESCRIPCION MVCB 1684	
Instalación de enchape de piso y cielo raso en alcoba 2	

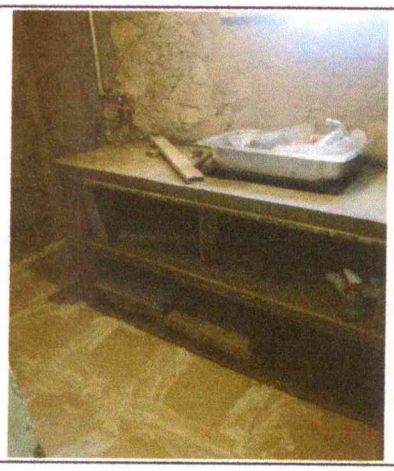


FECHA	sábado, 30 de enero de 2021
DESCRIPCION MVCB 1829	
Avance de obras en área de cocina	




FECHA	sábado, 30 de enero de 2021
DESCRIPCION MVCB 1829	
Avance instalación enchape piso en sala comedor	


REGISTRO FOTOGRÁFICO

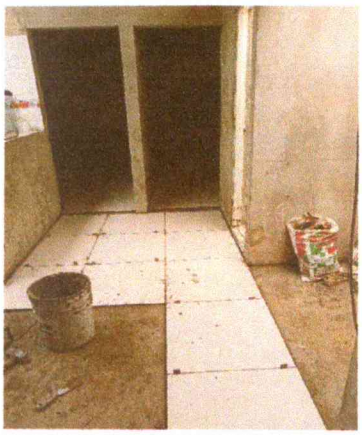

FECHA	jueves, 28 de enero de 2021
DESCRIPCION MVCB 0638	
Avance instalación enchape en piso del comedor	

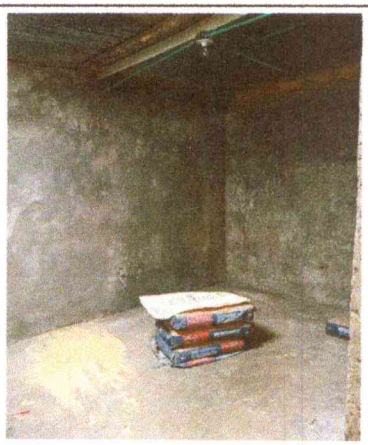


FECHA	jueves, 28 de enero de 2021
DESCRIPCION MVCB 0682	
Avance pañete de muros de alcoba en el 2° piso	

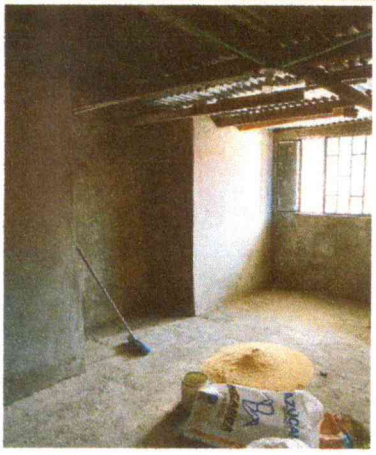


FECHA	jueves, 28 de enero de 2021
DESCRIPCION MVCB 0707	
Avance pañete de muros de alcoba principal	



FECHA	jueves, 28 de enero de 2021
DESCRIPCION MVCB 21283	
Instalación enchape cerámico en piso de sala comedor de la entrada 1	

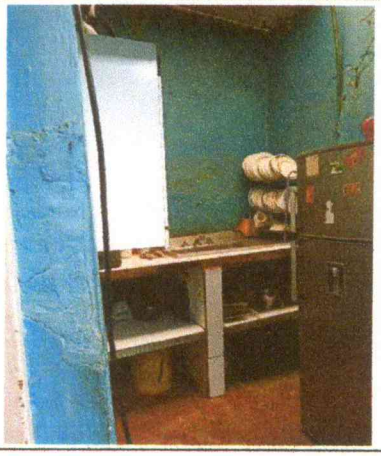

FECHA	lunes, 25 de enero de 2021
DESCRIPCION MVCB 09083	
Validación vivienda	

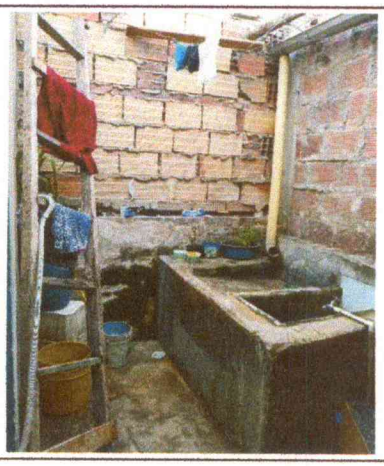

FECHA	lunes, 25 de enero de 2021
DESCRIPCION MVCB 09083	
Validación vivienda	

Subsecretaria de Coordinacion Operativa
Subdireccion de Barrios
Seguimiento ejecución proyectos de Mejoramiento de Vivienda - Habitabilidad

Proyecto mejoramiento de vivienda - AVANCE EJECUCIÓN SEMANAL

Fecha: **31-ene-21**

Consorcio mejoramiento EP 2020 - Contratista de obra

Contratato de obra	694-2020			Plazo	Cinco (5) meses
Objeto	Contratar la ejecución de las obras de mejoramiento de vivienda en la modalidad de habitabilidad de los proyectos estructurados en los territorios priorizados por la Secretaria Distrital de Habitat. Grupo I			Acta de inicio	4 de noviembre de 2020
CDP No.	No. 914 del 14 de julio de 2020	CRP No.		Valor del contrato	TRES MIL SETECIENTOS VEINTICUATRO MILLONES CIENTO TREINTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS DIEZ Y NUEVE PESOS ($3.724.135.319) M/Cte

Gonzalo Lievano Hoyos -INPLAYCO S.A.S.

Contratato de interventoría	701-2020			Plazo	Seis (6) meses
Objeto	Realizar la interventorias técnica, jurídica, social, administrativa y financiera, para la ejecución de las obras de mejoramiento de vivienda en la modalidad de habitablidad en los territorios priorizados por la secretaría distrital de hábitat.			Acta de inicio	04 de noviembre 2020
CDP No	No. 892 del 14 de julio de 2020	CRP No.		Valor del contrato	OCHOCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS M/CTE ($894.285.952),

Fase 1: Validación de la información entregada por el la SDHT									Fase 2: Ejecución de obras				
					Validación				Ejecución				
Territorio o barrio a intervenir	CIUDAD BOLIVAR	Barrios	Predios	Total Predios	Validada	V/Por Validar		V/Modificada	En Ejecución	Terminadas	Por Ejecutar	% de Avance	Acta de Entrega a Satisfacción
Arq o Ing. Responsable		ALTOS DE JALISCO	18		18	0		0	2	10	6	4,35%	10
		MIRADOR NUTIVARA	6		6	0		0	0	0	6	0,00%	0
Técnico Responsable	CRISTIAN VELASCO	ROCIO ALTOS DEL SUR	4		4	0		0	1	3	0	1,24%	3
		LA ESCALA	1		1	0		0	0	1	0	0,40%	1
		ACACIAS SUR	1		1	0		0	0	0	1	0,00%	0
		BARRIO GIBRALTAR I Y II	4		4	0		0	0	0	4	0,00%	0
		LA ESCALA 3ER SECTOR	2		2	0		0	0	0	2	0,00%	0
		CIUDAD MILAGRO	1		1	0		0	0	0	1	0,00%	0
		VILLAS DEL DIAMANTE	3		3	0		0	0	0	3	0,00%	0
		ARBORIZADORA ALTA	1	49	1	0		0	0	0	1	0,00%	0
		JERUSALEN	1		1	0		0	0	0	1	0,00%	0
		EL MIRADOR	1		1	0		0	0	0	1	0,00%	0
		VILLA ISRAEL	1		1	0		0	1	0	0	0,03%	0
		VILLA ANITA SUR	1		1	0		0	1	0	0	0,07%	0
		EL ESPINO	1		1	0		0	1	0	0	0,06%	0
		EL VIRREY	1		1	0		0	0	0	1	0,00%	0
		SAN LUIS	1		1	0		0	0	0	1	0,00%	0
		LAS DELICIAS DEL SUR	1		1	0		0	0	0	1	0,00%	0
Subtotal			49	49	49	0		0	6	14	29	6,14%	14

AVANCE DE EJECUCIÓN SEMANAL										ENERO				
Proyecto				FASE I			Tiempo Programacion			SEMANA DEL 28 AL 3	SEMANA DEL 4 AL 10	SEMANA DEL 11 AL 17	SEMANA DEL 18 AL 24	SEMANA DEL 25 AL 31
No.	ID_DMV	Direccion	Nombres y apellidos	Vi Validada	Vi Modificada	Vi/inicial	Fecha inicio	Fecha terminada	F. Inicio	9 semana	10 semana	11 semana	12 semana	13 semana
ALTOS DE JALISCO														
1	MVJA_2992	KR 18N BIS 61C 21 SUR	ISAURA AREVALO MALAGON	SI		$11.478.755	27/11/2020	26/12/2020	27/11/2020	0%	0%	0%	0%	100%
2	MVJA_3141	KR 18P 62 A 30 SUR MJ	GLORIA CRISTINA GUTIERREZ GARZON	SI		$11.433.514	26/11/2020	4/02/2021	26/11/2020	10%	15%	20%	0%	25%
3	MVJA_3146	KR 18P 62A 45 SUR MJ	CLARA INES GIL BAEZ	SI		$11.428.313	26/11/2020	5/02/2021	26/11/2020	8%	25%	20%	0%	25%
4	MVJA_3335	KR 18P BIS B 62A 48 SUR MJ	MYRIAM PATRICIA SARMIENTO APONTE	SI		$11.177.053	26/11/2020	28/01/2021	26/11/2020	35%	15%	15%	10%	100%
5	MVJA_3314	KR 18P BIS B 61D 36 SUR	MARIA OLMA MOLANO ROMERO	SI		$11.814.493	26/11/2020	26/12/2020	26/11/2020	0%	0%	0%	0%	100%
6	MVJA_3239	KR 18P BIS A 61C 22 SUR MJ	NATIVIDAD SILDANA CELYS VIUDA DE GARCIA	SI		$11.459.853	EN FASE DE VALIDACION	EN FASE DE VALIDACION	EN FASE DE VALIDACION	0%	0%	0%	0%	0%
7	MVJA_0259	CL 70H SUR 18L 16	ALBA CARMEN ARDILA MATEUS	SI		$11.264.898	24/11/2020	19/01/2021	24/11/2020	15%	40%	15%	0%	100%
8	MVJA_3223	KR 18P BIS A 61A 55 SUR	MYRIAM AMPARO GÓMEZ DE GALVIS	SI		$11.811.986	27/11/2020	26/12/2020	27/11/2020	0%	0%	0%	0%	100%
9	MVJA_3231	KR 18P BIS A 61B 12 SUR MJ	SOFIA MORENO	SI		$11.630.690	24/11/2020	26/01/2021	24/11/2020	20%	10%	10%	20%	100%
10	MVJA_3119	KR 18P 61A 67 SUR MJ	LUZ YANID PADUA	SI		$7.121.160	24/11/2020	30/01/2021	24/11/2020	5%	30%	0%	0%	100%
11	MVJA_3125	KR 18P 61 A 76 SUR MJ	MARIA AURORA RENGIFO	SI		$9.222.769	24/11/2020	26/12/2020	24/11/2020	0%	0%	0%	0%	100%
12	MVJA_0252	CL 61D SUR 18N 30 MJ	JESUS ANTONIO ORTIZ CASTRO	SI		$11.693.259	16/12/2020	16/01/2021	16/12/2020	10%	45%	10%	0%	100%

13	MVJA_2986	KR 18N BIS 61D 18 SUR	MARIA DEL SOCORRO CUPITRA CACAIS	SI		$11.787.984	24/11/2020	26/12/2020	24/11/2020	0%	0%	0%	0%	100%
14	MVJA_2712	KR 18M 62 29 SUR	JOSE ALIRIO ORTIZ CABRERA Y OTRA	SI		$11.813.746	EN FASE DE VALIDACION	EN FASE DE VALIDACION	EN FASE DE VALIDACION	0%	0%	0%	0%	0%
15	MVJA_2787	KR 18M 62 12 SUR	ANA LUISA BERNAL PULIDO	SI		56.092.091	EN FASE DE VALIDACION	EN FASE DE VALIDACION	EN FASE DE VALIDACION	0%	0%	0%	0%	0%
16	MVJA_2640	KR 18L BIS A 61D 47 SUR	PAOLA ANDREA BARRERA PELAEZ	SI NO		$11.440.930	FASE DE VALIDACION	FASE DE VALIDACION	FASE DE VALIDACION	0%	0%	0%	0%	0%
17	MVJA_2371	KR 18K 61B 02 SUR	ANA EDELMIRA ATARA ESPITIA	SI NO		$11.418.392	FASE DE VALIDACION	FASE DE VALIDACION	FASE DE VALIDACION	0%	0%	0%	0%	0%
18	MVJA_2978	KR 18N BIS 61A 53 SUR	BLANCA LEONOR RIOS CHAPARRO	SI NO		$11.821.739	FASE DE VALIDACION	FASE DE VALIDACION	FASE DE VALIDACION	0%	0%	0%	0%	0%
MIRADOR NUTIVARA														
19	MVCB_1774	CL 70I SUR 18N 23	JOSE WILSON MARULANDA GIRALDO	SI		$11.815.816	EN FASE DE VALIDACION	EN FASE DE VALIDACION	EN FASE DE VALIDACION	0%	0%	0%	0%	0%
20	MVCB_1742	CL 70I SUR 18N 34	ANA ELSIA MENDOZA DE HERNANDEZ	SI		$11.779.533	EN FASE DE VALIDACION	EN FASE DE VALIDACION	EN FASE DE VALIDACION	0%	0%	0%	0%	0%
21	MVCB_1907	CL 70N SUR 18N 22	ANA ROSA LLANOS DE GARCIA	SI		$11.042.205	EN FASE DE VALIDACION	EN FASE DE VALIDACION	EN FASE DE VALIDACION	0%	0%	0%	0%	0%
22	MVCB_1861	CL 70H SUR 18N 46 MI	MARICELO ARIAS CERQUERA	SI		$11.651.309	EN FASE DE VALIDACION	EN FASE DE VALIDACION	EN FASE DE VALIDACION	0%	0%	0%	0%	0%
23	MVCB_1698	CL 70I SUR 18P 22	LUZ AMALFI GUTIERREZ FRANCO	SI		59.465.986	EN FASE DE VALIDACION	EN FASE DE VALIDACION	EN FASE DE VALIDACION	0%	0%	0%	0%	0%
24	MVCB_1708	TV 18R 70H 57 SUR	MARIA EUGENIA TRUJILLO QUIMBAYO	SI		$11.722.491	FASE DE VALIDACION	FASE DE VALIDACION	FASE DE VALIDACION	0%	0%	0%	0%	0%
ROCIO ALTOS DEL SUR														
25	MVJA_2981	DG 69A BIS D SUR 18M 06	LEONOR TOVAR BARRERO	SI NO		$11.825.816	27/11/2020	5/02/2021	27/11/2020	0%	3%	0%	29%	0%
26	MVJA_2812	KR 18M BIS 61C 29 SUR	ANDREA JENNIFFER ACOSTA MENDIVELSO	SI NO		$10.471.857	27/11/2020	24/12/2020	27/11/2020	0%	0%	0%	0%	188%
27	MVJA_2909	KR 18N 61C 27 SUR	BLANCA CECILIA ALFONSO BOHORQUEZ	SI NO		$11.742.986	27/11/2020	24/12/2020	27/11/2020	0%	48%	8%	5%	102%
28	MVJA_0186	CL 61C SUR 18N 03	ISABEL ARDILA VARGAS	SI NO		58.994.273	27/11/2020	24/12/2020	27/11/2020	0%	0%	35%	0%	108%
LA ESCALA														
29	MVJA_2672	KR 18M 61 15 SUR MJ	CARLOS OLIMPO SEGURA GUERRERO	SI NO		$11.793.878	26/11/2020	23/01/2021	26/11/2020	25%	0%	45%	0%	100%
ACACIAS SUR														
30	MVJA_0588	CL 62A SUR 18R 13	RODULFO BEJARANO	SI NO		$11.813.894	FASE DE VALIDACION	FASE DE VALIDACION	FASE DE VALIDACION	0%	0%	0%	0%	0%
BARRIO GIBRALTAR I Y II														
31	MVJA_6834	CL 63A SUR 18Q 05	CLARA INES OCHOA GUTIERREZ	SI NO		59.526.817	FASE DE VALIDACION	FASE DE VALIDACION	FASE DE VALIDACION	0%	0%	0%	0%	0%
32	MVJA_3011	KR 18N BIS 63 27 SUR	RITA DEL CARMEN FONSECA CAMARGO	SI NO		$11.511.935	FASE DE VALIDACION	FASE DE VALIDACION	FASE DE VALIDACION	0%	0%	0%	0%	0%
33	MVJA_3157	KR 18P 63 16 SUR	IRIA ESTHER SILVA	SI NO		$11.683.822	FASE DE VALIDACION	FASE DE VALIDACION	FASE DE VALIDACION	0%	0%	0%	0%	0%
34	MVJA_3387	KR 18Q 63D 18 SUR	LUZ MARINA ROBAYO ALVARADO	SI NO		$11.795.938	FASE DE VALIDACION	FASE DE VALIDACION	FASE DE VALIDACION	0%	0%	0%	0%	0%
LA ESCALA 3ER SECTOR														
35	MVJA_6502	CL 62A SUR 18N 26	ROSALBA JARA DE ROJAS	SI NO		$10.438.708	FASE DE VALIDACION	FASE DE VALIDACION	FASE DE VALIDACION	0%	0%	0%	0%	0%
36	MVJA_6519	CL 62A SUR 18K 26	NESTOR JAVIER VALENZUELA PEÑA			$11.823.991	FASE DE VALIDACION	FASE DE VALIDACION	FASE DE VALIDACION	0%	0%	0%	0%	0%
CIUDAD MILAGRO														
37	MVJA_6365	CL 62 SUR 18K 78	JOSE ORVEY ORTIZ	SI NO		59.076.509	FASE DE VALIDACION	FASE DE VALIDACION	FASE DE VALIDACION	0%	0%	0%	0%	0%
VILLAS DEL DIAMANTE														
38	MVCB_5474	CL 70F SUR 19F 18 MV	OLIVA RIVERA	SI NO		$11.783.640	FASE DE VALIDACION	FASE DE VALIDACION	FASE DE VALIDACION	0%	0%	0%	0%	0%
39	MVCB_5365	CL 70B SUR 18R 29	MARÍA CRISTINA GONZALEZ GARCÍA	SI NO		$10.807.904	FASE DE VALIDACION	FASE DE VALIDACION	FASE DE VALIDACION	0%	0%	0%	0%	0%
40	MVCB_5388	CL 70C SUR 18R 48	DUBERNEY ARIAS BETANCUR	SI NO		$11.480.264	FASE DE VALIDACION	FASE DE VALIDACION	FASE DE VALIDACION	0%	0%	0%	0%	0%
ARBORIZADORA ALTA														
41	MV_16742	KR 38 75 54 SUR	DONELLA PATIÑO MURILLO	SI NO		$10.949.413	FASE DE VALIDACION	FASE DE VALIDACION	FASE DE VALIDACION	0%	0%	0%	0%	0%
JERUSALEN														
42	MV_17151	KR 38 79A 38 SUR	GUSTAVO VILLAREAL BERMUDEZ	SI NO		$11.825.431	FASE DE VALIDACION	FASE DE VALIDACION	FASE DE VALIDACION	0%	0%	0%	0%	0%
EL MIRADOR														
43	MV_09324	CL 71C SUR 27B 15	ALDEMAR DUARTE LOPEZ	SI NO		$11.259.469	FASE DE VALIDACION	FASE DE VALIDACION	FASE DE VALIDACION	0%	0%	0%	0%	0%
VILLA ISRAEL														
44	MVJB_0636	KR 5A BIS 110 34 SUR	EMPERATRIZ RODRIGUEZ LOPEZ	SI NO		$11.770.604	20/01/2021	20/02/2021	20/01/2021	0%	0%	0%	0%	7%
VILLA ANITA SUR														
45	MV_21099	KR 8 115B 11 SUR	ALEXANDER BERNAL AVENDAÑO	SI NO		$11.824.801	20/01/2021	20/02/2021	20/01/2021	0%	0%	0%	0%	18%
EL ESPINO														
46	MVJB_0236	CL 115B SUR 38 11	JORGE GABRIEL BUITRAGO INFANTE	SI NO		$11.632.663	20/01/2021	20/02/2021	20/01/2021	0%	0%	0%	0%	15%
EL VIRREY														
47	MV_20386	KR 44 97 15 SUR	JUAN FRANCISCO MEDINA SALAZAR	SI NO		$11.510.651	FASE DE VALIDACION	FASE DE VALIDACION	FASE DE VALIDACION	0%	0%	0%	0%	0%
SAN LUIS														
48	MVJA_1876	DG 64 BIS A SUR 18V 15	JOSE OMAR CAMACHO TELLEZ	SI NO		$11.780.072	FASE DE VALIDACION	FASE DE VALIDACION	FASE DE VALIDACION	0%	0%	0%	0%	0%
LAS DELICIAS DEL SUR														
49	MVJA_3287	KR 18P BIS A 65 10 SUR MJ	NELLY PIZA BUITRAGO	SI NO		$11.812.011	FASE DE VALIDACION	FASE DE VALIDACION	FASE DE VALIDACION	0%	0%	0%	0%	0%

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DEL HÁBITAT

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

PROYECTOS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA

INPLAYCO S.A.S.
Ingenieros Constructores e Interventores

FECHA	31/01/2021	PERIODO No.	13	DEL	25/01/2021	AL	31/01/2021

1. INFORMACIÓN GENERAL

OBJETO DEL CONTRATO	Realizar la interventorias técnica, jurídica, social, administrativa y financiera, para la ejecución de las obras de mejoramiento de vivienda en la modalidad de habitabilidad en los territorios priorizados por la secretaría distrital de hábitat.
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO	Corresponde al Grupo 1 a la ejecución de 254 mejoramientos de vivienda, localizados en 3 localidades: Bosa, Usme y Ciudad Bolívar, esta última localidad incluye cuatro (4) intervenciones de Mejoramientointegral.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA		CONTRATO DE OBRA	
CONTRATO No.:	701-2020	CONTRATO No.:	694--2020
PLAZO INICIAL:	6 meses	PLAZO INICIAL:	5 meses
FECHA DE INICIACIÓN:	4 de noviembre de 2020	FECHA DE INICIACIÓN:	4 de noviembre de 2020
**FECHA DE SUSPENSIÓN:	0	**FECHA DE SUSPENSIÓN:	0
**FECHA DE REINICIACIÓN:	0	**FECHA DE REINICIACIÓN:	0
FECHA DE TERMINACIÓN:	3 de mayo de 2021	FECHA DE TERMINACIÓN:	3 de abril 2021
PLAZO ACTUALIZADO:	0	PLAZO ACTUALIZADO:	0
PLAZO TRANSCURRIDO:	0	PLAZO TRANSCURRIDO:	0
VALOR INICIAL :	$ 894,285,952	VALOR INICIAL :	$ 3,724,135,319
VALOR ADICIONI(ES):	0	VALOR ADICION(ES):	$ -
VALOR ACTUALIZADO:	$ -	VALOR ACTUALIZADO:	$ -
VALOR ANTICIPO:	0	VALOR ANTICIPO:	$ -
VALOR POR PAGAR:	$ -	VALOR POR PAGAR:	$ -
SUPERVISOR:	JUAN CARLOS ARBELAEZ MURILLO	INTERVENTOR:	Gonzalo Llevano Hoyos -INPLAYCO S.A.S.

** Inserte las filas que requiera según el número de suspensiones y reinicios.

2. CONTROL DE HITOS.

No.	*** DESCRIPCIÓN DEL HITO	FECHA PROGRAMADA	FECHA REAL DE CUMPLIMIENTO	DÍAS DE RETRASO
	SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO (HITO OBLIGATORIO)			
1	Validación			
2	Entrega de informe de validación			
3	Ejecución			
	ENTREGA A LA INTERVENTORIA DE LOS PRODUCTOS Y/O ACTIVIDADES CONTRATADAS (HITO OBLIGATORIO)			

***** Inserte las filas que requiera según el número de hitos; teniendo en cuenta que como mínimo se deberán establecer 5 hitos adicionales a los obligatorios de inicio y terminación. Los hitos aprobados por la interventoría se socializarán con el supervisor del contrato para su Vo. Bo. Los Hitos aprobados por la interventoría y SDHT solo se podrán modificar previa novedad contractual que así lo requiera. La matriz ded seguimiento hace parte del presente documento.**


No.	INDICADORES BARRIO O TERRITORIO	VALORES	PORCENTAJE SOBRE EL VALOR TOTAL DEL CONTRATO	DIFERENCIA (+) ADELANTO (-) ATRASO
1	Valor acumulado de las actividades o productos conforme a la programación vigente.	$248,549,443.38	6.67%	
2	Valor acumulado de las actividades o productos ejecutados y aprobados por la Interventoría.	$228,635,784.72	6.14%	


3. ASPECTOS GENERALES INFORME TÉCNICO

Registre los avances y novedades técnicas, sociales, administrativas, contables y financieras, acompañadas por gráficos, cuadros, fotografías, análisis y comentarios sobre el estado de los trabajos, en todos sus aspectos en la fase de validación y ejecución de obra.

Fase de validación y apropiación.

CIUDAD BOLIVAR

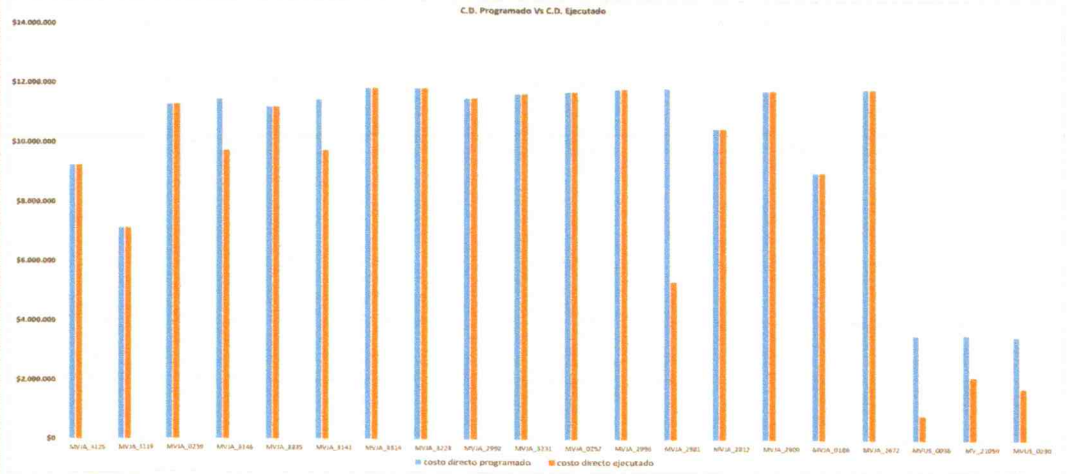

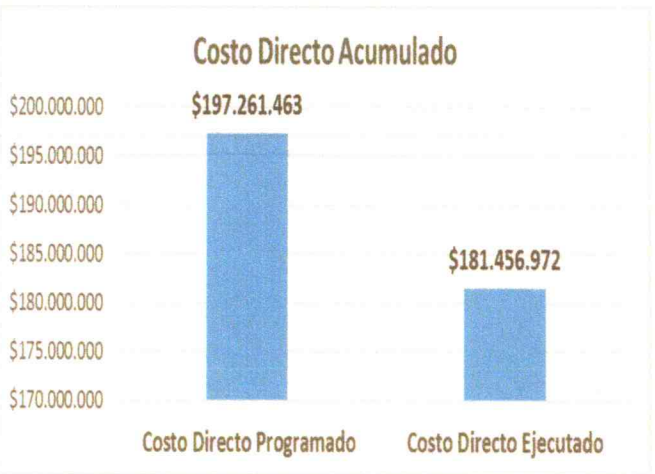

4- COMPONENTE TECNICO BARRIO O TERRITORIO			
ACTIVIDADES EJECUTADAS EN LA SEMANA. - ESTADO DE AVANCE SEMANAL POR VIVIENDA			
BARRIO O TERRITORIO - CIUDAD BOLIVAR			
FECHA: 17- ENE -2021			
	ALTOS DE JALISCO		
1	MVJA_2992	ISAURA AREVALO MALAGON	SE REALIZA ENTREGA A CONFORMIDAD DE LA BENEFICIARIA, SE SOCIALIZA PRESUPUESTO FINAL Y MANUAL DE USO Y MANTENIMIENTO. DE IGUAL MANERA SE HACE ENTREGA DE KIT ECOLOGICO.
2	MVJA_3141	GLORIA CRISTINA GUTIERREZ GARZON	SE REALIZA VISITA DE SEGUINMIENTO TECNICO, EN LA CUAL SE EVIDENCIAN TRABAJADORES Y AVANCES EN EJECUCIÓN
3	MVJA_3146	CLARA INES GIL BAEZ	SE REALIZA VISITA DE SEGUINMIENTO TECNICO, EN LA CUAL SE EVIDENCIAN TRABAJADORES Y AVANCES EN EJECUCIÓN
4	MVJA_3335	MYRIAM PATRICIA SARMIENTO APONTE	SE REALIZA ENTREGA A CONFORMIDAD DE LA BENEFICIARIA, SE SOCIALIZA PRESUPUESTO FINAL Y MANUAL DE USO Y MANTENIMIENTO. DE IGUAL MANERA SE HACE ENTREGA DE KIT ECOLOGICO.
5	MVJA_3314	MARIA OLMA MOLANO ROMERO	SE REALIZA ENTREGA A CONFORMIDAD DE LA BENEFICIARIA, SE SOCIALIZA PRESUPUESTO FINAL Y MANUAL DE USO Y MANTENIMIENTO. DE IGUAL MANERA SE HACE ENTREGA DE KIT ECOLOGICO.
6	MVJA_3239	NATIVIDAD SILDANA CELYS VIUDA DE GARCIA	Se hace validación en la vivienda, se definen espacios a intervenir, se hace levantamiento arquitectonico para calculo de cantidades de obra
7	MVJA_0259	ALBA CARMEN ARDILA MATEUS	SE REALIZA ENTREGA A CONFORMIDAD DE LA BENEFICIARIA, SE SOCIALIZA PRESUPUESTO FINAL Y MANUAL DE USO Y MANTENIMIENTO. DE IGUAL MANERA SE HACE ENTREGA DE KIT ECOLOGICO.
8	MVJA_3223	MYRIAM AMPARO GÓMEZ DE GALVIS	SE REALIZA ENTREGA A CONFORMIDAD DE LA BENEFICIARIA, SE SOCIALIZA PRESUPUESTO FINAL Y MANUAL DE USO Y MANTENIMIENTO. DE IGUAL MANERA SE HACE ENTREGA DE KIT ECOLOGICO.
9	MVJA_3231	SOFIA MORENO	SE REALIZA ENTREGA A CONFORMIDAD DE LA BENEFICIARIA, SE SOCIALIZA PRESUPUESTO FINAL Y MANUAL DE USO Y MANTENIMIENTO. DE IGUAL MANERA SE HACE ENTREGA DE KIT ECOLOGICO.
10	MVJA_3119	LUZ YANID PADUA	SE REALIZA ENTREGA A CONFORMIDAD DE LA BENEFICIARIA, SE SOCIALIZA PRESUPUESTO FINAL Y MANUAL DE USO Y MANTENIMIENTO. DE IGUAL MANERA SE HACE ENTREGA DE KIT ECOLOGICO.
11	MVJA_3125	MARIA AURORA RENGIFO	SE REALIZA ENTREGA A CONFORMIDAD DE LA BENEFICIARIA, SE SOCIALIZA PRESUPUESTO FINAL Y MANUAL DE USO Y MANTENIMIENTO. DE IGUAL MANERA SE HACE ENTREGA DE KIT ECOLOGICO.
12	MVJA_0252	JESUS ANTONIO ORTIZ CASTRO	SE REALIZA ENTREGA A CONFORMIDAD DE LA BENEFICIARIA, SE SOCIALIZA PRESUPUESTO FINAL Y MANUAL DE USO Y MANTENIMIENTO. DE IGUAL MANERA SE HACE ENTREGA DE KIT ECOLOGICO.
13	MVJA_2996	MARIA DEL SOCORRO CUPITRA CACAIS	SE REALIZA ENTREGA A CONFORMIDAD DE LA BENEFICIARIA, SE SOCIALIZA PRESUPUESTO FINAL Y MANUAL DE USO Y MANTENIMIENTO. DE IGUAL MANERA SE HACE ENTREGA DE KIT ECOLOGICO.
14	MVJA_2712	JOSE ALIRIO ORTIZ CABRERA Y OTRA	Se hace validación en la vivienda, se definen espacios a intervenir, se hace levantamiento arquitectonico para calculo de cantidades de obra
15	MVJA_2707	ANA LUISA BERNAL PULIDO	Se hace validación en la vivienda, se definen espacios a intervenir, se hace levantamiento arquitectonico para calculo de cantidades de obra
16	MVJA_2640	PAOLA ANDREA BARRERA PELAEZ	Se hace validación en la vivienda, se definen espacios a intervenir, se hace levantamiento arquitectonico para calculo de cantidades de obra
17	MVJA_2371	ANA EDELMIRA ATARA ESPITIA	Se hace validación en la vivienda, se definen espacios a intervenir, se hace levantamiento arquitectonico para calculo de cantidades de obra
18	MVJA_2976	BLANCA LEONOR RIOS CHAPARRO	Se hace validación en la vivienda, se definen espacios a intervenir, se hace levantamiento arquitectonico para calculo de cantidades de obra
	MIRADOR NUTIVARA		
19	MVCB_1774	JOSE WILSON MARULANDA GIRALDO	Se hace validación en la vivienda, se definen espacios a intervenir, se hace levantamiento arquitectonico para calculo de cantidades de obra
20	MVCB_1742	ANA ELVIA MENDOZA DE HERNANDEZ	Se hace validación en la vivienda, se definen espacios a intervenir, se hace levantamiento arquitectonico para calculo de cantidades de obra
21	MVCB_1907	ANA ROSA LLANOS DE GARCIA	Se hace validación en la vivienda, se definen espacios a intervenir, se hace levantamiento arquitectonico para calculo de cantidades de obra. Cubierta en pesimas condiciones se solicita aprobacion para intervencion de cubierta con estructura en su totalidad
22	MVCB_1661	MARICIELO ARIAS CERQUERA	Se hace validación en la vivienda, se definen espacios a intervenir, se hace levantamiento arquitectonico para calculo de cantidades de obra
23	MVCB_1698	LUZ AMALFI GUTIERREZ FRANCO	Se hace validación en la vivienda, se definen espacios a intervenir, se hace levantamiento arquitectonico para calculo de cantidades de obra
24	MVCB_1708	MARIA EUGENIA TRUJILLO QUIMBAYO	Se hace validación en la vivienda, se definen espacios a intervenir, se hace levantamiento arquitectonico para calculo de cantidades de obra
	ROCIO ALTOS DEL SUR		
25	MVJA_2981	LEONOR TOVAR BARRERO	SE REALIZA VISITA DE SEGUINMIENTO TECNICO, EN LA CUAL SE EVIDENCIAN TRABAJADORES Y AVANCES EN EJECUCIÓN
26	MVJA_2812	ANDREA JENNIFFER ACOSTA MENDIVELSO	SE REALIZA ENTREGA A CONFORMIDAD DE LA BENEFICIARIA, SE SOCIALIZA PRESUPUESTO FINAL Y MANUAL DE USO Y MANTENIMIENTO. DE IGUAL MANERA SE HACE ENTREGA DE KIT ECOLOGICO.
27	MVJA_2909	BLANCA CECILIA ALFONSO BOHORQUEZ	SE REALIZA ENTREGA A CONFORMIDAD DE LA BENEFICIARIA, SE SOCIALIZA PRESUPUESTO FINAL Y MANUAL DE USO Y MANTENIMIENTO. DE IGUAL MANERA SE HACE ENTREGA DE KIT ECOLOGICO.
28	MVJA_0188	ISABEL ARDILA VARGAS	SE REALIZA ENTREGA A CONFORMIDAD DE LA BENEFICIARIA, SE SOCIALIZA PRESUPUESTO FINAL Y MANUAL DE USO Y MANTENIMIENTO. DE IGUAL MANERA SE HACE ENTREGA DE KIT ECOLOGICO.
	LA ESCALA		
29	MVJA_2672	CARLOS OLIMPO SEGURA GUERRERO	SE REALIZA ENTREGA A CONFORMIDAD DE LA BENEFICIARIA, SE SOCIALIZA PRESUPUESTO FINAL Y MANUAL DE USO Y MANTENIMIENTO. DE IGUAL MANERA SE HACE ENTREGA DE KIT ECOLOGICO.
	ACACIAS SUR		
30	MVJA_0598	RODULFO BEJARANO	Se hace validación en la vivienda, se definen espacios a intervenir, se hace levantamiento arquitectonico para calculo de cantidades de obra
	BARRIO GIBRALTAR I Y II		

31	MVJA_0834	CLARA INES OCHOA GUTIERREZ	Se hace validación en la vivienda, se definen espacios a intervenir, se hace levantamiento arquitectonico para calculo de cantidades de obra
32	MVJA_3011	RITA DEL CARMEN FONSECA CAMARGO	Se hace validación en la vivienda, se definen espacios a intervenir, se hace levantamiento arquitectonico para calculo de cantidades de obra
33	MVJA_3157	IRIA ESTHER SILVA	e validación en la vivienda, se definen espacios a intervenir, se hace levantamien uitectonico para calculo de cantidades de obra
34	MVJA_3397	LUZ MARINA ROBAYO ALVARADO	Se hace validación en la vivienda, se definen espacios a intervenir, se hace levantamiento arquitectonico para calculo de cantidades de obra
		LA ESCALA 3ER SECTOR	
35	MVJA_0502	ROSALBA JARA DE ROJAS	Se hace validación en la vivienda, se definen espacios a intervenir, se hace levantamiento arquitectonico para calculo de cantidades de obra
36	MVJA_0519	NESTOR JAVIER VALENZUELA PEÑA	Se hace validación en la vivienda, se definen espacios a intervenir, se hace levantamiento arquitectonico para calculo de cantidades de obra
		CIUDAD MILAGRO	
37	MVJA_0395	JOSE ORVEY ORTIZ	Se hace validación en la vivienda, se definen espacios a intervenir, se hace levantamiento arquitectonico para calculo de cantidades de obra
		VILLAS DEL DIAMANTE	
38	MVCB-5474	OLIVIA RIVERA	SE REALIZA VISITA DE VALIDACION. SE TOMAN MEDIDAS PARA REALIZACION DE PRESUPUESTOS Y POSTERIORMENTE DEFINIR AREAS A INTERVENIR
39	MVCB-5395	MARÍA CRISTINA GONZALEZ GARCÍA	SE REALIZA VISITA DE VALIDACION. SE TOMAN MEDIDAS PARA REALIZACION DE PRESUPUESTOS Y POSTERIORMENTE DEFINIR AREAS A INTERVENIR
40	MVCB-5388	DUBERNEY ARIAS BETANCUR	SE REALIZA VISITA DE VALIDACION. SE TOMAN MEDIDAS PARA REALIZACION DE PRESUPUESTOS Y POSTERIORMENTE DEFINIR AREAS A INTERVENIR
		ARBORIZADORA ALTA	
41	MV-15742	DONELIA PATIÑO MURILLO	SE REALIZA VISITA DE VALIDACION. SE TOMAN MEDIDAS PARA REALIZACION DE PRESUPUESTOS Y POSTERIORMENTE DEFINIR AREAS A INTERVENIR
		JERUSALEN	
42	MV-17151	GUSTAVO VILLAREAL BERMUDEZ	SE REALIZA VISITA DE VALIDACION. SE TOMAN MEDIDAS PARA REALIZACION DE PRESUPUESTOS Y POSTERIORMENTE DEFINIR AREAS A INTERVENIR
		EL MIRADOR	
43	MV-05324	ALDEMAR DUARTE LOPEZ	SE REALIZA VISITA DE VALIDACION. SE TOMAN MEDIDAS PARA REALIZACION DE PRESUPUESTOS Y POSTERIORMENTE DEFINIR AREAS A INTERVENIR
		VILLA ISRAEL	
44	MVUS_0036	EMPERATRIZ RODRIGUEZ LOPEZ	SE REALIZA VISITA DE SEGUINMIENTO TECNICO, EN LA CUAL SE EVIDENCIAN TRABAJADORES Y AVANCES EN EJECUCIÓN
		VILLA ANITA SUR	
45	MV_21059	ALEXANDER BERNAL AVENDAÑO	SE REALIZA VISITA DE SEGUINMIENTO TECNICO, EN LA CUAL SE EVIDENCIAN TRABAJADORES Y AVANCES EN EJECUCIÓN
		EL ESPINO	
46	MVUS_0230	JORGE GABRIEL BUITRAGO INFANTE	SE REALIZA VISITA DE SEGUINMIENTO TECNICO, EN LA CUAL SE EVIDENCIAN TRABAJADORES Y AVANCES EN EJECUCIÓN
		EL VIRREY	
47	MV_20306	JUAN FRANCISCO MEDINA SALAZAR	SE REALIZA VISITA DE VALIDACION. SE TOMAN MEDIDAS PARA REALIZACION DE PRESUPUESTOS Y POSTERIORMENTE DEFINIR AREAS A INTERVENIR
		SAN LUIS	
48	MVJA_1876	JOSE OMAR CAMACHO TELLEZ	SE REALIZA VISITA DE VALIDACION. SE TOMAN MEDIDAS PARA REALIZACION DE PRESUPUESTOS Y POSTERIORMENTE DEFINIR AREAS A INTERVENIR
		LAS DELICIAS DEL SUR	
49	MVJA_3257	NELLY PIZA BUITRAGO	SE REALIZA VISITA DE VALIDACION. SE TOMAN MEDIDAS PARA REALIZACION DE PRESUPUESTOS Y POSTERIORMENTE DEFINIR AREAS A INTERVENIR

5. PLAN DE ACCIÓN RESULTADO DEL ANÁLISIS DE CAUSAS REGISTRADO EN EL NUMERAL ANTERIOR - CON EL OBJETIVO DE ELIMINAR LA CAUSA RAÍZ DE LA SITUACIÓN PROBLEMÁTICA - PLAN DE MEJORA

ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA
A la fecha se han realizado 14 entregas a satisfacción de 17 mv en ejecución. se realizan 2 validaciones, seguimientos tecnicos a los 3 MV faltantes por entregar, en los cuales se evidenció avances cosiderables en la ejecución. Los beneficirios manifiestan que los maestros no estan trabajando de turno completo sino que se presentan durante un par de horas y luego se van sin volver en el resto del día, de igual manera manifiestan que hay mucha demora en la entrega de materiales.	CRISTIAN VELASCO	
se le solicita al contratista hacer entrega de una programación acertada, donde se indique las fechas de aperturas y conclusión de las validaciones y aperturas		

6. ACTIVIDADES NO PREVISTAS Y MAYORES CANTIDADES

Se informa que en algunas de las viviendas se presentan mejoras en los acabados finales realizadas por los beneficiarios, por lo tanto se deside intervenir otros espacios en conjunto con el contratista garantizando una adecuada habitabilidad y dignificación de las viviendas

7. COMENTARIOS DEL INTERVENTOR: Por favor realice la descripción general del estado del contrato y según aplique informe sobre: actividades realizadas en la semana, control de lluvias, compra y suministro de materiales, mano de obra, subcontratos y tramites ante las diferentes empresas prestadoras de servicios, entre otros. Anexe las actas de seguimiento realizadas en la semana correspondiente al periodo del informe.

Barrio o Territorio: CIUDAD BOLIVAR


8. REGISTRO FOTOGRAFICO DEL AVANCE DURANTE LA SEMANA

SE ADJUNTA REGISTRO FOTOGRAFICO

REGISTRO FOTOGRÁFICO



FECHA	martes, 26 de enero de 2021
DESCRIPCION MVJA_3231	
ENTREGA	

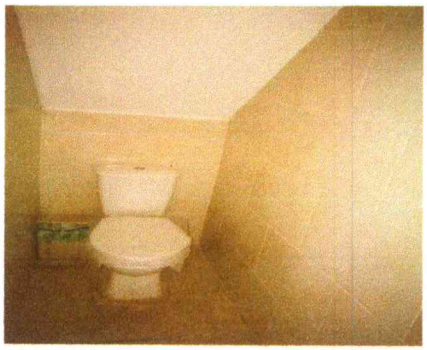

FECHA	martes, 26 de enero de 2021
DESCRIPCION MVJA_3231	
ENTREGA	



FECHA	martes, 26 de enero de 2021
DESCRIPCION MVJA_3231	
ENTREGA	



FECHA	sábado, 30 de enero de 2021
DESCRIPCION MVJA_2909	
ENTREGA	



FECHA	sábado, 30 de enero de 2021
DESCRIPCION MVJA_2909	
ENTREGA	



FECHA	sábado, 30 de enero de 2021
DESCRIPCION MVJA_2909	
ENTREGA	


REGISTRO FOTOGRÁFICO




FECHA	sábado, 30 de enero de 2021
DESCRIPCION MVJA_2976	
VALIDACIÓN	



FECHA	sábado, 30 de enero de 2021
DESCRIPCION MVJA_2976	
VALIDACIÓN	

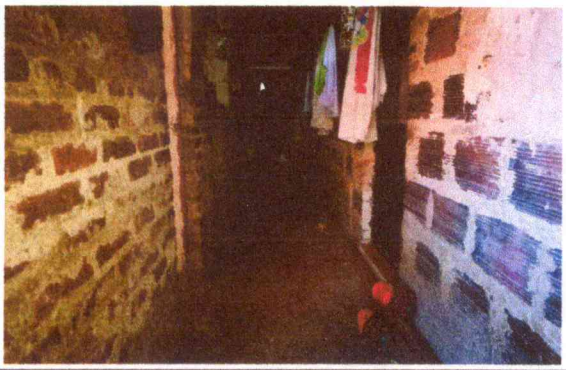

FECHA	sábado, 30 de enero de 2021
DESCRIPCION MVJA_2976	
VALIDACIÓN	



FECHA	lunes, 25 de enero de 2021
DESCRIPCION MVJA_3257	
VALIDACIÓN	



FECHA	lunes, 25 de enero de 2021
DESCRIPCION MVJA_3257	
VALIDACIÓN	



FECHA	lunes, 25 de enero de 2021
DESCRIPCION MVJA_3257	
VALIDACIÓN	

Subsecretaria de Coordinacion Operativa
Subdireccion de Barrios
Seguimiento ejecución proyectos de Mejoramiento de Vivienda - Habitabilidad

Proyecto mejoramiento de vivienda - AVANCE EJECUCIÓN SEMANAL

Fecha	31-ene-21

Consorcio mejoramiento EP 2020 - Contratista de obra

Contratato de obra	694-2020			Plazo	Cinco (5) meses
Objeto	Contratar la ejecución de las obras de mejoramiento de vivienda en la modalidad de habitabilidad de los proyectos estructurados en los territorios priorizados por la Secretaría Distrital de Habitat. Grupo I			Acta de inicio	4 de noviembre de 2020
CDP No.	No. 914 del 14 de julio de 2020	CRP No.		Valor del contrato	TRES MIL SETECIENTOS VEINTICUATRO MILLONES CIENTO TREINTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS DIEZ Y NUEVE PESOS ($3.724.135.319) M/Cte

Gonzalo Llevano Hoyos -INPLAYCO S.A.S.

Contratato de interventoría	701-2020			Plazo	Seis (6) meses
Objeto	Realizar la interventorías técnica, jurídica, social, administrativa y financiera, para la ejecución de las obras de mejoramiento de vivienda en la modalidad de habitabilidad en los territorios priorizados por la secretaría distrital de hábitat.			Acta de inicio	04 de noviembre 2020
CDP No	No. 892 del 14 de julio de 2020	CRP No.		Valor del contrato	OCHOCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS M/CTE ($894.285.952),

Fase 1: Validación de la información entregada por el la SDHT

Territorio o barrio a intervenir	CIUDAD BOLIVAR	Barrios	Predios	Total Predios	Validación				Fase 2: Ejecución de obras				
									Ejecución				
					Validada	V/Por Validar		V/Modificada	En Ejecución	Terminadas	Por Ejecutar	% de Avance	Acta de Entrega a Satisfacción
Arq o Ing. Responsable	ERICK ALVAREZ CADAVID	LA ESCALA 3ER SECTOR	1	54	1	0		0	0	1	0	0.36%	1
		DOMINGO LAIN II	8		8	0		0	1	0	7	0.00%	0
		LUCERO MEDIO	5		5	0		0	0	0	5	0.00%	0
		SAN FERNANDO	2		2			0	0	0	2	0.00%	0
		SAN LUIS	2		2	0		0	0	0	2	0.00%	0
		ACACIAS SUR	2		2	0		0	0	0	2	0.00%	0
		DOMINGO LAIN I	8		8	0		0	0	0	2	0.00%	0
Técnico Responsable		ALTOS DE JALISCO	10		10	0		0	0	3	5	1.16%	3
		LAS DELICIAS DEL SUR ZONA 19	1		1	0		0	1	9	0	3.51%	9
		CIUDAD MILAGRO	3		3	0		0	0	0	1	0.00%	0
		LA ESPERANZA	1		1	0		0	0	0	3	0.00%	0
		GIBRALTAR I Y II	6		6	0		0	0	0	1	0.00%	0
		LORENZO ALCANTUZ	1		1	0		0	0	1	5	0.29%	1
		ANTONIO JOSE DE SUCRE	4		4	0		0	1	0	0	0.25%	0
Subtotal			54	54	54	0		0	4	0	0	0.61%	0
									7	14	33	6.18%	14

AVANCE DE EJECUCIÓN SEMANAL

Proyecto				FASE I			Tiempo Programacion			ENERO				
										SEMANA DEL 28 AL 3	SEMANA DEL 4 AL 10	SEMANA DEL 11 AL 17	SEMANA DEL 18 AL 24	SEMANA DEL 25 AL 31
No.	ID_DMV	Dirección	Nombres y apellidos	V/ Validada	V/ Modificada	V/Inicial	Fecha inicio	Fecha terminación MV	F. Inicio	9 semana	10 semana	11 semana	12 semana	13 semana
DOMINGO LAIN II SECTOR Y CONDOMINIO DEL BOSQUE														
1	MVJA_0723	CL 63 SUR 18K 14	VICTOR MANUEL SAMORA HERNANDEZ	SI		$11,821,595	26/11/2020	EN EJECUCION	26/11/2020	0%	0%	0%	0%	0%
				NO										
2	MVJA_1085	CL 64 BIS SUR 18N 42	MARIA NERY ECHEVERRY DE RESTREPO	SI		$11,689,124	EN FASE DE VALIDACION	EN FASE DE VALIDACION	EN FASE DE VALIDACION	0%	0%	0%	0%	0%
				NO										
3	MVJA_2598	KR 18L BIS 64A 22 SUR	FLOR ANGELA MORANTES LOPEZ	SI		$11,687,520	EN FASE DE VALIDACION	EN FASE DE VALIDACION	EN FASE DE VALIDACION	0%	0%	0%	0%	0%
				NO										
4	MVJA_2476	KR 18K BIS 64A 12 SUR	JAIME HUMBERTO BORDA LIBERATO	SI		$11,622,585	EN FASE DE VALIDACION	EN FASE DE VALIDACION	EN FASE DE VALIDACION	0%	0%	0%	0%	0%
				NO										
5	MVJA_2763	KR 18M 64 21 SUR	CARLOS JESÚS BECERRA PEREZ	SI		$11,795,728	EN FASE DE VALIDACION	EN FASE DE VALIDACION	EN FASE DE VALIDACION	0%	0%	0%	0%	0%
				NO										
6	MVJA_1194	CL 64B SUR 18N 81	MOISES RODRÍGUEZ BETANCOURT	SI		$11,146,150	EN FASE DE VALIDACION	EN FASE DE VALIDACION	EN FASE DE VALIDACION	0%	0%	0%	0%	0%
				NO										
7	MVJA_1129	CL 64 SUR 18P 07	ANA BERTILDE GAMBOA VELANDIA	SI		$11,758,393	EN FASE DE VALIDACION	EN FASE DE VALIDACION	EN FASE DE VALIDACION	0%	0%	0%	0%	0%
				NO										
8	MVJA_2479	KR 18K BIS 64A 20 SUR	CRISTOBAL VALBUENA	SI		$10,217,769	EN FASE DE VALIDACION	EN FASE DE VALIDACION	EN FASE DE VALIDACION	0%	0%	0%	0%	0%
				NO										
DOMINGO LAIN I														
9	MVJA_0898	CL 63B SUR 18L 53	EFIGENIA GUIZA DE SANCHEZ	SI		$11,770,978	24/11/2020	26/12/2020	24/11/2020	100%	0%	0%	0%	0%
				NO										
10	MVJA_0899	CL 63B SUR 18L 61	DORIS AYDEE HERRERA OTALORA	SI		$11,058,620	24/11/2020	26/12/2020	24/11/2020	100%	0%	0%	0%	0%
				NO										
11	MVJA_0970	CL 63D SUR 18L 02	DORIS CUESTA DE RODRIGUEZ	SI		$11,559,058	25/11/2020	26/12/2020	25/11/2020	100%	0%	0%	0%	0%
				NO										
12	MVJA_2756	KR 18M 63D 08 SUR	ESTHER AROCA YARA	SI		$10,416,988	EN FASE DE VALIDACION	EN FASE DE VALIDACION	EN FASE DE VALIDACION	0%	0%	0%	0%	0%
				NO										
13	MVJA_2469	KR 18K BIS 63D 19 SUR	CARMEN LIBIA GÓMEZ DE CASTAÑEDA	SI		$10,422,672	EN FASE DE VALIDACION	EN FASE DE VALIDACION	EN FASE DE VALIDACION	0%	0%	0%	0%	0%
				NO										
14	MVJA_2342	KR 18J BIS 63D 25 SUR	MARIA DOLORES CASTILLO DE SANCHEZ	SI		$3,851,663	EN FASE DE VALIDACION	EN FASE DE VALIDACION	EN FASE DE VALIDACION	0%	0%	0%	0%	0%
				NO										
15	MVJA_2343	KR 18J BIS 63D 26 SUR	ERNESTO VERGARA NIETO	SI		$11,369,770	EN FASE DE VALIDACION	EN FASE DE VALIDACION	EN FASE DE VALIDACION	0%	0%	0%	0%	0%
				NO										
16	MVJA_1096	CL 64 SUR 18J 46	GONZALO OÑATE BONILLA	SI		$10,119,768	EN FASE DE VALIDACION	EN FASE DE VALIDACION	EN FASE DE VALIDACION	0%	0%	0%	0%	0%
				NO										

...TOS DE JALISCO															
17	MVJA_2741	KR 18M 62A 44 SUR	CARLOS ALBERTO MUÑETON FRANCO	SI / NO		$11,816,187	27/11/2020	EN EJECUCION	27/11/2020	0%	0%	0%	0%	0%
18	MVJA_2729	KR 18M 62A 07 SUR	JOSE IGNACIO TAO IBARRA	SI / NO		$11,801,634	25/11/2020	26/12/2020	25/11/2020	100%	0%	0%	0%	0%
19	MVJA_0544	CL 62A SUR 18M 09	MERCEDES RIAÑO PARRA	SI / NO		$11,820,308	24/11/2020	26/12/2020	24/11/2020	100%	0%	0%	0%	0%
20	MVJA_0567	CL 62A SUR 18M 41 IN 9	MARIA DEL ROSARIO RODRIGUEZ	SI / NO		$11,722,293	25/11/2020	26/12/2020	25/11/2020	100%	0%	0%	0%	0%
21	MVJA_3309	KR 18P BIS B 61D 25 SUR	TEOFILO MORALES TURGA Y OTRA	SI / NO		$11,799,687	24/11/2020	22/12/2020	24/11/2020	100%	0%	0%	0%	0%
22	MVJA_3366	KR 18Q 61C 34 SUR	EDILMA ALCIRA CASTILLO	SI / NO		$11,764,716	26/11/2020	22/12/2020	26/11/2020	100%	0%	0%	0%	0%
23	MVJA_4350	TV 18Q BIS C 61B 87 SUR	MARÍA BENDITA REDONDO CASTIBLANCO	SI / NO		$11,552,262	26/11/2020	22/12/2020	26/11/2020	100%	0%	0%	0%	0%
24	MVJA_2660	KR 18L BIS A 62A 39 SUR	MANUEL EDUARDO RODRIGUEZ PRIETO	SI / NO		$11,808,234	25/11/2020	22/12/2020	25/11/2020	100%	0%	0%	0%	0%
25	MVJA_4333	TV 18Q BIS C 61B 45 SUR	BEATRIZ CABRALES ACERO	SI / NO		$11,504,866	27/11/2020	19/12/2020	27/11/2020	100%	0%	0%	0%	0%
26	MVJA_0890	CL 63B SUR 18K 56	HERNAN HUMBERTO PARRA	SI / NO		$10,110,603	25/11/2020	19/12/2020	25/11/2020	100%	0%	0%	0%	0%
LA ESCALA 3ER SECTOR															
27	MVJA_0530	CL 62A SUR 18L 07	LUIS ALIRIO LÓPEZ DÍAZ	SI / NO		$10,524,980	26/11/2020	17/12/2020	26/11/2020	100%	0%	0%	0%	0%
GIBRALTAR I Y II															
28	MVJA_4375	TV 18R 61B 41 SUR	FERNANDO TORRES Y OTRA	SI / NO		$7,358,179	26/11/2020	17/12/2020	26/11/2020	100%	0%	0%	0%	0%
29	MVJA_3081	KR 18N BIS A 63 26 SUR	JOSE UNILCIO CIFUENTES QUINTERO Y OTRA	SI / NO		$10,723,231	EN FASE DE VALIDACION	EN FASE DE VALIDACION	EN FASE DE VALIDACION	0%	0%	0%	0%	0%
30	MVJA_3086	KR 18N BIS A 63C 23 SUR	LUIS ALFREDO CARPINTERO Y OTRA	SI / NO		$11,720,170	EN FASE DE VALIDACION	EN FASE DE VALIDACION	EN FASE DE VALIDACION	0%	0%	0%	0%	0%
31	MVJA_3168	KR 18P 63B 16 SUR	OLIVIA BOLAÑOS	SI / NO		$9,229,283	EN FASE DE VALIDACION	EN FASE DE VALIDACION	EN FASE DE VALIDACION	0%	0%	0%	0%	0%
32	MVJA_2395	KR 18K 64A 22 SUR	DELIO MARTINEZ GAMBA	SI / NO		$11,822,362	EN FASE DE VALIDACION	EN FASE DE VALIDACION	EN FASE DE VALIDACION	0%	0%	0%	0%	0%
33	MVJA_0922	CL 63C SUR 18P 22	FRANCISCO PIAMBA ANACONA	SI / NO		$9,697,112	EN FASE DE VALIDACION	EN FASE DE VALIDACION	EN FASE DE VALIDACION	0%	0%	0%	0%	0%
ACACIAS SUR															
34	MVJA_3670	KR 18Z 62 30 SUR	CRISTOBAL PITA CAMARGO	SI / NO		$11,791,446	EN FASE DE VALIDACION	EN FASE DE VALIDACION	EN FASE DE VALIDACION	0%	0%	0%	0%	0%
35	MVJA_0439	CL 62 SUR 18Z 04	GAVI ROZO RODRIGUEZ	SI / NO		$11,758,346	EN FASE DE VALIDACION	EN FASE DE VALIDACION	EN FASE DE VALIDACION	0%	0%	0%	0%	0%
LA ESPERANZA															
36	MVJA_3607	KR 18T 62A 21 SUR	LUIS ENRIQUE JIMENEZ VEGA	SI / NO		$11,760,814	EN FASE DE VALIDACION	EN FASE DE VALIDACION	EN FASE DE VALIDACION	0%	0%	0%	0%	0%
CIUDAD MILAGRO															
37	MVJA_0286	CL 62 BIS SUR 18J 12	HASBLEIDY GINA ROJAS ESCOBAR	SI / NO		$11,813,015	EN FASE DE VALIDACION	EN FASE DE VALIDACION	EN FASE DE VALIDACION	0%	0%	0%	0%	0%
38	MVJA_0235	CL 61D SUR 18K 58	MARIELA OSORIO TRUJILLO	SI / NO		$9,103,008	EN FASE DE VALIDACION	EN FASE DE VALIDACION	EN FASE DE VALIDACION	0%	0%	0%	0%	0%
39	MVJA_0326	CL 62 BIS SUR 18K 55	VICTOR MANUEL URREA ACOSTA	SI / NO		$9,129,217	EN FASE DE VALIDACION	EN FASE DE VALIDACION	EN FASE DE VALIDACION	0%	0%	0%	0%	0%
SAN LUIS															
40	MVJA_2051	DG 64A SUR 18V 14	FABIO VELASQUEZ CABALLERO	SI / NO		$5,791,775	EN FASE DE VALIDACION	EN FASE DE VALIDACION	EN FASE DE VALIDACION	0%	0%	0%	0%	0%
41	MVJA_1776	DG 64 BIS SUR 18V-15	UVA ESTHER BAQUERO DE GIL	SI / NO		$9,569,727	EN FASE DE VALIDACION	EN FASE DE VALIDACION	EN FASE DE VALIDACION	0%	0%	0%	0%	0%
SAN FERNANDO															
42	MVJA_2139	DG 64B SUR 19 76	MARIA ELIUD ORTEGON DE ALARCON	SI / NO		$8,133,977	EN FASE DE VALIDACION	EN FASE DE VALIDACION	EN FASE DE VALIDACION	0%	0%	0%	0%	0%
43	MVJA_2119	DG 64B SUR 19 36	MARIA CONCEPCION RIAÑO	SI / NO		$10,994,689	EN FASE DE VALIDACION	EN FASE DE VALIDACION	EN FASE DE VALIDACION	0%	0%	0%	0%	0%
LAS DELICIAS DEL SUR ZONA 19															
44	MVJA_1386	CL 65 SUR 18N 73	CRISTOBAL SUA ALBARRACÍN	SI / NO		$10,201,812	EN FASE DE VALIDACION	EN FASE DE VALIDACION	EN FASE DE VALIDACION	0%	0%	0%	0%	0%
LUCERO MEDIO															
45	MVJA_2324	KR 18J 64F 39 SUR	ARMANDO QUIROGA BARRIGA Y OTRA	SI / NO		$11,577,668	EN FASE DE VALIDACION	EN FASE DE VALIDACION	EN FASE DE VALIDACION	0%	0%	0%	0%	0%
46	MVJA_2617	KR 18L BIS 64F 07 SUR	QUINTILIANO CASTILLO DOMÍNGUEZ Y OTRA	SI / NO		$10,654,735	EN FASE DE VALIDACION	EN FASE DE VALIDACION	EN FASE DE VALIDACION	0%	0%	0%	0%	0%
47	MVJA_2628	KR 18L BIS 64F 47 SUR	MARIA ALICIA MAHECHA POVEDA	SI / NO		$11,621,525	EN FASE DE VALIDACION	EN FASE DE VALIDACION	EN FASE DE VALIDACION	0%	0%	0%	0%	0%
48	MVJA_2418	KR 18K 65A 15 SUR	BERTILDA URREGO	SI / NO		$11,712,907	EN FASE DE VALIDACION	EN FASE DE VALIDACION	EN FASE DE VALIDACION	0%	0%	0%	0%	0%
49	MVJA_2414	KR 18K 64F 29 SUR	MARIA ELENA RINCON RINCON	SI / NO		$11,664,556	EN FASE DE VALIDACION	EN FASE DE VALIDACION	EN FASE DE VALIDACION	0%	0%	0%	0%	0%
USMINIA - ANTONIO JOSE DE SUCRE I SECTOR															
50	MV_18353	CL 109 SUR 9 64	LUZ DAMARIS CASTRO PULGARIN	SI / NO		$11,776,148	20/01/2021	EN EJECUCION	20/01/2021	0%	0%	0%	0%	58%
51	MV_18951	CL 104A SUR 6 37 MJ	LUIS ANTONIO RINCON	SI / NO		$11,524,924	20/01/2021	EN EJECUCION	20/01/2021	0%	0%	0%	0%	63%
52	MV_19285	CL 108 SUR 3A 36	IAIRO ANTONIO ESPINOSA	SI / NO		$11,264,277	20/01/2021	EN EJECUCION	20/01/2021	0%	0%	0%	0%	32%
53	MV_21820	CL 106 B SUR 4 11	JUAN EUDES OREJUELA GARZON	SI / NO		$11,808,193	28/01/2021	EN EJECUCION	28/01/2021	0%	0%	0%	0%	3%
USMINIA - LORENZO ALCANTUZ															
54	MV_17421	CL 102 SUR 5 49	OLGA BARRETO	SI / NO		$11,766,972	20/01/2021	EN EJECUCION	20/01/2021	0%	0%	0%	0%	63%

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DEL HÁBITAT

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

PROYECTOS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA

INPLAYCO S.A.S.
INGENIEROS CONSTRUCTORES E INTERVENTORES

FECHA	24/01/2021	PERIODO No.	13	DEL	25/01/2021	AL	31/01/2021

1. INFORMACIÓN GENERAL

OBJETO DEL CONTRATO	Realizar la interventorías técnica, jurídica, social, administrativa y financiera, para la ejecución de las obras de mejoramiento de vivienda en la modalidad de habitabilidad en los territorios priorizados por la secretaría distrital de hábitat.
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO	Corresponde al Grupo 1 a la ejecución de 254 mejoramientos de vivienda, localizados en 3 localidades: Bosa, Usme y Ciudad Bolívar, esta última localidad incluye cuatro (4) intervenciones de Mejoramientointegral.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA		CONTRATO DE OBRA	
CONTRATO No.:	701-2020	CONTRATO No.:	694--2020
PLAZO INICIAL:	6 meses	PLAZO INICIAL:	5 meses
FECHA DE INICIACIÓN:	4 de noviembre de 2020	FECHA DE INICIACIÓN:	4 de noviembre de 2020
**FECHA DE SUSPENSIÓN:	0	**FECHA DE SUSPENSIÓN:	0
**FECHA DE REINICIACIÓN:	0	**FECHA DE REINICIACIÓN:	0
FECHA DE TERMINACIÓN:	3 de mayo de 2021	FECHA DE TERMINACIÓN:	3 de abril 2021
PLAZO ACTUALIZADO:	0	PLAZO ACTUALIZADO:	0
PLAZO TRANSCURRIDO:	0	PLAZO TRANSCURRIDO:	0
VALOR INICIAL :	$ 894,285,952	VALOR INICIAL :	$ 3,724,135,319
VALOR ADICION(ES):	0	VALOR ADICION(ES):	$ -
VALOR ACTUALIZADO:	$ -	VALOR ACTUALIZADO:	$ -
VALOR ANTICIPO:	0	VALOR ANTICIPO:	$ -
VALOR POR PAGAR:	$ -	VALOR POR PAGAR:	$ -
SUPERVISOR:	JUAN CARLOS ARBELAEZ MURILLO	INTERVENTOR:	Gonzalo Llevano Hoyos -INPLAYCO S.A.S.

** Inserte las filas que requiera según el número de suspensiones y reinicios.

2. CONTROL DE HITOS.

No.	*** DESCRIPCIÓN DEL HITO	FECHA PROGRAMADA	FECHA REAL DE CUMPLIMIENTO	DÍAS DE RETRASO
	SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO (HITO OBLIGATORIO)	4/11/2020	3/04/2021	
1	Validación			
2	Entrega de informe de validación			
3	Ejecución			
	ENTREGA A LA INTERVENTORIA DE LOS PRODUCTOS Y/O ACTIVIDADES CONTRATADAS (HITO OBLIGATORIO)			


***** Inserte las filas que requiera según el número de hitos; teniendo en cuenta que como mínimo se deberán establecer 5 hitos adicionales a los obligatorios de inicio y terminación. Los hitos aprobados por la interventoría se socializarán con el supervisor del contrato para su Vo. Bo. Los Hitos aprobados por la interventoría y SDHT solo se podrán modificar previa novedad contractual que así lo requiera. La matriz del seguimiento hace parte del presente documento.**


No.	INDICADORES BARRIO O TERRITORIO	VALORES	PORCENTAJE SOBRE EL VALOR TOTAL DEL CONTRATO	DIFERENCIA (+) ADELANTO (-) ATRASO
1	Valor acumulado de las actividades o productos conforme a la programación vigente.	$253,135,959.30	6.80%	-0.62%
2	Valor acumulado de las actividades o productos ejecutados y aprobados por la Interventoría.	$230,134,486.68	6.18%	

3. ASPECTOS GENERALES INFORME TÉCNICO

Registre los avances y novedades técnicas, sociales, administrativas, contables y financieras, acompañadas por gráficos, cuadros, fotografías, análisis y comentarios sobre el estado de los trabajos, en todos sus aspectos en la fase de validación y ejecución de obra.

CIUDAD BOLIVAR - USME

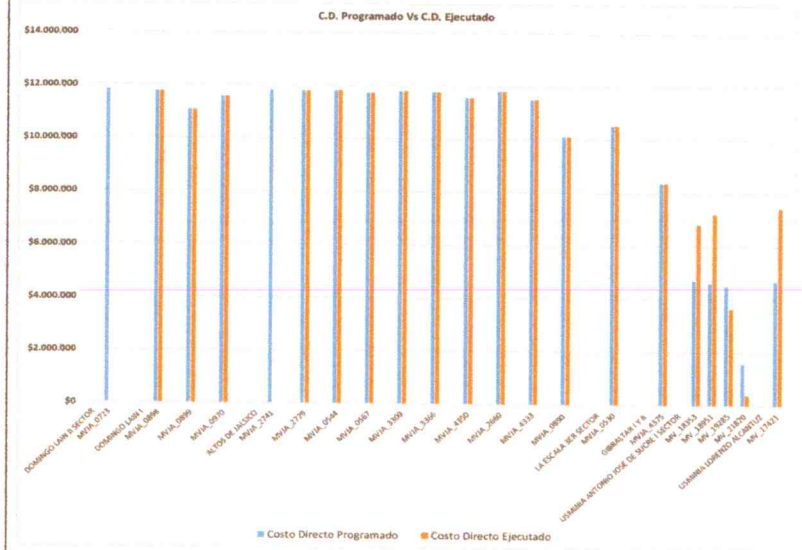

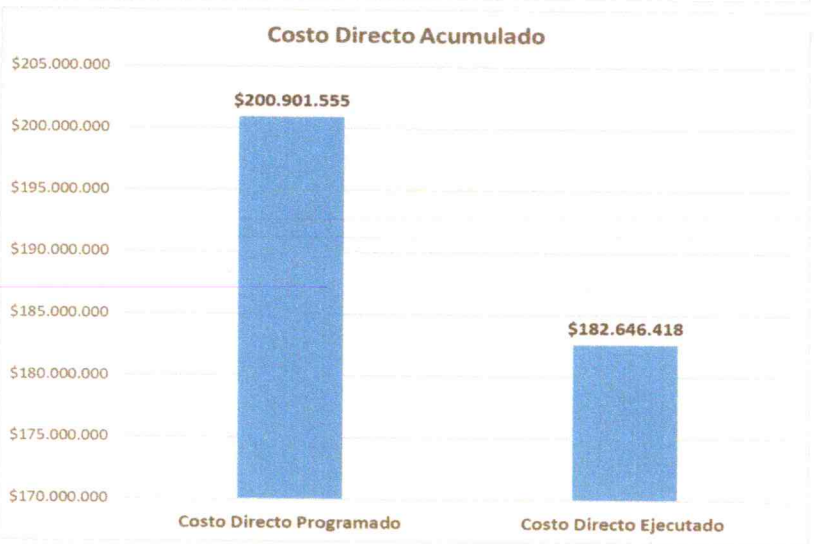

4- COMPONENTE TECNICO BARRIO O TERRITORIO			
ACTIVIDADES EJECUTADAS EN LA SEMANA. - ESTADO DE AVANCE SEMANAL POR VIVIENDA			
FECHA: 27-12 -2020			
BARRIO O TERRITORIO - CIUDAD BOLIVAR - DOMINGO LAIN II SECTOR Y CONDOMINIO DEL BOSQUE			
1	MVJA_0723	VICTOR MANUEL SAMORA HERNANDEZ	Se hace seguimiento, la vivienda no cuenta con ningun servicio publico (agua, luz y gas) por tal motivo aun no se inician actividades; se suscribe acta en la cual el beneficiario se compromete a realizar la gestion necesaria para contar con el suministro de luz y agua para poder dar comienzo a la ejecución de la mejora.
2	MVJA_1085	MARIA NERY ECHEVERRY DE RESTREPO	Se hace validación en la vivienda, se definen espacios a intervenir y se realiza levantamiento arquitectonico para calculo de cantidades de obra.
3	MVJA_2598	FLOR ANGELA MORANTES LOPEZ	Se hace validación en la vivienda, se definen espacios a intervenir y se realiza levantamiento arquitectonico para calculo de cantidades de obra.
4	MVJA_2476	JAIME HUMBERTO BORDA LIBERATO	Se hace validación en la vivienda, se definen espacios a intervenir y se realiza levantamiento arquitectonico para calculo de cantidades de obra.
5	MVJA_2763	CARLOS JESÚS BECERRA PEREZ	Se hace validación en la vivienda, se definen espacios a intervenir y se realiza levantamiento arquitectonico para calculo de cantidades de obra.
6	MVJA_1194	MOISES RODRÍGUEZ BETANCOURT	Se hace validación en la vivienda, se definen espacios a intervenir y se realiza levantamiento arquitectonico para calculo de cantidades de obra.
7	MVJA_1129	ANA BERTILDE GAMBOA VELANDIA	Se hace validación en la vivienda, se definen espacios a intervenir y se realiza levantamiento arquitectonico para calculo de cantidades de obra.
8	MVJA_2479	CRISTOBAL VALBUENA	Se hace validación en la vivienda, se definen espacios a intervenir y se realiza levantamiento arquitectonico para calculo de cantidades de obra.
BARRIO O TERRITORIO - CIUDAD BOLIVAR - DOMINGO LAIN I			
9	MVJA_0898	EFIGENIA GUIZA DE SANCHEZ	Se hace entrega de vivienda a conformidad del beneficiario, se socializa presupuesto final, manual de uso y mantenimiento; se entrega kit ecologico.
10	MVJA_0899	DORIS AYDEE HERRERA OTALORA	Se hace entrega de vivienda a conformidad del beneficiario, se socializa presupuesto final, manual de uso y mantenimiento; se entrega kit ecologico.
11	MVJA_0970	DORIS CUESTA DE RODRIGUEZ	Se hace entrega de vivienda a conformidad del beneficiario, se socializa presupuesto final, manual de uso y mantenimiento; se entrega kit ecologico.
12	MVJA_2756	ESTHER AROCA YARA	Se hace validación en la vivienda, se definen espacios a intervenir y se realiza levantamiento arquitectonico para calculo de cantidades de obra.
13	MVJA_2469	CARMEN LIBIA GÓMEZ DE CASTAÑEDA	Se hace validación en la vivienda, se definen espacios a intervenir y se realiza levantamiento arquitectonico para calculo de cantidades de obra.
14	MVJA_2342	MARIA DOLORES CASTILLO DE SANCHEZ	Se hace validación en la vivienda, se definen espacios a intervenir y se realiza levantamiento arquitectonico para calculo de cantidades de obra.
15	MVJA_2343	ERNESTO VERGARA NIETO	Se hace validación en la vivienda, se definen espacios a intervenir y se realiza levantamiento arquitectonico para calculo de cantidades de obra.
16	MVJA_1096	GONZALO OÑATE BONILLA	Se hace validación en la vivienda, se definen espacios a intervenir y se realiza levantamiento arquitectonico para calculo de cantidades de obra.
BARRIO O TERRITORIO - CIUDAD BOLIVAR - ALTOS DE JALISCO			
17	MVJA_2741	CARLOS ALBERTO MUÑETON FRANCO	Beneficiario no se encuentra hasta el mes de enero; se debe validar nuevamente una vez beneficiario termine adecuaciones por su cuenta.
18	MVJA_2729	JOSE IGNACIO TAO IBARRA	Se hace entrega de vivienda a conformidad del beneficiario, se socializa presupuesto final, manual de uso y mantenimiento; se entrega kit ecologico.
19	MVJA_0544	MERCEDES RIAÑO PARRA	Se hace entrega de vivienda a conformidad del beneficiario, se socializa presupuesto final, manual de uso y mantenimiento; se entrega kit ecologico.
20	MVJA_0567	MARIA DEL ROSARIO RODRIGUEZ	Se hace entrega de vivienda a conformidad del beneficiario, se socializa presupuesto final, manual de uso y mantenimiento; se entrega kit ecologico.
21	MVJA_3309	TEOFILO MORALES TURGA	Se hace entrega de vivienda a conformidad del beneficiario, se socializa presupuesto final, manual de uso y mantenimiento; se entrega kit ecologico.
22	MVJA_3366	EDILMA ALCIRA CASTILLO	Se hace entrega de vivienda a conformidad del beneficiario, se socializa presupuesto final, manual de uso y mantenimiento; se entrega kit ecologico.
23	MVJA_4350	MARÍA BENDITA REDONDO CASTIBLANCO	Se hace entrega de vivienda a conformidad del beneficiario, se socializa presupuesto final, manual de uso y mantenimiento; se entrega kit ecologico.
24	MVJA_2660	MANUEL EDUARDO RODRIGUEZ PRIETO	Se hace entrega de vivienda a conformidad del beneficiario, se socializa presupuesto final, manual de uso y mantenimiento; se entrega kit ecologico.
25	MVJA_4333	BEATRIZ CABRALES ACERO	Se hace entrega de vivienda a conformidad del beneficiario, se socializa presupuesto final, manual de uso y mantenimiento; se entrega kit ecologico.
26	MVJA_0890	HERNAN HUMBERTO PARRA	Se hace entrega de vivienda a conformidad del beneficiario, se socializa presupuesto final, manual de uso y mantenimiento; se entrega kit ecologico.
BARRIO O TERRITORIO - CIUDAD BOLIVAR - LA ESCALA 3ER SECTOR			
27	MVJA_0530	LUIS ALIRIO LÓPEZ DÍAZ	Se hace entrega de vivienda a conformidad del beneficiario, se socializa presupuesto final, manual de uso y mantenimiento; se entrega kit ecologico.
BARRIO O TERRITORIO - CIUDAD BOLIVAR - GIBRALTAR I Y II			
28	MVJA_4375	FERNANDO TORRES Y OTRA	Se hace entrega de vivienda a conformidad del beneficiario, se socializa presupuesto final, manual de uso y mantenimiento; se entrega kit ecologico.
29	MVJA_3081	JOSE UNILCIO CIFUENTES QUINTERO Y OTRA	Se hace validación en la vivienda, se definen espacios a intervenir y se realiza levantamiento arquitectonico para calculo de cantidades de obra.
30	MVJA_3086	LUIS ALFREDO CARPINTERO Y OTRA	Se hace validación en la vivienda, se definen espacios a intervenir y se realiza levantamiento arquitectonico para calculo de cantidades de obra.
31	MVJA_3168	OLIVIA BOLAÑOS	Se hace validación en la vivienda, se definen espacios a intervenir y se realiza levantamiento arquitectonico para calculo de cantidades de obra.
32	MVJA_2395	DELIO MARTINEZ GAMBA	Se hace validación en la vivienda, se definen espacios a intervenir y se realiza levantamiento arquitectonico para calculo de cantidades de obra.
33	MVJA_0922	FRANCISCO PIAMBA ANACONA	Se hace validación en la vivienda, se definen espacios a intervenir y se realiza levantamiento arquitectonico para calculo de cantidades de obra.
BARRIO O TERRITORIO - CIUDAD BOLIVAR - ACACIAS SUR			
34	MVJA_3670	CRISTOBAL PITA CAMARGO	Se hace validación en la vivienda, se definen espacios a intervenir y se realiza levantamiento arquitectonico para calculo de cantidades de obra.
35	MVJA_0439	GAVI ROZO RODRIGUEZ	Se hace validación en la vivienda, se definen espacios a intervenir y se realiza levantamiento arquitectonico para calculo de cantidades de obra.

		BARRIO O TERRITORIO - CIUDAD BOLIVAR - LA ESPERANZA	
36	MVJA_3607	LUIS ENRIQUE JIMENEZ VEGA	hace validación en la vivienda, se definen espacios a intervenir y se realiza levantamien ...itectonico para calculo de cantidades de obra.
		BARRIO O TERRITORIO - CIUDAD BOLIVAR - CIUDAD MILAGRO	
37	MVJA_0286	HASBLEIDY GINA ROJAS ESCOBAR	Se hace validación en la vivienda, se definen espacios a intervenir y se realiza levantamiento arquitectonico para calculo de cantidades de obra.
38	MVJA_0235	MARIELA OSORIO TRUJILLO	Se hace validación en la vivienda, se definen espacios a intervenir y se realiza levantamiento arquitectonico para calculo de cantidades de obra.
39	MVJA_0328	VICTOR MANUEL URREA ACOSTA	Se hace validación en la vivienda, se definen espacios a intervenir y se realiza levantamiento arquitectonico para calculo de cantidades de obra.
		BARRIO O TERRITORIO - CIUDAD BOLIVAR - SAN LUIS	
40	MVJA_2051	FABIO VELASQUEZ CABALLERO	Se hace validación en la vivienda, se definen espacios a intervenir y se realiza levantamiento arquitectonico para calculo de cantidades de obra.
41	MVJA_1776	UVA ESTHER BAQUERO DE GIL	Se hace validación en la vivienda, se definen espacios a intervenir y se realiza levantamiento arquitectonico para calculo de cantidades de obra.
		BARRIO O TERRITORIO - CIUDAD BOLIVAR - SAN FERNANDO	
42	MVJA_2139	MARIA ELIUD ORTEGON DE ALARCON	Se hace validación en la vivienda, se definen espacios a intervenir y se realiza levantamiento arquitectonico para calculo de cantidades de obra.
43	MVJA_2119	MARIA CONCEPCION RIAÑO	Se hace validación en la vivienda, se definen espacios a intervenir y se realiza levantamiento arquitectonico para calculo de cantidades de obra.
		BARRIO O TERRITORIO - CIUDAD BOLIVAR - LAS DELICIAS DEL SUR ZONA 19	
44	MVJA_1386	CRISTOBAL SUA ALBARRACÍN	Se hace validación en la vivienda, se definen espacios a intervenir y se realiza levantamiento arquitectonico para calculo de cantidades de obra.
		BARRIO O TERRITORIO - CIUDAD BOLIVAR - LUCERO MEDIO	
45	MVJA_2324	ARMANDO QUIROGA BARRIGA Y OTRA	Se hace validación en la vivienda, se definen espacios a intervenir y se realiza levantamiento arquitectonico para calculo de cantidades de obra.
46	MVJA_2617	QUINTILIANO CASTILLO DOMÍNGUEZ Y OTRA	Se hace validación en la vivienda, se definen espacios a intervenir y se realiza levantamiento arquitectonico para calculo de cantidades de obra.
47	MVJA_2628	MARIA ALICIA MAHECHA POVEDA	Se hace validación en la vivienda, se definen espacios a intervenir y se realiza levantamiento arquitectonico para calculo de cantidades de obra.
48	MVJA_2418	BERTILDA URREGO	Se hace validación en la vivienda, se definen espacios a intervenir y se realiza levantamiento arquitectonico para calculo de cantidades de obra.
49	MVJA_2414	MARIA ELENA RINCON RINCON	Se hace validación en la vivienda, se definen espacios a intervenir y se realiza levantamiento arquitectonico para calculo de cantidades de obra.
		BARRIO O TERRITORIO - USMINIA - ANTONIO JOSE DE SUCRE I SECTOR	
50	MV_18353	LUZ DAMARIS CASTRO PULGARIN	Se hace seguimiento a la vivienda, se evidencia materiales y maestro ejecutando actividades de enchape de piso y pañete impermeabilizado en baño.
51	MV_18951	LUIS ANTONIO RINCON	Se hace seguimiento a la vivienda, se evidencia materiales y maestro ejecutando actividades de en cocina y baño.
52	MV_19285	JAIRO ANTONIO ESPINOSA	Se hace seguimiento a la vivienda, se evidencia materiales y maestro ejecutando actividades de pañete.
53	MV_21820	JUAN EUDES ORJUELA GARZON	Se hace seguimiento a la vivienda, se evidencia materiales y maestro ejecutando actividades de pañete.
		BARRIO O TERRITORIO - USMINIA - LORENZO ALCANTUZ	
54	MV_17421	OLGA BARRETO	Se hace seguimiento a la vivienda, se evidencia materiales y maestro ejecutando actividades de en cocina y baño.

5. PLAN DE ACCIÓN RESULTADO DEL ANÁLISIS DE CAUSAS REGISTRADO EN EL NUMERAL ANTERIOR - CON EL OBJETIVO DE ELIMINAR LA CAUSA RAÍZ DE LA SITUACIÓN PROBLEMÁTICA - PLAN DE MEJORA

ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA
En conjunto con el contratista y esta interventoría se realizaran y supervisaran los respectivos presupuestos iniciales de obra y seguimiento a la ejecución de actividades, tambien se definiran posibles ajustes a las areas establecidas e indicadas inicialmente en cada uno de los expedientes de los beneficiaros del programa de mejoramiento de vivienda.	ERICK ALVAREZ CADAVID	

6. ACTIVIDADES NO PREVISTAS Y MAYORES CANTIDADES

Se informa que en algunas de las viviendas se presentan mejoras en los acabados finales realizadas por los beneficiarios, por lo tanto se deside intervenir otros espacios en conjunto con el contratista garantizando una adecuada habitabilidad y dignificación de las viviendas

7. COMENTARIOS DEL INTERVENTOR: Por favor realice la descripción general del estado del contrato y según aplique informe sobre: actividades realizadas en la semana, control de lluvias, compra y suministro de materiales, mano de obra, subcontratos y tramites ante las diferentes empresas prestadoras de servicios, entre otros. Anexe las actas de seguimiento realizadas en la semana correspondiente al periodo del informe.

Barrio o Territorio: CIUDAD BOLIVAR

En el presente periodo se hace seguimiento de obra a 16 viviendas beneficiadas, se le informa al contratista de obra y al beneficiario sobre los espacios a intervenir.

Se debe dar prioridad de entrega a los MV: 0530, 2729 y 3366.


8. REGISTRO FOTOGRAFICO DEL AVANCE DURANTE LA SEMANA

SE ADJUNTA REGISTRO FOTOGRAFICO


REGISTRO FOTOGRÁFICO



FECHA	lunes, 25 de enero de 2021
DESCRIPCION MV_2741	
Revalidacion	

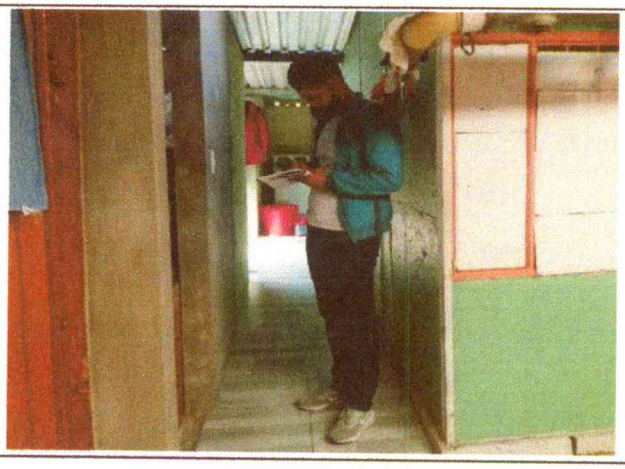


FECHA	lunes, 25 de enero de 2021
DESCRIPCION MV_2741	
Revalidacion	

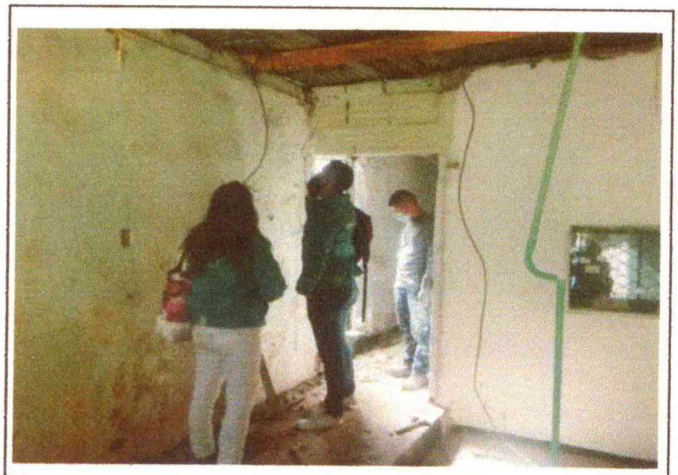

FECHA	sábado, 30 de enero de 2021
DESCRIPCION MV_21820	
Seguimiento	



FECHA	sábado, 30 de enero de 2021
DESCRIPCION MV_21820	
Seguimiento	

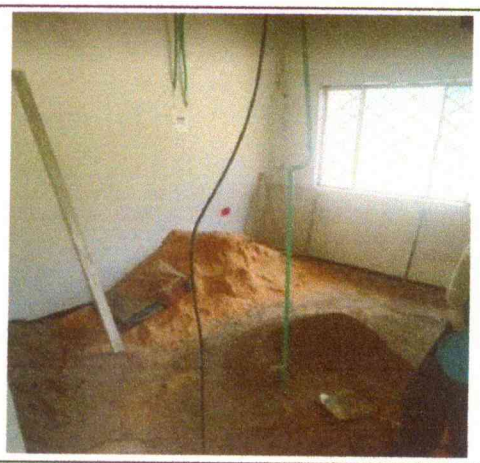


FECHA	sábado, 30 de enero de 2021
DESCRIPCION MV_21820	
Seguimiento	




FECHA	sábado, 30 de enero de 2021
DESCRIPCION MV_19285	
Validacion	

REGISTRO FOTOGRÁFICO

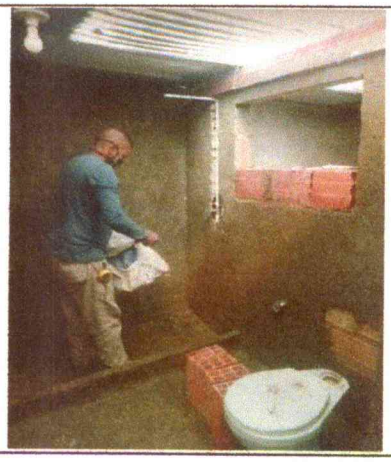

FECHA	sábado, 30 de enero de 2021
DESCRIPCION MV_19285	
Seguimiento	

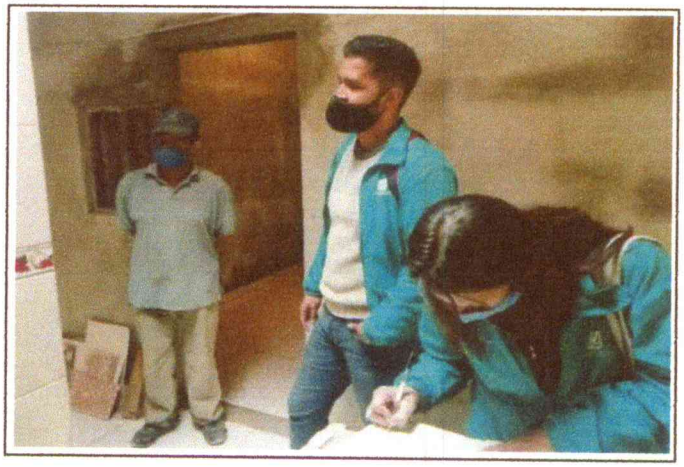

FECHA	sábado, 30 de enero de 2021
DESCRIPCION MV_18951	
Seguimiento	



FECHA	sábado, 30 de enero de 2021
DESCRIPCION MV_18951	
Seguimiento	



FECHA	sábado, 30 de enero de 2021
DESCRIPCION MV_17421	
Seguimiento	



FECHA	sábado, 30 de enero de 2021
DESCRIPCION MV_18353	
Seguimiento	



FECHA	sábado, 30 de enero de 2021
DESCRIPCION MV_17421	
Seguimiento	

INPLAYCO S.A.S.
INGENIEROS CONSTRUCTORES E INTERVENTORES

ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE HÁBITAT

INFORME SOCIAL SEMANAL 13

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DEL HÁBITAT

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

PROYECTOS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA
GRUPO 1

INPLAYCO S.A.S.
INGENIEROS CONSTRUCTORES E INTERVENTORES

FECHA	30 de enero de 2021	PERIODO No.	13	DEL	25/01/2021	AL	30/01/2021

1. INFORMACIÓN GENERAL

OBJETO DEL CONTRATO	Realizar la interventorías técnica, jurídica, social, administrativa y financiera, para la ejecución de las obras de mejoramiento de vivienda en la modalidad de habitabilidad en los territorios priorizados por la secretaría distrital de hábitat.
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO	Corresponde al Grupo 1 a la ejecución de 254 mejoramientos de vivienda, localizados en 3localidades: Bosa, Usme y Ciudad Bolívar, esta última localidad incluye cuatro (4) Intervenciones de Mejoramientointegral.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA		CONTRATO DE OBRA	
CONTRATO No.:	701-2020	CONTRATO No.:	694--2020
PLAZO INICIAL:	6 meses	PLAZO INICIAL:	5 meses
FECHA DE INICIACIÓN:	4 de noviembre de 2020	FECHA DE INICIACIÓN:	4 de noviembre de 2020
**FECHA DE SUSPENSIÓN:	0	**FECHA DE SUSPENSIÓN:	0
**FECHA DE REINICIACIÓN:	0	**FECHA DE REINICIACIÓN:	0
FECHA DE TERMINACIÓN:	3 de mayo de 2021	FECHA DE TERMINACIÓN:	3 de abril 2021
PLAZO ACTUALIZADO:	0	PLAZO ACTUALIZADO:	0
PLAZO TRANSCURRIDO:	0	PLAZO TRANSCURRIDO:	0
VALOR INICIAL :	$ 804.285.952,00	VALOR INICIAL :	$ 3.724.135.319,00
VALOR ADICIÓN(ES):	$ -	VALOR ADICIÓN(ES):	$ -
VALOR ACTUALIZADO:	$ -	VALOR ACTUALIZADO:	$ -
VALOR ANTICIPO:	$ -	VALOR ANTICIPO:	$ -
VALOR POR PAGAR:	$ -	VALOR POR PAGAR:	$ -
SUPERVISOR:	JUAN CARLOS ARBELÁEZ MURILLO	INTERVENTOR:	Gonzalo Liévano Hoyos -INPLAYCO S.A.S.

** Inserte las filas que requiera según el número de suspensiones y reinicios.

2. CONTROL DE HITOS.

No.	*** DESCRIPCIÓN DEL HITO	FECHA PROGRAMADA	FECHA REAL DE CUMPLIMIENTO	DÍAS DE RETRASO
	SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO (HITO OBLIGATORIO)	04/11/2020	03/04/2021	
1	Validación			
2	Entrega de informe de validación			
3	Ejecución			
	ENTREGA A LA INTERVENTORÍA DE LOS PRODUCTOS Y/O ACTIVIDADES CONTRATADAS (HITO OBLIGATORIO)			

*** Inserte las filas que requiera según el número de hitos; teniendo en cuenta que como mínimo se deberán establecer 5 hitos adicionales a los obligatorios de inicio y terminación. Los hitos aprobados por la interventoría se socializarán con el supervisor del contrato para su Vo. Bo. Los Hitos aprobados por la interventoría y SDHT solo se podrán modificar previa novedad contractual que así lo requiera. La matriz de seguimiento hace parte del presente documento.

No.	INDICADORES	VALORES	PORCENTAJE SOBRE EL VALOR TOTAL DEL CONTRATO	DIFERENCIA (+) ADELANTO (-) ATRASO
1	Valor acumulado de las actividades o productos conforme a la programación vigente.			
2	Valor acumulado de las actividades o productos ejecutados y aprobados por la interventoría.			

3. ASPECTOS GENERALES INFORME SOCIAL

COMPONENTE SOCIAL - AVANCE SOCIAL DE CADA UNIDAD DE VIVIENDA

LOCALIDAD: CIUDAD BOLÍVAR

BARRIO O TERRITORIO: ALTOS DE JALISCO

28/01/2021 - **MVJA_3335: MYRIAM PATRICIA,** seguimiento. El contratista socializa el nuevo presupuesto al autorizado Anderson. Quien manifiesta tranquilidad. Los maestros se encuentran ultimando detalles . Se procederá a la vivienda en horas de la tarde para la entrega.

28/01/2021 - **MVJA_3119: LUZ YANID PADUA,** seguimiento. Beneficiaria manifiesta conformidad con la obra por medio telefónico. Se observa personal de obra en el predio

28/01/2021 - **MVJA_3141: GLORIA CRISTINA GUTIÉRREZ GARZÓN,** seguimiento. Se observa personal en la obra, el beneficiario manifiesta conformidad con los avances constructivos.

28/01/2021 - **MVJA_3146: CLARA INÉS GIL BÁEZ ,** seguimiento. Se observa personal en la obra, la beneficiaria manifiesta inconformidad no por la obra sino por los tiempo de ejecución. La vivienda lleva dos meses aperturada. Se le sugiere interponer PQR a lo cual refiere estar de acuerdo ya que es una persona de la tercera edad junto con su esposo. Se regresará a la vivienda junto con el contratista para realizar la queja.

28/01/2021 - **MVJA_3335: MYRIAM PATRICIA,** entrega.

29/01/2021 - **MVJA_3119: LUZ YANID PADUA,** seguimiento. la visita era para entrega pero aún no se encuentra lista.

26/01/2021 - **MVJA_2996: MARÍA DEL SOCORRO CUPITRA CACAIS,** entrega de la vivienda
26/01/2021 - **MVJA_3231: SOFÍA MORENO,** entrega de la vivienda
30/01/2021 - **MVJA_3119: LUZ YANID PADUA,** entrega de la vivienda
30/01/2021 - **MVJA_3141: GLORIA CRISTINA GUTIÉRREZ GARZÓN,** visita de seguimiento social - técnico de interventoría y contratista, el autorizado no manifiesta inquietudes. Se evidencia avance de obra del 85 %.
30/01/2021 - **MVJA_3146: CLARA INÉS GIL BÁEZ,** visita de seguimiento social - técnico de interventoría y contratista, la beneficiaria manifiesta inconformidad por actividades ejecutadas, ya que, no eran las mismas que le habían socializado; beneficiaria solicita PQRS, el cual se realiza por social del contratista.
BARRIO O TERRITORIO NUEVA COLOMBIA
25/01/2021 - **MVCB_1867 : JOSÉ ALBER LUGO ,** apertura de vivienda
26/01/2021 - **MVCB_1352 : MARIA RAMOS ORTIZ ,** seguimiento de obra
26/01/2021 - **MVCB_1280 : BARBARA GALVIS,** seguimiento de obra
26 /01/2021 - **MVCB_1357 : MARTHA LILIA AGUDELO,** seguimiento de obra
26 /01/2021 - **MVCB_1320 : ISMENIA BARRETO ARIAS.** seguimiento de obra
26 /01/2021 - **MVCB_1310 : DORA ALICIA LÓPEZ SANABRIA.** seguimiento de obra
26 /01/2021 - **MVCB_1344 : ALBEIRO RUIZ SANABRIA ,** seguimiento de obra
26/01/2021 - **MVCB_1328 : EDILBETO CARDENAZ PÁEZ ,** seguimiento de obra
25/01/2021 - **MVCB_1341 : JOSÉ GABRIEL HERRERA ,** seguimiento de obra
27/01/2021 - **MVCB_1341 : JOSÉ GABRIEL HERRERA ,** seguimiento de obra
25/01/2021 - **MVCB_1371 : CONSUELO NAVARRO,** seguimiento de obra
27/01/2021 - **MVCB_1371 : CONSUELO NAVARRO,** seguimiento de obra
25/01/2021 - **MVCB_1381 : NOHORA NOHEMI MAYORGA ,** seguimiento de obra
25/01/2021 - **MVCB_1382 : MARÍA CELIA RINÓN RINCÓN ,** seguimiento de obra
27/01/2021 - **MVCB_1374 : OBED OSPINA RESTREPO ,** seguimiento de obra
26/01/2021 - **MVCB_1383 : EDGAR FERNANDO CAMARCO,** seguimiento de obra
25/01/2021 - **MVCB_1380 : ROSALBA MONTES DE CARDONA ,** seguimiento de obra
27/01/2021 - **MVCB_1380 : ROSALBA MONTES DE CARDONA ,** seguimiento de obra
26/01/2021 - **MVCB_1286 : LUZ MINDA CASTRO PEÑA ,** seguimiento de obra
29/01/2021 - **MVCB_1286: LUZ MINDA CASTRO PEÑA,** visita de seguimiento social - técnico de interventoría, la beneficiaria no manifiesta inconformidades en cuanto a las actividades, se observa a un trabajador en la vivienda, informa que por falta de materiales no hay mayor avance en la obra. Nota: se confirma a la beneficiaria que se instalará cielo raso.
BARRIO O TERRITORIO: DOMINGO LAIN I
25/01/2021 - **MVJA_3105: BLANCA NELLY HERNÁNDEZ,** validación.
BARRIO O TERRITORIO: MIRADOR NUTIBARA
26/01/2021 - **MVCB_1907 : ANA ROSA LLANOS GARCÍA,** seguimiento de obra
26/01/2021 - **MVCB_1843 :FLOR ALBA GUTIÉERREZ BELTRÁN,** seguimiento de obra
25/01/2021 - **MVCB_1886: LUZ MARÍA ARIZA ARIZA,** se realiza visita de seguimiento social - técnico - SST de interventoría y técnico del contratista, la beneficiaria no manifiesta inquietudes, ni se presentan novedades con el personal de obra.
25/01/2021 - **MVCB_1836: DELIA MARÍA MATEUS ESCAMILLA,** se realiza visita de seguimiento social - técnico - SST de interventoría y técnico del contratista, la beneficiaria está conforme con las actividades ejecutadas, no manifiesta inconformidades.

25/01/2021 - **MVCB_1829: DIANA PATRICIA PÁEZ FINO,** se realiza visita de seguimiento social - técnico - SST de interventoría y técnico del contratista, se observa a dos trabajadores, la beneficiaria no manifiesta inconformidades.
25/01/2021 - **MVCB_1684: MIRYAM MANRIQUE URUEÑA,** visita de seguimiento realizada por social - técnico - SST de interventoría y técnico del contratista, la beneficiaria informa que el día de hoy iniciaron obras se observa a dos trabajadores.
29/01/2021 - **MVCB_1843: FLORALBA GUTIÉRREZ BELTRÁN,** visita de seguimiento social - técnico de interventoría y contratista, no hay ingreso de material, ni presencia de trabajadores.
BARRIO O TERRITORIO: LAS DELICIAS DEL SUR.
25/01/2021 - **MVJA_3257 - NELLY PIZA BUITRAGO,** validación.
BARRIO O TERRITORIO: CIUDAD MILAGRO.
29/01/2021 - **MVJA_0268 - HASBLEIDY GINA ROJAS ESCOBAR,** socialización de presupuesto, beneficiaria solicita visita a SDHT para conocer presupuesto, se hace visita social y técnica y se explican presupuesto, se hacen modificaciones técnicas a gusto de beneficiaria y con aprobación del área técnica. Se queda en socializar nuevo presupuesto en apertura de obra.
BARRIO O TERRITORIO: ACACIAS SUR.
26/01/2021 - **MVJA_3670: CRISTOBAL PITA CAMARGO,** revalidación.
29/01/2021 - **MVJA_3670: CRISTÓBAL PITO CAMARGO**, socialización de presupuesto, beneficiario solicita visita a SDHT para explicarle el presupuesto asignado y actividades, se hace socialización de presupuesto y actividades, no se expresan inconvenientes con relación al presupuesto.
LOCALIDAD: USME
BARRIO O TERRITORIO: VILLA ALEMANA II SECTOR
28/01/2021 - **MVUS_0707: LUZ MERY YARA MATOMA,** seguimiento, ejecución #12, se evidencia personal en la obra; beneficiaria expresa conformidad con el avance, esposo de beneficiaria pidió realizar actividades que no estaban contempladas en presupuesto cambiando organización de la vivienda, técnicos y residente social explican que no se deben realizar esos cambios sin consultar contratista, beneficiaria y maestro de obra quedan al tanto para evitar la situación a futuro.
28/01/2021 - **MVUS_0638: EDWIN ARLEY QUINMBAYO QUINTERO,** seguimiento, ejecución #13, se observa personal en la obra; beneficiario demuestra conformidad con las obras.
28/01/2021 - **MVUS_0682: JOSÉ DEL CARMEN SÁNCHEZ PÁEZ,** seguimiento, ejecución #14, se evidencia personal y avance dentro de la obra; beneficiario no se encuentra dentro del predio, maestros dicen que beneficiario ha estado realizando obras con un maestro externo, no se han visto incidentes.
BARRIO O TERRITORIO: EL ESPINO
29/01/2021 - **MVUS_0230: JORGE GABRIEL BUITRAGO INFANTE,** seguimiento. El beneficiario manifiesta conformidad y refiere que empezaron labores constructivas el día de ayer. No refiere dudas e inquietudes
BARRIO O TERRITORIO: VILLA ANITA SUR
29/01/2021 - **MVUS_21059: ALEXANDER BERNAL AVENDAÑO,** seguimiento. La beneficiaria manifiesta que empezaron labores constructivas el lunes. No refiere dudas; se observa personal de obra en el predio.
28/01/2021 - **MVUS_21059 : ALEXANDER BERNAL AVENDAÑO,** seguimiento de obra
BARRIO O TERRITORIO: VILLA ISRRAEL
29/01/2021 - **MVUS_0036: EMPERATRÍZ RODRÍGUEZ LÓPEZ,** seguimiento. La beneficiaria manifiesta conformidad con los avances. Refiere que los maestros han laborado todos los días. No refiere dudas e inquietudes.
BARRIO O TERRITORIO: ROCÍO ALTOS DEL SUR
25/01/2021 - **MVJA_2909 - BLANCA CECILIA ALFONSO BOHÓRQUEZ,** seguimiento, se observa personal en la obra, la beneficiaria expresa inconformidad con la obra en precios, se aclara con técnico residente y contratista compromisos, se modifican tareas para hacer los ajustes aclarados en la bitácora. Firman personal contratista, de interventoría y beneficiaria.
28/01/2021 - **MVJA_2909: BLANCA CECILIA ALFONSO BOHÓRQUEZ**. Seguimiento. Se observa personal en la obra, beneficiaria expresa inconformidad nuevamente por una actividad que refiere en contratista no alcanza para ejecutarla. Se le indica que se procederá a la vivienda con el contratista para revisar el presupuesto. Nuevamente se le indica de interponer PQR pero refiere que no desea ponerla.
29/01/2021 - **MVJA_2909: BLANCA CECILIA ALFONSO BOHÓRQUEZ,** seguimiento. No se observa personal en la obra, beneficiaria expresa inconformidad ya que no hay material para que sigan las actividades. El contratista manifiesta que el día de hoy culminan la obra.
30/01/2021 - **MVJA_2909: BLANCA CECILIA ALFONSO BOHÓRQUEZ,** beneficiaria firma todos los documentos de entrega, no recibe kit ecológico y no accede a tomarse la foto.

BARRIO O TERRITORIO: EL BRILLANTE
28/01/20201 - **MV_22203: YENY ZURLEY LÓPEZ ULLOA,** visita de seguimiento social - técnica de interventoría y de contratista, se observan a dos trabajadores, se le informa al hermano de la beneficiaria que en su ausencia debe mostrar la carta de autorización.
28/01/2021 - **MV_22728: ECCEHOMO RIVERA RONCANCIO,** visita de seguimiento social - técnico de interventoría y contratista, se observa a un trabajador, el beneficiario está conforme con el avance de las actividades. Se aclara que el beneficiario afirma que no está trabajando en su propia vivienda.
BARRIO O TERRITORIO: NUEVO SAN LUIS
28/01/2021 - **MVUS_0795: AIDA MARÍA RUEDA NIETO,** se realiza visita de seguimiento social - técnico de interventoría y social del contratista, no se evidencia ingreso de material, ni presencia de trabajadores.
BARRIO O TERRITORIO: ANTONIO JOSÉ DE SUCRE I SECTOR
28/01/2021 - **MVUS_21820 : JUAN EUDES ORJUELA GARZÓN,** apertura de vivienda y autorización e implementación de historia de vida
BARRIO O TERRITORIO: ANTONIO JOSÉ DE SUCRE III SECTOR
28/01/2021 - **MV_21184 : AMALIA MERCHÁN SOSA,** seguimiento de obra
28/01/2021 - **MV_21368 : ALEJANDRO PAVA ,** seguimiento de obra
28/01/2021 - **MV_21212: ERNESTINA CAICEDO ,** seguimiento de obra
28/01/2021 - **MV_21240: ALFONSO GUERRERO,** seguimiento de obra
28/01/2021- **MV_21283 - TERESA DE JESÚS OSORIO ORTÍZ,** seguimiento, ejecución #11, se observa personal en la obra; beneficiaria expresa conformidad frente a la obra, tiene dudas frente al presupuesto y actividades, técnico residente explica y beneficiaria queda a gusto con procedimientos e información suministrada.
28/01/2021 - **MV_21341: ERMELINDA HERNÁNDEZ,** se realiza visita de seguimiento social - técnico de interventoría y social del contratista, la beneficiaria pide que se priorice la instalación del sanitario para su uso, manifiesta inquietudes técnicas en cuanto a las actividades a realizar que son aclaradas por el área técnica.
HISTORIAS DE VIDA: ANTONIO JOSÉ DE SUCRE I Y III SECTOR
28/01/2021 - **MV_21240: ALFONSO GUERRERO,** autorización e implementación de historia de vida
28/01/2021 - **MV_21820 : JUAN EUDES ORJUELA GARZÓN,** autorización e implementación de historia de vida
4. CASOS ESPECIALES COMPONENTE SOCIAL - CONFLICTOS Y ANÓMALIAS
30/01/2021 - MVJA_3146: CLARA INÉS GIL BÁEZ, por solicitud de la beneficiaria se realiza PQRS, debido a que se ha demorado mucho en ejecución y las actividades socializadas en el inicio no corresponden a las ejecutadas. Se recomienda al contratista actualizar presupuesto, socializarlo a la beneficiaria y finalizar prontamente labores en la vivienda a conformidad de la señora Clara.
5. PLAN DE ACCIÓN RESULTADO DEL ANÁLISIS DE CAUSAS REGISTRADO EN EL NUMERAL ANTERIOR - CON EL OBJETIVO DE ELIMINAR LA CAUSA RAÍZ DE LA SITUACIÓN PROBLEMÁTICA - PLAN DE MEJORA

ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA PROGRAMADA
Actualizar presupuesto con sus actividades, socializarlo y dejar copia en bitácora antes de la finalización de la vivienda.	CONSORCIO MEJORAMIENTO EP2020	Antes de finalizar labores constructivas

6. Actas de reunión con la comunidad y listados de asistencia o soporte de las diferentes acciones según corresponda (cuando aplique).
30/01/2021 - MVJA_3146: CLARA INÉS GIL BÁEZ, acta de PQR
7. COMENTARIOS DEL INTERVENTOR: Por favor realice la descripción general del estado del contrato y según aplique informe sobre: actividades realizadas en la semana, control de lluvias, compra y suministro de materiales, mano de obra, subcontratos y tramites ante las diferentes empresas prestadoras de servicios, entre otros. Anexe las actas de seguimiento realizadas en la semana correspondiente al periodo del informe.
* Durante la semana se genera un PQR, el cual se manejará de acuerdo a los lineamientos de la SDHT en estos casos, dando celeridad a finalización de obras, socializando el presupuesto actualizado y entregado a conformidad de la beneficiaria, a este informe se adjunta el acta hecha
8. REGISTRO FOTOGRÁFICO DEL AVANCE DURANTE LA SEMANA

INPLAYCO S.A.S.
INGENIEROS CONSTRUCTORES E INTERVENTORES

REGISTRO FOTOGRÁFICO

GRUPO 1



25/01/2021 - MVJA_3105: BLANCA NELLY HERNÁNDEZ, validación.




25/01/2021 - MVCB_1867 : JOSE ALBER LUGO , apertura de vivienda



26/01/2021 - MVJA_3670: CRISTOBAL PITA CAMARGO, validación.




26/01/2021 - MVCB_1843 :FLOR ALBA GUTIERREZ BELTRÁN, seguimiento de obra

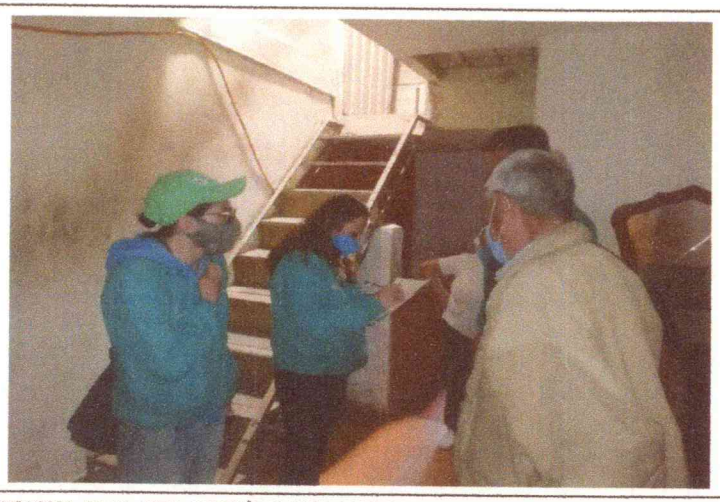


29/01/2021 - MVJA_3670 - CRISTÓBAL PITO CAMARGO, socializacion de presupuesto, beneficiario solicita visita a SDHT para explicarle el presupuesto asignado y actividades, se hace socializacion de presupuesto y acividades, no se expresan inconvenientes con relación al presupuesto.



30/01/2021 - MVJA_2909: BLANCA CECILIA ALFONSO: Entrega, en la cual la beneficiaria no accede a foto de entrega de la vivienda.

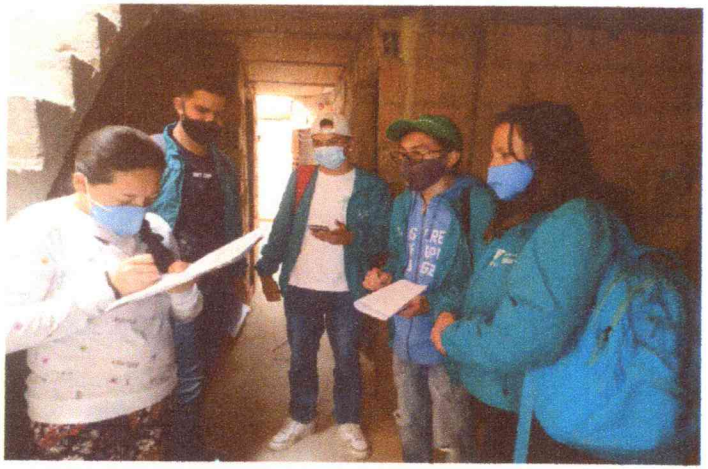

29/01/2021 - MVJA_0268 - HASBLEIDY GINA ROJAS ESCOBAR, socialización de presupuesto, beneficiaria solicit visita a SDHT para conocer presupuesto, se hace visita social y técnica y se explican presupuesto, se hacen modificaciones técnicas a gusto de beneficiaria y con aprobación del área técnica. Se queda en socializar nuevo presupuesto en apertura de obra.

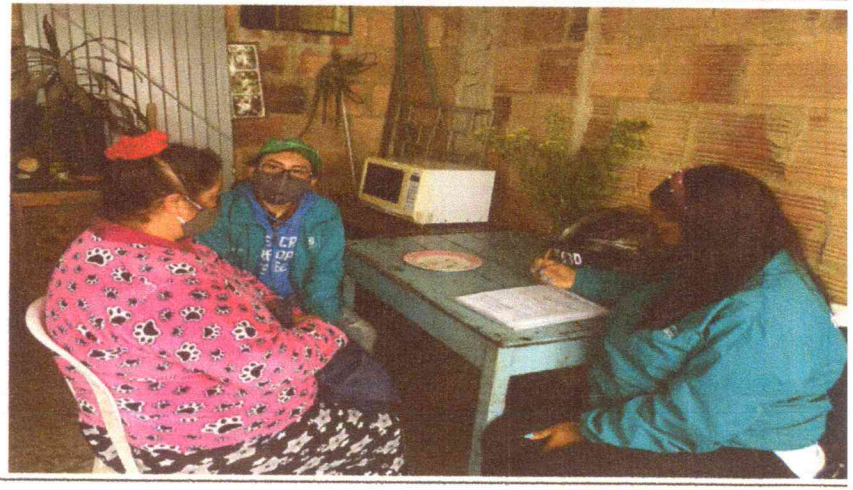

25/01/2021 - MVJA_3257 - NELLY PIZA BUITRAGO, validación.

INPLAYCO S.A.S.
INGENIEROS CONSTRUCTORES E INTERVENTORES

ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE HÁBITAT

INFORME SISO SEMANAL 13

INPLAYCO S.A.S. INGENIEROS CONSTRUCTORES E INTERVENTORES	INFORME HSE	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DEL HÁBITAT

INFORME INTERVENTORÍA SISO

FECHA DEL INFORME		OBJETO DEL CONTRATO	INFORME
DESDE	25/01/2021	" Ejecución de las obras de mejoramiento de vivienda en la modalidad de habitabilidad en los territorios priorizados por la Secretaría Distrital del Hábitat."	13
HASTA	31/01/2021		

1. Descripción de las Actividades Realizadas durante la semana

Contratista: Acompañamiento a las actividades de Seguimiento y apertura a las mejoras en las vivienda por parte del equipo técnico, divulgación del protocolo de seguridad y bioseguridad para ingreso a las viviendas; Se hace seguimiento a las actividades que vienen desarrollando en las viviendas asignadas a los diferentes grupos de trabajo en compañía de interventoría. Se verificó uso correcto de herramientas, autocuidado, trabajo seguro durante las visitas. Se realiza jornada de aseo y recogida de escombro en las viviendas. Se acompañó en aperturas y validaciones en los diferentes sectores de intervención.

Charla de " USO DOTACION ADECUADA" Dirigida al personal operativo, con recomendaciones aplicables en el trabajo.

Interventoría: Continuando con el acompañamiento y verificación del cumplimiento del protocolo de Bioseguridad entregado por parte del contratista, proceso que se cumple durante los recorridos realizados. Se realizan actividades administrativas referente a informe semanal y revisión de documentos del personal contratado y del personal que se ha retirado.

Recorrido por diferentes sectores en compañía de profesional SISO del contratista, tomando temperatura, reforzando tema de autocuidado y prevención, se revisan los contenido del kit de bioseguridad, se hace enfasis a los beneficiarios sobre el uso del tapabocas y evitar al máximo el contacto con los maestros de obra, en especial si se cuenta con enfermedades catalogadas de alto riesgo. Se hace énfasis especial en la recolección de Escombros y la ejecución de procedimientos de trabajo seguro durante las actividades.

CAPACITACION

Charla " USO DOTACION ADECUADA" Se recalca sobre la aplicación del protocolo de bioseguridad.	si	100% La charla se hace durante las visitas de seguimiento, se refuerza el tema de bioseguridad y se verifica su aplicación

2. Gestión Ambiental

Seguimiento a la recolección de escombros de las viviendas intervenidas y a la disposición final de escombros en lugar autorizado por la autoridad ambiental.

2.1. Generación y Disposición de Residuos Sólidos

Tipo de Residuo	Cantidad m3	Acumulado	Sitio de Disposición	Observaciones
Escombro	16	136	Cemex	Se recibe copia de la disposición

3. Gestión en Salud Ocupacional (Seguridad e Higiene Industrial)

Se sigue verificando la aplicación del protocolo de Bioseguridad, dando recomendaciones a los trabajadores como parte de las medidas de prevención de accidentes.

Se verifican afiliaciones de personal que ingresa y las planillas recibidas, asi mismo se solicitaron los respectivos paz y salvo del persona retirado.

3.1. Índices

Valor	Horas Hombre Trabajadas Contratista	Horas Hombre Capacitación	Horas Hombre Trabajadas Interventoría	Días Ausentismo por Enfermedad General	Ausentismo por Accidentes de Trabajo
Total Semanales	**2976**	12	**576**	**0**	**0**
Total Acumulado	**36688**	254	**5240**	**10**	**0**

3.1.1.Incidendentalidad

	Fatalidades	Casos Con Daños A propiedad	Incidente Ambiental	Incidente Vehicular	Casi Accidentes	Casos Con días Perdidos	Casos con Trabajo restringido	Casos Con Días de Incapacidad (tratamiento medico)
Total	**0**	**0**	**0**	**0**	**1**	**0**	**0**	**0**

3.2. Capacitaciones y Charlas

28/01/2021	Se realizó charla "USO DOTACION ADECUADA" dirigida al personal operativo. Se reafirma el protocolo de Bioseguridad en las viviendas aperturadas

3.3. Condiciones y Acciones Subsanar

3.3.1 Condición Substandar

No	Descripción	Acción Tomada	La Condición Continua?
1	Presencia de escombros en exteriores de la vivienda	Se informa a SST del contratista para tomar las acciones correspondientes	Se avisó al contratista, se verificará la recogida.
2	En Mv 18353 se evidenció falta de señalización condición insegura	Secomunica al maestro y se procede a la señalización correspondiente	Situación corregia inmediatamente

4. Registro Fotográfico

Toma de temperatura a beneficiarios



MV 1341




MV 1371




MV 21820

Toma de temperatura a Personal y charla de Seguridad

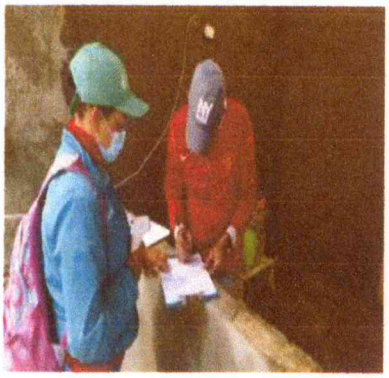

MV 18353

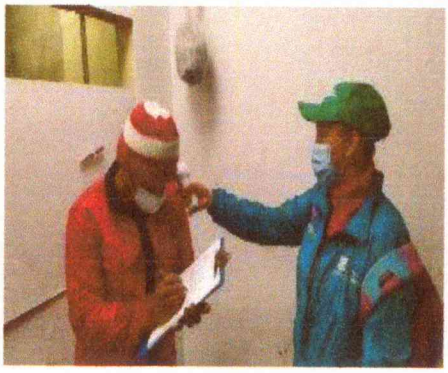

MV 21240



MV 17421

Protocolo ingreso a viviendas - kit bioseguridad



MV 21820





MV 21184



MV 19285

INFORME SISO
INPLAYCO SAS
Fecha: 18 al 24 de Enero de 2021

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DEL HÁBITAT

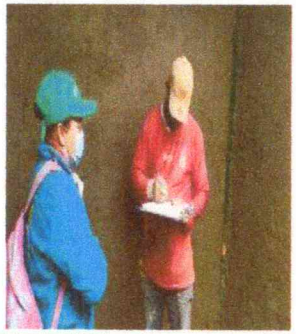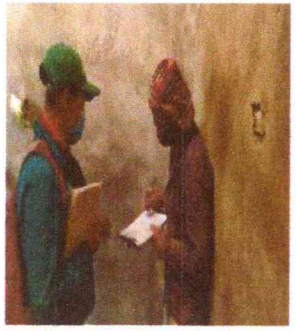RELACIÓN DE: CHARLAS DIARIAS CAPACITACIONES SIMULACROS LECCIONES APRENDIAS (Fechas)	OBSERVACION POR PARTE DE INTERVENTORÍA	REGISTRO FOTOGRÁFICO		
Se realizó charla en los diferentes puestos de trabajo TEMA: "USO DE LA DOTACIÓN ADECUADA"	Por la distancia entre los diferentes áreas de trabajo, se realiza la charla en cada una de las viviendas visitadas, diligenciando el respectivo registro			
		MV 19285	MV 18951	MV 21059

INPLAYCO S.A.S.
INGENIEROS CONSTRUCTORES E INTERVENTORES

INFORME SISO
INPLAYCO SAS
Fecha: 25 al 31 de Enero de 2021

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DEL HÁBITAT

META DE CUMPLIMIENTO AL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO, MEDIO AMBIENTE Y CALIDAD: 100%

ACTIVIDADES						GESTIÓN AMBIENTAL			No. HORAS HOMBRE CAPACITACIONES					Reportes de incidentes en el componente social y técnico.								
PROYECTO / DEPARTAMENTO	CONTRATO	CONTRATISTA	OBJETO CONTRATO	NUMERO DE TRABAJADORES	HORAS HOMBRE TRABAJADAS	ESCOMBROS (Cantidad m3)	RESIDUOS PELIGROSOS (Kg)	CONSUMO DE AGUA (m3), para las actividades de mejoramiento de vivienda	PROFESIONALES	TECNICOS	OPERATIVOS (Subcontratistas, maestros y auxiliares)	PROVEEDOR	TOTAL	LUGAR O ÁREA DE TRABAJO	FECHA DEL ACCIDENTE	No. DÍAS INCAPACIDAD	No. ACCIDENTE REGISTRABLE	FECHA DE INVESTIGACIÓN	DESCRIPCION DEL ACCIDENTE	RELACION DE EQUIPO DE INVESTIGACIÓN	LECCIÓN APRENDIDA	PLAN DE ACCIÓN Y FECHA
	CONTRATO 694 - 2020 CONTRATISTA: CONSORCIO MEJORAMIENTO EP 2020		Contratar la ejecución de las obras de mejoramiento de vivienda en la modalidad de habitabilidad de los proyectos estructurados en los territorios priorizados por la Secretaria Distrital de Hábitat. Grupo I	62	2976	16,0	0,0		0,00	0,00	48,00	0,00	48			0	0					
									0	0	0	0	0			0	0					
									0	0	0	0	0			0	0					
									0	0	0	0	0			0	0					
									0	0	0	0	0			0	0					
									0	0	0	0	0			0	0					
				62	2976	16	0	0,0	0,00	0,00	48,00	0,00	48,00	0	0	0	0		0			

ELABORO: ROBERT ROJAS TORRES -PROFESIONAL SISO

INDICADORES SST- CONTRATO No. 694 2020	
HORAS HOMBRE SEMANAL	3.552
HORAS HOMBRE ACUMULADAS MES	16.728
HORAS HOMBRE ACUMULADAS TOTAL	41.928
No. INCIDENTES REGISTRABLES	0
No. DÍAS DE INCAPACIDAD	0
No. DÍAS DE INCAPACIDAD ACUMULADOS MES	0
HORAS CAPACITACIONES SEMANAL	12,00
HORAS CAPACITACIONES ACUMULADO MENSUAL	58,00
HORAS CAPACITACIONES ACOMULADO TOTAL	264,00

GESTIÓN AMBIENTAL		
ESCOMBROS (Cantidad m3) Semanal	16	Escombrera Cemex
ESCOMBROS (Cantidad acumuladas mes)	56	
ESCOMBROS (Cantidad acumuladas mes)	136	
RESIDUOS PELIGROSOS (Cantidad Kg semanal)	0	
RESIDUOS PELIGROSOS (Cantidad acumuladas mes)	0	
CONSUMO DE AGUA (m3) Semanal	0	Uso de agua de cada vivienda, incluyendo agua lluvia, no se ha adquirido agua adicional
CONSUMO DE AGUA (m3), Mensual	0	

INFORME SISO

Fecha: 25 al 31 de Enero de 2021

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DEL HÁBITAT

CONTRATO: 694 - 2020
CONTRATISTA: CONSORCIO MEJORAMIENTO EP 2020

CONDICIONES Y ACCIONES SUBESTÁNDAR

No.	DESCRIPCIÓN	HALLAZGOS	ACCIÓN CONTINÚA		FECHAS		RESPONSABLE	REGISTRO FOTOGRÁFICO
			ABIERTA	CERRADA	FECHA DE APERTURA	FECHA DE CIERRE		
2	Kit bioseguridad	En MV 21368 No se evidencia alcohol en el kit. El contratista repone el contenido que faltaba.	1	1	28/01/2021	28/01/2021	Luis fernando Carrillo Leda Lambis	
3	Condición insegura no señalizada	En Mv 18353 se evidenció falta de señalización condición insegura, posibilidad de caída	1	1	28/01/2021	28/01/2021	Leda Lambis	 
			3	3				

TOTAL ACCIONES ABIERTAS	3
TOTAL ACCIONES CERRADAS	3

INPLAYCO S.A.S.

INFORME SISO

Fecha: 25 al 31 de Enero de 2021

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DEL HÁBITAT

CONTRATO: 694-2020
CONTRATISTA: CONSORCIO MEJORAMIENTO EP 2020

RELACIÓN DE TRABAJADORES ADMINISTRATIVOS Y OPERATIVOS AFILIADOS A SEGURIDAD SOCIAL

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	C.C.	Fecha de afiliación	Personal afiliado Administrativos	Personal afiliado (operativo: maestros y auxiliares)	EPS	PENSION	ARL	ESTADO ACTUAL		OBSERVACIONES
									ACTIVO	RETIRADO	
1	CARLOS JOSE HERNADEZ JIMENEZ	78.717.000	17/11/2020	1		NUEVA EPS	PORVENIR	POSITIVA	SI		
2	DIANA CAROLINA NAVARRO JIMENEZ	52.233.027	20/11/2020	1		COMPENSAR	PORVENIR	POSITIVA	SI		
3	LEDA LUZ LAMBIS CASTRO	22.732.637	19/11/2020	1		SURA	PORVENIR	POSITIVA	SI		
4	LUIS FERNANDOI CARRILLO JIMENEZ	72.097.065	19/11/2020	1		CAJACOPI	COLFONDOS	POSITIVA	SI		
5	RICARDO JAIMES RUIZ	19.144.052	19/11/2020	1		NUEVA EPS	NO APLICA	POSITIVA	SI		
6	SHIRLEY AMELI VITOLA SERRANO	64.583.890	19/11/2020	1		COMPENSAR	PORVENIR	POSITIVA	SI		
7	YESENIA VIVIANA GAMEZ SALAS	1.120.745.285	19/11/2020	1		NUEVA EPS	COLFONDOS	POSITIVA	SI		
8	MARCO AUGUSTO HAMON RODRIGUEZ	1.070.955.988	19/11/2020	1		FAMISANAR	PORVENIR	POSITIVA	SI		
9	LINA MARCELA COLORADO CASTRO	1.019.022.812	19/11/2020	1		SALUD TOTAL	PORVENIR	POSITIVA	SI		
10	DANIELA CASTAÑO CASTAÑO	1.032.447.818	19/11/2020	1		FAMISANAR	PROTECCION	POSITIVA	SI		
11	LIBYS PADILLA URUETA	1.073.822.532	2/10/2020	1		SALUD TOTAL	PORVENIR	POSITIVA	SI		
12	JUAN ADRES CORREDOR MAYORGA	1.022.401.358	19/11/2020	1		FAMISANAR	PORVENIR	POSITIVA	SI		
13	GERSON ASPRILLA LOPEZ	11.797.192	19/11/2020	1		SANITAS	COLPENSIONES	POSITIVA	SI		
14	WILFRED BENAVIDEZ SANCHEZ	79.851.515	19/11/2020	1		ALIANSA SALUD	PORVENIR	POSITIVA		SI	RETIRADO
15	GREGORY FERNEY MOSQUERA	1.105.305.250	29/11/2020	1		SALUD TOTAL	PROTECCION	POSITIVA	SI		
16	ANDAIR MONTIEL VAQUIRO	1.007.535.425	25/11/2020		1	SALUD TOTAL	COLPENSIONES	SURA		SI	RETIRADO
17	CARLOS COLORADO BANDO	13.107.585	24/11/2020		1	SALUD TOTAL	PORVENIR	SURA	SI		
18	EDGAR MARTINEZ CRUZ	79.296.107	25/11/2020		1	SALUD TOTAL	PROTECCION	SURA	SI		
19	EDWIN HARVEY DE LA CRUZ TORO	10.307.972	25/11/2020		1	SALUD TOTAL	COLPENSIONES	SURA		SI	RETIRADO
20	FERNANDO VIDAL ORTIZ	5.887.718	25/11/2020		1	FAMISANAR	COLPENSIONES	SURA		SI	RETIRADO
21	IDELFONSO CIFUENTES	19.232.722	25/11/2020		1	SURA	PORVENIR	SURA		SI	RETIRADO
22	MARLON HUMBERTO MARTINEZ VAZQUEZ	1.031.152.755	25/11/2020		1	FAMISANAR	PORVENIR	SURA		SI	RETIRADO
23	WILMER ANDRES ROJAS SOLANO	1.118.534.846	25/11/2020		1	SALUD TOTAL	PORVENIR	SURA		SI	RETIRADO
24	OSCAR ARMANDO CALVACHE PAZ	12.977.717	24/11/2020		1	SALUD TOTAL	PORVENIR	SURA	SI		
25	VICTOR RUIZ GARCIA	1.002.597.213	25/11/2020		1	CAPITAL SALUD	PORVENIR	SURA		SI	RETIRADO
26	CARLOS ALBERTO CAICEDO HINOJOSA	1.111.817.731	24/11/2020		1	SALUD TOTAL	PORVENIR	SURA	SI		
27	YARLI COLORADO PAZ	1.085.549.452	24/11/2020		1	CAPITAL SALUD	PORVENIR	SURA		SI	RETIRADO
28	ILDELFONSO RAMIREZ ESQUIVEL	96.361.399	1/12/2020		1	FAMISANAR	COLPENSIONES	SURA	SI		
29	JUAN PABLO CORREA MURCIA	1.116.920.538	1/12/2020		1	SALUD TOTAL	PORVENIR	SURA		SI	RETIRADO
30	KEVIN FABIAN HOYOS YEPEZ	1.083.043.276	1/12/2020		1	SALUD TOTAL	PROTECCION	SURA		SI	RETIRADO
31	LAMBERTO GABRIEL DORIA SANCHEZ	72.147.586	1/12/2020		1	SALUD TOTAL	PROTECCION	SURA	SI		
32	ARLEY GIOVANNI CAICEDO RAMIREZ	1.117.511.256	3/12/2020		1	SALUD TOTAL	PORVENIR	SURA		SI	RETIRADO
33	ALBERT JOSE LEON GOMEZ	828.089.416.111.997	3/12/2020		1	SALUD TOTAL	COLFONDOS	SURA		SI	RETIRADO
34	JHON WILLIAM BALLESTEROS MARTINEZ	1.033.761.449	8/12/2020		1	COMPENSAR	PORVENIR	SURA		SI	RETIRADO
35	CARLOS ENRIQUE REDONDO	80.373.803	13/12/2020		1	SALUD TOTAL	COLPENSIONES	SURA	SI		
36	JULIO FERNEY BENAVIDES MENDEZ	80.256.134	13/12/2020		1	SALUD TOTAL	COLFONDOS	SURA	SI		

RELACIÓN DE TRABAJADORES ADMINISTRATIVOS Y OPERATIVOS AFILIADOS A SEGURIDAD SOCIAL											
No.	NOMBRES Y APELLIDOS	C.C.	Fecha de afiliación	Personal afiliado Administrativos	Personal afiliado (operativo: maestros y auxiliares)	EPS	PENSION	ARL	ESTADO ACTUAL		OBSERVACIONES
									ACTIVO	RETIRADO	
37	FREDY EDINSON FORERO NIÑO	1.024.489.116	15/12/2020		1	SALUD TOTAL	PORVENIR	SURA		SI	RETIRADO
38	JUAN AGUSTIN LIZARAZO	4.103.403	15/12/2020		1	SANITAS	65 AÑOS LIQUIDADO	SURA	SI		
39	JOSE IGNACIO CANO NOVOA	7.330.323	15/12/2020		1	CAPITAL SALUD	64 AÑOS LIQUIDADO	SURA	SI		
40	ALDEMAR CHAUX	96.357.448				SALUD TOTAL	COLFONDOS	SURA	SI		
41	LUIS ALBERTO CHAUX MUÑOZ	17.682.809				SALUD TOTAL	PROTECCION	SURA	SI		
42	HERNA DARIO CHON MORA	1.024.482.739				FAMISANAR	PROTECCION	SURA	SI		
43	RUBEN DARIO RODRIGUEZ ALMANZA	79.250.468				FAMISANAR	PROTECCION	SURA	SI		
44	BRAYAN ESTIVEN LOPEZ MOLINA	1.024.602.801	17/11/2020		1	FAMISANAR	PROTECCION	POSITIVA		SI	RETIRADO
45	EDWIN JIMMY ESPINEL CHACON	80.064.358	17/11/2020		1	NUEVA EPS	COLPENSIONES	POSITIVA		SI	RETIRADO
46	EDGAR VELANDIA	80.090.780	26/11/2020		1	ALIANSA SALUD	PORVENIR	POSITIVA		SI	RETIRADO
47	EMITZO JOSE FANDIÑO FLOREZ	85.469.924	18/11/2020		1	NUEVA EPS	PORVENIR	POSITIVA	SI		
48	EVANGELISTA BRINEZ BURGOS	6.030.390	17/11/2020		1	SALUD TOTAL	COLPENSIONES	POSITIVA		SI	RETIRADO
49	FABIO NELSON LOPEZ DIAZ	80.124.048	17/11/2020		1	SALUD TOTAL	PROTECCION	POSITIVA	SI		
50	JULIO CESAR NEIRA BENAVIDEZ	79.903.950	18/11/2020		1	COMPENSAR	PROTECCION	POSITIVA		SI	RETIRADO
51	RAFAEL CASTRO VILLA	8.815.936	17/11/2020		1	SALUD TOTAL	PORVENIR	POSITIVA		SI	RETIRADO
52	LEYDY PATRICIA SUAREZ VELAZQUEZ	1.033.693.495	18/11/2020		1	CAPITAL SALUD	PROTECCION	POSITIVA		SI	RETIRADO
53	MICHEL LEONARDO SALAS CELIS	1.033.766.212	17/11/2020		1	FAMISANAR	PORVENIR	POSITIVA	SI		
54	VLADIMIR BRIÑEZ MAHECHA	1.033.682.982	17/11/2020		1	FAMISANAR	COLFONDOS	POSITIVA		SI	RETIRADO
55	CARLOS ANDRES SUAREZ VELAZQUEZ	1.033.693.493	18/11/2020		1	FAMISANAR	PORVENIR	POSITIVA		SI	RETIRADO
56	LUIS FERNANDO CUPITRA DUCUARA	1.022.939.409	18/11/2020		1	SURA	COLFONDOS	POSITIVA		SI	RETIRADO
57	LUIS ALEJANDRO ZAMBRANO	79.770.115	18/11/2020		1	CAPITAL SALUD	COLPENSIONES	POSITIVA		SI	RETIRADO
58	OSBAR RENE BERNAL PAEZ	80.778.371	20/11/2020		1	SALUD TOTAL	PROTECCION	POSITIVA	SI		
59	ALBEIRO GUERRERO MACANA	5.996.412	25/11/2020		1	NUEVA EPS	PORVENIR	POSITIVA	SI		
60	EDWIN RODRIGUEZ VIDAL	93.394.589	25/11/2020		1	MEDIMAS	PORVENIR	POSITIVA	SI		
61	JOSE ANTONIO SILVA ORTEGA	19.458.840	25/11/2020		1	COMFACUNDI	PORVENIR	POSITIVA		SI	RETIRADO
62	SAURITH REALES DELGADO	91.431.492	25/11/2020		1	NUEVA EPS	COLPENSIONES	POSITIVA		SI	RETIRADO
63	CARLOS PAEZ PULIDO	1.049.630.871	17/11/2020		1	MEDIMAS	PROTECCION	POSITIVA		SI	RETIRADO
64	RAUL OSORIO RINCON	79.669.250	17/11/2020		1	SALUD TOTAL	PORVENIR	POSITIVA	SI		
65	MISAEL PERDOMO VILLAMIL	1.033.784.477	24/11/2020		1	NUEVA EPS	PORVENIR	POSITIVA	SI		
66	JOSE GUILLERMO MARTINEZ VARGAS	79.666.136	27/11/2020		1	SALUD TOTAL	COLPENSIONES	POSITIVA	SI		
67	OMAR MARTINEZ ZULETA	4.946.584	27/11/2020		1	NUEVA EPS	COLPENSIONES	POSITIVA		SI	RETIRADO
68	VICTOR MANUEL GUERRERO PACHECO	80.126.593	26/11/2020		1	CAPITAL SALUD	PORVENIR	POSITIVA	SI		
69	QUEVIN FABIAN LESMES LINARES	1.000.003.268	27/11/2020		1	CAPITAL SALUD	PORVENIR	POSITIVA		SI	RETIRADO
70	EDISON JOSE VENECIA SARABIA	72.120.789	25/11/2020		1	FAMISANAR	PORVENIR	POSITIVA	SI		
71	YOENDISON JOSE VENECIA MORENO	1.101.879.446	25/11/2020		1	COMPARTA	PORVENIR	POSITIVA	SI		
72	RUBEN PINEDA MAHECHA	1.031.151.104	25/11/2020		1	SALUD TOTAL	PORVENIR	POSITIVA	SI		
73	RAUL ALEXANDER SALAMANCA SALGADO	80.749.213	26/11/2020		1	CAPITAL SALUD	PORVENIR	POSITIVA		SI	RETIRADO
74	LEONARDO SOLANO CELY	1.024.511.017	26/11/2020		1	FAMISANAR	PORVENIR	POSITIVA	SI		
75	LUIS FRANCISCO GOMEZ SANCHEZ	80857562	25/11/2020		1	FAMISANAR	COLPENSIONES	POSITIVA		SI	RETIRADO
76	HAYDER CAMILO GALVIZ	1.033.762.528	17/11/2020		1	FAMISANAR	PROTECCION	POSITIVA		SI	RETIRADO
77	CAMILO HERNANDEZ SANCHEZ	1.049.639.642	17/11/2020		1	FAMISANAR	COLFONDOS	POSITIVA		SI	RETIRADO
78	CESAR JULIO BENAVIDEZ	1.193.036.484	27/11/2020		1	COOSALUD	PORVENIR	POSITIVA	SI		
79	FERNANDO MORENO HUERTAS	3.199.429	26/11/2020		1	CAPITAL SALUD	PORVENIR	POSITIVA	SI		
80	JHON EDISON PALACIO MORENO	1.077.435.835	26/11/2020		1	SALUD TOTAL	PROTECCION	POSITIVA	SI		

RELACIÓN DE TRABAJADORES ADMINISTRATIVOS Y OPERATIVOS AFILIADOS A SEGURIDAD SOCIAL

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	C.C.	Fecha de afiliación	Personal afiliado Administrativos	Personal afiliado (operativo: maestros y auxiliares)	EPS	PENSION	ARL	ESTADO ACTUAL		OBSERVACIONES
									ACTIVO	RETIRADO	
81	LUIS HERNANDEZ BARRETO	80.858.697	25/11/2020		1	SANITAS	PROTECCION	POSITIVA		SI	RETIRADO
82	LUZ ADRIANA SILVA MUÑOZ	53.094.514	26/11/2020		1	CAPITAL SALUD	PORVENIR	POSITIVA		SI	RETIRADO
83	JEISON ACERO	1.044.391.694	25/11/2020		1	MUTUAL SER	PORVENIR	POSITIVA	SI		
84	ANDRES FERNANDO PEREZ DIAZ	1.063.625.214	1/12/2020		1	NUEVA EPS	PORVENIR	POSITIVA		SI	RETIRADO
85	ANGEL IVAN DIAZ	79.924.351	1/12/2020		1	FAMISANAR	PORVENIR	POSITIVA		SI	RETIRADO
86	CARLOS ALBERTO SUAREZ BARRERA	9.527.688	1/12/2020		1	CAPITAL SALUD	PORVENIR	POSITIVA		SI	RETIRADO
87	CIRO ARTURO NIÑO	4.255.303	1/12/2020		1	SALUD TOTAL	COLPENSIONES	POSITIVA		SI	RETIRADO
88	EDGAR HERNANDO NIÑO	4.225.078	1/12/2020		1	CAPITAL SALUD	PORVENIR	POSITIVA		SI	RETIRADO
89	EDWAR ARLEY RODRIGUEZ MAYORGA	1.033.754.705	1/12/2020		1	SALUD TOTAL	PORVENIR	POSITIVA		SI	RETIRADO
90	EMILIANO MUÑOZ PALACIO	80.265.681	1/12/2020		1	SALUD TOTAL	PORVENIR	POSITIVA		SI	RETIRADO
91	CAMILO ERNESTO RAMIREZ ROA	1.033.735.370	1/12/2020		1	COMPENSAR	PROTECCION	POSITIVA		SI	RETIRADO
92	CARLOS SEBASTIAN LOPEZ CASTELLANO	1.031.170.297	1/12/2020		1	FAMISANAR	PROTECCION	POSITIVA	SI		
93	IDELFONSO DE JESUS PEÑARANDA	1.118.873.986	1/12/2020		1	SALUD TOTAL	PORVENIR	POSITIVA	SI		
94	CARLOS ALBERTO PULIDO YATE	1.033.683.233	1/12/2020		1	FAMISANAR	PROTECCION	POSITIVA	SI		
95	CIPRIANO PIÑEROS	79.703.764	1/12/2020		1	FAMISANAR	COLFONDOS	POSITIVA	SI		
96	DAGOBERTO PAREJO AREVALO	8.668.649	1/12/2020		1	MUTUAL SER	PORVENIR	POSITIVA		SI	RETIRADO
97	DANIEL ARTURO NIÑO ROJAS	1.024.469.352	1/12/2020		1	SALUD TOTAL	COLPENSIONES	POSITIVA		SI	RETIRADO
98	EDER GONZALEZ GASTELBLONDO	84.062.070	1/12/2020		1	NUEVA EPS	PORVENIR	POSITIVA	SI		
99	GLORIA JIMENEZ	28.155.523	2/12/2020		1	NUEVA EPS	PROTECCION	POSITIVA	SI		
100	JESUS DAVID LOPEZ GALVIZ	13.860.790	2/12/2020		1	NUEVA EPS	COLPENSIONES	POSITIVA	SI		
101	JHON RIVER MAYORGA BENAVIDES	1.033.721.955	1/12/2020		1	CAPITAL SALUD	PORVENIR	POSITIVA	SI		
102	SAMIR ZIAD PINEDA YAHMURE	79.920.337	1/12/2020		1	COMPENSAR	PROTECCION	POSITIVA		SI	RETIRADO
103	SIMON LOPEZ PALACIOS	94.418.910	1/12/2020		1	SALUD TOTAL	COLPENSIONES	POSITIVA		SI	RETIRADO
104	WILSON FERNEY BERNAL GUASCA	1.033.707.175	1/12/2020		1	FAMISANAR	PORVENIR	POSITIVA		SI	RETIRADO
105	YOISEN HAIDIN CHIBUQUE CAICEDO	1.007.413.403	1/12/2020		1	MEDIMAS	PROTECCION	POSITIVA	SI		
106	LUIS HERNANDEZ GRANADA	19.219.713	1/12/2020		1	SANITAS	COLPENSIONES	POSITIVA	SI		
107	ANDRES GARCIA ROJAS	80.895.628	15/12/2020		1	SALUD TOTAL	PROTECCION	POSITIVA	SI		
108	EDGAR HERNANDO NIÑO	4.225.078	1/12/2020		1	CAPITAL SALUD	PORVENIR	POSITIVA	SI		
109	HELI RAMIREZ PERALTA	79.734.766	12/12/2020		1	SALUD TOTAL	PROTECCION	POSITIVA	SI		
110	JAVIER FRANCO RODRIGUEZ	731054127121978	1/12/2020		1	SALUD TOTAL	PROTECCION	POSITIVA	SI		
111	JEISON LOPEZ MEJIA	1.033.816.388	15/12/2020		1	SALUD TOTAL	PORVENIR	POSITIVA		SI	RETIRADO
112	JOSE RODRIGUEZ GARCIA	1.031.176.991	1/12/2020		1	CAPITAL SALUD	PORVENIR	POSITIVA	SI		
113	JULIAN ANDRES ARAGON DEVIA	1.030.628.205	15/12/2020		1	CONVIDA	PORVENIR	POSITIVA		SI	RETIRADO
114	KEVIN SEBASTIAN APARACIO	1.000.064.803	10/12/2020		1	FAMISANAR	PORVENIR	POSITIVA		SI	RETIRADO
115	LUIS CARLOS MENDOZA GAMEZ	17.971.346	4/12/2020		1	ALIANSA SALUD	PORVENIR	POSITIVA	SI		
116	LUIS MUÑOZ GRAJALES	80.774.495	1/12/2020		1	COOSALUD	PROTECCION	POSITIVA		SI	RETIRADO
117											
118											
119											
120											
	RESULTADOS:			15	97				62	54	

INFORME SISO

Fecha: 25 al 31 de Enero de 2021

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DEL HÁBITAT

CONTRATO: 694-2020
CONTRATISTA: CONSORCIO MEJORAMIENTO EP 2020

RELACIÓN PERSONAL CON EXÁMENES MÉDICOS

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	C.C.	FECHA DE INGRESO	FECHA DE EXAMEN MÉDICO DE INGRESO/ PERIODICO	PERSONAL		Personal Trabajos en Alturas		ESTADOL ACTUAL		OBSERVACIONES
					Administrativo	Operativo: maestros y auxiliares	APTO	NO APTO	ACTIVO	RETIRADO	
1	CARLOS JOSE HERNANDEZ JIMENEZ	78.717.000	17/11/2020	20/11/2020	1		SI		SI		
2	DIANA CAROLINA NAVARRO JIMENEZ	52.233.027	20/11/2020	10/11/2020	1		SI		SI		
3	LEDA LUZ LAMBIS CASTRO	22.732.637	19/11/2020	10/11/2020	1		SI		SI		
4	LUIS FERNANDOI CARRILLO JIMENEZ	72.097.065	19/11/2020	11/11/2020	1		SI		SI		
5	RICARDO JAIMES RUIZ	19.144.052	19/11/2020	10/11/2020	1		SI		SI		
6	SHIRLEY AMELI VITOLA SERRANO	64.583.890	19/11/2020	10/11/2020	1		SI		SI		
7	YESENIA VIVIANA GAMEZ SALAS	1.120.745.285	19/11/2020	12/11/2020	1		SI		SI		
8	MARCO AUGUSTO HAMON RODRIGUEZ	1.070.955.988	19/11/2020	10/11/2020	1		SI		SI		
9	LINA MARCELA COLORADO CASTRO	1.019.022.812	19/11/2020	10/11/2020	1		SI		SI		
10	DANIELA CASTAÑO CASTAÑO	1.032.447.818	19/11/2020	14/11/2020	1		SI		SI		
11	LIBYS PADILLA URUETA	1.073.822.532	2/10/2020	20/08/2020	1		SI		SI		
12	JUAN ANDRES CORREDOR MAYORGA	1.022.401.358	19/11/2020	24/11/2020	1		SI		SI		
13	GERSON ASPRILLA LOPEZ	11.797.192	19/11/2020	11/11/2020	1		SI		SI		
14	WILFRED BENAVIDEZ SANCHEZ	79.851.515	19/11/2020	13/11/2020	1		SI			SI	
15	GREGORY FERNEY MOSQUERA	1.105.305.250	29/11/2020	25/11/2020	1		SI		SI		
16	OSCAR ARMANDO CALVACHE PAZ	12.977.717	24/11/2020	28/11/2020		1	SI		SI		
17	CARLOS COLORADO BANDO	13.107.585	24/11/2020	28/11/2020		1	SI		SI		
18	YARLI COLORADO PAZ	1.085.549.452	24/11/2020	28/11/2020		1	SI			SI	
19	CARLOS ALBERTO CAICEDO HINOJOSA	1.111.617.731	24/11/2020	28/11/2020		1	SI		SI		
20	MARLON HUMBERTO MARTINEZ VAZQUEZ	1.031.152.755	25/11/2020	28/11/2020		1	SI			SI	
21	EDGAR MARTINEZ CRUZ	79.296.107	25/11/2020	28/11/2020		1	SI		SI		
22	IDELFONSO CIFUENTES	19.232.722	25/11/2020	28/11/2020		1	SI			SI	
23	ANDAIR MONTIEL VAQUIRO	1.007.535.425	25/11/2020	28/11/2020		1	SI			SI	
24	FERNANDO VIDAL ORTIZ	5.887.718	25/11/2020	28/11/2020		1	SI			SI	
25	VICTOR RUIZ GARCIA	1.002.597.213	25/11/2020	28/11/2020		1	SI			SI	

RELACIÓN PERSONAL CON EXÁMENES MÉDICOS

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	C.C.	FECHA DE INGRESO	FECHA DE EXAMEN MÉDICO DE INGRESO/ PERIODICO	PERSONAL		Personal Trabajos en Alturas		ESTADOL ACTUAL		OBSERVACIONES
					Administrativo	Operativo: maestros y auxiliares	APTO	NO APTO	ACTIVO	RETIRADO	
26	EDWIN HARVEY DE LA CRUZ TORO	10.307.972	25/11/2020	28/11/2020		1	SI			SI	
27	ILDELFONSO RAMIREZ ESQUIVEL	96.361.399	17/11/2020	5/12/2020		1	SI		SI		
28	JUAN PABLO CORREA MURCIA	1.116.920.538	17/11/2020	5/12/2020		1	SI			SI	
29	KEVIN FABIAN HOYOS YEPEZ	1.083.043.276	18/11/2020	5/12/2020		1	SI		SI		
30	LAMBERTO GABRIEL DORIA SANCHEZ	72.147.586	17/11/2020	5/12/2020		1	SI		SI		
31	ARLEY GIOVANNI CAICEDO RAMIREZ	1.117.511.256	3/12/2020	5/12/2020		1	SI			SI	
32	ALBERT JOSE LEON GOMEZ	828089416111997	3/12/2020	5/12/2020		1	SI		SI		
33	JHON WILLIAM BALLESTEROS MARTINEZ	1.033.761.449	8/12/2020	19/12/2020		1	SI			SI	
34	CARLOS ENRIQUE REDONDO	80.373.803	13/12/2020	19/12/2020		1	SI		SI		
35	JULIO FERNEY BENAVIDES MENDEZ	80.256.134	13/12/2020	19/12/2020		1	SI		SI		
36	FREDY EDINSON FORERO NIÑO	1.024.489.116	15/12/2020	19/12/2020		1	SI			SI	
37	JUAN AGUSTIN LIZARAZO	4.103.403	15/12/2020	19/12/2020		1	SI		SI		
38	JOSE IGNACIO CANO NOVOA	7.330.323	15/12/2020	19/12/2020		1	SI		SI		
39	ALBEIRO GUERRERO MACANA	5.996.412	25/11/2020	2/12/2020		1	SI		SI		
40	CAMILO HERNANDEZ SANCHEZ	1.049.639.642	17/11/2020	2/12/2020		1	SI			SI	
41	EVAGELISTA BRINEZ BURGOS	6.030.390	17/11/2020	2/12/2020		1	SI		SI		
42	FABIO NELSON LOPEZ DIAZ	80.124.048	17/11/2020	2/12/2020		1	SI		SI		
43	JEISON ACERO	1.044.391.694	25/11/2020	2/12/2020		1	SI		SI		
44	JOSE ANTONIO SILVA ORTEGA	19.458.840	25/11/2020	2/12/2020		1	SI			SI	
45	JULIO CESAR NEIRA BENAVIDEZ	79.903.950	18/11/2020	2/12/2020		1	SI			SI	
46	QUEVIN FABIAN LESMES LINARES	1.000.003.268	27/11/2020	2/12/2020		1	SI			SI	
47	LEYDY PATRICIA SUAREZ VELAZQUEZ	1.033.693.495	18/11/2020	2/12/2020		1	SI			SI	
48	LUIS FERNANDO CUPITRA DUCUARA	1.022.939.409	18/11/2020	2/12/2020		1	SI			SI	
49	LUIS FRANCISCO GOMEZ SANCHEZ	80.857.562	25/11/2020	2/12/2020		1	SI			SI	
50	LUZ ADRIANA SILVA MUÑOZ	53.094.514	26/11/2020	2/12/2020		1	SI			SI	
51	MICHEL LEONARDO SALAS CELIS	1.033.766.212	17/11/2020	2/12/2020		1	SI		SI		
52	MISAEL PERDOMO VILLAMIL	1.033.784.477	24/11/2020	2/12/2020		1	SI		SI		
53	OSBAR RENE BERNAL PAEZ	80.778.371	20/11/2020	2/12/2020		1	SI		SI		
54	RAUL OSORIO RINCON	79.669.250	17/11/2020	2/12/2020		1	SI		SI		
55	RUBEN PINEDA MAHECHA	1.031.151.104	25/11/2020	2/12/2020		1	SI		SI		
56	SAURITH REALES DELGADO	91.431.492	25/11/2020	2/12/2020		1	SI			SI	
57	VICTOR MANUEL GUERRERO PACHECO	80.126.593	26/11/2020	2/12/2020		1	SI		SI		
58	VLADIMIR BRIÑEZ MAHECHA	1.033.682.982	17/11/2020	2/12/2020		1	SI			SI	

RELACIÓN PERSONAL CON EXÁMENES MÉDICOS

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	C.C.	FECHA DE INGRESO	FECHA DE EXAMEN MÉDICO DE INGRESO/ PERIODICO	PERSONAL		Personal Trabajos en Alturas		ESTADOL ACTUAL		OBSERVACIONES
					Administrativo	Operativo: maestros y auxiliares	APTO	NO APTO	ACTIVO	RETIRADO	
59	CARLOS ALBERTO SUAREZ BARRERA	9.527.688	1/12/2020	2/12/2020		1	SI			SI	
60	YOENDISON JOSE VENECIA MORENO	1.101.879.446	25/11/2020	2/12/2020		1	SI		SI	-	
61	CIPRIANO PIÑEROS	79.703.764	1/12/2020	2/12/2020		1	SI		SI		
62	JOSE RODRIGUEZ GARCIA	1.031.176.991	1/12/2020	2/12/2020		1	SI		SI		
63	LUIS HERNANDEZ BARRETO	80.858.697	25/11/2020	2/12/2020		1	SI			SI	
64	WILSON FERNEY BERNAL GUASCA	1.033.707.175	1/12/2020	2/12/2020		1	SI			SI	
65	ANDRES FERNANDO PEREZ DIAZ	1.063.625.214	1/12/2020	2/12/2020		1	SI			SI	
66	CAMILO ERNESTO RAMIREZ ROA	1.033.735.370	1/12/2020	2/12/2020		1	SI			SI	
67	CESAR JULIO BENAVIDEZ	1.193.036.484	27/11/2020	2/12/2020		1	SI		SI		
68	EDISON JOSE VENECIA SARABIA	72.120.789	25/11/2020	2/12/2020		1	SI		SI		
69	HAYDER CAMILO GALVIZ	1.033.762.528	17/11/2020	2/12/2020		1	SI			SI	
70	LEONARDO SOLANO CELY	1.024.511.017	26/11/2020	2/12/2020		1	SI		SI		
71	YOISEN HAIDIN CHIBUQUE CAICEDO	1.007.413.403	1/12/2020	9/01/2021		1	SI		SI		
72	CARLOS ANDRES SUAREZ VELAZQUEZ	1.033.693.493	18/11/2020	2/12/2020		1	SI			SI	
73	EDER GONZALEZ GASTELBLONDO	84.062.070	1/12/2020	9/01/2021		1	SI		SI		
74	EDGAR VELANDIA	80.090.780	26/11/2020	2/12/2020		1	SI			SI	
75	OMAR MARTINEZ ZULETA	4.946.584	27/11/2020	2/12/2020		1	SI			SI	
76											
77											
78											
79											
RESULTADOS:					15	60	75	0	44	31	

INFORME SISO

Fecha: 25 al 31 de Enero de 2021

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DEL HÁBITAT

CONTRATO: 694-2020
CONTRATISTA: CONSORCIO MEJORAMIENTO EP 2020

RELACIÓN PERSONAL 7. Relación de actividades generales en donde se evidencie el cumplimiento de la implementación del Protocolo de Bioseguridad, así mismo, el interventor deberá informar sobre el cumplimiento o incumplimiento de este.

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	C.C.	FECHA DE INGRESO	FECHA DE EXAMEN MÉDICO DE INGRESO/ PERIODICO	PERSONAL		IMPLEMENTACIÓN PROTOCÓLO		ESTADO ACTUAL		OBSERVACIONES
					Administrativo	Operativo: maestros y auxiliares	SI	NO	ACTIVO	RETIRADO	
1	CARLOS JOSE HERNADEZ JIMENEZ	78.717.000	17/11/2020	20/11/2020	1		SI		SI		
2	DIANA CAROLINA NAVARRO JIMENEZ	52.233.027	20/11/2020	10/11/2020	1		SI		SI		
3	LEDA LUZ LAMBIS CASTRO	22.732.637	19/11/2020	10/11/2020	1		SI		SI		
4	LUIS FERNANDOI CARRILLO JIMENEZ	72.097.065	19/11/2020	11/11/2020	1		SI		SI		
5	RICARDO JAIMES RUIZ	19.144.052	19/11/2020	10/11/2020	1		SI		SI		
6	SHIRLEY AMELI VITOLA SERRANO	64.583.890	19/11/2020	10/11/2020	1		SI		SI		
7	YESENIA VIVIANA GAMEZ SALAS	1.120.745.285	19/11/2020	12/11/2020	1		SI		SI		
8	MARCO AUGUSTO HAMON RODRIGUEZ	1.070.955.988	19/11/2020	10/11/2020	1		SI		SI		
9	LINA MARCELA COLORADO CASTRO	1.019.022.812	19/11/2020	10/11/2020	1		SI		SI		
10	DANIELA CASTAÑO CASTAÑO	1.032.447.818	19/11/2020	14/11/2020	1		SI		SI		
11	LIBYS PADILLA URUETA	1.073.822.532	2/10/2020	20/08/2020	1		SI		SI		
12	JUAN ADRES CORREDOR MAYORGA	1.022.401.358	19/11/2020	24/11/2020	1		SI		SI		
13	GERSON ASPRILLA LOPEZ	11.797.192	19/11/2020	11/11/2020	1		SI		SI		
14	WILFRED BENAVIDEZ SANCHEZ	79.851.515	19/11/2020	13/11/2020	1		SI			SI	
15	GREGORY FERNEY MOSQUERA	1.105.305.250	29/11/2020	25/11/2020	1		si		SI		
16	ANDAIR MONTIEL VAQUIRO	1.007.535.425	25/11/2020	28/11/2020		1	SI			SI	
17	CARLOS COLORADO BANDO	13.107.585	24/11/2020	28/11/2020		1	SI		SI		
18	EDGAR MARTINEZ CRUZ	79.296.107	25/11/2020	28/11/2020		1	SI		SI		
19	EDWIN HARVEY DE LA CRUZ TORO	10.307.972	25/11/2020	28/11/2020		1	SI			SI	
20	FERNANDO VIDAL ORTIZ	5.887.718	25/11/2020	28/11/2020		1	SI			SI	
21	IDELFONSO CIFUENTES	19.232.722	25/11/2020	28/11/2020		1	SI			SI	
22	MARLON HUMBERTO MARTINEZ VAZQUEZ	1.031.152.755	25/11/2020	28/11/2020		1	SI			SI	
23	WILMER ANDRES ROJAS SOLANO	1.118.534.846	25/11/2020			1	SI			SI	

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	C.C.	FECHA DE INGRESO	FECHA DE EXAMEN MÉDICO DE INGRESO/ PERIODICO	PERSONAL		IMPLEMENTACIÓN PROTOCÓLO		ESTADO ACTUAL		OBSERVACIONES
					Administrativo	Operativo: maestros y auxiliares	SI	NO	ACTIVO	RETIRADO	
24	OSCAR ARMANDO CALVACHE PAZ	12.977.717	24/11/2020	28/11/2020		1	SI		SI		
25	VICTOR RUIZ GARCIA	1.002.597.213	25/11/2020	28/11/2020		1	SI			SI	
26	CARLOS ALBERTO CAICEDO HINOJOSA	1.111.817.731	24/11/2020	28/11/2020		1	SI		SI		
27	YARLI COLORADO PAZ	1.085.549.452	24/11/2020	28/11/2020		1	SI			SI	
28	ILDELFONSO RAMIREZ ESQUIVEL	96.361.399	17/11/2020	5/12/2020		1	SI		SI		
29	JUAN PABLO CORREA MURCIA	1.116.920.538	17/11/2020	5/12/2020		1	SI			SI	
30	KEVIN FABIAN HOYOS YEPEZ	1.083.043.276	18/11/2020	5/12/2020		1	SI			SI	
31	LAMBERTO GABRIEL DORIA SANCHEZ	72.147.586	17/11/2020	5/12/2020		1	SI		SI		
32	ARLEY GIOVANNI CAICEDO RAMIREZ	1.117.511.256	3/12/2020	5/12/2020		1	SI			SI	
33	ALBERT JOSE LEON GOMEZ	828089416111997	3/12/2020	5/12/2020		1	SI			SI	PERMISO DE TRABAJO MINISTERIO
34	JHON WILLIAM BALLESTEROS MARTINEZ	1.033.761.449	8/12/2020	19/12/2020		1	SI			SI	
35	CARLOS ENRIQUE REDONDO	80.373.803	13/12/2020	19/12/2020		1	SI		SI		
36	JULIO FERNEY BENAVIDES MENDEZ	80.256.134	13/12/2020	19/12/2020		1	SI		SI		
37	FREDY EDINSON FORERO NIÑO	1.024.489.116	15/12/2020	19/12/2020		1	SI			SI	
38	JUAN AGUSTIN LIZARAZO	4.103.403	15/12/2020	19/12/2020		1	SI		SI		
39	JOSE IGNACIO CANO NOVOA	7.330.323	15/12/2020	19/12/2020		1	SI		SI		
40	ALDEMAR CHAUX	96.357.448	16/12/2020			1	SI		SI		
41	LUIS ALBERTO CHAUX MUÑOZ	17.682.809	16/12/2020			1	SI		SI		
42	HERNA DARIO CHON MORA	1.024.482.739	22/12/2020			1	SI		SI		
43	RUBEN DARIO RODRIGUEZ ALMANZA	79.250.468	22/12/2020			1	SI		SI		
44	BRAYAN ESTIVEN LOPEZ MOLINA	1.024.602.801	17/11/2020			1	SI			SI	
45	EDWIN JIMMY ESPINEL CHACON	80.064.358	17/11/2020			1	SI			SI	
46	EDGAR VELANDIA	80.090.780	26/11/2020	2/12/2020		1	SI			SI	
47	EMITZO JOSE FANDIÑO FLOREZ	85.469.924	18/11/2020			1	SI		SI		
48	EVANGELISTA BRINEZ BURGOS	6.030.390	17/11/2020	2/12/2020		1	SI			SI	
49	FABIO NELSON LOPEZ DIAZ	80.124.048	17/11/2020	2/12/2020		1	SI		SI		
50	JULIO CESAR NEIRA BENAVIDEZ	79.903.950	18/11/2020	2/12/2020		1	SI			SI	
51	RAFAEL CASTRO VILLA	8.815.936	17/11/2020			1	SI			SI	
52	LEYDY PATRICIA SUAREZ VELAZQUEZ	1.033.693.495	18/11/2020	2/12/2020		1	SI			SI	
53	MICHEL LEONARDO SALAS CELIS	1.033.766.212	17/11/2020	2/12/2020		1	SI		SI		
54	VLADIMIR BRIÑEZ MAHECHA	1.033.682.982	17/11/2020	2/12/2020		1	SI			SI	
55	CARLOS ANDRES SUAREZ VELAZQUEZ	1.033.693.493	18/11/2020	2/12/2020		1	SI			SI	
56	LUIS FERNANDO CUPITRA DUCUARA	1.022.939.409	18/11/2020	2/12/2020		1	SI			SI	

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	C.C.	FECHA DE INGRESO	FECHA DE EXAMEN MÉDICO DE INGRESO/ PERIODICO	PERSONAL		IMPLEMENTACIÓN PROTOCÓLO		ESTADO ACTUAL		OBSERVACIONES
					Administrativo	Operativo: maestros y auxiliares	SI	NO	ACTIVO	RETIRADO	
57	LUIS ALEJANDRO ZAMBRANO	79.770.115	18/11/2020			1	SI			SI	
58	OSBAR RENE BERNAL PAEZ	80.778.371	20/11/2020	2/12/2020		1	SI		SI		
59	ALBEIRO GUERRERO MACANA	5.996.412	25/11/2020	2/12/2020		1	SI		SI		
60	EDWIN RODRIGUEZ VIDAL	93.394.589	25/11/2020			1	SI		SI		
61	JOSE ANTONIO SILVA ORTEGA	19.458.840	25/11/2020	2/12/2020		1	SI			SI	
62	SAURITH REALES DELGADO	91.431.492	25/11/2020	2/12/2020		1	SI			SI	
63	CARLOS PAEZ PULIDO	1.049.630.871	17/11/2020			1	SI			SI	
64	RAUL OSORIO RINCON	79.669.250	17/11/2020	2/12/2020		1	SI		SI		
65	MISAEL PERDOMO VILLAMIL	1.033.784.477	24/11/2020	2/12/2020		1	SI		SI		
66	JOSE GUILLERMO MARTINEZ VARGAS	79.666.136	27/11/2020			1	SI		SI		
67	OMAR MARTINEZ ZULETA	4.946.584	27/11/2020	2/12/2020		1	SI			SI	
68	VICTOR MANUEL GUERRERO PACHECO	80.126.593	26/11/2020	2/12/2020		1	SI		SI		
69	QUEVIN FABIAN LESMES LINARES	1.000.003.268	27/11/2020	2/12/2020		1	SI			SI	
70	EDISON JOSE VENECIA SARABIA	72.120.789	25/11/2020	2/12/2020		1	SI		SI		
71	YOENDISON JOSE VENECIA MORENO	1.101.879.446	25/11/2020	2/12/2020		1	SI		SI		
72	RUBEN PINEDA MAHECHA	1.031.151.104	25/11/2020	2/12/2020		1	SI		SI		
73	RAUL ALEXANDER SALAMANCA SALGADO	80.749.213	26/11/2020			1	SI			SI	
74	LEONARDO SOLANO CELY	1.024.511.017	26/11/2020	2/12/2020		1	SI		SI		
75	LUIS FRANCISCO GOMEZ SANCHEZ	80857562	25/11/2020	2/12/2020		1	SI			SI	
76	HAYDER CAMILO GALVIZ	1.033.762.528	17/11/2020	2/12/2020		1	SI			SI	
77	CAMILO HERNANDEZ SANCHEZ	1.049.639.642	17/11/2020	2/12/2020		1	SI			SI	
78	CESAR JULIO BENAVIDEZ	1.193.036.484	27/11/2020	2/12/2020		1	SI		SI		
79	FERNANDO MORENO HUERTAS	3.199.429	26/11/2020			1	SI		SI		
80	JHON EDISON PALACIO MORENO	1.077.435.835	26/11/2020			1	SI		SI		
81	LUIS HERNANDEZ BARRETO	80.858.697	25/11/2020	2/12/2020		1	SI			SI	
82	LUZ ADRIANA SILVA MUÑOZ	53.094.514	26/11/2020	2/12/2020		1	SI			SI	
83	JEISON ACERO	1.044.391.694	25/11/2020	2/12/2020		1	SI		SI		
84	ANDRES FERNANDO PEREZ DIAZ	1.063.625.214	1/12/2020	2/12/2020		1	SI			SI	
85	ANGEL IVAN DIAZ	79.924.351	1/12/2020			1	SI			SI	
86	CARLOS ALBERTO SUAREZ BARRERA	9.527.688	1/12/2020	2/12/2020		1	SI			SI	
87	CIRO ARTURO NIÑO	4.255.303	1/12/2020			1	SI			SI	
88	EDGAR HERNANDO NIÑO	4.225.078	1/12/2020			1	SI			SI	
89	EDWAR ARLEY RODRIGUEZ MAYORGA	1.033.754.705	1/12/2020			1	SI			SI	

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	C.C.	FECHA DE INGRESO	FECHA DE EXAMEN MÉDICO DE INGRESO/ PERIODICO	PERSONAL		IMPLEMENTACIÓN PROTOCÓLO		ESTADO ACTUAL		OBSERVACIONES
					Administrativo	Operativo: maestros y auxiliares	SI	NO	ACTIVO	RETIRADO	
90	EMILIANO MUÑOZ PALACIO	80.265.661	1/12/2020			1	SI			SI	
91	CAMILO ERNESTO RAMIREZ ROA	1.033.735.370	1/12/2020	2/12/2020		1	SI			SI	
92	CARLOS SEBASTIAN LOPEZ CASTELLANO	1.031.170.297	1/12/2020			1	SI		SI		
93	IDELFONSO DE JESUS PEÑARANDA	1.118.873.986	1/12/2020			1	SI		SI		
94	CARLOS ALBERTO PULIDO YATE	1.033.683.233	1/12/2020			1	SI		SI		
95	CIPRIANO PIÑEROS	79.703.764	1/12/2020	2/12/2020		1	SI		SI		
96	DAGOBERTO PAREJO AREVALO	8.668.649	1/12/2020			1	SI			SI	
97	DANIEL ARTURO NIÑO ROJAS	1.024.469.352	1/12/2020			1	SI			SI	
98	EDER GONZALEZ GASTELBLONDO	84.062.070	1/12/2020	9/01/2021		1	SI		SI		
99	GLORIA JIMENEZ	28.155.523	2/12/2020			1	SI		SI		
100	JESUS DAVID LOPEZ GALVIZ	13.860.790	2/12/2020			1	SI		SI		
101	JHON RIVER MAYORGA BENAVIDEZ	1.033.721.955	1/12/2020			1	SI		SI		
102	SAMIR ZIAD PINEDA YAHMURE	79.920.337	1/12/2020			1	SI			SI	
103	SIMON LOPEZ PALACIOS	94.418.910	1/12/2020			1	SI			SI	
104	WILSON FERNEY BERNAL GUASCA	1.033.707.175	1/12/2020	2/12/2020		1	SI			SI	
105	YOISEN HAIDIN CHIBUQUE CAICEDO	1.007.413.403	1/12/2020	9/01/2021		1	SI		SI		
106	LUIS HERNANDEZ GRANADA	19.219.713	1/12/2020			1	SI		SI		
107	ANDRES GARCIA ROJAS	80.895.628	15/12/2020			1	SI		SI		
108	EDGAR HERNANDO NIÑO	4.225.078	1/12/2020			1	SI		SI		
109	HELI RAMIREZ PERALTA	79.734.766	12/12/2020			1	SI		SI		
110	JAVIER FRANCO RODRIGUEZ	731.054.127.121.978	1/12/2020			1	SI		SI		PERMISO DE TRABAJO MINISTERIO
111	JEISON LOPEZ MEJIA	1.033.816.388	15/12/2020			1	SI			SI	
112	JOSE RODRIGUEZ GARCIA	1.031.176.991	1/12/2020	2/12/2020		1	SI		SI		
113	JULIAN ANDRES ARAGON DEVIA	1.030.628.205	15/12/2020			1	SI			SI	
114	KEVINN SEBASTIAN APARACIO	1.000.064.803	10/12/2020			1	SI			SI	
115	LUIS CARLOS MENDOZA GAMEZ	17.971.346	4/12/2020			1	SI		SI		
116	LUIS MUÑOZ GRAJALES	80.774.495	1/12/2020			1	SI			SI	
117											
205											
RESULTADOS:					**15**	**101**	**116**	**0**	**62**	**54**	


REGISTRO FOTOGRAFICO

MV - 1371



DESCRIPCIÓN Y FECHA: PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD
Semana 25 AL 31 Enero 2021

MV - 1371

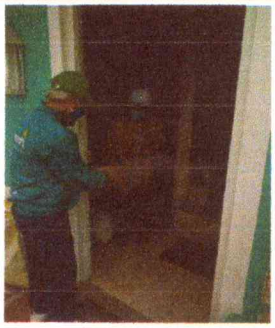

DESCRIPCIÓN Y FECHA: PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD
Semana 25 AL 31 Enero 2021

MV - 1684



DESCRIPCIÓN Y FECHA: PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD
Semana 25 AL 31 Enero 2021

MV - 1341




DESCRIPCIÓN Y FECHA: PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD
Semana 25 AL 31 Enero 2021

MV - 2981



DESCRIPCIÓN Y FECHA: PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD
Semana 25 AL 31 Enero 2021

MV - 2981

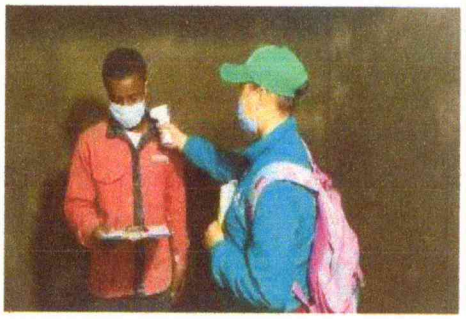

DESCRIPCIÓN Y FECHA: PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD
Semana 25 AL 31 Enero 2021

MV - 18353



DESCRIPCIÓN Y FECHA: PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD
Semana 25 AL 31 Enero 2021


MV - 18353



DESCRIPCIÓN Y FECHA: PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD
Semana 25 AL 31 Enero 2021


REGISTRO FOTOGRAFICO

MV - 19285

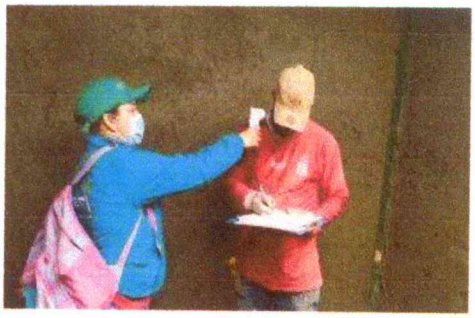

DESCRIPCIÓN Y FECHA: PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD
Semana 25 AL 31 Enero 2021

MV - 19285

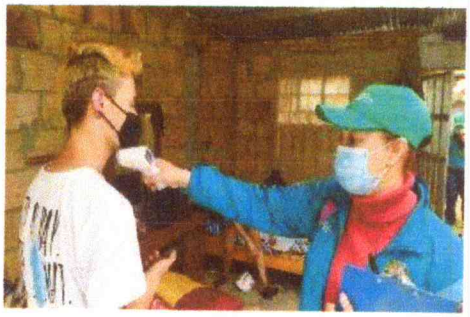

DESCRIPCIÓN Y FECHA: PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD
Semana 25 AL 31 Enero 2021

MV - 21184



DESCRIPCIÓN Y FECHA: PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD
Semana 25 AL 31 Enero 2021

MV - 21184



DESCRIPCIÓN Y FECHA: PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD
Semana 25 AL 31 Enero 2021

MV - 21820



DESCRIPCIÓN Y FECHA: PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD
Semana 25 AL 31 Enero 2021

MV - 21820



DESCRIPCIÓN Y FECHA: PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD
Semana 25 AL 31 Enero 2021

MV - 21341



DESCRIPCIÓN Y FECHA: PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD
Semana 25 AL 31 Enero 2021

MV - 21341



DESCRIPCIÓN Y FECHA: PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD
Semana 25 AL 31 Enero 2021
