CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. CIN-405-2019
INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No. 10
BOGOTÁ D.C.



Contenido:

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No. 10
(01 DE FEBRERO AL 19 DE FEBRERO DE 2020)



ARQUITECTURA URBANA LTDA

CONTRATO Nº No. CIN-405-2019
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CIUDAD BOLIVAR
Revisó y Aprobó : ARQ. HERNANDO DAZA BERRIO Director y Rep. Legal Interventoría.

TOMO 6 DE 10

TEST REPORT / RAPPORT D'ESSAI / INFORME DE ENSAYOS
SOFLEX RUBBER AND URETHANE SDN. BHD. / EPDM GRANULES

LABOSPORT

SYNTHESIS / SYNTHESE / SÍNTESIS

Ageing / Vieillissement / Envejecimiento

Tests Essais / Pruebas	Requirements Exigences / Exigencias	Conformity Conformité / Cumplimiento
UVA (340nm - 9600kJ - 5000H) ageing Vieillissement aux UVA Envejecimiento a los UVA	FIFA 2015	In progress / en cours / en progreso
	WORLD RUGBY 2017	In progress / en cours / en progreso

Date : 10/06/2020

APPROBATEUR
Benoit BOSSUET
Responsable Technique Sols Synthétiques

REDACTEUR
Anaïs LANGEVIN
Technicienne Laboratoire

eurofins

REPORT NO.: EFSN20061279C-CR1
DATE: JUL. 03, 2020

TEST REPORT

APPLICANT	:	**EUROFINS NM LABORATORY SDN. BHD.**
ADDRESS	:	27,JALAN IMPIAN EMAS 5,TAMAN IMPIAN EMAS, 81300 SKUDAI, JOHOR, BAHRU, JOHOR, MALAYSIA.
TESTED SAMPLE DESCRIPTION	:	EPDM GRANULES
TESTED ITEM NO.	:	156-2020-06000737
AGE REQUESTED ON APPLICATION FORM	:	NOT PRESENT
SAMPLE RECEIVED DATE	:	JUN. 22, 2020
TEST PERIOD	:	JUN. 22, 2020 TO JUN. 24, 2020
RESULT SUMMARY	:	

TEST(S) REQUESTED BY APPLICANT:
The 209 substances in the Candidate List of Substances of Very High Concern (SVHC) published by European Chemicals Agency (ECHA), latest updated on 25 June 2020, regarding the Regulation (EC) No. 1907/2006: Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals (REACH).
TEST RESULT
Please refer to next page(s).

**********FOR FURTHER DETAILS, PLEASE REFER TO THE FOLLOWING PAGE(S)**********

SIGNED FOR AND ON BEHALF OF
EUROFINS TESTING TECHNOLOGY (SHENZHEN) CO. LTD.

Harry Chen
Lab & Technical Support Manager

Coco Luo
Lab & Reporting Manager

Eurofins Testing Technology (Shenzhen) Co., Ltd. 欧陆检测技术(深圳)有限公司

The above sample(s) and sample information was/were submitted and identified on behalf of the applicant. Eurofins will not be liable to the authenticity of the information. This test report is valid for the tested sample only. Without permission of the test center this test report is not permitted to be duplicated in extracts. This test report does not entitle to carry any safety mark on this or similar products

Remark:

(1) The chemical analysis of specified SVHC is performed by means of currently available analytical techniques against the following SVHC related documents published by ECHA:
https://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table
These lists are under evaluation by ECHA and may subject to change in the future.

(2) In accordance with Regulation (EC) No 1907/2006, any EU producer or importer of articles shall notify ECHA, in accordance with paragraph 4 of Article 7, if a substance meets the criteria in Article 57 and is identified in accordance with Article 59(1) of the Regulation, if (a) the substance in the Candidate List is present in those articles in quantities totaling over one tonne per producer or importer per year; and (b) the substance in the Candidate List is present in those articles above a concentration of 0.1% weight by weight (w/w).

(3) From 28 October 2008, EU & EEA suppliers of articles which contain substances on the Candidate List in a concentration above 0.1% (w/w) must provide sufficient information, available to them, to their customers and on request to a consumer within 45 days of the receipt of this request. This information must ensure safe use of the article and, as a minimum, include the name of the substance.

(4) If a SVHC is found over the reporting limit, the client is suggested to identify the component which contains the SVHC and the exact concentration of the SVHC by requesting further quantitative analysis from the laboratory.

Material list

Testing material No.	Component	Material	Colour
1	EPDM granules	Synthetic rubber	Reddish brown

Test Result:

Test method : In-house method, GC-MS, LC-MS, ICP-OES, UV/VIS, IC -quantification of relevant SVHC (substances of very high concern) in material samples.

Detection limit : 0.010 %

Parameter	CAS No.	Test result (%)
		1
All tested SVHC	-	N.D.

List of 209 SVHC

Batch	SN	Test Item	CAS No.	Detection Limit (%)
I	1	Bis(tributyltin) oxide (TBTO) 2)	56-35-9	0.010
I	2	Dibutyl phthalate (DBP)	84-74-2	0.010
I	3	5-tert-butyl-2,4,6-trinitro-m-xylene(musk xylene)	81-15-2	0.010
I	4	Bis (2-ethylhexyl)phthalate (DEHP)	117-81-7	0.010
I	5	Benzyl butyl phthalate (BBP)	85-68-7	0.010
I	6	Hexabromocyclododecane (HBCDD) and all major diastereoisomers identified	25637-99-4 3194-55-6 134237-52-8 134237-51-7 134237-50-6	0.010
I	7	4,4'-Diaminodiphenylmethane (MDA)	101-77-9	0.010
I	8	Anthracene	120-12-7	0.010
I	9	Cobalt dichloride 1)	7646-79-9	0.010
I	10	Sodium dichromate 1)	10588-01-9 7789-12-0	0.010
I	11	Alkanes, C10-13, chloro (Short Chain Chlorinated Paraffins)	85535-84-8	0.010
I	12	Diarsenic pentaoxide 1)	1303-28-2	0.010
I	13	Diarsenic trioxide 1)	1327-53-3	0.010
I	14	Triethyl arsenate 1)	15606-95-8	0.010
I	15	Lead hydrogen arsenate 1)	7784-40-9	0.010
II	16	Diisobutyl phthalate	84-69-5	0.010
II	17	2,4-dinitrotoluene	121-14-2	0.010
II	18	Tris (2-chloroethyl) phosphate	115-96-8	0.010
II	19	Anthracene oil 2)	90640-80-5	0.010
II	20	Anthracene oil, anthracene paste,distn. Lights 2)	91995-17-4	0.010
II	21	Anthracene oil, anthracene paste,anthracene fraction 2)	91995-15-2	0.010
II	22	Anthracene oil, anthracene-low 2)	90640-82-7	0.010
II	23	Anthracene oil, anthracene paste 2)	90640-81-6	0.010
II	24	Pitch, coal tar, high-temp. 2)	65996-93-2	0.010
II	25	Acrylamide	79-06-1	0.010
II	26	Lead chromate 1)	7758-97-6	0.010
II	27	Lead chromate molybdate sulphate red (C.I. Pigment Red 104) 1)	12656-85-8	0.010
II	28	Lead sulfochromate yellow (C.I. Pigment Yellow 34) 1)	1344-37-2	0.010
III	29	Trichloroethylene	79-01-6	0.010
III	30	Boric acid 1)	10043-35-3 11113-50-1	0.010
III	31	Disodium tetraborate, anhydrous 1)	1303-96-4 1330-43-4 12179-04-3	0.010
III	32	Tetraboron disodium heptaoxide, hydrate 1)	12267-73-1	0.010
III	33	Sodium chromate 1)	7775-11-3	0.010
III	34	Potassium chromate 1)	7789-00-6	0.010
III	35	Ammonium dichromate 1)	7789-09-5	0.010
III	36	Potassium dichromate 1)	7778-50-9	0.010
IV	37	2-methoxyethanol	109-86-4	0.010
IV	38	2-ethoxyethanol	110-80-5	0.010
IV	39	Cobalt(II) sulphate 1)	10124-43-3	0.010
IV	40	Cobalt(II) dinitrate 1)	10141-05-6	0.010

Batch	SN	Test Item	CAS No.	Detection Limit (%)
IV	41	Cobalt(II) carbonate 1)	513-79-1	0.010
IV	42	Cobalt(II) diacetate 1)	71-48-7	0.010
IV	43	Chromium trioxide 1)	1333-82-0	0.010
IV	44	Acids generated from chromium trioxide and their oligomers: Chromic acid, Dichromic acid, Oligomers of chromic acid and dichromic acid 1)	7738-94-5 13530-68-2	0.010
V	45	2-ethoxyethyl acetate	111-15-9	0.010
V	46	Strontium chromate 1)	7789-06-2	0.010
V	47	1,2-Benzenedicarboxylic acid, di-C7-11-branched and linear alkyl esters	68515-42-4	0.010
V	48	Hydrazine	302-01-2 7803-57-8	0.010
V	49	1-Methyl-2-pyrrolidone (NMP)	872-50-4	0.010
V	50	1,2,3-trichloropropane	96-18-4	0.010
V	51	1,2-Benzenedicarboxylic acid, di-C6-8-branched alkyl esters, C7-rich	71888-89-6	0.010
VI	52	Dichromium tris(chromate) 1)	24613-89-6	0.010
VI	53	Potassium hydroxyoctaoxodizincatedichromate 1)	11103-86-9	0.010
VI	54	Pentazinc chromate octahydroxide 1)	49663-84-5	0.010
VI	55	Aluminosilicate Refractory Ceramic Fibres 1)	-	0.010
VI	56	Zirconia Aluminosilicate Refractory Ceramic Fibres 1)	-	0.010
VI	57	Formaldehyde, oligomeric reaction products with aniline 2)	25214-70-4	0.010
VI	58	Bis(2-methoxyethyl) phthalate	117-82-8	0.010
VI	59	2-Methoxyaniline, o-Anisidine	90-04-0	0.010
VI	60	4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenol	140-66-9	0.010
VI	61	1,2-dichloroethane	107-06-2	0.010
VI	62	Bis(2-methoxyethyl) ether	111-96-6	0.010
VI	63	Arsenic acid 1)	7778-39-4	0.010
VI	64	Calcium arsenate 1)	7778-44-1	0.010
VI	65	Trilead diarsenate 1)	3687-31-8	0.010
VI	66	N,N-dimethylacetamide	127-19-5	0.010
VI	67	2,2'-dichloro-4,4'-methylenedianiline	101-14-4	0.010
VI	68	Phenolphthalein	77-09-8	0.010
VI	69	Lead diazide, Lead azide 1)	13424-46-9	0.010
VI	70	Lead styphnate 1)	15245-44-0	0.010
VI	71	Lead dipicrate 1)	6477-64-1	0.010
VII	72	1,2-bis(2-methoxyethoxy)ethane (TEGDME; triglyme)	112-49-2	0.010
VII	73	1,2-dimethoxyethane; ethylene glycol dimethyl ether (EGDME)	110-71-4	0.010
VII	74	Diboron trioxide 1)	1303-86-2	0.010
VII	75	Formamide	75-12-7	0.010
VII	76	Lead(II) bis methanesulfonate 1)	17570-76-2	0.010
VII	77	1,3,5-Tris(oxiran-2-ylmethyl)-1,3,5-triazinane-2,4,6-trione (TGIC)	2451-62-9	0.010
VII	78	1,3,5-tris[(2S and 2R)-2,3-epoxypropyl]-1,3,5-triazine-2,4,6-(1H,3H,5H)-trione (β-TGIC)	59653-74-6	0.010
VII	79	4,4'-bis(dimethylamino) benzophenone (Michler's ketone)	90-94-8	0.010

Batch	SN	Test Item	CAS No.	Detection Limit (%)
VII	80	N,N,N',N'-tetramethyl-4,4'-methylenedianiline (Michler's base)	101-61-1	0.010
VII	81	[4-[4,4'-bis(dimethylamino) benzhydrylidene]cyclohexa-2,5-dien-1-ylidene] dimethylammonium chloride(C.I. Basic Violet 3)	548-62-9	0.010
VII	82	[4-[[4-anilino-1-naphthyl] [4-(dimethylamino)phenyl] methylene]cyclohexa-2,5- dien-1-ylidene] dimethylammonium chloride(C.I. Basic Blue 26)	2580-56-5	0.010
VII	83	α,α-Bis[4-(dimethylamino)phenyl]-4 (phenylamino)naphthalene-1-methanol (C.I. Solvent Blue 4) 2)	6786-83-0	0.010
VII	84	4,4'-bis(dimethylamino)-4"-(methylamino)trityl alcohol	561-41-1	0.010
VIII	85	Bis(pentabromophenyl) ether (decabromodiphenyl ether; DecaBDE)	1163-19-5	0.010
VIII	86	4-Nonylphenol, branched and linear [substances with a linear and/or branched alkyl chain with a carbon number of 9 covalently bound in position 4 to phenol, covering also UVCB- and well-defined substances which include any of the individual isomers or a combination thereof] 2)	-	0.010
VIII	87	Diazene-1,2-dicarboxamide (C,C'-azodi(formamide)) (ADCA)	123-77-3	0.010
VIII	88	4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenol, ethoxylated 2)	-	0.010
VIII	89	Henicosafluoroundecanoic acid 2)	2058-94-8	0.010
VIII	90	Pentacosafluorotridecanoic acid 2)	72629-94-8	0.010
VIII	91	Cyclohexane-1,2-dicarboxylic anhydride , cis-cyclohexane-1,2-dicarboxylic anhydride , trans-cyclohexane-1,2-dicarboxylic anhydride	85-42-7 13149-00-3 14166-21-3	0.010
VIII	92	Hexahydromethylphthalic anhydride, Hexahydro-4-methylphthalic anhydride, Hexahydro-1-methylphthalic anhydride, Hexahydro-3-methylphthalic anhydride	25550-51-0 19438-60-9 48122-14-1 57110-29-9	0.010
VIII	93	Heptacosafluorotetradecanoic acid 2)	376-06-7	0.010
VIII	94	Diisopentyl phthalate	605-50-5	0.010
VIII	95	1,2-Benzenedicarboxylic acid, dipentylester, branched and linear	84777-06-0	0.010
VIII	96	N-pentyl-isopentylphthalate	776297-69-9	0.010
VIII	97	Methoxyacetic acid	625-45-6	0.010
VIII	98	Tricosafluorododecanoic acid 2)	307-55-1	0.010
VIII	99	1,2-diethoxyethane	629-14-1	0.010
VIII	100	3-ethyl-2-methyl-2-(3-methylbutyl)-1,3-oxazolidine 2)	143860-04-2	0.010
VIII	101	4-methyl-m-phenylenediamine (toluene-2,4-diamine)	95-80-7	0.010
VIII	102	N-methylacetamide	79-16-3	0.010
VIII	103	Pentalead tetraoxide sulphate 1)	12065-90-6	0.010
VIII	104	Biphenyl-4-ylamine	92-67-1	0.010
VIII	105	Dinoseb (6-sec-butyl-2,4-dinitrophenol)	88-85-7	0.010
VIII	106	Dioxobis(stearato)trilead 1)	12578-12-0	0.010
VIII	107	Lead dinitrate 1)	10099-74-8	0.010

Batch	SN	Test Item	CAS No.	Detection Limit (%)
VIII	108	Tetralead trioxide sulphate 1)	12202-17-4	0.010
VIII	109	Lead monoxide (lead oxide) 1)	1317-36-8	0.010
VIII	110	Lead titanium trioxide 1)	12060-00-3	0.010
VIII	111	4,4'-methylenedi-o-toluidine	838-88-0	0.010
VIII	112	Acetic acid, lead salt, basic 1)	51404-69-4	0.010
VIII	113	Dimethyl sulphate	77-78-1	0.010
VIII	114	Furan	110-00-9	0.010
VIII	115	Pyrochlore, antimony lead yellow 1)	8012-00-8	0.010
VIII	116	Tetraethyllead 1)	78-00-2	0.010
VIII	117	[Phthalato(2-)]dioxotrilead 1)	69011-06-9	0.010
VIII	118	Diethyl sulphate	64-67-5	0.010
VIII	119	Lead cyanamidate 1)	20837-86-9	0.010
VIII	120	Silicic acid ($H_2Si_2O_5$), barium salt (1:1), lead-doped 1)	68784-75-8	0.010
VIII	121	Trilead dioxide phosphonate 1)	12141-20-7	0.010
VIII	122	o-toluidine	95-53-4	0.010
VIII	123	o-aminoazotoluene	97-56-3	0.010
VIII	124	4-aminoazobenzene	60-09-3	0.010
VIII	125	6-methoxy-m-toluidine (p-cresidine)	120-71-8	0.010
VIII	126	Dibutyltin dichloride (DBTC) 2)	683-18-1	0.010
VIII	127	Lead titanium zirconium oxide 1)	12626-81-2	0.010
VIII	128	Methyloxirane (Propylene oxide)	75-56-9	0.010
VIII	129	1-bromopropane (n-propyl bromide)	106-94-5	0.010
VIII	130	Trilead bis(carbonate)dihydroxide 1)	1319-46-6	0.010
VIII	131	Fatty acids, C16-18, lead salts 1)	91031-62-8	0.010
VIII	132	Orange lead (lead tetroxide) 1)	1314-41-6	0.010
VIII	133	Sulfurous acid, lead salt, dibasic 1)	62229-08-7	0.010
VIII	134	4,4'-oxydianiline and its salts 2)	101-80-4	0.010
VIII	135	Lead oxide sulfate 1)	12036-76-9	0.010
VIII	136	Lead bis(tetrafluoroborate) 1)	13814-96-5	0.010
VIII	137	Silicic acid, lead salt 1)	11120-22-2	0.010
VIII	138	N,N-dimethylformamide	68-12-2	0.010
IX	139	Cadmium 1)	7440-43-9	0.010
IX	140	Cadmium oxide 1)	1306-19-0	0.010
IX	141	Dipentyl phthalate (DPP)	131-18-0	0.010
IX	142	4-Nonylphenol, branched and linear, ethoxylated [substances with a linear and/or branched alkyl chain with a carbon number of 9 covalently bound in position 4 to phenol, ethoxylated covering UVCB- and well-defined substances, polymers and homologues, which include any of the individual isomers and/or combinations thereof] 2)	-	0.010
IX	143	Ammonium pentadecafluorooctanoate (APFO) 2)	3825-26-1	0.010
IX	144	Pentadecafluorooctanoic acid (PFOA) 2)	335-67-1	0.010
X	145	Trixylyl phosphate	25155-23-1	0.010
X	146	Disodium 4-amino-3-[[4'-[(2,4-diaminophenyl)azo][1,1'-biphenyl]-4-yl]azo] -5-hydroxy-6-(phenylazo)naphthalene-2,7-disulphonate (C.I. Direct Black 38)	1937-37-7	0.010
X	147	Dihexyl phthalate	84-75-3	0.010

Batch	SN	Test Item	CAS No.	Detection Limit (%)
X	148	Cadmium sulphide 1)	1306-23-6	0.010
X	149	Disodium 3,3'-[[1,1'-biphenyl]-4,4'-diylbis(azo)]bis(4-aminonaphthalene-1-sulphonate) (C.I. Direct Red 28)	573-58-0	0.010
X	150	Lead di(acetate) 1)	301-04-2	0.010
X	151	Imidazolidine-2-thione (2-imidazoline-2-thiol)	96-45-7	0.010
XI	152	1,2-Benzenedicarboxylic acid, dihexyl ester, branched and linear	68515-50-4	0.010
XI	153	Cadmium chloride 1)	10108-64-2	0.010
XI	154	Sodium perborate; perboric acid, sodium salt 1)	15120-21-5 11138-47-9	0.010
XI	155	Sodium peroxometaborate 1)	7632-04-4	0.010
XII	156	2-(2H-Benzotriazol-2-yl)-4,6-ditertpentylphenol (UV-328)	25973-55-1	0.010
XII	157	2-Benzotriazol-2-yl-4,6-di-tert-butylphenol (UV-320)	3846-71-7	0.010
XII	158	2-ethylhexyl 10-ethyl-4,4-dioctyl- 7-oxo-8-oxa-3,5-dithia-4- stannatetradecanoate (DOTE) 2)	15571-58-1	0.010
XII	159	Cadmium fluoride 1)	7790-79-6	0.010
XII	160	Cadmium sulphate 1)	10124-36-4 31119-53-6	0.010
XII	161	Reaction mass of 2-ethylhexyl 10-ethyl-4,4-dioctyl-7-oxo-8-oxa-3,5-dithia-4-stannatetradecanoate and 2-ethylhexyl 10-ethyl-4-[[2-[(2-ethylhexyl)oxy]-2-oxoethyl]thio]-4-octyl-7-oxo-8-oxa-3,5-dithia-4-stannatetradecanoate (reaction mass of DOTE and MOTE) 2)	-	0.010
XIII	162	1,2-benzenedicarboxylic acid, di-C6-10-alkylesters;1,2-benzenedicarboxylic acid, mixed decyl and hexyl and octyl diesters with ≥ 0.3% of dihexyl phthalate (EC No. 201-559-5)	68515-51-5 68648-93-1	0.010
XIII	163	5-sec-butyl-2-(2,4-dimethylcyclohex-3-en-1-yl)-5-methyl-1,3-dioxane [1], 5-sec-butyl-2-(4,6-dimethylcyclohex-3-en-1-yl)-5-methyl-1,3-dioxane [2] covering any of the individual stereoisomers of [1] and [2] or any combination thereof 2)	-	0.010
XIV	164	Nitrobenzene	98-95-3	0.010
XIV	165	2,4-di-tert-butyl-6-(5- chlorobenzotriazol-2-yl)phenol (UV-327)	3864-99-1	0.010
XIV	166	2-(2H-benzotriazol-2-yl)-4-(tert-butyl)-6-(sec-butyl)phenol (UV-350)	36437-37-3	0.010
XIV	167	1,3-propanesultone	1120-71-4	0.010
XIV	168	Perfluorononan-1-oic-acid and its sodium and ammonium salts 2)	375-95-1 21049-39-8 4149-60-4	0.010
XV	169	Benzo[def]chrysene (Benzo[a]pyrene)	50-32-8	0.010
XVI	170	4,4'-isopropylidenediphenol (bisphenol A; BPA)	80-05-7	0.010
XVI	171	Nonadecafluorodecanoic acid (PFDA) and its sodium and ammonium salts 2)	335-76-2 3108-42-7 3830-45-3	0.010

Batch	SN	Test Item	CAS No.	Detection Limit (%)
XVI	172	p-(1,1-dimethylpropyl)phenol	80-46-6	0.010
XVI	173	4-heptylphenol, branched and linear [substances with a linear and/or branched alkyl chain with a carbon number of 7 covalently bound predominantly in position 4 to phenol, covering also UVCB- and well-defined substances which include any of the individual isomers or a combination thereof] 2)	-	0.010
XVII	174	Perfluorohexane-1-sulphonic acid and its salts(PFHxS) 2)	-	0.010
XVIII	175	1,6,7,8,9,14,15,16,17,17,18,18-Dodecachloropentacyclo[12.2.1.16,9.02,13.05,10] octadeca-7,15-diene ("Dechlorane Plus"™) 2)	-	0.010
XVIII	176	Benz[a]anthracene	56-55-3	0.010
XVIII	177	Cadmium nitrate 1)	10325-94-7 10022-68-1	0.010
XVIII	178	Cadmium carbonate 1)	513-78-0	0.010
XVIII	179	Cadmium hydroxide 1)	21041-95-2	0.010
XVIII	180	Chrysene	218-01-9	0.010
XVIII	181	Reaction products of 1,3,4-thiadiazolidine-2,5-dithione, formaldehyde and 4-heptylphenol, branched and linear (RP-HP) [with ≥0.1% w/w 4-heptylphenol, branched and linear (4-HPbl)] 2)	-	0.010
XIX	182	Octamethylcyclotetrasiloxane (D4)	556-67-2	0.010
XIX	183	Decamethylcyclopentasiloxane (D5)	541-02-6	0.010
XIX	184	Dodecamethylcyclohexasiloxane (D6)	540-97-6	0.010
XIX	185	Lead 1)	7439-92-1	0.010
XIX	186	Disodium octaborate 1)	12008-41-2	0.010
XIX	187	Benzo[ghi]perylene	191-24-2	0.010
XIX	188	Terphenyl, hydrogenated	61788-32-7	0.010
XIX	189	Ethylenediamine (EDA)	107-15-3	0.010
XIX	190	Benzene-1,2,4-tricarboxylic acid 1,2 anhydride (trimellitic anhydride) (TMA)	552-30-7	0.010
XIX	191	Dicyclohexyl phthalate (DCHP)	84-61-7	0.010
XX	192	2,2-bis(4'-hydroxyphenyl)-4-methylpentane	6807-17-6	0.010
XX	193	Benzo[k]fluoranthene	207-08-9	0.010
XX	194	Fluoranthene	206-44-0	0.010
XX	195	Phenanthrene	85-01-8	0.010
XX	196	Pyrene	129-00-0	0.010
XX	197	1,7,7-trimethyl-3-(phenylmethylene)bicyclo[2.2.1]heptan-2-one (3-benzylidene camphor; 3-BC)	15087-24-8	0.010
XXI	198	2,3,3,3-tetrafluoro-2-(heptafluoropropoxy)propionic acid, its salts and its acyl halides2)	-	0.010
XXI	199	2-methoxyethyl acetate	110-49-6	0.010

Batch	SN	Test Item	CAS No.	Detection Limit (%)
XXI	200	4-tert-butylphenol	98-54-4	0.010
XXI	201	Tris(4-nonylphenyl, branched and linear) phosphite (TNPP) with ≥ 0.1% w/w of 4-nonylphenol, branched and linear (4-NP) [2)]	-	0.010
XXII	202	Perfluorobutane sulfonic acid (PFBS) and its salts [2)]	-	0.010
XXII	203	Diisohexyl phthalate	71850-09-4	0.010
XXII	204	2-methyl-1-(4-methylthiophenyl)-2-morpholinopropan-1-one	71868-10-5	0.010
XXII	205	2-benzyl-2-dimethylamino-4'-morpholinobutyrophenone	119313-12-1	0.010
XXIII	206	Dibutylbis(pentane-2,4-dionato-O,O')tin [2)]	22673-19-4	0.010
XXIII	207	Butyl 4-hydroxybenzoate	94-26-8	0.010
XXIII	208	2-methylimidazole	693-98-1	0.010
XXIII	209	1-vinylimidazole	1072-63-5	0.010

Note: - 1 mg/kg = 1 ppm = 0.0001%
- N.D. = Not Detected
- [1)] The substances are tested in terms of its respective elements (e.g. As, Pb, Cr(VI)) and calculated based on assumption of worst-case.
- [2)] The test results of substances are calculated by conversion from the representative compounds.

Other Information / Remark:

(1)Replacement of report (No: EFSN20061279C-C). Upon receipt of this report, the previous report (No: EFSN20061279C-C) will be invalid immediately.
(2)Revision history: Revise material list.

Photo Attachment
Material No.1


END OF THE REPORT

CONSTRUYENDO CONFIANZA

HOJA DE DATOS DEL PRODUCTO

Sikadur®-32 Primer

PUENTE DE ADHERENCIA DE CONCRETO FRESCO A ENDURECIDO.

DESCRIPCION DEL PRODUCTO

Sikadur®-32 Primer es un adhesivo epóxico de dos componentes, libre de solventes. Garantiza una pega perfecta entre concreto fresco y endurecido.

USOS

Sikadur®-32 Primer puede ser usado solamente por profesionales con experiencia.

- Como puente de adherencia para la pega de concreto fresco a concreto endurecido.
- Como ayuda a la adherencia de un mortero o concreto nuevo o de reparación a un sustrato de concreto para lograr una pega permanente que no sea afectada, en condiciones de servicio, por la humedad ó agentes agresores (durabilidad).
- Como imprimante de alta adherencia para recubrimientos epóxicos sobre superficies de concreto absorbentes, húmedas o metálicas secas.
- Como imprimante de la **Línea Sikaflex** en los casos en que lo requieren.
- Para rellenos.
- Como capa impermeable y barrera de vapor de agua en los casos que se requiera.

CARACTERISTICAS / VENTAJAS

- Insensible a la humedad.
- Excelente adhesión a superficies húmedas.
- Forma de barrera de vapor.
- Fácil de aplicar.
- Alta resistencia mecánica.
- Sin disolventes.
- Sin contracción.
- Disponible en dos versiones de curado (Normal y Lento).

INFORMACION DEL PRODUCTO

Empaques	Unidad: 1.0 kg, 3.0 kg y 6.0 kg.		
Color	Gris claro		
Vida en el recipiente	Versión Normal	3 kg a 10°C = 80 min A 20°C = 40 min A 30°C = 15 min	
	Versión lenta	3 kg a 20°C = 90 min A 30°C = 45 min A 40°C = 30 min	
Condiciones de Almacenamiento	Almacene el producto en su envase original bien cerrado, en lugar fresco y bajo techo. Transportar con las precauciones normales para productos químicos.		
Densidad	1,36 kg/l ± 0,05 kg/l		
Consistencia	Viscosa media.		
Resistencia a Compresión	Versión normal	740 kg/cm²	(ASTM D 695)
	Versión lenta	720 kg/cm²	
Módulo de Elasticidad a Compresión	Versión normal	17000 kg/cm²	(ASTM D 695)
	Versión lenta	11000 kg/cm²	
Resistencia a la Adherencia a tensión	Versión normal	(Falla de concreto) >30 kg/cm2	(ASTM C 1583)
	Versión lenta	(Falla de concreto) >30 kg/cm2	
Temperatura de deflexión térmica	Versión normal	36,7°C	(ASTM D 648)
	Versión lenta	36,9°C	
Absorción de Agua	Versión normal	0.45% to 1 día	(ASTM D 570)
	Versión lenta	0.43% to 1 día.	

INFORMACION DE APLICACIÓN

Proporción de la Mezcla	En peso y en volumen A:B = 2: 1
Consumo	Entre 400-600 g/m² dependiendo de la rugosidad de la superficie. Para rugosidades excesivas el consumo puede aún ser mayor. En caso de dudas sobre el consumo se recomienda hacer ensayos previos
Temperatura del Sustrato	Bajo: 5°C Alto: 40°C
Vida de la mezcla	Versión normal

INSTRUCCIONES DE APLICACION

CALIDAD DEL SUSTRATO

PREPARACION DEL SUSTRATO

Concreto, mortero, asbesto-cemento, piedra: La superficie debe estar sana y limpia, libre de partes sueltas, contaminación de aceites, polvo, residuos de curadores, lechada de cemento u otras sustancias extrañas.

MEZCLADO

Los dos componentes vienen en distintos colores para facilitar el control sobre la homogeneidad de la mezcla. Verter completamente el Componente B sobre el Componente A y mezclar con taladro de bajas revoluciones (máximo 400 r.p.m.) o manualmente, hasta obtener una mezcla de color uniforme.

METODO DE APLICACIÓN / HERRAMIENTAS

Por medio de brocha o rodillo. En caso de aplicación sobre superficies húmedas se debe frotar el producto sobre ellas fuertemente con una brocha de cerdas cortas.
Nota: Colocar el concreto fresco mientras el **Sikadur®-32 Primer** esté pegajoso, según tabla:

Versión normal	Versión lenta
A 10°C = máximo 5 horas	A 20°C = máximo 9 horas
A 20°C = máximo 3 horas	A 30°C = máximo 6 horas
A 30°C = máximo 1 horas	A 40°C = máximo 3 horas

Si el producto se ha secado se debe aplicar una segunda capa sobre la inicial. Las herramientas se limpian con **Sika Ajustador Epóxico** cuando el producto aún este fresco. El producto endurecido se puede retirar únicamente por chorro de arena, chorro de agua a presión, pulidora.

LIMPIEZA DE HERRAMIENTAS

- Acero, hierro: La superficie debe estar seca y libre de contaminación de grasas, aceites, oxidación, cascarilla de laminación.
- Chorro de arena, chorro de agua a presión, pulidora. (Limpiar hasta metal blanco de acuerdo con los patrones de la Americana SSP - SP5).

LIMITACIONES

El **Sikadur®-32 Primer** contiene endurecedores que son nocivos antes del curado final del producto.
El **Sikadur®-32 Primer** no reemplaza el uso de conectores en labores de reforzamiento estructural. En caso de requerirse conectores o refuerzo que atraviese la línea de pega de acuerdo con los esfuerzos esperados un ingeniero calculista o el responsable del diseño definirá su número, dimensiones y posición en la estructura. No se debe aplicar soldadura a elementos metálicos pegados con el adhesivo epóxico ya que seguramente se sobrepasará la temperatura máxima admisible de servicio del adhesivo, con ablandamiento ó daño del mismo y falla en la pega.
La temperatura de servicio del sistema de pega debe estar por debajo de la temperatura de defl exión (HDT) del adhesivo.

NOTAS

Los usuarios deben referirse siempre a la versión local más reciente de la Hoja Técnica del Producto cuya copia será suministrada al ser solicitada.

RESTRICCIONES LOCALES

Este producto puede variar en su funcionamiento o aplicación como resultado de regulaciones locales específicas. Por favor, consulte la hoja técnica del país para la descripción exacta de los modos de aplicación y uso.

ECOLOGIA, SALUD Y SEGURIDAD

Manténgase fuera del alcance de los niños. Usar guantes de caucho y gafas de protección para su manipulación, aplicar en lugares ventilados y cambiarse ropas contaminadas. Evite inhalar los vapores. Consultar Hojas de Seguridad del producto a través del Departamento Técnico.

DIRECTIVA 2004/42/CE - LIMITACIÓN DE LAS EMISIONES DE VOC

Versión normal	<70
Versión lenta	<100g/l

NOTAS LEGALES

La información, y en particular las recomendaciones relacionadas con la aplicación y uso final de los productos Sika, se proporcionan de buena fe, con base en el conocimiento y la experiencia actuales de Sika sobre los productos que han sido apropiadamente almacenados, manipulados y aplicados bajo condiciones normales de acuerdo con las recomendaciones de Sika. En la práctica, las diferencias en los materiales, sustratos y condiciones actuales de las obras son tales, que ninguna garantía con respecto a la comercialidad o aptitud para un propósito particular, ni responsabilidad proveniente de cualquier tipo de relación legal pueden ser inferidos ya sea de esta información o de cualquier recomendación escrita o de cualquier otra asesoría ofrecida. El usuario del producto debe probar la idoneidad del mismo para la aplicación y propósitos deseados. Sika se reserva el derecho de cambiar las propiedades de los productos. Los derechos de propiedad de terceras partes deben ser respetados. Todas las órdenes de compra son aceptadas con sujeción a nuestros términos de venta y despacho publicadas en la página web: col.sika.com.

Sika Colombia S.A.S
Vereda Canavita, Km 20.5 Autopista Norte
Tocancipá Cundinamarca Colombia
phone: +57 1 878 6333
e-mail: sika_colombia@co.sika.com
web: col.sika.com

ANEXO No. 6
CONTROL DEL CLIMA

	ARQUITECTURA URBANA LTDA				
VIGENCIA A PARTIR DE		VERSION	CONVENCIONES		Dominical
5/04/2016		1			Dia festivo

CONTROL DEL CLIMA

INFORMACION GENERAL

MES DE ENERO DEL 2020

CONTRATISTA: CONSORCIO OPORTO — CONTRATO No .COP 403 - 2019

INTERVENTORIA: ARQUITECTURA URBANA LTDA — CONTRATO No. CIN 405 - 2019

CLIMA DIAS - PAEOLES CIUDAD BOLIVAR


feb-21

CONDICIONES CLIMATICAS	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
MAÑANA																															
SOLEADO		5	5	5	5		5	5	5	5	5	5	5																		
DESPEJADO	5					5								5	5	5	5	5													
NUBLADO																			5												
LLUVIA LEVE																															
LLUVIA FUERTE																															
TARDE																															
SOLEADO		4	4	4	4																										
DESPEJADO	4					4		4	4	4	4	4	4			4	4														
NUBLADO															4			4	4												
LLUVIA LEVE																															
LLUVIA FUERTE																															

TOTALES

PORCENTAJE			
SOLEADO	45%	71	HRS
DESPEJADO	47%	75	HRS
NUBLADO	8%	13	HRS
LLUVIA LEVE	0%	0	HRS
LLUVIA FUERTE	0%	0	HRS
	100%		

GRAFICA DEL CLIMA

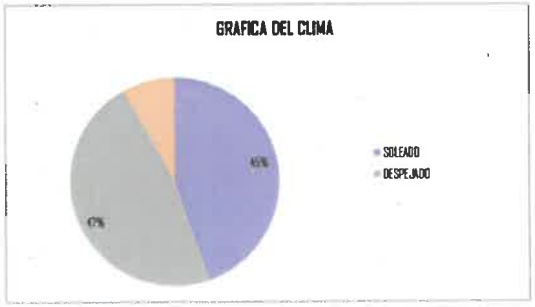

RESIDENTE DE INTERVENTORIA
ARQUITECTURA URBANA LTDA

INSPECTOR DE INTERVENTORIA
ARQUITECTURA URBANA LTDA

AG3

ANEXO No. 7
REGISTRO FOTOGRAFICO

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. CIN-405-2019 **"REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, LEGAL, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL Y SST AL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA QUE TENDRÁ POR OBJETO: REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LOS PARQUES VECINALES Y/O DE BOLSILLO POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE A MONTO AGOTABLE DE LA LOCALIDAD DE CIUDAD BOLÍVAR QUE SE DERIVE DEL PROCESO LICITATORIO FDLCB-LP-006-2019".**

REGISTRO FOTOGRAFICO INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA
MES DE FEBRERO 2021

CONTRATO INTERVENTORÍA No. CIN-405-2019 **ARQUITECTURA URBANA LTDA** **CONTRATO DE OBRA No. COP-403-2019** **CONSORCIO OPORTO**	**FECHA: 19 DE FEBRERO DE 2021**

MATERIALES Y EQUIPOS



FOTO No 1. Geotextil geoST300 y/o T2100 (Sum+Inst), fue utilizado para conformar la estructura de la rasante.



FOTO No 2. AdoquinArcill e=0.06 p<5% 4.2-1 fue utilizado para realizar el acabado de los senderos de los parques de la primera, segunda y tercera fase de intervención.



FOTO No 3. Material granular Subbase B400, utilizado para la estructura del suelo de acuerdo a las especificaciones técnicas de la segunda fase y tercera fase de intervención.



FOTO No 4. Rodadura asfáltica R-IDRD, fue utilizado para realizar la capa de rodadura de la cancha ubicada en el parque vecinal urbanización la estancia COD-19-149.



FOTO No 5. Material granular Subbase B600, utilizado para la estructura del suelo de acuerdo a las especificaciones técnicas de la segunda fase y tercera fase de intervención.



FOTO No 6. Bordillo A-80, fue utilizado para el confinamiento de material granular.



FOTO No 7. Concreto premezclado, fue utilizado para realizar el vaciado de concreto de 3000 PSI en la placa del parque vecinal urbanización madelena tercero y cuarto sector CÓD. 19-396.



FOTO No 8. Malla Electrosoldada con dimensiones 15x15 cm cal 2.5 mm utilizada como refuerzo para losa maciza en concreto.



FOTO No 9. Bordillo A-80, fue utilizado para el confinamiento de material granular.



FOTO No 10. Rajón con dimensiones mayores a 15 cm y menores a 25 cm, fue utilizado para la estructura del suelo de acuerdo con el estudio geotécnico.



FOTO No 11. Volqueta fue utilizado para realizar el retiro de material producto de excavaciones de la segunda fase y tercera fase de intervención.



FOTO No 12. Volqueta fue utilizada para realizar el trasporte de la mezcla rodadura asfáltica para la cancha ubicada en el parque vecinal urbanización la estancia CÓD. 19-149.



FOTO No 13. Neumatico rodillo vibrador fue utilizado para la compactación de rodadura asfáltica ubicada en la cancha ubicada en el parque vecinal urbanización la estancia CÓD. 19- 149.



FOTO No 14. Minicargador fue utilizado para realizar las excavaciones de la segunda y tercera fase de ejecución.



FOTO No 15. Emulsión asfáltica, fue utilizado para realizar la imprimación de la rasante de la placa de contrapiso de los parques intervenidos en la segunda y tercera etapa de ejecución del contrato.



FOTO No 16. Malla electro soldada fue utilizado como refuerzo para las placas de contrapiso en los parques intervenidos en la segunda y tercera fase de ejecución del contrato.



FOTO No 17. Concreto premezclado 3000 PSI, fue utilizado para el vaciado en concreto de 3000 PSI en las placas de contrapiso en los parques intervenidos en la segunda y tercera fase de ejecución.



FOTO No 18. Tabla burra, fue utilizada para realizar el encofrado de las vigas de cimentación de la malla contra impacto ubicada en el parque vecinal urbanización la estancia CÓD. 19-149.



FOTO No 19. Tubería estructural fue utilizada para realizar la ejecución de la actividad baranda M-80 en los parques intervenidos en la segunda y tercera fase de ejecución.



FOTO No 20. Acero de refuerzo 60000 PSI fue utilizado para realizar la cimentación en concreto de la malla contra impacto en el parque vecinal urbanización la estancia cód. 19-149

	
FOTO No 21. Retroexcavadora fue utilizado para realizar la excavación de material base granular existente en la cancha ubicada en el PARQUE DESARROLLO ARBORIZADORA BAJA CÓD. 19-060.	**FOTO No 22. EQUIPO TOPOGRÁFICO** fue utilizado para realizar la nivelación de los parques intervenidos en la cuarta etapa de ejecución del proyecto.
	
FOTO No 23. Canguro fue utilizado para realizar la compactación de material Subbase granular y base granular en los parques intervenidos en la TERCERA Y CUARTA ETAPA de ejecución del proyecto.	**FOTO No 24. Equipos de laboratorio** fueron utilizados para realizar los respectivos ensayos en campo de los parques intervenidos en la TERCERA Y CUARTA ETAPA de ejecución del contrato.

	
FOTO No 25. Vibro compactador de concreto fue utilizado para realizar la compactación del concreto vaciado en los parques intervenidos en la SEGUNDA Y TERCERA ETAPA de ejecución del contrato.	**FOTO No 26. Camión Mixer** fue utilizado para suministro de concreto premezclado vaciado en las placas de contrapiso de los parques intervenidos en la SEGUNDA Y TERCERA ETAPA de ejecución del contrato.
	
FOTO No 27. Planta eléctrica fue utilizada para realizar el suministro de fluido eléctrico para los equipos eléctricos necesarios en la ejecución de las actividades de obra.	**FOTO No 28. Formaleta Metálica** fue utilizada para realizar el encofrado del bordillo zarpa en los parques intervenidos en la TERCERA ETAPA de ejecución.

	
FOTO No 29. Emulsión asfáltica, fue utilizado para realizar la imprimación de la rasante de la placa de contrapiso de los parques intervenidos en la SEGUNDA Y TERCERA ETAPA de ejecución del contrato.	**FOTO No 30. Malla electro soldada** fue utilizado como refuerzo para las placas de contrapiso en los parques intervenidos en la SEGUNDA Y TERCERA ETAPA de ejecución del contrato.
	
FOTO No 31. Concreto premezclado 3000 PSI, fue utilizado para el vaciado en concreto de 3000 PSI en las placas de contrapiso en los parques intervenidos en la SEGUNDA Y TERCERA FASE de ejecución.	**FOTO No 32. Geotextil NT-1800+Trasiego (Suministro e instalación)**, fue utilizado para realizar la estructura de la subrasante en los parques intervenidos en LA TERCERA Y CUARTA ETAPA de ejecución

	
FOTO No 33. Geotextil nt 1100 alto flujo fue utilizado para realizar el filtro francés en el PARQUE VECINAL DESARROLLO SIERRA MORENA CÓD. 19-316	**FOTO No 34. Manguera perforada diámetro de 4"** fue utilizado para realizar el filtro francés en el PARQUE VECINAL DESARROLLO SIERRA MORENA CÓD. 19-316
	
FOTO No 35. Gravilla de ¾", fue utilizado para realizar el filtro francés en EL PARQUE VECINAL DESARROLLO SIERRA MORENA CÓD. 19-316	**FOTO No 36. Antisol**, fue utilizada para realizar el curado de los concretos vaciados en las placas de contrapiso ubicadas en los parques intervenidos en la fase 2 y 3 del contrato.

	
FOTO No 37. Piedra Rajón, fue utilizado para realizar el mejoramiento de la subrasante de acuerdo al estudio geotécnico en EL PARQUE DESARROLLO ARBORIZADORA BAJA.	**FOTO No 38. Bordillo A-80**, fue utilizado para realizar el confinamiento en los parques intervenidos de la etapa 2 y 3 del contrato.
	
FOTO No 39. Sikadur 32, utilizado para realizar la adherencia de concreto nuevo y antiguo en los parques intervenidos en la etapa 2 y 3 del contrato.	**FOTO No 40. Cemento**, utilizado para realizar los concretos en situ vaciados en los bordillos zarpa y mejoramiento de suelo cemento de los parques intervenidos de la etapa 2 y 3 del contrato.

	
FOTO No 41. Acero de refuerzo, utilizado para realizar el refuerzo del bordillo zarpa ubicado en los parques intervenidos de la 2 y 3 etapa de ejecución del contrato.	**FOTO No 42. Base Granular B400,** utilizada para realizar el relleno de la estructura de la rasante del parque vecinal desarrollo sierra morena COD 19-325.
	
FOTO No 43. Canguro utilizado para realizar la compactación de material Subbase granular y base granular en los parques intervenidos en la TERCERA Y CUARTA ETAPA de ejecución del proyecto.	**FOTO No 44. Mini Cargador** utilizado para realizar la mezcla de suelo cemento y vaciado de concreto en los parques intervenidos en la etapa 2 y 3 del contrato

	
FOTO No 45. Planta eléctrica utilizada para realizar el suministro de fluido eléctrico para los equipos eléctricos necesarios en la ejecución de las actividades de obra.	**FOTO No 46. Vibro compactador** utilizados para realizar la compactación de material suelo cemento en los parques intervenidos en la etapa 2 y 3 del proyecto.
	
FOTO No 47. Vibro compactador de concreto utilizado para realizar la compactación del concreto vaciado en los parques intervenidos en la SEGUNDA Y TERCERA ETAPA de ejecución del contrato.	**FOTO No 48. Camión Mixer** utilizado para suministro de concreto premezclado vaciado en las placas de contrapiso de los parques intervenidos en la SEGUNDA Y TERCERA ETAPA de ejecución del contrato.

	
FOTO No 49. Planta eléctrica utilizada para realizar el suministro de fluido eléctrico para los equipos eléctricos necesarios en la ejecución de las actividades de obra.	**FOTO No 50. Pulidora** utilizada para realizar los cortes del acero de refuerzo en los parques intervenidos en la etapa 2 y 3 del proyecto.

PARQUES PRIMERA ETAPA

- **PARQUE 19-038 URBANIZACIÓN LA ESTANCIA**

	
FOTO No 51. La interventoría **ARQUITECTURA URBANA LTDA.** reviso y verifico la actividad de obra baranda M-80 y modulo complementario para baranda de acuerdo a la especificación técnica y presupuesto de obra.	**FOTO No 52.** La interventoría **ARQUITECTURA URBANA LTDA.** reviso y verifico la actividad de obra baranda M-80 y modulo complementario para baranda de acuerdo a la especificación técnica y presupuesto de obra.



FOTO No 53. La interventoría **ARQUITECTURA URBANA LTDA.** reviso y verifico la excavación manual para dados de cimentación y anclajes de juegos carrusel y muelle.



FOTO No 54. La interventoría **ARQUITECTURA URBANA LTDA.** reviso y verifico la excavación manual para dados de cimentación y anclajes de juegos carrusel y muelle.

- **PARQUE 19-039 URBANIZACIÓN LA ESTANCIA**



FOTO No 55. Estado actual PARQUE DE BOLSILLO URBANIZACIÓN LA ESTANCIA COD 19- 039



FOTO No 56. Estado actual PARQUE DE BOLSILLO URBANIZACIÓN LA ESTANCIA COD 19- 039

- **PARQUE 19-149 URBANIZACIÓN LA ESTANCIA**



FOTO No 57. La interventoría **ARQUITECTURA URBANA LTDA.** Reviso y verifico la actividad de obra rodadura asfáltica R-1DRD E=0.07m en el campo deportivo parque vecinal urbanización la estancia CÓD. 19-149 de acuerdo al estudio geotécnico y especificaciones técnicas.



FOTO No 58. La interventoría **ARQUITECTURA URBANA LTDA.** Reviso y verifico la actividad de obra rodadura asfáltica R-1DRD E=0.07m en el campo deportivo parque vecinal urbanización la estancia CÓD. 19-149 de acuerdo al estudio geotécnico y especificaciones técnicas.



FOTO No 59. La interventoría **ARQUITECTURA URBANA LTDA.** Reviso y verifico la temperatura de la mezcla rodadura asfáltica R-DRD e=0,07m ingresada a la cancha ubicada en el parque vecinal urbanización la estancia CÓD. 19-149.



FOTO No 60. La interventoría **ARQUITECTURA URBANA LTDA.** Reviso y verifico la temperatura de la mezcla rodadura asfáltica R-DRD e=0,07m ingresada a la cancha ubicada en el parque vecinal urbanización la estancia CÓD. 19-149.



FOTO No 61. La interventoría **ARQUITECTURA URBANA LTDA.** reviso y verifico que el contratista de obra CONSORCIO OPORTO realice la toma de nivel de terminado de la rodadura asfáltica con equipo topográfico.



FOTO No 62. La interventoría **ARQUITECTURA URBANA LTDA.** reviso y verifico el espesor de 7 cm de la carpeta rodadura asfáltica. Ubicada en el parque vecinal urbanización la estancia CÓD. 19-149.



FOTO No 63. Amarre de acero de refuerzo de 6000 psi para la viga de cimentación de la malla contra impacto.



FOTO No 64. Encofrado de viga de cimentación de la malla contra impacto.



FOTO No 65. Vaciado en concreto de 300 psi para la viga cimentación de la malla contra impacto.



FOTO No 66. Encofrado de viga de cimentación de la malla contra impacto.



FOTO No 67. La interventoría **ARQUITECTURA URBANA LTDA.** realizo el ensayo de asentamiento (NTC 393)



FOTO No 68. La interventoría **ARQUITECTURA URBANA LTDA.** realizo el ensayo de asentamiento (NTC 393)

	
FOTO No 69. Estado actual PARQUE VECINAL URBANIZACIÓN LA ESTANCIA COD 19- 149.	**FOTO No 70.** Estado actual PARQUE VECINAL URBANIZACIÓN LA ESTANCIA COD 19- 149.

- **PARQUE 19-150 URBANIZACIÓN LA ESTANCIA**

	
FOTO No 71. La interventoría **ARQUITECTURA URBANA LTDA.** Reviso y verifico la actividad de obra rodadura asfáltica R-1DRD E=0.07m en el campo deportivo parque vecinal urbanización la estancia CÓD. 19-149 de acuerdo al estudio geotécnico y especificaciones técnicas.	**FOTO No 72.** La interventoría **ARQUITECTURA URBANA LTDA.** Reviso y verifico la actividad de obra rodadura asfáltica R-1DRD E=0.07m en el campo deportivo parque vecinal urbanización la estancia CÓD. 19-149 de acuerdo al estudio geotécnico y especificaciones técnicas.



FOTO No 73. La interventoría **ARQUITECTURA URBANA LTDA.** reviso y verifico la dimensión de los dados (0,40m*0,40m*0,80 m) para los anclajes de los juegos de acuerdo a planos y especificaciones técnicas de obra.



FOTO No 74. La interventoría **ARQUITECTURA URBANA LTDA.** reviso y verifico la dimensión de los dados (0,40m*0,40m*0,80 m) para los anclajes de los juegos de acuerdo a planos y especificaciones técnicas de obra.



FOTO No 75. La interventoría **ARQUITECTURA URBANA LTDA.** reviso y verifico la instalación de SBR con un espesor de 1 centímetro en zona de juegos infantiles.



FOTO No 76. La interventoría **ARQUITECTURA URBANA LTDA.** reviso y verifico la instalación de SBR con un espesor de 1 centímetro en zona de juegos infantiles.

- **PARQUE 19-479 URBANIZACIÓN CANDELARIA LA NUEVA SEGUNDO SECTOR PRIMERA ETAPA**



FOTO No 77. La interventoría **ARQUITECTURA URBANA LTDA.** reviso y verifico la instalación de baranda cerramiento M-80 y Modulo complemento para baranda.



FOTO No 78. La interventoría **ARQUITECTURA URBANA LTDA.** reviso y verifico la instalación de baranda cerramiento M-80 y Modulo complemento para baranda.



FOTO No 79. La interventoría **ARQUITECTURA URBANA LTDA.** reviso y verifico la dimensión de los dados (0,40m*0,40m*0,80 m) para los anclajes de los juegos de acuerdo a planos y especificaciones técnicas de obra.



FOTO No 80. La interventoría **ARQUITECTURA URBANA LTDA.** reviso y verifico la dimensión de los dados (0,40m*0,40m*0,80 m) para los anclajes de los juegos de acuerdo a planos y especificaciones técnicas de obra.



FOTO No 81. La interventoría **ARQUITECTURA URBANA LTDA.** reviso y verifico que el contratista de obra **CONSORCIO OPORTO** realice la instalación de JuegoMuellePanelesLateralesAnimales 2-8años.



FOTO No 82. La interventoría **ARQUITECTURA URBANA LTDA.** reviso y verifico que el contratista de obra **CONSORCIO OPORTO** realice la instalación de JuegoMuellePanelesLateralesAnimales 2-8años.



FOTO No 83. La interventoría **ARQUITECTURA URBANA LTDA.** reviso y verifico que el contratista de obra **CONSORCIO OPORTO** realice la instalación de Juego Carrusel 3-10 años Cap.: 8 niños



FOTO No 84. La interventoría **ARQUITECTURA URBANA LTDA.** reviso y verifico que el contratista de obra **CONSORCIO OPORTO** realice la instalación de Juego Carrusel 3-10 años Cap.: 8 niños



FOTO No 85. La interventoría **ARQUITECTURA URBANA LTDA.** reviso y verifico la instalación de SBR con un espesor de l centímetro en zona de juegos infantiles.



FOTO No 86. La interventoría **ARQUITECTURA URBANA LTDA.** reviso y verifico la instalación de SBR con un espesor de l centímetro en zona de juegos infantiles.

PARQUES SEGUNDA ETAPA

- **PARQUE DESARROLLO ARBORIZADORA BAJA 19-255**



FOTO No 87. La interventoría **ARQUITECTURA URBANA LTDA.** reviso y verifico la instalación de la baranda M-80 y módulos complementarios de acuerdo a las especificaciones técnicas de obra.



FOTO No 88. La interventoría **ARQUITECTURA URBANA LTDA.** reviso y verifico la instalación de la baranda M-80 y módulos complementarios de acuerdo a las especificaciones técnicas de obra.

	
FOTO No 89. La Interventoría **ARQUITECTURA URBANA LTDA.** reviso y verifico el estado actual PARQUE DESARROLLO ARBORIZADORA BAJA 19-255.	**FOTO No 90.** La Interventoría **ARQUITECTURA URBANA LTDA.** reviso y verifico el estado actual PARQUE DESARROLLO ARBORIZADORA BAJA 19-255.

- **PARQUE DESARROLLO ARBORIZADORA ALTA 19-368**

	
FOTO No 91. La interventoría **ARQUITECTURA URBANA LTDA.** reviso y verifico la aplicación de la pintura sobre la baranda M-80 (2 manos).	**FOTO No 92.**La interventoría **ARQUITECTURA URBANA LTDA.** reviso y verifico la aplicación de la pintura sobre la baranda M-80 (2 manos).

- **PARQUE DESARROLLO ARBORIZADORA ALTA 19-475**



FOTO No .93. La interventoría **ARQUITECTURA URBANA LTDA.** reviso y verifico la instalación de bordillo A-80 de acuerdo de planos y especificaciones técnicas.



FOTO No 94. La interventoría **ARQUITECTURA URBANA LTDA.** reviso y verifico la excavación manual para bordillo Zarpa de acuerdo de planos y especificaciones técnicas.



FOTO No 95. La interventoría **ARQUITECTURA URBANA LTDA.** realizo toma de densidades a material granular B600.



FOTO No 96. La interventoría **ARQUITECTURA URBANA LTDA.** realizo toma de densidades a material granular B600 con densímetro nuclear.



FOTO No 97. Amarre de acero de refuerzo de 60000 PSI (acero de refuerzo de ¼" y acero de refuerzo de 3/8") para bordillo zarpa de acuerdo a especificaciones técnicas de obra.



FOTO No 98. Encofrado en formaleta metálica de acuerdo a especificaciones técnicas de obra.



FOTO No 99. La interventoría **ARQUITECTURA URBANA LTDA.** reviso y verifico el Amarre de acero de refuerzo de 60000 PSI (acero de refuerzo de ¼" y acero de refuerzo de 3/8") para bordillo zarpa de acuerdo a especificaciones técnicas de obra.



FOTO No 100. La interventoría ARQUITECTURA URBANA LTDA. reviso y verifico el nacido en concreto de 3000 PSI para placa de contrapiso



FOTO No 101. La interventoría **ARQUITECTURA URBANA LTDA.** realizo toma de densidades a material granular B600 con densímetro nuclear.



FOTO No 102. La interventoría **ARQUITECTURA URBANA LTDA.** realizo toma de densidades a material granular B600 con densímetro nuclear.

- **PARQUE DESARROLLO SIERRA MORENA 19-079**



FOTO No 103. La interventoría **ARQUITECTURA URBANA LTDA.** reviso y verifico la instalación de bordillo A-80 de acuerdo de planos y especificaciones técnicas.



FOTO No 104. La interventoría **ARQUITECTURA URBANA LTDA.** reviso y verifico la excavación manual para bordillo Zarpa de acuerdo de planos y especificaciones técnicas.

	
FOTO No 105. La interventoría **ARQUITECTURA URBANA LTDA.** reviso y verifico el espesor de 20 cm de la capa de relleno compactado de base granular tipo IDRD de acuerdo a la estructura de la rasante establecida en el estudio geotécnico.	**FOTO No 106.** La interventoría **ARQUITECTURA URBANA LTDA.** reviso y verifico la instalación de bordillo prefabricado A-80 de acuerdo a especificaciones técnicas.
	
FOTO No 107. La interventoría **ARQUITECTURA URBANA LTDA.** reviso y verifico el espesor de 20 cm de la 3capa de relleno compactado de base granular tipo IDRD de acuerdo a la estructura de la rasante establecida en el estudio geotécnico.	**FOTO No 108.** La interventoría **ARQUITECTURA URBANA LTDA.** reviso y verifico la instalación de bordillo prefabricado A-80 de acuerdo a especificaciones técnicas.

	
FOTO No 109. La interventoría **ARQUITECTURA URBANA LTDA.** realizo toma de densidades a material granular B600 con densímetro nuclear.	**FOTO No 110.** La interventoría **ARQUITECTURA URBANA LTDA.** realizo toma de densidades a material granular B600 con densímetro nuclear.

- **PARQUE DESARROLLO ARBORIZADORA BAJA 19-022**

	
FOTO No 111. La interventoría **ARQUITECTURA URBANA LTDA.** revisa y verifica el figurado y amarre de acero para bordillo zarpa.	**FOTO No 112.** La interventoría **ARQUITECTURA URBANA LTDA.** revisa y verifica la dosificación y fundida de zarpa en concreto de 3000 psi.



FOTO No 113. La interventoría **ARQUITECTURA URBANA LTDA.** Revisa y verifica el estado de la formaleta, recubrimiento de 5 cm, alineación y plomo.



FOTO No 114. La interventoría **ARQUITECTURA URBANA LTDA.** revisa y verifica vaciado de concreto 3000 psi para muro de bordillo zarpa.



FOTO No 115. La interventoría **ARQUITECTURA URBANA LTDA.** reviso y verifico el amarre de acero de refuerzo y encofrado de la actividad de obra Bordillo zarpa 0.15m*0,50m*0,85m -3000 PSI.



FOTO No 116. La interventoría **ARQUITECTURA URBANA LTDA.** revisa y verifica el terminado de la actividad de obra Bordillo zarpa 0.15m*0,50m*0,85m -3000 PSI.

	
FOTO No 117. La interventoría **ARQUITECTURA URBANA LTDA.** reviso y verifico la compactación por medio de equipo mecánico "saltarín".	**FOTO No 118.** La interventoría **ARQUITECTURA URBANA LTDA.** reviso y verifico la compactación por medio de equipo mecánico "saltarín".

- **PARQUE DESARROLLO SIERRA MORENA 19-325**

	
FOTO No 119. La interventoría **ARQUITECTURA URBANA LTDA.** revisa y verifica que el contratista **CONSORCIO OPORTO** continúe con la actividad de obra excavación manual de la zona de juegos y plazoleta peatonal.	**FOTO No 120.** La interventoría **ARQUITECTURA URBANA LTDA.** revisa y verifica que el contratista **CONSORCIO OPORTO** continúe con la actividad de obra excavación manual de la zona de juegos y plazoleta peatonal.

	
FOTO No 121. La interventoría **ARQUITECTURA URBANA LTDA.** revisa y verifica que el contratista **CONSORCIO OPORTO** realice la instalación de geotextil NT 1800 en la rasante de acuerdo a lo solicitado en el estudio de suelo.	**FOTO No 122.** La interventoría **ARQUITECTURA URBANA LTDA.** revisa y verifica que el contratista **CONSORCIO OPORTO** realice el relleno de la sub base granular B400 en la rasante de acuerdo a lo solicitado en el estudio de suelo.

- **PARQUE DESARROLLO SIERRA MORENA 19-316**

	
FOTO No 123. La interventoría **ARQUITECTURA URBANA LTDA**. revisa y verifica la instalación de material granular B-600 (base) para la zona de juegos.	**FOTO No 124.** La interventoría **ARQUITECTURA URBANA LTDA.** Revisa y verifica la instalación de material granular B-400 (Subbase) para las zonas de juegos y sendero peatonal.

	
FOTO No 125. La interventoría **ARQUITECTURA URBANA LTDA.** realizo toma de densidades a material granular B400.	**FOTO No 126.** La interventoría **ARQUITECTURA URBANA LTDA.** realizo toma de densidades a material granular B400 con densímetro nuclear.
	
FOTO No 127. La interventoría **ARQUITECTURA URBANA LTDA.** revisa y verifica que el contratista de obra **CONSORCIO OPORTO** realice la excavación manual incluye retiro para la ejecución del filtro francés.	**FOTO No 128.** La interventoría **ARQUITECTURA URBANA LTDA.** revisa y verifica que el contratista de obra **CONSORCIO OPORTO** realice la excavación manual incluye retiro para la ejecución del filtro francés.



FOTO No 129. La interventoría **ARQUITECTURA URBANA LTDA.** reviso y verifico la actividad de obra baranda M-80 y modulo complementario para baranda de acuerdo a la especificación técnica y presupuesto de obra.



FOTO No 130. La interventoría **ARQUITECTURA URBANA LTDA.** reviso y verifico la actividad de obra baranda M-80 y modulo complementario para baranda de acuerdo a la especificación técnica y presupuesto de obra.

PARQUES TERCERA ETAPA

- **PARQUE URBANIZACION LAS QUINTAS 19-394**



FOTO No 131. La interventoría **ARQUITECTURA URBANA LTDA.** Revisa y verifica la instalación de material granular B-400 (Subbase) para las zonas de juegos y sendero peatonal.



FOTO No 132. La interventoría **ARQUITECTURA URBANA LTDA.** revisa y verifica la instalación de material granular B-600 (base) para la zona de juegos.



FOTO No 133. La interventoría **ARQUITECTURA URBANA LTDA.** revisa y verifica la instalación de material granular B-400 (Subbase) para las zonas de juegos y sendero peatonal.



FOTO No 134. La interventoría **ARQUITECTURA URBANA LTDA.** revisa y verifica la instalación de bordillo A-80 para confinamiento de material granular (zona de juegos).



FOTO No 135. La interventoría **ARQUITECTURA URBANA LTDA.** realizo toma de densidades a material granular B600 con densímetro nuclear.



FOTO No 136. La interventoría **ARQUITECTURA URBANA LTDA.** realizo toma de densidades a material granular B600 con densímetro nuclear.

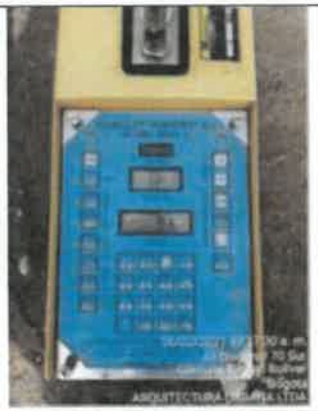
	
FOTO No 137. La interventoría **ARQUITECTURA URBANA LTDA.** revisa y verifica que contratista **CONSORCIO OPORTO** realice la instalación de adoquín en arcilla sobre una base en arena de 2 cm de espesor.	**FOTO No 138.** La interventoría **ARQUITECTURA URBANA LTDA.** revisa y verifica que contratista **CONSORCIO OPORTO** realice la instalación de adoquín en arcilla sobre una base en arena de 2 cm de espesor.
	
FOTO No 139. La interventoría **ARQUITECTURA URBANA LTDA.** realizo toma de densidades a material granular B600 con densímetro nuclear.	**FOTO No 140.** La interventoría **ARQUITECTURA URBANA LTDA.** realizo toma de densidades a material granular B600 con densímetro nuclear.



FOTO No 141. La interventoría **ARQUITECTURA URBANA LTDA.** revisa y verifica la excavación manual para la construcción de bordillo zarpa 0.80.

- **PARQUE DESARROLLO RINCÓN DE GALICIA Y URBANIZACIÓN LA ESTANCIA 19-016**



FOTO No 142. La interventoría **ARQUITECTURA URBANA LTDA.** revisa y verifica la instalación de geotextil T2100 con un traslapo de Min. 30 cm.



FOTO No 143. La interventoría **ARQUITECTURA URBANA LTDA.** revisa y verifica la instalación de material granular B-600 (base) para la zona de juegos.



FOTO No 144. La interventoría **ARQUITECTURA URBANA LTDA.** revisa y verifica la instalación de material granular B-600 (base) para la zona de juegos.



FOTO No 145. La interventoría **ARQUITECTURA URBANA LTDA.** revisa y verifica la instalación de bordillo A-80 con junta en mortero de 1 cm de espesor.



FOTO No 146. La interventoría **ARQUITECTURA URBANA LTDA.** revisa y verifica la instalación de material granular B-600 (base) para la zona de juegos.



FOTO No 147. La interventoría **ARQUITECTURA URBANA LTDA.** revisa y verifica la compactación de material granular B-600 (base) para la zona de juegos.



FOTO No 148. La interventoría **ARQUITECTURA URBANA LTDA.** revisa y verifica el tendido y compactación de material granular B-600 para la zona de juegos.



FOTO No 149. La interventoría **ARQUITECTURA URBANA LTDA.** revisa y verifica el tendido de material granular B-600 para la zona del sendero peatonal.



FOTO No 150. La interventoría **ARQUITECTURA URBANA LTDA.** revisa y verifica que el contratista **CONSORCIO OPORTO** realice la instalación de malla electrosoldada de 15x15 cm, cal. 5 mm con una separación horizontal de 5cm.



FOTO No 151. La interventoría **ARQUITECTURA URBANA LTDA.** revisa y verifica que el contratista **CONSORCIO OPORTO** realice el vaciado de concreto 3000 psi (losa maciza), cumpliendo con las especificaciones técnicas y espesor e: 10cm establecido.

	
FOTO No 152. La interventoría **ARQUITECTURA URBANA LTDA.** revisa y verifica que contratista **CONSORCIO OPORTO** realice la instalación de adoquín en arcilla sobre una base en arena de 2 cm de espesor.	**FOTO No 153.** La interventoría **ARQUITECTURA URBANA LTDA.** revisa y verifica la conformación de sardinel para acceso a parque infantil
	
FOTO No 154. La interventoría **ARQUITECTURA URBANA LTDA.** realizo toma de densidades a material granular B600 con densímetro nuclear.	**FOTO No 155.** La interventoría **ARQUITECTURA URBANA LTDA.** realizo toma de densidades a material granular B600 con densímetro nuclear.

	
FOTO No 156. La interventoría **ARQUITECTURA URBANA LTDA.** realizo el ensayo de asentamiento (NTC 393)	**FOTO No 157.** La interventoría **ARQUITECTURA URBANA LTDA.** realizo el ensayo de asentamiento (NTC 393)
	
FOTO No 158. La interventoría **ARQUITECTURA URBANA LTDA.** realizo toma de espécimen para ensayo de compresión (ntc 673).	**FOTO No 159.** La interventoría **ARQUITECTURA URBANA LTDA.** realizo toma de espécimen para ensayo de compresión (ntc 673).

- **PARQUE URBANIZACIÓN MADELENA III Y IV SECTOR 19-144**



FOTO No 160. La interventoría **ARQUITECTURA URBANA LTDA.** Revisa y verifica la instalación de bordillo A-80 para confinamiento de material granular (zona de juegos).



FOTO No . La interventoría **ARQUITECTURA URBANA LTDA.** revisa y verifica verticalidad e instalación de parales d= 2" complemento de la baranda M80A.



FOTO No 162. La interventoría **ARQUITECTURA URBANA LTDA.** revisa y verifica la compactación de material granular B-600 (base) para la zona de juegos.



FOTO No 163. La interventoría **ARQUITECTURA URBANA LTDA.** revisa y verifica que contratista **CONSORCIO OPORTO** realice la instalación de adoquín en arcilla sobre una base en arena de 2 cm de espesor.



FOTO No 164. La interventoría **ARQUITECTURA URBANA LTDA.** revisa y verifica que el contratista **CONSORCIO OPORTO** realice la instalación de malla electro soldada de 15x15 cm, cal. 5 mm con una separación horizontal de 5cm.



FOTO No 165. La interventoría **ARQUITECTURA URBANA LTDA.** revisa y verifica que el contratista **CONSORCIO OPORTO** realice el vaciado de concreto 3000 psi (losa maciza), cumpliendo con las especificaciones técnicas y espesor e: 10cm establecido.



FOTO No 166. La interventoría **ARQUITECTURA URBANA LTDA.** revisa y verifica verticalidad e instalación de parales d= 2" complemento de la baranda M80A.

- **PARQUE URBANIZACION MADELENA III Y IV SECTOR 19-393**



FOTO No 167. La interventoría **ARQUITECTURA URBANA LTDA.** Revisa y verifica la imprimación con emulsión asfáltica de rompimiento rápido.



FOTO No 168. La interventoría **ARQUITECTURA URBANA LTDA.** Revisa y verifica que el contratista **CONSORCIO OPORTO** realice el vaciado de concreto 3000 psi (losa maciza), cumpliendo con las especificaciones técnicas y espesor e: 10cm establecido...



FOTO No 169. La interventoría **ARQUITECTURA URBANA LTDA.** realizo toma de densidades a material granular B600 con densímetro nuclear.



FOTO No 170. La interventoría **ARQUITECTURA URBANA LTDA.** realizo toma de densidades a material granular B600 con densímetro nuclear.



FOTO No 171. La interventoría **ARQUITECTURA URBANA LTDA.** realizo el ensayo de asentamiento (NTC 393)



FOTO No 172. La interventoría **ARQUITECTURA URBANA LTDA.** realizo el ensayo de asentamiento (NTC 393)



FOTO No 173. La interventoría **ARQUITECTURA URBANA LTDA.** revisa y verifica que se realicen las dilataciones con pulidora con una profundidad de e: 2cm.



FOTO No 174. La interventoría **ARQUITECTURA URBANA LTDA.** revisa y verifica que contratista **CONSORCIO OPORTO** realice la instalación de adoquín en arcilla sobre una base en arena de 2 cm de espesor.



FOTO No 175. La interventoría **ARQUITECTURA URBANA LTDA.** revisa y verifica que el contratista **CONSORCIO OPORTO** realice la cimentación e instalación de anclajes para juegos bio saludables.

- **PARQUE URBANIZACION MADELENA III Y IV SECTOR 19-401**



FOTO No 176. La interventoría **ARQUITECTURA URBANA LTDA.** Revisa y verifica que el contratista **CONSORCIO OPORTO** realiza la estabilización de material existente con cemento al 4% (1.5 bultos de cemento / 1m3 de material granular).



FOTO No 177. La interventoría **ARQUITECTURA URBANA LTDA.** Revisa y verifica la instalación de bordillo A-80 para confinamiento de material granular (zona de juegos).



FOTO No 178. La interventoría **ARQUITECTURA URBANA LTDA.** Revisa y verifica la imprimación con emulsión asfáltica de rompimiento rápido.



FOTO No 179. La interventoría **ARQUITECTURA URBANA LTDA.** Realizo toma de densidades en material granular existente estabilizado con cemento al 4%.



FOTO No 180. La interventoría **ARQUITECTURA URBANA LTDA.** revisa y verifica que el contratista **CONSORCIO OPORTO** realice el vaciado de concreto 3000 psi (losa maciza), cumpliendo con las especificaciones técnicas y espesor e: 10cm establecido.



FOTO No 181. La interventoría **ARQUITECTURA URBANA LTDA.** revisa y verifica que se realicen las dilataciones con pulidora con una profundidad de e: 2cm.



FOTO No 182. La interventoría **ARQUITECTURA URBANA LTDA.** Realizo toma de densidades en material granular existente estabilizado con cemento al 4%.



FOTO No 183. La interventoría **ARQUITECTURA URBANA LTDA.** revisa y verifica que el contratista **CONSORCIO OPORTO** realice la demolición de cuneta existente.



FOTO No 184. La interventoría **ARQUITECTURA URBANA LTDA.** realizo el ensayo de asentamiento (NTC 393)



FOTO No 185. La interventoría **ARQUITECTURA URBANA LTDA.** realizo el ensayo de asentamiento (NTC 393)

	
FOTO No 186. La interventoría **ARQUITECTURA URBANA LTDA.** revisa y verifica que el contratista **CONSORCIO OPORTO** realice la demolición de cañuela existente y realice la excavación manual.	**FOTO No 187.** La interventoría **ARQUITECTURA URBANA LTDA.** revisa y verifica la instalación de cañuela prefabricada A-120 para manejo de aguas.

- **PARQUE URBANIZACIÓN LA ESTANCIA 19-484**

	
FOTO No 188. La interventoría **ARQUITECTURA URBANA LTDA.** Revisa y verifica que el contratista **CONSORCIO OPORTO** realice el vaciado de concreto 3000 psi (losa maciza), cumpliendo con las especificaciones técnicas y espesor e: 10cm establecido...	**FOTO No 189.** La interventoría **ARQUITECTURA URBANA LTDA.** revisa y verifica que se cumpla la longitud mínima de traslapos en malla electrosoldada, L : 30 cm.



FOTO No 190. La interventoría **ARQUITECTURA URBANA LTDA.** revisa y verifica que se realicen las dilataciones con pulidora con una profundidad de e: 2cm.



FOTO No 191. La **interventoría ARQUITECTURA URBANA LTDA.** Revisa y verifica que contratista **CONSORCIO OPORTO** realice la instalación de adoquín en arcilla sobre una base en arena de 2 cm de espesor.



FOTO No 192. La interventoría **ARQUITECTURA URBANA LTDA.** realizo el ensayo de asentamiento (NTC 393)



FOTO No 193. La interventoría **ARQUITECTURA URBANA LTDA.** realizo el ensayo de asentamiento (NTC 393)



FOTO No 194. La interventoría **ARQUITECTURA URBANA LTDA.** revisa y verifica que el contratista **CONSORCIO OPORTO** realice la cimentación e instalación de anclajes para juegos bio saludables.

PARQUES (4) CUARTA ETAPA

PARQUE VECINAL URBANIZACIÓN LAS QUINTAS 19- 031



FOTO No 195. La **interventoría ARQUITECTURA URBANA LTDA.** revisa y verifica que contratista **CONSORCIO OPORTO** realice la excavación manual de material existente.



FOTO No 196. La interventoría **ARQUITECTURA URBANA LTDA.** Revisa y verifica que el contratista **CONSORCIO OPORTO** realiza la estabilización de material existente con cemento al 4% (1.5 bultos de cemento / 1m3 de material granular).



FOTO No 197. La interventoría **ARQUITECTURA URBANA LTDA**. revisa y verifica que el contratista **CONSORCIO OPORTO** realice la imprimación con emulsión asfáltica de rompimiento rápido en la zona de juegos.



FOTO No 198. La interventoría **ARQUITECTURA URBANA LTDA.** realizo toma de densidades a material estabilizado con cemento al 4%.



FOTO No 199. La interventoría **ARQUITECTURA URBANA LTDA.** realizo toma de densidades en material granular B600.



FOTO No 200. La interventoría **ARQUITECTURA URBANA LTDA.** realizo toma de densidades en material granular B600.

	
FOTO No 201. La interventoría **ARQUITECTURA URBANA LTDA.** revisa y verifica que el contratista **CONSORCIO OPORTO** realice la instalación de malla electrosoldada de 15x15 cm, cal. 5 mm con una separación horizontal de 5cm.	**FOTO No 202.** La interventoría **ARQUITECTURA URBANA LTDA.** revisa y verifica que el contratista **CONSORCIO OPORTO** realice el vaciado de concreto 3000 psi (losa maciza), cumpliendo con las especificaciones técnicas y espesor e: 10cm establecido.
	
FOTO No 203. La interventoría **ARQUITECTURA URBANA LTDA.** revisa y las dimensiones y características del refuerzo para placa de contrapiso malla electrosoldada cumpla las especificaciones técnicas aprobadas las cuales es una malla Q4 (15CM*15cm) en grafil 6 milímetros(mm)	**FOTO No 204.** La interventoría **ARQUITECTURA URBANA LTDA.** revisa y las dimensiones y características del refuerzo para placa de contrapiso malla electrosoldada cumpla las especificaciones técnicas aprobadas las cuales es una malla Q4 (15CM*15cm) en grafil 6 milímetros(mm)

	
FOTO No 205. La interventoría **ARQUITECTURA URBANA LTDA.** realizo el ensayo de asentamiento (NTC 393)	**FOTO No 206.** La interventoría **ARQUITECTURA URBANA LTDA.** realizo el ensayo de asentamiento (NTC 393)
	
FOTO No 207. La interventoría **ARQUITECTURA URBANA LTDA.** realizo toma de espécimen para ensayo de compresión (ntc 673).	**FOTO No 208.** La interventoría **ARQUITECTURA URBANA LTDA.** realizo toma de espécimen para ensayo de compresión (ntc 673).

	
FOTO No 209. La interventoría **ARQUITECTURA URBANA LTDA.** revisa y verifica que el contratista **CONSORCIO OPORTO** realice el vaciado de concreto 3000 psi (losa maciza), cumpliendo con las especificaciones técnicas y espesor e: 10cm establecido.	**FOTO No 210.** La interventoría **ARQUITECTURA URBANA LTDA.** revisa y verifica que se realicen las dilataciones con pulidora con una profundidad de e: 2cm.

- **PARQUE ISMAEL PERDOMO 19-028**

	
FOTO No 211. La interventoría **ARQUITECTURA URBANA LTDA.** revisa y verifica que el contratista **CONSORCIO OPORTO** realice la demolición de carpeta asfáltica con un espesor de e: 10cm en la zona de juegos infantiles existentes.	**FOTO No 212.** La interventoría **ARQUITECTURA URBANA LTDA.** revisa y verifica el desmoste de juegos infantiles existentes.

	
FOTO No 213. La interventoría **ARQUITECTURA URBANA LTDA.** revisa y verifica la excavación mecánica de material granular y acopio del mismo para estabilización.	**FOTO No 214.** La interventoría **ARQUITECTURA URBANA LTDA.** revisa y verifica que el contratista **CONSORCIO OPORTO** realice la demolición de carpeta asfáltica con un espesor de e: 10cm en la zona de juegos infantiles existentes.



FOTO No 215. La interventoría **ARQUITECTURA URBANA LTDA.** revisa y verifica la dosificación (suelo cemento), 1.5 bultos de cemento/1. según estudio geotécnico aprobado.

- **PARQUE DESARROLLO ARBORIZADORA BAJA 19-060**



FOTO No 216. La interventoría **ARQUITECTURA URBANA LTDA.** revisa y verifica que el contratista **CONSORCIO OPORTO** realice la demolición de carpeta asfáltica con un espesor de e: 7cm en la zona de juegos infantiles existentes.



FOTO No 217. La interventoría **ARQUITECTURA URBANA LTDA.** revisa y verifica que se cumpla la longitud mínima de traslapos en malla electro soldada, L : 30 cm.



FOTO No 218. La interventoría **ARQUITECTURA URBANA LTDA.** revisa y verifica por medio de un apique la estructura del suelo existente, evidenciando que es un relleno por lo cual se solicita estudio geotécnico.



FOTO No 219. La interventoría **ARQUITECTURA URBANA LTDA.** revisa y verifica que la piedra rajón cumplan las dimensiones de Max. 25 cm y Min. 15 cm.

	
FOTO No 220. La interventoría **ARQUITECTURA URBANA LTDA.** revisa y verifica niveles de excavación, cumpliendo con la estructura establecida de 77 cm.	**FOTO No 221.** La interventoría **ARQUITECTURA URBANA LTDA.** revisa y verifica el desmonte de las estructuras de baloncesto y microfutbol.
	
FOTO No 222. La interventoría **ARQUITECTURA URBANA LTDA.** revisa y verifica el desmonte de juego existente, para su respectiva entrega a la comunidad.	**FOTO No 223.** La interventoría **ARQUITECTURA URBANA LTDA.** revisa y verifica que el contratista **CONSORCIO OPORTO** realice la demolición de carpeta asfáltica con un espesor de e: 10cm en la zona de juegos infantiles existentes.

	
FOTO No 224. La interventoría **ARQUITECTURA URBANA LTDA.** revisa y verifica el tendido de material granular B200 (sello) con una capa de e= 10 cm.	**FOTO No 225.** La interventoría **ARQUITECTURA URBANA LTDA.** revisa y verifica que la piedra rajón cumplan las dimensiones de Max. 25 cm y Min. 15 cm.

ANEXO No. 8
BITACORA DE OBRA

1079

Lunes 01/02/2021
Clima: Mañana: Nublado. Tarde:
Personal del contratista: 1 inspector y 1 apoyo sst.
Personal de interventoria: 2 inspectores.
Actividades en ejecucion:

19-022 Continua Figurado y amarre de acero para bordillo zarpa.

19-255 No se evidencian actividades en ejecucion. Se le solicita al contratista dar celeridad a la ejecucion de actividades de obra: Baranda M-80, Piso en caucho, juegos infantiles, obsmote en bacas, señales civicas, entre otras.

19-325 No se evidencian actividades en ejecucion. Se le solicita al contratista dar celeridad a la ejecucion de actividades de obra. Excavacion manual, rellenos con material granular, geotextil, entre otros.

Martes 02/02/2021.
Clima: Mañana: Soleado; Tarde: Soleado.
Personal del contratista: 1 residente, 1 inspector y 1 apoyo sst.
Personal de interventoria: 1 residente y 2 inspectores
Actividades en ejecucion:

19-022 Inicia vaciado de concreto 3000psi para zarpa.

19-255 No se evidencian actividades en ejecucion.

19-325 Inicia excavacion manual para la zona de juegos y sendero peatonal.

Miercoles 03/02/2021
Clima: Mañana; Soleado. Tarde: Soleado.
Personal del contratista: 1 residente, 1 inspector y apoyo sst.
Personal de interventoria: 1 residente y 2 inspectores
Actividades en ejecucion.

19-022	No se evidencian actividades en ejecucion.
19-255	No se evidencian actividades en ejecucion.
19-325	continua la excavacion manual en la zona de juegos y sendero peatonal.
	Jueves 04/02/2021
	Clima: Mañana. Soleado. Tarde: Soleado
	Personal del contratista: 1 residente, 1 inspector y 1 apoyo sst.
	Personal de interventoria: 1 residente y 2 inspectores.
	Actividades en ejecucion.
19-022	No se evidencian actividades en ejecucion.
19-255	No se evidencian actividades en ejecucion.
19-325	continua la excavacion manual para la zona de juegos y sendero peatonal.
	Viernes 05/02/2021
	Clima: Mañana: Soleado: Tarde: Soleado.
	Personal del contratista: 1 residente, 1 inspector y 1 apoyo sst.
	Personal de interventoria: 1 residente y 2 inspectores.
	Actividades en ejecucion:
19-022	No se evidencian actividades en ejecucion.
19-255	No se evidencian actividades en ejecucion.
19-325	continua la excavacion manual para la zona de juegos y sendero peatonal.
	Sabado 06/02/2021
	Clima: Mañana: Soleado. Tarde: Soleado
	Personal del contratista: 1 residente, 1 inspector y 1 apoyo sst.
	Personal de interventoria: 1 residente y 2 inspectores
	Actividades en ejecucion:
19-022	Se realiza desencofrado de bordillo zarpa.

19-255	No se evidencian actividades en ejecucion
19-325	Continua excavacion manual para la zona de juegos y sendero peatonal.

Lunes 08/22/2021
Clima: Mañana: Soleado. Tarde: Soleado
Personal del contratista: 1 residente, 1 inspector y 1 apoyo sst.
Personal de interventoria: 1 residente y 2 inspectores

19-022	No se evidencia actividades en esecucion, la interventoria ha solicitado reiteradamente al contratista de obra incrementar [illegible] operativo en este frente donde se evidencia atrazos en las siguientes actividades de obra de acuerdo a la programacion de obra: • Instalacion de piso caucho → 1 cuadrilla (1 oficial + 3 ayudantes) • Instalacion de baranda M-80 y modulos: (1 oficiales + 2 ayud • Placa de contrapiso (1 oficial + 2 ayudantes) Para este frente de trabajo se requiere de 9 personas [illegible] area operativa para dar cumplimiento a los atrazos evidenciados cantidad de personal y deficuencia en la planeacion de actividades de obra.
19-255	No se evidencia actividades en esecucion, la interventoria ha solicitado reiteradamente al contratista de obra incrementar [illegible] operativo en este frente de trabajo, donde se evidencia atra en los siguientes actividades de obra de acuerdo a la prog de obra: • Instalacion de piso caucho → 1 cuadrilla (1 oficial + 3 ay • Suministro e instalacion de juegos infantiles → 1 cuadrilla (2 3 ayudantes) Para este frente de trabajo se requiere 8 personas para la esecucion de estas actividades de obra y dar cumplim y la programacion de obra.

19-022. 08-02-21.	Profesional Ambiental y sst: Se realiza recorrido de obra donde se evidencia personal en actividades de excavación y compactación de material, así como se evidencia con sus respectivos elementos de protección personal y dotación. Frente al material acopiado y acopio de material pétreo, se evidencia retiro para disposición final como almacenamiento en lonas, los cuales serán retirados de la obra. Se solicita al contratista realizar señalización de punto de acopio de material pétreo, como demarcación de la zona. Se evidencia señalización de PMT. y de seguridad y salud en el trabajo.
19-325	se evidencia el siguiente personal operativo en obra: 2 oficiales + 3 ayudantes. se realizan actividades de obra excavacion manual. Se le solicita al contratista de obra incrementar personal en obra para dar cumplimiento a la programacion de obra y mitigar los retrasos ocasionados por la ausencia de personal operativo. la interventoria solicita y recomienda incrementar el siguiente personal por cuadrillas para dar cumplimiento a los atrasos: 1 cuadrilla (2 oficiales + 4 ayudantes) para llenos en subbase y base y llenos de contrapiso. 1 cuadrilla (1 oficial + 3 ayudantes) baranda y modulos 1 cuadrilla (3 oficiales + 3 ayudantes) instalacion de piso caucho 1 cuadrilla (2 oficiales + 3 ayudantes) instalacion de sucesos para este frente de trabajo se requieren 20 personas para dar cumplimiento a este frente de trabajo.
19-022	no se evidencia personal en obra, y ni ejecucion de actividades de obra.

1083

19-255	No se evidencia personal en obra, ni ejecucion de actividad sigue en atraso.
19-325	No se evidencia personal en obra ni ejecucion de activ de obra.
	Martes 09 del 2021 Febrero
	Tiempo: Seco
	Personal administrativo del contratista: 1 Ing residente, 1 Inspecto 1 Maestro SST.
P-19-022	No se evidencia actividad de obra en ejecucion, ni p en obra,
P-19-255	No se evidencia personal en obra, ni ejecucion de actividades de obra, se le recomienda al contratista inc mentar personal en obra.
P-19-325	2 oficiales y 3 ayudantes continuan con la (~~instalacion~~) ex manual.
	Miercoles 10 del Febrero del 2021
P-19-022	No se evidencia personal operativo en campo, ni ejecucio de actividades de obra.
P-19-255	No se evidencia personal operativo en campo, ni ejecuc de actividades de obra.
P-19-325	~~No se~~ 2 oficiales y 3 ayudantes continuan con excav manual.
	Jueves 11 del Febrero del 2021
P-19-022	No se evidencia personal en obra, ni ejecucion de activida

	de obra
p-19-255	El contratista de obra inicio con la instalacion de parales de metalicos de 2" para la baranda M-80. Se le solicita al contratista de obra realizar los modulos de 80 cm de acuerdo a las especificaciones tecnicas, tambien se le recomienda nuntener la verticalidad y alineamiento de la baranda
p-19-325	2 oficiales + 3 ayudantes continuan con Excavacion manual
	Viernes 12 de Febrero del 2021
p-19-022	No se evidencia Personal en obra, ni ejecucion de actividades de obra
p-19-255	2 soldadores y 2 ayudantes continuan con Instalacion de barandas M-80 y modulos.
p-19-325	2 oficiales y 3 ayudantes continuan con Excavacion manual incluye retiro
	Sabado 13 de Febrero del 2021
p-19-022	No se evidencia Personal en obra, ni ejecucion de actividades de obra.
p-19-255	No se evidencia personal en obra, ni ejecucion de actividades de obra.
p-19-325	2 oficiales y 3 ayudantes continuan con excavacion manual
	Lunes 15 de Febrero del 2021
p-19-022	No se evidencia Personal en obra, ni ejecucion de actividades de obra.
p-19-255	No se evidencia personal en obra, ni ejecucion de actividades de obra.
p-19-325	2 oficiales y 3 ayudantes continuan con excavacion manual incluye retiro.

	martes 16 de febrero de 2021.
P-abc 14-022	1 oficial y 1 ayudante realizo recompactacion a la subbase granular B600
P-14-255	no se evidencia personal en obra, ni ejecucion de actividades obra.
P-14-325	2 oficiales y 3 ayudantes realizan excavacion manual
	miercoles 17 de febrero del 2021
P-14-022	1 oficial y 1 ayudante continuan con recompactacion de base granular B600
P-14-255	no se evidencia personal en obra, ni ejecucion de actividades de obra.
P-14-325	1 oficial y 2 ayudantes continuan con excavacion manual para retiro en el area de sendero. 1 oficial y 2 ayudantes y 1 operador de bobcat realizan [illegible] de geotextil 2 ayudantes inician con relleno con subbase granular B400.
	jueves 18 de febrero del 2021 Tiempo: seco
P-14-022	1 ayudante continuan con recompactacion de base granular B[illegible]
P-14-255	no se evidencia personal en obra, ni ejecucion de actividades
P-14-325	2 oficiales y 3 ayudantes continuan con relleno de subbase [illegible] B400.

Viernes 19/02/2021
Tiempo: Seco - mañana; lluvioso tarde
Personal en Obra
Contratista: 1 residente, 1 residente apoyo, 1 inspector, 1 director
1 residente SST, 1 inspector SST
Interventoria: 2 residentes tecnico, SST, 2 inspectores
ACTIVIDADES DE OBRA

19-022: El contratista realiza la instalación de bordillos para confinamiento de piso caucho y concreto, extiende y compacta la capa de base granular y a su vez realiza la respectiva toma de densidades donde se consideraron 3 puntos a lo cual se arrojaron porcentajes de 103,6%, 100,8%, 101,7. Se procede a emulsionar la capa compacta y programar concreto de 3000 psi

19-325:
El contratista realiza la instalación de bordillos para la conformación de la implantación y termina lo extendido y compactación de Sub base granular y a su vez se realiza la respectiva toma de densidades donde se consideran 2 puntos a lo cual se arrojan porcentajes de 102,7% y 96,8%. Se procede a aplicar la siguiente capa de base granular.

19-355
El contratista ejecuta excavación y conformación de taludes a 45°, haciendo limpieza y aseo del parque en general

	Actividades en ejecucion.
19-475	continua la instalacion de bordillos A-80.
19-368	No se evidencian actividades en ejecucion.
19-316	Continua relleno de material granular B-900.
	Personal operativo: 1 oficial y 1 ayudante.
19-056	No se evidencian actividades en ejecucion.
19-077	No se evidencian actividades en ejecucion.

Lunes 01/02/2021
Personal del contratista: 1 inspector y 1 Apoyo sst.
Personal de interventoria: 2 inspectores
Clima: Mañana: Nublado. Tarde:
Actividades en ejecucion, = No se evidencian actividades en ejecucion.

Martes 02/02/2021
Clima: Mañana: Soleado Tarde: Soleado.
Personal del contratista: 1 residente, 1 inspector y 1 apoyo sst.
Personal de interventoria. 1 residente y 2 inspectores.
Actividades en ejecucion:

19-475	Inicia la excavacion manual para bordillo zarpa
19-368	Inicia la actividad de lijado, aplicacion de anticorrosivo y pintura de baranda M-80 existente
19-316	Continua relleno con material granular para contenciones.
19-077	No se evidencian actividades en ejecucion

Miercoles 03/02/2021
Clima: Mañana: Soleado. Tarde: Soleado.
Personal del contratista: 1 residente, 1 inspector y 1 apoyo sst.
Personal de interventoria: 1 residente y 2 inspectores
Actividades en ejecucion:

19-475	Continua la excavacion manual de bordillo zarpa e instala
	cion de Bordillo A-80
19-368	Continua la actividad de pintura para Baranda
	M-80 existente
19-316	Continua relleno con material granular B-400 para
	contenciones.
19-079	Inicia la actividad de relleno con material granul
	B-600 para la zona de juegos
	Jueves 09/02/2021
	Clima: Mañana: Soleado. Tarde: Soleado
	Personal del contratista: 1 residente, 1 inspector y
	apoyo sst
	Personal de interventoria: 1 residente, y 2 inspecto
	Actividades en ejecucion:
19-475	Continua la instalacion de bordillos A-80 y exc
	Vacion manual para bordillo zarpa.
19-368	Inicia la tala de raiz arbol existente para inst
	lacion de adoquin en arcilla.
19-316	Inicia excavacion para filtro frances, continua
	relleno para contenciones, inicia relleno con materi
	granular B-600 (Base) para zona de juegos
19-079	Continua relleno con material granular Base B-6
	Viernes 05/02/2021.
	Clima: Mañana: Soleado. Tarde: Soleado
	Personal del contratista: 1 residente, 1 inspector y
	1 apoyo sst.
	Personal de interventoria: 1 residente y 2 inspectores
	Actividades en ejecucion:
19-475	Inicia Figurado y amarre de acero para Bordillo
	Zarpa, continua relleno en material granular
	base B-600
19-368	No se evidencian actividades en ejecucion, se l

	Solicita al contratista Consorcio Oporto implementar plan de contingencia y dar celeridad a la ejecucion de actividades de obra: Instalacion de juegos infantiles, piso en caucho, Bancas M-31, e instalacion de adoquin en arcilla.
19-079	Continua relleno con material granular B-400 y excavacion manual para instalacion de bordillo A-80.
	Sabado 6/02/2021
	clima: Mañana, Soleado; Tarde: Soleado.
	Personal del contratista: 1 residente, 1 inspector y 1 apoyo sst.
	Personal de interventoria: 1 residente y 2 inspectores.
	Actividades en ejecucion:
19-475	Inicia vaciado de concreto para zarpa.
19-368	No se evidencian actividades en ejecucion, se le solicita al contratista dar inicio y celeridad a actividades de obra: Instalacion de juegos infantiles, piso caucho, Bancas M-31, adoquin en arcilla.
19-316	Continua relleno con material granular B-600.
	Lunes 08/02/2021.
	Clima: Mañana: Soleado; Tarde: Soleado
	Personal del contratista: 1 residente, 1 inspector y 1 apoyo sst.
	Personal de interventoria: 1 residente y 2 inspectoras
	Actividades en ejecucion:
19-475	Continua figurado y amarre de acero para bordillo zarpa.
19-368	No se evidencian actividades en ejecucion.
19-316	Continua relleno con material granular B-400 para contenciones.
19-079	Continua instalacion de bordillo A-80.

	Martes 09/02/2021
	Clima: Mañana: Soleado. Tarde: Soleado
	Personal de interventoria: 1 residente y 2 inspectore
	Personal del contratista: 1 residente, 1 inspector y
	1 apoyo sst.
	Actividades en ejecucion:
19-415	Continua figurado y amarre de acero para bordillo
	zarpa
19-368	No se evidencian actividades en ejecucion.
19-316	Continua relleno con material granular B400
19-079	Continua Instalacion de bordillo A-80.
	Miercoles 10/02/2021.
	Clima: Mañana: Soleado. Tarde: Soleada
	Personal del contratista: 1 residente, 1 inspector y
	1 apoyo sst.
	Personal de interventoria: 1 residente y 2 inspect
	Actividades en ejecucion:
19-475	Inicia vaciado de concreto 3000 psi para zarpa
19-368	No se evidencian actividades en ejecucion.
19-316	Continua relleno con material granular B400
19-079	Continua instalacion de bordillo A-80.
	Jueves 11/02/2021.
	clima: Mañana: Soleado. Tarde: Soleada
	Personal del contratista: 1 residente, 1 inspector y
	1 apoyo sst.
	Personal de interventoria: 1 residente, 2 inspector
	y 1 sst.
19-476.	Profesional Ambiental y sst de interventoria: Se realiza reco
	diano de obre, donde se evidencia la persistencia de la
	vacion frente al acopio de material en la respectiva s
	lizacion y cubrimiento del mismo, así mismo se eviden

material acopiado en lonas en zona de tránsito peatonal, razón por la cual el contratista deberá realizar el ingreso del mismo, ya que esa zona no es la indicada para almacenamiento del mismo.
Así mismo se recuerda al contratista que las zonas verdes que no cuenten con protección de material para acopio estas zonas no serán reconocidas económicamente y deberán ser asumidas por el mismo.
Diana Calorales y [illegible].

9-316. Profesional Ambiental de interventoria y SST: Se realiza recorrido diario de obra, donde se evidencia personal de obra con su respectiva dotación y uso de elementos de protección personal, se evidencia señalización de acopio de material pétreo, se evidencia el área de alquiler para lavado de manos y la unidad sanitaria. Diana Calorales y [illegible].

19-975 Inicia excavacion manual para muro bordillo zarpa
Personal operativo: 1 oficial y 1 ayudante.

19-368 No se evidencian actividades en ejecucion. Se le solicita al contratista dar celeridad a la ejecucion de actividades de obra: Instalacion de juegos infantiles, piso en caucho, desmonte, señales viales, adoquin en arcilla, lanzar M-90 entre otros

19-316 Continua relleno con material granular B-400 para contenciones.

19-079 Continua la instalacion de bordillo A-80.
Se le solicita al contratista respetar las dimensiones de los modulos complementarios a la baranda M-80A descritas en las especificaciones tecnicas del IDRD.

Viernes 12/02/2021
Clima: Mañana: Soleado, Tarde. Soleado.

Personal del contratista: 1 residente, 1 inspector y 1 apoyo sst.
Personal de interventoria: 1 residente y 2 inspectores
Actividades en ejecucion.

19-475 continua excavacion manual (Perfilacion) para bordillo zarpa.

19-368 No se evidencian actividades en ejecucion.

19-316 continua relleno con material granular B 400 para contenciones, excavacion para Filtro Franco.

19-079 Continua instalacion de bordillo A-80.

LUNES 15/02/2021
CLIMA: SOLEADO.
PERSONAL OBRA: 1 oficial 2 AYUDANTES.

19-316. ACTIVIDADES EN EJECUCION

(1) CONTINUA ACTIVIDAD DE BORDILLO A-80
SE INFORMA AL CONSORCIO OPERATIVO DEBE RESPETAR MODULACION DE DADOS BARANDA A-80
SE OBSERVAN MODULACIONES PARA DADOS QUE SUPERAN LOS 0.20 cm. SE SOLICITA CORRECCION DISTANCIAMIENTO DE DADOS BARANDA A-80.

(2) CONTINUA MATERIAL GRANULAR B-400 COMPACTADO PARA ESTRUCTURA CONTENCION SUELO REFORZADO SIN TALUD. SE SOLICITA AL CONSORCIO OPORTO HACER EL RETIRO DEL MATERIAL Y REMPLAZARLO CON EL REQUERIDO EN ESPECIFICACIONES TECNICAS
NOTA: SE SOLICITA AUMENTO DE PERSONAL OBRA ASI
1 CUADRILLA PARA CONTENCION (TALUD) Y EJECUCION FILTRO FRANCO LONGITUDINAL (TALUD).
1 CUADRILLA PARA EJECUCION - PLAZOLETA ACCESO EN ADOQUIN.
1 CUADRILLA PARA EJECUCION DE PLACA CONTRAPISO ESPESOR 0.10 cm.

19.079 Se observa el espacio de intervención sin personal de obra. Se solicita plan de contingencia en las siguientes actividades así:

1. Placa contrapiso 3000 psi e = 0.10 cm.
2. Mobiliario urbano. (Luminarias, bancas, biosaludables. Srp, escalinata y 6 toldos).

Martes 16/02/2021

Clima: Nublado

Personal obra: 1 Oficial 4 Ayudantes

Actividades en ejecución.

19.316 Continua actividad relleno. Material granular B 400 para contención (suelo reforzado).

Se solicita al contratista ejecutar filtro franceses perimetral.

Se solicita al consorcio oporto solución y viabilidad. Técnica y presupuestal acceso a plazoleta 4 toldos.

19.475 Continua formaleta bordillo zarpa. H = 0.80 cm.

Continua actividad base 600. Se hace toma. Densidades la estructura cumple con porcentaje 100.4%.

Nota: Se solicita implementar un plan de contingencia para las actividades para concreto 3000psi para ave 19316. y 19.475.

Fernando Aguirre
Residente interventor

Miércoles 17/02/2021

Clima soleado

Personal obra: 1 oficial 4 ayudantes.

Actividades en ejecución.

19.316	* SE HACE INSTALACIÓN MALLA ELECTROSOLDADA 5 mm. * SE HACE FUNDIDA DE LOSA CONCRETO 3000 PSI PLAZOLETA JUEGOS INFANTILES. SE TOMA PRUEBA DE ASENTAMIENTO Y MUESTRAS DE CONCRETO INSTALADO.
19.475	* SE EVIDENCIA PERSONAL OBRA, SE SOLICITA EJECUTAR ACTIVIDAD DE BORDILLO X ARDA 3000 PSI FERNANDO AG... RESIDENTE INTER...
	JUEVES 18/02/2021 CLIMA: NUBLADO SOLEADO. PERSONAL OBRA: 1 Oficial 6 Ayudantes.
19.316	CONTINUA ACTIVIDAD. DE SUB BASE GDO, SE INFORMA AL CONTRATISTA OPORTO QUE SE DEBE EJECUTAR EL FILTRO FRANCES PARA EVACUAR AGUAS DE ESCORRENTIA. LA ACTIVIDAD CONTINUA Y EL MATERIAL VUCIVE Y SE COLMATA, SE SOLICITA RETIRO MATERIAL GRANULAR COLMATADO
19-475	SE HACE INSTALACIÓN MALLA ELECTROSOLDADA 5 mm. SE HACE FUNDIDA DE LOSA CONCRETO 3000 PSI PLAZOLETA JUEGOS INFANTILES. SE TOMA PRUEBA DE ASENTAMIENTO. Y MUESTRAS CONCRETO INSTALA...
19-079.	* CONTINUA INSTALACION BORDILLO 14-80.. * PLAZOLETA BIO-SALUDABLES Y SENDERO ACCESO. FERNANDO AGUILERA RESIDENTE INTER...

Viernes 19-02-2021
Clima: Mañana Soleado; Tarde Lluvioso
Personal de contratista: 1 director de obra, 1 residentes, 1 inspector
Personal de interventoria: 1 residente de Obra, 2 inspectores, 1 inspector sst
ACTIVIDADES DE OBRA

19-079 = Se continua con la instalación del bordillo por parte del contratista en el sendero peatonal; Se retira el material de escombro acopiado
19-475 = El contratista ejecuta actividades de corte de dilataciones de placa y fundida de primera parte de bordillo zarpa a la altura de 1,20 m
19-376 = Se inicia por parte del contratista con la instalación de la baranda M-BQA; Se continua con la excavación para la conformación del filtro frances

tales como: piso en caucho, barandas y señalizacion las cuales presentan atrazos mayor a 30 dias.

Sabado 30/01/2021
clima: Soleado

Personal del contratista: 1 Inspector de obra, 1 apoyo sst
Personal de interventoria: 1 residente de Interventoria, 2 trabajadores
Personal operativo: no se evidencia personal en obra, ni ejecucion de actividades de obra, se le solicita al contratista de obra aumentar cuadrillas de obra para adelantar actividades de obra.

Lunes 01/02/2021
clima: Mañana: Soleado; Tarde: Soleado.
Personal del contratista: 1 inspector y 1 apoyo sst.
Personal de interventoria. 2 inspectores
Actividades en ejecucion: No se evidencian Actividades en ejecucion

Martes 02/02/2021
Clima: Mañana: Soleado. Tarde: Soleado
Personal del contratista: 1 residente, 1 inspector y 1 apoyo sst
Personal de interventoria: 1 inspector
Actividades en ejecucion: No se evidencian actividades en ejecucion

Miercoles 03/02/2021
Clima: Mañana: Soleado. Tarde: Soleado
Personal del contratista: 1 inspector y 1 apoyo sst.
Personal de interventoria: 1 residente y 2 inspectores
Actividades en ejecucion: No se evidencian actividades en ejecucion

1097

Jueves 04/02/2021
Clima: Mañana. Soleado. Tarde. Soleado
Personal del contratista: 1 inspector y 1 apoyo ss
Personal de interventoria: 1 residente y 2 inspecto
Actividades en ejecucion: No se evidencian activida
en ejecucion.

Viernes 05/02/2021
Clima: Mañana: Soleado. Tarde: Soleada
Personal del contratista: 1 residente, 1 inspector y 1
apoyo sst.
Personal de interventoria: 1 residente y 2 inspectores
Actividades en ejecucion: Se evidencia la instalacio
de parales 2" para baranda Π-80 y baranda
para la baranda Π-80.

Sabado 06/02/2021
Clima: Mañana. Soleado. Tarde: Soleado
Personal del contratista: 1 residente, 1 inspector
1 apoyo sst.
Personal de interventoria: 1 residente y 2 inspecto
Actividades en ejecucion: Continua la instalac
de baranda ϕ=3" para baranda Π-80 y con
la instalacion de modulos complementarios
baranda Π-80
La interventoria en recorrido de obra reviso
verifico que la verticalidad y alineamiento de
parale ϕ=2" no cumplen con lo exigido en la
especificaciones tecnicas del IDRD, se le solici
al contratista realizar su respectiva correc
antes de inicial con la soldadura de los mism

Lunes 08/02/2021
Clima: Mañana: Soleado. Tarde: Soleado
Personal del contratista: 1 residente, 1 inspector y 1 apoyo SST.
Personal de interventoria: 1 residente y 2 inspectores.
Actividades en ejecucion: Continua la instalacion de modulos complementarios para baranda M-80 y tuberia $\phi = 3"$

Martes 09/02/2021
Clima: Mañana: Soleado. Tarde: Soleado
Personal del contratista: 1 residente, 1 inspector y 1 apoyo SST.
Personal de interventoria: 1 residente y 2 inspectores
Actividades en ejecucion: No se evidencian actividades en ejecucion.

Miercoles 10/02/2021
Clima: Mañana: Soleado. Tarde: Soleado
Personal del contratista: 1 residente, 1 inspector y 1 apoyo SST.
Personal de interventoria: 1 residente y 2 inspectores
Actividades en ejecucion: No se evidencian actividades en ejecucion.

Jueves 11/02/2021
Clima: Mañana: Soleado. Tarde: Soleado
Personal del contratista: 1 residente, 1 inspector y 1 apoyo SST.
Personal de interventoria: 1 residente, 2 inspectores y 1 SST.
Actividades en ejecucion: No se evidencian actividades en ejecucion se le solicita al contratista dar celeridad a la ejecucion de actividades de obra.

instalacion de juegos infantiles, piso caucho, sello
en sikaflex, pintura sportmaster, entre otro

Viernes 12/02/2021
Clima: Mañana: Soleado; Tarde: Soleado
Personal del contratista: 1 residente, 1 inspector
1 apoyo sst.
Personal de interventoria. 1 residente y 2 inspect
Actividades en ejecucion: No se evidencian activ
en ejecucion.

Sabado 13/02/2021
Clima: Mañana: Soleado; Tarde: Soleado.
Personal del contratista: 1 residente, 1 inspector y
1 apoyo sst.
Personal de interventoria: 1 residente y 2 inspect
Actividades en ejecucion:
Se realiza demolicion y excavacion manual para
dados juegos infantiles.
Personal de obra: 3 oficiales.

Lunes 15/02/2021
Clima: Mañana: Soleado; Tarde: Nublado
Personal del contratista: 1 residente, 2 inspectores
1 apoyo sst.
Personal de interventoria: 1 residente y 2 inspect
Actividades en ejecucion: No se evidencian
actividades en ejecucion. Se le solicita al re
hasta dar celeridad a la ejecucion de act
dades de obra: Instalacion piso caucho, jueg
infantiles, Señales civicas, entre otras.

Martes 16/02/2021
Clima: Mañana: lluvioso; Tarde: Nublado

Personal del contratista: 1 residente, 2 inspectores y 1 apoyo sst.
Personal de interventoria: 1 residente, 1 sst y 2 inspectores.
Actividades en ejecucion:
Inicia Fundida de dados en concreto 3000 psi para juegos infantiles reportados
Personal operativo: 2 oficiales y 3 ayudantes.

Miercoles 17/02/2021
Clima: Mañana: Nublado. Tarde. Nublado.
Personal del contratista: 1 residente, 2 inspectores y 1 apoyo sst.
Personal de interventoria: 1 residente y 2 inspectores
Actividades en ejecucion.
Continua Fundida de dados en concreto 3000 psi para juegos infantiles reportados
Personal operativo: 2 oficiales y 3 ayudantes.

Jueves 18/02/2021
Clima: Mañana: Nublado. Tarde: Nublado.
Personal del contratista: 1 residente, 2 inspectores y 1 apoyo sst.
Personal de interventoria: 2 inspectores.
Actividades en ejecucion:
Inicia la instalacion de piso en caucho
Personal operativo: 1 opicial y 2 ayudantes.

Viernes 19/02/2021
Clima: Mañana: Nublado. Tarde:
Personal del contratista: 1 residente, 2 inspectores y 1 apoyo sst.
Personal de interventoria. 1 Residente, 1 sst y 2 inspectores.
Actividades en ejecucion.

Actividades en ejecucion:
No se evidencian actividades en ejecucion

Sabado 30/01/2021
Clima: Mañana. Despejado; Tarde: Despejado.
Personal del contratista: 1 residente, 1 inspector y 1 apoyo sst.
Personal delnterventoria: 1 residente y 2 inspectores.
Actividades en ejecuaon:
No se evidencian actividades en ejecucion

Lunes 01/02/2021
Clima: Mañana, Despejado; Tarde: Despejado.
Personal del contratista: 1 residente, 1 inspector y 1 apoyo sst.
Personal de interventoria: 1 residente y 2 inspectores.
Actividades en ejecucion:
No se evidencian actividades en ejecucion.

Martes 02/02/2021
Clima: Mañana: Despejado; Tarde: Despejado.
Personal del contratista: 1 residente, 1 inspector y 1 apoyo sst.
Personal de interventoria: 1 residente y 2 inspectores
Actividades en ejecucion:
No se evidencian actividades en ejecucion.

Miercoles 03/03/2021
Clima: Mañana: Despejado; Tarde: Despejado
Personal del contratista: 1 residente, 1 inspector y 1 apoyo sst.
Personal de interventoria: 1 residente y 2 inspectores.
Actividades en ejecucion:
19-03 Inicia excavacion manual (Zona de juegos).

// // // //

Norma

Jueves 04/02/2021
Clima: Mañana: Despejado, Tarde: Despejado.
Personal del contratista: 1 residente, 1 inspector y 1 apoyo sst.
Personal de Interventoria: 1 residente y 2 inspectores.
Actividades en ejecucion:
19-031 Continua la excavacion mecanica de material granular.

Viernes 05/02/2021
Clima: Mañana: Despejado, Tarde: Despejado.
Personal del contratista: 1 residente, 1 inspector y 1 apoyo sst.
Personal de interventoria: 1 residente y 2 inspectores
Actividades en ejecucion:
9-031 continua excavacion mecanica de material granular

Sabado 06/02/2021
Clima: Mañana: Despejado, Tarde: Despejado.
Personal del contratista: 1 residente, 1 inspertor y 1 apoyo sst.
Personal de intervencion. 1 residente y 2 inspectores
Actividades en ejecucion:
-031 Inicia la instalacion de geotextil TX100 y estabilizacion en cemento (suelo cemento) al 9%.

Lunes 08/02/2021
Clima: Mañana: Despejado, Tarde: Despejado.
Personal del contratista: 1 residente, 1 inspector y 1 apoyo sst.
Personal de interventoria: 1 residente y 2 inspectores.
Actividades en ejecucion.
031 continua relleno con material estabilizado (suelo cemento) al 9%.
060 Inicia demolicion de carpeta asfaltica, desmonte de marcos microfutbol y baloncesto.

Norma

Martes 09/02/2021
Clima: Mañana: Despejado. Tarde: Despejado.
Personal del contratista: 1 residente, 1 inspector y 1 apoyo sst.
Personal de interventoria: 1 residente y 2 inspectores.
Actividades en ejecucion:
31 continua relleno con material estabilizado (suelo cemento) al 4%
60 inicia excavacion mecanica de material granular existente y demolicion de cuneta existente.

Martes 09/02/2021
Clima: Mañana: Despejado, Tarde: Despejado.
Personal del contratista: 1 residente, 1 inspector y 1 apoyo sst.
Personal de interventoria: 1 residente y 2 inspectores.
Actividades en ejecucion.
31 No se evidencian actividades en ejecucion.
30 Continua excavacion mecanica de material granular existente.

Miercoles 10/02/2021
Clima: Mañana: Despejado, Tarde: Despejado.
Personal de/contratista: 1 residente, 1 inspector y 1 apoyo sst.
Personal de interventoria: 1 residente y 2 inspectores.
Actividades en ejecucion:
No se evidencian actividades en ejecucion.
) Continua excavacion mecanica.

Jueves 11/02/2021.
Clima: Mañana: Despejado, Tarde: Despejado.
Personal del contratista: 1 residente, 1 inspector y 1 apoyo sst.
Personal de interventoria: 1 residente, 2 inspectores y 1 Sst.

Norma

	Actividades en ejecucion:
19-031	Se realiza imprimacion de rotura rapida.
19-060	Continua excavacion mecanica.
19-028	Inicia desmonte de juegos existentes.
	Viernes 12/02/2021
	Clima: Mañana: Despejado. Tarde: Despejado
	Personal del contratista: 1 residente, 1 inspector y 1 apoyo sst.
	Personal de interventoria: 1 residente, 2 inspectores y 1 sst.
	Actividades en ejecucion
19-031	No se evidencian actividades en ejecucion
19-060	Continuan excavaciones mecanicas
19-028	Inicia demolicion de carpeta asfaltica e=10cm
	Sabado 13/02/2021.
	Clima: Mañana: Despejado. Tarde: Despejado.
	Personal del contratista: 1 residente, 1 inspector y 1 apoyo sst.
	Personal de interventoria: 1 residente, y 2 inspectores
	Actividades en ejecucion:
19-031	No se evidencian actividades en ejecucion
19-060	Continua excavaciones mecanicas.
19-028	Continua demolicion de Carpeta asfaltica e=10cm
	Lunes 15/02/2021.
	Clima: Mañana: Despejado. Tarde: Despejado.
	Personal del contratista: 1 residente, 1 inspector y 1. apoyo sst.
	Personal de interventoria: 1 residente y 2 inspectores
	Actividades en ejecucion:
19-031	Fundida e instalacion de malla electrosoldada 15x15cm
	para placa contrapiso 3000psi
19-060	Continuan excavaciones mecanicas.
19-028	Inicia excavacion mecanica en zona de juegos

Norma

Martes 16/02/2021
Clima: Mañana: Despejado. Tarde: Despejado
Personal del contratista: 1 residente, 1 inspector y 1 apoyo sst.
Personal de interventoria: 1 residente y 2 inspectores.
Actividades en ejecucion:
Inician los cortes con pulidora e= 2cm
Continua excavaciones mecanicas.
Continua excavacion mecanica en zona de juegos
Inicia desmonte de juegos y demolicion de placa en concreto.

Miercoles 17/02/2021
Clima: Mañana: Despejado. Tarde: Despejado.
Personal del contratista: 1 residente, 1 inspector y 1 apoyo sst.
Personal de interventoria: 1 residente y 2 inspectores.
Actividades en ejecucion:
No se evidencian actividades en ejecucion
Inicia instalacion de piedra rajon dimensiones Min. 0.15 m y Max 0.30m y desmonte de juegos infantiles M3. existente.
Continua excavaciones mecanicas
Continua demolicion de placa en concreto existente.

Jueves 18/02/2021
Clima: Mañana: Despejado. Tarde: Despejado.
Personal del contratista: 1 residente, 1 inspector y 1 apoyo sst.
Personal de interventoria: 1 residente y 2 inspectores.
Actividades en ejecucion:
No se evidencian actividades en ejecucion.
Continua instalacion de piedra rajon y tendido de material granular B200 (sello).
No se evidencian actividades en ejecucion.
No se evidencian actividades en ejecucion.

Norma

Viernes 19/02/2021
Clima: Mañana: Despejado; Tarde: Despejado
Personal del contratista. 1 residente, 1 inspector, 1 apoyo sst.
Personal de interventoria: 1 residente y 2 inspectores
Actividades en ejecucion.

19-031	No se evidencian actividades en ejecucion
19-060	continua instalacion de piedra rajon y tendido de material granular B200 (Sello).
19-028	No se evidencian actividades en ejecucion
19-014	No se evidencian actividades en ejecucion.

Norma

Actividades en ejecución:

19-394: Se continua con la extendido de la Sub base granular y compactacion sobre las areas de la implantación dispuesta.

19-144: Se Continua con actividades de instalación de bordillo A-80 para la conformación de la estructura

19-393: El dia lunes Se tomaron densidades a nivel de base granular donde arrojaron resultados de 110,1% y 106,4% dando aval para fundir losa de concreto para el jueves 04-02-2021
El dia 03-02-2021 Se realizo la aplicacion de emulsión sobre el area a fundir.

19-401: Se finalizan actividades de estabilización de suelo Cemento en Segunda Capa dando paso a los densidades y excavación para la instalación de bordillo A-80

19-016: Se inicio con la extendida de geotextil para iniciar a aplicar capa de base granular

19-484: El dia lunes 07-02-2021 Se realiza fundido de concreto de 3000 psi con malla electrosoldada en area de bio Soluddles
El dia martes Se ejecutan actividades de corte de placa para sello de juntas e instalacion de adoquin en Sendero peatonal

Jueves 04/02/2021
Clima: Mañana: Soleado; Tarde: Soleado.
Personal del contratista: 1 residente, 1 inspector y 1 apoyo sst.
Personal de interventoria: 1 residente y 2 inspectores.
Actividades en ejecucion:

9-394 Continua relleno con material granular B400 en las zonas de juegos y sendero peatonal.
-144 Continua instalacion de bordillo A-80
-393 Se realiza fundida concreto 3000psi para zona de juegos e:10cm.

1100

19-901	Se realiza toma de densidades por parte de la interventoria, cumpliendo con lo exigido en las especificaciones tecnicas
19-016	Continua relleno con material granular B600 para zona de juegos.
19-984	No se reportan actividades en ejecucion
	Viernes 05/02/2021.
	Clima: Mañana Soleado. Tarde: Soleado
	Personal del contratista: 1 residente, 1 inspector y 1 apoyo sst.
	Personal de interventoria: 1 residente, y 2 inspectores
	Actividades en ejecucion:
19-394	continua relleno con material granular B400 e instalacion de bordillo A-80 para la zona de juegos.
19-144	Inicia relleno con material (vaqyy) granular B-600 e instalacion de bordillo A-80.
19-393	Se realizan dilataciones a placa de concreto con un espesor e=2cm
19-901	No se evidencian actividades en ejecucion.
19-016	Continua relleno con material granular B-600 e instalacion de bordillo A-80.
19-984	No se reportan actividades en ejecucion.
	Sabado 06/02/2021.
	Clima: Mañana: Soleado: Tarde: Soleado.
	Personal del contratista: 1 residente, 1 inspector y 1 apoyo sst.
	Personal de interventoria: 1 residente y 2 inspectores.
	Actividades en ejecucion:
19-394	Continua relleno con material granular B400 e instalacion de bordillo A-80
19-144	Continua relleno con material granular B600 e instalacion de bordillo A-80

19-393	No se evidencian actividades en ejecucion
19-401	No se evidencian actividades en ejecucion.
19-016	Continua relleno con material granular B600 e instalacion de bordillo A-80.
19-984	No se evidencian actividades en ejecucion.
	Lunes 08/02/2021
	Clima: Mañana. Soleado, Tarde: Soleado.
	Personal del contratista: 1 residente, 1 inspector y 1 apoyo sst.
	Personal de interventoria. 1 residente y 2 inspectores
	Actividades en ejecucion:
9-393	Continua relleno con material granular B600 para las zonas de juegos y sendero peatonal, instalacion de bordillos A-80.
-144	Continua relleno con material granular B600 e instalacion de bordillo A-80.
-393	Inicia instalacion de adoquin en arcilla para sendero peatonal.
-401	Inicia vaciado de concreto 3000psi para placa maciza (zona de juegos).
-016	Continua relleno con material granular B600 e instalacion de bordillo A-80.
-984	No se evidencian actividades en ejecucion. se le solicita al contratista dar celeridad a la ejecucion de actividades de obra: juegos infantiles, pintura sportmaster, entre otros.
	Martes 09/02/2021
	Clima: Mañana: Soleado. Tarde: Soleado.
	Personal del contratista: 1 residente, 1 inspector y 1 apoyo sst.
	Personal de interventoria: 1 residente y 2 inspectores.
	Actividades en ejecucion:

1110

19-394	Continua relleno con material granular B600 e instalacion de bordillo A-80
19-149	Continua instalacion de bordillo A-80
19-393	No se evidencian actividades en ejecucion
19-901	No se evidencian actividades en ejecucion.
19-016	Continua relleno con material granular B600 y instalacion de bordillo A-80.
19-484	No se evidencian actividades en ejecucion
	Miercoles 10/02/2021
	Clima: Mañana: Soleado. Tarde: Soleado
	Personal del contratista: 1 residente, 1 inspector y 1 apoyo sst.
	Personal de interventoria: 1 residente, y 2 inspectores
	Actividades en ejecucion:
19-394	continua relleno con material granular B600 e instalacion de bordillo A-80.
19-149	continua instalacion de bordillo A-80
19-393	No se evidencian actividades en ejecucion.
19-901	Inician dilataciones al concreto con pulidora e=2cm y demolicion de cuneta existente.
19-016	Continua relleno con material granular B600 e instalacion de bordillo A-80
19-989	No se evidencian actividades en ejecucion.
	Jueves 11/02/2021
	Clima: Mañana: Soleado. Tarde: Tarde.
	Personal del contratista: 1 residente, 1 inspector y 1 apoyo est.
	Personal de interventoria: 1 residente y 2 inspectoras
	Actividades en ejecucion:
19-394	Continua relleno con material granular e instalacion de bordillo A-80. Se le solicita al contratista realizar bordillo Zarpa para contencion

perimetral donde las alturas sean mayores o iguales a 70 cm de altura, dilatando cada 2m, tambien se le solicita combiar o realizar traslapos al geotextil T2100 ya que no cumple la especificaciones tecnicas.

19-144 Inicia el suministro y aplicacion de mulsion asfaltica de rompimiento rapido.

19-393 No se evidencian actividades en ejecucion se le recomienda al contratista iniciar actividades de obra: Instalacion de juegos, pintura sportmaster, entre otras.

19-901 Continua la demolicion de cuneta existente.

19-016 Continua relleno con material granular B-600 e instalacion de bordillo A-30.

19-984 No se evidencian actividades en ejecucion. se le solicita al contratista dar celeridad a la ejecucion de actividades de obra: Instalacion de juegos infantiles pintura sportmaster, entre otra. La interventoria le solicita al contratista hacer la entrega de los resultado a compresion de cilindros de concreto de los siguientes parques:

1) Parque 19-984, edad a 7 dias se cumplio el 08/02/2021.

2) Parque 19-393, edad a 7 dias se cumplio el 11/02/2021.

Viernes 12/02/2021

Clima: Mañana: Soleado. Tarde: Soleada

Personal del contratista: 1 residente, 1 inspector y 1 apoyo sst.

Personal de interventoria: 1 residente y, 2 inspectores.

Actividades en ejecucion: No se evidenciaron actividades en ejecucion.

1112

Martes 16/02/2021
Clima: Mañana Nuvioso, Tarde Soleado
Personal de contratista: 1 residente apoyo:
Personal interventoría: 1 residente y 2 Inspectores
ACTIVIDADES EN EJECUCIÓN:

19-394 ⇒ Se continua con la instalación de bordillo A-80 en la zona del sendero peatonal y las areas de bio saludables

19-316: Se realiza toma de densidades en este parque por parte del contratista a nivel de base granular donde dieron resultados de 100.7 y 102,5 donde se aprueba la estructura para aplicar emulsión y fundir concreto de 3000 psi

FERNANDO HO

MIÉRCOLES 16/02/2021.
CLIMA: NUBLADO.
PERSONAL DIDRH: 1 OFICIAL 3 AYUDANTES 1 OPERADOR BOT CAT.

19.394
- CONTINUA COMPACTACIÓN BASE - 600, SE HACE TOMA DE DENSIDADES POR PARTE CONCRETELAB LOS AFIRMADOS DEBEN SER RECOMPACTADOS POR CONSORCIO OPORTO, SE SOLICITA TOMA DE DENSIDADES PARA LIBERACIÓN INTERVENTORIA.
- SE HACE EXCAVACIÓN MANUAL PARA EJECUCIÓN BORDILLO ZARPA 0.80.
- CONTINUA INSTALACIÓN BORDILLO A-80

19-144 INICIA LA INSTALACION DE MALLA ELECTROSOLDADA DE 15X15cm cal. 5mm Y VACIADO DE CONCRETO 3000 PSI PARA PLACA CONTRA PISO ZONA DE JUEGOS.

19-393 NO SE EVIDENCIAN ACTIVIDADES EN EJECUCION,

Se le solicita al contratista dar celeridad a la ejecucion de actividades de obra. Pintura sportmaster, juegos infantiles, entre otros.

19-901 continua demolicion y excavacion para cuneta desague de aguas lluvias de la zona de juegos infantiles.
Personal operativo: 1 oficial y 1 ayudante.
Se le solicita al contratista iniciar con actividades de obra: instalacion de juegos infantiles.

19-016 la interventoria realiza toma de densidades a material granular B-600 cumpliendo con lo exigido en la norma INVE-169-2013, Resultados.
1) zona de juegos 100,7%, 2) Sendero peatonal 96,8%.
la interventoria libera material granular y solicita al contratista realizar la imprimacion con emulsion asfaltica de rompimiento rapido, malla refuerzo y concreto 200psi.
Se evidencia que el contratista esta ejecutando actividades de instalacion de bordillo A-80.
Personal operativo: 1 oficial y 2 ayudantes.

9-989. No se evidencian actividades en ejecucion. se le solicita al contratista dar celeridad a la ejecucion de actividades de obra: Excavacion manual para cimentacion de juegos infantiles (Dados en concreto 3000psi), Pintura Sportmaster, anclajes para juegos infantiles, juegos infantiles, sello junta dilatacion en sikaflexx, entre otros.
Se le solicita al contratista CONSORCIO OPORTO implementar plan de contigencia ya que se evidencian actividades en atraso en los parques de tercera etapa.

1111

19-016 16-02-21	Profesional Ambiental y sst de interventoría: Se realiza recor de obra donde se evidencia el personal de obra con los mentos de protección personal y dotación, así como se dencia la instalación de señalización y de lavamanos tátil. Así mismo se evidencia la implementación del miento de los acopios temporales de material pét como pre fabricado, se evidencia el buen estado del miento perimetral. Diana Morales V
19-394 16-02-21	Profesional Ambiental y sst de interventoría: Se realiza recor diario de obra donde se evidencia la implementación por te de la interventoría la señalización en vías, retiro de re de construcción y demolición a través de minicargador, así la instalación de polietileno de cubrimiento de acopios, s ventea actividad de retiro de minicargador, como lim de la zona de descargo. El personal se evidencia con uso de los elementos de tección personal como dotación, así como instalac de lavamanos portátil y caneca rectilizada como pu de desecho de residuos ordinarios., razón por la c se evidencia subsanación de observaciones. Diana Morales V
19-401 16-02-21	Profesional Ambiental y sst de interventoría: Se realiza recor de obra donde no se encuentra personal, sin embargo se evi os puntos de acopio de prefabricado y residuos con su re pectiva señalización, demarcación y cubrimiento del mu con polietileno. Diana Morales V
19-393 16-02-21	Profesional Ambiental y sst de interventoría: Se realizar corrido de obra donde se evidencia retiro de material de residuos de construcción y demolición, así como el buen est do del cerramiento perimetral, sin embargo se debera manto

miento del trocha, así mismo se recomienta al contratista realizar limpieza de la zona verde para realizar la recuperación de la zona. No se evidencia personal de obra. Diana C Morales V.

Miercoles 17/02/2021.
Clima: Mañana: Nublado. Tarde: Despejado.
Personal del contratista: 1 residente, 2 inspectores y 1 apoyo sst.
Personal de interventoria: 1 residente y 2 inspectores.
Actividades en ejecucion:

19-394 · Continua instalacion de bordillo A-80
· Continua excavacion manual para bordillo zarpa 0.80.
· Continua Compactacion de material granular B-600

9-144 No se evidencian actividades en ejecucion.

9-393 No se evidencian actividades en ejecucion.

9-401 Continua excavacion manual para cuneta.
Personal de obra: 1 oficial y 1 ayudante.

9-016 Continua instalacion de bordillo A-80
Personal de obra: 1 oficial y 2 ayudantes.

9-484 Inicia cimentacion (Edades concreto 3000 psi) para juegos infantiles.
Personal de obra: 1 oficial y 2 ayudantes.

Jueves 18/02/2021
Clima: Mañana: nublado, Tarde: Despejado
Personal del contratista: 1 residente, 2 inspectores y 1 apoyo sst.
Personal de interventoria: 2 inspectores
Actividades en ejecucion:

9-394 · Continua compactacion de material granular B600
· Continua excavacion manual para bordillo zarpa 0.80m
Personal de obra: 1 oficial, 3 ayudantes y 1 operario.

19-194	Inicia instalacion de paral ϕ=2" complemento de baranda M-80 Personal de obra. 1 oficial y 2 ayudantes
19-393	No se evidencian actividades en ejecucion.
19-401	Continua excavacion manual para la instalacion de cuneta. Personal de obra: 1 oficial y 1 ayudante.
19-016	Inicia instalacion de malla electrosoldada de 15x15 cm cal. 5mm y Fundida de placa contrapiso 3000psi para la zona de juegos Personal de obra: 2 oficiales y 3 ayudantes
19-484	Inicia instalacion de anclajes y Fundida de cimentacion para juegos biosaludables. Personal de obra: 1 oficial y 2 ayudantes.
	Viernes 19/02/2021 Clima: Mañana: Nublado; Tarde: Personal del contratista: 1 residente, 2 inspectores y 1 apoyo sst. 1 OFICIAL 3 AYUDANTES. Personal de interventoria: 1 residente, 1 sst y 2 inspectores. Actividades en ejecucion:
19-394.	INICIA ACTIVIDAD DE ANDEN EN ADOQUIN. + SELLO y BASE ARENA, SENDERO TRANSVERSAL y PLAZOLETA ACCESO ZONA INFANTIL. SE SOLICITA AL CONSORCIO APORTE INCREMENTO DE PERSONAL. PARA ACTIVIDADES DE BORDILLO ZAMPA H=0.20 cm, IMPRIMACION MATERIAL GRANULAR B.600 PLAZOLETA JUEGOS INFANTILES; INSTALACION BORDILLO A-80 INCLUYE ATRAQUES.

19-394
El contratista en horas de la tarde implemento 5 personas para la instalación de adoquin, conformación de solado para muro y figurado de acero para iniciar a fundir bordillo zarpa. la Imprimación se realizara en horas de la mañana hasta la hora de la rotonda puesto que el concreto se extendera el día 22/02/2021

19-401 = El contratista realiza la instalacion de la cañuela prefabricado como se definio en primera instancia en acompañamiento con el residente de interventoria llevando una pendiente completa a 1 agua con el 1% hasta la caja de recoleccion de aguas lluvias garantizando asi la salida de las aguas lluvias de las dos rotondas de 90 y 30cm

19-393 = El contratista realiza el replanteo de los ejes ; corte demolición y excavacion para la fundida de los dados donde ira el mobiliario sobre la implantación

19-016 = El contratista realiza los cortes de la placa fundida de las dilataciones e inicia con la instalación de los paños de adoquin de arcilla en area de Sendero peatonal

19-744 = El contratista finaliza con la instalación de los parales de la baranda de ϕ 2" M-80

19-484 = El contratista Finaliza con la instalación de los anclajes y fundida de cimentación para Juegos

Viernes 29/01/2021
Clima: Mañana: Soleado; Tarde: Soleado.
Personal del contratista: 1 inspector y 1 apoyo sst.
Personal de interventoria: 1 residente y 2 inspectores.
Actividades en ejecucion:

19-199 Se realiza imprimacion en emulsion asfaltica de rompimiento rapido.

19-150 No se evidencian actividades en ejecucion, se le solicita al contratista dar celeridad a la ejecucion de actividades de obra: Baranda M-80, Modulos complementarios, piso caucho, juegos infantiles, entre otras.

Sabado 30/01/2021
Clima: Mañana: Soleado; Tarde;
Personal del contratista: 1 inspector y 1 apoyo sst.
Personal de interventoria: 1 residente y 2 inspectores.
Actividades en ejecucion. Ninguna.

19-199 No se evidencian actividades en ejecucion.

19-150 No se evidencian actividades en ejecucion.

Lunes 01/02/2021
Clima: Mañana. Nublado. Tarde:
Personal del contratista: 1 inspector y 1 apoyo sst
Personal de interventoria: 2 Inspectores
Actividades en ejecucion.

19-199 Se realiza solado para viga de cimentacion de malla contra impacto.

19-150 Se reliza la instalacion de modulos complementarios baranda M-80.

MARTES 02/02/2021
CLIMA: MAÑANA: NUBLADO.
PERSONAL OBRA: 1 OFICIAL 2 AYUDANTES.
ACTIVIDADES EN EJECUCIÓN.

19-150 CONTINUA: INSTALACIÓN DE MODULOS COMPLEMENTARIOS. BARANDA M-80.

1119

MIERCOLES 03/02/21.
CLIMA: SOLEADO
PERSONAL OBRA: 1 OFICIAL 2 AYUDANTES.
19.150 CONTINUA INSTALACION MODULOS COMPLEMENTARIOS BARANDA. NL-80

19-149 NO SE EVIDENCIA PERSONAL DE OBRA LA INTERVENTORIA, SOLICITA AL CONTRATISTA CONSORCIO OPORTO IMPLEMENTAR UNA CONTINGENCIA DE MANERA INMEDIATA EN LA EJECUCIÓN DE LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES.

1. BADEN ASFALTICA
2. PEGADO SINTETICO (SOBRE MUSTER).
3. CERRAMIENTO CONTRA IMPACTO
4. ESTRUCTURA BALONCESTO MINICOPUTBOL, SCOOTERS PEDAL ENTRE OTROS.


CERRAMIENTO ADYACENTE INTERSECCION

NOTA: SE SOLICITA INSTALACIÓN PUERTA DE ACCESO A ZONA INFANTIL (JUEGOS) PARQUE 19.150.

JUEVES 04/02/21
CLIMA: SOLEADO.
PERSONAL OBRA: 1 TOPOGRAFO, 1 OPERADOR VIBRO COMPACTADOR, 7 AYUDANTES.
ACTIVIDADES EN EJECUCION.

19-149 INICIA ACTIVIDAD. BADENA ASFALTICA E= 0.07 BADENA 1350. SE PROCEDE POR PARTE DE INTERVENTORIA ARQ. TELVERA URBANA ITDM. A LA REVISIÓN TEMPERATURA Y REVISIÓN DE MEZCLA SUMINISTRADO SEGÚN DISEÑO MARSHALL ENTREGADO POR EL CONTRATISTA CONSORCIO OPORTO.
SE PROCEDE A LA TOMA DE BRIQUETAS. (4)
DE REVISA TEMPERATURA DE ASFALTO. ISOP.C.
UNA VEZ RECIBIDOS LOS ANDELES QUE GARANTIZAN

El espesor 0.07 cm. se procede a hacer instalación manual de rodadura 1350. Se sugiere por parte de interventoría hacer control continuo con elementos de protección (ING) automático para garantizar bombeo de aguas sub-superficiales.
Se evidencia mezcla abierta rodadura 1350 sector (A).

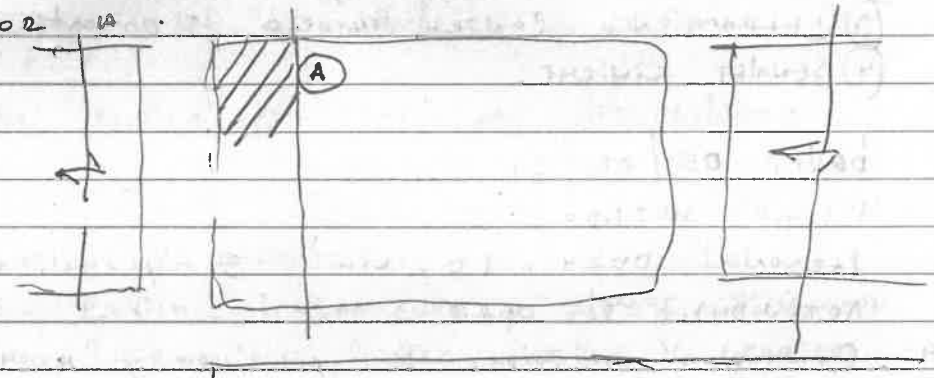

Se solicita al consorcio oporto hacer el correctivo correspondiente en este sector (A)

FERNANDO AGUILAR

Viernes 05/02/21.
Clima: soleado.
Personal obra: 1 operador vibro compactador, 7 ayudantes.
Actividades en ejecución:
19.149 Continua actividad rodadura asfáltica 1350 e: 0.07cm
La interventoría solicita el inicio actividades así:
① Cerramiento contra impacto.
② Estructura baloncesto y microfutbol.
Nota: Se evidencia anden cuneta con intervenciones en asfalto. Se solicita hacer el arreglo de estas con concreto fundido in situ.

FERNANDO AGUILAR

Sabado 06/02/21
Clima soleado.
Personal obra: 1 operador vibro compactador
7 ayudantes
Actividades en ejecución:

19-149. CONTINUA ACTIVIDAD LOSA DE CONCRETO ASFALTICA 1350. EN HORAS DE LA TARDE TERMINA ACTIVIDAD. LA INTERVENTORIA SOLICITA DAR INICIO A LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES LAS CUALES ESTAN ATRASADAS. ASI:

1. RECUBRIMIENTO SINTETICO (SPORT MASTER)
2. ESTRUCTURA BALONCESTO Y MICRO FUTBOL
3. CERRAMIENTO CONTRA IMPACTO 5.00 MTS.
4. SEÑALES CIVICAS.

OBRAS 08/02/21

CLIMA SOLEADO.

PERSONAL OBRA: 1 OFICIAL 3 AYUDANTES.

ACTIVIDADES DE OBRA

19-149 CONTINUA ACTIVIDAD DE FIGURADA Y ANCLAJES DE ACERO 60.000 PSI PARA CIMENTACIÓN CERRAMIENTO CONTRA IMPACTO (VIGA - PILOTINES) SE SOLICITA AL CONTRATISTA. CONSORCIO OPORTO EL INICIO DE ACTIVIDADES ASI:

1. RECUBRIMIENTO SINTETICO (SPORT MASTER)
2. ESTRUCTURAS BALONCESTO MICROFUTBOL
3. SEÑALIZACION. CIVICA.

LAS ACTIVIDADES MENCIONADAS PRESENTAN ATRASO SIGNIFICATIVO, ESTAS DEBEN SER EJECUTADAS DE MANERA INMEDIATA CON EL FIN DE EVITAR POSTERIORES INCUMPLIMIENTOS.

MIERCOLES 10/02/21

CLIMA: SOLEADO

PERSONAL OBRA: 1 OFICIAL 3 AYUDANTES.

ACTIVIDADES OBRA:

19-149 TERMINA ACTIVIDAD FIGURADO Y ANCLAJES ACERO 60.000 PSI PARA CIMENTACIÓN CERRAMIENTO CONTRA IMPACTO (VIGA, PILOTINES) SE SOLICITA ENTREGA DE ACERO POR PARTE DEL CONSORCIO OPORTO. PARA LIBERACIÓN DE INTERVENTORIA. Y POSTERIOR

VACIADO DE CONCRETO 3000 psi

FERNANDO AGUIRRE
RESIDENTE INTERVENTORIA

VIERNES 12-02-2021
CLIMA: SOLEADO.
PERSONAL OBRA: 1 OFICIAL 4 AYUDANTES.
ACTIVIDADES EN EJECUCION.

19-149. (1) SE REALIZA POR PARTE DE INTERVENTORIA.
LIBERACION ACERO REFUERZO 60.000 PSI PARA.
FUNDIDA DE CONCRETO. VIGA CERRAMIENTO CONTRA.
IMPACTO H: 1.00 MTS.
(2) SE REVISA TIERRAMIENTOS Y PLOMOS ENCOFRADO
VIGA CERRAMIENTO CONTRA IMPACTO SE PROCEDE.
HACER VACIADO CONCRETO 3000 PSI. VIGA CONTRA
IMPACTO 30 x 40 cm. (COSTADO OCCIDENTE) Y ORIENTE)
NOTA: SE OBSERVA CRUCE DE TUBERIA NOVAFORT.
6"Ø INTERFIRIENDO CON EJE AXIAL. PILOTAJE CERRAMIENTO.
CONTRA IMPACTO COSTADO OCCIDENTE, SE SOLICITA AL
CONSORCIO OPORTO. HACER EL DESVIO TUBERIA 6"Ø PUES
LOS MODULOS DEL CERRAMIENTO CONTRA IMPACTO. DEBEN.
QUEDAR DE LUZ LIBRE 2.50 MTS. VER ESPECIFICACIONES.
TECNICAS APROBADAS. ENTRE EJES ESTRUCTURALES.

FERNANDO AGUIRRE
RESIDENTE INTERVENTORIA

LUNES 15-02-2021.
CLIMA: MAÑANA SOLEADO TARDE: LLUVIA DE 1 PM A 3.30 PM.
PERSONAL OBRA: 1 OFIAL 5 AYUDANTES.
ACTIVIDADES EN EJECUCION:

19-149 (1) EN RECORRIDO DE OBRA SE OBSERVA EL
CONTRATISTA CONSORCIO OPORTO HACE CASO OMISO
A LA RECOMENDACIÓN DE LA INTERVENTORIA.
DE HACER EL RESPECTIVO DESVIO DE LA TUBERIA

NOVEDAD 6" ϕ QUE INTERFIERE A LA UBICACION DE CIMENTACIÓN (pilotin) VIGA CONTRA INFRACTO 80 x 40 CM COSTADO OCCIDENTAL, SE PRETENDE POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA LA UBICACIÓN DE LA CIMENTACIÓN (pilotin) SIN HACER EL DESVIO PREVIO DE LA TUBERIA EXISTENTE ENTRE CAJAS DE AGUAS NEGRAS. DEJANDO POR DEJAR UN MODULO DE 2.85 ~~MTS~~ ENTRE EJES Y OTRO MODULO DE 2.15 MTS ENTRE EJES LO CUAL NO ESTA PERMITIDO Y NO CUMPLE LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS APROBADAS, SE SOLICITA AL CONSORCIO PROCEDER HACER EL DESVIO DE LA TUBERIA 6" DIAMETRO Y CUMPLIR CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS (MEDIANTE MODULOS 2.5 APROBADAS PARA LA EJECUCIÓN DE ESTE FRENTE DE FINALMENTE SE INFORMA QUE LOS REPROCESOS DEBERAN SER HONRADOS POR EL CONSORCIO PROCE

FERNANDO AG
RESIDENTE INTE

16-02-21 19-149 Profesional Ambiental y SST de interventoria: Se realiza re diario de obra, donde se evidencia que en la zona de inter se encuentra material de residuos almacenado en bolsas, de l las se evidencian acopiados en varias zonas, y no han s retirados de la misma, así mismo, se evidencia material de duos en zona verde que no ha sido retirado y limpiado. Por lo anterior, se solicita al contratista de obra de ma inmediata el retiro, jornada de orden y aseo del proy así mismo el mantenimiento del cerramiento perim

Diana C Morales V

Nota: No se evidencia personal de obra.

16-02-21 19-150 Profesional Ambiental y SST de interventoria: Se realiza re de obra donde se evidencia personal realizando actividad d olida de datos en concreto del proveedor logistica y obstru

Se evidencia que el personal utiliza los elementos de protección personal, sin embargo se hace necesario que en el parque se realice mantenimiento de cerramiento perimetral, instalación de pendón informativo cuando haya personal, como retiro de material pre fabricado que no se utilice en el parque.
De igual forma, se evidencia el retiro de la bandeja de PMT instalada en el parque la cual deberá ser reinstalada, teniendo en cuenta que faltan actividades por ejecutar las cuales podrán ser verificadas según el PMT aprobado.
Diana C Morales H

19.149. ALEA TECNICA: EN RECORRIDO DE OBRA SE OBSERVA DESPRENDIMIENTO DE ASFALTO PROFUNDURA 1.50. CONTIENE PROBLEMAS DE EXUDACIÓN, SE SOLICITA AL CONSORCIO OPORTO INFORMAR LAS ACCIONES PERTINENTES. EN CUANTO AL TRATAMIENTO DE LAS INCONSISTENCIAS. EVIDENCIADAS: PARA HACER EL RECIBO A SATISFACCIÓN DE LA ACTIVIDAD.

FERNANDO AGUIRRE RESIDENTE INTERVENTORIA


NOTA: NO SE HA ENTREGADO PROPUESTA DE PREVIO TUBERIA 6" Ø DIAMETRO. SOLICITADAS EL DÍA 15 FEBRERO 2021.

17-feb/2021.

19.149 De acuerdo a la anotación nº1 del 15 feb/2021. informamos que el día sabado. 13 feb/2021 se Consulto en conjunto con la interventoria en campo, la posibilidad de monitorear el pilotin nº 8. de izquierda a derecha, teniendo en cuenta que a la distancia de 2.5 m exigidos por la norma entre el eje del pilotin nº 7 al nº8 se encontro tuberia Ø6" Novafort que desvia la linea de inspección localizado en el costado nor-oriente de la concha. lo que en su momento fue validado por la interventoria. Teniendo en cuenta lo anterior se verifico la distancia minima que permitia la existencia y cruce de la tuberia. instalar el pilotin nº8. quedando a una separación de 2.85mt

entre el eje del pilotin N°7 al pilotin N°8.
Sin embargo en el proceso de fundido del pilotin N°7 y pilotin N°9, la interventoria se retracta indicando el cumplimiento de la especificacion en donde se menciona una distancia de 2.5m entre ejes de los pocates de la malla contraimpacto, solicitando el desvio de la tuberia Ø6" existente y que cruza por debajo de una viga de espesor. 0.40m por un ancho de 0,4 mts.
Teniendo en cuenta las exigencias y recomendaciones entregadas por la interventoria en el momento de la fundida, se procede a la desinstalacion de la camisa de Ø4" y a la revision de desvio de tuberia Ø6" existente, evidenciando las dificultades que se registran a continuacion:

figura N°1

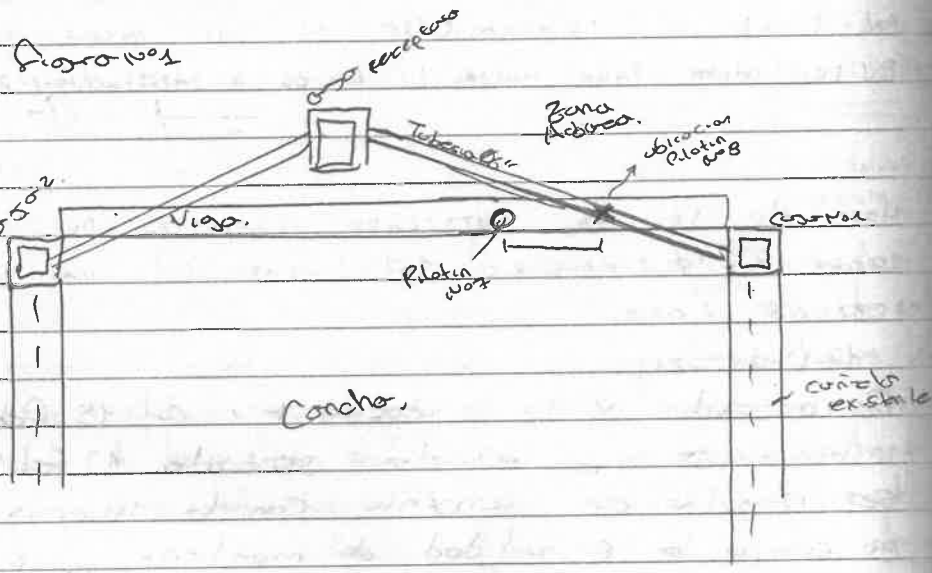

1) Se dificulta deflactar la tuberia existente Ø6" Nuevo teniendo en cuenta que se encuentra superficial y por debajo de una viga de concreto de 0.40mt x 0,40mts. Actividad que podria afectar la red y generar problemas de filtracion y socavacion del terreno.

2) No se encontro viable por el contratista desviar la red existente mediante tuberia nueva trasladandola por detras de la viga teniendo en cuenta que

en este punto se frane una zona de individuos arboreos de dimensiones de hasta 5mts de altura.

De acuerdo a lo anterior el Contratista propone Conectar la caja No 1 a la caja No 2 mediante tuberia Ø , enlubado la tuberia Ø6" existente. Teniendo en cuenta de la caja No 2 tambien conectar a la caja receptora evidenciada en la figura N°1. Dicha conexion se realizara antes de la viga con la finalidad de no afectar el tramo de viga fundida y pilotines ya instalados.

Jaison Ruiz
Residente obra.
Consorcio Oporto.

19-150 19 feb/2021.
Se realiza Visita tecnica en conjunto Interventoria, Contratista y el proveedor del Piso caucho para verificar la instalacion de la capa de EPDM sobre la zona de Juegos, la Interventoria autoriza continuar con las actividades de instalacion de Juegos y Piso caucho solicitando la garantia del Sello de los juntas de la capa de EPDM Cuando se tenga instalado el Mobiliario de Juegos infantiles la Interventoria recomienda la instalacion del Juego teniendo en cuenta que a la fecha se cuenta con el suministro de los Juegos por parte del proveedor.

Carlos Andres Ortiz

73155013

ANEXO No. 9
CONTROL Y SEGUIMIENTO A PAGO DE APORTES DE SEGURIDAD SOCIAL INTERVENTORÍA ARQUITECTURA URBANA LTDA /CONTRATISTA CONSORCIO OPORTO

CONTRATO DE INTERVENTORÍA NO.405 DE 2019

RELACIÓN DE PERSONAL DE LA INTERVENTORÍA

INTERVENTORÍA ARQUITECTURA URBANA LTDA.
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 405 DE 2019
FECHA: MARZO DEL 2021

N.	NOMBRES Y APELLIDOS	CÉDULA	CARGO	ARL	EPS	AFP	PORCENTAJE DEDICACIÓN	EXAMEN OCUPACIONAL	FECHA ÚLTIMO PAGO SEGURIDAD SOCIAL
1	Hernando Daza Berrio	18.939.069	Director de Interventoria	Positiva	Compensar	COLPENSIONES	50%	SI	23/01/2021
2	Paula Fernanda Morales Sanchez	529.592.013	Coordinadora de Interventoria	Positiva	Compensar	Porvenir	-	SI	17/01/2021
3	Fernando Aguirre Medina	7.182.768	Residente Tecnico de Interventoria	Positiva	Colpensiones	Colfondos	100%	SI	17/01/2021
4	Diana Catherine Morales Velásquez	1.026.572.178	Residente Seguridad y Salud en el Trabajo	Positiva	Famisanar	Porvenir	40%	SI	23/01/2021
5	Diana Catherine Morales Velásquez	1.026.572.178	Residente Ambiental	Positiva	Famisanar	Porvenir	30%	SI	23/01/2021
6	Liliana Celis Ruiz	52.386.191	Residente Social	Positiva	Compensar	Colfondos	50%	SI	23/01/2021
7	Juan Carlos Briceño	749.389.138	Inspector Seguridad y Salud en el Trabajo (SST)	Positiva	Salud Total	COLPENSIONES	-	SI	23/01/2021
8	Javier Antonio Millán López	79.345.746	Especialista Geotecnia	Colmena	Famisanar	Colfondos	30%	SI	20/01/2021
9	Jose Abelino Vargas Tenjo	1.057.463.178	Inspector	Positiva	Medimas	Colfondos	-	SI	17/01/2021
10	Katty Andrea Farfán Arias	1.031.146.000	Topografo Inspector - Laboratorista Inspector	Positiva	Nueva EPS	COLPENSIONES	-	SI	23/01/2021
11	Carmen Alicia Valencia Sierra	49.691.881	Secretaria	Positiva	Aliansalud	COLPENSIONES	-	SI	17/01/2021
12	Carlos Domingo Pérez	73.189.607	Contador	Colpatria	Sanitas	Protección	-	SI	17/01/2021
13	Luis Javier Rojas Jején	1.018.480.030	Especialista de transito	Sura	Sanitas	Porvenir	20%	SI	17/01/2021
14	Daniel Felipe Gomez Aldana	1.018.480.030	Inspector	Positiva	Famisanar	Porvenir	-	SI	17/01/2021

"Dentro de los procesos de licitación Pública y concursos de Méritos, tener un trato preferencial con las personas discapacitadas así. "En los procesos de licitaciones públicas y concursos de méritos, para incentivar el sistema preferencial con personas con discapacidad, la entidades estatales deberán otorgar el uno por ciento (1%) del total de los puntos establecidos en el pliego de condiciones, a los proponentes que acrediten la vinculación de trabajadores con discapacidad en su planta de personal de acuerdo con los siguientes requisitos 1. La persona natural, el representante legal, de la persona jurídica o el revisor fiscal, según corresponda, certificara el número total de trabajadores vinculados a la planta de personal del proponente o sus integrantes a la fecha de cierre del proceso de selección 2. Acreditar el número mínimo de personas con discapacidad en su planta de personal conformidad con lo señalado en el certificado expedido por el ministerio de trabajo, el cual deberá estar vigente a la fecha de cierre del proceso de selección".

La interventoría ARQUITECTURA URBANA LTDA. presenta la documentación del personal con discapacidad siendo certificado de vinculación del trabajador con discapacidad, el formato de constatación de vinculación de trabajadores en situación de discapacidad emitida por la entidad MINISTERIO DE TRABAJO, y el soporte de seguridad social del trabajador con discapacidad; del señor HERNANDO DAZA BERRIO identificado con cedula de ciudadanía No 18939069 de Agustín Codazzi

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

SOI

Banco Caja Social

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	901029778
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			AURELANA SAS
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	DEPARTAMENTO	BOGOTA - DISTRITO CAPITAL
DIRECCIÓN:	CLL 38 8 12 OFICINA 301	TELEFONO	7035370
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	C-MIPYMI MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA	Actividades de arquitectura e ingeniería y otras
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA			7778224118	TIPO DE PLANILLA:			E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	enero	AÑO 2021	PERIODO COTIZACIÓN SALUD	MES	febrero	AÑO 2021
DÍAS DE MORA			0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd)			2021/01/26	NUMERO AUTORIZACIÓN:			87586017

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS COTIZANTE	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	MORA COTIZACIÓN	MORA FSP	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES VALOR PAGADO
231001	231001-COLFONDOS	1	$ 36.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 36.400	$ 0	$ 36.400
SUBTOTALES:										$ 36.400	$ 0	$ 36.400

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP NUMERO AUTORIZACIÓN	INCAPACIDAD IRP VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	SALDO A FAVOR PLANILLA	SALDO A FAVOR VALOR	LIQUIDACIÓN COTIZACIÓN	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES DESCUENTO	TOTALES VALOR PAGADO
14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 4.800	$ 4.800	$ 0	$ 0	$ 4.800
SUBTOTALES:									$ 4.800	$ 0	$ 0	$ 4.800

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

ADMINISTRADORA CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	APORTES	TOTALES MORA	TOTALES VALOR PAGADO
CCF24	CCF24-COMPENSAR	1	$ 9.100	$ 0	$ 9.100
SUBTOTALES:			$ 9.100	$ 0	$ 9.100

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	NOVEDADES ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP
1	CC 46369183	QUINTERO AVELLA MYRIAM STELLA	DEPENDIENTE	DEPENDIENTE TIEMPO PARCIAL	$ 908.526		NO			04														

SEGURIDAD SOCIAL — PENSIÓN ADMIN	DÍAS COT.	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE
231001-COLFONDOS	1	$ 227.132	$ 36.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 36.400

SALUD ADMIN	DÍAS COT.	IBC	COTIZACIÓN	Vr UPC	TOTAL APORTE
		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

ARP ADMIN	DÍAS COT.	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE
14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 908.526	1	$ 4.800

PARAFISCALES CCF ADMIN	DÍAS COT.	IBC	TOTAL APORTE	SENA TOTAL APORTE	ICBF TOTAL APORTE	ESAP TOTAL APORTE	MINEDU TOTAL APORTE
CCF24-COMPENSAR	30	$ 227.132	$ 9.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL **$ 50.300**

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

SOI

Banco Caja Social

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN	901029778
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:			AURBANA SAS
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	DEPARTAMENTO:	BOGOTA - DISTRITO CAPITAL
DIRECCIÓN:	CL 1 38 8 12 OFICINA 301	TELÉFONO:	7035370
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	C-MIPYME MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades de arquitectura e ingeniería y otras
FORMA DE PRESENTACIÓN:	UNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA)			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:			7780742339	TIPO DE PLANILLA			E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	enero	AÑO 2021	PERIODO COTIZACIÓN SALUD	MES	febrero	AÑO 2021
DÍAS DE MORA			0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd)			2021/02/16	NUMERO AUTORIZACIÓN			89482582

TOTAL APORTES A PENSION

CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS COTIZANTE	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	MORA COTIZACIÓN	MORA FSP	APORTES	TOTALES MORA	TOTALES VALOR PAGADO
25-14	25-14 COLPENSIONES	3	$ 705.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 705.500	$ 0	$ 705.500
230301	230301-PORVENIR	2	$ 608.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 608.000	$ 0	$ 608.000
230201	230201- PROTECCION	2	$ 416.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 416.000	$ 0	$ 416.000
231001	231001-COLFONDOS	2	$ 861.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 861.500	$ 0	$ 861.500
SUBTOTALES:										$ 2.591.000	$ 0	$ 2.591.000

TOTAL APORTES A SALUD

CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD NUMERO AUTORIZACIÓN	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD VALOR	LICENCIA MATERNIDAD NUMERO AUTORIZACIÓN	LICENCIA MATERNIDAD VALOR	SALDO A FAVOR PLANILLA	SALDO A FAVOR VALOR	LIQUIDACIÓN COTIZACIÓN	LIQUIDACIÓN UPC	MORA COTIZACIÓN	MORA UPC	APORTES	MORA	TOTALES DESCUENTO	TOTALES VALOR PAGADO
EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 135.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 135.400	$ 0	$ 0	$ 135.400
EPS037	EPS037-NUEVA EPS	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 36.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 36.500	$ 0	$ 0	$ 36.500
EPS001	EPS001-ALIANSALUD S.A.	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 120.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 120.000	$ 0	$ 0	$ 120.000
EPS008	EPS008-COMPENSAR	2		$ 0		$ 0		$ 0	$ 124.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 124.000	$ 0	$ 0	$ 124.000
EPS017	EPS017-FAMISANAR	4		$ 0		$ 0		$ 0	$ 232.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 232.100	$ 0	$ 0	$ 232.100
SUBTOTALES:													$ 648.000	$ 0	$ 0	$ 648.000

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP NUMERO AUTORIZACIÓN	INCAPACIDAD IRP VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	SALDO A FAVOR PLANILLA	SALDO A FAVOR VALOR	LIQUIDACIÓN COTIZACIÓN	APORTES	MORA	TOTALES DESCUENTO	TOTALES VALOR PAGADO
14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	9		$ 0	$ 0		$ 0	$ 344.300	$ 344.300	$ 0	$ 0	$ 344.300
SUBTOTALES:									$ 344.300	$ 0	$ 0	$ 344.300

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	APORTES	TOTALES MORA	TOTALES VALOR PAGADO
CCF24	CCF24-COMPENSAR	8	$ 554.800	$ 0	$ 554.800
SUBTOTALES:			$ 554.800	$ 0	$ 554.800

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

Nº	DATOS DEL COTIZANTE: IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	NOVEDADES: ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP
1	CC 1003038476	VALENCIA SOTOLUAS ALEJANDRO	DEPEND		$ 908.526	FIJO		SI												05-06					
2	CC 1003038476	VALENCIA SOTOLUAS ALEJANDRO	DEPEND		$ 908.526	FIJO		SI																	
3	CC 1015408024	CARDENAS MORENO DAYAN KARINE	DEPEND		$ 3.000.000	FIJO		SI												01-30					
4	CC 1016480330	GOMEZ ALDANA DANIEL FELIPE	DEPEND		$ 1.800.000	FIJO		SI																	
5	CC 1015071786	COY ENDOY MOLINA ADRIANA	DEPEND		$ 1.500.000	FIJO		SI																	
6	CC 1024557954	WILCHES CASTIBLANCO ANGIE TATIANA	DEPEND		$ 2.000.000	FIJO		SI																	

Nº	SEGURIDAD SOCIAL: PENSIÓN FSP SUBSISTENCIA	PENSIÓN FSP SOLIDARIDAD	PENSIÓN APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	PENSIÓN APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	SALUD Vr UPC	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	ARP TOTAL APORTE	DIAS COT	IBC	PARAFISCALES CCF ADMIN	CCF TOTAL APORTE	SENA TOTAL APORTE	ICBF TOTAL APORTE	ESAP TOTAL APORTE	MINEDU TOTAL APORTE
1	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 14.600	25-14 COLPENSIONES	3	$ 90.853	$ 14.600		$ 3.700	EPS037-NUEVA EPS	3	$ 90.853		$ 0	3	$ 90.853	$ 60.561	CCF24-COMPENSAR	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
2	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 130.900	25-14 COLPENSIONES	27	$ 817.674	$ 130.900		$ 32.800	EPS037-NUEVA EPS	27	$ 817.674		$ 57.000	27	$ 817.674	$ 817.674	CCF24-COMPENSAR	$ 32.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
3	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 320.100	231001-COLFONDOS	30	$ 2.000.001	$ 320.100		$ 80.100	EPS017-FAMISANAR	30	$ 2.000.001		$ 0	30	$ 2.000.001	$ 0	CCF24-COMPENSAR	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
4	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 288.000	230301-PORVENIR	30	$ 1.800.000	$ 288.000		$ 72.000	EPS017-FAMISANAR	30	$ 1.800.000		$ 125.300	30	$ 1.800.000	$ 1.800.000	CCF24-COMPENSAR	$ 72.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
5	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 240.000	230201-PROTECCION	30	$ 1.500.000	$ 240.000		$ 60.000	EPS017-FAMISANAR	30	$ 1.500.000		$ 7.900	30	$ 1.500.000	$ 1.500.000	CCF24-COMPENSAR	$ 60.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
6	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 320.000	230301-PORVENIR	30	$ 2.000.000	$ 320.000		$ 80.000	EPS008-COMPENSAR	30	$ 2.000.000		$ 10.500	30	$ 2.000.000	$ 2.000.000	CCF24-COMPENSAR	$ 80.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

2021/02/16 3:25 PM USUARIO: SOI CC49691881

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

SOI

Banco Caja Social

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN	901029778
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:			AURBANA SAS
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	DEPARTAMENTO:	BOGOTA - DISTRITO CAPITAL
DIRECCIÓN:	CLL 38 8 12 OFICINA 301	TELEFONO:	7035370
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	G-MIPYME MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONÓMICA:	Actividades de arquitectura e ingeniería y otras
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA			77807423 39	TIPO DE PLANILLA			E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	enero	AÑO 2021	PERIODO COTIZACIÓN SALUD	MES	febrero	AÑO 2021
DÍAS DE MORA			0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd)			2021/02/16	NUMERO AUTORIZACIÓN			89482458J

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE								NOVEDADES																			SEGURIDAD SOCIAL																								PARAFISCALES										
																											PENSIÓN								SALUD						ARP					CCF			SENA			ICBF			ESAP			MINEDU		
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	Vr UPC	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
7	CC 20738707	RUIZ SIERRA MARIA CAROLINA	DEPEND		$ 3.500.000	FIJO		SI																		231001-COLFONDOS	27	$ 3,150,000	$ 504,000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 504,000	EPS005-SANITAS S.A.	27	$ 3,150,000	$ 126,000	$ 0	$ 126,000	14-23-POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS S.A.	27	$ 3,150,000	$ 16,500	27	$ 3,150,000	SCCF24-COMPENSAR	$ 126,000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
8	CC 20739707	RUIZ SIERRA MARIA CAROLINA	DEPEND		$ 3.500.000	FIJO		SI												26-28						231001-COLFONDOS	3	$ 233,334	$ 37,400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 37,400	EPS005-SANITAS S.A	3	$ 233,334	$ 9,400	$ 0	$ 9,400	14-23-POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS S.A.	3	$ 233,334	$ 0	3	$ 233,334	CCF24-COMPENSAR	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
9	CC 49691881	VALENCIA SIERRA CARMEN ALICIA	DEPEND		$ 1.500.000	FIJO		SI												01-30						25-14 COLPENSIONES	30	$ 3,000,000	$ 480,000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 480,000	EPS001-ALIANSALUD S.A.	30	$ 3,000,000	$ 120,000	$ 0	$ 120,000	14-23-POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 3,000,000	$ 15,700	30	$ 3,000,000	SCCF24-COMPENSAR	$ 120,000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
10	CC 80082650	VARGAS CELI CESAR MAURICIO	DEPEND		$ 3.000.000	FIJO		SI	H																	25-14 COLPENSIONES	5	$ 500,000	$ 80,000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 80,000	EPS017-FAMISANAR	5	$ 500,000	$ 20,000	$ 0	$ 20,000	14-23-POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS S.A.	5	$ 500,000	$ 34,800	5	$ 500,000	CCF24-COMPENSAR	$ 20,000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
11	CC 80928100	ZAMBRANO PEREZ EYSUN FERNANDO	DEPEND		$ 1.100.000	FIJO		SI																		230201-PROTECCION	30	$ 1,100,000	$ 176,000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 176,000	EPS008-COMPENSAR	30	$ 1,100,000	$ 44,000	$ 0	$ 44,000	14-23-POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1,100,000	$ 76,600	30	$ 1,100,000	SCCF24-COMPENSAR	$ 44,000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL **$ 4.138.100**

Planilla Pagada

A134

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Banco Caja Social

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	830098495
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:			ARQUITECTURA URBANA LTDA
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	DEPARTAMENTO:	BOGOTA - DISTRITO CAPITAL
DIRECCIÓN:	CALLE 38 NO. 8-12 OFC. 301	TELÉFONO:	7035370
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades reguladoras y facilitadoras de la act
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA).			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA			77807809B2	TIPO DE PLANILLA:			E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	enero AÑO	2021	PERIODO COTIZACIÓN SALUD.	MES	febrero AÑO	2021
DÍAS DE MORA			0				
FECHA PAGO (aaaammdd):			2021/02/16	NÚMERO AUTORIZACIÓN			895071072

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA			APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA			TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE	No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
230301	230301-PORVENIR	2	$ 663.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 663.100	$ 0	$ 663.100
231001	231001-COLFONDOS	2	$ 778.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 778.700	$ 0	$ 778.700
25-14	25-14 COLPENSIONES	4	$ 2.236.800	$ 0	$ 0	$ 43.500	$ 43.500	$ 0	$ 0	$ 2.323.800	$ 0	$ 2.323.800
SUBTOTALES:										$ 3.765.600	$ 0	$ 3.765.600

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA			INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA			TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE	No. COTIZANTES	NUMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	UPC	COTIZACIÓN	UPC	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	2		$ 0		$ 0		$ 0	$ 160.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 160.000	$ 0	$ 0	$ 160.000
EPS017	EPS017-FAMISANAR	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 100.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 100.100	$ 0	$ 0	$ 100.100
EPS010	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 65.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 65.800	$ 0	$ 0	$ 65.800
EPS002	EPS002-SALUD TOTAL	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 51.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 51.200	$ 0	$ 0	$ 51.200
EPS008	EPS008-COMPENSAR	2		$ 0		$ 0		$ 0	$ 468.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 468.000	$ 0	$ 0	$ 468.000
EPS044	EPS044-MEDIMÁS	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 74.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 74.700	$ 0	$ 0	$ 74.700
SUBTOTALES:													$ 919.800	$ 0	$ 0	$ 919.800

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA			INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE	No. COTIZANTES	NUMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	8		$ 0	$ 0			$ 600.500	$ 600.500	$ 0	$ 0	$ 600.500
SUBTOTALES.									$ 600.500	$ 0	$ 0	$ 600.500

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

ADMINISTRADORA			TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE	No. COTIZANTES	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
CCF24	CCF24-COMPENSAR	8	$ 915.200	$ 0	$ 915.200
SUBTOTALES:			$ 915.200	$ 0	$ 915.200

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE								NOVEDADES												SEGURIDAD SOCIAL																				PARAFISCALES							
																				PENSIÓN						SALUD							ARP					CCF		SENA		ICBF		ESAP		MINEDU	
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	SUBSISTENCIA	SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	Vr UPC	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DIAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
1	CC 1026572178	MORALES VELASQUEZ DIANA CATHERINE	DEPEND		$ 2.500.000	FIJO		SI																230301-PORVENIR	28	$ 2.333.334	$ 373.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 373.400	EPS017-FAMISANAR	28	$ 2.333.334		$ 93.400	$ 0	$ 93.400	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	28	$ 2.333.334		$ 162.500	28	$ 2.333.334	CCF24-COMPENSAR	$ 93.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
2	CC 1026572178	MORALES VELASQUEZ DIANA CATHERINE	DEPEND		$ 2.500.000	FIJO		SI												L-29-30				230301-PORVENIR	2	$ 166.667	$ 26.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 26.700	EPS017-FAMISANAR	2	$ 166.667		$ 6.700	$ 0	$ 6.700	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	2	$ 166.667		$ 0.2	2	$ 166.867	CCF24-COMPENSAR	$ 6.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
3	CC 1031146000	FARFAN ARIAS KATTY ANDREA	DEPEND		$ 2.000.000	FIJO		SI																25-14 COLPENSIONES	30	$ 2.000.000	$ 320.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 320.000	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 2.000.000		$ 80.000	$ 0	$ 80.000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 2.000.000	$ 174.2101	$ 10.500	30	$ 2.000.000	CCF24-COMPENSAR	$ 80.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
4	CC 1057483178	VARGAS TENJO JOSE ABELINO	DEPEND		$ 1.800.000	FIJO		SI																231001-COLFONDOS	30	$ 1.866.667	$ 298.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 298.700	EPS044-MEDIMÁS	30	$ 1.866.667		$ 74.700	$ 0	$ 74.700	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.866.667		$ 130.000	30	$ 1.866.667	CCF24-COMPENSAR	$ 74.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
5	CC 18936069	OAZA BERRIO HERNANDO	DEPEND		$ 8.700.000	FIJO		SI																25-14 COLPENSIONES	30	$ 8.700.000	$ 1.392.000	$ 43.500	$ 43.500	$ 0	$ 0	Normal	$ 1.479.000	EPS008-COMPENSAR	30	$ 8.700.000		$ 348.000	$ 0	$ 348.000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 8.700.000		$ 45.500	30	$ 8.700.000	CCF24-COMPENSAR	$ 348.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
6	CC 52386191	CELIS RUIZ LILIANA	DEPEND		$ 3.000.000	FIJO		SI																231001-COLFONDOS	30	$ 3.000.000	$ 480.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 480.000	EPS008-COMPENSAR	30	$ 3.000.000		$ 120.000	$ 0	$ 120.000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 3.000.000		$ 15.700	30	$ 3.000.000	CCF24-COMPENSAR	$ 120.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Banco Caja Social

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	830098495
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:			ARQUITECTURA URBANA LTDA
CIUDAD/MUNICIPIO:			BOGOTA - DISTRITO CAPITAL
DIRECCIÓN:	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	DEPARTAMENTO:	7035370
TIPO APORTANTE:	CALLE 38 NO. 8-12 OFC. 301	TELÉFONO:	
TIPO EMPRESA:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
FORMA DE PRESENTACIÓN:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades reguladoras y facilitadoras de la act
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):	UNICO		SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:			7780780982	TIPO DE PLANILLA:	E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	enero AÑO	2021	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES febrero AÑO 2021
DÍAS DE MORA			0		
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):			2021/02/16	NÚMERO AUTORIZACIÓN:	895071072

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES												SEGURIDAD SOCIAL																SALUD						ARP			PARAFISCALES							
																						PENSIÓN																																				
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	Vr UPC	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	CCF ADMIN	CCF TOTAL APORTE	SENA TOTAL APORTE	ICBF TOTAL APORTE	ESAP TOTAL APORTE	MINEDU TOTAL APORTE
7	CC 52796082	VALDERRAMA CARREÑO OLGA MARIA	DEPEND		$ 1.700.000	FIJO			SI													230301-PORVENIR	27	$ 1,530,000	$ 244,800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 244,800	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	27	$ 1,530,000	$ 61,200	$ 0	$ 61,200	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	27	$ 1,530,000		$ 8,000																				
8	CC 52796082	VALDERRAMA CARREÑO OLGA MARIA	DEPEND		$ 1.700.000	FIJO			SI											06-10		230301-PORVENIR	3	$ 113,334	$ 18,200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 18,200	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	3	$ 113,334	$ 4,600	$ 0	$ 4,600	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	3	$ 113,334		$ 0	3		CCF24-COMPENSAR		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
9	CC 7182768	AGUIRRE MEDINA FERNANDO	DEPEND		$ 2.000.000	FIJO			SI													25-14 COLPENSIONES	30	$ 2,000,000	$ 320,000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 320,000	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 2,000,000	$ 80,000	$ 0	$ 80,000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 2,000,000	1742101	$ 139,200																				
10	CC 9389138	BRICEÑO JUAN CARLOS	DEPEND		$ 1.600.000	FIJO			SI		24											25-14 COLPENSIONES	24	$ 1,280,000	$ 204,800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 204,800	EPS002-SALUD TOTAL	24	$ 1,280,000	$ 51,200	$ 0	$ 51,200	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	24	$ 1,280,000		$ 89,100	24		CCF24-COMPENSAR		$ 51,200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL **$ 6.201.100**

ANEXO No. 10
IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

porvenir

Fondo de Pensiones Obligatorias

Solicitud de Vinculación o Traslado

BOGOTA 10 2012 09

1000137161 20171030 BOGOTA

DIAZ RIVEROS KEVIN EDUARDO

19991025 BOGOTA

CRA 96 A BIS # 131 B 02 SUBA BOGOTA

BOGOTA 3104455910

jbdisenosas@gmail.com

ILSB 1487 / 20 SUR BOGOTA BOGOTA

901017504 JB DISEÑOS Y CONST.

BOGOTA CLSB 1 # 87 J 20 SUR BOGOTA

RUV121A2

KEVIN E. DIAZ R.

79452361

1136

ARL | sura

Medellín, 02 de Marzo de 2021

LA DIRECCIÓN DE AFILIACIONES Y RECAUDOS

HACE CONSTAR:

Que la(s) persona(s) relacionada(s) en el siguiente listado, se encuentra(n) afiliada(s) en Riesgos Laborales desde las fechas indicadas, a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A. como trabajadores de CONSORCIO OPORTO que se encuentra EN COBERTURA, en el centro de trabajo 0000000001 - PRINCIPAL DC, Clase de riesgo 5, Porcentaje de cotización 6.96%.

A continuación se relacionan las fechas de afiliación

Número identificació	Nombre	Fecha inicio afiliación	Fecha fin afiliación	Código de transacción	Tipo Cotizante
C1000137161	DIAZ RIVEROS KEVIN EDUARDO	01/02/2021		142X2714	DEPENDIENTE

Si desea validar que este certificado haya sido realmente emitido por ARL Sura y la información aquí contenida sea real, visite www.arlsura.com.co / validar certificados e ingrese el siguiente código único de generación válido por un mes:C530497082106141619

Atentamente,

Dirección de Afiliaciones y Recaudos

Este certificado tiene validez para efectos de afiliación del trabajador a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A. así como para su desafiliación

Importante: La información contenida en este certificado puede ser validada en cualquier momento por SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A.

Este certificado fue generado con la información registrada en la base de datos el 02/03/2021 11:33:39 .
Los trabajadores marcados con asterisco (*) son afiliados Independientes.
Las coberturas marcadas con dos asteriscos (**) son coberturas pendientes de retiro.

Dirección IP: 181.61.208.198, 198.143.41.29, 172.16.42.57

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA



REPÚBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACIÓN PERSONAL
CÉDULA DE CIUDADANÍA

NUMERO 1.000.137.161

DIAZ RIVEROS

APELLIDOS

KEVIN EDUARDO

NOMBRES

Kevin Diaz

FIRMA



FECHA DE NACIMIENTO 25-OCT-1999

BOGOTA D.C
(CUNDINAMARCA)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.75 ESTATURA

O+ G.S. RH

M SEXO

30-OCT-2017 SOACHA

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICIÓN

REGISTRADOR NACIONAL

INDICE DERECHO

P-1524700-01046533-M-1000137161-20181205 00633[illegible]8449A 1 9906748367

1156

PREVENCION LABORAL

Lina Paola Castañeda Gutierrez
Calle 140C No. 94D-38 Cons. 106
BOGOTA D.C.-SUBA (Bogotá D.C.)
Lic. Salud Ocupac. 5046 de 13/05/2019

CERTIFICADO MEDICO OCUPACIONAL

H.C. 1000137161

Fecha: 10-diciembre-2020 8:10 am
Impresión: 10-diciembre-2020 8:12 am



Paciente: **DIAZ RIVEROS KEVIN EDUARDO**
Doc.Iden.: **CC1000137161** Edad: 21 Años Sexo: M
Entidad: **PARTICULAR**
Act. Economic: N/D
Empresa: N/D
Dirección: AURES
Adm. Salud: Compensar E.P.S.
Admin.Riesgos SURA

Estrato: 2
Cargo: AYUDANTE DE OBRA
Teléfono: N/D Estado civil: SOLTERO(A)
Admin.Pension N/D

Tipo Evaluación: PREOCUPACIONAL

Se certifica que DIAZ RIVEROS KEVIN EDUARDO identificado con documento de identidad CC 1000137161 fue valorado, luego de lo cual se emite el siguiente concepto para desempeñar el cargo de AYUDANTE DE OBRA:

RESTRICCIONES:
Ninguna

RECOMENDACIONES:
Médico-Generales:
Valoración por optometria en EPS para prescripción de formula optométrica.
Alimentación balanceada
Actividad física regular
Estilos de vida saludable

Médico-Laborales:
Uso de elementos de protección personal según riesgo y necesidad del cargo
Higiene postural Y Correcta ergonomía
Realización de pausas activas generales
Adhiérase a las medidas de bioseguridad implementadas en su lugar de trabajo

PRUEBAS PARACLINICAS:
ENFASIS OSTEOMUSCULAR NORMAL

Lina Paola Castañeda G
Médico y Cirujano General
M. 1020770528
Esp. Salud Ocupacional
Licencia 5046 U.Rosario

Medico(a): CASTAÑEDA GUTIERREZ LINA PAOLA
Registro médico: 1020770528
Licencia en Salud Ocupacional: 5046 DE 13-05-19

Kevin D

DIAZ RIVEROS KEVIN EDUARDO
CC1000137161

Famisanar EPS

NIT 830.003.564-7

FORMULARIO ÚNICO DE AFILIACIÓN Y REGISTRO DE NOVEDADES AL SGSSS

9007386112

No. de Radicación: 21089379

Fecha de Radicación: 04 02 2021

I. DATOS DEL TRÁMITE

Lea las instrucciones que se encuentran anexas al formulario antes de diligenciarlo

1. Tipo de trámite	2. Tipo de Afiliación	3. Régimen	4. Tipo de afiliado	5. Tipo de cotizante	Código (a registrar por la EPS)
A. Afiliación X B. Reporte de Novedades	A. Individual: • Cotizante o cabeza de Familia X • Beneficiario o afiliado adicional B. Colectivo C. Institucional D. De oficio	A. Contributivo X B. Subsidiado	A. Cotizante X B. Cabeza de familia C. Beneficiario	A. Dependiente X B. Independiente C. Pensionado	

A. AFILIACIÓN B. DATOS BÁSICOS DE IDENTIFICACIÓN (del cotizante o cabeza de familia)

6. Apellidos y nombres				
	Primer Apellido: DIAZ	Segundo Apellido: RIVEROS	Primer Nombre: KEVIN	Segundo Nombre: EDUARDO

7. Tipo de documento de identidad	8. Número del documento de identidad	9. Sexo	10. Fecha de nacimiento
CC	1000137161	Femenino ☐ Masculino X	D 25 M 10 A 1999

III. DATOS COMPLEMENTARIOS (Datos personales)

11. Etnia	12. Discapacidad	13. Puntaje SISBEN	14. Grupo de población especial	15. Administradora de Riesgos Laborales - ARL	16. Administradora de pensiones
0	Tipo: Condición:	0		SEGUROS DE RIESGOS PROFESIONALES SURAMERICANA	PORVENIR S. A.

17. Ingreso base de cotización - IBC	18. Residencia			
$908.526	TV 14 8 27		NT	3208027406

KEVINSLBPAOLA@GMAIL.COM	BOGOTA	Zona: Urbana X Rural ☐	DISTRITO CAPITAL

IV. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE LOS MIEMBROS DEL NÚCLEO FAMILIAR (Datos básicos de identificación del cónyuge o compañero(s) permanente cotizante)

19. Apellidos y nombres			
Primer Apellido	Segundo Apellido	Primer Nombre	Segundo Nombre

20. Tipo de documento de identidad	21. Número del documento de identidad	22. Sexo	23. Fecha de nacimiento
		Femenino ☐ Masculino ☐	D D M M A A A A

Datos básicos de identificación de los beneficiarios y de los afiliados adicionales

24. Apellidos y nombres				
	Primer Apellido	Segundo Apellido	Primer Nombre	Segundo Nombre
01				
02				
03				
04				
05				

	25. Tipo de documento de identidad	26. Número del documento de identidad	27. Sexo Femenino	27. Sexo Masculino	28. Fecha de nacimiento	Datos complementarios 29. Parentesco	30. Etnia
01					D D M M A A A A		
02					D D M M A A A A		
03					D D M M A A A A		
04					D D M M A A A A		
05					D D M M A A A A		

	31. Discapacidad Tipo			Condición		32. Datos de residencia				33. Valor de la UPC del afiliado adicional (a registrarse la EPS)
	F	N	M	T	P	Municipio y Distrito	Zona Urbana	Zona Rural	Departamento	Teléfono fijo y/o celular
01										
02										
03										
04										
05										

Selección de la IPS Primaria

	34. Nombre de la Institución prestadora de servicios de salud - IPS	Código de la IPS (a registrar por la EPS)
C	COLSUBSIDIO CENTRO MEDICO 1 DE MAYO	1669
B		
B		
B		
B		

V. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEADOR Y OTROS APORTANTES O DE LAS ENTIDADES RESPONSABLES DE LA AFILIACIÓN COLECTIVA, INSTITUCIONAL O DE OFICIO

35. Nombre o razón social	36. Tipo de documento de identificación	37. Número del documento de identificación	38. Tipo de aportante o pagador de pensiones (a registrar por la EPS)
CONSORCIO APORTO	NT	901351629	

39. Ubicación				
CALLE 18 SUR 29 D 12	8054802		BOGOTA	DISTRITO CAPITAL
		Correo electrónico	Municipio / Distrito	Departamento

B. REPORTE DE NOVEDADES

40. Tipo de Novedad

1. Modificación de datos básicos de identificación ☐ 2. Corrección de datos básicos de identificación ☐ 3. Actualización del documento de identidad ☐ 4. Actualización y corrección de datos complementarios ☐ 5. Terminación de la inscripción en la EPS ☐ Código ☐ 6. Reinscripción en la EPS ☐ 7. Inclusión de beneficiarios o de afiliados adicionales ☐ 8. Exclusión de beneficiarios o de afiliados adicionales ☐ 9. Inicio de relación laboral o adquisición de condiciones para cotizar ☐ 10. Terminación de la relación laboral o pérdida de las condiciones para seguir cotizando ☐ 11. Vinculación a una entidad autorizada para realizar afiliaciones colectivas ☐ 12. Desvinculación de una entidad autorizada para realizar afiliaciones colectivas ☐ 13. Movilidad A. Régimen Contributivo ☐ B. Régimen Subsidiado ☐ 14. Traslado: A. Mismo Régimen ☐ B. Diferente Régimen ☐ 15. Reporte de fallecimiento ☐ 16. Reporte del trámite de protección al cesante ☐ 17. Reporte de la calidad de Pre-pensionado ☐ 18. Reporte de la calidad de Pensionado ☐

VI. DATOS PARA EL REPORTE DE LA NOVEDAD

41. Datos básicos de identificación					
Primer Apellido	Segundo Apellido	Primer Nombre	Segundo Nombre		
Tipo de documento de identidad	Número del documento de identidad	Sexo Femenino ☐ Masculino ☐	Fecha de nacimiento D D M M A A A A	42. Fecha novedad D 01 M 02 A 2021	
43. EPS anterior NINGUNA		44. Motivo de traslado Código	45. Caja de Compensación Familiar o Pagador de Pensiones		

VII. DECLARACIONES Y AUTORIZACIONES

46. Declaración de dependencia económica de los beneficiarios o afiliados adicionales.	X
47. Declaración de la no obligación de afiliarse al Régimen Contributivo, Especial o de Excepción.	
48. Declaración de existencia de razones de fuerza mayor o caso fortuito que impiden la entrega de los documentos que acreditan la condición de beneficiarios.	
49. Declaración de no información del cotizante, cabeza de familia, beneficiarios o afiliados adicionales en una Institución Prestadora de Servicios de Salud.	
50. Autorización para que la EPS solicite y obtenga datos y copia de la historia clínica del cotizante o cabeza de familia y de sus beneficiarios o afiliados adicionales.	X
51. Autorización para que la EPS reporte la información que se genere de la afiliación o del reporte de novedades a la base de datos de afiliados vigentes y a las entidades públicas que por sus funciones la requieran.	X
52. Autorización para que la EPS maneje los datos personales del cotizante o cabeza de familia y de sus beneficiarios o afiliados adicionales, de acuerdo con lo previsto en la Ley 1581 de 2012 y el Decreto 1377 de 2013.	X
53. Autorización para que la EPS envíe información al correo electrónico o al celular como mensajes de texto.	X

VIII. FIRMAS

54. Firma del cotizante, cabeza de familia o beneficiario	55. Firma del empleador, aportante o entidad responsable de la afiliación colectiva, institucional o de Oficio

IX. ANEXOS

56. Anexo copia del documento de identidad: CN ☐ RC ☐ TI ☐ CC ☐ PA ☐ CE ☐ CD ☐ SC ☐ Cantidad: Total:

57. Copia del dictamen de incapacidad permanente emitido por la autoridad competente.	
58. Copia del registro civil de matrimonio o de la Escritura pública, acta de conciliación o sentencia judicial que declare la unión marital.	
59. Copia de la escritura pública o sentencia judicial que declare el divorcio, sentencia judicial que declare la separación de cuerpos y escritura pública, acta de conciliación o sentencia judicial que declare la terminación de la unión marital.	
60. Copia del certificado de adopción o acta de entrega del menor.	
61. Copia de la orden judicial o del acto administrativo de custodia.	
62. Copia del documento en que conste la pérdida de la patria potestad o el certificado de defunción de los padres o la declaración suscrita por el cotizante sobre la ausencia de los dos padres.	
63. Copia de la autorización de traslado por parte de la Superintendencia Nacional de Salud.	
64. Certificación de vinculación a una entidad autorizada para realizar afiliaciones colectivas.	
65. Copia del acto administrativo o providencia de las autoridades competentes en la que conste la calidad de beneficiario o se ordene la afiliación de oficio.	

X. DATOS A SER DILIGENCIADOS POR LA ENTIDAD TERRITORIAL

66. Identificación de la Entidad Territorial		67. Datos del SISBEN			68. Fecha de radicación	69. Fecha de validación
Código del municipio	Código del departamento	Número de la ficha	Puntaje	Nivel	D D M M A A A A	D D M M A A A A

70. Datos del funcionario que realiza la validación

Primer Apellido	Segundo Apellido	Primer Nombre	Segundo Nombre

Tipo de documento de identidad	Número del documento de identidad	OBSERVACIONES
		CARGO: OBRERO DE CONSTRUCCION

71. Firma del funcionario

VIGILADO Supersalud

Recuerde que con la firma del formulario el afiliado manifiesta la veracidad de la información registrada y de las declaraciones contenidas en el capítulo VII del formulario.

INTERNET

Famisanar EPS

NIT 830.003.564-7

9007386112

CUESTIONARIO ENTREGA CARTA DE DERECHOS Y DEBERES DEL AFILIADO Y DEL PACIENTE EN EL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD Y DE LA CARTA DE DESEMPEÑO

	SI	NO
¿Previo al diligenciamiento del formulario de afiliación, la EPS le hizo entrega de la Carta de Derechos y deberes del Afiliado y del Paciente?	X	
¿Previo al diligenciamiento del formulario de afiliación, la EPS le hizo entrega de la Carta de Desempeño donde se presenta de manera clara su puesto en el ranking?	X	
¿Leyó el contenido de la Carta de Derechos y Deberes del afiliado y del paciente?	X	
¿Leyó el contenido de la Carta de Desempeño de la EPS?	X	
¿Si tuvo alguna duda sobre el contenido de la información fue asesorado adecuadamente por la EPS?	X	
¿Autoriza a EPS Famisanar S.A.S el envío de la carta de derechos y deberes y la carta de desempeño al correo electrónico?		X

AUTORIZACIÓN PREVIA PARA EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES Y DATOS PERSONALES SENSIBLES

En mi calidad de cotizante, manifiesto de manera clara, expresa, libre, inequívoca y espontánea que le otorgo a la EPS FAMISANAR S.A.S en su calidad de RESPONSABLE del tratamiento de mis datos personales, mi consentimiento previo para recolectar, almacenar, usar, circular, suprimir, reportar y en general para tratar los DATOS PERSONALES, DATOS PERSONALES SENSIBLES y demás información susceptible de tratamiento, registrada a mi nombre y/o de los beneficiarios de mi grupo familiar en sus Bases de Datos, con la finalidad de realizar las actividades propias del aseguramiento en salud y en los términos previstos en su POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE LA INFORMACIÓN y AVISO DE PRIVACIDAD, disponibles en www.famisanar.com.co, todo lo cual conforme lo establecido en la Ley Estatutaria 1581 de 2012 y demás normas que la sustituyan, adicionen, reglamenten, complementen o modifiquen.

Así mismo manifiesto que mis derechos como titular de los datos son los consagrados en la Constitución Nacional y la Ley, especialmente el derecho a conocer, actualizar, rectificar, y, a suprimir mi información personal y revocar el consentimiento otorgado para el tratamiento de datos personales cuando ello fuera procedente (artículo 9° Decreto 1377 de 2013).

*"**Datos sensibles:** Se entiende por datos sensibles aquellos que afectan la intimidad del Titular o cuyo uso indebido puede generar su discriminación, tales como aquellos que revelen el origen racial o étnico, la orientación política, las convicciones religiosas o filosóficas, la pertenencia a sindicatos, organizaciones sociales, de derechos humanos o que promueva intereses de cualquier partido político o que garanticen los derechos y garantías de partidos políticos de oposición; así como los datos relativos a la salud, a la vida sexual, y los datos biométricos." (Numeral 3° artículo 3° Decreto 1377 de 2013).*

Firma del afiliado:

Nombres y Apellidos KEVIN EDUARDO DIAZ RIVEROS
Identificación: CC 1000137161

AUTORIZACIÓN DONACIÓN DE ORGANOS Y TEJIDOS - LEY 1805 DE 2016

De acuerdo a lo definido en el artículo 4° de la Ley 1805, manifiesto a continuación que mi voluntad de ser donante de órganos y tejidos es:

SI ☐ NO X

Firma del afiliado:

Nombres y Apellidos KEVIN EDUARDO DIAZ RIVEROS
Identificación: CC 1000137161

"ARTÍCULO 15. Los menores de edad podrán ser donantes de órganos y tejidos, siempre y cando sus representantes legales expresen su consentimiento informado para la donación de órganos y/o tejidos dentro de las (8) horas siguientes a la concurrencia de la muerte cerebral. El médico responsable deberá informarles sus derechos y los beneficios de la donación.

FIRMA A RUEGO

A ruego del señor (a) _____ identificado (a) con el documento _____ No. _____ quien manifiesta no poder o no saber firmar, lo hace en su nombre el (la) señor(a) _____ quien es mayor de edad y sin ningún impedimento para dar fe de la información que está recibiendo.

Como testigo, da fe de todo lo anterior y certifica que la huella aquí impuesta pertenece al señor (a) _____

Firmante a Ruego:

Nombres y Apellidos: _____
Identificación: _____
Edad: _____
Dirección de Domicilio: _____

Nombres y Apellidos
de quien no sabe o
no puede firmar _____

Huella

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	830045463
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			ANDINA JUEGOS PARQUES SAS
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	DEPARTAMENTO:	BOGOTA - DISTRITO CAPITAL
DIRECCIÓN:	CALLE 18 SUR N. 29 D 12	TELÉFONO:	8054802
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Fabricación de otros productos de madera; fabrica
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:			7780933274	TIPO DE PLANILLA:			E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	enero	AÑO 2021	PERIODO COTIZACION SALUD:	MES	febrero	AÑO 2021
DÍAS DE MORA:			0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):			2021/02/17	NÚMERO AUTORIZACIÓN:			896299372

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
31001	31001-COLFONDOS	1	$ 224.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 224.000	$ 0	$ 224.000
25-14	25-14 COLPENSIONES	3	$ 579.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 579.000	$ 0	$ 579.000
30301	30301-PORVENIR	4	$ 786.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 786.800	$ 0	$ 786.800
SUBTOTALES:										$ 1.589.800	$ 0	$ 1.589.800

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	UPC	COTIZACIÓN	UPC	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS017	EPS017-FAMISANAR	2		$ 0		$ 0		$ 0	$ 80.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 80.400	$ 0	$ 0	$ 80.400
EPS002	EPS002-SALUD TOTAL	3		$ 0		$ 0		$ 0	$ 172.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 172.400	$ 0	$ 0	$ 172.400
EPS008	EPS008-COMPENSAR	2		$ 0		$ 0		$ 0	$ 108.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 108.400	$ 0	$ 0	$ 108.400
EPS037	EPS037-NUEVA EPS	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 36.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 36.400	$ 0	$ 0	$ 36.400
SUBTOTALES:													$ 397.600	$ 0	$ 0	$ 397.600

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-7	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	8		$ 0	$ 0		$ 0	$ 571.700	$ 571.700	$ 0	$ 0	$ 571.700
SUBTOTALES:									$ 571.700	$ 0	$ 0	$ 571.700

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE		APORTES	MORA	VALOR PAGADO
CCF22	CCF22-COLSUBSIDIO	8	$ 395.200	$ 0	$ 395.200
SUBTOTALES:			$ 395.200	$ 0	$ 395.200

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE									NOVEDADES																			SEGURIDAD SOCIAL																										PARAFISCALES							
																												PENSIÓN								SALUD						ARP					CCF			SENA		ICBF		ESAP		MINEDU	
N°	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	SUBSISTENCIA	SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	Vr UPC	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
1	CC 1012390541	TATE TIQUE CIELO RIMENA	DEPEND		$ 878.000	FIJO			SI																		230301-PORVENIR	30	$ 908.526	$ 145.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 145.400	EPS017-FAMISANAR	30	$ 908.526	$ 36.400	$ 0	$ 36.400	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	30	$ 908.526		$ 22.200	30	$ 878.000	CCF22-COLSUBSIDIO	$ 36.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
2	CC 1012450951	RIVERA MALDONADO RONALDO	DEPEND		$ 1.100.000	FIJO			SI																		230301-PORVENIR	30	$ 1.100.000	$ 178.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 178.000	EPS017-FAMISANAR	30	$ 1.100.000	$ 44.000	$ 0	$ 44.000	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	30	$ 1.100.000		$ 76.800	30	$ 1.100.000	CCF22-COLSUBSIDIO	$ 44.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
3	CC 1065870355	SANTANA LOPEZ SAMUEL DAVID	DEPEND		$ 1.400.000	FIJO			SI																		31001-COLFONDOS	30	$ 1.400.000	$ 224.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 224.000	EPS002-SALUD TOTAL	30	$ 1.400.000	$ 56.000	$ 0	$ 56.000	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	30	$ 1.400.000		$ 97.500	30	$ 1.400.000	CCF22-COLSUBSIDIO	$ 56.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
4	CC 52487763	RODRIGUEZ SARA LILIANA	DEPEND		$ 1.750.000	FIJO			SI																		25-14 COLPENSIONES	30	$ 1.750.000	$ 280.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 280.000	EPS008-COMPENSAR	30	$ 1.750.000	$ 70.000	$ 0	$ 70.000	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	30	$ 1.750.000		$ 42.700	30	$ 1.750.000	CCF22-COLSUBSIDIO	$ 70.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
5	CC 73050088	SANTANA ARRIETA NEY	DEPEND		$ 908.526	FIJO			SI																		25-14 COLPENSIONES	30	$ 908.526	$ 145.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 145.400	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 908.526	$ 36.400	$ 0	$ 36.400	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	30	$ 908.526		$ 63.300	30	$ 908.526	CCF22-COLSUBSIDIO	$ 36.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
6	CC 74183330	PEREZ RODRIGUEZ LUIS FERNANDO	DEPEND		$ 2.000.000	FIJO			SI																		230301-PORVENIR	30	$ 2.000.000	$ 320.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 320.000	EPS002-SALUD TOTAL	30	$ 2.000.000	$ 80.000	$ 0	$ 80.000	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	30	$ 2.000.000		$ 139.200	30	$ 2.000.000	CCF22-COLSUBSIDIO	$ 80.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
7	CC 86064478	MORENO RUBIANO DIOGENES	DEPEND		$ 878.000	FIJO			SI																		230301-PORVENIR	30	$ 908.526	$ 145.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 145.400	EPS002-SALUD TOTAL	30	$ 908.526	$ 36.400	$ 0	$ 36.400	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	30	$ 908.526		$ 63.300	30	$ 878.000	CCF22-COLSUBSIDIO	$ 36.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
8	CC 91263271	RODRIGUEZ TORRES RAMIRO	DEPEND		$ 1.200.000	FIJO			SI	07																	25-14 COLPENSIONES	24	$ 960.000	$ 153.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 153.600	EPS008-COMPENSAR	24	$ 960.000	$ 38.400	$ 0	$ 38.400	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	24	$ 960.000		$ 68.800	24	$ 960.000	CCF22-COLSUBSIDIO	$ 38.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL	$ 2.954.300

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	830115005-2	ABACO JUEGOS Y PARQUES INFANTILES SAS	CALLE 18 SUR No. 29 D - 12	7276707	info@parquesabaco.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	B – menos de 200 c		BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					2	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2021-02	2021-01	E	01/03/2021	48928586	$591.100	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS002	Salud Total EPS	800130907-4	40.000	0		0		0	0	0	0	40.000	1
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	36.400	0		0		0	0	0	0	36.400	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	145.400	0	0	0	0	0	0		145.400	1
230301	Porvenir	800224808-8	160.000	0	0	0	0	0	0		160.000	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-23	Positiva Seguros	860011153-6	132.900				132.900	0	0	132.900			1.329	132.900	2

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF24	Compensar Caja	860066942-7	76.400	0	0	76.400	2

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	2	76.400	76.400
Pensión	2	305.400	305.400
Riesgos Laborales	1	132.900	132.900
CCF	1	76.400	76.400
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	6	591.100	591.100

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	830115005-2	ABACO JUEGOS Y PARQUES INFANTILES SAS	CALLE 18 SUR No. 29 D - 12	7276707	info@parquesabaco.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	B – menos de 200 c		BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ. D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					2	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2021-02	2021-01	E	01/03/2021	48928586	$591.100	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	COMENTARIOS	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	1193225149	PEREZ MALDONADO HEIDY MICHELLE	1	0			S																	230301	1.000.000	160.000	0	0	0	0	EPS002	1.000.000	40.000	14-23	1.000.000	5	69.600	CCF24	1.000.000	40.000	0	0	0	0	0
2	CC	19378960	SILVA PINZON HENRY	1	0			S																	230201	908.526	145.400	0	0	0	0	EPS008	908.526	36.400	14-23	908.526	5	63.300	CCF24	908.526	36.400	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

1143

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

PAG 1 DE 1

DATOS GENERALES

TIPO	NUMERO	NOMBRE O RAZON SOCIAL	TIPO PRESENTACION (U C S D)	SUCURSAL / DEPENDENCIA	CODIGO
CC	53049708-	LADY ANDREA GIRALDO ORTEGA	U ☑ C ☐ S ☐ D ☐		

PERIODOS DE COTIZACION

SALUD MES	SALUD AÑO	PENSIONES, RIESGOS LAB., CCF, SENA, ICBF MES	PENSIONES, RIESGOS LAB., CCF, SENA, ICBF AÑO	NUMERO RADICACION
2021	1	2021	4778004	

TIPO EMPRESA	CLASE DE APORTANTE	CODIGO ARL	CODIGO OPERADOR
PUBLICA ☐ PRIVADA ☑ MIXTA ☐	PEQUEÑO ☐ GRANDE ☐ INDEPENDIENTE ☑	14-23	83

DIRECCION	CIUDAD/MUNICIPIO	CODIGO	DEPARTAMENTO	CODIGO	TELEFONO	FAX	CORREO ELECTRONICO	ACTIVIDAD ECONOMICA	VALOR NOMINA	TOTAL EMPLEADOS	FECHA DE PAGO (aaaa/mm/dd)	No. AUTORIZACION
CALLE 48 P SUR 05F-18	BOGOTÁ, D.C.	11001	BOGOTÁ D. C.	11	7723882		HAMTAROANDRE@GMAIL.COM	7490	0	1	2021/02/02	860211665

TOTAL APORTES DEL PERIODO A SALUD POR ADMINISTRADORA

COD EPS	NIT EPS	COTIZACION OBLIGATOR	UPC ADICIONAL	INCAPACIDADES No AUTOR	INCAPACIDADES VALOR	LIC MATERNIDAD No AUT	LIC MATERNIDAD VALOR	NETO COTIZAC	DIAS MORA	INTERESES MORA OBL	INTERESES MORA UPC	SUBTOTAL COTIZACION	SUBTOTAL UPC ADIC	No. RADIC SALDO A FAVOR	SALDO A FAVOR COTIZ OBLIG	SALDO A FAVOR UPC ADICIONAL	TOTAL A PAGAR	No. AFIL
EPS017	830003564-7	158.400	0		0		0	158.400	0	0	0	158.400	0		0	0	158.400	1

TOTAL APORTES DEL PERIODO A PENSIONES POR ADMINISTRADORA

COD AFP	NIT AFP	COTIZ OBLIGAT	COTIZ VOL AFILIADO	COTIZ VOL APORTANT	FONDO SOLI PENS	DIAS MORA	INTERES MORA COTIZ	INTERES MORA FONDO	TOTAL A PAGAR	No. AFIL
23001	800227940-8	202.800	0	0	0	0	0	0	202.800	1

TOTAL APORTES DEL PERIODO A CAJAS POR ADMINISTRADORA

COD CCF	NIT CCF	VALOR APORTE	DIAS MORA	INTERESES MORA	TOTAL A PAGAR	No. AFIL

TOTAL APORTES DEL PERIODO A ICBF Y SENA

CONC	VALOR	DIAS MORA	INT MORA	TOTAL A PAGAR	No. AFIL
ICBF					
1	0	0	0	0	0
SENA					
1	0	0	0	0	0

NUMERO DE ADMINISTRADORAS REPORTADAS

PENSIONES	1
SALUD	1
RIESGOS LABORALES	0
CAJAS DE COMPENSACION	0
OTRAS	0
TOTAL	2

TOTAL APORTES DEL PERIODO A RIESGOS LABORALES

COD ARL	NIT ARL	COTIZ OBLIGAT	INCAPACIDADES No.AUTORIZ	INCAPACIDADES VALOR	APORTES OTROS RIESG	VALOR NETO COTIZACION
DIAS MORA	**INTERES MORA COTI**	**SUBTOTAL APORT COTIZ**	**No. RADICAC SALDO A FAVOR**	**SALDO A FAVOR**	**FONDO SOLIDARIDAD**	**TOTAL A PAGAR**

TOTAL APORTES DEL PERIODO A MIN. EDUCACION

VALOR	DIAS MORA	INT MORA FONDO	TOTAL A PAGAR

TOTAL APORTES DEL PERIODO A ESAP

VALOR	DIAS MORA	INT MORA FONDO	TOTAL A PAGAR

TOTAL A PAGAR POR TIPO ADMINISTRADORA	ANTES DE IGE,ILMA,IRP Y MORA	VALOR TOTAL
PENSIONES	202.800	202.800
SALUD	158.400	158.400
RIESGOS LABORALES	0	0
CCF	0	0
SENA	0	0
ICBF	0	0
ESAP	0	0
MINISTERIO DE EDUCACION	0	0
GRAN TOTAL	361.200	361.200

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

DATOS DEL AFILIADO							NOVEDADES																		VALOR IBC						LIQUIDACION DE APORTES				
Nº	TIPO	NUMERO	APELLIDOS Y NOMBRES	COD EPS	COD AFP	COD CAJA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VTE	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	NUEVA EPS	NUEVA AFP	IBC SALUD	IBC PENSION	IBC CAJAS	IBC RIESGOS	DIAS COTIZANTE	ESTRATEGIA	TRABAJO EN EXTERIOR	COTIZ PENSION	FONDO SOLIDAR PENSION	APORTE VOLUNT PENSION	COTIZ SALUD	UPC ADICIONAL
1	CC	53049708	GIRALDO ORTEGA LADY ANDREA	EPS017	23100																				1 266 880	1 266 880	0	5	0			202 800	0	0	158 400	0

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE							
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	1019108010	CRISTIAN CAMILO GAMBOA CASTELLANOS		calle 157a #92-80 torre 2 apto 606	4697580	crgamboac@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2021-01	2021-01	I	15/02/2021	48583330	$259.000	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD												
Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	113.600	0		0		0	0	0	0	113.600	1

TOTALES PENSIÓN												
Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	145.400	0	0	0	0	0	0		145.400	1

TOTALES RIESGOS LABORALES														
Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										

TOTALES CAJAS						
Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados

TOTALES PARAFISCALES				
Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	113.600	113.600
Pensión	1	145.400	145.400
Riesgos Laborales	0	0	0
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	2	259.000	259.000

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	1019108010	CRISTIAN CAMILO GAMBOA CASTELLANOS	calle 157a #92-80 torre 2 apto 606	4697580	crgamboac@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente		BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ. D.C.		NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2021-01	2021-01	I	15/02/2021	48583330	$259.000	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																	PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Exonerado	IRET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	1019108010	GAMBOA CASTELLANOS CRISTIAN CAMILO	3	0			N																230201	908.526	145.400	0	0	0	0	EPS017	908.526	113.600		0		0		0	0	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 73155017		DIAZ HERAZO ERNESTO RAFAEL	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	FINCA LAS MERCEDES VEREDA EL HATO	LA CALERA-CUNDINAMARCA	8741125	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2021-01	2021-01	889230148	9416190163	I	2021/02/04	2021/02/10	BANCO DE BOGOTA	6	$570,400

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION		SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,869,777	$299,200			$1,869,777	$233,800			$1,869,777	$37,400			$0	$0		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,869,777	$299,200			$1,869,777	$233,800			$1,869,777	$37,400			$0	$0		$0	$0
Ciudad: LA CALERA Depto: CUNDINAMARCA (1 Afiliados)					$1,869,777	$299,200			$1,869,777	$233,800			$1,869,777	$37,400			$0	$0		$0	$0
1	CC 73155017	DIAZ ERNESTO	230301	30	$1,869,777	$299,200	EPS017	30	$1,869,777	$233,800	CCF21	30	$1,869,777	$37,400		0	$0	$0	30	$0	$0
Total	**Afiliados(1)**				$1,869,777	$299,200			$1,869,777	$233,800			$1,869,777	$37,400			$0	$0		$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 73155017		DIAZ HERAZO ERNESTO RAFAEL	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	FINCA LAS MERCEDES VEREDA EL HATO	LA CALERA-CUNDINAMARCA	8741125	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2021-01	2021-01	889230148	9416190163	I	2021/02/04	2021/02/10	BANCO DE BOGOTA	6	$570,400

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$299,200	$0	$0	$299,200
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$299,200	$0	$0	$299,200
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$37,400	$0	$0	$37,400
CAFAM	CCF21	860,013,570	3	1	$37,400	$0	$0	$37,400
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$233,800	$0	$0	$233,800
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	1	$233,800	$0	$0	$233,800
TOTAL				1	$570,400	$0	$0	$570,400

2021/02/10 02:00 PM

PAGOSIMPLE | Informe Histórico Resumido

Fecha de Creación del Informe: miércoles, 10 de febrero de 2021 12:44:43 PM

Período del Informe: Desde el 01 de febrero de 2021 hasta el 10 de febrero de 2021

Pagada en horario 05/02/2021

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	INVERSIONES DE SEGURIDAD LTDA		
Documento	NI800093106	**Dirección**	CL 74 #22 - 23
Tipo de Empresa		**Teléfono**	3125691
Tipo Persona		**Forma Presentación**	
Ciudad	BOGOTA D.C.	**Departamento**	BOGOTA D.C.
Representante Legal	PAEZ MONROY LUZ VIRGINIA	**Identificación**	CC41712296

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado		Información del Pago				Novedades																Administradoras								IBC				Liquidación de Aportes								
Identificación del Cotizante	Apellidos y Nombres	Referencia pago (PIN) / Número planilla	Fecha de Pago	Periodo de Cot.	Periodo Serv.	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	AFP	EPS	ARP	CCF	IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Caja	Aporte Pensión	Aporte Salud	Aporte Riesgos	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte Ministerio	TOTAL
CC 10879680	CUADRADO GARCIA ANDRES MANUEL	1035634182	05/02/2021	202101	202102														X				6	6	6	6	231001	EPS002	14-4	CCF26	$261.391	$261.391	$261.391	$261.391	$41.900	$10.500	$0	$10.500	$0	$0	$0	$0	$62.900
CC 10879680	CUADRADO GARCIA ANDRES MANUEL	1035634182	05/02/2021	202101	202102											X							3	3	3	3	231001	EPS002	14-4	CCF26	$109.472	$109.472	$109.472	$109.472	$17.600	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$17.600
CC 10879680	CUADRADO GARCIA ANDRES MANUEL	1035634182	05/02/2021	202101	202102																		19	19	19	19	231001	EPS002	14-4	CCF26	$693.320	$693.320	$693.320	$693.320	$111.000	$27.800	$30.200	$27.800	$0	$0	$0	$0	$196.800
PE 805508315021966	FERNANDEZ ARIAS CARLOS EDUARDO	1035634182	05/02/2021	202101	202102												X						25	25	25	25	230301	EPS008	14-4	CCF26	$757.105	$757.105	$757.105	$757.105	$121.200	$30.300	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$151.500
PE 805508315021966	FERNANDEZ ARIAS CARLOS EDUARDO	1035634182	05/02/2021	202101	202102																		5	5	5	5	230301	EPS008	14-4	CCF26	$182.453	$182.453	$182.453	$182.453	$29.200	$7.300	$8.000	$7.300	$0	$0	$0	$0	$51.800
CC 74183771	HERRERA ACEVEDO JOSUE ORLANDO	1035634182	05/02/2021	202101	202102																		30	30	30	30	230301	EPS005	14-4	CCF26	$1.094.715	$1.094.715	$1.094.715	$1.094.715	$175.200	$43.800	$47.700	$43.800	$0	$0	$0	$0	$310.500
CC 1000033441	ORTIZ AYALA JUAN PABLO	1035634182	05/02/2021	202101	202102																		30	30	30	30	230201	EPS041	14-4	CCF26	$1.094.715	$1.094.715	$1.094.715	$1.094.715	$175.200	$43.800	$47.700	$43.800	$0	$0	$0	$0	$310.500
CC 4229305	OSMA NELSON HUGO	1035634182	05/02/2021	202101	202102																		30	30	30	30	25-14	EPS008	14-4	CCF26	$1.094.715	$1.094.715	$1.094.715	$1.094.715	$175.200	$43.800	$47.700	$43.800	$0	$0	$0	$0	$310.500
CC 4290600	SOLER ESPITIA FAUSTINO	1035634182	05/02/2021	202101	202102																		30	30	30	30	25-14	EPS017	14-4	CCF26	$1.094.715	$1.094.715	$1.094.715	$1.094.715	$175.200	$43.800	$47.700	$43.800	$0	$0	$0	$0	$310.500

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 343 2949 - Cali: 554 0515 - Medellín: 514 66 69 - Bucaramanga: 643 80 00 - Cartagena: 694 54 44 - Pereira: 340 25 82 - Barranquilla: 361 88 50 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

¡El Poder de lo SIMPLE!

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900405131	0	JACARD OBRAS DE INGENIERIA CIVIL SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	CAFAM	calle 48 sur # 13 D -19	BOGOTA-BOGOTA D.E.	3719524	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2021-01	2021-02	882254034	9415895375	E	2021/02/08	2021/02/04	BANCOLOMBIA	0	$5,705,800

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	PE	829132905091983	BASTIDAS PEREZ JOSE EDUARDO																		230301	30	$908,526	$145,400	EPS037	30	$908,526	$36,400	CCF21	30	$908,526	$36,400	14-11	30	$908,526	$63,300	30	$0	$0	SI	$281,500
2	CC	70728180	CARDENAS CARDONA JAIRO ALBERTO							X											230201	30	$908,526	$145,400	EPS037	30	$908,526	$36,400	CCF21	30	$908,526	$36,400	14-11	30	$908,526	$63,300	30	$0	$0	SI	$281,500
3	CC	80500048	CASTELLANOS LOPEZ JOSE ANGEL							X											230301	30	$908,526	$145,400	EPS002	30	$908,526	$36,400	CCF21	30	$908,526	$36,400	14-11	30	$908,526	$63,300	30	$0	$0	SI	$281,500
4	CC	1117814376	CAVIEDES MUÑOZ CELIMO FERNANDO							X											230201	30	$908,526	$145,400	EPS002	30	$908,526	$36,400	CCF21	30	$908,526	$36,400	14-11	30	$908,526	$63,300	30	$0	$0	SI	$281,500
5	CC	17774991	CAVIEDES MUÑOZ JOSE ALFREDO							X											230301	30	$908,526	$145,400	EPS044	30	$908,526	$36,400	CCF21	30	$908,526	$36,400	14-11	30	$908,526	$63,300	30	$0	$0	SI	$281,500
6	CC	1005620183	CAVIEDES MUÑOS LUIS HERNANDO							X											230301	30	$908,526	$145,400	EPS017	30	$908,526	$36,400	CCF21	30	$908,526	$36,400	14-11	30	$908,526	$63,300	30	$0	$0	SI	$281,500
7	CC	1022410556	CAVIEDES MUÑOZ WILLIAM							X											231001	30	$908,526	$145,400	EPS016	30	$908,526	$36,400	CCF21	30	$908,526	$36,400	14-11	30	$908,526	$63,300	30	$0	$0	SI	$281,500
8	CC	80434676	DIAZ CUBIDES JOSE FERNANDO							X											25-14	30	$908,526	$145,400	EPS002	30	$908,526	$36,400	CCF21	30	$908,526	$36,400	14-11	30	$908,526	$63,300	30	$0	$0	SI	$281,500
9	CC	1087115026	ESTACIO EDINSON		X					X											231001	1	$30,285	$4,900	EPS037	1	$30,285	$1,300	CCF21	1	$30,285	$1,300	14-11	1	$30,285	$2,200	1	$0	$0	SI	$9,700
10	CC	13615626	FINO PACHECO HIPOLITO																		230301	30	$908,526	$145,400	EPS037	30	$908,526	$36,400	CCF21	30	$908,526	$36,400	14-11	30	$908,526	$63,300	30	$0	$0	SI	$281,500
11	CC	13992073	FINO VIVAS JHONN JAIME							X											230201	30	$908,526	$145,400	EPS037	30	$908,526	$36,400	CCF21	30	$908,526	$36,400	14-11	30	$908,526	$63,300	30	$0	$0	SI	$281,500
12	CC	9301894	GARCES MONTIEL VICTOR MANUEL							X											230301	30	$908,526	$145,400	EPS017	30	$908,526	$36,400	CCF21	30	$908,526	$36,400	14-11	30	$908,526	$63,300	30	$0	$0	SI	$281,500
13	CC	1079389086	GUILLOMBO RAMIREZ JHON FREDY							X											230201	30	$908,526	$145,400	EPS008	30	$908,526	$36,400	CCF21	30	$908,526	$36,400	14-11	30	$908,526	$63,300	30	$0	$0	SI	$281,500
14	CC	1033718480	MORENO TIRIA RICARDO ANDRES							X											230301	30	$908,526	$145,400	EPS044	30	$908,526	$36,400	CCF21	30	$908,526	$36,400	14-11	30	$908,526	$63,300	30	$0	$0	SI	$281,500
15	CC	6019159	OLAYA TORRES SAMUEL							X											230301	30	$908,526	$145,400	EPS008	30	$908,526	$36,400	CCF21	30	$908,526	$36,400	14-11	30	$908,526	$63,300	30	$0	$0	SI	$281,500
16	PE	954144305101991	PATINO PATINO YUNIOR MARINO							X											230201	30	$908,526	$145,400	EPS017	30	$908,526	$36,400	CCF21	30	$908,526	$36,400	14-11	30	$908,526	$63,300	30	$0	$0	SI	$281,500
17	CC	13992782	RIVERA GONZALES JUAN DIEGO	X																	230301	6	$181,720	$29,100	EPS008	6	$181,720	$7,300	CCF21	6	$181,720	$7,300	14-11	6	$181,720	$12,700	6	$0	$0	SI	$56,400
18	CC	1033797762	ROMERO MORENO JOSE HUMBERTO							X											230301	30	$908,526	$145,400	EPSC34	30	$908,526	$36,400	CCF21	30	$908,526	$36,400	14-11	30	$908,526	$63,300	30	$0	$0	SI	$281,500
19	CC	80878419	SANCHEZ CARDENAS LUIS EVELIO		X					X											230201	1	$30,285	$4,900	EPS017	1	$30,285	$1,300	CCF21	1	$30,285	$1,300	14-11	1	$30,285	$2,200	1	$0	$0	SI	$9,700
20	CC	80353853	SOTO HERNANDO							X											230201	30	$908,526	$145,400	EPS002	30	$908,526	$36,400	CCF21	30	$908,526	$36,400	14-11	30	$908,526	$63,300	30	$0	$0	SI	$281,500
21	CC	1022959819	TAVAREZ FLOREZ EVERARDO							X											230301	30	$908,526	$145,400	EPS017	30	$908,526	$36,400	CCF21	30	$908,526	$36,400	14-11	30	$908,526	$63,300	30	$0	$0	SI	$281,500
22	CC	85441428	TAVAREZ AREVALO EVERARDO							X											230201	30	$908,526	$145,400	EPS016	30	$908,526	$36,400	CCF21	30	$908,526	$36,400	14-11	30	$908,526	$63,300	30	$0	$0	SI	$281,500
23	CC	1007845621	VILLAQUIRAN MONTOYA DUBIER ARBEY							X											230301	30	$908,526	$145,400	EPS002	30	$908,526	$36,400	CCF21	30	$908,526	$36,400	14-11	30	$908,526	$63,300	30	$0	$0	SI	$281,500
Total	Afiliados(23)																						$18,412,810	$2,946,900			$18,412,810	$737,900			$18,412,810	$737,900			$18,412,810	$1,283,100		$0	$0		$5,705,800

2021/02/03 06:32 PM

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900405131	0	JACARD OBRAS DE INGENIERIA CIVIL SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	CAFAM	calle 48 sur # 13 D -19	BOGOTA-BOGOTA D.E.	3719524	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2021-01	2021-02	882254034	9415895375	E	2021/02/08	2021/02/04	BANCOLOMBIA	0	$5,705,800

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				23	$2,946,900	$0	$0	$2,946,900
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	2	$150,300	$0	$0	$150,300
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$145,400	$0	$0	$145,400
PORVENIR	230301	800,224,808	8	12	$1,628,500	$0	$0	$1,628,500
PROTECCION	230201	800,229,739	0	8	$1,022,700	$0	$0	$1,022,700
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				23	$1,283,100	$0	$0	$1,283,100
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	23	$1,283,100	$0	$0	$1,283,100
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				23	$737,900	$0	$0	$737,900
CAFAM	CCF21	860,013,570	3	23	$737,900	$0	$0	$737,900
EPS (ADMINISTRADORAS: 7)				23	$737,900	$0	$0	$737,900
CAPITAL SALUD	EPSC34	900,298,372	9	1	$36,400	$0	$0	$36,400
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	3	$80,100	$0	$0	$80,100
COOMEVA	EPS016	805,000,427	1	2	$72,800	$0	$0	$72,800
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	5	$146,900	$0	$0	$146,900
MEDIMAS EPS	EPS044	901,097,473	5	2	$72,800	$0	$0	$72,800
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	5	$146,900	$0	$0	$146,900
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	5	$182,000	$0	$0	$182,000
TOTAL				23	$5,705,800	$0	$0	$5,705,800

2021/02/03 06:32 PM

ASOPAGOS s.a.

PLANILLA DE AUTOLIQUIDACIÓN DE APORTES
PLANILLA NRO. 19860762
REFERENCIA DE PAGO (PIN):
Fecha Pago Planilla: 2021-02-16

PAGADA

DATOS DEL APORTANTE					
RAZÓN SOCIAL	JB DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES SAS	TIPO DE PERSONA	Jurídica	TIPO DE DOCUMENTO	NIT
Nro. DE IDENTIFICACIÓN	901017504	D.V.	3	TIPO DE APORTANTE	B menor a 200 empleados
DIRECCIÓN DE CORRESPONDENCIA	CLL 58 A NO 87 I 20 SUR	DEPARTAMENTO	BOGOTA D.C	MUNICIPIO	BOGOTA
ACTIVIDAD ECONÓMICA	4390	CORREO ELECTRÓNICO	SOLUCIONESINTEGRAR@HOTMAIL.COM	TELÉFONO	7836568
FAX	0	SUCURSAL	0	NOMBRE SUCURSAL	0
TIPO DE ENTIDAD	Privada	ARL	ARL SURA	Tipo de aportante	Empleador

REPRESENTANTE LEGAL					
Nro. DE IDENTIFICACIÓN	79995587	PRIMER APELLIDO	BELTRAN	SEGUNDO APELLIDO	FLOREZ
PRIMER NOMBRE	JAVIER	SEGUNDO NOMBRE	ALEXANDER		

PERÍODO COTIZACIÓN PENSIÓN		PERÍODO COTIZACIÓN SALUD		FORMA DE PRESENTACIÓN
Año: 2021	Mes: 01	Año: 2021	Mes: 02	Único
Nro. DE TRABAJADORES		Vlr. TOTAL NÓMINA		Nro. DE RADICACIÓN
17		$4.209.515		19860762

IDENTIFICACIÓN DEL AFILIADO									Salario
Identificación	Tipo Vinculación	Subtipo Cot	Ext no obl	Colombiano ext	Dpto	Mun	Tipo de Salario	Nombres	Salario Básico
CC-8748953	01	No	No	No	11	1	Fijo	AMARANTO PRENTT RUBEN DARIO	$908.526
CC-1013626891	01	No	No	No	11	1	Fijo	AMARANTO TABORDA YERBREIDI WILLIAM	$908.526
CC-1012334670	01	No	No	No	11	1	Fijo	BELTRAN FLOREZ AURA YANETH	$908.526
CC-79995587	01	No	No	No	11	1	Fijo	BELTRAN FLOREZ JAVIER ALEXANDER	$908.526
CC-1004636313	01	No	No	No	11	1	Fijo	CABEZAS BATIOJA JOHAN ANDRES	$908.526
PE-956772729071994	01	No	No	No	11	1	Fijo	CONTRERAS ACOSTA LEWIS ANDRES	$908.526
CC-1100551151	01	No	No	No	11	1	Fijo	CROES ANAYA MARVI JOSE	$908.526
CC-1000137161	01	No	No	No	11	1	Fijo	DIAZ RIVEROS KEVIN EDUARDO	$908.526
CC-1051356412	01	No	No	No	11	1	Fijo	ESTRADA CANTILLO MAURICIO	$908.526
CC-79935795	01	No	No	No	11	1	Fijo	FIGUEROA NARVAEZ ALVARO	$908.526
PE-824321517011989	01	No	No	No	11	1	Fijo	LEAL GOMEZ LURKIS LISNAR	$908.526
CC-6465786	01	No	No	No	11	1	Fijo	LEMUS CANO HILDEBRANDO	$908.526
CC-14251174	01	No	No	No	11	1	Fijo	PANTOJA PINZON EDGAR MIGUEL	$908.526
PE-821509308081972	01	No	No	No	11	1	Fijo	PEREZ JOSE RENNY	$908.526
CC-91437461	01	No	No	No	11	1	Fijo	RODRIGUEZ ARCHILA EVELIO	$908.526
CC-7255355	01	No	No	No	11	1	Fijo	VELEZ PEREZ JUAN ALEXANDER	$908.526
CC-80897902	01	No	No	No	11	1	Fijo	VIILABON OLIVERA YERNEY	$908.526

NOVEDADES																														
Identificación	ING	Fecha Ing	RET	Fecha Ret	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	Fecha Nov Vsp	VTE	VST	SLN	Fecha Sln Inicio	Fecha Sln Fin	IGE	Fecha Ige Inicio	Fecha Ige Fin	LMA	Fecha Lma Inicio	Fecha Lma Fin	VAC	Fecha Vac Inicio	Fecha Vac Fin	AVP	VCT	Fecha Vct Inicio	Fecha Vct Fin	IRL	Fecha Irp Inicio	Fecha Irp Fin
CC - 8748953	X	2021-01-20																											0		
CC - 1013626891	X	2021-01-20																											0		
CC - 1012334670	X	2021-01-14	X	2021-01-14																									0		
CC - 79995587																													0		
CC - 1004636313	X	2021-01-20	X	2021-01-20																									0		
PE - 956772729071994	X	2021-01-20																											0		
CC - 1100551151	X	2021-01-12	X	2021-01-12																									0		
CC - 1000137161			X	2021-01-06																									0		
CC - 1051356412	X	2021-01-07	X	2021-01-07																									0		
CC - 79935795			X	2021-01-06																									0		
PE - 824321517011989	X	2021-01-20	X	2021-01-20																									0		

NOVEDADES

Identificación	ING	Fecha Ing	RET	Fecha Ret	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	Fecha Nov Vsp	VTE	VST	SLN	Fecha Sln Inicio	Fecha Sln Fin	IGE	Fecha Ige Inicio	Fecha Ige Fin	LMA	Fecha Lma Inicio	Fecha Lma Fin	VAC	Fecha Vac Inicio	Fecha Vac Fin	AVP	VCT	Fecha Vct Inicio	Fecha Vct Fin	IRL	Fecha Irp Inicio	Fecha Irp Fin
CC - 6465786			X	2021-01-07																									0		
CC - 14251174			X	2021-01-06																									0		
PE - 821509308081972	X	2021-01-05	X	2021-01-05																									0		
CC - 91437461																													0		
CC - 7255355			X	2021-01-14																									0		
CC - 80897902	X	2021-01-06	X	2021-01-06																									0		

SISTEMA GENERAL DE PENSIONES

Identificación	AFP	Dias Cotizados	IBC pensión	Tarifa	Cot Obl	Cot Vol Afil	Cot Vol Aport	Total Cot	Fondo Sol	Fondo Subsistencia	Vlr no ret
CC - 8748953	PROTECCION	11	$333.127	0.1600000	$53.400	$0	$0	$53.400	$0	$0	$0
CC - 1013626891	COLFONDOS	11	$333.127	0.1600000	$53.400	$0	$0	$53.400	$0	$0	$0
CC - 1012334670	PROTECCION	1	$30.285	0.1600000	$4.900	$0	$0	$4.900	$0	$0	$0
CC - 79995587	PROTECCION	30	$908.526	0.1600000	$145.400	$0	$0	$82.400	$0	$0	$0
CC - 1004636313	PROTECCION	1	$30.285	0.1600000	$4.900	$0	$0	$4.900	$0	$0	$0
PE - 956772729071994	PORVENIR	11	$333.127	0.1600000	$53.400	$0	$0	$53.400	$0	$0	$0
CC - 1100551151	PROTECCION	1	$30.285	0.1600000	$4.900	$0	$0	$4.900	$0	$0	$0
CC - 1000137161	PORVENIR	6	$181.706	0.1600000	$29.100	$0	$0	$29.100	$0	$0	$0
CC - 1051356412	PORVENIR	1	$30.285	0.1600000	$4.900	$0	$0	$4.900	$0	$0	$0
CC - 79935795	PORVENIR	6	$181.706	0.1600000	$29.100	$0	$0	$29.100	$0	$0	$0
PE - 824321517011989	PORVENIR	1	$30.285	0.1600000	$4.900	$0	$0	$4.900	$0	$0	$0
CC - 6465786	PORVENIR	7	$211.990	0.1600000	$34.000	$0	$0	$34.000	$0	$0	$0
CC - 14251174	PROTECCION	6	$181.706	0.1600000	$29.100	$0	$0	$29.100	$0	$0	$0
PE - 821509308081972	PORVENIR	1	$30.285	0.1600000	$4.900	$0	$0	$4.900	$0	$0	$0
CC - 91437461	PORVENIR	30	$908.526	0.1600000	$145.400	$0	$0	$82.400	$0	$0	$0
CC - 7255355	PORVENIR	14	$423.979	0.1600000	$67.900	$0	$0	$67.900	$0	$0	$0
CC - 80897902	COLFONDOS	1	$30.285	0.1600000	$4.900	$0	$0	$4.900	$0	$0	$0

SISTEMA GENERAL DE SALUD											SISTEMA GENERAL DE RIESGOS PROFESIONALES				
Identificación	EPS	Dias Cot	IBC salud	Tarifa	Cot Obl	UPC Adic	Núm Aut EG	Valor EG	Núm Aut Lic	Valor Lic	Dias Cot	IBC Riesgos	Cód CT	Tarifa	Cot Obl
CC - 8748953	EPS-S MUTUAL - MOV	11	$333.127	0.0400000	$13.400	$0	0	$0	0	$0	11	$333.127	7020	0.0696000	$23.200
CC - 1013626891	SALUD TOTAL	11	$333.127	0.0400000	$13.400	$0	0	$0	0	$0	11	$333.127	7020	0.0696000	$23.200
CC - 1012334670	EPS-S CAPITAL	1	$30.285	0.0400000	$1.300	$0	0	$0	0	$0	1	$30.285	7020	0.0696000	$2.200
CC - 79995587	FAMISANAR	30	$908.526	0.0400000	$36.400	$0	0	$0	0	$0	30	$908.526	7020	0.0696000	$66.000
CC - 1004636313	FAMISANAR	1	$30.285	0.0400000	$1.300	$0	0	$0	0	$0	1	$30.285	7020	0.0696000	$2.200
PE - 956772729071994	FAMISANAR	11	$333.127	0.0400000	$13.400	$0	0	$0	0	$0	11	$333.127	7020	0.0696000	$23.200
CC - 1100551151	EPS-S CAPITAL	1	$30.285	0.0400000	$1.300	$0	0	$0	0	$0	1	$30.285	7020	0.0696000	$2.200
CC - 1000137161	FAMISANAR	6	$181.706	0.0400000	$7.300	$0	0	$0	0	$0	6	$181.706	7020	0.0696000	$12.700
CC - 1051356412	FAMISANAR	1	$30.285	0.0400000	$1.300	$0	0	$0	0	$0	1	$30.285	7020	0.0696000	$2.200
CC - 79935795	EPS-S MUTUAL - MOV	6	$181.706	0.0400000	$7.300	$0	0	$0	0	$0	6	$181.706	7020	0.0696000	$12.700
PE - 824321517011989	SALUD TOTAL	1	$30.285	0.0400000	$1.300	$0	0	$0	0	$0	1	$30.285	7020	0.0696000	$2.200
CC - 6465786	FAMISANAR	7	$211.990	0.0400000	$8.500	$0	0	$0	0	$0	7	$211.990	7020	0.0696000	$14.800
CC - 14251174	EPS SURA	6	$181.706	0.0400000	$7.300	$0	0	$0	0	$0	6	$181.706	7020	0.0696000	$12.700
PE - 821509308081972	SALUD TOTAL	1	$30.285	0.0400000	$1.300	$0	0	$0	0	$0	1	$30.285	7020	0.0696000	$2.200
CC - 91437461	NUEVA E.P.S. S.A.	30	$908.526	0.0400000	$36.400	$0	0	$0	0	$0	30	$908.526	7020	0.0696000	$66.000
CC - 7255355	NUEVA E.P.S. S.A.	14	$423.979	0.0400000	$17.000	$0	0	$0	0	$0	14	$423.979	7020	0.0696000	$29.600
CC - 80897902	MEDIMAS EPS	1	$30.285	0.0400000	$1.300	$0	0	$0	0	$0	1	$30.285	7020	0.0696000	$2.200

456

APORTES PARAFISCALES													
Identificación	CCF	Días Cot a CCF	IBC Cajas	Tarifa CCF	Aporte CCF	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF	Tarifa ESAP	Aporte ESAP	Tarifa Min Edu	Aporte Min Edu
CC-8748953	COMPENSAR-CCF	11	$333.127	0.0400000	$13.400	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1013626891	COMPENSAR-CCF	11	$333.127	0.0400000	$13.400	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1012334670	COMPENSAR-CCF	1	$30.285	0.0400000	$1.300	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-79995587	COMPENSAR-CCF	30	$908.526	0.0400000	$36.400	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1004636313	COMPENSAR-CCF	1	$30.285	0.0400000	$1.300	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
PE-956772729071994	COMPENSAR-CCF	11	$333.127	0.0400000	$13.400	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1100551151	COMPENSAR-CCF	1	$30.285	0.0400000	$1.300	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1000137161	COMPENSAR-CCF	6	$181.706	0.0400000	$7.300	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1051356412	COMPENSAR-CCF	1	$30.285	0.0400000	$1.300	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-79935795	COMPENSAR-CCF	6	$181.706	0.0400000	$7.300	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
PE-824321517011989	COMPENSAR-CCF	1	$30.285	0.0400000	$1.300	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-6465786	COMPENSAR-CCF	7	$211.990	0.0400000	$8.500	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-14251174	COMPENSAR-CCF	6	$181.706	0.0400000	$7.300	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
PE-821509308081972	COMPENSAR-CCF	1	$30.285	0.0400000	$1.300	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-91437461	COMPENSAR-CCF	30	$908.526	0.0400000	$36.400	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-7255355	COMPENSAR-CCF	14	$423.979	0.0400000	$17.000	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-80897902	COMPENSAR-CCF	1	$30.285	0.0400000	$1.300	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0

TOTALES PARA EL PERÍODO 2021 - 01											
TOTAL APORTES DEL PERÍODO A PENSIÓN POR ADMINISTRADORA											
ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR COTIZACIÓN VOL AFIL	VLR COTIZACIÓN VOL APOR	VLR APORTE FONDO PENSIÓN SOL	VLR APORTE FONDO PENSIÓN SUBS	DÍAS MORA	VLR INTERESES	VLR INTERESES FONDO DE SOLIDARIDAD	VLR INTERESES FONDO DE SUBSISTENCIA	TOTAL PAGAR
COLFONDOS	2	$58.300	$0	$0	$0	$0	0	$0	$0	$0	$58.300
PROTECCION	6	$242.600	$0	$0	$0	$0	0	$0	$0	$0	$242.600
PORVENIR	9	$373.600	$0	$0	$0	$0	0	$0	$0	$0	$373.600

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A SALUD POR ADMINISTRADORA																			
ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR UPC	AUT. IGE	VLR IGE	AUT. DESC LMA	VLR LMA	VLR NETO APORTES DE COT	DÍAS MORA	VLR INTERESES COT OBL	VLR INTERESES UPC	SUBTOTAL APORTES COT	SUBTOTAL APORTES	RADICACIÓN AUTOLIQ INICIAL	SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR COT OBL	SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR UPC	TOTAL PAGAR COT OBL	TOTAL PAGAR UPC	FONDO DE SOL SALUD	TOTAL PAGAR
FAMISANAR	6	$68.400	$0	0	$0	0	$0	$52.400	0	$0	$0	$68.400	$0	0	$0	$0	$68.400	$0	$0	$68.400
NUEVA E.P.S. S.A.	2	$53.600	$0	0	$0	0	$0	$53.600	0	$0	$0	$53.600	$0	0	$0	$0	$53.600	$0	$0	$53.600
MEDIMAS EPS	1	$1.300	$0	0	$0	0	$0	$1.300	0	$0	$0	$1.300	$0	0	$0	$0	$1.300	$0	$0	$1.300
SALUD TOTAL	3	$16.000	$0	0	$0	0	$0	$16.000	0	$0	$0	$16.000	$0	0	$0	$0	$16.000	$0	$0	$16.000
EPS-S CAPITAL	2	$2.600	$0	0	$0	0	$0	$2.600	0	$0	$0	$2.600	$0	0	$0	$0	$2.600	$0	$0	$2.600
EPS-S MUTUAL - MOV	2	$20.700	$0	0	$0	0	$0	$20.700	0	$0	$0	$20.700	$0	0	$0	$0	$20.700	$0	$0	$20.700
EPS SURA	1	$7.300	$0	0	$0	0	$0	$7.300	0	$0	$0	$7.300	$0	0	$0	$0	$7.300	$0	$0	$7.300

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A RIESGOS PROFESIONALES POR ADMINISTRADORA												
ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	NÚM AUT PAGO INCAPACIDADES	VLR INCAPACIDADES	VLR APORTES PAGADOS A OTROS RIESGOS	VLR NETO APORTES COTIZACIÓN	DÍAS MORA	INT MORA COT OBL	SUBTOTAL APORTES COT	NÚM RAD AUTOLIQUIDACIÓN INICIAL	SALDO A FAVOR PERÍODO ANTERIOR	FONDO SOL RIESGOS PROFESIONALES	TOTAL PAGAR
ARL SURA	17	$296.500	0	$0	$0	$296.500	0	$0	$296.500	0	$0	$0	$296.500

TOTAL APORTES PARAFISCALES					
NOMBRE ENTIDAD	NÚM DE AFIL	VLR TOTAL APORTES	DÍAS MORA	INTERESES MORA	TOTAL A PAGAR
COMPENSAR-CCF	17	$164.100	0	$0	$164.100
SENA	0	$0	0	$0	$0
ICBF	0	$0	0	$0	$0
ESAP	0	$0	0	$0	$0
MinEdu	0	$0	0	$0	$0

TOTAL A PAGAR		
CONCEPTO	TOTAL ENTIDADES	VALOR
SALUD	7	$169.900
PENSIONES	3	$674.500
RIESGOS PROFESIONALES	1	$296.500
CAJAS DE COMPENSACIÓN	1	$164.100
SENA	1	$0
ICBF	1	$0
ESAP	1	$0
MINISTERIO DE EDUCACIÓN	1	$0
GRAN TOTAL	1	$1.305.000

aportes en línea

Planilla Integrada

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 9115933		URIETA MENDEZ JOSE DE LOS SANTOS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	JOSE URIETA	dg 48 13 i 39	BOGOTA-BOGOTA D.E.	5358604	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2021-01	2021-02	878746819	9415730210	E	2021/02/08	2021/02/01	BANCO BBVA COLOMBIA S.A.	0	$1,080,700

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

| EMPLEADO | | | | | | | | | NOVEDADES | | | | | | | | |

aportes en línea

Planilla Integrada

							SALARIO			PENSION												SALUD					
t	Fecha Inicio vct	Fecha Fin vct	irl	Fecha Inicio irl	Fecha Fin irl	vip	Valor	Integral	Tipo de Salario	Administradora	Dias	IBC	Tarifa	Tarifa Alto Riesgo Pensión	Valor Cotizacion	Cotizacion Voluntaria Empleador	Cotizacion Voluntaria Afiliado	Fondo Sobidaridad Pensional	Fondo Subsistencia	Valor No retenido	Total	AFP Destino	Administradora	Dias	IBC	Tarifa	Valor Cotización	Valor UPC
							$ 908.526	No	Fijo	PORVENIR	1	$ 30.285	16%	SIN RIESGO	$ 4.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 4.900		SALUD TOTAL	1	$ 30.285	4%	$ 1.300	$
							$ 908.526	No	Fijo	PORVENIR	1	$ 30.285	16%	SIN RIESGO	$ 4.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 4.900		SALUD TOTAL	1	$ 30.285	4%	$ 1.300	$
							$ 908.526	No	Fijo	PORVENIR	26	$ 787.390	16%	SIN RIESGO	$ 126.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 126.000		FAMISANAR	26	$ 787.390	4%	$ 31.500	$
							$ 908.526	No	Fijo	PROTECCION	17	$ 514.832	16%	SIN RIESGO	$ 82.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 82.400		FAMISANAR	17	$ 514.832	4%	$ 20.600	$
							$ 908.526	No	Fijo	PORVENIR	2	$ 60.569	16%	SIN RIESGO	$ 9.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 9.700		CAPITAL SALUD	2	$ 60.569	4%	$ 2.500	$
							$ 908.526	No	Fijo	PORVENIR	26	$ 787.390	16%	SIN RIESGO	$ 126.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 126.000		SALUD TOTAL	26	$ 787.390	4%	$ 31.500	$
							$ 908.526	No	Fijo	PORVENIR	1	$ 30.285	16%	SIN RIESGO	$ 4.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 4.900		FAMISANAR	1	$ 30.285	4%	$ 1.300	$
							$ 908.526	No	Fijo	PORVENIR	2	$ 60.569	16%	SIN RIESGO	$ 9.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 9.700		SALUD TOTAL	2	$ 60.569	4%	$ 2.500	$
							$ 908.526	No	Fijo	PORVENIR	25	$ 757.105	16%	SIN RIESGO	$ 121.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 121.200		SALUD TOTAL	25	$ 757.105	4%	$ 30.300	$
							$ 908.526	No	Fijo	PROTECCION	13	$ 393.695	16%	SIN RIESGO	$ 63.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 63.000		COMPENSAR	13	$ 393.695	4%	$ 15.800	$
							$ 908.526	No	Fijo	PORVENIR	1	$ 30.285	16%	SIN RIESGO	$ 4.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 4.900		SALUD TOTAL	1	$ 30.285	4%	$ 1.300	$
																					$ 557.600						$ 139.900	

aportes en línea

Planilla Integrada

			CCF					RIESGOS						PARAFISCALES										
	Total	EPS Destino	Administradora	Días	IBC	Tarifa	Valor Cotización	Administradora	Días	IBC	Tarifa	Clase Riesgo	Valor Cotización	Días	IBC	Tarifa SENA	Valor Cotización SENA	Tarifa ICBF	Valor Cotización ICBF	Tarifa ESAP	Valor Cotización ESAP	Tarifa MEN	Valor Cotización MEN	Exonerado SENA e ICBF
0	$ 1.300		CAFAM	1	$ 30.285	4%	$ 1.300	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	1	$ 30.285	6,96%	5	$ 2.200	1	$ 0	0%	$ 0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	SI
0	$ 1.300		CAFAM	1	$ 30.285	4%	$ 1.300	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	1	$ 30.285	6,96%	5	$ 2.200	1	$ 0	0%	$ 0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	SI
0	$ 31.500		CAFAM	26	$ 787.390	4%	$ 31.500	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	26	$ 787.390	6,96%	5	$ 54.900	26	$ 0	0%	$ 0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	SI
0	$ 20.600		CAFAM	17	$ 514.832	4%	$ 20.600	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	17	$ 514.832	6,96%	5	$ 35.900	17	$ 0	0%	$ 0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	SI
0	$ 2.500		CAFAM	2	$ 60.569	4%	$ 2.500	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	2	$ 60.569	6,96%	5	$ 4.300	2	$ 0	0%	$ 0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	SI
0	$ 31.500		CAFAM	26	$ 787.390	4%	$ 31.500	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	26	$ 787.390	6,96%	5	$ 54.900	26	$ 0	0%	$ 0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	SI
0	$ 1.300		CAFAM	1	$ 30.285	4%	$ 1.300	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	1	$ 30.285	6,96%	5	$ 2.200	1	$ 0	0%	$ 0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	SI
0	$ 2.500		CAFAM	2	$ 60.569	4%	$ 2.500	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	2	$ 60.569	6,96%	5	$ 4.300	2	$ 0	0%	$ 0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	SI
0	$ 30.300		CAFAM	25	$ 757.105	4%	$ 30.300	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	25	$ 757.105	6,96%	5	$ 52.700	25	$ 0	0%	$ 0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	SI
0	$ 15.800		CAFAM	13	$ 393.695	4%	$ 15.800	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	13	$ 393.695	6,96%	5	$ 27.500	13	$ 0	0%	$ 0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	SI
0	$ 1.300		CAFAM	1	$ 30.285	4%	$ 1.300	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	1	$ 30.285	6,96%	5	$ 2.200	1	$ 0	0%	$ 0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	SI
	$ 139.900						$ 139.900						$ 243.300				$ 0		$ 0		$ 0		$ 0	

aportes en línea

Planilla Integrada

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 9115933		URIETA MENDEZ JOSE DE LOS SANTOS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	JOSE URIETA	dg 48 13 I 39	BOGOTA-BOGOTA D.E.	5358604	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2021-01	2021-02	878746819	9415730210	E	2021/02/08	2021/02/01	BANCO BBVA COLOMBIA S.A.	0	$1,080,700

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 2)				11	$557,600	$0	$0	$557,600
PORVENIR	230301	800,224,808	8	9	$412,200	$0	$0	$412,200
PROTECCION	230201	800,229,739	0	2	$145,400	$0	$0	$145,400
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				11	$243,300	$0	$0	$243,300
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	11	$243,300	$0	$0	$243,300
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				11	$139,900	$0	$0	$139,900
CAFAM	CCF21	860,013,570	3	11	$139,900	$0	$0	$139,900
EPS (ADMINISTRADORAS: 4)				11	$139,900	$0	$0	$139,900
CAPITAL SALUD	EPSC34	900,298,372	9	1	$2,500	$0	$0	$2,500
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	1	$15,800	$0	$0	$15,800
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	3	$53,400	$0	$0	$53,400
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	6	$68,200	$0	$0	$68,200
TOTAL				11	$1,080,700	$0	$0	$1,080,700

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 9115933		URIETA MENDEZ JOSE DE LOS SANTOS	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CR 11 C 49 A SUR	BOGOTA-BOGOTA D.E.	8932001	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2021-01	2021-01	889018975	9416177037	I	2021/02/08	2021/02/10	BANCO BBVA COLOMBIA S.A.	2	$279,400

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
1	CC	9115933	URIETA JOSE	230301	26	$787,390	$126,000	EPS002	26	$787,390	$98,500		0	$0	$0	14-23	26	$787,390	$54,900	0	$0	$0
Total	**Afiliados(1)**					$787,390	$126,000			$787,390	$98,500			$0	$0			$787,390	$54,900		$0	$0

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$126,000	$0	$0	$126,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$126,000	$0	$0	$126,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$54,900	$0	$0	$54,900
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$54,900	$0	$0	$54,900
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$98,500	$0	$0	$98,500
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	$98,500	$0	$0	$98,500
TOTAL				1	$279,400	$0	$0	$279,400

2021/02/10 11:32 AM

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900093077	1	GEOPAV LTDA	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	GEOPAV LTDA	CRA 129 No 23-48	BOGOTA-BOGOTA D.E.	2988838	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Días Mora	Valor
2021-01	2021-02	845105694	9414408985	E	2021/02/17	2021/02/17	BANCO AV VILLAS	0	$139.300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
Sucursal: GEOPAV LTDA (1 Afiliados)					$877.803	$140.500			$877.803	$35.200			$877.803	$35.200			$877.803	$21.400		$0	$0
Centro de Trabajo: LABORATORIO (1 Afiliados)					$877.803	$140.500			$877.803	$35.200			$877.803	$35.200			$877.803	$21.400		$0	$0
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)					$877.803	$140.500			$877.803	$35.200			$877.803	$35.200			$877.803	$21.400		$0	$0
1	CC 80012679	FRACOCA FABIO	230201	30	$877.803	$140.500	EPS017	30	$877.803	$35.200	CCF21	30	$877.803	$35.200	14	30	$877.803	$21.400	0	$0	$0
Total	**Afiliados(1)**				$877.803	$140.500			$877.803	$35.200			$877.803	$35.200			$877.803	$21.400		$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900093077	1	GEOPAV LTDA	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	GEOPAV LTDA	CRA 129 No 23 48	BOGOTA-BOGOTA D.E.	2988838	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2021-01	2021-02	845105694	9414408985	E	2021/02/17	2021/01/17	BANCO AV VILLAS	0	$232.300

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$140.500	$0	$0	$140.500
PROTECCION	230201	800.229.739	0	1	$140.500	$0	$0	$140.500
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$21.400	$0	$0	$21.400
LA EQUIDAD SEGUROS	14-29	830.008.686	1	1	$21.400	$0	$0	$21.400
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$35.200	$0	$0	$35.200
CAFAM	CCF21	860.013.570	3	1	$35.200	$0	$0	$35.200
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$35.200	$0	$0	$35.200
FAMISANAR	EPS017	830.003.564	7	1	$35.200	$0	$0	$35.200
TOTAL				1	$232.300	$0	$0	$232.300

compensar | miplanilla.com

CERTIFICADO DE APORTES AL SISTEMA DE PROTECCIÓN SOCIAL

El aportante **Leonardo Contreras Zartha**, identificado con **CC** número **1013668833**, aportó en nombre de **Leonardo Contreras Zartha**, identificado(a) con **CC** número **1013668833** en su condición a la fecha como tipo de cotizante **3 - Independiente** por concepto de aportes obligatorios al sistema General de Seguridad Social, mediante la Planilla Integrada de Liquidación de Aportes, para los periodos comprendidos en pensión **2020-12** y salud **2020-12** de la siguiente manera:

CÓDIGO	NOMBRE DE ADMINISTRADORA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	CORRECCIÓN	DIAS	IBC	COTIZACIÓN	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	PERIODO	NÚMERO DE PLANILLA	FECHA DE PAGO	EXONERADO PARAFISCALES Y SALUD
230201	Proteccion (ING + Proteccion)															0		30	$877.803	$140.500	$0	$0	Diciembre - 2020	47921790	12/01/2021	N
EPS005	Sanitas EPS															0		30	$877.803	$109.800	$0	$0	Diciembre - 2020	47921790	12/01/2021	N

PAGADO

El presente certificado se expide a los 12 días del mes Enero de 2021

Este documento está clasificado como privado por parte de Compensar Operador de Información.

ASOPAGOS s.a.

RAZON SOCIAL :	MONICA ROCIO MUNOZ
IDENTIFICACION:	CC-52393006
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACION REPORTE:	2021-02-03
FECHA LIMITE DE PAGO:	2021-02-03
FECHA DE PAGO:	2021-02-03
ENTIDAD DE PAGO:	BANCOLOMBIA
PERIODO PENSION:	2021-01
PERIODO SALUD:	2021-01
NUMERO PLANILLA:	19647451
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	19647451
TIPO DE PLANILLA:	I

CODIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NUMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS005	800251440	SANITAS	1	$ 908.526	$ 0	$ 0	$ 0	$ 113.600	$ 113.600
230301	800224808	PORVENIR	1	$ 908.526	$ 0	$ 0	$ 0	$ 145.400	$ 145.400
14-23	860011153	POSITIVA	1	$ 908.526	$ 0	$ 0	$ 0	$ 63.300	$ 63.300
				Total a pagar	$ 0	$ 0	$ 0	$ 322.300	$ 322.300

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	02/03/2021

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901351629-6	CONSORCIO OPORTO	cl 18 sur 29 d 12	3015621023	consrocio.oporto@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	C – MIPYME		BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
					9	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2021-02	2021-01	E	10/02/2021	48527178	$4.144.100	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS002	Salud Total EPS	800130907-4	30.300	0		0		0	0	0	0	30.300	1
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	96.000	0		0		0	0	0	0	96.000	1
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	72.800	0		0		0	0	0	0	72.800	2
EPS010	EPS Sura	800088702-2	200.000	0		0		0	0	0	0	200.000	1
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	61.900	0		0		0	0	0	0	61.900	3
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	68.000	0		0		0	0	0	0	68.000	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	1.237.100	0	0	25.000	25.000	0	0		1.287.100	4
230301	Porvenir	800224808-8	466.400	0	0	0	0	0	0		466.400	2
231001	Colfondos	800227940-8	121.200	0	0	0	0	0	0		121.200	1
25-14	Colpensiones	900336004-7	290.800	0	0	0	0	0	0		290.800	2

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-11	ARL SURA	890903790-5	920.600				920.600	0	0	920.600			9.206	920.600	9

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF24	Compensar Caja	860066942-7	529.000	0	0	529.000	9

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901351629-6	CONSORCIO OPORTO	cl 18 sur 29 d 12	3015621023	consrocio.oporto@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	C – MIPYME		BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ. D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					9	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2021-02	2021-01	E	10/02/2021	48527176	$4.144.100	

TOTALES PARAFISCALES				
Valor Aporte	Dias Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	6	529.000	529.000
Pensión	4	2.165.500	2.165.500
Riesgos Laborales	1	920.600	920.600
CCF	1	529.000	529.000
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	12	4.144.100	4.144.100

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE							
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901351629-6	CONSORCIO OPORTO		cl 18 sur 29 d 12	3015621023	consrocio.oporto@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	C – MIPYME			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					9	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2021-02	2021-01	E	10/02/2021	48527176	$4.144.100	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	1012422954	CARDONA GALEANO DAVID FELIPE	1	0			S																	25-14	908.526	145.400	0	0	0	0	EPS008	908.526	36.400	14-11	908.526	5	63.300	CCF24	908.526	36.400	0	0	0	0	0
2	CC	1013641189	MORENO SUAREZ MARIBEL	1	0			S	X	X															230201	151.421	24.300	0	0	0	0	EPS017	151.421	6.100	14-11	151.421	5	10.600	CCF24	151.421	6.100	0	0	0	0	0
3	CC	1018459532	HUERTAS RODRIGUEZ NELSON ENRIQUE	1	0			S	X																230201	880.000	140.800	0	0	0	0	EPS017	880.000	35.200	14-11	880.000	5	61.300	CCF24	880.000	35.200	0	0	0	0	0
4	CC	1018460149	DIAZ GONZALEZ CRISTIAN DAVID	1	0			S																	230201	5.000.000	800.000	0	0	25.000	25.000	EPS010	5.000.000	200.000	14-11	5.000.000	4	348.000	CCF24	5.000.000	200.000	0	0	0	0	0
5	CC	1022949654	DIAZ GONZALEZ CARLOS ANDRES	1	0			S	X	X															231001	757.105	121.200	0	0	0	0	EPS002	757.105	30.300	14-11	757.105	3	52.700	CCF24	757.105	30.300	0	0	0	0	0
6	CC	1026281608	GUERRERO BOYACA HEYBER JEFFERSON	1	0			S	X																230301	514.832	82.400	0	0	0	0	EPS017	514.832	20.600	14-11	514.832	5	35.900	CCF24	514.832	20.600	0	0	0	0	0
7	CC	1054091050	NOVA JEREZ ROBINSON GERMAN	1	0			S																	230301	2.400.000	384.000	0	0	0	0	EPS005	2.400.000	96.000	14-11	2.400.000	5	167.100	CCF24	2.400.000	96.000	0	0	0	0	0
8	CC	65753876	MORA CAMPOS MARYI ROCIO	1	0			S																	25-14	908.526	145.400	0	0	0	0	EPS008	908.526	36.400	14-11	908.526	5	63.300	CCF24	908.526	36.400	0	0	0	0	0
9	CC	70726180	CARDENAS CARDONA JAIRO ALBERTO	1	0			S																	230201	1.700.000	272.000	0	0	0	0	EPS037	1.700.000	68.000	14-11	1.700.000	5	118.400	CCF24	1.700.000	68.000	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901351629-6	CONSORCIO OPORTO	cl 18 sur 29 d 12	3015621023	consrocio.oporto@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	C – MIPYME		BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				8	0
					TOTAL A PAGAR	
2021-01	2021-01	Y	10/02/2021	48527075	$577.200	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD												
Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					

TOTALES PENSIÓN												
Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados

TOTALES RIESGOS LABORALES														
Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-11	ARL SURA	830603790-5	577.200				577.200	0	0	577.200			5.772	577.200	8

TOTALES CAJAS						
Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados

TOTALES PARAFISCALES				
Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	0	0	0
Pensión	0	0	0
Riesgos Laborales	1	577.200	577.200
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	1	577.200	577.200

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	901351629-6	CONSORCIO OPORTO		cl 18 sur 29 d 12	3015621023	consrocio.oporto@gmail.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	C – MIPYME			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ. D.C.	

EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					8	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2021-01	2021-01	Y	10/02/2021	48527075	$577.200	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE								INFORMACIÓN NOVEDADES																PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES					
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Cotiza. exterior	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	1012374654	NEVA MELO JINET MELISSA	59	0				N	X	X															0	0	0	0	0	0		0	0	14-11	787.390	5	54.900		0	0	0	0	0	0	0
2	CC	1013668833	CONTRERAS ZARTHA LEONARDO	59	0				N		X															0	0	0	0	0	0		0	0	14-11	908.526	5	63.300		0	0	0	0	0	0	0
3	CC	1018459532	HUERTAS RODRIGUEZ NELSON ENRIQUE	59	0				N	X	X															0	0	0	0	0	0		0	0	14-11	787.390	5	54.900		0	0	0	0	0	0	0
4	CC	1019108010	GAMBOA CASTELLANOS CRISTIAN CAMILO	59	0				N																	0	0	0	0	0	0		0	0	14-11	908.526	5	63.300		0	0	0	0	0	0	0
5	CC	1069740197	GUTIERREZ VARGAS ANGELA JULIETH	59	0				N	X	X															0	0	0	0	0	0		0	0	14-11	817.674	5	57.000		0	0	0	0	0	0	0
6	CC	52393006	MUÑOZ HERNANDEZ MONICA ROCIO	59	0				N																	0	0	0	0	0	0		0	0	14-11	908.526	5	63.300		0	0	0	0	0	0	0
7	CC	53049708	GIRALDO ORTEGA LADY ANDREA	59	0				N																	0	0	0	0	0	0		0	0	14-11	1.266.880	5	88.200		0	0	0	0	0	0	0
8	CC	73155017	DIAZ HERAZO ERNESTO RAFAEL	59	0				N																	0	0	0	0	0	0		0	0	14-11	1.900.590	5	132.300		0	0	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901106731-0	SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES S&S SAS	CRA 45 No. 22 -05	3153390362	ccmjrsan@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
SUCURSAL	C – MIPYME	SAN CRISTOBAL / OBRA 3	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					30	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2021-02	2021-01	E	08/02/2021	48485830	$8.183.600	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS002	Salud Total EPS	800130907-4	199.000	0		0		0	0	0	0	199.000	7
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	94.700	0		0		0	0	0	0	94.700	3
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	86.400	0		0		0	0	0	0	86.400	6
EPS010	EPS Sura	800088702-2	37.700	0		0		0	0	0	0	37.700	2
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	236.500	0		0		0	0	0	0	236.500	8
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	106.700	0		0		0	0	0	0	106.700	2
EPS044	MEDIMAS EPS SAS	901097473-5	2.500	0		0		0	0	0	0	2.500	1
ESSC24	EPS-S Coosalud	900226715-3	36.400	0		0		0	0	0	0	36.400	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	1.094.600	0	0	0	0	0	0		1.094.600	9
230301	Porvenir	800224808-8	1.555.800	0	0	0	0	0	0		1.555.800	15
231001	Colfondos	800227940-6	9.700	0	0	0	0	0	0		9.700	1
25-14	Colpensiones	900336004-7	533.200	0	0	0	0	0	0		533.200	5

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-11	ARL SURA	890903790-5	1.390.500				1.390.500	0	0	1.390.500			13.805	1.390.500	30

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF24	Compensar Caja	860066942-7	799.900	0	0	799.900	30

PAGADA
48485830

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

474

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901106731-0	SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES S&S SAS		CRA 45 No. 22 -05	3153390362	ccmjrsan@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
SUCURSAL	C -- MIPYME	SAN CRISTOBAL	OBRA 3	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					30	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2021-02	2021-01	E	08/02/2021	48485630	$6.183.600	

TOTALES PARAFISCALES				
Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	8	799.900	799.900
Pensión	4	3.193.300	3.193.300
Riesgos Laborales	1	1.390.500	1.390.500
CCF	1	799.900	799.900
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	14	6.183.600	6.183.600

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901106731-0	SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES S&S SAS	CRA 45 No. 22 -05	3153390362	ccmjrsan@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
SUCURSAL	C – MIPYME	SAN CRISTOBAL / OBRA 3	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					30	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2021-02	2021-01	E	08/02/2021	48485630	$8.183.600	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE								INFORMACIÓN NOVEDADES																		PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Colocante	Subtipo	Extranjero	Cotiz. exterior	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	COMENTARIOS	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	1024538135	LOPEZ MORENO CRISTIAN CAMILO	1	0			S	X																230301	60.569	9.700	0	0	0	0	EPS010	60.569	2.500	14-11	60.569	5	4.300	CCF24	60.569	2.500	0	0	0	0	0
2	CC	1033706128	LOPEZ CARDONA JULIAN ANDRES	1	0			S		X															230201	60.569	9.700	0	0	0	0	EPS044	60.569	2.500	14-11	60.569	5	4.300	CCF24	60.569	2.500	0	0	0	0	0
3	CC	1033765496	PINTO CASTILLO FABIO ALEXANDER	1	0			S		X															230301	60.569	9.700	0	0	0	0	EPS008	60.569	2.500	14-11	60.569	5	4.300	CCF24	60.569	2.500	0	0	0	0	0
4	CC	1067945052	HERRERA OLEA OSNEIDER JAVIER	1	0			S																	230301	908.526	145.400	0	0	0	0	EPS017	908.526	36.400	14-11	908.526	5	63.300	CCF24	908.526	36.400	0	0	0	0	0
5	CC	1073691034	MARTIN MORENO RICHARD RAMIRO	1	0			S	X																230301	151.421	24.300	0	0	0	0	EPS008	151.421	6.100	14-11	151.421	5	10.600	CCF24	151.421	6.100	0	0	0	0	0
6	CC	1099548467	MORALES BARRIOS JOHN JADERSON	1	0			S																	230201	908.526	145.400	0	0	0	0	EPS002	908.526	36.400	14-11	908.526	5	63.300	CCF24	908.526	36.400	0	0	0	0	0
7	CC	91478416	SANCHEZ JOSE ROMAN	1	0			S																	230201	1.600.000	256.000	0	0	0	0	EPS017	1.600.000	64.000	14-11	1.600.000	5	111.400	CCF24	1.600.000	64.000	0	0	0	0	0
8	CC	91539810	MELO CARREÑO LUIS CARLOS	1	0			S																	25-14	908.526	145.400	0	0	0	0	EPS005	908.526	36.400	14-11	908.526	5	63.300	CCF24	908.526	36.400	0	0	0	0	0
9	CC	9155592	RAMIREZ ZUÑIGA EBER LUIS	1	0			S																	230201	908.526	145.400	0	0	0	0	EPS037	908.526	36.400	14-11	908.526	5	63.300	CCF24	908.526	36.400	0	0	0	0	0
10	CE	13243627	FARIA ROMERO FREDDY ALBERTO	1	0			S	X																230201	757.105	121.200	0	0	0	0	EPS002	757.105	30.300	14-11	757.105	5	52.700	CCF24	757.105	30.300	0	0	0	0	0
11	PE	813168903011 999	MERCADO RONDON FRAYER JESUS	1	0			S																	230301	908.526	145.400	0	0	0	0	EPS017	908.526	36.400	14-11	908.526	5	63.300	CCF24	908.526	36.400	0	0	0	0	0
12	PE	834773421081 990	BELISARIO RENSO ALEJANDRO DE JESUS	1	0			S																	230301	908.526	145.400	0	0	0	0	EPS002	908.526	36.400	14-11	908.526	5	63.300	CCF24	908.526	36.400	0	0	0	0	0
13	CC	85161569	BAENA CASTRO HUMBERTO	1	0			S	X																230301	817.674	130.900	0	0	0	0	EPS002	817.674	32.600	14-11	817.674	5	57.000	CCF24	817.674	32.600	0	0	0	0	0
14	CC	85162982	BAENA FLOREZ WILMAN	1	0			S																	230301	908.526	145.400	0	0	0	0	EPS017	908.526	36.400	14-11	908.526	5	63.300	CCF24	908.526	36.400	0	0	0	0	0
15	CC	91003651	MENDOZA VARGAS JOHN JAIRO	1	0			S	X																230201	757.105	121.200	0	0	0	0	EPS002	757.105	30.300	14-11	757.105	5	52.700	CCF24	757.105	30.300	0	0	0	0	0
16	CC	91132095	RESTREPO CARDOZO HERNAN DE JESUS	1	0			S	X																25-14	545.116	87.300	0	0	0	0	EPS017	545.116	21.900	14-11	545.116	5	38.000	CCF24	545.116	21.900	0	0	0	0	0
17	CC	91133109	ANGULO SANCHEZ JIM ALEXANDER	1	0			S																	230301	1.755.606	280.900	0	0	0	0	EPS037	1.755.606	70.300	14-11	1.755.606	5	122.200	CCF24	1.755.606	70.300	0	0	0	0	0
18	CC	91442568	ARCINIEGAS JOSE ALEXANDER	1	0			S		X															230301	60.569	9.700	0	0	0	0	EPS017	60.569	2.500	14-11	60.569	5	4.300	CCF24	60.569	2.500	0	0	0	0	0
19	CC	7312115	GARCIA CASTELLANOS NELSON RAFAEL	1	0			S																	25-14	908.526	145.400	0	0	0	0	EPS008	908.526	36.400	14-11	908.526	5	63.300	CCF24	908.526	36.400	0	0	0	0	0
20	CC	79045696	TAFUR VILLANUEVA LUIS HERNANDO	1	0			S																	25-14	908.526	145.400	0	0	0	0	ESSC24	908.526	36.400	14-11	908.526	5	63.300	CCF24	908.526	36.400	0	0	0	0	0
21	CC	79449120	NUÑEZ RUIZ MIGUEL ANGEL	1	0			S		X															25-14	60.569	9.700	0	0	0	0	EPS002	60.569	2.500	14-11	60.569	5	4.300	CCF24	60.569	2.500	0	0	0	0	0
22	CC	79647607	REYES GONZALEZ PLINIO ALBERTO	1	0			S		X															230201	60.569	9.700	0	0	0	0	EPS008	60.569	2.500	14-11	60.569	5	4.300	CCF24	60.569	2.500	0	0	0	0	0
23	CC	79918203	RAMIREZ GOMEZ JULIAN YECID	1	0			S																	230301	908.526	145.400	0	0	0	0	EPS008	908.526	36.400	14-11	908.526	5	63.300	CCF24	908.526	36.400	0	0	0	0	0
24	CC	80129221	LEON CARVAJAL JAIME ALONSO	1	0			S																	230201	908.526	145.400	0	0	0	0	EPS017	908.526	36.400	14-11	908.526	5	63.300	CCF24	908.526	36.400	0	0	0	0	0
25	CC	1099551652	ANGULO PENILLA JAM KARLO	1	0			S	X																230301	575.400	92.100	0	0	0	0	EPS005	575.400	23.100	14-11	575.400	5	40.100	CCF24	575.400	23.100	0	0	0	0	0
26	CC	1107044909	MONTAÑO RAMOS CRISTIAN ANDRES	1	0			S	X																230301	757.105	121.200	0	0	0	0	EPS002	757.105	30.300	14-11	757.105	5	52.700	CCF24	757.105	30.300	0	0	0	0	0
27	CC	1126429128	GARZON DIAZ EDWAR YORDANO	1	0			S	X																230301	878.242	140.600	0	0	0	0	EPS010	878.242	35.200	14-11	878.242	5	61.200	CCF24	878.242	35.200	0	0	0	0	0
28	CC	17421280	MONJE MENSA ALEXANDER	1	0			S		X															230301	60.569	9.700	0	0	0	0	EPS017	60.569	2.500	14-11	60.569	5	4.300	CCF24	60.569	2.500	0	0	0	0	0
29	CC	3961868	MARTINEZ POLANCO JOSE DE JESUS	1	0			S	X	X															231001	60.569	9.700	0	0	0	0	EPS008	60.569	2.500	14-11	60.569	5	4.300	CCF24	60.569	2.500	0	0	0	0	0
30	CC	51891212	MORALES RATIVA GLORIA STELLA	1	0			S	X																230201	878.242	140.600	0	0	0	0	EPS005	878.242	35.200	14-11	878.242	5	61.200	CCF24	878.242	35.200	0	0	0	0	0

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900645765	9	TRANSERCON SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	Carrera 12C 52-11 SUR	BOGOTA-BOGOTA D.E.	4708240	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2021-01	2021-02	16243414	9416243414	E	2021/02/15	2021/02/15	BANCO AV VILLAS	0	$3,302,300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION		SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (14 Afiliados)						$10,660,043	$1,706,200			$10,660,043	$427,200			$10,629,320	$426,000			$10,660,043	$742,900		$0	$0
Centro de Trabajo: ADMINISTRACION (14 Afiliados)						$10,660,043	$1,706,200			$10,660,043	$427,200			$10,629,320	$426,000			$10,660,043	$742,900		$0	$0
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (14 Afiliados)						$10,660,043	$1,706,200			$10,660,043	$427,200			$10,629,320	$426,000			$10,660,043	$742,900		$0	$0
1	CC	80248233	BELTRAN WILFREDO	230301	30	$908,526	$145,400	EPS042	30	$908,526	$36,400	CCF21	30	$877,803	$35,200	14-7	30	$908,526	$63,300	30	$0	$0
2	CC	79310789	CABALLERO CARLOS	231001	27	$817,674	$130,900	EPS002	27	$817,674	$32,800	CCF21	27	$817,674	$32,800	14-7	27	$817,674	$57,000	27	$0	$0
3	CC	79726482	CRISTANCHO JOHN	25-14	27	$817,674	$130,900	EPS017	27	$817,674	$32,800	CCF21	27	$817,674	$32,800	14-7	27	$817,674	$57,000	27	$0	$0
4	CC	1000935015	DUQUE EDWAR	230301	17	$514,832	$82,400	EPS017	17	$514,832	$20,600	CCF21	17	$514,832	$20,600	14-7	17	$514,832	$35,900	17	$0	$0
5	CC	80877992	HERNANDEZ LUIS	25-14	30	$908,526	$145,400	EPS002	30	$908,526	$36,400	CCF21	30	$908,526	$36,400	14-7	30	$908,526	$63,300	30	$0	$0
6	CC	79734391	LOPEZ FREDY	25-14	26	$787,390	$126,000	EPS005	26	$787,390	$31,500	CCF21	26	$787,390	$31,500	14-7	26	$787,390	$54,900	26	$0	$0
7	CC	4049202	MONTENEGRO JAIME	231001	19	$575,400	$92,100	EPS044	19	$575,400	$23,100	CCF21	19	$575,400	$23,100	14-7	19	$575,400	$40,100	19	$0	$0
8	CC	19498494	MURILLO VICTOR	230301	19	$575,400	$92,100	EPS017	19	$575,400	$23,100	CCF21	19	$575,400	$23,100	14-7	19	$575,400	$40,100	19	$0	$0
9	CC	80489545	NIÑO DANIEL	230301	30	$908,526	$145,400	EPS005	30	$908,526	$36,400	CCF21	30	$908,526	$36,400	14-7	30	$908,526	$63,300	30	$0	$0
10	CC	1033815122	OLARTE ROBINSON	230301	25	$757,105	$121,200	EPS005	25	$757,105	$30,300	CCF21	25	$757,105	$30,300	14-7	25	$757,105	$52,700	25	$0	$0
11	CC	74320816	RODRIGUEZ EULISES	230201	30	$908,526	$145,400	EPS042	30	$908,526	$36,400	CCF21	30	$908,526	$36,400	14-7	30	$908,526	$63,300	30	$0	$0
12	CC	93294211	SAAVEDRA ORLANDO	230301	19	$575,400	$92,100	EPS017	19	$575,400	$23,100	CCF21	19	$575,400	$23,100	14-7	19	$575,400	$40,100	19	$0	$0
13	CC	79420448	SANDOVAL LUIS	230301	26	$787,390	$126,000	EPS008	26	$787,390	$31,500	CCF21	26	$787,390	$31,500	14-7	26	$787,390	$54,900	26	$0	$0
14	CC	1033700807	VENTURA JOHN	230301	27	$817,674	$130,900	EPS008	27	$817,674	$32,800	CCF21	27	$817,674	$32,800	14-7	27	$817,674	$57,000	27	$0	$0
Total			**Afiliados(14)**			$10,660,043	$1,706,200			$10,660,043	$427,200			$10,629,320	$426,000			$10,660,043	$742,900		$0	$0

2021/02/15 04:15 PM

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900645765	9	TRANSERCON SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	Carrera 12C 52-11 SUR	BOGOTA-BOGOTA D.E.	4708240	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2021-01	2021-02	16243414	9416243414	E	2021/02/15	2021/02/15	BANCO AV VILLAS	0	$3,302,300

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				14	$1,706,200	$0	$0	$1,706,200
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	2	$223,000	$0	$0	$223,000
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	3	$402,300	$0	$0	$402,300
PORVENIR	230301	800,224,808	8	8	$935,500	$0	$0	$935,500
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$145,400	$0	$0	$145,400
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				14	$742,900	$0	$0	$742,900
SEGUROS BOLIVAR	14-7	860,002,503	2	14	$742,900	$0	$0	$742,900
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				14	$426,000	$0	$0	$426,000
CAFAM	CCF21	860,013,570	3	14	$426,000	$0	$0	$426,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 6)				14	$427,200	$0	$0	$427,200
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	2	$64,300	$0	$0	$64,300
COOSALUD EPS	EPS042	900,226,715	3	2	$72,800	$0	$0	$72,800
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	4	$99,600	$0	$0	$99,600
MEDIMAS EPS	EPS044	901,097,473	5	1	$23,100	$0	$0	$23,100
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	2	$69,200	$0	$0	$69,200
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	3	$98,200	$0	$0	$98,200
TOTAL				14	$3,302,300	$0	$0	$3,302,300

2021/02/15 04:15 PM

Simple

PAGOSIMPLE | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2021-02-04, 02:49:38 PM **Tipo Planilla:** E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS. **Numéro Planilla:** 1035589709

Periodo Cotización: enero de 2021 **Periodo Servicio:** febrero de 2021

PAGADO 04/02/2021

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	NOBAL SAS		
Documento	NI900606324	**Dirección**	CL 62 SUR #82 - 41
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	**Teléfono**	4601406
Tipo Persona	JURÍDICA	**Forma Presentación**	ÚNICO
Ciudad	BOGOTA D.C.	**Departamento**	BOGOTA D.C.
Representante Legal	BERNAL JIMENEZ RENE STID	**Identificación**	CC 79834830
Total Afiliados	5	**ARP**	POSITIVA DE SEGUROS

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																		Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 1024467916	WENCESLAO RAMIREZ CUBILLOS	01	00																	0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION (ING + PROTECCION)	$ 908.526	$ 145.400	(EPS017) FAMISANAR EPS	$ 908.526	$ 36.400	6,960	$ 908.526	$ 63.300	(CCF22) COLSUBSIDIO	$ 908.526	$ 36.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 281.500
CC 1033703060	YEFERZON ANDRES CRISTIANO CARO	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 908.526	$ 145.400	(EPS008) COMPENSAR EPS	$ 908.526	$ 36.400	6,960	$ 908.526	$ 63.300	(CCF22) COLSUBSIDIO	$ 908.526	$ 36.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 281.500
CC 52306912	YEIMY LILIANA RUBIANO VARGAS	01	00																	0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 908.526	$ 145.400	(EPS017) FAMISANAR EPS	$ 908.526	$ 36.400	0,522	$ 908.526	$ 4.800	(CCF22) COLSUBSIDIO	$ 908.526	$ 36.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 223.000
CC 93469175	JHON JAIRO MORENO RUBIANO	01	00																	0	30	30	30	30	(231001) COLFONDOS	$ 1.000.000	$ 160.000	(EPS017) FAMISANAR EPS	$ 1.000.000	$ 40.000	6,960	$ 1.000.000	$ 69.600	(CCF22) COLSUBSIDIO	$ 1.000.000	$ 40.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 309.600
CC 93469409	HARBEY ALONSO MORENO RUBIANO	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.050.000	$ 168.000	(EPS017) FAMISANAR EPS	$ 1.050.000	$ 42.000	6,960	$ 1.050.000	$ 73.100	(CCF22) COLSUBSIDIO	$ 1.050.000	$ 42.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 325.100

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 4.775.578	$ 4.775.578	$ 4.775.578	$ 4.775.578	$ 764.200	$ 191.200	$ 274.100	$ 191.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.420.700	$ 0	$ 1.420.700

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 343 2949 - Cali: 554 0515 - Medellín: 514 66 69 - Bucaramanga: 643 80 00 - Cartagena: 694 54 44 - Pereira: 340 25 82 - Barranquilla: 361 88 50 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

¡El Poder de la SIMPLE!

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

Colpensiones
Ven por tu futuro ya

El futuro es de todos
Gobierno de Colombia

LA ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES - COLPENSIONES

CERTIFICA QUE

Verificada la base de datos de afiliados, el/la señor/a **CARLOS ALBERTO CASTILLO ORJUELA** identificado/a con documento de identidad **Cédula de Ciudadanía** número **1013652117,** se encuentra afiliado/a desde **03/04/2017** al Régimen de Prima Media con Prestación Definida (RPM) administrado por la Administradora Colombiana de Pensiones **COLPENSIONES**.

La presente certificación se expide en Bogotá, el día 06 de febrero de 2021.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Rosa Mercedes Niño Amaya
Dirección de Afiliaciones

Nota: Certificado generado desde la página Web. Este documento no es válido para el reconocimiento de prestaciones económicas, está sujeto a verificación y no tiene costo alguno.

1187

ARL | sura

Medellín, 03 de febrero de 2021

LA DIRECCIÓN DE AFILIACIONES Y RECAUDOS

HACE CONSTAR:

Que la(s) persona(s) relacionada(s) en el siguiente listado, se encuentra(n) afiliada(s) en Riesgos Laborales desde las fechas indicadas, a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A como trabajadores de CONSORCIO OPORTO que se encuentra EN COBERTURA.

A continuación se relacionan las fechas de afiliación

Número identificació	Nombre	Fecha inicio afiliación	Fecha fin afiliación	Código de transacción	Tipo Cotizante
Centro de trabajo:	0000000001 PRINCIPAL DC	Clase: 5		Porcentaje Cotización:	6,96 %
C1013652117	CASTILLO ORJUELA CARLOS ALBERTO	04/02/2021		t4224122	DEPENDIENTE

null

Atentamente,


Dirección de Afiliaciones y Recaudos

Este certificado tiene validez para efectos de afiliación del trabajador a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A así como para su desafiliación
Importante: La información contenida en este certificado puede ser validada en cualquier momento por SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A

Este certificado fue generado con la información registrada en la base de datos el 03/02/2021 18:29:16 .
Los trabajadores marcados con asterisco (*) son afiliados Independientes.
Las coberturas marcadas con dos asteriscos (**) son coberturas pendientes de retiro.

Dirección IP: 181.61.209.29, 198.143.41.14, 172.16.42.57

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

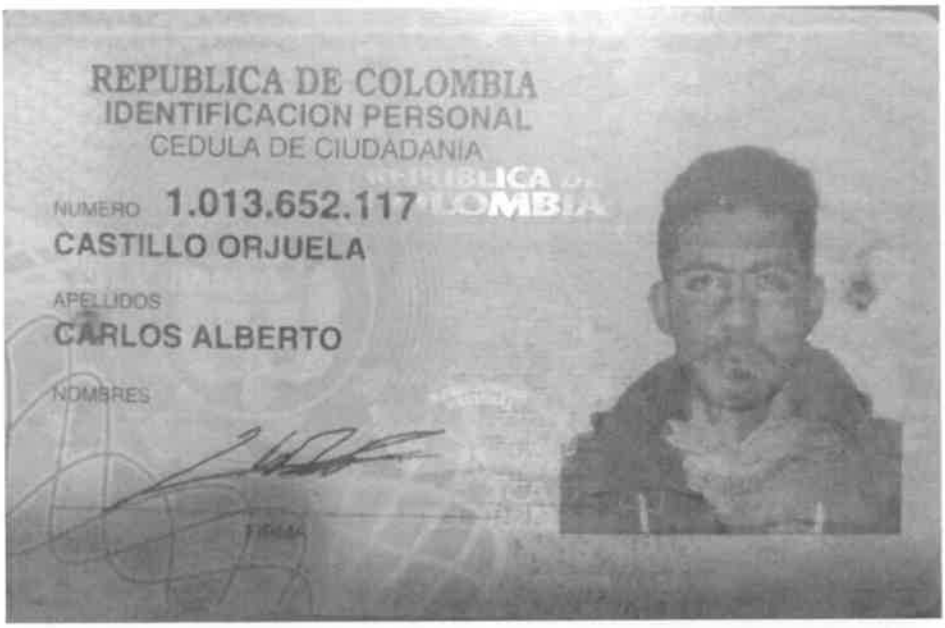

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 1.013.652.117

CASTILLO ORJUELA

APELLIDOS

CARLOS ALBERTO

NOMBRES



FECHA DE NACIMIENTO 02-JUN-1994
BOGOTA D.C
(CUNDINAMARCA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.83 O+ M
ESTATURA G.S. RH SEXO

05-SEP-2012 BOGOTA D.C.
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

INDICE DERECHO

A-1500150-00617494-M-1013652117-20140901 0039815157A 1 1303033957

Bienestar & Salud Laboral

Nit. 900.844.030-8
Licencia No. 64 del 10-01-2017
Calle 134 # 7-83 cons 233, Bogota D. C.
www.bsl.com.co



Fecha de Atención
4/2/21, 11:31 a. m.

DATOS DEMOGRÁFICOS

Edad	Documento #	Tipo de Examen	Cargo
26	1013652117	Ingreso	**CONDUCTOR Y OFICIOS VARIOS**

INFORMACIÓN

CARLOS
CASTILLO
ORJUELA

Ciudad
Bogotá

Empresa
CONSORCIO OPORTO

EXÁMENES REALIZADOS

Examen Médico Osteomuscular, Audiometría, Visiometría

CONCEPTO EVALUACIÓN MÉDICA

ELEGIBLE PARA EL CARGO SIN RECOMENDACIONES LABORALES

CONCLUSIONES OCUPACIONALES

RECOMENDACIONES GENERALES

1. REALIZAR PAUSAS ACTIVAS DURANTE JORNADA LABORAL
2. SUGIERO ADECUADA HIGIENE POSTURAL Y MANEJO DE COLUMNA
3. USO DE EPP TAPABOCAS SEGUN RESOLUCION 666 DE 2020
4. APLICACIÓN DEL PROTOCOLO ANTI COVID19 AL INICIO, DURANTE Y AL TERMINAR LA JORNADA.
5. APLICAR EL DISTANCIAMIENTO SOCIAL.

OBSERVACIONES FINALES

CONSIDERACIONES SEGÚN CIRCULAR 30 DE 2020 COVID 19:

Según valoración médica realizada el paciente NO PRESENTA comorbilidades o condiciones que deriven riesgo de complicaciones en caso de infección por Covid-19. Esta valoración se realiza de acuerdo a lo establecido a la Circular 30 de 2020 emitida por el Min. Salud

JUAN JOSE REATIGA
REGISTRO MEDICO NO 14791
LICENCIA SALUD OCUPACIONAL 460
6 DE JULIO DE 2020

Verifica la validez de este certificado

FIRMA TRABAJADOR
CARLOS
CASTILLO
1013652117

FORMULARIO ÚNICO DE AFILIACIÓN Y REGISTRO DE NOVEDADES AL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD

compensar eps

No. de Radicación | Fecha de Radicación: 05022021

I. DATOS DEL TRÁMITE (Lea las instrucciones que se encuentran anexas al formulario antes de diligenciarlo)

1. Tipo de trámite: A. Afiliación: X | B. Reporte de Novedades
2. Tipo de Afiliación: A. Cotizante: X | B. Cónyuge | C. Compañero(a) permanente | D. Padre o madre | • Cotizante o cabeza de familia: X | • Beneficiario o afiliado adicional
3. Régimen: A. Contributivo: X | B. Subsidiado
4. Tipo de afiliado: A. Cotizante: X | B. Cabeza de familia | C. Beneficiario
5. Tipo de cotizante: A. Dependiente: X | B. Independiente | C. Pensionado
Código (lo registra solo la EPS): 01

A. AFILIACIÓN II. DATOS BÁSICOS DE IDENTIFICACIÓN (del cotizante o cabeza de familia)

6. Apellidos y nombres			
CASTILLO	ORJUELA	CARLOS	ALBERTO

7. Tipo de documento de identidad	8. Número de documento de identidad	9. Sexo: Femenino	Masculino: X	10. Fecha de nacimiento
CC	1.013.652.117			02 06 1994

III. DATOS COMPLEMENTARIOS (Datos personales)

11. Etnia	12. Discapacidad	13. Puntaje SISBÉN	14. Grupo de población especial	15. Administradora de riesgos laborales - ARL	16. Administradora de pensiones
				SURA	COLPENSIONES

17. Ingreso mensual promedio en SMLMV	18. Residencia					
908526	CALLE 5 SUR N 11 B 02				8054802	3202447555
CARLOSCASTILLO7073@Hotmail.Com	BOGOTA	Zona Urbana: X	Rural	MARTIRES	BOGOTA	

IV. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE LOS MIEMBROS DEL NÚCLEO FAMILIAR (Datos básicos de identificación del cónyuge o compañero(a) permanente cotizante)

19. Apellidos y nombres				

20. Tipo de documento de identidad	21. Número de documento de identidad	22. Sexo: Femenino	Masculino	23. Fecha de nacimiento

Datos básicos de identificación de los beneficiarios y de los afiliados adicionales

	24. Apellidos y nombres: Primer Apellido	Segundo Apellido	Primer Nombre	Segundo Nombre	25. Tipo de documento de identidad	26. Número de documento de identidad	27. Sexo: Femenino	Masculino
01								
02								
03								
04								
05								

	28. Fecha de nacimiento	29. Parentesco	30.	31. Discapacidad: Tipo	Grado	32. Datos de residencia: Nacional - Distrito	Etnia - Cabildo - Rural	Departamento	Territorio Especial Indígena	33. Valor de la UPC adicional (lo registra solo la EPS)
01										
02										
03										
04										
05										

Selección de la IPS Primaria

34. Nombre de la institución prestadora de servicios de salud - IPS	Código de la IPS (lo registra solo la EPS)

V. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEADOR Y OTROS APORTANTES DE LAS ENTIDADES RESPONSABLES DE LA AFILIACIÓN COLECTIVA, INSTITUCIONAL O DE OFICIO

35. Nombre o razón social	36. Tipo de documento de identificación
CONSORCIO OPORTO	NIT

37. Número del documento de identificación	38. Tipo de aportante o pagador pensiones (lo registra solo la EPS)
901351629	

39. Ubicación			
CALLE 18 SUR N 29D 12.	8054802	CONSORCIO.OPORTO@GMAIL.Com	BOGOTA	BOGOTA

B. REPORTE DE NOVEDADES

40. Tipo de Novedad
1. Modificación datos básicos de identificación
2. Corrección datos básicos de identificación
3. Actualización documento de identidad
4. Actualización y corrección de datos complementarios
5. Terminación de la cotización en la EPS — Código:
6. Reactivación en la EPS
7. Inclusión de cónyuge o compañero(a) permanente
8. Inclusión de beneficiario o de afiliado adicional
9. Inicio de nuevo cargue o actualización de condiciones para cotizar
10. Terminación de la relación laboral o pérdida de las condiciones para seguir cotizando
11. Cambio de una entidad administradora para cotizar (Régimen Contributivo)
12. Desvinculación de una afiliado a cotizante para mantener afiliaciones colectivas
13. Movilidad: A. Régimen Contributivo | B. Régimen Subsidiado
14. Período: A. Mismo Régimen | B. Diferente Régimen
15. Reporte por fallecimiento
16. Reporte de Unidad de protección al usuario
17. Reporte de la calidad de Pre-pensionado
18. Reporte de la calidad de Pensionado

VI. DATOS PARA EL REPORTE DE LA NOVEDAD

41. Datos básicos de la persona afectada: Tipo de Documento de Identidad	Número de documento de identidad	Apellidos y nombres	Sexo: Femenino	Masculino	Fecha de nacimiento
	1.013.652.117	ORJUELA CARLOS ALBERTO		X	02 06 1994
CC	1.013.652.117				

42. EPS anterior	43. Código	44. Motivo de traslado	45. Caja de Compensación Familiar o Pagador de Pensiones	46. Fecha
COMPENSAR			COMPENSAR	02 02 2021

VII. DECLARACIONES Y AUTORIZACIONES

46. Declaración de veracidad sobre los datos del beneficiario y afiliado adicional.
47. Declaración de la no afiliación al Régimen Contributivo, Especial o de Excepción.
48. Declaración de autenticidad de soportes en físico (legajo) o bajo ningún que respalden la entrega de los documentos que acreditan la condición de beneficiario.
49. Declaración de no información de cotizante, cabeza de familia, beneficiario o afiliado adicional en otra Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud.
50. Autorización para que la EPS actualice y corrija datos y envíe de la misma forma del cotizante o cabeza de familia y de la beneficiario y afiliado adicionales.
51. Autorización para que la EPS reporte o consulte toda la información de la afiliación del reporte de novedades a cualquier base de datos de afiliados vigente y a las entidades públicas que por sus funciones lo requieran.
52. Autorización para que la EPS realice los cobros pertinentes del cotizante o cabeza de familia y de sus beneficiarios y afiliados adicionales, de acuerdo con lo previsto en la Ley 1581 de 2012 y el Decreto 1377 de 2013.
53. Autorización para que la EPS envíe la información al correo electrónico o al celular aquí reportados.

VIII. FIRMAS

IX. ANEXOS

05 FEB 2021
Fol. 649 Erica Johanna Leal G.
SUJETO A VERIFICACIÓN

X. DATOS A SER DILIGENCIADOS POR LA ENTIDAD TERRITORIAL

54. Identificación de la entidad Territorial: Código del municipio	Código del departamento	57. Datos del SISBÉN: Número de la ficha	Puntaje	Nivel	58. Fecha de radicación	59. Fecha de validación

60. Datos del funcionario que realiza la validación

Tipo de documento de identidad	Número de documento de identidad	71. Firma del funcionario

OBSERVACIONES:

VIGILADO Supersalud

VIGILADO Supersalud

1185

porvenir
sólo hay uno

SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR S.A.
En su condición de administradora del
FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS PORVENIR
NIT 800.224.808-8

CERTIFICA QUE:

DANIELA GONZALEZ ESCARRAGA, identificado(a) con cédula de ciudadanía **1.073.706.390,** se encuentra afiliado(a) al **Fondo de Pensiones Obligatorias Porvenir**.

La presente certificación se expide el 15 de Febrero del 2021.

Cordialmente,

Gerencia de Clientes

Tenga en cuenta:

En este momento de su vida, lo que más le conviene es estar en un fondo privado como Porvenir, ¿por que? porque está acumulando semanas, ahorrando dinero y obteniendo rendimiento.

ARL | sura

SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A.
ARL SURA S.A.
DATOS BÁSICOS TRABAJADOR DEPENDIENTE

Empresa CONSORCIO OPORTO **Documento** N901351629 **Contrato** 095558868

Documento C1073706390 **Nombre** DANIELA GONZALEZ ESCARRAGA **Fecha de nacimiento** 17-12-1995 **Sexo** F **Tipo** DEP

Cargo INSPECTOR **Salario** 1200000 **Fecha inicio cobertura** 15-02-2021 **AFP** 003 - PORVENIR **EPS** 008 - COMPENSAR ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD

Teletrabajador NO **Texto opcional para carné especial**

Centro de trabajo

Código - Nombre 0000000001 - PRINCIPAL DC **Clase riesgo** 5 **Porcentaje cotización** 6.96%

Ciudad BOGOTA **Dirección** CL 86 D # 30 - 38 **Teléfono** 2572887 **Teléfono 2**

Sucursal

Código - Nombre 1 - SEDE PRINCIPAL **Ciudad** 586 BOGOTA **Dirección** CL 86 D 30 - 38 **Teléfono**

Fecha de proceso: 15-02-2021 14:28:16

4486



REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 1.073.706.390

GONZALEZ ESCARRAGA

APELLIDOS

DANIELA

NOMBRES

Daniela Gonzalez G.

FIRMA



FECHA DE NACIMIENTO 18-DIC-1995

PACHO
(CUNDINAMARCA)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.65 ESTATURA

A+ G.S. RH

F SEXO

03-FEB-2014 SOACHA

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

INDICE DERECHO

P-1524700-00558835-F-1073706390-20140401 0037775060A 2 42295455

Escaneado con CamScanner

Bienestar & Salud Laboral

Nit. 900.844.030-8
Licencia No. 64 del 10-01-2017
Calle 134 # 7-83 cons 233, Bogotá D. C.
www.bsl.com.co



Fecha de Atención
15/2/21, 3:19 p. m.

DATOS DEMOGRÁFICOS

Edad	Documento #	Tipo de Examen	Cargo
25	1073706390	Ingreso	**INSPECTORA DE OBRA**

INFORMACIÓN

DANIELA
GONZÁLEZ
ESCARRAGA

Ciudad
Bogotá

Empresa
CONSORCIO OPORTO

EXÁMENES REALIZADOS

Examen Médico Osteomuscular, Audiometría, Visiometría

CONCEPTO EVALUACIÓN MÉDICA

ELEGIBLE PARA EL CARGO CON RECOMENDACIONES LABORALES

CONCLUSIONES OCUPACIONALES

USO PERMANENTE DE LENTES DURANTA LA JORNADA LABROAL.

RECOMENDACIONES GENERALES

1. USAR ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL EN FORMA CORRECTA SEGÚN AREA DE TRABAJO
2. PAUSAS ACTIVAS DURANTE JORNADA LABORAL
3. CAPACITACION EN HIGIENE POSTURAL Y MANEJO DE COLUMNA
4. MANEJO ADECUADO DE MAQUINARIA Y HERRAMIENTA (NO APLICA PARA CARGOS DE COORDINACION Y SUPERVISION)
5. CUMPLIR NORMAS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL
6. INCLUIR EN LOS PROGRAMAS DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICO DE ACUERDO A LOS RIESGO EVIDENCIADOS EN LA MATRIZ DE PELIGROS DE LA EMPRESA

OBSERVACIONES FINALES

CONSIDERACIONES SEGÚN CIRCULAR 30 DE 2020 COVID 19:

Según valoración médica realizada el paciente NO PRESENTA comorbilidades o condiciones que deriven riesgo de complicaciones en caso de infección por Covid-19. Esta valoración se realiza de acuerdo a lo establecido a la Circular 30 de 2020 emitida por el Min. Salud

JUAN JOSE REATIGA
REGISTRO MEDICO NO 14791
LICENCIA SALUD OCUPACIONAL 460
6 DE JULIO DE 2020

Verifica la validez de este certificado

FIRMA TRABAJADOR
DANIELA
GONZÁLEZ
1073706390

FORMULARIO ÚNICO DE AFILIACIÓN Y REGISTRO DE NOVEDADES
AL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD

compensar eps

No. de Radicación — Fecha de Radicación: 15 02 2021

I. DATOS DEL TRAMITE

1. Tipo de trámite: A. X
2. Tipo de Afiliación: A. X
3. Régimen: A. X
4. Tipo de afiliado: A. X
5. Tipo de cotizante: A. X
Código: 01

A. AFILIACIÓN B. DATOS BÁSICOS DE IDENTIFICACIÓN (del solicitante o cabeza de familia)

6. Apellidos y nombres: Gonzalez Escarraga Daniela
7. Tipo de documento de identidad: CC
8. Número de documento de identidad: 1073 706 390
9. Sexo: X
10. Fecha de nacimiento: 18 12 1995

II. DATOS COMPLEMENTARIOS (Datos personales)

11. Etnia
12. Discapacidad
13. Puntaje SISBEN
14. Grupo de población especial: 5074
15. Administradora de riesgos laborales - ARL: Positiva
16. Administradora de pensiones: Porvenir
17. Ingreso base de cotización - IBC: 1'200.000
18. Residencia: Cr 18 Nº 4b-12 Sur
42 45 32 L 322 304 3424
domelogonzalez1212@gmail.com Bta X Casa
natiree. Bogota

IV. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE LOS MIEMBROS DEL NÚCLEO FAMILIAR (Datos básicos de identificación del cónyuge o compañero(a) permanente cotizante)

19. Apellidos y nombres
20. Tipo de documento de identidad
21. Número de documento de identidad
22. Sexo
23. Fecha de nacimiento

Datos básicos de identificación de los beneficiarios y de los afiliados adicionales

24. Apellidos y nombres
25. Tipo de documento de identidad
26. Número de documento de identidad
27. Sexo
28. Fecha de nacimiento
29. Parentesco
30. Discapacidad
31. Ubicación
32. Datos de residencia
33. Valor de la UPC afiliado adicional

Selección de la IPS Primaria

34. Nombre de la institución prestadora de servicios de salud - IPS
Código de la IPS

V. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEADOR Y OTROS APORTANTES DE LAS ENTIDADES RESPONSABLES DE LA AFILIACIÓN COLECTIVA, INSTITUCIONAL O DE OFICIO

35. Nombre o razón social: Consorcio Oporto
36. Tipo de documento de identificación: N.I
37. Número del documento de identificación: 901351629
38. Tipo de aportante o pagador pensiones
39. Ubicación: Cll 17 Su Nº 29D-12 Ag3232 Consorcio Oporto Gamalcon Bta Bta

B. REPORTE DE NOVEDADES

40. Tipo de Novedad

VI. DATOS PARA EL REPORTE DE LA NOVEDAD

41. Datos básicos de identificación
Tipo de documento de identidad: CC
Número de documento de identidad: 1073 706 390
Sexo: X
Apellidos y nombres: Gonzalez Escarraga Daniela
Fecha de nacimiento: 18 12 1995
42. EPS anterior: COMPENSAR
43. Motivo de traslado
44. Caja de Compensación: Compensar
Código: 15 02 2021

VII. DECLARACIONES Y AUTORIZACIONES

VIII. FIRMAS

Daniela Gonzalez.

IX. ANEXOS

15 FEB 2021
Cód. 649 Erica Johanna Leal G.
SUJETO A VERIFICACIÓN

X. DATOS A SER DILIGENCIADOS POR LA ENTIDAD TERRITORIAL

66. Identificación de la entidad Territorial
67. Datos del SISBEN
68. Fecha de radicación
69. Fecha de validación
70. Datos del funcionario que realiza la validación
Tipo de documento de identidad
Número de documento de identidad
71. Firma del funcionario
OBSERVACIONES: Apoyos Marca

VIGILADO SUPERSALUD
VIGILADO Supersubsidio

1190

Certificado de Aptitud
Informe Salud Ocupacional

compensar | salud

Día	Mes	Año	Ciudad	Departamento
27	01	2021	Bta	Cund

Tipo de exámen: [1] Ingreso [2] Cambio ocupación [3] Periódico programado [4] Retiro [5] Post-incapacidad [6] Reintegro

Nombre y apellido de aspirante o trabajador						Tipo y número de identificación
Luis Alejandro Moreno						cc 80215314
Genero F ☐ M ☑	Fecha de nacimiento	Día 07	Mes 11	Año 1984	Edad 35a	Empresa Disa Pork
Actividad económica Operativo		Cargo u oficio Instalador			Fecha de ingreso	Día 29 Mes 10 Año 2018

Concepto de aptitud

1. Ingreso
- ☐ Apto para el cargo que aspira
- ☐ Apto con patología que no interviene con su labor
- ☐ Aptitud que no cumple con el perfil o requisitos para el cargo que aspira
- ☐ Apto con restricción
- ☐ Aplazado

2. Cambio ocupación
- ☐ Apto para el cargo que aspira
- ☐ Apto con patología que no interviene con su labor
- ☐ Aptitud que no cumple con el perfil o requisitos para el cargo que aspira
- ☐ Apto con restricción
- ☐ Aplazado

3. Periódico programado
- ☐ Evaluación satisfactoria para el cargo que desempeña
- ☑ Evaluación satisfactoria con recomendaciones
- ☐ Con restricciones que interviene con su labor o cargo

4. Retiro
- ☐ Trabajador sin enfermedad profesional ni secuela de accidente de trabajo
- ☐ Sospecha de enfermedad laboral
- ☐ Sospecha de enfermedad común agravada por el trabajo
- ☐ Sospecha de secuelas de accidente laboral

5. Post-incapacidad
- ☐ Aptitud física adecuada para el cargo que desempeña
- ☐ Aptitud física adecuada para el cargo que desempeña con recomendaciones preventivas
- ☐ Requiere continuar tratamiento o seguimiento médico para patología de base

6. Reintegro
- ☐ Apto para el cargo que aspira
- ☐ Apto con patología que no interviene con su labor
- ☐ Aptitud que no cumple con el perfil o requisitos para el cargo que aspira
- ☐ Apto con restricción
- ☐ Aplazado

Tipo de cargo (Marque con una X):
☐ Administrativo ☒ Operativo ☐ Manipulación de alimentos ☐ Trabajo en alturas ☐ Otros: _____

Exámenes realizados (Marque con una X): Anexo técnico: No ☐ Si ☐ Cuál? _____

☐ EKG	☐ Triglicéridos	☒ Audiometría	☐ Espirometría
☐ Cuadro hemático	☐ Glicemia	☒ Visiometría	☐ Otros: _____
☐ Colesterol	☐ Parcial de orina	☐ Optometría	

Recomendaciones al trabajador: lavado de manos pre de trabajar, aseo limpio optimo por otorrino, optometria y
Recomendaciones a la empresa: medicina pre y Epos de de
Concepto optico pos adecuado de Epp pagos
Recomendaciones especificas: actos, capacitacion en Seguridad ind
uso y uso de Epp
Restricciones: Si ☐ No ☐ _____
Causa de aplazamiento: _____

Examen de retiro: Remisión a EPS Si ☐ No ☐

Consentimiento informado del aspirante o trabajador

Autorizo de manera voluntaria al personal médico y paramédico que la institución defina para que se me realicen durante el tiempo necesario el examen médico ocupacional y los exámenes complementarios y dejo constancia de que tuve la oportunidad de manifestar mi consentimiento para la realización del examen médico ocupacional y/o exámenes complementarios necesarios. Comprendo el propósito, los beneficios, interpretación, limitaciones y riesgos del examen médico ocupacional y/o exámenes complementarios, a partir de la información recibida por el (los) profesional (es).

Certifico que la información que he suministrado es verdadera y completa, y acepto el manejo de confidencialidad que Compensar dé a la misma. Así mismo dejo constancia de que conozco los resultados de esta (s) evaluación (es) médica (s).

Autorizo que se suministre la información necesaria a las personas o entidades contempladas en la legislación para el buen cumplimiento del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo.

Profesional		Aspirante o trabajador
Dr. Orlando Fuentes D. Médico Esp. Seguridad y Salud en el trabajo C.C. Nº 25 [illegible] 2018		Firma
Registro	L.S.O.	C.C. 80215314
Nombre		Nombre Luis Alejandro Moreno Carvajal


*** Campos para cargue en SAP


FOR-PSS-836

VIGILADO Supersalud

VIGILADO SuperSubsidio

Caja de Compensación Familiar COMPENSAR Constitución LAPS 1487-2019

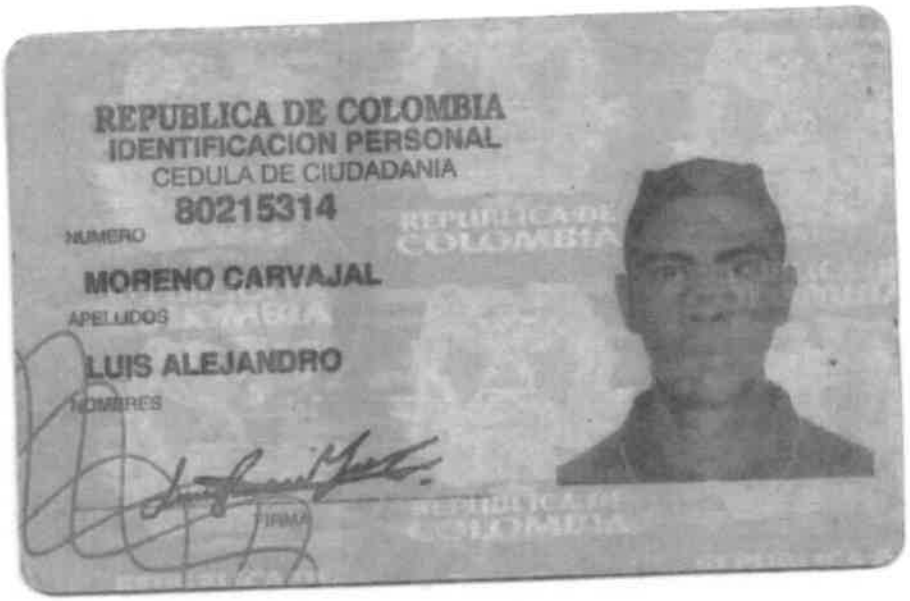
REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA
80215314
NUMERO
MORENO CARVAJAL
APELLIDOS
LUIS ALEJANDRO
NOMBRES
FIRMA

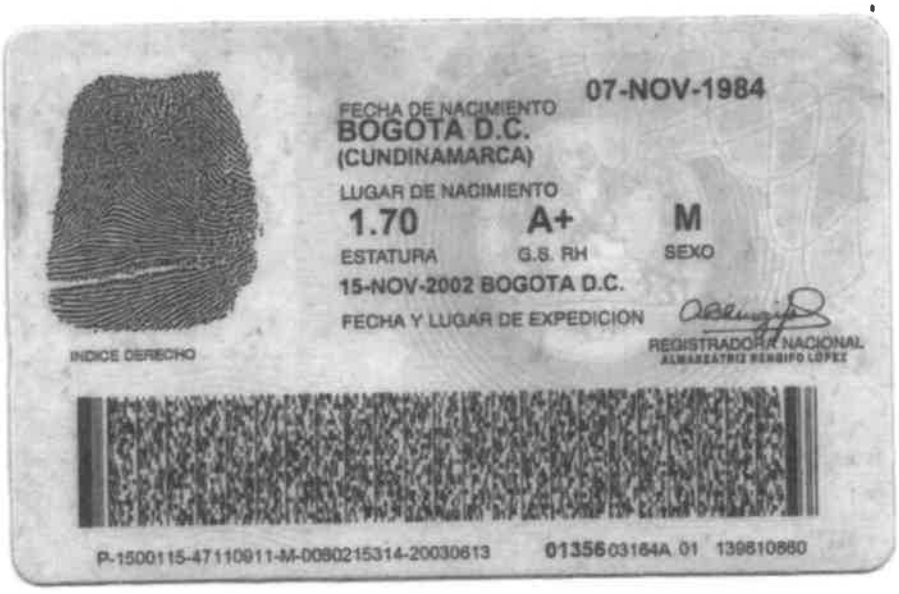
07-NOV-1984
FECHA DE NACIMIENTO
BOGOTA D.C.
(CUNDINAMARCA)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.70
ESTATURA
A+
G.S. RH
M
SEXO
15-NOV-2002 BOGOTA D.C.
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION
REGISTRADORA NACIONAL
INDICE DERECHO
P-1500115-47110911-M-0080215314-20030613
01356 03164A 01 139810860

1192

DiverPark F&F LTDA

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA
93089837
NUMERO



PRECIADO LOAIZA
APELLIDOS

DIEGO FERNANDO
NOMBRES

Diego F. Preciado L

FIRMA

Soldado V

303 Rancho
304 Medco



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 07-OCT-1983
SAN LUIS
(TOLIMA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.61 ESTATURA | O+ G.S. RH | M SEXO

08-ENE-2002 GUAMO
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
IVAN DUQUE ESCOBAR

P-2905800-63102181-M-0093089837-20020422 05156 02112B 02 123305136

1193

Certificado de Aptitud
Informe Salud Ocupacional

compensar | salud

Día	Mes	Año	Ciudad	Departamento
27	01	2021	Bta	Cund

Tipo de exámen: [1] Ingreso [2] Cambio ocupación [3] Periódico programado [4] Retiro [5] Post-incapacidad [6] Reintegro

Nombre y apellido de aspirante o trabajador							Tipo y número de identificación
Diego Fernando							1085 837
Genero F ☐ M ☑	**Fecha de nacimiento**	**Día** 07	**Mes** 10	**Año** 1983	**Edad** 37	**Empresa** Drug Park	
Actividad económica Operativo	**Cargo u oficio** Auxiliar	**Fecha de ingreso**	**Día** 29	**Mes** 01	**Año** 2021		

Concepto de aptitud

1. Ingreso
- ☐ Apto para el cargo que aspira
- ☐ Apto con patología que no interviene con su labor
- ☐ Aptitud que no cumple con el perfil o requisitos para el cargo que aspira
- ☐ Apto con restricción
- ☐ Aplazado

2. Cambio ocupación
- ☐ Apto para el cargo que aspira
- ☐ Apto con patología que no interviene con su labor
- ☐ Aptitud que no cumple con el perfil o requisitos para el cargo que aspira
- ☐ Apto con restricción
- ☐ Aplazado

3. Periódico programado
- ☐ Evaluación satisfactoria para el cargo que desempeña
- ☑ Evaluación satisfactoria con recomendaciones
- ☐ Con restricciones que interviene con su labor o cargo

4. Retiro
- ☐ Trabajador sin enfermedad profesional ni secuela de accidente de trabajo
- ☐ Sospecha de enfermedad laboral
- ☐ Sospecha de enfermedad común agravada por el trabajo
- ☐ Sospecha de secuelas de accidente laboral

5. Post-incapacidad
- ☐ Aptitud física adecuada para el cargo que desempeña
- ☐ Aptitud física adecuada para el cargo que desempeña con recomendaciones preventivas
- ☐ Requiere continuar tratamiento o seguimiento médico para patología de base

6. Reintegro
- ☐ Apto para el cargo que aspira
- ☐ Apto con patología que no interviene con su labor
- ☐ Aptitud que no cumple con el perfil o requisitos para el cargo que aspira
- ☐ Apto con restricción
- ☐ Aplazado

Tipo de cargo (Marque con una X):
☐ Administrativo ☑ Operativo ☐ Manipulación de alimentos ☐ Trabajo en alturas ☐ Otros: _____

Exámenes realizados (Marque con una X): Anexo técnico: No ☐ Si ☐ Cuál? _____

☐ EKG	☐ Triglicéridos	☑ Audiometría	☐ Espirometría
☐ Cuadro hemático	☐ Glicemia	☑ Visiometría	☐ Otros: _____
☐ Colesterol	☐ Parcial de orina	☐ Optometría	

Recomendaciones al trabajador: Lavado de manos uso de lentes de seguridad Visiometría optometría uso de gafas

Recomendaciones a la empresa: Correcta optica uso adecuado de EPP pausas activas Capacitación en Seguridad Industrial

Recomendaciones específicas: y en laboratorio de protección

Restricciones: SI ☐ No ☑ _____

Causa de aplazamiento: _____

Examen de retiro: Remisión a EPS Si ☐ No ☐

Consentimiento informado del aspirante o trabajador

Autorizo de manera voluntaria al personal médico y paramédico que la institución defina para que se me realicen durante el tiempo necesario el examen médico ocupacional y los exámenes complementarios y dejo constancia de que tuve la oportunidad de manifestar mi consentimiento para la realización del examen médico ocupacional y/o exámenes complementarios necesarios. Comprendo el propósito, los beneficios, interpretación, limitaciones y riesgos del examen médico ocupacional y/o exámenes complementarios, a partir de la información recibida por el (los) profesional (es).

Certifico que la información que he suministrado es verdadera y completa, y acepto el manejo de confidencialidad que Compensar dé a la misma. Así mismo dejo constancia de que conozco los resultados de esta (s) evaluación (es) médica (s).

Autorizo que se suministre la información necesaria a las personas o entidades contempladas en la legislación para el buen cumplimiento del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo.

Profesional		**Aspirante o trabajador**	
Dr. Orlando [illegible] Médico Esp. Seguridad y Salud en el trabajo Lic. No. 0950 / 2018	Firma	Diego Fernando	Firma
Registro	L.S.O.	C.C. 92089837	
Nombre		Nombre Diego Fernando [illegible]	

*** Campos para cargos en SAP FOR-PSS-836

VIGILADO Supersalud

VIGILADO Supersubsidio

Caja de Compensación Familiar COMPENSAR Comunicaciones LVPS 16-07-2015

Certificado de Aptitud
Informe Salud Ocupacional

compensar | salud

Día	Mes	Año	Ciudad	Departamento
24	01	2021	Bta	Cund

Tipo de examen: [1] Ingreso [2] Cambio ocupación [3] Periódico programado [4] Retiro [5] Post-incapacidad [6] Reintegro

Nombre y apellido de aspirante o trabajador						Tipo y número de identificación
Dilan Gonzalez						CC 1009103346
Genero F ☐ M ☒	Fecha de nacimiento	Día 03	Mes 02	Año 2002	Edad 18	Empresa Dilan Park
Actividad económica Operativo		Cargo u oficio Ayudante			Fecha de ingreso	Día 31 Mes 08 Año 2020

Concepto de aptitud

1. Ingreso
- ☐ Apto para el cargo que aspira
- ☐ Apto con patología que no interviene con su labor
- ☐ Aptitud que no cumple con el perfil o requisitos para el cargo que aspira
- ☐ Apto con restricción
- ☐ Aplazado

2. Cambio ocupación
- ☐ Apto para el cargo que aspira
- ☐ Apto con patología que no interviene con su labor
- ☐ Aptitud que no cumple con el perfil o requisitos para el cargo que aspira
- ☐ Apto con restricción
- ☐ Aplazado

3. Periódico programado
- ☒ Evaluación satisfactoria para el cargo que desempeña
- ☐ Evaluación satisfactoria con recomendaciones
- ☐ Con restricciones que interviene con su labor o cargo

4. Retiro
- ☐ Trabajador sin enfermedad profesional ni secuela de accidente de trabajo
- ☐ Sospecha de enfermedad laboral
- ☐ Sospecha de enfermedad común agravada por el trabajo
- ☐ Sospecha de secuelas de accidente laboral

5. Post-incapacidad
- ☐ Aptitud física adecuada para el cargo que desempeña
- ☐ Aptitud física adecuada para el cargo que desempeña con recomendaciones preventivas
- ☐ Requiere continuar tratamiento o seguimiento médico para patología de base

6. Reintegro
- ☐ Apto para el cargo que aspira
- ☐ Apto con patología que no interviene con su labor
- ☐ Aptitud que no cumple con el perfil o requisitos para el cargo que aspira
- ☐ Apto con restricción
- ☐ Aplazado

Tipo de cargo (Marque con una X):
☐ Administrativo ☒ Operativo ☐ Manipulación de alimentos ☐ Trabajo en alturas ☐ Otros: _____

Exámenes realizados (Marque con una X): Anexo técnico: No ☐ Si ☐ Cuál? _____

☐ EKG	☐ Triglicéridos	☒ Audiometría	☐ Espirometría
☐ Cuadro hemático	☐ Glicemia	☒ Visiometría	☐ Otros: _____
☐ Colesterol	☐ Parcial de orina	☐ Optometría	

Recomendaciones al trabajador: Lavado de manos uso de lentes correctivos, pausas activas, consumo de agua, dieta balanceada

Recomendaciones a la empresa: Programa de pausas activas, capacitación en seguridad industrial y uso de elementos de protección personal

Recomendaciones específicas: _____

Restricciones: Si ☐ No ☒ _____

Causa de aplazamiento: _____

Examen de retiro: Remisión a EPS Si ☐ No ☐

Consentimiento informado del aspirante o trabajador

Autorizo de manera voluntaria al personal médico y paramédico que la institución defina para que se me realicen durante el tiempo necesario el examen médico ocupacional y los exámenes complementarios y dejo constancia de que tuve la oportunidad de manifestar mi consentimiento para la realización del examen médico ocupacional y/o exámenes complementarios necesarios. Comprendo el propósito, los beneficios, interpretación, limitaciones y riesgos del examen médico ocupacional y/o exámenes complementarios, a partir de la información recibida por el (los) profesional (es).

Certifico que la información que he suministrado es verdadera y completa, y acepto el manejo de confidencialidad que Compensar dé a la misma. Así mismo dejo constancia de que conozco los resultados de esta (s) evaluación (es) médica (s).

Autorizo que se suministre la información necesaria a las personas o entidades contempladas en la legislación para el buen cumplimiento del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo.


Profesional	Aspirante o trabajador
Registro L.S.O.	Firma C.C. 1009103346
Nombre	Nombre Dilan Gonzalez

*** Campos para cargue en SAP FOR-PSS-836

VIGILADO Supersalud

VIGILADO SuperSubsidio

Caja de Compensación Familiar COMPENSAR Convenciones LAPE 16-07-2019

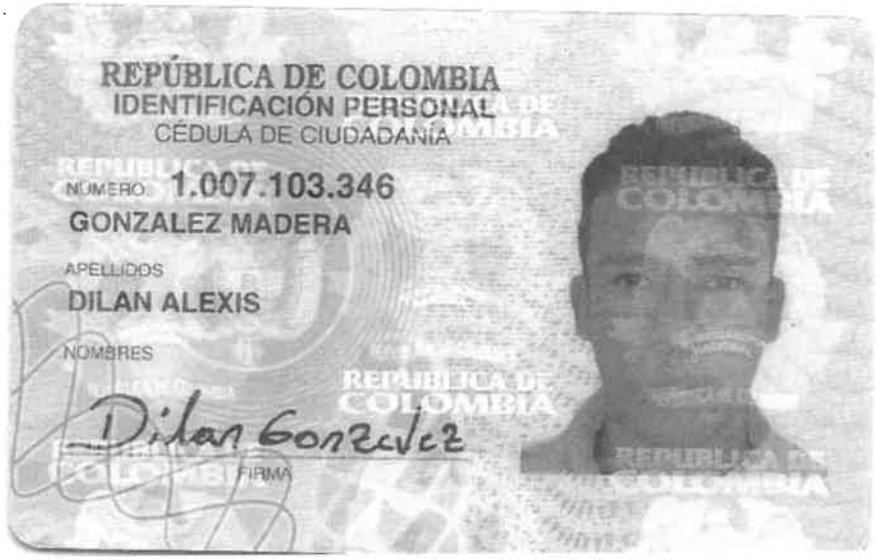

REPÚBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACIÓN PERSONAL
CÉDULA DE CIUDADANÍA

NÚMERO 1.007.103.346
GONZALEZ MADERA

APELLIDOS
DILAN ALEXIS

NOMBRES
Dilan Gonzalez

FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 03-FEB-2002
BOGOTA D.C
(CUNDINAMARCA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.63 ESTATURA
O+ G.S. RH
M SEXO

10-FEB-2020 BOGOTA D.C.
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICIÓN

REGISTRADOR NACIONAL
ALEXANDER VEGA ROCHA

P-1500150-01132237-M-1007103346-20200217 0070107937A 2 8500310945

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 80.008.744

MARTINEZ VILLARRAGA
APELLIDOS

ELGAR FREDY
NOMBRES

FIRMA





INDICE DERECHO


FECHA DE NACIMIENTO 10-DIC-1977
SAN ANTONIO DEL TEQUENDAMA
(CUNDINAMARCA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.77 ESTATURA | O+ G.S. RH | M SEXO

08-ABR-1997 BOGOTA D.C
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

A-1500150-00400539-M-0080008744-20120919 0031168994A 1 1311982965

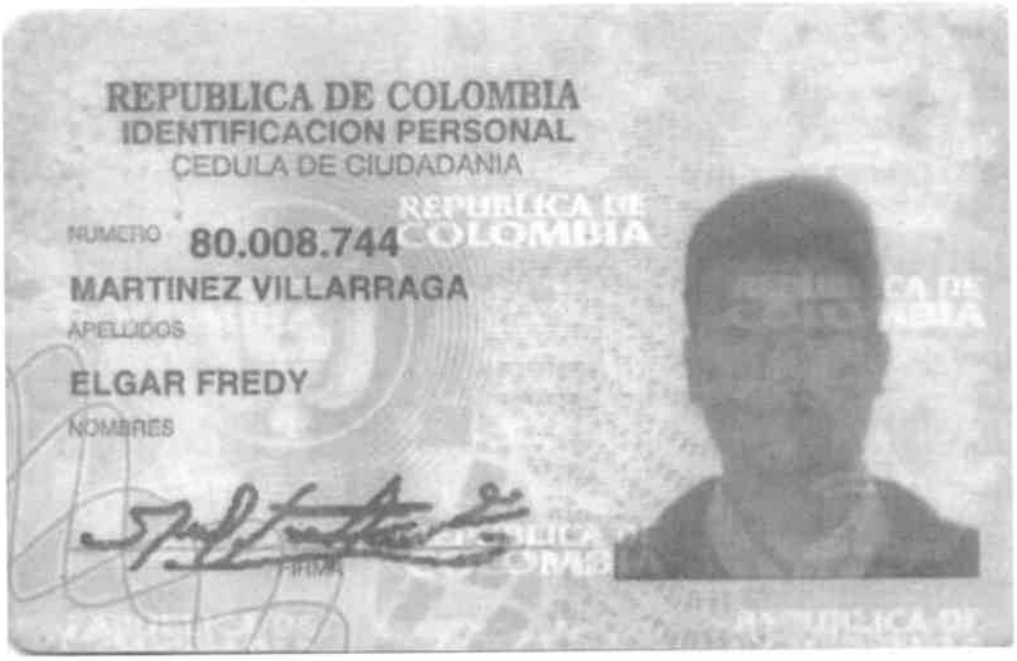

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 80.008.744

MARTINEZ VILLARRAGA
APELLIDOS

ELGAR FREDY
NOMBRES

FIRMA



FECHA DE NACIMIENTO 10-DIC-1977
SAN ANTONIO DEL TEQUENDAMA
(CUNDINAMARCA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.77 ESTATURA | O+ G.S. RH | M SEXO

08-ABR-1997 BOGOTA D.C
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

INDICE DERECHO

A-1500150-00400539-M-0080008744-20120919 0031168094A 1 1311982965

M98

Certificado de Aptitud
Informe Salud Ocupacional

compensar | salud

Día	Mes	Año	Ciudad	Departamento
27	01	2021	Bta	Cmca

Tipo de exámen: [1] Ingreso [2] Cambio ocupación [X] Periódico programado [4] Retiro [5] Post-incapacidad [6] Reintegro

Nombre y apellido de aspirante o trabajador	Tipo y número de identificación
Edgar martinez	CC 80008744

Genero	Fecha de nacimiento	Día	Mes	Año	Edad	Empresa
F [ ] M [X]		10	12	1977	43 A	Dow Park

Actividad económica	Cargo u oficio	Fecha de ingreso	Día	Mes	Año
Operario	Instalador		06	07	2021

Concepto de aptitud

1. Ingreso
- [ ] Apto para el cargo que aspira
- [ ] Apto con patología que no interviene con su labor
- [ ] Aptitud que no cumple con el perfil o requisitos para el cargo que aspira
- [ ] Apto con restricción
- [ ] Aplazado

2. Cambio ocupación
- [ ] Apto para el cargo que aspira
- [ ] Apto con patología que no interviene con su labor
- [ ] Aptitud que no cumple con el perfil o requisitos para el cargo que aspira
- [ ] Apto con restricción
- [ ] Aplazado

3. Periódico programado
- [ ] Evaluación satisfactoria para el cargo que desempeña
- [ ] Evaluación satisfactoria con recomendaciones
- [X] Con restricciones que interviene con su labor o cargo

4. Retiro
- [ ] Trabajador sin enfermedad profesional ni secuela de accidente de trabajo
- [ ] Sospecha de enfermedad laboral
- [ ] Sospecha de enfermedad común agravada por el trabajo
- [ ] Sospecha de secuelas de accidente laboral

5. Post-incapacidad
- [ ] Aptitud física adecuada para el cargo que desempeña
- [ ] Aptitud física adecuada para el cargo que desempeña con recomendaciones preventivas
- [ ] Requiere continuar tratamiento o seguimiento médico para patología de base

6. Reintegro
- [ ] Apto para el cargo que aspira
- [ ] Apto con patología que no interviene con su labor
- [ ] Aptitud que no cumple con el perfil o requisitos para el cargo que aspira
- [ ] Apto con restricción
- [ ] Aplazado

Tipo de cargo (Marque con una X):
[ ] Administrativo [X] Operativo [ ] Manipulación de alimentos [ ] Trabajo en alturas [ ] Otros: _____

Exámenes realizados (Marque con una X): Anexo técnico: No [ ] Si [ ] Cuál? _____

[ ] EKG	[ ] Triglicéridos	[X] Audiometría	[ ] Espirometría
[ ] Cuadro hemático	[ ] Glicemia	[X] Visiometría	[ ] Otros: _____
[ ] Colesterol	[ ] Parcial de orina	[ ] Optometría	

Recomendaciones al trabajador: lavado de manos antes de fumar, alimentos frios, dieta, ejercicio, valoración en Control por optometria, pausas activas capacitacion
Recomendaciones a la empresa: Su EPS por patología, la copy
Recomendaciones especificas: X Seguridad industrial y alimentos de proteccion
Restricciones: Si [X] No [ ] Disminuir esfuerzo físico fuerte cardiovascular por cardiología con su EPS
Causa de aplazamiento: _____

Examen de retiro: Remisión a EPS Si [ ] No [ ]

Consentimiento informado del aspirante o trabajador

Autorizo de manera voluntaria al personal médico y paramédico que la institución defina para que se me realicen durante el tiempo necesario el examen médico ocupacional y los exámenes complementarios y dejo constancia de que tuve la oportunidad de manifestar mi consentimiento para la realización del examen médico ocupacional y/o exámenes complementarios necesarios. Comprendo el propósito, los beneficios, interpretación, limitaciones y riesgos del examen médico ocupacional y/o exámenes complementarios, a partir de la información recibida por el (los) profesional (es).

Certifico que la información que he suministrado es verdadera y completa, y acepto el manejo de confidencialidad que Compensar dé a la misma. Así mismo dejo constancia de que conozco los resultados de este (s) evaluación (es) médica (s).

Autorizo que se suministre la información necesaria a las personas o entidades contempladas en la legislación para el buen cumplimiento del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo.

Profesional	Aspirante o trabajador
Dr. Orlando Fuentes Médico Esp. Seguridad y Salud en el trabajo Ln Nº 23 - 09/07/2018	Firma
Registro L.S.O.	C.C. 80008744
Nombre	Nombre Edgar Martinez J

*** Campos para cargue en SAP FOR-PSS-836

VIGILADO Supersalud

VIGILADO Supersubsidio

Caja de Compensación Familiar COMPENSAR Comunicación UAPS 15-07-2019

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 1.007.857.825
HERNANDEZ ELLES

APELLIDOS
JAVIER

NOMBRES
Jabier

FIRMA





FECHA DE NACIMIENTO 04-MAR-1993
BARRANCO DE LOBA
(BOLIVAR)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.71 ESTATURA | A+ G.S. RH | M SEXO

09-MAR-2012 MAGANGUE
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

INDICE DERECHO

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES



P-0502800-00366220-M-1007857825-20120708 0030433102A 1 37973646

1200

Certificado de Aptitud
Informe Salud Ocupacional

compensar | salud

Día	Mes	Año	Ciudad	Departamento
27	01	2021	Ibagué	Tolima

Tipo de examen: [1] Ingreso [2] Cambio ocupación [3] Periódico programado [4] Retiro [5] Post-incapacidad [6] Reintegro

Nombre y apellido de aspirante o trabajador	Tipo y número de identificación
Javier Hernandez	C.C. 1007857825

Genero	Fecha de nacimiento	Día	Mes	Año	Edad	Empresa
F ☐ M ☑		04	05	1993	27	Diver Perla

Actividad económica	Cargo u oficio	Fecha de ingreso	Día	Mes	Año
Deportivo	Instalador		15	10	2017

Concepto de aptitud

1. Ingreso
- ☐ Apto para el cargo que aspira
- ☐ Apto con patología que no interviene con su labor
- ☐ Aptitud que no cumple con el perfil o requisitos para el cargo que aspira
- ☐ Apto con restricción
- ☐ Aplazado

2. Cambio ocupación
- ☐ Apto para el cargo que aspira
- ☐ Apto con patología que no interviene con su labor
- ☐ Aptitud que no cumple con el perfil o requisitos para el cargo que aspira
- ☐ Apto con restricción
- ☐ Aplazado

3. Periódico programado
- ☑ Evaluación satisfactoria para el cargo que desempeña
- ☐ Evaluación satisfactoria con recomendaciones
- ☐ Con restricciones que interviene con su labor o cargo

4. Retiro
- ☐ Trabajador sin enfermedad profesional ni secuela de accidente de trabajo
- ☐ Sospecha de enfermedad laboral
- ☐ Sospecha de enfermedad común agravada por el trabajo
- ☐ Sospecha de secuelas de accidente laboral

5. Post-incapacidad
- ☐ Aptitud física adecuada para el cargo que desempeña
- ☐ Aptitud física adecuada para el cargo que desempeña con recomendaciones preventivas
- ☐ Requiere continuar tratamiento o seguimiento médico para patología de base

6. Reintegro
- ☐ Apto para el cargo que aspira
- ☐ Apto con patología que no interviene con su labor
- ☐ Aptitud que no cumple con el perfil o requisitos para el cargo que aspira
- ☐ Apto con restricción
- ☐ Aplazado

Tipo de cargo (Marque con una X):
☑ Administrativo ☐ Operativo ☐ Manipulación de alimentos ☐ Trabajo en alturas ☐ Otros: _____

Exámenes realizados (Marque con una X): Anexo técnico: No ☐ Si ☐ Cuál? _____

☐ EKG	☐ Triglicéridos	☑ Audiometría	☐ Espirometría
☐ Cuadro hemático	☐ Glicemia	☑ Visiometría	☐ Otros: _____
☐ Colesterol	☐ Parcial de orina	☐ Optometría	

Recomendaciones al trabajador: Lavado de manos uso de tapabocas aislamiento físico distanciamiento

Recomendaciones a la empresa: Promotora area de pausas activas. Capacitacion en Seguridad Industrial

Recomendaciones especificas: en uso de protección personal

Restricciones: Si ☐ No ☑

Causa de aplazamiento: _____

Examen de retiro: Remisión a EPS Si ☐ No ☐

Consentimiento informado del aspirante o trabajador

Autorizo de manera voluntaria al personal médico y paramédico que la institución defina para que se me realicen durante el tiempo necesario el examen médico ocupacional y los exámenes complementarios y dejo constancia de que tuve la oportunidad de manifestar mi consentimiento para la realización del examen médico ocupacional y/o exámenes complementarios necesarios. Comprendo el propósito, los beneficios, interpretación, limitaciones y riesgos del examen médico ocupacional y/o exámenes complementarios, a partir de la información recibida por el (los) profesional (es).

Certifico que la información que he suministrado es verdadera y completa, y acepto el manejo de confidencialidad que Compensar dé a la misma. Así mismo dejo constancia de que conozco los resultados de esta (s) evaluación (es) médica (s).

Autorizo que se suministre la información necesaria a las personas o entidades contempladas en la legislación para el buen cumplimiento del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo.

Profesional	Aspirante o trabajador
Dr. Orlando Fuentes Médico Esp. Seguridad y Salud en el trabajo LIC N° 23 - 6950 / 2018	
Registro L.S.O. Firma	C.C. 1007857825 Firma
Nombre	Nombre Javier Hernandez ELLES

*** Campos para cargarse SAP FOR-PSS-836

VIGILADO Supersalud

VIGILADO Superintendencia del Subsidio

Caja de Compensación Familiar COMPENSAR Comfenalco LAPS 16-02-2018
