ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE GOBIERNO

ALCALDIA LOCAL DE LOS MARTIRES

HOJA DE RUTA PARA REPROGRAMACION DE PAC Y PAGO

No Radicación: _____ Fecha: 01 de Marzo de 2021 Clase de contrato: OBRA PUBLICA

Pago No. **03** de: 03 Contrato No. **CO-137-2019**

Nombre del Contratista: **CONSULTORIA Y CONSTRUCCION SAS CON&CON**

ACTIVIDAD	TRAMITE			
	DEPENDENCIA	NOMBRE DEL FUNCIONARIO QUE REALIZA TRAMITE	FECHA DE RECIBIDO	FECHA DE SALIDA
RECIBIR Y REVISAR LOS DOCUMENTOS DEL CONTRATISTA: ➢ Carta dirigida al supervisor del contrato ➢ Informe de gestión o avance ➢ Factura o documento equivalente ➢ Certificación de aporte de pagos parafiscales y seguridad social Y los demás requisitos pactados	Supervisor o interventor	MIRS LATINOAMERICA S.A.S. INTERVENTOR	14/12/2020	15/12/2020
ELABORA CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO	Supervisor o interventor	MIRS LATINOAMERICA S.A.S. INTERVENTOR	14/12/2020	15/12/2020
RECIBIR Y REVISAR LOS DOCUMENTOS SOPORTES PARA REPROGRAMACIÓN DEL PAC Y PAGO REALIZAR CONSOLIDACIÓN	Coordinador(a) Administrativo(a) y Financiero(a)			
RECIBIR Y REVISAR DOCUMENTOS ➢ Acta de recibo parcial y/o certificación de cumplimiento o de Liquidación ➢ Factura o documento equivalente ➢ Elabora Cálculo de impuestos RELIZAR CAUSACIÓN	Profesional con funciones de Contador			
EFECTUAR LA REPROGRAMACION DEL PAC Y REGISTRAR PARA PAGO EN EL APLICATIVO. ➢ Recibe y verifica el listado de los documentos ➢ Reprograma PAC ➢ Elabora y aprueba Orden de Pago ➢ Revisa y valida Planilla ➢ Firma digital	Profesional con funciones de Presupuesto			
➢ Revisa Planilla ➢ Firma digital	Alcalde(sa) (E) Local	TATIANA PIÑEROS LAVERDE Alcaldesa (E) Local de los Mártires		
Recibe y archiva en el **Expediente Único** los documentos soporte del pago	Profesional con funciones de abogado del FDL			

Observaciones o Aclaraciones:

Registro devoluciones:

FECHA DEVOLUCION	OBSERVACIONES	FECHA RECIBIDO	RECIBE

Avenida Calle 19 No 28-80 C.C. Calima Piso 7 – Tel. 2683728 / 2683636 / 3759535 – Información Línea 195
Bogotá D.C. – ColombiaPágina Web: www.martires.gov.co

GCO-GCL-F046
Versión: 01
Vigencia: 17 de noviembre de 2017
Ajustado de acuerdo a Circular 16 del 1 de noviembre de 2017.

Avenida Calle 19 No 28-80 C.C. Calima Piso 7 – Tel. 2683728 / 2683636 / 3759535 – Información Línea 195
Bogotá D.C. – Colombia Página Web: www.martires.gov.co

ALCALDÍA MAYOR

ALCALDÍA LOCAL DE LOS MÁRTIRES

CONTRATO DE OBRA CO-137-2019

FACTURA DE VENTA

CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS POR LA MODALIDAD DE MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS Y ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACION DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PÚBLICO DE LA LOCALIDAD DE LOS MARTIRES

ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
GOBIERNO
Alcaldía Local de Los Mártires

5

CONSULTORIA Y CONSTRUCCION S.A.S

Resolución de facturación electrónica DIAN No. 18764006684600 del 30/10/2020, numeración autorizada del No. FECC 1 al FECC 1.000.

AV CRA 7 Nº 127 - 48 OF 1006

4821681 BOGOTÁ

contabilidad@conycon.com.co

www.conycon.com.co

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA	
FECC	**19**

TIMBRADO
2021-03-02 11:11:26

NIT: 830.041.411- 0 - IVA RÉGIMEN COMÚN ACTIVIDAD ECONÓMICA ICA 74211 6.9 X 1000

Cliente: **SECRETARIA DE HACIENDA**
Nit: 899999061
Tel:
Dirección: CRA 30 N 25 90
e-mail:
Reg. Fiscal: Responsable de Impuesto a las Ventas (48)
Resp. Fiscal: R-99-PN

ORDEN DE COMPRA NO	**FECHA**		
0	2	3	2021
CIUDAD	**VENCE**		
BOGOTÁ	01	04	2021
FORMA DE PAGO	**MEDIO DE PAGO**		
FORMA DE PAGO 30 DIAS	Crédito		

Item	Detalle	Cant.	Vr. Unitario	Vr Total
	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE LOS MARTIRES			
	ACTA N 3 CONTRATO DE OBRA PUBLICA 137 DE 2019			
1	COSTO DIRECTO	1.00	527,518,565.00	527,518,565.00
2	AIU 30.89%	1.00	162,950,485.00	162,950,485.00
	COSTO TOTAL OBRA EJECUTADA $ 690.469.050			
3	COSTO TOTAL COMPONENTES	1.00	47,664,861.00	47,664,861.00
	VALOR TOTAL ACTA N 3 $ 738.133.911			
	MENOS AMORTIZACION ANTICIPO 30% $ 221.440.173			
	MENOS RETENCION EN GARANTIA $ 73.813.391			
	VALOR TOTAL A PAGAR ACTA N 3 $ 442.880.347			

Valor en Letras:	SETECIENTOS DIECIOCHO MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL CIENTO NUEVE PESOS	**Vr Bruto**	**738,133,911**
		Administración	0
Observaciones:	Favor consignar y/o hacer trenaferencia a; BANCO AV VILLAS cuenta corriente N° 649-001005	Imprevistos	0
		Utilidad	0
CUFE:	72ab778c85ed5dd74992e684bb85ac43dd6cdc1d74559b988c074d45478ccae6f65072dc0f2a7b54b96540cb9fb5557b	I.V.A.	0
		Subtotal	**738,133,911.00**
Aceptada:		ReteFuente	14,762,678
		ReteIva	0
		ReteIca	5,093,124
Fecha y Firma Autorizada		**Total**	**718,278,109.00**

RAZON SOCIAL: PROASISTEMAS SA; NIT: 800.042.928; NOMBRE SOFTWARE: HELISA; NOMBRE PROVEEDOR TECNOLOGICO: ATEB COLOMBIA SAS; NIT: 900.965.992; PLATAFORMA: COFIDI

ORIGINAL

DIAN
POR UNA COLOMBIA MAS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 1 3 Actualización de oficio

4. Número de formulario 14720242233

(415)7707212489984(8020) 000001472024223 3

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
8 3 0 0 4 1 4 1 1	0	Impuestos de Bogotá 3 2	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	27. Fecha expedición
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición 28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
CONSULTORIA Y CONSTRUCCION S.A.S.

36. Nombre comercial	37. Sigla
	CON & CON

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Bogotá D.C. 1 1	Bogotá, D.C. 0 0 1

41. Dirección principal
AK 7 127 48 OF 1006

42. Correo electrónico contabilidad@conycon.com.co

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	4 8 2 1 6 8 1	5 2 0 1 2 4 7

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código 1	2	51. Código	52. Número establecimientos
4 3 3 0	1 9 9 8 0 3 2 3	4 2 1 0	1 9 9 8 0 2 2 3	4 2 2 0	4 2 9 0		

Responsabilidades, Calidades y Atributos

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código	5	7	8	9	1 0	1 4	4 2	4 8	5 2																	

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
07- Retención en la fuente a título de rent
08- Retención timbre nacional
09- Retención en la fuente en el impuesto
10- Obligado aduanero
14- Informante de exogena
42- Obligado a llevar contabilidad
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico

Obligados aduaneros

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54. Código	2 3									
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores

55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha 2020 - 10 - 30 / 17 : 59: 04

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.
Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre ACTUACIÓN DE OFICIO AUTOMÁTICA
985. Cargo

CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MAS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

Página 2 de 5 **Hoja 2**

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 14720242233

(415)7707212489984(8020) 000001472024223 3

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
8 3 0 0 4 1 4 1 1	0	Impuestos de Bogotá 3 2	

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza	2	63. Formas asociativas	1 0	64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados	
65. Fondos		66. Cooperativas		67. Sociedades y organismos extranjeros	
68. Sin personería jurídica		69. Otras organizaciones no clasificadas		70. Beneficio	1

Constitución, Registro y Última Reforma

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase	0 5	0 1
72. Número	1 9 5	2 2
73. Fecha	1 9 9 8 0 1 2 7	2 0 1 4 0 1 3 0
74. Número de notaría	1 2	
75. Entidad de registro	0 3	0 3
76. Fecha de registro	1 9 9 8 0 2 1 7	2 0 1 4 0 9 1 1
77. No. Matrícula mercantil	0 0 8 4 9 8 4 5	0 0 8 4 9 8 4 5
78. Departamento	1 1	1 1
79. Ciudad/Municipio	4	4
Vigencia		
80. Desde	1 9 9 8 0 1 2 7	2 0 1 4 0 1 3 0
81. Hasta		

Composición del Capital

82. Nacional	1 0 0 %
83. Nacional público	0 . 0 %
84. Nacional privado	1 0 0 . 0
85. Extranjero	0 %
86. Extranjero público	0 . 0 %
87. Extranjero privado	0 . 0 %

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control

Superintendencia de Sociedades 5

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1	8 0	2 0 1 5 0 1 0 1		-
2				-
3				-
4				-
5				-

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.
1			

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

CONSULTORIA Y CONSTRUCCION SAS

170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

DOCUMENTO CERTIFICADO SIN COSTO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MAS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario
Representación

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14720242233

(415)7707212489984(8020) 000001472024223 3

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
8 3 0 0 4 1 4 1 1	0	Impuestos de Bogotá 3 2	

Representación

1

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL PRIN 1 8	2 0 1 6 0 5 2 3

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadaní 1 3	8 0 4 1 7 3 7 7		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
RICCI	RUIZ	JUAN	PABLO

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

2

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL SUPL 1 9	2 0 1 4 0 1 3 0

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadan 1 3	1 2 2 3 5 4 2 4		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
FONSECA	GASCA	CESAR	AUGUSTO

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

3

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

4

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

5

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

DOCUMENTO CERTIFICADO SIN COSTO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Autorización Numeración de Facturación

1876

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 18764006684600

(415)7707212489984(8020) 001876400668460 0

5. Número de Identificación Tributaria - NIT	6. DV	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
830041411	0				

11. Razón social
CONSULTORIA Y CONSTRUCCION S.A.S.

12. Dirección seccional
Impuestos de Bogotá — Cód. 32

24. Dirección
AK 7 127 48 OF 1006

25. País	26.Departamento	27. Municipio
Colombia	Bogotá D.C.	Bogotá, D.C.

La U.A.E. Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, conforme a la facultad discrecional establecida en el artículo 684 - 2 del Estatuto Tributario y en virtud de lo estipulado en la Resolución 0042 del 05/05/2020, por la cual se dictan otras disposiciones en materia de sistemas de facturación; previo estudio y evaluación de la solicitud realizada por el contribuyente, representante legal o apoderado debidamente acreditado; determina autorizar los rangos de numeración de facturación y/o documento equivalente. En los casos, en que se agote dicha numeración antes de culminar su vigencia, el interesado tendrá derecho a solicitar una nueva autorización, de acuerdo con el tramite establecido.

Las vigencias de los rangos de numeración de facturación, se contarán a partir de la formalización de éste documento oficial.

Si el obligado a facturar; no hubiere agotado la numeración de facturación transcurrido el término de la vigencia autorizada, con 15 días de antelación podrá solicitar la habilitación de la numeración sobrante.

Cuando se trate de una solicitud de inhabilitación de la numeración de facturación y/o documento equivalente, la vigencia es permanente, por lo tanto, no procede la habilitación de dichos rangos.

AUTORIZADO

Nota: La no adopción o violación de los sistemas técnicos de control, dará lugar a la sanción establecida en el artículo 684-2 del E.T

Firma del funcionario autorizado

Firma del solicitante

DIAN
2020-10-30 / 03:32:57 PM
Fecha Acuse de Recibo
Firmado

984. Apellidos y nombres
985. Cargo
989. Dependencia Subdirección de Gestión de Asistencia al Cliente
990. Lugar administrativo
991. Organización U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACION
992. Área
993. Establecimiento

1001. Apellidos y nombres RICCI RUIZ JUAN PABLO
1002. Tipo documento Cédula de Ciudadanía
1003. No. Identiflcación 80417377 1004. DV 3
1005. Cod. Representación Representante Legal Principal
1006. Organización CONSULTORIA Y CONSTRUCCION S.A.S.

997. Fecha formalización 2020-10-30/15:32:57

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Autorización Numeración de Facturación

1876

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 18764006684600

(415)7707212489984(8020) **001876400668460 0**

5. Número de Identificación Tributaria - NIT	6. DV	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
830041411	0				

11. Razón social

CONSULTORIA Y CONSTRUCCION S.A.S.

Rangos de numeración para autorizar, habilitar o inhabilitar

	29. Establecimiento	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.
1	CONSULTORIA Y CONSTRUCCION S.A.S. AK 7 127 48 OF 1006	FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA	4	FECC	1	1,000	12	AUTORIZACIÓN	1
2	CONSULTORIA Y CONSTRUCCION S.A.S. AK 7 127 48 OF 1006	FACTURA DE TALONARIO O DE PAPEL	5	FVCT	1	500	12	AUTORIZACIÓN	1
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									

AUTORIZADO

10

Banco AV Villas
NIT. 860.035.827-5

BANCO COMERCIAL
"AV VILLAS"
NIT 860035827 - 5
CRA. 13 No. 27-47 P-24 BOGOTA D.C.

C E R T I F I C A :

Que CONSULTORA Y CONTRUCCIONES S identificado con el documento No. 830.041.411

posee en la oficina C.E SARMIENTO ANGULO (649) una cuenta corriente

No. 649001005 desde el 14 de febrero de 2019

Se expide la presente a solicitud del interesado a los 21 días del mes de diciembre de 2020

Atentamente,

Gerente Oficina 649

Esta certificación tiene un costo de $ 10.550,00 , el cual será debitado de su cuenta y se verá reflejado en el extracto de la misma.

CAP-IM1-119-V1

F-06-403-1

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A21119500D6CA2

1 DE FEBRERO DE 2021 HORA 11:52:17

AA21119500 PÁGINA: 1 DE 3

* *

****

LA MATRÍCULA MERCANTIL PROPORCIONA SEGURIDAD Y CONFIANZA EN LOS NEGOCIOS.

****

ESTE CERTIFICADO FUE GENERADO ELECTRÓNICAMENTE Y CUENTA CON UN CÓDIGO DE VERIFICACIÓN QUE LE PERMITE SER VALIDADO ILIMITADAMENTE DURANTE 60 DÍAS, INGRESANDO A WWW.CCB.ORG.CO

****

RECUERDE QUE ESTE CERTIFICADO LO PUEDE ADQUIRIR DESDE SU CASA U OFICINA DE FORMA FÁCIL, RÁPIDA Y SEGURA EN WWW.CCB.ORG.CO

****

PARA SU SEGURIDAD DEBE VERIFICAR LA VALIDEZ Y AUTENTICIDAD DE ESTE CERTIFICADO SIN COSTO ALGUNO DE FORMA FÁCIL, RÁPIDA Y SEGURA EN WWW.CCB.ORG.CO/CERTIFICADOSELECTRONICOS

****

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL O INSCRIPCION DE DOCUMENTOS.

LA CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA, CON FUNDAMENTO EN LAS MATRICULAS E INSCRIPCIONES DEL REGISTRO MERCANTIL

CERTIFICA:

NOMBRE : CONSULTORIA Y CONSTRUCCION S.A.S.
SIGLA : CON & CON
N.I.T. : 830.041.411-0
DOMICILIO : BOGOTÁ D.C.

CERTIFICA:

MATRICULA NO: 00849845 DEL 17 DE FEBRERO DE 1998

CERTIFICA:

RENOVACION DE LA MATRICULA :6 DE JULIO DE 2020
ULTIMO AÑO RENOVADO : 2020
ACTIVO TOTAL : 23,985,474,000

CERTIFICA:

DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL : CRA 7 NO.127 - 48 OFC. 1006
MUNICIPIO : BOGOTÁ D.C.
EMAIL DE NOTIFICACION JUDICIAL : CONYCON@CONYCON.COM.CO
DIRECCION COMERCIAL : AV CRA 7 NO.127 - 48 OFICINA 1006
MUNICIPIO : BOGOTÁ D.C.
EMAIL COMERCIAL : CONTABILIDAD@CONYCON.COM.CO

CERTIFICA:

CONSTITUCION: QUE POR ESCRITURA PUBLICA NO. 0000195 DE NOTARIA 12 DE BOGOTA D.C. DEL 27 DE ENERO DE 1998, INSCRITA EL 17 DE FEBRERO DE 1998 BAJO EL NUMERO 00622765 DEL LIBRO IX, SE CONSTITUYO LA SOCIEDAD COMERCIAL DENOMINADA CONSULTORIA Y CONSTRUCCION LIMITADA CON & CON LTDA.

CERTIFICA:

Signature Not Verified
Constanza del Pilar Puentes Trujillo

QUE POR ACTA NO. 22 DE JUNTA DE SOCIOS DEL 30 DE ENERO DE 2014, INSCRITA EL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2014 BAJO EL NÚMERO 01867358 DEL LIBRO IX, LA SOCIEDAD CAMBIO SU NOMBRE DE: CONSULTORIA Y CONSTRUCCION LIMITADA CON & CON LTDA POR EL DE: CONSULTORIA Y CONSTRUCCION S.A.S..

CERTIFICA:

QUE POR E.P. NO. 460 DEL 16 DE FEBRERO DE 1998 REGISTRADA BAJO EL NUMERO 622765 DEL LIBRO IX DEL 17 DE FEBRERO DE 1998 SE ACLARO LA ESCRITURA DE CONSTITUCION.

CERTIFICA:

QUE POR ACTA NO. 22 DE LA JUNTA DE SOCIOS, DEL 30 DE ENERO DE 2014, INSCRITA EL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2014 BAJO EL NÚMERO 01867358 DEL LIBRO IX, LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMÓ DE SOCIEDAD LIMITADA A SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA BAJO EL NOMBRE DE: CONSULTORIA Y CONSTRUCCION S.A.S.

CERTIFICA:

REFORMAS:

DOCUMENTO NO.	FECHA	ORIGEN	FECHA	NO.INSC.
0000960	2002/05/29	NOTARIA 22	2002/06/12	00830870
0000662	2008/03/17	NOTARIA 34	2008/04/01	01202383
0000662	2008/03/17	NOTARIA 34	2008/04/04	01203331
600	2010/03/02	NOTARIA 5	2010/03/16	01369065
798	2013/08/01	NOTARIA UNICA	2013/08/02	01754040
22	2014/01/30	JUNTA DE SOCIOS	2014/09/11	01867358

CERTIFICA:

VIGENCIA: QUE EL TERMINO DE DURACION DE LA SOCIEDAD ES INDEFINIDO

CERTIFICA:

OBJETO SOCIAL: EN DESARROLLO DEL OBJETO SOCIAL Y COMO PARTE DE ÉL LA SOCIEDAD PODRÁ EJECUTAR TODOS LOS ACTOS Y OPERACIONES QUE FUEREN CONVENIENTES Y/O NECESARIOS PARA EL CABAL CUMPLIMIENTO DE SU OBJETO SOCIAL Y QUE TENGAN RELACIÓN DIRECTA CON EL OBJETO MENCIONADO, TALES COMO: LA EXPLOTACIÓN DE LAS DIVERSAS RAMAS DE LA INGENIERÍA Y ARQUITECTURA EN TODOS SUS ASPECTOS DE INVESTIGACIÓN PURA Y APLICADA PUDIENDO LA SOCIEDAD CELEBRAR Y EJECUTAR TODA CLASE DE CONTRATOS QUE GUARDEN RELACIÓN DIRECTA CON EL OBJETO SOCIAL. EL PROYECTO Y LA CONSTRUCCIÓN DE TODO GÉNERO DE OBRAS E INSTALACIONES CIVILES, ARQUITECTÓNICAS, INDUSTRIALES Y ELECTRÓNICAS. LA PRESTACIÓN DE TODA CLASE DE SERVICIOS, ESTUDIOS TÉCNICOS, ECONÓMICOS Y DE FACTIBILIDAD, PLANEACIÓN Y TRABAJOS RELACIONADOS CON LA INGENIERÍA Y LA ARQUITECTURA, ASIMISMO, LA CONSTRUCCIÓN CON EXPLORACIONES, EXPLOTACIONES, APROVECHAMIENTOS Y DESARROLLO EN GENERAL LA COMPRAVENTA Y ALQUILER DE INSTRUMENTO Y MAQUINARIA EQUIPOS Y PARTES DE REFACCIONES PARA LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN. LA REPRESENTACIÓN DE FIRMAS NACIONALES O EXTRANJERAS RELACIONADAS CON EL OBJETO SOCIAL, LA ADQUISICIÓN, POSESIÓN Y EXPLOTACIÓN DE BIENES URBANOS Y RURALES CON EL DESTINO DE URBANIZARLOS, CONSTRUIRLOS, PARCELARIOS, MEJORARLOS O ENAJENARLOS, ASÍ COMO LA RECONSTRUCCIÓN Y REMODELACIÓN DE VIVIENDA PARA VENDER O ARRENDAR. EN DESARROLLO DE SU OBJETO SOCIAL LA SOCIEDAD PODRÁ ARRENDAR, COMPRAR, VENDER Y GRAVAR BIENES MUEBLES E INMUEBLES; DAR Y RECIBIR DINERO EN MUTUO CON INTERÉS; INVERTIR EN VALORES BURSÁTILES; CONTRAER OBLIGACIONES, EMITIENDO LOS TÍTULOS VALORES QUE FUEREN NECESARIOS; CELEBRAR CONTRATOS PARA LA ADQUISICIÓN DE LA PROPIEDAD O DE LA TENENCIA DE MAQUINARIA U OTROS BIENES PRODUCTIVOS. PODRÁ PARTICIPAR COMO SOCIO EN LA CONSTRUCCIÓN DE SOCIEDADES, ADQUIRIR ACCIONES DE SOCIEDADES NUEVAS O YA CONSTITUIDAS, HACER APORTES, FUSIONARSE CON OTRAS SOCIEDADES Y EN GENERAL PARTICIPAR EN CUALQUIER FORMA DE NEGOCIO QUE TENGAN RELACIÓN DIRECTA CON SU OBJETO SOCIAL;

PODRÁ CELEBRAR CONTRATOS DE SOCIEDAD ACCIDENTAL O DE CUENTAS EN PARTICIPACIÓN, Y EN GENERAL EJECUTAR O CELEBRAR POR CUENTA PROPIA O DE TERCEROS O EN PARTICIPACIÓN CON ESTOS TODA CLASE DE ACTOS O CONTRATOS CIVILES, COMERCIALES O ADMINISTRATIVOS QUE GUARDEN RELACIÓN DEMEDIO A FIN CON EL OBJETO SOCIAL ANTES INDICADO Y TODAS AQUELLAS QUE TENGAN COMO FINALIDAD EJERCER LOS DERECHOS Y CUMPLIR LAS OBLIGACIONES LEGALES O CONVENCIONALMENTE DERIVADAS DE LA EXISTENCIA Y DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR LA SOCIEDAD. A.- CONTRATAR O ESTABLECER CONVENIOS CON ENTIDADES PÚBLICAS O PRIVADAS. B.- REPRESENTAR FIRMAS NACIONALES O EXTRANJERAS QUE SE OCUPEN DE LOS MISMOS NEGOCIOS O ACTIVIDADES; C.- REALIZAR IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES DE MATERIAS PRIMAS, MAQUINARIAS, Y EN GENERAL TODO TIPO DE BIENES QUE SE RELACIONEN CON EL OBJETO SOCIAL EXPRESADO; D.- ALMACENAR, DISTRIBUIR, EMPACAR, REEMPACAR Y MANIPULAR TODO TIPO DE BIENES; E.- EMITIR, RECIBIR, DISTRIBUIR, REGISTRAR LOS DOCUMENTOS PROPIOS DE LA ACTIVIDAD; F.- PRESTAR SERVICIOS DE CONSULTORÍA, ASESORÍA, DESARROLLO Y GESTIÓN EN TODOS LOS CAMPOS RELACIONADOS CON EL OBJETO SOCIAL A ENTIDADES DE DERECHO PÚBLICO Y PRIVADO, NACIONALES O EXTRANJERAS; H.- ADQUIRIR BIENES DE CUALQUIER NATURALEZA; MUEBLES O INMUEBLES CORPORALES O INCORPORALES, ASÍ COMO HACER CONSTRUCCIONES SOBRE SUS BIENES INMUEBLES Y ENAJENAR Y GRAVAR A CUALQUIER TÍTULO LOS BIENES DE QUE SEA TITULAR DEL DERECHO DE DOMINIO O CUALQUIER OTRO DERECHO REAL; L- DAR Y RECIBIR EN GARANTÍA DE OBLIGACIONES BIENES MUEBLES E INMUEBLES Y TOMARLOS EN ARRENDAMIENTO U OPCIÓN DE CUALQUIER NATURALEZA; K.- SUSCRIBIR ACCIONES O DERECHOS EN EMPRESAS QUE FACILITEN O CONTRIBUYAN AL DESARROLLO DE SUS OPERACIONES; L.- COMPRAR O CONSTITUIR SOCIEDADES DE CUALQUIER GÉNERO, INCORPORARSE EN COMPAÑÍAS O FUSIONARSE CON ELLAS. M.- PARTICIPAR EN LICITACIONES DE ENTIDADES PÚBLICAS O PRIVADAS, NACIONALES O EXTRANJERAS, DE ACUERDO CON LAS ACTIVIDADES A DESARROLLAR POR LA SOCIEDAD. Y SER MIEMBRO DE CONSORCIOS, UNIÓN TEMPORAL O SOCIEDADES CON OBJETO ÚNICO, PARA CELEBRAR CONTRATO(S). CON DETERMINADA ENTIDAD ESTATAL O SUSCRIBIR UNA PROMESA DE CONSTITUCIÓN DE SOCIEDAD UNA VEZ SE HAYA ADJUDICADO EL CONTRATO CON LA FINALIDAD DE PODER PARTICIPAR EN PROCESOS DE CONTRATACIÓN CON EL ESTADO COLOMBIANO, CUALQUIER OTRO ESTADO O PERSONA JURÍDICA DE CARÁCTER PRIVADO.; N.- LA SOCIEDAD PODRÁ, EN ORDEN A LA CONSECUCIÓN Y EJERCICIO DE SU OBJETO SOCIAL, CELEBRAR TODO ACTO O CONTRATO CIVIL, COMERCIAL, ADMINISTRATIVO, O FISCAL, NECESARIO, CONVENIENTE Y/O INDISPENSABLE. ASÍ MISMO, PODRÁ REALIZAR CUALQUIER OTRA ACTIVIDAD ECONÓMICA LÍCITA TANTO EN COLOMBIA COMO EN EL EXTRANJERO. LA SOCIEDAD PODRÁ LLEVAR A CABO, EN GENERAL, TODAS LAS OPERACIONES, DE CUALQUIER NATURALEZA QUE ELLAS FUEREN, RELACIONADAS CON EL OBJETO MENCIONADO, ASÍ COMO CUALESQUIERA ACTIVIDADES SIMILARES, CONEXAS O COMPLEMENTARIAS O QUE PERMITAN FACILITAR O DESARROLLAR EL COMERCIO O LA INDUSTRIA DE LA SOCIEDAD.

CERTIFICA:

ACTIVIDAD PRINCIPAL:
4330 (TERMINACIÓN Y ACABADO DE EDIFICIOS Y OBRAS DE INGENIERÍA CIVIL)
ACTIVIDAD SECUNDARIA:
4210 (CONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS Y VÍAS DE FERROCARRIL)
OTRAS ACTIVIDADES:
4220 (CONSTRUCCIÓN DE PROYECTOS DE SERVICIO PUBLICO)

CERTIFICA:

CAPITAL:

** CAPITAL AUTORIZADO **

VALOR	: $400,000,000.00
NO. DE ACCIONES	: 1,000.00
VALOR NOMINAL	: $400,000.00

** CAPITAL SUSCRITO **

VALOR	: $4,000,000,000.00
NO. DE ACCIONES	: 10,000.00
VALOR NOMINAL	: $400,000.00

** CAPITAL PAGADO **

VALOR	: $4,000,000,000.00
NO. DE ACCIONES	: 10,000.00
VALOR NOMINAL	: $400,000.00

CERTIFICA:

REPRESENTACIÓN LEGAL: ACTUARÁ COMO REPRESENTANTE LEGAL DE LA SOCIEDAD EL GERENTE GENERAL EN EJERCICIO DEL CARGO. EL REPRESENTANTE LEGAL SERÁ EL MISMO GERENTE GENERAL Y TENDRÁ LA ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN DE LOS NEGOCIOS SOCIALES CON SUJECIÓN A LA LEY, LOS ESTATUTOS SOCIALES, LOS REGLAMENTOS Y RESOLUCIONES DE LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS. LA SOCIEDAD CONTARÁ CON UN SUPLENTE DEL REPRESENTANTE LEGAL, QUIEN SOLO ACTUARÁ EN LAS FALTAS ABSOLUTAS O TEMPORALES DEL PRINCIPAL Y EN TAL CASO CON LAS MISMAS FACULTADES Y FUNCIONES DE ESTE. EL SUPLENTE DEL REPRESENTANTE LEGAL SERÁ DESIGNADO POR LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS MEDIANTE ACTA CON EL 100% DEL QUÓRUM PRESENTE.

CERTIFICA:

** NOMBRAMIENTOS **

QUE POR ACTA NO. 31 DE ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DEL 23 DE MAYO DE 2016, INSCRITA EL 16 DE JUNIO DE 2016 BAJO EL NUMERO 02113873 DEL LIBRO IX, FUE (RON) NOMBRADO (S):

NOMBRE	IDENTIFICACION
GERENTE GENERAL	
RICCI RUIZ JUAN PABLO	C.C. 000000080417377
SUPLENTE DEL GERENTE	
FONSECA GASCA CESAR AUGUSTO	C.C. 000000012235424

CERTIFICA:

FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL: LA SOCIEDAD SERÁ GERENCIADA, ADMINISTRADA Y REPRESENTADA LEGALMENTE ANTE TERCEROS POR EL REPRESENTANTE LEGAL, QUIEN NO TENDRÁ RESTRICCIONES DE CONTRATACIÓN POR RAZÓN DE LA NATURALEZA NI DE LA CUANTÍA DE LOS ACTOS QUE CELEBRE. POR TANTO, SE ENTENDERÁ QUE EL REPRESENTANTE LEGAL PODRÁ CELEBRAR O EJECUTAR TODOS LOS ACTOS Y CONTRATOS COMPRENDIDOS EN EL OBJETO SOCIAL O QUE SE RELACIONEN DIRECTAMENTE CON LA EXISTENCIA Y EL FUNCIONAMIENTO DE LA SOCIEDAD. EL REPRESENTANTE LEGAL SE ENTENDERÁ INVESTIDO DE LOS MÁS AMPLIOS PODERES PARA ACTUAR EN TODAS LAS CIRCUNSTANCIAS EN NOMBRE DE LA SOCIEDAD, CON EXCEPCIÓN DE AQUELLAS FACULTADES QUE, DE ACUERDO CON LOS ESTATUTOS, SE HUBIEREN RESERVADO LOS ACCIONISTAS. EN LAS RELACIONES FRENTE A TERCEROS, LA SOCIEDAD QUEDARA OBLIGADA POR LOS

ACTOS Y CONTRATOS CELEBRADOS POR EL REPRESENTANTE LEGAL. PARAGRAFO: EL REPRESENTANTE LEGAL TENDRÁ ADEMÁS DE LAS ANTERIORES, LAS SIGUIENTES FUNCIONES: A) REPRESENTAR LA SOCIEDAD JUDICIAL O EXTRAJUDICIALMENTE. B) CONVOCAR A LA ASAMBLEA GENERAL A REUNIONES ORDINARIAS Y/O EXTRAORDINARIAS, C) PRESENTAR A ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS EN SUS REUNIONES ORDINARIAS, UN INFORME PORMENORIZADO SOBRE LA MARCHA DE LA COMPAÑÍA, D) PRESENTAR A LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS LAS CUENTAS, BALANCES, INVENTARIOS, E INFORMES SOBRE LA SITUACIÓN ECONÓMICA DE LA SOCIEDAD. E) MANTENER INFORMADA A LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS PERMANENTE Y DETALLADAMENTE DE LOS NEGOCIOS Y PROYECTOS QUE ADELANTE LA SOCIEDAD Y SUMINISTRARLE LOS INFORMES O DATOS QUE ELLOS SOLICITEN. F) CONSTITUIR MANDATARIOS QUE REPRESENTEN A LA SOCIEDAD, JUDICIAL O EXTRAJUDICIALMENTE, Y DELEGARLES O ATRIBUIRLES LAS FUNCIONES O ATRIBUCIONES DE QUE ÉL MISMO GOZA. G) EJECUTAR TODOS LOS ACTOS O CONTRATOS SIN NINGÚN LÍMITE DE LIMITACIÓN, H) NOMBRAR Y REMOVER LIBREMENTE EL PERSONAL SUB ALTERNO QUE ÉL CONSIDERE PARA EL NORMAL FUNCIONAMIENTO DE LA SOCIEDAD. I) ENAJENAR, GRAVAR O ARRENDAR LA TOTALIDAD DE LOS BIENES DE LA SOCIEDAD, PREVIA AUTORIZACIÓN DE LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS. J) CUMPLIR LAS DECISIONES DE LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS. K) EJECUTAR LOS ACTOS IDÓNEOS ANTE LAS ENTIDADES DE REGISTRO DE LAS REFORMAS APROBADAS POR LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS Y CUMPLIR CON LOS DEMÁS REQUISITOS DE LEY.

CERTIFICA:

** REVISOR FISCAL **

QUE POR ACTA NO. 0000003 DE JUNTA DE SOCIOS DEL 1 DE DICIEMBRE DE 2005, INSCRITA EL 7 DE ABRIL DE 2006 BAJO EL NUMERO 01048949 DEL LIBRO IX, FUE (RON) NOMBRADO (S):

NOMBRE	IDENTIFICACION
REVISOR FISCAL	
PARDO LLAMAS JESUS PANCRACIO	C.C. 000000073090339

CERTIFICA:

DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Y DE LA LEY 962 DE 2005, LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS DE REGISTRO AQUÍ CERTIFICADOS QUEDAN EN FIRME DIEZ (10) DÍAS HÁBILES DESPUÉS DE LA FECHA DE LA CORRESPONDIENTE ANOTACIÓN, SIEMPRE QUE NO SEAN OBJETO DE RECURSO. LOS SÁBADOS NO SON TENIDOS EN CUENTA COMO DÍAS HÁBILES PARA LA CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ.

* * * EL PRESENTE CERTIFICADO NO CONSTITUYE PERMISO DE * * *
* * * FUNCIONAMIENTO EN NINGUN CASO * * *

INFORMACION COMPLEMENTARIA

LOS SIGUIENTES DATOS SOBRE PLANEACION DISTRITAL SON INFORMATIVOS

FECHA DE ENVIO DE INFORMACION A PLANEACION DISTRITAL : 6 DE JULIO DE

2020

SEÑOR EMPRESARIO, SI SU EMPRESA TIENE ACTIVOS INFERIORES A 30.000 SMLMV Y UNA PLANTA DE PERSONAL DE MENOS DE 200 TRABAJADORES, USTED TIENE DERECHO A RECIBIR UN DESCUENTO EN EL PAGO DE LOS PARAFISCALES DE 75% EN EL PRIMER AÑO DE CONSTITUCION DE SU EMPRESA, DE 50% EN EL SEGUNDO AÑO Y DE 25% EN EL TERCER AÑO. LEY 590 DE 2000 Y DECRETO 525 DE 2009.

RECUERDE INGRESAR A WWW.SUPERSOCIEDADES.GOV.CO PARA VERIFICAR SI SU EMPRESA ESTA OBLIGADA A REMITIR ESTADOS FINANCIEROS. EVITE SANCIONES.

TAMAÑO EMPRESA

DE CONFORMIDAD CON LO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 2.2.1.13.2.1 DEL DECRETO 1074 DE 2015 Y LA RESOLUCIÓN 2225 DE 2019 DEL DANE EL TAMAÑO DE LA EMPRESA ES GRANDE

LO ANTERIOR DE ACUERDO A LA INFORMACIÓN REPORTADA POR EL MATRICULADO O INSCRITO EN EL FORMULARIO RUES:

INGRESOS POR ACTIVIDAD ORDINARIA $51,188,593,000

ACTIVIDAD ECONÓMICA POR LA QUE PERCIBIÓ MAYORES INGRESOS EN EL PERÍODO - CIIU : 4330

****
** ESTE CERTIFICADO REFLEJA LA SITUACION JURIDICA DE LA **
** SOCIEDAD HASTA LA FECHA Y HORA DE SU EXPEDICION. **
****

EL SECRETARIO DE LA CAMARA DE COMERCIO,
VALOR : $ 6,200

****
PARA VERIFICAR QUE EL CONTENIDO DE ESTE CERTIFICADO CORRESPONDA CON LA INFORMACIÓN QUE REPOSA EN LOS REGISTROS PÚBLICOS DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ, EL CÓDIGO DE VERIFICACIÓN PUEDE SER VALIDADO POR SU DESTINATARIO SOLO UNA VEZ, INGRESANDO A WWW.CCB.ORG.CO
****
ESTE CERTIFICADO FUE GENERADO ELECTRÓNICAMENTE CON FIRMA DIGITAL Y CUENTA CON PLENA VALIDEZ JURÍDICA CONFORME A LA LEY 527 DE 1999.
****
FIRMA MECÁNICA DE CONFORMIDAD CON EL DECRETO 2150 DE 1995 Y LA AUTORIZACIÓN IMPARTIDA POR LA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO, MEDIANTE EL OFICIO DEL 18 DE NOVIEMBRE DE 1996.



CON & CON
CONSULTORIA Y CONSTRUCCION
NIT 830.041.411-0

CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES LABORALES Y DE PAGO DE APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES.

Yo, JESUS P. PARDO LLAMAS identificado con cédula de ciudadanía No. 73.090.339 y con Tarjeta Profesional No 52249-T de la Junta Central de Contadores, en mi condición de Revisor Fiscal de CONSULTORIA Y CONSTRUCCION S.A.S identificada con NIT. 830.041.411-0, luego de examinar los estados financieros de la empresa de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia, certifico que durante los últimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles, la empresa realizó el pago de las obligaciones laborales y el pago de aportes a la seguridad social y parafiscales exigidos por la ley y se encuentra al día y a paz y salvo por todo concepto relacionado con dichos aportes.

Lo anterior en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007.

Dada en BOGOTA, a los Veinticinco (25) días del mes de Febrero de 2021.

JESUS P. PARDO LLAMAS
C.C.73.090.339 DE C/GENA
REVISOR FISCAL
CONSULTORIA Y CONSTRUCCION S.A.S
T.P. No.52249-T

aportes en línea

Resumen de Pago por Administradora

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 830041411	0	CONSULTORIA Y CONSTRUCCION S.A.S.	A - 200 O MAS COTIZANTES	PRINCIPAL	AV CRA 7 N 127-48 OF 1006	BOGOTA-BOGOTA D.E.	4821681	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2020-12	2021-01	879932753	9415121872	E	2021/01/06	2021/02/02	BANCOLOMBIA	27	$43,706,300

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 5)				46	$22,661,700	$0	$0	$22,661,700
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	6	$3,856,000	$0	$0	$3,856,000
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	13	$8,376,300	$0	$0	$8,376,300
PORVENIR	230301	800,224,808	8	16	$6,664,500	$0	$0	$6,664,500
PROTECCION	230201	800,229,739	0	10	$3,284,900	$0	$0	$3,284,900
SKANDIA	230901	800,253,055	2	1	$480,000	$0	$0	$480,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				46	$8,241,500	$0	$0	$8,241,500
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	46	$8,241,500	$0	$0	$8,241,500
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				46	$5,451,900	$0	$0	$5,451,900
COLSUBSIDIO	CCF22	860,007,336	1	46	$5,451,900	$0	$0	$5,451,900
EPS (ADMINISTRADORAS: 9)				46	$6,678,500	$0	$0	$6,678,500
ALIANSALUD EPS (ANTES COLMEDICA)	EPS001	830,113,831	0	1	$272,600	$0	$0	$272,600
`APITAL SALUD	EPSC34	900,298,372	9	1	$148,400	$0	$0	$148,400
JMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	11	$1,322,900	$0	$0	$1,322,900
COOMEVA	EPS016	805,000,427	1	1	$280,000	$0	$0	$280,000
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	2	$169,600	$0	$0	$169,600
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	11	$988,700	$0	$0	$988,700
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	5	$446,300	$0	$0	$446,300
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	$37,400	$0	$0	$37,400
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	13	$3,012,600	$0	$0	$3,012,600
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$403,600	$0	$0	$403,600
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	1	$403,600	$0	$0	$403,600
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$269,100	$0	$0	$269,100
SENA	PASENA	899,999,034	1	1	$269,100	$0	$0	$269,100
TOTAL				46	$43,706,300	$0	$0	$43,706,300

2021/02/04 10:35 AM

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

9 7 0 F 0 3 6 0 4 3 5 C 1 0 6 0

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **JESUS PANCRACIO PARDO LLAMAS** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 73090339 de CARTAGENA (BOLIVAR) Y Tarjeta Profesional No 52249-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS **********
****
****

Dado en BOGOTA a los 11 días del mes de Febrero de 2021 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

CON & CON
CONSULTORIA Y CONSTRUCCION





ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C.
Secretaría de Gobierno

GESTIÓN Y ADQUISICIÓN DE RECURSOS

FORMATO INFORME DE ACTIVIDADES PARA TODO TIPO DE CONTRATOS

PERÍODO: del 21 de noviembre de 2020 al 20 de enero de 2021

DATOS BÁSICOS DEL CONTRATO	
TIPO DE CONTRATO	**CONTRATO DE OBRA**
No. CONTRATO Y FECHA	**CO-137-2019**
NOMBRE DEL CONTRATISTA	**CONSULTORIA Y CONSTRUCCION SAS. CON&CON**
No. DE IDENTIFICACIÓN	**NIT 830.041.411-0**
TELÉFONO DE CONTACTO	**3124806060**
DIRECCIÓN	**Carrera 7 No. 127-48 Of. 1006**
PLAZO DE EJECUCIÓN	**SIETE (7) MESES**
VALOR	**$ 5.437.884.572**
No. DEL PROYECTO (IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL)	**Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 388 del 18 de octubre de 2019, rubro 3-3-1-15-02-18-1505-000 denominado "Mejor Movilidad para Todos"**
FECHA ACTA DE INICIO	**25 de febrero de 2020**
PRORROGA	**Dos (2) meses**
ADICIÓN	**$ 2.845.236.531**
SUSPENSIÓNES	**Suspensión No. 1 de fecha 24 de marzo de 2020 y No. 2 de fecha 28 de noviembre de 2020**
FECHA PREVISTA DE TERMINACIÓN (INCLUYENDO PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES)	**12 de abril de 2021**
OBJETO DEL CONTRATO	**CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS POR LA MODALIDAD DE MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS Y ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACION DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE LOS MARTIRES**

DESARROLLO DEL INFORME

Nota: Incluya los campos necesarios de acuerdo a esto.

OBLIGACIONES GENERALES:

OBLIGACIÓN GENERAL 1: Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de Contratación.

	ACTIVIDADES DESARROLLADAS	PRODUCTOS	MEDIO DE VERIFICACIÓN
1	Acta de Inicio	Acta de Inicio Contrato CO-137-2019	Carpeta del Contrato
Observación			

OBLIGACIÓN GENERAL 2: Desarrollar el objeto del Contrato en las condiciones de calidad, oportunidad, y obligaciones definidas en los Documentos del Proceso de contratación.

	ACTIVIDADES DESARROLLADAS	PRODUCTOS	MEDIO DE VERIFICACIÓN
1	Informe Mensual No. 6	Informe Mensual No. 6 Contrato CO-137-2019	Presente documento
Observación			

OBLIGACIÓN GENERAL 3: Garantizar la calidad de los bienes y servicios prestados, de acuerdo con el Anexo Técnico, el Pliego de Condiciones y demás Documentos del Proceso.

	ACTIVIDADES DESARROLLADAS	PRODUCTOS	MEDIO DE VERIFICACIÓN
1	Informe Mensual No. 6	Informe Mensual No. 6 Contrato CO-137-2019	Presente documento
Observación			

OBLIGACIÓN GENERAL 4: Dar a conocer a la Entidad cualquier reclamación que indirecta o directamente pueda tener algún efecto sobre el objeto del Contrato o sobre sus obligaciones.			
ACTIVIDADES DESARROLLADAS		**PRODUCTOS**	**MEDIO DE VERIFICACIÓN**
1	Informe Mensual No. 6	Informe Mensual No. 6 Contrato CO-137-2019	Presente documento
Observación			
OBLIGACIÓN GENERAL 5: Abstenerse de adelantar intervención alguna a los recursos sin contar con los permisos emitidos por la entidad competente (cuando aplique intervenciones).			
ACTIVIDADES DESARROLLADAS		**PRODUCTOS**	**MEDIO DE VERIFICACIÓN**
1	Informe Mensual No. 6	Informe Mensual No. 6 Contrato CO-137-2019	Presente documento
OBLIGACIÓN EGENERAL 6: Acreditar el cumplimiento del factor de calidad ofrecido durante la fase de selección en los plazos acordados con la Entidad.			
ACTIVIDADES DESARROLLADAS		**PRODUCTOS**	**MEDIO DE VERIFICACIÓN**
1	Informe No. 6 Componente Técnico	Informe Mensual No. 6 Contrato CO-137-2019	Presente documento
Observación			
OBLIGACIÓN GENERAL 7: Identificar las oportunidades para promover el empleo local durante la ejecución del contrato.			
ACTIVIDADES DESARROLLADAS		**PRODUCTOS**	**MEDIO DE VERIFICACIÓN**
1	Informe No. 6 Componente Social	Informe Mensual No. 6 Contrato CO-137-2019	Presente documento
Observación			
OBLIGACIÓN GENERAL 8: Implementar las medidas identificadas para promover el empleo local en el sitio de la obra.			
ACTIVIDADES DESARROLLADAS		**PRODUCTOS**	**MEDIO DE VERIFICACIÓN**
1	Informe No. 6 Componente Social	Informe Mensual No. 6 Contrato CO-137-2019	Presente documento
Observación			
OBLIGACIÓN GENERAL 9: Dar cabal cumplimiento al pacto de transparencia y declaraciones de la carta de presentación de la oferta.			
ACTIVIDADES DESARROLLADAS		**PRODUCTOS**	**MEDIO DE VERIFICACIÓN**
Observación		Se ha dado cumplimiento, en donde no existen quejas o requerimiento alguno	
OBLIGACIÓN GENERAL 10: Informar cualquier cambio en la composición del capital social del contratista, el de los integrantes del Consorcio o Unión Temporal, así como sobre su pertenencia o no a un grupo empresarial.			
ACTIVIDADES DESARROLLADAS		**PRODUCTOS**	**MEDIO DE VERIFICACIÓN**
1	Informe Mensual No. 6	Informe Mensual No. 6 Contrato CO-137-2019	Presente documento
Observación			

OBLIGACIÓN GENERAL 11: Informar a la Entidad Estatal cuando tenga ocurrencia una situación que implique una modificación del estado de los riegos existente al momento de proponer o celebrar el contrato, como sería el caso de la existencia de investigaciones, medidas de aseguramiento o condenas proferidas en Colombia o en el extranjero.			
ACTIVIDADES DESARROLLADAS		**PRODUCTOS**	**MEDIO DE VERIFICACIÓN**
Observación	Para el presente periodo no se presentan este tipo de situaciones.		

OBLIGACIÓN GENERAL 12: Comunicarle a la Entidad cualquier circunstancia política, jurídica, social, económica, técnica, ambiental o de cualquier tipo, que pueda afectar la ejecución del Contrato.			
ACTIVIDADES DESARROLLADAS		**PRODUCTOS**	**MEDIO DE VERIFICACIÓN**
1	Solicitud de suspensión del contrato	Acta de suspensión No.2 de fecha 28 de noviembre de 2020	
Observación			

OBLIGACIÓN GENERAL 13: Durante la ejecución del contrato deberá observar las leyes y los reglamentos relativos a Salud Ocupacional y Seguridad Industrial y tomar todas aquellas precauciones necesarias para evitar que se produzcan en las zonas de sus campamentos de trabajo, accidentes o condiciones insalubres; así como dotar a su personal y asegurar el uso adecuado de los elementos de protección personal (EPP).			
ACTIVIDADES DESARROLLADAS		**PRODUCTOS**	**MEDIO DE VERIFICACIÓN**
1	Informe No. 6 Componente SST	Informe Mensual No. 6 Contrato CO-137-2019	Presente documento
Observación			

OBLIGACIÓN GENERAL 14: Informar periódicamente la composición del capital social de la persona jurídica; la existencia de pactos o acuerdos de accionistas; su pertenencia o no a un grupo empresarial, si se trata de una matriz, subordinada, o sucursal de sociedad extranjera, así como la información relevante de índole jurídica, comercial o financiera, de la persona jurídica o de sus representantes legales, socios o accionistas.			
ACTIVIDADES DESARROLLADAS		**PRODUCTOS**	**MEDIO DE VERIFICACIÓN**
1	Informe Mensual No. 6	Informe Mensual No. 6 Contrato CO-137-2019	Presente documento
Observación			

OBLIGACIÓN GENERAL 15: Informar a la Entidad Estatal cuando tenga ocurrencia una situación que implique una modificación del estado de los riegos existente al momento de proponer o celebrar el contrato, como sería el caso de la existencia de investigaciones, medidas de aseguramiento o condenas proferidas en Colombia o en el extranjero.			
ACTIVIDADES DESARROLLADAS		**PRODUCTOS**	**MEDIO DE VERIFICACIÓN**
Observación	Para el presente periodo no se presentan este tipo de situaciones.		

OBLIGACIÓN GENERAL 16: Las definidas por la Entidad en los documentos técnicos del proceso.			
ACTIVIDADES DESARROLLADAS		**PRODUCTOS**	**MEDIO DE VERIFICACIÓN**
1	Informe Mensual No. 6	Informe Mensual No. 6 Contrato CO-137-2019	Presente documento

OBLIGACIOES ESPECIFICAS:		
El contratista CUMPLIO con las obligaciones especificas para el periodo reportado en el presente informe.	**SI**	**NO**
	X	

DECLARACIÓN DEL CONTRATISTA: Manifiesto que he cumplido con las obligaciones derivadas del contrato y que las actividades mencionadas en el presente informe corresponden a las labores efectivamente desarrolladas en el periodo indicado, declarando que seré responsable por las afirmaciones contenidas en el presente documento, que sirve como soporte para certificar el cumplimiento del objeto del contrato.

DECLARACIÓN DEL SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR: Manifiesto que el/la contratista ha cumplido a la fecha con las obligaciones establecidas en el contrato.

Las obligaciones verificadas se ejecutaron en el tiempo programado, modo, lugar y condiciones técnicas establecidas en el contrato.

CONSIGNACIÓN CUENTA BANCARIA		BANCO: AV VILLAS No. DE CUENTA: 649001005 TIPO DE CUENTA: **CORRIENTE**
FIRMA CONTRATISTA	**NOMBRE**	**JAVIER HERNANDO PERILLA VACCA**
	CARGO VINCULACIÓN	DIRECTOR DE OBRA
FIRMA INTERVENTOR Y/O SUPERVISOR	**NOMBRE**	**SANDRA MONICA CARDOZO ROJAS**
	CARGO VINCULACIÓN	DIRECTORA DE INTERVENTORIA
ORDENADOR DEL GASTO	**NOMBRE**	**TATIANA PIÑEROS LAVERDE**
	CARGO VINCULACIÓN	ALCALDESA LOCAL DE MARTIRES

CÓDIGO	FORMATO ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA PROCESO	VERSIÓN
FO-EO-23	Ejecución de Obras	2.0

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE LOS MARTIRES

ACTA No 3 **DE RECIBO PARCIAL No** 3 **CORRESPONDIENTE AL PERIODO** 21/11/2020 – 20/01/2021 (Fecha final del periodo)

CONTRATO No CO-137-2019 (Número de Contrato)

OBJETO DEL CONTRATO

CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS POR LA MODALIDAD DE MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS Y ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACION DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE LOS MARTIRES (Indique el objeto del contrato de ejecución suscrito)

CONTRATISTA CONSULTORIA Y CONSTRUCCION - CON & CON S.A.S. NIT 830.041.411-0

INTERVENTOR MIRS LATINOAMERICA S.A.S. NIT 900.241.875-6 (Escriba el nombre o razón social del Interventor)

SUPERVISOR DRA. TATIANA PIÑEROS LAVERDE (Escriba el nombre del supervisión delegado por el IDU para el contrato de Interventoría)

PROFESIONAL DE APOYO A LA SUPERVISION ING. DANIEL ROJAS Y ARQ. JAIME VILLABA (Escriba el nombre del Profesional de Apoyo Técnico a la Supervisión delegado por el IDU para el contrato de Interventoría)

A. DATOS ESPECÍFICOS

Las partes representadas por: ARQ. JUAN PABLO RICCI RUIZ (Diligencie este espacio el nombre del representante legal o delegado del contratista) representante Legal o

delegado del contratista y ING. NICK RANDY ALMEIDA GAMARRA (Nombre del representante legal o delegado de la Interventoría)

dejan constancia del recibo parcial de obra correspondiente según las condiciones Contractuales y de la presentación del Formato de MEMORIAS DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA Vigente, para los Ítems Ejecutados en este periodo, de la siguiente manera:

ÍTEM No.	CONDICIONES CONTRACTUALES INICIALES					ACTAS ANTERIORES								OBRA EJECUTADA			
						ACTA Nº 1		ACTA Nº 2						PRESENTE ACTA		ACUMULADA	
	DESCRIPCIÓN	UND.	CANT.	PRECIO UNIT	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
1,00	**PRELIMINARES**																
1,01	REPLANTEO GENERAL	M2		$ 553,00	$ -			3.105,98	$ 1.717.604,73					1.605,17	$ 887.659,01	4.711,15	$ 2.605.263,74
1,02	EXCAVACION MECANICA EN MATERIAL COMUN (Incluye Cargue)	M3		$ 4.432,00	$ -			3.789,66	$ 16.795.768,95					1.338,56	$ 5.932.507,67	5.128,22	$ 22.728.276,62
1,03	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN. Incluye cargue.	M3		$ 25.767,00	$ -			-	$ -					356,43	$ 9.184.156,29	356,43	$ 9.184.156,29
1,07	DEMOLICION PAVIMENTO ASFALTICO (Espesor Variable. Incluye Cargue). No incluye transporte y disposición final de sobrantes. Rendimiento estimado para espesores max. 0.15m	M2		$ 4.963,00	$ -			3.060,68	$ 15.190.154,84					885,05	$ 4.392.478,34	3.945,73	$ 19.582.633,18
1,08	DEMOLICION PISOS DE CONCRETO (incluye cargue). No incluye transporte y disposición final de sobrantes. Rendimiento estimado para espesores de 0.20m.	M3		$ 39.100,00	$ -			-	$ -					-	$ -	-	$ -
1,09	DEMOLICION MANUAL SARDINEL EXISTENTE (Incluye Cargue). No incluye transporte y disposición final de sobrantes.	ML		$ 3.715,00	$ -			170,00	$ 631.550,00					666,96	$ 2.477.756,40	836,96	$ 3.109.306,40
1,10	TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (distancia de transporte 21 Km). A distancia mayor del acarreo libre (90 m) en sitio autorizado por la entidad Ambiental competente.	M3		$ 23.718,00	$ -			5.212,15	$ 123.621.789,31					2.419,05	$ 57.375.021,97	7.631,20	$ 180.996.811,28
2,00	**RELLENOS**																
2,01	NIVELACION Y COMPACTACIÓN DE SUBRASANTE	M2		$ 1.093,00	$ -			-	$ -					3.492,64	$ 3.817.456,61	3.492,64	$ 3.817.456,61
2,02	ESTABILIZACIÓN DE SUBRASANTE CON RAJÓN (Suministro, Extendido, Nivelación y Compactación Manual)	M3		$ 60.332,00	$ -			-	$ -					-	$ -	-	$ -
2,04	SUBBASE GRANULAR CLASE C (SBG_C) (Suministro, Extendido Manual, Humedecimiento y Compactación)	M3		$ 107.740,00	$ -			-	$ -					-	$ -	-	$ -
2,08	SUBBASE GRANULAR B-200 (Suministro, Extendido, Nivelación, Humedecimiento y Compactación con vibrocompactador)	M3		$ 53.659,00	$ -			507,73	$ 27.244.262,61					286,42	$ 15.369.262,98	794,15	$ 42.613.525,58
2,10	GEOTEXTIL NT 4000 PARA ESTABILIZACION SUBRASANTE/CAPAS GRANULARES (Inc. Suministro e Instalación)	M2		$ 12.109,00	$ -			-	$ -					-	$ -	-	$ -
3,00	**PAVIMENTOS**																
3,01	MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE TIPO DENSO MD12 ASFALTO CONVENCIONAL 80-100 (cemento asfáltico 80-100) (Suministro, Extendido, Nivelación y Compactación con Vibrocompactador y compactador de llantas)	M3		$ 654.117,00	$ -			-	$ -					-	$ -	-	$ -
3,02	MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE TIPO DENSO MD20 ASFALTO CONVENCIONAL 60-70 (Suministro, Extendido, Nivelación y Compactación con vibrocompactador y compactador de llantas)	M3		$ 581.513,00	$ -			-	$ -					-	$ -	-	$ -
3,03	MEZCLA ASFALTICA CON ASFALTO CAUCHO (Suministro, Extendido, Nivelación y Compactación)	M3		$ 949.294,00	$ -			-	$ -					66,39	$ 63.018.882,19	66,39	$ 63.018.882,19

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE LOS MARTIRES

ACTA No 3 **DE RECIBO PARCIAL No** 3 **CORRESPONDIENTE AL PERIODO** 21/11/2020 – 20/01/2021 (Fecha final del periodo)

CONTRATO No CO-137-2019 (Número de Contrato)

3,05	IMPRIMACION CON EMULSION ASFALTICA CRL-0 (Suministro, Barrido Superficie y Riego)	M2		$ 1.669,00	$ -			-	$ -					586,50	$ 978.868,50	586,50	$ 978.868,50
3,09	GEODRÉN VIAL H= 1.0m o DRENAFLEX PLANAR H= 1.0m, TUBERÍA DE 100mm (Incluye colocación base granular clase C, suministro y colocación geodren)	ML		$ 69.144,00	$ -			-	$ -					-	$ -	-	$ -
4,00	**ESPACIO PUBLICO - ANDENES**																
4,08	BORDILLO PREFABRICADO A80 (Suministro e Instalación. Incluye 3cm Mortero de Nivelación 1:5)	ML		$ 39.193,00	$ -			-	$ -					110,85	$ 4.344.544,05	110,85	$ 4.344.544,05
4,09	SARDINEL TIPO A10 (Suministro e Instalación. Incluye 3cm Mortero 2000 PSI)	ML		$ 48.068,00	$ -			-	$ -					256,50	$ 12.329.442,00	256,50	$ 12.329.442,00
4,1	SARDINEL H=0.40m, e=0.15m CONCRETO 3000 PSI (Fundido en Sitio, Concreto Premezclado Inc. Sumin, Formalet. y Const.)	ML		$ 29.508,00	$ -			-	$ -					-	$ -	-	$ -
4,12	SARDINEL BAJO A85 PARA RAMPAS (Suministro e Instalación. Incluye 3cm Mortero 2000 PSI)	ML		$ 35.259,00	$ -			-	$ -					83,25	$ 2.935.311,75	83,25	$ 2.935.311,75
4,13	SARDINEL PREFABRICADO ALTO RAMPAS A86 (Suministro e Instalación. Incluye 3cm Mortero de Nivelación 2000 PSI)	ML		$ 40.555,00	$ -			-	$ -					-	$ -	-	$ -
4,14	SARDINEL ESPECIAL A100 PARA RAMPA TIPO A (Suministro e Instalación. Incluye 3cm Mortero 2000 PSI)	UN		$ 34.217,00	$ -			-	$ -					-	$ -	-	$ -
4,22	LOSA DE CONCRETO MR45 (Suministro, Formaleteado, Colocación y Acabado. No Incluye Acero, Curado, Juntas)	M3		$ 496.049,00	$ -			-	$ -					-	$ -	-	$ -
4,23	ACERO DE REFUERZO (Incluye Suministro, Figurado y Fijación)	KG		$ 2.907,00	$ -			-	$ -					-	$ -	-	$ -
4,28	ANDEN CONCRETO 3000 PSI (210 Kg/cm2) PREMEZCLADO e=0.10m (Incluye Suministro, Formaleteo, Fundida y Curado)	M2		$ 48.884,00	$ -			-	$ -					-	$ -	-	$ -
5,00	**ESTRUCTURA PARA REDES**																
5,04	RELLENO CON GRAVA ENTRE 3/4" Y 1/2" PARA FILTROS (RELACIÓN 1:1) SUMINISTRO Y COLOCACIÓN. (INCLUYE TRANSPORTE, SUMINISTRO, EXTENDIDO MANUAL Y COLOCACIÓN).	M3		$ 97.270,00	$ -			-	$ -					-	$ -	-	$ -
6,00	**REDES DE ACUEDUCTO**							-						-	$ -	-	$ -
6,61	ACOMETIDA DOMICILIARIA DE 1/2" CON COLLAR DE DERIVACION DE 4" x 1/2", SUMINISTRO E INSTALACION. (Incluye tuberia PF, registros y accesorios, longitud promedio de 6.5m, incluye cajilla en polipropileno para medidor)	UN		$ 253.685,00	$ -			1,00	$ 253.685,00					32,00	$ 8.117.920,00	33,00	$ 8.371.605,00
6,62	CONCRETO 4000 PSI IMPERMEABILIZADO (Hecho en Obra)	M3		$ 382.832,00	$ -			-	$ -					2,24	$ 857.543,68	2,24	$ 857.543,68
6,63	ACERO DE REFUERZO (Incluye Suministro, Figurado y Fijación)	KG		$ 2.907,00	$ -			-	$ -					-	$ -	-	$ -
7,00	**REDES DE ALCANTARILLADO**							-						-	$ -	-	$ -
7,01	EXCAVACION MANUAL PARA REDES PROFUNDIDAD 0m - 2m (Incluye Cargue)	M3		$ 25.767,00	$ -			177,41	$ 4.571.333,49					205,32	$ 5.290.495,90	382,73	$ 9.861.829,39
7,02	TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (distancia de transporte 21 Km). A distancia mayor del acarreo libre (90 m) en sitio autorizado por la entidad Ambiental competente	M3		$ 23.718,00	$ -			230,63	$ 5.470.165,48					266,92	$ 6.330.732,19	497,55	$ 11.800.897,67
7,06	RELLENO EN RECEBO COMUN (Suministro e instalación Extendido manual, Humedecimiento y Compactación TRANSPORTE A 28 KM).	M3		$ 54.659,00	$ -			322,88	$ 17.648.352,58					59,21	$ 3.236.408,58	382,09	$ 20.884.761,16
7,07	RELLENO EN TRITURADO DE 3/4'' (INCLUYE TRANSPORTE, SUMINISTRO, EXTENDIDO MANUAL Y COLOCACIÓN)	M3		$ 85.263,00	$ -			204,75	$ 17.457.497,81					47,03	$ 4.009.867,73	251,78	$ 21.467.365,55
7,08	RELLENO PARA REDES EN ARENA DE PEÑA (Suministro, Extendido, Humedecimiento y Compactación)	M3		$ 88.833,00	$ -			-	$ -					-	$ -	-	$ -
7,27	TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA NTC 3722-1 D=8" (Incluye Suministro e Instalación)	ML		$ 46.574,00	$ -			-	$ -					103,50	$ 4.820.409,00	103,50	$ 4.820.409,00
7,28	TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA NTC 3722-1 D=10" (Incluye Suministro e Instalación)	ML		$ 65.671,00	$ -			-	$ -					33,50	$ 2.199.978,50	33,50	$ 2.199.978,50
7,29	TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA NTC 3722-1 D=12" (Incluye Suministro e Instalación)	ML		$ 94.137,00	$ -			-	$ -					60,00	$ 5.648.220,00	60,00	$ 5.648.220,00
7,37	POZO DE INSPECCION D=1.7 M (INCL. SUMINISTRO E INSTALACION). INCLUYE CILINDRO POZO DE INSPECCION EN MAMPOSTERIA, CONO PREFABRICADO, PLACA FONDO.	UN		$ 2.340.369,00	$ -			-	$ -					-	$ -	-	$ -
7,38	PLACA FONDO D=1.70m POZO INSPEC. (Fundida en Sitio. Incl. Sumin, Formalet, Ref, Inst. Incl. Concreto 2000 PSI de base)	UN		$ 501.523,00	$ -			4,00	$ 2.006.092,00					-	$ -	4,00	$ 2.006.092,00
7,39	NIVELACIÓN DE POZO (Hasta rasante en Concreto 3000 PSI Hecho en Obra, h=0.15m. Incluye Suministro y Construcción)	UN		$ 74.372,00	$ -			-	$ -					-	$ -	-	$ -

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE LOS MARTIRES

ACTA No 3 **DE RECIBO PARCIAL No** 3 **CORRESPONDIENTE AL PERIODO** 21/11/2020 – 20/01/2021 (Fecha final del periodo)

CONTRATO No CO-137-2019 (Número de Contrato)

7,42	SUMIDERO ALCANTARILLADO PLUVIAL EN VIA NS-047-1V4 EAAB	UN		$ 3.964.584,00	$ -			-	$ -					-	$ -	-	$ -
7,44	DEMOLICION SUMIDERO EXISTENTE (Incluye Cargue)	UN		$ 131.064,00	$ -			12,00	$ 1.572.768,00					8,00	$ 1.048.512,00	20,00	$ 2.621.280,00
7,48	CONCRETO 3000 PSI PARA REDES (Suministro y Colocación)	M3		$ 378.531,00	$ -			-	$ -					-			
7,49	ACERO DE REFUERZO (Incluye Suministro, Figurado y Fijación)	KG		$ 2.907,00	$ -			-	$ -					-	$ -	-	$ -
9,00	**SEÑALIZACION, DEMARCACION Y SEMAFORIZACION**																
9,01	DEMARCACION LINEA CONTINUA A=0.12m (e=2.3mm,Termoplástica. Inc. Suministro y Aplicación con Equipo. Incl. Microesferas)	ML		$ 12.775,00	$ -			-	$ -					-	$ -	-	$ -
9,02	DEMARCACION LINEA DISCONTINUA A=0.12m (e=2.3mm,Termoplástica. Inc. Suministro y Aplicación con Equipo. Incl. Microesfera	ML		$ 12.775,00	$ -			-	$ -					-	$ -	-	$ -
9,03	DEMARCACION LINEA CONTINUA A=0.15m (e=2.3mm,Termoplástica. Inc. Suministro y Aplicación con Equipo. Incl. Microesferas)	ML		$ 16.173,00	$ -			-	$ -					-	$ -	-	$ -
9,05	DEMARCACION PASO PEATONAL-CEBRA (e=2.3mm,Termoplástica. Inc. Suministro y Aplicación con Equipo. Inc Microesferas)	M2		$ 107.821,00	$ -			-	$ -					-	$ -	-	$ -
9,07	ESTOPEROLES DE 10 cm x 2.5 cm. SUMINISTRO E INSTALACION.	UN		$ 4.799,00	$ -			-	$ -					-	$ -	-	$ -
9,08	FLECHA DIRECCIONAL "DE FRENTE A LA DERECHA" (e=2.3mm,Termoplástica. Inc. Sumin. y Aplic. con Equipo. Inc. Microesferas). Marca Vial para velocidades menores o iguales a 60 Km/h Area de la Marca: 2.18m2	UN		$ 232.072,00	$ -			-	$ -					-	$ -	-	$ -
9,09	FLECHA DIRECCIONAL "DE FRENTE" (e=2.3mm,Termoplástica. Inc. Suministro y Aplicación con Equipo. Inc Microesferas). Marca Vial para velocidades menores o iguales a 60 Km/h Area de la Marca: 1.20 m2	UN		$ 127.746,00	$ -			-	$ -					-	$ -	-	$ -
9,1	FLECHA DIRECCIONAL "A LA DERECHA" (e=2.3mm,Termoplástica. Inc. Suministro y Aplicación con Equipo. Inc Microesferas). Marca Vial para velocidades menores o iguales a 60 Km/h Area de la Marca: 1.51m2	UN		$ 160.747,00	$ -			-	$ -					-	$ -	-	$ -
10,00	**NO PREVISTOS**																
NP 1	SUBBASE GRANULAR CLASE B (SBG_B) CON RECICLADO DE CONCRETO (Suministro, Extendido, Nivelación, Humedecimiento y Compactación con vibrocompactador)	M3		$ 126.267,00				292,52	$ 36.935.496,57					116,30	$ 14.685.230,90	408,82	$ 51.620.727,47
NP 2	BASE GRANULAR CLASE B (BG_B) CON RECICLADO DE CONCRETO (Suministro, Extendido, Nivelación, Humedecimiento y Compactación con vibrocompactador)	M3		$ 129.709,00				162,76	$ 21.111.618,43					116,30	$ 15.085.545,83	275,06	$ 36.197.164,26
NP 3	BASE ESTABILIZADA CON ASFALTO EN CALIENTE MEZCLADA EN PLANTA (Incluye suministro, extendido, nivelación y compactación).	M3		$ 592.875,00				-	$ -					-	$ -	-	$ -
NP 4	ESTABILIZACION DE SUBRASANTE CON RAJON, INCLUYE EQUIPO DE COMPACTACIÓN (Suministro, extendido a mano, nivelación y compactación con retroexcavadora sobre oruga y benitin de 1 tonelada incluyen operario y combustible.	M3		$ 107.660,00				654,22	$ 70.433.205,70					886,93	$ 95.487.314,44	1.541,15	$ 165.920.520,14
NP 5	(DOVELAS) ACERO LISO PARA TRANSFERENCIA DE LOSAS D= 1 1/2" (NO INCLUYE CANASTILLA). SUMINISTRO E INSTALACIÓN.	KG		$ 4.260,00				-	$ -					-	$ -	-	$ -
NP 6	CANASTILLA PASAJUNTAS (Incluye suministro y fijación)	KG		$ 4.510,00				-	$ -					-	$ -	-	$ -
NP 7	SELLO DE JUNTAS CON ICOPOR Y SIKAFLEX 1A SELLADO DE JUNTAS (300cc) (Incluye suministro e instalación)	ML		$ 16.640,00				-	$ -					-	$ -	-	$ -
NP 8	PLACA CUBIERTA D=1.70m POZO INSPEC. (Fundida en Sitio. Inc. Sum, Formalet., Refuerzo e Inst. Incl.Tapa en Polipropileno)	UN		$ 1.875.596,00				-	$ -					2,00	$ 3.751.192,00	2,00	$ 3.751.192,00
NP 9	PISO EN CONCRETO COLOR GRIS MR41 (280 Kg/Cm2) GRAVA 1" 28 DIAS ESTAMPADO e=0.10m (INCLUYE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONCRETO, JUEGO DE MOLDES, DESMOLDANTE EN POLVO, CURADOR PARA CONCRETO, INCLUYE	M2		$ 176.905,00				-	$ -					-	$ -	-	$ -
NP 10	DEMOLICIÓN CONCRETO ESTRUCTURAL (Incluye Cargue manual). No incluye transporte y disposición final de sobrantes.	M3		$ 155.956,00				9,94	$ 1.550.202,64					2,24	$ 349.341,44	12,18	$ 1.899.544,08
NP 11	SUBBASE GRANULAR CLASE C (SBG_C) CON RECICLADO DE CONCRETO HIDRAULICO (Suministro, Extendido Manual, Humedecimiento y Compactación)	M3		$ 132.146,00				-	$ -					-	$ -	-	$ -
NP 12	DEMOLICIÓN DE CONCRETO ESPESORES 8cm A 15cm (Incluye retiro de material, transporte y disposición final de escombros en sitio autorizado).	M3		$ 74.088,00				-	$ -					10,27	$ 761.115,29	10,27	$ 761.115,29
NP 13	DEMOLICIÓN DE CONCRETO ESPESORES 16cm A 25cm. (Incluye retiro de material, transporte y disposición final de escombros en sitio autorizado).	M3		$ 80.314,00				-	$ -					-	$ -	-	$ -

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE LOS MARTIRES

ACTA No 3 **DE RECIBO PARCIAL No** 3 **CORRESPONDIENTE AL PERIODO** 21/11/2020 (Fecha inicial del periodo) 20/01/2021 (Fecha final del periodo)

CONTRATO No CO-137-2019 (Número de Contrato)

NP 14	LOSA DE CONCRETO MR45 ACELERADO A 3 DÍAS (SUMINISTRO, FORMALETEADO, COLOCACIÓN Y ACABADO. No incluye acero, curado y juntas).	M3		$ 771.611,00				-	$ -					-	$ -	-	$ -
NP 15	DEMOLICIÓN PISOS DE CONCRETO - RAMPAS VEHICULARES Y PEATONALES EXISTENTES. (Espesor variable hasta 0.10 m. Incluye Cargue, transporte y disposición final de sobrantes escombrera autorizada).	M2		$ 9.530,00				-	$ -					-	$ -	-	$ -
NP 16	GEOTEXTIL TEJIDO PARA SEPARACIÓN SUBRASANTE/CAPAS GRANULARES (Incluye Suministro e Instalación)	M2		$ 7.176,00				-	$ -					-	$ -	-	$ -
NP 17	CORTE DE PAVIMENTO - INCLUYE EQUIPO CORTADORA DE CONCRETO INCLUYE OPERARIO Y COMBUSTIBLE. INCLUYE DISCO DIAMANTADO ASFALTO-CONCRETO 350 mm, AGUA Y MANO DE OBRA.	ML		$ 1.733,00				-	$ -					302,88	$ 524.891,04	302,88	$ 524.891,04
NP 18	MALLA ELECTROSOLDADA 0.15x0.15m, D=5mm, 5mm (Incluye Suministro, Fijación e Instalación)	KG		$ 3.854,00				-	$ -					-	$ -	-	$ -
NP 19	CILINDRO POZO INSP. EN MAMPOSTERIA e=0.25m (Inc. Sumin. y Const, Acero para Escaleras, Geotextil y Pañete Impermeab.)	ML		$ 445.010,00				8,10	$ 3.604.581,00					-	$ -	8,10	$ 3.604.581,00
NP 20	CONEXIONES KIT SILLA YEE 200 x 160 PVC. SUMINISTRO E INSTALACIÓN.	UN		$ 110.670,00				-	$ -					-	$ -	-	$ -
NP 21	CONEXIONES KIT SILLA YEE 315 x 160 PVC. SUMINISTRO E INSTALACIÓN.	UN		$ 186.414,00				-	$ -					-	$ -	-	$ -
NP 22	REHABILITACIÓN RED DE ALCANTARILLADO CON TECNOLOGÍA CIPP, CON RESINA DE GRP CURADA CON RAYOS UV, INCLUYE EQUIPOS, MATERIALES, TRANSPORTES Y PERSONAL. DIÁMETRO 18" ESPESOR 4.20 mm. EC = 14.200 MPA. (Incluye: Fabricación, importación, nacionalización, logística y suministro de materiales (Liner), proceso instalación, curado con luz ultravioleta, personal y actividades complementarias para finalizar la rehabilitación, Inspección final con equipo CCTV. (Entrega de video, informe pos rehabilitación e informe de protocolo del proceso de rehabilitación con norma técnica EAB)).	ML		$ 1.334.017,00				-	$ -					-	$ -	-	$ -
NP 23	REHABILITACIÓN RED DE ALCANTARILLADO CON TECNOLOGÍA CIPP, CON RESINA DE GRP CURADA CON RAYOS UV, INCLUYE EQUIPOS, MATERIALES, TRANSPORTES Y PERSONAL. DIÁMETRO 20" ESPESOR 4.90 mm. EC = 14.200 MPA. (Incluye: Fabricación, importación, nacionalización, logística y suministro de materiales (Liner), proceso instalación, curado con luz ultravioleta, personal y actividades complementarias para finalizar la rehabilitación, Inspección final con equipo CCTV. (Entrega de video, informe pos rehabilitación e informe de protocolo del proceso de rehabilitación con norma técnica EAB)).	ML		$ 1.480.258,00				-	$ -					-	$ -	-	$ -
NP 24	REHABILITACIÓN RED DE ALCANTARILLADO CON TECNOLOGÍA CIPP, CON RESINA DE GRP CURADA CON RAYOS UV, INCLUYE EQUIPOS, MATERIALES, TRANSPORTES Y PERSONAL. DIÁMETRO 6" ESPESOR 4.90 mm. EC = 14.200 MPA. (Incluye: Fabricación, importación, nacionalización, logística y suministro de materiales (Liner), proceso instalación, curado con luz ultravioleta, personal y actividades complementarias para finalizar la rehabilitación, Inspección final con equipo CCTV. (Entrega de video, informe pos rehabilitación e informe de protocolo del proceso de rehabilitación con norma técnica EAB)).	ML		$ 656.250,00				-	$ -					-	$ -	-	$ -
NP 25	INVESTIGACION DE REDES PARA CIRCUITOS DE SEMAFORIZACION	UN		$ 1.253.595,00				-	$ -					2,00	$ 2.507.190,00	2,00	$ 2.507.190,00
NP 26	LAVADO Y SONDEO DE REDES DE ALCANTARILLADO ENTRE 6" Y 16" DE DIÁMETRO Y CON GRADO DE COLMATACIÓN MENOR DEL 30%. INCL MANO DE OBRA IDÓNEA, SEÑALIZACIÓN BÁSICA, SUMIN DE COMBUSTIBLE Y AGUA. INCL. IVA	ML		$ 14.875,00				-	$ -					78,40	$ 1.166.200,00	78,40	$ 1.166.200,00
NP 27	LAVADO Y SONDEO DE REDES DE ALCANTARILLADO ENTRE 18" Y 36" DE DIÁMETRO Y CON GRADO DE COLMATACIÓN MENOR DEL 30%. INCLUYE MANO DE OBRA IDÓNEA, SEÑALIZACIÓN BÁSICA, SUMIN DE COMBUSTIBLE Y AGUA. INCL IVA	ML		$ 16.065,00				-	$ -					188,00	$ 3.020.220,00	188,00	$ 3.020.220,00
NP 28	INSPECCIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO CON SISTEMAS CCTV PARA DIÁMETROS MAYORES A 36"	ML		$ 13.090,00				-	$ -					-	$ -	-	$ -
NP 29	INSPECCIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO CON SISTEMAS CCTV PARA DIÁMETROS ENTRE 6" A 36"	ML		$ 10.710,00				-	$ -					266,40	$ 2.853.144,00	266,40	$ 2.853.144,00
NP 30	EQUIPO VACTOR - SONDEO - LIMPIEZA - RECOLECCIÓN DE LODOS NO PELIGROSOS	HR		$ 261.800,00				-	$ -					-	$ -	-	$ -
NP 31	TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL DE LODOS NO PELIGROSOS PROVENIENTES DE ALCANTARILLADO	KG		$ 286,00				-	$ -					-	$ -	-	$ -

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE LOS MARTIRES

ACTA No 3 **DE RECIBO PARCIAL No** 3 **CORRESPONDIENTE AL PERIODO** 21/11/2020 20/01/2021
(Fecha final del periodo)

CONTRATO No CO-137-2019
(Numero de Contrato)

NP 32	CARROTANQUE IRRIGADOR DE AGUA - VIAJE	VIAJE		$ 175.000,00				-	$ -					-	$ -	-	$ -
NP 33	ESTABILIZACIÓN CON RCD. Incluye trasiego interno, nivelación y compactación.	M3		$ 42.033,00				-	$ -					-	$ -	-	$ -
NP 34	CARCAMO TIPO PLACA PARA PROTECCIÓN DE TUBO EN POLIETILENO D= 10", 12", 14" Y 16" (Incluye relleno en arena de peña, refuerzo, concreto de 2000 PSI y 4000 PSI, formaleta y transporte de petreos).	ML		$ 197.441,00				-	$ -					68,50	$ 13.524.708,50	68,50	$ 13.524.708,50
NP 35	TRANSPORTE DE EQUIPO DE CINCO TONELADAS POR VIAJE DIURNO SIN ESCOLTA	VIAJE		$ 389.725,00				2,00	$ 779.450,00					5,00	$ 1.948.625,00	7,00	$ 2.728.075,00
NP 36	TRANSPORTE DE EQUIPO DE DIEZ TONELADAS POR VIAJE DIURNO SIN ESCOLTA	VIAJE		$ 639.625,00				12,00	$ 7.675.500,00					16,00	$ 10.234.000,00	28,00	$ 17.909.500,00
NP 37	TRANSPORTE DE EQUIPO DE QUINCE TONELADAS POR VIAJE DIURNO SIN ESCOLTA	VIAJE		$ 887.145,00				-	$ -					-	$ -	-	$ -
NP 38	ENTIBADO EC-5 CONTINUO MADERA CON PERFILES DE METÁLICOS Y PARALES TELESCÓPICOS. SUMINISTRO E INSTALACIÓN.	M2		$ 57.236,00				-	$ -					-	$ -	-	$ -
NP 39	GEOTEXTIL T. RESIST. ULTIMA (TIRA ANCHA)=40 kN/m PARA SEPARACION SUBRASANTE/CAPAS GRANULARES (Inc. Sumin. e Instalación)	M2		$ 9.902,00				-	$ -					-	$ -	-	$ -
NP 40	BANDERERO (INCLUYE ALQUILER DE PALETA PARE-SIGA EN POLIETILENO)	H/ME		$ 1.448.946,00				-	$ -					9,00	$ 13.040.514,00	9,00	$ 13.040.514,00
NP 41	CORTE Y AMPLIACIÓN DE JUNTA EN PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO	ML		$ 4.166,00				-	$ -					-	$ -	-	$ -
NP 42	CURADO DE LOSAS DE CONCRETO (Suministro y Aplicación)	M2		$ 1.516,00				-	$ -					-	$ -	-	$ -
NP 43	ALQUILER DE CERRAMIENTO TIPO 2: CONSTA DE POSTES ROLLIZOS DE 1.90mt DE ALTURA LIBRE CON BASE EN CONCRETO 1500 PSI DE 30cm x 30cm, DOBLE CINTA PELIGRO CAL. 4, TELA PARA CERRAMIENTO.(INCL. INSTALACION, MANTENIMIENTO Y DESINSTALACIÓN).	ML/ME		$ 18.249,00				1.115,00	$ 20.347.635,00					1.870,60	$ 34.136.579,40	2.985,60	$ 54.484.214,40
NP 44	BARRICADA METALICA TIPO IDU CON CERRADO REFLECTIVO NARANJA Y BLANCO GRADO INGENIERIA, MEDIDAS: 2.40m x 1.50m - 3 BANDEJAS DE 20cm x 2.40m. TABLERO DE DESVIO DE 60cm. (Incluye caballete, suministro e instalación)	UN/MES		$ 41.575,00				4,00	$ 166.300,00					16,00	$ 665.200,00	20,00	$ 831.500,00
NP 45	TUBERIA PVC D=4" TIPO U.M. RDE 21 (Suministro e Instalación)	ML		$ 42.945,00				-	$ -					-	$ -	-	$ -
NP 46	UNION PVC TIPO U.M. D= 4" (Suministro e Instalación)	UN		$ 63.261,00				-	$ -					-	$ -	-	$ -
NP 47	TEE HD EXTREMO LISO 4"x4" (Suministro e Instalación)	UN		$ 313.367,00				-	$ -					-	$ -	-	$ -
NP 48	CODO G.RAD. PVC 22.5° TIPO U.M. D=4" (Suministro e Instalación)	UN		$ 85.516,00				-	$ -					-	$ -	-	$ -
NP 49	CODO G.RAD. PVC 11.25° TIPO U.M. D=4" RDE 21 (Suministro e Instalación)	UN		$ 81.509,00				-	$ -					-	$ -	-	$ -
NP 50	UNION DRESSER D=3" (Suministro e Instalación)	UN		$ 113.808,00				-	$ -					-	$ -	-	$ -
NP 51	UNION DRESSER D=4" (Suministro e Instalación)	UN		$ 127.631,00				-	$ -					-	$ -	-	$ -
NP 52	UNION DE REPARACION PVC TIPO U.M. D=4" (Suministro e Instalación)	UN		$ 75.661,00				-	$ -					-	$ -	-	$ -
NP 53	EMPATES DE TUBERÍA EN PVC A AC 4" LINEAL SEGÚN NORMA NS-023 SUMINISTRO E INSTALACIÓN. (INCLUYE ACCESORIOS).	UN		$ 272.156,00				-	$ -					-	$ -	-	$ -
NP 54	EMPATES DE TUBERÍA EN PVC A AC 3" LINEAL SEGÚN NORMA NS-023. SUMINISTRO E INSTALACIÓN. (INCLUYE ACCESORIOS).	UN		$ 196.509,00				-	$ -					-	$ -	-	$ -
NP 55	REDUCCIÓN CONCENTRICA HD EL 4" x 3". SUMINISTRO E INSTALACIÓN.	UN		$ 147.791,00				-	$ -					-	$ -	-	$ -
NP 56	REDUCCION HD 4"x 3" J.H. (Suministro e Instalación)	UN		$ 130.877,00				-	$ -					-	$ -	-	$ -
NP 57	CAJILLA PARA MEDIDOR EN POLIPLÁSTICO CON CONCRETO. SUMINISTRO E INSTALACIÓN.	UN		$ 202.303,00				-	$ -					-	$ -	-	$ -
NP 58	CAJA DE INSPECCIÓN DE 0.6x0.6m (H=0.6m. Incluye Suministro y Construcción. Incluye Marco y Tapa. No Inc. Base y Cañuela)	UN		$ 328.649,00				-	$ -					-	$ -	-	$ -
NP 59	TUBERIA PVC SANITARIA D=6" TIPO U.S. (Incluye Suministro e Instalación)	ML		$ 51.615,00				158,40	$ 8.175.816,00					-	$ -	158,40	$ 8.175.816,00
NP 60	TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA NTC 3722-1 D=14" (Incluye Suministro e Instalación)	ML		$ 136.772,00				80,00	$ 10.941.760,00					-	$ -	80,00	$ 10.941.760,00
NP 61	TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA NTC 3722-1 D=16" (Incluye Suministro e Instalación)	ML		$ 179.340,00				55,30	$ 9.917.502,00					-	$ -	55,30	$ 9.917.502,00
NP 62	TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA NTC 3722-1 D=18" (Incluye Suministro e Instalación)	ML		$ 229.549,00				50,50	$ 11.592.224,50					-	$ -	50,50	$ 11.592.224,50
NP 63	TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA NTC 3722-1 D=20" (Incluye Suministro e Instalación)	ML		$ 296.845,00				-	$ -					-	$ -	-	$ -

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE LOS MARTIRES

ACTA No 3 **DE RECIBO PARCIAL No** 3 **CORRESPONDIENTE AL PERIODO** 21/11/2020 20/01/2021
(Fecha final del periodo)

CONTRATO No CO-137-2019
(Número de Contrato)

NP 64	TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA NTC 3722-1 D=24" (Incluye Suministro e Instalación)	ML		$ 441.431,00				-	$ -					84,00	$ 37.080.204,00	84,00	$ 37.080.204,00
NP 65	TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA NTC 3722-1 D=36" (Incluye Suministro e Instalación)	ML		$ 1.148.347,00				-	$ -					-	$ -	-	$ -
NP 66	YEE PVC SANITARIA D=6"x 6" (Incluye suministro e instalación).	UN		$ 219.561,00				-	$ -					-	$ -	-	$ -
NP 67	YEE PVC SANITARIA D=6"x 10" (Incluye suministro e instalación).	UN		$ 299.387,00				-	$ -					-	$ -	-	$ -
NP 68	YEE PVC SANITARIA D=6"x 12" (Incluye suministro e instalación).	UN		$ 320.019,00				-	$ -					-	$ -	-	$ -
NP 69	YEE PVC SANITARIA D=6"x 14" (Incluye suministro e instalación).	UN		$ 432.304,00				-	$ -					-	$ -	-	$ -
NP 70	YEE PVC SANITARIA D=6"x 16" (Incluye suministro e instalación).	UN		$ 587.097,00				-	$ -					-	$ -	-	$ -
NP 71	YEE PVC SANITARIA D=6"x 18" (Incluye suministro e instalación).	UN		$ 745.249,00				-	$ -					-	$ -	-	$ -
NP 72	CONEXIONES KIT SILLA YEE 500 x 160 PVC SUMINISTRO E INSTALACIÓN.	UN		$ 346.831,00				-	$ -					46,00	$ 15.954.226,00	46,00	$ 15.954.226,00
NP 73	CONEXIONES KIT SILLA YEE 24" x 160 PVC SUMINISTRO E INSTALACIÓN.	UN		$ 427.176,00				-	$ -					-	$ -	-	$ -
NP 74	AFOROS DE TRÁNSITO (MOTORIZADOS Y NO MOTORIZADOS) A PARTIR DE CAPTURA DE VIDEO. Incluye digitación y entrega de base de datos en archivo Excel. Incluye 3 estaciones maestras, 1 estación intermedia tipo 1 y 1 estación intermedia tipo 2. 22 estaciones muestrales o complementarias. Captura día hábil y no hábil, con sus respectivos movimientos. Incluye todos los costos directos e indirectos.	HR		$ 194.751,00				-	$ -					108,00	$ 21.033.108,00	108,00	$ 21.033.108,00
NP 75	PINTURA EN PLASTICO EN FRIO METILMETACRILATO PARA MARCAS VIALES, CON MICROESFERAS Y ESPESOR SECO SEGÚN NORMA NTC 4744. SUMINISTRO Y APLICACIÓN. (Cebras, Flechas, pictogramas, lineas de pare, senderos peatonales, achurados, etc)	M2		$ 80.039,00				-	$ -					-	$ -	-	$ -
NP 76	TACHA REFLECTIVA BIDIRECCIONAL (Incluye suministro e instalación).	UN		$ 8.682,00				-	$ -					-	$ -	-	$ -
NP 77	SEGREGADOR BICICLETA (TACHON PLASTICO O CAUCHO ALTA RESISTENCIA COMO POLIPROPILENO DE ALTO IMPACTO, CON ESTRUCTURA DE REFUERZO, ELEMENTOS REFLECTIVOS DE ALTA EFICIENCIA. TIPO TRANSMILENIO 40.5cmx15cmx8.5cm). SUMIN. E INSTAL.	UN		$ 34.682,00				-	$ -					-	$ -	-	$ -
NP 78	ESTOPEROLES METÁLICOS CON ESPIGO. INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN.	UN		$ 14.032,00				-	$ -					-	$ -	-	$ -
NP 79	BANDAS SONORAS REDUCTORAS DE VELOCIDAD DE 2cm DE ALTURA, CONSTRUIDA CON GRAVILLA DE 1/2", PINTURA DE LARGA DURACIÓN BLANCA Y RESINA EPÓXICA.	M2		$ 176.429,00				-	$ -					-	$ -	-	$ -
NP 80	REAPERTURA EN CONEXIÓN DOMICILIARIA CON EQUIPO ROBOTIZADO DE CORTE, PARA DIAMETROS DE TUBERÍA ENTRE 18" Y 22"	UN		$ 454.545,00				-	$ -					-	$ -	-	$ -
NP 81	CORTE PARA ELIMINACIÓN DE OBSTRUCCIONES CON EQUIPO FRESADOR DE TUBERÍA ROBOTIZADO EASY CUTTER AUTOPROPULSADO, CON CÁMRA INCORPORADA , PARA DIAMETROS DE TUBERÍA ENTRE 18" Y 22"	UN		$ 738.636,00				-	$ -					-	$ -	-	$ -
NP 82	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y RETIRO DE AMOBLAMIENTO SEMAFÓRICO TEMPORAL DE ACUERDO A LOS REQUERIMIENTOS DE LA SDM	GL		$ 7.504.860,00				-	$ -					1,00	$ 7.504.860,00	1,00	$ 7.504.860,00
NP 83	ALQUILER DE AMOBLAMIENTO SEMAFÓRICO TEMPORAL DE ACUERDO A LOS REQUERIMIENTOS DE LA SDM	MES		$ 3.800.860,00				-	$ -					2,00	$ 7.601.720,00	2,00	$ 7.601.720,00
COSTOS DIRECTOS DE OBRA				**$ -**	**$ -**			**$ 437.412.317,00**	**$ -**	**$ -**				**$ 527.518.565,00**		**$ 964.930.882,00**	
OSTOS DIRECTOS REDES				**$ -**	**$ -**			**$ -**	**$ -**	**$ -**				**$ -**		**$ -**	
COSTO DIRECTO TOTAL OBRAS				**$ -**	**$ -**			**$ 437.412.317,00**	**$ -**	**$ -**				**$ 527.518.565,00**		**$ 964.930.882,00**	
ADMINISTRACIÓN		**22,89%**		**$ -**	**$ -**			**$ 100.123.679,00**	**$ -**	**$ -**				**$ 120.749.000,00**		**$ 220.872.679,00**	
IMPREVISTOS		**1,00%**		**$ -**	**$ -**			**$ 4.374.123,00**	**$ -**	**$ -**				**$ 5.275.186,00**		**$ 9.649.309,00**	
UTILIDAD		**7,00%**		**$ -**	**$ -**			**$ 30.618.862,00**	**$ -**	**$ -**				**$ 36.926.300,00**		**$ 67.545.162,00**	
AIU PARA OBRAS CIVILES		**30,89%**		**$ -**	**$ -**			**$ 135.116.665,00**	**$ -**	**$ -**				**$ 162.950.485,00**		**$ 298.067.149,00**	
COSTO TOTAL OBRAS CON A.I.U (A)				**$ 4.620.463.163,00**	**$ -**			**$ 572.528.982,00**	**$ -**	**$ -**				**$ 690.469.050,00**		**$ 1.262.998.031,00**	

CÓDIGO	FORMATO: ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA	VERSIÓN
FO-EO-23	PROCESO: Ejecución de Obras	2.0

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE LOS MARTIRES

ACTA No 3 **DE RECIBO PARCIAL No** 3 **CORRESPONDIENTE AL PERIODO** 21/11/2020 (Fecha final del periodo) 20/01/2021

CONTRATO No CO-137-2019 (Numero de Contrato)

UTILIDAD	7.00%	$ -	$ -	$ 30,618,862.00	$ -	$ -	$ 36,926,300.00	$ 67,545,162.00
AIU PARA OBRAS CIVILES	30.89%	$ -	$ -	$ 135,116,665.00	$ -	$ -	$ 162,950,485.00	$ 298,067,149.00
COSTO TOTAL OBRAS CON A.I.U (A)		$ 4,620,463,163.00	$ -	$ 572,528,982.00	$ -	$ -	$ 690,469,050.00	$ 1,262,998,031.00
COSTO ACTIVIDADES AMBIENTALES y SST(B)	2.96%	$ 136,604,472.00	$ -	$ 16,926,879.00	$ -	$ -	$ 20,413,789.00	$ 37,340,668.00
COSTO ACTIVIDADES SOCIALES (C)	2.72%	$ 125,654,686.00	$ -	$ 15,570,073.00	$ -	$ -	$ 18,777,484.00	$ 34,347,557.00
COSTO PLAN DE MANEJO DE TRAFICO (D)	1.23%	$ 56,703,337.00	$ -	$ 7,026,201.00	$ -	$ -	$ 8,473,588.00	$ 15,499,789.00
COSTOS ESTIMADOS PARA ENSAYOS DE LABORATORIO (E) (INCLUYE AJUSTES E IVA)		$ 20,262,855.00	$ -	$ 612,052,135.00	$ -	$ -	$ 738,133,911.00	$ 1,350,186,046.00
COSTO ESTIMADO DE AJUSTES A ESTUDIOS Y DISEÑOS (F) (INCLUYE IVA)		$ 337,110,102.00	$ 337,110,102.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 337,110,102.00
VALOR TOTAL SIN AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES		$ 5,296,798,615.00	$ 337,110,102.00	$ 612,052,135.00	$ -	$ -	$ 738,133,911.00	$ 1,687,296,148.00
PROVISION PARA AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES (SOLO OBRA) , INCLUYE COSTOS INDIRECTOS (G)		$ 141,085,957.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
VALOR TOTAL DELCONTRATO APROXIMADO AL PESO		$ 5,437,884,572.00	$ 337,110,102.00	$ 612,052,135.00	$ -	$ -	$ 738,133,911.00	$ 1,687,296,148.00

OBSERVACIONES

Nota:
Todas las cantidades de obra estarán aproximadas al entero por exceso o por defecto.
Todos los valores estarán expresados en pesos aproximando los centavos por exceso o por defecto, inclusive los costos indirectos, retenciones y amortizaciones.

DESCRIPCIÓN		VALOR CONDICIONES CONTRACTUALES INICIALES	ACTAS ANTERIORES				OBRA EJECUTADA	
							PRESENTE ACTA	ACUMULADA
SUBTOTAL COSTO DIRECTO OBRAS CIVILES + REDES		$ -	$ -	$ 437,412,317.00	$ -	$ -	$ 527,518,565.00	$ 964,930,882.00
AIU COSTO INDIRECTO	30.89%	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 162,950,485.00	$ 298,067,149.00
COSTO TOTAL OBRA EJECUTADA		$ 4,620,463,163.00	$ -	$ 437,412,317.00	$ -	$ -	$ 690,469,050.00	$ 1,262,998,031.00
COSTO TOTAL COMPONENTES		$ 318,962,495.00	$ -	$ 39,523,153.00	$ -	$ -	$ 47,664,861.00	$ 87,188,014.00
COSTO ENSAYOS LABORATORIO		$ 20,262,855.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
PROVISION PARA AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONAL.		$ 141,085,957.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
COSTO TOTAL OBRA MAS AJUSTES		$ 5,100,774,470.00	$ -	$ 476,935,470.00	$ -	$ -	$ 738,133,911.00	$ 1,350,186,045.00
PPTO COMPONENTE CONSULTORIA (DIAGNOSTICO + E&D)		$ 283,285,800.00	$ 283,285,800.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 283,285,800.00
IVA COSTO INDIRECTO	19.00%	$ 53,824,302.00	$ 53,824,302.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 53,824,302.00
COSTO TOTAL PPTO COMPONENTE CONSULTORIA		$ 337,110,102.00	$ 337,110,102.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 337,110,102.00
COSTO TOTAL DE OBRA + CONSULTORIA		$ 5,437,884,572.00	$ 337,110,102.00	$ 476,935,470.00	$ -	$ -	$ 738,133,911.00	$ 1,687,296,147.00
MENOS AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO (30%)			$ 101,133,031.00	$ 143,080,641.00	$ -	$ -	$ 221,440,173.00	$ 465,653,845.00
MENOS RETENCIÓN GARANTÍA			$ 33,711,010.00	$ 47,693,547.00	$ -	$ -	$ 73,813,391.00	$ 155,217,948.00
TOTAL A PAGAR			$ 202,266,061.00	$ 286,161,282.00	$ -	$ -	$ 442,880,347.00	$ 1,066,424,354.00

El recibo por parte de la interventoría de las obras ejecutadas no exime al contratista de su responsabilidad y de las obligaciones a que hace referencia el citado contrato de obra. Las cantidades de obra indicadas en la presente acta de recibo parcial son de absoluta responsabilidad del contratista e interventor.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el manual de interventoría, en Bogotá, D.C., a los

VEINTITRES (Día en letras) **(23)** (Día en números) días del mes de **FEBRERO** (Mes en que se firma el acta) **2021** (Año de firma del acta)

(Firma)
(Nombre) JUAN PABLO RICCI RUIZ
Contratista

(Firma)
(Nombre) NICK RANDY ALMEIDA GAMARRA
Interventor

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA EJECUTADA


CONTROL DE OBRA


MEMORIA: 1 de 47

CON & CON CONSULTORIA Y CONSTRUCCION

CONTRATO DE OBRA:	CO-137-2019	CONTRATISTA:	CONSULTORIA Y CONSTRUCCION - CON & CON S.A.S.	NIT:	830.041.411-0
OBJETO DEL CONTRATO:	EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS POR LA MODALIDAD DE MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS Y ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACION DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE LOS MARTIRES				
ACTA No.	3	PERIODO DE COBRO:	21/11/2020 AL 20/01/2021	ELABORÓ:	DIEGO RENE PEREZ
UPZ:		BARRIO:			
ITEM:	1,01	DESCRIPCION:	REPLANTEO GENERAL	UNIDAD:	M2

REGISTRO FOTOGRAFICO

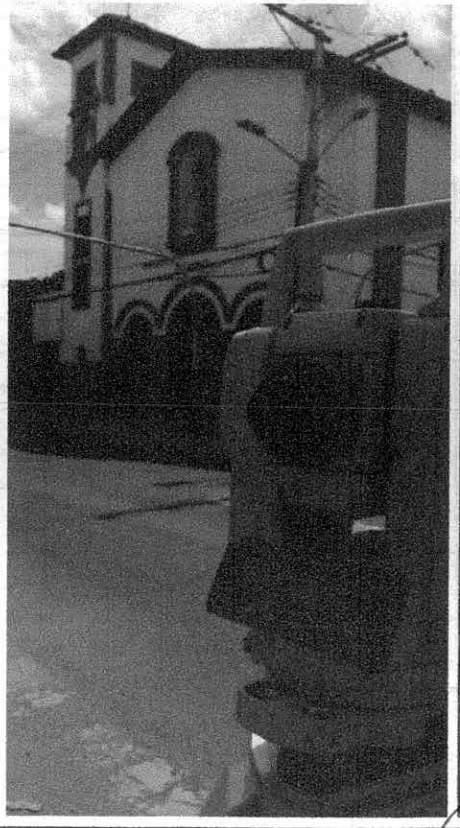

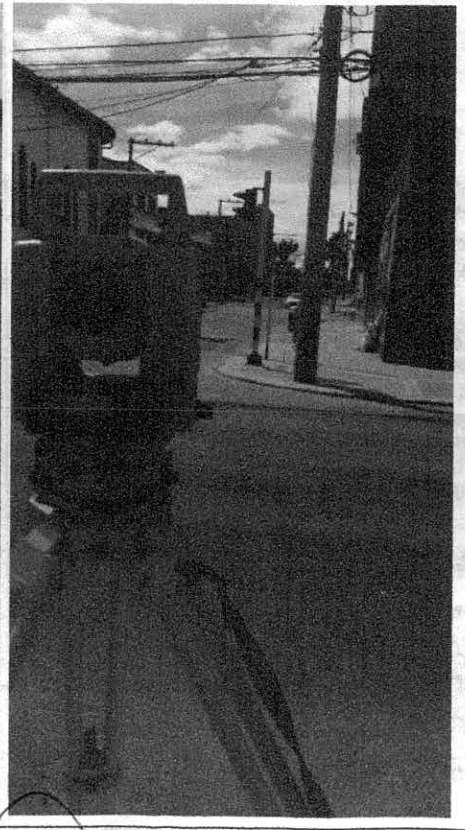

CIV	OBSERVACIONES	DIMENSIONES			CANTIDAD	TOTAL ACUMULADO
		Long.	Ancho	Alto		
14000178	AREA DE INTERVENCIÓN	72,40	9,80		1,00	709,52
14001367	AREA DE INTERVENCIÓN	85,30	10,50		1,00	895,65
	SUBTOTAL					1.605,17

OBSERVACIONES:

CONTRATISTA	INTERVENTORIA
APROBÓ	APORBÓ
Firma:	Firma:
Nombre: JAVIER HERNANDO PERILLA VACCA	Nombre: SANDRA MONICA CARDOZO ROJAS
Cargo: DIRECTOR DE OBRA	Cargo: DIRECTOR DE INTERVENTORIA

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA EJECUTADA

CONTROL DE OBRA

MEMORIA: 2 de 47


CON & CON CONSULTORIA Y CONSTRUCCION

CONTRATO DE OBRA:	CO-137-2019	CONTRATISTA:	CONSULTORIA Y CONSTRUCCION - CON & CON S.A.S.	NIT:	830.041.411-0
OBJETO DEL CONTRATO:	EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS POR LA MODALIDAD DE MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS Y ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACION DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE LOS MARTIRES				

ACTA No.	3	PERIODO DE COBRO:	21/11/2020 AL 20/01/2021	ELABORÓ:	JAVIER HERNANDO PERILLA VACCA
UPZ:		BARRIO:			

ITEM:	1,02	DESCRIPCION:	EXCAVACION MECANICA EN MATERIAL COMUN (Incluye Cargue)	UNIDAD:	M3

REGISTRO FOTOGRAFICO

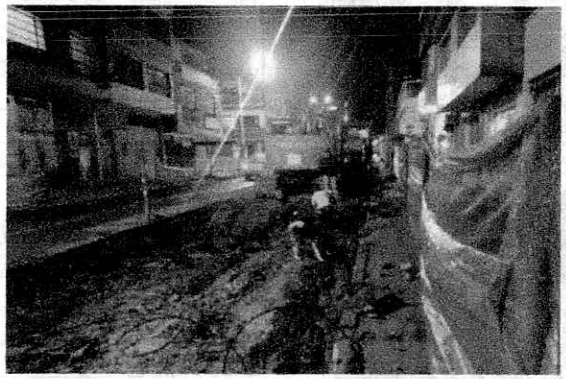



CIV	OBSERVACIONES	DIMENSIONES			CANTIDAD	TOTAL ACUMULADO
		Long.	Ancho	Alto		
14000178	CONF. ESTRUCTURA MEDIA CALZADA	72,40	4,90	0,95	1,00	337,02
14001156	FALLO POR SUBRASANTE BLANDA	11,50	3,50	0,50	1,00	20,13
14001367	CONF. ESTRUCTURA MEDIA CALZADA	86,80	5,85	1,04	1,00	528,09
14000178	TUBERIA PVC COLECTOR 12"	59,40	0,95	1,05	1,00	59,25
14001367	FALLO POR SUBRASANTE BLANDA	19,65	5,00	0,70	1,00	68,78
14000178	FALLO POR SUBRASANTE BLANDA	11,75	6,20	0,75	1,00	54,64
14000126	FALLO POR SUBRASANTE BLANDA	13,20	5,20	0,80	1,00	54,91
14000126	FALLO POR TUBERIA GRES COLAPSADA	21,90	5,80	0,90	1,00	114,32
14000126	FALLO POR TUBERIA GRES COLAPSADA	23,00	4,90	0,90	1,00	101,43
	SUBTOTAL					1.338,56

OBSERVACIONES:

CONTRATISTA	INTERVENTORIA
APROBÓ	APORBÓ
Firma:	Firma:
Nombre: JAVIER HERNANDO PERILLA VACCA	Nombre: SANDRA CARDOZO
Cargo: DIRECTOR DE OBRA	Cargo: DIRECTOR DE INTERVENTORIA

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA EJECUTADA


CONTROL DE OBRA

MEMORIA: 3 de 47

CON & CON CONSULTORIA Y CONSTRUCCION

CONTRATO DE OBRA:	CO-137-2019	CONTRATISTA:	CONSULTORIA Y CONSTRUCCION - CON & CON S.A.S.	NIT:	830.041.411-0
OBJETO DEL CONTRATO:	EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS POR LA MODALIDAD DE MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS Y ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACION DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE LOS MARTIRES				
ACTA No.	3	PERIODO DE COBRO:	21/11/2020 AL 20/01/2021	ELABORÓ:	JAVIER HERNANDO PERILLA VACCA
UPZ:		BARRIO:			
ITEM:	1,03	DESCRIPCION:	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN. Incluye cargue.	UNIDAD:	M3

REGISTRO FOTOGRAFICO

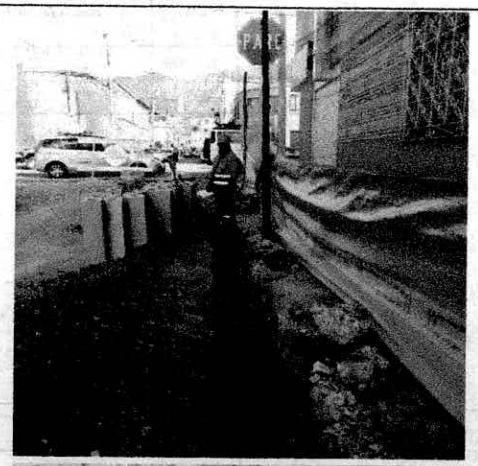



CIV	OBSERVACIONES	DIMENSIONES			CANTIDAD	TOTAL ACUMULADO
		Long.	Ancho	Alto		
14001156	SARDINEL A10 Y A85	87,00	0,32	0,25	2,00	13,92
14001619	SARDINEL A10 COSTADO NORTE	53,00	0,32	0,20	1,00	3,39
14001619	SARDINEL A10 COSTADO SUR	44,00	0,32	0,20	1,00	2,82
14001619	BAJO RAMPA A-85	13,45	0,35	0,20	1,00	0,94
14001616	SARDINEL A-10 COSTADO SUR	37,50	0,32	0,20	1,00	2,40
14001616	BAJO RAMPA A-85	17,80	0,32	0,20	1,00	1,14
14001367	FALLO POR SUBRASANTE BLANDA	16,65	5,10	0,70	1,00	59,44
14000178	FALLO POR SUBRASANTE BLANDA	11,75	6,25	0,70	1,00	51,41
14000126	FALLO POR SUBRASANTE BLANDA	26,40	4,85	0,80	1,00	102,43
14000126	FALLO POR TUBERIA GRES COLAPSADA	11,60	5,85	0,90	1,00	61,07
14000126	FALLO POR TUBERIA GRES COLAPSADA	12,90	4,95	0,90	1,00	57,47
SUBTOTAL						356,43

OBSERVACIONES:

CONTRATISTA

APROBÓ

Firma:

Nombre: JAVIER HERNANDO PERILLA VACCA

Cargo: DIRECTOR DE OBRA

INTERVENTORIA

APORBÓ

Firma:

Nombre: SANDRA CARDOZO

Cargo: DIRECTOR DE INTERVENTORIA

87

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA EJECUTADA

CONTROL DE OBRA


MEMORIA 4 de 47

CONTRATO DE OBRA:	CO-137-2019	CONTRATISTA:	CONSULTORIA Y CONSTRUCCION - CON & CON S.A.S.	NIT:	830.041.411-0
OBJETO DEL CONTRATO:	EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS POR LA MODALIDAD DE MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS Y ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACION DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE LOS MARTIRES				

ACTA No.	3	PERIODO DE COBRO:	21/11/2020 AL 20/01/2021	ELABORÓ:	JAVIER HERNANDO PERILLA VACCA
UPZ:			BARRIO:		

ITEM:	1,07	DESCRIPCION:	DEMOLICION PAVIMENTO ASFALTICO (Espesor Variable. Incluye Cargue). No incluye transporte y disposición final de sobrantes. Rendimiento estimado para espesores max. 0.15m	UNIDAD:	M2

REGISTRO FOTOGRAFICO

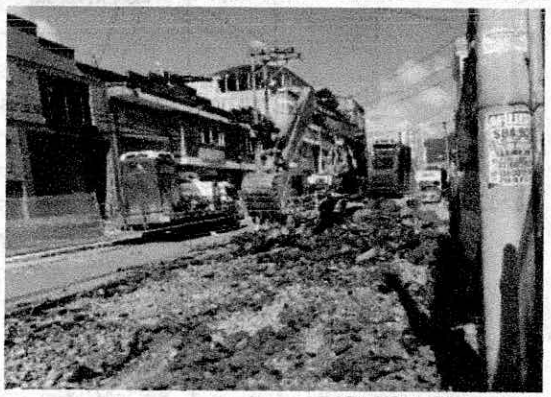



CIV	OBSERVACIONES	DIMENSIONES			CANTIDAD	TOTAL ACUMULADO
		Long.	Ancho	Alto		
14000178	CARPETA ASFALTICA EXISTENTE	73,40	5,10		1,00	374,34
14001367	CONF. ESTRUCTURA MEDIA CALZADA	87,30	5,85		1,00	510,71

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA EJECUTADA


CONTROL DE OBRA


MEMORIA: 5 de 47

CON & CON CONSULTORIA Y CONSTRUCCION

CONTRATO DE OBRA:	CO-137-2019	CONTRATISTA:	CONSULTORIA Y CONSTRUCCION - CON & CON S.A.S.	NIT:	830.041.411-0
OBJETO DEL CONTRATO:	EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS POR LA MODALIDAD DE MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS Y ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACION DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE LOS MARTIRES				
ACTA No.	3	PERIODO DE COBRO:	21/11/2020 AL 20/01/2021	ELABORÓ:	JAVIER HERNANDO PERILLA VACCA
UPZ:		BARRIO:			
ITEM:	1,09	DESCRIPCION:	DEMOLICION MANUAL SARDINEL EXISTENTE (Incluye Cargue). No incluye transporte y disposición final de sobrantes.	UNIDAD:	ML

REGISTRO FOTOGRAFICO

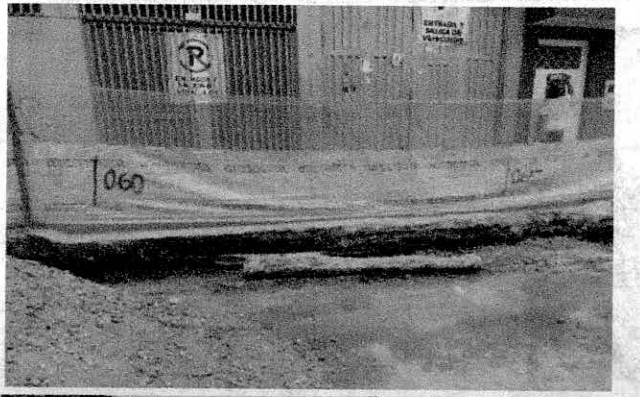

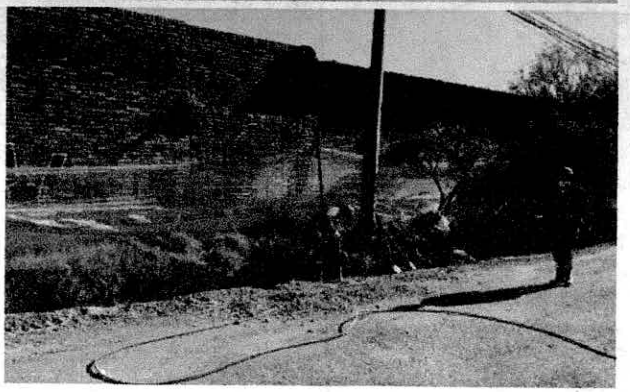

CIV	OBSERVACIONES	DIMENSIONES			CANTIDAD	TOTAL ACUMULADO
		Long.	Ancho	Alto		
14001469	SARDINEL EXISTENTE	46,00			2,00	92,00
14001481	SARDINEL EXISTENTE	49,00			2,00	98,00
14000126	SARDINEL EXISTENTE	97,00			1,00	97,00
14001619	SARDINEL EXISTENTE	57,48			2,00	114,96
14001616	SARDINEL EXISTENTE	52,65			2,00	105,30
14000178	SARDINEL EXISTENTE	73,40			1,00	73,40
14001367	SARDINEL EXISTENTE	86,30			1,00	86,30
SUBTOTAL						666,96

OBSERVACIONES:

CONTRATISTA		INTERVENTORIA	
APROBÓ		APROBÓ	
Firma:		Firma:	
Nombre:	JAVIER HERNANDO PERILLA VACCA	Nombre:	SANDRA CARDOZO
Cargo:	DIRECTOR DE OBRA	Cargo:	DIRECTOR DE INTERVENTORIA

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA EJECUTADA

CONTROL DE OBRA

MEMORIA: 6 de 47

CONTRATO DE OBRA:	CO-137-2019	CONTRATISTA:	CONSULTORIA Y CONSTRUCCION - CON & CON S.A.S.	NIT:	830.041.411-0
OBJETO DEL CONTRATO:	EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS POR LA MODALIDAD DE MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS Y ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACION DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE LOS MARTIRES				
ACTA No.	3	PERIODO DE COBRO:	21/11/2020 AL 20/01/2021	ELABORÓ:	JAVIER HERNANDO PERILLA VACCA
UPZ:		BARRIO:			
ITEM:	1,10	DESCRIPCION:	TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (distancia de transporte 21 Km). A distancia mayor del acarreo libre (90 m) en sitio autorizado por la entidad Ambiental competente.	UNIDAD:	M3

REGISTRO FOTOGRAFICO





CIV	OBSERVACIONES	DIMENSIONES			CANTIDAD	TOTAL ACUMULADO
		Long.	Ancho	Alto		
14000178	1,02				586,18	586,18
14000178	1,07				73,00	73,00
14001469	1,09	92,00	0,20	0,30	1,30	7,18
14001481	1,09	98,00	0,20	0,30	1,30	7,64
14000126	1,09	97,00	0,20	0,30	1,30	7,57
14001619	1,09	114,96	0,20	0,30	1,30	8,97
14001616	1,09	105,30	0,20	0,30	1,30	8,21
14000178	1,09	73,40	0,20	0,30	1,30	5,73
14001156	1,03	87,00	0,32	0,25	1,30	9,05
14001619	1,03	53,00	0,32	0,20	1,30	4,41
14001619	1,03	44,00	0,32	0,20	1,30	3,66
14001619	1,03	13,45	0,35	0,20	1,30	1,22
14001616	1,03	37,50	0,32	0,20	1,30	3,12
14001616	1,03	17,80	0,32	0,20	1,30	1,48
14001367	1,07				99,59	99,59
14001156	1,02				26,16	26,16
14001367	1,02				775,93	775,93
14001367	1,09	86,30	0,20	0,30	1,30	6,73
14000126	1,02				351,86	351,86
14001367	1,09	59,44			1,30	77,27
SUBTOTAL						2.064,95

OBSERVACIONES:

CONTRATISTA

APROBÓ
Firma:

Nombre: JAVIER HERNANDO PERILLA VACCA
Cargo: DIRECTOR DE OBRA

INTERVENTORIA

APROBÓ
Firma:

Nombre: SANDRA CARDOZO
Cargo: DIRECTOR DE INTERVENTORIA

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA EJECUTADA


CONTROL DE OBRA

MEMORIA: 7 de 47

CON & CON CONSULTORIA Y CONSTRUCCION

CONTRATO DE OBRA:	CO-137-2019	CONTRATISTA:	CONSULTORIA Y CONSTRUCCION - CON & CON S.A.S.	NIT:	830.041.411-0
OBJETO DEL CONTRATO:	EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS POR LA MODALIDAD DE MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS Y ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACION DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE LOS MARTIRES				
ACTA No.	3	PERIODO DE COBRO:	21/11/2020 AL 20/01/2021	ELABORÓ:	JAVIER HERNANDO PERILLA VACCA
UPZ:				BARRIO:	
ITEM:	1,10	DESCRIPCION:	TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (distancia de transporte 21 Km). A distancia mayor del acarreo libre (90 m) en sitio autorizado por la entidad Ambiental competente.	UNIDAD:	M3

REGISTRO FOTOGRAFICO

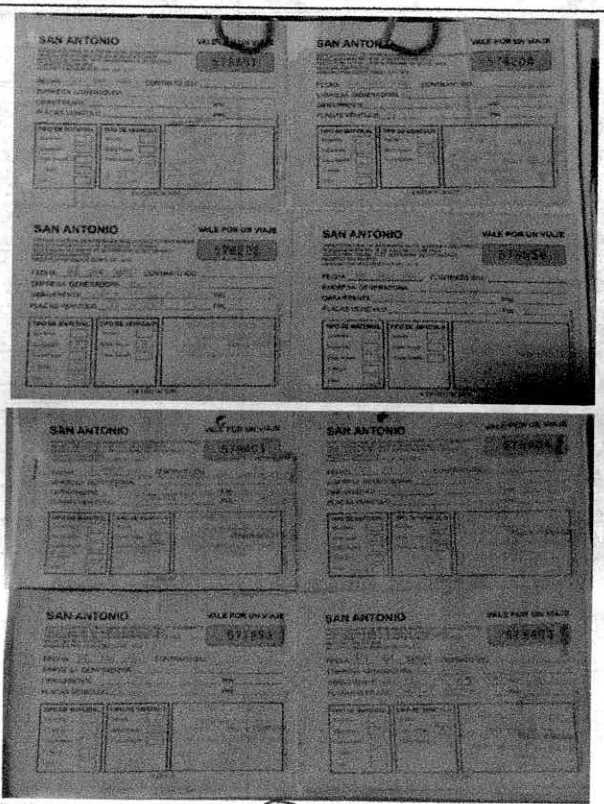

CIV	OBSERVACIONES	DIMENSIONES			CANTIDAD	TOTAL ACUMULADO
		Long.	Ancho	Alto		
14000178	1,09	51,41			1,30	66,83
14000126	1,09	102,43			1,30	133,16
14000126	1,09	61,07			1,30	79,40
14000126	1,09	57,47			1,30	74,71
SUBTOTAL						354,10

OBSERVACIONES:

CONTRATISTA

APROBÓ

Firma:

Nombre: JAVIER HERNANDO PERILLA VACCA

Cargo: DIRECTOR DE OBRA

INTERVENTORIA

APORBÓ

Firma:

Nombre: SANDRA CARDOZO

Cargo: DIRECTOR DE INTERVENTORIA

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA EJECUTADA

CONTROL DE OBRA

MEMORIA: 8 de 47


CONTRATO DE OBRA:	CO-137-2019	CONTRATISTA:	CONSULTORIA Y CONSTRUCCION - CON & CON S.A.S.	NIT:	830.041.411-0
OBJETO DEL CONTRATO:	EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS POR LA MODALIDAD DE MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS Y ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACION DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE LOS MARTIRES				

ACTA No.	3	PERIODO DE COBRO:	21/11/2020 AL 20/01/2021	ELABORÓ:	JAVIER HERNANDO PERILLA VACCA
UPZ:				BARRIO:	

ITEM:	2,01	DESCRIPCION:	NIVELACION Y COMPACTACIÓN DE SUBRASANTE	UNIDAD:	M2

REGISTRO FOTOGRAFICO



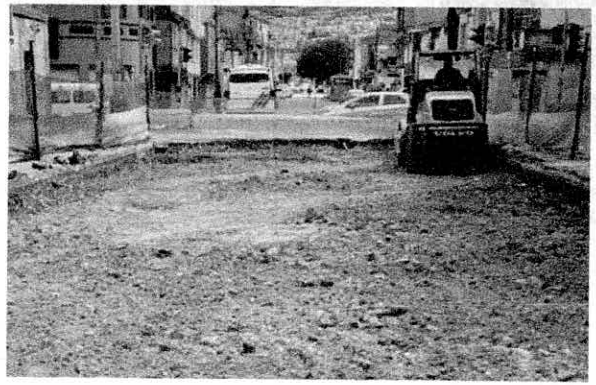

CIV	OBSERVACIONES	DIMENSIONES			CANTIDAD	TOTAL ACUMULADO
		Long.	Ancho	Alto		
14001469	PARA CONFORMACION DE ESTRUCTURA	45,00	8,90		1,00	400,50
14001481	PARA CONFORMACION DE ESTRUCTURA	48,00	8,90		1,00	427,20
14001156	PARA CONFORMACION DE ESTRUCTURA	85,00	7,50		1,00	637,50
14000126	PARA CONF. ESTRUCTURA - MEDIA CALZADA	96,00	5,35		1,00	513,60
14001619	PARA CONFORMACION DE ESTRUCTURA	56,48	6,20		1,00	350,18
14001616	PARA CONFORMACION DE ESTRUCTURA	51,65	6,00		1,00	309,90
14000178	PARA CONF. ESTRUCTURA - MEDIA CALZADA	72,40	4,90		1,00	354,76
14001367	PARA CONF. ESTRUCTURA - MEDIA CALZADA	85,30	5,85		1,00	499,01
SUBTOTAL						3.492,64

OBSERVACIONES:

CONTRATISTA		INTERVENTORIA	
APROBÓ		APROBÓ	
Firma:		Firma:	
Nombre:	JAVIER HERNANDO PERILLA VACCA	Nombre:	SANDRA CARDOZO
Cargo:	DIRECTOR DE OBRA	Cargo:	DIRECTOR DE INTERVENTORIA

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA EJECUTADA

CONTROL DE OBRA

MEMORIA: 9 de 47

CONTRATO DE OBRA:	CO-137-2019	CONTRATISTA:	CONSULTORIA Y CONSTRUCCION - CON & CON S.A.S.	NIT:	830.041.411-0
OBJETO DEL CONTRATO:	EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS POR LA MODALIDAD DE MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS Y ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACION DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE LOS MARTIRES				
ACTA No.	3	PERIODO DE COBRO:	21/11/2020 AL 20/01/2021	ELABORÓ:	JAVIER HERNANDO PERILLA VACCA
UPZ:				BARRIO:	
ITEM:	2,08	DESCRIPCION:	SUBBASE GRANULAR B-200 (Suministro, Extendido, Nivelación, Humedecimiento y Compactación con vibrocompactador)	UNIDAD:	M3

REGISTRO FOTOGRAFICO





CIV	OBSERVACIONES	DIMENSIONES			CANTIDAD	TOTAL ACUMULADO
		Long.	Ancho	Alto		
14001469	SELLO DE RAJÓN	45,00	8,90	0,15	1,00	60,08
14001481	SELLO DE RAJÓN	48,00	8,90	0,15	1,00	64,08
14000126	SELLO DE RAJON - MEDIA CALZADA	96,00	5,45	0,12	1,00	62,78
14000178	SELLO DE RAJON - MEDIA CALZADA	72,40	4,90	0,12	1,00	42,57
14001156	FALLO POR SUBRASANTE BLANDA	11,50	3,50	0,15	1,00	6,04
14001367	FALLO POR SUBRASANTE BLANDA	9,65	5,00	0,15	1,00	7,24
14000178	FALLO POR SUBRASANTE BLANDA	11,75	6,20	0,15	1,00	10,93
14000126	FALLO POR SUBRASANTE BLANDA	15,20	4,80	0,15	1,00	10,94
14000126	FALLO POR TUBERIA GRES COLAPSADA	13,70	5,80	0,15	1,00	11,92
14000126	FALLO POR TUBERIA GRES COLAPSADA	13,40	4,90	0,15	1,00	9,85
	SUBTOTAL					286,42

OBSERVACIONES:

CONTRATISTA

APROBÓ

Firma:

Nombre: JAVIER HERNANDO PERILLA VACCA

Cargo: DIRECTOR DE OBRA

INTERVENTORIA

APORBÓ

Firma:

Nombre: SANDRA CARDOZO

Cargo: DIRECTOR DE INTERVENTORIA

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA EJECUTADA

CONTROL DE OBRA

MEMORIA: 10 de 47

CONTRATO DE OBRA:	CO-137-2019	CONTRATISTA:	CONSULTORIA Y CONSTRUCCION - CON & CON S.A.S.	NIT:	830.041.411-0
OBJETO DEL CONTRATO:	EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS POR LA MODALIDAD DE MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS Y ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACION DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE LOS MARTIRES				

ACTA No.	3	PERIODO DE COBRO:	21/11/2020 AL 20/01/2021	ELABORÓ:	JAVIER HERNANDO PERILLA VACCA
UPZ:				BARRIO:	

ITEM:	3,03	DESCRIPCION:	MEZCLA ASFALTICA CON ASFALTO CAUCHO (Suministro, Extendido, Nivelación y Compactación)	UNIDAD:	M3

REGISTRO FOTOGRAFICO





CIV	OBSERVACIONES	DIMENSIONES			CANTIDAD	TOTAL ACUMULADO
		Long.	Ancho	Alto		
14001156	CAPA DE RODADURA	85,00	7,10	0,11	1,00	66,39

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA EJECUTADA

CONTROL DE OBRA

MEMORIA: 11 de 47

CONTRATO DE OBRA:	CO-137-2019	CONTRATISTA:	CONSULTORIA Y CONSTRUCCION - CON & CON S.A.S.	NIT:	830.041.411-0
OBJETO DEL CONTRATO:	EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS POR LA MODALIDAD DE MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS Y ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACION DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE LOS MARTIRES				
ACTA No.	3	PERIODO DE COBRO:	21/11/2020 AL 20/01/2021	ELABORÓ:	JAVIER HERNANDO PERILLA VACCA
UPZ:		BARRIO:			
ITEM:	3,05	DESCRIPCION:	IMPRIMACION CON EMULSION ASFALTICA CRL-0 (Suministro, Barrido Superficie y Riego)	UNIDAD:	M2

REGISTRO FOTOGRAFICO



CIV	OBSERVACIONES	DIMENSIONES			CANTIDAD	TOTAL ACUMULADO
		Long.	Ancho	Alto		
14001156	CAPA DE RODADURA	85,00	6,90		1,00	586,50
	SUBTOTAL					586,50

OBSERVACIONES:

CONTRATISTA		INTERVENTORIA	
APROBÓ		APORBÓ	
Firma:		Firma:	
Nombre:	JAVIER HERNANDO PERILLA VACCA	Nombre:	SANDRA CARDOZO
Cargo:	DIRECTOR DE OBRA	Cargo:	DIRECTOR DE INTERVENTORIA

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA EJECUTADA

CONTROL DE OBRA


MEMORIA: 12 de 47


CONTRATO DE OBRA:	CO-137-2019	CONTRATISTA:	CONSULTORIA Y CONSTRUCCION - CON & CON S.A.S.	NIT:	830.041.411-0
OBJETO DEL CONTRATO:	EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS POR LA MODALIDAD DE MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS Y ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACION DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE LOS MARTIRES				

ACTA No.	3	PERIODO DE COBRO:	21/11/2020 AL 20/01/2021	ELABORÓ:	JAVIER HERNANDO PERILLA VACCA
UPZ:		BARRIO:			

ITEM:	4,08	DESCRIPCION:	BORDILLO PREFABRICADO A80 (Suministro e Instalación. Incluye 3cm Mortero de Nivelación 1:5)	UNIDAD:	ML

REGISTRO FOTOGRAFICO

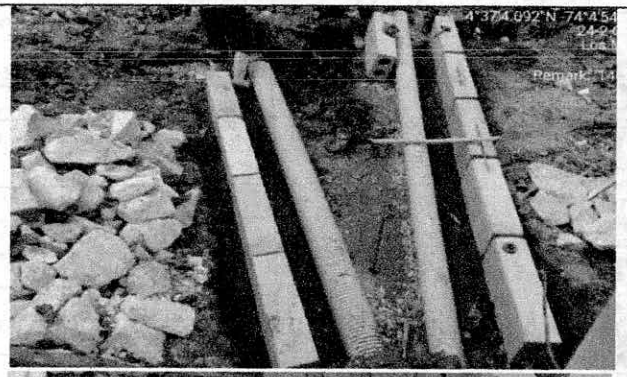

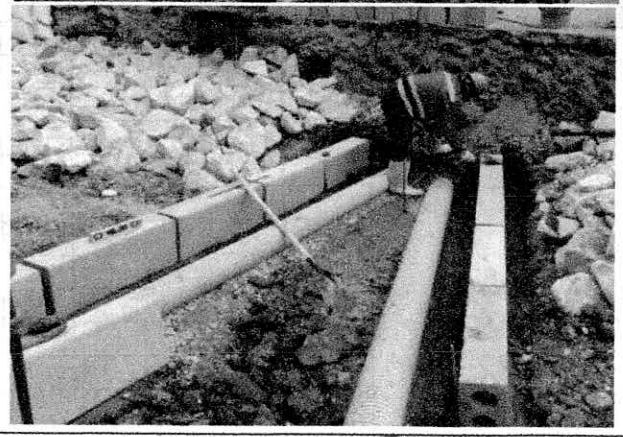

CIV	OBSERVACIONES	DIMENSIONES			CANTIDAD	TOTAL ACUMULADO
		Long.	Ancho	Alto		
14000126	PARA CONSTRUCCION DE CÁRCAMOS	10,50			1,00	10,50
14000126	PARA CONSTRUCCION DE CÁRCAMOS	11,30			1,00	11,30
14000126	PARA CONSTRUCCION DE CÁRCAMOS	10,20			1,00	10,20
14000126	PARA CONSTRUCCION DE CÁRCAMOS	10,45			1,00	10,45
14000126	PARA CONSTRUCCION DE CÁRCAMOS	10,00			1,00	10,00
14000126	PARA CONSTRUCCION DE CÁRCAMOS	9,80			1,00	9,80
14000126	PARA CONSTRUCCION DE CÁRCAMOS	9,40			1,00	9,40
14000126	PARA CONSTRUCCION DE CÁRCAMOS	9,40			1,00	9,40
14000126	PARA CONSTRUCCION DE CÁRCAMOS	9,80			1,00	9,80
14000126	PARA CONSTRUCCION DE CÁRCAMOS	8,00			1,00	8,00
14000178	PARA CONSTRUCCION DE CÁRCAMOS	12,00			1,00	12,00
SUBTOTAL						110,85

OBSERVACIONES:

CONTRATISTA	INTERVENTORIA
APROBÓ	APORBÓ
Firma:	Firma:
Nombre: JAVIER HERNANDO PERILLA VACCA	Nombre: SANDRA CARDOZO
Cargo: DIRECTOR DE OBRA	Cargo: DIRECTOR DE INTERVENTORIA

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA EJECUTADA

CONTROL DE OBRA

MEMORIA: 13 de 47

CONTRATO DE OBRA:	CO-137-2019	CONTRATISTA:	CONSULTORIA Y CONSTRUCCION - CON & CON S.A.S.	NIT:	830.041.411-0
OBJETO DEL CONTRATO:	EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS POR LA MODALIDAD DE MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS Y ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACION DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE LOS MARTIRES				
ACTA No.	3	PERIODO DE COBRO:	21/11/2020 AL 20/01/2021	ELABORÓ:	JAVIER HERNANDO PERILLA VACCA
UPZ:		BARRIO:			
ITEM:	4,09	DESCRIPCION:	SARDINEL TIPO A10 (Suministro e Instalación. Incluye 3cm Mortero 2000 PSI)	UNIDAD:	ML

REGISTRO FOTOGRAFICO





CIV	OBSERVACIONES	DIMENSIONES			CANTIDAD	TOTAL ACUMULADO
		Long.	Ancho	Alto		
14001156	RESPOSICION DEL EXISTENTE 2 COSTADOS	122,00			1,00	122,00
14001619	REPOSICION DEL COSTADO NORTE	53,00			1,00	53,00
14001619	REPOSICION DEL COSTADO SUR	44,00			1,00	44,00
14001616	REPOSICION DEL COSTADO SUR	37,50			1,00	37,50


MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA EJECUTADA

CONTROL DE OBRA

MEMORIA 14 de 47

CONTRATO DE OBRA:	CO-137-2019	CONTRATISTA:	CONSULTORIA Y CONSTRUCCION - CON & CON S.A.S.	NIT:	830.041.411-0
OBJETO DEL CONTRATO:	EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS POR LA MODALIDAD DE MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS Y ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACION DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE LOS MARTIRES				
ACTA No.	3	PERIODO DE COBRO:	21/11/2020 AL 20/01/2021	ELABORÓ:	JAVIER HERNANDO PERILLA VACCA
UPZ:		BARRIO:			
ITEM:	4,12	DESCRIPCION:	SARDINEL BAJO A85 PARA RAMPAS (Suministro e Instalación. Incluye 3cm Mortero 2000 PSI)	UNIDAD:	ML

REGISTRO FOTOGRAFICO

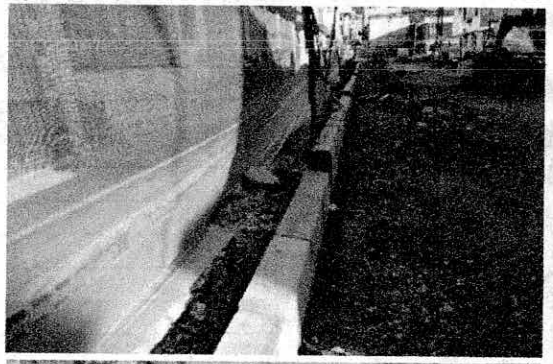



CIV	OBSERVACIONES	DIMENSIONES			CANTIDAD	TOTAL ACUMULADO
		Long.	Ancho	Alto		
14001156	RESPOSICION DEL EXISTENTE 2 COSTADOS	52,00			1,00	52,00
14001619	RESPOSICION DEL EXISTENTE	13,45			1,00	13,45
14001616	RESPOSICION DEL EXISTENTE	17,80			1,00	17,80

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA EJECUTADA


CONTROL DE OBRA

MEMORIA 15 de 47

CONTRATO DE OBRA:	CO-137-2019	CONTRATISTA:	CONSULTORIA Y CONSTRUCCION - CON & CON S.A.S.	NIT:	830.041.411-0
OBJETO DEL CONTRATO:	EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS POR LA MODALIDAD DE MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS Y ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACION DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE LOS MARTIRES				
ACTA No.	3	PERIODO DE COBRO:	21/11/2020 AL 20/01/2021	ELABORÓ:	JAVIER HERNANDO PERILLA VACCA
UPZ:		BARRIO:			
ITEM:	6,61	DESCRIPCION:	ACOMETIDA DOMICILIARIA DE 1/2" CON COLLAR DE DERIVACION DE 4" x 1/2". SUMINISTRO E INSTALACION. (Incluye tuberia PF, registros y accesorios, longitud promedio de 6.5m, incluye cajilla en polipropileno para medidor)	UNIDAD:	UN

REGISTRO FOTOGRAFICO



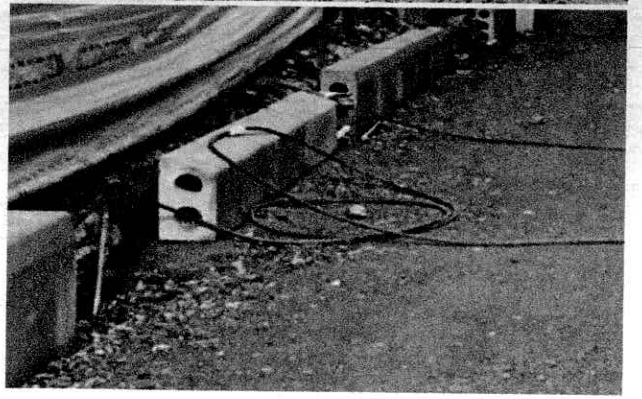

CIV	OBSERVACIONES	DIMENSIONES			CANTIDAD	TOTAL ACUMULADO
		Long.	Ancho	Alto		
14001156	PREDIO CL 2B # 25A - 60				1,00	1,00
14001156	PREDIO CL 2B # 25A - 50				2,00	2,00
14001156	PREDIO CL 2B # 25A - 42				1,00	1,00
14001156	PREDIO CL 2B # 25A - 36				1,00	1,00
14001156	PREDIO CL 2B # 25A - 30				2,00	2,00
14001156	PREDIO CL 2B # 25A - 14				3,00	3,00
14001619	PREDIO CL 1C # 19B - 07				1,00	1,00
14001619	PREDIO CL 1C # 19A - 45				1,00	1,00
14001619	PREDIO CL 1C # 19A - 31				1,00	1,00
14001619	PREDIO CL 1C # 19A - 35				1,00	1,00
14001619	PREDIO CL 1C # 19A - 07				1,00	1,00
14001616	PREDIO CL 1C # 19B - 21				2,00	2,00
14001616	PREDIO CL 1C # 19B - 29				2,00	2,00
14001616	PREDIO CL 1C # 19B - 35				1,00	1,00
14001616	PREDIO CL 1C # 19B - 43				2,00	2,00
14001616	PREDIO CL 1C # 19B - 53				1,00	1,00
14000126	PREDIO KR 24 # 22A - 06				1,00	1,00
14000126	PREDIO KR 24 # 22A - 14				1,00	1,00
14000126	PREDIO KR 24 # 22A - 24				1,00	1,00
14000126	PREDIO KR 24 # 22A - 30				1,00	1,00
	SUBTOTAL					27,00

OBSERVACIONES:

CONTRATISTA	INTERVENTORIA
APROBÓ	APORBÓ
Firma:	Firma:
Nombre: JAVIER HERNANDO PERILLA VACCA	Nombre: SANDRA CARDOZO
Cargo: DIRECTOR DE OBRA	Cargo: DIRECTOR DE INTERVENTORIA

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA EJECUTADA

CONTROL DE OBRA


MEMORIA 16 de 47

CONTRATO DE OBRA:	CO-137-2019	CONTRATISTA:	CONSULTORIA Y CONSTRUCCION - CON & CON S.A.S.	NIT:	830.041.411-0
OBJETO DEL CONTRATO:	EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS POR LA MODALIDAD DE MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS Y ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACION DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE LOS MARTIRES				

ACTA No.	3	PERIODO DE COBRO:	21/11/2020 AL 20/01/2021	ELABORÓ:	JAVIER HERNANDO PERILLA VACCA
UPZ:		BARRIO:			

ITEM:	6,61	DESCRIPCION:	ACOMETIDA DOMICILIARIA DE 1/2" CON COLLAR DE DERIVACION DE 4" x 1/2". SUMINISTRO E INSTALACION. (Incluye tuberia PF, registros y accesorios, longitud promedio de 6.5m, incluye cajilla en polipropileno para medidor)	UNIDAD:	UN

REGISTRO FOTOGRAFICO

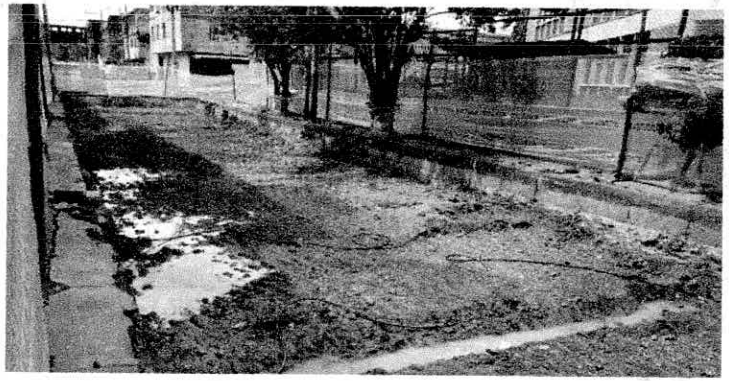

CIV	OBSERVACIONES	DIMENSIONES			CANTIDAD	TOTAL ACUMULADO
		Long.	Ancho	Alto		
14000126	PREDIO KR 24 # 22A - 42				1,00	1,00
14000126	PREDIO KR 24 # 22A - 54				1,00	1,00
14000126	PREDIO KR 24 # 22A - 58				1,00	1,00
14000126	PREDIO KR 24 # 22A - 76				1,00	1,00
14000126	PREDIO KR 24 # 22A - 84				1,00	1,00
	SUBTOTAL					5,00

OBSERVACIONES:

CONTRATISTA	INTERVENTORIA
APROBÓ	APORBÓ
Firma:	Firma:
Nombre: JAVIER HERNANDO PERILLA VACCA	Nombre: SANDRA CARDOZO
Cargo: DIRECTOR DE OBRA	Cargo: DIRECTOR DE INTERVENTORIA

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA EJECUTADA

CONTROL DE OBRA

MEMORIA: 17 de 47

CONTRATO DE OBRA:	CO-137-2019	CONTRATISTA:	CONSULTORIA Y CONSTRUCCION - CON & CON S.A.S.	NIT:	830.041.411-0
OBJETO DEL CONTRATO:	EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS POR LA MODALIDAD DE MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS Y ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACION DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE LOS MARTIRES				
ACTA No.	3	PERIODO DE COBRO:	21/11/2020 AL 20/01/2021	ELABORÓ:	JAVIER HERNANDO PERILLA VACCA
UPZ:		BARRIO:			
ITEM:	6,62	DESCRIPCION:	CONCRETO 4000 PSI IMPERMEABILIZADO (Hecho en Obra)	UNIDAD:	M3

REGISTRO FOTOGRAFICO



CIV	OBSERVACIONES	DIMENSIONES			CANTIDAD	TOTAL ACUMULADO
		Long.	Ancho	Alto		
14000126	DADOS PARA CONEXIONES DOMICILIARIAS	0,80	0,70	0,40	10,00	2,24
	SUBTOTAL					2,24

OBSERVACIONES:

CONTRATISTA	INTERVENTORIA
APROBÓ	APORBÓ
Firma:	Firma:
Nombre: JAVIER HERNANDO PERILLA VACCA	Nombre: SANDRA CARDOZO
Cargo: DIRECTOR DE OBRA	Cargo: DIRECTOR DE INTERVENTORIA

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA EJECUTADA

CONTROL DE OBRA

MEMORIA: 18 de 47

CONTRATO DE OBRA:	CO-137-2019	CONTRATISTA:	CONSULTORIA Y CONSTRUCCION - CON & CON S.A.S.	NIT:	830.041.411-0
OBJETO DEL CONTRATO:	EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS POR LA MODALIDAD DE MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS Y ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACION DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE LOS MARTIRES				
ACTA No.	3	PERIODO DE COBRO:	21/11/2020 AL 20/01/2021	ELABORÓ:	JAVIER HERNANDO PERILLA VACCA
UPZ:		BARRIO:			
ITEM:	7,01	DESCRIPCION:	EXCAVACION MANUAL PARA REDES PROFUNDIDAD 0m - 2m (Incluye Cargue)	UNIDAD:	M3

REGISTRO FOTOGRAFICO





CIV	OBSERVACIONES	DIMENSIONES			CANTIDAD	TOTAL ACUMULADO
		Long.	Ancho	Alto		
14001469	APIQUES CL 1F X KR 24B CRUCE GAS NATURAL	2,50	2,00	1,50	2,00	15,00
14001469	APIQUES CL 1F X KR 24B CRUCE AGUA POTABLE	2,50	1,50	1,50	2,00	11,25
14001481	APIQUES CL 1F X KR 24 CRUCE RED	2,50	2,00	1,50	2,00	15,00
14000126	TUBERIA PVC SANITARIA 8" DOMICILIARIAS	6,40	1,10	0,58	8,00	32,67
14000126	TUBERIA PVC 10" SUMIDEROS	11,00	1,10	0,63	2,00	15,25
14000126	TUBERIA TDP 4" PARA REPARACIONES EN CRUCE	11,00	0,60	0,42	3,00	8,32
14000126	TUBERIA TDP 4" PARA REPARACIONES EN CRUCE	9,00	0,60	0,43	4,00	9,29
14001367	APIQUES CL 1B X KR 27A CRUCE GAS NATURAL	2,00	2,00	1,60	2,00	12,80
14001156	TUBERIA PVC 10" SUMIDEROS	11,00	0,80	0,73	1,00	6,42
14000178	TUBERIA PVC SANITARIA 8" DOMICILIARIAS	6,80	0,85	0,82	7,00	33,18
14000178	TUBERIA PVC COLECTOR 12"	59,40	0,74	1,05	1,00	46,15
SUBTOTAL						205,32

OBSERVACIONES:

CONTRATISTA		INTERVENTORIA	
APROBÓ		APROBÓ	
Firma:		Firma:	
Nombre:	JAVIER HERNANDO PERILLA VACCA	Nombre:	SANDRA CARDOZO
Cargo:	DIRECTOR DE OBRA	Cargo:	DIRECTOR DE INTERVENTORIA

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA EJECUTADA

CONTROL DE OBRA

MEMORIA 19 de 47


CON & CON


CONTRATO DE OBRA:	CO-137-2019	CONTRATISTA:	CONSULTORIA Y CONSTRUCCION - CON & CON S.A.S.	NIT:	830.041.411-0
OBJETO DEL CONTRATO:	EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS POR LA MODALIDAD DE MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS Y ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACION DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE LOS MARTIRES				

ACTA No.	3	PERIODO DE COBRO:	21/11/2020 AL 20/01/2021	ELABORÓ:	JAVIER HERNANDO PERILLA VACCA
UPZ:				BARRIO:	

ITEM:	7,02	DESCRIPCION:	TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (distancia de transporte 21 Km). A distancia mayor del acarreo libre (90 m) en sitio autorizado por la entidad Ambiental competente.	UNIDAD:	M3

REGISTRO FOTOGRAFICO

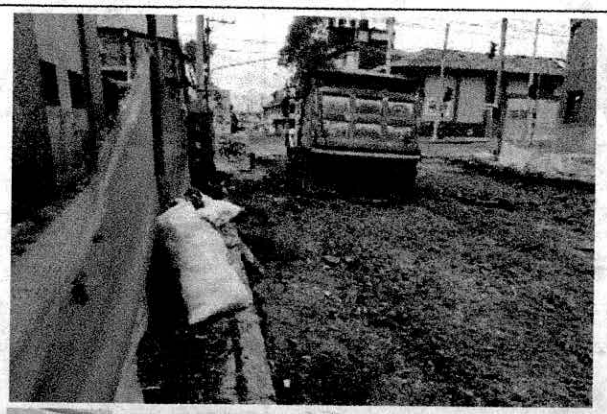

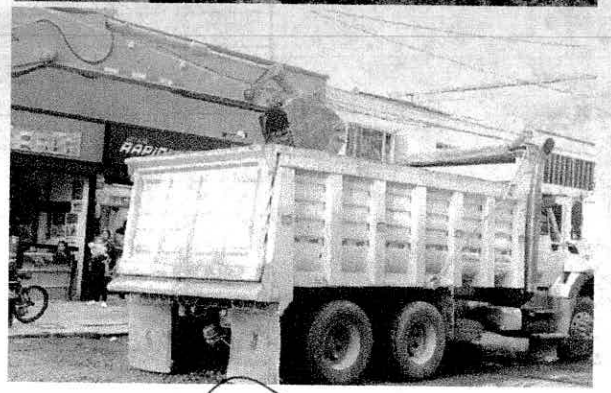

CIV	OBSERVACIONES	DIMENSIONES			CANTIDAD	TOTAL ACUMULADO
		Long.	Ancho	Alto		
14001469	7,01	15,00			1,30	19,50
14001469	7,01	11,25			1,30	14,63
14001481	7,01	15,00			1,30	19,50
14000126	7,01	32,67			1,30	42,47
14000126	7,01	15,25			1,30	19,82
14000126	7,01	8,32			1,30	10,81
14000126	7,01	9,29			1,30	12,07
14001367	7,01	12,80			1,30	16,64
14001156	7,01	6,42			1,30	8,35
14000178	7,01	33,18			1,30	43,13
14000178	7,01	46,15			1,30	60,00
SUBTOTAL						266,92

OBSERVACIONES:

CONTRATISTA

APROBÓ
Firma:

Nombre: JAVIER HERNANDO PERILLA VACCA
Cargo: DIRECTOR DE OBRA

INTERVENTORIA

APORBÓ
Firma:

Nombre: SANDRA CARDOZO
Cargo: DIRECTOR DE INTERVENTORIA

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA EJECUTADA

CONTROL DE OBRA

MEMORIA 20 de 47

CONTRATO DE OBRA:	CO-137-2019	CONTRATISTA:	CONSULTORIA Y CONSTRUCCION - CON & CON S.A.S.	NIT:	830.041.411-0
OBJETO DEL CONTRATO:	EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS POR LA MODALIDAD DE MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS Y ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACION DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE LOS MARTIRES				
ACTA No.	3	PERIODO DE COBRO:	21/11/2020 AL 20/01/2021	ELABORÓ:	JAVIER HERNANDO PERILLA VACCA
UPZ:		BARRIO:			
ITEM:	7,06	DESCRIPCION:	RELLENO EN RECEBO COMUN (Suministro e instalación Extendido manual, Humedecimiento y Compactación TRANSPORTE A 28 KM).	UNIDAD:	M3

REGISTRO FOTOGRAFICO





CIV	OBSERVACIONES	DIMENSIONES			CANTIDAD	TOTAL ACUMULADO
		Long.	Ancho	Alto		
14001156	TUBERIA PVC 10" SUMIDEROS	11,00	0,65	0,35	1,00	2,50
14000178	TUBERIA PVC SANITARIA 8" DOMICILIARIAS	6,20	0,75	0,65	7,00	21,16
14000178	TUBERIA PVC COLECTOR 12"	59,40	0,57	1,05	1,00	35,55
	SUBTOTAL					59,21

OBSERVACIONES:

CONTRATISTA	INTERVENTORIA
APROBÓ	APORBÓ
Firma:	Firma:
Nombre: JAVIER HERNANDO PERILLA VACCA	Nombre: SANDRA CARDOZO
Cargo: DIRECTOR DE OBRA	Cargo: DIRECTOR DE INTERVENTORIA


MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA EJECUTADA


CONTROL DE OBRA

MEMORIA: 21 de 47

CONTRATO DE OBRA:	CO-137-2019	CONTRATISTA:	CONSULTORIA Y CONSTRUCCION - CON & CON S.A.S.	NIT:	830.041.411-0
OBJETO DEL CONTRATO:	EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS POR LA MODALIDAD DE MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS Y ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACION DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE LOS MARTIRES				
ACTA No.	3	PERIODO DE COBRO:	21/11/2020 AL 20/01/2021	ELABORÓ:	JAVIER HERNANDO PERILLA VACCA
UPZ:		BARRIO:			
ITEM:	7,07	DESCRIPCION:	RELLENO EN TRITURADO DE 3/4`` (INCLUYE TRANSPORTE, SUMINISTRO, EXTENDIDO MANUAL Y COLOCACIÓN)	UNIDAD:	M3

REGISTRO FOTOGRAFICO

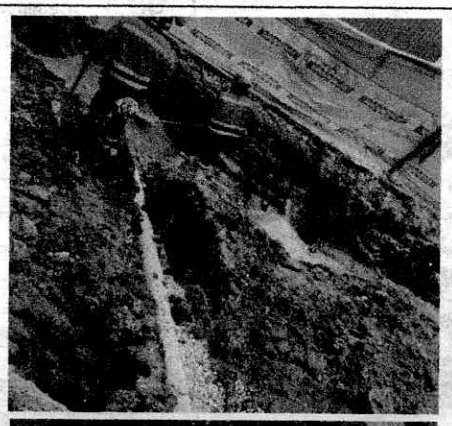

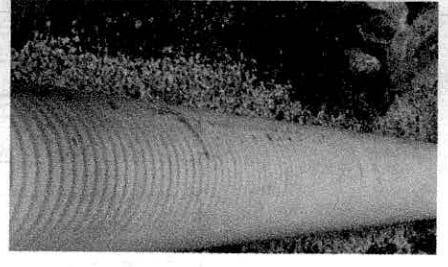

CIV	OBSERVACIONES	DIMENSIONES			CANTIDAD	TOTAL ACUMULADO
		Long.	Ancho	Alto		
14000126	TUBERIA PVC SANITARIA 8" DOMICILIARIAS	6,20	1,10	0,15	8,00	8,18
14000126	TUBERIA PVC SANITARIA 10" SUMIDEROS	10,10	1,10	0,15	2,00	3,33
14001156	TUBERIA PVC 10" SUMIDEROS	11,20	0,70	0,20	1,00	1,57
14000178	TUBERIA PVC SANITARIA 8" DOMICILIARIAS	6,30	0,34	0,60	7,00	9,00
14000178	TUBERIA PVC COLECTOR 12"	59,40	0,42	1,00	1,00	24,95
SUBTOTAL						47,03

OBSERVACIONES:

CONTRATISTA		INTERVENTORIA	
APROBÓ		APORBÓ	
Firma:		Firma:	
Nombre:	JAVIER HERNANDO PERILLA VACCA	Nombre:	SANDRA CARDOZO
Cargo:	DIRECTOR DE OBRA	Cargo:	DIRECTOR DE INTERVENTORIA

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA EJECUTADA

CONTROL DE OBRA

MEMORIA 22 de 47

CON & CON CONSULTORIA Y CONSTRUCCION

CONTRATO DE OBRA:	CO-137-2019	CONTRATISTA:	CONSULTORIA Y CONSTRUCCION - CON & CON S.A.S.	NIT:	830.041.411-0
OBJETO DEL CONTRATO:	EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS POR LA MODALIDAD DE MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS Y ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACION DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE LOS MARTIRES				

ACTA No.	3	PERIODO DE COBRO:	21/11/2020 AL 20/01/2021	ELABORÓ:	JAVIER HERNANDO PERILLA VACCA
UPZ:			BARRIO:		

ITEM:	7,27	DESCRIPCION:	TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA NTC 3722-1 D=8" (Incluye Suministro e Instalación)	UNIDAD:	ML

REGISTRO FOTOGRAFICO



CIV	OBSERVACIONES	DIMENSIONES			CANTIDAD	TOTAL ACUMULADO
		Long.	Ancho	Alto		
14000126	TUBERIA PVC SANITARIA 8" DOMICILIARIAS	6,50			8,00	52,00
14001619	PREDIO CL 1C # 19A - 09	6,00			1,00	6,00
14000178	DOMICILIARIAS PVC SANITARIA COSTADO SUR	6,50			7,00	45,50
	SUBTOTAL					103,50

OBSERVACIONES:

CONTRATISTA	INTERVENTORIA
APROBÓ	APORBÓ
Firma:	Firma:
Nombre: JAVIER HERNANDO PERILLA VACCA	Nombre: SANDRA CARDOZO
Cargo: DIRECTOR DE OBRA	Cargo: DIRECTOR DE INTERVENTORIA

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA EJECUTADA


CONTROL DE OBRA

MEMORIA: 23 de 47

CON & CON CONSULTORIA Y CONSTRUCCION

CONTRATO DE OBRA:	CO-137-2019	CONTRATISTA:	CONSULTORIA Y CONSTRUCCION - CON & CON S.A.S.	NIT:	830.041.411-0
OBJETO DEL CONTRATO:	EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS POR LA MODALIDAD DE MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS Y ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACION DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE LOS MARTIRES				
ACTA No.	3	PERIODO DE COBRO:	21/11/2020 AL 20/01/2021	ELABORÓ:	JAVIER HERNANDO PERILLA VACCA
UPZ:		BARRIO:			
ITEM:	7,28	DESCRIPCION:	TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA NTC 3722-1 D=10" (Incluye Suministro e Instalación)	UNIDAD:	ML

REGISTRO FOTOGRAFICO

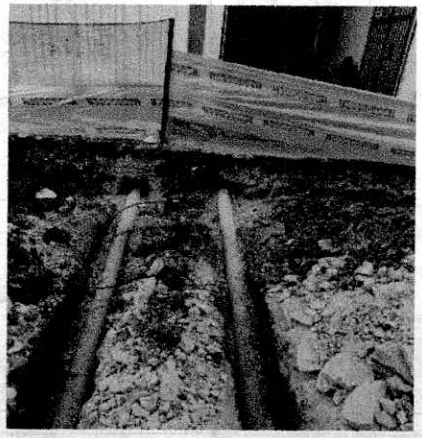

CIV	OBSERVACIONES	DIMENSIONES			CANTIDAD	TOTAL ACUMULADO
		Long.	Ancho	Alto		
14000126	TUBERIA PVC SANITARIA 10" SUMIDEROS	11,00			2,00	22,00
14001156	TUBERIA PVC SANITARIA 10" SUMIDEROS	11,50			1,00	11,50

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA EJECUTADA

CONTROL DE OBRA


MEMORIA: 24 de 47

CONTRATO DE OBRA:	CO-137-2019	CONTRATISTA:	CONSULTORIA Y CONSTRUCCION - CON & CON S.A.S.	NIT:	830.041.411-0
OBJETO DEL CONTRATO:	EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS POR LA MODALIDAD DE MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS Y ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACION DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE LOS MARTIRES				

ACTA No.	3	PERIODO DE COBRO:	21/11/2020 AL 20/01/2021	ELABORÓ:	JAVIER HERNANDO PERILLA VACCA
UPZ:				BARRIO:	

ITEM:	7,29	DESCRIPCION:	TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA NTC 3722-1 D=12" (Incluye Suministro e Instalación)	UNIDAD:	ML

REGISTRO FOTOGRAFICO

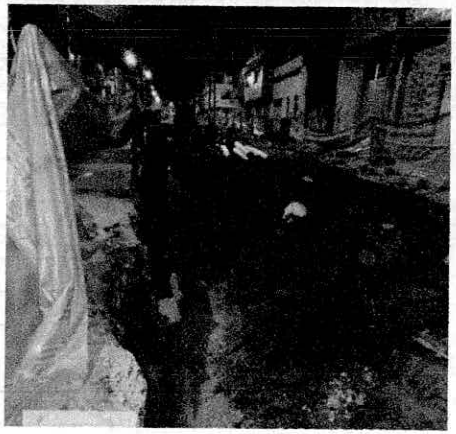

CIV	OBSERVACIONES	DIMENSIONES			CANTIDAD	TOTAL ACUMULADO
		Long.	Ancho	Alto		
14000178	REPOSICION RED EXISTENTE EN GRES	60,00			1,00	60,00


MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA EJECUTADA

CONTROL DE OBRA

MEMORIA 25 de 47

CONTRATO DE OBRA:	CO-137-2019	CONTRATISTA:	CONSULTORIA Y CONSTRUCCION - CON & CON S.A.S.	NIT:	830.041.411-0
OBJETO DEL CONTRATO:	EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS POR LA MODALIDAD DE MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS Y ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACION DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE LOS MARTIRES				
ACTA No.	3	PERIODO DE COBRO:	21/11/2020 AL 20/01/2021	ELABORÓ:	JAVIER HERNANDO PERILLA VACCA
UPZ:		BARRIO:			
ITEM:	7,44	DESCRIPCION:	DEMOLICION SUMIDERO EXISTENTE (Incluye Cargue)	UNIDAD:	UN

REGISTRO FOTOGRAFICO

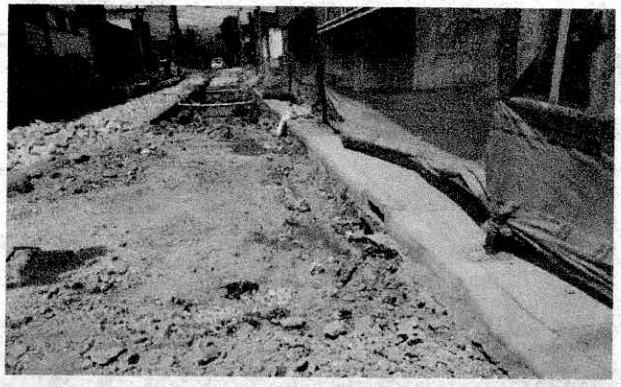

CIV	OBSERVACIONES	DIMENSIONES			CANTIDAD	TOTAL ACUMULADO
		Long.	Ancho	Alto		
14000126	DEMOL. SUMIDEROS EXISTENTES				2,00	2,00
14001469	DEMOL. SUMIDEROS EXISTENTES				2,00	2,00
14001481	DEMOL. SUMIDEROS EXISTENTES				2,00	2,00
14000178	DEMOL. SUMIDEROS EXISTENTES				2,00	2,00
	SUBTOTAL					8,00

OBSERVACIONES:

CONTRATISTA		INTERVENTORIA	
APROBÓ		APORBÓ	
Firma:		Firma:	
Nombre:	JAVIER HERNANDO PERILLA VACCA	Nombre:	SANDRA CARDOZO
Cargo:	DIRECTOR DE OBRA	Cargo:	DIRECTOR DE INTERVENTORIA

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA EJECUTADA


CONTROL DE OBRA

MEMORIA: 26 de 47

CON & CON CONSULTORIA Y CONSTRUCCION

CONTRATO DE OBRA:	CO-137-2019	CONTRATISTA:	CONSULTORIA Y CONSTRUCCION - CON & CON S.A.S.	NIT:	830.041.411-0
OBJETO DEL CONTRATO:	EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS POR LA MODALIDAD DE MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS Y ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACION DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE LOS MARTIRES				
ACTA No.	3	PERIODO DE COBRO:	21/11/2020 AL 20/01/2021	ELABORÓ:	JAVIER HERNANDO PERILLA VACCA
UPZ:		BARRIO:			
ITEM:	NP 1	DESCRIPCION:	SUBBASE GRANULAR CLASE B (SBG_B) CON RECICLADO DE CONCRETO (Suministro, Extendido, Nivelación, Humedecimiento y Compactación con vibrocompactador)	UNIDAD:	M3

REGISTRO FOTOGRAFICO

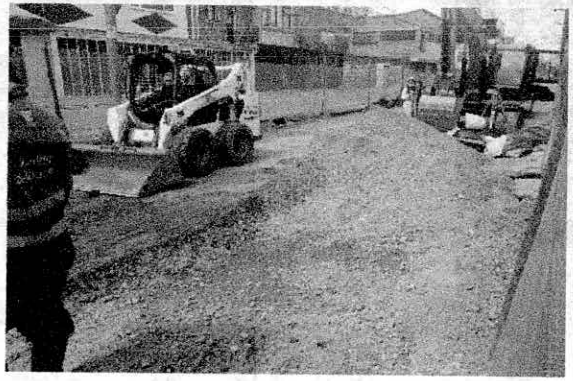

CIV	OBSERVACIONES	DIMENSIONES			CANTIDAD	TOTAL ACUMULADO
		Long.	Ancho	Alto		
14000126	PARA CONF. ESTRUCTURA - MEDIA CALZADA	97,00	5,45	0,22	1,00	116,30

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA EJECUTADA

CONTROL DE OBRA

MEMORIA: 27 de 47

CONTRATO DE OBRA:	CO-137-2019	CONTRATISTA:	CONSULTORIA Y CONSTRUCCION - CON & CON S.A.S.	NIT:	830.041.411-0
OBJETO DEL CONTRATO:	EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS POR LA MODALIDAD DE MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS Y ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACION DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE LOS MARTIRES				
ACTA No.	3	PERIODO DE COBRO:	21/11/2020 AL 20/01/2021	ELABORÓ:	JAVIER HERNANDO PERILLA VACCA
UPZ:		BARRIO:			
ITEM:	NP 2	DESCRIPCION:	BASE GRANULAR CLASE B (BG_B) CON RECICLADO DE CONCRETO (Suministro, Extendido, Nivelación, Humedecimiento y Compactación con vibrocompactador)	UNIDAD:	M3

REGISTRO FOTOGRAFICO



CIV	OBSERVACIONES	DIMENSIONES			CANTIDAD	TOTAL ACUMULADO
		Long.	Ancho	Alto		
14000126	PARA CONF. ESTRUCTURA - MEDIA CALZADA	97,00	5,45	0,22	1,00	116,30


MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA EJECUTADA

CONTROL DE OBRA

MEMORIA: 28 de 47

CONTRATO DE OBRA:	CO-137-2019	CONTRATISTA:	CONSULTORIA Y CONSTRUCCION - CON & CON S.A.S.	NIT:	830.041.411-0
OBJETO DEL CONTRATO:	EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS POR LA MODALIDAD DE MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS Y ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACION DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE LOS MARTIRES				
ACTA No.	3	PERIODO DE COBRO:	21/11/2020 AL 20/01/2021	ELABORÓ:	JAVIER HERNANDO PERILLA VACCA
UPZ:		BARRIO:			
ITEM:	NP 4	DESCRIPCION:	ESTABILIZACIÓN DE SUBRASANTE CON RAJÓN, INCLUYE EQUIPO DE COMPACTACIÓN (Suministro, extendido a mano, nivelación y compactación con retroexcavadora sobre oruga y benitin de 1 tonelada incluyen operario y	UNIDAD:	M3

REGISTRO FOTOGRAFICO

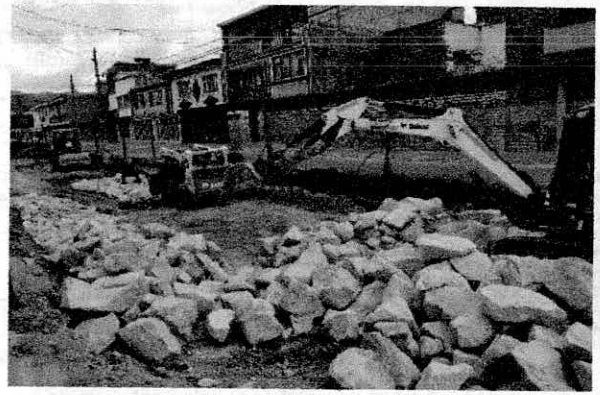



CIV	OBSERVACIONES	DIMENSIONES			CANTIDAD	TOTAL ACUMULADO
		Long.	Ancho	Alto		
14001469	CONFORMACION DE ESTRUCTURA	45,00	8,90	0,35	1,00	140,18
14001481	CONFORMACION DE ESTRUCTURA	48,00	8,90	0,35	1,00	149,52
14000126	PARA CONF. ESTRUCTURA - MEDIA CALZADA	96,00	5,45	0,35	1,00	183,12
14000178	PARA CONF. ESTRUCTURA - MEDIA CALZADA	72,40	4,90	0,35	1,00	124,17
14001156	FALLO POR SUBRASANTE BLANDA	11,50	3,50	0,50	1,00	20,13
14001367	FALLO POR SUBRASANTE BLANDA	19,65	5,00	0,60	1,00	58,95
14000178	FALLO POR SUBRASANTE BLANDA	11,75	6,20	0,60	1,00	43,71
14000126	FALLO POR SUBRASANTE BLANDA	15,20	4,80	0,70	1,00	51,07
14000126	FALLO POR TUBERIA GRES COLAPSADA	13,70	5,80	0,80	1,00	63,57
14000126	FALLO POR TUBERIA GRES COLAPSADA	13,40	4,90	0,80	1,00	52,53
	SUBTOTAL					886,93

OBSERVACIONES:

CONTRATISTA		INTERVENTORIA	
APROBÓ		APORBÓ	
Firma:		Firma:	
Nombre:	JAVIER HERNANDO PERILLA VACCA	Nombre:	SANDRA CARDOZO
Cargo:	DIRECTOR DE OBRA	Cargo:	DIRECTOR DE INTERVENTORIA


MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA EJECUTADA

CONTROL DE OBRA

MEMORIA 29 de 47

CONTRATO DE OBRA:	CO-137-2019	CONTRATISTA:	CONSULTORIA Y CONSTRUCCION - CON & CON S.A.S.	NIT:	830.041.411-0
OBJETO DEL CONTRATO:	EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS POR LA MODALIDAD DE MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS Y ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACION DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE LOS MARTIRES				
ACTA No.	3	PERIODO DE COBRO:	21/11/2020 AL 20/01/2021	ELABORÓ:	JAVIER HERNANDO PERILLA VACCA
UPZ:		BARRIO:			
ITEM:	NP 8	DESCRIPCION:	PLACA CUBIERTA D=1.70m POZO INSPEC. (Fundida en Sitio. Inc. Sum, Formalet., Refuerzo e Inst. Incl.Tapa en Polipropileno)	UNIDAD:	UN

REGISTRO FOTOGRAFICO

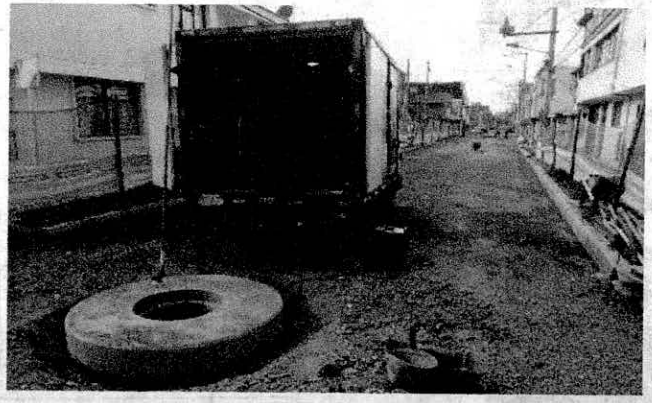

CIV	OBSERVACIONES	DIMENSIONES			CANTIDAD	TOTAL ACUMULADO
		Long.	Ancho	Alto		
14001156	CAMBIO PLACAS SUPERIORES DE POZOS				2,00	2,00

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA EJECUTADA

CONTROL DE OBRA


MEMORIA: 30 de 47

CONTRATO DE OBRA:	CO-137-2019	CONTRATISTA:	CONSULTORIA Y CONSTRUCCION - CON & CON S.A.S.	NIT:	830.041.411-0
OBJETO DEL CONTRATO:	EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS POR LA MODALIDAD DE MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS Y ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACION DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE LOS MARTIRES				

ACTA No.	3	PERIODO DE COBRO:	21/11/2020 AL 20/01/2021	ELABORÓ:	JAVIER HERNANDO PERILLA VACCA
UPZ:				BARRIO:	

ITEM:	NP 10	DESCRIPCION:	DEMOLICIÓN CONCRETO ESTRUCTURAL (Incluye Cargue manual). No incluye transporte y disposición final de sobrantes.	UNIDAD:	M3

REGISTRO FOTOGRAFICO

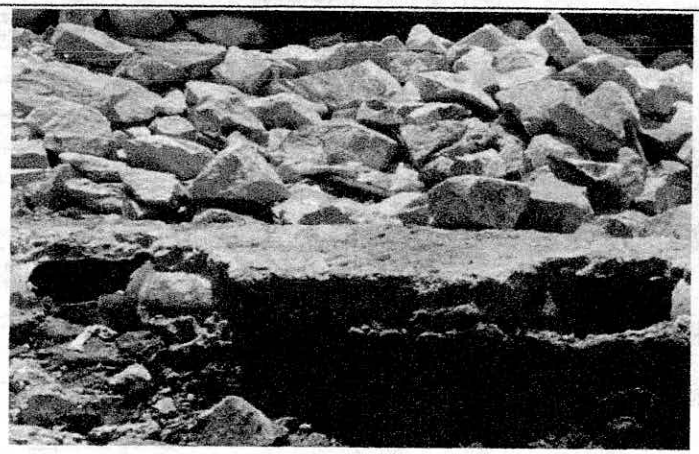

CIV	OBSERVACIONES	DIMENSIONES			CANTIDAD	TOTAL ACUMULADO
		Long.	Ancho	Alto		
14000126	DEMOL. COLECTOR PARA CONEXIÓN DOMICIL	0,80	0,70	0,40	10,00	2,24

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA EJECUTADA

CONTROL DE OBRA

MEMORIA: 31 de 47

CONTRATO DE OBRA:	CO-137-2019	CONTRATISTA:	CONSULTORIA Y CONSTRUCCION - CON & CON S.A.S.	NIT:	830.041.411-0
OBJETO DEL CONTRATO:	EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS POR LA MODALIDAD DE MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS Y ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACION DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE LOS MARTIRES				
ACTA No.	3	PERIODO DE COBRO:	21/11/2020 AL 20/01/2021	ELABORÓ:	JAVIER HERNANDO PERILLA VACCA
UPZ:				BARRIO:	
ITEM:	NP 12	DESCRIPCION:	DEMOLICIÓN DE CONCRETO: ESPESORES 8cm A 15cm. (Incluye retiro de material, transporte y disposición final de escombros en sitio autorizado).	UNIDAD:	M3

REGISTRO FOTOGRAFICO



CIV	OBSERVACIONES	DIMENSIONES			CANTIDAD	TOTAL ACUMULADO
		Long.	Ancho	Alto		
14001469	PROTECCION TUBERIA DE GRES EXISTENTE	43,65	0,65	0,15	1,00	4,26
14001469	PROTECCION TUBERIA DE GRES EXISTENTE	5,40	0,40	0,15	5,00	1,62
14001481	PROTECCION TUBERIA DE GRES EXISTENTE	45,10	0,65	0,15	1,00	4,40
SUBTOTAL						10,27

OBSERVACIONES:

CONTRATISTA	INTERVENTORIA
APROBÓ	APORBÓ
Firma:	Firma:
Nombre: JAVIER HERNANDO PERILLA VACCA	Nombre: SANDRA CARDOZO
Cargo: DIRECTOR DE OBRA	Cargo: DIRECTOR DE INTERVENTORIA

42


MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA EJECUTADA

CONTROL DE OBRA

MEMORIA 32 de 47

CONTRATO DE OBRA:	CO-137-2019	CONTRATISTA:	CONSULTORIA Y CONSTRUCCION - CON & CON S.A.S.	NIT:	830.041.411-0
OBJETO DEL CONTRATO:	EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS POR LA MODALIDAD DE MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS Y ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACION DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE LOS MARTIRES				
ACTA No.	3	PERIODO DE COBRO:	21/11/2020 AL 20/01/2021	ELABORÓ:	JAVIER HERNANDO PERILLA VACCA
UPZ:		BARRIO:			
ITEM:	NP 17	DESCRIPCION:	CORTE DE PAVIMENTO - INCLUYE EQUIPO: CORTADORA DE CONCRETO INCLUYE OPERARIO Y COMBUSTIBLE. INCLUYE DISCO DIAMANTADO ASFALTO-CONCRETO 350 mm, AGUA Y MANO DE OBRA	UNIDAD:	ML

REGISTRO FOTOGRAFICO

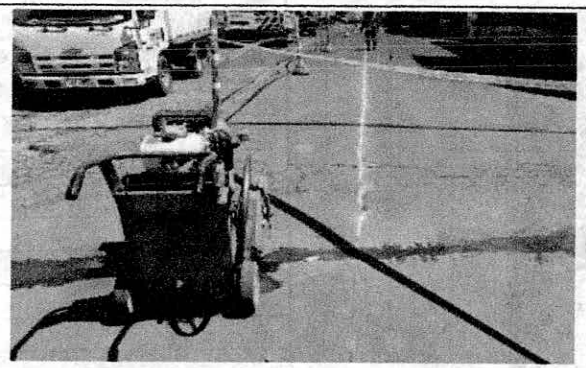



CIV	OBSERVACIONES	DIMENSIONES			CANTIDAD	TOTAL ACUMULADO
		Long.	Ancho	Alto		
14001156	PARA EMPALME CON ASFALTO EXISTENTE		11,30		1,00	11,30
14001156	PARA EMPALME CON ASFALTO EXISTENTE		11,83		1,00	11,83
14000126	PARA INTERVENCION DE MEDIA CALZADA	104,25			1,00	104,25
14000178	PARA INTERVENCION DE MEDIA CALZADA	80,00			1,00	80,00
14001367	PARA INTERVENCION DE MEDIA CALZADA	95,50			1,00	95,50
	SUBTOTAL					302,88

OBSERVACIONES:

CONTRATISTA	INTERVENTORIA
APROBÓ	APORBÓ
Firma:	Firma:
Nombre: JAVIER HERNANDO PERILLA VACCA	Nombre: SANDRA CARDOZO
Cargo: DIRECTOR DE OBRA	Cargo: DIRECTOR DE INTERVENTORIA


MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA EJECUTADA


CONTROL DE OBRA

MEMORIA: 33 de 47

CONTRATO DE OBRA:	CO-137-2019	CONTRATISTA:	CONSULTORIA Y CONSTRUCCION - CON & CON S.A.S.	NIT:	830.041.411-0
OBJETO DEL CONTRATO:	EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS POR LA MODALIDAD DE MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS Y ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACION DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE LOS MARTIRES				
ACTA No.	3	PERIODO DE COBRO:	21/11/2020 AL 20/01/2021	ELABORÓ:	JAVIER HERNANDO PERILLA VACCA
UPZ:		BARRIO:			
ITEM:	NP 25	DESCRIPCION:	INVESTIGACION DE REDES PARA CIRCUITOS DE SEMAFORIZACION	UNIDAD:	UN

REGISTRO FOTOGRAFICO

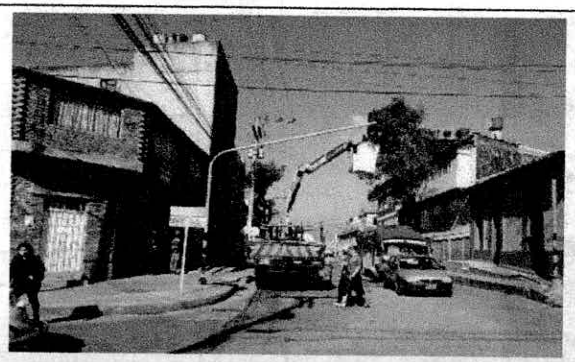

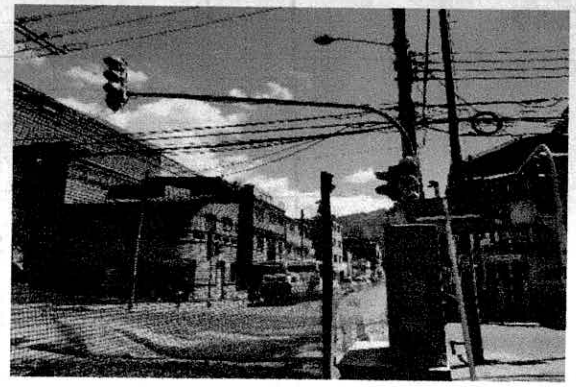

CIV	OBSERVACIONES	DIMENSIONES			CANTIDAD	TOTAL ACUMULADO
		Long.	Ancho	Alto		
14001469	EN SEMAFOROS DE LA CL 1F X KR 24B				1,00	1,00
14001481	EN SEMAFOROS DE LA CL 1F X KR 24				1,00	1,00


MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA EJECUTADA

CONTROL DE OBRA

MEMORIA: 34 de 47

CONTRATO DE OBRA:	CO-137-2019	CONTRATISTA:	CONSULTORIA Y CONSTRUCCION - CON & CON S.A.S.	NIT:	830.041.411-0
OBJETO DEL CONTRATO:	EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS POR LA MODALIDAD DE MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS Y ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACION DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE LOS MARTIRES				
ACTA No.	3	PERIODO DE COBRO:	21/11/2020 AL 20/01/2021	ELABORÓ:	JAVIER HERNANDO PERILLA VACCA
UPZ:		BARRIO:			
ITEM:	NP 26	DESCRIPCION:	LAVADO Y SONDEO DE REDES DE ALCANTARILLADO ENTRE 6" Y 16" DE DIÁMETRO Y CON GRADO DE COLMATACIÓN MENOR DEL 30%. INCL MANO DE OBRA IDÓNEA, SEÑALIZACIÓN BÁSICA, SUMIN DE COMBUSTIBLE Y AGUA.	UNIDAD:	ML

REGISTRO FOTOGRAFICO

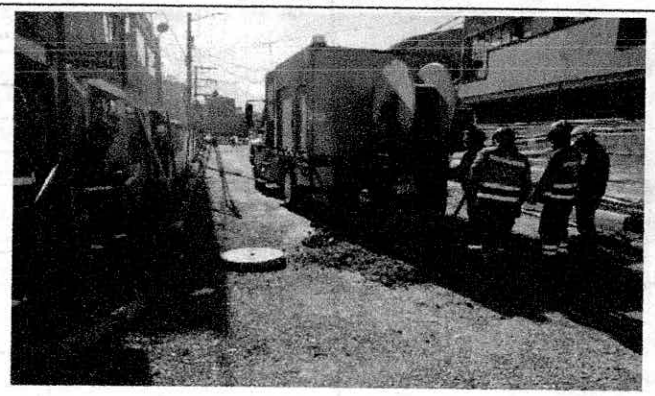

CIV	OBSERVACIONES	DIMENSIONES			CANTIDAD	TOTAL ACUMULADO
		Long.	Ancho	Alto		
14001156	TUBERIA PVC NOVAFORT 14" RENOVADA	78,40			1,00	78,40

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA EJECUTADA

CONTROL DE OBRA

MEMORIA 35 de 47

CON & CON CONSULTORIA Y CONSTRUCCION

CONTRATO DE OBRA:	CO-137-2019	CONTRATISTA:	CONSULTORIA Y CONSTRUCCION - CON & CON S.A.S.	NIT:	830.041.411-0
OBJETO DEL CONTRATO:	EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS POR LA MODALIDAD DE MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS Y ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACION DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE LOS MARTIRES				
ACTA No.	3	PERIODO DE COBRO:	21/11/2020 AL 20/01/2021	ELABORÓ:	JAVIER HERNANDO PERILLA VACCA
UPZ:		BARRIO:			
ITEM:	NP 27	DESCRIPCION:	LAVADO Y SONDEO DE REDES DE ALCANTARILLADO ENTRE 18" Y 36" DE DIÁMETRO Y CON GRADO DE COLMATACIÓN MENOR DEL 30%. INCLUYE MANO DE OBRA IDÓNEA, SEÑALIZACIÓN BÁSICA, SUMIN DE COMBUSTIBLE Y	UNIDAD:	ML

REGISTRO FOTOGRAFICO



CIV	OBSERVACIONES	DIMENSIONES			CANTIDAD	TOTAL ACUMULADO
		Long.	Ancho	Alto		
14000126	TUBERIA EXISTENTE EN LADRILLO 22"	100,00			1,00	100,00
14001367	TUBERIA EXISTENTE EN GRES 24"	88,00			1,00	88,00
	SUBTOTAL					188,00

OBSERVACIONES:

CONTRATISTA	INTERVENTORIA
APROBÓ	APORBÓ
Firma:	Firma:
Nombre: JAVIER HERNANDO PERILLA VACCA	Nombre: SANDRA CARDOZO
Cargo: DIRECTOR DE OBRA	Cargo: DIRECTOR DE INTERVENTORIA

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA EJECUTADA

CONTROL DE OBRA


MEMORIA 36 de 47

CONTRATO DE OBRA:	CO-137-2019	CONTRATISTA:	CONSULTORIA Y CONSTRUCCION - CON & CON S.A.S.	NIT:	830.041.411-0
OBJETO DEL CONTRATO:	EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS POR LA MODALIDAD DE MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS Y ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACION DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE LOS MARTIRES				

ACTA No.	3	PERIODO DE COBRO:	21/11/2020 AL 20/01/2021	ELABORÓ:	JAVIER HERNANDO PERILLA VACCA
UPZ:		BARRIO:			

ITEM:	NP 29	DESCRIPCION:	INSPECCIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO CON SISTEMAS CCTV PARA DIÁMETROS ENTRE 6" A 36"	UNIDAD:	ML

REGISTRO FOTOGRAFICO

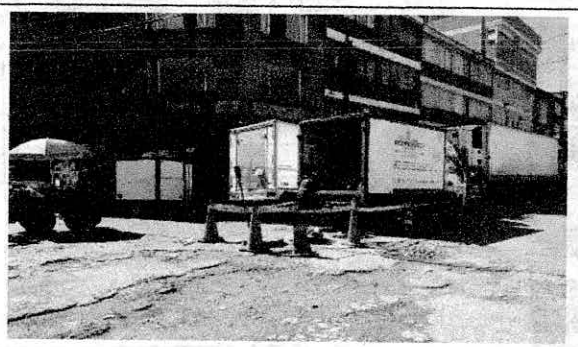

CIV	OBSERVACIONES	DIMENSIONES			CANTIDAD	TOTAL ACUMULADO
		Long.	Ancho	Alto		
14001156	TUBERIA PVC NOVAFORT 14" RENOVADA	78,40			1,00	78,40
14000126	TUBERIA EXISTENTE EN LADRILLO 22"	100,00			1,00	100,00
14001367	TUBERIA EXISTENTE EN GRES 24"	88,00			1,00	88,00

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA EJECUTADA


CONTROL DE OBRA

MEMORIA: 37 de 47

CONTRATO DE OBRA:	CO-137-2019	CONTRATISTA:	CONSULTORIA Y CONSTRUCCION - CON & CON S.A.S.	NIT:	830.041.411-0
OBJETO DEL CONTRATO:	EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS POR LA MODALIDAD DE MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS Y ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACION DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE LOS MARTIRES				
ACTA No.	3	PERIODO DE COBRO:	21/11/2020 AL 20/01/2021	ELABORÓ:	JAVIER HERNANDO PERILLA VACCA
UPZ:		BARRIO:			
ITEM:	NP 34	DESCRIPCION:	CARCAMO TIPO PLACA PARA PROTECCIÓN DE TUBO EN POLIETILENO D= 10", 12", 14" Y 16" (Incluye relleno en arena de peña, refuerzo, concreto de 2000 PSI y 4000 PSI, formaleta y transporte de petreos).	UNIDAD:	ML

REGISTRO FOTOGRAFICO



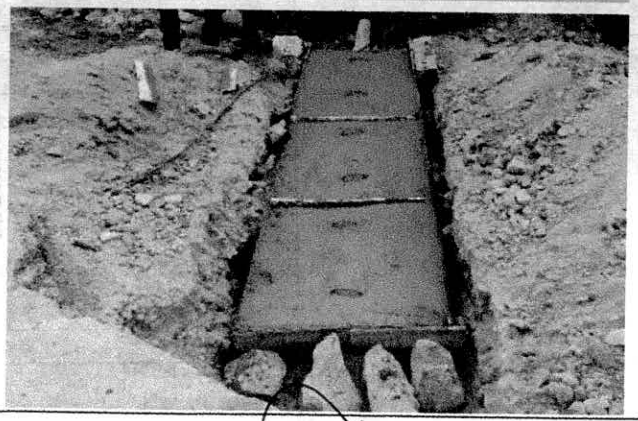

CIV	OBSERVACIONES	DIMENSIONES			CANTIDAD	TOTAL ACUMULADO
		Long.	Ancho	Alto		
14000126	PARA PROTECCION DE TUBERÍAS DOMICILIARIAS	61,40			1,00	61,40
14000178	PARA PROTECCION DE TUBERÍAS DOMICILIARIAS	7,10			1,00	7,10
	SUBTOTAL					68,50

OBSERVACIONES:

CONTRATISTA	INTERVENTORIA
APROBÓ	APORBÓ
Firma:	Firma:
Nombre: JAVIER HERNANDO PERILLA VACCA	Nombre: SANDRA CARDOZO
Cargo: DIRECTOR DE OBRA	Cargo: DIRECTOR DE INTERVENTORIA

45

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA EJECUTADA

CONTROL DE OBRA

MEMORIA: 38 de 47

CONTRATO DE OBRA:	CO-137-2019	CONTRATISTA:	CONSULTORIA Y CONSTRUCCION - CON & CON S.A.S.	NIT:	830.041.411-0
OBJETO DEL CONTRATO:	EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS POR LA MODALIDAD DE MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS Y ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACION DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE LOS MARTIRES				
ACTA No.	3	PERIODO DE COBRO:	21/11/2020 AL 20/01/2021	ELABORÓ:	JAVIER HERNANDO PERILLA VACCA
UPZ:		BARRIO:			
ITEM:	NP 35	DESCRIPCION:	TRANSPORTE DE EQUIPO DE CINCO TONELADAS POR VIAJE DIURNO SIN ESCOLTA	UNIDAD:	VIAJE

REGISTRO FOTOGRAFICO



CIV	OBSERVACIONES	DIMENSIONES			CANTIDAD	TOTAL ACUMULADO
		Long.	Ancho	Alto		
14001156	SALIDA MINICARGADOR				1,00	1,00
14001619	SALIDA MINICARGADOR				1,00	1,00
14001469	INGRESO MINICARGADOR				1,00	1,00
14000126	INGRESO MINICARGADOR				1,00	1,00
14001367	INGRESO MINICARGADOR				1,00	1,00
14000178	INGRESO MINICARGADOR					
SUBTOTAL						5,00

OBSERVACIONES:

CONTRATISTA	INTERVENTORIA
APROBÓ	APORBÓ
Firma:	Firma:
Nombre: JAVIER HERNANDO PERILLA VACCA	Nombre: SANDRA CARDOZO
Cargo: DIRECTOR DE OBRA	Cargo: DIRECTOR DE INTERVENTORIA


MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA EJECUTADA

CONTROL DE OBRA

MEMORIA: 39 de 47

CONTRATO DE OBRA:	CO-137-2019	CONTRATISTA:	CONSULTORIA Y CONSTRUCCION - CON & CON S.A.S.	NIT:	830.041.411-0
OBJETO DEL CONTRATO:	EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS POR LA MODALIDAD DE MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS Y ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACION DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE LOS MARTIRES				
ACTA No.	3	PERIODO DE COBRO:	21/11/2020 AL 20/01/2021	ELABORÓ:	JAVIER HERNANDO PERILLA VACCA
UPZ:				BARRIO:	
ITEM:	NP 36	DESCRIPCION:	TRANSPORTE DE EQUIPO DE DIEZ TONELADAS POR VIAJE DIURNO SIN ESCOLTA	UNIDAD:	VIAJE

REGISTRO FOTOGRAFICO

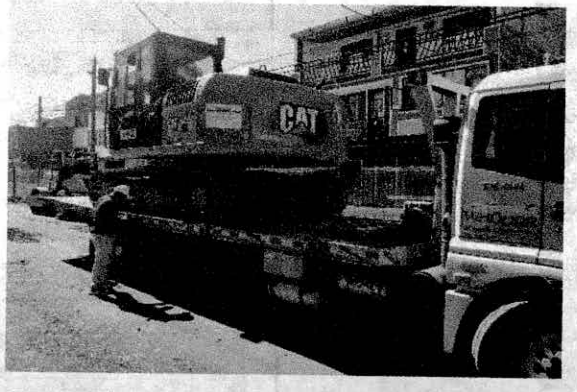



CIV	OBSERVACIONES	DIMENSIONES			CANTIDAD	TOTAL ACUMULADO
		Long.	Ancho	Alto		
14001156	SALIDA RETROEXCAVADORA				1,00	1,00
14001616	SALIDA RETROEXCAVADORA				1,00	1,00
14001156	INGRESO Y SALIDA VIBROCOMPACTADOR				2,00	2,00
14001616	INGRESO Y SALIDA VIBROCOMPACTADOR				2,00	2,00
14001469	INGRESO Y SALIDA RETROEXCAVADORA				2,00	2,00
14000126	INGRESO Y SALIDA RETROEXCAVADORA				2,00	2,00
14001156	INGRESO Y SALIDA FINISHER				2,00	2,00
14001156	INGRESO Y SALIDA COMPACTADOR ASFALTO				2,00	2,00
14001367	INGRESO RETROEXCAVADORA				1,00	1,00
14000178	INGRESO RETROEXCAVADORA				1,00	1,00
SUBTOTAL						16,00

OBSERVACIONES:

CONTRATISTA	INTERVENTORIA
APROBÓ	APORBÓ
Firma:	Firma:
Nombre: JAVIER HERNANDO PERILLA VACCA	Nombre: SANDRA CARDOZO
Cargo: DIRECTOR DE OBRA	Cargo: DIRECTOR DE INTERVENTORIA

46


MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA EJECUTADA

CONTROL DE OBRA

MEMORIA 40 de 47

CONTRATO DE OBRA:	CO-137-2019	CONTRATISTA:	CONSULTORIA Y CONSTRUCCION - CON & CON S.A.S.	NIT:	830.041.411-0
OBJETO DEL CONTRATO:	EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS POR LA MODALIDAD DE MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS Y ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACION DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE LOS MARTIRES				
ACTA No.	3	PERIODO DE COBRO:	21/11/2020 AL 20/01/2021	ELABORÓ:	JAVIER HERNANDO PERILLA VACCA
UPZ:		BARRIO:			
ITEM:	NP 40	DESCRIPCION:	BANDERERO (INCLUYE ALQUILER DE PALETA PARE-SIGA EN POLIETILENO).	UNIDAD:	H/ME

REGISTRO FOTOGRAFICO

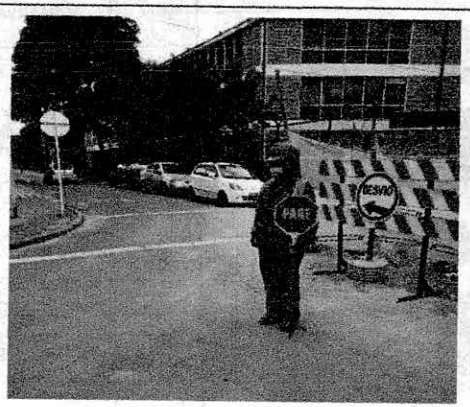

CIV	OBSERVACIONES	DIMENSIONES			CANTIDAD	TOTAL ACUMULADO
		Long.	Ancho	Alto		
14001469	CONTROL INGRESO Y SALIDA VOLQUETAS				1,00	1,00
14001481	CONTROL INGRESO Y SALIDA VOLQUETAS				1,00	1,00
14000126	CONTROL INGRESO Y SALIDA VOLQUETAS				2,00	2,00
14000178	CONTROL INGRESO Y SALIDA VOLQUETAS				1,00	1,00
14001156	CONTROL INGRESO Y SALIDA VOLQUETAS				1,00	1,00
14001619	CONTROL INGRESO Y SALIDA VOLQUETAS				1,00	1,00
14001367	CONTROL INGRESO Y SALIDA VOLQUETAS				2,00	2,00
SUBTOTAL						9,00

OBSERVACIONES:

CONTRATISTA	INTERVENTORIA
APROBÓ	APROBÓ
Firma:	Firma:
Nombre: JAVIER HERNANDO PERILLA VACCA	Nombre: SANDRA CARDOZO
Cargo: DIRECTOR DE OBRA	Cargo: DIRECTOR DE INTERVENTORIA

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA EJECUTADA


CONTROL DE OBRA


MEMORIA 41 de 47

CON & CON CONSULTORIA Y CONSTRUCCION

CONTRATO DE OBRA:	CO-137-2019	CONTRATISTA:	CONSULTORIA Y CONSTRUCCION - CON & CON S.A.S.	NIT:	830.041.411-0
OBJETO DEL CONTRATO:	EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS POR LA MODALIDAD DE MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS Y ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACION DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE LOS MARTIRES				
ACTA No.	3	PERIODO DE COBRO:	21/11/2020 AL 20/01/2021	ELABORÓ:	JAVIER HERNANDO PERILLA VACCA
UPZ:		BARRIO:			
ITEM:	NP 43	DESCRIPCION:	ALQUILER DE CERRAMIENTO TIPO 2: CONSTA DE POSTES ROLLIZOS DE 1.90mt DE ALTURA LIBRE CON BASE EN CONCRETO 1500 PSI DE 30cm x 30cm, DOBLE CINTA PELIGRO CAL. 4, TELA PARA CERRAMIENTO.(INCL	UNIDAD:	ML/ME

REGISTRO FOTOGRAFICO

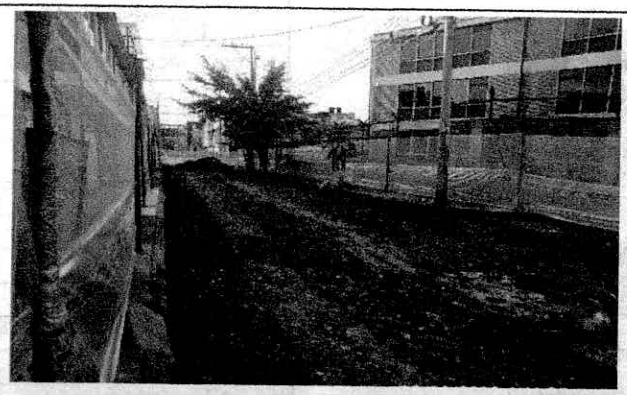

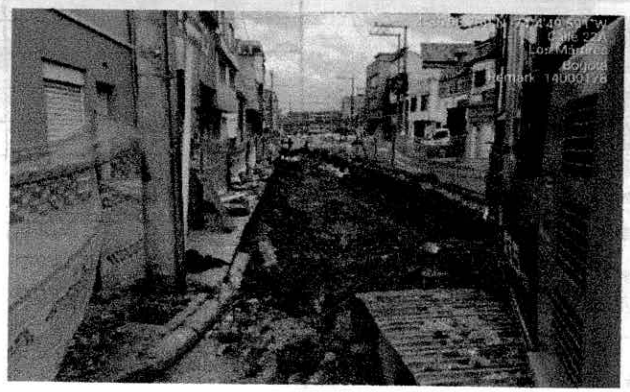

CIV	OBSERVACIONES	DIMENSIONES			CANTIDAD	TOTAL ACUMULADO
		Long.	Ancho	Alto		
14001156	CERRAMIENTO PERIMETRAL	191,50			2,00	383,00
14001619	CERRAMIENTO PERIMETRAL	137,00			2,00	274,00
14001616	CERRAMIENTO PERIMETRAL	137,00			2,00	274,00
14001469	CERRAMIENTO PERIMETRAL	99,00			2,00	198,00
14001481	CERRAMIENTO PERIMETRAL	99,50			2,00	199,00
14000126	CERRAMIENTO PERIMETRAL	209,00			1,00	209,00
14000178	CERRAMIENTO PERIMETRAL	156,00			1,00	156,00
14001367	CERRAMIENTO PERIMETRAL	177,60			1,00	177,60
SUBTOTAL						1.870,60

OBSERVACIONES:

CONTRATISTA	INTERVENTORIA
APROBÓ	APORBÓ
Firma:	Firma:
Nombre: JAVIER HERNANDO PERILLA VACCA	Nombre: SANDRA CARDOZO
Cargo: DIRECTOR DE OBRA	Cargo: DIRECTOR DE INTERVENTORIA

47

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA EJECUTADA


CONTROL DE OBRA

MEMORIA 46 de 47

CON & CON CONSULTORIA Y CONSTRUCCION

CONTRATO DE OBRA:	CO-137-2019	CONTRATISTA:	CONSULTORIA Y CONSTRUCCION - CON & CON S.A.S.	NIT:	830.041.411-0
OBJETO DEL CONTRATO:	EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS POR LA MODALIDAD DE MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS Y ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACION DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE LOS MARTIRES				
ACTA No.	3	PERIODO DE COBRO:	21/11/2020 AL 20/01/2021	ELABORÓ:	JAVIER HERNANDO PERILLA VACCA
UPZ:		BARRIO:			
ITEM:	NP 82	DESCRIPCION:	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y RETIRO DE AMOBLAMIENTO SEMAFÓRICO TEMPORAL DE ACUERDO A LOS REQUERIMIENTOS DE LA SDM	UNIDAD:	GL

REGISTRO FOTOGRAFICO

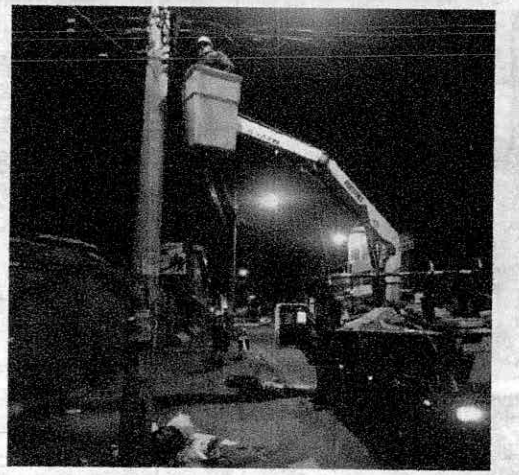

CIV	OBSERVACIONES	DIMENSIONES			CANTIDAD	TOTAL ACUMULADO
		Long.	Ancho	Alto		
14001469	INSTALACION SEMAFOROS PROVISIONALES				1,00	1,00

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA EJECUTADA


CONTROL DE OBRA

MEMORIA 47 de 47

CONTRATO DE OBRA:	CO-137-2019	CONTRATISTA:	CONSULTORIA Y CONSTRUCCION - CON & CON S.A.S.	NIT:	830.041.411-0
OBJETO DEL CONTRATO:	EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS POR LA MODALIDAD DE MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS Y ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACION DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE LOS MARTIRES				
ACTA No.	3	PERIODO DE COBRO:	21/11/2020 AL 20/01/2021	ELABORÓ:	JAVIER HERNANDO PERILLA VACCA
UPZ:		BARRIO:			
ITEM:	NP 83	DESCRIPCION:	ALQUILER DE AMOBLAMIENTO SEMAFÓRICO TEMPORAL DE ACUERDO A LOS REQUERIMIENTOS DE LA SDM	UNIDAD:	MES

REGISTRO FOTOGRAFICO



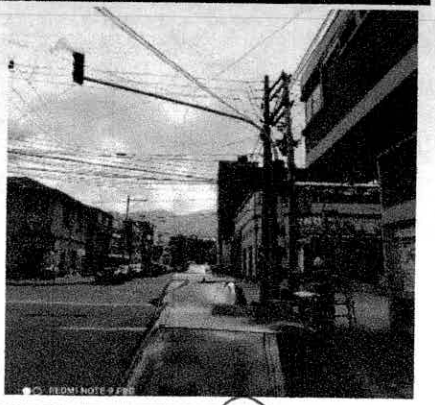

CIV	OBSERVACIONES	DIMENSIONES			CANTIDAD	TOTAL ACUMULADO
		Long.	Ancho	Alto		
14001469	POR INSTALACION DE SEMÁFOROS CL 1D X KR 24				2,00	2,00

CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS POR LA MODALIDAD DE MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS Y ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACION DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PÚBLICO DE LA LOCALIDAD DE LOS MARTIRES

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
GOBIERNO
Alcaldía Local de Los Mártires

CONTRATO DE OBRA CO-137-2019

INFORME TECNICO N° 06

CONTRATISTA

CONSULTORÍA Y CONSTRUCCION SAS - CON & CON SAS

INTERVENTORÍA

MIRS LATINOAMERICA S.A.S

ELABORO:	REVISO:	APROBO:
ING. DIEGO RENE PÉREZ GONZALEZ	**ING. JAVIER HERNANDO PERILLA VACCA**	**ING. SANDRA MONICA CARDOZO ROJAS**
FIRMA:	FIRMA:	FIRMA:
CARGO: **RESIDENTE TÉCNICO DE OBRA**	CARGO: **DIRECTOR DE OBRA**	CARGO: **DIRECTORA DE INTERVENTORÍA**

TABLA DE CONTENIDO

1. INFORME ADMINISTRATIVO 5
1.1. INTRODUCCIÓN 5
1.1.1. OBJETIVOS 6
1.1.2. MARCO TEÓRICO 7
1.1.3. METODOLOGÍA 9
1.2. ASPECTOS GENERALES 11
1.2.1. INFORMACIÓN Y DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 12
1.3. PERSONAL PROFESIONAL DEL CONTRATISTA, INTERVENTORÍA Y SUPERVISIÓN 13
1.3.1. PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL CONTRATISTA 13
1.3.2. PERSONAL ADMINISTRATIVO INTERVENTORÍA 14
1.3.3. PERSONAL ADMINISTRATIVO FDLM 15
1.4. CORRESPONDENCIA ENVIADA Y RECIBIDA 15
2. INFORME LEGAL CONTRATO DE OBRA 17
2.1. ACTA DE INICIO DE OBRA 17
2.2. ADICIONES, SUSPENSIONES Y PRORROGAS 18
2.2.1. SUSPENSIONES 18
2.2.2. REINICIOS 20
2.2.3. ADICIONES Y PRORROGAS 23
2.3. CONTRATOS SUSCRITOS 29
2.3.1. CONTRATO DE OBRA No. CO-137-2019 29
2.3.2. GARANTIAS Y VIGENCIAS 30
3. INFORME FINANCIERO DEL CONTRATO DE OBRA 31
3.1. ANTICIPO CONTRATO DE OBRA 31
3.2. PRESUPUESTO CONTRATO DE OBRA 32
3.3. ITEMS NO PREVISTOS 38
3.4. INFORMACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO 41
3.4.1. GESTIÓN FINANCIERA 41
3.4.2. PLAN DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO 42
3.4.3. FACTURACIÓN MENSUAL 42
4. INFORME TÉCNICO 43
4.1. EJECUCIÓN DE DIAGNOSTICOS EN CADA CIV 43
4.2. EJECUCIÓN DE OBRA EN CADA CIV 46
4.3. CIV´s 47
4.4. RESUMEN DE VERIFICACIÓN POR CIV: 48
4.4.1. REGISTRO DE DAÑOS 48
4.4.2. INDICADORES DE INTERVENCIÓN 51
4.4.3. DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS 51

4.5. PROGRAMACIÓN DE OBRA 59
4.6. PROBLEMAS PRESENTADOS 62
4.7. ACTAS DE SEGUIMIENTO DESARROLLADAS EN EL PERIODO (COMITES Y REUNIONES) 62
4.8. ACTAS DE COMITÉ 63
4.9. INFORMES SEMANALES DE EJECUCIÓN DE OBRA 63
5. INFORME TRANSITO 63
5.1. PLANES DE MANEJO DE TRANSITO 63
5.2. COMITES DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA (COI) 64
6. CALIDAD 66
6.1. RESULTADOS DE LABORATORIO CONTRATO DE OBRA 66
6.2. CERTIFICADOS DE CALIDAD 66
7. CONCLUSIONES 67

CONTROL DE CAMBIOS			
Revisión	**Fecha**	**Descripción**	**Elaboró**
0	25-enero-2021	Versión Inicial	Diego Rene Pérez González

1. INFORME ADMINISTRATIVO

1.1. INTRODUCCIÓN

Con el objeto de "CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS POR LA MODALIDAD DE MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS Y ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACION DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE LOS MARTIRES", la Alcaldía Local de Los Mártires a través de licitación pública FDLM-LP-134-2019 adjudicó a Consultoría y Construcción S.A.S, el contrato de obra CO-137-2019.

El valor inicial del contrato corresponde a CINCO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y SIETE MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS SETENTA Y DOS PESOS M/C ($5.437.884.572,00) MONEDA LEGAL, con un plazo de ejecución inicial de SIETE (7) MESES y con fecha de inicio del 25 de febrero del 2020.

En el presente informe se incluyen las actividades realizadas en el periodo comprendido entre el 21 de noviembre del 2020 y el 20 de enero del 2021.

1.1.1. OBJETIVOS

General:

Presentar un informe integral de manera mensual sobre el avance del contrato de obra CO-137-2019, en el cual se muestren todos los antecedentes, trazabilidad y aspectos relevantes de la etapa de ejecución.

Específicos:

- Presentar un informe administrativo de manera general, en el cual se muestren los detalles que se tuvieron en cuenta para la elaboración del contrato de obra.
- Presentar un informe legal acerca del avance del contrato de obra, para de esta forma dejar evidencia de las adiciones, suspensiones o prorrogas que se puedan llegar a generar durante la etapa de ejecución.
- Presentar un informe financiero sobre el plan de inversión del anticipo, variaciones en el presupuesto de obra y la gestión financiera del contrato de obra.
- Presentar un informe técnico acerca del avance y ejecución del contrato de obra, junto con los detalles propios de las actividades constructivas.
- Presentar un informe de transito sobre la gestión de pmts y aprobaciones publicadas por la SDM.
- Presentar un informe sobre la gestión de calidad, acerca de los resultados de ensayos de laboratorio realizados a los materiales utilizados en la ejecución de la obra.

1.1.2. MARCO TEÓRICO

A continuación se presentan los conceptos más relevantes dentro de la ejecución del contrato de la referencia:

DEMOLICIONES Y PRELIMINARES: Se refiere al desmonte de mobiliarios y demoliciones necesarias para iniciar los trabajos de excavaciones, rellenos y construcción de zonas duras o elementos de concreto o adoquín.

EXCAVACIONES Y RELLENOS: Se refiere al retiro de material necesario para conformar las bases y rellenos de contra elementos de concreto o adoquín.

ESTRUCTURA: Se refiere a la construcción de concretos o morteros, muros de concreto, bases para andenes en adoquín o concreto que se requieran en la consecución del proyecto.

REDES HIDRÁULICAS: Incluye el suministro e instalación de tuberías de drenaje de aguas lluvias, acometidas, cajas de inspección y cunetas.

CICLORUTA: Calzada destinada de manera permanente a la circulación de bicicletas, ubicada en el andén, el separador o segregada de la calzada vehicular o en otros lugares autorizados, debidamente señalizada y delimitada.

ESPACIO PÚBLICO: El conjunto de espacios urbanos conformados por plazas, las vías peatonales y andenes, los controles ambientales de las vías arterias, las alamedas y ciclo rutas delimitadas.

ESPECIFICACIONES: Procesos y procedimientos técnicos generales o particulares, según el caso a los que se debe ceñir el Contratista durante la ejecución de las obras, para obtener los resultados objeto del contrato.

ADITIVO: Es un material distinto del agua, agregados y cemento hidráulico usado como ingrediente en concretos y morteros añadido a la mezcla inmediatamente antes o durante su mezclado. Hoy en día, los aditivos se consideran un ingrediente más del concreto y se emplean para modificar las propiedades de modo que lo hagan más adecuado para condiciones de trabajo.

CURADO: Es el proceso con el cual se mantienen una temperatura y un contenido de humedad adecuados, durante los primeros días después del vaciado, para que se puedan desarrollar en él las propiedades de resistencia y durabilidad.

SELLO DE JUNTAS: Sellos de juntas de dilatación en pavimentos es un programa de mantenimiento que reduce el deterioro y ayuda a conservar el estado de este. La vida útil

de un pavimento puede prolongarse al menos en 2 años realizando el sellado en el momento adecuado, permitiendo mantener la utilidad del pavimento.

PAVIMENTO. Conjunto de capas superpuestas, relativamente horizontales, que se diseñan y construyen técnicamente con materiales apropiados y adecuadamente compactados. Estas estructuras estratificadas se apoyan sobre la subrasante de una vía y deben resistir adecuadamente los esfuerzos que las cargas repetidas del tránsito le transmiten durante el período para el cual fue diseñado la estructura y el efecto degradante de los agentes climáticos.

PAVIMENTO FLEXIBLE. Tipo de pavimento constituido por una capa de rodadura bituminosa apoyada generalmente sobre capas de material no ligado.

PAVIMENTO RÍGIDO. Es aquel que fundamentalmente está constituido por una losa de concreto hidráulico, apoyada sobre la subrasante o sobre una capa de material seleccionado, la cual se denomina sub base del pavimento rígido

RASANTE. Es la proyección vertical del desarrollo del eje de la superficie de rodadura de la vía.

REPLANTEO. Actividades topográficas encaminadas a localizar un proyecto vial en el terreno para su posterior construcción. Se apoya en los planos de diseño y en las bases de topografía empleadas previamente en el levantamiento del corredor vial.

CIV: Código de Identificación Vial.

SDM: Secretaria Distrital de Movilidad.

PMT: Plan de Manejo de Trafico.

55

1.1.3. METODOLOGÍA

A continuación se muestra la metodología que será empleada para la ejecución del contrato de obra CO-137-2019

INICIACION DEL CONTRATO	Proceso de Iniciación • Acta de Inicio del contrato Gestión de los Interesados • Identificar los interesados.

PLANIFICACION DEL CONTRATO (ACTIVIDADES PREVIAS)	Proceso de elaboración documentos • Acta de suspensión del contrato. • Acta de reinicio del plazo del contrato. Proceso de elaboración de diagnósticos • Elaboración de los diagnósticos de los segmentos viales proyectados. • Revisión diagnósticos entregados por el FDLM. Proceso de elaboración de los diseños • Elaboración de los diseños de los segmentos viales proyectados • Revisión de diseños entregados por el FDLM. Gestión de la Integración • Programa de Gerencia del Proyecto. Gestión del Alcance • Planificar la gestión del alcance del proyecto. Gestión del Cronograma • Planificar el cronograma de obra. • Definir actividades • Establecer secuencia de las actividades • Desarrollar el cronograma Gestión de Costos • Determinar el Presupuesto del proyecto Gestión de los Recursos • Gestionar los recursos Gestión de la Calidad • Planificar la gestión de la calidad. Gestión de las comunicaciones • Planificar la gestión de las comunicaciones. Gestión de Riesgos • Identificación de riesgos. Gestión de las adquisiciones • Plan de Gestión de las adquisiciones.

EJECUCION DEL CONTRATO (ACTIVIDADES DE OBRA)	Gestión de la Integración • Ejecución de las actividades de obra del proyecto. Gestión de la Calidad • Gestionar la calidad Gestión de los Recursos • Adquirir los recursos para la ejecución. • Desarrollar el equipo de trabajo. Gestión de las Comunicaciones • Desarrollar las comunicaciones enviadas y recibidas. Gestión de Riesgos • Respuesta a los riesgos. Gestión de las Adquisiciones • Gestionar las adquisiciones para ejecución. Gestión de los Interesados • Participación de los Interesados.


CONTROL DEL CONTRATO	Gestión de la Integración • Supervisar y contralar la ejecución de las obras. • Controlar las modificaciones del proyecto. Gestión del Alcance • Controlar el alcance del contrato. Gestión del Cronograma • Controlar el cronograma de obra. Gestión de Costos • Controlar el Presupuesto del proyecto Gestión de los Recursos • Controlar los recursos Gestión de la Calidad • Controlar la calidad del contrato. Gestión de las comunicaciones • Monitorear las comunicaciones de envío y recibido. Gestión de Riesgos • Monitorear los riesgos. Gestión de las adquisiciones • Controlar las adquisiciones. Gestión de los Interesados • Revisar la participación de los interesados.
CIERRE DEL CONTRATO	Gestión de la Integración • Informe final de obra • Acta de liquidación del contrato

56

1.2. ASPECTOS GENERALES

Los Mártires es la localidad número 14 del Distrito Capital de Bogotá. Se encuentra ubicada en la parte centro-sur de la ciudad. Entre sus residentes predomina la clase media baja, el estrato socioeconómico 3. El nombre se debe a que en el parque de su zona oriental fueron fusiladas varias figuras notables de la independencia de Colombia. La localidad se encuentra completamente urbanizada, salvo por parques y rondas de los ríos. Junto a las localidades de La Candelaria, Santa Fe y Teusaquillo conforma El Centro de la ciudad. Pese a albergar varios monumentos arquitectónicos e históricos, desde mediados del siglo XX sus zonas oriental y norte han sufrido un proceso de deterioro presentando algunos de sus barrios graves problemas de delincuencia y criminalidad.


IMAGEN 1: LOCALIDAD 14 LOS MARTIRES

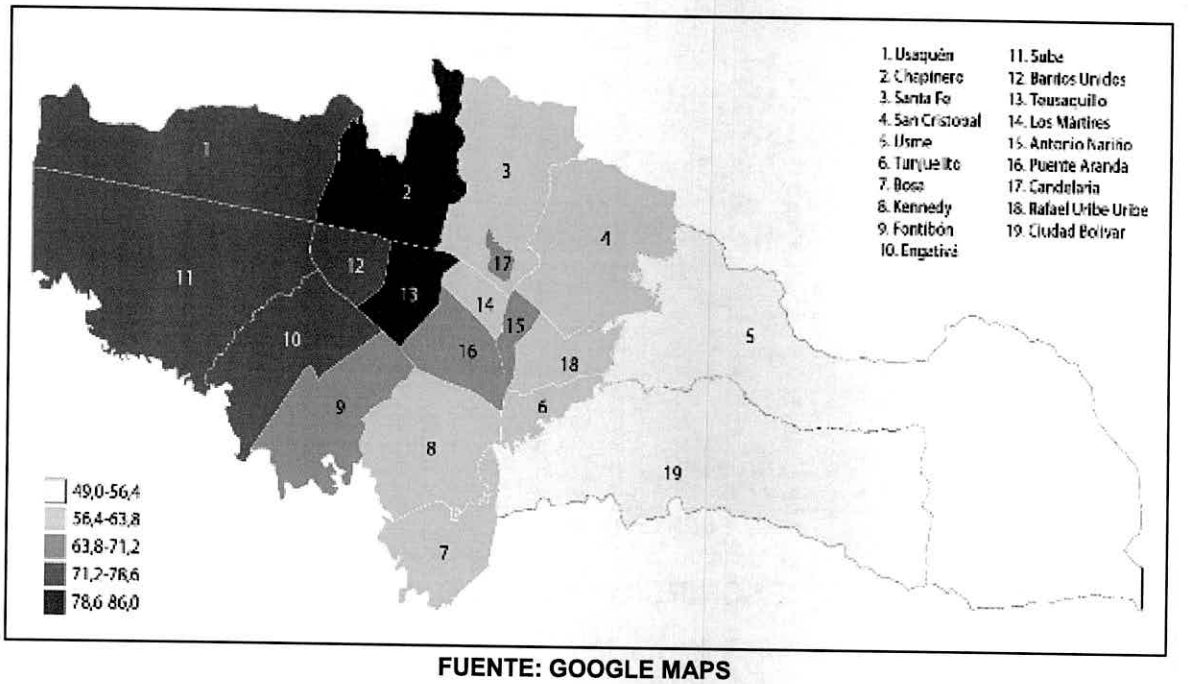

FUENTE: GOOGLE MAPS

PUNTO CARDINAL	LOCALIDAD	LIMITE
NORTE	TEUSAQUILLO	DIAGONAL 22 Y AVENIDA EL DORADO
SUR	ANTONIO NARIÑO	CALLE OCTAVA SUR Y AVENIDA PRIMERA
ORIENTE	SANTA FE	AVENIDA CARACAS
OCCIDENTE	PUENTE ARANDA	AVENIDA NORTE-QUITO-SUR

IMAGEN 2: LOCALIDAD 14 LOS MARTIRES

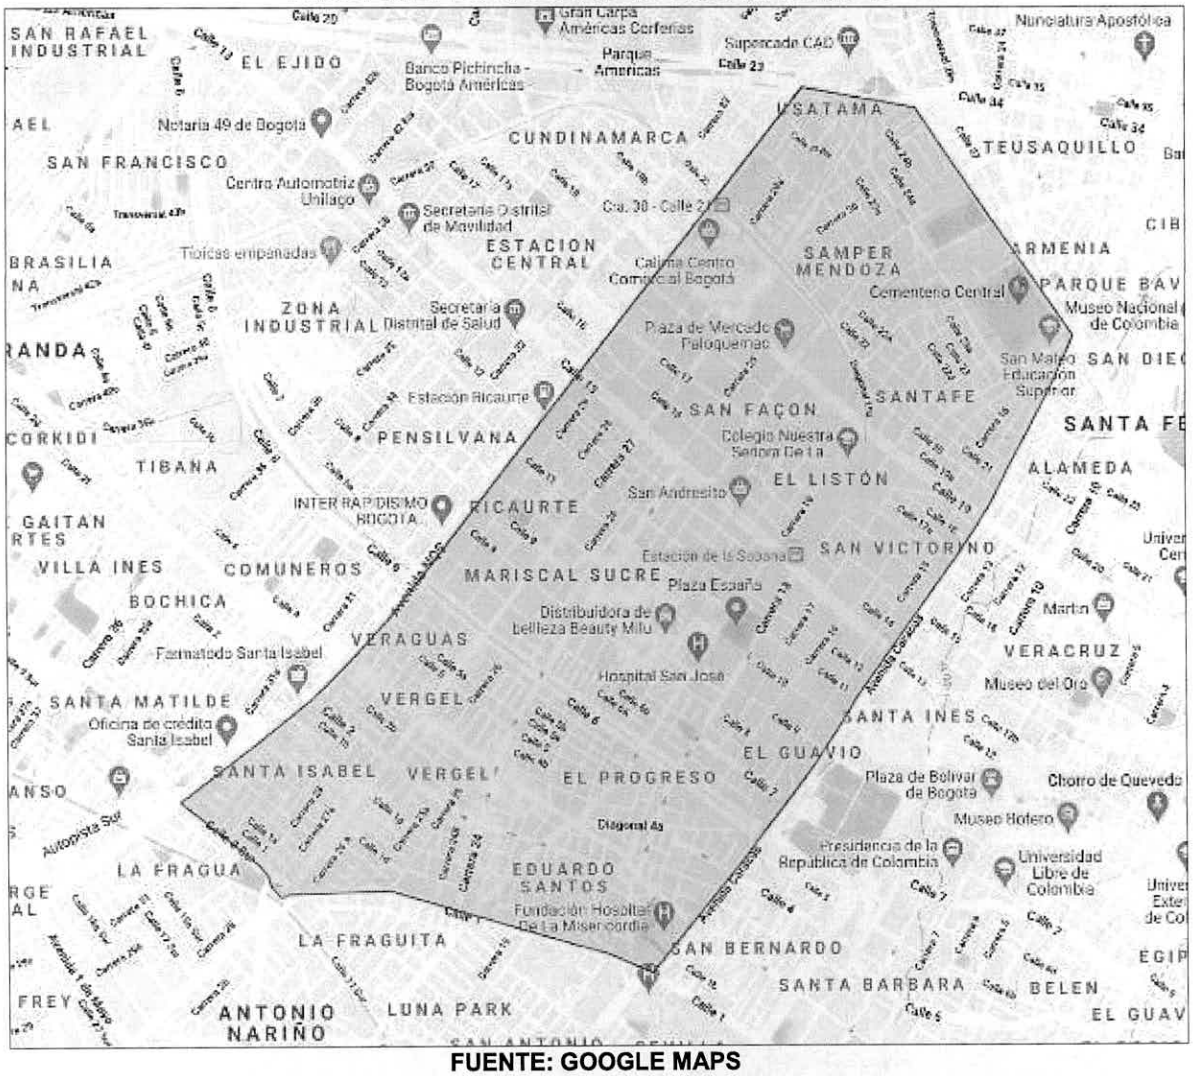

FUENTE: GOOGLE MAPS

1.2.1. INFORMACIÓN Y DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

A continuación se presenta la información relevante del contrato de obra CO-137-2019:

TABLA 1: INFORMACIÓN CONTRATO CO-137-2019

CONTRATISTA	**CONSULTORIA Y CONSTRUCCIÓN S.A.S.**
INTERVENTORIA	**MIRS LATINOAMERICA S.A.S**
CONTRATO No.	**CO-137-2019**
VALOR INICIAL DE LA OBRA	**$ 5.437.884.572**

ANTICIPO	**$ 1.631.365.372**
PLAZO DE EJECUCIÓN	**Siete (7) meses**
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO	**25 de febrero de 2020**
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	**24 de septiembre de 2020**
ADICIONES	**$ 2.845.236.531**
PRORROGAS	**Dos (2) meses**
SUSPENSIONES	**Suspensión No.1: 24 de marzo de 2020**
	Suspensión No.2: 28 de noviembre de 2020
REINICIOS	**Reinicio No.1: 21 de julio de 2020**
	Reinicio No.2: 21 de diciembre de 2020
FECHA DE TERMINACIÓN FINAL INCLUIDA SUSPENSIÓN Y PRORROGA	**12 de abril de 2021**

FUENTE: CON & CON SAS / CO-137-2019

1.3. PERSONAL PROFESIONAL DEL CONTRATISTA, INTERVENTORÍA Y SUPERVISIÓN

1.3.1. PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL CONTRATISTA

TABLA 2: PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL CONTRATISTA

CARGO	NOMBRE	DED.
DIRECTOR DE OBRA	JAVIER HERNANDO PERILLA VACCA	50%
RESIDENTE DE OBRA	DIEGO RENE PÉREZ GONZALEZ	100%
RESIDENTE AMBIENTAL	SE ESTA PRESENTANDO LA HOJA DE VIDA PARA APROBACIÓN DE LA INTERVENTORÍA	60%
RESIDENTE SST	SANDRA MILENA GIL	100%
RESIDENTE SOCIAL	JESSICA NARANJO MORENO	60%
ESPECIALISTA EN GEOTECNIA	JUAN DANIEL MOYA	10%
ESPECIALISTA EN PAVIMENTOS	JORGE GOMEZ	10%
ESPECIALISTA EN REDES HIDROSANITARIAS	GERMAN GABRIEL RODRIGUEZ	30%

ESPECIALISTA EN PRESUPUESTO Y PROGRAMACIÓN	HERNAN RICCI RUIZ	20%
ESPECIALISTA EN TRÁNSITO Y TRANSPORTE	MARTHA ROCIO CASTILLO	30%
TOPÓGRAFO	JUAN CARLOS PARRA	50%

FUENTE: CON & CON SAS / CO-137-2019

1.3.2. PERSONAL ADMINISTRATIVO INTERVENTORÍA

TABLA 3: PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA INTERVENTORÍA

CARGO	NOMBRE	DED.
DIRECTORA DE OBRA	SANDRA MONICA CARDOZO ROJAS	50%
ESPECIALISTA EN VIAS, GEOTÉCNIA O PAVIMENTOS	MELQUICEDEC CANTOR BELLO	35%
RESIDENTE DE INTERVENTORIA I	SANTIAGO CARRILLO VARGAS	100%
RESIDENTE DE INTERVENTORIA II	FREDY RAMIREZ PINZÓN	100%
APOYO TECNICO	DIEGO FORERO	100%
RESIDENTE AMBIENTAL	CLAUDIA EUGENIA PALOMARES QUINTERO	30%
RESIDENTE SST	CLAUDIA EUGENIA PALOMARES QUINTERO	30%
RESIDENTE SOCIAL	MARIA ADRIANA GUTIERREZ	30%
ESPECIALISTA EN TRÁNSITO Y TRANSPORTE	JORGE ALBERTO GARCIA SÁNCHEZ	7%
TOPOGRAFO	PEDRO ALEXANDER SOSA MARTINEZ	50%
CADENERO	ALBERTO SALAZAR	50%
INSPECTOR 1	MAIDA COMBITA	100%
INSPECTOR 2	DIEGO ALEXANDER RODRIGUEZ	100%
LABORATORISTA INSPECTOR	GABRIEL RODRIGUEZ MUÑOZ	5%
MENSAJERO	ALAN CASTELLÓN	100%
CONDUCTOR	EDWIN BARAJAS	20%
SECRETARIA	OLGA VARÓN ESPITIA	10%

FUENTE: CON & CON SAS / CO-137-2019

1.3.3. PERSONAL ADMINISTRATIVO FDLM

TABLA 4: PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL FDLM

CARGO	NOMBRE
ARQ. INFRAESTRUCTURA FDLM	JAIME HERNAN VILLALBA VARGAS
APOYO A LA SUPERVISIÓN	DANIEL MAURICIO ROJAS VALBUENA

1.4. CORRESPONDENCIA ENVIADA Y RECIBIDA

TABLA 5: CORRESPONDENCIA ENVIADA

CONTRATO DE OBRA CO-137-2019					
CORRESPONDENCIA ENVIADA - INFORME TÉCNICO Nº 06					
FECHA DE ELABORACIÓN	CONSECUTIVO	DESTINATARIO	ASUNTO	ELABORADO POR	FECHA DE RECIBIDO
23-nov.-20	C&C-CO137-2019-053	MIRS LATINOAMERICA S.A.S.	SOLICITUD DE SUSPENSIÓN Nº 2 - TEMPORADA DE LLUVIAS - TRÁMITES DE PMTS	Javier Hernando Perilla Vacca	23-nov.-20
25-nov.-20	C&C-CO137-2019-054	MIRS LATINOAMERICA S.A.S.	REMISIÓN INFORME Nº05 de gestión social - período octubre 21 de 2020 al 20 de noviembre de 2020 - soportes de verificación de informe	Javier Hernando Perilla Vacca	25-nov.-20
10-dic.-20	IND-CYC-310-TRA	SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD - Subdirección de planes de manejo de transito	Plan de manejo de transito CL 22A entre KR 19B y KR 19A	Ing. Martha Castillo	10-dic.-20
10-dic.-20	IND-CYC-324-TRA	SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD - Subdirección de planes de manejo de transito	Plan de manejo de transito CL 22 entre KR 18B y KR 19	Ing. Martha Castillo	10-dic.-20
10-dic.-20	IND-CYC-325-TRA	SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD - Subdirección de planes de manejo de transito	Plan de manejo de transito KR 25A entre AC 6 y CL 7Bis	Ing. Martha Castillo	10-dic.-20
10-dic.-20	IND-CYC-326-TRA	SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD - Subdirección de planes de manejo de transito	Plan de manejo de transito CL 12 entre KR 19 y KR 19A	Ing. Martha Castillo	11-dic.-20
11-dic.-20	C&C-CO137-2019-055	MIRS LATINOAMERICA S.A.S.	ENTREGA INFORME MENSUAL Nº5 Y ACTA Nº2 DE RECIBO PARCIAL Nº2	Javier Hernando Perilla Vacca	25-nov.-20
16-dic.-20	C&C-CO137-2019-057	MIRS LATINOAMERICA S.A.S.	ENTREGA INFORME MENSUAL	Javier Hernando Perilla Vacca	16-dic.-20
17-dic.-20	IND-CYC-337-TRA	SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD - Subdirección de planes de manejo de transito	Plan de manejo de transito KR 18 entre CL 2 y CL 3	Ing. Martha Castillo	18-dic.-20

CONTRATO DE OBRA CO-137-2019					
CORRESPONDENCIA ENVIADA - INFORME TÉCNICO N° 06					
FECHA DE ELABORACIÓN	CONSECUTIVO	DESTINATARIO	ASUNTO	ELABORADO POR	FECHA DE RECIBIDO
23-dic.-20	C&C-CO137-2019-056	PAULO CESAR SANABRIA GUIO	DERECHO DE PETICION - SOLICITUD DE INFORMACIÓN DETALLADA DEL CONTRATO DE OBRA, SEGMENTOS DE LA CL 1F - CIVs 14001469 Y 14001481	Javier Hernando Perilla Vacca	24-dic.-20
28-dic.-20	C&C-CO137-2019-058	MIRS LATINOAMERICA S.A.S.	SOLICITUD EVALUACIÓN DE PROCESOS PRESENCIALES CON LA COMUNIDAD	Javier Hernando Perilla Vacca	23 de diciembre - por correo electrónico
31-dic.-20	IND-CYC-002-TRA	SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD - Subdirección de planes de manejo de transito	Plan de manejo de transito CL 1B entre KR 27A y KR 28	Ing. Martha Castillo	31-dic.-20
7-ene.-21	C&C-CO137-2019-060	MIRS LATINOAMERICA S.A.S.	DERECHO DE PETICIÓN - SOLICITUD PAGO PARQUEADERO SEGMENTO CIV 14001367	Javier Hernando Perilla Vacca	12 de enero - por correo electrónico
7-ene.-21	C&C-CO137-2019-061	JAIME HERNÁNDEZ	RESPUESTA DERECHO DE PETICIÓN - SOLICITUD PAGO PARQUEADEROS SEGMENTO 10 CIV 14001367	Javier Hernando Perilla Vacca	7 de enero - por correo electrónico

FUENTE: CON & CON SAS / CO-137-2019

TABLA 6: CORRESPONDENCIA RECIBIDA

CONTRATO DE OBRA CO-137-2019					
CORRESPONDENCIA RECIBIDA - INFORME TÉCNICO N° 06					
FECHA DE ELABORACIÓN	CONSECUTIVO	FECHA DE RECIBIDO	REMITENTE	DESTINATARIO	ASUNTO
3-dic.-20	SDM-SPMT-198577-20	4-dic.-20	SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD	CONSULTORÍA Y CONSTRUCCIÓN CON&CON	Recibido por correo electrónico. Incumplimientos en la implementación del plan de manejo de tránsito (PMT)
3-dic.-20	20206420361021	3-dic.-20	ALCALDÍA LOCAL DE LOS MÁRTIRES	CONSULTORÍA Y CONSTRUCCIÓN CON&CON	Recibido por correo electrónico. Plan de acción y contingencia del contrato 137 de 2019
29-dic.-20	2020EE239487	29-dic.-20	SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE	ALCALDÍA LOCAL DE MÁRTIRES	Recibido por correo electrónico. Radicado SDA No.2020ER175897 - Revisión No.1 al plan de Gestión de Residuos de Construcción y Demolición (PGRCD) del contrato de obra pública No.137 del 2019, con PIN 19049
29-dic.-20	10153410-17610-20	29-dic.-20	GAS NATURAL VANTI	CONSULTORÍA Y CONSTRUCCIÓN CON&CON	Recibido por correo electrónico. Daño producido en el municipio de Bogotá DC en la dirección CL 1C 19B - 43, el día 7/12/2020, tubería de polietileno de 3/4" de diámetro
14-ene.-21	MIRS-MAR-079-2019	15-ene.-21	MIRS LATINOAMERICA S.A.S.	CONSULTORÍA Y CONSTRUCCIÓN CON&CON	Llamado de atención por incumplimiento de obligaciones contractuales
15-ene.-21	MIRS-MAR-080-2019	15-ene.-21	MIRS LATINOAMERICA S.A.S.	CONSULTORÍA Y CONSTRUCCIÓN CON&CON	Solicitud hoja de vida profesional ambiental

FUENTE: CON & CON SAS / CO-137-2019

2. *INFORME LEGAL CONTRATO DE OBRA*

2.1. ACTA DE INICIO DE OBRA

BOGOTÁ | SECRETARÍA DE GOBIERNO — ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

ALCALDIA LOCAL DE LOS MÁRTIRES

ACTA DE INICIO

CONTRATO No.:	**137 DE 2019**
Tipo de Contrato:	OBRA
Objeto del contrato:	OBJETO: CONTRATO DE OBRA PUBLICA Nº 137-2019 CUYO OBJETO ES CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS POR LA MODALIDAD DE MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS Y ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACION DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE LOS MARTIRES.
Nombre del Contratista:	**CONSULTORIA Y CONSTRUCCION S.A.S. CON&CON**
Identificación del Contratista:	NIT 830.041.411-0
Fecha de inicio:	25 de febrero de 2020
Plazo de ejecución:	SIETE (7) MESES
Fecha prevista de terminación:	24 de septiembre de 2020
Valor:	$5.437.884.572,00
No. Certificado de Registro Presupuestal:	355 del 18 de Octubre de 2019
Póliza:	Equidad Seguros No. AA007885 – Cumplimiento del contrato Equidad Seguros No. AA007887 – responsabilidad Civil Extracontractual.

En las instalaciones de la Alcaldía Local los Mártires, se reunieron **Raúl Hernando Esteban García**, Alcalde Local de los Mártires, en representación legal del FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE LOS MÁRTIRES y **JUAN PABLO RICCI RUIZ,** mayor de edad, identificado con la cédula de ciudadanía No. 80.417.377, en calidad de representante legal de **CONSULTORIA Y CONSTRUCCION S.A.S. CON&CON,** dan inicio a la ejecución del contrato relacionado anteriormente.

La presente se firma por quienes en ella intervinieron, a los veinticinco (25) días del mes de febrero de dos mil veinte (2020).

Por la Alcaldía Local de los Mártires,

RAÚL HERNANDO ESTEBAN GARCÍA
ALCALDE LOCAL DE LOS MÁRTIRES

NICK RANDY ALMEIDA GAMARRA
R.L MIRS LATINOAMERICA S.A.S.
Interventor

Contratista,

JUAN PABLO RICCI RUIZ
C.C.: 80.417.377
REPRESENTANTE LEGAL

Elaboró: DAPC-SAHM- Mirs Latinoamérica SAS.

2.2. ADICIONES, SUSPENSIONES Y PRORROGAS

2.2.1. SUSPENSIONES

De acuerdo al Secop II se presenta el pantallazo de la suspensión temporal No.01 del contrato:

Información general

Identificador Único de la Modificación	CO1.CTRMOD.2601856
ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.1245314
Estado	Publicados
Tipo	Suspender el contrato
¿Requiere reconocimiento del proveedor?	☑
Fecha del estado	24/03/2020 5:04:52 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
	SE REALIZA SUSPENSIÓN DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA NO. 137 DE 2019, CELEBRADO ENTRE LAS PARTES, QUIENES ACUERDAN SUSPENDER LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO POR UN (1) MES A PARTIR DEL 24 DE MARZO DE 2020 INCLUSIVE, ES DECIR, SE REINICIA A PARTIR DEL 24 DE ABRIL DE 2020, Y PODER CONTINUAR CON LA EJECUCIÓN DEL MISMO, EN ESTE PLAZO SE PODRÁ REINICIAR O PRORROGAR, ESTO DEPENDE LA DURACIÓN DEL ESTADO DE EMERGENCIA ECONÓMICA, SOCIAL Y ECOLÓGICA DERIVADA DE LA PANDEMIA COVID-19, EN RAZÓN A LA EXPEDICIÓN DEL
Justificación de la modificación	DECRETO 081 DE 2020 POR EL CUAL "SE ADOPTAN MEDIDAS SANITARIAS Y ACCIONES TRANSITORIAS DE POLICÍA PARA LA PRESERVACIÓN DE IA VIDA Y MITIGACIÓN DEL RIESGO CON OCASIÓN DE LA SITUACIÓN EPIDEMIOLÓGICA CAUSADA POR EL CORONAVIRUS (COVID-19) EN BOGOTÁ, D.C., Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES" ADOPTANDO LAS MEDIDAS CON EL OBJETO DE GARANTIZAR LA VIDA Y LA SALUD DE LOS HABITANTES DE BOGOTÁ D.C. Y EN CONCORDANCIA EL DECRETO 457 DE FECHA 22 DE MARZO DE 2020, EMITIDO POR EL MINISTERIO DEL INTERIOR.

Detalles de la modificación

Cambios de la Entidad Estatal

El contrato fue cambiado para Suspendido.

Reconocido por el proveedor *Andres Felipe Montaña Doncel 24-03-2020 15:55 ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Cambios del proveedor

Sin cambios...

Reconocido por la Entidad Estatal *RAUL HERNANDO ESTEBAN GARCIA 24-03-2020 13:53 ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

De la misma forma se presenta la suspensión No.02 del contrato de obra:

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE GOBIERNO

SUSPENSIÓN No. 2 AL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. 137 - 2019 SUSCRITO ENTRE EL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE LOS MARTIRES Y CONSULTORIA Y CONSTRUCCION CON & CON SAS

No. Contrato	CO-137-2019
Objeto	CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS POR LA MODALIDAD DE MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS Y ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACION DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE LOS MARTIRES
Contratista	**CONSULTORIA Y CONSTRUCCION S.A.S - CON & CON S.A.S.** NIT: 830.041.411-0
Valor incluido adiciones	$8.283.121.103
Plazo de Ejecución incluidas suspensión No. 1 y Prórroga No.1	Nueve (9) meses
Fecha de Inicio	25 de febrero de 2020
Fecha de Terminación Inicial	24 de septiembre de 2020
Adiciones	Adición No. 1: $2.845.236.531
Prorrogas	Prórroga No. Dos (02) meses
Suspensiones	Suspensión No. 1 de fecha 24 de marzo de 2020
Reinicios	Reinicio No. 1 de 21 de julio de 2020
Fecha de Terminación Incluida Suspensiones y prórroga	12 de abril de 2021

Entre los suscritos a saber, **TATIANA PIÑEROS LAVERDE,** mayor de edad, domiciliada en esta ciudad, identificada con la cédula de ciudadanía No 1.018.503.593 de Bogotá, quien actúa en su condición de Alcaldesa Local (E) de Los Mártires, y como tal ordenadora del Gasto del **FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE LOS MARTIRES,** cargo para el cual fue nombrada mediante Decreto No. 118 del 16 de abril de 2020 y Acta de posesión No. 112 del 20 de abril de 2020, con capacidad jurídica para suscribir la presente Suspensión No. 2 en virtud de las facultades conferidas por el Decreto Distrital No. 374 de 2019 y demás disposiciones legales vigentes, quien en adelante y para los efectos del presente documento se denominará **EL FONDO** y **JUAN PABLO RICCI RUIZ,** identificado con cedula de ciudadanía No. 80.417.377, quien obra en nombre y representación legal de la sociedad **CONSULTORIA Y CONSTRUCCION S.A.S. - CON & CON S.A.S.**, identificada con NIT 830.041.411-0, quien para los efectos de este contrato se ha denominado como **EL CONTRATISTA**, hemos acordado suscribir la Suspensión No. 2 al contrato de obra pública No 137 de 2019, la cual se regirá por las cláusulas descritas a continuación, previas las siguientes consideraciones: **1).** Que entre el **FONDO** y **EL CONTRATISTA**, se suscribió el contrato de obra pública No 137 de 2019 cuyo objeto es: "*CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS POR LA MODALIDAD DE MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS Y ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACION DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE LOS MARTIRES*". **2).** Que el valor del contrato se pactó por la suma de CINCO MIL CUATROSCIENTOS TREINTA Y SIETE MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS SETENTA Y DOS PESOS ($ 5.437.884.572) MCTE., incluido el IVA e impuestos a que haya lugar. **3).** Que el plazo de ejecución del contrato se pactó por el término de SIETE (7) MESES, contados a partir de la suscripción del acta de inicio, previo cumplimiento de los requisitos de ejecución. **4).** Que el día 24 de marzo de 2020, se suscribió otrosí modificatorio al contrato de

2.2.2. REINICIOS

A continuación se presenta el Acta de reinicio No.01:

ALCALDIA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARIA DE GOBIERNO

DOCUMENTO ANEXO A LA REACTIVACION DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. 137 DE 2019 SUSCRITO ENTRE EL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE LOS MARTIRES Y CONSULTORIA Y CONSTRUCCION S.A.S.

No. Contrato	137 DE 2019
Objeto	**CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS POR LA MODALIDAD DE MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS Y ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACION DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE LOS MARTIRES**
Contratista	**CONSULTORIA Y CONSTRUCCION S.A.S** NIT: 830041411
Valor	$ 5.437.884.572
Plazo de Ejecución	Siete (7) meses
Fecha de Inicio	25 de febrero de 2020
Fecha de Terminación Inicial	24 de septiembre de 2020
Adiciones	N/A
Prorrogas	N/A
Suspensiones	Suspensión No. 1 de fecha 24 de marzo de 2020
Fecha de Terminación Final Incluida Suspensión	20 de enero de 2021

Entre los suscritos a saber, **TATIANA PIÑEROS LAVERDE,** mayor de edad, domiciliado en esta ciudad, identificada con la cédula de ciudadanía No 1.018.503.593 de Bogotá, quien actúa en su condición de Alcaldesa Local de Los Mártires (E), y como tal ordenador del Gasto del **FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE LOS MARTIRES,** cargo para el cual fue nombrada mediante Decreto No. 118 del 16 de abril de 2020 y Acta de posesión No. 112 del 20 de abril de 2020, con capacidad jurídica para suscribir la presente reactivación en virtud de las facultades conferidas por el Decreto Distrital No. 374 de 2019 y demás disposiciones legales vigentes, quien en adelante y para los efectos del presente documento se denominará **EL FONDO** y **CONSULTORIA Y CONSTRUCCION S.A.S.**, sociedad identificada con NIT 900351236, representada legalmente por JUAN PABLO RICCI RUIZ, identificado con cedula de ciudadanía No. 80.417.377 quien para los efectos de este documento se ha denominado como **EL CONTRATISTA**, se ha convenido suscribir reactivación No. 1 al contrato de obra pública No. 137 DE 2019, previas las siguientes consideraciones: **1).** Que entre el **FONDO** y **CONSULTORIA Y CONSTRUCCION S.A.S.**, se suscribió el contrato de obra pública No. 137 de 2019 cuyo objeto es: *"CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS POR LA MODALIDAD DE MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS Y ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACION DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE LOS MARTIRES."* **2).** Que el valor del contrato se pactó por la suma de CINCO MIL CUATROSCIENTOS TREINTA Y SIETE MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS SETENTA Y DOS PESOS ($ 5.437.884.572) MCTE., incluido el IVA e impuestos a que haya lugar. **3).** Que el plazo de ejecución del contrato se pactó por el término de SIETE (7) MESES, contados a partir de la suscripción del acta de inicio, previo cumplimiento de los requisitos de ejecución. **4).** Que, como acción de prevención y cuidado de la vida de las personas, el Gobierno Nacional el 22 de marzo de 2020 expidió el Decreto 457 de 2020, mediante el cual se imparten instrucciones para el cumplimiento del Aislamiento Preventivo Obligatorio de 19 días en todo el territorio colombiano, que rigió a partir de las cero horas del 25 de marzo, hasta las cero horas del 13 de abril de 2020, en el marco de la emergencia sanitaria por causa de la pandemia del coronavirus COVID-19 .**5).** Que el día 24 de marzo de 2020, se suscribió otrosí

Y de la misma forma se presenta el Acta de reinicio No.02:

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE GOBIERNO

REINCIO No. 2 AL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. 137 - 2019 SUSCRITO ENTRE EL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE LOS MARTIRES Y CONSULTORIA Y CONSTRUCCION CON & CON SAS

No. Contrato	CO-137-2019
Objeto	CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS POR LA MODALIDAD DE MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS Y ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACION DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE LOS MARTIRES
Contratista	**CONSULTORIA Y CONSTRUCCION S.A.S - CON & CON S.A.S.** NIT: 830.041.411-0
Valor incluido adiciones	$8.283.121.103
Plazo de Ejecución incluidas suspensión No. 1 y Prórroga No.1	Nueve (9) meses
Fecha de Inicio	25 de febrero de 2020
Fecha de Terminación Inicial	24 de septiembre de 2020
Adiciones	Adición No. 1: $2.845.236.531
Prorrogas	Prórroga No. 1: Dos (02) meses
Suspensiones	Suspensión No. 1 de fecha 24 de marzo de 2020 Suspensión No. 2 de fecha 28 de noviembre de 2020
Reinicios	Reinicio No. 1 de fecha 21 de julio de 2020
Fecha de Terminación Incluida Suspensiones y prórroga	12 de abril de 2021

Entre los suscritos a saber, **TATIANA PIÑEROS LAVERDE,** mayor de edad, domiciliada en esta ciudad, identificada con la cédula de ciudadanía No 1.018.503.593 de Bogotá, quien actúa en su condición de Alcaldesa Local (E) de Los Mártires, y como tal ordenadora del Gasto del **FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE LOS MARTIRES,** cargo para el cual fue nombrada mediante Decreto No. 118 del 16 de abril de 2020 y Acta de posesión No. 112 del 20 de abril de 2020, con capacidad jurídica para suscribir la presente Reinicio No. 2 en virtud de las facultades conferidas por el Decreto Distrital No. 374 de 2019 y demás disposiciones legales vigentes, quien en adelante y para los efectos del presente documento se denominará **EL FONDO** y **JUAN PABLO RICCI RUIZ,** identificado con cedula de ciudadanía No. 80.417.377, quien obra en nombre y representación legal de la sociedad **CONSULTORIA Y CONSTRUCCION S.A.S. - CON & CON S.A.S.**, identificada con NIT 830.041.411-0, quien para los efectos de este contrato se ha denominado como **EL CONTRATISTA**, hemos acordado suscribir la Reinicio No. 2 al contrato de obra pública No 137 de 2019, la cual se regirá por las cláusulas descritas a continuación, previas las siguientes consideraciones: **1).** Que entre el **FONDO** y **EL CONTRATISTA**, se suscribió el contrato de obra pública No 137 de 2019 cuyo objeto es: "*CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS POR LA MODALIDAD DE MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS Y ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACION DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE LOS MARTIRES*". **2).** Que el valor del contrato se pactó por la suma de CINCO MIL CUATROSCIENTOS TREINTA Y SIETE MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS SETENTA Y DOS PESOS ($ 5.437.884.572) MCTE., incluido el IVA e impuestos a que haya lugar. **3).** Que el plazo de ejecución del contrato se pactó por el término de SIETE (7) MESES, contados a partir de la suscripción del acta de inicio, previo cumplimiento de los requisitos

de ejecución. **4).** Que el día 24 de marzo de 2020, se suscribió otrosí modificatorio al contrato de obra pública N° 137 de 2019, en el sentido de modificar en los documentos técnicos y de ejecución del proceso el personal profesional requerido. **5).** Que el día 24 de marzo de 2020, a través de la plataforma SECOP II, se suspendió el contrato de obra pública 137 de 2019. **6).** Que el 21 de julio de 2020 se reinició el contrato de obra pública 137 de 2019 través de la plataforma SECOP II. **7)** Que el 18 de noviembre de 2020, se suscribió la Prórroga y Adición No. 1 del Contrato de Obra Pública 137 de 2019, por la cual se amplió el plazo de ejecución del contrato en dos (02) meses y adición al valor del mismo la suma de DOS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y CINCO MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL QUINIENTOS TREINTA Y UN PESOS ($2.845.236.531). **8).** Qué el 28 de noviembre de 2020 se suspendió el 28 de noviembre de 2020 por el término de VEINTITRÉS (23) días, hasta el 20 de diciembre de 2020. **9).** Que vencido el término de suspensión dispuesto en el documento de Suspensión No. 2, se procede a dar reinicio al contrato Obra No. 137 de 2019. Que con fundamento en lo anteriormente expuesto las partes acuerdan: **CLAUSULA PRIMERA:** REINICIAR la ejecución del Contrato de Obra Pública 137 de 2019. **CLAUSULA SEGUNDA:** Conforme lo dispuesto en el documento de Suspensión No. 2, establecer como fecha de terminación final del contrato el 12 de abril de 2021. **CLÁUSULA TERCERA:** La presente acta forma parte del contrato, por lo cual se anexará al expediente del mismo y se publicará en la plataforma SECOP II. **CLÁUSULA CUARTA:** Las demás condiciones y obligaciones del Contrato de Obra No. 137 de 2019, se mantienen sin modificación alguna.

Elaboró: Ricardo Casas Iregui. Abogado FDL.
Reviso: Efraín Barros. Abogado de Despacho.
Aprobó: Tatiana Piñeros. Alcaldesa Local (E) de Los Mártires.

2.2.3. ADICIONES Y PRORROGAS

El día 18 de noviembre del año 2020 se firmó la adición por un valor de DOS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y CINCO MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL QUINIENTOS TREINTA Y UN PESOS ($2.845.236.531) y una prórroga de dos (02) meses, lo cual se soporta con la siguiente acta:

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE GOBIERNO

PRORROGA Y ADICIÓN No. 1 AL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. 137 - 2019 SUSCRITO ENTRE EL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE LOS MARTIRES Y CONSULTORIA Y CONSTRUCCION CON & CON SAS

No. Contrato	CO-137-2019
Objeto	CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS POR LA MODALIDAD DE MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS Y ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACION DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE LOS MARTIRES
Contratista	**CONSULTORIA Y CONSTRUCCION S.A.S** - CON & CON **S.A.S.** NIT: 830.041.411-0
Valor	$5.437.884.572
Plazo de Ejecución	Siete (7) meses
Fecha de Inicio	25 de febrero de 2020
Fecha de Terminación Inicial	24 de septiembre de 2020
Adiciones	N/A
Prorrogas	N/A
Suspensiones	Suspensión No. 1 de fecha 24 de marzo de 2020
Reinicios	Reinicio No. 1 de 21 de julio de 2020
Fecha de Terminación Incluida Suspensión y/o prórroga	20 de marzo de 2021

Entre los suscritos a saber, **TATIANA PIÑEROS LAVERDE,** mayor de edad, domiciliado en esta ciudad, identificada con la cédula de ciudadanía No 1.018.503.593 de Bogotá, quien actúa en su condición de Alcaldesa Local (E) de Los Mártires, y como tal ordenadora del Gasto del **FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE LOS MARTIRES,** cargo para el cual fue nombrado mediante Decreto No. 118 del 16 de abril de 2020 y Acta de posesión No. 112 del 20 de abril de 2020, con capacidad jurídica para suscribir la presente Adición y Prórroga en virtud de las facultades conferidas por el Decreto Distrital No. 374 de 2019 y demás disposiciones legales vigentes, quien en adelante y para los efectos del presente documento se denominará **EL FONDO** y **JUAN PABLO RICCI RUIZ,** identificado con cedula de ciudadanía No. 80.417.377, quien obra en nombre y representación legal de la sociedad **CONSULTORIA Y CONSTRUCCION S.A.S.** - **CON & CON S.A.S.**, identificada con NIT 830.041.411-0, quien para los efectos de este contrato se ha denominado como **EL CONTRATISTA**, hemos acordado suscribir prorroga y adición No. 1 al contrato de obra pública No 137 de 2019, la cual se regirá por las cláusulas descritas a continuación, previas las siguientes consideraciones: **1).** Que entre el **FONDO** y **EL CONTRATISTA**, se suscribió el contrato de obra pública No 137 de 2019 cuyo objeto es: "*CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS POR LA MODALIDAD DE MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS Y ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACION DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE LOS MARTIRES*". **2).** Que el valor del contrato se pactó por la suma de CINCO MIL CUATROSCIENTOS TREINTA Y SIETE MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS SETENTA Y DOS PESOS ($ 5.437.884.572) MCTE., incluido el IVA e impuestos a que haya lugar. **3).** Que el plazo de ejecución del contrato se pactó por el término de SIETE (7) MESES, contados a partir de la suscripción del acta de inicio, previo cumplimiento de los requisitos de ejecución. **4).** Que el día 24 de marzo de 2020, se suscribió otrosí modificatorio al contrato de obra pública N° 137 de 2019, en el sentido de modificar en los documentos técnicos

y de ejecución del proceso el personal profesional requerido. **5).** Que a través del Decreto 090 de 2020 se limitó totalmente la libre circulación de personas y vehículos en el territorio del Distrito desde el día 19 de marzo del presente año, lo que motivó la suspensión de actividades del contrato desde ese mismo 19 de marzo y que a su vez, el día 24 de marzo de 2020, a través de la plataforma SECOP II, se suspendiera el contrato de obra pública 137 de 2019 "*por un (1) mes a partir del 24 de marzo de 2020 inclusive, es decir, se reinicia a partir del 24 de abril de 2020, y poder continuar con la ejecución del mismo, en este plazo se podrá reiniciar o prorrogar, esto depende la duración del estado de emergencia económica, social y ecológica derivada de la pandemia covid-19, en razón a la expedición del decreto 081 de 2020 por el cual "se adoptan medidas sanitarias y acciones transitorias de policía para la preservación de la vida y mitigación del riesgo con ocasión de la situación epidemiológica causada por el coronavirus (covid-19) en Bogotá D.C., y se dictan otras disposiciones" adoptando las medidas con el objeto de garantizar la vida y la salud de los habitantes de Bogotá D.C. y en concordancia el decreto 457 de fecha 22 de marzo de 2020, emitido por el ministerio del interior.*". **6).** Que mediante oficio del 25 de septiembre de 2020, EL CONTRATISTA solicitó a la sociedad MIRS LATINOAMERICA S.A.S., prórroga y adición del contrato de obra pública 137 de 2019 con sustento en lo siguiente:

"Una vez evaluado y analizado el presupuesto de obra general, con base en los diseños debidamente aprobados por MIRS LATINOAMERICA S.A.S como Interventor de este contrato, se determina que los recursos presupuestados para la ejecución del contrato de obra 137 de 2019 con el Fondo de Desarrollo de Los Mártires – FDLM no son suficientes para lograr la meta física prevista para la terminación de los CIVs priorizados y seleccionados por parte del Fondo de Desarrollo Local de Los Mártires de acuerdo al correo enviado por parte del Arquitecto Jaime Villalba como Apoyo a la Supervisión el 14 de agosto de 2020 y ajustados en reunión del día 3 de septiembre de 2020 en las oficinas del FDLM.

A pesar de ser un contrato a monto agotable, se ha realizado un análisis de cada uno de los CIVs previstos con el objeto de que la intervención garantice la terminación de estos segmentos viales cumpliendo con las especificaciones y condiciones técnicas requeridas.

SEGMENTOS ESTABLECIDOS PARA INTERVENCION

Nº	CIV	EJE	DESDE	HASTA	ELEMENTO	UPZ	BARRIO	TIPO DE INTERVENCIÓN	TIPOLOGÍA	TIPO DE PAVIMENTO
1	14001469	CL 1F	KR 24A	KR 24B	CALZADA	SANTA ISABEL	EL VERGEL	REHABILITACIÓN	INTERMEDIA	FLEXIBLE
2	14001481	CL 1F	KR 24	KR 24A	CALZADA	SANTA ISABEL	EL VERGEL	REHABILITACIÓN	INTERMEDIA	FLEXIBLE
3	14000772	KR 25A	AC 6	CL 6BIS	CALZADA	LA SABANA	RICAURTE	REHABILITACIÓN	LOCAL	RIGIDO
4	14000741	KR 25A	CL 6BIS	CL 6A	CALZADA	LA SABANA	RICAURTE	REHABILITACIÓN	LOCAL	RIGIDO
5	14000718	KR 25A	CL 6A	CL 7	CALZADA	LA SABANA	RICAURTE	REHABILITACIÓN	LOCAL	RIGIDO
6	14001678	KR 25A	CL 7	CL 7BIS	CALZADA	LA SABANA	RICAURTE	REHABILITACIÓN	LOCAL	RIGIDO
7	14001545	CL 1ABIS	AC 1	KR 26	CALZADA	SANTA ISABEL	SANTA ISABEL SUR	REHABILITACIÓN	INTERMEDIA	FLEXIBLE
8	14001517	KR 26	CL 1ABIS	CL 1B	CALZADA	SANTA ISABEL	SANTA ISABEL SUR	REHABILITACIÓN	INTERMEDIA	FLEXIBLE
9	14001156	CL 2B	KR 25A	KR 26	CALZADA	SANTA ISABEL	SANTA ISABEL	REHABILITACIÓN	LOCAL	FLEXIBLE
10	14001367	CL 1B	KR 27A	KR 28	CALZADA	LA SABANA	SANTA ISABEL	REHABILITACIÓN	INTERMEDIA	FLEXIBLE
11	14000126	KR 24	CL 22A	DG 22B BIS	CALZADA	LA SABANA	SAMPER MENDOZA	REHABILITACIÓN	LOCAL	FLEXIBLE
12	14001506	KR 18	CL 2A	CL 3	CALZADA	SANTA ISABEL	EDUARDO SANTOS	REHABILITACIÓN	LOCAL	FLEXIBLE
13	14001619	CL 1C	KR 19A	KR 19BIS	CALZADA	SANTA ISABEL	EDUARDO SANTOS	REHABILITACIÓN	LOCAL	FLEXIBLE
14	14001616	CL 1C	KR 19BIS	KR 19C	CALZADA	SANTA ISABEL	EDUARDO SANTOS	REHABILITACIÓN	LOCAL	FLEXIBLE
15	14001058	KR 26	CL 2C	CL 3	CALZADA	SANTA ISABEL	SANTA ISABEL	REHABILITACIÓN	INTERMEDIA	FLEXIBLE

De igual manera, es importante realizar una intervención integral a las calzadas de estos CIVs, ya que, de acuerdo con los diagnósticos elaborados y aprobados por la Interventoría, se ha determinado el cambio de tipo de intervención al requerirse rehabilitación en lugar de lo previsto en los estudios previos que correspondía a mantenimiento.

Esta situación se presenta debido a las malas condiciones actuales de las estructuras de los CIVs priorizados, que sumado a la presencia de rutas de SITP y al incremento de los flujos vehiculares han causado mayor deterioro y obligan a construir estructuras acordes a los nuevos requerimientos, con mayores y mejores especificaciones que garanticen la estabilidad de los mismos y permita ofrecer a los usuarios vías en perfectas condiciones.

Adicionalmente y de acuerdo con las exigencias de la Empresa de Acueducto de Bogotá – EAB, se deben también intervenir las redes húmedas, ya que las actuales datan de muchos años, se encuentran en materiales que no se ajustan a las normas técnicas vigentes y tampoco permiten garantizar la estabilidad de cualquier tipo de intervención que se requiera efectuar (con base en la ley 1682 de 2013), que se traduce en la necesidad de una mayor inversión para la terminación total de cada CIV.

Debido a que se tienen diseños de CIVs de contratos anteriores suministrados por parte del Fondo de Desarrollo Local de Los Mártires – FDLM, sumado al requerimiento de las comunidades afectadas, se contemplan para la intervención estos segmentos viales, por el estado actual de los mismos, y se hace necesario una inversión adicional que permita entregar obras de calidad y con la estabilidad requerida. Lo anterior, previniendo la inclusión de uno o varios segmentos dentro del Registro Nacional de Obras Civiles Inconclusas de las Entidades Estatales, como lo ordena la Ley N° 2020 del 17 de julio de 2020.

CIVs ADICIONALES CONTRATO CO-137-2019

Nº	CIV	PK	EJE	DESDE	HASTA	ELEMENTO	LONGITUD (KM)	INTERVENCION REAL
1	14000131	72474	CL 22C	KR 20	KR 22	ANDEN	0,08	REHABILITACION
2	14000178	183819	CL 22A	KR 19A	KR 19B	CALZADA	0,05	REHABILITACION
3	14000206	72426	CL 22A	KR 18B	AK 19	ANDEN	0,11	REHABILITACION
4	14000233	183801	CL 22	KR 18B	AK 19	CALZADA	0,10	REHABILITACION
5	14000266	183679	KR 18	CL 22A	CL 22C BIS	CALZADA	0,02	REHABILITACION
6	14001098	182856	CL 1D BIS	KR 29B	KR 30	CALZADA	0,10	REHABILITACION
7	14000425	72013	KR 21	CL 14	CL 15	ANDEN	0,10	REHABILITACION
8	14000440	72011	KR 21	CL 13A	CL 14	ANDEN	0,04	REHABILITACION
9	14000463	72009	KR 21	AC 13	CL 13A	ANDEN	0,04	REHABILITACION
10	14000615	183438	CL 12	KR 19	KR 19A	CALZADA	0,08	REHABILITACION

Una vez elaborado el presupuesto de obra contractual con respecto a las cantidades reales de ejecución en cada uno de los CIV's, se ha determinado que los recursos apropiados por el Fondo de Desarrollo de Los Mártires no son suficientes para el cumplimiento del alcance real y total del proyecto lo cual se plasmó en las memorias de cálculo presentadas como soporte del presupuesto de obra final ajustado, con cada uno de los ítems contractuales e ítems no previstos.

Se ha previsto también en este adicional los valores requeridos para la implementación de los protocolos de bioseguridad debidamente aprobados por la interventoría y la ARL AXXA Colpatria.

Se deja constancia que de los segmentos viales contractuales contemplados en los estudios previos (Anexo Técnico), se excluyeron por la Intervención de terceros los siguientes CIVs:

SEGMENTOS VIALES EXCLUIDOS POR INTERVENCION DE TERCEROS

Nº	CIV	EJE	DESDE	HASTA	ELEMENTO	UPZ	BARRIO	TIPO DE INTERVENCION	TIPOLOGIA
1	14001265	KR 25	CL 2	CL 2A	CALZADA	SANTA ISABEL	EL VERGEL	MANTENIMIENTO	INTERMEDIA
2	14000565	CL 12	KR 20A	KR 21	CALZADA	LA SABANA	LA SABANA	REHABILITACION	INTERMEDIA
3	14000573	CL 12	KR 20	KR 20A	CALZADA	LA SABANA	LA SABANA	REHABILITACION	INTERMEDIA
4	14000550	CL 12A	KR 20	KR 21	CALZADA	LA SABANA	LA SABANA	MANTENIMIENTO	LOCAL

Como complemento a la solicitud de adición de los recursos que se necesitan para darle cumplimiento al alcance total del proyecto se debe tener en cuenta el plazo necesario para cumplir con estas actividades adicionales. Se debe prever un Plazo adicional que garantice la ejecución de las obras previstas y sus complementarias, por lo que solicitamos se prorrogue el contrato en un término de DOS (2) MESES con el objeto de garantizar el cumplimiento de todas las Obras contractuales como adicionales.

Teniendo en cuenta todas las condiciones y especificaciones técnicas requeridas se elaboró el presupuesto de obra con el soporte de las memorias de Cálculo para cada ítem, en cada uno de los segmentos a intervenir como soporte de esta solicitud, teniendo como objetivo llegar al alcance final de los mismos con base en los diseños aprobados. De igual manera se prevé que en este período de ejecución se apoye de manera efectiva la reactivación económica tanto de la localidad como de la ciudad.

El balance de los CIV's a intervenir es el siguiente:
