PROCESO DE GESTIÓN CONTRACTUAL

ETAPA CONTRACTUAL

FORMATO
INFOME DE SUPERVISIÓN

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 03 del 15 de marzo 2021	
DIRECCIÓN, ÁREA, REGIONAL O CENTRO ORDENADORA DE GASTO:	CENTRO AGROEMPRESARIAL Y TURISTICO DE LOS ANDES
SUPERVISOR DEL CONTRATO:	Jhon Edison Jimenez Martinez
APOYO A LA SUPERVISIÓN:	Ninguno
CONTRATO No:	CO1.PCCNTR.1942742
TIPO DE CONTRATO:	OBRA
OBJETO:	Contratar la ampliación y adecuación del sistema de producción de abono a base de estiércol de oveja y cabra incorporando activadores biológicos para la sede Granja los Andes del Centro Agroempresarial y Turístico de los Andes del SENA Regional
VALOR:	$ 80.395.237
CONTRATISTA:	COINGENSA S.A.S
NIT:	900896967-6
LUGAR DE EJECUCIÓN:	El lugar de ejecución del contrato es la sede de la GRANJA LOS ANDES: ubicada en la Vereda Calichal, Finca Venta quemada, del Municipio de Málaga, Departamento de Santander.
FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	27 de octubre de 2020
FECHA DE INICIO:	27 de octubre de 2020
PLAZO INICIAL DEL CONTRATO:	2 meses
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	$ 80.395.237
VALOR ACTUAL DEL CONTRATO:	$ 113.338.413
PRÓRROGA No 1:	1 mes
ADICIÓN No. 1:	$ 32.943.176
SUSPENSIÓN No. x:	Ninguno
FORMA DE PAGO:	El SENA realizará pagos parciales equivalentes hasta el 70% del avance de la ejecución de la obra, y un pago final equivalente al 30% con el acta de recibo final, una vez recibidas las adecuaciones y mantenimiento sobre los inmuebles determinados a satisfacción, previa presentación de la factura, debidamente diligenciada y soportada con la presentación de la certificación de cumplimiento a satisfacción expedida por el supervisor del contrato, informe de ejecución, los reportes mensuales del estado de cuenta y certificación

	del pago al sistema integral de seguridad social y parafiscales expedida por el representante legal o revisor fiscal del contratista. Los pagos a que se obliga el Centro Agroempresarial y turístico de los Andes, SENA Regional Santander en virtud del contrato, se sujetarán a las apropiaciones y disponibilidades presupuestales correspondientes, y a la situación de recursos del Programa Anual Mensualizado de Caja –PAC.

OBLIGACIONES	ACTIVIDADES REALIZADAS	PRODUCTO
1. Contratar la ampliación y adecuación del sistema de producción de abono a base de estiércol de oveja y cabra incorporando activadores biológicos para la sede Granja los Andes del Centro Agroempresarial y Turístico de los Andes del SENA Regional	Se recibe el tercer avance de ejecución de la obra de ampliación y adecuación de producción de abono a base de estiércol de oveja y cabra; el 26 de enero de 2021 con el conocimiento del supervisor del contrato en un periodo comprendido desde el 25 de diciembre de 2020, hasta el 26 de enero de 2021, correspondiente a la factura electrónica N° 530 del 15 de marzo de 2021.	Evidencias fotográficas.
Yo, **Jhon Edison Jimenez Martinez,** quien se identifica C.C No. **1100502021** en calidad de supervisor del Contrato deja constancia que el contratista COINGENSA S.A.S identificado con NIT N° 900896967-6 ha cumplido a cabalidad durante el presente periodo de ejecución con todas las obligaciones contractuales.		

FECHA	No. DE FACTURA	VALOR PARA CANCELAR	VALOR EJECUTADO	SALDO DEL CONTRATO	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FINANCIERA	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FÍSICA	
						No. de días ejecutados	%
26/01/2021	530	68.521.138	44.817.275	0	100%	90	100%

OBSERVACIONES

Se aclara que el presente informe se genera con fecha del 15 de marzo del 2021, en atención a los diferentes ajustes llevados a cabo a la factura de venta electrónica en cumplimiento de observaciones realizadas por el área de contabilidad.

El suscrito **Jhon Edison Jimenez Martinez**, quien se identifica con la cédula de ciudadanía No. **1100502021**, Coordinador Administrativo del centro CATA del Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA, Regional Santander, actuando en calidad de SUPERVISOR del contrato, deja constancia por medio de la presente acta parcial de recibo a satisfacción de la obra, así:

SEGÚN FACTURA ELECETRONICA DE VENTA No 530 DEL 15 DE MARZO DEL 2021

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	CONTRATAR LA AMPLIACION Y ADECUACION DEL SISTEMA DE PRODUCCION DE ABONO A BASE DE ESTIERCOL DE OVEJO Y CABRO INCORPORANDO ACTIVIDADES BIOLOGICAS PARA LA SEDE GRANJA LOS ANDES DEL CENTRO AGROEMPRESARIAL Y TURISTICO DE LOS ANDES DEL SENA REGIONAL ACTA DE PAGO N° 3 FINAL COSTO DIRECTO	1.00	54,403,444.23	54,403,444.23
2	ADMINISTRACION 20%	1.00	10,880,688.84	10,880,688.84
3	UTILIDAD 5 %	1.00	2,720,172.21	3,237,004.93

Total items: 3

Total Bruto	68,004,305.28
IVA 19%	516,832.72
Total a Pagar	68,521,138.00

Valor en Letras:
Sesenta y ocho millones quinientos veintiun mil ciento treinta y ocho pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2021-04-14 por $ 68,521,138.00

REGISTRO FOTOGRAFICO

2.1 Excavación manual en conglomerado:

<table>
<tr><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td></tr>
</table>

	REDMI NOTE 8 PRO 64MP QUAD CAMERA
	
	

2.3 Suministro e instalación sub-base granular:













2.4 Suministro e instalación concreto de 3000 psi para sardineles de 0,20x0,50 reforzado con 6 varillas de 3/8” y estribos de ¼”:

	
Patio de extendido	Patio de extendido
	
Patio de extendido	Patio de extendido
	
Patio de extendido	Patio de extendido

	
Acceso	Acceso
	
Acceso	Acceso
	
Acceso	Patio de extendido

2.5 Suministro e instalación concreto de 3500 psi, patio de extendido:

	
Andén costado norte	Andén costado sur
	
	

7.1 Suministro e instalación perfil en C – grado 50 de 250x75x25, espesor 3 mm, pintado con anticorrosivo y pintura base de aceite:













7.2 Suministro e instalación perfil en C – grado 50 de 100x50x15, espesor 2 mm, pintado con anticorrosivo y pintura base de aceite:













7.3 Suministro e instalación cubierta arquitectónica pintada calibre 28:













9.1 Suministro e instalación de puerta en lámina cold rolled:
9.2 Suministro e instalación de ventana en lámina cold rolled con reja tipo bancario:













10.1 Suministro e instalación pañete mortero 1.4:
10.2 Suministro e instalación pintura tipo 1 sobre pañete 3 manos:








11.1 Excavación manual en conglomerado:
11.2 Suministro e instalación de caja de 0,80x0,80x1,00 en ladrillo tolete y pañetada:







11.3 Suministro e instalación de cuneta V en concreto de 3000 psi, e=10 cm:













12.2 Suministro e instalación concreto de 2000 psi para solados:













12.3 Suministro e instalación acero de refuerzo 60000 psi:













12.4 Suministro e instalación concreto de 3000 psi para zarpa:

<table>
<tr><td></td><td>
</td></tr>
<tr><td></td><td></td></tr>
<tr><td>
</td><td>
</td></tr>
<tr><td></td><td></td></tr>
<tr><td>
</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td></tr>
</table>

12.5 Suministro e instalación concreto de 3000 psi para elevación:













12.6 Suministro e instalación de filtro dren francés:













15.1 Relleno en material común para muro de contención:













15.2 Relleno en material común para conformación talud sobre el muro de contención:













16.1 Suministro e instalación de canal en lámina galvanizada:













16.2 Suministro e instalación de bajantes en tubería PVC sanitaria tipo liviana de 3”:

17.1 Acero de refuerzo para dovelas transversales y barras de transferencia long:














17.2 Aserrado, limpieza y sello para las juntas de las losas de concreto:









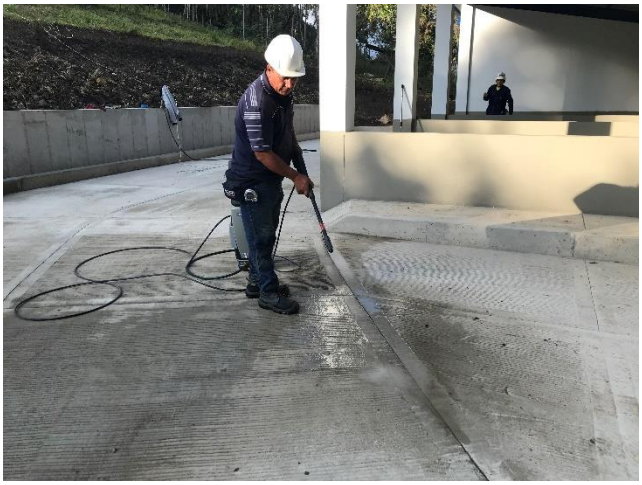



	
REDMI NOTE 8 PRO 64MP QUAD CAMERA	
	

17.3 Retiro y transporte del material proveniente de la excavación manual en conglomerado:













IMAGENES DEL PROYECTO TERMINADO:













Igualmente, en desarrollo de las funciones de supervisión o interventoría me permito certificar mediante la presente Acta que:

El CONTRATISTA **COINGENSA S.A.S**, ha cumplido a satisfacción con el objeto del contrato identificado al inicio de esta acta, razón por la cual se le debe reconocer a título de **PAGO DEFINITIVO** la suma de **$ 68.521.138 MCTE**, correspondiente al cumplimiento del objeto contractual durante periodo comprendido desde el 25 de diciembre hasta el 26 de enero de 2021 Y Como consecuencia de lo anterior, certifico que se ha cumplido con las funciones de verificación, vigilancia y control frente al concepto del pago solicitado, y que es procedente la ordenación de pago respectiva. Igualmente certifico que se ha dado cumplimiento a las obligaciones señaladas en el Manual de Supervisión e Interventoría del SENA y el Estatuto Anticorrupción, y entre las cuales se encuentra la verificación que el contratista se encuentra a paz y salvo en el pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral, aportes parafiscales y contratación de aprendices, durante toda la vigencia del contrato.

Elaboro: *Jhon Edison Jimenez Martinez - Supervisor*
Reviso: *Diana Marcela Arenales C-Apoyo administrativo*

	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA **GRUPO CONSTRUCCIONES**	**GIL-F-060** **V.1**

ACTA DE ENTREGA Y RECIBO FINAL DEL OBJETO CONTRACTUAL

TIPO DE CONTRATO	OBRA		
CONTRATO No.	C01.PCCNTR.1942742		
CONTRATISTA	COINGENSA S.A.S NIT. 900.896.967 - 6		
OBJETO	CONTRATAR LA AMPLIACION Y ADECUACION DEL SISTEMA DE PRODUCCION DE ABONO A BASE DE ESTIERCOL DE OVEJO Y CABRO INCORPORANDO ACTIVADORES BIOLÓGICOS PARA LA SEDE GRANJA LOS ANDES DEL CENTRO AGROEMPRESARIAL Y TURISTICO DE LOS ANDES DEL SENA REGIONAL		
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO	KM 2 VIA CONCEPCION FINCA VENTAQUEMADA		
INTERVENTOR	N.A.	CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	N.A.
SUPERVISOR	JHON EDISON JIMENEZ MARTINEZ		

CONDICIONES FINALES DEL CONTRATO

PLAZO ACTUAL	3 MESES
FECHA DE TERMINACIÓN	26/01/2021
VALOR EJECUTADO	$ 113.338.413,00

LOS SUSCRITOS MEDIANTE EL PRESENTE DOCUMENTO DEJAN CONSTANCIA DE LA ENTREGA Y RECIBO DEFINITIVO DEL OBJETO CONTRACTUAL EL DIA 26 DEL MES DE ENERO DE 2021

LA INTERVENTORIA (O EL SUPERVISOR SI ES EL CASO) HACE CONSTAR QUE EL PRODUCTO OBJETO DEL CONTRATO HA SIDO ENTREGADO POR EL CONTRATISTA Y RECIBIDO POR LA INTERVENTORIA A SATISFACCIÓN, DE ACUERDO CON LA DESCRIPCIÓN DEL SIGUIENTE CUADRO QUE INCLUYE CANTIDADES Y PRECIOS:

ACTIVIDADES EJECUTADAS

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD EJECUTADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1,1	Localización y Replanteo Topográfico	m2	330,96	$ 2.880,00	953.164,80
1,2	Excavación en conglomerado a maquina incluye retiro	m3	524,26	$ 16.400,00	8.597.864,00
2,1	Excavación manual en conglomerado	m3	73,72	$ 31.600,00	2.329.552,00
2,2	Suministro e instalación de filtro dren francés de 0,45 x 0,85 m.	ml	15,7	$ 92.400,00	1.450.680,00
2,3	Suministro e instalación de sub base granular.	m3	52,41	$ 84.720,00	4.440.175,20
2,4	Suministro e instalación concreto de 3000 psi para sardineles de 0,20x0,50 reforzado con 6 varillas de 3/8" y estribos de 1/4".	m	52,37	$ 67.600,00	3.540.212,00
2,5	Suministro e instalación concreto de 3500 psi, patio de extendido incluye junta de dilatación.	m3	23,53	$ 540.400,00	12.715.612,00
3,1	Excavación manual en conglomerado	m3	21,09	$ 31.600,00	666.444,00
3,2	Suministro e instalación concreto de 2000 psi para solados	m3	1,23	$ 360.640,00	443.587,20
3,3	Suministro e instalación acero de refuerzo 60000 psi	Kg	511,88	$ 4.000,00	2.047.520,00
3,4	Suministro e instalación concreto de 3000 psi para zapatas	m3	2,56	$ 500.640,00	1.281.638,40
3,5	Suministro e instalación concreto de 3000 psi para vigas de cimentación	m3	3,11	$ 516.160,00	1.605.257,60
4,1	Suministro e instalación acero de refuerzo 60000 psi	Kg	587,55	$ 4.000,00	2.350.200,00

4,2	Suministro e instalación concreto de 3000 psi para estructura	m3	3,63	$ 532.640,00	1.933.483,20
5,1	Suministro e instalación de sub base granular.	m3	6,18	$ 84.720,00	523.569,60
5,2	Suministro e instalación de concreto de 3000 psi con refuerzo en malla Q3, para placa de piso. E=0,12	m2	74,27	$ 60.160,00	4.468.083,20
6,1	Suministro e instalación de mampostería en ladrillo tolete mortero 1:3.	m2	55,36	$ 49.200,00	2.723.712,00
7,1	Suministro e instalación perfil en C - Grado 50 de 250x75x25. espesor 3mm. Pintado con anticorrosivo y pintura base de aceite.	m	65,16	$ 73.800,00	4.808.808,00
7,2	Suministro e instalación perfil en C - Grado 50 de 100x50x15. espesor 2mm. Pintado con anticorrosivo y pintura base de aceite.	m	96	$ 37.920,00	3.640.320,00
7,3	Suministro e instalación cubierta master 1000 pintada calibre 28	m2	125,28	$ 39.000,00	4.885.920,00
8,1	Suministro e instalación de salida lámpara techo (Bala LED Con Vidrio Redondo 510 Lúmenes)	und	0	$ 71.160,00	-
8,2	Suministro e instalación salida + interruptor.	und	0	$ 62.480,00	-
8,3	Suministro e instalación salida toma sencilla muro.	und	0	$ 62.800,00	-
9,1	Suministro e instalación de puerta en lamina cold rolled, marco en calibre 18 y hoja en calibre 20, con chapa doble cilindro, pintada con anticorrosivo y pintura en aceite.	m2	8,36	$ 160.720,00	1.343.619,20
9,2	Suministro e instalación de venta en lamina cold rolled, marco en calibre 18 y reja tipo bancario en tubo cuadrado de 1" calibre 22, pintada con anticorrosivo y pintura en aceite.	m2	3,48	$ 158.960,00	553.180,80
10,1	Suministro e instalación pañete mortero 1:4	m2	163,38	$ 13.760,00	2.248.108,80
10,2	Suministro e instalación pintura tipo 1 sobre pañete 3 manos	m2	163,38	$ 9.320,00	1.522.701,60
11,1	Excavación manual en conglomerado	m3	6,02	$ 31.600,00	190.232,00
11,2	Suministro e instalación de caja de 0,80*0,80*1,00 en ladrillo tolete y pañetada.	Und	1	$ 252.160,00	252.160,00
11,3	Suministro e instalación de cuneta v en concreto de 3000 psi, e=10cm. Con refuerzo malla Q3, de 0,60 de ancho x 0,10 de espesor.	m	17	$ 51.032,00	867.544,00
12.1	Excavación manual en conglomerado	M3	8,91	$ 31.600,00	281.556,00
12.2	Suministro e instalación concreto de 2000 psi para solados	M3	1,35	$ 360.640,00	486.864,00
12.3	Suministro e instalación acero de refuerzo 60000 psi	KG	945,33	$ 4.000,00	3.781.320,00
12.4	Suministro e instalación concreto de 3000 psi para zarpa	M3	6,75	$ 500.640,00	3.379.320,00
12.5	Suministro e instalación concreto de 3000 psi para elevación	M3	4,8	$ 532.640,00	2.556.672,00
12.6	Suministro e instalación de filtro dren francés	ML	20	$ 92.400,00	1.848.000,00

13.1	Excavación manual en conglomerado	M3	7,2	$ 31.600,00	227.520,00
13.2	Suministro e instalación acero de refuerzo 60000 psi	KG	0	$ 4.000,00	-
13.3	Suministro e instalación concreto de 3000 psi para cuneta	M3	0	$ 500.640,00	-
14.1	Concreto ciclópeo (2000 psi)	M3	4,34	$ 336.400,00	1.459.976,00
15.1	Relleno en material común para muro de contención	M3	15,15	$ 48.696,00	737.744,40
15.2	Relleno en material común para conformación talud sobre el muro de contención	M3	12,12	$ 48.696,00	590.195,52
16.1	Suministro e instalación de canal en lámina galvanizada, incluye soportes, accesorios de instalación, anticorrosivo y pintura de esmalte	ML	16	$ 60.000,00	960.000,00
16.2	Suministro e instalación de bajantes en tubería PVC saniaria tipo liviana de 3", incluye pintura, soportes y accesorios.	M3	21	$ 17.600,00	369.600,00
17.1	Acero de refuerzo para las dovelas transversales y barras de transferencia longitudinales de las losas de concreto	KG	89,28522	$ 4.000,00	357.140,88
17.2	Aserrado, limpieza y sello para las juntas de las losas de concreto con sellante de silicona (sellador auto-nivelante)	ML	107,14	$ 4.800,00	514.272,00
17.3	Retiro y transporte del material proveniente de la excavación manual en conglomerado	M3	32,373383	$ 10.000,00	323.733,83
SUBTOTAL					90.257.264
ADMINISTRACIÓN				20%	18.051.453
IMPREVISTOS				0%	-
UTILIDAD				5%	4.512.863
IVA/ UTILIDAD				19%	516.833
VALOR TOTAL EJECUTADO					113.338.413
VALOR TOTAL AJUSTES (SI APLICA)					
VALOR TOTAL FINAL (EJECUTADO MAS AJUSTES)					113.338.413

EN CASO DE CONSULTORIA ADJUNTE DEBIDAMENTE DILIGENCIADOS LOS FORMATOS DE VERIFICACION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS, FORMATO DE RELACION DE PLANOS Y FORMATO DE RELACION DE DOCUMENTOS SEGÚN CORRESPONDA.

EL RECIBO DE LOS TRABAJOS NO RELEVA AL CONTRATISTA DE SUS RESPONSABILIDADES Y OBLIGACIONES A QUE HACE REFERENCIA EL CONTRATO Y A LAS ESTABLECIDAS EN LAS NORMAS LEGALES VIGENTES. ASIMISMO, EL CONTRATISTA SE COMPROMETE A ACTUALIZAR LAS GARANTÍAS DE CONFORMIDAD CON LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO.

FIRMA

NOMBRE: RUBIELA SANCHEZ CACERES

REP. LEGAL CONTRATISTA

FIRMA

NOMBRE: JHON EDISON JIMENEZ MARTINEZ

SUPERVISOR

ACTA DE EJECUCIÓN FINAL DE OBRA

CONTRATO	CONTRATISTA	FECHA ACTA DE OBRA	ACTA Nº
C01.PCCNTR.1942742	COINGENSA S.A.S NIT. 900.896.967 - 6	26/01/2021	03 - FINAL

OBJETO DEL CONTRATO	SUPERVISOR:
CONTRATAR LA AMPLIACION Y ADECUACION DEL SISTEMA DE PRODUCCION DE ABONO A BASE DE ESTIERCOL DE OVEJO Y CABRO INCORPORANDO ACTIVADORES BIOLÓGICOS PARA LA SEDE GRANJA LOS ANDES DEL CENTRO AGROEMPRESARIAL Y TURISTICO DE LOS ANDES DEL SENA REGIONAL	SUPERVISOR: JHON EDISON JIMENEZ MARTINEZ

Plazo	Fecha de inicio		Valor ACTA	Valor final del contrato
3 MESES	27-oct			
		Vigencia del contrato	68.521.138,01	$113.338.413
Granja Los Andes		2020- 2021	Valor I.V.A. ACTA	Valor total I.V.A. contrato
Valor inicial del contrato	$ 80.395.237,00			
Valor adición	$ 32.943.176,01	Valor anticipo	$516.832,72	$ 516.832,72
Valor total	$ 113.338.413,01			

PRESUPUESTO CONTRATADO			CONTRATO INICIAL			ACTA DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES No. 1			ACTA DE OBRA N.01			ACTA DE OBRA N.02			ACTA FINAL			VALOR ACUMULADO		
ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	V/UNIT.	V/TOTAL	CANT.	V/UNIT.	V/TOTAL	CANT.	V/UNIT.	V/TOTAL	CANT.	V/UNIT.	V/TOTAL	CANT.	V/UNIT.	V/TOTAL	CANT.	V/UNIT.	V/TOTAL
1,1	Localización y Replanteo Topográfico	m2	223,66	$ 2.880,00	$ 644.140,80	330,96	$ 2.880	$ 953.164,80	223,66	$ 2.880,00	$ 644.140,80	107,30	$ 2.880,00	$ 309.024,00		$ 2.880,00		$ 330,96	$ 2.880,00	$ 953.164,80
1,2	Excavación en conglomerado a maquina incluye retiro	m3	362,70	$ 16.400,00	$ 5.948.280,00	524,26	$ 16.400	$ 8.597.864,00	362,7	$ 16.400,00	$ 5.948.280,00	161,56	$ 16.400,00	$ 2.649.584,00		$ 16.400,00		$ 524,26	$ 16.400,00	$ 8.597.864,00
2,1	Excavación manual en conglomerado	m3	30,56	$ 31.600,00	$ 965.696,00	73,72	$ 31.600	$ 2.329.552,00		$ 31.600,00		59,51	$ 31.600,00	$ 1.880.516,00	$ 14,21	$ 31.600,00	$ 449.036,00	$ 73,72	$ 31.600,00	$ 2.329.552,00
2,2	Suministro e instalación de filtro dren francés de 0,45 x 0,85 m.	ml	33,76	$ 92.400,00	$ 3.119.424,00	15,70	$ 92.400	$ 1.450.680,00		$ 92.400,00		15,70	$ 92.400,00	$ 1.450.680,00		$ 92.400,00		$ 15,70	$ 92.400,00	$ 1.450.680,00
2,3	Suministro e instalación de sub base granular.	m3	28,76	$ 84.720,00	$ 2.436.547,20	52,41	$ 84.720	$ 4.440.175,20		$ 84.720,00		23,65	$ 84.720,00	$ 2.003.628,00	$ 28,76	$ 84.720,00	$ 2.436.547,20	$ 52,41	$ 84.720,00	$ 4.440.175,20
2,4	Suministro e instalación concreto de 3000 psi para sardineles de 0,20x0,50 reforzado con 6 varillas de 3/8" y estribos de 1/4".	m	51,52	$ 67.600,00	$ 3.482.752,00	52,37	$ 67.600	$ 3.540.212,00		$ 67.600,00			$ 67.600,00		$ 52,37	$ 67.600,00	$ 3.540.212,00	$ 52,37	$ 67.600,00	$ 3.540.212,00
2,5	Suministro e instalación concreto de 3500 psi, patio de extendido incluye junta de dilatación.	m3	17,88	$ 540.400,00	$ 9.662.352,00	23,53	$ 540.400	$ 12.715.612,00		$ 540.400,00			$ 540.400,00		$ 23,53	$ 540.400,00	$ 12.715.612,00	$ 23,53	$ 540.400,00	$ 12.715.612,00
3,1	Excavación manual en conglomerado	m3	9,10	$ 31.600,00	$ 287.560,00	21,09	$ 31.600	$ 666.444,00	9,1	$ 31.600,00	$ 287.560,00		$ 31.600,00		$ 11,99	$ 31.600,00	$ 378.884,00	$ 21,09	$ 31.600,00	$ 666.444,00
3,2	Suministro e instalación concreto de 2000 psi para solados	m3	1,23	$ 360.640,00	$ 443.587,20	1,23	$ 360.640	$ 443.587,20	1,23	$ 360.640,00	$ 443.587,20		$ 360.640,00			$ 360.640,00		$ 1,23	$ 360.640,00	$ 443.587,20
3,3	Suministro e instalación acero de refuerzo 60000 psi	Kg	511,88	$ 4.000,00	$ 2.047.520,00	511,88	$ 4.000	$ 2.047.520,00	511,88	$ 4.000,00	$ 2.047.520,00		$ 4.000,00			$ 4.000,00		$ 511,88	$ 4.000,00	$ 2.047.520,00
3,4	Suministro e instalación concreto de 3000 psi para zapatas	m3	2,56	$ 500.640,00	$ 1.281.638,40	2,56	$ 500.640	$ 1.281.638,40	2,56	$ 500.640,00	$ 1.281.638,40		$ 500.640,00			$ 500.640,00		$ 2,56	$ 500.640,00	$ 1.281.638,40
3,5	Suministro e instalación concreto de 3000 psi para vigas de	m3	3,11	$ 516.160,00	$ 1.605.257,60	3,11	$ 516.160	$ 1.605.257,60	3,11	$ 516.160,00	$ 1.605.257,60		$ 516.160,00			$ 516.160,00		$ 3,11	$ 516.160,00	$ 1.605.257,60
4,1	Suministro e instalación acero de refuerzo 60000 psi	Kg	587,55	$ 4.000,00	$ 2.350.200,00	587,55	$ 4.000	$ 2.350.200,00	432,54	$ 4.000,00	$ 1.730.160,00	155,01	$ 4.000,00	$ 620.040,00		$ 4.000,00		$ 587,55	$ 4.000,00	$ 2.350.200,00
4,2	Suministro e instalación concreto de 3000 psi para estructura	m3	3,63	$ 532.640,00	$ 1.933.483,20	3,63	$ 532.640	$ 1.933.483,20	2,16	$ 532.640,00	$ 1.150.502,40	1,47	$ 532.640,00	$ 782.980,80		$ 532.640,00		$ 3,63	$ 532.640,00	$ 1.933.483,20
5,1	Suministro e instalación de sub base granular.	m3	6,33	$ 84.720,00	$ 536.277,60	6,18	$ 84.720	$ 523.569,60	6,18	$ 84.720,00	$ 523.569,60		$ 84.720,00			$ 84.720,00		$ 6,18	$ 84.720,00	$ 523.569,60
5,2	Suministro e instalación de concreto de 3000 psi con refuerzo en malla Q3, para placa de piso. E=0,12	m2	69,30	$ 60.160,00	$ 4.169.088,00	74,27	$ 60.160	$ 4.468.083,20	69,30	$ 60.160,00	$ 4.169.088,00		$ 60.160,00		$ 4,97	$ 60.160,00	$ 298.995,20	$ 74,27	$ 60.160,00	$ 4.468.083,20
6,1	Suministro e instalación de mampostería en ladrillo tolete mortero 1:3.	m2	55,36	$ 49.200,00	$ 2.723.712,00	55,36	$ 49.200	$ 2.723.712,00	38,78	$ 49.200,00	$ 1.907.976,00	16,58	$ 49.200,00	$ 815.736,00		$ 49.200,00		$ 55,36	$ 49.200,00	$ 2.723.712,00
7,1	Suministro e instalación perfil en C - Grado 50 de 250x75x25. espesor 3mm. Pintado con anticorrosivo y pintura base de aceite.	m	65,16	$ 73.800,00	$ 4.808.808,00	65,16	$ 73.800	$ 4.808.808,00		$ 73.800,00			$ 73.800,00		$ 65,16	$ 73.800,00	$ 4.808.808,00	$ 65,16	$ 73.800,00	$ 4.808.808,00
7,2	Suministro e instalación perfil en C - Grado 50 de 100x50x15. espesor 2mm. Pintado con anticorrosivo y pintura base de aceite.	m	96,00	$ 37.920,00	$ 3.640.320,00	96,00	$ 37.920	$ 3.640.320,00		$ 37.920,00			$ 37.920,00		$ 96,00	$ 37.920,00	$ 3.640.320,00	$ 96,00	$ 37.920,00	$ 3.640.320,00
7,3	Suministro e instalación cubierta master 1000 pintada calibre 28	m2	125,28	$ 39.000,00	$ 4.885.920,00	125,28	$ 39.000	$ 4.885.920,00		$ 39.000,00			$ 39.000,00		$ 125,28	$ 39.000,00	$ 4.885.920,00	$ 125,28	$ 39.000,00	$ 4.885.920,00
8,1	Suministro e instalación de salida lámpara techo (Bala LED Con Vidrio Redondo 510 Lúmenes)	und	8,00	$ 71.160,00	$ 569.280,00		$ 71.160			$ 71.160,00			$ 71.160,00			$ 71.160,00			$ 71.160,00	
8,2	Suministro e instalación salida + interruptor.	und	4,00	$ 62.480,00	$ 249.920,00		$ 62.480			$ 62.480,00			$ 62.480,00			$ 62.480,00			$ 62.480,00	
8,3	Suministro e instalación salida toma sencilla muro.	und	8,00	$ 62.800,00	$ 502.400,00		$ 62.800			$ 62.800,00			$ 62.800,00			$ 62.800,00			$ 62.800,00	
9,1	Suministro e instalación de puerta en lamina cold rolled, marco en calibre 18 y hoja en calibre 20, con chapa doble cilindro, pintada con anticorrosivo y pintura en aceite.	m2	8,36	$ 160.720,00	$ 1.343.619,20	8,36	$ 160.720	$ 1.343.619,20		$ 160.720,00			$ 160.720,00		$ 8,36	$ 160.720,00	$ 1.343.619,20	$ 8,36	$ 160.720,00	$ 1.343.619,20
9,2	Suministro e instalación de venta en lamina cold rolled, marco en calibre 18 y reja tipo bancario en tubo cuadrado de 1" calibre 22, pintada con anticorrosivo y pintura en aceite.	m2	3,48	$ 158.960,00	$ 553.180,80	3,48	$ 158.960	$ 553.180,80		$ 158.960,00			$ 158.960,00		$ 3,48	$ 158.960,00	$ 553.180,80	$ 3,48	$ 158.960,00	$ 553.180,80
10,1	Suministro e instalación pañete mortero 1:4	m2	112,82	$ 13.760,00	$ 1.552.403,20	163,38	$ 13.760	$ 2.248.108,80		$ 13.760,00		112,82	$ 13.760,00	$ 1.552.403,20	$ 50,56	$ 13.760,00	$ 695.705,60	$ 163,38	$ 13.760,00	$ 2.248.108,80
10,2	Suministro e instalación pintura tipo 1 sobre pañete 3 manos	m2	112,82	$ 9.320,00	$ 1.051.482,40	163,38	$ 9.320	$ 1.522.701,60		$ 9.320,00			$ 9.320,00		$ 163,38	$ 9.320,00	$ 1.522.701,60	$ 163,38	$ 9.320,00	$ 1.522.701,60
11,1	Excavación manual en conglomerado	m3	12,71	$ 31.600,00	$ 401.636,00	6,02	$ 31.600	$ 190.232,00	2,56	$ 31.600,00	$ 80.896,00		$ 31.600,00		$ 3,46	$ 31.600,00	$ 109.336,00	$ 6,02	$ 31.600,00	$ 190.232,00
11,2	Suministro e instalación de caja de 0,80*0,80*1,00 en ladrillo tolete y pañetada.	Und	1,00	$ 252.160,00	$ 252.160,00	1,00	$ 252.160	$ 252.160,00		$ 252.160,00			$ 252.160,00		$ 1,00	$ 252.160,00	$ 252.160,00	$ 1,00	$ 252.160,00	$ 252.160,00
11,3	Suministro e instalación de cuneta v en concreto de 3000 psi, e=10cm. Con refuerzo malla Q3, de 0,60 de ancho x 0,10 de espesor.	m	17,00	$ 51.032,00	$ 867.544,00	17,00	$ 51.032	$ 867.544,00		$ 51.032,00			$ 51.032,00		$ 17,00	$ 51.032,00	$ 867.544,00	$ 17,00	$ 51.032,00	$ 867.544,00
12.1	Excavación manual en conglomerado	M3				8,91	$ 31.600	$ 281.556,00		$ 31.600,00		8,91	$ 31.600,00	$ 281.556,00		$ 31.600,00		$ 8,91	$ 31.600,00	$ 281.556,00
12.2	Suministro e instalación concreto de 2000 psi para solados	M3				1,35	$ 360.640	$ 486.864,00		$ 360.640,00			$ 360.640,00		$ 1,35	$ 360.640,00	$ 486.864,00	$ 1,35	$ 360.640,00	$ 486.864,00
12.3	Suministro e instalación acero de refuerzo 60000 psi	KG				945,33	$ 4.000	$ 3.781.320,00		$ 4.000,00			$ 4.000,00		$ 945,33	$ 4.000,00	$ 3.781.320,00	$ 945,33	$ 4.000,00	$ 3.781.320,00
12.4	Suministro e instalación concreto de 3000 psi para zarpa	M3				6,75	$ 500.640	$ 3.379.320,00		$ 500.640,00			$ 500.640,00		$ 6,75	$ 500.640,00	$ 3.379.320,00	$ 6,75	$ 500.640,00	$ 3.379.320,00
12.5	Suministro e instalación concreto de 3000 psi para elevación	M3				4,8	$ 532.640	$ 2.556.672,00		$ 532.640,00			$ 532.640,00		$ 4,80	$ 532.640,00	$ 2.556.672,00	$ 4,80	$ 532.640,00	$ 2.556.672,00
12.6	Suministro e instalación de filtro dren francés	ML				20,00	$ 92.400	$ 1.848.000,00		$ 92.400,00			$ 92.400,00		$ 20,00	$ 92.400,00	$ 1.848.000,00	$ 20,00	$ 92.400,00	$ 1.848.000,00
13.1	Excavación manual en conglomerado	M3				7,20	$ 31.600	$ 227.520,00		$ 31.600,00		7,20	$ 31.600,00	$ 227.520,00		$ 31.600,00		$ 7,20	$ 31.600,00	$ 227.520,00
13.2	Suministro e instalación acero de refuerzo 60000 psi	KG					$ 4.000			$ 4.000,00			$ 4.000,00			$ 4.000,00			$ 4.000,00	
13.3	Suministro e instalación concreto de 3000 psi para cuneta	M3					$ 500.640			$ 500.640,00			$ 500.640,00			$ 500.640,00			$ 500.640,00	
14.1	Concreto ciclópeo (2000 psi)	M3				4,34	$ 336.400	$ 1.459.976,00		$ 336.400,00		4,34	$ 336.400,00	$ 1.459.976,00		$ 336.400,00		$ 4,34	$ 336.400,00	$ 1.459.976,00
15.1	Relleno en material común para muro de contención	M3				15,15	$ 48.696	$ 737.744,40		$ 48.696,00			$ 48.696,00		$ 15,15	$ 48.696,00	$ 737.744,40	$ 15,15	$ 48.696,00	$ 737.744,40
15.2	Relleno en material común para conformación talud sobre el muro de contención	M3				12,12	$ 48.696	$ 590.195,52		$ 48.696,00			$ 48.696,00		$ 12,12	$ 48.696,00	$ 590.195,52	$ 12,12	$ 48.696,00	$ 590.195,52
16.1	Suministro e instalación de canal en lámina galvanizada, incluye soportes, accesorios de instalación, anticorrosivo y pintura de esmalte	ML				16,00	$ 60.000	$ 960.000,00		$ 60.000,00			$ 60.000,00		$ 16,00	$ 60.000,00	$ 960.000,00	$ 16,00	$ 60.000,00	$ 960.000,00

16.2	Suministro e instalación de bajantes en tubería PVC saniaria tipo liviana de 3", incluye pintura, soportes y accesorios.	M3				21,00	$ 17.600	$ 369.600,00		$ 17.600,00			$ 17.600,00		$ 21,00	$ 17.600,00	$ 369.600,00	$ 21,00	$ 17.600,00	$ 369.600,00
17.1	Acero de refuerzo para las dovelas transversales y barras de transferencia longitudinales de las losas de concreto	KG				89,28522	$ 4.000	$ 357.140,88		$ 4.000,00			$ 4.000,00		$ 89,29	$ 4.000,00	$ 357.140,88	$ 89,29	$ 4.000,00	$ 357.140,88
17.2	Aserrado, limpieza y sello para las juntas de las losas de concreto con sellante de silicona (sellador auto-nivelante)	ML				107,14	$ 4.800	$ 514.272,00		$ 4.800,00			$ 4.800,00		$ 107,14	$ 4.800,00	$ 514.272,00	$ 107,14	$ 4.800,00	$ 514.272,00
17.3	Retiro y transporte del material proveniente de la excavación manual en conglomerado	M3				$ 32,37	$ 10.000	$ 323.733,83		$ 10.000,00			$ 10.000,00		$ 32,37	$ 10.000,00	$ 323.733,83	$ 32,37	$ 10.000,00	$ 323.733,83
COSTOS DIRECTOS OBRAS CIVILES					64.316.190			90.257.264			21.820.176			14.033.644			54.403.444			90.257.264
ADMINISTRACION				20,00%	12.863.238		20%	18.051.453		20,00%	4.364.035		20,00%	2.806.729		20%	10.880.689		20,00%	18.051.453
UTILIDAD				5,00%	3.215.809		5%	4.512.863		5,00%	1.091.009		5,00%	701.682		5%	2.720.172		5,00%	4.512.863
IVA (%) SOBRE UTILIDAD								516.833								19%	516.833		19,00%	516.833
TOTAL A.U.					16.079.047			23.081.149			5.455.044			3.508.411			14.117.694			23.081.149
TOTAL PRESUPUESTO OBRAS					80.395.237			113.338.413			27.275.220			17.542.055			68.521.138			113.338.413

BALANCE PRESUPUESTAL

V/R INICIAL CONTRATO:	**80.395.237**
V/R ADICIONES:	**32.943.176**
V/R ACTUAL CONTRATO:	**113.338.413**

V/R ANTICIPO:	**N/A**
% ANTICIPO :	**N/A**

NO.	DESCRIPCIÓN	FECHA DE PAGO	VALOR FACTURADO	% PAGADO	AMORTIZACIÓN	SALDO POR AMORTIZAR	VALOR NETO A PAGAR	SALDO POR PAGAR	% PAGADO ACUMULADO
1	PAGO PARCIAL Nº	17-dic.-20	**$ 27.275.220,00**	24,07%	-	-	**27.275.220**	**86.063.193**	**24,07%**
2	PAGO PARCIAL Nº	24-dic.-20	**$ 17.542.055,00**	15,48%	-	-	**17.542.055**	**68.521.138**	**39,54%**
3	PAGO	26-ene.-21	**$ 68.521.138,01**	60,46%			**68.521.138**	-	**100%**
TOTAL			**$ 113.338.413,01**	**100,00%**	-		**113.338.413**	-	

(1) Descripción de la etapa o el período facturado: acta parcial de obra. Para el caso de consultorías: pago anticipado, etapa fase o producto

Presento:

RUBIELA SANCHEZ CACERES
REPRESENTANTE LEGAL CONTRATISTA
COINGENSA S.A.S NIT. 900.896.967 - 6

ING.RUBEN DARIO MORENO MENDEZ
DIRECTOR DE OBRA
COINGENSA S.A.S NIT. 900.896.967 - 6

Aprobó:

REPRESENTANTE LEGAL INTERVENTORIA

NOMBRE
DIRECTOR DE INTERVENTORIA

Visto Bueno:

JHON EDISON JIMENEZ MARTINEZ
SUPERVISOR DEL CONTRATO

NOMBRE: JHON EDISON JIMENEZ MARTINEZ
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

	Versión:05
	Código: GIL-F-029

Proceso Gestión de Infraestructura y Logística

Formato Certificación Contrato para Intervenciones a Inmuebles

FECHA DILIGENCIAMIENTO	**26/01/2021**		

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

CONTRATO No.	CO1.PCCNTR.1942742	**FECHA SUSCRIPCIÓN**	27/10/2020
REGIONAL O CENTRO DE FORMACIÓN DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL	SANTANDER CENTRO AGROEMPRESARIAL Y TURISTICO D	**POSICIÓN CATÁLOGO INSTITUCIONAL REGIONAL O CENTRO DE FORMACIÓN**	36-02-00-068-954510
CONTRATISTA	COINGENSA S.A.S	**NIT**	900896967-6
OBJETO:	Contratar la ampliación y adecuación del sistema de producción de abono a base de estiércol de oveja y cabra incorporando activadores biológicos para la sede Granja los Andes del Centro Agroempresarial y Turístico de los Andes del SENA Regional		
REPRESENTANTE LEGAL	JOSE LEONARDO SILVA RIVERA		
CONCEPTO DEL CONTRATO	**ADECUACIONES Y MEJORAS**		
REGIONAL DONDE SE REALIZA EL PROYECTO O INVERSIÓN	SANTANDER	**POSICION CATALOGO INSITUCIONAL REGIONAL O CENTRO DE FORMACIÓN**	36-02-00-068-000000
CENTRO DONDE SE UBICA EL PROPYECTO O INVERSIÓN	CENTRO AGROEMPRESARIAL Y TURISTICO DE LOS	**ESTADO DE TENENCIA**	PROPIO EN USO
DIRECCIÓN DEL INMUEBLE	Km 2 via Concepciòn Finca Ventaquemada	**CIUDAD**	Màlaga
ORDENADOR DEL GASTO	JOSE LEONARDO SILVA RIVERA	**CARGO**	Subdirector de Centro
UNIDAD ADMNISTRATIVA RESPONSABLE DE ORDENAR EL GASTO			9545
SUPERVISIÓN / INTERVENTORIA	SUPERVISIÒN	**CONTRATO No**	CO1.PCCNTR.1942742
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	N/A		
SUPERVISIÓN SENA	Jhon Edison Jimenez Martinez	**APOYO SUPERVISIÓN**	
FECHA DE INICIO	27/10/2020	**FECHA ESTIMADA DE TERMINACIÓN**	26/01/2021

ACTOS ADMINISTRATIVOS

TIPO DE ACTO ADMINISTRATIVO	FECHA	CONCEPTO
PRORROGA Nº 1	24/12/2020	Se requiere prorroga del contrato por un (01) mes en atencion a solicitud del supervisor previa solicitud del contratista y autorizaciòn del ordenador del gasto
ADICION Nº 1	28/12/2020	SE solicita adiciòn al contrato por parte de la supervisiòn previa solicitud del contratista y autorizaciòn del Ordenador del Gasto
FORMATO ANEXO OTRO SI - ADENDA Nº 02 AL CONTRATO Nº C01.PCCNTR.1942742 DE 2020	28/12/2020	Por error de digitaciòn se modifica el acto administrativo Aceptaciòn de oferta en el Item 4.2

VALOR DEL CONTRATO

CONCEPTO	VALOR PARCIAL	VALOR TOTAL	ANTICIPO DISCRIMINADO	TOTAL ANTICIPO
CO1.PCCNTR.1942742	80.395.237,00	**80.395.237,00**	-	-
			-	
ACTO ADMINISTRATIVO	**VALOR PARCIAL**	**VALOR ACUMULADO**	**ANTICIPO**	**ANTICIPO ACUMULADO**
ADICION Nº 1	32.943.176,00	32.943.176,00	-	-
			-	-
SUBTOTAL ADICIONES O MODIFICACIONES	**32.943.176**			
VALOR TOTAL CONTRATO = VR INICIAL + ADICIONES		**113.338.413,00**	**VR TOTAL ANTICIPO**	-
DATOS CONTABLES	**VALOR TOTAL DEL IVA**	**516.832,72**		
	VALOR TOTAL DEL CONTRATO SIN IVA	**112.821.580,28**		

INFORMACIÓN PRESUPUESTAL			¿INCLUYE DEMOLICIÓN?		
No. REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO	**FECHA**	**VALOR**	**NOMBRE DEL COMPONENTE A DEMOLER**	**% DEMOLICIÓN**	**ÁREA EN M²**
287820	27/10/2020	80395237	N/A	N/A	N/A
287820	28/12/2020	32943176	N/A	N/A	N/A

FACTURA - CORTE O PAGO A REALIZAR

DATOS GENERALES DEL PAGO				AVANCE GENERAL	
PAGO No.	**FINAL**	**VALOR SIN IVA**	68.004.305,28	**TOTAL PAGADO CON ESTE COBRO**	113.338.413,00
		VALOR DEL IVA	516.832,72	**% AMORTIZADO**	N/A
FACTURA No.	**530**	**VALOR TOTAL FACTURA**	68.521.138,00	**% PRESUPUESTO EJECUTADO**	100,00%
TIPO DE PAGO	**FINAL**	**AMORTIZACIÓN**		**% PRESUPUESTO POR EJECUTAR**	0,00%
FECHA FACTURA	**15/03/2021**	**VALOR NETO A PAGAR**	**68.521.138,00**	**% AVANCE**	100%
CONCEPTO DEL PAGO	COINGENSA S.A.S			**CUENTA CONTABLE A AFECTAR**	1615

RELACION DE COMPONENTES BIENES INMUEBLES OBJETO DE CONSTRUCCION, ADICION O MEJORA

¿COMPONENTE NUEVO?	SI	¿AUMENTA VIDA ÚTIL?	SI	¿ENTREGADO A SATISFACCIÓN?	SI
¿INCREMENTA LA CAP. PRODUCTIVA Y EFICIENCIA OPERATIVA DEL INMUEBLE?, Y/O ¿MEJORA LA CALIDAD DE LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS?, Y/O ¿REDUCE SIGNIFICATIVAMENTE LOS COSTOS?	SI	AUMENTO DE VIDA ÚTIL (MESES)	60	FECHA ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCION	24/12/2020
¿OBRA TERMINADA Y EN CONDICIONES DE USO?	NO	¿INCLUYE ENTREGA DE BIENES MUEBLES?	NO	ÁREA CONSTRUIDA Y TERMINADA M²	72

CONSTRUCCIONES NUEVAS O NUEVOS COMPONENTES

NOMBRE COMPONENTE	ÁREA m2	VALOR SIN IVA DE CONSTRUCCIONES, ADICIÓN O MEJORA A COMPONENTE	IVA	VALOR EDIFICACION O ELEMENTO CONSTRUIDO
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
SUBTOTAL	-	-	-	-

HISTÓRICO DE PAGOS

CONTROL DE LA SUPERVISIÓN CONSTRUCCIONES

CONCEPTO	VALOR ACTAS DE AVANCE	% AVANCE	AMORTIZACION DEL ANTICIPO	NETO PAGADO	SALDO POR AMORTIZAR
ACTA DE AVANCE Nº 1	27.275.220,00	24,07%	0	27.275.220,00	
ACTA DE AVANCE Nº 2	17.542.055,00	15,48%		17.542.055,00	
TOTAL PAGADO	44.817.275,00	39,54%	-	44.817.275,00	
PAGO PENDIENTE O EN TRÁMITE					
ACTA FINAL DE PAGO	68.521.138,00	60,46%		68.521.138,00	
TOTAL EJECUTADO	**113.338.413,00**	**100,00%**	-	**113.338.413,00**	

CONTROL CONTABLE

CONCEPTO	VALOR IVA	VALOR SIN IVA	VALOR TOTAL = A NETO PAGADO	NO. COMPROMISO	ORDEN DE PAGO / # OBLIGACIÓN	FECHA
ACTA DE AVANCE Nº 1	$0,00	27.275.220,00	27.275.220,00	287820	ACTA AVANCE Nº 1	2020-12-17
ACTA DE AVANCE Nº 2	$0,00	17.542.055,00	17.542.055,00	287820	ACTA DE AVANCE Nº 2	2020-12-29
TOTAL PAGADO	$0,00	44.817.275,00	44.817.275,00			
PAGO PENDIENTE O EN TRÁMITE						
ACTA DE AVANCE FINAL	$516.832,72	68.004.305,28	68.521.138,00	287820	ACTA FINAL	2021-01-26
TOTAL EJECUTADO	**516.832,72**	**112.821.580,28**	**113.338.413,00**			

MOBILIARIO

NÚMERO NOTA DE ENTRADA ALMACÉN	FECHA NOTA DE ENTRADA ALMACEN	TIPO DE NOTA DE ENTRADA ALMACEN	VALOR NOTA DE ENTRADA ALMACEN
N/A	N/A		N/A

OBSERVACIONES: COMO SUPERVISOR O INTERVENTOR DEL CONTRATO DE LA REFERENCIA, CERTIFICO QUE LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN EL PRESENTE INFORME HA SIDO VERIFICADA Y CONFIRMADA, Y RECOMIENDO AUTORIZAR EL DESEMBOLSO REQUERIDO.

FIRMAS:			
SUPERVISOR / INTERVENTOR (NOMBRE)	**JHON EDISON JIMENEZ MARTINEZ**	**PROFESIONAL APOYO (NOMBRE)**	
CEDULA DE CIUDADANIA	**1100502021**	**CEDULA DE CIUDADANIA**	
