
INPLAYCO S.A.S.
INGENIEROS CONSTRUCTORES E INTERVENTORES

ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE HÁBITAT

INFORME SEMANAL 15

GRUPO No. 1

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 701-2020 CUYO OBJETO ES REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, JURÍDICA, SOCIAL, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA MODALIDAD DE HABITABILIDAD EN LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT.

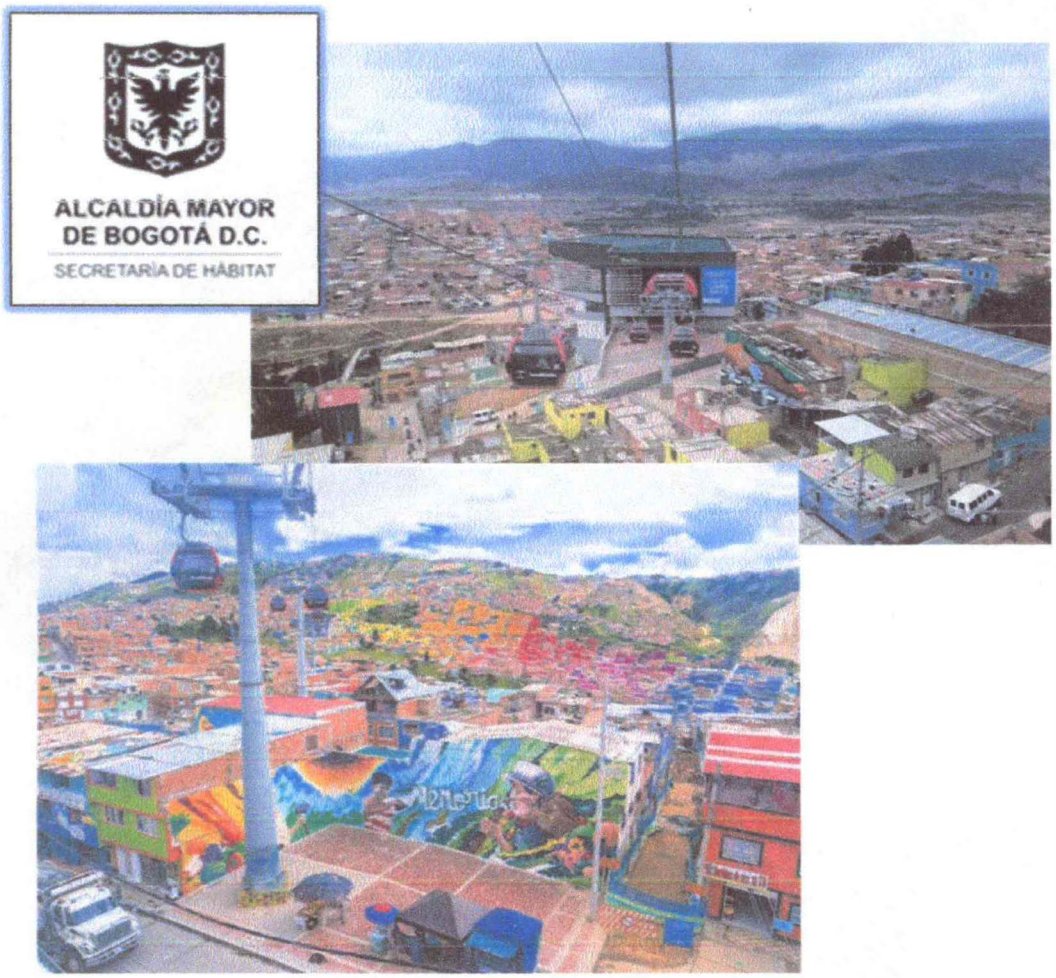

SEMANA 15 DEL 8 AL 14 DE FEBRERO DE 2021

INPLAYCO S.A.S.
INGENIEROS CONSTRUCTORES E INTERVENTORES

ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE HÁBITAT

CONTRATO DE INTERVENTORÍA
NÚMERO: 701-2020

CONTRATANTE:	**SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT**	
CONTRATISTA:	**INPLAYCO S.A.S**	
IDENTIFICACIÓN:	N.I.T.: **860.524.168- 8**	
REPRESENTANTE LEGAL:	**GONZALO LIÉVANO HOYOS**	
IDENTIFICACIÓN:	C.C. Nº 19.100.962	
DIRECCIÓN:	Carrera 16 A No 82-13 Oficina 201	
TELÉFONOS:	6181167	inplayco@yahoo.com.mx
SUPERVISOR	JUAN CARLOS ARBELÁEZ MURILLO	
FECHA DE INICIO	4 DE NOVIEMBRE DE 2020	
FECHA DE FINALIZACIÓN	3 DE MAYO DE 2021	
TIEMPO EJECUCIÓN DEL	6 MESES	
VALOR CONTRATO	$894.285.952	
FECHA ADICIÓN No. 1	------	
VALOR ADICIÓN No. 1	$0	
VALOR TOTAL CONTRATO	$894.285.952	
FECHA PRÓRROGA No. 1	------	
VALOR PRÓRROGA No. 1	$0	
VALOR TOTAL CONTRATO	$894.285.952	

INPLAYCO S.A.S.
INGENIEROS CONSTRUCTORES E INTERVENTORES

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE HÁBITAT

CONTRATO DE OBRA
NÚMERO: 694-2020

CONTRATANTE:	**SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT**	
CONTRATISTA:	CONSORCIO MEJORAMIENTO EP 2020	
REPRESENTANTE LEGAL	LUIS FERNANDO CARRILLO JIMÉNEZ	
OBJETO CONTRACTUAL	"CONTRATAR LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA MODALIDAD DE HABITABILIDAD DE LOS PROYECTOS ESTRUCTURADOS EN LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT.".	
APROPIACIÓN PRESUPUESTAL	CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL NO. 914 DEL 14 DE JULIO DE 2020	
FIDUCIA No.		
DIRECCIÓN:	Calle 31 No. 4 -47 oficina 501 MONTERÍA	
TELÉFONOS:	3212231771	Mejoramientoconsorcio2020@gmail.com
Consorciado No. 1.	CORPORACIÓN MULTIACTIVA EMPRENDER ONG	
NIT	900.164.714-9	
REPRESENTANTE LEGAL	JUAN CARLOS NOBLES NAVARRO	
C.C. R.L.	10.894.408	
Consorciado No. 2.	PROJECT CENTER LIMITADA	
NIT	900.236.613-3	
REPRESENTANTE LEGAL	LUIS FERNANDO CARRILLO JIMENEZ	
C.C. R.L.	72.097.065	
PARTICIPACIÓN		
CORPORACIÓN MULTIACTIVA EMPRENDER	60% / MANEJO TÉCNICO, CONTABLE Y ADMINISTRATIVO	
PROJECT CENTER LIMITADA	40% / MANEJO TÉCNICO y ADMINISTRATIVO	
SUPERVISOR	JUAN CARLOS ARBELÁEZ MURILLO	
FECHA DE INICIO	4 DE NOVIEMBRE DE 2020	
FECHA DE FINALIZACIÓN	3 DE ABRIL DE 2021	
TIEMPO EJECUCIÓN DEL CONTRATO	5 MESES	
VALOR CONTRATO	$3.728.543.252	
FECHA ADICIÓN No. 1	------	
VALOR ADICIÓN No. 1	$0	
VALOR TOTAL CONTRATO	$3.728.543.252	
FECHA PRÓRROGA No. 1	------	
VALOR PRÓRROGA No. 1	$0	
VALOR TOTAL CONTRATO	$3.728.543.252	

INPLAYCO S.A.S.
INGENIEROS CONSTRUCTORES E INTERVENTORES

ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE HÁBITAT

INTRODUCCION

Por intermedio de la Secretaria Distrital del Hábitat, se busca adelantar las obras de mejoramiento de vivienda en la modalidad de habitabilidad en los territorios de Ciudad Bolívar, Usme, Bosa; atendiendo a la Política Nacional y Distrital de Construcción Sostenible, ofreciendo a las familias favorecidas la mejora de sus ambientes habitacionales y de vida., para lograr este alcance del objeto contractual, la Secretaria Distrital del Hábitat celebró el contrato de interventoría con el No 701 de 2020 con la empresa INPLAYCO S.A.S, para su correcta ejecución con el fin de desarrollar las actividades de mejoramiento de las viviendas de los territorios mencionados anteriormente.

ETAPA DE EJECUCION

Este informe ejecutivo se desarrolla en la semana 14, comprendida del 8 de febrero al 14 de febrero del 2021, periodo en el cual después de la firma del acta de inicio el CONSORCIO MEJORAMIENTO EP 2020, continua con la ejecución de viviendas ya aperturadas.

Durante la fase 1 de validación se definió por parte el contratista **CONSORCIO MEJORAMIENTO EP 2020,** un punto de atención a la comunidad (PAC) por localidad y/o Territorio, con el fin de garantizar y resolver las dudas, inquietudes, quejas o reclamos de los beneficiarios las cuales son atendidas de manera oportuna; Ubicado en la Kr 18K Bis con Cll 69T Sur a una cuadra de la estación de Trasmicable de Manitas.

Estas reuniones se realizaron bajo los protocolos de Bioseguridad cumpliendo las exigencias del gobierno nacional.

SEMANA 15 DEL 8 AL 14 DE FEBRERO –ENTREGAS Y EJECUCION PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS

Para esta semana el consorcio realiza entregas a los beneficiarios y procede a realizar aperturas de viviendas en diferentes zonas, continuando con lo descrito en la programación entregada y en proceso de ejecución, a continuación, se relaciona los MV validados para ejecución de obra de la semana 15.

INPLAYCO S.A.S.
INGENIEROS CONSTRUCTORES E INTERVENTORES

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARIA DE HÁBITAT

ARQ. WILLIAM GARZON

No.	ID_DMV	Dirección	Nombres y apellidos
NUEVA COLOMBIA			
1	MVCB_1437	KR 18L 70H 09 SUR	FLOR ELISA PARRA ROJAS
2	MVCB_1441	CL 70H SUR 18L 22	LUZMILA TORRES BERMUDEZ
3	MVCB_1440	CL 70H SUR 18L 16	ALBA CARMEN ARDILA MATEUS
4	MVCB_1421	CL 70I SUR 18L 54	MARIA ESTER ZORRO GUERRERO
5	MVCB_1124	DG 69D SUR 18J 15	MARIA ANTONIA SANTOS CORREDOR DE RAMIREZ
6	MVCB_1120	DG 69D SUR 18J 31	QUERUBIN CHAGUALA
7	MVCB_1091	DG 69D BIS SUR 18J 32	LIGIA TEJADA DE BARRERO
JUAN PABLO II			
8	MVCB_2996	DG 69A BIS B SUR 18M 23	MARIA TERESA ANTOLINEZ Y OTRO
9	MVCB_2993	DG 69A BIS B SUR 18M 35	CARLOS JULIO CARDENAS TRIANA **Beneficiario renuncia subsidio**
10	MVCB_2999	DG 69A BIS B SUR 18M 15	MARIA LEONOR FRAILE SUAREZ
11	MVCB_2991	DG 69A BIS B SUR 18M 43	BRISNELDA CONSTANZA MACIAS MARTINEZ
12	MVCB_2967	DG 69A BIS D SUR 18M 36	MARIA OLGA FARFAN GALEON
13	MVCB_2960	DG 69A BIS D SUR 18M 06	MARIA NURY QUINTERO CARDONA
14	MVCB_2434	KR 18M BIS 69A 64 SUR	MARGARITA MARIA MORALES OROZCO
15	MVCB_2432	KR 18M BIS 69A 72 SUR	ACUSTÍN VILLANUEVA CUZMÁN
16	MVCB_3030	KR 18M BIS 69A 81 SUR	TEODOSIA GALICIA DE GARCIA
17	MVCB_3020	KR 18M BIS A 69A 70 SUR	PEDRO PABLO IBAÑEZ
MIRADOR NUTIVARA			
18	MV_1866	CL 70L SUR 18P 21	LUIS ALBERTO ALONSO CASTIBLANCO
19	MV_1818	KR 18P 70K 03 SUR	MERQUECIDE MONTANEZ UYOA
20	MV_1811	CL 70K SUR 18Q 09	ROSA ELVIRA GONZALEZ
21	MV_1726	CL 70K SUR 18P 10	EMPERATRIZ ACOSTA MARTINEZ
22	MV_1766	CL 70K SUR 18N 46	CARMEN QUIQUE MARTINEZ
23	MV_1574	CL 70F SUR 18R 27	JOSE HIPOLITO GUTIERREZ LUCERO
24	MV_1588	CL 70F SUR 18P 33	LUZ NELLY RODRIGUEZ
25	MV_1608	KR 18P 70F 06 SUR	ROSALBINA HERNANDEZ PIRACHICAN
URBANIZACION COMPARTIR			
26	MV_0252	TV 18P BIS 65D 04 SUR	JESUS ANTONIO BARRERA FANDIÑO
VISTA HERMOSA			
27	MV SH005	TV 18I 71 35 SUR	MARIA CUSTODIA SANCHEZ SANCHEZ
ANTONIO JOSE DE SUCRE III (USMINIA)			
28	MV 21341	KR 7 116 15 SUR	ERMELINDA HERNANDEZ
NUEVO SAN LUIS (USMINIA)			
29	MVUS 0795	KR 5A 112A 24 SUR	AIDA MARIA RUEDA NIETO
EL BRILLANTE (USMINIA)			
30	MV 22203	KR 3 100F 06 SUR MJ	YENY ZURLEY LOPEZ ULLOA
31	MV 22728	DG 101A SUR 2B 37	ECCEHOMO RIVERA RONCANCIO
LA COLMENA III SECTOR (CIUDAD BOLIVAR)			
32	MVJA 2062	DG 64A SUR 19 26	MERCEDES WALTEROS JOANIAS
33	MVJA 2077	DG 64A SUR 19 57	SOFIA PORRAS DE CAJAMARCA
34	MVJA 1896	DG 64BIS A SUR 19A 19	HERNANDO TIQUE GUZMAN
SANTA INES (BOSA LA LIBERTAD)			
35	MVBL 2134	KR 89A BIS 70 19 SUR CA 2	HERMELINA LOSADA CAICEDO
SAN ANTONIO (BOSA LA LIBERTAD)			
36	MVBL 2838	KR 88J 69A 19 SUR CA 1	ALVARO BARRERA ARIZA
37	MVCB_1119	CL 64 SUR 18N 21	GERARDO FONSECA ARIAS **Beneficiario renuncia subsidio**

INPLAYCO S.A.S.
INGENIEROS CONSTRUCTORES E INTERVENTORES

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARIA DE HÁBITAT

ARQ. LEONARDO SOLANO			
No.	**ID_DMV**	**Dirección**	**Nombres y apellidos**
JUAN PABLO II			
1	MVCB_4919	KR 18M BIS 68B 50 SUR MJ	URIEL PATIÑO RINCON
2	MVCB_4923	KR 18M BIS 68B 26 SUR	SIERVO MATIAS FIGUEROA CHAPARRO
3	MVCB_2932	TV 18N 69A 97 SUR	MARIA TERESA PIÑEROS PIÑEROS
4	MVCB_2926	TV 18N 69A 71 SUR	CORADO TORO DE TORRES Y OTRO
5	MVCB_3646	TV 18N BIS 69A 95 SUR	LUIS ANTONIO CABRERA LOPEZ Y OTRA
6	MVCB_3643	TV 18N BIS 69A 83 SUR	JOSE ARISTOBULO MENJURA LEITON Y OTRA
7	MVCB_2925	TV 18N 69A 67 SUR	MARTHA LUZ CAMPIÑO
8	MVCB_2917	DG 69A BIS B SUR 18M 30	CLAUDIA PATRICIA VARGAS GÓMEZ
9	MVCB_3642	TV 18N BIS 69A 77 SUR	JULIO CESAR FICHAS AVILA
10	MVCB_3641	TV 18N BIS 69A 75 SUR	CECILIA MENDEZ MORENO
11	MVCB_3640	TV 18N BIS 69A 71 SUR	OCTAVIO TELLEZ PINEDA
12	MVCB 3635	TV 18N BIS 69A 51 SUR	JUAN CARLOS MAZO CASTRO Y OTRA
13	MVCB_3634	TV 18N BIS 69A 47 SUR	AYDE NIÑO Y OTRO
14	MVCB_2939	TV 18N BIS 69A 84 SUR	MARIEYE LOAISA
15	MVCB_4918	KR 18M BIS 68B 56 SUR	ALVARO DIAZ AVILA
16	MVCB_3633	TV 18N BIS 69A 43 SUR	FRANCISCO JAVIER MENDIVELSO GUERRERO
17	MVCB_4917	KR 18M BIS 68B 62 SUR	ALVARO ALONSO MORENO
DESARROLLO NUEVA COLOMBIA			
18	MVCB_1320	CL70K SUR 18L 65	ISMINIA BARRETO ARIAS
19	MVCB 1383	CL70J SUR 18L 34	EDGAR FERNANDO CAMARCO ANGEL
20	MVCB_1380	CL 70J SUR 18L 22	ROSALBA MONTES DE CARDONA
21	MVCB_1382	CL 70J SUR 18L 30	MARIA CECILIA RINCON RINCON
22	MVCB_1381	CL 70J SUR 18L 26	NOHORA NOHEMI MAYORGA IBAGUE
23	MVCB_1374	CL 70J SUR 18L 11	OBED OSPINA RESTREPO
24	MVCB_1371	CL 70J SUR 18L 23	CONSUELO NAVARRO
25	MVCB_1328	CL 70K SUR 18L 29	EDILBERTO CARDENAS PAEZ
26	MVCB_1352	CL 70K SUR 18L 64	MARIA RAMOS ORTIZ
27	MVCB_1341	CL 70K SUR 18L 20	JOSE GABRIEL HERRERA MEDINA
28	MVCB_1344	CL 70K SUR 18L 32	ALBEIRO RUIZ SANABRIA
29	MVCB_1310	CL 70L SUR 18L 70	DORA ALICIA LÓPEZ SANABRIA
30	MVCB_1314	KR 18M 70K 16 SUR	MARTHA LUCIA OSPINA PEÑA **Beneficiario renuncia subsidio**
31	MVCB_1357	KR 18M 70J 16 SUR	MARTHA LILIA AGUDELO SANTOS
32	MVCB 1280	CL 70L SUR 18L 85	BARBARA GALVIS CHINCHILLA
33	MVCB_1286	CL 70L SUR 18L 61	LUZ MINDA CASTRO PEÑA
VILLAS DEL DIAMANTE			
34	MVCB_5128	CL 69N SUR 18N 52	DIEGO MARIO VANEGAS VILLAMIL
35	MVCB_5156	CL 69N SUR 18N 58 MJ	FRANCISCO JAVIER ARANGO GUTIERREZ
36	MVCB_5127	CL 69N SUR 18N 59 MJ	VICTOR MANUEL MUÑOZ VERGARA
37	MVCB_5489	KR 19F 70C 29 SUR MJ	GLORIA INES PEÑA BELTRAN
38	MVCB_5482	KR 19G 70C 18 SUR	LUIS HERNANDO MESA
39	MVCB_5486	CL 70C SUR 19F 07 MJ	MARIA DEL CARMEN ALONSO POSADA
40	MVCB_5314	TV 18N BIS A 69R 17 SUR MJ	ANA OTILIA GUACANEME CUESTA
41	MVCB_5295	CL 69R SUR 18P 45 MJ	MARIA YOLANDA LOZANO VERGARA
42	MVCB_5122	CL 69P SUR 18P 15	HERNAN LOPEZ GIRALDO
43	MVCB_5157	CL 69N SUR 18N 57	ANA TERESA PEÑA ROJAS

MIRADOR (NUTIVARA)			
44	MVCB_1586	CL 70F SUR 18P 45	MARIA DEL CARMEN RINCON
45	MVCB_1907	CL 70N SUR 18N 22	ANA ROSA LLANOS DE GARCIA
46	MVCB_1867	CL 70 SUR 18P 15	JOSE ALBRERTO LUGO
47	MVCB_1914	CL 70M BIS SUR 18N 33	BLANCA ODILIA PATIÑO DE MARTINEZ Y OTRO
USMINIA			
48	MV_21184	CL 112A SUR 7 48	AMALIA MERCHAN SOSA
49	MV_21368	CL 116 SUR 5 73	ALEJANDRO PAVA
50	MV_21240	CL 114 SUR 7 42	ALFONSO GUERRERO
51	MV_21212	CL 112A SUR 7 31	ERNESTINA CAICEDO

ING. HUMBERTO BLANCO			
No.	**ID_DMV**	**Dirección**	**Nombres y apellidos**
MIRADOR NUTIVARA			
1	MVCB_1873	CL 70L BIS SUR 18N 14	BLANCA FABIOLA LANDAZURI MESA
2	MVCB_1886	KR 18N 70K 31 SUR	LUZ MARIA ARIZA ARIZA
3	MVCB_1836	KR 18N 70K 09 SUR	DELIA MARÍA MATEUS ESCAMILLA
4	MVCB_1829	CL 70K SUR 18N 45	DIANA PATRICIA PÁEZ FINO
5	MVCB_1684	CL 70I SUR 18N 56	MIRYAM MANRIQUE URUEÑA
6	MVCB_1692	CL 70 H SUR 18 N 51	BEATRIZ ADIELA MARTINEZ JARAMILLO
7	MVCB_1681	CL 70 I SUR 18 N 36 MJ	ALVARO ELIECER VERDUGO RODRIGUEZ
8	MVCB_1638	KR 18R 70H 09 SUR	MAURICIO ENRIQUE MUÑOZ RIAÑO
9	MVCB_1664	KR 18P 70G 08 SUR	MARINA CLEMENCIA RAMOS
10	MVCB_1748	KR 18P 70I 04 SUR	OLGA LUZ BETANCOURT LEON
11	MVCB_1704	KR 18R 70H 08 SUR	ALBA LUCIA VALENCIA OCAMPO
12	MVCB_1631	CL 70G SUR 18R15	ELOISA LAVERDE RIOS
13	MVCB_1592	CL 70F SUR 18N 28	HOBER FABIAN BARRERA GUTIERREZ
14	MVCB_1908	CL 70N SUR 18N 28	JESUS MARIA COBA QUIROGA
NUEVA COLOMBIA			
15	MVCB_1130	DG 69F SUR 18J 18	CARMEN JULIA SUAREZ PARADA
16	MVCB_1180	DG 69F SUR 18J 15	BLANCA TERESA CALVO DE GARZON
76	MVCB_1181	DG 69F SUR 18J 11	ALBERTO ULLOA ULLOA
18	MVCB_1161	DG 69F SUR 18J 03	MARIA ROSA ELENA BECERRA SEGURA
19	MVCB_1212	DG 69G SUR 18J 43	HERNAN LOPEZ
20	MVCB_1194	DG 69H SUR 18J 20	VICTOR HUGO WILCHES BERNAL
21	MVCB_1467	CL 70H SUR 18J 70	TERESA DE JESUS OLIVOS DE BLANCO
22	MVCB_1469	CL 70H SUR 18J 82	JORGE SANCHEZ FORERO
23	MVCB_1470	KR 18L 70G 24 SUR	ANA SILVIA CHACON
24	MVCB_1495	KR 18L 70H 10 SUR	YACQUELINE RADA MOJICA
25	MVCB_1493	CL 70I SUR 18J 86	MARIA ELENA ALCIRA GARZON CASALLAS
26	MVCB_1516	KR 18L 70I 10 SUR	BERTHA CECILIA MOJICA RUIZ
27	MVCB_1417	CL 70I SUR 18L 30	DIANA MARCELA PARRA BALLESTEROS
28	MVCB_1416	CL 70I SUR 18L 22	ANA CENETH TORRES ROJAS
29	MVCB_1407	CL 70I SUR 18L 33	MARIA ELSA TORRES
30	MVCB_1409	CL 70I SUR 18L 21	FRAN EDILBERTO CRUZ CANO Y OTRA
VILLAS DEL DIAMANTE			
31	MVCB_5118	TV 18P BIS 69N 17 SUR	CARLOS ALFREDO CLAVIJO ROZO
32	MVCB_5464	KR 19D BIS 70C 25 SUR (KR 19B 70C 25 SUR)	IRMA ROJAS ROJAS
33	MVCB_5491	KR 19F 70C 41 SUR MJ	LEONILDE BUITRAGO MORENO

INPLAYCO S.A.S.
INGENIEROS CONSTRUCTORES E INTERVENTORES

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE HÁBITAT

ARBORIZADORA ALTA			
34	MV_14629	CL 75C SUR 34 51	HILDA MIRYAM NIÑO
35	MV_08564	KR 37A 75 55 SUR	ELSY CARDENAS MONROY
36	MV_09494	TV 35C 72F 31 SUR	GLADYS CASALLAS SUAREZ
SANTA VIVIANA			
37	MV_14485	KR 74D 75C 41 SUR MJ	PLINIO SANABRIA SANDOVAL
38	MV_09083	CL 75C BIS 75 39 SUR	RUTH GORDONS CASTAÑEDA
VILLA ALEMANA II SECTOR - USMINIA			
39	MVUS_0638	CL 115 SUR 3 36	EDWIN ARLEY QUINMBAYO QUINTERO
40	MVUS_0682	CL 113A SUR 4 25	JOSE DEL CARMEN SANCHEZ PAEZ
41	MVUS_0707	KR 4 115 21 SUR	LUZ MERY YARA MATOMA
ANTONIO JOSE DE SUCRE III - USMINIA			
42	MV_21283	KR 7 115 15 SUR	TERESA DE JESUS OSORIO ORTIZ
SAN LUIS - SECTOR JALISCO			
43	MVJA_2005	DG 64 SUR 19 11	AURORA MARGARITA ROJAS VELASQUEZ
44	MVJA_3776	KR 19 64A 23 SUR	LUS STELLA FONSECA OSORIO
ACACIAS SUR - SECTOR JALISCO			
45	MVJA_0675	CL 62B SUR 19 38	JENNY XIMENA CAMELO VELASCO

INSP. ERICK ALVAREZ CADAVID			
No.	**ID_DMV**	**Dirección**	**Nombres y apellidos**
DOMINGO LAIN II SECTOR Y CONDOMINIO DEL BOSQUE			
1	MVJA_0723	CL 63 SUR 18K 14	VICTOR MANUEL SAMORA HERNANDEZ
2	MVJA_1085	CL 64 BIS SUR 18N 42	MARIA NERY ECHEVERRY DE RESTREPO
3	MVJA_2590	KR 18L BIS 64A 22 SUR	FLOR ANGELA MORANTES LOPEZ
4	MVJA_2476	KR 18K BIS 64A 12 SUR	JAIME HUMBERTO BORDA LIBERATO
5	MVJA_2763	KR 18M 64 21 SUR	CARLOS JESÚS BECERRA PEREZ
6	MVJA_1194	CL 64B SUR 18N 81	MOISES RODRÍGUEZ BETANCOURT
7	MVJA_1129	CL 64 SUR 18P 07	ANA BERTILDE GAMBOA VELANDIA
8	MVJA_2479	KR 18K BIS 64A 20 SUR	CRISTOBAL VALBUENA
DOMINGO LAIN I			
9	MVJA_0898	CL 63B SUR 18L 53	EFIGENIA GUIZA DE SANCHEZ
10	MVJA_0899	CL 63B SUR 18L 61	DORIS AYDEE HERRERA OTALORA
11	MVJA_0970	CL 63D SUR 18L 02	DORIS CUESTA DE RODRIGUEZ
12	MVJA_2756	KR 18M 63D 08 SUR	ESTHER AROCA YARA
13	MVJA_2469	KR 18K BIS 63D 19 SUR	CARMEN LIBIA GÓMEZ DE CASTAÑEDA
14	MVJA_2342	KR 18J BIS 63D 25 SUR	MARIA DOLORES CASTILLO DE SANCHEZ
15	MVJA_2343	KR 18J BIS 63D 25 SUR	ERNESTO VERGARA NIETO
16	MVJA_1096	CL 64 SUR 18J 46	GONZALO OÑATE BONILLA
ALTOS DE JALISCO			
17	MVJA_2741	KR 18M 62ª 44 SUR	CARLOS ALBERTO MUÑETON FRANCO
18	MVJA_2729	KR 18M 62ª 07 SUR	
19	MVJA_0544	CL 62ª SUR 18M 09	MERCEDES RIAÑO PARRA
20	MVJA_0567	CL 62ª SUR 18M 41 IN 9	MARIA DEL ROSARIO RODRIGUEZ
21	MVJA_3309	KR 18P BIS B 61D 25 SUR	TEOFILO MORALES TURGA Y OTRA

22	MVJA_3366	KR 18Q 61C 34 SUR	EDILMA ALCIRA CASTILLO
23	MVJA_4350	TV 18Q BIS C 61B 87 SUR	MARÍA BENDITA REDONDO CASTIBLANCO
24	MVJA_2660	KR 18L BIS A 62ª 39 SUR	MANUEL EDUARDO RODRIGUEZ PRIETO
25	MVJA_4333	TV 18Q BIS C 61B 45 SUR	BEATRIZ CABRALES ACERO
26	MVJA_0890	CL 63B SUR 18K 56	HERNAN HUMBERTO PARRA CORREDOR DE RAMIREZ
LA ESCALA 3ER SECTOR			
27	MVJA_0530	CL 62ª SUR 18L 07	LUIS ALIRIO LÓPEZ DÍAZ
GIBRALTAR I Y II			
28	MVJA_4375	TV 18R 61B 41 SUR	FERNANDO TORRES Y OTRA
29	MVJA_3081	KR 18N BIS A 63 26 SUR	JOSE UNILCIO CIFUENTES QUINTERO Y OTRA
30	MVJA_3086	KR 18N BIS A 63C 23 SUR	LUIS ALFREDO CARPINTERO Y OTRA
31	MVJA_3168	KR 18P 63B 16 SUR	OLIVIA BOLAÑOS
32	MVJA_2395	KR 18K 64A 22 SUR	DELIO MARTINEZ GAMBA
33	MVJA_0922	CL 63C SUR 18P 22	FRANCISCO PIAMBA ANACONA
ACACIAS SUR			
34	MVJA_3670	KR 18Z 62 30 SUR	CRISTOBAL PITA CAMARGO
35	MVJA_0439	CL 62 SUR 18Z 04	GAVI ROZO RODRIGUEZ
LA ESPERANZA			
36	MVJA_3607	KR 18T 62A 21 SUR	LUIS ENRIQUE JIMENEZ VEGA
CIUDAD MILAGRO			
37	MVJA_0286	CL 62 BIS SUR 18J 12	HASBLEIDY GINA ROJAS ESCOBAR
38	MVJA_0235	CL 61D SUR 18K 58	LUZ NELLY RODRIGUEZ
39	MVJA_0328	CL 62 BIS SUR 18K 55	VICTOR MANUEL URREA ACOSTA
SAN LUIS			
40	MVJA_2051	DG 64A SUR 18V 14	FABIO VELASQUEZ CABALLERO
41	MVJA_1776	DG 64 BIS SUR 18V-15	UVA ESTHER BAQUERO DE GIL
SAN FERNANDO			
42	MVJA_2139	DG 64B SUR 19 76	MARIA ELIUD ORTEGON DE ALARCON
43	MVJA_2119	DG 64B SUR 19 36	MARIA CONCEPCION RIAÑO
LAS DELICIAS DEL SUR ZONA 19			
44	MVJA_1386	CL 65 SUR 18N 73	CRISTOBAL SUA ALBARRACÍN
LUCERO MEDIO			
45	MVJA_2324	KR 18J 64F 39 SUR	ARMANDO QUIROGA BARRIGA Y OTRA
46	MVJA_2617	KR 18L BIS 64F 07 SUR	QUINTILIANO CASTILLO DOMÍNGUEZ Y OTRA
47	MVJA_2628	KR 18L BIS 64F 47 SUR	MARIA ALICIA MAHECHA POVEDA
48	MVJA_2418	KR 18K 65A 15 SUR	BERTILDA URREGO
49	MVJA_2414	KR 18K 64F 29 SUR	MARIA ELENA RINCON RINCON **Beneficiario renuncia subsidio**
USMINIA - ANTONIO JOSE DE SUCRE I SECTOR			
50	MV_18353	CL 109 SUR 9 64	LUZ DAMARIS CASTRO PULGARIN
51	MV_18951	CL 104A SUR 6 37 MJ	LUIS ANTONIO RINCON
52	MV_19285	CL 108 SUR 3A 36	JAIRO ANTONIO ESPINOSA
53	MV_21820	CL 106 B SUR 4 11	JUAN EUDES OREJUELA GARZON
USMINIA - LORENZO ALCANTUZ			
54	MV_17421	CL 102 SUR 5 49	OLGA BARRETO

INS. CRITIAN VELASCO			
No.	**ID_DMV**	**Dirección**	**Nombres y apellidos**
ALTOS DE JALISCO			

INPLAYCO S.A.S.
INGENIEROS CONSTRUCTORES E INTERVENTORES

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE HÁBITAT

1	MVJA_2992	KR 18N BIS 61C 21 SUR	ISAURA AREVALO MALAGON
2	MVJA_3141	KR 18P 62 A 30 SUR MJ	GLORIA CRISTINA GUTIERREZ GARZON
3	MVJA_3146	KR 18P 62A 45 SUR MJ	CLARA INES GIL BAEZ
4	MVJA_3335	KR 18P BIS B 62A 48 SUR MJ	MYRIAM PATRICIA SARMIENTO APONTE
5	MVJA_3314	KR 18P BIS B 61D 36 SUR	MARIA OLMA MOLANO ROMERO
6	MVJA_3239	KR 18P BIS A 61C 22 SUR MJ	NATIVIDAD SILDANA CELYS VIUDA DE GARCIA
7	MVJA_0259	CL 70H SUR 18L 16	ALBA CARMEN ARDILA MATEUS
8	MVJA_3223	KR 18P BIS A 61A 55 SUR	MYRIAM AMPARO GÓMEZ DE GALVIS
9	MVJA_3231	KR 18P BIS A 61B 12 SUR MJ	SOFIA MORENO
10	MVJA_3119	KR 18P 61A 67 SUR MJ	LUZ YANID PADUA
11	MVJA_3125	KR 18P 61 A 76 SUR MJ	MARIA AURORA RENGIFO
12	MVJA_0252	CL 61D SUR 18N 30 MJ	JESUS ANTONIO ORTIZ CASTRO
13	MVJA_2996	KR 18N BIS 61D 18 SUR	MARIA DEL SOCORRO CUPITRA CACAIS
14	MVJA_2712	KR 18M 62 29 SUR	JOSE ALIRIO ORTIZ CABRERA Y OTRA
15	MVJA_2707	KR 18M 62 12 SUR	ANA LUISA BERNAL PULIDO
16	MVJA_2640	KR 18L BIS A 61D 47 SUR	PAOLA ANDREA BARRERA PELAEZ
17	MVJA_2371	KR 18K 61B 02 SUR	ANA EDELMIRA ATARA ESPITIA
18	MVJA_2976	KR 18N BIS 61A 53 SUR	BLANCA LEONOR RIOS CHAPARRO
MIRADOR NUTIVARA			
19	MVCB_1774	CL 70J SUR 18N 23	JOSE WILSON MARULANDA GIRALDO
20	MVCB_1742	CL 70J SUR 18N 34	ANA ELVIA MENDOZA DE HERNANDEZ
ROCIO ALTOS DEL SUR			
21	MVJA_2981	DG 69A BIS D SUR 18M 06	LEONOR TOVAR BARRERO
22	MVJA_2812	KR 18M BIS 61C 29 SUR	ANDREA JENNIFFER ACOSTA MENDIVELSO
23	MVJA_2909	KR 18N 61C 27 SUR	BLANCA CECILIA ALFONSO BOHORQUEZ
24	MVJA_0186	CL 61C SUR 18N 03	ISABEL ARDILA VARGAS
LA ESCALA			
25	MVJA_2672	KR 18M 61 15 SUR MJ	CARLOS OLIMPO SEGURA GUERRERO
ACACIAS SUR			
26	MVJA_0596	CL 62A SUR 18R 15	RODULFO BEJARANO
27	MVJA_0608	CL 62A SUR 18T 10	MARIA LUIDINA VARGAS AGUIRRE
28	MVJA_1018	CL 63D SUR 19 25	MARIA LEONOR APONTE VIUDA DE LOPEZ
BARRIO GIBRALTAR I Y II			
29	MVJA_0834	CL 63A SUR 18Q 05	CLARA INES OCHOA GUTIERREZ
30	MVJA_3011	KR 18N BIS 63 27 SUR	RITA DEL CARMEN FONSECA CAMARGO
31	MVJA_3157	KR 18P 63 16 SUR	IRIA ESTHER SILVA
32	MVJA_3397	KR 18Q 63D 10 SUR	LUZ MARINA ROBAYO ALVARADO
LA ESCALA 3ER SECTOR			
33	MVJA_0502	CL 62A SUR 18J 20	ROSALBA JARA DE ROJAS
CIUDAD MILAGRO			
34	MVJA_0395	CL 62 SUR 18K 78	JOSE ORVEY ORTIZ
VILLAS DEL DIAMANTE			
35	MVCB_5474	CL 70F SUR 19F 18 MJ	OLIVIA RIVERA
36	MVCB_5395	CL 70B SUR 18R 29	MARÍA CRISTINA GONZALEZ GARCÍA
37	MVCB_5388	CL 70C SUR 18R 48	DUBERNEY ARIAS BETANCUR
ARBORIZADORA ALTA			
38	MV_15742	KR 38 75 54 SUR	DONELIA PATIÑO MURILLO
JERUSALEN			
39	MV_17151	KR 38 79A 38 SUR	GUSTAVO VILLAREAL BERMUDEZ
EL MIRADOR			
40	MV_05324	CL 71C SUR 27B 15	ALDEMAR DUARTE LOPEZ
VILLA ISRAEL			
41	MVUS_0036	KR 5A BIS 110 34 SUR	EMPERATRIZ RODRIGUEZ LOPEZ
VILLA ANITA SUR			

INPLAYCO S.A.S.
INGENIEROS CONSTRUCTORES E INTERVENTORES

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE HÁBITAT

42	MV_21059	KR 8 115B 11 SUR	ALEXANDER BERNAL AVENDAÑO
EL ESPINO			
43	MVUS_0230	CL 115B SUR 3B 11	JORGE GABRIEL BUITRAGO INFANTE
EL VIRREY			
44	MV_20306	KR 4A 97 15 SUR	JUAN FRANCISCO MEDINA SALAZAR
SAN LUIS			
45	MVJA_1876	DG 64 BIS A SUR 18V 15	JOSE OMAR CAMACHO TELLEZ
LAS DELICIAS DEL SUR			
46	MVJA_3257	KR 18P BIS A 65 10 SUR MJ	NELLY PIZA BUITRAGO
DOMINGO LAIN III SECTOR			
47	MVJA_3105	KR 18N BIS A 64D 19 SUR MJ	BLANCA NELLY HERNÁNDEZ

SEMANA 14	OBSERVACION	APERTURA	CIERRE	PQR	
				SI	NO
NUEVA COLOMBIA					X
JUAN PABLO II	MVCB_4917	COMUNICADO DESPUES DE ENTREGA DEL MEJORAMIENTO	03 -02-2021	X	
MIRADOR NUTIVARA					X
DESARROLLO NUEVA COLOMBIA					X
URBANIIZACION COMPARTIR					X
EL BRILLANTE					X
LA COLMENA II SECTOR (CIUDAD BOLIVAR)					X
SANTA INES (BOSA LA LIBERTAD)					X
NUEVO SAN LUIS	MVUS_0795	21 -01-2021	3-03-2021	X	
DOMINGO LAIN II SECTOR Y CONDOMINIO DEL BOSQUE					X
DOMINGO LAIN I					X
ALTOS DE JALISCO	MVJA_3670 MVJA_0286 MVJA_3146 MVJA_2830	28 -12-2020 28 -12-2020 30 -01-2021 3-02-2021	6 -01-2021 6 -01-2021 5 -02-2021 14-02-2021		X
LA ESCALA 3ER SECTOR					X
LUCERO MEDIO	MVJA_2315 MVJA_2414	08-02-2021 09-02-2021	08-02-2021 09-02-2021		X
GIBRALTAR I Y II					X
ROCIO ALTOS DEL SUR					X
LA ESCALA					X
ACACIAS SUR					X
VILLAS DEL DIAMANTE					X
VILLA ISRAEL					X

INPLAYCO S.A.S.
INGENIEROS CONSTRUCTORES E INTERVENTORES

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE HÁBITAT

EL ESPINO					X
JERUSALEN					X
EL MIRADOR					X
CIUDAD MILAGRO					X

RESULTADOS- OBSERVACIÓN	
MVJA_2315	Beneficiaria fallece hijos **renuncian** ya que están en la espera de aprobación de sus viviendas.
MVJA_2414	Titular **renuncia** al subsidio por diferencias entre hermanos.
MVJA_2830	Beneficiaria solicita se deje material y ella ejecutar la obra. Se cita, pero no acude a las citaciones. **Renuncia**
MVCB_4917	El beneficiario manifiesta no haber vuelto a recibir noticias del subsidio. El predio se apertura, se socializaron actividades de obra, presupuesto inicial e indicaciones de bioseguridad, POR LO MISMO QUEDA CERRADO.
MVUS_0795	Beneficiaria manifiesta inquietud acerca del monto del subsidio. Se visita el predio en compañía de los profesionales técnicos y sociales de contratista e interventoría y la Profesional social de la SDHT, se socializan generalidades del proyecto. POR LO MISMO QUEDA CERRADO.
MVJA_3670	Solicitud comunicada a través de la SDHT indicando inquietudes por el subsidio e inicio de actividades, se realiza validación, se resuelve la inquietud EL 6 DE ENERO QUEDA CERRADA
MVJA_0286	Solicitud comunicada a través de la SDHT indicando inquietudes por el subsidio e inicio de actividades, se realiza validación EL 6 DE ENERO QUEDA CERRADA
MVJA_3146	La beneficiaria manifiesta inconformidad por el atraso de obras. Queda cerrada por entrega de la vivienda. EL 5 DE FEBREO QUEDA CERRADA.

PQR - A esta semana NO se recibieron PQR




RENUNCIAS				
MV	NOMBRE	FECHA	DESARROLLO	OBSERVACIONES
MVJA_2315	ANIBAL INFANTE NAVARRETE	FEBRERO 8	LUCERO MEDIO	Beneficiaria fallece hijos renuncian
MVJA_2414	MARIA ELENA RINCON RINCON	FEBRERO 9	LUCERO MEDIO	Titular renuncia al subsidio por diferencias entre hermanos
MVJA_2830	MARIA LUISA CONTRERAS SANABRIA	FEBRERO 3	ALTOS DE JALISCO	Beneficiaria solicita se deje material y ella ejecutar la obra
MVCB_2993	CARLOS JULIO CARDENAS TRIANA Y OTRO	NOVIEMBRE 18	JUAN PABLO II	Por motivos de salud tiene planeado trasladarse de ciudad
MVCB_1314	MARTHA LUCIA OSPINA PEÑA	ENERO 15	NUEVA COLOMBIA	Pleito jurídico familiar
MVCB_1119	GERARDO FONSECA ARIAS	ENERO 27	DOMINGO LAIN II SECTOR Y CONDOMINIO DEL BOSQUE	Se trasladó de ciudad y envía renuncia por Whatsapp

INPLAYCO S.A.S.
INGENIEROS CONSTRUCTORES E INTERVENTORES

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARIA DE HÁBITAT

Avance de Validaciones.

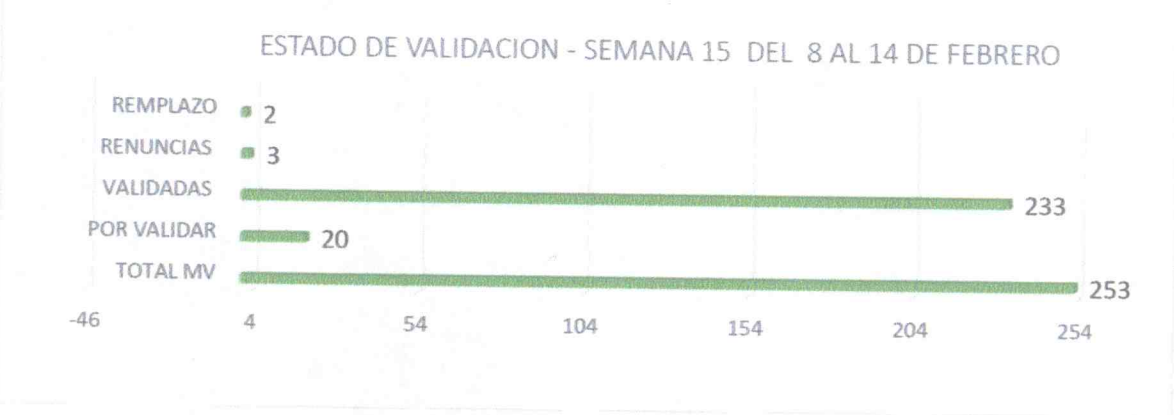



Para la semana 15 el Consorcio Mejoramiento EP 2020, se encuentra ejecutando las adecuaciones de las viviendas.



INPLAYCO S.A.S.
INGENIEROS CONSTRUCTORES E INTERVENTORES

ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE HÁBITAT

RENUNCIAS A LA FECHA

MVCB 2993 CARLOS JULIO CARDENAS 28 DE NOVIEMBRE

MVCV 1314 MARTHA LUCIA OSPINO PEÑA 15 DE ENERO

MVCB_1119 GERARDO FONSECA ARIAS ENERO 27

MVJA_2315 ANIBAL INFANTE NAVARRETE FEBRERO 8

MVUS 0905 LUIS EDUARDO GUATIVONZA 79.311.430 – FOLIOS 52

PROCESO DE VALIDACIÓN – TERRITORIO USMINIA

MV 19084 OCTAVIANO NIÑO ECHEVERRI 15.898.685 FOLIOS 32


% DE AVANCE DE OBRA POR VIVIENDA SEMANA 15



% DE AVANCE DE OBRA POR VIVIENDA SEMANA 15



% DE AVANCE DE OBRA POR VIVIENDA SEMANA 15

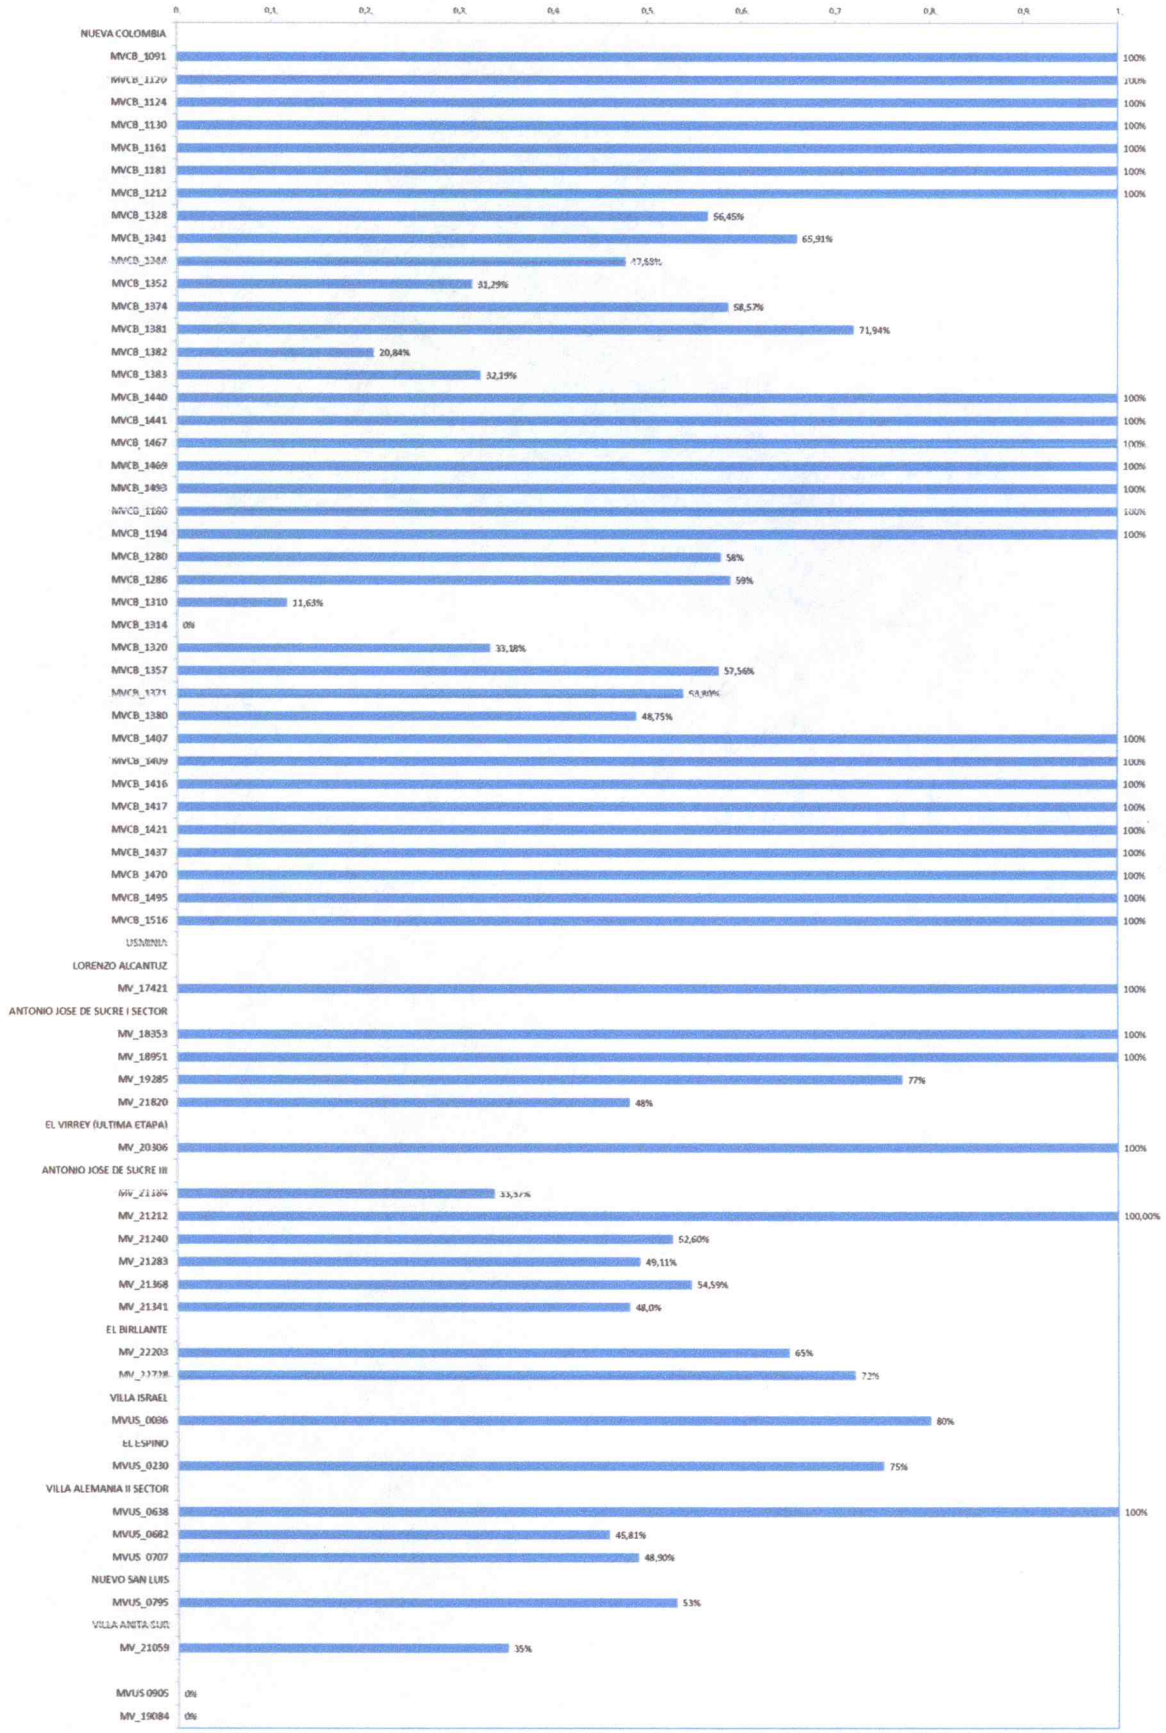

INPLAYCO S.A.S.
INGENIEROS CONSTRUCTORES E INTERVENTORES

ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE HÁBITAT

INFORME TECNICO SEMANAL 15

Subsecretaria de Coordinacion Operativa

Subdireccion de Barrios

Seguimiento ejecución proyectos de Mejoramiento de Vivienda - Habitabilidad

Proyecto mejoramiento de vivienda - AVANCE EJECUCIÓN SEMANAL

Fecha: **14-feb-21**

Consorcio mejoramiento EP 2020 - Contratista de obra

Contratato de obra	694-2020			Plazo	Cinco (5) meses
Objeto	Contratar la ejecución de las obras de mejoramiento de vivienda en la modalidad de habitabilidad de los proyectos estructurados en los territorios priorizados por la Secretaría Distrital de Habitat. Grupo I			Acta de inicio	4 de noviembre de 2020
CDP No.	No. 914 del 14 de julio de 2020	CRP No.		Valor del contrato	TRES MIL SETECIENTOS VEINTICUATRO MILLONES CIENTO TREINTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS DIEZ Y NUEVE PESOS ($3.724.135.319) M/Cte

Gonzalo Llevano Hoyos -INPLAYCO S.A.S.

Contratato de interventoría	701-2020			Plazo	Seis (6) meses
Objeto	Realizar la interventorias técnica, jurídica, social, administrative y financiera, para la ejecución de las obras de mejoramiento de vivienda en la modalidad de habitablidad en los territorios priorizados por la secretaría distrital de hábitat.			Acta de inicio	04 de noviembre 2020
CDP No	No. 892 del 14 de julio de 2020	CRP No.		Valor del contrato	OCHOCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS M/CTE ($894.285.952),

Fase 1: Validación de la información entregada por el la SDHT									Fase 2: Ejecución de obras				
					Validación				Ejecución				
Territorio o barrio a intervenir	CIUDAD BOLIVAR - USME - BOSA	Barrios	Predios	Total Predios	Validada	V/Por Validar	Renuncia	V/Modificada	En Ejecución	Terminadas	Por Ejecutar	% de Avance	Acta de Entrega a Satisfacción
Arq o Ing. Responsable	ARQ. WILLIAM FDO GARZÓN	NUEVA COLOMBIA	7	36	7	0		0	0	7	0	2.58%	7
		JAUN PABLO II	10		10	0	1	0	0	9	0	3.49%	9
Técnico Responsable	ARQ. WILLIAM FDO GARZÓN	MIRADOR NUTIVARA	8		8	0		0	0	2	6	0.78%	2
		URBANIZACION COMPARTIR	1		1	0		0	0	0	1	0.00%	0
		VISTA HERMOSA	1		1	0		0	0	0	1	0.00%	0
		ANTONIO JOSE DE SUCRE III SECTOR (USMINIA)	1		1	0		0	1	0	0	0.19%	0
		NUEVO SAN LUIS (USMINIA)	1		1	0		0	1	0	0	0.21%	0
		EL BRILLANTE (USMINIA)	2		2	0		0	2	0	0	0.54%	0
		LA COLMENA III SECTOR (CIUDAD BOLIVAR)	3		3	0		0	0	0	3	0.00%	0
		SANTA INES (BOSA LA LIBERTAD)	1		1	0		0	0	0	1	0.00%	0
		SAN ANTONIO (BOSA LA LIBERTAD)	1		1	0		0	0	0	1	0.00%	0
Subtotal			36		36	0	1	0	4	18	13	7.79%	18

AVANCE DE EJECUCIÓN SEMANAL										FEBRERO				
Proyecto				FASE I			Tiempo Programacion			ACUMULADO SEMANAS ANTERIORES	SEMANA DEL 8 AL 14	SEMANA DEL 15 AL 21	SEMANA DEL 22 AL 28	ACUMULADO TOTAL
No.	ID_DMV	Dirección	Nombres y apellidos	V/ Validada	V/ Modificada	V/Inicial	Fecha inicio	Fecha terminada	F. Inicio		15 semana	16 semana	17 semana	
	NUEVA COLOMBIA													
1	MVCB_1437	KR 18L 70H 09 SUR	FLOR ELISA PARRA ROJAS	SI		$11,751,182	24/11/2020	ENTREGADA	24/11/2020	100.0%	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%
2	MVCB_1441	CL 70H SUR 18L 22	LUZMILA TORRES BERMUDEZ	SI		$5,997,032	24/11/2020	ENTREGADA	24/11/2020	100%	0%	0%	0%	100%
3	MVCB_1440	CL 70H SUR 18L 16	ALBA CARMEN ARDILA MATEUS	SI		$11,812,067	24/11/2020	ENTREGADA	24/11/2020	100%	0%	0%	0%	100%
4	MVCB_1421	CL 70I SUR 18L 54	MARIA ESTER ZORRO GUERRERO	SI		$11,725,109	24/11/2020	ENTREGADA	24/11/2020	100%	0%	0%	0%	100%
5	MVCB_1124	DG 69D SUR 18J 15	MARIA ANTONIA SANTOS CORREDOR DE RAMIREZ	SI		$11,816,865	27/11/2020	ENTREGADA	27/11/2020	100%	0%	0%	0%	100%
6	MVCB_1120	DG 69D SUR 18J 31	QUERUBIN CHAGUALA	SI		$11,785,499	27/11/2020	ENTREGADA	27/11/2020	100%	0%	0%	0%	100%
7	MVCB_1091	DG 69D BIS SUR 18J 32	LIGIA TEJADA DE BARRERO	SI		$11,513,691	27/11/2020	ENTREGADA	27/11/2020	100%	0%	0%	0%	100%

			JUAN PABLO II												
8	MVCB_2996	DG 69A BIS B SUR 18M 23	MARIA TERESA ANTOLINEZ Y OTRO	SI / NO		$11,738,882	23/11/2020	ENTREGADA	23/11/2020	100.0%	0.0%	0.0%	0.0%	100%
9	MVCB_2993	DG 69A BIS B SUR 18M 35	CARLOS JULIO CARDENAS TRIANA	SI / NO		$11,820,087	RENUNCIA	RENUNCIA	RENUNCIA					
10	MVCB_2999	DG 69A BIS B SUR 18M 15	MARIA LEONOR FRAILE SUAREZ	SI / NO		$11,783,215	23/11/2020	ENTREGADA	23/11/2020	100%	0.0%	0.0%	0.0%	100%
11	MVCB_2991	DG 69A BIS B SUR 18M 43	BRISNELDA CONSTANZA MACIAS MARTINEZ	SI / NO		$11,757,101	23/11/2020	ENTREGADA	23/11/2020	100%	0.0%	0.0%	0.0%	100%
12	MVCB_2967	DG 69A BIS D SUR 18M 36	MARIA OLGA FARFAN GALEON	SI / NO		$11,712,722	27/11/2020	ENTREGADA	27/11/2020	100%	0.0%	0.0%	0.0%	100%
13	MVCB_2960	DG 69A BIS D SUR 18M 06	MARIA NURY QUINTERO CARDONA	SI / NO		$10,654,076	27/11/2020	ENTREGADA	27/11/2020	100%	0.0%	0.0%	0.0%	100%
14	MVCB_2434	KR 18M BIS 69A 64 SUR	MARGARITA MARIA MORALES OROZCO	SI / NO		$11,727,986	30/11/2020	ENTREGADA	30/11/2020	100%	0.0%	0.0%	0.0%	100%
15	MVCB_2432	KR 18M BIS 69A 72 SUR	AGUSTÍN VILLANUEVA GUZMÁN	SI / NO		$11,329,964	27/11/2020	ENTREGADA	27/11/2020	100%	0.0%	0.0%	0.0%	100%
16	MVCB_3030	KR 18M BIS 69A 81 SUR	TEODOSIA GALICIA DE GARCIA	SI / NO		$10,652,060	26/11/2020	ENTREGADA	26/11/2020	100%	0.0%	0.0%	0.0%	100%
17	MVCB_3020	KR 18M BIS A 69A 70 SUR	PEDRO PABLO IBAÑEZ	SI / NO		$11,672,077	27/11/2020	ENTREGADA	27/11/2020	100%	0.0%	0.0%	0.0%	100%
			MIRADOR NUTIVARA												
18	MV_1896	CL 70L SUR 18P 21	LUIS ALBERTO ALONSO CASTIBLANCO	SI / NO		$11,207,445	2/12/2020	ENTREGADA	2/12/2020	100%	0.0%	0.0%	0.0%	100%
19	MV_1818	KR 18P 70K 03 SUR	MERQUECIDE MONTANEZ UYOA	SI / NO		$11,776,857	2/12/2020	ENTREGADA	2/12/2020	100%	0.0%	0.0%	0.0%	100%
20	MV_1811	CL 70K SUR 18Q 09	ROSA ELVIRA GONZALEZ	SI / NO		$11,826,704	EN FASE DE VALIDACION	EN FASE DE VALIDACION	EN FASE DE VALIDACION	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
21	MV_1726	CL 70K SUR 18P 10	EMPERATRIZ ACOSTA MARTINEZ	SI / NO		$11,736,989	EN FASE DE VALIDACION	EN FASE DE VALIDACION	EN FASE DE VALIDACION	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
22	MV_1796	CL 70K SUR 18N 46	CARMEN QUIQUE MARTINEZ	SI / NO		$10,332,118	EN FASE DE VALIDACION	EN FASE DE VALIDACION	EN FASE DE VALIDACION	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
23	MV_1574	CL 70F SUR 18R 27	JOSE HIPOLITO GUTIERREZ LUCERO	SI / NO		$11,646,455	EN FASE DE VALIDACION	EN FASE DE VALIDACION	EN FASE DE VALIDACION	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
24	MV_1588	CL 70F SUR 18P 33	LUZ NELLY RODRIGUEZ	SI / NO		$10,983,242	EN FASE DE VALIDACION	EN FASE DE VALIDACION	EN FASE DE VALIDACION	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
25	MV_1608	KR 18P 70F 06 SUR	ROSALBINA HERNANDEZ PIRACHICAN	SI / NO		$11,804,701	EN FASE DE VALIDACION	EN FASE DE VALIDACION	EN FASE DE VALIDACION	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
			URBANIZACION COMPARTIR												
26	MVCB_0252	TV 18P BIS 65D 04 SUR	JESUS ANTONIO BARRERA FANDIÑO	SI / NO		$11,829,606	EN FASE DE VALIDACION	EN FASE DE VALIDACION	EN FASE DE VALIDACION	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
			VISTA HERMOSA												
27	MV SH-005	TV 18I 71 35 SUR	MARIA CUSTODIA SANCHEZ SANCHEZ	SI / NO		$11,809,551	EN FASE DE VALIDACION	EN FASE DE VALIDACION	EN FASE DE VALIDACION	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
			ANTONIO JOSE DE SUCRE III SECTOR (USMINIA)												
28	MV 21341	KR 7 116 15 SUR	ERMELINDA HERNANDEZ	SI / NO		$11,795,790	23/01/2021	EN EJECUCIÓN	23/01/2021	25.0%	23.0%	0.0%	0.0%	48.0%
			NUEVO SAN LUIS (USMINIA)												
29	MVUS 0795	KR 5A 112A 24 SUR	AIDA MARIA RUEDA NIETO	SI / NO		$11,772,737	23/01/2021	EN EJECUCIÓN	23/01/2021	0.0%	53.0%	0.0%	0.0%	53.0%
			EL BRILLANTE (USMINIA)												
30	MV 22203	KR 3 100F 06 SUR MJ	YENY ZURLEY LOPEZ ULLOA	SI / NO		$11,385,025	23/01/2021	EN EJECUCIÓN	23/01/2021	40.0%	25.0%	0.0%	0.0%	65.0%
31	MV 22728	DG 101A SUR 2B 37	ECCEHOMO RIVERA RONCANCIO	SI / NO		$11,786,931	23/01/2021	EN EJECUCIÓN	23/01/2021	38.0%	34.0%	0.0%	0.0%	72.0%
			LA COLMENA III SECTOR (CIUDAD BOLIVAR)												
32	MVJA 2062	DG 64A SUR 19 26	MERCEDES WALTEROS JOANIAS	SI / NO		$10,757,741	EN FASE DE VALIDACION	EN FASE DE VALIDACION	EN FASE DE VALIDACION	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
33	MVJA 2077	DG 64A SUR 19 57	SOFIA PORRAS DE CAJAMARCA	SI / NO		$11,387,778	EN FASE DE VALIDACION	EN FASE DE VALIDACION	EN FASE DE VALIDACION	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
34	MVJA 1896	DG 64BIS A SUR 19A 19	HERNANDO TIQUE GUZMAN	SI / NO		$11,822,034	EN FASE DE VALIDACION	EN FASE DE VALIDACION	EN FASE DE VALIDACION	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
			SANTA INES (BOSA LA LIBERTAD)												
35	MVBL 2734	KR 89A BIS 70 19 SUR CA 2	HERMELINA LOSADA CAICEDO	SI / NO		$11,761,838	EN FASE DE VALIDACION	EN FASE DE VALIDACION	EN FASE DE VALIDACION	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
			SAN ANTONIO (BOSA LA LIBERTAD)												
36	MVBL 2838	KR 88J 69A 19 SUR CA 1	ALVARO BARRERA ARIZA	SI / NO		$9,930,556	EN FASE DE VALIDACION	EN FASE DE VALIDACION	EN FASE DE VALIDACION	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DEL HÁBITAT

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

PROYECTOS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA

INPLAYCO S.A.S.

FECHA	14/02/2021	PERIODO No.	15	DEL	8/02/2021	AL	14/02/2021

1. INFORMACIÓN GENERAL

OBJETO DEL CONTRATO	Realizar la interventoría técnica, jurídica, social, administrativa y financiera, para la ejecución de las obras de mejoramiento de vivienda en la modalidad de habitabilidad en los territorios priorizados por la secretaría distrital de hábitat.
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO	Corresponde al Grupo 1 a la ejecución de 254 mejoramientos de vivienda, localizados en 3 localidades: Bosa, Usme y Ciudad Bolivar, esta última localidad incluye cuatro (4) Intervenciones de MejoramientoIntegral.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA		CONTRATO DE OBRA	
CONTRATO No.:	701-2020	CONTRATO No.:	694--2020
PLAZO INICIAL:	6 meses	PLAZO INICIAL:	5 meses
FECHA DE INICIACIÓN:	4 de noviembre de 2020	FECHA DE INICIACIÓN:	4 de noviembre de 2020
**FECHA DE SUSPENSIÓN:	0	**FECHA DE SUSPENSIÓN:	0
**FECHA DE REINICIACIÓN:	0	**FECHA DE REINICIACIÓN:	0
FECHA DE TERMINACIÓN:	3 de mayo de 2021	FECHA DE TERMINACIÓN:	3 de abril 2021
PLAZO ACTUALIZADO:	0	PLAZO ACTUALIZADO:	0
PLAZO TRANSCURRIDO:	0	PLAZO TRANSCURRIDO:	0
VALOR INICIAL :	$ 894,285,952	VALOR INICIAL :	$ 3,724,135,319
VALOR ADICION(ES)	0	VALOR ADICION(ES):	$ -
VALOR ACTUALIZADO:	$ -	VALOR ACTUALIZADO:	$ -
VALOR ANTICIPO:	0	VALOR ANTICIPO:	$ -
VALOR POR PAGAR:	$ -	VALOR POR PAGAR:	$ -
SUPERVISOR:	JUAN CARLOS ARBELAEZ MURILLO	INTERVENTOR:	Gonzalo Levano Hoyos -INPLAYCO S.A.S.

** Inserte las filas que requiera según el número de suspensiones y reinicios.

2. CONTROL DE HITOS.

No.	*** DESCRIPCIÓN DEL HITO	FECHA PROGRAMADA	FECHA REAL DE CUMPLIMIENTO	DÍAS DE RETRASO
	SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO (HITO OBLIGATORIO)	4/11/2020	3/04/2021	
1	Validación			
2	Entrega de informe de validación			
3	Ejecución			
	ENTREGA A LA INTERVENTORIA DE LOS PRODUCTOS Y/O ACTIVIDADES CONTRATADAS (HITO OBLIGATORIO)			


*** Inserte las filas que requiera según el número de hitos; teniendo en cuenta que como mínimo se deberán establecer 5 hitos adicionales a los obligatorios de inicio y terminación. Los hitos aprobados por la interventoría se socializarán con el supervisor del contrato para su Vo. Bo. Los Hitos aprobados por la interventoría y SDHT solo se podrán modificar previa novedad contractual que así lo requiera. La matriz del seguimiento hace parte del presente documento.


No.	INDICADORES BARRIO O TERRITORIO	VALORES CD + AIU	PORCENTAJE SOBRE EL VALOR TOTAL DEL CONTRATO	DIFERENCIA (+) ADELANTO (-) ATRASO
1	Valor acumulado de las actividades o productos conforme a la programación vigente.	$298,229,633.10	8.01%	
2	Valor acumulado de las actividades o productos ejecutados y aprobados por la Interventoría.	$290,054,793.42	7.79%	

3. ASPECTOS GENERALES INFORME TÉCNICO

Registre los avances y novedades técnicas, sociales, administrativas, contables y financieras, acompañadas por gráficos, cuadros, fotografías, análisis y comentarios sobre el estado de los trabajos, en todos sus aspectos en la fase de validación y ejecución de obra.

CIUDAD BOLIVAR - USME

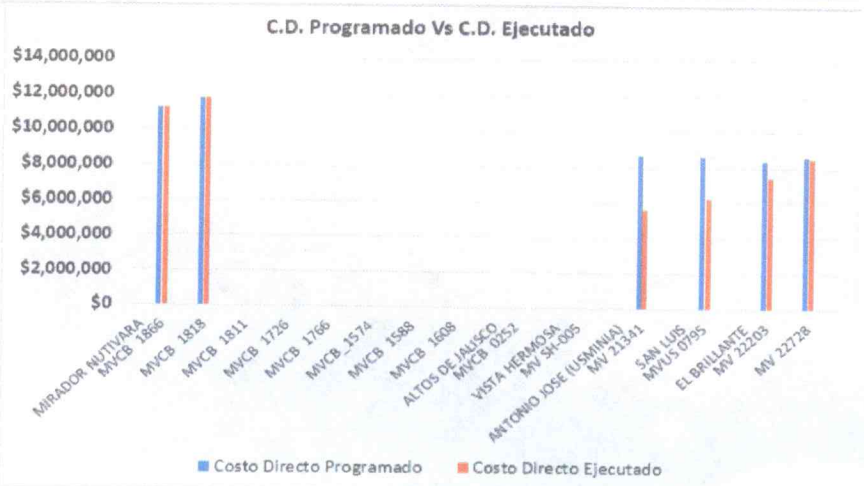

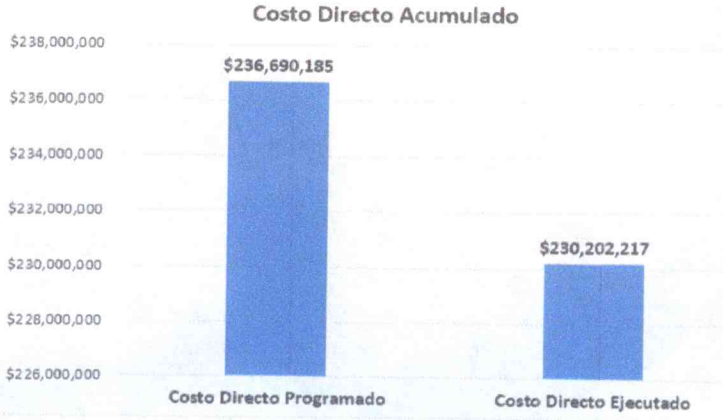

4- COMPONENTE TECNICO BARRIO O TERRITORIO			
ACTIVIDADES EJECUTADAS EN LA SEMANA. - ESTADO DE AVANCE SEMANAL POR VIVIENDA			
BARRIO O TERRITORIO - CIUDAD BOLIVAR- BARRIO NUEVA COLOMBIA			
FECHA: 31- ENERO -2021			
1	MVCB_1437	FLOR ELISA PARRA ROJAS	Se recibe la vivienda con las actividades acordadas y terminadas a satisfacción, fecha de entrega 21 de diciembre 2020
2	MVCB_1441	LUZMILA TORRES BERMUDEZ	Se recibe la vivienda con las actividades acordadas y terminadas a satisfacción, fecha de entrega 15 de diciembre 2020
3	MVCB_1440	ALBA CARMEN ARDILA MATEUS	Se recibe la vivienda con las actividades acordadas y terminadas a satisfacción, fecha de entrega 29 de diciembre 2020
4	MVCB_1421	MARIA ESTER ZORRO GUERRERO	Se recibe la vivienda con las actividades acordadas y terminadas a satisfacción, fecha de entrega 15 de diciembre 2020
5	MVCB_1124	MARIA ANTONIA SANTOS CORREDOR DE RAMIREZ	Se recibe la vivienda con las actividades acordadas y terminadas a satisfacción, fecha de entrega 23 de diciembre 2020
6	MVCB_1120	QUERUBIN CHAGUALA	Se recibe la vivienda con las actividades acordadas y terminadas a satisfacción, fecha de entrega 29 de diciembre 2020
7	MVCB_1091	LIGIA TEJADA DE BARRERO	Se recibe la vivienda con las actividades acordadas y terminadas a satisfacción, fecha de entrega 29 de diciembre 2020
BARRIO O TERRITORIO - CIUDAD BOLIVAR- JUAN PABLO II			
8	MVCB_2996	MARIA TERESA ANTOLINEZ Y OTRO	Se recibe la vivienda con las actividades acordadas y terminadas a satisfacción, fecha de entrega 21 de diciembre 2020
9	MVCB_2993	CARLOS JULIO CARDENAS TRIANA	El beneficiario de la vivienda decide voluntariamente renunciar al beneficio, ya que la vivienda se encuentra en optimas condiciones de habitabilidad
10	MVCB2999	MARIA LEONOR FRAILE SUAREZ	Se recibe la vivienda con las actividades acordadas y terminadas a satisfacción, fecha de entrega 15 de diciembre 2020
11	MVCB_2991	BRISNELDA CONSTANZA MACIAS MARTINEZ	Se recibe la vivienda con las actividades acordadas y terminadas a satisfacción, fecha de entrega 15 de diciembre 2020
12	MVCB_2967	MARIA OLGA FARFAN GALEON	Se recibe la vivienda con las actividades acordadas y terminadas a satisfacción, fecha de entrega 21 de diciembre 2020
13	MVCB_2960	MARIA NURY QUINTERO CARDONA	Se recibe la vivienda con las actividades acordadas y terminadas a satisfacción, fecha de entrega 17 de diciembre 2020
14	MVCB2434	MARGARITA MARIA MORALES OROZCO	Se recibe la vivienda con las actividades acordadas y terminadas a satisfacción, fecha de entrega 23 de diciembre 2020
15	MVCB_2432	AGUSTÍN VILLANUEVA GUZMÁN	Se recibe la vivienda con las actividades acordadas y terminadas a satisfacción, fecha de entrega 30 de diciembre 2020
16	MVCB_3030	TEODOSIA GALICIA DE GARCIA	Se recibe la vivienda con las actividades acordadas y terminadas a satisfacción, fecha de entrega 15 de diciembre 2020
17	MVCB_3020	PEDRO PABLO IBAÑEZ	Se recibe la vivienda con las actividades acordadas y terminadas a satisfacción, fecha de entrega 23 de diciembre 2020
BARRIO O TERRITORIO - CIUDAD BOLIVAR- MIRADOR NUTIVARA			
18	MV_1866	LUIS ALBERTO ALONSO CASTIBLANCO	Se recibe la vivienda con las actividades acordadas y terminadas a satisfacción, fecha de entrega 21 de diciembre 2020
19	MV_1818	MERQUECIDE MONTANEZ UYOA	Se recibe la vivienda con las actividades acordadas y terminadas a satisfacción, fecha de entrega 15 de diciembre 2020
20	MV_1811	ROSA ELVIRA GONZALEZ	Se hace validación en la vivienda y registro fotográfico
21	MV_1726	EMPERATRIZ ACOSTA MARTINEZ	Se hace validación en la vivienda y registro fotográfico
22	MV_1766	CARMEN QUIQUE MARTINEZ	Se hace validación en la vivienda y registro fotográfico
23	MV_1574	JOSE HIPOLITO GUTIERREZ LUCERO	Se hace validación en la vivienda y registro fotográfico
24	MV_1588	LUZ NELLY RODRIGUEZ	Se hace validación en la vivienda y registro fotográfico
25	MV_1606	ROSALBINA HERNANDEZ PIRACHICAN	Se hace validación en la vivienda y registro fotográfico
BARRIO O TERRITORIO - CIUDAD BOLIVAR- URBANIZACIÓN COMPARTIR			
26	MVCB_0252	JESUS ANTONIO BARRERA FANDIÑO	Se hace validación en la vivienda y registro fotográfico
BARRIO O TERRITORIO - CIUDAD BOLIVAR- VISTA HERMOSA			
27	MV SH-005	MARIA CUSTODIA SANCHEZ SANCHEZ	Se hace validación en la vivienda y registro fotográfico

BARRIO O TERRITORIO - ANTONIO JOSE DE SUCRE III SECTOR (USMINIA)			
28	MV 21341	ERMELINDA HERNANDEZ	Se continua con las actividades de enchape en paredes del baño y cocina, enchape de piso en las alcobas, tambien se termina de reconstruye el meson de la cocina y se aplica una segunda capa de estuco en las paredes de las alcobas y sala
BARRIO O TERRITORIO - NUEVO SAN LUIS (USMINIA)			
29	MVUS 0795	AIDA MARIA RUEDA NIETO	En la presente semana se realiza la instalación de la cubierta en el presente MV, dicha ejecución se realiza a satisfacción de la interventoría y del beneficiario, se inician actividades de pañete e instalación de enchape de piso en una de las alcobas del tercer piso
BARRIO O TERRITORIO - NUEVO SAN LUIS (USMINIA)			
30	MV 22203	YENY ZURLEY LOPEZ ULLOA	Se continua con las actividades de estuco en alcobas, enchapes de paredes de cocina y de baño, se instala el nuevo sanitario y lavamanos, se inician actividades de pintura
31	MV 22728	ECCEHOMO RIVERA RONCANCIO	Se continua con actividades de enchape de pisos en alcobas, tambien se instala enchape en meson de la cocina y se inician actividades de pintura en alcobas
LA COLMENA III SECTOR (CIUDAD BOLIVAR)			
32	MVJA 2062	MERCEDES WALTEROS JOANIAS	Se hace validación en la vivienda y registro fotográfico
33	MVJA 2077	SOFIA PORRAS DE CAJAMARCA	Se hace validación en la vivienda y registro fotográfico
34	MVJA 1896	HERNANDO TIQUE GUZMAN	Se hace validación en la vivienda y registro fotográfico
SANTA INES (BOSA LA LIBERTAD)			
35	MVBL 2134	HERMELINA LOSADA CAICEDO	Se hace validación en la vivienda y registro fotográfico
SAN ANTONIO (BOSA LA LIBERTAD)			
36	MVBL 2838	ALVARO BARRERA ARIZA	Se hace validación en la vivienda y registro fotográfico

5. PLAN DE ACCIÓN RESULTADO DEL ANÁLISIS DE CAUSAS REGISTRADO EN EL NUMERAL ANTERIOR - CON EL OBJETIVO DE ELIMINAR LA CAUSA RAÍZ DE LA SITUACIÓN PROBLEMÁTICA - PLAN DE MEJORA

ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA
En conjunto con el contratista y esta interventoría se continua con la supervisión a cada uno de los presupuestos, en los frentes aperturados se evidencia personal de obra ejecutando actividades contractuales	Arq. William Fdo Garzón	

6. ACTIVIDADES NO PREVISTAS Y MAYORES CANTIDADES

Se informa que en algunas de las viviendas se presentan mejoras en los acabados finales realizadas por los beneficiarios, por lo tanto se deside intervenir otros espacios en conjunto con el contratista garantizando una adecuada habitabilidad y dignificación de las viviendas

7. COMENTARIOS DEL INTERVENTOR: Por favor realice la descripción general del estado del contrato y según aplique informe sobre: actividades realizadas en la semana, control de lluvias, compra y suministro de materiales, mano de obra, subcontratos y tramites ante las diferentes empresas prestadoras de servicios, entre otros. Anexe las actas de seguimiento realizadas en la semana correspondiente al periodo del informe.

Barrio o Territorio: CIUDAD BOLIVAR - USMINIA - BOSA


En el presente periodo el contratista evidencia avances en los 4 frentes aperturados, en algunos frentes el contratista presenta demoras en el suministro de materiales, lo q ha generado algunos reclamos por parte de los beneficiarios

En la presente semana no se han registrado lluvias, tiempo soleado y seco

8. REGISTRO FOTOGRAFICO DEL AVANCE DURANTE LA SEMANA

SE ADJUNTA REGISTRO FOTOGRÁFICO

REGISTRO FOTOGRÁFICO

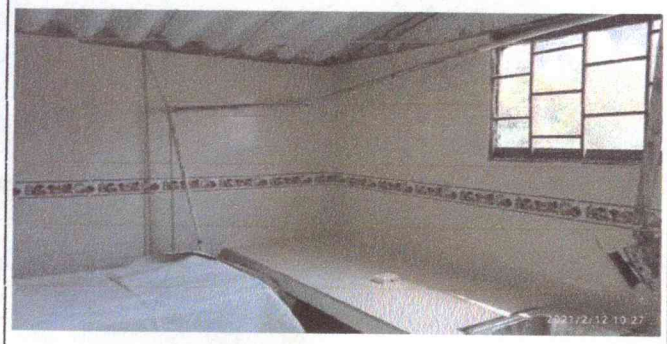

FECHA	viernes, 12 de febrero de 2021
DESCRIPCION MV 21341	
Avance de obra	



FECHA	viernes, 12 de febrero de 2021
DESCRIPCION MV 22203	
Avance de obra	



FECHA	viernes, 12 de febrero de 2021
DESCRIPCION MV 22728	
Avance de obra	



FECHA	viernes, 12 de febrero de 2021
DESCRIPCION MVUS 0795	

Subsecretaría de Coordinacion Operativa
Subdireccion de Barrios
Seguimiento ejecución proyectos de Mejoramiento de Vivienda - Habitabilidad

Proyecto mejoramiento de vivienda - AVANCE EJECUCIÓN SEMANAL

Fecha: 14-feb-21

Consorcio mejoramiento EP 2020 - Contratista de obra

Contratato de obra	694-2020			Plazo	Cinco (5) meses
Objeto	Contratar la ejecución de las obras de mejoramiento de vivienda en la modalidad de habitabilidad de los proyectos estructurados en los territorios priorizados por la Secretaria Distrital de Habitat. Grupo I			Acta de inicio	4 de noviembre de 2020
CDP No.	No. 914 del 24 de julio de 2020	CRP No.		Valor del contrato	TRES MIL SETECIENTOS VEINTICUATRO MILLONES CIENTO TREINTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS DIEZ Y NUEVE PESOS ($3.724.135.319) M/Cte

Gonzalo Llevano Hoyos -INPLAYCO S.A.S.

Contratato de interventoria	701-2020			Plazo	Seis (6) meses
Objeto	Realizar la interventorias técnica jurídica, social, administrativa y financiera, para la ejecución de las obras de mejoramiento de vivienda en la modalidad de habitabilidad en los territorios priorizados por la secretaría distrital de hábitat.			Acta de inicio	04 de noviembre 2020
CDP No	No. 892 del 24 de julio de 2020	CRP No.		Valor del contrato	OCHOCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS M/CTE ($894.185.952),

Territorio o barrio a intervenir	JUAN PABLO II NUEVA COLOMBIA	Barrios	Predios	Total Predios	Fase 1: Validación de la información entregada por el la SDHT				Fase 2: Ejecución de obras				
					Validación				Ejecución				
					Validada	V/Por Validar	Renuncias	V/Modificada	En Ejecución	Terminadas	For Ejecutar	% de Avance	Acta de Entrega a Satisfacción
Arq o Ing. Responsable	Arq.Leonardo Solano	JUAN PABLO II	17		17	0	0	0	0	17	0	6,51%	17
		NUEVA COLOMB.	15		14	0	1	0	1	13	0	5,31%	13
Técnico Responsable		VILLAS DIAMANTE	10		10	0	0	0	0	0	10	0,90%	0
		MIRADOR (NUTIVARA)	4		4	0	0	0	4	0	0	0,93%	0
		USMINIA	4		4	0	0		4	0	0	1,55%	0
	Subtotal		50	50	49	0	1	0	9	30	10	15,20%	30

AVANCE DE EJECUCIÓN SEMANAL

FEBRERO

No	ID_DMV	Dirección	Nombres y apellidos	FASE I			Tiempo Programacion			VR. ACUMULADO SEM. ANT.	SEM. DEL 08 AL 14			VR. ACUMULADO TOTAL
				V/ Validada	V/ Modificada	V/Inicial	Fecha Inicio	Fecha terminada	F. Inicio		SEMANA 15	SEMANA 16	SEMANA 17	
			JUAN PABLO II											
1	MVCB_4919	KR 18M BIS 68B 50 SUR MJ	URIEL PATIÑO RINCON	SI / NO		$11.696.006	17/11/2020	11/01/2021	3/12/2020	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
2	MVCB_4923	KR 18M BIS 68B 26 SUR	SIERVO MATIAS FIGUEROA CHAPARRO	SI / NO		$10.947.719	17/11/2020	18/12/2020	23/11/2020	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
3	MVCB_2932	TV 18N BIS 69A 97 SUR	MARIA TERESA PIÑEROS PIÑEROS	SI / NO		$11.700.811	17/11/2020	21/12/2020	23/11/2020	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
4	MVCB_2926	TV 18N BIS 69A 71 SUR	CORADO TORO DE TORRES Y OTRO	SI / NO		$11.800.475	17/11/2020	21/12/2020	23/11/2020	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
5	MVCB_3646	TV 18N BIS 69A 95 SUR	LUIS ANTONIO CABRERA LOPEZ Y OTRA	SI / NO		$11.416.175	2/12/2020	23/12/2020	24/11/2020	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
6	MVCB_3643	TV 18N BIS 69A 83 SUR	JOSE ARISTOBULO MENJURA LEITON Y OTRA	SI / NO		$11.078.062	2/12/2020	21/12/2020	24/11/2020	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
7	MVCB_2925	TV 18N BIS 69A 67 SUR	MARTHA LUZ CAMPIÑO	SI / NO		$11.553.359	2/12/2020	30/12/2020	24/11/2020	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
8	MVCB_2917	DG 69A BIS B SUR 18M 30	CLAUDIA PATRICIA VARGAS GÓMEZ	SI / NO		$11.229.192	18/11/2020	23/01/2021	24/11/2020	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
9	MVCB_3642	TV 18N BIS 69A 77 SUR	JULIO CESAR FICHAS AVILA	SI / NO		$11.811.376	2/12/2020	30/12/2020	25/11/2020	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
10	MVCB_3641	TV 18N BIS 69A 75 SUR	CECILIA MENDEZ MORENO	SI / NO		$11.551.960	2/12/2020	21/12/2020	25/11/2020	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
11	MVCB_3640	TV 18N BIS 69A 71 SUR	OCTAVIO TELLEZ PINEDA	SI / NO		$11.827.947	3/12/2020	21/12/2020	25/11/2020	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
12	MVCB_3635	TV 18N BIS 69A 51 SUR	JUAN CARLOS MAZO CASTRO Y OTRA	SI / NO		$11.819.965	3/12/2020	18/12/2020	25/11/2020	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
13	MVCB_3634	TV 18N BIS 69A 47 SUR	AYDE NIÑO Y OTRO	SI / NO		$10.732.650	3/12/2020	18/12/2020	23/11/2020	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
14	MVCB_2939	TV 18N BIS 69A 84 SUR	MARIA EYE LOAISA	SI / NO		$11.036.579	4/12/2020	23/12/2020	30/11/2020	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
15	MVCB_4918	KR 18M BIS 68B 56 SUR	ALVARO DIAZ AVILA	SI / NO		$11.639.626	4/12/2020	18/12/2020	23/11/2020	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%

16	MVCB_3633	TV 18N BIS 69A 43 SUR	FRANCISCO JAVIER MENDIVELSO GUERRERO	SI NO		$10 296.334	3/12/2020	ENTREGADA	30/11/2020	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00
17	MVCB_4917	KR 18M BIS 68B 62 SUR	ALVARO ALONSO MORENO	SI NO		$10 136.993	4/12/2020	ENTREGADA	3/12/2020	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00
			DESARROLLO NUEVA COLOMBIA											
18	MVCB_1320	CL 70K SUR 18L 65	ISMENIA BARRETO ARIAS	SI NO		$11.707.337	15/01/2021	ENTREGADA	15/01/2021	100,00%	0%	0%	0%	100,00
19	MVCB_1383	CL 70J SUR 18L 34	EDGAR FERNANDO CAMARCO ANGEL	SI NO		$10.129.674	11/01/2021	ENTREGADA	11/01/2021	100,00%	0%	0%	0%	100,00
20	MVCB_1380	CL 70J SUR 18L 22	ROSALBA MONTES DE CARDONA	SI NO		$11.330.297	11/01/2021	ENTREGADA	11/01/2021	100,00%	0%	0%	0%	100,00
21	MVCB_1382	CL 70J SUR 18L 30	MARIA CECILIA RINCON RINCON	SI NO		$11.818.990	11/01/2021	ENTREGADA	11/01/2021	100,00%	0%	0%	0%	100,00
22	MVCB_1381	CL 70J SUR 18L 26	NOHORA NOHEMI MAYORGA IBAGUE	SI NO		$8.886.491	11/01/2021	ENTREGADA	11/01/2021	100,00%	0%	0%	0%	100,00
23	MVCB_1374	CL 70J SUR 18L 11	OBED OSPINA RESTREPO	SI NO		$10.320.364	11/01/2021	ENTREGADA	11/01/2021	100,00%	0%	0%	0%	100,00
24	MVCB_1371	CL 70J SUR 18L 23	CONSUELO NAVARRO	SI NO		$11.808.362	11/01/2021	ENTREGADA	11/01/2021	100,00%	0%	0%	0%	100,00
25	MVCB_1328	CL 70K SUR 18L 29	EDILBERTO CARDENAS PAEZ	SI NO		$10.521.578	11/01/2021	ENTREGADA	11/01/2021	100,04%	0%	0%	0%	100,04
26	MVCB_1352	CL 70K SUR 18L 64	MARIA RAMOS ORTIZ	SI NO		$11.766.783	18/01/2021	ENTREGADA	18/01/2021	100,00%	0%	0%	0%	100,00
27	MVCB_1341	CL 70K SUR 18L 20	JOSE GABRIEL HERRERA MEDINA	SI NO		$11.783.941	11/01/2021	ENTREGADA	11/01/2021	100,00%	0%	0%	0%	100,00
28	MVCB_1344	CL 70K SUR 18L 32	ALBEIRO RUIZ SANABRIA	SI NO		$11.778.217	15/01/2021	ENTREGADA	15/01/2021	100,00%	0%	0%	0%	100,00
29	MVCB_1310	CL 70L SUR 18L 70	DORA ALICIA LÓPEZ SANABRIA	SI NO		$11.826.158	15/01/2021	ENTREGADA	15/01/2021	100,00%	0%	0%	0%	100,00
30	MVCB_1314	KR 18M 70K 16 SUR	MARTHA LUCIA OSPINA PEÑA	SI NO		$11.714.974	RENUNCIA	RENUNCIA	RENUNCIA	RENUNCIA	RENUNCIA	RENUNCIA	RENUNCIA	RENUNC
31	MVCB_1357	KR 18M 70J 16 SUR	MARTHA LILIA AGUDELO SANTOS	SI NO		$11.562.098	15/01/2021	ENTREGADA	15/01/2021	100,00%	0,00%	0%	0%	100,00
32	MVCB_1280	CL 70L SUR 18L 85	BARBARA GALVIS CHINCHILLA	SI NO		$ 11.796.700,60	15/01/2021	11/02/2021	15/01/2021	42,58%	15,20%	0%	0%	57,78%
33	MVCB_1286	CL 70L SUR 18L 61	LUZ MINDA CASTRO PEÑA	SI NO		$ 11.176.968,00	19/01/2021	16/02/2021	19/01/2021	38,50%	20,30%	0%	0%	58,80%
			VILLAS DEL DIAMANTE											
34	MVCB_5128	CL 69N SUR 18N 52	DIEGO MARIO VANEGAS VILLAMIL	SI NO		$8.215.304	EN FASE DE VALIDACION	EN FASE DE VALIDACION	EN FASE DE VALIDACION	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,00%
35	MVCB_5156	CL 69N SUR 18N 58 MJ	FRANCISCO JAVIER ARANGO GUTIERREZ	SI NO		$9.918.506	EN FASE DE VALIDACION	EN FASE DE VALIDACION	EN FASE DE VALIDACION	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,00%
36	MVCB_5127	CL 69N SUR 18N 59 MJ	VICTOR MANUEL MUÑOZ VERGARA	SI NO		$11.788.586	EN FASE DE VALIDACION	EN FASE DE VALIDACION	EN FASE DE VALIDACION	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,00%
37	MVCB_5489	KR 19F 70C 29 SUR MJ	GLORIA INES PEÑA BELTRAN	SI NO		$10.903.021	EN FASE DE VALIDACION	EN FASE DE VALIDACION	EN FASE DE VALIDACION	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,00%
38	MVCB_5482	KR 19G 70C 18 SUR	LUIS HERNANDO MESA	SI NO		$11.726.936	EN FASE DE VALIDACION	EN FASE DE VALIDACION	EN FASE DE VALIDACION	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,00%

39	VIVCB_5486	CL 70C SUR 19F 07 MJ	MARIA DEL CARMEN ALONSO POSADA	SI / NO		$11.648.943	EN FASE DE VALIDACION	EN FASE DE VALIDACION	EN FASE DE VALIDACION	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
40	VIVCB_5314	TV 18N BIS A 69R 17 SUR MJ	ANA OTILIA GUACANEME CUESTA	SI / NO		$11.762.842	EN FASE DE VALIDACION	EN FASE DE VALIDACION	EN FASE DE VALIDACION	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
41	VIVCB_5295	CL 69R SUR 18P 45 MJ	MARIA YOLANDA LOZANO VERGARA	SI / NO		$10.666.717	EN FASE DE VALIDACION	EN FASE DE VALIDACION	EN FASE DE VALIDACION	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
42	VIVCB_5122	CL 69 SUR 18F 15	HERNAN LOPEZ GIRALDO	SI / NO		$9.464.066	EN FASE DE VALIDACION	EN FASE DE VALIDACION	EN FASE DE VALIDACION	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
43	VIVCB_5157	CL 69N SUR 18N 57	ANA TERESA PEÑA ROJAS	SI / NO		$11.827.785	EN FASE DE VALIDACION	EN FASE DE VALIDACION	EN FASE DE VALIDACION	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
			MIRADOR (NUTIVARA											
44	VIVCB_1586	CL 70 SUR 18F 45	MARIA DEL CARMEN RINCON	SI / NO		$11.816.419	EN FASE DE VALIDACION	EN FASE DE VALIDACION	EN FASE DE VALIDACION	10,81%	23,30%	0,00%	0,00%	34,11
45	VIVCB_1907	CL 70N SUR 18N 22	ANA ROSA LLANOS DE GARCIA	SI / NO		$11.042.205	EN FASE DE VALIDACION	EN FASE DE VALIDACION	EN FASE DE VALIDACION	18,66%	22,00%	0,00%	0,00%	40,66
46	VIVCB_1867	CL 70 SUR 18F 15	JOSE ALBER LUGO	SI / NO		$ 11.317.334,40	EN FASE DE VALIDACION	EN FASE DE VALIDACION	EN FASE DE VALIDACION	33,00%	18,00%	0,00%	0,00%	51,00
47	VIVCB_1914	CL 70M BIS SUR 18N 33	BLANCA ODILIA PATIÑO DE MARTINEZ Y OTRO	SI / NO		$ 11.424.631,60	EN FASE DE VALIDACION	EN FASE DE VALIDACION	EN FASE DE VALIDACION	25,00%	23,00%	0,00%	0,00%	48,00
			USMINIA											
48	MV_21184	CL 112A SUR 7 48	AMALIA MERCHAN SOSA	SI / NO		$11.364.241	EN FASE DE VALIDACION	EN FASE DE VALIDACION	EN FASE DE VALIDACION	10,81%	22,76%	0,00%	0,00%	33,57
49	MV_21368	CL 116 SUR 5 73	ALEJANDRO PAVA	SI / NO		$11.111.995	EN FASE DE VALIDACION	EN FASE DE VALIDACION	EN FASE DE VALIDACION	18,66%	35,83%	0,00%	0,00%	54,69
50	MV_21240	CL 114 SUR 7 42	ALFONSO GUERRERO	SI / NO		$11.590.585	EN FASE DE VALIDACION	EN FASE DE VALIDACION	EN FASE DE VALIDACION	22,50%	30,10%	0,00%	0,00%	52,60
51	MV_21232	CL 112A SUR 7 31	ERNESTINA CAICEDO	SI / NO		$11.743.515	21/01/2021	ENTREGADA	21/01/2021	43,30%	56,70%	0,00%	0,00%	100,00

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DEL HÁBITAT

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

PROYECTOS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA

INPLAYCO S.A.S.

FECHA		PERIODO No.		DEL	8/02/2021	AL	14/02/2021

1. INFORMACIÓN GENERAL

OBJETO DEL CONTRATO	Realizar la interventorías técnica, jurídica, social, administrativa y financiera, para la ejecución de las obras de mejoramiento de vivienda en la modalidad de habitabilidad en los territorios priorizados por la secretaría distrital de hábitat
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO	Corresponde al Grupo 1 a la ejecución de 254 mejoramientos de vivienda, localizados en 3 localidades: Bosa, Usme y Ciudad Bolívar, esta última localidad incluye cuatro (4) intervenciones de Mejoramientointegral.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA		CONTRATO DE OBRA	
CONTRATO No.:	701-2020	CONTRATO No.:	694--2020
PLAZO INICIAL:	5 meses	PLAZO INICIAL:	5 meses
FECHA DE INICIACIÓN:	4 de noviembre de 2020	FECHA DE INICIACIÓN:	4 de noviembre de 2020
**FECHA DE SUSPENSIÓN:	0	**FECHA DE SUSPENSIÓN:	0
**FECHA DE REINICIACIÓN:	0	**FECHA DE REINICIACIÓN:	0
FECHA DE TERMINACIÓN:	3 de mayo de 2021	FECHA DE TERMINACIÓN:	3 de abril 2021
PLAZO ACTUALIZADO:	0	PLAZO ACTUALIZADO:	0
PLAZO TRANSCURRIDO:	0	PLAZO TRANSCURRIDO:	0
VALOR INICIAL :	$ 894 285.952	VALOR INICIAL :	$ 3.724.135.319
VALOR ADICION(ES):	0	VALOR ADICION(ES):	$ -
VALOR ACTUALIZADO:	$ -	VALOR ACTUALIZADO:	$ -
VALOR ANTICIPO:	0	VALOR ANTICIPO:	$ -
VALOR POR PAGAR:	$ -	VALOR POR PAGAR:	$ -
SUPERVISOR:	JUAN CARLOS ARBELAEZ MURILLO	INTERVENTOR:	Gonzalo Llevano Hoyos -INPLAYCO S.A.S.

** Inserte las filas que requiera según el número de suspensiones y reinicios.


2. CONTROL DE HITOS.


No.	*** DESCRIPCIÓN DEL HITO	FECHA PROGRAMADA	FECHA REAL DE CUMPLIMIENTO	DÍAS DE RETRASO
	SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO (HITO OBLIGATORIO)	4/11/2020	3/04/2021	
1	Validación			
2	Entrega de informe de validación			
3	Ejecución			
	ENTREGA A LA INTERVENTORIA DE LOS PRODUCTOS Y/O ACTIVIDADES CONTRATADAS (HITO OBLIGATORIO)			


*** Inserte las filas que requiera según el número de hitos; teniendo en cuenta que como mínimo se deberán establecer 5 hitos adicionales a los obligatorios de inicio y terminación. Los hitos aprobados por la interventoría se socializarán con el supervisor del contrato para su Vo. Bo. Los Hitos aprobados por la interventoría y SDHT solo se podrán modificar previa novedad contractual que así lo requiera. La matriz ded segimiento hace parte del presente documento.

No.	INDICADORES BARRIO O TERRITORIO	VALORES	PORCENTAJE SOBRE EL VALOR TOTAL DEL CONTRATO	DIFERENCIA (+) ADELANTO (-) ATRASO
1	Valor acumulado de las actividades o productos conforme a la programación vigente.	$ 611.800.839,83	16,43%	
2	Valor acumulado de las actividades o productos ejecutados y aprobados por la interventoría.	$ 566.011.808,45	15,20%	

3. ASPECTOS GENERALES INFORME TÉCNICO

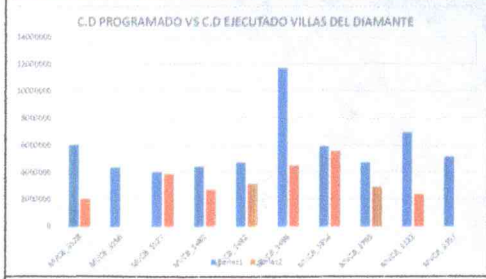

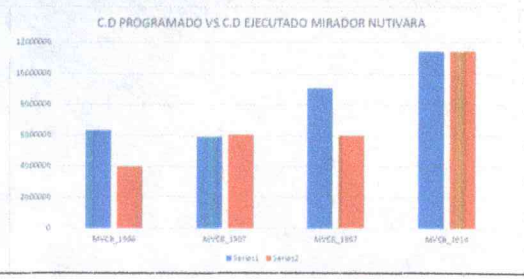

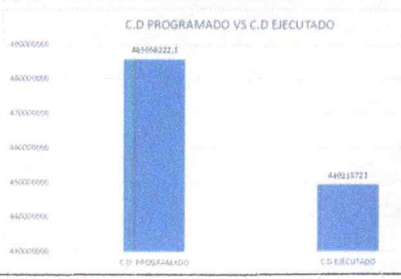

	4- COMPONENTE TECNICO BARRIO O TERRITORIO		
	ACTIVIDADES EJECUTADAS EN LA SEMANA. - ESTADO DE AVANCE SEMANAL POR VIVIENDA		
	JUAN PABLO II - NUEVA COLOMBIA		
	FECHA: 08 DE DICIEMBRE 2020		
	BARRIO JUAN PABLO II		
1	MVCB_4919	URIEL PATIÑO RINCON	Se realiza visita Técnica-Social Realizando Entrega Oficial de la vivienda
2	MVCB_4923	SIERVO MATIAS FIGUEROA CHAPARRO	Se realiza visita Técnica-Social Realizando Entrega Oficial de la vivienda
3	MVCB_2932	MARIA TERESA PIÑEROS PIÑEROS	Se realiza visita Técnica-Social Realizando Entrega Oficial de la vivienda
4	MVCB_2926	CORADO TORO DE TORRES Y OTRO	Se realiza visita Técnica-Social Realizando Entrega Oficial de la vivienda
5	MVCB_3646	LUIS ANTONIO CABRERA LOPEZ Y OTRA	Se realiza visita Técnica-Social Realizando Entrega Oficial de la vivienda
6	MVCB_3643	JOSE ARISTOBULO MENJURA LEITON Y OTRA	Se realiza visita Técnica-Social Realizando Entrega Oficial de la vivienda
7	MVCB_2925	MARTHA LUZ CAMPIÑO	Se realiza visita Técnica-Social Realizando Entrega Oficial de la vivienda
8	MVCB_2917	CLAUDIA PATRICIA VARGAS GÓMEZ	Se realiza visita Técnica-Social Realizando Entrega Oficial de la vivienda
9	MVCB_3642	JULIO CESAR FICHAS AVILA	Se realiza visita Técnica-Social Realizando Entrega Oficial de la vivienda
10	MVCB_3641	CECILIA MENDEZ MORENO	Se realiza visita Técnica-Social Realizando Entrega Oficial de la vivienda
11	MVCB_3640	OCTAVIO TELLEZ PINEDA	Se realiza visita Técnica-Social Realizando Entrega Oficial de la vivienda
12	MVCB_3635	JUAN CARLOS MAZO CASTRO Y OTRA	Se realiza visita Técnica-Social Realizando Entrega Oficial de la vivienda
13	MVCB_3634	AYDE NIÑO Y OTRO	Se realiza visita Técnica-Social Realizando Entrega Oficial de la vivienda
14	MVCB_3633	FRANCISCO JAVIER MENDIVELSO GUERRERO	Se realiza visita Técnica-Social Realizando Entrega Oficial de la vivienda
15	MVCB_2939	MARIEYE LOAISA	Se realiza visita Técnica-Social Realizando Entrega Oficial de la vivienda
16	MVCB_4917	ALVARO ALONSO MORENO	Se realiza visita Técnica-Social Realizando Entrega Oficial de la vivienda
17	MVCB_4918	ALVARO DIAZ AVILA	Se realiza visita Técnica-Social Realizando Entrega Oficial de la vivienda
		BARRIO NUEVA COLOMBIA	
18	MVCB_1320	ISMENIA BARRETO ARIAS	Se realiza visita Técnica-Social Realizando Entrega Oficial de la vivienda
19	MVCB_1383	EDGAR FERNANDO CAMARCO ANGEL	Se realiza visita Técnica-Social Realizando Entrega Oficial de la vivienda
20	MVCB_1380	ROSALBA MONTES DE CARDONA	Se realiza visita Técnica-Social Realizando Entrega Oficial de la vivienda
21	MVCB_1382	MARIA CECILIA RINCON RINCON	Se realiza visita Técnica-Social Realizando Entrega Oficial de la vivienda
22	MVCB_1381	NOHORA NOHEMI MAYORGA IBAGUE	Se realiza visita Técnica-Social Realizando Entrega Oficial de la vivienda
23	MVCB_1374	OBED OSPINA RESTREPO	Se realiza visita Técnica-Social Realizando Entrega Oficial de la vivienda
24	MVCB_1371	CONSUELO NAVARRO	Se realiza visita Técnica-Social Realizando Entrega Oficial de la vivienda
25	MVCB_1328	EDILBERTO CARDENAS PAEZ	Se realiza visita Técnica-Social Realizando Entrega Oficial de la vivienda
26	MVCB_1352	MARIA RAMOS ORTIZ	Se realiza visita Técnica-Social Realizando Entrega Oficial de la vivienda
27	MVCB_1341	JOSE GABRIEL HERRERA MEDINA	Se realiza visita Técnica-Social Realizando Entrega Oficial de la vivienda
28	MVCB_1344	ALBEIRO RUIZ SANABRIA	Se realiza visita Técnica-Social Realizando Entrega Oficial de la vivienda
29	MVCB_1310	DORA ALICIA LÓPEZ SANABRIA	Se realiza visita Técnica-Social Realizando Entrega Oficial de la vivienda
30	MVCB_1314	MARTHA LUCIA OSPINA PEÑA	Por temas juridicos se termina dando renuncia al programa de Mejoramiento
31	MVCB_1357	MARTHA LILIA AGUDELO SANTOS	Se realiza visita Técnica-Social Realizando Entrega Oficial de la vivienda
32	MVCB_1280	BARBARA GALVIS CHINCHILLA	Se realiza visita Técnica-Social Evidenciando actividades : Enchape pared en cerámica para baños , cocina y patio de ropas formato 60 x 30 o similar , Pintura interior tres manos sobre pañete muros, Enchape piso Cerámico
33	MVCB_1286	LUZ MINDA CASTRO PEÑA	Se realiza visita Técnica-Social Evidenciando actividades : Estuco sobre pañete muros, Enchape piso Cerámico
		VILLAS DEL DIAMANTE	
34	MVCB_5128	DIEGO MARIO VANEGAS VILLAMIL	Se realiza Estructuracion de Presupuesto para apertura de Ejecucion de actividades
35	MVCB_5129	FRANCISCO JAVIER ARANGO GUTIERREZ	Se realiza Estructuracion de Presupuesto para apertura de Ejecucion de actividades
36	MVCB_5156	VICTOR MANUEL MUÑOZ VERGARA	Se realiza Estructuracion de Presupuesto para apertura de Ejecucion de actividades
37	MVCB_5489	GLORIA INES PEÑA BELTRAN	Se realiza Estructuracion de Presupuesto para apertura de Ejecucion de actividades
38	MVCB_5482	LUIS HERNANDO MESA	Se realiza Estructuracion de Presupuesto para apertura de Ejecucion de actividades

39	MVCB_5486	MARIA DEL CARMEN ALONSO POSADA	Se realiza Estructuracion de Presupuesto para apertura de Ejecucion de actividades
40	MVCB_5314	ANA OTILIA GUACANEME CUESTA	Se realiza Estructuracion de Presupuesto para apertura de Ejecucion de actividades
41	MVCB_5295	MARIA YOLANDA LOZANO VERGARA	Se realiza Estructuracion de Presupuesto para apertura de Ejecucion de actividades
42	MVCB_5122	HERNAN LOPEZ GIRALDO	Se realiza Estructuracion de Presupuesto para apertura de Ejecucion de actividades
43	MVCB_5157	ANA TERESA PEÑA ROJAS	Se realiza Estructuracion de Presupuesto para apertura de Ejecucion de actividades
		MIRADOR (NUTIVARA)	
44	MVCB_1586	MARIA DEL CARMEN RINCON	Se realiza visita Técnica-Social Evidenciando actividades : Alistado de piso en mortero 1:4, Demolición Enchape Muro Cocina .Instalación de Enchape de piso en Porcelanato trafico Comercial Formato 45 x 45 o similar.
45	MVCB_1907	ANA ROSA LLANOS DE GARCIA	Se realiza visita Técnica-Social Evidenciando actividades : Alistado de piso en mortero 1:4, Demolición pañete Muro Cocina y Armado y fundición mesón cocina.
46	MVCB_1867	JOSE ALBER LUGO	Se realiza visita Técnica-Social Evidenciando actividades : Se realiza visita Técnica-Social Evidenciando actividades : Enchape pared en cerámica para baños , cocina formato 60 x 30 o similar. Instalación de Enchape de piso Cerámico Formato 45 x 45 o similar.
47	MVCB_1914	BLANCA ODILIA PATIÑO DE MARTINEZ Y OTRO	Se realiza visita Técnica-Social Evidenciando actividades : Enchape pared en cerámica para cocina y Baño . Instalación de Enchape de piso Cerámico Formato 45 x 45 o similar.
		USMINIA	
48	MV_21184	AMALIA MERCHAN SOSA	Se realiza visita Técnica-Social Evidenciando actividades : Alistado de piso en mortero 1:4, Demolición pañete Muro Cocina y Armado y fundición mesón cocina.
49	MV_21368	ALEJANDRO PAVA	Se realiza visita Técnica-Social Evidenciando actividades : Se realiza visita Técnica-Social Evidenciando actividades : Enchape pared en cerámica para baños , cocina formato 60 x 30 o similar. Instalación de Enchape de piso Cerámico Formato 45 x 45 o similar.
50	MV_21240	ALFONSO GUERRERO	Se realiza visita Técnica-Social Evidenciando actividades : Enchape pared en cerámica para cocina y Baño . Instalación de Enchape de piso Cerámico Formato 45 x 45 o similar.
51	MV_21212	ERNESTINA CAICEDO	Se realiza visita Técnica-Social Evidenciando actividades : Alistado de piso en mortero 1:4, Demolición Enchape Muro Cocina .Instalación de Enchape de piso en Porcelanato trafico Comercial Formato 45 x 45 o similar.

5. PLAN DE ACCIÓN RESULTADO DEL ANÁLISIS DE CAUSAS REGISTRADO EN EL NUMERAL ANTERIOR - CON EL OBJETIVO DE ELIMINAR LA CAUSA RAÍZ DE LA SITUACIÓN PROBLEMÁTICA - PLAN DE MEJORA

ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA
Se hace la observación bajo la verificación técnica (tanto de los materiales como de su ejecución) de que la obra cuenta deficiencias en las características específicas técnicas necesarias para evitar futuras fallas, malos métodos y deficientes prácticas constructivas, y asegurar así, que el usuario final va a recibir un producto de calidad.		

6. ACTIVIDADES NO PREVISTAS Y MAYORES CANTIDADES

Se a determinado en conjunto con el Contratista cada una de as actividades priorizando areas terminadas y viabilizando areas Primarias

7. COMENTARIOS DEL INTERVENTOR: Por favor realice la descripción general del estado del contrato y según aplique informe sobre: actividades realizadas en la semana, control de lluvias, compra y suministro de materiales, mano de obra, subcontratos y tramites ante las diferentes empresas prestadoras de servicios, entre otros. Anexe las actas de seguimiento realizadas en la semana correspondiente al periodo del informe.

Barrio o Territorio: JUAN PABLO II

En cada validación ejecutada en la semana es de vital importancia determinar conciciones de vulnerabilidad como hacinamiento, ausencia de servicios públicos, problemas de salud asociados a carencias en saneamiento básico, carencias de pisos, cubiertas, deficiencias constructivas, entre otras que permitan justificar y fijar una línea base del problema a abordar a través del proyecto de Mejoramiento de Vivienda

8. REGISTRO FOTOGRAFICO DEL AVANCE DURANTE LA SEMANA

SE ANEXA REGISTRO FOTOGRAFICO


REGISTRO FOTOGRAFICO



FECHA	domingo, 14 de febrero de 2021
DESCRIPCION	




FECHA	domingo, 14 de febrero de 2021
DESCRIPCION	

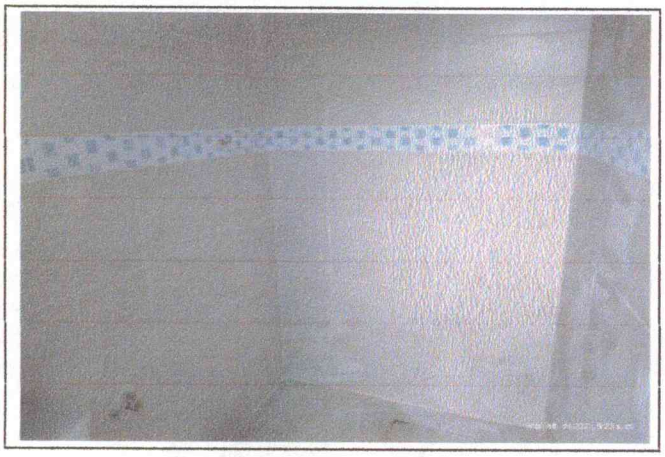


FECHA	domingo, 14 de febrero de 2021
DESCRIPCION	



FECHA	domingo, 14 de febrero de 2021
DESCRIPCION	

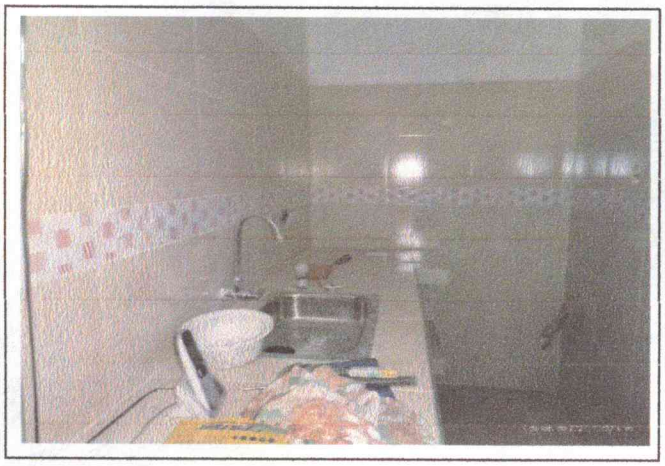

FECHA	domingo, 14 de febrero de 2021
DESCRIPCION	

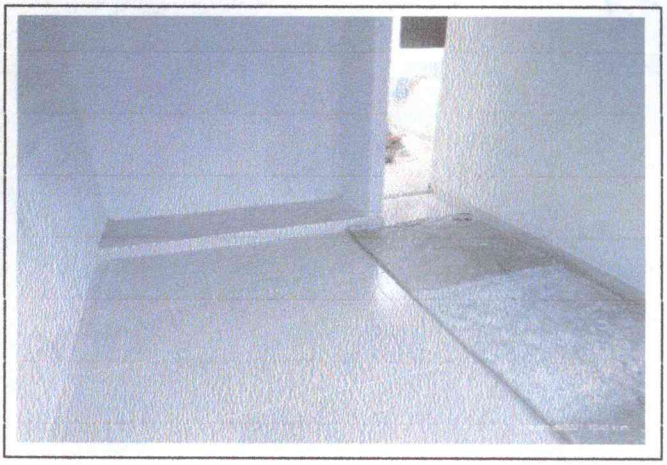

FECHA	domingo, 14 de febrero de 2021
DESCRIPCION	

Subsecretaria de Coordinación Operativa

Subdirección de Barrios

Seguimiento ejecución proyectos de Mejoramiento de Vivienda - Habitabilidad

Proyecto mejoramiento de vivienda - AVANCE EJECUCIÓN SEMANAL

Fecha 14-feb-21

Consorcio Mejoramiento EP 2020

Contrato de obra	694-2020			Plazo	Cinco (5) meses
Objeto	Contratar la ejecución de las obras de mejoramiento de vivienda en la modalidad de habitabilidad de los proyectos estructurados en los territorios priorizados por la Secretaria Distrital de Habitat. Grupo I			Acta de inicio	4 de noviembre de 2020
CDP No.	No. 914 del 14 de julio de 2020	CRP No.		Valor del contrato	TRES MIL SETECIENTOS VEINTICUATRO MILLONES CIENTO TREINTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS DIEZ Y NUEVE PESOS ($3.724.135.319) M/Cte

Gonzalo Liévano Hoyos -INPLAYCO S.A.S.

Contrato de interventoria	701-2020			Plazo	Seis (6) meses
Objeto	Realizar la interventorías técnica, jurídica, social, administrativa y financiera, para la ejecución de las obras de mejoramiento de vivienda en la modalidad de habitabilidad en los territorios priorizados por la secretaría distrital de hábitat.			Acta de inicio	04 de noviembre 2020
CDP No	No. 892 del 14 de julio de 2020	CRP No.		Valor del contrato	OCHOCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS M/CTE ($894.285.952),

Fase 1: Validación de la información entregada por el la SDHT								Fase 2: Ejecución de obras				
					Validación			Ejecución				
Territorio o barrio a intervenir	Ciudad Bolivar	Barrios	Predios	Total Predios	Validada		V/Modificada	En Ejecución	Terminadas	Por Ejecutar	% de Avance	Acta de Entrega a Satisfacción
Arq. o Ing. Responsable	Ing. Humberto Blanco González	MIRADOR (NUTIVARA)	14	45	14		0	5	3	3	1.70%	0
		NUEVA COLOMBIA	16		16		0	16	16	0	6.08%	16
Técnico Responsable		VILLAS EL DIAMANTE	3		3		0	0	0	0	0.00%	0
		ARBORIZADORA ALTA	3		3			0	0	0	0.00%	0
		SANTA VIVIANA	2		2		0	0	0	0	0.00%	0
		VILLA ALEMANA II SECTOR	3		3			3	1	2	0.77%	1
		ANTONIO JOSE DE SUCRE III	1		1		0	1	0	1	0.18%	0
		SAN LUIS	2		2		0	1	0	1	0.04%	0
		ACACIAS SUR	1		1		0	1	0	1	0.08%	0
Subtotal			45	45	45		0	28	20	8	8.85%	17

AVANCE DE EJECUCIÓN SEMANAL									FEBRERO				
Proyecto Ciudad Bolivar				FASE I		Tiempo Programación			Acumulado semanas anteriores	SEMANA DEL 8 AL 14	SEMANA DEL 15 AL 21	SEMANA DEL 22 AL 28	ACUMULADO TOTAL
No.	ID_DMV	Dirección	Nombres y apellidos	V/ Validada	V/Inicial	Fecha inicio	Fecha terminada	F. inicio		15 semana	16 semana	17 semana	
MIRADOR (NUTIVARA)													
1	MVCB_1873	CL 70L BIS SUR 18N 14	BLANCA FABIOLA LANDAZURI MESA	SI / NO	$11,828,247.60	20/01/2021	EN EJECUCION	20/01/2021	8.41%	9.08%			17.49%
2	MVCB_1886	KR 18N 70K 31 SUR	LUZ MARIA ARIZA ARIZA	SI / NO	$11,168,015.60	18/01/2021	ENTREGADA	18/01/2021	73.86%	26.14%			100.00%
3	MVCB_1836	KR 18N 70K 09 SUR	DELIA MARÍA MATEUS ESCAMILLA	SI / NO	$11,789,726.10	18/01/2021	EN EJECUCION	18/01/2021	58.63%	1.28%			59.91%
4	MVCB_1829	CL 70K SUR 18N 45	DIANA PATRICIA PÁEZ PINO	SI / NO	$11,105,245.60	18/01/2021	ENTREGADA	18/01/2021	53.20%	46.80%			100.00%
5	MVCB_1684	CL 70I SUR 18N 56	MIRYAM MANRIQUE URUEÑA	SI / NO	$11,749,188.70	20/01/2021	ENTREGADA	20/01/2021	60.45%	39.55%			100.00%
6	MVCB_1692	CL 70 H SUR 18 N 51	BEATRIZ ADIELA MARTINEZ JARAMILLO	SI / NO	$10,114,021.80	EN FASE DE VALIDACION	EN FASE DE VALIDACION	EN FASE DE VALIDACION	0.00%	0.00%			0.00%
7	MVCB_1681	CL 70 I SUR 18 N 36 MJ	ALVARO ELIECER VERDUGO RODRIGUEZ	SI / NO	$10,278,758.80	EN FASE DE VALIDACION	EN FASE DE VALIDACION	EN FASE DE VALIDACION	0.00%	0.00%			0.00%
8	MVCB_1638	KR 18R 70H 09 SUR	MAURICIO ENRIQUE MUÑOZ RIAÑO	SI / NO	$9,580,888.90	EN FASE DE VALIDACION	EN FASE DE VALIDACION	EN FASE DE VALIDACION	0.00%	0.00%			0.00%
9	MVCB_1664	KR 18P 70G 08 SUR	MARINA CLEMENCIA RAMOS	SI / NO	$9,223,968.20	EN FASE DE VALIDACION	EN FASE DE VALIDACION	EN FASE DE VALIDACION	0.00%	0.00%			0.00%
10	MVCB_1748	KR 18P 70I 04 SUR	OLGA LUZ BETANCOURT LEON	SI / NO	$11,750,274.10	EN FASE DE VALIDACION	EN FASE DE VALIDACION	EN FASE DE VALIDACION	0.00%	0.00%			0.00%
11	MVCB_1704	KR 18R 70H 08 SUR	ALBA LUCIA VALENCIA OCAMPO	SI / NO	$11,612,063.20	EN FASE DE VALIDACION	EN FASE DE VALIDACION	EN FASE DE VALIDACION	0.00%	0.00%			0.00%
12	MVCB_1631	CL 70G SUR 18R 15	ELOISA LAVERDE RIOS	SI / NO	$11,276,851.40	EN FASE DE VALIDACION	EN FASE DE VALIDACION	EN FASE DE VALIDACION	0.00%	0.00%			0.00%
13	MVCB_1592	CL 70F SUR 18N 28	HOBER FABIAN BARRERA GUTIERREZ	SI / NO	$11,822,174.20	EN FASE DE VALIDACION	EN FASE DE VALIDACION	EN FASE DE VALIDACION	0.00%	0.00%			0.00%
14	MVCB_1908	CL 70N SUR 18N 28	JESUS MARIA COBA QUIROGA	SI / NO	$11,728,052.70	21/01/2021	EN EJECUCION	21/01/2021	46.36%	14.72%			61.08%

NUEVA COLOMBIA													
15	MVCB_1130	DG 69F SUR 18J 18	CARMEN JULIA SUAREZ PARADA	SI / NO	$10,614,314.40	26/11/2020	ENTREGADA	26/11/2020	100.00%	0.00%			100.00%
16	MVCB_1180	DG 69F SUR 18J 15	BLANCA TERESA CALVO DE GARZON	SI / NO	$10,640,712.30	26/11/2020	ENTREGADA	26/11/2020	100.00%	0.00%			100.00%
17	MVCB_1181	DG 69F SUR 18J 11	ALBERTO ULLOA ULLOA	SI / NO	$7,917,003.90	27/11/2020	ENTREGADA	27/11/2020	100.00%	0.00%			100.00%
18	MVCB_1161	DG 69F SUR 18J 03	MARIA ROSA ELENA BECERRA SEGURA	SI / NO	$11,682,398.70	30/11/2020	ENTREGADA	30/11/2020	100.00%	0.00%			100.00%
19	MVCB_1212	DG 69G SUR 18J 43	HERNAN LOPEZ	SI / NO	$11,067,651.50	2/12/2020	ENTREGADA	2/12/2020	100.00%	0.00%			100.00%
20	MVCB_1194	DG 69H SUR 18J 20	VICTOR HUGO WILCHES BERNAL	SI / NO	$11,564,658.10	25/11/2020	ENTREGADA	25/11/2020	100.00%	0.00%			100.00%
21	MVCB_1467	CL 70H SUR 18J 70	TERESA DE JESUS OLIVOS DE BLANCO	SI / NO	$11,819,029.10	2/12/2020	ENTREGADA	2/12/2020	100.00%	0.00%			100.00%
22	MVCB_1469	CL 70H SUR 18J 82	JORGE SANCHEZ FORERO	SI / NO	$11,784,599.40	26/11/2020	ENTREGADA	26/11/2020	100.00%	0.00%			100.00%
23	MVCB_1470	KR 18L 70G 24 SUR	ANA SILVIA CHACON	SI / NO	$11,826,113.50	25/11/2020	ENTREGADA	25/11/2020	100.00%	0.00%			100.00%
24	MVCB_1495	KR 18L 70H 10 SUR	YACQUELINE RADA MOJICA	SI / NO	$11,751,135.80	25/11/2020	ENTREGADA	25/11/2020	100.00%	0.00%			100.00%
25	MVCB_1493	CL 70I SUR 18J 86	MARIA ELENA ALCIRA GARZON CASALLAS	SI / NO	$11,275,773.60	30/11/2020	ENTREGADA	30/11/2020	100.00%	0.00%			100.00%
26	MVCB_1516	KR 18L 70I 10 SUR	BERTHA CECILIA MOJICA RUIZ	SI / NO	$11,580,651.80	25/11/2020	ENTREGADA	25/11/2020	100.00%	0.00%			100.00%
27	MVCB_1417	CL 70I SUR 18L 30	DIANA MARCELA PARRA BALLESTEROS	SI / NO	$11,661,580.80	30/11/2020	ENTREGADA	30/11/2020	100.00%	0.00%			100.00%
28	MVCB_1416	CL 70I SUR 18L 22	ANA CENETH TORRES ROJAS	SI / NO	$11,557,790.90	27/11/2020	ENTREGADA	27/11/2020	100.00%	0.00%			100.00%
29	MVCB_1407	CL 70I SUR 18L 33	MARIA ELSA TORRES	SI / NO	$11,478,283.90	28/11/2020	ENTREGADA	28/11/2020	100.00%	0.00%			100.00%
30	MVCB_1409	CL 70I SUR 18L 21	FRAN EDILBERTO CRUZ CANO Y OTRA	SI / NO	$11,460,616.00	27/11/2020	ENTREGADA	27/11/2020	100.00%	0.00%			100.00%
VILLAS EL DIAMANTE													
31	MVCB_5518	TV 18P BIS 69N 17 SUR	CARLOS ALFREDO CLAVIJO ROZO	SI / NO	$11,761,610.50	EN FASE DE VALIDACION	EN FASE DE VALIDACION	EN FASE DE VALIDACION	0.00%	0.00%			0.00%
32	MVCB_5464	KR 19D BIS 70C 25 SUR (KR 19B 70C 25 SUR)	IRMA ROJAS ROJAS	SI / NO	$11,428,643.80	EN FASE DE VALIDACION	EN FASE DE VALIDACION	EN FASE DE VALIDACION	0.00%	0.00%			0.00%
33	MVCB_5491	KR 19F 70C 41 SUR MJ	LEONILDE BUITRAGO MORENO	SI / NO	$9,461,874.70	EN FASE DE VALIDACION	EN FASE DE VALIDACION	EN FASE DE VALIDACION	0.00%	0.00%			0.00%
ARBORIZADORA ALTA													
34	MV_14629	CL 75C SUR 34 51	HILDA MIRYAM NIÑO	SI / NO	$9,523,231.70	EN FASE DE VALIDACION	EN FASE DE VALIDACION	EN FASE DE VALIDACION	0.00%	0.00%			0.00%
35	MV_08584	KR 37A 75 55 SUR	ELSY CARDENAS MONROY	SI / NO	$11,264,578.20	EN FASE DE VALIDACION	EN FASE DE VALIDACION	EN FASE DE VALIDACION	0.00%	0.00%			0.00%
36	MV_09494	TV 35C 72F 31 SUR	GLADYS CASALLAS SUAREZ	SI / NO	$11,299,579.80	EN FASE DE VALIDACION	EN FASE DE VALIDACION	EN FASE DE VALIDACION	0.00%	0.00%			0.00%
SANTA VIVIANA													
37	MV_14435	KR 74D 75C 41 SUR MJ	PLINIO SANABRIA SANDOVAL	SI / NO	$11,786,495.00	EN FASE DE VALIDACION	EN FASE DE VALIDACION	EN FASE DE VALIDACION	0.00%	0.00%			0.00%
38	MV_09083	CL 75C BIS 75 39 SUR	RUTH GORDONS CASTAÑEDA	SI / NO	$11,800,204.20	EN FASE DE VALIDACION	EN FASE DE VALIDACION	EN FASE DE VALIDACION	0.00%	0.00%			0.00%
VILLA ALEMANA II SECTOR - USMINIA													
39	MVUS_0038	CL 115 SUR 3 36	EDWIN ARLEY QUINMBAYO QUINTERO	SI / NO	$11,710,217.10	21/01/2021	ENTREGADA	21/01/2021	100.00%	0.00%			100.00%
40	MVUS_0682	CL 113A SUR 4 25	JOSE DEL CARMEN SANCHEZ PAEZ	SI / NO	$11,755,145.40	21/01/2021	EN EJECUCION	21/01/2021	23.47%	22.34%			45.81%
41	MVUS_0707	KR 4 115 21 SUR	LUZ MERY YARA MATOMA	SI / NO	$11,808,556.50	21/01/2021	EN EJECUCION	21/01/2021	28.57%	20.39%			48.96%
ANTONIO JOSE DE SUCRE III - USMINIA													
42	MV_21283	KR 7 115 15 SUR	TERESA DE JESUS OSORIO ORTIZ	SI / NO	$10,513,778.60	21/01/2021	EN EJECUCION	21/01/2021	27.28%	21.83%			49.11%
SAN LUIS - SECTOR JALISCO													
43	MVJA_2005	DG 64 SUR 19 11	AURORA MARGARITA ROJAS VELASQUEZ	SI / NO	$11,790,169.70	EN FASE DE VALIDACION	EN FASE DE VALIDACION	EN FASE DE VALIDACION	0.00%	0.00%			0.00%
44	MVJA_3778	KR 19 64A 23 SUR	LUS STELLA FONSECA OSORIO	SI / NO	$7,494,628.70	4/02/2021	EN EJECUCION	4/02/2021	0.00%	15.00%			15.00%
ACACIAS SUR - SECTOR JALISCO													
45	MVJA_0675	CL 62B SUR 19 38	JENNY XIMENA CAMELO VELASCO	SI / NO	$11,755,416.30	4/02/2021	EN EJECUCION	4/02/2021	0.00%	20.82%			20.82%

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DEL HÁBITAT

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

PROYECTOS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA

INPLAYCO S.A.S. INGENIEROS CONSTRUCTORES E INTERVENTORES

FECHA		PERIODO No.		DEL	8/02/2021	AL	14/02/2021

1. INFORMACIÓN GENERAL

OBJETO DEL CONTRATO	Realizar la interventorías técnica, jurídica, social, administrativa y financiera, para la ejecución de las obras de mejoramiento de vivienda en la modalidad de habitabilidad en los territorios priorizados por la secretaría distrital de hábitat.
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO	Corresponde al Grupo 1 a la ejecución de 254 mejoramientos de vivienda, localizados en 3 localidades: Bosa, Usme y Ciudad Bolívar, esta última localidad incluye cuatro (4) Intervenciones de Mejoramientointegral.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA		CONTRATO DE OBRA	
CONTRATO No.:	701-2020	CONTRATO No.:	694--2020
PLAZO INICIAL:	6 meses	PLAZO INICIAL:	5 meses
FECHA DE INICIACIÓN:	4 de noviembre de 2020	FECHA DE INICIACIÓN:	4 de noviembre de 2020
**FECHA DE SUSPENSIÓN:	0	**FECHA DE SUSPENSIÓN:	0
**FECHA DE REINICIACIÓN:	0	**FECHA DE REINICIACIÓN:	0
FECHA DE TERMINACIÓN:	3 de mayo de 2021	FECHA DE TERMINACIÓN:	3 de abril 2021
PLAZO ACTUALIZADO:	0	PLAZO ACTUALIZADO:	0
PLAZO TRANSCURRIDO:	0	PLAZO TRANSCURRIDO:	0
VALOR INICIAL :	$ 894,285,952	VALOR INICIAL :	$ 3,724,135,319
VALOR ADICION(ES):	0	VALOR ADICION(ES):	$ -
VALOR ACTUALIZADO:	$ -	VALOR ACTUALIZADO:	$ -
VALOR ANTICIPO:	0	VALOR ANTICIPO:	$ -
VALOR POR PAGAR:	$ -	VALOR POR PAGAR:	$ -
SUPERVISOR:	JUAN CARLOS ARBELAEZ MURILLO	INTERVENTOR:	Gonzalo Llevano Hoyos -INPLAYCO S.A.S.

** Inserte las filas que requiera según el número de suspensiones y reinicios.

2. CONTROL DE HITOS.

No.	*** DESCRIPCIÓN DEL HITO	FECHA PROGRAMADA	FECHA REAL DE CUMPLIMIENTO	DÍAS DE RETRASO
	SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO (HITO OBLIGATORIO)	4/11/2020	3/04/2021	
1	Validación	17/11/2020	20/12/2020	
2	Entrega de informe de validación	17/11/2020	20/12/2020	
3	Ejecución	21/12/2020	3/04/2021	
	ENTREGA A LA INTERVENTORIA DE LOS PRODUCTOS Y/O ACTIVIDADES CONTRATADAS (HITO OBLIGATORIO)			


*** Inserte las filas que requiera según el número de hitos; teniendo en cuenta que como mínimo se deberán establecer 5 hitos adicionales a los obligatorios de inicio y terminación. Los hitos aprobados por la interventoría se socializarán con el supervisor del contrato para su Vo. Bo. Los Hitos aprobados por la interventoría y SDHT solo se podrán modificar previa novedad contractual que así lo requiera. La matriz de seguimiento hace parte del presente documento.


No.	INDICADORES BARRIO O TERRITORIO	VALORES	PORCENTAJE SOBRE EL VALOR TOTAL DEL CONTRATO	DIFERENCIA (+) ADELANTO (-) ATRASO
1	Valor acumulado de las actividades o productos conforme a la programación vigente.	$361,491,171.00	9.71%	
2	Valor acumulado de las actividades o productos ejecutados y aprobados por la Interventoría.	$329,634,303.00	8.85%	

3. ASPECTOS GENERALES INFORME TÉCNICO

Registre los avances y novedades técnicas, sociales, administrativas, contables y financieras, acompañadas por gráficos, cuadros, fotografías, análisis y comentarios sobre el estado de los trabajos, en todos sus aspectos en la fase de validación y ejecución de obra.

Ciudad Bolívar

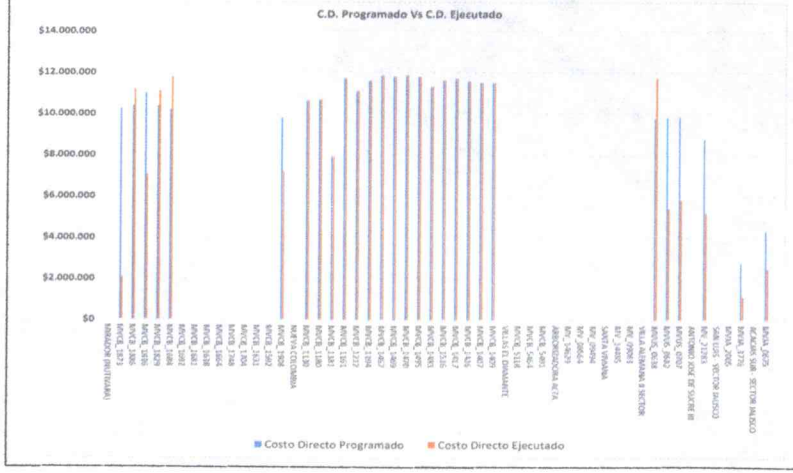

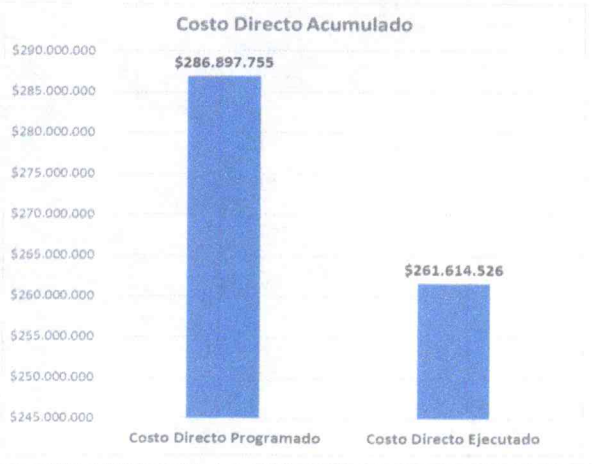

4- COMPONENTE TECNICO BARRIO O TERRITORIO			
ACTIVIDADES EJECUTADAS EN LA SEMANA. - ESTADO DE AVANCE SEMANAL POR VIVIENDA			
BARRIO O TERRITORIO: CIUDAD BOLIVAR - MIRADOR (NUTIVARA)			
1	MVCB_1873	BLANCA FABIOLA LANDAZURI MESA	Se hizo visita de **seguimiento** por parte de interventoría, evidenciando el siguiente avance de actividades: Se dio inicio al afinado de pañete de muros de hall de alcobas y muros de sala comedor y alcoba que da contra fachada principal; la interventoría reitera el requerimiento de mejorar el afinado de los pañetes. Se colocan maestras para iniciar pañete en muros de baño. Avance muy mínimo en ejecución de actividades. Se efectuó registro fotográfico del avance de obra.
2	MVCB_1886	LUZ MARIA ARIZA ARIZA	Se realizó visita de **seguimiento** por la interventoria, evidenciando lo siguiente: En el segundo piso, quedaron finalizadas la instalación de cerámica de piso y guardaescoba en sala comedor, alcoba principal, alcobas 2 y 3 del segundo piso; igualmente, se instaló el enchape de muros y mochetas de lavadero y se realizó la pintura con vinilo del área sobre enchape en zona de lavandería. De esta manera quedaron terminadas todas la obras de mejoramiento proyectadas en esta vivienda. Se programará entrega de la vivienca para la próxima semana. Se efectuó registro fotográfico del avance de obra.
3	MVCB_1836	DELIA MARÍA MATEUS ESCAMILLA	Se hizo visita de **seguimiento** por la interventoría, evidenciando el siguiente avance de actividades: No hubo avance en instalación de cerámica en los muros del baño. Se terminó la aplicación de la pintura con vinilo de los muros de la alcoba 3. Se avanzó en instalación de estructura para cielo raso en las áreas de sala comedor y hall de alcobas. El avance fue casi nulo en lo ejecución de actividades. Se efectuó registro fotográfico del avance de obra.
4	MVCB_1829	DIANA PATRICIA PÁEZ FINO	Personal técnico y social de la interventoría realizaron visitas de **seguimiento** al avance de obras, evidenciando lo siguiente: Se terminó el enchape de piso y guardaescoba en el pasillo, área de acceso y zona de lavandería. Quedó instalado el cielo raso en la alcoba No. 2, pasillo de alcobas y área de acceso. Se terminó el enchape de muros de la zona de lavandería. Quedaron pintados con vinilo los muros de sala comedor, alcobas, pasillo, área de acceso y zonas de muros sobre enchapes de cocina y baño. De esta manera se terminaron todas las actividades de mejoramiento contempladas para la vivienda. Se programará entrega para la próxima semana. Se efectuó registro fotográfico de las obras terminadas.
5	MVCB_1684	MIRYAM MANRIQUE URUEÑA	Personal técnico y social de la interventoría realizaron visitas de **seguimiento** para verificar el avance y calidad de las obras proyectadas, evidenciando lo siguiente: Se terminó la pintura con vinilo de la alcoba principal, de los muros altos del patio y las áreas en baño y cocina. Se terminó el enchape con cerámica de los muros y mesón de la cocina y se instalaron el lavaplatos y grifería. Se finalizó la instalación del cielo raso en baño, cocina, alcoba principal y área de patio. Quedó instalada la teja arquitectónica y el flanche en cubierta sobre fachada principal. Todas las actividades proyectadas para el mejoramiento de la vivienda quedaron terminadas. Se programará la entrega de la vivienda para la próxima semana. Se registró en bitácora el avance de las diferentes actividades. Se efectuó registro fotográfico del avance de obra.
6	MVCB_1692	BEATRIZ ADIELA MARTINEZ JARAMILLO	VIVIENDA VALIDADA, SIN APERTURAR..
7	MVCB_1681	ALVARO ELIECER VERDUGO RODRIGLEZ	VIVIENDA VALIDADA, SIN APERTURAR..
8	MVCB_1638	MAURICIO ENRIQUE MUÑOZ RIAÑO	VIVIENDA VALIDADA, SIN APERTURAR..
9	MVCB_1664	MARINA CLEMENCIA RAMOS	VIVIENDA VALIDADA, SIN APERTURAR..
10	MVCB_1748	OLGA LUZ BETANCOURT LEON	VIVIENDA VALIDADA, SIN APERTURAR..
11	MVCB_1704	ALBA LUCIA VALENCIA OCAMPO	VIVIENDA VALIDADA, SIN APERTURAR..
12	MVCB_1631	ELOISA LAVERDE RIOS	VIVIENDA VALIDADA, SIN APERTURAR..
13	MVCB_1592	HOBER FABIAN BARRERA GUTIERREZ	VIVIENDA VALIDADA, SIN APERTURAR..
14	MVCB_1908	JESUS MARIA COBA QUIROGA	Personal técnico y social de la interventoría realizaron visitas de **seguimiento** para verificar el avance y calidad de las obras proyectadas, evidenciando lo siguiente: se finaliza el alistado de pisos de alcobas, cocina y sala comedor. Se terminó el pañete de muros de alcobas, sala comecor, cocina y baño. Se dio inicio al enchape de pisos de sala comedor. En el baño se avanzó en enchape de piso y de muros. En la zona de cocina se avanza en enchape de muros. Se fundió el mesón intermedio de la cocina. Se registró en bitácora el avance de las diferentes actividades. Se efectuó registro fotográfico del avance de obra.
BARRIO O TERRITORIO: CIUDAD BOLIVAR - BARRIO NUEVA COLOMBIA			
15	MVCB_1130	CARMEN JULIA SUAREZ PARADA	VIVIENDA TERMINADA, ENTREGADA
16	MVCB_1180	BLANCA TERESA CALVO DE GARZON	VIVIENDA TERMINADA, ENTREGADA
17	MVCB_1181	ALBERTO ULLOA ULLOA	VIVIENDA TERMINADA, ENTREGADA
18	MVCB_1161	MARIA ROSA ELENA BECERRA SEGURA	VIVIENDA TERMINADA, ENTREGADA
19	MVCB_1212	HERNAN LOPEZ	VIVIENDA TERMINADA, ENTREGADA
20	MVCB_1194	VICTOR HUGO WILCHES BERNA	VIVIENDA TERMINADA, ENTREGADA
21	MVCB_1467	TERESA DE JESUS OLIVOS DE BLANCO	VIVIENDA TERMINADA, ENTREGADA
22	MVCB_1469	JORGE SANCHEZ FORERO	VIVIENDA TERMINADA, ENTREGADA
23	MVCB_1470	ANA SILVIA CHACON	VIVIENDA TERMINADA, ENTREGADA
24	MVCB_1495	YACQUELINE RADA MOJICA	VIVIENDA TERMINADA, ENTREGADA
25	MVCB_1493	MARIA ELENA ALCIRA GARZON CASALLAS	VIVIENDA TERMINADA, ENTREGADA

26	MVCB_1516	BERTHA CECILIA MOJICA RUIZ	VIVIENDA TERMINADA. ENTREGADA
27	MVCB_1417	DIANA MARCELA PARRA BALLESTEROS	VIVIENDA TERMINADA. ENTREGADA
28	MVCB_1416	ANA CENETH TORRES ROJAS	VIVIENDA TERMINADA. ENTREGADA
29	MVCB_1407	MARIA ELSA TORRES	VIVIENDA TERMINADA. ENTREGADA
30	MVCB_1409	FRAN EDILBERTO CRUZ CANO Y OTRA	VIVIENDA TERMINADA. ENTREGADA
BARRIO O TERRITORIO: CIUDAD BOLIVAR - BARRIO VILLAS EL DIAMANTE			
31	MVCB_5118	CARLOS ALFREDO CLAVIJO ROZO	VIVIENDA VALIDADA. SIN APERTURAR
32	MVCB_5464	IRMA ROJAS ROJAS	VIVIENDA VALIDADA. SIN APERTURAR
33	MVCB_5491	LEONILDE BUITRAGO MORENO	VIVIENDA VALIDADA. SIN APERTURAR
BARRIO O TERRITORIO: CIUDAD BOLIVAR - BARRIO ARBORIZADORA ALTA			
34	MV_14629	HILDA MIRYAM NIÑO	VIVIENDA VALIDADA. SIN APERTURAR
35	MV_08584	ELSY CARDENAS MONROY	VIVIENDA VALIDADA. SIN APERTURAR
36	MV_09494	GLADYS CASALLAS SUAREZ	VIVIENDA VALIDADA. SIN APERTURAR
BARRIO O TERRITORIO: CIUDAD BOLIVAR - BARRIO SANTA VIVIANA			
37	MV_14485	PLINIO SANABRIA SANDOVAL	VIVIENDA VALIDADA. SIN APERTURAR
38	MV_09083	RUTH GORDONS CASTAÑEDA	VIVIENDA VALIDADA. SIN APERTURAR
BARRIO O TERRITORIO: USMINIA - BARRIO VILLA ALEMANA II SECTOR			
39	MVUS_0638	EDWIN ARLEY QUINMBAYO QUINTERO	VIVIENDA TERMINADA. ENTREGADA
40	MVUS_0682	JOSE DEL CARMEN SANCHEZ PAEZ	Personal técnico y social de la interventoría realizaron visitas de **seguimiento** al avance de obras, evidenciando lo siguiente: A nivel del 2° piso se termina el pañete de muros de la sala comedor y se inicia el afinado de los mismos. Se termina alistado de pisos de sala comedor y estar de alcobas. Se avanza en la instalación de cerámica de pisos de la sala comedor y el estar de alcobas; falta instalar guardaescoba. Se requirió corregir la instalación de algunas tabletas cerámicas del piso de sala y estar de alcobas, las cuales presentaban vacíos en la pega. Se instalaron los bloques de vidrio en la estructura metálica de soporte a nivel del piso frente a la entrada del baño. Se termina el enchape de muros del baño del segundo piso, pendiente instalación de cenefa. No se evicencia avance satisfactorio en las actividades proyectadas. Durante la visita no se encontró personal de obra. Se registró en bitácora el avance de las diferentes actividades. Se efectuó registro fotográfico del avance de obra.
41	MVUS_0707	LUZ MERY YARA MATOMA	Personal técnico y social de la interventoría realizaron visitas de **seguimiento** al avance de obras: Se instaló cerámica en piso en hall de acceso, sala comedor en un 90% del área y alcoba No. 3; se avanza con la instalación del guardaescoba en las mismas áreas. En la alcoba principal se sacaron los filos de la columna interior y vanos de ventana, y se sacan filos de pañete en columnas de la sala. Se inició el enchape de piso en el área de cocina principal. Se avanza en enchape de mesón de cocina social y de la pared de la lavandería. Se tiene instalado enchape de muros del baño de la alcoba principal en un 95% de avance. Se terminó el enchape de piso y pared del baño de la sala. Se registró en bitácora el avance de las diferentes actividades. Se efectuó registro fotográfico del avance de obra.
BARRIO O TERRITORIO: USMINIA - BARRIO ANTONIO JOSE DE SUCRE III			
42	MV_21283	TERESA DE JESUS OSORIO ORTIZ	Personal técnico y social de la interventoría realizaron visitas de **seguimiento** para verificar el avance y calidad de las obras. En el apartamento 1 se terminó la instalación de enchape de piso y guardaescoba en la zona de lavandería. Se terminó la instalación del enchape de piso y muros del baño y se montaron el lavamanos y sanitario. En el apto. No. 2, se instaló la cerámica de piso en las áreas de sala, cocina y lavandería. Se ejecutó la instalación de enchape de muros en cocina y zona de lavandería. Se dio inicio a la instalación del enchape de muros del baño. Se hicieron requerimientos a la calidad en la ejecución de los acabados. Se registró en bitácora el avance de las diferentes actividades. Se efectuó registro fotográfico del avance de obra.

BARRIO O TERRITORIO: CIUDAD BOLIVAR - SAN LUIS - SECTOR JALISCO			
43	MVJA_2005	AURORA MARGARITA ROJAS VELASQUEZ	VIVIENDA VALIDADA. SIN APERTURAR..
44	MVJA_3776	LUS STELLA FONSECA OSORIO	Se realizó visita de **seguimiento** por parte de la interventoría en la cual se evidencia lo siguiente: Se avanzó en actividades de demolición de enchapes de piso en baño del 1 piso, demolición de mesón de cocina, instalación de estructura de cielo raso en primer piso, cistado de piso de la habitación 1.
BARRIO O TERRITORIO: CIUDAD BOLIVAR - ACACIAS SUR - SECTOR JALISCO			
45	MVJA_0675	JENNY XIMENA CAMELO VELASCO	Se llevó a cabo visita de **seguimiento** técnico en la cual se verifica: Se alistó pisos en áreas de sala, cocina, hall de acceso y habitación 1. Se aplicó estuco acrílico en muros de sala , cocina, hall de acceso. Se inicia instalación de estructura para cielo raso en la sala, hall de acceso y cocina.

5. PLAN DE ACCIÓN RESULTADO DEL ANÁLISIS DE CAUSAS REGISTRADO EN EL NUMERAL ANTERIOR - CON EL OBJETIVO DE ELIMINAR LA CAUSA RAÍZ DE LA SITUACIÓN PROBLEMÁTICA - PLAN DE MEJORA

ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA
En conjunto con el contratista y la interventoría se elaborarán los respectivos presupuestos iniciales de obra de las viviendas validadas. Se harán visitas de seguimiento en las viviendas aperturadas, para verificar avance y calidad de las obras proyectadas en cada vivienda.	Residentes de interventoría y de contratista	21/02/2021

6. ACTIVIDADES NO PREVISTAS Y MAYORES CANTIDADES

Se ajustarán, en caso de ser necesario, los ítems y cantidades de obra de las diferentes actividades que se desarrollan en las viviendas, velando porque se invierta al presupuesto proyectado.

7. COMENTARIOS DEL INTERVENTOR: Por favor realice la descripción general del estado del contrato y según aplique informe sobre: actividades realizadas en la semana, control de lluvias, compra y suministro de materiales, mano de obra, subcontratos y tramites ante las diferentes empresas prestadoras de servicios, entre otros. Anexe las actas de seguimiento realizadas en la semana correspondiente al periodo del informe.

Barrio o Territorio: Ciudad Bolivar y Usminia

Se avanza en las actividades proyectadas. Continúa el acopio de materiales para alistado y pañete (arena y cemento), baldosas para enchape de piso y pared, tablillas de pvc para cielo raso.


A la fecha del informe se han validado un total de 45 viviendas, de las cuales se han terminado y entregado, dieciséis (16) viviendas en el barrio Nueva Colombia y una (1) en el barrio Villa Alemana II sector, localidad de Usminia. Se terminaron las actividades proyectadas en 3 viviendas de Mirador (Nutivara),de las cuales se programa entrega para la próxima semana. Continúa el avance de obra en tres (3) viviendas del barrio Mirador (Nutivara); en dos (2) de Villa Alemana II sector; en una (1) del barrio Antonio José de Sucre III, de la localidad de Usminia; en una (1) vivienda del barrio San Luis y en una (1) vivienda del barrio Acacias Sur, sector Jalisco. Quedan por aperturar ocho (8) viviendas en el barrio Mirador (Nutivara); tres (3) en el barrio Villas El Diamante; tres (3) en Arborizadora Alta; dos (2) en Santa Viviana, y una (1) en San Luis.

Durante la semana se presentó tiempo seco.

8. REGISTRO FOTOGRAFICO DEL AVANCE DURANTE LA SEMANA

(SE ADJUNTA REGISTRO FOTOGRAFICO)


REGISTRO FOTOGRÁFICO

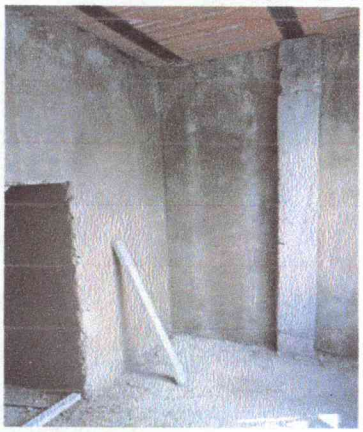


FECHA	miércoles, 10 de febrero de 2021
DESCRIPCION MVCB 1873	
Avance pañete de muros en alcoba contigua a fachada principal 2° piso	




FECHA	sábado, 13 de febrero de 2021
DESCRIPCION MVCB 1886	
Obras terminadas en sala comedor	

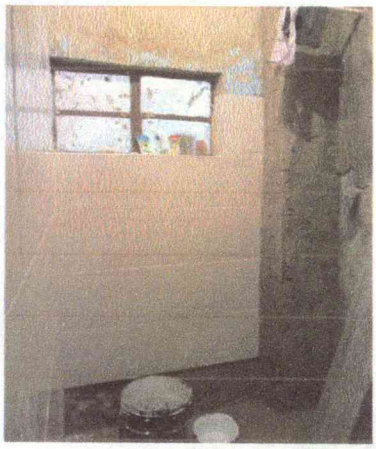


FECHA	miércoles, 10 de febrero de 2021
DESCRIPCION MVCB 1836	
Avance de obras en área de baño	

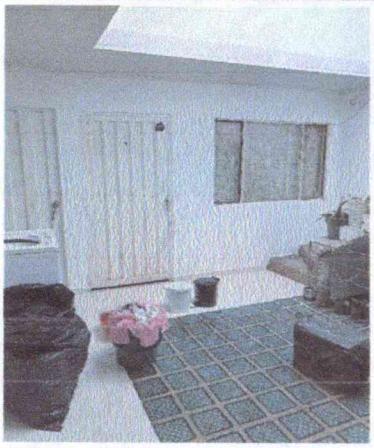

FECHA	sábado, 13 de febrero de 2021
DESCRIPCION MVCB 1684	
Avance de obras en área del patio central	

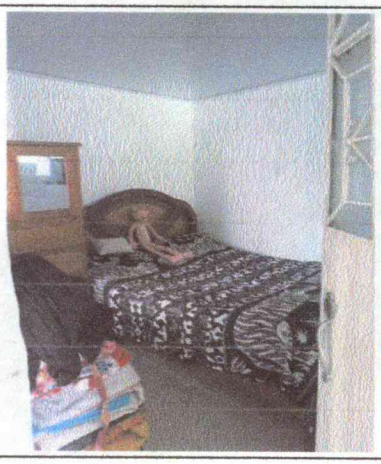


FECHA	sábado, 13 de febrero de 2021
DESCRIPCION MVCB 1829	
Avance de obras en alcoba principal	

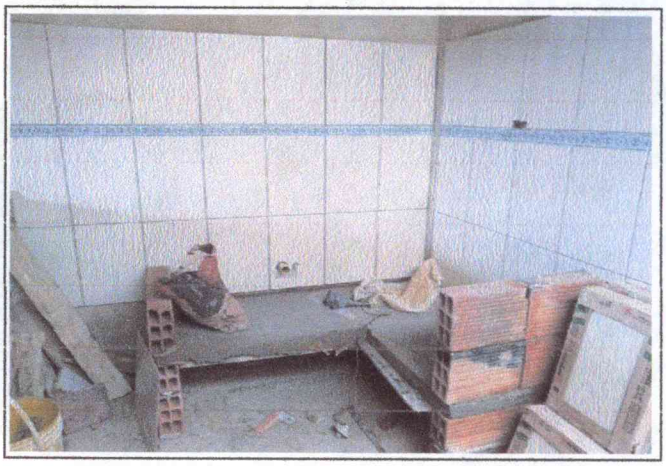


FECHA	miércoles, 10 de febrero de 2021
DESCRIPCION MVUS 1908	
Avance de obras en zona de cocina	


REGISTRO FOTOGRÁFICO

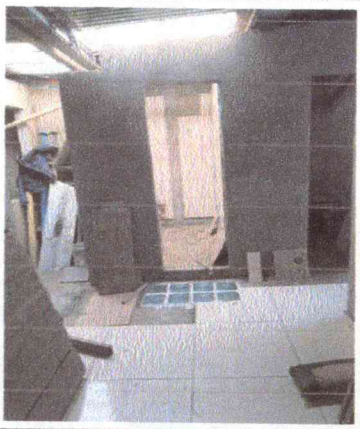

FECHA	viernes, 12 de febrero de 2021
DESCRIPCION MVUS 0682	
Avance de obras en estar de alcobas del 2° piso	

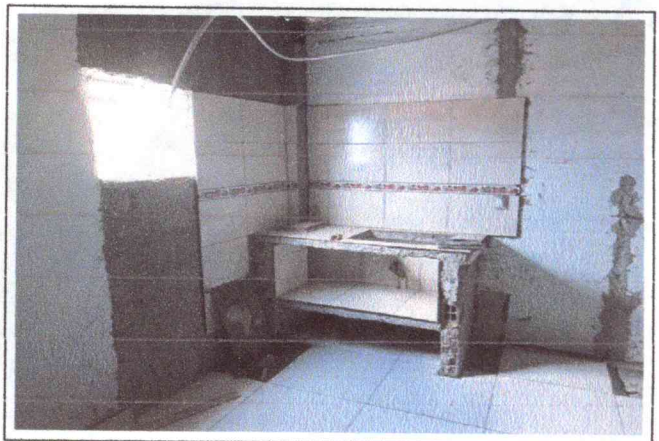


FECHA	viernes, 12 de febrero de 2021
DESCRIPCION MVUS 0707	
Avance de obra en cocina social	

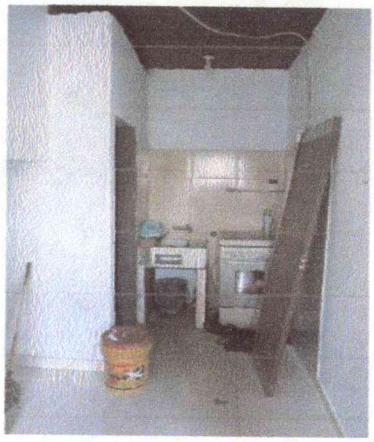

FECHA	viernes, 12 de febrero de 2021
DESCRIPCION MVUS 21283	
Avance de obra en lavandería del apartamento No. 1	



FECHA	viernes, 12 de febrero de 2021
DESCRIPCION MVUS 21283	
Avance de obra en área de baño del apartamento No. 1	

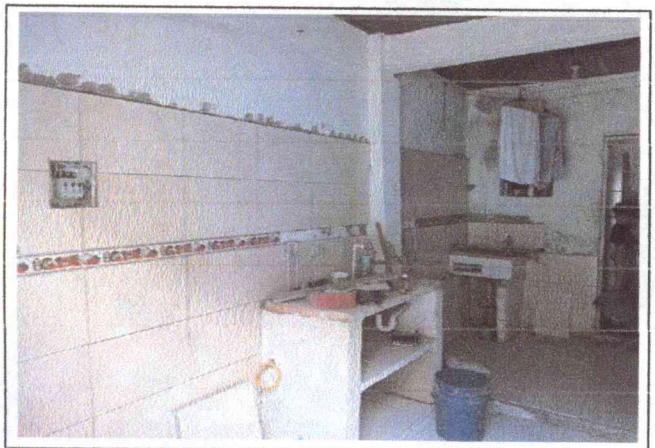

FECHA	viernes, 12 de febrero de 2021
DESCRIPCION MVUS 21283	
Avance de obra, instalación de enchape de piso y pared, en cocina y lavandería del apartamento No. 2	



FECHA	viernes, 12 de febrero de 2021
DESCRIPCION MVUS 21283	
Avance de obra, enchape de pared del baño del apartamento No. 2	

Subsecretaria de Coordinacion Operativa

Subdireccion de Barrios

Seguimiento ejecución proyectos de Mejoramiento de Vivienda - Habitabilidad

Proyecto mejoramiento de vivienda - AVANCE EJECUCIÓN SEMANAL

Fecha: 14-feb-21

Consorcio mejoramiento EP 2020 - Contratista de obra

Contratato de obra	694-2020	Plazo	Cinco (5) meses
Objeto	Contratar la ejecución de las obras de mejoramiento de vivienda en la modalidad de habitabilidad de los proyectos estructurados en los territorios priorizados por la Secretaria Distrital de Habitat. Grupo I	Acta de inicio	4 de noviembre de 2020
CDP No.	No. 514 del 14 de julio de 2020 — CRP No.	Valor del contrato	TRES MIL SETECIENTOS VEINTICUATRO MILLONES CIENTO TREINTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS DIEZ Y NUEVE PESOS ($3.724.135.319) M/Cte

Gonzalo Llevano Hoyos -INPLAYCO S.A.S.

Contratato de Interventoria	701-2020	Plazo	Seis (6) meses
Objeto	Realizar la interventorias técnica, jurídica, social, administrativa y financiera, para la ejecución de las obras de mejoramiento de vivienda en la modalidad de habitabilidad en los territorios priorizados por la secretaria distrital de hábitat	Acta de inicio	04 de noviembre 2020
CDP No	No. 892 del 14 de Julio de 2020 — CRP No.	Valor del contrato	OCHOCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS M/CTE ($894.285.952).

Territorio o barrio a intervenir	CIUDAD BOLIVAR	Barrios	Predios	Total Predios	Fase 1: Validación de la información entregada por el la SDHT — Validación: Validada	V/Por Validar		V/Modificada	Fase 2: Ejecución de obras — Ejecución: En Ejecución	Terminadas	Por Ejecutar	% de Avance	Acta de Entrega a Satisfacción
Arq o Ing. Responsable		ALTOS DE JALISCO	18		18	0		0	4	12	2	4,48%	12
		MIRADOR NUTIVARA	2		2	0		0	0	0	2	0,00%	0
		ROCIO ALTOS DEL SUR	4		4	0		0	0	4	0	1,46%	4
		LA ESCALA	1		1	0		0	0	1	0	0,40%	1
		ACACIAS SUR	3		3	0		0	3	0	0	0,14%	0
		BARRIO GERALTAR I Y II	4		4	0		0	3	0	1	0,30%	0
		LA ESCALA 3ER SECTOR	1		1	0		0	1	0	0	0,00%	0
		CIUDAD MILAGRO	1		1	0		0	1	0	0	0,00%	0
		VILLAS DEL DIAMANTE	3		3	0		0	0	0	3	0,00%	0
		ARBORIZADORA ALTA	1	47	1	0		0	0	0	1	0,00%	0
Técnico Responsable	CRISTIAN VELASCO	JERUSALEN	1		1	0		0	0	0	1	0,00%	0
		EL MIRADOR	1		1	0		0	0	0	1	0,00%	0
		VILLA ISRAEL	1		1	0		0	1	0	0	0,32%	0
		VILLA ANITA SUR	1		1	0		0	1	0	0	0,14%	0
		EL ESPINO	1		1	0		0	1	0	0	0,30%	0
		EL VIRREY	1		1	0		0	1	0	0	0,39%	0
		SAN LUIS	1		1	0		0	1	0	0	0,04%	0
		LAS DELICIAS DEL SUR	1		1	0		0	0	0	1	0,00%	0
		DOMINGO LAIN III SECTO	1		1	0		0	1	0	0	0,04%	0
Subtotal			47	47	47	0		0	18	17	12	7,97%	17

AVANCE DE EJECUCIÓN SEMANAL

Proyecto				FASE I			Tiempo Programacion				FEBRERO			
No.	ID_DMV	Direccion	Nombres y apellidos	V/ Validada	V/ Modificada	V/Inicial	Fecha inicio	Fecha terminada	F. Inicio	Acumulado semanas anteriores	SEMANA DEL 8 AL 14 — 15 semana	SEMANA DEL 15 AL 21 — 16 semana	SEMANA DEL 22 AL 28 — 17 semana	ACUMULADO TOTAL
		ALTOS DE JALISCO												
1	MVJA_2992	KR 18N BIS 61C 21 SUR	ISAURA AREVALO VALAGON	SI		$11.478.755	27/11/2020	ENTREGADA	27/11/2020	100%	0%	0%	0%	100%
				NO										
2	MVJA_3141	KR 18P 62 A 30 SUR MJ	GLORIA CRISTINA GUTIERREZ GARZON	SI		$11.433.514	26/11/2020	ENTREGADA	26/11/2020	100%	0%	0%	0%	100%
				NO										
3	MVJA_3146	KR 18P 62A 45 SUR MJ	CLARA INES GIL BAEZ	SI		$11.428.313	26/11/2020	ENTREGADA	26/11/2020	100%	0%	0%	0%	100%
				NO										
4	MVJA_3335	KR 18P BIS B 62A 48 SUR MJ	MYRIAM PATRICIA SARMIENTO APONTE	SI		$11.177.053	26/11/2020	ENTREGADA	26/11/2020	100%	0%	0%	0%	100%
				NO										
5	MVJA_3314	KR 18P BIS B 61D 36 SUR	MARIA OLMA MOLANO ROMERO	SI		$11.814.493	26/11/2020	ENTREGADA	26/11/2020	100%	0%	0%	0%	100%
				NO										
6	MVJA_3239	KR 18P BIS A 61C 22 SUR MJ	NATIVIDAD SILDANA CELYS VIUDA DE GARCIA	SI		$11.459.853	10/02/2021	10/03/2021	10/02/2021	0%	0%	0%	0%	0%
7	MVJA_0259	CL 70H SUR 18L 16	ALBA CARMEN ARDILA MATEUS	SI		$11.264.898	24/11/2020	ENTREGADA	24/11/2020	100%	0%	0%	0%	100%
				NO										
8	MVJA_3223	KR 18P BIS A 61A 55 SUR	MYRIAM AMPARO GOMEZ DE GALVIS	SI		$11.811.986	27/11/2020	ENTREGADA	27/11/2020	100%	0%	0%	0%	100%
				NO										

40

9	MVAV_3231	KR 18P BIS A 63B 12 SUR MI	SOFIA MORENO	SI NO		$11.630.698	24/11/2020	ENTREGADA	24/11/2020	100%	0%	0%	0%	100%
10	MVAV_3119	KR 18P 61A 67 SUR MI	LUZ YANID PADUA	SI NO		57.121.160	24/11/2020	ENTREGADA	24/11/2020	100%	0%	0%	0%	100%
11	MVAV_3125	KR 18P 61 A 76 SUR MI	MARIA AURORA RENGIFO	SI NO		59.222.789	24/11/2020	ENTREGADA	24/11/2020	100%	0%	0%	0%	100%
12	MVAV_9252	CL 61D SUR 18N 36 MI	JESUS ANTONIO ORTIZ CASTRO	SI NO		$11.699.259	26/12/2020	ENTREGADA	26/12/2020	100%	0%	0%	0%	100%
13	MVAV_2996	KR 18N B6 61D 18 SUR	MARIA DEL SOCORRO CUPITRA CACAIS	SI NO		$11.787.984	24/11/2020	ENTREGADA	24/11/2020	100%	0%	0%	0%	100%
14	MVAV_2712	KR 18M 62 29 SUR	JOSE ALIRIO ORTIZ CARRERA Y OTRA	SI NO		$11.813.746	3/02/2021	9/03/2121	3/02/2021	0%	0%	0%	0%	0%
15	MVAV_2787	KR 18M 62 L2 SUR	ANA LUISA BERNAL PULIDO	SI NO		56.892.091	FASE DE VALIDACION	FASE DE VALIDACION	FASE DE VALIDACION	0%	0%	0%	0%	0%
16	MVAV_2640	CR 18L B6 A 6 D 47 SUR	PAOLA ANDREA BARRERA PELAEZ	SI NO		$11.440.938	3/02/2021	9/03/2121	3/02/2021	0%	0%	0%	0%	0%
17	MVAV_2371	KR 18K 63B 32 SUR	ANA EDELMIRA ATARA ESPITIA	SI NO		$11.418.992	10/02/2021	10/09/2021	10/02/2021	0%	0%	0%	0%	0%
18	MVAV_2976	KR 18N B6 61A 93 SUR	BLANCA LEONOR RIOS CHAPARRO	SI NO		$11.821.739	10/02/2021	10/09/2021	10/02/2021	0%	0%	0%	0%	0%
		MIRADOR NUTIVARA												
19	MVCEI_1774	CL 78D SUR 18N 23	JOSE WILSON MARULANDA GIRALDO	SI		$11.815.916	EN FASE DE VALIDACION	EN FASE DE VALIDACION	EN FASE DE VALIDACION	0%	0%	0%	0%	0%
20	MVCEI_1742	CL 78D SUR 18N 34	ANA ELSA MENDOZA DE HERNANDEZ	SI		$11.779.533	EN FASE DE VALIDACION	EN FASE DE VALIDACION	EN FASE DE VALIDACION	0%	0%	0%	0%	0%
		ROCIO ALTOS DEL SUR												
21	MVAV_2981	CR 69A B1S D 5 AP 18M 06	LEONOR TOVAR BARRERO	SI NO		$11.825.816	27/11/2020	ENTREGADA	27/11/2020	100%	0%	0%	0%	100%
22	MVAV_2812	CR 18M B1S 61C 29 SUR	ANDREA JENNIFFER ACOSTA MENDIVESO	SI NO		$10.471.857	27/11/2020	ENTREGADA	27/11/2020	100%	0%	0%	0%	100%
23	MVAV_2909	KR 18N 63C 27 SUR	BLANCA CECILIA ALFONSO BONORQUIZ	SI NO		$11.742.586	27/11/2020	ENTREGADA	27/11/2020	100%	0%	0%	0%	100%
24	MVAV_0196	CL 64C SUR 18N 03	ISABEL ARDILA VARGAS	SI NO		$8.994.273	27/11/2020	ENTREGADA	27/11/2020	100%	0%	0%	0%	100%
		LA ESCALA												
25	MVAV_2672	KR 18M 61 15 SUR MI	CARLOS OLIMPO SEGURA GUERRERO	SI NO		$11.793.878	26/11/2020	ENTREGADA	26/11/2020	100%	0%	0%	0%	100%
		ACACIAS SUR												
26	MVAV_9568	CL 62A SUR 18R 15	RODULFO BELTRAN	SI NO		$11.813.894	3/02/2021	9/03/2121	3/02/2021	0%	20%	0%	0%	20%
27	MVAV_9698	CL 62A SUR 18T 10	MARIA LUDINA VARGAS AGUIRRE	SI NO		$11.762.856	3/02/2021	9/03/2121	3/02/2021	0%	15%	0%	0%	15%
28	MVAV_1018	CL 63D SUR 19 25	MARIA LEONOR APONTE VIUDA DE LOPEZ	SI NO		$11.823.581	3/02/2021	9/03/2121	3/02/2021	0%	15%	0%	0%	15%
		BARRIO GIBRALTAR I Y II												
29	MVAV_9834	CL 63A SUR 18Q 05	CLARA INES OCHOA GUTIERREZ	SI NO		$9.526.817	FASE DE VALIDACION	FASE DE VALIDACION	FASE DE VALIDACION	0%	0%	0%	0%	0%
30	MVAV_9011	KR 18N B1S 61 27 SUR	RITA DEL CARMEN FONSECA CAMARGO	SI NO		$11.511.595	3/02/2021	9/03/2121	3/02/2021	0%	40%	0%	0%	40%
31	MVAV_3167	KR 18P 63 46 SUR	IRIA ESTHER SILVA	SI NO		$11.683.822	3/02/2021	9/03/2121	3/02/2021	0%	10%	0%	0%	10%
32	MVAV_3397	KR 18Q 63D 10 SUR	LUZ MARINA ROBAYO ALVARADO	SI NO		$11.795.938	3/02/2021	9/03/2121	3/02/2021	0%	25%	0%	0%	25%
		LA ESCALA 3ER SECTOR												
33	MVAV_9562	CL 62A SUR 18J 20	ROSALBA VARA DE ROJAS	SI NO		$16.438.798	3/02/2021	9/03/2121	3/02/2021	0%	0%	0%	0%	0%
		CIUDAD MILAGRO												
34	MVAV_9395	CL 62 SUR 18K 78	JOSE ORVEY ORTIZ	SI NO		$9.976.508	3/02/2021	9/03/2121	3/02/2021	0%	0%	0%	0%	0%
		VILLAS DEL DIAMANTE												
35	MVCEI_9474	CL 70F SUR 19F 18 MI	OLIVIA RIVERA	SI NO		$11.783.646	FASE DE VALIDACION	FASE DE VALIDACION	FASE DE VALIDACION	0%	0%	0%	0%	0%
36	MVCEI_9395	CL 70B SUR 18R 29	MARIA CRISTINA GONZALEZ GARCIA	SI NO		$16.809.984	FASE DE VALIDACION	FASE DE VALIDACION	FASE DE VALIDACION	0%	0%	0%	0%	0%
37	MVCEI_9388	CL 70C SUR 18R 48	DUBERNEY ARIAS BETANCUR	SI NO		$11.480.264	FASE DE VALIDACION	FASE DE VALIDACION	FASE DE VALIDACION	0%	0%	0%	0%	0%
		ARBORIZADORA ALTA												
38	MV_15742	KR 38 75 54 SUR	DONELIA PATIÑO MURILLO	SI NO		$18.949.413	FASE DE VALIDACION	FASE DE VALIDACION	FASE DE VALIDACION	0%	0%	0%	0%	0%
		JERUSALEN												
39	MV_17161	KR 38 79A 18 SUR	GUSTAVO VILLAREAL BERMUDEZ	SI NO		$11.825.431	FASE DE VALIDACION	FASE DE VALIDACION	FASE DE VALIDACION	0%	0%	0%	0%	0%
		EL MIRADOR												
40	MV_26324	CL 71C SUR 27B 15	ALDEMAR DUARTE LOPEZ	SI NO		$11.259.469	FASE DE VALIDACION	FASE DE VALIDACION	FASE DE VALIDACION	0%	0%	0%	0%	0%
		VILLA ISRAEL												
41	MVAV_0036	KR 5A B5 11B 34 SUR	EMPERATRIZ RODRIGUEZ LOPEZ	SI NO		$11.770.664	20/01/2021	20/02/2021	20/01/2021	30%	50%	0%	0%	80%
		VILLA ANITA SUR												
42	MV_21099	KR 8 115B 31 SUR	ALEXANDER BERNAL AVENDAÑO	SI NO		$11.834.981	20/01/2021	20/02/2021	20/01/2021	25%	10%	0%	0%	35%
		EL ESPINO												
43	MVAV_0230	CL 115B SUR 3B 11	JORGE GABRIEL BUITRAGO INFANTE	SI NO		$11.632.663	20/01/2021	20/02/2021	20/01/2021	25%	55%	0%	0%	75%
		EL VIRREY												
44	MV_26366	KR 4A 97 15 SUR	JUAN FRANCISCO MEDINA SALAZAR	SI NO		$11.510.651	23/01/2021	23/02/2021	23/01/2021	45%	55%	0%	0%	100%
		SAN LUIS												
45	MVAV_1876	DG 64 B1S A SUR 18N 15	JOSE OMAR CAMACHO TELLEZ	SI NO		$11.780.972	4/02/2021	4/03/2121	4/02/2021	0%	10%	0%	0%	10%
		LAS DELICIAS DEL SUR												
46	MVAV_3257	KR 18P B1S A 65 10 SUR MI	NELLY PIZA BUITRAGO	SI NO		$11.812.811	FASE DE VALIDACION	FASE DE VALIDACION	FASE DE VALIDACION	0%	0%	0%	0%	0%
		DOMINGO LAIN III SECTOR												
47	MVAV_3195	KR 18N B1S A 64D 19 SUR MI	BLANCA NELLY HERNÁNDEZ	SI NO		$11.158.757	3/02/2021	9/03/2121	3/02/2021	0%	10%	0%	0%	10%

A1

4- COMPONENTE TECNICO BARRIO O TERRITORIO			
ACTIVIDADES EJECUTADAS EN LA SEMANA. - ESTADO DE AVANCE SEMANAL POR VIVIENDA			
BARRIO O TERRITORIO - CIUDAD BOLIVAR			
FECHA: 014- FEB -2021			
ALTOS DE JALISCO			
1	MVJA_2992	ISAURA AREVALO MALAGON	SE REALIZA ENTREGA A CONFORMIDAD DE LA BENEFICIARIA, SE SOCIALIZA PRESUPUESTO FINAL Y MANUAL DE USO Y MANTENIMIENTO. DE IGUAL MANERA SE HACE ENTREGA DE KIT ECOLOGICO.
2	MVJA_3141	GLORIA CRISTINA GUTIERREZ GARZON	SE REALIZA ENTREGA A CONFORMIDAD DE LA BENEFICIARIA, SE SOCIALIZA PRESUPUESTO FINAL Y MANUAL DE USO Y MANTENIMIENTO. DE IGUAL MANERA SE HACE ENTREGA DE KIT ECOLOGICO.
3	MVJA_3146	CLARA INES GIL BAEZ	SE REALIZA ENTREGA A CONFORMIDAD DE LA BENEFICIARIA, SE SOCIALIZA PRESUPUESTO FINAL Y MANUAL DE USO Y MANTENIMIENTO. DE IGUAL MANERA SE HACE ENTREGA DE KIT ECOLOGICO.
4	MVJA_3335	MYRIAM PATRICIA SARMIENTO APONTE	SE REALIZA ENTREGA A CONFORMIDAD DE LA BENEFICIARIA, SE SOCIALIZA PRESUPUESTO FINAL Y MANUAL DE USO Y MANTENIMIENTO. DE IGUAL MANERA SE HACE ENTREGA DE KIT ECOLOGICO.
5	MVJA_3314	MARIA OLMA MOLANO ROMERO	SE REALIZA ENTREGA A CONFORMIDAD DE LA BENEFICIARIA, SE SOCIALIZA PRESUPUESTO FINAL Y MANUAL DE USO Y MANTENIMIENTO. DE IGUAL MANERA SE HACE ENTREGA DE KIT ECOLOGICO.
6	MVJA_3239	NATIVIDAD SILDANA CELYS VIUDA DE GARCIA	SE REALIZA VISITA DE APERTURA EN LA CUAL LOS HIJOS DE LA BENEFICIARIA MANIFIESTAN QUE PARA PODER INICIAR LA EJECUCION DE LA OBRA DEBEN ESTAR LA TOTALIDAD DE LOS MATERIALES PARA REALIZAR DICHO MEJORAMIENTO.
7	MVJA_0259	ALBA CARMEN ARDILA MATEUS	SE REALIZA ENTREGA A CONFORMIDAD DE LA BENEFICIARIA, SE SOCIALIZA PRESUPUESTO FINAL Y MANUAL DE USO Y MANTENIMIENTO. DE IGUAL MANERA SE HACE ENTREGA DE KIT ECOLOGICO.
8	MVJA_3223	MYRIAM AMPARO GÓMEZ DE GALVIS	SE REALIZA ENTREGA A CONFORMIDAD DE LA BENEFICIARIA, SE SOCIALIZA PRESUPUESTO FINAL Y MANUAL DE USO Y MANTENIMIENTO. DE IGUAL MANERA SE HACE ENTREGA DE KIT ECOLOGICO.
9	MVJA_3231	SOFIA MORENO	SE REALIZA ENTREGA A CONFORMIDAD DE LA BENEFICIARIA, SE SOCIALIZA PRESUPUESTO FINAL Y MANUAL DE USO Y MANTENIMIENTO. DE IGUAL MANERA SE HACE ENTREGA DE KIT ECOLOGICO.
10	MVJA_3119	LUZ YANID PADUA	SE REALIZA ENTREGA A CONFORMIDAD DE LA BENEFICIARIA, SE SOCIALIZA PRESUPUESTO FINAL Y MANUAL DE USO Y MANTENIMIENTO. DE IGUAL MANERA SE HACE ENTREGA DE KIT ECOLOGICO.
11	MVJA_3125	MARIA AURORA RENGIFO	SE REALIZA ENTREGA A CONFORMIDAD DE LA BENEFICIARIA, SE SOCIALIZA PRESUPUESTO FINAL Y MANUAL DE USO Y MANTENIMIENTO. DE IGUAL MANERA SE HACE ENTREGA DE KIT ECOLOGICO.
12	MVJA_0252	JESUS ANTONIO ORTIZ CASTRO	SE REALIZA ENTREGA A CONFORMIDAD DE LA BENEFICIARIA, SE SOCIALIZA PRESUPUESTO FINAL Y MANUAL DE USO Y MANTENIMIENTO. DE IGUAL MANERA SE HACE ENTREGA DE KIT ECOLOGICO.
13	MVJA_2996	MARIA DEL SOCORRO CUPITRA CACAIS	SE REALIZA ENTREGA A CONFORMIDAD DE LA BENEFICIARIA, SE SOCIALIZA PRESUPUESTO FINAL Y MANUAL DE USO Y MANTENIMIENTO. DE IGUAL MANERA SE HACE ENTREGA DE KIT ECOLOGICO.
14	MVJA_2712	JOSE ALIRIO ORTIZ CAERERA Y OTRA	Se hace validación en la vivienda, se definen espacios a intervenir, se hace levantamiento arquitectonico para calculo de cantidades de obra
15	MVJA_2707	ANA LUISA BERNAL PULIDO	Se hace validación en la vivienda, se definen espacios a intervenir, se hace levantamiento arquitectonico para calculo de cantidades de obra
16	MVJA_2640	PAOLA ANDREA BARRERA PELAEZ	Se hace validación en la vivienda, se definen espacios a intervenir, se hace levantamiento arquitectonico para calculo de cantidades de obra
17	MVJA_2371	ANA EDELMIRA ATARA ESPITIA	Se hace validación en la vivienda, se definen espacios a intervenir, se hace levantamiento arquitectonico para calculo de cantidades de obra
18	MVJA_2976	BLANCA LEONOR RIOS CHAPARRO	Se hace validación en la vivienda, se definen espacios a intervenir, se hace levantamiento arquitectonico para calculo de cantidades de obra
MIRADOR NUTIVARA			
19	MVCB_1774	JOSE WILSON MARULANDA GIRALDO	Se hace validación en la vivienda, se definen espacios a intervenir, se hace levantamiento arquitectonico para calculo de cantidades de obra
20	MVCB_1742	ANA ELVIA MENDOZA DE HERNANDEZ	Se hace validación en la vivienda, se definen espacios a intervenir, se hace levantamiento arquitectonico para calculo de cantidades de obra
ROCIO ALTOS DEL SUR			
21	MVJA_2981	LEONOR TOVAR BARRERO	SE REALIZA ENTREGA A CONFORMIDAD DE LA BENEFICIARIA, SE SOCIALIZA PRESUPUESTO FINAL Y MANUAL DE USO Y MANTENIMIENTO. DE IGUAL MANERA SE HACE ENTREGA DE KIT ECOLOGICO.
22	MVJA_2812	ANDREA JENNIFFER ACOSTA MENDIVELSO	SE REALIZA ENTREGA A CONFORMIDAD DE LA BENEFICIARIA, SE SOCIALIZA PRESUPUESTO FINAL Y MANUAL DE USO Y MANTENIMIENTO. DE IGUAL MANERA SE HACE ENTREGA DE KIT ECOLOGICO.
23	MVJA_2909	BLANCA CECILIA ALFONSO BOHORQUEZ	SE REALIZA ENTREGA A CONFORMIDAD DE LA BENEFICIARIA, SE SOCIALIZA PRESUPUESTO FINAL Y MANUAL DE USO Y MANTENIMIENTO. DE IGUAL MANERA SE HACE ENTREGA DE KIT ECOLOGICO.
24	MVJA_0186	ISABEL ARDILA VARGAS	SE REALIZA ENTREGA A CONFORMIDAD DE LA BENEFICIARIA, SE SOCIALIZA PRESUPUESTO FINAL Y MANUAL DE USO Y MANTENIMIENTO. DE IGUAL MANERA SE HACE ENTREGA DE KIT ECOLOGICO.
LA ESCALA			
25	MVJA_2672	CARLOS OLMPO SEGURA GUERRERO	SE REALIZA ENTREGA A CONFORMIDAD DE LA BENEFICIARIA, SE SOCIALIZA PRESUPUESTO FINAL Y MANUAL DE USO Y MANTENIMIENTO. DE IGUAL MANERA SE HACE ENTREGA DE KIT ECOLOGICO.
ACACIAS SUR			
26	MVJA_0598	RODULFO BEJARANO	SE REALIZA VISITA DE SEGUINMIENTO TECNICO, EN LA CUAL SE EVIDENCIAN TRABAJADORES Y AVANCES EN EJECUCIÓN
27	MVJA_0608	MARIA LUIDINA VARGAS AGUIRRE	SE REALIZA VISTA DE VALIDACION. SE TOMAN MEDIDAS PARA REALIZACION DE PRESUPUESTOS Y POSTERIORMENTE DEFINIR AREAS A INTERVENIR. DE IGUAL MANERA SE REALIZA APERTURA PARA DAR INICIO A LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS
28	MVJA_1018	MARIA LEONOR APONTE VIUDA DE LOPEZ	SE REALIZA VISTA DE VALIDACION. SE TOMAN MEDIDAS PARA REALIZACION DE PRESUPUESTOS Y POSTERIORMENTE DEFINIR AREAS A INTERVENIR. DE IGUAL MANERA SE REALIZA APERTURA PARA DAR INICIO A LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS
BARRIO GIBRALTAR I Y II			
29	MVJA_0834	CLARA INES OCHOA GUTIERREZ	Se hace validación en la vivienda, se definen espacios a intervenir, se hace levantamiento arquitectonico para calculo de cantidades de obra
30	MVJA_3011	RITA DEL CARMEN FONSECA CAMARGO	SE REALIZA VISTA DE SEGUINMIENTO TECNICO, EN LA CUAL SE EVIDENCIAN TRABAJADORES Y AVANCES EN EJECUCIÓN
31	MVJA_3157	IRIA ESTHER SILVA	SE REALIZA VISTA DE SEGUINMIENTO TECNICO, EN LA CUAL SE EVIDENCIAN TRABAJADORES Y AVANCES EN EJECUCIÓN
32	MVJA_3397	LUZ MARINA ROBAYO ALVARADO	SE REALIZA VISTA DE SEGUINMIENTO TECNICO, EN LA CUAL SE EVIDENCIAN TRABAJADORES Y AVANCES EN EJECUCIÓN
LA ESCALA 3ER SECTOR			
33	MVJA_0502	ROSALBA JARA DE ROJAS	Se hace validación en la vivienda, se definen espacios a intervenir, se hace levantamiento arquitectonico para calculo de cantidades de obra
CIUDAD MILAGRO			
34	MVJA_0395	JOSE ORVEY ORTIZ	Se hace validación en la vivienda, se definen espacios a intervenir, se hace levantamiento arquitectonico para calculo de cantidades de obra
VILLAS DEL DIAMANTE			
35	MVCB-5474	OLIVIA RIVERA	SE REALIZA VISTA DE VALIDACION. SE TOMAN MEDIDAS PARA REALIZACION DE PRESUPUESTOS Y POSTERIORMENTE DEFINIR AREAS A INTERVENIR
36	MVCB-5395	MARÍA CRISTINA GONZALEZ GARCÍA	SE REALIZA VISTA DE VALIDACION. SE TOMAN MEDIDAS PARA REALIZACION DE PRESUPUESTOS Y POSTERIORMENTE DEFINIR AREAS A INTERVENIR
37	MVCB-5388	DUBERNEY ARIAS BETANCUR	SE REALIZA VISTA DE VALIDACION. SE TOMAN MEDIDAS PARA REALIZACION DE PRESUPUESTOS Y POSTERIORMENTE DEFINIR AREAS A INTERVENIR

		ARBORIZADORA ALTA	
38	MV-15742	DONELIA PATIÑO MURILLO	SE REALIZA VISTA DE VALIDACION. SE TOMAN MEDIDAS PARA REALIZACION DE PRESUPUESTOS Y POSTERIORMENTE DEFINIR AREAS A INTERVENIR
		JERUSALEN	
39	MV-17151	GUSTAVO VILLAREAL BERMUDEZ	SE REALIZA VISTA DE VALIDACION. SE TOMAN MEDIDAS PARA REALIZACION DE PRESUPUESTOS Y POSTERIORMENTE DEFINIR AREAS A INTERVENIR
		EL MIRADOR	
40	MV-05324	ALDEMAR DUARTE LOPEZ	SE REALIZA VISTA DE VALIDACION. SE TOMAN MEDIDAS PARA REALIZACION DE PRESUPUESTOS Y POSTERIORMENTE DEFINIR AREAS A INTERVENIR
		VILLA ISRAEL	
41	MVUS_0036	EMPERATRIZ RODRIGUEZ LOPEZ	SE REALIZA VISTA DE SEGUINMIENTO TECNICO, EN LA CUAL SE EVIDENCIAN TRABAJADORES Y AVANCES EN EJECUCIÓN
		VILLA ANITA SUR	
42	MV_21059	ALEXANDER BERNAL AVENDAÑO	SE REALIZA VISTA DE SEGUINMIENTO TECNICO, EN LA CUAL SE EVIDENCIAN TRABAJADORES Y AVANCES EN EJECUCIÓN
		EL ESPINO	
43	MVUS_0230	JORGE GABRIEL BUITRAGO INFANTE	SE REALIZA VISTA DE SEGUINMIENTO TECNICO, EN LA CUAL SE EVIDENCIAN TRABAJADORES Y AVANCES EN EJECUCIÓN
		EL VIRREY	
44	MV_20306	JUAN FRANCISCO MEDINA SALAZAR	SE REALIZA VISTA DE SEGUINMIENTO TECNICO, EN LA CUAL SE EVIDENCIAN TRABAJADORES Y AVANCES EN EJECUCIÓN
		SAN LUIS	
45	MVJA_1878	JOSE OMAR CAMACHO TELLEZ	SE REALIZA VISTA DE SEGUINMIENTO TECNICO, EN LA CUAL SE EVIDENCIAN TRABAJADORES Y AVANCES EN EJECUCIÓN
		LAS DELICIAS DEL SUR	
46	MVJA_3257	NELLY PIZA BUITRAGO	SE REALIZA VISTA DE VALIDACION. SE TOMAN MEDIDAS PARA REALIZACION DE PRESUPUESTOS Y POSTERIORMENTE DEFINIR AREAS A INTERVENIR
		DOMINGO LAIN III SECTOR	
47	MVJA_3105	BLANCA NELLY HERNÁNDEZ	SE REALIZA VISTA DE SEGUINMIENTO TECNICO, EN LA CUAL SE EVIDENCIAN TRABAJADORES Y AVANCES EN EJECUCIÓN

5. PLAN DE ACCIÓN RESULTADO DEL ANÁLISIS DE CAUSAS REGISTRADO EN EL NUMERAL ANTERIOR - CON EL OBJETIVO DE ELIMINAR LA CAUSA RAÍZ DE LA SITUACIÓN PROBLEMÁTICA - PLAN DE MEJORA

ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA
A la fecha se han realizado 17 entregas a satisfacción, se realizan 10 aperturas y 3 validaciones. Se presenta al personal que va estar a cargo de la ejecucón y se firman actas de inicio de obra.	CRISTIAN VELASCO	
Se le solicita al contratista hacer entrega oportuna de los materiales y que el personal a cargo de la ejecución cumpla con los horarios minimos establecidos de jornada laboral.		

6. ACTIVIDADES NO PREVISTAS Y MAYORES CANTIDADES

Se informa que en algunas de las viviendas se presentan mejoras en los acabados finales realizadas por los beneficiarios, por lo tanto se deside intervenir otros espacios en conjunto con el contratista garantizando una adecuada habitabilidad y dignificación de las viviendas


7. COMENTARIOS DEL INTERVENTOR: Por favor realice la descripción general del estado del contrato y según aplique informe sobre: actividades realizadas en la semana, control de lluvias, compra y suministro de materiales, mano de obra, subcontratos y tramites ante las diferentes empresas prestadoras de servicios, entre otros. Anexe las actas de seguimiento realizadas en la semana correspondiente al periodo del informe.

Barrio o Territorio: CIUDAD BOLIVAR

8. REGISTRO FOTOGRAFICO DEL AVANCE DURANTE LA SEMANA

SE ADJUNTA REGISTRO FOTOGRAFICO

REGISTRO FOTOGRAFICO
MV -21059

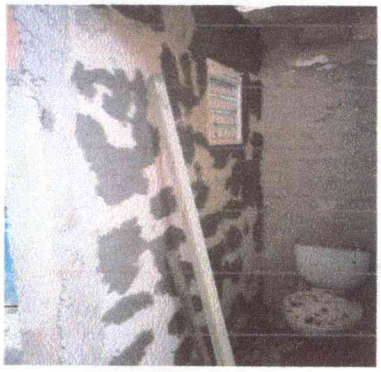


FECHA	jueves, 11 de febrero de 2021
SEGUIMIENTO	



FECHA	jueves, 11 de febrero de 2021
SEGUIMIENTO	




FECHA	jueves, 11 de febrero de 2021
SEGUIMIENTO	

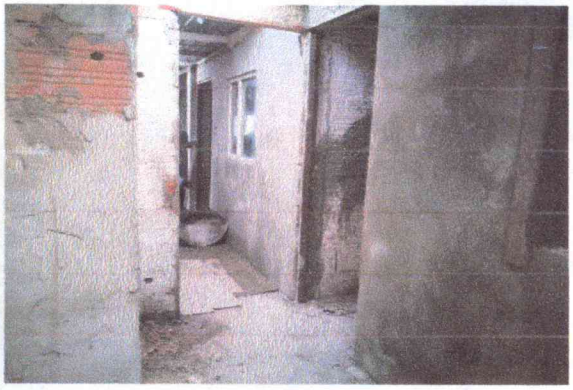

FECHA	jueves, 11 de febrero de 2021
SEGUIMIENTO	



FECHA	jueves, 11 de febrero de 2021
SEGUIMIENTO	

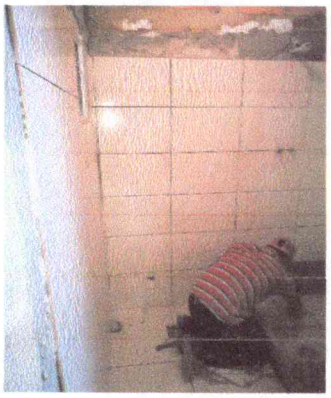

FECHA	jueves, 11 de febrero de 2021
SEGUIMIENTO	

REGISTRO FOTOGRAFICO

MV -0036



FECHA	sábado, 13 de febrero de 2021
SEGUIMIENTO	



FECHA	sábado, 13 de febrero de 2021
SEGUIMIENTO	



FECHA	sábado, 13 de febrero de 2021
SEGUIMIENTO	



FECHA	sábado, 13 de febrero de 2021
SEGUIMIENTO	



FECHA	sábado, 13 de febrero de 2021
SEGUIMIENTO	



FECHA	sábado, 13 de febrero de 2021
SEGUIMIENTO	

Subsecretaria de Coordinacion Operativa
Subdireccion de Barrios
Seguimiento ejecución proyectos de Mejoramiento de Vivienda - Habitabilidad

Proyecto mejoramiento de vivienda - AVANCE EJECUCIÓN SEMANAL

Fecha: **14-feb-21**

Consorcio mejoramiento EP 2020 - Contratista de obra

Contratato de obra	694-2020			Plazo	Cinco (5) meses
Objeto	Contratar la ejecución de las obras de mejoramiento de vivienda en la modalidad de habitabilidad de los proyectos estructurados en los territorios priorizados por la Secretaria Distrital de Habitat. Grupo I			Acta de inicio	4 de noviembre de 2020
CDP No.	No. 914 del 14 de julio de 2020	CRP No.		Valor del contrato	TRES MIL SETECIENTOS VEINTICUATRO MILLONES CIENTO TREINTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS DIEZ Y NUEVE PESOS ($3.724.135.319) M/Cte

Gonzalo Lievano Hoyos -INPLAYCO S.A.S.

Contratato de interventoria	701-2020			Plazo	Seis (6) meses
Objeto	Realizar la interventorias técnica, jurídica, social, administrativa y financiera, para la ejecución de las obras de mejoramiento de vivienda en la modalidad de habitablidad en los territorios priorizados por la secretaria distrital de hábitat.			Acta de inicio	04 de noviembre 2020
CDP No	No. 892 del 14 de julio de 2020	CRP No.		Valor del contrato	OCHOCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS M/CTE ($894.285.952),

Fase 1: Validación de la información entregada por el la SDHT									Fase 2: Ejecución de obras				
					Validación				Ejecución				
Territorio a barrio a intervenir	CIUDAD BOLIVAR	Barrios	Predios	Total Predios	Validada	V/For Validar		V/Modificada	En Ejecución	Terminadas	Por Ejecutar	% de Avance	Acta de Entrega a Satisfacción
Arq o Ing. Responsable	ERICK ALVAREZ CADAVID	LA ESCALA 3ER SECTOR	1	54	1	0		0	0	1	0	0.36%	1
		DOMINGO LAIN II	8		8	0		0	2	0	6	0.00%	0
		LUCERO MEDIO	5		5	0		0	2	0	3	0.00%	0
		SAN FERNANDO	2		2	0		0	1	0	1	0.01%	0
		SAN LUIS	2		2	0		0	1	0	1	0.01%	0
		ACACIAS SUR	2		2	0		0	2	0	0	0.21%	0
Técnico Responsable		DOMINGO LAIN I	8		8	0		0	1	3	4	1.16%	3
		ALTOS DE JALISCO	10		10	0		0	1	9	0	3.51%	9
		LAS DELCIAS DEL SUR ZONA 19	1		1	0		0	0	0	1	0.00%	0
		CIUDAD MILAGRO	3		3	0		0	3	0	0	0.00%	0
		LA ESPERANZA	1		1	0		0	1	0	0	0.00%	0
		GIBRALTAR I Y II	6		6	0		0	4	1	1	0.65%	1
		LORENZO ALCANTUZ	1		1	0		0	0	1	0	0.40%	1
		ANTONIO JOSE DE SUCRE	4		4	0		0	2	2	0	1.27%	2
Subtotal			54	54	54	0		0	20	17	17	7.58%	17

AVANCE DE EJECUCIÓN SEMANAL

Proyecto				FASE I			Tiempo Programacion			FEBRERO				
No.	ID_DMV	Dirección	Nombres y apellidos	V/ Validada	V/ Modificada	V/Inicial	Fecha inicio	Fecha terminación MV	F. Inicio	Acumulado semanas anteriores	SEMANA DEL 8 AL 14	SEMANA DEL 15 AL 21	SEMANA DEL 22 AL 28	ACUMULADO TOTAL
											15 semana	16 semana	17 semana	
DOMINGO LAIN II SECTOR Y CONDOMINIO DEL BOSQUE														
1	MVJA_0723	CL 63 SUR 18K 14	VICTOR MANUEL SAMORA HERNANDEZ	SI		$11,821,595	26/11/2020	EN EJECUCION	26/11/2020	0%	0%	0%	0%	0%
2	MVJA_1085	CL 64 BIS SUR 18N 42	MARIA NERY ECHEVERRY DE RESTREPO	NO		$11,689,124	EN FASE DE VALIDACION	EN FASE DE VALIDACION	EN FASE DE VALIDACION	0%	0%	0%	0%	0%
3	MVJA_2598	KR 18L BIS 64A 22 SUR	FLOR ANGELA MORANTES LOPEZ	SI		$11,687,520	EN FASE DE VALIDACION	EN FASE DE VALIDACION	EN FASE DE VALIDACION	0%	0%	0%	0%	0%
4	MVJA_2476	KR 18K BIS 64A 12 SUR	JAIME HUMBERTO BORDA LIBERATO	NO		$11,622,585	EN FASE DE VALIDACION	EN FASE DE VALIDACION	EN FASE DE VALIDACION	0%	0%	0%	0%	0%
5	MVJA_2783	KR 18M 64 21 SUR	CARLOS JESÚS BECERRA PEREZ	SI		$11,795,728	EN FASE DE VALIDACION	EN FASE DE VALIDACION	EN FASE DE VALIDACION	0%	0%	0%	0%	0%
6	MVJA_1194	CL 64B SUR 18N 81	MOISES RODRÍGUEZ BETANCOURT	NO		$11,146,150	8/02/2021	EN EJECUCION	8/02/2021	0%	0%	0%	0%	0%
7	MVJA_1129	CL 64 SUR 18P 07	ANA BERTILDE GAMBOA VELANDIA	SI		$11,758,393	EN FASE DE VALIDACION	EN FASE DE VALIDACION	EN FASE DE VALIDACION	0%	0%	0%	0%	0%
8	MVJA_2479	KR 18K BIS 64A 20 SUR	CRISTOBAL VALBUENA	NO		$10,217,769	EN FASE DE VALIDACION	EN FASE DE VALIDACION	EN FASE DE VALIDACION	0%	0%	0%	0%	0%
DOMINGO LAIN I														
9	MVJA_0898	CL 63B SUR 18L 53	EFIGENIA GUIZA DE SANCHEZ	SI		$11,770,978	24/11/2020	ENTREGADA	24/11/2020	100%	0%	0%	0%	100%
10	MVJA_0899	CL 63B SUR 18L 61	DORIS AYDEE HERRERA OTALORA	NO		$11,058,620	24/11/2020	ENTREGADA	24/11/2020	100%	0%	0%	0%	100%
11	MVJA_0970	CL 63D SUR 18L 02	DORIS CUESTA DE RODRIGUEZ	SI		$11,559,058	25/11/2020	ENTREGADA	25/11/2020	100%	0%	0%	0%	100%
12	MVJA_2756	KR 18M 63D 08 SUR	ESTHER AROCA YARA	NO		$10,416,988	10/02/2021	EN EJECUCION	10/02/2021	0%	0%	0%	0%	0%
13	MVJA_2469	KR 18K BIS 63D 19 SUR	CARMEN LIBIA GÓMEZ DE CASTAÑEDA	SI		$10,422,672	EN FASE DE VALIDACION	EN FASE DE VALIDACION	EN FASE DE VALIDACION	0%	0%	0%	0%	0%
14	MVJA_2342	KR 18J BIS 63D 25 SUR	MARIA DOLORES CASTILLO DE SANCHEZ	NO		$3,851,663	EN FASE DE VALIDACION	EN FASE DE VALIDACION	EN FASE DE VALIDACION	0%	0%	0%	0%	0%
15	MVJA_2343	KR 18J BIS 63D 26 SUR	ERNESTO VERGARA NIETO	SI		$11,369,770	EN FASE DE VALIDACION	EN FASE DE VALIDACION	EN FASE DE VALIDACION	0%	0%	0%	0%	0%
16	MVJA_1096	CL 64 SUR 18J 46	GONZALO OÑATE BONILLA	NO		$10,119,768	EN FASE DE VALIDACION	EN FASE DE VALIDACION	EN FASE DE VALIDACION	0%	0%	0%	0%	0%

ALTOS DE JALISCO															
17	MVJA_2741	KR 18M 62A 44 SUR	CARLOS ALBERTO MUÑETON FRANCO	SI		$11,816,187	27/11/2020	EN EJECUCION	27/11/2020	0%	0%	0%	0%	0%
18	MVJA_2729	KR 18M 62A 07 SUR	JOSE IGNACIO TAO IBARRA	NO		$11,801,634	25/11/2020	ENTREGADA	25/11/2020	100%	0%	0%	0%	100%
19	MVJA_0544	CL 62A SUR 18M 05	MERCEDES RIAÑO PARRA	SI		$11,820,308	24/11/2020	ENTREGADA	24/11/2020	100%	0%	0%	0%	100%
20	MVJA_0567	CL 62A SUR 18M 41 IN 9	MARIA DEL ROSARIO RODRIGUEZ	NO		$11,722,293	25/11/2020	ENTREGADA	25/11/2020	100%	0%	0%	0%	100%
21	MVJA_3309	KR 18P 3IS B 61D 25 SUR	TEOFILO MORALES TURGA Y OTRA	SI		$11,799,687	24/11/2020	ENTREGADA	24/11/2020	100%	0%	0%	0%	100%
22	MVJA_3366	KR 18Q 61C 34 SUR	EDILMA ALCIRA CASTILLO	NO		$11,764,716	26/11/2020	ENTREGADA	26/11/2020	100%	0%	0%	0%	100%
23	MVJA_4350	TV 18Q BIS C 61B 87 SUR	MARÍA BENDTA REDONDO CASTIBLANCO	SI		$11,552,262	26/11/2020	ENTREGADA	26/11/2020	100%	0%	0%	0%	100%
24	MVJA_2660	KR 18L BIS A 62A 39 SUR	MANUEL EDJARDO RODRIGUEZ PRIETO	NO		$11,808,234	25/11/2020	ENTREGADA	25/11/2020	100%	0%	0%	0%	100%
25	MVJA_4333	TV 18Q BIS C 61B 45 SUR	BEATRIZ CABRALES ACERO	SI		$11,504,866	27/11/2020	ENTREGADA	27/11/2020	100%	0%	0%	0%	100%
26	MVJA_0890	CL 63B SUR 18K 56	HERNAN HUMBERTO PARRA	NO		$10,110,603	25/11/2020	ENTREGADA	25/11/2020	100%	0%	0%	0%	100%
LA ESCALA 3ER SECTOR															
27	MVJA_0530	CL 62A SUR 18L 07	LUIS ALIRIO LÓPEZ DÍAZ	SI		$10,524,980	26/11/2020	ENTREGADA	26/11/2020	100%	0%	0%	0%	100%
GIBRALTAR I Y II															
28	MVJA_4375	TV 18R 61B 41 SUR	FERNANDO TORRES Y OTRA	SI		$7,358,179	26/11/2020	ENTREGADA	26/11/2020	100%	0%	0%	0%	100%
29	MVJA_3081	KR 18N BIS A 63 26 SUR	JOSE UNILCIO CIFUENTES QUINTERO Y OTRA	NO		$10,723,231	5/02/2021	EN EJECUCION	5/02/2021	0%	27%	0%	0%	27%
30	MVJA_3086	KR 18N BIS A 63C 23 SUR	LUIS ALFREDO CARPINTERO Y OTRA	SI		$11,720,170	4/02/2021	EN EJECUCION	4/02/2021	0%	24%	0%	0%	24%
31	MVJA_3168	KR 19P 63B 16 SUR	OLIVIA BOLAÑOS	NO		$9,229,283	4/02/2021	EN EJECUCION	4/02/2021	0%	20%	0%	0%	20%
32	MVJA_2395	KR 19K 64A 22 SUR	DELIO MARTINEZ GAMBA	SI		$11,822,362	EN FASE DE VALIDACION	EN FASE DE VALIDACION	EN FASE DE VALIDACION	0%	0%	0%	0%	0%
33	MVJA_0922	CL 63C SUR 18P 22	FRANCISCO PIAMBA ANACONA	NO		$9,697,112	4/02/2021	EN EJECUCION	4/02/2021	0%	35%	0%	0%	35%
ACACIAS SUR															
34	MVJA_3670	KR 18Z 62 30 SUR	CRISTOBAL PITA CAMARGO	SI		$11,791,446	4/02/2021	EN EJECUCION	4/02/2021	0%	35%	0%	0%	35%
35	MVJA_0439	CL 62 SUR 18Z 04	GAVI ROZO RODRIGUEZ	NO		$11,758,346	5/02/2021	EN EJECUCION	5/02/2021	0%	18%	0%	0%	18%
LA ESPERANZA															
36	MVJA_3607	KR 19T 62A 21 SUR	LUIS ENRIQUE JIMENEZ VEGA	SI		$11,760,814	8/02/2021	EN EJECUCION	8/02/2021	0%	0%	0%	0%	0%
CIUDAD MILAGRO															
37	MVJA_0286	CL 62 BIS SUR 18J 12	HASBLEIDY GINA ROJAS ESCOBAR	SI		$11,813,015	10/02/2021	EN EJECUCION	10/02/2021	0%	0%	0%	0%	0%
38	MVJA_0235	CL 62D SUR 18K 58	MARIELA OSORIO TRUJILLO	NO		$9,103,008	9/02/2021	EN EJECUCION	9/02/2021	0%	0%	0%	0%	0%
39	MVJA_0328	CL 62 BIS SUR 18K 53	VICTOR MANUEL URREA ACOSTA	SI		$9,129,217	9/02/2021	EN EJECUCION	9/02/2021	0%	0%	0%	0%	0%
SAN LUIS				NO											
40	MVJA_2051	DG 64A SUR 18V 14	FABIO VELASQUEZ CABALLERO	SI		$5,791,775	EN FASE DE VALIDACION	EN FASE DE VALIDACION	EN FASE DE VALIDACION	0%	0%	0%	0%	0%
41	MVJA_1776	DG 64 BIS SUR 18V 35	UVA ESTHER BAQUERO DE GIL	NO		$9,569,727	5/02/2021	EN EJECUCION	5/02/2021	0%	2.10%	0%	0%	2.10%
SAN FERNANDO															
42	MVJA_2139	DG 64B SUR 19 76	MARIA ELIUD ORTEGON DE ALARCON	SI		$8,133,977	5/02/2021	EN EJECUCION	5/02/2021	0%	3.50%	0%	0%	3.50%
43	MVJA_2119	DG 64B SUR 19 36	MARIA CONCEPCION RIAÑO	NO		$10,994,689	EN FASE DE VALIDACION	EN FASE DE VALIDACION	EN FASE DE VALIDACION	0%	0%	0%	0%	0%
LAS DELICIAS DEL SUR ZONA 19				SI											
44	MVJA_1386	CL 65 SUR 18N 73	CRISTOBAL SUA ALBARRACÍN	NO		$10,201,812	EN FASE DE VALIDACION	EN FASE DE VALIDACION	EN FASE DE VALIDACION	0%	0%	0%	0%	0%
LUCERO MEDIO															
45	MVJA_2324	KR 18J 64F 39 SUR	ARMANDO QUIROGA BARRIGA Y OTRA	SI		$11,577,668	9/02/2021	EN EJECUCION	9/02/2021	0%	0%	0%	0%	0%
46	MVJA_2617	KR 18L BIS 64F 07 SUR	QUINTILIANO CASTILLO DOMÍNGUEZ Y OTRA	NO		$10,654,735	EN FASE DE VALIDACION	EN FASE DE VALIDACION	EN FASE DE VALIDACION	0%	0%	0%	0%	0%
47	MVJA_2628	KR 18L BIS 64F 47 SUR	MARIA ALICIA MAHECHA POVEDA	SI		$11,621,525	EN FASE DE VALIDACION	EN FASE DE VALIDACION	EN FASE DE VALIDACION	0%	0%	0%	0%	0%
48	MVJA_2418	KR 18K 65A 15 SUR	BERTILDA URREGO	NO		$11,712,907	9/02/2021	EN EJECUCION	9/02/2021	0%	0%	0%	0%	0%
49	MVJA_2414	KR 18K 64F 29 SUR	MARIA ELENA RINCON RINCON	SI		$11,664,556	RENUNCIA	RENUNCIA	RENUNCIA	-	-	-	-	-
USMINIA - ANTONIO JOSE DE SUCRE I SECTOR				NO											
50	MV_18353	CL 109 SUR 9 64	LUZ DANARIS CASTRO PULGARIN	SI		$11,776,148	20/01/2021	ENTREGADA	20/01/2021	100%	0%	0%	0%	100%
51	MV_18951	CL 104A SUR 6 37 N1	LUIS ANTONIO RINCON	NO		$11,524,924	20/01/2021	ENTREGADA	20/01/2021	100%	0%	0%	0%	100%
52	MV_19285	CL 108 SUR 3A 36	JAIRO ANTONIO ESPINOSA	SI		$11,264,277	20/01/2021	EN EJECUCION	20/01/2021	43%	34%	0%	0%	77%
53	MV_21820	CL 136 B SUR 4 11	JUAN EUDES OREJUELA GARZON	NO		$11,808,193	28/01/2021	EN EJECUCION	28/01/2021	20%	29%	0%	0%	48%
USMINIA - LORENZO ALCANTUZ				SI											
54	MV_17421	CL 102 SUR 5 49	OLGA BARRETO	NO		$11,766,972	20/01/2021	ENTREGADA	20/01/2021	100%	0%	0%	0%	100%

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DEL HÁBITAT

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

PROYECTOS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA

INPLAYCO S.A.S.
INGENIEROS CONSTRUCTORES E INTERVENTORES

FECHA	14/02/2021	PERIODO No.	15	DEL	3/02/2021	AL	14/02/2021

1. INFORMACIÓN GENERAL

OBJETO DEL CONTRATO	Realizar la interventorias técnica, jurídica, social, administrativa y financiera, para la ejecución de las obras de mejoramiento de vivienda en la modalidad de habitabilidad en los territorios priorizados por la secretaría distrital de hábitat.
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO	Corresponde al Grupo 1 a la ejecución de 254 mejoramientos de vivienda, localizados en 3 localidades: Bosa, Usme y Ciudad Bolivar, esta última localidad incluye cuatro (4) Intervenciones de Mejoramientointegral.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA		CONTRATO DE OBRA	
CONTRATO No.:	701-2020	CONTRATO No.:	694 -2020
PLAZO INIC AL:	6 meses	PLAZO INICIAL:	5 meses
FECHA DE INICIACIÓN:	4 de noviembre de 2020	FECHA DE INICIACIÓN:	4 de noviembre de 2020
**FECHA DE SUSPENSIÓN:	0	**FECHA DE SUSPENSIÓN:	0
**FECHA DE REINICIACIÓN:	0	**FECHA DE REINICIACIÓN:	0
FECHA DE TERMINACIÓN:	3 de mayo de 2021	FECHA DE TERMINACIÓN:	3 de abril 2021
PLAZO ACTJALIZADO:	0	PLAZO ACTUALIZADO:	0
PLAZO TRANSCURRIDO:	0	PLAZO TRANSCURRIDO:	0
VALOR INICIAL :	$ 894,285,952	VALOR INICIAL :	$ 3,724,135,319
VALOR ADICION(ES):	0	VALOR ADICION(ES):	$ -
VALOR ACTUALIZADO:	$ -	VALOR ACTUALIZADO:	$ -
VALOR ANTICIPO:	0	VALOR ANTICIPO:	$ -
VALOR POR PAGAR:	$ -	VALOR FOR PAGAR:	$ -
SUPERVISCR:	JUAN CARLOS ARBELAEZ MURILLO	INTERVENTOR:	Gonzalo Llevano Hoyos -INPLAYCO S.A.S.

** Inserte las filas que requiera según el número de suspensiones y reinicios.

2. CONTROL DE HITOS.

No.	*** DESCRIPCIÓN DEL HITO	FECHA PROGRAMADA	FECHA REAL DE CUMPLIMIENTO	DÍAS DE RETRASO
	SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO (HITO OBLIGATORIO)	4/11/2020	3/04/2021	
1	Validación			
2	Entrega de informe de validación			
3	Ejecución			
	ENTREGA A LA INTERVENTORIA DE LOS PRODUCTOS Y/O ACTIVIDADES CONTRATADAS (HITO OBLIGATORIO)			


***** Inserte las filas que requiera según el número de hitos; teniendo en cuenta que como mínimo se deberán establecer 5 hitos adicionales a los obligatorios de inicio y terminación. Los hitos aprobados por la interventoría se socializarán con el supervisor del contrato para su Vo. Bo. Los Hitos aprobados por la interventoría y SDHT solo se podrán modificar previa novedad contractual que así lo requiera. La matriz ded segimiento hace parte del presente documento.**


No.	INDICADORES BARRIO O TERRITORIO	VALORES	PORCENTAJE SOBRE EL VALOR TOTAL DEL CONTRATO	DIFERENCIA (+) ADELANTO (-) ATRASO
1	Valor acumulado de las actividades o productos conforme a la programación vigente.	$334,379,723.58	8.98%	-1.40%
2	Valor acumulado de las actividades o productos ejecutados y aprobados por la interventoría.	$282,403,122.12	7.58%	

3. ASPECTOS GENERALES INFORME TÉCNICO

Registre los avances y novedades técnicas, sociales, administrativas, contables y financieras, acompañadas por gráficos, cuadros, fotografías, análisis y comentarios sobre el estado de los trabajos, en todos sus aspectos en la fase de validación y ejecución de obra.

CIUDAD BOLIVAR - USME

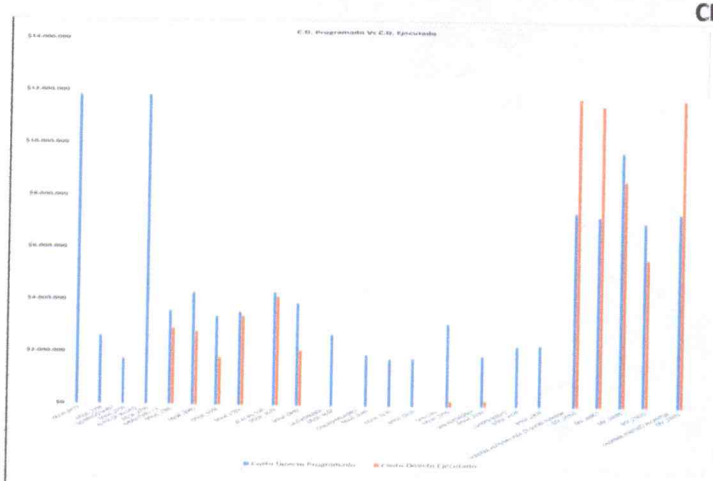

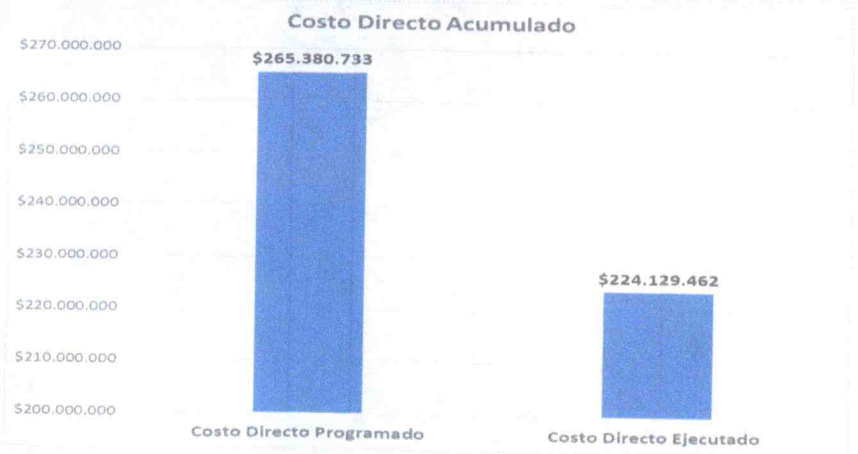

4- COMPONENTE TECNICO BARRIO O TERRITORIO			
ACTIVIDADES EJECUTADAS EN LA SEMANA. - ESTADO DE AVANCE SEMANAL POR VIVIENDA			
FECHA: 27-12 -2020			
BARRIO O TERRITORIO - CIUDAD BOLIVAR - DOMINGO LAIN II SECTOR Y CONDOMINIO DEL BOSQUE			
1	MVJA_0723	VICTOR MANUEL SAMORA HERNANDEZ	Se hace seguimiento, la vivienda no cuenta con ningun servicio publico (agua, luz y gas) por tal motivo aun no se inician actividades; se suscribe acta en la cual el beneficiario se compromete a realizar la gestion necesaria para contar con el suministro de luz y agua para poder dar comienzo a la ejecución de lo mejora.
2	MVJA_1085	MARIA NERY ECHEVERRY DE RESTREPO	Se hace validación en la vivienda, se definen espacios a intervenir y se realiza levantamiento arquitectonico para calculo de cantidades de obra.
3	MVJA_2598	FLOR ANGELA MORANTES LOPEZ	Se hace validación en la vivienda, se definen espacios a intervenir y se realiza levantamiento arquitectonico para calculo de cantidades de obra.
4	MVJA_2476	JAIME HUMBERTO BORDA LIBERATO	Se hace validación en la vivienda, se definen espacios a intervenir y se realiza levantamiento arquitectonico para calculo de cantidades de obra.
5	MVJA_2763	CARLOS JESÚS BECERRA PEREZ	Se hace validación en la vivienda, se definen espacios a intervenir y se realiza levantamiento arquitectonico para calculo de cantidades de obra.
6	MVJA_1194	MOISES RODRÍGUEZ BETANCOURT	Se realiza apertura en la cual se socializan actividades de obra, presupuesto, indicaciones de bioseguridad.
7	MVJA_1129	ANA BERTILDE GAMBOA VELANDIA	Se hace validación en la vivienda, se definen espacios a intervenir y se realiza levantamiento arquitectonico para calculo de cantidades de obra.
8	MVJA_2479	CRISTOBAL VALBUENA	Se hace validación en la vivienda, se definen espacios a intervenir y se realiza levantamiento arquitectonico para calculo de cantidades de obra.
BARRIO O TERRITORIO - CIUDAD BOLIVAR - DOMINGO LAIN I			
9	MVJA_0898	EFIGENIA GUIZA DE SANCHEZ	Se hace entrega de vivienda a conformidad del beneficiario, se socializo presupuesto final, manual de uso y mantenimiento; se entrega kit ecologico.
10	MVJA_0899	DORIS AYDEE HERRERA OTALORA	Se hace entrega de vivienda a conformidad del beneficiario, se socializo presupuesto final, manual de uso y mantenimiento; se entrega kit ecologico.
11	MVJA_0970	DORIS CUESTA DE RODRIGUEZ	Se hace entrega de vivienda a conformidad del beneficiario, se socializo presupuesto final, manual de uso y mantenimiento; se entrega kit ecologico.
12	MVJA_2756	ESTHER ARCCA YARA	Se realiza apertura en la cual se socializan actividades de obra, presupuesto, indicaciones de bioseguridad.
13	MVJA_2469	CARMEN LIBIA GÓMEZ DE CASTAÑEDA	Se hace validación en la vivienda, se definen espacios a intervenir y se realiza levantamiento arquitectonico para calculo de cantidades de obra.
14	MVJA_2342	MARIA DOLORES CASTILLO DE SANCHEZ	Se hace validación en la vivienda, se definen espacios a intervenir y se realiza levantamiento arquitectonico para calculo de cantidades de obra.
15	MVJA_2343	ERNESTO VERGARA NIETO	Se hace validación en la vivienda, se definen espacios a intervenir y se realiza levantamiento arquitectonico para calculo de cantidades de obra.
16	MVJA_1096	GONZALO OÑATE BONILLA	Se hace validación en la vivienda, se definen espacios a intervenir y se realiza levantamiento arquitectonico para calculo de cantidades de obra.
BARRIO O TERRITORIO - CIUDAD BOLIVAR - ALTOS DE JALISCO			
17	MVJA_2741	CARLOS ALBERTO MUÑETON FRANCO	Beneficiario no se encuentra hasta el mes de enero; se debe validar nuevamente una vez beneficiario termine adecuaciones por su cuenta.
18	MVJA_2729	JOSE IGNACIO TAO IBARRA	Se hace entrega de vivienda a conformidad del beneficiario, se socializo presupuesto final, manual de uso y mantenimiento; se entrega kit ecologico.
19	MVJA_0544	MERCEDES RIAÑO PARRA	Se hace entrega de vivienda a conformidad del beneficiario, se socializo presupuesto final, manual de uso y mantenimiento; se entrega kit ecologico.
20	MVJA_0567	MARIA DEL ROSARIO RODRIGUEZ	Se hace entrega de vivienda a conformidad del beneficiario, se socializo presupuesto final, manual de uso y mantenimiento; se entrega kit ecologico.
21	MVJA_3309	TEOFILO MORALES TURGA	Se hace entrega de vivienda a conformidad del beneficiario, se socializo presupuesto final, manual de uso y mantenimiento; se entrega kit ecologico.
22	MVJA_3366	EDILMA ALCIRA CASTILLO	Se hace entrega de vivienda a conformidad del beneficiario, se socializo presupuesto final, manual de uso y mantenimiento; se entrega kit ecologico.
23	MVJA_4350	MARÍA BENDITA REDONDO CASTIBLANCO	Se hace entrega de vivienda a conformidad del beneficiario, se socializo presupuesto final, manual de uso y mantenimiento; se entrega kit ecologico.
24	MVJA_2660	MANUEL EDUARDO RODRIGUEZ PRIETO	Se hace entrega de vivienda a conformidad del beneficiario, se socializo presupuesto final, manual de uso y mantenimiento; se entrega kit ecologico.
25	MVJA_4333	BEATRIZ CABRALES ACERO	Se hace entrega de vivienda a conformidad del beneficiario, se socializo presupuesto final, manual de uso y mantenimiento; se entrega kit ecologico.
26	MVJA_0890	HERNAN HUMBERTO PARRA	Se hace entrega de vivienda a conformidad del beneficiario, se socializo presupuesto final, manual de uso y mantenimiento; se entrega kit ecologico.
BARRIO O TERRITORIO - CIUDAD BOLIVAR - LA ESCALA 3ER SECTOR			
27	MVJA_0530	LUIS ALIRIO LÓPEZ DÍAZ	Se hace entrega de vivienda a conformidad del beneficiario, se socializo presupuesto final, manual de uso y mantenimiento; se entrega kit ecologico.
BARRIO O TERRITORIO - CIUDAD BOLIVAR - GIBRALTAR I Y II			
28	MVJA_4375	FERNANDO TORRES Y OTRA	Se hace entrega de vivienda a conformidad del beneficiario, se socializo presupuesto final, manual de uso y mantenimiento; se entrega kit ecologico.
29	MVJA_3081	JOSE UNILCIO CIFUENTES QUINTERO Y OTRA	Se hace seguimiento a la vivienda, se evidencia materiales y maestro ejecutando actividades de enchape en piso.
30	MVJA_3086	LUIS ALFREDO CARPINTERO Y OTRA	Se hace seguimiento a la vivienda, se evidencia materiales y maestro ejecutando actividades de enchape en cocina y pañete en muro.
31	MVJA_3168	OLIVIA BOLAÑOS	Se hace seguimiento a la vivienda, se evidencia materiales y maestro ejecutando actividades de pañete y demolicion de meson.
32	MVJA_2395	DELIO MARTINEZ GAMBA	Se hace validación en la vivienda, se definen espacios a intervenir y se realiza levantamiento arquitectonico para calculo de cantidades de obra.
33	MVJA_0922	FRANCISCO PIAMBA ANACONA	Se hace seguimiento a la vivienda, se evidencia materiales y maestro ejecutando actividades de enchape en piso.
BARRIO O TERRITORIO - CIUDAD BOLIVAR - ACACIAS SUR			
34	MVJA_3670	CRISTOBAL PITA CAMARGO	Se hace seguimiento a la vivienda, se evidencia materiales y maestro ejecutando actividades de instalacion de meson en concreto y pañete en baño.
35	MVJA_0439	GAVI ROZO RODRIGUEZ	Se hace seguimiento a la vivienda, se evidencia materiales y maestro ejecutando actividades de alisatdo de piso.

BARRIO O TERRITORIO - CIUDAD BOLIVAR - LA ESPERANZA			
36	MVJA_3607	LUIS ENRIQUE JIMENEZ VEGA	Se realiza apertura en la cual se socializan actividades de obra, presupuesto, indicaciones de bioseguridad.
BARRIO O TERRITORIO - CIUDAD BOLIVAR - CIUDAD MILAGRO			
37	MVJA_0286	HASBLEIDY GINA ROJAS ESCOBAR	Se realiza apertura en la cual se socializan actividades de obra, presupuesto, indicaciones de bioseguridad.
38	MVJA_0235	MARIELA OSORIO TRUJILLO	Se realiza apertura en la cual se socializan actividades de obra, presupuesto, indicaciones de bioseguridad.
39	MVJA_0328	VICTOR MANUEL URREA ACOSTA	Se realiza apertura en la cual se socializan actividades de obra, presupuesto, indicaciones de bioseguridad.
BARRIO O TERRITORIO - CIUDAD BOLIVAR - SAN LUIS			
40	MVJA_2051	FABIO VELASQUEZ CABALLERO	Se hace validación en la vivienda, se definen espacios a intervenir y se realiza levantamiento arquitectonico para calculo de cantidades de obra.
41	MVJA_1776	UVA ESTHER BAQUERO DE GIL	Se hace seguimiento a la vivienda, se evidencia materiales pero sin maestro.
BARRIO O TERRITORIO - CIUDAD BOLIVAR - SAN FERNANDO			
42	MVJA_2139	MARIA ELIUD ORTEGON DE ALARCON	Se hace seguimiento a la vivienda, se evidencia materiales pero sin maestro.
43	MVJA_2119	MARIA CONCEPCION RIAÑO	Se hace validación en la vivienda, se definen espacios a intervenir y se realiza levantamiento arquitectonico para calculo de cantidades de obra.
BARRIO O TERRITORIO - CIUDAD BOLIVAR - LAS DELICIAS DEL SUR ZONA 1ª			
44	MVJA_1386	CRISTOBAL SUA ALBARRACÍN	Se hace validación en la vivienda, se definen espacios a intervenir y se realiza levantamiento arquitectonico para calculo de cantidades de obra.
BARRIO O TERRITORIO - CIUDAD BOLIVAR - LUCERO MEDIO			
45	MVJA_2324	ARMANDO QUIROGA BARRIGA Y OTRA	Se realiza apertura en la cual se socializan actividades de obra, presupuesto, indicaciones de bioseguridad.
46	MVJA_2617	QUINTILIANO CASTILLO DOMÍNGUEZ Y OTRA	Se hace validación en la vivienda, se definen espacios a intervenir y se realiza levantamiento arquitectonico para calculo de cantidades de obra.
47	MVJA_2628	MARIA ALICIA MAHECHA POVEDA	Se hace validación en la vivienda, se definen espacios a intervenir y se realiza levantamiento arquitectonico para calculo de cantidades de obra.
48	MVJA_2418	BERTILDA URREGO	Se realiza apertura en la cual se socializan actividades de obra, presupuesto, indicaciones de bioseguridad.
49	MVJA_2414	MARIA ELENA RINCON RINCON	Beneficiaria renuncia al subsidio por razones familiares.
BARRIO O TERRITORIO - USMINIA - ANTONIO JOSE DE SUCRE I SECTOR			
50	MV_18353	LUZ DAMARIS CASTRO PULGARIN	Se hace entrega de vivienda a conformidad del beneficiario, se socializo presupuesto final, manual de uso y mantenimiento; se entrega kit ecologico.
51	MV_18951	LUIS ANTONIO RINCON	Se hace entrega de vivienda a conformidad del beneficiario, se socializo presupuesto final, manual de uso y mantenimiento; se entrega kit ecologico.
52	MV_19285	JAIRO ANTONIO ESPINOSA	Se hace seguimiento a la vivienda, se evidencia materiales y maestro ejecutando actividades de instalacion de meson en concreto y enchape en piso.
53	MV_21820	JUAN EUDES ORJUELA GARZON	Se hace seguimiento a la vivienda, se evidencia materiales y maestro ejecutando actividades de pañete.
BARRIO O TERRITORIO - USMINIA - LORENZO ALCANTUZ			
54	MV_17421	OLGA BARRETO	Se hace entrega de vivienda a conformidad del beneficiario, se socializo presupuesto final, manual de uso y mantenimiento; se entrega kit ecologico.

5. PLAN DE ACCIÓN RESULTADO DEL ANÁLISIS DE CAUSAS REGISTRADO EN EL NUMERAL ANTERIOR - CON EL OBJETIVO DE ELIMINAR LA CAUSA RAÍZ DE LA SITUACIÓN PROBLEMÁTICA - PLAN DE MEJORA

ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA
En conjunto con el contratista y esta interventoría se realizaran y supervisaran los respectivos presupuestos iniciales de obra y seguimiento a la ejecución de actividades, tambien se definiran posibles ajustes a las areas establecidas e indicadas inicialmente en cada uno de los expedientes de los beneficiaros del programa de mejoramiento de vivienda.	ERICK ALVAREZ CADAVID	

6. ACTIVIDADES NO PREVISTAS Y MAYORES CANTIDADES

Se informa que en algunas de las viviendas se presentan mejoras en los acabados finales realizadas por los beneficiarios, por lo tanto se deside intervenir otros espacios en conjunto con el contratista garantizando una adecuada habitabilidad y dignificación de las viviendas

7. COMENTARIOS DEL INTERVENTOR: Por favor realice la descripción general del estado del contrato y según aplique informe sobre: actividades realizadas en la semana, control de lluvias, compra y suministro de materiales, mano de obra, subcontratos y tramites ante las diferentes empresas prestadoras de servicios, entre otros. Anexe las actas de seguimiento realizadas en la semana correspondiente al periodo del informe.

Barrio o Territorio: CIUDAD BOLIVAR

En el presente periodo se hace entrega de 3 viviendas y seguimiento de obra a 10 viviendas beneficiadas, se le informa al contratista de obra y al beneficiario sobre los espacios a intervenir.

8. REGISTRO FOTOGRAFICO DEL AVANCE DURANTE LA SEMANA

SE ADJUNTA REGISTRO FOTOGRAFICO

REGISTRO FOTOGRÁFICO



FECHA	lunes, 8 de febrero de 2021
DESCRIPCION MVJA_3607	
Apertura	



FECHA	martes, 9 de febrero de 2021
DESCRIPCION MVJA_0235	
Apertura	



FECHA	martes, 9 de febrero de 2021
DESCRIPCION MVJA_0328	
Apertura	



FECHA	sábado, 13 de febrero de 2021
DESCRIPCION MVJA_3086	
Seguimiento	



FECHA	sábado, 13 de febrero de 2021
DESCRIPCION MVJA_3168	
Seguimiento	



FECHA	sábado, 13 de febrero de 2021
DESCRIPCION MVJA_0922	
Seguimiento	

REGISTRO FOTOGRÁFICO



FECHA	martes, 9 de febrero de 2021
DESCRIPCION MVJA_2324	
Apertura	



FECHA	martes, 9 de febrero de 2021
DESCRIPCION MVJA_2418	
Apertura	



FECHA	sábado, 6 de febrero de 2021
DESCRIPCION MVJA_2414	
Renuncia	



FECHA	miércoles, 10 de febrero de 2021
DESCRIPCION MVJA_0286	
Apertura	



FECHA	lunes, 8 de febrero de 2021
DESCRIPCION MVJA_2756	
Apertura	



FECHA	lunes, 8 de febrero de 2021
DESCRIPCION MVJA_1194	
Apertura	

INPLAYCO S.A.S.
INGENIEROS CONSTRUCTORES & INTERVENTORES

ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE HÁBITAT

INFORME SOCIAL SEMANAL 15

SEMANA 15
INFORME SOCIAL

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DEL HÁBITAT

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

PROYECTOS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA
GRUPO 1

INPLAYCO S.A.S.
INGENIEROS CONSTRUCTORES E INTERVENTORES

FECHA	13/02/2021	PERIODO No.	15	DEL	08/02/2021	AL	13/02/2021

1. INFORMACIÓN GENERAL

OBJETO DEL CONTRATO	Realizar la interventorías técnica, jurídica social, ad ministrative y financiera, para la ejecución de las obras de mejoramiento de vivienda en la modalidad de hab tabilidad e n los territorios priorizados por la secretaría distrital de hábitat.
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO	Corresponde al Grupo 1 a la ejecución de 254 mejoramientos de viviend , localizados en 3localidades: Bosa, Usme y Ciudad Bolívar, esta última localidad incluye cuatro (4) Intervenciones de Mejoramientolntegral.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA		CONTRATO DE OBRA	
CONTRATO No.:	701-2020	CONTRATO No.:	694—2020
PLAZO INICIAL:	6 meses	PLAZO INICIAL:	5 meses
FECHA DE INICIACIÓN:	4 de noviembre de 2020	FECHA DE INICIACIÓN:	4 de noviembre de 2020
**FECHA DE SUSPENSIÓN:	0	**FECHA DE SUSPENSIÓN:	0
**FECHA DE REINICIACIÓN	0	**FECHA DE REINICIACIÓN:	0
FECHA DE TERMINACIÓN:	3 de mayo de 2021	FECHA DE TERMINACIÓN:	3 de abril 2021
PLAZO ACTUALIZADO:	0	PLAZO ACTUALIZADO:	0
PLAZO TRANSCURRIDO:	0	PLAZO TRANSCURRIDO:	0
VALOR INICIAL :	$ 894.285.952,00	VALOR INICIAL :	$ 3.724.135.319,00
VALOR ADICIÓN(ES):	$ -	VALOR AD CIÓN(ES):	$ -
VALOR ACTUALIZADO:	$ -	VALOR ACTUALIZADO:	$ -
VALOR ANTICIPO:	$ -	VALOR ANTICIPO:	$ -
VALOR POR PAGAR:	$ -	VALOR POR PAGAR:	$ -
SUPERVISOR:	JUAN CARLOS ARBELÁEZ MURILLO	INTERVENTOR:	Gonzalo Llévano Hoyos -INPLAYCO S.A.S.

** Inserte las filas que requiera según el número de suspensiones y reinicios.

2. CONTROL DE HITOS.

No.	*** DESCRIPCIÓN DEL HITO	FECHA PROGRAMADA	FECHA REAL DE CUMPLIMIENTO	DÍAS DE RETRASO
	SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO (HITO OBLIGATORIO)	04/11/2020	03/04/2021	
1	Validación			
2	Entrega de informe de validación			
3	Ejecución			
	ENTREGA A LA INTERVENTORÍA DE LOS PRODUCTOS Y/O ACTIVIDADES CONTRATADAS (HITO OBLIGATORIO)			

*** Inserte las filas que requiera según el número de hitos; teniendo en cuenta que como mínimo se deberán establecer 5 hitos adicionales a los obligatorios de inicio y terminación. Los hitos aprobados por la interventoría se socializarán con el supervisor del contrato para su Vo. Bo. Los Hitos aprobados por la interventoría y SDHT solo se podrán modificar previa novedad contractual que así lo requiera. La matriz de seguimiento hace parte del presente documento.

No.	INDICADORES	VALORES	PORCENTAJE SOBRE EL VALOR TOTAL DEL CONTRATO	DIFERENCIA (+) ADELANTO (-) ATRASO
1	Valor acumulado de las actividades o productos conforme a la programación vigente.			
2	Valor acumulado de las actividades o productos ejecutados y aprobados por la interventoría.			

3. ASPECTOS GENERALES INFORME SOCIAL

COMPONENTE SOCIAL - AVANCE SOCIAL DE CADA UNIDAD DE VIVIENDA

LOCALIDAD: CIUDAD BOLÍVAR

BARRIO O TERRITORIO: MIRADOR NUTIBARA

08/02/2021 - **MVCB_1907 : ANA ROSA LLANOS DE GARCÍA ,** seguimiento de obra

08/02/2021 - **MVCB_1914 : BLANCA ODILIA PATIÑO,** seguimiento de obra

10/02/2021 - **MVCB_1908: JESÚS MARÍA COBA QUIROGA,** seguimiento, se realiza seguimiento técnico y social por parte de interventoría no se observa personal en la obra (tomando onces) , se observan avances, el beneficiario se muestra conforme con el avance.
10/02/2021 - **MVCB_1873: BLANCA FABIOLA LANDÁZURI MESA**, seguimiento, se realiza seguimiento técnico y socia por parte de interventoría, se observa personal en la obra , se observan avances, el beneficiaria se muestra conforme con el avance.
10/02/2021 - **MVCB_1886: LUZ MARÍA ARIZA ARIZA**, seguimiento, se realiza seguimiento técnico y social por parte de interventoría, se observa personal en la obra , se observan avances, el beneficiaria se muestra conforme con el avance.
10/02/2021 - **MVCB_1836: DELIA MARÍA MATEUS ESCAMILLA**, seguimiento, se realiza seguimiento técnico y social por parte de interventoría, no se observa personal en la obra, maestros reportan que no pueden continuar debido a la humedad (goteras) que presenta la cubierta, beneficiaria se compromete a arreglar los problemas con la cubierta para que los maestros puedan continuar.
10/02/2021 - **MVCB_1829: DIANA PATRICIA PÁEZ FINO**, seguimiento, se realiza seguimiento técnico y social por parte de interventoría, se observa personal en la obra, beneficiaria desea realizar cambio en zona de lavandería no dejando enchapado de toda la pared, área técnica de contratista e interventoría dan visto bueno y se modifica actividad.
10/02/2021 - **MVCB_1684: MIRYAM MANRIQUE URUEÑA**, seguimiento, se realiza seguimiento por parte técnica y social de interventoría, se observa persona en la obra, no se reporta ninguna dificultad por parte de la beneficiaria. Se encuentra conforme con la obra.
11/02/2021 - **MVCB_1907: ANA ROSA LLANOS DE GARCÍA -Autorizada SANDRA HIGUERA,** seguimiento, se realiza seguimiento técnico y social, se observa personal en la obra, se observan avances, es necesario cambiar actividades en presupuesto ya que a momento de realizar alistado para el enchapado de la cocina el maestro da cuenta de que previo pañete es defectuoso y es necesario pañetar de nuevo toda el área de la cocina.
11/02/2021 - **MVCB_1914: BLANCA ODILIA PATIÑO,** seguimiento, se realiza seguimiento técnico y social, se observa personal en la obra, se observan avances, se le aclara al maestro como es necesario colocar el enchapado para la zona de ropas.
11/02/2021 - **MVCB_1586: MARÍA DEL CARMEN RINCÓN,** seguimiento, se realiza seguimiento técnico y social, se observa personal en la obra, se observan avances, beneficiaria no reporta ninguna inconformidad.
13/02/2021 - **MVCB_1586: MARÍA DEL CARMEN RINCÓN,** visita de seguimiento social - técnico de contratista y social de interventoría, la beneficiaria no manifiesta novedades en cuanto a las actividades en ejecución.
13/02/2021 - **MVCB_1867: JOSÉ ALBER LUGO,** visita de seguimiento social - técnico de contratista y social de interventoría, beneficiario refiere estar conforme con el avance en todas las áreas.
13/02/2021 - **MVCB_1914: BLANCA ODILIA PATIÑO DE MARTÍNEZ Y OTRO,** beneficiaria se encuentra indispuesta, por lo que se verifica avance de intervención en espacios, que se consigna en la bitácora.
13/02/2021 - **MVCB_1907: ANA ROSA LLANOS DE GARCÍA,** visita de seguimiento social - técnico del contratista y social de interventoría, se evidencia avance de obra en pañete y de muros de cocina, enchape de mesón, demolición de piso en habitación 2.
BARRIO O TERRITORIO: ALTOS DE JALISCO
09/02/2021 - **MVJA_2712: JOSÉ ALIRIO ORTÍZ CABRERA,** apertura de la vivienda, en la que se socializan presupuesto, actividades de obra, protocolo de bioseguridad y recomendaciones sociales de vivienda
09/02/2021 - **MVJA_2640: PAOLA ANDREA BARRERA PELÁEZ,** apertura de la vivienda, en la que se socializan presupuesto, actividades de obra, protocolo de bioseguridad y recomendaciones sociales de vivienda
10/02/2021 - **MVJA_3239: NATIVIDAD SILDANA CELYS VIUDA DE GARCÍA,** apertura de la vivienda, en la que se socializan presupuesto, actividades de obra, protocolo de bioseguridad y recomendaciones sociales de vivienda.
10/02/2021 - **MVJA_2976: BLANCA LEONOR RÍOS CHAPARRO,** apertura de la vivienda, en la que se socializan presupuesto, actividades de obra, protocolo de bioseguridad y recomendaciones sociales de vivienda.
10/02/2021 - **MVJA_2371: ANA EDELMIRA ATARA ESPITIA,** apertura de la vivienda, en la que se socializan presupuesto, actividades de obra, protocolo de bioseguridad y recomendaciones sociales de vivienda.
BARRIO O TERRITORIO: NUEVA COLOMBIA
11/02/2021 - **MVCB_1320: ISMENIA BARRETO ARIAS,** entrega de la vivienda a conformidad del beneficiario , se socializa presupuesto final, manual de uso y mantenimiento y se entrega kit ecológico
11/02/2021 - **MVCB_1310: DORA ALICIA LÓPEZ SANABRIA**, entrega de la vivienda a conformidad de la beneficiaria , se socializa presupuesto final, manual de uso y mantenimiento y se entrega kit ecológico
11/02/2021 - **MVCB_1357: MARTHA LILIA AGUDELO SANTOS,** entrega de la vivienda a conformidad del beneficiario , se socializa presupuesto final, manual de uso y mantenimiento y se entrega kit ecológico
11/02/2021 - **MVCB_1280: BÁRBARA GALVIS CHINCHILLA,** se realiza seguimiento técnico y social, se observa personal en la obra, se observan avances, debido a como esta a tubería de gas en el área de cocina no se va a enchapar cerca a la tubería sino que se estuca y pinta pero el área de la estufa si quedará enchapada. Beneficiaria fue operada recientemente así que no se encuentra en la casa.
13/02/2021 - **MVCB_1280: BÁRBARA GALVIS CHINCHILLA,** visita de seguimiento social - técnico de contratista y social de interventoría, se observa avance en mesón y enchape de muro en baño.

BARRIO O TERRITORIO: DOMINGO LAIN II SECTOR
09/02/2021 - **MVJA_3105: BLANCA NELLY HERNÁNDEZ,** apertura de la vivienda, en la que se socializan presupuesto, actividades de obra, protocolo de bioseguridad y recomendaciones sociales.
12/02/2021 - **MVJA_3105: BLANCA NELLY HERNÁNDEZ.** Seguimiento. La beneficiaria manifiesta conformidad con los avances constructivos. Refiere dudas técnicas las cuales son resueltas por el área técnica. Se observa personal de obra.
BARRIO O TERRITORIO: LA ESPERANZA
08/02/2021 - **MVJA_ 3607: LUIS ENRIQUE JIMÉNEZ VEGA,** apertura de la vivienda, en la que se socializan presupuesto, actividades de obra, protocolo de bioseguridad y recomendaciones sociales.
BARRIO O TERRITORIO: ACACIAS SUR
8/02/2021 - **MVJA_0598: RODULFO BEJARANO,** apertura de la vivienda, en la que se socializan presupuesto, actividades de obra, protocolo de bioseguridad y recomendaciones sociales.
8/02/2021 - **MVJA_0608: MARÍA LUIDINA VARGAS AGUIRRE,** apertura de la vivienda, en la que se socializan presupuesto, actividades de obra, protocolo de biosegur dad y recomendaciones sociales atendida por la autorizada mediante carta: Nubia Esperanza Chaperro.
9/02/2021 - **MVJA_0598: RODULFO BEJARANO,** seguimiento Se hace ajuste al presupuesto ya que la cubierta no cumple las especificaciones técnicas para el cielo raso. Con el consentimiento del beneficiario y con la aprobación de la parte técnica de la interventoría
10/02/2021 - **MVJA_1018: MARÍA LEONOR APONTE VIUDA DE LÓPEZ,** apertura de la vivienda, en la que se socializan presupuesto, actividades de obra, protocolo de bioseguridad y recomendaciones sociales de vivienda.
12/02/2021 - **MVJA_0608: MARÍA LUIDINA VARGAS AGUIRRE,** seguimiento. Atiende la autorizada mediante carta: Nubia Esperanza Chaparro. La autorizada manifiesta conformidad con el avance de la obra y se observa personal de obra en el predio
12/02/2021 - **MVJA_0598: RODULFO BEJARANO,** seguimiento. Atiende la visita la esposa autorizada. Se evidencia personal de obra en el predio. La beneficiaria manifiesta conformidad y refiere dudas las cuales son resueltas por el área técnica.
DESARROLLO: LA ESCALA III SECTOR
08/02/2021 - **MVJA_0502: ROSALBA JARA DE ROJAS,** apertura de la vivienda, en la que se socializan presupuesto, actividades de obra, protocolo de bioseguridad y recomendaciones sociales de la vivienda en la cual se socializa presupuesto nicial de obras, actividades, protocolo de bioseguridad. Se acota a la beneficiaria mediante bitácora acerca ce las zonas que presentan humedad y la contrapendiente en el hall.
DESARROLLO: DOMINGO LAIN I
08/02/2021 - **MVJA_2756: ESTHER AROCA YATRA,** apertura de la vivienda, en la que se socializan presupuesto, actividades de obra, protocolo de bioseguridad y recomendaciones sociales de la vivienda en la que se socializa presupuesto de inicio, recomendaciones sociales, de bioseguridad y se hace observación de instalación eléctrica en habitaciones
BARRIO O TERRITORIO: LUCERO MEDIO
08/02/2021 - **MVJA_2315: ANÍBAL INFANTE NAVARRETE**, seguimiento de citación, se realiza visita de citación, en el predio se encuentran presentes dos de los hijos del señor fallecido, expresan que ellos están a la espera de aprobación de subsidio para la vivienda de ellos entonces no ven conveniente el hacerse cargo y aceptar el subsidio para la vivienda del señor Aníbal, deciden optar por la renuncia en dicha vivienda, se generan acta de visita y acta de renuncia.
09/02/2021 - **MVJA_2324: ARMANDO QUIROGA BARRIGA Y OTRA,** apertura de la vivienda, en la cue se socializan presupuesto, actividades de obra, protocolo de bioseguridad y recomendaciones sociales.
09/02/2021 - **MVJA_2414: MARÍA ELENA RINCÓN RINCÓN**, apertura fallida en la vivienda figuran 4 hermanos. 3 de ellos no se encuentran de acuerdo con el mejoram ento ya que el subsidio no abarca todas las zonas del predio. La beneficiaria solicita por dicho motivo la renuncia. En el momento de diligenciar los formatos pertinentes la beneficiaria y una hermana se agredieron física y verbalmente. La beneficiaria cogió un ladrillo y un objeto corto punzante (cuchillo). Profesionales las separaron y se procedió a llamar a la policía. La beneficiaria manifestó que en el momento de la validación otro hermano también presento disgustos.
09/02/2021 - **MVJA_2418: BERTILDA URREGO,** apertura de la vivienda, en la que se socializan presupuesto, actividades de obra, protocolo de bioseguridad y recomendaciones sociales.
BARRIO O TERRITORIO: SAN LUIS
12/02/2021 - **MVJA_1876: JOSÉ OMAR CAMACHO TELLEZ,** seguimiento. Se socializa al beneficiario los ajustes del nuevo presupuesto quien firma a conformidad. Refiere inquietudes técnicas las cuáles son resueltas por el área correspondiente. No se observa personal de obra en la casa.

BARRIO O TERRITORIO: GIBRALTAR I Y II
08/02/2021 - **MVJA_3086: HERMINDA BALAGUERA GARZÓN,** visita de seguimiento en la cual se encuentra conforme a la beneficiaria, quien además solicita reemplazo de actividad en mesón por instalación de cielo raso, la cual es aprobada por el área técnica de interventoría. Posterior al ajuste del presupuesto se socializará.
12/02/2021 - **MVJA_3011: RITA DEL CARMEN FONSECA,** seguimiento. La beneficiaria manifiesta inquietudes sobre los residentes de obra contratistas ya que no han ido a hacer seguimiento de obra. Se observa personal de obra en la casa y conformidad por parte de doña Rita. Se le suministra teléfono de la residente social contratista.
12/02/2021 - **MVJA_3011: IRIA ESTHER SILVA,** seguimiento. La beneficiaria se encuentra inconforme y disgustada, la vivienda se aperturó hace 8 días y ella refiere que solo han laborado dos días. Se le solicita al contratista hacer seguimiento ya que la señora Iria vive sola, es adulto mayor, lava la loza en el lavadero ya que la cocina no está habilitada. También refiere que varias ocasiones ha reforzado el uso de tapa bocas al personal de obra.
12/02/2021 - **MVJA_3397: LUZ MARINA ROBAYO,** seguimiento. La beneficiaria manifiesta conformidad con los avances constructivos. Se observa personal de obra en el predio. No manifiesta dudas e inquietudes.
DESARROLLO CIUDAD MILAGROS
09/02/2021 - **MVJA_0395: JOSÉ ORVEY ORTÍZ,** apertura de la vivienda, en la que se socializan presupuesto, actividades de obra, protocolo de bioseguridad y recomendaciones sociales de vivienda
09/02/2021 - **MVJA_0235 : MARIELA OSORIO TRUJILLO,** apertura de la vivienda, en la que se socializan presupuesto, actividades de obra, protocolo de bioseguridad y recomendaciones sociales de vivienda
09/02/2021 - **MVJA_0328 : VÍCTOR MANUEL URREA ACOSTA,** apertura de la vivienda, en la que se socializan presupuesto, actividades de obra, protocolo de bioseguridad y recomendaciones sociales de vivienda
10/02/2021 - **MVJA_0286: HASBLEIDY GINA ROJAS ESCOBAR,** apertura de la vivienda, en la que se socializan presupuesto, actividades de obra, protocolo de bioseguridad y recomendaciones sociales de vivienda.
BARRIO O TERRITORIO: VILLAS EL DIAMANTE
08/02/2021 - **MVCB_5209: MARCELINDA MURCIA**, compromiso de citación, no se encuentra beneficiaria dentro de la vivienda. Vecinos expresan que la beneficiaria sale del hogar en las mañanas (6am) y no se tiene claridad de hora de llegada. Se realiza acta con información dada por una vecina.
DESARROLLO: EL PARAÍSO
08/02/2021 - **MV_04993: ROSALBINA ZABALA MENDOZA**, se realiza visita de citación, no se encuentra beneficiaria dentro de la vivienda. Vecinos expresan que la beneficiaria sale del hogar en las mañanas (7am) y no se tiene claridad de hora de llegada, una vecina informa también que beneficiaria ya tiene el número de contacto pero ella no se ha comunicado con el contratista. Se realiza acta con información dada por la vecina.
LOCALIDAD: USME
09/02/2021 - Se realiza visita de presentación con la señora Marta (presidenta de la junta de accion comunal de Usminia) por parte de la Secretaría Distrital de Hábitat en compañía de interventoría y contratista.
DESARROLLO USMINIA
12/02/2021 - **MV_21184: AMALIA MERCHÁN SOSA,** seguimiento de obra sin novedades de tipo social
12/02/2021 - **MV_21212: ERNESTINA CAICEDO,** seguimiento de obra sin novedades de tipo social
12/02/2021 - **MV_21368: ALEJANDRO PAVA,** seguimiento de obra sin novedades de tipo social
12/02/2021 - **MV_21240: ALFONSO GUERRERO,** entrega de vivienda en la que se socializan presupuesto final, manual de uso y conservación y se entrega kit ecológico.
DESARROLLO: ANTONIO JOSÉ DE SUCRE I SECTOR
09/02/2021 - **MV_21820: JUAN EUDES ORJUELA GARZÓN**, visita de seguimiento social y de Secretaría Distrital de Hábitat, se observa personal en la obra pero están a la espera de materiales para continuar alistado de pisos, se observa avances frente al alistado de piso y pañete, mesón de cocina y mampostería del muro de cocina/baño.
12/02/2021 - **MV_21820: JUAN EUDES ORJUELA GARZÓN**, seguimiento en el cual se evidencia avance en obra, se contacta telefónicamente al beneficiario, quien indica conformidad con el avance.
12/02/2021 - **MV_19285: SANDRA PINZÓN**, seguimiento en el que se encuentra autorizada mediante carta a la señora Sandra García, manifiesta conformidad de la beneficiaria. Se recomienda el uso permanente de tapabocas durante la obra.

HISTORIA DE VIDA
12/02/2021 - **MV_21820: JUAN EUDES ORJUELA GARZÓN**, seguimiento en el cual se evidencia avance en obra, se contacta telefónicamente al beneficiario, quien indica conformidad con el avance.
DESARROLLO: ANTONIO JOSÉ DE SUCRE III SECTOR
08/02/2021 - **MV_21341: ERMELINDA HERNÁNDEZ**, visita de seguimiento social - técnico de interventoría, se evidencia personal de obra, avance en enchape de alcoba, baño y cocina y construcción de mesón en cocina. Nota: la beneficiaria y la presidenta de la JAC quien llegó en el momento de la visita, manifestaron inconformidad por trato hacia ellas del señor Fernando Carrillo, quien tiene una actitud grosera cuando se le hace alguna pregunta debido a demora en la obra por falta de material; no se consigna en bitácora por miedo de la beneficiaria, se responde que debe manifestar su queja al área social del contratista en la siguiente visita.
09/02/2021 - **MV_21341: ERMELINDA HERNÁNDEZ**, visita de secretaria, se realiza seguimiento por parte técnico, social y de secretaría de hábitat, se observa personal trabajando y avances en la obra. Beneficiaria expresa conformidad y se aclaran actividades con interventoría y Secretaria de Hábitat.
09/02/2021 - **MV_21240: ALFONSO GUERRERO**, visita de secretaria, se realiza seguimiento por parte técnico, social y de secretaría de hábitat, se observa personal trabajando y avances en la obra. Beneficiaria expresa conformidad y se aclaran actividades con contratista y Secretaria de Hábitat.
09/02/2021 - **MV_21283: TERESA DE JESÚS OSORIO ORTÍZ**, visita de secretaria se hace seguimiento técnico, social y de secretaría de hábitat. No se observa personal en la obra, se observan avances, se explica una vez más actividades a hacer, en especifico como se hará la obra para los baños.
12/02/2021 - **MV_21341: ERMELINDA HERNÁNDEZ**, visita de seguimiento social - técnico de interventoría y social del contratista, la beneficiaria está conforme con el avance de obra en cocina, baño y habitaciones.
12/02/2021 - **MV_21283:TERESA DE JESÚS OSORIO ORTÍZ**, seguimiento, se observa personal en la obra, se evidencian avances. Beneficiaria informa que a discreción de ella se realizó la modificación al mesón en cocina 1 y que ella arreglara la ventana para su adecuado uso. Se muestra conforme con el avance de la obra.
DESARROLLO: NUEVO SAN LUIS
08/02/2021 - **MVUS_0795: AIDA MARÍA RUEDA NIETO,** visita de seguimiento social - técnico de interventoría, se evidencia que no han iniciado labores, teniendo en cuenta que el contratista se comprometió con la beneficiaria a ingresar trabajadores el día jueves 4 de febrero.
09/02/2021 - **MVUS_0795 - AIDA MARÍA RUEDA NIETO,** visita de secretaria se hace seguimiento social y de secretaría de hábitat, se observa personal en la obra y avances en pañete y alistado de pisos, contratista expresa que labores en cubierta se empezaran apenas se tenga materiales disponibles, beneficiaria se muestra conforme con el avance de obra.
09/02/2021 - **MVJA_0905 - LUIS EDUARDO GUATIBONZA**, visita de secretaria, se realiza seguimiento social con acompañamiento de Secretaría del Hábitat con el fin de definir la situación del subsidio para el predio, en previa visita el beneficiario expresó interés por continuar en el proyecto pero no se encuentra en predio. Vecinos informan que solo se encuentra los domingos y han escuchado que el ya no desea recibir, pero no se tiene confirmación directa.
12/02/2021 - **MVUS_0795: AIDA MARÍA RUEDA NIETO,** visita de seguimiento social - técnico de interventoría y social del contratista, la beneficiaria solicita que el tubo de agua lluvia baje a la caja, por lo tanto propone encargarse de la excavación y el contratista se encargaría de la instalación hacia la caja. Se informa al director de obra, quien pasará a resolver la duda al respecto.
DESARROLLO: EL BRILLANTE
08/02/2021 - **MV_22728: ECCEHOMO RIVERA RONCANCIO,** visita de seguimiento área social - técnica de interventoría, el beneficiario informa que el día de hoy no se presentaron los trabajadores, manifiesta preocupación por la calidad del material, por la demora en las obras, debido a falta de material, además de la rotación del personal que trabaja en otra vivienda, se le recuerda que el contratista tiene un tiempo para entregar la obra a conformidad, pero se tienen en cuenta sus observaciones.
12/02/20201 - **MV_22203: YENY ZURLEY LÓPEZ ULLOA,** visita de seguimiento social - técnico de interventoría y social del contratista, la beneficiaria expresa inconformidad por instalación de platero debido a los acabados, se recuerda que en la apertura de la vivienda, en la que se socializan presupuesto, actividades de obra, protocolo de bioseguridad y recomendaciones sociales se le sugirió demoler el mesón para poner uno nuevo con su respectivo platero pero la señora manifestó que quería dejar el mismo. Se validará instalación de enchape en zona de lavadero y suministro de luminarias. Igualmente beneficiaria manifiesta inconformidad por daño en puerta (ocasionado por un trabajador) situación que será solucionada por el contratista.
12/02/2021 - **MV_22728: ECCEHOMO RIVERA RONCANCIO,** visita de seguimiento social - técnico de interventoría y social del contratista, beneficiario expresa inconformidad debido a que no se avanza en obra de mesón y cocina lo que hace que no pueda usar el espacio; se reitera que no debe pedirle a los trabajadores explicaciones acerca de materiales o de la ejecución, porque ellos no le van a responder con certeza. Se toman nuevamente dimensiones en sala y habitaciones, evidenciando que desde la validación se contempló piso en estos espacios, lo cual se le aclara al beneficiario, quien estaba preocupado por la no intervención de una habitación.
DESARROLLO: VILLA ALEMANA II SECTOR
12/02/2021 - **MVUS_ 0707: LUZ MERY YARA MATOMA,** seguimiento, se evidencia personal dentro de la obra, se observan avances, ya se inició ejecución en el baño ya que la beneficiaria hizo el cambio en la puerta de baño. Beneficiaria tiene un obrero externo realizando las obras de plomería para que maestros puedan continuar con el enchapado en el área de lavandería. Se le deja la recomendación a la beneficiaria en la bitácora sobre las obras simultáneas con contratistas externos.
12/02/2021 - **MVUS_0682: JOSÉ DEL CARMEN SÁNCHEZ PÁEZ,** seguimiento, no se evidencia personal dentro de la obra desde el martes 9 de Febrero, beneficiario expresa que maestros no tienen material para continuar y que en varias ocasiones materiales que llegan a la obra son distribuidos en otras casas. La parte técnica nota que varias tabletas están mal instaladas. Beneficiario también expresa inconformidad frente al nivel del alistado ya que contratista le dijo que para el área de habitaciones el nivel iba a cambiar drásticamente, se le indico que a menos que dicha anotación este en la bitácora el alistado del piso es a nivel en toda la ejecución. Se dejan anotaciones correspondientes en bitácora.
DESARROLLO: VILLA ISRAEL
11/02/2021 - **MVUS_0036: EMPERATRIZ RODRÍGUEZ LÓPEZ,** visita de seguimiento social - técnico de interventoría y social del contratista, la beneficiaria pregunta si se van a enchapar los muros del patio, por lo que el área técnica aclara que se enchapará la zona del salpicadero. No manifiesta inquietudes.
13/02/2021 - **MVUS_0036: EMPERATRIZ RODRÍGUEZ LÓPEZ,** seguimiento, se realiza seguimiento técnico y social por parte de interventoría y contratista, se evidencia avances pero faltan detalles y la instalación de puerta de baño, bajo concepto técnico no se realizará la entrega programada hasta que se tenga la totalidad de los acabados.

DESARROLLO: EL ESPINO
11/02/2021 - **MVUS_0230: JORGE GABRIEL BUITRAGO INFANTE,** visita de seguimiento social - técnico de interventoría y social del contratista, el beneficiario no manifiesta novedades, está conforme con el personal de obra y el avance en la ejecución.
13/02/2021 - **MVUS_0230: JORGE GABRIEL BUITRAGO INFANTE,** seguimiento se realiza seguimiento técnico y social por parte de interventoría y contratista, se evidencia avances pero falta una parte de cielo y la instalación de puerta de baño, beneficiario también expresa no querer el lavadero y la pintura en el área de la cocina donde finaliza el enchapado. Área técnica queda de acuerdo con esto, y se deja constancia en bitácora.
DESARROLLO: VILLA ANITA SUR
11/02/2021 - **MV_21059: ALEXANDER BERNAL AVENDAÑO,** visita de seguimiento social - técnico de interventoría y social del contratista, la beneficiaria manifiesta preocupación por el tiempo que se demorará la obra, debido a que está pagando arriendo, se aclara que el contratista está dentro el tiempo estimado para ejecutar las actividades, pero que se tendrá en cuenta su observación. Se evidencia avance en pañete en muros a nivel general, alistado de piso en habitación 1 y 2, equivalente al 35 %.
13/02/2021 - **MV_21059: ALEXANDER BERNAL AVENDAÑO,** ejecucion#2, seguimiento, se realiza seguimiento técnico y social por parte de interventoría, se evidencia avances pero esposa de beneficiario indica que maestros expresan falta de material, indica también que el día de ayer la secretaria del hábitat estuvo realizando visita y esta consciente de la situación de falta de materiales.
13/02/2021 - **MV_21059: ALEXANDER BERNAL AVENDAÑO,** visita de seguimiento componente social de SDHT, contratista e interventoría, evidenciando conformidad del núcleo familiar.
DESARROLLO: EL VIRREY
11/02/2021 - **MV_20306: JUAN FRANCISCO MEDINA SALAZAR,** entrega, en la cual se socializa presupuesto final, manual de uso y mantenimiento y entrega de kit ecológico
4. CASOS ESPECIALES COMPONENTE SOCIAL - CONFLICTOS Y ANÓMALIAS
08/02/2021 - **MV_04993: ROSALBINA ZABALA MENDOZA,** seguimiento de citación, se realiza visita de citación, no se encuentra beneficiaria dentro de la vivienda. Vecinos expresan que la beneficiaria sale del hogar en las mañanas (7am) y no se tiene claridad de hora de llegada, una vecina informa también que beneficiaria ya tiene el número de contacto pero ella no se ha comunicado con el contratista. Se realiza acta con información dada por la vecina.
08/02/2021 - **MVCB_5209: MARCELINDA MURCIA,** seguimiento de citación, se realiza visita de citación, no se encuentra beneficiaria dentro de la vivienda. Vecinos expresan que la beneficiaria sale del hogar en las mañanas (8am) y no se tiene claridad de hora de llegada. Se realiza acta con información dada por una vecina.
09/02/2021 - **MVJA_0905: LUIS EDUARDO GUATIBONZA,** visita de SDHT, se realiza seguimiento social con acompañamiento de la profesional social María Isabel Serrano, con el fin de definir la situación del subsidio para el predio, en previa visita el beneficiario expresó interés por continuar en el proyecto pero no se encuentra en predio. Vecinos informan que solo se encentra los domingos y han escuchado que el ya no desea recibir, pero no se tiene confirmación directa.
5. PLAN DE ACCIÓN RESULTADO DEL ANÁLISIS DE CAUSAS REGISTRADO EN EL NUMERAL ANTERIOR - CON EL OBJETIVO DE ELIMINAR LA CAUSA RAÍZ DE LA SITUACIÓN PROBLEMÁTICA - PLAN DE MEJORA

ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA PROGRAMADA
Programar citaciones de los casos especiales a quienes se les ha notificado por correo certificado.	CONSORCIO MEJORAMIENTO EP2020	Próxima semana

6. Actas de reunión con la comunidad y listados de asistencia o soporte de las diferentes acciones según corresponda (cuando aplique).
7. COMENTARIOS DEL INTERVENTOR: Por favor realice la descripción general del estado del contrato y según aplique informe sobre: actividades realizadas en la semana, control de lluvias, compra y suministro de materiales, mano de obra, subcontratos y tramites ante las diferentes empresas prestadoras de servicios, entre otros. Anexe las actas de seguimiento realizadas en la semana correspondiente al periodo del informe.
08/02/2021 - **MVCB_1914 : BLANCA ODILIA PATIÑO,** se realizo acta de seguimiento de obra resolviendo inquietudes de obra.
08/02/2021 - **MV_04993: ROSALBINA ZABALA MENDOZA,** seguimiento de citación, se realiza visita de citación, no se encuentra beneficiaria dentro de la vivienda. Vecinos expresan que la beneficiaria sale del hogar en las mañanas (7am) y no se tiene claridad de hora de llegada, una vecina informa también que beneficiaria ya tiene el número de contacto pero ella no se ha comunicado con el contratista. Se realiza acta con información dada por la vecina.
08/02/2021 - **MVCB_5209: MARCELINDA MURCIA,** seguimiento de citación, se realiza visita de citación, no se encuentra beneficiaria dentro de la vivienda. Vecinos expresan que la beneficiaria sale del hogar en las mañanas (8am) y no se tiene claridad de hora de llegada. Se realiza acta con información dada por una vecina.
09/02/2021 - **MVJA_0905: LUIS EDUARDO GUATIBONZA,** visita de SDHT, se realiza seguimiento social con acompañamiento de la profesional social María Isabel Serrano, con el fin de definir la situación del subsidio para el predio, en previa visita el beneficiario expresó interés por continuar en el proyecto pero no se encuentra en predio. Vecinos informan que solo se encentra los domingos y han escuchado que el ya no desea recibir, pero no se tiene confirmación directa.
8. REGISTRO FOTOGRÁFICO DEL AVANCE DURANTE LA SEMANA

INPLAYCO S.A.S.
INGENIEROS CONSTRUCTORES E INTERVENTORES

REGISTRO FOTOGRÁFICO

INPLAYCO S.A.S.
INGENIEROS CONSTRUCTORES E INTERVENTORES

REGISTRO FOTOGRÁFICO

GRUPO 1



08/02/2021 - MVJA_1194, MOISÉS RODRÍGUEZ BETANCOURT, apertura.



09/02/2021 - MVJA_3105 BLANCA NELLY HERNÁNDEZ. Apertura.



08/02/2021 - MVCB_5209 - MARCELINDA MURCIA, seguimiento de citación, se realiza visita de citación, no se encuentra beneficiaria dentro de la vivienda. Vecinos expresan que la beneficiaria sale del hogar en las mañanas (6am) y no se tiene claridad de hora de llegada. Se realiza acta con información dada por una vecina.



06/02/2021 - MV_04993 - ROSALBINA ZABALA MENDOZA, seguimiento de citación, se realiza visita de citación, no se encuentra beneficiaria dentro de la vivienda. Vecinos expresan que la beneficiaria sale del hogar en las mañanas (7am) y no se tiene claridad de hora de llegada, una vecina informa también que beneficiaria ya tiene el número de contacto pero ella no se ha comunicado con el contratista. Se realiza acta con información dada por la vecina.



08/02/2021 - MVJA_2315 - ANIBAL INFANTE NAVARRETE, seguimiento de citación, se realiza visita de citación, en el predio se encuentran presentes dos de los hijos del señor fallecido, expresan que ellos están a la espera de aprobación de subsidio para la vivienda de ellos entonces no ven conveniente el hacerse cargo y aceptar el subsidio para la vivienda del señor Anibal, deciden optar por la renuncia en dicha vivienda, se generan acta de visita y acta de renuncia.



09/02/2021 - MVJA_0395: JOSE ORVEY ORTIZ , apetura de vivienda



10/02/2021 - MVJA_1018: MARÍA LEONOR APONTE VIUDA DE LÓPEZ, apertura de vivienda.



09/02/2021 - MVJA_0235 : MARIELA OSORIO TRUJILLO , apetura de vivienda

INPLAYCO S.A.S.
INGENIEROS CONSTRUCTORES E INTERVENTORES

ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARIA DE HÁBITAT

INFORME SISO SEMANAL 15

INPLAYCO S.A.S.	INFORME HSE	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DEL HÁBITAT

INFORME INTERVENTORÍA SISO

FECHA DEL INFORME		OBJETO DEL CONTRATO	INFORME
DESDE	8/2/2021	" Ejecución de las obras de mejoramiento de vivienda en la modalidad de habitabilidad en los territorios priorizados por la Secretaría Distrital del Hábitat."	15
HASTA	14/2/2021		

1. Descripción de las Actividades Realizadas durante la semana

Contratista: Acompañamiento a las actividades de Seguimiento y apertura a las mejoras en las vivienda por parte del equipo técnico, divulgación del protocolo de seguridad y bioseguridad para ingreso a las viviendas; Se hace seguimiento a las actividades que vienen desarrollando en las viviendas asignadas a los diferentes grupos de trabajo en compañía de interventoría. Se verificó uso correcto de herramientas, autocuidado, trabajo seguro durante las visitas. Se realiza jornada de aseo y recogida de escombro en las viviendas. Se acompañó en aperturas y validaciones en los diferentes sectores de intervención.

Charla de "CONCIENCIA AMBIENTAL" Dirigida al personal operativo, con recomendaciones aplicables en el trabajo.

Interventoría: Continuando con el acompañamiento y verificación del cumplimiento del protocolo de Bioseguridad entregado por parte del contratista, proceso que se cumple durante los recorridos realizados. Se realizan actividades administrativas referente a informe semanal y revisión de documentos del personal contratado y del personal que se ha retirado.

Recorrido por diferentes sectores en compañía de profesional SISO del contratista, tomando temperatura, reforzando tema de autocuidado y prevención, se revisa el contenido del kit de bioseguridad, se hace enfasis a los beneficiarios sobre el uso del tapabocas y evitar al máximo el contacto con los maestros de obra, en especial si se cuenta con enfermedades catalogadas de alto riesgo. Se hace énfasis en la periodicidad de recolección de Escombros y la ejecución de procedimientos de trabajo seguro durante las actividades. Se solicita refuerzo con charla para uso de Tapaboca al personal que labora en el MV 3157.

CAPACITACION

Charla "CONCIENCIA AMBIENTAL" Se recalca sobre la aplicación del protocolo de bioseguridad.	si	100%
	La charla se hace durante las visitas de seguimiento, se refuerza el tema de bioseguridad y se verifica su aplicación	

2. Gestión Ambiental

Seguimiento a la recolección de escombros de las viviendas intervenidas y a la disposición final de escombros en lugar autorizado por la autoridad ambiental.

2.1. Generación y Disposición de Residuos Sólidos

Tipo de Residuo	Cantidad m3	Acumulado	Sitio de Disposición	Observaciones
Escombro	24	200	Cemex	Se recibe copia de la disposición

3. Gestión en Salud Ocupacional (Seguridad e Higiene Industrial)

Se sigue verificando la aplicación del protocolo de Bioseguridad, dando recomendaciones a los trabajadores como parte de las medidas de prevención de accidentes.

Se realiza visita de seguimiento en el MV 3157 IRIA ESTER SILVA. ya que la beneficiaria se encontraba incorfome porque los trabajadores no hacian uso debido del tapabocas , se le realizo charla de bioseguridad recordandoles uso obligatorio de este mismo, y a la beneficiaria se le recuerda el distanciamiento social.

Se verifican afiliaciones de personal que ingresa y las planillas recibidas, asi mismo se solicitaron los respectivos paz y salvo del persona retirado del cual se hara una recopilación para informe final.

3.1. Indices

Valor	Horas Hombre Trabajadas Contratista	Horas Hombre Capacitación	Horas Hombre Trabajadas Interventoria	Dias Ausentismo por Enfermedad General	Ausentismo por Accidentes de Trabajo
Total Semanales	**2208**	5	**576**	**0**	**0**
Total Acumulado	**41056**	269	**6392**	**10**	**0**

3.1.1.Incidendentalidad

	Fatalidades	Casos Con Daños A propiedad	Incidente Ambiental	Incidente Vehicular	Casi Accidentes	Casos Con dias Perdidos	Casos con Trabajo restringido	Casos Con Dias de Incapacidad (tratamiento medico)
Total	**0**	**0**	**0**	**0**	**1**	**0**	**0**	**0**

3.2. Capacitaciones y Charlas

10/2/2021	Se realizó Charla de "CONCIENCIA AMBIENTAL" Dirigida al personal operativo, con recomendaciones aplicables en el trabajo. Se reafirma el protocolo de Bioseguridad en las viviendas aperturadas

3.3. Condiciones y Acciones Subsanar

3.3.1 Condición Substandar


No	Descripción	Acción Tomada	La Condición Continua?
1	En Mv 1908 se evidenció falta alcohol en el kit de bioseguridad	Se informa a SST del contratista para tomar las acciones correspondientes	Situación corregia inmediatamente
2	En MV 3157 se solicita reforzar charla para incentivar el uso de tapaboca	Se informa a SST del contratista para tomar las acciones correspondientes	Se realiza charla al personal involucrado
3	Se solicita recolección de escombros acopiado en el exterior de vivienda: MV 0638	Se informa a SST del contratista para tomar las acciones correspondientes	Se realiza recolección

4. Registro Fotográfico


Toma de temperatura a beneficiarios



MV 0682

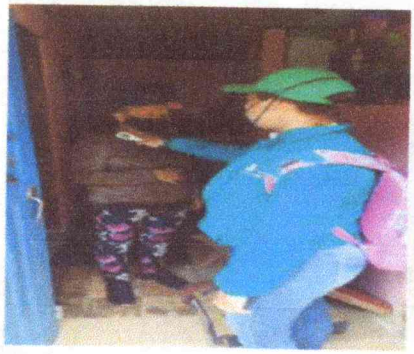

MV 0707

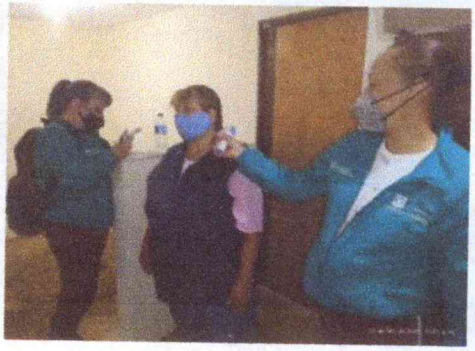


MV 1586


Toma de temperatura a Personal y charla de Seguridad



MV 1586

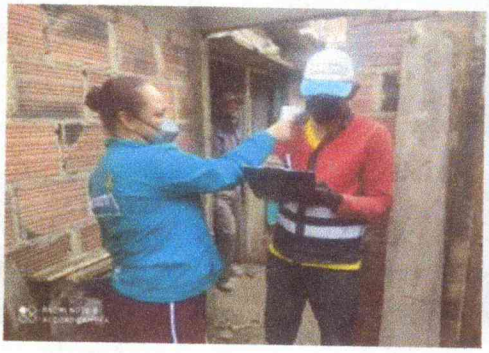

MV 4917



MV 0795

Protocolo ingreso a viviendas - kit bioseguridad



MV 0682



MV 0707



MV 1907

INPLAYCO S.A.S.
INGENIEROS CONSTRUCTORES E INTERVENTORES

INFORME SISO
INPLAYCO SAS
Fecha: 8 al 14 de Febrero de 2021

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DEL HÁBITAT

META DE CUMPLIMIENTO AL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO, MEDIO AMBIENTE Y CALIDAD: 100%

ACTIVIDADES						GESTIÓN AMBIENTAL			No. HORAS HOMBRE CAPACITACIONES					Reportes de incidentes en el componente social y técnico.								
PROYECTO / DEPARTAMENTO	CONTRATO	CONTRATISTA	OBJETO CONTRATO	NUMERO DE TRABAJADORES	HORAS HOMBRE TRABAJADAS	ESCOMBROS (Cantidad m3)	RESIDUOS PELIGROSOS (Kg)	CONSUMO DE AGUA (m3), para las actividades de mejoramiento de vivienda	PROFESIONALES	TECNICOS	OPERATIVOS (Subcontratistas, maestros y auxiliares)	PROVEEDOR	TOTAL	LUGAR O ÁREA DE TRABAJO	FECHA DEL ACCIDENTE	No. DÍAS INCAPACIDAD	No. ACCIDENTE REGISTRABLE	FECHA DE INVESTIGACIÓN	DESCRIPCION DEL ACCIDENTE	RELACION DE EQUIPO DE INVESTIGACIÓN	LECCIÓN APRENDIDA	PLAN DE ACCIÓN Y FECHA
				46	2208	24 0	0.0		0.00	0.00	20.00	0.00	20			0	0					
									0	0	0	0	0			0	0					
									0	0	0	0	0			0	0					
									0	0	0	0	0			0	0					
									0	0	0	0	0			0	0					
									0	0	0	0	0			0	0					
CONTRATO 694 - 2020			Contratar la ejecución de las obras de mejoramiento de vivienda en la modalidad de habitabilidad de los proyectos estructurados en los territorios priorizados por la Secretaria Distrital de Hábitat. Grupo I																			
CONTRATISTA: CONSORCIO MEJORAMIENTO EP 2020																						
				46	2208	24	0	0.0	0.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0	0	0	0		0			


ELABORO: ROBERT ROJAS TORRES -PROFESIONAL SISO

INDICADORES SST- CONTRATO No. 694 2020	
HORAS HOMBRE SEMANAL	2,784
HORAS HOMBRE ACUMULADAS MES	5,520
HORAS HOMBRE ACUMULADAS TOTAL	47,448
No. INCIDENTES REGISTRABLES	0
No. DÍAS DE INCAPACIDAD	0
No. DÍAS DE INCAPACIDAD ACUMULADOS MES	0
HORAS CAPACITACIONES SEMANAL	5.00
HORAS CAPACITACIONES ACUMULADO MENSUAL	15.00
HORAS CAPACITACIONES ACOMULADO TOTAL	269.00

GESTIÓN AMBIENTAL		
ESCOMBROS (Cantidad m3) Semanal	24	Escombrera Cemex
ESCOMBROS (Cantidad acumuladas mes)	64	
ESCOMBROS (Cantidad acumuladas mes)	200	
RESIDUOS PELIGROSOS (Cantidad Kg semanal)	0	
RESIDUOS PELIGROSOS (Cantidad acumuladas mes)	0	
CONSUMO DE AGUA (m3) Semanal	0	Uso de agua de cada vivienda, incluyendo agua lluvia, no se ha adquirido agua adicional
CONSUMO DE AGUA (m3), Mensual	0	

INFORME SISO
INPLAYCO SAS
Fecha: 8 al 14 de Febrero de 2021

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DEL HÁBITAT

RELACIÓN DE: CHARLAS DIARIAS CAPACITACIONES SIMULACROS LECCIONES APRENDIAS (Fechas)	OBSERVACION POR PARTE DE INTERVENTORÍA	REGISTRO FOTOGRÁFICO		
Se realizó charla en los diferentes puestos de trabajo CONCIENCIA AMBIENTAL	Por la distancia entre los diferentes áreas de trabajo, se realiza la charla en cada una de las viviendas visitadas, diligenciando el respectivo registro			
		MV 1867	MV 0795	MV 1586

INPLAYCO S.A.S.

INFORME SISO

Fecha: 8 al 14 de Febrero de 2021

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

CONTRATO: 694-2020
CONTRATISTA: CONSORCIO MEJORAMIENTO EP 2020

RELACIÓN DE TRABAJADORES ADMINISTRATIVOS Y OPERATIVOS AFILIADOS A SEGURIDAD SOCIAL

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	C.C.	Fecha de afiliación	Personal afiliado Administrativos	Personal afiliado (operativo: maestros y auxiliares)	EPS	PENSION	ARL	ESTADO ACTUAL		OBSERVACIONES
									ACTIVO	RETIRADO	
1	CARLOS JOSE HERNADEZ JIMENEZ	78,717,000	17/11/2020	1		NUEVA EPS	PORVENIR	POSITIVA	SI		
2	DIANA CAROLINA NAVARRO JIMENEZ	52,233,027	20/11/2020	1		COMPENSAR	PORVENIR	POSITIVA	SI		
3	LEDA LUZ LAMBIS CASTRO	22,732,637	19/11/2020	1		SURA	PORVENIR	POSITIVA	SI		
4	LUIS FERNANDO CARRILLO JIMENEZ	72,097,065	19/11/2020	1		CAJACOPI	COLFONDOS	POSITIVA	SI		
5	RICARDO JAIMES RUIZ	19,144,052	19/11/2020	1		NUEVA EPS	NO APLICA	POSITIVA	SI		
6	SHIRLEY AMELI VITOLA SERRANO	64,583,890	19/11/2020	1		COMPENSAR	PORVENIR	POSITIVA	SI		
7	YESENIA VIVIANA GAMEZ SALAS	1,120,745,285	19/11/2020	1		NUEVA EPS	COLFONDOS	POSITIVA	SI		
8	MARCO AUGUSTO HAMON RODRIGUEZ	1,070,955,988	19/11/2020	1		FAMISANAR	PORVENIR	POSITIVA	SI		
9	LINA MARCELA COLORADO CASTRO	1,019,022,812	19/11/2020	1		SALUD TOTAL	PORVENIR	POSITIVA	SI		
10	DANIELA CASTAÑO CASTAÑO	1,032,447,818	19/11/2020	1		FAMISANAR	PROTECCION	POSITIVA	SI		
11	LIBYS PADILLA URUETA	1,073,822,532	2/10/2020	1		SALUD TOTAL	PORVENIR	POSITIVA		SI	RETIRADO
12	JUAN ADRES CORREDOR MAYORGA	1,022,401,358	19/11/2020	1		FAMISANAR	PORVENIR	POSITIVA		SI	RETIRADO
13	GERSON ASPRILLA LOPEZ	11,797,192	19/11/2020	1		SANITAS	COLPENSIONES	POSITIVA	SI		
14	WILFRED BENAVIDEZ SANCHEZ	79,851,515	19/11/2020	1		ALIANSA SALUD	PORVENIR	POSITIVA		SI	RETIRADO
15	JUAN SEBASTIAN GONZALEZ	1,022,402,058	19/11/2020	1		SANITAS	PORVENIR	POSITIVA	SI		
16	GREGORY FERNEY MOSQUERA	1,105,305,250	29/11/2020	1		SALUD TOTAL	PROTECCION	POSITIVA	SI		
17	CARLOS COLORADO BANDO	13,107,585	24/11/2020		1	SALUD TOTAL	PORVENIR	SURA		SI	RETIRADO
18	OSCAR ARMANDO CALVACHE PAZ	12,977,717	24/11/2020		1	SALUD TOTAL	PORVENIR	SURA		SI	RETIRADO
19	CARLOS ALBERTO CAICEDO HINOJOSA	1,111,817,731	24/11/2020		1	SALUD TOTAL	PORVENIR	SURA		SI	RETIRADO
20	YARLI COLORADO PAZ	1,085,549,452	24/11/2020		1	CAPITAL SALUD	PORVENIR	SURA		SI	RETIRADO
21	ANDAIR MONTIEL VAQUIRO	1,007,535,425	25/11/2020		1	SALUD TOTAL	COLPENSIONES	SURA		SI	RETIRADO
22	EDGAR MARTINEZ CRUZ	79,296,107	25/11/2020		1	SALUD TOTAL	PROTECCION	SURA		SI	RETIRADO
23	EDWIN HARVEY DE LA CRUZ TORO	10,307,972	25/11/2020		1	SALUD TOTAL	COLPENSIONES	SURA		SI	RETIRADO
24	FERNANDO VIDAL ORTIZ	5,887,718	25/11/2020		1	FAMISANAR	COLPENSIONES	SURA		SI	RETIRADO
25	IDELFONSO CIFUENTES	19,232,722	25/11/2020		1	SURA	PORVENIR	SURA		SI	RETIRADO
26	MARLON HUMBERTO MARTINEZ VAZQUEZ	1,031,152,755	25/11/2020		1	FAMISANAR	PORVENIR	SURA		SI	RETIRADO
27	WILMER ANDRES ROJAS SOLANO	1,118,534,846	25/11/2020		1	SALUD TOTAL	PORVENIR	SURA		SI	RETIRADO
28	VICTOR RUIZ GARCIA	1,002,597,213	25/11/2020		1	CAPITAL SALUD	PORVENIR	SURA		SI	RETIRADO
29	ILDELFONSO RAMIREZ ESQUIVEL	96,361,399	1/12/2020		1	FAMISANAR	COLPENSIONES	SURA		SI	RETIRADO
30	JUAN PABLO CORREA MURCIA	1,116,920,538	1/12/2020		1	SALUD TOTAL	PORVENIR	SURA		SI	RETIRADO
31	KEVIN FABIAN HOYOS YEPEZ	1,083,043,276	1/12/2020		1	SALUD TOTAL	PROTECCION	SURA		SI	RETIRADO
32	LAMBERTO GABRIEL DORIA SANCHEZ	72,147,586	1/12/2020		1	SALUD TOTAL	PROTECCION	SURA		SI	RETIRADO
33	ARLEY GIOVANNI CAICEDO RAMIREZ	1,117,511,256	3/12/2020		1	SALUD TOTAL	PORVENIR	SURA		SI	RETIRADO
34	ALBERT JOSE LEON GOMEZ	828,089,416,111,997	3/12/2020		1	SALUD TOTAL	COLFONDOS	SURA		SI	RETIRADO

RELACIÓN DE TRABAJADORES ADMINISTRATIVOS Y OPERATIVOS AFILIADOS A SEGURIDAD SOCIAL											
No.	NOMBRES Y APELLIDOS	C.C.	Fecha de afiliación	Personal afiliado Administrativos	Personal afiliado (operativo: maestros y auxiliares)	EPS	PENSION	ARL	ESTADO ACTUAL		OBSERVACIONES
									ACTIVO	RETIRADO	
35	NUBIA VERGARA ALDANA	53,092,609	3/12/2020		1	SALUD TOTAL	PROTECCION	SURA	SI		Afiliado el 3 de diciembre , ingresa por cambio de frente de trabajo en Febrero 3 de 2021 al G1
36	ALEXANDER VERGARA ALDANA	80,332,087	3/12/2020		1	FAMISANAR	PROTECCION	SURA	SI		Afiliado el 3 de diciembre , ingresa por cambio de frente de trabajo en Febrero 3 de 2021 al G1
37	ANTONIO PAZ SEGUNDO	16,537,810	3/12/2020		1	SALUD TOTAL	PROTECCION	SURA	SI		Afiliado el 3 de diciembre , ingresa por cambio de frente de trabajo en Febrero 3 de 2021 al G1
38	JHON WILLIAM BALLESTEROS MARTINEZ	1,033,761,449	8/12/2020		1	COMPENSAR	PORVENIR	SURA		SI	RETIRADO
39	CARLOS ENRIQUE REDONDO	80,373,803	13/12/2020		1	SALUD TOTAL	COLPENSIONES	SURA	SI		
40	JULIO FERNEY BENAVIDES MENDEZ	80,256,134	13/12/2020		1	SALUD TOTAL	COLFONDOS	SURA		SI	RETIRADO
41	FREDY EDINSON FORERO NIÑO	1,024,489,116	15/12/2020		1	SALUD TOTAL	PORVENIR	SURA		SI	RETIRADO
42	JUAN AGUSTIN LIZARAZO	4,103,403	15/12/2020		1	SANITAS	65 AÑOS LIQUIDADO	SURA		SI	RETIRADO
43	JOSE IGNACIO CANO NOVOA	7,330,323	15/12/2020		1	CAPITAL SALUD	64 AÑOS LIQUIDADO	SURA		SI	RETIRADO
44	BRAYAN ESTIVEN LOPEZ MOLINA	1,024,602,801	17/11/2020		1	FAMISANAR	PROTECCION	POSITIVA		SI	RETIRADO
45	EDWIN JIMMY ESPINEL CHACON	80,064,358	17/11/2020		1	NUEVA EPS	COLPENSIONES	POSITIVA		SI	RETIRADO
46	EVANGELISTA BRINEZ BURGOS	6,030,390	17/11/2020		1	SALUD TOTAL	COLPENSIONES	POSITIVA		SI	RETIRADO
47	FABIO NELSON LOPEZ DIAZ	80,124,048	17/11/2020		1	SALUD TOTAL	PROTECCION	POSITIVA		SI	RETIRADO
48	RAFAEL CASTRO VILLA	8,815,936	17/11/2020		1	SALUD TOTAL	PORVENIR	POSITIVA		SI	RETIRADO
49	MICHEL LEONARDO SALAS CELIS	1,033,766,212	17/11/2020		1	FAMISANAR	PORVENIR	POSITIVA		SI	RETIRADO
50	VLADIMIR BRIÑEZ MAHECHA	1,033,682,982	17/11/2020		1	FAMISANAR	COLFONDOS	POSITIVA		SI	RETIRADO
51	CARLOS PAEZ PULIDO	1,049,630,871	17/11/2020		1	MEDIMAS	PROTECCION	POSITIVA		SI	RETIRADO
52	RAUL OSORIO RINCON	79,669,250	17/11/2020		1	SALUD TOTAL	PORVENIR	POSITIVA		SI	RETIRADO
53	HAYDER CAMILO GALVIZ	1,033,762,528	17/11/2020		1	FAMISANAR	PROTECCION	POSITIVA		SI	RETIRADO
54	CAMILO HERNANDEZ SANCHEZ	1,049,639,642	17/11/2020		1	FAMISANAR	COLFONDOS	POSITIVA		SI	RETIRADO
55	EMITZO JOSE FANDIÑO FLOREZ	85,469,924	18/11/2020		1	NUEVA EPS	PORVENIR	POSITIVA		SI	RETIRADO
56	JULIO CESAR NEIRA BENAVIDEZ	79,903,950	18/11/2020		1	COMPENSAR	PROTECCION	POSITIVA		SI	RETIRADO
57	LEYDY PATRICIA SUAREZ VELAZQUEZ	1,033,693,495	18/11/2020		1	CAPITAL SALUD	PROTECCION	POSITIVA		SI	RETIRADO
58	CARLOS ANDRES SUAREZ VELAZQUEZ	1,033,693,493	18/11/2020		1	FAMISANAR	PORVENIR	POSITIVA		SI	RETIRADO
59	LUIS FERNANDO CUPITRA DUCUARA	1,022,939,409	18/11/2020		1	SURA	COLFONDOS	POSITIVA		SI	RETIRADO
60	LUIS ALEJANDRO ZAMBRANO	79,770,115	18/11/2020		1	CAPITAL SALUD	COLPENSIONES	POSITIVA		SI	RETIRADO
61	OSBAR RENE BERNAL PAEZ	80,778,371	20/11/2020		1	SALUD TOTAL	PROTECCION	POSITIVA	SI		
62	MISAEL PERDOMO VILLAMIL	1,033,784,477	24/11/2020		1	NUEVA EPS	PORVENIR	POSITIVA	SI		
63	ALBEIRO GUERRERO MACANA	5,996,412	25/11/2020		1	NUEVA EPS	PORVENIR	POSITIVA	SI		
64	EDWIN RODRIGUEZ VIDAL	93,394,589	25/11/2020		1	MEDIMAS	PORVENIR	POSITIVA	SI		
65	JOSE ANTONIO SILVA ORTEGA	19,458,640	25/11/2020		1	COMFACUNDI	PORVENIR	POSITIVA		SI	RETIRADO
66	SAURITH REALES DELGADO	91,431,492	25/11/2020		1	NUEVA EPS	COLPENSIONES	POSITIVA		SI	RETIRADO
67	EDISON JOSE VENECIA SARABIA	72,120,789	25/11/2020		1	FAMISANAR	PORVENIR	POSITIVA		SI	RETIRADO
68	YOENDISON JOSE VENECIA MORENO	1,101,879,446	25/11/2020		1	COMPARTA	PORVENIR	POSITIVA		SI	RETIRADO
69	RUBEN PINEDA MAHECHA	1,031,151,104	25/11/2020		1	SALUD TOTAL	PORVENIR	POSITIVA	SI		
70	LUIS FRANCISCO GOMEZ SANCHEZ	80857562	25/11/2020		1	FAMISANAR	COLPENSIONES	POSITIVA		SI	RETIRADO
71	LUIS HERNANDEZ BARRETO	80,858,697	25/11/2020		1	SANITAS	PROTECCION	POSITIVA		SI	RETIRADO

RELACIÓN DE TRABAJADORES ADMINISTRATIVOS Y OPERATIVOS AFILIADOS A SEGURIDAD SOCIAL											
No.	NOMBRES Y APELLIDOS	C.C.	Fecha de afiliación	Personal afiliado Administrativos	Personal afiliado (operativo: maestros y auxiliares)	EPS	PENSION	ARL	ESTADO ACTUAL		OBSERVACIONES
									ACTIVO	RETIRADO	
72	JEISON ACERO	1,044,381,694	25/11/2020		1	MUTUAL SER	PORVENIR	POSITIVA		SI	RETIRADO
73	EDGAR VELANDIA	80,090,780	26/11/2020		1	ALIANSA SALUD	PORVENIR	POSITIVA		SI	RETIRADO
74	VICTOR MANUEL GUERRERO PACHECO	80,128,593	26/11/2020		1	CAPITAL SALUD	PORVENIR	POSITIVA		SI	RETIRADO
75	RAUL ALEXANDER SALAMANCA SALGADO	80,749,213	26/11/2020		1	CAPITAL SALUD	PORVENIR	POSITIVA		SI	RETIRADO
76	LEONARDO SOLANO CELY	1,024,511,017	26/11/2020		1	FAMISANAR	PORVENIR	POSITIVA		SI	RETIRADO
77	FERNANDO MORENO HUERTAS	3,199,429	26/11/2020		1	CAPITAL SALUD	PORVENIR	POSITIVA		SI	RETIRADO
78	JHON EDISON PALACIO MORENO	1,077,435,835	26/11/2020		1	SALUD TOTAL	PROTECCION	POSITIVA		SI	RETIRADO
79	LUZ ADRIANA SILVA MUÑOZ	53,094,514	26/11/2020		1	CAPITAL SALUD	PORVENIR	POSITIVA		SI	RETIRADO
80	JOSE GUILLERMO MARTINEZ VARGAS	79,666,136	27/11/2020		1	SALUD TOTAL	COLPENSIONES	POSITIVA	SI		
81	OMAR MARTINEZ ZULETA	4,946,584	27/11/2020		1	NUEVA EPS	COLPENSIONES	POSITIVA		SI	RETIRADO
82	QUEVIN FABIAN LESMES LINARES	1,000,003,268	27/11/2020		1	CAPITAL SALUD	PORVENIR	POSITIVA		SI	RETIRADO
83	CESAR JULIO BENAVIDEZ	1,193,036,484	27/11/2020		1	COOSALUD	PORVENIR	POSITIVA		SI	RETIRADO
84	ANDRES FERNANDO PEREZ DIAZ	1,063,625,214	1/12/2020		1	NUEVA EPS	PORVENIR	POSITIVA		SI	RETIRADO
85	ANGEL IVAN DIAZ	79,924,351	1/12/2020		1	FAMISANAR	PORVENIR	POSITIVA		SI	RETIRADO
86	CARLOS ALBERTO SUAREZ BARRERA	9,527,688	1/12/2020		1	CAPITAL SALUD	PORVENIR	POSITIVA		SI	RETIRADO
87	CIRO ARTURO NIÑO	4,255,303	1/12/2020		1	SALUD TOTAL	COLPENSIONES	POSITIVA		SI	RETIRADO
88	EDGAR HERNANDO NIÑO	4,225,078	1/12/2020		1	CAPITAL SALUD	PORVENIR	POSITIVA		SI	RETIRADO
89	EDWAR ARLEY RODRIGUEZ MAYORGA	1,033,754,705	1/12/2020		1	SALUD TOTAL	PORVENIR	POSITIVA		SI	RETIRADO
90	EMILIANO MUÑOZ PALACIO	80,265,681	1/12/2020		1	SALUD TOTAL	PORVENIR	POSITIVA		SI	RETIRADO
91	CAMILO ERNESTO RAMIREZ ROA	1,033,735,370	1/12/2020		1	COMPENSAR	PROTECCION	POSITIVA		SI	RETIRADO
92	CARLOS SEBASTIAN LOPEZ CASTELLANO	1,031,170,297	1/12/2020		1	FAMISANAR	PROTECCION	POSITIVA		SI	RETIRADO
93	IDELFONSO DE JESUS PEÑARANDA	1,118,873,986	1/12/2020		1	SALUD TOTAL	PORVENIR	POSITIVA		SI	RETIRADO
94	CARLOS ALBERTO PULIDO YATE	1,033,683,233	1/12/2020		1	FAMISANAR	PROTECCION	POSITIVA		SI	RETIRADO
95	CIPRIANO PIÑEROS	79,703,764	1/12/2020		1	FAMISANAR	COLFONDOS	POSITIVA		SI	RETIRADO
96	DAGOBERTO PAREJO AREVALO	8,668,649	1/12/2020		1	MUTUAL SER	PORVENIR	POSITIVA		SI	RETIRADO
97	DANIEL ARTURO NIÑO ROJAS	1,024,469,352	1/12/2020		1	SALUD TOTAL	COLPENSIONES	POSITIVA		SI	RETIRADO
98	EDER GONZALEZ GASTELBLONDO	84,062,070	1/12/2020		1	NUEVA EPS	PORVENIR	POSITIVA		SI	RETIRADO
99	JHON RIVER MAYORGA BENAVIDES	1,033,721,955	1/12/2020		1	CAPITAL SALUD	PORVENIR	POSITIVA		SI	RETIRADO
100	SAMIR ZIAD PINEDA YAHMURE	79,920,337	1/12/2020		1	COMPENSAR	PROTECCION	POSITIVA		SI	RETIRADO
101	SIMON LOPEZ PALACIOS	94,418,910	1/12/2020		1	SALUD TOTAL	COLPENSIONES	POSITIVA		SI	RETIRADO
102	WILSON FERNEY BERNAL GUASCA	1,033,707,175	1/12/2020		1	FAMISANAR	PORVENIR	POSITIVA		SI	RETIRADO
103	YOISEN HAIDIN CHIBUQUE CAICEDO	1,007,413,403	1/12/2020		1	MEDIMAS	PROTECCION	POSITIVA		SI	RETIRADO
104	LUIS HERNANDEZ GRANADA	19,219,713	1/12/2020		1	SANITAS	COLPENSIONES	POSITIVA	SI		
105	EDGAR HERNANDO NIÑO	4,225,078	1/12/2020		1	CAPITAL SALUD	PORVENIR	POSITIVA		SI	RETIRADO
106	JAVIER FRANCO RODRIGUEZ	731054127121978	1/12/2020		1	SALUD TOTAL	PROTECCION	POSITIVA		SI	RETIRADO
107	JOSE RODRIGUEZ GARCIA	1,031,176,991	1/12/2020		1	CAPITAL SALUD	PORVENIR	POSITIVA		SI	RETIRADO
108	LUIS MUÑOZ GRAJALES	80,774,495	1/12/2020		1	COOSALUD	PROTECCION	POSITIVA		SI	RETIRADO
109	GLORIA JIMENEZ	28,155,523	2/12/2020		1	NUEVA EPS	PROTECCION	POSITIVA	SI		
110	JESUS DAVID LOPEZ GALVIZ	13,860,790	2/12/2020		1	NUEVA EPS	COLPENSIONES	POSITIVA	SI		
111	LUIS CARLOS MENDOZA GAMEZ	17,971,346	4/12/2020		1	ALIANSA SALUD	PORVENIR	POSITIVA	SI		

RELACIÓN DE TRABAJADORES ADMINISTRATIVOS Y OPERATIVOS AFILIADOS A SEGURIDAD SOCIAL											
No.	NOMBRES Y APELLIDOS	C.C.	Fecha de afiliación	Personal afiliado Administrativos	Personal afiliado (operativo: maestros y auxiliares)	EPS	PENSION	ARL	ESTADO ACTUAL		OBSERVACIONES
									ACTIVO	RETIRADO	
112	KEVIN SEBASTIAN APARACIO	1,000,064,803	10/12/2020		1	FAMISANAR	PORVENIR	POSITIVA		SI	RETIRADO
113	HELI RAMIREZ PERALTA	79,734,766	12/12/2020		1	SALUD TOTAL	PROTECCION	POSITIVA		SI	RETIRADO
114	ANDRES GARCIA ROJAS	80,895,628	15/12/2020		1	SALUD TOTAL	PROTECCION	POSITIVA		SI	RETIRADO
115	JEISON LOPEZ MEJIA	1,033,816,388	15/12/2020		1	SALUD TOTAL	PORVENIR	POSITIVA		SI	RETIRADO
116	JULIAN ANDRES ARAGON DEVIA	1,030,628,205	15/12/2020		1	CONVIDA	PORVENIR	POSITIVA		SI	RETIRADO
117	ALDEMAR CHAUX	98,357,448	16/12/2020		1	SALUD TOTAL	COLFONDOS	SURA	SI		
118	LUIS ALBERTO CHAUX MUÑOZ	17,682,809	16/12/2020		1	SALUD TOTAL	PROTECCION	SURA	SI		
119	HERNA DARIO CHON MORA	1,024,482,739	22/12/2020		1	FAMISANAR	PROTECCION	SURA	SI		
120	RUBEN DARIO RODRIGUEZ ALMANZA	79,250,468	22/12/2020		1	FAMISANAR	PROTECCION	SURA	SI		
121	WILLIAM ZABALA ALVAREZ	916,866,813,041,981	10/1/2021		1	SALUD TOTAL	PROTECCION	POSITIVA	SI		
122	DANIEL ESTIVEN OSORIO HERNANDEZ	1,000,001,451	13/1/2021		1	NUEVA EPS	PORVENIR	POSITIVA	SI		
123	HARRY SAENZ SUA	1,010,220,994	13/1/2021		1	CAPITAL SALUD	PORVENIR	POSITIVA	SI		
124	JORGE FINO MORENO	1,057,462,261	13/1/2021		1	FAMISANAR	PROTECCION	POSITIVA	SI		
125	FABIAN ESCOBAR GOMEZ	1,024,482,810	18/1/2021		1	FAMISANAR	COLPENSIONES	POSITIVA	SI		
126	JHON PERILLA CHAPARRO	8,090,191	18/1/2021		1	SURA	PORVENIR	POSITIVA	SI		
127	JOSE DE JESUS GONZALEZ MOLANO	79,419,331	18/1/2021		1	SALUD TOTAL	PROTECCION	POSITIVA	SI		
128	SOCRATES PITER TORENEGRA	8,601,642	20/1/2021		1	CAPITAL SALUD	PORVENIR	POSITIVA	SI		
129	EDWIN MARIN OVIEDO	1,033,744,320	22/1/2021		1	NUEVA EPS	PORVENIR	POSITIVA	SI		
130	FREDY BARRERA SOL	807,710,070	22/1/2021		1	FAMISANAR	PROTECCION	POSITIVA	SI		
131	OSCAR HERRERA ESTEPA	1,116,690,533	22/1/2021		1	FAMISANAR	COLFONDOS	POSITIVA	SI		
132	JEFERSON ZUÑIGA BARBOSA	1,001,274,101	25/1/2021		1	SALUD TOTAL	PORVENIR	POSITIVA	SI		
133	JOSE OVIEDO MESTIZO	1,018,422,138	25/1/2021		1	NUEVA EPS	COLFONDOS	POSITIVA	SI		
134	LEANDRO GIL MATEUS	1,033,743,641	31/1/2021		1	ALIANSA SALUD	PORVENIR	POSITIVA	SI		
135	JONATAN SAINEA LOPEZ	1,032,365,909	1/2/2021		1	SALUD TOTAL	PROTECCION	POSITIVA	SI		
136											
137											
RESULTADOS:				16	119				46	89	

INFORME SISO

Fecha: 8 al 14 de Febrero de 2021

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DEL HÁBITAT

CONTRATO: 694-2020
CONTRATISTA: CONSORCIO MEJORAMIENTO EP 2020

RELACIÓN PERSONAL 7. Relación de actividades generales en donde se evidencie el cumplimiento de la implementación del Protocolo de Bioseguridad, así mismo, el interventor deberá informar sobre el cumplimiento o incumplimiento de este.

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	C.C.	FECHA DE INGRESO	FECHA DE EXAMEN MÉDICO DE INGRESO/ PERIODICO	PERSONAL		IMPLEMENTACIÓN PROTOCÓLO		ESTADO ACTUAL		OBSERVACIONES
					Administrativo	Operativo: maestros y auxiliares	SI	NO	ACTIVO	RETIRADO	
1	CARLOS JOSE HERNADEZ JIMENEZ	78,717,000	17/11/2020	20/11/2020	1		SI		SI		
2	DIANA CAROLINA NAVARRO JIMENEZ	52,233,027	20/11/2020	10/11/2020	1		SI		SI		
3	LEDA LUZ LAMBIS CASTRO	22,732,637	19/11/2020	10/11/2020	1		SI		SI		
4	LUIS FERNANDO CARRILLO JIMENEZ	72,097,065	19/11/2020	11/11/2020	1		SI		SI		
5	RICARDO JAIMES RUIZ	19,144,052	19/11/2020	10/11/2020	1		SI		SI		
6	SHIRLEY AMELI VITOLA SERRANO	64,583,890	19/11/2020	10/11/2020	1		SI		SI		
7	YESENIA VIVIANA GAMEZ SALAS	1,120,745,285	19/11/2020	12/11/2020	1		SI		SI		
8	MARCO AUGUSTO HAMON RODRIGUEZ	1,070,955,988	19/11/2020	10/11/2020	1		SI		SI		
9	LINA MARCELA COLORADO CASTRO	1,019,022,812	19/11/2020	10/11/2020	1		SI		SI		
10	DANIELA CASTAÑO CASTAÑO	1,032,447,818	19/11/2020	14/11/2020	1		SI		SI		
11	LIBYS PADILLA URUETA	1,073,822,532	2/10/2020	20/8/2020	1		SI			SI	
12	JUAN ADRES CORREDOR MAYORGA	1,022,401,358	19/11/2020	24/11/2020	1		SI			SI	
13	GERSON ASPRILLA LOPEZ	11,797,192	19/11/2020	11/11/2020	1		SI		SI		
14	WILFRED BENAVIDEZ SANCHEZ	79,851,515	19/11/2020	13/11/2020	1		SI			SI	
15	JUAN SEBASTIAN GONZALEZ	1,022,402,058	19/11/2020	11/11/2020	1		SI			SI	
16	GREGORY FERNEY MOSQUERA	1,105,305,250	29/11/2020	25/11/2020	1		SI		SI		
17	CARLOS COLORADO BANDO	13,107,585	24/11/2020	28/11/2020		1	SI			SI	
18	OSCAR ARMANDO CALVACHE PAZ	12,977,717	24/11/2020	28/11/2020		1	SI			SI	
19	CARLOS ALBERTO CAICEDO HINOJOSA	1,111,817,731	24/11/2020	28/11/2020		1	SI			SI	
20	YARLI COLORADO PAZ	1,085,549,452	24/11/2020	28/11/2020		1	SI			SI	
21	ANDAIR MONTIEL VAQUIRO	1,007,535,425	25/11/2020	28/11/2020		1	SI			SI	
22	EDGAR MARTINEZ CRUZ	79,296,107	25/11/2020	28/11/2020		1	SI			SI	
23	EDWIN HARVEY DE LA CRUZ TORO	10,307,972	25/11/2020	28/11/2020		1	SI			SI	
24	FERNANDO VIDAL ORTIZ	5,887,718	25/11/2020	28/11/2020		1	SI			SI	
25	IDELFONSO CIFUENTES	19,232,722	25/11/2020	28/11/2020		1	SI			SI	
26	MARLON HUMBERTO MARTINEZ VAZQUEZ	1,031,152,755	25/11/2020	28/11/2020		1	SI			SI	
27	WILMER ANDRES ROJAS SOLANO	1,118,534,846	25/11/2020			1	SI			SI	
28	VICTOR RUIZ GARCIA	1,002,597,213	25/11/2020	28/11/2020		1	SI			SI	
29	ILDELFONSO RAMIREZ ESQUIVEL	96,361,399	1/12/2020	5/12/2020		1	SI			SI	

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	C.C.	FECHA DE INGRESO	FECHA DE EXAMEN MÉDICO DE INGRESO/ PERIODICO	PERSONAL		IMPLEMENTACIÓN PROTOCÓLO		ESTADO ACTUAL		OBSERVACIONES
					Administrativo	Operativo: maestros y auxiliares	SI	NO	ACTIVO	RETIRADO	
105	EDGAR HERNANDO NIÑO	4,225,078	1/12/2020			1	SI			SI	
106	JAVIER FRANCO RODRIGUEZ	731,054,127,121,978	1/12/2020			1	SI			SI	PERMISO DE TRABAJO MINISTERIO
107	JOSE RODRIGUEZ GARCIA	1,031,176,991	1/12/2020	2/12/2020		1	SI			SI	
108	LUIS MUÑOZ GRAJALES	80,774,495	1/12/2020			1	SI			SI	
109	GLORIA JIMENEZ	28,155,523	2/12/2020			1	SI		SI		
110	JESUS DAVID LOPEZ GALVIZ	13,860,790	2/12/2020			1	SI		SI		
111	LUIS CARLOS MENDOZA GAMEZ	17,971,346	4/12/2020			1	SI		SI		
112	KEVINN SEBASTIAN APARACIO	1,000,064,803	10/12/2020			1	SI			SI	
113	HELI RAMIREZ PERALTA	79,734,766	12/12/2020			1	SI			SI	
114	ANDRES GARCIA ROJAS	80,895,628	15/12/2020			1	SI			SI	
115	JEISON LOPEZ MEJIA	1,033,816,388	15/12/2020			1	SI			SI	
116	JULIAN ANDRES ARAGON DEVIA	1,030,628,205	15/12/2020			1	SI			SI	
117	ALDEMAR CHAUX	96,357,448	16/12/2020			1	SI		SI		
118	LUIS ALBERTO CHAUX MUÑOZ	17,682,809	16/12/2020			1	SI		SI		
119	HERNA DARIO CHON MORA	1,024,482,739	22/12/2020			1	SI		SI		
120	RUBEN DARIO RODRIGUEZ ALMANZA	79,250,468	22/12/2020			1	SI		SI		
121	WILLIAN ZABALA ALVAREZ	916,866,813,041,981	10/1/2021	9/1/2021		1	SI		SI		PERMISO DE TRABAJO MINISTERIO
122	DANIEL ESTIVEN OSORIO HERNANDEZ	1,000,001,451	13/1/2021			1	SI		SI		
123	HARRY SAENZ SUA	1,010,220,994	13/1/2021			1	SI		SI		
124	JORGE FINO MORENO	1,057,462,261	13/1/2021			1	SI		SI		
125	FABIAN ESCOBAR GOMEZ	1,024,482,810	18/1/2021			1	SI		SI		
126	JHON PERILLA CHAPARRO	8,090,191	18/1/2021			1	SI		SI		
127	JOSE DE JESUS GONZALEZ MOLANO	79,419,331	18/1/2021			1	SI		SI		
128	SOCRATES PITER TORENEGRA	8,601,642	20/1/2021			1	SI		SI		
129	EDWIN MARIN OVIEDO	1,033,744,320	22/1/2021			1	SI		SI		
130	FREDY BARRERA SOL	807,710,070	22/1/2021			1	SI		SI		
131	OSCAR HERRERA ESTEPA	1,116,690,533	22/1/2021			1	SI		SI		
132	JEFERSON ZUÑIGA BARBOSA	1,001,274,101	25/1/2021			1	SI		SI		
133	JOSE OVIEDO MESTIZO	1,018,422,138	25/1/2021			1	SI		SI		
134	LEANDRO GIL MATEUS	1,033,743,641	31/1/2021			1	SI		SI		
135	JONATAN SAINEA LOPEZ	1,032,365,909	1/2/2021			1	SI		SI		
136											
137											
RESULTADOS:					16	119	135	0	46	89	

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	C.C.	FECHA DE INGRESO	FECHA DE EXAMEN MÉDICO DE INGRESO/ PERIODICO	PERSONAL		IMPLEMENTACIÓN PROTOCÓLO		ESTADO ACTUAL		OBSERVACIONES
					Administrativo	Operativo: maestros y auxiliares	SI	NO	ACTIVO	RETIRADO	
67	EDISON JOSE VENECIA SARABIA	72,120,789	25/11/2020	2/12/2020		1	SI			SI	
68	YOENDISON JOSE VENECIA MORENO	1,101,879,446	25/11/2020	2/12/2020		1	SI			SI	
69	RUBEN PINEDA MAHECHA	1,031,151,104	25/11/2020	2/12/2020		1	SI		SI		
70	LUIS FRANCISCO GOMEZ SANCHEZ	80,857,562	25/11/2020	2/12/2020		1	SI			SI	
71	LUIS HERNANDEZ BARRETO	80,856,697	25/11/2020	2/12/2020		1	SI			SI	
72	JEISON ACERO	1,044,391,694	25/11/2020	2/12/2020		1	SI			SI	
73	EDGAR VELANDIA	80,090,780	26/11/2020	2/12/2020		1	SI			SI	
74	VICTOR MANUEL GUERRERO PACHECO	80,126,593	26/11/2020	2/12/2020		1	SI			SI	
75	RAUL ALEXANDER SALAMANCA SALGADO	80,749,213	26/11/2020			1	SI			SI	
76	LEONARDO SOLANO CELY	1,024,511,017	26/11/2020	2/12/2020		1	SI			SI	
77	FERNANDO MORENO HUERTAS	3,199,429	26/11/2020			1	SI			SI	
78	JHON EDISON PALACIO MORENO	1,077,435,835	26/11/2020			1	SI			SI	
79	LUZ ADRIANA SILVA MUÑOZ	53,094,514	26/11/2020	2/12/2020		1	SI			SI	
80	JOSE GUILLERMO MARTINEZ VARGAS	79,666,136	27/11/2020			1	SI		SI		
81	OMAR MARTINEZ ZULETA	4,946,584	27/11/2020	2/12/2020		1	SI			SI	
82	QUEVIN FABIAN LESMES LINARES	1,000,003,268	27/11/2020	2/12/2020		1	SI			SI	
83	CESAR JULIO BENAVIDEZ	1,193,036,484	27/11/2020	2/12/2020		1	SI			SI	
84	ANDRES FERNANDO PEREZ DIAZ	1,063,625,214	1/12/2020	2/12/2020		1	SI			SI	
85	ANGEL IVAN DIAZ	79,924,351	1/12/2020			1	SI			SI	
86	CARLOS ALBERTO SUAREZ BARRERA	9,527,688	1/12/2020	2/12/2020		1	SI			SI	
87	CIRO ARTURO NIÑO	4,255,303	1/12/2020			1	SI			SI	
88	EDGAR HERNANDO NIÑO	4,225,078	1/12/2020			1	SI			SI	
89	EDWAR ARLEY RODRIGUEZ MAYORGA	1,033,754,705	1/12/2020			1	SI			SI	
90	EMILIANO MUÑOZ PALACIO	80,265,681	1/12/2020			1	SI			SI	
91	CAMILO ERNESTO RAMIREZ ROA	1,033,735,370	1/12/2020	2/12/2020		1	SI			SI	
92	CARLOS SEBASTIAN LOPEZ CASTELLANO	1,031,170,297	1/12/2020			1	SI			SI	
93	IDELFONSO DE JESUS PEÑARANDA	1,118,873,986	1/12/2020			1	SI		SI		
94	CARLOS ALBERTO PULIDO YATE	1,033,683,233	1/12/2020			1	SI			SI	
95	CIPRIANO PIÑEROS	79,703,764	1/12/2020	2/12/2020		1	SI			SI	
96	DAGOBERTO PAREJO AREVALO	8,668,649	1/12/2020			1	SI			SI	
97	DANIEL ARTURO NIÑO ROJAS	1,024,469,352	1/12/2020			1	SI			SI	
98	EDER GONZALEZ GASTELBLONDO	84,062,070	1/12/2020	9/1/2021		1	SI			SI	
99	JHON RIVER MAYORGA BENAVIDEZ	1,033,721,955	1/12/2020			1	SI			SI	
100	SAMIR ZIAD PINEDA YAHMURE	79,920,337	1/12/2020			1	SI			SI	
101	SIMON LOPEZ PALACIOS	94,418,910	1/12/2020			1	SI			SI	
102	WILSON FERNEY BERNAL GUASCA	1,033,707,175	1/12/2020	2/12/2020		1	SI			SI	
103	YOISEN HAIDIN CHIBUQUE CAICEDO	1,007,413,403	1/12/2020	9/1/2021		1	SI			SI	
104	LUIS HERNANDEZ GRANADA	19,219,713	1/12/2020			1	SI		SI		

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	C.C.	FECHA DE INGRESO	FECHA DE EXAMEN MÉDICO DE INGRESO/ PERIODICO	PERSONAL		IMPLEMENTACIÓN PROTOCÓLO		ESTADO ACTUAL		OBSERVACIONES
					Administrativo	Operativo: maestros y auxiliares	SI	NO	ACTIVO	RETIRADO	
30	JUAN PABLO CORREA MURCIA	1,116,920,538	1/12/2020	5/12/2020		1	SI			SI	
31	LAMBERTO GABRIEL DORIA SANCHEZ	72,147,586	1/12/2020	5/12/2020		1	SI			SI	
32	KEVIN FABIAN HOYOS YEPEZ	1,083,043,276	1/12/2020	5/12/2020		1	SI			SI	
33	ARLEY GIOVANNI CAICEDO RAMIREZ	1,117,511,256	3/12/2020	5/12/2020		1	SI			SI	
34	ALBERT JOSE LEON GOMEZ	828089416111997	3/12/2020	5/12/2020		1	SI			SI	PERMISO DE TRABAJO MINISTERIO
35	NUBIA VERGARA ALDANA	53,092,609	3/12/2020			1	SI		SI		Afiliado el 3 de diciembre , ingresa por cambio de frente de trabajo en Febrero 3
36	ALEXANDER VERGARA ALDANA	60,332,087	3/12/2020			1	SI		SI		Afiliado el 3 de diciembre , ingresa por cambio de frente de trabajo en Febrero 3
37	ANTONIO PAZ SEGUNDO	16,537,810	3/12/2020			1	SI		SI		Afiliado el 3 de diciembre , ingresa por cambio de frente de trabajo en Febrero 3
38	JHON WILLIAM BALLESTEROS MARTINEZ	1,033,761,449	8/12/2020	19/12/2020		1	SI			SI	
39	CARLOS ENRIQUE REDONDO	80,373,803	13/12/2020	19/12/2020		1	SI		SI		
40	JULIO FERNEY BENAVIDES MENDEZ	80,256,134	13/12/2020	19/12/2020		1	SI			SI	
41	FREDY EDINSON FORERO NIÑO	1,024,489,116	15/12/2020	19/12/2020		1	SI			SI	
42	JUAN AGUSTIN LIZARAZO	4,103,403	15/12/2020	19/12/2020		1	SI			SI	
43	JOSE IGNACIO CAÑO NOVOA	7,330,323	15/12/2020	19/12/2020		1	SI			SI	
44	BRAYAN ESTIVEN LOPEZ MOLINA	1,024,602,801	17/11/2020			1	SI			SI	
45	EDWIN JIMMY ESPINEL CHACON	80,064,358	17/11/2020			1	SI			SI	
46	EVANGELISTA BRINEZ BURGOS	6,030,390	17/11/2020	2/12/2020		1	SI			SI	
47	FABIO NELSON LOPEZ DIAZ	80,124,048	17/11/2020	2/12/2020		1	SI			SI	
48	RAFAEL CASTRO VILLA	8,815,936	17/11/2020			1	SI			SI	
49	MICHEL LEONARDO SALAS CELIS	1,033,766,212	17/11/2020	2/12/2020		1	SI			SI	
50	VLADIMIR BRIÑEZ MAHECHA	1,033,682,982	17/11/2020	2/12/2020		1	SI			SI	
51	CARLOS PAEZ PULIDO	1,049,630,871	17/11/2020			1	SI			SI	
52	RAUL OSORIO RINCON	79,669,250	17/11/2020	2/12/2020		1	SI			SI	
53	HAYDER CAMILO GALVIZ	1,033,762,528	17/11/2020	2/12/2020		1	SI			SI	
54	CAMILO HERNANDEZ SANCHEZ	1,049,639,642	17/11/2020	2/12/2020		1	SI			SI	
55	EMITZO JOSE FANDIÑO FLOREZ	85,469,924	18/11/2020			1	SI			SI	
56	JULIO CESAR NEIRA BENAVIDEZ	79,903,950	18/11/2020	2/12/2020		1	SI			SI	
57	LEYDY PATRICIA SUAREZ VELAZQUEZ	1,033,693,495	18/11/2020	2/12/2020		1	SI			SI	
58	CARLOS ANDRES SUAREZ VELAZQUEZ	1,033,693,493	18/11/2020	2/12/2020		1	SI			SI	
59	LUIS FERNANDO CUPITRA DUCUARA	1,022,939,409	18/11/2020	2/12/2020		1	SI			SI	
60	LUIS ALEJANDRO ZAMBRANO	79,770,115	18/11/2020			1	SI			SI	
61	OSBAR RENE BERNAL PAEZ	80,778,371	20/11/2020	2/12/2020		1	SI		SI		
62	MISAEL PERDOMO VILLAMIL	1,033,784,477	24/11/2020	2/12/2020		1	SI		SI		
63	ALBEIRO GUERRERO MACANA	5,996,412	25/11/2020	2/12/2020		1	SI		SI		
64	EDWIN RODRIGUEZ VIDAL	93,394,589	25/11/2020			1	SI		SI		
65	JOSE ANTONIO SILVA ORTEGA	19,458,840	25/11/2020	2/12/2020		1	SI			SI	
66	SAURITH REALES DELGADO	91,431,492	25/11/2020	2/12/2020		1	SI			SI	

REGISTRO FOTOGRAFICO

MV - 0682



DESCRIPCIÓN Y FECHA: PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD
Semana 8 AL 14 Febrero 2021

MV - 0682




DESCRIPCIÓN Y FECHA: PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD
Semana 8 AL 14 Febrero 2021

MV - 0707



DESCRIPCIÓN Y FECHA: PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD
Semana 8 AL 14 Febrero 2021

MV - 0707



DESCRIPCIÓN Y FECHA: PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD Y CHARLA
Semana 8 AL 14 Febrero 2021

MV - 0795




DESCRIPCIÓN Y FECHA: PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD
Semana 8 AL 14 Febrero 2021

MV - 0795



DESCRIPCIÓN Y FECHA: : PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD Y CHARLA
Semana 8 AL 14 Febrero 2021

MV - 0795

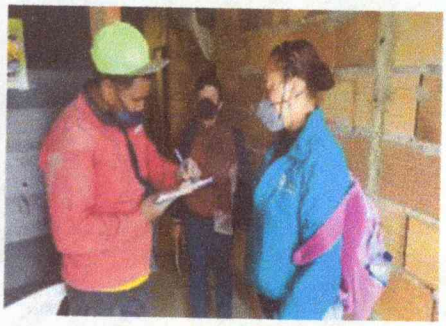

DESCRIPCIÓN Y FECHA: CHARLA INFORMATIVA
Semana 8 AL 14 Febrero 2021

MV - 1586



DESCRIPCIÓN Y FECHA: CHARLA INFORMATIVA
Semana 8 AL 14 Febrero 2021
