DICO D&C S.A.S.
NIT. 900.478.878-6

INFORME
EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES

OBJETO: Adecuación infraestructura y redes de servicio para instalación de equipos centro agroindustrial y de fortalecimiento empresarial de Casanare - subsede Paz de Ariporo.

OBRA EJECUTADA			
ÍTEM	**DESCRIPCIÓN**	**UNIDAD**	**CANTIDAD**
1	**ACTIVIDADES PRELIMINARES**		
1.1	**CORTES Y DEMOLICIONES**		
1.1.1	Demolición muro de ladrillo de espesor menor a 0.15 m. con retiro.	m²	-
1.1.2	Corte y demolición muro en ladrillo brecha de (0,12*0,25)m, con transporte.	m	11.50
1.1.3	Demolición a mano de tableta piso, espesor 0-5 cm con retiro.	m²	22.05
1.1.4	Corte en concreto	m	42.40
1.2	**ARQUITECTURA**		
1.2.1	Muro en bloque No. 4 de 0.10 m	m²	-
1.2.2	Pañete liso (allanado) muros 1:4, incluye filos y dilataciones	m²	1.15
1.2.3	Estuco plástico muros. Suministro e instalación.	m²	1.15
1.2.4	Pintura epoxica para muros (dos manos)	m²	102.00
1.2.5	Baldosa grano de mármol 30 x 30 /33 x 33 cm, blanco incluye destronque, pulida y brillado a todo costo.	m²	22.05
1.3	**INSTALACIONES HIDRÁULICAS, SANITARIAS Y DE GAS**		
1.3.1	Excavación a mano en material común	m³	24.00
1.3.2	Excavación manual en conglomerado	m³	5.75
1.3.3	Tubería PF+UAD Ø=3/4". Suministro e instalación.	m	102.00
1.3.4	Collar de derivación RDE 21 PVC 3" x 1/2". Suministro e instalación	unid.	1.00
1.3.5	Tubo presión RDE 21 PVC Ø=1/2"	m	220.00
1.3.6	Registro de Corte Antifraude 1/2" Inserto DZR Interior a PEALPE 16 mm	unid.	3.00
1.3.7	Tubería sanitaria PVC 2". Suministro e instalación.	m	15.00
1.3.8	Punto desagüe sanitario pvc Ø=2"	unid.	9.00

Diseño & Construcciones

1.3.9	Tubería de Polietileno PE-80 RDE 9 de 1/2" para gas. Suministro e Instalación.	m	40.00
1.3.10	Registro de Corte Antifraude 1/2" Inserto DZR Interior a PEALPE 16 mm. Para gas.	unid.	4.00
1.3.11	Relleno con material sub-base triturada tamaño máximo 2", compactado para áreas pequeñas de cimentación con transporte	m^3	6.50
1.4	**INSTALACIONES ELECTRICAS**		
1.4.1	Tablero trifásico 12 circuitos con chapa, puerta y llave barraje 225 A	unid.	2.00
1.4.2	Caja tablero CT 4 Circuitos, Con breaker de 40 amp.	unid.	2.00
1.4.3	Salida para toma corriente doble monofásica con polo a tierra, incluye: tubo EMT tipo pesado 3/4", cable de cobre aislado THWN 2 x N° 10 + 1 x N° 12T AWG, caja metálica 5800 o 2400, terminales tipo rosca. Suministro e instalación.	unid.	32.00
1.4.4	Salida para toma corriente trifásica con polo a tierra, 50A - 220v, incluye: tubo EMT tipo pesado 3/4", cable de cobre aislado THWN 4 x N° 10 + 1 x N° 12T AWG, caja metálica 5800 o 2400, terminales tipo rosca. Suministro e instalación.	unid.	17.00
1.4.5	Cable de cobre 7 hilos 12 - AWG THWN	m	1,791.03
1.4.6	Cable de cobre 7 hilos 10 - AWG THWN	m	1,611.92
1.4.7	Campana extractora industrial cocina, de (2*0.8*0.5)m, Acero inoxidable, motor y bombillo. Suministro e Instalación.	unid.	-
1.5	**RED VAPOR _CALDERA**		
1.5.1	Tubo Conduit Ø=1" EMT. Incluye Cable de cobre 3 x 10 -AWG THWN +1 x 12T - AWG	m	12.00
1.5.2	Tubo AC. Ø=1" ASTM A-53_SCH40. C/C. (incluye aislamiento térmico en poliuretano acabado en lamina de aluminio, cal. 22 o similar)	m.	170.00
1.5.3	Válvula de corte universal, Ø=1"	unid.	8.00
1.5.4	Distribuidor de vapor (tubo AC Ø=3" ASTM A-53, SCH 40, dos salidas Tubo AC Ø=1" ASTM A-53 SCH 40)	unid.	1.00
1.5.5	Tubo AC. Ø=3/4" ASTM A-53_SCH 40. C/C (incluye aislamiento térmico en poliuretano acabado en lamina de aluminio, cal. 22 o similar)	m.	180.00
1.5.6	Cheque globo Ø=3/4" A.C. Rosca x 800	unid.	8.00
1.5.7	Trampa termodinámica para vapor con filtro, Ø=1/2"	unid.	8.00
1.5.8	Universal AC. Ø=1" Roscada 150 lb.	unid.	6.00
1.5.9	Universal AC. Ø=3/4" Roscada 150 lb.	unid.	6.00

Diseño & Construcciones

- **LOCALIZACIÓN:**

Las actividades referenciadas se ejecutaron en centro agroindustrial y de fortalecimiento empresarial de Casanare - subsede Paz de Ariporo.

- **FUNCIONES PRELIMINARES:**

Se estudió y analizo cada una de las especificaciones técnicas para el desarrollo de las actividades, verificando su alcance con el fin de efectuar el debido control sobre su ejecución.

- **ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS**

1) Afiliar al personal de la obra a los sistemas de seguridad social y parafiscales.
2) Mantener comunicación permanente con la supervisión del contrato.
3) Solicitar autorización para el ingreso de nuestro personal a las instalaciones del centro agroindustrial y de fortalecimiento empresarial de Casanare - subsede Paz de Ariporo.
4) Señalizar las áreas en las que se desarrollan los trabajos.
5) Suministrar dotación al personal.
6) Llevar una carpeta de los trabajos desarrollados donde se deben archivar todos los documentos referentes a estos.
7) Supervisión diaria de las actividades ejecutadas.
8) llevar un control en la programación de los trabajos, tomando las acciones del caso para dar cumplimiento y culminar de una manera exitosa.
9) Realizar informe de obra.

- **CONTROL DE CALIDAD**

Se consideró la totalidad de las recomendaciones establecidas por la supervisión del contrato, además se organizaron los trabajos para que los procedimientos aplicados sean compatibles con los requerimientos técnicos necesarios.

- **MATERIALES**

Absolutamente todos los materiales que se utilizaron para realizar las actividades, son materiales nuevos y de primera calidad.

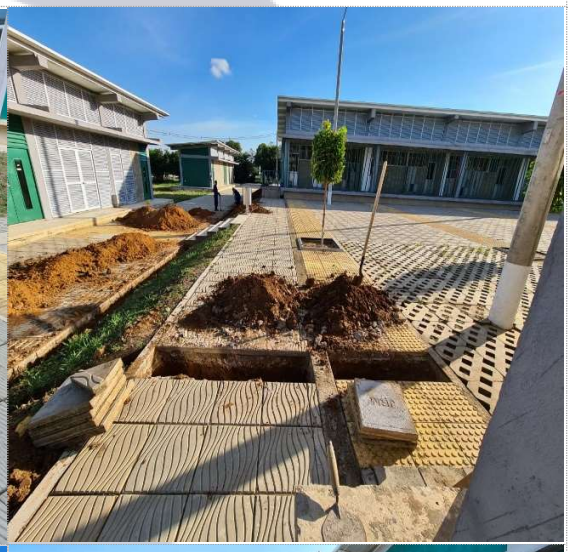
- **PERSONAL Y SEGURIDAD SOCIAL**

VINCULACIÓN SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL

Se vinculó todo el personal involucrado en la ejecución de las actividades con un Sistema de Seguridad Social Integral, de conformidad con las disposiciones legales pertinentes, con el fin de dar cubrimiento de los riesgos por accidente de trabajo y enfermedades profesionales, a través del Sistema de Riesgos Profesionales y la prestación de servicios salud.

DICO
Diseño & Construcciones

REGISTRO FOTOGRAFICO



Diseño & Construcciones

REGISTRO FOTOGRAFICO

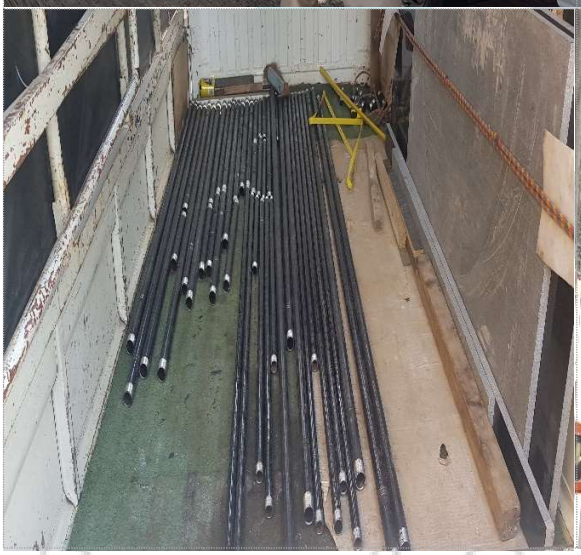


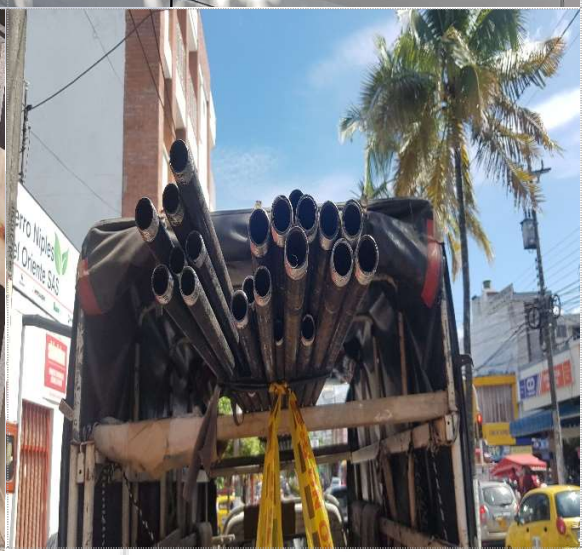



Diseño & Construcciones

REGISTRO FOTOGRAFICO







Diseño & Construcciones

Teléfono: (8) 634 19 71
Móvil: 311 553 30 94
Dirección: Carrera 23 N° 12 - 32 Yopal Casanare
E-mail: dico.construcciones@hotmail.com

REGISTRO FOTOGRAFICO

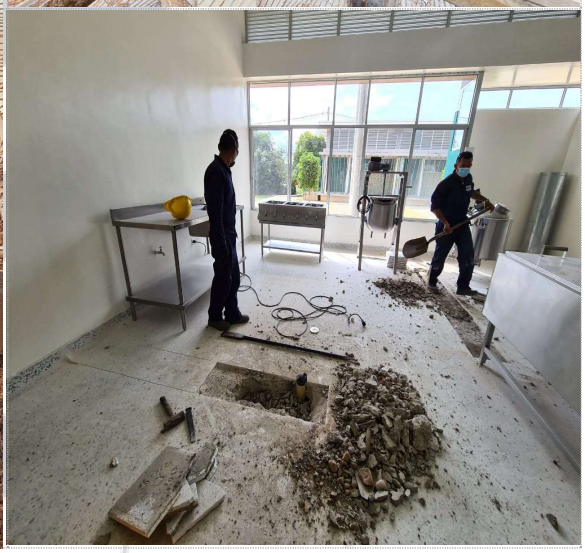


Diseño & Construcciones

REGISTRO FOTOGRAFICO







Diseño & Construcciones

REGISTRO FOTOGRAFICO

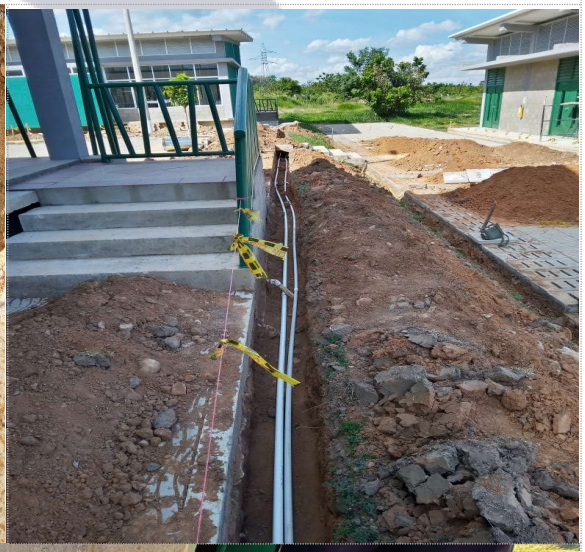


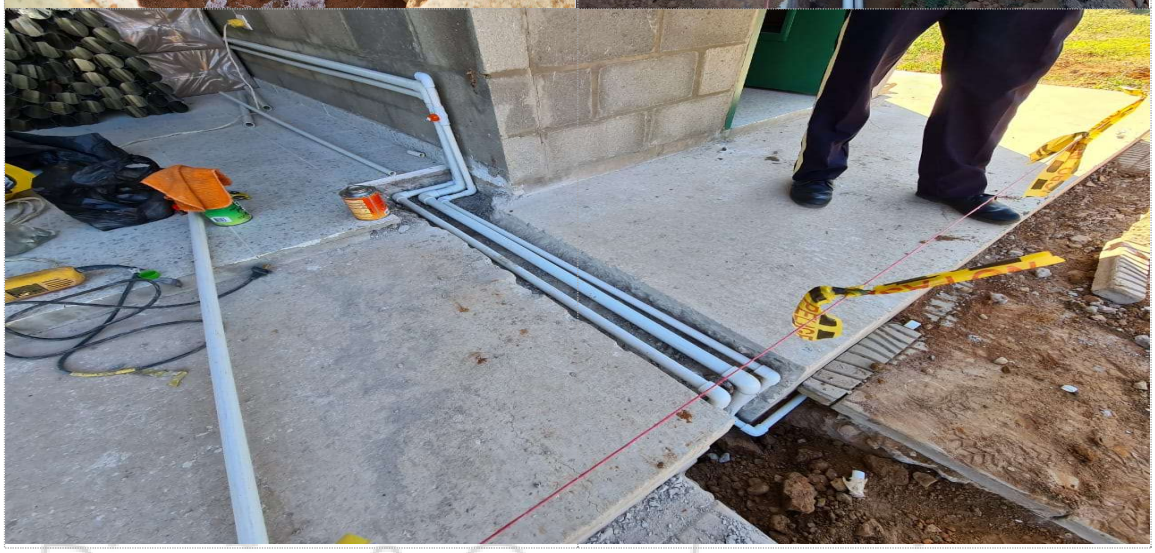
Diseño & Construcciones

Teléfono: (8) 634 19 71
Móvil: 311 553 30 94
Dirección: Carrera 23 N° 12 - 32 Yopal Casanare
E-mail: dico.construcciones@hotmail.com

REGISTRO FOTOGRAFICO







Diseño & Construcciones

REGISTRO FOTOGRAFICO



Diseño & Construcciones

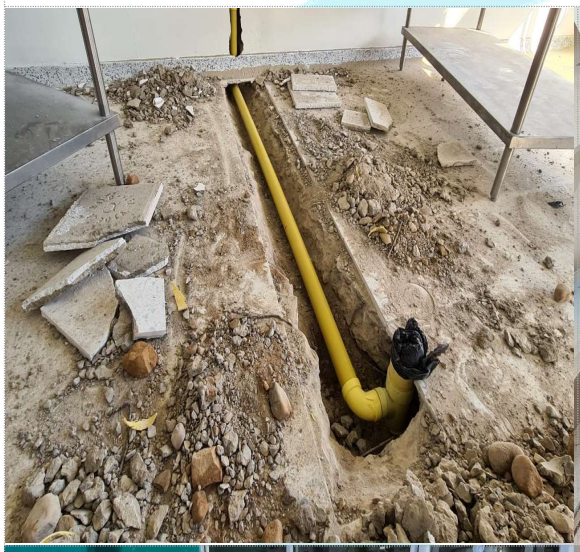
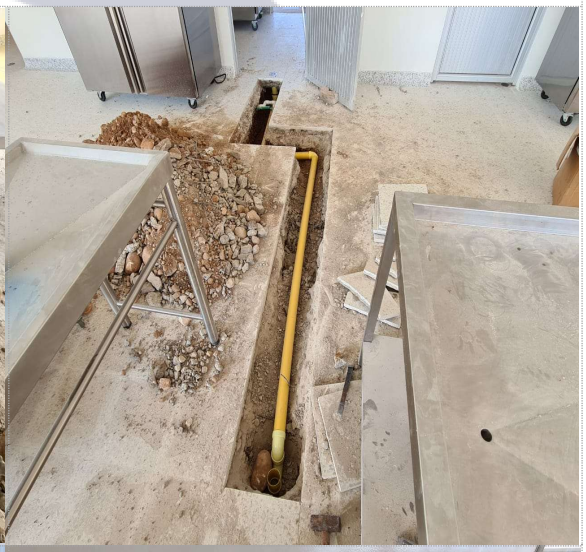
REGISTRO FOTOGRAFICO







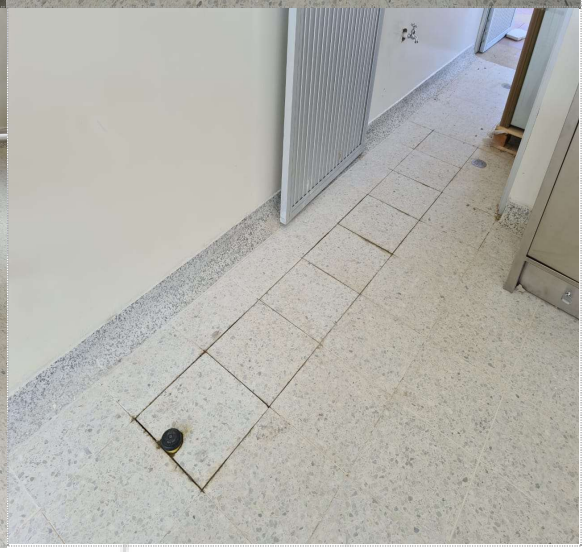
Diseno & Construcciones

REGISTRO FOTOGRAFICO
   

Diseño & Construcciones

REGISTRO FOTOGRAFICO



Diseno & Construcciones

REGISTRO FOTOGRAFICO



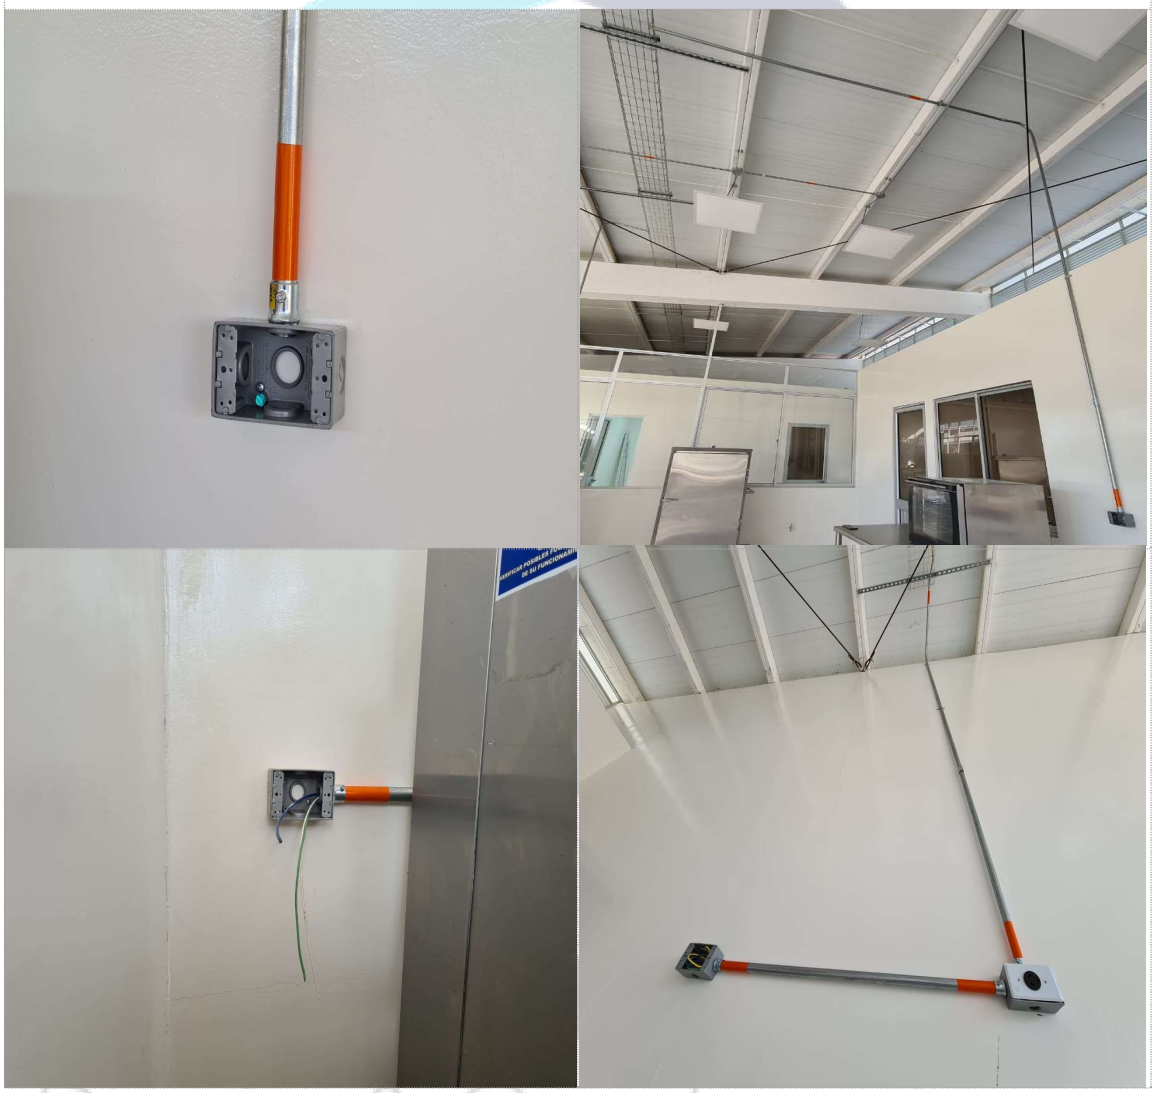






Diseno & Construcciones

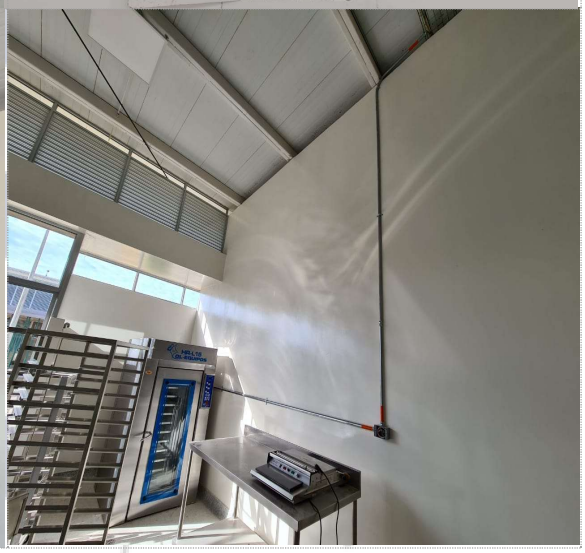
REGISTRO FOTOGRAFICO



Diseno & Construcciones

REGISTRO FOTOGRAFICO

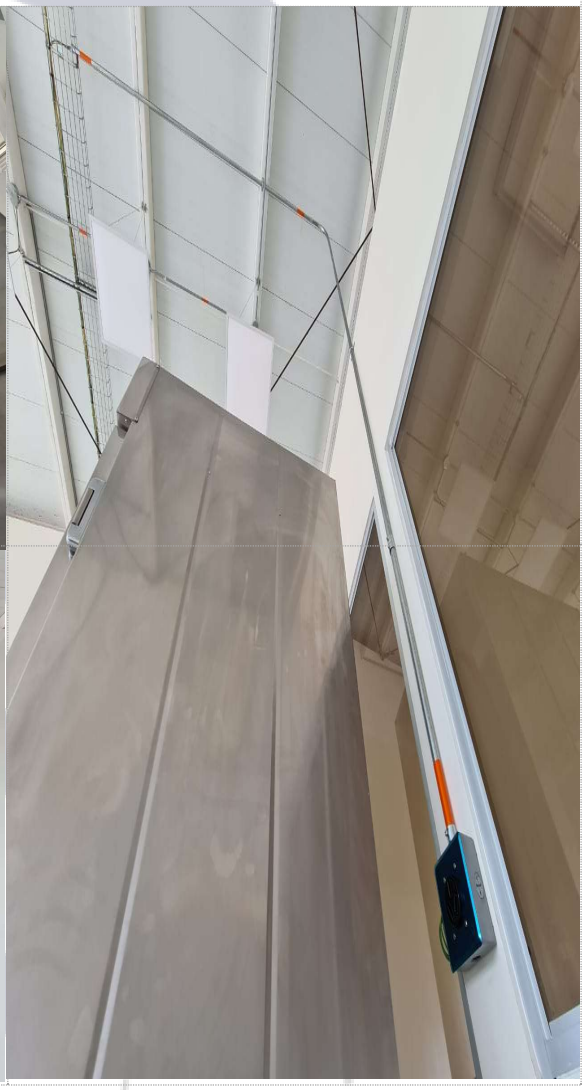


Diseño & Construcciones

REGISTRO FOTOGRAFICO

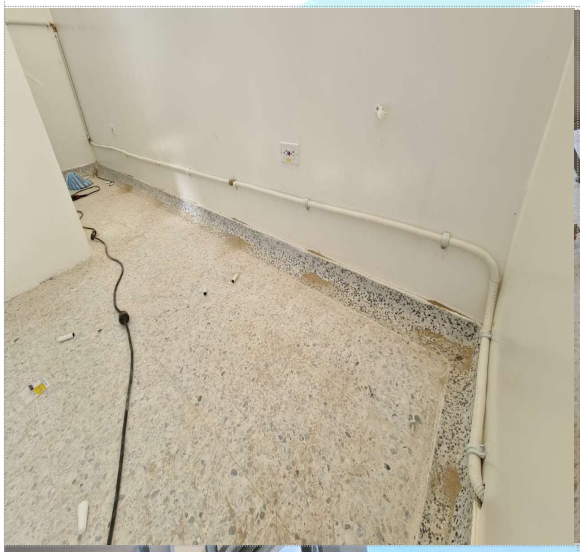
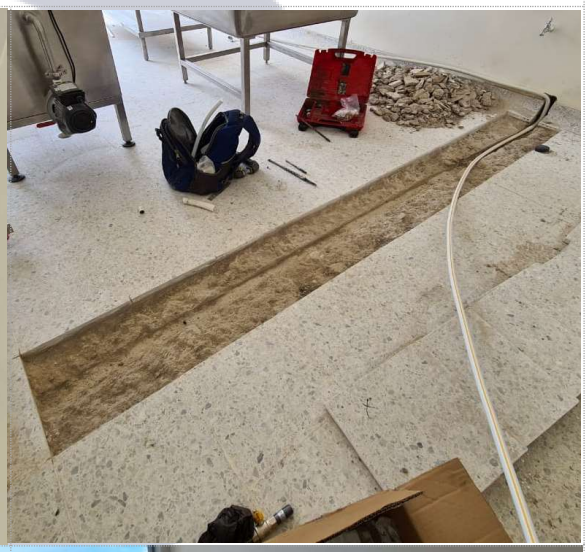






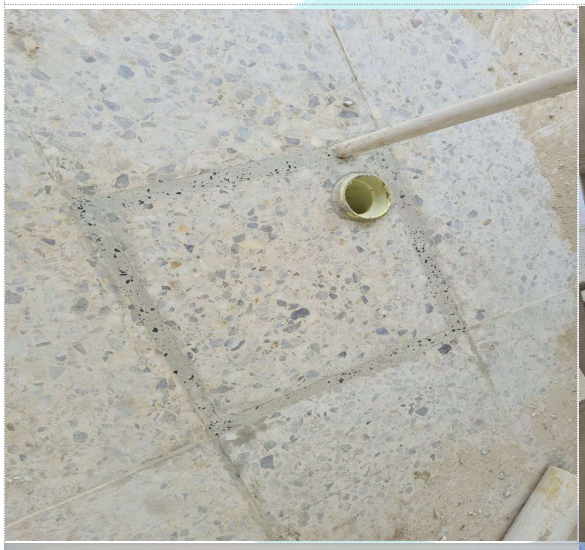
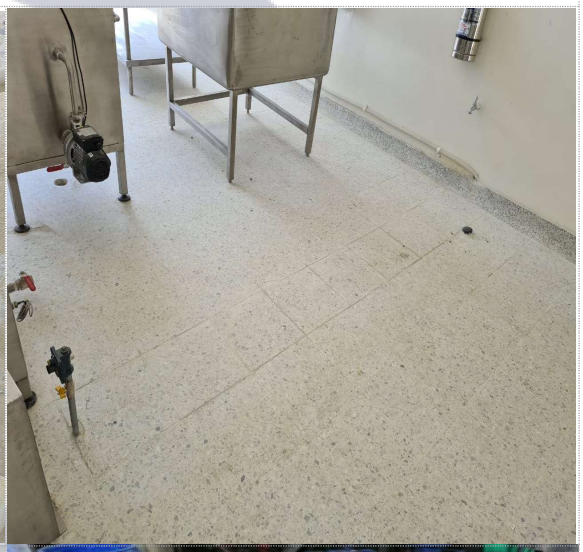
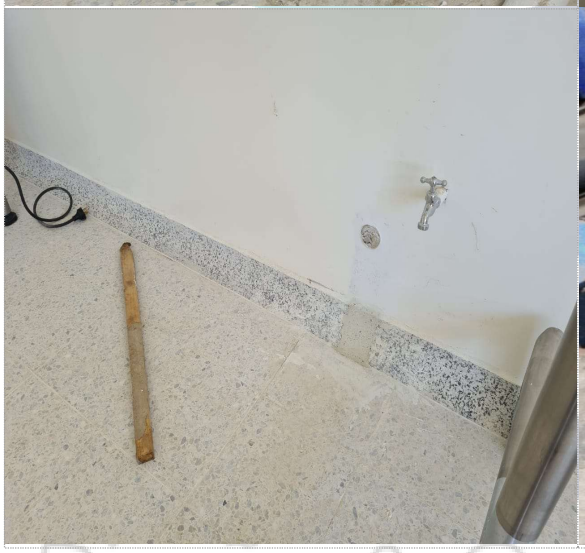
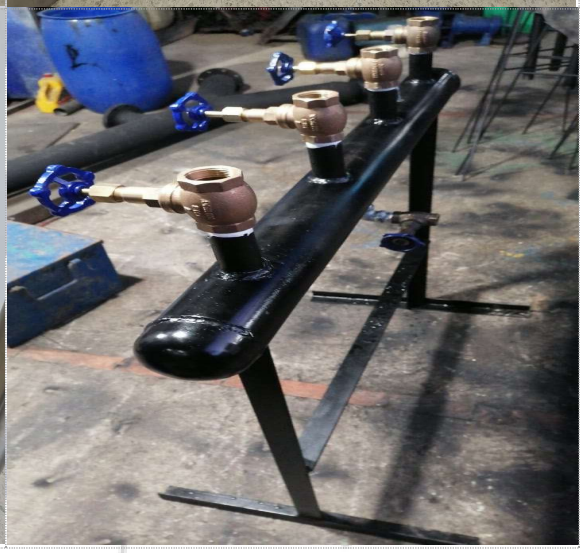
Diseno & Construcciones

REGISTRO FOTOGRAFICO


Diseño & Construcciones

REGISTRO FOTOGRAFICO

Diseno & Construcciones
