“EJECUTAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, LEGAL, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL Y DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES: EJECUTAR A MONTO AGOTABLE Y A PRECIOS UNITARIOS LAS OBRAS Y ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL LOCAL, INTERMEDIA Y ESPACIO PÚBLICO DE LA LOCALIDAD DE BARRIOS UNIDOS, el cual incluye apropiación de los diseños existentes, diagnóstico, estudios y diseños para conservación, mantenimientos, rehabilitación, reconstrucción, acciones de movilidad, atención de emergencias y las demás actividades que se detallan en los anexos técnicos.”



INFORME TÉCNICO MENSUAL No 10

PERIODO DEL 01 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2021

INTERVENTORÍA & CONSTRUCIVILES

CONTRATO No. 242 DE 2019

BOGOTÁ D. C.

MARZO DE 2021

CONTENIDO

1. INTRODUCCION 4
2. GENERALIDADES 5
3. ROLES DEL PROYECTO 7
4. ANTECEDENTES 8
5. ACTIVIDADES GENERALES 10
6. GENERALIDADES DEL CONTRATO 12
6.1. CONTRATO DE INTERVENTORIA 12
6.2. CONTRATO DE OBRA 13
6.3. RESUMEN DE GARANTIAS 13
7. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 14
7.1. LOCALIZACION DEL PROYECTO 14
8. IDENTIFICACIÓN DE LOS SEGMENTOS VIALES 15
8.1. LISTADO INICIAL PRIORIZACIÓN DE LA ALCALDÍA 15
9. ACTIVIDADES INTERVENTORIA TECNICA 17
9.1. ACTIVIDADES DE OBRA 17
10. CRONOGRAMA ACTUALIZADO 26
11. FACTURACIÓN 32
12. ALCANCE 33
13. OBJETIVOS DE LA CALIDAD 33
14. CONCLUSIONES 33

1. INTRODUCCION

El Fondo de Desarrollo Local de Barrios Unidos (FDLBU), con el objeto de procurar que el mejoramiento de la red vial del distrito mediante el mantenimiento, rehabilitación y reconstrucción de las vías locales, sea realizado teniendo en cuenta las especificaciones y normatividad existente, ha celebrado el Contrato de Consultoría No. 242 de 2019, cuyo objeto es "EJECUTAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, LEGAL, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL Y DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES: EJECUTAR A MONTO AGOTABLE Y A PRECIOS UNITARIOS LAS OBRAS Y ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL LOCAL, INTERMEDIA Y ESPACIO PÚBLICO DE LA LOCALIDAD DE BARRIOS UNIDOS", que busca contribuir con el desarrollo social de la localidad y su movilidad, realizando la supervisión y medición de las obras, calidad de los materiales, garantía de las actividades entre otras, y cumplimiento de las obligaciones contractuales por parte del Contratista de Obra.

La interventoría ha hecho acompañamiento al contratista CONSORCIO BARRIOS UNIDOS 2020, con el fin de dar cumplimiento al Contrato de Obra Pública No. 241 de 2019 cuyo objeto es "EJECUTAR A MONTO AGOTABLE Y A PRECIOS UNITARIOS SIN FORMULA DE AJUSTE, LAS OBRAS Y ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL LOCAL, INTERMEDIA Y ESPACIO PÚBLICO DE LA LOCALIDAD DE BARRIOS UNIDOS (CTO 241-2019).

Este informe tecnico contiene los diferentes aspectos del resultado de las actividades de iniciación, planificación, ejecución, supervisión y control, del periodo comprendido entre el 01 de FEBRERO al 28 de FEBRERO de 2021, del contrato de Consultoría No. 242 de 2019 entre el FDLBU e INTERVENTORÍA Y CONSTRUCIVILES S.A.S.

2. GENERALIDADES

El FDLBU con el objetivo de fortalecer la red vial del distrito por medio del mantenimiento, rehabilitación y/o reconstrucción de las vías de la localidad, y mediante el desarrollo del proceso licitatorio celebró el contrato de Obra Pública No. 241 de 2019, que tiene como objeto ***EJECUTAR A MONTO AGOTABLE Y A PRECIOS UNITARIOS SIN FORMULA DE AJUSTE, LAS OBRAS Y ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL LOCAL, INTERMEDIA Y ESPACIO PÚBLICO DE LA LOCALIDAD DE BARRIOS UNIDOS (CTO 241-2019).***

GENERALIDADES CONTRATO 241 DE 2020					
OBJETO DEL CONTRATO					
"**EJECUTAR A MONTO AGOTABLE Y A PRECIOS UNITARIOS SIN FORMULA DE AJUSTE, LAS OBRAS Y ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL LOCAL, INTERMEDIA Y ESPACIO PÚBLICO DE LA LOCALIDAD DE BARRIOS UNIDOS.**					
CONTRATO DE OBRA ASOCIADO	241 de 2019				
CONSTRUCTOR	CONSORCIO BARRIOS UNIDOS 2020				
INTERVENTOR	INTERVENTORÍA Y CONSTRUCIVILES SAS.				
APOYO TÉCNICO DE LA SUPERVISIÓN FDLBU	ARQUITECTO JAVIER ROJAS				
VALOR INICIAL CONTRATO OBRA	$ 7.770.000.000				
VALOR ADICION No. 1 CONTRATO OBRA	$ 3.885.000.000				
TOTAL CONTRATO OBRA	$ 11.655.000.000				
VALOR INICIAL CONTRATO INTERVENTORIA	$766.436.856				
VALOR ADICION No 1 CONTRATO INTERVENTORIA	$383.218.428				
VALOR INICIALCONTRATO INTERVENTORIA	$1.149.655.2484				
DURACIÓN INICIAL	8 MESES				
PRORROGA No. 1	4 MESES				
PLAZO TOTAL	12 MESES				
FECHA DE INICIACIÓN DEL CONTRATO	2	**DE**	MARZO	**DE**	2020

FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO INICIAL	1	**DE**	NOVIEMBRE	**DE**	2020
FECHA DE INICIO SUSPENSIÓN 1*	24	**DE**	MARZO	**DE**	2020
FECHA DE TERMINACION SUSPENSIÒN 1	16	**DE**	JUNIO	**DE**	2020
FECHA DE TERMINACION DEL CONTRATO DESPUES SUPENSIÒN 1	23	**DE**	ENERO	**DE**	2021

3. ROLES DEL PROYECTO

En la siguiente tabla se describen los participantes en la ejecución del proyecto, tanto de la parte de contratista, como de la interventoría y la Supervisión, “Ejecución de las obras de la malla vial local de Barrios Unidos .

Personal profesional

Cargo	Nombre	Responsabilidad
Supervisor del Proyecto	**Dr. Antonio Carrillo** Alcalde Local de Barrios Unidos	Supervisión por parte del FDLBU a los contratos de obra e Interventoría.
Apoyo a la supervisión	**Arq. Javier Rojas**	Apoyo a la supervisión por parte del FDLBU al contrato de Interventoría.
Director de interventoría	**Ing. Carlos Arámbula.**	Director de interventoría

Residente de Interventoría	**Ing. Juan Pablo Lemus.**	Residente de la Interventoría.
Director de Obra COP 241 de 2019	**Ing. Ivan Pardo**	Dirección de la ejecución de la Obra.
Residente de obra COP 241 de 2019	**Ing. Manuel Ruiz**	Residente de obra.

4. ANTECEDENTES

La Alcaldía local de Barrios Unidos, con el objetivo de fortalecer la red vial del distrito mediante el mantenimiento de las vías de la localidad, ha realizado el contrato No 241 de 2019, el cual busca priorizar e intervenir las vías de la localidad de Santa Fe y cuyo contratista es el **CONSORCIO BARRIOS UNIDOS 2020.**

Se estableció además el contrato No.242 de 2019 firmado entre Interventoría y Construciviles SAS y el Fondo de Desarrollo Local de Barrios Unidos y cuyo objeto es "EJECUTAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, LEGAL, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL Y DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES: EJECUTAR A MONTO AGOTABLE Y A PRECIOS UNITARIOS LAS OBRAS Y ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL LOCAL, INTERMEDIA Y ESPACIO PÚBLICO DE LA LOCALIDAD DE BARRIOS UNIDOS, el cual incluye apropiación de los diseños existentes, diagnóstico, estudios y diseños para

conservación, mantenimientos, rehabilitación, reconstrucción, acciones de movilidad, atención de emergencias y las demás actividades que se detallan en los anexos técnicos."

El plazo para la ejecución del contrato se contará a partir del día siguiente a la fecha de suscripción del Acta de Iniciación del mismo, previo cumplimiento de los requisitos de ejecución establecidos. Para este contrato queda establecido un plazo inicial de 8 meses.

Para el presente periodo dentro de las labores de ejecución del contrato en curso, se inició con la localización de los segmentos viales los cuales fueron priorizados por la alcaldía local de Barrios Unidos. Cabe destacar que dentro del proceso de intervención habrá un control permanente por parte de la **INTERVENTORÍA Y CONSTRUCIVILES SAS.**

5. ACTIVIDADES GENERALES

Controlar: Este objetivo se logra por medio de una labor de inspección, consistente en una vigilancia planeada, en tal forma que se ejecute de manera permanente sobre todas y cada una de las etapas en las cuales se desarrolla el cumplimiento de la respectiva relación contractual, con el fin de establecer si dicha ejecución se ajusta a lo acordado, vale decir, a lo ofrecido por las partes.

Solicitar: Esta facultad se materializa cuando el interventor pide al contratista oportunamente, que subsane de manera inmediata, incorrecciones, que no afectan la validez del contrato o la ejecución del mismo. Esta facultad la ejerce cuando solicita la imposición de una sanción por motivos contractuales, o emite su concepto fundamentado, sobre la viabilidad de prórroga, modificación o adición contractual, entre otros temas.

Exigir: En la medida en que la función de interventoría encuentre que, en el desarrollo de la relación contractual, no se está cumpliendo estrictamente con las cláusulas contractuales, adquiere la obligación de exigir a la parte morosa, la satisfacción de las exigencias contractuales, utilizando como instrumentos, el contenido del acuerdo de voluntades, y las garantías ofrecidas para respaldar el cumplimiento del contrato.

Colaborar: La interventoría debe comunicar a los contratistas que su propósito es el de prestar toda la colaboración que sea necesaria para el éxito de la empresa propuesta, colaboración que no debe ser confundida con permisividad. Colaborar es trabajar con los demás para lograr el fin común.

Absolver: Muchas relaciones contractuales se desvían de los objetivos propuestos, por falta de comunicación entre las partes. El contratista, con un equivocado concepto de independencia, o la administración, desentendida del desarrollo de la obra o servicio, generan a veces con éstas actitudes perjuicios para el contrato. Una interventoría que

aplique el principio de la inmediación, obligatoriamente se convierte en un factor de consulta y en un elemento que absuelve las dudas y dificultades que conlleva la ejecución de todo contrato.

Verificar: Las acciones que se han enunciado, deben culminar en la verificación de la realización del objeto contratado. Esto implica la aplicación de correctivos, la exigencia del cumplimiento de lo pactado, la solución de los problemas y la absolución de las dudas, todo dentro de un criterio de colaboración, que a la postre habrá de traducirse en el éxito de la empresa en la cual se han comprometido la administración y los particulares.

Prevenir: El control no está destinado exclusivamente a sancionar las faltas cometidas, y en realidad, es más fácil evitar que éstas ocurran. La interventoría no es una función pasiva, limitada a observar la ejecución de un contrato y a informar sobre los errores cometidos por la contraparte. Si se acepta el concepto consistente en que el fin es común, en beneficio de la sociedad, se entenderá que el mayor aporte de esta función es la corrección de conceptos erróneos, impidiendo así que su aplicación se traduzca en desviaciones del objeto del contrato, o en el incumplimiento de las obligaciones adquiridas. La interventoría debe extender su función de prevención hacia ambos aspectos, porque de lo contrario, estaría atentando contra los principios rectores de la función pública y de la ley de contratación estatal.

Aprobar: El personal propuesto por el contratista para le etapa de obra, las obras ejecutadas, las modificaciones realizadas en obra, las decisiones tomadas en comité, los planos record entregados por el contratista, y en general todas las acciones derivadas de la ejecución del contrato de obra.

6. GENERALIDADES DEL CONTRATO

En las tablas siguientes se encuentra la información detallada del contrato de interventoría y de obra.

6.1. CONTRATO DE INTERVENTORIA

	Contrato Interventoría No. 242 de 2019
OBJETO	*"EJECUTAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, LEGAL, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL Y DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES: EJECUTAR A MONTO AGOTABLE Y A PRECIOS UNITARIOS LAS OBRAS Y ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL LOCAL, INTERMEDIA Y ESPACIO PÚBLICO DE LA LOCALIDAD DE BARRIOS UNIDOS, el cual incluye apropiación de los diseños existentes, diagnóstico, estudios y diseños para conservación, mantenimientos, rehabilitación, reconstrucción, acciones de movilidad, atención de emergencias y las demás actividades que se detallan en los anexos técnicos."*
Contratista	*CONSORCIO BARRIOS UNIDOS 2020*
Plazo inicial	Ocho (8) meses
Prorroga No.1	Cuatro (4) meses
Plazo Total	Doce (12) meses
Fecha de inicio de contrato	02 de marzo de 2019
Fecha de terminación inicial	01 de noviembre de 2020
Fecha de Suspension No. 1	24 de marzo de 2020
Fecha de Reinicio No. 1	16 de junio de 2020
Fecha de Terminación	23 de enero de 2021
Valor inicial del Contrato	$766.436.856
Valor adicion No.1 del Contrato	$383.218.428
Valor total del Contrato	$1.149.655.2484
Interventoría	Interventoría y Construciviles SAS

6.2. CONTRATO DE OBRA

	Contrato Interventoría No. 242 de 2019
OBJETO	*""EJECUTAR A MONTO AGOTABLE Y A PRECIOS UNITARIOS SIN FORMULA DE AJUSTE, LAS OBRAS Y ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL LOCAL, INTERMEDIA Y ESPACIO PÚBLICO DE LA LOCALIDAD DE BARRIOS UNIDOS.*
Plazo inicial	Ocho (8) meses
Prorroga No.1	Cuatro (4) meses
Plazo Total	Doce (12) meses
Fecha de inicio de contrato	02 de marzo de 2019
Fecha de terminación inicial	01 de noviembre de 2020
Fecha de Suspension No. 1	24 de marzo de 2020
Fecha de Reinicio No. 1	16 de junio de 2020
Fecha de Terminación	23 de enero de 2021
Valor del Contrato	$ 7.770.000.000
Valor adicion No. del Contrato	$383.218.428
Valor total del Contrato	$1.149.655.2484
Apoyo Técnico de la Supervisión FDLBU	ARQUITECTO JAVIER ROJAS

6.3. RESUMEN DE GARANTIAS

A continuación se listan las garantías suscritas para el contrato de obra, aprobadas por la supervisión, suscritas con la aseguradora Solidaria

N° DE POLIZA	AA010565 – AA010566		
Cumplimiento del Contrato	$ 2.331.000.000	14/01/2020	14/03/2021
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e Indemnización Laboral	$ 777.000.000	14/01/2020	14/09/2023
Estabilidad y Calidad De Obra	$ 2.331.000.000	14/03/2021	14/03/2026
Predios labores y operaciones	$ 438.901.500	14/01/2020	14/03/2021

N° DE POLIZA	AA010565 – AA010566		
Cumplimiento del Contrato	$ 2.331.000.000	02/03/2020	14/03/2021
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e Indemnización Laboral	$ 777.000.000	02/03/2020	14/09/2023
Estabilidad y Calidad De Obra	$ 2.331.000.000	14/03/2021	14/03/2026
Predios labores y operaciones	$ 438.901.500	02/03/2020	14/03/2021

7. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

7.1. LOCALIZACION DEL PROYECTO

Barrios Unidos es la localidad número 12 del Distrito Capital de Bogotá. Se encuentra en el norte de la ciudad, limita por el norte con la localidad de Suba, por el sur con la localidad de Teusaquillo, por el oriente con la localidad de Chapinero, y por el occidente con las localidades de Engativa y Suba. Cuenta con una superficie de 11,9 Km2, y su pablacion asciende a los 300.000 habitantes.



Figura 2. Localización localidad de Barrios Unidos.

8. IDENTIFICACIÓN DE LOS SEGMENTOS VIALES

El proyecto inicialmente comprende el un listado de 66 segmentos de viales priorizados por parte

Figura 1. Mapa localidades de Bogotá D.C. 2019 (http://www.bogota.gov.co/localidades/mapa)

del Fondo de Desarrollo Local de Barrios unidos (FDLBU), con base en el diagnostico preliminar y el estado y deterioro de las vías de la malla local, en diferentes zonas; para brindar una mejor movilidad a los habitantes de los diferentes barrios que componen la localidad.

8.1. LISTADO INICIAL PRIORIZACIÓN DE LA ALCALDÍA

NUMERO	CIV	EJE VIAL	DESDE	HASTA
1	12001648	Calle 75 A	Carrera 28	carrera 28 A
2	12001288	Carrera 28	Calle 83 BIS	Calle 84
3	12001302	Carrera 28	Calle 80	Calle 83 BIS
4	12001171	CALLE 84	Carrera 28	Carrera 28 B
5	12001180	CALLE 84	Carrear 27	Carrera 28
6	12000073	Carrera 67 A	Calle 95	Calle 100
7	12000753	Calle 73	Carrera 65	Carrera 65 B
8	12002465	Calle 63 F	Carrera 28	Carrera 28 A
9	12001804	Carrera 56 B	Calle 67 A	Calle 67 A BIS
10	12001759	Carrera 56 B	Calle 67 A BIS	Diagonal 67 B
11	12000914	Calle 67 D Bis	Carrera 66 A	Carrera 67
12	12001480	Carrera 62	Calle 66 C	Calle 67
13	12002585	Carrera 14 A	Calle 67	CALLE 68

14	12002610	Carrera 14 A Bis	Calle 66	Calle 67
15	12002503	Calle 63 F	Av. Carrera 24	Carrera 25
16	12002501	Calle 63 F	Carrera 25	Carrera 25 Bis
17	12002511	Calle 64	Carrera 22	Carrera 23
18	12002500	Carrera 25	Calle 63 F	Calle 64
19	12000106	Calle 97 A	carrera 58	carrera 60
20	12000110	Calle 97 A	Tranv 55	Carrera 58
21	12000147	Carrera 58	Calle 97	Calle 97 A
22	12002104	Calle 71 B	Carrera 26	Carrera 27
23	12002311	Calle 64 A	Carrera 28 b	Carrera 30
24	12002780	Carrera 21	Av. Calle 63	Calle 63A
25	12003160	Carrera 62	Calle 64	Calle 66C
26	12001447	Carrera 62	Calle 67	Calle 67A
27	12002120	KR 52	CL 64A	CL 65
28	12000448	CL 91A	KR 58	KR 59
29	12000201	CL 94	KR 64	KR 65
30	12002284	Calle 71	Carrera 19	Carrera 20
31	12001752	Carrera 50	Calle 71 A	Calle 71 C
32	12001704	Carrera 51	Calle 71 A	Calle 71 C
33	12001761	Carrera 51	Diagonal 71 BIS	Calle 71 A
34	12001762	Diagonal 71 BIS	Carrera 51	Carrera 52
35	12001849	Diagonal 71 BIS	Carrera 50	Carrera 51
36	12002699	Carrera 36 A	Calle 63	Calle 63 A
37	12002606	Calle 63 B	Carrera 35	Carrera 36
38	12002639	Carrera 36 A	Calle 63 A	Calle 63 B
39	12002614	Calle 63 B	Carrera 30	Carrera 35
40	12002593	Carrera 36 A	Calle 63 B	Calle 63 B Bis
41	12002560	Carrera 36 A	Calle 63 B Bis	Calle 63 C
42	12002645	Calle 63 A	Carrera 36 A	Carrera 36
43	12002644	Carrera 36	Calle 63 B	Calle 63 A
44	12002536	Carrera 36 A	Calle 63 C	Calle 63 G
45	12000837	Calle 79	Carrera 55 A	Carrera 55 B
46	12000436	CALLE 93	CRA47	CRA47A
47	12000423	CALLE 93	CRA 49	CRA 49A
48	12000744	CALLE 72 A	CRA 65B	CRA66
49	12000853	Calle 75	CARRERA 61	CARRERA 62
50	12002216	CL 70	KR 25	KR 26
51	12002244	CL 70	KR 24	KR 25
52	12000855	CL 67 F	KR 66 A	KR 67
53	12000874	CL 67 D BIS	KR 67	AV. KR 68
54	12001962	KR 27	CL 73 BIS	CL 74
55	12000093	KR 65 A	CL 96	CL 97
56	12000072	CL 97	KR 64	KR 65
57	12000088	CL 97 A	KR 61	KR 61 BIS
58	12000098	CL 97 A	KR 60	KR 60D
59	12000078	CL 97 A	KR 61 A	KR 61 BIS
60	12001501	CL 70 C	KR 56 B	KR 57
61	12001439	CL 78	KR 28 A	KR 28 B
62	12001473	CL 78	KR 28	KR 28A
63	12001504	CL 78	KR 27B	KR 28
64	12001518	CL 78	KR 27 A	KR 27 B
65	12002418	CL 66 A	KR 23	KR 22
66	12002481	CL 64	KR 23	KR 24

9. ACTIVIDADES INTERVENTORIA TECNICA

Para el periodo de análisis del presente informe se realizaron las actividades propias de la ejecución de obra, se dio continuidad al cronograma de ejecución de obra, se dio cumplimiento a los requerimientos de los protocolos aprobados de bioseguridad debido a la situación de salud publica ocacionada por el virus COVID-19, adicionalmente se adelantaron las siguientes actividades durante la vigencia del presente informe:

- Revision, ajuste y aprobación de los estudios y diseños de los CIV a intervenir.
- Elaboración el alcance, la metodología, el enfoque, y el Plan de Calidad,
- Elaboración del cronograma detallado del contrato.
- Levantamiento de topografía e implentacion de cotas de diseño
- Elaboración del presupuesto para la ejecución de las obras conforme a los diagnosticos y diseños realizados.
- Participarcipacion de los Comités de obra citados por la supervisión del contrato o interventoría.

9.1. ACTIVIDADES DE OBRA

Para este perriodo de ejecución se dio inicio a las activiades propias de obra de los CIV priorizados, después de tener autorización y aprobación del PMT, a continuación se listan los CIV intervenidos y las actividades realizadas:

CIV 12001804 Carrera 56B entre Calle 67ª y Calle 67b. Oriental (Reconstruccion)

Para este peridodo de análisis se culmino con el proceso de instalación dematerila bituminoso reciclado, se realizo la demolición de todo el espacio publico, se construyeron todas las cajas de inspecion para la red sanitaria, su culminaron las actividades propias de

intervecion de espacio publico tendintes al mejoramiento de los andenes, se implemento una estructura granular para apoyar el concreto estampado MR 41, en las siguientes fotografías se evidencia el avance de este CIV.







CIV 12001759 Carrera 56B entre Calle 67B y Diagonal 67B Oriental (Reconstruccion)

Para este peridodo de análisis se culmino con el proceso de instalación dematerila bituminoso reciclado, se realizo la demolición de todo el espacio publico, se construyeron todas las cajas de inspecion para la red sanitaria, su culminaron las actividades propias de intervecion de espacio publico tendintes al mejoramiento de los andenes, se implemento una estructura granular para apoyar el concreto estampado MR 41, en las siguientes fotografías se evidencia el avance de este CIV.









CIV 12002244 Calle 70 entre Carrera 24 y Carrera 23 (Reconstrucción)

Para el periodo de análisis se culmina el proceso instalación de material tipo rajon para el mejoramiento de la saubrasante, se inicia con el proceso de instalación de material reciclado bituminoso, se continua con la instalación de sardinel a lo largo de todo el CIV, con el fin de brindar confinamiento a la estructura de la via, se construyeron los sumideros, se continuo con la demolición de del espacio publico, demolición de andenes y esxacion para implementar la estructura del anden.









CIV 12002216 Calle 70 entre Carrera 25 y Carrera 26

Para el periodo de análisis se culmina el proceso instalación de material tipo rajon para el mejoramiento de la saubrasante, se inicia con el proceso de instalación de material reciclado bituminoso, se continua con la instalación de sardinel a lo largo de todo el CIV, con el fin de brindar confinamiento a la estructura de la via, se construyeron los sumideros, se continuo con la demolición de del espacio publico, demolición de andenes y esxacion para implementar la estructura del anden.







CIV 12002104 Calle 71B entre Carrera 26 y Carrera 27

Para el periodo de análisis se finaliza el proceso de instalación de material tipo rajon, asi como la construcción de pozos y sumideros, se realizo la instalación de sardinel prefabricado tipo A-10 para darle confinamiento a la estructura de la via y espacio publico, el cual fue demolido para iniciar con su rehabilitación

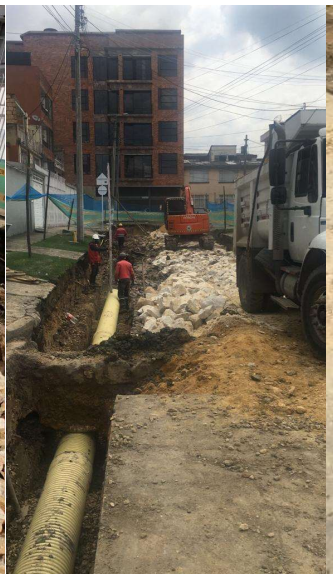






CIV 12000914 Calle 67 D Bis entre Carrera 66 A y Carrera 67

Para el periodo de análisis se inicia actividades en este CIV, se inicia con el fresado de la totalidad de la carpeta asfáltica,posteriormente se realiza la excavación de la caja de la via, y la renovación de la red pluvial existente, posterior se realiza la nivelación del civ y el mejoramiento de subrasante con material tipo rajon y material granular.


CIV 12000874 Calle 67 D Bis entre Carrera 66 A y Carrera 68

Para el periodo de análisis se inicia actividades, con la realización del fresado de la totalidad de la carpeta asfáltica, igualmente se realiza la excavación de la caja de la via, la actualización de la red pluvial existente, posterior se realiza la nivelación del civ y el mejoramiento de subrasante con material tipo rajon y material granular.







CIV 12000853 Calle 75 entre Carrera 61 y Carrera 62

Para el periodo de análisis se inicia actividades, con la realización del fresado de la totalidad de la carpeta asfáltica, igualmente se realiza la excavación de la caja de la vía, posterior se realiza la nivelación del CIV y el mejoramiento de subrasante con material tipo rajón y material granular. A su vez es importante mencionar que se realizó la reconstrucción de sumideros y la construcción de un pozo para la red combinada existente



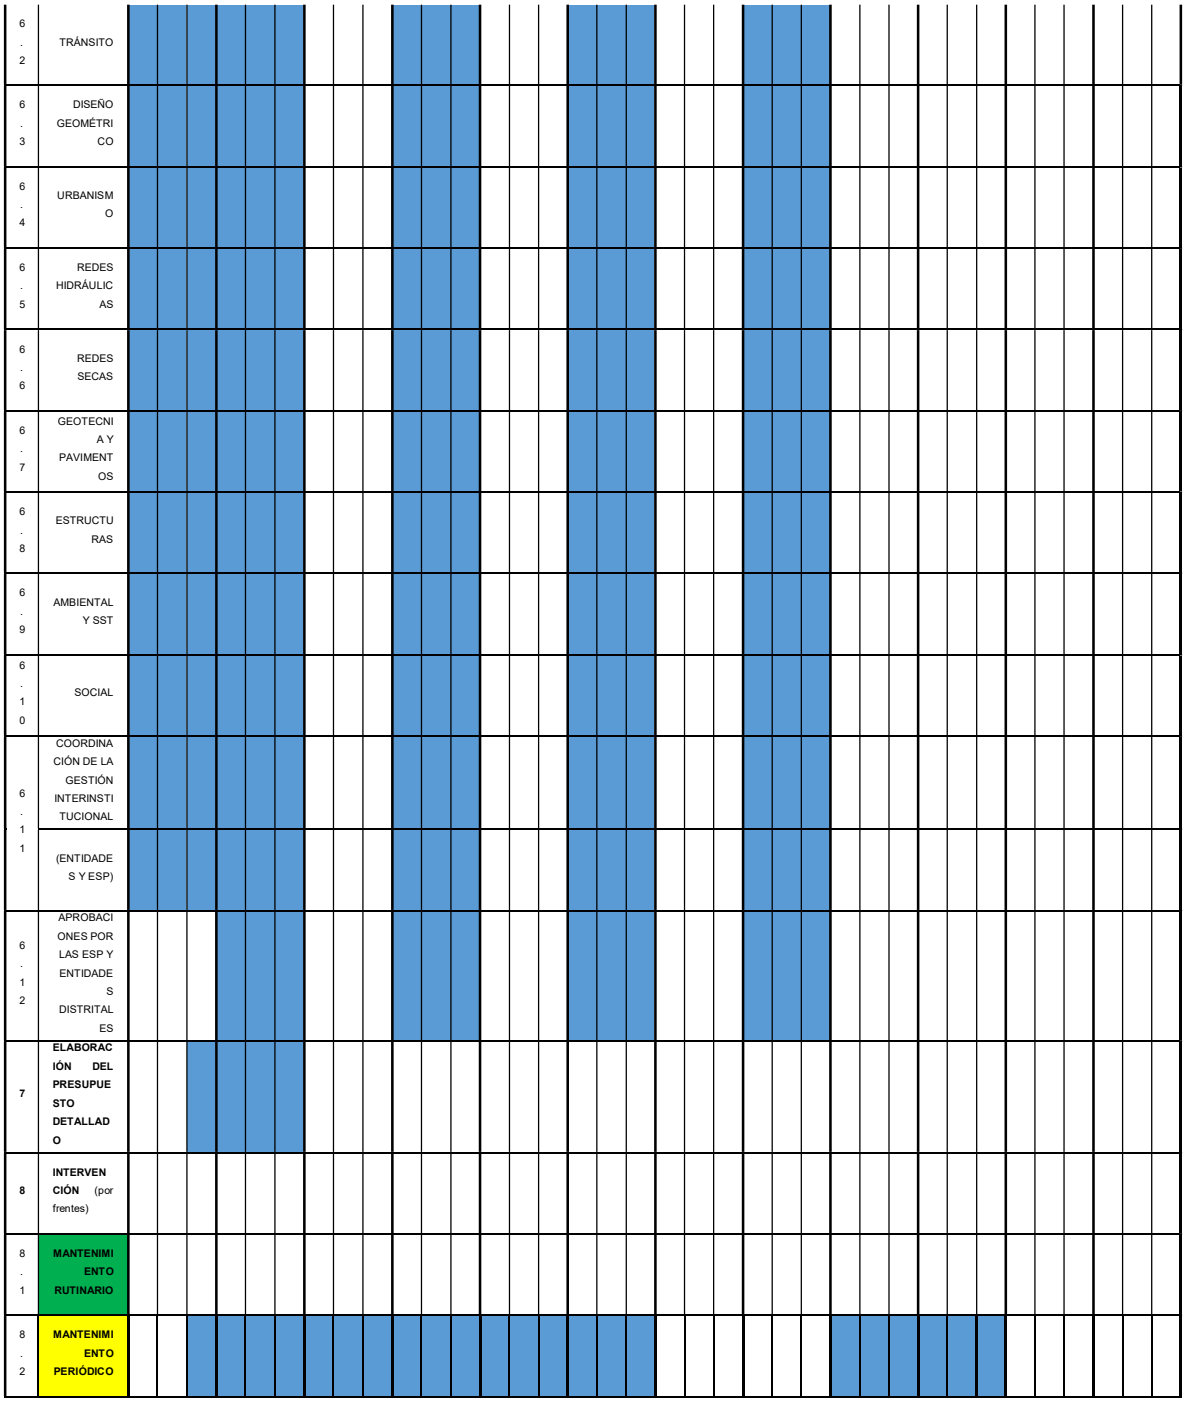


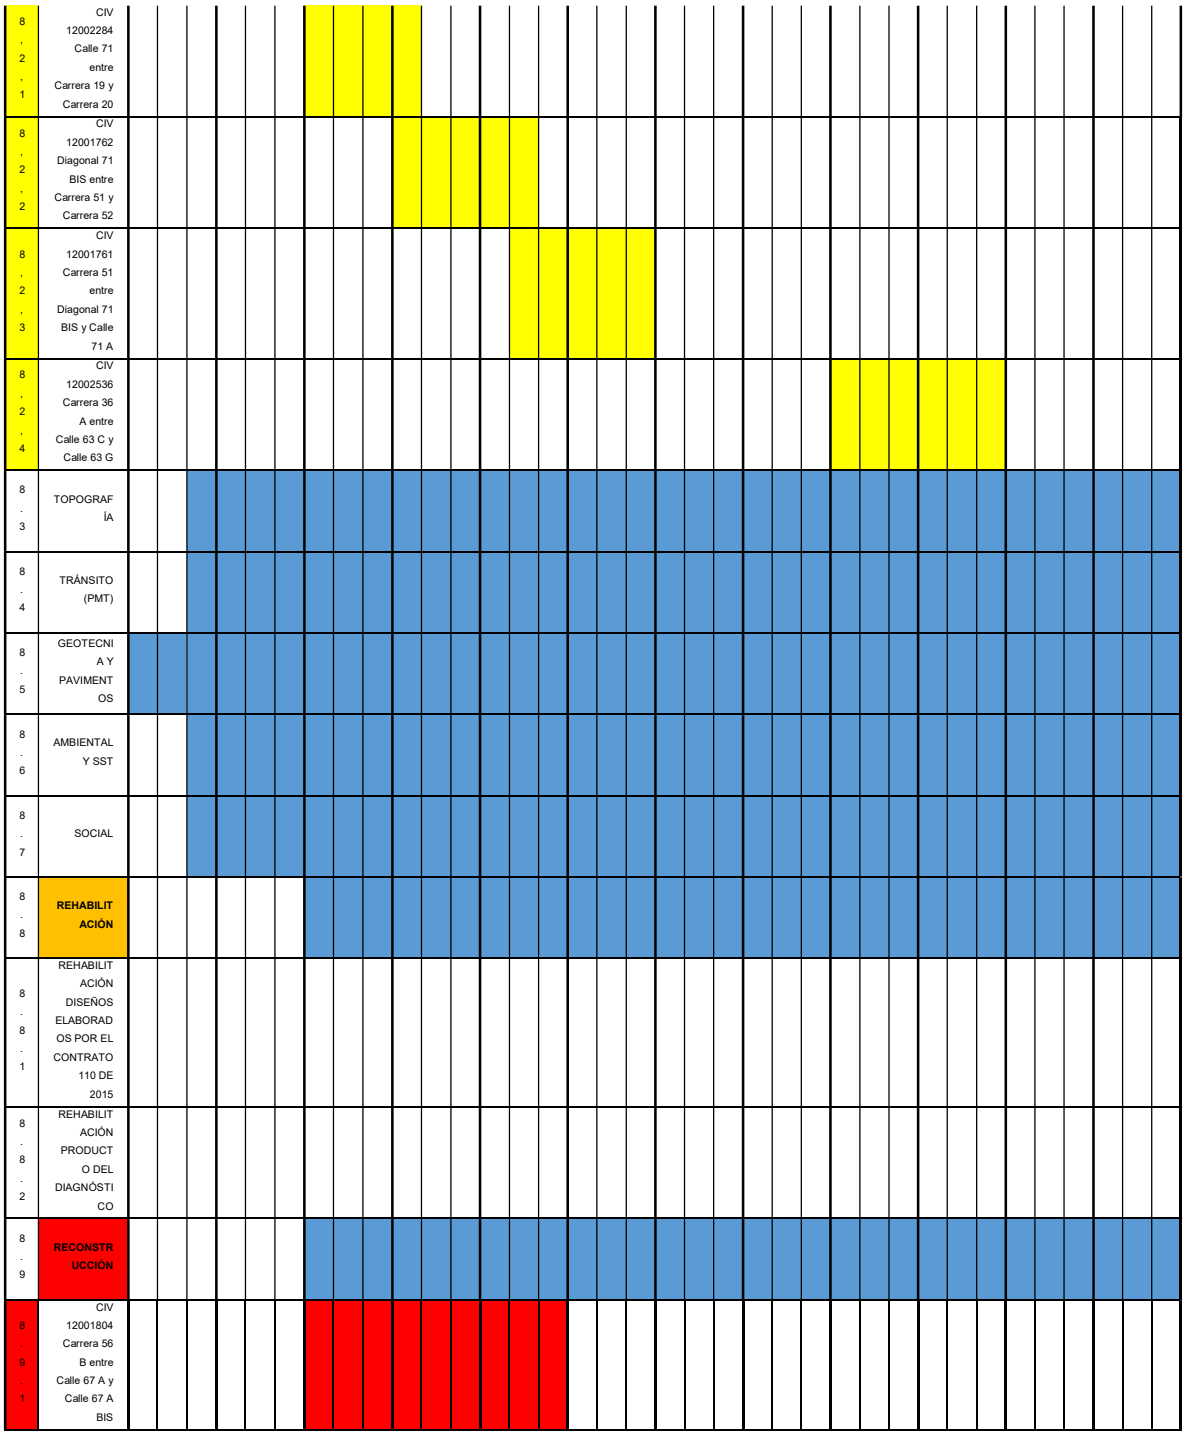


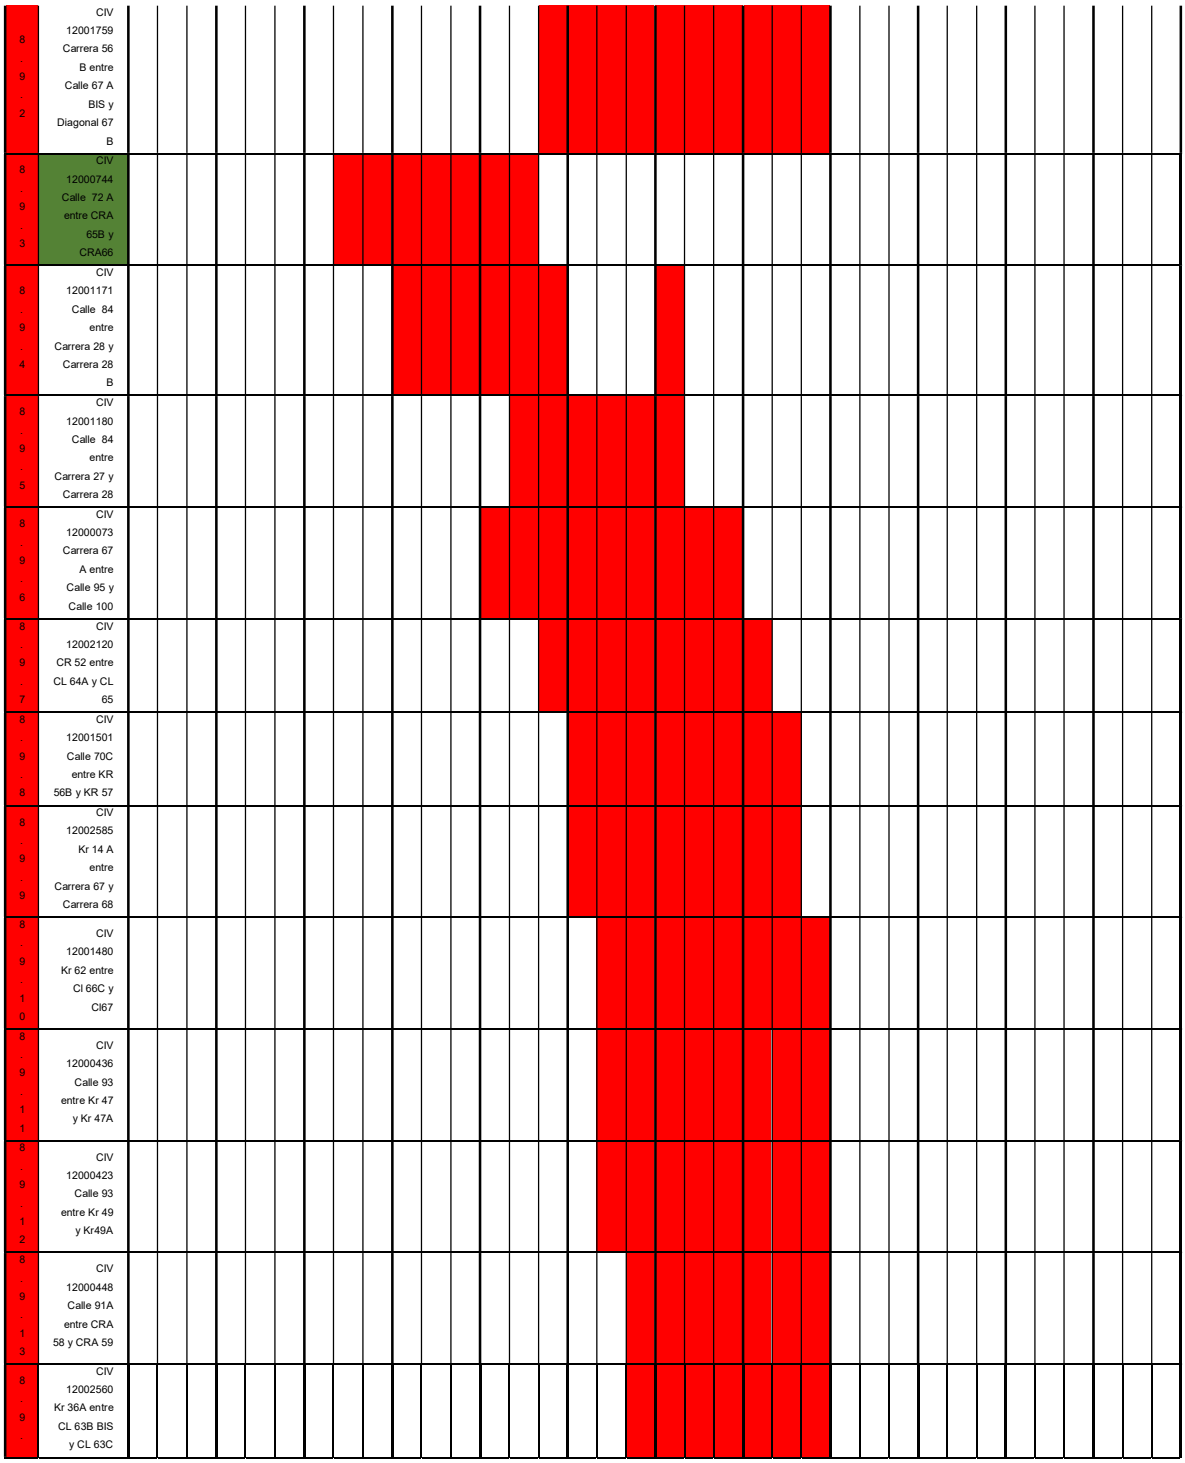
10. CRONOGRAMA ACTUALIZADO

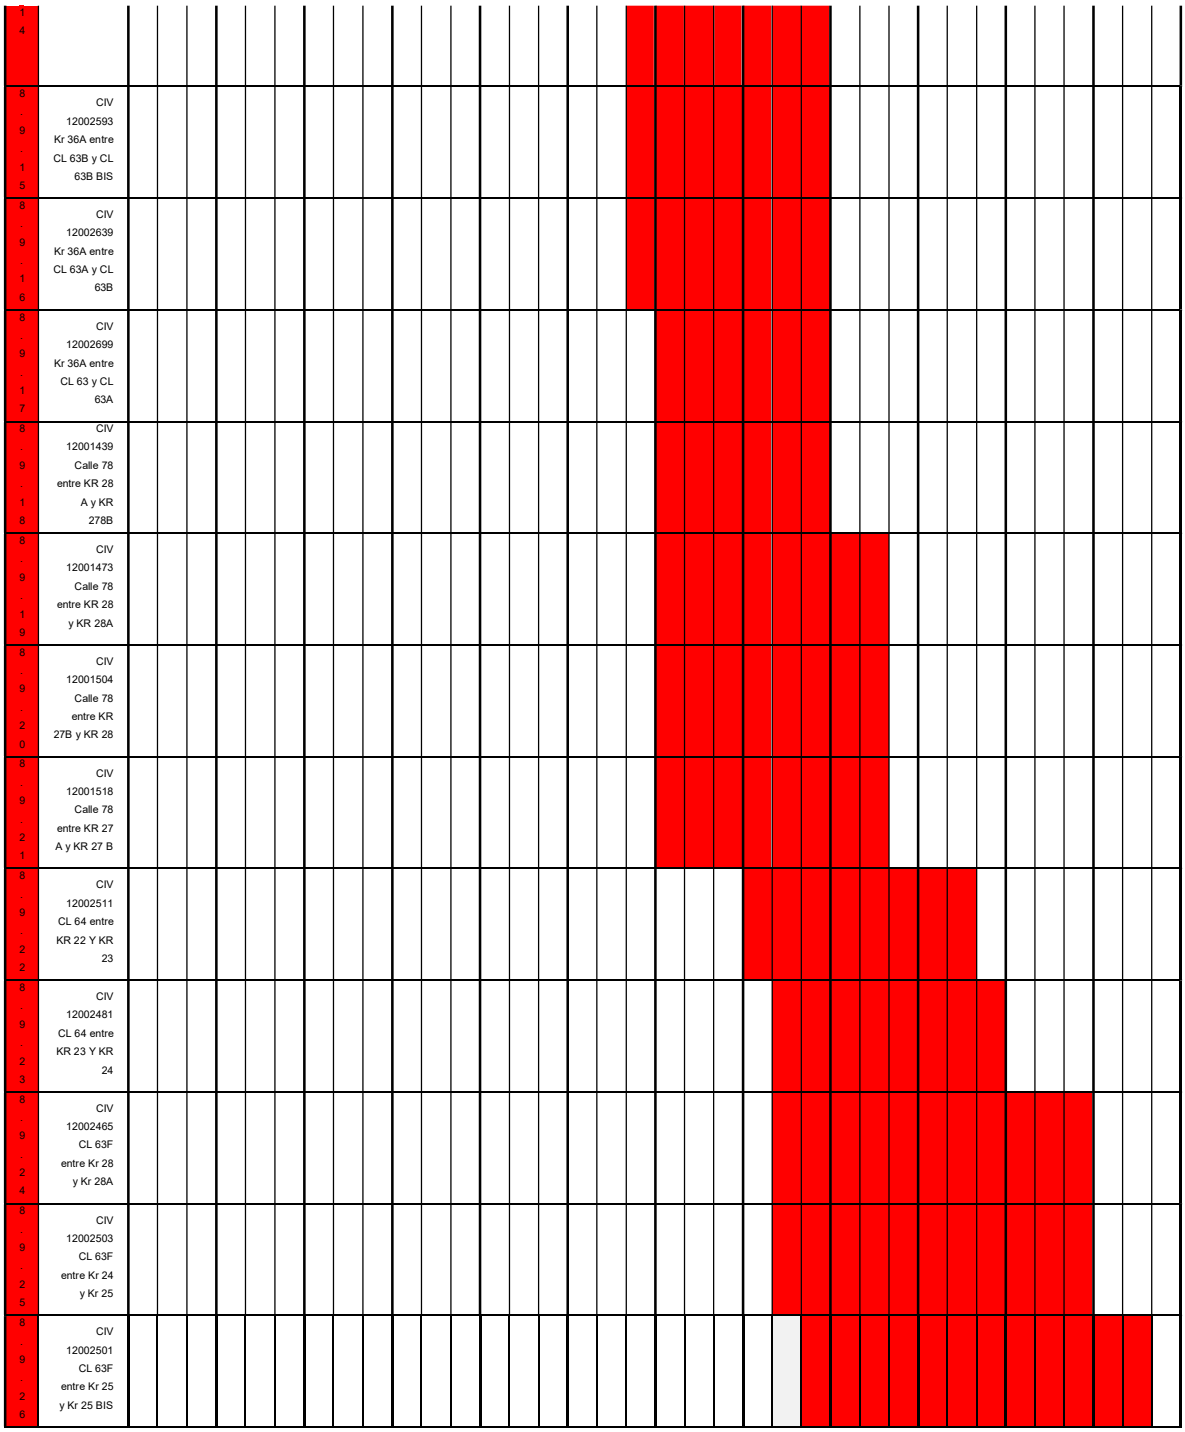
Se revisa el cronograma actualizado de las actividades presentado por el contratista.

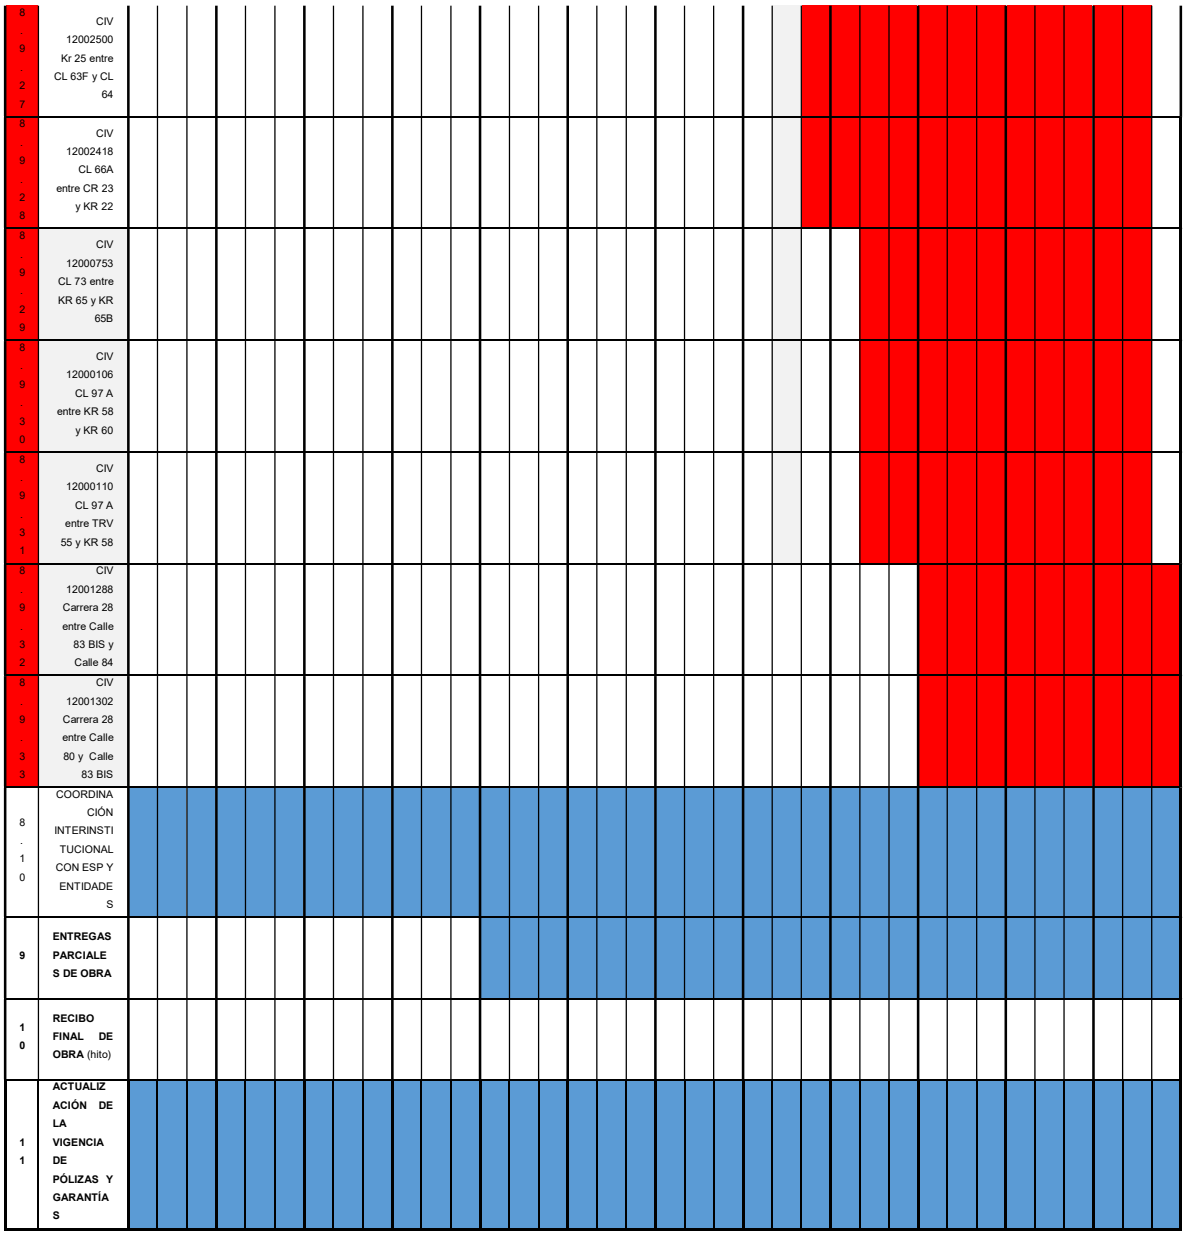
ÍTEM	ACTIVIDAD	DURACIÓN CONTRATO								ADICIÓN			
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	**INICIO** (hito)												
2	**ELABORACIÓN CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN**												
3	**APROPIACIÓN DE DISEÑOS**												
3.1	APROPIACIÓN DE LOS DISEÑOS ELABORADOS CON EL CONTRATO 110 DE 2015												
3.2	AJUSTES A LOS DISEÑOS (En caso de requerirse)												
4	**DIAGNÓSTICO**												
4.1	ELABORACIÓN DE FICHAS DE DIAGNÓSTICO POR CIV												
5	**ESTUDIOS**												
5.1	ENSAYOS DE LABORATORIO												
5.2	PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN												
6	**DISEÑOS POR COMPONENTES**												
6.1	TOPOGRAFÍA												


6.2 TRÁNSITO
6.3 DISEÑO GEOMÉTRICO
6.4 URBANISMO
6.5 REDES HIDRÁULICAS
6.6 REDES SECAS
6.7 GEOTECNIA Y PAVIMENTOS
6.8 ESTRUCTURAS
6.9 AMBIENTAL Y SST
6.10 SOCIAL
6.11 COORDINACIÓN DE LA GESTIÓN INTERINSTITUCIONAL
(ENTIDADES Y ESP)
6.12 APROBACIONES POR LAS ESP Y ENTIDADES DISTRITALES
7 ELABORACIÓN DEL PRESUPUESTO DETALLADO
8 INTERVENCIÓN (por frentes)
8.1 MANTENIMIENTO RUTINARIO
8.2 MANTENIMIENTO PERIÓDICO


8.2.1 CIV 12002284 Calle 71 entre Carrera 19 y Carrera 20
8.2.2 CIV 12001762 Diagonal 71 BIS entre Carrera 51 y Carrera 52
8.2.3 CIV 12001761 Carrera 51 entre Diagonal 71 BIS y Calle 71 A
8.2.4 CIV 12002536 Carrera 36 A entre Calle 63 C y Calle 63 G
8.3 TOPOGRAFÍA
8.4 TRÁNSITO (PMT)
8.5 GEOTECNIA Y PAVIMENTOS
8.6 AMBIENTAL Y SST
8.7 SOCIAL
8.8 REHABILITACIÓN
8.8.1 REHABILITACIÓN DISEÑOS ELABORADOS POR EL CONTRATO 110 DE 2015
8.8.2 REHABILITACIÓN PRODUCTO DEL DIAGNÓSTICO
8.9 RECONSTRUCCIÓN
8.9.1 CIV 12001804 Carrera 56 B entre Calle 67 A y Calle 67 A BIS


8.9.2
CIV 12001759 Carrera 56 B entre Calle 67 A BIS y Diagonal 67 B
8.9.3
CIV 12000744 Calle 72 A entre CRA 65B y CRA66
8.9.4
CIV 12001171 Calle 84 entre Carrera 28 y Carrera 28 B
8.9.5
CIV 12001180 Calle 84 entre Carrera 27 y Carrera 28
8.9.6
CIV 12000073 Carrera 67 A entre Calle 95 y Calle 100
8.9.7
CIV 12002120 CR 52 entre CL 64A y CL 65
8.9.8
CIV 12001501 Calle 70C entre KR 56B y KR 57
8.9.9
CIV 12002585 Kr 14 A entre Carrera 67 y Carrera 68
8.9.10
CIV 12001480 Kr 62 entre Cl 66C y Cl67
8.9.11
CIV 12000436 Calle 93 entre Kr 47 y Kr 47A
8.9.12
CIV 12000423 Calle 93 entre Kr 49 y Kr49A
8.9.13
CIV 12000448 Calle 91A entre CRA 58 y CRA 59
8.9.
CIV 12002560 Kr 36A entre CL 63B BIS y CL 63C


CIV 12002593 Kr 36A entre CL 63B y CL 63B BIS
CIV 12002639 Kr 36A entre CL 63A y CL 63B
CIV 12002699 Kr 36A entre CL 63 y CL 63A
CIV 12001439 Calle 78 entre KR 28 A y KR 278B
CIV 12001473 Calle 78 entre KR 28 y KR 28A
CIV 12001504 Calle 78 entre KR 27B y KR 28
CIV 12001518 Calle 78 entre KR 27 A y KR 27 B
CIV 12002511 CL 64 entre KR 22 Y KR 23
CIV 12002481 CL 64 entre KR 23 Y KR 24
CIV 12002465 CL 63F entre Kr 28 y Kr 28A
CIV 12002503 CL 63F entre Kr 24 y Kr 25
CIV 12002501 CL 63F entre Kr 25 y Kr 25 BIS


8.9.27
CIV 12002500 Kr 25 entre CL 63F y CL 64
8.9.28
CIV 12002418 CL 66A entre CR 23 y KR 22
8.9.29
CIV 12000753 CL 73 entre KR 65 y KR 65B
8.9.30
CIV 12000106 CL 97 A entre KR 58 y KR 60
8.9.31
CIV 12000110 CL 97 A entre TRV 55 y KR 58
8.9.32
CIV 12001288 Carrera 28 entre Calle 83 BIS y Calle 84
8.9.33
CIV 12001302 Carrera 28 entre Calle 80 y Calle 83 BIS
8.10
COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL CON ESP Y ENTIDADES
9
ENTREGAS PARCIALES DE OBRA
10
RECIBO FINAL DE OBRA (hito)
11
ACTUALIZACIÓN DE LA VIGENCIA DE PÓLIZAS Y GARANTÍAS

11. FACTURACIÓN

Para este periodo, el contratista presenta el acta parcial No. 7, dejando el siguiente balance del contrato, el porcentaje de ejecución corresponde a 81,24%

BALANCE DEL CONTRATO

VALOR DEL CONTRATO	$	7.770.000.000		
ADICIÓN 1	$	3.850.000.000		
VALOR EJECUTADO ACTA 1			$	892.068.794
VALOR EJECUTADO ACTA 2			$	807.254.710
VALOR EJECUTADO ACTA 3			$	968.891.149
VALOR EJECUTADO ACTA 4			$	1.103.284.426
VALOR EJECUTADO ACTA 5			$	2.949.570.000
VALOR EJECUTADO ACTA 6			$	1.549.570.000
VALOR EJECUTADO ACTA 7			$	924.380.000
VALOR POR EJECUTAR			$	2.259.600.000
SUMAS IGUALES	$	11.620.000.000	$	11.620.000.000

12. ALCANCE

Los alcances de la Interventoría son garantizar el cumplimiento de las actividades contratadas para el contrato de obra No. 241 de 2019 entre la Alcaldía Local Barrios Unidos y el contratista Consorcio Barrios Unidos 2020.

13. OBJETIVOS DE LA CALIDAD

Los objetivos de calidad que abarcan el proyecto están planteados de la siguiente forma:

- Realizar el proceso de recopilación y extracción de información para así mismo ofrecer una Interventoría oportuna y eficaz.
- Generar una mejora continua en los procesos de planificación, control y vigilancia de las obras de la malla vial.
- Elaborar diagnósticos de las zonas, adicionalmente la ejecución específica del mantenimiento y recuperación de las vías.
- Llevar un control minucioso del presupuesto determinado para el proyecto.

14. CONCLUSIONES

Para este perido de ejecucion se identificaron las siguientes conclusiones.

- Es absolutamente imperativo el cumplimiento de los protocolos de bio seguridad, cumpliendo con los requerimentos del gobierno nacional, frente a la emergencia sanitaria Covid-19
- Todos y cada uno de los diagnosticos deben ser presentados, verificados, avalados y aprobados por la supervisión y la interventoría
- Actuelmente se encuantra en tramite la aprobación del PMT de 3 CIV

25

FORMATO DIARIO			FONDO DE DESARROLLO ALCALDIA LOCAL DE BARRIOS UNIDOS
FECHA			INTERVENTORÍA Y CONTRUCIVILES SAS Contrato de Interventoría No. 242 de 2019
			CONSORCIO BARRIOS UNIDOS Contrato de Obra Pública No. 241 de 2019
29	1	2021	
DD	MM	AA	TIPO DE INTERVENCIÓN: REHABILITACIÓN VIAL

INFORME DIARIO DE INTERVENTORÍA

LOCALIZACIÓN	**BARRIO**	alcazeres	**CIV**		
NOMENCLATURA	calle 70	**DESDE**	carrera 24	**HASTA**	carrera 25 y carrera 26

NOMBRE DEL RESIDENTE INTERVENTOR	**Ing. JUAN PABLO LEMUS**
NOMBRE DEL RESIDENTE DE OBRA	**Ing. MANUEL RUIZ**

A. OBJETO DE MANTENIMIENTO

	BIEN	MAL
SEÑALIZACIÓN	X	
MANEJO DE ESCOMBROS	X	
MANEJO DE MATERIALES	X	
DOTACION	X	

LLUVIA	SI		NO	X	DURACIÓN
	MAÑANA				
	TARDE				
ACCIDENTES	SI		NO	X	

PERSONAL	CANT
Residente de obra	
Inspector de obra	1
Obreros	2
Operarios	1
Topografía	2
Brigadistas	-
Transito	2
Vigilantes	

EQUIPO	CANT
compresor	
Volquetas dobletroques	
imprimador	
Compactadoras	1
mini Cargadores	1
Finisher	
Cortadora	
excavadora	

BOSQUEJO DEL TRAMO



MATERIALES	UND	CANT
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
--	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

TEMPERATURA ASFALTO	TIPO:	
PLACA VOLQUETA	**LLEGADA**	**COMPACTACIÓN**
-	-	-
-	-	-

PRUEBAS DE LABORATORIO	CANT	UBICACIÓN
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

INVENTARIO			
SUMIDEROS	2	CAMARAS	
POZOS	2	DOMICILIARIAS	

ESTUVO PARADO EL FRENTE	SI	x	NO	X
RAZONES				

B. CONTROL DE VOLQUETAS

	PLACA	M3	ESCOMBRERA
CARGUE DE ESCOMBROS			
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-

TRANS MATERIAL	PLACA	M3	ORIGEN
sello	thr243	30	cantera
-	-	-	-
-	-	-	-

C. ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DÍA

el cosntratista realiza el figurado del hierro para refuerzo de los sumideros y hace el fundido de las tapas de los carcamos. Actividades realizadas en las abscisas k0+48

INSPECTOR DE INTERVENTORÍA



ROBINXON ALBEIRO GONZALEZ MENDEZ

25

FORMATO DIARIO			FONDO DE DESARROLLO ALCALDIA LOCAL DE BARRIOS UNIDOS
FECHA			INTERVENTORÍA Y CONTRUCIVILES SAS Contrato de Interventoría No. 242 de 2019
			CONSORCIO BARRIOS UNIDOS Contrato de Obra Pública No. 241 de 2019
1	2	2021	
DD	MM	AA	TIPO DE INTERVENCIÓN: REHABILITACIÓN VIAL

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS
SECRETARÍA DE CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE

INFORME DIARIO DE INTERVENTORÍA

LOCALIZACIÓN	**BARRIO**	alcazeres	**CIV**		
NOMENCLATURA	calle 70	**DESDE**	carrera 24	**HASTA**	carrera 25 y carrera 26

NOMBRE DEL RESIDENTE INTERVENTOR	**Ing. JUAN PABLO LEMUS**
NOMBRE DEL RESIDENTE DE OBRA	**Ing. MANUEL RUIZ**

A. OBJETO DE MANTENIMIENTO

	BIEN	MAL
SEÑALIZACIÓN	X	
MANEJO DE ESCOMBROS	X	
MANEJO DE MATERIALES	X	
DOTACION	X	

LLUVIA	SI		NO	X	DURACIÓN
	MAÑANA				
	TARDE				
ACCIDENTES	SI		NO	X	

PERSONAL	CANT
Residente de obra	
Inspector de obra	2
Obreros	2
Operarios	1
Topografía	2
Brigadistas	-
Transito	2
Vigilantes	

EQUIPO	CANT
compresor	
Volquetas dobletroques	
imprimador	
Compactadoras	1
mini Cargadores	1
Finisher	
Cortadora	
excavadora	

BOSQUEJO DEL TRAMO



MATERIALES	UND	CANT
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
--	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

TEMPERATURA ASFALTO	TIPO:	
PLACA VOLQUETA	**LLEGADA**	**COMPACTACIÓN**
-	-	-
-	-	-

PRUEBAS DE LABORATORIO	CANT	UBICACIÓN
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

INVENTARIO			
SUMIDEROS	2	CAMARAS	
POZOS	2	DOMICILIARIAS	

ESTUVO PARADO EL FRENTE	SI	x	NO	X
RAZONES				

B. CONTROL DE VOLQUETAS

CARGUE DE ESCOMBROS	PLACA	M3	ESCOMBRERA
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-

TRANS MATERIAL	PLACA	M3	ORIGEN
-	-	-	-
-	-	-	-

C. ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DÍA

el contratista realiza actividad de extendido y compactacion del sello sobre lel cruce de la carrera 25 de forma manual ya que se encuentra con los pozos de inspeccion ubicados alli.

INSPECTOR DE INTERVENTORÍA

ROBINXON ALBEIRO GONZALEZ MENDEZ

25

FORMATO DIARIO			FONDO DE DESARROLLO ALCALDIA LOCAL DE BARRIOS UNIDOS
FECHA			INTERVENTORÍA Y CONTRUCIVILES SAS Contrato de Interventoría No. 242 de 2019
			CONSORCIO BARRIOS UNIDOS Contrato de Obra Pública No. 241 de 2019
2	2	2021	
DD	MM	AA	TIPO DE INTERVENCIÓN: REHABILITACIÓN VIAL

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS
SECRETARÍA DE CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE

INFORME DIARIO DE INTERVENTORÍA

LOCALIZACIÓN	**BARRIO**	alcazeres	**CIV**		
NOMENCLATURA	calle 70	**DESDE**	carrera 24	**HASTA**	carrera 25 y carrera 26

NOMBRE DEL RESIDENTE INTERVENTOR	**Ing. JUAN PABLO LEMUS**
NOMBRE DEL RESIDENTE DE OBRA	**Ing. MANUEL RUIZ**

A. OBJETO DE MANTENIMIENTO

	BIEN	MAL
SEÑALIZACIÓN	X	
MANEJO DE ESCOMBROS	X	
MANEJO DE MATERIALES	X	
DOTACION	X	

LLUVIA	SI		NO	X	DURACIÓN
	MAÑANA				
	TARDE				
ACCIDENTES	SI		NO	X	

PERSONAL	CANT
Residente de obra	
Inspector de obra	2
Obreros	2
Operarios	1
Topografía	2
Brigadistas	-
Transito	2
Vigilantes	

EQUIPO	CANT
compresor	
Volquetas dobletroques	
imprimador	
Compactadoras	1
mini Cargadores	1
Finisher	
Cortadora	
excavadora	

BOSQUEJO DEL TRAMO



MATERIALES	UND	CANT
cargues	UND	2
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
--	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

TEMPERATURA ASFALTO	TIPO:	
PLACA VOLQUETA	**LLEGADA**	**COMPACTACIÓN**
-	-	-
-	-	-

PRUEBAS DE LABORATORIO	CANT	UBICACIÓN
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

INVENTARIO			
SUMIDEROS	2	CAMARAS	
POZOS	2	DOMICILIARIAS	

ESTUVO PARADO EL FRENTE	SI	x	NO	X
RAZONES				

B. CONTROL DE VOLQUETAS

	PLACA	M3	ESCOMBRERA
CARGUE DE ESCOMBROS			
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-

TRANS MATERIAL	PLACA	M3	ORIGEN
-	-	-	-
-	-	-	-

C. ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DÍA

el contratista realiza la instalacion de 2 cargues y hace la instalacion del hierro de refuerso para los sumideros sobre a abscisa k0+48.

INSPECTOR DE INTERVENTORÍA



ROBINXON ALBEIRO GONZALEZ MENDEZ

25

FORMATO DIARIO			FONDO DE DESARROLLO ALCALDIA LOCAL DE BARRIOS UNIDOS
FECHA			INTERVENTORÍA Y CONTRUCIVILES SAS Contrato de Interventoría No. 242 de 2019
			CONSORCIO BARRIOS UNIDOS Contrato de Obra Pública No. 241 de 2019
3	2	2021	
DD	MM	AA	TIPO DE INTERVENCIÓN: REHABILITACIÓN VIAL

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE — BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

INFORME DIARIO DE INTERVENTORÍA

LOCALIZACIÓN	**BARRIO**	alcazeres	**CIV**		
NOMENCLATURA	calle 70	**DESDE**	carrera 24	**HASTA**	carrera 25 y carrera 26

NOMBRE DEL RESIDENTE INTERVENTOR	**Ing. JUAN PABLO LEMUS**
NOMBRE DEL RESIDENTE DE OBRA	**Ing. MANUEL RUIZ**

A. OBJETO DE MANTENIMIENTO

	BIEN	MAL
SEÑALIZACIÓN	X	
MANEJO DE ESCOMBROS	X	
MANEJO DE MATERIALES	X	
DOTACION	X	

LLUVIA	SI		NO	X	DURACIÓN
	MAÑANA				
	TARDE				
ACCIDENTES	SI		NO	X	

PERSONAL

	CANT
Residente de obra	
Inspector de obra	2
Obreros	2
Operarios	1
Topografía	2
Brigadistas	-
Transito	2
Vigilantes	

EQUIPO

	CANT
compresor	
Volquetas dobletroques	
imprimador	
Compactadoras	1
mini Cargadores	1
Finisher	
Cortadora	
excavadora	

BOSQUEJO DEL TRAMO



MATERIALES

	UND	CANT
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
--	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

TEMPERATURA ASFALTO	TIPO:	
PLACA VOLQUETA	**LLEGADA**	**COMPACTACIÓN**
-	-	-
-	-	-

PRUEBAS DE LABORATORIO	**CANT**	**UBICACIÓN**
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

INVENTARIO

SUMIDEROS	2	CAMARAS	
POZOS	2	DOMICILIARIAS	

ESTUVO PARADO EL FRENTE	SI	x	NO	X
RAZONES				

B. CONTROL DE VOLQUETAS

CARGUE DE ESCOMBROS	PLACA	M3	ESCOMBRERA
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-

TRANS MATERIAL	PLACA	M3	ORIGEN
-	-	-	-
-	-	-	-

C. ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DÍA

el contratista realiza la instalacion del encofrado de los sumideros sobre las abscisas ko+48 y continua con la extendida del sello y su compactacion.

INSPECTOR DE INTERVENTORÍA



ROBINXON ALBEIRO GONZALEZ MENDEZ

25

FORMATO DIARIO			FONDO DE DESARROLLO ALCALDIA LOCAL DE BARRIOS UNIDOS
FECHA			INTERVENTORÍA Y CONTRUCIVILES SAS Contrato de Interventoría No. 242 de 2019
			CONSORCIO BARRIOS UNIDOS Contrato de Obra Pública No. 241 de 2019
4	2	2021	
DD	MM	AA	TIPO DE INTERVENCIÓN: REHABILITACIÓN VIAL

INFORME DIARIO DE INTERVENTORÍA

LOCALIZACIÓN	**BARRIO**	alcazeres	**CIV**		
NOMENCLATURA	calle 70	**DESDE**	carrera 24	**HASTA**	carrera 25 y carrera 26

NOMBRE DEL RESIDENTE INTERVENTOR	**Ing. JUAN PABLO LEMUS**
NOMBRE DEL RESIDENTE DE OBRA	**Ing. MANUEL RUIZ**

A. OBJETO DE MANTENIMIENTO

	BIEN	MAL
SEÑALIZACIÓN	X	
MANEJO DE ESCOMBROS	X	
MANEJO DE MATERIALES	X	
DOTACION	X	

LLUVIA	SI		NO	X	DURACIÓN
	MAÑANA				
	TARDE				
ACCIDENTES	SI		NO	X	

PERSONAL	CANT
Residente de obra	
Inspector de obra	2
Obreros	3
Operarios	1
Topografía	2
Brigadistas	-
Transito	2
Vigilantes	

EQUIPO	CANT
compresor	
camion concreto	1
imprimador	
Compactadoras	1
mini Cargadores	1
Finisher	
Cortadora	
excavadora	

BOSQUEJO DEL TRAMO



MATERIALES	UND	CANT
concreto	m3	7
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
--	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

TEMPERATURA ASFALTO	TIPO:	
PLACA VOLQUETA	LLEGADA	COMPACTACIÓN
-	-	-
-	-	-

PRUEBAS DE LABORATORIO	CANT	UBICACIÓN
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

INVENTARIO			
SUMIDEROS	2	CAMARAS	
POZOS	2	DOMICILIARIAS	

ESTUVO PARADO EL FRENTE	SI	x	NO	X
RAZONES				

B. CONTROL DE VOLQUETAS

	PLACA	M3	ESCOMBRERA
CARGUE DE ESCOMBROS			
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-

TRANS MATERIAL	PLACA	M3	ORIGEN
concreto	trn239	7	planta
-	-	-	-
-	-	-	-

C. ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DÍA

se realiza el fundido de 2 sumideros sobre las abscisas k0+48 y se prosede hacer el seriado de el sello.

INSPECTOR DE INTERVENTORÍA



ROBINXON ALBEIRO GONZALEZ MENDEZ

FORMATO DIARIO			FONDO DE DESARROLLO ALCALDIA LOCAL DE BARRIOS UNIDOS
FECHA			INTERVENTORÍA Y CONTRUCIVILES SAS Contrato de Interventoría No. 242 de 2019
			CONSORCIO BARRIOS UNIDOS Contrato de Obra Pública No. 241 de 2019
5	2	2021	
DD	MM	AA	TIPO DE INTERVENCIÓN: REHABILITACIÓN VIAL

INFORME DIARIO DE INTERVENTORÍA

LOCALIZACIÓN	**BARRIO**	alcazeres	**CIV**		
NOMENCLATURA	calle 70	**DESDE**	carrera 24	**HASTA**	carrera 25 y carrera 26

NOMBRE DEL RESIDENTE INTERVENTOR	**Ing. JUAN PABLO LEMUS**
NOMBRE DEL RESIDENTE DE OBRA	**Ing. MANUEL RUIZ**

A. OBJETO DE MANTENIMIENTO

	BIEN	MAL
SEÑALIZACIÓN	X	
MANEJO DE ESCOMBROS	X	
MANEJO DE MATERIALES	X	
DOTACION	X	

LLUVIA	SI		NO	X	DURACIÓN
	MAÑANA				
	TARDE				
ACCIDENTES	SI		NO	X	

PERSONAL	CANT
Residente de obra	
Inspector de obra	2
Obreros	2
Operarios	1
Topografía	2
Brigadistas	-
Transito	2
Vigilantes	

EQUIPO	CANT
compresor	
Volquetas dobletroques	
imprimador	
Compactadoras	1
mini Cargadores	1
Finisher	
Cortadora	
excavadora	

BOSQUEJO DEL TRAMO



MATERIALES	UND	CANT
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
--	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

TEMPERATURA ASFALTO	TIPO:	
PLACA VOLQUETA	**LLEGADA**	**COMPACTACIÓN**
-	-	-
-	-	-

PRUEBAS DE LABORATORIO	CANT	UBICACIÓN
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

INVENTARIO			
SUMIDEROS	2	CAMARAS	
POZOS	2	DOMICILIARIAS	

ESTUVO PARADO EL FRENTE	SI	x	NO	X
RAZONES				

B. CONTROL DE VOLQUETAS

CARGUE DE ESCOMBROS	PLACA	M3	ESCOMBRERA
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-

TRANS MATERIAL	PLACA	M3	ORIGEN
-	-	-	-
-	-	-	-

C. ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DÍA

se realiza seriado del sello en los puntos que se evidenciaron con fallas. Se hace el desencofrado de kos sumideros.

INSPECTOR DE INTERVENTORÍA

ROBINXON ALBEIRO GONZALEZ MENDEZ

25

FORMATO DIARIO			FONDO DE DESARROLLO ALCALDIA LOCAL DE BARRIOS UNIDOS
FECHA			INTERVENTORÍA Y CONTRUCIVILES SAS Contrato de Interventoría No. 242 de 2019
			CONSORCIO BARRIOS UNIDOS Contrato de Obra Pública No. 241 de 2019
6	2	2021	
DD	MM	AA	TIPO DE INTERVENCIÓN: REHABILITACIÓN VIAL

INFORME DIARIO DE INTERVENTORÍA

LOCALIZACIÓN	**BARRIO**	alcazeres	**CIV**		
NOMENCLATURA	calle 70	**DESDE**	carrera 24	**HASTA**	carrera 25 y carrera 26

NOMBRE DEL RESIDENTE INTERVENTOR	**Ing. JUAN PABLO LEMUS**
NOMBRE DEL RESIDENTE DE OBRA	**Ing. MANUEL RUIZ**

A. OBJETO DE MANTENIMIENTO

	BIEN	MAL
SEÑALIZACIÓN	X	
MANEJO DE ESCOMBROS	X	
MANEJO DE MATERIALES	X	
DOTACION	X	

LLUVIA	SI		NO	X	DURACIÓN
	MAÑANA				
	TARDE				
ACCIDENTES	SI		NO	X	

PERSONAL	CANT
Residente de obra	
Inspector de obra	2
Obreros	2
Operarios	1
Topografía	2
Brigadistas	-
Transito	2
Vigilantes	

EQUIPO	CANT
compresor	
Volquetas dobletroques	
imprimador	
Compactadoras	1
mini Cargadores	1
Finisher	
Cortadora	
excavadora	

BOSQUEJO DEL TRAMO



MATERIALES	UND	CANT
sub base	m3	15
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
--	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

TEMPERATURA ASFALTO	TIPO:	
PLACA VOLQUETA	LLEGADA	COMPACTACIÓN
-	-	-
-	-	-

PRUEBAS DE LABORATORIO	CANT	UBICACIÓN
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

INVENTARIO			
SUMIDEROS	2	CAMARAS	
POZOS	2	DOMICILIARIAS	

ESTUVO PARADO EL FRENTE	SI	x	NO	X
RAZONES				

B. CONTROL DE VOLQUETAS

	PLACA	M3	ESCOMBRERA
CARGUE DE ESCOMBROS	srt364	15	maquinas amarillas
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-

TRANS MATERIAL	PLACA	M3	ORIGEN
sub base tipo c	srt364	15canter	
-	-	-	-
-	-	-	-

C. ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DÍA

el contratista realiza limpieza de escombro producto de la obra. Se realiza suministro de base para el mbr

INSPECTOR DE INTERVENTORÍA



ROBINXON ALBEIRO GONZALEZ MENDEZ

25

FORMATO DIARIO			FONDO DE DESARROLLO ALCALDIA LOCAL DE BARRIOS UNIDOS
FECHA			INTERVENTORÍA Y CONTRUCIVILES SAS Contrato de Interventoría No. 242 de 2019
			CONSORCIO BARRIOS UNIDOS Contrato de Obra Pública No. 241 de 2019
8	2	2021	
DD	MM	AA	TIPO DE INTERVENCIÓN: REHABILITACIÓN VIAL

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. | BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS
SECRETARÍA DE CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE

INFORME DIARIO DE INTERVENTORÍA

LOCALIZACIÓN	**BARRIO**	alcazeres	**CIV**		
NOMENCLATURA	calle 70	**DESDE**	carrera 24	**HASTA**	carrera 25 y carrera 26

NOMBRE DEL RESIDENTE INTERVENTOR	**Ing. JUAN PABLO LEMUS**
NOMBRE DEL RESIDENTE DE OBRA	**Ing. MANUEL RUIZ**

A. OBJETO DE MANTENIMIENTO

	BIEN	MAL
SEÑALIZACIÓN	X	
MANEJO DE ESCOMBROS	X	
MANEJO DE MATERIALES	X	
DOTACION	X	

LLUVIA	SI		NO	X	DURACIÓN
	MAÑANA				
	TARDE				
ACCIDENTES	SI		NO	X	

PERSONAL

	CANT
Residente de obra	
Inspector de obra	2
Obreros	2
Operarios	1
Topografía	2
Brigadistas	-
Transito	2
Vigilantes	

EQUIPO

	CANT
compresor	
Volquetas dobletroques	
imprimador	
Compactadoras	1
mini Cargadores	1
Finisher	
Cortadora	
excavadora	

BOSQUEJO DEL TRAMO



MATERIALES

	UND	CANT
fresado	m3	7,5
sub base tio c	m3	7,5
cemento	kl	350
emulsion asfaltica	lt	1100
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
--	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

TEMPERATURA ASFALTO		TIPO:	
PLACA VOLQUETA	**LLEGADA**	**COMPACTACIÓN**	
-	-	-	
-	-	-	

PRUEBAS DE LABORATORIO	**CANT**	**UBICACIÓN**
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

INVENTARIO

SUMIDEROS	2	CAMARAS	
POZOS	2	DOMICILIARIAS	

ESTUVO PARADO EL FRENTE	SI	x	NO	X
RAZONES				

B. CONTROL DE VOLQUETAS

	PLACA	M3	ESCOMBRERA
CARGUE DE ESCOMBROS			
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-

TRANS MATERIAL	PLACA	M3	ORIGEN
-	-	-	-
-	-	-	-

C. ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DÍA

se realiza el mezclado e instalado de 15 m3 de mbr los cuales se extienden sobre las abscisas k0+05 a k0+18 con un espesor promedio de 13 centimetros.

INSPECTOR DE INTERVENTORÍA



ROBINXON ALBEIRO GONZALEZ MENDEZ

25

FORMATO DIARIO			FONDO DE DESARROLLO ALCALDIA LOCAL DE BARRIOS UNIDOS
FECHA			INTERVENTORÍA Y CONTRUCIVILES SAS Contrato de Interventoría No. 242 de 2019
			CONSORCIO BARRIOS UNIDOS Contrato de Obra Pública No. 241 de 2019
9	2	2021	
DD	MM	AA	TIPO DE INTERVENCIÓN: REHABILITACIÓN VIAL

INFORME DIARIO DE INTERVENTORÍA

LOCALIZACIÓN	**BARRIO**	alcazeres	**CIV**		
NOMENCLATURA	calle 70	**DESDE**	carrera 24	**HASTA**	carrera 25 y carrera 26

NOMBRE DEL RESIDENTE INTERVENTOR	**Ing. JUAN PABLO LEMUS**
NOMBRE DEL RESIDENTE DE OBRA	**Ing. MANUEL RUIZ**

A. OBJETO DE MANTENIMIENTO

	BIEN	MAL
SEÑALIZACIÓN	X	
MANEJO DE ESCOMBROS	X	
MANEJO DE MATERIALES	X	
DOTACION	X	

LLUVIA	SI		NO	X	DURACIÓN
	MAÑANA				
	TARDE				
ACCIDENTES	SI		NO	X	

PERSONAL	CANT
Residente de obra	
Inspector de obra	2
Obreros	2
Operarios	1
Topografía	2
Brigadistas	-
Transito	2
Vigilantes	

EQUIPO	CANT
compresor	
Volquetas dobletroques	
imprimador	
Compactadoras	1
mini Cargadores	1
Finisher	
Cortadora	
excavadora	

BOSQUEJO DEL TRAMO



MATERIALES	UND	CANT
sub base tipo c	m3	7,5
fresado	m3	7,5
cemento	kl	350
emulsion asfaltica	lt	1100
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
--	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

TEMPERATURA ASFALTO		TIPO:	
PLACA VOLQUETA	**LLEGADA**	**COMPACTACIÓN**	
-	-	-	
-	-	-	

PRUEBAS DE LABORATORIO	CANT	UBICACIÓN
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

INVENTARIO			
SUMIDEROS	2	CAMARAS	
POZOS	2	DOMICILIARIAS	

ESTUVO PARADO EL FRENTE	SI	x	NO	X
RAZONES				

B. CONTROL DE VOLQUETAS

CARGUE DE ESCOMBROS	PLACA	M3	ESCOMBRERA
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-

TRANS MATERIAL	PLACA	M3	ORIGEN
-	-	-	-
-	-	-	-

C. ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DÍA

se realiza el mezclado e instalado de 15 m3 de mbr los cuales se extienden sobre las abscisas k0+18 a k0+32 con un espesor promedio de 13 centimetros.

INSPECTOR DE INTERVENTORÍA



ROBINXON ALBEIRO GONZALEZ MENDEZ

25

FORMATO DIARIO			FONDO DE DESARROLLO ALCALDIA LOCAL DE BARRIOS UNIDOS
FECHA			INTERVENTORÍA Y CONTRUCIVILES SAS Contrato de Interventoría No. 242 de 2019
			CONSORCIO BARRIOS UNIDOS Contrato de Obra Pública No. 241 de 2019
10	2	2021	
DD	MM	AA	TIPO DE INTERVENCIÓN: REHABILITACIÓN VIAL

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. | BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS
SECRETARÍA DE CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE

INFORME DIARIO DE INTERVENTORÍA

LOCALIZACIÓN	**BARRIO**	alcazeres	**CIV**		
NOMENCLATURA	calle 70	**DESDE**	carrera 24	**HASTA**	carrera 25 y carrera 26

NOMBRE DEL RESIDENTE INTERVENTOR	**Ing. JUAN PABLO LEMUS**
NOMBRE DEL RESIDENTE DE OBRA	**Ing. MANUEL RUIZ**

A. OBJETO DE MANTENIMIENTO

	BIEN	MAL
SEÑALIZACIÓN	X	
MANEJO DE ESCOMBROS	X	
MANEJO DE MATERIALES	X	
DOTACION	X	

LLUVIA	SI		NO	X	DURACIÓN
	MAÑANA				
	TARDE				
ACCIDENTES	SI		NO	X	

PERSONAL	CANT
Residente de obra	
Inspector de obra	2
Obreros	2
Operarios	1
Topografía	2
Brigadistas	-
Transito	2
Vigilantes	

EQUIPO	CANT
compresor	
Volquetas dobletroques	
imprimador	
Compactadoras	1
mini Cargadores	1
Finisher	
Cortadora	
excavadora	

BOSQUEJO DEL TRAMO



MATERIALES	UND	CANT
cemento	kl	350
emulsion asfaltica	lt	1100
sub base tipo c	m3	7,5
fresado	m3	7,5
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
--	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

TEMPERATURA ASFALTO		TIPO:	
PLACA VOLQUETA	**LLEGADA**	**COMPACTACIÓN**	
-	-	-	
-	-	-	

PRUEBAS DE LABORATORIO	CANT	UBICACIÓN
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

INVENTARIO			
SUMIDEROS	2	CAMARAS	
POZOS	2	DOMICILIARIAS	

ESTUVO PARADO EL FRENTE	SI	x	NO	X
RAZONES				

B. CONTROL DE VOLQUETAS

	PLACA	M3	ESCOMBRERA
CARGUE DE ESCOMBROS			
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-

TRANS MATERIAL	PLACA	M3	ORIGEN
sub base	hdg565	15	cantera
fresado	dhg580	15	interno
-	-	-	-
-	-	-	-

C. ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DÍA

se realiza el mezclado e instalado de 15 m3 de mbr los cuales se extienden sobre las abscisas k0+32 a k0+50 con un espesor promedio de 13 centimetros

INSPECTOR DE INTERVENTORÍA



ROBINXON ALBEIRO GONZALEZ MENDEZ

FORMATO DIARIO			FONDO DE DESARROLLO ALCALDIA LOCAL DE BARRIOS UNIDOS
FECHA			INTERVENTORÍA Y CONTRUCIVILES SAS Contrato de Interventoría No. 242 de 2019
			CONSORCIO BARRIOS UNIDOS Contrato de Obra Pública No. 241 de 2019
11	2	2021	
DD	MM	AA	TIPO DE INTERVENCIÓN: REHABILITACIÓN VIAL

INFORME DIARIO DE INTERVENTORÍA

LOCALIZACIÓN	**BARRIO**	alcazeres	**CIV**		
NOMENCLATURA	calle 70	**DESDE**	carrera 24	**HASTA**	carrera 25 y carrera 26

NOMBRE DEL RESIDENTE INTERVENTOR	**Ing. JUAN PABLO LEMUS**
NOMBRE DEL RESIDENTE DE OBRA	**Ing. MANUEL RUIZ**

A. OBJETO DE MANTENIMIENTO

	BIEN	MAL
SEÑALIZACIÓN	X	
MANEJO DE ESCOMBROS	X	
MANEJO DE MATERIALES	X	
DOTACION	X	

LLUVIA	SI		NO	X	DURACIÓN
	MAÑANA				
	TARDE				
ACCIDENTES	SI		NO	X	

PERSONAL	CANT
Residente de obra	
Inspector de obra	2
Obreros	2
Operarios	1
Topografía	2
Brigadistas	-
Transito	2
Vigilantes	

EQUIPO	CANT
compresor	
Volquetas dobletroques	
imprimador	
Compactadoras	1
mini Cargadores	1
Finisher	
Cortadora	
excavadora	

BOSQUEJO DEL TRAMO



MATERIALES	UND	CANT
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
--	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

TEMPERATURA ASFALTO	TIPO:	
PLACA VOLQUETA	LLEGADA	COMPACTACIÓN
-	-	-
-	-	-

PRUEBAS DE LABORATORIO	CANT	UBICACIÓN
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

INVENTARIO			
SUMIDEROS	2	CAMARAS	
POZOS	2	DOMICILIARIAS	

ESTUVO PARADO EL FRENTE	SI	x	NO	X
RAZONES				

B. CONTROL DE VOLQUETAS

CARGUE DE ESCOMBROS	PLACA	M3	ESCOMBRERA
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-

TRANS MATERIAL	PLACA	M3	ORIGEN
-	-	-	-
-	-	-	-

C. ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DÍA

EL CONRATISTA RELAIZA ACTIVIDADES DE FIGURADO DE HIERRO PARA 2 SUMINEROS QUE SE CONSTRUIRAN EN LAS ABSCISAS K0+115

INSPECTOR DE INTERVENTORÍA

ROBINXON ALBEIRO GONZALEZ MENDEZ

25

FORMATO DIARIO			FONDO DE DESARROLLO ALCALDIA LOCAL DE BARRIOS UNIDOS
FECHA			INTERVENTORÍA Y CONTRUCIVILES SAS Contrato de Interventoría No. 242 de 2019
			CONSORCIO BARRIOS UNIDOS Contrato de Obra Pública No. 241 de 2019
12	2	2021	
DD	MM	AA	TIPO DE INTERVENCIÓN: REHABILITACIÓN VIAL

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE — BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

INFORME DIARIO DE INTERVENTORÍA

LOCALIZACIÓN	**BARRIO**	alcazeres	**CIV**		
NOMENCLATURA	calle 70	**DESDE**	carrera 24	**HASTA**	carrera 25 y carrera 26

NOMBRE DEL RESIDENTE INTERVENTOR	**Ing. JUAN PABLO LEMUS**
NOMBRE DEL RESIDENTE DE OBRA	**Ing. MANUEL RUIZ**

A. OBJETO DE MANTENIMIENTO

	BIEN	MAL
SEÑALIZACIÓN	X	
MANEJO DE ESCOMBROS	X	
MANEJO DE MATERIALES	X	
DOTACION	X	

LLUVIA	SI		NO	X	DURACIÓN
	MAÑANA				
	TARDE				
ACCIDENTES	SI		NO	X	

PERSONAL	CANT
Residente de obra	
Inspector de obra	2
Obreros	2
Operarios	1
Topografía	2
Brigadistas	-
Transito	2
Vigilantes	

EQUIPO	CANT
compresor	
Volquetas dobletroques	
imprimador	
Compactadoras	1
mini Cargadores	1
Finisher	
Cortadora	
excavadora	

BOSQUEJO DEL TRAMO



MATERIALES	UND	CANT
EMULSION ASFALTICA	LT	1250
CEMENTO	KL	350
GEO MALLA	M2	105
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
--	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

TEMPERATURA ASFALTO	TIPO:	
PLACA VOLQUETA	**LLEGADA**	**COMPACTACIÓN**
-	-	-
-	-	-

PRUEBAS DE LABORATORIO	CANT	UBICACIÓN
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

INVENTARIO			
SUMIDEROS	2	CAMARAS	
POZOS	2	DOMICILIARIAS	

ESTUVO PARADO EL FRENTE	SI	x	NO	X
RAZONES				

B. CONTROL DE VOLQUETAS

CARGUE DE ESCOMBROS	PLACA	M3	ESCOMBRERA
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-

TRANS MATERIAL	PLACA	M3	ORIGEN
-	-	-	-
-	-	-	-

C. ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DÍA

SE REALIZA MEZCLADO DE 15 M3 DE MBR, Y SE FINALIZA CON LA EXTENDIDA DE LA PRIMERA CAPA CON SU RESPECTIVA GEO MALLA; SE CONTINUA CON EL FIGURADO DE HIERRO PARA LOS SUMIDEROS.

INSPECTOR DE INTERVENTORÍA

ROBINXON ALBEIRO GONZALEZ MENDEZ

25

FORMATO DIARIO			FONDO DE DESARROLLO ALCALDIA LOCAL DE BARRIOS UNIDOS
FECHA			INTERVENTORÍA Y CONTRUCIVILES SAS Contrato de Interventoría No. 242 de 2019
			CONSORCIO BARRIOS UNIDOS Contrato de Obra Pública No. 241 de 2019
15	2	2021	
DD	MM	AA	TIPO DE INTERVENCIÓN: REHABILITACIÓN VIAL

INFORME DIARIO DE INTERVENTORÍA

LOCALIZACIÓN	**BARRIO**	alcazeres	**CIV**		
NOMENCLATURA	calle 70	**DESDE**	carrera 24	**HASTA**	carrera 25 y carrera 26

NOMBRE DEL RESIDENTE INTERVENTOR	**Ing. JUAN PABLO LEMUS**
NOMBRE DEL RESIDENTE DE OBRA	**Ing. MANUEL RUIZ**

A. OBJETO DE MANTENIMIENTO

	BIEN	MAL
SEÑALIZACIÓN	X	
MANEJO DE ESCOMBROS	X	
MANEJO DE MATERIALES	X	
DOTACION	X	

LLUVIA	SI		NO	X	DURACIÓN
	MAÑANA				
	TARDE				
ACCIDENTES	SI		NO	X	

BOSQUEJO DEL TRAMO



PERSONAL	CANT
Residente de obra	
Inspector de obra	2
Obreros	2
Operarios	1
Topografía	2
Brigadistas	-
Transito	2
Vigilantes	

EQUIPO	CANT
compresor	
Volquetas dobletroques	1
imprimador	
Compactadoras	1
mini Cargadores	
Finisher	
Cortadora	
excavadora	

MATERIALES	UND	CANT
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
--	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

TEMPERATURA ASFALTO	TIPO:	
PLACA VOLQUETA	**LLEGADA**	**COMPACTACIÓN**
-	-	-
-	-	-

PRUEBAS DE LABORATORIO	CANT	UBICACIÓN
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

INVENTARIO			
SUMIDEROS	2	CAMARAS	
POZOS	2	DOMICILIARIAS	

ESTUVO PARADO EL FRENTE	SI	x	NO	X
RAZONES				

B. CONTROL DE VOLQUETAS

	PLACA	M3	ESCOMBRERA
CARGUE DE ESCOMBROS	SWE225	15	MAQUINAS AMARILLAs
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-

TRANS MATERIAL	PLACA	M3	ORIGEN
-	-	-	-
-	-	-	-

C. ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DÍA

EL CONTRATISTA REALISO ASEO EN EL FRENTE DE OBRA Y DIO INICIO A LA CONSTRUCCION DEL ENCOFRADO PARA LA COPNSTRUCCION DE LOS SUMIDEROS.

INSPECTOR DE INTERVENTORÍA

ROBINXON ALBEIRO GONZALEZ MENDEZ

25

FORMATO DIARIO			FONDO DE DESARROLLO ALCALDIA LOCAL DE BARRIOS UNIDOS
FECHA			INTERVENTORÍA Y CONTRUCIVILES SAS Contrato de Interventoría No. 242 de 2019
			CONSORCIO BARRIOS UNIDOS Contrato de Obra Pública No. 241 de 2019
16	2	2021	
DD	MM	AA	TIPO DE INTERVENCIÓN: REHABILITACIÓN VIAL

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS
SECRETARÍA DE CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE

INFORME DIARIO DE INTERVENTORÍA

LOCALIZACIÓN	**BARRIO**	alcazeres	**CIV**		
NOMENCLATURA	calle 70	**DESDE**	carrera 24	**HASTA**	carrera 25 y carrera 26

NOMBRE DEL RESIDENTE INTERVENTOR	**Ing. JUAN PABLO LEMUS**
NOMBRE DEL RESIDENTE DE OBRA	**Ing. MANUEL RUIZ**

A. OBJETO DE MANTENIMIENTO

	BIEN	MAL
SEÑALIZACIÓN	X	
MANEJO DE ESCOMBROS	X	
MANEJO DE MATERIALES	X	
DOTACION	X	

LLUVIA	SI		NO	X	DURACIÓN
	MAÑANA				
	TARDE				
ACCIDENTES	SI		NO	X	

PERSONAL	CANT
Residente de obra	
Inspector de obra	2
Obreros	2
Operarios	1
Topografía	2
Brigadistas	-
Transito	2
Vigilantes	

EQUIPO	CANT
compresor	
Volquetas dobletroques	
imprimador	
Compactadoras	
mini Cargadores	1
Finisher	
Cortadora	
excavadora	

BOSQUEJO DEL TRAMO



MATERIALES	UND	CANT
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
--	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

TEMPERATURA ASFALTO	TIPO:	
PLACA VOLQUETA	**LLEGADA**	**COMPACTACIÓN**
-	-	-
-	-	-

PRUEBAS DE LABORATORIO	CANT	UBICACIÓN
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

INVENTARIO			
SUMIDEROS	2	CAMARAS	
POZOS	2	DOMICILIARIAS	

ESTUVO PARADO EL FRENTE	SI	x	NO	X
RAZONES				

B. CONTROL DE VOLQUETAS

CARGUE DE ESCOMBROS	PLACA	M3	ESCOMBRERA
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-

TRANS MATERIAL	PLACA	M3	ORIGEN
-	-	-	-
-	-	-	-

C. ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DÍA

EL CONTRATISTA REALIZO INSTALACION DE ESTRUCTURA METALICA DE REFUERZO Y ENCOFRADOS PARA LA CONSTRUCCION DE 2 SUMIDEROS SOBRE LAS ABSCISAS K0+110

INSPECTOR DE INTERVENTORÍA

ROBINXON ALBEIRO GONZALEZ MENDEZ

25

FORMATO DIARIO			FONDO DE DESARROLLO ALCALDIA LOCAL DE BARRIOS UNIDOS
FECHA			INTERVENTORÍA Y CONTRUCIVILES SAS Contrato de Interventoría No. 242 de 2019
			CONSORCIO BARRIOS UNIDOS Contrato de Obra Pública No. 241 de 2019
17	2	2021	
DD	MM	AA	TIPO DE INTERVENCIÓN: REHABILITACIÓN VIAL

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. | BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS
SECRETARÍA DE CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE

INFORME DIARIO DE INTERVENTORÍA

LOCALIZACIÓN	**BARRIO**	alcazeres	**CIV**		
NOMENCLATURA	calle 70	**DESDE**	carrera 24	**HASTA**	carrera 25 y carrera 26

NOMBRE DEL RESIDENTE INTERVENTOR	**Ing. JUAN PABLO LEMUS**
NOMBRE DEL RESIDENTE DE OBRA	**Ing. MANUEL RUIZ**

A. OBJETO DE MANTENIMIENTO

	BIEN	MAL
SEÑALIZACIÓN	X	
MANEJO DE ESCOMBROS	X	
MANEJO DE MATERIALES	X	
DOTACION	X	

LLUVIA	SI		NO	X	DURACIÓN
	MAÑANA				
	TARDE				
ACCIDENTES	SI		NO	X	

PERSONAL

	CANT
Residente de obra	
Inspector de obra	2
Obreros	2
Operarios	1
Topografía	2
Brigadistas	-
Transito	2
Vigilantes	

EQUIPO

	CANT
Camion concreto	
Volquetas dobletroques	1
imprimador	
Compactadoras	
mini Cargadores	1
Finisher	
Cortadora	
excavadora	

BOSQUEJO DEL TRAMO



MATERIALES

	UND	CANT
CONCRETO	M3	5.2
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
--	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

TEMPERATURA ASFALTO	TIPO:	
PLACA VOLQUETA	**LLEGADA**	**COMPACTACIÓN**
-	-	-
-	-	-

PRUEBAS DE LABORATORIO	**CANT**	**UBICACIÓN**
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

INVENTARIO

SUMIDEROS	2	CAMARAS	
POZOS	2	DOMICILIARIAS	

ESTUVO PARADO EL FRENTE	SI	x	NO	X
RAZONES				

B. CONTROL DE VOLQUETAS

	PLACA	M3	ESCOMBRERA
CARGUE DE ESCOMBROS			
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-

TRANS MATERIAL	PLACA	M3	ORIGEN
concreto	DCT344	5.5	PLANTA
-	-	-	-
-	-	-	-

C. ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DÍA

se realiza la instalacion de los encofrados para los sumideros en las abscisas k0+110

INSPECTOR DE INTERVENTORÍA

ROBINXON ALBEIRO GONZALEZ MENDEZ

25

FORMATO DIARIO			FONDO DE DESARROLLO ALCALDIA LOCAL DE BARRIOS UNIDOS
FECHA			INTERVENTORÍA Y CONTRUCIVILES SAS Contrato de Interventoría No. 242 de 2019
			CONSORCIO BARRIOS UNIDOS Contrato de Obra Pública No. 241 de 2019
18	2	2021	
DD	MM	AA	TIPO DE INTERVENCIÓN: REHABILITACIÓN VIAL

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE — BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

INFORME DIARIO DE INTERVENTORÍA

LOCALIZACIÓN	**BARRIO**	alcazeres	**CIV**		
NOMENCLATURA	calle 70	**DESDE**	carrera 24	**HASTA**	carrera 25 y carrera 26

NOMBRE DEL RESIDENTE INTERVENTOR	**Ing. JUAN PABLO LEMUS**
NOMBRE DEL RESIDENTE DE OBRA	**Ing. MANUEL RUIZ**

A. OBJETO DE MANTENIMIENTO

	BIEN	MAL
SEÑALIZACIÓN	X	
MANEJO DE ESCOMBROS	X	
MANEJO DE MATERIALES	X	
DOTACION	X	

LLUVIA	SI		NO	X	DURACIÓN
	MAÑANA				
	TARDE				
ACCIDENTES	SI		NO	X	

PERSONAL	CANT
Residente de obra	
Inspector de obra	1
Obreros	3
Operarios	1
Topografía	2
Brigadistas	-
Transito	2
Vigilantes	

EQUIPO	CANT
compresor	
Volquetas dobletroques	
imprimador	
Compactadoras	
mini Cargadores	1
Finisher	
Cortadora	
excavadora	

BOSQUEJO DEL TRAMO



MATERIALES	UND	CANT
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
--	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

TEMPERATURA ASFALTO	TIPO:	
PLACA VOLQUETA	**LLEGADA**	**COMPACTACIÓN**
-	-	-
-	-	-

PRUEBAS DE LABORATORIO	CANT	UBICACIÓN
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

INVENTARIO			
SUMIDEROS	2	CAMARAS	
POZOS	2	DOMICILIARIAS	

ESTUVO PARADO EL FRENTE	SI	x	NO	X
RAZONES				

B. CONTROL DE VOLQUETAS

CARGUE DE ESCOMBROS	PLACA	M3	ESCOMBRERA
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-

TRANS MATERIAL	PLACA	M3	ORIGEN
-	-	-	-
-	-	-	-

C. ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DÍA

el contratista realiza insstalacion de sardinel costado noste desde la abscisa k0+00 a k0+20

INSPECTOR DE INTERVENTORÍA

ROBINXON ALBEIRO GONZALEZ MENDEZ

25

FORMATO DIARIO			FONDO DE DESARROLLO ALCALDIA LOCAL DE BARRIOS UNIDOS
FECHA			INTERVENTORÍA Y CONTRUCIVILES SAS Contrato de Interventoría No. 242 de 2019
			CONSORCIO BARRIOS UNIDOS Contrato de Obra Pública No. 241 de 2019
19	2	2021	
DD	MM	AA	TIPO DE INTERVENCIÓN: REHABILITACIÓN VIAL

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. | BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS
SECRETARÍA DE CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE

INFORME DIARIO DE INTERVENTORÍA

LOCALIZACIÓN	**BARRIO**	alcazeres	**CIV**		
NOMENCLATURA	calle 70	**DESDE**	carrera 24	**HASTA**	carrera 25 y carrera 26

NOMBRE DEL RESIDENTE INTERVENTOR	**Ing. JUAN PABLO LEMUS**
NOMBRE DEL RESIDENTE DE OBRA	**Ing. MANUEL RUIZ**

A. OBJETO DE MANTENIMIENTO

	BIEN	MAL
SEÑALIZACIÓN	X	
MANEJO DE ESCOMBROS	X	
MANEJO DE MATERIALES	X	
DOTACION	X	

LLUVIA	SI		NO	X	DURACIÓN
	MAÑANA				
	TARDE				
ACCIDENTES	SI		NO	X	

PERSONAL	CANT
Residente de obra	
Inspector de obra	2
Obreros	3
Operarios	1
Topografía	2
Brigadistas	-
Transito	2
Vigilantes	

EQUIPO	CANT
compresor	
Volquetas dobletroques	
imprimador	
Compactadoras	1
mini Cargadores	1
Finisher	
Cortadora	
excavadora	

BOSQUEJO DEL TRAMO



MATERIALES	UND	CANT
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
--	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

TEMPERATURA ASFALTO	TIPO:	
PLACA VOLQUETA	**LLEGADA**	**COMPACTACIÓN**
-	-	-
-	-	-

PRUEBAS DE LABORATORIO	CANT	UBICACIÓN
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

INVENTARIO			
SUMIDEROS	2	CAMARAS	
POZOS	2	DOMICILIARIAS	

ESTUVO PARADO EL FRENTE	SI	x	NO	X
RAZONES				

B. CONTROL DE VOLQUETAS

CARGUE DE ESCOMBROS	PLACA	M3	ESCOMBRERA
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-

TRANS MATERIAL	PLACA	M3	ORIGEN
-	-	-	-
-	-	-	-

C. ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DÍA

el contratista realiza insstalacion de sardinel costado noste desde la abscisa k0+00 a k0+35

INSPECTOR DE INTERVENTORÍA



ROBINXON ALBEIRO GONZALEZ MENDEZ

25

FORMATO DIARIO			FONDO DE DESARROLLO ALCALDIA LOCAL DE BARRIOS UNIDOS
FECHA			INTERVENTORÍA Y CONTRUCIVILES SAS Contrato de Interventoría No. 242 de 2019
			CONSORCIO BARRIOS UNIDOS Contrato de Obra Pública No. 241 de 2019
20	2	2021	
DD	MM	AA	TIPO DE INTERVENCIÓN: REHABILITACIÓN VIAL

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. | BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS
SECRETARÍA DE CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE

INFORME DIARIO DE INTERVENTORÍA

LOCALIZACIÓN	**BARRIO**	alcazeres	**CIV**		
NOMENCLATURA	calle 70	**DESDE**	carrera 24	**HASTA**	carrera 25 y carrera 26

NOMBRE DEL RESIDENTE INTERVENTOR	**Ing. JUAN PABLO LEMUS**
NOMBRE DEL RESIDENTE DE OBRA	**Ing. MANUEL RUIZ**

A. OBJETO DE MANTENIMIENTO

	BIEN	MAL
SEÑALIZACIÓN	X	
MANEJO DE ESCOMBROS	X	
MANEJO DE MATERIALES	X	
DOTACION	X	

LLUVIA	SI		NO	X	DURACIÓN
	MAÑANA				
	TARDE				
ACCIDENTES	SI		NO	X	

PERSONAL	CANT
Residente de obra	
Inspector de obra	2
Obreros	2
Operarios	1
Topografía	2
Brigadistas	-
Transito	2
Vigilantes	

EQUIPO	CANT
compresor	
Volquetas dobletroques	
imprimador	
Compactadoras	1
mini Cargadores	1
Finisher	
Cortadora	
excavadora	

BOSQUEJO DEL TRAMO



MATERIALES	UND	CANT
concreto	m3	5.5
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
--	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

TEMPERATURA ASFALTO	TIPO:	
PLACA VOLQUETA	**LLEGADA**	**COMPACTACIÓN**
-	-	-
-	-	-

PRUEBAS DE LABORATORIO	CANT	UBICACIÓN
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

INVENTARIO			
SUMIDEROS	2	CAMARAS	
POZOS	2	DOMICILIARIAS	

ESTUVO PARADO EL FRENTE	SI	x	NO	X
RAZONES				

B. CONTROL DE VOLQUETAS

CARGUE DE ESCOMBROS	PLACA	M3	ESCOMBRERA
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-

TRANS MATERIAL	PLACA	M3	ORIGEN
concreto	EEW312	5.5	
-	-	-	-
-	-	-	-

C. ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DÍA

el contratista realiza insstalacion de sardinel costado noste desde la abscisa k0+00 a k0+40 y hace la fundida de los sumideros sobre las abscisas k0+110.

INSPECTOR DE INTERVENTORÍA



ROBINXON ALBEIRO GONZALEZ MENDEZ

25

FORMATO DIARIO			FONDO DE DESARROLLO ALCALDIA LOCAL DE BARRIOS UNIDOS
FECHA			INTERVENTORÍA Y CONTRUCIVILES SAS Contrato de Interventoría No. 242 de 2019
			CONSORCIO BARRIOS UNIDOS Contrato de Obra Pública No. 241 de 2019
22	2	2021	TIPO DE INTERVENCIÓN: REHABILITACIÓN VIAL
DD	MM	AA	

INFORME DIARIO DE INTERVENTORÍA

LOCALIZACIÓN	**BARRIO**	alcazeres	**CIV**		
NOMENCLATURA	calle 70	**DESDE**	carrera 24	**HASTA**	carrera 25 y carrera 26

NOMBRE DEL RESIDENTE INTERVENTOR	**Ing. JUAN PABLO LEMUS**
NOMBRE DEL RESIDENTE DE OBRA	**Ing. MANUEL RUIZ**

A. OBJETO DE MANTENIMIENTO

	BIEN	MAL
SEÑALIZACIÓN	X	
MANEJO DE ESCOMBROS	X	
MANEJO DE MATERIALES	X	
DOTACION	X	

LLUVIA	SI		NO	X	DURACIÓN
	MAÑANA				
	TARDE				
ACCIDENTES	SI		NO	X	

PERSONAL	CANT
Residente de obra	
Inspector de obra	2
Obreros	2
Operarios	1
Topografía	2
Brigadistas	-
Transito	2
Vigilantes	

EQUIPO	CANT
compresor	
Volquetas dobletroques	
imprimador	
Compactadoras	1
mini Cargadores	1
Finisher	
Cortadora	
excavadora	

BOSQUEJO DEL TRAMO



MATERIALES	UND	CANT
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
--	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

TEMPERATURA ASFALTO	TIPO:	
PLACA VOLQUETA	**LLEGADA**	**COMPACTACIÓN**
-	-	-
-	-	-

PRUEBAS DE LABORATORIO	CANT	UBICACIÓN
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

INVENTARIO			
SUMIDEROS	2	CAMARAS	
POZOS	2	DOMICILIARIAS	

ESTUVO PARADO EL FRENTE	SI	x	NO	X
RAZONES				

B. CONTROL DE VOLQUETAS

CARGUE DE ESCOMBROS	PLACA	M3	ESCOMBRERA
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-

TRANS MATERIAL	PLACA	M3	ORIGEN
-	-	-	-
-	-	-	-

C. ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DÍA

SE REALIZA INSTALACION DE SARDINEL EN LAS ABSCISAS K0+40 A K0+50 COSTADO NORTE.

INSPECTOR DE INTERVENTORÍA

ROBINXON ALBEIRO GONZALEZ MENDEZ

23

FORMATO DIARIO			FONDO DE DESARROLLO ALCALDIA LOCAL DE BARRIOS UNIDOS
FECHA			INTERVENTORÍA Y CONTRUCIVILES SAS Contrato de Interventoría No. 242 de 2019
			CONSORCIO BARRIOS UNIDOS Contrato de Obra Pública No. 241 de 2019
23	2	2021	
DD	MM	AA	TIPO DE INTERVENCIÓN: REHABILITACIÓN VIAL

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS
SECRETARÍA DE CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE

INFORME DIARIO DE INTERVENTORÍA

LOCALIZACIÓN	**BARRIO**	alcazeres	**CIV**		
NOMENCLATURA	calle 70	**DESDE**	carrera 24	**HASTA**	carrera 25 y carrera 26

NOMBRE DEL RESIDENTE INTERVENTOR	**Ing. JUAN PABLO LEMUS**
NOMBRE DEL RESIDENTE DE OBRA	**Ing. MANUEL RUIZ**

A. OBJETO DE MANTENIMIENTO

	BIEN	MAL
SEÑALIZACIÓN	X	
MANEJO DE ESCOMBROS	X	
MANEJO DE MATERIALES	X	
DOTACION	X	

LLUVIA	SI		NO	X	DURACIÓN
	MAÑANA				
	TARDE				
ACCIDENTES	SI		NO	X	

PERSONAL

	CANT
Residente de obra	
Inspector de obra	2
Obreros	6
Operarios	1
Topografía	2
Brigadistas	-
Transito	2
Vigilantes	

EQUIPO

	CANT
compresor	
Volquetas dobletroques	
imprimador	
Compactadoras	1
mini Cargadores	1
Finisher	
Cortadora	
excavadora	

BOSQUEJO DEL TRAMO



MATERIALES

	UND	CANT
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
--	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

TEMPERATURA ASFALTO	TIPO:	
PLACA VOLQUETA	**LLEGADA**	**COMPACTACIÓN**
-	-	-
-	-	-

PRUEBAS DE LABORATORIO	**CANT**	**UBICACIÓN**
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

INVENTARIO

SUMIDEROS	2	CAMARAS	
POZOS	2	DOMICILIARIAS	

ESTUVO PARADO EL FRENTE	SI	x	NO	X
RAZONES				

B. CONTROL DE VOLQUETAS

	PLACA	M3	ESCOMBRERA
CARGUE DE ESCOMBROS			
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-

TRANS MATERIAL	PLACA	M3	ORIGEN
-	-	-	-
-	-	-	-

C. ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DÍA

EL CONTRATISTA REALIZA LA INSTALACION DEL SARDINEL COSTADO SUR DESDE LA ABSCISA K0+05 A K0+50.

INSPECTOR DE INTERVENTORÍA



ROBINXON ALBEIRO GONZALEZ MENDEZ

23

FORMATO DIARIO			FONDO DE DESARROLLO ALCALDIA LOCAL DE BARRIOS UNIDOS
FECHA			INTERVENTORÍA Y CONTRUCIVILES SAS Contrato de Interventoría No. 242 de 2019
			CONSORCIO BARRIOS UNIDOS Contrato de Obra Pública No. 241 de 2019
24	2	2021	
DD	MM	AA	TIPO DE INTERVENCIÓN: REHABILITACIÓN VIAL

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE — BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

INFORME DIARIO DE INTERVENTORÍA

LOCALIZACIÓN	**BARRIO**	alcazeres	**CIV**		
NOMENCLATURA	calle 70	**DESDE**	carrera 24	**HASTA**	carrera 25 y carrera 26

NOMBRE DEL RESIDENTE INTERVENTOR	**Ing. JUAN PABLO LEMUS**
NOMBRE DEL RESIDENTE DE OBRA	**Ing. MANUEL RUIZ**

A. OBJETO DE MANTENIMIENTO

	BIEN	MAL
SEÑALIZACIÓN	X	
MANEJO DE ESCOMBROS	X	
MANEJO DE MATERIALES	X	
DOTACION	X	

LLUVIA	SI		NO	X	DURACIÓN
	MAÑANA				
	TARDE				
ACCIDENTES	SI		NO	X	

PERSONAL

	CANT
Residente de obra	
Inspector de obra	2
Obreros	8
Operarios	1
Topografía	2
Brigadistas	-
Transito	2
Vigilantes	

EQUIPO

	CANT
compresor	
Volquetas dobletroques	
imprimador	
Compactadoras	1
mini Cargadores	1
Finisher	
Cortadora	
excavadora	

BOSQUEJO DEL TRAMO



MATERIALES

	UND	CANT
EMULSION ASFALTICA	LT	720
CEMENTO	KL	175
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
--	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

TEMPERATURA ASFALTO	TIPO:	
PLACA VOLQUETA	**LLEGADA**	**COMPACTACIÓN**
-	-	-
-	-	-

PRUEBAS DE LABORATORIO	**CANT**	**UBICACIÓN**
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

INVENTARIO

SUMIDEROS	2	CAMARAS	
POZOS	2	DOMICILIARIAS	

ESTUVO PARADO EL FRENTE	SI	x	NO	X
RAZONES				

B. CONTROL DE VOLQUETAS

	PLACA	M3	ESCOMBRERA
CARGUE DE ESCOMBROS			
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-

TRANS MATERIAL	PLACA	M3	ORIGEN
-	-	-	-
-	-	-	-

C. ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DÍA

EL CONTRATISTA REALIZA LA INSTALACION DEL SARDINEL COSTADO NORTE Y SOR, SOBRE LAS ABSCISAS K0+71 A K0+105 Y HACE EL MEZCLADO DE 8 M3 DE MBR Y SE EXTIENDE.

INSPECTOR DE INTERVENTORÍA

ROBINXON ALBEIRO GONZALEZ MENDEZ

23

FORMATO DIARIO			FONDO DE DESARROLLO ALCALDIA LOCAL DE BARRIOS UNIDOS
FECHA			INTERVENTORÍA Y CONTRUCIVILES SAS Contrato de Interventoría No. 242 de 2019
			CONSORCIO BARRIOS UNIDOS Contrato de Obra Pública No. 241 de 2019
25	2	2021	
DD	MM	AA	TIPO DE INTERVENCIÓN: REHABILITACIÓN VIAL

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS
SECRETARÍA DE CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE

INFORME DIARIO DE INTERVENTORÍA

LOCALIZACIÓN	**BARRIO**	alcazeres	**CIV**		
NOMENCLATURA	calle 70	**DESDE**	carrera 24	**HASTA**	carrera 25 y carrera 26

NOMBRE DEL RESIDENTE INTERVENTOR	**Ing. JUAN PABLO LEMUS**
NOMBRE DEL RESIDENTE DE OBRA	**Ing. MANUEL RUIZ**

A. OBJETO DE MANTENIMIENTO

	BIEN	MAL
SEÑALIZACIÓN	X	
MANEJO DE ESCOMBROS	X	
MANEJO DE MATERIALES	X	
DOTACION	X	

LLUVIA	SI		NO	X	DURACIÓN
	MAÑANA				
	TARDE				
ACCIDENTES	SI		NO	X	

PERSONAL	CANT
Residente de obra	
Inspector de obra	2
Obreros	5
Operarios	1
Topografía	2
Brigadistas	-
Transito	2
Vigilantes	

EQUIPO	CANT
compresor	
Volquta dobletroque	1
imprimador	
Compactadoras	1
mini Cargadores	1
Finisher	
Cortadora	
excavadora	

BOSQUEJO DEL TRAMO



MATERIALES	UND	CANT
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
--	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

TEMPERATURA ASFALTO	TIPO:	
PLACA VOLQUETA	**LLEGADA**	**COMPACTACIÓN**
-	-	-
-	-	-

PRUEBAS DE LABORATORIO	CANT	UBICACIÓN
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

INVENTARIO			
SUMIDEROS	2	CAMARAS	
POZOS	2	DOMICILIARIAS	

ESTUVO PARADO EL FRENTE	SI	x	NO	X
RAZONES				

B. CONTROL DE VOLQUETAS

	PLACA	M3	ESCOMBRERA
CARGUE DE ESCOMBROS	ssd343	45	maquinas
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-

TRANS MATERIAL	PLACA	M3	ORIGEN
-	-	-	-
-	-	-	-

C. ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DÍA

el contratista realiza demolicion de concreto existente en el anden costado norte desde la abscisa k0+03 a k0+25y hace la excavacion manual para garantizar la estructura que constara de 30 cm.

INSPECTOR DE INTERVENTORÍA

ROBINXON ALBEIRO GONZALEZ MENDEZ

23

FORMATO DIARIO			FONDO DE DESARROLLO ALCALDIA LOCAL DE BARRIOS UNIDOS
FECHA			INTERVENTORÍA Y CONTRUCIVILES SAS Contrato de Interventoría No. 242 de 2019
			CONSORCIO BARRIOS UNIDOS Contrato de Obra Pública No. 241 de 2019
26	2	2021	
DD	MM	AA	TIPO DE INTERVENCIÓN: REHABILITACIÓN VIAL

INFORME DIARIO DE INTERVENTORÍA

LOCALIZACIÓN	**BARRIO**	alcazeres	**CIV**		
NOMENCLATURA	calle 70	**DESDE**	carrera 24	**HASTA**	carrera 25 y carrera 26

NOMBRE DEL RESIDENTE INTERVENTOR	**Ing. JUAN PABLO LEMUS**
NOMBRE DEL RESIDENTE DE OBRA	**Ing. MANUEL RUIZ**

A. OBJETO DE MANTENIMIENTO

	BIEN	MAL
SEÑALIZACIÓN	X	
MANEJO DE ESCOMBROS	X	
MANEJO DE MATERIALES	X	
DOTACION	X	

LLUVIA	SI		NO	X	DURACIÓN
	MAÑANA				
	TARDE				
ACCIDENTES	SI		NO	X	

PERSONAL	CANT
Residente de obra	
Inspector de obra	2
Obreros	5
Operarios	1
Topografía	2
Brigadistas	-
Transito	2
Vigilantes	

EQUIPO	CANT
compresor	
Volquetas dobletroques	
imprimador	
Compactadoras	1
mini Cargadores	1
Finisher	
Cortadora	
excavadora	

BOSQUEJO DEL TRAMO



MATERIALES	UND	CANT
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
--	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

TEMPERATURA ASFALTO	TIPO:	
PLACA VOLQUETA	**LLEGADA**	**COMPACTACIÓN**
-	-	-
-	-	-

PRUEBAS DE LABORATORIO	CANT	UBICACIÓN
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

INVENTARIO			
SUMIDEROS	2	CAMARAS	
POZOS	2	DOMICILIARIAS	

ESTUVO PARADO EL FRENTE	SI	x	NO	X
RAZONES				

B. CONTROL DE VOLQUETAS

	PLACA	M3	ESCOMBRERA
CARGUE DE ESCOMBROS	ssd343	45	maquinas amarillas
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-

TRANS MATERIAL	PLACA	M3	ORIGEN
-	-	-	-
-	-	-	-

C. ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DÍA

se continua con la demolicion del concreto existente y la excavacion manual para la conformacion de la estructura del anden entre las abscisasd ko+25 a k0+40. Se hace la desinstalacion de los encofrados de los sumideros .

INSPECTOR DE INTERVENTORÍA

ROBINXON ALBEIRO GONZALEZ MENDEZ

23

FORMATO DIARIO			FONDO DE DESARROLLO ALCALDIA LOCAL DE BARRIOS UNIDOS
FECHA			INTERVENTORÍA Y CONTRUCIVILES SAS Contrato de Interventoría No. 242 de 2019
			CONSORCIO BARRIOS UNIDOS Contrato de Obra Pública No. 241 de 2019
27	2	2021	
DD	MM	AA	TIPO DE INTERVENCIÓN: REHABILITACIÓN VIAL

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. | BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS
SECRETARÍA DE CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE

INFORME DIARIO DE INTERVENTORÍA

LOCALIZACIÓN	**BARRIO**	alcazeres	**CIV**		
NOMENCLATURA	calle 70	**DESDE**	carrera 24	**HASTA**	carrera 25 y carrera 26

NOMBRE DEL RESIDENTE INTERVENTOR	**Ing. JUAN PABLO LEMUS**
NOMBRE DEL RESIDENTE DE OBRA	**Ing. MANUEL RUIZ**

A. OBJETO DE MANTENIMIENTO

	BIEN	MAL
SEÑALIZACIÓN	X	
MANEJO DE ESCOMBROS	X	
MANEJO DE MATERIALES	X	
DOTACION	X	

LLUVIA	SI		NO	X	DURACIÓN
	MAÑANA				
	TARDE				
ACCIDENTES	SI		NO	X	

PERSONAL	CANT
Residente de obra	
Inspector de obra	2
Obreros	2
Operarios	1
Topografía	2
Brigadistas	-
Transito	2
Vigilantes	

EQUIPO	CANT
compresor	
Volquetas dobletroques	
imprimador	
Compactadoras	1
mini Cargadores	1
Finisher	
Cortadora	
excavadora	

BOSQUEJO DEL TRAMO



MATERIALES	UND	CANT
sub base para estructura opeatonal	m3	15
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
--	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

TEMPERATURA ASFALTO		TIPO:	
PLACA VOLQUETA	LLEGADA	COMPACTACIÓN	
-	-	-	
-	-	-	

PRUEBAS DE LABORATORIO	CANT	UBICACIÓN
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

INVENTARIO			
SUMIDEROS	2	CAMARAS	
POZOS	2	DOMICILIARIAS	

ESTUVO PARADO EL FRENTE	SI	x	NO	X
RAZONES				

B. CONTROL DE VOLQUETAS

	PLACA	M3	ESCOMBRERA
CARGUE DE ESCOMBROS	ssd343	45	maquinas amarillas
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-

TRANS MATERIAL	PLACA	M3	ORIGEN
sub base peatonal	ssd343	15	planta
-	-	-	-
-	-	-	-

C. ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DÍA

el contratista realiza demolicion y excavacion manual en el anden costado norte entre las abscisas k0+40 a k0+50, hace la instalacion de el geo textil y una caopa de 20cm de subbase para estructura peatonal entre las abscisas k0+05 a k0+29

INSPECTOR DE INTERVENTORÍA

ROBINXON ALBEIRO GONZALEZ MENDEZ

FORMATO DIARIO			FONDO DE DESARROLLO ALCALDIA LOCAL DE BARRIOS UNIDOS
FECHA			INTERVENTORÍA Y CONTRUCIVILES SAS Contrato de Interventoría No. 242 de 2019
			CONSORCIO BARRIOS UNIDOS Contrato de Obra Pública No. 241 de 2019
1	2	2021	
DD	MM	AA	TIPO DE INTERVENCIÓN: REHABILITACIÓN VIAL

INFORME DIARIO DE INTERVENTORÍA

LOCALIZACIÓN	BARRIO	MODELO NORTE	CIV	
NOMENCLATURA	calle 71b	DESDE: CARRERA 26	HASTA:	carrera 27

NOMBRE DEL RESIDENTE INTERVENTOR	Ing. JUAN PABLO LEMUS
NOMBRE DEL RESIDENTE DE OBRA	Ing. MANUEL RUIZ

A. OBJETO DE MANTENIMIENTO

	BIEN	MAL
SEÑALIZACIÓN	X	
MANEJO DE ESCOMBROS	X	
MANEJO DE MATERIALES	X	
DOTACION	X	

LLUVIA	SI		NO	X	DURACIÓN
	MAÑANA				
	TARDE				
ACCIDENTES	SI		NO	X	

PERSONAL	CANT
Residente de obra	
Inspector de obra	2
Obreros	2
Operarios	1
Topografía	2
Brigadistas	-
Transito	2
Vigilantes	

EQUIPO	CANT
camion del concreto	
Volquetas dobletroques	1
Retroescavadoras	1
Compactadoras	
Cargadores	
Finisher	
fresadora	
Canguro	

BOSQUEJO DEL TRAMO



MATERIALES	UND	CANT
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
--	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

TEMPERATURA ASFALTO	TIPO:	
PLACA VOLQUETA	LLEGADA	COMPACTACIÓN
-	-	-
-	-	-
-	-	-

PRUEBAS DE LABORATORIO	CANT	UBICACIÓN
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

INVENTARIO			
SUMIDEROS	2	CÁRCAMOS	-
POZOS	2	DOMICILIARIAS	

ESTUVO PARADO EL FRENTE	SI		NO	X
RAZONES				

B. CONTROL DE VOLQUETAS

	PLACA	M3	ESCOMBRERA
CARGUE DE ESCOMBROS			
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-

TRANS MATERIAL	PLACA	M3	ORIGEN
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-

C. ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DÍA

el contratista realiza el figurado del hierro para el refuerzo del sumidero.

INSPECTOR DE INTERVENTORÍA

ALBEIRO GONZALEZ

FORMATO DIARIO			FONDO DE DESARROLLO ALCALDIA LOCAL DE BARRIOS UNIDOS
FECHA			INTERVENTORÍA Y CONTRUCIVILES SAS Contrato de Interventoría No. 242 de 2019
			CONSORCIO BARRIOS UNIDOS
1	2	2021	Contrato de Obra Pública No. 241 de 2019
DD	MM	AA	TIPO DE INTERVENCIÓN: REHABILITACIÓN VIAL

INFORME DIARIO DE INTERVENTORÍA

LOCALIZACION	**BARRIO**	MODELO NORTE	**CIV**	12001759-12001804	
NOMENCLATURA	Carrera 56B	**DESDE**	Calle 64A Bis	**HASTA**	Diagonal 67B

NOMBRE DEL RESIDENTE INTERVENTOR	**Ing. JUAN PABLO LEMUS**
NOMBRE DEL RESIDENTE DE OBRA	**Ing. MANUEL RUIZ**

A. OBJETO DE MANTENIMIENTO

	BIEN	MAL
SEÑALIZACIÓN	X	
MANEJO DE ESCOMBROS	X	
MANEJO DE MATERIALES	X	
DOTACION	X	

LLUVIA	SI		NO	X	DURACION
	MAÑANA				
	TARDE				
ACCIDENTES	SI		NO	X	

PERSONAL	CANT
Residente de obra	1
Inspector de obra	1
Obreros	3
Operarios	2
Topografía	2
Brigadistas	-
Transito	-
Vigilantes	1

EQUIPO	CANT
Volquetas sencillas	
Volquetas dobletroques	0
Retroescavadoras	1
Compactadoras	1
Cargadores	1
Finisher	-
Cortadora	-
Canguro	1

BOSQUEJO DEL TRAMO



MATERIALES	UND	CANT
GRAVILLA 3/4"	M3	14
RELLENO B-200	M3	-
RAJON	M3	14
B-400	M3	28
TRITURADO 1/2	M3	14
MBR	LT	2400
EMULSION	-	-
	-	-
-	-	-
-	-	-
--	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

TEMPERATURA ASFALTO	TIPO:	
PLACA VOLQUETA	**LLEGADA**	**COMPACTACIÓN**
-	-	-
-	-	-
-	-	-

PRUEBAS DE LABORATORIO	CANT	UBICACIÓN
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

INVENTARIO

SUMIDEROS _____ CÁRCAMOS -

POZOS _____ DOMICILIARIAS _____

ESTUVO PARADO EL FRENTE	SI		NO	X
RAZONES				

B. CONTROL DE VOLQUETAS

	PLACA	M3	ESCOMBRERA
CARGUE DE ESCOMBROS	QWU	14	MATERIAL COMUN
	FGH	14	MAETRIAL COMUN
	-	-	
	-	-	
	-	-	
	-	-	

TRANS MATERIAL	PLACA	M3	ORIGEN
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-

C. ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DÍA

Dia nublado se continua con la excavacion para cajs de inspeccion en el civ 12001759

INSPECTOR DE INTERVENTORÍA

ALEJANDRA HERRAN AVILA

FORMATO DIARIO			FONDO DE DESARROLLO ALCALDIA LOCAL DE BARRIOS UNIDOS
FECHA			INTERVENTORÍA Y CONTRUCIVILES SAS Contrato de Interventoría No. 242 de 2019
			CONSORCIO BARRIOS UNIDOS
2	2	2021	Contrato de Obra Pública No. 241 de 2019
DD	MM	AA	TIPO DE INTERVENCIÓN: REHABILITACIÓN VIAL

INFORME DIARIO DE INTERVENTORÍA

LOCALIZACION	**BARRIO**	MODELO NORTE	**CIV**	12001759-12001804	
NOMENCLATURA	Carrera 56B	**DESDE**	Calle 64A Bis	**HASTA**	Diagonal 67B

NOMBRE DEL RESIDENTE INTERVENTOR	**Ing. JUAN PABLO LEMUS**
NOMBRE DEL RESIDENTE DE OBRA	**Ing. MANUEL RUIZ**

A. OBJETO DE MANTENIMIENTO

	BIEN	MAL
SEÑALIZACIÓN	X	
MANEJO DE ESCOMBROS	X	
MANEJO DE MATERIALES	X	
DOTACION	X	

LLUVIA	SI		NO	X	DURACION
	MAÑANA				
	TARDE				
ACCIDENTES	SI		NO	X	

BOSQUEJO DEL TRAMO



PERSONAL	CANT
Residente de obra	1
Inspector de obra	1
Obreros	3
Operarios	2
Topografía	2
Brigadistas	-
Transito	-
Vigilantes	1

EQUIPO	CANT
Volquetas sencillas	
Volquetas dobletroques	0
Retroescavadoras	1
Compactadoras	1
Cargadores	1
Finisher	-
Cortadora	-
Canguro	1

MATERIALES	UND	CANT
GRAVILLA 3/4"	M3	14
RELLENO B-200	M3	-
RAJON	M3	14
B-400	M3	28
TRITURADO 1/2	M3	14
MBR	LT	2400
EMULSION	-	-
	-	-
-	-	-
-	-	-
--	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

TEMPERATURA ASFALTO	TIPO:	
PLACA VOLQUETA	**LLEGADA**	**COMPACTACIÓN**
-	-	-
-	-	-
-	-	-

PRUEBAS DE LABORATORIO	CANT	UBICACIÓN
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

INVENTARIO

SUMIDEROS _____ CÁRCAMOS -

POZOS _____ DOMICILIARIAS _____

ESTUVO PARADO EL FRENTE	SI		NO	X
RAZONES				

B. CONTROL DE VOLQUETAS

CARGUE DE ESCOMBROS	PLACA	M3	ESCOMBRERA
	QWU	14	MATERIAL COMUN
	FGH	14	MAETRIAL COMUN
	QUR	14	MAETRIAL COMUN
	-	-	
	-	-	
	-	-	
	-	-	

TRANS MATERIAL	PLACA	M3	ORIGEN
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-

C. ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DÍA

Dia nublado , continuan con la actividad de contruccion de cajas de inspeccion , e inician excavaciones para endenes.

INSPECTOR DE INTERVENTORÍA

ALEJANDRA HERRAN AVILA

FORMATO DIARIO			FONDO DE DESARROLLO ALCALDIA LOCAL DE BARRIOS UNIDOS
FECHA			INTERVENTORÍA Y CONTRUCIVILES SAS Contrato de Interventoría No. 242 de 2019
			CONSORCIO BARRIOS UNIDOS
3	2	2021	Contrato de Obra Pública No. 241 de 2019
DD	MM	AA	TIPO DE INTERVENCIÓN: REHABILITACIÓN VIAL

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE — BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

INFORME DIARIO DE INTERVENTORÍA

LOCALIZACION	**BARRIO**	MODELO NORTE	**CIV**	12001759-12001804	
NOMENCLATURA	Carrera 56B	**DESDE**	Calle 64A Bis	**HASTA**	Diagonal 67B

NOMBRE DEL RESIDENTE INTERVENTOR	**Ing. JUAN PABLO LEMUS**
NOMBRE DEL RESIDENTE DE OBRA	**Ing. MANUEL RUIZ**

A. OBJETO DE MANTENIMIENTO

	BIEN	MAL
SEÑALIZACIÓN	X	
MANEJO DE ESCOMBROS	X	
MANEJO DE MATERIALES	X	
DOTACION	X	

LLUVIA	SI		NO	X	DURACION
	MAÑANA				
	TARDE				
ACCIDENTES	SI		NO	X	

PERSONAL

	CANT
Residente de obra	1
Inspector de obra	1
Obreros	3
Operarios	2
Topografía	2
Brigadistas	-
Transito	-
Vigilantes	1

EQUIPO

	CANT
Volquetas sencillas	
Volquetas dobletroques	0
Retroescavadoras	1
Compactadoras	1
Cargadores	1
Finisher	-
Cortadora	-
Canguro	1

BOSQUEJO DEL TRAMO



MATERIALES

	UND	CANT
GRAVILLA 3/4"	M3	14
RELLENO B-200	M3	-
RAJON	M3	14
B-400	M3	28
TRITURADO 1/2	M3	14
MBR	LT	2400
EMULSION	-	-
	-	-
-	-	-
-	-	-
--	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

TEMPERATURA ASFALTO		TIPO:	
PLACA VOLQUETA	**LLEGADA**	**COMPACTACIÓN**	
-	-	-	
-	-	-	
-	-	-	

PRUEBAS DE LABORATORIO	CANT	UBICACIÓN
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

INVENTARIO

SUMIDEROS _____ CÁRCAMOS -

POZOS _____ DOMICILIARIAS _____

ESTUVO PARADO EL FRENTE	SI		NO	X
RAZONES				

B. CONTROL DE VOLQUETAS

	PLACA	M3	ESCOMBRERA
CARGUE DE ESCOMBROS	QWU	14	MATERIAL COMUN
	FGH	14	MAETRIAL COMUN
	QUR	14	MAETRIAL COMUN
	-	-	
	-	-	
	-	-	
	-	-	

TRANS MATERIAL	PLACA	M3	ORIGEN
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-

C. ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DÍA

Dia lluvioso durante la jornada laboral, se continua con demolicion y excavacion de andenes para el civ 12001759, y se mezcla 15m3 para primera capa MBR al civ 12001804

INSPECTOR DE INTERVENTORÍA

ALEJANDRA HERRAN AVILA

FORMATO DIARIO			FONDO DE DESARROLLO ALCALDIA LOCAL DE BARRIOS UNIDOS
FECHA			INTERVENTORÍA Y CONTRUCIVILES SAS Contrato de Interventoría No. 242 de 2019
			CONSORCIO BARRIOS UNIDOS
4	2	2021	Contrato de Obra Pública No. 241 de 2019
DD	MM	AA	TIPO DE INTERVENCIÓN: REHABILITACIÓN VIAL

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE — BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

INFORME DIARIO DE INTERVENTORÍA

LOCALIZACION	**BARRIO**	MODELO NORTE	**CIV**	12001759-12001804	
NOMENCLATURA	Carrera 56B	**DESDE**	Calle 64A Bis	**HASTA**	Diagonal 67B

NOMBRE DEL RESIDENTE INTERVENTOR	**Ing. JUAN PABLO LEMUS**
NOMBRE DEL RESIDENTE DE OBRA	**Ing. MANUEL RUIZ**

A. OBJETO DE MANTENIMIENTO

	BIEN	MAL
SEÑALIZACIÓN	X	
MANEJO DE ESCOMBROS	X	
MANEJO DE MATERIALES	X	
DOTACION	X	

LLUVIA	SI		NO	X	DURACION
	MAÑANA				
	TARDE				
ACCIDENTES	SI		NO	X	

PERSONAL

	CANT
Residente de obra	1
Inspector de obra	1
Obreros	3
Operarios	2
Topografía	2
Brigadistas	-
Transito	-
Vigilantes	1

EQUIPO

	CANT
Volquetas sencillas	
Volquetas dobletroques	0
Retroescavadoras	1
Compactadoras	1
Cargadores	1
Finisher	-
Cortadora	-
Canguro	1

BOSQUEJO DEL TRAMO



MATERIALES

	UND	CANT
GRAVILLA 3/4"	M3	14
RELLENO B-200	M3	-
RAJON	M3	14
B-400	M3	28
TRITURADO 1/2	M3	14
MBR	LT	2400
EMULSION	-	-
	-	-
-	-	-
-	-	-
--	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

TEMPERATURA ASFALTO	TIPO:	
PLACA VOLQUETA	**LLEGADA**	**COMPACTACIÓN**
-	-	-
-	-	-
-	-	-

PRUEBAS DE LABORATORIO	**CANT**	**UBICACIÓN**
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

INVENTARIO

SUMIDEROS _____ CÁRCAMOS -

POZOS _____ DOMICILIARIAS _____

ESTUVO PARADO EL FRENTE	SI		NO	X
RAZONES				

B. CONTROL DE VOLQUETAS

	PLACA	M3	ESCOMBRERA
CARGUE DE ESCOMBROS	QWU	14	MATERIAL COMUN
	FGH	14	MAETRIAL COMUN
	QUR	14	MAETRIAL COMUN
	-	-	
	-	-	
	-	-	
	-	-	

TRANS MATERIAL	PLACA	M3	ORIGEN
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-

C. ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DÍA

Dia nublado lluvias leves durante la jornada laboral, se realiza trabajo de traslado de la manguera del gas natural vanti de 3/4¨, se realiza extenecion de geotextil, y se instala y se serea B-4000 y nivela materia para anden , se nivela y se instala cajillas para acueducto al civ 12001759 se continua con la extencion nivelacion y mezcla del MBR segunda capa al civ 12001804.

INSPECTOR DE INTERVENTORÍA

ALEJANDRA HERRAN AVILA

FORMATO DIARIO			FONDO DE DESARROLLO ALCALDIA LOCAL DE BARRIOS UNIDOS
FECHA			INTERVENTORÍA Y CONTRUCIVILES SAS Contrato de Interventoría No. 242 de 2019
			CONSORCIO BARRIOS UNIDOS
5	2	2021	Contrato de Obra Pública No. 241 de 2019
DD	MM	AA	TIPO DE INTERVENCIÓN: REHABILITACIÓN VIAL

INFORME DIARIO DE INTERVENTORÍA

LOCALIZACION	**BARRIO**	MODELO NORTE	**CIV**	12001759-12001804	
NOMENCLATURA	Carrera 56B	**DESDE**	Calle 64A Bis	**HASTA**	Diagonal 67B

NOMBRE DEL RESIDENTE INTERVENTOR	**Ing. JUAN PABLO LEMUS**
NOMBRE DEL RESIDENTE DE OBRA	**Ing. MANUEL RUIZ**

A. OBJETO DE MANTENIMIENTO

	BIEN	MAL
SEÑALIZACIÓN	X	
MANEJO DE ESCOMBROS	X	
MANEJO DE MATERIALES	X	
DOTACION	X	

LLUVIA	SI		NO	X	DURACION
	MAÑANA				
	TARDE				
ACCIDENTES	SI		NO	X	

PERSONAL

	CANT
Residente de obra	1
Inspector de obra	1
Obreros	3
Operarios	2
Topografía	2
Brigadistas	-
Transito	-
Vigilantes	1

EQUIPO

	CANT
Volquetas sencillas	
Volquetas dobletroques	1
Retroescavadoras	1
Compactadoras	1
Cargadores	1
Finisher	-
Cortadora	-
Canguro	1

BOSQUEJO DEL TRAMO



MATERIALES

	UND	CANT
GRAVILLA 3/4"	M3	-
RELLENO B-200	M3	-
RAJON	M3	-
B-400	M3	-
TRITURADO 1/2	M3	-
MBR	LT	-
EMULSION	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
--	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

TEMPERATURA ASFALTO		TIPO:
PLACA VOLQUETA	**LLEGADA**	**COMPACTACIÓN**
-	-	-
-	-	-
-	-	-

PRUEBAS DE LABORATORIO	CANT	UBICACIÓN
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

INVENTARIO

SUMIDEROS _____ CÁRCAMOS -

POZOS _____ DOMICILIARIAS _____

ESTUVO PARADO EL FRENTE	SI		NO	X
RAZONES				

B. CONTROL DE VOLQUETAS

	PLACA	M3	ESCOMBRERA
CARGUE DE ESCOMBROS	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-

TRANS MATERIAL	PLACA	M3	ORIGEN
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-

C. ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DÍA

Dia soelado, actividades de instalacion de cajillas , se observa con normalidad la ejecucion de las actividades en obra , se istalan marcos y tapas para las cajas e inspeccion , se instala y serea sub-base anden y se hace toma de densidades a la subbase instalada dando como resultado un alcance optimo y garantizando la estabilidad del material y de la estrcutura.

INSPECTOR DE INTERVENTORÍA

ALEJANDRA HERRAN AVILA

FORMATO DIARIO			FONDO DE DESARROLLO ALCALDIA LOCAL DE BARRIOS UNIDOS
FECHA			INTERVENTORÍA Y CONTRUCIVILES SAS Contrato de Interventoría No. 242 de 2019
6	2	2021	CONSORCIO BARRIOS UNIDOS Contrato de Obra Pública No. 241 de 2019
DD	MM	AA	TIPO DE INTERVENCIÓN: REHABILITACIÓN VIAL

INFORME DIARIO DE INTERVENTORÍA

LOCALIZACION	BARRIO	MODELO NORTE	CIV	12001759-12001804	
NOMENCLATURA	Carrera 56B	DESDE	Calle 64A Bis	HASTA	Diagonal 67B

NOMBRE DEL RESIDENTE INTERVENTOR	Ing. JUAN PABLO LEMUS
NOMBRE DEL RESIDENTE DE OBRA	Ing. MANUEL RUIZ

A. OBJETO DE MANTENIMIENTO

	BIEN	MAL
SEÑALIZACIÓN	X	
MANEJO DE ESCOMBROS	X	
MANEJO DE MATERIALES	X	
DOTACION	X	

	SI		NO	X	DURACION
LLUVIA	MAÑANA				
	TARDE				
ACCIDENTES	SI		NO	X	

PERSONAL	CANT
Residente de obra	1
Inspector de obra	1
Obreros	2
Operarios	-
Topografía	-
Brigadistas	-
Transito	-
Vigilantes	1

EQUIPO	CANT
Volquetas sencillas	
Volquetas dobletroques	x
Retroescavadoras	x
Compactadoras	x
Cargadores	x
Finisher	-
Cortadora	-
Canguro	x

BOSQUEJO DEL TRAMO



MATERIALES	UND	CANT
GRAVILLA 3/4"	M3	-
RELLENO B-200	M3	-
RAJON	M3	-
B-400	M3	-
TRITURADO 1/2	M3	-
MBR	LT	-
EMULSION	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
--	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

TEMPERATURA ASFALTO	TIPO:	
PLACA VOLQUETA	LLEGADA	COMPACTACIÓN
-	-	-
-	-	-
-	-	-

PRUEBAS DE LABORATORIO	CANT	UBICACIÓN
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

INVENTARIO			
SUMIDEROS	10	CÁRCAMOS	-
POZOS	4	DOMICILIARIAS	

ESTUVO PARADO EL FRENTE	SI		NO	X
RAZONES				

B. CONTROL DE VOLQUETAS

CARGUE DE ESCOMBROS	PLACA	M3	ESCOMBRERA
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-

TRANS MATERIAL	PLACA	M3	ORIGEN
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-

C. ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DÍA

Dia soelado se instala MBR para el anden cvi 12001759

INSPECTOR DE INTERVENTORÍA

ALEJANDRA HERRAN AVILA

FORMATO DIARIO			FONDO DE DESARROLLO ALCALDIA LOCAL DE BARRIOS UNIDOS
FECHA			INTERVENTORÍA Y CONTRUCIVILES SAS Contrato de Interventoría No. 242 de 2019
8	2	2021	CONSORCIO BARRIOS UNIDOS Contrato de Obra Pública No. 241 de 2019
DD	MM	AA	TIPO DE INTERVENCIÓN: REHABILITACIÓN VIAL

INFORME DIARIO DE INTERVENTORÍA

LOCALIZACION	BARRIO	MODELO NORTE		CIV	12001759-12001804	
NOMENCLATURA	Carrera 56B	DESDE	Calle 64A Bis	HASTA	Diagonal 67B	

NOMBRE DEL RESIDENTE INTERVENTOR	Ing. JUAN PABLO LEMUS
NOMBRE DEL RESIDENTE DE OBRA	Ing. MANUEL RUIZ

A. OBJETO DE MANTENIMIENTO

	BIEN	MAL
SEÑALIZACIÓN	X	
MANEJO DE ESCOMBROS	X	
MANEJO DE MATERIALES	X	
DOTACION	X	

LLUVIA	SI		NO	X	DURACION
	MAÑANA				
	TARDE				
ACCIDENTES	SI		NO	X	

PERSONAL

	CANT
Residente de obra	1
Inspector de obra	1
Obreros	2
Operarios	-
Topografía	-
Brigadistas	-
Transito	-
Vigilantes	1

EQUIPO

	CANT
Volquetas sencillas	
Volquetas dobletroques	x
Retroescavadoras	x
Compactadoras	x
Cargadores	x
Finisher	-
Cortadora	-
Canguro	x

BOSQUEJO DEL TRAMO



MATERIALES

	UND	CANT
GRAVILLA 3/4"	M3	-
RELLENO B-200	M3	-
RAJON	M3	-
B-400	M3	-
TRITURADO 1/2	M3	-
MBR	LT	-
EMULSION	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
--	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

TEMPERATURA ASFALTO	TIPO:	
PLACA VOLQUETA	LLEGADA	COMPACTACIÓN
-	-	-
-	-	-
-	-	-

PRUEBAS DE LABORATORIO	CANT	UBICACIÓN
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

INVENTARIO

SUMIDEROS	10	CÁRCAMOS	-
POZOS	4	DOMICILIARIAS	

ESTUVO PARADO EL FRENTE	SI		NO	X
RAZONES				

B. CONTROL DE VOLQUETAS

	PLACA	M3	ESCOMBRERA
CARGUE DE ESCOMBROS	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-

TRANS MATERIAL	PLACA	M3	ORIGEN
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-

C. ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DÍA

Dia soleado se continua con la instalacion del MBR al anden 12001759.

INSPECTOR DE INTERVENTORÍA

ALEJANDRA HERRAN AVILA

FORMATO DIARIO			**FONDO DE DESARROLLO ALCALDIA LOCAL DE BARRIOS UNIDOS**
FECHA			**INTERVENTORÍA Y CONTRUCIVILES SAS** Contrato de Interventoría No. 242 de 2019
9	2	2021	**CONSORCIO BARRIOS UNIDOS** Contrato de Obra Pública No. 241 de 2019
DD	MM	AA	**TIPO DE INTERVENCIÓN** REHABILITACIÓN VIAL

INFORME DIARIO DE INTERVENTORÍA

LOCALIZACION	**BARRIO**	MODELO NORTE		**CIV**	12001759-12001804	
NOMENCLATURA	Carrera 56B	**DESDE**	Calle 64A Bis	**HASTA**	Diagonal 67B	

NOMBRE DEL RESIDENTE INTERVENTOR	**Ing. JUAN PABLO LEMUS**
NOMBRE DEL RESIDENTE DE OBRA	**Ing. MANUEL RUIZ**

A. OBJETO DE MANTENIMIENTO

	BIEN	MAL
SEÑALIZACIÓN	X	
MANEJO DE ESCOMBROS	X	
MANEJO DE MATERIALES	X	
DOTACION	X	

LLUVIA	SI	x	NO		DURACION
	MAÑANA				
	TARDE			x	
ACCIDENTES	SI		NO	X	

PERSONAL	CANT
Residente de obra	1
Inspector de obra	1
Obreros	2
Operarios	-
Topografía	-
Brigadistas	-
Transito	-
Vigilantes	1

EQUIPO	CANT
Volquetas sencillas	
Volquetas dobletroques	x
Retroescavadoras	x
Compactadoras	x
Cargadores	x
Finisher	-
Cortadora	-
Canguro	x

BOSQUEJO DEL TRAMO



MATERIALES	UND	CANT
GRAVILLA 3/4"	M3	-
RELLENO B-200	M3	-
RAJON	M3	-
B-400	M3	-
TRITURADO 1/2	M3	-
MBR	LT	-
EMULSION	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
--	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

TEMPERATURA ASFALTO	TIPO:	
PLACA VOLQUETA	**LLEGADA**	**COMPACTACIÓN**
-	-	-
-	-	-
-	-	-

PRUEBAS DE LABORATORIO	**CANT**	**UBICACIÓN**
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

INVENTARIO

SUMIDEROS	10	CÁRCAMOS	-
POZOS	4	DOMICILIARIAS	

ESTUVO PARADO EL FRENTE	SI		NO	X
RAZONES				

B. CONTROL DE VOLQUETAS

	PLACA	M3	ESCOMBRERA
CARGUE DE ESCOMBROS	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-

TRANS MATERIAL	PLACA	M3	ORIGEN
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-

C. ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DÍA

Dia soleado se instala concreto para anden del civ 12001759, y se funden cabezotes de sumideros.

INSPECTOR DE INTERVENTORÍA

ALEJANDRA HERRAN AVILA

FORMATO DIARIO			FONDO DE DESARROLLO ALCALDIA LOCAL DE BARRIOS UNIDOS
FECHA			INTERVENTORÍA Y CONTRUCIVILES SAS Contrato de Interventoría No. 242 de 2019
10	2	2021	CONSORCIO BARRIOS UNIDOS Contrato de Obra Pública No. 241 de 2019
DD	MM	AA	TIPO DE INTERVENCIÓN: REHABILITACIÓN VIAL

INFORME DIARIO DE INTERVENTORÍA

LOCALIZACION	BARRIO	MODELO NORTE	CIV	12001759-12001804	
NOMENCLATURA	Carrera 56B	DESDE	Calle 64A Bis	HASTA	Diagonal 67B

NOMBRE DEL RESIDENTE INTERVENTOR	Ing. JUAN PABLO LEMUS
NOMBRE DEL RESIDENTE DE OBRA	Ing. MANUEL RUIZ

A. OBJETO DE MANTENIMIENTO

	BIEN	MAL
SEÑALIZACIÓN	X	
MANEJO DE ESCOMBROS	X	
MANEJO DE MATERIALES	X	
DOTACION	X	

	SI		NO		DURACION
LLUVIA	MAÑANA				
	TARDE			x	
ACCIDENTES	SI		NO	X	

PERSONAL	CANT
Residente de obra	1
Inspector de obra	1
Obreros	2
Operarios	-
Topografía	-
Brigadistas	-
Transito	-
Vigilantes	1

EQUIPO	CANT
Volquetas sencillas	
Volquetas dobletroques	x
Retroescavadoras	x
Compactadoras	x
Cargadores	x
Finisher	-
Cortadora	-
Canguro	x

BOSQUEJO DEL TRAMO



MATERIALES	UND	CANT
GRAVILLA 3/4"	M3	-
RELLENO B-200	M3	-
RAJON	M3	-
B-400	M3	-
TRITURADO 1/2	M3	-
MBR	LT	-
EMULSION	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
--	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

TEMPERATURA ASFALTO	TIPO:	
PLACA VOLQUETA	LLEGADA	COMPACTACIÓN
-	-	-
-	-	-
-	-	-

PRUEBAS DE LABORATORIO	CANT	UBICACIÓN
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

INVENTARIO

SUMIDEROS	10	CÁRCAMOS	-
POZOS	4	DOMICILIARIAS	

ESTUVO PARADO EL FRENTE	SI		NO	X
RAZONES				

B. CONTROL DE VOLQUETAS

CARGUE DE ESCOMBROS	PLACA	M3	ESCOMBRERA
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-

TRANS MATERIAL	PLACA	M3	ORIGEN
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-

C. ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DÍA

Dia soleado, se inicia pañete y remate para cajas de inspeccion al civ 12001759, y se inicia excavacion manual de cajas de aguas negras para el civ 12001804.

INSPECTOR DE INTERVENTORÍA

ALEJANDRA HERRAN AVILA

FORMATO DIARIO			FONDO DE DESARROLLO ALCALDIA LOCAL DE BARRIOS UNIDOS
FECHA			INTERVENTORÍA Y CONTRUCIVILES SAS Contrato de Interventoría No. 242 de 2019
11	2	2021	CONSORCIO BARRIOS UNIDOS Contrato de Obra Pública No. 241 de 2019
DD	MM	AA	TIPO DE INTERVENCIÓN: REHABILITACIÓN VIAL

INFORME DIARIO DE INTERVENTORÍA

LOCALIZACION	BARRIO	MODELO NORTE	CIV	12001759-12001804	
NOMENCLATURA	Carrera 56B	DESDE	Calle 64A Bis	HASTA	Diagonal 67B

NOMBRE DEL RESIDENTE INTERVENTOR	Ing. JUAN PABLO LEMUS
NOMBRE DEL RESIDENTE DE OBRA	Ing. MANUEL RUIZ

A. OBJETO DE MANTENIMIENTO

	BIEN	MAL
SEÑALIZACIÓN	X	
MANEJO DE ESCOMBROS	X	
MANEJO DE MATERIALES	X	
DOTACION	X	

	SI	x	NO		DURACION
LLUVIA	MAÑANA				
	TARDE			x	
ACCIDENTES	SI		NO	X	

PERSONAL	CANT
Residente de obra	1
Inspector de obra	1
Obreros	2
Operarios	-
Topografía	2
Brigadistas	-
Transito	-
Vigilantes	1

EQUIPO	CANT
Volquetas sencillas	
Volquetas dobletroques	
Retroescavadoras	x
Compactadoras	x
Cargadores	x
Finisher	-
Cortadora	-
Canguro	x

BOSQUEJO DEL TRAMO



MATERIALES	UND	CANT
GRAVILLA 3/4"	M3	-
RELLENO B-200	M3	-
RAJON	M3	-
B-400	M3	-
TRITURADO 1/2	M3	-
MBR	LT	-
EMULSION	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
--	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

TEMPERATURA ASFALTO	TIPO:	
PLACA VOLQUETA	LLEGADA	COMPACTACIÓN
-	-	-
-	-	-
-	-	-

PRUEBAS DE LABORATORIO	CANT	UBICACIÓN
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

INVENTARIO			
SUMIDEROS	10	CÁRCAMOS	-
POZOS	4	DOMICILIARIAS	

ESTUVO PARADO EL FRENTE	SI		NO	X
RAZONES				

B. CONTROL DE VOLQUETAS

CARGUE DE ESCOMBROS	PLACA	M3	ESCOMBRERA
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-

TRANS MATERIAL	PLACA	M3	ORIGEN
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-

C. ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DÍA

Dia soleado, se continua con la excavacion manual para cajas de aguas negras del civ 12001804, y se continua remate cajs de inspeccion para el civ 12001759.

INSPECTOR DE INTERVENTORÍA

ALEJANDRA HERRAN AVILA

FORMATO DIARIO			**FONDO DE DESARROLLO ALCALDIA LOCAL DE BARRIOS UNIDOS**
FECHA			**INTERVENTORÍA Y CONTRUCIVILES SAS** Contrato de Interventoría No. 242 de 2019
			CONSORCIO BARRIOS UNIDOS Contrato de Obra Pública No. 241 de 2019
12	2	2021	
DD	MM	AA	**TIPO DE INTERVENCIÓN** REHABILITACIÓN VIAL

INFORME DIARIO DE INTERVENTORÍA

LOCALIZACION	**BARRIO**	MODELO NORTE		**CIV**	12001759-12001804	
NOMENCLATURA	Carrera 56B	**DESDE**	Calle 64A Bis	**HASTA**	Diagonal 67B	

NOMBRE DEL RESIDENTE INTERVENTOR	**Ing. JUAN PABLO LEMUS**
NOMBRE DEL RESIDENTE DE OBRA	**Ing. MANUEL RUIZ**

A. OBJETO DE MANTENIMIENTO

	BIEN	MAL
SEÑALIZACIÓN	X	
MANEJO DE ESCOMBROS	X	
MANEJO DE MATERIALES	X	
DOTACION	X	

LLUVIA	SI		NO	X	DURACION
	MAÑANA				
	TARDE				
ACCIDENTES	SI		NO	X	

PERSONAL	CANT
Residente de obra	1
Inspector de obra	1
Obreros	2
Operarios	-
Topografía	-
Brigadistas	-
Transito	-
Vigilantes	1

EQUIPO	CANT
Volquetas sencillas	
Volquetas dobletroques	x
Retroescavadoras	x
Compactadoras	x
Cargadores	x
Finisher	-
Cortadora	-
Canguro	x

BOSQUEJO DEL TRAMO



MATERIALES	UND	CANT
GRAVILLA 3/4"	M3	-
RELLENO B-200	M3	-
RAJON	M3	-
B-400	M3	-
TRITURADO 1/2	M3	-
MBR	LT	-
EMULSION	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
--	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

TEMPERATURA ASFALTO	TIPO:	
PLACA VOLQUETA	**LLEGADA**	**COMPACTACIÓN**
-	-	-
-	-	-
-	-	-

PRUEBAS DE LABORATORIO	**CANT**	**UBICACIÓN**
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

INVENTARIO

SUMIDEROS	10	CÁRCAMOS	-
POZOS	4	DOMICILIARIAS	

ESTUVO PARADO EL FRENTE	SI		NO	X
RAZONES				

B. CONTROL DE VOLQUETAS

	PLACA	M3	ESCOMBRERA
CARGUE DE ESCOMBROS	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-

TRANS MATERIAL	PLACA	M3	ORIGEN
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-

C. ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DÍA

Dia soleado, se continua con la excavacion manual, y se funden placa fondo para cajs de inspeccion .

INSPECTOR DE INTERVENTORÍA

ALEJANDRA HERRAN AVILA

FORMATO DIARIO			FONDO DE DESARROLLO ALCALDIA LOCAL DE BARRIOS UNIDOS
FECHA			INTERVENTORÍA Y CONTRUCIVILES SAS Contrato de Interventoría No. 242 de 2019
13	2	2021	CONSORCIO BARRIOS UNIDOS Contrato de Obra Pública No. 241 de 2019
DD	MM	AA	TIPO DE INTERVENCIÓN: REHABILITACIÓN VIAL

INFORME DIARIO DE INTERVENTORÍA

LOCALIZACION	BARRIO	MODELO NORTE	CIV	12001759-12001804	
NOMENCLATURA	Carrera 56B	DESDE	Calle 64A Bis	HASTA	Diagonal 67B

NOMBRE DEL RESIDENTE INTERVENTOR	Ing. JUAN PABLO LEMUS
NOMBRE DEL RESIDENTE DE OBRA	Ing. MANUEL RUIZ

A. OBJETO DE MANTENIMIENTO

	BIEN	MAL
SEÑALIZACIÓN	X	
MANEJO DE ESCOMBROS	X	
MANEJO DE MATERIALES	X	
DOTACION	X	

LLUVIA	SI	x	NO		DURACION
	MAÑANA				
	TARDE			x	
ACCIDENTES	SI		NO	X	

PERSONAL	CANT
Residente de obra	1
Inspector de obra	1
Obreros	2
Operarios	-
Topografía	-
Brigadistas	-
Transito	-
Vigilantes	1

EQUIPO	CANT
Volquetas sencillas	
Volquetas dobletroques	x
Retroescavadoras	x
Compactadoras	x
Cargadores	x
Finisher	-
Cortadora	-
Canguro	x

BOSQUEJO DEL TRAMO



MATERIALES	UND	CANT
GRAVILLA 3/4"	M3	-
RELLENO B-200	M3	-
RAJON	M3	-
B-400	M3	-
TRITURADO 1/2	M3	-
MBR	LT	-
EMULSION	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
--	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

TEMPERATURA ASFALTO	TIPO:	
PLACA VOLQUETA	LLEGADA	COMPACTACIÓN
-	-	-
-	-	-
-	-	-

PRUEBAS DE LABORATORIO	CANT	UBICACIÓN
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

INVENTARIO

SUMIDEROS	10	CÁRCAMOS	-
POZOS	4	DOMICILIARIAS	

ESTUVO PARADO EL FRENTE	SI		NO	X
RAZONES				

B. CONTROL DE VOLQUETAS

	PLACA	M3	ESCOMBRERA
CARGUE DE ESCOMBROS	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-

TRANS MATERIAL	PLACA	M3	ORIGEN
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-

C. ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DÍA

Dia soleado se continua con la cosntruccion de las cajas de inspeccion .

INSPECTOR DE INTERVENTORÍA

ALEJANDRA HERRAN AVILA

FORMATO DIARIO			FONDO DE DESARROLLO ALCALDIA LOCAL DE BARRIOS UNIDOS
FECHA			INTERVENTORÍA Y CONTRUCIVILES SAS Contrato de Interventoría No. 242 de 2019
15	2	2021	CONSORCIO BARRIOS UNIDOS Contrato de Obra Pública No. 241 de 2019
DD	MM	AA	TIPO DE INTERVENCIÓN: REHABILITACIÓN VIAL

INFORME DIARIO DE INTERVENTORÍA

LOCALIZACION	BARRIO	MODELO NORTE		CIV	12001759-12001804	
NOMENCLATURA	Carrera 56B	DESDE	Calle 64A Bis	HASTA	Diagonal 67B	

NOMBRE DEL RESIDENTE INTERVENTOR	Ing. JUAN PABLO LEMUS
NOMBRE DEL RESIDENTE DE OBRA	Ing. MANUEL RUIZ

A. OBJETO DE MANTENIMIENTO

	BIEN	MAL
SEÑALIZACIÓN	X	
MANEJO DE ESCOMBROS	X	
MANEJO DE MATERIALES	X	
DOTACION	X	

LLUVIA	SI		NO		DURACION
	MAÑANA				
	TARDE			x	
ACCIDENTES	SI		NO	X	

PERSONAL	CANT
Residente de obra	1
Inspector de obra	1
Obreros	2
Operarios	-
Topografía	-
Brigadistas	-
Transito	-
Vigilantes	1

EQUIPO	CANT
Volquetas sencillas	
Volquetas dobletroques	x
Retroescavadoras	x
Compactadoras	x
Cargadores	x
Finisher	-
Cortadora	-
Canguro	x

BOSQUEJO DEL TRAMO



MATERIALES	UND	CANT
GRAVILLA 3/4"	M3	-
RELLENO B-200	M3	-
RAJON	M3	-
B-400	M3	-
TRITURADO 1/2	M3	-
MBR	LT	-
EMULSION	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
--	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

TEMPERATURA ASFALTO	TIPO:	
PLACA VOLQUETA	LLEGADA	COMPACTACIÓN
-	-	-
-	-	-
-	-	-

PRUEBAS DE LABORATORIO	CANT	UBICACIÓN
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

INVENTARIO			
SUMIDEROS	1	CÁRCAMOS	-
POZOS	4	DOMICILIARIAS	

ESTUVO PARADO EL FRENTE	SI		NO	X
RAZONES				

B. CONTROL DE VOLQUETAS

	PLACA	M3	ESCOMBRERA
CARGUE DE ESCOMBROS	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-

TRANS MATERIAL	PLACA	M3	ORIGEN
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-

C. ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DÍA

Dia soleado, se continua con la construccion cajas de aguas negras, y se inician con demolicon de andenes.

INSPECTOR DE INTERVENTORÍA

ALEJANDRA HERRAN AVILA

FORMATO DIARIO			FONDO DE DESARROLLO ALCALDIA LOCAL DE BARRIOS UNIDOS
FECHA			INTERVENTORÍA Y CONTRUCIVILES SAS Contrato de Interventoría No. 242 de 2019
16	2	2021	CONSORCIO BARRIOS UNIDOS Contrato de Obra Pública No. 241 de 2019
DD	MM	AA	TIPO DE INTERVENCIÓN: REHABILITACIÓN VIAL

INFORME DIARIO DE INTERVENTORÍA

LOCALIZACION	BARRIO	MODELO NORTE	CIV	12001759-12001804	
NOMENCLATURA	Carrera 56B	DESDE	Calle 64A Bis	HASTA	Diagonal 67B

NOMBRE DEL RESIDENTE INTERVENTOR	Ing. JUAN PABLO LEMUS
NOMBRE DEL RESIDENTE DE OBRA	Ing. MANUEL RUIZ

A. OBJETO DE MANTENIMIENTO

	BIEN	MAL
SEÑALIZACIÓN	X	
MANEJO DE ESCOMBROS	X	
MANEJO DE MATERIALES	X	
DOTACION	X	

	SI		NO	X	DURACION
LLUVIA	MAÑANA				
	TARDE				
ACCIDENTES	SI		NO	X	

PERSONAL	CANT
Residente de obra	1
Inspector de obra	1
Obreros	2
Operarios	-
Topografía	-
Brigadistas	-
Transito	-
Vigilantes	1

EQUIPO	CANT
Volquetas sencillas	
Volquetas dobletroques	x
Retroescavadoras	x
Compactadoras	x
Cargadores	x
Finisher	-
Cortadora	-
Canguro	x

BOSQUEJO DEL TRAMO



MATERIALES	UND	CANT
GRAVILLA 3/4"	M3	-
RELLENO B-200	M3	-
RAJON	M3	-
B-400	M3	-
TRITURADO 1/2	M3	-
MBR	LT	-
EMULSION	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
--	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

TEMPERATURA ASFALTO	TIPO:	
PLACA VOLQUETA	LLEGADA	COMPACTACIÓN
-	-	-
-	-	-
-	-	-

PRUEBAS DE LABORATORIO	CANT	UBICACIÓN
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

INVENTARIO

SUMIDEROS	10	CÁRCAMOS	-
POZOS	4	DOMICILIARIAS	

ESTUVO PARADO EL FRENTE	SI		NO	X
RAZONES				

B. CONTROL DE VOLQUETAS

	PLACA	M3	ESCOMBRERA
CARGUE DE ESCOMBROS	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-

TRANS MATERIAL	PLACA	M3	ORIGEN
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-

C. ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DÍA

Dia soleado, se continua con la construccion cajas de inspeccion de aguas negras.

INSPECTOR DE INTERVENTORÍA

ALEJANDRA HERRAN AVILA

FORMATO DIARIO			FONDO DE DESARROLLO ALCALDIA LOCAL DE BARRIOS UNIDOS
FECHA			INTERVENTORÍA Y CONTRUCIVILES SAS Contrato de Interventoría No. 242 de 2019
17	2	2021	CONSORCIO BARRIOS UNIDOS Contrato de Obra Pública No. 241 de 2019
DD	MM	AA	TIPO DE INTERVENCIÓN: REHABILITACIÓN VIAL

INFORME DIARIO DE INTERVENTORÍA

LOCALIZACION	BARRIO	MODELO NORTE	CIV	12001759-12001804	
NOMENCLATURA	Carrera 56B	DESDE	Calle 64A Bis	HASTA	Diagonal 67B

NOMBRE DEL RESIDENTE INTERVENTOR	Ing. JUAN PABLO LEMUS
NOMBRE DEL RESIDENTE DE OBRA	Ing. MANUEL RUIZ

A. OBJETO DE MANTENIMIENTO

	BIEN	MAL
SEÑALIZACIÓN	X	
MANEJO DE ESCOMBROS	X	
MANEJO DE MATERIALES	X	
DOTACION	X	

	SI		NO	X	DURACION
LLUVIA	MAÑANA				
	TARDE				
ACCIDENTES	SI		NO	X	

PERSONAL	CANT
Residente de obra	1
Inspector de obra	1
Obreros	2
Operarios	-
Topografía	-
Brigadistas	-
Transito	-
Vigilantes	1

EQUIPO	CANT
Volquetas sencillas	
Volquetas dobletroques	x
Retroescavadoras	x
Compactadoras	x
Cargadores	x
Finisher	-
Cortadora	-
Canguro	x

BOSQUEJO DEL TRAMO



MATERIALES	UND	CANT
GRAVILLA 3/4"	M3	-
RELLENO B-200	M3	-
RAJON	M3	-
B-400	M3	-
TRITURADO 1/2	M3	-
MBR	LT	-
EMULSION	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
--	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

TEMPERATURA ASFALTO	TIPO:	
PLACA VOLQUETA	LLEGADA	COMPACTACIÓN
-	-	-
-	-	-
-	-	-

PRUEBAS DE LABORATORIO	CANT	UBICACIÓN
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

INVENTARIO			
SUMIDEROS	10	CÁRCAMOS	-
POZOS	4	DOMICILIARIAS	

ESTUVO PARADO EL FRENTE	SI		NO	X
RAZONES				

B. CONTROL DE VOLQUETAS

	PLACA	M3	ESCOMBRERA
CARGUE DE ESCOMBROS	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-

TRANS MATERIAL	PLACA	M3	ORIGEN
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-

C. ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DÍA

Dia soleado, se continua con la demolicion y excavacion anden del civ 12001804.

INSPECTOR DE INTERVENTORÍA

ALEJANDRA HERRAN AVILA

FORMATO DIARIO			FONDO DE DESARROLLO ALCALDIA LOCAL DE BARRIOS UNIDOS
FECHA			INTERVENTORÍA Y CONTRUCIVILES SAS Contrato de Interventoría No. 242 de 2019
18	2	2021	CONSORCIO BARRIOS UNIDOS Contrato de Obra Pública No. 241 de 2019
DD	MM	AA	TIPO DE INTERVENCIÓN: REHABILITACIÓN VIAL

INFORME DIARIO DE INTERVENTORÍA

LOCALIZACION	BARRIO	MODELO NORTE	CIV	12001759-12001804	
NOMENCLATURA	Carrera 56B	DESDE	Calle 64A Bis	HASTA	Diagonal 67B

NOMBRE DEL RESIDENTE INTERVENTOR	Ing. JUAN PABLO LEMUS
NOMBRE DEL RESIDENTE DE OBRA	Ing. MANUEL RUIZ

A. OBJETO DE MANTENIMIENTO

	BIEN	MAL
SEÑALIZACIÓN	X	
MANEJO DE ESCOMBROS	X	
MANEJO DE MATERIALES	X	
DOTACION	X	

	SI		NO	X	DURACION
LLUVIA	MAÑANA				
	TARDE				
ACCIDENTES	SI		NO	X	

PERSONAL	CANT
Residente de obra	1
Inspector de obra	1
Obreros	2
Operarios	-
Topografía	-
Brigadistas	-
Transito	-
Vigilantes	1

EQUIPO	CANT
Volquetas sencillas	
Volquetas dobletroques	x
Retroescavadoras	x
Compactadoras	x
Cargadores	x
Finisher	-
Cortadora	-
Canguro	x

BOSQUEJO DEL TRAMO



MATERIALES	UND	CANT
GRAVILLA 3/4"	M3	-
RELLENO B-200	M3	-
RAJON	M3	-
B-400	M3	-
TRITURADO 1/2	M3	-
MBR	LT	-
EMULSION	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
--	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

TEMPERATURA ASFALTO	TIPO:	
PLACA VOLQUETA	LLEGADA	COMPACTACIÓN
-	-	-
-	-	-
-	-	-

PRUEBAS DE LABORATORIO	CANT	UBICACIÓN
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

INVENTARIO

SUMIDEROS	10	CÁRCAMOS	-
POZOS	4	DOMICILIARIAS	

ESTUVO PARADO EL FRENTE	SI		NO	X
RAZONES				

B. CONTROL DE VOLQUETAS

CARGUE DE ESCOMBROS	PLACA	M3	ESCOMBRERA
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-

TRANS MATERIAL	PLACA	M3	ORIGEN
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-

C. ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DÍA

Dia soleados, se continua demolicion y excavacion de andenes, cergue y retiro de escombros al civ 12001804 y se instala geotextil y se sere con B-400.

INSPECTOR DE INTERVENTORÍA

ALEJANDRA HERRAN AVILA

FORMATO DIARIO			FONDO DE DESARROLLO ALCALDIA LOCAL DE BARRIOS UNIDOS
FECHA			INTERVENTORÍA Y CONTRUCIVILES SAS Contrato de Interventoría No. 242 de 2019
19	2	2021	CONSORCIO BARRIOS UNIDOS Contrato de Obra Pública No. 241 de 2019
DD	MM	AA	TIPO DE INTERVENCIÓN: REHABILITACIÓN VIAL

INFORME DIARIO DE INTERVENTORÍA

LOCALIZACION	BARRIO	MODELO NORTE	CIV	12001759-12001804	
NOMENCLATURA	Carrera 56B	DESDE	Calle 64A Bis	HASTA	Diagonal 67B

NOMBRE DEL RESIDENTE INTERVENTOR	Ing. JUAN PABLO LEMUS
NOMBRE DEL RESIDENTE DE OBRA	Ing. MANUEL RUIZ

A. OBJETO DE MANTENIMIENTO

	BIEN	MAL
SEÑALIZACIÓN	X	
MANEJO DE ESCOMBROS	X	
MANEJO DE MATERIALES	X	
DOTACION	X	

	SI		NO	X	DURACION
LLUVIA	MAÑANA				
	TARDE				
ACCIDENTES	SI		NO	X	

PERSONAL	CANT
Residente de obra	1
Inspector de obra	1
Obreros	2
Operarios	-
Topografía	-
Brigadistas	-
Transito	-
Vigilantes	1

EQUIPO	CANT
Volquetas sencillas	
Volquetas dobletroques	x
Retroescavadoras	x
Compactadoras	x
Cargadores	x
Finisher	-
Cortadora	-
Canguro	x

BOSQUEJO DEL TRAMO



MATERIALES	UND	CANT
GRAVILLA 3/4"	M3	-
RELLENO B-200	M3	-
RAJON	M3	-
B-400	M3	-
TRITURADO 1/2	M3	-
MBR	LT	-
EMULSION	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
--	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

TEMPERATURA ASFALTO	TIPO:	
PLACA VOLQUETA	LLEGADA	COMPACTACIÓN
-	-	-
-	-	-
-	-	-

PRUEBAS DE LABORATORIO	CANT	UBICACIÓN
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

INVENTARIO

SUMIDEROS	10	CÁRCAMOS	-
POZOS	4	DOMICILIARIAS	

ESTUVO PARADO EL FRENTE	SI		NO	X
RAZONES				

B. CONTROL DE VOLQUETAS

	PLACA	M3	ESCOMBRERA
CARGUE DE ESCOMBROS	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-

TRANS MATERIAL	PLACA	M3	ORIGEN
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-

C. ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DÍA

Dia nublado, se inicia y se serea con subbase anden y se realizan toma de densidades al b-400 material granular.

INSPECTOR DE INTERVENTORÍA

ALEJANDRA HERRAN AVILA

FORMATO DIARIO			FONDO DE DESARROLLO ALCALDIA LOCAL DE BARRIOS UNIDOS
FECHA			INTERVENTORÍA Y CONTRUCIVILES SAS Contrato de Interventoría No. 242 de 2019
20	2	2021	CONSORCIO BARRIOS UNIDOS Contrato de Obra Pública No. 241 de 2019
DD	MM	AA	TIPO DE INTERVENCIÓN: REHABILITACIÓN VIAL

INFORME DIARIO DE INTERVENTORÍA

LOCALIZACION	BARRIO	MODELO NORTE	CIV	12001759-12001804	
NOMENCLATURA	Carrera 56B	DESDE	Calle 64A Bis	HASTA	Diagonal 67B

NOMBRE DEL RESIDENTE INTERVENTOR	Ing. JUAN PABLO LEMUS
NOMBRE DEL RESIDENTE DE OBRA	Ing. MANUEL RUIZ

A. OBJETO DE MANTENIMIENTO

	BIEN	MAL
SEÑALIZACIÓN	X	
MANEJO DE ESCOMBROS	X	
MANEJO DE MATERIALES	X	
DOTACION	X	

	SI		NO	X	DURACION
LLUVIA	MAÑANA				
	TARDE				
ACCIDENTES	SI		NO	X	

PERSONAL	CANT
Residente de obra	1
Inspector de obra	1
Obreros	2
Operarios	-
Topografía	-
Brigadistas	-
Transito	-
Vigilantes	1

EQUIPO	CANT
Volquetas sencillas	
Volquetas dobletroques	x
Retroescavadoras	x
Compactadoras	x
Cargadores	x
Finisher	-
Cortadora	-
Canguro	x

BOSQUEJO DEL TRAMO



MATERIALES	UND	CANT
GRAVILLA 3/4"	M3	-
RELLENO B-200	M3	-
RAJON	M3	-
B-400	M3	-
TRITURADO 1/2	M3	-
MBR	LT	-
EMULSION	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
--	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

TEMPERATURA ASFALTO	TIPO:	
PLACA VOLQUETA	LLEGADA	COMPACTACIÓN
-	-	-
-	-	-
-	-	-

PRUEBAS DE LABORATORIO	CANT	UBICACIÓN
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

INVENTARIO			
SUMIDEROS	10	CÁRCAMOS	-
POZOS	4	DOMICILIARIAS	

ESTUVO PARADO EL FRENTE	SI		NO	X
RAZONES				

B. CONTROL DE VOLQUETAS

	PLACA	M3	ESCOMBRERA
CARGUE DE ESCOMBROS	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-

TRANS MATERIAL	PLACA	M3	ORIGEN
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-

C. ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DÍA

Dia nublado, se realiza la contruccion de las cajas de inspeccion de aguas negras, y se funden sardinles sumideros y nivelestas de las cajas de ETB, y se instalan marcos a las cajs de aguas negras

INSPECTOR DE INTERVENTORÍA

ALEJANDRA HERRAN AVILA

FORMATO DIARIO			FONDO DE DESARROLLO ALCALDIA LOCAL DE BARRIOS UNIDOS
FECHA			INTERVENTORÍA Y CONTRUCIVILES SAS Contrato de Interventoría No. 242 de 2019
22	1	2021	CONSORCIO BARRIOS UNIDOS Contrato de Obra Pública No. 241 de 2019
DD	MM	AA	TIPO DE INTERVENCIÓN: REHABILITACIÓN VIAL

INFORME DIARIO DE INTERVENTORÍA

LOCALIZACION	BARRIO	MODELO NORTE		CIV	12001759-12001804	
NOMENCLATURA	Carrera 56B	DESDE	Calle 64A Bis	HASTA	Diagonal 67B	

NOMBRE DEL RESIDENTE INTERVENTOR	Ing. JUAN PABLO LEMUS
NOMBRE DEL RESIDENTE DE OBRA	Ing. MANUEL RUIZ

A. OBJETO DE MANTENIMIENTO

	BIEN	MAL
SEÑALIZACIÓN	X	
MANEJO DE ESCOMBROS	X	
MANEJO DE MATERIALES	X	
DOTACION	X	

	SI		NO	X	DURACION
LLUVIA	MAÑANA				
	TARDE				
ACCIDENTES	SI		NO	X	

PERSONAL	CANT
Residente de obra	1
Inspector de obra	1
Obreros	2
Operarios	-
Topografía	-
Brigadistas	-
Transito	-
Vigilantes	1

EQUIPO	CANT
Volquetas sencillas	
Volquetas dobletroques	x
Retroescavadoras	x
Compactadoras	x
Cargadores	x
Finisher	-
Cortadora	-
Canguro	x

BOSQUEJO DEL TRAMO



MATERIALES	UND	CANT
GRAVILLA 3/4"	M3	-
RELLENO B-200	M3	-
RAJON	M3	-
B-400	M3	-
TRITURADO 1/2	M3	-
MBR	LT	-
EMULSION	m3	-
ARENA DE PEÑA	m3	-
ARENA DE RIO	-	-
-	-	-
--	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

TEMPERATURA ASFALTO	TIPO:	
PLACA VOLQUETA	LLEGADA	COMPACTACIÓN
-	-	-
-	-	-
-	-	-

PRUEBAS DE LABORATORIO	CANT	UBICACIÓN
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

INVENTARIO

SUMIDEROS	10	CÁRCAMOS	-
POZOS	4	DOMICILIARIAS	

ESTUVO PARADO EL FRENTE	SI		NO	X
RAZONES				

B. CONTROL DE VOLQUETAS

	PLACA	M3	ESCOMBRERA
CARGUE DE ESCOMBROS	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-

TRANS MATERIAL	PLACA	M3	ORIGEN
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-

C. ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DÍA

Dia soleado, se con tinua con la instalacion y sereo de subbase y se continua con la instalcion de cajas de acueducto y marcos de cajsa de aguas negras.

INSPECTOR DE INTERVENTORÍA

ALEJANDRA HERRAN AVILA

FORMATO DIARIO			FONDO DE DESARROLLO ALCALDIA LOCAL DE BARRIOS UNIDOS
FECHA			INTERVENTORÍA Y CONTRUCIVILES SAS Contrato de Interventoría No. 242 de 2019
23	2	2021	CONSORCIO BARRIOS UNIDOS Contrato de Obra Pública No. 241 de 2019
DD	MM	AA	TIPO DE INTERVENCIÓN: REHABILITACIÓN VIAL

INFORME DIARIO DE INTERVENTORÍA

LOCALIZACION	BARRIO	MODELO NORTE	CIV	12001759-12001804	
NOMENCLATURA	Carrera 56B	DESDE	Calle 64A Bis	HASTA	Diagonal 67B

NOMBRE DEL RESIDENTE INTERVENTOR	Ing. JUAN PABLO LEMUS
NOMBRE DEL RESIDENTE DE OBRA	Ing. MANUEL RUIZ

A. OBJETO DE MANTENIMIENTO

	BIEN	MAL
SEÑALIZACIÓN	X	
MANEJO DE ESCOMBROS	X	
MANEJO DE MATERIALES	X	
DOTACION	X	

	SI		NO	X	DURACION
LLUVIA	MAÑANA				
	TARDE				
ACCIDENTES	SI		NO	X	

PERSONAL	CANT
Residente de obra	1
Inspector de obra	1
Obreros	2
Operarios	-
Topografía	-
Brigadistas	-
Transito	-
Vigilantes	1

EQUIPO	CANT
Volquetas sencillas	
Volquetas dobletroques	x
Retroescavadoras	x
Compactadoras	x
Cargadores	x
Finisher	-
Cortadora	-
Canguro	x

BOSQUEJO DEL TRAMO



MATERIALES	UND	CANT
GRAVILLA 3/4"	M3	-
RELLENO B-200	M3	-
RAJON	M3	-
B-400	M3	-
TRITURADO 1/2	M3	-
MBR	LT	-
EMULSION	m3	-
ARENA DE PEÑA	m3	-
-	-	-
-	-	-
--	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

TEMPERATURA ASFALTO	TIPO:	
PLACA VOLQUETA	LLEGADA	COMPACTACIÓN
-	-	-
-	-	-
-	-	-

PRUEBAS DE LABORATORIO	CANT	UBICACIÓN
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

INVENTARIO

SUMIDEROS	10	CÁRCAMOS	-
POZOS	4	DOMICILIARIAS	

ESTUVO PARADO EL FRENTE	SI		NO	X

RAZONES	

B. CONTROL DE VOLQUETAS

	PLACA	M3	ESCOMBRERA
CARGUE DE ESCOMBROS	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-

TRANS MATERIAL	PLACA	M3	ORIGEN
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-

C. ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DÍA

Dia nublado , se continua con la instalcion y sereo de andenes al material granular.

INSPECTOR DE INTERVENTORÍA

ALEJANDRA HERRAN AVILA

FORMATO DIARIO			FONDO DE DESARROLLO ALCALDIA LOCAL DE BARRIOS UNIDOS
FECHA			INTERVENTORÍA Y CONTRUCIVILES SAS Contrato de Interventoría No. 242 de 2019
			CONSORCIO BARRIOS UNIDOS Contrato de Obra Pública No. 241 de 2019
25	2	2021	
DD	MM	AA	TIPO DE INTERVENCIÓN: REHABILITACIÓN VIAL

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS
SECRETARÍA DE CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE

INFORME DIARIO DE INTERVENTORÍA

LOCALIZACION	**BARRIO**	MODELO NORTE		**CIV**	12001759-12001804	
NOMENCLATURA	Carrera 56B	**DESDE**	Calle 64A Bis	**HASTA**	Diagonal 67B	

NOMBRE DEL RESIDENTE INTERVENTOR	**Ing. JUAN PABLO LEMUS**
NOMBRE DEL RESIDENTE DE OBRA	**Ing. MANUEL RUIZ**

A. OBJETO DE MANTENIMIENTO

	BIEN	MAL
SEÑALIZACIÓN	X	
MANEJO DE ESCOMBROS	X	
MANEJO DE MATERIALES	X	
DOTACION	X	

LLUVIA	SI		NO	X	DURACION
	MAÑANA				
	TARDE				
ACCIDENTES	SI		NO	X	

PERSONAL	CANT
Residente de obra	1
Inspector de obra	1
Obreros	2
Operarios	-
Topografía	-
Brigadistas	-
Transito	-
Vigilantes	1

EQUIPO	CANT
Volquetas sencillas	
Volquetas dobletroques	x
Retroescavadoras	x
Compactadoras	x
Cargadores	x
Finisher	-
Cortadora	-
Canguro	x

BOSQUEJO DEL TRAMO



MATERIALES	UND	CANT
GRAVILLA 3/4"	M3	-
RELLENO B-200	M3	-
RAJON	M3	-
B-400	M3	-
TRITURADO 1/2	M3	-
MBR	LT	-
EMULSION	m3	-
ARENA DE PEÑA	m3	-
-	-	-
-	-	-
--	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

TEMPERATURA ASFALTO	TIPO:	
PLACA VOLQUETA	**LLEGADA**	**COMPACTACIÓN**
-	-	-
-	-	-
-	-	-

PRUEBAS DE LABORATORIO	CANT	UBICACIÓN
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

INVENTARIO

SUMIDEROS	10	CÁRCAMOS	-
POZOS	4	DOMICILIARIAS	

ESTUVO PARADO EL FRENTE	SI		NO	X
RAZONES				

B. CONTROL DE VOLQUETAS

	PLACA	M3	ESCOMBRERA
CARGUE DE ESCOMBROS	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-

TRANS MATERIAL	PLACA	M3	ORIGEN
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-

C. ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DÍA

Dia nublado, se instala concreto al anden del civ 12001804.

INSPECTOR DE INTERVENTORÍA

ALEJANDRA HERRAN AVILA

FORMATO DIARIO			FONDO DE DESARROLLO ALCALDIA LOCAL DE BARRIOS UNIDOS
FECHA			INTERVENTORÍA Y CONTRUCIVILES SAS Contrato de Interventoría No. 242 de 2019
			CONSORCIO BARRIOS UNIDOS Contrato de Obra Pública No. 241 de 2019
26	2	2021	
DD	MM	AA	TIPO DE INTERVENCIÓN: REHABILITACIÓN VIAL

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS
SECRETARÍA DE CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE

INFORME DIARIO DE INTERVENTORÍA

LOCALIZACION	**BARRIO**	MODELO NORTE		**CIV**	12001759-12001804	
NOMENCLATURA	Carrera 56B	**DESDE**	Calle 64A Bis	**HASTA**	Diagonal 67B	

NOMBRE DEL RESIDENTE INTERVENTOR	**Ing. JUAN PABLO LEMUS**
NOMBRE DEL RESIDENTE DE OBRA	**Ing. MANUEL RUIZ**

A. OBJETO DE MANTENIMIENTO

	BIEN	MAL
SEÑALIZACIÓN	X	
MANEJO DE ESCOMBROS	X	
MANEJO DE MATERIALES	X	
DOTACION	X	

LLUVIA	SI		NO	X	DURACION
	MAÑANA				
	TARDE				
ACCIDENTES	SI		NO	X	

PERSONAL	CANT
Residente de obra	1
Inspector de obra	1
Obreros	2
Operarios	-
Topografía	-
Brigadistas	-
Transito	-
Vigilantes	1

EQUIPO	CANT
Volquetas sencillas	
Volquetas dobletroques	x
Retroescavadoras	x
Compactadoras	x
Cargadores	x
Finisher	-
Cortadora	-
Canguro	x

BOSQUEJO DEL TRAMO



MATERIALES	UND	CANT
GRAVILLA 3/4"	M3	-
RELLENO B-200	M3	-
RAJON	M3	-
B-400	M3	-
TRITURADO 1/2	M3	-
MBR	LT	-
EMULSION	m3	-
ARENA DE PEÑA	m3	-
-	-	-
-	-	-
--	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

TEMPERATURA ASFALTO	TIPO:	
PLACA VOLQUETA	**LLEGADA**	**COMPACTACIÓN**
-	-	-
-	-	-
-	-	-

PRUEBAS DE LABORATORIO	CANT	UBICACIÓN
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

INVENTARIO

SUMIDEROS	10	CÁRCAMOS	-
POZOS	4	DOMICILIARIAS	

ESTUVO PARADO EL FRENTE	SI		NO	X
RAZONES				

B. CONTROL DE VOLQUETAS

	PLACA	M3	ESCOMBRERA
CARGUE DE ESCOMBROS	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-

TRANS MATERIAL	PLACA	M3	ORIGEN
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-

C. ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DÍA

Dia nublado se rematan cajas de aguas negras al civ 12001759 y al civ 12001804, se conitnua con el pañete a las cañuelas, y se realizan los cortes al anden del civ 12001804.

INSPECTOR DE INTERVENTORÍA

ALEJANDRA HERRAN AVILA

FORMATO DIARIO			FONDO DE DESARROLLO ALCALDIA LOCAL DE BARRIOS UNIDOS
FECHA			INTERVENTORÍA Y CONTRUCIVILES SAS Contrato de Interventoría No. 242 de 2019
			CONSORCIO BARRIOS UNIDOS Contrato de Obra Pública No. 241 de 2019
27	2	2021	
DD	MM	AA	TIPO DE INTERVENCIÓN: REHABILITACIÓN VIAL

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS
SECRETARÍA DE CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE

INFORME DIARIO DE INTERVENTORÍA

LOCALIZACION	**BARRIO**	MODELO NORTE		**CIV**	12001759-12001804	
NOMENCLATURA	Carrera 56B	**DESDE**	Calle 64A Bis	**HASTA**	Diagonal 67B	

NOMBRE DEL RESIDENTE INTERVENTOR	**Ing. JUAN PABLO LEMUS**
NOMBRE DEL RESIDENTE DE OBRA	**Ing. MANUEL RUIZ**

A. OBJETO DE MANTENIMIENTO

	BIEN	MAL
SEÑALIZACIÓN	X	
MANEJO DE ESCOMBROS	X	
MANEJO DE MATERIALES	X	
DOTACION	X	

LLUVIA	SI		NO	X	DURACION
	MAÑANA				
	TARDE				
ACCIDENTES	SI		NO	X	

PERSONAL	CANT
Residente de obra	1
Inspector de obra	1
Obreros	2
Operarios	-
Topografía	-
Brigadistas	-
Transito	-
Vigilantes	1

EQUIPO	CANT
Volquetas sencillas	
Volquetas dobletroques	x
Retroescavadoras	x
Compactadoras	x
Cargadores	x
Finisher	-
Cortadora	-
Canguro	x

BOSQUEJO DEL TRAMO



MATERIALES	UND	CANT
GRAVILLA 3/4"	M3	-
RELLENO B-200	M3	-
RAJON	M3	-
B-400	M3	-
TRITURADO 1/2	M3	-
MBR	LT	-
EMULSION	m3	-
ARENA DE PEÑA	m3	-
-	-	-
-	-	-
--	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

TEMPERATURA ASFALTO	TIPO:	
PLACA VOLQUETA	**LLEGADA**	**COMPACTACIÓN**
-	-	-
-	-	-
-	-	-

PRUEBAS DE LABORATORIO	CANT	UBICACIÓN
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

INVENTARIO

SUMIDEROS	10	CÁRCAMOS	-
POZOS	4	DOMICILIARIAS	

ESTUVO PARADO EL FRENTE	SI		NO	X
RAZONES				

B. CONTROL DE VOLQUETAS

	PLACA	M3	ESCOMBRERA
CARGUE DE ESCOMBROS	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-

TRANS MATERIAL	PLACA	M3	ORIGEN
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-

C. ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DÍA

Dia soleado, se continua con el remate de las cajas de aguas negras y pañete a las cañuelas del civ 12001759.

INSPECTOR DE INTERVENTORÍA

ALEJANDRA HERRAN AVILA

FORMATO DIARIO			FONDO DE DESARROLLO ALCALDIA LOCAL DE BARRIOS UNIDOS
FECHA			INTERVENTORÍA Y CONTRUCIVILES SAS Contrato de Interventoría No. 242 de 2019
			CONSORCIO BARRIOS UNIDOS
3	2	2021	Contrato de Obra Pública No. 241 de 2019
DD	MM	AA	TIPO DE INTERVENCIÓN: REHABILITACIÓN VIAL

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE — BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

INFORME DIARIO DE INTERVENTORÍA

LOCALIZACION	**BARRIO**	SAN FERNANDO	**CIV**		
NOMENCLATURA		**DESDE**		**HASTA**	

NOMBRE DEL RESIDENTE INTERVENTOR	**Ing. JUAN PABLO LEMUS**
NOMBRE DEL RESIDENTE DE OBRA	**Ing. MANUEL RUIZ**

A. OBJETO DE MANTENIMIENTO

	BIEN	MAL
SEÑALIZACIÓN	X	
MANEJO DE ESCOMBROS	X	
MANEJO DE MATERIALES	X	
DOTACION	X	

LLUVIA	SI		NO	X	DURACION
	MAÑANA				
	TARDE				
ACCIDENTES	SI		NO	X	

PERSONAL	CANT
Residente de obra	1
Inspector de obra	1
Obreros	3
Operarios	2
Topografía	2
Brigadistas	-
Transito	-
Vigilantes	1

EQUIPO	CANT
Volquetas sencillas	
Volquetas dobletroques	0
Retroescavadoras	1
Compactadoras	1
Cargadores	1
Finisher	-
Cortadora	-
Canguro	1

BOSQUEJO DEL TRAMO

MATERIALES	UND	CANT
GRAVILLA 3/4"	M3	14
RELLENO B-200	M3	-
RAJON	M3	14
B-400	M3	28
TRITURADO 1/2	M3	14
MBR	LT	2400
EMULSION	-	-
	-	-
-	-	-
-	-	-
--	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

TEMPERATURA ASFALTO	TIPO:	
PLACA VOLQUETA	**LLEGADA**	**COMPACTACIÓN**
-	-	-
-	-	-
-	-	-

PRUEBAS DE LABORATORIO	CANT	UBICACIÓN
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

INVENTARIO

SUMIDEROS _____ CÁRCAMOS -

POZOS _____ DOMICILIARIAS _____

ESTUVO PARADO EL FRENTE	SI		NO	X
RAZONES				

B. CONTROL DE VOLQUETAS

CARGUE DE ESCOMBROS	PLACA	M3	ESCOMBRERA
	-	-	
	-	-	
	-	-	

TRANS MATERIAL	PLACA	M3	ORIGEN
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-

C. ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DÍA

LOS DÍAS 03 Y 04 SE REALIZÓ LAVADO E INSPECCIÓN CON CAMAR TUBERÍA 16" ALCANTARILLADO.

INSPECTOR DE INTERVENTORÍA

ALEJANDRA HERRAN AVILA

FORMATO DIARIO			FONDO DE DESARROLLO ALCALDIA LOCAL DE BARRIOS UNIDOS
FECHA			INTERVENTORÍA Y CONTRUCIVILES SAS Contrato de Interventoría No. 242 de 2019
			CONSORCIO BARRIOS UNIDOS
4	2	2021	Contrato de Obra Pública No. 241 de 2019
DD	MM	AA	TIPO DE INTERVENCIÓN: REHABILITACIÓN VIAL

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE — BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

INFORME DIARIO DE INTERVENTORÍA

LOCALIZACION	**BARRIO**	SAN FERNANDO	**CIV**		
NOMENCLATURA		**DESDE**		**HASTA**	

NOMBRE DEL RESIDENTE INTERVENTOR	**Ing. JUAN PABLO LEMUS**
NOMBRE DEL RESIDENTE DE OBRA	**Ing. MANUEL RUIZ**

A. OBJETO DE MANTENIMIENTO

	BIEN	MAL
SEÑALIZACIÓN	X	
MANEJO DE ESCOMBROS	X	
MANEJO DE MATERIALES	X	
DOTACION	X	

LLUVIA	SI		NO	X	DURACION
	MAÑANA				
	TARDE				
ACCIDENTES	SI		NO	X	

PERSONAL	CANT
Residente de obra	1
Inspector de obra	1
Obreros	3
Operarios	2
Topografía	2
Brigadistas	-
Transito	-
Vigilantes	1

EQUIPO	CANT
Volquetas sencillas	
Volquetas dobletroques	0
Retroescavadoras	1
Compactadoras	1
Cargadores	1
Finisher	-
Cortadora	-
Canguro	1

BOSQUEJO DEL TRAMO

MATERIALES	UND	CANT
GRAVILLA 3/4"	M3	14
RELLENO B-200	M3	-
RAJON	M3	14
B-400	M3	28
TRITURADO 1/2	M3	14
MBR	LT	2400
EMULSION	-	-
	-	-
-	-	-
-	-	-
--	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

TEMPERATURA ASFALTO	TIPO:	
PLACA VOLQUETA	**LLEGADA**	**COMPACTACIÓN**
-	-	-
-	-	-
-	-	-

PRUEBAS DE LABORATORIO	CANT	UBICACIÓN
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

INVENTARIO

SUMIDEROS _____ CÁRCAMOS -

POZOS _____ DOMICILIARIAS _____

ESTUVO PARADO EL FRENTE	SI		NO	X
RAZONES				

B. CONTROL DE VOLQUETAS

CARGUE DE ESCOMBROS	PLACA	M3	ESCOMBRERA
	QWU	14	MATERIAL COMUN
	FGH	14	MAETRIAL COMUN
	QUR	14	MAETRIAL COMUN
	-	-	
	-	-	
	-	-	
	-	-	

TRANS MATERIAL	PLACA	M3	ORIGEN
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-

C. ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DÍA

LOS DÍAS 03 Y 04 SE REALIZÓ LAVADO E INSPECCIÓN CON CAMAR TUBERÍA 16" ALCANTARILLADO.

INSPECTOR DE INTERVENTORÍA

ALEJANDRA HERRAN AVILA

FORMATO DIARIO			FONDO DE DESARROLLO ALCALDIA LOCAL DE BARRIOS UNIDOS	
FECHA			INTERVENTORÍA Y CONTRUCIVILES SAS Contrato de Interventoría No. 242 de 2019	
8	2	2021	CONSORCIO BARRIOS UNIDOS Contrato de Obra Pública No. 241 de 2019	
DD	MM	AA	TIPO DE INTERVENCIÓN	REHABILITACIÓN VIAL

INFORME DIARIO DE INTERVENTORÍA

LOCALIZACION	BARRIO	SAN FERNANDO	CIV		
NOMENCLATURA		DESDE		HASTA	

NOMBRE DEL RESIDENTE INTERVENTOR	Ing. JUAN PABLO LEMUS
NOMBRE DEL RESIDENTE DE OBRA	Ing. MANUEL RUIZ

A. OBJETO DE MANTENIMIENTO

	BIEN	MAL
SEÑALIZACIÓN	X	
MANEJO DE ESCOMBROS	X	
MANEJO DE MATERIALES	X	
DOTACION	X	

	SI		NO	X	DURACION
LLUVIA	MAÑANA				
	TARDE				
ACCIDENTES	SI		NO	X	

PERSONAL	CANT
Residente de obra	1
Inspector de obra	1
Obreros	2
Operarios	-
Topografía	-
Brigadistas	-
Transito	-
Vigilantes	1

EQUIPO	CANT
Volquetas sencillas	
Volquetas dobletroques	x
Retroescavadoras	x
Compactadoras	x
Cargadores	x
Finisher	-
Cortadora	-
Canguro	x

BOSQUEJO DEL TRAMO

MATERIALES	UND	CANT
GRAVILLA 3/4"	M3	-
RELLENO B-200	M3	-
RAJON	M3	-
B-400	M3	-
TRITURADO 1/2	M3	-
MBR	LT	-
EMULSION	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
--	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

TEMPERATURA ASFALTO	TIPO:	
PLACA VOLQUETA	LLEGADA	COMPACTACIÓN
-	-	-
-	-	-
-	-	-

PRUEBAS DE LABORATORIO	CANT	UBICACIÓN
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

INVENTARIO			
SUMIDEROS	10	CÁRCAMOS	-
POZOS	4	DOMICILIARIAS	

ESTUVO PARADO EL FRENTE	SI		NO	X
RAZONES				

B. CONTROL DE VOLQUETAS

CARGUE DE ESCOMBROS	PLACA	M3	ESCOMBRERA
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-

TRANS MATERIAL	PLACA	M3	ORIGEN
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-

C. ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DÍA

EL DÍA 08 SE INSTALA CERRAMIENTO Y SE INICIA EL FRESADO DE LA VÍA, SE INICIAN APIQUES PARA VERIFICAR REDES DE ACUEDUCTO Y GAS.
PERSONAL EN OBRA: 1 INSPECTOR OBRA, 1 INSPECTOR SISO, 1 COMISIÓN TOPOGRAFÍA, 1 BOAL, 2 AYUDANTES.
MAQUINARIA EN OBRA: 1 FRESADORA, 2 VOLQUETAS.
CLIMA: DÍA NUBLADO, LLUVIAS FUERTES EN HORAS DE LA TARDE.

INSPECTOR DE INTERVENTORÍA



ALEJANDRA HERRAN AVILA

FORMATO DIARIO			FONDO DE DESARROLLO ALCALDIA LOCAL DE BARRIOS UNIDOS	
FECHA			INTERVENTORÍA Y CONTRUCIVILES SAS Contrato de Interventoría No. 242 de 2019	
9	2	2021	CONSORCIO BARRIOS UNIDOS Contrato de Obra Pública No. 241 de 2019	
DD	MM	AA	TIPO DE INTERVENCIÓN	REHABILITACIÓN VIAL

INFORME DIARIO DE INTERVENTORÍA

LOCALIZACION	BARRIO	SAN FERNANDO	CIV		
NOMENCLATURA		DESDE		HASTA	

NOMBRE DEL RESIDENTE INTERVENTOR	Ing. JUAN PABLO LEMUS
NOMBRE DEL RESIDENTE DE OBRA	Ing. MANUEL RUIZ

A. OBJETO DE MANTENIMIENTO

	BIEN	MAL
SEÑALIZACIÓN	X	
MANEJO DE ESCOMBROS	X	
MANEJO DE MATERIALES	X	
DOTACION	X	

LLUVIA	SI	x	NO		DURACION
	MAÑANA				
	TARDE			x	
ACCIDENTES	SI		NO	X	

PERSONAL	CANT
Residente de obra	1
Inspector de obra	1
Obreros	2
Operarios	-
Topografía	-
Brigadistas	-
Transito	-
Vigilantes	1

EQUIPO	CANT
Volquetas sencillas	
Volquetas dobletroques	x
Retroescavadoras	x
Compactadoras	x
Cargadores	x
Finisher	-
Cortadora	-
Canguro	x

BOSQUEJO DEL TRAMO

MATERIALES	UND	CANT
GRAVILLA 3/4"	M3	-
RELLENO B-200	M3	-
RAJON	M3	-
B-400	M3	-
TRITURADO 1/2	M3	-
MBR	LT	-
EMULSION	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
--	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

TEMPERATURA ASFALTO	TIPO:	
PLACA VOLQUETA	LLEGADA	COMPACTACIÓN
-	-	-
-	-	-
-	-	-

PRUEBAS DE LABORATORIO	CANT	UBICACIÓN
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

INVENTARIO			
SUMIDEROS	10	CÁRCAMOS	-
POZOS	4	DOMICILIARIAS	

ESTUVO PARADO EL FRENTE	SI		NO	X
RAZONES				

B. CONTROL DE VOLQUETAS


CARGUE DE ESCOMBROS	PLACA	M3	ESCOMBRERA
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-

TRANS MATERIAL	PLACA	M3	ORIGEN
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-

C. ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DÍA

EL DÍA 09 SE CONTINÚAN APIQUES, LLEGA RETRO AL FRENTE DE OBRA.
PERSONAL EN OBRA: 1 INSPECTOR OBRA, 1 INSPECTOR SISO, 1 COMISIÓN TOPOGRAFÍA, 1 BOAL, 1 AYUDANTE.

INSPECTOR DE INTERVENTORÍA



ALEJANDRA HERRAN AVILA

FORMATO DIARIO			FONDO DE DESARROLLO ALCALDIA LOCAL DE BARRIOS UNIDOS
FECHA			INTERVENTORÍA Y CONTRUCIVILES SAS Contrato de Interventoría No. 242 de 2019
10	2	2021	CONSORCIO BARRIOS UNIDOS Contrato de Obra Pública No. 241 de 2019
DD	MM	AA	TIPO DE INTERVENCIÓN: REHABILITACIÓN VIAL

INFORME DIARIO DE INTERVENTORÍA

LOCALIZACION	BARRIO	SAN FERNANDO	CIV		
NOMENCLATURA		DESDE		HASTA	

NOMBRE DEL RESIDENTE INTERVENTOR	Ing. JUAN PABLO LEMUS
NOMBRE DEL RESIDENTE DE OBRA	Ing. MANUEL RUIZ

A. OBJETO DE MANTENIMIENTO

	BIEN	MAL
SEÑALIZACIÓN	X	
MANEJO DE ESCOMBROS	X	
MANEJO DE MATERIALES	X	
DOTACION	X	

	SI		NO		DURACION
LLUVIA	MAÑANA				
	TARDE			x	
ACCIDENTES	SI		NO	X	

PERSONAL	CANT
Residente de obra	1
Inspector de obra	1
Obreros	2
Operarios	-
Topografía	-
Brigadistas	-
Transito	-
Vigilantes	1

EQUIPO	CANT
Volquetas sencillas	
Volquetas dobletroques	x
Retroescavadoras	x
Compactadoras	x
Cargadores	x
Finisher	-
Cortadora	-
Canguro	x

BOSQUEJO DEL TRAMO

MATERIALES	UND	CANT
GRAVILLA 3/4"	M3	-
RELLENO B-200	M3	-
RAJON	M3	-
B-400	M3	-
TRITURADO 1/2	M3	-
MBR	LT	-
EMULSION	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
--	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

TEMPERATURA ASFALTO	TIPO:	
PLACA VOLQUETA	LLEGADA	COMPACTACIÓN
-	-	-
-	-	-
-	-	-

PRUEBAS DE LABORATORIO	CANT	UBICACIÓN
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

INVENTARIO			
SUMIDEROS	10	CÁRCAMOS	-
POZOS	4	DOMICILIARIAS	

ESTUVO PARADO EL FRENTE	SI		NO	X
RAZONES				

B. CONTROL DE VOLQUETAS

CARGUE DE ESCOMBROS	PLACA	M3	ESCOMBRERA
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-

TRANS MATERIAL	PLACA	M3	ORIGEN
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-

C. ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DÍA

SE INICIA EXCAVACIÓN MECÁNICA CAJA VÍA Y DEMOLICIÓN DE SARDINEL.
PERSONAL EN OBRA: 1 INSPECTOR OBRA, 1 INSPECTOR SISO, 1 COMISIÓN TOPOGRAFÍA, 1 BOAL, 1 AYUDANTE.
MAQUINARIA EN OBRA: 1 RETRO DE ORUGA, 4 VOLQUETAS.
CLIMA: DÍA NUBLADO, LLUVIAS FUERTES EN HORAS DE LA TARDE.

INSPECTOR DE INTERVENTORÍA

ALEJANDRA HERRAN AVILA

FORMATO DIARIO			FONDO DE DESARROLLO ALCALDIA LOCAL DE BARRIOS UNIDOS	
FECHA			INTERVENTORÍA Y CONTRUCIVILES SAS Contrato de Interventoría No. 242 de 2019	
11	2	2021	CONSORCIO BARRIOS UNIDOS Contrato de Obra Pública No. 241 de 2019	
DD	MM	AA	TIPO DE INTERVENCIÓN	REHABILITACIÓN VIAL

INFORME DIARIO DE INTERVENTORÍA

LOCALIZACION	BARRIO	SAN FERNANDO	CIV		
NOMENCLATURA		DESDE		HASTA	

NOMBRE DEL RESIDENTE INTERVENTOR	Ing. JUAN PABLO LEMUS
NOMBRE DEL RESIDENTE DE OBRA	Ing. MANUEL RUIZ

A. OBJETO DE MANTENIMIENTO

	BIEN	MAL
SEÑALIZACIÓN	X	
MANEJO DE ESCOMBROS	X	
MANEJO DE MATERIALES	X	
DOTACION	X	

LLUVIA	SI	x	NO		DURACION
	MAÑANA				
	TARDE		x		
ACCIDENTES	SI		NO	X	

BOSQUEJO DEL TRAMO

PERSONAL	CANT
Residente de obra	1
Inspector de obra	1
Obreros	2
Operarios	-
Topografía	2
Brigadistas	-
Transito	-
Vigilantes	1

EQUIPO	CANT
Volquetas sencillas	
Volquetas dobletroques	
Retroescavadoras	x
Compactadoras	x
Cargadores	x
Finisher	-
Cortadora	-
Canguro	x

MATERIALES	UND	CANT
GRAVILLA 3/4"	M3	-
RELLENO B-200	M3	-
RAJON	M3	-
B-400	M3	-
TRITURADO 1/2	M3	-
MBR	LT	-
EMULSION	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
--	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

TEMPERATURA ASFALTO	TIPO:	
PLACA VOLQUETA	LLEGADA	COMPACTACIÓN
-	-	-
-	-	-
-	-	-

PRUEBAS DE LABORATORIO	CANT	UBICACIÓN
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

INVENTARIO

SUMIDEROS	10	CÁRCAMOS	-
POZOS	4	DOMICILIARIAS	

ESTUVO PARADO EL FRENTE	SI		NO	X
RAZONES				

B. CONTROL DE VOLQUETAS


	PLACA	M3	ESCOMBRERA
CARGUE DE ESCOMBROS	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-

TRANS MATERIAL	PLACA	M3	ORIGEN
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-

C. ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DÍA

SE CONTINÚA EXCAVACIÓN MECÁNICA CAJA VÍA, SE INICIA INSTALACIÓN Y SEREO DE RAJÓN
PERSONAL EN OBRA: 1 INSPECTOR OBRA, 1 INSPECTOR SISO, 1 COMISIÓN TOPOGRAFÍA, 1 BOAL, 1 OFICIAL, 2 AYUDANTES.
MAQUINARIA EN OBRA: 1 RETRO DE ORUGA, 4 VOLQUETAS.
CLIMA: DÍA NUBLADO, LLUVIAS FUERTES EN HORAS DE LA TARDE.

INSPECTOR DE INTERVENTORÍA



ALEJANDRA HERRAN AVILA

FORMATO DIARIO			FONDO DE DESARROLLO ALCALDIA LOCAL DE BARRIOS UNIDOS
FECHA			INTERVENTORÍA Y CONTRUCIVILES SAS Contrato de Interventoría No. 242 de 2019
			CONSORCIO BARRIOS UNIDOS Contrato de Obra Pública No. 241 de 2019
12	2	2021	
DD	MM	AA	TIPO DE INTERVENCIÓN: REHABILITACIÓN VIAL

INFORME DIARIO DE INTERVENTORÍA

LOCALIZACION	BARRIO	SAN FERNANDO	CIV		
NOMENCLATURA		DESDE		HASTA	

NOMBRE DEL RESIDENTE INTERVENTOR	Ing. JUAN PABLO LEMUS
NOMBRE DEL RESIDENTE DE OBRA	Ing. MANUEL RUIZ

A. OBJETO DE MANTENIMIENTO

	BIEN	MAL
SEÑALIZACIÓN	X	
MANEJO DE ESCOMBROS	X	
MANEJO DE MATERIALES	X	
DOTACION	X	

	SI		NO	X	DURACION
LLUVIA	MAÑANA				
	TARDE				
ACCIDENTES	SI		NO	X	

PERSONAL	CANT
Residente de obra	1
Inspector de obra	1
Obreros	2
Operarios	-
Topografía	-
Brigadistas	-
Transito	-
Vigilantes	1

EQUIPO	CANT
Volquetas sencillas	
Volquetas dobletroques	x
Retroescavadoras	x
Compactadoras	x
Cargadores	x
Finisher	-
Cortadora	-
Canguro	x

BOSQUEJO DEL TRAMO

MATERIALES	UND	CANT
GRAVILLA 3/4"	M3	-
RELLENO B-200	M3	-
RAJON	M3	-
B-400	M3	-
TRITURADO 1/2	M3	-
MBR	LT	-
EMULSION	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
--	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

TEMPERATURA ASFALTO	TIPO:	
PLACA VOLQUETA	LLEGADA	COMPACTACIÓN
-	-	-
-	-	-
-	-	-

PRUEBAS DE LABORATORIO	CANT	UBICACIÓN
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

INVENTARIO

SUMIDEROS	10	CÁRCAMOS	-
POZOS	4	DOMICILIARIAS	

ESTUVO PARADO EL FRENTE	SI		NO	X
RAZONES				

B. CONTROL DE VOLQUETAS

CARGUE DE ESCOMBROS	PLACA	M3	ESCOMBRERA
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-

TRANS MATERIAL	PLACA	M3	ORIGEN
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-

C. ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DÍA

SE CONTINÚA EXCAVACIÓN MECÁNICA CAJA VÍA, SE CONTINÚA INSTALACIÓN Y SEREO DE RAJÓN B-400.
PERSONAL EN OBRA: 1 INSPECTOR OBRA, 1 INSPECTOR SISO, 1 COMISIÓN TOPOGRAFÍA, 2 BOAL.
MAQUINARIA EN OBRA: 1 RETRO DE ORUGA, 1 VIBRO COMPACTADOR, 4 VOLQUETAS
CLIMA: DÍA SOLEADO.

INSPECTOR DE INTERVENTORÍA

ALEJANDRA HERRAN AVILA

FORMATO DIARIO			FONDO DE DESARROLLO ALCALDIA LOCAL DE BARRIOS UNIDOS	
FECHA			INTERVENTORÍA Y CONTRUCIVILES SAS Contrato de Interventoría No. 242 de 2019	
13	2	2021	CONSORCIO BARRIOS UNIDOS Contrato de Obra Pública No. 241 de 2019	
DD	MM	AA	TIPO DE INTERVENCIÓN	REHABILITACIÓN VIAL

INFORME DIARIO DE INTERVENTORÍA

LOCALIZACION	BARRIO	SAN FERNANDO	CIV		
NOMENCLATURA		DESDE		HASTA	

NOMBRE DEL RESIDENTE INTERVENTOR	Ing. JUAN PABLO LEMUS
NOMBRE DEL RESIDENTE DE OBRA	Ing. MANUEL RUIZ

A. OBJETO DE MANTENIMIENTO

	BIEN	MAL
SEÑALIZACIÓN	X	
MANEJO DE ESCOMBROS	X	
MANEJO DE MATERIALES	X	
DOTACION	X	

LLUVIA	SI	x	NO		DURACION
	MAÑANA				
	TARDE		x		
ACCIDENTES	SI		NO	X	

PERSONAL	CANT
Residente de obra	1
Inspector de obra	1
Obreros	2
Operarios	-
Topografía	-
Brigadistas	-
Transito	-
Vigilantes	1

EQUIPO	CANT
Volquetas sencillas	
Volquetas dobletroques	x
Retroescavadoras	x
Compactadoras	x
Cargadores	x
Finisher	-
Cortadora	-
Canguro	x

BOSQUEJO DEL TRAMO

MATERIALES	UND	CANT
GRAVILLA 3/4"	M3	-
RELLENO B-200	M3	-
RAJON	M3	-
B-400	M3	-
TRITURADO 1/2	M3	-
MBR	LT	-
EMULSION	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
--	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

TEMPERATURA ASFALTO	TIPO:	
PLACA VOLQUETA	LLEGADA	COMPACTACIÓN
-	-	-
-	-	-
-	-	-

PRUEBAS DE LABORATORIO	CANT	UBICACIÓN
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

INVENTARIO

SUMIDEROS	10	CÁRCAMOS	-
POZOS	4	DOMICILIARIAS	

ESTUVO PARADO EL FRENTE	SI		NO	X
RAZONES				

B. CONTROL DE VOLQUETAS


	PLACA	M3	ESCOMBRERA
CARGUE DE ESCOMBROS	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-

TRANS MATERIAL	PLACA	M3	ORIGEN
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-

C. ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DÍA

SE CONTINÚA EXCAVACIÓN MECÁNICA CAJA VÍA, SE CONTINÚA INSTALACIÓN Y SEREO DE RAJÓN B-400.
PERSONAL EN OBRA: 1 INSPECTOR OBRA, 1 INSPECTOR SISO, 1 COMISIÓN TOPOGRAFÍA, 1 BOAL, 1 OFICIAL, 3 AYUDANTES.
MAQUINARIA EN OBRA: 1 RETRO DE ORUGA, 1 VIBRO COMPACTADOR, 4 VOLQUETAS
CLIMA: DÍA SOLEADO.

INSPECTOR DE INTERVENTORÍA



ALEJANDRA HERRAN AVILA

FORMATO DIARIO			FONDO DE DESARROLLO ALCALDIA LOCAL DE BARRIOS UNIDOS
FECHA			INTERVENTORÍA Y CONTRUCIVILES SAS Contrato de Interventoría No. 242 de 2019
15	2	2021	CONSORCIO BARRIOS UNIDOS Contrato de Obra Pública No. 241 de 2019
DD	MM	AA	TIPO DE INTERVENCIÓN: REHABILITACIÓN VIAL

INFORME DIARIO DE INTERVENTORÍA

LOCALIZACION	BARRIO	SAN FERNANDO	CIV		
NOMENCLATURA		DESDE		HASTA	

NOMBRE DEL RESIDENTE INTERVENTOR	Ing. JUAN PABLO LEMUS
NOMBRE DEL RESIDENTE DE OBRA	Ing. MANUEL RUIZ

A. OBJETO DE MANTENIMIENTO

	BIEN	MAL
SEÑALIZACIÓN	X	
MANEJO DE ESCOMBROS	X	
MANEJO DE MATERIALES	X	
DOTACION	X	

	SI		NO		DURACION
LLUVIA	MAÑANA				
	TARDE			x	
ACCIDENTES	SI		NO	X	

PERSONAL	CANT
Residente de obra	1
Inspector de obra	1
Obreros	2
Operarios	-
Topografía	-
Brigadistas	-
Transito	-
Vigilantes	1

EQUIPO	CANT
Volquetas sencillas	
Volquetas dobletroques	x
Retroescavadoras	x
Compactadoras	x
Cargadores	x
Finisher	-
Cortadora	-
Canguro	x

BOSQUEJO DEL TRAMO

MATERIALES	UND	CANT
GRAVILLA 3/4"	M3	-
RELLENO B-200	M3	-
RAJON	M3	-
B-400	M3	-
TRITURADO 1/2	M3	-
MBR	LT	-
EMULSION	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
--	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

TEMPERATURA ASFALTO	TIPO:	
PLACA VOLQUETA	LLEGADA	COMPACTACIÓN
-	-	-
-	-	-
-	-	-

PRUEBAS DE LABORATORIO	CANT	UBICACIÓN
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

INVENTARIO

SUMIDEROS	1	CÁRCAMOS	-
POZOS	4	DOMICILIARIAS	

ESTUVO PARADO EL FRENTE	SI		NO	X
RAZONES				

B. CONTROL DE VOLQUETAS


	PLACA	M3	ESCOMBRERA
CARGUE DE ESCOMBROS	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-

TRANS MATERIAL	PLACA	M3	ORIGEN
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-

C. ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DÍA

SE CONTINÚA EXCAVACIÓN MECÁNICA CAJA VÍA Y DEMOLICIÓN SARDINEL, SE CONTINÚA INSTALACIÓN Y SEREO DE RAJÓN Y B-400.
PERSONAL EN OBRA: 1 INSPECTOR OBRA, 1 INSPECTOR SISO, 1 COMISIÓN TOPOGRAFÍA, 1 BOAL, 1 OFICIAL, 3 AYUDANTES.
MAQUINARIA EN OBRA: 1 RETRO DE ORUGA, 1 VIBRO COMPACTADOR.
NOTA: POR MOTIVO DEL PARO NO HAY VOLQUETAS DISPONIBLES PARA EL RETIRO DE EXCAVACIÓN
CLIMA: DÍA NUBLADO, LLUVIAS FUERTES EN HORAS DE LA TARDE.

INSPECTOR DE INTERVENTORÍA



ALEJANDRA HERRAN AVILA

FORMATO DIARIO			FONDO DE DESARROLLO ALCALDIA LOCAL DE BARRIOS UNIDOS
FECHA			INTERVENTORÍA Y CONTRUCIVILES SAS Contrato de Interventoría No. 242 de 2019
16	2	2021	CONSORCIO BARRIOS UNIDOS Contrato de Obra Pública No. 241 de 2019
DD	MM	AA	TIPO DE INTERVENCIÓN: REHABILITACIÓN VIAL

INFORME DIARIO DE INTERVENTORÍA

LOCALIZACION	BARRIO	SAN FERNANDO	CIV		
NOMENCLATURA		DESDE		HASTA	

NOMBRE DEL RESIDENTE INTERVENTOR	Ing. JUAN PABLO LEMUS
NOMBRE DEL RESIDENTE DE OBRA	Ing. MANUEL RUIZ

A. OBJETO DE MANTENIMIENTO

	BIEN	MAL
SEÑALIZACIÓN	X	
MANEJO DE ESCOMBROS	X	
MANEJO DE MATERIALES	X	
DOTACION	X	

	SI		NO	X	DURACION
LLUVIA	MAÑANA				
	TARDE				
ACCIDENTES	SI		NO	X	

PERSONAL	CANT
Residente de obra	1
Inspector de obra	1
Obreros	2
Operarios	-
Topografía	-
Brigadistas	-
Transito	-
Vigilantes	1

EQUIPO	CANT
Volquetas sencillas	
Volquetas dobletroques	x
Retroescavadoras	x
Compactadoras	x
Cargadores	x
Finisher	-
Cortadora	-
Canguro	x

BOSQUEJO DEL TRAMO

MATERIALES	UND	CANT
GRAVILLA 3/4"	M3	-
RELLENO B-200	M3	-
RAJON	M3	-
B-400	M3	-
TRITURADO 1/2	M3	-
MBR	LT	-
EMULSION	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
--	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

TEMPERATURA ASFALTO	TIPO:	
PLACA VOLQUETA	LLEGADA	COMPACTACIÓN
-	-	-
-	-	-
-	-	-

PRUEBAS DE LABORATORIO	CANT	UBICACIÓN
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

INVENTARIO

SUMIDEROS	10	CÁRCAMOS	-
POZOS	4	DOMICILIARIAS	

ESTUVO PARADO EL FRENTE	SI		NO	X
RAZONES				

B. CONTROL DE VOLQUETAS

CARGUE DE ESCOMBROS	PLACA	M3	ESCOMBRERA
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-

TRANS MATERIAL	PLACA	M3	ORIGEN
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-

C. ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DÍA

SE CONTINÚA EXCAVACIÓN MECÁNICA CAJA VÍA Y DEMOLICIÓN SARDINEL, SE INICIA EXCAVACIÓN MANUAL PARA POZO, SE CONTINÚA INSTALACIÓN Y SEREO DE RAJÓN.
PERSONAL EN OBRA: 1 INSPECTOR OBRA, 1 INSPECTOR SISO, 1 COMISIÓN TOPOGRAFÍA, 1 BOAL, 1 OFICIAL, 3 AYUDANTES.
MAQUINARIA EN OBRA: 1 RETRO DE ORUGA, 1 VIBRO COMPACTADOR, 4 VOLQUETAS.
CLIMA: DÍA SOLEADO.

INSPECTOR DE INTERVENTORÍA

ALEJANDRA HERRAN AVILA

FORMATO DIARIO			FONDO DE DESARROLLO ALCALDIA LOCAL DE BARRIOS UNIDOS
FECHA			INTERVENTORÍA Y CONTRUCIVILES SAS Contrato de Interventoría No. 242 de 2019
17	2	2021	CONSORCIO BARRIOS UNIDOS Contrato de Obra Pública No. 241 de 2019
DD	MM	AA	TIPO DE INTERVENCIÓN: REHABILITACIÓN VIAL

INFORME DIARIO DE INTERVENTORÍA

LOCALIZACION	BARRIO	SAN FERNANDO	CIV		
NOMENCLATURA		DESDE		HASTA	

NOMBRE DEL RESIDENTE INTERVENTOR	Ing. JUAN PABLO LEMUS
NOMBRE DEL RESIDENTE DE OBRA	Ing. MANUEL RUIZ

A. OBJETO DE MANTENIMIENTO

	BIEN	MAL
SEÑALIZACIÓN	X	
MANEJO DE ESCOMBROS	X	
MANEJO DE MATERIALES	X	
DOTACION	X	

	SI		NO	X	DURACION
LLUVIA	MAÑANA				
	TARDE				
ACCIDENTES	SI		NO	X	

PERSONAL	CANT
Residente de obra	1
Inspector de obra	1
Obreros	2
Operarios	-
Topografía	-
Brigadistas	-
Transito	-
Vigilantes	1

EQUIPO	CANT
Volquetas sencillas	
Volquetas dobletroques	x
Retroescavadoras	x
Compactadoras	x
Cargadores	x
Finisher	-
Cortadora	-
Canguro	x

BOSQUEJO DEL TRAMO

MATERIALES	UND	CANT
GRAVILLA 3/4"	M3	-
RELLENO B-200	M3	-
RAJON	M3	-
B-400	M3	-
TRITURADO 1/2	M3	-
MBR	LT	-
EMULSION	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
--	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

TEMPERATURA ASFALTO	TIPO:	
PLACA VOLQUETA	LLEGADA	COMPACTACIÓN
-	-	-
-	-	-
-	-	-

PRUEBAS DE LABORATORIO	CANT	UBICACIÓN
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

INVENTARIO

SUMIDEROS	10	CÁRCAMOS	-
POZOS	4	DOMICILIARIAS	

ESTUVO PARADO EL FRENTE	SI		NO	X
RAZONES				

B. CONTROL DE VOLQUETAS

CARGUE DE ESCOMBROS	PLACA	M3	ESCOMBRERA
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-

TRANS MATERIAL	PLACA	M3	ORIGEN
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-

C. ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DÍA

SE CONTINÚA INSTALACIÓN Y SEREO DE RAJÓN Y B-400, SE INSTALA HIERRO DE 42 Y SE FUNDE PLACA FONDO POZO CONCRETO 3000 PSI IMPERMEHABILIZADO.
PERSONAL EN OBRA: 1 INSPECTOR OBRA, 1 INSPECTOR SISO, 1 BOAL, 2 OFICIALES, 1 AYUDANTE.
MAQUINARIA EN OBRA: 1 RETRO DE ORUGA, 1 VIBRO COMPACTADOR, 1 MINI CARGADOR, 2 VOLQUETAS.
CLIMA: DÍA SOLEADO.

INSPECTOR DE INTERVENTORÍA

ALEJANDRA HERRAN AVILA

FORMATO DIARIO			FONDO DE DESARROLLO ALCALDIA LOCAL DE BARRIOS UNIDOS
FECHA			INTERVENTORÍA Y CONTRUCIVILES SAS Contrato de Interventoría No. 242 de 2019
			CONSORCIO BARRIOS UNIDOS Contrato de Obra Pública No. 241 de 2019
17	2	2021	
DD	MM	AA	TIPO DE INTERVENCIÓN: REHABILITACIÓN VIAL

INFORME DIARIO DE INTERVENTORÍA

LOCALIZACION	BARRIO	SAN FERNANDO	CIV		
NOMENCLATURA		DESDE		HASTA	

NOMBRE DEL RESIDENTE INTERVENTOR	Ing. JUAN PABLO LEMUS
NOMBRE DEL RESIDENTE DE OBRA	Ing. MANUEL RUIZ

A. OBJETO DE MANTENIMIENTO

	BIEN	MAL
SEÑALIZACIÓN	X	
MANEJO DE ESCOMBROS	X	
MANEJO DE MATERIALES	X	
DOTACION	X	

	SI		NO	X	DURACION
LLUVIA	MAÑANA				
	TARDE				
ACCIDENTES	SI		NO	X	

PERSONAL	CANT
Residente de obra	1
Inspector de obra	1
Obreros	2
Operarios	-
Topografía	-
Brigadistas	-
Transito	-
Vigilantes	1

EQUIPO	CANT
Volquetas sencillas	
Volquetas dobletroques	x
Retroescavadoras	x
Compactadoras	x
Cargadores	x
Finisher	-
Cortadora	-
Canguro	x

BOSQUEJO DEL TRAMO

MATERIALES	UND	CANT
GRAVILLA 3/4"	M3	-
RELLENO B-200	M3	-
RAJON	M3	-
B-400	M3	-
TRITURADO 1/2	M3	-
MBR	LT	-
EMULSION	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
--	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

TEMPERATURA ASFALTO	TIPO:	
PLACA VOLQUETA	LLEGADA	COMPACTACIÓN
-	-	-
-	-	-
-	-	-

PRUEBAS DE LABORATORIO	CANT	UBICACIÓN
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

INVENTARIO

SUMIDEROS	10	CÁRCAMOS	-
POZOS	4	DOMICILIARIAS	

ESTUVO PARADO EL FRENTE	SI		NO	X

RAZONES	

B. CONTROL DE VOLQUETAS

CARGUE DE ESCOMBROS	PLACA	M3	ESCOMBRERA
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-

TRANS MATERIAL	PLACA	M3	ORIGEN
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-

C. ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DÍA

SE CONTINÚA INSTALACIÓN Y SEREO DE RAJÓN Y B-400, SE CONSTRUYE POZO.
PERSONAL EN OBRA: 1 INSPECTOR OBRA, 1 INSPECTOR SISO, 1 BOAL, 2 OFICIALES, 1 AYUDANTE.
MAQUINARIA EN OBRA: 1 RETRO DE ORUGA, 1 VIBRO COMPACTADOR, 1 MINI CARGADOR, 2 VOLQUETAS.
CLIMA: DÍA SOLEADO.

INSPECTOR DE INTERVENTORÍA

ALEJANDRA HERRAN AVILA

FORMATO DIARIO			FONDO DE DESARROLLO ALCALDIA LOCAL DE BARRIOS UNIDOS
FECHA			INTERVENTORÍA Y CONTRUCIVILES SAS Contrato de Interventoría No. 242 de 2019
19	2	2021	CONSORCIO BARRIOS UNIDOS Contrato de Obra Pública No. 241 de 2019
DD	MM	AA	TIPO DE INTERVENCIÓN: REHABILITACIÓN VIAL

INFORME DIARIO DE INTERVENTORÍA

LOCALIZACION	BARRIO	SAN FERNANDO	CIV		
NOMENCLATURA		DESDE		HASTA	

NOMBRE DEL RESIDENTE INTERVENTOR	Ing. JUAN PABLO LEMUS
NOMBRE DEL RESIDENTE DE OBRA	Ing. MANUEL RUIZ

A. OBJETO DE MANTENIMIENTO

	BIEN	MAL
SEÑALIZACIÓN	X	
MANEJO DE ESCOMBROS	X	
MANEJO DE MATERIALES	X	
DOTACION	X	

	SI		NO	X	DURACION
LLUVIA	MAÑANA				
	TARDE				
ACCIDENTES	SI		NO	X	

PERSONAL	CANT
Residente de obra	1
Inspector de obra	1
Obreros	2
Operarios	-
Topografía	-
Brigadistas	-
Transito	-
Vigilantes	1

EQUIPO	CANT
Volquetas sencillas	
Volquetas dobletroques	x
Retroescavadoras	x
Compactadoras	x
Cargadores	x
Finisher	-
Cortadora	-
Canguro	x

BOSQUEJO DEL TRAMO

MATERIALES	UND	CANT
GRAVILLA 3/4"	M3	-
RELLENO B-200	M3	-
RAJON	M3	-
B-400	M3	-
TRITURADO 1/2	M3	-
MBR	LT	-
EMULSION	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
--	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

TEMPERATURA ASFALTO	TIPO:	
PLACA VOLQUETA	LLEGADA	COMPACTACIÓN
-	-	-
-	-	-
-	-	-

PRUEBAS DE LABORATORIO	CANT	UBICACIÓN
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

INVENTARIO

SUMIDEROS	10	CÁRCAMOS	-
POZOS	4	DOMICILIARIAS	

ESTUVO PARADO EL FRENTE	SI		NO	X

RAZONES	

B. CONTROL DE VOLQUETAS

CARGUE DE ESCOMBROS	PLACA	M3	ESCOMBRERA
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-

TRANS MATERIAL	PLACA	M3	ORIGEN
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-

C. ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DÍA

SE REALIZA EXCAVACIÓN MANUAL PARA TUBO 12" SUMIDEROS.
PERSONAL EN OBRA: 1 INSPECTOR OBRA, 1 INSPECTOR SISO, 1 COMISIÓN TOPOGRAFÍA, 1 BOAL, 1 OFICIAL, 1 AYUDANTE.
MAQUINARIA EN OBRA: 1 RETRO DE ORUGA.
CLIMA: DÍA NUBLADO.

INSPECTOR DE INTERVENTORÍA

ALEJANDRA HERRAN AVILA

FORMATO DIARIO			FONDO DE DESARROLLO ALCALDIA LOCAL DE BARRIOS UNIDOS
FECHA			INTERVENTORÍA Y CONTRUCIVILES SAS Contrato de Interventoría No. 242 de 2019
20	2	2021	CONSORCIO BARRIOS UNIDOS Contrato de Obra Pública No. 241 de 2019
DD	MM	AA	TIPO DE INTERVENCIÓN: REHABILITACIÓN VIAL

INFORME DIARIO DE INTERVENTORÍA

LOCALIZACION	BARRIO	SAN FERNANDO	CIV		
NOMENCLATURA		DESDE		HASTA	

NOMBRE DEL RESIDENTE INTERVENTOR	Ing. JUAN PABLO LEMUS
NOMBRE DEL RESIDENTE DE OBRA	Ing. MANUEL RUIZ

A. OBJETO DE MANTENIMIENTO

	BIEN	MAL
SEÑALIZACIÓN	X	
MANEJO DE ESCOMBROS	X	
MANEJO DE MATERIALES	X	
DOTACION	X	

	SI		NO	X	DURACION
LLUVIA	MAÑANA				
	TARDE				
ACCIDENTES	SI		NO	X	

PERSONAL	CANT
Residente de obra	1
Inspector de obra	1
Obreros	2
Operarios	-
Topografía	-
Brigadistas	-
Transito	-
Vigilantes	1

EQUIPO	CANT
Volquetas sencillas	
Volquetas dobletroques	x
Retroescavadoras	x
Compactadoras	x
Cargadores	x
Finisher	-
Cortadora	-
Canguro	x

BOSQUEJO DEL TRAMO

MATERIALES	UND	CANT
GRAVILLA 3/4"	M3	-
RELLENO B-200	M3	-
RAJON	M3	-
B-400	M3	-
TRITURADO 1/2	M3	-
MBR	LT	-
EMULSION	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
--	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

TEMPERATURA ASFALTO	TIPO:	
PLACA VOLQUETA	LLEGADA	COMPACTACIÓN
-	-	-
-	-	-
-	-	-

PRUEBAS DE LABORATORIO	CANT	UBICACIÓN
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

INVENTARIO

SUMIDEROS	10	CÁRCAMOS	-
POZOS	4	DOMICILIARIAS	

ESTUVO PARADO EL FRENTE	SI		NO	X

RAZONES	

B. CONTROL DE VOLQUETAS

CARGUE DE ESCOMBROS	PLACA	M3	ESCOMBRERA
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-

TRANS MATERIAL	PLACA	M3	ORIGEN
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-

C. ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DÍA

SE CONTINÚA EXCAVACIÓN MANUAL PARA TUBO 12", SE INICIA EXCAVACIÓN MANUAL SUMIDEROS.
PERSONAL EN OBRA: 1 INSPECTOR OBRA, 1 INSPECTOR SISO, 1 COMISIÓN TOPOGRAFÍA, 1 BOAL, 1 OFICIAL, 1 AYUDANTE.
CLIMA: DÍA NUBLADO.

INSPECTOR DE INTERVENTORÍA



ALEJANDRA HERRAN AVILA

FORMATO DIARIO			FONDO DE DESARROLLO ALCALDIA LOCAL DE BARRIOS UNIDOS
FECHA			INTERVENTORÍA Y CONTRUCIVILES SAS Contrato de Interventoría No. 242 de 2019
22	2	2021	CONSORCIO BARRIOS UNIDOS Contrato de Obra Pública No. 241 de 2019
DD	MM	AA	TIPO DE INTERVENCIÓN: REHABILITACIÓN VIAL

INFORME DIARIO DE INTERVENTORÍA

LOCALIZACION	BARRIO	SAN FERNANDO	CIV		
NOMENCLATURA		DESDE		HASTA	

NOMBRE DEL RESIDENTE INTERVENTOR	Ing. JUAN PABLO LEMUS
NOMBRE DEL RESIDENTE DE OBRA	Ing. MANUEL RUIZ

A. OBJETO DE MANTENIMIENTO

	BIEN	MAL
SEÑALIZACIÓN	X	
MANEJO DE ESCOMBROS	X	
MANEJO DE MATERIALES	X	
DOTACION	X	

	SI		NO	X	DURACION
LLUVIA	MAÑANA				
	TARDE				
ACCIDENTES	SI		NO	X	

PERSONAL	CANT
Residente de obra	1
Inspector de obra	1
Obreros	2
Operarios	-
Topografía	-
Brigadistas	-
Transito	-
Vigilantes	1

EQUIPO	CANT
Volquetas sencillas	
Volquetas dobletroques	x
Retroescavadoras	x
Compactadoras	x
Cargadores	x
Finisher	-
Cortadora	-
Canguro	x

BOSQUEJO DEL TRAMO

MATERIALES	UND	CANT
GRAVILLA 3/4"	M3	-
RELLENO B-200	M3	-
RAJON	M3	-
B-400	M3	-
TRITURADO 1/2	M3	-
MBR	LT	-
EMULSION	m3	-
ARENA DE PEÑA	m3	-
ARENA DE RIO	-	-
-	-	-
--	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

TEMPERATURA ASFALTO	TIPO:	
PLACA VOLQUETA	LLEGADA	COMPACTACIÓN
-	-	-
-	-	-
-	-	-

PRUEBAS DE LABORATORIO	CANT	UBICACIÓN
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

INVENTARIO

SUMIDEROS	10	CÁRCAMOS	-
POZOS	4	DOMICILIARIAS	

ESTUVO PARADO EL FRENTE	SI		NO	X
RAZONES				

B. CONTROL DE VOLQUETAS

CARGUE DE ESCOMBROS	PLACA	M3	ESCOMBRERA
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-

TRANS MATERIAL	PLACA	M3	ORIGEN
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-

C. ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DÍA

SE INSTALA TUBO 12", SE CONTINÚA EXCAVACIÓN MANUAL SUMIDEROS, SE FIGURA HIERRO SUMIDEROS.
PERSONAL EN OBRA: 1 INSPECTOR OBRA, 1 INSPECTOR SISO, 1 COMISIÓN TOPOGRAFÍA, 1 BOAL, 1 OFICIAL, 1 AYUDANTE.
MAQUINARIA EN OBRA: 1 MINICARGADOR.
CLIMA: DÍA NUBLADO.

INSPECTOR DE INTERVENTORÍA

ALEJANDRA HERRAN AVILA

FORMATO DIARIO			FONDO DE DESARROLLO ALCALDIA LOCAL DE BARRIOS UNIDOS
FECHA			INTERVENTORÍA Y CONTRUCIVILES SAS Contrato de Interventoría No. 242 de 2019
23	2	2021	CONSORCIO BARRIOS UNIDOS Contrato de Obra Pública No. 241 de 2019
DD	MM	AA	TIPO DE INTERVENCIÓN: REHABILITACIÓN VIAL

INFORME DIARIO DE INTERVENTORÍA

LOCALIZACION	BARRIO	SAN FERNANDO	CIV		
NOMENCLATURA		DESDE		HASTA	

NOMBRE DEL RESIDENTE INTERVENTOR	Ing. JUAN PABLO LEMUS
NOMBRE DEL RESIDENTE DE OBRA	Ing. MANUEL RUIZ

A. OBJETO DE MANTENIMIENTO

	BIEN	MAL
SEÑALIZACIÓN	X	
MANEJO DE ESCOMBROS	X	
MANEJO DE MATERIALES	X	
DOTACION	X	

	SI		NO	X	DURACION
LLUVIA	MAÑANA				
	TARDE				
ACCIDENTES	SI		NO	X	

PERSONAL	CANT
Residente de obra	1
Inspector de obra	1
Obreros	2
Operarios	-
Topografía	-
Brigadistas	-
Transito	-
Vigilantes	1

EQUIPO	CANT
Volquetas sencillas	
Volquetas dobletroques	x
Retroescavadoras	x
Compactadoras	x
Cargadores	x
Finisher	-
Cortadora	-
Canguro	x

BOSQUEJO DEL TRAMO

MATERIALES	UND	CANT
GRAVILLA 3/4"	M3	-
RELLENO B-200	M3	-
RAJON	M3	-
B-400	M3	-
TRITURADO 1/2	M3	-
MBR	LT	-
EMULSION	m3	-
ARENA DE PEÑA	m3	-
-	-	-
-	-	-
--	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

TEMPERATURA ASFALTO	TIPO:	
PLACA VOLQUETA	LLEGADA	COMPACTACIÓN
-	-	-
-	-	-
-	-	-

PRUEBAS DE LABORATORIO	CANT	UBICACIÓN
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

INVENTARIO

SUMIDEROS	10	CÁRCAMOS	-
POZOS	4	DOMICILIARIAS	

ESTUVO PARADO EL FRENTE	SI		NO	X
RAZONES				

B. CONTROL DE VOLQUETAS

CARGUE DE ESCOMBROS	PLACA	M3	ESCOMBRERA
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-

TRANS MATERIAL	PLACA	M3	ORIGEN
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-

C. ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DÍA

SE ARMAN CANASTILLAS Y SE FORMALETEAN SUMIDEROS.
PERSONAL EN OBRA: 1 INSPECTOR OBRA, 1 INSPECTOR SISO, 1 BOAL, 1 OFICIAL, 1 AYUDANTE.
MAQUINARIA EN OBRA: 1 MINICARGADOR.
CLIMA: DÍA NUBLADO.

INSPECTOR DE INTERVENTORÍA



ALEJANDRA HERRAN AVILA

FORMATO DIARIO			FONDO DE DESARROLLO ALCALDIA LOCAL DE BARRIOS UNIDOS
FECHA			INTERVENTORÍA Y CONTRUCIVILES SAS Contrato de Interventoría No. 242 de 2019
24	2	2021	CONSORCIO BARRIOS UNIDOS Contrato de Obra Pública No. 241 de 2019
DD	MM	AA	TIPO DE INTERVENCIÓN: REHABILITACIÓN VIAL

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS
SECRETARÍA DE CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE

INFORME DIARIO DE INTERVENTORÍA

LOCALIZACION	**BARRIO**	SAN FERNANDO	**CIV**		
NOMENCLATURA		**DESDE**		**HASTA**	

NOMBRE DEL RESIDENTE INTERVENTOR	**Ing. JUAN PABLO LEMUS**
NOMBRE DEL RESIDENTE DE OBRA	**Ing. MANUEL RUIZ**

A. OBJETO DE MANTENIMIENTO

	BIEN	MAL
SEÑALIZACIÓN	X	
MANEJO DE ESCOMBROS	X	
MANEJO DE MATERIALES	X	
DOTACION	X	

	SI		NO	X	DURACION
LLUVIA	MAÑANA				
	TARDE				
ACCIDENTES	SI		NO	X	

PERSONAL	CANT
Residente de obra	1
Inspector de obra	1
Obreros	2
Operarios	-
Topografía	-
Brigadistas	-
Transito	-
Vigilantes	1

EQUIPO	CANT
Volquetas sencillas	
Volquetas dobletroques	x
Retroescavadoras	x
Compactadoras	x
Cargadores	x
Finisher	-
Cortadora	-
Canguro	x

BOSQUEJO DEL TRAMO

MATERIALES	UND	CANT
GRAVILLA 3/4"	M3	-
RELLENO B-200	M3	-
RAJON	M3	-
B-400	M3	-
TRITURADO 1/2	M3	-
MBR	LT	-
EMULSION	m3	-
ARENA DE PEÑA	m3	-
-	-	-
-	-	-
--	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

TEMPERATURA ASFALTO	TIPO:	
PLACA VOLQUETA	**LLEGADA**	**COMPACTACIÓN**
-	-	-
-	-	-
-	-	-

PRUEBAS DE LABORATORIO	CANT	UBICACIÓN
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

INVENTARIO

SUMIDEROS	10	CÁRCAMOS	-
POZOS	4	DOMICILIARIAS	

ESTUVO PARADO EL FRENTE	SI		NO	X
RAZONES				

B. CONTROL DE VOLQUETAS

CARGUE DE ESCOMBROS	PLACA	M3	ESCOMBRERA
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-

TRANS MATERIAL	PLACA	M3	ORIGEN
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-

C. ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DÍA

SE CONTINÚA INSTALACIÓN DE HIERRO Y FORMALETEADA SUMIDEROS. SE CONSTRUYEN CÁRCAMOS TUBO 12" SUMIDEROS.
PERSONAL EN OBRA: 1 INSPECTOR OBRA, 1 INSPECTOR SISO, 1 COMISIÓN TOPOGRAFÍA, 1 BOAL, 2 OFICIALES, 2 AYUDANTES.
CLIMA: DÍA NUBLADO.

INSPECTOR DE INTERVENTORÍA



ALEJANDRA HERRAN AVILA

FORMATO DIARIO			FONDO DE DESARROLLO ALCALDIA LOCAL DE BARRIOS UNIDOS	
FECHA			INTERVENTORÍA Y CONTRUCIVILES SAS Contrato de Interventoría No. 242 de 2019	
25	2	2021	CONSORCIO BARRIOS UNIDOS Contrato de Obra Pública No. 241 de 2019	
DD	MM	AA	TIPO DE INTERVENCIÓN	REHABILITACIÓN VIAL

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS
SECRETARÍA DE CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE

INFORME DIARIO DE INTERVENTORÍA

LOCALIZACION	BARRIO	SAN FERNADO	CIV		
NOMENCLATURA		DESDE		HASTA	

NOMBRE DEL RESIDENTE INTERVENTOR	Ing. JUAN PABLO LEMUS
NOMBRE DEL RESIDENTE DE OBRA	Ing. MANUEL RUIZ

A. OBJETO DE MANTENIMIENTO

	BIEN	MAL
SEÑALIZACIÓN	X	
MANEJO DE ESCOMBROS	X	
MANEJO DE MATERIALES	X	
DOTACION	X	

	SI		NO	X	DURACION
LLUVIA	MAÑANA				
	TARDE				
ACCIDENTES	SI		NO	X	

PERSONAL	CANT
Residente de obra	1
Inspector de obra	1
Obreros	2
Operarios	-
Topografía	-
Brigadistas	-
Transito	-
Vigilantes	1

EQUIPO	CANT
Volquetas sencillas	
Volquetas dobletroques	x
Retroescavadoras	x
Compactadoras	x
Cargadores	x
Finisher	-
Cortadora	-
Canguro	x

BOSQUEJO DEL TRAMO

MATERIALES	UND	CANT
GRAVILLA 3/4"	M3	-
RELLENO B-200	M3	-
RAJON	M3	-
B-400	M3	-
TRITURADO 1/2	M3	-
MBR	LT	-
EMULSION	m3	-
ARENA DE PEÑA	m3	-
-	-	-
-	-	-
--	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

TEMPERATURA ASFALTO	TIPO:	
PLACA VOLQUETA	LLEGADA	COMPACTACIÓN
-	-	-
-	-	-
-	-	-

PRUEBAS DE LABORATORIO	CANT	UBICACIÓN
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

INVENTARIO

SUMIDEROS	10	CÁRCAMOS	-
POZOS	4	DOMICILIARIAS	

ESTUVO PARADO EL FRENTE	SI		NO	X
RAZONES				

B. CONTROL DE VOLQUETAS

CARGUE DE ESCOMBROS	PLACA	M3	ESCOMBRERA
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-

TRANS MATERIAL	PLACA	M3	ORIGEN
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-

C. ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DÍA

SE FUNDEN SUMIDEROS CONCRETO 4000 PSI IMPERMEABILIZADO. SE FUNDEN PLACAS CÁRCAMOS TUBO 12" SUMIDEROS.
PERSONAL EN OBRA: 1 INSPECTOR OBRA, 1 INSPECTOR SISO, 1 COMISIÓN TOPOGRAFÍA, 1 BOAL, 2 OFICIALES, 3 AYUDANTES.
CLIMA: DÍA NUBLADO, LLUVIAS EN HORAS DE LA TARDE.

INSPECTOR DE INTERVENTORÍA



ALEJANDRA HERRAN AVILA

FORMATO DIARIO			FONDO DE DESARROLLO ALCALDIA LOCAL DE BARRIOS UNIDOS	
FECHA			INTERVENTORÍA Y CONTRUCIVILES SAS Contrato de Interventoría No. 242 de 2019	
26	2	2021	CONSORCIO BARRIOS UNIDOS Contrato de Obra Pública No. 241 de 2019	
DD	MM	AA	TIPO DE INTERVENCIÓN	REHABILITACIÓN VIAL

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS
SECRETARÍA DE CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE

INFORME DIARIO DE INTERVENTORÍA

LOCALIZACION	BARRIO	SAN FERNANDO	CIV		
NOMENCLATURA		DESDE		HASTA	

NOMBRE DEL RESIDENTE INTERVENTOR	Ing. JUAN PABLO LEMUS
NOMBRE DEL RESIDENTE DE OBRA	Ing. MANUEL RUIZ

A. OBJETO DE MANTENIMIENTO

	BIEN	MAL
SEÑALIZACIÓN	X	
MANEJO DE ESCOMBROS	X	
MANEJO DE MATERIALES	X	
DOTACION	X	

LLUVIA	SI		NO	X	DURACION
	MAÑANA				
	TARDE				
ACCIDENTES	SI		NO	X	

PERSONAL	CANT
Residente de obra	1
Inspector de obra	1
Obreros	2
Operarios	-
Topografía	-
Brigadistas	-
Transito	-
Vigilantes	1

EQUIPO	CANT
Volquetas sencillas	
Volquetas dobletroques	x
Retroescavadoras	x
Compactadoras	x
Cargadores	x
Finisher	-
Cortadora	-
Canguro	x

BOSQUEJO DEL TRAMO

MATERIALES	UND	CANT
GRAVILLA 3/4"	M3	-
RELLENO B-200	M3	-
RAJON	M3	-
B-400	M3	-
TRITURADO 1/2	M3	-
MBR	LT	-
EMULSION	m3	-
ARENA DE PEÑA	m3	-
-	-	-
-	-	-
--	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

TEMPERATURA ASFALTO	TIPO:	
PLACA VOLQUETA	LLEGADA	COMPACTACIÓN
-	-	-
-	-	-
-	-	-

PRUEBAS DE LABORATORIO	CANT	UBICACIÓN
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

INVENTARIO

SUMIDEROS	10	CÁRCAMOS	-
POZOS	4	DOMICILIARIAS	

ESTUVO PARADO EL FRENTE	SI		NO	X
RAZONES				

B. CONTROL DE VOLQUETAS

CARGUE DE ESCOMBROS	PLACA	M3	ESCOMBRERA
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-

TRANS MATERIAL	PLACA	M3	ORIGEN
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-

C. ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DÍA

SE CONTINÚA INSTALACIÓN Y SEREO DE RAJÓN, SE HACE PERFILADA MANUAL CAJA VÍA CONTORNO POZO Y SUMIDEROS.
PERSONAL EN OBRA: 1 INSPECTOR OBRA, 1 INSPECTOR SISO, 1 COMISIÓN TOPOGRAFÍA, 2 BOAL, 2 OFICIALES, 3 AYUDANTES.
CLIMA: DÍA NUBLADO, LLUVIAS FUERTES EN HORAS DE LA TARDE.

INSPECTOR DE INTERVENTORÍA



ALEJANDRA HERRAN AVILA

FORMATO DIARIO			FONDO DE DESARROLLO ALCALDIA LOCAL DE BARRIOS UNIDOS	
FECHA			INTERVENTORÍA Y CONTRUCIVILES SAS Contrato de Interventoría No. 242 de 2019	
27	2	2021	CONSORCIO BARRIOS UNIDOS Contrato de Obra Pública No. 241 de 2019	
DD	MM	AA	TIPO DE INTERVENCIÓN	REHABILITACIÓN VIAL

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS
SECRETARÍA DE CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE

INFORME DIARIO DE INTERVENTORÍA

LOCALIZACION	BARRIO	SAN FERNANDO	CIV		
NOMENCLATURA		DESDE		HASTA	

NOMBRE DEL RESIDENTE INTERVENTOR	Ing. JUAN PABLO LEMUS
NOMBRE DEL RESIDENTE DE OBRA	Ing. MANUEL RUIZ

A. OBJETO DE MANTENIMIENTO

	BIEN	MAL
SEÑALIZACIÓN	X	
MANEJO DE ESCOMBROS	X	
MANEJO DE MATERIALES	X	
DOTACION	X	

LLUVIA	SI		NO	X	DURACION
	MAÑANA				
	TARDE				
ACCIDENTES	SI		NO	X	

PERSONAL	CANT
Residente de obra	1
Inspector de obra	1
Obreros	2
Operarios	-
Topografía	-
Brigadistas	-
Transito	-
Vigilantes	1

EQUIPO	CANT
Volquetas sencillas	
Volquetas dobletroques	x
Retroescavadoras	x
Compactadoras	x
Cargadores	x
Finisher	-
Cortadora	-
Canguro	x

BOSQUEJO DEL TRAMO

MATERIALES	UND	CANT
GRAVILLA 3/4"	M3	-
RELLENO B-200	M3	-
RAJON	M3	-
B-400	M3	-
TRITURADO 1/2	M3	-
MBR	LT	-
EMULSION	m3	-
ARENA DE PEÑA	m3	-
-	-	-
-	-	-
--	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

TEMPERATURA ASFALTO	TIPO:	
PLACA VOLQUETA	LLEGADA	COMPACTACIÓN
-	-	-
-	-	-
-	-	-

PRUEBAS DE LABORATORIO	CANT	UBICACIÓN
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

INVENTARIO

SUMIDEROS	10	CÁRCAMOS	-
POZOS	4	DOMICILIARIAS	

ESTUVO PARADO EL FRENTE	SI		NO	X
RAZONES				

B. CONTROL DE VOLQUETAS

	PLACA	M3	ESCOMBRERA
CARGUE DE ESCOMBROS	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-

TRANS MATERIAL	PLACA	M3	ORIGEN
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-

C. ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DÍA

SE CONTINÚA SEREO DE RAJÓN.
PERSONAL EN OBRA: 1 INSPECTOR OBRA, 1 INSPECTOR SISO, 1 COMISIÓN TOPOGRAFÍA, 2 BOAL, 2 OFICIALES, 3 AYUDANTES.
CLIMA: DÍA NUBLADO, LLUVIAS EN HORAS DE LA TARDE.

INSPECTOR DE INTERVENTORÍA



ALEJANDRA HERRAN AVILA
