Capital SISTEMA DE COMUNICACIÓN PÚBLICA	**CERTIFICACIÓN DEL SUPERVISOR PARA EL PAGO A CONTRATISTAS (Personas Jurídicas)**	**CÓDIGO: AGJC-CN-FT-005J** **VERSIÓN: 15** **FECHA DE APROBACIÓN: 06/08/2020** **RESPONSABLE: SUBDIRECCIÓN FINANCIERA**	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

I. INFORMACIÓN DE SUPERVISOR

Fecha de expedición		
DD	MM	AAAA
25	03	2021

Supervisor	
Nombre:	CAROLIN OLARTE CIPRIAN
Cargo:	COORDINADORA ÁREA TÉCNICA

RADICACIÓN EN FINANCIERA	
Fecha	
No. Radicado	

II. INFORMACIÓN CONTRACTUAL

Razón Social del Contratista

SERGEMAQ S.A.S

No. NIT: 830.043.941 **D.V.** 1

Datos de identificación del contrato

Tipo	Contrato	Clase	Prestación de Servicios
No.	468	Fecha de Suscripción	22 de julio del 2020
		Fecha Aprob. Poliza	29 de julio del 2020

Actividad económica codigo CIIU
3312

III. ACTIVIDADES Y O PRODUCTOS ENTREGADOS EN EL PERIODO:

Pago de la tercera jornada de mantenimientos preventivos a los equipos del canal, de acuerdo a la facturas N° SE2 - SE1 - SE3
1. Mantenimiento preventivos a las ups del canal; Ups Power Eaton 80 kva, Ups Liebert 20 kva, Ups Liebert 130 kva, Ups Powerware Prestige 6 kva, Ups Voltex 6 kva,
Ups Voltex 6 kva, Ups Online Titan 10 kva, Ups Online Titan 10 kva, Ups Eaton 9 px 11 kva.
2. Mantenimiento preventivos a las Aires Acondicionado del canal; Aire acondicionado Lenox KF6624GW6 Minisplit KF25-09-6W 25000 BTU 2 TR, Aire acondicionado Trane
TSC 120F3E0A000 AA Central 120000 BTU-1TR, Aire acondicionado Trane MCX536G10RAA-2TTA0036A – 36000 BTU – 3 TR, Aire acondicionado Coleman 48204C966 -
(Movil pequeñana),BTU, Aire acondicionado Coleman 48203C 966 BTU (Movil grande), Aire acondicionado York Blue Line 36000 BTU – 3 TR - 32080157016100002
Aire acondicionado York Blue Line 36000 BTU – 3 TR (H3CE120A25A, Aire acondicionado Trane 4 TTB3036E1000AA 36000 BTU – 3 TR.
3. Mantenimiento preventivos a las Plantas Electricas del canal; Planta Electrica Power Link-GMP45C645KVA, Planta Electrica Kohler Jhon Dere 50 kva, Planta Electrica -
Modasa MP-451 42 kva, Planta Electrica Lister Petter IPW4A081 21 kva, Planta Electrica Honda EU 2000, Planta Electrica Honda EU 1000, Planta Electrica Perkins 150 kva.

Tipo de observación	Adición y prorroga	**Detalle de la observación:**

V. PERIODO CERTIFICADO

Desde	DD	MM	AAAA	Hasta	DD	MM	AAAA	DIAS SERVICIOS PRESTADOS	

VI. CERTIFICACION

El suscrito Supervisor certifica que el contratista cumplió a cabalidad con las obligaciones, en los términos y tiempo pactados, las cuales se verificaron y avalaron por el período relacionado, conforme a las condiciones de pago, así como, que se constató la presentación de la certificación expedida por el representante legal o revisor fiscal de la empresa, de acuerdo con lo establecido en la Ley 789/2002 y Decreto 1703/02. Por lo tanto autorizo el pago por valor de:

$ 27.715.100	VEINTISIETE MILLONES SETECIENTOS QUINCE MIL CIEN PESOS M/L

Tipo de pago	Por Mantenimientos Realizados	Número total de pagos pactados		Número de pago actual	
		Número total de entregables		Número de entregables	

VII. ESTADO PRESUPUESTAL

1.	Valor total contrato	$ 130.000.000
2	Adición	$ 15.000.000
3.	Valor cancelado a la fecha	$ 73.051.720
4.	Valor a cancelar en este pago	$ 27.715.100
5.	SALDO =(1+2-3-4)	$ 44.233.180

Recursos		CANAL	
No.(s) Registro(s)		101	
Valor a Afectar por cada RP(s)			

VIII. FIRMA DEL SUPERVISOR

Firma supervisor

C.C.

Firma supervisor

C.C. **1.032.389.865**

(Solo en el caso de ser compartida la supervisión)

ESPACIO PARA RADICADO DE RECEPCIÓN

Factura Electrónica de Venta

No.SE2

SERGEMAQ SAS

Nit: 830043941-1
Departamento: Bogotá
Ciudad: BOGOTÁ, D.C.
Dirección: CR 9 53 58 LC 114

Teléfono: 3508639383
Correo: energiasergemaq@gmail.com
Tipo de contribuyente: Persona Jurídica
Régimen: Impuesto sobre las ventas – IVA

Nombre Cliente: CANAL CAPITAL
Número Documento: NIT 830012587-4
Teléfono: 4578300
Dirección: AV EL DORADO # 66-63
Correo: dayro.oviedo@canalcapital.gov.co
Departamento: Bogotá

Ciudad: BOGOTÁ, D.C.
Fecha Expedición: 24/03/2021 12:37 PM
Fecha Vencimiento: 25/03/2021
Forma pago: Crédito

Cufe: 464800560adf1d833cb8bf06a7c5d5838ba49b81179361be16a35bf288afc3d27066dec16113113974ac7dde7a94fc09

Producto	Cantidad	Descuento	IVA	INC	Total
Eaton9PX Eaton 9 PX Mantenimiento Preventivo $ 400,000	1 unidad(s)	$ 0	$ 76,000	$ 0	$ 400,000
Onlinetitan10Kva Online titan 10 Kva Mantenimiento Preventivo $ 400,000	2 unidad(s)	$ 0	$ 152,000	$ 0	$ 800,000
Voltex6K Voltex 6 Kva Mantenimiento Preventivo $ 400,000	2 unidad(s)	$ 0	$ 152,000	$ 0	$ 800,000
PowerwarePrestige6 Powerware Prestige 6 Kva Mantenimiento Preventivo $ 400,000	1 unidad(s)	$ 0	$ 76,000	$ 0	$ 400,000
Liebert130 Liebert 130 Kva Mantenimiento Preventivo $ 1,900,000	1 unidad(s)	$ 0	$ 361,000	$ 0	$ 1,900,000
Liebert20Kva Liebert 20 Kva Mantenimiento Preventivo $ 1,350,000	1 unidad(s)	$ 0	$ 256,500	$ 0	$ 1,350,000
PowerEaton80KVA Power Eaton 80 KVA Mantenimiento Preventivo $ 1,700,000	1 unidad(s)	$ 0	$ 323,000	$ 0	$ 1,700,000

Total items: 7

Descripción de cargos y descuentos

Numero de resolución:18764011769209

Rango Autorizado: Desde SE-1 Hasta SE-1000

Vigencia:23/03/2021 Hasta 23/03/2022

Subtotal:	$ 7,350,000
Descuento:	$ 0
IVA:	$ 1,396,500
INC:	$ 0
Bolsas:	$ 0
Total factura:	**$ 8,746,500**
Cargos:	$ 0
Otros descuentos:	$ 0
Retefuente:	$ 0
Reteiva:	$ 0
Reteica:	$ 0

Valor en Letras:
OCHO MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS PESOS.

Total a Pagar: **$ 8,746,500**

Observaciones: FORMA DE PAGO: DE ACUERDO AL CONTRATO 468-2020

Factura Electrónica de Venta

No.SE1

SERGEMAQ SAS

Nit: 830043941-1
Departamento: Bogotá
Ciudad: BOGOTÁ, D.C.
Dirección: CR 9 53 58 LC 114

Teléfono: 3508639383
Correo: energiasergemaq@gmail.com
Tipo de contribuyente: Persona Jurídica
Régimen: Impuesto sobre las ventas – IVA

Nombre Cliente: CANAL CAPITAL
Número Documento: NIT 830012587-4
Teléfono: 4578300
Dirección: AV EL DORADO # 66-63
Correo: dayro.oviedo@canalcapital.gov.co
Departamento: Bogotá

Ciudad: BOGOTÁ, D.C.
Fecha Expedición: 24/03/2021 12:16 PM
Fecha Vencimiento: 25/03/2021
Forma pago: Crédito

Cufe: 432c42ad42a9fc08c291a09b472568ebecf6970cb153b297ad3569a4567d87d867298a99a30fad1112bddbe74c7342a8

Producto	Cantidad	Descuento	IVA	INC	Total
TRANE4TTB TRANE 4TTB3036E1000AA 30000 BTU – 3 TR Mantenimiento Preventivo (Sistemas) $ 480,000	1 unidad(s)	$ 0	$ 91,200	$ 0	$ 480,000
YORKBLUELINE36000H3CE YORK BLUE LINE 36000 BTU – 3 TR Mantenimiento Preventivo H3CE120A25A (Estudios- Estudios 2) $ 480,000	1 unidad(s)	$ 0	$ 91,200	$ 0	$ 480,000
YORKBLUELINE36000 YORK BLUE LINE 36000 BTU – 3 TR Mantenimiento Preventivo Cuarto Eléctrico $ 480,000	1 unidad(s)	$ 0	$ 91,200	$ 0	$ 480,000
COLEMAN48204C COLEMAN 48204C 9600 BTU Mantenimiento Preventivo (Móvil pequeña) $ 350,000	1 unidad(s)	$ 0	$ 66,500	$ 0	$ 350,000
COLEMAN48203C COLEMAN 48203C 9600 BTU Mantenimiento Preventivo (Móvil Grande) $ 350,000	4 unidad(s)	$ 0	$ 266,000	$ 0	$ 1,400,000
TRANEMCX536G TRANE MCX536G10RAA - 2TTA0036A 36000 BTU – 3 TR Mantenimiento Preventivo (Master de Emisión) $ 480,000	1 unidad(s)	$ 0	$ 91,200	$ 0	$ 480,000
TRANETSC120 TRANE TSC120F3E0A000 AA Central 120000 BTU – 1TR Mantenimiento Preventivo (Estudios-In_out) $ 450,000	1 unidad(s)	$ 0	$ 85,500	$ 0	$ 450,000
LENOXKF6624GW6 LENOX KF6624GW6 minisplit KF25-09-6W 25000 BTU 2TR Mantenimiento Preventivo (trafíco-grafícas) $ 350,000	2 unidad(s)	$ 0	$ 133,000	$ 0	$ 700,000

Total items: 8

Descripción de cargos y descuentos

Numero de resolución:18764011769209

Rango Autorizado: Desde SE-1 Hasta SE-1000

Vigencia:23/03/2021 Hasta 23/03/2022

Subtotal:	$ 4,820,000
Descuento:	$ 0
IVA:	$ 915,800
INC:	$ 0
Bolsas:	$ 0
Total factura:	**$ 5,735,800**
Cargos:	$ 0
Otros descuentos:	$ 0
Retefuente:	$ 0
Reteiva:	$ 0
Reteica:	$ 0

Valor en Letras:
CINCO MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS PESOS.

Total a Pagar: **$ 5,735,800**

Observaciones: FORMA DE PAGO: DE ACUERDO AL CONTRATO 468-2020

Factura Electrónica de Venta

No.SE3

SERGEMAQ SAS

Nit: 830043941-1
Departamento: Bogotá
Ciudad: BOGOTÁ, D.C.
Dirección: CR 9 53 58 LC 114

Teléfono: 3508639383
Correo: energiasergemaq@gmail.com
Tipo de contribuyente: Persona Jurídica
Régimen: Impuesto sobre las ventas – IVA

Nombre Cliente: CANAL CAPITAL
Número Documento: NIT 830012587-4
Teléfono: 4578300
Dirección: AV EL DORADO # 66-63
Correo: dayro.oviedo@canalcapital.gov.co
Departamento: Bogotá

Ciudad: BOGOTÁ, D.C.
Fecha Expedición: 24/03/2021 12:48 PM
Fecha Vencimiento: 25/03/2021
Forma pago: Crédito

Cufe: 8cade65171ba7194514739bd3123e5949695917b1cd919c70076038e130757ce128fe3e9d32c9acd549e1488643f8656

Producto	Cantidad	Descuento	IVA	INC	Total
Perkins150Kva Perkins 150 Kva Mantenimiento Preventivo $ 2,650,000	1 unidad(s)	$ 0	$ 503,500	$ 0	$ 2,650,000
PlantasHondaEU1000 Plantas Honda EU 1000 Mantenimiento Preventivo $ 340,000	1 unidad(s)	$ 0	$ 64,600	$ 0	$ 340,000
PlantasHondaEU2000 Plantas Honda EU 2000 Mantenimiento Preventivo $ 340,000	1 unidad(s)	$ 0	$ 64,600	$ 0	$ 340,000
ListerPetteripw4a08121Kva Lister -Petter ipw4a081 21 Kva Mantenimiento Preventivo $ 1,340,000	1 unidad(s)	$ 0	$ 254,600	$ 0	$ 1,340,000
PlantaModasaMP45142Kva Planta Modasa MP- 451 42 Kva Mantenimiento Preventivo $ 2,150,000	1 unidad(s)	$ 0	$ 408,500	$ 0	$ 2,150,000
KohlerJhonDere50Kva Kohler Jhon Dere 50 Kva Mantenimiento Preventivo $ 2,150,000	1 unidad(s)	$ 0	$ 408,500	$ 0	$ 2,150,000
POWERLINKGMP45C6 POWER LINK :GMP45C645KVA:Mantenimiento Preventivo $ 2,150,000	1 unidad(s)	$ 0	$ 408,500	$ 0	$ 2,150,000

Total items: 7

Descripción de cargos y descuentos

Numero de resolución:18764011769209

Rango Autorizado: Desde SE-1 Hasta SE-1000

Vigencia:23/03/2021 Hasta 23/03/2022

Subtotal:	$ 11,120,000
Descuento:	$ 0
IVA:	$ 2,112,800
INC:	$ 0
Bolsas:	$ 0
Total factura:	**$ 13,232,800**
Cargos:	$ 0
Otros descuentos:	$ 0
Retefuente:	$ 0
Reteiva:	$ 0
Reteica:	$ 0

Valor en Letras:
TRECE MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS PESOS.

Total a Pagar: **$ 13,232,800**

Observaciones: FORMA DE PAGO: DE ACUERDO AL CONTRATO 468-2020

CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES

ARTÍCULO 50 DE LA LEY 789 DE 2002

Para dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, el suscrito Representante Legal ANGELA SOFIA QUIROGA PEREZ de acuerdo con los requisitos legales de la sociedad SERGEMAQ, identificada con NIT No. 830.043.941-1, se permite certificar que la mencionada sociedad ha realizado los pagos de seguridad social y aportes parafiscales que correspondan a las nóminas de los últimos seis meses (6) calendario.

Dado en Bogotá a los 20 días del mes de Marzo del 2021

Firma:

ANGELA SOFIA QUIROGA PEREZ



REP. LEGAL

CC: 52.933.074

SERGEMAQ

DATOS DEL CLIENTE			
CLIENTE	Banco Capital	FECHA	12-03/21
TIPO DE MANTENIMIENTO	Preventivo	HORA INICIO	9:00 PM
CONTACTO	Dayro Ovicdo	HORA FIN	11:00 PM.

DATOS DEL EQUIPO			
EQUIPO	UPS	UBICACIÓN	Av. 68 calle 26.
MARCA	EATON.	MODELO	80KVA.
POTENCIA	80KVA.	SERIAL	ED354

CHECK LIST DE ACTIVIDADES			
ACTIVIDAD	SI	NO	DETALLES
Inspección general conductores:	✓		
Inspección general ventiladores:	✓		
Inspección general breakers:	✓		
Inspección general conexiones eléctricas :	✓		
Inspección general conexiones baterías :	✓		
Inspección general conexiones filtros:	✓		
Inspección general conexiones transformadores:	✓		
Inspección general conexiones fusibles:	✓		
Inspección general conexiones terminales in/out:	✓		
Inspección general conexiones distribución:	✓		
Limpieza general:	✓		
Limpieza interna:	✓		
Limpieza externa:	✓		
Verificación de log alarmas:	✓		
Verificación de funcionamiento inversor:	✓		
Verificación de funcionamiento cargador de baterías:	✓		
Verificación de funcionamiento rectificador:	✓		
Verificación de funcionamiento transformador:	✓		
Verificación de funcionamiento etapa de filtrado:	✓		
Verificación de funcionamiento transferencia Automática:	✓		
Actualización de software		✓	

SERGEMAQ

VARIABLE	MEDICIONES ENTRADA	CARGA		MEDICIONES DE SALIDA	CARGA	
		SI	NO			
L1-N	119.7 VAC.	/		119.4 VAC	/	
L2-N	119.7 VAC.	/		119.8 VAC	/	
L3-N	120.4 VAC.	/		120.2 VAC	/	
I1	59.2 AAC	/		59.9 ACA	/	
I2	66.3 AC	/		60 AAC	/	
I3	68.5 AC.	/		54.4 AAC	/	
NEUTRO-TIERRA	0.VAC	/		0.VAC		
BANCO BATERÍAS	545. VDC	/		545. VDC	/	

OBSERVACIONES GENERALES
OPS en trabajo Normal, No presenta alarmas. funcionamiento correcto.

PENDIENTES POR COTIZAR

REP. DEL CLIENTE		REP. DE SERGEMAQ	
Nombre	Dayro Oviedo	Nombre	Javier Lasso.
Cargo	Ing. Proyecto.	Cargo	Tec. Mto.
Firma	Dayro Oviedo.	Firma	Javier Lasso.

INFORME TERCERA JORNADA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO

DATOS DEL CLIENTE			
CLIENTE	CANAL CAPITAL	FECHA	12-MARZO-2021
TIPO DE MANTENIMIENTO	PREVENTIVO	HORA INICIO	9:00 PM
CONTACTO	DAYRO OVIEDO	HORA FIN	11:00 PM

DATOS DEL EQUIPO			
EQUIPO	UPS	UBICACIÓN	CUARTO ELÉCTRICO SEDE PRINCIPAL CANAL CAPITAL
MARCA	POWER EATON 9390	MODELO	9390-80
POTENCIA	80 KVA	SERIAL	ED354CBB12

REGISTRO FOTOGRÁFICO 1



REGISTRO FOTOGRÁFICO 2



REGISTRO FOTOGRÁFICO 3



REGISTRO FOTOGRÁFICO 4



REGISTRO FOTOGRÁFICO 5



REGISTRO FOTOGRÁFICO 6



REGISTRO FOTOGRÁFICO 7



SERGEMAQ

DATOS DEL CLIENTE			
CLIENTE	Canal Capital	FECHA	12-03/21
TIPO DE MANTENIMIENTO	Preventivo	HORA INICIO	9:00 AM
CONTACTO	Dairo Ovicdo	HORA FIN	10:30 AM

DATOS DEL EQUIPO			
EQUIPO	UPS	UBICACIÓN	Cerro Manjui
MARCA	Liebert.	MODELO	Mxh 20
POTENCIA	20 kVA	SERIAL	38-1841

CHECK LIST DE ACTIVIDADES			
ACTIVIDAD	SI	NO	DETALLES
Inspección general conductores:	/		
Inspección general ventiladores:	/		
Inspección general breakers:	/		
Inspección general conexiones eléctricas :	/		
Inspección general conexiones baterías :	/		
Inspección general conexiones filtros:	/		
Inspección general conexiones transformadores:	/		
Inspección general conexiones fusibles:	/		
Inspección general conexiones terminales in/out:	/		
Inspección general conexiones distribución:	/		
Limpieza general:	/		
Limpieza interna:	/		
Limpieza externa:	/		
Verificación de log alarmas:	/		
Verificación de funcionamiento inversor:	/		
Verificación de funcionamiento cargador de baterías:	/		
Verificación de funcionamiento rectificador:	/		
Verificación de funcionamiento transformador:	/		
Verificación de funcionamiento etapa de filtrado:	/		
Verificación de funcionamiento transferencia Automática:	/		
Actualización de software		/	

SERGEMAQ

VARIABLE	MEDICIONES ENTRADA	CARGA		MEDICIONES DE SALIDA	CARGA	
		SI	NO			
L1-N	125.3 VAC	/		119.5 VAC	/	
L2-N	124.2 VAC	/		119.3 VAC	/	
L3-N	125.4 VAC	/		119.2 VAC	/	
I 1	27.6 AAC	/		19.5 AAC	/	
I 2	38.9 AAC	/		21.7 AAC	/	
I 3	25.9 AC.	/		30.2 AC	/	
NEUTRO-TIERRA	0 VAC	/		0. VA.	/	
BANCO BATERÍAS	330.1	/		330.2	/	

OBSERVACIONES GENERALES
UPS presenta Falla en Baterias, al Momento de Respaldo no dura 30 segundos se Recomienda Banco de Baterias Nuevo 24 Baterias 12V 35 Ah, falla debido a inactividad

PENDIENTES POR COTIZAR
24 Baterías 12V 35 Ah.

REP. DEL CLIENTE		REP. DE SERGEMAQ	
Nombre	Dayro oviedo	Nombre	Javier Lasso
Cargo	Apoyo Area Tecnica	Cargo	Tec. Mto.
Firma	Dayro Oviedo.	Firma	Javier Lasso.

INFORME TERCERA JORNADA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO

DATOS DEL CLIENTE			
CLIENTE	CANAL CAPITAL	FECHA	12-MARZO-2021
TIPO DE MANTENIMIENTO	PREVENTIVO	HORA INICIO	9:00 AM
CONTACTO	DAYRO OVIEDO	HORA FIN	10:30 AM

DATOS DEL EQUIPO			
EQUIPO	UPS	UBICACIÓN	CERRO MANJUI
MARCA	LIEBERT NX	MODELO	NX20
POTENCIA	20 KVA	SERIAL	38-1841

REGISTRO FOTOGRÁFICO 1



REGISTRO FOTOGRÁFICO 2




REGISTRO FOTOGRÁFICO 3



REGISTRO FOTOGRÁFICO 4



REGISTRO FOTOGRÁFICO 5

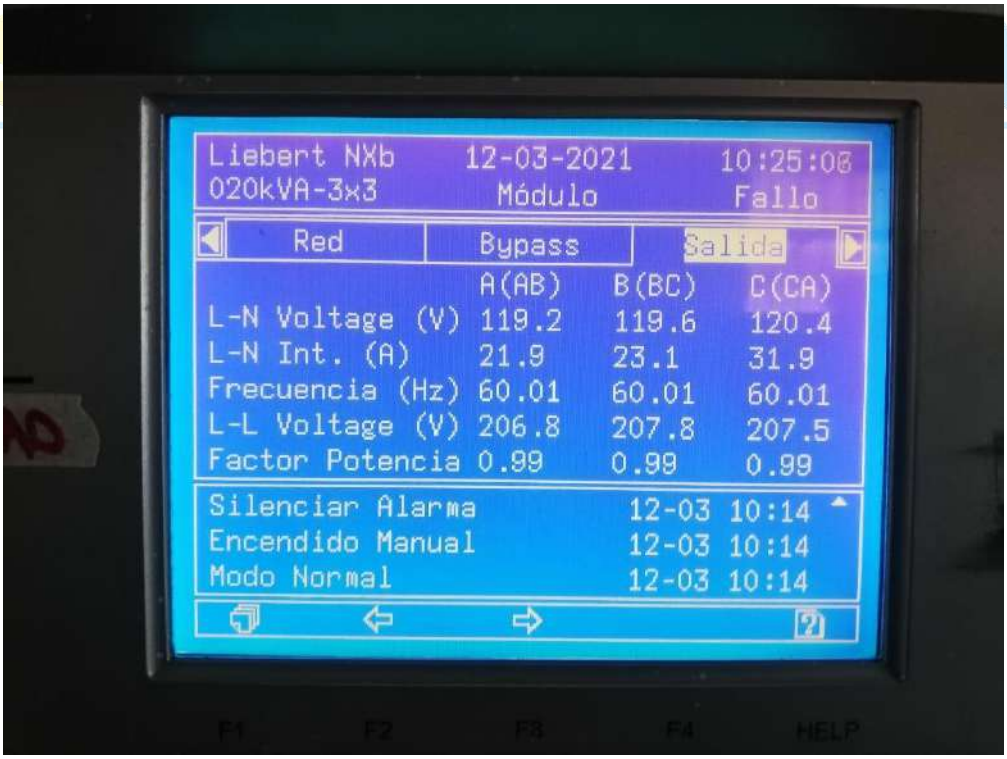

REGISTRO FOTOGRÁFICO 6



REGISTRO FOTOGRÁFICO 7



SERGEMAQ

DATOS DEL CLIENTE			
CLIENTE	Canal Capital	FECHA	Marzo 12 2021
TIPO DE MANTENIMIENTO	Preventivo	HORA INICIO	8:30 AM.
CONTACTO	Dayro ovieda	HORA FIN	12:30 AM

DATOS DEL EQUIPO			
EQUIPO	UPS	UBICACIÓN	CUARTO ELECTRICO
MARCA	LIEBERT.	MODELO	N Power.
POTENCIA	130 KVA	SERIAL	37-2141

CHECK LIST DE ACTIVIDADES			
ACTIVIDAD	SI	NO	DETALLES
Inspección general conductores:	✓		
Inspección general ventiladores:	✓		
Inspección general breakers:	✓		
Inspección general conexiones eléctricas :	✓		
Inspección general conexiones baterías :	✓		
Inspección general conexiones filtros:	✓		
Inspección general conexiones transformadores:	✓		
Inspección general conexiones fusibles:	✓		
Inspección general conexiones terminales in/out:	✓		
Inspección general conexiones distribución:	✓		
Limpieza general:	✓		
Limpieza interna:	✓		
Limpieza externa:	✓		
Verificación de log alarmas:	.		BAJO NIVEL DC.
Verificación de funcionamiento inversor:			
Verificación de funcionamiento cargador de baterías:	✓		
Verificación de funcionamiento rectificador:	✓		
Verificación de funcionamiento transformador:	✓		
Verificación de funcionamiento etapa de filtrado:	✓		
Verificación de funcionamiento transferencia Automática:	✓		
Actualización de software			NO APLICA

SERGEMAQ

VARIABLE	MEDICIONES ENTRADA	CARGA		MEDICIONES DE SALIDA	CARGA	
		SI	NO			
L1-N	118.9V	X		120.V	X	
L2-N	118. V.	X		120V.	X	
L3-N	118.V.	X		120V.	X	
I 1	85.9 Amp	X		115. Amp	X	
I 2	87.3 Amp	X		113. Amp.	X	
I 3	90.8 Amp.	X		118 Amp.	X	
NEUTRO-TIERRA	0.3 V.	X		0.3V.	X	
BANCO BATERÍAS	517V.	X		517V.	X	

OBSERVACIONES GENERALES
El banco de baterias no respalda ante ausencia de voltaje de entrada, se revisan individualmente cada bateria marca CBS, se revisa CCA con Analizador se encuentra menor a 400 CCA, se revisa fecha de fabricación donde se evidencia que es superior a 10 AÑOS, razon por la cual se requiere su reemplazo inmediato.

PENDIENTES POR COTIZAR
80 baterias 85Amp o superior a 12V.

REP. DEL CLIENTE		REP. DE SERGEMAQ	
Nombre	Dayro Oviedo	Nombre	Javier Lasso
Cargo	Apoyo Area tecnica	Cargo	Tec. Mto
Firma	Dayro Oviedo.	Firma	JavierLasso.

INFORME TERCERA JORNADA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO


DATOS DEL CLIENTE			
CLIENTE	CANAL CAPITAL	FECHA	12-MARZO-2021
TIPO DE MANTENIMIENTO	PREVENTIVO	HORA INICIO	08:30 AM
CONTACTO	DAYRO OVIEDO	HORA FIN	12:30 PM

DATOS DEL EQUIPO			
EQUIPO	UPS	UBICACIÓN	CUARTO ELÉCTRICO CANAL CAPITAL
MARCA	LIEBERT	MODELO	N POWER
POTENCIA	130 KVA	SERIAL	37-2141

REGISTRO FOTOGRÁFICO 1



REGISTRO FOTOGRÁFICO 2

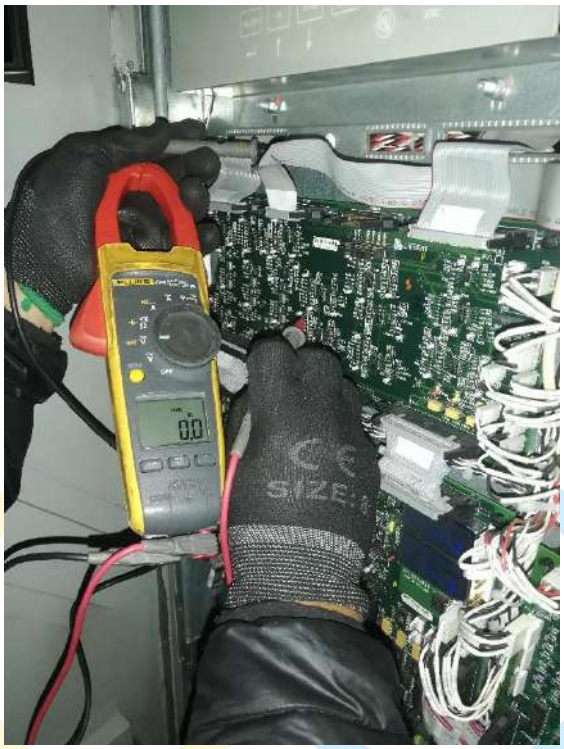

REGISTRO FOTOGRÁFICO 3



REGISTRO FOTOGRÁFICO 4



REGISTRO FOTOGRÁFICO 5



REGISTRO FOTOGRÁFICO 6



REGISTRO FOTOGRÁFICO 7



SERGEMAQ

DATOS DEL CLIENTE			
CLIENTE	Canal Capital	FECHA	06-03/21
TIPO DE MANTENIMIENTO	Preventivo	HORA INICIO	9:15 AM
CONTACTO	Dayro Oviedo	HORA FIN	10:40 AM

DATOS DEL EQUIPO			
EQUIPO	UPS	UBICACIÓN	Cerro el cable
MARCA	EAST.	MODELO	EA 9061I RTS
POTENCIA	6 KVA.	SERIAL	E1402016294

CHECK LIST DE ACTIVIDADES			
ACTIVIDAD	SI	NO	DETALLES
Inspección general conductores:	✓		
Inspección general ventiladores:	✓		
Inspección general breakers:	✓		
Inspección general conexiones eléctricas :	✓		
Inspección general conexiones baterías :	✓		
Inspección general conexiones filtros:	✓		
Inspección general conexiones transformadores:	✓		
Inspección general conexiones fusibles:	✓		
Inspección general conexiones terminales in/out:	✓		
Inspección general conexiones distribución:	✓		
Limpieza general:	✓		
Limpieza interna:	✓		
Limpieza externa:	✓		
Verificación de log alarmas:	✓		
Verificación de funcionamiento inversor:	✓		
Verificación de funcionamiento cargador de baterías:	✓		
Verificación de funcionamiento rectificador:	✓		
Verificación de funcionamiento transformador:	✓		
Verificación de funcionamiento etapa de filtrado:	✓		
Verificación de funcionamiento transferencia Automática:	✓		
Actualización de software		✓	

SERGEMAQ

VARIABLE	MEDICIONES ENTRADA	CARGA SI	CARGA NO	MEDICIONES DE SALIDA	CARGA SI	CARGA NO
L1-N	121.3 V AC	/		121.2 VAC	/	
L2-N	121.2V AC	/		120.1VAC.	/	
L3-N	L1 L2 221.2VAC	/		L1 L2 221.VA	/	
I 1	0.7 A	/		0.6A	/	
I 2	0.5 A	/		0.01		
I 3	N/A		/	N/A	N/A	
NEUTRO-TIERRA	0.V	/		0V.	/	
BANCO BATERÍAS	212.1	/		228.1VDC	/	

OBSERVACIONES GENERALES
Ups en correcto estado pruebas satisfactorias -

PENDIENTES POR COTIZAR

REP. DEL CLIENTE		REP. DE SERGEMAQ	
Nombre	Doyer Oviedo	Nombre	Javier Tasso
Cargo	Ing. Boyacho	Cargo	Tec. Mto.
Firma	Dayro Oviedo.	Firma	

INFORME TERCERA JORNADA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO

DATOS DEL CLIENTE			
CLIENTE	CANAL CAPITAL	FECHA	06-MARZO-2021
TIPO DE MANTENIMIENTO	PREVENTIVO	HORA INICIO	9:15AM
CONTACTO	DAYRO OVIEDO	HORA FIN	10:40 AM

DATOS DEL EQUIPO			
EQUIPO	UPS	UBICACIÓN	CERRO EL CABLE
MARCA	POWERWARE PRESTIGE	MODELO	EA90611RTS
POTENCIA	6 KVA	SERIAL	E1402016294


REGISTRO FOTOGRÁFICO 1



REGISTRO FOTOGRÁFICO 2



REGISTRO FOTOGRÁFICO 3

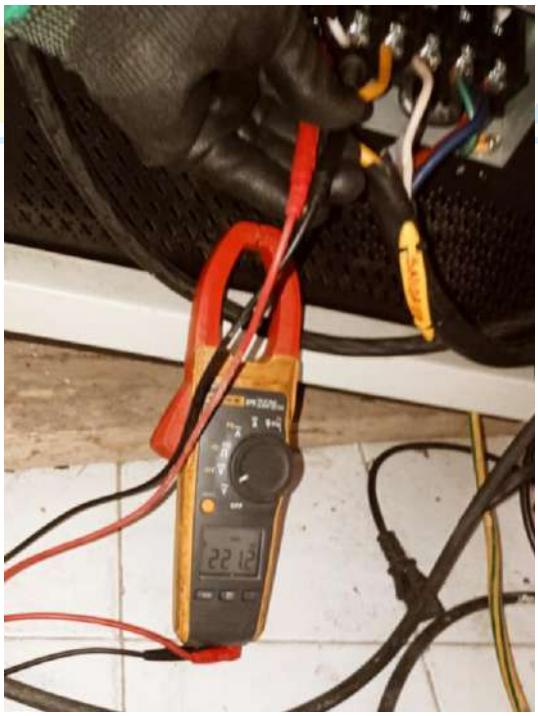


REGISTRO FOTOGRÁFICO 4




REGISTRO FOTOGRÁFICO 5



REGISTRO FOTOGRÁFICO 6

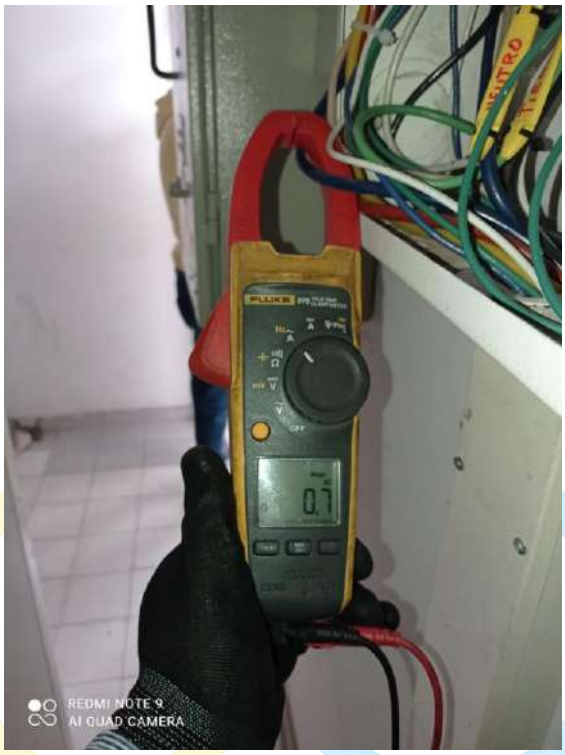

REGISTRO FOTOGRÁFICO 7

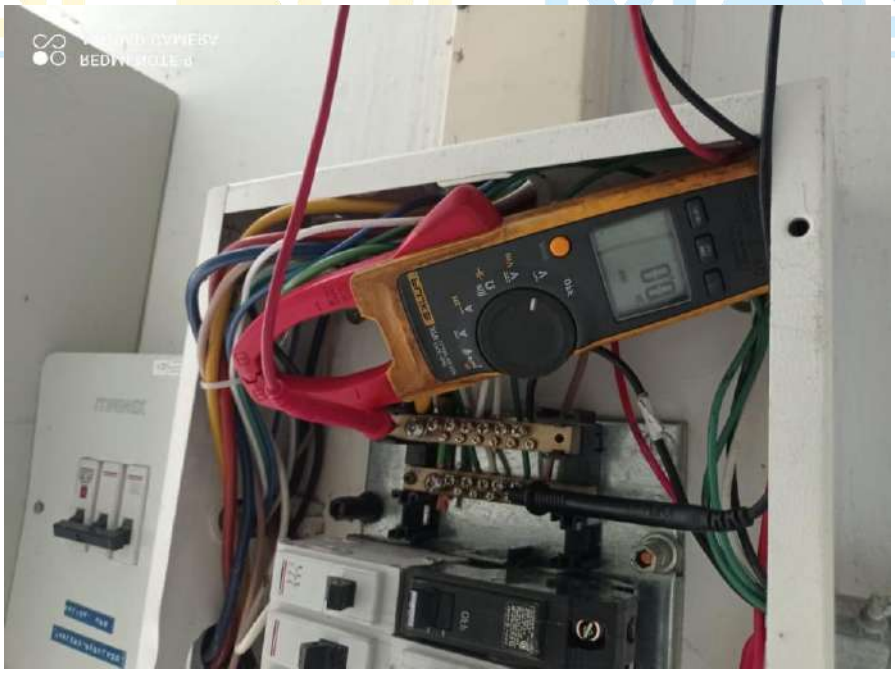

SERGEMAQ

DATOS DEL CLIENTE			
CLIENTE	Canal Capital	FECHA	11-03/21
TIPO DE MANTENIMIENTO	Preventivo	HORA INICIO	9:00 AM
CONTACTO	Dayro Oviedo	HORA FIN	10:15 AM

DATOS DEL EQUIPO			
EQUIPO	UPS	UBICACIÓN	Cerro Boqueron
MARCA	Voltex	MODELO	Voltex 6kVA
POTENCIA	6kVA	SERIAL	001000627

CHECK LIST DE ACTIVIDADES			
ACTIVIDAD	SI	NO	DETALLES
Inspección general conductores:	/		
Inspección general ventiladores:	/		
Inspección general breakers:	/		
Inspección general conexiones eléctricas :	/		
Inspección general conexiones baterías :	/		
Inspección general conexiones filtros:	/		
Inspección general conexiones transformadores:	/		
Inspección general conexiones fusibles:	/		
Inspección general conexiones terminales in/out:	/		
Inspección general conexiones distribución:	/		
Limpieza general:	/		
Limpieza interna:			
Limpieza externa:	/		
Verificación de log alarmas:	/		
Verificación de funcionamiento inversor:	/		
Verificación de funcionamiento cargador de baterías:	/		
Verificación de funcionamiento rectificador:	/		
Verificación de funcionamiento transformador:	/		
Verificación de funcionamiento etapa de filtrado:	/		
Verificación de funcionamiento transferencia Automática:	/		
Actualización de software		/	

SERGEMAQ

VARIABLE	MEDICIONES ENTRADA	CARGA		MEDICIONES DE SALIDA	CARGA	
		SI	NO			
L1-N	120.8 VAC	/		119.7 VAC	/	
L2-N	120.8 VAC	/		119.5 VAC	/	
L3-N	F1 F2 229 VAC	/		F1-F2 219.6 VAC	/	
I1	12A AC	/		12.1 AAC.	/	
I2	12.3 A AC.	/		12.2 AAC.	/	
I3	N/A.	/		N/A.	/	
NEUTRO-TIERRA	0.V AC.	/		0. VAC.	/	
BANCO BATERÍAS	271.7 VDC	/		271.6 VDC.	/	

OBSERVACIONES GENERALES
Baterias Agotadas UPS NO Respalda, al hacer pruebas se apaga la UPS

PENDIENTES POR COTIZAR
20 Baterías 12V 9A

REP. DEL CLIENTE		REP. DE SERGEMAQ	
Nombre	Duvan Oviedo	Nombre	Javier Lasso
Cargo	Apoyo Area tecnica	Cargo	Tec. Mto.
Firma	Duvan Oviedo.	Firma	

INFORME TERCERA JORNADA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO

DATOS DEL CLIENTE			
CLIENTE	CANAL CAPITAL	FECHA	11-MARZO-2021
TIPO DE MANTENIMIENTO	PREVENTIVO	HORA INICIO	09:00 AM
CONTACTO	DAYRO OVIEDO	HORA FIN	10:15 PM

DATOS DEL EQUIPO			
EQUIPO	UPS	UBICACIÓN	BOQUERON CHIPAQUE
MARCA	VOLTEX	MODELO	CGK
POTENCIA	CGK 6KVA	SERIAL	06020053

REGISTRO FOTOGRÁFICO 1



REGISTRO FOTOGRÁFICO 2



REGISTRO FOTOGRÁFICO 3



REGISTRO FOTOGRÁFICO 4



REGISTRO FOTOGRÁFICO 5



SERGEMAQ

DATOS DEL CLIENTE			
CLIENTE	Canal Capital	FECHA	Marzo-8-2021
TIPO DE MANTENIMIENTO	Preventivo.	HORA INICIO	4:30 pm
CONTACTO	Dayro Oviedo.	HORA FIN	6:40 pm.

DATOS DEL EQUIPO			
EQUIPO	UPS.	UBICACIÓN	Cerro Chosica subida
MARCA	Voltex	MODELO	6KVA.
POTENCIA	6KVA	SERIAL	S/S

CHECK LIST DE ACTIVIDADES			
ACTIVIDAD	SI	NO	DETALLES
Inspección general conductores:	✓		
Inspección general ventiladores:	✓		
Inspección general breakers:	✓		
Inspección general conexiones eléctricas :	✓		
Inspección general conexiones baterías :	✓		
Inspección general conexiones filtros:	✓		
Inspección general conexiones transformadores:	✓		
Inspección general conexiones fusibles:	✓		
Inspección general conexiones terminales in/out:	✓		
Inspección general conexiones distribución:	✓		
Limpieza general:	✓		
Limpieza interna:	✓		
Limpieza externa:	✓		
Verificación de log alarmas:	✓		Ninguna
Verificación de funcionamiento inversor:	✓		
Verificación de funcionamiento cargador de baterías:	✓		
Verificación de funcionamiento rectificador:	✓		
Verificación de funcionamiento transformador:	✓		
Verificación de funcionamiento etapa de filtrado:	✓		
Verificación de funcionamiento transferencia Automática:	✓		
Actualización de software			N/A

SERGEMAQ

VARIABLE	MEDICIONES ENTRADA	CARGA		MEDICIONES DE SALIDA	CARGA	
		SI	NO		SI	NO
L1-N	121.1V.	X		120.V.	X	
L2-N	121.2V.	X		120V.	X	
L3-N	N/A	X		N/A	X	
I 1	2.4.A.	X		3.1A	X	
I 2	2.3A	X		2.9A	X	
I 3	N/A.	X		N/A	X	
NEUTRO-TIERRA	Ø	X		Ø	X	
BANCO BATERÍAS	157.5VDC.	X		151.VDC.	X	

OBSERVACIONES GENERALES
Equipo operativo

PENDIENTES POR COTIZAR
Ninguno

REP. DEL CLIENTE		REP. DE SERGEMAQ	
Nombre	Dayro Oviedo	Nombre	Javier Lusso
Cargo	Apoyo Area Tecnica	Cargo	Tecnico
Firma	Dayro Oviedo.	Firma	Javier Lusso

INFORME TERCERA JORNADA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO

DATOS DEL CLIENTE			
CLIENTE	CANAL CAPITAL	FECHA	08-MARZO -2021
TIPO DE MANTENIMIENTO	PREVENTIVO	HORA INICIO	04:30 AM
CONTACTO	DAYRO OVIEDO	HORA FIN	06:40 AM

DATOS DEL EQUIPO			
EQUIPO	UPS	UBICACIÓN	CERRO SUBA
MARCA	VOLTEX	MODELO	6CK
POTENCIA	6 KVA	SERIAL	06020052


REGISTRO FOTOGRÁFICO 1



REGISTRO FOTOGRÁFICO 2



REGISTRO FOTOGRÁFICO 3

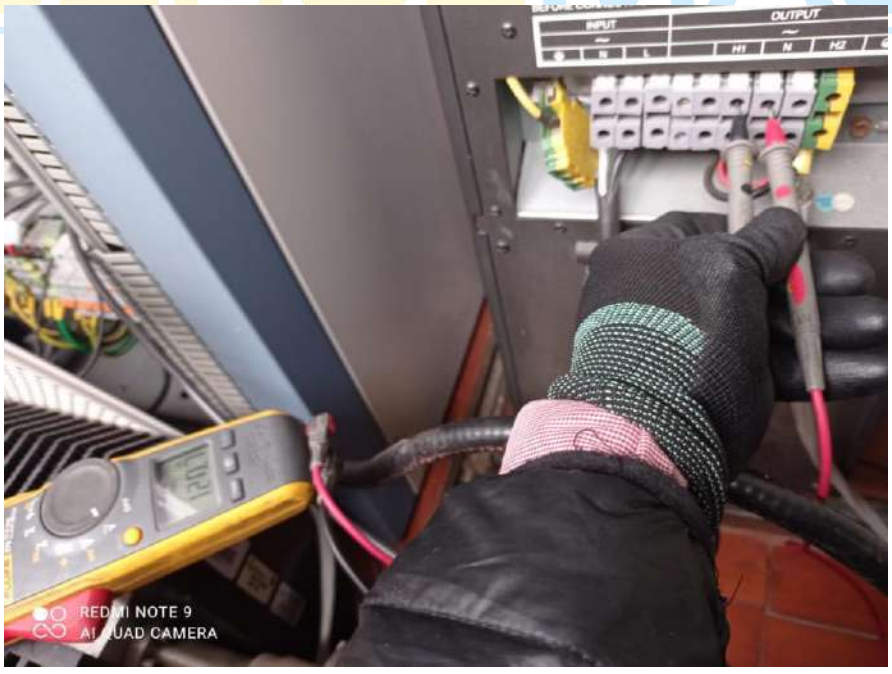

REGISTRO FOTOGRÁFICO 4



REGISTRO FOTOGRÁFICO 5



SERGEMAQ

DATOS DEL CLIENTE			
CLIENTE	Canal Capital	FECHA	Marzo 9/2021
TIPO DE MANTENIMIENTO	Preventivo	HORA INICIO	2:30 PM
CONTACTO	Dayro Ovieda	HORA FIN	3:45 PM

DATOS DEL EQUIPO			
EQUIPO	UPS	UBICACIÓN	Movil Pequeña
MARCA	Titán	MODELO	Titan 10 KVA.
POTENCIA	10 KVA.	SERIAL	130110KR0006PSC

CHECK LIST DE ACTIVIDADES			
ACTIVIDAD	SI	NO	DETALLES
Inspección general conductores:	/		
Inspección general ventiladores:	/		
Inspección general breakers:	/		
Inspección general conexiones eléctricas :	/		
Inspección general conexiones baterías :	/		
Inspección general conexiones filtros:	/		
Inspección general conexiones transformadores:	/		
Inspección general conexiones fusibles:	/		
Inspección general conexiones terminales in/out:	/		
Inspección general conexiones distribución:	/		
Limpieza general:	/		
Limpieza interna:	/		
Limpieza externa:	/		
Verificación de log alarmas:	/		
Verificación de funcionamiento inversor:	/		
Verificación de funcionamiento cargador de baterías:	/		
Verificación de funcionamiento rectificador:	/		
Verificación de funcionamiento transformador:	/		
Verificación de funcionamiento etapa de filtrado:	/		
Verificación de funcionamiento transferencia Automática:	/		
Actualización de software		/	

SERGEMAQ

VARIABLE	MEDICIONES ENTRADA	CARGA		MEDICIONES DE SALIDA	CARGA	
		SI	NO			
L1-N	126.6 VAC		/	127.0 VAC	/	
L2-N	126.0 VAC		/	127.1 VAC	/	
L3-N	F1 F2 219.8 VAC		/	N/A	/	
I 1	2.0 A AC		/	4.9 A AC	/	
I 2	1.9 A AC		/	3.9 AAC	/	
I 3	N/A		/	N/A	/	
NEUTRO-TIERRA	0 VAC		/	0. VAC	/	
BANCO BATERÍAS	B1 147.3 B2 155.6		/	B1 150.1 B2 153	/	

OBSERVACIONES GENERALES
Ups No presenta Fallas en Pruebas

PENDIENTES POR COTIZAR


REP. DEL CLIENTE		REP. DE SERGEMAQ	
Nombre	Dairo Oviedo.	Nombre	Javier Lasso
Cargo	Ing. Proyecto	Cargo	Tec Mto.
Firma	Dairo Oviedo.	Firma	

INFORME TERCERA JORNADA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO

DATOS DEL CLIENTE			
CLIENTE	CANAL CAPITAL	FECHA	09-MARZO_2021
TIPO DE MANTENIMIENTO	PREVENTIVO	HORA INICIO	2:30 PM
CONTACTO	DAYRO OVIEDO	HORA FIN	3:45 PM

DATOS DEL EQUIPO			
EQUIPO	UPS	UBICACIÓN	MOVIL PEQUEÑA
MARCA	ONLINE TITAN	MODELO	TITAN 10KVA R
POTENCIA	10 KVA	SERIAL	1001667

REGISTRO FOTOGRÁFICO 1

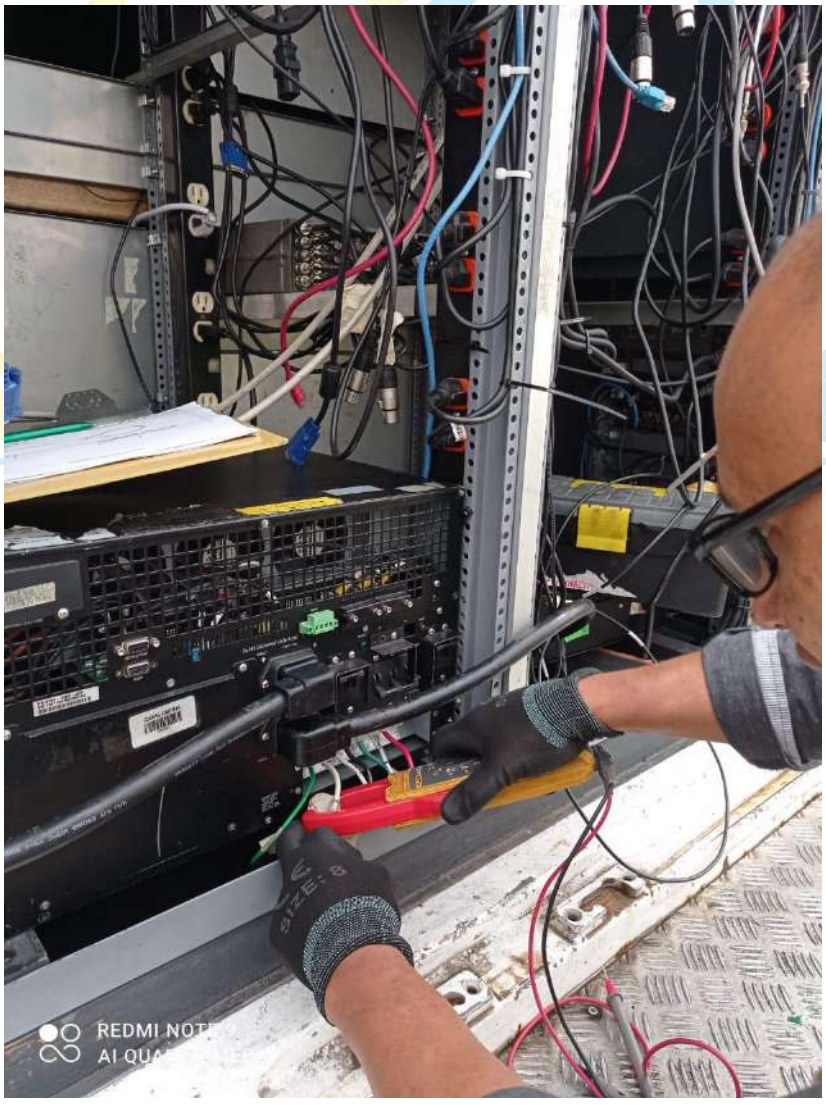

REGISTRO FOTOGRÁFICO 2



REGISTRO FOTOGRÁFICO 3



REGISTRO FOTOGRÁFICO 4



REGISTRO FOTOGRÁFICO 5



SERGEMAQ

DATOS DEL CLIENTE			
CLIENTE	Canal capital.	FECHA	Mar 20.09.2021
TIPO DE MANTENIMIENTO	Preventivo.	HORA INICIO	4:00 pm
CONTACTO	Dayro Oviedo	HORA FIN	6:30 pm

DATOS DEL EQUIPO			
EQUIPO	UPS.	UBICACIÓN	CANAL CAPITAL
MARCA	ONLINE TITAN	MODELO	TITAN 10KVA.
POTENCIA	10 KVA	SERIAL	S/S

CHECK LIST DE ACTIVIDADES			
ACTIVIDAD	SI	NO	DETALLES
Inspección general conductores:	✓		
Inspección general ventiladores:	✓		
Inspección general breakers:	✓		
Inspección general conexiones eléctricas :	✓		
Inspección general conexiones baterías :	✓		
Inspección general conexiones filtros:	✓		
Inspección general conexiones transformadores:	✓		
Inspección general conexiones fusibles:	✓		
Inspección general conexiones terminales in/out:	✓		
Inspección general conexiones distribución:	✓		
Limpieza general:	✓		
Limpieza interna:	✓		
Limpieza externa:	✓		
Verificación de log alarmas:	✓		Alarma bateria S
Verificación de funcionamiento inversor:	✓		
Verificación de funcionamiento cargador de baterías:	✓		
Verificación de funcionamiento rectificador:	✓		
Verificación de funcionamiento transformador:	-		
Verificación de funcionamiento etapa de filtrado:	✓		
Verificación de funcionamiento transferencia Automática:	✓		
Actualización de software			N/A

SERGEMAQ

VARIABLE	MEDICIONES ENTRADA	CARGA		MEDICIONES DE SALIDA	CARGA	
		SI	NO		SI	NO
L1-N	118.4V.	X		118 V.	X	
L2-N	118.1V	X		118 V.	X	
L3-N	N/A.	X		N/A	X	
I1	18 A.	X		21.2 A	X	
I2	16.1 A.	X		20.6 A	X	
I3	N/A.	X		N/A.	X	
NEUTRO-TIERRA	0V.	X		0V.	X	
BANCO BATERÍAS		X			X	

OBSERVACIONES GENERALES
Equipo operativo.

PENDIENTES POR COTIZAR


REP. DEL CLIENTE		REP. DE SERGEMAQ	
Nombre	Dayro Oviedo	Nombre	Javier lasso
Cargo	Apoyo Area Tecnica	Cargo	tec. Mto.
Firma	Dayro Oviedo.	Firma	Javier lasso.

INFORME TERCERA JORNADA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO

DATOS DEL CLIENTE			
CLIENTE	CANAL CAPITAL	FECHA	09-MARZO-2020
TIPO DE MANTENIMIENTO	PREVENTIVO	HORA INICIO	04:00 PM
CONTACTO	DAYRO OVIEDO	HORA FIN	6:30 pm

DATOS DEL EQUIPO			
EQUIPO	UPS	UBICACIÓN	MOVIL PEQUEÑA
MARCA	ONLINE TITAN	MODELO	TITAN 10KVA R
POTENCIA	10 KVA	SERIAL	1001667

REGISTRO FOTOGRÁFICO 1

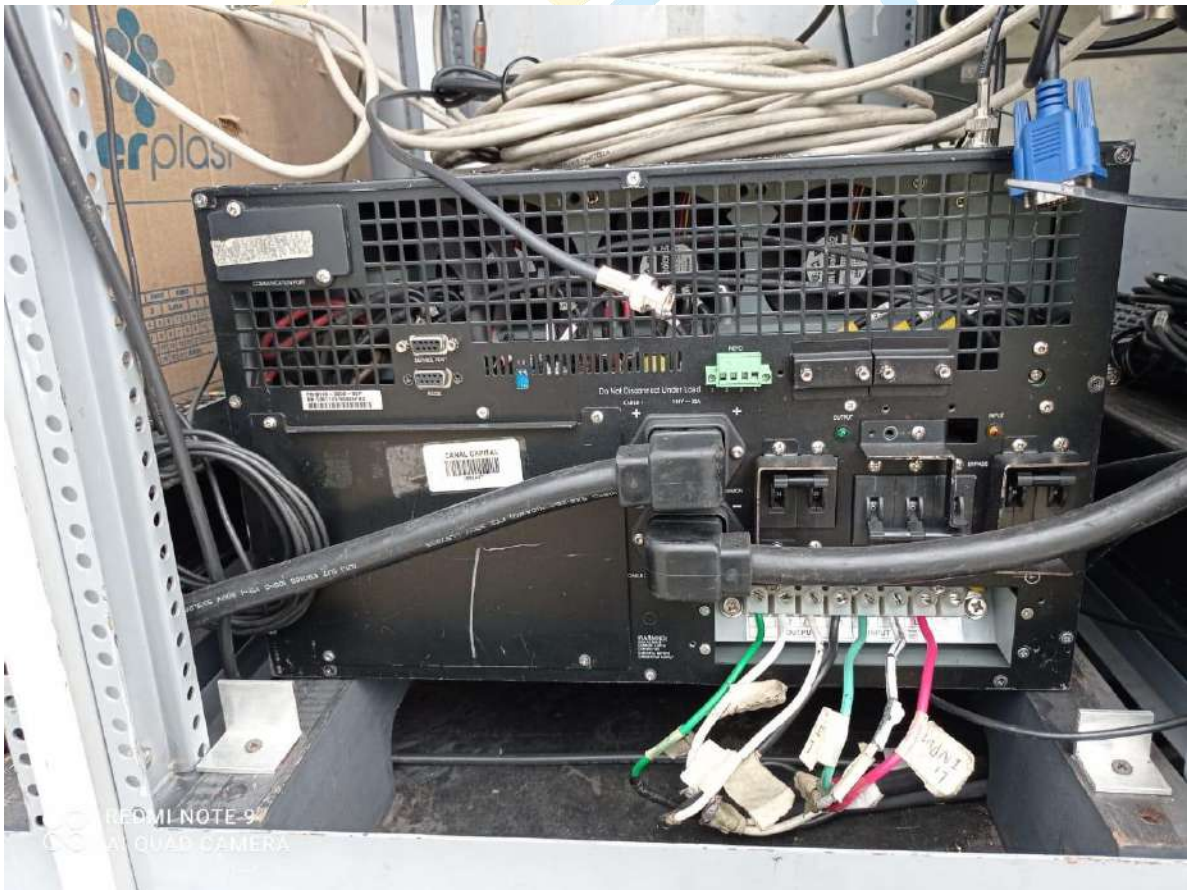

REGISTRO FOTOGRÁFICO 2



REGISTRO FOTOGRÁFICO 3



REGISTRO FOTOGRÁFICO 4



REGISTRO FOTOGRÁFICO 5



SERGEMAQ

DATOS DEL CLIENTE			
CLIENTE	Canal Capital	FECHA	Marzo 9/2021
TIPO DE MANTENIMIENTO	Preventivo	HORA INICIO	4:00 PM
CONTACTO	Dayro Oviedo	HORA FIN	5:30

DATOS DEL EQUIPO			
EQUIPO	UPS	UBICACIÓN	Movil Grande.
MARCA	EATON	MODELO	9PX11KPM
POTENCIA	9k.	SERIAL	G211F03042

CHECK LIST DE ACTIVIDADES			
ACTIVIDAD	SI	NO	DETALLES
Inspección general conductores:	/		
Inspección general ventiladores:	/		
Inspección general breakers:	/		
Inspección general conexiones eléctricas :	/		
Inspección general conexiones baterías :	/		
Inspección general conexiones filtros:	/		
Inspección general conexiones transformadores:	/		
Inspección general conexiones fusibles:	/		
Inspección general conexiones terminales in/out:	/		
Inspección general conexiones distribución:	/		
Limpieza general:	/		
Limpieza interna:	/		
Limpieza externa:	/		
Verificación de log alarmas:	/		
Verificación de funcionamiento inversor:	/		
Verificación de funcionamiento cargador de baterías:	/		
Verificación de funcionamiento rectificador:	/		
Verificación de funcionamiento transformador:	/		
Verificación de funcionamiento etapa de filtrado:	/		
Verificación de funcionamiento transferencia Automática:	/		
Actualización de software		/	

SERGEMAQ

VARIABLE	MEDICIONES ENTRADA	CARGA		MEDICIONES DE SALIDA	CARGA	
		SI	NO			
L1-N	127.8 VAC		/	121.3 VAC	/	
L2-N	127.8 VAC			121.2 VAC	/	
L3-N	N/A.			N/A.		
I1	2.6A		/	8.64 A	/	
I2	2.4A		/	6.4 A.	/	
I3	N/A		/	N/A		
NEUTRO-TIERRA	0V		/	0V		
BANCO BATERÍAS	254 VDC		/	254DC.		

OBSERVACIONES GENERALES
UPS No presenta Fallas en su funcionamiento, Display con intermitencia

PENDIENTES POR COTIZAR

REP. DEL CLIENTE		REP. DE SERGEMAQ	
Nombre	Dayro Oviedo	Nombre	Javier Lasso
Cargo	Apoyo Area Tecnica	Cargo	Tec. Mto.
Firma	Dayro Oviedo.	Firma	

INFORME TERCERA JORNADA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO

DATOS DEL CLIENTE			
CLIENTE	CANAL CAPITAL	FECHA	8-MARZO-2021
TIPO DE MANTENIMIENTO	PREVENTIVO	HORA INICIO	08:00 AM
CONTACTO	DAYRO OVIEDO	HORA FIN	11 PM

DATOS DEL EQUIPO			
EQUIPO	UPS	UBICACIÓN	MOVIL GRANDE CANAL CAPITAL
MARCA	EATON	MODELO	9PX11KPM
POTENCIA	9 KVA	SERIAL	G211E03042

REGISTRO FOTOGRÁFICO 1



REGISTRO FOTOGRÁFICO 2



REGISTRO FOTOGRÁFICO 2



REGISTRO FOTOGRÁFICO 3



REGISTRO FOTOGRÁFICO 4



REGISTRO FOTOGRÁFICO 5



REGISTRO FOTOGRÁFICO 6



SERGEMAQ

DATOS DEL CLIENTE			
CLIENTE	CANAL CAPITAL	FECHA	8-MARZO-2021
TIPO DE MANTENIMIENTO	PREVENTIVO	HORA INICIO	8:00 A.M.
CONTACTO	DIANO OVIEDO	HORA FIN	6:00 P.M.

DATOS DEL EQUIPO			
EQUIPO	AIRE ACONDICIONADO	UBICACIÓN	GRAFICOS CANAL CAPITAL
MARCA	LENOX.	MODELO	KT 2S-09-GW
POTENCIA	25.000 BTU.	SERIAL	N/A.

CHECK LIST DE ACTIVIDADES			
ACTIVIDAD	SI	NO	DETALLES
Limpieza general interior Exterior:	✓		
Revisión del correcto funcionamiento del equipo:	✓		
Inspección eléctrica:	✓		
Medición de consumos de corriente:	✓		
Medición de amperaje compresor :	✓		
Medición de amperaje moto-ventilador :	✓		
Inspección del funcionamiento general de los drenajes:	✓		
Limpieza general de los drenajes:	✓		
Medición de presión del refrigerante:	✓		
Revisión y limpieza de filtros:	✓		
Chequeo y limpieza de los moto-ventiladores:	✓		
Revisión del tablero eléctrico:	✓		
Revisión de la mirilla, filtro secador:	✓		
Inspección de aislamiento térmico:	✓		
Chequeo del sistema de tuberías:	✓		
Revisión evaporadora:	✓		
Revisión tarjeta de control:	✓		
Revisión sensores:	✓		
Revisión termostato	✓		
Unidad Externa general:	✓		
Unidad Externa Interna:	✓		
Otras:			NINGUNO

SERGEMAQ

VARIABLE	VALOR	OBSERVACIONES
Presión Alta	220 psi	
Presión Baja	60 PSi	
Voltaje Alimentación:	220 V.	
Medición de Amperaje compresor :	N/A.	
Medición de amperaje moto-ventilador :	0.8	
Medición de presión del refrigerante:		

OBSERVACIONES GENERALES
se debe cambiar compresor y filtros desde

PENDIENTES POR COTIZAR
- compresor. - filtros de Aire

REP. DEL CLIENTE		REP. DE SERGEMAQ	
Nombre	Dayro Oviedo	Nombre	John Vega
Cargo	Apoyo Area Tecnica	Cargo	Tecnico AS
Firma	Dayro Oviedo.	Firma	John Vega

INFORME TERCERA JORNADA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO

DATOS DEL CLIENTE			
CLIENTE	CANAL CAPITAL	FECHA	8-MARZO-2021
TIPO DE MANTENIMIENTO	PREVENTIVO	HORA INICIO	08:00 AM
CONTACTO	DAYRO OVIEDO	HORA FIN	06:00 PM

DATOS DEL EQUIPO			
EQUIPO	AIRE ACONDICIONADO	UBICACIÓN	GRAFICAS
MARCA	LENOX	MODELO	KF25-09-6W
POTENCIA	25.000 BTU	SERIAL	N.A

REGISTRO FOTOGRÁFICO 1



REGISTRO FOTOGRÁFICO 2



REGISTRO FOTOGRÁFICO 3



REGISTRO FOTOGRÁFICO 4



REGISTRO FOTOGRÁFICO 5



SERGEMAQ 12

DATOS DEL CLIENTE			
CLIENTE	CANAL CAPITAL	FECHA	8-MARZO-2021
TIPO DE MANTENIMIENTO	PREVENTIVO	HORA INICIO	8:00 AM
CONTACTO	DAYRO OVIEDO	HORA FIN	6:00 P.M.

DATOS DEL EQUIPO			
EQUIPO	AIRE ACONDICIONADO	UBICACIÓN	TRAFICO.
MARCA	LENOX.	MODELO	YF662461G.
POTENCIA	25000	SERIAL	00070082

CHECK LIST DE ACTIVIDADES			
ACTIVIDAD	SI	NO	DETALLES
Limpieza general interior Exterior:	✓		
Revisión del correcto funcionamiento del equipo:	✓		
Inspección eléctrica:	✓		
Medición de consumos de corriente:	✓		
Medición de amperaje compresor :	✓		
Medición de amperaje moto-ventilador :	✓		
Inspección del funcionamiento general de los drenajes:	✓		
Limpieza general de los drenajes:	✓		
Medición de presión del refrigerante:	✓		
Revisión y limpieza de filtros:	✓		
Chequeo y limpieza de los moto-ventiladores:	✓		
Revisión del tablero eléctrico:	✓		
Revisión de la mirilla, filtro secador:	✓		
Inspección de aislamiento térmico:	✓		
Chequeo del sistema de tuberías:	✓		
Revisión evaporadora:	✓		
Revisión tarjeta de control:	✓		
Revisión sensores:	✓		
Revisión termostato	✓		
Unidad Externa general:	✓		
Unidad Externa Interna:	✓		
Otras:			Ninguno

SERGEMAQ

VARIABLE	VALOR	OBSERVACIONES
Presión Alta	210 PSI	
Presión Baja	64 PSI	
Voltaje Alimentación:	220 V.	
Medición de Amperaje compresor :	4.2 A	
Medición de amperaje moto-ventilador :	0.9 A	
Medición de presión del refrigerante:	N/A	

OBSERVACIONES GENERALES
Equipo operativo

PENDIENTES POR COTIZAR

REP. DEL CLIENTE		REP. DE SERGEMAQ	
Nombre	Dayro Oviedo	Nombre	John Vega
Cargo	Apoyo Area Tecnica	Cargo	Tec. AA.
Firma	Dayro Oviedo.	Firma	John Vega

INFORME TERCERA JORNADA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO

DATOS DEL CLIENTE			
CLIENTE	CANAL CAPITAL	FECHA	8-MARZO-2021
TIPO DE MANTENIMIENTO	PREVENTIVO	HORA INICIO	08:00 AM
CONTACTO	DAYRO OVIEDO	HORA FIN	06:00 PM

DATOS DEL EQUIPO			
EQUIPO	AIRE ACONDICIONADO	UBICACIÓN	TRAFICO
MARCA	LENOX	MODELO	KF6624GW6
POTENCIA	25.000 BTU	SERIAL	000700082

REGISTRO FOTOGRÁFICO 1



REGISTRO FOTOGRÁFICO 2



REGISTRO FOTOGRÁFICO 3



REGISTRO FOTOGRÁFICO 4



REGISTRO FOTOGRÁFICO 5



DATOS DEL CLIENTE			
CLIENTE	CANAL CAPITAL	FECHA	8-MARZO-2021
TIPO DE MANTENIMIENTO	PREVENTIVO	HORA INICIO	8:00 AM.
CONTACTO	DAYLO OVIEDO	HORA FIN	0:00 PM.

DATOS DEL EQUIPO			
EQUIPO	AIRE ACONDICIONADO	UBICACIÓN	ESTUDIOS - IN-OUT.
MARCA	TRANE.	MODELO	TSC120F3EDA000
POTENCIA	120.000 BTU	SERIAL	11401139Z

CHECK LIST DE ACTIVIDADES			
ACTIVIDAD	SI	NO	DETALLES
Limpieza general interior Exterior:	✓		
Revisión del correcto funcionamiento del equipo:	✓		
Inspección eléctrica:	✓		
Medición de consumos de corriente:	✓		
Medición de amperaje compresor :	✓		
Medición de amperaje moto-ventilador :	✓		
Inspección del funcionamiento general de los drenajes:	✓		
Limpieza general de los drenajes:	✓		
Medición de presión del refrigerante:	✓		
Revisión y limpieza de filtros:	✓		
Chequeo y limpieza de los moto-ventiladores:	✓		
Revisión del tablero eléctrico:	✓		
Revisión de la mirilla, filtro secador:	✓		
Inspección de aislamiento térmico:	✓		
Chequeo del sistema de tuberías:	✓		
Revisión evaporadora:	✓		
Revisión tarjeta de control:	✓		
Revisión sensores:	✓		
Revisión termostato	✓		
Unidad Externa general:	✓		
Unidad Externa Interna:	✓		
Otras:			N.APLICA

SERGEMAQ

VARIABLE	VALOR	OBSERVACIONES
Presión Alta	210 PSI	
Presión Baja	68 PSI	
Voltaje Alimentación:	220 V.	
Medición de Amperaje compresor :	6.2 A 7.8A	
Medición de amperaje moto-ventilador :	1.6. Amp	
Medición de presión del refrigerante:	NA	

OBSERVACIONES GENERALES
N N apro

PENDIENTES POR COTIZAR

REP. DEL CLIENTE		REP. DE SERGEMAQ	
Nombre	Dayro Oviedo	Nombre	John Vega
Cargo	Apoyo Area Tecnica	Cargo	Tecnico AA
Firma	Dayro Oviedo.	Firma	John Vega

SERGEMAQ

INFORME TERCERA MANTENIMIENTO PREVENTIVO

DATOS DEL CLIENTE			
CLIENTE	CANAL CAPITAL	FECHA	8-MARZO-2021
TIPO DE MANTENIMIENTO	PREVENTIVO	HORA INICIO	8:00 AM
CONTACTO	DAYRO OVIEDO	HORA FIN	6:00 PM

DATOS DEL EQUIPO			
EQUIPO	AIRE ACONDICIONADO	UBICACIÓN	CANAL CAPITAL ESTUDIOS IN-OUT
MARCA	TRANE	MODELO	TSC120F3E0A000
POTENCIA	120.000 BTU	SERIAL	114011342

REGISTRO FOTOGRÁFICO 1



REGISTRO FOTOGRÁFICO 2



REGISTRO FOTOGRÁFICO 3



REGISTRO FOTOGRÁFICO 4



REGISTRO FOTOGRÁFICO 5



REGISTRO FOTOGRÁFICO 6



REGISTRO FOTOGRÁFICO 7



SERGEMAQ 11

DATOS DEL CLIENTE			
CLIENTE	CANAL CAPITAL	FECHA	8- MARZO-2021
TIPO DE MANTENIMIENTO	PREVENTIVO.	HORA INICIO	8:00 AM
CONTACTO	DAYRO OVIEDO	HORA FIN	6:00 pm

DATOS DEL EQUIPO			
EQUIPO	AIRE ACONDICIONADO	UBICACIÓN	MASTER EMISION
MARCA	TRANE.	MODELO	MCXS366 10QRAA-2T1ADD6A
POTENCIA	36.000 BTU	SERIAL	3T1011-116996

CHECK LIST DE ACTIVIDADES			
ACTIVIDAD	SI	NO	DETALLES
Limpieza general interior Exterior:	✓		
Revisión del correcto funcionamiento del equipo:	✓		
Inspección eléctrica:	✓		
Medición de consumos de corriente:	✓		
Medición de amperaje compresor :	✓		
Medición de amperaje moto-ventilador :	✓		
Inspección del funcionamiento general de los drenajes:	✓		
Limpieza general de los drenajes:	✓		
Medición de presión del refrigerante:	✓		
Revisión y limpieza de filtros:	✓		
Chequeo y limpieza de los moto-ventiladores:	✓		
Revisión del tablero eléctrico:	✓		
Revisión de la mirilla, filtro secador:	✓		
Inspección de aislamiento térmico:	✓		
Chequeo del sistema de tuberías:	✓		
Revisión evaporadora:	✓		
Revisión tarjeta de control:	✓		
Revisión sensores:	✓		
Revisión termostato	✓		
Unidad Externa general:	✓		
Unidad Externa Interna:	✓		
Otras:			N.n fpo

VARIABLE	VALOR	OBSERVACIONES
Presión Alta	223 PSI	
Presión Baja	60 PSI	
Voltaje Alimentación:	220 V.	
Medición de Amperaje compresor :	3.8 Amp	
Medición de amperaje moto-ventilador :	0.78 Amp	
Medición de presión del refrigerante:	N/A	

OBSERVACIONES GENERALES
Equipo Operativo.

PENDIENTES POR COTIZAR

REP. DEL CLIENTE		REP. DE SERGEMAQ	
Nombre	Dayro Oviedo	Nombre	John Vega
Cargo	Apoyo Area tecnica	Cargo	Tecnico AA
Firma	Dayro Oviedo.	Firma	John Vega

INFORME TERCERA JORNADA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO

DATOS DEL CLIENTE			
CLIENTE	CANAL CAPITAL	FECHA	8-MARZO-2021
TIPO DE MANTENIMIENTO	PREVENTIVO	HORA INICIO	8:00 AM
CONTACTO	DAYRO OVIEDO	HORA FIN	6:00 PM

DATOS DEL EQUIPO			
EQUIPO	AIRE ACONDICIONADO	UBICACIÓN	MASTER DE EMISION
MARCA	TRANE	MODELO	MCX 536G10RAA-2TTA0036A
POTENCIA	36000 BTU	SERIAL	3T1011-116996

REGISTRO FOTOGRÁFICO 1



REGISTRO FOTOGRÁFICO 2



REGISTRO FOTOGRÁFICO 3




REGISTRO FOTOGRÁFICO 4



REGISTRO FOTOGRÁFICO 5



REGISTRO FOTOGRÁFICO 6

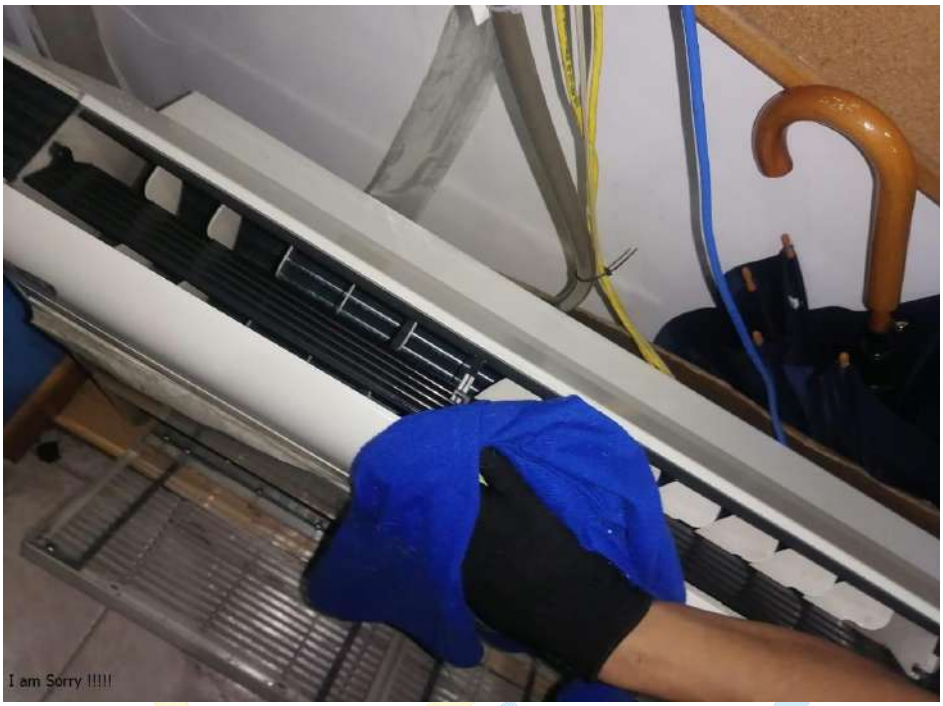

REGISTRO FOTOGRÁFICO 7



SERGEMAQ

DATOS DEL CLIENTE			
CLIENTE	CANAL CAPITAL	FECHA	9-MARZO-2021
TIPO DE MANTENIMIENTO	PREVENTIVO	HORA INICIO	7:30 AM
CONTACTO	DAYRO OVIEDO	HORA FIN	6:30 AM

DATOS DEL EQUIPO			
EQUIPO	AIRE ACONDICIONADO	UBICACIÓN	MOVIL GRANDE
MARCA	COLEMAN MACH	MODELO	48203696G
POTENCIA	9600 BTU	SERIAL	111219040

CHECK LIST DE ACTIVIDADES			
ACTIVIDAD	SI	NO	DETALLES
Limpieza general interior Exterior:	✓		
Revisión del correcto funcionamiento del equipo:	✓		
Inspección eléctrica:	✓		
Medición de consumos de corriente:	✓		
Medición de amperaje compresor :	✓		
Medición de amperaje moto-ventilador :	✓		
Inspección del funcionamiento general de los drenajes:	✓		
Limpieza general de los drenajes:	✓		
Medición de presión del refrigerante:	✓		
Revisión y limpieza de filtros:	✓		
Chequeo y limpieza de los moto-ventiladores:	✓		
Revisión del tablero eléctrico:	✓		
Revisión de la mirilla, filtro secador:	✓		
Inspección de aislamiento térmico:	✓		
Chequeo del sistema de tuberías:	✓		
Revisión evaporadora:	✓		
Revisión tarjeta de control:	✓		
Revisión sensores:	✓		
Revisión termostato	✓		
Unidad Externa general:	✓		
Unidad Externa Interna:	✓		
Otras:			NINGUNO

SERGEMAQ

VARIABLE	VALOR	OBSERVACIONES
Presión Alta	204 PSI	
Presión Baja	98 PSI.	
Voltaje Alimentación:	110V.	
Medición de Amperaje compresor :	4.3 Amp.	
Medición de amperaje moto-ventilador :	0.9 Amp	
Medición de presión del refrigerante:	N/A.	

OBSERVACIONES GENERALES
Equipo optimo

PENDIENTES POR COTIZAR

REP. DEL CLIENTE		REP. DE SERGEMAQ	
Nombre	Dayro Oviedo	Nombre	John Vega
Cargo	Apoyo Area Tecnica	Cargo	Tecnico A, A.
Firma	Dayro Oviedo.	Firma	Jonvega

SERGEMAQ

DATOS DEL CLIENTE			
CLIENTE	CANAL CAPITAL	FECHA	9-MARZO-2021
TIPO DE MANTENIMIENTO	PREVENTIVO	HORA INICIO	7:30 AM
CONTACTO	DAYRO OVIEDO	HORA FIN	6:30PM.

DATOS DEL EQUIPO			
EQUIPO	AIRE ACONDICIONADO	UBICACIÓN	MOVIL GRANDE.
MARCA	COLEMAN MACH.	MODELO	48203C9GG.
POTENCIA	9600 BTU.	SERIAL	13001121411

CHECK LIST DE ACTIVIDADES			
ACTIVIDAD	SI	NO	DETALLES
Limpieza general interior Exterior:	✓		
Revisión del correcto funcionamiento del equipo:	✓		
Inspección eléctrica:	✓		
Medición de consumos de corriente:	✓		
Medición de amperaje compresor :	✓		
Medición de amperaje moto-ventilador :	✓		
Inspección del funcionamiento general de los drenajes:	✓		
Limpieza general de los drenajes:	✓		
Medición de presión del refrigerante:	✓		
Revisión y limpieza de filtros:	✓		
Chequeo y limpieza de los moto-ventiladores:	✓		
Revisión del tablero eléctrico:	✓		
Revisión de la mirilla, filtro secador:	✓		
Inspección de aislamiento térmico:	✓		
Chequeo del sistema de tuberías:	✓		
Revisión evaporadora:	✓		
Revisión tarjeta de control:	✓		
Revisión sensores:	✓		
Revisión termostato	✓		
Unidad Externa general:	✓		
Unidad Externa Interna:	✓		
Otras:			NINGUNO

VARIABLE	VALOR	OBSERVACIONES
Presión Alta	201 psi	
Presión Baja	99 psi	
Voltaje Alimentación:	110 V.	
Medición de Amperaje compresor :	9.8. V.	
Medición de amperaje moto-ventilador :	1.3A.	
Medición de presión del refrigerante:	NA	

OBSERVACIONES GENERALES
Equipo operativo

PENDIENTES POR COTIZAR

REP. DEL CLIENTE		REP. DE SERGEMAQ	
Nombre	Dayro Oviedo	Nombre	John Vega
Cargo	Apoyo Area Tecnica	Cargo	Tecnico AS
Firma	Dayro Oviedo.	Firma	John Vega

SERGEMAQ

DATOS DEL CLIENTE			
CLIENTE	CANAL CAPITAL	FECHA	9-MARZO-2021
TIPO DE MANTENIMIENTO	PREVENTIVO.	HORA INICIO	7:30 AM.
CONTACTO	DAYRO OVIEDO	HORA FIN	6:30 PM

DATOS DEL EQUIPO			
EQUIPO	AIRE ACONDICIONADO	UBICACIÓN	MOVIL GRANDE
MARCA	WLGMAN MACH.	MODELO	48203696
POTENCIA	9600 BTU.	SERIAL	140 222252

CHECK LIST DE ACTIVIDADES			
ACTIVIDAD	SI	NO	DETALLES
Limpieza general interior Exterior:	✓		
Revisión del correcto funcionamiento del equipo:	✓		
Inspección eléctrica:	✓		
Medición de consumos de corriente:	✓		
Medición de amperaje compresor :	✓		
Medición de amperaje moto-ventilador :	✓		
Inspección del funcionamiento general de los drenajes:	✓		
Limpieza general de los drenajes:	✓		
Medición de presión del refrigerante:	✓		
Revisión y limpieza de filtros:	✓		
Chequeo y limpieza de los moto-ventiladores:	✓		
Revisión del tablero eléctrico:	✓		
Revisión de la mirilla, filtro secador:	✓		
Inspección de aislamiento térmico:	✓		
Chequeo del sistema de tuberías:	✓		
Revisión evaporadora:	✓		
Revisión tarjeta de control:	✓		
Revisión sensores:	✓		
Revisión termostato	✓		
Unidad Externa general:	✓		
Unidad Externa Interna:	✓		
Otras:			NA

SERGEMAQ

VARIABLE	VALOR	OBSERVACIONES
Presión Alta	210 psi	
Presión Baja	95 psi	
Voltaje Alimentación:	110 v.	
Medición de Amperaje compresor :	9.5 A.	
Medición de amperaje moto-ventilador :	0.6. A.	
Medición de presión del refrigerante:	N/A	

OBSERVACIONES GENERALES
Equipo operativo

PENDIENTES POR COTIZAR

REP. DEL CLIENTE		REP. DE SERGEMAQ	
Nombre	Dayro Oviedo	Nombre	John Vega
Cargo	Apoyo Area Tecnica	Cargo	Tec AA.
Firma	Dayro Oviedo.	Firma	John Vega

SERGEMAQ

DATOS DEL CLIENTE			
CLIENTE	CANAL CAPITAL	FECHA	9-MARZO-2021
TIPO DE MANTENIMIENTO	PREVENTIVO.	HORA INICIO	7:30 AM
CONTACTO	DAYRO OVIEDO	HORA FIN	6:30 PM.

DATOS DEL EQUIPO			
EQUIPO	AIRE ACONDICIONADO	UBICACIÓN	MOVIL GRANDE
MARCA	COLEMAN MACH.	MODELO	48Z030966
POTENCIA	9600 BTU.	SERIAL	1112091 42

CHECK LIST DE ACTIVIDADES			
ACTIVIDAD	SI	NO	DETALLES
Inspección general conductores:	✓		
Inspección general ventiladores:	✓		
Inspección general breakers:	✓		
Inspección general conexiones eléctricas :	✓		
Inspección general conexiones baterías :	✓		
Inspección general conexiones filtros:	✓		
Inspección general conexiones transformadores:	✓		
Inspección general conexiones fusibles:	✓		
Inspección general conexiones terminales in/out:	✓		
Inspección general conexiones distribución:	✓		
Limpieza general:	✓		
Limpieza interna:	✓		
Limpieza externa:	✓		
Verificación de log alarmas:	✓		
Verificación de funcionamiento inversor:	✓		
Verificación de funcionamiento cargador de baterías:	✓		
Verificación de funcionamiento rectificador:	✓		
Verificación de funcionamiento transformador:	✓		
Verificación de funcionamiento etapa de filtrado:	✓		
Verificación de funcionamiento transferencia Automática:	✓		
Actualización de software			NINGUNO

VARIABLE	VALOR	OBSERVACIONES
Presión Alta	192 PSI.	
Presión Baja	91 PSI.	
Voltaje Alimentación:	110 V.	
Medición de Amperaje compresor :	45. Amp.	
Medición de amperaje moto-ventilador :	1 Amp.	
Medición de presión del refrigerante:	N/A	

OBSERVACIONES GENERALES
EQUIPO OPERA EN CONDICIONES NORMALES

PENDIENTES POR COTIZAR

REP. DEL CLIENTE		REP. DE SERGEMAQ	
Nombre	Dayro Oviedo	Nombre	John Vega
Cargo	Apoyo Area tecnica	Cargo	Tecnico AA.
Firma	Dayro Oviedo.	Firma	John Vega.

INFORME TERCERA JORNADA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO

DATOS DEL CLIENTE			
CLIENTE	CANAL CAPITAL	FECHA	09-MARZO-2021
TIPO DE MANTENIMIENTO	PREVENTIVO	HORA INICIO	7:30 AM
CONTACTO	DAYRO OVIEDO	HORA FIN	6:30 PM

DATOS DEL EQUIPO			
EQUIPO	AIRE ACONDICIONADO	UBICACIÓN	CAMION GRANDE WER 613
MARCA	COLEMAN MACH	MODELO	48203C966
POTENCIA	9600 BTU	SERIALES	
SERIALES: 140722252,111219040, 130112141,111209142.			

REGISTRO FOTOGRÁFICO 1



REGISTRO FOTOGRÁFICO 2




REGISTRO FOTOGRÁFICO 3



REGISTRO FOTOGRÁFICO 4



REGISTRO FOTOGRÁFICO 5

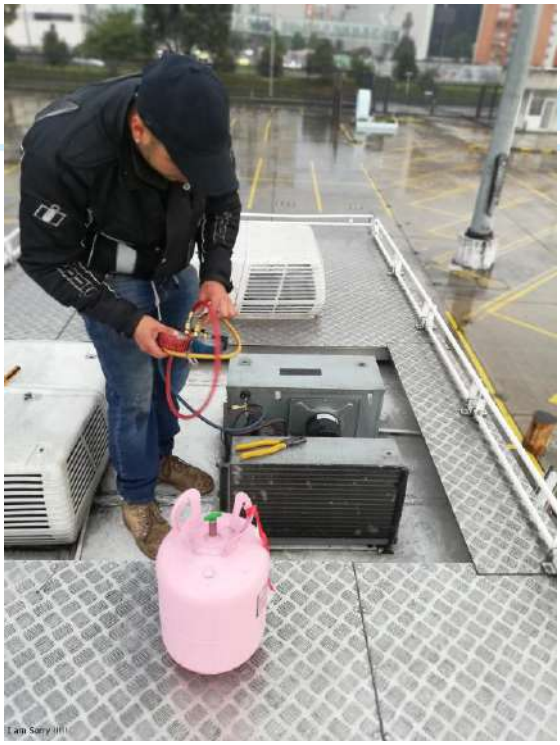

REGISTRO FOTOGRÁFICO 6



REGISTRO FOTOGRÁFICO 7



REGISTRO FOTOGRÁFICO 8



REGISTRO FOTOGRÁFICO 9



REGISTRO FOTOGRÁFICO 10 (AIRE 3)



REGISTRO FOTOGRÁFICO 11 (AIRE 3)



REGISTRO FOTOGRÁFICO 12



REGISTRO FOTOGRÁFICO 13



REGISTRO FOTOGRÁFICO 14



REGISTRO FOTOGRÁFICO 15



SERGEMAQ

DATOS DEL CLIENTE			
CLIENTE	CANAL CAPITAL	FECHA	Marzo 9-2021
TIPO DE MANTENIMIENTO	PREVENTIVO.	HORA INICIO	7:30 AM.
CONTACTO	DAYRO OVIEDO	HORA FIN	6:45 pm.

DATOS DEL EQUIPO			
EQUIPO	AIRE ACONDICIONADO	UBICACIÓN	MOVIL PEQUEÑA
MARCA	COLEMAN MACH.	MODELO	48203-966
POTENCIA	9600 BTU	SERIAL	1301121466.

CHECK LIST DE ACTIVIDADES			
ACTIVIDAD	SI	NO	DETALLES
Limpieza general interior Exterior:	✓		
Revisión del correcto funcionamiento del equipo:	✓		
Inspección eléctrica:	✓		
Medición de consumos de corriente:	✓		
Medición de amperaje compresor :	✓		
Medición de amperaje moto-ventilador :	✓		
Inspección del funcionamiento general de los drenajes:	✓		
Limpieza general de los drenajes:	✓		
Medición de presión del refrigerante:	✓		
Revisión y limpieza de filtros:	✓		
Chequeo y limpieza de los moto-ventiladores:	✓		
Revisión del tablero eléctrico:	✓		
Revisión de la mirilla, filtro secador:	✓		
Inspección de aislamiento térmico:	✓		
Chequeo del sistema de tuberías:	✓		
Revisión evaporadora:	✓		
Revisión tarjeta de control:	✓		
Revisión sensores:	✓		
Revisión termostato	✓		
Unidad Externa general:	✓		
Unidad Externa Interna:	✓		
Otras:			Ninguno

SERGEMAQ

VARIABLE	VALOR	OBSERVACIONES
Presión Alta	200 PSI	
Presión Baja	91 PSI	
Voltaje Alimentación:	110V.	
Medición de Amperaje compresor :	1.45A.	
Medición de amperaje moto-ventilador :	0.62A.	
Medición de presión del refrigerante:	N/D	

OBSERVACIONES GENERALES
Equipo open en condiciones normales

PENDIENTES POR COTIZAR

REP. DEL CLIENTE		REP. DE SERGEMAQ	
Nombre	Dayro Oviedo	Nombre	John Vega
Cargo	Apoyo Area tecnica	Cargo	Tecnico A1
Firma	Dayro Oviedo.	Firma	John Vega.

INFORME TERCERA JORNADA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO

DATOS DEL CLIENTE			
CLIENTE	CANAL CAPITAL	FECHA	MARZO -09-2021
TIPO DE MANTENIMIENTO	PREVENTIVO	HORA INICIO	7:30 AM
CONTACTO	DAYRO OVIEDO	HORA FIN	6:45 PM

DATOS DEL EQUIPO			
EQUIPO	AIRE ACONDICIONADO	UBICACIÓN	UNIDAD MÓVIL PEQUEÑA
MARCA	COLEMAN MACH	MODELO	48204C966
POTENCIA	9600 BTU	SERIAL	130112146

REGISTRO FOTOGRÁFICO 1



REGISTRO FOTOGRÁFICO 2




REGISTRO FOTOGRÁFICO 3



REGISTRO FOTOGRÁFICO 4



REGISTRO FOTOGRÁFICO 5

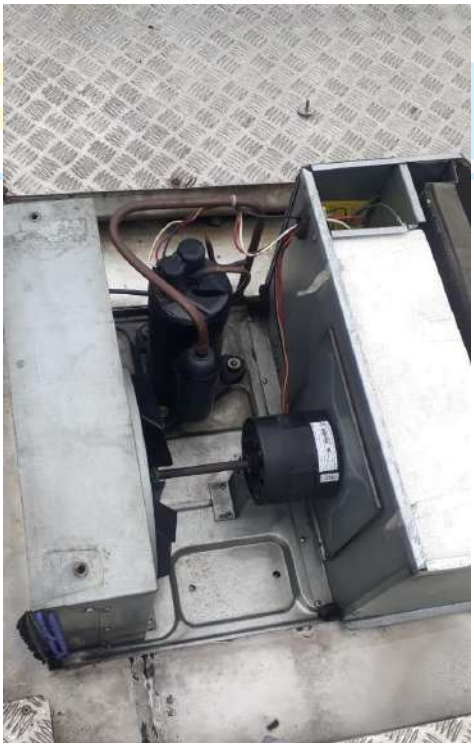

SERGEMAQ

DATOS DEL CLIENTE			
CLIENTE	CANAL CAPITAL	FECHA	8- MARZO 2021
TIPO DE MANTENIMIENTO	PREVENTIVO.	HORA INICIO	8:00 AM.
CONTACTO	DAYRO OVIEDO	HORA FIN	6:00 PM

DATOS DEL EQUIPO			
EQUIPO	AIRE ACONDICIONADO	UBICACIÓN	CUARTO ELECTRICO
MARCA	YORK.	MODELO	BLUE LINE.
POTENCIA	36.000 BTU.	SERIAL	320801570161000002

CHECK LIST DE ACTIVIDADES			
ACTIVIDAD	SI	NO	DETALLES
Limpieza general interior Exterior:	✓		
Revisión del correcto funcionamiento del equipo:	✓		
Inspección eléctrica:	✓		
Medición de consumos de corriente:	✓		
Medición de amperaje compresor :	✓		
Medición de amperaje moto-ventilador :	✓		
Inspección del funcionamiento general de los drenajes:	✓		
Limpieza general de los drenajes:	✓		
Medición de presión del refrigerante:	✓		
Revisión y limpieza de filtros:	✓		
Chequeo y limpieza de los moto-ventiladores:	✓		
Revisión del tablero eléctrico:	✓		
Revisión de la mirilla, filtro secador:	✓		
Inspección de aislamiento térmico:	✓		
Chequeo del sistema de tuberías:	✓		
Revisión evaporadora:	✓		
Revisión tarjeta de control:	✓		
Revisión sensores:	✓		
Revisión termostato	✓		
Unidad Externa general:	✓		
Unidad Externa Interna:	✓		
Otras:			Ninguno

SERGEMAQ

VARIABLE	VALOR	OBSERVACIONES
Presión Alta	222 PIS.	
Presión Baja	106 PS.	
Voltaje Alimentación:	220 V.	
Medición de Amperaje compresor :	4.9 A.	
Medición de amperaje moto-ventilador :	0.8 A	
Medición de presión del refrigerante:	N/A	

OBSERVACIONES GENERALES
Equipo Operativo

PENDIENTES POR COTIZAR

Escriba el texto aquí

REP. DEL CLIENTE		REP. DE SERGEMAQ	
Nombre	Dayro Oviedo	Nombre	John Vega
Cargo	Apoyo Area Tecnica	Cargo	Tecnico AA.
Firma	Dayro Oviedo.	Firma	John Vega

SERGEMAQ

INFORME TERCERA JORNADA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO

DATOS DEL CLIENTE			
CLIENTE	CANAL CAPITAL	FECHA	08-MARZO-2021
TIPO DE MANTENIMIENTO	PREVENTIVO	HORA INICIO	08:00 AM
CONTACTO	DAYRO OVIEDO	HORA FIN	06:00 PM

DATOS DEL EQUIPO			
EQUIPO	AIRE ACONDICIONADO	UBICACIÓN	CUARTO ELECTRICO
MARCA	YORK	MODELO	BLUE LINE
POTENCIA	36000 BTU	SERIAL	320801570161000002

REGISTRO FOTOGRÁFICO 1



REGISTRO FOTOGRÁFICO 2



REGISTRO FOTOGRÁFICO 3



REGISTRO FOTOGRÁFICO 4



REGISTRO FOTOGRÁFICO 5



REGISTRO FOTOGRÁFICO 6



REGISTRO FOTOGRÁFICO 7



SERGEMAQ

DATOS DEL CLIENTE			
CLIENTE	CANAL CAPITAL	FECHA	8-MARZO-2021
TIPO DE MANTENIMIENTO	PREVENTIVO	HORA INICIO	8:00 AM
CONTACTO	DAIRO OVIEDO	HORA FIN	6:00 P.M

DATOS DEL EQUIPO			
EQUIPO	AIRE ACONDICIONADO	UBICACIÓN	TRICASTER
MARCA	YORK	MODELO	H3C3120A2S.A.
POTENCIA	36000 BTU	SERIAL	6273266

CHECK LIST DE ACTIVIDADES			
ACTIVIDAD	SI	NO	DETALLES
Limpieza general interior Exterior:	✓		
Revisión del correcto funcionamiento del equipo:	✓		
Inspección eléctrica:	✓		
Medición de consumos de corriente:	✓		
Medición de amperaje compresor :	✓		
Medición de amperaje moto-ventilador :	✓		
Inspección del funcionamiento general de los drenajes:	✓		
Limpieza general de los drenajes:	✓		
Medición de presión del refrigerante:	✓		
Revisión y limpieza de filtros:	✓		
Chequeo y limpieza de los moto-ventiladores:	✓		
Revisión del tablero eléctrico:	✓		
Revisión de la mirilla, filtro secador:	✓		
Inspección de aislamiento térmico:	✓		
Chequeo del sistema de tuberías:	✓		
Revisión evaporadora:	✓		
Revisión tarjeta de control:	✓		
Revisión sensores:	✓		
Revisión termostato	✓		
Unidad Externa general:	✓		
Unidad Externa Interna:	✓		
Otras:			Ninguno

VARIABLE	VALOR	OBSERVACIONES
Presión Alta	200 PSI	
Presión Baja	61 PSI	
Voltaje Alimentación:	220V	
Medición de Amperaje compresor :	7.6A.	
Medición de amperaje moto-ventilador :	1.6A	
Medición de presión del refrigerante:	N/A	

OBSERVACIONES GENERALES
Equipo operativo.

PENDIENTES POR COTIZAR

REP. DEL CLIENTE		REP. DE SERGEMAQ	
Nombre	Dayro Oviedo	Nombre	John Vega
Cargo	Apoyo Area Tecnica	Cargo	Tecnico A.A
Firma	Dayro Oviedo.	Firma	John vega

INFORME TERCERA JORNADA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO

DATOS DEL CLIENTE			
CLIENTE	CANAL CAPITAL	FECHA	8-MARZO-2021
TIPO DE MANTENIMIENTO	PREVENTIVO	HORA INICIO	8:00 AM
CONTACTO	DAYRO OVIEDO	HORA FIN	6:00 PM

DATOS DEL EQUIPO			
EQUIPO	AIRE ACONDICIONADO	UBICACIÓN	TRICASTER
MARCA	YORK	MODELO	H3CE120A25A
POTENCIA	36000 BTU	SERIAL	6273266

REGISTRO FOTOGRÁFICO 1



REGISTRO FOTOGRÁFICO 2



REGISTRO FOTOGRÁFICO 3



REGISTRO FOTOGRÁFICO 4



REGISTRO FOTOGRÁFICO 4



REGISTRO FOTOGRÁFICO 5



REGISTRO FOTOGRÁFICO 7



SERGEMAQ

DATOS DEL CLIENTE			
CLIENTE	CANAL CAPITAL	FECHA	8-MAR-2021
TIPO DE MANTENIMIENTO	PREVENTIVO.	HORA INICIO	8:00 AM
CONTACTO	DAYRO OVIEDO.	HORA FIN	6:00 PM

DATOS DEL EQUIPO			
EQUIPO	AIRE ACONDICIONADO	UBICACIÓN	STI TEMAS
MARCA	MANE	MODELO	4TTB330 36EY000 AA
POTENCIA	36000 BTU	SERIAL	122000773041 320360005

CHECK LIST DE ACTIVIDADES			
ACTIVIDAD	SI	NO	DETALLES
Limpieza general interior Exterior:	✓		
Revisión del correcto funcionamiento del equipo:	✓		
Inspección eléctrica:	✓		
Medición de consumos de corriente:	✓		
Medición de amperaje compresor :	✓		
Medición de amperaje moto-ventilador :	✓		
Inspección del funcionamiento general de los drenajes:	✓		
Limpieza general de los drenajes:	✓		
Medición de presión del refrigerante:	✓		
Revisión y limpieza de filtros:	✓		
Chequeo y limpieza de los moto-ventiladores:	✓		
Revisión del tablero eléctrico:	✓		
Revisión de la mirilla, filtro secador:	✓		
Inspección de aislamiento térmico:	✓		
Chequeo del sistema de tuberías:	✓		
Revisión evaporadora:	✓		
Revisión tarjeta de control:	✓		
Revisión sensores:	✓		
Revisión termostato	✓		
Unidad Externa general:	✓		
Unidad Externa Interna:	✓		
Otras:			Ninguno

SERGEMAQ

VARIABLE	VALOR	OBSERVACIONES
Presión Alta	222 psi	
Presión Baja	106 psi	
Voltaje Alimentación:	223 psi	
Medición de Amperaje compresor :	4.2 A.	
Medición de amperaje moto-ventilador :	0.9 A	
Medición de presión del refrigerante:	N/A	

OBSERVACIONES GENERALES
Equipo operativo

PENDIENTES POR COTIZAR

REP. DEL CLIENTE		REP. DE SERGEMAQ	
Nombre	Dayro Oviedo	Nombre	John Vega
Cargo	Apoyo area Tecnica	Cargo	Tecnico AA
Firma	Dayro Oviedo.	Firma	John Vega

INFORME TERCERA JORNADA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO


DATOS DEL CLIENTE			
CLIENTE	CANAL CAPITAL	FECHA	8-MARZO-2021
TIPO DE MANTENIMIENTO	PREVENTIVO	HORA INICIO	8:00 AM
CONTACTO	DAYRO OVIEDO	HORA FIN	6:00 PM

DATOS DEL EQUIPO			
EQUIPO	AIRE ACONDICIONADO	UBICACIÓN	SISTEMAS
MARCA	TRANE	MODELO	4TTB3036E1000AA
POTENCIA	36.000 BTU	SERIAL	1220000772041520360005

REGISTRO FOTOGRÁFICO 1




REGISTRO FOTOGRÁFICO 2

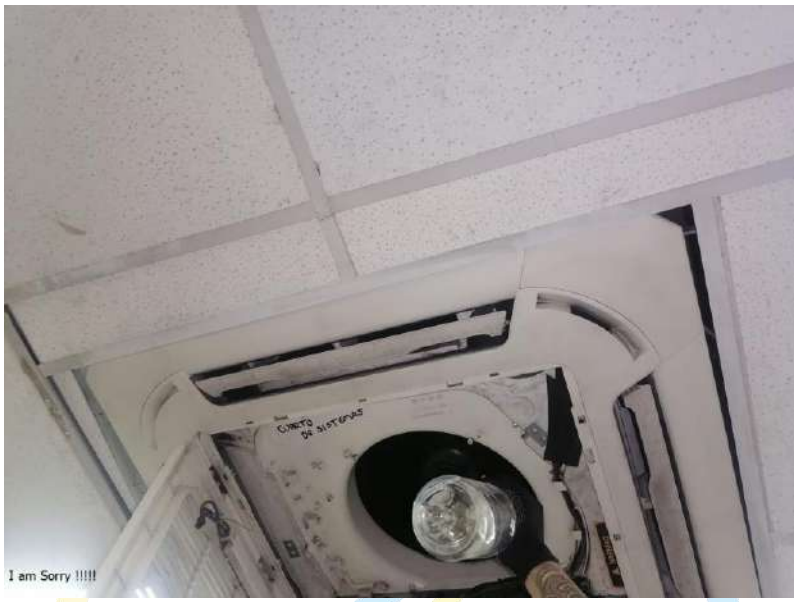

REGISTRO FOTOGRÁFICO 3



REGISTRO FOTOGRÁFICO 4

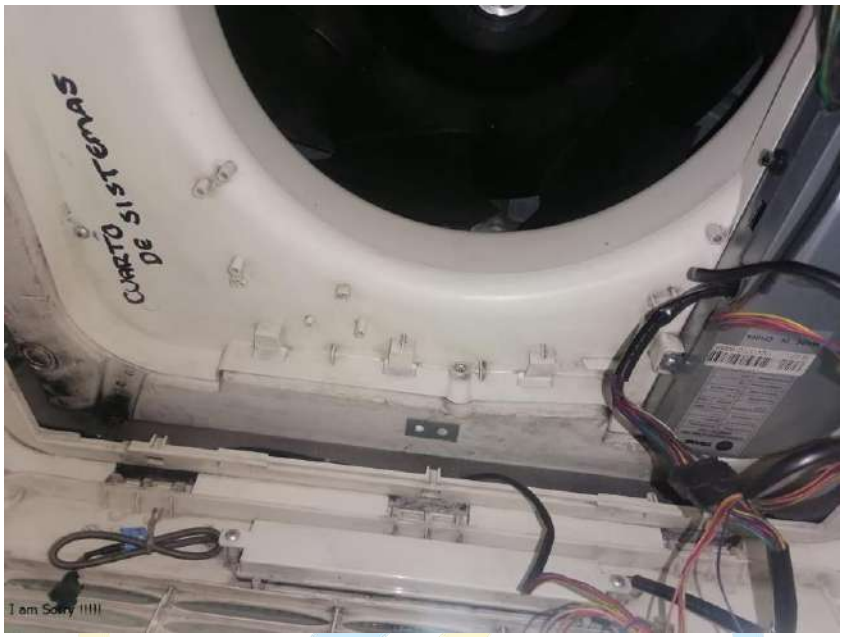

REGISTRO FOTOGRÁFICO 5



SERGEMAQ

DATOS DEL CLIENTE			
CLIENTE	CANAL CAPITAL	FECHA	4 - MARZO - 2021
TIPO DE MANTENIMIENTO	PREVENTIVO.	HORA INICIO	1:30 PM.
CONTACTO	DAYAN OVIEDO	HORA FIN	3:00 PM.

DATOS DEL EQUIPO			
EQUIPO	GENERADOR ELECTRICO	UBICACIÓN	CANAL CAPITAL
MARCA	HONDA.	MODELO	EU 1000
POTENCIA	1000 KA.	SERIAL	E76A

CHECK LIST DE ACTIVIDADES			
ACTIVIDAD	SI	NO	DETALLES
Limpieza general, des-engrase de motor, y tráiler.	✓		
Lavado de tanque:			LIMPIEZA
Lavado de radiador:			N/A
Chequeo eléctrico: fusibles, condensadores, diodos, SCR, ETC	✓		
Calibración general:	✓		
Cambio de elementos menores:	.		N/A
Mediciones de Voltajes sin carga :	✓		SI.
Mediciones de Voltajes con carga :	✓		SI
Mediciones de corrientes con carga :	✓		SI
Mediciones de corrientes con carga :	✓		SI.
Verificación de alarmas panel de control:	✓		
Verificación de eventos panel de control:	✓		
Verificación bomba de combustible	✓		
Verificación Bomba de inyección	✓		
Cambio de Filtros de Aire:	✓		LIMPIEZA
Cambio de Filtros de Aceite:	✓		LIMPIEZA
Cambio de Filtros de Combustible:	✓		
Cambio de Aceite:	✓		20W/30
Cambio refrigerante:			N/A.
Verificación funcionamiento generador	✓		
Verificación funcionamiento Motor	✓		
Verificación Tablero instrumentos o panel de control			N/A

SERGEMAQ

VARIABLE	MEDICIONES A LA SALIDA SIN CARGA	MEDICIONES A LA SALIDA CON CARGA
L1-N	127v	127v.
L2-N	N/A	N/A
L3-N	N/A	N/A
I 1	Ø.	3.5A.
I 2	N/A	N/A
I 3	N/A	N/A
NEUTRO-TIERRA	0V.	0V.
CARGADOR DE BATERÍAS	N/A.	N/A.
BATERÍAS	N/A	N/A

OBSERVACIONES GENERALES
EQUIPO operativo

PENDIENTES POR COTIZAR
Ninguno

REP. DEL CLIENTE		REP. DE SERGEMAQ	
Nombre	Dayro oviedo	Nombre	Manuel Corredor
Cargo	Apoyo area tecnica	Cargo	TEC. P.E.
Firma	Dayro Oviedo.	Firma	Manuel Corredor

SERGEMAQ

INFORME TERCERA JORNADA MANTENIMIENTO PREVENTIVO

DATOS DEL CLIENTE			
CLIENTE	CANAL CAPITAL	FECHA	9-MARZO-2021
TIPO DE MANTENIMIENTO	PREVENTIVO	HORA INICIO	1:30 PM
CONTACTO	DAYRO OVIEDO	HORA FIN	3:00 PM

DATOS DEL EQUIPO			
EQUIPO	GENERADOR ELECTRICO	UBICACIÓN	CANAL CAPITAL
MARCA	HONDA	MODELO	EU 1000
POTENCIA	1000 VA	SERIAL	E76A

REGISTRO FOTOGRÁFICO 1



REGISTRO FOTOGRÁFICO 2



REGISTRO FOTOGRÁFICO 3



REGISTRO FOTOGRÁFICO 4



REGISTRO FOTOGRÁFICO 5



SERGEMAQ

DATOS DEL CLIENTE			
CLIENTE	CANAL CAPITAL	FECHA	4- MARZO -2021
TIPO DE MANTENIMIENTO	PREVENTIVO.	HORA INICIO	3:30 PM.
CONTACTO	DAYRO OVIEDO	HORA FIN	4:30 PM.

DATOS DEL EQUIPO			
EQUIPO	GENERADOR ELECTRICO	UBICACIÓN	CANAL CAPITAL
MARCA	HONDA.	MODELO	EU 2000
POTENCIA	2000 VA	SERIAL	SIN SERIAL

CHECK LIST DE ACTIVIDADES			
ACTIVIDAD	SI	NO	DETALLES
Limpieza general, des-engrase de motor, y tráiler.	✓		
Lavado de tanque:	SD.		LIMPIEZA.
Lavado de radiador:			N/A
Chequeo eléctrico: fusibles, condensadores, diodos, SCR, ETC	✓		
Calibración general:	✓		Fo 60 Hz
Cambio de elementos menores:			NO.
Mediciones de Voltajes sin carga :	SI		
Mediciones de Voltajes con carga :	SI		
Mediciones de corrientes con carga :	SI		
Mediciones de corrientes con carga :	SI		
Verificación de alarmas panel de control:	SI		NINGUNA
Verificación de eventos panel de control:			N/A
Verificación bomba de combustible	✓		
Verificación Bomba de inyección	✓		
Cambio de Filtros de Aire:	✓		LIMPIEZA
Cambio de Filtros de Aceite:	✓		LIMPIEZ.
Cambio de Filtros de Combustible:	✓		LIMPIEZA
Cambio de Aceite:	✓		20W/30.
Cambio refrigerante:			N/A
Verificación funcionamiento generador	✓		
Verificación funcionamiento Motor	✓		
Verificación Tablero instrumentos o panel de control			N/A

SERGEMAQ

VARIABLE	MEDICIONES A LA SALIDA SIN CARGA	MEDICIONES A LA SALIDA CON CARGA
L1-N	122 V	121V.
L2-N	N/A	N/A
L3-N	N/A	N/A.
I 1	0 A.	4.5 Amp.
I 2	N/A	N/A
I 3	N/A	N/A
NEUTRO-TIERRA	0 V.	0V.
CARGADOR DE BATERÍAS	N/A	N/A.
BATERÍAS	N/A	N/A

OBSERVACIONES GENERALES
EQUIPO OPERATIVO

PENDIENTES POR COTIZAR
NINGUNO.

REP. DEL CLIENTE		REP. DE SERGEMAQ	
Nombre	Dayro Oviedo	Nombre	Manuel Corredor
Cargo	Apoyo Area Tecnica	Cargo	TCC. P.E.
Firma	Dayro Oviedo.	Firma	Manuel Corredor.

Escriba el texto aquí

SERGEMAQ

INFORME TERCERA JORNADA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO

DATOS DEL CLIENTE			
CLIENTE	CANAL CAPITAL	FECHA	9 de marzo de 2021
TIPO DE MANTENIMIENTO	PREVENTIVO	HORA INICIO	3:30 pm
CONTACTO	DAYRO OVIEDO	HORA FIN	4:30 pm

DATOS DEL EQUIPO			
EQUIPO	GENERADOR ELECTRICO	UBICACIÓN	CANAL CAPITAL
MARCA	HONDA	MODELO	EU 2000
POTENCIA	2000	SERIAL	SIN SERIAL

REGISTRO FOTOGRÁFICO 1



REGISTRO FOTOGRÁFICO 2



REGISTRO FOTOGRÁFICO 3



REGISTRO FOTOGRÁFICO 4



REGISTRO FOTOGRÁFICO 5



SERGEMAQ

DATOS DEL CLIENTE			
CLIENTE	CANAL CAPITAL.	FECHA	9-MARZO-2021
TIPO DE MANTENIMIENTO	PREVENTIVO.	HORA INICIO	9:00 AM
CONTACTO	DAYRO OVIEDO	HORA FIN	10:45. AM.

DATOS DEL EQUIPO			
EQUIPO	Generador Electrico	UBICACIÓN	AV Cra 66 63
MARCA	MODASA.	MODELO	MP451
POTENCIA	92 KVA	SERIAL	X13286.

CHECK LIST DE ACTIVIDADES			
ACTIVIDAD	SI	NO	DETALLES
Limpieza general, des-engrase de motor, y tráiler.	✓		
Lavado de tanque:	✓		
Lavado de radiador:		X	
Chequeo eléctrico: fusibles, condensadores, diodos, SCR, ETC	✓		
Calibración general:	✓		FO. 61.5 · 1833 RPM.
Cambio de elementos menores:		X	
Mediciones de Voltajes sin carga :	✓		
Mediciones de Voltajes con carga :	✓		
Mediciones de corrientes con carga :	✓		
Mediciones de corrientes con carga :	✓		
Verificación de alarmas panel de control:	✓		
Verificación de eventos panel de control:	✓		
Verificación bomba de combustible	✓		
Verificación Bomba de inyección	✓		
Cambio de Filtros de Aire:	✓		DA 2922
Cambio de Filtros de Aceite:	✓		CLA 3542
Cambio de Filtros de Combustible:	✓		A 2660163
Cambio de Aceite:	✓		MOBILDELVAC 20W/40.
Cambio refrigerante:	✓		LLENADO ANTES
Verificación funcionamiento generador	✓		
Verificación funcionamiento Motor	✓		
Verificación Tablero instrumentos o panel de control	✓		NINGUNA ALARMA

SERGEMAQ

VARIABLE	MEDICIONES A LA SALIDA SIN CARGA	MEDICIONES A LA SALIDA CON CARGA
L1-N	125.5 V	125. V
L2-N	125.8 V.	125. V
L3-N	125.5 V	125 V.
I 1	ϕ	3.8 A
I 2	ϕ	3.6 A
I 3	ϕ.	2.9 A
NEUTRO-TIERRA	ϕ V.	ϕ.
CARGADOR DE BATERÍAS	13.6. V	13.6. V
BATERÍAS	13.2 V.	13.2. V

OBSERVACIONES GENERALES
Equipo operativo.

PENDIENTES POR COTIZAR
Ninguno

REP. DEL CLIENTE		REP. DE SERGEMAQ	
Nombre	Dayro Oviedo	Nombre	Manuel Corredor
Cargo	Apoyo Area tecnica	Cargo	tecnico PG
Firma	Dayro Oviedo	Firma	Manuel Corredor.

Escriba el texto aquí

SERGEMAQ

INFORME TERCERA JORNADA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO

DATOS DEL CLIENTE			
CLIENTE	CANAL CAPITAL	FECHA	9-MARZO-2021
TIPO DE MANTENIMIENTO	PREVENTIVO	HORA INICIO	9:00 AM
CONTACTO	DAYRO OVIEDO	HORA FIN	10:45 AM

DATOS DEL EQUIPO			
EQUIPO	GENERADOR ELECTRICO	UBICACIÓN	AV EL DORADO #66-63
MARCA	MODASA	MODELO	MP 451
POTENCIA	42 KVA	SERIAL	X 13286

REGISTRO FOTOGRÁFICO 1



REGISTRO FOTOGRÁFICO 2



REGISTRO FOTOGRÁFICO 3



REGISTRO FOTOGRÁFICO 4



REGISTRO FOTOGRÁFICO 5



REGISTRO FOTOGRÁFICO 6



REGISTRO FOTOGRÁFICO 7



SERGEMAQ

DATOS DEL CLIENTE			
CLIENTE	CANAL CAPITAL	FECHA	9- MARZO 2021
TIPO DE MANTENIMIENTO	PREVENTIVO.	HORA INICIO	11:00 AM
CONTACTO	DAYRO OVIEDO	HORA FIN	1:15 PM.

DATOS DEL EQUIPO			
EQUIPO	Generador electrico	UBICACIÓN	AV C/ Dorado 66-63
MARCA	power LINK	MODELO	GMP45664S
POTENCIA	45 KVA	SERIAL	PL6335

CHECK LIST DE ACTIVIDADES			
ACTIVIDAD	SI	NO	DETALLES
Limpieza general, des-engrase de motor, y tráiler.	✓		
Lavado de tanque:	✓		
Lavado de radiador:		X	
Chequeo eléctrico: fusibles, condensadores, diodos, SCR, ETC	✓		
Calibración general:	✓		61.5 Hz
Cambio de elementos menores:		X	
Mediciones de Voltajes sin carga :	✓		
Mediciones de Voltajes con carga :	✓		
Mediciones de corrientes con carga :	✓		
Mediciones de corrientes con carga :	✓		
Verificación de alarmas panel de control:	✓		Ninguna
Verificación de eventos panel de control:	✓		Ninguna
Verificación bomba de combustible	✓		
Verificación Bomba de inyección	✓		
Cambio de Filtros de Aire:	✓		CLAAS
Cambio de Filtros de Aceite:	✓		3T 427
Cambio de Filtros de Combustible:	✓		BF 988
Cambio de Aceite:	✓		MOBIL DELVAC 20W/40
Cambio refrigerante:	✓		Llenado nivel
Verificación funcionamiento generador	✓		
Verificación funcionamiento Motor	✓		
Verificación Tablero instrumentos o panel de control	✓		

SERGEMAQ

VARIABLE	MEDICIONES A LA SALIDA SIN CARGA	MEDICIONES A LA SALIDA CON CARGA
L1-N	122V	121 V
L2-N	122V	121 V
L3-N	122V	121V.
I 1	0 A	3.2 A.
I 2	0 A	3.1 A.
I 3	0 A.	3.8 A.
NEUTRO-TIERRA	0V.	0 V
CARGADOR DE BATERÍAS	14.2 V	14.2 V
BATERÍAS	13.6.V	13.8 V

OBSERVACIONES GENERALES
Equipo Operativo

PENDIENTES POR COTIZAR
Ninguno

REP. DEL CLIENTE		REP. DE SERGEMAQ	
Nombre	Dayro Oviedo	Nombre	Manuel Cordero
Cargo	Apoyo area Tecnica	Cargo	TCE. PC.
Firma	Dayro Oviedo	Firma	Manuel Cordero

Escriba el texto aquí


SERGEMAQ

INFORME TERCERA JORNADA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO

DATOS DEL CLIENTE			
CLIENTE	CANAL CAPITAL	FECHA	9-MARZO-2021
TIPO DE MANTENIMIENTO	PREVENTIVO	HORA INICIO	11:00 AM
CONTACTO	DAYRO OVIEDO	HORA FIN	1:15 PM

DATOS DEL EQUIPO			
EQUIPO	GENERADOR ELECTRICO	UBICACIÓN	CANAL CAPITAL
MARCA	POWER LINK	MODELO	GMP45C645
POTENCIA	45 KVA	SERIAL	PLG335

REGISTRO FOTOGRÁFICO 1

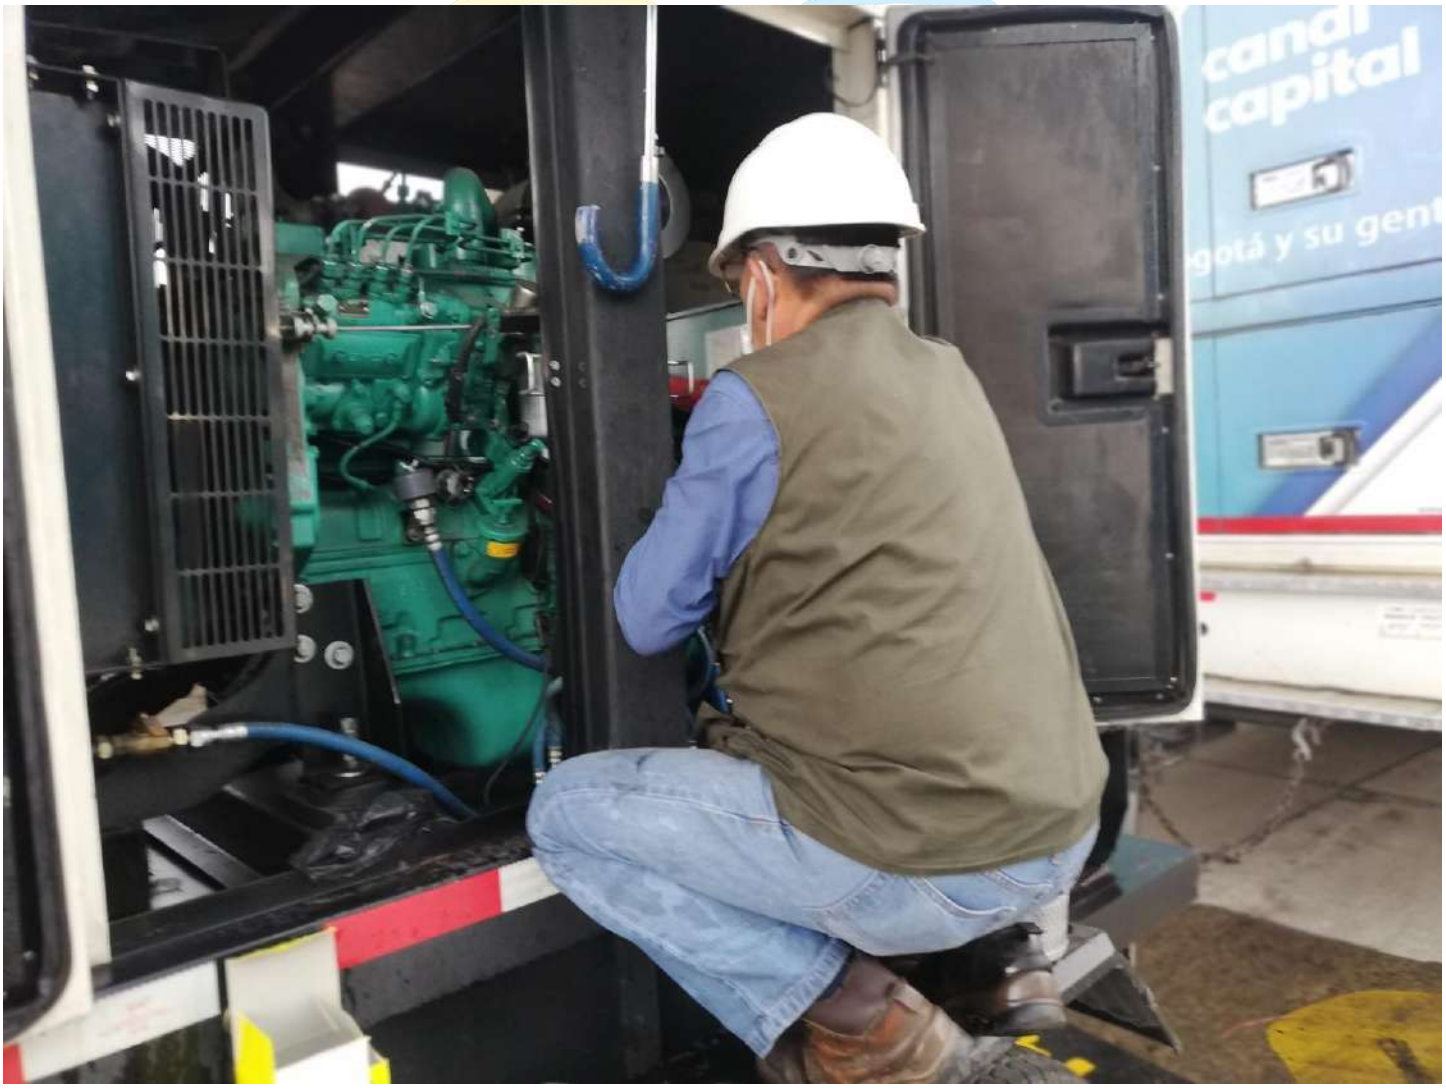

REGISTRO FOTOGRÁFICO 2



REGISTRO FOTOGRÁFICO 3



REGISTRO FOTOGRÁFICO 4



REGISTRO FOTOGRÁFICO 5



REGISTRO FOTOGRÁFICO 6



REGISTRO FOTOGRÁFICO 7



SERGEMAQ

DATOS DEL CLIENTE			
CLIENTE	CANAL CAPITAL	FECHA	9-MARZO-2021
TIPO DE MANTENIMIENTO	PREVENTIVO.	HORA INICIO	4:30. PM
CONTACTO	DAYRO OVIEDO	HORA FIN	6:45. PM.

DATOS DEL EQUIPO			
EQUIPO	Generador Electrico	UBICACIÓN	Canal Capital
MARCA	Kohler.	MODELO	50R7758
POTENCIA	50 KVA	SERIAL	39613

CHECK LIST DE ACTIVIDADES			
ACTIVIDAD	SI	NO	DETALLES
Limpieza general, des-engrase de motor, y tráiler.	✓		
Lavado de tanque:		X	
Lavado de radiador:	✓		
Chequeo eléctrico: fusibles, condensadores, diodos, SCR, ETC	✓		
Calibración general:	✓		Fo 62 Hz
Cambio de elementos menores:			Perno tempentum
Mediciones de Voltajes sin carga :	✓		
Mediciones de Voltajes con carga :	✓		
Mediciones de corrientes con carga :	✓		
Mediciones de corrientes con carga :	✓		
Verificación de alarmas panel de control:	✓		
Verificación de eventos panel de control:	✓		
Verificación bomba de combustible	✓		
Verificación Bomba de inyección	✓		
Cambio de Filtros de Aire:	✓		AIP 540
Cambio de Filtros de Aceite:	✓		BT259
Cambio de Filtros de Combustible:	✓		D346
Cambio de Aceite:	✓		MOVIL DELVAC 15W/40
Cambio refrigerante:	✓		5T.
Verificación funcionamiento generador	✓		
Verificación funcionamiento Motor	✓		
Verificación Tablero instrumentos o panel de control	✓		

SERGEMAQ

VARIABLE	MEDICIONES A LA SALIDA SIN CARGA	MEDICIONES A LA SALIDA CON CARGA
L1-N	127V	127V
L2-N	127V	127V
L3-N	127V	127V
I 1	N/A	3.1A
I 2	N/A	2.9A
I 3	N/A	1.8A
NEUTRO-TIERRA	0V.	0V.
CARGADOR DE BATERÍAS	13.8V.	13.8V
BATERÍAS	13.2V.	13.2V

OBSERVACIONES GENERALES
Equipo operativo.

PENDIENTES POR COTIZAR
Ninguno.

REP. DEL CLIENTE		REP. DE SERGEMAQ	
Nombre	Dayro Oviedo	Nombre	Manuel Corredor.
Cargo	Apoyo Area Tecnica	Cargo	TCC. P6
Firma	Dayro Oviedo.	Firma	Manuel Corredor

Escriba el texto aquí

INFORME TERCERA JORNADA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO

DATOS DEL CLIENTE			
CLIENTE	CANAL CAPITAL	FECHA	9 de marzo de 2021
TIPO DE MANTENIMIENTO	PREVENTIVO	HORA INICIO	4.30 PM
CONTACTO	DAYRO OVIEDO	HORA FIN	6:45 PM

DATOS DEL EQUIPO			
EQUIPO	GENERADOR ELECTRICO	UBICACIÓN	AV EL DORADO #66-63
MARCA	KOHLER	MODELO	50R 7758
POTENCIA	50 KVA	SERIAL	39613

REGISTRO FOTOGRÁFICO 1



REGISTRO FOTOGRÁFICO 2



REGISTRO FOTOGRÁFICO 3



REGISTRO FOTOGRÁFICO 4



REGISTRO FOTOGRÁFICO 5



REGISTRO FOTOGRÁFICO 6



REGISTRO FOTOGRÁFICO 7



REGISTRO FOTOGRÁFICO 8



REGISTRO FOTOGRÁFICO 9



SERGEMAQ

DATOS DEL CLIENTE			
CLIENTE	CANAL CAPITAL	FECHA	9-MARZO-2021
TIPO DE MANTENIMIENTO	PREVENTIVO.	HORA INICIO	6:30 AM
CONTACTO	DAYRO OVIEDO.	HORA FIN	8:40. PM.

DATOS DEL EQUIPO			
EQUIPO	Generador Electrico	UBICACIÓN	Ferreteria AV Dor. 66-63
MARCA	Lister peter.	MODELO	IPW00081
POTENCIA	21 KVA.	SERIAL	C084511

CHECK LIST DE ACTIVIDADES			
ACTIVIDAD	SI	NO	DETALLES
Limpieza general, des-engrase de motor, y tráiler.	✓		
Lavado de tanque:		X	
Lavado de radiador:		X	
Chequeo eléctrico: fusibles, condensadores, diodos, SCR, ETC	✓		
Calibración general:	✓		70-60 HZ
Cambio de elementos menores:		X	
Mediciones de Voltajes sin carga :	✓		
Mediciones de Voltajes con carga :	✓		
Mediciones de corrientes con carga :	✓		
Mediciones de corrientes con carga :	✓		
Verificación de alarmas panel de control:	✓		N.N/N
Verificación de eventos panel de control:	✓		N.N/N
Verificación bomba de combustible	✓		
Verificación Bomba de inyección	✓		
Cambio de Filtros de Aire:	✓		B22.43002
Cambio de Filtros de Aceite:	✓		BF.7221
Cambio de Filtros de Combustible:	✓		BFP.2481
Cambio de Aceite:	✓		MOBILGEAR 20W/40.
Cambio refrigerante:	✓		
Verificación funcionamiento generador	✓		
Verificación funcionamiento Motor	✓		
Verificación Tablero instrumentos o panel de control	✓		

SERGEMAQ

VARIABLE	MEDICIONES A LA SALIDA SIN CARGA	MEDICIONES A LA SALIDA CON CARGA
L1-N	122V	120 V
L2-N	122 V.	121 V
L3-N	121 V.	121 V
I 1	Ø	Ø
I 2	Ø	Ø
I 3	0.	Ø.
NEUTRO-TIERRA	0.54 V.	0.54 V.
CARGADOR DE BATERÍAS	13.6 V.	13.6 V.
BATERÍAS	12.8 V	12.8 V

OBSERVACIONES GENERALES
Equipo Operativo

PENDIENTES POR COTIZAR
Ninguno

REP. DEL CLIENTE		REP. DE SERGEMAQ	
Nombre	Dayro Oviedo	Nombre	Manuel Corredor
Cargo	Apoyo Area tecnica	Cargo	TEC. PC.
Firma	Dayro Oviedo.	Firma	Manuel Corredor.

SERGEMAQ

INFORME TERCERA JORNADA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO

DATOS DEL CLIENTE			
CLIENTE	CANAL CAPITAL	FECHA	9-MARZO-2021
TIPO DE MANTENIMIENTO	PREVENTIVO	HORA INICIO	06:30 AM
CONTACTO	DAYRO OVIEDO	HORA FIN	8:40 AM

DATOS DEL EQUIPO			
EQUIPO	GENERADOR ELECTRICO	UBICACIÓN	AV EL DORADO #66-63
MARCA	LISTER -PETTER	MODELO	IPW4A081
POTENCIA	21 KVA	SERIAL	C084511

REGISTRO FOTOGRÁFICO 1



REGISTRO FOTOGRÁFICO 2



REGISTRO FOTOGRÁFICO 3



REGISTRO FOTOGRÁFICO 4



REGISTRO FOTOGRÁFICO 5



REGISTRO FOTOGRÁFICO 7



REGISTRO FOTOGRÁFICO 8



SERGEMAQ

DATOS DEL CLIENTE			
CLIENTE	CAMM CAPITAL	FECHA	12-MARZO-2021
TIPO DE MANTENIMIENTO	PREVENTIVO	HORA INICIO	7:30 AM
CONTACTO	DAYRO OVIEDO	HORA FIN	11:45 AM

DATOS DEL EQUIPO			
EQUIPO	Generador Electrico	UBICACIÓN	Cerro Monzui
MARCA	PEMENS.	MODELO	MD451
POTENCIA	150 KVA	SERIAL	C071720103

CHECK LIST DE ACTIVIDADES			
ACTIVIDAD	SI	NO	DETALLES
Limpieza general, des-engrase de motor, y tráiler.	✓		
Lavado de tanque:		X	
Lavado de radiador:		X	
Chequeo eléctrico: fusibles, condensadores, diodos, SCR, ETC	✓		
Calibración general:	✓		FO 60HZ
Cambio de elementos menores:	✓	X	
Mediciones de Voltajes sin carga :	✓		
Mediciones de Voltajes con carga :	✓		
Mediciones de corrientes con carga :	✓		
Mediciones de corrientes con carga :	✓		
Verificación de alarmas panel de control:	✓		
Verificación de eventos panel de control:	✓		
Verificación bomba de combustible	✓		
Verificación Bomba de inyección	✓		
Cambio de Filtros de Aire:	✓		AF1541.
Cambio de Filtros de Aceite:	✓		LFP.2292(2).
Cambio de Filtros de Combustible:	✓		BF7674(2)
Cambio de Aceite:	✓		MOBILDELVAC1SW/40
Cambio refrigerante:	✓		LLENADO ANTES
Verificación funcionamiento generador	✓		
Verificación funcionamiento Motor	✓		
Verificación Tablero instrumentos o panel de control	✓		

SERGEMAQ

VARIABLE	MEDICIONES A LA SALIDA SIN CARGA	MEDICIONES A LA SALIDA CON CARGA
L1-N	126V	126V
L2-N	126V	126V
L3-N	126.8V.	126.5V.
I 1	Ø	8.2A
I 2	Ø	8.9A
I 3	Ø	6.7A.
NEUTRO-TIERRA	0.4V.	0.4V.
CARGADOR DE BATERÍAS	25.2V	25.2V
BATERÍAS	24.3.	24.3V

OBSERVACIONES GENERALES
Equipo operativo.

PENDIENTES POR COTIZAR
Amperimetro. Analogo.

REP. DEL CLIENTE		REP. DE SERGEMAQ	
Nombre	Dayro Oviedo	Nombre	Manuel Conedor
Cargo	Apoyo Area Tecnica	Cargo	TECNICO
Firma	Dayro Oviedo.	Firma	Manuel Conedor

Escriba el texto aquí


SERGEMAQ

INFORME TERCERA JORNADA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO

DATOS DEL CLIENTE			
CLIENTE	CANAL CAPITAL	FECHA	12-MARZO-2021
TIPO DE MANTENIMIENTO	PREVENTIVO	HORA INICIO	7:30 AM
CONTACTO	DAYRO OVIEDO	HORA FIN	11:45 AM

DATOS DEL EQUIPO			
EQUIPO	GENERADOR ELECTRICO	UBICACIÓN	CERRO MAJUI
MARCA	PERKINS	MODELO	MD 451
POTENCIA	150 KVA	SERIAL	C071720103

REGISTRO FOTOGRÁFICO 1

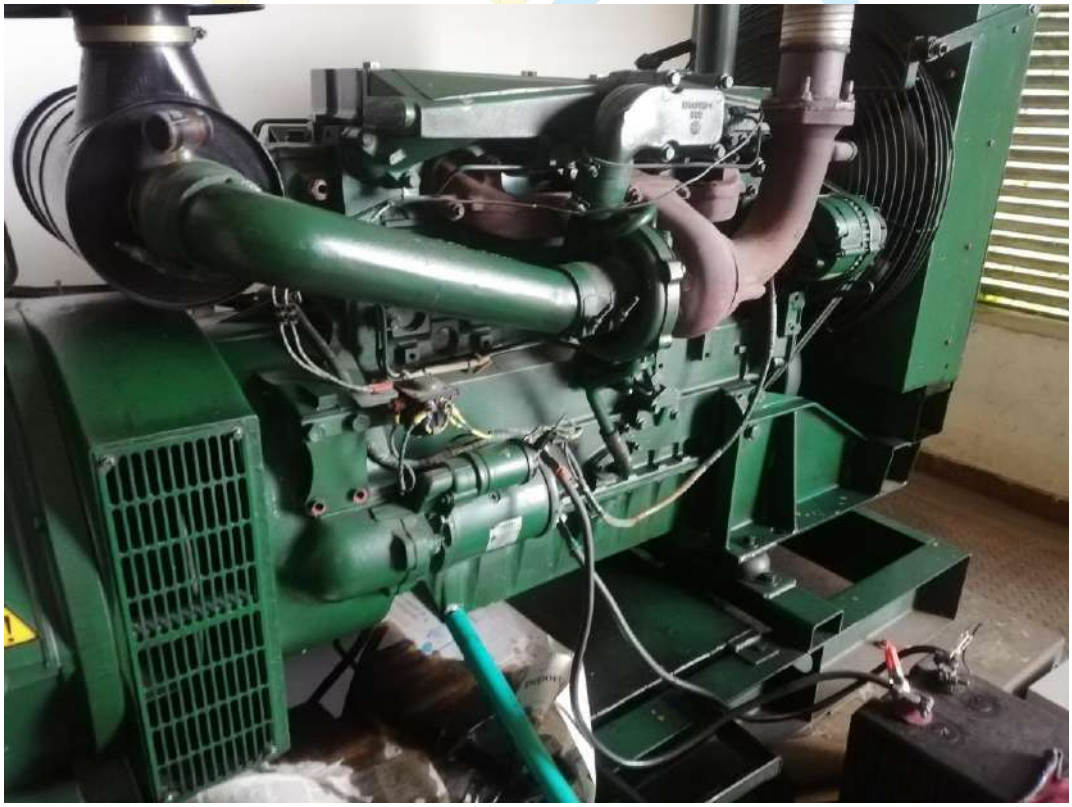

REGISTRO FOTOGRÁFICO 2



REGISTRO FOTOGRÁFICO 3



REGISTRO FOTOGRÁFICO 4



REGISTRO FOTOGRÁFICO 5



REGISTRO FOTOGRÁFICO 6




REGISTRO FOTOGRÁFICO 7



REGISTRO FOTOGRÁFICO 8



REGISTRO FOTOGRÁFICO 9

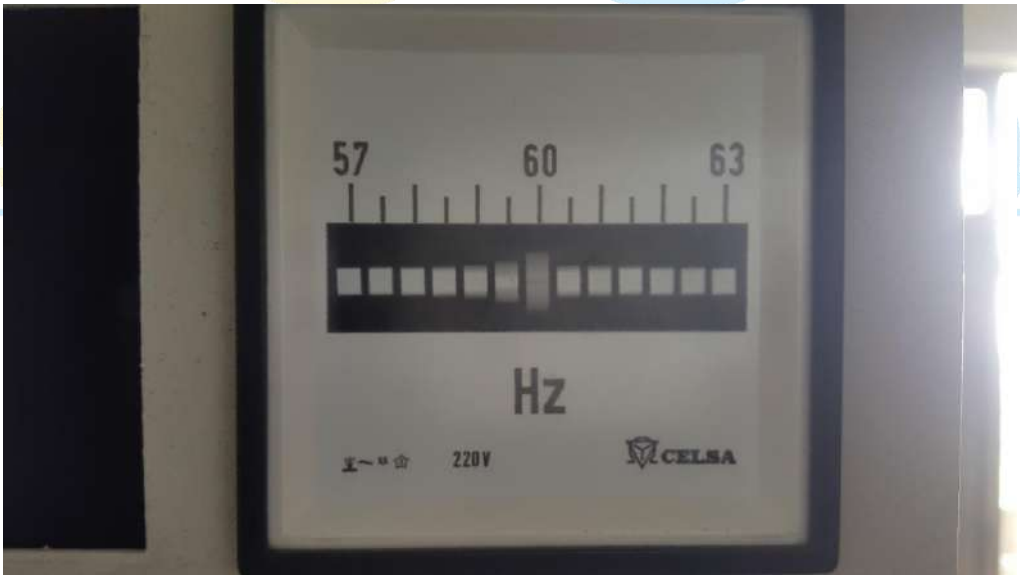

En las instalaciones de Canal Capital, se reunieron CAROLIN OLARTE CIPRIAN identificado con Cédula de Ciudadanía No. 1.032.389.865 de Bogotá, en representación de CANAL CAPITAL (Supervisor), por una parte, y por la otra el contratista ANGELA SOFIA QUIROGA PEREZ, identificado con Cédula de Ciudadanía No. 52.930.074 de Bogota en representación de SERGEMAQ SAS (Contratista), con el propósito de hacer entrega real y efectiva de los siguientes servicios de conformidad con lo estipulado en las obligaciones especificas del Contrato de Prestación de servicios No. 468 del 2020 suscrito entre Canal Capital Y SERGEMAQ SAS.

En tal virtud, EL CONTRATISTA hace entrega a CANAL CAPITAL de la tercera jornada de mantenimientos preventivos realizados a los equipos del canal, de acuerdo al contrato N° 468-2020.

CANTIDAD	OBJETO (ELEMENTOS Y EQUIPOS)	CARACTERÍSTICAS
1	Ups Power Eaton 80 kva	Tercera jornada de mantenimiento preventivo, (Cuarto Electrico).
1	Ups Liebert 20 kva	Tercera jornada de mantenimiento preventivo, (Cerro Manjui).
1	Ups Liebert 130 kva	Tercera jornada de mantenimiento preventivo, (Cuarto Electrico).
1	Ups Powerware Prestige 6 kva	Tercera jornada de mantenimiento preventivo, (Cerro el Cable).
1	Ups Voltex 6 kva	Tercera jornada de mantenimiento preventivo, (Cerro Boqueron).
1	Ups Voltex 6 kva	Tercera jornada de mantenimiento preventivo, (Cerro Suba).
1	Ups Online Titan 10 kva	Tercera jornada de mantenimiento preventivo, (Movil Pequeña).
1	Ups Online Titan 10 kva	Tercera jornada de mantenimiento preventivo, (Movil Pequeña Backup).
1	Ups Eaton 9 px 11 kva	Taercera jornada de mantenimiento preventivo, (Movil Grande).
2	Aire acondicionado Lenox KF6624GW6 Minisplit KF25-09-6W 25000 BTU 2 TR	Tercera jornada de mantenimiento preventivo, (Trafico-Graficas).
1	Aire acondicionado Trane TSC 120F3E0A000 AA Central 120000 BTU-1TR	Tercera jornada de mantenimiento preventivo, (Estudios – In Out).
1	Aire acondicionado Trane MCX536G10RAA-2TTA0036A – 36000 BTU – 3 TR	Tercera jornada de mantenimiento preventivo, (Master de Emisión).

4	Aire acondicionado Coleman 48203C 9600 BTU	Tercera jornada de mantenimiento preventivo, (Unidad Movil grande).
1	Aire acondicionado Coleman 48204C 9600 BTU	Tercera jornada de mantenimiento preventivo, (Unidad Movil pequeña).
1	Aire acondicionado York Blue Line 36000 BTU – 3 TR	Tercera jornada de mantenimiento preventivo, (Cuarto Electrico).
1	Aire acondicionado York Blue Line 36000 BTU – 3 TR (H3CE120A25A	Tercera jornada de mantenimiento preventivo,(Estudios 2).
1	Aire acondicionado Trane 4 TTB3036E1000AA 30000 BTU – 3 TR	Tercera jornada de mantenimiento preventivo, (Sistemas).
1	Planta Electrica Power Link-GMP45C645KVA	Tercera jornada de mantenimiento preventivo, (Planta Unidad Movil).
1	Planta Electrica Kohler Jhon Dere 50 kva.	Tercera jornada de mantenimiento preventivo, (Planta Unidad Movil).
1	Planta Electrica Modasa MP-451 42 kva	Tercera jornada de mantenimiento preventivo, (Planta Unidad Movil).
1	Planta Electrica Lister Petter IPW4A081 21 kva	Tercera jornada de mantenimiento preventivo, (Terraza Canal Capital).
1	Planta Electrica Honda EU 2000	Tercera jornada de mantenimiento preventivo, (Canal Capital MW).
1	Planta Electrica Honda EU 1000	Tercera jornada de mantenimiento preventivo, (Canal Capital MW).
1	Planta Electrica Perkins 150 kva	Tercera jornada de mantenimiento preventivo, (Cerro Manjui).

Una vez entregados los elementos las partes constataron la entrega del servicio en las instalaciones del Canal.

Igualmente certifico en calidad de supervisor, que el contratista ha cumplido con la obligación del pago de
[x]

APORTES PARAFISCALES Y OBLIGACIONES CON EL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL (Sí es persona Jurídica, debe presentar certificación expedida por el representante legal y/o revisor fiscal, independientemente de su plazo y valor).

Dada en Bogotá D.C., a los (24/03/2021)

POR CANAL CAPITAL
CAROLIN OLARTE CIPRIAN
COORDINADORA ÁREA TÉCNICA

POR EL CONTRATISTA
ANGELA SOFIA QUIROGA PEREZ
SERGEMAQ SAS

Realizó: Dayro Oviedo – Auxiliar área técnica.ok
