Informe Ejecutivo Semanal de Interventoria

Consejo Superior de la Judicatura

Dirección Ejecutiva de Administración Judicial

Oficina de Coordinación Administrativa de Riohacha

1. INFORMACIÓN GENERAL

INFORME SEMANAL No. **1** PERIODO: **31/12/2020 al 03/01/2021**

OBJETO

"LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL Y JURÍDICA DEL CONTRATO QUE RESULTE DEL PROCESO DE SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA SAMC-CR-01-2020 CUYO OBJETO ES "CONTRATAR EN NOMBRE DE LA NACIÓN- CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA- DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE VALLEDUPAR- OFICINA DE COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE RIOHACHA, LA ETAPA II DE LA REPOTENCIACIÓN Y ADECUACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO BAJO LA NORMATIVIDAD VIGENTE, DEL PALACIO DE JUSTICIA LUÍS ROBLES DE RIOHACHA".

2. INFORMACIÓN CONTRACTUAL

CONTRATO DE INTERVENTORÍA			5,12%	CONTRATO DE OBRA			
INTERVENTOR:	OBRAS Y CONSULTORIAS ARQTEK SAS			CONTRATISTA:	CONSORCIO JOSE FERNANDO VILLEGAS - JLSM		
CONTRATO No.:	CO1.PCCNTR.2092712			CONTRATO No.:	CO1,PCCNTR.2071522		
VALOR INICIAL:	$	41.888.000,00		VALOR INICIAL:	$	818.871.366,16	
VALOR ADICIÓN 1:	$	-		VALOR ADICIÓN 1:	$	-	
VALOR ADICIÓN 2:	$	-		VALOR ADICIÓN 2:	$	-	
VALOR ACTUALIZADO:	**$**	**41.888.000,00**		**VALOR ACTUALIZADO:**	**$**	**818.871.366,16**	
PLAZO INICIAL:	**6 meses**			PLAZO INICIAL:	**6 meses**		
PLAZO ACTUALIZADO:	**6 meses**			PLAZO ACTUALIZADO:	**6 meses**		
FECHA DE SUSPENSIÓN:	**N.A.**			FECHA DE SUSPENSIÓN:	**N.A.**		
FECHA DE REINICIACIÓN:	**N.A.**			FECHA DE REINICIACIÓN:	**N.A.**		
FECHA DE INICIACIÓN:	**31/12/2020**			FECHA DE INICIACIÓN:	**31/12/2020**		
FECHA DE TERMINACIÓN:	**30/06/2021**			FECHA DE TERMINACIÓN:	**30/06/2021**		
VALOR EJECUTADO:	**$**	**-**	**0,00%**	VALOR EJECUTADO:	**$**	**-**	**0,00%**
VALOR POR EJECUTAR:	**$**	**41.888.000,00**	**100,00%**	VALOR POR EJECUTAR:	**$**	**818.871.366,16**	**100,00%**

3. ESTADO GENERAL DEL CONTRATO

3.1 ESTADO DE LICENCIAS, PERMISOS Y /O SERVICIOS PÚBLICOS


LICENCIAS, PERMISOS Y/O SERVICIOS	DESCRIPCIÓN DEL ESTADO	FECHA DE APROBACIÓN Y/O CONEXIÓN

3.2 CONTROL DE PROGRAMACION

AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

	% PROGRAMADO SEMANA	% EJECUTADO EN LA SEMANA	DIFERENCIA
Acumulado anterior	0,00%	0,00%	0,00%
Acumulado presente semana	0,08%	0,00%	0,08%
Acumulado Actual	0,08%	0,00%	-0,08%

GRAFICA DE AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

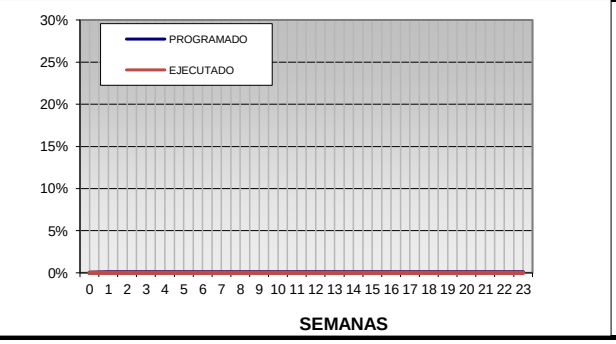

AVANCE O ATRASO DEL CONTRATO EN TIEMPO

Tiempo total Contractual	Tiempo transcurrido	Faltante	Atraso o adelanto en tiempo
181	3	178,00	-0,14

ACTIVIDADES PROGRAMADAS Y EJECUTADAS EN LA SEMANA

PROGRAMADO SEMANA	%	EJECUTADO SEMANA	%
Preliminares	0,08%	En esta semana no se ejecuto ninguna actividad	0,00%

Informe Ejecutivo Semanal de Interventoria	**Consejo Superior de la Judicatura** **Dirección Ejecutiva de Administración Judicial** **Oficina de Coordinación Administrativa de Riohacha**	

1. INFORMACIÓN GENERAL

INFORME SEMANAL No. **1** PERIODO: **31/12/2020 al 03/01/2021**

OBJETO

"LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL Y JURÍDICA DEL CONTRATO QUE RESULTE DEL PROCESO DE SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA SAMC-CR-01-2020 CUYO OBJETO ES "CONTRATAR EN NOMBRE DE LA NACIÓN- CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA- DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE VALLEDUPAR- OFICINA DE COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE RIOHACHA, LA ETAPA II DE LA REPOTENCIACIÓN Y ADECUACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO BAJO LA NORMATIVIDAD VIGENTE, DEL PALACIO DE JUSTICIA LUÍS ROBLES DE RIOHACHA".

INTERVENTORIA

REGISTRO FOTOGRAFICO







