
| BOGOTÁ Secretaria de Educación | INFORME SEMANAL # 19 CURVA DE INVERSIÓN SEMANAL | VERSIÓN 01<br>Pág. 4 De 4 |
|---|---|---|

## 1. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| INFORME No. | 19 | PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL | 28 de diciembre de 2020 | Y EL | 3 de enero de 2021 |
| OBJETO | INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO. | | | | |
| LOCALIZACIÓN | LOCALIDAD DE SAN CRISTOBAL | | | | |

## 2. CURVA DE INVERSIÓN "S"

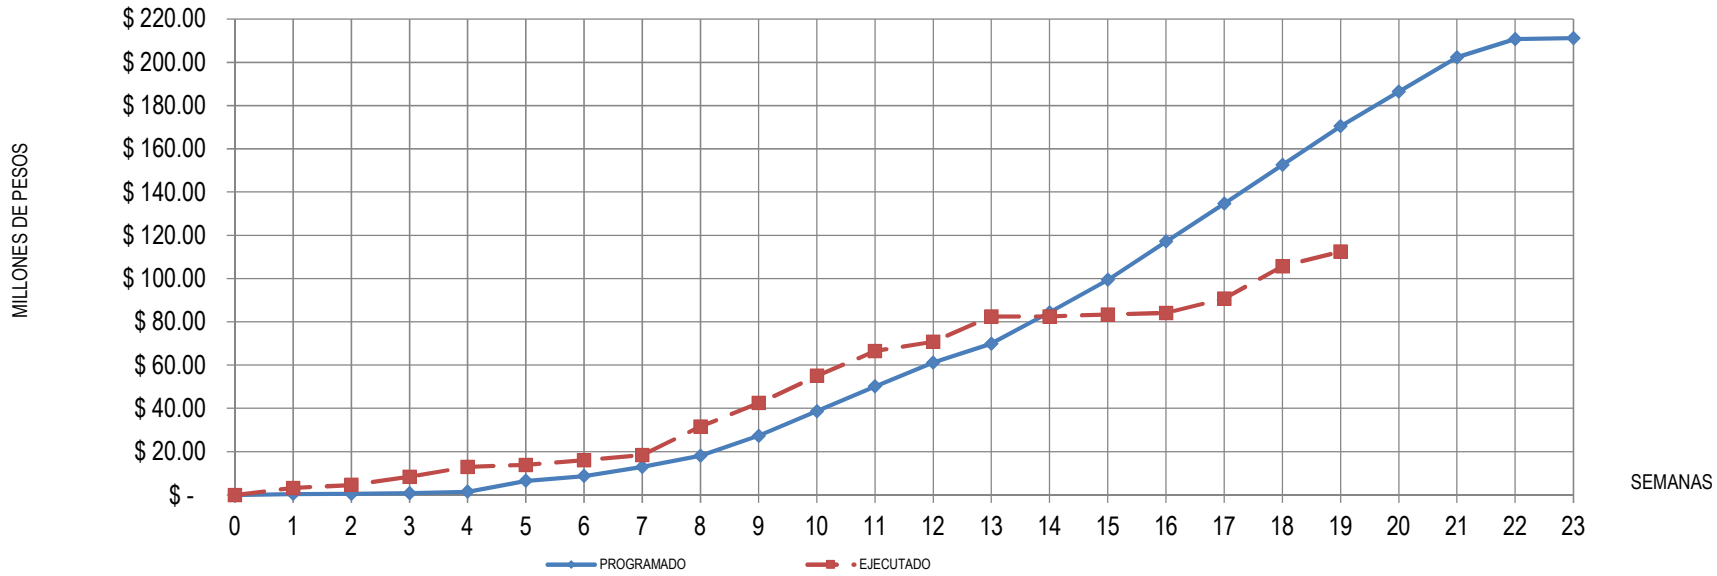

| BOGOTÁ Secretaría de Educación | **INFORME SEMANAL # 20** | VERSIÓN 01<br>Pág. 1 De 4 |
|---|---|---|

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **OBJETO** | INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO. | | | | |
| **INTERVENTOR** | CONSORCIO INAR INGENIEROS | | | | |
| **CONTRATISTA** | MUÑOZ Y HERRERA INGENIEROS ASOCIADOS S.A | C. OBRA Nº | CO1.PCCNTR. 1577474 DE MAYO 28 DE 2020 | COLEGIO JUAN EVANGELISTA GOMEZ (I.E.D) | **ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL DISTRITO CAPITAL.** |
| **CONTRATANTE** | SECRETARIA DE EDUCACIÓN DISTRITAL (SED) | | | | |

| **SEMANA N°** | 20 | **DEL** | 4-Jan-21 | **AL** | 10-Jan-21 |
|---|---|---|---|---|---|

## 1. INFORMACIÓN CONTRACTUAL

| **CONTRATO DE INTERVENTORIA** | | **CONTRATO DE OBRA** | |
|---|---|---|---|
| **Contrato No .** | CO1.PCCNTR. 1680516 DE JULIO 21 DE 2020 | **Contrato No .** | CO1.PCCNTR.1577474 DE MAYO 28 DE 2020 |
| **Fecha de Iniciación** | 12 de Agosto de 2020 | **Fecha de Iniciación** | 19 de Agosto de 2020 |
| **Fecha de Terminación** | 11 de Febrero de 2021 | **Fecha de Terminación** | 18 de Enero de 2021 |
| **Plazo Inicial** | 6 meses | **Plazo Inicial** | 5 meses |
| **Valor inicial** | $ 160,550,040.00 | **Valor inicial** | $ 1,023,694,436.00 |

## 2. CONTROL DE PROGRAMACIÓN

| **EJECUCION SEMANAL POR CAPITULOS** | | | | **ACTIVIDADES** | |
|---|---|---|---|---|---|
| **No.** | **CAPÍTULO** | **PORCENTAJE PROGRAMADO** | **PORCENTAJE EJECUTADO** | **ACTIVIDADES** | **DESCRIPCIÓN** |
| 1 | PRELIMINARES | 0.07% | | | |
| 2 | CIMENTACIÓN | 0.12% | | | |
| 3 | DESAGÜES E INSTALACIONES SUBTERRANEAS | 0.22% | | | |
| 5 | MAMPOSTERÍA | 0.46% | | | |
| 10 | PISOS | 30.30% | 20.70% | PISOS | INSTALACIÓN, EMBOQUILLADO, DESTROQUE Y ULIDA DE PISOS EN AULAS. |
| 12 | CARPINTERIA METALICA | 2.15% | | | |
| 18 | PINTURA | 1.54% | | | |
| 20 | OBRAS EXTERIORES | | | | |
| 21 | ASEO Y VARIOS | | | | |
| **TOTALES** | | **34.86%** | **20.70%** | | |

| BOGOTÁ Secretaria de Educación | **INFORME SEMANAL # 20** | VERSIÓN 01 |
|---|---|---|
| | | Pág. 1 De 4 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **OBJETO** | INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO. | | | | |
| **INTERVENTOR** | CONSORCIO INAR INGENIEROS | | | | |
| **CONTRATISTA** | MUÑOZ Y HERRERA INGENIEROS ASOCIADOS S.A | C. OBRA Nº | CO1.PCCNTR. 1577474 DE MAYO 28 DE 2020 | COLEGIO JUAN EVANGELISTA GOMEZ (I.E.D) | **ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL DISTRITO CAPITAL.** |
| **CONTRATANTE** | SECRETARIA DE EDUCACIÓN DISTRITAL (SED) | | | | |

| **SEMANA N°** | 20 | **DEL** | 4-Jan-21 | **AL** | 10-Jan-21 |
|---|---|---|---|---|---|


## 3. RESUMEN FINANCIERO

| **BALANCE DE OBRA EJECUTADA** | **VR.TOTAL DEL FRENTE DE OBRA** | **VR. TOTAL EJECUTADO** | **VR. POR EJECUTAR** | **AVANCE DE INVERSION** | **SEMANA** | **ACUMULADO** |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | $ 211,113,392 | $ 146,907,137 | **$ 64,206,255** | | 20.70% | 88.36% |

## 4. PERSONAL EN LA OBRA

| PERSONAL | CANTIDAD | PERSONAL | CANTIDAD |
|---|---|---|---|
| | | PINTORES | |
| MAESTRO | 1 | OFICIALES | 1 |
| ELECTRICISTA | | AYUDANTES | 4 |
| AYU. DE ELECTRICIDAD | | ALMACENISTA | |
| INSTALADORES DE PISO | | RESIDENTE DE OBRA | 1 |
| SISOMA | 1 | | |
| HIDRÁULICOS | | | |

## 5. GRÁFICA CONTROL AVANCE DE OBRA (PROGRAMACIÓN)

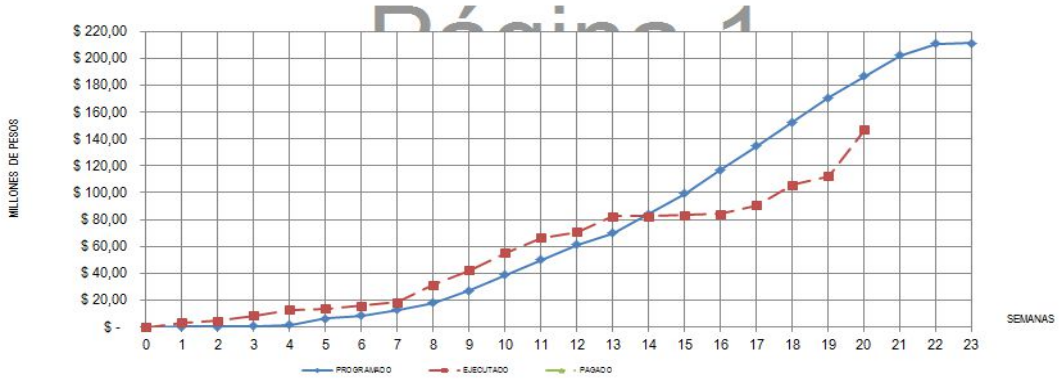


## 5. OBSERVACIONES, RECOMENDACIONES Y CONCLUSIONES

Se continua con instalación de piso, emboquillado, destronque y pulida.

KEVIN RODRÍGUEZ
**INSPECTOR DE INTERVENTORIA**

LILIANA CUADROS GARCÍA
**Vo. Bo. RESIDENTE DE INTERVENTORIA**

**ANEXO FOTOGRÁFICO SEMANA 20**





INSTALACIÓN PISO EN AULAS





DESTRONQUE





PULIDA

| | | | |
|---|---|---|---|
| **CONTRATO No./ NOMBRE DEL PROYECTO** | INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DIST | | |
| **INTERVENTOR** | CONSORCIO INAR INGENIEROS | | |
| **CONTRATISTA** | MUÑOZ Y HERRERA INGENIEROS ASOCIADOS S.A | C. DE OBRA Nº | CO1.PCCNTR.1577474 DE MAYO 28 DE 2020 |
| **ENTIDAD CONTRATANTE** | SECRETARIA DE EDUCACIÓN DISTRITAL (SED) | | |


| PROYECTO | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **FECHA** | **VR. INVERSIÓN** | **VR. ACUMULADO** | **SEMANA** | **% PROGRAMADO** | **% PROGRAMADO ACUMULADO** |
| 30 de Agosto de 2020 | $ 496,250 | $ 496,250 | 1 | 0.24% | 0.24% |
| 6 de septiembre de 2020 | $ 53,277 | $ 549,527 | 2 | 0.03% | 0.26% |
| 13 de septiembre de 2020 | $ 266,378 | $ 815,905 | 3 | 0.13% | 0.39% |
| 20 de septiembre de 2020 | $ 711,898 | $ 1,527,803 | 4 | 0.34% | 0.72% |
| 27 de septiembre de 2020 | $ 5,013,320 | $ 6,541,123 | 5 | 2.37% | 3.10% |
| 4 de octubre de 2020 | $ 2,231,671 | $ 8,772,795 | 6 | 1.06% | 4.16% |
| 11 de octubre de 2020 | $ 4,244,374 | $ 13,017,169 | 7 | 2.01% | 6.17% |
| 18 de octubre de 2020 | $ 5,084,991 | $ 18,102,159 | 8 | 2.41% | 8.57% |
| 25 de octubre de 2020 | $ 9,265,608 | $ 27,367,767 | 9 | 4.39% | 12.96% |
| 1 de noviembre de 2020 | $ 11,403,253 | $ 38,771,020 | 10 | 5.40% | 18.37% |
| 8 de noviembre de 2020 | $ 11,403,253 | $ 50,174,273 | 11 | 5.40% | 23.77% |
| 15 de noviembre de 2020 | $ 11,038,384 | $ 61,212,657 | 12 | 5.23% | 29.00% |
| 22 de noviembre de 2020 | $ 8,766,939 | $ 69,979,595 | 13 | 4.15% | 33.15% |
| 29 de noviembre de 2020 | $ 14,447,081 | $ 84,426,677 | 14 | 6.84% | 39.99% |
| 6 de diciembre de 2020 | $ 15,006,934 | $ 99,433,610 | 15 | 7.11% | 47.10% |
| 13 de diciembre de 2020 | $ 17,753,280 | $ 117,186,891 | 16 | 8.41% | 55.51% |
| 20 de diciembre de 2020 | $ 17,475,000 | $ 134,661,890 | 17 | 8.28% | 63.79% |
| 27 de diciembre de 2020 | $ 17,907,556 | $ 152,569,446 | 18 | 8.48% | 72.27% |
| 3 de enero de 2021 | $ 17,907,557 | $ 170,477,003 | 19 | 8.48% | 80.75% |
| 10 de enero de 2021 | $ 16,050,955 | $ 186,527,958 | 20 | 7.60% | 88.35% |
| 17 de enero de 2021 | $ 15,831,495 | $ 202,359,453 | 21 | 7.50% | 95.85% |
| 24 de enero de 2021 | $ 8,323,216 | $ 210,682,669 | 22 | 3.94% | 99.80% |
| 31 de enero de 2021 | $ 430,724 | $ 211,113,392 | 23 | 0.20% | 100.00% |
| **TOTAL** | **$ 211,113,392.18** | | | | |

| | | |
|---|---|---|
| BOGOTÁ Secretaria de Educación | **INFORME SEMANAL # 20 CURVA DE INVERSIÓN SEMANAL** | **VERSIÓN 01**<br>Pág. 4 De 4 |

**1. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| INFORME No. | 20 | PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL | 4 de enero de 2021 | Y EL | 10 de enero de 2021 |
| OBJETO | INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO. | | | | |
| LOCALIZACIÓN | LOCALIDAD DE SAN CRISTOBAL | | | | |

**2. CURVA DE INVERSIÓN "S"**

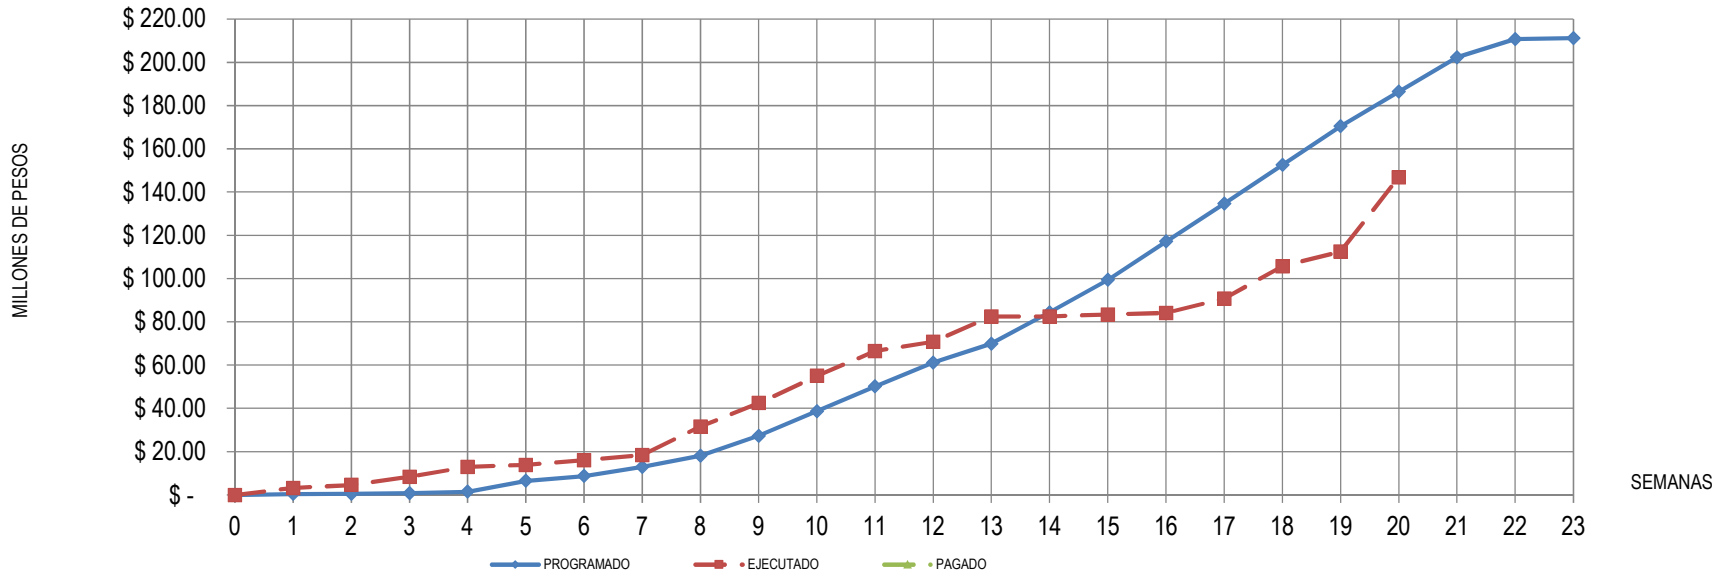

| BOGOTÁ Secretaría de Educación | **INFORME SEMANAL # 21** | VERSIÓN 01<br>Pág. 1 De 4 |
|---|---|---|

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **OBJETO** | INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO. | | | | |
| **INTERVENTOR** | CONSORCIO INAR INGENIEROS | | | | |
| **CONTRATISTA** | MUÑOZ Y HERRERA INGENIEROS ASOCIADOS S.A | C. OBRA Nº | CO1.PCCNTR. 1577474 DE MAYO 28 DE 2020 | COLEGIO JUAN EVANGELISTA GOMEZ (I.E.D) | **ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL DISTRITO CAPITAL.** |
| **CONTRATANTE** | SECRETARIA DE EDUCACIÓN DISTRITAL (SED) | | | | |

| **SEMANA N°** | 21 | **DEL** | 11-Jan-21 | **AL** | 17-Jan-21 |
|---|---|---|---|---|---|

## 1. INFORMACIÓN CONTRACTUAL

| **CONTRATO DE INTERVENTORIA** | | **CONTRATO DE OBRA** | |
|---|---|---|---|
| **Contrato No .** | CO1.PCCNTR. 1680516 DE JULIO 21 DE 2020 | **Contrato No .** | CO1.PCCNTR.1577474 DE MAYO 28 DE 2020 |
| **Fecha de Iniciación** | 12 de Agosto de 2020 | **Fecha de Iniciación** | 19 de Agosto de 2020 |
| **Fecha de Terminación** | 11 de Febrero de 2021 | **Fecha de Terminación** | 18 de Enero de 2021 |
| **Plazo Inicial** | 6 meses | **Plazo Inicial** | 5 meses |
| **Valor inicial** | $ 160,550,040.00 | **Valor inicial** | $ 1,023,694,436.00 |

## 2. CONTROL DE PROGRAMACIÓN

| **EJECUCION SEMANAL POR CAPITULOS** | | | | **ACTIVIDADES** | |
|---|---|---|---|---|---|
| **No.** | **CAPÍTULO** | **PORCENTAJE PROGRAMADO** | **PORCENTAJE EJECUTADO** | **ACTIVIDADES** | **DESCRIPCIÓN** |
| 1 | PRELIMINARES | 0.07% | | | |
| 2 | CIMENTACIÓN | 0.06% | | | |
| 3 | DESAGÜES E INSTALACIONES SUBTERRANEAS | 0.22% | | | |
| 5 | MAMPOSTERÍA | 0.42% | | | |
| 10 | PISOS | 3.03% | 5.36% | GUARDAESCOBA GRANO MARMOL PRENSADO | INICIO INSTALACION DE GUARDA ESCOBAS SE CONTINUA CON , EMBOQUILLADO, DESTROQUE Y ULIDA DE PISOS EN AULAS. |
| 12 | CARPINTERIA METALICA | 2.15% | | | |
| 18 | PINTURA | 1.54% | 1.20% | VINILO MUROS INTERIORES 3 MANOS | SE CONTINUA CON PINTUARA AL INTERIOR AULAS BLOQUE C |
| 20 | OBRAS EXTERIORES | | | | |
| 21 | ASEO Y VARIOS | | | | |
| **TOTALES** | | **7.49%** | **6.56%** | | |

| BOGOTÁ Secretaria de Educación | **INFORME SEMANAL # 21** | VERSIÓN 01 |
|---|---|---|
| | | Pág. 1 De 4 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **OBJETO** | INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO. | | | | |
| **INTERVENTOR** | CONSORCIO INAR INGENIEROS | | | | |
| **CONTRATISTA** | MUÑOZ Y HERRERA INGENIEROS ASOCIADOS S.A | C. OBRA Nº | CO1.PCCNTR. 1577474 DE MAYO 28 DE 2020 | COLEGIO JUAN EVANGELISTA GOMEZ (I.E.D) | **ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL DISTRITO CAPITAL.** |
| **CONTRATANTE** | SECRETARIA DE EDUCACIÓN DISTRITAL (SED) | | | | |

| **SEMANA N°** | 21 | **DEL** | 11-Jan-21 | **AL** | 17-Jan-21 |
|---|---|---|---|---|---|


## 3. RESUMEN FINANCIERO

| BALANCE DE OBRA EJECUTADA | VR.TOTAL DEL FRENTE DE OBRA | VR. TOTAL EJECUTADO | VR. POR EJECUTAR | AVANCE DE INVERSION | SEMANA | ACUMULADO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | $ 211,113,392 | $ 157,808,769 | **$ 53,304,623** | | 6.56% | 94.92% |

## 4. PERSONAL EN LA OBRA

| PERSONAL | CANTIDAD | PERSONAL | CANTIDAD |
|---|---|---|---|
| | | PINTORES | |
| MAESTRO | 1 | OFICIALES | 1 |
| ELECTRICISTA | | AYUDANTES | 4 |
| AYU. DE ELECTRICIDAD | | ALMACENISTA | |
| INSTALADORES DE PISO | | RESIDENTE DE OBRA | 1 |
| SISOMA | 1 | | |
| HIDRÁULICOS | | | |

## 5. GRÁFICA CONTROL AVANCE DE OBRA (PROGRAMACIÓN)

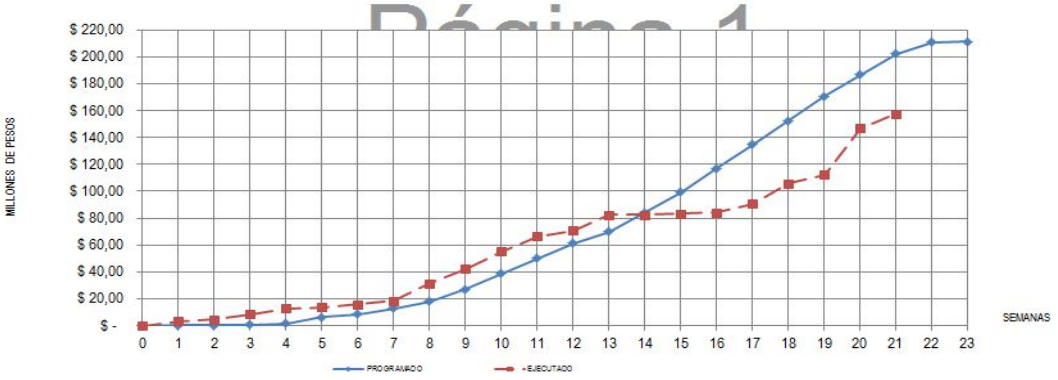


## 5. OBSERVACIONES, RECOMENDACIONES Y CONCLUSIONES

Se inicia con la instalación de guardaescobas en marmol.

Se realiza emboquillado, destronque y pulida del piso instalado.

KEVIN RODRÍGUEZ
**INSPECTOR DE INTERVENTORIA**

LILIANA CUADROS GARCÍA
**Vo. Bo. RESIDENTE DE INTERVENTORIA**

**ANEXO FOTOGRÁFICO SEMANA 21**





INSTALACIÓN DE GUARDAESCOBAS EN AULAS





DESTRONQUE





PULIDA

| | | | |
|---|---|---|---|
| **CONTRATO No./ NOMBRE DEL PROYECTO** | INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DIST | | |
| **INTERVENTOR** | CONSORCIO INAR INGENIEROS | | |
| **CONTRATISTA** | MUÑOZ Y HERRERA INGENIEROS ASOCIADOS S.A | C. DE OBRA Nº | CO1.PCCNTR.1577474 DE MAYO 28 DE 2020 |
| **ENTIDAD CONTRATANTE** | SECRETARIA DE EDUCACIÓN DISTRITAL (SED) | | |


| PROYECTO | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **FECHA** | **VR. INVERSIÓN** | **VR. ACUMULADO** | **SEMANA** | **% PROGRAMADO** | **% PROGRAMADO ACUMULADO** |
| 30 de Agosto de 2020 | $ 496,250 | $ 496,250 | 1 | 0.24% | 0.24% |
| 6 de septiembre de 2020 | $ 53,277 | $ 549,527 | 2 | 0.03% | 0.26% |
| 13 de septiembre de 2020 | $ 266,378 | $ 815,905 | 3 | 0.13% | 0.39% |
| 20 de septiembre de 2020 | $ 711,898 | $ 1,527,803 | 4 | 0.34% | 0.72% |
| 27 de septiembre de 2020 | $ 5,013,320 | $ 6,541,123 | 5 | 2.37% | 3.10% |
| 4 de octubre de 2020 | $ 2,231,671 | $ 8,772,795 | 6 | 1.06% | 4.16% |
| 11 de octubre de 2020 | $ 4,244,374 | $ 13,017,169 | 7 | 2.01% | 6.17% |
| 18 de octubre de 2020 | $ 5,084,991 | $ 18,102,159 | 8 | 2.41% | 8.57% |
| 25 de octubre de 2020 | $ 9,265,608 | $ 27,367,767 | 9 | 4.39% | 12.96% |
| 1 de noviembre de 2020 | $ 11,403,253 | $ 38,771,020 | 10 | 5.40% | 18.37% |
| 8 de noviembre de 2020 | $ 11,403,253 | $ 50,174,273 | 11 | 5.40% | 23.77% |
| 15 de noviembre de 2020 | $ 11,038,384 | $ 61,212,657 | 12 | 5.23% | 29.00% |
| 22 de noviembre de 2020 | $ 8,766,939 | $ 69,979,595 | 13 | 4.15% | 33.15% |
| 29 de noviembre de 2020 | $ 14,447,081 | $ 84,426,677 | 14 | 6.84% | 39.99% |
| 6 de diciembre de 2020 | $ 15,006,934 | $ 99,433,610 | 15 | 7.11% | 47.10% |
| 13 de diciembre de 2020 | $ 17,753,280 | $ 117,186,891 | 16 | 8.41% | 55.51% |
| 20 de diciembre de 2020 | $ 17,475,000 | $ 134,661,890 | 17 | 8.28% | 63.79% |
| 27 de diciembre de 2020 | $ 17,907,556 | $ 152,569,446 | 18 | 8.48% | 72.27% |
| 3 de enero de 2021 | $ 17,907,557 | $ 170,477,003 | 19 | 8.48% | 80.75% |
| 10 de enero de 2021 | $ 16,050,955 | $ 186,527,958 | 20 | 7.60% | 88.35% |
| 17 de enero de 2021 | $ 15,831,495 | $ 202,359,453 | 21 | 7.50% | 95.85% |
| 24 de enero de 2021 | $ 8,323,216 | $ 210,682,669 | 22 | 3.94% | 99.80% |
| 31 de enero de 2021 | $ 430,724 | $ 211,113,392 | 23 | 0.20% | 100.00% |
| **TOTAL** | **$ 211,113,392.18** | | | | |

| BOGOTÁ Secretaria de Educación | INFORME SEMANAL # 21 CURVA DE INVERSIÓN SEMANAL | VERSIÓN 01<br>Pág. 4 De 4 |
|---|---|---|

## 1. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| INFORME No. | 21 | PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL | 11 de enero de 2021 | Y EL | 17 de enero de 2021 |
| OBJETO | INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO. | | | | |
| LOCALIZACIÓN | LOCALIDAD DE SAN CRISTOBAL | | | | |

## 2. CURVA DE INVERSIÓN "S"

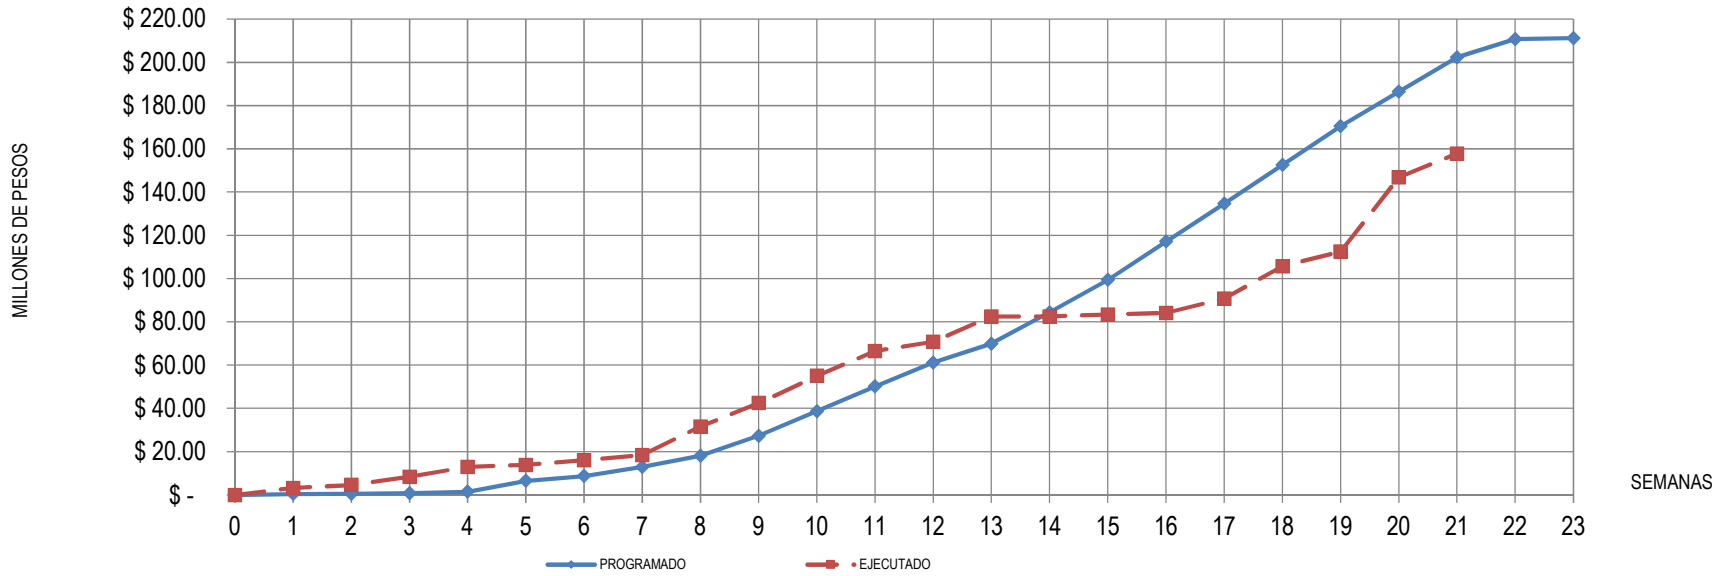

| BOGOTÁ Secretaría de Educación | **INFORME SEMANAL # 7** | VERSIÓN 01 |
|---|---|---|
| | | Pág. 1 De 4 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **OBJETO** | INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO. | | | | |
| **INTERVENTOR** | CONSORCIO INAR INGENIEROS | | | | |
| **CONTRATISTA** | MUÑOZ Y HERRERA INGENIEROS ASOCIADOS S.A | C. OBRA Nº | CO1.PCCNTR. 1577474 DE MAYO 28 DE 2020 | COLEGIO ALPES (I.E.D) | **ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL DISTRITO CAPITAL.** |
| **CONTRATANTE** | SECRETARIA DE EDUCACIÓN DISTRITAL (SED) | | | | |

| **SEMANA N°** | 7 | **DEL** | 14-Dec-20 | **AL** | 20-Dec-20 |
|---|---|---|---|---|---|

## 1. INFORMACIÓN CONTRACTUAL

| **CONTRATO DE INTERVENTORIA** | | **CONTRATO DE OBRA** | |
|---|---|---|---|
| **Contrato No .** | CO1.PCCNTR. 1680516 DE JULIO 21 DE 2020 | **Contrato No .** | CO1.PCCNTR.1577474 DE MAYO 28 DE 2020 |
| **Fecha de Iniciación** | 12 de Agosto de 2020 | **Fecha de Iniciación** | 19 de Agosto de 2020 |
| **Fecha de Terminación** | 11 de Febrero de 2021 | **Fecha de Terminación** | 18 de Enero de 2021 |
| **Plazo Inicial** | 6 meses | **Plazo Inicial** | 5 meses |
| **Valor inicial** | $ 160,550,040.00 | **Valor inicial** | $ 1,023,694,436.00 |

## 2. CONTROL DE PROGRAMACIÓN

| **EJECUCION SEMANAL POR CAPITULOS** | | | | **ACTIVIDADES** | |
|---|---|---|---|---|---|
| **No.** | **CAPÍTULO** | **PORCENTAJE PROGRAMADO** | **PORCENTAJE EJECUTADO** | **ACTIVIDADES** | **DESCRIPCIÓN** |
| 1 | PRELIMINARES | | | | |
| 2 | CIMENTACIÓN - | | 0.26% | ACERO DE RFUERZO | ARMADO DE HIERRO PARA CARCAMOS |
| 3 | DESAGÜES E INSTALACIONES SUBTERRANEAS | | | | |
| 4 | MAMPOSTERÍA | | | | |
| 5 | PREFABRICADOS EN CONCRETO Y OTROS | | | | |
| 6 | INSTALACIÓN HIDRAULICA SANITARIA Y DE GAS | | 0.25% | PUNTO DESAGUES | PUNTOS DE DESAGUE BATERIAS DE BAÑOS |
| 7 | INSTALACIÓN ELECTRICA, TELEFÓNICA Y COMUNICACIONES | | | | |
| 8 | PAÑETES | | | | |
| 9 | PISOS | | | | |
| 10 | CARPINTERIA METALICA | | | | |
| 11 | ENCHAPES | | | | |
| 12 | ILUMINACIÓN | | | | |
| 13 | APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS | | | | |
| 14 | CIELO RASOS Y DIVISIONES | | | | |
| 15 | PINTURA | | | | |
| 16 | CERRADURAS Y VIDRIOS | | | | |
| 17 | ASEO Y VARIOS | | | | |
| **TOTALES** | | **0.00%** | **0.51%** | | |

| BOGOTÁ Secretaría de Educación | **INFORME SEMANAL # 7** | **VERSIÓN 01**<br>Pág. 1 De 4 |
|---|---|---|

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **OBJETO** | INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO. | | | | |
| **INTERVENTOR** | CONSORCIO INAR INGENIEROS | | | | |
| **CONTRATISTA** | MUÑOZ Y HERRERA INGENIEROS ASOCIADOS S.A | C. OBRA Nº | CO1.PCCNTR. 1577474 DE MAYO 28 DE 2020 | COLEGIO ALPES (I.E.D) | **ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL DISTRITO CAPITAL.** |
| **CONTRATANTE** | SECRETARIA DE EDUCACIÓN DISTRITAL (SED) | | | | |

| **SEMANA N°** | 7 | **DEL** | 14-Dec-20 | **AL** | 20-Dec-20 |
|---|---|---|---|---|---|

## 3. RESUMEN FINANCIERO


| **BALANCE DE OBRA EJECUTADA** | **VR.TOTAL DEL FRENTE DE OBRA** | **VR. TOTAL EJECUTADO** | **VR. POR EJECUTAR** | **AVANCE DE INVERSION** | **SEMANA** | **ACUMULADO** |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | $ 134,855,122 | $ 28,056,746 | **$ 106,798,376** | | 0.51% | 20.81% |

## 4. PERSONAL EN LA OBRA

| **PERSONAL** | **CANTIDAD** | **PERSONAL** | **CANTIDAD** |
|---|---|---|---|
| | | PINTORES | |
| MAESTRO | | OFICIALES | 2 |
| ELECTRICISTA | | AYUDANTES | 4 |
| AYU. DE ELECTRICIDAD | | ALMACENISTA | |
| INSTALADORES DE PISO | | RESIDENTE DE OBRA | 1 |
| SISOMA | 1 | | |
| HIDRÁULICOS | | | |

## 5. GRÁFICA CONTROL AVANCE DE OBRA (PROGRAMACIÓN)

Página 1

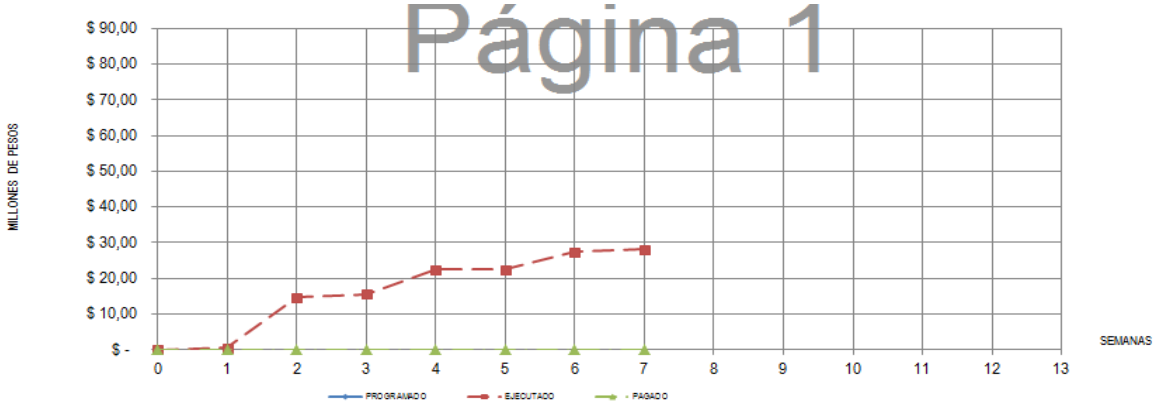


## 5. OBSERVACIONES, RECOMENDACIONES Y CONCLUSIONES

Se continua con el armado de hierro para los carcamos perimetrales de la cancha.

se realiza instalación de puntos de desague en baños.

No se ha entregado programación ni flujo de inversión.

KEVIN RODRÍGUEZ
**INSPECTOR DE INTERVENTORIA**

LILIANA CUADROS GARCÍA
**Vo. Bo. RESIDENTE DE INTERVENTORIA**

**ANEXO FOTOGRÁFICO SEMANA 07**





FIGURADO DE HIERRO PARA CARCAMO EN CANCHA





FIGURADO DE HIERRO PARA CARCAMO EN CANCHA





PUNTOS DE DESAGUES

| | | | |
|---|---|---|---|
| **CONTRATO No./ NOMBRE DEL PROYECTO** | INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DIST | | |
| **INTERVENTOR** | CONSORCIO INAR INGENIEROS | | |
| **CONTRATISTA** | MUÑOZ Y HERRERA INGENIEROS ASOCIADOS S.A | C. DE OBRA Nº | CO1.PCCNTR.1577474 DE MAYO 28 DE 2020 |
| **ENTIDAD CONTRATANTE** | SECRETARIA DE EDUCACIÓN DISTRITAL (SED) | | |


| **PROYECTO** | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **FECHA** | **VR. INVERSIÓN** | **VR. ACUMULADO** | **SEMANA** | **% PROGRAMADO** | **% PROGRAMADO ACUMULADO** |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| **TOTAL** | **$** - | | | | |

| | | |
|---|---|---|
| BOGOTÁ Secretaria de Educación | **INFORME SEMANAL # 7 CURVA DE INVERSIÓN SEMANAL** | **VERSIÓN 01**<br>Pág. 4 De 4 |

**1. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| INFORME No. | 7 | PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL | 14 de diciembre de 2020 | Y EL | 20 de diciembre de 2020 |
| OBJETO | INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO. | | | | |
| LOCALIZACIÓN | LOCALIDAD DE SAN CRISTOBAL | | | | |

**2. CURVA DE INVERSIÓN "S"**

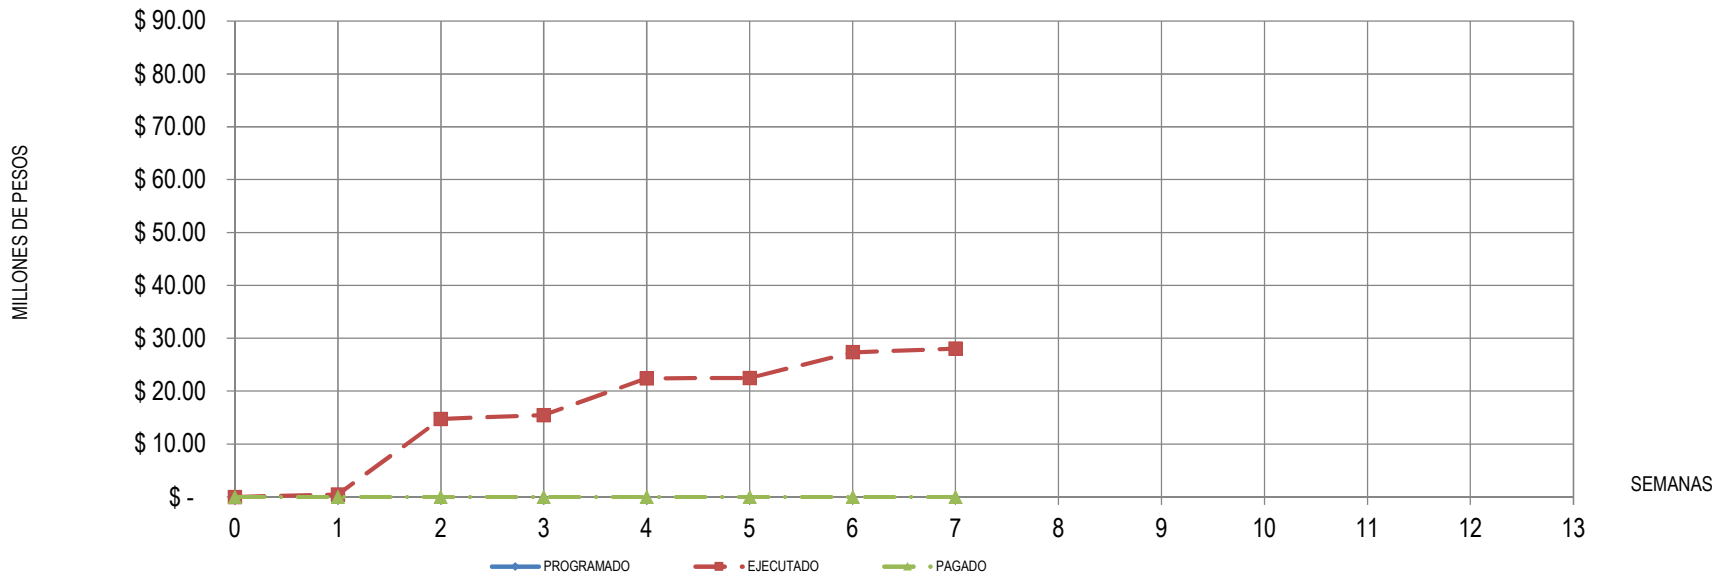

| BOGOTÁ Secretaría de Educación | **INFORME SEMANAL # 8** | VERSIÓN 01 |
|---|---|---|
| | | Pág. 1 De 4 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **OBJETO** | INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO. | | | | |
| **INTERVENTOR** | CONSORCIO INAR INGENIEROS | | | | |
| **CONTRATISTA** | MUÑOZ Y HERRERA INGENIEROS ASOCIADOS S.A | C. OBRA Nº | CO1.PCCNTR. 1577474 DE MAYO 28 DE 2020 | COLEGIO ALPES (I.E.D) | **ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL DISTRITO CAPITAL.** |
| **CONTRATANTE** | SECRETARIA DE EDUCACIÓN DISTRITAL (SED) | | | | |

| **SEMANA N°** | 8 | **DEL** | 21-Dec-20 | **AL** | 27-Dec-20 |
|---|---|---|---|---|---|

## 1. INFORMACIÓN CONTRACTUAL

| **CONTRATO DE INTERVENTORIA** | | **CONTRATO DE OBRA** | |
|---|---|---|---|
| **Contrato No .** | CO1.PCCNTR. 1680516 DE JULIO 21 DE 2020 | **Contrato No .** | CO1.PCCNTR.1577474 DE MAYO 28 DE 2020 |
| **Fecha de Iniciación** | 12 de Agosto de 2020 | **Fecha de Iniciación** | 19 de Agosto de 2020 |
| **Fecha de Terminación** | 11 de Febrero de 2021 | **Fecha de Terminación** | 18 de Enero de 2021 |
| **Plazo Inicial** | 6 meses | **Plazo Inicial** | 5 meses |
| **Valor inicial** | $ 160,550,040.00 | **Valor inicial** | $ 1,023,694,436.00 |

## 2. CONTROL DE PROGRAMACIÓN

| **EJECUCION SEMANAL POR CAPITULOS** | | | | **ACTIVIDADES** | |
|---|---|---|---|---|---|
| **No.** | **CAPÍTULO** | **PORCENTAJE PROGRAMADO** | **PORCENTAJE EJECUTADO** | **ACTIVIDADES** | **DESCRIPCIÓN** |
| 1 | PRELIMINARES | | | | |
| 2 | CIMENTACIÓN - | 1.60% | 0.35% | ACERO DE REFUERZO | ARMADO DE HIERRO PARA CARCAMOS |
| 3 | DESAGÜES E INSTALACIONES SUBTERRANEAS | 0.46% | | | |
| 4 | MAMPOSTERÍA | 0.32% | | | |
| 5 | PREFABRICADOS EN CONCRETO Y OTROS | | | | |
| 6 | INSTALACIÓN HIDRAULICA SANITARIA Y DE GAS | 0.49% | | | |
| 7 | INSTALACIÓN ELECTRICA, TELEFÓNICA Y COMUNICACIONES | | | | |
| 8 | PAÑETES | | | | |
| 9 | PISOS | | | | |
| 10 | CARPINTERIA METALICA | | | | |
| 11 | ENCHAPES | 0.003% | | | |
| 12 | ILUMINACIÓN | | | | |
| 13 | APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS | | | | |
| 14 | CIELO RASOS Y DIVISIONES | | | | |
| 15 | PINTURA | | | | |
| 16 | CERRADURAS Y VIDRIOS | | | | |
| 17 | ASEO Y VARIOS | 0.74% | | | |
| **TOTALES** | | **3.61%** | **0.35%** | | |

| BOGOTÁ Secretaría de Educación | **INFORME SEMANAL # 8** | **VERSIÓN 01**<br>Pág. 1 De 4 |
|---|---|---|

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **OBJETO** | INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO. | | | | |
| **INTERVENTOR** | CONSORCIO INAR INGENIEROS | | | | |
| **CONTRATISTA** | MUÑOZ Y HERRERA INGENIEROS ASOCIADOS S.A | C. OBRA Nº | CO1.PCCNTR. 1577474 DE MAYO 28 DE 2020 | COLEGIO ALPES (I.E.D) | **ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL DISTRITO CAPITAL.** |
| **CONTRATANTE** | SECRETARIA DE EDUCACIÓN DISTRITAL (SED) | | | | |

| **SEMANA N°** | 8 | **DEL** | 21-Dec-20 | **AL** | 27-Dec-20 |
|---|---|---|---|---|---|

## 3. RESUMEN FINANCIERO

| **BALANCE DE OBRA EJECUTADA** | **VR.TOTAL DEL FRENTE DE OBRA** | **VR. TOTAL EJECUTADO** | **VR. POR EJECUTAR** | **AVANCE DE INVERSION** | **SEMANA** | **ACUMULADO** |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | $ 197,434,522 | $ 28,746,929 | **$ 168,687,593** | | 0.35% | 14.56% |

## 4. PERSONAL EN LA OBRA

| **PERSONAL** | **CANTIDAD** | **PERSONAL** | **CANTIDAD** |
|---|---|---|---|
| | | PINTORES | |
| MAESTRO | 1 | OFICIALES | 2 |
| ELECTRICISTA | | AYUDANTES | 4 |
| AYU. DE ELECTRICIDAD | | ALMACENISTA | |
| INSTALADORES DE PISO | | RESIDENTE DE OBRA | 1 |
| SISOMA | 1 | | |
| HIDRÁULICOS | | | |

## 5. GRÁFICA CONTROL AVANCE DE OBRA (PROGRAMACIÓN)

Página 1




## 5. OBSERVACIONES, RECOMENDACIONES Y CONCLUSIONES

Se continua con el armado de hierro para los carcamos perimetrales de la cancha.

Se reliza la toma de 4 densidades el dia 22 de diciembre 2020 de las cuales solo da una y reiteradamente se solicita la estructura de la cancha ,y las medidas correctivas a relizar dado que la interventoria desde el inicio realizo recomendaciones las cuales no fueron acatadas

KEVIN RODRÍGUEZ
**INSPECTOR DE INTERVENTORIA**

LILIANA CUADROS GARCÍA
**Vo. Bo. RESIDENTE DE INTERVENTORIA**

**ANEXO FOTOGRÁFICO SEMANA 08**





FIGURADO DE HIERRO PARA CARCAMO EN CANCHA





FIGURADO DE HIERRO PARA CARCAMO EN CANCHA





TOMA DENSIDADES

| | | | |
|---|---|---|---|
| **CONTRATO No./ NOMBRE DEL PROYECTO** | INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DIST | | |
| **INTERVENTOR** | CONSORCIO INAR INGENIEROS | | |
| **CONTRATISTA** | MUÑOZ Y HERRERA INGENIEROS ASOCIADOS S.A | C. DE OBRA Nº | CO1.PCCNTR.1577474 DE MAYO 28 DE 2020 |
| **ENTIDAD CONTRATANTE** | SECRETARIA DE EDUCACIÓN DISTRITAL (SED) | | |


| PROYECTO | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **FECHA** | **VR. INVERSIÓN** | **VR. ACUMULADO** | **SEMANA** | **% PROGRAMADO** | **% PROGRAMADO ACUMULADO** |
| 1 de noviembre de 2020 | $ 576,541.74 | $ 576,541.74 | 1 | 0.29% | 0.29% |
| 8 de noviembre de 2020 | $ 2,301,047.39 | $ 2,877,589.13 | 2 | 1.16% | 1.45% |
| 15 de noviembre de 2020 | $ 10,215,294.74 | $ 13,092,883.88 | 3 | 5.16% | 6.61% |
| 22 de noviembre de 2020 | $ 13,560,363.40 | $ 26,653,247.27 | 4 | 6.85% | 13.47% |
| 29 de noviembre de 2020 | $ 13,556,340.71 | $ 40,209,587.99 | 5 | 6.85% | 20.31% |
| 6 de diciembre de 2020 | $ 11,880,323.65 | $ 52,089,911.64 | 6 | 6.00% | 26.32% |
| 13 de diciembre de 2020 | $ 4,406,764.60 | $ 56,496,676.23 | 7 | 2.23% | 28.54% |
| 20 de diciembre de 2020 | $ 34,007,795.85 | $ 90,504,472.08 | 8 | 17.18% | 45.72% |
| 27 de diciembre de 2020 | $ 50,223,450.47 | $ 140,727,922.55 | 9 | 25.37% | 71.10% |
| 3 de enero de 2021 | $ 23,048,461.45 | $ 163,776,384.00 | 10 | 11.64% | 82.74% |
| 10 de enero de 2021 | $ 27,054,881.37 | $ 190,831,265.37 | 11 | 13.67% | 96.41% |
| 17 de enero de 2021 | $ 7,109,924.78 | $ 197,941,190.15 | 12 | 3.59% | 100.00% |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| **TOTAL** | **$ 197,941,190.15** | | | | |

| BOGOTÁ Secretaria de Educación | INFORME SEMANAL # 8 CURVA DE INVERSIÓN SEMANAL | VERSIÓN 01 |
|---|---|---|
| | | Pág. 4 De 4 |

**1. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| INFORME No. | 8 | PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL | 21 de diciembre de 2020 | Y EL | 27 de diciembre de 2020 |
| OBJETO | INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO. | | | | |
| LOCALIZACIÓN | LOCALIDAD DE SAN CRISTOBAL | | | | |

**2. CURVA DE INVERSIÓN "S"**

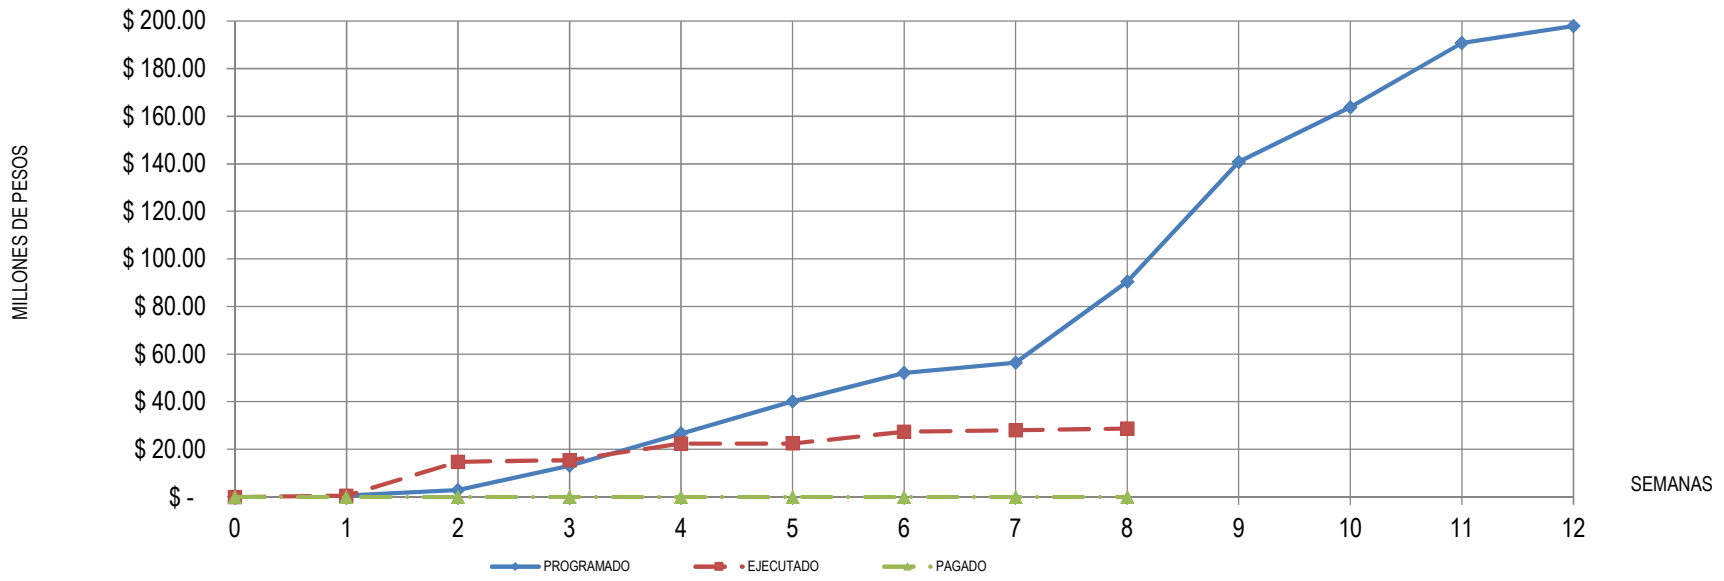

| BOGOTÁ Secretaría de Educación | **INFORME SEMANAL # 9** | VERSIÓN 01 |
|---|---|---|
| | | Pág. 1 De 4 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **OBJETO** | INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO. | | | | |
| **INTERVENTOR** | CONSORCIO INAR INGENIEROS | | | | |
| **CONTRATISTA** | MUÑOZ Y HERRERA INGENIEROS ASOCIADOS S.A | C. OBRA Nº | CO1.PCCNTR. 1577474 DE MAYO 28 DE 2020 | COLEGIO ALPES (I.E.D) | **ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL DISTRITO CAPITAL.** |
| **CONTRATANTE** | SECRETARIA DE EDUCACIÓN DISTRITAL (SED) | | | | |

| **SEMANA N°** | 9 | **DEL** | 28-Dec-20 | **AL** | 3-Jan-21 |
|---|---|---|---|---|---|

## 1. INFORMACIÓN CONTRACTUAL

| **CONTRATO DE INTERVENTORIA** | | **CONTRATO DE OBRA** | |
|---|---|---|---|
| **Contrato No .** | CO1.PCCNTR. 1680516 DE JULIO 21 DE 2020 | **Contrato No .** | CO1.PCCNTR.1577474 DE MAYO 28 DE 2020 |
| **Fecha de Iniciación** | 12 de Agosto de 2020 | **Fecha de Iniciación** | 19 de Agosto de 2020 |
| **Fecha de Terminación** | 11 de Febrero de 2021 | **Fecha de Terminación** | 18 de Enero de 2021 |
| **Plazo Inicial** | 6 meses | **Plazo Inicial** | 5 meses |
| **Valor inicial** | $ 160,550,040.00 | **Valor inicial** | $ 1,023,694,436.00 |

## 2. CONTROL DE PROGRAMACIÓN

| **EJECUCION SEMANAL POR CAPITULOS** | | | | **ACTIVIDADES** | |
|---|---|---|---|---|---|
| **No.** | **CAPÍTULO** | **PORCENTAJE PROGRAMADO** | **PORCENTAJE EJECUTADO** | **ACTIVIDADES** | **DESCRIPCIÓN** |
| 1 | PRELIMINARES | 0.26% | | | |
| 2 | CIMENTACIÓN - | 18.12% | 0.47% | relleno | relleno y novelacion de baños |
| 3 | DESAGÜES E INSTALACIONES SUBTERRANEAS | 0.04% | | | |
| 4 | MAMPOSTERÍA | 0.06% | | | |
| 5 | PREFABRICADOS EN CONCRETO Y OTROS | | | carcamo fundido en sitio | se inicia fundida de carcamo perimetral cancha |
| 6 | INSTALACIÓN HIDRAULICA SANITARIA Y DE GAS | | | | |
| 7 | INSTALACIÓN ELECTRICA, TELEFÓNICA Y COMUNICACIONES | 0.02% | | | |
| 8 | PAÑETES | 0.73% | | | |
| 9 | PISOS | 0.07% | | | |
| 10 | CARPINTERIA METALICA | | | | |
| 11 | ENCHAPES | | | | |
| 12 | ILUMINACIÓN | 0.04% | | | |
| 13 | APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS | | | | |
| 14 | CIELO RASOS Y DIVISIONES | | | | |
| 15 | PINTURA | | | | |
| 16 | CERRADURAS Y VIDRIOS | | | | |
| 17 | ASEO Y VARIOS | 0.56% | 0.45% | carcamo fundido en sitio | se inicia fundida de carcamo perimetral cancha |
| **TOTALES** | | **19.90%** | **0.92%** | | |

| BOGOTÁ Secretaría de Educación | **INFORME SEMANAL # 9** | **VERSIÓN 01**<br>Pág. 1 De 4 |
|---|---|---|

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **OBJETO** | INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO. | | | | |
| **INTERVENTOR** | CONSORCIO INAR INGENIEROS | | | | |
| **CONTRATISTA** | MUÑOZ Y HERRERA INGENIEROS ASOCIADOS S.A | C. OBRA Nº | CO1.PCCNTR. 1577474 DE MAYO 28 DE 2020 | COLEGIO ALPES (I.E.D) | **ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL DISTRITO CAPITAL.** |
| **CONTRATANTE** | SECRETARIA DE EDUCACIÓN DISTRITAL (SED) | | | | |

| **SEMANA N°** | 9 | **DEL** | 28-Dec-20 | **AL** | 3-Jan-21 |
|---|---|---|---|---|---|

## 3. RESUMEN FINANCIERO


| **BALANCE DE OBRA EJECUTADA** | **VR.TOTAL DEL FRENTE DE OBRA** | **VR. TOTAL EJECUTADO** | **VR. POR EJECUTAR** | **AVANCE DE INVERSION** | **SEMANA** | **ACUMULADO** |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | $ 197,434,522 | $ 30,562,745 | **$ 166,871,777** | | 0.92% | 15.48% |

## 4. PERSONAL EN LA OBRA

| **PERSONAL** | **CANTIDAD** | **PERSONAL** | **CANTIDAD** |
|---|---|---|---|
| | | PINTORES | |
| MAESTRO | 1 | OFICIALES | 2 |
| ELECTRICISTA | | AYUDANTES | 4 |
| AYU. DE ELECTRICIDAD | | ALMACENISTA | |
| INSTALADORES DE PISO | | RESIDENTE DE OBRA | 1 |
| SISOMA | 1 | | |
| HIDRÁULICOS | | | |

## 5. GRÁFICA CONTROL AVANCE DE OBRA (PROGRAMACIÓN)

Página 1

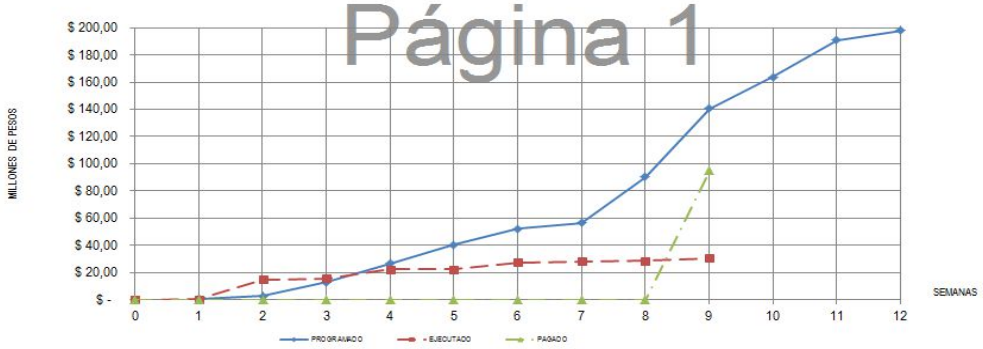


## 5. OBSERVACIONES, RECOMENDACIONES Y CONCLUSIONES

Se inicia fundida de carcamo perimetral de la cancha

Se realiza relleno con en recebo común en baños

KEVIN RODRÍGUEZ
**INSPECTOR DE INTERVENTORIA**


LILIANA CUADROS GARCÍA
**Vo. Bo. RESIDENTE DE INTERVENTORIA**

**ANEXO FOTOGRÁFICO SEMANA 09**





Inicio fundida de carcamo

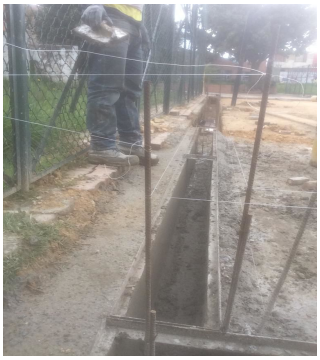



Fundida de carcamo





Relleno baños

| | | | |
|---|---|---|---|
| **CONTRATO No./ NOMBRE DEL PROYECTO** | INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DIST | | |
| **INTERVENTOR** | CONSORCIO INAR INGENIEROS | | |
| **CONTRATISTA** | MUÑOZ Y HERRERA INGENIEROS ASOCIADOS S.A | C. DE OBRA Nº | CO1.PCCNTR.1577474 DE MAYO 28 DE 2020 |
| **ENTIDAD CONTRATANTE** | SECRETARIA DE EDUCACIÓN DISTRITAL (SED) | | |


| **PROYECTO** | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **FECHA** | **VR. INVERSIÓN** | **VR. ACUMULADO** | **SEMANA** | **% PROGRAMADO** | **% PROGRAMADO ACUMULADO** |
| 1 de noviembre de 2020 | $ 576,541.74 | $ 576,541.74 | 1 | 0.29% | 0.29% |
| 8 de noviembre de 2020 | $ 2,301,047.39 | $ 2,877,589.13 | 2 | 1.16% | 1.45% |
| 15 de noviembre de 2020 | $ 10,215,294.74 | $ 13,092,883.88 | 3 | 5.16% | 6.61% |
| 22 de noviembre de 2020 | $ 13,560,363.40 | $ 26,653,247.27 | 4 | 6.85% | 13.47% |
| 29 de noviembre de 2020 | $ 13,556,340.71 | $ 40,209,587.99 | 5 | 6.85% | 20.31% |
| 6 de diciembre de 2020 | $ 11,880,323.65 | $ 52,089,911.64 | 6 | 6.00% | 26.32% |
| 13 de diciembre de 2020 | $ 4,406,764.60 | $ 56,496,676.23 | 7 | 2.23% | 28.54% |
| 20 de diciembre de 2020 | $ 34,007,795.85 | $ 90,504,472.08 | 8 | 17.18% | 45.72% |
| 27 de diciembre de 2020 | $ 50,223,450.47 | $ 140,727,922.55 | 9 | 25.37% | 71.10% |
| 3 de enero de 2021 | $ 23,048,461.45 | $ 163,776,384.00 | 10 | 11.64% | 82.74% |
| 10 de enero de 2021 | $ 27,054,881.37 | $ 190,831,265.37 | 11 | 13.67% | 96.41% |
| 17 de enero de 2021 | $ 7,109,924.78 | $ 197,941,190.15 | 12 | 3.59% | 100.00% |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| **TOTAL** | **$ 197,941,190.15** | | | | |

| BOGOTÁ Secretaria de Educación | INFORME SEMANAL # 9 CURVA DE INVERSIÓN SEMANAL | VERSIÓN 01<br>Pág. 4 De 4 |
|---|---|---|

## 1. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| INFORME No. | 9 | PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL | 28 de diciembre de 2020 | Y EL | 3 de enero de 2021 |
| OBJETO | INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO. | | | | |
| LOCALIZACIÓN | LOCALIDAD DE SAN CRISTOBAL | | | | |

## 2. CURVA DE INVERSIÓN "S"

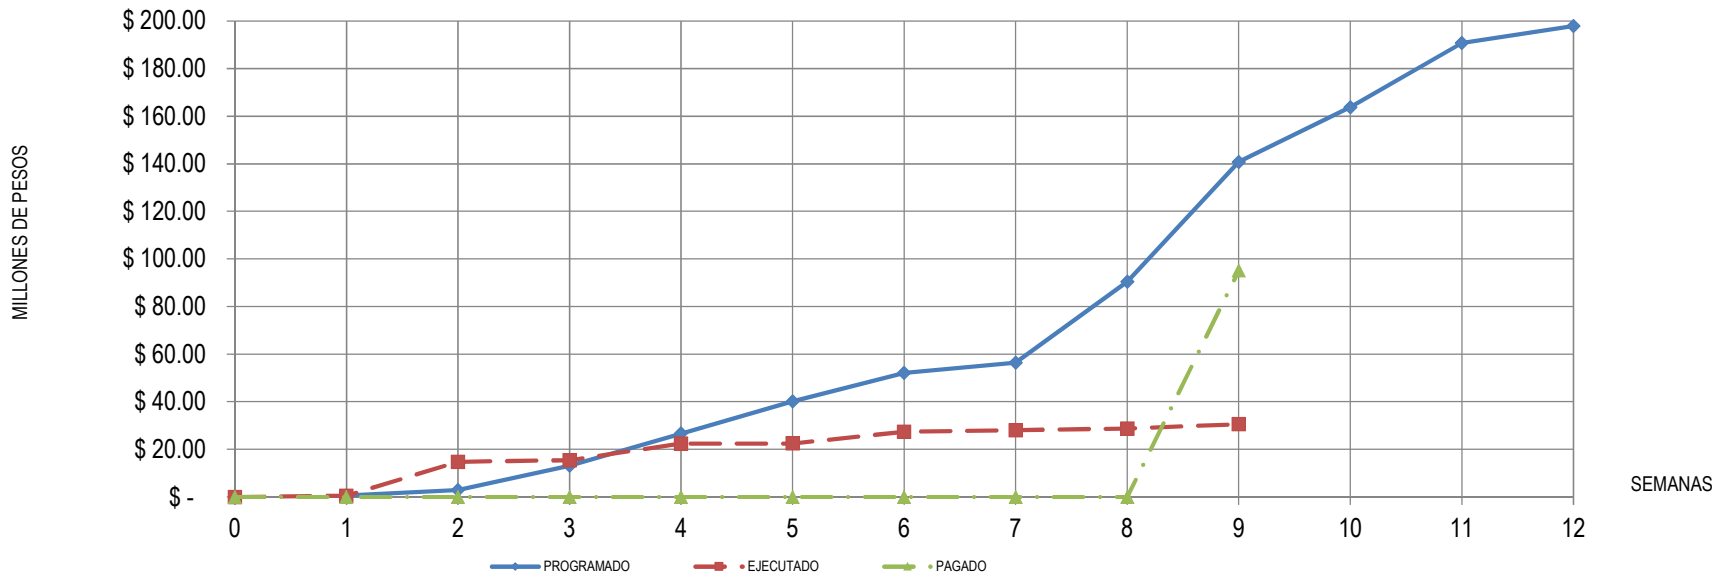

| BOGOTÁ Secretaría de Educación | **INFORME SEMANAL # 10** | VERSIÓN 01 |
|---|---|---|
| | | Pág. 1 De 4 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **OBJETO** | INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO. | | | | |
| **INTERVENTOR** | CONSORCIO INAR INGENIEROS | | | | |
| **CONTRATISTA** | MUÑOZ Y HERRERA INGENIEROS ASOCIADOS S.A | C. OBRA Nº | CO1.PCCNTR. 1577474 DE MAYO 28 DE 2020 | COLEGIO ALPES (I.E.D) | **ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL DISTRITO CAPITAL.** |
| **CONTRATANTE** | SECRETARIA DE EDUCACIÓN DISTRITAL (SED) | | | | |

| **SEMANA N°** | 10 | **DEL** | 4-Jan-21 | **AL** | 10-Jan-21 |
|---|---|---|---|---|---|

## 1. INFORMACIÓN CONTRACTUAL

| **CONTRATO DE INTERVENTORIA** | | **CONTRATO DE OBRA** | |
|---|---|---|---|
| **Contrato No .** | CO1.PCCNTR. 1680516 DE JULIO 21 DE 2020 | **Contrato No .** | CO1.PCCNTR.1577474 DE MAYO 28 DE 2020 |
| **Fecha de Iniciación** | 12 de Agosto de 2020 | **Fecha de Iniciación** | 19 de Agosto de 2020 |
| **Fecha de Terminación** | 11 de Febrero de 2021 | **Fecha de Terminación** | 18 de Enero de 2021 |
| **Plazo Inicial** | 6 meses | **Plazo Inicial** | 5 meses |
| **Valor inicial** | $ 160,550,040.00 | **Valor inicial** | $ 1,023,694,436.00 |

## 2. CONTROL DE PROGRAMACIÓN

| **EJECUCION SEMANAL POR CAPITULOS** | | | | **ACTIVIDADES** | |
|---|---|---|---|---|---|
| **No.** | **CAPÍTULO** | **PORCENTAJE PROGRAMADO** | **PORCENTAJE EJECUTADO** | **ACTIVIDADES** | **DESCRIPCIÓN** |
| 1 | PRELIMINARES | 0.13% | | | |
| 2 | CIMENTACIÓN - | 1.27% | | | |
| 3 | DESAGÜES E INSTALACIONES SUBTERRANEAS | | | | |
| 4 | MAMPOSTERÍA | 0.16% | | | |
| 5 | PREFABRICADOS EN CONCRETO Y OTROS | | | | |
| 6 | INSTALACIÓN HIDRAULICA SANITARIA Y DE GAS | | | | |
| 7 | INSTALACIÓN ELECTRICA, TELEFÓNICA Y COMUNICACIONES | 0.37% | | | |
| 8 | PAÑETES | 0.60% | | | |
| 9 | PISOS | 1.71% | | | |
| 10 | CARPINTERIA METALICA | | | | |
| 11 | ENCHAPES | 1.45% | | | |
| 12 | ILUMINACIÓN | 0.40% | | | |
| 13 | APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS | | | | |
| 14 | CIELO RASOS Y DIVISIONES | | | | |
| 15 | PINTURA | 0.37% | | | |
| 16 | CERRADURAS Y VIDRIOS | | | | |
| 17 | ASEO Y VARIOS | 5.58% | 2.52% | Carcamo fundido en sitio | Se continua fundida de carcamo perimetral cancha |
| **TOTALES** | | **12.04%** | **2.52%** | | |

| BOGOTÁ Secretaría de Educación | INFORME SEMANAL # 10 | VERSIÓN 01 |
|---|---|---|
| | | Pág. 1 De 4 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **OBJETO** | INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO. | | | | |
| **INTERVENTOR** | CONSORCIO INAR INGENIEROS | | | | |
| **CONTRATISTA** | MUÑOZ Y HERRERA INGENIEROS ASOCIADOS S.A | C. OBRA Nº | CO1.PCCNTR. 1577474 DE MAYO 28 DE 2020 | COLEGIO ALPES (I.E.D) | **ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL DISTRITO CAPITAL.** |
| **CONTRATANTE** | SECRETARIA DE EDUCACIÓN DISTRITAL (SED) | | | | |

| **SEMANA N°** | 10 | **DEL** | 4-Jan-21 | **AL** | 10-Jan-21 |
|---|---|---|---|---|---|

## 3. RESUMEN FINANCIERO


| **BALANCE DE OBRA EJECUTADA** | **VR.TOTAL DEL FRENTE DE OBRA** | **VR. TOTAL EJECUTADO** | **VR. POR EJECUTAR** | **AVANCE DE INVERSION** | **SEMANA** | **ACUMULADO** |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | $ 197,434,522 | $ 35,531,496 | **$ 161,903,027** | | 2.52% | 18.00% |

## 4. PERSONAL EN LA OBRA

| **PERSONAL** | **CANTIDAD** | **PERSONAL** | **CANTIDAD** |
|---|---|---|---|
| | | PINTORES | |
| MAESTRO | 1 | OFICIALES | 2 |
| ELECTRICISTA | | AYUDANTES | 4 |
| AYU. DE ELECTRICIDAD | | ALMACENISTA | |
| INSTALADORES DE PISO | | RESIDENTE DE OBRA | 1 |
| SISOMA | 1 | | |
| HIDRÁULICOS | | | |

## 5. GRÁFICA CONTROL AVANCE DE OBRA (PROGRAMACIÓN)

Página 1

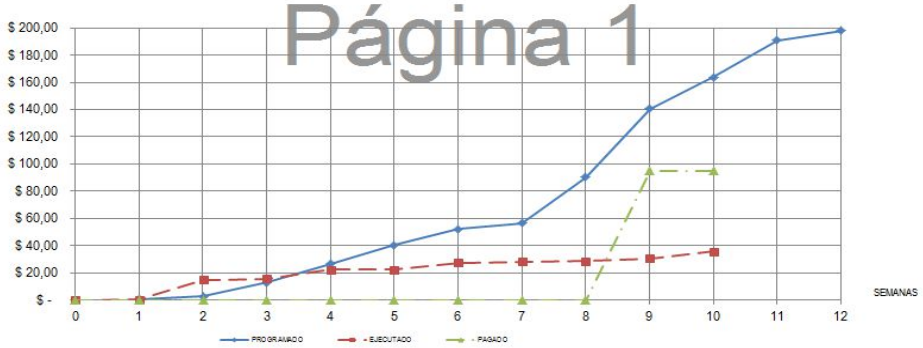


## 5. OBSERVACIONES, RECOMENDACIONES Y CONCLUSIONES

Se continua fundida de carcamo perimetral de la cancha

KEVIN RODRÍGUEZ
**INSPECTOR DE INTERVENTORIA**

LILIANA CUADROS GARCÍA
**Vo. Bo. RESIDENTE DE INTERVENTORIA**

**ANEXO FOTOGRÁFICO SEMANA 10**





Fundida de carcamo





Fundida de carcamo





Fundida de carcamo

| | | | |
|---|---|---|---|
| **CONTRATO No./ NOMBRE DEL PROYECTO** | INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DIST | | |
| **INTERVENTOR** | CONSORCIO INAR INGENIEROS | | |
| **CONTRATISTA** | MUÑOZ Y HERRERA INGENIEROS ASOCIADOS S.A | C. DE OBRA Nº | CO1.PCCNTR.1577474 DE MAYO 28 DE 2020 |
| **ENTIDAD CONTRATANTE** | SECRETARIA DE EDUCACIÓN DISTRITAL (SED) | | |


| PROYECTO | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **FECHA** | **VR. INVERSIÓN** | **VR. ACUMULADO** | **SEMANA** | **% PROGRAMADO** | **% PROGRAMADO ACUMULADO** |
| 1 de noviembre de 2020 | $ 576,541.74 | $ 576,541.74 | 1 | 0.29% | 0.29% |
| 8 de noviembre de 2020 | $ 2,301,047.39 | $ 2,877,589.13 | 2 | 1.16% | 1.45% |
| 15 de noviembre de 2020 | $ 10,215,294.74 | $ 13,092,883.88 | 3 | 5.16% | 6.61% |
| 22 de noviembre de 2020 | $ 13,560,363.40 | $ 26,653,247.27 | 4 | 6.85% | 13.47% |
| 29 de noviembre de 2020 | $ 13,556,340.71 | $ 40,209,587.99 | 5 | 6.85% | 20.31% |
| 6 de diciembre de 2020 | $ 11,880,323.65 | $ 52,089,911.64 | 6 | 6.00% | 26.32% |
| 13 de diciembre de 2020 | $ 4,406,764.60 | $ 56,496,676.23 | 7 | 2.23% | 28.54% |
| 20 de diciembre de 2020 | $ 34,007,795.85 | $ 90,504,472.08 | 8 | 17.18% | 45.72% |
| 27 de diciembre de 2020 | $ 50,223,450.47 | $ 140,727,922.55 | 9 | 25.37% | 71.10% |
| 3 de enero de 2021 | $ 23,048,461.45 | $ 163,776,384.00 | 10 | 11.64% | 82.74% |
| 10 de enero de 2021 | $ 27,054,881.37 | $ 190,831,265.37 | 11 | 13.67% | 96.41% |
| 17 de enero de 2021 | $ 7,109,924.78 | $ 197,941,190.15 | 12 | 3.59% | 100.00% |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| **TOTAL** | **$ 197,941,190.15** | | | | |

| | | |
|---|---|---|
| BOGOTÁ Secretaria de Educación | **INFORME SEMANAL # 10 CURVA DE INVERSIÓN SEMANAL** | **VERSIÓN 01**<br>Pág. 4 De 4 |

**1. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| INFORME No. | 10 | PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL | 4 de enero de 2021 | Y EL | 10 de enero de 2021 |
| OBJETO | INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO. | | | | |
| LOCALIZACIÓN | LOCALIDAD DE SAN CRISTOBAL | | | | |

**2. CURVA DE INVERSIÓN "S"**

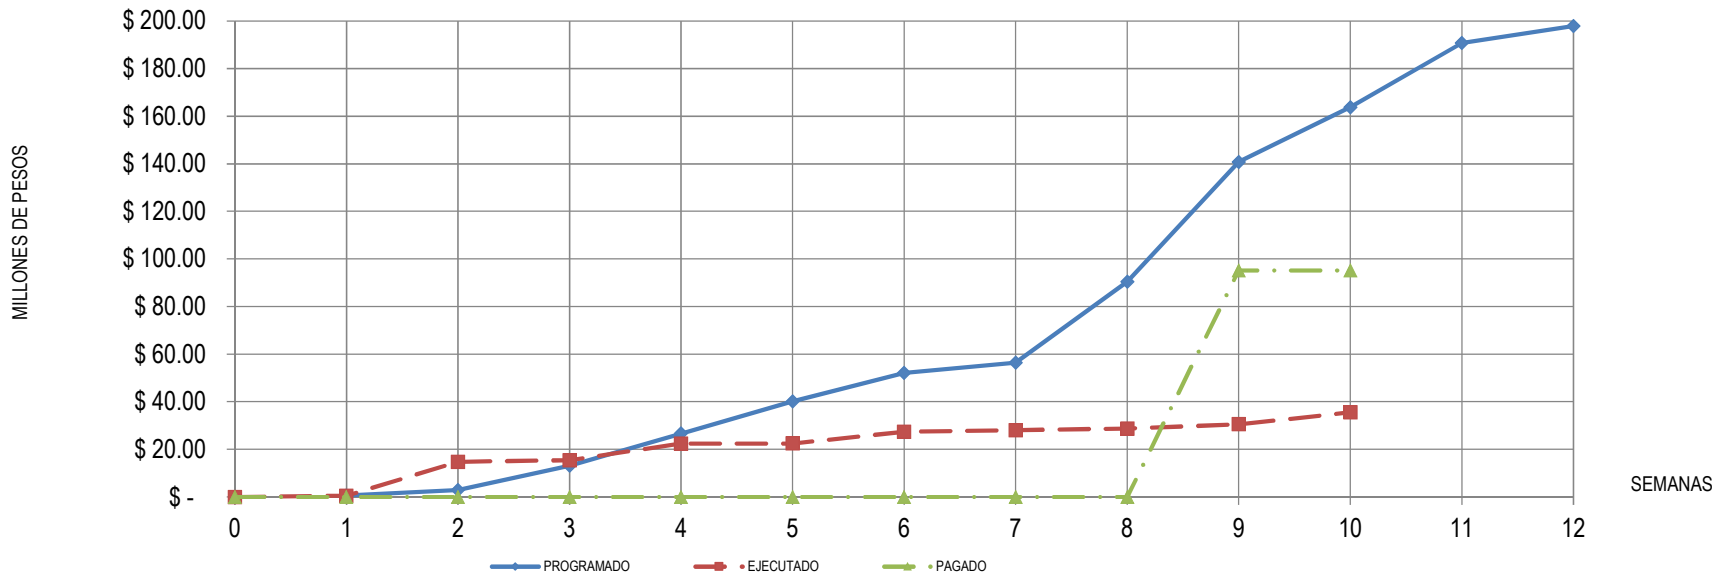

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **OBJETO** | INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO. | | | | |
| **INTERVENTOR** | CONSORCIO INAR INGENIEROS | | | | |
| **CONTRATISTA** | MUÑOZ Y HERRERA INGENIEROS ASOCIADOS S.A | C. OBRA Nº | CO1.PCCNTR. 1577474 DE MAYO 28 DE 2020 | COLEGIO ALPES (I.E.D) | **ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL DISTRITO CAPITAL.** |
| **CONTRATANTE** | SECRETARIA DE EDUCACIÓN DISTRITAL (SED) | | | | |

| **SEMANA N°** | 11 | **DEL** | 11-Jan-21 | **AL** | 17-Jan-21 |
|---|---|---|---|---|---|

## 1. INFORMACIÓN CONTRACTUAL

| **CONTRATO DE INTERVENTORIA** | | **CONTRATO DE OBRA** | |
|---|---|---|---|
| **Contrato No .** | CO1.PCCNTR. 1680516 DE JULIO 21 DE 2020 | **Contrato No .** | CO1.PCCNTR.1577474 DE MAYO 28 DE 2020 |
| **Fecha de Iniciación** | 12 de Agosto de 2020 | **Fecha de Iniciación** | 19 de Agosto de 2020 |
| **Fecha de Terminación** | 11 de Febrero de 2021 | **Fecha de Terminación** | 18 de Enero de 2021 |
| **Plazo Inicial** | 6 meses | **Plazo Inicial** | 5 meses |
| **Valor inicial** | $ 160,550,040.00 | **Valor inicial** | $ 1,023,694,436.00 |

## 2. CONTROL DE PROGRAMACIÓN

| **EJECUCION SEMANAL POR CAPITULOS** | | | | **ACTIVIDADES** | |
|---|---|---|---|---|---|
| **No.** | **CAPÍTULO** | **PORCENTAJE PROGRAMADO** | **PORCENTAJE EJECUTADO** | **ACTIVIDADES** | **DESCRIPCIÓN** |
| 1 | PRELIMINARES | 0.13% | | | |
| 2 | CIMENTACIÓN - | 0.02% | 0.39% | Acero de refuerzo carcamo | Acero refuerzo carcamo |
| 3 | DESAGÜES E INSTALACIONES SUBTERRANEAS | | | | |
| 4 | MAMPOSTERÍA | 0.09% | | | |
| 5 | PREFABRICADOS EN CONCRETO Y OTROS | | | | |
| 6 | INSTALACIÓN HIDRAULICA SANITARIA Y DE GAS | | | | |
| 7 | INSTALACIÓN ELECTRICA, TELEFÓNICA Y COMUNICACIONES | | | | |
| 8 | PAÑETES | | | | |
| 9 | PISOS | 0.40% | | | |
| 10 | CARPINTERIA METALICA | | | | |
| 11 | ENCHAPES | 0.87% | | | |
| 12 | ILUMINACIÓN | 0.16% | | | |
| 13 | APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS | 3.73% | | | |
| 14 | CIELO RASOS Y DIVISIONES | 6.17% | | | |
| 15 | PINTURA | 0.99% | | | |
| 16 | CERRADURAS Y VIDRIOS | 0.20% | | | |
| 17 | ASEO Y VARIOS | 0.67% | 8.78% | Carcamo fundido en sitio | Se culmina la fundida de carcamo perimetral cancha |
| **TOTALES** | | **13.43%** | **9.17%** | | |

| BOGOTÁ Secretaría de Educación | INFORME SEMANAL # 11 | VERSIÓN 01 |
|---|---|---|
| | | Pág. 1 De 4 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **OBJETO** | INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO. | | | | |
| **INTERVENTOR** | CONSORCIO INAR INGENIEROS | | | | |
| **CONTRATISTA** | MUÑOZ Y HERRERA INGENIEROS ASOCIADOS S.A | C. OBRA Nº | CO1.PCCNTR. 1577474 DE MAYO 28 DE 2020 | COLEGIO ALPES (I.E.D) | **ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL DISTRITO CAPITAL.** |
| **CONTRATANTE** | SECRETARIA DE EDUCACIÓN DISTRITAL (SED) | | | | |

| **SEMANA N°** | 11 | **DEL** | 11-Jan-21 | **AL** | 17-Jan-21 |
|---|---|---|---|---|---|

## 3. RESUMEN FINANCIERO


| **BALANCE DE OBRA EJECUTADA** | **VR.TOTAL DEL FRENTE DE OBRA** | **VR. TOTAL EJECUTADO** | **VR. POR EJECUTAR** | **AVANCE DE INVERSION** | **SEMANA** | **ACUMULADO** |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | $ 197,434,522 | $ 53,645,796 | **$ 143,788,727** | | 9.17% | 27.17% |

## 4. PERSONAL EN LA OBRA

| PERSONAL | CANTIDAD | PERSONAL | CANTIDAD |
|---|---|---|---|
| | | PINTORES | |
| MAESTRO | 1 | OFICIALES | 2 |
| ELECTRICISTA | | AYUDANTES | 4 |
| AYU. DE ELECTRICIDAD | | ALMACENISTA | |
| INSTALADORES DE PISO | | RESIDENTE DE OBRA | 1 |
| SISOMA | 1 | | |
| HIDRÁULICOS | | | |

## 5. GRÁFICA CONTROL AVANCE DE OBRA (PROGRAMACIÓN)

Página 1

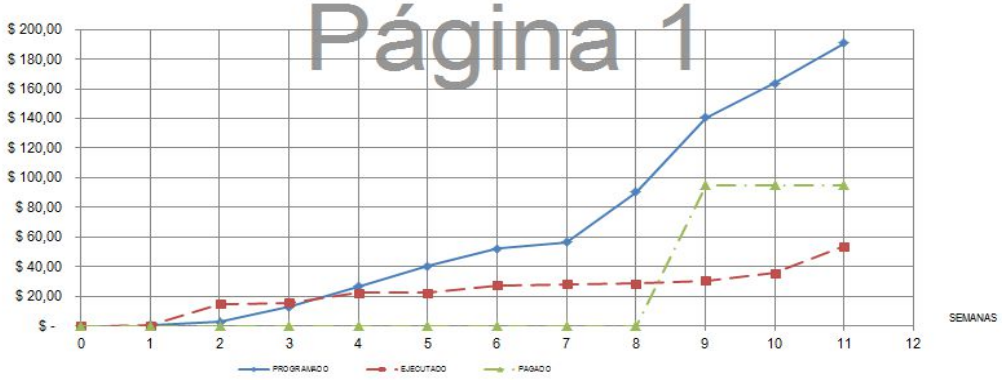


## 5. OBSERVACIONES, RECOMENDACIONES Y CONCLUSIONES

Se culmina fundida de carcamo perimetral de la cancha

Se solicita al contrastista retirar el material de la cancha, colocar nuevo material y compactar para la toma de densidades.

KEVIN RODRÍGUEZ
**INSPECTOR DE INTERVENTORIA**

LILIANA CUADROS GARCÍA
**Vo. Bo. RESIDENTE DE INTERVENTORIA**

**ANEXO FOTOGRÁFICO SEMANA 11**





ultimo tramo de carcamo





ultimo tramo de carcamo





ultimo tramo de carcamo

| | | | |
|---|---|---|---|
| **CONTRATO No./ NOMBRE DEL PROYECTO** | INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DIST | | |
| **INTERVENTOR** | CONSORCIO INAR INGENIEROS | | |
| **CONTRATISTA** | MUÑOZ Y HERRERA INGENIEROS ASOCIADOS S.A | C. DE OBRA Nº | CO1.PCCNTR.1577474 DE MAYO 28 DE 2020 |
| **ENTIDAD CONTRATANTE** | SECRETARIA DE EDUCACIÓN DISTRITAL (SED) | | |


| PROYECTO | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **FECHA** | **VR. INVERSIÓN** | **VR. ACUMULADO** | **SEMANA** | **% PROGRAMADO** | **% PROGRAMADO ACUMULADO** |
| 1 de noviembre de 2020 | $ 576,541.74 | $ 576,541.74 | 1 | 0.29% | 0.29% |
| 8 de noviembre de 2020 | $ 2,301,047.39 | $ 2,877,589.13 | 2 | 1.16% | 1.45% |
| 15 de noviembre de 2020 | $ 10,215,294.74 | $ 13,092,883.88 | 3 | 5.16% | 6.61% |
| 22 de noviembre de 2020 | $ 13,560,363.40 | $ 26,653,247.27 | 4 | 6.85% | 13.47% |
| 29 de noviembre de 2020 | $ 13,556,340.71 | $ 40,209,587.99 | 5 | 6.85% | 20.31% |
| 6 de diciembre de 2020 | $ 11,880,323.65 | $ 52,089,911.64 | 6 | 6.00% | 26.32% |
| 13 de diciembre de 2020 | $ 4,406,764.60 | $ 56,496,676.23 | 7 | 2.23% | 28.54% |
| 20 de diciembre de 2020 | $ 34,007,795.85 | $ 90,504,472.08 | 8 | 17.18% | 45.72% |
| 27 de diciembre de 2020 | $ 50,223,450.47 | $ 140,727,922.55 | 9 | 25.37% | 71.10% |
| 3 de enero de 2021 | $ 23,048,461.45 | $ 163,776,384.00 | 10 | 11.64% | 82.74% |
| 10 de enero de 2021 | $ 27,054,881.37 | $ 190,831,265.37 | 11 | 13.67% | 96.41% |
| 17 de enero de 2021 | $ 7,109,924.78 | $ 197,941,190.15 | 12 | 3.59% | 100.00% |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| **TOTAL** | **$ 197,941,190.15** | | | | |

| | | |
|---|---|---|
| BOGOTÁ Secretaria de Educación | **INFORME SEMANAL # 11 CURVA DE INVERSIÓN SEMANAL** | **VERSIÓN 01**<br>Pág. 4 De 4 |

**1. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| INFORME No. | 11 | PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL | 11 de enero de 2021 | Y EL | 17 de enero de 2021 |
| OBJETO | INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO. | | | | |
| LOCALIZACIÓN | LOCALIDAD DE SAN CRISTOBAL | | | | |

**2. CURVA DE INVERSIÓN "S"**

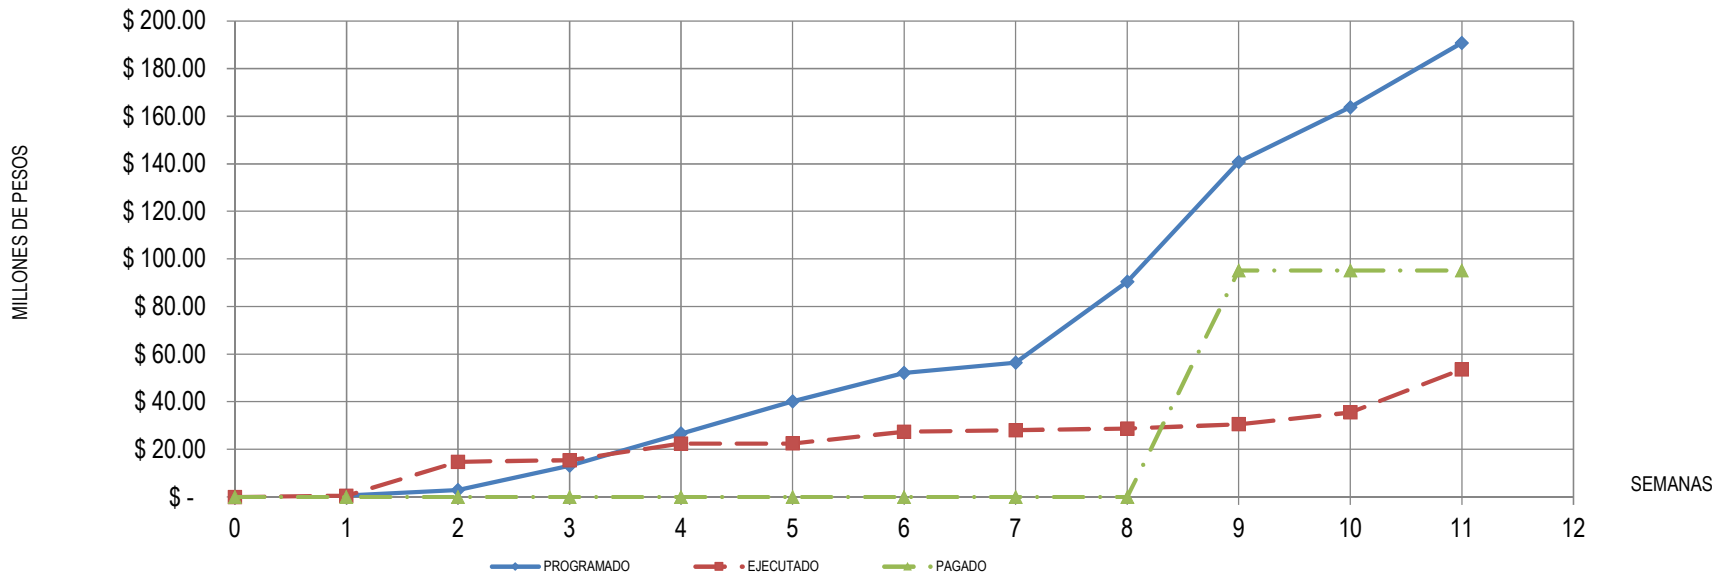

| BOGOTÁ Secretaría de Educación | **INFORME SEMANAL # 7** | VERSIÓN 01 |
|---|---|---|
| | | Pág. 1 De 4 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **OBJETO** | INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO. | | | | |
| **INTERVENTOR** | CONSORCIO INAR INGENIEROS | | | | |
| **CONTRATISTA** | MUÑOZ Y HERRERA INGENIEROS ASOCIADOS S.A | C. OBRA Nº | CO1.PCCNTR. 1577474 DE MAYO 28 DE 2020 | COLEGIO GRAN COLOMBIA (I.E.D) | **ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL DISTRITO CAPITAL.** |
| **CONTRATANTE** | SECRETARIA DE EDUCACIÓN DISTRITAL (SED) | | | | |

| **SEMANA N°** | 7 | **DEL** | 14-Dec-20 | **AL** | 20-Dec-20 |
|---|---|---|---|---|---|

## 1. INFORMACIÓN CONTRACTUAL

| **CONTRATO DE INTERVENTORIA** | | **CONTRATO DE OBRA** | |
|---|---|---|---|
| **Contrato No .** | CO1.PCCNTR. 1680516 DE JULIO 21 DE 2020 | **Contrato No .** | CO1.PCCNTR.1577474 DE MAYO 28 DE 2020 |
| **Fecha de Iniciación** | 12 de Agosto de 2020 | **Fecha de Iniciación** | 19 de Agosto de 2020 |
| **Fecha de Terminación** | 11 de Febrero de 2021 | **Fecha de Terminación** | 18 de Enero de 2021 |
| **Plazo Inicial** | 6 meses | **Plazo Inicial** | 5 meses |
| **Valor inicial** | $ 160,550,040.00 | **Valor inicial** | $ 1,023,694,436.00 |

## 2. CONTROL DE PROGRAMACIÓN

| **EJECUCION SEMANAL POR CAPITULOS** | | | | **ACTIVIDADES** | |
|---|---|---|---|---|---|
| **No.** | **CAPÍTULO** | **PORCENTAJE PROGRAMADO** | **PORCENTAJE EJECUTADO** | **ACTIVIDADES** | **DESCRIPCIÓN** |
| 1 | PRELIMINARES | | | | |
| 2 | CIMENTACIÓN - | | 4.25% | CONCRETOS PARA CIMENTACION | SUMINISTRO E INSTALACION DE CONCRETO PARA RAMPA EXTERIOR |
| 3 | DESAGÜES E INSTALACIONES SUBTERRANEAS | | | | |
| 4 | ESTRUCTURA | | | | |
| 5 | MAMPOSTERÍA | | | | |
| 6 | PREFABRICADOS EN CONCRETO Y OTROS | | | | |
| 7 | INSTALACIÓN HIDRAULICA SANITARIA Y DE GAS | | | | |
| 8 | INSTALACIÓN ELECTRICA, TELEFÓNICA Y COMUNICACIONES | | | | |
| 9 | PAÑETES | | | | |
| 10 | PISOS | | | | |
| 11 | CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES | | | | |
| 12 | CARPINTERIA METALICA | | | | |
| 14 | ENCHAPES | | | | |
| 15 | ILUMINACIÓN | | | | |
| 16 | APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS | | | | |
| 18 | PINTURA | | | | |
| 19 | CERRADURAS Y VIDRIOS | | | | |
| 21 | ASEO Y VARIOS | | | | |
| **TOTALES** | | **0.00%** | **4.25%** | | |

| BOGOTÁ Secretaria de Educación | **INFORME SEMANAL # 7** | **VERSIÓN 01**<br>Pág. 1 De 4 |
|---|---|---|

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **OBJETO** | INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO. | | | | |
| **INTERVENTOR** | CONSORCIO INAR INGENIEROS | | | | |
| **CONTRATISTA** | MUÑOZ Y HERRERA INGENIEROS ASOCIADOS S.A | C. OBRA Nº | CO1.PCCNTR. 1577474 DE MAYO 28 DE 2020 | COLEGIO GRAN COLOMBIA (I.E.D) | **ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL DISTRITO CAPITAL.** |
| **CONTRATANTE** | SECRETARIA DE EDUCACIÓN DISTRITAL (SED) | | | | |

| **SEMANA N°** | 7 | **DEL** | 14-Dec-20 | **AL** | 20-Dec-20 |
|---|---|---|---|---|---|

## 3. RESUMEN FINANCIERO


| **BALANCE DE OBRA EJECUTADA** | **VR.TOTAL DEL FRENTE DE OBRA** | **VR. TOTAL EJECUTADO** | **VR. POR EJECUTAR** | **AVANCE DE INVERSION** | **SEMANA** | **ACUMULADO** |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | $ 50,001,183 | $ 14,659,092 | **$ 35,342,091** | | 4.25% | 29.32% |

## 4. PERSONAL EN LA OBRA

| **PERSONAL** | **CANTIDAD** | **PERSONAL** | **CANTIDAD** |
|---|---|---|---|
| | | PINTORES | |
| MAESTRO | | OFICIALES | 1 |
| ELECTRICISTA | | AYUDANTES | 5 |
| AYU. DE ELECTRICIDAD | | ALMACENISTA | |
| INSTALADORES DE PISO | | RESIDENTE DE OBRA | |
| SISOMA | 1 | | |
| HIDRÁULICOS | | | |

## 5. GRÁFICA CONTROL AVANCE DE OBRA (PROGRAMACIÓN)

Página 1

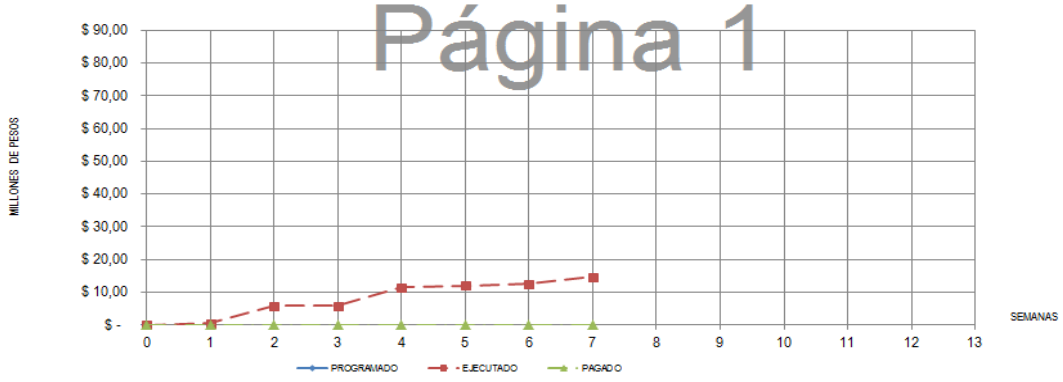


## 5. OBSERVACIONES, RECOMENDACIONES Y CONCLUSIONES

Se funde rampa exterior, anden y escaleras de acceso a la Institución.

Se recomienda al contratista incrementar el equipo de trabajo para no generar retrasos en el frente de obra.

No se ha entregado programación ni flujo de inversión.

Se realiza la curva con solo valores ejecutados.

ARLEY VARGAS RODRÍGUEZ
**INSPECTOR DE INTERVENTORIA**

LILIANA CUADROS GARCÍA
**Vo. Bo. RESIDENTE DE INTERVENTORIA**

**ANEXO FOTOGRÁFICO SEMANA 07**




**SUMINISTRO DE CONCRETO PARA RAMPA EXTERIOR**



**VACIADO DE CONCRETO PARA RAMPA**



**VACIADO DE CONCRETO PARA RAMPA**



**ESCOBEADO DE ANDEN**



**ESCOBEADO DE ANDEN**



**DILATACIONES EN RAMPA EXTERIOR**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **CONTRATO No./ NOMBRE DEL PROYECTO** | INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DIST | | |
| **INTERVENTOR** | CONSORCIO INAR INGENIEROS | | |
| **CONTRATISTA** | MUÑOZ Y HERRERA INGENIEROS ASOCIADOS S.A | C. DE OBRA Nº | CO1.PCCNTR.1577474 DE MAYO 28 DE 2020 |
| **ENTIDAD CONTRATANTE** | SECRETARIA DE EDUCACIÓN DISTRITAL (SED) | | |


| **PROYECTO** | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **FECHA** | **VR. INVERSIÓN** | **VR. ACUMULADO** | **SEMANA** | **% PROGRAMADO** | **% PROGRAMADO ACUMULADO** |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| **TOTAL** | **$** - | | | | |

| | | |
|---|---|---|
| BOGOTÁ Secretaria de Educación | **INFORME SEMANAL # 7 CURVA DE INVERSIÓN SEMANAL** | **VERSIÓN 01**<br>Pág. 4 De 4 |

**1. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| INFORME No. | 7 | PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL | 14 de diciembre de 2020 | Y EL | 20 de diciembre de 2020 |
| OBJETO | INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO. | | | | |
| LOCALIZACIÓN | LOCALIDAD DE SAN CRISTOBAL | | | | |

**2. CURVA DE INVERSIÓN "S"**

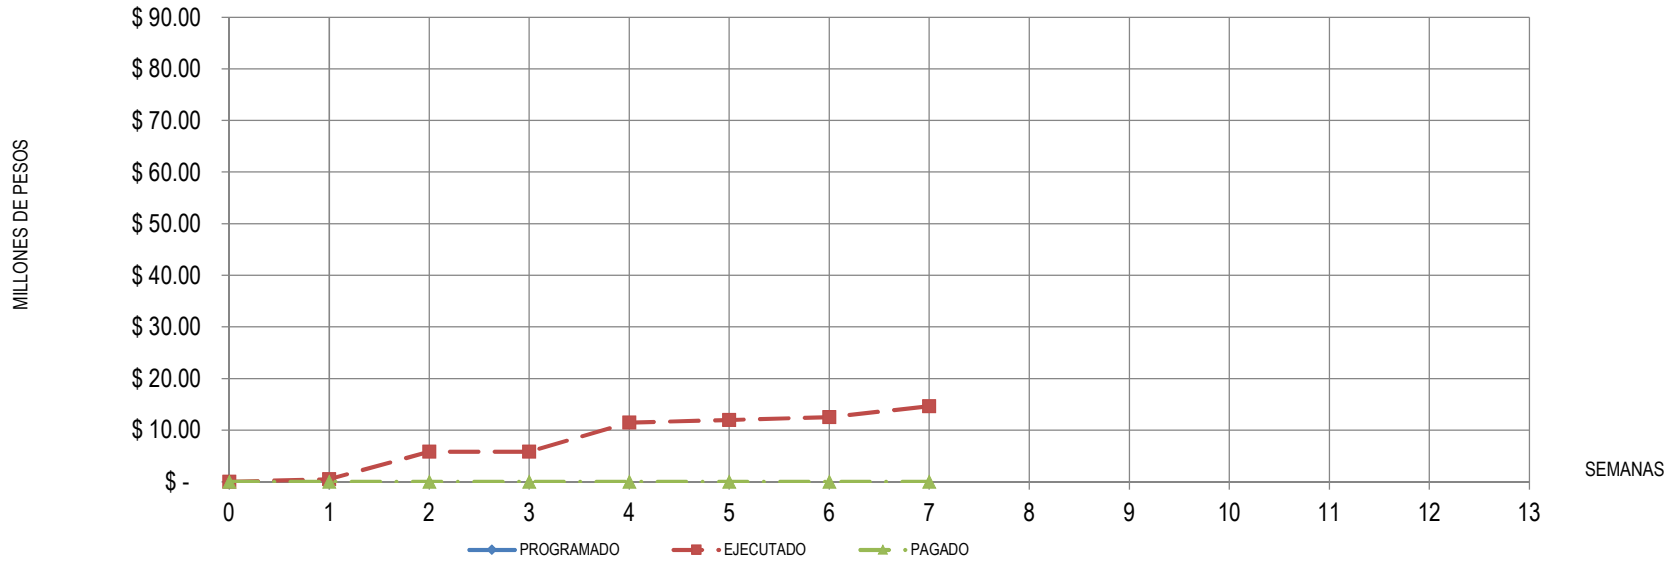

| BOGOTÁ Secretaría de Educación | **INFORME SEMANAL # 8** | VERSIÓN 01 |
|---|---|---|
| | | Pág. 1 De 4 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **OBJETO** | INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO. | | | | |
| **INTERVENTOR** | CONSORCIO INAR INGENIEROS | | | | |
| **CONTRATISTA** | MUÑOZ Y HERRERA INGENIEROS ASOCIADOS S.A | C. OBRA Nº | CO1.PCCNTR. 1577474 DE MAYO 28 DE 2020 | COLEGIO GRAN COLOMBIA (I.E.D) | **ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL DISTRITO CAPITAL.** |
| **CONTRATANTE** | SECRETARIA DE EDUCACIÓN DISTRITAL (SED) | | | | |

| **SEMANA N°** | 8 | **DEL** | 21-Dec-20 | **AL** | 27-Dec-20 |
|---|---|---|---|---|---|

## 1. INFORMACIÓN CONTRACTUAL

| **CONTRATO DE INTERVENTORIA** | | **CONTRATO DE OBRA** | |
|---|---|---|---|
| **Contrato No .** | CO1.PCCNTR. 1680516 DE JULIO 21 DE 2020 | **Contrato No .** | CO1.PCCNTR.1577474 DE MAYO 28 DE 2020 |
| **Fecha de Iniciación** | 12 de Agosto de 2020 | **Fecha de Iniciación** | 19 de Agosto de 2020 |
| **Fecha de Terminación** | 11 de Febrero de 2021 | **Fecha de Terminación** | 18 de Enero de 2021 |
| **Plazo Inicial** | 6 meses | **Plazo Inicial** | 5 meses |
| **Valor inicial** | $ 160,550,040.00 | **Valor inicial** | $ 1,023,694,436.00 |

## 2. CONTROL DE PROGRAMACIÓN

| **EJECUCION SEMANAL POR CAPITULOS** | | | | **ACTIVIDADES** | |
|---|---|---|---|---|---|
| **No.** | **CAPÍTULO** | **PORCENTAJE PROGRAMADO** | **PORCENTAJE EJECUTADO** | **ACTIVIDADES** | **DESCRIPCIÓN** |
| 1 | PRELIMINARES | 0.06% | 0.15% | PRELIMINAR | DESMONTE CERRAMIENTOS EN MALLA TIPO ONDULADA Ó ESLABONADA |
| 2 | CIMENTACIÓN - | 0.64% | | | |
| 3 | DESAGÜES E INSTALACIONES SUBTERRANEAS | | | | |
| 4 | ESTRUCTURA | | 0.59% | ESTRUCTURA | CONCRETO PARA ESCALERA DEACCESO PRINCIPAL |
| 5 | MAMPOSTERÍA | | | | |
| 6 | PREFABRICADOS EN CONCRETO Y OTROS | | | | |
| 7 | INSTALACIÓN HIDRAULICA SANITARIA Y DE GAS | | | | |
| 8 | INSTALACIÓN ELECTRICA, TELEFÓNICA Y COMUNICACIONES | | | | |
| 9 | PAÑETES | | | | |
| 10 | PISOS | | | | |
| 11 | CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES | 0.57% | | | |
| 12 | CARPINTERIA METALICA | | | | |
| 14 | ENCHAPES | | | | |
| 15 | ILUMINACIÓN | | | | |
| 16 | APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS | | | | |
| 18 | PINTURA | | | | |
| 19 | OBRAS EXTERIORES | | | | |
| 21 | ASEO Y VARIOS | 0.10% | | | |
| **TOTALES** | | **1.37%** | **0.74%** | | |

| BOGOTÁ Secretaría de Educación | **INFORME SEMANAL # 8** | **VERSIÓN 01**<br>Pág. 1 De 4 |
|---|---|---|

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **OBJETO** | INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO. | | | | |
| **INTERVENTOR** | CONSORCIO INAR INGENIEROS | | | | |
| **CONTRATISTA** | MUÑOZ Y HERRERA INGENIEROS ASOCIADOS S.A | C. OBRA Nº | CO1.PCCNTR. 1577474 DE MAYO 28 DE 2020 | COLEGIO GRAN COLOMBIA (I.E.D) | **ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL DISTRITO CAPITAL.** |
| **CONTRATANTE** | SECRETARIA DE EDUCACIÓN DISTRITAL (SED) | | | | |

| **SEMANA N°** | 8 | **DEL** | 21-Dec-20 | **AL** | 27-Dec-20 |
|---|---|---|---|---|---|

## 3. RESUMEN FINANCIERO


| **BALANCE DE OBRA EJECUTADA** | **VR.TOTAL DEL FRENTE DE OBRA** | **VR. TOTAL EJECUTADO** | **VR. POR EJECUTAR** | **AVANCE DE INVERSION** | **SEMANA** | **ACUMULADO** |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | $ 87,929,178 | $ 15,027,593 | **$ 72,901,585** | | 0.74% | 17.09% |

## 4. PERSONAL EN LA OBRA

| **PERSONAL** | **CANTIDAD** | **PERSONAL** | **CANTIDAD** |
|---|---|---|---|
| | | PINTORES | |
| MAESTRO | | OFICIALES | 1 |
| ELECTRICISTA | | AYUDANTES | 1 |
| AYU. DE ELECTRICIDAD | | ALMACENISTA | |
| INSTALADORES DE PISO | | RESIDENTE DE OBRA | |
| SISOMA | | | |
| HIDRÁULICOS | | | |

## 5. GRÁFICA CONTROL AVANCE DE OBRA (PROGRAMACIÓN)

Página 1

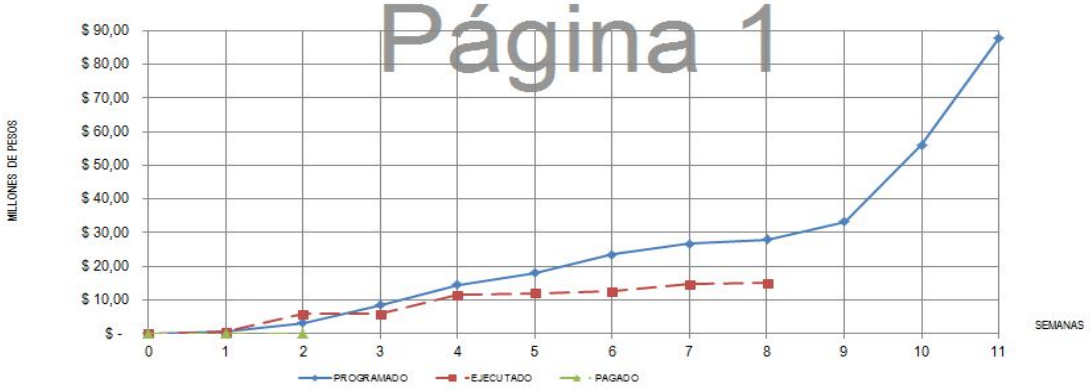


## 5. OBSERVACIONES, RECOMENDACIONES Y CONCLUSIONES

Se hace el desmonte de panel de cerramiento en malla eslabonada.

Se funde escaleras de acceso principal.

Se recomienda al contratista incrementar el equipo de trabajo para no generar retrasos en el frente de obra.

ARLEY VARGAS RODRÍGUEZ
**INSPECTOR DE INTERVENTORIA**

LILIANA CUADROS GARCÍA
**Vo. Bo. RESIDENTE DE INTERVENTORIA**

**ANEXO FOTOGRÁFICO SEMANA 08**



**FORMALETA PARA ESCALERA**



**VACIADO DE CONCRETO PARA ESCALERA**



**CONCRETO PARA ESCALERA**



**DESMONTE DE CERRAMIENTO**



**DESMONTE DE CERRAMIENTO**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **CONTRATO No./ NOMBRE DEL PROYECTO** | INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DIST | | |
| **INTERVENTOR** | CONSORCIO INAR INGENIEROS | | |
| **CONTRATISTA** | MUÑOZ Y HERRERA INGENIEROS ASOCIADOS S.A | C. DE OBRA Nº | CO1.PCCNTR.1577474 DE MAYO 28 DE 2020 |
| **ENTIDAD CONTRATANTE** | SECRETARIA DE EDUCACIÓN DISTRITAL (SED) | | |


| PROYECTO | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **FECHA** | **VR. INVERSIÓN** | **VR. ACUMULADO** | **SEMANA** | **% PROGRAMADO** | **% PROGRAMADO ACUMULADO** |
| 8 de noviembre de 2020 | $ 496,250.46 | $ 496,250.46 | 1 | 0.56% | 0.56% |
| 15 de noviembre de 2020 | $ 2,682,125.32 | $ 3,178,375.77 | 2 | 3.05% | 3.61% |
| 22 de noviembre de 2020 | $ 5,207,069.95 | $ 8,385,445.72 | 3 | 5.92% | 9.54% |
| 29 de noviembre de 2020 | $ 6,146,741.41 | $ 14,532,187.13 | 4 | 6.99% | 16.53% |
| 6 de diciembre de 2020 | $ 3,497,999.91 | $ 18,030,187.04 | 5 | 3.98% | 20.51% |
| 13 de diciembre de 2020 | $ 5,408,467.54 | $ 23,438,654.58 | 6 | 6.15% | 26.66% |
| 20 de diciembre de 2020 | $ 3,309,406.05 | $ 26,748,060.64 | 7 | 3.76% | 30.42% |
| 27 de diciembre de 2020 | $ 1,206,150.47 | $ 27,954,211.11 | 8 | 1.37% | 31.79% |
| 3 de enero de 2021 | $ 5,250,004.24 | $ 33,204,215.35 | 9 | 5.97% | 37.76% |
| 10 de enero de 2021 | $ 22,888,423.90 | $ 56,092,639.25 | 10 | 26.03% | 63.79% |
| 17 de enero de 2021 | $ 31,836,538.61 | $ 87,929,177.86 | 11 | 36.21% | 100.00% |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| **TOTAL** | **$ 87,929,177.86** | | | | |

| | | |
|---|---|---|
| BOGOTÁ Secretaria de Educación | **INFORME SEMANAL # 8 CURVA DE INVERSIÓN SEMANAL** | **VERSIÓN 01**<br>Pág. 4 De 4 |

## 1. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| INFORME No. | 8 | PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL | 21 de diciembre de 2020 | Y EL | 27 de diciembre de 2020 |
| OBJETO | INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO. | | | | |
| LOCALIZACIÓN | LOCALIDAD DE SAN CRISTOBAL | | | | |

## 2. CURVA DE INVERSIÓN "S"

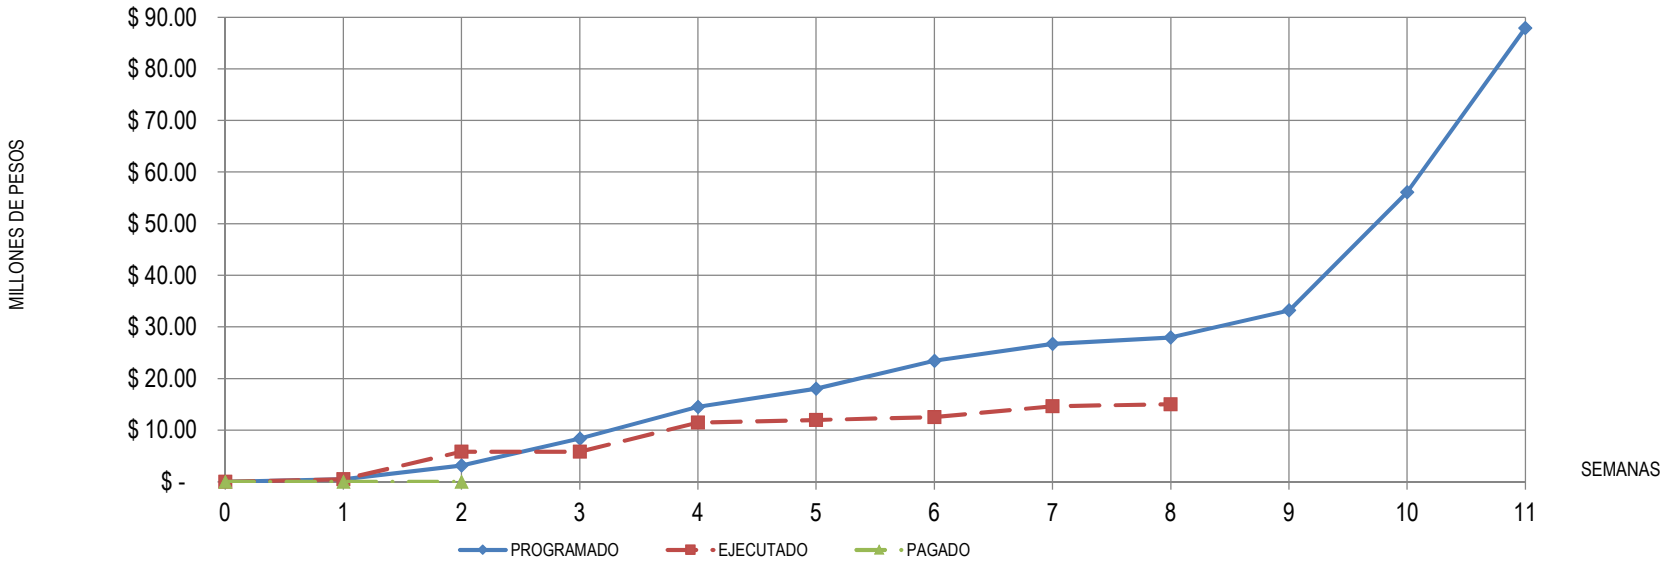

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **OBJETO** | INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO. | | | | |
| **INTERVENTOR** | CONSORCIO INAR INGENIEROS | | | | |
| **CONTRATISTA** | MUÑOZ Y HERRERA INGENIEROS ASOCIADOS S.A | C. OBRA Nº | CO1.PCCNTR. 1577474 DE MAYO 28 DE 2020 | COLEGIO GRAN COLOMBIA (I.E.D) | **ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL DISTRITO CAPITAL.** |
| **CONTRATANTE** | SECRETARIA DE EDUCACIÓN DISTRITAL (SED) | | | | |

| **SEMANA N°** | 9 | **DEL** | 28-Dec-20 | **AL** | 3-Jan-21 |
|---|---|---|---|---|---|

## 1. INFORMACIÓN CONTRACTUAL

| **CONTRATO DE INTERVENTORIA** | | **CONTRATO DE OBRA** | |
|---|---|---|---|
| **Contrato No .** | CO1.PCCNTR. 1680516 DE JULIO 21 DE 2020 | **Contrato No .** | CO1.PCCNTR.1577474 DE MAYO 28 DE 2020 |
| **Fecha de Iniciación** | 12 de Agosto de 2020 | **Fecha de Iniciación** | 19 de Agosto de 2020 |
| **Fecha de Terminación** | 11 de Febrero de 2021 | **Fecha de Terminación** | 18 de Enero de 2021 |
| **Plazo Inicial** | 6 meses | **Plazo Inicial** | 5 meses |
| **Valor inicial** | $ 160,550,040.00 | **Valor inicial** | $ 1,023,694,436.00 |

## 2. CONTROL DE PROGRAMACIÓN

| **EJECUCION SEMANAL POR CAPITULOS** | | | | **ACTIVIDADES** | |
|---|---|---|---|---|---|
| **No.** | **CAPÍTULO** | **PORCENTAJE PROGRAMADO** | **PORCENTAJE EJECUTADO** | **ACTIVIDADES** | **DESCRIPCIÓN** |
| 1 | PRELIMINARES | 0.80% | | | |
| 2 | CIMENTACIÓN - | 0.64% | | | |
| 3 | DESAGÜES E INSTALACIONES SUBTERRANEAS | 0.50% | | | |
| 4 | ESTRUCTURA | | | | |
| 5 | MAMPOSTERÍA | 0.75% | | | |
| 6 | PREFABRICADOS EN CONCRETO Y OTROS | | | | |
| 7 | INSTALACIÓN HIDRAULICA SANITARIA Y DE GAS | | | | |
| 8 | INSTALACIÓN ELECTRICA, TELEFÓNICA Y COMUNICACIONES | | | | |
| 9 | PAÑETES | 0.33% | | | |
| 10 | PISOS | 0.14% | | | |
| 11 | CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES | 0.06% | | | |
| 12 | CARPINTERIA METALICA | 1.40% | | | |
| 14 | ENCHAPES | | | | |
| 15 | ILUMINACIÓN | | | | |
| 16 | APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS | | | | |
| 18 | PINTURA | | | | |
| 19 | OBRAS EXTERIORES | | | | |
| 21 | ASEO Y VARIOS | 0.62% | | | |
| **TOTALES** | | **5.24%** | **0.00%** | | |

| BOGOTÁ Secretaría de Educación | **INFORME SEMANAL # 9** | **VERSIÓN 01**<br>Pág. 1 De 4 |
|---|---|---|

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **OBJETO** | INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO. | | | | |
| **INTERVENTOR** | CONSORCIO INAR INGENIEROS | | | | |
| **CONTRATISTA** | MUÑOZ Y HERRERA INGENIEROS ASOCIADOS S.A | C. OBRA Nº | CO1.PCCNTR. 1577474 DE MAYO 28 DE 2020 | COLEGIO GRAN COLOMBIA (I.E.D) | **ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL DISTRITO CAPITAL.** |
| **CONTRATANTE** | SECRETARIA DE EDUCACIÓN DISTRITAL (SED) | | | | |

| **SEMANA N°** | 9 | **DEL** | 28-Dec-20 | **AL** | 3-Jan-21 |
|---|---|---|---|---|---|

## 3. RESUMEN FINANCIERO


| **BALANCE DE OBRA EJECUTADA** | **VR.TOTAL DEL FRENTE DE OBRA** | **VR. TOTAL EJECUTADO** | **VR. POR EJECUTAR** | **AVANCE DE INVERSION** | **SEMANA** | **ACUMULADO** |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | $ 87,929,178 | $ 15,027,593 | **$ 72,901,585** | | 0.00% | 17.09% |

## 4. PERSONAL EN LA OBRA

| **PERSONAL** | **CANTIDAD** | **PERSONAL** | **CANTIDAD** |
|---|---|---|---|
| | | PINTORES | |
| MAESTRO | | OFICIALES | |
| ELECTRICISTA | | AYUDANTES | |
| AYU. DE ELECTRICIDAD | | ALMACENISTA | |
| INSTALADORES DE PISO | | RESIDENTE DE OBRA | |
| SISOMA | | | |
| HIDRÁULICOS | | | |

## 5. GRÁFICA CONTROL AVANCE DE OBRA (PROGRAMACIÓN)

Página 1

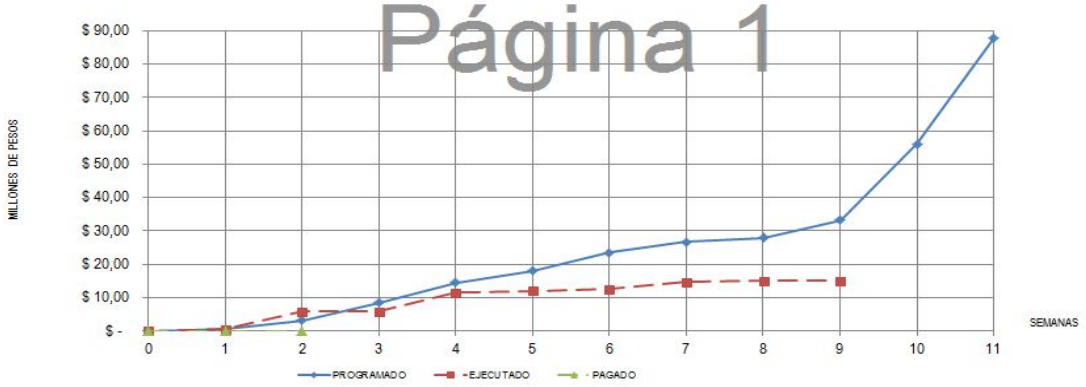


## 5. OBSERVACIONES, RECOMENDACIONES Y CONCLUSIONES

DURANTE ESTA SEMANA NO SE REALIZARON ACTIVIDADES EN ESTE FRENTE DE OBRA

Actividades por ejecutar: nivelacion de piso para caucho de color, pañete en muros ubicados en parque infantil, pintura en capinteria metalica, construccion de cañuela, construccion de caja de inspeccion, instalacion de baldosin de piso.

Se recomienda al contratista incrementar el equipo de trabajo para no generar retrasos en el frente de obra.

Se recomienda al contratista el cumplimiento del protocolo de bioseguridad.

ARLEY VARGAS RODRÍGUEZ
**INSPECTOR DE INTERVENTORIA**

LILIANA CUADROS GARCÍA
**Vo. Bo. RESIDENTE DE INTERVENTORIA**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **CONTRATO No./ NOMBRE DEL PROYECTO** | INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DIST | | |
| **INTERVENTOR** | CONSORCIO INAR INGENIEROS | | |
| **CONTRATISTA** | MUÑOZ Y HERRERA INGENIEROS ASOCIADOS S.A | C. DE OBRA Nº | CO1.PCCNTR.1577474 DE MAYO 28 DE 2020 |
| **ENTIDAD CONTRATANTE** | SECRETARIA DE EDUCACIÓN DISTRITAL (SED) | | |


| PROYECTO | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **FECHA** | **VR. INVERSIÓN** | **VR. ACUMULADO** | **SEMANA** | **% PROGRAMADO** | **% PROGRAMADO ACUMULADO** |
| 8 de noviembre de 2020 | $ 496,250.46 | $ 496,250.46 | 1 | 0.56% | 0.56% |
| 15 de noviembre de 2020 | $ 2,682,125.32 | $ 3,178,375.77 | 2 | 3.05% | 3.61% |
| 22 de noviembre de 2020 | $ 5,207,069.95 | $ 8,385,445.72 | 3 | 5.92% | 9.54% |
| 29 de noviembre de 2020 | $ 6,146,741.41 | $ 14,532,187.13 | 4 | 6.99% | 16.53% |
| 6 de diciembre de 2020 | $ 3,497,999.91 | $ 18,030,187.04 | 5 | 3.98% | 20.51% |
| 13 de diciembre de 2020 | $ 5,408,467.54 | $ 23,438,654.58 | 6 | 6.15% | 26.66% |
| 20 de diciembre de 2020 | $ 3,309,406.05 | $ 26,748,060.64 | 7 | 3.76% | 30.42% |
| 27 de diciembre de 2020 | $ 1,206,150.47 | $ 27,954,211.11 | 8 | 1.37% | 31.79% |
| 3 de enero de 2021 | $ 5,250,004.24 | $ 33,204,215.35 | 9 | 5.97% | 37.76% |
| 10 de enero de 2021 | $ 22,888,423.90 | $ 56,092,639.25 | 10 | 26.03% | 63.79% |
| 17 de enero de 2021 | $ 31,836,538.61 | $ 87,929,177.86 | 11 | 36.21% | 100.00% |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| **TOTAL** | **$ 87,929,177.86** | | | | |

| | | |
|---|---|---|
| BOGOTÁ Secretaria de Educación | **INFORME SEMANAL # 9 CURVA DE INVERSIÓN SEMANAL** | **VERSIÓN 01**<br>Pág. 4 De 4 |

**1. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| INFORME No. | 9 | PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL | 28 de diciembre de 2020 | Y EL | 3 de enero de 2021 |
| OBJETO | INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO. | | | | |
| LOCALIZACIÓN | LOCALIDAD DE SAN CRISTOBAL | | | | |

**2. CURVA DE INVERSIÓN "S"**

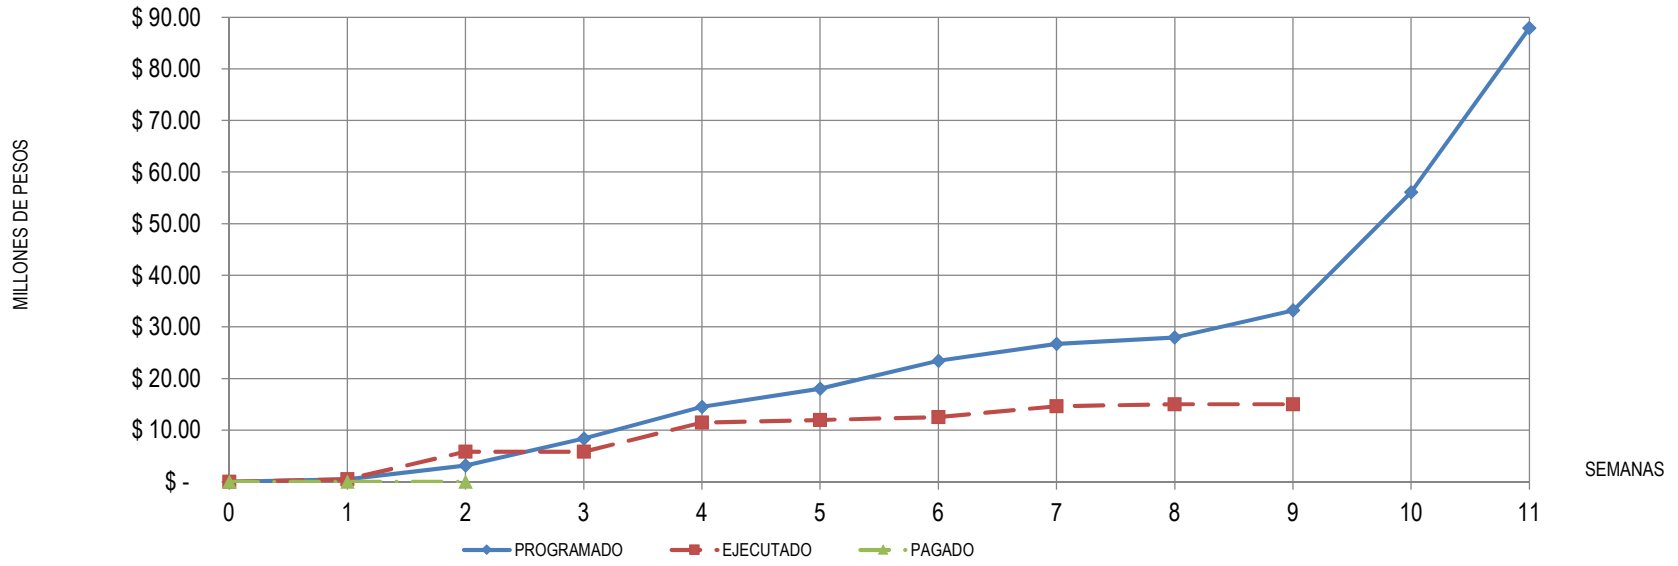

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **OBJETO** | INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO. | | | | |
| **INTERVENTOR** | CONSORCIO INAR INGENIEROS | | | | |
| **CONTRATISTA** | MUÑOZ Y HERRERA INGENIEROS ASOCIADOS S.A | C. OBRA Nº | CO1.PCCNTR. 1577474 DE MAYO 28 DE 2020 | COLEGIO GRAN COLOMBIA (I.E.D) | **ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL DISTRITO CAPITAL.** |
| **CONTRATANTE** | SECRETARIA DE EDUCACIÓN DISTRITAL (SED) | | | | |

| **SEMANA N°** | 10 | **DEL** | 4-Jan-20 | **AL** | 10-Jan-21 |
|---|---|---|---|---|---|

## 1. INFORMACIÓN CONTRACTUAL

| **CONTRATO DE INTERVENTORIA** | | **CONTRATO DE OBRA** | |
|---|---|---|---|
| **Contrato No .** | CO1.PCCNTR. 1680516 DE JULIO 21 DE 2020 | **Contrato No .** | CO1.PCCNTR.1577474 DE MAYO 28 DE 2020 |
| **Fecha de Iniciación** | 12 de Agosto de 2020 | **Fecha de Iniciación** | 19 de Agosto de 2020 |
| **Fecha de Terminación** | 11 de Febrero de 2021 | **Fecha de Terminación** | 18 de Enero de 2021 |
| **Plazo Inicial** | 6 meses | **Plazo Inicial** | 5 meses |
| **Valor inicial** | $ 160,550,040.00 | **Valor inicial** | $ 1,023,694,436.00 |

## 2. CONTROL DE PROGRAMACIÓN

| **EJECUCION SEMANAL POR CAPITULOS** | | | | **ACTIVIDADES** | |
|---|---|---|---|---|---|
| **No.** | **CAPÍTULO** | **PORCENTAJE PROGRAMADO** | **PORCENTAJE EJECUTADO** | **ACTIVIDADES** | **DESCRIPCIÓN** |
| 1 | PRELIMINARES | 0.44% | | | |
| 2 | CIMENTACIÓN - | 0.82% | | | |
| 3 | DESAGÜES E INSTALACIONES SUBTERRANEAS | 1.42% | | | |
| 4 | ESTRUCTURA | | | | |
| 5 | MAMPOSTERÍA | 0.45% | | | |
| 6 | PREFABRICADOS EN CONCRETO Y OTROS | | | | |
| 7 | INSTALACIÓN HIDRAULICA SANITARIA Y DE GAS | | | | |
| 8 | INSTALACIÓN ELECTRICA, TELEFÓNICA Y COMUNICACIONES | | | | |
| 9 | PAÑETES | 0.55% | | | |
| 10 | PISOS | 1.30% | | | |
| 11 | CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES | 0.12% | | | |
| 12 | CARPINTERIA METALICA | 13.70% | | | |
| 14 | ENCHAPES | | | | |
| 15 | ILUMINACIÓN | | | | |
| 16 | APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS | | | | |
| 18 | PINTURA | 0.58% | | | |
| 19 | OBRAS EXTERIORES | | | | |
| 21 | ASEO Y VARIOS | 0.41% | | | |
| **TOTALES** | | **19.79%** | **0.00%** | | |

| BOGOTÁ Secretaría de Educación | **INFORME SEMANAL # 10** | **VERSIÓN 01**<br>Pág. 1 De 4 |
|---|---|---|

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **OBJETO** | INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO. | | | | |
| **INTERVENTOR** | CONSORCIO INAR INGENIEROS | | | | |
| **CONTRATISTA** | MUÑOZ Y HERRERA INGENIEROS ASOCIADOS S.A | C. OBRA Nº | CO1.PCCNTR. 1577474 DE MAYO 28 DE 2020 | COLEGIO GRAN COLOMBIA (I.E.D) | **ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL DISTRITO CAPITAL.** |
| **CONTRATANTE** | SECRETARIA DE EDUCACIÓN DISTRITAL (SED) | | | | |

| **SEMANA N°** | 10 | **DEL** | 4-Jan-20 | **AL** | 10-Jan-21 |
|---|---|---|---|---|---|

## 3. RESUMEN FINANCIERO


| **BALANCE DE OBRA EJECUTADA** | **VR.TOTAL DEL FRENTE DE OBRA** | **VR. TOTAL EJECUTADO** | **VR. POR EJECUTAR** | **AVANCE DE INVERSION** | **SEMANA** | **ACUMULADO** |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | $ 87,929,178 | $ 15,027,593 | **$ 72,901,585** | | 0.00% | 17.09% |

## 4. PERSONAL EN LA OBRA

| **PERSONAL** | **CANTIDAD** | **PERSONAL** | **CANTIDAD** |
|---|---|---|---|
| | | PINTORES | |
| MAESTRO | | OFICIALES | |
| ELECTRICISTA | | AYUDANTES | |
| AYU. DE ELECTRICIDAD | | ALMACENISTA | |
| INSTALADORES DE PISO | | RESIDENTE DE OBRA | |
| SISOMA | | | |
| HIDRÁULICOS | | | |

## 5. GRÁFICA CONTROL AVANCE DE OBRA (PROGRAMACIÓN)

Página 1

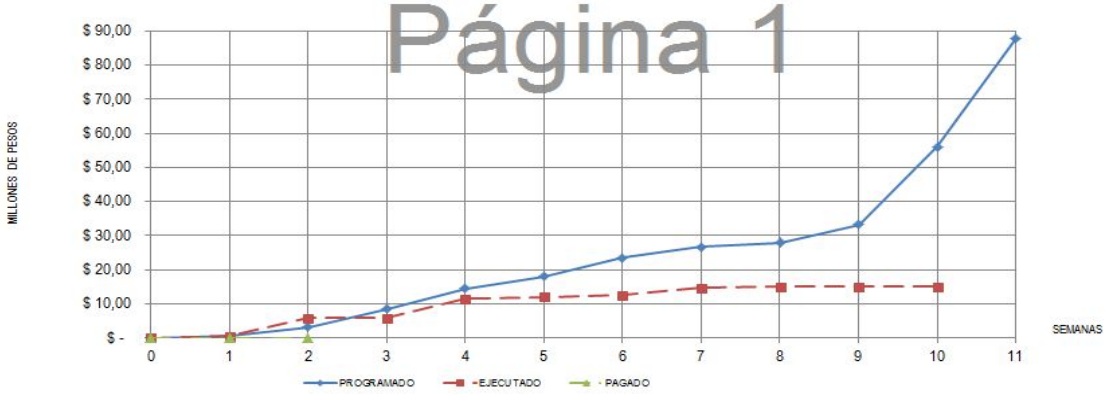


## 5. OBSERVACIONES, RECOMENDACIONES Y CONCLUSIONES

DURANTE ESTA SEMANA NO SE REALIZARON ACTIVIDADES EN ESTE FRENTE DE OBRA

Actividades por ejecutar: nivelacion de piso para caucho de color, pañete en muros ubicados en parque infantil, pintura en capinteria metalica, construccion de cañuela, construccion de caja de inspeccion, instalacion de baldosin de piso.

Se recomienda al contratista incrementar el equipo de trabajo para no generar retrasos en el frente de obra.

Se recomienda al contratista el cumplimiento del protocolo de bioseguridad.

ARLEY VARGAS RODRÍGUEZ
**INSPECTOR DE INTERVENTORIA**

LILIANA CUADROS GARCÍA
**Vo. Bo. RESIDENTE DE INTERVENTORIA**


| | | | |
|---|---|---|---|
| **CONTRATO No./ NOMBRE DEL PROYECTO** | INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DIST | | |
| **INTERVENTOR** | CONSORCIO INAR INGENIEROS | | |
| **CONTRATISTA** | MUÑOZ Y HERRERA INGENIEROS ASOCIADOS S.A | C. DE OBRA Nº | CO1.PCCNTR.1577474 DE MAYO 28 DE 2020 |
| **ENTIDAD CONTRATANTE** | SECRETARIA DE EDUCACIÓN DISTRITAL (SED) | | |

| **PROYECTO** | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **FECHA** | **VR. INVERSIÓN** | **VR. ACUMULADO** | **SEMANA** | **% PROGRAMADO** | **% PROGRAMADO ACUMULADO** |
| 8 de noviembre de 2020 | $ 496,250.46 | $ 496,250.46 | 1 | 0.56% | 0.56% |
| 15 de noviembre de 2020 | $ 2,682,125.32 | $ 3,178,375.77 | 2 | 3.05% | 3.61% |
| 22 de noviembre de 2020 | $ 5,207,069.95 | $ 8,385,445.72 | 3 | 5.92% | 9.54% |
| 29 de noviembre de 2020 | $ 6,146,741.41 | $ 14,532,187.13 | 4 | 6.99% | 16.53% |
| 6 de diciembre de 2020 | $ 3,497,999.91 | $ 18,030,187.04 | 5 | 3.98% | 20.51% |
| 13 de diciembre de 2020 | $ 5,408,467.54 | $ 23,438,654.58 | 6 | 6.15% | 26.66% |
| 20 de diciembre de 2020 | $ 3,309,406.05 | $ 26,748,060.64 | 7 | 3.76% | 30.42% |
| 27 de diciembre de 2020 | $ 1,206,150.47 | $ 27,954,211.11 | 8 | 1.37% | 31.79% |
| 3 de enero de 2021 | $ 5,250,004.24 | $ 33,204,215.35 | 9 | 5.97% | 37.76% |
| 10 de enero de 2021 | $ 22,888,423.90 | $ 56,092,639.25 | 10 | 26.03% | 63.79% |
| 17 de enero de 2021 | $ 31,836,538.61 | $ 87,929,177.86 | 11 | 36.21% | 100.00% |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| **TOTAL** | **$ 87,929,177.86** | | | | |

## 1. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| INFORME No. | 10 | PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL | 4 de enero de 2020 | Y EL | 10 de enero de 2021 |
| OBJETO | INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO. | | | | |
| LOCALIZACIÓN | LOCALIDAD DE SAN CRISTOBAL | | | | |

## 2. CURVA DE INVERSIÓN "S"

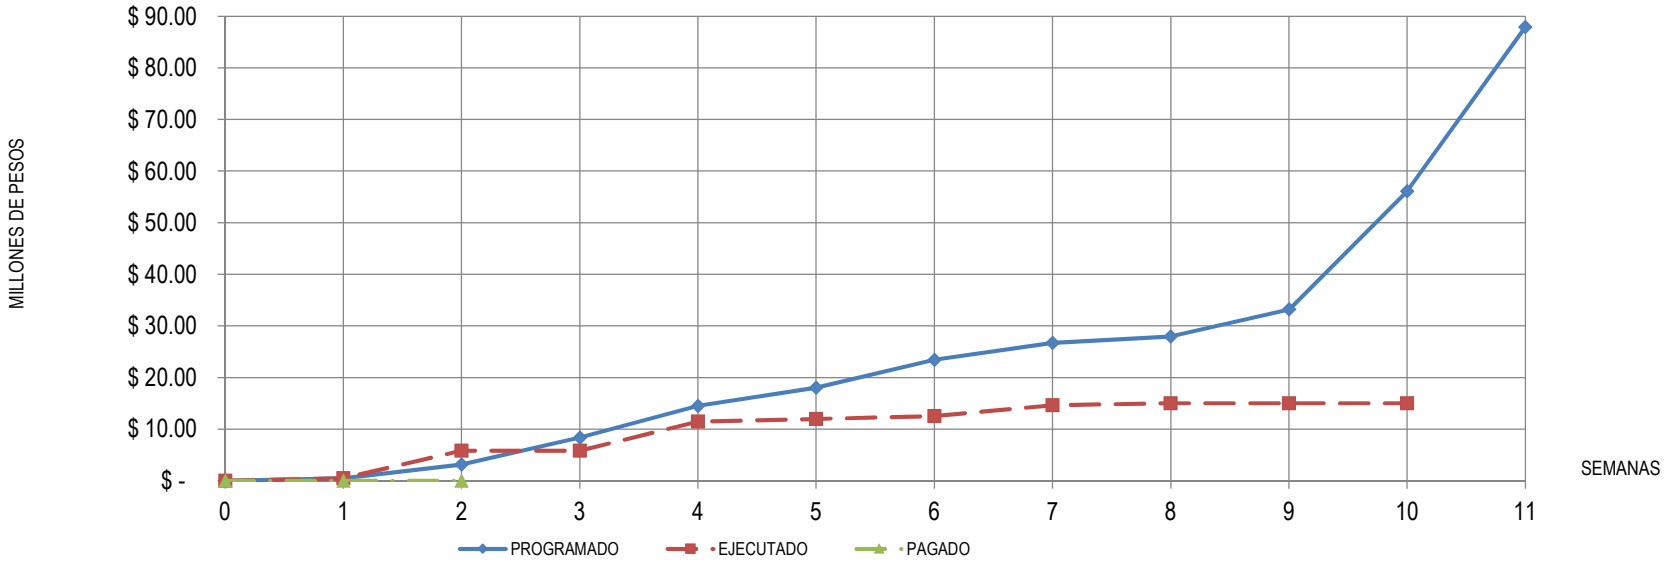

| BOGOTÁ Secretaría de Educación | INFORME SEMANAL # 11 | VERSIÓN 01 |
|---|---|---|
| | | Pág. 1 De 4 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **OBJETO** | INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO. | | | | |
| **INTERVENTOR** | CONSORCIO INAR INGENIEROS | | | | |
| **CONTRATISTA** | MUÑOZ Y HERRERA INGENIEROS ASOCIADOS S.A | C. OBRA Nº | CO1.PCCNTR. 1577474 DE MAYO 28 DE 2020 | COLEGIO GRAN COLOMBIA (I.E.D) | **ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL DISTRITO CAPITAL.** |
| **CONTRATANTE** | SECRETARIA DE EDUCACIÓN DISTRITAL (SED) | | | | |

| **SEMANA N°** | 11 | **DEL** | 11-Jan-20 | **AL** | 17-Jan-21 |
|---|---|---|---|---|---|

## 1. INFORMACIÓN CONTRACTUAL

| **CONTRATO DE INTERVENTORIA** | | **CONTRATO DE OBRA** | |
|---|---|---|---|
| **Contrato No .** | CO1.PCCNTR. 1680516 DE JULIO 21 DE 2020 | **Contrato No .** | CO1.PCCNTR.1577474 DE MAYO 28 DE 2020 |
| **Fecha de Iniciación** | 12 de Agosto de 2020 | **Fecha de Iniciación** | 19 de Agosto de 2020 |
| **Fecha de Terminación** | 11 de Febrero de 2021 | **Fecha de Terminación** | 18 de Enero de 2021 |
| **Plazo Inicial** | 6 meses | **Plazo Inicial** | 5 meses |
| **Valor inicial** | $ 160,550,040.00 | **Valor inicial** | $ 1,023,694,436.00 |

## 2. CONTROL DE PROGRAMACIÓN

| **EJECUCION SEMANAL POR CAPITULOS** | | | | **ACTIVIDADES** | |
|---|---|---|---|---|---|
| **No.** | **CAPÍTULO** | **PORCENTAJE PROGRAMADO** | **PORCENTAJE EJECUTADO** | **ACTIVIDADES** | **DESCRIPCIÓN** |
| 1 | PRELIMINARES | 0.04% | 0.09% | DESCAPOTE | LIMPIEZA Y DESCAPOTE PARA CONSTRUCCION DE CAÑUELA |
| 2 | CIMENTACIÓN - | 0.75% | 0.13% | EXCAVACION Y RELLENO | EXCAVACION EN MATERIAL COMUN Y RELLENO PARA CONSTRUCCION DE CAÑUELA |
| 3 | DESAGÜES E INSTALACIONES SUBTERRANEAS | 3.28% | | | |
| 4 | ESTRUCTURA | | | | |
| 5 | MAMPOSTERÍA | | | | |
| 6 | PREFABRICADOS EN CONCRETO Y OTROS | | | | |
| 7 | INSTALACIÓN HIDRAULICA SANITARIA Y DE GAS | | | | |
| 8 | INSTALACIÓN ELECTRICA, TELEFÓNICA Y COMUNICACIONES | | | | |
| 9 | PAÑETES | | | | |
| 10 | PISOS | | | | |
| 11 | CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES | 1.90% | | | |
| 12 | CARPINTERIA METALICA | | | | |
| 14 | ENCHAPES | | | | |
| 15 | ILUMINACIÓN | | | | |
| 16 | APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS | | | | |
| 18 | PINTURA | 1.12% | | | |
| 19 | CERRADURAS Y VIDRIOS | | | | |
| 20 | OBRAS EXTERIORES | 18.54% | | | |
| 21 | ASEO Y VARIOS | 0.41% | | | |
| **TOTALES** | | **26.04%** | **0.22%** | | |

| BOGOTÁ Secretaría de Educación | INFORME SEMANAL # 11 | VERSIÓN 01 |
|---|---|---|
| | | Pág. 1 De 4 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **OBJETO** | INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO. | | | | |
| **INTERVENTOR** | CONSORCIO INAR INGENIEROS | | | | |
| **CONTRATISTA** | MUÑOZ Y HERRERA INGENIEROS ASOCIADOS S.A | C. OBRA Nº | CO1.PCCNTR. 1577474 DE MAYO 28 DE 2020 | COLEGIO GRAN COLOMBIA (I.E.D) | **ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL DISTRITO CAPITAL.** |
| **CONTRATANTE** | SECRETARIA DE EDUCACIÓN DISTRITAL (SED) | | | | |

| **SEMANA N°** | 11 | **DEL** | 11-Jan-20 | **AL** | 17-Jan-21 |
|---|---|---|---|---|---|

## 3. RESUMEN FINANCIERO


| BALANCE DE OBRA EJECUTADA | VR.TOTAL DEL FRENTE DE OBRA | VR. TOTAL EJECUTADO | VR. POR EJECUTAR | AVANCE DE INVERSION | SEMANA | ACUMULADO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | $ 87,929,178 | $ 15,222,454 | **$ 72,706,724** | | 0.22% | 17.31% |

## 4. PERSONAL EN LA OBRA

| PERSONAL | CANTIDAD | PERSONAL | CANTIDAD |
|---|---|---|---|
| | | PINTORES | |
| MAESTRO | | OFICIALES | 1 |
| ELECTRICISTA | | AYUDANTES | 1 |
| AYU. DE ELECTRICIDAD | | ALMACENISTA | |
| INSTALADORES DE PISO | | RESIDENTE DE OBRA | 1 |
| SISOMA | | | |
| HIDRÁULICOS | | | |

## 5. GRÁFICA CONTROL AVANCE DE OBRA (PROGRAMACIÓN)

Página 1

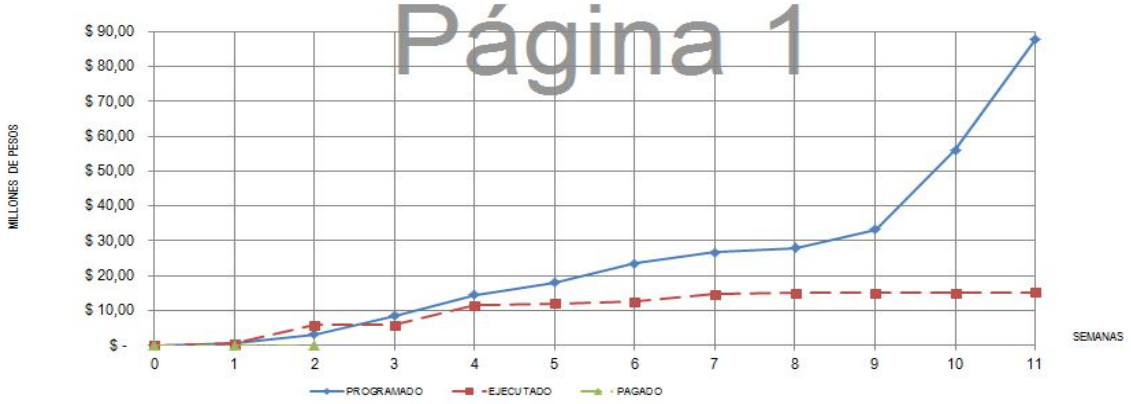


## 5. OBSERVACIONES, RECOMENDACIONES Y CONCLUSIONES

Se realiza limpieza, descapote y excavacion en material comun para construccion de cañuela.

Se recomienda al contratista incrementar el equipo de trabajo para no generar retrasos en el frente de obra.

Se recomienda al contratista el cumplimiento del protocolo de bioseguridad.

ARLEY VARGAS RODRÍGUEZ
**INSPECTOR DE INTERVENTORIA**

LILIANA CUADROS GARCÍA
**Vo. Bo. RESIDENTE DE INTERVENTORIA**

**ANEXO FOTOGRÁFICO SEMANA 11**




**LIMPIEZA Y DESCAPOTE**



**LIMPIEZA Y DESCAPOTE**




**EXCAVACION EN MATERIAL COMUN**



**EXCAVACION EN MATERIAL COMUN**



**SUMINISTRO DE RECEBO COMUN**



**SUMINISTRO DE RECEBO COMUN**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **CONTRATO No./ NOMBRE DEL PROYECTO** | INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DIST | | |
| **INTERVENTOR** | CONSORCIO INAR INGENIEROS | | |
| **CONTRATISTA** | MUÑOZ Y HERRERA INGENIEROS ASOCIADOS S.A | C. DE OBRA Nº | CO1.PCCNTR.1577474 DE MAYO 28 DE 2020 |
| **ENTIDAD CONTRATANTE** | SECRETARIA DE EDUCACIÓN DISTRITAL (SED) | | |


| PROYECTO | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **FECHA** | **VR. INVERSIÓN** | **VR. ACUMULADO** | **SEMANA** | **% PROGRAMADO** | **% PROGRAMADO ACUMULADO** |
| 8 de noviembre de 2020 | $ 496,250.46 | $ 496,250.46 | 1 | 0.56% | 0.56% |
| 15 de noviembre de 2020 | $ 2,682,125.32 | $ 3,178,375.77 | 2 | 3.05% | 3.61% |
| 22 de noviembre de 2020 | $ 5,207,069.95 | $ 8,385,445.72 | 3 | 5.92% | 9.54% |
| 29 de noviembre de 2020 | $ 6,146,741.41 | $ 14,532,187.13 | 4 | 6.99% | 16.53% |
| 6 de diciembre de 2020 | $ 3,497,999.91 | $ 18,030,187.04 | 5 | 3.98% | 20.51% |
| 13 de diciembre de 2020 | $ 5,408,467.54 | $ 23,438,654.58 | 6 | 6.15% | 26.66% |
| 20 de diciembre de 2020 | $ 3,309,406.05 | $ 26,748,060.64 | 7 | 3.76% | 30.42% |
| 27 de diciembre de 2020 | $ 1,206,150.47 | $ 27,954,211.11 | 8 | 1.37% | 31.79% |
| 3 de enero de 2021 | $ 5,250,004.24 | $ 33,204,215.35 | 9 | 5.97% | 37.76% |
| 10 de enero de 2021 | $ 22,888,423.90 | $ 56,092,639.25 | 10 | 26.03% | 63.79% |
| 17 de enero de 2021 | $ 31,836,538.61 | $ 87,929,177.86 | 11 | 36.21% | 100.00% |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| **TOTAL** | **$ 87,929,177.86** | | | | |

| BOGOTÁ Secretaria de Educación | INFORME SEMANAL # 11 CURVA DE INVERSIÓN SEMANAL | VERSIÓN 01<br>Pág. 4 De 4 |
|---|---|---|

## 1. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| INFORME No. | 11 | PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL | 11 de enero de 2020 | Y EL | 17 de enero de 2021 |
| OBJETO | INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO. | | | | |
| LOCALIZACIÓN | LOCALIDAD DE SAN CRISTOBAL | | | | |

## 2. CURVA DE INVERSIÓN "S"

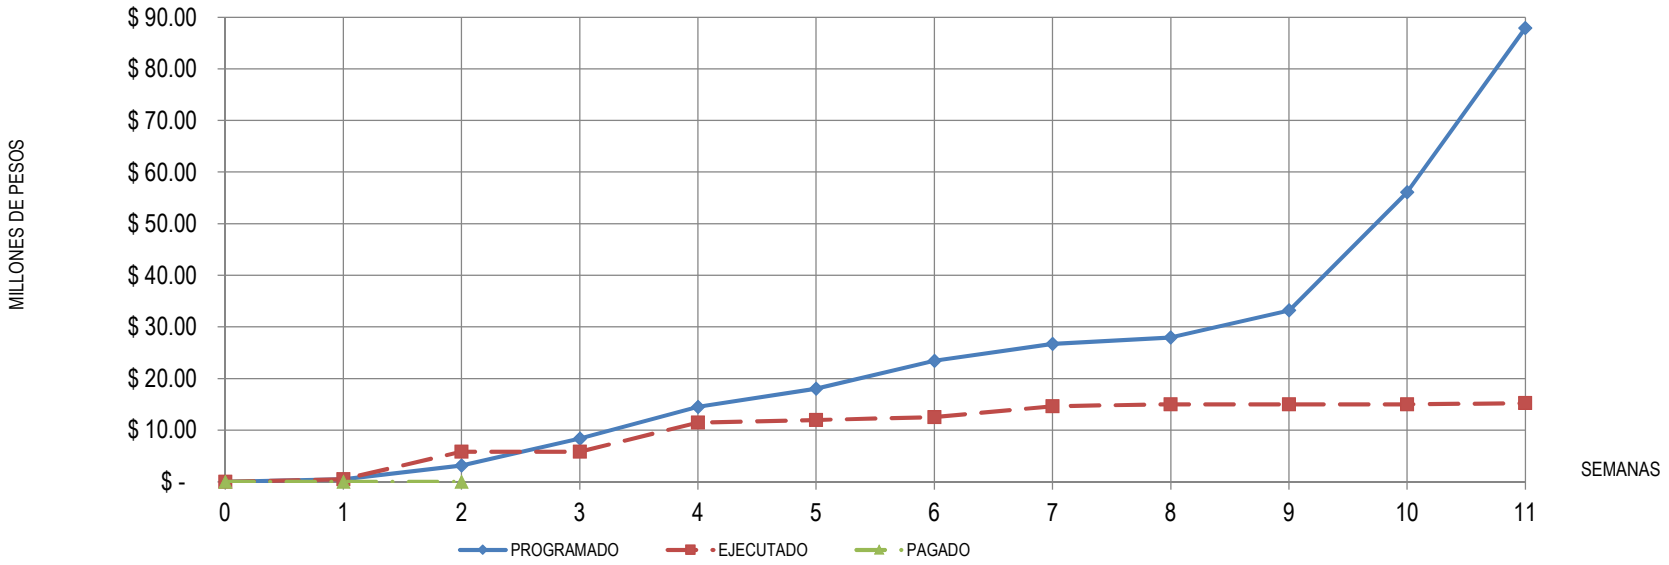

| BOGOTÁ Secretaría de Educación | **INFORME SEMANAL # 2** | **VERSIÓN 01**<br>Pág. 1 De 4 |
|---|---|---|

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **OBJETO** | INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO. | | | | |
| **INTERVENTOR** | CONSORCIO INAR INGENIEROS | | | | |
| **CONTRATISTA** | MUÑOZ Y HERRERA INGENIEROS ASOCIADOS S.A | C. OBRA Nº | CO1.PCCNTR. 1577474 DE MAYO 28 DE 2020 | COLEGIO SAN ISIDRO (I.E.D) | **ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL DISTRITO CAPITAL.** |
| **CONTRATANTE** | SECRETARIA DE EDUCACIÓN DISTRITAL (SED) | | | | |

| **SEMANA N°** | 2 | **DEL** | 14-Dec-20 | **AL** | 20-Dec-20 |
|---|---|---|---|---|---|

## 1. INFORMACIÓN CONTRACTUAL

| **CONTRATO DE INTERVENTORIA** | | **CONTRATO DE OBRA** | |
|---|---|---|---|
| **Contrato No .** | CO1.PCCNTR. 1680516 DE JULIO 21 DE 2020 | **Contrato No .** | CO1.PCCNTR.1577474 DE MAYO 28 DE 2020 |
| **Fecha de Iniciación** | 12 de Agosto de 2020 | **Fecha de Iniciación** | 19 de Agosto de 2020 |
| **Fecha de Terminación** | 11 de Febrero de 2021 | **Fecha de Terminación** | 18 de Enero de 2021 |
| **Plazo Inicial** | 6 meses | **Plazo Inicial** | 5 meses |
| **Valor inicial** | $ 160,550,040.00 | **Valor inicial** | $ 1,023,694,436.00 |

## 2. CONTROL DE PROGRAMACIÓN

| **EJECUCION SEMANAL POR CAPITULOS** | | | | **ACTIVIDADES** | |
|---|---|---|---|---|---|
| **No.** | **CAPÍTULO** | **PORCENTAJE PROGRAMADO** | **PORCENTAJE EJECUTADO** | **ACTIVIDADES** | **DESCRIPCIÓN** |
| 1 | PRELIMINARES | 0.01% | | | |
| 2 | CIMENTACION | | | | |
| 4 | ESTRUCTURA | | 1.38% | ESTRUCTURA METALICA | SE REALIZA ESTRUCTURA METALICA EN TALLER |
| 5 | MAMPOSTERIA | | | | |
| 7 | INSTALACIÓN HIDRAULICA SANITARIA Y DE GAS | | | | |
| 8 | INSTALACIÓN ELECTRICA, TELEFÓNICA Y COMUNICACIONES | | | | |
| 9 | PAÑETES | | | | |
| 10 | PISOS | | | | |
| 11 | CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES | | | | |
| 12 | CARPINTERIA DE METÁLICA | | | | |
| 15 | ILUMINACION | | | | |
| 18 | PINTURA | | | | |
| 19 | CERRADURAS Y VIDRIOS | | | | |
| 21 | ASEO Y VARIOS | | | | |
| **TOTALES** | | **0.01%** | **1.38%** | | |

| BOGOTÁ Secretaría de Educación | **INFORME SEMANAL # 2** | **VERSIÓN 01**<br>Pág. 1 De 4 |
|---|---|---|

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **OBJETO** | INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO. | | | | |
| **INTERVENTOR** | CONSORCIO INAR INGENIEROS | | | | |
| **CONTRATISTA** | MUÑOZ Y HERRERA INGENIEROS ASOCIADOS S.A | C. OBRA Nº | CO1.PCCNTR. 1577474 DE MAYO 28 DE 2020 | COLEGIO SAN ISIDRO (I.E.D) | **ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL DISTRITO CAPITAL.** |
| **CONTRATANTE** | SECRETARIA DE EDUCACIÓN DISTRITAL (SED) | | | | |

| **SEMANA N°** | 2 | **DEL** | 14-Dec-20 | **AL** | 20-Dec-20 |
|---|---|---|---|---|---|

## 3. RESUMEN FINANCIERO

| **BALANCE DE OBRA EJECUTADA** | **VR.TOTAL DEL FRENTE DE OBRA** | **VR. TOTAL EJECUTADO** | **VR. POR EJECUTAR** | **AVANCE DE INVERSION** | **SEMANA** | **ACUMULADO** |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | $ 183,609,136 | $ 12,669,190 | **$ 170,939,946** | | 1.38% | 6.90% |

## 4. PERSONAL EN LA OBRA

| **PERSONAL** | **CANTIDAD** | **PERSONAL** | **CANTIDAD** |
|---|---|---|---|
| HORNAMENTADOR | 2 | PINTORES | |
| MAESTRO | | OFICIALES | |
| ELECTRICISTA | | AYUDANTES | |
| AYU. DE HORNAMENTACIÓN | 2 | ALMACENISTA | |
| INSTALADORES DE PISO | | RESIDENTE DE OBRA | |
| SISOMA | | | |
| HIDRÁULICOS | | | |

## 5. GRÁFICA CONTROL AVANCE DE OBRA (PROGRAMACIÓN)

Página 1





## 5. OBSERVACIONES, RECOMENDACIONES Y CONCLUSIONES

SE CONTINUA CON LA CONTRUCCIÓN DE ESTRUCTURA METALICA EN TALLER.

KEVIN RODRÍGUEZ
**INSPECTOR DE INTERVENTORIA**

LILIANA CUADROS GARCÍA
**Vo. Bo. RESIDENTE DE INTERVENTORIA**

**ANEXO FOTOGRÁFICO SEMANA 02**

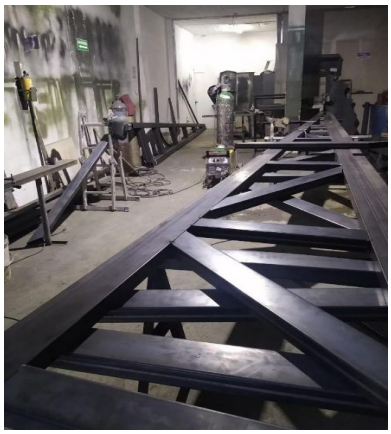


CONTRUCCIÓN ESTRUCTURA METALICA EN TALLER



CONTRUCCIÓN ESTRUCTURA METALICA EN TALLER



CONTRUCCIÓN ESTRUCTURA METALICA EN TALLER

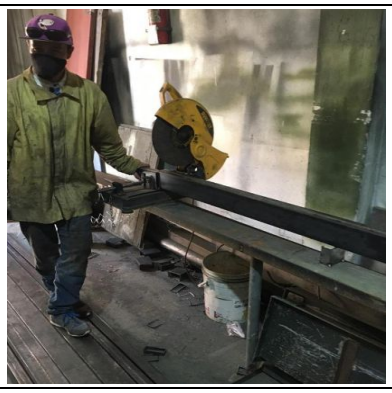

CONTRUCCIÓN ESTRUCTURA METALICA EN TALLER





CONTRUCCIÓN ESTRUCTURA METALICA EN TALLER

| | | | |
|---|---|---|---|
| **CONTRATO No./ NOMBRE DEL PROYECTO** | INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DIST | | |
| **INTERVENTOR** | CONSORCIO INAR INGENIEROS | | |
| **CONTRATISTA** | MUÑOZ Y HERRERA INGENIEROS ASOCIADOS S.A | C. DE OBRA Nº | CO1.PCCNTR.1577474 DE MAYO 28 DE 2020 |
| **ENTIDAD CONTRATANTE** | SECRETARIA DE EDUCACIÓN DISTRITAL (SED) | | |


| PROYECTO | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **FECHA** | **VR. INVERSIÓN** | **VR. ACUMULADO** | **SEMANA** | **% PROGRAMADO** | **% PROGRAMADO ACUMULADO** |
| 1 de noviembre de 2020 | $ 496,732 | $ 496,732 | 1 | 0.27% | 0.27% |
| 8 de noviembre de 2020 | $ 21,723 | $ 518,455 | 2 | 0.01% | 0.28% |
| 15 de noviembre de 2020 | $ 74,291 | $ 592,746 | 3 | 0.04% | 0.32% |
| 22 de noviembre de 2020 | $ 76,735 | $ 669,481 | 4 | 0.04% | 0.36% |
| 29 de noviembre de 2020 | $ 6,213,374 | $ 6,882,855 | 5 | 3.38% | 3.75% |
| 6 de diciembre de 2020 | $ 9,158,419 | $ 16,041,273 | 6 | 4.99% | 8.74% |
| 13 de diciembre de 2020 | $ 9,216,099 | $ 25,257,372 | 7 | 5.02% | 13.76% |
| 20 de diciembre de 2020 | $ 9,773,446 | $ 35,030,818 | 8 | 5.32% | 19.08% |
| 27 de diciembre de 2020 | $ 13,433,433 | $ 48,464,251 | 9 | 7.32% | 26.40% |
| 3 de enero de 2021 | $ 41,583,234 | $ 90,047,486 | 10 | 22.65% | 49.04% |
| 10 de enero de 2021 | $ 91,323,168 | $ 181,370,654 | 11 | 49.74% | 98.78% |
| 17 de enero de 2021 | $ 2,238,482 | $ 183,609,136 | 12 | 1.22% | 100.00% |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| **TOTAL** | **$ 183,609,136** | | | | |

| BOGOTÁ Secretaria de Educación | INFORME SEMANAL # 2 CURVA DE INVERSIÓN SEMANAL | VERSIÓN 01 |
|---|---|---|
| | | Pág. 4 De 4 |

## 1. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| INFORME No. | 2 | PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL | 14 de diciembre de 2020 | Y EL | 20 de diciembre de 2020 |
| OBJETO | INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO. | | | | |
| LOCALIZACIÓN | LOCALIDAD DE SAN CRISTOBAL | | | | |

## 2. CURVA DE INVERSIÓN "S"

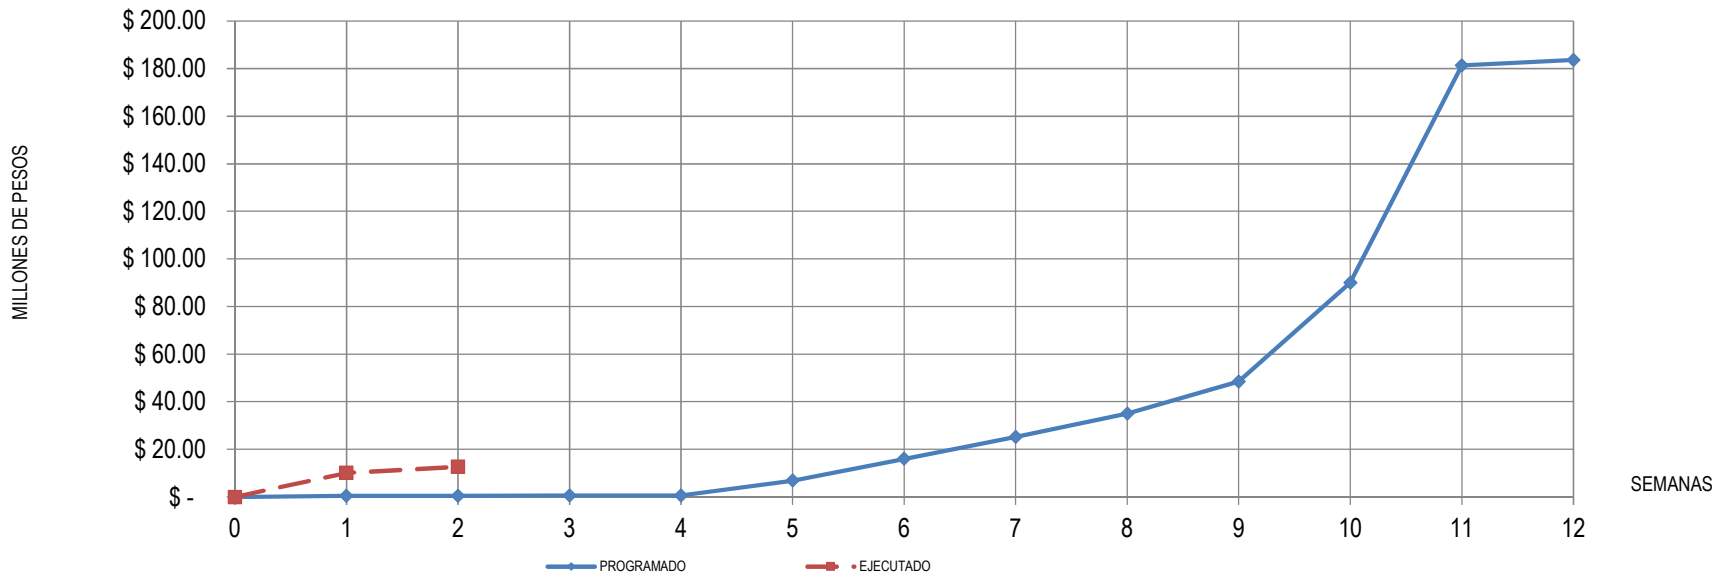

| BOGOTÁ Secretaría de Educación | **INFORME SEMANAL # 3** | VERSIÓN 01 |
|---|---|---|
| | | Pág. 1 De 4 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **OBJETO** | INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO. | | | | |
| **INTERVENTOR** | CONSORCIO INAR INGENIEROS | | | | |
| **CONTRATISTA** | MUÑOZ Y HERRERA INGENIEROS ASOCIADOS S.A | C. OBRA Nº | CO1.PCCNTR. 1577474 DE MAYO 28 DE 2020 | COLEGIO SAN ISIDRO (I.E.D) | **ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL DISTRITO CAPITAL.** |
| **CONTRATANTE** | SECRETARIA DE EDUCACIÓN DISTRITAL (SED) | | | | |

| **SEMANA N°** | 3 | **DEL** | 21-Dec-20 | **AL** | 27-Dec-20 |
|---|---|---|---|---|---|

## 1. INFORMACIÓN CONTRACTUAL

| **CONTRATO DE INTERVENTORIA** | | **CONTRATO DE OBRA** | |
|---|---|---|---|
| **Contrato No .** | CO1.PCCNTR. 1680516 DE JULIO 21 DE 2020 | **Contrato No .** | CO1.PCCNTR.1577474 DE MAYO 28 DE 2020 |
| **Fecha de Iniciación** | 12 de Agosto de 2020 | **Fecha de Iniciación** | 19 de Agosto de 2020 |
| **Fecha de Terminación** | 11 de Febrero de 2021 | **Fecha de Terminación** | 18 de Enero de 2021 |
| **Plazo Inicial** | 6 meses | **Plazo Inicial** | 5 meses |
| **Valor inicial** | $ 160,550,040.00 | **Valor inicial** | $ 1,023,694,436.00 |

## 2. CONTROL DE PROGRAMACIÓN

| **EJECUCION SEMANAL POR CAPITULOS** | | | | **ACTIVIDADES** | |
|---|---|---|---|---|---|
| **No.** | **CAPÍTULO** | **PORCENTAJE PROGRAMADO** | **PORCENTAJE EJECUTADO** | **ACTIVIDADES** | **DESCRIPCIÓN** |
| 1 | **PRELIMINARES** | 0.04% | | | |
| 2 | **CIMENTACION** | | | | |
| 4 | **ESTRUCTURA** | | 1.38% | ESTRUCTURA METALICA | SE REALIZA ESTRUCTURA METALICA EN TALLER |
| 5 | **MAMPOSTERIA** | | | | |
| 7 | **INSTALACIÓN HIDRAULICA SANITARIA Y DE GAS** | | | | |
| 8 | **INSTALACIÓN ELECTRICA, TELEFÓNICA Y COMUNICACIONES** | | | | |
| 9 | **PAÑETES** | | | | |
| 10 | **PISOS** | | | | |
| 11 | **CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES** | | | | |
| 12 | **CARPINTERIA DE METÁLICA** | | | | |
| 15 | **ILUMINACION** | | | | |
| 18 | **PINTURA** | | | | |
| 19 | **CERRADURAS Y VIDRIOS** | | | | |
| 21 | **ASEO Y VARIOS** | | | | |
| **TOTALES** | | **0.04%** | **1.38%** | | |

| BOGOTÁ Secretaría de Educación | **INFORME SEMANAL # 3** | **VERSIÓN 01**<br>Pág. 1 De 4 |
|---|---|---|

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **OBJETO** | INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO. | | | | |
| **INTERVENTOR** | CONSORCIO INAR INGENIEROS | | | | |
| **CONTRATISTA** | MUÑOZ Y HERRERA INGENIEROS ASOCIADOS S.A | C. OBRA Nº | CO1.PCCNTR. 1577474 DE MAYO 28 DE 2020 | COLEGIO SAN ISIDRO (I.E.D) | **ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL DISTRITO CAPITAL.** |
| **CONTRATANTE** | SECRETARIA DE EDUCACIÓN DISTRITAL (SED) | | | | |

| **SEMANA N°** | 3 | **DEL** | 21-Dec-20 | **AL** | 27-Dec-20 |
|---|---|---|---|---|---|

## 3. RESUMEN FINANCIERO

| **BALANCE DE OBRA EJECUTADA** | **VR.TOTAL DEL FRENTE DE OBRA** | **VR. TOTAL EJECUTADO** | **VR. POR EJECUTAR** | **AVANCE DE INVERSION** | **SEMANA** | **ACUMULADO** |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | $ 183,609,136 | $ 15,203,028 | **$ 168,406,108** | | 1.38% | 8.28% |

## 4. PERSONAL EN LA OBRA

| **PERSONAL** | **CANTIDAD** | **PERSONAL** | **CANTIDAD** |
|---|---|---|---|
| HORNAMENTADOR | 2 | PINTORES | |
| MAESTRO | | OFICIALES | |
| ELECTRICISTA | | AYUDANTES | |
| AYU. DE HORNAMENTACIÓN | 2 | ALMACENISTA | |
| INSTALADORES DE PISO | | RESIDENTE DE OBRA | |
| SISOMA | | | |
| HIDRÁULICOS | | | |

## 5. GRÁFICA CONTROL AVANCE DE OBRA (PROGRAMACIÓN)

Página 1





## 5. OBSERVACIONES, RECOMENDACIONES Y CONCLUSIONES

SE CONTINUA CON LA CONTRUCCIÓN DE ESTRUCTURA METALICA EN TALLER.

KEVIN RODRÍGUEZ
**INSPECTOR DE INTERVENTORIA**

LILIANA CUADROS GARCÍA
**Vo. Bo. RESIDENTE DE INTERVENTORIA**

**ANEXO FOTOGRÁFICO SEMANA 03**

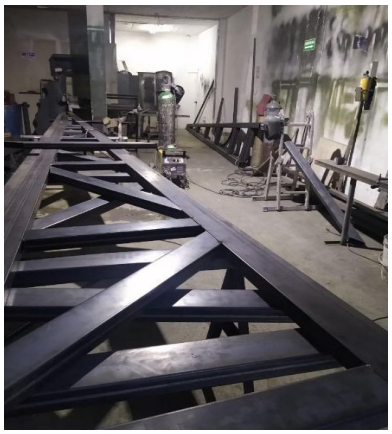

CONTRUCCIÓN ESTRUCTURA METALICA EN TALLER



CONTRUCCIÓN ESTRUCTURA METALICA EN TALLER



CONTRUCCIÓN ESTRUCTURA METALICA EN TALLER



CONTRUCCIÓN ESTRUCTURA METALICA EN TALLER





CONTRUCCIÓN ESTRUCTURA METALICA EN TALLER

| | | | |
|---|---|---|---|
| **CONTRATO No./ NOMBRE DEL PROYECTO** | INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DIST | | |
| **INTERVENTOR** | CONSORCIO INAR INGENIEROS | | |
| **CONTRATISTA** | MUÑOZ Y HERRERA INGENIEROS ASOCIADOS S.A | C. DE OBRA Nº | CO1.PCCNTR.1577474 DE MAYO 28 DE 2020 |
| **ENTIDAD CONTRATANTE** | SECRETARIA DE EDUCACIÓN DISTRITAL (SED) | | |


| PROYECTO | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **FECHA** | **VR. INVERSIÓN** | **VR. ACUMULADO** | **SEMANA** | **% PROGRAMADO** | **% PROGRAMADO ACUMULADO** |
| 1 de noviembre de 2020 | $ 496,732.23 | $ 496,732.23 | 1 | 0.27% | 0.27% |
| 8 de noviembre de 2020 | $ 21,723.03 | $ 518,455.26 | 2 | 0.01% | 0.28% |
| 15 de noviembre de 2020 | $ 74,290.60 | $ 592,745.86 | 3 | 0.04% | 0.32% |
| 22 de noviembre de 2020 | $ 76,735.16 | $ 669,481.02 | 4 | 0.04% | 0.36% |
| 29 de noviembre de 2020 | $ 6,213,373.74 | $ 6,882,854.76 | 5 | 3.38% | 3.75% |
| 6 de diciembre de 2020 | $ 9,158,418.69 | $ 16,041,273.45 | 6 | 4.99% | 8.74% |
| 13 de diciembre de 2020 | $ 9,216,098.66 | $ 25,257,372.11 | 7 | 5.02% | 13.76% |
| 20 de diciembre de 2020 | $ 9,773,446.03 | $ 35,030,818.14 | 8 | 5.32% | 19.08% |
| 27 de diciembre de 2020 | $ 13,433,433.21 | $ 48,464,251.35 | 9 | 7.32% | 26.40% |
| 3 de enero de 2021 | $ 41,583,234.48 | $ 90,047,485.84 | 10 | 22.65% | 49.04% |
| 10 de enero de 2021 | $ 91,323,167.74 | $ 181,370,653.58 | 11 | 49.74% | 98.78% |
| 17 de enero de 2021 | $ 2,238,482.25 | $ 183,609,135.83 | 12 | 1.22% | 100.00% |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| **TOTAL** | **$ 183,609,135.83** | | | | |

| BOGOTÁ Secretaría de Educación | INFORME SEMANAL # 3 CURVA DE INVERSIÓN SEMANAL | VERSIÓN 01<br>Pág. 4 De 4 |
|---|---|---|

## 1. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| INFORME No. | 3 | PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL | 21 de diciembre de 2020 | Y EL | 27 de diciembre de 2020 |
| OBJETO | INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO. | | | | |
| LOCALIZACIÓN | LOCALIDAD DE SAN CRISTOBAL | | | | |

## 2. CURVA DE INVERSIÓN "S"

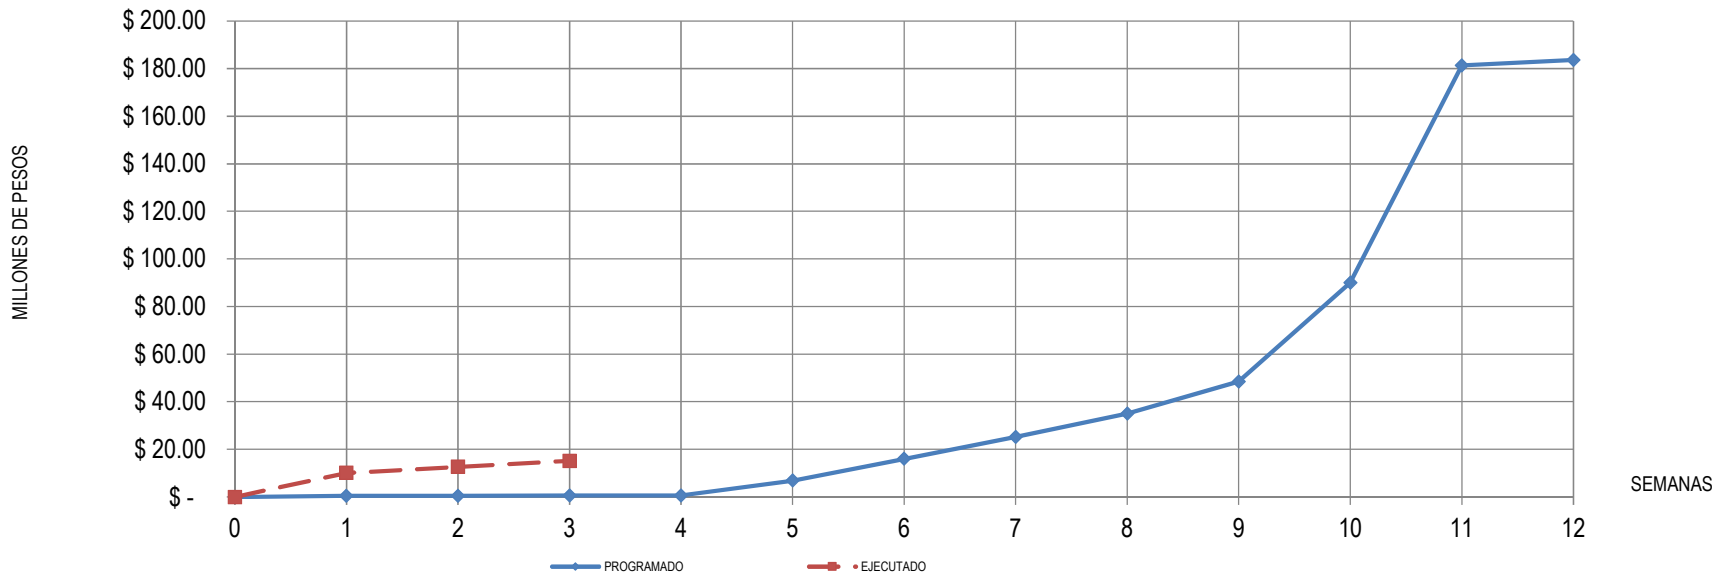

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **OBJETO** | INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO. | | | | |
| **INTERVENTOR** | CONSORCIO INAR INGENIEROS | | | | |
| **CONTRATISTA** | MUÑOZ Y HERRERA INGENIEROS ASOCIADOS S.A | C. OBRA Nº | CO1.PCCNTR. 1577474 DE MAYO 28 DE 2020 | COLEGIO SAN ISIDRO (I.E.D) | **ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL DISTRITO CAPITAL.** |
| **CONTRATANTE** | SECRETARIA DE EDUCACIÓN DISTRITAL (SED) | | | | |

| **SEMANA N°** | 4 | **DEL** | 28-Dec-20 | **AL** | 3-Jan-21 |
|---|---|---|---|---|---|

## 1. INFORMACIÓN CONTRACTUAL

| **CONTRATO DE INTERVENTORIA** | | **CONTRATO DE OBRA** | |
|---|---|---|---|
| **Contrato No .** | CO1.PCCNTR. 1680516 DE JULIO 21 DE 2020 | **Contrato No .** | CO1.PCCNTR.1577474 DE MAYO 28 DE 2020 |
| **Fecha de Iniciación** | 12 de Agosto de 2020 | **Fecha de Iniciación** | 19 de Agosto de 2020 |
| **Fecha de Terminación** | 11 de Febrero de 2021 | **Fecha de Terminación** | 18 de Enero de 2021 |
| **Plazo Inicial** | 6 meses | **Plazo Inicial** | 5 meses |
| **Valor inicial** | $ 160,550,040.00 | **Valor inicial** | $ 1,023,694,436.00 |

## 2. CONTROL DE PROGRAMACIÓN

| **EJECUCION SEMANAL POR CAPITULOS** | | | | **ACTIVIDADES** | |
|---|---|---|---|---|---|
| **No.** | **CAPÍTULO** | **PORCENTAJE PROGRAMADO** | **PORCENTAJE EJECUTADO** | **ACTIVIDADES** | **DESCRIPCIÓN** |
| 1 | PRELIMINARES | 0.04% | | | |
| 2 | CIMENTACION | | | | |
| 4 | ESTRUCTURA | | | | |
| 5 | MAMPOSTERIA | | | | |
| 7 | INSTALACIÓN HIDRAULICA SANITARIA Y DE GAS | | | | |
| 8 | INSTALACIÓN ELECTRICA, TELEFÓNICA Y COMUNICACIONES | | | | |
| 9 | PAÑETES | | | | |
| 10 | PISOS | | | | |
| 11 | CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES | | | | |
| 12 | CARPINTERIA DE METÁLICA | | | | |
| 15 | ILUMINACION | | | | |
| 18 | PINTURA | | | | |
| 19 | CERRADURAS Y VIDRIOS | | | | |
| 21 | ASEO Y VARIOS | | | | |
| **TOTALES** | | **0.04%** | **0.00%** | | |

| BOGOTÁ Secretaría de Educación | **INFORME SEMANAL # 4** | **VERSIÓN 01**<br>Pág. 1 De 4 |
|---|---|---|

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **OBJETO** | INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO. | | | | |
| **INTERVENTOR** | CONSORCIO INAR INGENIEROS | | | | |
| **CONTRATISTA** | MUÑOZ Y HERRERA INGENIEROS ASOCIADOS S.A | C. OBRA Nº | CO1.PCCNTR. 1577474 DE MAYO 28 DE 2020 | COLEGIO SAN ISIDRO (I.E.D) | **ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL DISTRITO CAPITAL.** |
| **CONTRATANTE** | SECRETARIA DE EDUCACIÓN DISTRITAL (SED) | | | | |

| **SEMANA N°** | 4 | **DEL** | 28-Dec-20 | **AL** | 3-Jan-21 |
|---|---|---|---|---|---|

## 3. RESUMEN FINANCIERO

| **BALANCE DE OBRA EJECUTADA** | **VR.TOTAL DEL FRENTE DE OBRA** | **VR. TOTAL EJECUTADO** | **VR. POR EJECUTAR** | **AVANCE DE INVERSION** | **SEMANA** | **ACUMULADO** |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | $ 183,609,136 | $ 15,203,028 | **$ 168,406,108** | | 0.00% | 8.28% |

## 4. PERSONAL EN LA OBRA

| **PERSONAL** | **CANTIDAD** | **PERSONAL** | **CANTIDAD** |
|---|---|---|---|
| HORNAMENTADOR | | PINTORES | |
| MAESTRO | | OFICIALES | |
| ELECTRICISTA | | AYUDANTES | |
| AYU. DE HORNAMENTACIÓN | | ALMACENISTA | |
| INSTALADORES DE PISO | | RESIDENTE DE OBRA | |
| SISOMA | | | |
| HIDRÁULICOS | | | |

## 5. GRÁFICA CONTROL AVANCE DE OBRA (PROGRAMACIÓN)

Página 1




## 5. OBSERVACIONES, RECOMENDACIONES Y CONCLUSIONES

DURANTE ESTA SEMANA NO SE REALIZO ACTIVIDAD EN EL TALLER NI EN EL FRENTE DE OBRA.

KEVIN RODRÍGUEZ
**INSPECTOR DE INTERVENTORIA**

LILIANA CUADROS GARCÍA
**Vo. Bo. RESIDENTE DE INTERVENTORIA**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **CONTRATO No./ NOMBRE DEL PROYECTO** | INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DIST | | |
| **INTERVENTOR** | CONSORCIO INAR INGENIEROS | | |
| **CONTRATISTA** | MUÑOZ Y HERRERA INGENIEROS ASOCIADOS S.A | C. DE OBRA Nº | CO1.PCCNTR.1577474 DE MAYO 28 DE 2020 |
| **ENTIDAD CONTRATANTE** | SECRETARIA DE EDUCACIÓN DISTRITAL (SED) | | |


| PROYECTO | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **FECHA** | **VR. INVERSIÓN** | **VR. ACUMULADO** | **SEMANA** | **% PROGRAMADO** | **% PROGRAMADO ACUMULADO** |
| 1 de noviembre de 2020 | $ 496,732.23 | $ 496,732.23 | 1 | 0.27% | 0.27% |
| 8 de noviembre de 2020 | $ 21,723.03 | $ 518,455.26 | 2 | 0.01% | 0.28% |
| 15 de noviembre de 2020 | $ 74,290.60 | $ 592,745.86 | 3 | 0.04% | 0.32% |
| 22 de noviembre de 2020 | $ 76,735.16 | $ 669,481.02 | 4 | 0.04% | 0.36% |
| 29 de noviembre de 2020 | $ 6,213,373.74 | $ 6,882,854.76 | 5 | 3.38% | 3.75% |
| 6 de diciembre de 2020 | $ 9,158,418.69 | $ 16,041,273.45 | 6 | 4.99% | 8.74% |
| 13 de diciembre de 2020 | $ 9,216,098.66 | $ 25,257,372.11 | 7 | 5.02% | 13.76% |
| 20 de diciembre de 2020 | $ 9,773,446.03 | $ 35,030,818.14 | 8 | 5.32% | 19.08% |
| 27 de diciembre de 2020 | $ 13,433,433.21 | $ 48,464,251.35 | 9 | 7.32% | 26.40% |
| 3 de enero de 2021 | $ 41,583,234.48 | $ 90,047,485.84 | 10 | 22.65% | 49.04% |
| 10 de enero de 2021 | $ 91,323,167.74 | $ 181,370,653.58 | 11 | 49.74% | 98.78% |
| 17 de enero de 2021 | $ 2,238,482.25 | $ 183,609,135.83 | 12 | 1.22% | 100.00% |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| **TOTAL** | **$ 183,609,135.83** | | | | |

| | | |
|---|---|---|
| BOGOTÁ Secretaria de Educación | **INFORME SEMANAL # 4 CURVA DE INVERSIÓN SEMANAL** | **VERSIÓN 01**<br>Pág. 4 De 4 |

**1. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| INFORME No. | 4 | PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL | 28 de diciembre de 2020 | Y EL | 3 de enero de 2021 |
| OBJETO | INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO. | | | | |
| LOCALIZACIÓN | LOCALIDAD DE SAN CRISTOBAL | | | | |

**2. CURVA DE INVERSIÓN "S"**

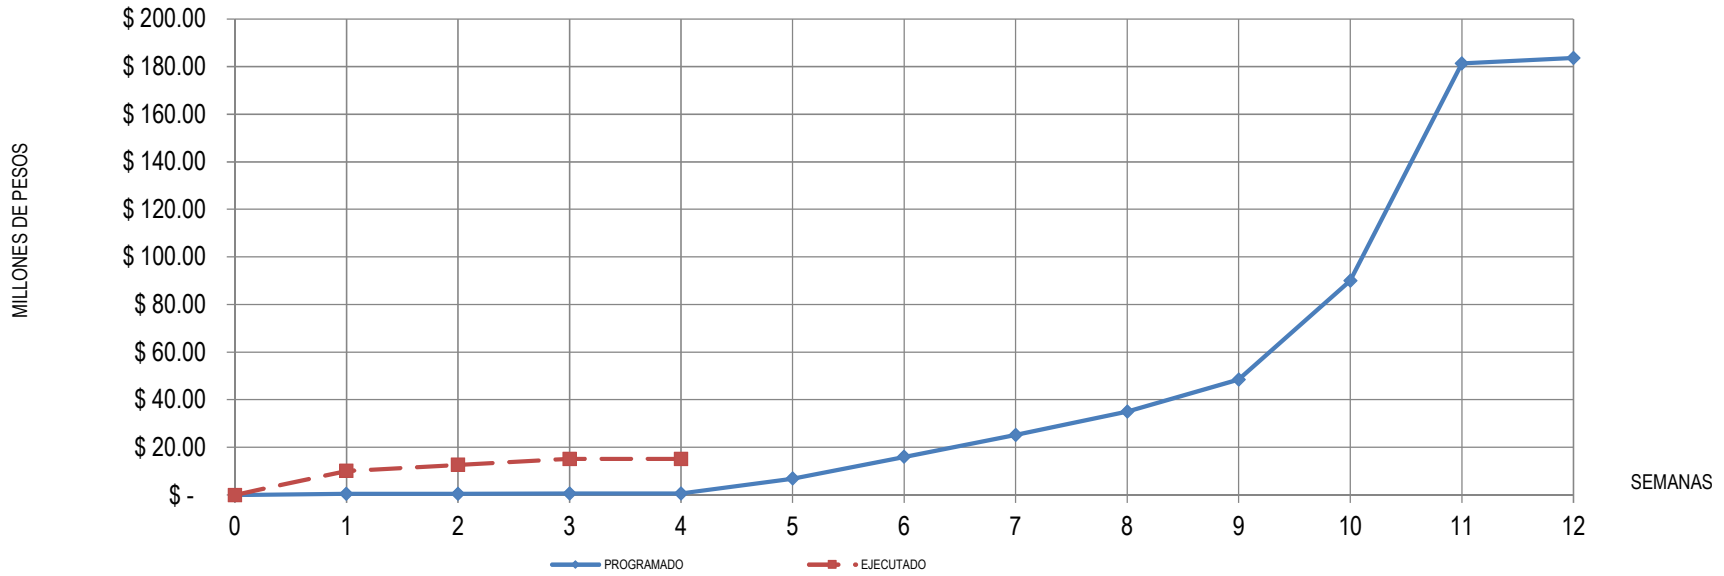

| BOGOTÁ Secretaría de Educación | **INFORME SEMANAL # 5** | VERSIÓN 01 |
|---|---|---|
| | | Pág. 1 De 4 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **OBJETO** | INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO. | | | | |
| **INTERVENTOR** | CONSORCIO INAR INGENIEROS | | | | |
| **CONTRATISTA** | MUÑOZ Y HERRERA INGENIEROS ASOCIADOS S.A | C. OBRA Nº | CO1.PCCNTR. 1577474 DE MAYO 28 DE 2020 | COLEGIO SAN ISIDRO (I.E.D) | **ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL DISTRITO CAPITAL.** |
| **CONTRATANTE** | SECRETARIA DE EDUCACIÓN DISTRITAL (SED) | | | | |

| **SEMANA N°** | 5 | **DEL** | 4-Jan-21 | **AL** | 10-Jan-21 |
|---|---|---|---|---|---|

## 1. INFORMACIÓN CONTRACTUAL

| **CONTRATO DE INTERVENTORIA** | | **CONTRATO DE OBRA** | |
|---|---|---|---|
| **Contrato No .** | CO1.PCCNTR. 1680516 DE JULIO 21 DE 2020 | **Contrato No .** | CO1.PCCNTR.1577474 DE MAYO 28 DE 2020 |
| **Fecha de Iniciación** | 12 de Agosto de 2020 | **Fecha de Iniciación** | 19 de Agosto de 2020 |
| **Fecha de Terminación** | 11 de Febrero de 2021 | **Fecha de Terminación** | 18 de Enero de 2021 |
| **Plazo Inicial** | 6 meses | **Plazo Inicial** | 5 meses |
| **Valor inicial** | $ 160,550,040.00 | **Valor inicial** | $ 1,023,694,436.00 |

## 2. CONTROL DE PROGRAMACIÓN

| **EJECUCION SEMANAL POR CAPITULOS** | | | | **ACTIVIDADES** | |
|---|---|---|---|---|---|
| **No.** | **CAPÍTULO** | **PORCENTAJE PROGRAMADO** | **PORCENTAJE EJECUTADO** | **ACTIVIDADES** | **DESCRIPCIÓN** |
| 1 | PRELIMINARES | 0.04% | | | |
| 2 | CIMENTACION | | | | |
| 4 | ESTRUCTURA | 3.34% | 6.90% | ESTRUCTURA METALICA | SE REALIZA ESTRUCTURA METALICA EN TALLER |
| 5 | MAMPOSTERIA | | | | |
| 7 | INSTALACIÓN HIDRAULICA SANITARIA Y DE GAS | | | | |
| 8 | INSTALACIÓN ELECTRICA, TELEFÓNICA Y COMUNICACIONES | | | | |
| 9 | PAÑETES | | | | |
| 10 | PISOS | | | | |
| 11 | CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES | | | | |
| 12 | CARPINTERIA DE METÁLICA | | | | |
| 15 | ILUMINACION | | | | |
| 18 | PINTURA | | | | |
| 19 | CERRADURAS Y VIDRIOS | | | | |
| 21 | ASEO Y VARIOS | | | | |
| **TOTALES** | | **3.38%** | **6.90%** | | |

| BOGOTÁ Secretaría de Educación | **INFORME SEMANAL # 5** | **VERSIÓN 01**<br>Pág. 1 De 4 |
|---|---|---|

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **OBJETO** | INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO. | | | | |
| **INTERVENTOR** | CONSORCIO INAR INGENIEROS | | | | |
| **CONTRATISTA** | MUÑOZ Y HERRERA INGENIEROS ASOCIADOS S.A | C. OBRA Nº | CO1.PCCNTR. 1577474 DE MAYO 28 DE 2020 | COLEGIO SAN ISIDRO (I.E.D) | **ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL DISTRITO CAPITAL.** |
| **CONTRATANTE** | SECRETARIA DE EDUCACIÓN DISTRITAL (SED) | | | | |

| **SEMANA N°** | 5 | **DEL** | 4-Jan-21 | **AL** | 10-Jan-21 |
|---|---|---|---|---|---|

## 3. RESUMEN FINANCIERO

| **BALANCE DE OBRA EJECUTADA** | **VR.TOTAL DEL FRENTE DE OBRA** | **VR. TOTAL EJECUTADO** | **VR. POR EJECUTAR** | **AVANCE DE INVERSION** | **SEMANA** | **ACUMULADO** |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | $ 183,609,136 | $ 27,872,217 | **$ 155,736,918** | | 6.90% | 15.18% |

## 4. PERSONAL EN LA OBRA

| **PERSONAL** | **CANTIDAD** | **PERSONAL** | **CANTIDAD** |
|---|---|---|---|
| HORNAMENTADOR | 2 | PINTORES | |
| MAESTRO | | OFICIALES | |
| ELECTRICISTA | | AYUDANTES | |
| AYU. DE HORNAMENTACIÓN | 2 | ALMACENISTA | |
| INSTALADORES DE PISO | | RESIDENTE DE OBRA | |
| SISOMA | | | |
| HIDRÁULICOS | | | |

## 5. GRÁFICA CONTROL AVANCE DE OBRA (PROGRAMACIÓN)

Página 1





## 5. OBSERVACIONES, RECOMENDACIONES Y CONCLUSIONES

SE RETOMA LA CONTRUCCIÓN DE ESTRUCTURA METALICA EN TALLER.

KEVIN RODRÍGUEZ
**INSPECTOR DE INTERVENTORIA**

LILIANA CUADROS GARCÍA
**Vo. Bo. RESIDENTE DE INTERVENTORIA**

**ANEXO FOTOGRÁFICO SEMANA 05**

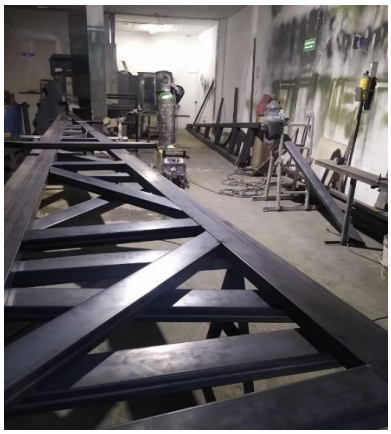

CONTRUCCIÓN ESTRUCTURA METALICA EN TALLER



CONTRUCCIÓN ESTRUCTURA METALICA EN TALLER



CONTRUCCIÓN ESTRUCTURA METALICA EN TALLER



CONTRUCCIÓN ESTRUCTURA METALICA EN TALLER

| | | | |
|---|---|---|---|
| **CONTRATO No./ NOMBRE DEL PROYECTO** | INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DIST | | |
| **INTERVENTOR** | CONSORCIO INAR INGENIEROS | | |
| **CONTRATISTA** | MUÑOZ Y HERRERA INGENIEROS ASOCIADOS S.A | C. DE OBRA Nº | CO1.PCCNTR.1577474 DE MAYO 28 DE 2020 |
| **ENTIDAD CONTRATANTE** | SECRETARIA DE EDUCACIÓN DISTRITAL (SED) | | |


| PROYECTO | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **FECHA** | **VR. INVERSIÓN** | **VR. ACUMULADO** | **SEMANA** | **% PROGRAMADO** | **% PROGRAMADO ACUMULADO** |
| 1 de noviembre de 2020 | $ 496,732.23 | $ 496,732.23 | 1 | 0.27% | 0.27% |
| 8 de noviembre de 2020 | $ 21,723.03 | $ 518,455.26 | 2 | 0.01% | 0.28% |
| 15 de noviembre de 2020 | $ 74,290.60 | $ 592,745.86 | 3 | 0.04% | 0.32% |
| 22 de noviembre de 2020 | $ 76,735.16 | $ 669,481.02 | 4 | 0.04% | 0.36% |
| 29 de noviembre de 2020 | $ 6,213,373.74 | $ 6,882,854.76 | 5 | 3.38% | 3.75% |
| 6 de diciembre de 2020 | $ 9,158,418.69 | $ 16,041,273.45 | 6 | 4.99% | 8.74% |
| 13 de diciembre de 2020 | $ 9,216,098.66 | $ 25,257,372.11 | 7 | 5.02% | 13.76% |
| 20 de diciembre de 2020 | $ 9,773,446.03 | $ 35,030,818.14 | 8 | 5.32% | 19.08% |
| 27 de diciembre de 2020 | $ 13,433,433.21 | $ 48,464,251.35 | 9 | 7.32% | 26.40% |
| 3 de enero de 2021 | $ 41,583,234.48 | $ 90,047,485.84 | 10 | 22.65% | 49.04% |
| 10 de enero de 2021 | $ 91,323,167.74 | $ 181,370,653.58 | 11 | 49.74% | 98.78% |
| 17 de enero de 2021 | $ 2,238,482.25 | $ 183,609,135.83 | 12 | 1.22% | 100.00% |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| **TOTAL** | **$ 183,609,135.83** | | | | |

| BOGOTÁ Secretaria de Educación | INFORME SEMANAL # 5 CURVA DE INVERSIÓN SEMANAL | VERSIÓN 01<br>Pág. 4 De 4 |
|---|---|---|

## 1. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| INFORME No. | 5 | PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL | 4 de enero de 2021 | Y EL | 10 de enero de 2021 |
| OBJETO | INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO. | | | | |
| LOCALIZACIÓN | LOCALIDAD DE SAN CRISTOBAL | | | | |

## 2. CURVA DE INVERSIÓN "S"

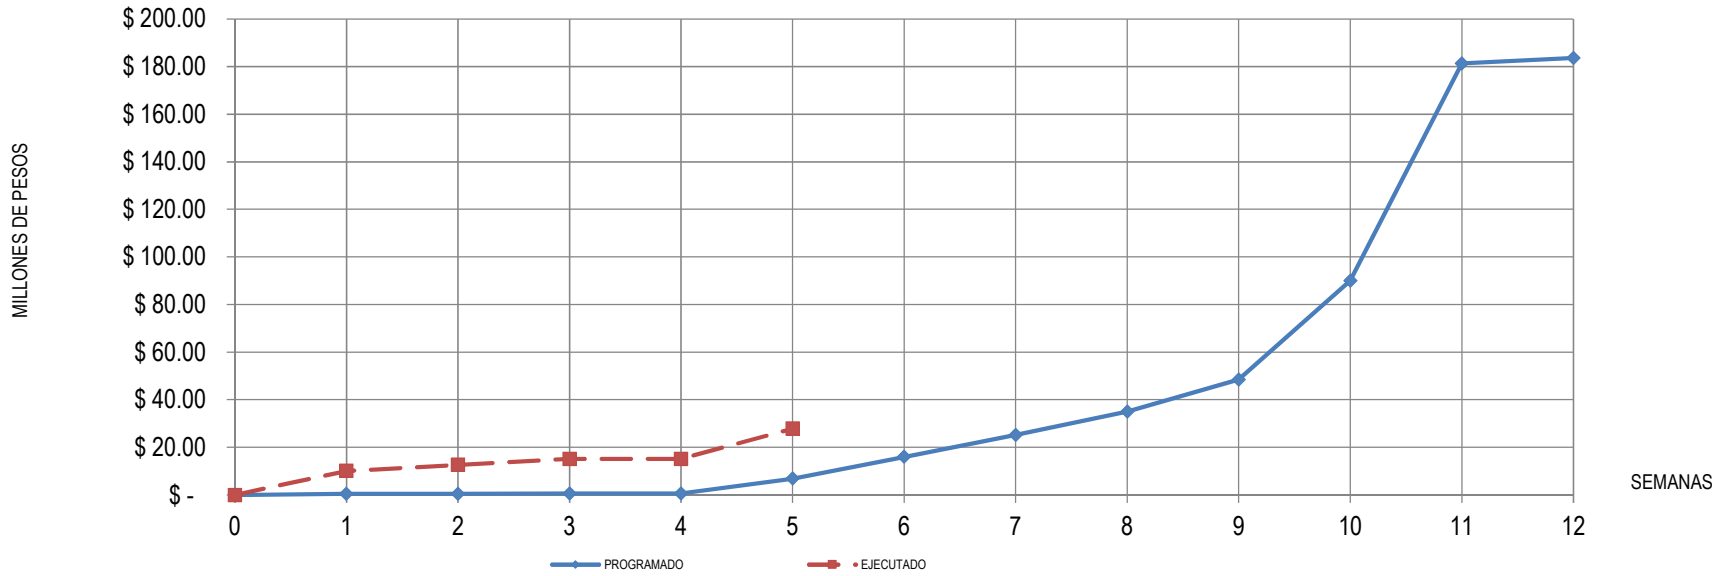

| BOGOTÁ Secretaría de Educación | **INFORME SEMANAL # 6** | **VERSIÓN 01**<br>Pág. 1 De 4 |
|---|---|---|

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **OBJETO** | INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO. | | | | |
| **INTERVENTOR** | CONSORCIO INAR INGENIEROS | | | | |
| **CONTRATISTA** | MUÑOZ Y HERRERA INGENIEROS ASOCIADOS S.A | C. OBRA Nº | CO1.PCCNTR. 1577474 DE MAYO 28 DE 2020 | COLEGIO SAN ISIDRO (I.E.D) | **ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL DISTRITO CAPITAL.** |
| **CONTRATANTE** | SECRETARIA DE EDUCACIÓN DISTRITAL (SED) | | | | |

| **SEMANA N°** | 6 | **DEL** | 11-Jan-21 | **AL** | 17-Jan-21 |
|---|---|---|---|---|---|

## 1. INFORMACIÓN CONTRACTUAL

| **CONTRATO DE INTERVENTORIA** | | **CONTRATO DE OBRA** | |
|---|---|---|---|
| **Contrato No .** | CO1.PCCNTR. 1680516 DE JULIO 21 DE 2020 | **Contrato No .** | CO1.PCCNTR.1577474 DE MAYO 28 DE 2020 |
| **Fecha de Iniciación** | 12 de Agosto de 2020 | **Fecha de Iniciación** | 19 de Agosto de 2020 |
| **Fecha de Terminación** | 11 de Febrero de 2021 | **Fecha de Terminación** | 18 de Enero de 2021 |
| **Plazo Inicial** | 6 meses | **Plazo Inicial** | 5 meses |
| **Valor inicial** | $ 160,550,040.00 | **Valor inicial** | $ 1,023,694,436.00 |

## 2. CONTROL DE PROGRAMACIÓN

| **EJECUCION SEMANAL POR CAPITULOS** | | | | **ACTIVIDADES** | |
|---|---|---|---|---|---|
| **No.** | **CAPÍTULO** | **PORCENTAJE PROGRAMADO** | **PORCENTAJE EJECUTADO** | **ACTIVIDADES** | **DESCRIPCIÓN** |
| 1 | PRELIMINARES | 0.42% | | | |
| 2 | CIMENTACION | 0.09% | | | |
| 4 | ESTRUCTURA | | 4.85% | | |
| 5 | MAMPOSTERIA | | | | |
| 7 | INSTALACIÓN HIDRAULICA SANITARIA Y DE GAS | | | | |
| 8 | INSTALACIÓN ELECTRICA, TELEFÓNICA Y COMUNICACIONES | | | | |
| 9 | PAÑETES | | | | |
| 10 | PISOS | | | | |
| 11 | CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES | | | | |
| 12 | CARPINTERIA DE METÁLICA | | | | |
| 15 | ILUMINACION | | | | |
| 18 | PINTURA | | | | |
| 19 | CERRADURAS Y VIDRIOS | | | | |
| 21 | ASEO Y VARIOS | | | | |
| **TOTALES** | | **0.51%** | **4.85%** | | |

| BOGOTÁ Secretaría de Educación | **INFORME SEMANAL # 6** | **VERSIÓN 01**<br>Pág. 1 De 4 |
|---|---|---|

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **OBJETO** | INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO. | | | | |
| **INTERVENTOR** | CONSORCIO INAR INGENIEROS | | | | |
| **CONTRATISTA** | MUÑOZ Y HERRERA INGENIEROS ASOCIADOS S.A | C. OBRA Nº | CO1.PCCNTR. 1577474 DE MAYO 28 DE 2020 | COLEGIO SAN ISIDRO (I.E.D) | **ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL DISTRITO CAPITAL.** |
| **CONTRATANTE** | SECRETARIA DE EDUCACIÓN DISTRITAL (SED) | | | | |

| **SEMANA N°** | 6 | **DEL** | 11-Jan-21 | **AL** | 17-Jan-21 |
|---|---|---|---|---|---|

## 3. RESUMEN FINANCIERO

| **BALANCE DE OBRA EJECUTADA** | **VR.TOTAL DEL FRENTE DE OBRA** | **VR. TOTAL EJECUTADO** | **VR. POR EJECUTAR** | **AVANCE DE INVERSION** | **SEMANA** | **ACUMULADO** |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | $ 183,609,136 | $ 27,872,217 | **$ 155,736,918** | | 0.00% | 15.18% |

## 4. PERSONAL EN LA OBRA

| **PERSONAL** | **CANTIDAD** | **PERSONAL** | **CANTIDAD** |
|---|---|---|---|
| HORNAMENTADOR | | PINTORES | |
| MAESTRO | | OFICIALES | |
| ELECTRICISTA | | AYUDANTES | |
| AYU. DE HORNAMENTACIÓN | | ALMACENISTA | |
| INSTALADORES DE PISO | | RESIDENTE DE OBRA | |
| SISOMA | | | |
| HIDRÁULICOS | | | |

## 5. GRÁFICA CONTROL AVANCE DE OBRA (PROGRAMACIÓN)

Página 1




## 5. OBSERVACIONES, RECOMENDACIONES Y CONCLUSIONES

EN ESTA SEMANA NO SE REALIZO ACTIVIDAD EN TALLER NI EN EL FRENTE DE OBRA.

KEVIN RODRÍGUEZ
**INSPECTOR DE INTERVENTORIA**

LILIANA CUADROS GARCÍA
**Vo. Bo. RESIDENTE DE INTERVENTORIA**
