
CONTRATO No./ NOMBRE DEL PROYECTO	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DIST		
INTERVENTOR	CONSORCIO INAR INGENIEROS		
CONTRATISTA	MUÑOZ Y HERRERA INGENIEROS ASOCIADOS S.A	C. DE OBRA Nº	CO1.PCCNTR.1577474 DE MAYO 28 DE 2020
ENTIDAD CONTRATANTE	SECRETARIA DE EDUCACIÓN DISTRITAL (SED)		

PROYECTO					
FECHA	**VR. INVERSIÓN**	**VR. ACUMULADO**	**SEMANA**	**% PROGRAMADO**	**% PROGRAMADO ACUMULADO**
1 de noviembre de 2020	$ 496,732.23	$ 496,732.23	1	0.27%	0.27%
8 de noviembre de 2020	$ 21,723.03	$ 518,455.26	2	0.01%	0.28%
15 de noviembre de 2020	$ 74,290.60	$ 592,745.86	3	0.04%	0.32%
22 de noviembre de 2020	$ 76,735.16	$ 669,481.02	4	0.04%	0.36%
29 de noviembre de 2020	$ 6,213,373.74	$ 6,882,854.76	5	3.38%	3.75%
6 de diciembre de 2020	$ 9,158,418.69	$ 16,041,273.45	6	4.99%	8.74%
13 de diciembre de 2020	$ 9,216,098.66	$ 25,257,372.11	7	5.02%	13.76%
20 de diciembre de 2020	$ 9,773,446.03	$ 35,030,818.14	8	5.32%	19.08%
27 de diciembre de 2020	$ 13,433,433.21	$ 48,464,251.35	9	7.32%	26.40%
3 de enero de 2021	$ 41,583,234.48	$ 90,047,485.84	10	22.65%	49.04%
10 de enero de 2021	$ 91,323,167.74	$ 181,370,653.58	11	49.74%	98.78%
17 de enero de 2021	$ 2,238,482.25	$ 183,609,135.83	12	1.22%	100.00%
TOTAL	**$ 183,609,135.83**				

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO

INFORME No.	6	PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL	11 de enero de 2021	Y EL	17 de enero de 2021
OBJETO	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO.				
LOCALIZACIÓN	LOCALIDAD DE SAN CRISTOBAL				

2. CURVA DE INVERSIÓN "S"

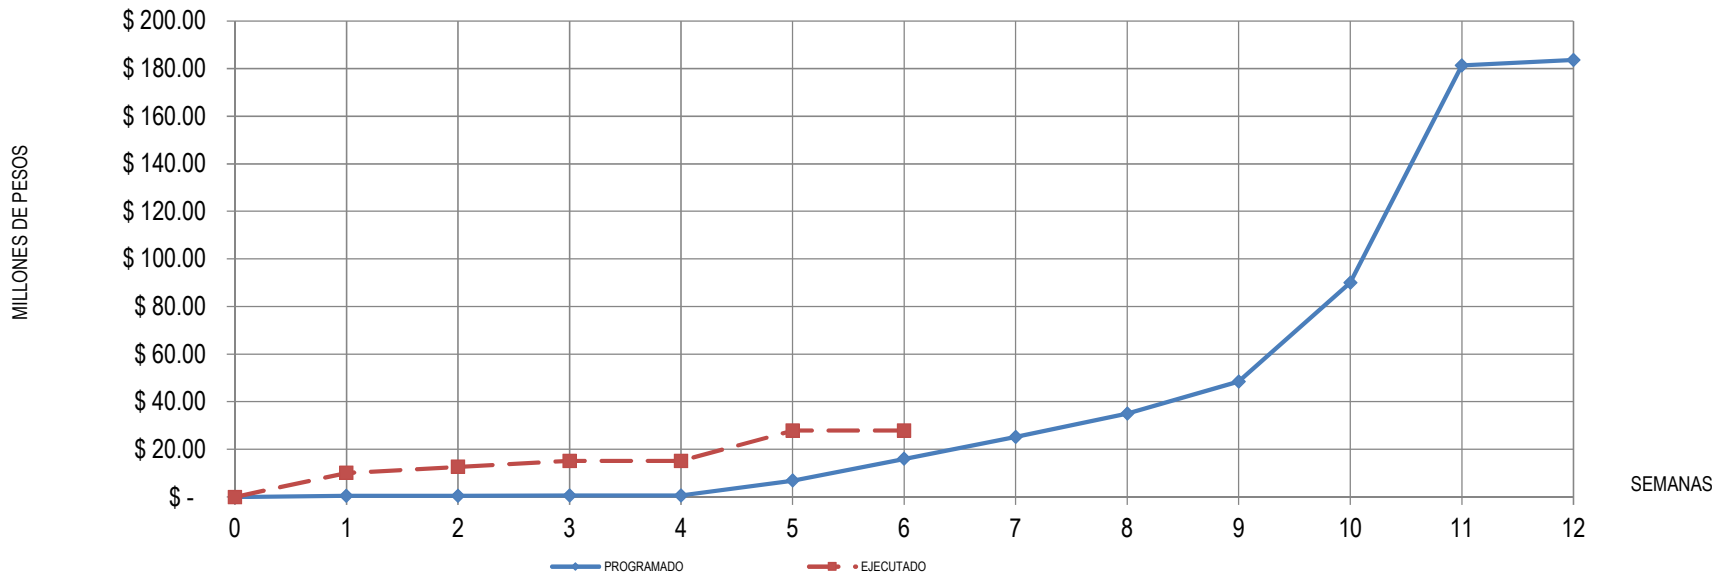

ANEXO 8.
RELACIÓN DE CORRESPONDENCIA.

CONSORCIO INAR INGENIEROS	CONSORCIO INAR INGENIEROS
RELACIÓN DE CORRESPONDENCIA INFORME No 5	

TIPO DE CONTRATO:	INTERVENTORIA
NÚMERO DE CONTRATO:	CO1.PCCNTR.1680516
OBJETO:	GRUPO 10. INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, JURIDICA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRAS DE ADECUACION, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FISICAS, ASI COMO LA ADECUACION Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TERMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO EDUCATIVO.
CONTRATISTA:	MUÑOZ Y HERRERA INGENIEROS ASOCIADOS S.A.
INTERVENTOR:	CONSORCIO INAR INGENIEROS
SUPERVISOR:	ING. JULIETA MERCADO

CORRESPONDENCIA ENVIADA

FECHA	CONSECUTIVO	ASUNTO	ENVIADO POR	ENVIADO A
30-12-2020	CINAR-CO1.PCCNTR.1680516-035-2020	INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No 4	CONSORCIO INAR INGENIEROS	SECRETARIA DE EDUCACIÓN ING. JULIETA MERCADO
06/01/2021	CINAR-CO1.PCCNTR.1680516-036-2021	RESPUESTA OFICIO No MYH-SED-MNTO009-2020 SOLICITUD DE PRORROGA	CONSORCIO INAR INGENIEROS	MUÑOZ Y HERRERA INGENIEROS ASOCIADOS S.A.
06/01/2021	CINAR-CO1.PCCNTR.1680516-037-2021	AVAL SOLICITUD DE PRORROGA CONTRATO DE OBRA No CO1.PCCNTR.1577474	CONSORCIO INAR INGENIEROS	SECRETARIA DE EDUCACIÓN ING. JULIETA MERCADO
08/01/2021	CORREO ELECTRONICO	COMITÉ DE SEGUIMIENTO	CONSORCIO INAR INGENIEROS	MUÑOZ Y HERRERA INGENIEROS ASOCIADOS S.A.
12/01/2021	CORREO ELECTRONICO	Programación PRORROGA	CONSORCIO INAR INGENIEROS	SECRETARIA DE EDUCACIÓN ING. JULIETA MERCADO
14/01/2021	CORREO ELECTRONICO	COMITÉ DE SEGUIMIENTO	CONSORCIO INAR INGENIEROS	MUÑOZ Y HERRERA INGENIEROS ASOCIADOS S.A.

CONSORCIO INAR INGENIEROS

CONSORCIO INAR INGENIEROS

RELACIÓN DE CORRESPONDENCIA INFORME No 5

TIPO DE CONTRATO:	INTERVENTORIA
NÚMERO DE CONTRATO:	CO1.PCCNTR.1680516
OBJETO:	GRUPO 10. INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, JURIDICA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRAS DE ADECUACION, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FISICAS, ASI COMO LA ADECUACION Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TERMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO EDUCATIVO.
CONTRATISTA:	MUÑOZ Y HERRERA INGENIEROS ASOCIADOS S.A.
INTERVENTOR:	CONSORCIO INAR INGENIEROS
SUPERVISOR:	ING. JULIETA MERCADO

CORRESPONDENCIA RECIBIDA

FECHA	CONSECUTIVO	ASUNTO	ENVIADO POR	ENVIADO A
28/12/2020	MYH-SED-MNTO009-2020	SOLICITUD DE PRORROGA	MUÑOZ Y HERRERA INGENIEROS ASOCIADOS S.A.	CONSORCIO INAR INGENIEROS
21/12/2020	CORREO ELECTRONICO	PROGRAMACIÓN Y FLUJO JUANA B Y JUAN EVANGELISTA	MUÑOZ Y HERRERA INGENIEROS ASOCIADOS S.A.	CONSORCIO INAR INGENIEROS
22/12/2020	CORREO ELECTRONICO	PROGRAMACIÓN Y FLUJO ATENAS, JUANA C Y GRAN COLOMBIA	MUÑOZ Y HERRERA INGENIEROS ASOCIADOS S.A.	CONSORCIO INAR INGENIEROS
23/12/2021	CORREO ELECTRONICO	PROGRAMACIÓN Y FLUJO SAN ISIDRO	MUÑOZ Y HERRERA INGENIEROS ASOCIADOS S.A.	CONSORCIO INAR INGENIEROS
28/12/2020	CORREO ELECTRONICO	BOLETIN PISOS MONSERRATE	MUÑOZ Y HERRERA INGENIEROS ASOCIADOS S.A.	CONSORCIO INAR INGENIEROS
04/01/2021	CORREO ELECTRONICO	PROGRAMACIÓN Y FLUJO ALPES	MUÑOZ Y HERRERA INGENIEROS ASOCIADOS S.A.	CONSORCIO INAR INGENIEROS
06/01/2021	OFICIO MYH-SED-MNTO010-2021	NUEVA CUARENTENA ESTRICTA EN LOCALIDAES USAQUEN, ENGATIVA Y SUBA	MUÑOZ Y HERRERA INGENIEROS ASOCIADOS S.A.	CONSORCIO INAR INGENIEROS
07/01/2021	CORREO ELECTRONICO	Solicitud de autorización para desplazamiento, contrato de Obra Pública No. CO1.PCCNTR.1577474 de 2020 y Contrato de interventoría No CO1.PCCNTR.1680516 de 2020	SECRETARIA DE EDUCACIÓN ING . JULIETA MERCADO	CONSORCIO INAR INGENIEROS
08/01/2021	CORREO ELECTRONICO	Cronograma de demarcación de aulas en sedes en obra	SECRETARIA DE EDUCACIÓN ING . JULIETA MERCADO	CONSORCIO INAR INGENIEROS
08/01/2021	CORREO ELECTRONICO	Autorización de ingreso de personal de obra - Colegio San Isidro Sede B	SECRETARIA DE EDUCACIÓN ING . JULIETA MERCADO	CONSORCIO INAR INGENIEROS
08/01/2021	CORREO ELECTRONICO	PROGRAMACION 2021 SED MANTENIMIENTOS	MUÑOZ Y HERRERA INGENIEROS ASOCIADOS S.A.	CONSORCIO INAR INGENIEROS
12/01/2021	CORREO ELECTRONICO	Programación PRORROGA	MUÑOZ Y HERRERA INGENIEROS ASOCIADOS S.A.	CONSORCIO INAR INGENIEROS
12/01/2021	CORREO ELECTRONICO	Informe técnico No. 2	MUÑOZ Y HERRERA INGENIEROS ASOCIADOS S.A.	CONSORCIO INAR INGENIEROS
14/01/2021	CORREO ELECTRONICO	programación actualizada	MUÑOZ Y HERRERA INGENIEROS ASOCIADOS S.A.	CONSORCIO INAR INGENIEROS
17/01/2021	CORREO ELECTRONICO	PLANOS GRAN COLOMBIA	MUÑOZ Y HERRERA INGENIEROS ASOCIADOS S.A.	CONSORCIO INAR INGENIEROS
