MYRIAM ROMERO PULECIO
ING. SANITARIA. UNIVALLE

COM-2042-2020-22

Santiago de Cali, marzo 30 de 2021.

Señores;
CARLOS ALBERTO DIAGO ALZATE
SECRETARIO DE DEPORTE Y LA RECREACION
Santiago de Cali — Colombia

REFERENCIA: CONTRATO No. 4162.010.26.1.2042-2020 - EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FORMULA DE REAJUSTE LAS SIGUIENTES OBRAS: A) ADECUACION DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (STAR) - DEL ESCENARIO DEPORTIVO DE VILLA CARMELO, B.P. 26002190, DE CONFORMIDAD CON LOS PLIEGOS DE CONDICIONES, ESTUDIOS PREVIOS, FORMULACIÓN DEL PROYECTO Y DEMÁS CONDICIONES ESTABLECIDAS EN LOS ANEXOS TÉCNICOS".

ASUNTO: SOLICITUD PRORROGA EN EL TIEMPO DE ACTIVIDADES CONTRATO DE OBRA

Estimados señores:

Las condiciones en las que se encuentra el sitio de la obra, ha dificultado el desarrollo normal de las actividades pendientes por ejecutar.

De acuerdo a los informes meteorológicos de la ciudad de Cali, las precipitaciones han incrementado en los últimos días y se han presentado a diario, y se pronostica que las lluvias continuaran de forma permanente durante las próximas semanas.

CALLE 4 No. 75-72 Casa 32 tel 3242955 cel 3155211889
myromero@yahoo.com

CALI –COLOMBIA

MYRIAM ROMERO PULECIO
ING. SANITARIA. UNIVALLE

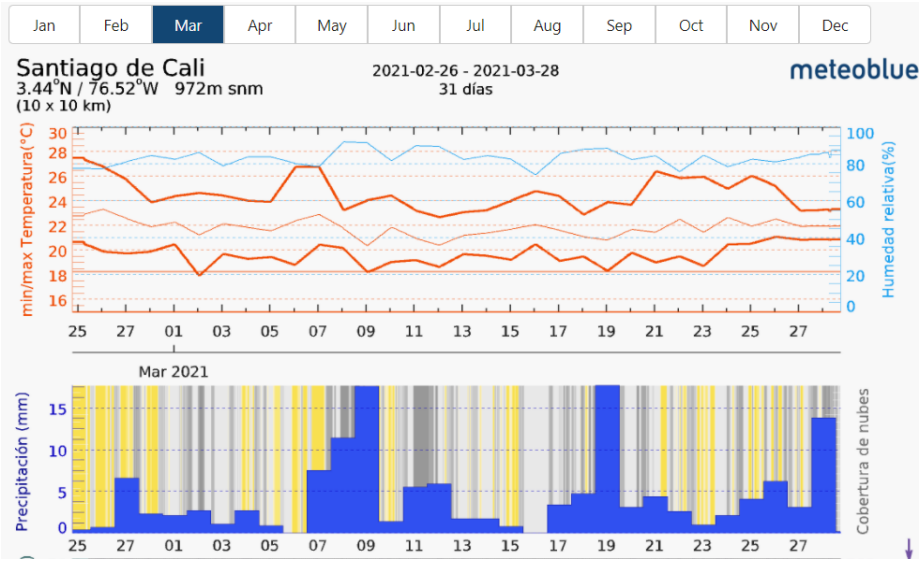


Grafico 1: tomado de: https://www.meteoblue.com/es/tiempo/historyclimate/weatherarchive/santiago-de-cali_colombia_3687925

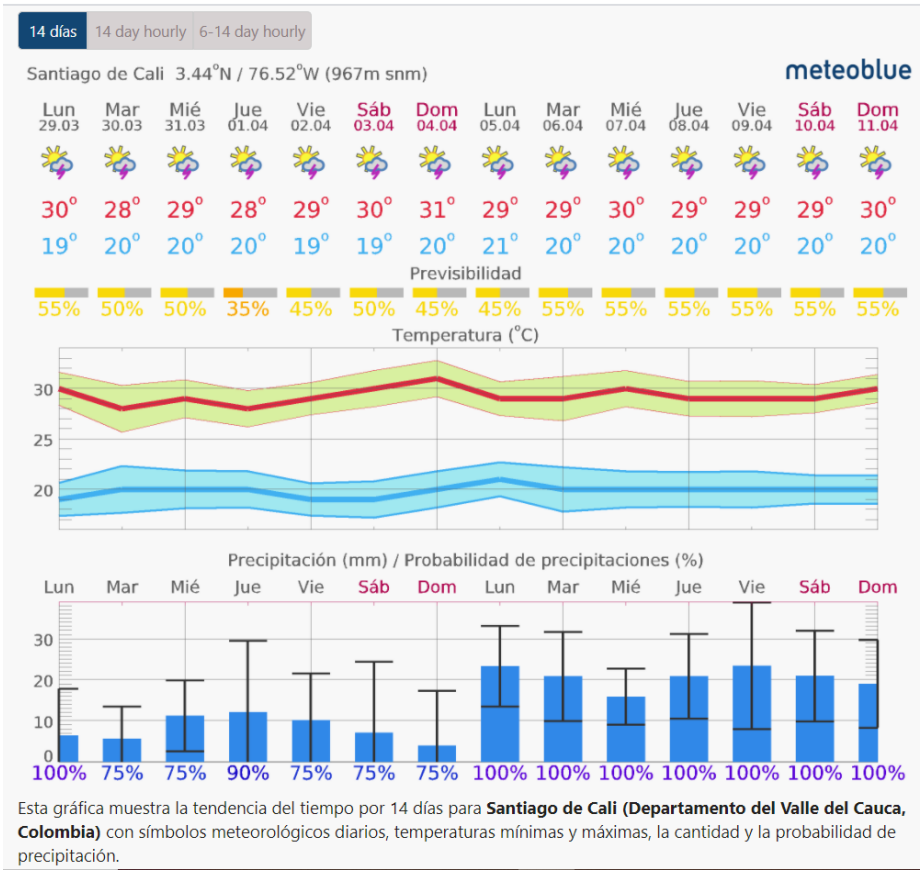


Grafico 2: tomado de: https://www.meteoblue.com/es/tiempo/14-dias/santiago-de-cali_colombia_3687925

CALLE 4 No. 75-72 Casa 32 tel 3242955 cel 3155211889
myromero@yahoo.com

CALI –COLOMBIA

MYRIAM ROMERO PULECIO
ING. SANITARIA. UNIVALLE

Con lo anterior, y el incremento de las lluvias en la ciudad de Santiago de Cali, y específicamente en la zona de la obra, ha causado varios inconvenientes que afectan directamente la entrega definitiva de las obras las cuales son:

1. Los trabajos para la implementación del sistema fotovoltaico se desarrollan en poco tiempo, sin embargo, la nubosidad y las fuertes lluvias que se están presentando, hacen que las pruebas para verificar el correcto funcionamiento del sistema instalado no se han podido desarrollar en forma definitiva, y se puede requerir entre 10 y 15 días, dadas las condiciones actuales.

2. El estado actual de la vía y el lugar de la obra, no facilita la entrada y salida de los equipos requeridos para el retiro de escombros, lo que ha dificultado el desarrollo normal de esta actividad.

De acuerdo a lo anterior se solicita una prórroga del contrato por 15 días con el fin de poder terminar a satisfacción todas las actividades pendientes y hacer entrega de estas a la entidad contratante de forma definitiva.

Atentamente,



MYRIAM ROMERO PULECIO
CONTRATISTA

CALLE 4 No. 75-72 Casa 32 tel 3242955 cel 3155211889
myromero@yahoo.com

CALI –COLOMBIA
