INPLAYCO S.A.S.
INGENIEROS CONSTRUCTORES E INTERVENTORES


ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE HÁBITAT


INFORME SEMANAL 18

GRUPO No. 1

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 701-2020 CUYO OBJETO ES REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, JURÍDICA, SOCIAL, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA MODALIDAD DE HABITABILIDAD EN LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT.

ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE HÁBITAT

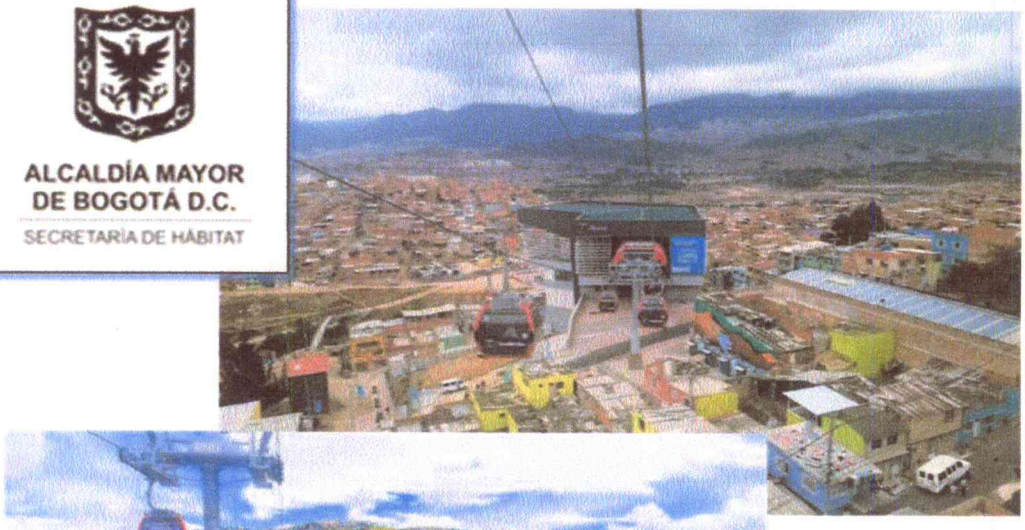

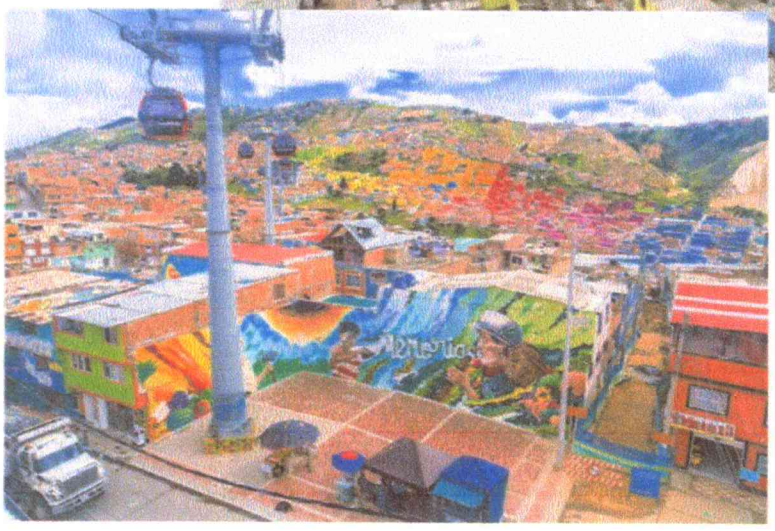

SEMANA 18 DEL 1 AL 7 DE MARZO DE 2021

INPLAYCO S.A.S.
INGENIEROS CONSTRUCTORES E INTERVENTORES

ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE HÁBITAT

CONTRATO DE INTERVENTORÍA
NÚMERO: 701-2020

CONTRATANTE:	**SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT**	
CONTRATISTA:	**INPLAYCO S.A.S**	
IDENTIFICACIÓN:	N.I.T.: **860.524.168- 8**	
REPRESENTANTE LEGAL:	**GONZALO LIÉVANO HOYOS**	
IDENTIFICACIÓN:	C.C. Nº 19.100.962	
DIRECCIÓN:	Carrera 16 A No 82-13 Oficina 201	
TELÉFONOS:	6181167	inplayco@yahoo.com.mx
SUPERVISOR	JUAN CARLOS ARBELÁEZ MURILLO	
FECHA DE INICIO	4 DE NOVIEMBRE DE 2020	
FECHA DE FINALIZACIÓN	3 DE MAYO DE 2021	
TIEMPO EJECUCIÓN DEL	6 MESES	
VALOR CONTRATO	$894.285.952	
FECHA ADICIÓN No. 1	------	
VALOR ADICIÓN No. 1	$0	
VALOR TOTAL CONTRATO	$894.285.952	
FECHA PRÓRROGA No. 1	------	
VALOR PRÓRROGA No. 1	$0	
VALOR TOTAL CONTRATO	$894.285.952	

INPLAYCO S.A.S.
INGENIEROS CONSTRUCTORES E INTERVENTORES

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE HÁBITAT

CONTRATO DE OBRA
NÚMERO: 694-2020

CONTRATANTE:	**SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT**	
CONTRATISTA:	CONSORCIO MEJORAMIENTO EP 2020	
REPRESENTANTE LEGAL	LUIS FERNANDO CARRILLO JIMÉNEZ	
OBJETO CONTRACTUAL	"CONTRATAR LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA MODALIDAD DE HABITABILIDAD DE LOS PROYECTOS ESTRUCTURADOS EN LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT.".	
APROPIACIÓN PRESUPUESTAL	CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL NO. 914 DEL 14 DE JULIO DE 2020	
FIDUCIA No.		
DIRECCIÓN:	Calle 31 No. 4 -47 oficina 501 MONTERÍA	
TELÉFONOS:	3212231771	Mejoramientoconsorcio2020@gmail.com
Consorciado No. 1.	CORPORACIÓN MULTIACTIVA EMPRENDER ONG	
NIT	900.164.714-9	
REPRESENTANTE LEGAL	JUAN CARLOS NOBLES NAVARRO	
C.C. R.L.	10.894.408	
Consorciado No. 2.	PROJECT CENTER LIMITADA	
NIT	900.236.613-3	
REPRESENTANTE LEGAL	LUIS FERNANDO CARRILLO JIMENEZ	
C.C. R.L.	72.097.065	
PARTICIPACIÓN		
CORPORACIÓN MULTIACTIVA EMPRENDER	60% / MANEJO TÉCNICO, CONTABLE Y ADMINISTRATIVO	
PROJECT CENTER LIMITADA	40% / MANEJO TÉCNICO y ADMINISTRATIVO	
SUPERVISOR	JUAN CARLOS ARBELÁEZ MURILLO	
FECHA DE INICIO	4 DE NOVIEMBRE DE 2020	
FECHA DE FINALIZACIÓN	3 DE ABRIL DE 2021	
TIEMPO EJECUCIÓN DEL CONTRATO	5 MESES	
VALOR CONTRATO	$3.728.543.252	
FECHA ADICIÓN No. 1	------	
VALOR ADICIÓN No. 1	$0	
VALOR TOTAL CONTRATO	$3.728.543.252	
FECHA PRÓRROGA No. 1	------	
VALOR PRÓRROGA No. 1	$0	
VALOR TOTAL CONTRATO	$3.728.543.252	

INPLAYCO S.A.S.
INGENIEROS CONSTRUCTORES E INTERVENTORES

ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE HÁBITAT

INTRODUCCION

Por intermedio de la Secretaria Distrital del Hábitat, se busca adelantar las obras de mejoramiento de vivienda en la modalidad de habitabilidad en los territorios de Ciudad Bolívar, Usme, Bosa; atendiendo a la Política Nacional y Distrital de Construcción Sostenible, ofreciendo a las familias favorecidas la mejora de sus ambientes habitacionales y de vida., para lograr este alcance del objeto contractual, la Secretaria Distrital del Hábitat celebró el contrato de Interventoría con el No 701 de 2020 con la empresa INPLAYCO S.A.S, para su correcta ejecución con el fin de desarrollar las actividades de mejoramiento de las viviendas de los territorios mencionados anteriormente.

ETAPA DE EJECUCION

Este informe ejecutivo se desarrolla en la semana 18, comprendida del 1 de marzo al 7 de marzo del 2021, periodo en el cual después de la firma del acta de inicio el CONSORCIO MEJORAMIENTO EP 2020, continua con la ejecución de viviendas ya que todas quedaron aperturadas.

Durante la fase de validación el contratista **CONSORCIO MEJORAMIENTO EP 2020,** ubico un punto de atención a la comunidad (PAC) por localidad y/o Territorio, con el fin de garantizar y resolver las dudas, inquietudes, quejas o reclamos de los beneficiarios las cuales son atendidas de manera oportuna; Ubicado en la Kr 18K Bis con Cll 69T Sur a una cuadra de la estación de Trasmicable de Manitas.

Estas reuniones se realizaron bajo los protocolos de Bioseguridad cumpliendo las exigencias del gobierno nacional.

SEMANA 18 DEL 1 AL 7 DE MARZO – ENTREGAS Y EJECUCION PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS

Para esta semana el consorcio continuo con las entregas a los beneficiarios las viviendas se encuentran aperturadas en las diferentes localidades, continuando con lo descrito en la programación entregada y en proceso de ejecución, a continuación, se relaciona los MV validados para ejecución de obra de la semana 18.

INPLAYCO S.A.S.
INGENIEROS CONSTRUCTORES E INTERVENTORES

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARIA DE HÁBITAT

ARQ. WILLIAM GARZON

No.	ID_DMV	Dirección	Nombres y apellidos
NUEVA COLOMBIA			
1	MVCB_1437	KR 18L 70H 09 SUR	FLOR ELISA PARRA ROJAS
2	MVCB_1441	CL 70H SUR 18L 22	LUZMILA TORRES BERMUDEZ
3	MVCB_1440	CL 70H SUR 18L 16	ALBA CARMEN ARDILA MATEUS
4	MVCB_1421	CL 70I SUR 18L 54	MARIA ESTER ZORRO GUERRERO
5	MVCB_1124	DG 69D SUR 18J 15	MARIA ANTONIA SANTOS CORREDOR DE RAMIREZ
6	MVCB_1120	DG 69D SUR 18J 31	QUERUBIN CHAGUALA
7	MVCB_1091	DG 69D BIS SUR 18J 32	LIGIA TEJADA DE BARRERO
JUAN PABLO II			
8	MVCB_2996	DG 69A BIS B SUR 18M 23	MARIA TERESA ANTOLINEZ Y OTRO
9	MVCB_2993	DG 69A BIS B SUR 18M 35	CARLOS JULIO CARDENAS TRIANA **Beneficiario renuncia subsidio**
10	MVCB_2999	DG 69A BIS B SUR 18M 15	MARIA LEONOR FRAILE SUAREZ
11	MVCB_2991	DG 69A BIS B SUR 18M 43	BRISNELDA CONSTANZA MACIAS MARTINEZ
12	MVCB_2967	DG 69A BIS D SUR 18M 36	MARIA OLGA FARFAN GALEON
13	MVCB_2960	DG 69A BIS D SUR 18M 06	MARIA NURY QUINTERO CARDONA
14	MVCB_2434	KR 18M BIS 69A 64 SUR	MARGARITA MARIA MORALES OROZCO
15	MVCB_2432	KR 18M BIS 69A 72 SUR	AGUSTÍN VILLANUEVA GUZMÁN
16	MVCB_3030	KR 18M BIS 69A 81 SUR	TEODOSIA GALICIA DE GARCIA
17	MVCB_3020	KR 18M BIS A 69A 70 SUR	PEDRO PABLO IBAÑEZ
18	MVCB_3534	TV 18P 69A 90 SUR	MARIA ELISA RODRÍGUEZ GAMEZ
19	MVCB_3537	TV 18P 69A 74 SUR	EDILY JIMENEZ OSORIO
MIRADOR NUTIVARA			
20	MV_1866	CL 70L SUR 18P 21	LUIS ALBERTO ALONSO CASTIBLANCO
21	MV_1818	KR 18P 70K 03 SUR	MERQUECIDE MONTANEZ UYOA
22	MV_1811	CL 70K SUR 18Q 09	ROSA ELVIRA GONZALEZ
23	MV_1726	CL 70K SUR 18P 10	EMPERATRIZ ACOSTA MARTINEZ
24	MV_1766	CL 70K SUR 18N 46	CARMEN QUIQUE MARTINEZ
25	MV_1574	CL 70F SUR 18R 27	JOSE HIPOLITO GUTIERREZ LUCERO
26	MV_1588	CL 70F SUR 18P 33	LUZ NELLY RODRIGUEZ
27	MV_1608	KR 18P 70F 06 SUR	ROSALBINA HERNANDEZ PIRACHICAN
URBANIZACION COMPARTIR			
28	MV_0252	TV 18P BIS 65D 04 SUR	JESUS ANTONIO BARRERA FANDIÑO
VISTA HERMOSA			
29	MV SH005	TV 18I 71 35 SUR	MARIA CUSTODIA SANCHEZ SANCHEZ
ANTONIO JOSE DE SUCRE III (USMINIA)			
30	MV 21341	KR 7 116 15 SUR	ERMELINDA HERNANDEZ
31	MVUS_0905	KR 5A 111B 21 SUR	LUIS EDUARDO GUATIBONZA
NUEVO SAN LUIS (USMINIA)			
32	MVUS 0795	KR 5A 112A 24 SUR	AIDA MARIA RUEDA NIETO
EL BRILLANTE (USMINIA)			
33	MV 22203	KR 3 100F 06 SUR MJ	YENY ZURLEY LOPEZ ULLOA
34	MV 22728	DG 101A SUR 2B 37	ECCEHOMO RIVERA RONCANCIO
LA COLMENA III SECTOR (CIUDAD BOLIVAR)			
35	MVJA 2062	DG 64A SUR 19 26	MERCEDES WALTEROS JOANIAS
36	MVJA 2077	DG 64A SUR 19 57	SOFIA PORRAS DE CAJAMARCA
37	MVJA 1896	DG 64BIS A SUR 19A 19	HERNANDO TIQUE GUZMAN
SANTA INES (BOSA LA LIBERTAD)			
38	MVBL 2134	KR 89A BIS 70 19 SUR CA 2	HERMELINA LOSADA CAICEDO
SAN ANTONIO (BOSA LA LIBERTAD)			
39	MVBL 2838	KR 88J 69A 19 SUR CA 1	ALVARO BARRERA ARIZA
LAS MARGARITAS			
40	MVBL 1875	CLL 66 SUR 89ª 77	MARIA LUZ BONILLA

40	MVCB_1119	CL 64 SUR 18N 21	GERARDO FONSECA ARIAS **Beneficiario renuncia subsidio**

ARQ. LEONARDO SOLANO			
No.	**ID_DMV**	**Dirección**	**Nombres y apellidos**
JUAN PABLO II			
1	MVCB_4919	KR 18M BIS 68B 50 SUR MJ	URIEL PATIÑO RINCON
2	MVCB_4923	KR 18M BIS 68B 26 SUR	SIERVO MATIAS FIGUEROA CHAPARRO
3	MVCB_2932	TV 18N 69A 97 SUR	MARIA TERESA PIÑEROS PIÑEROS
4	MVCB_2926	TV 18N 69A 71 SUR	CORADO TORO DE TORRES Y OTRO
5	MVCB_3646	TV 18N BIS 69A 95 SUR	LUIS ANTONIO CABRERA LOPEZ Y OTRA
6	MVCB_3643	TV 18N BIS 69A 83 SUR	JOSE ARISTOBULO MENJURA LEITON Y OTRA
7	MVCB_2925	TV 18N 69A 67 SUR	MARTHA LUZ CAMPIÑO
8	MVCB_2917	DG 69A BIS B SUR 18M 30	CLAUDIA PATRICIA VARGAS GÓMEZ
9	MVCB_3642	TV 18N BIS 69A 77 SUR	JULIO CESAR FICHAS AVILA
10	MVCB_3641	TV 18N BIS 69A 75 SUR	CECILIA MENDEZ MORENO
11	MVCB_3640	TV 18N BIS 69A 71 SUR	OCTAVIO TELLEZ PINEDA
12	MVCB_3635	TV 18N BIS 69A 51 SUR	JUAN CARLOS MAZO CASTRO Y OTRA
13	MVCB_3634	TV 18N BIS 69A 47 SUR	AYDE NIÑO Y OTRO
14	MVCB_2939	TV 18N BIS 69A 84 SUR	MARIEYE LOAISA
15	MVCB_4918	KR 18M BIS 68B 56 SUR	ALVARO DIAZ AVILA
16	MVCB_3633	TV 18N BIS 69A 43 SUR	FRANCISCO JAVIER MENDIVELSO GUERRERO
17	MVCB_4917	KR 18M BIS 68B 62 SUR	ALVARO ALONSO MORENO
18	MVCB_3524	TV 18P 69 A 63 SUR	REINED DE JESUS RODRIGUEZ
19	MVCB_3540	TV 18 69 A 66 S	SANDRA PATRICIA BETANCUR RINCON
DESARROLLO NUEVA COLOMBIA			
20	MVCB_1320	CL70K SUR 18L 65	ISMINIA BARRETO ARIAS
21	MVCB_1383	CL70J SUR 18L 34	EDGAR FERNANDO CAMARCO ANGEL
22	MVCB_1380	CL 70J SUR 18L 22	ROSALBA MONTES DE CARDONA
23	MVCB_1382	CL 70J SUR 18L 30	MARIA CECILIA RINCON RINCON
24	MVCB_1381	CL 70J SUR 18L 26	NOHORA NOHEMI MAYORGA IBAGUE
25	MVCB_1374	CL 70J SUR 18L 11	OBED OSPINA RESTREPO
26	MVCB_1371	CL 70J SUR 18L 23	CONSUELO NAVARRO
27	MVCB_1328	CL 70K SUR 18L 29	EDILBERTO CARDENAS PAEZ
28	MVCB_1352	CL 70K SUR 18L 64	MARIA RAMOS ORTIZ
29	MVCB_1341	CL 70K SUR 18L 20	JOSE GABRIEL HERRERA MEDINA
30	MVCB_1344	CL 70K SUR 18L 32	ALBEIRO RUIZ SANABRIA
31	MVCB_1310	CL 70L SUR 18L 70	DORA ALICIA LÓPEZ SANABRIA
32	MVCB_1314	KR 18M 70K 16 SUR	MARTHA LUCIA OSPINA PEÑA **Beneficiario renuncia subsidio**
33	MVCB_1357	KR 18M 70J 16 SUR	MARTHA LILIA AGUDELO SANTOS
34	MVCB_1280	CL 70L SUR 18L 85	BARBARA GALVIS CHINCHILLA
35	MVCB_1286	CL 70L SUR 18L 61	LUZ MINDA CASTRO PEÑA
VILLAS DEL DIAMANTE			
36	MVCB_5128	CL 69N SUR 18N 52	DIEGO MARIO VANEGAS VILLAMIL
37	MVCB_5156	CL 69N SUR 18N 58 MJ	FRANCISCO JAVIER ARANGO GUTIERREZ
38	MVCB_5127	CL 69N SUR 18N 59 MJ	VICTOR MANUEL MUÑOZ VERGARA
39	MVCB_5489	KR 19F 70C 29 SUR MJ	GLORIA INES PEÑA BELTRAN
40	MVCB_5482	KR 19G 70C 18 SUR	LUIS HERNANDO MESA
41	MVCB_5486	CL 70C SUR 19F 07 MJ	MARIA DEL CARMEN ALONSO POSADA

INPLAYCO S.A.S.
INGENIEROS CONSTRUCTORES E INTERVENTORES

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARIA DE HÁBITAT

42	MVCB_5314	TV 18N BIS A 69R 17 SUR MJ	ANA OTILIA GUACANEME CUESTA
43	MVCB_5295	CL 69R SUR 18P 45 MJ	MARIA YOLANDA LOZANO VERGARA
44	MVCB_5122	CL 69P SUR 18P 15	HERNAN LOPEZ GIRALDO
45	MVCB_5157	CL 69N SUR 18N 57	ANA TERESA PEÑA ROJAS
MIRADOR (NUTIVARA)			
46	MVCB_1586	CL 70F SUR 18P 45	MARIA DEL CARMEN RINCON
47	MVCB_1907	CL 70N SUR 18N 22	ANA ROSA LLANOS DE GARCIA
48	MVCB_1867	CL.70 SUR 18P 15	JOSE ALBRERTO LUGO
49	MVCB_1914	CL 70M BIS SUR 18N 33	BLANCA ODILIA PATIÑO DE MARTINEZ Y OTRO
50	MVCB_1661	CL 70H SUR 18N 46 MJ	MARICIELO ARIAS CERQUERA
51	MVCB_1706	TV 18R 70H 57 SUR	MARIA EUGENIA TRUJILLO QUIMBAYO
52	MVCB_1698	CL 70I SUR 18P 22	LUZ AMALFI GUTIERREZ FRANCO
53	MVCB_1585	CL 70F SUR 18P 51	ELIECER RONCANCIO MARTINEZ
54	MVCB_1811	CL 70K SUR 18Q 09	VICTOR MANUEL MUÑOZ VERGARA
USMINIA			
55	MV_21184	CL 112A SUR 7 48	AMALIA MERCHAN SOSA
56	MV_21368	CL 116 SUR 5 73	ALEJANDRO PAVA
57	MV_21240	CL 114 SUR 7 42	ALFONSO GUERRERO
58	MV_21212	CL 112A SUR 7 31	ERNESTINA CAICEDO

ING. HUMBERTO BLANCO			
No.	**ID_DMV**	**Dirección**	**Nombres y apellidos**
MIRADOR NUTIVARA			
1	MVCB_1873	CL 70L BIS SUR 18N 14	BLANCA FABIOLA LANDAZURI MESA
2	MVCB_1886	KR 18N 70K 31 SUR	LUZ MARIA ARIZA ARIZA
3	MVCB_1836	KR 18N 70K 09 SUR	DELIA MARÍA MATEUS ESCAMILLA
4	MVCB_1829	CL 70K SUR 18N 45	DIANA PATRICIA PÁEZ FINO
5	MVCB_1684	CL 70I SUR 18N 56	MIRYAM MANRIQUE URUEÑA
6	MVCB_1692	CL 70 H SUR 18 N 51	BEATRIZ ADIELA MARTINEZ JARAMILLO
7	MVCB_1681	CL 70 I SUR 18 N 36 MJ	ALVARO ELIECER VERDUGO RODRIGUEZ
8	MVCB_1638	KR 18R 70H 09 SUR	MAURICIO ENRIQUE MUÑOZ RIAÑO
9	MVCB_1664	KR 18P 70G 08 SUR	MARINA CLEMENCIA RAMOS
10	MVCB_1748	KR 18P 70I 04 SUR	OLGA LUZ BETANCOURT LEON
11	MVCB_1704	KR 18R 70H 08 SUR	ALBA LUCIA VALENCIA OCAMPO
12	MVCB_1631	CL 70G SUR 18R15	ELOISA LAVERDE RIOS
13	MVCB_1592	CL 70F SUR 18N 28	HOBER FABIAN BARRERA GUTIERREZ
14	MVCB_1908	CL 70N SUR 18N 28	JESUS MARIA COBA QUIROGA
15	MVCB_1733	KR 18 70I 11 SUR	YINTH CUENCA ROA
NUEVA COLOMBIA			
16	MVCB_1130	DG 69F SUR 18J 18	CARMEN JULIA SUAREZ PARADA
17	MVCB_1180	DG 69F SUR 18J 15	BLANCA TERESA CALVO DE GARZON
18	MVCB_1181	DG 69F SUR 18J 11	ALBERTO ULLOA ULLOA
19	MVCB_1161	DG 69F SUR 18J 03	MARIA ROSA ELENA BECERRA SEGURA
20	MVCB_1212	DG 69G SUR 18J 43	HERNAN LOPEZ
21	MVCB_1194	DG 69H SUR 18J 20	VICTOR HUGO WILCHES BERNAL
22	MVCB_1467	CL 70H SUR 18J 70	TERESA DE JESUS OLIVOS DE BLANCO
23	MVCB_1469	CL 70H SUR 18J 82	JORGE SANCHEZ FORERO
24	MVCB_1470	KR 18L 70G 24 SUR	ANA SILVIA CHACON
25	MVCB_1495	KR 18L 70H 10 SUR	YACQUELINE RADA MOJICA
26	MVCB_1493	CL 70I SUR 18J 86	MARIA ELENA ALCIRA GARZON CASALLAS
27	MVCB_1516	KR 18L 70I 10 SUR	BERTHA CECILIA MOJICA RUIZ
28	MVCB_1417	CL 70I SUR 18L 30	DIANA MARCELA PARRA BALLESTEROS
29	MVCB_1416	CL 70I SUR 18L 22	ANA CENETH TORRES ROJAS

30	MVCB_1407	CL 70I SUR 18L 33	MARIA ELSA TORRES
31	MVCB_1409	CL 70I SUR 18L 21	FRAN EDILBERTO CRUZ CANO Y OTRA
VILLAS DEL DIAMANTE			
32	MVCB_5118	TV 18P BIS 69N 17 SUR	CARLOS ALFREDO CLAVIJO ROZO
33	MVCB_5464	KR 19D BIS 70C 25 SUR (KR 19B 70C 25 SUR)	IRMA ROJAS ROJAS
34	MVCB_5491	KR 19F 70C 41 SUR MJ	LEONILDE BUITRAGO MORENO
35	MVCB_5252	DG 69Q BIS SUR 18N 59	MARIA DE LA CRUZ TRUJILLO AVILES
36	MVCB_5349	DG 69R SUR 18N 23	JHON JAIRO MELO MARTIN
37	MVCB_5012	TV 18R 69I 16 SUR MJ	MARGARITA FORERO ARTEAGA
ARBORIZADORA ALTA			
38	MV_14629	CL 75C SUR 34 51	HILDA MIRYAM NIÑO
39	MV_08564	KR 37A 75 55 SUR	ELSY CARDENAS MONROY
40	MV_09494	TV 35C 72F 31 SUR	GLADYS CASALLAS SUAREZ
SANTA VIVIANA			
41	MV_14485	KR 74D 75C 41 SUR MJ	PLINIO SANABRIA SANDOVAL
42	MV_09083	CL 75C BIS 75 39 SUR	RUTH GORDONS CASTAÑEDA
VILLA ALEMANA II SECTOR - USMINIA			
43	MVUS_0638	CL 115 SUR 3 36	EDWIN ARLEY QUINMBAYO QUINTERO
44	MVUS_0682	CL 113A SUR 4 25	JOSE DEL CARMEN SANCHEZ PAEZ
45	MVUS_0707	KR 4 115 21 SUR	LUZ MERY YARA MATOMA
ANTONIO JOSE DE SUCRE III - USMINIA			
46	MV_21283	KR 7 115 15 SUR	TERESA DE JESUS OSORIO ORTIZ
SAN LUIS - SECTOR JALISCO			
47	MVJA_2005	DG 64 SUR 19 11	AURORA MARGARITA ROJAS VELASQUEZ
48	MVJA_3776	KR 19 64A 23 SUR	LUS STELLA FONSECA OSORIO
ACACIAS SUR - SECTOR JALISCO			
49	MVJA_0675	CL 62B SUR 19 38	JENNY XIMENA CAMELO VELASCO
50	MV_19084	CL 106 SUR 2B 79 ESTE	OCTAVIANO NIÑO ECHEVERRI

INSP. ERICK ALVAREZ CADAVID			
No.	**ID_DMV**	**Dirección**	**Nombres y apellidos**
DOMINGO LAIN II SECTOR Y CONDOMINIO DEL BOSQUE			
1	MVJA_0723	CL 63 SUR 18K 14	VICTOR MANUEL SAMORA HERNANDEZ
2	MVJA_1085	CL 64 BIS SUR 18N 42	MARIA NERY ECHEVERRY DE RESTREPO
3	MVJA_2598	KR 18L BIS 64A 22 SUR	FLOR ANGELA MORANTES LOPEZ
4	MVJA_2476	KR 18K BIS 64A 12 SUR	JAIME HUMBERTO BORDA LIBERATO
5	MVJA_2763	KR 18M 64 21 SUR	CARLOS JESÚS BECERRA PEREZ
6	MVJA_1194	CL 64B SUR 18N 81	MOISES RODRÍGUEZ BETANCOURT
7	MVJA_1129	CL 64 SUR 18P 07	ANA BERTILDE GAMBOA VELANDIA
8	MVJA_2479	KR 18K BIS 64A 20 SUR	CRISTOBAL VALBUENA
DOMINGO LAIN I			

9	MVJA_0898	CL 63B SUR 18L 53	EFIGENIA GUIZA DE SANCHEZ
10	MVJA_0899	CL 63B SUR 18L 61	DORIS AYDEE HERRERA OTALORA
11	MVJA_0970	CL 63D SUR 18L 02	DORIS CUESTA DE RODRIGUEZ
12	MVJA_2756	KR 18M 63D 08 SUR	ESTHER AROCA YARA
13	MVJA_2469	KR 18K BIS 63D 19 SUR	CARMEN LIBIA GÓMEZ DE CASTAÑEDA
14	MVJA_2342	KR 18J BIS 63D 25 SUR	MARIA DOLORES CASTILLO DE SANCHEZ
15	MVJA_2343	KR 18J BIS 63D 25 SUR	ERNESTO VERGARA NIETO
16	MVJA_1096	CL 64 SUR 18J 46	GONZALO OÑATE BONILLA
ALTOS DE JALISCO			
17	MVJA_2741	KR 18M 62ª 44 SUR	CARLOS ALBERTO MUÑETON FRANCO
18	MVJA_2729	KR 18M 62ª 07 SUR	JOSE IGNACIO TAO IBARRA
19	MVJA_0544	CL 62ª SUR 18M 09	MERCEDES RIAÑO PARRA
20	MVJA_0567	CL 62ª SUR 18M 41 IN 9	MARIA DEL ROSARIO RODRIGUEZ
21	MVJA_3309	KR 18P BIS B 61D 25 SUR	TEOFILO MORALES TURGA Y OTRA
22	MVJA_3366	KR 18Q 61C 34 SUR	EDILMA ALCIRA CASTILLO
23	MVJA_4350	TV 18Q BIS C 61B 87 SUR	MARÍA BENDITA REDONDO CASTIBLANCO
24	MVJA_2660	KR 18L BIS A 62ª 39 SUR	MANUEL EDUARDO RODRIGUEZ PRIETO
25	MVJA_4333	TV 18Q BIS C 61B 45 SUR	BEATRIZ CABRALES ACERO
26	MVJA_0890	CL 63B SUR 18K 56	HERNAN HUMBERTO PARRA CORREDOR DE RAMIREZ
LA ESCALA 3ER SECTOR			
27	MVJA_0530	CL 62ª SUR 18L 07	LUIS ALIRIO LÓPEZ DÍAZ
28	MVJA_0519	CL 62A SUR 18K 20	NESTOR JAVIER VALENZUELA PEÑA
GIBRALTAR I Y II			
29	MVJA_4375	TV 18R 61B 41 SUR	FERNANDO TORRES Y OTRA
30	MVJA_3081	KR 18N BIS A 63 26 SUR	JOSE UNILCIO CIFUENTES QUINTERO Y OTRA
31	MVJA_3086	KR 18N BIS A 63C 23 SUR	LUIS ALFREDO CARPINTERO Y OTRA
32	MVJA_3168	KR 18P 63B 16 SUR	OLIVIA BOLAÑOS
33	MVJA_2395	KR 18K 64A 22 SUR	DELIO MARTINEZ GAMBA
34	MVJA_0922	CL 63C SUR 18P 22	FRANCISCO PIAMBA ANACONA
ACACIAS SUR			
35	MVJA_3670	KR 18Z 62 30 SUR	CRISTOBAL PITA CAMARGO
36	MVJA_0439	CL 62 SUR 18Z 04	GAVI ROZO RODRIGUEZ
LA ESPERANZA			
37	MVJA_3607	KR 18T 62A 21 SUR	LUIS ENRIQUE JIMENEZ VEGA
CIUDAD MILAGRO			
38	MVJA_0286	CL 62 BIS SUR 18J 12	HASBLEIDY GINA ROJAS ESCOBAR
39	MVJA_0235	CL 61D SUR 18K 58	LUZ NELLY RODRIGUEZ
40	MVJA_0328	CL 62 BIS SUR 18K 55	VICTOR MANUEL URREA ACOSTA
SAN LUIS			
41	MVJA_2051	DG 64A SUR 18V 14	FABIO VELASQUEZ CABALLERO
42	MVJA_1776	DG 64 BIS SUR 18V-15	UVA ESTHER BAQUERO DE GIL
SAN FERNANDO			
43	MVJA_2139	DG 64B SUR 19 76	MARIA ELIUD ORTEGON DE ALARCON
44	MVJA_2119	DG 64B SUR 19 36	MARIA CONCEPCION RIAÑO
LAS DELICIAS DEL SUR ZONA 19			
45	MVJA_1386	CL 65 SUR 18N 73	CRISTOBAL SUA ALBARRACÍN
LUCERO MEDIO			
46	MVJA_2324	KR 18J 64F 39 SUR	ARMANDO QUIROGA BARRIGA Y OTRA

INPLAYCO S.A.S.
INGENIEROS CONSTRUCTORES E INTERVENTORES


ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE HÁBITAT

47	MVJA_2617	KR 18L BIS 64F 07 SUR	QUINTILIANO CASTILLO DOMÍNGUEZ Y OTRA
48	MVJA_2628	KR 18L BIS 64F 47 SUR	MARIA ALICIA MAHECHA POVEDA
49	MVJA_2418	KR 18K 65A 15 SUR	BERTILDA URREGO
50	MVJA_2414	KR 18K 64F 29 SUR	MARIA ELENA RINCON RINCON
			Beneficiario renuncia subsidio
USMINIA - ANTONIO JOSE DE SUCRE I SECTOR			
51	MV_18353	CL 109 SUR 9 64	LUZ DAMARIS CASTRO PULGARIN
52	MV_18951	CL 104A SUR 6 37 MJ	LUIS ANTONIO RINCON
53	MV_19285	CL 108 SUR 3A 36	JAIRO ANTONIO ESPINOSA
54	MV_21820	CL 106 B SUR 4 11	JUAN EUDES OREJUELA GARZON
USMINIA - LORENZO ALCANTUZ			
55	MV_17421	CL 102 SUR 5 49	OLGA BARRETO

INS. CRITIAN VELASCO			
No.	**ID_DMV**	**Dirección**	**Nombres y apellidos**
ALTOS DE JALISCO			
1	MVJA_2992	KR 18N BIS 61C 21 SUR	ISAURA AREVALO MALAGON
2	MVJA_3141	KR 18P 62 A 30 SUR MJ	GLORIA CRISTINA GUTIERREZ GARZON
3	MVJA_3146	KR 18P 62A 45 SUR MJ	CLARA INES GIL BAEZ
4	MVJA_3335	KR 18P BIS B 62A 48 SUR MJ	MYRIAM PATRICIA SARMIENTO APONTE
5	MVJA_3314	KR 18P BIS B 61D 36 SUR	MARIA OLMA MOLANO ROMERO
6	MVJA_3239	KR 18P BIS A 61C 22 SUR MJ	NATIVIDAD SILDANA CELYS VIUDA DE GARCIA
7	MVJA_0259	CL 70H SUR 18L 16	ALBA CARMEN ARDILA MATEUS
8	MVJA_3223	KR 18P BIS A 61A 55 SUR	MYRIAM AMPARO GÓMEZ DE GALVIS
9	MVJA_3231	KR 18P BIS A 61B 12 SUR MJ	SOFIA MORENO
10	MVJA_3119	KR 18P 61A 67 SUR MJ	LUZ YANID PADUA
11	MVJA_3125	KR 18P 61 A 76 SUR MJ	MARIA AURORA RENGIFO
12	MVJA_0252	CL 61D SUR 18N 30 MJ	JESUS ANTONIO ORTIZ CASTRO
13	MVJA_2996	KR 18N BIS 61D 18 SUR	MARIA DEL SOCORRO CUPITRA CACAIS
14	MVJA_2712	KR 18M 62 29 SUR	JOSE ALIRIO ORTIZ CABRERA Y OTRA
15	MVJA_2707	KR 18M 62 12 SUR	ANA LUISA BERNAL PULIDO
16	MVJA_2640	KR 18L BIS A 61D 47 SUR	PAOLA ANDREA BARRERA PELAEZ
17	MVJA_2371	KR 18K 61B 02 SUR	ANA EDELMIRA ATARA ESPITIA
18	MVJA_2976	KR 18N BIS 61A 53 SUR	BLANCA LEONOR RIOS CHAPARRO
MIRADOR NUTIVARA			
19	MVCB_1774	CL 70J SUR 18N 23	JOSE WILSON MARULANDA GIRALDO
20	MVCB_1742	CL 70J SUR 18N 34	ANA ELVIA MENDOZA DE HERNANDEZ
21	MVCB_1691	CL 70 I SUR 18 N 42	GINNA PAOLA MAHECHA FORERO
22	MVCB_1745	KR 18P 70I 22 SUR	ROSA GERTUDRIS MARTINEZ LIZARAZO
ROCIO ALTOS DEL SUR			
23	MVJA_2981	DG 69A BIS D SUR 18M 06	LEONOR TOVAR BARRERO
24	MVJA_2812	KR 18M BIS 61C 29 SUR	ANDREA JENNIFFER ACOSTA MENDIVELSO
25	MVJA_2909	KR 18N 61C 27 SUR	BLANCA CECILIA ALFONSO BOHORQUEZ
26	MVJA_0186	CL 61C SUR 18N 03	ISABEL ARDILA VARGAS
LA ESCALA			
27	MVJA_2672	KR 18M 61 15 SUR MJ	CARLOS OLIMPO SEGURA GUERRERO
ACACIAS SUR			
28	MVJA_0598	CL 62A SUR 18R 15	RODULFO BEJARANO
29	MVJA_0608	CL 62A SUR 18T 10	MARIA LUIDINA VARGAS AGUIRRE
30	MVJA_1018	CL 63D SUR 19 25	MARIA LEONOR APONTE VIUDA DE LOPEZ
BARRIO GIBRALTAR I Y II			
31	MVJA_0834	CL 63A SUR 18Q 05	CLARA INES OCHOA GUTIERREZ
32	MVJA_3011	KR 18N BIS 63 27 SUR	RITA DEL CARMEN FONSECA CAMARGO

33	MVJA_3157	KR 18P 63 16 SUR	IRIA ESTHER SILVA
34	MVJA_3397	KR 18Q 63D 10 SUR	LUZ MARINA ROBAYO ALVARADO
LA ESCALA 3ER SECTOR			
35	MVJA_0502	CL 62A SUR 18J 20	ROSALBA JARA DE ROJAS
CIUDAD MILAGRO			
36	MVJA_0395	CL 62 SUR 18K 78	JOSE ORVEY ORTIZ
VILLAS DEL DIAMANTE			
37	MVCB_5474	CL 70F SUR 19F 18 MJ	OLIVIA RIVERA
38	MVCB_5395	CL 70B SUR 18R 29	MARÍA CRISTINA GONZALEZ GARCÍA
39	MVCB_5388	CL 70C SUR 18R 48	DUBERNEY ARIAS BETANCUR
ARBORIZADORA ALTA			
40	MV_15742	KR 38 75 54 SUR	DONELIA PATIÑO MURILLO
JERUSALEN			
41	MV_17151	KR 38 79A 38 SUR	GUSTAVO VILLAREAL BERMUDEZ
EL MIRADOR			
42	MV_05324	CL 71C SUR 27B 15	ALDEMAR DUARTE LOPEZ
VILLA ISRAEL			
43	MVUS_0036	KR 5A BIS 110 34 SUR	EMPERATRIZ RODRIGUEZ LOPEZ
VILLA ANITA SUR			
44	MV_21059	KR 8 115B 11 SUR	ALEXANDER BERNAL AVENDAÑO
EL ESPINO			
45	MVUS_0230	CL 115B SUR 3B 11	JORGE GABRIEL BUITRAGO INFANTE
EL VIRREY			
46	MV_20306	KR 4A 97 15 SUR	JUAN FRANCISCO MEDINA SALAZAR
SAN LUIS			
47	MVJA_1876	DG 64 BIS A SUR 18V 15	JOSE OMAR CAMACHO TELLEZ
LAS DELICIAS DEL SUR			
48	MVJA_3257	KR 18P BIS A 65 10 SUR MJ	NELLY PIZA BUITRAGO
49	MVJA_1377	CL 65 SUR 18N 41	CORNELIO ANTONIO MOLINA LEON
DOMINGO LAIN III SECTOR			
50	MVJA_3105	KR 18N BIS A 64D 19 SUR MJ	BLANCA NELLY HERNÁNDEZ

PQR - A esta semana se recibieron 2 PQR

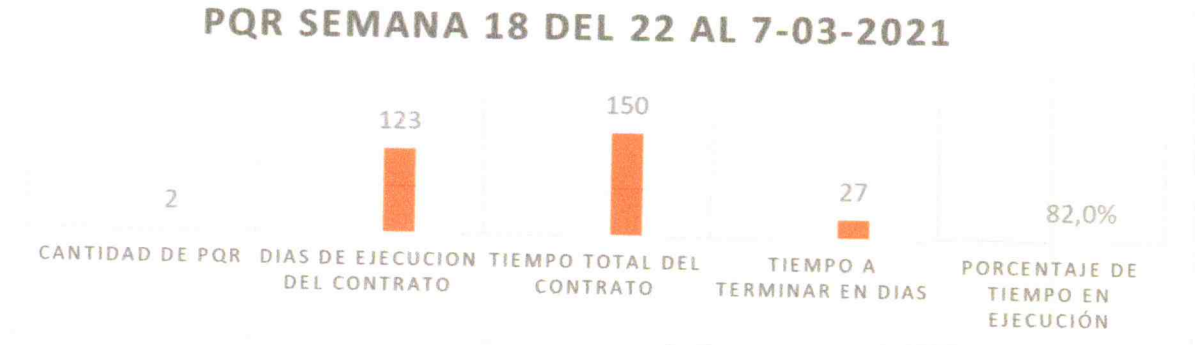

SEMANA 18	OBSERVACION	APERTURA	CIERRE	PQR	
				SI	NO
NUEVA COLOMBIA					X
JUAN PABLO II	MVCB_4917	COMUNICADO DESPUES DE ENTREGA DEL MEJORAMIENTO	03 -02-2021		X
MIRADOR NUTIVARA	MVCB_1745	FEBRERO 24	FEBRERO 24		X

DESARROLLO NUEVA COLOMBIA					X
URBANIIZACION COMPARTIR					X
EL BRILLANTE					X
LA COLMENA II SECTOR (CIUDAD BOLIVAR)					X
SANTA INES (BOSA LA LIBERTAD)					X
NUEVO SAN LUIS	MVUS_0795 MVUS_0905	21 -01-2021 20 -01-2021	3-02-2021		X
DOMINGO LAIN II SECTOR Y CONDOMINIO DEL BOSQUE					X
DOMINGO LAIN I					X
ALTOS DE JALISCO	MVJA_3670	28 -12-2020	6 -01-2021		X
	MVJA_0286	28 -12-2020	6 -01-2021		X
	MVJA_3146	30 -01-2021	5 -02-2021		X
	MVJA_2830	3-02-2021	14-02-2021		X
	MVJA_2976	01/03/2021		X	
	MVJA_3157	05/03/2021		X	
LA ESCALA 3ER SECTOR					X
LUCERO MEDIO	MVJA_2315	08-02-2021	08-02-2021		X
	MVJA_2414	09-02-2021	09-02-2021		X
GIBRALTAR I Y II					X
ROCIO ALTOS DEL SUR					X
LA ESCALA					X
ACACIAS SUR					X
VILLAS EL DIAMANTE	MVCB_5209		20/02/2021		X
VILLA ISRAEL					X
EL ESPINO					X
JERUSALEN					X
EL MIRADOR					X
CIUDAD MILAGRO					X
EL PARAISO	MV_04993		20/02/2021		X

RESULTADOS- OBSERVACIÓN	
MVJA_2976	Acta De PQR Por Incumplimiento En Fecha De Inicio De Obra
MVJA_3157	Acta De PQR Por Incumplimiento En Fecha De Reanudación De Obra

Se presentaron dos 2 renuncias en la semana 18 del 1 al 7 de marzo.

RENUNCIAS A LA FECHA DEL CONTRATO				
MV	NOMBRE	FECHA	DESARROLLO	OBSERVACIONES
MVCB_3523	Blanca Ines Ramirez	Marzo 4	Juan pablo	Renuncia al subsidio
MVBL_1875	Maria Luz Bonilla	Marzo 6	Margaritas Sector III	La beneficiaria reside en Ibagué comunicación Telefónica

INPLAYCO S.A.S.
INGENIEROS CONSTRUCTORES E INTERVENTORES

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE HÁBITAT

MVCB_1745	Rosa Gertudris Martinez Lizarazo	Febrero 24	Mirador Nutibara	Está haciendo labores constructivas en el predio y no puede recibir el subsidio
MVCB_5209	Marcelinda Murcia	Febrero 20	Villas El Diamante	No se contacta con el consorcio a pesar de hacer labor de vecindario.
MV_04993	Rosalbina Zabala Mendoza	Febrero 20	El Paraíso	el número de contacto está errado, se hizo labor de vecindario, pero nunca se contactó con el consorcio.
MVJA_2414	Maria Elena Rincon Rincon	Febrero 9	Lucero Medio	Titular renuncia al subsidio por diferencias entre hermanos
MVJA_2315	Anibal Infante Navarrete	Febrero 8	Lucero Medio	Beneficiaria fallece hijos renuncian
MVJA_2830	María Luisa Contreras Sanabria	Febrero 3	Altos De Jalisco	Beneficiaria solicita se deje material y ella ejecutar la obra
MVCB_2993	Carlos Julio Cardenas Triana Y Otro	Noviembre 18	Juan Pablo Ii	Por motivos de salud tiene planeado trasladarse de ciudad
MVCB_1314	Martha Lucia Ospina Peña	Enero 15	Nueva Colombia	Pleito jurídico familiar
MVCB_1119	Gerardo Fonseca Arias	Enero 27	Domingo Laín Ii Sector Y Condominio Del Bosque	Se trasladó de ciudad y envía renuncia por Whatsapp

Avance de Validaciones.






Para la semana 18 el Consorcio Mejoramiento EP 2020, se presentaron renuncias de las viviendas entregadas por la entidad ya que los beneficiarios no se encontraron a pesar de varios acercamientos y citaciones.

INPLAYCO S.A.S.
INGENIEROS CONSTRUCTORES E INTERVENTORES

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE HÁBITAT

PORCENTAJE EJECUTADO ACUMULADO A LA SEMANA 18 DEL 1 AL 7 DE MARZO 2021

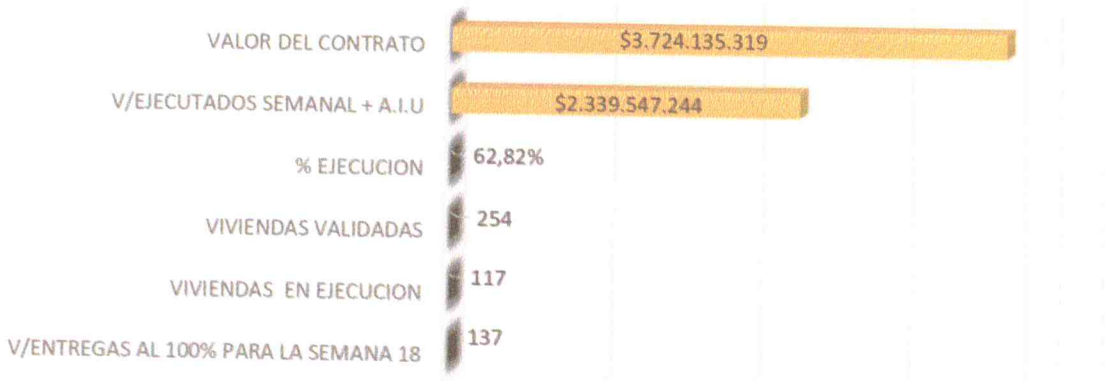

Resumen de Renuncias y Casos Especiales

RENUNCIAS				
MV	NOMBRE	FECHA	DESARROLLO	OBSERVACIONES
MVCB_2993	Carlos julio cárdenas Triana y otro	Noviembre 18	JUAN PABLO II	por motivos de salud tiene planeado trasladarse de ciudad
MVCB_1314	Martha lucia Ospina peña	Enero 15	NUEVA COLOMBIA	pleito juridico familiar
MVCB_1119	Gerardo Fonseca arias	Enero 27	DOMINGO LAIN II SECTOR Y CONDOMINIO DEL BOSQUE	se trasladó de ciudad y envia renuncia por WhatsApp
MVJA_2315	Anibal infante Navarrete	Febrero 8	LUCERO MEDIO	titular del beneficio falleció y los hijos desean acceder con sus predios.
MVJA_2414	Maria elena rincon rincon	Febrero 9	LUCERO MEDIO	titular renuncia al subsidio por diferencias entre hermanos.
MVCB_1745	Rosa Gertrudis Martinez Lizarazo	Febrero 24	MIRADOR NUTIBARA	está haciendo labores constructivas en el predio y no puede recibir el subsidio
MVCB_3523	Blanca Inés Ramirez	Marzo 4	JUAN PABLO II	Ha realizado mejoras en su vivienda y desea subsidio estructural

CASOS ESPECIALES				
MV	Nombre	Fecha	DESARROLLO	OBSERVACIONES
MVJA_2830	Maria luisa contreras Sanabria	Febrero 3	ALTOS DE JALISCO	beneficiaria solicita se deje material y ella ejecutar la obra.
MVCB_5209	Marcelina Murcia	Febrero 20	VILLAS EL DIAMANTE	no se contacta con el consorcio a pesar de hacer labor de vecindario.
MV_04993	Rosalbina Zabala Mendoza	Febrero 20	EL PARAÍSO	el número de contacto está errado, se hizo labor de vecindario, pero nunca se contactó con el consorcio.
MVBL_1875	Maria luz bonilla	Marzo 6	MARGARITAS SECTOR III	Se comunico Telefónicamente no envió renuncia

% DE AVANCE DE OBRA POR VIVIENDA SEMANA 18



% DE AVANCE DE OBRA POR VIVIENDA SEMANA 18



% DE AVANCE DE OBRA POR VIVIENDA SEMANA 18



INPLAYCO S.A.S.
INGENIEROS CONSTRUCTORES E INTERVENTORES

ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE HÁBITAT

INFORME TECNICO SEMANAL 18

Subsecretaria de Coordinacion Operativa

Subdireccion de Barrios

Seguimiento ejecución proyectos de Mejoramiento de Vivienda - Habitabilidad

Proyecto mejoramiento de vivienda - AVANCE EJECUCIÓN SEMANAL

Fecha	7-mar-21

Consorcio mejoramiento EP 2020 - Contratista de obra

Contratato de obra	694-2020			Plazo	Cinco (5) meses
Objeto	Contratar la ejecución de las obras de mejoramiento de vivienda en la modalidad de habitabilidad de los proyectos estructurados en los territorios priorizados por la Secretaria Distrital de Habitat. Grupo I			Acta de inicio	4 de noviembre de 2020
CDP No.	No. 914 del 14 de julio de 2020	CRP No.		Valor del contrato	TRES MIL SETECIENTOS VEINTICUATRO MILLONES CIENTO TREINTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS DIEZ Y NUEVE PESOS ($3.724.135.319) M/Cte

Gonzalo Lievano Hoyos -INPLAYCO S.A.S.

Contratato de interventoria	701-2020			Plazo	Seis (6) meses
Objeto	Realizar la interventorias técnica, jurídica, social, administrativa y financiera, para la ejecución de las obras de mejoramiento de vivienda en la modalidad de habitablidad en los territorios priorizados por la secretaría distrital de hábitat.			Acta de inicio	04 de noviembre 2020
CDP No	No. 892 del 14 de julio de 2020	CRP No.		Valor del contrato	OCHOCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS M/CTE ($894.285.952),

Fase 1: Validación de la información entregada por el la SDHT									Fase 2: Ejecución de obras				
					Validación				Ejecución				
Territorio o barrio a intervenir	CIUDAD BOLIVAR - USME - BOSA	Barrios	Predios	Total Predios	Validada	V/Por Validar	Renuncia	V/Modificada	En Ejecución	Terminadas	Por Ejecutar	% de Avance	Acta de Entrega a Satisfacción
Arq o Ing. Responsable	ARQ. WILLIAM FDO GARZÓN	NUEVA COLOMBIA	7	41	7	0		0	0	7	0	2,56%	7
		JUAN PABLO II	12		12	0	1	0	0	9	2	3,49%	9
Técnico Responsable	ARQ. WILLIAM FDO GARZÓN	MIRADOR NUTIVARA	8		8	0		0	6	2	0	1,59%	2
		URBANIZACION COMPARTIR	1		1	0		0	1	0	0	0,00%	0
		VISTA HERMOSA	1		1	0		0	1	0	0	0,00%	0
		ANTONIO JOSE DE SUCRE III SECTOR (USMINIA)	2		2	0	1	0	0	1	0	0,40%	1
		NUEVO SAN LUIS (USMINIA)	1		1	0		0	0	1	0	0,40%	1
		EL BRILLANTE (USMINIA)	2		2	0		0	0	2	0	0,78%	2
		LA COLMENA III SECTOR (CIUDAD BOLIVAR)	3		3	0		0	3	0	0	0,14%	0
		SANTA INES (BOSA LA LIBERTAD)	1		1	0		0	0	0	1	0,00%	0
		SAN ANTONIO (BOSA LA LIBERTAD)	1		1	0		0	0	0	1	0,00%	0
		LAS MARGARITAS (BOSA LA LIBERTAD)	2		2	0	2	0	0	0	0	0,00%	0
Subtotal			41		41	0	4	0	11	22	4	9,38%	22

AVANCE DE EJECUCIÓN SEMANAL											MARZO			
Proyecto				FASE I			Tiempo Programacion			ACUMULADO SEMANAS ANTERIORES	SEMANA DEL 01 AL 07	SEMANA DEL 08 AL 14	SEMANA DEL 15 AL 21	ACUMULADO TOTAL
No.	ID_DMV	Dirección	Nombres y apellidos	V/ Validada	V/ Modificada	V/Inicial	Fecha inicio	Fecha terminada	F. Inicio		18 semana	19 semana	20 semana	
		NUEVA COLOMBIA												
1	MVCB_1437	KR 18L 70H 09 SUR	FLOR ELISA PARRA ROJAS	SI / NO		$11.751.182	24/11/2020	ENTREGADA	24/11/2020	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%	100,0%
2	MVCB_1441	CL 70H SUR 18L 22	LUZMILA TORRES BERMUDEZ	SI / NO		$5.997.032	24/11/2020	ENTREGADA	24/11/2020	100%	0%	0%	0%	100%
3	MVCB_1440	CL 70H SUR 18L 16	ALBA CARMEN ARDILA MATEUS	SI / NO		$11.812.067	24/11/2020	ENTREGADA	24/11/2020	100%	0%	0%	0%	100%
4	MVCB_1421	CL 70I SUR 18L 54	MARIA ESTER ZORRO GUERRERO	SI / NO		$11.725.109	24/11/2020	ENTREGADA	24/11/2020	100%	0%	0%	0%	100%
5	MVCB_1124	DG 69D SUR 18J 15	MARIA ANTONIA SANTOS CORREDOR DE RAMIREZ	SI / NO		$11.816.865	27/11/2020	ENTREGADA	27/11/2020	100%	0%	0%	0%	100%
6	MVCB_1120	DG 69D SUR 18J 31	QUERUBIN CHAGUALA	SI / NO		$11.785.499	27/11/2020	ENTREGADA	27/11/2020	100%	0%	0%	0%	100%
7	MVCB_1091	DG 69D BIS SUR 18J 32	LIGIA TEJADA DE BARRERO	SI / NO		$11.513.691	27/11/2020	ENTREGADA	27/11/2020	100%	0%	0%	0%	100%

JUAN PABLO II															
8	MVCB_2998	DG 69A BIS B SUR 18M 23	MARIA TERESA ANTOLINEZ Y OTRO	SI		$11.738.882	23/11/2020	ENTREGADA	23/11/2020	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%	100%
9	MVCB_2993	DG 69A BIS B SUR 18M 35	CARLOS JULIO CARDENAS TRIANA	NO		$11.820.087	RENUNCIA	RENUNCIA	RENUNCIA					
10	MVCB_2999	DG 69A BIS B SUR 18M 15	MARIA LEONOR FRAILE SUAREZ	SI		$11.783.215	23/11/2020	ENTREGADA	23/11/2020	100%	0,0%	0,0%	0,0%	100%
11	MVCB_2991	DG 69A BIS B SUR 18M 43	BRISNELDA CONSTANZA MACIAS MARTINEZ	NO		$11.757.191	23/11/2020	ENTREGADA	23/11/2020	100%	0,0%	0,0%	0,0%	100%
12	MVCB_2967	DG 69A BIS D SUR 18M 36	MARIA OLGA FARFAN GALEON	SI		$11.712.722	27/11/2020	ENTREGADA	27/11/2020	100%	0,0%	0,0%	0,0%	100%
13	MVCB_2968	DG 69A BIS D SUR 18M 06	MARIA NURY QUINTERO CARDONA	NO		$10.654.076	27/11/2020	ENTREGADA	27/11/2020	100%	0,0%	0,0%	0,0%	100%
14	MVCB_2434	KR 18M BIS 69A 64 SUR	MARGARITA MARIA MORALES OROZCO	SI		$11.727.986	30/11/2020	ENTREGADA	30/11/2020	100%	0,0%	0,0%	0,0%	100%
15	MVCB_2432	KR 18M BIS 69A 72 SUR	AGUSTÍN VILLANUEVA GUZMÁN	NO		$11.329.964	27/11/2020	ENTREGADA	27/11/2020	100%	0,0%	0,0%	0,0%	100%
16	MVCB_3639	KR 18M BIS 69A 81 SUR	TEODOSIA GALICIA DE GARCIA	SI		$10.652.060	26/11/2020	ENTREGADA	26/11/2020	100%	0,0%	0,0%	0,0%	100%
17	MVCB_3626	KR 18M BIS A 69A 70 SUR	PEDRO PABLO IBAÑEZ	NO		$11.672.077	27/11/2020	ENTREGADA	27/11/2020	100%	0,0%	0,0%	0,0%	100%
18	MVCB_3634	TV 18P 69A 90 SUR	MARIA ELISA RODRÍGUEZ GAMEZ	SI		$11.824.896	EN FASE DE VALIDACION	EN FASE DE VALIDACION	EN FASE DE VALIDACION	0%	0,0%	0,0%	0,0%	0%
19	MVCB_3637	TV 18P 69A 74 SUR	EDILY AMENEZ OSORIO	NO		$11.765.020	EN FASE DE VALIDACION	EN FASE DE VALIDACION	EN FASE DE VALIDACION	0%	0,0%	0,0%	0,0%	0%
MIRADOR NUTIVARA															
20	MV_1866	CL 70L SUR 18P 21	LUIS ALBERTO ALONSO CASTIBLANCO	SI		$11.207.445	2/12/2020	ENTREGADA	2/12/2020	100%	0,0%	0,0%	0,0%	100%
21	MV_1818	KR 18P 70K 03 SUR	MERQUEGIDE MONTANEZ UYOA	NO		$11.776.857	2/12/2020	ENTREGADA	2/12/2020	100%	0,0%	0,0%	0,0%	100%
22	MV_1811	CL 70K SUR 18Q 09	ROSA ELVIRA GONZALEZ	SI		$11.826.704	15/02/2021	EN EJECUCIÓN	15/02/2021	20,0%	55,0%	0,0%	0,0%	75,0%
23	MV_1726	CL 70K SUR 18P 10	EMPERATRIZ ACOSTA MARTINEZ	NO		$11.736.989	15/02/2021	EN EJECUCIÓN	15/02/2021	20,0%	17,0%	0,0%	0,0%	37,0%
24	MV_1786	CL 70K SUR 18N 46	CARMEN QUIQUE MARTINEZ	SI		$10.332.118	24/02/2021	EN EJECUCIÓN	24/02/2021	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
25	MV_1574	CL 70F SUR 18R 27	JOSE HIPOLITO GUTIERREZ LUCERO	NO		$11.646.455	19/02/2021	EN EJECUCIÓN	19/02/2021	25,0%	10,0%	0,0%	0,0%	35,0%
26	MV_1568	CL 70F SUR 18P 39	LUZ NELLY RODRIGUEZ	SI		$10.983.242	19/02/2021	EN EJECUCIÓN	19/02/2021	20,0%	8,0%	0,0%	0,0%	28,0%
27	MV_1698	KR 18P 70F 06 SUR	ROSALBINA HERNANDEZ PINACHICAN	NO		$11.894.701	19/02/2021	EN EJECUCIÓN	19/02/2021	20,0%	12,0%	0,0%	0,0%	32,0%
URBANIZACION COMPARTIR															
28	MVCB_0252	TV 18P BIS 65D 04 SUR	JESUS ANTONIO BARRERA FANDIÑO	SI		$11.829.606	25/02/2021	EN EJECUCIÓN	25/02/2021	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
				NO										
VISTA HERMOSA															
29	MV SH-905	TV 1B 71 35 SUR	MARIA CUSTODIA SANCHEZ SANCHEZ	SI		$11.809.551	25/02/2021	EN EJECUCIÓN	25/02/2021	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
				NO										
ANTONIO JOSE DE SUCRE III SECTOR (USMINIA)															
30	MV 21341	KR 7 116 15 SUR	ERMELINDA HERNANDEZ	SI		$11.795.790	23/01/2021	ENTREGADA	23/01/2021	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%	100,0%
31	MVUB_0905	KR 5A 116B 21 SUR	LUIS EDUARDO GUATIBONZA	NO		$11.100.192	RENUNCIA	RENUNCIA	RENUNCIA					
NUEVO SAN LUIS (USMINIA)															
32	MVUB 9795	KR 5A 112A 24 SUR	AIDA MARIA RUEDA NIETO	SI		$11.772.737	23/01/2021	ENTREGADA	23/01/2021	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%	100,0%
				NO										
EL BRILLANTE (USMINIA)															
33	MV 22293	KR 3 190F 06 SUR MJ	YENY ZURLEY LOPEZ ULLOA	SI		$11.385.025	23/01/2021	ENTREGADA	23/01/2021	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%	100,0%
34	MV 22728	DG 191A SUR 2B 37	ECCEHOMO RIVERA RONCANCIO	NO		$11.786.931	23/01/2021	ENTREGADA	23/01/2021	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%	100,0%
LA COLMENA III SECTOR (CIUDAD BOLIVAR)															
35	MVJA 2062	DG 64A SUR 19 26	MERCEDES WALTEROS JOANAS	SI		$10.757.741	26/02/2021	EN EJECUCIÓN	26/02/2021	0,0%	11,0%	0,0%	0,0%	11,0%
36	MVJA 2077	DG 64A SUR 19 57	SOFIA PORRAS DE CAJAMARCA	NO		$11.387.778	26/02/2021	EN EJECUCIÓN	26/02/2021	0,0%	13,0%	0,0%	0,0%	13,0%
37	MVJA 1896	DG 64BIS A SUR 19A 19	HERNANDO TIQUE GUZMAN	SI		$11.822.034	26/02/2021	EN EJECUCIÓN	26/02/2021	0,0%	10,0%	0,0%	0,0%	10,0%
				NO										
SANTA INES (BOSA LA LIBERTAD)															
38	MVBL 2134	KR 89A BIS 70 19 SUR CA 2	HERMELINA LOSADA CAICEDO	SI		$11.761.838	EN FASE DE VALIDACION	EN FASE DE VALIDACION	EN FASE DE VALIDACION	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
				NO										
SAN ANTONIO (BOSA LA LIBERTAD)															
39	MVBL 2838	KR 88J 69A 19 SUR CA 1	ALVARO BARRERA ARIZA	SI		$9.830.556	EN FASE DE VALIDACION	EN FASE DE VALIDACION	EN FASE DE VALIDACION	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
				NO										
LAS MARGARITAS III SECTOR (BOSA LA LIBERTAD)															
40	MVBL_1875	CL 66 SUR 89A 77	MARIA LUZ BONILLA	SI		$11.102.907	RENUNCIA	RENUNCIA	RENUNCIA	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
				NO										
41	MVCB_1119	CL 64 SUR 18N 21	GERARDO FONSECA ARIAS	SI		$11.766.009	RENUNCIA	RENUNCIA	RENUNCIA	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
				NO										

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DEL HÁBITAT

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

PROYECTOS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA

INPLAYCO S.A.S.
INGENIEROS CONSTRUCTORES E INTERVENTORES

FECHA	7/03/2021	PERIODO No.	18	DEL	1/03/2021	AL	7/03/2021

1. INFORMACIÓN GENERAL

OBJETO DEL CONTRATO	Realizar la interventorías técnica, jurídica, social, administrativa y financiera, para la ejecución de las obras de mejoramiento de vivienda en la modalidad de habitabilidad en los territorios priorizados por la secretaría distrital de hábitat.
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO	Corresponde al Grupo 1 a la ejecución de 254 mejoramientos de vivienda, localizados en 3 localidades: Bosa, Usme y Ciudad Bolivar, este última localidad incluye cuatro (4) Intervenciones de MejoramientoIntegral.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA		CONTRATO DE OBRA	
CONTRATO No.:	701-2020	CONTRATO No.:	694--2020
PLAZO INICIAL:	6 meses	PLAZO INICIAL:	5 meses
FECHA DE INICIACIÓN:	4 de noviembre de 2020	FECHA DE INICIACIÓN:	4 de noviembre de 2020
**FECHA DE SUSPENSIÓN:	0	**FECHA DE SUSPENSIÓN:	0
**FECHA DE REINICIACIÓN:	0	**FECHA DE REINICIACIÓN:	0
FECHA DE TERMINACIÓN:	3 de mayo de 2021	FECHA DE TERMINACIÓN:	3 de abril 2021
PLAZO ACTUALIZADO:	0	PLAZO ACTUALIZADO:	0
PLAZO TRANSCURRIDO:	0	PLAZO TRANSCURRIDO:	0
VALOR INICIAL :	$ 894.285.952	VALOR INICIAL :	$ 3.724.135.319
VALOR ADICION(ES):	0	VALOR ADICION(ES):	$ -
VALOR ACTUALIZADO:	$ -	VALOR ACTUALIZADO:	$ -
VALOR ANTICIPO:	0	VALOR ANTICIPO:	$ -
VALOR POR PAGAR:	$ -	VALOR POR PAGAR:	$ -
SUPERVISOR:	JUAN CARLOS ARBELAEZ MURILLO	INTERVENTOR:	Gonzalo Llevano Hoyos -INPLAYCO S.A.S.

** Inserte las filas que requiera según el número de suspensiones y reinicios.

2. CONTROL DE HITOS.

No.	*** DESCRIPCIÓN DEL HITO	FECHA PROGRAMADA	FECHA REAL DE CUMPLIMIENTO	DÍAS DE RETRASO
	SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO (HITO OBLIGATORIO)	4/11/2020	3/04/2021	
1	Validación			
2	Entrega de informe de validación			
3	Ejecución			
	ENTREGA A LA INTERVENTORIA DE LOS PRODUCTOS Y/O ACTIVIDADES CONTRATADAS (HITO OBLIGATORIO)			


*** Inserte las filas que requiera según el número de hitos; teniendo en cuenta que como mínimo se deberán establecer 5 hitos adicionales a los obligatorios de inicio y terminación. Los hitos aprobados por la interventoría se socializarán con el supervisor del contrato para su Vo. Bo. Los Hitos aprobados por la interventoría y SDHT solo se podrán modificar previa novedad contractual que así lo requiera. La matriz ded segimiento hace parte del presente documento.

No.	INDICADORES BARRIO O TERRITORIO	VALORES CD + AIU	PORCENTAJE SOBRE EL VALOR TOTAL DEL CONTRATO	DIFERENCIA (+) ADELANTO (-) ATRASO
1	Valor acumulado de las actividades o productos conforme a la programación vigente.	$384.409.472,58	10,32%	
2	Valor acumulado de las actividades o productos ejecutados y aprobados por la Interventoría.	$349.199.001,90	9,38%	

3. ASPECTOS GENERALES INFORME TÉCNICO

Registre los avances y novedades técnicas, sociales, administrativas, contables y financieras, acompañadas por gráficos, cuadros, fotografías, análisis y comentarios sobre el estado de los trabajos, en todos sus aspectos en la fase de validación y ejecución de obra.

CIUDAD BOLIVAR - USME

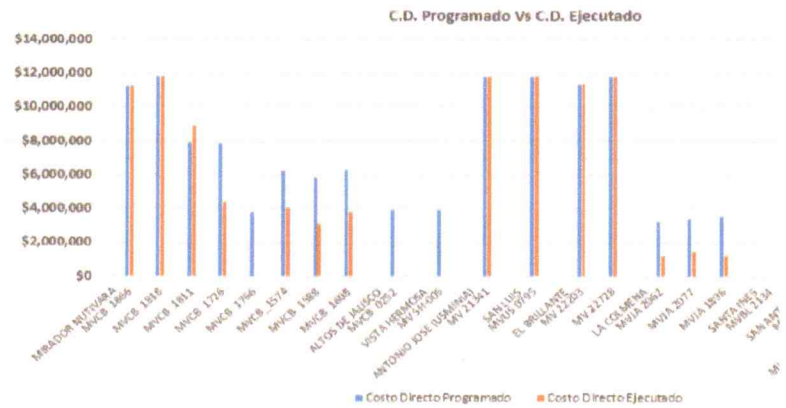

4- COMPONENTE TECNICO BARRIO O TERRITORIO			
ACTIVIDADES EJECUTADAS EN LA SEMANA. - ESTADO DE AVANCE SEMANAL POR VIVIENDA			
BARRIO O TERRITORIO - CIUDAD BOLIVAR- BARRIO NUEVA COLOMBIA FECHA: 28- FEBRERO -2021			
1	MVCB_1437	FLOR ELISA PARRA ROJAS	**Se recibe la vivienda con las actividades acordadas y terminadas a satisfacción, fecha de entrega 21 de diciembre 2020**
2	MVCB_1441	LUZMILA TORRES BERMUDEZ	**Se recibe la vivienda con las actividades acordadas y terminadas a satisfacción, fecha de entrega 15 de diciembre 2020**
3	MVCB_1440	ALBA CARMEN ARDILA MATEUS	**Se recibe la vivienda con las actividades acordadas y terminadas a satisfacción, fecha de entrega 29 de diciembre 2020**
4	MVCB_1421	MARIA ESTER ZORRO GUERRERO	**Se recibe la vivienda con las actividades acordadas y terminadas a satisfacción, fecha de entrega 15 de diciembre 2020**
5	MVCB_1124	MARIA ANTONIA SANTOS CORREDOR DE RAMIREZ	**Se recibe la vivienda con las actividades acordadas y terminadas a satisfacción, fecha de entrega 23 de diciembre 2020**
6	MVCB_1120	QUERUBIN CHAGUALA	**Se recibe la vivienda con las actividades acordadas y terminadas a satisfacción, fecha de entrega 29 de diciembre 2020**
7	MVCB_1091	LIGIA TEJADA DE BARRERO	**Se recibe la vivienda con las actividades acordadas y terminadas a satisfacción, fecha de entrega 29 de diciembre 2020**
BARRIO O TERRITORIO - CIUDAD BOLIVAR- JUAN PABLO II			
8	MVCB_2996	MARIA TERESA ANTOLINEZ Y OTRO	**Se recibe la vivienda con las actividades acordadas y terminadas a satisfacción, fecha de entrega 21 de diciembre 2020**
9	MVCB_2993	**CARLOS JULIO CARDENAS TRIANA**	**El beneficiario de la vivienda decide voluntariamente renunciar al beneficio, ya que la vivienda se encuentra en optimas condiciones de habitabilidad**
10	MVCB2999	MARIA LEONOR FRAILE SUAREZ	**Se recibe la vivienda con las actividades acordadas y terminadas a satisfacción, fecha de entrega 15 de diciembre 2020**
11	MVCB_2991	BRISNELDA CONSTANZA MACIAS MARTINEZ	**Se recibe la vivienda con las actividades acordadas y terminadas a satisfacción, fecha de entrega 15 de diciembre 2020**
12	MVCB_2967	MARIA OLGA FARFAN GALEON	**Se recibe la vivienda con las actividades acordadas y terminadas a satisfacción, fecha de entrega 21 de diciembre 2020**
13	MVCB_2960	MARIA NURY QUINTERO CARDONA	**Se recibe la vivienda con las actividades acordadas y terminadas a satisfacción, fecha de entrega 17 de diciembre 2020**
14	MVCB2434	MARGARITA MARIA MORALES OROZCO	**Se recibe la vivienda con las actividades acordadas y terminadas a satisfacción, fecha de entrega 23 de diciembre 2020**
15	MVCB_2432	AGUSTÍN VILLANUEVA GUZMÁN	**Se recibe la vivienda con las actividades acordadas y terminadas a satisfacción, fecha de entrega 30 de diciembre 2020**
16	MVCB_3030	TEODOSIA GALICIA DE GARCIA	**Se recibe la vivienda con las actividades acordadas y terminadas a satisfacción, fecha de entrega 15 de diciembre 2020**
17	MVCB_3020	PEDRO PABLO IBAÑEZ	**Se recibe la vivienda con las actividades acordadas y terminadas a satisfacción, fecha de entrega 23 de diciembre 2020**
18	MVCB_3534	MARIA ELISA RODRÍGUEZ GAMEZ	SE REALIZA VALIDACIÓN DEL PREDIO EN LA PRESENTE SEMANA, MV ENTRA BN REEMPLAZO POR UNA RENUNCIA
19	MVCB_3537	EDILY JIMENEZ OSORIO	SE REALIZA VALIDACIÓN DEL PREDIO EN LA PRESENTE SEMANA, MV ENTRA BN REEMPLAZO POR UNA RENUNCIA
BARRIO O TERRITORIO - CIUDAD BOLIVAR- MIRADOR NUTIVARA			
20	MV_1866	LUIS ALBERTO ALONSO CASTIBLANCO	**Se recibe la vivienda con las actividades acordadas y terminadas a satisfacción, fecha de entrega 21 de diciembre 2020**
21	MV_1818	MERQUECIDE MONTAÑEZ UYOA	**Se recibe la vivienda con las actividades acordadas y terminadas a satisfacción, fecha de entrega 15 de diciembre 2020**
22	MV_1811	ROSA ELVIRA GONZALEZ	Se continua con actividades de enchape encocina y baño, se inician actividades de pintura en alcobas e instalacion de estructura para cielo raso en PVC, la propietaria esta conforme con las actividades
23	MV_1726	EMPERATRIZ ACOSTA MARTINEZ	Se inician actividades de instalación de enchapes en pisos de alcobas, en paredes de la cocina y actvidades de pintura en alcobas y patio
24	MV_1766	CARMEN QUIQUE MARTINEZ	A la fecha no se han realizado actividades en dicho MV ya que el predio se debio revalidar con el fin de hacer cambio de cubierta, el contratista se encuentra realizando la compra de la cubierta y perfileria
25	MV_1574	JOSE HIPOLITO GUTIERREZ LUCERO	Se inician actividades de instalación de enchape en alcobas, baño y cocina, beneficiario manifiesta estar conforme con las actividades
26	MV_1588	LUZ NELLY RODRIGUEZ	**Se inician actividades de instalación de enchape en paredes del baño y de la cocina, tambien se inicia instalación de enchape en piso de una de las alcobas**
27	MV_1608	ROSALBINA HERNANDEZ PIRACHICAN	Se inician actividades de enchape de paredes en el baño y en una de las alcobas y el corredor, tambien se pinta una de las alcobas, beneficiaria refiere estar de acuerdo y conforme con las actividades
BARRIO O TERRITORIO - CIUDAD BOLIVAR- URBANIZACIÓN COMPARTIR			
28	MVCB_0252	JESUS ANTONIO BARRERA FANDIÑO	A la fecha el contratista no ha iniciado actividades de obra
BARRIO O TERRITORIO - CIUDAD BOLIVAR- VISTA HERMOSA			
29	MV SH-005	MARIA CUSTODIA SANCHEZ SANCHEZ	A la fecha el contratista no ha iniciado actividades de obra

BARRIO O TERRITORIO - ANTONIO JOSE DE SUCRE III SECTOR (USMINIA)			
30	MV 21341	ERMELINDA HERNANDEZ	**Se recibe la vivienda con las actividades acordadas y terminadas a satisfacción, fecha de entrega 23 de febrero de 2021**
31	MVUS_0905	LUIS EDUARDO GUATIBONZA	**El beneficiario no se logra contactar despues de varios intentos y notificaciones, no se ejecuta ninguna actividad**
BARRIO O TERRITORIO - NUEVO SAN LUIS (USMINIA)			
32	MVUS 0795	AIDA MARIA RUEDA NIETO	**Se recibe la vivienda con las actividades acordadas y terminadas a satisfacción, fecha de entrega 23 de febrero de 2021**
BARRIO O TERRITORIO - NUEVO SAN LUIS (USMINIA)			
33	MV 22203	YENY ZURLEY LOPEZ ULLOA	**Se recibe la vivienda con las actividades acordadas y terminadas a satisfacción, fecha de entrega 20 de febrero de 2021**
34	MV 22728	ECCEHOMO RIVERA RONCANCIO	**Se recibe la vivienda con las actividades acordadas y terminadas a satisfacción, fecha de entrega 20 de febrero de 2021**
LA COLMENA III SECTOR (CIUDAD BOLIVAR)			
35	MVJA 2062	MERCEDES WALTEROS JOANIAS	Se inician actividades de picado y alistado de piso en las alcobas, tambien se da inicio a actividades de pañete en la zona de lavado
36	MVJA 2077	SOFIA PORRAS DE CAJAMARCA	Se inician actividades de picado y alistado de piso en las alcobas, tambien se da inicio a actividades de pañete en las alcobas
37	MVJA 1896	HERNANDO TIQUE GUZMAN	Se inician actividades de alistado de pisos, y pañetes en las dos alcobas de la parte de atrás del lote y se hace demolición de enchape viejo en el baño
SANTA INES (BOSA LA LIBERTAD)			
38	MVBL 2134	HERMELINA LOSADA CAICEDO	NO SE REALIZAN ACTIVIDADES EN EL MV, SE ENCUENTRA EN FASE DE VALIDACIÓN
SAN ANTONIO (BOSA LA LIBERTAD)			
39	MVBL 2838	ALVARO BARRERA ARIZA	NO SE REALIZAN ACTIVIDADES EN EL MV, SE ENCUENTRA EN FASE DE VALIDACIÓN
LAS MARGARITAS III SECTOR (BOSA LA LIBERTAD)			
40	MVBL_1875	MARIA LUZ BONILLA	**El beneficiario informa vía telefonica q renuncia al beneficio ya que la casa la vendio**
41	MVCB_1119	GERARDO FONSECA ARIAS	**Se realizaron tres comunicados no contesto ninguno**

5. PLAN DE ACCIÓN RESULTADO DEL ANÁLISIS DE CAUSAS REGISTRADO EN EL NUMERAL ANTERIOR - CON EL OBJETIVO DE ELIMINAR LA CAUSA RAÍZ DE LA SITUACIÓN PROBLEMÁTICA - PLAN DE MEJORA

ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA
En conjunto con el contratista y esta interventoría se continua con la supervisión a cada uno de los presupuestos, en los frentes aperturados se evidencia personal de obra ejecutando actividades contractuales, en la presente semana dos beneficiarios renuncian al mejoramiento de vivienda, el MVBL_1875 , MVUS_0905 y MVCB_1119 completando así un total de tres (03) renuncias	Arq. William Fdo Garzón	

6. ACTIVIDADES NO PREVISTAS Y MAYORES CANTIDADES

Se informa que en algunas de las viviendas se presentan mejoras en los acabados finales realizadas por los beneficiarios, por lo tanto se deside intervenir otros espacios en conjunto con el contratista garantizando una adecuada habitabilidad y dignificación de las viviendas

7. COMENTARIOS DEL INTERVENTOR: Por favor realice la descripción general del estado del contrato y según aplique informe sobre: actividades realizadas en la semana, control de lluvias, compra y suministro de materiales, mano de obra, subcontratos y tramites ante las diferentes empresas prestadoras de servicios, entre otros. Anexe las actas de seguimiento realizadas en la semana correspondiente al periodo del informe.

Barrio o Territorio: CIUDAD BOLIVAR - USMINIA - BOSA

En el presente periodo el contratista evidencia avances en los 11 frentes aperturados, no se hace entrega de MV en la presente semana, y se realiza la apertura de otros 3 MV, quedando así con un total de 11 MV aperturados y en ejecución, 22 MV recibidos por la interventoría y 3 renuncias, en algunos frentes el contratista presenta demoras en el suministro de materiales, lo q ha generado algunos reclamos por parte de los beneficiarios

En la presente semana se han registrado lluvias fuertes

8. REGISTRO FOTOGRAFICO DEL AVANCE DURANTE LA SEMANA

SE ADJUNTA REGISTRO FOTOGRÁFICO

REGISTRO FOTOGRÁFICO



FECHA	sábado, 6 de marzo de 2021
DESCRIPCION MV_1608	
Avance de obra	



FECHA	sábado, 6 de marzo de 2021
DESCRIPCION MVCB_0252	
NO HAY AVANCES DE OBRA	



FECHA	sábado, 6 de marzo de 2021
DESCRIPCION MV SH-005	
NO HAY AVANCES DE OBRA	



FECHA	miércoles, 3 de marzo de 2021
DESCRIPCION MVJA 2062	
Avance de obra	



FECHA	miércoles, 3 de marzo de 2021
DESCRIPCION MVJA 2077	
Avance de obra	



FECHA	miércoles, 3 de marzo de 2021
DESCRIPCION MVJA 1896	
Avance de obra	

REGISTRO FOTOGRÁFICO




FECHA	jueves, 4 de marzo de 2021
DESCRIPCION MVCB 3534	
VALIDACIÓN DE OBRA	




FECHA	jueves, 4 de marzo de 2021
DESCRIPCION MVCB 3537	
VALIDACIÓN DE OBRA	



FECHA	viernes, 5 de marzo de 2021
DESCRIPCION MV 1811	
Avance de obra	

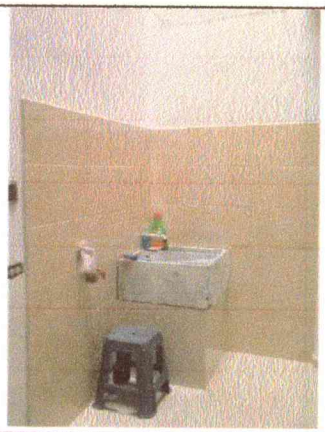

FECHA	viernes, 5 de marzo de 2021
DESCRIPCION MV 1726	
Avance de obra	

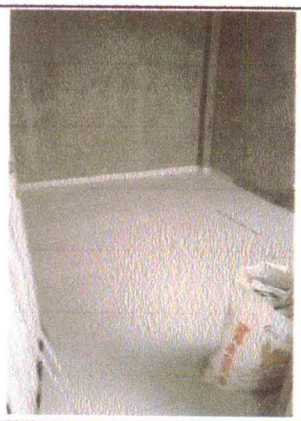

FECHA	viernes, 5 de marzo de 2021
DESCRIPCION MV_1574	
Avance de obra	



FECHA	viernes, 5 de marzo de 2021
DESCRIPCION MV_1588	
Avance de obra	

Subsecretaria de Coordinacion Operativa
Subdireccion de Barrios
Seguimiento ejecución proyectos de Mejoramiento de Vivienda - Habitabilidad

Proyecto mejoramiento de vivienda - AVANCE EJECUCIÓN SEMANAL					Fecha	7-mar-21
Consorcio mejoramiento EP 2020 - Contratista de obra						
Contratato de obra	694-2020			Plazo	Cinco (5) meses	
Objeto	Contratar la ejecución de las obras de mejoramiento de vivienda en la modalidad de habitabilidad de los proyectos estructurados en los territorios priorizados por la Secretaria Distrital de Habitat. Grupo I			Acta de inicio	4 de noviembre de 2020	
CDP No.	No. 914 del 14 de julio de 2020	CRP No.		Valor del contrato	TRES MIL SETECIENTOS VEINTICUATRO MILLONES CIENTO TREINTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS DIEZ Y NUEVE PESOS ($3.724.135.319) M/Cte	

Gonzalo Llevano Hoyos -INPLAYCO S.A.S.					
Contratato de interventoría	701-2020		Plazo	Seis (6) meses	
Objeto	Realizar la interventorias técnica, jurídica, social, administrativa y financiera, para la ejecución de las obras de mejoramiento de vivienda en la modalidad de habitabilidad en los territorios priorizados por la secretaría distrital de hábitat.		Acta de inicio	04 de noviembre 2020	
CDP No	No. 892 del 14 de julio de 2020	CRP No.	Valor del contrato	OCHOCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS M/CTE ($894.285.952),	

Fase 1: Validación de la información entregada por el la SDHT									Fase 2: Ejecución de obras				
					Validación				Ejecución				
Territorio o barrio a intervenir	JUAN PÁBLO II NUEVA COLOMBIA	Barrios	Predios	Total Predios	Validada	V/Por Validar	Renuncias	V/Modificada	En Ejecución	Terminadas	Por Ejecutar	% de Avance	Acta de Entrega a Satisfacción
Arq o Ing. Responsable	Arq.Leonardo Solano	JUAN PABLO II	19		19	0	0	0	2	17	0	6,51%	17
		NUEVA COLOMB.	16		16	0	1	0	0	14	2	5,31%	14
	Arq.Leonardo Solano	VILLAS DIAMANTE	10		10	0	0	0	10	0	0	2,12%	0
		MIRADOR (NUTIVAR	9		9	0	0	0	5	4	0	1,51%	4
	Arq.Leonardo Solano	USMINIA	4		4	0	0	0	0	4	0	1,55%	4
		LUCERO MEDIO	0		0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0
Subtotal			58	58	58	0	1	0	17	39	2	17,00%	39

AVANCE DE EJECUCIÓN SEMANAL											FEBRERO				
				FASE I			Tiempo Programacion					SEM. DEL 21 AL 28			
No.	ID_DMV	Dirección	Nombres y apellidos	V/ Validada	V/ Modificada	V/Inicial	Fecha inicio	Fecha terminada	F. Inicio	VR. ACUMULADO SEM ANT.		SEMANA 18	SEMANA 19	SEMANA 20	VR. ACUMULADO TOTAL
			JUAN PABLO II												
1	MVCB_4919	KR 18M BIS 68B 50 SUR MJ	URIEL PATIÑO RINCON	SI / NO		$11.696.006	17/11/2020	ENTREGADA	3/12/2020	100,00%		0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
2	MVCB_4923	KR 18M BIS 68B 26 SUR	SIERVO MATIAS FIGUEROA CHAPARRO	SI / NO		$10.947.719	17/11/2020	ENTREGADA	23/11/2020	100,00%		0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
3	MVCB_2932	TV 18N 69A 97 SUR	MARIA TERESA PIÑEROS PIÑEROS	SI / NO		$11.700.811	17/11/2020	ENTREGADA	23/11/2020	100,00%		0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
4	MVCB_2926	TV 18N 69A 71 SUR	CORADO TORO DE TORRES Y OTRO	SI / NO		$11.800.475	17/11/2020	ENTREGADA	23/11/2020	100,00%		0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
5	MVCB_3646	TV 18N BIS 69A 95 SUR	LUIS ANTONIO CABRERA LOPEZ Y OTRA	SI / NO		$11.416.175	2/12/2020	ENTREGADA	24/11/2020	100,00%		0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
6	MVCB_3643	TV 18N BIS 69A 83 SUR	JOSE ARISTOBULO MENJURA LEITON Y OTRA	SI / NO		$11.078.062	2/12/2020	ENTREGADA	24/11/2020	100,00%		0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
7	MVCB_2925	TV 18N 69A 67 SUR	MARTHA LUZ CAMPIÑO	SI / NO		$11.553.359	2/12/2020	ENTREGADA	24/11/2020	100,00%		0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
8	MVCB_2917	DG 69A BIS B SUR 18M 30	CLAUDIA PATRICIA VARGAS GÓMEZ	SI / NO		$11.229.192	18/11/2020	ENTREGADA	24/11/2020	100,00%		0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
9	MVCB_3642	TV 18N BIS 69A 77 SUR	JULIO CESAR FICHAS AVILA	SI / NO		$11.811.376	2/12/2020	ENTREGADA	25/11/2020	100,00%		0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
10	MVCB_3641	TV 18N BIS 69A 75 SUR	CECILIA MENDEZ MORENO	SI / NO		$11.561.960	2/12/2020	ENTREGADA	25/11/2020	100,00%		0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
11	MVCB_3640	TV 18N BIS 69A 71 SUR	OCTAVIO TELLEZ PINEDA	SI / NO		$11.827.947	3/12/2020	ENTREGADA	25/11/2020	100,00%		0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
12	MVCB_3635	TV 18N BIS 69A 51 SUR	JUAN CARLOS MAZO CASTRO Y OTRA	SI / NO		$11.819.965	3/12/2020	ENTREGADA	25/11/2020	100,00%		0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
13	MVCB_3634	TV 18N BIS 69A 47 SUR	AYDE NIÑO Y OTRO	SI / NO		$10.782.650	3/12/2020	ENTREGADA	23/11/2020	100,00%		0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
14	MVCB_2939	TV 18N BIS 69A 84 SUR	MARIEYE LOAISA	SI / NO		$11.086.579	4/12/2020	ENTREGADA	30/11/2020	100,00%		0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
15	MVCB_4918	KR 18M BIS 68B 56 SUR	ALVARO DIAZ AVILA	SI / NO		$11.639.626	4/12/2020	ENTREGADA	23/11/2020	100,00%		0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
16	MVCB_3633	TV 18N BIS 69A 43 SUR	FRANCISCO JAVIER MENDIVELSO GUERRERO	SI / NO		$10.296.334	3/12/2020	ENTREGADA	30/11/2020	100,00%		0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
17	MVCB_4917	KR 18M BIS 68B 62 SUR	ALVARO ALONSO MORENO	SI / NO		$10.136.993	4/12/2020	ENTREGADA	3/12/2020	100,00%		0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
18	MVCB_3524	TV 18 K 69 A 90 S - /- TV 18P 69 A 63 SUR	REINED DE JESUS RODRIGUEZ	SI / NO		$11.800.000	9/03/2021	EN EJECUCION	9/03/2021	0,00%		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

19	MVCB_3540	TV 18 69 A 66 S	SANDRA BETANCUR	SI / NO		$11.800.001	9/03/2021	EN EJECUCION	9/03/2021	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
DESARROLLO NUEVA COLOMBIA														
20	MVCB_1320	CL 70K SUR 18L 65	ISMENIA BARRETO ARIAS	SI / NO		$11.707.337	15/01/2021	ENTREGADA	15/01/2021	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
21	MVCB_1383	CL 70J SUR 18L 34	EDGAR FERNANDO CAMARCO ANGEL	SI / NO		$10.129.674	11/01/2021	ENTREGADA	11/01/2021	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
22	MVCB_1380	CL 70J SUR 18L 22	ROSALBA MONTES DE CARDONA	SI / NO		$11.330.297	11/01/2021	ENTREGADA	11/01/2021	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
23	MVCB_1382	CL 70J SUR 18L 30	MARIA CECILIA RINCON RINCON	SI / NO		$11.818.990	11/01/2021	ENTREGADA	11/01/2021	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
24	MVCB_1381	CL 70J SUR 18L 26	NOHORA NOHEMI MAYORGA IBAGUE	SI / NO		$8.886.491	11/01/2021	ENTREGADA	11/01/2021	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
25	MVCB_1374	CL 70J SUR 18L 11	OBED OSPINA RESTREPO	SI / NO		$10.330.364	11/01/2021	ENTREGADA	11/01/2021	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
26	MVCB_1371	CL 70J SUR 18L 23	CONSUELO NAVARRO	SI / NO		$11.808.362	11/01/2021	ENTREGADA	11/01/2021	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
27	MVCB_1328	CL 70K SUR 18L 29	EDILBERTO CARDENAS PAEZ	SI / NO		$10.521.578	11/01/2021	ENTREGADA	11/01/2021	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
28	MVCB_1352	CL 70K SUR 18L 64	MARIA RAMOS ORTIZ	SI / NO		$11.766.783	18/01/2021	ENTREGADA	18/01/2021	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
29	MVCB_1341	CL 70K SUR 18L 20	JOSE GABRIEL HERRERA MEDINA	SI / NO		$11.783.941	11/01/2021	ENTREGADA	11/01/2021	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
30	MVCB_1344	CL 70K SUR 18L 32	ALBEIRO RUIZ SANABRIA	SI / NO		$11.778.217	15/01/2021	ENTREGADA	15/01/2021	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
31	MVCB_1310	CL 70L SUR 18L 70	DORA ALICIA LÓPEZ SANABRIA	SI / NO		$11.826.158	15/01/2021	ENTREGADA	15/01/2021	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
32	MVCB_1314	KR 18M 70K 16 SUR	MARTHA LUCIA OSPINA PEÑA	SI / NO		$11.714.974	RENUNCIA	RENUNCIA	RENUNCIA	RENUNCIA	RENUNCIA	RENUNCIA	RENUNCIA	RENUNCIA
33	MVCB_1357	KR 18M 70J 16 SUR	MARTHA LILIA AGUDELO SANTOS	SI / NO		$11.562.098	15/01/2021	ENTREGADA	15/01/2021	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
34	MVCB_1280	CL 70L SUR 18L 85	BARBARA GALVIS CHINCHILLA	SI / NO		$11.796.701	15/01/2021	ENTREGADA	15/01/2021	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
35	MVCB_1286	CL 70L SUR 18L 61	LUZ MINDA CASTRO PEÑA	SI / NO		$ 11.176.968,00	19/01/2021	ENTREGADA	19/01/2021	100,00%	0,00%	0%	0%	100,00%
VILLAS DEL DIAMANTE														
36	MVCB_5128	CL 69N SUR 18N 52	DIEGO MARIO VANEGAS VILLAMIL	SI / NO		$8.215.804	22/02/2021	EN EJECUCION	22/02/2021	47,45%	15,50%	0,00%	0%	62,95%
37	MVCB_5129	CL 69N SUR 18N 58 MI	FRANCISCO JAVIER ARANGO GUTIERREZ	SI / NO		$9.918.506	22/02/2021	EN EJECUCION	22/02/2021	0,00%	0,00%	0,00%	0%	0,00%
38	MVCB_5156	CL 69N SUR 18N 59 MJ	VICTOR MANUEL MUÑOZ VERGARA	SI / NO		$11.788.586	22/02/2021	EN EJECUCION	22/02/2021	45,50%	13,00%	0,00%	0%	58,50%
39	MVCB_5489	KR 19F 70C 29 SUR MJ	GLORIA INES PEÑA BELTRAN	SI / NO		$10.903.021	22/02/2021	EN EJECUCION	22/02/2021	33,55%	15,00%	0,00%	0%	48,55%
40	MVCB_5482	KR 19G 70C 18 SUR	LUIS HERNANDO MESA	SI / NO		$11.726.936	25/02/2021	EN EJECUCION	25/02/2021	30,00%	26,00%	0,00%	0%	56,00%
41	MVCB_5486	CL 70C SUR 19F 07 MI	MARIA DEL CARMEN ALONSO POSADA	SI / NO		$11.648.943	23/02/2021	ENTREGADA	23/02/2021	49,00%	51,00%	0,00%	0%	100,00%
42	MVCB_5314	TV 18N BIS A 69R 17 SUR MJ	ANA OTILIA GUACANEME CUESTA	SI / NO		$11.762.842	24/02/2021	EN EJECUCION	24/02/2021	59,00%	38,00%	0,00%	0%	97,00%
43	MVCB_5295	CL 69R SUR 18P 45 MJ	MARIA YOLANDA LOZANO VERGARA	SI / NO		$10.666.717	24/02/2021	EN EJECUCION	24/02/2021	39,55%	30,00%	0,00%	0%	69,55%

44	MVCB_5122	CL 69P SUR 18P 15	HERNAN LOPEZ GIRALDO	SI / NO		$9.464.066	23/02/2021	EN EJECUCION	23/02/2021	49,33%	32,00%	0,00%	0%	81,33%
45	MVCB_5157	CL 69N SUR 18N 57	ANA TERESA PEÑA ROJAS	SI / NO		$11.827.785	22/02/2021	EN EJECUCION	22/02/2021	0,00%	0,00%	0,00%	0%	0,00%
MIRADOR (NUTIVARA)														
46	MVCB_1586	CL 70F SUR 18P 45	MARIA DEL CARMEN RINCON	SI / NO		$11.816.419	5/02/2021	ENTREGADA	5/02/2021	74,92%	25,08%	0,00%	0,00%	100,00%
47	MVCB_1907	CL 70N SUR 18N 22	ANA ROSA LLANOS DE GARCIA	SI / NO		$11.042.205	2/02/2021	ENTREGADA	2/02/2021	84,72%	15,28%	0,00%	0,00%	100,00%
48	MVCB_1867	CL 70L SUR 18P 15	JOSE ALBER LUGO	SI / NO		$11.317.334	25/01/2021	ENTREGADA	25/01/2021	81,25%	18,75%	0,00%	0,00%	100,00%
49	MVCB_1914	CL 70M BIS SUR 18N 33	BLANCA ODILIA PATIÑO DE MARTINEZ Y OTRO	SI / NO		$11.424.632	19/01/2021	ENTREGADA	19/01/2021	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
50	MVCB_1661	CL 70H SUR 18N 46 MJ	MARICIELO ARIAS CERQUERA	SI / NO		$11.651.309	19/02/2021	EN EJECUCION	19/02/2021	38,30%	40,00%	0,00%	0,00%	78,30%
51	MVCB_1708	TV 18R 70H 57 SUR	MARIA EUGENIA TRUJILLO QUIMBAYO	SI / NO		$11.722.491	19/02/2021	EN EJECUCION	19/02/2021	45,50%	32,30%	0,00%	0,00%	77,80%
52	MVCB_1698	CL 70I SUR 18P 22	LUZ AMALFI GUTIERREZ FRANCO	SI / NO		$9.465.986	19/02/2021	EN EJECUCION	19/02/2021	33,90%	15,00%	0,00%	0,00%	48,90%
53	MVCB_1585	CL 70F SUR 18P 51	ELIECER RONCANCIO MARTINEZ	SI / NO		$11.805.655	19/02/2021	EN EJECUCION	19/02/2021	47,30%	2,00%	0,00%	0,00%	49,30%
54	MVCB_1811	CL 70K SUR 18Q 09	VICTOR MANUEL MUÑOZ VERGARA	SI / NO		$11.826.704	15/02/2021	EN EJECUCION	15/02/2021	31,90%	15,00%	0,00%	0,00%	46,90%
LISMINIA														
55	MV_21184	CL 112A SUR 7 48	AMALIA MERCHAN SOSA	SI / NO		$11.364.241	21/01/2021	ENTREGADA	21/01/2021	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
56	MV_21368	CL 116 SUR 5 73	ALEJANDRO PAVA	SI / NO		$11.111.995	21/01/2021	ENTREGADA	21/01/2021	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
57	MV_21240	CL 114 SUR 7 42	ALFONSO GUERRERO	SI / NO		$11.590.585	21/01/2021	ENTREGADA	21/01/2021	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
58	MV_21212	CL 112A SUR 7 31	ERNESTINA CAICEDO	SI / NO		$11.743.515	21/01/2021	ENTREGADA	21/01/2021	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DEL HÁBITAT

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

PROYECTOS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA

INPLAYCO S.A.S.
INGENIEROS CONSTRUCTORES E INTERVENTORES

FECHA	7/03/2021	PERIODO No.	18	DEL	1/03/2021	AL	7/03/2021

1. INFORMACIÓN GENERAL

OBJETO DEL CONTRATO	Realizar la interventorías técnica, jurídica, social, administrativa y financiera, para la ejecución de las obras de mejoramiento de vivienda en la modalidad de habitabilidad en los territorios priorizados por la secretaría distrital de hábitat
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO	Corresponde al Grupo 1 a la ejecución de 254 mejoramientos de vivienda, localizados en 3 localidades: Bosa, Usme y Ciudad Bolívar, esta última localidad incluye cuatro (4) Intervenciones de MejoramientoIntegral.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA		CONTRATO DE OBRA	
CONTRATO No.:	701-2020	CONTRATO No.:	694--2020
PLAZO INICIAL:	6 meses	PLAZO INICIAL:	5 meses
FECHA DE INICIACIÓN:	4 de noviembre de 2020	FECHA DE INICIACIÓN:	4 de noviembre de 2020
**FECHA DE SUSPENSIÓN:	0	**FECHA DE SUSPENSIÓN:	0
**FECHA DE REINICIACIÓN:	0	**FECHA DE REINICIACIÓN:	0
FECHA DE TERMINACIÓN:	3 de mayo de 2021	FECHA DE TERMINACIÓN:	3 de abril 2021
PLAZO ACTUALIZADO:	0	PLAZO ACTUALIZADO:	0
PLAZO TRANSCURRIDO:	0	PLAZO TRANSCURRIDO:	0
VALOR INICIAL :	$ 894.285.952	VALOR INICIAL :	$ 3.724.135.319
VALOR ADICION(ES):	0	VALOR ADICION(ES):	$ -
VALOR ACTUALIZADO:	$ -	VALOR ACTUALIZADO:	$ -
VALOR ANTICIPO:	0	VALOR ANTICIPO:	$ -
VALOR POR PAGAR:	$ -	VALOR POR PAGAR:	$ -
SUPERVISOR:	JUAN CARLOS ARBELAEZ MURILLO	INTERVENTOR:	Gonzalo Llevano Hoyos -INPLAYCO S.A.S.

** Inserte las filas que requiera según el número de suspensiones y reinicios.

2. CONTROL DE HITOS.


No.	*** DESCRIPCIÓN DEL HITO	FECHA PROGRAMADA	FECHA REAL DE CUMPLIMIENTO	DÍAS DE RETRASO
	SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO (HITO OBLIGATORIO)	4/11/2020	3/04/2021	
1	Validación			
2	Entrega de informe de validación			
3	Ejecución			
	ENTREGA A LA INTERVENTORIA DE LOS PRODUCTOS Y/O ACTIVIDADES CONTRATADAS (HITO OBLIGATORIO)			

***** Inserte las filas que requiera según el número de hitos; teniendo en cuenta que como mínimo se deberán establecer 5 hitos adicionales a los obligatorios de inicio y terminación. Los hitos aprobados por la interventoría se socializarán con el supervisor del contrato para su Vo. Bo. Los Hitos aprobados por la interventoría y SDHT solo se podrán modificar previa novedad contractual que así lo requiera. La matriz ded segimiento hace parte del presente documento.**

No.	INDICADORES BARRIO O TERRITORIO	VALORES	PORCENTAJE SOBRE EL VALOR TOTAL DEL CONTRATO	DIFERENCIA (+) ADELANTO (-) ATRASO
1	Valor acumulado de las actividades o productos conforme a la programación vigente.	$ 667.387.434,73	17,92%	
2	Valor acumulado de las actividades o productos ejecutados y aprobados por la Interventoría.	$ 633.237.340,08	17,00%	

3. ASPECTOS GENERALES INFORME TÉCNICO







4- COMPONENTE TECNICO BARRIO O TERRITORIO		
ACTIVIDADES EJECUTADAS EN LA SEMANA. - ESTADO DE AVANCE SEMANAL POR VIVIENDA		
JUAN PABLO II - NUEVA COLOMBIA		
FECHA: 06 DE DICIEMBRE 2020		
BARRIO JUAN PABLO II		
MVCB_4919	URIEL PATIÑO RINCON	Se realiza visita Técnica-Social Realizando Entrega Oficial de la vivienda
MVCB_4923	SIERVO MATIAS FIGUEROA CHAPARRO	Se realiza visita Técnica-Social Realizando Entrega Oficial de la vivienda
MVCB_2932	MARIA TERESA PIÑEROS PIÑEROS	Se realiza visita Técnica-Social Realizando Entrega Oficial de la vivienda
MVCB_2926	CORADO TORO DE TORRES Y OTRO	Se realiza visita Técnica-Social Realizando Entrega Oficial de la vivienda
MVCB_3646	LUIS ANTONIO CABRERA LOPEZ Y OTRA	Se realiza visita Técnica-Social Realizando Entrega Oficial de la vivienda
MVCB_3643	JOSE ARISTOBULO MENJURA LEITON Y OTRA	Se realiza visita Técnica-Social Realizando Entrega Oficial de la vivienda
MVCB_2925	MARTHA LUZ CAMPIÑO	Se realiza visita Técnica-Social Realizando Entrega Oficial de la vivienda
MVCB_2917	CLAUDIA PATRICIA VARGAS GÓMEZ	Se realiza visita Técnica-Social Realizando Entrega Oficial de la vivienda
MVCB_3642	JULIO CESAR FICHAS AVILA	Se realiza visita Técnica-Social Realizando Entrega Oficial de la vivienda
MVCB_3641	CECILIA MENDEZ MORENO	Se realiza visita Técnica-Social Realizando Entrega Oficial de la vivienda
MVCB_3640	OCTAVIO TELLEZ PINEDA	Se realiza visita Técnica-Social Realizando Entrega Oficial de la vivienda
MVCB_3635	JUAN CARLOS MAZO CASTRO Y OTRA	Se realiza visita Técnica-Social Realizando Entrega Oficial de la vivienda
MVCB_3634	AYDE NIÑO Y OTRO	Se realiza visita Técnica-Social Realizando Entrega Oficial de la vivienda
MVCB_3633	FRANCISCO JAVIER MENDIVELSO GUERRERO	Se realiza visita Técnica-Social Realizando Entrega Oficial de la vivienda
MVCB_2939	MARIEYE LOAISA	Se realiza visita Técnica-Social Realizando Entrega Oficial de la vivienda
MVCB_4917	ALVARO ALONSO MORENO	Se realiza visita Técnica-Social Realizando Entrega Oficial de la vivienda
MVCB_4918	ALVARO DIAZ AVILA	Se realiza visita Técnica-Social Realizando Entrega Oficial de la vivienda
MVCB_3524	REINED DE JESUS RODRIGUEZ	Se realiza visita Técnica-Social Realizando Validacion de Obra
MVCB_3540	SANDRA BETANCUR	Se realiza visita Técnica-Social Realizando Validacion de Obra
BARRIO NUEVA COLOMBIA		
MVCB_1320	ISMENIA BARRETO ARIAS	Se realiza visita Técnica-Social Realizando Entrega Oficial de la vivienda
MVCB_1383	EDGAR FERNANDO CAMARCO ANGEL	Se realiza visita Técnica-Social Realizando Entrega Oficial de la vivienda
MVCB_1380	ROSALBA MONTES DE CARDONA	Se realiza visita Técnica-Social Realizando Entrega Oficial de la vivienda

MVCB_1382	**MARIA CECILIA RINCON RINCON**	**Se realiza visita Técnica-Social Realizando Entrega Oficial de la vivienda**
MVCB_1381	**NOHORA NOHEMI MAYORGA IBAGUE**	**Se realiza visita Técnica-Social Realizando Entrega Oficial de la vivienda**
MVCB_1374	**OBED OSPINA RESTREPO**	**Se realiza visita Técnica-Social Realizando Entrega Oficial de la vivienda**
MVCB_1371	**CONSUELO NAVARRO**	**Se realiza visita Técnica-Social Realizando Entrega Oficial de la vivienda**
MVCB_1328	**EDILBERTO CARDENAS PAEZ**	**Se realiza visita Técnica-Social Realizando Entrega Oficial de la vivienda**
MVCB_1352	**MARIA RAMOS ORTIZ**	**Se realiza visita Técnica-Social Realizando Entrega Oficial de la vivienda**
MVCB_1341	**JOSE GABRIEL HERRERA MEDINA**	**Se realiza visita Técnica-Social Realizando Entrega Oficial de la vivienda**
MVCB_1344	**ALBEIRO RUIZ SANABRIA**	**Se realiza visita Técnica-Social Realizando Entrega Oficial de la vivienda**
MVCB_1310	**DORA ALICIA LÓPEZ SANABRIA**	**Se realiza visita Técnica-Social Realizando Entrega Oficial de la vivienda**
MVCB_1314	MARTHA LUCIA OSPINA PEÑA	Por temas jurídicos se termina dando renuncia al programa de Mejoramiento
MVCB_1357	**MARTHA LILIA AGUDELO SANTOS**	**Se realiza visita Técnica-Social Realizando Entrega Oficial de la vivienda**
MVCB_1280	BARBARA GALVIS CHINCHILLA	**Se realiza visita Técnica-Social Realizando Entrega Oficial de la vivienda**
MVCB_1286	**LUZ MINDA CASTRO PEÑA**	**Se realiza visita Técnica-Social Realizando Entrega Oficial de la vivienda**
	VILLAS DEL DIAMANTE	
MVCB_5128	DIEGO MARIO VANEGAS VILLAMIL	Se realiza visita Técnica-Social Evidenciando actividades : Alistado de piso en mortero 1:4, Demolición Enchape Muro Cocina .Instalación de Enchape de piso, Enchape pared en ceramica rectificada para baños y ropas.
MVCB_5129	FRANCISCO JAVIER ARANGO GUTIERREZ	No se evidencia inicio de actividades.
MVCB_5156	VICTOR MANUEL MUÑOZ VERGARA	Demolición Enchape Muro Cocina y Baño, Pañete sobre mampostería e=1,5 cm, Alistado de piso en mortero 1:4
MVCB_5489	GLORIA INES PEÑA BELTRAN	Se realiza visita Técnica-Social Evidenciando actividades : Alistado de piso en mortero 1:4, Demolición Enchape Muro Cocina .Instalación de Enchape de piso, Enchape pared en ceramica rectificada para baños y ropas.
MVCB_5482	LUIS HERNANDO MESA	Pañete sobre mampostería e=1,5 cm, Alistado de piso en mortero 1:4,Desmonte de Meson existente.
MVCB_5486	MARIA DEL CARMEN ALONSO POSADA	Se realiza visita Técnica-Social Evidenciando actividades : Alistado de piso en mortero 1:4, Demolición Enchape Muro Cocina .Instalación de Enchape de piso, Enchape pared en ceramica rectificada para cocina.
MVCB_5314	ANA OTILIA GUACANEME CUESTA	Pañete sobre mampostería e=1,5 cm, Alistado de piso en mortero 1:4
MVCB_5295	MARIA YOLANDA LOZANO VERGARA	Demolición Enchape Muro Cocina y Baño, Pañete sobre mampostería e=1,5 cm, Alistado de piso en mortero 1:4
MVCB_5122	HERNAN LOPEZ GIRALDO	Se realiza visita Técnica-Social Evidenciando actividades : Alistado de piso en mortero 1:4, Demolición Enchape Muro Cocina .Instalación de Enchape de piso, Enchape pared en ceramica rectificada para baños y ropas.
MVCB_5157	ANA TERESA PEÑA ROJAS	No se evidencia inicio de actividades.

MIRADOR (NUTIVARA)		
MVCB_1586	MARIA DEL CARMEN RINCON	**Se realiza visita Técnica-Social Realizando Entrega Oficial de la vivienda**
MVCB_1907	ANA ROSA LLANOS DE GARCIA	**Se realiza visita Técnica-Social Realizando Entrega Oficial de la vivienda**
MVCB_1867	JOSE ALBER LUGO	Se realiza visita Técnica-Social Evidenciando actividades : Se realiza visita Técnica-Social Evidenciando actividades : Enchape pared en cerámica para baños , cocina formato 60 x 30 o similar. Instalación de Enchape de piso Cerámico Formato 45 x 45 o similar.
MVCB_1914	BLANCA ODILIA PATIÑO DE MARTINEZ Y OTRO	**Se realiza visita Técnica-Social Realizando Entrega Oficial de la vivienda**
MVCB_1661	MARICIELO ARIAS CERQUERA	Se realiza visita Técnica-Social Evidenciando actividades : Se realiza visita Técnica-Social Evidenciando actividades : Enchape pared en cerámica para baños , cocina formato 60 x 30 o similar. Instalación de Enchape de piso Cerámico Formato 45 x 45 o similar.
MVCB_1708	MARIA EUGENIA TRUJILLO QUIMBAYO	Se realiza visita Técnica-Social Evidenciando actividades : Se realiza visita Técnica-Social Evidenciando actividades : Enchape pared en cerámica para baños , cocina formato 60 x 30 o similar. Instalación de Enchape de piso Cerámico Formato 45 x 45 o similar.
MVCB_1698	LUZ AMALFI GUTIERREZ FRANCO	Demolición Enchape Muro Cocina y Baño, Pañete sobre mamposteria e=1,5 cm, Alistado de piso en mortero 1:4
MVCB_1585	ELIECER RONCANCIO MARTINEZ	Demolición Enchape Muro Cocina y Baño, Pañete sobre mamposteria e=1,5 cm, Alistado de piso en mortero 1:4
USMINIA		
MV_21184	AMALIA MERCHAN SOSA	**Se realiza visita Técnica-Social Realizando Entrega Oficial de la vivienda**
MV_21368	ALEJANDRO PAVA	**Se realiza visita Técnica-Social Realizando Entrega Oficial de la vivienda**
MV_21240	ALFONSO GUERRERO	**Se realiza visita Técnica-Social Realizando Entrega Oficial de la vivienda**
MV_21212	ERNESTINA CAICEDO	**Se realiza visita Técnica-Social Realizando Entrega Oficial de la vivienda**

5. PLAN DE ACCIÓN RESULTADO DEL ANÁLISIS DE CAUSAS REGISTRADO EN EL NUMERAL ANTERIOR - CON EL OBJETIVO DE ELIMINAR LA CAUSA RAÍZ DE LA SITUACIÓN PROBLEMÁTICA - PLAN DE MEJORA

ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA

6. ACTIVIDADES NO PREVISTAS Y MAYORES CANTIDADES

Se a determinado en conjunto con el Contratista cada una de las actividades priorizando areas terminadas y viabiliazando areas Primarias

7. COMENTARIOS DEL INTERVENTOR: Por favor realice la descripción general del estado del contrato y según aplique informe sobre: actividades realizadas en la semana, control de lluvias, compra y suministro de materiales, mano de obra, subcontratos y tramites ante las diferentes empresas prestadoras de servicios, entre otros. Anexe las actas de seguimiento realizadas en la semana correspondiente al periodo del informe.

Barrio o Territorio: JUAN PABLO II

En cada validación ejecutada en la semana es de vital importancia determinar condiciones de vulnerabilidad como hacinamiento, ausencia de servicios públicos, problemas de salud asociados a carencias en saneamiento básico, carencias de pisos, cubiertas, deficiencias constructivas, entre otras que permitan justificar y fijar una línea base del problema a abordar a través del proyecto de Mejoramiento de Vivienda

8. REGISTRO FOTOGRAFICO DEL AVANCE DURANTE LA SEMANA


REGISTRO FOTOGRAFICO




FECHA	domingo, 7 de marzo de 2021
DESCRIPCION	



FECHA	domingo, 7 de marzo de 2021
DESCRIPCION	

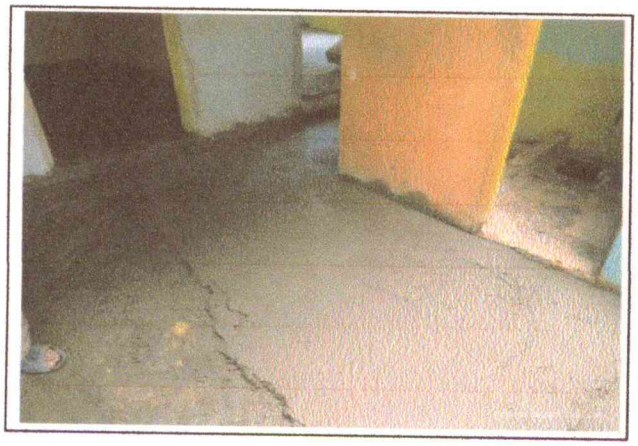

FECHA	domingo, 7 de marzo de 2021
DESCRIPCION	

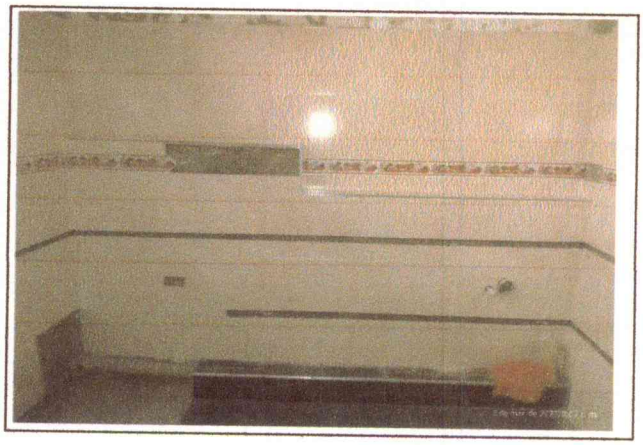

FECHA	domingo, 7 de marzo de 2021
DESCRIPCION	



FECHA	domingo, 7 de marzo de 2021
DESCRIPCION	



FECHA	domingo, 7 de marzo de 2021
DESCRIPCION	

Subsecretaria de Coordinación Operativa
Subdirección de Barrios
Seguimiento ejecución proyectos de Mejoramiento de Vivienda - Habitabilidad

Proyecto mejoramiento de vivienda - AVANCE EJECUCIÓN SEMANAL

Fecha: **7-mar-21**

Consorcio Mejoramiento EP 2020

Contrato de obra	694-2020	Plazo	Cinco (5) meses
Objeto	Contratar la ejecución de las obras de mejoramiento de vivienda en la modalidad de habitabilidad de los proyectos estructurados en los territorios priorizados por la Secretaría Distrital de Hábitat. Grupo I	Acta de inicio	4 de noviembre de 2020
CDP No.	No. 914 del 14 de julio de 2020 — CRP No.	Valor del contrato	TRES MIL SETECIENTOS VEINTICUATRO MILLONES CIENTO TREINTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS DIEZ Y NUEVE PESOS ($3.724.135.319) M/Cte

Gonzalo Liévano Hoyos -INPLAYCO S.A.S.

Contrato de interventoría	701-2020	Plazo	Seis (6) meses
Objeto	Realizar la interventorías técnica, jurídica, social, administrativa y financiera, para la ejecución de las obras de mejoramiento de vivienda en la modalidad de habitabilidad en los territorios priorizados por la secretaría distrital de hábitat.	Acta de inicio	04 de noviembre 2020
CDP No	No. 892 del 14 de julio de 2020 — CRP No.	Valor del contrato	OCHOCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS M/CTE ($894.285.952),

Fase 1: Validación de la información entregada por el la SDHT							Fase 2: Ejecución de obras				
					Validación		Ejecución				
Territorio o barrio a intervenir	Ciudad Bolivar	Barrios	Predios	Total Predios	Validada	V/Modificada	En Ejecución	Terminadas	Por Ejecutar	% de Avance	Acta de Entrega a Satisfacción
Arq. o Ing. Responsable	Ing. Humberto Blanco González	MIRADOR (NUTIVARA)	15	50	15	0	15	7	8	3,67%	7
Técnico Responsable		NUEVA COLOMBIA	16		16	0	16	16	0	6,08%	16
		VILLAS EL DIAMANTE	6		6	0	6	0	6	0,42%	0
		ARBORIZADORA ALTA	3		3		3	0	3	0,13%	0
		SANTA VIVIANA	2		2	0	2	0	2	0,00%	0
		VILLA ALEMANA II SECTOR	3		3		3	3	0	1,19%	3
		ANTONIO JOSE DE SUCRE III	1		1	0	1	1	0	0,36%	1
		SAN LUIS	2		2	0	2	1	1	0,25%	1
		ACACIAS SUR	1		1	0	1	1	0	0,40%	1
		ANTONIO JOSE DE SUCRE I	1		1	0	1	0	1	0,00%	0
Subtotal			50	50	50	0	50	29	21	12,50%	29

AVANCE DE EJECUCIÓN SEMANAL — MARZO

Proyecto Ciudad Bolivar				FASE I		Tiempo Programación			Acumulado semanas anteriores	SEMANA DEL 1 AL 7	SEMANA DEL 8 AL 14	SEMANA DEL 15 AL 21	ACUMULADO TOTAL
No.	ID_DMV	Dirección	Nombres y apellidos	V/ Validada	Vinicial	Fecha inicio	Fecha terminada	F. inicio		18 semana	19 semana	20 semana	
MIRADOR (NUTIVARA)													
1	MVCB_1873	CL 70L BIS SUR 18N 14	BLANCA FABIOLA LANDAZURI MESA	SI / NO	$11.828.247,60	20/01/2021	5/03/2021	20/01/2021	70,58%	29,42%			100,00%
2	MVCB_1886	KR 18N 70K 31 SUR	LUZ MARIA ARIZA ARIZA	SI / NO	$11.168.015,60	18/01/2021	15/02/2021	18/01/2021	100,00%	0,00%			100,00%
3	MVCB_1836	KR 18N 70K 09 SUR	DELIA MARÍA MATEUS ESCAMILLA	SI / NO	$11.789.726,10	18/01/2021	22/02/2021	18/01/2021	100,00%	0,00%			100,00%
4	MVCB_1829	CL 70K SUR 18N 46	DIANA PATRICIA PÁEZ FINO	SI / NO	$11.105.245,60	18/01/2021	15/02/2021	18/01/2021	100,00%	0,00%			100,00%
5	MVCB_1884	CL 70I SUR 18N 66	MIRYAM MANRIQUE URUEÑA	SI / NO	$11.749.188,70	20/01/2021	15/02/2021	20/01/2021	100,00%	0,00%			100,00%
6	MVCB_1802	CL 70 H SUR 18 N 51	BEATRIZ ADIELA MARTINEZ JARAMILLO	SI / NO	$10.114.021,80	16/02/2021	3/03/2021	16/02/2021	78,56%	21,44%			100,00%
7	MVCB_1681	CL 70 I SUR 18 N 36 MI	ALVARO EUECER VERDUGO RODRIGUEZ	SI / NO	$10.278.758,80	19/02/2021	EN EJECUCION	19/02/2021	33,26%	12,98%			46,24%
8	MVCB_1838	KR 18R 70H 09 SUR	MAURICIO ENRIQUE MUÑOZ RIAÑO	SI / NO	$9.580.888,90	19/02/2021	EN EJECUCION	19/02/2021	21,51%	26,03%			47,54%
9	MVCB_1864	KR 18P 70G 08 SUR	MARINA CLEMENCIA RAMOS	SI / NO	$9.223.968,20	19/02/2021	EN EJECUCION	19/02/2021	8,20%	29,67%			37,87%
10	MVCB_1748	KR 18P 70I 04 SUR	OLGA LUZ BETANCOURT LEON	SI / NO	$11.750.274,10	15/02/2021	EN EJECUCION	15/02/2021	17,13%	12,00%			29,13%
11	MVCB_1704	KR 18R 70H 08 SUR	ALBA LUCIA VALENCIA OCAMPO	SI / NO	$11.612.063,20	19/02/2021	EN EJECUCION	19/02/2021	5,00%	10,44%			15,44%
12	MVCB_1631	CL 70G SUR 18R 15	ELOISA LAVERDE RIOS	SI / NO	$11.276.851,40	19/02/2021	EN EJECUCION	19/02/2021	13,89%	9,24%			23,13%
13	MVCB_1592	CL 70F SUR 18N 28	HOBER FABIAN BARRERA GUTIERREZ	SI / NO	$11.822.174,20	19/02/2021	EN EJECUCION	19/02/2021	15,45%	40,46%			55,91%
14	MVCB_1908	CL 70N SUR 18N 28	JESUS MARIA COBA QUIROGA	SI / NO	$11.728.052,70	21/01/2021	22/02/2021	21/01/2021	100,00%	0,00%			100,00%
15	MVCB_1733	KR 18P 70I 11 SUR	YINETH CUENCA ROA	SI / NO	$11.806.669,10	16/02/2021	EN EJECUCION	16/02/2021	0,00%	15,00%			15,00%

NUEVA COLOMBIA														
16	MVCB_1130	DG 69F SUR 18J 18	CARMEN JULIA SUAREZ PARADA	SI / NO	$10.614.314,40	26/11/2020	22/12/2020	26/11/2020	100,00%	0,00%			100,00%
17	MVCB_1180	DG 69F SUR 18J 16	BLANCA TERESA CALVO DE GARZON	SI / NO	$10.640.712,30	26/11/2020	22/12/2020	24/11/2020	100,00%	0,00%			100,00%
18	MVCB_1191	DG 69F SUR 18J 11	ALBERTO ULLOA ULLOA	SI / NO	$7.917.003,90	27/11/2020	23/12/2020	27/11/2020	100,00%	0,00%			100,00%
19	MVCB_1161	DG 69F SUR 18J 03	MARIA ROSA ELENA BECERRA SEGURA	SI / NO	$11.682.398,70	30/11/2020	23/12/2020	30/11/2020	100,00%	0,00%			100,00%
20	MVCB_1212	DG 69G SUR 18J 43	HERNAN LOPEZ	SI / NO	$11.067.851,50	2/12/2020	22/12/2020	2/12/2020	100,00%	0,00%			100,00%
21	MVCB_1194	DG 69H SUR 18J 20	VICTOR HUGO WILCHES BERNAL	SI / NO	$11.564.858,10	25/11/2020	30/12/2020	25/11/2020	100,00%	0,00%			100,00%
22	MVCB_1467	CL 70H SUR 18I 70	TERESA DE JESUS OLIVOS DE BLANCO	SI / NO	$11.839.029,10	2/12/2020	16/01/2021	2/12/2020	100,00%	0,00%			100,00%
23	MVCB_1499	CL 70H SUR 18I 82	JORGE SANCHEZ FORERO	SI / NO	$11.784.999,40	26/11/2020	28/12/2020	26/11/2020	100,00%	0,00%			100,00%
24	MVCB_1470	KR 18L 70G 24 SUR	ANA SILVIA CHACON	SI / NO	$11.826.113,50	25/11/2020	30/12/2020	25/11/2020	100,00%	0,00%			100,00%
25	MVCB_1495	KR 18L 70H 10 SUR	YACQUELINE RADA MOJICA	SI / NO	$11.791.135,80	25/11/2020	22/12/2020	25/11/2020	100,00%	0,00%			100,00%
26	MVCB_1493	CL 70I SUR 18J 86	MARIA ELENA ALCIRA GARZON CASALLAS	SI / NO	$11.275.773,60	30/11/2020	30/12/2020	30/11/2020	100,00%	0,00%			100,00%
27	MVCB_1516	KR 18L 70I 10 SUR	BERTHA CECILIA MOJICA RUIZ	SI / NO	$11.580.951,80	25/11/2020	30/12/2020	25/11/2020	100,00%	0,00%			100,00%
28	MVCB_1417	CL 70I SUR 18L 30	DIANA MARCELA PARRA BALLESTEROS	SI / NO	$11.661.580,80	30/11/2020	23/12/2020	30/11/2020	100,00%	0,00%			100,00%
29	MVCB_1418	CL 7N SUR 18L 22	ANA CENETH TORRES ROJAS	SI / NO	$11.567.790,90	27/11/2020	30/12/2020	27/11/2020	100,00%	0,00%			100,00%
30	MVCB_1407	CL 70I SUR 18L 33	MARIA ELSA TORRES	SI / NO	$11.478.383,90	28/11/2020	28/12/2020	28/11/2020	100,00%	0,00%			100,00%
31	MVCB_1409	CL 70I SUR 18L 21	FRAN EDILBERTO CRUZ CANO Y OTRA	SI / NO	$11.460.816,00	27/11/2020	30/12/2020	27/11/2020	100,00%	0,00%			100,00%
VILLAS EL DIAMANTE														
32	MVCB_5118	TV 18P BIS 69N 17 SUR	CARLOS ALFREDO CLAVIJO ROZO	SI / NO	$11.761.810,50	22/02/2021	EN EJECUCION	22/02/2021	0,00%	0,00%			0,00%
33	MVCB_5464	KR 19D BIS 70C 25 SUR (KR 19B 70C 25 SUR)	IRMA ROJAS ROJAS	SI / NO	$11.428.943,80	23/02/2021	EN EJECUCION	23/02/2021	0,00%	56,50%			56,50%
34	MVCB_5491	KR 19F 70C 43 SUR Mi	LEONILDE BATRAGO MORENO	SI / NO	$9.461.874,70	22/02/2021	EN EJECUCION	22/02/2021	0,00%	0,00%			0,00%
35	MVCB_5292	DG 69Q BIS SUR 18N 69	MARIA DE LA CRUZ TRUJILLO AVILES	SI / NO	$11.808.805,30	23/02/2021	EN EJECUCION	23/02/2021	0,00%	25,97%			25,97%
36	MVCB_5349	DG 69K SUR 18N 23	JHON JAIRO MELO MARTIN	SI / NO	$11.623.149,20	23/02/2021	EN EJECUCION	23/02/2021	0,00%	5,40%			5,40%
37	MVCB_5012	TV 18R 69I 16 SUR Mi	MARGARITA FORERO ARTEAGA	SI / NO	$11.788.384,70	23/02/2021	EN EJECUCION	23/02/2021	0,00%	19,83%			19,83%
ARBORIZADORA ALTA														
38	MV_14829	CL 75C SUR 34 51	HILDA MIRYAM NIÑO	SI / NO	$9.523.231,70	24/02/2021	EN EJECUCION	24/02/2021	0,00%	25,74%			25,74%
39	MV_08564	KR 37A 75 55 SUR	ELSY CARDENAS MONROY	SI / NO	$11.264.578,20	24/02/2021	EN EJECUCION	24/02/2021	0,00%	12,75%			12,75%
40	MV_09494	TV 35C 72F 31 SUR	GLADYS CASALLAS SUAREZ	SI / NO	$11.299.979,80	24/02/2021	EN EJECUCION	24/02/2021	0,00%	0,00%			0,00%
SANTA VIVIANA														
41	MV_14485	KR 74O 75C 43 SUR Mi	PLINIO SANABRIA SANDOVAL	SI / NO	$11.786.465,00	24/02/2021	EN EJECUCION	24/02/2021	0,00%	0,00%			0,00%
42	MV_09083	CL 75C BIS 76 89 SUR	RUTH GORDONS CASTAÑEDA	SI / NO	$11.800.204,20	24/02/2021	EN EJECUCION	24/02/2021	0,00%	0,00%			0,00%
VILLA ALEMANA II SECTOR - USMINIA														
43	MVUS_9838	CL 115 SUR 3 86	EDWIN ARLEY QUINAMBAYO QUINTERO	SI / NO	$11.710.217,10	23/01/2021	4/02/2021	21/01/2021	100,00%	0,00%			100,00%
44	MVUS_9882	CL 113A SUR 4 25	JOSE DEL CARMEN SANCHEZ PAEZ	SI / NO	$11.795.145,40	23/01/2021	2/03/2021	21/01/2021	82,06%	17,94%			100,00%
45	MVUS_9797	KR 4 115 21 SUR	LUZ MERY YARA MATOMA	SI / NO	$11.808.556,50	23/01/2021	20/02/2021	21/01/2021	100,00%	0,00%			100,00%
ANTONIO JOSE DE SUCRE III - USMINIA														
46	MV_21283	KR 7 115 16 SUR	TERESA DE JESUS OSORIO ORTIZ	SI / NO	$10.513.778,60	23/01/2021	TERMINADA	21/01/2021	96,10%	3,90%			100,00%
SAN LUIS - SECTOR JALISCO														
47	MVJA_2905	DG 64 SUR 19 11	AURORA MARGARITA ROJAS VELASQUEZ	SI / NO	$11.790.169,70	6/03/2021	EN EJECUCION	6/03/2021	0,00%	0,00%			0,00%
48	MVJA_3778	KR 19 64A 23 SUR	LUIS STELLA FONSECA OSORIO	SI / NO	$7.494.628,70	4/02/2021	25/02/2021	4/02/2021	100,00%	0,00%			100,00%
ACACIAS SUR - SECTOR JALISCO														
49	MVJA_0675	CL 62B SUR 19 38	JENNY XIMENA CAMELO VELASCO	SI / NO	$11.755.416,30	4/02/2021	5/03/2021	4/02/2021	63,58%	36,42%			100,00%
ANTONIO JOSE DE SUCRE I SECTOR - USMINIA														
50	MV_19084	CL 106 SUR 2B 79 ESTE	OCTAVIANO NIÑO ECHEVERRI	SI / NO	$11.830.188,00	EN FASE DE VALIDACION	EN FASE DE VALIDACION	EN FASE DE VALIDACION	0,00%	0,00%			0,00%

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DEL HÁBITAT

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

PROYECTOS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA

INPLAYCO S.A.S.

FECHA		PERIODO No.	17	DEL	1/03/2021	AL	7/03/2021

1. INFORMACIÓN GENERAL

OBJETO DEL CONTRATO	Realizar la interventorías técnica, jurídica, social, administrativa y financiera, para la ejecución de las obras de mejoramiento de vivienda en la modalidad de habitabilidad en los territorios priorizados por la secretaría distrital de hábitat.
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO	Corresponde al Grupo 1 a la ejecución de 254 mejoramientos de vivienda, localizados en 3 localidades: Bosa, Usme y Ciudad Bolívar, esta última localidad incluye cuatro (4) intervenciones de Mejoramientointegral.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA		CONTRATO DE OBRA	
CONTRATO No.:	701-2020	CONTRATO No.:	694--2020
PLAZO INICIAL:	6 meses	PLAZO INICIAL:	5 meses
FECHA DE INICIACIÓN:	4 de noviembre de 2020	FECHA DE INICIACIÓN:	4 de noviembre de 2020
**FECHA DE SUSPENSIÓN:	0	**FECHA DE SUSPENSIÓN:	0
**FECHA DE REINICIACIÓN:	0	**FECHA DE REINICIACIÓN:	0
FECHA DE TERMINACIÓN:	3 de mayo de 2021	FECHA DE TERMINACIÓN:	3 de abril 2021
PLAZO ACTUALIZADO:	0	PLAZO ACTUALIZADO:	0
PLAZO TRANSCURRIDO:	0	PLAZO TRANSCURRIDO:	0
VALOR INICIAL :	$ 894.285.952	VALOR INICIAL :	$ 3.724.135.319
VALOR ADICION(ES):	0	VALOR ADICION(ES):	$ -
VALOR ACTUALIZADO:	$ -	VALOR ACTUALIZADO:	$ -
VALOR ANTICIPO:	0	VALOR ANTICIPO:	$ -
VALOR POR PAGAR:	$ -	VALOR POR PAGAR:	$ -
SUPERVISOR:	JUAN CARLOS ARBELAEZ MURILLO	INTERVENTOR:	Gonzalo Libyano Hoyos -INPLAYCO S.A.S.

** Inserte las filas que requiera según el número de suspensiones y reinicios.

2. CONTROL DE HITOS

No.	*** DESCRIPCIÓN DEL HITO	FECHA PROGRAMADA	FECHA REAL DE CUMPLIMIENTO	DÍAS DE RETRASO
	SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO (HITO OBLIGATORIO)	4/11/2020	3/04/2021	
1	Validación			
2	Entrega de informe de validación			
3	Ejecución			
	ENTREGA A LA INTERVENTORIA DE LOS PRODUCTOS Y/O ACTIVIDADES CONTRATADAS (HITO OBLIGATORIO)			

***** Inserte las filas que requiera según el número de hitos; teniendo en cuenta que como mínimo se deberán establecer 5 hitos adicionales a los obligatorios de inicio y terminación. Los hitos aprobados por la interventoría se socializarán con el supervisor del contrato para su Vo. Bo. Los Hitos aprobados por la interventoría y SDHT solo se podrán modificar previa novedad contractual que así lo requiera. La matriz de seguimiento hace parte del presente documento.**


No.	INDICADORES BARRIO O TERRITORIO	VALORES	PORCENTAJE SOBRE EL VALOR TOTAL DEL CONTRATO	DIFERENCIA (+) ADELANTO (-) ATRASO
1	Valor acumulado de las actividades o productos conforme a la programación vigente.	$537.080.208,42	14,42%	
2	Valor acumulado de las actividades o productos ejecutados y aprobados por la Interventoría.	$465.678.983,94	12,50%	

3. ASPECTOS GENERALES INFORME TÉCNICO

Registre los avances y novedades técnicas, sociales, administrativas, contables y financieras, acompañadas por gráficos, cuadros, fotografías, análisis y comentarios sobre el estado de los trabajos, en todos sus aspectos en la fase de validación y ejecución de obra.

Fase de validación y apropiación.

Ciudad Bolívar

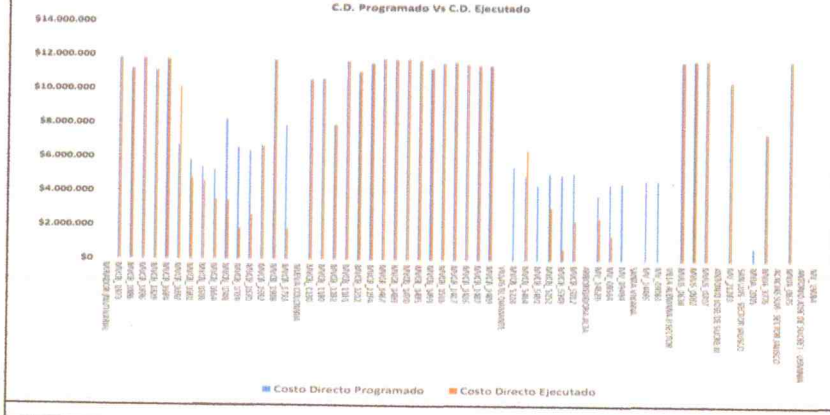



4- COMPONENTE TECNICO BARRIO O TERRITORIO

ACTIVIDADES EJECUTADAS EN LA SEMANA. - ESTADO DE AVANCE SEMANAL POR VIVIENDA

BARRIO O TERRITORIO: CIUDAD BOLIVAR - MIRADOR (NUTIVARA)

1	MVCB_1873	BLANCA FABIOLA LANDAZURI MESA	Se hizo visita de seguimiento técnico por parte de interventoría, con el fin de efectuar inspección y control al avance y calidad de las actividades proyectadas, evidenciando lo siguiente: Se fundió poyo de cocina, se terminó la instalación de cielo raso en sala comedor, alcoba de fachada principal, cocina, baño, pasillo y zona de lavandería; se aplicó la pintura vínilica sobre los muros de las áreas proyectadas. Se terminó la instalación de cerámica de piso en las áreas faltantes de baño, cocina, pasillo y lavandería. Se instaló cerámica piso en alcoba y sala comedor. Quedaron terminadas las obras proyectadas en las vivienda, por la cual se protocolizan los documentos haciendo **entrega de obras al beneficiario.** Se efectuó registro fotográfico del estado final de la obras proyectadas.
2	MVCB_1866	LUZ MARIA ARIZA ARIZA	VIVIENDA TERMINADA, ENTREGADA
3	MVCB_1836	DELIA MARÍA MATEUS ESCAMILLA	VIVIENDA TERMINADA, ENTREGADA
4	MVCB_1829	DIANA PATRICIA PÁEZ PINO	VIVIENDA TERMINADA, ENTREGADA
5	MVCB_1684	MIRYAM MANRIQUE URUEÑA	VIVIENDA TERMINADA, ENTREGADA
6	MVCB_1692	BEATRIZ ADIELA MARTINEZ JARAMILLO	Se hizo visita de seguimiento técnico por parte de interventoría, con el fin de efectuar inspección y control al avance y calidad de las actividades proyectadas, evidenciando lo siguiente: Se instaló la tablilla pvc para cielo raso en comedor, pasillo, alcoba principal, cocina y baño. A nivel de segundo piso se instaló cielo rasa en alcoba 2. Quedaron terminadas las obras proyectadas en las vivienda, por la cual se protocolizan los documentos haciendo **entrega de obras al beneficiario.** Se efectuó registro fotográfico del estado final de la obras proyectadas.
7	MVCB_1681	ALVARO ELIECER VERDUGO RODRIGUEZ	Se hizo visita de **seguimiento** técnica por parte de interventoría, con el fin de efectuar inspección y control al avance y calidad de las actividades proyectadas, evidenciando lo siguiente: Se terminó la instalación de enchape en pared y mesón de cocina. Se aplicó estuco sobre muros de sala comedor. En el área de lavandería del 3er. piso quedaron terminados los pañetes proyectados y se avanzó en el enchape de muros en un 95%. Se efectuó registro fotográfico del avance de obra.
8	MVCB_1638	MAURICIO ENRIQUE MUÑOZ RIAÑO	Se hizo visita de **seguimiento** técnica por parte de interventoría, con el fin de efectuar inspección y control al avance y calidad de las actividades proyectadas, evidenciando lo siguiente: Se terminó el enchape de pared y mesón de cocina, se montó el lavaplatas y grifería. Se instaló la estructura para cielo rasa en áreas de sala comedor y alcoba 2. Se efectuó registro fotográfico del avance de obra.
9	MVCB_1684	MARINA CLEMENCIA RAMOS	Se hizo visita de **seguimiento** técnica por parte de interventoría, con el fin de efectuar inspección y control al avance y calidad de las actividades proyectadas, evidenciando lo siguiente: En la zona de lavandería se terminó el levante de mampostería en bloque de arcilla y se pañeta quedándo pendiente su afinado. En la zona de cocina se avanzó en el enchape de mesones y pared. En el baño se terminó el enchape de muros y piso. Se efectuó registro fotográfico del avance de obra.
10	MVCB_1748	OLGA LUZ BETANCOURT LEON	Se hizo visita de **seguimiento** técnica por parte de interventoría, con el fin de efectuar inspección y control al avance y calidad de las actividades proyectadas, evidenciando lo siguiente: Se instaló cerámica de piso y guarda escoba en el área de sala comedor. En el baño se demolió el enchape antiguo de pared y se inicia el desmonte del marco existente. Se efectuó registro fotográfico del avance de obra.
11	MVCB_1784	ALBA LUCIA VALENCIA OCAMPO	Se hizo visita de **seguimiento** técnica por parte de interventoría, con el fin de efectuar inspección y control al avance y calidad de las actividades proyectadas, evidenciando lo siguiente: Se fundieron los dos mesones de la cocina y se avanzo en la instalación de cerámica de piso en áreas de alcoba 1 y sala comedor. Se efectuó registro fotográfico del avance de obra.
12	MVCB_1631	ELOISA LAVERDE RIOS	Se hizo visita de **seguimiento** técnica por parte de interventoría, con el fin de efectuar inspección y control al avance y calidad de las actividades proyectadas, evidenciando lo siguiente: Continuó la ejecución y afinado de pañetes de los muros de cocina, sala comedor, baño, cocina, zona de jardín y escalera. Se alistó piso en el área de cocina. Se efectuó registro fotográfico del avance de obra.
13	MVCB_1592	HOBER FABIAN BARRERA GUTIERREZ	Se hizo visita de **seguimiento** técnica por parte de interventoría, con el fin de efectuar inspección y control al avance y calidad de las actividades proyectadas, evidenciando lo siguiente: En el área de baño se terminó el enchape de paredes y piso, se ejecutó el bordillo de la ducha. En el área de cocina quedaron instalados los enchapes de paredes, mesones, poyo y piso. Quedó instalado el enchape de piso en un 80% en el área de la sala comedor. Se terminó el alistado de piso del patio y se inicia el enchape en esta zona. Se efectuó registro fotográfico del avance de obra.
14	MVCB_1998	JESUS MARIA COBA QUIROGA	VIVIENDA TERMINADA, ENTREGADA
15	MVCB_1733	YINETH CUENCA ROA	Se dio inicio a la ejecución de actividades en esta vivienda, avanzando en el pañete de muros de sala, patio y baño. Se hizo registro fotográfico del avance de actividades.
		BARRIO O TERRITORIO: CIUDAD BOLIVAR - BARRIO NUEVA COLOMBIA	
16	MVCB_1130	CARMEN JULIA SUAREZ FARIDA	VIVIENDA TERMINADA, ENTREGADA
17	MVCB_1160	BLANCA TERESA CALVO DE GARZON	VIVIENDA TERMINADA, ENTREGADA
18	MVCB_1181	ALBERTO ULLOA VILLOA	VIVIENDA TERMINADA, ENTREGADA
19	MVCB_1161	MARIA ROSA ELENA BECERRA SEGURA	VIVIENDA TERMINADA, ENTREGADA
20	MVCB_1212	HERNAN LOPEZ	VIVIENDA TERMINADA, ENTREGADA
21	MVCB_1194	VICTOR HUGO WILCHES BERNA	VIVIENDA TERMINADA, ENTREGADA
22	MVCB_1467	TERESA DE JESUS OLIVOS DE BLANCO	VIVIENDA TERMINADA, ENTREGADA
23	MVCB_1469	JORGE SANCHEZ FORERO	VIVIENDA TERMINADA, ENTREGADA
24	MVCB_1470	ANA SILVIA CHACON	VIVIENDA TERMINADA, ENTREGADA
25	MVCB_1495	YACQUELINE RADA MOJICA	VIVIENDA TERMINADA, ENTREGADA
26	MVCB_1493	MARIA ELENA ALCIRA GARZON CASALLAS	VIVIENDA TERMINADA, ENTREGADA

27	MVCB_1516	BERTHA CECILIA MOJICA RUIZ	VIVIENDA TERMINADA. ENTREGADA
28	MVCB_1417	DIANA MARCELA PARRA BALLESTEROS	VIVIENDA TERMINADA. ENTREGADA
29	MVCB_1416	ANA CENETH TORRES ROJAS	VIVIENDA TERMINADA. ENTREGADA
30	MVCB_1407	MARIA ELSA TORRES	VIVIENDA TERMINADA. ENTREGADA
31	MVCB_1409	FRAN EDILBERTO CRUZ CANO Y OTRA	VIVIENDA TERMINADA. ENTREGADA
		BARRIO O TERRITORIO: CIUDAD BOLIVAR - BARRIO VILLAS EL DIAMANTE	
32	MVCB_5118	CARLOS ALFREDO CLAVIJO ROZO	El 22 de febrero de 2021. se realizó el protocolo de **apertura** de actividades en la vivienda. Después de catorce días de aperturada la vivienda. a la fecha **no se ha dado inicio a actividades.**
33	MVCB_5464	IRMA ROJAS ROJAS	Se hizo visita de **seguimiento** técnico por parte de interventoría. con el fin de efectuar inspección y control al avance y calidad de las actividades proyectadas. evidenciando lo siguiente: Se ejecutaron alistados de piso. Se instaló cerámica de piso en áreas de alcobas 1. 2. 3. 4. comedor. y sala . quedando por enchapar en esta última área 2 m2. Se instaló guarda escoba en alcobas 3 y 4. En la zona de cocina se enchaparon los mesones y muros con una avance del 80% aproximadamente. Se avanzó con instalación de estructura para cielo raso en áreas de las alcobas. sala. cocina y baño. Se terminó enchape de pared de baño.
34	MVCB_5491	LEONILDE BUITRAGO MORENO	El 22 de febrero de 2021. se realizó el protocolo de **apertura** de actividades en la vivienda. Después de catorce días de aperturada la vivienda. a la fecha **no se ha dado inicio a actividades.**
35	MVCB_5252	MARIA DE LA CRUZ TRUJILLO AVILES	Se hizo visita de **seguimiento** técnico por parte de interventoría. con el fin de efectuar inspección y control al avance y calidad de las actividades proyectadas. evidenciando lo siguiente: En el área de baño se demolió el enchape antiguo del piso. se alistó y se instaló la nueva cerámica. Se pañetaron los muros en la zona del lavadero. En la zona del patio se demolió enchape de pared y se avanza en instalación de nueva cerámica sobre muros. En área de cocina se demolió enchape de mesón. Se enchapó piso de la alcoba 3 y se avanza en enchape de piso de la alcoba 2.
36	MVCB_5349	JHON JAIRO MELO MARTIN	Se hizo visita de **seguimiento** técnico por parte de interventoría. con el fin de efectuar inspección y control al avance y calidad de las actividades proyectadas. evidenciando lo siguiente: Se avanzó en pañete de muros de alcobas 1 y 2. Falta afinar pañetes.
37	MVCB_5012	MARGARITA FORERO ARTEAGA	Se hizo visita de **seguimiento** técnico por parte de interventoría. con el fin de efectuar inspección y control al avance y calidad de las actividades proyectadas. evidenciando lo siguiente: Se enchapó el piso y se instaló guarda escoba en las alcobas 1 y 2. Se demolió baldosa de piso antigua en sala y alcoba 3.
		BARRIO O TERRITORIO: CIUDAD BOLIVAR - BARRIO ARBORIZADORA ALTA	
38	MV_14629	HILDA MIRYAM NIÑO	Se hizo visita de **seguimiento** técnico por parte de interventoría. con el fin de efectuar inspección y control al avance y calidad de las actividades proyectadas. evidenciando lo siguiente: En la alcoba del segundo piso se pañetaron los muros. se alistó y enchapó el piso. Se aplicó vinilo sobre muros. Se avanza en pañete de muros del área sobre escalera.
39	MV_08564	ELSY CARDENAS MONROY	Se hizo visita de **seguimiento** técnico por parte de interventoría. con el fin de efectuar inspección y control al avance y calidad de las actividades proyectadas. evidenciando lo siguiente: En el 4° piso. se alistó el área de cocina. lavandería y hall de alcobas: se pañetaron los muros de lavandería y hall de alcobas. En el segundo piso se aplicó vinilo en sala. hall. cocina y baño.
40	MV_09494	GLADYS CASALLAS SUAREZ	El 24 de febrero de 2021. se realizó el protocolo de **apertura** de actividades en la vivienda. A la fecha **no se ha dado inicio a actividades.**
		BARRIO O TERRITORIO: CIUDAD BOLIVAR - BARRIO SANTA VIVIANA	
41	MV_14485	PLINIO SANABRIA SANDOVAL	El 24 de febrero de 2021. se realizó el protocolo de **apertura** de actividades en la vivienda. A la fecha **no se ha dado inicio a actividades.**
42	MV_09083	RUTH GORDONS CASTAÑEDA	El 24 de febrero de 2021. se realizó el protocolo de **apertura** de actividades en la vivienda. A la fecha **no se ha dado inicio a actividades.**
		BARRIO O TERRITORIO: USMINIA - BARRIO VILLA ALEMANA II SECTOR	
43	MVUS_0638	EDWIN ARLEY QUINMBAYO QUINTERO	VIVIENDA TERMINADA. ENTREGADA
44	MVUS_0682	JOSE DEL CARMEN SANCHEZ PAEZ	Se **terminaron** las actividades proyectadas en esta vivienda y se protocolizan los documentos haciendo **entrega de obras** al beneficiario. Se efectuó registro fotográfico del estado final de la obras proyectadas.
45	MVUS_0707	LUZ MERY YARA MATOMA	VIVIENDA TERMINADA. ENTREGADA
		BARRIO O TERRITORIO: USMINIA - BARRIO ANTONIO JOSE DE SUCRE III	
46	MV_21283	TERESA DE JESUS OSORIO ORTIZ	Se **terminaron** las actividades proyectadas en la vivienda. se programa entrega para la próxima semana. Se efectuó registro fotográfico del estado final de la obras proyectadas.
		BARRIO O TERRITORIO: CIUDAD BOLIVAR - SAN LUIS - SECTOR JALISCO	
47	MVJA_2005	AURORA MARGARITA ROJAS VELASQUEZ	El 6 de marzo de 2021 se realizó el protocolo de **apertura** de actividades en la vivienda. Se hicieron presentes el personal técnico y social de interventoría y contratista. Los residentes técnicos de interventoría y contratista explican al beneficiario las actividades a ejecutar de acuerdo con los presupuestos aprobados. Se abren las bitácoras con anotación y firma de personal técnico. social y beneficiario. No se han iniciado actividades.
48	MVJA_3776	LUS STELLA FONSECA OSORIO	VIVIENDA TERMINADA. ENTREGADA
		BARRIO O TERRITORIO: CIUDAD BOLIVAR - ACACIAS SUR - SECTOR JALISCO	

49	MVJA_0675	JENNY XIMENA CAMELO VELASCO	Se **terminaron** las actividades proyectadas en esta vivienda y se protocolizan los documentos haciendo **entrega de obras** al beneficiario. Se efectuó registro fotográfico del estado final de la obras proyectadas.

BARRIO O TERRITORIO: USMINIA - BARRIO ANTONIO JOSÉ DE SUCRE I

50	MV_19084	OCTAVIANO NIÑO ECHEVERRI	El día 5 de marzo de 2021, personal tanto técnico como social de la interventoría y del contratista, realizó visita a la vivienda con el fin de **validar** y/o priorizar las actividades de mejoramiento a ejecutar en dicha inmueble. Se efectuaron mediciones de las diferentes áreas a priorizar y se dejó registro fotográfico del estado inicial de las posibles áreas a intervenir. Se elaborará el presupuesto de acuerdo con las actividades priorizados.

5. PLAN DE ACCIÓN RESULTADO DEL ANÁLISIS DE CAUSAS REGISTRADO EN EL NUMERAL ANTERIOR - CON EL OBJETIVO DE ELIMINAR LA CAUSA RAIZ DE LA SITUACIÓN PROBLEMÁTICA - PLAN DE MEJORA

ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA
En conjunto con el contratista y la interventoría se elaborarán los respectivos presupuestos iniciales de obra de las vivienda que se validen. Se harán visitas de seguimiento a las viviendas aperturadas, para inspeccionar y efectuar el control y seguimiento al avance y calidad de las obras proyectadas.	Residentes de interventoría y de contratista	14/03/2021

6. ACTIVIDADES NO PREVISTAS Y MAYORES CANTIDADES

Se ajustarán, en caso de ser necesario, los ítems y cantidades de obra de las diferentes actividades que se desarrollan en las viviendas, velando porque se invierta el presupuesto proyectado.

7. COMENTARIOS DEL INTERVENTOR: Por favor realice la descripción general del estado del contrato y según aplique informe sobre: actividades realizadas en la semana, control de lluvias, compra y suministro de materiales, mano de obra, subcontratos y tramites ante las diferentes empresas prestadoras de servicios, entre otros. Anexe las actas de seguimiento realizadas en la semana correspondiente al periodo del informe.

Barrio o Territorio: Ciudad Bolívar y Usminia

Se avanza en las actividades proyectadas. Continúa el acopio de materiales para alistado y pañete (arena y cemento), baldosas para enchape de piso y pared, tablillas de pvc para cielo raso.

A la fecha del informe se han validado un total de 50 viviendas, de las cuales se han entregado siete (7) en el barrio Mirador (Nuttivara) y se encuentran en ejecución ocho (8) más. En el barrio Nueva Colombia se han entregado dieciséis (16) viviendas. En el barrio Villas El Diamante se están ejecutando seis (6) viviendas. En Arborizadora Alta hay tres (3) casas en ejecución y dos (2) en Santa Viviana. En el barrio Villa Alemana II sector, localidad de Usminia, se entregaron las tres (3) casas. Se terminó una (1) casa en el barrio Antonio José de Sucre III, de la localidad de Usminia. En el barrio San Luis se aperturaron dos (2) casas, ya se entregó una (1) vivienda y queda una (1) en ejecución. En el barrio Acacias Sur, sector Jalisco, se entregó una (1) vivienda. Esta semana se validó una (1) vivienda en el barrio Antonio José de Sucre I, sector de Usminia.


Durante la semana se presentó cielo nublado y hubo lluvias.

8. REGISTRO FOTOGRAFICO DEL AVANCE DURANTE LA SEMANA

REGISTRO FOTOGRÁFICO




FECHA	viernes, 5 de marzo de 2021
DESCRIPCION MVCB 1873	
Entrega de vivienda, vista final de la cocina	

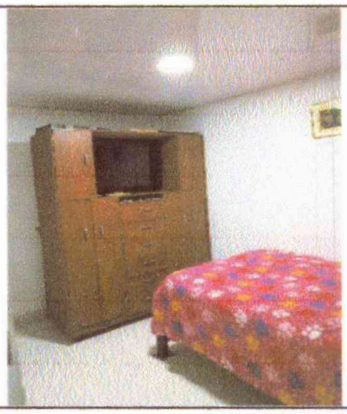


FECHA	miércoles, 3 de marzo de 2021
DESCRIPCION MVCB 1692	
Entrega de vivienda, vista final de la alcoba principal	



FECHA	jueves, 4 de marzo de 2021
DESCRIPCION MVCB 1681	
Avance de obras en área social	

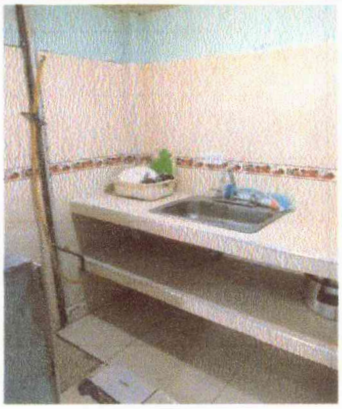

FECHA	miércoles, 3 de marzo de 2021
DESCRIPCION MVCB 1638	
Avance de obras en área de la cocina	

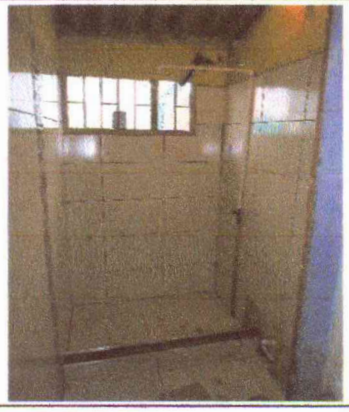


FECHA	jueves, 4 de marzo de 2021
DESCRIPCION MVCB 1664	
Avance de obras en área del baño	




FECHA	jueves, 4 de marzo de 2021
DESCRIPCION MVCB 1748	
Avance de obras en sala comedor, enchape de piso	


REGISTRO FOTOGRÁFICO

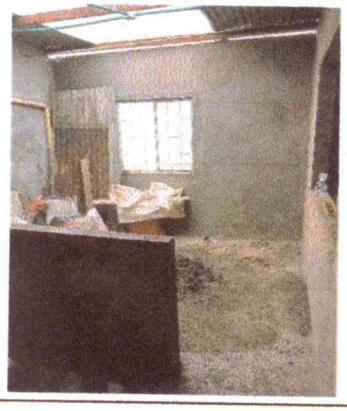


FECHA	miércoles, 3 de marzo de 2021
DESCRIPCION MVCB 1631	
Avance de obra en zona de jardín, pañete de muros	

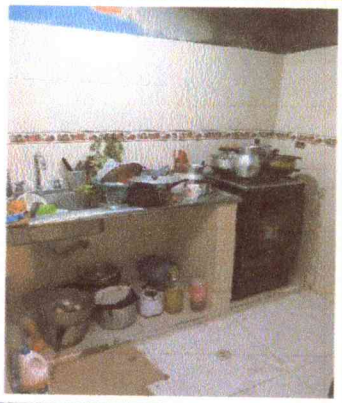

FECHA	jueves, 4 de marzo de 2021
DESCRIPCION MVCB 1592	
Avance de obras en cocina, enchapes de mesón, pared y piso	

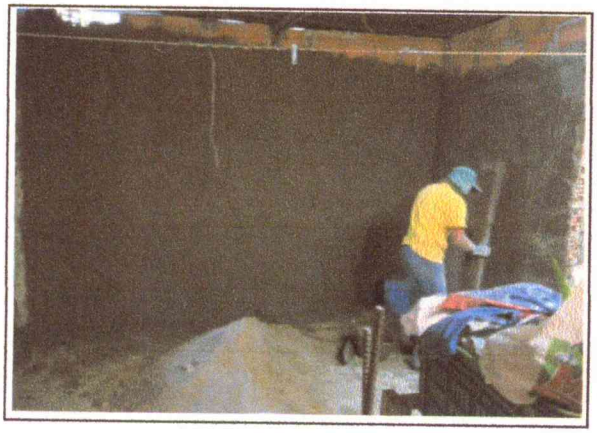

FECHA	jueves, 4 de marzo de 2021
DESCRIPCION MVCB 1733	
Avance de obras en área de sala comedor, pañete de muros	

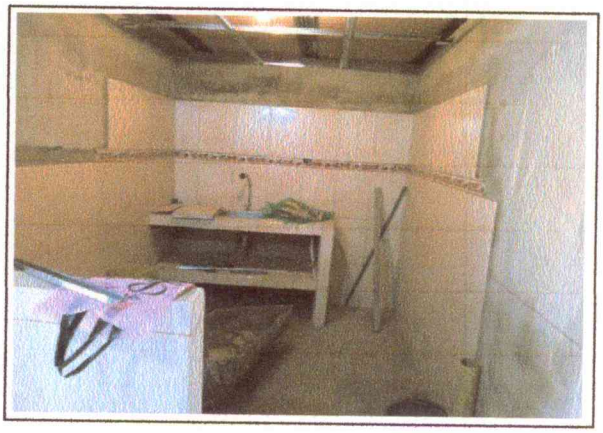

FECHA	sábado, 6 de marzo de 2021
DESCRIPCION MVCB 5464	
Avance de obras en área de cocina, enchape de mesones y pared, estructura de cielo raso	



FECHA	sábado, 6 de marzo de 2021
DESCRIPCION MVCB_5252	
Avance de obra en área de lavandería, enchape de pared	



FECHA	viernes, 5 de marzo de 2021
DESCRIPCION MVJA_0675	
Entrega de vivienda, vista final del baño	

Subsecretaria de Coordinacion Operativa

Subdireccion de Barrios

Seguimiento ejecución proyectos de Mejoramiento de Vivienda - Habitabilidad

Proyecto mejoramiento de vivienda - AVANCE EJECUCIÓN SEMANAL

Fecha	7-mar-21

Consorcio mejoramiento EP 2020 - Contratista de obra

Contratato de obra	694-2020			Plazo	Cinco (5) meses
Objeto	Contratar la ejecución de las obras de mejoramiento de vivienda en la modalidad de habitabilidad de los proyectos estructurados en los territorios priorizados por la Secretaria Distrital de Habitat. Grupo I			Acta de inicio	4 de noviembre de 2020
CDP No.	No. 914 del 14 de julio de 2020	CRP No.		Valor del contrato	TRES MIL SETECIENTOS VEINTICUATRO MILLONES CIENTO TREINTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS DIEZ Y NUEVE PESOS ($3.724.135.319) M/Cte

Gonzalo Lievano Hoyos -INPLAYCO S.A.S.

Contratato de interventoria	701-2020			Plazo	Seis (6) meses
Objeto	Realizar la interventorias técnica, jurídica, social, administrativa y financiera, para la ejecución de las obras de mejoramiento de vivienda en la modalidad de habitabilidad en los territorios priorizados por la secretaría distrital de hábitat.			Acta de inicio	04 de noviembre 2020
CDP No	No. 892 del 14 de julio de 2020	CRP No.		Valor del contrato	OCHOCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS M/CTE ($894.285.952),

Fase 1: Validación de la información entregada por el la SDHT									Fase 2: Ejecución de obras				
					Validación				Ejecución				
Territorio o barrio a intervenir	CIUDAD BOLIVAR	Barrios	Predios	Total Predios	Validada	V/Por Validar	Renuncia	V/Modificada	En Ejecución	Terminadas	Por Ejecutar	% de Avance	Acta de Entrega a Satisfacción
Arq o Ing. Responsable		ALTOS DE JALISCO	18		18	0		0	3	13	2	5,196%	13
		MIRADOR NUTIVARA	4		4	0	1	0	3	0	0	0,973%	0
		ROCIO ALTOS DEL SUR	4		4	0		0	0	4	0	1,456%	4
		LA ESCALA	1		1	0		0	0	1	0	0,399%	1
		ACACIAS SUR	3		3	0		0	3	0	0	0,663%	0
		BARRIO GIBRALTAR I Y I	4		4	0		0	3	1	0	0,728%	1
		LA ESCALA 3ER SECTOR	1		1	0		0	1	0	0	0,300%	0
		CIUDAD MILAGRO	1		1	0		0	0	1	0	0,307%	1
		VILLAS DEL DIAMANTE	3		3	0		0	3	0	0	0,132%	0
Técnico Responsable	CRISTIAN VELASCO	ARBORIZADORA ALTA	1	50	1	0		0	1	0	0	0,000%	0
		JERUSALEN	1		1	0		0	1	0	0	0,000%	0
		EL MIRADOR	1		1	0		0	1	0	0	0,080%	0
		VILLA ISRAEL	1		1	0		0	0	1	0	0,398%	1
		VILLA ANITA SUR	1		1	0		0	0	1	0	0,400%	1
		EL ESPINO	1		1	0		0	0	1	0	0,394%	1
		EL VIRREY	1		1	0		0	0	1	0	0,389%	1
		SAN LUIS	1		1	0		0	1	0	0	0,259%	0
		LAS DELICIAS DEL SUR	2		2	0		0	2	0	0	0,040%	0
		DOMINGO LAIN III SECTO	1		1	0		0	1	0	0	0,133%	0
Subtotal			50	50	50	0	1	0	23	24	2	12,25%	24

50

AVANCE DE EJECUCIÓN SEMANAL

Proyecto				FASE I			Tiempo Programacion			MARZO				
No.	ID_DMV	Dirección	Nombres y apellidos	V/ Validada	V/ Modificada	V/Inicial	Fecha inicio	Fecha terminada	F. Inicio	Acumulado semanas anteriores	SEMANA DEL 1 AL 7	SEMANA DEL 8 AL 14	SEMANA DEL 15 AL 21	ACUMULADO TOTAL
											18 semana	19 semana	20 semana	
		ALTOS DE JALISCO												
1	MVJA_2992	KR 18N BIS 61C 21 SUR	ISAURA AREVALO MALAGON	SI		$11.478.755	27/11/2020	ENTREGADA	27/11/2020	100%	0%	0%	0%	100%
2	MVJA_3141	KR 18P 62 A 30 SUR MJ	GLORIA CRISTINA GUTIERREZ GARZON	SI		$11.433.514	26/11/2020	ENTREGADA	26/11/2020	100%	0%	0%	0%	100%
3	MVJA_3146	KR 18P 62A 45 SUR MJ	CLARA INES GIL BAEZ	SI		$11.428.313	26/11/2020	ENTREGADA	26/11/2020	100%	0%	0%	0%	100%
4	MVJA_3335	KR 18P BIS B 62A 48 SUR MJ	MYRIAM PATRICIA SARMIENTO APONTE	SI		$11.177.053	26/11/2020	ENTREGADA	26/11/2020	100%	0%	0%	0%	100%
5	MVJA_3314	KR 18P BIS B 61D 36 SUR	MARIA OLMA MOLANO ROMERO	SI		$11.814.493	26/11/2020	ENTREGADA	26/11/2020	100%	0%	0%	0%	100%
6	MVJA_3239	KR 18P BIS A 61C 22 SUR MJ	NATIVIDAD SILDANA CELYS VIUDA DE GARCIA	SI		$11.459.853	10/02/2021	EN EJECUCIÓN	10/02/2021	0%	0%	0%	0%	0%
7	MVJA_0259	CL 70H SUR 18L 16	ALBA CARMEN ARDILA MATEUS	SI		$11.264.898	24/11/2020	ENTREGADA	24/11/2020	100%	0%	0%	0%	100%
8	MVJA_3223	KR 18P BIS A 61A 55 SUR	MYRIAM AMPARO GÓMEZ DE GALVIS	SI		$11.811.986	27/11/2020	ENTREGADA	27/11/2020	100%	0%	0%	0%	100%
9	MVJA_3231	KR 18P BIS A 61B 12 SUR MJ	SOFIA MORENO	SI		$11.630.690	24/11/2020	ENTREGADA	24/11/2020	100%	0%	0%	0%	100%
10	MVJA_3119	KR 18P 61A 67 SUR MJ	LUZ YANID PADUA	SI		$7.121.160	24/11/2020	ENTREGADA	24/11/2020	100%	0%	0%	0%	100%

11	MVJA_3125	KR 18P 61 A 76 SUR MJ	MARIA AURORA RENGIFO	SI		$9.222.769	24/11/2020	ENTREGADA	24/11/2020	100%	0%	0%	0%	100%
12	MVJA_9252	CL 61D SUR 18N 30 MJ	JESUS ANTONIO ORTIZ CASTRO	NO SI		$11.693.259	16/12/2020	ENTREGADA	16/12/2020	100%	0%	0%	0%	100%
13	MVJA_2996	KR 18N BIS 61D 18 SUR	MARIA DEL SOCORRO CUPITRA CACAIS	SI		$11.787.984	24/11/2020	ENTREGADA	24/11/2020	100%	0%	0%	0%	100%
14	MVJA_2712	KR 18M 62 29 SUR	JOSE ALIRIO ORTIZ CABRERA Y OTRA	SI		$11.813.746	9/02/2021	EN EJECUCIÓN	9/02/2021	20%	67%	0%	0%	87%
15	MVJA_2797	KR 18M 62 12 SUR	ANA LUISA BERNAL PULIDO	SI	$11.830.120	$6.092.091	6/03/2021	6/04/2021	6/03/2021	0%	0%	0%	0%	0%
16	MVJA_2640	KR 18L BIS A 61D 47 SUR	PAOLA ANDREA BARRERA PELAEZ	SI NO		$11.440.930	9/02/2021	ENTREGADA	9/02/2021	40%	60%	0%	0%	100%
17	MVJA_2371	KR 18K 61B 02 SUR	ANA EDELMIRA ATARA ESPITIA	SI NO		$11.418.392	10/02/2021	EN EJECUCIÓN	10/02/2021	0%	0%	0%	0%	0%
18	MVJA_2976	KR 18N BIS 61A 53 SUR	BLANCA LEONOR RIOS CHAPARRO	SI NO		$11.821.739	10/02/2021	EN EJECUCIÓN	10/02/2021	0%	0%	0%	0%	0%
		MIRADOR NUTIVARA												
19	MVCB_1774	CL 70J SUR 18N 23	JOSE WILSON MARULANDA GIRALDO	SI	$11.830.130	$11.815.916	15/02/2021	EN EJECUCIÓN	15/02/2021	15%	50%	0%	0%	65%
20	MVCB_1742	CL 70J SUR 18N 34	ANA ELVIA MENDOZA DE HERNANDEZ	SI	$11.830.113	$11.779.533	15/02/2021	EN EJECUCIÓN	15/02/2021	20%	70%	0%	0%	90%
21	MVCB_1691	CL 70 I SUR 18 N 42	GINNA PAOLA MAHECHA FORERO	SI	$11.830.104	$10.086.819	15/02/2021	EN EJECUCIÓN	15/02/2021	20%	68%	0%	0%	88%
22	MVCB_1745	KR 18P 70I 22 SUR	ROSA GERTUDRIS MARTINEZ LIZARAZO	SI		$11.819.661	RENUNCIA	RENUNCIA	RENUNCIA	0%	0%	0%	0%	0%
		ROCIO ALTOS DEL SUR												
23	MVJA_2981	DG 69A BIS D SUR 18M 06	LEONOR TOVAR BARRERO	SI NO		$11.825.816	27/11/2020	ENTREGADA	27/11/2020	100%	0%	0%	0%	100%
24	MVJA_2812	KR 18M BIS 61C 29 SUR	ANDREA JENNIFFER ACOSTA MENDIVELSO	SI NO		$10.471.857	27/11/2020	ENTREGADA	27/11/2020	100%	0%	0%	0%	100%
25	MVJA_2909	KR 18N 61C 27 SUR	BLANCA CECILIA ALFONSO BOHORQUEZ	SI NO		$11.742.586	27/11/2020	ENTREGADA	27/11/2020	100%	0%	0%	0%	100%
26	MVJA_9196	CL 61C SUR 18N 03	ISABEL ARDILA VARGAS	SI NO		$8.994.273	27/11/2020	ENTREGADA	27/11/2020	100%	0%	0%	0%	100%
		LA ESCALA												
27	MVJA_2672	KR 18M 61 15 SUR MJ	CARLOS OLIMPO SEGURA GUERRERO	SI NO		$11.793.878	26/11/2020	ENTREGADA	26/11/2020	100%	0%	0%	0%	100%
		ACACIAS SUR												
28	MVJA_9598	CL 62A SUR 18R 15	RODULFO BEJARANO	SI NO		$11.813.894	8/02/2021	EN EJECUCIÓN	8/02/2021	25%	0%	0%	0%	25%
29	MVJA_9868	CL 62A SUR 18T 10	MARIA LUDINA VARGAS AGUIRRE	SI NO		$11.762.856	9/02/2021	EN EJECUCIÓN	9/02/2021	35%	30%	0%	0%	65%
30	MVJA_1018	CL 63D SUR 19 25	MARIA LEONOR APONTE VIUDA DE LOPEZ	SI NO		$11.823.531	9/02/2021	EN EJECUCIÓN	9/02/2021	46%	30%	0%	0%	76%
		BARRIO GIBRALTAR I Y II												
31	MVJA_9834	CL 63A SUR 18Q 05	CLARA INES OCHOA GUTIERREZ	SI NO	$11.830.215	$9.526.817	27/02/2021	EN EJECUCIÓN	27/02/2021	0%	0%	0%	0%	0%
32	MVJA_3011	KR 18N BIS 63 27 SUR	RITA DEL CARMEN FONSECA CAMARGO	SI NO		$11.511.935	5/02/2021	ENTREGADA	5/02/2021	80%	20%	0%	0%	100%
33	MVJA_3157	KR 18P 63 16 SUR	IRIA ESTHER SILVA	SI NO		$11.683.822	5/02/2021	EN EJECUCIÓN	5/02/2021	30%	0%	0%	0%	30%
34	MVJA_3397	KR 18Q 63D 10 SUR	LUZ MARINA ROBAYO ALVARADO	SI NO		$11.795.938	5/02/2021	EN EJECUCIÓN	5/02/2021	30%	25%	0%	0%	55%
		LA ESCALA 3ER SECTOR												
35	MVJA_9562	CL 62A SUR 18J 20	ROSALBA JARA DE ROJAS	SI NO		$10.438.798	8/02/2021	EN EJECUCIÓN	8/02/2021	25%	60%	0%	0%	85%
		CIUDAD MILAGRO												
36	MVJA_9395	CL 62 SUR 18K 78	JOSE ORVEY ORTIZ	SI NO		$9.976.509	9/02/2021	ENTREGADA	9/02/2021	50%	50%	0%	0%	100%
		VILLAS DEL DIAMANTE												
37	MVCB_5474	CL 70F SUR 19F 18 MJ	OLIVIA RIVERA	SI NO	$11.830.160	$11.783.640	22/02/2021	EN EJECUCIÓN	22/02/2021	0%	25%	0%	0%	25%
38	MVCB_5355	CL 70B SUR 18R 29	MARÍA CRISTINA GONZALEZ GARCÍA	SI NO	$11.830.119	$10.807.904	22/02/2021	EN EJECUCIÓN	22/02/2021	0%	0%	0%	0%	0%
39	MVCB_5368	CL 70C SUR 18R 48	DUBERNEY ARIAS BETANCUR	SI NO	$11.830.167	$11.480.264	22/02/2021	EN EJECUCIÓN	22/02/2021	0%	8%	0%	0%	8%
		ARBORIZADORA ALTA												
40	MV_15742	KR 38 75 54 SUR	DONELIA PATIÑO MURILLO	SI NO	$11.830.125	$10.949.413	24/02/2021	EN EJECUCIÓN	24/02/2021	0%	0%	0%	0%	0%
		JERUSALEN												
41	MV_17151	KR 38 79A 38 SUR	GUSTAVO VILLAREAL BERMUDEZ	SI NO	$11.830.215	$11.825.431	26/02/2021	EN EJECUCIÓN	26/02/2021	0%	0%	0%	0%	0%
		EL MIRADOR												
42	MV_05324	CL 71C SUR 27B 15	ALDEMAR DUARTE LOPEZ	SI NO	$11.830.112	$11.259.469	25/02/2021	EN EJECUCIÓN	25/02/2021	0%	20%	0%	0%	20%
		VILLA ISRAEL												
43	MVJB_0038	KR 5A BIS 110 34 SUR	EMPERATRIZ RODRIGUEZ LOPEZ	SI NO		$11.770.694	20/01/2021	ENTREGADA	20/01/2021	100%	0%	0%	0%	100%
		VILLA ANITA SUR												
44	MV_21059	KR 8 115B 11 SUR	ALEXANDER BERNAL AVENDAÑO	SI NO		$11.824.901	20/01/2021	ENTREGADA	20/01/2021	35%	65%	0%	0%	100%
		EL ESPINO												
45	MVJB_0230	CL 115B SUR 3B 11	JORGE GABRIEL BUITRAGO INFANTE	SI NO		$11.632.663	20/01/2021	ENTREGADA	20/01/2021	100%	0%	0%	0%	100%
		EL VIRREY												
46	MV_20366	KR 4A 97 15 SUR	JUAN FRANCISCO MEDINA SALAZAR	SI NO		$11.510.651	23/01/2021	ENTREGADA	23/01/2021	100%	0%	0%	0%	100%
		SAN LUIS												
47	MVJA_1878	DG 64 BIS A SUR 18V 15	JOSE OMAR CAMACHO TELLEZ	SI NO		$11.780.872	4/02/2021	EN EJECUCIÓN	4/02/2021	25%	40%	0%	0%	65%
		LAS DELICIAS DEL SUR												
48	MVJA_3257	KR 18P BIS A 65 10 SUR MJ	NELLY PIZA BUITRAGO	SI NO	$11.830.045	$11.812.811	27/02/2021	EN EJECUCIÓN	27/02/2021	0%	10%	0%	0%	10%
49	MVJA_1377	CL 65 SUR 18N 41	CORNELIO ANTONIO MOLINA LEON	SI NO	$11.830.110	$11.637.121	27/02/2021	EN EJECUCIÓN	27/02/2021	0%	0%	0%	0%	0%
		DOMINGO LAIN III SECTOR												
50	MVJA_3105	KR 18N BIS A 64D 19 SUR MJ	BLANCA NELLY HERNÁNDEZ	SI NO		$11.258.757	9/02/2021	EN EJECUCIÓN	9/02/2021	10%	25%	0%	0%	35%

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DEL HÁBITAT

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

PROYECTOS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA

INPLAYCO S.A.S.
INGENIEROS CONSTRUCTORES E INTERVENTORES

FECHA	7/03/2021	PERIODO No.	18	DEL	1/03/2021	AL	7/03/2021

1. INFORMACIÓN GENERAL

OBJETO DEL CONTRATO	Realizar la interventorías técnica, jurídica, social, administrativa y financiera, para la ejecución de las obras de mejoramiento de vivienda en la modalidad de habitabilidad en los territorios priorizados por la secretaría distrital de hábitat.
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO	Corresponde al Grupo 1 a la ejecución de 254 mejoramientos de vivienda, localizados en 3 localidades: Bosa, Usme y Ciudad Bolívar, esta última localidad incluye cuatro (4) intervenciones de MejoramientoIntegral.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA		CONTRATO DE OBRA	
CONTRATO No.:	701-2020	CONTRATO No.:	694--2020
PLAZO INICIAL:	6 meses	PLAZO INICIAL:	5 meses
FECHA DE INICIACIÓN:	4 de noviembre de 2020	FECHA DE INICIACIÓN:	4 de noviembre de 2020
**FECHA DE SUSPENSIÓN:	0	**FECHA DE SUSPENSIÓN:	0
**FECHA DE REINICIACIÓN:	0	**FECHA DE REINICIACIÓN:	0
FECHA DE TERMINACIÓN:	3 de mayo de 2021	FECHA DE TERMINACIÓN:	3 de abril 2021
PLAZO ACTUALIZADO:	0	PLAZO ACTUALIZADO:	0
PLAZO TRANSCURRIDO:	0	PLAZO TRANSCURRIDO:	0
VALOR INICIAL :	$ 894.285.952	VALOR INICIAL :	$ 3.724.135.319
VALOR ADICION(ES):	0	VALOR ADICION(ES):	$ -
VALOR ACTUALIZADO:	$ -	VALOR ACTUALIZADO:	$ -
VALOR ANTICIPO:	0	VALOR ANTICIPO:	$ -
VALOR POR PAGAR:	$ -	VALOR POR PAGAR:	$ -
SUPERVISOR:	JUAN CARLOS ARBELAEZ MURILLO	INTERVENTOR:	Gonzalo Llevano Hoyos -INPLAYCO S.A.S.

** Inserte las filas que requiera según el número de suspensiones y reinicios.

2. CONTROL DE HITOS.

No.	*** DESCRIPCIÓN DEL HITO	FECHA PROGRAMADA	FECHA REAL DE CUMPLIMIENTO	DÍAS DE RETRASO
	SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO (HITO OBLIGATORIO)			
1	Validación			
2	Entrega de informe de validación			
3	Ejecución			
	ENTREGA A LA INTERVENTORIA DE LOS PRODUCTOS Y/O ACTIVIDADES CONTRATADAS (HITO OBLIGATORIO)			


***** Inserte las filas que requiera según el número de hitos; teniendo en cuenta que como mínimo se deberán establecer 5 hitos adicionales a los obligatorios de inicio y terminación. Los hitos aprobados por la interventoría se socializarán con el supervisor del contrato para su Vo. Bo. Los Hitos aprobados por la interventoría y SDHT solo se podrán modificar previa novedad contractual que así lo requiera. La matriz del seguimiento hace parte del presente documento.**

No.	INDICADORES BARRIO O TERRITORIO	VALORES	PORCENTAJE SOBRE EL VALOR TOTAL DEL CONTRATO	DIFERENCIA (+) ADELANTO (-) ATRASO
1	Valor acumulado de las actividades o productos conforme a la programación vigente.	$587.535.513,40	15,78%	
2	Valor acumulado de las actividades o productos ejecutados y aprobados por la Interventoría.	$456.104.029,89	12,25%	

3. ASPECTOS GENERALES INFORME TÉCNICO

Registre los avances y novedades técnicas, sociales, administrativas, contables y financieras, acompañadas por gráficos, cuadros, fotografías, análisis y comentarios sobre el estado de los trabajos, en todos sus aspectos en la fase de validación y ejecución de obra.

Fase de validación y apropiación.

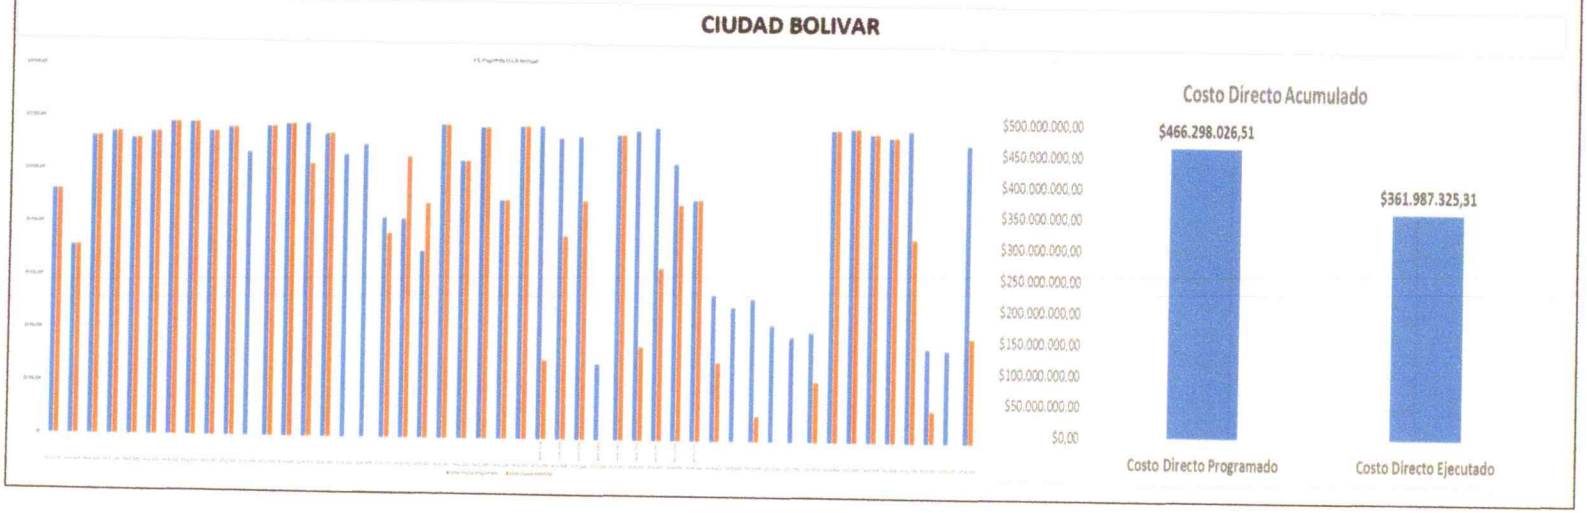

4- COMPONENTE TECNICO BARRIO O TERRITORIO			
ACTIVIDADES EJECUTADAS EN LA SEMANA. - ESTADO DE AVANCE SEMANAL POR VIVIENDA			
BARRIO O TERRITORIO - CIUDAD BOLIVAR			
FECHA: 014- FEB -2021			
ALTOS DE JALISCO			
1	MVJA_2992	ISAURA AREVALO MALAGON	SE REALIZA ENTREGA A CONFORMIDAD DE LA BENEFICIARIA, SE SOCIALIZA PRESUPUESTO FINAL Y MANUAL DE USO Y MANTENIMIENTO. DE IGUAL MANERA SE HACE ENTREGA DE KIT ECOLOGICO.
2	MVJA_3141	GLORIA CRISTINA GUTIERREZ GARZON	SE REALIZA ENTREGA A CONFORMIDAD DE LA BENEFICIARIA, SE SOCIALIZA PRESUPUESTO FINAL Y MANUAL DE USO Y MANTENIMIENTO. DE IGUAL MANERA SE HACE ENTREGA DE KIT ECOLOGICO.
3	MVJA_3146	CLARA INES GIL BAEZ	SE REALIZA ENTREGA A CONFORMIDAD DE LA BENEFICIARIA, SE SOCIALIZA PRESUPUESTO FINAL Y MANUAL DE USO Y MANTENIMIENTO. DE IGUAL MANERA SE HACE ENTREGA DE KIT ECOLOGICO.
4	MVJA_3335	MYRIAM PATRICIA SARMIENTO APONTE	SE REALIZA ENTREGA A CONFORMIDAD DE LA BENEFICIARIA, SE SOCIALIZA PRESUPUESTO FINAL Y MANUAL DE USO Y MANTENIMIENTO. DE IGUAL MANERA SE HACE ENTREGA DE KIT ECOLOGICO.
5	MVJA_3314	MARIA OLMA MOLANO ROMERO	SE REALIZA ENTREGA A CONFORMIDAD DE LA BENEFICIARIA, SE SOCIALIZA PRESUPUESTO FINAL Y MANUAL DE USO Y MANTENIMIENTO. DE IGUAL MANERA SE HACE ENTREGA DE KIT ECOLOGICO.
6	MVJA_3239	NATIVIDAD SILDANA CELYS VIUDA DE GARCIA	VISITA DE SEGUIMIENTO, NO SE ENCUENTRA LA PERSONA AUTORIZADA. NO SE EVIDENCIA SUMINISTRO DE MATERIALES NI PERSONAL DE OBRA.
7	MVJA_0259	ALBA CARMEN ARDILA MATEUS	SE REALIZA ENTREGA A CONFORMIDAD DE LA BENEFICIARIA, SE SOCIALIZA PRESUPUESTO FINAL Y MANUAL DE USO Y MANTENIMIENTO. DE IGUAL MANERA SE HACE ENTREGA DE KIT ECOLOGICO.
8	MVJA_3223	MYRIAM AMPARO GÓMEZ DE GALVIS	SE REALIZA ENTREGA A CONFORMIDAD DE LA BENEFICIARIA, SE SOCIALIZA PRESUPUESTO FINAL Y MANUAL DE USO Y MANTENIMIENTO. DE IGUAL MANERA SE HACE ENTREGA DE KIT ECOLOGICO.
9	MVJA_3231	SOFIA MORENO	SE REALIZA ENTREGA A CONFORMIDAD DE LA BENEFICIARIA, SE SOCIALIZA PRESUPUESTO FINAL Y MANUAL DE USO Y MANTENIMIENTO. DE IGUAL MANERA SE HACE ENTREGA DE KIT ECOLOGICO.
10	MVJA_3119	LUZ YANID PADUA	SE REALIZA ENTREGA A CONFORMIDAD DE LA BENEFICIARIA, SE SOCIALIZA PRESUPUESTO FINAL Y MANUAL DE USO Y MANTENIMIENTO. DE IGUAL MANERA SE HACE ENTREGA DE KIT ECOLOGICO.
11	MVJA_3125	MARIA AURORA RENGIFO	SE REALIZA ENTREGA A CONFORMIDAD DE LA BENEFICIARIA, SE SOCIALIZA PRESUPUESTO FINAL Y MANUAL DE USO Y MANTENIMIENTO. DE IGUAL MANERA SE HACE ENTREGA DE KIT ECOLOGICO.
12	MVJA_0252	JESUS ANTONIO ORTIZ CASTRO	SE REALIZA ENTREGA A CONFORMIDAD DE LA BENEFICIARIA, SE SOCIALIZA PRESUPUESTO FINAL Y MANUAL DE USO Y MANTENIMIENTO. DE IGUAL MANERA SE HACE ENTREGA DE KIT ECOLOGICO.
13	MVJA_2996	MARIA DEL SOCORRO CUPITRA CACAIS	SE REALIZA ENTREGA A CONFORMIDAD DE LA BENEFICIARIA, SE SOCIALIZA PRESUPUESTO FINAL Y MANUAL DE USO Y MANTENIMIENTO. DE IGUAL MANERA SE HACE ENTREGA DE KIT ECOLOGICO.
14	MVJA_2712	JOSE ALIRIO ORTIZ CABRERA Y OTRA	VISITA DE SEGUIMIENTO EN LA CUAL SE EVIDENCIA PERSONAL DE OBRA Y AVANCE EN ACTIVIDADES DE ENCHAPE DE PISO A NIVEL GENERAL Y ENCHAPE DE COCINA Y BAÑO FALTAN REMATES
15	MVJA_2707	ANA LUISA BERNAL PULIDO	SE REALIZA APERTURA. SE SOCIALIZA PRESUPUESTO Y SE PRESENTA AL PERSONAL DE OBRA
16	MVJA_2640	PAOLA ANDREA BARRERA PELAEZ	SE REALIZA ENTREGA A CONFORMIDAD DE LA BENEFICIARIA, SE SOCIALIZA PRESUPUESTO FINAL Y MANUAL DE USO Y MANTENIMIENTO. DE IGUAL MANERA SE HACE ENTREGA DE KIT ECOLOGICO.
17	MVJA_2371	ANA EDELMIRA ATARA ESPITIA	VISITA DE SEGUIMIENTO EN LA CUAL NO SE EVIDENCIA PERSONAL DE OBRA EL MV LLEVA 24 DIAS APERTURADO, A LA FECHA NO HAN PRESENTADO MAESTROS
18	MVJA_2976	BLANCA LEONOR RIOS CHAPARRO	VISITA DE SEGUIMIENTO EN LA CUAL NO SE EVIDENCIA SUMINISTRO DE MATERIALES NI PERSONAL DE OBRA. EL MV LLEVA 20 DESDE SU FECHA DE APERTURA. EL BENEFICIARIO INSTAURO UN PQR.
MIRADOR NUTIVARA			
19	MVCB_1774	JOSE WILSON MARULANDA GIRALDO	VISITA DE SEGUIMIENTO EN LA CUAL SE EVIDENCIA PERSONAL DE OBRA Y AVANCE EN ACTIVIDAES PROYECTADAS PARA LA FECHA
20	MVCB_1742	ANA ELVIA MENDOZA DE HERNANDEZ	VISITA DE SEGUIMIENTO EN LA CUAL SE EVIDENCIA PERSONAL DE OBRA Y AVANCE EN ACTIVIDAES PROYECTADAS PARA LA FECHA
21	MVCB_1691	GINNA PAOLA MAHECHA FORERO	VISITA DE SEGUIMIENTO EN LA CUAL SE EVIDENCIA PERSONAL DE OBRA Y AVANCE EN ACTIVIDAES PROYECTADAS PARA LA FECHA
22	MVCB_1745	ROSA GERTRUDIS MARTINEZ LIZARAZO	RENUNCIA
ROCIO ALTOS DEL SUR			
23	MVJA_2981	LEONOR TOVAR BARRERO	SE REALIZA ENTREGA A CONFORMIDAD DE LA BENEFICIARIA, SE SOCIALIZA PRESUPUESTO FINAL Y MANUAL DE USO Y MANTENIMIENTO. DE IGUAL MANERA SE HACE ENTREGA DE KIT ECOLOGICO.
24	MVJA_2812	ANDREA JENNIFFER ACOSTA MENDIVELSO	SE REALIZA ENTREGA A CONFORMIDAD DE LA BENEFICIARIA, SE SOCIALIZA PRESUPUESTO FINAL Y MANUAL DE USO Y MANTENIMIENTO. DE IGUAL MANERA SE HACE ENTREGA DE KIT ECOLOGICO.
25	MVJA_2909	BLANCA CECILIA ALFONSO BOHORQUEZ	SE REALIZA ENTREGA A CONFORMIDAD DE LA BENEFICIARIA, SE SOCIALIZA PRESUPUESTO FINAL Y MANUAL DE USO Y MANTENIMIENTO. DE IGUAL MANERA SE HACE ENTREGA DE KIT ECOLOGICO.
26	MVJA_0186	ISABEL ARDILA VARGAS	SE REALIZA ENTREGA A CONFORMIDAD DE LA BENEFICIARIA, SE SOCIALIZA PRESUPUESTO FINAL Y MANUAL DE USO Y MANTENIMIENTO. DE IGUAL MANERA SE HACE ENTREGA DE KIT ECOLOGICO.
LA ESCALA			
27	MVJA_2672	CARLOS OLIMPO SEGURA GUERRERO	SE REALIZA ENTREGA A CONFORMIDAD DE LA BENEFICIARIA, SE SOCIALIZA PRESUPUESTO FINAL Y MANUAL DE USO Y MANTENIMIENTO. DE IGUAL MANERA SE HACE ENTREGA DE KIT ECOLOGICO.
ACACIAS SUR			
28	MVJA_0598	RODULFO BEJARANO	VISITA DE SEGUIMIENTO EN LA CUAL NO SE EVIDENCIA PERSONAL DE OBRA NI AVANCE DE ACTIVIDADES PROYECTADAS PARA LA FECHA. EL ENCHAPE QUE SE ENCUENTRA INSTALADO NO CUENTA CON LAS CONDICIONES ADECUADAS. A LO CUAL SE SUGIERE SEA LEVANTADO DICHO ENCHAPE E INSTALADO BAJO LOS CRITERIOS CORRESPONDIENTES PARA EL MISMO
29	MVJA_0608	MARIA LUIDINA VARGAS AGUIRRE	VISITA DE SEGUIMIENTO EN LA CUAL SE EVIDENCIA PERSONAL DE OBRA Y AVANCE EN ATIVIDADES DE ENCHAPE DE MUROS EN COCINA, ESTUCO EN HALL, SALA Y COCINA
30	MVJA_1018	MARIA LEONOR APONTE VIUDA DE LOPEZ	VISITA DE SEGUIMIENTO EN LA CUAL SE EVIDENCIA PERSONAL DE OBRA Y AVANCE DE ACTIVIDADES PROYECTADAS PARA LA FECHA
BARRIO GIBRALTAR I Y II			

31	MVJA_0834	CLARA INES OCHOA GUTIERREZ	SE REALIZA APERTURA, SE SOCIALIZA PRESUPUESTO Y SE PRESENTA AL PERSONAL DE OBRA
32	MVJA_3011	RITA DEL CARMEN FONSECA CAMARGO	SE REALIZA ENTREGA A CONFORMIDAD DE LA BENEFICIARIA. SE SOCIALIZA PRESUPUESTO FINAL Y MANUAL DE USO Y MANTENIMIENTO. DE IGUAL MANERA SE HACE ENTREGA DE KIT ECOLOGICO.
33	MVJA_3157	IRIA ESTHER SILVA	VISITA DE SEGUIMIENTO EN LA CUAL NO SE EVIDENCIA PERSONAL DE OBRA NI MATERIALES, NO SE EVIDENCIA AVANCE EN ACTIVIDADES. EN 3 DIAS CUMPLE UN MES DE APERTURADA LA VIVIENDA
34	MVJA_3397	LUZ MARINA ROBAYO ALVARADO	VISITA DE SEGUIMIENTO EN LA CUAL SE EVIDENCIA PERSONAL DE OBRA Y AVANCE EN ACTIVIDAD DE ENCHAPE DE PISO
		LA ESCALA 3ER SECTOR	
35	MVJA_0502	ROSALBA JARA DE ROJAS	VISITA DE SEGUIMIENTO EN LA CUAL SE EVIDENCIA PERSONAL DE OBRA Y AVANCE EN ACTIVIDAD DE ENCHAPE DE PISO, ENCHAPE DE MUROS, PINTURA A 1 MANO Y CONSTRUCCION MESON COCINA
		CIUDAD MILAGRO	
36	MVJA_0395	JOSE ORVEY ORTIZ	SE REALIZA ENTREGA A CONFORMIDAD DE LA BENEFICIARIA. SE SOCIALIZA PRESUPUESTO FINAL Y MANUAL DE USO Y MANTENIMIENTO. DE IGUAL MANERA SE HACE ENTREGA DE KIT ECOLOGICO.
		VILLAS DEL DIAMANTE	
37	MVCB-5474	OLIVIA RIVERA	VISITA DE SEGUIMIENTO EN LA CUAL SE EVIDENCIA PERSONAL DE OBRA Y AVANCE EN ACTIVIDAES PROYECTADAS PARA LA FECHA, LOS TRABAJADORES MANIFIESTAN QUE ESTAN SIN MATERIALES DESDE HACE 2 DIAS.
38	MVCB-5395	MARÍA CRISTINA GONZALEZ GARCÍA	VISITA DE SEGUIMIENTO EN LA CUAL NO SE EVIDENCIAN MATERIALES NI PERSONAL DE OBRA . NO SE EVIDENCIA EL INICIO DE ACTIVIDADES
39	MVCB-5388	DUBERNEY ARIAS BETANCUR	VISITA DE SEGUIMIENTO EN LA CUAL SE EVIDENCIAN MATERIALES PERO NO PERSONAL DE OBRA. AVANCE EN ACTIVIDAD DE ALISTADO DE PISO Y DEMOLICION ENCHAPE DE PISO
		ARBORIZADORA ALTA	
40	MV-15742	DONELIA PATIÑO MURILLO	SE REALIZA APERTURA, SE SOCIALIZA PRESUPUESTO Y SE PRESENTA AL PERSONAL DE OBRA
		JERUSALEN	
41	MV-17151	GUSTAVO VILLAREAL BERMUDEZ	SE REALIZA APERTURA, SE SOCIALIZA PRESUPUESTO Y SE PRESENTA AL PERSONAL DE OBRA
		EL MIRADOR	
42	MV-05324	ALDEMAR DUARTE LOPEZ	VISITA DE SEGUIMIENTO EN LA CUAL SE EVIDENCIA PERSONAL DE OBRA, LOS CUALES MANIFIESTAN QUE NO CUENTAN CON LOS MATERIALES SUFICIENTES PARA AVANZAR EN LAS ACTIVIDADES PROYECTADAS
		VILLA ISRAEL	
43	MVUS_0036	EMPERATRIZ RODRIGUEZ LOPEZ	SE REALIZA VISITA DE SEGUINMIENTO TECNICO, EN LA CUAL SE EVIDENCIAN TRABAJADORES Y AVANCES EN EJECUCIÓN
		VILLA ANITA SUR	
44	MV_21059	ALEXANDER BERNAL AVENDAÑO	SE REALIZA VISITA DE SEGUINMIENTO TECNICO, EN LA CUAL SE EVIDENCIAN TRABAJADORES Y AVANCES EN EJECUCIÓN
		EL ESPINO	
45	MVUS_0230	JORGE GABRIEL BUITRAGO INFANTE	SE REALIZA VISITA DE SEGUINMIENTO TECNICO, EN LA CUAL SE EVIDENCIAN TRABAJADORES Y AVANCES EN EJECUCIÓN
		EL VIRREY	
46	MV_20306	JUAN FRANCISCO MEDINA SALAZAR	SE REALIZA VISITA DE SEGUINMIENTO TECNICO, EN LA CUAL SE EVIDENCIAN TRABAJADORES Y AVANCES EN EJECUCIÓN
		SAN LUIS	
47	MVJA_1876	JOSE OMAR CAMACHO TELLEZ	VISITA DE SEGUIMIENTO EN LA CUAL SE EVIDENCIA PERSONAL DE OBRA Y AVANCE EN ACTIVIDADES DE ENCHAPE DE PISO EN PATIO ROPAS Y HABITACIONES, ENCHAPE DE MURO EN BAÑO Y ESTUCO A NIVEL GENERAL
		LAS DELICIAS DEL SUR	
48	MVJA_3257	NELLY PIZA BUITRAGO	VISITA DE SEGUIMIENTO EN LA CUAL SE EVIDENCIAN MATERIALES Y PERSONAL DE OBRA, AVANCE EN ACTIVIDAD DE PAÑETE
49	MVJA_1377	CORNELIO ANTONIO MOLINA LEON	SE REALIZA VISITA DE VALIDACIÓN, SE TOMAN MEDIDAS PARA REALIZACION DE PRESUPUESTOS Y POSTERIORMENTE DEFINIR AREAS A INTERVENIR. DE IGUAL MANERA SE REALIZA APERTURA PARA DAR INICIO A LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS
		DOMINGO LAIN III SECTOR	
50	MVJA_3105	BLANCA NELLY HERNÁNDEZ	VISITA DE SEGUIMIENTO EN LA CUAL SE EVIDENCIA PERSONAL DE OBRA Y MATERIALES. AVANCE DE ACTIVIDADES PROYECTADAS PARA LA FECHA

5. PLAN DE ACCIÓN RESULTADO DEL ANÁLISIS DE CAUSAS REGISTRADO EN EL NUMERAL ANTERIOR - CON EL OBJETIVO DE ELIMINAR LA CAUSA RAÍZ DE LA SITUACIÓN PROBLEMÁTICA - PLAN DE MEJORA

ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA
A la fecha se han realizado 20 entregas a satisfacción, se realizan 9 aperturas y 1 validacion. Se presenta al personal que va estar a cargo de la ejecucón y se firman actas de inicio de obra.	CRISTIAN VELASCO	
Se le solicita al contratista hacer entrega oportuna de los materiales y que el personal a cargo de la ejecución cumpla con los horarios minimos establecidos de jornada laboral.		

6. ACTIVIDADES NO PREVISTAS Y MAYORES CANTIDADES

Se informa que en algunas de las viviendas se presentan mejoras en los acabados finales realizadas por los beneficiarios, por lo tanto se deside intervenir otros espacios en conjunto con el contratista garantizando una adecuada habitabilidad y dignificación de las viviendas

7. COMENTARIOS DEL INTERVENTOR: Por favor realice la descripción general del estado del contrato y según aplique informe sobre: actividades realizadas en la semana, control de lluvias, compra y suministro de materiales, mano de obra, subcontratos y tramites ante las diferentes empresas prestadoras de servicios, entre otros. Anexe las actas de seguimiento realizadas en la semana correspondiente al periodo del informe.

Barrio o Territorio: CIUDAD BOLIVAR

8. REGISTRO FOTOGRÁFICO DEL AVANCE DURANTE LA SEMANA

SE ADJUNTA REGISTRO FOTOGRAFICO


REGISTRO FOTOGRÁFICO



FECHA	miércoles, 3 de marzo de 2021
DESCRIPCION MVCB_1774	
SEGUIMIENTO	




FECHA	miércoles, 3 de marzo de 2021
DESCRIPCION MVCB_1774	
SEGUIMIENTO	

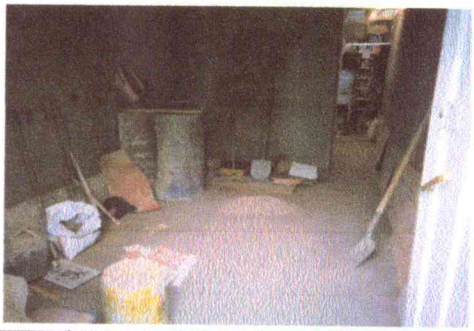

FECHA	miércoles, 3 de marzo de 2021
DESCRIPCION MVCB_1774	
SEGUIMIENTO	



FECHA	miércoles, 3 de marzo de 2021
DESCRIPCION MVCB_1742	
SEGUIMIENTO	

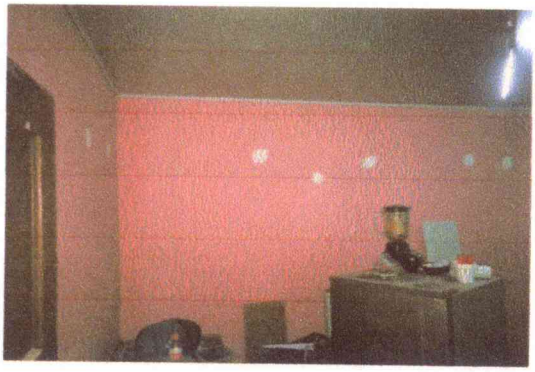

FECHA	lunes, 1 de febrero de 2021
DESCRIPCION MVCB_1742	
SEGUIMIENTO	



FECHA	lunes, 1 de febrero de 2021
DESCRIPCION MVCB_1742	
SEGUIMIENTO	

REGISTRO FOTOGRÁFICO



FECHA	martes, 2 de marzo de 2021
DESCRIPCION MVJA_3011	
ENTREGA	



FECHA	martes, 2 de marzo de 2021
DESCRIPCION MVJA_3011	
ENTREGA	



FECHA	martes, 2 de marzo de 2021
DESCRIPCION MVJA_3011	
ENTREGA	



FECHA	viernes, 5 de marzo de 2021
DESCRIPCION MVJA_2640	
ENTREGA	



FECHA	viernes, 5 de marzo de 2021
DESCRIPCION MVJA_2640	
ENTREGA	



FECHA	viernes, 5 de marzo de 2021
DESCRIPCION MVJA_2640	
ENTREGA	

Subsecretaria de Coordinacion Operativa
Subdireccion de Barrios
Seguimiento ejecución proyectos de Mejoramiento de Vivienda - Habitabilidad

Proyecto mejoramiento de vivienda - AVANCE EJECUCIÓN SEMANAL

Fecha: 7-mar-21

Consorcio mejoramiento EP 2020 - Contratista de obra

Contratato de obra	694-2020			Plazo	Cinco (5) meses
Objeto	Contratar la ejecución de las obras de mejoramiento de vivienda en la modalidad de habitabilidad de los proyectos estructurados en los territorios priorizados por la Secretaria Distrital de Habitat. Grupo I			Acta de inicio	4 de noviembre de 2020
CDP No.	No. 914 del 14 de julio de 2020	CRP No.		Valor del contrato	TRES MIL SETECIENTOS VEINTICUATRO MILLONES CIENTO TREINTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS DIEZ Y NUEVE PESOS ($3.724.135.319) M/Cte

Gonzalo Lievano Hoyos -INPLAYCO S.A.S.

Contratato de interventoría	701-2020			Plazo	Seis (6) meses
Objeto	Realizar la interventorias técnica, juridica, social, administrativa y financiera, para la ejecución de las obras de mejoramiento de vivienda en la modalidad de habitabilidad en los territorios priorizados por la secretaria distrital de hábitat.			Acta de inicio	04 de noviembre 2020
CDP No	No. 892 del 14 de julio de 2020	CRP No.		Valor del contrato	OCHOCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS M/CTE ($894.285.952),

Fase 1: Validación de la información entregada por el la SDHT

Territorio o barrio a intervenir	CIUDAD BOLIVAR - USME	Barrios	Predios	Total Predios	Validación				Fase 2: Ejecución de obras				
									Ejecución				
					Validada	V/Por Validar	Renuncia	V/Modificada	En Ejecución	Terminadas	Por Ejecutar	% de Avance	Acta de Entrega a Satisfacción
Arq o Ing. Responsable	ARQ. WILLIAM GARZON	LA ESCALA 3ER SECTOR	2	55	2	0		0	1	1	0	0,36%	1
		DOMINGO LAIN II	8		8	0		0	8	0	0	0,29%	0
		LUCERO MEDIO	5		5	0	1	0	4	0	0	0,56%	0
		SAN FERNANDO	2		2	0		0	2	0	0	0,25%	0
		SAN LUIS	2		2	0		0	0	1	1	0,32%	1
		ACACIAS SUR	2		2	0		0	1	1	0	0,67%	1
		DOMINGO LAIN I	8		8	0		0	4	4	0	1,52%	4
Técnico Responsable	ERICK ALVAREZ CADAVID	ALTOS DE JALISCO	10		10	0		0	1	9	0	3,51%	9
		LAS DELICIAS DEL SUR ZONA 19	1		1	0		0	1	0	0	0,00%	0
		CIUDAD MILAGRO	3		3	0		0	3	0	0	0,80%	0
		LA ESPERANZA	1		1	0		0	1	0	0	0,17%	0
		GIBRALTAR I Y II	6		6	0		0	4	2	0	1,28%	2
		LORENZO ALCANTUZ	1		1	0		0	0	1	0	0,40%	1
		ANTONIO JOSE DE SUCRE	4		4	0		0	0	4	0	1,56%	4
Subtotal			55	55	55	0	1	0	30	23	1	11,69%	23

AVANCE DE EJECUCIÓN SEMANAL

Proyecto				FASE I			Tiempo Programacion			FEBRERO	MARZO			
No.	ID_DMV	Dirección	Nombres y apellidos	V/ Validada	V/ Modificada	V/inicial	Fecha inicio	Fecha terminación MV	F. Inicio	Acumulado semanas anteriores	SEMANA DEL 1 AL 7	SEMANA DEL 8 AL 14	SEMANA DEL 15 AL 21	ACUMULADO TOTAL
											18 semana	19 semana	20 semana	
DOMINGO LAIN II SECTOR Y CONDOMINIO DEL BOSQUE														
1	MVJA_0723	CL 63 SUR 18K 14	VICTOR MANUEL SAMORA HERNANDEZ	SI / NO		$11.821.595	26/11/2020	EN EJECUCION	26/11/2020	0%	0%	0%	0%	0%
2	MVJA_1085	CL 64 BIS SUR 18N 42	MARIA NERY ECHEVERRY DE RESTREPO	SI / NO		$11.689.124	6/03/2021	EN EJECUCION	6/03/2021	0%	0%	0%	0%	0%
3	MVJA_2598	KR 18L BIS 64A 22 SUR	FLOR ANGELA MORANTES LOPEZ	SI / NO		$11.687.520	27/02/2021	EN EJECUCION	27/02/2021	0%	0%	0%	0%	0%
4	MVJA_2476	KR 18K BIS 64A 12 SUR	JAIME HUMBERTO BORDA LIBERATO	SI / NO		$11.622.585	6/03/2021	EN EJECUCION	6/03/2021	0%	0%	0%	0%	0%
5	MVJA_2763	KR 18M 64 21 SUR	CARLOS JESÚS BECERRA PEREZ	SI / NO		$11.795.728	6/03/2021	EN EJECUCION	6/03/2021	0%	0%	0%	0%	0%
6	MVJA_1194	CL 64B SUR 18N 81	MOISES RODRÍGUEZ BETANCOURT	SI / NO		$11.146.150	8/02/2021	EN EJECUCION	8/02/2021	37%	41%	0%	0%	78%
7	MVJA_1129	CL 64 SUR 18P 07	ANA BERTILDE GAMBOA VELANDIA	SI / NO		$11.758.393	6/03/2021	EN EJECUCION	6/03/2021	0%	0%	0%	0%	0%
8	MVJA_2479	KR 18K BIS 64A 20 SUR	CRISTOBAL VALBUENA	SI / NO		$10.217.769	6/03/2021	EN EJECUCION	6/03/2021	0%	0%	0%	0%	0%
DOMINGO LAIN I														
9	MVJA_0808	CL 63B SUR 18L 53	EFIGENIA GUIZA DE SANCHEZ	SI / NO		$11.770.978	24/11/2020	26/12/2020	24/11/2020	100%	0%	0%	0%	100%
10	MVJA_0809	CL 63B SUR 18L 61	DORIS AYDEE HERRERA OTALORA	SI / NO		$11.058.620	24/11/2020	26/12/2020	24/11/2020	100%	0%	0%	0%	100%
11	MVJA_0970	CL 63D SUR 18L 02	DORIS CUESTA DE RODRIGUEZ	SI / NO		$11.559.058	25/11/2020	26/12/2020	25/11/2020	100%	0%	0%	0%	100%
12	MVJA_2756	KR 18M 63D 08 SUR	ESTHER AROCA YARA	SI / NO		$10.416.988	10/02/2021	25/02/2021	10/02/2021	100%	0%	0%	0%	100%
13	MVJA_2469	KR 18K BIS 63D 19 SUR	CARMEN LIBIA GÓMEZ DE CASTAÑEDA	SI / NO		$10.422.672	6/03/2021	EN EJECUCION	6/03/2021	0%	0%	0%	0%	0%
14	MVJA_2342	KR 18J BIS 63D 25 SUR	MARIA DOLORES CASTILLO DE SANCHEZ	SI / NO		$11.369.770	6/03/2021	EN EJECUCION	6/03/2021	0%	0%	0%	0%	0%
15	MVJA_2343	KR 18J BIS 63D 26 SUR	ERNESTO VERGARA NIETO	SI / NO		$11.369.770	6/03/2021	EN EJECUCION	6/03/2021	0%	0%	0%	0%	0%
16	MVJA_1096	CL 64 SUR 18J 46	GONZALO OÑATE BONILLA	SI / NO		$10.119.768	6/03/2021	EN EJECUCION	6/03/2021	0%	0%	0%	0%	0%

ALTOS DE JALISCO														
17	MVJA_2741	KR 18M 62A 44 SUR	CARLOS ALBERTO MUÑETON FRANCO	SI / NO		$11.816.187	27/11/2020	EN EJECUCION	27/11/2020	0%	0%	0%	0%	0%
18	MVJA_2729	KR 18M 62A 07 SUR	JOSE IGNACIO TAO IBARRA	SI / NO		$11.801.634	25/11/2020	26/12/2020	25/11/2020	100%	0%	0%	0%	100%
19	MVJA_0544	CL 62A SUR 18M 09	MERCEDES RIAÑO PARRA	SI / NO		$11.820.308	24/11/2020	26/12/2020	24/11/2020	100%	0%	0%	0%	100%
20	MVJA_0567	CL 62A SUR 18M 41 IN 9	MARIA DEL ROSARIO RODRIGUEZ	SI / NO		$11.722.293	25/11/2020	26/12/2020	25/11/2020	100%	0%	0%	0%	100%
21	MVJA_3309	KR 18P BIS B 61D 25 SUR	TEOFILO MORALES TURGA Y OTRA	SI / NO		$11.799.687	24/11/2020	22/12/2020	24/11/2020	100%	0%	0%	0%	100%
22	MVJA_3366	KR 18Q 61C 34 SUR	EDILMA ALCIRA CASTILLO	SI / NO		$11.764.716	26/11/2020	22/12/2020	26/11/2020	100%	0%	0%	0%	100%
23	MVJA_4350	TV 18Q BIS C 63B 87 SUR	MARÍA BENDITA REDONDO CASTIBLANCO	SI / NO		$11.562.262	26/11/2020	22/12/2020	26/11/2020	100%	0%	0%	0%	100%
24	MVJA_2889	KR 18L BIS A 62A 39 SUR	MANUEL EDUARDO RODRIGUEZ PRIETO	SI / NO		$11.808.234	25/11/2020	22/12/2020	25/11/2020	100%	0%	0%	0%	100%
25	MVJA_4333	TV 18Q BIS C 61B 46 SUR	BEATRIZ CABRALES ACERO	SI / NO		$11.504.866	27/11/2020	19/12/2020	27/11/2020	100%	0%	0%	0%	100%
26	MVJA_0899	CL 63B SUR 18K 56	HERNAN HUMBERTO PARRA	SI / NO		$10.330.603	25/11/2020	19/12/2020	25/11/2020	100%	0%	0%	0%	100%
LA ESCALA 3ER SECTOR														
27	MVJA_0936	CL 62A SUR 18L 07	LUIS ALIRIO LÓPEZ DÍAZ	SI / NO		$10.624.980	26/11/2020	17/12/2020	26/11/2020	100%	0%	0%	0%	100%
28	MVJA_0619	CL 62A SUR 18K 20	NESTOR JAVIER VALENZUELA PEÑA	SI / NO		$11.823.991	27/02/2021	EN EJECUCION	27/02/2021	0%	0%	0%	0%	0%
GIBRALTAR I Y II														
29	MVJA_4375	TV 18R 61B 41 SUR	FERNANDO TORRES Y OTRA	SI / NO		$7.358.179	26/11/2020	17/12/2020	26/11/2020	100%	0%	0%	0%	100%
30	MVJA_3081	KR 18N BIS A 63 26 SUR	JOSE UNILCIO CIFUENTES QUINTERO Y OTRA	SI / NO		$10.723.231	5/02/2021	3/03/2021	5/02/2021	85%	15%	0%	0%	100%
31	MVJA_3085	KR 18N BIS A 63C 28 SUR	LUIS ALFREDO CARPINTERO Y OTRA	SI / NO		$11.720.170	4/02/2021	EN EJECUCION	4/02/2021	51%	11%	0%	0%	61%
32	MVJA_3108	KR 18P 63B 16 SUR	OLIVIA BOLAÑOS	SI / NO		$9.229.283	4/02/2021	EN EJECUCION	4/02/2021	32%	7%	0%	0%	39%
33	MVJA_2395	KR 18K 64A 22 SUR	DELIO MARTINEZ GAMBA	SI / NO		$11.822.362	6/03/2021	EN EJECUCION	6/03/2021	0%	0%	0%	0%	0%
34	MVJA_0822	CL 63C SUR 18P 22	FRANCISCO PIAMBA ANACONA	SI / NO		$9.697.112	4/02/2021	EN EJECUCION	4/02/2021	72%	10%	0%	0%	82%
ACACIAS SUR														
35	MVJA_3870	KR 18Z 62 30 SUR	CRISTOBAL PITA CAMARGO	SI / NO		$11.791.446	4/02/2021	4/03/2021	4/02/2021	78%	22%	0%	0%	100%
36	MVJA_6499	CL 62 SUR 18Z 04	GAVI ROZO RODRIGUEZ	SI / NO		$11.758.346	5/02/2021	EN EJECUCION	5/02/2021	42%	28%	0%	0%	69%
LA ESPERANZA														
37	MVJA_3807	KR 18T 62A 21 SUR	LUIS ENRIQUE JIMENEZ VEGA	SI / NO		$11.760.814	8/02/2021	EN EJECUCION	8/02/2021	25%	16%	0%	0%	42%
CIUDAD MILAGRO														
38	MVJA_9286	CL 62 BIS SUR 18J 12	HASBLEIDY GINA ROJAS ESCOBAR	SI / NO		$11.813.015	10/02/2021	EN EJECUCION	10/02/2021	40%	33%	0%	0%	73%
39	MVJA_9236	CL 61D SUR 18K 58	MARBELA OSORIO TRUJILLO	SI / NO		$9.103.008	9/02/2021	EN EJECUCION	9/02/2021	64%	22%	0%	0%	86%
40	MVJA_9326	CL 62 BIS SUR 18K 55	VICTOR MANUEL URREA ACOSTA	SI / NO		$9.129.217	9/02/2021	EN EJECUCION	9/02/2021	20%	60%	0%	0%	79%
SAN LUIS														
41	MVJA_2961	DG 64A SUR 18V 14	FABIO VELASQUEZ CABALLERO	SI / NO		$5.791.775	EN FASE DE VALIDACION	EN FASE DE VALIDACION	EN FASE DE VALIDACION	0%	0%	0%	0%	0%
42	MVJA_1776	DG 64 BIS SUR 18V-15	UVA ESTHER BAQUERO DE GIL	SI / NO		$9.569.727	5/02/2021	25/02/2023	5/02/2021	100%	0%	0%	0%	100%
SAN FERNANDO														
43	MVJA_2138	DG 64B SUR 19 76	MARIA ELIUD ORTEGON DE ALARCON	SI / NO		$8.133.977	5/02/2021	EN EJECUCION	5/02/2021	55%	32%	0%	0%	87%
44	MVJA_2119	DG 64B SUR 19 36	MARIA CONCEPCION RIAÑO	SI / NO		$10.994.689	6/03/2021	EN EJECUCION	6/03/2021	0%	0%	0%	0%	0%
LAS DELICIAS DEL SUR ZONA 19														
45	MVJA_1386	CL 66 SUR 18N 73	CRISTOBAL SUA ALBARRACÍN	SI / NO		$10.201.812	27/02/2021	EN EJECUCION	27/02/2021	0%	0%	0%	0%	0%
LUCERO MEDIO														
46	MVJA_2324	KR 18J 64F 39 SUR	ARMANDO QUIROGA BARRIGA Y OTRA	SI / NO		$11.577.668	9/02/2021	EN EJECUCION	9/02/2021	39%	21%	0%	0%	60%
47	MVJA_2617	KR 18L BIS 64F 07 SUR	QUINTILIANO CASTILLO DOMÍNGUEZ Y OTRA	SI / NO		$10.654.735	6/03/2021	EN EJECUCION	6/03/2021	0%	0%	0%	0%	0%
48	MVJA_2626	KR 18L BIS 64F 47 SUR	MARIA ALICIA MANRIQUE POVEDA	SI / NO		$11.621.525	26/02/2021	EN EJECUCION	26/02/2021	0%	0%	0%	0%	0%
49	MVJA_2418	KR 18K 65A 15 SUR	BERTILDA URREGO	SI / NO		$11.712.907	9/02/2021	EN EJECUCION	9/02/2021	57%	25%	0%	0%	82%
50	MVJA_2414	KR 18K 64F 29 SUR	MARIA ELENA RINCON RINCÓN	SI / NO		$11.664.556	RENUNCIA	RENUNCIA	RENUNCIA	-	-	-	-	-
USMINIA - ANTONIO JOSE DE SUCRE I SECTOR														
51	MV_18353	CL 109 SUR 9 64	LUZ DAMARIS CASTRO PULGARIN	SI / NO		$11.776.148	29/01/2021	6/02/2021	29/01/2021	100%	0%	0%	0%	100%
52	MV_18051	CL 104A SUR 6 37 MJ	LUIS ANTONIO RINCON	SI / NO		$11.524.924	29/01/2021	6/02/2021	29/01/2021	100%	0%	0%	0%	100%
53	MV_19285	CL 108 SUR 3A 36	JAIRO ANTONIO ESPINOSA	SI / NO		$11.264.277	29/01/2021	26/02/2021	29/01/2021	100%	0%	0%	0%	100%
54	MV_21820	CL 106 B SUR 4 11	JUAN EUDES OREJUELA GARZON	SI / NO		$11.808.193	28/01/2021	26/02/2023	28/01/2021	100%	0%	0%	0%	100%
USMINIA - LORENZO ALCANTUZ														
55	MV_17421	CL 102 SUR 5 49	OLGA BARRETO	SI / NO		$11.766.972	29/01/2021	6/02/2021	29/01/2021	100%	0%	0%	0%	100%

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DEL HÁBITAT

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

PROYECTOS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA

INPLAYCO S.A.S.

FECHA	7/03/2021	PERIODO No.	18	DEL	1/03/2021	AL	7/03/2021

1. INFORMACIÓN GENERAL

OBJETO DEL CONTRATO	Realizar la interventorias técnica, jurídica, social, administrativa y financiera, para la ejecución de las obras de mejoramiento de vivienda en la modalidad de habitablidad en los territorios priorizados por la secretaría distrital de hábitat.
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO	Corresponde al Grupo 1 a la ejecución de 254 mejoramientos de vivienda, localizados en 3 localidades: Bosa, Usme y Ciudad Bolívar, esta última localidad incluye cuatro (4) intervenciones de Mejoramientointegral.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA		CONTRATO DE OBRA	
CONTRATO No.:	701-2020	CONTRATO No.:	694--2020
PLAZO INICIAL:	6 meses	PLAZO INICIAL:	5 meses
FECHA DE INICIACIÓN:	4 de noviembre de 2020	FECHA DE INICIACIÓN:	4 de noviembre de 2020
**FECHA DE SUSPENSIÓN:	0	**FECHA DE SUSPENSIÓN:	0
**FECHA DE REINICIACIÓN:	0	**FECHA DE REINICIACIÓN:	0
FECHA DE TERMINACIÓN:	3 de mayo de 2021	FECHA DE TERMINACIÓN:	3 de abril 2021
PLAZO ACTUALIZADO:	0	PLAZO ACTUALIZADO:	0
PLAZO TRANSCURRIDO:	0	PLAZO TRANSCURRIDO:	0
VALOR INICIAL :	$ 894.285.952	VALOR INICIAL :	$ 3.724.135.319
VALOR ADICION(ES):	0	VALOR ADICION(ES):	$ -
VALOR ACTUALIZADO:	$ -	VALOR ACTUALIZADO:	$ -
VALOR ANTICIPO:	0	VALOR ANTICIPO:	$ -
VALOR POR PAGAR:	$ -	VALOR POR PAGAR:	$ -
SUPERVISOR:	JUAN CARLOS ARBELAEZ MURILLO	INTERVENTOR:	Gonzalo Llevano Hoyos -INPLAYCO S.A.S.

** Inserte las filas que requiera según el número de suspensiones y reinicios.

2. CONTROL DE HITOS.

No.	*** DESCRIPCIÓN DEL HITO	FECHA PROGRAMADA	FECHA REAL DE CUMPLIMIENTO	DÍAS DE RETRASO
	SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO (HITO OBLIGATORIO)	4/11/2020	3/04/2021	
1	Validación			
2	Entrega de informe de validación			
3	Ejecución			
	ENTREGA A LA INTERVENTORIA DE LOS PRODUCTOS Y/O ACTIVIDADES CONTRATADAS (HITO OBLIGATORIO)			


***** Inserte las filas que requiera según el número de hitos; teniendo en cuenta que como mínimo se deberán establecer 5 hitos adicionales a los obligatorios de inicio y terminación. Los hitos aprobados por la interventoría se socializarán con el supervisor del contrato para su Vo. Bo. Los Hitos aprobados por la interventoría y SDHT solo se podrán modificar previa novedad contractual que así lo requiera. La matriz ded segimiento hace parte del presente documento.**


No.	INDICADORES BARRIO O TERRITORIO	VALORES	PORCENTAJE SOBRE EL VALOR TOTAL DEL CONTRATO	DIFERENCIA (+) ADELANTO (-) ATRASO
1	Valor acumulado de las actividades o productos conforme a la programación vigente.	$523.831.773,78	14,07%	
2	Valor acumulado de las actividades o productos ejecutados y aprobados por la Interventoría.	$435.327.888,24	11,69%	


3. ASPECTOS GENERALES INFORME TÉCNICO

Registre los avances y novedades técnicas, sociales, administrativas, contables y financieras, acompañadas por gráficos, cuadros, fotografías, análisis y comentarios sobre el estado de los trabajos, en todos sus aspectos en la fase de validación y ejecución de obra.

CIUDAD BOLIVAR - USME

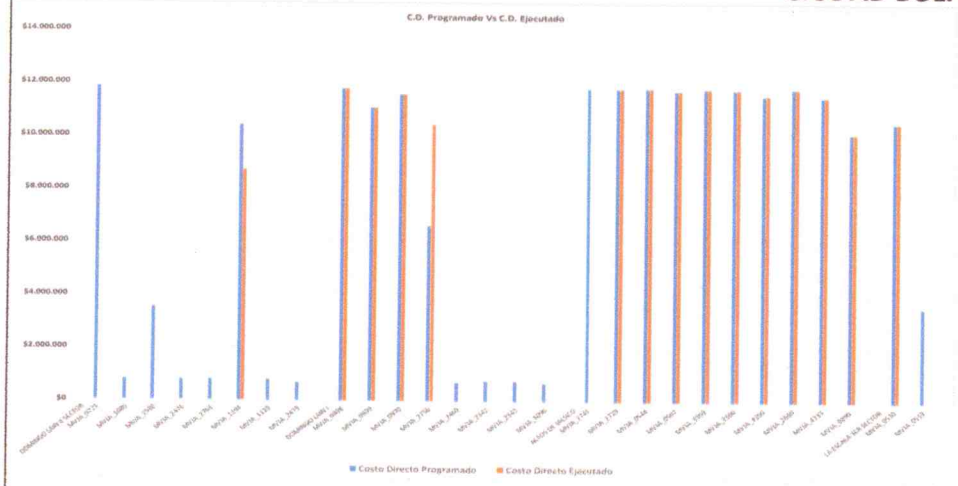

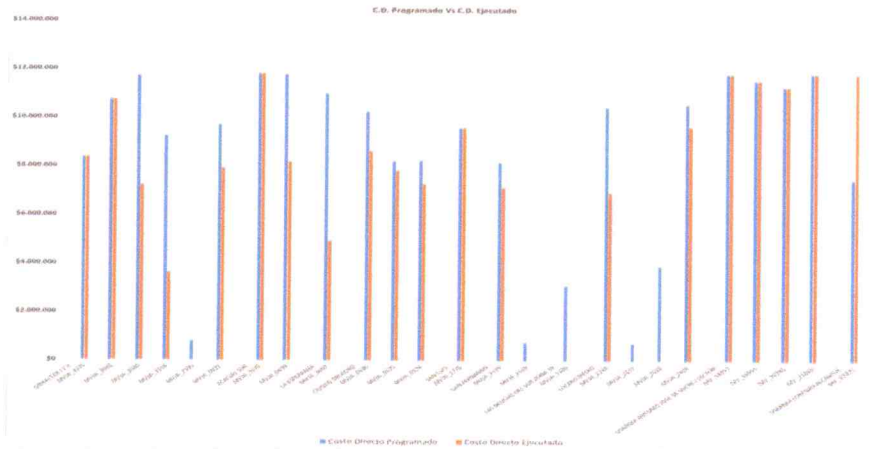

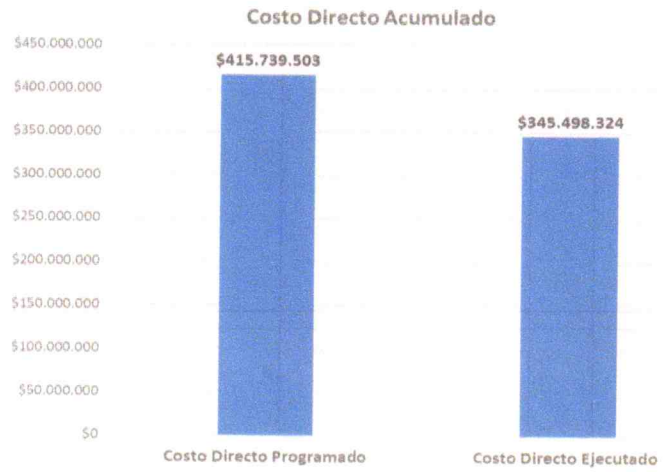

4- COMPONENTE TECNICO BARRIO O TERRITORIO			
ACTIVIDADES EJECUTADAS EN LA SEMANA. - ESTADO DE AVANCE SEMANAL POR VIVIENDA			
FECHA: 7-03-2021			
BARRIO O TERRITORIO - CIUDAD BOLIVAR - DOMINGO LAIN II SECTOR Y CONDOMINIO DEL BOSQUE			
1	MVJA_0723	VICTOR MANUEL SAMORA HERNANDEZ	Se hace seguimiento, la vivienda no cuenta con ningun servicio publico (agua, luz y gas) por tal motivo aun no se inician actividades; se suscribe acta en la cual el beneficiario se compromete a realizar la gestion necesaria para contar con el suministro de luz y agua para poder dar comienzo a la ejecución de la mejora.
2	MVJA_1085	MARIA NERY ECHEVERRY DE RESTREPO	Se hace apertura en la cual se socializan actividades de obra, presupuesto, indicaciones de bioseguridad.
3	MVJA_2598	FLOR ANGELA MORANTES LOPEZ	Se hace seguimiento, no se evidencia material ni maestro sin inicio de actividades.
4	MVJA_2476	JAIME HUMBERTO BORDA LIBERATO	Se hace apertura en la cual se socializan actividades de obra, presupuesto, indicaciones de bioseguridad.
5	MVJA_2763	CARLOS JESÚS BECERRA PEREZ	Se hace apertura en la cual se socializan actividades de obra, presupuesto, indicaciones de bioseguridad.
6	MVJA_1194	MOISES RODRÍGUEZ BETANCOURT	Se hace seguimiento, se evidencia a personal ejecutando actividades de instalacion de enchape en piso y cielo raso; beneficiario se encuentra conforme
7	MVJA_1129	ANA BERTILDE GAMBOA VELANDIA	Se hace apertura en la cual se socializan actividades de obra, presupuesto, indicaciones de bioseguridad.
8	MVJA_2479	CRISTOBAL VALBUENA	Se hace apertura en la cual se socializan actividades de obra, presupuesto, indicaciones de bioseguridad.
BARRIO O TERRITORIO - CIUDAD BOLIVAR - DOMINGO LAIN I			
9	MVJA_0898	EFIGENIA GUIZA DE SANCHEZ	Se hace entrega de vivienda a conformidad del beneficiario, se socializa presupuesto final, manual de uso y mantenimiento; se entrega kit ecologico.
10	MVJA_0899	DORIS AYDEE HERRERA OTALORA	Se hace entrega de vivienda a conformidad del beneficiario, se socializa presupuesto final, manual de uso y mantenimiento; se entrega kit ecologico.
11	MVJA_0970	DORIS CUESTA DE RODRIGUEZ	Se hace entrega de vivienda a conformidad del beneficiario, se socializa presupuesto final, manual de uso y mantenimiento; se entrega kit ecologico.
12	MVJA_2756	ESTHER AROCA YARA	Se hace entrega de vivienda a conformidad de la beneficiaria, se socializa presupuesto final, manual de uso y mantenimiento; se entrega kit ecologico.
13	MVJA_2469	CARMEN LIBIA GÓMEZ DE CASTAÑEDA	Se hace apertura en la cual se socializan actividades de obra, presupuesto, indicaciones de bioseguridad.
14	MVJA_2342	MARIA DOLORES CASTILLO DE SANCHEZ	Se hace apertura en la cual se socializan actividades de obra, presupuesto, indicaciones de bioseguridad.
15	MVJA_2343	ERNESTO VERGARA NIETO	Se hace apertura en la cual se socializan actividades de obra, presupuesto, indicaciones de bioseguridad.
16	MVJA_1096	GONZALO OÑATE BONILLA	Se hace apertura en la cual se socializan actividades de obra, presupuesto, indicaciones de bioseguridad.
BARRIO O TERRITORIO - CIUDAD BOLIVAR - ALTOS DE JALISCO			
17	MVJA_2741	CARLOS ALBERTO MUÑETON FRANCO	Beneficiario no se encuentra hasta el mes de enero; se debe validar nuevamente una vez beneficiario termine adecuaciones por su cuenta.
18	MVJA_2729	JOSE IGNACIO TAO IBARRA	Se hace entrega de vivienda a conformidad del beneficiario, se socializa presupuesto final, manual de uso y mantenimiento; se entrega kit ecologico.
19	MVJA_0544	MERCEDES RIAÑO PARRA	Se hace entrega de vivienda a conformidad del beneficiario, se socializa presupuesto final, manual de uso y mantenimiento; se entrega kit ecologico.
20	MVJA_0567	MARIA DEL ROSARIO RODRIGUEZ	Se hace entrega de vivienda a conformidad del beneficiario, se socializa presupuesto final, manual de uso y mantenimiento; se entrega kit ecologico.
21	MVJA_3309	TEOFILO MORALES TURGA	Se hace entrega de vivienda a conformidad del beneficiario, se socializa presupuesto final, manual de uso y mantenimiento; se entrega kit ecologico.
22	MVJA_3366	EDILMA ALCIRA CASTILLO	Se hace entrega de vivienda a conformidad del beneficiario, se socializa presupuesto final, manual de uso y mantenimiento; se entrega kit ecologico.
23	MVJA_4350	MARÍA BENDITA REDONDO CASTIBLANCO	Se hace entrega de vivienda a conformidad del beneficiario, se socializa presupuesto final, manual de uso y mantenimiento; se entrega kit ecologico.
24	MVJA_2660	MANUEL EDUARDO RODRIGUEZ PRIETO	Se hace entrega de vivienda a conformidad del beneficiario, se socializa presupuesto final, manual de uso y mantenimiento; se entrega kit ecologico.
25	MVJA_4333	BEATRIZ CABRALES ACERO	Se hace entrega de vivienda a conformidad del beneficiario, se socializa presupuesto final, manual de uso y mantenimiento; se entrega kit ecologico.
26	MVJA_0890	HERNAN HUMBERTO PARRA	Se hace entrega de vivienda a conformidad del beneficiario, se socializa presupuesto final, manual de uso y mantenimiento; se entrega kit ecologico.
BARRIO O TERRITORIO - CIUDAD BOLIVAR - LA ESCALA 3ER SECTOR			
27	MVJA_0530	LUIS ALIRIO LÓPEZ DÍAZ	Se hace entrega de vivienda a conformidad del beneficiario, se socializa presupuesto final, manual de uso y mantenimiento; se entrega kit ecologico.
28	MVJA_0519	NESTOR JAVIER VALENZUELA PEÑA	Se hace seguimiento, no se evidencia material ni maestro sin inicio de actividades.
BARRIO O TERRITORIO - CIUDAD BOLIVAR - GIBRALTAR I Y II			
29	MVJA_4375	FERNANDO TORRES Y OTRA	Se hace entrega de vivienda a conformidad del beneficiario, se socializa presupuesto final, manual de uso y mantenimiento; se entrega kit ecologico.
30	MVJA_3081	JOSE UNILCIO CIFUENTES QUINTERO Y OTRA	Se hace entrega de vivienda a conformidad del beneficiario, se socializa presupuesto final, manual de uso y mantenimiento; se entrega kit ecologico.
31	MVJA_3086	LUIS ALFREDO CARPINTERO Y OTRA	Se hace seguimiento a la vivienda, se evidencia materiales y maestro ejecutando actividades de enchape en sala y habitacion.
32	MVJA_3168	OLIVIA BOLAÑOS	Se hace seguimiento a la vivienda, se evidencia materiales y maestro ejecutando actividades de alistado de piso y pañete en muro.
33	MVJA_2395	DELIO MARTINEZ GAMBA	Se hace apertura en la cual se socializan actividades de obra, presupuesto, indicaciones de bioseguridad.
34	MVJA_0922	FRANCISCO PIAMBA ANACONA	Se hace seguimiento a la vivienda, se evidencia materiales y maestro ejecutando actividades de enchape en piso y baño

BARRIO O TERRITORIO - CIUDAD BOLIVAR - ACACIAS SUR			
35	MVJA_3670	CRISTOBAL PITA CAMARGO	Se hace entrega de vivienda a conformidad del beneficiario, se socializa presupuesto final, manual de uso y mantenimiento; se entrega kit ecologico.
36	MVJA_0439	GAVI ROZO RODRIGUEZ	Se hace seguimiento a la vivienda, se evidencia materiales y maestro ejecutando actividades de instalacion de enchape en habitacion, baño y cocina
BARRIO O TERRITORIO - CIUDAD BOLIVAR - LA ESPERANZA			
37	MVJA_3607	LUIS ENRIQUE JIMENEZ VEGA	Se hace seguimiento a la vivienda, se evidencia maestro ejecutando actividades de enchape en baño.
BARRIO O TERRITORIO - CIUDAD BOLIVAR - CIUDAD MILAGRO			
38	MVJA_0286	HASBLEIDY GINA ROJAS ESCOBAR	Se hace seguimiento a la vivienda, se evidencia maestro ejecutando actividades de instalacion de enchape en sala y habitacion.
39	MVJA_0235	MARIELA OSORIO TRUJILLO	Se hace seguimiento a la vivienda, se evidencia maestro ejecutando actividades de enchape en cocina, aplicación de vinilo en habitacion.
40	MVJA_0328	VICTOR MANUEL URREA ACOSTA	Se hace seguimiento a la vivienda, se evidencia maestro ejecutando actividades de enchape en habitacion e instalacion de cielo raso.
BARRIO O TERRITORIO - CIUDAD BOLIVAR - SAN LUIS			
41	MVJA_2051	FABIO VELASQUEZ CABALLERO	Se hace validación en la vivienda, se definen espacios a intervenir y se realiza levantamiento arquitectonico para calculo de cantidades de obra.
42	MVJA_1776	UVA ESTHER BAQUERO DE GIL	Se hace entrega de vivienda a conformidad de la beneficiaria, se socializa presupuesto final, manual de uso y mantenimiento; se entrega kit ecologico.
BARRIO O TERRITORIO - CIUDAD BOLIVAR - SAN FERNANDO			
43	MVJA_2139	MARIA ELIUD ORTEGON DE ALARCON	Se hace seguimiento a la vivienda, se evidencia maestro ejecutando actividades de instalacion de enchape en habitacion e instalacion de meson.
44	MVJA_2119	MARIA CONCEPCION RIAÑO	Se hace apertura en la cual se socializan actividades de obra, presupuesto, indicaciones de bioseguridad.
BARRIO O TERRITORIO - CIUDAD BOLIVAR - LAS DELICIAS DEL SUR ZONA 19			
45	MVJA_1386	CRISTOBAL SUA ALBARRACÍN	Se hace seguimiento, no se evidencia material ni maestro sin inicio de actividades.
BARRIO O TERRITORIO - CIUDAD BOLIVAR - LUCERO MEDIO			
46	MVJA_2324	ARMANDO QUIROGA BARRIGA Y OTRA	Se hace seguimiento a la vivienda, se evidencia maestro ejecutando actividades de estuco.
47	MVJA_2617	QUINTILIANO CASTILLO DOMÍNGUEZ Y OTRA	Se hace apertura en la cual se socializan actividades de obra, presupuesto, indicaciones de bioseguriaad.
48	MVJA_2628	MARIA ALICIA MAHECHA POVEDA	Se hace seguimiento, no se evidencia material ni maestro sin inicio de actividades.
49	MVJA_2418	BERTILDA URREGO	Se hace seguimiento a la vivienda, se evidencia maestro ejecutando actividades de instalacion de enchape en cocina, baño y habitacion.
50	MVJA_2414	MARIA ELENA RINCON RINCON	Beneficiaria renuncia al subsidio por razones familiares.
BARRIO O TERRITORIO - USMINIA - ANTONIO JOSE DE SUCRE I SECTOR			
51	MV_18353	LUZ DAMARIS CASTRO PULGARIN	Se hace entrega de vivienda a conformidad del beneficiario, se socializa presupuesto final, manual de uso y mantenimiento; se entrega kit ecologico.
52	MV_18951	LUIS ANTONIO RINCON	Se hace entrega de vivienda a conformidad del beneficiario, se socializa presupuesto final, manual de uso y mantenimiento; se entrega kit ecologico.
53	MV_19285	JAIRO ANTONIO ESPINOSA	Se hace entrega de vivienda a conformidad del beneficiario, se socializa presupuesto final, manual de uso y mantenimiento; se entrega kit ecologico.
54	MV_21820	JUAN EUDES ORJUELA GARZON	Se hace entrega de vivienda a conformidad del beneficiario, se socializa presupuesto final, manual de uso y mantenimiento; se entrega kit ecologico.
BARRIO O TERRITORIO - USMINIA - LORENZO ALCANTUZ			
55	MV_17421	OLGA BARRETO	Se hace entrega de vivienda a conformidad del beneficiario, se socializa presupuesto final, manual de uso y mantenimiento; se entrega kit ecologico.

5. PLAN DE ACCIÓN RESULTADO DEL ANÁLISIS DE CAUSAS REGISTRADO EN EL NUMERAL ANTERIOR - CON EL OBJETIVO DE ELIMINAR LA CAUSA RAÍZ DE LA SITUACIÓN PROBLEMÁTICA - PLAN DE MEJORA

ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA
En conjunto con el contratista y esta interventoría se realizaran y supervisaran los respectivos presupuestos iniciales de obra y seguimiento a la ejecución de actividades, tambien se definiran posibles ajustes a las areas establecidas e indicadas inicialmente en cada uno de los expedientes de los beneficiarios del programa de mejoramiento de vivienda.	ERICK ALVAREZ CADAVID	

6. ACTIVIDADES NO PREVISTAS Y MAYORES CANTIDADES

Se informa que en algunas de las viviendas se presentan mejoras en los acabados finales realizadas por los beneficiarios, por lo tanto se deside intervenir otros espacios en conjunto con el contratista garantizando una adecuada habitabilidad y dignificación de las viviendas

7. COMENTARIOS DEL INTERVENTOR: Por favor realice la descripción general del estado del contrato y según aplique informe sobre: actividades realizadas en la semana, control de lluvias, compra y suministro de materiales, mano de obra, subcontratos y tramites ante las diferentes empresas prestadoras de servicios, entre otros. Anexe las actas de seguimiento realizadas en la semana correspondiente al periodo del informe.

Barrio o Territorio: CIUDAD BOLIVAR


En el presente periodo se hace entrega de 2 viviendas y seguimiento de obra a 30 viviendas beneficiadas, se le informa al contratista de obra y al beneficiario sobre los espacios a intervenir.

8. REGISTRO FOTOGRAFICO DEL AVANCE DURANTE LA SEMANA

REGISTRO FOTOGRÁFICO




FECHA	miércoles, 3 de marzo de 2021
DESCRIPCION MVJA_3081	
Entrega	

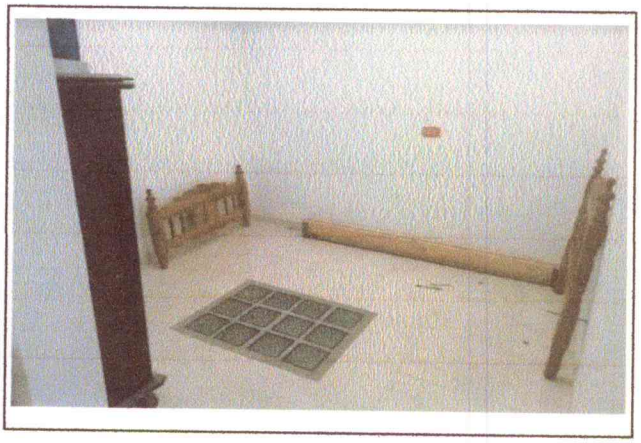

FECHA	miércoles, 3 de marzo de 2021
DESCRIPCION MVJA_3081	
Entrega	



FECHA	jueves, 4 de marzo de 2021
DESCRIPCION MVJA_3670	
Entrega	

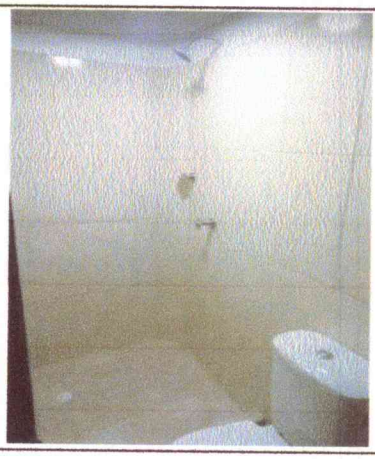

FECHA	jueves, 4 de marzo de 2021
DESCRIPCION MVJA_3670	
Entrega	



FECHA	sábado, 6 de marzo de 2021
DESCRIPCION MVJA_1085	
Apertura	




FECHA	sábado, 6 de marzo de 2021
DESCRIPCION MVJA_2476	
Apertura	

REGISTRO FOTOGRÁFICO



FECHA	sábado, 6 de marzo de 2021
DESCRIPCION MVJA_2763	
Apertura	

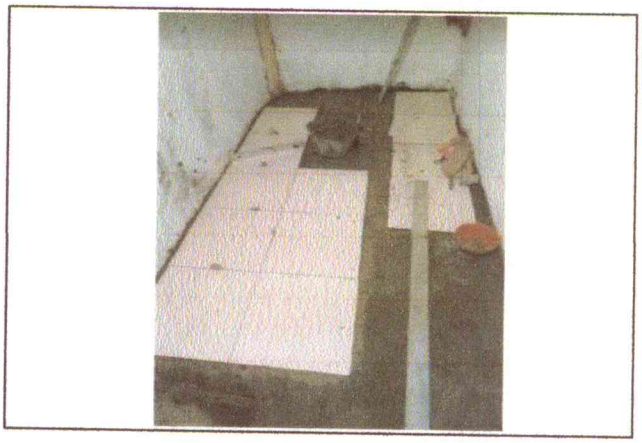

FECHA	jueves, 4 de marzo de 2021
DESCRIPCION MVJA_3086	
Seguimiento	




FECHA	jueves, 4 de marzo de 2021
DESCRIPCION MVJA_0922	
Seguimiento	



FECHA	viernes, 5 de marzo de 2021
DESCRIPCION MVJA_0439	
Seguimiento	



FECHA	viernes, 5 de marzo de 2021
DESCRIPCION MVJA_0286	
Seguimiento	

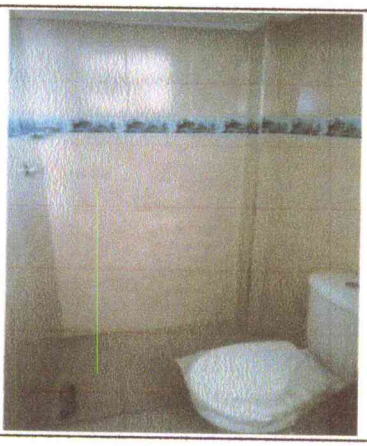

FECHA	viernes, 5 de marzo de 2021
DESCRIPCION MVJA_0235	
Seguimiento	

INPLAYCO S.A.S.
INGENIEROS CONSTRUCTORES E INTERVENTORES

ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE HÁBITAT

INFORME SOCIAL SEMANAL 18

ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE HÁBITAT

INPLAYCO S.A.S.
INGENIEROS CONSTRUCTORES E INTERVENTORES

INFORME SOCIAL

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DEL HÁBITAT

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

PROYECTOS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA
GRUPO 1

INPLAYCO S.A.S.
INGENIEROS CONSTRUCTORES E INTERVENTORES

FECHA	06 de marzo de 2021	PERIODO No.	18	DEL	01/03/2021	AL	06/03/2021

1. INFORMACIÓN GENERAL

OBJETO DEL CONTRATO	Realizar la interventorías técnica, jurídica, social, administrativa y financiera, para la ejecución de las obras de mejoramiento de vivienda en la modalidad de habitabilidad en los territorios priorizados por la secretaría distrital de hábitat.
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO	Corresponde al Grupo 1 a la ejecución de 254 mejoramientos de vivienda, localizados en 3localidades: Bosa, Usme y Ciudad Bolívar, esta última localidad incluye cuatro (4) Intervenciones de MejoramientoIntegral.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA		CONTRATO DE OBRA	
CONTRATO No.:	701-2020	CONTRATO No.:	694--2020
PLAZO INICIAL:	6 meses	PLAZO INICIAL:	5 meses
FECHA DE INICIACIÓN:	4 de noviembre de 2020	FECHA DE INICIACIÓN:	4 de noviembre de 2020
**FECHA DE SUSPENSIÓN:	0	**FECHA DE SUSPENSIÓN:	0
**FECHA DE REINICIACIÓN:	0	**FECHA DE REINICIACIÓN:	0
FECHA DE TERMINACIÓN:	3 de mayo de 2021	FECHA DE TERMINACIÓN:	3 de abril 2021
PLAZO ACTUALIZADO:	0	PLAZO ACTUALIZADO:	0
PLAZO TRANSCURRIDO:	0	PLAZO TRANSCURRIDO:	0
VALOR INICIAL :	$ 894,285,952.00	VALOR INICIAL :	$ 3,724,135,319.00
VALOR ADICION(ES):	$ -	VALOR ADICION(ES):	$ -
VALOR ACTUALIZADO:	$ -	VALOR ACTUALIZADO:	$ -
VALOR ANTICIPO:	$ -	VALOR ANTICIPO:	$ -
VALOR POR PAGAR:	$ -	VALOR POR PAGAR:	$ -
SUPERVISOR:	JUAN CARLOS ARBELÁEZ MURILLO	INTERVENTOR:	Gonzalo Liévano Hoyos -INPLAYCO S.A.S.

** Inserte las filas que requiera según el número de suspensiones y reinicios.

2. CONTROL DE HITOS.

No.	*** DESCRIPCIÓN DEL HITO	FECHA PROGRAMADA	FECHA REAL DE CUMPLIMIENTO	DÍAS DE RETRASO
	SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO (HITO OBLIGATORIO)	04/11/2020	03/04/2021	-150
1	Validación			
2	Entrega de informe de validación			
3	Ejecución			
	ENTREGA A LA INTERVENTORÍA DE LOS PRODUCTOS Y/O ACTIVIDADES CONTRATADAS (HITO OBLIGATORIO)			

*** Inserte las filas que requiera según el número de hitos; teniendo en cuenta que como mínimo se deberán establecer 5 hitos adicionales a los obligatorios de inicio y terminación. Los hitos aprobados por la interventoría se socializarán con el supervisor del contrato para su Vo. Bo. Los Hitos aprobados por la interventoria y SDHT solo se podrán modificar previa novedad contractual que así lo requiera. La matriz de seguimiento hace parte del presente documento.

No.	INDICADORES	VALORES	PORCENTAJE SOBRE EL VALOR TOTAL DEL CONTRATO	DIFERENCIA (+) ADELANTO (-) ATRASO
1	Valor acumulado de las actividades o productos conforme a la programación vigente.			
2	Valor acumulado de las actividades o productos ejecutados y aprobados por la Interventoría.			

3. ASPECTOS GENERALES INFORME SOCIAL

COMPONENTE SOCIAL - AVANCE SOCIAL DE CADA UNIDAD DE VIVIENDA

LOCALIDAD: CIUDAD BOLÍVAR

JUAN PABLO II

04/03/2021 -**MVCB_3534: MARÍA ELISA RODRÍGUEZ GAMEZ,** validaciòn.

04/03/2021 -**MVCB_3537: EDELY JIMÉNEZ OSORIO,** validaciòn.

04/03/2021 - **MVCB_3524: REIDED DE JESÚS RODRÍGUEZ,** validación

04/03/2021 - **MVCB_3540: SANDRA PATRICIA BETANCUR RINCÓN,** validación
04/03/2021 - **MVCB_3523: BLANCA INÉS RAMÍREZ,** renuncia del subsidio de mejoramiento de vivienda argumentando que ha hecho adecuaciones en su vivienda y ahora está interesada en el subsidio estructural.
DESARROLLO: SAN FERNANDO
02/03/2021 - **MVJA_2139: MARÍA ELIUD ORTEGÓN DE ALARCÓN,** visita de seguimiento social - técnico de interventoría, la persona autorizada no reporta novedades, está satisfecha con la ejecución de las actividades, se observa personal de obra trabajando. Se evidencia instalación de enchape en habitación.
04/03/2021 - **MVJA_2139: MARÍA ELIUD ORTEGÓN DE ALARCÓN,** visita de seguimiento contratista e interventoría, la persona autorizada no reporta novedades con relación a la visita anterior. Se evidencia personal de obra y avance general en las actividades.
06/03/2021 - **MVJA_2119: MARÍA CONCEPCION RIAÑO,** apertura de obra en la que se socializan actividades de obra, presupuesto, indicaciones de bioseguridad, se entrega bitácora y se firman actas sociales y técnicas.
DESARROLLO: LA ESPERANZA
02/03/2021 - **MVJA_3607: LUIS ENRIQUE JIMÉNEZ VEGA,** visita de seguimiento social - técnico de interventoría, el beneficiario refiere que el día de hoy no llegó personal de obra a trabajar y tampoco le informaron de ello, manifiesta dudas que son resueltas por el área técnica.
04/03/2021 - **MVJA_3607: LUIS ENRIQUE JIMÉNEZ VEGA,** visita de seguimiento contratista e interventoría, el beneficiario manifiesta estar satisfecho con la instalación del mesón, se evidencia avance en instalación de enchape en el baño, se observa a tres trabajadores en la vivienda.
DESARROLLO: ACACIAS SUR
01/03/2021 - **MVJA_ 0598: RODULFO BEJARANO,** seguimiento. La autorizada manifiesta inconformidad por el enchape del baño y cocina. No sé observa personal de obra en el predio, Elvia indica que no han laborado desde el viernes. Refiere que pierden mucho tiempo y desperdician material, solicitan el cambio de los maestros de obra ya que no observan avance.
01/03/2021 -**MVJA_0608: MARÍA LUIDINA VARGAS AGUIRRE,** seguimiento. Atendido por la autorizada mediante carta Nubia Esperanza Chaparro. La autorizada manifiesta conformidad con el avance de la obra y se observa personal de obra en el predio . No refiere dudas e inquietudes
01/03/2021 -**MVJA_1018: MARÍA LEONOR APONTE VIUDA DE LÓPEZ,** seguimiento. La beneficiaria manifiesta inconformidad ya que la semana pasada los maestros han ido al predio intermitentemente y el día de hoy no se encuentran en la casa. Se le indica si el día de mañana no retoman llamen a la Social contratista.
02/03/2021 - **MVJA_3670: CRISTÓBAL PITA CAMARGO,** visita de seguimiento social - técnico interventoría, para atender inconformidad con respecto al taponamiento de un sifón en el área del patio, se informa al contratista para que subsane el daño, ya que genera dificultad para hacer uso del lavadero.
04/03/2021 - **MVJA_3670: CRISTÓBAL PITA CAMARGO,** entrega de la vivienda en la que se socializan presupuesto final, manual de uso y conservación y se entrega kit ecológico.
05/03/2021 - **MVJA_0675: JENNY XIMENA CAMELO VELASCO,** entrega de la vivienda en la que se socializan presupuesto final, manual de uso y conservación y se entrega kit ecológico.
05/03/2021 - **MVJA_0439: GAVI ROZO RODRÍGUEZ,** visita de seguimiento contratista e interventoría para atender solicitud de la beneficiaria: se solicita que la pintura que se va a usar sea la que se estipula en el presupuesto y que cumpla con la normatividad ICONTEC vigente. El subcontratista responde que entre el 5 y 6 de marzo, se hará el cambio de pintura, acorde a la solicitud de la beneficiaria. Área técnica toma foto de la pintura entregada que se debe cambiar.
DESARROLLO: DOMINGO LAIN II SECTOR
02/03/2021 - **MVJA_1194: MOISÉS RODRÍGUEZ BETANCOURT,** visita de seguimiento social - técnico de interventoría, la persona autorizada manifiesta estar satisfecha con las obras, se observa personal de obra trabajando.
02/03/2021 - **MVJA_3105: BLANCA NELLY HERNÁNDEZ.** Seguimiento, la beneficiaria manifiesta inconformidad ya que los trabajadores no han sido constantes, de igual manera refiere que no cuentan con la herramienta suficiente para ejecutar obras. Manifiesta que el día de hoy interpondrá PQR con en contratista y si no se acercan a la vivienda; indica que mañana irá directamente a la entidad.
04/03/2021 - **MVJA_1194: MOISÉS RODRÍGUEZ BETANCOURT,** visita de seguimiento contratista e interventoría, se aclara a la persona autorizada las áreas a pintar en zona de lavandería, se observa personal de obra en la vivienda.
06/03/2021 - **MVJA_2469: CARMEN LIVIA GÓMEZ DE CASTAÑEDA,** apertura de obra en la que se socializan actividades de obra, presupuesto, indicaciones de bioseguridad, se entrega bitácora y se firman actas sociales y técnicas.
06/03/2021 - **MVJA_2342: MARÍA DOLORES CASTILLO DE SÁNCHEZ** apertura atendida por la autorizada Tatiana Bolilla Sánchez por medio de carta de autorización y fotocopias de cédulas de ciudadanía.
06/03/2021 - **MVJA_2343: ERNESTO VERGARA NIETO,** apertura atendida por la autorizada Gloria Patricia Vergara Tapias por medio de carta de autorización.
06/03/2021 - **MVJA_1096: GONZALO OÑATE BONILLA,** apertura de obra en la que se socializan actividades de obra, presupuesto, indicaciones de bioseguridad, se entrega bitácora y se firman actas sociales y técnicas.

DESARROLLO: LUCERO MEDIO
02/03/2021 - **MVJA_2418: BERTILDA URREGO,** visita de seguimiento social - técnico de interventoría, se observa a un trabajador, se evidencia avance general en las actividades. La beneficiaria no reporta novedades.
02/03/2021 - **MVJA_2324: ARMANDO QUIROGA BARRIGA Y OTRA,** visita de seguimiento social - técnico de interventoría, se observa a un trabajador en la obra, se evidencia avance en actividades de estuco en habitación y sala.
02/03/2021 - **MVJA_2628: MARÍA ALICIA MAHECHA POVEDA,** visita de seguimiento social - técnico de interventoría, no se evidencia ingreso de material, tampoco personal de obra. Se solicita anexar en bitácora memorias de cantidades, carta de autorización y fotocopia de cédula.
04/03/2021 - **MVJA_2418: BERTILDA URREGO,** visita de seguimiento contratista e interventoría, se evidencia al maestro instalando enchape en cocina y avance general en las obras.
06/03/2021 - **MVJA_2617: QUINTIALINO CASTILLO DOMÍNGUEZ,** apertura de vivienda en la que se socializa presupuesto, indicaciones de bioseguridad, medidas de prevención por la cuarentena, se entrega bitácora y se firman actas sociales y técnicas
DESARROLLO VILLAS EL DIAMANTE
03/03/2021 - **MVCB_5122: HERNÁN LÓPEZ GIRALDO ,** seguimiento de obra
03/03/2021 - **MVCB_5314: ANA OTLIA GUACANEME,** seguimiento de obra
03/03/2021 - **MVCB_5295: MARÍA YOLANDA LOZANO,** seguimiento de obra
01/03/2021 - **MVCB_5110: LIBIA MARITZA HUERTAS CAMACHO**, seguimiento de obra
03/03/2021 - **MVCB_5110: LIBIA MARITZA HUERTAS CAMACHO,** seguimiento de obra
03/03/2021 - **MVCB_5156: VÍCTOR MANUEL MUÑOZ,** seguimiento de obra
03/03/2021 - **MVCB_5128: DIEGO MARIO VANEGAS,** seguimiento de obra
DESARROLLO: MIRADOR NUTIBARA
01/03/2021 - **MVCB_1873: BLANCA FABIOLA LANDÁZURI MESA,** se realiza seguimiento técnico y social por parte de interventoria, se observa personal en la obra , se observan avances, maestro encargado expresa que las actividades pueden estar finalizando el día de mañana.
01/03/2021 - **MVCB_1748: OLGA LUZ BETANCOURT LEÓN**, se realiza seguimiento técnico y social por parte de interventoria, no se evidencia personal dentro de la obra, maestro expresa que hace falta material, se observan avances en la ejecución, beneficiaria se muestra a gusto con el avance de la obra.
01/03/2021 - **MVCB_1681: ÁLVARO ELIÉCER VERDUGO RODRÍGUEZ**, seguimiento, se realiza seguimiento técnico y social por parte de interventoria, se evidencia personal dentro de la obra, se observan avances en la ejecución, beneficiario se muestra a gusto con el avance de la obra
01/03/2021 - **MVCB_1692: BEATRIZ ADIELA MARTÍNEZ JARAMILLO**, se realiza seguimiento técnico y social por parte de interventoria, se evidencia personal dentro de la obra, se observan avances en la ejecución, beneficiaria se muestra a gusto con el avance de la obra.
01/03/2021 - **MVCB_1704: ALBA LUCÍA VALENCIA OCAMPO**, se realiza seguimiento técnico y social por parte de interventoria, se evidencia personal dentro de la obra, se observan avances en la ejecución, beneficiaria se muestra a gusto con el avance de la obra.
01/03/2021 - **MVCB_1638: MAURICIO ENRIQUE MUÑOZ RIAÑO**, seguimiento técnico y social por parte de interventoria, se evidencia personal dentro de la obra, se observan avances en la ejecución, beneficiaria se muestra a gusto con el avance de la obra.
01/03/2021 - **MVCB_1631: ELOISA LAVERDE RÍOS**, se realiza seguimiento técnico y social por parte de interventoria, se evidencia personal dentro de la obra, se observan avances en la ejecución, beneficiaria se muestra a gusto con el avance de la obra.
01/03/2021 - **MVCB_1664: MARINA CLEMENCIA RAMOS**, seguimiento técnico y social por parte de interventoria, se evidencia personal dentro de la obra, se observan avances en la ejecución, beneficiaria se muestra a gusto con el avance de la obra.
01/03/2021 - **MVCB_1592: HOBER FABIÁN BARRERA GUTIÉRREZ**, seguimiento técnico y social por parte de interventoria, se evidencia personal dentro de la obra, se observan avances en la ejecución, beneficiario se muestra a gusto con el avance de la obra.
02/03/2021 - **MVCB_1843: FLOR ALBA GUTIÉRREZ BELTRÁN ,** seguimiento de obra
01/03/2021 - **MVCB_1811: ROSA ELVIRA GONZÁLEZ ,** seguimiento de obra

01/03/2021 - **MVCB_1698: LUZ AMALFI GUTIÉRREZ ,** seguimiento de obra
01/03/2021 - **MVCB_1708: MARÍA EUGENIA TRUJILLO ,** seguimiento de obra
02/03/2021 - **MVCB_1608: ROSALBINA HERNÁNDEZ ,** seguimiento de obra
02/03/2021 - **MVCB_1726: EMPERATRIZ ACOSTA MARTÍNEZ,** seguimiento de obra
02/03/2021 - **MVCB_1588: LUZ NELLY RODRÍGUEZ,** seguimiento de obra
02/03/2021 - **MVCB_1585: ELIÉCER RONCANCIO,** seguimiento de obra
02/03/2021 - **MVCB_1867: JOSÉ ALBER LUGO,** entrega de vivienda en la cual se socializa presupuesto final, manual de uso y conservación y se entrega kit ecologio.
03/03/2021 - **MVCB_1608: ROSALBINA HERNÁNDEZ PIRACHICAN,** visita de seguimiento social - técnico de interventoría, la beneficiaria está satisfecha con las actividades adelantadas, no reporta inquietudes; se observa a un trabajador. Se solicita anexar en bitácora, las memorias de cantidades con los respectivos ajustes enviados por la interventoría.
03/03/2021 - **MVCB_1588: LUZ NELLY RODRÍGUEZ,** visita de interventoría, para atender inconformidad, la beneficiaria manifiesta molestia debido a, falta de celeridad en las obras porque el personal no trabaja todos los días, además se le propone retirar la puerta de las habitaciones con el fin de poder instalar enchape de piso, a lo que ella responde que prefiere subir la puerta para no tener que cortarla; también refiere que parte de la placa se "destempló" (fisura) en la zona frontal que se puede observar desde la fachada, por golpes generados en la demolición del enchape, por lo tanto se suspende esa actividad hasta tanto se defina entre contratista e interventoría si se termina de demoler o no dicho enchape. No se observa personal de obra trabajando.
03/03/2021 - **MVCB_1574: JOSÉ HIPÓLITO GUTIÉRREZ LUCERO,** visita de seguimiento de interventoría, la persona autorizada tiene dudas acerca de las actividades en cocina y zona de ropas, que son resueltas por área técnica; solicita sea priorizada intervención de cocina, ya que, solo dispone de una en toda la vivienda. Se observa personal de obra trabajando.
03/03/2021 - **MVCB_1631: ELOISA LAVERDE RÍOS,** se realiza seguimiento técnico y social por parte de interventoria, se evidencia personal dentro de la obra, se observan avances en la ejecución, beneficiaria se muestra a gusto con el avance de la obra, la beneficiaria pide explicación frente a el poyo de la cocina que son resueltas por el área técnica.
03/03/2021 - **MVCB_1638: MAURICIO ENRIQUE MUÑOZ RIAÑO,** se realiza seguimiento técnico y social por parte de interventoria, se evidencia personal dentro de la obra, se observan avances en la ejecución, técnico de interventoria hace nota al maestro que en la ejecución de la cocina esta considerado el poyo del mesón para que esa actividad sea realizada, beneficiario se muestra a gusto con el avance de la obra.
03/03/2021 - **MVCB_1704: ALBA LUCÍA VALENCIA OCAMPO**, se realiza seguimiento técnico y social por parte de interventoria, no se evidencia personal dentro de la obra (consiguiendo materiales), se observan avances en la ejecución, beneficiaria se muestra a gusto con el avance de la obra, expresa que desea la ejecución de habitación y cocina se finalicen en su totalidad lo mas pronto posible.
03/03/2021 - **MVCB_1691: GINNA PAOLA MAECHA,** seguimiento. Se observa personal de obra en el predio. La familia refiere conformidad. Se evidencian relaciones adecuadas con el personal de obra. La beneficiaria refiere dudas técnicas las cuales son resueltas.
03/03/2021 - **MVCB_1742: ANA ELVIRA MENDOZA DE HERNÁNDEZ,** seguimiento. Atiende la visita su hijo autorizado Héctor. Manifiesta que trabajadores han laborado todos los días. Se observa en el predio. Hay dudas técnicas las cuales son resueltas.
03/03/2021 - **MVCB_1774: JOSÉ WILSON MARULANDA GIRALDO,** seguimiento. Se observa personal de obra en el predio. El beneficiario manifiesta conformidad con los avances constructivos; refiere que los trabajadores han laborado todos los días.
03/03/2021 - **MVCB_1692: BEATRIZ ADIELA MARTÍNEZ JARAMILLO,** se entrega de la vivienda a conformidad del beneficiario , se socializa presupuesto final, manual de uso y mantenimiento y se entrega kit ecológico.
04/03/2021 - **MVCB_1873: BLANCA FABIOLA LANDAZURI MESA,** seguimiento técnico y social por parte de interventoria, se observa el personal de obra ya esta finalizando actividades, la beneficiaria se muestra conforme con el avance, maestro encargado expresa que por parte de ejecución la obra queda lista hoy.
04/03/2021 - **MVCB_1748: OLGA LUZ BETANCOURT LEÓN,** seguimiento técnico y social por parte de interventoria, no se evidencia personal dentro de la obra (consiguiendo materiales) , se observan avances en la ejecución, la beneficiaria se muestra a gusto con el avance.
04/03/2021 - **MVCB_1733: YINETH CUENCA ROA**, seguimiento técnico y social por parte de interventoria y contratista, se evidencia personal dentro de la obra , se observan avances en la ejecución, la beneficiaria se muestra a gusto con el avance.
04/03/2021 - **MVCB_1681: ÁLVARO ELIÉCER VERDUGO RODRÍGUEZ**, seguimiento técnico y social por parte de interventoria, se evidencia personal dentro de la obra, se observan avances en la ejecución, beneficiario se muestra a gusto con el avance de la obra.
04/03/2021 - **MVCB_1664: MARINA CLEMENCIA RAMOS,** seguimiento técnico y social por parte de interventoria, se evidencia personal dentro de la obra, se observan avances en la ejecución, beneficiaria se muestra a gusto con el avance de la obra.
04/03/2021 - **MVCB_1592: HOBER FABIÁN BARRERA GUTIÉRREZ**, seguimiento técnico y social por parte de interventoria, se evidencia personal dentro de la obra, se observan avances en la ejecución, beneficiario se muestra a gusto con el avance de la obra.
05/03/2021 - **MVCB_1873: BLANCA FABIOLA LANDÁZURI MESA,** se realiza entrega de la vivienda a conformidad del beneficiario , se socializa presupuesto final, manual de uso y mantenimiento y se entrega kit ecológico.
05/03/2021 - **MVCB_1691: GINNA PAOLA MAECHA,** se observa personal de obra en el predio. La familia refiere conformidad. Se evidencian relaciones adecuadas con el personal de obra. La beneficiaria refiere dudas técnicas las cuales se le sugiere al contratista técnico se acerque y las haga.
05/03/2021 - **MVCB_1742: ANA ELVIRA MENDOZA DE HERNÁNDEZ,** seguimiento. Atiende la visita su hijo autorizado Héctor. Manifiesta que trabajadores han laborado todos los días. Se observa en el predio. Hay dudas técnicas las cuales son resueltas.

05/03/2021 - **MVCB_1774: JOSÉ WILSON MARULANDA GIRALDO,** seguimiento. Se observa personal de obra en el predio. El beneficiario manifiesta conformidad con los avances constructivos pero observa que hay actividades en el presupuesto que no se han ejecutado. Parte técnica de interventoria verifica que hay actividades que a la fecha no se ejecutaron por las condiciones en que se encontraban. Beneficiario refiere que los trabajadores han laborado todos los días.
05/03/2021 - **MVCB_5474: OLIVIA RIVERA.** Seguimiento, la beneficiaria manifiesta conformidad pero refiere que los trabajadores empezaron labores constructivas la semana en curso. Indica que a los trabajadores les falta material. Se observa personal de obra el en predio pero se le indica a doña Oliva que si los trabajadores no trabajan continuamente o es recurrente la ausencia de material llame al contratista..
05/03/2021 - **MVCB_5388: DUBERNEY ARIAS BETANCOURT,** seguimiento. Beneficiario manifiesta empezaron está semana pero no han trabajado constantemente. Se evidencia angustia por parte de la familia. Se le sugiere al contratista retomar labores ya que el avance ha sido mínimo
05/03/2021 - **MVCB_5395: MARÍA CRISTINA GONZÁLEZ GARCÍA,** seguimiento. No sé observa personal de obra en el predio. La señora María indica que el contratista le refirió que está semana empezarian las labores constructivas pero no ha sido así. Se le sugiere siga haciendo contacto telefónico y la interventoria pasará el reporte respectivo.
05/03/2021 -**MV_05324: ALDEMAR DUARTE LÓPEZ,** seguimiento. Recibe la visita su esposa María se recomienda hacer carta de autorización y anexarla a la bitácora. La familia se encuentra inconforme ya que la vivienda lleva 10 días de apertura y los maestros llegaron a laborar la semana en curso pero no han podido avanzar porque no poseen material. La señora María refiere que los residentes contratistas no han hecho seguimiento. El contratista refirió que en horas de la mañana llevarán material. Se le solicita avanzar las labores constructivas porque en la vivienda hay dos personas con condición de discapacitad
05/03/2021 - **MVCB_1748: OLGA LUZ BETANCOURT LEÓN**, seguimiento técnico y social por parte de interventoria y contratista, se evidencia personal dentro de la obra, se observan avances en la ejecución, la beneficiaria expresa un inconveniente con la tubería de salida del baño, dice que esta conectada a la cocina y esto hace que se genere malos olores y se tapone la ducha, contratista dice que va a dar solución a esta situación pero como son actividades no previstas se le dice a la beneficiaria que se va a modificar presupuesto para acomodar actividades, se deja escrito en bitácora y beneficiaria acepta compromiso.
06/03/2021 - **MVCB_1742: ANA ELVIRA MENDOZA DE HERNÁNDEZ,** visita de seguimiento con proyección a entrega, pero no han finalizado actividades. Beneficiaria conforme con la ejecución de obra.
06/03/2021 - **MVCB_2691: GINNA PAOLA MAHECHA FORERO,** visita de seguimiento, la cual e proyectaba para entrega, pero hay actividades pendientes por finalizar. La beneficiaria manifiesta conformidad con la ejecución de obra.
DESARROLLO: COLMENA
01/03/2021 - **MVJA_2062: MERCEDES WALTEROS JOANIAS**, seguimiento de obra
01/03/2021 - **MVJA_1896:HERNANDO TIQUE GUZMÁN,** seguimiento de obra
03/03/2021 - **MVJA_1896: HERNANDO TIQUE GUZMÁN,** visita de seguimiento de interventoría, se observa personal de obra trabajando, la persona autorizada refiere tener dudas de las actividades a ejecutar, que son resueltas por área técnica.
03/03/2021 - **MVJA_2077: SOFÍA PORRAS DE CAJAMARCA,** visita de seguimiento de interventoría, no se evidencia ingreso de materiales, ni personal de obra.
DESARROLLO: BARRIO GIBRALTAR I Y II
02/03/2021 - **MVJA_3397: LUZ MARINA ROBAYO,** seguimiento. La beneficiaria manifiesta conformidad con los avances constructivos pero indica que ayer y hoy solo llegó un trabajador. Se observa personal de obra en el predio. No manifiesta dudas e inquietudes.
02/03/2021 - **MVJA_3151: IRIA ESTHER SILVA,** seguimiento. la beneficiaria manifiesta inconformidad y angustia, el día sábado llego uno de los trabajadores que transportan el material y entro sin autorización al predio de la beneficiaria sacando sin la autorización de ella una herramienta de forma grosera. De igual manera los trabajadores se fueron del predio y le indicaron que no volverían . La señora iria refiere que la social contratista le indico que la obra iba a seguir su curso pero el día de hoy no retomaron labores. Con el consentimiento de la señora Iria mañana se interpondrá PQR si no retoman labores constructivas. Se le solicita al contratista llegar al día de mañana junto con la interventoria al predio . Por otro lado anoche se le inundo una habitación a la beneficiaria por el inadecuado enchape que instalaron. Se le
02/03/2021 - **MVJA_3011: RITA DEL CARMEN FONSECA,** seguimiento. La beneficiaria manifiesta conformidad con los avances constructivos. Se observa personal de obra en el predio
02/03/2021 -**MVJA_3157: IRIA ESTHER SILVA,** nuevamente se hace acercamiento al predio en compañía del contratista y el maestro de obra. El contratista refiere que hubo la perdida de un material; la beneficiaria refiere que no sabe si algún maestro lo saco ya que desde el inicio le indicaron que el contratista podía disponer del material. Se hace el compromiso dirigido a la familia de dejar registrado en bitácora el material que entra y sale de la casa. El contratista da la fecha del 12 de marzo para entrega a la beneficiaria de la vivienda.
03/03/2021 - **MVJA_3011: RITA FONSECA,** entrega de la vivienda, se socializa presupuesto final, manual de uso y conservción y se entrega kit ecológico.
03/03/2021 - **MVJA_3081: JOSÉ UNILCIO CIFUENTES QUINTERO Y OTRA**, entrega de la vivienda, se socializa presupuesto final, manual de uso y conservción y se entrega kit ecológico.
04/03/2021 - **MVJA_0922: FRANCISCO PIAMBA ANACONA,** visita de seguimiento contratista e interventoría, se observa personal de obra trabajando, el beneficiario no encontró la bitácora, por lo que se genera compromiso de encontrarla el día de hoy. Se explica al beneficiario que debe dejar secar el enchape de la ducha para poder usar el espacio, el contratista se compromete a cambiar enchape que se dañó, para que la familia pueda usar la ducha el día de mañana.
04/03/2021 - **MVJA_3086: LUIS ALFREDO CARPINTERO,** visita de seguimiento contratista e interventoría, se observa a un trabajador en la vivienda, avance de enchape en el área de sala. No se reportan novedades en la intervención.
04/03/2021 - **MVJA_3168: OLIVIA BOLAÑOS,** visita de seguimiento contratista e interventoría, la beneficiaria no desea la cenefa que instala el contratista, por lo que entrega al personal de obra una cenefa de su preferencia para continuar labores en el baño.
05/03/2021 -**MVJA_3157: IRIA ESTHER SILVA,** se hace visita de seguimiento en la cual no se observa personal de obra, por lo cual la beneficiaria interpone recurso de PQR, argumentando que debido a la obra no cuenta con espacios de cocina y baño. Se acuerda con el contratista reinicio de labores mañana 6 de marzo.
06/03/2021 - **MVJA_2395: DELIO MARTÍNEZ GAMBA:** Apertura de vivienda en la que se socializa presupuesto, indicaciones de bioseguridad, se entrega bitácora y se firman actas sociales y técnicas
ALTOS DE JALISCO

01/03/2021 - **MVJA_2371: ANA EDILMA ATARÁ ESPITIA,** seguimiento. La beneficiaria manifiesta que no han empezado obras constructivas. No sé observa personal de obra ni material. La señora Ana refiere inconformidad ya que la vivienda se aperturó hace 20 días. Indica si el día de mañana no se acercan los maestros al predio interpondrá PQR. Se le sugiere al contratista iniciar labores constructivas.
01/03/2021 - **MVJA_2712: JOSÉ ALIRIO ORTÍZ CABRERA ,** seguimiento. Se observa material en la vivienda, se evidencian maestros. La familia refleja conformidad con los avances.
1/03/2021 - **MVJA_ 2640: PAOLA ANDREA BARRERA PELÁEZ,** seguimiento. Beneficiaria manifiesta conformidad con los avances de la obra, se observa personal de obra en el predio.
01/03/2021 - **MVJA 2976: BLANCA LEONOR RÍOS CHAPARRO,** seguimiento (fallecida), aperturada con cónyuge Pedro Becerra. Se aperturó el 10-02-20 no sé observa personal de obra ni maestros en el predio. Por solicitud de la familia se interpone PQR ya que el beneficiario es de la tercera edad y la vivienda lleva 20 días de apertura. Se le solicita al contratista iniciar labores el día de mañana.
01/03/2021 - **MVJA_3239: NATIVIDAD SILDADNA CELYS,** seguimiento. No atienden a la puerta y la beneficiaria no contesta el teléfono.
3/03/2021 - **MVJA_ 2640: PAOLA ANDREA BARRERA PELÁEZ,** seguimiento.Responsable del predio ALIXON GARAY ORTÍZ. Se hace llamada a la beneficiaria para verifica si autoriza a Alixon a recibir la vivienda. Indica que solo la autorizo para los seguimientos, dicha aclaración y solicitud. también la realizó en días anteriores y quedó registrado en bitácora.
05/03/2021 - **MVJA_3239: NATIVIDAD SILDADNA CELYS,** seguimiento. Visita de seguimiento no atienden a la puerta y la beneficiaria no contesta el teléfono.
06/03/2021 - **MVJA_2640: PAOLA ANDREA BARRERA PELAEZ,** entrega de la vivienda, se socializa presupuesto final, manual de uso y conservción y se entrega kit ecológico.
06/03/2021 - **MVJA_2707: ANA LUISA BERNAL PULIDO:** Apertura de vivienda en la que se socializa presupuesto, indicaciones de bioseguridad, medidas de prevención por la cuarentena, se entrega bitácora y se firman actas sociales y técnicas
DESARROLLO: LAS DELICIAS DEL SUR ZONA 19
02/03/2021 - **MVJA_3257: NELLY PIZA BUITRAGO,** seguimiento. Se observa personal de obra pero no han iniciado labores por falta de material. La beneficiaria no manifiesta dudas. Se le indica si al día de mañana no empiezan labores constructivas se comunique con el consorcio.
04/03/2021 - **MVJA_1386: CRISTÓBAL SUA ALBARRACÍN,** visita de seguimiento contratista e interventoría, nadie atiende en el predio.
04/03/2021 - **MVJA_3257: NELLY PIZA BUITRAGO,** visita de seguimiento interventoría y contratista, se observa personal de obra en la vivienda, la beneficiaria no refiere inquietudes.
DESARROLLO: LA ESCALA TERCER SECTOR
01/03/2021 - **MVJA_0502: ROSALBA JARA DE ROJAS,** seguimiento. Se observa personal de obra en el predio. La familia refiere conformidad con los avances de la obra, doña Rosalba refiere que los trabajadores empezaron a laborar hace 8 días. Indica relaciones adecuadas con el personal de obra. Manifiesta dudas técnicas las cuales no son resuelta ya que hay ausencia de personal técnico en dicha zona.
05/03/2021 - **MVJA_0519: NÉSTOR JAVIER VALENZUELA PEÑA,** visita de seguimiento social - técnico de interventoría, no se evidencia ingreso de material, ni personal de obra.
DESARROLLO: DOMINGO LAIN II SECTOR Y CONDOMINIO DEL BOSQUE
05/03/2021 - **MVJA_2598: FLOR ÁNGELA MORANTES LÓPEZ,** visita de seguimiento interventoría y contratista, se evidencia cumplimiento del compromiso de entejar la habitación que se usa como patio, lo que permite iniciar el proceso de mejoramiento, presentando al personal de obra y socializando nuevamente las actividades a ejecutar. Se solicita ajustar e imprimir la validación y las memorias con el cambio de la actividad de vinilo por estuco.
06/03/2021 - **MVJA_2476: JAIME HUMBERTO BORDA LIBERATO**, apertura de obra en la que se socializan actividades de obra, presupuesto, indicaciones de bioseguridad, medidas de prevención por la cuarentena, se entrega bitácora y se firman actas sociales y técnicas.
06/03/2021 - **MVJA_2479: CRISTÓBAL VALBUENA**, apertura de obra en la que se socializan actividades de obra, presupuesto, indicaciones de bioseguridad, medidas de prevención por la cuarentena, se entrega bitácora y se firman actas sociales y técnicas.
06/03/2021 - **MVJA_1129: ANA BERTILDE GAMBOA VELANDIA,** apertura de obra en la que se socializan actividades de obra, presupuesto, indicaciones de bioseguridad, medidas de prevención por la cuarentena, se entrega bitácora y se firman actas sociales y técnicas.
06/03/2021 - **MVJA_1085: MARÍA NERY ECHEVERRY DE RESTREPO**, apertura de obra en la que se socializan actividades de obra, presupuesto, indicaciones de bioseguridad, medidas de prevención por la cuarentena, se entrega bitácora y se firman actas sociales y técnicas.
06/03/2021 - **MVJA_2763: CARLOS JESÚS BECERRA PEREZ autorizado JUAN CAMILO BECERRA MONROY,** apertura de obra, se socializan actividades de obra, presupuesto, indicaciones de bioseguridad, medidas de prevención por la cuarentena, se entrega bitácora y se firman actas sociales y técnicas.
BARRIO O TERRITORIO: DOMINGO LAIN III SECTOR
02/03/2021 - **MVJA_3105: BLANCA NELLY HERNÁNDEZ,** Seguimiento, la beneficiaria manifiesta inconformidad ya que los trabajadores no han Sido constantes, de igual manera refiere que no cuentan con la herramienta suficiente para ejecutar obras. Manifiesta que el día de hoy interpondrá PQR con en contratista y si no se acercan a la vivienda; indica que mañana irá directamente a la entidad.
06/03/2021 - **MVJA_2469: CARMEN LIVIA GÓMEZ DE CASTAÑEDA,** apertura en la cual se scializa presupuesto inicial, protocolo de bioseguridad, se firman actas de inicio técnicas y sociales.

06/03/2021 - **MVJA_2342: MARÍA DOLORES CASTILLO DE SÁNCHEZ,** apertura. Atiende visita la autorizada Tatiana Bolilla Sánchez por medio de carta de autorización y fotocopias de cédulas de ciudadanía.
06/03/2021 - **MVJA_2343: ERNESTO VERGARA NIETO,** apertura. Atiende visita la autorizada Gloria Patricia Vergara Tapias por medio de carta de autorización.
06/03/2021 - **MVJA_1096: GONZALO OÑATE BONILLA,** apertura en la cual se scializa presupuesto inicial, protocolo de bioseguridad, se firman actas de inicio técnicas y sociales.
DESARROLLO URBANIZACIÓN COMPARTIR
03/03/2021 - **MVCB_0527: LINA ROSA CARDENAS PATIÑO**, seguimiento de obra
DESARROLLO: CIUDAD MILAGRO
01/03/2021 - **MVJA_0286: HASBLEIDY GINA ROJAS,** seguimiento. Se observa personal de obra y conformidad por parte de la beneficiaria.
01/03/2021 - **MVJA_ 0395: JOSÉ ORVEY ORTÍZ,** seguimiento. Encargada del predio, su esposa MAGDALENA DÍAZ. Se observa personal de obra. La familia manifiesta conformidad por los trabajos constructivos.
05/03/2021 - **MVJA_0235: MARIELA OSORIO TRUJILLO,** visita de seguimiento contratista e interventoría, se observa a dos trabajadores en la vivienda, recibe la visita hijo de la beneficiaria, quién no reporta novedades. Avance del 90 % en las actividades, se proyecta entrega para el lunes.
02/03/2021 - **MVJA_0395: JOSÉ ORVEY ORTÍZ,** entrega de la vivienda, en la que se socializan presupuesto final, manual de uso y conservación y se entrega kit ecológico.
05/03/2021 - **MVJA_0235: MARIELA OSORIO TRUJILLO,** visita de seguimiento contratista e interventoría, se observa a dos trabajadores en la vivienda, recibe la visita hijo de la beneficiaria, quién no reporta novedades. Avance del 90 % en las actividades, se proyecta entrega para el lunes.
05/03/2021 - **MVJA_0286: HASBLEIDY GINA ROJAS ESCOBAR,** visita de seguimiento interventoría y contratista, se observa a dos trabajadores en la vivienda, la persona autorizada no manifiesta inquietudes; avance general en las actividades.
05/03/2021 - **MVJA_0328: VÍCTOR MANUEL URREA ACOSTA,** visita de contratista e interventoría, se observa a dos trabajadores en la vivienda, la persona autorizada no refiere novedades. Avance general en las actividades.
BARRIO O TERRITORIO: SAN LUIS
02/03/2021 - **MVJA_1876: JOSÉ OMAR CAMACHO TÉLLEZ, s**eguimiento. No se observa personal de obra, el beneficiario manifiesta que los maestros no laboraron 4 días la semana pasada . Manifiesta que ayer si laboraron. Se le sugiere al contratista retomar labores ya que es adulto mayor oxígeno dependiente y la casa lleva un mes de apertura.
06/03/2021 - **MVJA_2051: FABIO VELÁSQUEZ CABALLERO** apertura fallida. No se logra contacto telefónico, el señor dejo el celular en la vivienda, se encuentra su nuera pero no hay carta de autorización, social contratista da su número de contacto para que el beneficiario la llame
06/03/2021 - **MVJA_2005: AURORA ROJAS VELÁSQUEZ** apertura de obra, se socializan actividades, presuuesto inicial, protocolo de bioseguridad y se firman documentos técnicos y sociales.
LOCALIDAD: BOSA
DESARROLLO: LAS MARGARITAS SECTOR III
06/03/2021 - **MVBL_1875: MARÍA LUZ BONILLA,** visita de contratista e interventoría, la beneficiaria no se presenta a la citación, se evidencia que la vivienda continúa deshabitada.
LOCALIDAD: USME
DESARROLLO: VILLA ALEMANA II SECTOR
02/03/2021 - **MVUS_0682: JOSÉ DEL CARMEN SÁNCHEZ PÁEZ**, se entrega de la vivienda a conformidad del beneficiario , se socializa presupuesto final, manual de uso y mantenimiento y se entrega kit ecológico.
DESARROLLO: ANTONIO JOSÉ DE SUCRE I SECTOR
03/03/2021 - **MV_21184:AMALIA MERCHÁN SOSA ,** entrega de vivienda
05/03/2021 - **MV_19084: OCTAVIANO ECHEVERRY,** validación.

DESARROLLO: ANTONIO JOSE DE SUCRE III

05/03/2021 - **MV_21283: TERESA DE JESÚS OSORIO ORTÍZ,** seguimiento, se realiza seguimiento para comprobar compromisos de contratista para poder validar la entrega, se observa aún actividades pendientes que ya se les había aclarado al contratista, adicionalmente se observa fuga en la tubería de desagüe en la zona de lavandería.

4. CASOS ESPECIALES COMPONENTE SOCIAL - CONFLICTOS Y ANÓMALIAS

01/03/2021 - **MVJA 2976: BLANCA LEONOR RÍOS CHAPARRO,** seguimiento (fallecida), aperturada con cónyuge Pedro Becerra. Se aperturó el 10-02-20 no sé observa personal de obra ni maestros en el predio. Por solicitud de la familia se interpone PQR ya que el beneficiario es de la tercera edad y la vivienda lleva 20 días de apertura. Se le solicita al contratista iniciar labores el día de mañana.

02/03/2021 - **MVJA_3151: IRIA ESTHER SILVA,** seguimiento. la beneficiaria manifiesta inconformidad y angustia, el día sábado llego uno de los trabajadores que transportan el material y entro sin autorización al predio de la beneficiaria sacando sin la autorización de ella una herramienta de forma grosera. De igual manera los trabajadores se fueron del predio y le indicaron que no volverían . La señora iria refiere que la social contratista le indico que la obra iba a seguir su curso pero el día de hoy no retomaron labores. Con el consentimiento de la señora Iria mañana se interpondrá PQR si no retoman labores constructivas. Se le solicita al contratista llegar al día de mañana junto con la interventoria al predio . Por otro lado anoche se le inundo una habitación a la beneficiaria por el inadecuado enchape que instalaron. Se le sugiere al hermano de la beneficiaria estar pendiente de ella y de las labores constructivas ya que es de la tercera edad y vive sola.

5. PLAN DE ACCIÓN RESULTADO DEL ANÁLISIS DE CAUSAS REGISTRADO EN EL NUMERAL ANTERIOR - CON EL OBJETIVO DE ELIMINAR LA CAUSA RAÍZ DE LA SITUACIÓN PROBLEMÁTICA - PLAN DE MEJORA

ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA
02/03/2021 -**MVJA_3157: IRIA ESTHER SILVA,** nuevamente se hace acercamiento al predio en compañía del contratista y el maestro de obra. El contratista refiere que hubo la perdida de un material; la beneficiaria refiere que no sabe si algún maestro lo saco ya que desde el inicio le indicaron que el contratista podía disponer del material. Se hace el compromiso dirigido a la familia de dejar registrado en bitácora el material que entra y sale de la casa. El contratista da la fecha del 12 de marzo para entrega a la beneficiaria de la vivienda.	CONSORCIO MEJORAMIENTO EP 2020	02/03/2021
05/03/2021 -**MVJA_3157: IRIA ESTHER SILVA,** seguimiento. Se hace acercamiento al predio para verificar si los trabajadores empezaron las labores constructivas y se evidencia que no. Con el consentimiento de la beneficiaria se interpone PQR ya que los compromisos no se han cumplido a la fecha. La señora Iria es de la tercera edad y en el momento no está habilitada la cocina y el baño por cuestiones del mejoramiento. El contratista se compromete a traer al predio el día de mañana a los trabajadores.	CONSORCIO MEJORAMIENTO EP 2020	05/03/2021

6. Actas de reunión con la comunidad y listados de asistencia o soporte de las diferentes acciones según corresponda (cuando aplique).

01/03/2021 - **MVJA_2976: BLANCA RÍOS,** acta de PRQ por incumplimiento con la familia del inicio de obras y entrega de material para el mismo.

02/03/2021 - **MVJA_3105: BLANCA NELLY HERNÁNDEZ,** acta de seguimiento por solicitud de la beneficiaria para dar celeridad a su mejoramiento de vivienda.

03/03/2021 - **MVCB_5295: MARÍA YOLANDA LOZANO,** acta por obras externas a cargo de la beneficiaria.

04/03/2021 - **MVCB_3523: BLANCA INÉS RAMÍREZ,** acta de renuncia del subsidio de moejoramiento de vivienda.

05/03/2021 - **MVJA_3157: IRIA ESTER SILVA,** acta de PQR por incumplimiento de reanudación de labores constructivas.

7. COMENTARIOS DEL INTERVENTOR: Por favor realice la descripción general del estado del contrato y según aplique informe sobre: actividades realizadas en la semana, control de lluvias, compra y suministro de materiales, mano de obra, subcontratos y tramites ante las diferentes empresas prestadoras de servicios, entre otros. Anexe las actas de seguimiento realizadas en la semana correspondiente al periodo del informe.

Durante este periodo se recepcionaron dos PQR, las cuales se desglosan a continuación:
MARZO 02 DE 2021:
MVJA 2976: BLANCA LEONOR RÍOS CHAPARRO, por parte del núcleo familiar se informa que la vivienda lleva aperturada 20 días, pero no han iniciado labores, por lo tanto, se verifica con el contratista y se solicita se inicie ejecución el 2 de marzo.
MARZO 05 DE 2021:
MVJA_3157: IRIA ESTHER SILVA, se hace visita de seguimiento para verificar si los trabajadores retomaron las labores constructivas y se evidencia que no, por lo tanto, la beneficiaria interpone PQR debido a que es una persona de la tercera edad y no cuenta con los espacios de baño y cocina habilitados por las intervenciones. Se acuerda con el contratista . El contratista se compromete a traer personal al predio el día de mañana a los trabajadores.

8. REGISTRO FOTOGRÁFICO DEL AVANCE DURANTE LA SEMANA

ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE HÁBITAT


INPLAYCO S.A.S.
INGENIEROS CONSTRUCTORES E INTERVENTORES

REGISTRO FOTOGRÁFICO

INPLAYCO S.A.S.
INGENIEROS CONSTRUCTORES E INTERVENTORES

REGISTRO FOTOGRÁFICO

GRUPO 1

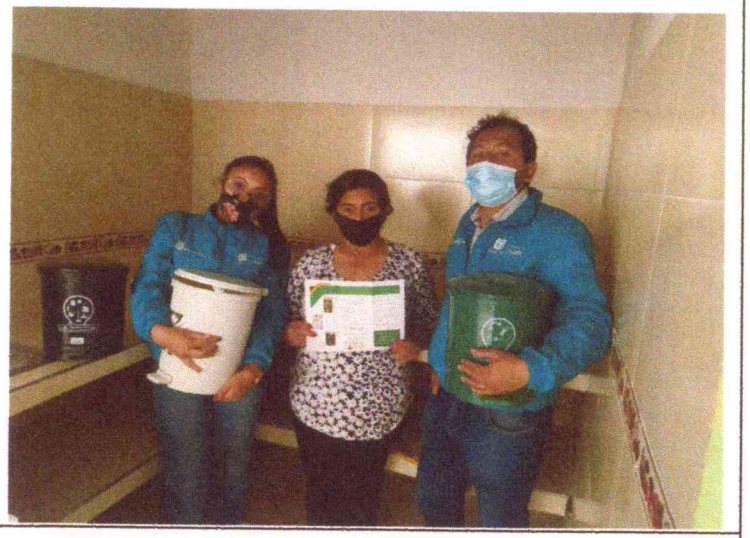

03/03/2021 - MV_21184:AMALIA MERCHÁN SOSA , seguimiento de obra



02/03/2021 - MVCB_1867: JOSÉ ALBER LUGO, entrega de vivienda



03/03/2021 - MVCB_1692: BEATRIZ ADIELA MARTÍNEZ JARAMILLO, ejecución # 39, entrega, se entrega de la vivienda a conformidad del beneficiario , se socializa presupuesto final, manual de uso y mantenimiento y se entrega kit ecológico.




05/03/2021 - MVCB_1873: BLANCA FABIOLA LANDÁZURI MESA, entrega, se realiza entrega de la vivienda a conformidad del beneficiario , se socializa presupuesto final, manual de uso y mantenimiento y se entrega kit ecológico.




05/03/2021 - MV_21283 : TERESA DE JESUS OSORIO ORTÍZ, seguimiento, se realiza seguimiento para comprobar compromisos de contratista para poder validar la entrega, se observa aún actividades pendientes que ya se les había aclarado al contratista, adicionalmente se observa fuga en la tubería de desagüe en la zona de lavandería.



05/03/2021 - MVJA_0675: JENNY XIMENA CAMELO VELASCO, entrega.

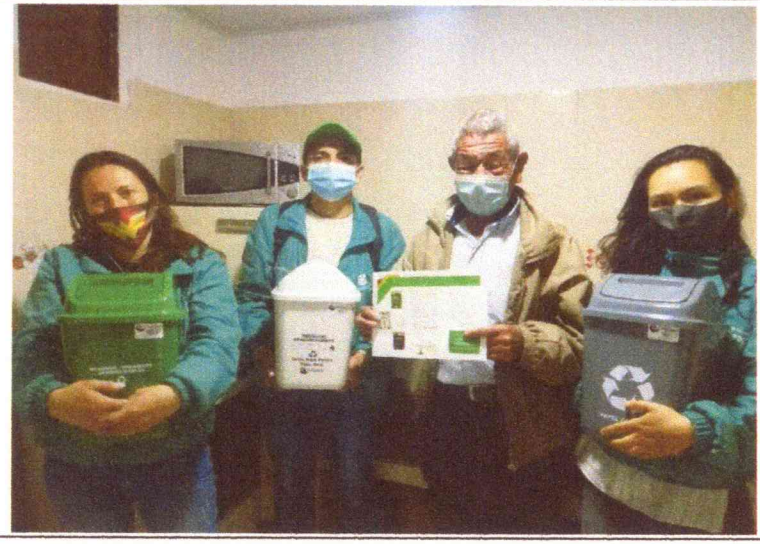

04/03/2021 - MVJA_3670: CRISTÓBAL PITA CAMARGO, entrega.

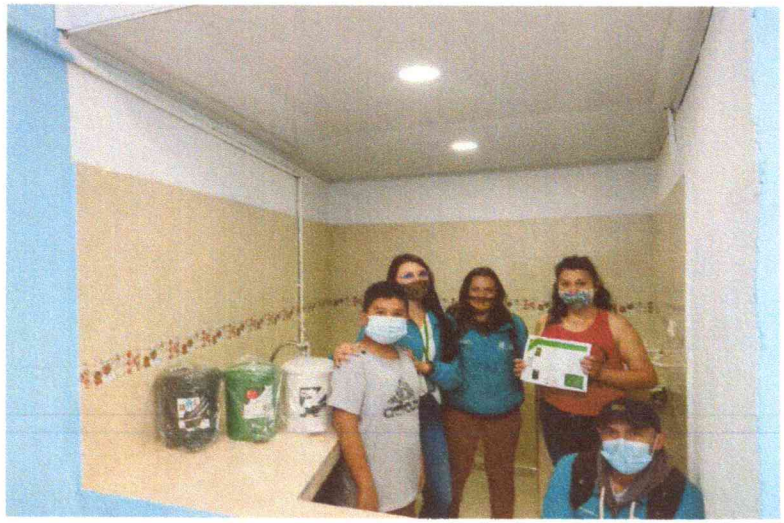

06/03/2021 - MVJA_2640: PAOLA ANDREA BARRERA PELAEZ, entrega.

ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE HÁBITAT

INPLAYCO S.A.S.
INGENIEROS CONSTRUCTORES E INTERVENTORES

MATRIZ DE PQR

BASE DE DATOS SEGUIMIENTO DE PETICIONES QUEJAS Y RECLAMOS EJECUCION DE OBRAS
SUBDIRECCIÓN DE BARRIOS
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA

Nº	Nº CONSECUTIVO DEL SISTEMA SIT	MV - ID	FECHA APERTURA	FECHA CIERRE	NOMBRE DE LA PERSONA SOLICITANTE	LOCALIDAD	TOS	BARRIO	DIRECCIÓN	TELÉFONO DE CONTACTO	TIPO DE SOLICITUD				DESCRIPCIÓN DEL ASUNTO Y/O SITUACIÓN	RECOMENDACIÓN / TRAMITE Y/O RESPUESTA	SEGUIMIENTO OBRA	SEGUIMIENTO INTERVENTORÍA	RESPUESTA DE CIERRE Y SOPORTE O TRAMITE ADELANTADO	ESTADO	
											P	Q	R	S						ABIERTO	CERRADO
1	1	MVJA_3314	21/12/2020	30/12/2020	MARÍA OLMA MOLANO ROMERO	CIUDAD BOLÍVAR	JALISCO	ALTOS DE JALISCO	CARRERA 18 P BIS B N 61 D 36 SUR	7912832 3222121133		X			La beneficiaria quien se encuentra vinculada como Historia de vida, manifiesta inconformidad con el atraso de obra ya que reside con su progenitora, quien está en seguimiento por parte de la Secretaria de Salud y debido a la incomodidad generada por la intervención se cayó, por lo expuesto anteriormente el contratista se compromete a a darle celeridad a la ejecución de obra en esta	La interventoria recomienda al contratista darle celeridad a la ejecución de obras en la vivienda, dados los factores de salud, seguimiento institucional de salud los adultos mayores y la edad de quienes residen allí.	29/12/2020	29/12/2020	Se realiza visita para cierre y entrega de la residencia. En dicha visita se observe que los compromisos hechos por el contratista están totalmente ejecutados de la mejor manera, dándole cierre a la queja y reclamo interpuesto por la beneficiaria en el desarrollo del mejoramiento de vivienda. Este cierre es firmado a satisfacción, por la beneficiaria.		X
2	1	MVJA_2812	23/12/2020	28/12/2020	ANDREA JENNIFFER ACOSTA MENDIVELSO	CIUDAD BOLÍVAR	JALISCO	ROCÍO ALTOS DEL SUR	KR 18M BIS 61C 29 SUR	3124384528 3108150889		X			Beneficiaria manifiesta inconformidad con respecto a los tiempos de ejecución y la intermitencia del personal de obra	Se recomienda al contratista acelerar la ejecución en la vivienda y seguimientos periódicos para verificar su avance	12/1/2021	19/01/2021 22/01/2021	Se finalizan las actividades constructivas por parte del contratista, dando cumplimiento a lo acordado para el cierre de la queja. Se entregan actividades finalizada, se socializa presupuesto, manual de uso y mantenimiento y se entrega kit ecológico.		X
3	1	MVJA_3670	28/12/2020	06/01/2021	CRISTÓBAL PITA CAMARGO	CIUDAD BOLÍVAR	JALISCO	ACACIAS SUR	KR 18Z 62 30 SUR	3118666063 3134655773		X			Radicado SDHT 1 2020 37091 Bajo derecho de peticion tramitado a la Personeria Distrital solicita "(...) se dé respuesta de fondo sobre el subsidio distrital de mejoramiento de vivienda según resolución 548 de 30 de diciembre de 2019 (...)"	Se remite respuesta por la SDHT informando ... "(...) contrato de obra No. 694 de 2020. cuya fecha de inicio fue el 4 de noviembre de 2020 cuenta con un grupo de 254 viviendas las cuales deben ser ejecutadas conforme al contrato de este. en un término de 5 meses. en su caso específico de tiene programada la visita de validación el dia 6 enero de 2021 a las 10:00 am. en donde se le brindará la información correspondiente y se verificaré las obras a realizar (...)"	6/1/2021	6/1/2021	Se visita al beneficiario en su vivienda en compañía de los profesionales técnicos y sociales de contratista e interventoría. Se socializa al beneficiario la información suministrada durante la reunión de inicio adelantada el 06 de noviembre del 2020. a la cual no logra acceder debido a su edad. siendo estos compementes: Normativa. requisitos. modalidad de habitabilidad. proceso. número de viviendas. contratista e interventoría y recomedaciones. Adicionalmente. se indica que se hará nueva visita para informar el presupuesto. actividades a		x
4	1	MVJA_0286	28/12/2020	06/01/2021	HASBLEIDY GINA ROJAS ESCOBAR	CIUDAD BOLÍVAR	JALISCO	CIUDAD MILAGRO	CL 62 BIS SUR 18J 12	3123501088 3115812468		X			Radicado SDHT 1 2020 37710 – MVJA_0286 – IIM Jalisco "(...) estoy muy inquieta porque habian quedado de venir a visitarme el dia 3 de diciembre para revisar el presupuesto e iniciar la obra (...)"	Se remite respuesta por la SDHT informando ... "(...) contrato de obra No. 694 de 2020. cuya fecha de inicio fue el 4 de noviembre de 2020 cuenta con un grupo de 254 viviendas las cuales deben ser ejecutadas conforme al contrato de este. en un término de 5 meses. en su caso específico de tiene programada la visita de validación el dia 6 enero de 2021 a las 2:00 pm. en donde se le brindará la información correspondiente y se verificaré las obras a realizar.(...)"	6/1/2021	6/1/2021	Se visita a la beneficiaria en su vivienda en compañía de los profesionales técnicos y sociales de contratista e interventoría. Se socializa a la beneficiaria la información suministrada durante la reunión de inicio: Normativa. requisitos. modalidad de habitabilidad. proceso. número de viviendas. contratista e interventoría y recomedaciones. Durante la visita se identifica por el área técnica que la vivienda no cuenta con instalaciones hidráulicas y eléctricas. Adicionalmente. se indica que se hará nueva visita para informar el presupuesto. actividades a		x
5	1	MVUS_0795	21/01/2021	03/02/2021	AÍDA MARÍA RUEDA NIETO	USME	USMINIA	NUEVO SAN LUIS	KR 5A 112A 24 SUR	3123523589		X			Radicado SDHT 1 2021 02006 – MVUS_0795 – IIM Usminia "(...) Tengo la inquietud y quiero saber realmente de cuanto es el valor total del subsidio de mejoramiento y en que se ve intervenir, que me otorgo el Hábitat ya que me siento inconforme(...)"	Se recomienda al contratista que al aperturar la vivienda para iniciar labores constructivas se socialicen actividades y presupuesto indicando claramente los temas a tratar dentro de la reunión de socialización y los motivos por los cuales no se hizo en este sector.	03/02/2021	03/02/2021	Se visita el predio en compañía de los profesionales técnicos y sociales de contratista e interventoría y la Profesional María Isabel Serrano. quienes socializan a la beneficiaria las actividades prioritarias. de acuerdo a las recomedaciones de habitabilidad del programa. Se brinda claridad al hogar beneficiario frente a las actividades a ejecutar de acuerdo al presupuesto de validación aprobados. brindando explicaciones frente a cubierta. l cual abarca un gran porcentaje del subsidio. Se exponen costos director e indirectos. se verifica presupuesto existente y se sugiere por parte de la SDHT la claridad en cuanto a las unidades de medida. lo cual se debe plasmar en bitácora en la próxima visita.		X

6	1	MVCB_4917	23/01/2021	03/02/2021	ÁLVARO ALONSO MORENO	CIUDAD BOLÍVAR	HABITARTE 2019	JUAN PABLO II	KR 18M BIS 66B 62 SUR	3115238646 3124274163	X				Radicado SDHT 1 2021 02616 – MVCB_4917– HM Habitarte 2019 "(…) No he vuelto a recibir ninguna respuesta segun ellos dicen que necesitan hacer una aprobacion más por el proyecto de Hábitat (…)"	Se realiza reapertura en la cual se socializan actividades de obra con presupuesto inicial. indicaciones de bioseguridad por parte de la profesional social SST. Se realizaron recomendaciones sociales.	03/03/2021	03/02/2021	En compañía de la SDHT a cargo de María Isabel Serrano. los profesionales técnicos y sociales de la interventoría y contratista. se isita el predio beneficiario para proceder a explicar al beneficiario el trámite de cierre a su petición teniendo en cuenta que ya se iniciaron labores constructivas en la vivienda. además se explican los costos directos e indirectos del subsidio. Por último. se decide llevar el caso de la vivienda a comité de obra para dialogar sobre las		X
7	1	MVJA_3146	30/01/2021	05/02/2021	CLARA INÉS GIL BÁEZ	CIUDAD BOLÍVAR	JALISCO	ALTOS DE JALISCO	KR 18F 62A 45 SUR MJ	7907027 313325352		X			La beneficiaria presenta inconformidad por el tiempo durante la ejecución de obra. manifiesta que las cantidades socializadas a inicio son diferentes a las indicadas dos días antes de finalizar.	Se recomienda al contratista hacer seguimiento social frecuentemente para aclarar inquietudes que puedan surgir hasta finalizar la etapa de ejecución; en la vivienda. adicionalmente. verificar las cantidades. actividades y presupuesto inicial y final. en caso de presentarse cambios. informarlos a la beneficiaria e interventoría y modificarlos como corresponde.	02/02/2021	01/02/202105/02/2021	Se entrega la vivienda con la intervención finalizada en la habitacion N° 5. la cual había sido solicitada por la beneficiaria. y aunque manifiesta inconformidad generalizada frente a las intervenciones. firma las actas de cierre. pero no se tomarre la foto de entrega		X
8	1	MVJA_2414	10/02/2021	24/02/2021	LUZ MARINA RINCÓN	CIUDAD BOLÍVAR	JALISCO	LUCERO MEDIO	KR 18E 64F 29 SUR	3222424729	X				Radicado SDHT 1 2021 05863 – MVJA_2414– HM Jalisco "(…) el día 09 de febrero .. se comunica la señora Luz Marina Rincón para manifestar su inconformidad ante la secretaria del Hábitat (…)"	Mediante correo electrónico se informa a la SDHT: En atención a la solicitud expuesta en el correo que antecede. Nos permitimos informar que la beneficiaria titular del subsidio correspondiente a la vivienda MVJA_2414: MARÍA ELENA RINCÓN. renunció al proceso el 09 de febrero de 2021. día en que se pretendían iniciar actividades de obra: posterior a un altercado familiar del cual fueron testigos los profesionales técnicos y sociales del contratista e interventoría. Según manifestó la beneficiaria. no se ha hecho sucesión. por lo cual sus demás hermanos se encuentran en discusiones constantes frente al proceso jurídico. Apelando la	09/02/2021	09/02/2021	Mediante correo electrónico se informa a la SDHT: En atención a la solicitud expuesta en el correo que antecede. Nos permitimos informar que la beneficiaria titular del subsidio correspondiente a la vivienda MVJA_2414: MARÍA ELENA RINCÓN. renunció al proceso el 09 de febrero de 2021. día en que se pretendían iniciar actividades de obra: posterior a un altercado familiar del cual fueron testigos los profesionales técnicos y sociales del contratista e interventoría. Según manifestó la beneficiaria. no se ha hecho sucesión. por lo cual sus demás hermanos se encuentran en discusiones constantes frente al proceso jurídico. Apelando la decisión de la hermana de postular el inmueble para este beneficio. Para su verificación. adjuntamos		X
9	1	MVJA_2976	01/03/2021		BLANCA LEONOR RÍOS CHAPARRO	CIUDAD BOLÍVAR	JALISCO	ALTOS DE JALISCO	KR 18N BIS 61A 53 SUR	41695123		X			Beneficiario Pedro Becerra de la tercera edad quien asume el subsidio porque su esposa falleció. refiere inconformidad por el retraso en el inicio de actividades. se aperturó el 19 02 26 no se observa personal de obra ni maestros en el predio. Por solicitud de la familia se interpone PQR ya que el beneficiario es de la tercera edad y la vivienda lleva 20 días de apertura.	Se le recomienda al contratista iniciar labores el día 02 de marzo de 2021					X	
10	1	MVJA_3157	05/03/2021		IRIA ESTHER SILVA	CIUDAD BOLÍVAR	JALISCO	GIBRALTAR I Y II	KR 18F 63 16 SUR	34345129		X			Se hace acercamiento al predio para verificar si los trabajadores empezaron las labores constructivas y se evidencia que no.Se interpone PQR ya que los compromisos no se han cumplido a la fecha. La señora Iris es de la tercera edad y en el momento no está habilitada la cocina y el baño por cuestiones del mejoramiento. El contratista se compromete a traer al predio el día de mañana a los trabajadores.	Se recomienda al contratista acelerar la ejecución en la vivienda y seguimientos periódicos para verificar su avance					X	

INPLAYCO S.A.S.
INGENIEROS CONSTRUCTORES & INTERVENTORES

ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE HÁBITAT

INFORME SISO SEMANAL 18

INPLAYCO S.A.S.	INFORME HSE	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DEL HÁBITAT

INFORME INTERVENTORÍA SISO

FECHA DEL INFORME		OBJETO DEL CONTRATO	INFORME
DESDE	1/3/2021	" Ejecución de las obras de mejoramiento de vivienda en la modalidad de habitabilidad en los territorios priorizados por la Secretaría Distrital del Hábitat."	18
HASTA	7/3/2021		

1. Descripción de las Actividades Realizadas durante la semana

Contratista: Acompañamiento a las actividades de Seguimiento y apertura a las mejoras en las vivienda por parte del equipo técnico, Contratista: Acompañamiento a las actividades de Seguimiento y apertura a las mejoras en las vivienda por parte del equipo técnico, divulgación del protocolo de seguridad y bioseguridad para ingreso a las viviendas; Se hace seguimiento a las actividades que vienen desarrollando en las viviendas asignadas a los diferentes grupos de trabajo en compañía de interventoría. Se verificó uso correcto de herramientas, autocuidado, trabajo seguro durante las visitas. Se realiza jornada de aseo y recogida de escombro en las viviendas. Se acompañó en aperturas en los diferentes sectores de intervención.

Charla de " **USO PERMANENTE DE TAPABOCAS**" Dirigida al personal operativo, con recomendaciones aplicables en el trabajo. medidas para prevenir la transmision del coronavirus.

Interventoría: Continuando con el acompañamiento y verificación del cumplimiento del protocolo de Bioseguridad entregado por parte del contratista, proceso que se cumple durante los recorridos realizados. Se realizan actividades administrativas referente a informe semanal y revisión de documentos del personal contratado y del personal que se ha retirado.

Recorrido por diferentes sectores en compañía de profesional SISO del contratista, reforzando tema de autocuidado y prevención, se revisa el contenido del kit de bioseguridad, se hace enfasis a los beneficiarios sobre el uso del tapabocas y evitar al máximo el contacto con los maestros de obra, en especial si se cuenta con enfermedades catalogadas de alto riesgo. Se hace énfasis en la periodicidad de recolección de Escombros y la ejecución de procedimientos de trabajo seguro durante las actividades.

CAPACITACION

Jornadas de Inducción y divulgación del Protocolo de Bioseguridad , Capacitación "USO PERMANENTE DE TAPABOCAS"	si	100%
	La charla se hace durante las visitas de seguimiento, se refuerza el tema de bioseguridad y se verifica su aplicación	

2. Gestión Ambiental

Seguimiento a la recolección de escombros de las viviendas intervenidas y a la disposición final de escombros en lugar autorizado por la autoridad ambiental.

2.1. Generación y Disposición de Residuos Sólidos

Tipo de Residuo	Cantidad m3	Acumulado	Sitio de Disposición	Observaciones
Escombro	8	256	CEMEX	SE RECIBE COPIA DEL VALE DE DISPOSICIÓN FINAL

3. Gestión en Salud Ocupacional (Seguridad e Higiene Industrial)

Se sigue verificando la aplicación del protocolo de Bioseguridad, dando recomendaciones a los trabajadores como parte de las medidas de prevención de accidentes.

Se verifican afiliaciones de personal que ingresa y las planillas recibidas, asi mismo se solicitaron los respectivos paz y salvo del persona retirado del cual se hara una recopilación para informe final.

3.1. Indices

Valor	Horas Hombre Trabajadas Contratista	Horas Hombre Capacitación	Horas Hombre Trabajadas Interventoria	Dias Ausentismo por Enfermedad General	Ausentismo por Accidentes de Trabajo
Total Semanales	3648	10	576	0	0
Total Acumulado	51424	300	8120	10	0

3.1.1.Incidendentalidad

	Fatalidades	Casos Con Daños A propiedad	Incidente Ambiental	Incidente Vehicular	Casi Accidentes	Casos Con dias Perdidos	Casos con Trabajo restringido	Casos Con Dias de Incapacidad (tratamiento medico)
Total	0	0	0	0	1	0	0	0

3.2. Capacitaciones y Charlas

3/3/2021	Se realizó charla "USO PERMANENTE DE TAPABOCAS" dirigida al personal operativo. Se reafirma el protocolo de Bioseguridad en las viviendas aperturadas

3.3. Condiciones y Acciones Subsanar

3.3.1 Condición Substandar


No	Descripción	Acción Tomada	La Condición Continua?
1	Se solicita la recolección de escombros en los siguientes MV: MV 1310 MV 1692 MV 1608 MV 1691 MV1 811	se le informa al SISO del comtratista para tomar las medidas pertinentes	El escombro es recogido

4. Registro Fotográfico

KIT DE BIOSEGURIDAD



MV 1592



MV 1631



MV 1664


Recogida escombro






MV 1310


ENTREGA DE DOTACIONES



MV 1681

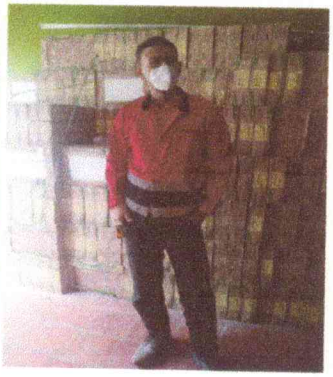



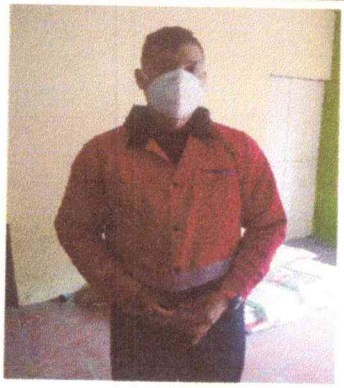

ENTREGADOS EN BODEGA

INPLAYCO S.A.S.
INGENIEROS CONSTRUCTORES E INTERVENTORES

INFORME SISO
INPLAYCO SAS
Fecha: 1 al 7 de Marzo de 2021

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DEL HÁBITAT

META DE CUMPLIMIENTO AL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO, MEDIO AMBIENTE Y CALIDAD: 100%

ACTIVIDADES						GESTIÓN AMBIENTAL			No. HORAS HOMBRE CAPACITACIONES					Reportes de incidentes en el componente social y técnico.								
PROYECTO / DEPARTAMENTO	CONTRATO	CONTRATISTA	OBJETO CONTRATO	NUMERO DE TRABAJADORES	HORAS HOMBRE TRABAJADAS	ESCOMBROS (Cantidad m3)	RESIDUOS PELIGROSOS (Kg)	CONSUMO DE AGUA (m3), para las actividades de mejoramiento de viviendá	PROFESIONALES	TECNICOS	OPERATIVOS (Subcontratistas, maestros y auxiliares)	PROVEEDOR	TOTAL	LUGAR O ÁREA DE TRABAJO	FECHA DEL ACCIDENTE	No. DÍAS INCAPACIDAD	No. ACCIDENTE REGISTRABLE	FECHA DE INVESTIGACIÓN	DESCRIPCION DEL ACCIDENTE	RELACION DE EQUIPO DE INVESTIGACIÓN	LECCIÓN APRENDIDA	PLAN DE ACCIÓN Y FECHA
	CONTRATO 694 - 2020 CONTRATISTA: CONSORCIO MEJORAMIENTO EP 2020		Contratar la ejecución de las obras de mejoramiento de vivienda en la modalidad de habitabilidad de los proyectos estructurados en los territorios priorizados por la Secretaria Distrital de Hábitat. Grupo I	76	3648	8.0	0.0		0.00	0.00	40.00	0.00	40			0	0					
				12	576				0	0	0	0	0			0	0					
									0	0	0	0	0			0	0					
									0	0	0	0	0			0	0					
									0	0	0	0	0			0	0					
									0	0	0	0	0			0	0					
				88	4224	8	0	0.0	0.00	0.00	40.00	0.00	40.00	0	0	0	0		0			

ELABORO: ROBERT ROJAS TORRES -PROFESIONAL SISO

INDICADORES SST- CONTRATO No. 694 2020	
HORAS HOMBRE SEMANAL	4,224
HORAS HOMBRE ACUMULADAS MES	4,224
HORAS HOMBRE ACUMULADAS TOTAL	59,544
No. INCIDENTES REGISTRABLES	0
No. DÍAS DE INCAPACIDAD	0
No. DÍAS DE INCAPACIDAD ACUMULADOS MES	0
HORAS CAPACITACIONES SEMANAL	10.00
HORAS CAPACITACIONES ACUMULADO MENSUAL	10.00
HORAS CAPACITACIONES ACOMULADO TOTAL	300.00

GESTIÓN AMBIENTAL		
ESCOMBROS (Cantidad m3) Semanal	8	Escombrera Cemex
ESCOMBROS (Cantidad acumuladas mes)	8	
ESCOMBROS (Cantidad acumuladas mes)	256	
RESIDUOS PELIGROSOS (Cantidad Kg semanal)	0	
RESIDUOS PELIGROSOS (Cantidad acumuladas mes)	0	
CONSUMO DE AGUA (m3) Semanal	0	Uso de agua de cada vivienda, incluyendo agua lluvia, no se ha adquirido agua adicional
CONSUMO DE AGUA (m3), Mensual	0	

INFORME SISO
INPLAYCO SAS
Fecha: 1 al 7 de Marzo de 2021

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARIA DEL HABITAT

RELACIÓN DE: CHARLAS DIARIAS CAPACITACIONES SIMULACROS LECCIONES APRENDIAS (Fechas)	OBSERVACION POR PARTE DE INTERVENTORÍA	REGISTRO FOTOGRÁFICO		
Se realizó charla en los diferentes puestos de trabajo USO PERMANENTE DE TAPABOCAS	Por la distancia entre los diferentes áreas de trabajo, se realiza la charla en cada una de las viviendas visitadas, diligenciando el respectivo registro			
		MV 1638	MV 1704	


INFORME SISO

Fecha: 1 al 7 de Marzo de 2021

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DEL HÁBITAT

CONTRATO: 694 - 2020
CONTRATISTA: CONSORCIO MEJORAMIENTO EP 2020

CONDICIONES Y ACCIONES SUBESTÁNDAR

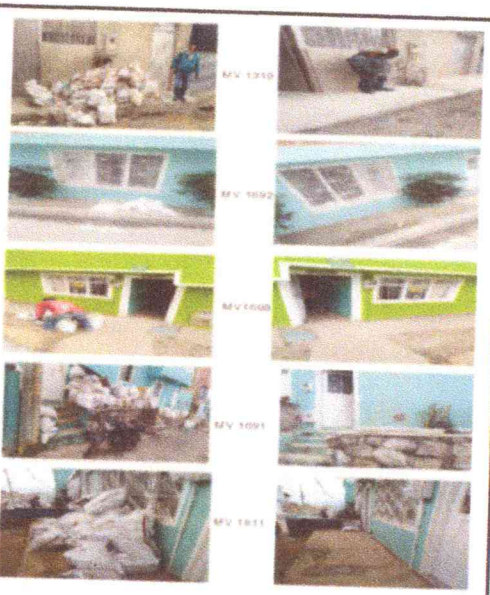No.	DESCRIPCIÓN	HALLAZGOS	ACCIÓN CONTINÚA		FECHAS		RESPONSABLE	REGISTRO FOTOGRÁFICO
			ABIERTA	CERRADA	FECHA DE APERTURA	FECHA DE CIERRE		
1	AMBIENTAL	Se solicita la recolección de escombros en los siguientes MV: MV 1310 MV 1692 MV 1608 MV 1691 MV 1811	1	1	27/2/2021	1/3/2021	LEDA LAMBIS	
			1	1				

TOTAL ACCIONES ABIERTAS	1
TOTAL ACCIONES CERRADAS	1

INPLAYCO S.A.S.

INFORME SISO

Fecha: 1 al 7 de Marzo de 2021

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DEL HÁBITAT

CONTRATO: 694-2020
CONTRATISTA: CONSORCIO MEJORAMIENTO EP 2020

RELACIÓN DE TRABAJADORES ADMINISTRATIVOS Y OPERATIVOS AFILIADOS A SEGURIDAD SOCIAL

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	C.C.	Fecha de afiliación	Personal afiliado Administrativos	Personal afiliado (operativo: maestros y auxiliares)	EPS	PENSION	ARL	ESTADO ACTUAL		OBSERVACIONES
									ACTIVO	RETIRADO	
1	CARLOS JOSE HERNADEZ JIMENEZ	78,717,000	17/11/2020	1		NUEVA EPS	PORVENIR	POSITIVA	SI		
2	DIANA CAROLINA NAVARRO JIMENEZ	52,233,027	20/11/2020	1		COMPENSAR	PORVENIR	POSITIVA	SI		
3	LEDA LUZ LAMBIS CASTRO	22,732,837	19/11/2020	1		SURA	PORVENIR	POSITIVA	SI		
4	LUIS FERNANDOI CARRILLO JIMENEZ	72,097,065	19/11/2020	1		CAJACOPI	COLFONDOS	POSITIVA	SI		
5	RICARDO JAIMES RUIZ	19,144,052	19/11/2020	1		NUEVA EPS	NO APLICA	POSITIVA	SI		
6	SHIRLEY AMELI VITOLA SERRANO	64,583,890	19/11/2020	1		COMPENSAR	PORVENIR	POSITIVA	SI		
7	YESENIA VIVIANA GAMEZ SALAS	1,120,745,285	19/11/2020	1		NUEVA EPS	COLFONDOS	POSITIVA	SI		
8	MARCO AUGUSTO HAMON RODRIGUEZ	1,070,955,988	19/11/2020	1		FAMISANAR	PORVENIR	POSITIVA	SI		
9	LINA MARCELA COLORADO CASTRO	1,019,022,812	19/11/2020	1		SALUD TOTAL	PORVENIR	POSITIVA	SI		
10	DANIELA CASTAÑO CASTAÑO	1,032,447,818	19/11/2020	1		FAMISANAR	PROTECCION	POSITIVA	SI		
11	LIBYS PADILLA URUETA	1,073,822,532	2/10/2020	1		SALUD TOTAL	PORVENIR	POSITIVA		SI	RETIRADO
12	JUAN ADRES CORREDOR MAYORGA	1,022,401,358	19/11/2020	1		FAMISANAR	PORVENIR	POSITIVA		SI	RETIRADO
13	GERSON ASPRILLA LOPEZ	11,797,192	19/11/2020	1		SANITAS	COLPENSIONES	POSITIVA	SI		
14	WILFRED BENAVIDEZ SANCHEZ	79,851,515	19/11/2020	1		ALIANSA SALUD	PORVENIR	POSITIVA		SI	RETIRADO
15	JUAN SEBASTIAN GONZALEZ	1,022,402,058	19/11/2020	1		SANITAS	PORVENIR	POSITIVA		SI	RETIRADO
16	GREGORY FERNEY MOSQUERA	1,105,305,250	29/11/2020	1		SALUD TOTAL	PROTECCION	POSITIVA	SI		
17	CARLOS COLORADO BANDO	13,107,585	24/11/2020		1	SALUD TOTAL	PORVENIR	SURA		SI	RETIRADO
18	OSCAR ARMANDO CALVACHE PAZ	12,977,717	24/11/2020		1	SALUD TOTAL	PORVENIR	SURA		SI	RETIRADO
19	CARLOS ALBERTO CAICEDO HINOJOSA	1,111,817,731	24/11/2020		1	SALUD TOTAL	PORVENIR	SURA		SI	RETIRADO
20	YARLI COLORADO PAZ	1,065,549,452	24/11/2020		1	CAPITAL SALUD	PORVENIR	SURA		SI	RETIRADO
21	ANDAIR MONTIEL VAQUIRO	1,007,535,425	25/11/2020		1	SALUD TOTAL	COLPENSIONES	SURA		SI	RETIRADO
22	EDGAR MARTINEZ CRUZ	79,296,107	25/11/2020		1	SALUD TOTAL	PROTECCION	SURA		SI	RETIRADO
23	EDWIN HARVEY DE LA CRUZ TORO	10,307,972	25/11/2020		1	SALUD TOTAL	COLPENSIONES	SURA		SI	RETIRADO
24	FERNANDO VIDAL ORTIZ	5,887,718	25/11/2020		1	FAMISANAR	COLPENSIONES	SURA		SI	RETIRADO
25	IDELFONSO CIFUENTES	19,232,722	25/11/2020		1	SURA	PORVENIR	SURA		SI	RETIRADO
26	MARLON HUMBERTO MARTINEZ VAZQUEZ	1,031,152,755	25/11/2020		1	FAMISANAR	PORVENIR	SURA		SI	RETIRADO
27	WILMER ANDRES ROJAS SOLANO	1,118,534,846	25/11/2020		1	SALUD TOTAL	PORVENIR	SURA		SI	RETIRADO
28	VICTOR RUIZ GARCIA	1,002,597,213	25/11/2020		1	CAPITAL SALUD	PORVENIR	SURA		SI	RETIRADO
29	ILDELFONSO RAMIREZ ESQUIVEL	96,361,399	1/12/2020		1	FAMISANAR	COLPENSIONES	SURA		SI	RETIRADO
30	JUAN PABLO CORREA MURCIA	1,116,920,538	1/12/2020		1	SALUD TOTAL	PORVENIR	SURA		SI	RETIRADO
31	KEVIN FABIAN HOYOS YEPEZ	1,083,043,276	1/12/2020		1	SALUD TOTAL	PROTECCION	SURA		SI	RETIRADO
32	LAMBERTO GABRIEL DORIA SANCHEZ	72,147,586	1/12/2020		1	SALUD TOTAL	PROTECCION	SURA		SI	RETIRADO
33	ARLEY GIOVANNI CAICEDO RAMIREZ	1,117,511,256	3/12/2020		1	SALUD TOTAL	PORVENIR	SURA		SI	RETIRADO
34	ALBERT JOSE LEON GOMEZ	828,089,416,111,997	3/12/2020		1	SALUD TOTAL	COLFONDOS	SURA		SI	RETIRADO
35	NUBIA VERGARA ALDANA	53,092,609	3/12/2020		1	SALUD TOTAL	PROTECCION	SURA	SI		Afiliado el 3 de diciembre , ingresa por cambio de frente de trabajo en Febrero 3 de 2021 al G1

RELACIÓN DE TRABAJADORES ADMINISTRATIVOS Y OPERATIVOS AFILIADOS A SEGURIDAD SOCIAL											
No.	NOMBRES Y APELLIDOS	C.C.	Fecha de afiliación	Personal afiliado Administrativos	Personal afiliado (operativo: maestros y auxiliares)	EPS	PENSION	ARL	ESTADO ACTUAL		OBSERVACIONES
									ACTIVO	RETIRADO	
36	ALEXANDER VERGARA ALDANA	80,332,087	3/12/2020		1	FAMISANAR	PROTECCION	SURA		SI	RETIRADO
37	ANTONIO PAZ SEGUNDO	16,537,810	3/12/2020		1	SALUD TOTAL	PROTECCION	SURA		SI	RETIRADO
38	JHON WILLIAM BALLESTEROS MARTINEZ	1,033,781,449	8/12/2020		1	COMPENSAR	PORVENIR	SURA		SI	RETIRADO
39	CARLOS ENRIQUE REDONDO	80,373,803	13/12/2020		1	SALUD TOTAL	COLPENSIONES	SURA	SI		
40	JULIO FERNEY BENAVIDES MENDEZ	80,256,134	13/12/2020		1	SALUD TOTAL	COLFONDOS	SURA		SI	RETIRADO
41	FREDY EDINSON FORERO NIÑO	1,024,489,116	15/12/2020		1	SALUD TOTAL	PORVENIR	SURA		SI	RETIRADO
42	JUAN AGUSTIN LIZARAZO	4,103,403	15/12/2020		1	SANITAS	65 AÑOS LIQUIDADO	SURA		SI	RETIRADO
43	JOSE IGNACIO CANO NOVOA	7,330,323	15/12/2020		1	CAPITAL SALUD	64 AÑOS LIQUIDADO	SURA		SI	RETIRADO
44	BRAYAN ESTIVEN LOPEZ MOLINA	1,024,602,801	17/11/2020		1	FAMISANAR	PROTECCION	POSITIVA		SI	RETIRADO
45	EDWIN JIMMY ESPINEL CHACON	80,064,358	17/11/2020		1	NUEVA EPS	COLPENSIONES	POSITIVA		SI	RETIRADO
46	EVANGELISTA BRINEZ BURGOS	6,030,390	17/11/2020		1	SALUD TOTAL	COLPENSIONES	POSITIVA		SI	RETIRADO
47	FABIO NELSON LOPEZ DIAZ	80,124,048	17/11/2020		1	SALUD TOTAL	PROTECCION	POSITIVA		SI	RETIRADO
48	RAFAEL CASTRO VILLA	8,815,936	17/11/2020		1	SALUD TOTAL	PORVENIR	POSITIVA		SI	RETIRADO
49	MICHEL LEONARDO SALAS CELIS	1,033,766,212	17/11/2020		1	FAMISANAR	PORVENIR	POSITIVA		SI	RETIRADO
50	VLADIMIR BRIÑEZ MAHECHA	1,033,682,982	17/11/2020		1	FAMISANAR	COLFONDOS	POSITIVA		SI	RETIRADO
51	CARLOS PAEZ PULIDO	1,049,630,871	17/11/2020		1	MEDIMAS	PROTECCION	POSITIVA		SI	RETIRADO
52	RAUL OSORIO RINCON	79,669,250	17/11/2020		1	SALUD TOTAL	PORVENIR	POSITIVA		SI	RETIRADO
53	HAYDER CAMILO GALVIZ	1,033,762,528	17/11/2020		1	FAMISANAR	PROTECCION	POSITIVA		SI	RETIRADO
54	CAMILO HERNANDEZ SANCHEZ	1,049,639,642	17/11/2020		1	FAMISANAR	COLFONDOS	POSITIVA		SI	RETIRADO
55	EMITZO JOSE FANDIÑO FLOREZ	85,469,924	18/11/2020		1	NUEVA EPS	PORVENIR	POSITIVA		SI	RETIRADO
56	JULIO CESAR NEIRA BENAVIDEZ	79,903,950	18/11/2020		1	COMPENSAR	PROTECCION	POSITIVA		SI	RETIRADO
57	LEYDY PATRICIA SUAREZ VELAZQUEZ	1,033,693,495	18/11/2020		1	CAPITAL SALUD	PROTECCION	POSITIVA		SI	RETIRADO
58	CARLOS ANDRES SUAREZ VELAZQUEZ	1,033,693,493	18/11/2020		1	FAMISANAR	PORVENIR	POSITIVA		SI	RETIRADO
59	LUIS FERNANDO CUPITRA DUCUARA	1,022,939,409	18/11/2020		1	SURA	COLFONDOS	POSITIVA		SI	RETIRADO
60	LUIS ALEJANDRO ZAMBRANO	79,770,115	18/11/2020		1	CAPITAL SALUD	COLPENSIONES	POSITIVA		SI	RETIRADO
61	OSBAR RENE BERNAL PAEZ	80,778,371	20/11/2020		1	SALUD TOTAL	PROTECCION	POSITIVA	SI		
62	MISAEL PERDOMO VILLAMIL	1,033,784,477	24/11/2020		1	NUEVA EPS	PORVENIR	POSITIVA		SI	RETIRADO
63	ALBEIRO GUERRERO MACANA	5,996,412	25/11/2020		1	NUEVA EPS	PORVENIR	POSITIVA		SI	RETIRADO
64	EDWIN RODRIGUEZ VIDAL	93,394,589	25/11/2020		1	MEDIMAS	PORVENIR	POSITIVA	SI		
65	JOSE ANTONIO SILVA ORTEGA	19,456,840	25/11/2020		1	COMFACUNDI	PORVENIR	POSITIVA		SI	RETIRADO
66	SAURITH REALES DELGADO	91,431,492	25/11/2020		1	NUEVA EPS	COLPENSIONES	POSITIVA		SI	RETIRADO
67	EDISON JOSE VENECIA SARABIA	72,120,789	25/11/2020		1	FAMISANAR	PORVENIR	POSITIVA		SI	RETIRADO
68	YOENDISON JOSE VENECIA MORENO	1,101,879,446	25/11/2020		1	COMPARTA	PORVENIR	POSITIVA		SI	RETIRADO
69	RUBEN PINEDA MAHECHA	1,031,151,104	25/11/2020		1	SALUD TOTAL	PORVENIR	POSITIVA		SI	RETIRADO
70	LUIS FRANCISCO GOMEZ SANCHEZ	80857562	25/11/2020		1	FAMISANAR	COLPENSIONES	POSITIVA		SI	RETIRADO
71	LUIS HERNANDEZ BARRETO	80,856,697	25/11/2020		1	SANITAS	PROTECCION	POSITIVA		SI	RETIRADO
72	JEISON ACERO	1,044,391,694	25/11/2020		1	MUTUAL SER	PORVENIR	POSITIVA		SI	RETIRADO
73	EDGAR VELANDIA	80,090,780	26/11/2020		1	ALIANSA SALUD	PORVENIR	POSITIVA		SI	RETIRADO
74	VICTOR MANUEL GUERRERO PACHECO	80,126,593	26/11/2020		1	CAPITAL SALUD	PORVENIR	POSITIVA		SI	RETIRADO
75	RAUL ALEXANDER SALAMANCA SALGADO	80,749,213	26/11/2020		1	CAPITAL SALUD	PORVENIR	POSITIVA		SI	RETIRADO
76	LEONARDO SOLANO CELY	1,024,511,017	26/11/2020		1	FAMISANAR	PORVENIR	POSITIVA		SI	RETIRADO
77	FERNANDO MORENO HUERTAS	3,199,429	26/11/2020		1	CAPITAL SALUD	PORVENIR	POSITIVA		SI	RETIRADO

RELACIÓN DE TRABAJADORES ADMINISTRATIVOS Y OPERATIVOS AFILIADOS A SEGURIDAD SOCIAL											
No.	NOMBRES Y APELLIDOS	C.C.	Fecha de afiliación	Personal afiliado Administrativos	Personal afiliado (operativo: maestros y auxiliares)	EPS	PENSION	ARL	ESTADO ACTUAL		OBSERVACIONES
									ACTIVO	RETIRADO	
78	JHON EDISON PALACIO MORENO	1,077,435,835	26/11/2020		1	SALUD TOTAL	PROTECCION	POSITIVA		SI	RETIRADO
79	LUZ ADRIANA SILVA MUÑOZ	53,094,514	26/11/2020		1	CAPITAL SALUD	PORVENIR	POSITIVA		SI	RETIRADO
80	JOSE GUILLERMO MARTINEZ VARGAS	79,666,136	27/11/2020		1	SALUD TOTAL	COLPENSIONES	POSITIVA	SI		
81	OMAR MARTINEZ ZULETA	4,946,564	27/11/2020		1	NUEVA EPS	COLPENSIONES	POSITIVA		SI	RETIRADO
82	QUEVIN FABIAN LESMES LINARES	1,000,003,268	27/11/2020		1	CAPITAL SALUD	PORVENIR	POSITIVA		SI	RETIRADO
83	CESAR JULIO BENAVIDEZ	1,193,036,484	27/11/2020		1	COOSALUD	PORVENIR	POSITIVA		SI	RETIRADO
84	ANDRES FERNANDO PEREZ DIAZ	1,063,625,214	1/12/2020		1	NUEVA EPS	PORVENIR	POSITIVA		SI	RETIRADO
85	ANGEL IVAN DIAZ	79,924,351	1/12/2020		1	FAMISANAR	PORVENIR	POSITIVA		SI	RETIRADO
86	CARLOS ALBERTO SUAREZ BARRERA	9,527,688	1/12/2020		1	CAPITAL SALUD	PORVENIR	POSITIVA		SI	RETIRADO
87	CIRO ARTURO NIÑO	4,255,303	1/12/2020		1	SALUD TOTAL	COLPENSIONES	POSITIVA		SI	RETIRADO
88	EDGAR HERNANDO NIÑO	4,225,078	1/12/2020		1	CAPITAL SALUD	PORVENIR	POSITIVA		SI	RETIRADO
89	EDWAR ARLEY RODRIGUEZ MAYORGA	1,033,754,705	1/12/2020		1	SALUD TOTAL	PORVENIR	POSITIVA		SI	RETIRADO
90	EMILIANO MUÑOZ PALACIO	80,265,681	1/12/2020		1	SALUD TOTAL	PORVENIR	POSITIVA		SI	RETIRADO
91	CAMILO ERNESTO RAMIREZ ROA	1,033,736,370	1/12/2020		1	COMPENSAR	PROTECCION	POSITIVA		SI	RETIRADO
92	CARLOS SEBASTIAN LOPEZ CASTELLANO	1,031,170,297	1/12/2020		1	FAMISANAR	PROTECCION	POSITIVA		SI	RETIRADO
93	IDELFONSO DE JESUS PEÑARANDA	1,118,873,986	1/12/2020		1	SALUD TOTAL	PORVENIR	POSITIVA		SI	RETIRADO
94	CARLOS ALBERTO PULIDO YATE	1,033,683,233	1/12/2020		1	FAMISANAR	PROTECCION	POSITIVA		SI	RETIRADO
95	CIPRIANO PIÑEROS	79,703,764	1/12/2020		1	FAMISANAR	COLFONDOS	POSITIVA		SI	RETIRADO
96	DAGOBERTO PAREJO AREVALO	8,668,649	1/12/2020		1	MUTUAL SER	PORVENIR	POSITIVA		SI	RETIRADO
97	DANIEL ARTURO NIÑO ROJAS	1,024,469,352	1/12/2020		1	SALUD TOTAL	COLPENSIONES	POSITIVA		SI	RETIRADO
98	EDER GONZALEZ GASTELBLONDO	84,062,070	1/12/2020		1	NUEVA EPS	PORVENIR	POSITIVA		SI	RETIRADO
99	JHON RIVER MAYORGA BENAVIDES	1,033,721,955	1/12/2020		1	CAPITAL SALUD	PORVENIR	POSITIVA		SI	RETIRADO
100	SAMIR ZIAD PINEDA YAHMURE	79,920,337	1/12/2020		1	COMPENSAR	PROTECCION	POSITIVA		SI	RETIRADO
101	SIMON LOPEZ PALACIOS	94,418,910	1/12/2020		1	SALUD TOTAL	COLPENSIONES	POSITIVA		SI	RETIRADO
102	WILSON FERNEY BERNAL GUASCA	1,033,707,175	1/12/2020		1	FAMISANAR	PORVENIR	POSITIVA	SI		
103	YOISEN HAIDIN CHIBUQUE CAICEDO	1,007,413,403	1/12/2020		1	MEDIMAS	PROTECCION	POSITIVA		SI	RETIRADO
104	LUIS HERNANDEZ GRANADA	19,219,713	1/12/2020		1	SANITAS	COLPENSIONES	POSITIVA	SI		
105	EDGAR HERNANDO NIÑO	4,225,078	1/12/2020		1	CAPITAL SALUD	PORVENIR	POSITIVA		SI	RETIRADO
106	JAVIER FRANCO RODRIGUEZ	731054127121978	1/12/2020		1	SALUD TOTAL	PROTECCION	POSITIVA		SI	RETIRADO
107	JOSE RODRIGUEZ GARCIA	1,031,176,991	1/12/2020		1	CAPITAL SALUD	PORVENIR	POSITIVA		SI	RETIRADO
108	LUIS MUÑOZ GRAJALES	80,774,495	1/12/2020		1	COOSALUD	PROTECCION	POSITIVA		SI	RETIRADO
109	GLORIA JIMENEZ	28,155,523	2/12/2020		1	NUEVA EPS	PROTECCION	POSITIVA	SI		
110	JESUS DAVID LOPEZ GALVIZ	13,860,790	2/12/2020		1	NUEVA EPS	COLPENSIONES	POSITIVA	SI		
111	LUIS CARLOS MENDOZA GAMEZ	17,971,345	4/12/2020		1	ALIANSA SALUD	PORVENIR	POSITIVA	SI		
112	KEVIN SEBASTIAN APARACIO	1,000,064,803	10/12/2020		1	FAMISANAR	PORVENIR	POSITIVA		SI	RETIRADO
113	HELI RAMIREZ PERALTA	79,734,766	12/12/2020		1	SALUD TOTAL	PROTECCION	POSITIVA		SI	RETIRADO
114	ANDRES GARCIA ROJAS	80,895,628	15/12/2020		1	SALUD TOTAL	PROTECCION	POSITIVA		SI	RETIRADO
115	JEISON LOPEZ MEJIA	1,033,816,388	15/12/2020		1	SALUD TOTAL	PORVENIR	POSITIVA		SI	RETIRADO
116	JULIAN ANDRES ARAGON DEVIA	1,030,628,206	15/12/2020		1	CONVIDA	PORVENIR	POSITIVA		SI	RETIRADO
117	ALDEMAR CHAUX	96,357,448	16/12/2020		1	SALUD TOTAL	COLFONDOS	SURA	SI		
118	LUIS ALBERTO CHAUX MUÑOZ	17,682,809	16/12/2020		1	SALUD TOTAL	PROTECCION	SURA	SI		

RELACIÓN DE TRABAJADORES ADMINISTRATIVOS Y OPERATIVOS APILIADOS A SEGURIDAD SOCIAL											
No.	NOMBRES Y APELLIDOS	C.C.	Fecha de afiliación	Personal afiliado Administrativos	Personal afiliado (operativo: maestros y auxiliares)	EPS	PENSION	ARL	ESTADO ACTUAL		OBSERVACIONES
									ACTIVO	RETIRADO	
119	HERNAN DARIO CHON MORA	1,024,482,739	22/12/2020		1	FAMISANAR	PROTECCION	SURA	SI		
120	RUBEN DARIO RODRIGUEZ ALMANZA	79,250,468	22/12/2020		1	FAMISANAR	PROTECCION	SURA	SI		
121	WILLIAM ZABALA ALVAREZ	916,866,813,041,981	10/1/2021		1	SALUD TOTAL	PROTECCION	POSITIVA	SI		
122	DANIEL ESTIVEN OSORIO HERNANDEZ	1,000,001,451	13/1/2021		1	NUEVA EPS	PORVENIR	POSITIVA	SI		
123	HARRY SAENZ SUA	1,010,220,994	13/1/2021		1	CAPITAL SALUD	PORVENIR	POSITIVA	SI		
124	JORGE FINO MORENO	1,057,462,261	13/1/2021		1	FAMISANAR	PROTECCION	POSITIVA		SI	RETIRADO
125	FABIAN ESCOBAR GOMEZ	1,024,482,810	18/1/2021		1	FAMISANAR	COLPENSIONES	POSITIVA	SI		
126	JHON PERILLA CHAPARRO	8,090,191	18/1/2021		1	SURA	PORVENIR	POSITIVA	SI		
127	JOSE DE JESUS GONZALEZ MOLANO	79,419,331	18/1/2021		1	SALUD TOTAL	PROTECCION	POSITIVA		SI	RETIRADO
128	SOCRATES PITER TORENEGRA	8,601,642	20/1/2021		1	CAPITAL SALUD	PORVENIR	POSITIVA	SI		
129	EDWIN MARIN OVIEDO	1,033,744,320	22/1/2021		1	NUEVA EPS	PORVENIR	POSITIVA	SI		
130	FREDY BARRERA SOL	807,710,070	22/1/2021		1	FAMISANAR	PROTECCION	POSITIVA		SI	RETIRADO
131	OSCAR HERRERA ESTEPA	1,116,690,533	22/1/2021		1	FAMISANAR	COLFONDOS	POSITIVA	SI		
132	JEFERSON ZUÑIGA BARBOSA	1,001,274,101	25/1/2021		1	SALUD TOTAL	PORVENIR	POSITIVA	SI		
133	JOSE OVIEDO MESTIZO	1,018,422,138	25/1/2021		1	NUEVA EPS	COLFONDOS	POSITIVA	SI		
134	LEANDRO GIL MATEUS	1,033,743,641	31/1/2021		1	ALIANSA SALUD	PORVENIR	POSITIVA		SI	RETIRADO
135	JONATAN SAINEA LOPEZ	1,032,365,909	1/2/2021		1	SALUD TOTAL	PROTECCION	POSITIVA		SI	RETIRADO
136	JOSE STEER MARTINEZ	1,044,002,473	30/1/2021		1	NUEVA EPS	COLFONDOS	SURA	SI		
137	RICHAR PIÑEREZ PEDROZO	1,067,303,337	30/1/2021		1	FAMISANAR	PORVENIR	SURA	SI		
138	LUIS ERNESTO FAJARDO	1,033,782,690	30/1/2021		1	NUEVA EPS	PORVENIR	SURA	SI		
139	JORGE ARTURO PALACIO	10,172,596	3/2/2021		1	NUEVA EPS	PORVENIR	SURA	SI		
140	SERGIO LUIS JUNTICO NOVOA	1,033,753,797	3/2/2021		1	FAMISANAR	PORVENIR	SURA	SI		
141	JOSE TAPIERO COCOMA	14,420,134	10/2/2021		1	SALUD TOTAL	COLPENSIONES	SURA	SI		
142	PABLO CUELLAR TAMAYO	93,453,458	10/2/2021		1	SALUD TOTAL	PROTECCION	SURA	SI		
143	JHEYSSON LONDOÑO	1,013,627,891	10/2/2021		1	SALUD TOTAL	PORVENIR	SURA	SI		
144	ALEJANDRO GALLEGO LLANOS	80,741,119	11/2/2021		1	SALUD TOTAL	COLPENSIONES	SURA	SI		
145	BLANCA BEJARANO LLANO	1,031,138,363	11/2/2021		1	SALUD TOTAL	PORVENIR	SURA	SI		
146	GUSTAVO SANCHEZ CORREA	93,062,333	11/2/2021		1	SALUD TOTAL	COLFONDOS	SURA	SI		
147	HAROL ZULUAGA ZULUAGA	80,747,595	11/2/2021		1	FAMISANAR	PROTECCION	SURA	SI		
148	JOSE SEGURA	80,311,182	11/2/2021		1	SALUD TOTAL	COLFONDOS	SURA	SI		
149	OSCAR TORRES ZABALA	79,728,364	11/2/2021		1	SALUD TOTAL	COLFONDOS	SURA	SI		
150	MICHEL MILARION ZABALA	1,033,785,162	15/2/2021		1	FAMISANAR	PORVENIR	SURA	SI		
151	JOSE UMBARILA ZAMBRANO	1,033,684,519	17/2/2021		1	SALUD TOTAL	COLPENSIONES	SURA	SI		
152	LUIS ROMERO LOPEZ	1,065,855,962	17/2/2021		1	SALUD TOTAL	PORVENIR	SURA	SI		
153	MOISES PALENCIA JIMENEZ	1,235,243,588	17/2/2021		1	FAMISANAR	PORVENIR	SURA	SI		
154	RAFAEL CHACON	P.E 815549523031988	17/2/2021		1	SALUD TOTAL	PORVENIR	SURA	SI		
155	WILLIAN ANDRES JIMENEZ ROCHA	1,031,138,321	17/2/2021		1	FAMISANAR	PORVENIR	SURA	SI		
156	GREIFE JOAQUIN RUBIANO FAJARDO	1,022,925,336	20/2/2021		1	CAPITAL SALUD	COLFONDOS	SURA	SI		
157	MARTIN DE JESUS CASTRO FONSECA	1,065,140,404	20/2/2021		1	NUEVA EPS	PORVENIR	SURA	SI		
158	ARMANDO MACHACON CAMPO	1,043,613,351	22/2/2021		1	SALUD TOTAL	PORVENIR	SURA	SI		

RELACIÓN DE TRABAJADORES ADMINISTRATIVOS Y OPERATIVOS AFILIADOS A SEGURIDAD SOCIAL											
No.	NOMBRES Y APELLIDOS	C.C.	Fecha de afiliación	Personal afiliado Administrativos	Personal afiliado (operativo: maestros y auxiliares)	EPS	PENSION	ARL	ESTADO ACTUAL		OBSERVACIONES
									ACTIVO	RETIRADO	
159	CECILIO MACHACON CAMPO	1,043,613,352	24/2/2021		1	CAPITAL SALUD	COLFONDOS	SURA	SI		
160	ALFONSO PARADA TENSA	80,370,018	26/2/2021		1	COMPENSAR	PROTECCION	SURA	SI		
161	ANGEL ALONSO VARGAS SANCHEZ	804,439,409	26/2/2021		1	COMPENSAR	PORVENIR	SURA	SI		
162	CHARLI MARTINEZ	1,045,763,223	26/2/2021		1	SALUD TOTAL	PORVENIR	SURA	SI		
163	DAVID VELA	79,136,110	26/2/2021		1	COMPENSAR	PORVENIR	SURA	SI		
164	ILSIDRO MANUEL BARBOZA SALCEDO	92,552,995	26/2/2021		1	FAMISANAR	PROTECCION	SURA	SI		
165	JHON ANDERSON JIMENEZ FLOREZ	1,013,666,629	26/2/2021		1	NUEVA EPS	PROTECCION	SURA	SI		
166	JHONATAN TOSCANO MERIÑO	1,108,767,156	26/2/2021		1	COOSALUD	PORVENIR	SURA	SI		
167	JOE CASTAÑEDA RIOS	1,024,573,542	26/2/2021		1	SALUD TOTAL	PORVENIR	SURA	SI		
168	JOSE AGUSTIN CARABUENA	91,041,833	26/2/2021		1	FAMISANAR	PORVENIR	SURA	SI		
169	EDGAR CHACON OLARTE	79,329,986	5/3/2021		1	SALUD TOTAL	PROTECCION	SURA	SI		
170	GERARDO APONTE CASTILLO	P.E 989866629011990	6/3/2021		1	NUEVA EPS	PORVENIR	SURA	SI		
171	GERSAIN OLAYA GALINDO	3,076,553	6/3/2021		1	SANITAS	COLPENSIONES	SURA	SI		
172	LEONARDO ROA MONTENEGRO	79,972,650	6/3/2021		1	COMPENSAR	PORVENIR	SURA	SI		
173	JHONATAN STIVEN ARCINIEGAS	1,023,024,367	6/3/2021		1	FAMISANAR	PORVENIR	SURA	SI		
174	LUIS MARTINEZ MARIMON	1,047,486,620	6/3/2021		1	SALUD TOTAL	COLFONDOS	SURA	SI		
175	NADIN MARTINEZ HERRERA	1,066,001,833	7/3/2021		1	NUEVA EPS	PORVENIR	SURA	SI		
176											
177											
RESULTADOS:				16	159				76	99	

INFORME SISO

Fecha: 1 AL 7 de Marzo de 2021

INPLAYCO S.A.S.

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DEL HÁBITAT

CONTRATO: 694-2020
CONTRATISTA: CONSORCIO MEJORAMIENTO EP 2020

RELACIÓN PERSONAL 7. Relación de actividades generales en donde se evidencie el cumplimiento de la implementación del Protocolo de Bioseguridad, así mismo, el interventor deberá informar sobre el cumplimiento o incumplimiento de este.

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	C.C.	FECHA DE INGRESO	FECHA DE EXAMEN MÉDICO DE INGRESO/ PERIODICO	PERSONAL		IMPLEMENTACIÓN PROTOCÓLO		ESTADO ACTUAL		OBSERVACIONES
					Administrativo	Operativo: maestros y auxiliares	SI	NO	ACTIVO	RETIRADO	
1	CARLOS JOSE HERNADEZ JIMENEZ	78,717,000	17/11/2020	20/11/2020	1		SI		SI		
2	DIANA CAROLINA NAVARRO JIMENEZ	52,233,027	20/11/2020	10/11/2020	1		SI		SI		
3	LEDA LUZ LAMBIS CASTRO	22,732,637	19/11/2020	10/11/2020	1		SI		SI		
4	LUIS FERNANDOI CARRILLO JIMENEZ	72,097,065	19/11/2020	11/11/2020	1		SI		SI		
5	RICARDO JAIMES RUIZ	19,144,052	19/11/2020	10/11/2020	1		SI		SI		
6	SHIRLEY AMELI VITOLA SERRANO	64,583,890	19/11/2020	10/11/2020	1		SI		SI		
7	YESENIA VIVIANA GAMEZ SALAS	1,120,745,285	19/11/2020	12/11/2020	1		SI		SI		
8	MARCO AUGUSTO HAMON RODRIGUEZ	1,070,955,988	19/11/2020	10/11/2020	1		SI		SI		
9	LINA MARCELA COLORADO CASTRO	1,019,022,812	19/11/2020	10/11/2020	1		SI		SI		
10	DANIELA CASTAÑO CASTAÑO	1,032,447,818	19/11/2020	14/11/2020	1		SI		SI		
11	LIBYS PADILLA URUETA	1,073,822,532	2/10/2020	20/8/2020	1		SI			SI	
12	JUAN ADRES CORREDOR MAYORGA	1,022,401,358	19/11/2020	24/11/2020	1		SI			SI	
13	GERSON ASPRILLA LOPEZ	11,797,192	19/11/2020	11/11/2020	1		SI		SI		
14	WILFRED BENAVIDEZ SANCHEZ	79,851,515	19/11/2020	13/11/2020	1		SI			SI	
15	JUAN SEBASTIAN GONZALEZ	1,022,402,058	19/11/2020	11/11/2020	1		SI			SI	
16	GREGORY FERNEY MOSQUERA	1,105,305,250	29/11/2020	25/11/2020	1		SI		SI		
17	CARLOS COLORADO BANDO	13,107,585	24/11/2020	28/11/2020		1	SI			SI	
18	OSCAR ARMANDO CALVACHE PAZ	12,977,717	24/11/2020	28/11/2020		1	SI			SI	
19	CARLOS ALBERTO CAICEDO HINOJOSA	1,111,817,731	24/11/2020	28/11/2020		1	SI			SI	
20	YARLI COLORADO PAZ	1,085,549,452	24/11/2020	28/11/2020		1	SI			SI	
21	ANDAIR MONTIEL VAQUIRO	1,007,535,425	25/11/2020	28/11/2020		1	SI			SI	
22	EDGAR MARTINEZ CRUZ	79,296,107	25/11/2020	28/11/2020		1	SI			SI	
23	EDWIN HARVEY DE LA CRUZ TORO	10,307,972	25/11/2020	28/11/2020		1	SI			SI	
24	FERNANDO VIDAL ORTIZ	5,887,718	25/11/2020	28/11/2020		1	SI			SI	
25	IDELFONSO CIFUENTES	19,232,722	25/11/2020	28/11/2020		1	SI			SI	
26	MARLON HUMBERTO MARTINEZ VAZQUEZ	1,031,152,755	25/11/2020	28/11/2020		1	SI			SI	
27	WILMER ANDRES ROJAS SOLANO	1,118,534,846	25/11/2020			1	SI			SI	
28	VICTOR RUIZ GARCIA	1,002,597,213	25/11/2020	28/11/2020		1	SI			SI	
29	ILDELFONSO RAMIREZ ESQUIVEL	96,361,399	1/12/2020	5/12/2020		1	SI			SI	

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	C.C.	FECHA DE INGRESO	FECHA DE EXAMEN MÉDICO DE INGRESO/ PERIODICO	PERSONAL		IMPLEMENTACIÓN PROTOCÓLO		ESTADO ACTUAL		OBSERVACIONES
					Administrativo	Operativo: maestros y auxiliares	SI	NO	ACTIVO	RETIRADO	
30	JUAN PABLO CORREA MURCIA	1,116,920,538	1/12/2020	5/12/2020		1	SI			SI	
31	LAMBERTO GABRIEL DORIA SANCHEZ	72,147,586	1/12/2020	5/12/2020		1	SI			SI	
32	KEVIN FABIAN HOYOS YEPEZ	1,083,043,276	1/12/2020	5/12/2020		1	SI			SI	
33	ARLEY GIOVANNI CAICEDO RAMIREZ	1,117,511,256	3/12/2020	5/12/2020		1	SI			SI	
34	ALBERT JOSE LEON GOMEZ	828089416111997	3/12/2020	5/12/2020		1	SI			SI	PERMISO DE TRABAJO MINISTERIO
35	NUBIA VERGARA ALDANA	53,092,609	3/12/2020			1	SI		SI		Afiliado el 3 de diciembre , ingresa por cambio de frente de trabajo en Febrero 3 de 2021 al G1
36	ALEXANDER VERGARA ALDANA	60,332,087	3/12/2020			1	SI			SI	
37	ANTONIO PAZ SEGUNDO	16,537,810	3/12/2020			1	SI			SI	
38	JHON WILLIAM BALLESTEROS MARTINEZ	1,033,761,449	8/12/2020	19/12/2020		1	SI			SI	
39	CARLOS ENRIQUE REDONDO	80,373,803	13/12/2020	19/12/2020		1	SI		SI		
40	JULIO FERNEY BENAVIDES MENDEZ	80,256,134	13/12/2020	19/12/2020		1	SI			SI	
41	FREDY EDINSON FORERO NIÑO	1,024,489,116	15/12/2020	19/12/2020		1	SI			SI	
42	JUAN AGUSTIN LIZARAZO	4,103,403	15/12/2020	19/12/2020		1	SI			SI	
43	JOSE IGNACIO CANO NOVOA	7,330,323	15/12/2020	19/12/2020		1	SI			SI	
44	BRAYAN ESTIVEN LOPEZ MOLINA	1,024,602,801	17/11/2020			1	SI			SI	
45	EDWIN JIMMY ESPINEL CHACON	80,064,358	17/11/2020			1	SI			SI	
46	EVANGELISTA BRINEZ BURGOS	6,030,390	17/11/2020	2/12/2020		1	SI			SI	
47	FABIO NELSON LOPEZ DIAZ	80,124,048	17/11/2020	2/12/2020		1	SI			SI	
48	RAFAEL CASTRO VILLA	8,815,936	17/11/2020			1	SI			SI	
49	MICHEL LEONARDO SALAS CELIS	1,033,766,212	17/11/2020	2/12/2020		1	SI			SI	
50	VLADIMIR BRIÑEZ MAHECHA	1,033,682,982	17/11/2020	2/12/2020		1	SI			SI	
51	CARLOS PAEZ PULIDO	1,049,630,871	17/11/2020			1	SI			SI	
52	RAUL OSORIO RINCON	79,669,250	17/11/2020	2/12/2020		1	SI			SI	
53	HAYDER CAMILO GALVIZ	1,033,762,528	17/11/2020	2/12/2020		1	SI			SI	
54	CAMILO HERNANDEZ SANCHEZ	1,049,639,642	17/11/2020	2/12/2020		1	SI			SI	
55	EMITZO JOSE FANDIÑO FLOREZ	85,469,924	18/11/2020			1	SI			SI	
56	JULIO CESAR NEIRA BENAVIDEZ	79,903,950	18/11/2020	2/12/2020		1	SI			SI	
57	LEYDY PATRICIA SUAREZ VELAZQUEZ	1,033,693,495	18/11/2020	2/12/2020		1	SI			SI	
58	CARLOS ANDRES SUAREZ VELAZQUEZ	1,033,693,493	18/11/2020	2/12/2020		1	SI			SI	
59	LUIS FERNANDO CUPITRA DUCUARA	1,022,939,409	18/11/2020	2/12/2020		1	SI			SI	
60	LUIS ALEJANDRO ZAMBRANO	79,770,115	18/11/2020			1	SI			SI	
61	OSBAR RENE BERNAL PAEZ	80,778,371	20/11/2020	2/12/2020		1	SI		SI		
62	MISAEL PERDOMO VILLAMIL	1,033,784,477	24/11/2020	2/12/2020		1	SI			SI	
63	ALBEIRO GUERRERO MACANA	5,996,412	25/11/2020	2/12/2020		1	SI			SI	
64	EDWIN RODRIGUEZ VIDAL	93,394,589	25/11/2020			1	SI		SI		
65	JOSE ANTONIO SILVA ORTEGA	19,458,840	25/11/2020	2/12/2020		1	SI			SI	
66	SAURITH REALES DELGADO	91,431,492	25/11/2020	2/12/2020		1	SI			SI	

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	C.C.	FECHA DE INGRESO	FECHA DE EXAMEN MÉDICO DE INGRESO/ PERIODICO	PERSONAL		IMPLEMENTACIÓN PROTOCÓLO		ESTADO ACTUAL		OBSERVACIONES
					Administrativo	Operativo: maestros y auxiliares	SI	NO	ACTIVO	RETIRADO	
67	EDISON JOSE VENECIA SARABIA	72,120,789	25/11/2020	2/12/2020		1	SI			SI	
68	YOENDISON JOSE VENECIA MORENO	1,101,879,446	25/11/2020	2/12/2020		1	SI			SI	
69	RUBEN PINEDA MAHECHA	1,031,151,104	25/11/2020	2/12/2020		1	SI			SI	
70	LUIS FRANCISCO GOMEZ SANCHEZ	80,857,562	25/11/2020	2/12/2020		1	SI			SI	
71	LUIS HERNANDEZ BARRETO	80,858,697	25/11/2020	2/12/2020		1	SI			SI	
72	JEISON ACERO	1,044,391,694	25/11/2020	2/12/2020		1	SI			SI	
73	EDGAR VELANDIA	80,090,780	26/11/2020	2/12/2020		1	SI			SI	
74	VICTOR MANUEL GUERRERO PACHECO	80,126,593	26/11/2020	2/12/2020		1	SI			SI	
75	RAUL ALEXANDER SALAMANCA SALGADO	80,749,213	26/11/2020			1	SI			SI	
76	LEONARDO SOLANO CELY	1,024,511,017	26/11/2020	2/12/2020		1	SI			SI	
77	FERNANDO MORENO HUERTAS	3,199,429	26/11/2020			1	SI			SI	
78	JHON EDISON PALACIO MORENO	1,077,435,835	26/11/2020			1	SI			SI	
79	LUZ ADRIANA SILVA MUÑOZ	53,094,514	26/11/2020	2/12/2020		1	SI			SI	
80	JOSE GUILLERMO MARTINEZ VARGAS	79,666,136	27/11/2020			1	SI			SI	
81	OMAR MARTINEZ ZULETA	4,946,584	27/11/2020	2/12/2020		1	SI		SI		
82	QUEVIN FABIAN LESMES LINARES	1,000,003,268	27/11/2020	2/12/2020		1	SI			SI	
83	CESAR JULIO BENAVIDEZ	1,193,036,484	27/11/2020	2/12/2020		1	SI			SI	
84	ANDRES FERNANDO PEREZ DIAZ	1,063,625,214	1/12/2020	2/12/2020		1	SI			SI	
85	ANGEL IVAN DIAZ	79,924,351	1/12/2020			1	SI			SI	
86	CARLOS ALBERTO SUAREZ BARRERA	9,527,688	1/12/2020	2/12/2020		1	SI			SI	
87	CIRO ARTURO NIÑO	4,255,303	1/12/2020			1	SI			SI	
88	EDGAR HERNANDO NIÑO	4,225,078	1/12/2020			1	SI			SI	
89	EDWAR ARLEY RODRIGUEZ MAYORGA	1,033,754,705	1/12/2020			1	SI			SI	
90	EMILIANO MUÑOZ PALACIO	80,265,681	1/12/2020			1	SI			SI	
91	CAMILO ERNESTO RAMIREZ ROA	1,033,735,370	1/12/2020	2/12/2020		1	SI			SI	
92	CARLOS SEBASTIAN LOPEZ CASTELLANO	1,031,170,297	1/12/2020			1	SI			SI	
93	IDELFONSO DE JESUS PEÑARANDA	1,118,873,986	1/12/2020			1	SI			SI	
94	CARLOS ALBERTO PULIDO YATE	1,033,683,233	1/12/2020			1	SI			SI	
95	CIPRIANO PIÑEROS	79,703,764	1/12/2020	2/12/2020		1	SI			SI	
96	DAGOBERTO PAREJO AREVALO	8,668,649	1/12/2020			1	SI			SI	
97	DANIEL ARTURO NIÑO ROJAS	1,024,469,352	1/12/2020			1	SI			SI	
98	EDER GONZALEZ GASTELBLONDO	84,062,070	1/12/2020	9/1/2021		1	SI			SI	
99	JHON RIVER MAYORGA BENAVIDEZ	1,033,721,955	1/12/2020			1	SI			SI	
100	SAMIR ZIAD PINEDA YAHMURE	79,920,337	1/12/2020			1	SI			SI	
101	SIMON LOPEZ PALACIOS	94,418,910	1/12/2020			1	SI			SI	
102	WILSON FERNEY BERNAL GUASCA	1,033,707,175	1/12/2020	2/12/2020		1	SI			SI	
103	YOISEN HAIDIN CHIBUQUE CAICEDO	1,007,413,403	1/12/2020	9/1/2021		1	SI		SI		
104	LUIS HERNANDEZ GRANADA	19,219,713	1/12/2020			1	SI			SI	
						1	SI		SI		

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	C.C.	FECHA DE INGRESO	FECHA DE EXAMEN MÉDICO DE INGRESO/ PERIODICO	PERSONAL		IMPLEMENTACIÓN PROTOCÓLO		ESTADO ACTUAL		OBSERVACIONES
					Administrativo	Operativo: maestros y auxiliares	SI	NO	ACTIVO	RETIRADO	
105	EDGAR HERNANDO NIÑO	4,225,078	1/12/2020			1	SI			SI	
106	JAVIER FRANCO RODRIGUEZ	731,054,127,121,978	1/12/2020			1	SI			SI	PERMISO DE TRABAJO MINISTERIO
107	JOSE RODRIGUEZ GARCIA	1,031,176,991	1/12/2020	2/12/2020		1	SI			SI	
108	LUIS MUÑOZ GRAJALES	80,774,495	1/12/2020			1	SI			SI	
109	GLORIA JIMENEZ	28,155,523	2/12/2020			1	SI		SI		
110	JESUS DAVID LOPEZ GALVIZ	13,860,790	2/12/2020			1	SI		SI		
111	LUIS CARLOS MENDOZA GAMEZ	17,971,346	4/12/2020			1	SI		SI		
112	KEVINN SEBASTIAN APARACIO	1,000,064,803	10/12/2020			1	SI			SI	
113	HELI RAMIREZ PERALTA	79,734,766	12/12/2020			1	SI			SI	
114	ANDRES GARCIA ROJAS	80,895,628	15/12/2020			1	SI			SI	
115	JEISON LOPEZ MEJIA	1,033,816,388	15/12/2020			1	SI			SI	
116	JULIAN ANDRES ARAGON DEVIA	1,030,628,205	15/12/2020			1	SI			SI	
117	ALDEMAR CHAUX	96,357,448	16/12/2020			1	SI		SI		
118	LUIS ALBERTO CHAUX MUÑOZ	17,682,809	16/12/2020			1	SI		SI		
119	HERNA DARIO CHON MORA	1,024,482,739	22/12/2020			1	SI		SI		
120	RUBEN DARIO RODRIGUEZ ALMANZA	79,250,468	22/12/2020			1	SI		SI		
121	WILLIAN ZABALA ALVAREZ	916,866,813,041,981	10/1/2021	9/1/2021		1	SI		SI		PERMISO DE TRABAJO MINISTERIO
122	DANIEL ESTIVEN OSORIO HERNANDEZ	1,000,001,451	13/1/2021			1	SI		SI		
123	HARRY SAENZ SUA	1,010,220,994	13/1/2021			1	SI		SI		
124	JORGE FINO MORENO	1,057,462,261	13/1/2021			1	SI			SI	
125	FABIAN ESCOBAR GOMEZ	1,024,482,810	18/1/2021			1	SI		SI		
126	JHON PERILLA CHAPARRO	8,090,191	18/1/2021			1	SI		SI		
127	JOSE DE JESUS GONZALEZ MOLANO	79,419,331	18/1/2021			1	SI			SI	
128	SOCRATES PITER TORENEGRA	8,601,642	20/1/2021			1	SI		SI		
129	EDWIN MARIN OVIEDO	1,033,744,320	22/1/2021			1	SI		SI		
130	FREDY BARRERA SOL	807,710,070	22/1/2021			1	SI			SI	
131	OSCAR HERRERA ESTEPA	1,116,690,533	22/1/2021			1	SI		SI		
132	JEFERSON ZUÑIGA BARBOSA	1,001,274,101	25/1/2021			1	SI		SI		
133	JOSE OVIEDO MESTIZO	1,018,422,138	25/1/2021			1	SI		SI		
134	LEANDRO GIL MATEUS	1,033,743,641	31/1/2021			1	SI			SI	
135	JONATAN SAINEA LOPEZ	1,032,365,909	1/2/2021			1	SI			SI	
136	JOSE STEER MARTINEZ	1,044,002,473	30/1/2021			1	SI		SI		
137	RICHAR PIÑEREZ PEDROZO	1,067,303,337	30/1/2021			1	SI		SI		
138	LUIS ERNESTO FAJARDO	1033782690	30/1/2021			1	SI		SI		
139	JORGE ARTURO PALACIO	10,172,596	3/2/2021			1	SI		SI		
140	SERGIO LUIS JUNTICO NOVOA	1,033,753,797	3/2/2021			1	SI		SI		
141	JOSE TAPIERO COCOMA	14,420,134	10/2/2021			1	SI		SI		

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	C.C.	FECHA DE INGRESO	FECHA DE EXAMEN MÉDICO DE INGRESO/ PERIODICO	PERSONAL		IMPLEMENTACIÓN PROTOCÓLO		ESTADO ACTUAL		OBSERVACIONES
					Administrativo	Operativo: maestros y auxiliares	SI	NO	ACTIVO	RETIRADO	
142	PABLO CUELLAR TAMAYO	93,453,458	10/2/2021			1	SI		SI		
143	JHEYSSON LONDOÑO	1,013,627,891	10/2/2021			1	SI		SI		
144	ALEJANDRO GALLEGO LLANOS	80,741,119	11/2/2021			1	SI		SI		
145	BLANCA BEJARANO LLANO	1,031,138,363	11/2/2021			1	SI		SI		
146	GUSTAVO SANCHEZ CORREA	93,062,333	11/2/2021			1	SI		SI		
147	HAROL ZULUAGA ZULUAGA	80,747,595	11/2/2021			1	SI		SI		
148	JOSE SEGURA	80,311,182	11/2/2021			1	SI		SI		
149	OSCAR TORRES ZABALA	79,728,364	11/2/2021			1	SI		SI		
150	MICHEL MILARION ZABALA	1,033,785,162	15/2/2021			1	SI		SI		
151	JOSE UMBARILA ZAMBRANO	1,033,684,519	17/2/2021			1	SI		SI		
152	LUIS ROMERO LOPEZ	1,065,855,982	17/2/2021			1	SI		SI		
153	MOISES PALENCIA JIMENEZ	1,235,243,588	17/2/2021			1	SI		SI		
154	RAFAEL CHACON	P.E 815549523031988	17/2/2021			1	SI		SI		PERMISO DE TRABAJO MINISTERIO
155	WILLIAN ANDRES JIMENEZ ROCHA	1031138321	17/2/2021			1	SI		SI		
156	GREIFE JOAQUIN RUBIANO FAJARDO	1022925336	20/2/2021			1	SI		SI		
157	MARTIN DE JESUS CASTRO FONSECA	1065140404	20/2/2021			1	SI		SI		
158	ARMANDO MACHACON CAMPO	1,043,613,351	22/2/2021			1	SI		SI		
159	CECILIO MACHACON CAMPO	1043613352	24/2/2021			1	SI		SI		
160	ALFONSO PARADA TENSA	80,370,018	26/2/2021			1	SI		SI		
161	ANGEL ALONSO VARGAS SANCHEZ	804,439,409	26/2/2021			1	SI		SI		
162	CHARLI MARTINEZ	1045763223	26/2/2021			1	SI		SI		
163	DAVID VELA	79136110	26/2/2021			1	SI		SI		
164	IISIDRO MANUEL BARBOZA SALCEDO	92552995	26/2/2021			1	SI		SI		
165	JHON ANDERSON JIMENEZ FLOREZ	1013666629	26/2/2021			1	SI		SI		
166	JHONATAN TOSCANO MERIÑO	1108767158	26/2/2021			1	SI		SI		
167	JOE CASTAÑEDA RIOS	1024573542	26/2/2021			1	SI		SI		
168	JOSE AGUSTIN CARABUENA	91041833	26/2/2021			1	SI		SI		
169	EDGAR CHACON OLARTE	79329986	5/3/2021			1	SI		SI		
170	GERARDO APONTE CASTILLO	P.E 989866629011990	6/3/2021			1	SI		SI		
171	GERSAIN OLAYA GALINDO	3076553	6/3/2021			1	SI		SI		PERMISO DE TRABAJO MINISTERIO
172	LEONARDO ROA MONTENEGRO	79972650	6/3/2021			1	SI		SI		
173	JHONATAN STIVEN ARCINIEGAS	1023024367	6/3/2021			1	SI		SI		
174	LUIS MARTINEZ MARIMON	1047486620	6/3/2021			1	SI		SI		
175	NADIN MARTINEZ HERRERA	1066001833	7/3/2021			1	SI		SI		
176											
RESULTADOS:					16	159	175	0	76	99	

REGISTRO FOTOGRAFICO

MV - 1574




DESCRIPCIÓN Y FECHA: KIT DE BIOSEGURIDAD
Semana 1 AL 7 Marzo 2021

MV - 1592




DESCRIPCIÓN Y FECHA: KIT DE BIOSEGURIDAD
Semana 1 AL 7 Marzo 2021

MV - 1631



DESCRIPCIÓN Y FECHA: PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD
Semana 1 AL 7 Marzo 2021

MV - 1638

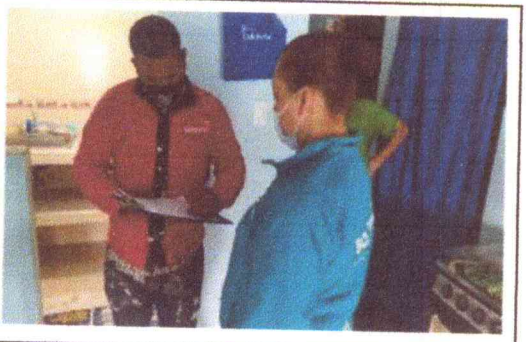


DESCRIPCIÓN Y FECHA: CHARLA DE SEGURIDAD
Semana 1 AL 7 Marzo 2021

MV - 1638



DESCRIPCIÓN Y FECHA: PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD
Semana 1 AL 7 Marzo 2021

MV - 1638



DESCRIPCIÓN Y FECHA: : KIT DE BIOSEGURIDAD
Semana 1 AL 7 Marzo 2021

MV - 1704



DESCRIPCIÓN Y FECHA: PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD
Semana 1 AL 7 Marzo 2021

MV - 1704



DESCRIPCIÓN Y FECHA: PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD BENEFICIARIO USO DE TAPABOCAS
Semana 1 AL 7 Marzo 2021
