MARTES 10 DE NOVIEMBRE DE 2020 (Clima Soleado)

Personal en Obra: Ing. German Mauricio Rueda; Ing. Fabian Villamizar; Julian Pedraza; Jairo Garces.

Actividades: Replanteo muro Segun diseño ajustado por el Contratista, Cerramiento Perimetral, Excavaciones para acondicionamiento acceso Carcava para ingresar material, y personal.

Se Revisa Replanteo realizado por el Contratista Por parte de interventoria realizando la liberacion pertinente, Se aprueba Cerramiento realizado por el Contratista.

INTERVENTORIA

MIERCOLES 11 DE NOVIEMBRE DE 2020. (Clima Soleado)

Personal en Obra: Ing. German Mauricio Rueda; Ing Fabian Villamizar, Julian Pedraza, Jairo Garces, Marco Lino Ruiz.

Actividades: Excavaciones Cimentacion muro Contencion Kot23 A Kot33. Demolicion Placa huella exutente Kot33 A Kot23, Tala de arbol exutente en la localizacion del modulo Kot23 A Kot33

Se realiza liberacion para la excavacion Kot23 A Kot33 por parte de Interventoria, Se evidencia la presencia de un árbol que interfiere Con la Construccion del muro en la absasa Kot23 A Kot33. y se Autoriza la tala por parte de Interventoria

INTERVENTORIA

JUEVES 12 DE NOVIEMBRE DE 2020 (Clima Soleado)

Personal en Obra: Ingeniero German, Ingeniero Fabian; Julian Pedraza, Jairo Garces, Marcolino Ruiz.

Actividades: Excavaciones Cimentacion Modulo Ko+23 A Kot33, y Modulo Kot20 A Kot23. hasta nivel N+ 0.00; Se realiza dilatacion para demolicion Placa huella exutente sector Kot20; Acarreo piedra bolo tipo Gavion,

Se aprueba por parte de interventoria el tamaño y Condiciones de forma para la piedra tipo Gavion que empleara el Contratista,


Se aprueba excavaciones modulos Kot 20 A Ko t 23 y
Kot 23 A Kot 33 Por Parte de Interventoria.

INTERVENTORIA

VIERNES 13 DE NOVIEMBRE 2020 (clima Soleado)

Personal en Obra: Ing. German; Ing. Fabian, Julian Pedraza, Jairo Garcel, Marcolino Ruiz.

Actividades: Se realiza ajustes al tipo de Cimentacion del muro, a lo cual se cambian los micropilotes por un mejoramiento en Concreto Ciclopeo de espesor 1,5m por toda el area de zapata Como se muestra acontinuación

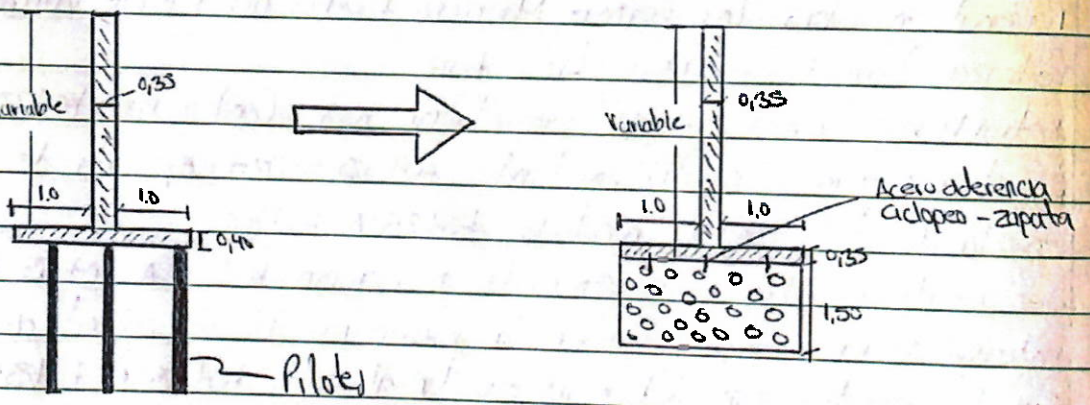

Se evidencia la presencia de una roca negra tipo laminar, arcillosa a lo cual el especialista geotecnista recomienda No" hacer los micropilotes

Debido a la presencia de la roca tipo laminar, arcillosa de Color negro se propone por recomendacion del especialista Geotecnista la implementacion de un mejoramiento con concreto Ciclopeo lo cual elevaria el Factor de Seguridad en la estabilidad de la Estructura.

Revisando la evidencia Presentada en el lugar y las recomendaciones Impartidas por el especialista se aprueba por Parte de interventoria la implementacion del mejoramiento en Ciclopeo, Por lo cual se aprueba la excavacion necesaria para implantar el mejoramiento

en concreto Ciclopeo previamente aprobado por interventoria.
NOTA: Se presento Fuerte lluvia la noche del 16/12/20.

INTERVENTORIA

SABADO 14 DE NOVIEMBRE 2020 (Clima Nublado / lluvioso)
Personal de Obra: Ing. German; Ing. Fabian, Julian Pedraza, Jairo Garces, Marco Lino Ruiz.
Actividades: Debido a las fuertes lluvias que se han presentado en el lugar y que amanecio llovendo las actividades de inicio de excavaciones se atrasan debido a las condiciones Climaticas.
Se realiza excavaciones para Vaciado de mejoramiento en Km33 a Km23
Se evidencia la presencia de Roca por la cual el Item de Cobro Será excavacion en roca, el porcentaje de dicha excavación Será Conciliada Con interventoria dependiendo de la evidencia en el lugar de las excavaciones.

INTERVENTORIA

LUNES 16 DE NOVIEMBRE 2020 (Clima Soleado)
Personal de Obra: Ing German; Ing. Fabian, Julian Pedraza, Jairo Garces, Marcolino Ruiz.
Actividades: Excavacion mejoramiento Km23 a Km 14; Vaciado de Concreto Ciclopeo en el mejoramiento Km33 a Km23. teniendo en Cuenta el ajuste realizado por el Contratista y aprobado por Interventoria descrito en los apuntes del Libro de bitacora del dia 17/12/2020.
Se libera por parte de Interventoria la localización, dimensiones del mejoramiento en Ciclopeo a instalar.

INTERVENTORIA

SABADO 14 DE NOVIEMBRE 2020 (Clima Soleado)

Personal en Obra: Ing German; Ing. Fabian, Julian Pedraza, Jairo Gomez, Marcelino Ruiz.

Actividades: Excavacion Cimentacion Muro Kot00 A Kot7,7, excavacion taludes literales; Acopio Piedra bolo Para Ciclopeo, Por Parte de Interventoría se realiza la inspección de la localizacion, la presencia de Roca a menos de 1mt de Profundida, Por este motivo se Concilia que el Porcentaje de material Rocoso es del 80% y 20% en material Común. Ya que se evidencio que la presencia de la roca se encontro a menos de 1mt de Profundidad en la Parte mas alta.

INTERVENTORIA.

LUNES 16 DE NOVIEMBRE 2020 (Clima Soleado)

Personal en Obra: Ing. German; Ing. Fabian; Julian Pedraza; Jairo Gomez; Marcelino Ruiz; Victor Abella.

Actividades: Se Continua excavaciones en roca Para la Cimentación del muro entre Kot00 A Kot7,7; Figurado Acero de refuerza Zapata Kot23 a Kot35.

INTERVENTORIA

MARTES 17 DE NOVIEMBRE 2020 (Clima Soleado)

Personal en Obra: Ing. German; Ing Fabian, Julian Pedraza, Jairo Gomez, Marcelino Ruiz, Victor Abella.

Actividades Excavacion en Roca Para Cimentacion Kot00 a Kot7,7. Se evidencia bajo rendimiento Por la Presencia de la Roca; se toman Videos para dejar Constancia de dicho Imprevisto. Se Continua Con figurado de acero.

INTERVENTORIA

Miercoles 18 de Noviembre 2020 (Clima Soleado)

Personal en Obra: Ing Germán; Ing Fabian, Julian Pedraza, Jairo Garcés, Marcolino Ruiz, Victor Abella.

Actividad: Excavación en Roca Para mejoramiento Kot 7,7 A Kot 14.

Se evidencia bajo rendimiento debido a la Roca que en Video y Registro fotografico de la dirección de la baja Roca.

INTERVENTORIA

Jueves 19 de Noviembre 2020 (Clima Soleado)

Personal en Obra Ing Germán, Ing. Fabian, Julian Pedraza, Jairo Garcés, Marcolino Ruiz, Victor Abella

Actividades: Excavación en roca Para Cimentacion en Kot 7,7 A Kot 14

Liberación Por Parte de Interventoria para la instacion del mejoramiento en ciclopeo en Kot 00 A Kot 14.

INTERVENTORIA

Viernes 20 de Noviembre 2020 (Clima Soleado)

Personal en Obra: Ing Germán, Ing Fabian, Julian Pedraza, Jairo Garcés, Marcolino Ruiz, Victor Abella.

Actividad: Instalación de Concreto Ciclopeo Para mejoramiento entre Kot 00 A Kot 14.

(Clima Soleado)

Personal de Obra Ing Germán, Ing Fabian, Julian Pedraza, Jairo Garcés, Marcolino Ruiz, Victor Abella.

Actividades: Excavación en Roca Fracturada de las excavaciones para Cuerpo Vertical de la Zapata.

SABADO 21 DE NOVIEMBRE 2020. (Clima Soleado)
Personal en Obra: Ing Germán, Ing Fabian; Julian Pedraza; Jairo Garces; Marcolino Ruiz, Victor abella.
Actividades: Amarre acero zapata Kot23 A Kot33; Excavaciones Para terrazas de trinchos en Carcava de la ladera 3:1 del diseño aprobado por Interventoria.

INTERVENTORIA

MIERCOLES 25 DE NOVIEMBRE 2020. (Clima Soleado)
Personal en Obra: Ing. Germán; Ing. Fabian; Julian Pedraza; Jairo Garces; Marcolino Ruiz; Victor abella; Maximino Correa.
Actividades: Excavacion Para terrazas de trinchos metalicos, Figurado y amarre acero zapata Kot23 A Kot33 Replante Fila 1 de trinchos metálicos

INTERVENTORIA

JUEVES 26 DE NOVIEMBRE 2020 (Clima Soleado)
Personal en Obra: Ing Germán, Ing. Fabian; Julian Pedraza, Jairo Garces; Marcolino Ruiz; Victor abella; Maximino Correa, Alvaro Castillo
Actividades: Instalación de tubería de Perforación de 5,5" y espesor 6mm hasta una Profundidad de fechazo con el fin de garantizar la estabilidad necesaria Para Contener el relleno.

INTERVENTORIA

LUNES 07 DE DICIEMBRE 2020. (Clima Soleado)
Personal en Obra: Ing. Germán; Ing. Fabian, Julian Pedraza, Jairo Garces, Marcolino Ruiz, Victor Abella, Maximino Correa, Alvaro Castillo,
Actividades: Amarre acero de Zapata Ko+20 A Ko+23.
Instalacion de trinchos metalicos Primera Fila Cantidad de tubos 11 und a una Profundidad Promedio de 6,60 mt. ya que se hincan hasta el Punto de Rechazo, debido aque en la carretera hay material de arrastre no apto para Cimentar el trincho.

INTERVENTORIA

MARTES 08 DE DICIEMBRE 2020. (Clima Soleado)
Personal en Obra: Ing. Germán; Ing. Fabian; Julian Pedraza; Jairo Garces, Marcolino Ruiz; Victor abella; Maximino Correa; Alvaro Castillo, Misael Vargas, Javier Rodriguez.
Actividades: Amarre acero zapata Ko+20 A Ko+33; encofrado de Zapata.
liberacion Por Parte de Interventoria del acero de Refuerzo Zapatas Ko+20 A Ko+33.
Replanteo Fila 2 de trinchos metálicos y aprobacion de Interventoria.

INTERVENTORIA.

MIERCOLES 09 DE DICIEMBRE 2020. (Clima Soleado)
Personal en Obra: Ing Germán, Ing. fabian, Julian Pedraza, Jairo Garces, Marcolino Ruiz; Victor Abella; Maximino Correa; Alvaro Castillo, Misael Vargas; Javier Rodriguez.
Actividades: Vaciado Concreto 4000 PSI Para Zapatas muro entre Ko+20 A Ko+23, Amarre y Figurado acero Zapata Ko+00 A Ko+77 Instalacion trinchos metalicos Segunda fila Cantidad 14 unidades a una Profundidad promedio 5,5 mt hasta Punto de Rechazo

Toma de muestras de Concreto

INTERVENTORIA

LUNES 14 DE DICIEMBRE 2020. (Clima Soleado)

Personal en Obra: Ing. Germán; Ing Fabian; Julian Pedraza; Jairo Garcet, Marcolino Ruiz; Victor Abella; Maximino Correa; Alvaro Castillo; Misael Vargas, Javier Rodriguez

Actividades: Instalacion trincho, metálico, segunda fila hasta Profundidad de fechazo; Figurado y amarre acero zapata K0+00 A K0+7,7 y Amarre acero refuerzo pantalla K0+23 A K0+33

INTERVENTORIA.

MARTES 15 DE DICIEMBRE 2020 (Clima Soleado)

Personal en Obra: Ing Germán; Ing Fabian; Julian Pedraza; Jairo Garcet; Marcolino Ruiz; Victor Abella; Maximino Correa; Alvaro Castillo; Misael Vargas; Javier Rodriguez.

Actividades: Instalacion trincho, metálico, segunda fila hasta Profundidad de fechazo; debido ala Profundidad Mayor a 3mt se deben Soldar más tuberia. Amarre acero pantalla K0+23 A K0+33 y Zapata K0+00 A K0+7,7.

INTERVENTORIA

MIERCOLES 16 DE DICIEMBRE 2020 (Clima Soleado)
Personal en Obra: Ing. German; Ing. Fabian; Julian Pedraza, Jairo Garces; Marcolino Fuir; Victor Abella; Maximino Correa; Alvaro Castillo; Misael Vargas, Javier Rodriguez.
Actividades: Encofrado zapata Kot 00 A Kot 7,7.; Previa liberación por parte de Interventoria del acero de refuerzo; Encofrado Pantalla a una altura de 1,8 mt entre las Kot 20 A Kot 23; Previa liberación por parte de interventoria el acero de refuerzo y la localización de los anclajes y Subdrenes de Penetración.
Instalacion trinchos metalicos tercera fila de trinchos Cantidad 14 und a una altura aproximada de 6mt. hasta Punto de rechazo.

INTERVENTORIA.

LUNES 21 DE DICIEMBRE 2020. (Clima Soleado)
Personal en Obra: Ing. German, Ing. Fabian; Julian Pedraza; Jairo Garces, Marcolino Fuir; Victor Abella; Maximino Correa; Alvaro Castillo; Misael Vargas; Javier Rodriguez.
Actividades: Vaciado Concreto de 4000 PSI Para muro en los elementos Zapata Kot 00 A Kot 7,7; Pantalla a una altura de 1,8 m entre Kot 20 A Kot 23; y Zapata Kot 7,7 a Kot 11.
Previa liberacion por Parte de Interventoria en acero, localizacion, Nivel, localizacion anclaje y Subdrenes
Instalación tercera fila de ~~anclajes~~ hasta Profundidad de Rechazo.

INTERVENTORIA.

MARTES 22 DE DICIEMBRE 2020. (Clima Soleado)
Personal en Obra: Ing. Germán, Ing. Fabian, Julian Pedraza, Jairo Garcés, Marcolino Paz, Victor Abella, Maximino Correa, Alvaro Castillo, Misael Vargas, Javier Rodriguez. Luis Bustamante
Actividades: Figurado y armado acero Zapatas, Pot 11 A Pot 20 y Pantalla Pot 23 a Pot 33, Instalacion trinchos metalicos tercera fila. Se realiza Soldadura para añadir tuberia y realizar la penetracion del trincho hasta punto de rechazo en la segunda fila, Previa autorizacion de interventoria.

INTERVENTORIA.

MARTES 29 DE DICIEMBRE 2020 (Clima Soleado)
Personal en Obra: Ing. Germán, Ing. Fabian, Julian Pedraza, Jairo Garcés, Marcolino Paz, Victor Abella, Maximino Correa, Alvaro Castillo, Misael Vargas, Javier Rodriguez. Luis Bustamante
Actividades: Encofrado zapatas, Pot 11 A Pot 20 Previa liberacion por parte de Interventoria en localizacion y acero. Reencofrado pantalla Pot 20 A Pot 23 aplicacion de antisol para Proceso de Curado; Encofrado pantalla acero a toma de 1,80, Previa autorizacion y liberacion por parte de Interventoria en localizacion de anclajes, Subdrenes, Capa de refuerzo Soldadura de trinchos segunda y tercera fila Para Completar la profundidad hasta rechazo Aprobado por interventoria.

INTERVENTOR

MIERCOLES 30 DE DICIEMBRE 2020 (Clima Soleado)
Personal en Obra: Ing. German, Ing Fabian; Julian Pedraza; Jairo Garces, Marcelino Ruiz; Victor Abella, Maximino Correa; Alvaro Castillo; Miguel Vargas; Javier Rodriguez. Luis Bustamante.
Actividades: Vaciado Concreto de 4000 PSI para muro para los elementos zapatas entre Kot 17 A Kot 20 y Pantalla entre Kot 23 a Kot 33 con altura de 1,8 mt.
Instalacion trinchos metalicos Cuarta fila trinchos Cant. 15 con altura Promedio de 6,m, Se emplea Soldadura para añadir tuberia y darle la Profundidad hasta rechazo.
Se toma muestras de Concreto para laboratorio

INTERVENTORIA

LUNES 18 DE ENERO 2021 (Clima Soleado)
Personal en Obra: Ing German, Ing. Fabian, Julian Pedraza; Jairo Garces, Marcelino Ruiz; Victor abella; Maximino Correa; Alvaro Castillo, Miguel Vargas; Javier Rodriguez, Luis Bustamante.
Actividades: Desencofrado Pantalla Kot 23 A Kot 33 y aplicado de antisol para Curado; Amarre y Figurado de acero Pantalla Kot 00 A Kot 7,7 y Kot 20 A Kot 23; Instalacion trinchos metalicos Cuarta fila, Soldadura para añadir y alargar tuberia para Penetracion hasta rechazo

INTERVENTORIA

MARTES 19 DE ENERO 2021 (Clima Soleado)
Personal de Obra: Ing. German; Ing. fabian, Julian Pedraza; Jairo Garces; Marcelino Ruiz, Victor Abella, Maximino Correa; Alvaro Castillo; Miguel Vargas; Javier Rodriguez; Luis Bustamante.
Actividades: Encofrado Pantalla Kot 00 A Kot 7,7 con altura de 1,7 mt y Pantalla Kot 20 A Kot 23 A con tura de 2,5mt.

Liberación por Parte de Interventoria en excavación y
y acero de refuerzo. Instalación trinchos metalicos Cuarta
fila hasta Profundidad de rechazo.

INTERVENTORIA.

MIERCOLES 20 DE ENERO 2021 (Clima, Soleado)
Personal en Obra: Ing German; Ing. Fabian; Julian Pedraza;
Jairo Garces; Marcelino Ruiz; Victor Abella; Maximino Correa;
Alvaro Castillo; Miguel Vargas; Javier Rodriguez.
Actividades: Vaciado Concreto de 4000 PSI para muros
para los elementos Pantalla Para muro Kot 00 A Kot 7,7 y
Kot 20 A Kot 23, Se envia a trabajador al medico por Sintomas Covid.
Excavación en corte para relleno Cargue trinchos;
transporte material de relleno proveniente de excavaciones y
de Prestamo. Visita por Parte dela oficina de Gestion de
Riesgo Ing. Sergio e Ing

INTERVENTORIA.

JUEVES 21 DE ENERO 2021 (Clima Soleado)
Personal en Obra: Ing German; Ing. fabian, Julian Pedraza;
Jairo Garces; Marcelino Ruiz, Victor Abella; Maximino Correa;
Alvaro Castillo; Miguel Vargas;
Actividades: Refrentrado Pantallas; transporte material de
relleno; En las horas de la mañana al rededor de la 9:00 am
se presenta en la Obra el Señor Sergio Secretario de
Salud del municipio de Guadalupe y el Ingeniero Orlando
Secretario de Planeación del Municipio de Guadalupe a
realizar un Procedimiento de Sellado de Obra Preventivo
por aislamiento Preventivo Sostenible debido a un Caso

positivo de Covid-19 en un trabajador de la Obra
por este motivo realizan el Cerco epidemiológico a todo el
personal de Obra y de Intervenidos directo a la inspección de
Contacto estrecho con el Caso positivo. Realizan el Procedimiento
de Cierre por aislamiento obligatorio por un Periodo de 14 días.
los cuales todo el Personal deberá aislarse por este periodo y
no se podrá ingresar a la Obra hasta el día 4/02/2021 Previa
Visita por Parte del señor Sergio Secretario de Salud del
municipio.
El Contratista Solicita formalmente una Suspensión provisional o
temporal durante dicho periodo de aislamiento obligatorio, para
evitar que este periodo de suspensión no genere atraso en el
periodo del Contrato.

INTERVENTOR

Martes 23 de Febrero 2021 (Clima Soleado)

Personal en Obra: Ing German, Ing Fabian, Julian Pedraza, Jairo Garcel, Marcolino Ruiz, Victor Abella, Maximino Correa, Alvaro Castillo, Miguel Vargas, Javier Rodriguez.

Actividades: Teniendo en cuenta las directrices dadas por la Secretaria de Salud del municipio de Guadalupe, Realiza la visita de reapertura de Obra a lo cual depresenta en la obra a las 9:30 am para realizar las inspecciones de Protocolos y bioseguridad y la aplicacion por parte del personal; a lo cual sugiere se reactive con una capacitacion los temas de lavados de manos y como colocar y quitar el tapabocas; enviando las evidencias al secretario. Igualmente instalar afiche de los pasos estipulados por el ministerio de Salud en Como se deben lavar las manos. Teniendo dichas evidencias se procederia a realizar el acta de reapertura definitiva de la Obra.

Se procede a reactivar labores realizando el destronconado de las Pantallas K0+00 A K0+7,7 y K0+20 A K0+23. Figurado y amarre de acero Pantallas K0+7,7 A K0+11 y K0+11 A K0+14, Se aplica antisol a pantallas K0+00 A K0+7,7 y K0+20 A K0+23.

Debido a las Fuertes lluvias que se han Presentado en la Zona, debido a que el terreno esta enlodado es Imposibe transpitar el material de relleno. a lo Cual se reprogramara dicha actividad hasta que se de buen clima.

INTERVENTORIA

MIERCOLES 24 DE FEBRERO 2021 (Clima lluvioso)

Personal en Obra: Ing. German; Ing. Fabian, Julian Pedroza; Jairo Garces, Marcolino Ruiz; Victor Abella; Maximino Correa, Alvaro Castillo; Miguel Vargas; Javier Rodriguez.

Actividades: Figurado y amarre de acero Pantallas Kot 7,7 A Kot 14 Liberacion por parte de Interventoria en el febrero, localizacion de anclajes y Subdrenes de Penetracion. Encofrado Pantallas Kot 7,7 A Kot 14.

Debido a las lluvias Presentadas no es posible realizar el transporte del material de relleno.

INTERVENTORIA

JUEVES 25 DE FEBRERO 2021 (Clima lluvioso)

Personal en Obra: Ing. German; Ing. Fabian; Julian Pedroza; Jairo Garces Marcolino Ruiz; Victor Abella; Maximino Correa; Alvaro Castillo; Miguel Vargas; Javier Rodriguez.

Actividades: Vaciado Concreto de 4000 PSI Para muro Para los elementos de las Pantallas Kot 7,7 A Kot 11 a una altura de 2,4mt y Pantalla Kot 11 A Kot 14 A una altura de 3,0 mt.

Por fuertes lluvias presentada la noche anterior y las malas Condiciones de la Via de acceso Guadalupe - Contratacion es imposible realizar el transporte del material de relleno;

INTERVENTORIA.

Viernes 26 de Febrero 2021 (Clima [illegible])
Personal en Obra: Ing. Germán; Ing. Fabian; Julian Pedroza, Jairo Garces, Marcolino Fuz; Victor Abella; Maximino Correa; Alvaro Castillo; Miguel Vargas; Javier Rodriguez.
Actividades; Retencofrado y aplicacion antisol Pantalla entre Kot 2,7 A Kot 14 Cuadro el Verner; encofrado y armarre de acero Pantallas Kot 14 a Kot 20 y Kot 11 a Kot 14 Segunda altura.
Debido a las lluvias presentadas la noche del domingo 07 de Febrero de 2021; se puede Iniciar relleno despues de las 10:00am debido al acceso de la Obra para la Volqueta.
Se Solicita por medio de Oficio a la secretaria de Salud del municipio de Guadalupe, la emision del acta de reapertura definitiva de la Obra ya que en dicho Oficio se subsanan los pendientes solicitados y se envia evidencia Fotografica.

INTERVENTORIA

Sabado 27 de Febrero 2021 (Clima nublado)
Personal en Obra: Ing. Germán; Ing. Fabián, Julian Pedroza; Jairo Garces; Marcolino Fuz; Victor Abella; Maximino Correa; Alvaro Castillo; Miguel Vargas; Javier Rodriguez.
Actividades: Encofrado y Aplomado muros Kot 11 A Kot 14 Segunda altura y Kot 14 A Kot 20 Primera altura; Liberacion por parte de la interventoria, localizacion anclajes, Subdrenes; Liberacion Acero de refuerzo.
Vaciado Concreto de 4000 PSI Concreto para muros para Anclajes Kot 11 A Kot 14 y Kot 14 A Kot 20. Toma de muestra de Concreto.
Debido a las lluvias que se han presentado en las noches han ocasionado retrasos en la actividad de relleno ya que el acceso a la obra queda impedido hasta que el

Sol no seque y se haga el acondicionamiento necesario para que la Volqueta acceda seguramente.

INTERVENTORIA

LUNES 01 DE MARZO 2021 (Clima lluvioso)

Personal en Obra: Ing. German; Ing. Fabian; Julian Pedraza; Jairo Garces; Marcolino Ruiz; Victor Abella; Maximino Correa; Alvaro Castillo; Miguel Vargas; Javier Rodriguez.

Actividades: Encofrado Pantalla muro Kot 23 A Kot 32,60; Desencofrado Pantalla Kot 7,10 A Kot 20; Aplicación Antisol para Curado

Se evidencio lluvia desde la noche anterior y parte de la mañana Hasta las 10:00am; por este motivo fue imposible realizar Relleno por el mal estado de los accesos y el material saturado. Se realiza liberacion por parte de interventoría del Acero de refuerzo; localizacion de anclajes y Subdrenes.

INTERVENTORIA.

MARTES 02 DE MARZO 2021 (Clima nublado)

Personal en Obra: Ing. German; Ing. Fabián; Julian Pedraza; Jairo Garces; Marcolino Ruiz; Victor Abella; Maximino Correa; Alvaro Castillo; Miguel Vargas; Javier Rodriguez.

Actividades: La noche anterior llovio moderadamente por lo cual se permite el movimiento de relleno desde las 7:00 am; Aplomado Pantalla Kot 23 A Kot 32,6; Liberacion por parte de Interventoría en Acero de refuerzo, localizacion Anclajes y Subdrenes, y Nivel Superior muro.

VACIADO PANTALLA KOT 23 A KOT 32,6 Y TOMA DE MUESTRAS

INTERVENTORIA.

MIERCOLES 03 DE MARZO 2021 (Clima nublado)
Personal en Obra: Ing German; Ing. Fabian; Jairo Garces; Julian Pedraza, Marcolino Ruiz; Victor Abella, Maximino Correa; Alvaro Castillo; Miguel Vargas; Javier Rodriguez.
Actividades; Se realiza desencofrado Pantallas muro vaciado el 11 de Febrero de 2021; Aplicacion Antisol para curado. Anclajes y Figurado Acero Muros Kot 14 A Kot 20 y Kot 7,7 A Kot 11 Altura 2° y Altura final respectivamente.
Suministro material para filtro piedra bola de 3" A 4"
Suministro material de Corte de pretanil para Relleno.

INTERVENTORIA


JUEVES 04 DE MARZO 2021 (Clima Nublado)
Personal en Obra: Ing. German; Ing Fabian, Julian Pedraza, Jairo Garces; Marcolino Ruiz; Victor Abella, Maximino Correa; Alvaro Castillo, Miguel Vargas; Javier Rodriguez.
Actividades: se realiza encofrado Ventanas Kot 14 A Kot 20 Segunda Altura y Kot 7,7 A Kot 11 Altura final; Liberacion por parte de Interventoria acero de Refuerzo; localizacion Anclajes y Subdrenes.
Suministro Material de relleno decorte, se inicia dicha actividad por motivos de lluvias la noche anterior a las 9:00 am. hora en la que se encuentra en Condiciones seguras para el Ingreso de la Volqueta para acopiar el material.

INTERVENTOR

VIERNES 05 DE MARZO 2021 (Día soleado)

Personal en Obra: Ing Germán; Ing Fabian; Julian Pedraza; Jairo Garces; Marcelino Ruiz; Victor Abella; Maximino Correa; Alvaro Castillo; Miguel Vanegas; Javier Rodriguez.

Actividades: Se Concilia Con Interventoria Con el fin de la correcta funcionalidad del filtro en la parte del muro Pie del costado interno; se realiza de la siguiente manera:

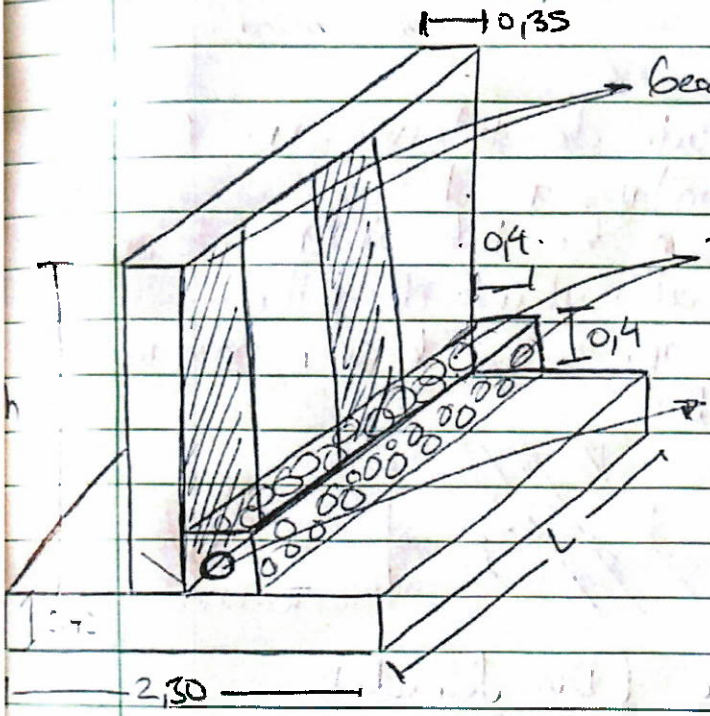

Se inicia Construccion de filtro Muro según Concilia Con Interventoria según esquema anterior; Instalacion de Geodren planar segun especificaciones del diseño.

Vaciado Muro Kot 19 A Kot 20 Segunda altura; y Kot 7,7 Kot 11 Altura final. Se realizan la toma de muestras de Concreto.

INTERVENTOR

SABADO 06 DE MARZO 2021 (Dia soleado).

Personal de Obra: Ing. GERMAN; Ing fabian; Julian pedraza; Victor A. Jairo Garces; Marcelino Ruiz; Maximino Correa; Alvaro Castillo; Miguel V Javier Rodriguez; Luis Alfonso Bustamante.

Actividades: Se inicia. el Relleno Con material seleccionado

Detras del muro; Compactandolo en Capas de 30 cm.ts para Garantizar una Densidad optima y Asi Evitar Espacios en el Confinamiento

* Se Continua Con el Armado de formaleta para Encofrar y mañana el Vaciado de Concreto de la Estructura.
* Se realiza el Soldado de la primer hilera de trinchos metalico Con su respectivo tubo horizontal.
* Instalacion de Geodren plunar detras del muro
* Toma de muestra de Concreto.

Se realiza liberacion por parte de Interventoria Acero de refuerzo, localizacion de anclajes y Subdrenes, liberacion Capa de relleno Con densidad al 95% segun Proctor modificado tomado al material de relleno empleado en el muro. Cada Capa se hace de 30cm maximo y Compactada a Maxima densidad.

INTERVENTORIA

LUNES 08 DE MARZO 2021 (Din Soldado)

Personal de OBRA: Ing GERMAN; Ing [illegible]; Julian Pedroza. Jairo Garcer; Marcolino Poiz; Victor Abella; Marcolino Correa; Alvaro Castillo, Miguel Vargas; Javier Rodriguez, Luis Alfonso Bustamante

Actividades: Se Realiza Relleno de muro al 95% densidad. Segun proctor, Construccion de filtro e instalacion de Geodren. Vaciado de Concreto de la ultima Seccion ubicada en la Ko+14 a la Ko+20, Figurado y Amarre de Hierro de la Ko+0.00 a Ko+0,30, localizacion de Drenes, localizacion de Anclajes; instalacion de tuberia transversal de 4" en los trinchos metalicos, toma de muestra de Concreto.

* Se Realiza liberacion por parte de Interventoria Acuro de Refuerzo, localizacion de Anclajes y Subdrenes liberacion de capa de relleno Con densidad al 95% Segun proctor modificado tomado al material de Relleno empleado en el muro. Cada capa se hace de 30 cm maximo Compactada

MARTES 09 DE MARZO 2021 (DIA Soleado)

Personal de obra: Ing GERMAN, Ing FABIAN; Julian Pedraza. Jairo Gorcez; Marcolino Ruiz; Victor Abella; Maximino Correa; Alvaro Castillo Miguel Vargas; Javier Rodriguez, luis Alfonso Bustamante.

Actividades: Suministro de material Seleccionado para relleno de muro, Construccion de filtro de muro; Instalacion de Geodren encofrado de muro de ultima Seccion entre K0+00 a K0+6.30. Compactacion de material de relleno al 95%, Instalacion de tuberia transveral de 4" en trincho metalico (Soldadura) liberacion por parte de interventoria de Acero de refuerzo localizado en la K0+0.0 a K0+6.30, localizacion de Anclajes localizacion de drenes; Compactacion de relleno, Instalacion de tubo longitudinal trinchos metalicos.

MIERCOLES 10 DE MARZO 2021 (DIA Soleado)

Personal: Ing GERMAN; Ing FABIAN; Julian Pedraza.; Jairo Gorcez Marcolino Ruiz; Victor Abella; Maximino Correa; Alvaro Castillo; Miguel Vargas Javier Rodriguez; luis Alfonso Bustamante.

Actividades: Se Realiza relleno con material Seleccionado y con densidad al 95% Segun proctor; Construccion de filtro e instalacion de Geodren planar, encofrado de muro ultima Seccion entre la K0+00 a K0+6.3 localizacion de drenes, localizacion de anclajes, Instalacion de tuberia longitudinal de 4" en trinchos metalicos, toma de muestra de Concreto.

* Se realiza liberacion por parte de interventoria Acero de refuerzo, localizacion de Anclajes y Subdrenes, liberacion de Capa de relleno con densidad a 96% Segun proctor modificado torrado al material de relleno empleado en el muro Cada Capa se hace de 30 cm (h). maximo Compactada
