CONTRATO ACEPTACION DE OFERTA MC-IPCC-004-2021, SUSCRITO ENTRE EL INSTITUTO DE PATRIMONIO E INGGEA CONSTRUCTORES

ACTA N°1 FINAL

OBJETO

CONTRATAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LAS PUERTAS EN VIDRIO TEMPLADO DE SEGURIDAD DE LA MEGABIBLIOTECA PUBLICA JUAN JOSÉ NIETO DE ROSEDAL, EN VIRTUD DEL CONTRATO ACEPTACION DE OFERTA MC-IPCC-004-2021 ENTRE EL IPCC E INGGEA CONSTRUCTORES SAS".

DESCRIPCION DE CONTRATO MC-IPCC-004-2021

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Desmonte de vidrios templado, limpieza y disposición de residuos.	UND	1,00	$ 150.000	$ 150.000,00
2	Suministro, transporte e instalación de vidrio templado incoloro de 8 mm (1.00 m x 2,07 m) incluye accesorios y consumibles para su correcta instalación.	UND	1,00	$ 1.130.000	$ 1.130.000,00
3	Mantenimiento de puerta de vidrio de seguridad acceso principal de 8 mm. de espesor (4,00 m de ancho, cuatro hojas batientes), incluye desmonte y montaje, retiro de los zócalos superior e inferior y accesorios, se deben pegar nuevamente los zócalos y accesorios, revisión de empaques, engrase y revisión de bisagra. nivelación de puerta y revisión de todas las partes para correcto funcionamiento.	UND	3,00	$ 290.000	$ 870.000,00
4	Mantenimiento de puerta de vidrio de seguridad interior de 8 m.m. de espesor (1,00 m de ancho), incluye desmonte y montaje revisión y cambio de empaques y accesorios si lo requieren, engrase y revisión de la bisagra, nivelación de puerta y revisión de todas las partes para correcto funcionamiento.	UND	1,00	$ 290.000	$ 290.000,00
5	Mantenimiento de puerta de vidrio de seguridad interior de 8 mm. de espesor (2,00 m de ancho, dos hojas batientes), incluye desmonte y montaje, retiro de los zócalos superior e inferior y accesorios, pegar nuevamente los zócalos y accesorios, revisión de empaques, engrase y revisión de bisagra. nivelación de puerta y revisión de todas las partes para correcto funcionamiento.	UND	6,00	$ 290.000	$ 1.740.000,00
5	Suministro e instalación de cerraduras para puerta ventanas, Tipo Cerrojo Doble multipunto niquelado con picaporte de 1", cilindro de uso cilíndrico	UND	6,00	$ 235.000	$ 1.410.000,00
VALOR TOTAL INC IVA					**$ 5.590.000**

INGGEA CONSTRUCTORES

LILIANA PRIERO P.
INGGEA CONSTRUCTORES SAS
CONTRATISTA

ALFONSO CABRERA CRUZ
IPCC
SUPERVISOR DEL CONTRATO

MEMORIAS DE CÁLCULO

FECHA:	15/04/2021	EDICION:	Hoja 1 de 1

OBRA:	CONTRATAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LAS PUERTAS EN VIDRIO TEMPLADO DE SEGURIDAD DE LA MEGABIBLIOTECA PUBLICA JUAN JOSÉ NIETO DE ROSEDAL

DESCRIPCIÓN	ITEM: 1	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD	Desmonte de vidrios templado, limpieza y disposición de residuos.	UNIDAD	UND



(Este espacio es para anexar partes de planos en planta y/o fotografías como evidencias de obra)

ITEM	LOCALIZACION	TIPO	1. LONG (m)	1. ANCHO (m)	1. ALTURA (m)	CANT	TOTAL	DESCUENTOS LONG (m)	DESCUENTOS ANCHO (m)	DESCUENTOS ALTURA (m)	TOTAL	OBSERVACIONES
	ACCESO PRINCIPAL PLANTA SUPERIOR					1,00	1,00					

OBSERVACIONES	totales	1,00
	VIENEN	
	TOTAL	PASAN 1,00

Vo. Bo. CONSTRUCTOR	Vo.Bo. INTERVENTORIA	APRUEBA:


MEMORIAS DE CÁLCULO

FECHA:	15/04/2021	EDICION:	Hoja 1 de 1

OBRA:	CONTRATAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LAS PUERTAS EN VIDRIO TEMPLADO DE SEGURIDAD DE LA MEGABIBLIOTECA PUBLICA JUAN JOSÉ NIETO DE ROSEDAL

	ITEM: 2	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD	Suministro, transporte e instalación de vidrio templado incoloro de 8 mm (1.00 m x 2,07 m) incluye accesorios y consumibles para su correcta instalación.	UNIDAD	UND



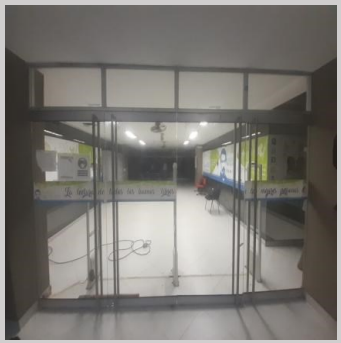

(Este espacio es para anexar partes de planos en planta y/o fotografías como evidencias de obra)

ITEM	LOCALIZACION	TIPO	1. LONG (m)	1. ANCHO (m)	1. ALTURA (m)	CANT	TOTAL	DESCUENTOS LONG (m)	DESCUENTOS ANCHO (m)	DESCUENTOS ALTURA (m)	TOTAL	OBSERVACIONES
	ACCESO PRINCIPAL PLANTA SUPERIOR					1,00	1,00					

OBSERVACIONES	totales	1,00
	VIENEN	
	TOTAL	PASAN 1,00

Vo. Bo. CONSTRUCTOR	Vo.Bo. INTERVENTORIA	APRUEBA:


MEMORIAS DE CÁLCULO

MEMORIAS DE CÁLCULO

FECHA:	15/04/2021	EDICION:	Hoja 1 de 1

OBRA:	CONTRATAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LAS PUERTAS EN VIDRIO TEMPLADO DE SEGURIDAD DE LA MEGABIBLIOTECA PUBLICA JUAN JOSÉ NIETO DE ROSEDAL

ITEM: 3	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD	Mantenimiento de puerta de vidrio de seguridad acceso principal de 8 mm. de espesor (4,00 m de ancho, cuatro hojas batientes), incluye desmonte y montaje, retiro de los zócalos superior e inferior y accesorios, se deben pegar nuevamente los zócalos y accesorios, revisión de empaques, engrase y revisión de bisagra. nivelación de puerta y revisión de todas las partes para correcto funcionamiento.	UNIDAD UND

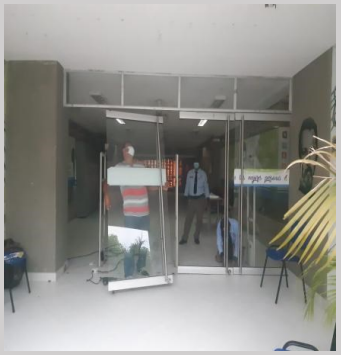



(Este espacio es para anexar partes de planos en planta y/o fotografías como evidencias de obra)

ITEM	LOCALIZACION	TIPO	1. LONG (m)	1. ANCHO (m)	1. ALTURA (m)	CANT	TOTAL	DESCUENTOS LONG (m)	DESCUENTOS ANCHO (m)	DESCUENTOS ALTURA (m)	TOTAL	OBSERVACIONES
	ACCESO PRINCIPAL PLANTA SUPERIOR					3,00	3,00					

OBSERVACIONES	totales	3,00
	VIENEN	
	TOTAL	PASAN 3,00


Vo. Bo. CONSTRUCTOR | Vo.Bo. INTERVENTORIA | APRUEBA:

MEMORIAS DE CÁLCULO

FECHA:	15/04/2021	EDICION:	Hoja 1 de 1

OBRA:	CONTRATAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LAS PUERTAS EN VIDRIO TEMPLADO DE SEGURIDAD DE LA MEGABIBLIOTECA PUBLICA JUAN JOSÉ NIETO DE ROSEDAL

ITEM: 4	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD	Mantenimiento de puerta de vidrio de seguridad interior de 8 m.m. de espesor (1,00 m de ancho), incluye desmonte y montaje revisión y cambio de empaques y accesorios si lo requieren, engrase y revisión de la bisagra, nivelación de puerta y revisión de todas las partes para correcto funcionamiento.	UNIDAD UND

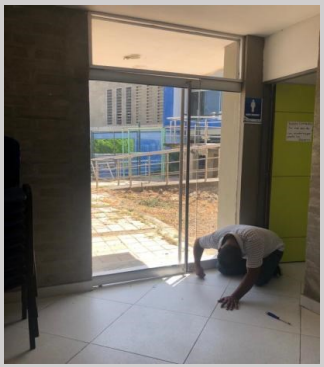



(Este espacio es para anexar partes de planos en planta y/o fotografías como evidencias de obra)

ITEM	LOCALIZACION	TIPO	1. LONG (m)	1. ANCHO (m)	1. ALTURA (m)	CANT	TOTAL	DESCUENTOS LONG (m)	DESCUENTOS ANCHO (m)	DESCUENTOS ALTURA (m)	TOTAL	OBSERVACIONES
	ACCESO SECUNDARIO PLANTA INFERIOR					1,00	1,00					

OBSERVACIONES	totales	1,00
	VIENEN	
	TOTAL	PASAN 1,00

Vo. Bo. CONSTRUCTOR | Vo.Bo. INTERVENTORIA | APRUEBA:


MEMORIAS DE CÁLCULO

MEMORIAS DE CÁLCULO

FECHA:	15/04/2021	EDICION:	Hoja 1 de 1

OBRA:	CONTRATAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LAS PUERTAS EN VIDRIO TEMPLADO DE SEGURIDAD DE LA MEGABIBLIOTECA PUBLICA JUAN JOSÉ NIETO DE ROSEDAL

ITEM: 5	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD	Mantenimiento de puerta de vidrio de seguridad interior de 8 mm. de espesor (2,00 m de ancho, dos hojas batientes), incluye desmonte y montaje, retiro de los zócalos superior e inferior y accesorios, pegar nuevamente los zócalos y accesorios, revisión de empaques, engrase y revisión de bisagra. nivelación de puerta y revisión de todas las partes para correcto funcionamiento.	UNIDAD UND

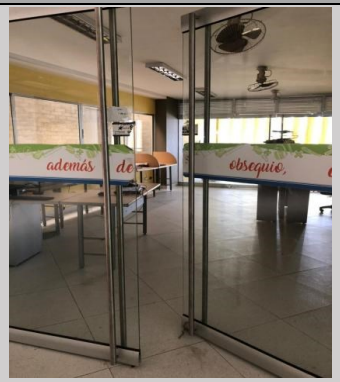



(Este espacio es para anexar partes de planos en planta y/o fotografías como evidencias de obra)

ITEM	LOCALIZACION	TIPO	1. LONG (m)	1. ANCHO (m)	1. ALTURA (m)	CANT	TOTAL	DESCUENTOS LONG (m)	DESCUENTOS ANCHO (m)	DESCUENTOS ALTURA (m)	TOTAL	OBSERVACIONES
	ACCESO PRINCIPAL PLANTA INFERIOR					2,00	2,00					
	SALA DE DIRECCION					2,00	2,00					
	SALA DE INFORMATICA					2,00	2,00					

OBSERVACIONES	totales	6,00
	VIENEN	
	TOTAL	PASAN 6,00

Vo. Bo. CONSTRUCTOR	Vo.Bo. INTERVENTORIA	APRUEBA:

MEMORIAS DE CÁLCULO

FECHA:	15/04/2021	EDICION:	Hoja 1 de 1

OBRA:	CONTRATAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LAS PUERTAS EN VIDRIO TEMPLADO DE SEGURIDAD DE LA MEGABIBLIOTECA PUBLICA JUAN JOSÉ NIETO DE ROSEDAL

ITEM: 6	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD	Suministro e instalación de cerraduras para puerta ventanas, Tipo Cerrojo Doble multipunto niquelado con picaporte de 1", cilindro de uso cilíndrico	UNIDAD UND





(Este espacio es para anexar partes de planos en planta y/o fotografías como evidencias de obra)

ITEM	LOCALIZACION	TIPO	1. LONG (m)	1. ANCHO (m)	1. ALTURA (m)	CANT	TOTAL	DESCUENTOS LONG (m)	DESCUENTOS ANCHO (m)	DESCUENTOS ALTURA (m)	TOTAL	OBSERVACIONES
	ACCESO PRINCIPAL PLANTA SUPERIOR					2,00	2,00					
	ACCESO PRINCIPAL PLANTA INFERIOR					1,00	1,00					
	SALA DE DIRECCION					1,00	1,00					
	SALA DE INFORMATICA					1,00	1,00					
	ACCESO SECUNDARIO PLANTA INFERIOR					1,00	1,00					

OBSERVACIONES	totales	6,00
	VIENEN	
	TOTAL	PASAN 6,00

Vo. Bo. CONSTRUCTOR	Vo.Bo. INTERVENTORIA	APRUEBA:
