PROGRAMA DE CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
Contrato Interadministrativo 859 de 2019 (Numeración ENTerritorio 219141)

Proyecto: Programa de Conexiones Intradomiciliarias Atrato, Chocó

Informe correspondiente al periodo entre el 26 de enero y el 26 de febrero de 2021

Fecha de elaboración: 27 de febrero de 2021

ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL PERIODO

1. ACTIVIDADES TRANSVERSALES

- El 30 de julio de 2020 se dio inicio a la ejecución del contrato. Se inicia ejecución de las Actividades 1 y 2

- Se aprobó por parte de la interventoría el 14 de septiembre de 2020 la Actividad No. 1: chequeo de los diseños, realizado por el contratista de obra.

- Se inició la Actividad 3 ejecución de obras en septiembre de 2020.

El 04 de febrero de 2021: Se realiza reunión de regularización con el equipo de trabajo de conexiones intradomiciliarias.

El 11 de febrero de 2021: Se realiza reunión de regularización con el equipo de trabajo de conexiones intradomiciliarias.

El 19 de febrero de 2021: Se realiza reunión de regularización con el equipo de trabajo de conexiones intradomiciliarias.

El 24 de febrero de 2021: Se realiza reunión de regularización con el equipo de trabajo de conexiones intradomiciliarias.

- Se realiza la prórroga del contrato de obra No. 2200814 por 45 días luego de la solicitud de la interventoría mediante radicado No. 20214300003302 del 7 de enero de 2021 y el posterior envío al Área de Operaciones mediante radicado No. 20212200020093 del 28 de enero de 2021.

- Se realiza la prórroga del contrato de interventoría No. 2200817 por 45 días luego de la solicitud de la interventoría mediante radicado No. 20214300003302 del 7 de enero de 2021 y el posterior envío al Área de Operaciones mediante radicado No. 20212200020323 del 28 de enero de 2021.

2. DATOS CONTRATO DE OBRA

Contrato No.	2200814
Objeto	Chequeo, validación de prototipos, diagnóstico, concertación, intervención y gestión social para la ejecución del programa de conexiones intradomiciliarias de acueducto y alcantarillado, en los municipios de María la Baja (Bolívar), Sabanas de San Ángel (Magdalena), Astrea (Cesar), Tadó (Chocó) y Atrato (Chocó) - grupo 5 Atrato - Chocó
CONTRATISTA	CONSORCIO TERRITORIAL 21
Plazo inicial	6 MESES
Prórroga	45 días
Valor inicial	**$ 4.838.871.936,00**


FECHAS IMPORTANTES DEL CONTRATO DE OBRA	
EVENTO	**Fecha**
Adjudicación del contrato	25 de junio de 2020
Suscripción de contratos	06 de julio de 2020
Aprobación de protocolos de bioseguridad por parte del municipio	24 de julio de 2020
Acta de inicio del contrato	30 de Julio de 2020
Fecha de Terminación inicial	30 de enero de 2021
Fecha de Terminación actual	06 de marzo de 2021

	ALCANCE DE OBRAS					
Barrio	**Viabilizadas**	**Diagnosticadas**	**Aprobadas**	**Ejecutadas**	**Avance (%)**	**Observaciones**
Malvi Club	142	129	129	129	100	Se encuentran en ejecución 35 viviendas
Yuto Nuevo	103	93	93	93	100	
Carretera	76	66	66	66	100	
Pueblo Nuevo	99	95	95	69	73	
San Antonio	113	106	106	106	100	
Santander	87	85	85	16	19	
Centro	48	41	41	12	29	

Potenciales inclusiones						

ASPECTOS TÉCNICOS – SITUACIÓN ACTUAL

Continúa la ejecución de las Actividades 2, 3 y 4 en el municipio de Atrato.

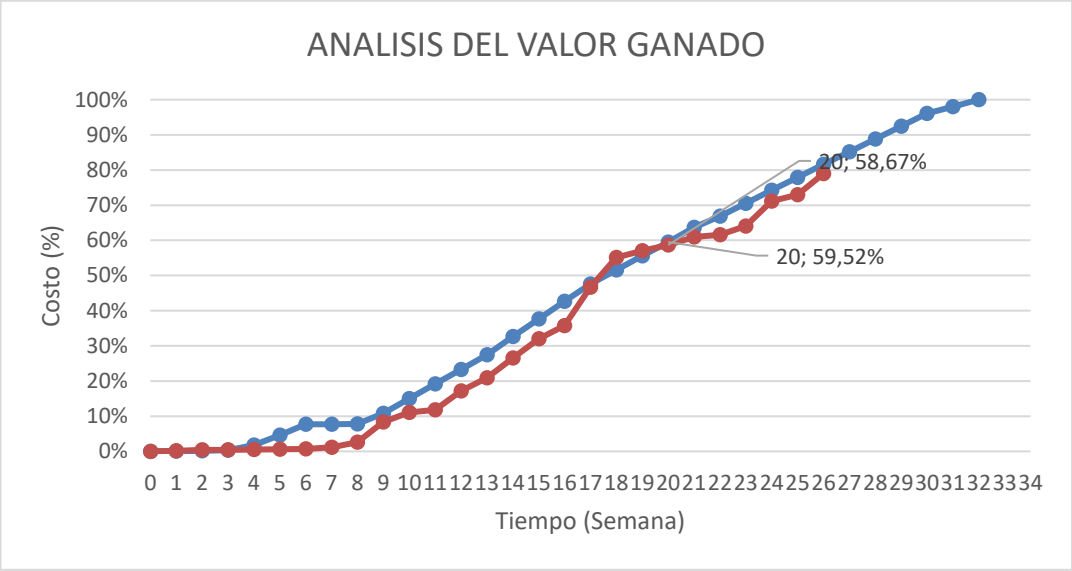

Curva S de acuerdo a programación aprobada a contratista de obra a la fecha.

REGISTRO FOTOGRÁFICO DEL PROYECTO





18 de febrero de 2021 Construcción unidad sanitaria tipo 2 con lavadero




18 de febrero de 2021: Pruebas técnicas para recibo de obras. Instalación de lavaplatos

PÓLIZAS CONTRATO DE OBRA

A continuación, se presentan las pólizas que actualmente amparan la ejecución del contrato de Obra:

CONCEPTO AMPARO	No. PÓLIZA CERTIFICADO	% CUBRIMIENTO	VALOR AMPARADO	VIGENCIAS		ASEGURADORA	OBS
				DESDE	HASTA		
Cumplimiento	45-45-101086779	30%	$ 1.451.661.580,80	30/07/2020	16/11/2021	SEGUROS DEL ESTADO S.A	
Calidad del Servicio	45-45-101086779	30%	$ 34.550.345,00	30/01/2021	30/01/2024	SEGUROS DEL ESTADO S.A	
Salarios, Prestaciones Sociales e Indemnizaciones	45-45-101086779	5%	$ 241.943.596,80	30/07/2020	16/03/2021	SEGUROS DEL ESTADO S.A	
Estabilidad de Obra	45-45-101086779	50%	$ 2.419.435.968,00	5 años 0 meses 0 dias A partir del acta de recibo final		SEGUROS DEL ESTADO S.A	

Responsabilidad Civil Extracontractual	45-40-101059774	15% Del valor de la perdida - Minimo: 1,00 SMMLV	$ 1.451.661.580,80	30/07/2020	16/03/2021	SEGUROS DEL ESTADO S.A	
Buen manejo del anticipo	45-45-101086779	100%	$ 472.370.412,00	30/07/2020	16/11/2021	SEGUROS DEL ESTADO S.A	

MANEJO DE ANTICIPOS

Se realizó el desembolso del anticipo el 29 de septiembre de 2020 por valor de $472.370.412

A la fecha se ha realizado una amortización del anticipo por valor de $ 326.102.544,68 quedando un saldo de $146.267.867,32.

3. CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Contrato No.	2200817
Objeto	Interventoría técnica, administrativa, de control financiero, presupuestal, social y ambiental para el chequeo, validación de prototipos, diagnóstico, concertación, intervención y gestión social para la ejecución del programa de conexiones intradomiciliarias, en los municipios de María la Baja (Bolívar) Sabanas de San Ángel (Magdalena), Astrea (Cesar), Tadó (Chocó) y Atrato (Chocó) - Grupo 5. Atrato - Chocó.
CONTRATISTA	GNG INGENIERIA SAS
Plazo inicial	6 MESES
Valor inicial	$424.452.579,6
Fecha de Inicio	30-07-2020
Fecha de Terminación inicial	30-01-2021
Prórroga	Por 45 días (hasta el 16 de marzo de 2021)

PERSONAL APROBADO DE INTERVENTORÍA – PARA EL PERIODO DEL INFORME

CARGO A DESEMPEÑAR	NOMBRE	PROFESIÓN
DIRECTOR DE INTERVENTORIA	DORIS XIOMARA CASTAÑEDA	ING CIVIL
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	LUIS FELIPE QUIMBAYO ORTIZ	ING CIVIL
AUXILIAR DE INTERVENTORÍA	MAYRA ALEJANDRA PEÑA ZAMBRANO	ING CIVIL
ESPECIALISTA ESTRUCTURAL	JAIRO ANDRES MEZA ROSAS	ING CIVIL - ESP. EN ESTRUCTURAS
PROFESIONAL SOCIAL	LUZ AYDA ESCOBAR OSPINA	TRABAJADORA SOCIAL
PROFESIONAL SOCIAL DE APOYO	OLGA YOLANDA ROBAYO CRUZ	TRABAJADORA SOCIAL
PROFESIONAL DE CALIDAD	MILETH ESCALANTE TAPIAS	INGENIERA INDUSTRIAL- ESP Gestión de Calidad
INSPECTOR DE INTERVENTORÍA 1	ANDRÉS ALBERTO SALGADO SALGADO	ING CIVIL
INSPECTOR DE INTERVENTORÍA 2	JOHAN ELIAS MUÑOZ VEGA	ING CIVIL

CARGO A DESEMPEÑAR	NOMBRE	PROFESIÓN
TECNICO PGIO	MARÍA EUGENIA CUBURUCO AGUIRRE	PROFESIONAL EN SALUD OCUPACIONAL

PÓLIZAS DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

A continuación, se presentan las pólizas que actualmente amparan la ejecución del contrato de Interventoría:

CONCEPTO AMPARO	No. PÓLIZA CERTIFICADO	% CUBRIMIENTO	VALOR AMPARADO	VIGENCIAS		ASEGURADORA	OBS
				DESDE	HASTA		
Cumplimiento	15-45-101116708	20%	$ 84.890.515,92	30/07/2020	16/11/2021	SEGUROS DEL ESTADO S.A	
Calidad del Servicio	15-45-101116708	30%	$ 127.335.773,88	30/01/2021	30/01/2026	SEGUROS DEL ESTADO S.A	
Salarios, Prestaciones Sociales e Indemnizaciones	15-45-101116708	5%	$ 21.222.628,98	30/07/2020	16/03/2024	SEGUROS DEL ESTADO S.A	
Responsabilidad Civil Extracontractual	15-40-101065073	15% del valor de la perdida - Minimo: 1,00 SMMLV	$ 219.450.750,00	30/07/2020	16/03/2021	SEGUROS DEL ESTADO S.A	

PROBLEMÁTICAS

PROBLEMA IDENTIFICADO	ACCION ESTRATEGICA	ACTIVIDADES DETALLADAS
En consideración a las dificultades presentadas para el normal desarrollo del proyecto antes mencionado, que se describen a continuación, tales como disponibilidad de mano de obra; provisión, disponibilidad y entrega de materiales de conformidad a las condiciones contractuales; medidas de protección frente a la pandemia por COVID-19, ejecución de obras en época decembrina, entre otras que fueron de	La Supervisión de ENTerritorio ha revisado todos los insumos técnicos presentados por el Contratista de Obra y la Interventoría, requeridos para la modificación propuesta para los Contratos de Obra No. 2200814 e Interventoría No. 2200817, encontrando que éstos son consistentes y se ajustan a los determinados en el "Manual de Interventoría y Supervisión MMI002" de la Entidad.	Se tramitó la prórroga de los contratos de obra e interventoría por 45 días, es decir hasta el 16 de marzo de 2021 con el fin de que se de cumplimiento al objeto del contrato.

conocimiento del contratista al momento de participar en la licitación y, en ese sentido, el Contratista solicitó la prórroga del Contrato de Obra en un plazo de cuarenta y cinco (45) días.		

SEGUIMIENTO A LOS INFORMES DE INTERVENTORIA

La Interventoría ha presentado en este periodo 4 Informes semanales de interventoría con corte a:
07 de febrero de 2021
14 de febrero de 2021
21 de febrero de 2021
28 de febrero de 2021

Y ha presentado en este periodo 1 Informe mensual con corte al 31 de enero de 2021

Se anexa Matriz

RELACION INFORMES DE INTERVENTORIA

MUNICIPIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
	APROBADO	APROBADO	APROBADO	APROBADO	APROBADO
Atrato	20202200190281	20202200223131	20202200227121	20212200018601	20212200028861

COMUNICACIONES Y SEGUIMIENTO A CORRESPONDENCIA

Se anexa Matriz de comunicaciones

REUNIONES REALIZADAS EN EL PERIODO

03 de febrero de 2021: Reunión con contratista de obra e interventoría de seguimiento del proyecto.
10 de febrero de 2021: Reunión con contratista de obra e interventoría de seguimiento del proyecto.
17 de febrero de 2021: Reunión con contratista de obra e interventoría de seguimiento del proyecto.
24 de febrero de 2021: Reunión con contratista de obra e interventoría de seguimiento del proyecto.

Elaborado por:

ALEXANDER BUSTAMANTE DUQUE
SUPERVISOR
