ALCALDÍA DE
BUENAVISTA
Nit. 800096739-8

Buenavista – Córdoba, 13 de abril de 2021

Señores
MINISTERIO DEL DEPORTE
Doctor ERNESTO LUCENA BARRERO
Ministro del Deporte
Av. Carrera 68 No. 55 65
Ciudad

Asunto: Solicitud Modificación al Convenio Interadministrativo COID-1269-2020.

Referencia: Convenio Interadministrativo COID-1269-2020.

Respetado ministro;

Reciba usted un afectuoso saludo de parte del municipio de Buenavista departamento de Córdoba, como de costumbre agradeciendo de antemano su alto sentido de pertenencia en pro del Deporte en nuestro municipio, a través del fomento de escenarios deportivos de alto impacto, tal como es el caso de la Construcción de la Unidad Recreo deportiva en el Sector el Poli en nuestro municipio.

La presente es con el fin de solicitar la modificación del convenio COID-1269-2020, en las siguientes Clausulas, quedando así:

***"Clausula 3) Plazo:** El plazo de ejecución del convenio será hasta de DOCE (12) meses, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento, ejecución y suscripción del acta de inicio.*

El plazo contempla las siguientes etapas:

Etapa 1: Realizar las labores de afinamiento mejora y maduración conforme a las posibilidades de actualización del proyecto de acuerdo con lo reglado por el DNP y lo determinado en el concepto técnico sectorial. Lo anterior a más tardar el 30 de abril de 2021.

Etapa 2: Ejecución del proyecto.

***PARÁGRAFO 1:** Si la entidad ejecutora no realiza las labores de afinamiento mejora y maduración, el MINISTERIO DEL DEPORTE podrá optar por no financiar el mismo, pero la entidad formuladora asumirá el cumplimiento de las expectativas generadas en la comunidad, y sobre el particular el MINDEPORTE solamente prestaría una asistencia técnica.*

PARÁGRAFO 2: *El plazo de ejecución del contrato podrá ser prorrogado y/o modificado de mutuo acuerdo entre las partes, en todo caso, se realizará mediante escrito en documento adicional al presente convenio, previo a la finalización del mismo. En caso de prórrogas, igualmente se deberán prorrogar las pólizas. (...)"*

"Clausula 9 Obligaciones o Compromisos a cargo del Ente Ejecutor – Obligaciones o Compromisos Generales: 1. *Realizar, en los componentes técnicos de la alternativa de solución defina por la entidad formuladora, las labores de afinamiento, mejora y maduración que estos requieran para un óptimo adelanto de la fase de ejecución, lo cual podrá realizar conforme a las posibilidades de actualización del proyecto de acuerdo con lo reglado por el DNP y lo determinado en el concepto técnico sectorial. Lo anterior a más tardar el 30 de abril de 2021."*

Lo anterior justificado en que el cronograma general del proyecto contempla dos (2) meses de etapa precontractual, seis (6) meses de etapa de ejecución y cuatro (4) meses de etapa post-contractual o de liquidación para un total de doce (12) meses, motivo por la cual se solicita modificar el plazo de ejecución del convenio hasta el 31 de diciembre del 2021, teniendo en cuenta que el convenio actualmente contempla los seis (6) meses de ejecución, encontrándose pendiente adicionar la etapa precontractual y post-contractual.


Lo que respecta al plazo para la maduración del proyecto a fase III hasta el 30 de abril de 2021, se debe a la situación actual que enfrenta el país referente a la emergencia sanitaria decretada en el país, motivada por la pandemia del Covid-19, lo cual ha generado inconvenientes y atrasos en la articulación de estudios y diseños, así como demoras en la obtención de permisos y licencias expedidos por terceros.

En virtud de lo anterior, se solicita de manera respetuosa realizar las modificaciones al Convenio COID-1269-2020 en su CLÁUSULA 3) Plazo y CLÁUSULA 9) OBLIGACIONES O COMPROMISOS GENERALES en el numeral 1, hasta las fechas anteriormente relacionada.

Agradecemos su atención a la presente

Cordialmente,

FÉLIX GUTIÉRREZ CÓRDOBA
Alcalde Municipal
Buenavista – Córdoba

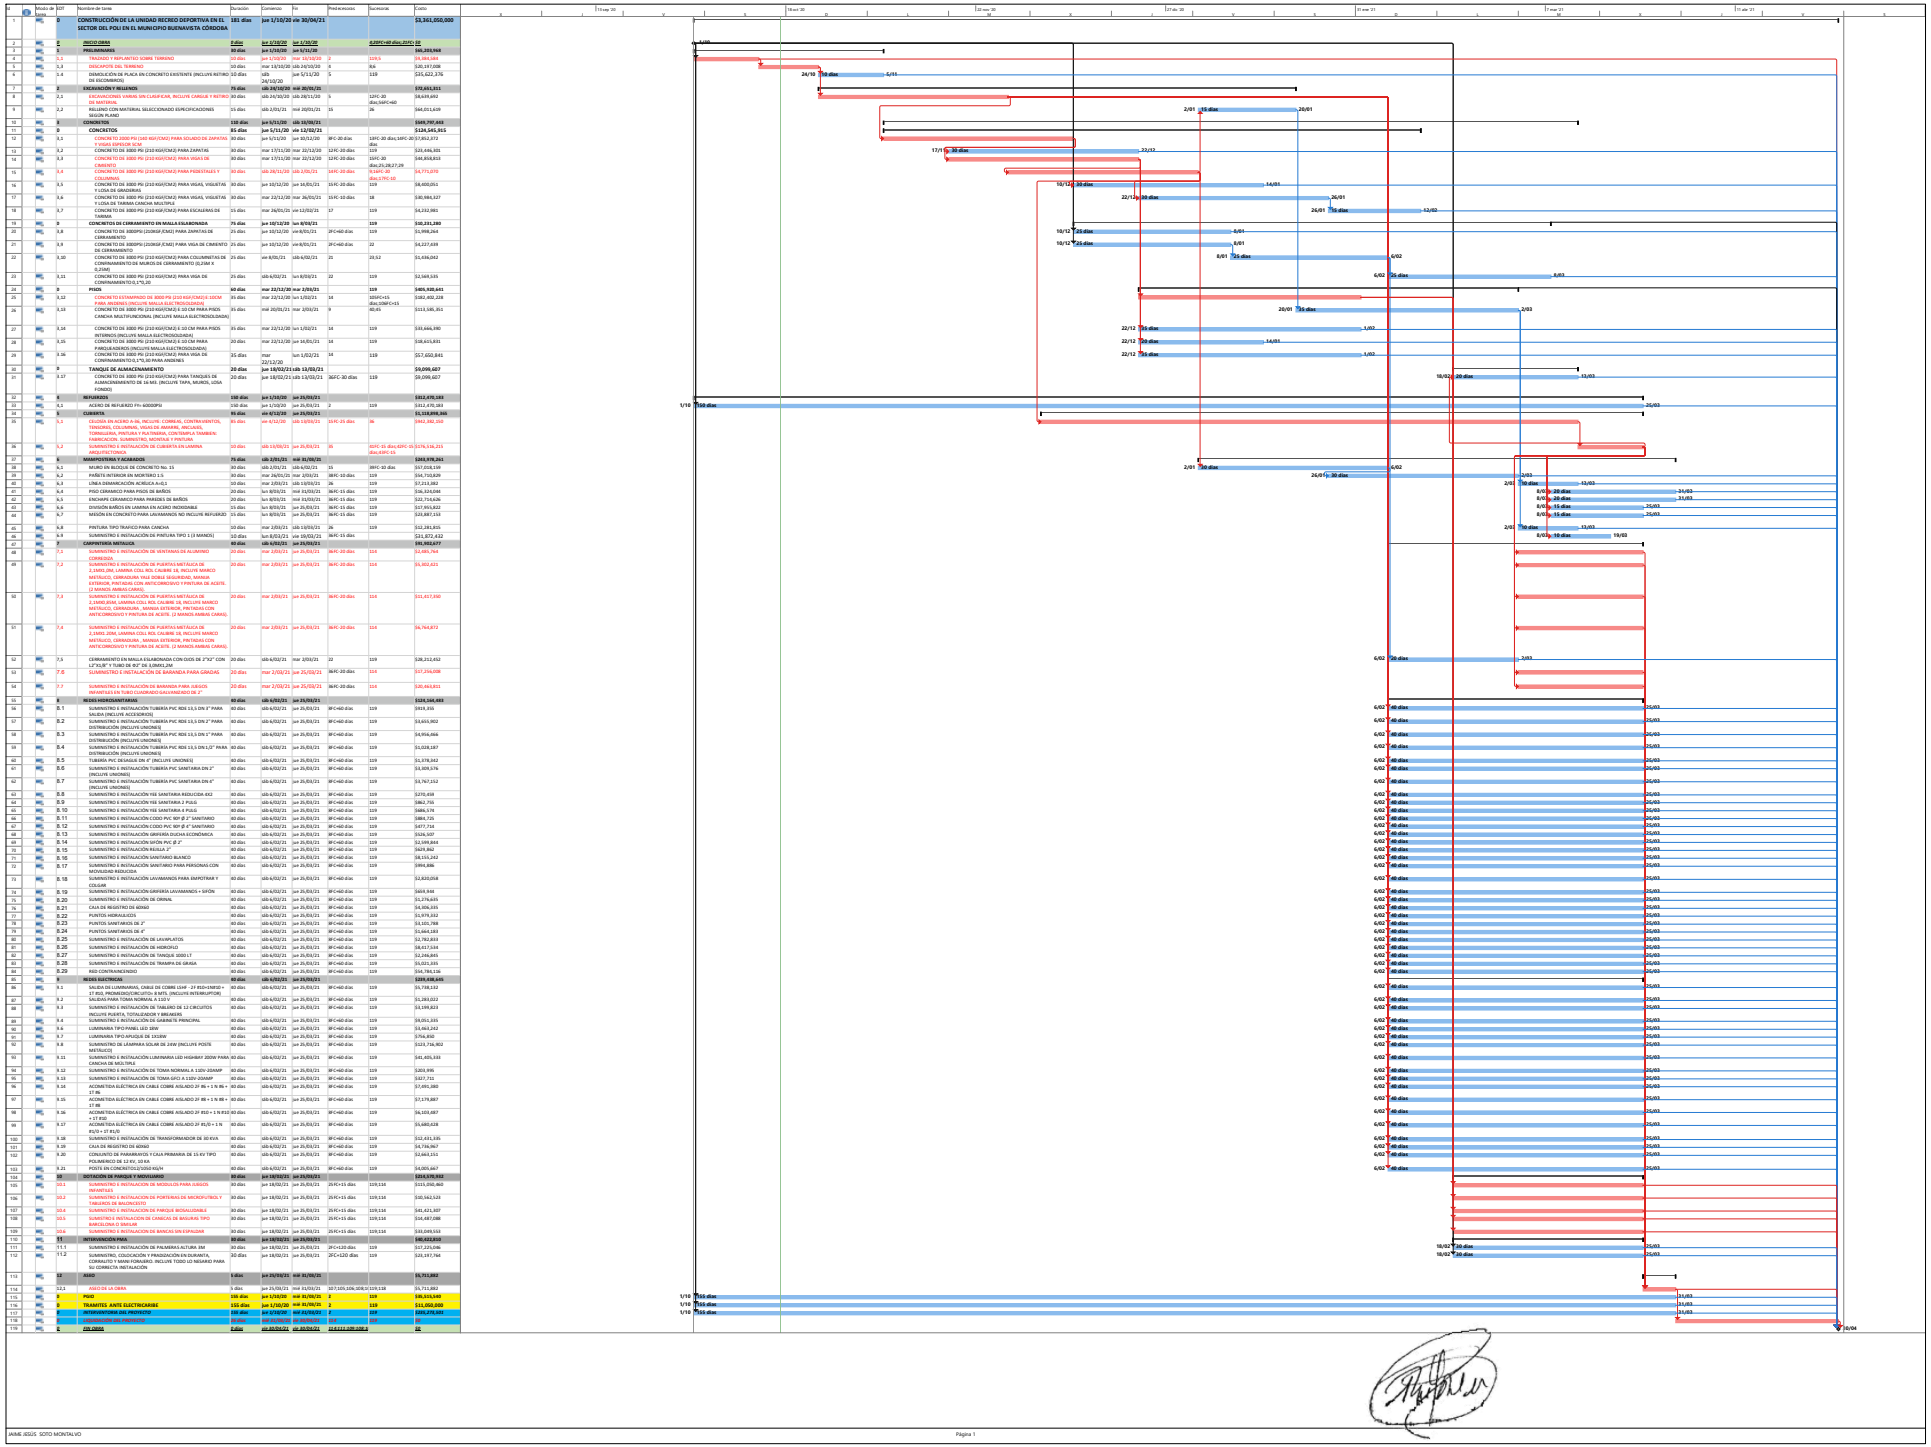

Id	Modo de tarea	EDT	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	Sucesoras	Costo
1		0	CONSTRUCCIÓN DE LA UNIDAD RECREO DEPORTIVA EN EL SECTOR DEL POLI EN EL MUNICIPIO BUENAVISTA CÓRDOBA	181 días	jue 1/10/20	vie 30/04/21			$3,361,050,000
2		0	INICIO OBRA	0 días	jue 1/10/20	jue 1/10/20		4;59FC+40 días;3;47C	0$
3		1	PRELIMINARES	80 días	jue 1/10/20	jue 5/11/20			$65,202,960
4		1,1	TRAZADO Y REPLANTEO SOBRE TERRENO	10 días	jue 1/10/20	mar 13/10/20	2	10;9;5	$1,484,160
5		1,3	DESCAPOTE DEL TERRENO	10 días	mar 13/10/20	lún 26/10/20	4	8;6	$20,137,008
6		1,4	DEMOLICIÓN DE PLACA EN CONCRETO EXISTENTE (INCLUYE RETIRO DE ESCOMBROS)	10 días	lún 26/10/20	jue 5/11/20	5	110	$25,622,376
7		2	EXCAVACIÓN Y RELLENOS	75 días	lún 26/10/20	mié 20/01/21			$72,651,311
8		2,1	EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR, INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE MATERIAL	80 días	lún 26/10/20	lún 28/11/20	5	10FC-20 días;10AT+40	$8,649,692
9		2,2	RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO ESPECIFICACIONES SEGÚN PLANO	15 días	lún 2/01/21	mié 20/01/21	15	26	$66,011,619
10		3	CONCRETOS	110 días	jue 5/11/20	lún 13/03/21			$569,797,455
11		3	CONCRETOS	85 días	jue 5/11/20	vie 12/02/21			$139,145,915
12		3,1	CONCRETO 2000 PSI (140 KGF/CM2) PARA SOLADO DE ZAPATAS Y VIGAS ESPESOR 5CM	30 días	jue 5/11/20	jue 10/12/20	9FC-20 días	13FC-20 días;16FC-20 días	$7,852,272
13		3,2	CONCRETO DE 3000 PSI (210 KGF/CM2) PARA ZAPATAS	30 días	mar 17/11/20	mar 22/12/20	12FC-20 días	119	$23,496,355
14		3,3	CONCRETO DE 3000 PSI (210 KGF/CM2) PARA VIGAS DE CIMIENTO	30 días	mar 17/11/20	mar 22/12/20	12FC-20 días	14FC-20 días;28;27;29	$46,818,813
15		3,4	CONCRETO DE 3000 PSI (210 KGF/CM2) PARA PEDESTALES Y COLUMNAS	30 días	lún 28/11/20	lún 1/01/21	14FC-20 días	31AM+30 días;17FC-10	$3,771,070
16		3,5	CONCRETO DE 3000 PSI (210 KGF/CM2) PARA VIGAS, VIGUETAS Y LOSA DE GRADERIAS	30 días	jue 31/12/20	jue 14/01/21	14FC-20 días	119	$8,400,051
17		3,6	CONCRETO DE 3000 PSI (210 KGF/CM2) PARA VIGAS, VIGUETAS Y LOSA DE TARIMA CANCHA MULTIPLE	30 días	mar 22/12/20	mar 26/01/21	15FC-10 días	18	$30,986,327
18		3,7	CONCRETO DE 3000 PSI (210 KGF/CM2) PARA ESCALERAS DE TARIMA	15 días	mar 26/01/21	vie 12/02/21	17	119	$4,232,985
19		4	CONCRETOS DE CERRAMIENTO EN MALLA ESLABONADA	75 días	jue 10/12/20	lún 8/03/21		119	$30,251,280
20		4,8	CONCRETO DE 3000PSI (210KGF/CM2) PARA ZAPATAS DE CERRAMIENTO	25 días	jue 10/12/20	vie 8/01/21	3FC+60 días	119	$1,998,264
21		4,9	CONCRETO DE 3000PSI (210KGF/CM2) PARA VIGA DE CIMIENTO	25 días	jue 10/12/20	vie 8/01/21	3FC+60 días	22	$4,227,659
22		4,10	CONCRETO DE 3000 PSI (210 KGF/CM2) PARA COLUMNETAS DE CONFINAMIENTO DE MUROS DE CERRAMIENTO (ELEMA K (LEVA)	25 días	vie 8/01/21	lún 4/02/21	21	23;52	$1,438,062
23		3,11	CONCRETO DE 3000 PSI (210 KGF/CM2) PARA VIGA DE CONFINAMIENTO 0.1*0.20	25 días	lún 4/02/21	lun 8/03/21	22	119	$2,568,535
24		5	PISOS	60 días	mar 23/12/20	mar 2/03/21		119	$405,920,641
25		5,12	CONCRETO ESTAMPADO DE 3000 PSI (210 KGF/CM2) E:10CM PARA ANDENES (INCLUYE MALLA ELECTROSOLDADA)	35 días	mar 23/12/20	lun 1/02/21	14	105FC+15 días;106FC+15	$182,402,208
26		5,13	CONCRETO DE 3000 PSI (210 KGF/CM2) E:10 CM PARA PISOS CANCHA MULTIFUNCIONAL (INCLUYE MALLA ELECTROSOLDADA)	35 días	mié 20/01/21	mar 2/03/21	9	40;45	$113,585,351
27		5,14	CONCRETO DE 3000 PSI (210 KGF/CM2) E:10 CM PARA PISOS GRADERIAS (INCLUYE MALLA ELECTROSOLDADA)	35 días	mar 22/12/20	lun 1/02/21	14	119	$33,666,390
28		5,15	CONCRETO DE 3000 PSI (210 KGF/CM2) E:15 CM PARA PARQUILADEROS (INCLUYE MALLA ELECTROSOLDADA)	20 días	mar 22/12/20	lun 14/01/21	14	119	$18,615,831
29		5,16	CONCRETO DE 3000 PSI (210 KGF/CM2) PARA VIGA DE CONFINAMIENTO 0.1*0.30 PARA ANDENES	35 días	mar 22/12/20	lun 1/02/21	14	110	$17,650,841
30		9	TANQUE DE ALMACENAMIENTO	20 días	jue 19/01/21	lún 15/03/21			$9,099,607
31		9,17	CONCRETO DE 3000 PSI (210 KGF/CM2) PARA TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE 10 M3. (INCLUYE TAPA, MUROS, LOSA FONDO)	20 días	jue 18/02/21	lún 15/03/21	36FC-30 días	110	$9,099,607
32		6	REFUERZOS	150 días	jue 1/10/20	jue 25/03/21			$312,670,103
33		6,1	ACERO DE REFUERZO Ffc- 60000PSI	150 días	jue 1/10/20	jue 25/03/21	2	119	$312,670,103
34		8	CUBIERTA	95 días	mié 4/12/20	jue 25/03/21			$1,318,898,368
35		8,3	CELOSIA EN ACERO A-36, INCLUYE: CORREAS, CONTRAVIENTOS, TENSORES, COLUMNAS, VIGAS DE AMARRE, ANCLAJES, PLACAS BASE, PERNOS Y SOLDADURA, CONTARMA TAMBIEN: FABRICACION, TRANSPORTE Y MONTAJE	95 días	mié 4/12/20	lún 12/04/21	31FC-25 días	36	$842,382,310
36		8,3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUBIERTA EN LAMINA ARQUITECTONICA	10 días	lún 15/03/21	jue 25/03/21	35	40FC-35 días;42FC-35 días;43FC-15	$476,536,215
37		6	MAMPOSTERIA Y ACABADOS	75 días	lún 2/01/21	mié 31/03/21			$263,978,261
38		6,1	MURO EN BLOQUE DE CONCRETO No. 11	20 días	lún 1/01/21	lún 6/02/21	15	39FC-10 días	$57,018,139
39		6,2	PAÑETE INTERIOR EN MORTERO 1:5	40 días	mar 26/01/21	mar 2/03/21	36FC-10 días	119	$54,710,829
40		6,3	LÍNEA DESMARCACIÓN ACRÍLICA A=0,3	10 días	mar 2/03/21	lún 1/03/21	26	119	$7,213,282
41		6,4	PISO CERAMICO PARA PISOS DE BAÑOS	20 días	lun 8/03/21	mié 31/03/21	36FC-15 días	119	$36,324,048
42		6,5	ENCHAPE CERAMICO PARA PAREDES DE BAÑOS	20 días	lun 8/03/21	mié 31/03/21	36FC-15 días	119	$22,714,626
43		6,6	DIVISIÓN BAÑOS EN LAMINA EN ACERO INOXIDABLE	15 días	lun 8/03/21	lun 29/03/21	36FC-15 días	119	$17,913,922
44		6,7	MESÓN EN CONCRETO PARA LAVAMANOS NO INCLUYE REFUGRIO	15 días	lun 8/03/21	jue 25/03/21	36FC-15 días	119	$23,887,153
45		6,8	PINTURA TIPO TRAFICO PARA CANCHA	10 días	mar 2/03/21	lún 15/03/21	26	119	$12,281,855
46		6,9	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PINTURA TIPO 1 (3 MANOS)	10 días	lun 8/03/21	lún 15/03/21	36FC-15 días		$21,877,412
47		7	CARPINTERIA METALICA	60 días	lún 8/03/21	jue 25/03/21			$91,902,677
48		7,1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANAS DE ALUMINIO CORRIDAS	20 días	mar 2/03/21	jue 25/03/21	36FC-20 días	116	$2,985,764
49		7,2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTAS METÁLICA DE 2,15MDLBM, LAMINA COLL ROL CALIBRE 18, INCLUYE MARCO METÁLICO, CERRADURA YALE DOBLE SEGURIDAD, MANIJA EXTERIOR, PINTADAS CON ANTICORROSIVO Y PINTURA DE ACEITE. (2 MANOS AMBAS CARAS).	20 días	mar 2/03/21	jue 25/03/21	36FC-20 días	116	$1,302,621
50		7,3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTAS METÁLICA DE 2,15MDLBM, LAMINA COLL ROL CALIBRE 18, INCLUYE MARCO METÁLICO, CERRADURA , MANIJA EXTERIOR, PINTADAS CON ANTICORROSIVO Y PINTURA DE ACEITE. (2 MANOS AMBAS CARAS).	20 días	mar 2/03/21	jue 25/03/21	36FC-20 días	116	$11,417,160
51		7,4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTAS METÁLICA DE 2,15MD 20M, LAMINA COLL ROL CALIBRE 18, INCLUYE MARCO METÁLICO, CERRADURA , MANIJA EXTERIOR, PINTADAS CON ANTICORROSIVO Y PINTURA DE ACEITE. (2 MANOS AMBAS CARAS).	20 días	mar 2/03/21	jue 25/03/21	36FC-20 días	116	$6,764,872
52		7,5	CERRAMIENTO EN MALLA ESLABONADA CON OJOS DE 2"X2" CON L2"X1/8" Y TUBO DE 4½" DE 1,08MX1,2M	20 días	lún 6/02/21	mar 2/03/21	22	119	$28,212,452
53		7,6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BARANDA PARA GRADAS	20 días	mar 2/03/21	jue 25/03/21	36FC-20 días	116	$17,264,008
54		7,7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BARANDA PARA JUEGOS INFANTILES EN TUBO CUADRADO GALVANIZADO DE 2"	20 días	mar 2/03/21	jue 25/03/21	36FC-20 días	116	$20,463,831
55		8	REDES HIDROSANITARIAS	60 días	lún 6/03/21	jue 25/03/21			$128,566,483
56		8,1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA PVC RDE 13,5 EN 1" PARA SALIDA (INCLUYE ACCESORIOS)	60 días	lún 6/02/21	jue 25/03/21	8FC+60 días	119	$919,355
57		8,2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA PVC RDE 13,5 EN 2" PARA DISTRIBUCIÓN (INCLUYE UNIONES)	60 días	lún 6/02/21	jue 25/03/21	8FC+60 días	119	$3,655,902
58		8,3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA PVC RDE 13,5 EN 1" PARA DISTRIBUCIÓN (INCLUYE UNIONES)	60 días	lún 6/02/21	jue 25/03/21	8FC+60 días	119	$4,956,066
59		8,4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA PVC RDE 13,5 EN 1/2" PARA DISTRIBUCIÓN (INCLUYE UNIONES)	60 días	lún 6/02/21	jue 25/03/21	8FC+60 días	119	$1,018,187
60		8,5	TUBERIA PVC DESAGUE EN 4" (INCLUYE UNIONES)	60 días	lún 6/02/21	jue 25/03/21	8FC+60 días	119	$1,378,162
61		8,6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA PVC SANITARIA EN 2" (INCLUYE UNIONES)	60 días	lún 6/02/21	jue 25/03/21	8FC+60 días	119	$3,309,376
62		8,7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA PVC SANITARIA EN 4" (INCLUYE UNIONES)	60 días	lún 6/02/21	jue 25/03/21	8FC+60 días	119	$3,767,152
63		8,8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN Y66 SANITARIA REDUCIDA 4X2	60 días	lún 6/02/21	jue 25/03/21	8FC+60 días	119	$270,459
64		8,9	SUMINISTRO E INSTALACIÓN Y66 SANITARIA 2 PULG	60 días	lún 6/02/21	jue 25/03/21	8FC+60 días	119	$862,755
65		8,10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN Y66 SANITARIA 4 PULG	60 días	lún 6/02/21	jue 25/03/21	8FC+60 días	119	$686,576
66		8,11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CODO PVC 90º Ø 2" SANITARIO	60 días	lún 6/02/21	jue 25/03/21	8FC+60 días	119	$884,725
67		8,12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CODO PVC 90º Ø 4" SANITARIO	60 días	lún 6/02/21	jue 25/03/21	8FC+60 días	119	$477,714
68		8,13	SUMINISTRO E INSTALACIÓN GRIFERÍA DUCHA ECONÓMICA	60 días	lún 6/02/21	jue 25/03/21	8FC+60 días	119	$326,107
69		8,14	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SIFÓN PVC Ø 2"	60 días	lún 6/02/21	jue 25/03/21	8FC+60 días	119	$2,599,864
70		8,15	SUMINISTRO E INSTALACIÓN REJILLA 2"	60 días	lún 6/02/21	jue 25/03/21	8FC+60 días	119	$629,862
71		8,16	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SANITARIO BLANCO	60 días	lún 6/02/21	jue 25/03/21	8FC+60 días	119	$8,155,242
72		8,17	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SANITARIO PARA PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA	60 días	lún 6/02/21	jue 25/03/21	8FC+60 días	119	$994,886
73		8,18	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LAVAMANOS PARA EMPOTRAR Y COLGAR	60 días	lún 6/02/21	jue 25/03/21	8FC+60 días	119	$2,820,058
74		8,19	SUMINISTRO E INSTALACIÓN GRIFERÍA LAVAMANOS + SIFÓN	60 días	lún 6/02/21	jue 25/03/21	8FC+60 días	119	$669,948
75		8,20	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ORINAL	60 días	lún 6/02/21	jue 25/03/21	8FC+60 días	119	$1,276,635
76		8,21	CAJA DE REGISTRO DE 60X60	60 días	lún 6/02/21	jue 25/03/21	8FC+60 días	119	$4,006,335
77		8,22	PUNTOS HIDRAULICOS	60 días	lún 6/02/21	jue 25/03/21	8FC+60 días	119	$1,979,163
78		8,23	PUNTOS SANITARIOS DE 2"	60 días	lún 6/02/21	jue 25/03/21	8FC+60 días	119	$3,103,788
79		8,24	PUNTOS SANITARIOS DE 4"	60 días	lún 6/02/21	jue 25/03/21	8FC+60 días	119	$1,644,183
80		8,25	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAPLATOS	60 días	lún 6/02/21	jue 25/03/21	8FC+60 días	119	$2,762,813
81		8,26	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE HIDROFLO	60 días	lún 6/02/21	jue 25/03/21	8FC+60 días	119	$8,417,164
82		8,27	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TANQUE 1000 LT	60 días	lún 6/02/21	jue 25/03/21	8FC+60 días	119	$2,246,845
83		8,28	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TRAMPA DE GRASA	60 días	lún 6/02/21	jue 25/03/21	8FC+60 días	119	$5,021,335
84		8,29	RED CONTRAINCENDIO	60 días	lún 6/02/21	jue 25/03/21	8FC+60 días	119	$66,784,116
85		9	REDES ELECTRICAS	60 días	lún 6/03/21	jue 25/03/21			$209,438,495
86		9,1	SALIDA DE LUMINARIAS, CABLE DE COBRE 12AWG - 2T #10+1NEGRO + 1 #12 (INCLUYE CANALIZACIÓN Y ACCESORIOS) (INCLUYE INTERRUPTOR)	60 días	lún 6/02/21	jue 25/03/21	8FC+60 días	119	$1,738,132
87		9,2	SALIDA PARA TOMA NORMAL A 110 V	60 días	lún 6/02/21	jue 25/03/21	8FC+60 días	119	$1,283,022
88		9,3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO DE 12 CIRCUITOS INCLUYE PUERTA, TOTALIZADOR Y MBE4GBS	60 días	lún 6/02/21	jue 25/03/21	8FC+60 días	119	$3,199,823
89		9,4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRABAS TS PRINCIPAL	60 días	lún 6/02/21	jue 25/03/21	8FC+60 días	119	$9,051,335
90		9,6	LUMINARIA TIPO PANEL LED 18W	60 días	lún 6/02/21	jue 25/03/21	8FC+60 días	119	$1,460,242
91		9,7	LUMINARIA TIPO APLIQUE DE 12X1W	60 días	lún 6/02/21	jue 25/03/21	8FC+60 días	119	$794,850
92		9,8	SUMINISTRO DE LÁMPARA SOLAR DE 24W (INCLUYE POSTE METÁLICO)	60 días	lún 6/02/21	jue 25/03/21	8FC+60 días	119	$123,736,952
93		9,11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LUMINARIA LED HIGHBAY 200W PARA CANCHA DE MULTIPLA	60 días	lún 6/02/21	jue 25/03/21	8FC+60 días	119	$41,455,133
94		9,12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TOMA NORMAL A 110V-15AMP	60 días	lún 6/02/21	jue 25/03/21	8FC+60 días	119	$203,995
95		9,13	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TOMA GFCI A 110V-20AMP	60 días	lún 6/02/21	jue 25/03/21	8FC+60 días	119	$327,711
96		9,14	ACOMETIDA ELÉCTRICA EN CABLE COBRE AISLADO 2F #8 + 1 N #8 + 17 #8	60 días	lún 6/02/21	jue 25/03/21	8FC+60 días	119	$7,491,080
97		9,15	ACOMETIDA ELÉCTRICA EN CABLE COBRE AISLADO 2F #8 + 1 N #8 + 17 #8	60 días	lún 6/02/21	jue 25/03/21	8FC+60 días	119	$7,179,887
98		9,16	ACOMETIDA ELÉCTRICA EN CABLE COBRE AISLADO 2F #10 + 1 N #10 + 17 #10	60 días	lún 6/02/21	jue 25/03/21	8FC+60 días	119	$6,102,697
99		9,17	ACOMETIDA ELÉCTRICA EN CABLE COBRE AISLADO 2F #1/0 + 1 N #1/0 + 17 #1/0	60 días	lún 6/02/21	jue 25/03/21	8FC+60 días	119	$5,680,418
100		9,18	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TRANSFORMADOR DE 50 KVA	60 días	lún 6/02/21	jue 25/03/21	8FC+60 días	119	$12,431,335
101		9,19	CAJA DE REGISTRO DE 60X60	60 días	lún 6/02/21	jue 25/03/21	8FC+60 días	119	$4,736,967
102		9,20	CONJUNTO DE PASAMUROS Y CAJA PRIMARIA DE 15 KV TIPO POLIMERICO DE 12 KV, 10 KA	60 días	lún 6/02/21	jue 25/03/21	8FC+60 días	119	$2,663,151
103		9,21	POSTE EN CONCRETO12/1050 45kN	60 días	lún 6/02/21	jue 25/03/21	8FC+60 días	119	$4,005,667
104		10	DOTACIÓN DE PARQUE Y MOBILIARIO	80 días	jue 18/02/21	jue 25/03/21			$263,370,933
105		10,1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MODULOS PARA JUEGOS INFANTILES	80 días	jue 18/02/21	jue 25/03/21	25FC+15 días	119;116	$115,050,460
106		10,2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PORTERIAS DE MICROFUTBOL Y TABLEROS DE BALONCESTO	80 días	jue 18/02/21	jue 25/03/21	25FC+15 días	119;116	$30,562,520
107		10,6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PARQUE BIOSALUDABLE	80 días	jue 18/02/21	jue 25/03/21	25FC+15 días	119;116	$41,421,307
108		10,5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANECAS DE BASURAS TIPO BARCELONA O SIMILAR	80 días	jue 18/02/21	jue 25/03/21	25FC+15 días	119;116	$14,487,288
109		10,6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BANCAS SIN ESPALDAR	80 días	jue 18/02/21	jue 25/03/21	25FC+15 días	119;116	$33,099,553
110		11	INTERVENTORÍA PMA	80 días	jue 18/02/21	jue 25/03/21			$40,422,810
111		11,1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PALMERAS ALTURA 3M	30 días	jue 18/02/21	jue 25/03/21	24FC+120 días	119	$17,225,096
112		11,2	SUMINISTRO, COLOCACIÓN Y PRADIZACIÓN EN DURANTA, CORNALITO Y MANI FORRAJERO. INCLUYE TODO LO NEGARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	30 días	jue 18/02/21	jue 25/03/21	24FC+120 días	119	$23,197,744
113		12	AIUO	5 días	jue 29/03/21	mié 31/03/21			$1,713,882
114		12,1	AIUO DE LA OBRA	5 días	jue 25/03/21	mié 31/03/21	107;105;106;108;91;109;118		$1,713,882
115		9	PGIO	155 días	jue 1/10/20	mié 31/03/21	2	119	$30,333,540
116		9	TRAMITES ANTE ELECTRICARIBE	155 días	jue 1/10/20	mié 31/03/21	2	119	$11,000,000
117		F	INTERVENTORIA DEL PROYECTO	180 días	vie 2/10/20	mié 23/03/21	2	119	$201,270,101
118		13	CONSTRUCCION PROVISIONAL	10 días	lun 15/03/21	vie 26/03/21	109	121	0$
119		C	FIN OBRA	0 días	vie 30/04/21	vie 30/04/21	111;112;108;106;3		0$
