INFORME MENSUAL DE OBRA No. 7

PERIODO:

DEL 27 DE FEBRERO AL 26 DE MARZO DE 2021

CONTRATO DE OBRA No: CO1.PCCNTR.1575887

– GRUPO 1 –

COLEGIOS LOCALIDAD DE KENNEDY – BOGOTÁ D.C.

CONTRATISTA: JAIME HERRERA OSORIO

OBJETO:

"ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO".

BOGOTÁ D.C., MARZO DE 2021

Aprobado por:

ING. JAIME HERRERA OSORIO
Representante Legal
JAIME HERRERA OSORIO

INTRODUCCIÓN

El presente documento corresponde al INFORME TÉCNICO MENSUAL DE OBRA No. 7 elaborado dentro de la ejecución de las obras del Contrato de Obra No. No. CO1.PCCNTR.1575887 - GRUPO 1 – COLEGIOS DE LA LOCALIDAD DE KENNEDY, BOGOTÁ D.C., con el objetivo de realizar una descripción las obras programadas y ejecutadas dentro del alcance establecido para la ejecución de las obras de adecuación, mejoramiento y mantenimiento correctivo de las Plantas Físicas de los Colegios Distritales atendiendo las requerimientos y necesidades requeridas por la **SECRETARIA DE EDUCACIÓN**, cuyas generalidades son las siguientes:

CONTRATO DE OBRA No.	:	**CO1.PCCNTR 1575887 - GRUPO 1 – COLEGIOS LOCALIDAD DE KENNEDY – BOGOTÁ D.C.**
CONTRATISTA	:	**JAIME HERRERA OSORIO**
REPRESENTANTE LEGAL	:	Ing. JAIME HERRERA OSORIO
OBJETO	:	"ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO".
PLAZO CONTRATO	:	Siete (7) meses
VALOR CONTRATO	:	$ 1.423.020.608,00
FECHA DE INICIACIÓN	:	27 DE AGOSTO DE 2020
FECHA DE TERMINACIÓN	:	26 DE MARZO DE 2021

La Interventoría de las obras de adecuación, mejoramiento y mantenimiento correctivo de las plantas físicas y comedores escolares de los trece (13) Colegios Distritales de la Localidad de Kennedy, Bogotá D.C. mediante el siguiente contrato:

CONTRATO No.	:	**CO1.PCCNTR.1679913 de 2020**
CONTRATISTA	:	**MAPO INGENIERÍA S.A.S.**
OBJETO	:	"INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) PARA ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO".
NIT	:	900.364.545-9
REPRESENTANTE LEGAL	:	Ing. MARÍA ALEXANDRA POSADA PEÑA

La Supervisión del contrato por parte de la **SECRETARIA DE EDUCACIÓN – SED** está a cargo del **Arquitecto LUIS ENRIQUE CAMPOS TORRES.**

1. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROYECTO

El proyecto de obras de adecuación, mejoramiento y mantenimiento se desarrollara en trece (13) Colegios Distritales de la Localidad de Kennedy de la ciudad de Bogotá D.C. donde se encuentra realizando la adecuación de obras menores correspondientes al saneamiento básico como reposición de cubiertas, reposición del sistema eléctrico, reposición de sistema hidrosanitario, mejoramiento de zonas exteriores y recreativas, reposición de cerramientos, impermeabilización de placas – cubierta de concreto y mejoramiento en general de los ambientes educativos de las sedes priorizadas por la Dirección de Construcción y Conservación de Establecimientos Educativos de la SED con los recursos disponibles para las dichas adecuaciones, mejoramientos y/o mantenimientos correctivos.

El contrato de obra se ejecutará mediante la modalidad de monto agotable, de tal forma que se dará prioridad a la ejecución de las actividades de obra señaladas y contenidas en el presupuesto de obra adjudicado.

2. LOCALIZACIÓN Y ALCANCE DEL PROYECTO

La Dirección de Construcción y Conservación de Establecimientos Educativos ha dividido el Grupo I en trece (13) sedes de las Instituciones Educativas por intervenir en la Localidad de Kennedy, con el fin de garantizar una intervención y operación eficiente y eficaz de los recursos económicos priorizados por la SED.

En la Tabla No.1 se presenta el listado de las sedes educativas distritales de la localidad de Kennedy beneficiadas y su respectiva codificación según las condiciones establecidas en el contrato de obra en referencia a intervenir:

GRUPO	No. DE FRENTE	CPF	ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO	NOMBRE SEDE EDUCATIVA	DIRECCIÓN
1	1	0845	Villa Rica	Sede A - Villa Rica	Calle 49 Sur # 78 - 35
	2	0815	El Japón	Sede A - El Japón	Cra 78G # 38C 11 Sur
	3	0884	Codema	Sede A - CODEMA	Calle 2 # 93-28
	4	0849	Carlos Arturo Torres	Sede A - Carlos A Torres y Rep. de Finlandia	Transversal 72B # 44 C-19 Sur
	5	0823	San Pedro Claver	Sede B - German Zea Hernández	Calle 42G Sur # 87-06
	6	0820	Tom Adams	Sede A - Tom Adams	Calle 40J Sur # 76A-20
	7	0822	Gustavo Rojas Pinilla	Sede B - El Tintal	Cra. 84B # 13-65
	8	0839	Class	Sede B - Rómulo Gallegos	Calle 56 Sur # 78A -20
	9	0848	San Pedro Claver	Sede A - San Pedro Claver	Cra. 79C # 41B 51 Sur
	10	0802	Instituto Técnico Rodrigo de Triana	Sede A - Rodrigo de Triana	Calle 38B Sur # 89-81

	11	0807	O.E.A	Sede B - Antonia Santos I	Cra. 69 Bis # 30-39 S
	12	0852	Kennedy	Sede A - Kennedy	Calle 5 Sur # 72A-69
	13	0877	Cafam Bellavista	Sede A - Bellavista (Cafam)	Calle 40 Sur # 96B-17

Tabla 1 - Codificación sedes educativas beneficiadas, Fuente: (Pliego de condiciones contrato de obra CO1.PCCNTR.1575887 – GRUPO 1, 2020)

En la Ilustración 1 se presenta la sectorización de las áreas indirectas puntuales colaborativas a través de la Localidad Kennedy, así mismo en la Tabla 3 se registran las direcciones de las 13 sedes educativas distritales beneficiadas.

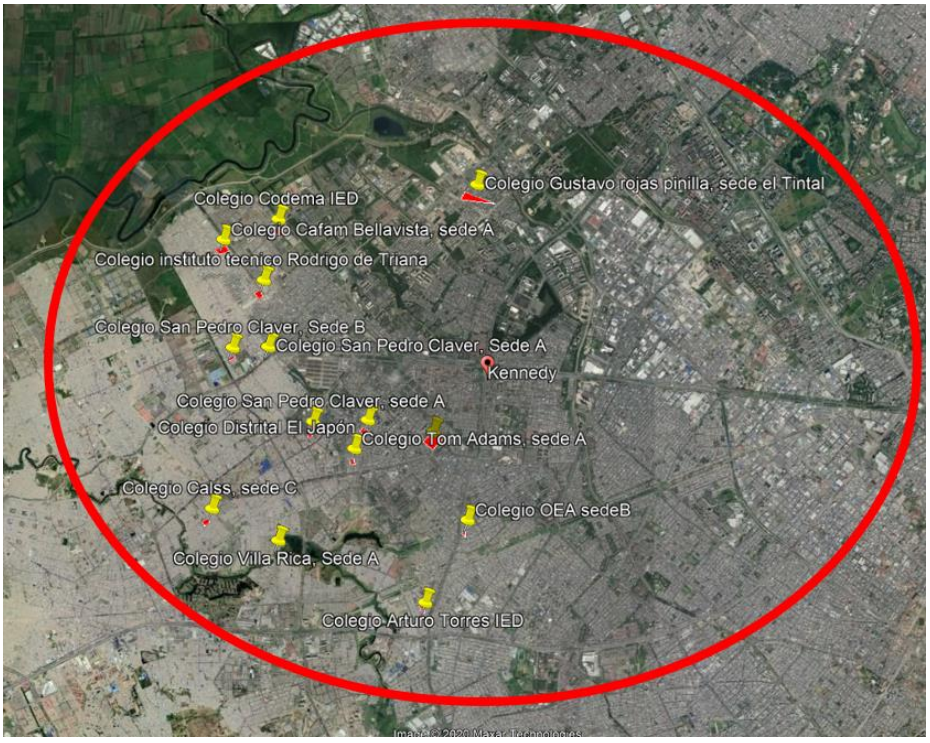


Ilustración 1- Identificación de sede beneficiadas en la localidad de Kennedy. Fuente (Autor 2020)

3. GENERALIDADES DE LA LOCALIDAD (8) DE KENNEDY

La localidad de Kennedy se ubica en el sector suroccidental de la sabana de Bogotá y está demarcada de la siguiente manera:

- ✓ Por el Oriente, limita con la Avenida Congreso Eucarístico (Av. Carrera. 68);
- ✓ Por el Norte, con el Río Fucha y la calle 13;
- ✓ Por el Sur, con la Autopista Sur, el Río Tunjuelito y la Avenida calle 40 Sur y
- ✓ Por el Occidente, con Camino Osorio Bosa y el Municipio de Mosquera.

La Localidad tiene una forma de cuadrado, cuyos puntos extremos son:

- ✓ Al Noroccidente, la intersección del Río Fucha con el Río Bogotá;
- ✓ Al Nororiente, la Avenida El Espectador con Cl 13;
- ✓ Al Suroriente, el cruce de la Avenida 68 con Autopista Sur;
- ✓ Al Suroccidente, el Río Tunjuelito y parte de la Avenida Ciudad de Cali.

El promedio de escolaridad de la localidad de Kennedy fue de 9,7 años en 2014. Para los hombres fue de 9,7 años y para las mujeres de 9,7 años. Sin embargo, la tasa de analfabetismo que presenta es de 1,2%. Para hombres la tasa es de 0,8% y para mujeres de 1,5%. Comparada con Bogotá D.C., presenta 0,20 puntos porcentuales por debajo.

La localidad de Kennedy está dividida en doce (12) Unidades de Planeamiento Zonal (UPZ), como son Américas (44), Carvajal (45), Castilla (46), Kennedy Central (47), Timiza (48), Tintal Norte (78), Calandaima (79), Corabastos (80), Gran Britalia (84), Patio Bonito (83), Las Margaritas (82) y Bavaria (113) y en ellas se localizan 257 establecimientos educativos.

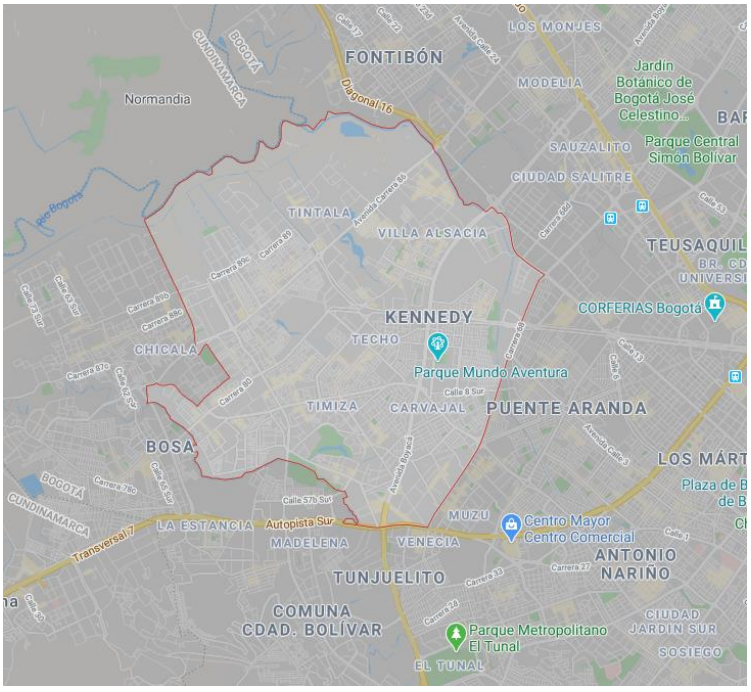


Ilustración 2 – Geo referenciación localidad de Kennedy. Fuente (Autor 2020)

3. AVANCE DE CADA UNA DE LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS

De conformidad con la Programación General aprobada para la ejecución de las obras, durante el sexto período de obra del 27 de febrero al 26 de marzo de 2021 se realizaron las siguientes actividades de obra:

3.1 COLEGIO VILLA RICA SEDE A

El Contratista en este periodo No realizó actividades de obra en el periodo, ya que se había realizado en el periodo tres (3) la entrega física de las áreas intervenidas en las aulas de clase a satisfacción final y recibo ante el Rector del Colegio, la Interventoría y la Supervisión del Contrato de Obra Arq. Luis Enrique Campos Torres de la Secretaria de Educación el día 11 de noviembre de 2020.

3.2 COLEGIO I.E.D. - EL JAPÓN SEDE A

El Contratista en este periodo No realizó actividades de obra en el periodo, ya que se había realizado en el periodo cinco (5) la entrega física de las áreas intervenidas en las aulas de clase a satisfacción final y recibo ante el Rector del Colegio, la Interventoría y la Supervisión del Contrato de Obra Arq. Luis Enrique Campos Torres de la Secretaria de Educación el día 18 de enero de 2021.

3.3 COLEGIO I.E.D. - CODEMA SEDE A

El Contratista en este periodo No realizó actividades de obra en el periodo, ya que realizo la entrega física de las áreas intervenidas en las baterías sanitarias a satisfacción final y recibo ante el Rector del Colegio, la Interventoría y la Supervisión del Contrato de Obra Arq. Luis Enrique Campos Torres de la Secretaria de Educación el día 27 de enero de 2021.

3.4 COLEGIO CARLOS ARTURO TORRES SEDE A

El Contratista en este periodo No realizó actividades de obra en el periodo, ya que se había realizado en el periodo tres (3) la entrega física de las áreas intervenidas en las aulas de clase a satisfacción final y recibo ante el Rector del Colegio, la Interventoría y la Supervisión del Contrato de Obra Arq. Luis Enrique Campos Torres de la Secretaria de Educación el día 30 de noviembre de 2020.

3.5 COLEGIO SAN PEDRO CLAVER SEDE B

El Contratista en este periodo No se realizó actividades de obra, ya que realizo en el periodo No. 4 (cuatro) la entrega física de las áreas intervenidas en las baterías sanitarias a satisfacción final y recibo ante el Rector del Colegio, la Interventoría y la Supervisión del Contrato de Obra Arq. Luis Enrique Campos Torres de la Secretaria de Educación el día 21 de diciembre de 2020.

3.6 COLEGIO TOM ADAMS SEDE A

El Contratista en este periodo No realizó actividades de obra en el periodo, ya que realizo la entrega física de las áreas intervenidas en las baterías sanitarias a satisfacción final y recibo ante el Rector del Colegio, la Interventoría y la Supervisión del Contrato de Obra Arq. Luis Enrique Campos Torres de la Secretaria de Educación el día 27 de enero de 2021.

3.7 COLEGIO GUSTAVO ROJAS PINILLA - SEDE B EL TINTAL

El Contratista en este periodo No realizó actividades de obra en el periodo, ya que se había realizado en el periodo tres (3) la entrega física de las áreas intervenidas en las aulas de clase a satisfacción final y recibo ante el Rector del Colegio, la Interventoría y la Supervisión del Contrato de Obra Arq. Luis Enrique Campos Torres de la Secretaria de Educación el día 13 de noviembre de 2020.

3.8 COLEGIO CLASS SEDE B – RÓMULO GALLEGOS

El Contratista en este periodo No realizó actividades de obra en el periodo, ya que se había realizado en el periodo tres (3) la entrega física de las áreas intervenidas en las aulas de clase a satisfacción final y recibo ante el Rector del Colegio, la Interventoría y la Supervisión del Contrato de Obra Arq. Luis Enrique Campos Torres de la Secretaria de Educación el día 25 de noviembre de 2020.

3.9 COLEGIO SAN PEDRO CLAVER SEDE A

El Contratista en este periodo No se realizó actividades de obra, ya que realizo en el periodo anterior la entrega física de las áreas intervenidas en las baterías sanitarias a satisfacción final y recibo ante el Rector del Colegio, la Interventoría y la Supervisión del Contrato de Obra Arq. Luis Enrique Campos Torres de la Secretaria de Educación.

3.10 COLEGIO INSTITUTO TÉCNICO RODRIGO DE TRIANA SEDE A

El Contratista en este periodo NO ha iniciado la ejecución de actividades de obra programadas en el cerramiento perimetral del predio de la Institución educativa por el costado oriental, ya que la Entidad Contratante no dio la factibilidad de inicio de obras por falta de la legalización de los predios vecinos colindantes con las obras viales y de espacio público por el costado oriental del Colegio (límite con el cerramiento perimetral por construir con el parqueadero vehicular y las viviendas parcialmente demolidas) por parte del Instituto de Desarrollo Urbano – IDU, quien realiza dichas intervenciones.

El Contratista, la Interventoría y la Supervisión del Contrato dio el aval para realizar la ejecución de las obras de adecuación y mejoramiento del muro interno de la Biblioteca del Colegio con las siguientes actividades de obra:

- Cerramiento provisional en repisa y lona verde en el área intervenida en la demolición y construcción del muro interno de la Biblioteca del Colegio,
- Localización y replanteo topográfico del muro construido en el área interna de la Biblioteca del Colegio,
- Desmonte del cielo raso falso en el área del muro intervenido en la Biblioteca del Colegio,
- Cortes con pulidora en muro de ladrillo existente intervenido en el área interna de la Biblioteca del Colegio,
- Demolición de muro divisorio (fisurado) interno existente en el área de la biblioteca del Colegio,
- Escarificado de fisuras y juntas de dilatación en muro interno existente del área de la Biblioteca del Colegio,
- Tratamiento de fisuras y juntas de dilatación con grafil de 4 mm en muro interno existente del área de la Biblioteca del Colegio,
- Construcción de muro divisorio en mampostería ladrillo tolete perforado en el área interna de la Biblioteca del Colegio,
- Construcción de cielo raso en el área del muro intervenido en la Biblioteca del Colegio,
- Trasiego en carretilla de materiales sobrantes y escombros del muro del área la Biblioteca del Colegio,
- Retiro, cargue, transporte y disposición final de materiales sobrantes y escombros de las actividades de adecuación de la mampostería interna de la Biblioteca del Colegio,
- Aseo y limpieza general de las áreas intervenidas en área del muro intervenido en la Biblioteca del Colegio.

3.11 COLEGIO O.E.A. - (ANTONIA SANTOS I) SEDE B

El Contratista en el periodo anterior realizó la ejecución de actividades de obra de adecuación y mejoramiento priorizadas por la Interventoría – Mapo Ingeniería S.A.S y la Supervisión del Contrato – Secretaria de Educación.

Dentro del alcance de las obras priorizadas por la Secretaria de Educación – SED se realizó la ejecución de las siguientes actividades de obra:

- Desmonte puertas existentes con marcos para reparaciones de las aulas de clase 101, 102, 103, 203,204,205,206 y aula de tiflología,
- Suministro e instalación de pirlan pisa vidrio en aluminio parta marcos de puertas aulas de clase 101, 102, 103, 203,204,205,206 y aula de tiflología,
- Instalación carpintería metálica de puertas reparadas de las aulas de clase 101, 102, 103, 203,204,205,206 y aula de tiflología,

- Suministro e instalación de baranda y pasamanos en tubo metálico de manijas para puerta reparada del aula de tiflología,
- Suministro e instalación de tríplex pizano tapa luz de 2.44 m x 5 cm de ancho en marcos de puertas reparadas en aulas de clase 101, 102, 103, 203,204,205,206 y aula de tiflología,
- Suministro de cerraduras safe tipo alcoba en aluminio satinado en puertas reparadas en aulas de clase 101, 102, 103, 203,204,205,206 y aula de tiflología,
- Instalación de pomas en las puertas reparadas en aulas de clase 101, 102, 103, 203,204,205,206 y aula de tiflología,
- Suministro e instalación de rodachinas de puertas de aulas 101, 102 y 103 de puertas reparadas,
- Suministro e instalación de vidrios cristales en puertas de aulas 205, 206 y tiflologías reparadas,
- Mano de obra de 2 oficiales y 3 ayudantes en las actividades de reparación de las aulas de clase 101, 102, 103, 203,204,205,206 y aula de tiflología del Colegio.

El Contratista en el periodo anterior realizó la entrega física de las puertas y demás carpintería metálica en las aulas de clase intervenidas a satisfacción final y recibo ante el Rector del Colegio, la Interventoría y la Supervisión del Contrato de Obra Arq. Luis Enrique Campos Torres de la Secretaria de Educación el día 26 de febrero de 2021.

3.12 COLEGIO KENNEDY SEDE A

El Contratista en este periodo No se realizó actividades de obra, ya que realizo en el periodo cuatro (4) realizo la entrega física de las áreas intervenidas en las baterías sanitarias a satisfacción final y recibo ante el Rector del Colegio, la Interventoría y la Supervisión del Contrato de Obra Arq. Luis Enrique Campos Torres de la Secretaria de Educación el día 04 de diciembre de 2020.

3.13 COLEGIO CAFAM - BELLAVISTA SEDE A

El Contratista en este periodo realizo la ejecución de las actividades de reposición e impermeabilización de la placa - cubierta de mantenimiento a la planta física en el área de la Biblioteca del Colegio Distrital Bellavista Cafam - Sede A:

- Localización y replanteo topográfico de las vigas canal de desagüe de las aguas lluvias en la placa de concreto cubierta del área de la biblioteca del Colegio,
- Demoliciones varias en concreto y mampostería en la placa de concreto cubierta del área de la biblioteca del Colegio,
- Retiro de mantos asfalticos existente en las vigas canal de desagüe de las aguas lluvias en la placa de concreto cubierta del área de la biblioteca del Colegio,
- Trasiego en carretilla de materiales sobrantes y escombros generados por la demolición del muro de la Biblioteca avalados por la interventoría a una distancia de 0 - 100 m,
- Tratamiento de juntas de dilatación con Sika Flex en vigas canal con ventanas en las vigas

canal de la cubierta impermeabilizada en el área de la Biblioteca del Colegio,

- Construcción de pañetes impermeabilizados en ventanas adecuadas en vigas canal de desagüe de aguas lluvias en el área de la placa cubierta de la Biblioteca del Colegio,
- Trasiego en carretilla de materiales sobrantes y escombros del muro del área de la Biblioteca del Colegio,
- Impermeabilización con manto Ply flass en la placa cubierta del área de la Biblioteca del Colegio,
- Cortes y desmonte de teja en cubierta para impermeabilización de vigas canal de desagüe de las aguas lluvias,
- Sondeo y revisión de desagües de sifones y bajantes en vigas canal de desagüe de aguas lluvias,
- Retiro, cargue, transporte y disposición final de materiales sobrantes y escombros de las actividades de adecuación de la impermeabilización de la cubierta,
- Limpieza y aseo general de áreas intervenidas en vigas canal de aguas en el área de la placa cubierta en concreto de la Biblioteca del Colegio.

Se concluye que el Contratista **JAIME HERRERA OSORIO** está dando cumplimiento satisfactoriamente con las actividades programadas inicialmente de conformidad con el Programa de trabajo presentado para control y seguimiento de la ejecución de las obras de adecuación y mantenimiento de los Colegios a la Interventoría y Supervisión del Contrato.



4. BALANCE PRESUPUESTAL EJECUTADO Y PROYECTADO PARA TERMINAR LAS OBRAS Y TOTAL


El Contratista realizó el Balance presupuestal final consolidando las cantidades de obra ejecutada en los siete (7) periodos mensuales de las obras de adecuación y mantenimiento en las trece (13) Instituciones Educativas intervenidas a la fecha actual, las cuales fueron viabilizadas por la Interventoría y Supervisión del Contrato de obra, con las cantidades de obra estimadas por ejecutar inicialmente Vs las cantidades de obra ejecutadas, de esta manera que se balancearon las mayores y menores cantidades, dando cumplimiento al avance de obra programado y ajustando a la realidad del contrato las cantidades definitivas de cada Colegio y optimizando las actividades faltantes por ejecutar en pro del objeto del contrato de obra.

5. REGISTROS FOTOGRÁFICOS

A continuación, se presenta un breve registro fotográfico de las obras de adecuación y mejoramientos ejecutadas y entregadas a satisfacción de los Rectores de los Colegios, Interventoría – Mapo Ingeniería S.A.S. y la Supervisión del Contrato de la Secretaria de Educación en el séptimo (7) periodo de obra del 27 de febrero al 26 de marzo de 2021 en los frentes de las obras de los Colegios: Antonia Santos I- O.E.A. y Bellavista Cafam.

5.1 Registro fotográfico Colegio Distrital Antonia Santos I – O.E.A. Sede B:

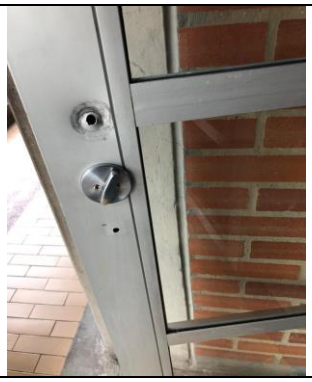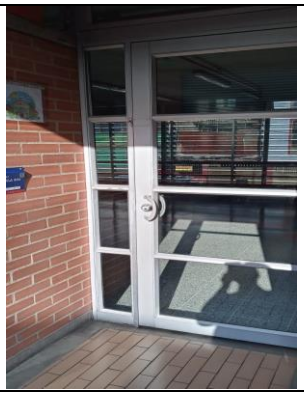FOTOGRAFÍA No. 1	FOTOGRAFÍA No. 2
	
Desmonte de puertas metálicas en aluminio para reparación en taller de las aulas de clases del Colegio.	
FOTOGRAFÍA No. 3	**FOTOGRAFÍA No. 4**
	
Desmonte de puertas metálicas en aluminio para reparación en taller de las aulas de clases del Colegio.	
FOTOGRAFÍA No. 5	**FOTOGRAFÍA No. 6**
	
Reinstalación de puertas metálicas en aluminio reparadas con chapas, manijas y vidrios de las aulas de clases del Colegio.	

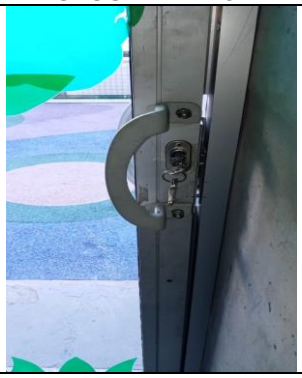
FOTOGRAFÍA No. 7	FOTOGRAFÍA No. 8
	
Suministro e instalación de chapas y manijas de las puertas en aluminio reparadas de aulas de clases del Colegio.	


5.2 Registro fotográfico Colegio Distrital Bellavista Cafam – Sede A.:

FOTOGRAFÍA No. 1	FOTOGRAFÍA No. 2
	
Demolición de muros y resanes con pañetes con mortero en ventanas de vigas canal de desagüe de aguas lluvias en la cubierta impermeabilizada del área de la biblioteca del Colegio.	
FOTOGRAFÍA No. 3	**FOTOGRAFÍA No. 4**
	
Retiro de manto asfaltico existente en vigas canal de desagüe de aguas lluvias en la cubierta impermeabilizada del área de la biblioteca del Colegio.	

FOTOGRAFÍA No. 5	FOTOGRAFÍA No. 6
	
Resanes y pañetes con mortero en ventanas de vigas canal de desagüe de aguas lluvias en la cubierta impermeabilizada del área de la biblioteca del Colegio.	

FOTOGRAFÍA No. 7	FOTOGRAFÍA No. 8
	
Cortes de tejas sobre vigas canal de desagüe de aguas lluvias en la cubierta impermeabilizada del área de la biblioteca del Colegio.	

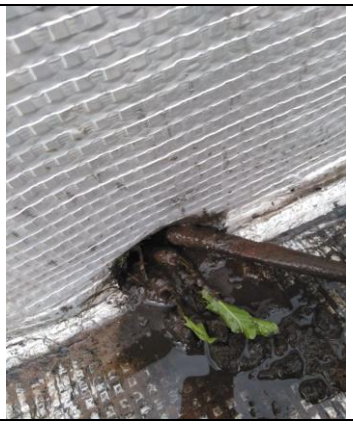FOTOGRAFÍA No. 9	FOTOGRAFÍA No. 10
	
Sondeo y revisión de sifones y desagües en vigas canal de aguas lluvias en la cubierta impermeabilizada del área de la biblioteca del Colegio.	

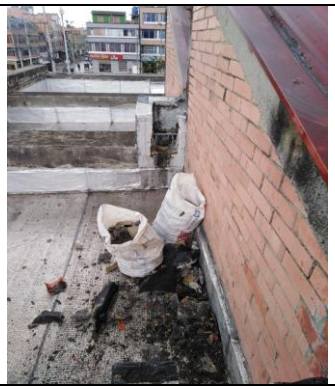FOTOGRAFÍA No. 11	FOTOGRAFÍA No. 12
	
Trasiego en carretilla de materiales sobrantes y escombros de las vigas canal de desagüe de aguas lluvias en la cubierta impermeabilizada del área de la biblioteca del Colegio.	


FOTOGRAFÍA No. 13	FOTOGRAFÍA No. 14
	
Impermeabilización de placa de concreto y vigas canal de desagüe de aguas lluvias en la cubierta impermeabilizada del área de la biblioteca del Colegio.	

FOTOGRAFÍA No. 15	FOTOGRAFÍA No. 16
	
Impermeabilización de placa de concreto y vigas canal de desagüe de aguas lluvias en la cubierta impermeabilizada del área de la biblioteca del Colegio.	

FOTOGRAFÍA No. 17	FOTOGRAFÍA No. 18
	
Juntas de dilatación con sellado con Sika Flex en viga canal de desagüe y ventana en la cubierta impermeabilizada del área de la biblioteca del Colegio.	

5.2 Registro fotográfico Colegio Distrital Rodrigo Triana – Sede A.:

FOTOGRAFÍA No. 1	FOTOGRAFÍA No. 2
	
Cerramiento provisional en repisa y lona verde en el área de la Biblioteca y de sistemas del Colegio.	
FOTOGRAFÍA No. 3	**FOTOGRAFÍA No. 4**
	
Desmonte de cielo raso falso y demolición de muro en ladrillo en el área de la Biblioteca del Colegio.	

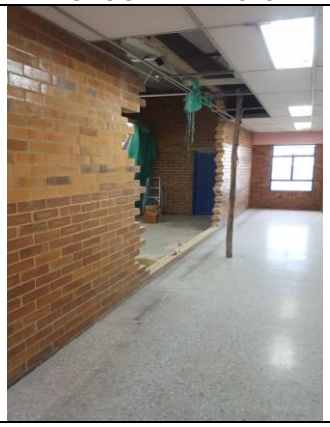FOTOGRAFÍA No. 5	FOTOGRAFÍA No. 6
	
Construcción de muros y tratamiento de juntas de dilatación en el área de la Biblioteca del Colegio.	

FOTOGRAFÍA No. 7	FOTOGRAFÍA No. 8
	
Tratamiento de juntas de dilatación y construcción del muro interno en el área de la Biblioteca del Colegio.	

FOTOGRAFÍA No. 9	FOTOGRAFÍA No. 10
	
Trasiego en carretilla de materiales sobrantes, retiro al puno de acopio, cargue en volqueta, transporte y disposición final de escombros.	

El Contratista ha realizado las respectivas visitas técnicas de campo semanalmente en conjunto con la Interventoría y Supervisión de la SED con el fin de verificar el avance de las obras ejecutadas según el cronograma establecido y la priorización de las intervenciones de los Colegios Distritales.

6. RESULTADOS DE ENSAYOS DE MATERIALES Y DEMÁS PRUEBAS REALIZADAS

El Contratista **JAIME HERRERA OSORIO** en este periodo No realizo suministro ni instalación de materiales granulares ni concretos. Cabe aclarar, que en los periodos anteriores se presentaron los respectivos ensayos de laboratorio de cilindros de concretos suministrados e instalados en los siguientes Colegios relacionados:

- Resultado de los cilindros de concreto de la placa maciza y muro de contención de concreto del área recreativa fundida en el Colegio Class Roma.
- Resultado de los cilindros de concreto de las zapatas, vigas de cimentación y placa contra piso del área recreativa fundida en el Colegio Gustavo Rojas Pinilla.
- Resultado de los cilindros de concreto de las vigas de cimentación y columnas fundidas en el cerramiento del Colegio San Pedro Claver Sede A;
- Resultado de los cilindros de concreto de la viga de cimentación y placa de concreto del área recreativa fundida en el Colegio Tom Adams.

Los resultados de los ensayos realizados en Laboratorio de los concretos suministrados e instalados en obra presentados a la Interventoría evidenciaron el cumplimiento con los requerimientos de la normatividad legal vigente.

7. SEGUIMIENTO DEL PLAN DE CALIDAD TÉCNICA DE LA OBRA

El Contratista JAIME HERRERA OSORIO realiza continuamente el seguimiento al plan de calidad técnico mediante el uso de dispositivos de medición, aplicación de variables de control, criterios de aceptación, frecuencia de medición y registro según sea necesario en los frentes de obra donde actualmente se están ejecutando actividades constructivas a continuación, se presenta cada una de las actividades que fueron objeto de seguimiento para el periodo comprendido entre 27 de febrero de 2021 y el 26 de marzo de 2021.

JAIME HERRERA OSORIO Ingeniero Civil	**FORMATO DE PLAN DE CALIDAD TÉCNICA DE LA OBRA**	**CÓDIGO:**	**JHO-01**
	GERENCIA DE PROYECTOS	**VERSIÓN:**	**01B**
		VIGENCIA:	**2020-01-01**

NOMBRE DEL PROYECTO	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO
LOCALIZACIÓN	KENNEDY, BOGOTÁ
CONTRATISTA	JAIME HERRERA OSORIO
CONTRATO NO.	CO1.PCCNTR.1575887 – GRUPO 1
PROCESO	MOVIMIENTOS DE TIERRAS
ACTIVIDAD	COMPACTACIÓN DE MATERIAL
MEDICIÓN	DENSIDAD
REGISTRO	CADA TRAMO DE TRABAJO, ESTRUCTURA Y/O 500 m LINEALES
FECHA DEL REGISTRO	26/03/2020

GEOCRETOS
LABORATORIO DE INGENIERIA CIVIL

INV - E - 162


REF. GDEN-120201-152

CLIENTE	IC INGENIEROS CONSTRUCTORES	**FECHA DE TOMA**	Sep 22 de 2020
OBRA	COLEGIO SAN PEDRO CLAVER SEDE B	**FECHA DE INFORME**	Sep 24 de 2020
LOCALIZACION	CALLE 42 G SUR CON CRA 87 BIS		
MATERIAL	MATERIAL GRANULAR TIPO SUBBASE	**MUNICIPIO**	BOGOTA DC

DENSIDADES EN EL TERRENO
METODO CONO Y ARENA

Densidad No		1	2	3			
Capa		ULTIMA	ULTIMA	ULTIMA			
Abscisa (aproximada por lab)			PARQUEADERO				
Peso frasco + arena inicial	gr	6485	6455	6464			
Peso frasco + arena final	gr	3535	3496	3493			
Peso total arena usada	gr	2930	2959	2971			
Constante del cono	gr	1602	1645	1645			
Peso arena en el hueco	gr	1328	1314	1326			
Densidad de la arena	gr/cm	1,42	1,42	1,42			
Volumen del hueco	cm	935	925	934			
Peso material humedo	gr	1895	1872	1888			
Humedad del material	%	7,5	6,1	7,2			
Peso material seco	gr	1763	1764	1761			
Densidad del material	gr/cm	1,885	1,907	1,886			
Densidad max del material	gr/cm	1,981	1,981	1,981			
Grado de compactacion	%	95,1	96,2	95,2			

ESQUEMA DE LOCALIZACION DENSIDADES



PEDRO ESTEPA — LABORATORISTA
ING RICARDO LARROTA — REVISO
GEOCRETOS — APROBO

El Contratista de obra verificó junto con la Interventoría los resultados de los ensayos de laboratorio de los cilindros de concretos suministrados e instalados en obra en los periodos anteriores de obra, los cuales evidencian el cumplimiento de los estándares de calidad requeridos por la normatividad legal vigente.

JAIME HERRERA OSORIO Ingeniero Civil Consultoría y Construcción	**FORMATO DE PLAN DE CALIDAD TÉCNICA DE LA OBRA**	**CÓDIGO:**	**JHO-01**
	GERENCIA DE PROYECTOS	**VERSIÓN:**	**01B**
		VIGENCIA:	**2020-01-01**

NOMBRE DEL PROYECTO	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO
LOCALIZACIÓN	KENNEDY, BOGOTÁ
CONTRATISTA	JAIME HERRERA OSORIO
CONTRATO NO.	CO1.PCCNTR.1575887 – GRUPO 1
PROCESO	CONCRETOS Y ESTRUCTURAS
ACTIVIDAD	CONCRETO PREMEZCLADO
MEDICIÓN	PROTOCOLO DE CALIDAD DEL PRODUCTO
REGISTRO	POR LOTE DE SUMINISTRO
FECHA DEL REGISTRO	26/03/2020





El Contratista realizó el suministro e instalación del concretos premezclados de HOLCIM en los periodos anteriores de obra, con los respectivos protocolos de calidad cumpliendo con los lineamientos técnicos establecidos por SED.

JAIME HERRERA OSORIO ingeniero civil consultoría y construcción	**FORMATO DE PLAN DE CALIDAD TÉCNICA DE LA OBRA**	**CÓDIGO:**	**JHO-01**
	GERENCIA DE PROYECTOS	**VERSIÓN:**	**01B**
		VIGENCIA:	**2020-01-01**

NOMBRE DEL PROYECTO	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO
LOCALIZACIÓN	KENNEDY, BOGOTÁ
CONTRATISTA	JAIME HERRERA OSORIO
CONTRATO NO.	CO1.PCCNTR.1575887 – GRUPO 1
PROCESO	CONCRETOS Y ESTRUCTURAS
ACTIVIDAD	MUESTREO DE CONCRETO
MEDICIÓN	PROTOCOLA DE CALIDAD DEL PRODUCTO
REGISTRO	RESULTADOS DE LABORATORIO
FECHA DEL REGISTRO	26/03/2020






El contratista de Obra realizó la toma de las muestras de cilindros de concreto en los periodos anteriores de obra para la respectiva verificación mediante la rotura en Laboratorio la resistencia del concreto a la compresión, los cuales cumplen con la normatividad legal vigente.

JAIME HERRERA OSORIO Ingeniero Civil Consultoría y Construcción	**FORMATO DE PLAN DE CALIDAD TÉCNICA DE LA OBRA**	**CÓDIGO:**	**JHO-01**
	GERENCIA DE PROYECTOS	**VERSIÓN:**	**01B**
		VIGENCIA:	**2020-01-01**

NOMBRE DEL PROYECTO	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO
LOCALIZACIÓN	KENNEDY, BOGOTÁ
CONTRATISTA	JAIME HERRERA OSORIO
CONTRATO NO.	CO1.PCCNTR.1575887 – GRUPO 1
PROCESO	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA
ACTIVIDAD	INSTALACIÓN DE TUBERÍA
MEDICIÓN	PRESIÓN
REGISTRO	POR CADA TRAMO DE TRABAJO
FECHA DEL REGISTRO	23/02/2020



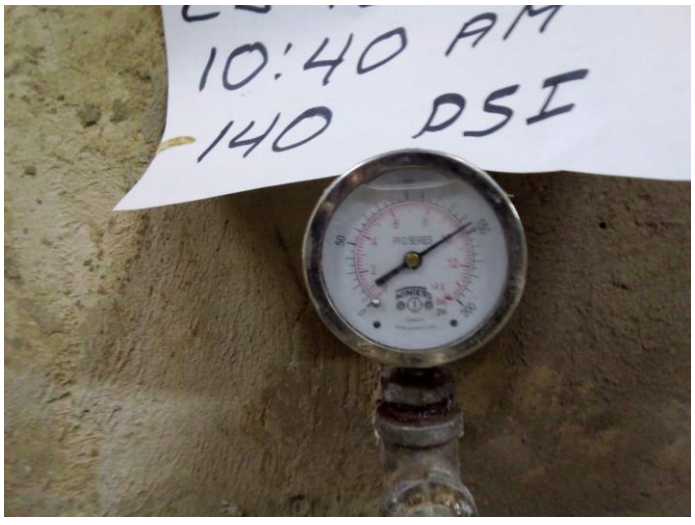

El Contratista de Obra realizo la prueba de presión hidráulica en cada uno de los redes y sistema de agua potable de las baterías sanitarias intervenidas en los Colegios cumpliendo con la normatividad legal vigente.

8. FOTOCOPIA DE LAS ACTAS DE ENTREGA DE LAS ÁREAS Y ESPACIOS INTERVENIDOS EN LOS COLEGIOS

En el **Anexo No. 1** se entrega la copia del Acta de entrega de las aulas de clases y espacios intervenidos en la sede educativa del Colegio Antonia Santos I – O.E.A. entregada y recibida a satisfacción de los Rectores y/ Delegados del Colegio, la Interventoría – MAPO INGENIERÍA S.A.S. y la Supervisión del Contrato Arquitecto Luis Enrique Campos Torres de la Secretaria de Educación, con una breve descripción de las actividades realizadas en la adecuación y mejoramiento de las puertas y carpintería metálica, reposición e impermeabilización de las cubiertas sobre placas de concreto, entre otros con sus respectivas cantidades y observaciones debidamente suscrita por las partes intervinientes en la ejecución del Proyecto.

9. RESUMEN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL MES

El Contratista **JAIME HERRERA OSORIO** en este séptimo (7) periodo realizó las actividades ya enunciadas en el Capítulo 3: **AVANCE DE CADA UNA DE LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS** en las instituciones educativas intervenidas.

El Contratista concluye que ha dado cumplimiento con las actividades planteadas en la programación de obra y programa de trabajo de cada una de las Instituciones Educativas intervenidas, donde se han realizado la entrega y recibo a satisfacción del Colegio, Interventoría y Supervisión de las actividades: como la reposición de puertas y carpintería metálica de las aulas de clase, impermeabilización de cubiertas de placa en concreto en el área de la Biblioteca y reposición de muro interno existente en la Biblioteca de los tres (3) Colegios intervenidos.

10. RELACIÓN DEL PERSONAL EMPLEADO EN LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS

Durante este período de obra el Contratista **JAIME HERRERA OSORIO** contó con el siguiente personal profesional para la ejecución del proyecto:

Tabla No. 1: Personal Administrativo

No.	CARGO	NOMBRE
1	Director del proyecto	Ing. Jaime Herrera Osorio.
2	Ingeniero Residente de Obra	Ing. Javier Ricardo Santander González
3	Ingeniero Residente de Obra	Ing. Ariel Humberto Calderón Torres
4	Profesional Ambiental	Ing. David Leonardo Lozada Cedeño
5	Profesional SISO	Julieth Alejandra Cruz Garzón
6	Profesional de Costos y Presupuestos	Ing. Jaime Herrera Osorio

Así mismo en la Tabla No. 2 se presenta la relación de personal de obra empleado durante el primer período de obra:

Tabla No. 2: Personal de obra

No.	CARGO	NOMBRE
1	**Supervisor de Obra**	**Daniel Fernando Gualteros Rodríguez**
2	Maestro de Obra	Jorge Hernán Torres Mazurco
3	Oficial de obra	Ramiro Barragán Farfán
4	Oficial de obra	Andrés Benancio Valencia Marín
5	Ayudante de obra	Zeus Cárdenas Simanca

11. INFORME DE SEGURIDAD INDUSTRIAL

El Contratista **JAIME HERRERA OSORIO** presentó a la Interventoría mediante correo electrónico un documento separado e independiente en pdf del Componente de Seguridad Industrial y Salud Ocupacional con el seguimiento de obras de adecuación y mantenimiento de las plantas físicas en las trece (13) Instituciones Educativas intervenidas en este periodo de obra de las actividades programadas y realizadas, el cual será revisado y aprobado por parte del Profesional SISO de MAPO INGENIERÍA S.A.S.

12. INFORME DE MANEJO AMBIENTAL Y DEL PGRCD.

El Contratista **JAIME HERRERA OSORIO** presentó a la Interventoría mediante correo electrónico un documento separado e independiente en pdf del Componente Ambiental con el seguimiento ambiental de obras de adecuación y mantenimiento de las plantas físicas en las trece (13) Instituciones Educativas intervenidas en este periodo de obra de las actividades programadas y realizadas, el cual será revisado y aprobado por la Profesional Ambiental **Ingeniera Jessica Andrea Tamayo Escobar** de MAPO INGENIERÍA S.A.S.

13. INFORME DE LAS ACTAS DE ENTREGA DE LOS ESPACIOS EN LAS ÁREAS INTERVENIDAS

Durante este período séptimo (7) de obra del 27 de febrero al 26 de marzo de 2021 no se implementaron Actas de entrega de los espacios internos de áreas en ninguna de las sedes educativas ya que las intervenciones de adecuación, construcción, mejoramiento de las plantas físicas de los Colegios Distritales se habían realizado en los periodos mensuales anteriores.

Dentro del desarrollo de la socialización realizada con las directivas y/o delegados de los Colegios, Interventoría y Supervisión de la adecuación y mejoramiento de las sedes educativas se contemplaron los siguientes componentes:

- ✓ Contratación de gestión humana y mano de obra,
- ✓ Componente de Comunicación y socialización con la Rectoría de los Colegios y
- ✓ Componente de acompañamiento social (No aplica)

13.1 Componente de gestión humana y contratación de mano de obra.

De conformidad con las exigencias del contrato, el Contratista JAIME HERRERA OSORIO ha generado trabajos directos al realizar la contratación del mayor porcentaje de la mano de obra no calificada de la Localidad de Kennedy, Bogotá D.C.

Adicionalmente el Contratista está generando trabajos indirectos al adquirir los insumos en la Localidad de Kennedy y ciudad de Bogotá D.C. y contratar el suministro de cargue, transporte de los proveedores materiales e insumos de la ciudad de Bogotá D.C. Así mismo se contrató el suministro de materiales granulares y pétreos de minas cercanas de la ciudad de Bogotá D.C. para los rellenos y concretas in situ construidos en obra.

13.2 Componente de Comunicación y socialización con la Rectoría de los Colegios.

Durante el período mensual de obras se realizaron reuniones de entrega de las obras a satisfacción del Rector y/o delegado con el acompañamiento de la Interventoría con el fin de realizar la entrega de las obras intervenidas en los Colegios Antonia Santos I – O.E.A. Sede B, Bellavista Cafam Sede A y el Instituto Técnico Rodrigo Triana Sede A.

13.3 Componente de Acompañamiento Social

Este componente NO APLICA para el Proyecto de las actividades que se realizarán durante la adecuación y mejoramiento de las plantas físicas, ya que no se realizaran intervenciones de espacio público ni vías locales que requieren del acompañamiento social con la comunidad perimetral o vecina al área de influencia de los Colegios Distritales intervenidas.

14. INFORME DE SEGUIMIENTO ACTUALIZACIÓN DEL PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE OBRA CON SUS ALERTAS RESPECTIVAS

El Contratista **JAIME HERRERA OSORIO** presentó a la Interventoría el Programa de ejecución global de obra actualizado de cada una de las Instituciones Educativas por intervenir, donde se especifican:

- La fecha de inicio de actividades de cada una de las Instituciones educativas,
- La duración en semanas y días de cada una de las Instituciones educativas,
- La fecha de terminación de actividades de cada una de las Instituciones educativas y
- La secuencia de intervención de cada una de las Instituciones educativas.

Adjunto relacionamos en el **Anexo No. 2** la Programación de obra global presentada y aprobada por la Interventoría mediante correo electrónico del día 10 de septiembre de 2020 en archivo Project para el respectivo control y seguimiento técnico y financiero semanal y mensual por parte del Interventor del estado de ejecución presupuestal y contractual de las obras programadas Vs. obras ejecutadas en la adecuación y mantenimiento de las plantas físicas en las trece (13) Instituciones Educativas priorizadas por la Supervisión de la Secretaria de Educación –SED, con el propósito de generar alertas tempranas con el fin de mantener el buen y óptimo desarrollo de la gestión y cumplir con las metas previstas por el Contratista de Obra.

15. ACREDITACIÓN DEL PAGO DE APORTES DE PARAFISCALES DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y PARAFISCALES

En el **Anexo No. 3** se presenta la certificación de pago de las seguridades sociales y parafiscales del Contratista **JAIME HERRERA OSORIO** y se adjuntan las planillas de pago de los aportes correspondientes al personal administrativo.

En el **Anexo No. 4** se presenta el soporte de las afiliaciones a seguridad social de los trabajadores de la obra.

16. ANEXOS

El Contratista **JAIME HERRERA OSORIO** presenta los documentos anexos de obra requeridos para el cumplimiento contractual objeto de la adecuación y mantenimiento de las Instituciones Educativas intervenidas en este primer periodo de obra.

ANEXO No. 1
ACTAS DE ENTREGA FÍSICA DE LAS OBRAS

ANEXO No. 1.1
ACTA DE ENTREGA FÍSICA DE LAS OBRAS DEL COLEGIO DISTRITAL ANTONIA SANTOS I – O.E.A.

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DISTRITAL
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIONES Y CONSERVACION DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS

ACTA DE ENTREGA FÍSICA DE LA OBRA

CONTRATO DE OBRA : CO1.PCCNTR.1575887 - 2020
CENTRO EDUCATIVO DISTRITAL : OEA (Antonia Santos I), SEDE B
DIRECCIÓN : CARRERA 69 BIS # 30 - 39 SUR
LOCALIDAD : 8 DE KENNEDY
FECHA DE ENTREGA : 26 DE FEBRERO DE 2021

I. COMPARECIENTES EN LA DILIGENCIA DE ENTREGA FISICA DE LA OBRA

POR LA SECRETARIA DE EDUCACION. – LUIS ENRIQUE CAMPOS TORRES en su calidad de Arquitecto Apoyo a la Supervisión – SED

POR LA INTERVENTORIA. – EDUARDO POSADA POSADA, Ingeniero Residente de Mapo Ingeniería S.A.S, en calidad de Interventor.

POR EL CONTRATISTA. – ARIEL HUMBERTO CALDERON TORRES en su calidad de Ingeniero Residente de JAIME HERRERA OSORIO.

POR EL COLEGIO. - ISMAEL PÉREZ A. en su calidad de Rector del Colegio.

II. OBJETO DE LA DILIGENCIA DE ENTREGA FISICA DE LA OBRA

La presente diligencia tiene por objeto la entrega física de las obras de la **I.E.D. OEA(Antonia Santos I) SEDE B** ubicada en la Localidad 8ª de Kennedy de la ciudad de Bogotá D.C., distinguida en la nomenclatura actual con el número 30 – 39 SUR de la carrera 69 Bis que comprende:

SECTOR	ESPACIO	CANTIDAD	OBSERVACIONES
PRIMER PISO Aulas 101 - 102 - 103 (AREA TRANSICIÓN)	CARPINTERIA METALICA	3 UN	SE LLEVA A CABO EL DESMONTE, MANTENIMIENTO Y RESINTELACION DE: 3 PUERTAS EN ALUMINIO, SE CAMBIA VIDRIO, CERRADURA Y SE MEJORA LA FIJACION DEL SISTEMA RIEL. SE HACE ENTREGA DE UNA LLAVE ORIGINAL Y DOS COPIAS DE CADA PUERTA, DEBIDAMENTE MARCADAS PARA SU IMPLEMENTACION.

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DISTRITAL
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIONES Y CONSERVACION DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS

ACTA DE ENTREGA FÍSICA DE LA OBRA

SEGUNDO PISO Aulas 203 - 204 - 205 - 206 - aula regular (AREA PRIMARIA)	CARPINTERIA METALICA	5 UN	SE LLEVA A CABO EL DESMONTE, MANTENIMIENTO Y RESINTELACION DE: 5 PUERTAS EN ALUMINIO, SE CAMBIAN VIDRIOS, SE REALIZA EL REFORZAMIENTO DE MARCOS, PERFILES, CAMBIO DE CERRADURAS Y SE MEJORA SU FUNCIONAMIENTO EN GENERAL. SE HACE ENTREGA DE UNA LLAVE ORIGINAL Y DOS COPIAS DE CADA PUERTA, DEBIDAMENTE MARCADAS PARA SU IMPLEMENTACION. ADICIONAL, SE REALIZA LA ENTREGA DE TRES PASADORES, LOS CUALES SE ENCONTRABAN EN FUNCIONAMIENTO EN LAS PUERTAS INTERVENIDAS.

III. ESTADO DE LAS EDIFICACIONES. -

1.- ¿Las observaciones realizadas al Constructor en el transcurso de la obra por parte de la Interventoría en consideración a la calidad de la misma se ejecutaron?

SI [X] **NO** [ ]

2.- ¿Se entregan las instalaciones correspondientes a la parte eléctrica, hidráulica, sanitaria, en funcionamiento?

SI [ ] **NO** [X]

3.- ¿Los acabados corresponden a los indicados en el Pliego de Condiciones y al diseño arquitectónico?

SI [X] **NO** [ ]

4.- Descripción de los equipos entregados

NO APLICA

ACTA DE ENTREGA FÍSICA DE LA OBRA

5.- ¿El proyecto cuenta con los medios de acceso requeridos para el debido funcionamiento sin que implique riesgo alguno a la comunidad estudiantil?

SI [X] **NO** [ ]

6.- ¿El constructor entrega las llaves con su respectivo cuadro explicativo y debidamente numeradas?

SI [X] **NO** [ ]

IV. OBSERVACIONES GENERALES

V. DECLARACIONES

Para constancia de lo anterior se firma la presente Acta en la Ciudad de Bogotá D.C., a los veintiséis (26) días del mes de Febrero del año dos mil veintiuno (2021), por los que en ella intervinieron.

CONTRATISTA
NOMBRE: Ing. Ariel Humberto Calderón Torres
CARGO: Residente de Obra

INTERVENTOR
NOMBRE: Ing. Eduardo Posada Posada
CARGO: Residente de Interventoría.

SUPERVISION – SED
NOMBRE: Arq. Luis Enrique Campos Torres
CARGO: Apoyo a la Supervisión DCCEE

ANEXO No. 2
BITACORA DE OBRA COLEGIO BELLAVISTA CAFAM SEDE A

Bitacora de Obra Colegio Cafam Bellavista Sede A.

Contrato de Obra:

CO1.PCCNTR.1575887 de 2020; cuyo objeto es: "Adelantar obras de adecuación, mejoramiento y mantenimiento correctivo de las plantas fisicas, así como la adecuación y/o mejoramiento de comedores escolares de los colegios distritales con el fin de atender los requerimientos y necesidades en terminos de infraestructura para la prestación del servicio educativo."

Contrato de Interventoría:

CO1.PCCNTR.1679913 de 2020; cuyo objeto es: "Interventoría técnica, administrativa, juridica, financiera y ambiental al contrato Obras de adecuación, mejoramiento y mantenimiento correctivo de las plantas fisicas, así como la adecuación y/o mejoramiento de comedores escolares de los colegios distritales, con el fin de atender los requerimientos y necesidades en terminos de infraestructura para la prestación del servicio educativo."

Escaneado con CamScanner

11/03/2021.

Se lleva a cabo socialización al Supervisor SED, de las actividades que el contratista estableció en su alcance; Durante la visita hizo presencia Contratista de Obra con su equipo de trabajo, Interventoria con sus respectivos profesionales y supervisor de la SED, terminado el recorrido y resueltas las inquietudes de las partes, se lleva a cabo la firma del acta de inicio del proyecto por las siguientes personas:

Contratista de Obra: Ing. Jaime Herrera Osorio.
Interventoría: MAPO Ingenieria S.A.S. - Ing. María Posada.
Supervisor SED: Arq. Luis Campos.

De acuerdo con lo anterior, se da la apertura al libro de obra, el cual será diligenciado a diario con los avances, inquietudes y eventualidades que se presente en el frente de Obra, firmado por el residente de obra y el residente o inspector de Interventoría.

Juan Camilo Acosta C.
Residente de Apoyo de Interventoria.

Escaneado con CamScanner

12/03/2021.

Interventoría: El Contratista de Obra cumple con el desarrollo de los protocolos de Bioseguridad y el uso adecuado de los EPP's por parte del personal.

Clima: Lluvias fuertes.
Personal: Residente, Maestro y Oficial.
Actividades:
- Se inicia corte de teja.
- Se inicia limpieza de pases, sifones y bajantes.

Novedades: El clima no ha permitido ejecutar las actividades de manera continua.

Residente de Apoyo de Interventoria.

13/03/2021.

Interventoría: Se lleva a cabo el cumplimiento de los protocolos de Bioseguridad y el uso adecuado de los EPP's por parte del Contratista de Obra.

Clima: Lluvias Fuertes.
Personal: Residente, Maestro y Oficial.
Actividades:
- Se continua con corte de teja.
- Se continua con limpieza de pases, sifones y bajantes.
- Se inicia mejoramiento en desagues de viga canal.

Novedades: Las fuertes lluvias dificultan el avance de Obra.

Residente de Interventoria de Apoyo.

Escaneado con CamScanner

15/03/2021

Interventoria: Se da cumplimiento a los protocolos de Bioseguridad y uso de EPPs por parte del personal de Obra.

Clima: Lluvias fuertes.
Personal: Maestro y Oficial.
Actividades:
- Se continua con corte de teja.
- Se continua con limpieza de elementos de desagüe.
- Se continua con mejoramiento de desagües de viga canal.

Novedades: Las lluvias no permiten continuar con la ejecución de las obras.

Residente de Apoyo de Interventoría.

16/03/2021.

Interventoria: El Contratista de Obra cumple con los protocolos de Bioseguridad y con el uso adecuado de EPP's.

Clima: Lluvias fuertes.
Personal: Maestro y Oficial.
Actividades.
- Se continua con corte de teja.
- Se finaliza con limpieza de pases, desagües y bajantes.
- Se continua con mejoramiento de desagues de viga canal.

Novedades: Las actividades se desarrollan de manera itinerante por la dificultad del Clima.

Residente de Apoyo de Interventoría.

Escaneado con CamScanner

17/03/2021.

Interventoría: Se cumplen los protocolos de Bioseguridad y el uso adecuado de EPP's por parte del personal de Obra.

Clima: Lluvias fuertes.
Personal: Residente, Maestro y Oficial
Actividades:
- Se continua con corte de teja.
- Se continua con mejoramiento de desagues de viga canal.
Novedades: Las fuertes lluvias dificultan la ejecución adecuada de las actividades.

Residente de Apoyo de Interventoría.

18/03/2021.

Interventoria: Se llevan a cabo los Protocolos de Bioseguridad y el uso adecuado de EPP's por parte del Contratista de Obra.

Clima: Lluvias, fuertes.
Personal: Residente, Maestro y Oficial.
Actividades:
- Se continua con corte de teja.
- Se continua con mejoramiento de desagües de viga canal.
- Se inicia retiro de manto asfaltico en vigas canal.
Novedades: El Clima dificulta llevar a cabo las actividades de acuerdo a programación.

Residente de Apoyo de Interventoría.

Escaneado con CamScanner

19/03/2021.

Interventoría: El Contratista cumple con el desarrollo de Protocolos de Bioseguridad y con el uso adecuado de EPP's por parte de los trabajadores.

Clima: Lluvias suaves, pero constantes.
Personal: Residente, Maestro y Oficial.
Actividades:
- Se continua con mejoramiento de desagües de viga canal.
- Se inicia inicia retiro de manto en vigas canal.

Novedades: las lluvias no favorecen a la ejecución de las obras, retrasan el desarrollo del proyecto.

Residente de Apoyo de Interventoría.

20/03/2021.

Interventoría: Se cumplen los protocolos de Bioseguridad y el uso adecuado de EPP's por parte del personal de Obra.

Clima: Fuertes lluvias.
Personal: Maestro y Oficial.
Actividades:
- Se continua con mejoramiento de desagües de vigas canal.
- Se continua retiro de manto de vigas canal.
- Se inicia aplicación de sika flex en marcos de ventanas.

Novedades: Las lluvias afectan las áreas a intervenir, dificultan el desarrollo de la Obra.

Residente de Apoyo de Interventoría.

Escaneado con CamScanner

23/03/2021.

Interventoría: El contratista cumple con la ejecución de los protocolos de Bioseguridad y el uso adecuado de los EPP's por parte del personal.

Clima: Lluvias continuas.
Personal: Residente, Maestro y Oficial.
Actividades:
- Se inicia aplicación de manto en vigas - canal.
- Se termina el retiro del manto existente.
- Se inicia aplicación de sikaflex en marcos.

Novedades: El clima no permite la ejecución adecuada de las obras.

Residente de Apoyo de Interventoría.

24/03/2021.

Interventoría: Se llera a cabo la ejecución de los protocolos de Bioseguridad y el uso adecuado de EPP's por parte del Contratista de Obra.

Clima: Nublado
Personal: Residente, Maestro y Oficial.
Actividades:
- Se continua aplicación de manto en vigas - canal.
- Se finaliza el retiro del manto.
- Se continua con aplicación de Sikaflex en marcos.

Novedades: No se presentan.

Residente de Apoyo de Interventoría.

Escaneado con CamScanner

25/03/2021.

Interventoría: Se cumplen los protocolos de Bioseguridad y el uso de manera adecuada de los EPP's por parte del Contratista de Obra.

Clima: Lluvias leves.
Personal: Maestro y Oficial.
Actividades:
- Se continua aplicación de manto en vigas - canal.
- Se continua con aplicación de Sikaflex en ventanas.
- Se inicia limpieza de desagües en ala izquierda de la cubierta.

Novedades: No se ha podido desarrollar la obra de manera oportuna, debido a las lluvias que se presentan en la zona.

Residente de Apoyo de Interventoría.

26/03/2021.

Interventoría: El contratista de Obra cumple con los protocobs de Bioseguridad y con el uso adecuado de EPP's por parte del personal.

Clima: Soleado.
Personal: Residente, Maestro y Oficial.
Actividades:
- Se continúa aplicación de manto en vigas - canal.
- Se continúa con aplicación de Sikaflex en ventanas.
- Se continúa con limpieza de desagües en ala izquierda.

Novedades: No se presentan.

Residente de Apoyo de Interventoría.

Escaneado con CamScanner

27/03/2021.

Interventoría: Se cumplen los protocolos de Bioseguridad y el uso de EEPs por parte del personal de obra.

Clima: Soleado.
Personal: Maestro y Oficial.
Actividades:
- Se continúa instalación de manto en vigas - canal.
- Se continúa aplicación de sikaflex en ventanas.
- Se lleva a cabo aseo de obra y se realiza acopio de escombros.

Novedades: No se presentan.


Residente de Apoyo de Interventoría.

Escaneado con CamScanner

ANEXO No. 3
PROGRAMACIÓN INICIAL DE EJECUCIÓN DE OBRA

PROGRAMACION PRELIMNAR GRUPO 1 KENNEDY

Id	ITEM	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin
1		**GRUPO 1 – KENNEDY**	**210 días**	**jue 27/08/20**	**mié 24/03/21**
2	0	INICIO	0 días	jue 27/08/20	jue 27/08/20
3	1	GUSTAVO ROJAS	84 días	jue 27/08/20	mié 18/11/20
4	2	SAN PEDRO CLAVER B	84 días	jue 27/08/20	mié 18/11/20
5	3	VILLARICA	84 días	jue 27/08/20	mié 18/11/20
6	4	SAN PEDRO CLAVER A	84 días	vie 04/09/20	jue 26/11/20
7	5	JAPON	84 días	lun 02/11/20	dom 24/01/21
8	6	TOM ADAMS	158 días	jue 03/09/20	dom 07/02/21
9	7	CLASS	130 días	jue 03/09/20	dom 10/01/21
10	8	CARLOS ARTURO TORRES	84 días	lun 16/11/20	dom 07/02/21
11	9	CODEMA	137 días	jue 27/08/20	dom 10/01/21
12	10	KENNEDY	84 días	lun 14/12/20	dom 07/03/21
13	11	CAFAM BELLAVISTA	84 días	lun 14/12/20	dom 07/03/21
14	12	RODRIGO DE TRIANA	84 días	lun 14/12/20	dom 07/03/21
15	13	OEA	45 días	lun 08/02/21	mié 24/03/21
16		FIN	0 días	mié 24/03/21	mié 24/03/21

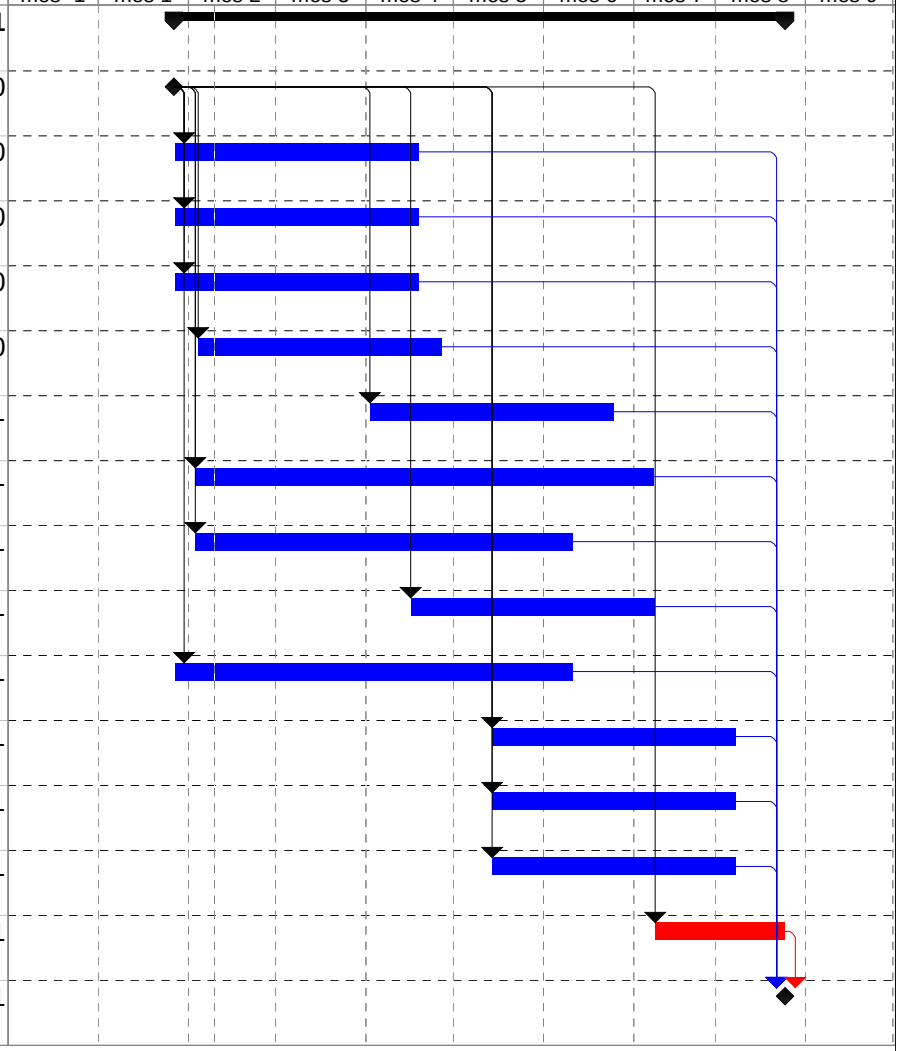

PROGRAMACION PRELIMINAR

Tarea	División	Sólo duración			
Tarea crítica	Tareas externas	Informe de resumen manual			
Hito	Resumen del proyecto	Resumen manual			
Resumen	Agrupar por síntesis	Sólo el comienzo			
Tarea resumida	Tarea inactiva	Sólo fin			
Tarea crítica resumida	Hito inactivo	Progreso			
Hito resumido	Resumen inactivo	Fecha límite			
Progreso resumido	Tarea manual	Progreso manual			

ANEXO No. 4
CERTIFICADO DE PAGO DE PARAFISCALES Y SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL

DECLARACIÓN JURAMENTADA DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES- PERSONAS NATURALES

Yo, JAIME HERRERA OSORIO identificado con cedula de ciudadanía No. 79.655.971 Bogotá D.C., actuando en nombre propio, CERTIFICO que de acuerdo con lo señalado en el artículo 9 de la Ley 828 de 2003, DECLARO BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO, que he efectuado el pago y me encuentro al día, por concepto de mis aportes y el de mis empleados a los sistemas de salud, pensiones, riesgos profesionales, cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), cuando a ello hubiere lugar.

Dada en Bogotá D.C., a los veintiseis (26) días del mes de marzo del 2021.



JAIME HERRERA OSORIO
C.C. No. 79.655.971 de BOGOTÁ




UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

263922-T

DEDSY JULIETH
SALINAS RAMIREZ
C.C. 1077084313
RES. INSCRIPCION 1414 DEL 07/10/2019
CORPORACION UNIVERSITARIA REMINGTON

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA
DIRECTOR GENERAL

278889 294747

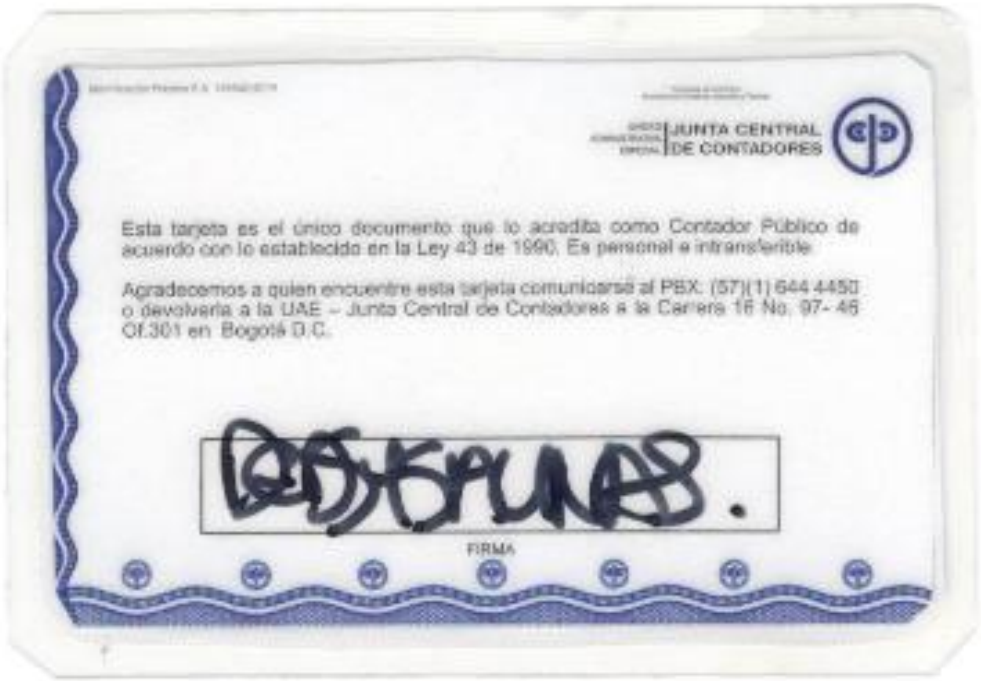

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como Contador Público de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990. Es personal e intransferible.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse al PBX. (57)(1) 644 4450 o devolverla a la UAE – Junta Central de Contadores a la Carrera 16 No. 97- 46 Of.301 en Bogotá D.C.

FIRMA

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

5 8 F 0 B 6 A D 0 B 6 9 7 E C 7

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **DEDSY JULIETH SALINAS RAMIREZ** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1077084313 de TOCANCIPA (CUNDINAMARCA) Y Tarjeta Profesional No 263922-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *


REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA
NUMERO 1.077.084.313
SALINAS RAMIREZ
APELLIDOS
DEDSY JULIETH
NOMBRES
FIRMA
REPUBLICA DE COLOMBIA


INDICE DERECHO
FECHA DE NACIMIENTO 03-FEB-1990
CHIQUINQUIRA
(BOYACA)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.50
ESTATURA
O+
G.S. RH
F
SEXO
07-FEB-2008 TOCANCIPA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION
REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES
P-1529200-00079703-F-1077084313-20080926
0003763421A 1
24504032

ANEXO No. 5
PLANILLA DE PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y TRABAJADORES DE OBRA

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 79655971		HERRERA OSORIO JAIME	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	AV CARRERA 15 # 100-69	BOGOTA-BOGOTA D.E.	7550985	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2021-02	2021-02	932076478	9416855949	I	2021/03/16	2021/03/23	BANCOLOMBIA	7	$1,276,600

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																PENSION		SALUD		CCF		RIESGOS		PARAFISCALES	
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	Codigo	Dias	Codigo	Días	Codigo	Días	Días	Exonerado SENA e ICBF
1	CC	79655971	HERRERA OSORIO JAIME																		25-14	30	EPS037	30		0	14-11	30	0	No
Total	**Afiliados(1)**																												

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 79655971		HERRERA OSORIO JAIME	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	AV CARRERA 15 # 100-69	BOGOTA-BOGOTA D.E.	7550985	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2021-02	2021-02	932076478	9416855949	I	2021/03/16	2021/03/23	BANCOLOMBIA	7	$1,276,600

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$576,000	$0	$0	$576,000
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$576,000	$0	$0	$576,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$250,600	$0	$0	$250,600
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	$250,600	$0	$0	$250,600
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$450,000	$0	$0	$450,000
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$450,000	$0	$0	$450,000
TOTAL				1	$1,276,600	$0	$0	$1,276,600

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901291812-1	IC INGENIEROS CONSTRUCTORES SAS	CR 15 100 69 OF 508	7550985	CONTABLE@INGASI.COM.CO	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
SUCURSAL	C – MIPYME	PRINCIPAL / PPAL	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					2	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2021-03	2021-02	E	12/03/2021	48908640	$889.900	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS001	ALIANSALUD EPS S.A.	830113831-0	72.000	0		0		0	0	0	0	72.000	1
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	46.800	0		0		0	0	0	0	46.800	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230301	Porvenir	800224808-8	288.000	0	0	0	0	0	0		288.000	1
25-14	Colpensiones	900336004-7	187.200	0	0	0	0	0	0		187.200	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-25	Riesgos prof Colmena	800226175-3	206.800				206.800	0	0	206.800			2.068	206.800	2

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF22	Colsubsidio	860007336-1	89.100	0	0	89.100	2

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	2	118.800	118.800
Pensión	2	475.200	475.200
Riesgos Laborales	1	206.800	206.800
CCF	1	89.100	89.100
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	6	889.900	889.900

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	901291812-1	IC INGENIEROS CONSTRUCTORES SAS		CR 15 100 69 OF 508	7550985	CONTABLE@INGASI.COM.CO
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
SUCURSAL	C – MIPYME	PRINCIPAL	PPAL	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	

EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					2	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2021-03	2021-02	E	12/03/2021	48908640	$889.900	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Estudiante	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	1022385482	CRUZ GARZON JULIETH ALEJANDRA	1	0			S																	25-14	1.170.000	187.200	0	0	0	0	EPS017	1.170.000	46.800	14-25	1.170.000	5	81.500	CCF22	1.170.000	35.100	0	0	0	0	0
2	CC	79634982	SANTANDER GONZALEZ JAVIER RICARDO	1	0			S																	230301	1.800.000	288.000	0	0	0	0	EPS001	1.800.000	72.000	14-25	1.800.000	5	125.300	CCF22	1.800.000	54.000	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	900496836-3	INGENIERIA ESPECIALIZADA GESTION AMBIENTAL SEGURID	AV CR 15 100 69 OF 508	7550985	gerencia@ingasi.com.co	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	C – MIPYME		BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
					13	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2021-03	2021-02	E		49212853	$4.177.900	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS002	Salud Total EPS	800130907-4	178.400	0		0		0	0	0	0	178.400	3
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	203.200	0		0		0	0	0	0	203.200	3
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	143.200	0		0		0	0	0	0	143.200	3
EPS010	EPS Sura	800088702-2	36.400	0		0		0	0	0	0	36.400	1
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	50.400	0		0		0	0	0	0	50.400	1
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	40.000	0		0		0	0	0	0	40.000	1
EPS044	MEDIMAS EPS SAS	901097473-5	6.100	0		0		0	0	0	0	6.100	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	232.300	0	0	0	0	0	0		232.300	3
230301	Porvenir	800224808-8	1.601.400	0	0	0	0	0	0		1.601.400	8
231001	Colfondos	800227940-6	220.800	0	0	0	0	0	0		220.800	1
25-14	Colpensiones	900336004-7	576.000	0	0	0	0	0	0		576.000	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-25	Riesgos prof Colmena	800226175-3	232.000				232.000	0	0	232.000			2.320	232.000	13

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF22	Colsubsidio	860007336-1	657.700	0	0	657.700	13

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	900496836-3	INGENIERIA ESPECIALIZADA GESTION AMBIENTAL SEGURID	AV CR 15 100 69 OF 508	7550985	gerencia@ingasi.com.co	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	C – MIPYME		BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					13	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2021-03	2021-02	E		49212853	$4.177.900	

TOTALES PARAFISCALES				
Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	7	657.700	657.700
Pensión	4	2.630.500	2.630.500
Riesgos Laborales	1	232.000	232.000
CCF	1	657.700	657.700
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	13	4.177.900	4.177.900

PAGADO 92215252

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	900496836-3	INGENIERIA ESPECIALIZADA GESTION AMBIENTAL SEGURID		AV CR 15 100 69 OF 508	7550985	gerencia@ingasi.com.co
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	C – MIPYME			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	

EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					13	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2021-03	2021-02	E		49212853	$4.177.900	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																		PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	1013669715	ACOSTA LADINO BRAYAN STEVEN	1	0			S																	230301	1.080.000	172.800	0	0	0	0	EPS002	1.080.000	43.200	14-25	1.080.000	1	5.700	CCF22	1.080.000	43.200	0	0	0	0	0
2	CC	1015438636	HERNANDEZ TORRES ELIUD PAOLA	1	0			S		X															230201	100.000	16.000	0	0	0	0	EPS005	100.000	4.000	14-25	100.000	1	600	CCF22	100.000	4.000	0	0	0	0	0
3	CC	1015996863	FRANCO ROJAS PABLO ANTONIO	1	0			S																	230301	1.260.000	201.600	0	0	0	0	EPS017	1.260.000	50.400	14-25	1.260.000	5	87.700	CCF22	1.260.000	50.400	0	0	0	0	0
4	CC	1016073172	GARZON HERNANDEZ CRISTIAN ALEXANDER	1	0			S																	230301	1.000.000	160.000	0	0	0	0	EPS008	1.000.000	40.000	14-25	1.000.000	5	69.600	CCF22	1.000.000	40.000	0	0	0	0	0
5	CC	1022372831	LOZADA CEDEÑO DAVID LEONARDO	1	0			S																	230301	1.380.000	220.800	0	0	0	0	EPS008	1.380.000	55.200	14-25	1.380.000	1	7.300	CCF22	1.380.000	55.200	0	0	0	0	0
6	CC	1022389113	ROZO PINTO YEIMY TATIANA	1	0			S																	230301	1.380.000	220.800	0	0	0	0	EPS005	1.380.000	55.200	14-25	1.380.000	1	7.300	CCF22	1.380.000	55.200	0	0	0	0	0
7	CC	37947929	GOMEZ MEJIA CAMILA FERNANDA	1	0			S																	25-14	3.600.000	576.000	0	0	0	0	EPS005	3.600.000	144.000	14-25	3.600.000	1	18.800	CCF22	3.600.000	144.000	0	0	0	0	0
8	CC	52806275	CASTRO GALVIS DIONILDE	1	0			S	X	X															230201	151.421	24.300	0	0	0	0	EPS044	151.421	6.100	14-25	151.421	1	800	CCF22	151.421	6.100	0	0	0	0	0
9	CC	74346826	CALDERON TORRES ARIEL HUMBERTO	1	0			S																	230301	2.000.000	320.000	0	0	0	0	EPS002	2.000.000	80.000	14-25	2.000.000	1	10.500	CCF22	2.000.000	80.000	0	0	0	0	0
10	CC	1026271088	VILLEGAS ORTIZ CAMILO ALEJANDRO	1	0			S																	231001	1.380.000	220.800	0	0	0	0	EPS002	1.380.000	55.200	14-25	1.380.000	1	7.300	CCF22	1.380.000	55.200	0	0	0	0	0
11	CC	1032446039	JARAMILLO SANDOVAL YASUNARI	1	0			S																	230301	908.526	145.400	0	0	0	0	EPS010	908.526	36.400	14-25	908.526	1	4.800	CCF22	908.526	36.400	0	0	0	0	0
12	CC	1077084313	SALINAS RAMIREZ DEDSY JULIETH	1	0			S																	230201	1.200.000	192.000	0	0	0	0	EPS008	1.200.000	48.000	14-25	1.200.000	1	6.300	CCF22	1.200.000	48.000	0	0	0	0	0
13	CC	1101688703	CAMACHO GOMEZ PEDRO FELIPE	1	0			S																	230301	1.000.000	160.000	0	0	0	0	EPS037	1.000.000	40.000	14-25	1.000.000	1	5.300	CCF22	1.000.000	40.000	0	0	0	0	0

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información
