CONTRATO No. CO1.PCCNTR.1680516 - GRUPO 10.
"INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, JURIDICA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRAS DE ADECUACION, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FISICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TERMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO".



INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No 6
DEL 19 DE ENERO AL 9 DE FEBRERO Y DEL 26 AL 28 DE FEBRERO DE 2021.

CONSORCIO INAR INGENIEROS

MARZO 2021

TABLA DE CONTENIDO

INTRODUCCION 4

1. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO 5

2. CONTRATO DE OBRA 7

2.1 INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO DE OBRA 7

2.2 CONTROL DE OBRA 8

- **Semana 23. Del 18 al 24 de Enero de 2021. ....8**
- **Semana 24. Del 25 al 31 de Enero de 2021. ....9**
- **Semana 25. Del 1 al 9 de Febrero de 2021. .... 10**
- **Semana 26. Del 26 al 28 de Febrero de 2021. .... 11**

2.3 DESCRIPCION GENERAL. 14
2.3.1 Control financiero 14

3. CONTRATO DE INTERVENTORIA. 16

3.1 INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA 16

3.2 INFORMACIÓN GENERAL DE LOS RECURSOS DE LA INTERVENTORÍA 17

3.3 ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR LA INTERVENTORÍA 17
3.3.1 Actividades administrativas 17
3.3.2 Actividades técnicas 18
3.3.3 Informe financiero de Interventoría 18
3.3.4 Seguimiento al plan de Bioseguridad 19
3.3.5 Comités de Seguimiento 19

4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 20

4.1 ÁREA TÉCNICA 20

4.2 ÁREA ADMINISTRATIVA 20

5. ANEXOS 21

Anexo No 1. Control de personal. 21

Anexo No 2. Control de Equipos. 21

Anexo No 3. Control de Seguridad Industrial. 21

Anexo No 4. Estado del Tiempo. 21

Anexo No 5. Registro Fotográfico. 21

Anexo No 6. Libro o Bitácora de Obra 21

Anexo No 7. Informes Semanales del Periodo. 21

Anexo No 8. Relación de Correspondencia Enviada y Recibida. 21

INTRODUCCION

La ejecución del contrato de Obra No CO1.PCCNTR.1577474 del 28 de Mayo de 2020, cuyo objetivo es la "ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO", a realizar en un plazo de 5 meses, se adelanta en predios localizado dentro las diferentes instituciones educativas a intervenir en la localidad No 4 San Cristóbal.

El acta de inicio para el contrato de Interventoría se firmó el 13 de agosto de 2020 dando inicio a su contrato, el acta de inicio de obra se firmó el 19 de agosto de 2020 dando apertura a las actividades físicas de obra en Juana Escobar - Sede B, Juana Escobar Sede C – Republica de Canadá II, posteriormente se dio inicio en Juan Evangelista Gómez - Sede A y Atenas, durante este periodo se dio inicio a los tres frentes restantes Gran Colombia sede A, San Isidro Sede B y Los Alpes sede A.

El presente documento corresponde al Informe de Interventoría No 6 del periodo comprendido entre el 19 de enero al el 9 de febrero de 2021 y del 26 al 28 de febrero de 2021, en este informe se evidencia el porcentaje ejecutado, las actividades ejecutadas semana a semana y el estado del contrato.

Se realizó la prorroga al contrato de Obra por 25 días justificado en los retrasos en suministro de material por parte de proveedores, el invierno y las fuertes lluvias que se presentaron en el mes de noviembre y diciembre, falta de mano de obra y la cuarentena estricta que inicio el 5 de enero de 2021 en las tres localidades de Bogotá, de acuerdo a dicha prorroga la nueva fecha de terminación está dada para el 12 de febrero de 2021.

Se realizó la suspensión de los contratos de obra e Interventoría por 15 días y se realizó la adición y prorroga a los contratos de Obra e Interventoría por 3 meses para la intervención y mantenimiento a otras Instituciones Educativas en la misma localidad 4 de San Cristóbal, la adición básicamente se realiza para el mejoramiento de espacios, ventilación y saneamiento respecto a planificar los espacios con el fin de mitigar el contagio por el COVIC 19.

La firma contratista desarrollo durante este periodo de tiempo las siguientes labores del contrato de obra: instalación de estructura metálica, instalación de cubierta, enchapes de piso y pared, pintura, demoliciones, excavaciones, rellenos. En este periodo se realizaron además labores de control técnico, administrativo y financiero por parte de esta Interventoría.

Se realizó la entrega de 4 Instituciones Educativas en las cuales se finalizaron los mantenimientos solicitados.

1. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

El proyecto como ya se mencionó se adelanta en predios urbanos (instituciones educativas del distrito), sobre una topografía inclinada y con unos niveles freáticos medios.

El planteamiento arquitectónico básicamente hace alusión a obras de adecuación y mantenimiento dentro de las I.E.D y algunas exteriores a las edificaciones como zonas verdes, andenes y patio. El total del proyecto son siete (07) instituciones educativas entre las cuales tenemos:

1. Atenas – Sede A.
2. Juan Evangelista Gómez - Sede A.
3. Rural Gran Colombia - Sede A.
4. San Isidro sur Oriental - Sede B - Omar Torrijos.
5. Los Alpes - Sede A.
6. Juana Escobar - Sede B - San Luis.
7. Juana Escobar Sede C - Republica de Canadá II.

El proyecto Plantea en su parte inicial la ejecución de actividades preliminares como desmontes y demoliciones. La segunda parte de la obra contempla la ejecución de las cimentaciones, la tercera parte desagües e instalaciones subterráneas, sanitarias e hidráulicas, la cuarta contempla el tema de instalaciones eléctricas, la quinta parte contempla mamposterías, pañetes y pisos, la sexta cubiertas e impermeabilizaciones, la séptima los capítulos de carpintería en general, la octava los enchapes y pinturas, siguiendo con instalaciones de aparatos sanitarios y por ultimo aseo y obras exteriores.

Las actividades macro que resumen técnicamente la ejecución de los frentes a intervenir son las siguientes:

- PRELIMINARES
- CIMENTACIÓN
- DESAGÜES E INSTALACIONES SUBTERRÁNEAS
- ESTRUCTURA
- MAMPOSTERÍA
- PREFABRICADOS EN CONCRETO Y OTROS
- INSTALACIONES HIDRÁULICAS, SANITARIAS Y GAS
- INSTALACIÓN ELÉCTRICA, TELEFÓNICA Y COMUNICACIONES
- PAÑETES
- PISOS

- CUBIERTA E IMPERMEABILIZACIONES
- CARPINTERÍA METÁLICA
- ENCHAPES
- ILUMINACIÓN
- PINTURA
- CERRADURAS Y VIDRIOS
- OBRAS EXTERIORES
- ASEO Y VARIOS
- OBRAS ADICIONALES

La adición realizada es para el mejoramiento de espacios, ventilación y saneamiento respecto a planificar los espacios con el fin de mitigar el contagio por el COVIC 19 de las siguientes instituciones educativas:

1. Colegio José Félix Restrepo.
2. Colegio José Joaquín Castro.
3. Colegio La Belleza.

2. CONTRATO DE OBRA

2.1 INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO DE OBRA

CONTRATISTA	MUÑOZ Y HERRERA INGENIEROS ASOCIADOS S.A.
CONTRATO No	CO1.PCCNTR.1577474
OBJETO:	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO
LUGAR DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO:	LOCALIDAD (4) SAN CRISTOBAL.
CONTRATANTE:	SECRETARIA DE EDUCACIÓN
PLAZO:	5 MESES
PRORROGA No 1:	25 DÍAS
PRORROGA No 2:	3 MESES
VALOR INICIAL:	$ 1.023.694.436,00
ADICIÓN:	$ 491.373.316,00
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	$ 1.515.067.752,00
REPRESENTANTE LEGAL:	JUAN GUILLERMO MUÑOZ GIRALDO
DIRECCIÓN:	CALLE 125 No 53 - 17
TELEFONO:	2 536224
INTERVENTOR:	CONSORCIO INAR INGENIEROS

2.2 CONTROL DE OBRA

Durante el periodo se realizaron los respectivos informes de control de obra, los cuales reflejan las actividades programadas a ejecutar semana a semana, la cantidad o porcentaje realizado de dichas actividades y el estado del avance financiero del proyecto, el cual está directamente relacionado con la ejecución real en obra.

En este sentido, se documenta la ejecución de las actividades así:

- **Semana 23. Del 18 al 24 de Enero de 2021.**

En esta semana se realizaron las siguientes actividades por institución:

JUANA SEDE B

Se hace instalación de sanitarios, lavamanos, tapa registros y orinales, se recomienda el cumplimiento del protocolo de bioseguridad, se ajusta cantidad de ítem de pintura según medidas tomadas en campo.

JUANA SEDE C

Se aplicó pintura coraza sobre fachada de salones, se finaliza actividad de enchape en tableta de gres, se ajustan algunas tuberías para instalar sanitarios y orinales, se realiza instalación de lavamanos.
Se preparan superficies para aplicar pintura en muros internos, está en curso la instalación de ventaneria, se realizan pañetes en fachada de baterías sanitarias .

JUAN EVANGELISTA

Se continúa con la instalación de guarda escobas en mármol, se construye caja de inspección en cárcamo bloque c, se continúa con destronque y brillo del mármol y pintura.
Se realiza verificación y ajuste de medidas en obra.

ATENAS

Terminación desmonte de cielo raso en rectoría, instalación bajante y teja traslucido hall.
Cableado y salidas y lamprearas en cafetería baños y cuarto de aseo se continua rectoría.
Remates de soldadura y pintura estructura de cubierta.

LOS ALPES

Se realiza demolición de placa en sitio donde se instalara la tubería de desagüe del cárcamo, se realiza excavaciones para desagües del cárcamo y excavación para mejoramiento de la estructura de la cancha.
Se instala tubería para desaguar cárcamo, se compacta sub base granular en cancha.

RURAL GRAN COLOMBIA

Se realiza limpieza y descapote para construcción de cuneta.
Se realiza excavación en material común para construcción de caja de inspección, cuneta y tubería, se pañeta muro de la zona de juegos.
Se recomienda al contratista incrementar el equipo de trabajo para no generar retrasos en el frente de obra. Se recomienda al contratista el cumplimiento del protocolo de bioseguridad.

SAN ISIDRO

En esta semana no se realizó actividad en taller ni en el frente de obra.

- **Semana 24. Del 25 al 31 de Enero de 2021.**

JUANA SEDE B

Se ajustan cantidades de los ítem de tubería sanitaria, pañete, mediacaña y enchape según medidas tomadas en campo, se realiza actualización de presupuesto.
Se hace culmina la instalación de accesorios, espejos y divisiones en acero inoxidable de las baterías sanitarias.
Se hace recorrido para recibo de este frente de obra, sin embargo se encuentran algunas observaciones que deberán ser corregidas por el contratista.
El contratista informara el ajuste y corrección de observaciones realizadas para realizar el recibo del frente de obra y ser entregado a la Rectora de la Institución.

JUANA SEDE C

Se ajustan cantidades de acuerdo a las medidas tomadas en campo, se hace instalación de luminarias, cubierta en cuarto de cafetería, divisiones en acero inoxidable y espejos.
Se finaliza actividad de pintura.
Se hace aseo general al frente de obra y se programó la recolección de escombros.

Se hace recorrido al frente de obra para entregar las obras al personal administrativo. Durante el recorrido se encuentran algunas observaciones que deberán ser subsanadas por el contratista para entregar la obra a satisfacción.

JUAN EVANGELISTA

Se continúa con revisión de cantidades en obra, se realiza limpieza interior y exterior de áreas intervenidas, se realiza arreglo de fisura en fachada.

ATENAS

Se realiza instalación de estructura canales y flanches en área de acceso a rectoría y hall, se realiza el cambio de luminaria en todos los espacios, pintura exterior y aseo general.

LOS ALPES

Se realiza el ajuste de medidas, se inicia pulida de pisos y mesones mármol, toma de densidades nuevas con buen resultado.

RURAL GRAN COLOMBIA

Se hace el desmonte de un tramo de cerramiento en malla ondulada, se construye cuneta en concreto para conducción de aguas lluvias, se ejecuta actividad de fundida de placa en concreto en zona de juegos y se instala de bajante en fachada principal.

SAN ISIDRO

Durante esta semana se realizó desmonte de ventanas, vidrios, lámparas y cerchas.

Instalación de ventanas en salones del segundo piso faltan vidrios, se realizaron muros perimetrales (cuchillas).

- **Semana 25. Del 1 al 9 de Febrero de 2021.**

JUAN EVANGELISTA

Se ajustan todos los detalles en la ventaneria instalada, se realiza pintura en puertas de aulas, hidrófugo y sellado en muros de mampostería construidos en fachada bloque c, seo general.
Se programa entrega del frente de obra al rector del colegio.

ATENAS

Se realiza presupuesto ajustado, se terminan las actividades en obra realizando correcciones de pintura exterior, se realizan correcciones de soldadura y pintura en estructura de cubierta.
Se programa entrega del frente a rectora del colegio.

LOS ALPES

Se continúa con pulida de mesones y piso en mármol en baños.

RURAL GRAN COLOMBIA

Se realiza construcción caja de inspección, suministro e instalación de concreto certificado para rampa y escalera, se instala baranda exterior

Se ejecutaron actividades de escarificado de superficies y actividades de pañetes y filos.

SAN ISIDRO

Durante esta semana no se realizaron actividades.

- **Semana 26. Del 26 al 28 de Febrero de 2021.**

LOS ALPES

Se continúa y culmina con media caña y piso de mármol, enchape con cenefa, instalación lámparas, mantenimiento de canchas y rejillas cárcamo.

RURAL GRAN COLOMBIA

Durante el transcurso de esta semana se realizaron remates en el cárcamo y caja de inspección.

Se recomienda al contratista hacer aseo general al frente de obra, incorporar más personal al frente de obra para no generar retrasos y el cumplimiento del protocolo de bioseguridad.

SAN ISIDRO SUR ORIENTAL

Durante esta semana no se realizaron actividades.

Avance del proyecto durante el Sexto mes 24.94 %

Avance del proyecto hasta la fecha 71.62 %


Nota: hasta la fecha del presente informe no se registró ningún accidente en el proyecto.

Se realiza el siguiente análisis incluyendo las programaciones de los 7 frentes de obra.

ESTADO DEL PLAZO GENERAL	DIAS TRANSCURRIDOS	PORCENTAJE DEL PLAZO (%)
	176	100,00%
	VALOR ($)	PORCENTAJE (%)
INVERSIÓN PROGRAMADA ACUMULADA (1)	$ 1.023.694.436,00	100,00%
INVERSIÓN EJECUTADA ACUMULADA (2)	$ 733.199.341,01	71,62%
EVALUACIÓN DEL AVANCE (2) - (1)	-$ 290.495.094,99	-28,38%
Se presenta un atraso en la Obra	-$ 290.495.094,99	**-28,38%**
ESTADO DE AVANCE EN DÍAS (Retraso)		**(49,95)**

Respecto al estado general del proyecto tenemos un atraso del proyecto con relación a la programación presentada por la firma contratista, el porcentaje de avance alcanzado por la firma contratista es de 71.62 % con relación a 100 % programado lo que refleja un desfase por debajo de lo programado en 28.38 %, se realizó la prorroga al contrato por 25 días dados los diferentes inconvenientes surgidos respecto a la crisis sanitaria y a las diferentes cuarentenas que han afectado el suministro de materiales y la mano de obra hecho que llevo a la suspensión del contrato por 15 días, y se realizó la adición a los contratos y prorroga por 3 meses para la intervención de tres nuevos colegios.

GRÁFICO CRONOGRAMA ESTADO GENERAL

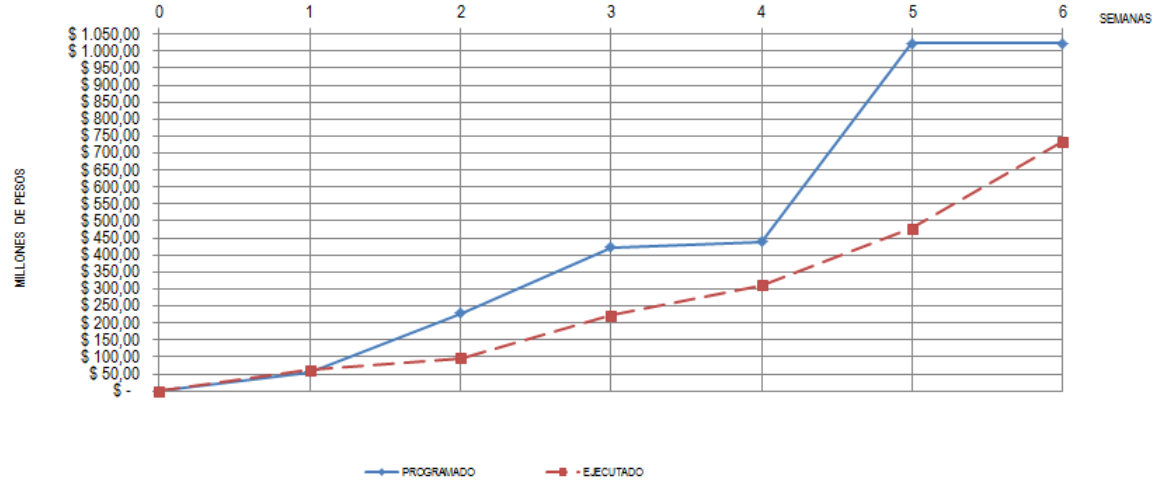

ESTADO DEL PLAZO EN EL PERIODO CUARTO MES	DIAS TRANSCURRIDOS	PORCENTAJE DEL PLAZO (%)
	30	17,05%
	VALOR ($)	PORCENTAJE (%)
INVERSIÓN PROGRAMADA ACUMULADA (1)	$ 202.145.425,25	19,75%
INVERSIÓN EJECUTADA ACUMULADA (2)	$ 255.320.700,81	24,94%
EVALUACIÓN DEL AVANCE (2) - (1)	$ 53.175.275,56	5,19%
Se presenta un atraso en la Obra	$ 53.175.275,56	**5,19%**
ESTADO DE AVANCE EN DÍAS (Retraso)		**1,56**

Se programó la entrega a los respectivos rectores para cuatro instituciones educativas entre las cuales tenemos:

1. Atenas – Sede A.
2. Juan Evangelista Gómez - Sede A.
3. Juana Escobar - Sede B - San Luis.
4. Juana Escobar Sede C - Republica de Canadá II.

Sin embargo se continúa con el atraso en la ejecución de actividades en los frentes tres frentes restantes.

En cuanto a la información presupuestal, se han hecho algunas observaciones a los presupuestos elaborados, falta por incluir algunas actividades en la estructura presupuestal de algunos frentes, por tanto se está a la espera de la remisión de estas programaciones y flujos de inversión actualizados respecto a las actividades a ejecutar en cada frente de obra.

2.3 DESCRIPCION GENERAL.

Las labores ejecutadas durante el lapso comprendido entre el 19 de enero al 9 de febrero y del 26 al 28 de febrero de 2021 , para el mejoramiento y adecuación de las I.E. de la localidad No 4 de San Cristóbal fueron:

2.3.1 Control financiero

Dentro de las actividades de control en el aspecto financiero, esta Interventoría en conjunto con el contratista adelantamos la revisión de las cantidades de obra por Institución educativa, se realizó un cambio en los presupuestos dado que se contaba con recursos en los frentes de obra y se incluyeron nuevas actividades para su ejecución para finalmente realizar el ajuste de los presupuestos ya que por el tipo de contrato que se adelanta el cual contempla el sistema de precios unitarios fijos sin cláusula de reajuste, el valor final del contrato debe mantenerse dentro de lo presupuestado, garantizando que no se deben comprometer más recursos para la ejecución del mismo. De acuerdo a esto se tienen establecidos los presupuestos finales de las 7 Instituciones sin embargo el contratista no los ha remitido con los ajustes solicitados.

Durante este periodo no se radico acta parcial a la fecha se está realizando corte para remitir a la Entidad.

BALANCE FINANCIERO		
VALOR TOTAL DEL CONTRATO DE OBRA:	$	$1.023.694.436,00
VALOR FACTURADO ACTA PARCIAL DE OBRA No 1:	$	60.327.879,00
VALOR FACTURADO ACTA PARCIAL DE OBRA No 2:	$	36.502.706,00
VALOR FACTURADO ACTA PARCIAL DE OBRA No 3:	$	420.298.592,00
SALDO TOTAL DEL CONTRATO DE OBRA:	$	506.565.259,00

2.3.2 Control Técnico

El control técnico que adelanta esta interventoría pretende garantizar la correcta ejecución de las obras en todos los aspectos, entre ellos, verificar que el contratista aplique adecuadamente sus capacidades y recursos, empleando procedimientos de control con los cuales pueda asegurar que la calidad de los resultados será la especificada en los documentos técnicos del contrato.

Para ello se adelanta conjuntamente programas de organización y control de insumos y materiales, con el objeto de garantizar que estos sean de primera calidad. A la fecha se han

realizado varias compras de materiales de los cuales se inspecciona que sean de primera calidad y que cumplan con las especificaciones técnicas.

Se adelanta el control del proceso en el sentido de garantizar que se realicen las actividades de manera secuencial y concatenada para garantizar que no se presenten interrupciones en la producción e interrelación de los procesos constructivos. En este sentido, ha sido consecuente la realización de las actividades preliminares, garantizando que las obras tenga un orden cronológico y adecuado de acometer dentro de cada frente que garantice la continuidad de las obras.

La Interventoría ha elaborado los informes semanales correspondientes a las semanas 23, 24, 25 y 26, período que corresponde a los días en donde se han venido ejecutando las obras previstas en el contrato de obra.

2.3.3 Control Administrativo

Hasta la fecha de elaboración de este informe, la Interventoría ha podido evidenciar varios aspectos importantes para revisar y tomar medidas correctivas o de actualización a saber:

- **Personal disponible:** dentro del equipo de personal se cuenta con un personal de administración y un personal operativo.

INTERVENTORÍA	CARGO	CANT
	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	1
	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	1
	INSPECTORES DE INTERVENTORÍA	2
CONTRATISTA	**CARGO**	**CANT**
	DIRECTOR DE OBRA	1
	RESIDENTES DE OBRA	2
	MAESTRO DE OBRA	1
	OFICIALES	2
	AYUDANTES	20
TOTAL PERSONAL VINCULADO EN OBRA		**30**

- **Personal por incluir:** Se realizó aumento de personal en algunos frentes de obra sin embargo este se debe mantener y realizar aumento en los frentes faltantes.

3. CONTRATO DE INTERVENTORIA.

3.1 INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

CONTRATISTA	CONSORCIO INAR INGENIERIA
CONTRATO No	CO1.PCCNTR.1680516
OBJETO:	GRUPO 10. INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, JURIDICA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRAS DE ADECUACION, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FISICAS, ASI COMO LA ADECUACION Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TERMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO EDUCATIVO.
LUGAR DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO:	LOCALIDAD (4) SAN CRISTOBAL.
CONTRATANTE:	SECRETARIA DE EDUCACIÓN
INTERVENTOR:	CONSORCIO INAR INGENIEROS
PLAZO:	6 MESES
PRORROGA:	3 MESES
PLAZO TOTAL:	9 MESES
VALOR INICIAL:	$ 160.550.040,00
ADICIÓN:	$ 80.275.020,00
VALOR TOTAL:	$ 240.825.060,00
REPRESENTANTE LEGAL:	ING. NATALIA AMADOR BAQUIRO
DIRECCIÓN:	CALLE 98 # 22-64 OFI 603 – EDIFICIO CALLE 100 – BOGOTÁ D.C.
TELEFONO:	2113822 / 312 5850939
CORREO ELECTRONICO:	argsastecnica@gmail.com
SUPERVISIÓN DEL PROYECTO:	ING. JULIETA MERCADO

3.2 INFORMACIÓN GENERAL DE LOS RECURSOS DE LA INTERVENTORÍA

La Interventoría cuenta para el desarrollo de las actividades, con los siguientes recursos:

- **Personal:**

  Director de Interventoría.

  Residente Interventoría.

  Inspectores.

  Especialistas.

- **Equipo:** Los equipos disponibles para atender el contrato de Interventoría comprenden:

  Computadores.

  Impresoras.

  Cámaras Digitales.

3.3 ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR LA INTERVENTORÍA

Durante este periodo de trabajo, la Interventoría desarrollo las siguientes actividades:

3.3.1 Actividades administrativas

- Revisión, acompañamiento y aprobación de los documentos del contrato, programaciones, presupuestos, planes, flujos entre otros, oficios de seguimiento y control a la seguridad industrial del personal operativo.
- Seguimiento en la vinculación y control del personal operativo de obra.
- Permanencia en los frentes donde se iniciaron actividades. (Localidad No 4 San Cristóbal)
- Atención de las diferentes reuniones de coordinación, seguimiento y aclaraciones a las inquietudes del Contratista.
- Atención de la correspondencia solicitada por el Cliente.
- Informes semanales de seguimiento y control presupuestal.
- Balance de cantidades y control presupuestal.
- Registro diario en bitácora de obra.
- Registro fotográfico.

3.3.2 Actividades técnicas

- Revisión de los planos del Proyecto, definición de los parámetros mínimos de diseños a tener en cuenta para el inicio de las actividades en cada frente de trabajo.
- Atención de reuniones solicitadas por el Cliente.
- Revisión de actividades por ejecutar, durante la ejecución y del resultado del producto.
- Seguimiento y control a la ejecución de las actividades por realizar en obra.

3.3.3 Informe financiero de Interventoría

A la fecha esta interventoría realizo la radicación del Acta de costos de Interventoría No 1 respecto al costo fijo, Acta de costos de Interventoría No 2 respecto al costo variable, Acta de costos de Interventoría No 3 respecto al costo fijo, Acta de costos de Interventoría No 4 respecto al costo variable, Acta de costos de Interventoría No 5 respecto al costo fijo, Acta de costos de Interventoría No 6 respecto al costo variable, Acta de costos de Interventoría No 7 respecto al costo fijo y Acta de costos de Interventoría No 8 respecto al costo fijo.

BALANCE FINANCIERO		
VALOR TOTAL DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:	$	160.550.040,00
VALOR ACTA DE COSTOS No 1- COSTO FIJO:	$	13.379.170,00
VALOR ACTA DE COSTOS No 2- COSTO VARIABLE:	$	3.788.980,00
VALOR ACTA DE COSTOS No 3- COSTO FIJO:	$	13.379.170,00
VALOR ACTA DE COSTOS No 4- COSTO VARIABLE:	$	2.292.654,00
VALOR ACTA DE COSTOS No 5- COSTO FIJO:	$	13.379.170,00
VALOR ACTA DE COSTOS No 6- COSTO VARIABLE:	$	26.368.738,00
VALOR ACTA DE COSTOS No 7- COSTO FIJO:	$	13.379.170,00
VALOR ACTA DE COSTOS No 8- COSTO FIJO:	$	13.379.170,00
SALDO TOTAL DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:	$	87.962.158,00

3.3.4 Seguimiento al plan de Bioseguridad

Plan de Bioseguridad		**Cumple**
1.	Entrega de elementos de protección personal para la prevención del Covid 19	Si
2.	Limpieza y desinfección de áreas de trabajo, maquinas, herramientas, vehículos, epp, etc. FOR-SST-040	Si
3.	Instalación de afiches prevención Covid-19	Si
4.	Toma de temperatura a las personas que ingresan a obra.	Si
5.	Cuestionario diario de signos de alarma frente al covid -19 y seguimiento a ausentismo a causa de enfermedad por COVID-19	Si
6.	Lavado de manos cada 3 horas.	Si
7.	Distanciamiento Físico	Si
8.	Uso de Tapabocas	Si

3.3.5 Comités de Seguimiento

Durante el presente periodo se realizaron los siguientes comités virtuales mediante la plataforma zoom:

COMITÉ No	**FECHA**
19	22 de enero de 2021
20	29 de enero de 2021
21	3 de febrero de 2021
22	5 de febrero de 2021
23	6 de febrero de 2021

4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

4.1 ÁREA TÉCNICA

Se siguen presentando atrasos en la entrega de frentes a la fecha se deberían tener los 7 frentes iniciales entregados, si bien es cierto se realizó la prorrogo el contrato esta prórroga es en función de la adición y la intervención para los tres nuevos colegios.

Es preocupante el avance ya que los frentes son abandonados constantemente y se deja de laborar en ellos por semanas, debido a esto no se ha podido terminar y entregar todos las 7 instituciones.

Se ha reiterado la solicitud de un Plan de Contingencia para la terminación de los frentes iniciales pero a la fecha no ha sido entregado.

Esperamos que los tres frentes que faltan por entregar se terminen en el próximo mes para poder culminar el contrato inicial.

La bitácora de obra se diligencia diariamente consignando todos los aspectos técnicos de la obra, el estado del clima y los imprevistos detectados luego de las actividades constructivas.

4.2 ÁREA ADMINISTRATIVA

Durante el periodo documentado, la Interventoría ha verificado el cumplimiento de lo relacionado con las exigencias de personal en todas las áreas y funciones de la obra de acuerdo al pliego de condiciones y la propuesta. Se han realizado los respectivos reportes e informes semanales, recomendaciones técnicas adicionales, control de personal, lo que ha servido para mantener dentro de los márgenes aceptables la correcta ejecución de la obra y garantizando la calidad y estabilidad de la misma, al tiempo que se mitigan riesgos e impactos que podrían ser nocivos para el personal operativo como para la comunidad circundante.

5. ANEXOS

Anexo No 1. Control de personal.

Anexo No 2. Control de Equipos.

Anexo No 3. Control de Seguridad Industrial.

Anexo No 4. Estado del Tiempo.

Anexo No 5. Registro Fotográfico.

Anexo No 6. Libro o Bitácora de Obra.

Anexo No 7. Informes Semanales del Periodo.

Anexo No 8. Relación de Correspondencia Enviada y Recibida.

ANEXO 1.
CONTROL DE PERSONAL.

CONTROL DE PERSONAL COLEGIO JUANA ESCOBAR SEDE B

BOGOTÁ Secretaría de Educación

CONSORCIO INAR INGENIEROS

INFORMACIÓN GENERAL

PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL — PLAZO: **5 MESES**

CONTRATISTA: **MUÑOZ Y HERRERA S.A** — CONTRATO No. **CO1.PCCNTR.1577474**

INTERVENTOR: **CONSORCIO INAR INGENIEROS** — CONTRATO No. **CO1.PCCNTR.1680516**

PERSONAL DEL CONTRATISTA

FECHA	ENERO													FEBRERO																								OBSERVACIONES
	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	
CARGO																																									
INGENIERO DIRECTOR DE OBRA																																									
RESIDENTE DE OBRA	1	1	1	1			1	1	1	1	1	1		1	1	1	1					1																		
PROFESIONAL SISO																																								
MAESTRO DE OBRA																																								
OFICIALES	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		2	1	1	1	1	1																					
AYUDANTES HOMBRES	2	1	1				1	1		1		1		1																										
ELECTRICOS																																								
PERSONAL CONTRATISTA	**4**	**3**	**3**	**2**	**1**		**3**	**3**	**2**	**3**	**2**	**3**		**4**	**2**	**2**	**2**	**1**	**1**			**1**																	**TOTAL PERIODO**	**137**

PROCEDENCIA / CONDICIÓN	MANO DE OBRA LOCAL Y POBLACIÓN VULNERABLE																																					SUMATORIA	PORCENTAJE	CUMPLE S/N
MANO OBRA NO CALIFICADA	**2**	**1**	**1**	**0**	**0**		**1**	**1**	**0**	**1**	**0**	**1**		**1**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**																	**38**	**27,74%**	
De la región	2	1	1	0	0		1	1	0	1	0	1		1	0	0	0	0	0		0	0																	38	27,74%	
De fuera de la región																																							0	0,00%	
MANO OBRA CALIFICADA	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**		**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**		**1**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1**		**0**	**0**																	**47**	**34,31%**	
De la región	1	1	1	1	1		1	1	0	1	1	1		1	0	0	0	0	1		0	0																	46	33,58%	
De fuera de la región																																							0	0,00%	
PROFESIONALES - TÉCNICOS	**1**	**1**	**1**	**1**	**0**		**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**		**2**	**2**	**2**	**2**	**1**	**0**		**0**	**1**																	**50**	**36,50%**	
De la región	1	1	1	1	0		1	1	1	1	1	1		2	2	2	2	1	0		0	1																	50	36,50%	
De fuera de la región																																							0	0,00%	
POBLACIÓN VULNERABLE	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**																	**0**	**0,00%**	
En proceso de reinserción social	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0		0	0																	0	0,00%	
En condición de desplazamiento																																							0	0,00%	
MUJERES	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**																	**0**	**0,00%**	
Mano de Obra no Calificada	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0		0	0																	0	0,00%	
Mano de Obra Calificada																																							0	0,00%	
Profesionales - Técnicos	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0		0	0																	0	0,00%	
PROVEEDORES																																									
Local																																									
Nacional																																									
Internacional																																									

COMENTARIOS DE LA INTERVENTORÍA:

CONTROL DE PERSONAL COLEGIO JUANA ESCOBAR SEDE C

BOGOTÁ Secretaría de Educación

CONSORCIO INAR INGENIEROS

INFORMACIÓN GENERAL

PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL — PLAZO: **5 MESES**

CONTRATISTA: **MUÑOZ Y HERRERA S.A** — CONTRATO No. **CO1.PCCNTR.1577474**

INTERVENTOR: **CONSORCIO INAR INGENIEROS** — CONTRATO No. **CO1.PCCNTR.1680516**

PERSONAL DEL CONTRATISTA

FECHA	ENERO													FEBRERO																									OBSERVACIONES
CARGO	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	
INGENIERO DIRECTOR DE OBRA																																									
RESIDENTE DE OBRA	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1																			
PROFESIONAL SISO																																									
MAESTRO DE OBRA																																									
OFICIALES	1	2	1	2	2		2	2	2	2	1	1		2	2	2	2	2																							
AYUDANTES HOMBRES	2	2	2	2	4		4	3	3	3	3			2	2	2	2	2	2																							
ELECTRICOS																																									
PERSONAL CONTRATISTA	**4**	**5**	**4**	**5**	**7**		**7**	**6**	**6**	**6**	**5**	**2**		**5**	**5**	**5**	**5**	**5**	**3**		**1**	**1**																			**TOTAL PERIODO**	**182**

PROCEDENCIA / CONDICIÓN	MANO DE OBRA LOCAL Y POBLACIÓN VULNERABLE	SUMATORIA	PORCENTAJE	CUMPLE S/N
MANO OBRA NO CALIFICADA		**69**	**37,91%**	
De la región		69	37,91%	
De fuera de la región		0	0,00%	
MANO OBRA CALIFICADA		**62**	**34,07%**	
De la región		62	34,07%	
De fuera de la región		0	0,00%	
PROFESIONALES - TÉCNICOS		**49**	**26,92%**	
De la región		49	26,92%	
De fuera de la región		0	0,00%	
POBLACIÓN VULNERABLE		**0**	**0,00%**	
En proceso de reinserción social		0	0,00%	
En condición de desplazamiento		0	0,00%	
MUJERES		**0**	**0,00%**	
Mano de Obra no Calificada		0	0,00%	
Mano de Obra Calificada		0	0,00%	
Profesionales - Técnicos		0	0,00%	
PROVEEDORES				
Local				
Nacional				
Internacional				

COMENTARIOS DE LA INTERVENTORÍA:

CONTROL DE PERSONAL COLEGIO ATENAS

CONSORCIO INAR INGENIEROS

INFORMACION GENERAL

PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL **19 DE ENERO DE 2021** Y EL **09 DE FEBRERO DE 2021** PLAZO: **5 MESES**

26 DE FEBRERO DE 2021 **28 DE FEBRERO DE 2021**

CONTRATISTA: **MUÑOZ Y HERRERA S.A** CONTRATO No. **CO1.PCCNTR.1577474**

INTERVENTOR: **CONSORCIO INAR INGENIEROS** CONTRATO No. **CO1.PCCNTR.1680516**

PERSONAL DEL CONTRATISTA

FECHA	MES	ENERO												FEBRERO																		OBSERVACIONES
	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9										
CARGO																																
INGENIERO DIRECTOR DE OBRA																																
RESIDENTE DE OBRA	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1										
MAESTRO DE OBRA	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1										
OFICIALES	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1										
AYUDANTES HOMBRES	3	3	3	3	3		3	3	3	3	3	3		2	2	2	2	2	2		2	2										
PERSONAL CONTRATISTA	**6**	**6**	**6**	6	**6**		**6**	**6**	**6**	**6**	6	**6**					**5**	**5**	**5**		**5**	**5**									**TOTAL PERIODO**	**91**

PROCEDENCIA / CONDICIÓN	MANO DE OBRA LOCAL Y POBLACIÓN VULNERABLE																														SUMATORIA	PORCENTAJE	CUMPLE S/N
MANO OBRA NO CALIFICADA	**3**	**3**	**3**	**3**	**3**		**3**	**3**	**3**	**3**	**3**	**3**		**2**	**2**	**2**	**2**	**2**	**2**		**2**	**2**									**49**	**53,85%**	
De la región	3	3	3	3	3		3	3	3	3	3	3		2	2	2	2	2	2		2	2									49	53,85%	
De fuera de la región	0																														0	0,00%	
MANO OBRA CALIFICADA	**2**	**2**	**2**	**2**	**2**		**2**	**2**	**2**	**2**	**2**	**2**		**2**	**2**	**2**	**2**	**2**	**2**		**2**	**2**									**38**	**41,76%**	
De la región	2	2	2	2	2		2	2	2	2	2	2		2	2	2	2	2	2		2	2									38	41,76%	
De fuera de la región																															0	0,00%	
PROFESIONALES - TÉCNICOS	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**		**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**		**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**		**1**	**1**									**19**	**20,88%**	
De la región	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1									19	20,88%	
De fuera de la región																															0	0,00%	
POBLACIÓN VULNERABLE	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**									**0**	**0,00%**	
En proceso de reinserción social	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0		0	0									0	0,00%	
En condición de desplazamiento																															0	0,00%	
MUJERES	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**									**0**	**0,00%**	
Mano de Obra no Calificada	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0		0	0									0	0,00%	
Mano de Obra Calificada																															0	0,00%	
Profesionales - Técnicos	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0		0	0									0	0,00%	
PROVEEDORES																																	
Local																																	
Nacional																																	
Internacional																																	

COMENTARIOS DE LA INTERVENTORÍA:

ACTIVIDADES CULMINADAS SE PROGRAMO ENTREGA DE OBRA.

CONTROL DE PERSONAL COLEGIO JUAN EVANGELISTA

BOGOTÁ Secretaría de Educación

CONSORCIO INAR INGENIEROS

INFORMACION GENERAL

PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL **19 DE ENERO DE 2021** Y EL **09 DE FEBRERO DE 2021** PLAZO: **5 MESES**

26 D FEBRERO DE 2021 **28 DE FEBRERO DE 2021**

CONTRATISTA: **MUÑOZ Y HERRERA S.A** CONTRATO No. **CO1.PCCNTR.1577474**

INTERVENTOR: **CONSORCIO INAR INGENIEROS** CONTRATO No. **CO1.PCCNTR.1680516**

PERSONAL DEL CONTRATISTA

FECHA	MES	ENERO												FEBRERO																	OBSERVACIONES
	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9									
CARGO																															
INGENIERO DIRECTOR DE OBRA																															
RESIDENTE DE OBRA	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1									
MAESTRO DE OBRA	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1									
OFICIALES	2	2	2	2	2		2	2	2	2	2	2		1	1	1	1	1	1		1	1									
AYUDANTES HOMBRES	5	5	5	5	5		5	5	5	5	5	5		5	5	5	5	5	5		5	5									
PERSONAL CONTRATISTA	**9**	**9**	**9**	**9**	**9**	**0**	**9**	**9**	**9**	**9**	**9**	**9**		8	8	8	8	8	8		**8**	**8**								**TOTAL PERIODO**	**163**

PROCEDENCIA / CONDICIÓN	MANO DE OBRA LOCAL Y POBLACIÓN VULNERABLE	SUMATORIA	PORCENTAJE	CUMPLE S/N
MANO OBRA NO CALIFICADA		**95**	**58,28%**	
De la región		95	58,28%	
De fuera de la región		0	0,00%	
MANO OBRA CALIFICADA		**49**	**30,06%**	
De la región		49	30,06%	
De fuera de la región		0	0,00%	
PROFESIONALES - TÉCNICOS		**19**	**11,66%**	
De la región		19	11,66%	
De fuera de la región		0	0,00%	
POBLACIÓN VULNERABLE		**0**	**0,00%**	
En proceso de reinserción social		0	0,00%	
En condición de desplazamiento		0	0,00%	
MUJERES		**0**	**0,00%**	
Mano de Obra no Calificada		0	0,00%	
Mano de Obra Calificada		0	0,00%	
Profesionales - Técnicos		0	0,00%	
PROVEEDORES				
Local				
Nacional				
Internacional				

COMENTARIOS DE LA INTERVENTORÍA:

SE TERMNANA CTIVIDADES EL 9 DE FEBRERO DE 2021. SE PROGRAMA ENTREGA DEL FRENTE.

CONTROL DE PERSONAL COLEGIO ALPES

BOGOTÁ Secretaría de Educación

CONSORCIO INAR INGENIEROS

INFORMACION GENERAL

PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL: 19 DE ENERO DE 2021 Y EL 8 DE FEBRERO DE 2021 PLAZO: 5 MESES

26 DE FEBRERO DE 2021 Y EL 28 DE FEBRERO DE 2021

CONTRATISTA: MUÑOZ Y HERRERA S.A — CONTRATO No. CO1.PCCNTR.1577474

INTERVENTOR: CONSORCIO INAR INGENIEROS — CONTRATO No. CO1.PCCNTR.1680516

PERSONAL DEL CONTRATISTA

FECHA	MES	ENERO												FEBRERO																							OBSERVACIONES
	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	
CARGO																																									
INGENIERO DIRECTOR DE OBRA																																									
RESIDENTE DE OBRA	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1																1	1		
MAESTRO DE OBRA	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1																1	1		
OFICIALES	2	2	2	2	2		2	2	2	2	2	2		2	2	2	2	2	2		1	1																2	2		
AYUDANTES HOMBRES	4	4	4	4	4		2	2	2	2	2	2		5	5	5	5	5	5		1	1																5	5		
PERSONAL CONTRATISTA	**8**		**8**	**8**	**8**		**6**	**6**		**6**	**6**	6					**9**	**9**	**9**		**4**	**4**																**9**	**9**		**TOTAL PERIODO** 115

SUSPENSIÓN

PROCEDENCIA / CONDICIÓN	MANO DE OBRA LOCAL Y POBLACIÓN VULNERABLE																																				SUMATORIA	PORCENTAJE	CUMPLE S/N
MANO OBRA NO CALIFICADA	**4**	**4**	**4**	**4**	**4**		**2**	**2**	**2**	**2**	**2**	**2**		**5**	**5**	**5**	**5**	**5**	**5**		**1**	**1**																	**5**	**5**		**74**	**64,35%**	
De la región	4	4	4	4	4		2	2	2	2	2	2		5	5	5	5	5	5		1	1																	5	5		74	64,35%	
De fuera de la región	0																																							0	0,00%	
MANO OBRA CALIFICADA	**3**	**3**	**3**	**3**	**3**		**3**	**3**	**3**	**3**	**3**	**3**		**3**	**3**	**3**	**3**	**3**	**3**		**2**	**2**																	**3**	**3**		**61**	**53,04%**	
De la región	3	3	3	3	3		3	3	3	3	3	3		3	3	3	3	3	3		2	2																	3	3		61	53,04%	
De fuera de la región																																								0	0,00%	
PROFESIONALES - TÉCNICOS	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**		**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**		**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**		**1**	**1**																	**1**	**1**		**21**	**18,26%**	
De la región	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1																	1	1		21	18,26%	
De fuera de la región																																								0	0,00%	
POBLACIÓN VULNERABLE	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**																	**0**	**0**		**0**	**0,00%**	
En proceso de reinserción social	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0		0	0																	0	0		0	0,00%	
En condición de desplazamiento																																								0	0,00%	
MUJERES	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**																	**0**	**0**		**0**	**0,00%**	
Mano de Obra no Calificada	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0		0	0																	0	0		0	0,00%	
Mano de Obra Calificada																																								0	0,00%	
Profesionales - Técnicos	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0		0	0																	0	0		0	0,00%	
PROVEEDORES																																										
Local																																										
Nacional																																										
Internacional																																										

SUSPENSIÓN

COMENTARIOS DE LA INTERVENTORÍA:

CONTROL DE PERSONAL COLEGIO GRAN COLOMBIA

BOGOTÁ Secretaría de Educación

CONSORCIO INAR INGENIEROS

INFORMACIÓN GENERAL

PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL — PLAZO: **5 MESES**

CONTRATISTA: **MUÑOZ Y HERRERA S.A** — CONTRATO No. **CO1.PCCNTR.1577474**

INTERVENTOR: **CONSORCIO INAR INGENIEROS** — CONTRATO No. **CO1.PCCNTR.1680516**

PERSONAL DEL CONTRATISTA

FECHA	ENERO													FEBRERO																								OBSERVACIONES
	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	
CARGO																																									
INGENIERO DIRECTOR DE OBRA																																									Se recomienda al contratista hacer incremento de personal en este frente de obra para no generar retrasos
RESIDENTE DE OBRA	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1																												
PROFESIONAL SISO																																									Se recomienda el cumplimiento del protocolo de bioseguridad
MAESTRO DE OBRA																																								
OFICIALES	1	1	3	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1			1	1																		
AYUDANTES HOMBRES	2	2	2	2	1		2	1	2	2	2	2		1	1	1	2	3			1	3																		
ELECTRICOS																																								
PERSONAL CONTRATISTA	**4**	**4**	**6**	**4**	**3**		**4**	**3**	**4**	**4**	**4**	**4**		**2**	**2**	**2**	**3**	**4**			**2**	**4**																		

TOTAL PERIODO	158

PROCEDENCIA / CONDICIÓN	MANO DE OBRA LOCAL Y POBLACIÓN VULNERABLE																																				SUMATORIA	PORCENTAJE	CUMPLE S/N
MANO OBRA NO CALIFICADA	**2**	**2**	**2**	**2**	**1**		**2**	**1**	**2**	**2**	**2**	**2**		**1**	**1**	**1**	**2**	**3**	**0**		**1**	**3**															**0**	**0**		**61**	**38,61%**	
De la región	2	2	2	2	1		2	1	2	2	2	2		1	1	1	2	3	0		1	3															0	0		61	38,61%	
De fuera de la región																																							0	0,00%	
MANO OBRA CALIFICADA	**1**	**1**	**3**	**1**	**1**		**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**		**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**0**		**1**	**1**															**0**	**0**		**54**	**34,18%**	
De la región	1	1	3	1	1		1	1	0	1	1	1		1	1	1	1	1	0		1	1															0	0		53	33,54%	
De fuera de la región																																							0	0,00%	
PROFESIONALES - TÉCNICOS	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**		**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**															**0**	**0**		**41**	**25,95%**	
De la región	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		0	0	0	0	0	0		0	0															0	0		41	25,95%	
De fuera de la región																																							0	0,00%	
POBLACIÓN VULNERABLE	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**															**0**	**0**		**0**	**0,00%**	
En proceso de reinserción social	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0		0	0															0	0		0	0,00%	
En condición de desplazamiento																																							0	0,00%	
MUJERES	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**															**0**	**0**		**0**	**0,00%**	
Mano de Obra no Calificada	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0		0	0															0	0		0	0,00%	
Mano de Obra Calificada																																							0	0,00%	
Profesionales - Técnicos	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0		0	0															0	0		0	0,00%	
PROVEEDORES																																									
Local																																									
Nacional																																									
Internacional																																									

COMENTARIOS DE LA INTERVENTORÍA:

Se recomienda al contratista aumentar personal en este frente de obra para no generar retrasos.

CONTROL DE PERSONAL COLEGIO SAN ISIDRO

BOGOTÁ Secretaría de Educación

CONSORCIO INAR INGENIEROS

INFORMACIÓN GENERAL

PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL **19 DE ENERO DE 2021** Y EL **09 DE FEBRERO DE 2021** PLAZO: **5 MESES**

26 DE FEBRERO DE 2021 Y EL **28 DEFEBRERO DE 2021**

CONTRATISTA: **MUÑOZ Y HERRERA S.A** CONTRATO No. **CO1.PCCNTR.1577474**

INTERVENTOR: **CONSORCIO INAR INGENIEROS** CONTRATO No. **CO1.PCCNTR.1680516**

PERSONAL DEL CONTRATISTA

FECHA	MES	ENERO												FEBRERO												OBSERVACIONES
	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	26	27	28	
CARGO																										
INGENIERO DIRECTOR DE OBRA																										
RESIDENTE DE OBRA	0	0	0	0	0		1	1	1	1	1	1		0	0	0	0	0	0		0	0	0	0		
MAESTRO DE OBRA	0	0	0	0	0		1	1	1	1	1	1		0	0	0	0	0	0		0	0	0	0		
OFICIALES	0	0	0	0	0		1	1	1	1	1	1		0	0	0	0	0	0		0	0	0	0		
AYUDANTES HOMBRES	0	0	0	0	0		2	2	2	2	2	2		0	0	0	0	0	0		0	0	0	0		
HORNAMENTADOR	0	0	0	0	0		1	1	1	1	1	1		0	0	0	0	0	0		0	0	0	0		
PERSONAL CONTRATISTA	0	0	0	0	0		**6**	**6**	**6**	**6**	**6**	**6**		0	0	0	0	0	0		0	0	0	0		**TOTAL PERIODO** **36**

SUSPENSIÓN

PROCEDENCIA / CONDICIÓN	MANO DE OBRA LOCAL Y POBLACIÓN VULNERABLE																									SUMATORIA	PORCENTAJE	CUMPLE S/N
MANO OBRA NO CALIFICADA	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**2**	**2**	**2**	**2**	**2**	**2**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**		**12**	**33,33%**	
De la región	0	0	0	0	0		2	2	2	2	2	2		0	0	0	0	0	0		0	0	0	0		12	33,33%	
De fuera de la región																										0	0,00%	
MANO OBRA CALIFICADA	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**3**	**3**	**3**	**3**	**3**	**3**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**		**18**	**50,00%**	
De la región	0	0	0	0	0		3	3	3	3	3	3		0	0	0	0	0	0		0	0	0	0		18	50,00%	
De fuera de la región																										0	0,00%	
PROFESIONALES - TÉCNICOS	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**		**6**	**16,67%**	
De la región	0	0	0	0	0		1	1	1	1	1	1		0	0	0	0	0	0		0	0	0	0		6	16,67%	
De fuera de la región																										0	0,00%	
POBLACIÓN VULNERABLE	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0,00%**	
En proceso de reinserción social	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0		0	0	0	0		0	0,00%	
En condición de desplazamiento																										0	0,00%	
MUJERES	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**		**6**	**16,67%**	
Mano de Obra no Calificada	0	0	0	0	0		1	1	1	1	1	1		0	0	0	0	0	0		0	0	0	0		6	16,67%	
Mano de Obra Calificada																										0	0,00%	
Profesionales - Técnicos	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0		0	0	0	0		0	0,00%	
PROVEEDORES																												
Local																												
Nacional																												
Internacional																												

SUSPENSIÓN

COMENTARIOS DE LA INTERVENTORÍA:

ANEXO 2.
CONTROL DE EQUIPOS.

CONTROL DE MAQUINARIA Y EQUIPOS COLEGIO JUANA ESCOBAR SEDE B

CONSORCIO INAR INGENIEROS

INFORMACIÓN GENERAL

PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL	19 DE ENERO DE 2021 26 DE FEBRERO DE 2021	**Y EL**	9 DEFEBRERO DE 2021 28 DE FEBRERO DE 2021	**FECHA INICIO**	19 DE AGOSTO DE 2020
CONTRATISTA:	MUÑOZ Y HERRERA S.A			**CONTRATO No.**	CO1.PCCNTR.1577474
INTERVENTOR:	CONSORCIO INAR INGENIEROS			**CONTRATO No.**	CO1.PCCNTR.1680516

EQUIPO	PROGRAMADO	UTILIZADO	PROPIO	ALQUILADO	LOCALIZACIÓN	ACTIVIDAD	OBSERVACIONES
TALADRO	SI	SI	X		BATERIAS SANITARIAS DE SOTANO, PISO 1 Y 2	INSTALACION DE DISPENSADORES DE PAPEL, JABONERAS Y DIVISIONES EN ACERO INOXIDABLE	SE VERFICA QUE SE ENCUETREN EN BUENAS CONDICIONES PARA PODER EJECUTAR LAS ACTIVIDADES DE MANERA SEGURA
HERRAMIENTA MENOR	SI	SI	X		BATERIAS SANITARIAS DE SOTANO, PISO 1, PISO 2, CUARTO DE ASEO Y BAÑO DE PROFESORES	AJUSTE DE FUGAS EN LAVAMANOS, INSTALACION DE CERRADURA EN BAÑO DE PROFESORES, INSTALACION DE ESPEJOS	SE VERFICA QUE SE ENCUETREN EN BUENAS CONDICIONES PARA PODER EJECUTAR LAS ACTIVIDADES DE MANERA SEGURA

COMENTARIOS DEL INTERVENTOR: SE OBSERVA QUE LOS TRABAJADORES TIENEN CORRECTA MANIPULACION DE LAS HERRAMIENTAS Y EQUIPOS SUMINISTRADOS, SE VERIFICA QUE LOS TRABAJADORES CUENTEN CON SUS ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL COMPLETOS.

CONTROL DE MAQUINARIA Y EQUIPOS COLEGIO JUANA ESCOBAR SEDE C

CONSORCIO INAR INGENIEROS

INFORMACIÓN GENERAL

PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL	19 DE ENERO DE 2021 26 DE FEBRERO DE 2021	**Y EL**	9 DEFEBRERO DE 2021 28 DE FEBRERO DE 2021	**FECHA INICIO**	19 DE AGOSTO DE 2020
CONTRATISTA:	MUÑOZ Y HERRERA S.A			**CONTRATO No.**	CO1.PCCNTR.1577474
INTERVENTOR:	CONSORCIO INAR INGENIEROS			**CONTRATO No.**	CO1.PCCNTR.1680516

EQUIPO	PROGRAMADO	UTILIZADO	PROPIO	ALQUILADO	LOCALIZACIÓN	ACTIVIDAD	OBSERVACIONES
TALADRO	SI	SI	X		BATERIAS SANITARIAS	INSTALACION DE DISPENSADORES DE PAPEL, JABONERAS Y DIVISIONES EN ACERO INOXIDABLE	SE VERFICA QUE SE ENCUETREN EN BUENAS CONDICIONES PARA PODER EJECUTAR LAS ACTIVIDADES DE MANERA SEGURA
HERRAMIENTA MENOR	SI	SI	X		BATERIAS SANITARIAS , CUARTO DE ASEO Y BAÑO DE PROFESORES	AJUSTE DE FUGAS EN LAVAMANOS, INSTALACION DE CERRADURA EN BAÑO DE PROFESORES, INSTALACION DE ESPEJOS	SE VERFICA QUE SE ENCUETREN EN BUENAS CONDICIONES PARA PODER EJECUTAR LAS ACTIVIDADES DE MANERA SEGURA

COMENTARIOS DEL INTERVENTOR: SE OBSERVA QUE LOS TRABAJADORES TIENEN CORRECTA MANIPULACION DE LAS HERRAMIENTAS Y EQUIPOS SUMINISTRADOS, SE VERIFICA QUE LOS TRABAJADORES CUENTEN CON SUS ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL COMPLETOS.

CONTROL DE MAQUINARIA Y EQUIPOS COLEGIO ATENAS

INFORMACIÓN GENERAL

PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL	19 DE ENERO DE 2020 26 DE FEBRERO DE 2021	**Y EL**	9 DE FEBREO DE 2020 28 DE FEBRERO DE 2021	**FECHA INICIO**	18 DE AGOSTO DE 2020		
CONTRATISTA:	MUÑOZ Y HERRERA S.A					**CONTRATO No.**	CO1.PCCNTR.1577474
INTERVENTOR:	CONSORCIO INAR INGENIEROS					**CONTRATO No.**	CO1.PCCNTR.1680516

EQUIPO	PROGRAMADO	UTILIZADO	PROPIO	ALQUILADO	LOCALIZACIÓN	ACTIVIDAD	OBSERVACIONES
HERRAMIENTA MENOR	SI	SI		X	BAÑOS	SE REALIZA PINTURA PERIMETRALE INTERIOR ,BAÑOS , RECTORIA,CAFETERIA ,CUARTO DE ASEO	

COMENTARIOS DEL INTERVENTOR:

BOGOTÁ Secretaría de Educación

CONTROL DE MAQUINARIA Y EQUIPOS COLEGIO JUNA EVANGELISTA

CONSORCIO INAR INGENIEROS

INFORMACIÓN GENERAL

PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL	19 DE ENERO DE 2021 26 DE FEBRERO DE 2021	**Y EL**	09 DE FEBRERO DE 2020 28 DE FEBRERO DE 2021	**FECHA INICIO**	18 AGOTO DE 2020		
CONTRATISTA:	MUÑOZ Y HERRERA S.A					**CONTRATO No.**	CO1.PCCNTR.1577474
INTERVENTOR:	CONSORCIO INAR INGENIEROS					**CONTRATO No.**	CO1.PCCNTR.1680516

EQUIPO	PROGRAMADO	UTILIZADO	PROPIO	ALQUILADO	LOCALIZACIÓN	ACTIVIDAD	OBSERVACIONES
HERRAMIENTA MENOR	SI	SI			AULAS DEL BLOQUE C	INSTALACION DE GUARDA ESCOBAS ,PINTURA ,DETALLES FINALES	SE VERIFICA QUE CUENTA CON EL MATERIAL Y ELEMENTOS DE PROTECCIO PERSONAL
BRILLADORA DESTROCNCADORA MARMOL	SI	SI		X	AULAS DEL BLOQUE C	BRILLO PISO MARMOL	SE VERIFICA QUE CUENTA CON EL MATERIAL Y ELEMENTOS DE PROTECCIO PERSONAL

COMENTARIOS DEL INTERVENTOR: SE OBSERVA QUE LOS TRABAJADORES TIENEN CORRECTA MANIPULACION DE LAS HERRAMIENTAS Y EQUIPOS SUMINISTRADOS, SE VERIFICA QUE LOS TRABAJADORES CUENTEN CON SUS ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL COMPLETOS.

BOGOTÁ
Secretaría de Educación

CONTROL DE MAQUINARIA Y EQUIPOS COLEGIO ALPES

CONSORCIO INAR INGENIEROS

INFORMACIÓN GENERAL

PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL	19 DE ENERO DE 2021	**Y EL**	8 DE FEBRERO DE 2021	**FECHA INICIO**	18 DE AGOSTO DE 2020		
	26 DEFEBREO DE 2021	**Y EL**	28 DE FEBRERO DE 2021				
CONTRATISTA:	MUÑOZ Y HERRERA S.A					**CONTRATO No.**	CO1.PCCNTR.1577474
INTERVENTOR:	CONSORCIO INAR INGENIEROS					**CONTRATO No.**	CO1.PCCNTR.1680516

EQUIPO	PROGRAMADO	UTILIZADO	PROPIO	ALQUILADO	LOCALIZACIÓN	ACTIVIDAD	OBSERVACIONES
HERRAMIENTA MENOR	SI	SI	X		BAÑOS	PAÑETE , ENCHAPE,PISO ,APARATOS SANITARIOS, MESONES	
HERRAMIENTA MENOR	SI	SI	X		CANCHA , CARCAMO	MANTENIEMIENTO CANCHA Y CARCAMO	

COMENTARIOS DEL INTERVENTOR:

CONTROL DE MAQUINARIA Y EQUIPOS COLEGIO GRAN COLOMBIA

CONSORCIO INAR INGENIEROS

INFORMACIÓN GENERAL

PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL	19 DE ENERO DE 2021 26 DE FEBRERO DE 2021	**Y EL**	9 DEFEBRERO DE 2021 28 D FEBRERO DE 2021	**FECHA INICIO**	18 DE AGOSTO DE 2020
CONTRATISTA:	MUÑOZ Y HERRERA S.A			**CONTRATO No.**	CO1.PCCNTR.1577474
INTERVENTOR:	CONSORCIO INAR INGENIEROS			**CONTRATO No.**	CO1.PCCNTR.1680516

EQUIPO	PROGRAMADO	UTILIZADO	PROPIO	ALQUILADO	LOCALIZACIÓN	ACTIVIDAD	OBSERVACIONES
PULIDORAS	SI	SI	X		PARTE EXTERIOR DE LA INSTITUCION EDUCATIVA	CORTE DE PLACA DE CONCRETO Y CONTE DE HIERRO	SE VERFICAN LAS CONEXIONES DE ENERGIA PARA PODER EJECUTAR LAS ACTIVIDADES DE MANERA SEGURA
HERRAMIENTA MENOR	SI	SI	X		ZONA DE JUEGOS - PARTE TRASERA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA	PAÑETE Y DESCAPOTE	SE VERFICA QUE SE ENCUETREN EN BUENAS CONDICIONES PARA PODER EJECUTAR LAS ACTIVIDADES DE MANERA SEGURA

COMENTARIOS DEL INTERVENTOR: SE OBSERVA QUE LOS TRABAJADORES TIENEN CORRECTA MANIPULACION DE LAS HERRAMIENTAS Y EQUIPOS SUMINISTRADOS, SE VERIFICA QUE LOS TRABAJADORES CUENTEN CON SUS ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL COMPLETOS.

BOGOTÁ
Secretaría de Educación

CONTROL DE MAQUINARIA Y EQUIPOS COLEGIO SAN ISIDRO

CONSORCIO INAR INGENIEROS

INFORMACIÓN GENERAL

PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL	19 DE ENERO DE 2021	**Y EL**	09 DE FEBRERO DE 2021	**FECHA INICIO**	18 DE AGOSTO DE 2021		
	26 DEFEBRERO DE 2021	**Y EL**	28 DE FEBRERO DE 2021				
CONTRATISTA:	MUÑOZ Y HERRERA S.A					**CONTRATO No.**	CO1.PCCNTR.1577474
INTERVENTOR:	CONSORCIO INAR INGENIEROS					**CONTRATO No.**	CO1.PCCNTR.1680516

EQUIPO	PROGRAMADO	UTILIZADO	PROPIO	ALQUILADO	LOCALIZACIÓN	ACTIVIDAD	OBSERVACIONES
HERRAMIENTA MENOR	SI	SI		X	TERMINADA DE CERCHAS	CERCHAS EN ESTRUCTURA METALICA CONSTRUIDAS EN SITIO	
HERRAMIENTA MENOR	SI	SI	X		INICIO EXCABACION CARCAMO	EXCAVACION PARA CARCAMO COSTADO DE LA CANCHA	

COMENTARIOS DEL INTERVENTOR:

ANEXO 3.
CONTROL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL.

BOGOTÁ Secretaría de Educación	**CONTROL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL** **COLEGIO JUANA ESCOBAR SEDEB B**	CONSORCIO INAR INGENIEROS

TIPO DE CONTRATO:	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, JURIDICA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRAS DE ADECUACION, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FISICAS, ASÍ´COMO LA ADECUACIO´N Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TE´RMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO					
NÚMERO DE CONTRATO:	CO1.PCCNTR.1577474	**PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL**	19/01/2021	**Y EL**	09/02/2021	
			26/02/2021		28/02/2021	
CONTRATISTA:	MUÑOZ Y HERRERA S.A					
INTERVENTOR:	CONSORCIO INAR INGENIEROS					

DESCRIPCIÓN	ESTADO		OBSERVACIONES
	Bueno	Deficiente	
MAQUINARIA - EQUIPO			
- Estado del equipo	X		TODOS LOS EQUIPOS CON QUE SE CUENTAN ESTAN EN BUENAS CONDICIONES MECANICAS.
- Regularidad del mantenimiento	X		
- Vibraciones /Ruidos	X		
- Protecciones / Guardas / Frenos	X		
- Idoneidad operarios	X		
DOTACIÓN CAMPAMENTO			
- Dotación completa			
- Buen estado			
- Fácil acceso y operación	X		
DOTACIÓN DEL PERSONAL			
- Dotación completa	X		EL PERSONAL CUENTA CON TODOS LOS ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL COMO: CASCO, OVEROL, BOTAS, MONO GAFAS, TAPA BOCAS, GUANTES, ETC.
- Buen estado	X		
- Uso según zona de trabajo	X		
SEÑALIZACIÓN, DEMARCACIÓN, ILUMINACIÓN			
- Uso permanente	X		
- Uso según zona de trabajo	X		
VIGILANCIA			
- Personal suficiente			
- Diurna	X		EXISTE PERSONAL DE VIGILANCIA
- Nocturna	X		EXISTE PERSONAL DE VIGILANCIA
EMERGENCIAS			
- Convenio centro de asistencia			N.A.
- Afiliación del Personal al Sistema de seguridad social y ARP		X	TODO EL PERSONAL SE ENCUENTRA AFILIADO A LA EPS Y ARP SEGUN SOPORTES ENTREGADOS POR EL RESIDENTE DEL CONTRATISTA.

Comentario del interventor: DURANTE EL PERIODO SE HICIERON VARIAS OBSERVACIONES DEL USO DE LOS ELEMENTOS DE DOTACIÓN Y LAS SEÑALIZACIONES PREVENTIVAS Y PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD.

BOGOTÁ Secretaría de Educación	**CONTROL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL** **COLEGIO JUANA ESCOBAR SEDE C**	CONSORCIO INAR INGENIEROS

TIPO DE CONTRATO:	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, JURIDICA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRAS DE ADECUACION, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FISICAS, ASÍ´COMO LA ADECUACIO´N Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TE´RMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO					
NÚMERO DE CONTRATO:	CO1.PCCNTR.1577474	**PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL**	19/01/2021	**Y EL**	09/02/2021	
			26/02/2021		28/02/2021	
CONTRATISTA:	MUÑOZ Y HERRERA S.A					
INTERVENTOR:	CONSORCIO INAR INGENIEROS					

DESCRIPCIÓN	ESTADO		OBSERVACIONES
	Bueno	Deficiente	
MAQUINARIA - EQUIPO			
- Estado del equipo	X		TODOS LOS EQUIPOS CON QUE SE CUENTAN ESTAN EN BUENAS CONDICIONES MECANICAS.
- Regularidad del mantenimiento	X		
- Vibraciones /Ruidos	X		
- Protecciones / Guardas / Frenos	X		
- Idoneidad operarios	X		
DOTACIÓN CAMPAMENTO			
- Dotación completa			
- Buen estado			
- Fácil acceso y operación	X		
DOTACIÓN DEL PERSONAL			
- Dotación completa	X		EL PERSONAL CUENTA CON TODOS LOS ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL COMO: CASCO, OVEROL, BOTAS, MONO GAFAS, TAPA BOCAS, GUANTES, ETC.
- Buen estado	X		
- Uso según zona de trabajo	X		
SEÑALIZACIÓN, DEMARCACIÓN, ILUMINACIÓN			
- Uso permanente	X		
- Uso según zona de trabajo	X		
VIGILANCIA			
- Personal suficiente			
- Diurna	X		EXISTE PERSONAL DE VIGILANCIA
- Nocturna	X		EXISTE PERSONAL DE VIGILANCIA
EMERGENCIAS			
- Convenio centro de asistencia			N.A.
- Afiliación del Personal al Sistema de seguridad social y ARP		X	TODO EL PERSONAL SE ENCUENTRA AFILIADO A LA EPS Y ARP SEGUN SOPORTES ENTREGADOS POR EL RESIDENTE DEL CONTRATISTA.

Comentario del interventor: DURANTE EL PERIODO SE HICIERON VARIAS OBSERVACIONES DEL USO DE LOS ELEMENTOS DE DOTACIÓN Y LAS SEÑALIZACIONES PREVENTIVAS Y PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD.

CONTROL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL COLEGIO ATENAS

TIPO DE CONTRATO:	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, JURIDICA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRAS DE ADECUACION, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FISICAS, ASI'COMO LA ADECUACIO'N Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TE'RMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO				
NÚMERO DE CONTRATO:	CO1.PCCNTR.1577474	**PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL**	19 DE ENERO DE 2021	**Y EL**	09/02/2021
			26 DE FEBRERO DE 2021		28/02/2021
CONTRATISTA:	MUÑOZ Y HERRERA S.A				
INTERVENTOR:	CONSORCIO INAR INGENIEROS				

DESCRIPCIÓN	ESTADO		OBSERVACIONES
	Bueno	Deficiente	
MAQUINARIA - EQUIPO			
- Estado del equipo	X		
- Regularidad del mantenimiento	X		
- Vibraciones /Ruidos	X		
- Protecciones / Guardas / Frenos	X		
- Idoneidad operarios	X		
DOTACIÓN CAMPAMENTO			
- Dotación completa	X		SE ENCUENTRA CON TODA SU DOTACION
- Buen estado	X		
- Fácil acceso y operación	X		
DOTACIÓN DEL PERSONAL			
- Dotación completa	X		EL PERSONAL CUENTA CON TODOS LOS ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL COMO: CASCO, OVEROL, BOTAS, MONO GAFAS, TAPA BOCAS, GUANTES, ETC.
- Buen estado	X		
- Uso según zona de trabajo	X		
SEÑALIZACIÓN, DEMARCACIÓN, ILUMINACIÓN			
- Uso permanente	X		SE TIENE SEÑALIZADO Y DEMARCADO CUALQUIER CLASE DE RIESGO EN LA OBRA
- Uso según zona de trabajo	X		
VIGILANCIA			
- Personal suficiente			
- Diurna			N.A
- Nocturna			N.A
EMERGENCIAS			
- Convenio centro de asistencia			N.A.
- Afiliación del Personal al Sistema de seguridad social y ARP	X		TODO EL PERSONAL SE ENCUENTRA AFILIADO A LA EPS Y ARP SEGUN SOPORTES ENTREGADOS POR LA SISO DEL CONTRATISTA.

Comentario del interventor:

CONTROL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL
COLEGIO JUAN EVANGELISTA

CONSORCIO INAR INGENIEROS

TIPO DE CONTRATO:	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, JURIDICA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRAS DE ADECUACION, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FISICAS, ASI'COMO LA ADECUACIO'N Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TE'RMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO				
NÚMERO DE CONTRATO:	CO1.PCCNTR.1577474	**PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL**	19 DE ENERO DE 2021	**Y EL**	09/02/2021
			26 DE FEBRERO DE 2021		28/02/2021
CONTRATISTA:	MUÑOZ Y HERRERA S.A				
INTERVENTOR:	CONSORCIO INAR INGENIEROS				

DESCRIPCIÓN	ESTADO		OBSERVACIONES
	Bueno	Deficiente	
MAQUINARIA - EQUIPO			
- Estado del equipo	X		
- Regularidad del mantenimiento	X		
- Vibraciones /Ruidos	X		
- Protecciones / Guardas / Frenos	X		
- Idoneidad operarios	X		
DOTACIÓN CAMPAMENTO			
- Dotación completa	X		SE ENCUENTRA CON TODA SU DOTACION
- Buen estado	X		
- Fácil acceso y operación	X		
DOTACIÓN DEL PERSONAL			
- Dotación completa	X		EL PERSONAL CUENTA CON TODOS LOS ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL COMO: CASCO, OVEROL, BOTAS, MONO GAFAS, TAPA BOCAS, GUANTES, ETC.
- Buen estado	X		
- Uso según zona de trabajo	X		
SEÑALIZACIÓN, DEMARCACIÓN, ILUMINACIÓN			
- Uso permanente	X		SE TIENE SEÑALIZADO Y DEMARCADO CUALQUIER CLASE DE RIESGO EN LA OBRA
- Uso según zona de trabajo	X		
VIGILANCIA			
- Personal suficiente			
- Diurna			N.A
- Nocturna			N.A
EMERGENCIAS			
- Convenio centro de asistencia			N.A.
- Afiliación del Personal al Sistema de seguridad social y ARP	X		TODO EL PERSONAL SE ENCUENTRA AFILIADO A LA EPS Y ARP SEGUN SOPORTES ENTREGADOS POR LA SISO DEL CONTRATISTA.

Comentario del interventor:

CONTROL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL COLEGIO ALPES

CONSORCIO INAR INGENIEROS

TIPO DE CONTRATO:	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, JURIDICA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRAS DE ADECUACION, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FISICAS, ASI'COMO LA ADECUACIO´N Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TE´RMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO				
NÚMERO DE CONTRATO:	CO1.PCCNTR.1577474	**PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL**	19 DE ENERO DE 2021	**Y EL**	09/02/2021
			26 DE FEBRERO DE 2021	**Y EL**	28/02/2021
CONTRATISTA:	MUÑOZ Y HERRERA S.A				
INTERVENTOR:	CONSORCIO INAR INGENIEROS				

DESCRIPCIÓN	ESTADO		OBSERVACIONES
	Bueno	Deficiente	
MAQUINARIA - EQUIPO			
- Estado del equipo	X		
- Regularidad del mantenimiento	X		
- Vibraciones /Ruidos	X		
- Protecciones / Guardas / Frenos	X		
- Idoneidad operarios	X		
DOTACIÓN CAMPAMENTO			
- Dotación completa	X		SE ENCUENTRA CON TODA SU DOTACION
- Buen estado	X		
- Fácil acceso y operación	X		
DOTACIÓN DEL PERSONAL			
- Dotación completa	X		EL PERSONAL CUENTA CON TODOS LOS ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL COMO: CASCO, OVEROL, BOTAS, MONO GAFAS, TAPA BOCAS, GUANTES, ETC.
- Buen estado	X		
- Uso según zona de trabajo	X		
SEÑALIZACIÓN, DEMARCACIÓN, ILUMINACIÓN			
- Uso permanente	X		SE TIENE SEÑALIZADO Y DEMARCADO CUALQUIER CLASE DE RIESGO EN LA OBRA
- Uso según zona de trabajo	X		
VIGILANCIA			
- Personal suficiente			
- Diurna			N.A
- Nocturna			N.A
EMERGENCIAS			
- Convenio centro de asistencia			N.A.
- Afiliación del Personal al Sistema de seguridad social y ARP	X		TODO EL PERSONAL SE ENCUENTRA AFILIADO A LA EPS Y ARP SEGUN SOPORTES ENTREGADOS POR LA SISO DEL CONTRATISTA.

Comentario del interventor:

BOGOTÁ Secretaría de Educación	**CONTROL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL** **COLEGIO GRAN COLOMBIA**	CONSORCIO INAR INGENIEROS

TIPO DE CONTRATO:	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, JURIDICA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRAS DE ADECUACION, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FISICAS, ASÍ´COMO LA ADECUACIO´N Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TE´RMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO					
NÚMERO DE CONTRATO:	CO1.PCCNTR.1577474	**PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL**	19/01/2021	**Y EL**	09/02/2021	
			26/02/2021		28/02/2021	
CONTRATISTA:	MUÑOZ Y HERRERA S.A					
INTERVENTOR:	CONSORCIO INAR INGENIEROS					

DESCRIPCIÓN	ESTADO		OBSERVACIONES
	Bueno	Deficiente	
MAQUINARIA - EQUIPO			
- Estado del equipo	X		TODOS LOS EQUIPOS CON QUE SE CUENTAN ESTAN EN BUENAS CONDICIONES MECANICAS.
- Regularidad del mantenimiento	X		
- Vibraciones /Ruidos	X		
- Protecciones / Guardas / Frenos	X		
- Idoneidad operarios	X		
DOTACIÓN CAMPAMENTO			
- Dotación completa			
- Buen estado			
- Fácil acceso y operación	X		
DOTACIÓN DEL PERSONAL			
- Dotación completa	X		EL PERSONAL CUENTA CON TODOS LOS ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL COMO: CASCO, OVEROL, BOTAS, MONO GAFAS, TAPA BOCAS, GUANTES, ETC.
- Buen estado	X		
- Uso según zona de trabajo	X		
SEÑALIZACIÓN, DEMARCACIÓN, ILUMINACIÓN			
- Uso permanente	X		
- Uso según zona de trabajo	X		
VIGILANCIA			
- Personal suficiente			
- Diurna	X		EXISTE PERSONAL DE VIGILANCIA
- Nocturna	X		EXISTE PERSONAL DE VIGILANCIA
EMERGENCIAS			
- Convenio centro de asistencia			N.A.
- Afiliación del Personal al Sistema de seguridad social y ARP		X	TODO EL PERSONAL SE ENCUENTRA AFILIADO A LA EPS Y ARP SEGUN SOPORTES ENTREGADOS POR EL RESIDENTE DEL CONTRATISTA.

Comentario del interventor: DURANTE EL PERIODO SE HICIERON VARIAS OBSERVACIONES DEL USO DE LOS ELEMENTOS DE DOTACIÓN Y LAS SEÑALIZACIONES PREVENTIVAS Y PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD.

BOGOTÁ Secretaría de Educación	**CONTROL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL COLEGIO SAN ISIDRO**	CONSORCIO INAR INGENIEROS

TIPO DE CONTRATO:	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, JURIDICA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRAS DE ADECUACION, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FISICAS, ASI´COMO LA ADECUACIO´N Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TE´RMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO					
NÚMERO DE CONTRATO:	CO1.PCCNTR.1577474	**PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL**	19 DE ENERO DE 2021	**Y EL**	09/02/2021
			26 DE FEBRERODE 2021	**Y EL**	28/02/2021
CONTRATISTA:	MUÑOZ Y HERRERA S.A				
INTERVENTOR:	CONSORCIO INAR INGENIEROS				

DESCRIPCIÓN	ESTADO		OBSERVACIONES
	Bueno	Deficiente	
MAQUINARIA - EQUIPO			
- Estado del equipo	X		
- Regularidad del mantenimiento	X		
- Vibraciones /Ruidos	X		
- Protecciones / Guardas / Frenos	X		
- Idoneidad operarios	X		
DOTACIÓN CAMPAMENTO			
- Dotación completa	X		SE ENCUENTRA CON TODA SU DOTACION
- Buen estado	X		
- Fácil acceso y operación	X		
DOTACIÓN DEL PERSONAL			
- Dotación completa	X		EL PERSONAL CUENTA CON TODOS LOS ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL COMO: CASCO, OVEROL, BOTAS, MONO GAFAS, TAPA BOCAS, GUANTES, ETC.
- Buen estado	X		
- Uso según zona de trabajo	X		
SEÑALIZACIÓN, DEMARCACIÓN, ILUMINACIÓN			
- Uso permanente	X		SE TIENE SEÑALIZADO Y DEMARCADO CUALQUIER CLASE DE RIESGO EN LA OBRA
- Uso según zona de trabajo	X		
VIGILANCIA			
- Personal suficiente			
- Diurna			N.A
- Nocturna			N.A
EMERGENCIAS			
- Convenio centro de asistencia			N.A.
- Afiliación del Personal al Sistema de seguridad social y ARP	X		TODO EL PERSONAL SE ENCUENTRA AFILIADO A LA EPS Y ARP SEGUN SOPORTES ENTREGADOS POR LA SISO DEL CONTRATISTA.

Comentario del interventor:

ANEXO 4.
ESTADO DEL TIEMPO.

BOGOTÁ
Secretaría de Educación

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA Nº 06
INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, JURIDICA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRAS DE ADECUACION, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FISICAS, ASI´COMO LA ADECUACIO´N Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TE´RMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO

INFORMACION METEOROLOGICA COLEGIO JUANA ESCOBAR SEDE B

CONSORCIO INAR INGENIEROS

FECHA	SOLEADO	NUBLADO	LLUVIOSO	HORARIO PRECIPITACION	INTENSIDAD	HORARIO LABORAL AFECTADO	NUMERO DE HORAS
19 de enero de 2021	x						
20 de enero de 2021	x						
21 de enero de 2021	x						
22 de enero de 2021	x						
23 de enero de 2021	X						
24 de enero de 2021							
25 de enero de 2021	X						
26 de enero de 2021	X						
27 de enero de 2021	x						
28 de enero de 2021	x						
29 de enero de 2021	x						
30 de enero de 2021	x						
31 de enero de 2021							
1 de febrero de 2021	X						
2 de febrero de 2021	X						
3 de febrero de 2021	x						
4 de febrero de 2021	x						
5 de febrero de 2021	X						
6 de febrero de 2021	x						
7 de febrero de 2021							
8 de febrero de 2021	x						
9 de febrero de 2021	X						
10 de febrero de 2021	**SUSPENSIÓN**						
11 de febrero de 2021							
12 de febrero de 2021							
13 de febrero de 2021							
14 de febrero de 2021							
15 de febrero de 2021							
16 de febrero de 2021							
17 de febrero de 2021							
18 de febrero de 2021							
19 de febrero de 2021							
20 de febrero de 2021							
21 de febrero de 2021							
22 de febrero de 2021							
23 de febrero de 2021							
24 de febrero de 2021							
25 de febrero de 2021							
26 de febrero de 2021							
27 de febrero de 2021							
28 de febrero de 2021							

BOGOTÁ
Secretaría de Educación

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA Nº 06
INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, JURIDICA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRAS DE ADECUACION, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FISICAS, ASI´COMO LA ADECUACIO´N Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TE´RMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO

INFORMACION METEOROLOGICA COLEGIO JUANA ESCOBAR SEDE C

CONSORCIO INAR INGENIEROS

FECHA	SOLEADO	NUBLADO	LLUVIOSO	HORARIO PRECIPITACION	INTENSIDAD	HORARIO LABORAL AFECTADO	NUMERO DE HORAS
19 de enero de 2021	x						
20 de enero de 2021	x						
21 de enero de 2021	x						
22 de enero de 2021	x						
23 de enero de 2021	X						
24 de enero de 2021							
25 de enero de 2021	X						
26 de enero de 2021	X						
27 de enero de 2021	x						
28 de enero de 2021	x						
29 de enero de 2021	x						
30 de enero de 2021	x						
31 de enero de 2021							
1 de febrero de 2021	X						
2 de febrero de 2021	X						
3 de febrero de 2021	x						
4 de febrero de 2021	x						
5 de febrero de 2021	X						
6 de febrero de 2021	x						
7 de febrero de 2021							
8 de febrero de 2021	x						
9 de febrero de 2021	X						
10 de febrero de 2021	**SUSPENSIÓN**						
11 de febrero de 2021							
12 de febrero de 2021							
13 de febrero de 2021							
14 de febrero de 2021							
15 de febrero de 2021							
16 de febrero de 2021							
17 de febrero de 2021							
18 de febrero de 2021							
19 de febrero de 2021							
20 de febrero de 2021							
21 de febrero de 2021							
22 de febrero de 2021							
23 de febrero de 2021							
24 de febrero de 2021							
25 de febrero de 2021							
26 de febrero de 2021							
27 de febrero de 2021							
28 de febrero de 2021							

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA Nº 06
INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, JURIDICA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRAS DE ADECUACION, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FISICAS, ASI´COMO LA ADECUACIO´N Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TE´RMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO

INFORMACION METEOROLOGICA COLEGIO ATENAS

CONSORCIO INAR INGENIEROS

FECHA	SOLEADO	NUBLADO	LLUVIOSO	HORARIO PRECIPITACION	INTENSIDAD	HORARIO LABORAL AFECTADO	NUMERO DE HORAS
19 de enero de 2021	x						
20 de enero de 2021	x						
21 de enero de 2021	x						
22 de enero de 2021	x						
23 de enero de 2021	x						
24 de enero de 2021							
25 de enero de 2021	x						
26 de enero de 2021	x						
27 de enero de 2021	x						
28 de enero de 2021	x						
29 de enero de 2021	x						
30 de enero de 2021	x						
31 de enero de 2021							
1 de febrero de 2021	x						
2 de febrero de 2021	x						
3 de febrero de 2021	x						
4 de febrero de 2021	x						
5 de febrero de 2021	x						
6 de febrero de 2021	x						
7 de febrero de 2021							
8 de febrero de 2021	x						
9 de febrero de 2021	x						

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA Nº 06
INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, JURIDICA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRAS DE ADECUACION, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FISICAS, ASI´COMO LA ADECUACIO´N Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TE´RMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO

INFORMACION METEOROLOGICA COLEGIO JUAN EVANGELISTA

CONSORCIO INAR INGENIEROS

FECHA	SOLEADO	NUBLADO	LLUVIOSO	HORARIO PRECIPITACION	INTENSIDAD	HORARIO LABORAL AFECTADO	NUMERO DE HORAS
19 de enero de 2021	X						
20 de enero de 2021	X						
21 de enero de 2021	X						
22 de enero de 2021	X						
23 de enero de 2021	X						
24 de enero de 2021							
25 de enero de 2021	X						
26 de enero de 2021	X						
27 de enero de 2021	X						
28 de enero de 2021	X						
29 de enero de 2021	X						
30 de enero de 2021	X						
31 de enero de 2021							
1 de febrero de 2021	X						
2 de febrero de 2021	X						
3 de febrero de 2021	X						
4 de febrero de 2021	X						
5 de febrero de 2021	X						
6 de febrero de 2021	X						
7 de febrero de 2021							
8 de febrero de 2021	X						
9 de febrero de 2021	X						
10 de febrero de 2021	SUSPENSIÓN						
11 de febrero de 2021							
12 de febrero de 2021							
13 de febrero de 2021							
14 de febrero de 2021							
15 de febrero de 2021							
16 de febrero de 2021							
17 de febrero de 2021							
18 de febrero de 2021							
19 de febrero de 2021							
20 de febrero de 2021							
21 de febrero de 2021							
22 de febrero de 2021							
23 de febrero de 2021							
24 de febrero de 2021							
25 de febrero de 2021							
26 de febrero de 2021							
27 de febrero de 2021							
28 de febrero de 2021							

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA Nº 06
INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, JURIDICA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRAS DE ADECUACION, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FISICAS, ASI´COMO LA ADECUACIO´N Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TE´RMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO

INFORMACION METEOROLOGICA COLEGIO ALPES

CONSORCIO INAR INGENIEROS

FECHA	SOLEADO	NUBLADO	LLUVIOSO	HORARIO PRECIPITACION	INTENSIDAD	HORARIO LABORAL AFECTADO	NUMERO DE HORAS
19 de enero de 2021	X						
20 de enero de 2021	X						
21 de enero de 2021	X						
22 de enero de 2021	X						
23 de enero de 2021	X						
24 de enero de 2021							
25 de enero de 2021	X						
26 de enero de 2021	X						
27 de enero de 2021	X						
28 de enero de 2021	X						
29 de enero de 2021	X						
30 de enero de 2021	X						
31 de enero de 2021							
1 de febrero de 2021	X						
2 de febrero de 2021	X						
3 de febrero de 2021	X						
4 de febrero de 2021	X						
5 de febrero de 2021	X						
6 de febrero de 2021	X						
7 de febrero de 2021							
8 de febrero de 2021	X						
9 de febrero de 2021	X						
10 de febrero de 2021	SUSPENSIÓN						
11 de febrero de 2021							
12 de febrero de 2021							
13 de febrero de 2021							
14 de febrero de 2021							
15 de febrero de 2021							
16 de febrero de 2021							
17 de febrero de 2021							
18 de febrero de 2021							
19 de febrero de 2021							
20 de febrero de 2021							
21 de febrero de 2021							
22 de febrero de 2021							
23 de febrero de 2021							
24 de febrero de 2021							
25 de febrero de 2021							
26 de febrero de 2021	X						
27 de febrero de 2021	X						
28 de febrero de 2021							

BOGOTÁ
Secretaría de Educación

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA Nº 06
INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, JURIDICA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRAS DE ADECUACION, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FISICAS, ASI´COMO LA ADECUACIO´N Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TE´RMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO

CONSORCIO INAR INGENIEROS

INFORMACION METEOROLOGICA

FECHA	SOLEADO	NUBLADO	LLUVIOSO	HORARIO PRECIPITACION	INTENSIDAD	HORARIO LABORAL AFECTADO	NUMERO DE HORAS
19 de enero de 2021	x						
20 de enero de 2021	x						
21 de enero de 2021	x						
22 de enero de 2021	x						
23 de enero de 2021	X						
24 de enero de 2021							
25 de enero de 2021		x					
26 de enero de 2021		x					
27 de enero de 2021	x						
28 de enero de 2021	x						
29 de enero de 2021	x						
30 de enero de 2021	x						
31 de enero de 2021							
1 de febrero de 2021		x					
2 de febrero de 2021	X						
3 de febrero de 2021	x						
4 de febrero de 2021	x	x					
5 de febrero de 2021		x					
6 de febrero de 2021	x						
7 de febrero de 2021							
8 de febrero de 2021	x						
9 de febrero de 2021	X						
10 de febrero de 2021	SUSPENSIÓN						
11 de febrero de 2021							
12 de febrero de 2021							
13 de febrero de 2021							
14 de febrero de 2021							
15 de febrero de 2021							
16 de febrero de 2021							
17 de febrero de 2021							
18 de febrero de 2021							
19 de febrero de 2021							
20 de febrero de 2021							
21 de febrero de 2021							
22 de febrero de 2021							
23 de febrero de 2021							
24 de febrero de 2021							
25 de febrero de 2021							
26 de febrero de 2021	x						
27 de febrero de 2021	x						
28 de febrero de 2021							

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA Nº 06
INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, JURIDICA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRAS DE ADECUACION, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FISICAS, ASI´COMO LA ADECUACIO´N Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TE´RMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO

INFORMACION METEOROLOGICA COLEGIO SAN ISIDRO

CONSORCIO INAR INGENIEROS

FECHA	SOLEADO	NUBLADO	LLUVIOSO	HORARIO PRECIPITACION	INTENSIDAD	HORARIO LABORAL AFECTADO	NUMERO DE HORAS
19 de enero de 2021	X						
20 de enero de 2021	X						
21 de enero de 2021	X						
22 de enero de 2021	X						
23 de enero de 2021	X						
24 de enero de 2021							
25 de enero de 2021	X						
26 de enero de 2021	X						
27 de enero de 2021	X						
28 de enero de 2021	X						
29 de enero de 2021	X						
30 de enero de 2021	X						
31 de enero de 2021							
1 de febrero de 2021	X						
2 de febrero de 2021	X						
3 de febrero de 2021	X						
4 de febrero de 2021	X						
5 de febrero de 2021	X						
6 de febrero de 2021	X						
7 de febrero de 2021							
8 de febrero de 2021	X						
9 de febrero de 2021	**SUSPENSIÓN**						
10 de febrero de 2021							
11 de febrero de 2021							
12 de febrero de 2021							
13 de febrero de 2021							
14 de febrero de 2021							
15 de febrero de 2021							
16 de febrero de 2021							
17 de febrero de 2021							
18 de febrero de 2021							
19 de febrero de 2021							
20 de febrero de 2021							
21 de febrero de 2021							
22 de febrero de 2021							
23 de febrero de 2021							
24 de febrero de 2021							
25 de febrero de 2021							
26 de febrero de 2021	X						
27 de febrero de 2021	X						
28 de febrero de 2021							

ANEXO 5.
REGISTRO FOTOGRAFICO.

BOGOTA Secretaría de Educación	**REGISTRO FOTOGRÁFICOMENSUAL No 6**	CONSORCIO INAR INGENIEROS

NOMBRE DEL PROYECTO:	"INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, JURIDICA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRAS DE ADECUACION, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FISICAS, ASI´COMO LA ADECUACIO´N Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TE´RMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO".
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	LOCALIDAD 4 SAN CRISTOBAL
CONTRATISTA:	MUÑOZ Y HERRERA S.A
CONTRATO No.:	CO1.PCCNTR.1577474
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	DEL 19 DE ENERO AL 9 DE FEBRERO DE 2021. DEL 26 AL 28 DE FEBRERO DE 2021.

INSTITUCIÓN EDUCATIVA JUANA ESCOBAR SEDE B



INSTALACION DE LAVAMOS

BOGOTA Secretaría de Educación	**REGISTRO FOTOGRÁFICOMENSUAL No 6**	CONSORCIO INAR INGENIEROS

NOMBRE DEL PROYECTO:	"INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, JURIDICA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRAS DE ADECUACION, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FISICAS, ASI´COMO LA ADECUACIO´N Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TE´RMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO".
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	LOCALIDAD 4 SAN CRISTOBAL
CONTRATISTA:	MUÑOZ Y HERRERA S.A
CONTRATO No.:	CO1.PCCNTR.1577474
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	DEL 19 DE ENERO AL 9 DE FEBRERO DE 2021. DEL 26 AL 28 DE FEBRERO DE 2021.



INSTALACION DE ORINALES

BOGOTA Secretaría de Educación	**REGISTRO FOTOGRÁFICOMENSUAL No 6**	CONSORCIO INAR INGENIEROS

NOMBRE DEL PROYECTO:	"INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, JURIDICA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRAS DE ADECUACION, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FISICAS, ASI´COMO LA ADECUACIO´N Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TE´RMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO".
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	LOCALIDAD 4 SAN CRISTOBAL
CONTRATISTA:	MUÑOZ Y HERRERA S.A
CONTRATO No.:	CO1.PCCNTR.1577474
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	DEL 19 DE ENERO AL 9 DE FEBRERO DE 2021. DEL 26 AL 28 DE FEBRERO DE 2021.



INSTALACION DE JABONERAS

BOGOTA Secretaría de Educación	**REGISTRO FOTOGRÁFICOMENSUAL No 6**	CONSORCIO INAR INGENIEROS

NOMBRE DEL PROYECTO:	"INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, JURIDICA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRAS DE ADECUACION, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FISICAS, ASI´COMO LA ADECUACIO´N Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TE´RMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO".
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	LOCALIDAD 4 SAN CRISTOBAL
CONTRATISTA:	MUÑOZ Y HERRERA S.A
CONTRATO No.:	CO1.PCCNTR.1577474
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	DEL 19 DE ENERO AL 9 DE FEBRERO DE 2021. DEL 26 AL 28 DE FEBRERO DE 2021.



INSTALACION DE SECADORES

BOGOTA Secretaría de Educación	**REGISTRO FOTOGRÁFICOMENSUAL No 6**	CONSORCIO INAR INGENIEROS


NOMBRE DEL PROYECTO:	"INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, JURIDICA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRAS DE ADECUACION, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FISICAS, ASI´COMO LA ADECUACIO´N Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TE´RMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO".
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	LOCALIDAD 4 SAN CRISTOBAL
CONTRATISTA:	MUÑOZ Y HERRERA S.A
CONTRATO No.:	CO1.PCCNTR.1577474
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	DEL 19 DE ENERO AL 9 DE FEBRERO DE 2021. DEL 26 AL 28 DE FEBRERO DE 2021.



PULIDA DE GRANITO

BOGOTA Secretaría de Educación	**REGISTRO FOTOGRÁFICOMENSUAL No 6**	CONSORCIO INAR INGENIEROS

NOMBRE DEL PROYECTO:	"INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, JURIDICA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRAS DE ADECUACION, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FISICAS, ASI´COMO LA ADECUACIO´N Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TE´RMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO".
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	LOCALIDAD 4 SAN CRISTOBAL
CONTRATISTA:	MUÑOZ Y HERRERA S.A
CONTRATO No.:	CO1.PCCNTR.1577474
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	DEL 19 DE ENERO AL 9 DE FEBRERO DE 2021. DEL 26 AL 28 DE FEBRERO DE 2021.

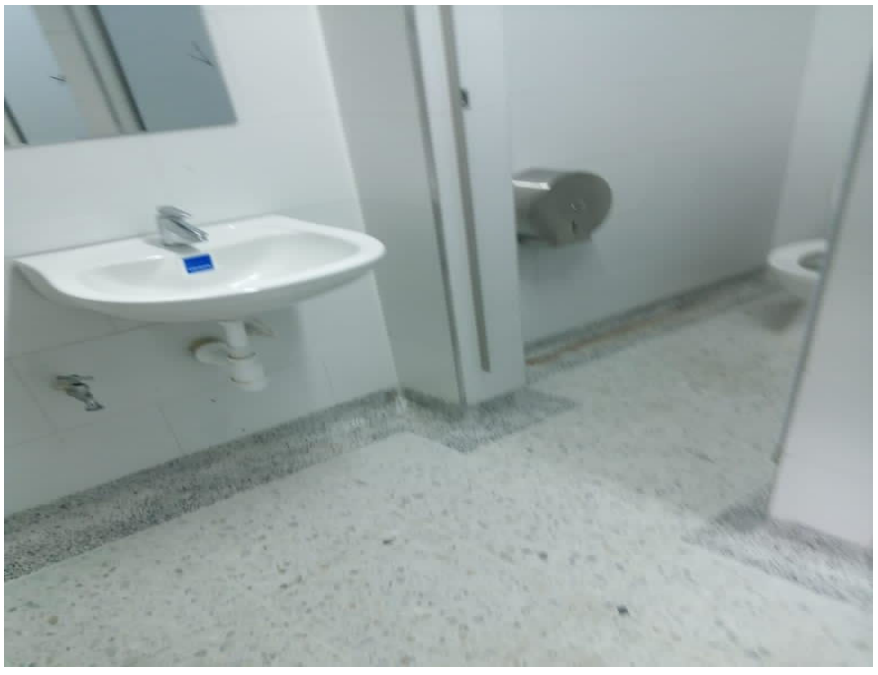

INSTALACION DE DISPENSADOR DE PAPEL

BOGOTA Secretaría de Educación	**REGISTRO FOTOGRÁFICOMENSUAL No 6**	CONSORCIO INAR INGENIEROS

NOMBRE DEL PROYECTO:	"INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, JURIDICA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRAS DE ADECUACION, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FISICAS, ASI´COMO LA ADECUACIO´N Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TE´RMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO".
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	LOCALIDAD 4 SAN CRISTOBAL
CONTRATISTA:	MUÑOZ Y HERRERA S.A
CONTRATO No.:	CO1.PCCNTR.1577474
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	DEL 19 DE ENERO AL 9 DE FEBRERO DE 2021. DEL 26 AL 28 DE FEBRERO DE 2021.



INSTALACION DE ESPEJOS

BOGOTA Secretaría de Educación	**REGISTRO FOTOGRÁFICOMENSUAL No 6**	CONSORCIO INAR INGENIEROS

NOMBRE DEL PROYECTO:	"INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, JURIDICA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRAS DE ADECUACION, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FISICAS, ASI´COMO LA ADECUACIO´N Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TE´RMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO".
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	LOCALIDAD 4 SAN CRISTOBAL
CONTRATISTA:	MUÑOZ Y HERRERA S.A
CONTRATO No.:	CO1.PCCNTR.1577474
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	DEL 19 DE ENERO AL 9 DE FEBRERO DE 2021. DEL 26 AL 28 DE FEBRERO DE 2021.

INSTITUCIÓN EDUCATIVA JUANA ESCOBAR SEDE C



INSTALACION DE PUERTAS

BOGOTA Secretaría de Educación	**REGISTRO FOTOGRÁFICOMENSUAL No 6**	CONSORCIO INAR INGENIEROS

NOMBRE DEL PROYECTO:	"INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, JURIDICA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRAS DE ADECUACION, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FISICAS, ASI´COMO LA ADECUACIO´N Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TE´RMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO".
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	LOCALIDAD 4 SAN CRISTOBAL
CONTRATISTA:	MUÑOZ Y HERRERA S.A
CONTRATO No.:	CO1.PCCNTR.1577474
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	DEL 19 DE ENERO AL 9 DE FEBRERO DE 2021. DEL 26 AL 28 DE FEBRERO DE 2021.



DIVISIONES EN ACERO INOXIDABLE

BOGOTA Secretaría de Educación	**REGISTRO FOTOGRÁFICOMENSUAL No 6**	CONSORCIO INAR INGENIEROS

NOMBRE DEL PROYECTO:	"INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, JURIDICA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRAS DE ADECUACION, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FISICAS, ASI´COMO LA ADECUACIO´N Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TE´RMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO".
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	LOCALIDAD 4 SAN CRISTOBAL
CONTRATISTA:	MUÑOZ Y HERRERA S.A
CONTRATO No.:	CO1.PCCNTR.1577474
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	DEL 19 DE ENERO AL 9 DE FEBRERO DE 2021. DEL 26 AL 28 DE FEBRERO DE 2021.



INSTALACION DE LAVAMANOS

BOGOTA Secretaría de Educación	**REGISTRO FOTOGRÁFICOMENSUAL No 6**	CONSORCIO INAR INGENIEROS

NOMBRE DEL PROYECTO:	"INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, JURIDICA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRAS DE ADECUACION, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FISICAS, ASI´COMO LA ADECUACIO´N Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TE´RMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO".
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	LOCALIDAD 4 SAN CRISTOBAL
CONTRATISTA:	MUÑOZ Y HERRERA S.A
CONTRATO No.:	CO1.PCCNTR.1577474
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	DEL 19 DE ENERO AL 9 DE FEBRERO DE 2021. DEL 26 AL 28 DE FEBRERO DE 2021.



PINTURA INTERIOR

BOGOTA Secretaría de Educación	**REGISTRO FOTOGRÁFICOMENSUAL No 6**	CONSORCIO INAR INGENIEROS

NOMBRE DEL PROYECTO:	"INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, JURIDICA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRAS DE ADECUACION, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FISICAS, ASI´COMO LA ADECUACIO´N Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TE´RMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO".
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	LOCALIDAD 4 SAN CRISTOBAL
CONTRATISTA:	MUÑOZ Y HERRERA S.A
CONTRATO No.:	CO1.PCCNTR.1577474
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	DEL 19 DE ENERO AL 9 DE FEBRERO DE 2021. DEL 26 AL 28 DE FEBRERO DE 2021.



PINTURA DE FACHADA Y VENTANERIA

BOGOTA Secretaría de Educación	**REGISTRO FOTOGRÁFICOMENSUAL No 6**	CONSORCIO INAR INGENIEROS

NOMBRE DEL PROYECTO:	"INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, JURIDICA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRAS DE ADECUACION, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FISICAS, ASI´COMO LA ADECUACIO´N Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TE´RMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO".
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	LOCALIDAD 4 SAN CRISTOBAL
CONTRATISTA:	MUÑOZ Y HERRERA S.A
CONTRATO No.:	CO1.PCCNTR.1577474
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	DEL 19 DE ENERO AL 9 DE FEBRERO DE 2021. DEL 26 AL 28 DE FEBRERO DE 2021.

INSTITUCIÓN EDUCATIVA GRAN COLOMBIA



INSTALACION DE BARANDA INTERNA

BOGOTA Secretaría de Educación	**REGISTRO FOTOGRÁFICOMENSUAL No 6**	CONSORCIO INAR INGENIEROS

NOMBRE DEL PROYECTO:	"INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, JURIDICA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRAS DE ADECUACION, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FISICAS, ASI´COMO LA ADECUACIO´N Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TE´RMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO".
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	LOCALIDAD 4 SAN CRISTOBAL
CONTRATISTA:	MUÑOZ Y HERRERA S.A
CONTRATO No.:	CO1.PCCNTR.1577474
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	DEL 19 DE ENERO AL 9 DE FEBRERO DE 2021. DEL 26 AL 28 DE FEBRERO DE 2021.



ACTIVIDAD DE PAÑETE

BOGOTA Secretaría de Educación	**REGISTRO FOTOGRÁFICOMENSUAL No 6**	CONSORCIO INAR INGENIEROS

NOMBRE DEL PROYECTO:	"INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, JURIDICA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRAS DE ADECUACION, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FISICAS, ASI´COMO LA ADECUACIO´N Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TE´RMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO".
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	LOCALIDAD 4 SAN CRISTOBAL
CONTRATISTA:	MUÑOZ Y HERRERA S.A
CONTRATO No.:	CO1.PCCNTR.1577474
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	DEL 19 DE ENERO AL 9 DE FEBRERO DE 2021. DEL 26 AL 28 DE FEBRERO DE 2021.



BARANDA EXTERNA

BOGOTA Secretaría de Educación	**REGISTRO FOTOGRÁFICOMENSUAL No 6**	CONSORCIO INAR INGENIEROS

NOMBRE DEL PROYECTO:	"INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, JURIDICA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRAS DE ADECUACION, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FISICAS, ASI´COMO LA ADECUACIO´N Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TE´RMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO".
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	LOCALIDAD 4 SAN CRISTOBAL
CONTRATISTA:	MUÑOZ Y HERRERA S.A
CONTRATO No.:	CO1.PCCNTR.1577474
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	DEL 19 DE ENERO AL 9 DE FEBRERO DE 2021. DEL 26 AL 28 DE FEBRERO DE 2021.



INSTALACION DE TUBERIA DE 6"

BOGOTA Secretaría de Educación	**REGISTRO FOTOGRÁFICOMENSUAL No 6**	CONSORCIO INAR INGENIEROS

NOMBRE DEL PROYECTO:	"INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, JURIDICA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRAS DE ADECUACION, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FISICAS, ASI´COMO LA ADECUACIO´N Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TE´RMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO".
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	LOCALIDAD 4 SAN CRISTOBAL
CONTRATISTA:	MUÑOZ Y HERRERA S.A
CONTRATO No.:	CO1.PCCNTR.1577474
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	DEL 19 DE ENERO AL 9 DE FEBRERO DE 2021. DEL 26 AL 28 DE FEBRERO DE 2021.



INSTALACION DE BAJANTE

BOGOTA Secretaría de Educación	**REGISTRO FOTOGRÁFICOMENSUAL No 6**	CONSORCIO INAR INGENIEROS

NOMBRE DEL PROYECTO:	"INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, JURIDICA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRAS DE ADECUACION, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FISICAS, ASI´COMO LA ADECUACIO´N Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TE´RMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO".
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	LOCALIDAD 4 SAN CRISTOBAL
CONTRATISTA:	MUÑOZ Y HERRERA S.A
CONTRATO No.:	CO1.PCCNTR.1577474
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	DEL 19 DE ENERO AL 9 DE FEBRERO DE 2021. DEL 26 AL 28 DE FEBRERO DE 2021.



LIMPIEZA CAJAS DE INSPECCION

BOGOTA Secretaría de Educación	**REGISTRO FOTOGRÁFICOMENSUAL No 6**	CONSORCIO INAR INGENIEROS

NOMBRE DEL PROYECTO:	"INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, JURIDICA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRAS DE ADECUACION, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FISICAS, ASI´COMO LA ADECUACIO´N Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TE´RMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO".
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	LOCALIDAD 4 SAN CRISTOBAL
CONTRATISTA:	MUÑOZ Y HERRERA S.A
CONTRATO No.:	CO1.PCCNTR.1577474
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	DEL 19 DE ENERO AL 9 DE FEBRERO DE 2021. DEL 26 AL 28 DE FEBRERO DE 2021.



CONSTRUCCION DE CAÑUELA

BOGOTA Secretaría de Educación	**REGISTRO FOTOGRÁFICOMENSUAL No 6**	CONSORCIO INAR INGENIEROS

NOMBRE DEL PROYECTO:	"INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, JURIDICA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRAS DE ADECUACION, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FISICAS, ASI´COMO LA ADECUACIO´N Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TE´RMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO".
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	LOCALIDAD 4 SAN CRISTOBAL
CONTRATISTA:	MUÑOZ Y HERRERA S.A
CONTRATO No.:	CO1.PCCNTR.1577474
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	DEL 19 DE ENERO AL 9 DE FEBRERO DE 2021. DEL 26 AL 28 DE FEBRERO DE 2021.



CONSTRUCCION CAJA DE INSPECCION

BOGOTA Secretaría de Educación	**REGISTRO FOTOGRÁFICOMENSUAL No 6**	CONSORCIO INAR INGENIEROS

NOMBRE DEL PROYECTO:	"INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, JURIDICA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRAS DE ADECUACION, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FISICAS, ASI´COMO LA ADECUACIO´N Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TE´RMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO".
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	LOCALIDAD 4 SAN CRISTOBAL
CONTRATISTA:	MUÑOZ Y HERRERA S.A
CONTRATO No.:	CO1.PCCNTR.1577474
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	DEL 19 DE ENERO AL 9 DE FEBRERO DE 2021. DEL 26 AL 28 DE FEBRERO DE 2021.



LIMPIEZA DE JUEGOS INFANTIL

BOGOTA Secretaría de Educación	**REGISTRO FOTOGRÁFICOMENSUAL No 6** **COLEGIO ATENAS**	CONSORCIO INAR INGENIEROS

NOMBRE DEL PROYECTO:	"INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, JURIDICA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRAS DE ADECUACION, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FISICAS, ASI´COMO LA ADECUACIO´N Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TE´RMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO".
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	LOCALIDAD 4 SAN CRISTOBAL
CONTRATISTA:	MUÑOZ Y HERRERA S.A
CONTRATO No.:	CO1.PCCNTR.1577474
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	DEL 19 DE ENERO AL 09 DE FEBRERO DE 2020. DEL 26 AL 28 DE FEBRERO DE 2021.

CUBIERTA ONDULADA HALL



BOGOTA Secretaría de Educación	**REGISTRO FOTOGRÁFICOMENSUAL No 6** **COLEGIO ATENAS**	CONSORCIO INAR INGENIEROS

NOMBRE DEL PROYECTO:	"INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, JURIDICA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRAS DE ADECUACION, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FISICAS, ASI´COMO LA ADECUACIO´N Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TE´RMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO".
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	LOCALIDAD 4 SAN CRISTOBAL
CONTRATISTA:	MUÑOZ Y HERRERA S.A
CONTRATO No.:	CO1.PCCNTR.1577474
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	DEL 19 DE ENERO AL 09 DE FEBRERO DE 2020. DEL 26 AL 28 DE FEBRERO DE 2021.

CUBIERTA HALL



BOGOTA Secretaría de Educación	**REGISTRO FOTOGRÁFICOMENSUAL No 6** **COLEGIO ATENAS**	CONSORCIO INAR INGENIEROS

NOMBRE DEL PROYECTO:	"INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, JURIDICA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRAS DE ADECUACION, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FISICAS, ASI´COMO LA ADECUACIO´N Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TE´RMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO".
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	LOCALIDAD 4 SAN CRISTOBAL
CONTRATISTA:	MUÑOZ Y HERRERA S.A
CONTRATO No.:	CO1.PCCNTR.1577474
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	DEL 19 DE ENERO AL 09 DE FEBRERO DE 2020. DEL 26 AL 28 DE FEBRERO DE 2021.

CUBIERTA TIPO SANDWICHS



BOGOTA Secretaría de Educación	**REGISTRO FOTOGRÁFICOMENSUAL No 6** **COLEGIO ATENAS**	CONSORCIO INAR INGENIEROS

NOMBRE DEL PROYECTO:	"INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, JURIDICA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRAS DE ADECUACION, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FISICAS, ASI´COMO LA ADECUACIO´N Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TE´RMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO".
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	LOCALIDAD 4 SAN CRISTOBAL
CONTRATISTA:	MUÑOZ Y HERRERA S.A
CONTRATO No.:	CO1.PCCNTR.1577474
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	DEL 19 DE ENERO AL 09 DE FEBRERO DE 2020. DEL 26 AL 28 DE FEBRERO DE 2021.

CUBIERTA TIPO SANDWICHS



BOGOTA Secretaría de Educación	**REGISTRO FOTOGRÁFICOMENSUAL No 6** **COLEGIO ATENAS**	CONSORCIO INAR INGENIEROS

NOMBRE DEL PROYECTO:	"INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, JURIDICA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRAS DE ADECUACION, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FISICAS, ASI´COMO LA ADECUACIO´N Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TE´RMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO".
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	LOCALIDAD 4 SAN CRISTOBAL
CONTRATISTA:	MUÑOZ Y HERRERA S.A
CONTRATO No.:	CO1.PCCNTR.1577474
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	DEL 19 DE ENERO AL 09 DE FEBRERO DE 2020. DEL 26 AL 28 DE FEBRERO DE 2021.

PINTURA EXTERIOR FACHADAS



BOGOTA Secretaría de Educación	**REGISTRO FOTOGRÁFICOMENSUAL No 6** **COLEGIO ATENAS**	CONSORCIO INAR INGENIEROS

NOMBRE DEL PROYECTO:	"INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, JURIDICA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRAS DE ADECUACION, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FISICAS, ASI´COMO LA ADECUACIO´N Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TE´RMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO".
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	LOCALIDAD 4 SAN CRISTOBAL
CONTRATISTA:	MUÑOZ Y HERRERA S.A
CONTRATO No.:	CO1.PCCNTR.1577474
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	DEL 19 DE ENERO AL 09 DE FEBRERO DE 2020. DEL 26 AL 28 DE FEBRERO DE 2021.

PINTURA EXTERIOR FACHADAS



BOGOTA Secretaría de Educación	**REGISTRO FOTOGRÁFICOMENSUAL No 6** **COLEGIO JUAN EVANGELISTA**	CONSORCIO INAR INGENIEROS

NOMBRE DEL PROYECTO:	"INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, JURIDICA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRAS DE ADECUACION, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FISICAS, ASI´COMO LA ADECUACIO´N Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TE´RMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO".
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	LOCALIDAD 4 SAN CRISTOBAL
CONTRATISTA:	MUÑOZ Y HERRERA S.A
CONTRATO No.:	CO1.PCCNTR.1577474
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	DEL 19 DE ENERO AL 09 DE FEBRERO DE 2021. DEL 26 AL 28 DE FEBRERO DE 2021.

DETALLES DE PINTURA Y SALONES TERMINADOS



BOGOTA Secretaría de Educación	**REGISTRO FOTOGRÁFICOMENSUAL No 6** **COLEGIO JUAN EVANGELISTA**	CONSORCIO INAR INGENIEROS

NOMBRE DEL PROYECTO:	"INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, JURIDICA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRAS DE ADECUACION, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FISICAS, ASI´COMO LA ADECUACIO´N Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TE´RMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO".
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	LOCALIDAD 4 SAN CRISTOBAL
CONTRATISTA:	MUÑOZ Y HERRERA S.A
CONTRATO No.:	CO1.PCCNTR.1577474
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	DEL 19 DE ENERO AL 09 DE FEBRERO DE 2021. DEL 26 AL 28 DE FEBRERO DE 2021.

DETALLES DE PINTURA Y SALONES TERMINADOS



BOGOTA Secretaría de Educación	**REGISTRO FOTOGRÁFICOMENSUAL No 6** **COLEGIO JUAN EVANGELISTA**	CONSORCIO INAR INGENIEROS

NOMBRE DEL PROYECTO:	"INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, JURIDICA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRAS DE ADECUACION, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FISICAS, ASI´COMO LA ADECUACIO´N Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TE´RMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO".
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	LOCALIDAD 4 SAN CRISTOBAL
CONTRATISTA:	MUÑOZ Y HERRERA S.A
CONTRATO No.:	CO1.PCCNTR.1577474
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	DEL 19 DE ENERO AL 09 DE FEBRERO DE 2021. DEL 26 AL 28 DE FEBRERO DE 2021.

DETALLES DE PINTURA Y SALONES TERMINADOS



BOGOTA Secretaría de Educación	**REGISTRO FOTOGRÁFICOMENSUAL No 6** **COLEGIO JUAN EVANGELISTA**	CONSORCIO INAR INGENIEROS

NOMBRE DEL PROYECTO:	"INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, JURIDICA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRAS DE ADECUACION, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FISICAS, ASI´COMO LA ADECUACIO´N Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TE´RMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO".
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	LOCALIDAD 4 SAN CRISTOBAL
CONTRATISTA:	MUÑOZ Y HERRERA S.A
CONTRATO No.:	CO1.PCCNTR.1577474
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	DEL 19 DE ENERO AL 09 DE FEBRERO DE 2021. DEL 26 AL 28 DE FEBRERO DE 2021.

DETALLES DE PINTURA Y SALONES TERMINADOS



BOGOTA Secretaría de Educación	**REGISTRO FOTOGRÁFICOMENSUAL No 6** **COLEGIO JUAN EVANGELISTA**	CONSORCIO INAR INGENIEROS

NOMBRE DEL PROYECTO:	"INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, JURIDICA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRAS DE ADECUACION, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FISICAS, ASI´COMO LA ADECUACIO´N Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TE´RMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO".
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	LOCALIDAD 4 SAN CRISTOBAL
CONTRATISTA:	MUÑOZ Y HERRERA S.A
CONTRATO No.:	CO1.PCCNTR.1577474
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	DEL 19 DE ENERO AL 09 DE FEBRERO DE 2021. DEL 26 AL 28 DE FEBRERO DE 2021.

LAVADO DE FACHADA EXTERIOR Y LIMPIEZA



BOGOTA Secretaría de Educación	**REGISTRO FOTOGRÁFICOMENSUAL No 6** **COLEGIO JUAN EVANGELISTA**	CONSORCIO INAR INGENIEROS

NOMBRE DEL PROYECTO:	"INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, JURIDICA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRAS DE ADECUACION, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FISICAS, ASI´COMO LA ADECUACIO´N Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TE´RMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO".
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	LOCALIDAD 4 SAN CRISTOBAL
CONTRATISTA:	MUÑOZ Y HERRERA S.A
CONTRATO No.:	CO1.PCCNTR.1577474
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	DEL 19 DE ENERO AL 09 DE FEBRERO DE 2021. DEL 26 AL 28 DE FEBRERO DE 2021.

LAVADO DE FACHADA EXTERIOR Y LIMPIEZA



BOGOTA Secretaría de Educación	**REGISTRO FOTOGRÁFICOMENSUAL No 6** **COLEGIO JUAN EVANGELISTA**	CONSORCIO INAR INGENIEROS

NOMBRE DEL PROYECTO:	"INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, JURIDICA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRAS DE ADECUACION, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FISICAS, ASI´COMO LA ADECUACIO´N Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TE´RMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO".
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	LOCALIDAD 4 SAN CRISTOBAL
CONTRATISTA:	MUÑOZ Y HERRERA S.A
CONTRATO No.:	CO1.PCCNTR.1577474
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	DEL 19 DE ENERO AL 09 DE FEBRERO DE 2021. DEL 26 AL 28 DE FEBRERO DE 2021.

LAVADO DE FACHADA EXTERIOR Y LIMPIEZA



BOGOTA Secretaría de Educación	**REGISTRO FOTOGRÁFICOMENSUAL No 6** **COLEGIO JUAN EVANGELISTA**	CONSORCIO INAR INGENIEROS

NOMBRE DEL PROYECTO:	"INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, JURIDICA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRAS DE ADECUACION, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FISICAS, ASI´COMO LA ADECUACIO´N Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TE´RMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO".
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	LOCALIDAD 4 SAN CRISTOBAL
CONTRATISTA:	MUÑOZ Y HERRERA S.A
CONTRATO No.:	CO1.PCCNTR.1577474
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	DEL 19 DE ENERO AL 09 DE FEBRERO DE 2021. DEL 26 AL 28 DE FEBRERO DE 2021.

FACHADA TERMINADA



BOGOTA Secretaría de Educación	**REGISTRO FOTOGRÁFICOMENSUAL No 6** **COLEGIO ALPES**	CONSORCIO INAR INGENIEROS

NOMBRE DEL PROYECTO:	"INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, JURIDICA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRAS DE ADECUACION, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FISICAS, ASI´COMO LA ADECUACIO´N Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TE´RMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO".
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	LOCALIDAD 4 SAN CRISTOBAL
CONTRATISTA:	MUÑOZ Y HERRERA S.A
CONTRATO No.:	CO1.PCCNTR.1577474
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	DEL 19 DE ENERO AL 08 DE FEBRERO DE 2021. DEL 26 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2021.

REDES HIDRO SANITARIAS



BOGOTA Secretaría de Educación	**REGISTRO FOTOGRÁFICOMENSUAL No 6** **COLEGIO ALPES**	CONSORCIO INAR INGENIEROS

NOMBRE DEL PROYECTO:	"INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, JURIDICA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRAS DE ADECUACION, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FISICAS, ASI´COMO LA ADECUACIO´N Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TE´RMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO".
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	LOCALIDAD 4 SAN CRISTOBAL
CONTRATISTA:	MUÑOZ Y HERRERA S.A
CONTRATO No.:	CO1.PCCNTR.1577474
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	DEL 19 DE ENERO AL 08 DE FEBRERO DE 2021. DEL 26 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2021.

REDES HIDROSANITARIAS



BOGOTA Secretaría de Educación	**REGISTRO FOTOGRÁFICOMENSUAL No 6** **COLEGIO ALPES**	CONSORCIO INAR INGENIEROS

NOMBRE DEL PROYECTO:	"INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, JURIDICA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRAS DE ADECUACION, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FISICAS, ASI´COMO LA ADECUACIO´N Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TE´RMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO".
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	LOCALIDAD 4 SAN CRISTOBAL
CONTRATISTA:	MUÑOZ Y HERRERA S.A
CONTRATO No.:	CO1.PCCNTR.1577474
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	DEL 19 DE ENERO AL 08 DE FEBRERO DE 2021. DEL 26 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2021.

PAÑETES



BOGOTA Secretaría de Educación	**REGISTRO FOTOGRÁFICOMENSUAL No 6** **COLEGIO ALPES**	CONSORCIO INAR INGENIEROS

NOMBRE DEL PROYECTO:	"INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, JURIDICA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRAS DE ADECUACION, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FISICAS, ASI´COMO LA ADECUACIO´N Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TE´RMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO".
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	LOCALIDAD 4 SAN CRISTOBAL
CONTRATISTA:	MUÑOZ Y HERRERA S.A
CONTRATO No.:	CO1.PCCNTR.1577474
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	DEL 19 DE ENERO AL 08 DE FEBRERO DE 2021. DEL 26 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2021.

PAÑETES



BOGOTA Secretaría de Educación	**REGISTRO FOTOGRÁFICOMENSUAL No 6** **COLEGIO ALPES**	CONSORCIO INAR INGENIEROS

NOMBRE DEL PROYECTO:	"INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, JURIDICA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRAS DE ADECUACION, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FISICAS, ASI´COMO LA ADECUACIO´N Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TE´RMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO".
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	LOCALIDAD 4 SAN CRISTOBAL
CONTRATISTA:	MUÑOZ Y HERRERA S.A
CONTRATO No.:	CO1.PCCNTR.1577474
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	DEL 19 DE ENERO AL 08 DE FEBRERO DE 2021. DEL 26 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2021.

PISO MARMOL Y MEDIACAÑA



BOGOTA Secretaría de Educación	**REGISTRO FOTOGRÁFICOMENSUAL No 6** **COLEGIO ALPES**	CONSORCIO INAR INGENIEROS

NOMBRE DEL PROYECTO:	"INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, JURIDICA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRAS DE ADECUACION, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FISICAS, ASI´COMO LA ADECUACIO´N Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TE´RMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO".
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	LOCALIDAD 4 SAN CRISTOBAL
CONTRATISTA:	MUÑOZ Y HERRERA S.A
CONTRATO No.:	CO1.PCCNTR.1577474
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	DEL 19 DE ENERO AL 08 DE FEBRERO DE 2021. DEL 26 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2021.

PISO EN MARMOL Y MEDIA CAÑA



BOGOTA Secretaría de Educación	**REGISTRO FOTOGRÁFICOMENSUAL No 6** **COLEGIO ALPES**	CONSORCIO INAR INGENIEROS

NOMBRE DEL PROYECTO:	"INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, JURIDICA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRAS DE ADECUACION, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FISICAS, ASI´COMO LA ADECUACIO´N Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TE´RMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO".
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	LOCALIDAD 4 SAN CRISTOBAL
CONTRATISTA:	MUÑOZ Y HERRERA S.A
CONTRATO No.:	CO1.PCCNTR.1577474
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	DEL 19 DE ENERO AL 08 DE FEBRERO DE 2021. DEL 26 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2021.

ANTEPECHOS Y MESONES



BOGOTA Secretaría de Educación	**REGISTRO FOTOGRÁFICOMENSUAL No 6** **COLEGIO ALPES**	CONSORCIO INAR INGENIEROS

NOMBRE DEL PROYECTO:	"INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, JURIDICA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRAS DE ADECUACION, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FISICAS, ASI´COMO LA ADECUACIO´N Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TE´RMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO".
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	LOCALIDAD 4 SAN CRISTOBAL
CONTRATISTA:	MUÑOZ Y HERRERA S.A
CONTRATO No.:	CO1.PCCNTR.1577474
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	DEL 19 DE ENERO AL 08 DE FEBRERO DE 2021. DEL 26 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2021.

ANTEPECHO Y MESONES



BOGOTA Secretaría de Educación	**REGISTRO FOTOGRÁFICOMENSUAL No 6** **COLEGIO ALPES**	CONSORCIO INAR INGENIEROS

NOMBRE DEL PROYECTO:	"INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, JURIDICA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRAS DE ADECUACION, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FISICAS, ASI´COMO LA ADECUACIO´N Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TE´RMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO".
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	LOCALIDAD 4 SAN CRISTOBAL
CONTRATISTA:	MUÑOZ Y HERRERA S.A
CONTRATO No.:	CO1.PCCNTR.1577474
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	DEL 19 DE ENERO AL 08 DE FEBRERO DE 2021. DEL 26 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2021.

APARATOS SANITARIOS




.

BOGOTA Secretaría de Educación	**REGISTRO FOTOGRÁFICOMENSUAL No 6** **COLEGIO ALPES**	CONSORCIO INAR INGENIEROS

NOMBRE DEL PROYECTO:	"INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, JURIDICA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRAS DE ADECUACION, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FISICAS, ASI´COMO LA ADECUACIO´N Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TE´RMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO".
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	LOCALIDAD 4 SAN CRISTOBAL
CONTRATISTA:	MUÑOZ Y HERRERA S.A
CONTRATO No.:	CO1.PCCNTR.1577474
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	DEL 19 DE ENERO AL 08 DE FEBRERO DE 2021. DEL 26 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2021.

APARATOS SANITARIOS

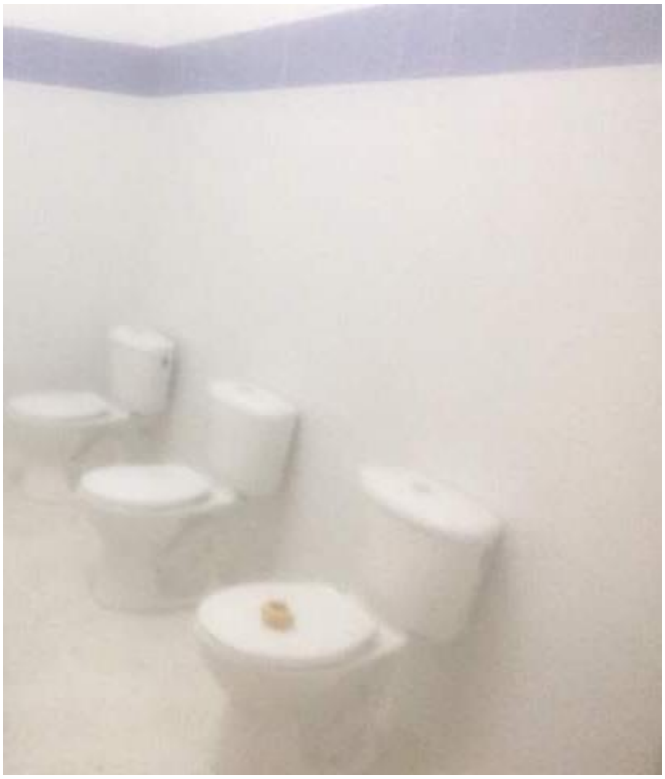

BOGOTA Secretaría de Educación	**REGISTRO FOTOGRÁFICOMENSUAL No 6** **COLEGIO ALPES**	CONSORCIO INAR INGENIEROS

NOMBRE DEL PROYECTO:	"INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, JURIDICA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRAS DE ADECUACION, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FISICAS, ASI´COMO LA ADECUACIO´N Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TE´RMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO".
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	LOCALIDAD 4 SAN CRISTOBAL
CONTRATISTA:	MUÑOZ Y HERRERA S.A
CONTRATO No.:	CO1.PCCNTR.1577474
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	DEL 19 DE ENERO AL 08 DE FEBRERO DE 2021. DEL 26 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2021.

ENCHAPES BAÑOS



BOGOTA Secretaría de Educación	**REGISTRO FOTOGRÁFICOMENSUAL No 6** **COLEGIO ALPES**	CONSORCIO INAR INGENIEROS

NOMBRE DEL PROYECTO:	"INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, JURIDICA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRAS DE ADECUACION, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FISICAS, ASI´COMO LA ADECUACIO´N Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TE´RMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO".
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	LOCALIDAD 4 SAN CRISTOBAL
CONTRATISTA:	MUÑOZ Y HERRERA S.A
CONTRATO No.:	CO1.PCCNTR.1577474
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	DEL 19 DE ENERO AL 08 DE FEBRERO DE 2021. DEL 26 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2021.

ENCHAPES BAÑOS



BOGOTA Secretaría de Educación	**REGISTRO FOTOGRÁFICOMENSUAL No 6** **COLEGIO SAN ISIDRO**	CONSORCIO INAR INGENIEROS

NOMBRE DEL PROYECTO:	"INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, JURIDICA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRAS DE ADECUACION, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FISICAS, ASI´COMO LA ADECUACIO´N Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TE´RMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO".
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	LOCALIDAD 4 SAN CRISTOBAL
CONTRATISTA:	MUÑOZ Y HERRERA S.A
CONTRATO No.:	CO1.PCCNTR.1577474
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	DEL 19 DE ENERO AL 9 DE FEBRERO DE 2021 DEL 26 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2021.

CONSTRUCCION DE CORREAS E HIZADA DE CERCHAS
MUROS PERIMETRALES



BOGOTA Secretaría de Educación	**REGISTRO FOTOGRÁFICOMENSUAL No 6** **COLEGIO SAN ISIDRO**	CONSORCIO INAR INGENIEROS

NOMBRE DEL PROYECTO:	"INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, JURIDICA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRAS DE ADECUACION, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FISICAS, ASI´COMO LA ADECUACIO´N Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TE´RMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO".
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	LOCALIDAD 4 SAN CRISTOBAL
CONTRATISTA:	MUÑOZ Y HERRERA S.A
CONTRATO No.:	CO1.PCCNTR.1577474
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	DEL 19 DE ENERO AL 9 DE FEBRERO DE 2021 DEL 26 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2021.

CONSTRUCCION DE CORREAS E HIZADA DE CERCHAS MUROS PERIMETRALES



BOGOTA Secretaría de Educación	**REGISTRO FOTOGRÁFICOMENSUAL No 6** **COLEGIO SAN ISIDRO**	CONSORCIO INAR INGENIEROS

NOMBRE DEL PROYECTO:	"INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, JURIDICA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRAS DE ADECUACION, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FISICAS, ASI´COMO LA ADECUACIO´N Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TE´RMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO".
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	LOCALIDAD 4 SAN CRISTOBAL
CONTRATISTA:	MUÑOZ Y HERRERA S.A
CONTRATO No.:	CO1.PCCNTR.1577474
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	DEL 19 DE ENERO AL 9 DE FEBRERO DE 2021 DEL 26 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2021.

CONSTRUCCION DE CORREAS E HIZADA DE CERCHAS MUROS PERIMETRALES



BOGOTA Secretaría de Educación	**REGISTRO FOTOGRÁFICOMENSUAL No 6** **COLEGIO SAN ISIDRO**	CONSORCIO INAR INGENIEROS

NOMBRE DEL PROYECTO:	"INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, JURIDICA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRAS DE ADECUACION, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FISICAS, ASI´COMO LA ADECUACIO´N Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TE´RMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO".
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	LOCALIDAD 4 SAN CRISTOBAL
CONTRATISTA:	MUÑOZ Y HERRERA S.A
CONTRATO No.:	CO1.PCCNTR.1577474
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	DEL 19 DE ENERO AL 9 DE FEBRERO DE 2021 DEL 26 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2021.

DESMONTE VENTANERIA



BOGOTA Secretaría de Educación	**REGISTRO FOTOGRÁFICOMENSUAL No 6** **COLEGIO SAN ISIDRO**	CONSORCIO INAR INGENIEROS

NOMBRE DEL PROYECTO:	"INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, JURIDICA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRAS DE ADECUACION, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FISICAS, ASI´COMO LA ADECUACIO´N Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TE´RMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO".
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	LOCALIDAD 4 SAN CRISTOBAL
CONTRATISTA:	MUÑOZ Y HERRERA S.A
CONTRATO No.:	CO1.PCCNTR.1577474
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	DEL 19 DE ENERO AL 9 DE FEBRERO DE 2021 DEL 26 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2021.

DESMONTE DE VENTANERIA



BOGOTA Secretaría de Educación	**REGISTRO FOTOGRÁFICOMENSUAL No 6** **COLEGIO SAN ISIDRO**	CONSORCIO INAR INGENIEROS

NOMBRE DEL PROYECTO:	"INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, JURIDICA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRAS DE ADECUACION, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FISICAS, ASI´COMO LA ADECUACIO´N Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TE´RMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO".
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	LOCALIDAD 4 SAN CRISTOBAL
CONTRATISTA:	MUÑOZ Y HERRERA S.A
CONTRATO No.:	CO1.PCCNTR.1577474
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	DEL 19 DE ENERO AL 9 DE FEBRERO DE 2021 DEL 26 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2021.

INSTALACION DE VENTANERIA



BOGOTA Secretaría de Educación	**REGISTRO FOTOGRÁFICOMENSUAL No 6** **COLEGIO SAN ISIDRO**	CONSORCIO INAR INGENIEROS

NOMBRE DEL PROYECTO:	"INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, JURIDICA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRAS DE ADECUACION, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FISICAS, ASI´COMO LA ADECUACIO´N Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TE´RMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO".
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	LOCALIDAD 4 SAN CRISTOBAL
CONTRATISTA:	MUÑOZ Y HERRERA S.A
CONTRATO No.:	CO1.PCCNTR.1577474
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	DEL 19 DE ENERO AL 9 DE FEBRERO DE 2021 DEL 26 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2021.

INSTALACION DE VENTANERIA



ANEXO 6.
LIBRO O BITACORA DE OBRA.

JUANA ESCOBAR - SEDE B - SAN LUIS.

18-01-21

Dia Sabado, Recibimos la Orden, a Escuela de Infantería, a Escuadra de Mar, a Unidad de Infantería a Caballo, se Hace Entrega de Uniformes en Almacen de Ropa Solicitado por Jefes.

2-1 Diario Color 2-3t

19-01-21

Dia Domingo, Recibimos la Orden, a Escuela de Infantería, a Escuadra de Mar, a Oficial, a Practicante, se Hace entrega de Uniformes de la Brigada Solicitada por Jefes, se Entrego al Cabo Unidad Naval que Solicito la Ropa de Mar, se Recibimos el Cuestionario del Personal de Infantería.

Diario Color 2-3t 2-1

20-01-21

Dia Lunes, Recibimos Ordenes, a Escuela de Mar, a Escuadra de Infantería, a Oficial, a Practicante, se Hace Entrega de Uniformes para Personal de Mar Naval, se Hizo Entrega de Uniformes a Unidad Solicitada por Pie 2, se Recibio el Cuestionario Donde nos Pide Informacion sobre Fuerza Fisica de Mar.

2-1 Diario Color 2-3t

21-01-21

Dia Jueves, Recibimos Ordenes, a Escuela de Infantería, a Escuadra de Mar, a Oficial, a Practicante, se Hace Entrega de Uniformes a Unidad Solicitada por Pie 2, se Recibio el Cuestionario Donde nos Pide Informacion sobre Fuerza Fisica de Mar.

2-1 Diario Color 2-3t

22-01-21

Dia Viernes, Recibimos la Orden, a Escuela de Mar, a Escuadra de Infantería, a Oficial, a Practicante de Mar Naval, se Hizo Entrega de Uniformes para Personal de Mar Naval, se Recibio el Cuestionario de Mar Naval Solicitado por Pie 2.

2-3t. 2-1 Diario Color

23-01-21

Dia Sabado, Recibimos la Orden, a Escuela de Infantería, a Escuadra de Mar, a Oficial, se Hizo la Entrega de Uniformes de Brigada Solicitado por Pie 2, se Hizo Entrega de Uniformes a Unidad Solicitada y se Recibio Ordenes a la Misma Recibida.

Diario Color 2-3t 2-1

24-01-21

Dia Domingo, Recibimos la Orden, a Escuela de Infantería, a Escuadra de Mar, a Oficial, a Practicante, se Hizo Visita de Evaluar las Bases Solicitadas por Jefes, se Hizo Entrega de Uniformes en Bases Solicitadas, se Hizo Nueva Recepción de Nuevos Uniformes de Personal Solicitado por Jefes para Nueva Recepción.

2-1 Diario Color 2-3t

25-01-21

Dia Lunes, Recibimos la Orden, a Escuela de Mar, a Escuadra de Infantería, a Oficial, a Practicante, se Hizo Entrega de Uniformes a Unidad Solicitada por Jefes, se Recibio Ordenes de Nueva Fuerza de Mar.

2-3t. 2-1 Diario Color

29-01-21

Dia Sabado, Recibido en Obra, 1 Residente de Interventoria, 1 Residente de Obra, Auxiliar Administrativo de Obra Interventoria para Revisión Semanal de la Obra 2, se realizo Dia Capacitación Hacia Acerca de Riesgos Psicosociales con Tema de Prevención en Covid-19, 1 Oficial.

28-01-21

Dia Sabado, Recibido en Obra, 1 Residente de Obra, 1 Residente de Interventoria, 1 Oficial, 1 Ayudante, se Solicito Al Contratista Hacer Limpieza de Lotes en Costado de Avda 3a Hacia Instalación de Interventoria y Retiro, se Gasto Hacia Acceso en Arena Mediante Volquetas en Costado de Avda 3a Con Escombro Tubos, se Verifica Avance de Obra Suministro Concreto.

29-01-21

Dia Sabado, Recibido en Obra, 1 Residente de Interventoria, 1 Residente de Obra, 1 Oficial, Hacia Suministro de Oficinas en Hacia Instalación para Bodega Sobre la Avda 2, se Hacia Instalación de Interventoria en Area de Profesores.

30-01-21

Dia Sabado Recibido en Obra, 1 Residente de Obra, 1 Residente de Interventoria, 1 Oficial, 1 Ayudante, Hacia Suministro de Oficinas de Hacia, se Hacia Aseo General de Frente de Obra, se Solicita Al Contratista Hacer Limpieza de Sus Hierros de Sobrantes.

01-02-21

Dia Sabado Recibido en Obra, 1 Residente de Obra 1 Residente de Interventoria, 1 Oficial, 1 Ayudante, 1 Encargado de Hacia Instalación de Señalización de Piques de Seguridad Para la Avda 2a, Hacia Suministro de Andamios y Hacia Instalación para Retiro de Sobrantes, Continua Los Trabajos de Pilotes de Hacia.

02-02-21

Dia Sabado, Recibido en Obra, 1 Residente de Interventoria, 1 Residente de Obra, 1 Auxiliar de Residente de Hacia Instalación Con Personal de Obra Interventoria de Hacia Instalación Piques de Señalización de la Avda 2a.

03-02-21

Dia Sabado Recibido en Obra, 1 Residente de Obra, 1 Residente de Interventoria, 1 Inspector de Obra de Hacia Instalación Con Personal de Obra Interventoria de Hacia Instalación Piques de Señalización de la Avda 2a.

04-02-21

Dia Sabado, Recibido en Obra, 1 Residente de Obra, 1 Residente de Interventoria, 1 Inspector de Interventoria, 1 Inspector de Hacia Instalación para Personal, Continua Retiro de Sobrantes de Diferentes de Hacia Instalación del Sector.

05-02-21

Día Siendo, Reunión de Obra, I Residente de Inspección Técnica, I Inspector de Intervención, Se Solicita Cuantificación Partida Para Cubrición de Fosa de Ascensor Recientemente. Para Que se Incluyan con Posterioridad al Fraguado de Obra Para un Correcto Funcionamiento, Se Solicita Que Cuantifique Los Sobrantes de Tierras de Obra Mismas Tierras Excedentarias Inicialmente Para Rellenos I Aceras Exteriores.

Diego Cañizo

06-02-21

Día Siendo Reunión en Obra, I Residente de Inspección Técnica, I Inspector de Intervención, I Oficial Se Solicita Verificar una Fisura de Pilar Que Cumple de Pared. Se Solicita Aquisición Inmediata del Foso de Protección, Se Solicita Instalar el Pasarela de la Puerta del Foso de Protección, Se Recuerda al Cuantificador Incorporar Las Partidas a Este Efecto de Obra Para Que Puedan Retirarse.

Diego Cañizo

08-02-21

Día Siendo Reunión en Obra, I Inspector de Intervención, I Residente de Intervención, Se Recuerda Al Cuantificador, En Cumplimiento del Protocolo de Subsanación del Curso en Apertura de Puertas en Obra Para Que Puedan Retirarse, Se Solicita Hacer Recepción de Ejecución Ventanas en Las Partidas del Fuego.

Diego Cañizo

09-02-21

Día Siendo, Reunión en Obra, I Residente de Obra, I Residente de Instalaciones, I Inspector de Intervención, Se Solicita Cuantificación de Obra de Tierra de Apertura de Puerta en Obra Para Hacer Entrega de Residuos Domésticos en Contenedor, Retirada de Escombros de Inspector de Empresas Que Se Dedican Para Poder Entregar Más Tierras en Fecha de Siguiente.

Diego Cañizo

JUANA ESCOBAR – SEDE C - REPUBLICA DE CANADÁ II.

Contratista En Cumplimiento del Protocolo de Bioseguridad, Suministra Actividad de Retiro de Estuco en Puntos de Clase.

Diego Patiño

14-01-21

Din Saludo, Personal en Obra, 1 Residente de Obra, 1 Residente de Interventoría, 1 Oficial, 2 Ayudantes, Se inicia Actividad de Resane de Falencias en Baterías Sanitarias de Niños y Profesores, Hubo Suministro de Arena y Cemento para Retiro de Falencias, Continua el Resane de Fachadas en Aulas de Clase y la Instalación de Piso en Oficina de Orientación.

Diego Patiño

15-01-21

Din Saludo, Personal en Obra, 1 Residente de Interventoría, 1 Residente de Obra, 1 Oficial, 1 Inspector de Interventoría, 2 Ayudantes, Se Hace Retiro de Estuco en Baños de Profesores para Instalar Ventana de Ventilación, Hubo Suministro de Estuco para Falencias, Continua Actividad de Resanes de Fallados y la Instalación de Guadua en Aula de Clase, Se Hace Retiro de Cinco (5) Vidrios de Ventana de Oficina de Orientación, Se Recuerdan al Contratista el Cumplimiento del Protocolo de Bioseguridad.

Diego Patiño

16-01-21

Din Saludo, Personal en Obra, 1 Residente de Obra, 1 Residente de Interventoría, 1 Oficial, 2 Ayudantes, 1 Inspector de Interventoría, Se Rectifican Medidas en Compañía del Contratista, Esto para Actualizar

Contratista de Obra, Se Hace Recepción para Iniciar Trabajo en Caja de Inspección de Aguas de Profesores, Continua Instalación de Guadua en Oficina de Orientación y Aula de Clase.

Diego Patiño

13-01-21

Din Saludo, Personal en Obra, 1 Residente de Interventoría, 1 Residente de Obra, 1 Oficial, 2 Ayudantes, Se inicia Actividad de Estuco de Falencias en Aulas de Clase, se inicia Actividad de Pintura en Baterías de Baños de niños y Profesores, Se hace entrega de Cantidades de Lumplimiento del Protocolo de Bioseguridad.

Diego Patiño

19-01-21

Din Saludo, Personal en Obra, 1 Residente de Obra, 1 Residente de Interventoría, 1 Oficial, 2 Ayudantes, 1 Inspector de Interventoría, Se Hace Limpieza de Estructura Metálica de Cubierta de Aulas de Clase y Oficina de Orientación, Continua Actividad de Pintura en Baterías Sanitarias, Hubo Suministro de Pintura tipo Cocina para Falencias.

Diego Patiño

20-01-21

Din Saludo, Personal en Obra, 1 Residente de Obra, 1 Residente de Interventoría, 1 Oficial, 2 Ayudantes, Se Aplica Capa de Estuco Plástico en Falencias de Aulas y Oficina de Orientación, Continua Actividad de Pintura en Baterías Sanitarias.

Diego Patiño

21-01-21

Dio Sereno, Personal en obra, 1 Residente de intervención, 1 Residente de obra, 1 Inspector, 2 Oficiales, 2 Ayudas, 3 instalaciones de tuberías, Continua Actividad de Estructura en Fachada de Patio, Se Hace Limpieza de Estructura de Cubierta, Se Inicia La instalación de Ventanería de Aulas y Oficina de Orientación, Se Hace instalación de Ventanas en Baterías Sanitarias, Hoy Suministro de Malla y Cemento.

Diego Patiño

22-01-21

Dio Sereno, Personal en obra, 1 Residente de Intervención, 1 Residente de obra, 2 Oficiales, 3 Ayudas, 1 Electricista mas Ayudante, 1 inspector de intervención, Continua Actividad de instalación de Ventanas en Fachada de Aulas, 2 Lavamanos instalados de Aulas y oficina de Orientación, se Habilito Toma Corriente en Aulas #2 ya que la toma se encontraba inhabilitada, Hoy Suministro de Refilleria para instalación de Luminarias en Cubículo de Aulas y oficina de Orientación.

Diego Patiño

23-01-21

Dio Sereno, Personal en obra, 1 Residente de obra, 1 Residente de intervención, 2 oficiales, 4 Ayudantes, 1 inspector de intervención, Se inicia Actividad de pintura en Fachada en Cubículo de Aulas y Cuarto de Aseo, Se Hace Retiro de Pintura en Muros, Se Hace Aseo General.

Diego Patiño

24-01-21

Dio Sereno, Personal en obra, 1 Residente de obra, 1 Residente de intervención, 2 oficiales, 4 Ayudantes, Continua Actividad de pintura en Fachada, Se Hace Pintura de Muro en Lavamanos de Baño de niños, se Recomienda el Cumplimiento de Protocolo de Bioseguridad, Hoy Recolección de Escombros.

Diego Patiño

26-01-21

Dio Sereno, Personal en obra, 1 Residente de intervención, 1 Residente de obra, 2 oficiales 3 Ayudantes, Hoy suministro de pintura, Se Hace Pintura en Cubículo de Aseo, Se Habilito Punto Eléctrico en Cuarto de Aseo, Se Hace Limpieza a Cubierta de inspección, Se Hace Reposición de Mallas de Baño Público, Se Hace Retiro de Pintura en Muros,

Diego Patiño

27-01-21

Dio Sereno, Personal en obra, 1 Residente de obra, 1 Residente de intervención, 2 oficiales, 3 Ayudantes, Se Hace Retiro de Pintura en Muros y Sobre Retiro de los Baterías Sanitarias se Hace instalación de Lavamanos en Baño de niños, Se realiza Luminaria en Baño de Profesores y se instala Ventana en Baño de Profesores

Diego Patiño

28-01-21

Din Sorenso, Personal en obra, 1 Residente de obra, 1 Residente de intervención, 2 oficiales y Ayudantes. Se solicita al contratista hacer limpieza de pozetas de aguas y Bajas, se verifica que las luminarias instaladas se encuentren en buen funcionamiento. Continúa Actividad de Retiro en Fachada, se solicita al contratista Apisonamiento de terreno.

Diego Cetina

29-01-21

Din Sorenso, Personal en obra, 1 Residente de intervención, 1 Residente de obra, 1 oficial, 3 Ayudantes, Hubo suministro de divisiones en Acero inoxidable, se hace Remate de Pintura en cuarto de Aseo, se instala Puerta en cuarto de Aseo que fue destinada para Estructura de Escalera.

30-01-21

Din Sorenda Personal en obra, 1 Residente de obra, 1 Residente de intervención, 1 oficial, Se hace Ajuste en Luminarias del Baño de Profesores, se solicita al contratista el cumplimiento del Protocolo de bioseguridad, se solicita al contratista verificar el Cierre del 3er Nivel ya que se encuentra Trabajo, Hubo Recolección de escombros.

Diego Cetina

01-02-21

Din Sorenso, Personal en obra, 1 Residente de intervención, 1 Residente de obra, 2 oficiales, 2 Ayudantes. Se inicia instalación de divisiones en Acero inoxidable, Hubo suministro de Porcelanato para baños, se Hace Remate de Pintura en Fachada de Aulas.

Diego Cetina

02-02-21

Din Sorenso, Personal en obra, 1 Residente de obra, 1 Residente de intervención, 2 oficiales, 2 Ayudantes, 1 Inspector de intervención. Continúa Actividad de instalación de Divisiones en Acero inoxidable, se hace instalación de Dispensadores de Papel en baños, Hubo suministro de Jabones.

Diego Cetina

03-02-21

Din Sorenso, Personal en obra, 1 Residente de intervención, 1 Residente de obra, 2 oficiales, 2 Ayudantes, se hace instalación de Jabonera en baños, continúa Actividad de Remate a Pintura en Fachada de Aulas, se hace Limpieza de Estructura de cubierta de Aulas. Se hace Aseo General en Aula que fue Asignada para Almacenar material de obra.

04-02-21

Dio Sonido, Personal en obra, 1 Residente de Obra, 1 Residente de Intervención, 2 Oficiales, 2 Ayudantes, Se inicia Actividad de Nivelación de Bases en Sótano Sanitaria, Se Hace Aseo General al Frente de Obra, Se solicita al Contratista Verificar Fugas en Sótano del Baño de Niños.

Zst Diego Cotino Zst

05-02-21

Dio Sonido, Personal en Obra, 1 Residente de Intervención, 2 Oficiales, 2 Ayudantes, Continua Instalación de Canalizaciones en Muro Medianero de Bodegas de Sótano, Se Solicita al Contratista instalar los Medidores de los Baños de la Pulpa para que sean Revisados a Satisfacción.

Z" Zst Diego Cotino

06-02-21

Dio Sonido, Personal en Obra, 1 Residente de Obra, 1 Residente de Intervención, 2 Ayudantes, Se Hace Recolección de Escombros y Aseo General al Frente de Obra, Se Solicita al Contratista Hacer Limpieza de Ventanas a los Pulpa de Cubos y Baños.

Diego Cotino Z" Zst

08-02-21

Dio Sonido, Personal en Obra, 1 Residente de Obra, 1 Residente de Intervención, Se Verifica que los Sensores de Humo se encuentren en Correcto Funcionamiento, Se Verifican Puertas y Ventanas Estas se encuentran en buen Estado, se Verifica la Portería de Fachada.

Z" Zst Diego Cotino

09-02-21

Dia Sonido, Personal en Obra, 1 Residente de Obra, 1 Residente de Intervención, 1 Inspector de Interventoría, Supervisión de la SD, Se inicia Recorrido al Frente de Obra para hacer la Entrega de Personal Permanente del Colegio, se informa a Contratista que se deben Hacer unas Correcciones de Pintura se Fachada para Continuar en Pleno a Satisfacción.

Diego Cotino Zst Z"

ATENAS SEDE A.

se continua con la construccion de cachuflas remates y adecuacion de estructura cubierta. Soldadura, pintura, correas.

19 Enero 2021
Dia Soleado
Personal 1 oficial, 3 ayudantes, 1 siso, 1 interventor, 1 residente
- Se inicia el desmonte de la alarma que se encuentra en rectoria.
- Se continua con detalles de soldadura en estructura de cubierta en rectoria y cafeteria.

20 Enero 2021
Dia Soleado
Personal 1 oficial, 3 ayudantes, 1 siso, 1 interventor, 1 residente.
- Se continua desmonte de la alarma que se encuentra en rectoria
- Se continua con detalles de soldadura en estructura de cubierta en rectoria y cafeteria.

Norma

Escaneado con CamScanner

21 Enero 2021
Dia: Soleado.
Personal: 1oficial, 3ayudntes, 1sso, 1residente, 1interventor
- Se continua con detalles de soldadura en estructura de cubierta en rectoria y cafeteria.

22 enero 2021
Dia: Soleado
Personal: 1 oficial, 3ayudantes, 1siso, 1residente, 1interventor
- Se continua con detalles de soldadura en estructura de cubierta en rectoria y cafeteria.

23 Enero 2021
Dia: Soleado
Personal: 1oficial, 3ayudntes, 1siso, 1residente, 1interventor.
- Se finalizan detalles de soldadura en estructura de cubierta en rectoria y cafeteria.


25 Enero 2021
Dia Soleado
Personal 1 oficial, 3ayudntes, 1siso, 1residente, 1 interventor
- Se inicia con instalación de teja ondulada en hall

Escaneado con CamScanner


Se continua con remate de pintura en estructura de cubierta.



26 Enero 2021
Dia Soleado
Personal 1 oficial, 3 ayudantes, 1 soldador, 1 residente, 1 interventor
- Se continua con instalación de teja ondulada en hall,
- Se continua con remate de pintura en estructura de cubierta.



27 Enero 2021
Dia: Soleado
Personal: 1 oficial, 3 ayudantes, 1 oso, 1 residente, 1 interventor
- Se continua con instalación de teja ondulada en hall.
- Se continua con remate de pintura en estructura de cubierta.



28 Enero 2021
Dia: Soleado
Personal: 1 oficial, 3 ayudantes, 1 oso, 1 residente, 1 interventor

Norma

Escaneado con CamScanner

- Se inicia instalación de teja tipo sandwich
- Se continua con remate de pintura en estructura de cubierta.

29 enero 2021
Día Soleado
Personal 1 oficial, 3 ayudantes, 1 siso, 1 residente, 1 interventor
- Se continua instalación de teja tipo sandwich.
- Se continua con remate de pintura en estructura de cubierta.

30 enero 2021
Día: Soleado
Personal: 1 oficial, 3 ayudantes, 1 siso, 1 residente, 1 interventor
- Se continua instalación de teja tipo Sand.
- Se continua con remate de pintura en estructura de cubierta.

1 Febrero 2021
Día Soleado
Personal 1 oficial, 3 ayudantes, 1 siso, 1 residente, 1 interventor

Norma

Escaneado con CamScanner

- Se inicia Pintura fachada rectoria, fachada Baños e interior del hall.
- Se inicia instalación de cielo raso PVC, cuarto de aseo.
- Se realiza instalación de canal en hall.


2 Febrero 2021
Día Soleado
Personal 1oficial, 2ayudantes, 1siso, 1residente, 1interventor
- Se continua pintura fachada rectoria, fachada Baños, e interior del hall.
- Se continua instalación de cieloraso PVC, cuarto de aseo
- Se realiza instalación de canal en hall.

3 Febrero 2021
Dia: Soleado.
Personal: 1oficial, 2ayudantes, 1siso, 1interventor, 1residente
- Se continua pintura fachada rectoria, fachada Baños e interior del hall.
- Se continua instalación de cieloraso PVC, cuarto de aseo.


Norma

Escaneado con CamScanner

4 Febrero 2021
Dia Soleado
Personal 1oficial, 2ayudantes, 1siso, 1Interventor, 1residente
- Se continua pintera fachada rectoria, fachada Baños e interior del hall
- Se continua instalación de cielo razo PVC del cuarto de aseo



5 Febrero 2021
Dia Soleado
Personal 1oficial, 2ayudantes, 1siso, 1residente, 1interventor
- Se continua pintera fachada rectoria, fachada Baños e interior del hall, para finalizar.
Se continua instalación de cielo razo PVC del cuarto de aseo.




6 Febrero 2021
Dia Soleado
Personal 1 oficial, 2ayudantes, 1siso, 1residente, 1interventor
- Se continua pintura fachada rectoria, fachada Baños e interior del hall.
- Se finaliza instalación de cielorazo PVC del

Norma


Escaneado con CamScanner

cuarto de aseo.

8 Febrero 2021
Dia Soleado
Personal 1oficial, 2ayudantes, 1siso, 1interventor, 1residente
- Detalles pintura de Fachada y Aseo



9 febrero 2021
Dia Soleado
Personal 1oficial, 2ayudantes, 1siso, 1interventor, 1residente.
- Detalles pintura de Fachada y Aseo.



Norma

Escaneado con CamScanner

JUAN EVANGELISTA GÓMEZ - SEDE A.

- Se continua emboquillada, destronque y pulida de piso.
- Se continuan arreglos en el corredor del Bloque C, la reconstruccion de tapas y cambio de tablefas en mal estado.

19 enero 2021.
Dia. Soleado
Personal 20 Ficial. 5 Ayudante. 1 SISO 1 Interventora 1 residente.


- Se continua con la instalacion de guardaescobas
- se continua con emboquillada, destronque pulida piso, marmol aulas bloque C.
- se continua. arreglos en el corredor del bloque C reconstrucion de tapas.
- se inicia pintura aulas bloque C.
- se realiza caja de inspeccion corredor bloque C.

20 enero. 2021.
Dia Soleado
Personal. 20 Ficiales 5 Ayudante 1 SISO 1 interventor 1 residente.
- Se continua con la instalacion de guardaescobas
- se continua con emboquillado, destronque pulida

Escaneado con CamScanner

pisos marmol aulas bloque C.
- se continua con arreglos en el corredor del bloque C reconstruccion de tapas y caja de inspeccion construccion.
- se continua pintura. aulas bloque C.

21 enero 2021.
dia Soleado



Personal: 2 oficiales 5 Ayudantes, 1 siso. 1 interventor. 1 residente.

- se continua con la instalacion de guarda escobas.
- se continua con emboquillada, destronque, pulida de piso marmol. aulas bloque C.
- se continua con arreglos en el corredor del bloque C. reconstruccion tapas y caja de inspeccion. construccion.
- se continua pintura aulas bloque C.

22 enero 2021.
dia. Soleado



Personal: 2 oficiales 5 Ayudantes, 1 siso, 1 interventor. 1 residente.

- se continua con la instalacion de guarda escobas.
- se continua con emboquillada, destronque, pulida,

Escaneado con CamScanner

de piso maimal aulas bloque C.
- se continua pintura aulas bloque C.
23 enero 2021
Dia Soleado
Personal: 2 oficiales 5 Ayudantes 1 SISO, 1 Interventor
1 residente.
- Se finaliza instalacion de guarda escobas.
- se continua con pulida brillada pisos.
aulas Bloque C.
- se continua con pintura aulas bloque C
25. enero 2021.
Dia. Soleado
Personal: 2 oficiales: 5 ayudantes 1 siso 1 interventor
1 residente.
- se continua con pulida de piso. maimal.
- se inicia pintura puestas aulas bloque C.
- se continua pintura aulas bloque C.
26 enero 2021.
Dia. Soleado
Personal: 2 oficiales 5 Ayudantes 1 siso 1 interventor
1 residente.
- se continua con pulida de piso brillada.

Escaneado con CamScanner

-se continua con pintura puertas aulas bloque C
-se continua con pintura aulas bloque C.
27 enero 2021.
dia Soleado
Personal. 2 oficiales. 5 Ayudantes 1 SISO 1 interventor. 1 residente.
-se continua con pulida brillada piso.
-se continua con pintura puertas aulas bloque C.
- se continua con pintura aulas bloque C.
28. enero 2021.
dia Soleado
Personal: 2 oficiales. 5 ayudantes 1. SISO. 1 interventor 1 residente.
-se continua con pulida brillada piso.
-se continua con pintura puertas aulas bloque C.
-se continua con pintura aulas bloque C.
29. enero 2021.
dia. Soleado
Personal: 2 oficiales. 5 ayudantes. 1 SISO. 1 interventor 1 residente.

Escaneado con CamScanner

se continua con pulida brillada piso marmol aulas bloque C.
-se continua con pintura puertas aulas bloque C.
-se continua con pintura aulas bloque C.
30 enero 2021
Dia Soleado
Personal 2 oficiales saquelantes. 1 siso 1 interventor
1 residente.
- se continua con pulida piso marmol.
aulas bloque C.
- se continua con pintura aulas bloque C.
- se continua con pintura puertas aulas
bloque. C.

1- Febrero. 2021.
dia Soleado
Personal 1 oficial. 5 Ayudantes. 1 siso 1 interventora
1 residente.
- se inicia instalacion de ventanena. aulas Fachada
bloque C
- se continua con pintura aulas bloque C

Escaneado con CamScanner

- Se continua con pintura puertas aulas bloque C. Hidrofugada Fachada aulas Bloque C-int-ex

2 Febrero 2021
Dia Soleado
Personal. Oficial, Sayudantes, 1 Siso, 1 Interventor, 1 residente
- Se continua instalación de ventaneria aulas Fachadas bloque C.
- Se continua con pintura aulas bloque C.
- Se continua con pintura puertas aulas bloque C. Hidrofugada Fachada aulas Blq C. -interior-exterior

3 Febrero 2021
Dia Soleado
Personal Oficial, Sayudantes, 1 Siso, 1 Interventor, 1 residente
- Se continua instalacion aulas ventaneria Fachadas bloque C, Hidrofugada Blq C. inter-exter.
- Se continua con pintura aulas bloque C
- Se continua con pintura puertas aulas bloque

4 Febrero 2021
Dia Soleado

Escaneado con CamScanner

Personal 1 oficial, 5 ayudantes, 1 siso, 1 interventor, 1 residente.
- Se continua instalación aulas ventanería fachada bloque C, y pintura de aulas. Hidrofugada fachada.
- Se continua con pinturas puertas aulas bloque C.

5 Febrero 2021
Dia_Soleado
Personal 1 oficial, 5 ayudantes, 1 siso, 1 interventor, 1 residente.
- Se continua instalación aulas ventanería fachada bloque C. y pintura de aulas, Hidrofugada fachada Blq C.
- Se continua con pinturas puertas aulas Bloque C.

6 Febrero 2021
Dia_ Soleado
Personal 1 oficial, 5 ayudantes, 1 siso, 1 interventor, 1 residente
- Se continua con pintura aulas Bloque C.
- Se continua instalación ventanería en fachada Bloque C, Hidrofugada Bloque C. Fachada Int, Ext.
- Se continua con pintura puertas Bloque C.

8 Febrero 2021
Dia_Soleado

Escaneado con CamScanner

Personal Oficial, 5 ayudantes, 1 Piso, 1 Interventor, 1 Presidente.
- Brillo de Aulas para entrega,
- Aseo pasillo interior - Exterior.



9 Febrero 2021
Día _ Soleado.
Personal Oficial, 5 ayudantes, 1 Piso, 1 Interventor, 1 Presidente.
- Brillo de aulas para entrega,
- Aseo pasillo interior - exterior.



Escaneado con CamScanner

LOS ALPES.

20 Enero 2021
Dia: Soleado
Personal: 20 Ficiales 4 Ayudantes 1. Siso. 1residente 1 interventor.
- Se instala tuveria para drenaje de carga.
- Se continua fundida de carcamo.



21 Enero 2021
Dia soleado.
personal 20ficiales 4Ayudantes 1siso 1residente 1interventor.
- Se continua instalación tuveria para drenaje de carga
- Se continua fundida de carcamo




22 Enero 2021
Dia soleado.
Personal 20ficiales 4Ayudantes 1siso 1residente 1interventor.
- Se continua instalación, tuveria para drenaje de carga.
- Se continua fundida de carcamo.



23 Enero 2021
Dia soleado
Personal 20ficiales 4Ayudantes 1siso 1residente 1interventor.
- Se Finaliza instalación de tuveria para drenaje.
- Se finaliza fundida de carcamo.

25 Enero 2021
Dia soleado
Personal. 20ficiales 4 Ayudantes 1siso 1residente 1interventor.
- Se inicia construcción de antepechos para mesones



Escaneado con CamScanner

de los baños.

26 Enero 2021
Dia Soleado
Personal 2 Oficiales 2 Ayudantes 1 SISO 1 residente 1 interventor
- Se continua con construcción de antepechos para mesones de Baños.
- Se inicia pañete de antepechos para dejar listo para fundir meson.

27 Enero 2021
Dia Soleado
Personal. 2 Oficiales 2 Ayudantes 1 SISO 1 residente 1 interventor.
- Se finaliza antepechos con pañete y se toma densidades en cancha.

28 Enero 2021
Dia Soleado.
Personal. 2 Oficiales 2 Ayudantes 1 SISO 1 residente 1 interventor
- Se tomen densidades en cancha con resultados favorables para fundieda de placa.

29 Enero 2021
Dia Soleado
Personal 2 Oficiales 2 Ayudantes 1 SISO 1 residente 1 interventor
- Se funden mesones para baños.

30 Enero 2021
Dia soleado
Personal. 2 Oficiales 2 Ayudantes 1 SISO 1 residente 1 interventor.

Escaneado con CamScanner

- Se continua fundición de mesones.

1 Febrero 2021
Dia soleado
Personal 2 Oficiales 5 Ayudantes 1 SISO 1 Interventor 1 residente
- Se inicia instalación de redes hidrosanitarias.
- Se inicia pañete en paredes de los baños

2 Febrero 2021
Dia soleado
Personal 2 oficiales 5 Ayudantes 1 SISO 1 interventor 1 residente.
- Se inicia instalación de redes hidrosanitarias.
- Se inicia pañete en paredes de los baños

3 Febrero 2021
Dia soleado
Personal 2 oficiales. 5 Ayudantes 1 SISO 1 interventor 1 residente
- Se funde placa de baños
- Se termina pañete y se realiza instalación de lamparas.

4 Febrero 2021
Dia soleado.
Personal 2 oficiales 5 Ayudantes 1 SISO 1 interventor 1 residente
- Se finaliza la placa. y se inicia instalación de piso marmol y media caña. y se inicia achique en paredes.

5 Febrero 2021
Dia soleado.

Escaneado con CamScanner

Personal 20 oficiales 5 Ayudantes 1 SISO 1 interventor 1 residente
- Se continua instalación de piso en marmol y media caña
- Se continua enchape en paredes.

6 Febrero 2021
Dia soleado
Personal 20 oficiales 5 Ayudantes 1 SISO. 1 residente 1 interventor
- Se finaliza instalación de piso en marmol y media caña
- Se finaliza enchepe en paredes
- Se inicia instalación de aparatos.

8 Febrero 2021
Dia Soleado
Personal 20 oficiales 5 Ayudante 1 SISO 1 residente 1 interventor
- Pulida de mesones 6 baños
- se continua con la instalacion de
- aparatos sanitarios instalacion.

9 Febrero 2021
dia soleado
Personal 20 oficiales 5 Ayudante 1 SISO 1 residente 1 interventor
- Pulida de mesones 6 baños.
- aparatos sanitarios instalacion.

Suspencion.

Escaneado con CamScanner
