FACTURA

Calle 3 N°. 4 -70 of. 301 Mosquera, Cundinamarca
E-mail: info@gygingenierosltda.com - gerencia@gygingenierosltda.com
Teléfono: (1) 8299043 - 3502705607
www.gygingenierosltda.com

G&G Ingenieros Ltda.

Contribuyente : Regimen Comun
Actividad Económica CIIU : 4112
Tarifa ICA : 9,66 x 1000
Dirección : CL 3 4 70 OF 301
MOSQUERA, CUNDINAMARCA
PBX : 8299043
gygingenierosltda@hotmail.com

N.I.T. 800.227.917-6
FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
FE 44

GYG INGENIEROS LTDA

CLIENTE :

SEÑOR(ES) :	UNIDAD ADMINISTRATIVA CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS DE BOGOTA D.C
NIT :	899999061-9
DIRECCION :	calle 20#68a-06 edificio comando
TELEFONO :	
CIUDAD :	BOGOTA
CONTACTO :	GLORIA ZAMBRANO

FECHA DE EMISION	
19 / ABRIL / 2021	
CONDICIONES DE PAGO	**VENCIMIENTO**
CONTADO	19 / ABRIL / 2021
EJECUTIVO(A) COMERCIAL	
OFICINA	

DETALLE :

CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	TOTAL
1,00	Acta de corte parcial No15 Contrato 470-2018 "Const.Estacion Bomberos Bellavista	608.521.160	608.521.160
1,00	ADMINISTRACION 17,00 %	103.448.597	103.448.597
1,00	IMPREVISTOS 0,00 %	0	0
1,00	UTILIDAD 5,00 %	30.426.140	30.426.140

Nota: El porcentaje exacto de la utilidad corresponde a 5,0000134 %

Son: SETECIENTOS CUARENTA Y DOS MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS

SUB-TOTAL	742.395.897
EXENTO	742.395.897
TOTAL FACTURA $	742.395.897

REFERENCIA :

Timbre Electronico DIAN

Verifique documento :
http://www.dian.gov.co/

Recibi

Documento Elaborado y
Tramitado a la DIAN
A traves de VisualDTE
Fecha y Hora de Validacion:

Resolución 18764005701610 de fecha 15/10/2020 hasta 15/10/2021 FOLIOS DESDE FE 1 AL 224
CUFE : c87fe50858784463669a3d911f280b024eaabb0788951a61e4d7ec149f24a1af63bc383c42d9c158aa8cbbd0d01394ab

CERTIFICACION DE APORTES PARAFISCALES

Calle 3 N°. 4 -70 of. 301 Mosquera, Cundinamarca
E-mail: info@gygingenierosltda.com - gerencia@gygingenierosltda.com
Teléfono: (1) 8299043 - 3502705607
www.gygingenierosltda.com

G&G Ingenieros Ltda.

CERTIFICADO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES PERSONA JURÍDICA

Yo, **TITO AUGUSTO GUTIERREZ CORREA**, identificado con C.C. 3.100.408, en mi condición de Representante Legal de **GYG INGENIEROS LTDA** identificada con Nit 800.227.917-6, debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de Facatativá, y Yo, **CESAR GÓMEZ ARIAS**, identificado con C.C. 19.487.979, y con Tarjeta Profesional No. 66003-T de la Junta Central de Contadores de Colombia, en mi condición de Revisor Fiscal de **GYG INGENIEROS LTDA** certificamos el pago de los aportes de seguridad social (pensión, salud y riesgos laborales) y de los aportes parafiscales (Instituto Colombiano de Bienestar familiar ICBF, Servicio Nacional de Aprendizaje SENA y Caja de Compensación Familiar), cuando a ello hubiere lugar, pagados por la compañía durante el mes de febrero Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Nota: Para relacionar el pago de los aportes correspondientes a los Sistemas de Seguridad Social, se deberán tener en cuenta los plazos previstos en el Decreto 1406 de 1999 artículos 19 a 24 y Decreto 2236 de 1999. Así mismo, en el caso correspondiente a los aportes parafiscales: CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR, ICBF y SENA, se deberá tener en cuenta el plazo dispuesto para tal efecto en el Decreto 1464 de 2005.

Dada en Mosquera a los (01) días del mes de marzo de 2021.

CESAR GÓMEZ ARIAS
C.C. 19.487.979
T.P 66003-T
Revisor Fiscal

TITO AUGUSTO GUTIERREZ C.
C.C. 3.100.408
Representante Legal

DOCUMENTOS REPRESENTANTE LEGAL

- **COPIA CEDULA DE CIUDADANIA**

Calle 3 N°. 4 -70 of. 301 Mosquera, Cundinamarca
E-mail: info@gygingenierosltda.com - gerencia@gygingenierosltda.com
Teléfono: (1) 8299043 - 3502705607
www.gygingenierosltda.com


REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA
NUMERO 3.100.408
GUTIERREZ CORREA
APELLIDOS
TITO AUGUSTO
NOMBRES
FIRMA


INDICE DERECHO
FECHA DE NACIMIENTO 11-ENE-1952
TENJO
(CUNDINAMARCA)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.65
ESTATURA
O+
G.S. RH
M
SEXO
21-MAR-1975 MOSQUERA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION
REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES
A-1500150-00170389-M-0003100408-20090818
0015067812A 1
1350104224

DOCUMENTOS DEL REVISOR FISCAL

- COPIA CEDULA DE CIUDADANIA
- COPIA DE LA TARJETA PROFESIONAL
- CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS.

Calle 3 N°. 4 -70 of. 301 Mosquera, Cundinamarca
E-mail: info@gygingenierosltda.com - gerencia@gygingenierosltda.com
Teléfono: (1) 8299043 - 3502705607
www.gygingenierosltda.com



República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO


66003-T

CESAR
GOMEZ ARIAS
C.C. 19467979
RESOLUCION INSCRIPCION 54
UNIVERSIDAD LIBRE

FECHA 10/26/99

Presidente

Secretario

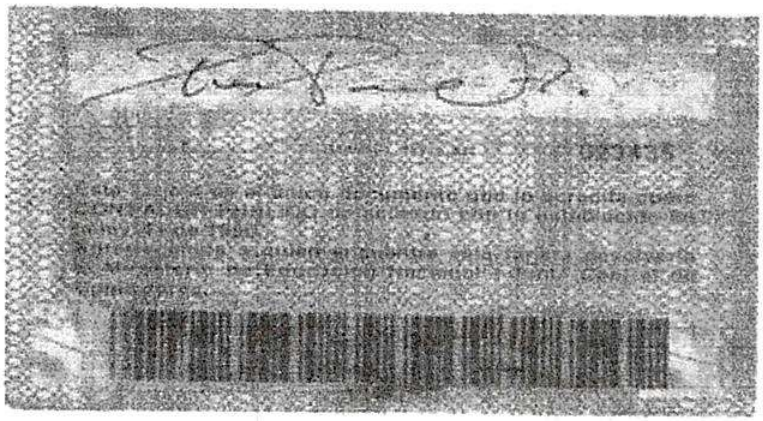

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

7 1 E 4 D 2 5 0 F D 0 1 7 E 6 4

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **CESAR GOMEZ ARIAS** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 19487979 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 66003-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

B0938055E5A418EA1

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **CESAR GOMEZ ARIAS** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 19487979 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 66003-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS **********
****
****

Dado en BOGOTA a los 27 días del mes de Abril de 2021 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado


REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA
NUMERO 19.487.979
GOMEZ ARIAS
APELLIDOS
CESAR
NOMBRES
FIRMA


FECHA DE NACIMIENTO 15-SEP-1962
BOGOTA D.C.
(CUNDINAMARCA)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.70
ESTATURA
O+
G.S. RH
M
SEXO
20-NOV-1980 BOGOTA D.C.
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION
REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES
INDICE DERECHO
A-1500150-00164705-M-0019487979-20090729 0014064014A 1 1360105795

aporte en línea

Planill. esumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE							
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 800227917	6	G. Y G. INGENIEROS LTDA.	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	G&G INGENIEROS LTDA	CALLE 3 No 4 -70	BOGOTA-BOGOTA D.E.	8299043	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2021-02	2021-02	917070047	9417298833	Y	2021/03/04	2021/03/08	BANCOLOMBIA		$654,800

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																		PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip		Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: G&G INGENIEROS LTDA (6 Afiliados)																								$0	$0			$0	$0			$0	$0			$7,237,052	$464,900		$0	$0		$464,900
Centro de Trabajo: BOMBEROS AMBIENTAL (1 Afiliados)																								$0	$0			$0	$0			$0	$0			$1,500,000	$65,300		$0	$0		$65,300
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)																								$0	$0			$0	$0			$0	$0			$1,500,000	$65,300		$0	$0		$65,300
1	CC	1070951642	PEDROZA NARANJO NARLY YOHANNA																				0	$0	$0		0	$0	$0		0	$0	$0	14-25	30	$1,500,000	$65,300	0	$0	$0	No	$65,300
Centro de Trabajo: BOMBEROS BELLAVISTA (1 Afiliados)																								$0	$0			$0	$0			$0	$0			$1,200,000	$83,600		$0	$0		$83,600
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)																								$0	$0			$0	$0			$0	$0			$1,200,000	$83,600		$0	$0		$83,600
2	CC	52183927	MENDEZ PLAZAS ERIKA MARCELA																				0	$0	$0		0	$0	$0		0	$0	$0	14-25	30	$1,200,000	$83,600	0	$0	$0	No	$83,600
Centro de Trabajo: ELECTRICO (1 Afiliados)																								$0	$0			$0	$0			$0	$0			$908,526	$63,300		$0	$0		$63,300
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)																								$0	$0			$0	$0			$0	$0			$908,526	$63,300		$0	$0		$63,300
3	CC	15900765	GIRALDO GIRALDO GERMAN																				0	$0	$0		0	$0	$0		0	$0	$0	14-25	30	$908,526	$63,300	0	$0	$0	No	$63,300
Centro de Trabajo: PROFESIONALES BELLAVISTA (3 Afiliados)																								$0	$0			$0	$0			$0	$0			$3,628,526	$252,700		$0	$0		$252,700
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (3 Afiliados)																								$0	$0			$0	$0			$0	$0			$3,628,526	$252,700		$0	$0		$252,700
4	CC	19371269	CANTOR BELLO MELQUICEDEC																				0	$0	$0		0	$0	$0		0	$0	$0	14-25	30	$1,320,000	$91,900	0	$0	$0	No	$91,900
5	CC	19264953	MARTINEZ MURCIA JOSE GUSTAVO																				0	$0	$0		0	$0	$0		0	$0	$0	14-25	30	$1,400,000	$97,500	0	$0	$0	No	$97,500
6	CC	79474146	NIVIA OSORIO JOHN IVAN																				0	$0	$0		0	$0	$0		0	$0	$0	14-25	30	$908,526	$63,300	0	$0	$0	No	$63,300
Total	**Afiliados(6)**																							$0	$0			$0	$0			$0	$0			$7,237,052	$464,900		$0	$0		$464,900

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				6	$464,900
COLMENA	14-25	800,226,175	3	6	$464,900
TOTAL				6	$464,900

aporte en línea

Planill esumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE							
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 800227917	6	G. Y G. INGENIEROS LTDA.	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	G&G INGENIEROS LTDA	CALLE 3 No 4 -70	BOGOTA-BOGOTA D.E.	8299043	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2021-02	2021-03	917061680	9417307405	E	2021/03/04	2021/03/08	BANCOLOMBIA		$26,011,700

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ingret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: G&G INGENIEROS LTDA (5 Afiliados)																						$16,133,333	$2,671,400			$16,133,333	$645,400			$15,400,000	$616,000			$16,133,333	$1,072,000		$0	$0		$5,004,800
Centro de Trabajo: PROFESIONALES BELLAVISTA (5 Afiliados)																						$16,133,333	$2,671,400			$16,133,333	$645,400			$15,400,000	$616,000			$16,133,333	$1,072,000		$0	$0		$5,004,800
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (5 Afiliados)																						$16,133,333	$2,671,400			$16,133,333	$645,400			$15,400,000	$616,000			$16,133,333	$1,072,000		$0	$0		$5,004,800
1	CC	1015438262	ALBA MARIO																	230301	30	$2,200,000	$352,000	EPS017	30	$2,200,000	$88,000	CCF22	30	$2,200,000	$88,000	14-25	30	$2,200,000	$153,200	30	$0	$0	SI	$681,200
2	CC	1026558978	ESCOBAR JAVIER																	230301	30	$2,300,000	$368,000	EPS008	30	$2,300,000	$92,000	CCF22	30	$2,300,000	$92,000	14-25	30	$2,300,000	$160,100	30	$0	$0	SI	$712,100
3	CC	51728640	GUTIERREZ MYRIAM																	230301	19	$1,900,000	$304,000	EPS008	19	$1,900,000	$76,000	CCF22	19	$1,900,000	$76,000	14-25	19	$1,900,000	$132,300	19	$0	$0	SI	$588,300
4	CC	51728640	GUTIERREZ MYRIAM											X						230301	11	$733,333	$117,400	EPS008	11	$733,333	$29,400	CCF22	0	$0	$0	14-25	11	$733,333	$0	0	$0	$0	SI	$146,800
5	CC	80136774	ROMERO CAMILO																	231001	30	$4,500,000	$765,000	EPS002	30	$4,500,000	$180,000	CCF22	30	$4,500,000	$180,000	14-25	30	$4,500,000	$313,200	30	$0	$0	SI	$1,438,200
6	CC	79966053	SARMIENTO MARCELO																	25-14	30	$4,500,000	$765,000	EPS017	30	$4,500,000	$180,000	CCF22	30	$4,500,000	$180,000	14-25	30	$4,500,000	$313,200	30	$0	$0	SI	$1,438,200
Total	**Afiliados(5)**																					$16,133,333	$2,671,400			$16,133,333	$645,400			$15,400,000	$616,000			$16,133,333	$1,072,000		$0	$0		$5,004,800

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				5	$2,671,400
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	$765,000
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$765,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	3	$1,141,400
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				5	$1,072,000
COLMENA	14-25	800,226,175	3	5	$1,072,000
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				5	$616,000
COLSUBSIDIO	CCF22	860,007,336	1	5	$616,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 3)				5	$645,400
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	2	$197,400
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	2	$268,000
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	$180,000
TOTAL				5	$5,004,800

2021/04/15 08:10 AM

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 19264953		MARTINEZ MURCIA JOSE GUSTAVO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Calle 168 # 9 - 11 int 7 cs 1	BOGOTA-BOGOTA D.C.	8020585	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2021-02	2021-02	76577096	9416828329	I	2021/03/11	2021/03/23	BANCO DE OCCIDENTE	0	$113,600

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
	Identificación	Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$0	$0			$908,526	$113,600			$0	$0			$0	$0		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$0	$0			$908,526	$113,600			$0	$0			$0	$0		$0	$0
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)					$0	$0			$908,526	$113,600			$0	$0			$0	$0		$0	$0
1	CC 19264953	MARTINEZ JOSE		0	$0	$0	MENDO	30	$908,526	$113,600		0	$0	$0		0	$0	$0	0	$0	$0
Total	**Afiliados(1)**				$0	$0			$908,526	$113,600			$0	$0			$0	$0		$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 19264953		MARTINEZ MURCIA JOSE GUSTAVO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Calle 168 # 9 - 11 int 7 cs 1	BOGOTA-BOGOTA D.E.	8020585	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2021-02	2021-02	76577096	9416828329	I	2021/03/11	2021/03/23	BANCO DE OCCIDENTE	0	$113,600

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$113,600	$0	$0	$113,600
GA RÉGIMEN DE EXCEPCIÓN	MIN002	901,037,916	1	1	$113,600	$0	$0	$113,600
TOTAL				1	$113,600	$0	$0	$113,600

2021/03/23 12:21 PM

aportes en línea

Certificado de Aportes

Se certifica que ERIKA MARCELA MENDEZ PLAZAS identificado(a) con CC 52183927 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social.

APORTANTE: CONSTRUCTORA BOLIVAR NI 860513493

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días	Novedades															
										ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip
9416148089	887872294	E	2021-02-09	EPS	EPS005	SANITAS	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2021-02	14													X				
9416148089	887872294	E	2021-02-09	EPS	EPS005	SANITAS	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2021-02	16																	
9416148089	887872294	E	2021-02-09	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2021-01	14													X				
9416148089	887872294	E	2021-02-09	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2021-01	16																	
[illegible]148089	887872294	E	2021-02-09	ARL	14-7	SEGUROS BOLIVAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2021-01	14													X				
[illegible]16148089	887872294	E	2021-02-09	ARL	14-7	SEGUROS BOLIVAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2021-01	16																	
9416148089	887872294	E	2021-02-09	CCF	CCF22	COLSUBSIDIO	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2021-01	14													X				
9416148089	887872294	E	2021-02-09	CCF	CCF22	COLSUBSIDIO	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2021-01	16																	
9416148089	887872294	E	2021-02-09	FSP	25-14	COLPENSIONES	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2021-01	14													X				
9416148089	887872294	E	2021-02-09	FSP	25-14	COLPENSIONES	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2021-01	16																	
9416148089	887872294	E	2021-02-09	SUB	25-14	COLPENSIONES	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2021-01	14													X				
9416148089	887872294	E	2021-02-09	SUB	25-14	COLPENSIONES	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2021-01	16																	
[illegible]479052	846487417	E	2020-12-30	EPS	EPS005	SANITAS	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2021-01	1													X				
[illegible]479052	846487417	E	2020-12-30	EPS	EPS005	SANITAS	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2021-01	29																	
9414479052	846487417	E	2020-12-30	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2020-12	1													X				
9414479052	846487417	E	2020-12-30	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2020-12	29																	
9414479052	846487417	E	2020-12-30	ARL	14-7	SEGUROS BOLIVAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2020-12	1													X				
9414479052	846487417	E	2020-12-30	ARL	14-7	SEGUROS BOLIVAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2020-12	29																	
9414479052	846487417	E	2020-12-30	CCF	CCF22	COLSUBSIDIO	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2020-12	1													X				

aportes en línea

Certificado de Aportes

APORTANTE: CONSTRUCTORA BOLIVAR NI 860513493

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días	Novedades																
										ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip
9414479052	846487417	E	2020-12-30	CCF	CCF22	COLSUBSIDIO	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2020-12	29																	
9414479052	846487417	E	2020-12-30	FSP	25-14	COLPENSIONES	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2020-12	1													X				
9414479052	846487417	E	2020-12-30	FSP	25-14	COLPENSIONES	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2020-12	29																	
9414479052	846487417	E	2020-12-30	SUB	25-14	COLPENSIONES	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2020-12	1													X				
9414479052	846487417	E	2020-12-30	SUB	25-14	COLPENSIONES	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2020-12	29																	

APORTANTE: G. Y G. INGENIEROS LTDA. NI 800227917

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días	Novedades																
										ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip
9415963230	883438410	Y	2021-02-05	ARL	14-25	COLMENA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2021-01	30																	

Este certificado se expide el dia 2021-03-07 a las 15:03.

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Banco Caja Social

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

RAZON SOCIAL:	CIUDAD DE UBICACIÓN:	NUMERO DE IDENTIFICACIÓN:	NATURALEZA:
ICIPV2:	BOGOTA- DISTRITO CAPITAL	DEPARTAMENTO:	BOGOTA - DISTRITO CAPITAL
	CC 79.4.886.554.71	TELÉFONO:	6383314
TIPO EMPRESA:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
FORMA DE PRESENTACIÓN:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONÓMICA:	Actividades de arquitectura e ingeniería y otras ac
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):	UNICO		
			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NUMERO PLANILLA:		73617679996	TIPO DE PLANILLA:				I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	febrero AÑO 2021	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:		MES	febrero AÑO	2021
DIAS DE MORA:		0					
FECHA PAGO (aaaammdd)		20210301	NUMERO AUTORIZACIÓN:				900.399.11

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NUMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NUMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	UPC	COTIZACIÓN	UPC	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS005	EPS005 SANITAS E.A.	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 750.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 750.000	$ 0	$ 0	$ 750.000
SUBTOTAL $													$ 750.000	$ 0	$ 0	$ 750.000

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE								NOVEDADES																				SEGURIDAD SOCIAL																		PARAFISCALES						
																												PENSIÓN								SALUD						APS										
TP	TIPO DOC. COTIZ	NUMERO	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BASICO	TIPO DE SALARIO	EXTRANJERO NO OBLIGADO A COTIZAR PENSIONES	EXTRANJERO RESIDENTE	COLOMBIANO EN EL EXTERIOR	SUSPENSION TEMPORAL	INCAPACIDAD TEMPORAL	LICENCIA MATERNIDAD	VACACIONES	VAC LR	AVP	VSP	SLN	IGE	LMA	VAC	AVC	VCT	IRP	ADMIN	SANCION	IBC	INTERESES MORA	FSP	APORTES VOLUNTARIOS	INDEMNIZACION TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	SANCION	IBC	COTIZACION	UPC	TOTAL APORTE	ADMIN	SANCION	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	IBC	CCF	SENA	ICBF	ESAP	MENEU
																												SUBCUENTA SOLIDARIDAD	SUBCUENTA SUBSISTENCIA	SUBCUENTA SOLIDARIDAD	SUBCUENTA SUBSISTENCIA																		

PAGOSIMPLE | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2021-01-15, 04:11:43 AM **Tipo Planilla:** I: PLANILLA INDEPENDIENTES **Numéro Planilla:** 1035094710

Periodo Cotización: enero de 2021 **Periodo Servicio:** enero de 2021 **Referencia pago (PIN):** 8833715730

PAGADO 14/01/2021 EN HORARIO EXTENDIDO

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	GERMAN GIRALDO GIRALDO		
Documento	CC15900765	**Dirección**	CRA 112 C N 76 19
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	**Teléfono**	3213430222
Tipo Persona	NATURAL	**Forma Presentación**	ÚNICO
Ciudad	BOGOTA D.C.	**Departamento**	BOGOTA D.C.
Representante Legal		**Identificación**	
Total Afiliados	1	**ARP**	ARL SURA

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																	Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	IRP	RET	RET F	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	Días PP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 15900765	GERMAN GIRALDO GIRALDO	59	04																		0	0	30	30	0	(NIN-AF) NINGUNA AFP	$ 0	$ 0	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 908.526	$ 113.600	0.522	$ 908.526	$ 4.800	(NIN-CC) NINGUNA CCF	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 118.400

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 0	$ 908.526	$ 908.526	$ 0	$ 0	$ 113.600	$ 4.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 118.400	$ 0	$ 118.400

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 343 2949 - Cali: 554 0515 - Medellín: 514 66 69 - Bucaramanga: 643 80 00 - Cartagena: 694 54 44 - Pereira: 340 25 82 - Barranquilla: 361 88 50 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

¡El Poder de lo SIMPLE!

Simple

PAGOSIMPLE | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2021-02-05, 10:04:55 AM **Tipo Planilla:** I: PLANILLA INDEPENDIENTES **Numéro Planilla:** 1035579578

Periodo Cotización: enero de 2021 **Periodo Servicio:** enero de 2021 **Referencia pago (PIN):** 8836207460

PAGADO 05/02/2021

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	NARLY YOHANNA PEDROZA NARANJO		
Documento	CC1070951642	**Dirección**	CRA 46 NO 91 77
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	**Teléfono**	3102577275
Tipo Persona	NATURAL	**Forma Presentación**	ÚNICO
Ciudad	BOGOTA D.C.	**Departamento**	BOGOTA D.C.
Representante Legal		**Identificación**	
Total Afiliados	1	**ARP**	COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES

II. . .ALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	IRP	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	Días PRN	Días SLN	Días IGE	Días LMA	Días VAC	Días VCT	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Mineducación	Total
CC 1070951642	NARLY YOHANNA PEDROZA NARANJO	59	00															0	30	0	0	0	0	(230301) PORVENIR	$ 908.526	$ 145.400	(EPS017) FAMISANAR EPS	$ 908.526	$ 113.600	0.522	$ 908.526	$ 4.800	(ARH-CC) NINGUNA CCF	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 263.800

III. TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 908.526	$ 908.526	$ 908.526	$ 0	$ 145.400	$ 113.600	$ 4.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 263.800	$ 0	$ 263.800

Lineas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 343 2949 - Cali: 554 0515 - Medellin: 514 66 69 - Bucaramanga: 643 80 00 - Cartagena: 694 54 44 - Pereira: 340 25 82 - Barranquilla: 361 88 50 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

¡El Poder de lo SIMPLE!

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	7695863	ALEXANDER OSORIO RAMIREZ	CRA 88 D No. 6D-27 TR 10 AP 136	6619466	alexo2704@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO		DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	I – Independiente			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ D.C.	NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				1	0
					TOTAL A PAGAR	
2021-02	2021-02	I		49055994	$1.533.000	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD													
Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	600.000	0		0		0	0	0	0	600.000	1

TOTALES PENSIÓN												
Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
25-14	Colpensiones	900336004-7	768.000	0	0	24.000	24.000	0	0		816.000	1

TOTALES RIESGOS LABORALES															
Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-11	ARL SURA	890903790-5	117.000				117.000	0	0	117.000			1.170	117.000	1

TOTALES CAJAS							
Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados

TOTALES PARAFISCALES				
Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	600.000	600.000
Pensión	1	816.000	816.000
Riesgos Laborales	1	117.000	117.000
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	3	1.533.000	1.533.000

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	7695863	ALEXANDER OSORIO RAMIREZ	CRA 88 D No. 6D-27 TR 10 AP 136	6619466	alexo2704@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente		BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2021-02	2021-02	I		49055994	$1.533.000	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE								INFORMACIÓN NOVEDADES																		PENSIÓN						SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES					
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Colombia	Bolivia	Extranjero	Colombia en el exterior	Ecuador	IGE	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	7695863	OSORIO RAMIREZ ALEXANDER	59	0			N							X								25-14	4.800.000	756.000	0	0	24.000	24.000	EPS017	4.800.000	600.000	14-11	4.800.000	3	117.000		0	0	0	0	0	0	0	0

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA Unidad Administrativa Especial Cuerpo Oficial de Bomberos	**FORMATO DE DESIGNACIÓN DE APOYO A LA SUPERVISIÓN**	**Código: FOR-CON-04-14**
		Versión: 2
		Vigente desde: 29/07/2020
		Página 1 de 1

00070843

Al contestar cite Radicado I-00643-2021003557-UAECOB Id: 70843
Folios: 2 Fecha: 2021-02-15 17:10:11
Anexos: 0
Remitente: SUBDIRECCION DE GESTION CORPORATIVA
Destinatario: INFRAESTRUCTURA

FECHA: 15 de febrero de 2021

Respetado Señor **CRISTIAN CAMILO GOMEZ RIOS**
Contratista SGC

Atentamente me permito comunicarle que ha sido designado(a) como **APOYO A LA SUPERVISIÓN** de los contratos citados en referencia, en virtud de las calidades personales y profesionales para dichas actividades:

CONTRATO No.	OBJETO	CONTRATISTA	SUPERVISOR
168-2018	Suministro e instalación de redes y equipos electrónicos para aumentar la capacidad de energía de la estación de bomberos de Bosa	Comsistelco sas	DIANA MIREYA PARRA CARDONA
325-2019	Mantenimiento de ascensor nuevo estación de Bomberos de Fontibón	Mitsubishi Electronic de Colombia Ltda	
738-2020	Mantenimiento de ascensor nuevo estación de Bomberos de Fontibón	Mitsubishi Electronic de Colombia Ltd	
394-2019	Realizar el mantenimiento preventivo, correctivo y suministro de repuestos para los equipos de gimnasio instalados en las diferentes estaciones de la UAE Cuerpo Oficial de Bomberos	Tu Servicio Titness S.A.S.	
470-2018	Construcción de la Estación de Bomberos de Bellavista	GyG Ingenieros Ltda	
331-2019	Interventoría técnica, administrativa, financiera, contable, jurídica y ambiental a: (i)Construcción de la Estación de Bomberos Bellavista; (ii) realizar el mantenimiento predictivo, preventivo, correctivo, adecuaciones y mejoras a las instalaciones de las dependencias de la Unidad Administrativa Especial Cuerpo Oficial de Bomberos de BogotáD.C. y,(iii) estudios, diseños y obras de la Estación de Bomberos las Ferias	Promciviles S.A.S	
667-2020	Prestación de servicios profesionales para apoyar las actividades técnicas del área de infraestructura de la Subdirección de Gestión Corporativa	Alexandra Yanira Morales Rey	

Es importante tener en cuenta, que quienes ejerzan apoyo a la supervisión de contratos/convenios suscritos por la UAECOB, junto con el supervisor del contrato, deberán efectuar la vigilancia, control y seguimiento a la ejecución de estos. Lo anterior con el fin de asegurar el logro exitoso de los objetivos y finalidades que se persiguen, en los términos, condiciones y especificaciones pactadas. Esto como garantía del buen uso, manejo e inversión de los dineros públicos y demás recursos del Estado que se han puesto a disposición del contratista.

El ejercicio de dicha actividad debe adelantarse con sujeción a las disposiciones legales vigentes y a lo establecido en el Manual de Contratación de la UAECOB, velando en todo caso por la ejecución del contrato/convenio en los términos pactados e igualmente por la vigencia de las garantías; de igual manera vigilar el debido cargue de los informes de ejecución con sus soportes al Sistema Electrónico de Contratación Pública - SECOP II.

00070843

Al contestar cite Radicado I-00643-2021003557-UAECOB Id: 70843
Folios: 2 Fecha: 2021-02-15 17:10:11
Anexos: 0
Remitente: SUBDIRECCION DE GESTION CORPORATIVA
Destinatario: INFRAESTRUCTURA

Para lo anterior, es necesario que al momento de asumir las actividades de apoyo a la supervisión usted conozca y consulte de manera permanente los documentos precontractuales y contractuales, los cuales se encuentran a su disposición en la Oficina Asesora Jurídica.

El ejercicio de la supervisión y apoyo a la supervisión de los contratos también comprende las obligaciones referidas a los aspectos técnico –administrativo y jurídicos particulares, aplicables a los respectivos contratos.

Atentamente,

Nombre del Supervisor: DIANA MIREYA PARRA CARDONA
Cargo:SUBDIRECTORA DE GESTIÓN CORPORATIVA

DIANA MIREYA PARRA CARDONA
SUBDIRECTORA GESTIÓN CORPORATIVA

Firma:

Elaboró: Blanca Islena Vanegas Cárdenas-SGC-

CERTIFICACION DE EQUILIBRIO ECONÓMICO

Calle 3 N°. 4 -70 of. 301 Mosquera, Cundinamarca
E-mail: info@gygingenierosltda.com - gerencia@gygingenierosltda.com
Teléfono: (1) 8299043 - 3502705607
www.gygingenierosltda.com

Señores
PROMCIVILES
Atn: Ing. Luis Orlando Pulido García
Director de Interventoría
Av Kr 19 No. 95-12 Of. 605
Bogotá D.C.

Referencia: Contrato No. 470 – 2018 "Construcción Estación de Bomberos de Bellavista"

Asunto: Certificación de equilibrio de la ecuación económica del contrato 470-2018.

Cordial Saludo.

De conformidad con lo dispuesto en el contrato No. 470 – 2018 cuyo objeto se describe en la referencia, CLAUSULA QUINTA "FORMA DE PAGO", numeral SEGUNDO *"PAGOS PARCIALES"*, literal A. que indica:

(...) "SEGUNDO: PAGOS PARCIALES:

*La UAECOB pagará al **CONTRATISTA** el restante valor del contrato y hasta completar el 90% del mismo, por concepto de pagos parciales, así:*

El contratista facturará mensualmente el 100% de la obra ejecutada en el respectivo periodo, soportada en las actas mensuales de recibo parcial de obra ejecutada, revisada, aceptada y recibida a satisfacción por parte de la interventoría, acompañado de los siguientes requisitos:

A. *Certificación suscrita por el **CONTRATISTA**, EN DONDE CONSTE EL CORRECTO EQUILIBRIO DE LA ECUACION ECONÓMICA DEL CONTRATO (NO MAYOR PERMANENCIA EN OBRA, ENTRE OTROS), A LA FECHA DE LA FACTURACIÓN."* (...)
(Subrayado fuera de texto)

En cumplimiento de los requisitos contemplados en la cláusula contractual antes mencionada para el respectivo proceso de facturación, procedemos a suscribir la presente certificación de equilibrio de la ecuación económica del contrato 470-2018, al 28 de febrero de 2021.

No obstante, en el caso que realizado el balance económico del contrato a la fecha, se evidencia afectación de la ecuación financiera del contrato 470 – 2018, por causas no imputables a GYG INGENIEROS LTDA, de existir aquellas, nos permitimos indicar como salvedad a lo aquí suscrito, que la presente certificación no indica en ningún momento renuncia por parte de GYG INGENIEROS LTDA, a efectuar la respectiva reclamación económica a que haya lugar ante UAECOB.

Cordialmente,

GYG INGENIEROS LTDA
ING. TITO AUGUSTO GUTIERREZ CORREA
Representante Legal

PROMCIVILES S.A.S
901.001.320-5

CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE PERSONAL

Teniendo en cuenta el Plan de trabajo presentado por el contratista del Contrato de Obra No. 470 de 2018 del contratista **TITO AUGUSTO GUTIÉRREZ CORREA** representante legal de **G&G INGENIEROS LTDA.**, sobre las actividades desarrolladas para dar cumplimiento a los términos contratados y el cumplimiento del ofrecimiento de personal conforme a la propuesta presentada, una vez realizada la revisión y supervisión de las obras ejecutadas En el informe No 18, periodo comprendido entre 01 al 28 de febrero de 2021. Se certifica el cumplimento del personal ofertado por parte del contratista basados en la certificación dada por el mismo.

Contrato:	No.470 DE 2018
Tipo de Contrato:	Contrato de Obra
Contratista:	TITO AUGUSTO GUTIÉRREZ CORREA REPRESENTANTE LEGAL G&G INGENIEROS LTDA.
Cédula o NIT	800.227.917-6
Objeto:	Contrato de obra No. 470-2018, cuyo objeto es: "CONSTRUCCIÓN DE LA ESTACIÓN DE BOMBEROS BELLAVISTA".
PLAZO INICIAL DEL CONTRATO:	Diez (10) meses
Fecha Iniciación:	19 de junio de 2019
Fecha de Terminación:	18 de abril de 2020
Suspensión:	1 de abril del 2020
Fecha de Reinicio	3 de junio del 2020
Prorroga 1:	5 Meses y 17 días.
Prorroga 2:	84 días.
Prorroga 3:	90 días.
Fecha de terminación actualizada:	31 de mayo del 2021.
Valor total contrato:	**$ 8.357.224.570.20**
Valor anticipo:	**$ 2.507.167.371,06**
Valor total acta 15:	**$ 742,395,897.00** (porcentaje ejecución del acta 8.88%)

El Representante Legal **TITO AUGUSTO GUTIÉRREZ CORREA de G&G INGENIEROS LTDA** certifica que se encuentra a Paz y Salvo por concepto de pago de las obligaciones con el Sistema General de Seguridad Social Integral.

En constancia se expide en Bogotá D.C., la presente Certificación para efectos de pago, a los diecinueve (19) días del mes de abril del año dos mil veintiuno (2021).

LUIS ORLANDO PULIDO GARCÍA
REPRESENTANTE LEGAL
INTERVENTORÍA
PROMCIVILES S.A.S

G&G Ingenieros Ltda.

CERTIFICACION

Relacionamos listado de personal de profesionales que se encuentran vinculados actualmente con **G&G INGENIEROS LTDA** para el contrato 470-2018 cuyo objeto es "Construcción Estación de Bomberos de Bellavista" a partir del mes de junio/2019.

PERSONAL PROFESIONAL DIRECTO CON G&G INGENIEROS LTDA			
NOMBRE	**CARGO**	**TIPO DE VINCULACION**	**PORCENTAJE DE DEDICACION**
CAMILO ANDRES ROMERO	RESIDENTE DE OBRA	CONTRATO TERMINO FIJO	100%
MIRIAM GUTIERREZ R	RESIDENTE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD OCUPACIONAL SISOMA	CONTRATO TERMINO FIJO	100%
JAVIER ESCOBAR PINTOR	AUXILIAR DE INGENIERIA	CONTRATO TERMINO FIJO	100%

PERSONAL ESPECIALISTA INDIRECTO CON G&G INGENIEROS LTDA			
NOMBRE	**CARGO**	**TIPO DE VINCULACION**	**PORCENTAJE DE DEDICACION**
JOSE GUSTAVO MARTINEZ MURCIA	DIRECTOR DE OBRA	PRESTACION DE SERVICIOS	25%
ERIKA MENDEZ	ESPECIALISTA HIDROSANITARIO-RED CONTRA INCENDIO	PRESTACION DE SERVICIOS	25%
MELQUICEDEC CANTOR	ESPECIALISTA EN GEOTECNIA	PRESTACION DE SERVICIOS	20%
JOHN IVAN NIVIA	ESPECIALISTA ESTRUCTURAL	PRESTACION DE SERVICIOS	20%
GERMAN GIRALDO	ESPECIALISTA ELECTRICO	PRESTACION DE SERVICIOS	25%
NARLY JOHANA PEDROZA	ESPECIALISTA AMBIENTAL	PRESTACION DE SERVICIOS	25%
ALEXANDER OSORIO	TOPOGRAFO	PRESTACION DE SERVICIOS	25%

Yo, **TITO AUGUSTO GUTIERREZ CORREA,** identificado con C.C. 3.100.408, en mi condición de Representante Legal de GYG INGENIEROS LTDA identificada con Nit 800.227.917-6, debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de Facatativá, certifico el pago de los aportes seguridad social del equipo mínimo de profesionales exigido antes relacionado realizados durante el periodo comprendido desde el 01 al 28 de febrero de 2021.

Tito Augusto Gutiérrez Correa
Representante Legal
G&G Ingenieros Ltda.
Nit. 800.227.917-6

Calle 3 N°. 4 -70 of. 301 Mosquera, Cundinamarca
E-mail: gygingenierosltda@hotmail.com - gygingenierosltda@gmail.com
Teléfono: (1) 8299043
www.gygingenierosltda.com

PROMCIVILES S.A.S
901.001.320-5

Al contestar cite Radicado: R-00268-202101383-UAECOB Id: 77885
Folios: 2 Fecha: 2021-04-15 15:39:56
Anexos: 1 CD/DVD, 3384 FOLIOS
Remitente : PROMCIVILES - LUIS ORLANDO PULIDO GARCIA
Destinatario: SUBDIRECCION DE GESTION CORPORATIVA

Bogotá D.C., 15 de abril de 2021

Correspondencia Despachada
Consecutivo: D-2
Sede: PROMCIVILES - BOMBEROS
Fecha de Radicación: 15/04/2021 12:44 PM
Consecutivo: D-2
Asunto: ENTREGA INFORMES MENSUALES DE ACTIVIDADES No 18
Folios: 1774
Tipo Documento: TECNICO
Destinatarios Externos: BOMBEROS-(BOGOTA)
D-2-2021-18

Doctora
Diana Mireya Parra Cardona
Subdirección de Gestión Corporativa
UAE Cuerpo Oficial de Bomberos.
Calle 20 No. 68ª - 06
Bogotá D.C.

Referencia: *Contrato No. 331 de 2019, cuyo objeto es: "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA Y AMBIENTAL A: (i) CONSTRUCCIÓN DE LA ESTACIÓN DE BOMBEROS BELLAVISTA; (ii) REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREDICTIVO, PREVENTIVO, CORRECTIVO, ADECUACIONES Y MEJORAS A LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS DE BOGOTÁ D.C. Y, (iii) ESTUDIOS, DISEÑOS, Y OBRAS DE LA ESTACIÓN DE BOMBEROS LAS FERIAS"*

Asunto: *Entrega de informes mensuales de actividades* **No. 18** *comprendido entre el 1 de febrero al 28 de febrero del 2021 tanto del contrato de obra como de interventoría.*

Respetados señores,

En cumplimiento de nuestras obligaciones contractuales como interventoría, nos permitimos remitir los informes técnicos, social, SST y Ambiental del contratista e Interventoría, los cuales se relacionan en el siguiente cuadro:

No. DE INFORME	CONTRATO	OBSERVACIONES
Informe No. 18	*470 del 2018*	*Se remite el informe de actividades No. 18 en 1447 folios, radicados mediante el comunicado G&G-2020-UAECOB-494 de fecha 07.03.2021, el cual comprende las actividades desarrolladas del 1 de febrero hasta el 28 de febrero del 2021, se anexa un CD; no se adjunta el acta No. 15, pues la misma presentaba observaciones, las cuales fueron subsanadas en su totalidad el pasado 13 de abril, pero no ha sido remitido en físico a la interventoría.*
Informe No. 18	*331 del 2019*	*Se realiza la entrega formal del Informe No. 18 para su respectiva revisión y aprobación, el cual comprende las actividades desarrolladas del 1 de febrero hasta el 28 de febrero del 2021, se anexan 327 folios y un CD, con el fin de cumplir con las obligaciones contractuales referentes a la*

PROMCIVILES S.A.S
901.001.320-5

		entrega de los informes mensuales, semanales y factura de cobro de esta interventoría, se realiza el cobro del costo variable del 25 % contra avance obra de los costos operacionales de esta interventoría.

Es de aclarar que la entrega de los informes semanales de interventoría se ha venido realizando en cada uno de los comités de obra realizados al apoyo a la supervisión del contrato, los cuales se relacionan en el informe mensual de cada periodo.

Atentamente,

Luis Orlando Pulido García
Director de Interventoría.
PROMCIVILES S.A.S.

ANEXOS: *Informe Mensual de Actividades del contratista No. 18 1286 folios y 1 CD*
Informe Mensual de Actividades de interventoría No. 18 y cuenta en No. 11en 327Folios y 1 CD

Con copia:
Ing. Camilo Pardo Rocha– Coordinador Infraestructura UAECOB
Ing. Cristian camilo Gómez Ríos - Apoyo a la supervisión UAECOB
Calle 20 No. 68ª – 06 Edificio Comando Bogotá D.C.

Gmail

G&G INGENIEROS LTDA <gygbellavista@gmail.com>

Contrato 470_Informe técnico No. 18_febrero de 2021

Promciviles UAECOB <interuaecob@gmail.com> 11 de marzo de 2021, 14:48
Para: G&G INGENIEROS LTDA <gygbellavista@gmail.com>
Cc: "Ing. Jose Luis Juyo" <residenteparques@gmail.com>, EDUARDO CONTRERAS <LUISEDUARDOCONTRERAS1917@gmail.com>, Osca Maya <ingenieria@promciviles.com>, Cristian Camilo Gomez Rios <ccgomez@bomberosbogota.gov.co>, Diana Mireya Parra Cardona <dmparra@bomberosbogota.gov.co>, HSEQ G&G <hseqgyg2015@gmail.com>, GYG INGENIEROS LTDA <gygingenierosltda@gmail.com>

Buenas tardes, una vez revisado el informe tecnico del mes de febrero, se da aprobación al mismo. Respecto a los monitoreos y control de asentamientos tienen visto bueno del area de topografía de la interventoría y solicitamos sean enviados en físico para su respectiva firma.

Cordialmente,
[El texto citado está oculto]

CONSTRUCCIÓN DE LA ESTACIÓN DE BOMBEROS DE BELLAVISTA



Contrato de Obra No. 470 de 2018

INFORME MENSUAL 018

Contratista. G&G Ingenieros Ltda.

Interventoría. PROMCIVILES SAS

Tiempo de ejecución. 10 meses

Fecha de inicio. 19 de junio de 2019

Prorroga 1 de tiempo. 5 meses y 17 días.

Prorroga 2 de tiempo. 84 días.

Prorroga 3 de tiempo. 3 meses.

Contenido

LISTA DE DISTRIBUCIÓN 2

INTRODUCCIÓN 4

1. CONSTRUCCIÓN DE LA ESTACIÓN DE BOMBEROS DE BELLAVISTA, EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. 5

1.1. CONTRATO DE OBRA 5

1.1.1. Garantías 6
1.1.2. Descripción del proyecto 7
1.1.3. Localización del proyecto 9

1.2. PERSONAL INVOLUCRADO EN EL PROYECTO 10

1.2.1. Personal Autorizado por el Cliente 10
1.2.2. Personal del Contratista 10

1.3. DOCUMENTACIÓN TÉCNICA 10

1.4. AVANCE DE LA OBRA 11

1.5. ACTAS LEGALES SUSCRITAS 20

1.6. REGISTRO FOTOGRÁFICO 20

1.7. ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS 20

1.8. CONTROL DEL PERSONAL DEL CONTRATISTA 20

1.8.1. Disposiciones laborales, pagos parafiscales y dotación 21

1.9. ENSAYOS DE LABORATORIO 21

2. CONCLUSIONES 21

LISTA DE DISTRIBUCIÓN




Copias de este documento serán entregadas a las dependencias indicadas en el cuadro siguiente. Todas aquellas observaciones que resulten de su revisión y aplicaciones, deben ser informadas al director del Proyecto para proceder a ejecutar sus modificaciones.

ÁREAS O DEPENDENCIA		No. DE COPIAS
Copia No.1	PROMCIVILES SAS (Interventoría)	1 (original) y CD
Copia No.2	Folder del Proyecto	1

ÍNDICE DE MODIFICACIONES

ÍNDICE VERSIÓN	CAPITULO MODIFICADO	FECHA DE MODIFICACIÓN	OBSERVACIONES
1		05/03/2021	Original
2	Conclusiones	10/03/2021	Se realiza modificaciones a observaciones de la interventoría

ESTADO DE REVISIÓN Y APROBACIÓN

INFORME MENSUAL 018		
PERIODO: 1 de febrero a febrero 28 de 2021		
NUMERO DE REVISIÓN		2
RESPONSABLE ELABORACIÓN Residente(s) de Obra	Nombre:	Marcelo Augusto Sarmiento Chiquillo
	Firma:	
	Fecha:	Febrero 28 de 2021
RESPONSABLE REVISIÓN Director de Obra	Nombre:	José Gustavo Martínez Murcia
	Firma:	
	Fecha:	Febrero 28 de 2021
Vo. Bo. Gerente Técnico	Nombre:	Fernando Gómez González
	Firma:	
	Fecha:	Febrero 28 de 2021
Vo. Bo. Representante Legal	Nombre:	Tito Gutiérrez Correa
	Firma:	
	Fecha:	Febrero 28 de 2021

INTRODUCCIÓN

La Unidad Administrativa Especial del Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá, quien en adelante se denominará la UAECOB, tiene varias proyecciones en cuanto a la infraestructura física de las estaciones de bomberos de la ciudad de Bogotá, entre las cuales se encuentra **"CONTRATAR LA CONSTRUCCIÓN DE LA ESTACIÓN DE BOMBEROS DE BELLAVISTA, EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ. D.C."** Por lo cual, la UAECOB realizó convocatoria pública denominada UAECOB-LP-008-2018, luego de finalizado el proceso licitatorio en mención, se adjudicó el objeto del contrato a G&G INGENIEROS LTDA, mediante resolución No. 939 del 24 de diciembre de 2018, y se suscribió el contrato de obra No. 470 de 2018.

Para finalizar lo anterior, el presente documento contiene el Informe Mensual de obra No.018, en el cual se reporta el avance de obra en los aspectos técnicos y administrativos, durante el período comprendido entre febrero 1 y febrero 28 de 2021.

1. CONSTRUCCIÓN DE LA ESTACIÓN DE BOMBEROS DE BELLAVISTA, EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.

PERIODO CONTEMPLADO: Febrero 1 al 28 de 2021.

1.1. CONTRATO DE OBRA

El proyecto se desarrolla en la etapa de construcción.

Datos generales del Contrato de Obra

CONTRATO DE OBRA	470 de 2018
CONTRATISTA:	G&G INGENIEROS LTDA
REPRESENTANTE LEGAL:	TITO AUGUSTO GUTIÉRREZ CORREA
OBJETO:	**CONSTRUCCIÓN DE LA ESTACIÓN DE BOMBEROS DE BELLAVISTA.**
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	$8.357.224.570,20 M/CTE.
VALOR ADICIONAL DEL CONTRATO:	N/A
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO:	26 de diciembre de 2018
PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO:	Diez (10) meses
PLAZO ADICIONAL 1:	Cinco (5) meses y Diecisiete (17) días.
FECHA DE INICIACIÓN:	Junio 19 de 2019
FECHA DE SUSPENSIÓN:	Abril 1 de 2020
FECHA DE REINICIO:	Junio 3 de 2020
PLAZO ADICIONAL 2:	Ochenta y cuatro (84) días.
FECHA DE TERMINACIÓN	Marzo 1 de 2021.
PLAZO ADICIONAL 3:	Tres (3) meses.
FECHA DE TERMINACIÓN	Junio 1 de 2021.

1.1.1. Garantías

Durante la ejecución del proyecto de este periodo se generaron pólizas de garantía, las cuales se relacionan a continuación.

ASEGURADORA SEGUROS DEL ESTADO	No, POLIZA	TIPO DE MOVIMIENTO	GARANTIA DE CUMPLIMIENTO			VALOR ASEGURADO
ANEXO			AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	
12	21-44-101287317	ANEXO DE PRORROGA	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	19/06/2019	21/12/2020	$ 1.671.444.914,00
			BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO	19/06/2019	21/12/2020	$ 2.507.167.371,00
			PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	19/06/2019	21/06/2023	$ 417.861.228,50
			CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES	19/06/2019	21/06/2023	$ 1.671.444.914,00
			ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	19/06/2019	21/06/2025	$ 2.507.167.371,00
ACLARACIONES	Por medio del presente anexo se ajusta la vigencia del amparo de la póliza, según acta de reinicio al Contrato No. 470 de 2018. Los demás términos y condiciones sin modificar continúan vigentes.					

ASEGURADORA SEGUROS DEL ESTADO	No, POLIZA	TIPO DE MOVIMIENTO	GARANTIA DE CUMPLIMIENTO			VALOR ASEGURADO
ANEXO			AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	
6	21-40-101130763	ANEXO DE PRORROGA	PREDIOS LABORES Y OPERACIONES	19/06/2019	21/06/2020	$ 417.861.228,50
ACLARACIONES	Por medio del presente anexo se ajusta la vigencia del amparo de la póliza, según acta de reinicio al Contrato No. 470 de 2018. Los demás términos y condiciones sin modificar continúan vigentes.					

ASEGURADORA SEGUROS DEL ESTADO	No, POLIZA	TIPO DE MOVIMIENTO	GARANTIA DE CUMPLIMIENTO			VALOR ASEGURADO
ANEXO			AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	
13	21-44-101287317	ANEXO DE PRORROGA	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	19/06/2019	09/06/2021	$ 1.671.444.914,00
			BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO	19/06/2019	09/06/2021	$ 2.507.167.371,00
			PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	19/06/2019	09/12/2023	$ 417.861.228,50
			CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES	19/06/2019	21/06/2023	$ 1.671.444.914,00
			ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	19/06/2019	21/06/2025	$ 2.507.167.371,00
ACLARACIONES	Por medio del presente anexo y según modificación No. 01 prorroga al Contrato No. 470 de 2018, se amplía el plazo de 5 meses y 17 días, de igual forma se prorroga la vigencia de los amparos tal como se muestra en la parte superior. Los demás términos sin condiciones sin modificar continúan vigentes.					

ASEGURADORA SEGUROS DEL ESTADO	No, POLIZA	TIPO DE MOVIMIENTO	GARANTIA DE CUMPLIMIENTO			VALOR ASEGURADO
ANEXO			AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	
7	21-40-101130763	ANEXO DE PRORROGA	PREDIOS LABORES Y OPERACIONES	19/06/2019	09/12/2020	$ 417.861.228,50
ACLARACIONES	Por medio del presente anexo y según modificación No. 01 prorroga al Contrato No. 470 de 2018, se amplía el plazo de 5 meses y 17 días, de igual forma se prorroga la vigencia de los amparos tal como se muestra en la parte superior. Los demás términos sin condiciones sin modificar continúan vigentes.					

ASEGURADORA SEGUROS DEL ESTADO	No, POLIZA	TIPO DE MOVIMIENTO	GARANTIA DE CUMPLIMIENTO			VALOR ASEGURADO
ANEXO			AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	
15	21-44-101287317	ANEXO DE PRORROGA	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	19/06/2019	03/09/2021	$ 1.671.444.914,00
			BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO	19/06/2019	03/09/2021	$ 2.507.167.371,00
			PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	19/06/2019	03/03/2024	$ 417.861.228,50

			CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES	19/06/2019	03/03/2024	$ 1.671.444.914,00
			ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	19/06/2019	03/03/2026	$ 2.507.167.371,00
ACLARACIONES	Por medio del presente anexo y según modificación No. 02 prorroga al Contrato No. 470 de 2018, se amplía el plazo de 84 días, de igual forma se prorroga la vigencia de los amparos tal como se muestra en la parte superior. Los demás términos sin condiciones sin modificar continúan vigentes.					

ASEGURADORA SEGUROS DEL ESTADO	**No, POLIZA**	**TIPO DE MOVIMIENTO**	**GARANTIA DE CUMPLIMIENTO**			**VALOR ASEGURADO**
ANEXO			**AMPAROS**	**VIGENCIA DESDE**	**VIGENCIA HASTA**	
8	21-40-101130763	ANEXO DE PRORROGA	PREDIOS LABORES Y OPERACIONES	19/06/2019	03/03/2021	$ 417.861.228,50
ACLARACIONES	Por medio del presente anexo y según modificación No. 02 prorroga al Contrato No. 470 de 2018, se amplía el plazo de 84 días, de igual forma se prorroga la vigencia de los amparos tal como se muestra en la parte superior. Los demás términos sin condiciones sin modificar continúan vigentes.					

1.1.2. Descripción del proyecto

La estación de bomberos de Bellavista tendrá como actividad principal la Búsqueda y rescate en estructuras colapsadas, mejorando los tiempos de respuesta en esta zona de alto riesgo geológico y gran valor ambiental, para lo cual contará con un cuerpo de bomberos quienes estarán capacitados para desarrollar dichas tareas, siguiendo como prioridades el rescate, la extinción de fuego y protección de bienes.

Por sus características esta estación comprende las siguientes áreas:

Administrativa: En esta se ubicará la oficina correspondiente al comandante delegado por la administración Distrital para el manejo de la estación. En esta área también se ubican las oficinas necesarias para la operación de la estación.

Operativa: En esta se instalará toda la infraestructura de comunicaciones para la respuesta a emergencias de la zona, la dotación logística específica de herramientas, equipos y accesorios y el alojamiento del personal operativo.


Servicios: Destinada a la ubicación de los espacios y los equipos necesarios para el funcionamiento de la edificación como baños y áreas comunes.

1.1.3. Localización del proyecto

El proyecto se encuentra ubicado en la localidad No. 4. San Cristóbal del Distrito Capital de Bogotá. Se encuentra ubicada al suroriente de la ciudad, incluyendo una parte urbana y una extensión rural en los cerros orientales. La topografía es plana hacia el occidente, pero pendientes fuertes de entre 20° y 30° comienzan a surgir. El cerro de Guadalupe tiene sus faldas allí; las calles son empinadas y hay alto riesgo de deslizamiento.

El proyecto se encuentra ubicado en la zona suroriental de la ciudad de Bogotá sobre la ladera de la cordillera montañosa que enmarca la ciudad sobre el costado Oriental. Por lo tanto, la topografía del lugar es inclinada con un desnivel longitudinal de aproximadamente 10 m de diferencia y una pendiente del 17%. Sus colindantes inmediatos son: al Norte con la Calle 41B Sur y al Occidente con la Kra 15 Este. Al Oriente y Sur limita con edificaciones vecinas con una altura máxima de 4 pisos. Por su ubicación en los cerros y su cercanía a zonas rurales y reservas forestales, el microclima genera bastante humedad y pluviosidad constante más que en la parte plana o sabana de Bogotá. Los vientos son un poco más fuertes que en el resto de la ciudad ya que descienden de la montaña sin ningún obstáculo importante.

PROYECTO UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTOBAL, CIUDAD DE BOGOTÁ

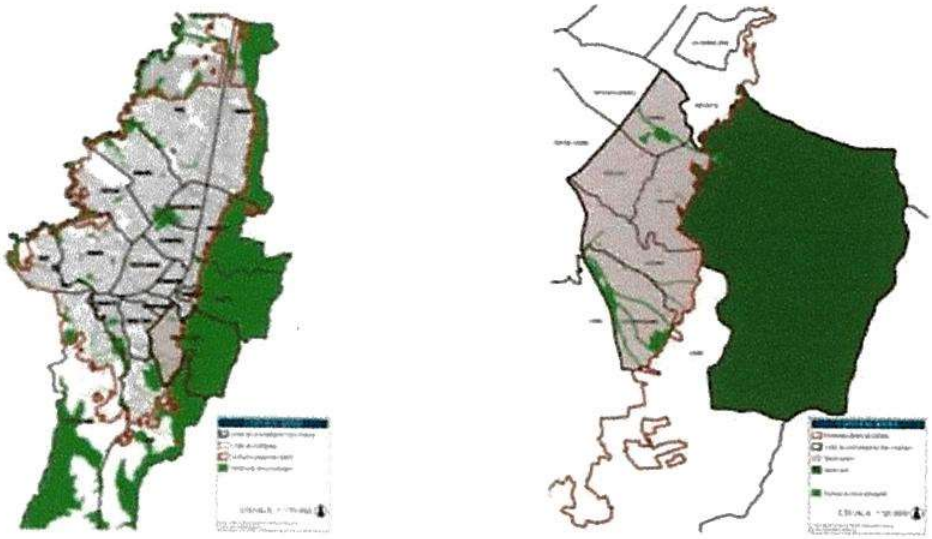

Fuente: Recorriendo San Cristóbal; Diagnostico físico y socioeconómico de las localidades de Bogotá, D.C.

1.2. PERSONAL INVOLUCRADO EN EL PROYECTO

Durante el presente período, cada una de las entidades contó con un equipo de personas que se relaciona a continuación:

1.2.1. Personal Autorizado por el Cliente

UAECOB

CARGO	NOMBRE
Supervisor del Proyecto	Diana Mireya Parra Cardona
Apoyo a la Supervisión	Ing. Cristian Camilo Gómez Ríos
Apoyo a la Supervisión	Arq. Camilo Pardo

1.2.2. Personal del Contratista

G&G INGENIEROS LTDA

CARGO	NOMBRE
Director de obra	José Gustavo Martínez Murcia
Residente de obra	Marcelo Augusto Sarmiento Ch.
Residente de Obra	Camilo Andrés Romero Carrillo.
Asesor estructural	John Iván Nivia Osorio
Asesor en Geotecnia	Melquicedec Cantor Bello
Especialista en Redes Hidráulicas	Erika Marcela Méndez Plaza
Ingeniero Eléctrico y de voz & datos	German Giraldo Giraldo
Profesional ambiental	Narly Yohanna Pedroza Naranjo
Topógrafo	Alexander Osorio Ramirez
Auxiliar de ingeniería	Javier Andrés Escobar Pintor
Asesor seguridad industrial	Myriam Gutiérrez Rodríguez

1.3. DOCUMENTACIÓN TÉCNICA

En el anexo No. 1, del presente documento se relaciona la correspondencia enviada radicada ante el cliente e interventoría, correspondiente al presente periodo.

1.4. AVANCE DE LA OBRA

Durante el presente período se realizan las siguientes actividades:

- Mampostería para las cajas CS-276 de la red eléctrica en nivel N-3.30 ejes D al D2 y 4 al 6.
- Enchape muro en baño ejes 1 al 2 entre A al B en nivel N+3.30.
- Estuco y pintura entre los ejes 1 al 2 entre A al B en nivel N+3.30.
- Instalación de tubería de la red de incendio, con válvula expulsora y registro bola entre los ejes 1 al 2 y A0 al D.
- Fundida de columnetas y viguetas de confinamiento e instalación de cubierta tipo sandwich ejes 1 al 2 y C al D.
- Mampostería en ladrillo arena con fachaleta entre los ejes C al D y 2 al 4 nivel N+0.00.
- Instalación tubería alcantarillado, relleno en arena de peña y recebo común con material RCD entre los ejes C al D y 2 al 4 nivel N+0.00.
- Descargue e instalación celda triplex, transformador eléctrico y transferencia automática en nivel N-3.30 entre los ejes 4 al 5 y A al B.
- Montaje lavamanos N+0.00 ejes 4 y 5 entre C y D.
- Mampostería para las cajas CS 276 eléctricas entre los ejes 4 al 6 y B al D2 en nivel N-3.30.
- Excavación manual, excavación a máquina para la tubería enterrada y fundida de placas de los pozo de aguas lluvias y residuales ejes B al D y 2 al 4 en nivel N+0.00.
- Mampostería en ladrillo arena con fachaleta N+9.90 ejes 1 al 2 entre B al C.
- Pañete liso N+9.90 ejes 1 al 2 entre B al C.
- Instalación enchape N+6,60 ejes 1 al 2 entre B al C.
- Instalación tubería alcantarillado, relleno de arena de peña y relleno en recebo común con material RCD ejes 2 al 3 y C al D nivel N+0.00.
- Pañete impermeabilizado, estuco y pintura N+3.30 ejes 1 y 2 entre A y B.
- Terminación puntos hidráulicos N+0.00 ejes 1 y 2 entre A y B.
- Instalación cubierta tipo sandwich N+13.20 ejes 1 al 2 y A al C.
- Mampostería en ladrillo arena ejes 1 y 2 entre A y B.
- Instalación enchape muro en baño, fundida de columnetas y viguetas de confinamiento ejes 1 y 2 entre A y B.

- Excavación manual para muro de contención T3A eje A0 entre 6 y cerramiento occidental.
- Mampostería cajas CS-276 entre ejes 4 al 6 y A0 al D2.
- Mampostería en bloque # 4 y pañete N+0.00 entre los ejes 1 al 2 y A0 al B.
- Enchape piso N+3.30 entre los ejes 1 al 2 y A0 al B.
- Mampostería en pozos de aguas lluvias, aguas negras, instalación tubería alcantarillado y relleno en arena de peña entre los ejes 2 al 4 y C al D en nivel N+0.00.
- Instalación cubierta tipo sandwich N+13.20 entre ejes 1 al 2 y B al D.
- Enchape baño en muro lineal N+6.60, estuco y pintura N+6.60 entre ejes 1 al 2 y B al D.
- Excavación a máquina en urbanismo, relleno en recebo común entre los ejes 2 al 4 y C al D en nivel N+0.00.
- Estuco y pintura lineal entre ejes 3 al 5 C al D 2 en nivel N+0.00.
- Excavación manual para la instalación del poste sobre el andén norte entre ejes 4 y 5.
- Mampostería caja CS276 entre los ejes 4 al 6 y A0 al D2 en nivel N-3.30.
- Pañete impermeabilizado en baños, fundida de viguetas de confinamiento entre los ejes 1 al 2 y A al B en nivel N-3.30.
- Excavación a máquina sardinel, mampostería para los pozos de aguas lluvias y aguas negras entre los ejes 2 al 4 C al D2 en nivel N+0.00.
- Instalación cubierta tipo sandwich en nivel N+13.20 entre los ejes 1 al 2 y A0 al D.
- Mampostería en bloque # 4 N+6.60 entre los ejes 1 al 2 y A0 al B.
- Relleno en recebo común con material RCD y relleno en subbase granular con material RCD entre los ejes 2 al 4 y C al D en nivel N+0.00.
- Tubería acometida red de gas y fundida de concreto de limpieza para la zarpa muro T3A ejes 5 al 6 A0 al C en el nivel N-3.30.
- Fundida de columnetas de confinamiento, pañete liso entre los ejes 1 al 2 y A0 al B nivel N+9.90.
- Instalación estructura ascensor, estuco y pintura lineal entre los ejes 4 al 5 y B al D en nivel N-3.30.
- Mampostería para los pozos de aguas lluvias y aguas residuales N+0.00 en ejes C y D entre ejes 2 y 3.
- Mampostería caja CS-276 N-3.30 entre los ejes C al D2 y 4 al 6.
- Enchape piso en baño N+6.60 ejes A al B y 1 al 2.

- Relleno en subbase granular N+0.00 ejes 3 al 4 y C al D.
- Pañete impermeabilizado N+0.00, mampostería en bloque # 4 N+3.30, enchape muro en bañon+3.30 entre los ejes A al B y 1 al 2.
- Recubrimiento para en geotextil pozos AN y ALL, relleno en recebo común, relleno en subbase granular entre los ejes 2 al 3 y C al D en nivel N+0.00.
- Desmonte y montaje del poste de la zona peatonal norte N+0.00, instalación tubería con relleno en arena de peña para ductos eléctricos N-3.30 entre ejes 4 al 5 y D al D2.
- Excavación manual y conexión a gas principal hasta el nicho de la obra entre los ejes 5 al 6 y B al C en nivel N-3.30.
- Relleno en arena de peña, relleno en material seleccionado y armado de acero para el muro de contención 3A ejes 5 al 6 y A0 al C.
- Instalación registros N+6.60, terminación puntos hidráulicos duchas N+6.60, enchape piso N+6.60 y muro en baños N+3.30 entre ejes 1 al 2 y A al C.
- Mampostería en bloque # 4 N+9.90, mampostería en ladrillo arena N+0.00 fundida de columnetas de confinamiento y pañete en m2 y lineal N+6.60 entre ejes 1 al 2 y A0 al D.
- Excavación manual e instalación tubería para las salidas desagües del cárcamo en nivel N+0.00 ejes 2 al 4 y C al D.
- Terminación cajas CS-276 en nivel N-3.30 entre los ejes 4 al 6 y D al D 2.
- Armado de acero para el muro de contención 3A entre los ejes 5 al 6 y A0 al A en nivel N-3.30.
- Instalación geodrén en muro de contención 3A entre los ejes 5 al 6 y A0 al A en nivel N-3.30.
- Relleno en subbase granular con material RCD zona placa N+0,00, relleno en recebo común con material RCD zona los ductos eléctricos N+3.30 ejes 2 al 5 y C al D.
- Mampostería en ladrillo arena N+0.00, pañete bajo escalera N+3.30 entre los ejes 1 al 2 y A0 al B.
- Terminación puntos duchas N+6.60, instalación enchape baño en piso N+3.30 e instalación enchape muros en baños N+6.60 entre los ejes 1 al 2 y A0 al B.
- Fundida de columnetas y viguetas de confinamiento entre los 1 al 2 y A0 al D en nivel N+9.90.
- Instalación tubería PVC-S, instalación sifones y relleno en arena de peña entre los ejes 2 al 4 y C al D en nivel N+0.00.

- Estuco y pintura lineal N+3.30 ejes C al D y 2 al 5.
- Excavación manual para la tubería enterrada y excavación manual para el urbanismo en nivel N-3.30 entre ejes 4 al 6 y C al D2.
- Mampostería el ladrillo arena entre los ejes 1 al 2 y A al B en nivel N+0.00.
- Relleno en subbase granular en nivel N+0.00 entre los ejes C al D2 y 2 al 4.
- Terminación punto duchas, pañete liso entre los ejes 1 al 2 y B al D en nivel N+9.90.
- Inicio instalación estructura cieloraso e instalación enchape en baño en nivel N+6.60 entre los ejes 1 al 2 y A al B.
- Pañete lineal en alojamientos entre los ejes 1 al 2 ay C al D en nivel N+6.60.
- Instalación enchape muro y piso en baño en nivel N+3.30 entre los ejes 1 al 2 y A al B.
- Terminación puntos duchas e instalación push sanitarios entre los ejes 1 al 2 y A al D en nivel N+9.90.
- Mampostería en bloque # 4 entre los ejes 1 al 2 y C al D en nivel N+6.60.
- Estructura de cielo raso entre los ejes 1 al 2 y C al D en nivel N+6.60.
- Fundida de columnetas y viguetas de confinamiento entre los ejes 1 al 2 y C al D en nivel N+6.60.
- Excavación manual zona norte andenes.
- Relleno en recebo común, relleno en subbase granular entre los ejes C al D2 y 2 al 4 en nivel N+0.00.
- Excavación a máquina N -3.30, fundida de mesón N+3.30 entre los ejes 4 al 6 al A0 al D.
- Estuco y pintura N+3.30 entre los ejes 4 al 6 al A0 al D.
- Mampostería en ladrillo arena con fachaleta lineal y en m2 entre los ejes D al D1 y 1 al 2 en nivel N+6.60.
- Instalación estructura metálica para el cielo raso en niveles N+3.30 y N+6.60 entre los ejes 1 al 2 y A al C.
- Terminación puntos duchas, instalación enchape muro baños entre los ejes a al b y 1 al 2 en nivel N+0.00.
- Instalación enchape muro en baños y cuarto de aseo, pañete liso entre los ejes 1 al 2 y B al D en nivel N+6.60.
- Excavación manual zona sardinel, y fundida de concreto de limpieza para la curva sardinel en nivel N+0.00 entre los ejes 2 al 4 y D al D2.

- Instalación marcos de las lámparas de iluminación N-3.30, estuco y pintura N+3.30 entre los ejes 4 al 5 y B al D.
- Pañete impermeabilizado en baño, mampostería el ladrillo arena con fachaleta entre los ejes C al D y 1 al 2 en nivel N+9.90.
- Fundida de alfajía en concreto con acabado endurecido, pañete liso y lineal entre los ejes 1 al 2 y A al C en nivel N+9.90.
- Relleno en base granular con RCD ejes 3 al 5 y C al D2 el nivel N+0.00.
- Instalación marcos luminaria ejes 4 al 6 y B al D del nivel N+0.00.
- Fundida de concreto 4000 para la zarpa muro T3A N-3.30 sobre el eje A0 y 5 al 6, viga N+4.85 ejes 1A al 1 y D al D1.
- Fundida de concreto en cárcamos y fundida de concreto para borde sardinel ejes 2 al 4 y C al D2 N+0.00.
- Mampostería en bloque # 4 N+3.30 entre los ejes 1 al 2 y A al C.
- Instalación enchape muros en baños N+0.00, estructura cielo raso N+3.30 entre los ejes 1 al 2 y A al C.
- Terminación mesones zona cocina N+3.30, estuco y pintura N+0.00 ejes A al C y 4 al 5.
- Mampostería en ladrillo arena con fachaleta N+9.90, armado de acero para curva sardinel N+0.00 ejes C al D2 y 2 al 4.
- Fundida de concreto para los cárcamos de la salida patio maquinas, relleno en base granular ejes 2 al 4 y C al D nivel N+0.00.
- Instalación luminarias N+0.00 ejes 4 al 6 y C al D nivel N+0.00.
- Relleno en recebo común con RCD N-3.30 ejes C al D y 4 al 5.
- Instalación enchape de piso entre los ejes 1 al 2 y A0 al B en nivel N+6.60.
- Mampostería en bloque # 4, enchape muro en baños ejes 1 al 2 y A al B en nivel N+0.00.
- Mampostería en bloque # 4 N+3.30 y mampostería en ladrillo con fachaleta N+9.90 entre los ejes 1 al 2 y B al D.
- Estructura cielo raso entre los ejes 1 al 2 y A0 al B nivel N+3.30.
- Instalación tubería PVC-P, CPVC-P con reguladora de presión entre los ejes 1 al 2 y A0 al B nivel N+3.30.
- Enchape piso para baños y enchape piso de 60 x 60 entre los ejes B al D y 1 al 2 en nivel N+6.60.
- Relleno en recebo común entre los ejes 4 al 5 y D al D2 en nivel N-3.30.
- Instalación luminarias en nivel N+0.00 entre los ejes 4 al 5 y C al D.
- Relleno en base granular entre los ejes 3 al 4 y C al D en nivel N+0.00.

- Mampostería en ladrillo arena con fachaleta entre los ejes 1 al 2 y sobre el eje D en nivel N+13.20.
- Fundida de alfajía en concreto con acabado endurecido ejes 1 y 2 entre ejes A0 y D en el nivel N +6.60.
- Pañete liso en ejes 1 y 2 entre ejes A y C en el nivel N +6.60.
- Fundida de columnetas y viguetas de confinamiento, pañete impermeabilizado entre los ejes 1 al 2 y ejes A y B en el nivel N+/- 0.00.
- Instalación de tubería PVC-P y CPVC-P entre los ejes 1 al 2 y ejes A y B.
- Instalación de enchape piso nivel N+6.60 ejes 1 al 2 y ejes A al D.
- Instalación luminarias N +/- 0.00 ejes 4 al 5 y ejes C y D.
- Instalación de láminas de cieloraso en los ejes 1 al 2 y ejes A y B nivel N+3.30
- Mampostería en bloque # 4 N+9.90.
- Aplicación mortero ignifugo en estructura metálica de la cubierta N+13.20.
- Soporte RCI transversal N+6.60 entre ejes 1 al 2 y A0 al D.
- Desmonte de puerta de la cr 15 este.
- Continuación cerramiento provisional sobre eje 6 y A al C en nivel N-3.30.
- Terminación mesones N+3.30 entre los ejes 4 al 5 y A al B.
- Instalación luminarias N+0.00 entre los ejes 4 al 5 y A al B.
- Fundida de columnas y viguetas de confinamiento, puntos eléctricos, láminas de cielo raso entre los ejes 1 al 2 y A0 al B.
- Enchape piso, pañete liso en escaleras y soporte longitudinal RCI entre los ejes A0 al B y 1 al 2 en nivel N+6.60.
- Acabado endurecido cárcamos, relleno en base y subbase granular entre los ejes 2 al 4 y C al D en nivel N+0.00.
- Cerramiento provisional, demolición vigas y columnas sobre el eje 6 entre ejes A0 al C en nivel N-3.30.
- Enchape piso en baños, enchape muro en baños, salidas sanitarias, mampostería en bloque # 4 ejes 1 al 2 y A al D en nivel N+6.60.
- Desmonte de cerchas existentes, excavación a máquina urbanismo, demolición mampostería entre ejes A0 al C sobre el eje 6.
- Relleno en base granular. Instalación luminarias, acabado endurecido en cárcamos ejes 2 al 5 y C al D en nivel N+0.00.
- Instalación láminas en cieloraso N+3.30, enchape piso N+6.60, aplicación mortero contra fuego N+13.20 ejes 1 al 2 y A al C.

- Pañete liso, instalación tubería PVC-P, CPVC-P, enchape muro en baños entre los ejes A0 al B y 1 al 2 en nivel N+0.00.
- Pañete liso, mampostería en bloque # 4 e instalación válvulas balanceadoras y tubería CPVC-P, PVC-P ejes 1 al 2 y A0 al B nivel N+6.60.
- Enchape piso N+6.60, aplicación mortero sello contra fuego N+13.20 y enchape muros baños N+0.00 ejes 1 al 2 y A al C.
- Instalación cerramiento provisional, excavación a máquina entre los ejes A al C y sobre el eje 6 en nivel N-3.30.
- Instalación láminas del cielo raso, instalación guardaescoba, enchape en piso cuarto aseo entre los ejes 1 al 2 y B al D en el nivel N+6.60.
- Demolición mampostería, columnas y vigas en nivel N-3.30 entre ejes A al C sobre el eje 6, fundida de columnetas y viguetas de confinamiento N+3.30.
- Relleno base granular N+0.00 ejes 2 al 4 y A al D.
- Fundida de mesones en baños N+0.00 ejes 1 al 4 y A al D.
- Instalación luminarias N+3.30 ejes 4 al 5 y A al B.
- Mampostería en ladrillo arena N+4.85 ejes C al D y sobre el eje 2.
- Demolición cimiento enterrado, excavación ciclópeo y fundida de concreto ciclópeo ejes A al C y 5 al 6 en nivel N-3.30.
- Aplicación mortero contrafuego N+13.20, pañete impermeabilizado baños N+9.90 entre los ejes 1 al 2 y B al D
- Excavación manual para curva placa, fundida mesones lavandería, relleno en base granular ejes 2 al 4 y A al D en nivel N+0.00.
- Instalación láminas en cielo raso, enchape piso 60 x 60 e instalación guardaescoba en nivel N+6.60 ejes 1 al 2 y A al C.
- Instalación rubatex, enchape muros en lavandería, instalación válvulas balanceadoras en nivel N+0.00 ejes 1 al 2 y A al B.
- Pañete impermeabilizado N+9.90, mampostería en ladrillo arena N+4.85 entre los ejes 1 al 2 y C al D.
- Instalación láminas en cielo raso, instalación en guardaescoba entre ejes 1 al 2 y B al C en nivel N+6.60.
- Fundida de alfajía en concreto con acabado endurecido, aplicación mortero contrafuego entre los ejes 1 al 2 y B al D en nivel N+13.20.
- Armado de acero para vigas de cerramiento, excavación manual zarpa muro y excavación concreto ciclópeo ejes 5 al 6 A0 al C.

- Fundida de concreto para columnetas y viguetas de confinamiento ejes 1 al 2 y a 0 al D en nivel N+6.60.
- Instalación enchape muro en lavandería e instalación tubería PVC-P y CPVC-P entre ejes 1 al 2 y A al B en nivel N+0.00.
- Excavación zarpa muro T3A, instalación geodrén vial y amarre de acero muro ejes 5 al 6 y A0 al A en nivel N-3.30.
- Instalación malla eléctrosoldada ejes 1 al 1A y C al D en nivel N+4.85.
- Aplicación mortero para afinado de piso en lavandería ejes 1 al 2 y A al B en nivel N+0.00.
- Compactación relleno de base granular ejes 2 al 4 y C al D en nivel N+0.00.
- Mampostería en ladrillo arena con fachaleta N+6.60, pañete liso N+3.30 y amarre de acero para placa 0.20m ejes B al D y 1 al 4.
- Fundida de concreto 4000 psi placa 0.125 m con acabado endurecido y terminación en estampado ejes 1 al 1A y C al D en nivel N+4.85.
- Aplicación mortero contrafuego N+13.20, puntos hidráulicos con registros N+9.90, instalación láminas cielo raso N+6.60 ejes 1 al 2 y B al D.
- Enchape baños zona lavandería con enchape lineal muros, instalación lavamanos, terminación en guardaescoba N+6.60 ejes 1 al 2 y A al C N+0.00.
- Demolición cimiento enterrado y excavación para ciclópeo de cerramiento ejes 5 al 6 y A al B N-3.30.
- Fundida de concreto 4000 psi para zarpa muro T3A, fundida de concreto ciclópeo cerramiento, estuco y pintura ejes 5 al 6 y A0 al C N-3.30.
- Alfajía en concreto con acabado endurecido N+3.30.
- Enchape muro con enchape lineal, enchape piso zona lavandería N+0.00 ejes 1 al 3 y A al B.
- Fundida de concreto 4000 PSI para muro de contención 3A y viga cerramiento, fundida de ciclópeo para cerramiento ejes 5 al 6 y A al C nivel N-3.30.
- Mampostería en ladrillo arena, terminación guardaescoba y cielo raso lineal en puertas ejes 1 al 2 y B al D en nivel N+6.60.
- Armado de acero placa N+0.00, fundida de concreto 4000 psi placa 0.2m con acabado endurecido y terminación en estampado ejes 1 al 1A y C al D en nivel N+0.00.

- Mampostería en bloque # 4 N+9.90, aplicación mortero contra fuego N+13.20, instalación tubería RCI N+3.30, demolición cimiento enterrado y excavación para ciclópeo de cerramiento ejes 5 al 6 y A al B N-3.30.
- Terminación de mesones baños, afinado de piso zona baños desinfección ejes 1 al 2 y A al B en nivel N+0.00.
- Armado de acero placa N+0.00, fundida de concreto 4000 psi placa 0.2m con acabado endurecido y terminación en estampado ejes 1 al 1A y C al D en nivel N+0.00.
- Terminación en guardaescoba, instalación láminas de cielo raso y tubería RCI ejes 1 al 2 y A al B en nivel N+6.60.
- Armado de acero viga cerramiento, fundida de concreto 4000 psi para el muro de contención 3A y viga cerramiento, estuco y pintura lineal en N-3.30 ejes 5 al 6 y A0 al D.
- Pañete liso N+3.30 y mampostería en ladrillo arena N+6.60 entre los ejes 1 al 2 y B al D.
- Mampostería en ladrillo arena con terminación en fachaleta N+3.30 ejes 1 al 2 y A al B.
- Pañete liso N+3.30 y terminación guardaescoba N+6.60 ejes 1 al 2 y B al D.
- Armado de acero para la viga de cerramiento N-3.30 e instalación vidrios en ventanera N+3.30 ejes 4 al 6 y A al C.
- Fundida de columnetas y viguetas de confinamiento ejes 1 al 2 y A0 al B en nivel N+6.60.
- Fundida de concreto 4000 psi placa 0.2m con acabado endurecido y terminación en estampado ejes 1 al 1A y C al D en nivel N+0.00.
- Mampostería en ladrillo arena N+3.30 e instalación enchape piso en baño N+0.00 ejes A al B y 1 al 2.
- Terminación fundida mesones e instalación enchape baños entre los ejes 1 al 2 y A al C en nivel N+6.60.
- Mampostería en ladrillo arena N+9.90, terminación en cielo raso lineal N+6.60 ejes 1 al 2 y B al D.
- Relleno en recebo común con material RCD, armado de acero para sardinel ejes 5 al 6 y A0 al C N-3.30.
- Fundida de concreto para la viga cerramiento y excavación manual caja de aguas lluvias ejes 5 al 6 y A0 al B en nivel N-3.30.
- Mampostería en ladrillo arena con fachaleta, pañete liso entre ejes 1 al 2 y A al C nivel N+3.30.

- Instalación ventanera N+0.00 ejes 4 al 5 y C al D.
- Instalación de enchape piso en baño N+0.00 ejes 1 al 2 y A al B.
- Mampostería en ladrillo arena N+9.90, fachaleta en ladrillo arena N+3.30 ejes 1 al 2 y A al D.
- Armado de acero y fundida de concreto para la curva sardinel entre ejes 5 al 6 y B al C en nivel N-3.30.
- Excavación manual y limpieza zona N+4.85 entre ejes 1A al 1 B al D1.

1.5. ACTAS LEGALES SUSCRITAS

TIPO DE ACTA	FECHA DE SUSCRIPCIÓN	MOTIVO
Comité de obra No. 53	3/02/2021	Reunión de seguimiento de obra
Comité de obra No. 54	11/02/2021	Reunión de seguimiento de obra
Comité de obra No. 55	18/02/2021	Reunión de seguimiento de obra
Comité de obra No. 56	25/02/2021	Reunión de seguimiento de obra

1.6. REGISTRO FOTOGRÁFICO

En el Anexo 2, se adjuntan los informes diarios y el registro fotográfico, donde se evidencian las actividades ejecutadas en el presente periodo.

1.7. ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Los análisis de precios unitarios, son los mismos que se encuentran anexados en la propuesta, con la cual fue adjudicado el Contrato de obra.

1.8. CONTROL DEL PERSONAL DEL CONTRATISTA

En el Anexo 3 "Control de personal del contratista", se evidencia el personal durante el presente periodo.

1.8.1. Disposiciones laborales, pagos parafiscales y dotación

G&G INGENIEROS LTDA, ha dado cumplimiento a los pagos a seguridad social y parafiscal del personal que se ha encontrado durante la ejecución del proyecto de este periodo, se adjuntan certificación en el anexo No. 4.

1.9. ENSAYOS DE LABORATORIO

En el anexo 5 "Ensayos de laboratorio", se evidencia los resultados de los ensayos durante el presente periodo.

2. CONCLUSIONES

- Inician actividades en el urbanismo tales como cajas eléctricas, excavaciones para andenes.
- Continúa la instalación de cieloraso.
- Instalación de mortero ignifugo sobre la estructura metálica de la cubierta.
- Fundida de placa de contrapiso estampada de transición del patio de máquinas y la vía principal sobre la calle 41B.
- Construcción de pozos de aguas lluvias y aguas residuales.
- Continúa instalación de luminarias en todos los niveles.
- Instalación tableros en cuartos eléctricos.
- Instalación de ascensor
- La interventoría viabiliza ante la Entidad la solicitud de prórroga hecha y finalmente la Entidad es la que da la aprobación de la ampliación del plazo hasta el próximo 1ro de junio de 2021.

ANEXOS

Anexo 1. Control de correspondencia

RADICADO EN FISICO	ENVIADO A CORREO ELECTRONICO	COMUNICACIÓN	FECHA DE RADICACION	PARA	CON COPIA	ASUNTO
	Promciviles UAECOB <interuaecob@gmail.com>, "Ing. Jose Luis Juyo" <residenteparques@gmail.com>, EDUARDO CONTRERAS <LUISEDUARDOCONTRERAS1917@gmail.com>	G&G-2020-UAECOB-464	1-feb	PROMCIVILES	Cristian Camilo Gomez Rios <ccgomez@bomberosbogota.gov.co>, Diana Mireya Parra Cardona <dmparra@bomberosbogota.gov.co>, Camilo Augusto Pardo Rocha <cpardo@bomberosbogota.gov.co>, GYG INGENIEROS LTDA <gygingenierosltda@gmail.com>, Fernando Gomez Gonzalez <gerencia@gygingenierosltda.com>, Tito Augusto Gutierrez Correa <tito2012_1@hotmail.com>	ACTA PARCIAL No. 13 DIC_01 AL DIC_31 DE 2020
	Promciviles UAECOB <interuaecob@gmail.com>, "Ing. Jose Luis Juyo" <residenteparques@gmail.com>, EDUARDO CONTRERAS <LUISEDUARDOCONTRERAS1917@gmail.com>	G&G-2020-UAECOB-465	4-feb	PROMCIVILES	Cristian Camilo Gomez Rios <ccgomez@bomberosbogota.gov.co>, Diana Mireya Parra Cardona <dmparra@bomberosbogota.gov.co>, Camilo Augusto Pardo Rocha <cpardo@bomberosbogota.gov.co>, GYG INGENIEROS LTDA <gygingenierosltda@gmail.com>, Fernando Gomez Gonzalez <gerencia@gygingenierosltda.com>, Tito Augusto Gutierrez Correa <tito2012_1@hotmail.com>	ACCIONES A IMPLEMENTAR PARA MITIGAR LA DESVIACION NEGATIVA EN LA EJECUCION DE LAS OBRAS.
	Promciviles UAECOB <interuaecob@gmail.com>, "Ing. Jose Luis Juyo" <residenteparques@gmail.com>, EDUARDO CONTRERAS <LUISEDUARDOCONTRERAS1917@gmail.com>	G&G-2020-UAECOB-466	4-feb	PROMCIVILES	Cristian Camilo Gomez Rios <ccgomez@bomberosbogota.gov.co>, Diana Mireya Parra Cardona <dmparra@bomberosbogota.gov.co>, Camilo Augusto Pardo Rocha <cpardo@bomberosbogota.gov.co>, GYG INGENIEROS LTDA <gygingenierosltda@gmail.com>, Fernando Gomez Gonzalez <gerencia@gygingenierosltda.com>, Tito Augusto Gutierrez Correa <tito2012_1@hotmail.com>	INFORME MNSUAL No. 16 DEL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020
	Promciviles UAECOB <interuaecob@gmail.com>, "Ing. Jose Luis Juyo" <residenteparques@gmail.com>, EDUARDO CONTRERAS <LUISEDUARDOCONTRERAS1917@gmail.com>	G&G-2020-UAECOB-467	5-feb	PROMCIVILES	Cristian Camilo Gomez Rios <ccgomez@bomberosbogota.gov.co>, Diana Mireya Parra Cardona <dmparra@bomberosbogota.gov.co>, Camilo Augusto Pardo Rocha <cpardo@bomberosbogota.gov.co>, GYG INGENIEROS LTDA <gygingenierosltda@gmail.com>, Fernando Gomez Gonzalez <gerencia@gygingenierosltda.com>, Tito Augusto Gutierrez Correa <tito2012_1@hotmail.com>	SOLICITUD CAMBIO DE ESPECIFICACION ITEM 9.12. PUERTA SECCIONAL GRANDES DMENSIONES.
	Promciviles UAECOB <interuaecob@gmail.com>, "Ing. Jose Luis Juyo" <residenteparques@gmail.com>, EDUARDO CONTRERAS <LUISEDUARDOCONTRERAS1917@gmail.com>	G&G-2020-UAECOB-468	6-feb	PROMCIVILES	Cristian Camilo Gomez Rios <ccgomez@bomberosbogota.gov.co>, Diana Mireya Parra Cardona <dmparra@bomberosbogota.gov.co>, Camilo Augusto Pardo Rocha <cpardo@bomberosbogota.gov.co>, GYG INGENIEROS LTDA <gygingenierosltda@gmail.com>, Fernando Gomez Gonzalez <gerencia@gygingenierosltda.com>, Tito Augusto Gutierrez Correa <tito2012_1@hotmail.com>	JUSTIFICACION CAMBIO DE LUMINARIAS, ITEMS 21.3.3, 21.3.4, 21.3.5.
	info@promciviles.com, "Ing. Luis O Pulido" <gerencia@promciviles.com>, financiera@promciviles.com,	G&G-2020-UAECOB-469	11-feb	PROMCIVILES	Cristian Camilo Gomez Rios <ccgomez@bomberosbogota.gov.co>, Diana Mireya Parra Cardona <dmparra@bomberosbogota.gov.co>, Camilo Augusto Pardo Rocha <cpardo@bomberosbogota.gov.co>, GYG INGENIEROS LTDA <gygingenierosltda@gmail.com>, Fernando Gomez Gonzalez <gerencia@gygingenierosltda.com>, Tito Augusto Gutierrez Correa <tito2012_1@hotmail.com>	INFORME FINAL FIDUCIA
	Promciviles UAECOB <interuaecob@gmail.com>, "Ing. Jose Luis Juyo" <residenteparques@gmail.com>, EDUARDO CONTRERAS <LUISEDUARDOCONTRERAS1917@gmail.com>	G&G-2020-UAECOB-470	12-feb	PROMCIVILES	Cristian Camilo Gomez Rios <ccgomez@bomberosbogota.gov.co>, Diana Mireya Parra Cardona <dmparra@bomberosbogota.gov.co>, Camilo Augusto Pardo Rocha <cpardo@bomberosbogota.gov.co>, GYG INGENIEROS LTDA <gygingenierosltda@gmail.com>, Fernando Gomez Gonzalez <gerencia@gygingenierosltda.com>, Tito Augusto Gutierrez Correa <tito2012_1@hotmail.com>	Acta parcial No. 14_ ENE_01 AL ENE_31 DE 2021

RADICADO EN FISICO	ENVIADO A CORREO ELECTRONICO	COMUNICACIÓN	FECHA DE RADICACION	PARA	CON COPIA	ASUNTO
	info@promciviles.com, "Ing. Luis O Pulido" <gerencia@promciviles.com>, financiera@promciviles.com,	G&G-2020-UAECOB-471	12-feb	PROMCIVILES	Cristian Camilo Gomez Rios <ccgomez@bomberosbogota.gov.co>, Diana Mireya Parra Cardona <dmparra@bomberosbogota.gov.co>, Camilo Augusto Pardo Rocha <cpardo@bomberosbogota.gov.co>, GYG INGENIEROS LTDA <gygingenierosltda@gmail.com>, Fernando Gomez Gonzalez <gerencia@gygingenierosltda.com>, Tito Augusto Gutierrez Correa <tito2012_1@hotmail.com>	INFORME AMBIENTAL ENERO 2021
	Promciviles UAECOB <interuaecob@gmail.com>, "Ing. Jose Luis Juyo" <residenteparques@gmail.com>, EDUARDO CONTRERAS <LUISEDUARDOCONTRERAS1917@gmail.com>	G&G-2020-UAECOB-472	12-feb	PROMCIVILES	Cristian Camilo Gomez Rios <ccgomez@bomberosbogota.gov.co>, Diana Mireya Parra Cardona <dmparra@bomberosbogota.gov.co>, Camilo Augusto Pardo Rocha <cpardo@bomberosbogota.gov.co>, GYG INGENIEROS LTDA <gygingenierosltda@gmail.com>, Fernando Gomez Gonzalez <gerencia@gygingenierosltda.com>, Tito Augusto Gutierrez Correa <tito2012_1@hotmail.com>	INFORME MNSUAL No. 17 DEL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1 AL 31 DE ENERO DE 2021
	info@promciviles.com, "Ing. Luis O Pulido" <gerencia@promciviles.com>, financiera@promciviles.com,	G&G-2020-UAECOB-473	12-feb	PROMCIVILES	Cristian Camilo Gomez Rios <ccgomez@bomberosbogota.gov.co>, Diana Mireya Parra Cardona <dmparra@bomberosbogota.gov.co>, Camilo Augusto Pardo Rocha <cpardo@bomberosbogota.gov.co>, GYG INGENIEROS LTDA <gygingenierosltda@gmail.com>, Fernando Gomez Gonzalez <gerencia@gygingenierosltda.com>, Tito Augusto Gutierrez Correa <tito2012_1@hotmail.com>	COMUNICADO
	info@promciviles.com, "Ing. Luis O Pulido" <gerencia@promciviles.com>, financiera@promciviles.com,	G&G-2020-UAECOB-474	16-feb	PROMCIVILES	Cristian Camilo Gomez Rios <ccgomez@bomberosbogota.gov.co>, Diana Mireya Parra Cardona <dmparra@bomberosbogota.gov.co>, Camilo Augusto Pardo Rocha <cpardo@bomberosbogota.gov.co>, GYG INGENIEROS LTDA <gygingenierosltda@gmail.com>, Fernando Gomez Gonzalez <gerencia@gygingenierosltda.com>, Tito Augusto Gutierrez Correa <tito2012_1@hotmail.com>	Respuesta a comunicado D_12-2021-16 informe liquidación fiducia ajustado
	info@promciviles.com, "Ing. Luis O Pulido" <gerencia@promciviles.com>, financiera@promciviles.com,	G&G-2020-UAECOB-475	16-feb	PROMCIVILES	Cristian Camilo Gomez Rios <ccgomez@bomberosbogota.gov.co>, Diana Mireya Parra Cardona <dmparra@bomberosbogota.gov.co>, Camilo Augusto Pardo Rocha <cpardo@bomberosbogota.gov.co>, GYG INGENIEROS LTDA <gygingenierosltda@gmail.com>, Fernando Gomez Gonzalez <gerencia@gygingenierosltda.com>, Tito Augusto Gutierrez Correa <tito2012_1@hotmail.com>	COMUNICADO
	Promciviles UAECOB <interuaecob@gmail.com>, "Ing. Jose Luis Juyo" <residenteparques@gmail.com>, EDUARDO CONTRERAS <LUISEDUARDOCONTRERAS1917@gmail.com>	G&G-2020-UAECOB-476	18-feb	PROMCIVILES	Cristian Camilo Gomez Rios <ccgomez@bomberosbogota.gov.co>, Diana Mireya Parra Cardona <dmparra@bomberosbogota.gov.co>, Camilo Augusto Pardo Rocha <cpardo@bomberosbogota.gov.co>, GYG INGENIEROS LTDA <gygingenierosltda@gmail.com>, Fernando Gomez Gonzalez <gerencia@gygingenierosltda.com>, Tito Augusto Gutierrez Correa <tito2012_1@hotmail.com>	ESPECIFICACIONES TECNICAS Y PLANO DE TALLER PUERTA ENROLLABLE NP-38.
	Promciviles UAECOB <interuaecob@gmail.com>, "Ing. Jose Luis Juyo" <residenteparques@gmail.com>, EDUARDO CONTRERAS <LUISEDUARDOCONTRERAS1917@gmail.com>	G&G-2020-UAECOB-477	18-feb	PROMCIVILES	Cristian Camilo Gomez Rios <ccgomez@bomberosbogota.gov.co>, Diana Mireya Parra Cardona <dmparra@bomberosbogota.gov.co>, Camilo Augusto Pardo Rocha <cpardo@bomberosbogota.gov.co>, GYG INGENIEROS LTDA <gygingenierosltda@gmail.com>, Fernando Gomez Gonzalez <gerencia@gygingenierosltda.com>, Tito Augusto Gutierrez Correa <tito2012_1@hotmail.com>	A SU COMUNICACION D-21 DE FECHA 12 DE FEBRERO DE 2021_OBSERVACIONES AL SEGUNDO BALANCE DE OBRA V-4

RADICADO EN FISICO	ENVIADO A CORREO ELECTRONICO	COMUNICACIÓN	FECHA DE RADICACION	PARA	CON COPIA	ASUNTO
	Promciviles UAECOB <interuaecob@gmail.com>, "Ing. Jose Luis Juyo" <residenteparques@gmail.com>, EDUARDO CONTRERAS <LUISEDUARDOCONTRERAS1917@gmail.com>	G&G-2020-UAECOB-478	18-feb	PROMCIVILES	Cristian Camilo Gomez Rios <ccgomez@bomberosbogota.gov.co>, Diana Mireya Parra Cardona <dmparra@bomberosbogota.gov.co>, Camilo Augusto Pardo Rocha <cpardo@bomberosbogota.gov.co>, GYG INGENIEROS LTDA <gygingenierosltda@gmail.com>, Fernando Gomez Gonzalez <gerencia@gygingenierosltda.com>, Tito Augusto Gutierrez Correa <tito2012_1@hotmail.com>	EQUIPOS VOZ Y DÁTOS.
	Promciviles UAECOB <interuaecob@gmail.com>, "Ing. Jose Luis Juyo" <residenteparques@gmail.com>, EDUARDO CONTRERAS <LUISEDUARDOCONTRERAS1917@gmail.com>	G&G-2020-UAECOB-479	18-feb	PROMCIVILES	Cristian Camilo Gomez Rios <ccgomez@bomberosbogota.gov.co>, Diana Mireya Parra Cardona <dmparra@bomberosbogota.gov.co>, Camilo Augusto Pardo Rocha <cpardo@bomberosbogota.gov.co>, GYG INGENIEROS LTDA <gygingenierosltda@gmail.com>, Fernando Gomez Gonzalez <gerencia@gygingenierosltda.com>, Tito Augusto Gutierrez Correa <tito2012_1@hotmail.com>	CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES EN PREDIOS VECINOS.
	Promciviles UAECOB <interuaecob@gmail.com>, "Ing. Jose Luis Juyo" <residenteparques@gmail.com>, EDUARDO CONTRERAS <LUISEDUARDOCONTRERAS1917@gmail.com>	G&G-2020-UAECOB-480	22-feb	PROMCIVILES	Cristian Camilo Gomez Rios <ccgomez@bomberosbogota.gov.co>, Diana Mireya Parra Cardona <dmparra@bomberosbogota.gov.co>, Camilo Augusto Pardo Rocha <cpardo@bomberosbogota.gov.co>, GYG INGENIEROS LTDA <gygingenierosltda@gmail.com>, Fernando Gomez Gonzalez <gerencia@gygingenierosltda.com>, Tito Augusto Gutierrez Correa <tito2012_1@hotmail.com>	PDT AJUSTADO SEGUN SOLICITUD EN COMUNICACION D-6
	info@promciviles.com, "Ing. Luis O Pulido" <gerencia@promciviles.com>, financiera@promciviles.com,	G&G-2020-UAECOB-481	25-feb	PROMCIVILES	Cristian Camilo Gomez Rios <ccgomez@bomberosbogota.gov.co>, Diana Mireya Parra Cardona <dmparra@bomberosbogota.gov.co>, Camilo Augusto Pardo Rocha <cpardo@bomberosbogota.gov.co>, GYG INGENIEROS LTDA <gygingenierosltda@gmail.com>, Fernando Gomez Gonzalez <gerencia@gygingenierosltda.com>, Tito Augusto Gutierrez Correa <tito2012_1@hotmail.com>	INFORME FIDUCIA AJUSTADO
	atencionalciudadano@ambientebogota.gov.co	G&G-2020-UAECOB-482	27-feb	SDA	HSEQ G&G <hseqgyg2015@gmail.com>, GYG INGENIEROS LTDA <gygingenierosltda@gmail.com>, G&G INGENIEROS LTDA <gygbellavista@gmail.com>, agamba@bomberosbogota.gov.co, msarmien2@hotmail.com, inarvaez@bomberosbogota.gov.co, LADY ALMANZA <sisomaparques@gmail.com>, Cristian Camilo Gomez Rios <ccgomez@bomberosbogota.gov.co>	Tercera prórroga del plazo de ejecución del Contrato de Obra Pública No.470 de 2018.

Anexo 2. Informes diarios

GC Ingeniería Ltda.	INFORME DIARIO DE ACTIVIDADES	Fecha:01/06/2019
		Código: F-OBR-024
	EJECUCIÓN DE OBRA	Versión: 1
		Hoja No.: 1 de 1

No DE CONTRATO DE OBRA Y OBJETO	CONTRATO DE OBRA PUBLICA No 405 DE 2020 SUSCRITO ENTRE EL DISTRITO CAPITAL - UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL CUERPO DE BOMBEROS Y GYG INGENIEROS LTDA	CONSECUTIVO	550
LUGAR o ESPECIALIDAD DE LOS TRABAJOS	OBRA	FECHA	lunes 1 de febrero de 2021

HORAS PERDIDAS	POR LLUVIA	POR FALLA		OTROS	TOTALES
Horas Perdidas					0 h
Horas Equipo					9.0

ITEM	DESCRIPCION	CAUSAS FUNCIONALES	UNID.	CANTIDAD			
				CONTRACTUAL	ACUMULADO ANTERIOR	AVANCE HOY	ACUMULADO ACTUAL
1,10	ACOMETIDA PROVISIONAL DE ALCANTARILLADO (ADECUACIÓN ACOMETIDA VIVIENDA EXISTENTE)	N-3.30	UN	1.00	0.00	1.00	1.00
3,1	EXCAVACIONES VARIAS A MAQUINA SIN CLASIFICAR INCLUYE RETIRO	N+0.00	M3	6684.95	6856.40	67.50	6923.90
3,3	RELLENO EN RECEBO COMÚN COMPACTADO MECÁNICAMENTE	N+0.00	M3	2929.95	3187.81	11.55	3199.36
4,11	REFUERZO MALLA ELECTROSOLDADA.	N-3.30	KG	15906.21	14937.08	600.00	15437.08
6,2	ANCLAJE BARRA 1/2" L=40CM INCLUYE EPÓXICO.	N+6.60	UN	600.00	3187.00	48.00	3235.00
6,3	MURO EN LADRILLO A LA VISTA GRAN FORMATO COLOR AMARILLO 11.5 CM.	N+6.60	M2	581.49	913.23	27.36	940.59
6,5	ENCHAPE EN FACHALETA LADRILLO A LA VISTA GRAN FORMATO COLOR AMARILLO. H< 0.60 M.	N+9.90	ML	618.36	361.50	22.80	384.30
6,8	COLUMNETA DE CONFINAMIENTO DE 0.095 X 0.21 M. EN CONCRETO DE 3000 PSI. REFUERZO= 4 D=3/8"	N+3.30	ML	758.00	1470.45	19.60	1490.05
6,9	VIGUETA DE CONFINAMIENTO DE 0.095 X 0.21 M. EN CONCRETO DE 3000 PSI. REFUERZO= 4 D=3/8"	N+3.30	ML	677.72	887.94	19.76	907.70
6,11	DOVELAS PARA MAMPOSTERIA INCLUYE ACERO DE REFUERZO 1 a 4.	N+6.60	ML	840.00	2161.90	69.60	2231.50
7,1	PAÑETE LISO MUROS 1:4, E=1.5 CM	N+9.90	M2	2786.25	2479.38	9.24	2488.62
11,7	ENCHAPE PUREO EN PORCELANATO DE 40 X 40 CM. COLOR BLANCO.	N+3.30	M2	545.32	258.83	15.00	273.83
14,1	ESTUCO Y VINILO TIPO 1 BLANCO PARA INTERIORES SOBRE PAÑETE 3 MANOS. INCLUYE FELOS Y	N+6.60	M2	1780.43	899.66	18.76	918.42
17,2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUBIERTA TIPO SANDWICH E=0.50 H=1.5" POLIURETANO. INCLUYE ACCESORIOS Y HERRAJES.	N+13.20	M2	347.78	0.00	76.95	76.95
23,3,1	CAMARA DE INSPECCION NORMA CS 276 CODENSA PARA MT (DE ACUERDO A ESPECIFICACIÓN TECNICA 3.6.1. PLANO TABLEROS Y CUADRO DE CARGAS)	N-3.30	UN	3.00	0.60	0.20	0.80
27.4.10	TUBERIA PVC ALCANTARILLADO 250MM	N+0.00	ML	49.50	35.90	10.50	46.40
28.3.2	TUBERIA ACERO NEGRO 3" CALIBRE 10	N+9.90	ML	85.86	75.00	6.00	81.00
28.3.4	TUBERIA ACERO NEGRO 1" CALIBRE 10	N+9.90	ML	12.71	0.00	18.00	18.00
28.3.8	ACCESORIOS ACERO NEGRO 1" CALIBRE 40	N+9.90	UN	8.00	0.00	8.00	8.00
28.3.17	COUPLING 3"	N+6.60	UN	53.00	8.00	45.00	53.00
28.3.23	VÁLVULA EXPULSORA DE AIRE 1"	N+13.20	UN	6.00	2.00	3.00	5.00
30.3.2	RELLENO ARENA DE PEÑA	N+0.00	M3	72.60	64.01	2.10	66.11

DESCRIPCION DE ACTIVIDADES EJECUTADAS

MAMPOSTERIA PARA LAS CAJAS CS 276 DE LA RED ELÉCTRICA EN NIVEL N-3.30 EJES D AL D 2 Y 4 AL 6, PAÑETE LISO. ENCHAPE MURO EN BAÑO, ESTUCO Y PINTURA ENTRE LOS EJES 1 AL 2 Y A AL B EN NIVEL N+3.30, INSTALACIÓN DE TUBERIA DE LA RED DE INCENDIO, CON VÁLVULA EXPULSORA Y REGISTRO BOLA ENTRE LOS EJES 1 AL 2 Y A0 AL D, FUNDIDA DE COLUMNETAS Y VIGUETAS DE CONFINAMIENTO E INSTALACIÓN DE CUBIERTA TIPO SANDWICH EJES 1 AL 2 Y C AL D, INSTLACIÓN MALLA ELÉCTROSOLDADA, RELLENO EN RECEBO COMÚN CON MATERIAL RCD, MAMPOSTERÍA EN LADRILLO ARENA CON FACHALETA, INSTALACIÓN TUBERIA ALCANTARILLADO, RELLENO EN ARENA DE PEÑA Y RECEBO COMÚN CON MATERIAL RCD ENTRE LOS EJES C AL D Y 2 AL 4 NIVEL N+0.00.

CARGO	TIPOS		CANT.	TIEMPO (Horas)
	PACTO	Hh		
Ing. Residente	$ 80.00	$ 10.000.00	1	10.00:00
Ayd. Ingeniero civil	$ 40.00	$ 80.000.00	1	10.00:00
Ing. Mecánicos (E)	$ 80.00	$ 10.000.00	1	10.00:00
Profesional Calidad	$ 80.00	$ 10.000.00	1	10.00:00
Residentes	$ 40.00	$ 5.000.00	1	10.00:00
Maestro	$ 40.00	$ 5.000.00	1	10.00:00
Oficial, ayudantes fijos y fijos	$ 30.00	$ 37.500.00	1	10.00:00
Oficiales	$ 30.00	$ 1.740.00	7	29.00:00
Ayudantes	$ 20.00	$ 11.600.00	20	290.00:00
Topógrafos de topografía GLO	$ 20.00	$ 11.600.00	20	290.00:00
Especialista Ing. Hidráulica Ing. Sol	$ 40.00	$ 1.160.00	1	4.00:00
Externo Externo	$ 40.00	$ 20.000.00	1	20.00:00
Inspector Hidrosanitario	$ 40.00	$ 5.000.00	5	50.00:00
Pasante Eléctrico	$ 20.00	$ 5.000.00	1	10.00:00
Pasante Estructura	$ 20.00	$ 11.600.00	0	0.00:00
	$ 20.00	$ 11.600.00	0	0.00:00

EQUIPO UTILIZADO		
DESCRIPCIÓN	CANT.	TIEMPO (Horas)
RETROEXCAVADORA SOBRE	1	10.00:00
VIBRO COMPACTADOR PEQUEÑA	1	10.00:00

MATERIALES UTILIZADOS		
DESCRIPCIÓN	UNID.	CANT.
MALLA ELECTROSOLDADA RCD	KG	15.15
LADRILLO GRAN FORMATO COLOR ARENA	UN	4127
CONCRETO DE 3000 PSI	M3	4.13


ESTADO DEL TIEMPO		
	X	HORAS
NUBLADO		8.0
LLUVIA		
LLUVIOSA		
NIEVE		
NEBLINA		

ACCESO	
CERRADO	
PEATONAL	X
VEHICULO	
TARDE	

TERRENO			
ACCIDENTADO		PLANO	
ARENOSO		LODOSO	
NORMAL	X	PANTANO	

CAUSA RAIZ/EVIDENCIA - MEDIDA CORRECTIVA:

ESQUEMA GRAFICO DE OBRA

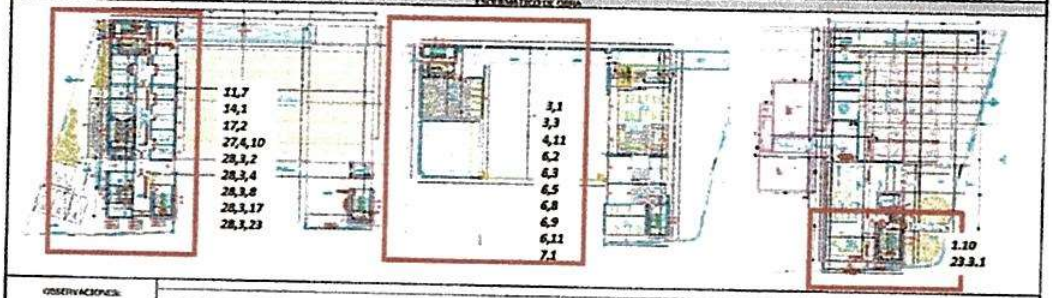

OBSERVACIONES:

FIRMA:		FIRMA:	APOYO
NOMBRE:		NOMBRE:	
CARGO:		CARGO:	
FIRMA:		FIRMA:	
NOMBRE:		NOMBRE:	
CARGO:		CARGO:	

G&G Ingeniería	INFORME DIARIO DE ACTIVIDADES	Fecha:01/Abl/2019
	EJECUCIÓN DE OBRA	Código: F-OBR-024
		Versión: 1
		Hoja No.: 1 de 1

No DE CONTRATO Y OBJETO	CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No 470 DE 2018 SUSCRITO ENTRE EL DISTRITO CAPITAL - UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL CUERPO DE BOMBEROS Y GYG INGENIEROS LTDA	CONSECUTIVO	550
LUGAR o ESPECIALIDAD DE LOS TRABAJOS	OBRA	FECHA	lunes 1 de febrero de 2021

INFORME DIARIO No. 550

2 de 2

REGISTRO FOTOGRÁFICO



MAMPOSTERIA PARA LAS CAJAS CS 276 DE LA RED ELECTRICA EN NIVEL N-3.30 EJES D AL D 2 Y 4 AL 6



PAÑETE LISO. ENCHAPE MURO EN BAÑO, ESTUCO Y PINTURA ENTRE LOS EJES 1 AL 2 Y A AL B EN NIVEL N+3.30



INSTALACIÓN DE TUBERIA DE LA RED DE INCENDIO, CON VÁLVULA EXPULSORA Y REGISTRO BOLA ENTRE LOS EJES 1 AL 2 Y A0 AL D



FUNDIDA DE COLUMNETAS Y VIGUETAS DE CONFINAMIENTO E INSTALACIÓN DE CUBIERTA TIPO SANDWICH EJES 1 AL 2 Y C AL D



INSTLACIÓN MALLA ELECTROSOLDADA, RELLENO EN RECEBO COMÚN CON MATERIAL RCD, MAMPOSTERÍA EN LADRILLO AREJA CON FACHALETA



INSTALACIÓN TUBERIA ALCANTARILLADO, RELLENO EN ARENA DE PEÑA Y RECEBO COMÚN CON MATERIAL RCD ENTRE LOS EJES C AL D Y 2 AL 4 NIVEL N+0.00

ELABORO:

ING. JAVIER ESCOBAR PINTOR
AUXILIAR DE INGENIERIA - CONTRATISTA

APROBO

ING CAMILO ROMERO
RESIDENTE DE OBRA CONTRATISTA

CG Ingeniería	**INFORME DIARIO DE ACTIVIDADES**	**Fecha:01/06/2019**
	EJECUCIÓN DE OBRA	**Código: F-OBR-024**
		Versión: 1
		Hoja No.: 1 de 1

No DE CONTRATO DE OBRA Y OBJETO:	CONTRATO DE OBRA No. 497 DE 2018 CUYO OBJETO ENTRE EL MUNICIPIO CAPITAL - DISTRITO HIDROSTATICA ESPECIAL CLUSTER DE SERVICIOS Y VIVIENDA DE LTDA.	CONSECUTIVO:	551
LUGAR o ESPECIAL SITIO DE LOS TRABAJOS:	OBRA	FECHA:	martes 2 de febrero de 2021

RESIDENTE/INTERVENTOR:	POR CUADRILLA:	POR PERSONAL:		OTROS:	TOTALES:
					0.0
					0.0

ITEM	DESCRIPCIÓN	UBICACIÓN FUNCIONAL	UNID.	CANTIDAD CONTRACTUAL	CANTIDAD ACUMULADO ANTERIOR	CANTIDAD AVANCE HOY	CANTIDAD ACUMULADO ACTUAL
3,1	EXCAVACIONES VARIAS A MAQUINA SIN CLASIFICAR INCLUYE RETIRO	N+0.00	M3	6684.95	6923.90	54.00	6977.90
3,2	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN H= < 2.00 M INCLUYE RETIRO	N+0.00	M3	343.95	442.75	4.80	447.55
3,3	RELLENO EN RECEBO COMUN COMPACTADO MECÁNICAMENTE	N+0.00	M3	2929.95	3199.36	6.60	3205.96
6,2	ANCLAJE BARRA 1/2" L=40CM INCLUYE EPOXICO	N+9.90	UN	600.00	3235.00	10.00	3245.00
6,3	MURO EN LADRILLO A LA VISTA GRAN FORMATO COLOR AMARILLO 11.5 CM.	N+9.90	M2	581.49	940.59	13.16	953.75
6,5	ENCHAPE EN FACHALETA LADRILLO A LA VISTA GRAN FORMATO COLOR AMARILLO. H< 0.60 M	N+9.90	ML	618.36	384.30	9.30	393.60
6,11	DOVELAS PARA MAMPOSTERIA INCLUYE ACERO DE REFUERZO 1#4.	N+9.90	ML	840.00	2231.58	23.40	2254.98
7,1	PAÑETE LISO MUROS 1:4, E=1.5 CM	N+7.30	M2	2786.25	2488.62	19.32	2507.94
7,3	PAÑETE LISO 1:4 IMPERMEABILIZADO	N+0.00	M2	266.92	1104.16	21.25	1125.41
11,7	ENCHAPE PARED EN PORCELANATO DE 40 X 40 CM. COLOR BLANCO	N-3.30	M2	545.32	273.83	16.25	290.08
12,2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LAVAMANOS SAN LORENZO DE INCRUSTAR BLANCO	N+0.00	UN	32.00	1.00	2.00	3.00
14,1	ESTUCO Y VINILO TIPO 1 BLANCO PARA INTERIORES SOBRE PAÑETE 3 MANOS, INCLUYE FILOS Y DILATACIONES.	N+6.60	M2	1780.43	918.42	39.48	957.90
17,2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUBIERTA TIPO SANDWICH E=0.50 H=1.5" POLIURETANO INCLUYE	N+13.20	M2	347.78	76.95	96.95	173.89
23,3,1	CAMARA DE INSPECCION NORMA CS 276 CODENSA PARA NT (DE ACUERDO A ESPECIFICACIÓN TECNICA	N-3.30	UN	3.00	0.80	0.20	1.00
26,3,1	PUNTO SANITARIO PUSH PARAL DE PISO 1 1/4" AF	N+0.00	UN	22.00	16.00	2.00	18.00
26,3,2	PUNTO ORINAL PUSH PARAL DE PISO 3/4" AF	N+0.00	UN	1.00	0.00	1.00	1.00
26,3,3	PUNTO LAVAMANOS PARAL DE PISO 1/2" AF/EZ	N+0.00	UN	32.00	23.00	8.00	31.00
26,3,4	PUNTO DUCHA PARAL DE PISO 1/2" AF/EZ	N+0.00	UN	21.00	15.00	5.00	20.00
26,3,5	PUNTO LAVADORA PARAL DE PISO 1/2" AF/EZ	N+0.00	UN	1.00	0.00	2.00	2.00
27,2,12	TUBERIA PVC ALCANTARILLADO 160MM	N+0.00	ML	26.67	30.00	6.00	36.00
30,2,3	POZO DE INSPECCION PROF<2.50M	N+0.00	UN	1.00	0.90	0.20	1.10
30,3,2	RELLENO ARENA DE PEÑA	N+0.00	M3	72.60	66.11	1.20	67.31
NP-12	Suministro, transporte e instalación de Transferencia automática de planta eléctrica según unifilar	N-3.30	UN	1.00	0.60	0.20	0.80
NP-13	Suministro. Transporte e instalacion de Transformador trifásico de piso 112.5kva 11400-208/120v ydn5,	N-3.30	UN	1.00	0.50	0.30	0.80
NP-14	Suministro. Transporte e instalacion de celda Triplex entrada y salida operación bajo carga 17.5kV	N-3.30	UN	1.00	0.60	0.20	0.80

DESCRIPCION DE ACTIVIDADES EJECUTADAS

DESCARGUE E INSTALACIÓN CELDA TRIPLEX, TRANSFORMADOR ELÉCTRICO Y TRANSFERENCIA AUTOMÁTICA EN NIVEL N-3.30 ENTRE LOS EJES 4 AL 5 Y A AL B, MONTAJE LAVAMANOS N+0.00, MAMPOSTERÍA PARA LAS CAJAS CS 276 ELÉCTRICAS ENTRE LOS EJES 4 AL 6 Y B AL D2 EN NIVEL N-3.30, , EXCAVACIÓN MANUAL, EXCAVACIÓN A MAQUINA PARA LA TUBERIA ENTERRADA Y FUNDIDA DE PLACAS DE LOS POZO DE AGUAS LLUVIAS Y RESIDUALES EJES B AL D Y 2 AL 4 EN NIVEL N+0.00, MAMPOSTERÍA EN LADRILLO ARENA CON FACHALETA N+9.90, PAÑETE LISO N+9.90 E INSTALACIÓN ENCHAPE N+6,60 EJES 1 AL 2 Y B AL C, INSTALACIÓN TUBERIA ALCANTARILLADO, RELLENO DE ARENA DE PEÑA Y RELLENO EN RECEBO COMÚN CON MATERIAL RCD EJES 2 AL 3 Y C AL D NIVEL N+0.00, PAÑETE IMPERMEABILIZADO, ESTUCO Y PINTURA N+3.30 TERMINACIÓN PUNTOS HIDRAULICOS N+0.00, INSTALACIÓN CUBIERTA TIPO SANDWICH N+13.20 EJES 1 AL 2 Y A AL C.

MANO DE OBRA EMPLEADA

CARGO	HORA INICIO	HORA FIN	CANT.	TIEMPO (Horas)
Ing. Residente, Ing. Jefe	8:00:00	17:00:00	2	18:00:00
Ing. Residente	8:00:00	17:00:00	1	9:00:00
Aux. Ingeniero civil	8:00:00	18:00:00	1	10:00:00
Ing. Profesional SST	8:00:00	18:00:00	1	10:00:00
Profesional Calidad	8:00:00	17:00:00	1	9:00:00
Almacenista	8:00:00	17:00:00	1	9:00:00
Maestro	8:00:00	18:00:00	1	10:00:00
Ayud. Carpintero de ob. y mayor	8:00:00	17:00:00	2	18:00:00
Celador	8:00:00	17:00:00	2	18:00:00
Ayudante	8:00:00	17:00:00	23	216:00:00
Profesional de Seguridad SST	8:00:00	18:00:00	27	270:00:00
Inspectores Sup. SST, ambientales, etc.	8:00:00	17:00:00	6	54:00:00
Personal Cuadrilla	8:00:00	17:00:00	1	9:00:00
Personal Instalador	8:00:00	18:00:00	4	40:00:00
Personal Electricista	8:00:00	18:00:00	1	10:00:00
Personal Topografo	8:00:00	18:00:00	2	20:00:00
Personal Electricista	8:00:00	18:00:00	1	10:00:00

EQUIPO UTILIZADO

DESCRIPCIÓN	CANT.	TIEMPO (Horas)
RETROEXCAVADORA SENCILLA	1	10:00:00
VIBRO COMPACTADOR MANUAL	1	10:00:00

MATERIALES UTILIZADOS

DESCRIPCIÓN	UNID.	CANT.
RELLENO EXTRAIDO DE OBRA	M3	6.42
CONCRETO COMPACTO CON ZODE M	M3	2.16
CONCRETO DE 3000 PSI	M3	5.58

ESTADO DEL TIEMPO

	HORAS
BUENO	9.0
MEDIANO	
LLUVIOSO	
NUBOSO	
SECO	

ACCESO


BUENO	X
REGULAR	
MALO	
CERRADO	

ACCIDENTES: NINGUNO

ACCIDENTE DIRECTO: NO | DAÑO MATERIAL: NO | NOMINA AFECTADA: NO

CAUSA ACCIDENTE - MEDIDA CORRECTIVA:

ESQUEMÁTICO DE OBRA

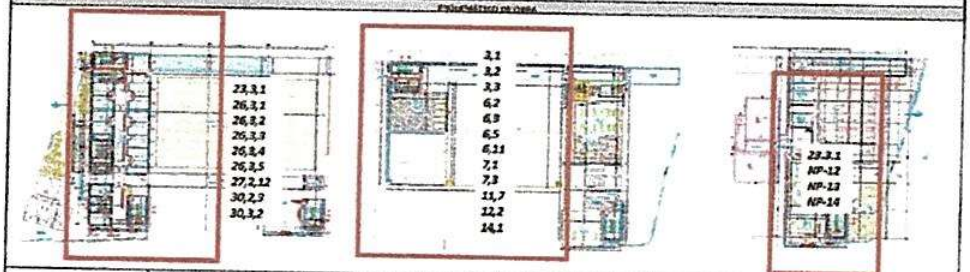

OBSERVACIONES:

FIRMA:		FIRMA:	
NOMBRE:		NOMBRE:	
CARGO:		CARGO:	
FIRMA:		FIRMA:	
NOMBRE:		NOMBRE:	
CARGO:		CARGO:	

G-G Ingenieros Ltda.	INFORME DIARIO DE ACTIVIDADES	Fecha:01/06/2019
	EJECUCIÓN DE OBRA	Código: F-OBR-024
		Versión: 1
		Hoja No.: 1 de 1

No DE CONTRATO Y OBJETO	CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No 470 DE 2018 SUSCRITO ENTRE EL DISTRITO CAPITAL - UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL CUERPO DE BOMBEROS Y GYG INGENIEROS LTDA	CONSECUTIVO	551
LUGAR o ESPECIALIDAD DE LOS TRABAJOS	OBRA	FECHA	martes 2 de febrero de 2021

INFORME DIARIO No. 551

Página 2 de 2

REGISTRO FOTOGRÁFICO



DESCARGUE E INSTALACIÓN CELDA TRIPLEX, TRANSFORMADOR ELÉCTRICO Y TRANSFERENCIA AUTOMÁTICA EN NIVEL N-3.30 ENTRE LOS EJES 4 AL 5 Y A AL B



MONTAJE LAVAMANOS N+0.80, MAMPOSTERÍA PARA LAS CAJAS CS 276 ELÉCTRICAS ENTRE LOS EJES 4 AL 6 Y B AL D2 EN NIVEL N-3.30



EXCAVACIÓN MANUAL TUBERIA ENTERRADA , EXCAVACIÓN A MAQUINA PARA LA TUBERIA ENTERRADA Y FUNDIDA DE PLACAS DE LOS POZOS DE AGUAS LLUVIAS Y RESIDUALES EJES C AL D Y 2 AL 4 EN NIVEL N+0.00



MAMPOSTERÍA EN LADRILLO ARENA CON FACHALETA N+9.90, PAÑETE LISO N+9.90 E INSTALACIÓN ENCHAPE N+6,60 EJES 1 AL 2 Y B AL C



INSTALACIÓN TUBERIA ALCANTARILLADO, RELLENO DE ARENA DE PEÑA Y RELLENO EN RECEBO COMÚN CON MATERIAL RCD EJES 2 AL 3 Y C AL D NIVEL N+0.00



PAÑETE IMPERMEABILIZADO, ESTUCO Y PINTURA N+3.30 TERMINACIÓN PUNTOS HIDRAULICOS N+0.00, INSTALACIÓN CUBIERTA TIPO SANDWICH N+13.20 EJES 1 AL 2 Y A AL C

ELABORO:

ING. JAVIER ESCOBAR PINTOR
AUXILIAR DE INGENIERIA - CONTRATISTA

APROBO:

ING. CAMILO ROMERO
RESIDENTE DE OBRA CONTRATISTA

GC Ingenieros Ltda	INFORME DIARIO DE ACTIVIDADES	Fecha:01/06/2019
	EJECUCIÓN DE OBRA	Código: P-OBR-024
		Versión: 2
		Hoja No.: 1 de 1

No DE CONTRATO DE OBRA Y OBJETO	CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No 470 DE 2018 SUSCRITO ENTRE EL DISTRITO CAPITAL - UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL CUERPO DE BOMBEROS Y GHG INGENIEROS LTDA	CONSECUTIVO	552
LUGAR o ESPECIALIDAD DE LOS TRABAJOS	OBRA	FECHA	miércoles 3 de febrero de 2021

HORAS PERDIDAS	POR LLUVIA	POR PAROS		OTROS	TOTALES
Horas Hombre					0.0
Horas Equipo					0.0

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD FUNCIONAL	UND.	CANTIDAD			
				CONTRACTUAL	ACUMULADO ANTERIOR	AVANCE HOY	ACUMULADO ACTUAL
3,1	EXCAVACIONES VARIAS A MAQUINA SIN CLASIFICAR INCLUYE RETIRO	N+0.00	M3	6684.95	6977.90	40.50	7018.40
3,2	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMUN Ha < 2.00 M. INCLUYE RETIRO.	N+0.00	M3	343.95	447.55	1.25	448.80
3,3	RELLENO EN RECEBO COMÚN COMPACTADO MECÁNICAMENTE	N+0.00	M3	2929.95	3205.96	9.35	3215.31
6,1	MURO EN BLOQUE Nº 4 E=0.09 M.	N+9.90	M2	2222.99	2604.48	11.20	2615.68
6,2	ANCLAJE BARRA 1/2" L=40CM INCLUYE EPOXICO.	N+9.90	UN	600.00	3245.00	41.00	3286.00
6,3	MURO EN LADRILLO A LA VISTA GRAN FORMATO COLOR AMARILLO 11.5 CM.	N+6.60	M2	581.49	953.75	11.16	964.91
6,8	COLUMNETA DE CONFINAMIENTO DE 0.095 X 0.21 M. EN CONCRETO DE 3000 PSI. REFUERZO= 4 D=3/8" ESTRIBO 1/4" CADA 0.14 M.	N+9.90	ML	758.80	1490.05	22.40	1512.45
6,9	VIGUETA DE CONFINAMIENTO DE 0.095 X 0.21 M. EN CONCRETO DE 3000 PSI. REFUERZO= 4 D=3/8"	N+9.90	ML	677.72	907.70	10.23	917.93
6,11	DOVELAS PARA MAMPOSTERIA INCLUYE ACERO DE REFUERZO 1#4	N+3.30	ML	840.00	2254.90	20.10	2275.08
7,1	PAÑETE LISO MUROS 1:4, E=1.5 CM	N+9.90	M2	2286.25	2507.94	9.52	2517.46
11,2	ENCHAPE PISO EN PORCELANATO DE 60 X 60 CM. ANTIDESLIZANTE CON DILATACION DE 2 MM.	N-3.30	M2	1174.33	607.69	11.52	619.21
11,7	ENCHAPE PARED EN PORCELANATO DE 40 X 40 CM. COLOR BLANCO.	N-3.30	M2	545.33	290.08	15.00	305.08
11,11	ENCHAPE PARED EN PORCELANATO DE 40 X 40 CM. COLOR BLANCO. (LINEAL)	N+3.30	ML	62.00	10.00	10.00	20.00
12,2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LAVAMANOS SAN LORENZO DE INCRUSTAR BLANCO	N+0.00	UN	32.00	3.00	2.00	5.00
14,1	ESTUCO Y VINILO TIPO 1 BLANCO PARA INTERIORES SOBRE PAÑETE 3 MANOS. INCLUYE FILOS Y	N+6.60	M2	1780.43	957.90	25.48	983.38
14,2	ESTUCO Y VINILO TIPO 1 BLANCO PARA INTERIORES SOBRE PAÑETE 3 MANOS. INCLUYE FILOS Y	N+6.60	ML	215.75	53.20	8.44	61.64
17,2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUBIERTA TIPO SANDWICH E=0.50 H=1.5" POLIURETANO. INCLUYE	N+13.20	M2	347.78	173.89	101.95	275.84
23,3,1	CAMARA DE INSPECCION NORMA CS 276 CODENSA PARA MT (DE ACUERDO A ESPECIFICACIÓN TECNICA	N+0.00	UN	3.00	1.00	0.20	1.20
27,2,12	TUBERIA PVC ALCANTARILLADO 160MM	N+9.00	ML	26.67	36.00	8.50	44.50
30,2,1	POZO DE INSPECCION PROF<2.50M	N+0.00	UN	1.00	1.10	0.20	1.30
30,3,2	RELLENO ARENA DE PEÑA	N+0.00	M3	72.60	67.31	1.70	69.01

DESCRIPCION DE ACTIVIDADES EJECUTADAS

MAMPOSTERÍA EN LADRILLO ARENA CON, INSTALACIÓN ENCHAPE MURO EN BAÑO, FUNDIDA DE COLUMNETAS Y VIGUETAS DE CONFINAMIENTO, MONTAJE LAVAMANOS N+0.00, EXCAVACIÓN MANUAL PARA MURO DE CONTENCIÓN T3A, MAMPOSTERÍA CAJAS CS276 ENTRE EJES 4 AL 6 Y A0 AL D2, MAMPOSTERÍA EN BLOQUE # 4, PAÑETE N+0.00, ENCHAPE PISO N+3.30 ENTRE LOS EJES 1 AL 2 Y A0 AL B, MAMPOSTERÍA EN POZOS DE AGUAS LLUVIAS, AGUAS NEGRAS, INSTALACIÓN TUBERIA ALCANTARILLADO Y RELLENO EN ARENA DE PEÑA ENTRE LOS EJES 2 AL 4 Y C AL D EN NIVEL N+0.00, INSTALACIÓN CUBIERTA TIPO SANDWICH N+13.20, ENCHAPE BAÑO EN MURO LINEAL N+6.60, ESTUCO Y PINTURA N+6.60 ENTRE EJES 1 AL 2 Y B AL D, EXCAVACIÓN A MAQUINA EN URBANISMO, RELLENO EN RECEBO COMÚN ESTUCO Y PINTURA LINEAL ENTRE EJES 3 AL 5 C AL D 2 EN NIVEL N+0.00.

MANO DE OBRA EMPLEADA

CARGO	HORA INICIO	HORA FIN	CANT.	TIEMPO (Horas)
Ing. Residente	8:00:00	18:00:00	1	10:00:00
Ing. Residente	8:00:00	13:00:00	1	05:00:00
Aux. Ingeniero Civil	7:00:00	17:00:00	1	10:00:00
Insp. Profesional SST	8:00:00	18:00:00	1	10:00:00
Profesional Catastro	8:00:00	18:00:00	1	10:00:00
Topografo	8:00:00	16:00:00	2	16:00:00
Maestro	8:00:00	18:00:00	1	10:00:00
Oficiales	8:00:00	18:00:00	1	10:00:00
Ayudantes	8:00:00	18:00:00	2	20:00:00
Ayudantes	8:00:00	18:00:00	27	270:00:00
Profesionales de topografia SIG	10:00:00	18:00:00	0	0:00:00
Laboratorista Jose Miguel Arciniegas - Ing Civil	9:00:00	18:00:00	1	09:00:00
Personal Catastro	8:00:00	13:00:00	4	20:00:00
Personal Administrativo	8:00:00	12:00:00	1	04:00:00
Personal Electrico	8:00:00	13:00:00	1	05:00:00
Personal Estructura	8:00:00	13:00:00	1	05:00:00

EQUIPO UTILIZADO

DESCRIPCIÓN	CANT.	TIEMPO (Horas)
VIBROCOMPACTADOR DR220	1	10:00:00
PISTOLA ENCHAPADORA MONOMO	1	10:00:00

MATERIALES UTILIZADOS

DESCRIPCIÓN	UND	CANT
LADRILLO EN MATERIAL ROJO	UD	9.25
LADRILLO CONCRETO COLOR AMARILLO	UD	400
CEMENTO DE 50KG P/S	UD	2.21

ESTADO DEL TIEMPO

	HORAS
LLUVIA	0.0
SOL	
NUBLADO	

ACCESO


BUENO	BUENO
REGULAR	
MALO	

TERRENO

POZOSO	NO	DAÑO	NO
ARENOSO	SI	NORMAL	SI

CAUSA ATRASO/DIA - MEDIDA CORRECTIVA:

ESQUEMÁTICO DE OBRA

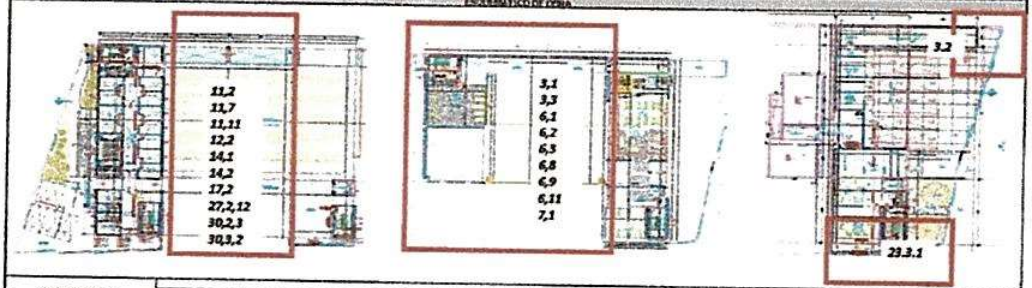

OBSERVACIONES:

FIRMA:		FIRMA:	
NOMBRE CARGO		NOMBRE CARGO	
FIRMA:		FIRMA:	
NOMBRE CARGO		NOMBRE CARGO	

G-G Ingenieros Ltda	INFORME DIARIO DE ACTIVIDADES	Fecha:01/06/2019
		Código: F-OBR-024
	EJECUCIÓN DE OBRA	Versión: 1
		Hoja No.: 1 de 1

No DE CONTRATO Y OBJETO	CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No 470 DE 2018 SUSCRITO ENTRE EL DISTRITO CAPITAL - UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL CUERPO DE BOMBEROS Y GYG INGENIEROS LTDA	CONSECUTIVO	552
LUGAR o ESPECIALIDAD DE LOS TRABAJOS	OBRA	FECHA	miércoles 3 de febrero de 2021

INFORME DIARIO No. 552

Página 2 de 2

REGISTRO FOTOGRÁFICO



MAMPOSTERÍA EN LADRILLO ARENA CON, INSTALCIÓN ENCHAPE MURO EN BAÑO, FUNDIDA DE COLUMNETAS Y VIGUETAS DE CONFINAMIENTO



MONTAJE LAVAMANOS N+0.00, EXCAVACIÓN MANUAL PARA MURO DE CONTENCIÓN T3A, MAMPOSTERÍA CAJAS CS276 ENTRE EJES 4 AL 5 Y A0 AL D2



MAMPOSTERÍA EN BLOQUE # 4, PAÑETE N+0.00, ENCHAPE PISO N+3.30 ENTRE LOS EJES 1 AL 2 Y A0 AL B



MAMPOSTERÍA EN POZOS DE AGUAS LLUVIAS, AGUAS NEGRAS, INSTALACIÓN TUBERIA ALCANTARILLADO Y RELLENO EN ARENA DE PEÑA ENTRE LOS EJES 2 AL 4 Y C AL D EN NIVEL N+0.00



INSTALACIÓN CUBIERTA TIPO SANDWICH N+13.20, ENCHAPE BAÑO EN MURO LINEAL N+0.00, ESTUCO Y PINTURA N+0.60 ENTRE EJES 1 AL 2 Y B AL D



EXCAVACIÓN A MAQUINA EN URBANISMO, RELLENO EN RECEBO COMÚN ESTUCO Y PINTURA LINEAL ENTRE EJES 3 AL 5 C AL D 2 EN NIVEL N+0.00

ELABORO:

ING. JAVIER ESCOBAR PINTOR
AUXILIAR DE INGENIERIA - CONTRATISTA

APROBO:

ING. CAMILO ROMERO
RESIDENTE DE OBRA CONTRATISTA

GyG Ingenieros Ltda	INFORME DIARIO DE ACTIVIDADES	Fecha:01/06/2019
	EJECUCIÓN DE OBRA	Código: F-OBR-024
		Versión: 1
		Hoja No.: 1 de 1

No DE CONTRATO DE OBRA Y OBJETO	CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No 470 DE 2020 SUSCRITO ENTRE EL DISTRITO CAPITAL - UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL CUERPO DE BOMBEROS Y GYG INGENIEROS LTDA	CONSECUTIVO	553
LUGAR O ESPECIALIDAD DE LOS TRABAJOS	OBRA	FECHA	jueves 4 de febrero de 2021

HORAS PERDIDAS	POR LLUVIA	POR PAROS		OTROS	TOTALES
Horas Hombre					0.0
Horas Equipo					0.0

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD FUNCIONAL	UND.	CANTIDAD			
				CONTRACTUAL	ACUMULADO ANTERIOR	AVANCE HOY	ACUMULADO ACTUAL
3,1	EXCAVACIONES VARIAS A MAQUINA SIN CLASIFICAR INCLUYE RETIRO	N+0.00	M3	6684.95	7018.40	48.00	7066.40
3,2	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMUN H= < 2.00 M. INCLUYE RETIRO	N-3.30	M3	343.95	448.80	6.32	455.12
3,3	RELLENO EN RECEBO COMUN COMPACTADO MECÁNICAMENTE	N+0.00	M3	2929.95	3215.31	19.17	3234.48
3,4	RELLENO SUBBASE GRANULAR	N+0.00	M3	231.16	138.49	19.17	157.66
6,1	MURO EN BLOQUE Nº 4 E=0.09 M.	N+6.60	M2	2222.99	2615.68	33.32	2649.00
6,9	VIGUETA DE CONFINAMIENTO DE 0.095 X 0.21 M. EN CONCRETO DE 3000 PSI. REFUERZO= 4 D=3/8"	N+0.00	ML	677.72	917.93	11.90	929.83
7,3	PAÑETE LISO 1:4 IMPERMEABILIZADO	N+0.00	M2	266.97	1125.41	13.44	1138.85
11,7	ENCHAPE PARED EN PORCELANATO DE 40 X 40 CM. COLOR BLANCO.	N+6.60	M2	545.32	305.08	7.92	313.00
14,1	ESTUCO Y VINILO TIPO 1 BLANCO PARA INTERIORES SOBRE PAÑETE 3 MANOS. INCLUYE FILOS Y	N+6.60	M2	1780.43	983.38	41.16	1024.54
17,2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUBIERTA TIPO SANDWICH E=0.50 H=1.5" POLIURETANO. INCLUYE	N+13.20	M2	347.78	275.84	71.95	347.78
23,3,1	CAMARA DE INSPECCION NORMA CS 276 CODENSA PARA MT (DE ACUERDO A ESPECIFICACIÓN TECNICA	N-3.30	UN	3.00	1.20	0.30	1.50
30,2,3	POZO DE INSPECCION PROF<2.50M	N+0.00	UN	1.00	1.30	0.20	1.50

DESCRIPCION DE ACTIVIDADES EJECUTADAS

EXCAVACIÓN MANUAL PARA LA INSTALACIÓN DEL POSTE Y MURO DE CONTENCIÓN T3A, MAMPOSTERÍA CAJA CS276 ENTRE LOS EJES 4 AL 6 Y A0 AL D2 EN NIVEL N-3.30, PAÑETE IMPERMEABILIZADO EN BAÑOS, FUNDIDA DE VIGUETAS DE CONFINAMIENTO ENTRE LOS EJES 1 AL 2 Y A AL B EN NIVEL N-3.30, EXCAVACIÓN A MAQUINA SARDINEL, MAMPOSTERÍA PARA LOS POZOS DE DE AGUAS LLUVIAS Y AGUAS NEGRAS ENTRE LOS EJES 2 AL 4 C AL D2 EN NIVELN+0.00, INSTALACIÓN CUBIERTA TIPO SANDWICH EN NIVEL N+13.20 ENTRE LOS EJES 1 AL 2 Y A0 AL D, MAMPOSTERÍA EN BLOQUE # 4 N+6.60, ENCHAPE MURO EN BAÑO N+3.30, ESTUCO Y PINTURA N+6.60 ENTRE LOS EJES 1 AL 2 Y A0 AL B, RELLENO EN RECEBO COMUN CON MATERIAL RCD Y RELLENO EN SUBBASE GRANULAR CON MATERIAL RCD ENTRE LOS EJES 2 AL 4 Y C AL D EN NIVEL N+0.00.

MANO DE OBRA EMPLEADA

CARGO	HORA		CANT.	TIEMPO (Horas)
	INICIO	FIN		
Arq. Residente, Arq auxiliar	5:00:00	19:00:00	2	28:00:00
Ing. Residente	6:00:00	18:00:00	1	10:00:00
Aux. Ingeniero civil	6:00:00	18:00:00	1	10:00:00
Ing. Profesional SST	8:00:00	18:00:00	1	10:00:00
Profesional Calidad	9:00:00	18:00:00	1	10:00:00
Almacenista	8:00:00	18:00:00	1	10:00:00
Maestro	6:00:00	18:00:00	1	10:00:00
Ejero , conductor mixer , retro, tractor oruga	9:00:00	18:00:00	4	40:00:00
Oficiales	8:00:00	18:00:00	22	220:00:00
Ayudantes	6:00:00	18:00:00	24	240:00:00
Profesionales de topografia GyG	10:00:00	18:00:00	0	0:00:00
Interventoria Ing SST, ing residente, ing asi	8:00:00	18:00:00	3	30:00:00
Personal Cubierta	9:00:00	18:00:00	1	10:00:00
Personal Hidrosanitario	8:00:00	18:00:00	1	10:00:00
Personal Electrico	8:00:00	18:00:00	2	20:00:00
Personal Estructura	8:00:00	18:00:00	0	0:00:00

EQUIPO UTILIZADO

DESCRIPCIÓN	CANT.	TIEMPO (Horas)
MINICARGADOR SR220	1	10:00:00
RETRO EXCAVADORA HITACHI	1	10:00:00

MATERIALES UTILIZADOS

DESCRIPCION	UND.	CANT.
RELLENO DE MATERIAL RCD	m3	58.34
CONCRETO DE 3000 PSI	m3	8.49
BLOQUE # 4	un	523

ESTADO DEL TIEMPO

		HORAS
SECO	X	9.0
NEBLINA		
LLOVIZNA		
LLUVIA		
TORMENTA		

ACCESO


BUENO	X
REGULAR	
MALO	
NULO	

TERRENO

BOSCOSO		DURO		NORMAL	X
ARENOSO		LODOSO		PANTANO	

CAUSA ATRASO/DÍA - MEDIDA CORRECTIVA:

PROGRAMÁTICO DE OBRA

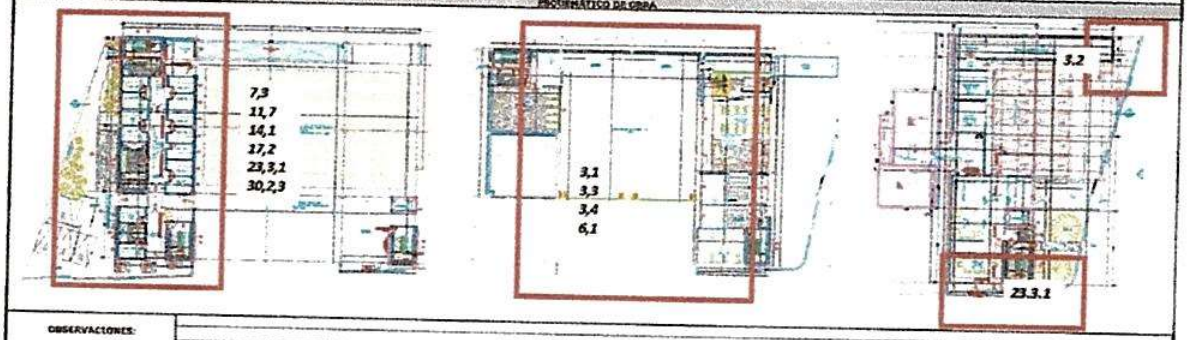

OBSERVACIONES:

	ELABORÓ	REVISÓ
FIRMA:		
NOMBRE:	ING. WILBER ANDRES ESCOBAR PINTOR	ARQ. MARCELO SARMIENTO
CARGO:	AUXILIAR DE INGENIERIA CONTRATISTA	RESIDENTE DE OBRA CONTRATISTA
FIRMA:		APROBÓ
NOMBRE:	ING. CAMILO ROMERO	
CARGO:	RESIDENTE DE OBRA CONTRATISTA	

G+G Ingenieros Ltda	INFORME DIARIO DE ACTIVIDADES EJECUCIÓN DE OBRA	Fecha:01/06/2019 Código: F-OBR-024 Versión: 1 Hoja No.: 1 de 1


No DE CONTRATO Y OBJETO	CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No 470 DE 2018 SUSCRITO ENTRE EL DISTRITO CAPITAL - UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL CUERPO DE BOMBEROS Y GYG INGENIEROS LTDA	CONSECUTIVO	553
LUGAR o ESPECIALIDAD DE LOS TRABAJOS	OBRA	FECHA	Jueves 4 de febrero de 2021

INFORME DIARIO No. 553 | Página 2 de 2

REGISTRO FOTOGRÁFICO



EXCAVACIÓN MANUAL PARA LA INSTALCIÓN DEL POSTE Y MURO DE CONTENCIÓN T3A, MAMPOSTERÍA CAJA CS276 ENTRE LOS EJES 4 AL 6 Y A0 AL D2 EN NIVEL N-3.30

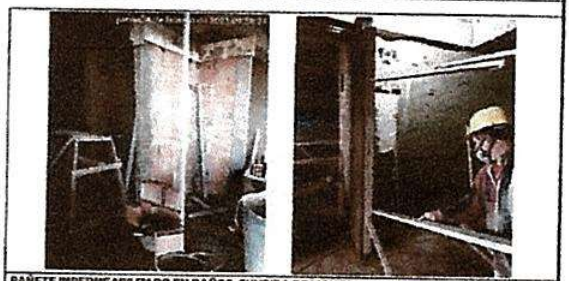

PAÑETE IMPERMEABILIZADO EN BAÑOS, FUNDIDA DE VIGUETAS DE CONFINAMIENTO ENTRE LOS EJES 1 AL 2 Y A AL B EN NIVEL N-3.30



EXCAVACIÓN A MAQUINA SARDINEL, MAMPOSTERÍA PARA LOS POZOS DE DE AGUAS LLUVIAS Y AGUAS NEGRAS ENTRE LOS EJES 2 AL 4 C AL D2 EN NIVELN+0.00



INSTALACIÓN CUBIERTA TIPO SANDWICH EN NIVEL N+13.20 ENTRE LOS EJES 1 AL 2 Y A0 AL D



MAMPOSTERÍA EN BLOQUE # 4 N+0.60, ENCHAPE MURO EN BAÑO N+3.30, ESTUCO Y PINTURA N+6.60 ENTRE LOS EJES 1 AL 2 Y A0 AL B



RELLENO EN RECEBO COMUN CON MATERIAL RCD Y RELLENO EN SUBBASE GRANULAR CON MATERIAL RCD ENTRE LOS EJES 2 AL 4 Y C AL D EN NIVEL N+0.00

ELABORO: _____
ING. JAVIER ESCOBAR PINTOR
AUXILIAR DE INGENIERIA - CONTRATISTA

APROBO _____
ING CAMILO ROMERO
RESIDENTE DE OBRA CONTRATISTA

GG Ingenieros Ltda	INFORME DIARIO DE ACTIVIDADES	Fecha:01/06/2019
	EJECUCIÓN DE OBRA	Código: F-OBR-024
		Versión: 1
		Hoja No.: 1 de 1

No DE CONTRATO DE OBRA Y OBJETO	CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. 472 DE 2020 SUSCRITO ENTRE EL DISTRITO CAPITAL - UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS Y GHS INGENIEROS LTDA	CONSECUTIVO	554
LUGAR o ESPECIALIDAD DE LOS TRABAJOS	OBRA	FECHA	viernes 5 de febrero de 2021

HORAS PERDIDAS	POR LLUVIA	POR PAROS		OTROS	TOTALES
Horas Hombre					0.0
Horas Equipo					0.0

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD FUNCIONAL	UND.	CANTIDAD			
				CONTRACTUAL	ACUMULADO ANTERIOR	AVANCE HOY	ACUMULADO ACTUAL
3,2	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMUN H= < 2.00 M. INCLUYE RETIRO.	N-3.30	M3	343.95	455.12	3.16	458.28
3,4	RELLENO SUBBASE GRANULAR	N+0.00	M3	231.16	157.66	11.10	168.76
4,1	CONCRETO DE LIMPIEZA EN CONCRETO DE 2500 PSI. E=0.04	N-3.30	M2	510.12	560.74	3.80	564.54
6,1	MURO EN BLOQUE Nº 4 E=0.09 M.	N+3.30	M2	2222.99	2849.00	43.96	2692.96
6,2	ANCLAJE BARRA 1/2" L=40CM INCLUYE EPOXICO.	N+9.90	UN	600.00	3286.00	48.00	3334.00
6,8	COLUMNETA DE CONFINAMIENTO DE 0.095 X 0.21 M. EN CONCRETO DE 3000 PSI. REFUERZO= 4 D=3/8" ESTRIBO 1/4" CADA 0.14 M.	N+9.90	ML	758.80	1512.45	33.60	1546.05
6,9	VIGUETA DE CONFINAMIENTO DE 0.095 X 0.21 M. EN CONCRETO DE 3000 PSI. REFUERZO= 4 D=3/8" ESTRIBO 1/4" CADA 0.14 M.	N+9.90	ML	677.72	929.83	10.85	940.68
7,1	PAÑETE LISO MUROS 1:4, E=1.5 CM	N+9.90	M2	2708.25	2517.46	24.92	2542.38
7,3	PAÑETE LISO 1:4 IMPERMEABILIZADO	N+0.00	M2	266.97	1139.85	45.64	1184.49
11,6	ENCHAPE PISO PARA BAÑO EN PORCELANATO DE 28 X 56 CM.	N+6.60	M2	204.89	48.28	9.31	57.59
11,7	ENCHAPE PARED EN PORCELANATO DE 40 X 40 CM. COLOR BLANCO.	N+3.30	M2	545.32	313.00	9.00	322.00
11,11	ENCHAPE PARED EN PORCELANATO DE 40 X 40 CM. COLOR BLANCO. (LINEAL)	N+3.30	ML	62.00	20.00	7.50	27.50
14,2	ESTUCO Y VINILO TIPO 1 BLANCO PARA INTERIORES	N-3.30	ML	215.75	61.64	8.44	70.08
23,3,1	CAMARA DE INSPECCION NORMA CS 276 CODENSA PARA MT (DE ACUERDO A ESPECIFICACIÓN TECNICA 3.6.1, PLANO TABLEROS Y CUADRO DE CARGAS)	N-3.30	UN	3.00	1.50	0.20	1.70
25,4	SUMINISTRO E INSTALACION DE ASCENSOR ELÉCTRICO CAPACIDAD PARA 9 PERSONAS CON 4 PARADAS MOTOR TRIFASICO DIMENSIONES DE 2.00 X 1.75 M. RECORRIDO EN ALTURA DE 9.00 M. CABINA	N+0.00	UN	1.00	0.70	0.10	0.80
30,2,2	POZO DE INSPECCION PROF<2.50M	N+0.00	UN	1.00	1.50	0.80	2.30

DESCRIPCION DE ACTIVIDADES EJECUTADAS

EXCAVACIÓN MANUAL MURO DE CONTENCIÓN T3A, TUBERIA ACOMETIDA RED DE GAS Y FUNDIDA DE CONCRETO DE LIMPIEZA PARA LA ZARPA MURO T3A EJES 5 AL 6 A0 AL C N-3.30, FUNDIDA DE COLUMNETAS DE CONFINAMIENTO, PAÑETE LISO ENTRE LOS EJES 1 AL 2 Y A0 AL B NIVEL N+9.90, INSTALACIÓN ESTRUCTURA ASCENSOR, ESTUCO Y PINTURA LINEAL ENTRE LOS EJES 4 AL 5 Y B AL D EN NIVEL N-3.30, MAMPOSTERÍA PARA LOS POZOS DE AGUAS LLUVIAS Y AGUAS RESIDUALES N+0.00, MAMPOSTERÍA CAJA CS 276 N-3.30 ENTRE LOS EJES C AL D Y 2 AL 6, ENCHAPE PISO EN BAÑO N+6.60 EJES A AL B Y 1 AL 2, RELLENO EN SUBBASE GRANULAR N+0.00 EJES 3 AL 4 Y C AL D, PAÑETE IMPERMEABILIZADO N+0.00, MAMPOSTERÍA EN BLOQUE # 4 N+3.30, ENCHAPE MURO EN BAÑON+3.30 ENTRE LOS EJES A AL B Y 1 AL 2.

MANO DE OBRA EMPLEADA

CARGO	HORA INICIO	HORA FIN	CANT.	TIEMPO (Horas)
Aux. Residente I, ocp aux	8:00:00	18:00:00	2	20:00:00
Ing. Residente	8:00:00	18:00:00	1	10:00:00
Aux. Ingeniero civil	8:00:00	18:00:00	1	10:00:00
Ing. Profesional SST	8:00:00	18:00:00	1	10:00:00
Profesional Calidad	8:00:00	18:00:00	1	10:00:00
Almacenista	8:00:00	18:00:00	1	10:00:00
Maestro	8:00:00	18:00:00	1	10:00:00
Ejero , conductor mixer , bomba vaciadora	8:00:00	18:00:00	3	30:00:00
Oficiales	8:00:00	18:00:00	22	220:00:00
Ayudantes	8:00:00	18:00:00	26	260:00:00
Profesionales de Topografia (ayu)	10:00:00	18:00:00	1	8:00:00
Interventoria, Ing. SST, Ing residente, Ing Civil	8:00:00	18:00:00	3	30:00:00
Personal Administrativo	8:00:00	18:00:00	3	30:00:00
Personal Electrico	8:00:00	18:00:00	7	70:00:00
Personal Extranjero	8:00:00	18:00:00	9	0:00:00

EQUIPO UTILIZADO

DESCRIPCIÓN	CANT.	TIEMPO (Horas)
RETROEXCAVADOR 320D	1	10:00:00

MATERIALES UTILIZADOS

DESCRIPCION	UND.	CANT.
RELLENO EN MATERIAL RCD	m3	11.10
CONCRETO DE 3000 PSI	m3	3.80
BLOQUE # 4	un	744

ESTADO DEL TIEMPO

		HORAS
SECO	X	8.0
NEBLINA		
LLOVIZNA		
LLUVIA		
TORMENTA		

ACCESO


BUENO	X
REGULAR	
MALO	
MUY MALO	

TERRENO

ROCOSO		BLANDO		NORMAL	X
ARENOSO		LODOSO		PANTANO	

CAUSA ATRASO/HSA - MEDIDA CORRECTIVA:

ESQUEMÁTICO DE OBRA

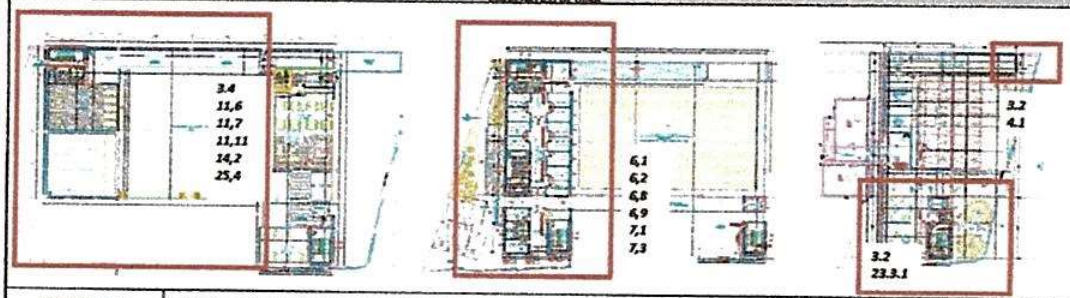

OBSERVACIONES:

ELABORÓ	APROBÓ
FIRMA:	FIRMA:
NOMBRE: ING. JAVIER ANDRES SOSSA PERDOMO	NOMBRE: ING. MARCELO SOMMESTO
CARGO: AUXILIAR DE INTERVENTORIA CONTRACTUAL	CARGO: RESIDENTE DE OBRA CONTRATISTA
FIRMA:	APROBÓ
NOMBRE:	FIRMA:
CARGO: RESIDENTE DE OBRA CONTRATISTA	NOMBRE: ING. ANGELUIS JUNO
	CARGO: RESIDENTE DE INTERVENTORIA


G+G Ingenieros Ltda	INFORME DIARIO DE ACTIVIDADES	Fecha:01/06/2019
	EJECUCIÓN DE OBRA	Código: F-OBR-024
		Version: 1
		Hoja No.: 1 de 1

No DE CONTRATO Y OBJETO	CONTRATO DE OBRA PUBLICA No 470 DE 2018 SUSCRITO ENTRE EL DISTRITO CAPITAL - UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL CUERPO DE BOMBEROS Y GYG INGENIEROS LTDA	CONSECUTIVO	554
LUGAR o ESPECIALIDAD DE LOS TRABAJOS	OBRA	FECHA	viernes 5 de febrero de 2021


INFORME DIARIO No. 554 | Página 2 de 2



EXCAVACIÓN MANUAL MURO DE CONTENCIÓN T3A, TUBERIA ACOMETIDA RED DE GAS Y FUNDIDA DE CONCRETO DE LIMPIEZA PARA LA ZARPA MURO T3A EJES 5 AL 6 A0 AL C N-3.30

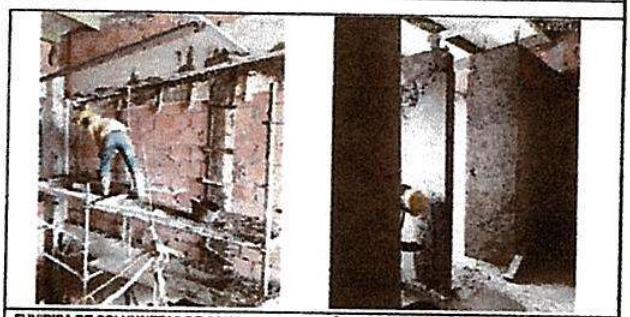

FUNIDIDA DE COLUMNETAS DE CONFINAMIENTO, PAÑETE LISO ENTRE LOS EJES 1 AL 2 Y A0 AL B NIVEL N+9.90

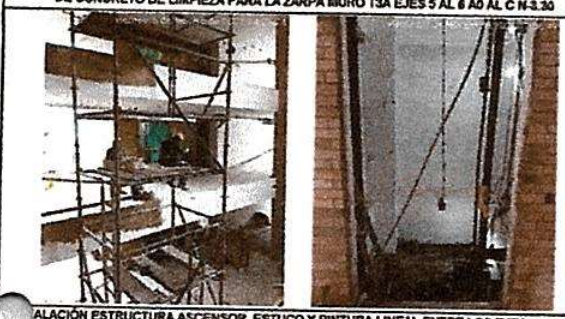

ALACIÓN ESTRUCTURA ASCENSOR, ESTUCO Y PINTURA LINEAL ENTRE LOS EJES 4 AL 5 Y B AL D EN NIVEL N-3.30



MAMPOSTERIA PARA LOS POZOS DE AGUAS LLUVIAS Y AGUAS RESIDUALES N+0.00, MAMPOSTERÍA CAJA CS 276 N-3.30 ENTRE LOS EJES C AL D 2 Y 2 AL 6



ENCHAPE PISO EN BAÑO N+6.00 EJES A AL B Y 1 AL 2, RELLENO EN SUBBASE GRANULAR N+0.00 EJES 3 AL 4 Y C AL D



PAÑETE IMPERMEABILIZADO N+0.00, MAMPOSTERÍA EN BLOQUE # 4 N+3.30, ENCHAPE MURO EN BAÑON+3.30 ENTRE LOS EJES A AL B Y 1 AL 2

ELABORO:

ING. JAVIER ESCOBAR PINTOR
AUXILIAR DE INGENIERIA - CONTRATISTA

APROBO

ING CAMILO ROMERO
RESIDENTE DE OBRA CONTRATISTA

GG Ingenieros Ltda	INFORME DIARIO DE ACTIVIDADES	Fecha:01/06/2019
		Código: F-OBR-024
	EJECUCIÓN DE OBRA	Versión: 1
		Hoja No.: 1 de 1

No DE CONTRATO DE OBRA Y OBJETO	CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. 470 DE 2019 SUSCRITO ENTRE EL DISTRITO CAPITAL - UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL CUERPO DE BOMBEROS Y GHG INGENIEROS LTDA	CONSECUTIVO	555
LUGAR o ESPECIALIDAD DE LOS TRABAJOS	OBRA	FECHA	Sábado 6 de febrero de 2021

HORAS PERDIDAS	POR LLUVIA	POR PAROS		OTROS	TOTALES
Horas Hombre					0.0
Horas Equipo					0.0

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD FUNCIONAL	UND.	CANTIDAD			
				CONTRACTUAL	ACUMULADO ANTERIOR	AVANCE HOY	ACUMULADO ACTUAL
1,8	RETIRO DE POSTE DEPOSTE EXISTENTE UBICADO EN EL PREDIO DONDE SE VA A ENCONTRAR LA SALIDA	N+0.00	UN	1.00	0.00	1.00	1.00
1,9	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE POSTE DE CONCRETO 1050 KG DE 12 M DE ALTURA	N+0.00	UN	1.00	0.00	1.00	1.00
3,2	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN H= < 2.00 M, INCLUYE RETIRO	N-3.30	M3	343.95	458.28	2.24	460.52
3,3	RELLENO EN RECEBO COMÚN COMPACTADO MECÁNICAMENTE	N+0.00	M3	2929.95	3234.48	13.80	3248.28
3,4	RELLENO SUBBASE GRANULAR	N+0.00	M3	731.16	168.76	21.24	190.00
5,30	ACERO FIGURADO 60000 PSI	N-3.30	KG	62395.90	92972.64	650.00	93622.64
6,1	MURO EN BLOQUE NP 4 E=0.09 M.	N+9.90	M2	2222.99	2692.96	42.84	2735.80
6,2	ANCLAJE BARRA 1/2" L=40CM INCLUYE EPOXICO.	N-3.30	UN	690.00	3334.00	42.00	3376.00
6,3	MURO EN LADRILLO A LA VISTA GRAN FORMATO COLOR AMARILLO 11.5 CM	N+0.00	M2	581.49	964.91	9.30	974.21
6,8	COLUMNETA DE CONFINAMIENTO DE 0.095 X 0.21 M. EN CONCRETO DE 3000 PSI, REFUERZO= 4 Ø=3/8"	N+9.90	ML	758.80	1546.05	25.20	1571.25
6,11	DOVELAS PARA MAMPOSTERIA INCLUYE ACERO DE REFUERZO 1#4	N+0.00	ML	840.00	2275.08	15.30	2290.38
7,1	PAÑETE LISO MUROS 1:4, E=1.5 CM	N+6.60	M2	2786.25	2542.38	30.80	2573.18
7,2	PAÑETE LISO MUROS 1:4, E=1.5 CM (LINEAL) H< 0.60 M	N+6.60	ML	321.75	487.21	5.60	492.81
11,6	ENCHAPE PISO PARA BAÑO EN PORCELANATO DE 25 X 55 CM	N+6.60	M2	204.89	57.59	9.78	67.37
11,7	ENCHAPE PARED EN PORCELANATO DE 40 X 40 CM. COLOR BLANCO	N+3.30	M2	545.32	322.00	19.75	341.75
11,11	ENCHAPE PARED EN PORCELANATO DE 40 X 40 CM. COLOR BLANCO. (LINEAL)	N+3.30	ML	62.00	27.50	7.50	35.00
26,2,4	MONTAJE DUCHA PARAL DE PISO 1/2" AF/AC	N+6.60	UN	21.00	0.00	13.00	13.00
26,3,4	PUNTO DUCHA PARAL DE PISO 1/2" AF/AC	N+6.60	UN	21.00	20.00	9.00	29.00
26,6,12	REGISTRO COMPUERTA PESADO RED WHITE 1 1/4"	N+6.60	UN	15.00	12.00	3.00	15.00
26,8,14	REGISTRO BOLA FLOWARD GOLD O SIMILAR TEMP 60°C - 1/2"	N+6.60	UN	26.00	7.00	11.00	18.00
30,2,3	POZO DE INSPECCIÓN PROF<2.50M	N-3.30	UN	1.00	2.30	0.50	2.80
30,3,2	RELLENO ARENA DE PEÑA	N-3.30	M3	72.60	69.01	4.52	73.53
30,3,4	RELLENO SELECCIONADO PROVENIENTE DE LA EXCAVACIÓN (EXTENDIDA Y COMPACTACIÓN	N-3.30	M3	96.79	81.81	1.28	83.09
NP-26	6 DUCTOS D=6" PVC TDP (Incluye suministro e Instalacion. No incluye Rellenos) NORMA CS212	N-3.30	0.00	9.00	0.00	9.00	9.00

DESCRIPCION DE ACTIVIDADES EJECUTADAS

RECUBRIMIENTO PARA EN GEOTEXTIL POZOS AN Y AL, RELLENO EN RECEBO COMÚN, RELLENO EN SUBASE GRANULAR ENTRE LOS EJES 2 AL 3 Y C AL D EN NIVEL N+0.00, DESMONTE Y MONTAJE DEL POSTE DE LA ZONA PEATONAL N+0.00, INSTALACIÓN TUBERIA CON RELLENO EN ARENA DE PEÑA PARA DUCTOS ELÉCTRICOS N-3.30 ENTRE EJES 4 AL 5 Y D AL D2, EXCAVACIÓN MANUAL Y CONEXIÓN A GAS PRICIPAL HASTA EL NICHO DE LA OBRA ENTRE LOS EJES 5 AL 6 Y B AL C EN NIVEL N-3.30, RELLENO EN ARENA DE PEÑA, RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO Y ARMADO DE ACERO PARA EL MURO DE CONTENCIÓN 3A EJES 5 AL 6 Y A0 AL C, INSTALACIÓN REGISTROS N+6.60, TERMINACIÓN PUNTOS HIDRAULICOS DUCHAS N+6.60, ENCHAPE PISO N+6.60 Y MURO EN BAÑOS N+3.30 ENTRE EJES 1 AL 2 Y A AL C, MAMPOSTERÍA EN BLOQUE # 4 N+9.90, MAMPOSTERÍA EN LADRILLO ARENA N+0.00 FUNDIDA DE COLUMNETAS DE CONFINAMIENTO Y PAÑETE EN M2 Y LINEAL N+6.60 ENTRE EJES 1 AL 2 Y A0 AL D.

MANO DE OBRA EMPLEADA

CARGO	HORA		CANT.	TIEMPO (Horas)
	INICIO	FIN		
Aux. Residente1, avg exc	8:00:00	18:00:00	2	20.00:00
Ing. Residente	8:00:00	18:00:00	1	10.00:00
Aux. Ingeniero civil	9:00:00	19:00:00	1	10:00:00
Ing. Profesional SST	8:00:00	18:00:00	1	10:00:00
Profesional Calidad	8:00:00	18:00:00	1	10:00:00
Almacenista	8:00:00	18:00:00	1	10:00:00
Maestro	8:00:00	18:00:00	1	10:00:00
Ejcto , albañiles exc	8:00:00	18:00:00	2	20:00:00
Oficiales	8:00:00	18:00:00	18	180:00:00
Ayudantes	8:00:00	18:00:00	23	230:00:00
Profesionales de Topografia (Lic)	10:00:00	18:00:00	0	0:00:00
Interventoria (esp SST, avg residente, Ing civ	8:00:00	18:00:00	2	20:00:00
Personal Hidrosanitario	8:00:00	18:00:00	2	20:00:00
Personal Electrico	8:00:00	18:00:00	1	10:00:00
Personal Estructura	8:00:00	18:00:00	0	0:00:00

EQUIPO UTILIZADO

DESCRIPCIÓN	CANT.	TIEMPO (Horas)
RETROEXCAVADOR 5R220	1	10:00:00

MATERIALES UTILIZADOS

DESCRIPCIÓN	UND.	CANT.
RELLENO EN MATERIAL RCD	m3	33.04
CARBUCO CEMENTO MAS COLOR ARENA	UN	420
CONCRETO DE 3000 PSI	m3	1.67
BLOQUE # 4	UN	750

ESTADO DEL TIEMPO

		NOMBRE
SECO	X	0.0
NUBLADO		
LLOVIZNA		
LLUVIA		
TORMENTA		

ACCESO


BARRIO	X
REGULAR	
MALO	
MALO	

TERRENO

FONDO		DURO		NORMAL	X
ARENOSO		SUELTO		PANTANO	

CAUSA ATRASO/DIA + MEDIDA CORRECTIVA/

ESQUEMÁTICO DE OBRA

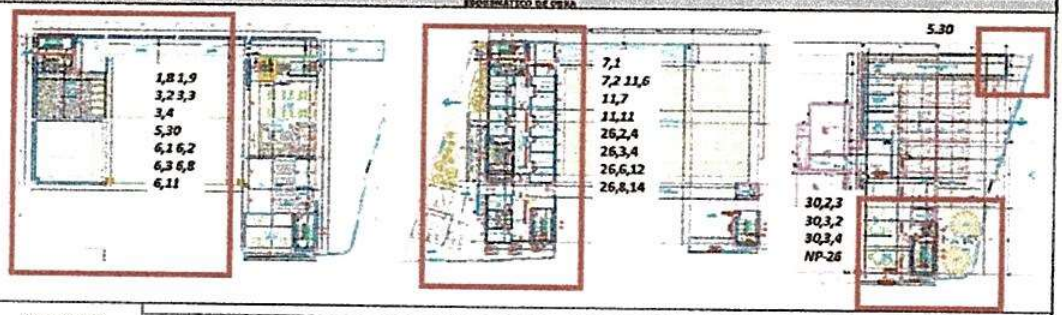

OBSERVACIONES:

FIRMA:		FIRMA:	
NOMBRE: JAVIER ARDILA T.		NOMBRE: ARQ. MARCELO SAURITEGUI	
CARGO: RESIDENTE DE OBRA CONTRATISTA		CARGO: RESIDENTE DE OBRA CONTRATISTA	
FIRMA:		FIRMA:	
NOMBRE:		NOMBRE:	
CARGO: RESIDENTE DE OBRA CONTRATISTA		CARGO: RESIDENTE DE SST INTERVENTORIA	

G-G Ingenieros Ltda	INFORME DIARIO DE ACTIVIDADES	Fecha:01/06/2019
		Código: F-OBR-024
	EJECUCIÓN DE OBRA	Versión: 1
		Hoja No.: 1 de 1

No DE CONTRATO Y OBJETO	CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No 470 DE 2018 SUSCRITO ENTRE EL DISTRITO CAPITAL - UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL CUERPO DE BOMBEROS Y GYG INGENIEROS LTDA	CONSECUTIVO	555
LUGAR o ESPECIALIDAD DE LOS TRABAJOS	OBRA	FECHA	sábado 6 de febrero de 2021

INFORME DIARIO No. 555

REGISTRO FOTOGRÁFICO



RECUBRIMIENTO PARA EN GEOTEXTIL POZOS AN Y ALL, RELLENO EN RECEBO COMÚN, RELLENO EN SUBASE GRANULAR ENTRE LOS EJES 2 AL 3 Y C AL D EN NIVEL N+0.00



DESMONTE Y MONTAJE DEL POSTE DE LA ZONA PEATONAL N+0.00, INSTALACIÓN TUBERIA CON RELLENO EN ARENA DE PEÑA PARA DUCTOS ELÉCTRICOS N-3.30 ENTRE EJES 4 AL 5 Y D AL D2



EXCAVACIÓN MANUAL Y CONEXIÓN A GAS PRICIPAL HASTA EL NICHO DE LA OBRA ENTRE LOS EJES 5 AL 6 Y B AL C EN NIVEL N-3.30



RELLENO EN ARENA DE PEÑA, RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO Y ARMADO DE ACERO PARA EL MURO DE CONTENCIÓN 3A EJES 5 AL 6 Y A0 AL C



INSTALACIÓN REGISTROS N+6.60, TERMINACIÓN PUNTOS HIDRAULICOS DUCHAS N+6.60, ENCHAPE PISO N+6.60 Y MURO EN BAÑOS N+3.30 ENTRE EJES 1 AL 2 Y A AL C



MAMPOSTERÍA EN BLOQUE # 4 N+9.90, MAMPOSTERÍA EN LADRILLO ARENA N+0.00 FUNDIDA DE COLUMNETAS DE CONFINAMIENTO Y PAÑETE EN M2 Y LINEAL N+6.60 ENTRE EJES 1 AL 2 Y A0 AL D

ELABORO: JAVIER E.

ING. JAVIER ESCOBAR PINTOR
AUXILIAR DE INGENIERIA - CONTRATISTA

APROBO:

ING. CAMILO ROMERO
RESIDENTE DE OBRA CONTRATISTA

G-G Ingenieros Ltda	INFORME DIARIO DE ACTIVIDADES	Fecha:01/06/2019
		Código: F-OBR-024
	EJECUCIÓN DE OBRA	Versión: 1
		Hoja No.: 1 de 1

No DE CONTRATO DE OBRA Y OBJETO	CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No 470 DE 2018 SUSCRITO ENTRE EL DISTRITO CAPITAL - UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL CUERPO DE BOMBEROS Y GYG INGENIEROS LTDA	CONSECUTIVO	556
LUGAR o ESPECIALIDAD DE LOS TRABAJOS	OBRA	FECHA	domingo 7 de febrero de 2021

HORAS PERDIDAS	POR LLUVIA	POR PAROS		OTROS	TOTALES
Horas Hombre					0.0
Horas Equipo					0.0

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD FUNCIONAL	UND.	CANTIDAD			
				CONTRACTUAL	ACUMULADO ANTERIOR	AVANCE HOY	ACUMULADO ACTUAL
3,2	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMUN H= < 2.00 M. INCLUYE RETIRO.	N+0.00	M3	343.95	460.52	1.44	461.96
5.30	ACERO FIGURADO 60000 PSI	N-3.30	KG	62395.90	93622.64	750.00	94372.64
23,3,1	CAMARA DE INSPECCION NORMA CS 276 CODENSA PARA MT (DE ACUERDO A ESPECIFICACIÓN TECNICA 3.6.1. PLANO TABLEROS Y CUADRO DE CARGAS)	N-3.30	UN	3.00	1.70	0.10	1.80
27.4.1	TUBERIA PVC SANITARIA 4"	N+0.00	ML	322.36	238.62	6.00	244.62
NP-02	GEODREN VIAL CON TUBERIA CIRCULAR 100 mm H=2.0 M SUMINISTRO E INSTALACION.(No incluye excavacion y rellenos). - CODIGO IDU 5845	N+0.00	ML	120.00	354.68	3.60	358.28

DESCRIPCION DE ACTIVIDADES EJECUTADAS

EXCAVACIÓN MANUAL E INSTALACIÓN TUBERIA PARA LAS SALIDAS DESAGUES DEL CÁRCAMO EN NIVELN+0.00 EJES 2 AL 4 Y C AL D, TERMINANCIÓN CAJAS CS 276 EN NIVEL N-3.30 ENTRE LOS EJES 4 AL 6 Y D AL D 2, ARMADO DE ACERO PARA EL MURO DE CONTENCIÓN 3A ENTRE LOS EJES 5 AL 6 Y A0 AL A EN NIVEL N-3.30, INSTALACIÓN GEODRÉN EN MURO DE CONTENCIÓN 3A ENTRE LOS EJES 5 AL 6 Y A0 AL A EN NIVEL N-3.30.

MANO DE OBRA EMPLEADA

CARGO	HORA		CANT.	TIEMPO (Horas)
	INICIO	FIN		
Arq. Residente, Ing. Ambiental, arq aux	6:00:00	18:00:00	0	0:00:00
Ing. Residente	6:00:00	18:00:00	1	10:00:00
Aux. Ingeniero civil	6:00:00	18:00:00	0	0:00:00
Ing. Profesional SST	6:00:00	18:00:00	0	0:00:00
Profesional Calidad	6:00:00	18:00:00	0	0:00:00
Almacenista	6:00:00	18:00:00	0	0:00:00
Maestro	9:00:00	18:00:00	0	0:00:00
Ejero , conductor mini	8:00:00	18:00:00	1	10:00:00
Oficiales	8:00:00	18:00:00	3	30:00:00
Ayudantes	8:00:00	18:00:00	6	60:00:00
Profesionales de topografia GyG	10:00:00	18:00:00	0	0:00:00
Interventoria Insp SST, ing residente, arq aux	8:00:00	18:00:00	0	0:00:00
Personal Hidrosanitario	8:00:00	18:00:00	0	0:00:00
Personal Electrico	9:00:00	18:00:00	1	10:00:00
Personal Estructura	8:00:00	18:00:00	0	0:00:00

EQUIPO UTILIZADO

DESCRIPCIÓN	CANT.	TIEMPO (Horas)
MINICARGADOR SR320	1	00:00:00

MATERIALES UTILIZADOS

DESCRIPCION	UND.	CANT.
ACERO FIGURADO	KG	750.00

ESTADO DEL TIEMPO

		HORAS
SECO	X	0.0
NEBLINA		
LLOVIZNA		
LLUVIA		
TORMENTA		

ACCESO


BUENO	X
REGULAR	
MALO	
NULO	

TERRENO

ROCOSO		DURO		NORMAL	X
ARENOSO		LODOSO		PANTANO	

CAUSA ATRASO/DIA - MEDIDA CORRECTIVA:

ESQUEMÁTICO DE OBRA

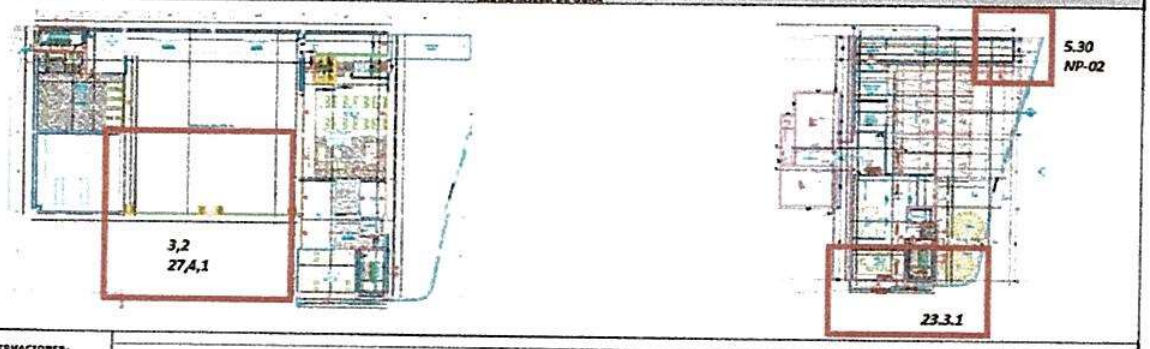

OBSERVACIONES:

	ELABORÓ	APROBÓ
FIRMA:		
NOMBRE:	ING. JAVIER ANDRES ESCOBAR PINTOR	ING. MARCELO SARMIENTO
CARGO:	AUXILIAR DE INGENIERIA CONTRATISTA	RESIDENTE DE OBRA CONTRATISTA
	VALIDÓ	APROBÓ
FIRMA:		
NOMBRE:	ING. IVANDRO ROMERO	ING. JOSE LUIS ARIAS
CARGO:	RESIDENTE DE OBRA CONTRATISTA	RESIDENTE DE INTERVENTORIA

G-G Ingenieros Ltda	INFORME DIARIO DE ACTIVIDADES	Fecha:01/06/2019
	EJECUCIÓN DE OBRA	Código: F-OBR-024
		Versión: 1
		Hoja No.: 1 de 1


No DE CONTRATO Y OBJETO	CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No 470 DE 2018 SUSCRITO ENTRE EL DISTRITO CAPITAL - UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL CUERPO DE BOMBEROS Y GYG INGENIEROS LTDA	CONSECUTIVO	556
LUGAR o ESPECIALIDAD DE LOS TRABAJOS	OBRA	FECHA	domingo 7 de febrero de 2021

INFORME DIARIO No. 556 — Página 2 de 2

REGISTRO FOTOGRÁFICO



EXCAVACIÓN MANUAL E INSTALACIÓN TUBERIA PARA LAS SALIDAS DESAGUES DEL CÁRCAMO EN NIVELH+0.00 EJES 2 AL 4 Y C AL D

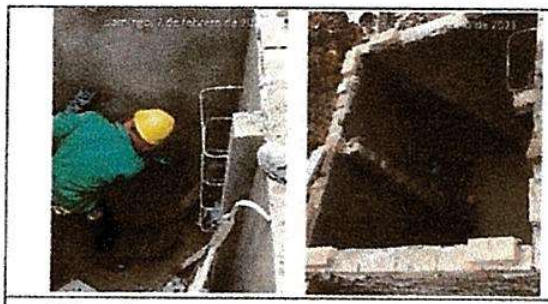

TERMINANCIÓN CAJAS CS 278 EN NIVEL N-3.30 ENTRE LOS EJES 4 AL 6 Y D AL D 2



ARMADO DE ACERO PARA EL MURO DE CONTENCIÓN 3A ENTRE LOS EJES 5 AL 6 Y A0 AL A EN NIVEL N-3.30



INSTALACIÓN GEODRÉN EN MURO DE CONTENCIÓN 3A ENTRE LOS EJES 5 AL 6 Y A0 AL A EN NIVEL N-3.30

ELABORO: JAVIER E.

ING. JAVIER ESCOBAR PINTOR
AUXILIAR DE INGENIERIA - CONTRATISTA

APROBO:

ING CAMILO ROMERO
RESIDENTE DE OBRA CONTRATISTA

GG Ingenieros Ltda	INFORME DIARIO DE ACTIVIDADES	Fecha:01/06/2019
	EJECUCIÓN DE OBRA	Código: F-OBR-024
		Versión: 1
		Hoja No.: 1 de 1

No DE CONTRATO DE OBRA Y OBJETO	CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No 499 DE 2018 SUSCRITO ENTRE EL DISTRITO CAPITAL - UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL CUERPO DE BOMBEROS Y GYG INGENIEROS LTDA	CONSECUTIVO	557
LUGAR o ESPECIALIDAD DE LOS TRABAJOS	OBRA	FECHA	lunes 8 de febrero de 2021

HORAS PERDIDAS	POR LLUVIA	POR PAROS		OTROS	TOTALES
Horas Hombre					0.0
Horas Equipo					0.0

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD FUNCIONAL	UND.	CANTIDAD			
				CONTRACTUAL	ACUMULADO ANTERIOR	AVANCE HOY	ACUMULADO ACTUAL
3,2	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMUN H= < 2.00 M. INCLUYE RETIRO	N-3.30	M3	343.95	461.96	7.85	469.81
3,3	RELLENO EN RECEBO COMUN COMPACTADO MECÁNICAMENTE	N+0.00	M3	2929.95	3248.28	4.41	3252.69
3,4	RELLENO SUBBASE GRANULAR	N+0.00	M3	211.16	190.00	8.88	198.88
6,2	ANCLAJE BARRA 1/2" L=40CM INCLUYE EPOXICO.	N+6.60	UN	600.00	3376.00	32.00	3408.00
6,3	MURO EN LADRILLO A LA VISTA GRAN FORMATO COLOR AMARILLO 11.5 CM	N+9.90	M2	581.49	974.21	4.20	978.41
6,8	COLUMNETA DE CONFINAMIENTO DE 0.095 X 0.21 M. EN CONCRETO DE 3000 PSI. REFUERZO= 4 D=3/8"	N+9.90	ML	758.80	1571.25	22.40	1593.65
6,9	VIGUETA DE CONFINAMIENTO DE 0.095 X 0.21 M. EN CONCRETO DE 3000 PSI. REFUERZO= 4 D=3/8"	N+9.90	ML	677.72	940.60	15.70	956.30
7,1	PAÑETE LISO MUROS 1:4. E=1.5 CM	N+3.30	M2	2786.25	2573.18	19.20	2592.38
11,6	ENCHAPE PISO PARA BAÑO EN PORCELANATO DE 28 X 56 CM	N+3.30	M2	204.89	67.37	9.52	76.89
11,7	ENCHAPE PARED EN PORCELANATO DE 40 X 40 CM. COLOR BLANCO	N+6.60	M2	545.32	341.75	30.00	371.75
14,2	ESTUCO Y VINILO TIPO 1 BLANCO PARA INTERIORES SOBRE PAÑETE 3 MANOS. INCLUYE FILOS Y	N+3.30	ML	215.75	70.08	15.60	85.68
26.2.4	MONTAJE DUCHA PARAL DE PISO 1/2" AF/AC	N+6.60	UN	21.00	13.00	6.00	19.00
26.3.4	PUNTO DUCHA PARAL DE PISO 1/2" AF/AC	N+6.60	UN	21.00	29.00	9.00	38.00
27.1.4	SALIDA SANITARIA DUCHAS 2"	N+6.60	UN	23.00	8.00	11.00	19.00
27.1.7	SIFON DE PISO 4"	N+0.00	UN	8.00	0.00	6.00	6.00
27.4.1	TUBERÍA PVC SANITARIA 4"	N+0.00	ML	322.36	244.62	18.50	263.12
27.4.3	ACCESORIO SANITARIO 4"	N+0.00	UN	108.00	102.00	18.00	120.00
30.3.2	RELLENO ARENA DE PEÑA	N+0.00	M3	72.60	73.53	2.21	75.73

DESCRIPCION DE ACTIVIDADES EJECUTADAS

RELLENO EN SUBBASE GRANULAR CON MATERIAL RCD ZONA PLACA N+0,00, RELLENO EN RECEBO COMÚN CON MATERIAL RCD ZONA LOS DUCTOS ELÉCTRICOS N+3.30 EJES 2 AL 5 Y C AL D, MAMPOSTERÍA EN LADRILLO ARENA N+0.00, PAÑETE BAJO ESCALERA N+3.30 ENTRE LOS EJES 1 AL 2 Y A0 AL B, TERMINACIÓN PUNTOS DUCHAS N+6.60, INSTALACIÓN ENCHAPE BAÑO EN PISO N+3.30 E INSTALACIÓN ENCHAPE MUROS EN BAÑOS N+6.60 ENTRE LOS EJES 1 AL 2 Y A0 AL B, FUNDIDA DE COLUMNETAS Y VIGUETAS DE CONFINAMIENTO ENTRE LOS 1 AL 2 Y A0 AL D EN NIVEL N+9.90, INSTALACIÓN TUBERIA PVC-S, INSTALACIÓN SIFONES Y RELLENE EN ARENA DE PEÑA ENTRE LOS EJES 2 AL 4 Y C AL D EN NIVEL N+0.00, EXCAVACIÓN MANUAL PARA LA TUBERIA ENTERRADA N+0.00 Y ZONA URBANISMON-3.30 , ESTUCO Y PINTURA LINEAL N+3.30 EJES C AL D Y 2 AL 5.

MANO DE OBRA EMPLEADA

CARGO	DIURA		CANT.	TIEMPO (Horas)
	Inicio	Fin		
Ayudante	8:00:00	18:00:00	15	150:00:00
Profesionales de Ingeniería GyG	10:00:00	18:00:00	8	64:00:00
Personal Administrativo	8:00:00	18:00:00	3	30:00:00
Personal Electrico	8:00:00	18:00:00	0	0:00:00
Personal Estructura	8:00:00	18:00:00	0	0:00:00

EQUIPO UTILIZADO

DESCRIPCIÓN	CANT.	TIEMPO (Horas)
MINICARGADOR SR220	1	10:00:00
VIBROCOMPACTADOR MENTOR	1	10:00:00
VIBROCOMPACTADOR TIPO CANGURO	1	10:00:00

MATERIALES UTILIZADOS

DESCRIPCIÓN	UND.	CANT.
RELLENO EN MATERIAL RCD	m3	22.2o
LADRILLO GRANFORMADO COLOR ARENA	UN	184
CONCRETO DE 3000 PSI	m3	1.50

ESTADO DEL TIEMPO

		HORAS
SECO	X	8.0
NUBLINA		
NIEBLINA		
LLUVIA		
TORMENTA		

TERRENO


ROCOSO		DURO		NORMAL	X
ARENOSO		LODOSO		PANTANO	

ACCESO

BUENO	X
REGULAR	
MALO	
NULO	

CAUSA ATRASO/SGA - MEDIDA CORRECTIVA:

ESQUEMÁTICO DE OBRA

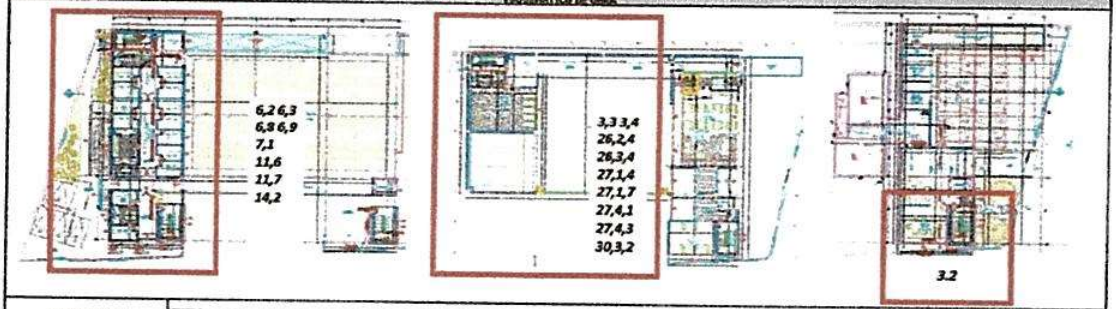

OBSERVACIONES:

	ELABORÓ	APROBÓ
FIRMA:	JAVIER E	
NOMBRE:	ING. JUAN ANDRES PISCIOTTI PARRA	ARQ. MARCELO SARMIENTO
CARGO:	AUXILIAR DE INGENIERIA CONTRATISTA	RESIDENTE DE OBRA CONTRATISTA
FIRMA:	VALIDÓ	APROBÓ
NOMBRE:	ING. CARLOS ROJAS	ING. ROSARIO KURI
CARGO:	SUPERVISOR DE OBRA CONTRATISTA	RESIDENTE DE INTERVENTORIA

G&G Ingenieros Ltda	INFORME DIARIO DE ACTIVIDADES	Fecha:01/06/2019
		Código: F-OBR-024
	EJECUCIÓN DE OBRA	Versión: 1
		Hoja No.: 1 de 1


No DE CONTRATO Y OBJETO	CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No 470 DE 2018 SUSCRITO ENTRE EL DISTRITO CAPITAL - UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL CUERPO DE BOMBEROS Y GYG INGENIEROS LTDA	CONSECUTIVO	557
LUGAR o ESPECIALIDAD DE LOS TRABAJOS	OBRA	FECHA	lunes 8 de febrero de 2021

INFORME DIARIO No. 557

REGISTRO FOTOGRÁFICO




RELLENO EN SUBBASE GRANULAR CON MATERIAL RCD ZONA PLACA N+0.00, RELLENO EN RECEBO COMÚN CON MATERIAL RCD ZONA LOS DUCTOS ELÉCTRICOS N+3.30 EJES 2 AL 5 Y C AL D

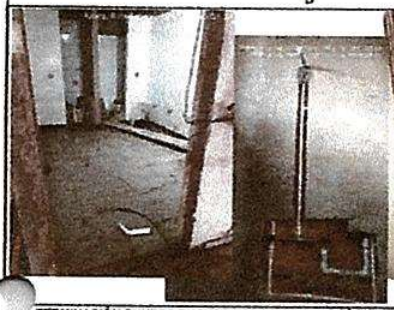


TERMINACIÓN PUNTOS DUCHAS N+6.60, INSTALACIÓN ENCHAPE BAÑO EN PISO N+3.30 E INSTALACIÓN ENCHAPE MUROS EN BAÑOS N+6.60 ENTRE LOS EJES 1 AL 2 Y A0 AL B



INSTALACIÓN TUBERIA PVC-S, INSTALACIÓN SIFONES Y RELLENE EN ARENA DE PEÑA ENTRE LOS EJES 2 AL 4 Y C AL D EN NIVEL N+0.00




MAMPOSTERÍA EN LADRILLO ARENA N+0.00, PAÑETE BAJO ESCALERA N+3.30 ENTRE LOS EJES 1 AL 2 Y A0 AL B




FUNDIDA DE COLUMNETAS Y VIGUETAS DE CONFINAMIENTO ENTRE LOS 1 AL 2 Y A0 AL D EN NIVEL N+9.90



EXCAVACIÓN MANUAL PARA LA TUBERIA ENTERRADA N+0.00 Y ZONA URBANISMON-3.30 , ESTUCO Y PINTURA LINEAL N+3.30 EJES C AL D Y 2 AL 5

ELABORO: JAVIER E.

ING. JAVIER ESCOBAR PINTOR
AUXILIAR DE INGENIERIA - CONTRATISTA

APROBO

ING. CAMILO ROMERO
RESIDENTE DE OBRA CONTRATISTA

GG Ingenieros Ltda	INFORME DIARIO DE ACTIVIDADES	Fecha:01/06/2019
	EJECUCIÓN DE OBRA	Código: F-OBR-024
		Versión: 1
		Hoja No.: 1 de 1

No DE CONTRATO DE OBRA Y OBJETO	CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No 476 DE 2018 SUSCRITO ENTRE EL DISTRITO CAPITAL - UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL CUERPO DE BOMBEROS Y GYG INGENIEROS LTDA	CONSECUTIVO	558
LUGAR o ESPECIALIDAD DE LOS TRABAJOS	OBRA	FECHA	martes 9 de febrero de 2021

HORAS PERDIDAS	POR LLUVIA	POR PAROS		OTROS	TOTALES
Horas Hombre					0.0
Horas Equipo					0.0

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD PERSONAL	UND.	CANTIDAD			
				CONTRACTUAL	ACUMULADO ANTERIOR	AVANCE HOY	ACUMULADO ACTUAL
3,2	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMUN H= < 2.00 M. INCLUYE RETIRO.	N-3.30	M3	343.95	469.81	6.72	476.53
3,4	RELLENO SUBBASE GRANULAR	N+0.00	M3	231.16	198.88	23.10	221.98
6,2	ANCLAJE BARRA 1/2" L=40CM INCLUYE EPOXICO.	N+0.00	UN	600.00	3408.00	6.00	3414.00
6,3	MURO EN LADRILLO A LA VISTA GRAN FORMATO COLOR AMARILLO 11.5 CM.	N+0.00	M2	581.49	978.41	4.20	982.61
6,5	ENCHAPE EN FACHALETA LADRILLO A LA VISTA GRAN FORMATO COLOR AMARILLO. H< 0.60 M.	N+6.60	ML	618.36	393.60	9.45	403.05
6,11	DOVELAS PARA MAMPOSTERIA INCLUYE ACERO DE REFUERZO 1#4.	N+0.00	ML	840.00	2290.38	14.40	2304.78
7,1	PAÑETE LISO MUROS 1:4, E=1.5 CM	N+9.90	M2	2786.25	2592.38	24.64	2617.02
7,2	PAÑETE LISO MUROS 1:4, E=1.5 CM (LINEAL) H< 0.60 M.	N+6.60	ML	321.75	492.81	18.00	510.81
11,7	ENCHAPE PARED EN PORCELANATO DE 40 X 40 CM. COLOR BLANCO.	N+6.60	M2	545.32	371.75	10.75	382.50
13,1	CIELO RASO PLANO EN SUPERBOARD 6 MM. INCLUYE DILATACIÓN PLASTICA Y PINTURA	N+6.60	M2	1437.30	695.22	7.05	702.27
26,2,4	MONTAJE DUCHA PARAL DE PISO 1/2" AF/AC	N+9.90	UN	21.00	19.00	1.00	20.00
26,3,4	PUNTO DUCHA PARAL DE PISO 1/2" AF/AC	N+9.90	UN	21.00	38.00	2.00	40.00
27,1,4	SALIDA SANITARIA DUCHAS 2"	N+9.90	UN	21.00	19.00	1.00	20.00

DESCRIPCION DE ACTIVIDADES EJECUTADAS

EXCAVACIÓN MANUAL PARA LA TUBERIA ENTERRADA Y EXCAVACIÓN MANUAL PARA EL URBANISMO EN NIVEL N-3.30 ENTRE EJES 4 AL 6 Y C AL D2, MAMPOSTERÍA EL LADRILLO ARENA ENTRE LOS EJES 1 AL 2 Y A AL B EN NIVEL N+0.00, RELLENO EN SUBBASE GRANULAR EN NIVEL N+0.00 ENTRE LOS EJES C AL D2 Y 2 AL 4, TERMINACIÓN PUNTO DUCHAS, PAÑETE LISO ENTRE LOS EJES 1 AL 2 Y B AL D EN NIVEL N+9.90, INICIO INSTALACIÓN ESTRUCTURA CIELO RASO E INSTALACIÓN ENCHAPE EN BAÑO EN NIVEL N+6.60 ENTRE LOS EJES 1 AL 2 Y A AL B, MAMPOSTERÍA EN FACHALETA EN NIVEL Y PAÑETE LINEA EN ALOJAMIENTOS ENTRE LOS EJES 1 AL 2 AY C AL D EN NIVEL N+6.60.

MANO DE OBRA EMPLEADA

CARGO	HORA INICIO	HORA FIN	CANT.	TIEMPO (Horas)
Arq. Residente, Arq asc, ing ambiental	8:00:00	18:00:00	3	30:00:00
Ing. Residente	8:00:00	18:00:00	1	10:00:00
Asc. Ingeniero civil	8:00:00	18:00:00	1	10:00:00
Ing. Profesional SST	8:00:00	18:00:00	1	10:00:00
Profesional Calidad	8:00:00	18:00:00	1	10:00:00
Almacenista	8:00:00	18:00:00	1	10:00:00
Maestro	8:00:00	18:00:00	1	10:00:00
Ejero , conductor mini	8:00:00	18:00:00	2	20:00:00
Oficiales	8:00:00	18:00:00	18	180:00:00
Ayudantes	8:00:00	18:00:00	23	230:00:00
Profesionales de topografia GyG	10:00:00	18:00:00	1	8:00:00
Interventoria Ing SST, Ing residente, ing asc	8:00:00	18:00:00	2	20:00:00
Personal Hidrosanitaria	8:00:00	18:00:00	2	20:00:00
Personal Electrico	8:00:00	18:00:00	1	10:00:00
Personal Ascensor	8:00:00	18:00:00	2	20:00:00

EQUIPO UTILIZADO

DESCRIPCIÓN	CANT.	TIEMPO (Horas)
MINICARGADOR SR220	1	10:00:00
VIBROCOMPACTADOR BENETTI	1	10:00:00
VIBROCOMPACTADOR TIPO CANGURO	1	10:00:00

MATERIALES UTILIZADOS

DESCRIPCIÓN	UNID.	CANT.
RELLENO EN MATERIAL RCD	m3	23.10
LADRILLO CARAVISTA MAYO COLOR ARENA	UN	184

ESTADO DEL TIEMPO

		HORAS
SECO	X	8.0
NEBLINA		
LLOVIZNA		
LLUVIA		
TORMENTA		

ACCESO


BUENO	X
REGULAR	
MALO	
NULO	

TERRENO

ROCOSO		DURO	NORMAL X
ARENOSO		LODOSO	PANTANO

CAUSA ATRASO/OBS - MEDIDA CORRECTIVA:

ESQUEMÁTICO DE OBRA

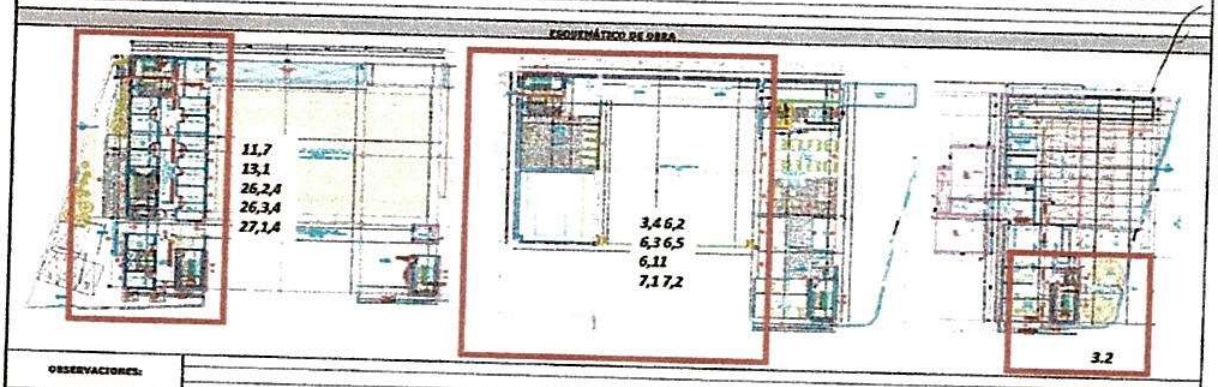

OBSERVACIONES:

	ELABORO	APROBO	APROBO
FIRMA:			
NOMBRE:	ING. JAVIER ANDRES ESCOBAR PINTOR	ARQ. MARCELO GUERRERO	ING. JOSE LUIS JUYO
CARGO:	AUXILIAR DE INGENIERIA CONTRATISTA	RESIDENTE DE OBRA CONTRATISTA	RESIDENTE DE INTERVENTORIA

G-G Ingenieros Ltda.	INFORME DIARIO DE ACTIVIDADES	Fecha:01/06/2019
	EJECUCIÓN DE OBRA	Código: F-OBR-024
		Versión: 1
		Hoja No.: 1 de 1

No DE CONTRATO Y OBJETO	CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No 470 DE 2018 SUSCRITO ENTRE EL DISTRITO CAPITAL - UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL CUERPO DE BOMBEROS Y GYG INGENIEROS LTDA	CONSECUTIVO	558
LUGAR o ESPECIALIDAD DE LOS TRABAJOS	OBRA	FECHA	martes 9 de febrero de 2021

INFORME DIARIO No. 558 | Página 2 de 2

REGISTRO FOTOGRÁFICO





EXCAVACIÓN MANUAL PARA LA TUBERIA ENTERRADA Y EXCAVACIÓN MANUAL PARA EL URBANISMO EN NIVEL N-3.30 ENTRE EJES 4 AL 6 Y C AL D2




MAMPOSTERÍA EL LADRILLO ARENA ENTRE LOS EJES 1 AL 2 Y A AL B EN NIVEL N+0.00





RELLENO EN SUBBASE GRANULAR EN NIVEL N+0.00 ENTRE LOS EJES C AL D2 Y 2 AL 4

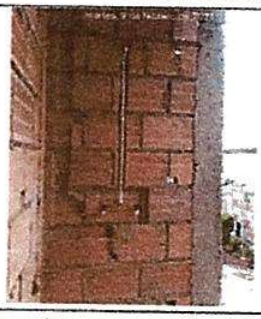


TERMINACIÓN PUNTO DUCHAS, PAÑETE LISO ENTRE LOS EJES 1 AL 2 Y B AL D EN NIVEL N+8.90




INICIO INSTALACIÓN ESTRUCTURA CIELO RASO E INSTALACIÓN ENCHAPE EN BAÑO EN NIVEL N+6.60 ENTRE LOS EJES 1 AL 2 Y A AL B




MAMPOSTERÍA EN FACHALETA EN NIVEL Y PAÑETE LINEA EN ALOJAMIENTOS ENTRE LOS EJES 1 AL 2 AY C AL D EN NIVEL N+6.60

ELABORO: JAVIER E.

ING. JAVIER ESCOBAR PINTOR
AUXILIAR DE INGENIERIA - CONTRATISTA

APROBO:

ING. CAMILO ROMERO
RESIDENTE DE OBRA CONTRATISTA

447

	INFORME DIARIO DE ACTIVIDADES	Fecha:01/06/2019
GG Ingeniería Ltda	EJECUCIÓN DE OBRA	Código: F-OBR-024
		Versión: 1
		Hoja No.: 1 de 1

No DE CONTRATO DE OBRA Y OBJETO	CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No-484 DE 2018 CELEBRADO ENTRE EL DISTRITO CAPITAL - UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL CUERPO DE BOMBEROS Y GHC INGENIEROS LTDA	CONSECUTIVO	559
LUGAR o ESPECIALIDAD DE LOS TRABAJOS	OBRA	FECHA	miércoles 10 de febrero de 2021

HORAS PERDIDAS	POR LLUVIA	POR PAROS		OTROS	TOTALES
Horas Hombre					0.0
Horas Equipo					0.0

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD FUNCIONAL	UND.	CANTIDAD			
				CONTRACTUAL	ACUMULADO ANTERIOR	AVANCE HOY	ACUMULADO ACTUAL
3,1	EXCAVACIONES VARIAS A MAQUINA SIN CLASIFICAR INCLUYE RETIRO	N-3.30	M3	6684.95	7066.40	13.50	7079.90
3,2	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN H= < 3.00 M. INCLUYE RETIRO.	N+0.00	M3	343.95	476.53	3.80	480.33
3,3	RELLENO EN RECEBO COMUN COMPACTADO MECÁNICAMENTE	N+0.00	M3	2929.95	3252.69	4.18	3256.87
3,4	RELLENO SUBBASE GRANULAR	N+0.00	M3	231.16	221.98	7.44	229.42
6,1	MURO EN BLOQUE Nº 4 E=0.09 M.	N+0.00	M2	2222.99	2735.80	31.08	2766.88
6,2	ANCLAJE BARRA 1/2" L=40CM INCLUYE EPOXICO.	N+0.00	UN	600.00	3414.00	28.00	3442.00
6,3	MURO EN LADRILLO A LA VISTA GRAN FORMATO COLOR AMARILLO 11.5 CM.	N+9.90	M2	581.49	982.61	9.80	992.41
6,6	ENCHAPE EN FACHALETA LADRILLO A LA VISTA GRAN FORMATO COLOR OCRE. H< 0.60 M.	N+6.60	ML	127.58	67.76	3.30	71.06
6,7	ENCHAPE EN FACHALETA LADRILLO A LA VISTA GRAN	N+6.60	M2	92.92	75.08	(0.36	85.44
6,8	COLUMNETA DE CONFINAMIENTO DE 0.095 X 0.21 M. EN CONCRETO DE 3000 PSI. REFUERZO= 4 D=3/8" ESTRIBO 1/4" CADA 0.14 M.	N+6.60	ML	758.80	1593.65	14.00	1607.65
6,9	VIGUETA DE CONFINAMIENTO DE 0.095 X 0.21 M. EN CONCRETO DE 3000 PSI. REFUERZO= 4 D=3/8" ESTRIBO 1/4" CADA 0.14 M.	N+6.60	ML	677.72	956.38	7.98	964.36
6,11	DOVELAS PARA MAMPOSTERIA INCLUYE ACERO DE REFUERZO 1/4.	N+6.60	ML	840.00	2304.78	18.20	2322.98
7,1	PAÑETE LISO MUROS 1:4, E= 1.5 CM	N+9.90	M2	2786.25	2617.02	30.08	2647.10
11,5	MESON EN CONCRETO CON ACABADO EN GRANITO PULIDO	N+3.30	M2	19.85	3.84	2.86	6.70
11,6	ENCHAPE PISO PARA BAÑO EN PORCELANATO DE 28 X 56 CM.	N+3.30	M2	204.89	76.89	2.56	79.45
11,7	ENCHAPE PARED EN PORCELANATO DE 40 X 40 CM. COLOR BLANCO	N+3.30	M2	545.32	382.50	21.25	403.75
13,1	CIELO RASO PLANO EN SUPERBOARD 6 MM. INCLUYE DILATACIÓN PLASTICA Y PINTURA	N+6.60	M2	1437.30	702.27	16.41	718.68
14,2	ESTUCO Y VINILO TIPO 1 BLANCO PARA INTERIORES SOBRE PAÑETE 3 MANOS. INCLUYE FILOS Y	N+3.30	ML	215.75	85.68	15.16	100.84
26,2,4	MONTAJE DUCHA PARAL DE PISO 1/2" AFIAC	N+9.90	UN	21.00	20.00	1.00	21.00
26,3,1	PUNTO SANITARIO PUSH PARAL DE PISO 1 1/4" AF	N+9.90	UN	22.00	18.00	4.00	22.00
26,3,4	PUNTO DUCHA PARAL DE PISO 1/2" AFIAC	N+9.90	UN	21.00	40.00	2.00	42.00
27,1,4	SALIDA SANITARIA DUCHAS 2"	N+9.90	UN	23.00	20.00	1.00	21.00

DESCRIPCION DE ACTIVIDADES EJECUTADAS

INSTALACIÓN ENCHAPE MURO Y PISO EN BAÑO EN NIVEL N+3.30 ENTRE LOS EJES 1 AL 2 Y A AL B EN NIVEL, PAÑETE LISO, TERMINACIÓN PUNTOS DUCHAS E INSTALACIÓN PUSH SANITARIOS ENTRE LOS EJES 1 AL 2 Y A AL D EN NIVEL N+9.90, MAMPOSTERÍA EN BLOQUE # 4, ESTRUCTURA DE CIELO RASO Y FUNDIDA DE COLUMNETAS Y VIGUETAS DE CONFINAMIENTO ENTRE LOS EJES 1 AL 2 Y C AL D EN NIVEL N+6.60, EXCAVACIÓN MANUAL ZONA URBANISMO, RELLENO EN RECEBO COMÚN, RELLENO EN SUBBASE GRANULAR ENTRE LOS EJES C AL D2 Y 2 AL 4 EN NIVEL N+0.00, EXCAVACIÓN A MAQUINA N-3.30, FUNDIDA DE MESÓN N+3.30, ESTUCO Y PINTURA N+3.30 ENTRE LOS EJES 4 AL 6 AL A0 AL D, MAMPOSTERÍA EN LADRILLO ARENA CON FACHALETA LINEA Y EN M2 ENTRE LOS EJES D AL D1 Y 1 AL 2 EN NIVEL N+6.60.

MANO DE OBRA EMPLEADA

CARGO	HORA		CANT.	TIEMPO (Horas)
	DIRECTO	FIN		
Aux. Residente - Ing civil	8:00:00	18:00:00	1	10:00:00
Dpto. Auxiliares	8:00:00	12:00:00	1	04:00:00
Aux. Ing civil	8:00:00	18:00:00	1	10:00:00
Ing. Profesional SST	8:00:00	12:00:00	1	04:00:00
Profesional Calidad	8:00:00	18:00:00	1	10:00:00
Almacenista	8:00:00	18:00:00	1	10:00:00
Electrico	8:00:00	18:00:00	1	10:00:00
Ayud. - cerrajero raso	8:00:00	18:00:00	1	10:00:00
Oficiales	8:00:00	18:00:00	1	10:00:00
Ayudantes	8:00:00	18:00:00	23	230:00:00
Profesionales de topografia (pr)	8:00:00	18:00:00	23	230:00:00
Laboratorista, Inspector SST, Ing residente, Ing	8:00:00	18:00:00	9	90:00:00
Personal Administrativo	8:00:00	18:00:00	3	30:00:00
Personal Electrico	8:00:00	18:00:00	2	20:00:00
Personal Ascensor	8:00:00	18:00:00	2	20:00:00
	8:00:00	18:00:00	2	20:00:00

EQUIPO UTILIZADO

DESCRIPCIÓN	CANT.	TIEMPO (Horas)
RETROEXCAVADORA 320	1	10:00:00
VIBROCOMPACTADORA RETRITEK	1	10:00:00
VIBROAPISONADOR TIPO CANGURO	1	10:00:00

MATERIALES

DESCRIPCIÓN	UNID.	CANT.
RELLENO EN MATERIAL SECO	m3	7.08
LADRILLO CALIFORMATO LIBRA ARENA	UN	504
CONCRETO DE 3000 PSI	m3	0.91
BLOQUE # 4	UN	516

ESTADO DEL TIEMPO

	HORAS PERDIDAS	
SECO	[x]	
NUBLADO	[ ]	
LLUVIOSO	[ ]	
NIEVE	[ ]	
TORMENTA	[ ]	

ACCESO


BUENO	[x]
REGULAR	[ ]
MALO	[ ]
MUY MALO	[ ]

TERRENO

FANGOSO	[ ]	NORMAL	[x]
ARENOSO	[ ]	DURO (ROCOSO)	[ ]

CAUSA ATRASO/DIA - MEDIDA CORRECTIVA:

ESQUEMÁTICO DE OBRA

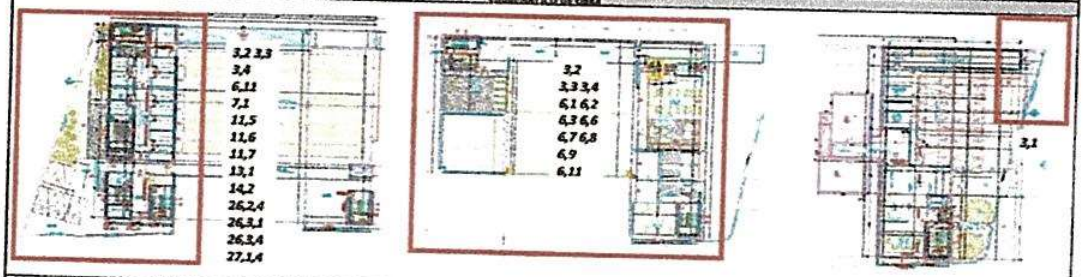

OBSERVACIONES:


ELABORÓ		APROBÓ	
FIRMA:		FIRMA:	
NOMBRE:	ING. MAYRA ALEJANDRA ESCOBAR PINTOR	NOMBRE:	C. MARCELO SARMIENTO
CARGO:	AUXILIAR DE INGENIERÍA CONTRATISTA	CARGO:	RESIDENTE DE OBRA CONTRATISTA
FIRMA:		FECHA:	
NOMBRE:			
CARGO:			

GyG Ingenieros Ltda	INFORME DIARIO DE ACTIVIDADES	Fecha: 01/06/2019
	EJECUCIÓN DE OBRA	Código: F-OBR-024
		Versión: 1
		Hoja No.: 1 de 1


No DE CONTRATO Y OBJETO	CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No 470 DE 2018 SUSCRITO ENTRE EL DISTRITO CAPITAL - UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL CUERPO DE BOMBEROS Y GYG INGENIEROS LTDA	CONSECUTIVO	559
LUGAR o ESPECIALIDAD DE LOS TRABAJOS	OBRA	FECHA	miércoles 10 de febrero de 2021

INFORME DIARIO No. 559 — Página 2 de 2

REGISTRO FOTOGRÁFICO

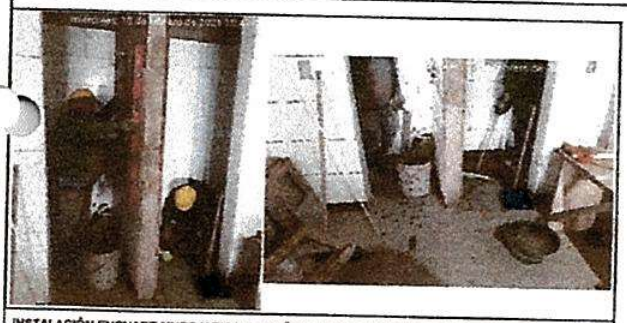

INSTALACIÓN ENCHAPE MURO Y PISO EN BAÑO EN NIVEL N+3.30 ENTRE LOS EJES 1 AL 2 Y A AL B EN NIVEL

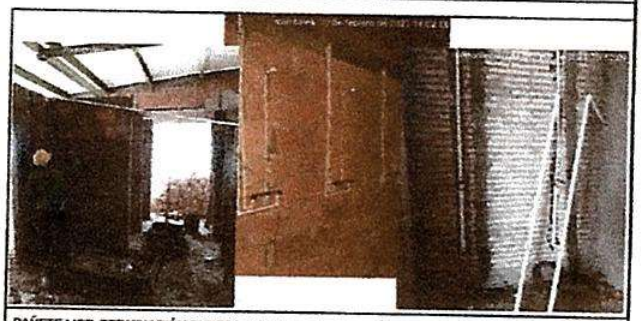

PAÑETE LISO, TERMINACIÓN PUNTOS DUCHAS E INSTALACIÓN PUSH SANITARIOS ENTRE LOS EJES 1 AL 2 Y A AL D EN NIVEL N+9.90




MPOSTERÍA EN BLOQUE #4, ESTRUCTURA DE CIELO RASO Y FUNDIDA DE COLUMNETAS Y VIGUETAS DE CONFINAMIENTO ENTRE LOS EJES 1 AL 2 Y C AL D EN NIVEL N+6.60



EXCAVACIÓN MANUAL ZONA URBANISMO, RELLENO EN RECEBO COMÚN, RELLENO EN SUBBASE GRANULAR ENTRE LOS EJES C AL D2 Y 2 AL 4 EN NIVEL N+0.00



EXCAVACIÓN A MAQUINA N-3.30, FUNDIDA DE MESÓN N+3.30, ESTUCO Y PINTURA N+3.30 ENTRE LOS EJES 4 AL 6 AE A0 AL D

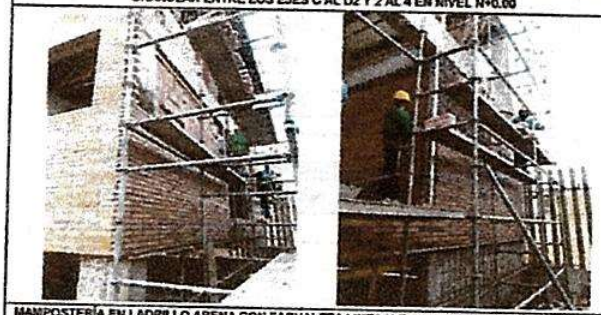

MAMPOSTERÍA EN LADRILLO ARENA CON FACHALETA LINEA Y EN M2 ENTRE LOS EJES D AL D1 Y 1 AL 2 EN NIVEL N+6.00

ELABORO: Javier F.

ING. JAVIER ESCOBAR PINTOR
AUXILIAR DE INGENIERIA - CONTRATISTA

APROBO:

ING. MARCO ROMERO
RESIDENTE DE OBRA CONTRATISTA

49

Aux. Ingeniero civil	8:00:00	18:00:00	1	10:00:00			
Ing. Profesional SST	8:00:00	18:00:00	1	10:00:00	VIDRIOCOMPACTADOR TIPO CANGURO	1	10:00:00
Profesional Calidad	8:00:00	18:00:00	1	10:00:00		1	10:00:00
Almacenista	8:00:00	18:00:00	1	10:00:00			
Maestro	8:00:00	18:00:00	1	10:00:00			
Ayud., conductor mec.	8:00:00	18:00:00	1	10:00:00			
Oficiales	8:00:00	18:00:00	2	20:00:00			
Ayudantes	8:00:00	18:00:00	22	220:00:00			

G-G Ingenieros Ltda	INFORME DIARIO DE ACTIVIDADES EJECUCIÓN DE OBRA	Fecha: 01/06/2019 Código: F-OBR-024 Versión: 1 Hoja No.: 1 de 1

No DE CONTRATO Y OBJETO	CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No 470 DE 2018 SUSCRITO ENTRE EL DISTRITO CAPITAL - UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL CUERPO DE BOMBEROS Y GYG INGENIEROS LTDA	CONSECUTIVO	560
LUGAR o ESPECIALIDAD DE LOS TRABAJOS	OBRA	FECHA	Jueves 11 de febrero de 2021

INFORME DIARIO No. 560 | Página 2 de 2

REGISTRO FOTOGRÁFICO



INSTALACIÓN ESTRUCTURA METÁLICA PARA EL CIELO RASO EN NIVELES N+3.30 Y N+8.60 ENTRE LOS EJES 1 AL 2 Y A AL C.



TERMINACIÓN PUNTOS DUCHAS, INSTALACIÓN ENCHAPE MURO BAÑOS ENTRE LOS EJES A AL B Y 1 AL 2 EN NIVEL N+0.00




INSTALACIÓN ENCHAPE MURO EN BAÑOS Y CUARTO DE ASEO, PAÑETE LISO ENTRE LOS EJES 1 AL 2 Y B AL D EN NIVEL N+8.60



EXCAVACIÓN MANAL ZONA SARDINEL, Y FUNDIDA DE CONCRETO DE LIMPIEZA PARA LA CURVA SARDINEL EN NIVEL N+0.00 ENTRE LOS EJES 2 AL 4 Y D AL D2



INSTALACIÓN MARCOS DE LAS LÁMPARAS DE ILUMINACIÓN N-3.30, ESTUCO Y PINTURA N+3.30ENTRE LOS EJES 4 AL 5 Y B AL D

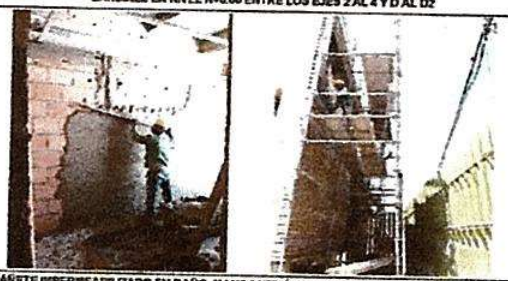

PAÑETE IMPERMEABILIZADO EN BAÑO, MAMPOSTERÍA EL LADRILLO ARENA CON FACHALETA ENTRE LOS EJES C AL D Y 1 AL 2 EN NIVEL N+9.80

ELABORÓ
ELABORÓ

ING. JAVIER ESCOBAR DIAZ
INGENIERO AUXILIAR
AUXILIAR DE INGENIERIA - CONTRATISTA
AUXILIAR DE INGENIERIA - CONTRATISTA

APROBÓ
APROBÓ

ING. CAMILO ROMERO
INGENIERO RESIDENTE
RESIDENTE DE OBRA CONTRATISTA
RESIDENTE DE OBRA CONTRATISTA

	INFORME DIARIO DE ACTIVIDADES	Fecha:01/08/2019
CG	EJECUCIÓN DE OBRA	Código: F-OBR-024
		Versión: 1
		Hoja No.: 1 de 1

No DE CONTRATO DE OBRA Y OBJETO	CONTRATO DE OBRA No 2019-161-CTO 2019 SUMINISTRO QUE EL CONTRATO CAPITAL - UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL CUERPO OFICIAL BOMBEROS Y FONDO DE EMERGENCIAS LTDA	CONSECUTIVO	561
LUGAR O ESPECIFICACIÓN DE LOS TRABAJOS	OBRA	FECHA	viernes 12 de febrero de 2021

HORAS PERDIDAS	POR CLIMA	POR PARO		OTROS	TOTALES
Horas Hombre					0.0
Horas Equipo					0.0

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD FUNCIONAL	UNID.	CANTIDAD			
				CONTRACTUAL	ACUMULADO ANTERIOR	AVANCE HOY	ACUMULADO ACTUAL
3,1	EXCAVACIONES VARIAS A MAQUINA SIN CLASIFICAR INCLUYE RETIRO	N+0.00	M3	6694.95	7079.90	13.50	7093.40
3,3	RELLENO EN RECEBO COMÚN COMPACTADO MECÁNICAMENTE	N+0.00	M3	2929.95	3256.87	5.24	3262.11
3,4	RELLENO SUBBASE GRANULAR	N+0.00	M3	231.16	229.42	16.20	245.62
4,3	ZARPA EN CONCRETO 4000 PSI. NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO	N-3.30	M3	38.86	37.02	0.95	37.97
5,14	CONCRETO DE 4000 PSI PARA VIGA AÉREA DE 0.20 X 0.50 M. NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO.	N+4.85	M3	30.36	46.61	0.22	46.83
5,20	ACERO FIGURADO 60000 PSI	N+0.00	KG	62395.90	94372.64	350.00	94722.64
6,1	MURO EN BLOQUE Nº 4 E=0.09 M.	N+3.30	M2	2222.99	2766.88	31.02	2797.90
6,3	MURO EN LADRILLO A LA VISTA GRAN FORMATO COLOR AMARILLO 11.5 CM.	N+9.90	M2	981.49	995.21	7.00	1002.21
6,5	ENCHAPE EN FACHALETA LADRILLO A LA VISTA GRAN FORMATO COLOR AMARILLO. H< 0.60 M.	N+9.90	ML	618.36	403.05	6.60	409.65
6,10	ALFAGIAS EN CONCRETO A LA VISTA 3000 PSI, A= 0.20 E=0.07 INC. 2 D3/8" FLEJE 3/8"	N+9.90	ML	244.34	165.06	28.27	193.33
7,1	PAÑETE LISO MUROS 1:4, E=1.5 CM	N+9.90	M2	2286.25	2677.18	30.80	2707.98
7,2	PAÑETE LISO MUROS 1:4, E=1.5 CM (LINEAL) H< 0.60 M.	N+9.90	ML	321.75	510.81	5.60	516.41
11,5	MESON EN CONCRETO CON ACABADO EN GRANITO PULIDO	N+3.30	M2	19.85	6.70	5.42	12.12
11,7	ENCHAPE PARED EN PORCELANATO DE 40 X 40 CM. COLOR BLANCO	N+0.00	M2	545.32	443.00	21.50	464.50
11,9	ACABADO PARA PISO CON ENDURECIDO TIPO SIKAFOOR 3 QUARTZ TOP COLOR O SIMILAR. (LINEAL)	N+9.90	ML	342.00	545.14	28.27	573.41
13,1	CIELO RASO PLANO EN SUPERBOARD 6 MM. INCLUYE DILATACIÓN PLASTICA Y PINTURA	N+3.30	M2	1437.30	747.71	35.75	783.46
14,2	ESTUCO Y VINILO TIPO 1 BLANCO PARA INTERIORES	N+3.30	ML	215.75	117.39	16.39	133.78
21,3,3	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE LUMINARIA PHILIPS TCS760 2X20W 4000K LED (DE ACUERDO A ESPECIFICACIÓN TECNICA 1.7.4 Y	N+0.00	UN	239.00	2.00	2.00	4.00
30,1,3	CARCAMO DE 30 CM X 25 CM	N+0.00	ML	34.12	0.00	11.20	11.20
30,2,2	CARCAMO DE 40 CM X 60 CM	N+0.00	ML	18.85	0.00	9.45	9.45
NP-22	SARDINEL FUNDIDO EN SITIO EN CONCRETO PREMEZCLADO DE 3.000 PSI. SUMINISTRO Y CONSTRUCCION (Grava Común) E= 0.20m H= 0.15m	N+0.00	ML	27.00	0.00	6.10	6.10

DESCRIPCION DE ACTIVIDADES EJECUTADAS

FUNDIDA DE ALFAJIA EN CONCRETO CON ACABADO ENDURECIDO, PAÑETE LISO Y LINEAL ENTRE LOS EJES 1 AL 2 Y A AL C EN NIVEL N+9.90, RELLENO EN RECEBO COMÚN CON RCD PARA ZONA URBANISMO, RELLENO EN BASE GRANULAR CON RCD Y INSTALACIÓN MARCOS LUMINARIA EJES 3 AL 5 Y C AL D2 ENI NIVEL N+0.00, FUNDIDA DE CONCRETO 4000 PARA LA ZARPA MURO T3A N-3.30 SOBRE EL EJE A0 Y 5 AL 6, VIGA N+4.85 EJES 1A AL 1 Y D AL D1, FUNDIDA DE CONCRETO CARCAMOS CON FUNDIDA DE CONCRETO PARA BORDE SARDINEL EJES 2 AL 4 Y C AL D2 N+0.00, MAMPOSTERÍA EN BLOQUE # 4 N+3.30, INSTALACIÓN ENCHAPE MUROS EN BAÑOS N+0.00, ESCTRUCTURA CIELO RASO N+3.30 ENTRE LOS EJES 1 AL 2 Y A AL C, TERMINACIÓN MESONES ZONA COCINA N+3.30, ESTUCO Y PINTURA LINEAL N+0.00 EJES A AL C Y 4 AL 5, EXCVACIÓN A MAQUINA N+4.85, MAMPOSTERÍA EN LADRILLO ARENA CON FACHALETA N+9.90, ARMADO DE ACERO PARA CURVA SARDINEL N+0.00 EJES C AL D2 Y 2 AL 4.

MANO DE OBRA EMPLEADA

CARGO	HORA		CANT.	TIEMPO (Horas)
	INICIO	FIN		
Ing. Residente	8:00:00	18:00:00	1	10:00:00
Ing. Residente	8:00:00	18:00:00	1	10:00:00
Aux. Ingeniería Civil	8:00:00	18:00:00	1	10:00:00
Ing. Profesional SST	8:00:00	18:00:00	1	10:00:00
Profesional Calidad	8:00:00	18:00:00	1	10:00:00
Almacenista	8:00:00	16:00:00	1	8:00:00
Maestro	6:00:00	18:00:00	1	10:00:00
Oficiales	7:00:00	14:00:00	2	20:00:00
Ayudantes	6:00:00	18:00:00	12	120:00:00
Profesional de topografía (JC)	8:00:00	16:00:00	19	190:00:00
Inspector Ing. Civil - Ingeniería Ambiental	10:00:00	16:00:00	2	12:00:00
Inspector Profesional SST	8:00:00	18:00:00	1	10:00:00
Personal Cocinas	6:00:00	18:00:00	2	20:00:00
Personal Resonce	6:00:00	16:00:00	1	10:00:00
	8:00:00	18:00:00	1	10:00:00

EQUIPO UTILIZADO

DESCRIPCIÓN	CANT.	TIEMPO (Horas)
RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS	1	10:00:00
VIBROCOMPACTADOR MANUAL	1	10:00:00
VIBROCOMPACTADOR TIPO CANGURO	1	10:00:00

MATERIALES UTILIZADOS

DESCRIPCIÓN	UNID.	CANT.
AGUA	M3	21.44
LADRILLO GRAN FORMATO COLOR AMARILLO	UN	396
BLOQUE # 4	UN	540

ESTADO DEL TIEMPO

	HORAS
SOLEADO	9:0
NUBLADO	
LLUVIA	
VIENTO	
TORMENTA	

ACCESO


SUELTO	
MODULAR	
MANUAL	
TALUD	

EVENTOS

ACCIDENTE		DAÑO	
ATRACO		HURTO	

CAUSA A EVALUACIÓN - MEDIDA CORRECTIVA:

ESQUEMÁTICO DE OBRA

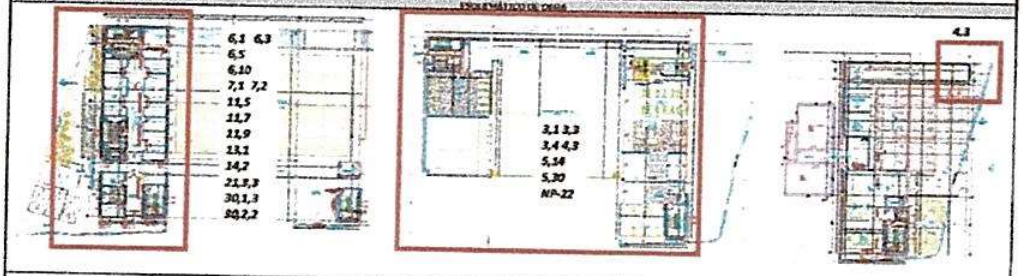

OBSERVACIONES:

ELABORÓ		REVISÓ	
FIRMA:	JAVIER E	FIRMA:	
NOMBRE:		NOMBRE:	
CARGO:		CARGO:	
FIRMA:		FIRMA:	
NOMBRE:		NOMBRE:	
CARGO:		CARGO:	

GyG Ingenieros Ltda	INFORME DIARIO DE ACTIVIDADES	Fecha: 01/06/2019
		Código: F-OBR-024
	EJECUCIÓN DE OBRA	Versión: 1
		Hoja No.: 1 de 1

No DE CONTRATO Y OBJETO	CONTRATO DE OBRA PUBLICA No 470 DE 2018 SUSCRITO ENTRE EL DISTRITO CAPITAL - UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL CUERPO DE BOMBEROS Y GYG INGENIEROS LTDA	CONSECUTIVO	561
LUGAR o ESPECIALIDAD DE LOS TRABAJOS	OBRA	FECHA	viernes 12 de febrero de 2021

INFORME DIARIO No. 561

REGISTRO FOTOGRÁFICO




FUNDIDA DE ALFAJIA EN CONCRETO CON ACABADO ENDURECIDO, PAÑETE LISO Y LINEAL ENTRE LOS EJES 1 AL 2 Y A AL C EN NIVEL N+0.00



RELLENO EN RECEBO COMÚN CON RCD PARA ZONA URBANISMO, RELLENO EN BASE GRANULAR CON RCD Y INSTALACIÓN MARCOS LUMINARIA EJES 3 AL 5 Y C AL D2 EN NIVEL N+0.00



FUNDIDA DE CONCRETO 4000 PARA LA ZARPA MURO T3A N-3.30 SOBRE EL EJE A0 Y 5 AL 6, N+4.85 EJES 1A AL 1 Y D AL D1, FUNDIDA DE CONCRETO CARCAMOS CON FUNDIDA DE CONCRETO PARA BORDE SARDINEL EJES 2 AL 4 Y C AL D2 N+0.00

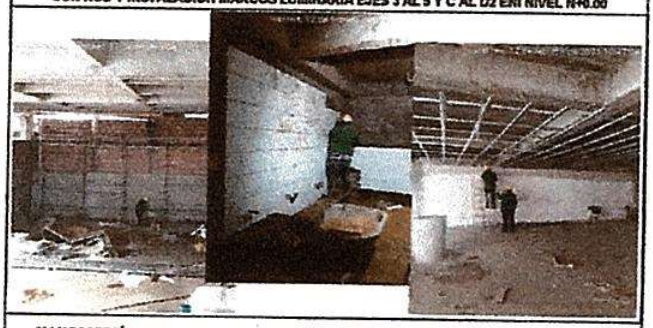

MAMPOSTERÍA EN BLOQUE #4 N+3.30, INSTALACIÓN ENCHAPE MUROS EN BAÑOS N+0.00, ESCTRUCTURA CIELO RASO N+3.30 ENTRE LOS EJES 1 AL 2 Y A AL C



TERMINACIÓN MESONES ZONA COCINA N+3.30, ESTUCO Y PINTURA LINEAL N+0.00 EJES A AL C Y 4 AL 5



EXCVACIÓN A MAQUINA N+4.85, MAMPOSTERÍA EN LADRILLO ARENA CON FACHALETA N+0.90, ARMADO DE ACERO PARA CURVA SARDINEL N+0.00 EJES C AL D2 Y 2 AL 4

ELABORO

JAVIER E.

ING. JAVIER ESCOBAR PINTOR
AUXILIAR DE INGENIERIA - CONTRATISTA

APROBO

ING. CAMILO ROMERO
RESIDENTE DE OBRA CONTRATISTA

GG Ingeniería Ltda	INFORME DIARIO DE ACTIVIDADES	Fecha:01/06/2019
	EJECUCIÓN DE OBRA	Código: F-OBR-024
		Versión: 1
		Hoja No.: 1 de 1

No DE CONTRATO DE OBRA Y OBJETO	CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No 470 DE 2020 SUSCRITO ENTRE EL DISTRITO CAPITAL - UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL CUERPO DE BOMBEROS Y GYG INGENIEROS LTDA	CONSECUTIVO	562
LUGAR & ESPECIALIDAD DE LOS TRABAJOS	OBRA	FECHA	sábado 13 de febrero de 2021

HORAS PERDIDAS	POR ESPERA	POR PAROS		OTROS	TOTALES
Horas Hombre					0.0
Horas Equipo					0.0

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD FUNCIONAL	UND.	CANTIDAD			
				CONTRACTUAL	ACUMULADO ANTERIOR	AVANCE HOY	ACUMULADO ACTUAL
3,3	RELLENO EN RECEBO COMUN COMPACTADO MECÁNICAMENTE	N-3.30	M3	2929.95	3262.11	6.55	3268.66
3,4	RELLENO SUBBASE GRANULAR	N+0.00	M3	231.16	245.62	12.96	258.58
6,1	MURO EN BLOQUE Nº 4 E=0.09 M.	N+3.30	M2	2222.99	2797.90	30.36	2828.26
6,2	ANCLAJE BARRA 1/2" L=40CM INCLUYE EPOXICO.	N+9.90	UN	600.00	3442.00	16.00	3458.00
6,3	MURO EN LADRILLO A LA VISTA GRAN FORMATO COLOR AMARILLO 11.5 CM.	N+9.90	M2	581.49	1002.21	16.34	1018.55
6,5	ENCHAPE EN FACHALETA LADRILLO A LA VISTA GRAN FORMATO COLOR AMARILLO H< 0.60 M.	N+9.90	ML	618.36	409.65	9.45	419.10
6,11	DOVELAS PARA MAMPOSTERIA INCLUYE ACERO DE REFUERZO 1#4	N+9.90	ML	840.00	2322.98	36.40	2359.38
7,1	PAÑETE LISO MUROS 1:4, E=1.5 CM	N+9.90	M2	2786.25	2707.98	18.20	2726.18
11,2	ENCHAPE PISO EN PORCELANATO DE 60 X 60 CM. ANTIDESLIZANTE CON DILATACION DE 2 MM. BOQUILLA	N+6.60	M2	1174.33	619.21	26.89	646.10
11,7	ENCHAPE PARED EN PORCELANATO DE 40 X 40 CM. COLOR BLANCO	N+0.00	M2	545.32	464.50	22.75	487.25
13,1	CIELO RASO PLANO EN SUPERBOARD 6 MM. INCLUYE DILATACIÓN PLASTICA Y PINTURA	N+3.30	M2	1437.30	783.46	12.20	795.66
21,3,3	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE LUMINARIA PHILIPS TCS760 2X26W 4000K LED (DE	N+0.00	UN	239.00	4.00	2.00	6.00
26,4,7	TUBERIA RDE 9 PVC PRESION 500 PSI 1/2"	N+3.30	ML	149.02	165.90	24.00	210.90
26,4,14	ACCESORIOS PVC PRESIÓN 1/2"	N+3.30	UN	403.00	268.00	45.00	313.00
26,4,21	SOPORTE TIPO PERA 1/2"	N+3.30	UN	76.00	19.00	35.00	54.00
26,5,3	REGISTRO COMPUERTA PESADO RED WHITE 1/2"	N+3.30	UN	12.00	7.00	6.00	13.00
26,6,20	SOPORTE TIPO PERA 1/2"	N+3.30	UN	15.40	11.00	4.00	15.00
26,7,8	TUBERÍA C-PVC 1/2"	N+3.30	ML	182.09	170.10	24.00	194.10
26,7,14	ACCESORIOS C-PVC 1/2"	N+3.30	UN	276.00	181.00	56.00	237.00
26,7,17	REGISTRO BOLA FLOWARD GOLD O SIMILAR TEMP 60°C - 1/2"	N+3.30	UN	13.00	21.00	12.00	33.00
26,8,16	CHEQUE 1/2"	N+3.30	UN	13.00	8.00	6.00	14.00
30,2,2	CARCAMO DE 40 CM X 60 CM	N+0.00	ML	18.85	9.45	9.40	18.85
NP-01	ESTABILIZACION DE SUBRASANTE CON RAJON, INCLUYE EQUIPO DE COMPACTACION (Suministro, extendido a	N-3.30	M3	250.71	304.56	0.50	305.06

DESCRIPCION DE ACTIVIDADES EJECUTADAS

FUNDIDA DE CONCRETO PARA LOS CARCAMOS PARA LA SALIDA PATIO MQUINAS, RELLENO EN BASE GRANULAR EJES 2 AL 4 Y C AL D NIVEL N+0.00, RELLENO EN RAJÓN PARA MEJORAMIENTO N-3.30, INSTLACIÓN LUMINARIAS N+0.00, Y RELLENO EN RECEBO COMÚN CON RCD N-3.30 EJES C AL D Y 4 AL 5, PAÑETE LISO E INSTALACIÓN ENCHAPE PISO ENTRE LOS EJES 1 AL 2 Y A0 AL B EN NIVEL N+6.60, MAMPOSTERÍA EN BLOQUE # 4, ENCHAPE MURO EN BAÑOS EJES 1 AL 2 Y A AL B EN NIVEL N+0.00, MAMPOSTERÍA EN BLOQUE # 4 N+3.30 Y MAMPOSTERÍA EN LADRILLO CON FACHALETA N+9.90 ENTRE LOS EJES 1 AL 2 Y B AL D, ESTRUCTURA CIELO RASO, INSTALACIÓN TUBERIA PVC-P, CPVC-P CON REGULADORA DE PRESIÓN ENTRE LOS EJES 1 AL 2 Y A0 AL B NIVEL N+3.30.

MANO DE OBRA EMPLEADA

CARGO	HORA		CANT.	TIEMPO (Horas)
	INICIO	FIN		
Arq. Residente, Arq aux	6:00:00	16:00:00	0	0:00:00
Ing. Residente	6:00:00	18:00:00	1	8:00:00
Aux. Ingeniero civil	0:00:00	16:00:00	1	8:00:00
Ing. Profesional SST	0:00:00	16:00:00	1	8:00:00
Profesional Calidad	0:00:00	16:00:00	0	0:00:00
Almacenista	0:00:00	16:00:00	1	8:00:00
Pintor	0:00:00	16:00:00	1	8:00:00
Ayud., conductor mini	0:00:00	16:00:00	2	16:00:00
Oficiales	0:00:00	16:00:00	16	144:00:00
Ayudantes	0:00:00	16:00:00	22	176:00:00
Profesionales de topografia GyG	10:00:00	18:00:00	0	0:00:00
Interventoria Insp SST, ing residente, ing aux	0:00:00	16:00:00	3	24:00:00
Personal Hidrosanitario	0:00:00	16:00:00	2	16:00:00
Personal Electrico	0:00:00	16:00:00	2	16:00:00
Personal Ascensor	0:00:00	16:00:00	0	0:00:00

EQUIPO UTILIZADO

DESCRIPCIÓN	CANT.	TIEMPO (Horas)
MINICARGADOR SK320	1	08:00:00
VIBROCOMPACTADOR BW213D	1	08:00:00
VIBROCOMPACTADOR TIPO CANGURO	1	08:00:00

MATERIALES UTILIZADOS

DESCRIPCION	UND.	CANT.
RELLENO EN MATERIAL RCD	m3	65.55
LADRILLO GRANFORMATO COLOR AMENA	UN	322
CONCRETO DE 3000 PSI	m3	1.50
BLOQUE # 4	UN	525

ESTADO DEL TIEMPO

		HORAS
SECO	X	7.0
NUBLINA		
LLOVIZNA		
LLUVIA		
TORMENTA		

ACCESO


BUENO	
REGULAR	X
MALO	
MALO	

TERRENO

BOCOSO		DURO		NORMAL	
ARENOSO		LODOSO		PASTOSO	X

CAUSA ATRASO/DIA - MEDIDA CORRECTIVA:

ESQUEMÁTICO DE OBRA

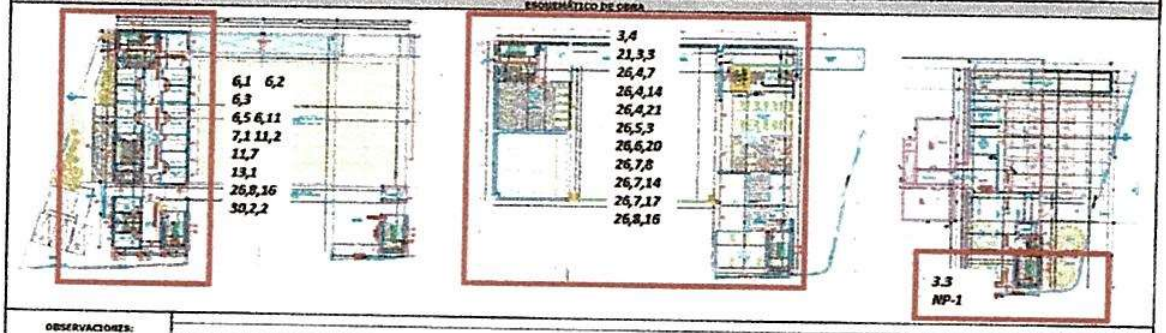

OBSERVACIONES:

FIRMA:	1098360 Javier E.	FIRMA:	APROBO
NOMBRE: CARGO:	ING. JAVIER ANDRES ESCOBAR PINZON AUXILIAR DE INGENIERIA CONTRATISTA	NOMBRE: CARGO:	ARQ. MARCELO SARMIENTO RESIDENTE DE OBRA CONTRATISTA
FIRMA:	APROBO	FIRMA:	APROBO
NOMBRE: CARGO:	ING. CESAR GOMEZ RESIDENTE DE OBRA CONTRATISTA	NOMBRE: CARGO:	ING. JOSE LUIS NIVO RESIDENTE DE INTERVENTORIA


G.G Ingenieros Ltda.	INFORME DIARIO DE ACTIVIDADES	Fecha:01/06/2019
	EJECUCIÓN DE OBRA	Código: F-OBR-024
		Versión: 1
		Hoja No.: 1 de 1

No DE CONTRATO Y OBJETO	CONTRATO DE OBRA PUBLICA No 470 DE 2019 SUSCRITO ENTRE EL DISTRITO CAPITAL - UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL CUERPO DE BOMBEROS Y GYG INGENIEROS LTDA	CONSECUTIVO	562
LUGAR o ESPECIALIDAD DE LOS TRABAJOS	OBRA	FECHA	sábado 13 de febrero de 2021

INFORME DIARIO No. 562

Página 2 de 2

REGISTRO FOTOGRÁFICO

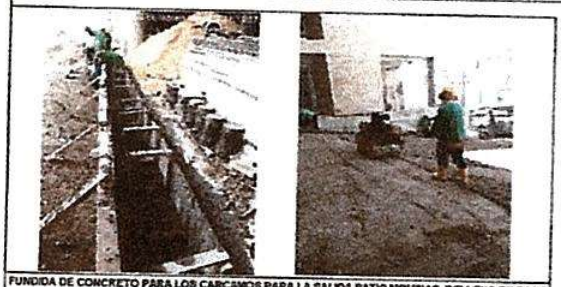

FUNDIDA DE CONCRETO PARA LOS CARCAMOS PARA LA SALIDA PATIO MQUINAS, RELLENO EN BASE GRANULAR EJES 2 AL 4 Y C AL D NIVEL N+0.00




RELLENO EN RAJÓN PARA MEJORAMIENTO N-3.30, INSTLACIÓN LUMINARIAS N+0.00, Y RELLENO EN RECEBO COMÚN CON RCD N-3.30 EJES C AL D Y 4 AL 5



PAÑETE LISO E INSTALACIÓN ENCHAPE PISO ENTRE LOS EJES 1 AL 2 Y A0 AL B EN NIVEL N+0.00



MAMPOSTERÍA EN BLOQUE # 4, ENCHAPE MURO EN BAÑOS EJES 1 AL 2 Y A AL B EN NIVEL N+0.00

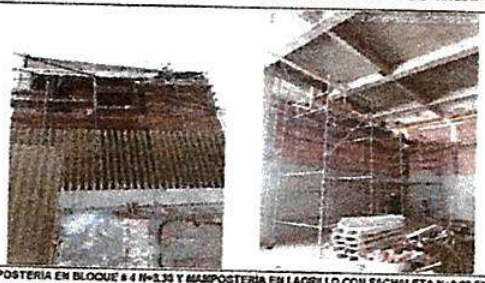

MAMPOSTERIA EN BLOQUE # 4 N+3.30 Y MAMPOSTERIA EN LADRILLO CON FACHALETA N+2.30 ENTRE LOS EJES 1 AL 2 Y B AL D



ESTRUCTURA CIELO RASO, INSTALACIÓN TUBERIA PVC-P, CPVC-P CON REGULADORA DE PRESIÓN ENTRE LOS EJES 1 AL 2 Y A0 AL B NIVEL N+2.30

ELABORO: JAVIER F.

ING. JAVIER ESCOBAR PINTOR
AUXILIAR DE INGENIERIA - CONTRATISTA

APROBO:

ING CAMILO ROMERO
RESIDENTE DE OBRA CONTRATISTA

GG Ingenieros Ltda	INFORME DIARIO DE ACTIVIDADES	Fecha:01/06/2019
	EJECUCIÓN DE OBRA	Código: F-OBR-024
		Versión: 1
		Hoja No.: 1 de 1

No DE CONTRATO DE OBRA Y OBJETO	CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No 439 DE 2018 SUSCRITO ENTRE EL DISTRITO CAPITAL - UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL CUERPO DE BOMBEROS Y GMG INGENIEROS LTDA	CONSECUTIVO	563
LUGAR o ESPECIALIDAD DE LOS TRABAJOS	OBRA	FECHA	domingo 14 de febrero de 2021

HORAS PERDIDAS	POR LLUVIA	POR PAROS		OTROS	TOTALES
Horas Hombre	1.5				1.5
Horas Equipo	1.5				1.5

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD FUNCIONAL	UNID.	CANTIDAD			
				CONTRACTUAL	ACUMULADO ANTERIOR	AVANCE HOY	ACUMULADO ACTUAL
3,3	RELLENO EN RECEBO COMUN COMPACTADO MECÁNICAMENTE	N-3.30	M3	2929.95	3268.66	2.62	3271.28
3.4	RELLENO SUBBASE GRANULAR	N+0.00	M3	231.16	258.58	3.24	261.82
6,2	ANCLAJE BARRA 1/2" L=40CM INCLUYE EPOXICO.	N+13.20	UN	600.00	3458.00	9.00	3467.00
6,3	MURO EN LADRILLO A LA VISTA GRAN FORMATO COLOR AMARILLO 11.5 CM	N+13.20	M2	581.49	1018.55	6.00	1024.55
6,5	ENCHAPE EN FACHALETA LADRILLO A LA VISTA GRAN FORMATO COLOR AMARILLO. H< 0.60 M	N+13.20	ML	618.36	419.10	9.45	428.55
6,11	DOVELAS PARA MAMPOSTERIA INCLUYE ACERO DE REFUERZO 1#4	N+13.20	ML	840.00	2359.38	29.70	2389.08
11,2	ENCHAPE PISO EN PORCELANATO DE 60 X 60 CM. ANTIDESLIZANTE CON DILATACION DE 2 MM	N+6.60	M2	1174.33	646.10	17.14	663.24
11,6	ENCHAPE PISO PARA BAÑO EN PORCELANATO DE 28 X 56 CM	N+6.60	M2	204.89	79.45	9.15	88.60
21,3,3	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE LUMINARIA PHILIPS TCS760 2X28W 4000K LED (DE ACUERDO A ESPECIFICACIÓN TECNICA 1.7.4 Y PLANO	N+0.00	UN	239.00	6.00	1.00	7.00

DESCRIPCION DE ACTIVIDADES EJECUTADAS

ENCHAPE PISO PARA BAÑOS Y ENCHAPE PISO DE 60 X 60 ENTRE LOS EJES B AL D Y 1 AL 2 EN NIVEL N+6.60, RELLENO EN RECEBO COMÚN ENTRE LOS EJES 4 AL 5 Y D AL D2 EN NIVEL N-3.30, INSTALACIÓN LUMINARIAS EN NIVEL N+0.00 ENTRE LOS EJES 4 AL 5 Y C AL D, RELLENO EN BASE GRANULAR ENTRE LOS EJES 3 AL 4 Y C AL D EN NIVEL N+0.00, MAMPOSTERÍA EN LADRILLO ARENA CON FACHALETA ENTRE LOS EJES 1 AL 2 Y SOBRE EL EJE D EN NIVEL N+13.20.

MANO DE OBRA EMPLEADA

CARGO	HORA INICIO	HORA FIN	CANT.	TIEMPO (Horas)
Arq. Residente, Arq Asst	8:00:00	16:00:00	0	0:00:00
Ing. Residente	8:00:00	16:00:00	0	0:00:00
Asst. Ingeniero civil	8:00:00	16:00:00	1	8:00:00
Ing. Profesional SST	8:00:00	16:00:00	1	8:00:00
Profesional Calidad	8:00:00	16:00:00	0	0:00:00
Almacenista	8:00:00	16:00:00	1	8:00:00
Maestro	8:00:00	16:00:00	0	0:00:00
Ejaro , conductor mixe	8:00:00	16:00:00	0	0:00:00
Oficiales	8:00:00	16:00:00	8	64:00:00
Ayudantes	8:00:00	16:00:00	8	64:00:00
Profesionales de topografia GmG	10:00:00	16:00:00	5	0:00:00
Interventoria Insp SST, ing residente, Ing Inst	8:00:00	16:00:00	0	0:00:00
Personal Hidrosanitario	8:00:00	16:00:00	0	0:00:00
Personal Electrico	8:00:00	16:00:00	0	0:00:00
Personal Aleman	8:00:00	16:00:00	0	0:00:00

EQUIPO UTILIZADO

DESCRIPCIÓN	CANT.	TIEMPO (Horas)
PENSCARGADOR 5R220	1	00:00:00
VIBROCOMPACTADOR 80KITH	1	00:00:00
VIBROCOMPACTADOR TIPO CANGURO	1	00:00:00

MATERIALES UTILIZADOS

DESCRIPCION	UNID.	CANTIDAD
RELLENO EN MATERIAL RECEBO	m3	2.62
LADRILLO GRANFORMATO COLOR ARENA	UN	449
CONCRETO DE 3000 PSI	m3	2.22

ESTADO DEL TIEMPO

		HORAS
SECO	[X]	6.5
NUBLADO	[ ]	
LLUVIOSO	[X]	1.5
TORMENTOSO	[ ]	

ACCESO

BUENO	[ ]
REGULAR	[X]
MALO	[ ]
NULO	[ ]


TERRENO

ROCOSO	[ ]	DURO	[ ]	NORMAL	[X]
ARENOSO	[ ]	FANGOSO	[ ]		

CAUSA ATRASO/DIA - MEDIDA CORRECTIVA:

LLUVIA DE 1PM A 2:30PM

ESQUEMÁTICO DE OBRA

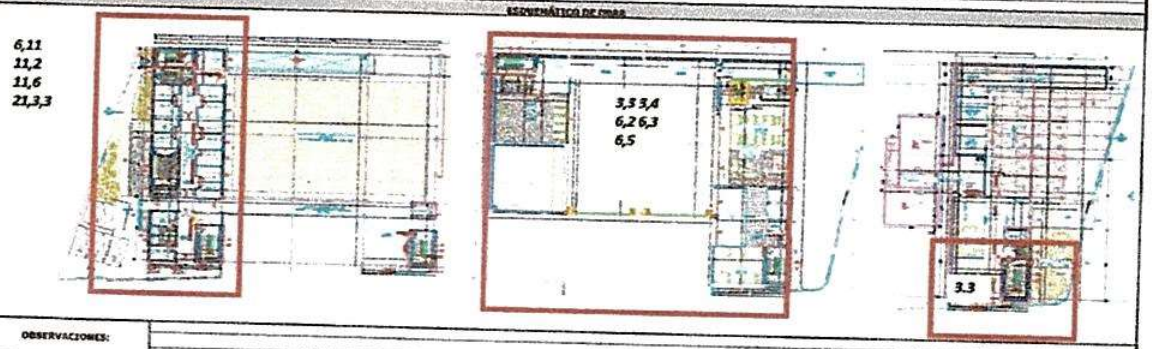

OBSERVACIONES:

ELABORÓ	APROBÓ
FIRMA:	FIRMA:
NOMBRE: ING. JAVIER ANDRES ESCOBAR PINTOR	NOMBRE: ING. MAURICIO BARRIENTO
CARGO: AUXILIAR DE INGENIERÍA CONTRATISTA	CARGO: RESIDENTE DE OBRA CONTRATISTA
VALIDÓ	APROBÓ
FIRMA:	FIRMA:
NOMBRE: ING. CARLOS ROMERO	NOMBRE: ING. JOSE LUIS JOYO
CARGO: RESIDENTE DE OBRA CONTRATISTA	CARGO: RESIDENTE DE INTERVENTORIA


G&G Ingenieros Ltda	INFORME DIARIO DE ACTIVIDADES EJECUCIÓN DE OBRA	Fecha:01/06/2019 Código: F-OBR-024 Versión: 1 Hoja No.: 1 de 1

No DE CONTRATO Y OBJETO	CONTRATO DE OBRA PUBLICA No 470 DE 2018 SUSCRITO ENTRE EL DISTRITO CAPITAL - UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL CUERPO DE BOMBEROS Y GYG INGENIEROS LTDA	CONSECUTIVO	563
LUGAR o ESPECIALIDAD DE LOS TRABAJOS		FECHA	domingo 14 de febrero de 2021


INFORME DIARIO No. 563

Página 2 de 2


REGISTRO FOTOGRÁFICO

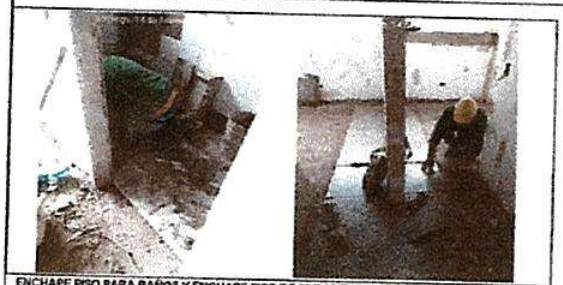

ENCHAPE PISO PARA BAÑOS Y ENCHAPE PISO DE 60 X 60 ENTRE LOS EJES B AL D Y 1 AL 2 EN NIVEL N+0.60

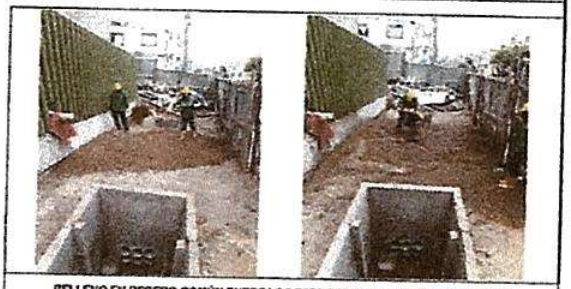

RELLENO EN RECEBO COMÚN ENTRE LOS EJES 4 AL 5 Y D AL D2 EN NIVEL N-3.30

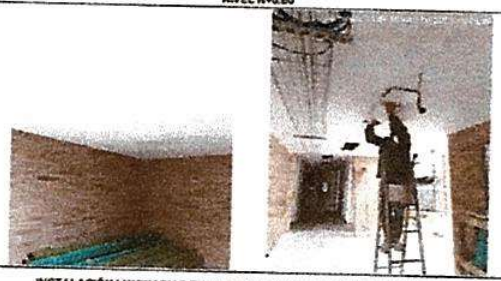

INSTALACIÓN LUMINARIAS EN NIVEL N+0.00 ENTRE LOS EJES 4 AL 5 Y C AL D



RELLENO EN BASE GRANULAR ENTRE LOS EJES 3 AL 4 Y C AL D EN NIVEL N+0.00



MAMPOSTERÍA EN LADRILLO ARENA CON FACHALETA ENTRE LOS EJES 1 AL 2 Y SOBRE EL EJE D EN NIVEL N+12.20

ELABORO: _____
ING. JAVIER ESCOBAR PINTOR
AUXILIAR DE INGENIERIA - CONTRATISTA

APROBO: _____
ING CAMILO ROMERO
RESIDENTE DE OBRA CONTRATISTA

GG Ingeniería Ltda	INFORME DIARIO DE ACTIVIDADES	Fecha:01/06/2020
	EJECUCIÓN DE OBRA	Código: F-OBR-024
		Versión: 1
		Hoja No.: 1 de 1

No DE CONTRATO DE OBRA Y OBJETO	CONTRATO DE OBRA NÚMERO No. APOYO 2020 SUSCRITO ENTRE EL OBSERVATORIO CAPITAL - UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL CUERPO DE BOMBEROS Y GRG INGENIERÍA LTDA	CONSECUTIVO	564
LUGAR o ESPECIALIDAD DE LOS TRABAJOS	OBRA	FECHA	lunes 15 de febrero de 2021

HORAS PERDIDAS	POR LLUVIA	POR PAROS		OTROS	TOTALES
Horas Hombre	2				2.0
Horas Equipo	2				2.0

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD FUNCIONAL	UND.	CANTIDAD			
				CONTRACTUAL	ACUMULADO ANTERIOR	AVANCE HOY	ACUMULADO ACTUAL
6,1	MURO EN BLOQUE Nº 4 E=0.09 M.	N+3.30	M2	2272.99	2825.26	17.92	2846.18
6,3	MURO EN LADRILLO A LA VISTA GRAN FORMATO COLOR AMARILLO 11.5 CM.	N+0.00	M2	581.49	1024.55	5.60	1030.15
6,8	COLUMNETA DE CONFINAMIENTO DE 0.095 X 0.21 M. EN CONCRETO DE 3000 PSI. REFUERZO= 4 D=3/8"	N+0.00	ML	758.80	1607.65	13.20	1620.85
6,9	VIGUETA DE CONFINAMIENTO DE 0.095 X 0.21 M. EN CONCRETO DE 3000 PSI. REFUERZO= 4 D=3/8"	N+0.00	ML	677.72	964.36	18.70	983.06
6,10	ALFAGIAS EN CONCRETO A LA VISTA 3000 PSI, A= 0,20 E=0,07 INC. 2 D3/8" EJE 3/8"	N+6.60	ML	244.34	193.33	28.16	221.49
7,1	PAÑETE LISO MUROS 1:4, E=1.5 CM	N+6.60	M2	2786.25	2726.18	13.72	2739.90
7,3	PAÑETE LISO 1:4 IMPERMEABILIZADO	N+0.00	M2	266.97	1238.25	61.88	1300.13
11,2	ENCHAPE PISO EN PORCELANATO DE 60 X 60 CM. ANTIDESLIZANTE CON DILATACION DE 2 MM.	N+6.60	M2	1174.33	663.24	26.03	689.27
11,9	ACABADO PARA PISO CON ENDURECIDO TIPO SIKAFLOOR 3 QUARTZ TOP COLOR O SIMILAR.	N+6.60	ML	342.00	573.41	28.16	601.57
13,1	CIELO RASO PLANO EN SUPERBOARD 6 MM. INCLUYE DILATACIÓN PLASTICA Y PINTURA	N+3.30	M2	1437.30	795.66	26.97	822.63
21,3,3	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE LUMINARIA PHILIPS TCS760 2X28W 4000K LED IDE	N+0.00	UN	239.00	7.00	2.00	9.00
26.4.6	TUBERÍA RDE 11 PVC PRESION 400 PSI 3/4"	N+3.30	ML	52.74	14.90	18.00	32.80
26.4.7	TUBERÍA RDE 9 PVC PRESION 500 PSI 1/2"	N+3.30	ML	149.02	210.90	18.00	228.90
26.4.13	ACCESORIOS PVC PRESION 3/4"	N+3.30	UN	141.00	32.00	39.00	71.00
26.4.14	ACCESORIOS PVC PRESION 1/2"	N+3.30	UN	403.00	313.00	42.00	355.00
26.4.20	SOPORTE TIPO PERA 3/4"	N+3.30	UN	26.00	3.00	7.00	10.00
26.4.21	SOPORTE TIPO PERA 1/2"	N+3.30	UN	76.00	54.00	15.00	69.00
26.7.7	TUBERÍA C-PVC 3/4"	N+3.30	ML	65.98	45.80	18.00	63.80
26.7.13	ACCESORIOS C-PVC 3/4"	N+3.30	UN	106.00	75.00	37.00	112.00
26.7.28	SOPORTE TIPO PERA 3/4"	N+3.30	UN	32.00	0.00	23.00	23.00
26.8.6	TUBERÍA C-PVC 1/2"	N+3.30	ML	121.95	50.00	24.00	74.00
26.8.12	ACCESORIOS C-PVC 1/2"	N+3.30	UN	194.00	86.00	35.00	121.00

DESCRIPCION DE ACTIVIDADES EJECUTADAS

FUNDIDA DE ALFAJIA EN CONCRETO CON ACABADO ENDURECIDO, PAÑETE LISO EN NIVEL N+6.60 EJES 1 AL 2 Y A AL C, FUNDIDA DE COLUMNETAS Y VIGUETAS DE CONFINAMIENTO, PAÑETE IMPERMEABILIZADO ENTRE LOS EJES 1 AL 2 Y A AL B EN NIVEL N+0.00, MAMPOSTERÍA EN LADRILLO ARENA N+0.00, MAMPOSTERÍA EN BLOQUE # 4 ENTRE EJES 1 AL 2 Y A AL C, INSTALACIÓN TUBERIA PVC-P, CPVC-P ENTRE LOS EJES 1 AL 2 Y A AL B EN NIVEL N+3.30, INSTALACIÓN ENCHAPE PISO N+6.60 EJES 1 AL 2 A AL D, INSTALACIÓN LUMINARIAS N+0.00 EJES 4 AL 5 Y C AL D, INSTALACIÓN LÁMINAS DE CIELO RASO ENTRE LOS EJES 1 AL 2 Y A AL B EN NIVEL N+3.30.

MANO DE OBRA EMPLEADA

CARGO	HORA		CANT.	TIEMPO (Horas)
	INICIO	FIN		
Aux. Residente, Arq./ace	8:00:00	16:00:00	1	16:00:00
Ing. Residente	8:00:00	16:00:00	1	8:00:00
Aux. Ingeniero Civil	8:00:00	16:00:00	1	8:00:00
Ing. Profesional SST	8:00:00	16:00:00	1	8:00:00
Profesional Calidad	8:00:00	16:00:00	1	8:00:00
Almacenista	8:00:00	16:00:00	1	8:00:00
Maestro	8:00:00	16:00:00	1	8:00:00
Ejec., contratist sstst	8:00:00	16:00:00	1	8:00:00
Oficiales	8:00:00	16:00:00	2	16:00:00
Ayudantes	8:00:00	16:00:00	24	192:00:00
Profesionales de topografia Civil	8:00:00	16:00:00	20	320:00:00
Inspector(es) Seg. SST, los mismos, sus aux.	12:00:00	16:00:00	1	8:00:00
Personal Administrativo	8:00:00	16:00:00	2	16:00:00
Personal Electrico	8:00:00	16:00:00	2	16:00:00
Personal Asistencial	8:00:00	16:00:00	2	16:00:00
	8:00:00	16:00:00	0	0:00:00
	8:00:00	16:00:00	2	16:00:00

EQUIPO UTILIZADO

DESCRIPCIÓN	CANT.	TIEMPO (Horas)
MINICARGADOR SR220	1	08:00:00
VIBROCOMPACTADOR MENTER	1	08:00:00
VIBROCOMPACTADOR TIPO CANGURO	1	08:00:00

MATERIALES UTILIZADOS

DESCRIPCIÓN	UND.	CANT.
LADRILLO GRANFORMATO COLOR ARENA	UN	245.00
CONCRETO DE 3000 PSI	m3	1.33

ESTADO DEL TIEMPO

		HORAS
SECO	X	8
BUENA		
LLUVIOSA		
LLUVIA		2
NUBLADO		

ACCESO

BUENA	X
REGULAR	
MALO	
NULO	


TRABAJO

NOCTURNO		DIURNO	X	NORMAL	X
APOYO				EXTRAS	

CAUSA ATRASO/DÍA - MEDIDA CORRECTIVA:

LLUVIA 12:00PM A 2 PM

ESQUEMÁTICO DE OBRA

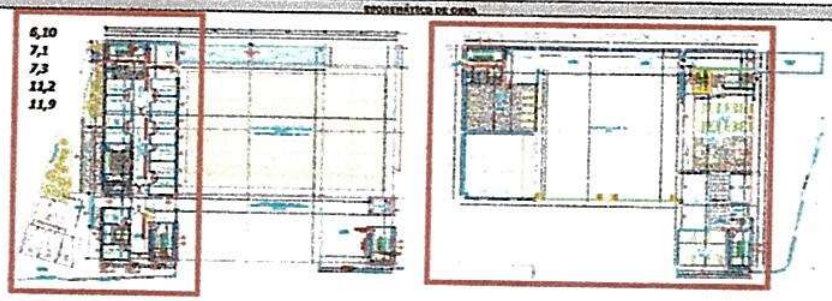

OBSERVACIONES:

	ELABORÓ	APROBÓ
FIRMA:	JAVIER E.	
NOMBRE:	ING. JAVIER ANDRES ESCOBAR PERALTA	ARQ. MARCELO BARRIENTO
CARGO:	RESIDENTE DE INGENIERIA CONTRATISTA	RESIDENTE DE OBRA CONTRATISTA
FIRMA:		APROBÓ
NOMBRE:		
CARGO:		

G·G Ingenieros Ltda	INFORME DIARIO DE ACTIVIDADES		Fecha:01/06/2019
	EJECUCIÓN DE OBRA		Código: F-OBR-024
			Versión: 1
			Hoja No.: 1 de 1
No DE CONTRATO Y OBJETO	CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No 470 DE 2018 SUSCRITO ENTRE EL DISTRITO CAPITAL - UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL CUERPO DE BOMBEROS Y GYG INGENIEROS LTDA	CONSECUTIVO	564
LUGAR o ESPECIALIDAD DE LOS TRABAJOS	OBRA	FECHA	lunes 15 de febrero de 2021

INFORME DIARIO No. 564 | Página 2 de 2

REGISTRO FOTOGRÁFICO



FUNDIDA DE ALFAJIA EN CONCRETO CON ACABADO ENDURECIDO, PAÑETE LISO EN NIVEL N+6.60 EJES 1 AL 2 Y A AL C




FUNDIDA DE COLUMNETAS Y VIGUETAS DE CONFINAMIENTO, PAÑETE IMPERMEABILIZADO ENTRE LOS EJES 1 AL 2 Y A AL B EN NIVEL N+0.00



MPOSTERIA EN LADRILLO ARENA N+0.00, MAMPOSTERIA EN BLOQUE # 4 ENTRE EJES 1 AL 2 Y A AL C



INSTALACIÓN TUBERIA PVC-P, CPVC-P ENTRE LOS EJES 1 AL 2 Y A AL B EN NIVEL N+3.30

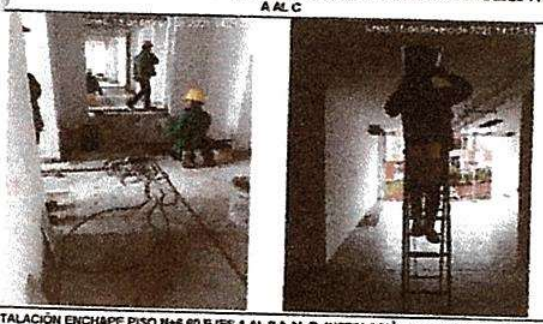

INSTALACIÓN ENCHAPE PISO N+6.60 EJES 1 AL 2 A AL D, INSTALACIÓN LUMINARIAS N+0.00 EJES 4 AL 5 Y C AL D



INSTALACIÓN LÁMINAS DE CIELO RASO ENTRE LOS EJES 1 AL 2 Y A AL B EN NIVEL N+3.30

ELABORO: JAVIER E.
ING. JAVIER ESCOBAR PINTOR
AUXILIAR DE INGENIERIA - CONTRATISTA

APROBO:
ING CAMILO ROMERO
RESIDENTE DE OBRA CONTRATISTA

	INFORME DIARIO DE ACTIVIDADES	Fecha:01/06/2019
	EJECUCIÓN DE OBRA	Código: P-OBR-024
		Versión: 1
		Hoja No.: 1 de 1

No DE CONTRATO DE OBRA Y OBJETO	CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. 470 DE 2021 CELEBRADO ENTRE EL DISTRITO CAPITAL - UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS Y EMERGENCIAS BOGOTÁ	CONSECUTIVO	565
LUGAR Y FECHA DILIGENCIADO DE LOS FORMULARIOS	OBRA	FECHA	martes 16 de febrero de 2021

HOJAS VENTEADAS	BORRADOR	HOJAS BLANCAS		OTROS	TOTALES
Hojas Normales					9
Hojas Blancas					7

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD FUNCIONAL	UNID.	CANTIDAD			
				CONTRACTUAL	ACUMULADO ANTERIOR	AVANCE NOV	ACUMULADO ACTUAL
1,3	CERRAMIENTO PROVISIONAL EN ZINC Y MADERA BASTIDOR. Ha 1.50 M.	N-3.30	ML	86.76	98.10	3.00	101.10
2,6	DESMONTE DE PORTON Y PUERTA INCLUYE RETIRO.	N-3.30	M2	28.00	35.49	26.00	61.49
3,4	RELLENO SUBBASE GRANULAR	N+0.00	M3	231.16	261.82	2.34	264.16
3,5	RELLENO BASE GRANULAR	N+0.00	M3	231.16	139.49	26.46	166.95
6,1	MURO EN BLOQUE Nº 4 E=0.09 M.	N+2.30	M2	2222.99	2846.18	25.48	2871.66
6,2	ANCLAJE BARRA 1/2" L=40CM INCLUYE EPOXICO	N+6.60	UN	600.00	3467.00	24.00	3491.00
6,8	COLUMNETA DE CONFINAMIENTO DE 0.09 X 0.21 M. EN CONCRETO DE 3000 PSI. REFUERZO= 4 D= 3/8"	N+3.30	ML	759.80	1620.85	19.80	1640.65
6,9	VIGUETA DE CONFINAMIENTO DE 0.09 X 0.21 M. EN CONCRETO DE 3000 PSI. REFUERZO= 4 D= 3/8"	N+3.30	ML	677.72	983.06	18.30	1001.36
7,1	PAÑETE LISO MUROS 1:4, E=1.5 CM	N+6.60	M2	2786.25	2739.90	27.16	2767.06
11,2	ENCHAPE PISO EN PORCELANATO DE 60 X 60 CM, ANTIDESLIZANTE CON DILATACION DE 2 MM.	N+6.60	M2	1174.33	689.27	32.47	721.74
11,5	MESON EN CONCRETO CON ACABADO EN GRANITO PULIDO	N+3.30	M2	19.85	12.12	1.06	13.18
11,6	ENCHAPE PISO PARA BAÑO EN PORCELANATO DE 28 X 86 CM	N+6.60	M2	204.89	88.60	12.08	100.68
11,9	ACABADO PARA PISO CON ENDURECIDO TIPO SIKAFLOOR 3 QUARTZ TOP COLOR O SIMILAR. (UNIFICAR)	N+0.00	ML	342.00	601.57	26.06	627.63
13,1	CIELO RASO PLANO EN SUPERBOARD 6 MM. INCLUYE DILATACIÓN PLASTICA Y PINTURA	N+3.30	M2	1437.30	822.63	12.87	835.50
16,2	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE MORTERO DE PROTECCION CONTRA FUEGO E= 0.025 MM. PARA 2	N+13.20	M2	233.33	0.00	19.68	19.68
20,1,1	SALIDA ELUMINACIÓN INCRUSTAR Y SOBREPONER , INCLUYE MARQUILLADO, TUBERIA 3/4"EMT, CURVAS	N+6.60	UN	280.00	294.00	5.00	299.00
20,1,3	SALIDA PARA SENSOR DE MOVIMIENTO, INCLUYE MARQUILLADO, TUBERIA 3/4"EMT, CURVAS, UNIONES,	N+6.60	UN	52.00	45.00	7.00	52.00
21,3,3	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE LUMINARIA PHILIPS TCS760 2X28W 4000K LED (DE ACUERDO A ESPECIFICACIÓN TECNICA 1.7.4 Y PLANO	N+0.00	UN	239.00	9.00	3.00	12.00
28,3,14	SOPORTE LONGITUDINAL	N+6.60	UN	8.00	9.00	2.00	10.00
28,3,15	SOPORTE TRANSVERSAL	N+6.60	UN	3.00	4.00	3.00	7.00

DESCRIPCION DE ACTIVIDADES EJECUTADAS

MAMPOSTERIA EN BLOQUE # 4 N+9.90, APLICACION MORTERO CONTRA FUEGO N+13.20, SOPORTE RCI TRANSVERSAL N+6.60 ENTRE EJES 1 AL 2 Y A0 AL D, DESMONTE DE PUERTA DE LA CR 15 ESTE, CONTINUACIÓN CERRAMIENTO PROVISIONAL SOBRE EJE 6 Y A AL C EN NIVEL N-3.30, TERMINACIÓN MESONES N+3.30 E INSTALACIÓN LUMINARIAS N+0.00 ENTRE LOS EJES 4 AL 5 Y A AL B, FUNDIDA DE COLUMNAS Y VIGUETAS DE CONFINAMIENTO, PUNTOS ELÉCTRICOS, LAMINAS DE CIELO RASO ENTRE LOS EJES 1 AL 2 Y A0 AL B, ENCHAPE PISO, PAÑETE LISO EN ESCALERAS Y SOPORTE LONGITUDINAL RCI ENTRE LOS EJES A0 AL B Y 1 AL 2 EN NIVEL N+6.60, ACABADO ENDURECIDO CARCAMOS, RELLENO EN BASE Y SUBBASE GRANULAR ENTRE LOS EJES 2 AL 4 Y C AL D EN NIVEL N+0.00.

CARGO	PERS.		CANT.	TIEMPO (Horas)
Vía residente, Arquitecto	6.00.00	14.00.00	1	8.00.00
Ing. residente	6.00.00	14.00.00	1	8.00.00
Aux. Ingeniero civil	6.00.00	14.00.00	1	8.00.00
Ing. Residencial SST	6.00.00	14.00.00	1	8.00.00
Profesional de Sst	6.00.00	14.00.00	1	8.00.00
Almacenista	6.00.00	14.00.00	1	8.00.00
Maestro	6.00.00	14.00.00	1	8.00.00
Conductor mixer	6.00.00	14.00.00	1	8.00.00
Oficiales	6.00.00	14.00.00	1	8.00.00
Ayudantes	6.00.00	14.00.00	1	8.00.00
Profesional de Mecanica dura	6.00.00	14.00.00	1	8.00.00
Silvicultor y Ing. Sst - Supervisora civil sst	6.00.00	14.00.00	1	8.00.00
Topógrafo mantenimiento	6.00.00	14.00.00	1	8.00.00
Pintor a Exterior	6.00.00	14.00.00	1	8.00.00
Tecnico Electrico	6.00.00	14.00.00	1	8.00.00
Pintor - Mantenimiento Fuego	6.00.00	14.00.00	1	8.00.00


EQUIPO UTILIZADO		
DESCRIPCION	CANT.	TIEMPO (Horas)

MATERIALES UTILIZADOS		
DESCRIPCION	UNID.	CANT.

ESTADO DEL TIEMPO			ACCESO	
	X	HORAS		X
SECO		8.0	BUENO	
LLUVIA			REGULAR	
GRANIZO			MALO	
NIEBLA				
		HORARIO		
NORMAL		LABOR NOCTURNA		X
EXTENDIDO				

CAUSA ATRASO/ANA - MEDIDA CORRECTIVA:

EVIDENCIA DE OBRA

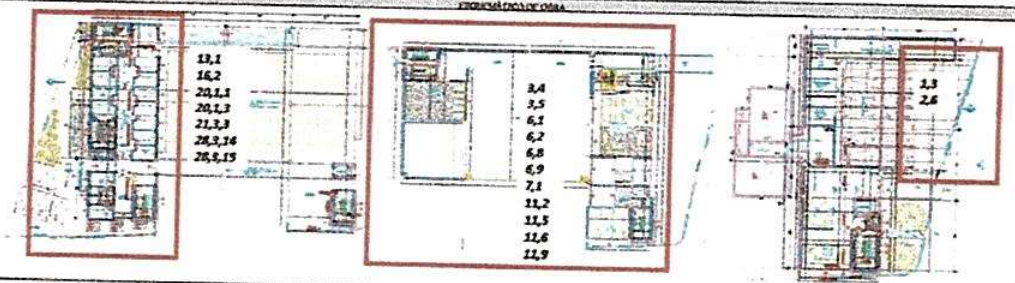

OBSERVACIONES:

FIRMA:	NOMBRE: JAVIER E CARGO:	FIRMA:	NOMBRE: CARGO:
FIRMA:	NOMBRE: CARGO:	FIRMA:	NOMBRE: CARGO:

G-G Ingenieros Ltda	INFORME DIARIO DE ACTIVIDADES	Fecha: 01/06/2019
	EJECUCIÓN DE OBRA	Código: F-OBR-024
		Versión: 1
		Hoja No.: 1 de 1

No DE CONTRATO Y OBJETO	CONTRATO DE OBRA PUBLICA No 470 DE 2018 SUSCRITO ENTRE EL DISTRITO CAPITAL - UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL CUERPO DE BOMBEROS Y GYG INGENIEROS LTDA	CONSECUTIVO	565
LUGAR o ESPECIALIDAD DE LOS TRABAJOS	OBRA	FECHA	martes 16 de febrero de 2021

INFORME DIARIO No. 565 2 de 2

REGISTRO FOTOGRÁFICO



MAMPOSTERÍA EN BLOQUE # 4 N+9.90, APLCACIÓN MORTERO CONTRA FUEGO N+13.20, SOPORTE RCI TRANSVERSAL N+6.00 ENTRE EJES 1 AL 2 Y A0 AL D




DESMONTE DE PUERTA DE LA CR 15 ESTE, CONTINUACIÓN CERRAMIENTO PROVISIONAL SOBRE EJE 6 Y A AL C EN NIVEL N-3.30



TERMINACIÓN MESONES N+3.30 E INSTALACIÓN LUMINARIAS N+0.00 ENTRE LOS EJES 4 AL 6 Y A AL B



FUNDIDA DE COLUMNAS Y VIGUETAS DE CONFINAMIENTO, PUNTOS ELÉCTRICOS, LAMINAS DE CIELO RASO ENTRE LOS EJES 1 AL 2 Y A0 AL B

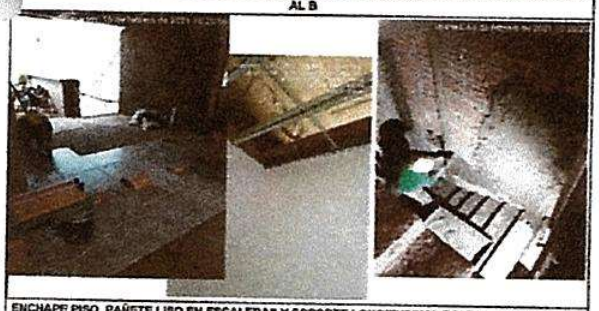

ENCHAPE PISO, PAÑETE LISO EN ESCALERAS Y SOPORTE LONGITUDINAL RCI ENTRE LOS EJES A0 AL B Y 1 AL 2 EN NIVEL N+0.60



ACABADO ENDURECIDO CARCAMOS, RELLENO EN BASE Y SUBBASE GRANULAR ENTRE LOS EJES 2 AL 4 Y C AL D EN NIVEL N+0.00

ELABORO: JAVIER F.

ING. JAVIER ESCOBAR PINTOR
AUXILIAR DE INGENIERIA - CONTRATISTA

APROBO:

ING CAMILO ROMERO
RESIDENTE DE OBRA CONTRATISTA

	INFORME DIARIO DE ACTIVIDADES		**Fecha:01/06/2019**
	EJECUCIÓN DE OBRA		**Código: P-OBR-024**
			Versión: 1
			Hoja No.: 1 de 1
No DE CONSECUTIVO DE OBRA Y OBJETO	CONTRATO 20220396 PUBLICAR 1 MATS DE 20M DIAMETRO ENTRE EL(LA) PREC. SANTAL - UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL CUERPO DE BOMBEROS Y GRS SOACHA EN LA UTA		
LUGAR o ESPECIALIDAD DEL DE TRABAJOS	OBRA	**CONSECUTIVO**	566
		FECHA	miércoles 17 de febrero de 2021

HORAS PROGRAM		HORAS EXTRAS		HORAS PERDIDAS		OTROS	TOTALES
Hombre Horadora							0
Hombre Estudio							0

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD FUNCIONAL	UND.	CONTRACTUAL	AVANCE ANTERIOR	AVANCE HOY	ACUMULADO ACTUAL
1,3	CERRAMIENTO PROVISIONAL EN ZINC Y MADERA BASTIDOR. H= 1.80 M.	N-3.30	ML	86.76	101.10	3.00	104.10
2,2	DEMOLICIÓN DE MAMPOSTERIA INCLUYE RETIRO.	N-3.30	M2	506.30	467.50	66.60	534.10
2,3	DEMOLICION DE CIMIENTO ENTERRADO INCLUYE RETIRO	N-3.30	M3	18.37	24.85	1.08	25.93
2,4	DEMOLICION DE VIGAS Y COLUMNAS INCLUYE RETIRO	N-3.30	M3	16.23	23.31	2.16	25.47
2,7	DESMONTE DE ESTRUCTURA METALICA CELOCIA PARA CUBIERTA INCLUYE RETIRO	N-3.30	ML	149.00	148.74	24.00	172.74
3,1	EXCAVACIONES VARIAS A MAQUINA SIN CLASIFICAR INCLUYE RETIRO	N-3.30	M3	6684.95	7093.40	20.25	7113.65
3,5	RELLENO BASE GRANULAR	N+0.00	M3	231.16	166.95	28.56	195.51
6,1	MURO EN BLOQUE Nº 4 E=0.09 M.	N+6.60	M2	2232.99	2871.66	32.92	2904.58
7,1	PAÑETE LISO MUROS 1:4, E=1.5 CM	N+3.30	M2	2786.25	2767.06	19.88	2786.94
11,2	ENCHAPE PISO EN PORCELANATO DE 60 X 60 CM. ANTIDESLIZANTE CON DILATACION DE 2 MM	N+6.60	M2	1174.33	721.74	35.09	756.83
11,6	ENCHAPE PISO PARA BAÑO EN PORCELANATO DE 28 X 56 CM	N+6.60	M2	204.89	100.60	6.28	106.96
11,7	ENCHAPE MURO EN PORCELANATO DE 40 X 40 CM, COLOR BLANCO	N+0.00	M2	545.32	487.25	25.00	512.25
11,9	ACCESORIO PARA PISO CON ENDURECIDO TIPO SIKAFLOOR 3 DIAMETZ TOP COLOR O SIMILAR	N+0.00	ML	342.00	627.63	17.50	645.13
13,1	CIELO RASO PLANO EN SUPERBOARD 6 MM. INCLUYE DILATACIÓN PLASTICA Y PINTURA	N+6.60	M2	1437.30	805.50	15.15	850.65
16,2	SUMINISTRO Y APLICACION DE MORTERO DE PROTECCION CONTRA FUEGO E= 0.025 MM. PARA 2	N+13.20	M2	231.33	19.68	49.20	68.88
21,3,3	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE LUMINARIA PHILIPS TCS760 2X28W 4000K LED (DE	N+3.30	UN	239.00	12.00	3.00	15.00
26,4,6	TUBERIA RDE 11 PVC PRESION 400 PSI 3/4"	N+6.60	ML	52.24	32.80	12.00	44.80
26,4,7	TUBERIA RDE 9 PVC PRESION 500 PSI 1/2"	N+6.60	ML	149.02	228.90	6.00	234.90
26,4,13	ACCESORIOS PVC PRESION 3/4"	N+6.60	UN	141.00	71.00	15.00	86.00
26,4,14	ACCESORIOS PVC PRESION 1/2"	N+6.60	UN	403.00	255.00	17.00	372.00
26,7,12	ACCESORIOS C-PVC 1"	N+0.00	UN	74.00	9.00	12.00	21.00
26,8,4	TUBERIA C-PVC 1"	N+0.00	ML	24.10	0.00	12.00	12.00
27,1,1	SALIDA SANITARIA SANITARIO 4"	N+0.00	UN	23.00	15.00	8.00	23.00
27,1,2	SALIDA SANITARIA ORINALES 2"	N+0.00	UN	1.00	0.00	1.00	1.00
27,1,3	SALIDA SANITARIA LAVAMANOS 2"	N+0.00	UN	32.00	23.00	9.00	32.00
27,1,5	SALIDA SANITARIA LAVADORAS 3"	N+0.00	UN	2.00	0.00	2.00	2.00
27,1,6	SALIDA SANITARIA LAVAPLATOS 3"	N+0.00	UN	2.00	0.00	2.00	2.00

DESCRIPCION DE ACTIVIDADES EJECUTADAS

CERRAMIENTO PROVISIONAL, DEMOLICIÓN VIGAS Y COLUMNAS SOBRE EL EJE 6 ENTRE EJES A0 AL C EN NIVEL N-3.30, ENCHAPE PISO EN BAÑOS, ENCHAPE MURO EN BAÑOS,SALIDAS SANITARIAS, MAMPOSTERÍA EN BLOQUE # 4 EJES 1 AL 2 Y A AL D EN NIVEL N+6.60, DESMONTE DE CERCHAS EXISTENTES, EXCAVACIÓN A MAQUINA URBANISMO, DEMOLICIÓN MAMPOSTERÍA ENTRE EJES A0 AL C SOBRE EL EJE 6, RELLENO EN BASE GRANULAR. INSTLACIÓN LUMINARIAS, ACABADO ENDURECIDO EN CARCAMOS EJES 2 AL 5 Y C AL D EN NIVEL N+0.00, INSTALACIÓN LÁMINAS EN CIELO RASO N+3.30, ENCHAPE PISO N+6.60, APLICACIÓN MORTERO CONTRA FUEGO N+13.20 EJES 1 AL 2 Y A AL C, PAÑETE LISO, INSTALACIÓN TUBERIA PVC-P, CPVC-P, ENCHAPE MURO EN BAÑOS ENTRE LOS EJES A0 AL B Y 1 AL 2 EN NIVEL N+0.00.

MANO DE OBRA EMPLEADA

CARGO	HORA		CANT.	TIEMPO (Horas)
	ORDINARIO	EXTRA		
Ing. Residente, Jefe Mec. Instrumental	$ 65.000	$ 89.000,00	1	10,00,00
Ing. Residente	$ 65.000	$ 89.000,00	1	10,00,00
Aux. Ingeniero civil	$ 45.000	$ 61.875,00	1	10,00,00
Ing. Residente civil UCT	$ 65.000	$ 89.000,00	1	10,00,00
Profesional Calidad	$ 65.000	$ 89.000,00	1	10,00,00
Inspector de	$ 45.000	$ 61.875,00	1	10,00,00
Maestro	$ 45.000	$ 61.875,00	1	10,00,00
Topógrafo	$ 30.000	$ 41.250,00	1	10,00,00
Ayudante	$ 25.000	$ 34.375,00	1	10,00,00
Oficiales	$ 30.000	$ 41.250,00	1	10,00,00
Ayudantes	$ 25.000	$ 34.375,00	1	10,00,00
Ambulancias de Emergencia 6x2	$ 1.499,00	$ 2.061,00	24	240,00,00
Supervisor Seg. y Sal. Ocup. Inspector Seg. y Sal.	$ 65.000,00	$ 89.375,00	1	10,00,00
Personal Mantenimiento	$ 45.000,00	$ 61.875,00	1	10,00,00
Personal Electricista	$ 45.000,00	$ 61.875,00	1	10,00,00
Personal Supervisor	$ 65.000,00	$ 89.375,00	1	10,00,00
Personal Auxiliares Almacén Campo	$ 25.000,00	$ 34.375,00	2	20,00,00
	$ 45.000,00	$ 61.875,00	1	10,00,00

EQUIPO UTILIZADO

DESCRIPCIÓN	CANT.	TIEMPO (Horas)
[illegible]	1	10,00,00
[illegible]	1	10,00,00
[illegible]	1	10,00,00

MATERIALES UTILIZADOS

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT.
[illegible]	[illegible]	[illegible]

ESTADO DEL TIEMPO

SOL	X	
NUBLADO		
LLUVIA		
NIEVE		
VIENTO		

ACCESO


BUENO	X
REGULAR	
MALO	

RECURSOS

ADECUADOS	X	INSUFICIENTES	

CAUSA ATRASO/DIA - MEDIDA CORRECTIVA

ESQUEMA/CROQUIS DE OBRA

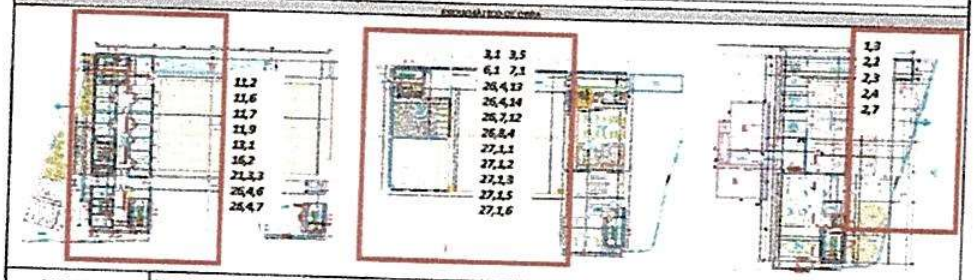

OBSERVACIONES:

FIRMA:	ELABORÓ	FIRMA:	APROBÓ
NOMBRE:	JAVIER F	NOMBRE:	
CARGO:		CARGO:	
FIRMA:		FIRMA:	
NOMBRE:		NOMBRE:	
CARGO:		CARGO:	

G+G Ingenieros Ltda	INFORME DIARIO DE ACTIVIDADES	Fecha:01/06/2019
	EJECUCIÓN DE OBRA	Codigo: F-OBR-024
		Versión: 1
		Hoja No.: 1 de 1

No DE CONTRATO Y OBJETO	CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No 470 DE 2018 SUSCRITO ENTRE EL DISTRITO CAPITAL - UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL CUERPO DE BOMBEROS Y GYG INGENIEROS LTDA	CONSECUTIVO	566
LUGAR o ESPECIALIDAD DE LOS TRABAJOS	OBRA	FECHA	miércoles 17 de febrero de 2021

INFORME DIARIO No. 566 | Página 2 de 2

REGISTRO FOTOGRÁFICO



CERRAMIENTO PROVISIONAL, DEMOLICIÓN VIGAS Y COLUMNAS SOBRE EL EJE 6 ENTRE EJES A0 AL C EN NIVEL N-3.30



ENCHAPE PISO EN BAÑOS, ENCHAPE MURO EN BAÑOS,SALIDAS SANITARIAS, MAMPOSTERÍA EN BLOQUE #4 EJES 1 AL 2 Y A AL D EN NIVEL N+6.60



DESMONTE DE CERCHAS EXISTENTES, EXCAVACIÓN A MAQUINA URBANISMO, DEMOLICIÓN MAMPOSTERÍA ENTRE EJES A0 AL C SOBRE EL EJE 6



RELLENO EN BASE GRANULAR, INSTLACIÓN LUMINARIAS, ACABADO ENDURECIDO EN CARCAMOS EJES 2 AL 5 Y C AL D ENI NIVEL N+0.00



INSTALACIÓN LÁMINAS EN CIELO RASO N+3.30, ENCHAPE PISO N+6.60, APLICACIÓN MORTERO CONTRA FUEGO N+13.20 EJES 1 AL 2 Y A AL C



PAÑETE LISO, INSTALACIÓN TUBERIA PVC-P, CPVC-P, ENCHAPE MURO EN BAÑOS ENTRE LOS EJES A0 AL B Y 1 AL 2 EN NIVEL N+0.00

ELABORO: JAVIER E.

ING. JAVIER ESCOBAR PINTOR
AUXILIAR DE INGENIERIA - CONTRATISTA

APROBO:

ING CAMILO ROMERO
RESIDENTE DE OBRA CONTRATISTA

	INFORME DIARIO DE ACTIVIDADES	Fecha:01/06/2019
	EJECUCIÓN DE OBRA	Código: F-OBR-024
		Versión: 1
		Hoja No.: 1 de 1

No DE CONTRATO DE OBRA Y OBJETO	CONTRATO DE OBRA PUBLICA No 47 DE 2019 SUSCRITO ENTRE EL DISTRITO CAPITAL - UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS Y LA EMPRESA	CONSECUTIVO	567
LUGAR o DESCRIPCIÓN DE LAS TRABAJOS	OBRA	FECHA	Jueves 18 de febrero de 2021

MEDIO DE SEGURIDAD	POR LA OBRA	POR PARQUE	OTROS	TOTALES
Mangueras				0
Hachas Equipo				0

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD PRESUPUESTAL	UNID.	CANTIDAD			
				CONTRACTUAL	ACUMULADO ANTERIOR	AVANCE HOY	ACUMULADO ACTUAL
1,3	CERRAMIENTO PROVISIONAL EN ZINC Y MADERA BALTEROS H= 1.80 M	N-3.30	ML	86.76	104.10	3.00	107.10
2,3	DEMOLICION DE CIMIENTO ENTERRADO INCLUYE RETIRO	N-3.30	M3	18.37	25.93	0.54	26.47
2,4	DEMOLICION DE VIGAS Y COLUMNAS INCLUYE RETIRO	N-3.30	M3	16.23	25.47	1.26	26.73
3,1	EXCAVACIONES VARIAS A MAQUINA SIN CLASIFICAR INCLUYE RETIRO	N-3.30	M3	6684.95	7113.65	20.25	7133.90
3,5	RELLENO BASE GRANULAR	N+0.00	M3	231.16	195.51	32.40	227.91
6,1	MURO EN BLOQUE No 4 E=0.09 H	N+6.60	M2	2222.99	2004.50	27.00	2031.50
6,2	ANCLAJE BARRA 1/2" L=40CM INCLUYE EPOXICO	N+0.00	UN	600.00	3491.00	32.00	3523.00
6,8	COLUMNETA DE CONFINAMIENTO DE 0.095 X 0.21 H, EN CONCRETO DE 3000 PSI. REFUERZO= 4 0=3/8" ESTRIBO 1/4" CADA 0.14 H.	N+3.30	ML	788.80	1640.65	22.40	1663.05
6,9	VIGUETA DE CONFINAMIENTO DE 0.095 X 0.21 H, EN CONCRETO DE 3000 PSI. REFUERZO= 4 0=3/8"	N+3.30	ML	677.72	1001.36	15.30	1016.66
7,1	PAÑETE LISO MUROS 1:4, E=1.5 CM	N+6.60	M2	2786.24	2788.04	17.44	2805.48
11,3	GUARDAESCOBA EN PORCELANATO 60CM	N+6.60	ML	813.16	240.77	38.53	279.30
11,5	MESON EN CONCRETO CON ACABADO EN GRANITO PULIDO	N+3.30	M2	19.05	13.18	2.78	15.96
11,7	ENCHAPE PARED EN PORCELANATO DE 40 X 40 CM. COLOR BLANCO.	N+0.00	M2	545.32	512.25	38.50	550.75
13,1	CIELO RASO PLANO EN SUPERBOARD 6 MM. INCLUYE DILATACIÓN PLASTICA Y PINTURA	N+6.60	M2	1437.30	850.65	17.25	867.90
16,2	SUMINISTRO Y APLICACION DE MORTERO DE PROTECCION CONTRA FUEGO E= 0.025 MM. PARA 2	N+13.20	M2	233.33	68.88	59.80	128.68
26,4,5	TUBERIA RDE 13,5 PVC PRESION 315 PSI 1"	N+0.00	ML	30.07	24.00	6.00	30.00
26,4,6	TUBERIA RDE 11 PVC PRESION 400 PSI 3/4"	N+0.00	ML	92.24	44.80	7.00	51.80
26,4,7	TUBERIA RDE 9 PVC PRESION 500 PSI 1/2"	N+0.00	ML	149.02	234.90	6.00	240.90
26,4,12	ACCESORIOS PVC PRESION 1"	N+0.00	UN	24.00	48.00	6.00	54.00
26,4,13	ACCESORIOS PVC PRESION 3/4"	N+0.00	UN	141.00	66.00	11.00	77.00
26,4,14	ACCESORIOS PVC PRESION 1/2"	N+0.00	UN	403.00	372.00	13.00	385.00
26,7,12	ACCESORIOS C-PVC 1"	N+0.00	UN	74.00	21.00	18.00	39.00
26,7,13	ACCESORIOS C-PVC 3/4"	N+0.00	UN	108.93	112.00	7.00	119.00
26,7,14	ACCESORIOS C-PVC 1/2"	N+0.00	UN	726.00	217.00	15.00	232.00
26,8,4	TUBERIA C-PVC 1"	N+0.00	ML	24.19	12.00	12.00	24.00
26,8,5	TUBERIA C-PVC 3/4"	N+0.00	ML	25.91	18.00	6.00	24.00
26,8,6	TUBERIA C-PVC 1/2"	N+0.00	ML	131.95	74.00	12.00	108.00
26,8,14	REGISTRO BOLA FLOWARU GIRO 0 SIPELAR TERP 90PC - 1/2"	N+6.60	UN	26.00	18.00	10.00	28.00
26,8,18	VALVULA BALANCEADORA DE CAUDAL 1/2"	N+6.60	UN	13.00	9.00	4.00	12.00

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES EJECUTADAS

PAÑETE LISO, MAMPOSTERÍA EN BLOQUE # 4 E INSTALACIÓN VÁLVULAS BALANCEADORAS Y TUBERIA CPVC-P, PVC-P EJES 1 AL 2 Y A0 AL B NIVEL N+6.60, ENCHAPE PISO N+0.60, APLICACIÓN MORTERO SELLO CONTRA FUEGO N+13.20 Y ENCHAPE MUROS BAÑOS N+0.00 EJES 1 AL 2 Y A AL C, INSTALACIÓN CERRAMIENTO PROVISIONAL, EXCAVACIÓN A MAQUINA ENTRE LOS EJES A AL C Y SOBRE EL EJE 6 EN NIVEL N-3.30, INSTALACIÓN LAMINAS DEL CIELO RASO, INSTALACIÓN GUARDAESCOBA, ENCHAPE EN PISO CUARTO ASEO ENTRE LOS EJES 1 AL 2 Y B AL D EN NIVEL N+6.60, DEMOLICIÓN MAMPOSTERÍA, COLUMNAS Y VIGAS EN NIVEL N-3.30 ENTRE EJES A AL C SOBRE EL EJE 6, FUNDIDA DE COLUMNETAS Y VIGUETAS DE CONFINAMIENTO N+3.30, RELLENO BASE GRAZULAR N+0.00 Y FUNDIDA DE MESONES EN BAÑOS N+0.00 EJES 1 AL 4 Y A AL D.

MANO DE OBRA EMPLEADA

CARGO	HORA		CANT.	TIEMPO (Horas)
	INICIO	FIN		
Arq. Residente, Arquitecto	6:00:00	15:00:00	1	09:00:00
Ing. Residente	6:00:00	15:00:00	1	09:00:00
Aux. Ingeniería Civil	6:00:00	15:00:00	1	09:00:00
Ing. Residente SST	6:00:00	15:00:00	1	09:00:00
Profesional Social	8:00:00	17:00:00	1	09:00:00
Almacenista	6:00:00	15:00:00	1	09:00:00
Maestro	6:00:00	13:00:00	3	21:00:00
Oficial	6:00:00	17:00:00	1	11:00:00
Ayudantes	6:00:00	15:00:00	1	09:00:00
Profesional de Seguridad SST	8:00:00	17:00:00	1	09:00:00
Topografo	10:00:00	18:00:00	1	08:00:00
Inspector de Obra	6:00:00	15:00:00	1	09:00:00
Residente Electrico	7:00:00	16:00:00	1	09:00:00
Residente Hidraulico	6:00:00	15:00:00	1	09:00:00
Inspector Ambiental Obra	7:00:00	16:00:00	1	09:00:00

EQUIPO UTILIZADO

DESCRIPCIÓN	CANT.	TIEMPO (Horas)
HERRAMIENTA MENOR	1	09:00:00
FORMALETAS MADERA	1	09:00:00
HERRAMIENTA MENOR	1	09:00:00

MATERIALES UTILIZADOS		
DESCRIPCIÓN	UNID.	CANT.
BLOQUE # 4	UN	1.000
CONCRETO DE 3000 PSI	M3	1.00

ESTADO DEL EQUIPO


	BUENO	REGULAR	MALO
EQUIPO MENOR	X		
EQUIPO MAYOR			

ACCESO

	BUENO	REGULAR	MALO
ACCESO PEATONAL	X		
ACCESO VEHICULAR			

CAUSA ACCIDENTE - MEDIDA CORRECTIVA:

ESQUEMÁTICO DE OBRA

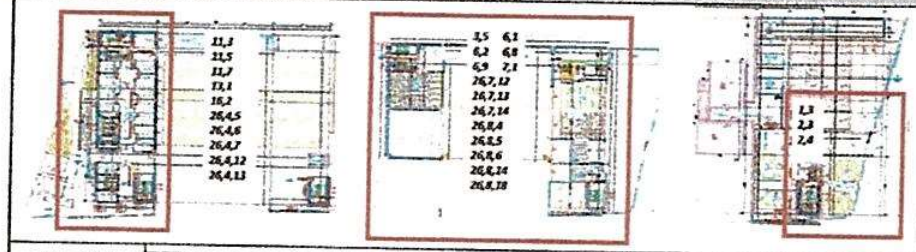

OBSERVACIONES:

FIRMA:	JAVIER F.	FIRMA:	
NOMBRE Y CARGO:		NOMBRE Y CARGO:	
FIRMA:		FIRMA:	
NOMBRE Y CARGO:		NOMBRE Y CARGO:	

G+G Ingenieros Ltda	INFORME DIARIO DE ACTIVIDADES	Fecha:01/06/2019
	EJECUCIÓN DE OBRA	Código: F-OBR-024
		Versión: 1
		Hoja No.: 1 de 1

No DE CONTRATO Y OBJETO	CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No 470 DE 2018 SUSCRITO ENTRE EL DISTRITO CAPITAL - UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL CUERPO DE BOMBEROS Y GYG INGENIEROS LTDA	CONSECUTIVO	567
LUGAR o ESPECIALIDAD DE LOS TRABAJOS	OBRA	FECHA	Jueves 18 de febrero de 2021

INFORME DIARIO No. 567 | Página 2 de 2

REGISTRO FOTOGRÁFICO



PAÑETE LISO, MAMPOSTERÍA EN BLOQUE # 4 E INSTALACIÓN VÁLVULAS BALANECEADORAS Y TUBERIA CPVC-P, PVC-P EJES 1 AL 2 Y A0 AL B NIVEL N+6.60



ENCHAPE PISO N+0.60, APLICACIÓN MORTERO SELLO CONTRA FUEGO N+13.20 Y ENCHAPE MUROS BAÑOS N+0.00 EJES 1 AL 2 Y A AL C



INSTALACIÓN CERRAMIENTO PROVISIONAL, EXCAVACIÓN A MAQUINA ENTRE LOS EJES A AL C Y SOBRE EL EJE 6 EN NIVEL N-3.30



INSTALACIÓN LÁMINAS DEL CIELO RASO, INSTALACIÓN GUARDAESCOBA, ENCHAPE EN PISO CUARTO ASEO ENTRE LOS EJES 1 AL 2 Y B AL D EN NIVEL N+0.60



DEMOLICIÓN MAMPOSTERÍA, COLUMNAS Y VIGAS EN NIVEL N-3.30 ENTRE EJES A AL C SOBRE EL EJE 6



FUNDIDA DE COLUMNETAS Y VIGUETAS DE CONFINAMIENTO N+3.30, RELLENO BASE GRANULAR N+0.00 Y FUNDIDA DE MESONES EN BAÑOS N+0.00 EJES 1 AL 4 Y A AL D

ELABORO: JAVIER F

ING. JAWER ESCOBAR PINTOR
AUXILIAR DE INGENIERIA - CONTRATISTA

APROBO:

ING CAMILO ROMERO
RESIDENTE DE OBRA CONTRATISTA

GG Ingenieros Ltda	INFORME DIARIO DE ACTIVIDADES	Fecha:01/08/2019
		Código: F-OBR-024
	EJECUCIÓN DE OBRA	Versión: 1
		Hoja No.: 1 de 1

No DE CONTRATO DE OBRA Y OBJETO	CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No 420 DE 2020 SUSCRITO ENTRE EL DISTRITO CAPITAL - UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL CUERPO DE BOMBEROS Y GIG INGENIEROS LTDA	CONSECUTIVO	568
LUGAR Y ESPECIALIDAD DE LOS TRABAJOS	OBRA	FECHA	viernes 19 de febrero de 2021

HORAS PERDIDAS	POR LLUVIA	POR PAROS		OTROS	TOTALES
Horas Hombre	1				1.0
Horas Equipo	1				1.0

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD FUNCIONAL	UND.	CANTIDAD			
				CONTRACTUAL	ACUMULADO ANTERIOR	AVANCE HOY	ACUMULADO ACTUAL
2,3	DEMOLICIÓN DE CIMIENTO ENTERRADO INCLUYE RETIRO	N-3.30	M3	18.37	26.47	4.50	30.97
3,2	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN H.= < 2.00 M. INCLUYE RETIRO	N-3.30	M3	343.95	486.03	4.47	490.50
3,5	RELLENO BASE GRANULAR	N+0.00	M3	731.16	227.91	29.63	257.54
6,3	MURO EN LADRILLO A LA VISTA GRAN FORMATO COLOR AMARILLO 11.5 CM.	N+4.85	M2	581.49	1030.15	5.50	1035.65
7,3	PAÑETE LISO 1:4 IMPERMEABILIZADO	N+9.90	M2	266.97	1300.13	30.52	1330.65
11,2	ENCHAPE PISO EN PORCELANATO DE 60 X 60 CM. ANTIDESLIZANTE CON DILATACION DE 2 MM. BOQUILLA	N+6.60	M2	1174.33	756.83	68.89	825.72
11,3	GUARDAESCOBA EN PORCELANATO 60CM	N+6.60	ML	813.16	278.80	52.42	331.22
11,5	MESON EN CONCRETO CON ACABADO EN GRANITO PULIDO	N+6.60	M2	19.85	15.96	2.78	18.74
11,7	ENCHAPE PARED EN PORCELANATO DE 40 X 40 CM. COLOR BLANCO	N+0.00	M2	545.32	550.75	15.50	566.25
13,1	CIELO RASO PLANO EN SUPERBOARD 6 MM. INCLUYE DILATACIÓN PLASTICA Y PINTURA	N+6.60	M2	1437.30	867.90	13.70	881.60
16,2	SUMINISTRO Y APLICACION DE MORTERO DE PROTECCION CONTRA FUEGO E= 0.025 MM. PARA 2	N+13.20	M2	233.33	128.68	59.80	188.48
19,3	CONCRETO CICLOPEO DE 0.50 X 0.50 M.	N-3.30	MI	65.30	24.25	6.50	30.75
21,3,3	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE LUMINARIA PHILIPS TCS760 2X26W 4000K LED (DE	N+3.30	UN	239.00	15.00	9.00	24.00
26,7,16	REGISTRO BOLA FLOWARD GOLD O SIMILAR TEMP 60°C - 3/4"	N+0.00	UN	2.00	1.00	1.00	2.00
26,7,18	RUBATEX 2"	N+0.00	ML	30.80	24.00	6.80	30.80
26,7,19	RUBATEX 1 1/2"	N+0.00	ML	14.90	0.00	14.90	14.90
26,7,22	RUBATEX 3/4"	N+0.00	ML	65.98	30.00	35.98	65.98
26,7,23	RUBATEX 1/2"	N+0.00	ML	182.09	126.00	48.00	174.00
26,8,13	REGISTRO BOLA FLOWARD GOLD O SIMILAR TEMP 60°C - 3/4"	N+0.00	UN	6.00	1.00	5.00	6.00
26,8,17	VÁLVULA BALANCEADORA DE CAUDAL 3/4"	N+0.00	UN	3.00	0.00	3.00	3.00
26,8,18	VÁLVULA BALANCEADORA DE CAUDAL 1/2"	N+0.00	UN	13.00	12.00	1.00	13.00
26,8,21	RUBATEX 1 1/4"	N+0.00	ML	45.60	0.00	30.00	30.00
26,8,22	RUBATEX 1"	N+0.00	ML	24.10	0.00	24.10	24.10
26,8,23	RUBATEX 3/4"	N+0.00	ML	25.91	0.00	25.91	25.91
26,8,24	RUBATEX 1/2"	N+0.00	ML	131.95	26.00	66.00	92.00

DESCRIPCION DE ACTIVIDADES EJECUTADAS

INSTALACIÓN LUMINARIAS N+3.30 EJES 4 AL 5 Y A AL B, MAMPOSTERÍA EN LADRILLO ARENA N+4.85 EJES C AL D Y SOBRE EL EJE 2, DEMOLICIÓN CIMIENTO ENTERRADO, EXCAVACIÓN CICLOPÉO Y FUNDIDA DE CONCRETO CICLOPEO EJES A AL C Y 5 AL 6 EN NIVEL N-3.30, APLICACIÓN MORTERO CONTRAFUEGO N+13.20, PAÑETE IMPERMEABILIZADO BAÑOS N+9.90 ENTRE LOS EJES 1 AL 2 Y B AL D, EXCAVACIÓN MANUAL PARA CURVA PLACA, FUNDIDA MESONES LAVANDERIA, RELLENO EN BASE GRANULAR EJES 2 AL 4 Y A AL D EN NIVEL N+0.00, INSTALACIÓN LÁMINAS EN CIELO RASO, ENCHAPE PISO 60 X 60 E INSTALACIÓN GUARDAESCOBA EN NIVEL N+6.60 EJES 1 AL 2 Y A AL C, INSTALACIÓN RUBATEX, ENCHAPE MUROS EN LAVANDERIA, INSTALACIÓN VALVULAS BALANCEADORAS EN NIVEL N+0.00 EJES 1 AL 2 Y A AL B.

MANO DE OBRA EMPLEADA

CARGO	HORA		CANT.	TIEMPO (Horas)
	INICIO	FIN		
Arq. Residente, Arq aux	8:00:00	18:00:00	2	20:00:00
Ing. Residente	8:00:00	18:00:00	1	10:00:00
Asz. Ingeniero civil	8:00:00	18:00:00	1	10:00:00
Ing. Profesional SST	8:00:00	18:00:00	1	10:00:00
Profesional Calidad	8:00:00	18:00:00	1	10:00:00
Almacenista	8:00:00	18:00:00	1	10:00:00
Maestro	8:00:00	18:00:00	1	10:00:00
conductor mixta	8:00:00	18:00:00	1	10:00:00
Oficiales	8:00:00	18:00:00	1	10:00:00
Ayudantes	8:00:00	18:00:00	22	220:00:00
Profesionales de topografía GyG	8:00:00	18:00:00	23	230:00:00
Interventoria Engr SST, ing residente, arq aux	10:00:00	18:00:00	1	8:00:00
Personal Administrativo	8:00:00	18:00:00	3	30:00:00
Personal Electrico	8:00:00	18:00:00	2	20:00:00
Personal De urbanismo	8:00:00	18:00:00	2	20:00:00
Personal montaje contra fuego	8:00:00	18:00:00	4	40:00:00
	8:00:00	18:00:00	5	50:00:00

EQUIPO UTILIZADO

DESCRIPCIÓN	CANT.	TIEMPO (Horas)
MINICARGADOR SR220	1	10:00:00
VIBROCOMPACTADOR BW217D	1	10:00:00
VIBROCOMPACTADOR TIPO CANGURO	1	10:00:00

MATERIALES UTILIZADOS

DESCRIPCION	UNID.	CANT.
RELLENO EN MATERIAL RECO	m3	29.63
LADRILLO GRANFORMATO COLOR ARENA	UN	241

ESTADO DEL TIEMPO

		HORAS
SECO	X	6.9
NEBLINA		
LLOVIZNA		
LLUVIA	X	1
TORMENTA		

ACCESO

BUENO	X
REGULAR	
MALO	
NULO	


TERRENO

ROCOSO		DURO	
ARENOSO		LODOSO	
		NORMAL	X
		PANTANO	

CAUSA ATRASO/DIA - MEDIDA CORRECTIVA:

LLUVIA DE 2 PM A 4PM

ESQUEMÁTICO DE OBRA

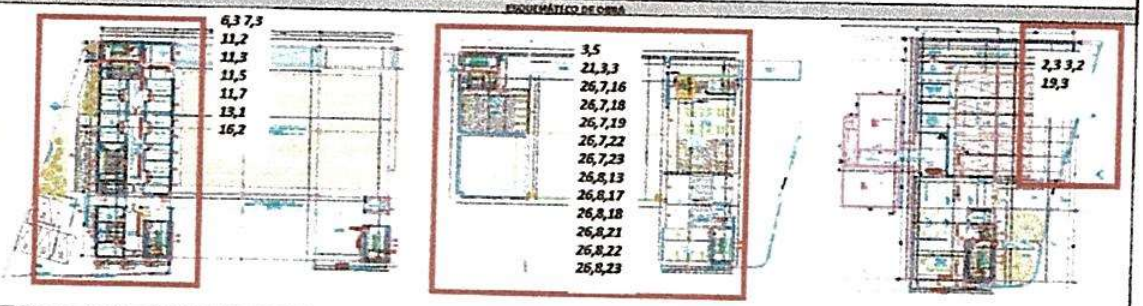

OBSERVACIONES:

FIRMA:	ELABORÓ	FIRMA:	APROBÓ
NOMBRE:	ING. JAVIER ANDRES ESCOBAR PINTOR	NOMBRE:	ARQ. MARCELO SARMIENTO
CARGO:	AUXILIAR DE INTERVENTORIA CONTRATISTA	CARGO:	RESIDENTE DE OBRA CONTRATISTA
FIRMA:	VALIDÓ	FIRMA:	APROBÓ
NOMBRE:		NOMBRE:	
CARGO:		CARGO:	

G+G Ingenieros Ltda	INFORME DIARIO DE ACTIVIDADES	Fecha:01/06/2019
	EJECUCIÓN DE OBRA	Código: F-OBR-024
		Versión: 1
		Hoja No.: 1 de 1

No DE CONTRATO Y OBJETO	CONTRATO DE OBRA PUBLICA No 470 DE 2018 SUSCRITO ENTRE EL DISTRITO CAPITAL - UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL CUERPO DE BOMBEROS Y GYG INGENIEROS LTDA	CONSECUTIVO	568
LUGAR o ESPECIALIDAD DE LOS TRABAJOS	OBRA	FECHA	viernes 19 de febrero de 2021

INFORME DIARIO No. 568 | Página 2 de 2

REGISTRO FOTOGRÁFICO



INSTALACIÓN LUMINARIAS N+3.30 EJES 4 AL 5 Y A AL B, MAMPOSTERÍA EN LADRILLO ARENA N+4.85 EJES C AL D Y SOBRE EL EJE 2



DEMOLICIÓN CIMIENTO ENTERRADO, EXCAVACIÓN CICLOPEO Y FUNDIDA DE CONCRETO CICLOPEO EJES A AL C Y 5 AL 6 EN NIVEL N-3.30



APLICACIÓN MORTERO CONTRAFUEGO N+13.20, PAÑETE IMPERMEABILIZADO BAÑOS N+9.90 ENTRE LOS EJES 1 AL 2 Y B AL D



EXCAVACIÓN MANUAL PARA CURVA PLACA, FUNDIDA MESONES LAVANDERIA, RELLENO EN BASE GRANULAR EJES 2 AL 4 Y A AL D EN NIVEL N+0.00



INSTALACIÓN LÁMINAS EN CIELO RASO, ENCHAPE PISO 60 X 60 E INSTALACIÓN GUARDAESCOBA EN NIVEL N+6.60 EJES 1 AL 2 Y A AL C



INSTALACIÓN RUBATEX, ENCHAPE MUROS EN LAVANDERIA, INSTALACIÓN VALVULAS BALANCEADORAS EN NIVEL N+0.00 EJES 1 AL 2 Y A AL B

ELABORO: JAVIER E

ING JAVIER ESCOBAR PINTOR
AUXILIAR DE INGENIERIA - CONTRATISTA

APROBO

ING CAMILO ROMERO
RESIDENTE DE OBRA CONTRATISTA

G&G Ingeniería Ltda	INFORME DIARIO DE ACTIVIDADES	Fecha:01/06/2019
	EJECUCIÓN DE OBRA	Código: F-OBR-024
		Versión: 1
		Hoja No.: 1 de 1

No DE CONTRATO DE OBRA Y OBJETO	CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. 019 DE 2020 SUSCRITO ENTRE EL DISTRITO CAPITAL - UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL CUERPO DE BOMBEROS Y G&G INGENIEROS LTDA	CONSECUTIVO	569
LUGAR y ESPECIALIDAD DE LOS TRABAJOS	OBRA	FECHA	sábado 20 de febrero de 2021

HORAS PERDIDAS	POR LLUVIA	POR PARO		OTROS	TOTALES
Hora Hombre					0.0
Hora Equipo					0.0

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD FUNCIONAL	UND.	CANTIDAD			
				CONTRACTUAL	ACUMULADO ANTERIOR	AVANCE HOY	ACUMULADO ACTUAL
3,2	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN H= < 2.00 M. INCLUYE RETIRO.	N-3.30	M3	343.95	490.50	7.00	497.50
3,5	RELLENO BASE GRANULAR	N+0.00	M3	231.16	257.54	6.62	264.16
5,30	ACERO FIGURADO 60000 PSI	N-3.30	KG	62395.99	94722.64	350.00	95072.64
6,2	ANCLAJE BARRA 1/2" L=40CM INCLUYE EPOXICO.	N+6.60	UN	600.00	3523.00	73.00	3596.00
6,3	MURO EN LADRILLO A LA VISTA GRAN FORMATO COLOR AMARILLO 11.5 CM.	N+4.85	M2	581.49	1035.65	4.73	1040.38
6,8	COLUMNETA DE CONFINAMIENTO DE 0.095 X 0.21 M. EN CONCRETO DE 3000 PSI. REFUERZO= 4 D=3/8" ESTRIBO 1/4" CADA 0.14 M.	N+6.60	ML	758.80	1663.05	44.80	1707.85
6,9	VIGUETA DE CONFINAMIENTO DE 0.095 X 0.21 M. EN CONCRETO DE 3000 PSI. REFUERZO= 4 D=3/8" ESTRIBO 1/4" CADA 0.14 M.	N+6.60	ML	677.72	1016.86	26.19	1043.05
6,10	ALFAGIAS EN CONCRETO A LA VISTA 3000 PSI, A= 0,20 E=0,07 INC. 2 D3/8" FLEJE 3/8"	N+13.20	ML	244.34	221.49	50.28	271.77
6,11	DOVELAS PARA MAMPOSTERIA INCLUYE ACERO DE REFUERZO 1#4.	N+4.85	ML	840.00	2389.08	29.30	2418.38
7,2	PAÑETE LISO MUROS 1:4, E=1.5 CM (LINEAL) H< 0.60 M.	N+0.00	ML	321.75	516.41	58.80	575.21
7,3	PAÑETE LISO 1:4 IMPERMEABILIZADO	N+0.00	M2	266.97	1330.65	12.32	1342.97
11,3	GUARDAESCOBA EN PORCELANATO 60CM	N+6.60	ML	813.16	331.22	57.10	388.32
11,7	ENCHAPE PARED EN PORCELANATO DE 40 X 40 CM. COLOR BLANCO.	N+0.00	M2	545.32	566.25	14.75	581.00
11,9	ACABADO PARA PISO CON ENDURECIDO TIPO SIKAFOOR 3 QUARTZ TOP COLOR O SIMILAR. (LINEAL)	N+13.20	ML	342.00	645.13	50.28	695.41
11,11	ENCHAPE PARED EN PORCELANATO DE 40 X 40 CM. COLOR BLANCO. (LINEAL)	N+0.00	ML	62.00	35.00	24.50	59.50
13,1	CIELO RASO PLANO EN SUPERBOARD 6 MM. INCLUYE DILATACION PLASTICA Y PINTURA	N+6.60	M2	1437.30	881.60	34.83	916.43
16,2	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE MORTERO DE PROTECCION CONTRA FUEGO E= 0.025 MM. PARA 2 HORAS PARA ESTRUCTURAS METALICAS.	N+13.20	M2	233.33	188.48	20.50	208.98

DESCRIPCION DE ACTIVIDADES EJECUTADAS

PAÑETE IMPERMEABILIZADO N+9.90, MAMPOSTERÍA EN LADRILLO ARENA N+4.85 ENTRE LOS EJES 1 AL 2 Y C AL D, INSTALACIÓN LÁMINAS EN CIELO RASO, INSTALACIÓN EN GUARDAESCOBA ENTRE EJES 1 AL 2 Y B AL C EN NIVEL N+6.60, FUNDIDA DE ALFAJIA EN CONCRETO CON ACABADO ENDURECIDO, APLICACIÓN MORTERO CONTRAFUEGO ENTRE LOS EJES 1 AL 2 Y B AL D EN NIVEL N+13.20, ARMADO DE ACERO PARA VIGAS DE CERRAMIENTO, EXCAVACIÓN MANUAL ZARPA MURO Y EXCAVACIÓN CONCRETO CICLOPEO EJES 5 AL 6 A0 AL C, FUNDIDA DE CONCRETO PARA COLUMNETAS Y VIGUETAS DE CONFINAMIENTO EJES 1 AL 2 Y A 0 AL D EN NIVEL N+6.60, INSTALACIÓN ENCHAPE MURO EN LAVANDERIA E INSTLACIÓN TUBERIA PVC-P Y CPVC-P ENTRE EJES 1 AL 2 Y A AL B EN NIVEL N+0.00.

MANO DE OBRA EMPLEADA

CARGO	HORA		CANT.	TIEMPO (Horas)
	INICIO	FIN		
Arq. Residente, Ing aux	6:00:00	16:00:00	1	10:00:00
Ing. Residente	8:00:00	18:00:00	0	0:00:00
Res. Ingeniero civil	8:00:00	18:00:00	1	10:00:00
Ing. Profesional SST	8:00:00	18:00:00	1	10:00:00
Profesional Calidad	8:00:00	18:00:00	1	10:00:00
Almacenista	8:00:00	18:00:00	1	10:00:00
Residente	8:00:00	18:00:00	1	10:00:00
conductor civil	8:00:00	18:00:00	1	10:00:00
Oficiales	8:00:00	18:00:00	1	10:00:00
Ayudantes	8:00:00	18:00:00	22	220:00:00
Profesionales de topografia Civil	8:00:00	18:00:00	23	230:00:00
Entrenadores, Ing SST, Ing residente, Ing aux	10:00:00	10:00:00	0	0:00:00
Personal Administrativo	8:00:00	18:00:00	3	30:00:00
Personal Electrico	8:00:00	18:00:00	2	20:00:00
Personal De urbanismo	3:00:00	13:00:00	0	0:00:00
Personal cerrajero cuerpo fuego	8:00:00	18:00:00	4	40:00:00
	8:00:00	18:00:00	2	20:00:00

EQUIPO UTILIZADO

DESCRIPCIÓN	CANT.	TIEMPO (Horas)
RENCARGADOR SR220	1	10:00:00
VIBROCOMPACTADOR RETRIER	1	10:00:00
VIBROCOMPACTADOR TIPO CANGURO	1	10:00:00

MATERIALES UTILIZADOS

DESCRIPCIÓN	UND.	CANT.
CONCRETO DE 3000 PSI	m3	3.50
LADRILLO GRANPRODUCTO COLOR ARENA	UN	207

ESTADO DEL TIEMPO

		HORAS
SECO	X	8.0
NUBLINA		
LLUVIA FUERTE		
LLUVIA		
NIEVE		

ACCESO


BUENO	X
REGULAR	
MALO	
NULO	

TERRENO

ROCOSO		ÚLTIMO		NORMAL	X
ARENOSO				FANGOSO	

CAUSA ATRASO/OBS - MEDIDA CORRECTIVA:

ESQUEMÁTICO DE OBRA

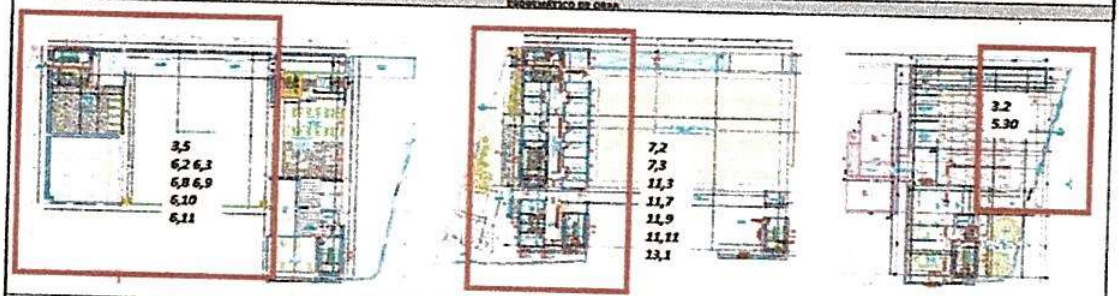

OBSERVACIONES:

ELABORÓ		APROBÓ	
FIRMA:	JAVIER E.	FIRMA:	
NOMBRE:		NOMBRE: MARCELO BARRUETO	
CARGO:		CARGO: RESIDENTE OBRA CONTRATANTE	
FIRMA:		FIRMA:	
NOMBRE:		NOMBRE:	
CARGO:		CARGO:	

G&G Ingenieros Ltda	INFORME DIARIO DE ACTIVIDADES EJECUCIÓN DE OBRA	Fecha:01/06/2019 Código: F-OBR-024 Versión: 1 Hoja No.: 1 de 1

No DE CONTRATO Y OBJETO	CONTRATO DE OBRA PUBLICA No 470 DE 2018 SUSCRITO ENTRE EL DISTRITO CAPITAL - UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL CUERPO DE BOMBEROS Y GYG INGENIEROS LTDA	CONSECUTIVO	569
LUGAR o ESPECIALIDAD DE LOS TRABAJOS	OBRA	FECHA	sábado 20 de febrero de 2021


INFORME DIARIO No. 569 | Página 2 de 2




PAÑETE IMPERMEABILIZADO N+9.90, MAMPOSTERÍA EN LADRILO ARENA N+4.85 ENTRE LOS EJES 1 AL 2 Y C AL D




INSTALACIÓN LÁMINAS EN CIELO RASO, INSTALACIÓN EN GUARDAESCOBA ENTRE EJES 1 AL 2 Y B AL C EN NIVEL N+6.60

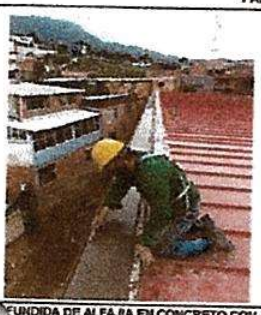


FUNDIDA DE ALFAJIA EN CONCRETO CON ACABADO ENDURECIDO, APLICACIÓN MORTERO CONTRAFUEGO ENTRE LOS EJES 1 AL 2 Y B AL D EN NIVEL N+13.20




ARMADO DE ACERO PARA VIGAS DE CERRAMIENTO, EXCAVACIÓN MANUAL ZARPA MURO Y EXCAVACIÓN CONCRETO CICLOPEO EJES 5 AL 6 A0 AL C




FUNDIDA DE CONCRETO PARA COLUMNETAS Y VIGUETAS DE CONFINAMIENTO EJES 1 AL 2 Y A 0 AL D EN NIVEL N+6.60




INSTALACIÓN ENCHAPE MURO EN LAVANDERIA E INSTLACIÓN TUBERIA PVC-P Y CPVC-P ENTRE EJES 1 AL 2 Y A AL B EN NIVEL N+0.00

ELABORO: JAVIER E

ING. JAVIER ESCOBAR PINTOR
AUXILIAR DE INGENIERIA - CONTRATISTA

APROBO:

ING CAMILO ROMERO
RESIDENTE DE OBRA CONTRATISTA

GG Ingeniería Ltda	INFORME DIARIO DE ACTIVIDADES	Fecha:01/06/2019
	EJECUCIÓN DE OBRA	Código: F-OBR-024
		Versión: 1
		Hoja No.: 1 de 1

No DE CONTRATO DE OBRA Y OBJETO	CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No 409 DE 2018 SUSCRITO ENTRE EL DISTRITO CAPITAL - UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL CUERPO DE BOMBEROS Y GYG INGENIEROS LTDA	CONSECUTIVO	570
LUGAR o ESPECIALIDAD DE LOS TRABAJOS	OBRA	FECHA	domingo 21 de febrero de 2021

HORAS PERDIDAS	POR LLUVIA	POR PAROS		OTROS	TOTALES
Horas Hombre					0.0
Horas Equipo					0.0

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD FUNCIONAL	UND.	CANTIDAD			
				CONTRACTUAL	ACUMULADO ANTERIOR	AVANCE HOY	ACUMULADO ACTUAL
3,2	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN H= < 2.00 M. INCLUYE RETIRO.	N-3.30	M3	343.95	497.50	2.10	499.60
4,11	REFUERZO MALLA ELECTROSOLDADA	N-3.30	KG	15906.21	15437.08	600.00	16037.08
5,30	ACERO FIGURADO 60000 PSI	N-3.30	KG	62395.90	95072.64	550.00	95622.64
11,1	AFINADO DE PISO EN MORTERO 1:4 E=0.04 M.	N+0.00	M2	1381.63	1841.79	9.61	1851.40
NP-02	GEODREN VIAL CON TUBERIA CIRCULAR 100 mm H=2.0 M SUMINISTRO E INSTALACION.(No incluye excavacion y rellenos). - CODIGO IDU 5845	N+0.00	ML	120.00	358.28	3.50	361.78

DESCRIPCION DE ACTIVIDADES EJECUTADAS

EXCAVACIÓN ZARPA MURO T3A, INSTALACIÓN GEODRÉN VIAL Y AMARRE DE ACERO MURO EJES 5 AL 6 Y A0 AL A EN NIVEL N-3.30, INSTALACIÓN MALLA ELÉCTROSOLDADA EJES 1 AL AL 1 Y C AL D EN NIVEL N+4.85, APLICACIÓN MORTERO PARA AFINADO DE PISO EN LAVANDERIA EJES 1 AL 2 Y A AL B EN NIVELN+0.00, COMPACTACIÓN RELLENO DE BASE GRANULAR EJES 2 AL 4 Y C AL D EN NIVEL N+0.00.

MANO DE OBRA EMPLEADA

CARGO	HORA		CANT.	TIEMPO (Horas)
	INICIO	FIN		
Arq. Residente I, arq aux	8:00:00	18:00:00	0	0:00:00
Ing. Residente	8:00:00	18:00:00	1	10:00:00
Aux. Ingeniero civil	8:00:00	18:00:00	0	0:00:00
Ing. Profesional SST	8:00:00	18:00:00	0	0:00:00
Profesional Calidad	8:00:00	18:00:00	1	10:00:00
Almacenista	8:00:00	18:00:00	0	0:00:00
Maestro	8:00:00	18:00:00	0	0:00:00
Ejero , conductor mini	8:00:00	18:00:00	0	0:00:00
Oficiales	8:00:00	18:00:00	5	50:00:00
Ayudantes	8:00:00	18:00:00	5	50:00:00
Profesionales de topografia GyG	10:00:00	18:00:00	0	0:00:00
Interventoria Insp SST, ing residente, ing aux	8:00:00	18:00:00	0	0:00:00
Personal Hidrosanitario	8:00:00	18:00:00	0	0:00:00
Personal Electrico	8:00:00	18:00:00	0	0:00:00
Personal De urbanismo	8:00:00	18:00:00	4	40:00:00

EQUIPO UTILIZADO

DESCRIPCIÓN	CANT.	TIEMPO (Horas)
VIBROCOMPACTADOR BENITIN	1	10:00:00
VIBROCOMPACTADOR TIPO CANGURO	1	10:00:00

MATERIALES UTILIZADOS

DESCRIPCIÓN	UNID.	CANT.

ESTADO DEL TIEMPO

		HORAS
SECO	X	9.0
NEBLINA		
LLOVIZNA		
LLUVIA		
TORMENTA		

ACCESO


BUENO	X
REGULAR	
MALO	
NULO	

TERRENO

ROCOSO		DURO		NORMAL	
ABRIGOSO		LODOSO		PANTANO	X

CAUSA ATRASO/DIA - MEDIDA CORRECTIVA:

ESQUEMÁTICO DE OBRA

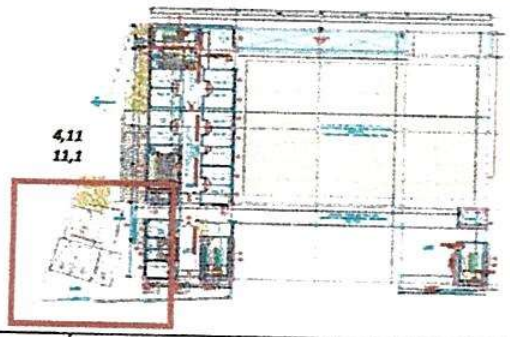



OBSERVACIONES:

	ELABORO	APROBO
FIRMA:		
NOMBRE:	ING. JAVIER ANDRES ESCOBAR PINTOR	ARQ. MARCELO SARMIENTO
CARGO:	AUXILIAR DE INGENIERIA CONTRATISTA	RESIDENTE DE OBRA CONTRATISTA
FIRMA:	VALIDO	APROBO
NOMBRE:	ING. CARLOS ROMERO	ING. CARLOS LUIS JULIO
CARGO:	RESIDENTE DE OBRA CONTRATISTA	RESIDENTE DE INTERVENTORIA

G·G Ingenieros Ltda	INFORME DIARIO DE ACTIVIDADES	Fecha: 01/06/2019
	EJECUCIÓN DE OBRA	Código: F-OBR-024
		Versión: 1
		Hoja No.: 1 de 1

No DE CONTRATO Y OBJETO	CONTRATO DE OBRA PUBLICA No 470 DE 2018 SUSCRITO ENTRE EL DISTRITO CAPITAL - UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL CUERPO DE BOMBEROS Y GYG INGENIEROS LTDA	CONSECUTIVO	570
LUGAR o ESPECIALIDAD DE LOS TRABAJOS	OBRA	FECHA	domingo 21 de febrero de 2021

INFORME DIARIO No. 570 — Página 2 de 2

REGISTRO FOTOGRÁFICO






EXCAVACIÓN ZARPA MURO T3A, INSTALACIÓN GEODREN VIAL Y AMARRE DE ACERO MURO EJES 5 AL 6 Y A0 AL A EN NIVEL N-3.30



INSTALACIÓN MALLA ELÉCTROSOLDADA EJES 1 AL AL 1 Y C AL D EN NIVEL N+4.85

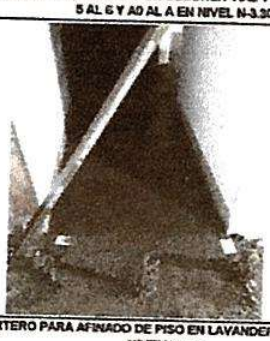

APLICACIÓN MORTERO PARA AFINADO DE PISO EN LAVANDERIA EJES 1 AL 2 Y A AL B EN NIVELN+0.00



COMPACTACIÓN RELLENO DE BASE GRANULAR EJES 2 AL 4 Y C AL D EN NIVEL N+0.00

ELABORO: JAVIER E

ING. JAVIER ESCOBAR PINTOR
AUXILIAR DE INGENIERIA - CONTRATISTA

APROBO:

ING CAMILO ROMERO
RESIDENTE DE OBRA CONTRATISTA

CC Ingeniería Ltda.	**INFORME DIARIO DE ACTIVIDADES**	Fecha:01/06/2019
	EJECUCIÓN DE OBRA	Código: F-OBR-024
		Versión: 1
		Hoja No.: 1 de 1

No DE CONTRATO DE OBRA O OBJETO	CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. 1-02-102-[illegible] PARA EL DISTRITO CAPITAL - UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL CUERPO DE BOMBEROS Y DEMÁS DISPOSICIONES	CONSECUTIVO	571
LUGAR O ESPECIFICACIÓN DE LOS TRABAJOS	OBRA	FECHA	lunes 22 de febrero de 2021

RECURSOS UTILIZADOS	POR CUENTA	POR CAMBIO	OTROS	TOTALES
Horas Hombre				0.0
Horas Equipo				0.0

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD PRESUPUESTO	UNID.	CANTIDADES			
				PRESUPUESTADA	ACUMULADO ANTERIOR	AVANCE HOY	ACUMULADO ACTUAL
2,3	DEMOLICION DE CIMIENTO ENTERRADO INCLUYE RETIRO	N-3.30	M3	38.37	30.97	1.38	32.35
3,2	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMUN N= < 2.00 M. INCLUYE RETIRO.	N-3.30	M3	243.95	499.60	1.75	501.35
4,1	CONCRETO DE LIMPIEZA EN CONCRETO DE 2500 PSI E=0.04	N-3.30	M2	510.12	566.37	3.10	569.47
4,3	ZAPATA EN CONCRETO 4000 PSI. NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO.	N-3.30	M3	38.86	37.97	0.78	38.75
4,12	ACERO FIGURADO 60000 PSI	N+0.00	KG	60921.33	83718.75	2080.00	85798.75
5,14	CONCRETO DE 4000 PSI PARA VIGA AÉREA DE 0.20 X 0.50 M. NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO.	N+4.85	M3	30.36	46.82	0.23	47.06
5,24	ENTREPISO PLACA MACIZA EN CONCRETO DE 4000PSI E=12.5 CM NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO.	N+0.00	M2	1914.86	2164.73	63.50	2228.23
6,3	MURO EN LADRILLO A LA VISTA GRAN FORMATO COLOR AMARILLO 11.5 CM.	N+6.60	M2	581.49	1040.38	6.72	1047.10
6,5	ENCHAPE EN FACHALETA LADRILLO A LA VISTA GRAN FORMATO COLOR AMARILLO. H< 0.60 M.	N+6.60	ML	618.36	428.55	12.89	441.44
7,1	PAÑETE LISO MUROS 1:4, E=1.5 CM	N+3.30	M2	2706.25	2804.58	30.69	2835.27
11,3	GUARDAESCOBA EN PORCELANATO 60CM	N+6.60	ML	813.16	399.32	28.93	417.75
11,6	ENCHAPE PISO PARA BAÑO EN PORCELANATO DE 28 X 56 CM.	N+0.00	M2	204.89	106.96	5.97	112.93
11,7	ENCHAPE PARED EN PORCELANATO DE 40 X 40 CM. COLOR BLANCO.	N+0.00	M2	545.32	581.00	7.50	588.50
11,8	ACABADO PARA PISO CON ENDURECIDO TIPO SIKAFLOOR 3 QUARTZ TOP COLOR O SIMILAR.	N+0.00	M2	2232.44	2493.71	63.50	2557.21
11,11	ENCHAPE PARED EN PORCELANATO DE 40 X 40 CM. COLOR BLANCO. (LINEAL)	N+0.00	ML	62.00	59.50	2.50	62.00
12,2	SUMINISTRO E INSTALACION LAVAMANOS SAN LORENZO DE INCRUSTAR BLANCO	N+0.00	UN	32.00	5.00	7.00	12.00
13,1	CIELO RASO PLANO EN SUPERBOARD 6 MM. INCLUYE DILATACIÓN PLASTICA Y PINTURA	N+6.60	M2	1437.30	916.43	11.19	927.62
14,1	ESTUCO Y VINILO TIPO 1 BLANCO PARA INTERIORES SOBRE PAÑETE 3 MANOS, INCLUYE FILOS Y	N+0.00	M2	1780.43	1024.54	17.08	1041.62
16,2	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE MORTERO DE PROTECCION CONTRA FUEGO E= 0.025 MM. PARA 2 HORAS PARA ESTRUCTURAS METALICAS.	N+13.20	M2	233.33	208.98	12.30	221.28
19,1	ESTAMPADO COLOR A CONCRETO PLACA DE CONTRAPISO	N+0.00	M2	721.56	197.70	63.50	261.20
19,3	CONCRETO CICLOPEO DE 0.50 X 0.50 M.	N-3.30	ML	65.20	30.75	8.71	39.46
26.2.3	MONTAJE LAVAMANOS PARAL DE PISO 1/2" AP/AC	N+0.00	UN	32.00	31.00	1.00	32.00
26.3.3	PUNTO LAVAMANOS PARAL DE PISO 1/2" AP/AC	N+0.00	UN	32.00	31.00	1.00	32.00
26.3.7	PUNTO LLAVE DE MANO 1/2" AP	N+9.90	UN	6.00	0.00	2.00	2.00
26.3.8	PUNTO LLAVE DE MANO 1/2" AC	N+9.90	UN	2.00	0.00	1.00	1.00
26.5.1	REGISTRO COMPUERTA PESADO RED WHITE 1"	N+9.90	UN	7.00	1.00	6.00	7.00
26.6.13	REGISTRO COMPUERTA PESADO RED WHITE 1"	N+9.90	UN	4.00	3.00	1.00	4.00
26.6.14	REGISTRO COMPUERTA PESADO RED WHITE 1/2"	N+9.90	UN	3.00	2.00	1.00	3.00

DESCRIPCION DE ACTIVIDADES EJECUTADAS

MAMPOSTERÍA EN LADRILLO ARENA CON FACHALETA N+6.60, PAÑETE LISO N+3.30 Y AMARRE DE ACERO PARA PLACA 0.20m EJES B AL D Y 1 AL 4, FUNDIDA DE CONCRETO 4000 PSI PLACA 0.125m CON ACABADO ENDURECIDO Y TERMINACIÓN EN ESTAMPADO EJES 1 AL 1A Y C AL D EN NIVEL N+4.05, APLICACIÓN MORTERO CONTRAFUEGO N+13.20, PUNTOS HIDRAULICOS CON REGISTROS N+9.90, INSTALACION LÁMINAS CIELO RASO N+6.60 EJES 1 AL 2 Y B AL D, ENCHAPE BAÑOS ZONA LAVANDERIA CON ENCHAPE LINEAL MUROS, INSTALACIÓN LAVAMANOS, TERMINACIÓN EN GUARDAESCOBA N+0.60 EJES 1 AL 2 Y A AL C N+0.00, DEMOLICIÓN CIMIENTO ENTERRADO Y EXCAVACIÓN PARA CICLOPEO DE CERRAMIENTO EJES 5 AL 6 Y A AL B N-3.30, FUNDIDA DE CONCRETO 4000 PSI PARA ZARPA MURO 3A, FUNDIDA DE CONCRETO CICLOPEO CERRAMIENTO, ESTUCO Y PINTURA EJES 5 AL 6 Y A0 AL C N-3.30

MANEJO OBRA EMPLEADA

CARGO	HORA		CANT.	TIEMPO (Horas)
	Entrada	Salida		
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

COMPONENTES USADOS

DESCRIPCIÓN	CANT.	TIEMPO (Horas)
[illegible]	[illegible]	[illegible]

MATERIALES UTILIZADOS

MATERIALES	CANT.	UNID.
[illegible]	[illegible]	[illegible]

CONDICIONES DEL TIEMPO


[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

ACCESO

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

CADENA ADMINISTRATIVA - MESA CONTRACTUAL

REGISTRO DE OBRA

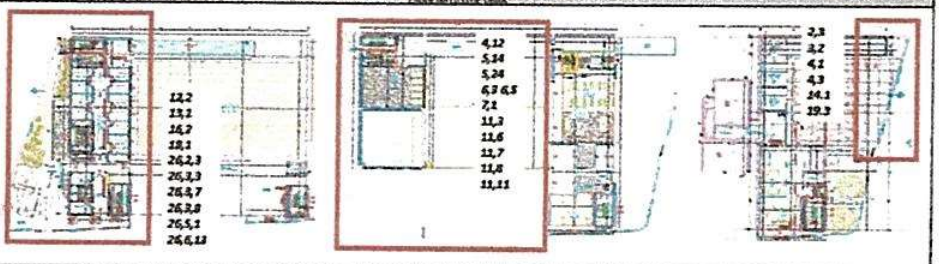

OBSERVACIONES:

FIRMA:	REVISO	FIRMA:	APROBO
NOMBRE:	[illegible]	NOMBRE:	[illegible]
CARGO:	[illegible]	CARGO:	[illegible]
FIRMA:		FIRMA:	
NOMBRE:	[illegible]	NOMBRE:	[illegible]

G+G Ingenieros Ltda	INFORME DIARIO DE ACTIVIDADES	Fecha:01/06/2019
	EJECUCIÓN DE OBRA	Código: F-OBR-024
		Versión: 1
		Hoja No.: 1 de 1

No DE CONTRATO Y OBJETO	CONTRATO DE OBRA PUBLICA No 470 DE 2018 SUSCRITO ENTRE EL DISTRITO CAPITAL - UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL CUERPO DE BOMBEROS Y GYG INGENIEROS LTDA	CONSECUTIVO	571
LUGAR o ESPECIALIDAD DE LOS TRABAJOS	OBRA	FECHA	lunes 22 de febrero de 2021

INFORME DIARIO No. 571 | Página 2 de 2


REGISTRO FOTOGRÁFICO



MAMPOSTERÍA EN LADRILLO ARENA CON FACHALETA N+6.60, PAÑETE LISO N+3.30 Y AMARRE DE ACERO PARA PLACA 0.20m EJES B AL D Y 1 AL 4



FUNDIDA DE CONCRETO 4000 PSI PLACA 0.125m CON ACABADO ENDURECIDO Y TERMINACIÓN EN ESTAMPADO EJES 1 AL 1A Y C AL D EN NIVEL N+4.85

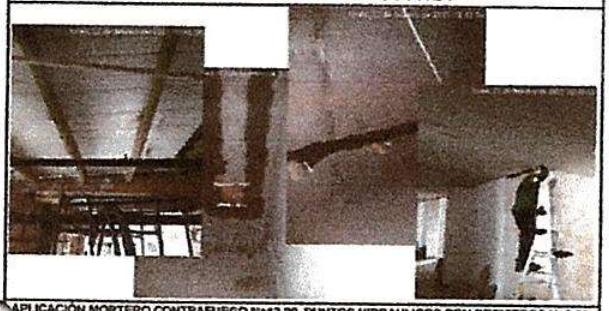

APLICACIÓN MORTERO CONTRAFUEGO N+13.20, PUNTOS HIDRAULICOS CON REGISTROS N+9.90, INSTALACIÓN LÁMINAS CIELO RASO N+6.60 EJES 1 AL 2 Y B AL D



ENCHAPE BAÑOS ZONA LAVANDERIA CON ENCHAPE LINEAL MUROS, INSTALACIÓN LAVAMANOS, TERMINACIÓN EN GUARDAESCOBA N+6.60 EJES 1 AL 2 Y A AL C N+0.00



DEMOLICIÓN CIMIENTO ENTERRADO Y EXCAVACIÓN PARA CICLOPEO DE CERRAMIENTO EJES 5 AL 6 Y A AL B N-3.30



FUNDIDA DE CONCRETO 4000 PSI PARA ZARPA MURO 3A, FUNDIDA DE CONCRETO CICLOPEO CERRAMIENTO, ESTUCO Y PINTURA EJES 5 AL 6 Y A0 AL C N-3.30

ELABORO: _____
ING. JAVIER ESCOBAR PINTOR
AUXILIAR DE INGENIERIA - CONTRATISTA

APROBO _____
ING CAMILO ROMERO
RESIDENTE DE OBRA CONTRATISTA

GGI Ingeniería	INFORME DIARIO DE ACTIVIDADES	Fecha:01/06/2019
	EJECUCIÓN DE OBRA	Código: F-OBR-024
		Versión: 1
		Hoja No.: 1 de 1

No DE CONTRATO DE OBRA Y OBJETO	CONTRATO DE OBRA PUBLICA No 470 DE 2019 SUSCRITO ENTRE EL CONSEJO CAPITAL - UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL CUERPO DE BOMBEROS Y GRUPO BACHILLERES LTDA	CONSECUTIVO	572
LUGAR o ESPECIALIDAD DE LA(S) TAREA(S)	OBRA	FECHA	martes 23 de febrero de 2021

HORAS EFECTIVAS	PRODUCCIÓN	POR PAGAR		OTROS	TOTALES
Horas Hombre					0.0
Hora Equipo					0.0

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD FUNCIONAL	UNID.	CANTIDAD			
				CONTRACTUAL	ACUMULADO ANTERIOR	AVANCE HOY	ACUMULADO ACTUAL
2,3	DEMOLICIÓN DE CIMIENTO ENTERRADO INCLUYE RETIRO	N-3.30	M3	18.37	32.35	1.90	34.25
3,2	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMUN H= < 2.00 M. INCLUYE RETIRO	N-3.30	M3	343.95	501.35	0.68	502.02
4,4	VIGA DE CIMENTACION EN CONCRETO 4000 PSI. NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO	N-3.30	M3	109.89	62.40	0.66	63.06
4,9	PLACA DE CONTRAPISO E= 0.20 M. EN CONCRETO DE 4000 PSI. FORMALETA METALICA NO INCLUYE	N+0.00	M2	866.96	430.50	69.80	900.30
4,12	ACERO FIGURADO 60000 PSI	N+0.00	KG	60921.33	85298.75	2150.00	87948.75
5,9	CONCRETO DE 4000 PSI PARA MURO DE CONTENCION DE 0.20 M. NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO	N+0.00	M3	143.04	181.50	1.69	183.19
6,1	MURO EN BLOQUE Nº 4 E=0.09 M.	N+9.90	M2	2222.99	2931.58	14.40	2945.98
6,3	MURO EN LADRILLO A LA VISTA GRAN FORMATO COLOR AMARILLO 11.5 CM.	N+6.60	M2	581.49	1047.10	8.40	1055.50
6,10	ALFAGIAS EN CONCRETO A LA VISTA 3000 PSI, A= 0.20 E=0.07 INC. 2 DIAM. P.E.H. 3/8"	N+3.30	ML	244.34	271.77	9.27	281.04
6,11	DOVELAS PARA MAMPOSTERIA INCLUYE ACERO DE REFUERZO 1+4.	N+6.60	ML	840.00	2418.38	34.40	2452.78
11,3	GUARDAESCOBA EN PORCELANATO 60CM	N+6.60	ML	813.16	417.25	14.37	431.62
11,6	ENCHAPE PISO PARA BAÑO EN PORCELANATO DE 28 X 56 CM.	N+0.00	M2	204.89	112.93	6.16	119.09
11,7	ENCHAPE PARED EN PORCELANATO DE 40 X 40 CM. COLOR BLANCO.	N+0.00	M2	545.32	588.50	8.25	596.75
11,8	ACABADO PARA PISO CON ENDURECIDO TIPO SIKAFOOR 3 QUARTZ TOP COLOR O SIMILAR.	N+0.00	M2	2232.44	2557.21	69.80	2627.01
11,9	ACABADO PARA PISO CON ENDURECIDO TIPO SIKAFOOR 3 QUARTZ TOP COLOR O SIMILAR. (LINEAL)	N+3.30	ML	342.00	695.41	9.27	704.68
11,11	ENCHAPE PARED EN PORCELANATO DE 40 X 40 CM. COLOR BLANCO. (LINEAL)	N+0.00	ML	62.00	62.00	5.00	67.00
13,2	CIELO RASO PLANO EN SUPERBOARD 6 MM. INCLUYE DILATACIÓN PLASTICA Y PINTURA (LINEAL)	N+6.60	ML	64.01	176.51	10.40	186.91
16,2	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE MORTERO DE PROTECCION CONTRA FUEGO E= 0.025 MM. PARA 2	N+13.20	M2	233.33	221.28	12.30	233.58
18,1	ESTAMPADO COLOR A CONCRETO PLACA DE CONTRAPISO	N+0.00	M2	721.56	261.20	69.80	331.00
19,3	CONCRETO CICLOPEO (DE 0.30 X 0.50 M.	N-3.30	M3	65.20	39.46	2.00	41.46
28,3,1	TUBERIA ACERO NEGRO 2 1/2" CALIBRE 10	N+3.30	ML	42.93	44.30	5.20	49.50
28,3,18	COUPLING 2.1/2"	N+3.30	UN	58.00	33.00	15.00	48.00

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES EJECUTADAS

ALFAJIA EN CONCRETO CON ACABADO ENDURECIDO N+3.30, ENCHAPE MURO CON ENCHAPE LINEAL, ENCHAPE PISO ZONA LAVANDERIA N+0.00 EJES 1 AL 3 Y A AL B, FUNDIDA DE CONCRETO 4000 PSI PARA MURO DE CONTENCIÓN 3A Y VIGA CERRAMIENTO, FUNDIDA DE CICLOPEO PARA CERRAMIENTO EJES 5 AL 6 Y A AL C NIVEL N-3.30, MAMPOSTERÍA EN LADRILLO ARENA, TERINACIÓN GUARDAESCOBA Y CIELO RASO LINEAL EN PUERTAS EJES 1 AL 2 Y B AL D EN NIVEL N+6.60, ARMADO DE ACERO PLACA N+0.00, FUNDIDA DE CONCRETO 4000 PSI PLACA 0.2m CON ACABADO ENDURECIDO Y TERMINACION EN ESTAMPADO EJES 1 AL 1A Y C AL D EN NIVEL N+0.00, MAMPOSTERÍA EN BLOQUE # 4 N+9.90, APLICACIÓN MORTERO CONTRA FUEGO N+13.20, INSTALACIÓN TUBERIA RCI N+3.30, DEMOLICIÓN CIMIENTO ENTERRADO Y EXCAVACIÓN PARA CICLOPEO DE CERRAMIENTO EJES 5 AL 6 Y A AL B N-3.30.

MANO DE OBRA DIRECTA	HORA		CANT.	TIEMPO (Horas)
CARGO	INICIO	FIN		
Ing. Residente Obra	8:00:00	18:00:00	2	20:00:00
Ing. Residente	9:00:00	17:00:00	1	10:00:00
Ing. Especialista Civil	8:00:00	19:00:00	1	11:00:00
Inspector Obra	8:00:00	19:00:00	1	11:00:00
Profesional Gerente	8:00:00	17:00:00	1	9:00:00
Almacenista	8:00:00	17:00:00	1	9:00:00
Maestro, oficial Obra	8:00:00	17:00:00	1	9:00:00
Maestro, oficial Obra	8:00:00	17:00:00	2	18:00:00
Personal Enterrado	8:00:00	17:00:00	2	18:00:00
Ayudantes	8:00:00	17:00:00	2	18:00:00
Ayudantes	8:00:00	17:00:00	17	153:00:00
Ayudantes	8:00:00	17:00:00	12	108:00:00
Ambulancias de Urgencia (EU)	08:00:00	08:00:00	0	0:00:00
Veterinaria, Trab. Soc., Ing.residente, Ing.Sst	8:00:00	12:00:00	1	4:00:00
Peluquer, maquillador(a)	7:00:00	15:00:00	3	24:00:00
Portero(a) Bachilleres	8:00:00	16:00:00	3	24:00:00
Personal de Limpieza	8:00:00	15:00:00	4	28:00:00
Personal Técnico carpa Salud	8:00:00	13:00:00	3	15:00:00

EQUIPO UTILIZADO		
DESCRIPCIÓN	CANT.	TIEMPO (Horas)
ANDAMIO DE 4 CUE	1	10:00:00

MATERIALES UTILIZADOS		
DESCRIPCIÓN	UNID.	CANT.
BLOQUE # 4	UN	1000
LADRILLO GRAN FORMATO COLOR AMARILLO	UN	1000
CONCRETO 4000 PSI	M3	15.5


ESTADO DEL TIEMPO		HORAS
SOL	X	8.0
NUBLADO		
LLUVIOSO		
LLUVIA TORRENCIAL		
NIEBLA		

ACCIDENTE	
MORTAL	
INCAPACITANTE	
GRAVE	
LEVE	

TIEMPOS			
HORAS EXTRAS		NORMAL	X
HORAS NOCTURNAS		DOMINICAL	

CAUSA ATRIBUIDA - MEDIDA CORRECTIVA:

ESQUEMÁTICO DE OBRA

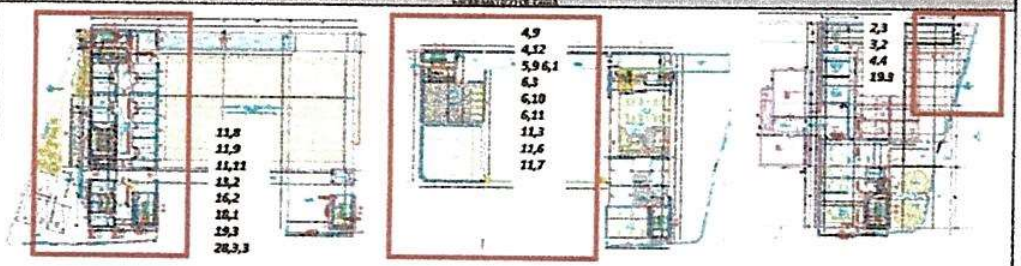

OBSERVACIONES:

FIRMA:		FIRMA:	
NOMBRE:		NOMBRE:	
CARGO:		CARGO:	
FIRMA:		FIRMA:	
NOMBRE:		NOMBRE:	
EMPRESA:		EMPRESA:	

G-G Ingenieros Ltda	INFORME DIARIO DE ACTIVIDADES	Fecha:01/06/2019
	EJECUCIÓN DE OBRA	Código: F-OBR-024
		Versión: 1
		Hoja No.: 1 de 1

No DE CONTRATO Y OBJETO	CONTRATO DE OBRA PUBLICA No 470 DE 2018 SUSCRITO ENTRE EL DISTRITO CAPITAL - UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL CUERPO DE BOMBEROS Y GYG INGENIEROS LTDA	CONSECUTIVO	572
LUGAR o ESPECIALIDAD DE LOS TRABAJOS	OBRA	FECHA	martes 23 de febrero de 2021

INFORME DIARIO No. 572 | Página 2 de 2


REGISTRO FOTOGRÁFICO




ALFAJIA EN CONCRETO CON ACABADO ENDURECIDO N+3.30, ENCHAPE MURO CON ENCHAPE LINEAL, ENCHAPE PISO ZONA LAVANDERIA N+0.00 EJES 1 AL 3 Y A AL B



FUNDIDA DE CONCRETO 4000 PSI PARA MURO DE CONTENCIÓN 3A Y VIGA CERRAMIENTO, FUNDIDA DE CICLOPEO PARA CERRAMIENTO EJES 5 AL 6 Y A AL C NIVEL N-3.30

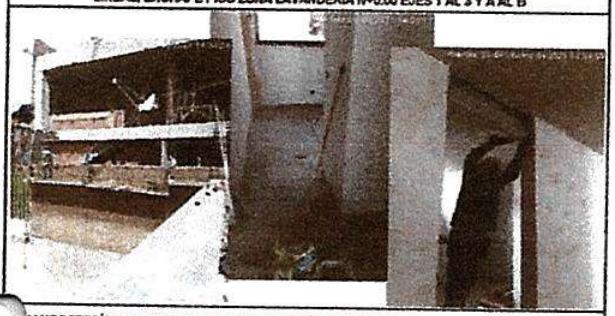


MAMPOSTERÍA EN LADRILLO ARENA, TERINACIÓN GUAROAESCOBA Y CIELO RASO LINEAL EN PUERTAS EJES 1 AL 2 Y B AL D EN NIVEL N+6.60

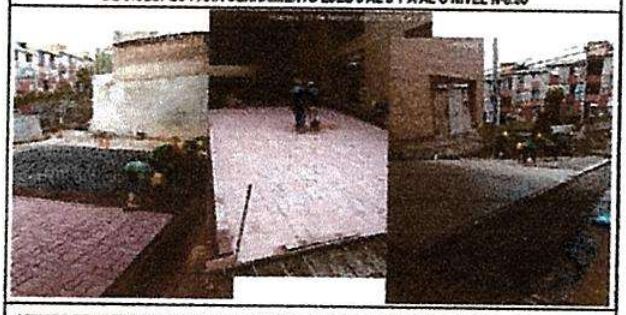

ARMADO DE ACERO PLACA N+0.00, FUNDIDA DE CONCRETO 4000 PSI PLACA 0.2m CON ACABADO ENDURECIDO Y TERMINACIÓN EN ESTAMPADO EJES 1 AL 1A Y C AL D EN NIVEL N+0.00



MAMPOSTERÍA EN BLOQUE # 4 N+9.90, APLICACIÓN MORTERO CONTRA FUEGO N+13.20, INSTALACIÓN TUBERIA RCI N+3.30

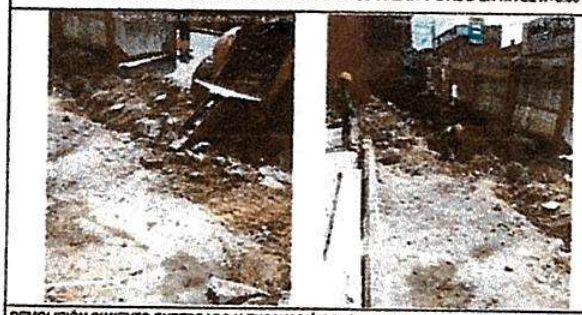

DEMOLICIÓN CIMIENTO ENTERRADO Y EXCAVACIÓN PARA CICLOPEO DE CERRAMIENTO EJES 5 AL 6 Y A AL B N-3.30

ELABORO:

ING. JAVIER ESCOBAR PINTOR
AUXILIAR DE INGENIERIA - CONTRATISTA

APROBO:

ING CAMILO ROMERO
RESIDENTE DE OBRA CONTRATISTA

GG Ingeniería Ltda	INFORME DIARIO DE ACTIVIDADES	Fecha:01/06/2019
		Código: F-OBR-024
	EJECUCIÓN DE OBRA	Versión: 1
		Hoja No.: 1 de 1

No DE CONTRATO DE OBRA Y OBJETO	CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No 405 DE 2020 SUSCRITO ENTRE EL DISTRITO CAPITAL - UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL CUERPO DE BOMBEROS Y GHS INGENIEROS LTDA	CONSECUTIVO	573
LUGAR o ESPECIALIDAD DE LOS TRABAJOS	OBRA	FECHA	miércoles 24 de febrero de 2021

HORAS PERDIDAS	POR CLIMA	POR PAROS		OTROS	TOTALES
Nivel Hombre					0.0
Nivel Equipo					0.0

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD FUNCIONAL	UND.	CANTIDAD			
				CONTRACTUAL	ACUMULADO ANTERIOR	AVANCE HOY	ACUMULADO ACTUAL
4,4	VIGA DE CIMENTACIÓN EN CONCRETO 4000 PSI. NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO	N-3.30	M3	109.89	63.06	0.81	63.87
4,9	PLACA DE CONTRAPISO E= 0.20 M. EN CONCRETO DE 4000 PSI. FORMALETA METALICA NO INCLUYE	N+0.00	M2	866.96	500.30	75.80	576.10
4,12	ACERO FIGURADO 60000 PSI	N+0.00	KG	60921.33	87948.75	2150.00	90098.75
5,9	CONCRETO DE 4000 PSI PARA MURO DE CONTENCION DE 0.20 M. NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO	N-3.30	M3	143.04	183.18	1.18	184.36
6,5	ENCHAPE EN FACHALETA LADRILLO A LA VISTA GRAN FORMATO COLOR AMARILLO. H< 0.60 M.	N+3.30	ML	618.36	441.44	8.91	450.35
7,1	PAÑETE LISO MUROS 1:4, E=1.5 CM	N+3.30	M2	2786.25	2835.27	10.34	2845.61
11,1	AFINADO DE PISO EN MORTERO 1:4 E=0.04 M.	N+0.00	M2	1381.63	1851.40	15.54	1866.94
11,3	GUARDAESCOBA EN PORCELANATO 60CM	N+6.60	ML	813.16	431.62	13.00	444.62
11,5	MESON EN CONCRETO CON ACABADO EN GRANITO PULIDO	N+0.00	M2	19.85	18.74	2.15	20.89
11,8	ACABADO PARA PISO CON ENDURECIDO TIPO SIKAFLOOR 3 QUARTZ TOP COLOR O SIMILAR	N+0.00	M2	2232.44	2627.01	75.80	2702.81
13,1	CIELO RASO PLANO EN SUPERBOARD O MRL INCLUYE DRATACIÓN PLASTICA Y PINTURA	N+6.60	M2	1437.30	927.62	3.50	931.12
14,2	ESTUCO Y VINILO TIPO I BLANCO PARA INTERIORES SOBRE PAÑETE 3 MANOS. INCLUYE FILOS Y	N-3.30	ML	215.75	133.78	11.84	145.62
16,1	ESTAMPADO COLOR A CONCRETO PLACA DE CONTRAPISO	N+0.00	M2	721.56	331.00	75.80	406.80
28,3,2	TUBERIA ACERO NEGRO 3" CALIBRE 10	N+3.30	ML	85.65	81.00	6.00	87.00
28,3,6	ACCESORIOS ACERO NEGRO 3" CALIBRE 40	N+3.30	UN	32.00	41.00	5.00	46.00
28,3,10	SOPORTE TIPO PERA 3"	N+3.30	UN	41.00	14.00	4.00	18.00
28,3,17	COUPLING 3"	N+3.30	UN	53.00	52.00	3.00	56.00

DESCRIPCION DE ACTIVIDADES EJECUTADAS

TERMINACIÓN DE MESONES BAÑOS, AFINADO DE PISO ZONA BAÑOS DESINFECCIÓN EJES 1 AL 2 Y A AL B EN NIVEL N+0.00, ARMADO DE ACERO PLACA N+0.00, FUNDIDA DE CONCRETO 4000 PSI PLACA 0.2m CON ACABADO ENDURECIDO Y TERMINACIÓN EN ESTAMPADO EJES 1 AL 1A Y C AL D EN NIVEL N+0.00, TERMINACIÓN EN GUARDAESCOBA, INSTALACIÓN LÁMINAS DE CIELO RASO Y TUBERIA RCI EJES 1 AL 2 Y A AL B EN NIVEL N+6.60, ARMADO DE ACERO VIGA CERRAMIENTO, FUNDIDA DE CONCRETO 4000 PSI PARA EL MURO DE CONTENCIÓN 3A Y VIGA CERRAMIENTO, ESTUCO Y PINTURA LINEAL EN N-3.30 EJES 5 AL 6 Y A0 AL D, PAÑETE LISO N+3.30 Y MAMPOSTERÍA EN LADRILLO ARENA N+6.60 ENTRE LOS EJES 1 AL 2 Y B AL D, MAMPOSTERÍA EN LADRILLO ARENA CON TERMINACIÓN EN FACHALETA N+3.30 EJES 1 AL 2 Y A AL B.

MANO DE OBRA EMPLEADA

CARGO	HORA		CANT.	TIEMPO (Horas)
	INICIO	FIN		
Arq. Residente, Arq ssc	8:00:00	18:00:00	2	20:00:00
Ing. Residente	8:00:00	18:00:00	1	10:00:00
Aux. Ingeniera civil	8:00:00	18:00:00	1	10:00:00
Ing. Profesional SST	8:00:00	18:00:00	1	10:00:00
Profesional Calidad	8:00:00	18:00:00	1	10:00:00
Almacenista	8:00:00	18:00:00	1	10:00:00
Maestro, conductor Fisr	8:00:00	18:00:00	2	20:00:00
Personal Estampado	8:00:00	18:00:00	3	30:00:00
Oficiales	8:00:00	18:00:00	17	170:00:00
Ayudantes	8:00:00	18:00:00	18	180:00:00
Profesionales de topografia GHS	18:00:00	18:00:00	0	0:00:00
Interventoria Ing SST, ing residente, arq ssc	8:00:00	18:00:00	2	20:00:00
Personal Mamposteria	8:00:00	18:00:00	3	30:00:00
Personal Electrico	8:00:00	18:00:00	1	10:00:00
Personal De urbanismo	8:00:00	18:00:00	4	40:00:00
Personal mortero contra fuego	8:00:00	18:00:00	1	10:00:00
Personal Carpinteria Metalica vidrios	8:00:00	18:00:00	1	10:00:00

EQUIPO UTILIZADO

DESCRIPCIÓN	CANT.	TIEMPO (Horas)
MINICARGADOR SA220	1	10:00:00

MATERIALES UTILIZADOS

DESCRIPCIÓN	UND.	CANT.
CONCRETO 4000 PSI	m3	18.6

ESTADO DEL TIEMPO

SECO	X	HORAS	8.0
NEBLINA			
LLOVIZNA			
LLUVIA			
TORMENTA			

ACCESO


BUENO	
REGULAR	
MALO	
NULO	

TERRENO

ADECUADO		DURO		NORMAL	
ARENOSO		LODOSO		PANTANO	X

CAUSA ATRASO/DIA - MEDIDA CORRECTIVA:

ESQUEMÁTICO DE OBRA

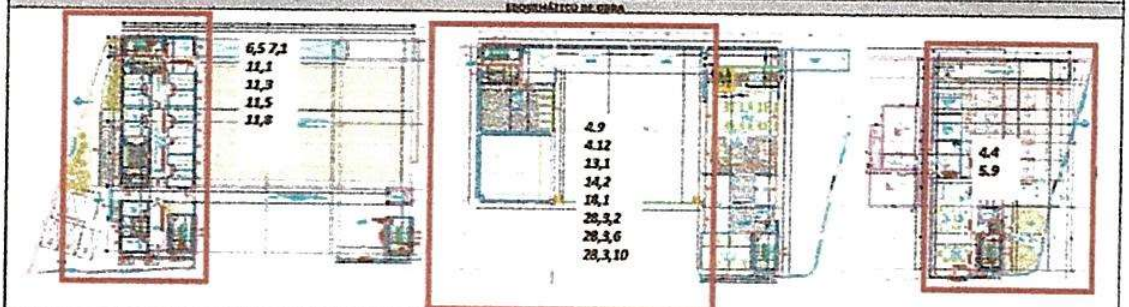

OBSERVACIONES:


FIRMA:		FIRMA:	
NOMBRE: ING. JAVIER ANDRES CASTELLANOS MARTIN		NOMBRE: ING. MARCELO SARMIENTO	
CARGO: AUXILIAR DE INGENIERIA CONTRATISTA		CARGO: RESIDENTE DE OBRA CONTRATISTA	
FIRMA:		FIRMA:	
NOMBRE:		NOMBRE:	
CARGO:		CARGO:	

G-G Ingenieros Ltda	INFORME DIARIO DE ACTIVIDADES	Fecha:01/06/2019
		Código: F-OBR-024
	EJECUCIÓN DE OBRA	Versión: 1
		Hoja No.: 1 de 1


No DE CONTRATO Y OBJETO	CONTRATO DE OBRA PUBLICA No 470 DE 2018 SUSCRITO ENTRE EL DISTRITO CAPITAL - UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL CUERPO DE BOMBEROS Y GYG INGENIEROS LTDA	CONSECUTIVO	573
LUGAR o ESPECIALIDAD DE LOS TRABAJOS	OBRA	FECHA	miércoles 24 de febrero de 2021

INFORME DIARIO No. 573 | Página 2 de 2

REGISTRO FOTOGRÁFICO

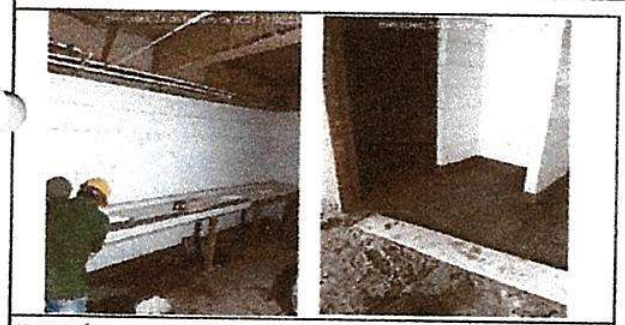

TERMINACIÓN DE MESONES BAÑOS, AFINADO DE PISO ZONA BAÑOS DESINFECCIÓN EJES 1 AL 2 Y A AL B EN NIVEL N+0.00

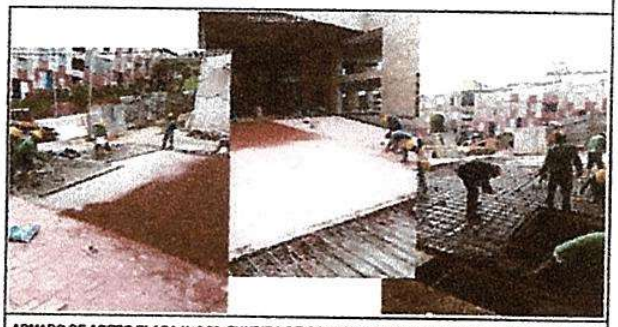

ARMADO DE ACERO PLACA N+0.00, FUNDIDA DE CONCRETO 4000 PSI PLACA 0.2m CON ACABADO ENDURECIDO Y TERMINACIÓN EN ESTAMPADO EJES 1 AL 1A Y C AL D EN NIVEL N+0.00



TERMINACIÓN EN GUARDAESCOBA, INSTALACIÓN LÁMINAS DE CIELO RASO Y TUBERIA RCI EJES 1 AL 2 Y A AL B EN NIVEL N+6.60



ARMADO DE ACERO VIGA CERRAMIENTO, FUNDIDA DE CONCRETO 4000 PSI PARA EL MURO DE CONTENCIÓN 3A Y VIGA CERRAMIENTO, ESTUCO Y PINTURA LINEAL EN N-3.30 EJES 5 AL 6 Y A0 AL D



PAÑETE LISO N+3.30 Y MAMPOSTERÍA EN LADRILLO ARENA N+6.60 ENTRE LOS EJES 1 AL 2 Y B AL D



MAMPOSTERÍA EN LADRILLO ARENA CON TERMINACION EN FACHALETA N+3.30 EJES 1 AL 2 Y A AL B

ELABORO

ING. JAVIER ESCOBAR PINTOR
AUXILIAR DE INGENIERIA - CONTRATISTA

APROBO

ING CAMILO ROMERO
RESIDENTE DE OBRA CONTRATISTA

GG Ingeniería Ltda	INFORME DIARIO DE ACTIVIDADES	Fecha:01/06/2019
		Código: F-OBR-024
	EJECUCIÓN DE OBRA	Versión: 1
		Hoja No.: 1 de 1

No DE CONTRATO DE OBRA Y OBJETO	CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No 470 DE 2018 SUSCRITO ENTRE EL DISTRITO CAPITAL - UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL CUERPO DE BOMBEROS Y GYG INGENIEROS LTDA	CONSECUTIVO	574
LUGAR O ESPECIALIDAD DE LOS TRABAJOS	OBRA	FECHA	Jueves 25 de febrero de 2021

HORAS PERDIDAS	POR LLUVIA	POR PAROS		OTROS	TOTALES
Horas Hombre	2				2.0
Horas Equipo	2				2.0

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD FUNCIONAL	UND.	CANTIDAD			
				CONTRACTUAL	ACUMULADO ANTERIOR	AVANCE HOY	ACUMULADO ACTUAL
4,9	PLACA DE CONTRAPISO E= 0.20 M. EN CONCRETO DE 4000 PSI. FORMALETA METALICA NO INCLUYE	N+0.00	M2	866.96	576.10	73.70	649.80
4.12	ACERO FIGURADO 60000 PSI	N-3.30	KG	60921.33	90098.75	350.00	90448.75
6,2	ANCLAJE BARRA 1/2" L=40CM INCLUYE EPOXICO	N+6.60	UN	600.00	3596.00	10.00	3606.00
6,3	MURO EN LADRILLO A LA VISTA GRAN FORMATO COLOR AMARILLO 11.5 CM	N+3.30	M2	581.49	1055.50	3.22	1058.72
6,6	COLUMNETA DE CONFINAMIENTO DE 0.095 X 0.21 M. EN CONCRETO DE 3000 PSI. REFUERZO= 4 D=3/8" ESTRIBO 1/4" CADA 0.14 M.	N+6.60	ML	758.80	1707.85	15.00	1722.85
6,9	VIGUETA DE CONFINAMIENTO DE 0.095 X 0.21 M. EN CONCRETO DE 3000 PSI. REFUERZO= 4 D=3/8" ESTRIBO 1/4" CADA 0.14 M.	N+6.60	ML	677.72	1043.05	12.68	1055.73
7,1	PAÑETE LISO MUROS 1:4, E=1.5 CM	N+3.30	M2	2786.23	2845.61	10.34	2855.95
9,1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANA FIJA TERNO ACÚSTICA TIPO PROYECTANTE, PERFILES EN VACÍOS INYECTADOS CON POLIURETANO, CON VIDRIO	N+3.30	M2	240.82	23.95	44.00	67.95
11,3	GUARDAESCOBA EN PORCELANATO 60CM	N+6.60	ML	813.16	444.62	13.87	458.49
11,5	MESON EN CONCRETO CON ACABADO EN GRANITO PULIDO	N+6.60	M2	19.85	20.89	1.06	21.95
11,6	ENCHAPE PISO PARA BAÑO EN PORCELANATO DE 28 X 56 CM.	N+0.00	M2	204.89	119.09	6.00	125.09
11,7	ENCHAPE PARED EN PORCELANATO DE 40 X 40 CM. COLOR BLANCO	N+6.60	M2	545.32	596.75	7.75	604.50
11,8	ACABADO PARA PISO CON ENDURECIDO TIPO SIKAFLOOR 3 QUARTZ TOP COLOR O SIMILAR	N+0.00	M2	2232.44	2702.81	73.70	2776.51
18,1	ESTAMPADO COLOR A CONCRETO PLACA DE CONTRAPISO	N+0.00	M2	721.56	406.00	73.70	480.50

DESCRIPCION DE ACTIVIDADES EJECUTADAS

PAÑETE LISO N+3.30 Y TERMINACIÓN GUARDAESCOBA N+6.60 EJES 1 AL 2 Y B AL D, ARMADO DE ACERO PARA LA VIGA DE CERRAMIENTO N-3.30 E INSTALACIÓN VIDRIOS EN VENTANERIA N+3.30 EJES 4 AL 6 Y A AL C, FUNDIDA DE COLUMNETAS Y VIGUETAS DE CONFINAMIENTO EJES 1 AL 2 Y A0 AL EN NIVEL N+6.60, FUNDIDA DE CONCRETO 4000 PSI PLACA 0.2m CON ACABADO ENDURECIDO Y TERMINACIÓN EN ESTAMPADO EJES 1 AL 1A Y C AL D EN NIVEL N+0.00, MAMPOSTERÍA EN LADRILLO ARENA N+3.30 Y INSTALACIÓN ENCHAPE PISO EN BAÑO N+0.00 EJES A AL B Y 1 AL 2, TERMINACIÓN FUNDIDA MESONES E INSTALACIÓN ENCHAPE BAÑOS ENTRE LOS EJES 1 AL 2 Y A AL C ENNIVEL N+6.60.

MANO DE OBRA EMPLEADA

CARGO	HORA INICIO	HORA FIN	CANT.	TIEMPO (Horas)
Arq. Residente, Arq aux	8:00:00	18:00:00	2	20:00:00
Ing. Residente	8:00:00	18:00:00	1	10:00:00
Aux. Ingeniero civil	8:00:00	18:00:00	1	10:00:00
Ing. Profesional SST	9:00:00	18:00:00	1	10:00:00
Profesional Calidad	8:00:00	18:00:00	1	10:00:00
Almacenista	8:00:00	18:00:00	1	10:00:00
Maestro, inspector Hse	8:00:00	18:00:00	2	20:00:00
Personal Entramado	8:00:00	18:00:00	4	40:00:00
Oficiales	8:00:00	18:00:00	11	110:00:00
Ayudantes	8:00:00	18:00:00	21	210:00:00
Profesionales de topografia GyG	10:00:00	16:00:00	1	6:00:00
Interventoria Ing SST, Ing residente, Ing aux	8:00:00	18:00:00	3	30:00:00
Personal Hidrosanitario	8:00:00	18:00:00	3	30:00:00
Personal Electricos	8:00:00	18:00:00	1	10:00:00
Personal De urbanismo	8:00:00	18:00:00	3	30:00:00
Personal Carpinteria Metalica varios	8:00:00	18:00:00	4	40:00:00

EQUIPO UTILIZADO

DESCRIPCIÓN	CANT.	TIEMPO (Horas)
MINICARGADOR SKIDS	1	10:00:00

MATERIALES	UNID.	CANT.
CONCRETO 3000 PSI	m3	14.0
LADRILLO SANTAFE GRAN FORMATO COLOR ARENA	UN	641
CONCRETO DE 3000 PSI	m3	1.14


ESTADO DEL TIEMPO		HORAS	ACCESO	
SECO	X	7.0	BUENO	X
NUBLADO			REGULAR	
LLUVIOSO			MALO	
LLUVIA	X	2	NULO	
TORMENTA				

TERRENO					
BOCCOC		DURO		NORMAL	X
ARENOSO		LODOSO		PANTANO	

CAUSA ATRASO/DÍA - MEDIDA CORRECTIVA:

LLUVIA DEL 12, 21 pm A 2 30 pm

FOTOGRAFÍAS DE OBRA

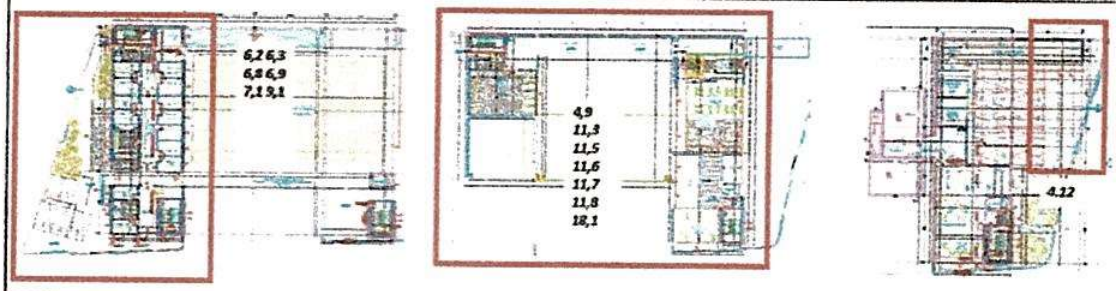

OBSERVACIONES:

FIRMA:	ELABORÓ	FIRMA:	APROBÓ
NOMBRE:	[illegible]	NOMBRE:	[illegible]
CARGO:	RESIDENTE DE OBRA CONTRATISTA	CARGO:	RESIDENTE DE OBRA CONTRATISTA
FIRMA:	REVISÓ	FIRMA:	APROBÓ
NOMBRE:	[illegible]	NOMBRE:	[illegible]
CARGO:	RESIDENTE DE OBRA CONTRATISTA	CARGO:	RESIDENTE DE INTERVENTORIA


G&G Ingenieros Ltda.	INFORME DIARIO DE ACTIVIDADES	Fecha:01/06/2019
	EJECUCIÓN DE OBRA	Código: F-OBR-024
		Versión: 1
		Hoja No.: 1 de 1

No DE CONTRATO Y OBJETO	CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No 470 DE 2018 SUSCRITO ENTRE EL DISTRITO CAPITAL - UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL CUERPO DE BOMBEROS Y GYG INGENIEROS LTDA	CONSECUTIVO	574
LUGAR o ESPECIALIDAD DE LOS TRABAJOS	OBRA	FECHA	Jueves 25 de febrero de 2021

INFORME DIARIO No. 574

Página 2 de 2


REGISTRO FOTOGRÁFICO

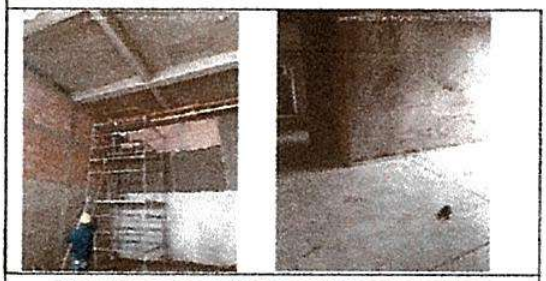

PAÑETE LISO N+3.30 Y TERMINACIÓN GUARDAESCOBA N+0.60 EJES 1 AL 2 Y B AL D



ARMADO DE ACERO PARA LA VIGA DE CERRAMIENTO N-3.30 E INSTALACIÓN VIDRIOS EN VENTANERIA N+3.30 EJES 4 AL 5 Y A AL C

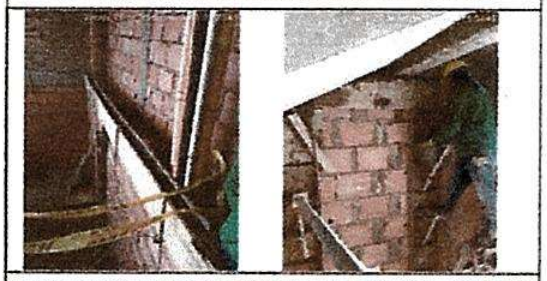


FUNDIDA DE COLUMNETAS Y VIGUETAS DE CONFINAMIENTO EJES 1 AL 2 Y A3 AL EN NIVEL N+0.60



FUNDIDA DE CONCRETO 4000 PSI PLACA 0.2m CON ACABADO ENDURECIDO Y TERMINACIÓN EN ESTAMPADO EJES 1 AL 1A Y C AL D EN NIVEL N+0.00



MAMPOSTERÍA EN LADRILLO ARENA N+3.30 Y INSTALACIÓN ENCHAPE PISO EN BAÑO N+0.00 EJES A AL B Y 1 AL 2

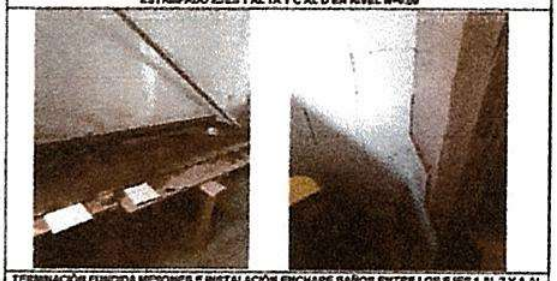

TERMINACIÓN FUNDIDA MESONES E INSTALACIÓN ENCHAPE BAÑOS ENTRE LOS EJES 1 AL 2 Y A AL C EN NIVEL N+0.60

ELABORO:

ING. JAVIER ESCOBAR PINTOR
AUXILIAR DE INGENIERIA - CONTRATISTA

APROBO:

ING CAMILO ROMERO
RESIDENTE DE OBRA CONTRATISTA

GyG Ingeniería Ltda	INFORME DIARIO DE ACTIVIDADES	Fecha:01/06/2019
		Código: F-OBR-024
	EJECUCIÓN DE OBRA	Versión: 1
		Hoja No.: 1 de 1

No DE CONTRATO DE OBRA Y OBJETO	CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No 470 DE 2018 SUSCRITO ENTRE EL DISTRITO CAPITAL - UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL CUERPO DE BOMBEROS Y GYG INGENIEROS LTDA	CONSECUTIVO	575
LUGAR o ESPECIALIDAD DE LOS TRABAJOS	OBRA	FECHA	viernes 26 de febrero de 2021

HORAS PERDIDAS	POR LLUVIA	POR FALLAS		OTROS	TOTALES
Horas Hombre					0.0
Horas Equipo					0.0

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD PERCIONAL	UNID.	CANTIDAD			
				CONTRACTUAL	ACUMULADO ANTERIOR	AVANCE HOY	ACUMULADO ACTUAL
3,2	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN H< < 2.00 M. INCLUYE RETIRO	N-3.30	M3	343.95	502.02	1.21	503.23
3,3	RELLENO EN RECEBO COMUN COMPACTADO MECANICAMENTE	N-3.30	M3	2929.95	3271.28	6.12	3277.40
4,4	VIGA DE CIMENTACION EN CONCRETO 4000 PSI. NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO	N-3.30	M3	109.59	63.87	0.36	64.23
4,12	ACERO FIGURADO 60000 PSI	N-3.30	KG	60921.33	90448.75	300.00	90748.75
6,3	MURO EN LADRILLO A LA VISTA GRAN FORMATO COLOR AMARILLO 11.5 CM	N+6.60	M2	581.49	1058.72	3.22	1061.94
6,5	ENCHAPE EN FACHALETA LADRILLO A LA VISTA GRAN FORMATO COLOR AMARILLO. H< 0.60 M.	N+6.60	ML	618.36	450.35	10.23	460.58
7,1	PAÑETE LISO MUROS 1:4, E=1.5 CM	N+9.90	M2	2786.25	2855.95	10.34	2865.29
9,1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANA FIJA TERMO ACÚSTICA TIPO PROYECTANTE, PERFILES EN	N+0.00	M2	240.82	67.95	22.75	90.70
11,6	ENCHAPE PISO PARA BAÑO EN PORCELANATO DE 28 X 56 CM.	N+0.00	M2	204.89	125.09	5.83	130.92
13,2	CIELO RASO PLANO EN SUPERBOARD 6 MM. INCLUYE DILATACIÓN PLASTICA Y PINTURA (LINEAL)	N+3.30	ML	64.01	186.91	13.69	200.60

DESCRIPCION DE ACTIVIDADES EJECUTADAS

MAMPOSTERÍA EN LADRILLO ARENA N+9.,90, TERMINACIÓN EN CIELO RASO LINEAL N+6.60 EJES 1 AL 2 Y B AL D, RELLENO EN RECEBO COMÚN CON MATERIAL RCD, ARMADO DE ACERO PARA SARDINEL EJES 5 AL 6 Y A0 AL C N-3.30, FUNDIDA DE CONCRETO PARA LA VIGA CERRAMIENTO Y EXCAVACIÓN MANUAL CAJA DE AGUAS LLUVIAS EJES 5 AL 6 Y A0 AL B EN NIVEL N-3.30, MAMPOSTERÍA EN LADRILLO ARENA CON FACHALETA, PAÑETE LISO ENTRE EJES 1 AL 2 Y A AL C NIVEL N+3.30, INSTALACIÓN VENTANERIA N+0.00 EJES 4 AL 5 Y C AL D, INSTALACIÓN DE ENCHAPE PISO EN BAÑO N+0.00 EJES 1 AL 2 Y A AL B.

MANO DE OBRA EMPLEADA

CARGO	HORA INICIO	HORA FIN	CANT.	TIEMPO (Horas)
Arq. Residente, Arq aux	8:00:00	18:00:00	2	20:00:00
Ing. Residente	8:00:00	18:00:00	1	10:00:00
Aux. Ingeniero civil	8:00:00	18:00:00	1	10:00:00
Ing. Profesional SST	8:00:00	18:00:00	1	10:00:00
Profesional Calidad	8:00:00	18:00:00	1	10:00:00
Almacenista	8:00:00	18:00:00	1	10:00:00
Maestro, conductor Mix	8:00:00	18:00:00	2	20:00:00
Personal Enterrado	8:00:00	18:00:00	0	0:00:00
Oficiales	8:00:00	18:00:00	19	190:00:00
Ayudantes	8:00:00	18:00:00	21	210:00:00
Profesionales de topografia GyG	18:00:00	18:00:00	0	0:00:00
Interventoria Ing SST, ing residente, ing aux	8:00:00	18:00:00	3	30:00:00
Personal Hidrosanitario	8:00:00	18:00:00	2	20:00:00
Personal Electrico	8:00:00	18:00:00	2	20:00:00
Personal De urbanismo	8:00:00	18:00:00	4	40:00:00
Personal Ascensor	8:00:00	18:00:00	1	10:00:00
Personal Carpintería Metálica vidrios	8:00:00	18:00:00	5	50:00:00

EQUIPO UTILIZADO

DESCRIPCIÓN	CANT.	TIEMPO (Horas)
RETROCARGADOR 580N	1	10:00:00

MATERIALES UTILIZADOS

DESCRIPCION	UNID.	CANT.
	m3	0.4
LADRILLO GRANFORMATO COLOR AMARILLO	MV	1.38

ESTADO DEL TIEMPO

		JORNAL
SECO	X	7.5
NEBLINA		
LLOVIZNA		
LLUVIA		
TORMENTA		

ACCESO


BUENO	
REGULAR	
MALO	
NULO	

TERRENO

ROCOSO		DURO		NORMAL	
ARENOSO		LODOSO		PANTANO	X

CAUSA ATRASO/DEA - MEDIDA CORRECTIVA:

CRONOGRAMA DE OBRA

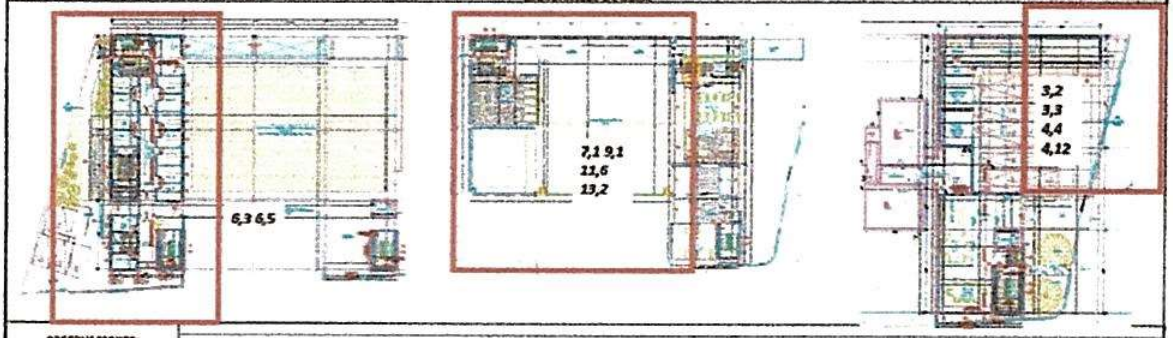

OBSERVACIONES:


ELABORÓ		APROBÓ	
FIRMA:		FIRMA:	
NOMBRE:	ING. DAVID RICARDO DE JESUS PINTO	NOMBRE:	ARQ. MARCELO SARMIENTO
CARGO:	AUXILIAR DE INGENIERIA CONTRATISTA	CARGO:	RESIDENTE DE OBRA CONTRATISTA
FIRMA:		APROBÓ FIRMA:	
NOMBRE:	ING. MANUEL ROMERO	NOMBRE:	ING. JOSE LUIS JAIME
CARGO:	RESIDENTE DE OBRA CONTRATISTA	CARGO:	RESIDENTE DE INTERVENTORIA

G-G Ingenieros Ltda.	INFORME DIARIO DE ACTIVIDADES	Fecha: 01/06/2018
		Código: F-ORP-024
	EJECUCIÓN DE OBRA	Versión: 1
		Hoja No.: 1 de 1

No DE CONTRATO Y OBJETO	CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No 479 DE 2018 SUSCRITO ENTRE EL DISTRITO CAPITAL - UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL CUERPO DE BOMBEROS Y GYG INGENIEROS LTDA	CONSECUTIVO	575
LUGAR o ESPECIALIDAD DE LOS TRABAJOS	OBRA	FECHA	viernes 26 de febrero de 2021

INFORME DIARIO No. 575

REGISTRO FOTOGRÁFICO

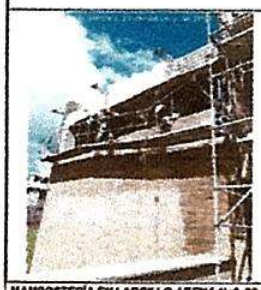


MAMPOSTERÍA EN LADRILLO ARENA N+2.90, TERMINACIÓN EN CIELO RASO LINEAL N+2.60 EJES 1 AL 2 Y B AL D




RELLENO EN RECEBO COMÚN CON MATERIAL RCD, ARMADO DE ACERO PARA SARDINEL EJES 5 AL 6 Y A0 AL C N-3.30




FUNDIDA DE CONCRETO PARA LA VIGA CERRAMIENTO Y EXCAVACIÓN MANUAL CAJA DE AGUAS LLUVIAS EJES 5 AL 6 Y A0 AL B EN NIVEL N-3.30




MAMPOSTERÍA EN LADRILLO ARENA CON FACHALETA, PAÑETE LISO ENTRE EJES 1 AL 2 Y A AL C NIVEL N+2.30




INSTALACIÓN VENTANERIA N+0.00 EJES 4 AL 5 Y C AL D



INSTALACIÓN DE ENCHAPE PISO EN BAÑO N+0.00 EJES 1 AL 2 Y A AL B

ELABORO:

ING. JAVIER ESCOBAR PINTOR
AUXILIAR DE INGENIERIA - CONTRATISTA

APROBO:

ING CAMILO ROMERO
RESIDENTE DE OBRA CONTRATISTA

G&G Ingeniería Ltda	INFORME DIARIO DE ACTIVIDADES	Fecha:01/06/2019
		Código: F-OBR-024
	EJECUCIÓN DE OBRA	Versión: 1
		Hoja No.: 1 de 1

No DE CONTRATO DE OBRA Y OBJETO	CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No 472 DE 2019 SUSCRITO ENTRE EL DISTRITO CAPITAL - UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL CUERPO DE BOMBEROS Y GYG INGENIEROS LTDA	CONSECUTIVO	576
LUGAR o ESPECIALIDAD DE LOS TRABAJOS	OBRA	FECHA	sábado 27 de febrero de 2021

HORAS PERDIDAS	POR LLUVIA	POR PAROS		OTROS	TOTALES
Horas Hombre					0.0
Horas Equipo					0.0

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD FUNCIONAL	UND.	CANTIDAD			
				CONTRACTUAL	ACUMULADO ANTERIOR	AVANCE HOY	ACUMULADO ACTUAL
3,2	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN H= < 2.00 M. INCLUYE RETIRO.	N-3.30	M3	343.95	503.23	1.09	504.32
4,12	ACERO FIGURADO 60000 PSI	N-3.30	KG	60921.33	90748.75	330.00	91078.75
6,2	ANCLAJE BARRA 1/2" L=40CM INCLUYE EPOXICO.	N+9.90	UN	600.00	3606.00	24.00	3630.00
6,3	MURO EN LADRILLO A LA VISTA GRAN FORMATO COLOR AMARILLO 11.5 CM.	N+9.90	M2	581.49	1061.94	28.00	1089.94
6,5	ENCHAPE EN FACHALETA LADRILLO A LA VISTA GRAN FORMATO COLOR AMARILLO. H< 0.60 M.	N+3.30	ML	618.36	460.58	10.68	471.26
6,11	DOVELAS PARA MAMPOSTERIA INCLUYE ACERO DE REFUERZO 1#4.	N+9.90	ML	840.00	2452.78	58.20	2510.98
NP-22	SARDINEL FUNDIDO EN SITIO EN CONCRETO PREMEZCLADO DE 3.000 PSI. SUMINISTRO Y CONSTRUCCION (Grava Común) E= 0.20m H= 0.35m	N-3.30	ML	27.00	6.10	5.50	11.60

DESCRIPCION DE ACTIVIDADES EJECUTADAS

MAMPOSTERÍA EN LADRILLO ARENA N+9.90, FACHALETA EN LADRILLO ARENA N+3.30 EJES 1 AL 2 Y A AL D, ARMADO DE ACERO Y FUNDIDA DE CONCRETO PARA LA CURVA SARDINEL ENTRE EJES 5 AL 6 Y B AL C EN NIVEL N-3.30, EXCAVACIÓN MANUAL PARA LA CAJA DE AGUAS LLUVIAS EN NIVELN N-3.30, EXCAVACIÓN MANUAL Y LIMPIEZA ZONA N+4.65 ENTRER EJES 1A AL 1 B AL D1.

MANO DE OBRA EMPLEADA

CARGO	HORA		CANT.	TIEMPO (Horas)
	INICIO	FIN		
Arq. Residente, Arq aux	8:00:00	18:00:00	2	20:00:00
Ing. Residente	8:00:00	16:00:00	1	10:00:00
Aux. Ingeniero civil	8:00:00	18:00:00	1	10:00:00
Ing. Profesional SST	8:00:00	18:00:00	1	10:00:00
Profesional Calidad	8:00:00	18:00:00	1	10:00:00
Almacenista	8:00:00	18:00:00	1	10:00:00
Maestro, conductor Mini	8:00:00	18:00:00	1	10:00:00
Personal Estampado	8:00:00	18:00:00	0	0:00:00
Oficiales	8:00:00	18:00:00	17	170:00:00
Ayudantes	8:00:00	18:00:00	20	200:00:00
Profesionales de topografia GyG	10:00:00	18:00:00	0	0:00:00
Interventoria Ing SST, ing residente, ing aux	8:00:00	18:00:00	3	30:00:00
Personal Hidrosanitario	8:00:00	18:00:00	2	20:00:00
Personal Electrico	8:00:00	18:00:00	0	0:00:00
Personal De urbanismo	8:00:00	18:00:00	4	40:00:00
Personal Ascensor	8:00:00	18:00:00	0	0:00:00

EQUIPO UTILIZADO

DESCRIPCIÓN	CANT.	TIEMPO (Horas)
MINICARGADOR SR250	0	00:00:00

MATERIALES UTILIZADOS

DESCRIPCION	UND.	CANT.
CONCRETO DE 3000 PSI	m3	2.42
LADRILLO GRAN FORMATO COLOR AMARILLO	UN	1125

ESTADO DEL TIEMPO

		HORAS
SECO	X	6.0
NEBLINA		
LLOVIZNA		
LLUVIA		
TORMENTA		

ACCESO


BUENO	
REGULAR	
MALO	
MALO	

TERRENO

ROCOSO		DURO		NORMAL	
ARENOSO		LODOSO		PANTANO	

CAUSA ATRASO/DÍA - MEDIDA CORRECTIVA:

ESQUEMÁTICO DE OBRA

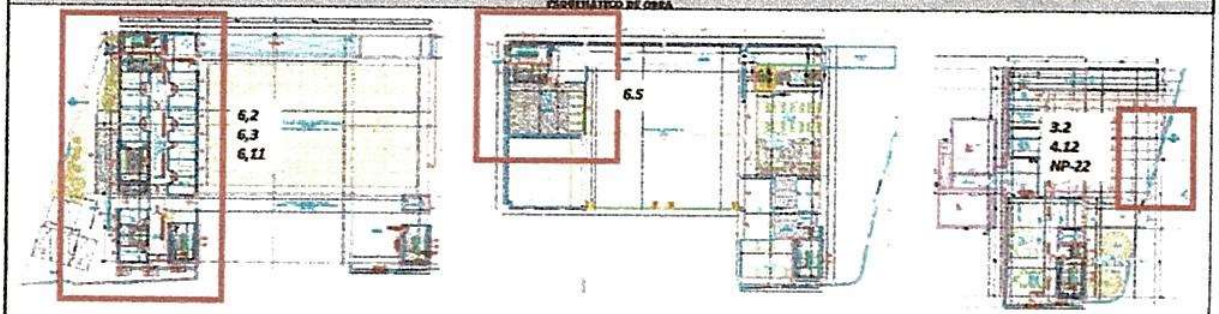

OBSERVACIONES:

ELABORÓ		APROBÓ	
FIRMA:		FIRMA:	
NOMBRE/ CARGO:	ING. JAVIER ANDRES SOLORZA FIGUEROA AUXILIAR DE INGENIERIA CONTRATISTA	NOMBRE/ CARGO:	ING. MARCELO SARMIENTO RESIDENTE DE OBRA CONTRATISTA
VIABILIZÓ		APROBÓ	
FIRMA:		FIRMA:	
NOMBRE/ CARGO:	ING. CAMILO ROMERO	NOMBRE/ CARGO:	ING. JOSE LUIS JOYO RESIDENTE DE INTERVENTORIA

GyG Ingenieros Ltda	INFORME DIARIO DE ACTIVIDADES	Fecha:01/06/2019
		Código: F-OBR-024
	EJECUCIÓN DE OBRA	Versión: 1
		Hoja No.: 1 de 1

No DE CONTRATO Y OBJETO	CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No 470 DE 2018 SUSCRITO ENTRE EL DISTRITO CAPITAL - UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL CUERPO DE BOMBEROS Y GYG INGENIEROS LTDA	CONSECUTIVO	576
LUGAR o ESPECIALIDAD DE LOS TRABAJOS	OBRA	FECHA	sábado 27 de febrero de 2021

INFORME DIARIO No. 576 | Página 2 de 2

REGISTRO FOTOGRÁFICO





MAMPOSTERÍA EN LADRILLO ARENA N+0.90, FACHALETA EN LADRILLO ARENA N+3.30 EJES 1 AL 2 Y A AL D





ARMADO DE ACERO Y FUNDIDA DE CONCRETO PARA LA CURVA BARDINEL ENTRE EJES 5 AL 6 Y B AL C EN NIVEL N-3.30



EXCAVACIÓN MANUAL PARA LA CAJA DE AGUAS LLUVIAS EN NIVELN N-3.30





EXCAVACIÓN MANUAL Y LIMPIEZA ZONA N+4.85 ENTRER EJES 1A AL 1 B AL D1

ELABORO: _____
ING JAVIER ESCOBAR PINTOR
AUXILIAR DE INGENIERIA - CONTRATISTA

APROBO: _____
ING CAMILO ROMERO
RESIDENTE DE OBRA CONTRATISTA

G&G Ingenieros Ltda	INFORME DIARIO DE ACTIVIDADES	Fecha:01/06/2019
		Código: F-OBR-024
	EJECUCIÓN DE OBRA	Versión: 1
		Hoja No.: 1 de 1

No DE CONTRATO DE OBRA Y OBJETO	CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No 470 DE 2018 SUSCRITO ENTRE EL DISTRITO CAPITAL - UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL CUERPO DE BOMBEROS Y G+G INGENIEROS LTDA	CONSECUTIVO	577
LUGAR o ESPECIALIDAD DE LOS TRABAJOS	OBRA	FECHA	domingo 28 de febrero de 2021

HORAS PERDIDAS	POR LLUVIA	POR PAROS		OTROS	TOTALES
Horas Hombre					0.0
Horas Equipo					0.0

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD FUNCIONAL	UND.	CANTIDAD			
				CONTRACTUAL	ACUMULADO ANTERIOR	AVANCE HOY	ACUMULADO ACTUAL
	DOMINGO NO TRABAJADO					-	

DESCRIPCION DE ACTIVIDADES EJECUTADAS

DOMINGO NO TRABAJADO

MANO DE OBRA EMPLEADA

CARGO	HORA		CANT.	TIEMPO (Horas)
	DIURNO	NTN		

EQUIPO UTILIZADO

DESCRIPCIÓN	CANT.	TIEMPO (Horas)

MATERIALES UTILIZADOS

DESCRIPCIÓN	UND.	CANT.
RELLENO EN MATERIAL RIO	m3	0.00
LADRILLO GRANRIOMURO COLOR ARENA	UN	0
CONCRETO DE 3000 PSI	m2	0.00
BLOQUE 6 4	UN	0

ESTADO DEL TIEMPO

		HORAS
SECO	X	7.0
SEREINA		
LLOVIZNA		
LLUVIA		
TORRENTOSA		

ACCESO

BUENO	X
REGULAR	
MALO	
NULO	

TRABAJO

ROCOSO		DURO		NORMAL	X
ARENOSO		LODOSO		PANTANO	

CAUSA ATRASO/DIA - MEDIDA CORRECTIVA:

SIEMBRÁTICO DE OBRA

OBSERVACIONES:

	ELABORÓ	AVALÓ
FIRMA:		
NOMBRE:	ING. JAVIER ANDRES CACERES PEREZ	ARQ. MARCELO SAMPAYO
CARGO:	AUXILIAR DE INGENIERIA CONTRATISTA	RESIDENTE DE OBRA CONTRATISTA
	VALIDO	AFORO
FIRMA:		
NOMBRE:	ING. CARLOS ROMERO	INGENIERO LUIS SOTO
CARGO:	RESIDENTE DE OBRA CONTRATISTA	RESIDENTE DE SUPERVISORIA

Anexo 3. Control Personal

G&G Ingenieros Ltda.	RELACIÓN DE PERSONAL	Fecha:01/06/2019
		Código: F-HSEQ-085
	HSEQ	Versión: 2
		Hoja No.: 1 de 1

FECHA DE DILIGENCIAMIENTO 28/02/2020

CONTRATO OBRA No. 470 del 2018 **CONTRATISTA** G&G INGENIEROS LTDA

OBJETO **PERIODO DEL INFORME :** 1/02/2021 AL 28/02/2021

CONSTRUCCIÓN ESTACIÓN DE BOMBEROS DE BELLAVISTA

No.	CONTRATISTA	DATOS DEL TRABAJADOR				ARL	EPS	AFP	MUNICIPIO DE OBRA DE LA LOCALIDAD (MOL)	FECHA EXAMENES		CERTIFICADO TSA
		NOMBRE DEL TRABAJADOR	CEDULA	CARGO	FECHA DE INGRESO	ARL	EPS	AFP		EXAMEN DE INGRESO	EXAMEN DE INGRESO CON ENFASIS EN ALTURAS	
PERSONAL NUEVO												
1	G&G INGENIEROS LTDA	SOTO ESPINOZA LUIS MARIO	1.019.101.556	AYUDANTE GRANITERO	03/02/2021	COLMENA	SALUD TOTAL	PROTECCION		02/02/2021	—	—
2	G&G INGENIEROS LTDA	REYES CRISTIAN	1049609302	OFICIAL DE DRYWALL	09/02/2021	COLMENA	FAMISANAR	PROTECCION		01/09/2020	01/09/2020	16/11/2020
3	G&G INGENIEROS LTDA	BOHORQUEZ DIEGO ANDRES	1.014.180.388	OFICIAL DE DRYWALL	09/02/2021	COLMENA	SANITAS	PORVENIR		05/02/2021	05/02/2021	RESTRICCIÓN
4	G&G INGENIEROS LTDA	MENDOZA JAVIER	1.049.602.705	OFICIAL DE DRYWALL	09/02/2021	COLMENA	SALUD TOTAL	COLFONDOS		05/02/2021	05/02/2021	09/03/2021
5	G&G INGENIEROS LTDA	GUTIERREZ ESCOBAR WINTER YAMID	1.019.045.715	AYUDANTE DE DRYWALL	11/02/2021	COLMENA	COMPENSAR	COLFONDOS		10/02/2021	10/02/2021	06/12/2020
6	G&G INGENIEROS LTDA	BOTACHE RAYO CRISTIAN JUAN CARLOS	1.006.089.104	AYUDANTE DE DRYWALL	12/02/2021	COLMENA	FAMISANAR	PROTECCION		11/02/2021	11/02/2021	11/02/2020
7	G&G INGENIEROS LTDA	TINJACA CRISTIAN DAVID	1.019.106.992	OFICIAL DRYWOLL	15/02/2021	COLMENA	COMPENSAR	PORVENIR		24/08/2020	24/08/2020	27/08/2020
8	G&G INGENIEROS LTDA	SANABRIA ALFARO KEVIN ALEXANDER	1.019.112.383	AYUDANTE DE DRYWALL	16/02/2021	COLMENA	SALUD TOTAL	PORVENIR		13/02/2021	—	—
9	G&G INGENIEROS LTDA	YUNDA YUNDA PATRICIO	1.003.037.382	AYUDANTE BRIGADA	16/02/2021	COLMENA	SALUD TOTAL	PROTECCION	MOL	13/02/2021	—	—
10	G&G INGENIEROS LTDA	ORTIZ ORTIZ MIGUEL ANGEL	1.031.159.903	AYUDANTE URBANISMO	18/02/2021	COLMENA	SANITAS	PORVENIR		17/02/2021	17/02/2021	21/01/2021
11	M&M INSTALACION DE CUBIERTA	OSNAIDER PEÑA	1079885400	INSTALADOR JEFE	01/02/2021	POSITIVA	SANITAS	PROTECCION		18/01/2021	18/01/2021	13/02/2020
12	M&M INSTALACION DE CUBIERTA	HERNAN BARRIOS	1.079.884.516	INSTALADOR	01/02/2021	POSITIVA	FAMISANAR	PORVENIR		10/11/2020	10/11/2020	21/01/2021
13	M&M INSTALACION DE CUBIERTA	GREGORIO CARDONA	8537396	INSTALADOR	01/02/2021	POSITIVA	NUEVA EPS	COLPENSIONES		16/01/2021	16/01/2021	13/02/2020
14	M&M INSTALACION DE CUBIERTA	YANCARLOS VELAZQUEZ	1.014.264.445	INSTALADOR	01/02/2021	POSITIVA	ASOCIACIÓN MUTUAL SER	PORVENIR		16/01/2021	16/01/2021	13/02/2020
15	M&M INSTALACION DE CUBIERTA	JAVIER MEJIA RICCI	72.174.395	DIRECTOR DE PROYECTO	01/02/2021	POSITIVA	COMPENSAR	PORVENIR		03/03/2020	03/03/2020	13/02/2020
16	M&M INSTALACION DE CUBIERTA	DONALDO CORDOBA	1.121.327.212	INSPECTOR TSS	01/02/2021	POSITIVA	FAMISANAR	PORVENIR		03/08/2020	03/08/2020	15/12/2020
17	FIRA INGENIERIA SAS	ROSSO NAFER LUIS	79.034.026	AYUDANTE DE PLOMERIA	02/02/1900	BOLIVAR	COMPARTA	COLFONDOS		04/09/2020	04/09/2020	07/12/2020
18	FIRA INGENIERIA SAS	QUITIAN QUITIAN MISAEL	5.658.675	AYUDANTE DE PLOMERIA	04/02/2021	BOLIVAR	NUEVA EPS	COLPENSIONES		22/05/2020	22/05/2020	06/09/2020
19	ASCENSORES SCHINDLER	COGUA AVILA DIEGO FERNEY	1.022.341.303	TECNICO INSTALADOR	09/02/2021	COLMENA	FAMISANAR	PROTECCIÓN		26/05/2020	26/05/2020	21/11/2020
20	IMC LTDA	SANTAMARIA DUARTE YOLANDA	52.871.034	COOD. PROYECTOS	16/02/2021	POSITIVA	COMPENSAR	PORVENIR		30/01/2021	30/01/2021	02/02/2021
21	IMC LTDA	DIAZ H. MIGUEL	1.055.228.496	OFICIAL INSTALADOR	16/02/2021	POSITIVA	COMPENSAR	PORVENIR		24/02/2020	24/02/2020	26/02/2020
22	IMC LTDA	RINCON RIVERA JAVIER EDUARDO	79.912.818	OFICIAL INSTALADOR	16/02/2021	POSITIVA	FAMISANAR	PORVENIR		30/01/2021	30/01/2021	02/02/2021
23	IMC LTDA	DIAZ MALDONADO JORGE ANDRES	1.055.227.823	OFICIAL INSTALADOR	16/02/2021	POSITIVA	FAMISANAR	PORVENIR		24/02/2020	24/02/2020	26/02/2020
24	IMC LTDA	AMAYA R. PEDRO NEL	80.037.189	OFICIAL INSTALADOR	16/02/2021	POSITIVA	SANITAS	COLFONDOS		24/02/2020	24/02/2020	25/02/2020
25	IMC LTDA	CASTELBLANCO LUIS ANGEL	80165886	GERENTE GENERAL	17/02/2021	POSITIVA	COMPENSAR	PROTECCIÓN		30/01/2021	30/01/2021	02/02/2021
26	IMC LTDA	MONROY C. EDUWIN GIOVANNI	80020635	OFICIAL INSTALADOR	19/02/2020	POSITIVA	COMPENSAR	COLFONDOS		30/01/2021	30/01/2021	02/02/2021
27	CASTILLO PISOS SAS - ESTAMPADO DECORCONCRETOS	MENDOZA SABOGAL ANDERSON	1.023.865.702	OFICIAL ESTAMPADOR	22/02/2021	SURA	SANITAS	PORVENIR		12/10/2019	N/A	N/A
28	CASTILLO PISOS SAS - ESTAMPADO DECORCONCRETOS	SABOGAL YOVANY	79.214.338	AYUDANTE ESTAMPADOR	22/10/2020	SURA	SALUD TOTAL	COLDONDOS		21/07/2020	N/A	N/A
29	CASTILLO PISOS SAS - ESTAMPADO DECORCONCRETOS	CASTILLO BARRERA WILSON ORLANDO	79.870.655	OFICIAL ESTAMPADOR	25/02/2021	SURA	FAMISANAR	COLFONDOS		24/08/2020	N/A	N/A

No.	CONTRATISTA	DATOS DEL TRABAJADOR				ARL	EPS	AFP	MANO DE OBRA DE LA LOCALIDAD (MOL)	FECHA EXAMENES		CERTIFICADO TSA
		NOMBRE DEL TRABAJADOR	CEDULA	CARGO	FECHA DE INGRESO	ARL	EPS	AFP		EXAMEN DE INGRESO	EXAMEN DE INGRESO CON ENFASIS EN ALTURAS	
30	SOLUCIONES INTEGRALES ALUM GLASS SAS - SIAG	REYES VELASQUEZ ANTONIO JOSE	24.108. 486	INSTALADOR	24/02/2021	POSITIVA	SALUD TOTAL	-		19/02/2021	19/02/2021	12/11/2020
31	SOLUCIONES INTEGRALES ALUM GLASS SAS - SIAG	QUIÑONES GAMBOA DIEGO ARMANDO	1.111.746.669	INSTALADOR	24/02/2021	POSITIVA	SALUD TOTAL	COLPENSIONES		10/11/2020	10/11/2020	12/11/2020
32	SOLUCIONES INTEGRALES ALUM GLASS SAS - SIAG	MAGO ABREU ANTONIO ALEJANDRO	25.281.154	INSTALADOR	24/02/2021	POSITIVA	SALUD TOTAL	-		19/02/2021	19/02/2021	06/11/2020
33	SOLUCIONES INTEGRALES ALUM GLASS SAS - SIAG	DAZA FANDIÑO ERMINSO	80.858.547	INSTALADOR	24/02/2021	POSITIVA	SALUD TOTAL	PROTECCIÓN		23/02/2021	23/02/2021	16/02/2021
34	SOLUCIONES INTEGRALES ALUM GLASS SAS - SIAG	RODRIGUEZ HERNANDEZ WILDER JAVIER	79.749.315	INSTALADOR	24/02/2021	POSITIVA	SALUD TOTAL	PORVENIR		23/02/2021	23/02/2021	04/12/2020
PERSONAL ROTATIVOS												
1	RAC PETREOS SAS	CRISTIAN EDUARDO OLIVERA	1031142742	CONDUCTOR DE LA VOLQUETA WEP 835	01/02/2021	COLPATRIA	SALUD TOTAL	COLPENSIONES	NA	NA	NA	NA
2	WJ EQUIPOS Y CONSTRUCCIONES SAS	MORALES RAMOS LUIS GERMAN	80800778	CONDUCTOR DE LA VOLQUETA TZW 812	01/02/2021	POSITIVA	FAMISANAR	PORVENIR	NA	NA	NA	NA
3	RAC PETREOS SAS	VICTOR JULIO MORALES HERRERA	79547125	CONDUCTOR DE LA VOLQUETA SPY 167	04/02/2021	COLPATRIA	NUEVA EPS	PORVENIR	NA	NA	NA	NA
4	GAS NATURAL (VANTI)	CIENDUA CIENDUA SILVIA ESPERANZA	51.790.033	INSPECTORA	06/02/2021	BOLIVAR	COMPENSAR	PROTECCIÓN	NA	NA	NA	NA
5	GAS NATURAL (VANTI)	MORALES BELLO YOFRE	5.571.911	INSPECTORA	06/02/2021	BOLIVAR	COMPENSAR	COLPESIONES	NA	NA	NA	NA
6	GAS NATURAL (VANTI)	CASTRO PEREZ HECTOR JULIO	79.245.507	INSPECTORA	06/02/2021	BOLIVAR	COMPENSAR	PROTECCIÓN	NA	NA	NA	NA
7	GAS NATURAL (VANTI)	CRUZ CARDENAS LUIS ALFREDO	1.024.540.105	INSPECTORA	06/02/2021	BOLIVAR	COMPENSAR	COLPESIONES	NA	NA	NA	NA
8	TU FACHADA .COM	ACOSTA HERNANDEZ CESAR AUGUSTO	1.052.953.458	INSTALADOR	09/02/2021	SURA	SANITAS	PROTECCIÓN	NA	NA	NA	NA
9	TU FACHADA .COM	SANGUINO MALDARRIAGA ARIDES	13.378 319	INSTALADOR	09/02/2021	SURA	SANITAS	PROTECCIÓN	NA	NA	NA	NA
10	INVERSIONES Y CONSTRUCCIONES RISCANEVO	ALARCON SEPULVEDA ELKIN LEONARDO	1.032.484.567	MECANICO	09/02/2021	POSITIVA	FAMISANAR	PORVENIR	NA	NA	NA	NA
11	RAC PETREOS SAS	EFREN MORALES HERRERA	80050130	CONDUCTOR DE LA VOLQUETA TOQ 605	11/02/2021	COLPATRIA	SALUD TOTAL	PROTECCION	NA	NA	NA	NA
12	AGREGADOS Y TRANSPORTES AR SAS	EDGAR IVAN GONZALEZ JIMENEZ	11523775	CONDUCTOR DE LA VOLQUETA TSW 275	11/02/2021	SURA	FAMISANAR	PORVENIR	NA	NA	NA	NA
13	TRANSPORTES GUERREROS SAS	AYALA GORDILLO ROMER AUGUSTO	1072366189	CONDUCTOR DE LA VOLQUETA TTZ 263	12/02/2021	BOLIVAR	FAMISANAR	COLFONDOS	NA	NA	NA	NA
14	SGS	VALERO NELSON ALFONSO	79.816.798	TECNICO	16/02/2021	POSITIVA	COMPENSAR	COLPENSIONES	NA	NA	NA	NA
15	AGREGADOS Y TRANSPORTES AR SAS	NILSO ALFONSO DIAZ PRIETO	79734201	CONDUCTOR DE LA VOLQUETA WGP 221	16/02/2021	SURA	COMPENSAR	COLPENSIONES	NA	NA	NA	NA
16	AGREGADOS Y TRANSPORTES AR SAS	JUAN RENNET MORENO PIÑEROS	79968428	CONDUCTOR DE LA VOLQUETA TAY 151	17/02/2021	SURA	COMPENSAR	PORVENIR	NA	NA	NA	NA
17	ASCENSORES SCHINDLER	TORRES ESCOBAR MIGUEL ANGEL	80.741.089	INSPECTOR	18/02/2021	COLMENA	COMPENSAR	PROTECCIÓN	NA	NA	NA	NA
18	FERRETERIA AM	VALENCIA OSPINA EDISSON JOSÉ	1.010.161.140	CONDUCTOR	20/02/2021	SURA	NUEVA EPS	PROTECCIÓN	NA	NA	NA	NA
19	ADL	CARDOZO RODRIGUEZ ARISTOBULO	80.161.070	CONDUCTOR	09/02/2021	COLMENA	FAMISANAR	PORVENIR	NA	NA	NA	NA
20	RAYCO LTDA	OLARTE LOPEZ LUIS FREDY	79.613.964	CONDUCTOR	04/02/2021	BOLIVAR	COMPENSAR	COLFONDOS	NA	NA	NA	NA
21	RAYCO LTDA	SEGURO CABALLERO ROBERTO RAFAEL	7.594.448	AUXILIAR	04/02/2021	BOLIVAR	SANITAS	COLPENSIONES	NA	NA	NA	NA
22	HUMAN OUTSOURCING	GUACANEME RINCON MOISES	13.834.227	CONDUCTOR	19/02/2021	SURA	FAMISANAR	____	NA	NA	NA	NA
23	CONCRETERA TREMIX	HIDALGO GARNICA ALONSO	13.689.466	CONDUCTOR	12/02/2021	BOLIVAR	COMPENSAR	COLPENSIONES	NA	NA	NA	NA
24	CONCRETERA TREMIX	PEÑUELA FLOREZ WILSON	80.636.534	CONDUCTOR	22/02/2021	BOLIVAR	NUEVA EPS	COLPENSIONES	NA	NA	NA	NA
25	CONCRETERA TREMIX	PARADA CALDERON VICTOR ALFONSO	79.630.747	CONDUCTOR	22/02/2021	BOLIVAR	SALUD TOTAL	PROTECCIÓN	NA	NA	NA	NA
26	CONCRETERA TREMIX	HERNANDEZ GUTIERREZ ENRIQUE	17.643.996	CONDUCTOR	23/02/2021	BOLIVAR	COMPENSAR	COLPENSIONES	NA	NA	NA	NA
27	CONCRETERA TREMIX	SÁNCHEZ GONZALEZ JOSE AMADEO	79.818.397	CONDUCTOR	24/02/2021	BOLIVAR	FAMISANAR	COLFONDOS	NA	NA	NA	NA
28	CONCRETERA TREMIX	LOPEZ RAMIREZ YIMMI ALEXANDER	80.083.074	CONDUCTOR	24/02/2021	BOLIVAR	FAMISANAR	PORVENIR	NA	NA	NA	NA
29	CONCRETERA TREMIX	CASTRO LOAIZA LEONARDO FABIO	9.858.652	CONDUCTOR	24/02/2021	BOLIVAR	SALUD TOTAL	PORVENIR	NA	NA	NA	NA
30	CONCRETERA TREMIX	GUERRERO GOMEZ LUIS PASTOR	80.114.444	CONDUCTOR	25/02/2021	BOLIVAR	FAMISANAR	PORVENIR	NA	NA	NA	NA
PERSONAL PROVEEDOR												
1	ASCENSORES SCHINDLER	SARMIENTO MOLINA JHON FREDY	1.057.462.925	TECNICO INSTALADOR	26/01/2021	COLMENA	SANITAS	PROTECCION	MOL	21/07/2020	21/07/2020	15/01/2021
2	SEGURIDAD THOR LTDA NIT 900497763	PIRA PARDO JUAN CAMILO	1.000.774.232	GUARDA DE SEGURIDAD	29/10/2020	COLPATRIA	SALUD TOTAL	PROTECCIÓN		28/10/2020	N/A	N/A

No.	CONTRATISTA	DATOS DEL TRABAJADOR				ARL	EPS	AFP	MANO DE OBRA DE LA LOCALIDAD (SOL)	FECHA EXAMENES		CERTIFICADO TSA
		NOMBRE DEL TRABAJADOR	CEDULA	CARGO	FECHA DE INGRESO	ARL	EPS	AFP		EXAMEN DE INGRESO	EXAMEN DE INGRESO CON ENFASIS EN ALTURAS	
3	SEGURIDAD THOR LTDA NIT 900497764	QUINTERO ACOSTA MIGUEL ANGEL	1.033.778.737	GUARDA DE SEGURIDAD	28/12/2020	AXA COLPATRIA	CAPITAL SALUD	PORVENIR		24/12/2020	NA	NA
4	FIRA INGENIERIA SAS	GIRALDO RAMIREZ NORHA ELENA	39.702.098	INGENIERA HIDROSANITARIA	10/01/2020	BOLIVAR	SANITAS	COLPENSIONES		03/04/2019	03/04/2019	06/08/2020
5	FIRA INGENIERIA SAS	VARGAS ROMERO EDDY JAVIER	1.022.330.531	HIDROSANITARIO	10/01/2020	BOLIVAR	MEDIMÁS	PORVENIR		18/05/2019	18/05/2019	22/09/2020
6	FIRA INGENIERIA SAS	ARENILLA BOHORQUEZ EDUARDO	91.445.424	OFICIAL DE PLOMERIA	10/01/2020	BOLIVAR	NUEVA EPS	COLPENSIONES		27/06/2019	27/06/2019	07/11/2020
7	FIRA INGENIERIA SAS	RODRIGUEZ TAMAYO DIEGO HERNANDO	1.015.433.829	INGENIERO SUPERVISOR	23/07/2020	BOLIVAR	SURA	COLFONDOS		16/06/2020	16/06/2020	NA
8	FIRA INGENIERIA SAS	PARRA TREJOS ALIRIO	79.615.077	AYUDANTE DE PLOMERIA	04/06/2020	BOLIVAR	FAMISANARR	COLPENSIONES		27/04/2020	27/04/2020	02/08/2020
9	FIRA INGENIERIA SAS	SARMIENTO CASTAÑEDA HUGO GABRIEL	79.273.305	OFICIAL DE PLOMERIA	04/06/2020	BOLIVAR	SALUD TOTAL	COLPENSIONES		02/02/2019	02/02/2019	02/08/2020
10	WJ EQUIPOS Y CONSTRUCCIONES SAS	URUEÑA OSPINA JHONATHAN GABRIEL	14.139.533	OPERADOR CARGADOR	20/11/2020	POSITIVA	FAMISANAR	PORVENIR		20/12/2019	N/A	———
11	VENEGAS DUARTE JOSE MARTIN	VENEGAS DUARTE JOSE MARTIN	79.114.580	SOLDADOR	06/11/2020	POSITIVA	NUEVA EPS	COLPENSIONES		30/10/2020	30/10/2020	11/11/2019
PERSONAL ANTIGUO												
1	G&G INGENIEROS LTDA	ABRIL PINEDA MARTHA LILIANA	52.300.642	COORDINADORA DE CALIDAD	19/06/2019	COLMENA	COMPENSAR	PORVENIR		15/05/2020	15/05/2020	07/08/2020
2	G&G INGENIEROS LTDA	ALBA ARCILA MARIO FERNANDO	1.015.438.282	ARQUITECTO AUXILIAR	05/09/2020	COLMENA	FAMISANAR	PORVENIR		18/03/2020	NA	NA
3	G&G INGENIEROS LTDA	AMAYA ARAQUE ANTOLINO	5.697.499	OFICIAL	30/09/2019	COLMENA	NUEVA EPS	PORVENIR	MOL	28/09/2019	28/09/2019	15/02/2020
4	G&G INGENIEROS LTDA	ARROYO MARMOLEJO ONOFRE	8.115.708	EJERO	03/06/2020	COLMENA	SALUD TOTAL	PROTECCION		15/05/2020	19/02/2020	03/02/2020
5	G&G INGENIEROS LTDA	CANTOR BELLO MELQUICEDEC	19.371.259	ESPECIALISTA EN GEOTECNIA	19/06/2019	COLMENA	SANITAS	COLPENSIONES			N/A	N/A
6	G&G INGENIEROS LTDA	CASTELLANOS DIAZ FRANCISCO JAVIER	79.971.248	OFICIAL MAMPOSTERIA	05/06/2020	COLMENA	FAMISANAR	PROTECCIÓN	MOL	03/08/2020	03/08/2020	28/07/2020
7	G&G INGENIEROS LTDA	CASTELLANOS MUÑOZ BRAYAN JAVIER	1.023.973.051	AYUDANTE MAMPOSTERIA	05/08/2020	COLMENA	SANITAS	PORVENIR	MOL	03/08/2020	03/08/2020	29/07/2020
8	G&G INGENIEROS LTDA	DIAZ GRANADOS JUAN ALEXIS	1.015.392.764	OFICIAL	03/06/2020	COLMENA	COMPENSAR	PORVENIR	MOL	15/05/2020	15/05/2020	24/02/2020
9	G&G INGENIEROS LTDA	ESCOBAR PINTOR JAVIER ANDRES	1.026.558.978	AUXILIAR DE INGENIERIA	04/06/2019	COLMENA	COMPENSAR	PORVENIR		30/05/2019	30/05/2019	07/08/2020
10	G&G INGENIEROS LTDA	GARCIA GORDILLO LISANDRO	79.667.255	AYUDANTE	03/06/2020	COLMENA	SALUD TOTAL	PORVENIR	MOL	04/06/2020	04/06/2020	07/08/2020
11	G&G INGENIEROS LTDA	GARCIA MADROÑERO RENZO EDUARDO	1.115.912.571	AYUDANTE MAMPOSTERIA	17/06/2020	COLMENA	SALUD TOTAL	PORVENIR		12/06/2020	12/06/2020	10/01/2021
12	G&G INGENIEROS LTDA	GARCIA RIAÑO MOISES FELIPE	1.000.990.115	AYUDANTE	28/07/2020	COLMENA	SALUD TOTAL	PORVENIR		27/07/2020	27/07/2020	NA
13	G&G INGENIEROS LTDA	GIL RAMIREZ PABLO EMANUEL	1.032.432.064	OFICIAL MAMPOSTERIA	15/10/2020	COLMENA	FAMISANAR	PORVENIR		14/10/2020	14/10/2020	02/01/2021
14	G&G INGENIEROS LTDA	GIRALDO GIRALDO GERMAN	15.900.765	ASESOR ELÉCTRICO Y DE VOZ Y DATOS	30/09/2019	COLMENA	SALUD TOTAL	PESIONADO	MOL	11/04/2019	NA	NA
15	G&G INGENIEROS LTDA	GOENAGA OSMA EVER ANDRES	1.030.613.866	AYUDANTE MAMAPOSTERIA	15/10/2020	COLMENA	SANITAS	PORVENIR		14/10/2020	14/10/2020	———
16	G&G INGENIEROS LTDA	GONZALEZ RIOS CRISTIAN CAMILO	1.023.908.733	OFICIAL	09/07/2020	COLMENA	FAMISANAR	PROTECCION		07/07/2020	07/07/2020	30/01/2020
17	G&G INGENIEROS LTDA	GUTIERREZ RODRIGUEZ MYRIAM	51.728.640	PROFESIONAL HS	19/06/2019	COLMENA	COMPENSAR	PORVENIR		16/02/2019	16/02/2019	19/12/2020
18	G&G INGENIEROS LTDA	HERNANDEZ PALACIO HECTOR GUILLERMO	1.073.156.378	OFICIAL DE MAMPOSTERIA	17/06/2020	COLMENA	FAMISANAR	PORVENIR	MOL	12/06/2020	12/06/2020	10/01/2021
19	G&G INGENIEROS LTDA	HURTADO MURILLO YUBER EMIR	1.076.326.522	AYUDANTE	05/06/2020	COLMENA	SALUD TOTAL	COLFONDOS	MOL	04/06/2020	23/01/2020	07/08/2020
20	G&G INGENIEROS LTDA	JAIMES DIAZ JHON DARIO	1.000.611.401	AYUDANTE	29/09/2020	COLMENA	SURA	COLPENSIONES		28/09/2020	28/09/2020	12/08/2020
21	G&G INGENIEROS LTDA	LOPEZ PEREZ CADIR ALFONSO	1.104.011.635	AYUDANTE	25/09/2020	COLMENA	MUTUAL SER	PORVENIR		24/09/2020	24/09/2020	25/07/2020
22	G&G INGENIEROS LTDA	LOZANO NICANOR	5968180	AYUDANTE	02/09/2020	COLMENA	FAMISANAR	PORVENIR		01/09/2020	01/09/2020	21/09/2020
23	G&G INGENIEROS LTDA	MALDONADO MEJIA MILTON	80.304.928	TÉCNICO ELECTRICO	11/10/2019	COLMENA	COMPENSAR	PORVENIR		03/04/2019	03/04/2019	17/09/2020
24	G&G INGENIEROS LTDA	MARTIN RODRIGUEZ JOSE HUGO	79.324.337	AYUDANTE	03/06/2020	COLMENA	SALUD TOTAL	PROTECCION		14/05/2020	N/A	N/A
25	G&G INGENIEROS LTDA	MARTIN RODRIGUEZ WENCESLAO	79.700.970	AYUDANTE	03/06/2020	COLMENA	SANITAS	PROTECCION	MOL	14/05/2020	N/A	N/A

No.	CONTRATISTA	DATOS DEL TRABAJADOR				ARL	EPS	AFP	MANO DE OBRA DE LA LOCALIDAD (MOL)	FECHA EXAMENES		CERTIFICADO TSA
		NOMBRE DEL TRABAJADOR	CEDULA	CARGO	FECHA DE INGRESO	ARL	EPS	AFP		EXAMEN DE INGRESO	EXAMEN DE INGRESO CON ENFASIS EN ALTURAS	
26	G&G INGENIEROS LTDA	MARTINEZ GIL LUIS ADRIAN	80.896.416	ENCARGADO MAMPOTERIA	17/06/2020	COLMENA	FAMISANAR	PORVENIR		12/06/2020	12/06/2020	10/01/2021
27	G&G INGENIEROS LTDA	MARTINEZ MURCIA JOSE GUSTAVO	19.264.953	DIRECTOR DE OBRA	19/06/2019	COLMENA	FOSYGA	COLPENSIONES		30/12/2019	30/12/2019	21/01/2020
28	G&G INGENIEROS LTDA	MENDOZA MELENDEZ DEBINSON	1.104.133.312	AYUDANTE	10/06/2020	COLMENA	NUEVA EPS	PROTECCION		04/06/2020	01/11/2019	06/11/2020
29	G&G INGENIEROS LTDA	MENDEZ PLAZAS ERIKA MARCELA	52.183.927	ASESOR HIDROSANITARIO	04/06/2020	COLMENA	SANITAS	COLPENSIONES		NA	NA	NA
30	G&G INGENIEROS LTDA	NIVIA OSORIO JOHN IVAN	79.474.146	ESPECIALISTA ESTRUCTURAL	15/02/2020	COLMENA	ALIANSALUD	PROTECCIÓN		NA	NA	NA
31	G&G INGENIEROS LTDA	OBANDO HENRY ALBERTO	80.377.053	MAESTRO DE OBRA	03/06/2020	COLMENA	SANITAS	PROTECCION		16/05/2020	16/05/2020	24/02/2020
32	G&G INGENIEROS LTDA	OLAYA RODRIGUEZ CLAUDIA XIMENA	52.694.991	AYUDANTE	04/06/2020	COLMENA	SALUD TOTAL	COLPENSIONES		03/06/2020	N/A	N/A
33	G&G INGENIEROS LTDA	PADILLA JOSE GUILLERMO	79.452.393	OFICIAL	09/07/2020	COLMENA	FAMISANAR	COLPENSIONES		07/07/2020	07/07/2020	17/03/2020
34	G&G INGENIEROS LTDA	PADILLA EDUARDO	79.388.911	OFICIAL ENCHAPADOR	02/09/2020	COLMENA	FAMISANAR	COLPENSIONES		31/08/2020	31/08/2020	31/07/2020
35	G&G INGENIEROS LTDA	PEDROZA N. NARLY YOHANNA	1.070.951.642	INGENIERO AMBIENTAL	04/06/2019	COLMENA	FAMISANAR	PORVENIR	MOL	01/06/2019	01/06/2019	NA
36	G&G INGENIEROS LTDA	PEÑA SALAMANCA ELKIN ANDRES	1.073.236.829	ALMACENISTA	04/06/2020	COLMENA	SALUD TOTAL	PORVENIR	MOL	02/06/2020	02/06/2020	NA
37	G&G INGENIEROS LTDA	PRECIADO CORREA JOSE GERMAN	79.513.021	AYUDANTE	24/07/2020	COLMENA	FAMISANAR	COLPENSIONES		22/07/2020	NA	NA
38	G&G INGENIEROS LTDA	ROMERO CARRILLO CAMILO ANDRES	80.136.774	RESIDENTE DE OBRA	04/06/2019	COLMENA	SALUD TOTAL	COLFONDOS		30/05/2019	30/05/2019	07/06/2020
39	G&G INGENIEROS LTDA	RUIZ ROBERTO CARLOS	92.400.503	AYUDANTE	01/07/2020	COLMENA	SALUD TOTAL	COLPENSIONES		27/06/2020	27/06/2020	18/09/2020
40	G&G INGENIEROS LTDA	SANCHEZ AMAYA MARIA ARQUILIA	1.109.293.838	AYUDANTE	10/06/2020	COLMENA	NUEVA EPS	PORVENIR		04/06/2020	N/A	22/07/2020
41	G&G INGENIEROS LTDA	SARMIENTO CHIQUILLO MARCELO AUGUSTO	79.966.053	RESIDENTE DE OBRA	04/06/2019	COLMENA	FAMISANAR	COLPENSIONES	MOL	30/05/2019	30/05/2019	18/10/2020
42	G&G INGENIEROS LTDA	SOTO CAJAMARCA JHON EWAR	11.387.045	TECNICO ELECTRICO	13/09/2019	COLMENA	COMPENSAR	PORVENIR	MOL	06/07/2019	06/07/2019	11/09/2020
43	G&G INGENIEROS LTDA	CASTRO HUESO LUIS ALBERTO	1.014.238.184	OFICIAL DE ESTUCO	08/01/2021	COLMENA	SALUD TOTAL	PORVENIR	MOL	06/01/2021	06/01/2021	06/01/2021
44	G&G INGENIEROS LTDA	PADILLA LOPEZ FARID ANDRES	1.023.900.606	AYUDANTE DE MAMPOSTERIA	08/01/2021	COLMENA	FAMISANAR	COLFONDOS		31/08/2020	31/08/2020	05/09/2019
45	G&G INGENIEROS LTDA	BOTACHE RAYO CRISTIAN ANDRES	1.000.774.636	AYUDANTE DE MAMPOSTERIA	12/01/2021	COLMENA	COMPENSAR	PROTECCION		09/01/2021	09/0/2021	NA
46	G&G INGENIEROS LTDA	GARCIA MEJIA MAXIMO ANTONIO	1.051.656.935	OFICIAL	12/01/2021	COLMENA	SALUD TOTAL	PORVENIR	MOL	07/01/2021	07/01/2021	02/03/2020
47	G&G INGENIEROS LTDA	NUÑEZ RITIVA GERMAN ANTONIO	7.313.664	OFICIAL	14/01/2021	COLMENA	NUEVA EPS	COLPENSIONES		12/01/2021	12/01/2021	06/09/2020
48	G&G INGENIEROS LTDA	BARRANTES SALAZAR ASTRID CAROLINA	1.026.295.221	AYUDANTE DE MAMPOSTERIA	14/01/2021	COLMENA	CAPITAL SALUD	PORVENIR	MOL	13/01/2021	NA	NA
49	G&G INGENIEROS LTDA	HERNANDEZ PALACIO JOSE ALFREDO	1.073.511.144	OFICIAL DE MAMPOSTERIA	15/01/2021	COLMENA	FAMISANAR	PROTECCION		14/01/2021	14/01/2021	09/01/2021
50	G&G INGENIEROS LTDA	LOPEZ GRANADOS JOHAN ESTICK	1.013.689.316	AYUDANTE DE ENCHAPE	20/01/2021	COLMENA	FAMISANAR	PROTECCION	MOL	19/01/2021	NA	NA
51	G&G INGENIEROS LTDA	HERNANDEZ VELOSA MIGUEL ALFONSO	19.212.619	OFICIAL	20/01/2021	COLMENA	CAPITAL SALUD	PORVENIR	MOL	19/01/2021	NA	NA
52	G&G INGENIEROS LTDA	PUENTES MEDINA FLORENTINO	19.379.636	OFICIAL	20/01/2021	COLMENA	COMPENSAR	COLPENSIONES	MOL	19/01/2021	NA	NA
53	G&G INGENIEROS LTDA	ESPITIA VARGAS SANDRO IVAN	79.767.734	OFICIAL	26/01/2021	COLMENA	SALUD TOTAL	PORVENIR		26/01/2021	26/01/2021	17/07/2020
54	G&G INGENIEROS LTDA	SAA ROBLES JOSE EVER	1.023.917.691	OFICIAL DE ESTUCO	27/01/2021	COLMENA	CAPITAL SALUD	PROTECCION	MOL	26/01/2021	NA	NA
55	G&G INGENIEROS LTDA	SAA CASTRO JOSE EVER	10.554.114	OFICIAL DE ESTUCO	27/01/2021	COLMENA	CAPITAL SALUD	PORVENIR	MOL	26/01/2021	NA	NA

PERSONAL RETIRADO

No.	CONTRATISTA	DATOS DEL TRABAJADOR				AFILIADO A			MANO DE OBRA DE LA LOCALIDAD	ORDENES DE EXAMEN		CERTIFICADO TSA
		NOMBRE DEL TRABAJADOR	CEDULA	CARGO	FECHA DE RETIRO DE OBRA	ARL	EPS	AFP		EXAMEN DE EGRESO	EXAMEN DE INGRESO	
1	G&G INGENIEROS LTDA	AGUIRRE VASQUEZ EDWIN	1.022.939.047	OFICIAL	04/02/2021	COLMENA	FAMISANAR	PROTECCIÓN		31/08/2020	31/08/2020	06/02/2020

No.	CONTRATISTA	DATOS DEL TRABAJADOR				ARL	EPS	AFP	MANO DE OBRA DE LA LOCALIDAD (MOL)	FECHA EXAMENES		CERTIFICADO TSA
		NOMBRE DEL TRABAJADOR	CEDULA	CARGO	FECHA DE INGRESO	ARL	EPS	AFP		EXAMEN DE INGRESO	EXAMEN DE INGRESO CON ENFASIS EN ALTURAS	
2	G&G INGENIEROS LTDA	AGUIRRE VASQUEZ YEFERSON GIOVANI	1.000.227.070	AYUDANTE DE MAMPOSTERIA	04/02/2021	COLMENA	CAPITAL SALUD	PROTECCION		22/01/2021	22/01/2021	16/03/2020
3	G&G INGENIEROS LTDA	BOLIVAR SANDRA PATRICIA	52.271.058	AYUDANTE	09/10/2020	COLMENA	FAMISANAR	COLPENSIONES		07/10/2020	07/10/2020	15/08/2020
4	G&G INGENIEROS LTDA	GONZALEZ JIMENEZ HECTOR JULIO	80.782.096	AYUDANTE	15/02/2021	COLMENA	SALUD TOTAL	PORVENIR		12/09/2020	12/09/2020	25/07/2020
5	G&G INGENIEROS LTDA	SANCHEZ AMAYA DIOMAR	77.105.441	AYUDANTE	15/02/2021	COLMENA	FAMISANAR	COLPENSIONES		14/05/2020	14/05/2020	02/10/2020
6	G&G INGENIEROS LTDA	VALENCIA DOMINICHA LUIS VALDO	1.076.384.363	AYUDANTE	15/02/2021	COLMENA	CAPITAL SALUD	PROTECCIÓN	MOL	29/09/2020	29/09/2020	_____
7	G&G INGENIEROS LTDA	VILCHES VIDAL RICHARD	74.770.958	AYUDANTE	15/02/2021	COLMENA	NUEVA EPS	PROTECCION	MOL	14/05/2020	14/05/2020	16/10/2020
8	G&G INGENIEROS LTDA	RODRIGUEZ CARDENAS CARLOS ALBERTO	1.023.884.661	OFICIAL MAMPOSTERIA	22/02/2021	COLMENA	FAMISANAR	COLFONDOS		04/11/2020	04/11/2020	30/07/2020
9	G&G INGENIEROS LTDA	RODRIGUEZ CARDENAS JEFFERSON ANDREY	1.010.197.888	AYUDANTE DE MAMPOSTERIA	22/02/2021	COLMENA	SALUD TOTAL	PORVENIR		06/01/2021	NA	NA
10	G&G INGENIEROS LTDA	CUBILLOS MOLINA CARLOS JULIAN	1.003.691.464	AYUDANTE DE MAMPOSTERIA	22/02/2021	COLMENA	FAMISANAR	PORVENIR		06/01/2021	06/01/2021	22/07/2020
11	G&G INGENIEROS LTDA	GUERRA PUENTES LUIS JAVIER	79.706.089	OFICIAL	27/02/2021	COLMENA	CAPITAL SALUD	COLPENSIONES	MOL	19/01/2021	NA	NA
12	SEGURIDAD THOR	RODRIGUEZ NIEVES EDGAR FELIPE	1.070.781.251	GUARDA DE SEGURIDAD	21/02/2021	COLPATRIA	SALUD TOTAL	PORVENIR		21/01/2021	NA	NA
13	M&M INSTALACION DE CUBIERTA	OSNAIDER PEÑA	1079885400	INSTALADOR JEFE	04/02/2021	POSITIVA	SANITAS	PROTECCION		18/01/2021	18/01/2021	13/02/2020
14	M&M INSTALACION DE CUBIERTA	HERNAN BARRIOS	1.079.884.516	INSTALADOR	04/02/2021	POSITIVA	FAMISANAR	PORVENIR		10/11/2020	10/11/2020	21/01/2021
15	M&M INSTALACION DE CUBIERTA	GREGORIO CARMONA	8537396	INSTALADOR	04/02/2021	POSITIVA	NUEVA EPS	COLPENSIONES		16/01/2021	16/01/2021	13/02/2020
16	M&M INSTALACION DE CUBIERTA	YANCARLOS VELAZQUEZ	1.014.264.445	INSTALADOR	04/02/2021	POSITIVA	ASOCIACIÓN MUTUAL SER	PORVENIR		16/01/2021	16/01/2021	13/02/2020
17	M&M INSTALACION DE CUBIERTA	JAVIER MEJIA RICCI	72.174.395	DIRECTOR DE PROYECTO	04/02/2021	POSITIVA	COMPENSAR	PORVENIR		03/03/2020	03/03/2020	13/02/2020
18	M&M INSTALACION DE CUBIERTA	DONALDO CORDOBA	1.121.327.212	INSPECTOR TSS	04/02/2021	POSITIVA	FAMISANAR	PORVENIR		03/08/2020	03/08/2020	13/02/2020
19	IMC LTDA	SANTAMARIA DUARTE YOLANDA	52.871.034	COOD. PROYECTOS	24/02/2021	POSITIVA	COMPENSAR	PORVENIR		30/01/2021	30/01/2021	02/02/2021
20	IMC LTDA	DIAZ H. MIGUEL	1.055.228.496	OFICIAL INSTALADOR	24/02/2021	POSITIVA	COMPENSAR	PORVENIR		24/02/2020	24/02/2020	26/02/2020
21	IMC LTDA	RINCON RIVERA JAVIER EDUARDO	79.912.818	OFICIAL INSTALADOR	24/02/2021	POSITIVA	FAMISANAR	PORVENIR		30/01/2021	30/01/2021	02/02/2021
22	IMC LTDA	DIAZ MALDONADO JORGE ANDRES	1.055.227.823	OFICIAL INSTALADOR	24/02/2021	POSITIVA	FAMISANAR	PORVENIR		24/02/2020	24/02/2020	26/02/2020
23	IMC LTDA	AMAYA R. PEDRO NEL	80.037.189	OFICIAL INSTALADOR	24/02/2021	POSITIVA	SANITAS	COLFONDOS		24/02/2020	24/02/2020	25/02/2020
24	COBALTO INGENIERIA LTDA	RODRIGUEZ JAIME ANDRES	79.841.739	TOPOGRAFO	28/02/2021	POSITIVA	SANITAS	COLPENSIONES		06/01/2021	06/01/2021	06/01/2021
25	IMC LTDA	CASTELBLANCO LUIS ANGEL	80165886	GERENTE GENERAL	24/02/2021	POSITIVA	COMPENSAR	PROTECCIÓN		30/01/2021	30/01/2021	02/02/2021
26	IMC LTDA	MONROY C. EDUWIN GIOVANNI	80020635	OFICIAL INSTALADOR	24/02/2021	POSITIVA	COMPENSAR	COLFONDOS		30/01/2021	30/01/2021	02/02/2021
27	FERREMOR AC SAS	VENEGAS DUARTE LUIS ENRIQUE	79.121.356	SOLDADOR	01/02/2021	AXA COLPATRIA	SALUD TOTAL	COLPENSIONES		30/10/2020	30/10/2020	11/11/2019
28	FERREMOR AC SAS	VENEGAS DUARTE RODOLFO	79.122.595	SOLDADOR	01/02/2021	AXA COLPATRIA	CAPITAL SALUD	COLPENSIONES		20/10/2020	20/10/2020	11/11/2019
29	WJ EQUIPOS Y CONSTRUCCIONES	ARBOLEDA UZUGA EDIER DE JESUS	1.039.680.601	OPERADOR DE EXCAVADORA	04/02/2021	POSITIVA	FAMISANAR	PORVENIR		04/01/2021	NA	NA

OBSERVACIONES:

RESPONSABLE HS - SST

NOMBRE: MYRIAM GUTIERREZ RODRIGUEZ

CARGO: PROFESIONAL HS

Anexo 4. Certificación de Parafiscales

G&G Ingenieros Ltda.

CERTIFICADO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES PERSONA JURÍDICA

Yo, CESAR GÓMEZ ARIAS, identificado con C.C. 19.487.979, y con Tarjeta Profesional No. 66003-T de la Junta Central de Contadores de Colombia, en mi condición de Revisor Fiscal de G&G INGENIEROS LTDA identificada con Nit 800.227.917-6 , debidamente inscrita en la Cámara de Comercio de Facatativá, luego de examinar de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia, los estados financieros de la compañía, certifico el pago de los aportes a seguridad social se encuentra al día el periodo del 1 al 28 de febrero de 2021, por los conceptos de salud, pensiones, riesgos profesionales, cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA)

Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Nota: Para relacionar el pago de los aportes correspondientes a los Sistemas de Seguridad Social, se deberán tener en cuenta los plazos previstos en el Decreto 1406 de 1999 artículos 19 a 24 y Decreto 2236 de 1999. Así mismo, en el caso correspondiente a los aportes parafiscales: CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR, ICBF y SENA, se deberá tener en cuenta el plazo dispuesto para tal efecto en el Decreto 1464 de 2005.

Dada en Mosquera a los (5) días del mes de marzo de 2021.

CESAR GÓMEZ ARIAS
C.C. 19.487.979
T.P 66003-T

Anexo 5. Ensayos de laboratorio

G&G Ingenieros Ltda.	ENSAYO DE COMPRESION EN CILINDROS DE CONCRETO	Fecha: 07/06/2018
		Codigo: F-CIV-031
	EJECUCIÓN DE OBRA	Version: 1
		Hoja 1 de 1

Obra y/o Proyecto: ESTACIÓN DE BOMBEROS DE BELLAVISTA

No. Del contrato: 470 DE 2018

MUESTRA No.	LOCALIZACION (ELEMENTO)	M³ FUNDIDOS	RESISTENCIA DE DISEÑO (PSI)	ASENTAMIENTO (Pulgadas)	FECHA DE FUNDIDA DD/MM/AA	FECHA DE ROTURA DD/MM/AA	EDAD (DIAS)	RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN (MPa)	RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN (PSI)	RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN (%)	PROMEDIO MPa	PROM RESISTENCIA (%)
122	ESCALERA EJE A N+3.30 EJES A0-A ENTRE EJES 1-2 COLUMNAS RAMPA N+4.85 EJES 1 -1A ENTRE EJES B-C		4000	8"	06/01/2021	03/02/2021	28	52,9	7680	193,1%	52,9	193,07%
								52,4	7610	191,2%	52,4	191,24%
123	ESCALERA EJE A N+6.60 EJES A0-A ENTRE EJES 1-2. VCIM 2 N+0.00 ZAPATA T17 EJE 2 ENTRE A-A0		4000	8"	09/01/2021	06/02/2021	28	47,5	6890	173,4%	47,5	173,36%
								48,5	7040	177,0%	48,5	177,01%
124	RAMPA N+4.85 CON VIGAS Y PLACA EJES 1 - 1A ENTRE EJES B-C		4000	8"	09/01/2021	06/02/2021	28	50,9	7380	185,8%	50,9	185,77%
								51,4	7460	187,6%	51,4	187,59%
125	PLACA CONTRAPISO 0.10M N+0.00 EJES 1-2 ENTRE EJES A0-B		4000	8"	15/01/2021	06/02/2021	28	35,9	5210	131,0%	35,9	131,02%
								36,4	5280	132,8%	36,4	132,85%
126	PLACA CONTRAPISO 0.20M N+0.00 EJES 2-3 ENTRE EJES A-C		4000	8"	20/01/2021	03/02/2021	14	34,2	4960	124,8%	34,2	124,82%
								35	5090	127,7%	35,0	127,74%
						17/02/2021	28	35,3	5130	128,8%	35,3	128,83%
								35,7	5190	130,3%	35,7	130,29%
127	PLACA N+0.00 (0.10M), MURO 3A CON CERRAMIENTO		4000	8"	26/01/2021	02/02/2021	7	26,5	3840	96,7%	26,5	96,72%
								30	4360	109,5%	30,0	109,49%
						09/02/2021	14	34,4	4990	125,5%	34,4	125,55%
								33,9	4920	123,7%	33,9	123,72%
						23/02/2021	28	38,8	5640	141,6%	38,8	141,61%
								38,5	5590	140,5%	38,5	140,51%
128	ZARPA MURO T 3A EJE A0 ENTRE EJES 6 Y CERRAMIENTO, CARCAMOS NIVEL 0,00		4000	8"	12/02/2021	19/02/2021	7	16,1	2330	58,8%	16,1	58,76%
						26/02/2021	14	20,8	3020	75,9%	20,8	75,91%

	SUPERVISIÓN	APROBO
NOMBRE	JAVIER ESCOBAR	CAMILO ANDRES ROMERO
CARGO	AUXILIAR DE INGENIERIA	RESIDENTE DE OBRA
FIRMA		
FECHA		

Diagonal 24C # 96-85
Tel: 57-1-756 2656

ENSAYO A LA COMPRESION DE CILINDROS DE CONCRETO / MORTERO

NTC 673 / INV E-410-13 / NTC 3546

Consulta General de Muestras

* El presente informe afecta únicamente a las muestras referenciadas en el mismo y esta sujeto a verificación.
** Este informe no deberá reproducirse parcial o totalmente sin la aprobación por escrito del Laboratorio Contecon Urbar S. A.S.

Cliente: G Y G INGENIEROS LTDA

Proyecto: B-17495 ESTACIÓN DE BOMBEROS BELLA VISTA

Concreto TREMIX

Muestra:	122	ESCALERA EJE A N+3.30 COLUMNAS RAMPA N+4.85				Fecha de muestreo:	06/ene./2021 1:00PM
Dimensión:	6"x12"	Código de mezcla:	4-280-1-6			Resistencia nominal:	27.4 MPa
Asentamiento:	0 mm	Peso unitario:	0 Kg/m3	Frente	0 - n.a.	Contenido aire:	0.0%
Temperatura:	0,0 °C	Planta:	n.a.	Mixer:	n.a.	Remisión:	
Observaciones:							

Edad	F. Ensayo	kg/cm2	psi	MPa	%	Prensa	Tipo Falla	Observación	Calificación
9	15/ene./2021	441	6,280	43.3	158	Lab-03-0	Fisuras verticales		
9	15/ene./2021	433	6,160	42.5	155	Lab-03-0	Fractura diagonal		
14	20/ene./2021	480	6,830	47.1	172	LAB-03-0	Fisuras verticales		
14	20/ene./2021	453	6,450	44.4	162	LAB-03-0	Fractura diagonal		
28	03/feb./2021	540	7,680	52.9	193	LAB-03-0	Fractura diagonal		
28	03/feb./2021	535	7,610	52.4	191	LAB-03-0	Fracturas en los lados superior o inferior		
56	03/mar./2021					n.a.	n.a.		
56	03/mar./2021					n.a.	n.a.		

Muestra:	123	ESCALERA EJE A N+6.60 VCIM 2 N+0.00 ZAPATADA T17				Fecha de muestreo:	09/ene./2021 11:00AM
Dimensión:	6"x12"	Código de mezcla:	4-280-1-6			Resistencia nominal:	27.4 MPa
Asentamiento:	0 mm	Peso unitario:	0 Kg/m3	Frente	0 - n.a.	Contenido aire:	0.0%
Temperatura:	0,0 °C	Planta:	n.a.	Mixer:	n.a.	Remisión:	
Observaciones:							

Edad	F. Ensayo	kg/cm2	psi	MPa	%	Prensa	Tipo Falla	Observación	Calificación
6	15/ene./2021	285	4,050	27.9	102	LAB-03-0	Fractura diagonal		
7	16/ene./2021	333	4,740	32.7	119	LAB-03-0	Fractura diagonal		
7	16/ene./2021	332	4,720	32.5	119	LAB-03-0	Fractura diagonal		
14	23/ene./2021	427	6,070	41.8	152	LAB-03-0	Fractura diagonal		
28	06/feb./2021	484	6,890	47.5	173	n.a.	Fractura diagonal		
28	06/feb./2021	495	7,040	48.5	177	LAB-03-0	Fracturas en los lados superior o inferior		
56	06/mar./2021					n.a.	n.a.		
56	06/mar./2021					n.a.	n.a.		

SGS
LABORATORIO CONTECON URBAR INGENIEROS CONSULTORES
Diagonal 24C # 96-85
Tel: 57-1-756 2656

ENSAYO A LA COMPRESION DE CILINDROS DE CONCRETO / MORTERO

NTC 673 / INV E-410-13 / NTC 3546

Consulta General de Muestras

* El presente informe afecta únicamente a las muestras referenciadas en el mismo y esta sujeto a verificación
** Este informe no deberá reproducirse parcial o totalmente sin la aprobación por escrito del Laboratorio Contecon Urbar S. A.S.

Muestra:	**124**	RAMPA N+4.85 CON VIGAS Y VT				Fecha de muestreo:	12/ene./2021 9:00PM
Dimensión:	6"x12"	Código de mezcla:	4-280-1-6			Resistencia nominal:	27.4 MPa
Asentamiento:	0 mm	Peso unitario:	0 Kg/m3	Frente	0 - n.a.	Contenido aire:	0.0%
Temperatura:	0,0 °C	Planta:	n.a.	Mixer:	n.a.	Remisión:	
Observaciones:							

Edad	F. Ensayo	kg/cm2	psi	MPa	%	Prensa	Tipo Falla	Observación	Calificación
3	15/ene./2021	288	4,090	28.2	103	LAB-03-0	Fracturas en los lados superior o inferior		
3	15/ene./2021	268	3,810	26.2	96	LAB-03-0	Fracturas en los lados superior o inferior		
7	19/ene./2021	375	5,330	36.7	134	LAB-03-0	Fractura diagonal		
7	19/ene./2021	374	5,320	36.7	134	LAB-03-0	Fracturas en los lados superior o inferior		
14	26/ene./2021	471	6,700	46.2	168	LAB-03-0	Fractura diagonal		
14	26/ene./2021	461	6,560	45.2	165	LAB-03-0	Fisuras verticales		
28	09/feb./2021	519	7,380	50.9	185	LAB-03-0	Fractura diagonal		
28	09/feb./2021	525	7,460	51.4	187	LAB-03-0	Fractura diagonal		

Muestra:	**125**	PLACA CONTRAPISO 0.10M N+0.00				Fecha de muestreo:	15/ene./2021 1:00PM
Dimensión:	6"x12"	Código de mezcla:	4-280-1-10			Resistencia nominal:	27.4 MPa
Asentamiento:	0 mm	Peso unitario:	0 Kg/m3	Frente	0 - n.a.	Contenido aire:	0.0%
Temperatura:	0,0 °C	Planta:	n.a.	Mixer:	n.a.	Remisión:	
Observaciones:							

Edad	F. Ensayo	kg/cm2	psi	MPa	%	Prensa	Tipo Falla	Observación	Calificación
7	22/ene./2021	248	3,530	24.3	89	LAB-03-0	Fracturas en los lados superior o inferior		
7	22/ene./2021	256	3,650	25.1	92	LAB-03-0	Fracturas en los lados superior o inferior		
14	29/ene./2021	307	4,370	30.1	110	LAB-03-0	Fractura diagonal		
14	29/ene./2021	333	4,740	32.7	119	LAB-03-0	Fractura diagonal		
28	12/feb./2021	366	5,210	35.9	131	LAB-03-0	Fractura diagonal		
28	12/feb./2021	371	5,280	36.4	133	Lab-03-0	Fracturas en los lados superior o inferior		

96

SGS
LABORATORIOS CONTECON URBAR INGENIEROS CONSULTORES
Diagonal 24C # 96-85
Tel: 57-1-756 2656

ENSAYO A LA COMPRESION DE CILINDROS DE CONCRETO / MORTERO

NTC 673 / INV E-410-13 / NTC 3546

Consulta General de Muestras

* El presente informe afecta únicamente a las muestras referenciadas en el mismo y esta sujeto a verificación.
** Este informe no deberá reproducirse parcial o totalmente sin la aprobación por escrito del Laboratorio Contecon Urbar S. A.S.

Muestra:	**126**	PLACA CONTRAPISO 0.20M N+0.00				Fecha de muestreo:	20/ene./2021 11:00PM
Dimensión:	6"x12"	Código de mezcla:	4-280-1-10			Resistencia nominal:	27.4 MPa
Asentamiento:	0 mm	Peso unitario:	0 Kg/m3	Frente	0 - n.a.	Contenido aire:	0.0%
Temperatura:	0,0 °C	Planta:	n.a.	Mixer:	n.a.	Remisión:	
Observaciones:							

Edad	F. Ensayo	kg/cm 2	psi	MPa	%	Prensa	Tipo Falla	Observación	Calificación
7	27/ene./2021	309	4,400	30.3	110	LAB-03-0	Fractura diagonal		
7	27/ene./2021	275	3,910	26.9	98	LAB-03-0	Fractura diagonal		
14	03/feb./2021	349	4,960	34.2	125	n.a.	Fractura diagonal		
14	03/feb./2021	358	5,090	35.0	128	n.a.	Fractura diagonal		
28	17/feb./2021	360	5,130	35.3	129	LAB-03-0	Fractura diagonal		
28	17/feb./2021	365	5,190	35.7	130	LAB-03-0	Fractura diagonal		

Muestra:	**127**	PLACA N+0.00 (0.10M) VIGAS N + 4.85				Fecha de muestreo:	26/ene./2021 12:00AM
Dimensión:	6"x12"	Código de mezcla:	4-280-1-10			Resistencia nominal:	27.4 MPa
Asentamiento:	0 mm	Peso unitario:	0 Kg/m3	Frente	0 - n.a.	Contenido aire:	0.0%
Temperatura:	0,0 °C	Planta:	n.a.	Mixer:	n.a.	Remisión:	
Observaciones:							

Edad	F. Ensayo	kg/cm 2	psi	MPa	%	Prensa	Tipo Falla	Observación	Calificación
7	02/feb./2021	270	3,840	26.5	97	Lab-03-0	Fractura diagonal		
7	02/feb./2021	306	4,360	30.0	109	LAB-03-0	Fractura diagonal		
14	09/feb./2021	351	4,990	34.4	125	LAB-03-0	Fractura diagonal		
14	09/feb./2021	346	4,920	33.9	124	LAB-03-0	Fractura diagonal		
28	23/feb./2021	396	5,640	38.8	142	LAB-03-0	Fisuras verticales		
28	23/feb./2021	393	5,590	38.5	140	LAB-03-0	Fisuras verticales		

Muestra:	**128**	ZARPA MURO T 13A CARCAMOS				Fecha de muestreo:	12/feb./2021 6:00PM
Dimensión:	6"x12"	Código de mezcla:	4000 Psi			Resistencia nominal:	27.4 MPa
Asentamiento:	0 mm	Peso unitario:	0 Kg/m3	Frente	0 - n.a.	Contenido aire:	0.0%
Temperatura:	0,0 °C	Planta:	n.a.	Mixer:	n.a.	Remisión:	
Observaciones:							

Edad	F. Ensayo	kg/cm 2	psi	MPa	%	Prensa	Tipo Falla	Observación	Calificación
7	19/feb./2021	164	2,330	16.1	59	LAB-03-0	Fracturas en los lados superior o inferior		
14	26/feb./2021	212	3,020	20.8	76	LAB-03-0	Fractura diagonal		

97

ENSAYO A LA COMPRESION DE CILINDROS DE CONCRETO / MORTERO

NTC 673 / INV E-410-13 / NTC 3546

Consulta General de Muestras

* El presente informe afecta únicamente a las muestras referenciadas en el mismo y esta sujeto a verificación.

** Este informe no deberá reproducirse parcial o totalmente sin la aprobación por escrito del Laboratorio Contecon Urbar S. A.S.

28	12/mar./2021					n.a.	n.a.		
28	12/mar./2021					n.a.	n.a.		

Muestra: 129 PLACA N + 4.85 EJES C AL D Y 14,1 — Fecha de muestreo: 22/feb./2021 5:00PM

Dimensión: 6"x12" — Código de mezcla: 4000 Psi — Resistencia nominal: 27.4 MPa

Asentamiento: 0 mm — Peso unitario: 0 Kg/m3 — Frente 0 - n.a. — Contenido aire: 0.0%

Temperatura: 0,0 °C — Planta: n.a. — Mixer: n.a. — Remisión:

Observaciones:

Edad	F. Ensayo	kg/cm2	psi	MPa	%	Prensa	Tipo Falla	Observación	Calificación
7	01/mar./2021	178	2,530	17.4	63	LAB-03-0	Fracturas en los lados superior o inferior		
14	08/mar./2021					n.a.	n.a.		
14	08/mar./2021					n.a.	n.a.		
28	22/mar./2021					n.a.	n.a.		
28	22/mar./2021					n.a.	n.a.		
28	22/mar./2021					n.a.	n.a.		
28	22/mar./2021					n.a.	n.a.		

Muestra: 130 PLACA N + 0.00 PARTE 1 VCIM MURO DE CIMENTACIÓN 3A — Fecha de muestreo: 23/feb./2021 4:00PM

Dimensión: 6"x12" — Código de mezcla: 4000 Psi — Resistencia nominal: 27.4 MPa

Asentamiento: 0 mm — Peso unitario: 0 Kg/m3 — Frente 0 - n.a. — Contenido aire: 0.0%

Temperatura: 0,0 °C — Planta: n.a. — Mixer: n.a. — Remisión:

Observaciones:

Edad	F. Ensayo	kg/cm2	psi	MPa	%	Prensa	Tipo Falla	Observación	Calificación
7	02/mar./2021					n.a.	n.a.		
7	02/mar./2021					n.a.	n.a.		
14	09/mar./2021					n.a.	n.a.		
14	09/mar./2021					n.a.	n.a.		
28	23/mar./2021					n.a.	n.a.		
28	23/mar./2021					n.a.	n.a.		
28	23/mar./2021					n.a.	n.a.		
28	23/mar./2021					n.a.	n.a.		

Muestra: 131 PLACA N + 0.00 PARTE 2 VIGA VICM MURO CONTENCIÓN 3A — Fecha de muestreo: 24/feb./2021 4:00PM

Dimensión: 6"x12" — Código de mezcla: 4000 Psi — Resistencia nominal: 27.4 MPa

Asentamiento: 0 mm — Peso unitario: 0 Kg/m3 — Frente 0 - n.a. — Contenido aire: 0.0%

Temperatura: 0,0 °C — Planta: n.a. — Mixer: n.a. — Remisión:

Observaciones:

Edad	F. Ensayo	kg/cm2	psi	MPa	%	Prensa	Tipo Falla	Observación	Calificación
7	03/mar./2021					n.a.	n.a.		
14	10/mar./2021					n.a.	n.a.		
28	24/mar./2021					n.a.	n.a.		
28	24/mar./2021					n.a.	n.a.		
28	24/mar./2021					n.a.	n.a.		

98

Diagonal 24C # 96-85
Tel: 57-1-756 2656

ENSAYO A LA COMPRESION DE CILINDROS DE CONCRETO / MORTERO

NTC 673 / INV E-410-13 / NTC 3546

Consulta General de Muestras

* El presente informe afecta únicamente a las muestras referenciadas en el mismo y esta sujeto a verificación.
** Este informe no deberá reproducirse parcial o totalmente sin la aprobación por escrito del Laboratorio Contecon Urbar S. A.S.

28	24/mar./2021							n.a.	n.a.		

Muestra:	**132**	PLACA N +0.00 PARTE 3						Fecha de muestreo:	25/feb./2021 10:00AM
Dimensión:	6"x12"	Código de mezcla:	4000 Psi					Resistencia nominal:	27.4 MPa
Asentamiento:	0 mm	Peso unitario:		0	Kg/m3	Frente	0 - n.a.	Contenido aire:	0.0%
Temperatura:	0,0 °C	Planta:	n.a.			Mixer:	n.a.	Remisión:	
Observaciones:									

Edad	F. Ensayo	kg/cm^2	psi	MPa	%	Prensa	Tipo Falla	Observación	Calificación
7	04/mar./2021					n.a.	n.a.		
7	04/mar./2021					n.a.	n.a.		
14	11/mar./2021					n.a.	n.a.		
14	11/mar./2021					n.a.	n.a.		
28	25/mar./2021					n.a.	n.a.		
28	25/mar./2021					n.a.	n.a.		
28	25/mar./2021					n.a.	n.a.		
28	25/mar./2021					n.a.	n.a.		

Los tipos de falla corresponden a los indicados en la norma NTC 673 figura 2 "Esquema de los Modelos de Fractura Típicos"

ISO/IEC 17025:2017
15-LAB-015

Informe de Resultados No. BO2101568 Rev. 0

Fecha: 2021/02/25

SGS Colombia S.A.S
Laboratorio de Construcción
Diagonal 24 c No 96-85 - Bogotá D.C, Colombia
Phone: +57.1.756.2656

G Y G INGENIEROS LTDA
CL 3 4 70 OF 301
800227917-6
COLOMBIA

Obra: B_17495 ESTACIÓN DE BOMBEROS BELLA VISTA

Fecha de Recepción :	Feb 18 2021 12:00PM
Muestra ID :	BO2101568.001
Identificación de Muestra :	1
Localización :	SALIDA PATIO DE MAQUINAS EJES C-D ENTRE 2-4
Tipo del Material :	B-600
Muestra ID :	BO2101568.002
Identificación de Muestra :	2
Localización :	SALIDA PATIO DE MAQUINAS EJES C-D ENTRE 2-4
Tipo del Material :	B-600
Muestra ID :	BO2101568.003
Identificación de Muestra :	3
Localización :	SALIDA PATIO DE MAQUINAS EJES C-D ENTRE 2-4
Tipo del Material :	B-600
Muestra ID :	BO2101568.004
Identificación de Muestra :	4
Localización :	SALIDA PATIO DE MAQUINAS EJES C-D ENTRE 2-4
Tipo del Material :	B-600
Muestra ID :	BO2101568.005
Identificación de Muestra :	5
Localización :	SALIDA PATIO DE MAQUINAS EJES C-D ENTRE 2-4
Tipo del Material :	B-600
Fecha de Recibido:	2021/02/18
Período de Análisis :	2021/02/24 al 2021/02/24
Ensayo Solicitado :	Ensayo(s) seleccionado(s) conforme ha solicitado el cliente.
Método de ensayo :	Consulte la(s) página(s) siguiente(s).
Resultados de los Ensayos :	Consulte la(s) página(s) siguiente(s).

25022021124400000015277

Este documento es emitido por la Compañía bajo sus Condiciones Generales de Servicio accesibles en http://www.sgs.com/en/Terms-and-Conditions.aspx. Se destacan las estipulaciones que sobre limitación de responsabilidad, indemnización y jurisdicción se encuentran incluidas en las Condiciones Generales de Servicio. Se advierte a cualquier tenedor de este documento que la información aquí contenida refleja las conclusiones de la Compañía para el momento de su intervención y dentro de los límites de las instrucciones del Cliente, si las hubiere. La responsabilidad de la Compañía es exclusiva para con su Cliente y este documento no exonera a las partes de una transacción de ejercer todos sus derechos y obligaciones bajo los documentos de la misma. Cualquier alteración no autorizada, adulteración o falsificación del contenido o apariencia de este documento es ilegal y los infractores podrán ser procesados hasta los máximos que permita la ley.
ADVERTENCIA: Si la(s) muestra(s) a la(s) que se refiere(n) las conclusiones registradas en este documento (los "Resultados") fueron elaboradas y/o proporcionadas por el Cliente o por un tercero que actúa bajo las directrices del Cliente, los hallazgos no constituyen garantía de la representatividad de la muestra de ningún material y se refieren estrictamente a la (s) muestra(s). La Compañía no acepta ninguna responsabilidad con respecto al origen o la fuente de donde se indica que la(s) muestra(s) es/fue extraída.
A menos que se indique lo contrario, los resultados que se muestran en esta reporte se refieren sólo a la muestra o muestras probadas y dichas muestras se conservan sólo durante 30 días.

Informe de Resultados No. BO2101568 Rev. 0

Asignado en nombre de
SGS de Colombia S.A.



Rossember Eduardo Duran Colmenares
Coordinador Técnico

Este documento es emitido por la Compañía bajo sus Condiciones Generales de Servicio accesibles en http://www.sgs.com/en/Terms-and-Conditions.aspx. Se destacan las estipulaciones que sobre limitación de responsabilidad, indemnización y jurisdicción se encuentran incluidas en las Condiciones Generales de Servicio. Se advierte a cualquier tenedor de este documento que la información aquí contenida refleja las conclusiones de la Compañía para el momento de su intervención y dentro de los límites de las instrucciones del Cliente, si las hubiere. La responsabilidad de la Compañía es exclusiva para con su Cliente y este documento no exonera a las partes de una transacción de ejercer todos sus derechos y obligaciones bajo los documentos de la misma. Cualquier alteración no autorizada, adulteración o falsificación del contenido o apariencia de este documento es ilegal y los infractores podrán ser procesados hasta los máximos que permita la ley.
ADVERTENCIA: Si la(s) muestra(s) a la(s) que se refiere(n) las conclusiones registradas en este documento (los "Resultados") fueron elaboradas y/o proporcionadas por el Cliente o por un tercero que actúa bajo las directrices del Cliente, los hallazgos no constituyen garantía de la representatividad de la muestra de ningún material y se refieren estrictamente a la (s) muestra(s). La Compañía no acepta ninguna responsabilidad con respecto al origen o la fuente de donde se indica que la(s) muestra(s) es/fue extraída.
A menos que se indique lo contrario, los resultados que se muestran en este reporte se refieren sólo a la muestra o muestras probadas y dichas muestras se conservan sólo durante 30 días.

Resultados de los Ensayos :

Determinación De La Densidad Y Del Contenido De Agua Del Suelo Y Del Suelo-Agregado En El Terreno Empleando Medidores Nucleares (Profundidad Reducida) (A)

Método Ensayo : INV E 164 : 2013

Especificación Comparativa : --

Instrumento(s) Empleado(s) : LAB-05-019

Item(s) de Ensayo	Unid.	Especificación	001	002	003	004	005	Incert.
Metodo	-	-	Transmisión Directa	Transmisión Directa	Transmisión Directa	Transmisión Directa	Transmisión Directa	NA
Conteo Estándar Ds	-	-	2329	2329	2329	2329	2329	NA
Conteo Estándar Ms	-	-	695	695	695	695	695	NA
Tipo de Material	-	-	B-600	B-600	B-600	B-600	B-600	NA
Espesor de la Capa	cm	-	30	30	30	30	30	NA
Profundidad	cm	-	25	25	25	25	25	NA
Densidad Húmeda Terreno	kg/m³	-	2109	1980	2054	2052	2008	NA
Humedad Terreno	%	-	11.5	11.3	10.6	9.5	9.1	NA
Densidad Seca en Terreno	kg/m³	-	1892	1779	1857	1874	1840	± 3.94
Densidad Seca Máxima Proctor	kg/m³	-	1995	1995	1995	1995	1995	NA
Humedad Óptima	%	-	11.9	11.9	11.9	11.9	11.9	NA
Compactación	%	-	94.8	89.2	93.1	93.9	92.2	NA
Especificación de la Obra	%	-	95.0	95.0	95.0	95.0	95.0	NA
Observación	-	-	PROCTOR SUMINISTRADO EN OBRA	PROCTOR SUMINISTRADO EN OBRA	PROCTOR SUMINISTRADO EN OBRA	PROCTOR SUMINISTRADO EN OBRA	PROCTOR SUMINISTRADO EN OBRA	NA
Laboratorista	-	-	Nelson Alfonso	Nelson Alfonso	Nelson Alfonso	Nelson Alfonso	Nelson Alfonso	NA

- Las incertidumbres expandidas se calcularon considerando k = 2 y un intervalo de confianza de ± 95%.

25022021124400000015277

Este documento es emitido por la Compañía bajo sus Condiciones Generales de Servicio accesibles en http://www.sgs.com/en/Terms-and-Conditions.aspx. Se destacan las estipulaciones que sobre limitación de responsabilidad, indemnización y jurisdicción se encuentran incluidas en las Condiciones Generales de Servicio. Se advierte a cualquier tenedor de este documento que la información aquí contenida refleja las conclusiones de la Compañía para el momento de su intervención y dentro de los límites de las instrucciones del Cliente, si las hubiere. La responsabilidad de la Compañía es exclusiva para con su Cliente y este documento no exonera a las partes de una transacción de ejercer todos sus derechos y obligaciones bajo los documentos de la misma. Cualquier alteración no autorizada, adulteración o falsificación del contenido o apariencia de este documento es ilegal y los infractores podrán ser procesados hasta los máximos que permita la ley.
ADVERTENCIA: Si la(s) muestra(s) a la(s) que se refiere(n) las conclusiones registradas en este documento (los "Resultados") fueron elaboradas y/o proporcionadas por el Cliente o por un tercero que actúa bajo las directrices del Cliente, los hallazgos no constituyen garantía de la representatividad de la muestra de ningún material y se refieren estrictamente a la (s) muestra(s). La Compañía no acepta ninguna responsabilidad con respecto al origen o la fuente de donde se indica que la(s) muestra(s) es/fue extraída.
A menos que se indique lo contrario, los resultados que se muestran en este reporte se refieren sólo a la muestra o muestras probadas y dichas muestras se conservan sólo durante 30 días.

Nota :

(1) LCM =	Limite de Cuantificación	(4) "-" =	No Analizado
(2) ND =	No Detectado (< LCM)	(5) "--" =	Análisis en Proceso
(3) NA =	No Aplicable		

(6) (A) = Los resultados del análisis están acreditados por el ONAC (Organismo Nacional de Acreditación de Colombia) bajo el Certificado No. 13-LAB-015.

(7) Declaración de cumplimiento. Los resultados de los ensayos y la declaración de cumplimiento con la especificación en este informe se refieren solamente a la muestra de ensayo tal como ha sido analizada / ensayada y no del ítem del cual se ha sacado la muestra de ensayo. Valores de declaración:
(C) = El valor medido cumple con el límite de la especificación
(NC) = El valor medido no cumple con el límite de la especificación
(NR) = Para el valor medido no es posible una declaración de cumplimiento con la especificación

Observaciones :

Los resultados de estas pruebas son válidos única y exclusivamente para las muestras ensayadas. Cualquier alteración a este documento lo invalida.

*** Fin de Reporte ***

Este documento es emitido por la Compañía bajo sus Condiciones Generales de Servicio accesibles en http://www.sgs.com/en/Terms-and-Conditions.aspx. Se destacan las estipulaciones que sobre limitación de responsabilidad, indemnización y jurisdicción se encuentran incluidas en las Condiciones Generales de Servicio. Se advierte a cualquier tenedor de este documento que la información aquí contenida refleja las conclusiones de la Compañía para el momento de su intervención y dentro de los límites de las instrucciones del Cliente, si las hubiere. La responsabilidad de la Compañía es exclusiva para con su Cliente y este documento no exonera a las partes de una transacción de ejercer todos sus derechos y obligaciones bajo los documentos de la misma. Cualquier alteración no autorizada, adulteración o falsificación del contenido o apariencia de este documento es ilegal y los infractores podrán ser procesados hasta los máximos que permita la ley.
ADVERTENCIA: Si la(s) muestra(s) a la(s) que se refiere(n) las conclusiones registradas en este documento (los "Resultados") fueron elaboradas y/o proporcionadas por el Cliente o por un tercero que actúa bajo las directrices del Cliente, los hallazgos no constituyen garantía de la representatividad de la muestra de ningún material y se refieren estrictamente a la (s) muestra(s). La Compañía no acepta ninguna responsabilidad con respecto al origen o la fuente de donde se indica que la(s) muestra(s) es/fue extraída.
A menos que se indique lo contrario, los resultados que se muestran en este reporte se refieren sólo a la muestra o muestras probadas y dichas muestras se conservan sólo durante 30 días.

ISO/IEC 17025:2017
15-LAB-015

Informe de Resultados No. BO2101502 Rev. 0

Fecha: 2021/02/25

SGS Colombia S.A.S
Laboratorio de Construcción
Diagonal 24 c No 96-85 - Bogotá D.C, Colombia
Phone: +57.1.756.2656

G Y G INGENIEROS LTDA
CL 3 4 70 OF 301
800227917-6
COLOMBIA

Obra: B_17495 ESTACIÓN DE BOMBEROS BELLA VISTA

Fecha de Recepción :	Feb 22 2021 12:00PM
Muestra ID :	BO2101502.004
Identificación de Muestra :	4
Localización :	SALIDA PATIO DE MAQUINAS
Tipo del Material :	BG
Muestra ID :	BO2101502.005
Identificación de Muestra :	5
Localización :	SALIDA PATIO DE MAQUINAS
Tipo del Material :	BG
Fecha de Recibido:	2021/02/22
Período de Análisis :	2021/02/22 al 2021/02/24
Ensayo Solicitado :	Ensayo(s) seleccionado(s) conforme ha solicitado el cliente.
Método de ensayo :	Consulte la(s) página(s) siguiente(s).
Resultados de los Ensayos :	Consulte la(s) página(s) siguiente(s).

Asignado en nombre de
SGS de Colombia S.A.

Rossember Eduardo Duran Colmenares
Coordinador Técnico

25022021125100000015281

Este documento es emitido por la Compañía bajo sus Condiciones Generales de Servicio accesibles en http://www.sgs.com/en/Terms-and-Conditions.aspx. Se destacan las estipulaciones que sobre limitación de responsabilidad, indemnización y jurisdicción se encuentran incluidas en las Condiciones Generales de Servicio. Se advierte a cualquier tenedor de este documento que la información aquí contenida refleja las conclusiones de la Compañía para el momento de su intervención y dentro de los límites de las instrucciones del Cliente, si las hubiere. La responsabilidad de la Compañía es exclusiva para con su Cliente y este documento no exonera a las partes de una transacción de ejercer todos sus derechos y obligaciones bajo los documentos de la misma. Cualquier alteración no autorizada, adulteración o falsificación del contenido o apariencia de este documento es ilegal y los infractores podrán ser procesados hasta los máximos que permita la ley.
ADVERTENCIA: Si la(s) muestra(s) a la(s) que se refiere(n) las conclusiones registradas en este documento (los "Resultados") fueron elaboradas y/o proporcionadas por el Cliente o por un tercero que actúa bajo las directrices del Cliente, los hallazgos no constituyan garantía de la representatividad de la muestra de ningún material y se refieren estrictamente a la (s) muestra(s). La Compañía no acepta ninguna responsabilidad con respecto al origen o la fuente de donde se indica que la(s) muestra(s) es/fue extraída.
A menos que se indique lo contrario, los resultados que se muestran en esta reporte se refieren sólo a la muestra o muestras probadas y dichas muestras se conservan sólo durante 30 días.

Resultados de los Ensayos :

Determinación De La Densidad Y Del Contenido De Agua Del Suelo Y Del Suelo-Agregado En El Terreno Empleando Medidores Nucleares (Profundidad Reducida) (A)

Método Ensayo : INV E 164 : 2013

Especificación Comparativa: --

Muestra ID: 001

Item(s) de Ensayo	Unid.	Resultado	Especificación	Incert.
Metodo	-	Transmisión Directa	-	NA
Conteo Estándar Ds	-	2344	-	NA
Conteo Estándar Ms	-	701	-	NA
Tipo de Material	-	BG	-	NA
Localización	-	SALIDA PATIO DE MAQUINAS	-	NA
Capa	-	UNICA	-	NA
Espesor de la Capa	cm	30	-	NA
Profundidad	cm	30	-	NA
Densidad Húmeda Terreno	kg/m³	2096	-	NA
Humedad Terreno	%	10.0	-	NA
Densidad Seca en Terreno	kg/m³	1905	-	± 3.94
Densidad Seca Máxima Proctor	kg/m³	1993	-	NA
Humedad Óptima	%	9.8	-	NA
Compactación	%	95.6	-	NA
Especificación de la Obra	%	95.0	-	NA
Observación	-	PROCTOR SUMINISTRADO EN OBRA	-	NA
Laboratorista	-	Nelson Alfonso	-	NA

Instrumento(s) Empleado(s) : LAB-05-019

Muestra ID: 002

Item(s) de Ensayo	Unid.	Resultado	Especificación	Incert.
Metodo	-	Transmisión Directa	-	NA
Conteo Estándar Ds	-	2344	-	NA
Conteo Estándar Ms	-	701	-	NA
Tipo de Material	-	BG	-	NA
Localización	-	SALIDA PATIO DE MAQUINAS	-	NA
Capa	-	UNICA	-	NA
Espesor de la Capa	cm	30	-	NA
Profundidad	cm	30	-	NA

25022021125100000015281

Este documento es emitido por la Compañía bajo sus Condiciones Generales de Servicio accesibles en http://www.sgs.com/en/Terms-and-Conditions.aspx. Se destacan las estipulaciones que sobre limitación de responsabilidad, indemnización y jurisdicción se encuentran incluidas en las Condiciones Generales de Servicio. Se advierte a cualquier tenedor de este documento que la información aquí contenida refleja las conclusiones de la Compañía para el momento de su intervención y dentro de los límites de las instrucciones del Cliente, si las hubiere. La responsabilidad de la Compañía es exclusiva para con su Cliente y este documento no exonera a las partes de una transacción de ejercer todos sus derechos y obligaciones bajo los documentos de la misma. Cualquier alteración no autorizada, adulteración o falsificación del contenido o apariencia de este documento es ilegal y los infractores podrán ser procesados hasta los máximos que permita la ley.
ADVERTENCIA: Si la(s) muestra(s) a la(s) que se refiere(n) las conclusiones registradas en este documento (los "Resultados") fueron elaboradas y/o proporcionadas por el Cliente o por un tercero que actúa bajo las directrices del Cliente, los hallazgos no constituyen garantía de la representatividad de la muestra de ningún material y se refieren estrictamente a la (s) muestra(s). La Compañía no acepta ninguna responsabilidad con respecto al origen o la fuente de donde se indica que la(s) muestra(s) astue extraída.
A menos que se indique lo contrario, los resultados que se muestran en este reporte se refieren sólo a la muestra o muestras probadas y dichas muestras se conservan sólo durante 30 días.

Informe de Resultados No. BO2101502 Rev. 0

Fecha: 2021/02/25

Item(s) de Ensayo	Unid.	Resultado	Especificación	Incert.
Densidad Húmeda Terreno	kg/m³	2080	-	NA
Humedad Terreno	%	10.3	-	NA
Densidad Seca en Terreno	kg/m³	1885	-	± 3.94
Densidad Seca Máxima Proctor	kg/m³	1993	-	NA
Humedad Óptima	%	9.8	-	NA
Compactación	%	94.6	-	NA
Especificación de la Obra	%	95.0	-	NA
Observación	-	PROCTOR SUMINISTRADO EN OBRA	-	NA
Laboratorista	-	Nelson Alfonso	-	NA

Instrumento(s) Empleado(s) : LAB-05-019

Muestra ID: 003

Item(s) de Ensayo	Unid.	Resultado	Especificación	Incert.
Metodo	-	Transmisión Directa	-	NA
Conteo Estándar Ds	-	2344	-	NA
Conteo Estándar Ms	-	701	-	NA
Tipo de Material	-	BG	-	NA
Localización	-	SALIDA PATIO DE MAQUINAS	-	NA
Capa	-	UNICA	-	NA
Espesor de la Capa	cm	30	-	NA
Profundidad	cm	30	-	NA
Densidad Húmeda Terreno	kg/m³	2082	-	NA
Humedad Terreno	%	11.0	-	NA
Densidad Seca en Terreno	kg/m³	1875	-	± 3.94
Densidad Seca Máxima Proctor	kg/m³	1993	-	NA
Humedad Óptima	%	9.8	-	NA
Compactación	%	94.1	-	NA
Especificación de la Obra	%	95.0	-	NA
Observación	-	PROCTOR SUMINISTRADO EN OBRA	-	NA
Laboratorista	-	Nelson Alfonso	-	NA

Instrumento(s) Empleado(s) : LAB-05-019

Muestra ID: 004

Item(s) de Ensayo	Unid.	Resultado	Especificación	Incert.
Metodo	-	Transmisión Directa	-	NA
Conteo Estándar Ds	-	2344	-	NA
Conteo Estándar Ms	-	701	-	NA

25022021125100000015281

Este documento es emitido por la Compañía bajo sus Condiciones Generales de Servicio accesibles en http://www.sgs.com/en/Terms-and-Conditions.aspx. Se destacan las estipulaciones que sobre limitación de responsabilidad, indemnización y jurisdicción se encuentran incluidas en las Condiciones Generales de Servicio. Se advierte a cualquier tenedor de este documento que la información aquí contenida refleja las conclusiones de la Compañía para el momento de su intervención y dentro de los límites de las instrucciones del Cliente, si las hubiere. La responsabilidad de la Compañía es exclusiva para con su Cliente y este documento no exonera a las partes de una transacción de ejercer todos sus derechos y obligaciones bajo los documentos de la misma. Cualquier alteración no autorizada, adulteración o falsificación del contenido o apariencia de este documento es ilegal y los infractores podrán ser procesados hasta los máximos que permita la ley.
ADVERTENCIA: Si la(s) muestra(s) a la(s) que se refiere(n) las conclusiones registradas en este documento (los "Resultados") fueron elaboradas y/o proporcionadas por el Cliente o por un tercero que actúa bajo las directrices del Cliente, los hallazgos no constituyen garantía de la representatividad de la muestra de ningún material y se refieren estrictamente a la (s) muestra(s). La Compañía no acepta ninguna responsabilidad con respecto al origen o la fuente de donde se indica que la(s) muestra(s) es/fue extraída.
A menos que se indique lo contrario, los resultados que se muestran en este reporte se refieren sólo a la muestra o muestras probadas y dichas muestras se conservan sólo durante 30 días.

Item(s) de Ensayo	Unid.	Resultado	Especificación	Incert.
Conteo Estándar Ms	-	701	-	NA
Tipo de Material	-	BG	-	NA
Localización	-	SALIDA PATIO DE MAQUINAS	-	NA
Capa	-	UNICA	-	NA
Espesor de la Capa	cm	30	-	NA
Profundidad	cm	30	-	NA
Densidad Húmeda Terreno	kg/m³	2075	-	NA
Humedad Terreno	%	9.8	-	NA
Densidad Seca en Terreno	kg/m³	1889	-	± 3.94
Densidad Seca Máxima Proctor	kg/m³	1993	-	NA
Humedad Óptima	%	9.8	-	NA
Compactación	%	94.8	-	NA
Especificación de la Obra	%	95.0	-	NA
Observación	-	PROCTOR SUMINISTRADO EN OBRA	-	NA
Laboratorista	-	Nelson Alfonso	-	NA

Instrumento(s) Empleado(s) : LAB-05-019

Muestra ID: 005

Item(s) de Ensayo	Unid.	Resultado	Especificación	Incert.
Metodo	-	Transmisión Directa	-	NA
Conteo Estándar Ds	-	2344	-	NA
Conteo Estándar Ms	-	701	-	NA
Tipo de Material	-	BG	-	NA
Localización	-	SALIDA PATIO DE MAQUINAS	-	NA
Capa	-	UNICA	-	NA
Espesor de la Capa	cm	30	-	NA
Profundidad	cm	30	-	NA
Densidad Húmeda Terreno	kg/m³	2118	-	NA
Humedad Terreno	%	9.6	-	NA
Densidad Seca en Terreno	kg/m³	1933	-	± 3.94
Densidad Seca Máxima Proctor	kg/m³	1993	-	NA
Humedad Óptima	%	9.8	-	NA
Compactación	%	97.0	-	NA
Especificación de la Obra	%	95.0	-	NA
Observación	-	PROCTOR SUMINISTRADO EN OBRA	-	NA

25022021125100000015281

Este documento es emitido por la Compañía bajo sus Condiciones Generales de Servicio accesibles en http://www.sgs.com/en/Terms-and-Conditions.aspx. Se destacan las estipulaciones que sobre limitación de responsabilidad, indemnización y jurisdicción se encuentran incluidas en las Condiciones Generales de Servicio. Se advierte a cualquier tenedor de este documento que la información aquí contenida refleja las conclusiones de la Compañía para el momento de su intervención y dentro de los límites de las instrucciones del Cliente, si las hubiere. La responsabilidad de la Compañía es exclusiva para con su Cliente y este documento no exonera a las partes de una transacción de ejercer todos sus derechos y obligaciones bajo los documentos de la misma. Cualquier alteración no autorizada, adulteración o falsificación del contenido o apariencia de este documento es ilegal y los infractores podrán ser procesados hasta los máximos que permita la ley.
ADVERTENCIA: Si la(s) muestra(s) a la(s) que se refiere(n) las conclusiones registradas en este documento (los "Resultados") fueron elaboradas y/o proporcionadas por el Cliente o por un tercero que actúa bajo las directrices del Cliente, los hallazgos no constituyen garantía de la representatividad de la muestra de ningún material y se refieren estrictamente a la (s) muestra(s). La Compañía no acepta ninguna responsabilidad con respecto al origen o la fuente de donde se indica que la(s) muestra(s) esfue extraída.
A menos que se indique lo contrario, los resultados que se muestran en este reporte se refieren sólo a la muestra o muestras probadas y dichas muestras se conservan sólo durante 30 días.

Informe de Resultados No. BO2101502 Rev. 0

Fecha: 2021/02/25

Item(s) de Ensayo	Unid.	Resultado	Especificación	Incert.
Observación	-	PROCTOR SUMINISTRADO EN OBRA	-	NA
Laboratorista	-	Nelson Alfonso	-	NA

Instrumento(s) Empleado(s) : LAB-05-019

- Las incertidumbres expandidas se calcularon considerando k = 2 y un intervalo de confianza de ± 95%.

Nota :

(1) LCM = Limite de Cuantificación
(2) ND = No Detectado (< LCM)
(3) NA = No Aplicable
(4) "-" = No Analizado
(5) "--" = Análisis en Proceso

(6) (A) = Los resultados del análisis están acreditados por el ONAC (Organismo Nacional de Acreditación de Colombia) bajo el Certificado No. 13-LAB-015.

(7) Declaración de cumplimiento. Los resultados de los ensayos y la declaración de cumplimiento con la especificación en este informe se refieren solamente a la muestra de ensayo tal como ha sido analizada / ensayada y no del ítem del cual se ha sacado la muestra de ensayo. Valores de declaración:
(C) = El valor medido cumple con el límite de la especificación
(NC) = El valor medido no cumple con el límite de la especificación
(NR) = Para el valor medido no es posible una declaración de cumplimiento con la especificación

Observaciones :

Los resultados de estas pruebas son válidos única y exclusivamente para las muestras ensayadas. Cualquier alteración a este documento lo invalida.

*** Fin de Reporte ***

Este documento es emitido por la Compañía bajo sus Condiciones Generales de Servicio accesibles en http://www.sgs.com/en/Terms-and-Conditions.aspx. Se destacan las estipulaciones que sobre limitación de responsabilidad, indemnización y jurisdicción se encuentran incluidas en las Condiciones Generales de Servicio. Se advierte a cualquier tenedor de este documento que la información aquí contenida refleja las conclusiones de la Compañía para el momento de su intervención y dentro de los límites de las instrucciones del Cliente, si las hubiere. La responsabilidad de la Compañía es exclusiva para con su Cliente y este documento no exonera a las partes de una transacción de ejercer todos sus derechos y obligaciones bajo los documentos de la misma. Cualquier alteración no autorizada, adulteración o falsificación del contenido o apariencia de este documento es ilegal y los infractores podrán ser procesados hasta los máximos que permita la ley.
ADVERTENCIA: Si la(s) muestra(s) a la(s) que se refiere(n) las conclusiones registradas en este documento (los "Resultados") fueron elaboradas y/o proporcionadas por el Cliente o por un tercero que actúa bajo las directrices del Cliente, los hallazgos no constituyen garantía de la representatividad de la muestra de ningún material y se refieren estrictamente a la (s) muestra(s). La Compañía no acepta ninguna responsabilidad con respecto al origen o la fuente de donde se indica que la(s) muestra(s) es/fue extraída.
A menos que se indique lo contrario, los resultados que se muestran en este reporte se refieren sólo a la muestra o muestras probadas y dichas muestras se conservan sólo durante 30 días.

Anexo 6. Liberaciones

G-G Ingenieros Ltda.	LIBERACIONES OBRAS CIVILES	Fecha: 07/06/018
	CIVIL	Codigo: F-CIV-025
		Version: 1
		Hoja 1 de 1

PROYECTO: ESTACIÓN DE COMBEROS DE BELLAVISTA

Contrato No.: 470 DE 2018

Fecha	12-02-21.	**Localización**	ZARPA MURO 3 -3,30. CARAMUS MURO 0.00
Actividad	FUNDIDA CONCRETO		

1. PLANOS

1.1.	LOS PLANOS SE ENCUENTRAN APROBADOS	☐SI	☐NO	☐NA	**Plano No.**	
1.2.	Observaciones: PLANOS ESTRUCTURALES					

2. LOCALIZACION Y REPLANTEO

2.1.	LOS PLANOS SE ENCUENTRAN APROBADOS	☑SI	☐NO	☐NA	**Plano No.**	
2.2.	Observaciones: PLANOS ESTRUCTURALES					

3. EXCAVACION

3.1.	SE REALIZA TRABAJOS DE EXCAVACION	☑SI	☐NO	☐NA	**En caso de ser si diligencie lo siguiente**			
3.2.	**ANCHO:**		**LARGO:**		**ALTURA:**		**NA**	
3.3.	Observaciones: REVISION TOPOGRAFICA.							

4. RELLENO

4.1.	SE REALIZA TRABAJOS DE RELLENO	☐SI	☑NO	☐NA	**En caso de ser si diligencie lo siguiente**
4.2.	**MATERIAL DE RELLENO:** ☐BASE ☐SUB BASE ☐ARENA ☐RECEBO ☐ZAHORRA ☐OTRO. CUAL:				
4.3.	**ENSAYO DE COMPACTACION**	**ESPECIFICADO:**		**OBTENIDO:**	
4.4.	Observaciones:				

5. FORMALETA

5.1.	SE CUENTA CON FORMALETAS	☑SI	☐NO	☐NA	**En caso de ser si diligencie lo siguiente**	
5.2.	TIPO DE MATERIAL ☑Madera ☐Metálica			5.3.	**ESPECIFICACIONES:**	
					☐ALINEACION	☐SI ☐NA
					☐A PLOMO	☐SI ☐NA
					☑MEDIDAS CORRECTAS	☑SI ☐NA
					☐APUNTALAMIENTO	☑SI ☐NA
5.4.	Observaciones:					

6. ACERO DE REFUERZO

6.1.	SE UTILIZA ACERO DE REFUERZO	☑SI	☐NO	☐NA	**En caso de ser si diligencie lo siguiente**	
6.2.	TIPO ☑Est. Metálica ☑Carpintería Metálica			6.3.	**ESPECIFICACIONES:**	
					☐Dimensiones Correctas	☑SI ☐NA
					☑Figuración	☐SI ☐NA
					☐Ubicación	☐SI ☐NA
					☑Traslapos	☐SI ☐NA
					☑Amarres	☑SI ☐NA
					☐Soldadura	☐SI ☑NA
					☐Platinas	☐SI ☑NA
					☐Pernos	☐SI ☑NA
6.4.	Observaciones: HIERRO DESCUADRADO LOSPATAS.					

7. CONCRETOS

7.1.	VACIADO DE CONCRETO	☑SI	☐NO	☐NA	**RESISTENCIA:**	280	**PSI:** 4000
7.2.	**ESPECIFICACIONES**	Concreto de:	PLANTA.	Mezcladora:	TREMIX	SLUMP	8"
		Hora Fundida	4:00 Pm	Inicio:	5:30 Pm.	Fin:	7:00 Pm.
		No. Tiquete	1336777	Volumen m3	4 m³	No. Cilindros tomados	8.
		lluvia?	☐SI ☑NO	Inicio:	—	Fin:	—
7.3.	Observaciones:						

8. MATERIALES

	Cemento	Acero de Refuerzo	Ø	Aditivos	Otros O1:	Otros O2:
LOTE						
LOTE						

9. RESISTENCIA A LA COMPRESION

Asentamiento	Edad	Fecha Vaciado	Fecha Rotura	Diametro	Resistencia Obetenida	Resistencia especifica

POR EL CONTRATISTA		INTERVENTORIA	
NOMBRE	Camilo Lozano.	NOMBRE	Luis Contreras
CARGO	Residente de Obra.	CARGO	Ing civil aux
FECHA	12-02-21	FECHA	12-02-21

G-G Ingenieros Ltda.	LIBERACIONES OBRAS CIVILES	Fecha: 07/06/016
	CIVIL	Codigo: F-CIV-025
		Version: 1
		Hoja 1 de 1

PROYECTO: ESTACIÓN DE COMBEROS DE BELLAVISTA

Contrato No.: 470 DE 2018

Fecha	22-02-21.	**Localización**	PLACA +4,85 EJES C-D Y 1A-1.
Actividad	FUNDIDA CONCRETO.		

1. PLANOS

1.1.	LOS PLANOS SE ENCUENTRAN APROBADOS	☑SI	☐NO	☐NA	Plano No.	
1.2.	Observaciones: PLANOS ESTRUCTURALES.					

2. LOCALIZACION Y REPLANTEO

2.1.	LOS PLANOS SE ENCUENTRAN APROBADOS	☑SI	☐NO	☐NA	Plano No.	
2.2.	Observaciones: PLANOS ESTRUCTURALES.					

3. EXCAVACION

3.1.	SE REALIZA TRABAJOS DE EXCAVACION	☐SI	☑NO	☐NA	En caso de ser si diligencie lo siguiente			
3.2.	ANCHO:		LARGO:		ALTURA:		NA	
3.3.	Observaciones:							

4. RELLENO

4.1.	SE REALIZA TRABAJOS DE RELLENO	☑SI	☐NO	☐NA	En caso de ser si diligencie lo siguiente			
4.2.	MATERIAL DE RELLENO: ☐BASE ☐SUB BASE ☐ARENA ☑RECEBO ☐ZAHORRA ☐OTRO CUAL:							
4.3.	ENSAYO DE COMPACTACION	ESPECIFICADO:			OBTENIDO:			
4.4.	Observaciones: RELLENO EN MATERIAL RECICLADO.							

5. FORMALETA

5.1.	SE CUENTA CON FORMALETAS	☑SI	☐NO	☐NA	En caso de ser si diligencie lo siguiente			
5.2.	TIPO DE MATERIAL ☐Madera ☑Metálica				5.3.	ESPECIFICACIONES: ☐ALINEACION ☑SI ☐NA; ☐A PLOMO ☑SI ☐NA; ☑MEDIDAS CORRECTAS ☑SI ☐NA; ☐APUNTALAMIENTO ☐SI ☐NA		
5.4.	Observaciones:							

6. ACERO DE REFUERZO

6.1.	SE UTILIZA ACERO DE REFUERZO	☑SI	☐NO	☐NA	En caso de ser si diligencie lo siguiente			
6.2.	TIPO ☐Est. Metálica ☑Carpintería Metálica				6.3.	ESPECIFICACIONES: ☐Dimensiones Correctas ☑SI ☐NA; ☑Fijación ☑SI ☐NA; ☑Ubicación ☑SI ☐NA; ☑Traslapos ☑SI ☐NA; ☐Amarres ☑SI ☐NA; ☐Soldadura ☐SI ☑NA; ☐Platinas ☐SI ☑NA; ☐Pernos ☐SI ☑NA		
6.4.	Observaciones:							

7. CONCRETOS

7.1.	VACIADO DE CONCRETO ☐SI ☐NO ☐NA			RESISTENCIA:	280	PSI:	4000.
7.2.	ESPECIFICACIONES	Concreto de:	PLANTA	Mezcladora:	3 EJES.	SLUMP	
		Hora Fundida	8:00 AM.	Inicio:	8:45.	Fin:	9:40
		No. Tiquete	1337032	Volumen m3	9,5.	No. Cilindros tomados	8
		lluvia?	☐SI ☐NO	Inicio:	—	Fin:	—
7.3.	Observaciones:						

8. MATERIALES

	Cemento	Acero de Refuerzo	Ø	Aditivos	Otros	
LOTE					O1:	O2:
LOTE						

9. RESISTENCIA A LA COMPRESION

Asentamiento	Edad	Fecha Vaciado	Fecha Rotura	Diametro	Resistencia Obetenida	Resistencia especifica

POR EL CONTRATISTA	INTERVENTORIA
NOMBRE Danilo Romero	Luis contreras
CARGO Residente de Obra.	CARGO Ing civil aux.
FECHA 22-02-21	FECHA 22-02-21

G-G Ingenieros Ltda.	LIBERACIONES OBRAS CIVILES	Fecha: 07/06/016
		Codigo: F-CIV-025
	CIVIL	Version: 1
		Hoja 1 de 1

PROYECTO:
ESTACIÓN DE COMBEROS DE BELLAVISTA

Contrato No.: 470 DE 2018

Fecha	23 FEB -21.	**Localización**	PLACA N+0.00 PARTE 1
Actividad	FUNDIDA DE CONCRETO.		CD - 2A

1. PLANOS

1.1.	LOS PLANOS SE ENCUENTRAN APROBADOS	☑SI	☐NO	☐NA	**Plano No.**		
1.2.	Observaciones: P. ESTRUCTURALES.						

2. LOCALIZACION Y REPLANTEO

2.1.	LOS PLANOS SE ENCUENTRAN APROBADOS	☑SI	☐NO	☐NA	**Plano No.**		
2.2.	Observaciones:						

3. EXCAVACION

3.1.	SE REALIZA TRABAJOS DE EXCAVACION	☑SI	☐NO	☐NA	**En caso de ser si diligencie lo siguiente**				
3.2.	**ANCHO:**		**LARGO:**		**ALTURA:**		**NA**		
3.3.	Observaciones:								

4. RELLENO

4.1.	SE REALIZA TRABAJOS DE RELLENO	☑SI	☐NO	☐NA	**En caso de ser si diligencie lo siguiente**		
4.2.	**MATERIAL DE RELLENO:** ☐BASE ☐SUB BASE ☐ARENA ☐RECEBO ☐ZAHORRA ☐OTRO CUAL:						
4.3.	**ENSAYO DE COMPACTACION**	**ESPECIFICADO:**			**OBTENIDO:**		
4.4.	Observaciones:						

5. FORMALETA

5.1.	SE CUENTA CON FORMALETAS	☑SI	☐NO	☐NA	**En caso de ser si diligencie lo siguiente**		
5.2.	TIPO DE MATERIAL ☐Madera ☐Metálica			5.3.	**ESPECIFICACIONES:** ☐ALINEACION ☐A PLOMO ☐MEDIDAS CORRECTAS ☐APUNTALAMIENTO	☐SI ☐SI ☐SI ☐SI	☐NA ☐NA ☐NA ☐NA
5.4.	Observaciones:						

6. ACERO DE REFUERZO

6.1.	SE UTILIZA ACERO DE REFUERZO	☐SI	☐NO	☐NA	**En caso de ser si diligencie lo siguiente**		
6.2.	TIPO ☐Est. Metálica ☐Carpintería Metálica			6.3.	**ESPECIFICACIONES:** ☐Dimensiones Correctas ☐Figuración ☐Ubicación ☐Traslapos ☐Amarres ☐Soldadura ☐Platinas ☐Pernos	☑SI ☑SI ☑SI ☑SI ☑SI ☐SI ☐SI ☐SI	☐NA ☐NA ☐NA ☐NA ☐NA ☑NA ☑NA ☑NA
6.4.	Observaciones:						

7. CONCRETOS

7.1.	VACIADO DE CONCRETO	☑SI	☐NO	☐NA	**RESISTENCIA:**	280	**PSI:** 4000
7.2.	**ESPECIFICACIONES**	Concreto de:	PLANTA	Mezcladora:	TROMPO	SLUMP	21
		Hora Fundida	800.	Inicio:	800	Fin:	12800.
		No. Tiquete	133710-74-0	Volumen m3	16,17	No. Cilindros tomados	8
		Lluvia?	☐SI ☑NO	Inicio:	—	Fin:	—
7.3.	Observaciones:						

8. MATERIALES

	Cemento	Acero de Refuerzo	Ø	Aditivos	Otros O1:	Otros O2:
LOTE						
LOTE						

9. RESISTENCIA A LA COMPRESION

Asentamiento	Edad	Fecha Vaciado	Fecha Rotura	Diametro	Resistencia Obtenida	Resistencia especifica

POR EL CONTRATISTA		INTERVENTORIA	
NOMBRE	Gonzalo Romero	NOMBRE	Luis contreras
CARGO	Residente de Obra	CARGO	Ing civil aux.
FECHA	23-02-21	FECHA	23-02-21

G&G Ingenieros Ltda.	LIBERACIONES OBRAS CIVILES	Fecha: 07/06/016
		Codigo: F-CIV-025
	CIVIL	Version: 1
		Hoja 1 de 1

PROYECTO:
ESTACIÓN DE COMBEROS DE BELLAVISTA

Contrato No.: 470 DE 2018

Fecha	24-02-21	Localización	PLACA N+0.00 PARTE.
Actividad	FUNDIDA.	EJES	2-4 - C-D-

1. PLANOS

1.1.	LOS PLANOS SE ENCUENTRAN APROBADOS	☑SI	☐NO	☐NA	Plano No.	
1.2.	Observaciones:					

2. LOCALIZACION Y REPLANTEO

2.1.	LOS PLANOS SE ENCUENTRAN APROBADOS	☑SI	☐NO	☐NA	Plano No.	
2.2.	Observaciones:					

3. EXCAVACION

3.1.	SE REALIZA TRABAJOS DE EXCAVACION	☑SI	☐NO	☐NA	En caso de ser si diligencie lo siguiente			
3.2.	ANCHO:		LARGO:		ALTURA:		NA	
3.3.	Observaciones:							

4. RELLENO

4.1.	SE REALIZA TRABAJOS DE RELLENO	☑SI	☐NO	☐NA	En caso de ser si diligencie lo siguiente		
4.2.	MATERIAL DE RELLENO:	☑BASE	☑SUB BASE	☐ARENA	☐RECEBO	☐ZAHORRA	☐OTRO
	CUAL:						
4.3.	ENSAYO DE COMPACTACION	ESPECIFICADO:			OBTENIDO:		
4.4.	Observaciones: TOPOGRAFIA						

5. FORMALETA

5.1.	SE CUENTA CON FORMALETAS	☑SI	☐NO	☐NA	En caso de ser si diligencie lo siguiente
5.2.	TIPO DE MATERIAL ☐Madera ☐Metálica			5.3.	ESPECIFICACIONES: ☐ALINEACION ☑SI ☐NA; ☐A PLOMO ☑SI ☐NA; ☐MEDIDAS CORRECTAS ☑SI ☐NA; ☐APUNTALAMIENTO ☑SI ☐NA
5.4.	Observaciones:				

6. ACERO DE REFUERZO

6.1.	SE UTILIZA ACERO DE REFUERZO	☑SI	☐NO	☐NA	En caso de ser si diligencie lo siguiente
6.2.	TIPO ☐Est. Metálica ☐Carpintería Metálica			6.3.	ESPECIFICACIONES: ☐Dimensiones Correctas ☑SI ☐NA; ☐Figuración ☑SI ☐NA; ☐Ubicación ☑SI ☐NA; ☐Traslapos ☑SI ☐NA; ☐Amarres ☑SI ☐NA; ☐Soldadura ☐SI ☐NA; ☐Platinas ☐SI ☐NA; ☐Pernos ☐SI ☐NA
6.4.	Observaciones:				

7. CONCRETOS

7.1.	VACIADO DE CONCRETO	☑SI	☐NO	☐NA	RESISTENCIA:	280	PSI: 4000.
7.2.	ESPECIFICACIONES	Concreto de:	PLANTA		Mezcladora:	TREMY.	SLUMP: B11
		Hora Fundida	800		Inicio:	900	Fin: 1100
		No. Tiquete	13370 68-72		Volumen m3	16.	No. Cilindros tomados: 8.
		lluvia?	☐SI	☑NO	Inicio:	—	Fin: —
7.3.	Observaciones:						

8. MATERIALES

	Cemento	Acero de Refuerzo	Ø	Aditivos	Otros O1:	Otros O2:
LOTE						
LOTE						

9. RESISTENCIA A LA COMPRESION

Asentamiento	Edad	Fecha Vaciado	Fecha Rotura	Diametro	Resistencia Obetenida	Resistencia especifica

POR EL CONTRATISTA	INTERVENTORIA
NOMBRE: Camilo Romero	Luis Contreras
CARGO: Residente de Obra	Ing Civil aux
FECHA: 24-02-21	24-02-21

G&G Ingenieros Ltda	LIBERACIONES OBRAS CIVILES	Fecha: 07/06/016
	CIVIL	Codigo: F-CIV-025
		Version: 1
		Hoja 1 de 1

PROYECTO:
ESTACIÓN DE COMBEROS DE BELLAVISTA

Contrato No.: 470 DE 2018

Fecha	25-02-21	Localización	PLACA N+000 PANTES. EJES 2-4 Y CD.
Actividad	FUNDIDA CONCRETO		

1. PLANOS

1.1.	LOS PLANOS SE ENCUENTRAN APROBADOS	☑SI	☐NO	☐NA	Plano No.	
1.2.	Observaciones:					

2. LOCALIZACION Y REPLANTEO

2.1.	LOS PLANOS SE ENCUENTRAN APROBADOS	☑SI	☐NO	☐NA	Plano No.	
2.2.	Observaciones:					

3. EXCAVACION

3.1.	SE REALIZA TRABAJOS DE EXCAVACION	☑SI	☐NO	☐NA	En caso de ser si diligencie lo siguiente			
3.2.	ANCHO:		LARGO:		ALTURA:		NA	
3.3.	Observaciones:							

4. RELLENO

4.1.	SE REALIZA TRABAJOS DE RELLENO	☑SI	☐NO	☐NA	En caso de ser si diligencie lo siguiente		
4.2.	MATERIAL DE RELLENO:	☑BASE	☑SUB BASE	☐ARENA	☐RECEBO	☐ZAHORRA	☐OTRO
	CUAL:						
4.3.	ENSAYO DE COMPACTACION	ESPECIFICADO:			OBTENIDO:		
4.4.	Observaciones: TOPOGRAFIA REGISTRO.						

5. FORMALETA

5.1.	SE CUENTA CON FORMALETAS	☑SI	☐NO	☐NA
5.2.	TIPO DE MATERIAL	☐Madera	☐Metálica	
5.3.	En caso de ser si diligencie lo siguiente			
	ESPECIFICACIONES:			
	☑ALINEACION	☑SI	☐NA	
	☑A PLOMO	☑SI	☐NA	
	☐MEDIDAS CORRECTAS	☑SI	☐NA	
	☐APUNTALAMIENTO	☑SI	☐NA	
6.4.	Observaciones:			

6. ACERO DE REFUERZO

6.1.	SE UTILIZA ACERO DE REFUERZO	☐SI	☐NO	☐NA	En caso de ser si diligencie lo siguiente		
6.2.	TIPO	☐Ind. Metálica	☑Carpintería Metálica				
6.3.	ESPECIFICACIONES:						
	☑Dimensiones Correctas	☑SI	☐NA				
	☑Figuración	☑SI	☐NA				
	☑Ubicación	☑SI	☐NA				
	☑Traslapos	☑SI	☐NA				
	☐Alturas	☑SI	☐NA				
	☐Soldadura	☐SI	☑NA				
	☑Rotulas	☐SI	☐NA				
	☐Pernos	☐SI	☑NA				
6.4.	Observaciones:						

7. CONCRETOS

7.1.	VACIADO DE CONCRETO	☑SI	☐NO	☐NA	RESISTENCIA:	280	PSI: 4000
7.2.	ESPECIFICACIONES	Concreto de:	PLANTA	Mezcladora:	TREMIX	SLUMP	8
		Hora Fundida	800	Inicio:	800	Fin:	12 M.
		No. Tiquete	1337113/10/16	Volumen m3	16.	No. Cilindros tomados	8
		lluvia?	☐SI ☑NO	Inicio:	—	Fin:	—
7.3.	Observaciones:						

8. MATERIALES

	Cemento	Acero de Refuerzo	Ø	Aditivos	Otros O1:	Otros O2:
LOTE						
LOTE						

9. RESISTENCIA A LA COMPRESION

Asentamiento	Edad	Fecha Vaciado	Fecha Rotura	Diametro	Resistencia Obetenida	Resistencia especifica

POR EL CONTRATISTA	INTERVENTORIA
NOMBRE Camilo Romero	Luis contreras
CARGO Residente de Obra.	Ing civil mva
FECHA 24-02-21	25-02-21

Anexo 7. Bitácora

en Baño N+6.60, enchape piso N+3.30, estuco y pintura N+6.60 entre los ejes 1 al 2 y A al 7, pañete impermeabilizado puntos electricos y fundida de columnetas y viguetas de confinamiento N+3.30 entre los ejes 1 al 2 y A al C, montaje de lavamanos 3, mamposteria para la casa CS276, y encofrado cajas de aforos N+0.00, excavacion a maquina para tuberia enterrado, instalacion de tuberia AlC y rellenos en recebo común y arena de Peña ejes 2 al 4 y C al 21 N+0.00.

31/En/2021 Personal de obra Ing aux civil, Ing SST, almacenista maestro, ejero, conductor mini, oficiales 9, ayudantes 9. Pañete lineal entre los ejes 1 al 2 y C al 2 en nivel N+6.60, terminacion de caja de aforos y casa electrica CS 276 entre los ejes C al 7 y 2 al 4 en nivel N+0.00, mamposteria entre los ejes 1 al 2 y A0 al 2 en nivel N+9.90, pañete liso impermeabilizado entre los ejes 1 al 2 y A0 al B en nivel N+0.00, fundida de confinamiento N+0.00 y enchape piso N+3.30 entre los ejes 1 al 2 y A al 7, relleno en recebo comun entre los ejes 2 al 3 y C al 7 en nivel N+0.00.

1/Febr/2020 Personal de obra Arq residente, Aux arq, Ing residente, Ing aux civil, Ing sst, coord calidad, almacenista operativo, maestro, ejero, conductor mini, conductor retro, oficiales 20, ayudantes 26 topografia 1, personal de cubierta 6, hidrosanitario 1. Intervento: Ing residente, Ing aux civil, Ins sst. mamposteria para los cajas CS 276 de la red electrica en nivel N+3.30 ejes 7 al 7 y 2 al 4 y al 6, pañete liso. Enchape muro en baño y pintura entre los ejes 1 al 2 y A al B en nivel N+3.30, instalación de tubera de la red de incendia, con valvula expulsora y registro Bola entre los ejes 1 al 2 y A0 al 2. Fundida de columnetas y viguetas de confinamiento e instalación de cubierta tipo sandwich ejes 1 al 2 y C al 7, instalacion de malla electrosoldada, relleno en recebo común con material de rec, mamposteria en ladrillo arena con fachaleta, instalacion tuberia

Scanned by TapScanner

alcantarillado, relleno de arena de peña y relleno en recebo comun con material rec ejes 2 al 3 y C al 7 nivel N+0.00, pañete impermeabilizado, estuco y pintura N+3.30

9/feb/2021 Personal de obra: Arq. residente, Arq aux, Ing residente Ing aux, Ing sst, Coord. calidad, almacenista. guarda de seguridad, operativo: 18 oficiales, 23 ayudantes, maestro, ejeo, conductor mini, tecnicos ascensor 2, 2 hidrosanitarios 2 electricos, Interventoria: Ing residente, Ing civil aux, Ing sst, Excavación manual para la tuberia enterrada. y excavación manual para Urbanismo en nivel N-3.30 entre ejes 4 al 6 y CalD2, mamposteria en ladrillo gran Formato, arcno entre ejes 1-2 y A-B en nivel Nt 0.00, relleno en subbase granular en nivel Nt 0.00 entre los ejes C-D2 y 2-4, terminación punto duchas, pañete liso entre los ejes 1-2 y B-D Nivel +9.90, Inicio de instalación estructura cielo raso e instalación enchape en baño en nivel Nt 6.60 entre 6 ejes 1 al 2 y A-B mamposteria en Fachaleta en nivel y pañete lineal en alojamientos entre 1 al 2 y C al d en nivel Nt 6.60.

10/feb/21 Personal de obra: Arq residente, Arq aux, Ing residente Ing civil aux, Ing sst, Coord. Calidad, almacenista, guarda de seguridad, operativo: 23 oficiales, 23 ayudantes maestro, ejero conductor de mini, tecnicos de azensor 2 hidrosanitarios, 2 electricos, Interventoria: Ing residente Ing civil aux, Ing sst. Instalación enchape muro y piso en baño en nivel +3.30 entre ejes 1-2 y A-B pañeteliso, terminación puntos eletricos y puntos de duchas en instalación push sanitarios entre ejes 1 al 2 y a-D en nivel +9.90, mamposteria en bloque #4, estructura en cielo raso y Fundida de columetas y viguetas de confinamiento entre los ejes 1-2 y C-D nivel 6.60, excavación manual zona urbanismo, relleno en recebo común y subbase. entre ejes C-D2 y 2-4 nivel 0.00, excavación maquina N-3.30, Fundida de mesón Nt 3.30, estuco y pintura Nt 3.30 entre ejes 4 al 6 y Ao al D, mamposteria en ladrillo con Fachaleta lineal y en metro cuadrado entre ejes D al D1 y 1 al 2 Nivel t6.60. Se realiza mesa de trabajo para el tema de acta #4.

Scanned by TapScanner

11/feb/2021 Personal de obra: Arq residente, Arq aux, Ing residente, Ing aux, Ing sst, Coord. calidad, almacenista, operativo 23 oficiales, 24 ayudantes, maestro, ejero, conductor de mini, 2 tecnicos ascensor, 2 hidrosanitarios 2electricos, Interventoria: Ing residente, Ing Civil, Ing sst, Instalación estructura metalica para el cielo raso Nt 3,30 y Nt 6.60 entre ejes los ejes 1-2 y A-C, terminación puntos duchas, Instalación enchape muro de baños entre los ejes A-B y 1-2 Nt 0.00, Instalación enchape muro en baño y Cuarto de asco, Pañete liso en ejes 1 al 2 y B al C Nt 6,60 excavación manual zona sardinel, Fundida en concreto de limpieza para la cava sardinel en nivel 0,00 entre ejes 2-4 al D-D2 Instalación marcos de lamparas de Iluminación N-3.30, estuco y Pintura Nt 3.30 entre ejes 4 al 5 al B al D, Pañete Impermeab en baño, mamposteria en ladrillo gran Formato con Cocholeta entre los ejes C al D y 1 al 2 Nt 9,90.

12/feb/2021 Personal de obra: Arq residente, Arq aux, Ing residente Ing aux, Ing sst, Coord. calidad, almacenista, operativo: 22 oficiales, 27 ayudantes, maestro, ejero, conductor de mini, 2 tecnicos ascensor, 2 hidrosanitarios 2 electricos, Interventoria: Ing residente, Ing Civil aux, Ing sst. Fundida alFalla en concreto con acabado endurecido, Pañete liso y lincal entre ejes 1 al 2 y a-c en nivel Nt 9.90, relleno en recebo común con RCD para Urbanismo, relleno en base granular con RCD e Instalación marcos de luminarias en ejes 3-5 y C-D2 en nivel +0,00, Fundida en concreto 4000 para zarpa muro T3A N-3.30 en ejes AC ejes 5-6, Viga Nt 4,85 ejes 1A-1 ejes D-D1, Fndida de Concreto de Carcamos y borde de sardinel ejes 1 al 2 y A-C, terminación mesones zona cocina Nt 3,30 Instalación de enchape muros Baños Nt 0,00 estruct Cielo raso Nt 3,30 entre ejes 1-2 al A-C, terminación estuco y Pintura lineal Nt 0,00 ejes A-C y H-5 excavación a maquina de zona de urbanismo.

Scanned by TapScanner

13/Febrero Personal de obra: Arqo. residente, Arq aux, Ing residente, Ing aux, Ing SST, coord. calidad, almacenista, operativo: 18 oficiales, 22 ayudantes, maestro, cuero, conductor de mini, 2 tecnicos ascensor, 2 hidrosanitarios, 2 electrico Interventoria: Ing residente, Ing civil aux, Ing sst. Fundida en concreto para los cargamos para la salida patio de maquinas, relleno en base granular ejes 2-4 y C-D Nivel 0,00, relleno en rajon para mesramiento N+3,30, Instalación de luminarias N+0.00 y relleno en recebo común CD N+3.30 ejes C-D y 4-5, Puñete liso e instalación enchape piso entre los ejes 1-2 y A0-B en nivel N+6.60, mamposteria en blaque#4 enchape muro de baños ejes 1-2 y A-B N+0,00, mampostería en bloque#4 N+3,30 y mamposteria en ladrillo amarillo con Fachaleta N+9.90 entre ejes 1-2 y B-D, estructura cielo raso, instalación tubería PVC-P-CVP-P con regulardora de presión en ejes 1-2

14/Febrero Personal de Obra: Ing civil aux. Ing residente Ing sst, almacenista, operativo: 8 oficiales, 8 ayudantes, Interventoria: Ing civil aux, Enchape piso para baños de 60x60 entre los ejes B-D y 1 AL 2 en nivel N+6.60, relleno en recebo común entre los ejes 4 AL 5 y D al D2 en nivel N-3.30 Instalación luminarias en nivel 0,00 entre los ejes 4 al 5 y C al D, relleno en base granular entre los ejes 3 AL 4 y C al D en nivel N+0.00, mamposteria en ladrillo gran Formato color amarillo con Fachaleta en vigas aereas y cubo entre los ejes 1 y 2 y sobre ex D en nivel +13,20. Se hace aseo a la obra y se hace recolección y seleccionado de materiales granulares y se hace la respectivo acopiamiento de estos., la obra se encuentra en perfectas condiciones de Señalamiento en zonas de riesgo.

Lluvia: 1:00pm a 2:30 pm

Scanned by TapScanner

15/Feb/2021 Personal de obra: Arq residente, Arq aux, Ing residente Ing Civil aux, Ing sst, coord. calidad, almacenista operativo: 24 oficiales, 26 ayudantes, maestro, cisco Conductor de mini, 2 tecnicos de ascensor, 2 hidrosanitarios, Interventoria: Ing residente, Ing Civil aux, Ing sst, Fundida de alfajia en concreto con acabado endurecido, Pañete liso Nt 6.60 ejes 1 a 2 y A-C, Fundida de columnetas y vigetas de confinamiento, pañete impermeabilizado entre ejes 1-2 al A-B en nivel 0.00, mampostera en ladrillo amarillo N+0.00 mamposteria en bloque # 4 entre ejes 1-2 y A-C Instalación tuberia, PVC-P en ejes 1-2 al A-B Instalación enchape PISO N+6.60 eje 1 A 2 Al D-A Instalación luminarias Nt 0.00 ejes 4, a 5 Instalación cielo raso 1-2 y A-B. Lluvia de 12:00 pm a 2:00 pm

16/Feb/2021 Personal de obra Ing residente, Arq residente, Ing aux civil Arq aux, Ing sst, coord calidad, almacenista, operativo, maestro, conductor del mini, oficiales 23, ayudantes 25, hidrosanitario 2, electrico 1, Ascensor 2, corta fuegos 5. mamposteria en Bloque #4 N+9.90, aplicacion de mortero contra fuego N+13.20, soporte RC1 transversal N+6.60 Entre ejes 1 al 2 y A0 al ?, desmonte de la cris este, continuacion de cerramiento provisional sobre Eje 6 y A al C en nivel N-3.30, terminacion mesones N+3.30 e instalaciones luminarias N+0.00 Entre los ejes 4 al 5 y A al B, fundido de columnas y vigetas de confinamiento, puntos electricos, luminas del cielo raso entre los ejes 1 al 2 y A0 al B, enchape de piso, pañete liso en escaleras y soportes longitudinal RC1 entre los ejes A0 al B y 1 al 2 en nivel N+6.60, acabados endurecidos carcamos, relleno en base y subbase Granular entre los ejes 2 al 4 y C al ? en nivel N+0.00.

Scanned by TapScanner
