Anexo 2. Informes diarios

GyG Ingenieros Ltda.	INFORME DIARIO DE ACTIVIDADES	Fecha:01/06/2019
		Código: F-OBR-024
	EJECUCIÓN DE OBRA	Versión: 1
		Hoja No.: 1 de 1

No DE CONTRATO DE OBRA Y OBJETO	CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No 470 DE 2018 SUSCRITO ENTRE EL DISTRITO CAPITAL - UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL CUERPO DE BOMBEROS Y GYG INGENIEROS LTDA	CONSECUTIVO	44
LUGAR o ESPECIALIDAD DE LOS TRABAJOS	OBRA	FECHA	jueves 1 de agosto de 2019

HORAS PERDIDAS	POR LLUVIA	POR PAROS		OTROS	TOTALES
Horas Hombre					0.0
Horas Equipo					0.0

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD FUNCIONAL	UND.	CANTIDAD			
				CONTRACTUAL	ACUMULADO ANTERIOR	AVANCE HOY	ACUMULADO ACTUAL
1.00	CORTE DE CERCHA EXISTENTE	GLB	1.00				
2.00	ARREGLO CAMPAMENTO	GLB	1.00				

DESCRIPCION DE ACTIVIDADES EJECUTADAS

SE HACE INICIO DE CORTE DE CERCHAS EXISTENTES Y ARREGLO CAMPAMENTO SEGUNDO PISO (COLOCACIÓN DE PUERTA EN BAÑO Y VIDRIO)

MANO DE OBRA EMPLEADA

CARGO	HORA		CANT.	TIEMPO (Horas)
	INICIO	FIN		
Arq. Residente	7:00:00	16:30:00	1	9
Ing. Residente	7:00:00	16:30:00	1	9
Aux. Ingeniero civil	7:00:00	16:30:00	1	9
Ing.. Profesional SST	7:00:00	16:30:00	1	9
Trabajadores	7:00:00	16:30:00	3	27
Arq. Residente interventoría	16:00:00	16:30:00	1	1
ing. Auxiliar de interventoría	16:00:00	16:30:00	1	1

EQUIPO UTILIZADO

DESCRIPCIÓN	CANT.	TIEMPO (Horas)
ANDAMIOS CERTIFICADOS	1	9
PULIDORA	1	9
TALADRO	1	1

MATERIALES UTILIZADOS

DESCRIPCIÓN	UND.	CANT.

ESTADO DEL TIEMPO

		HORAS
SECO	X	9
NEBLINA		
LLOVIZNA		
LLUVIA		
TORMENTA		

ACCESO


BUENO	X
REGULAR	
MALO	
NULO	

TERRENO

ROCOSO		DURO		NORMAL	X
ARENOSO		LODOSO		PANTANO	

CAUSA ATRASO/DIA - MEDIDA CORRECTIVA:

ESQUEMÁTICO DE OBRA

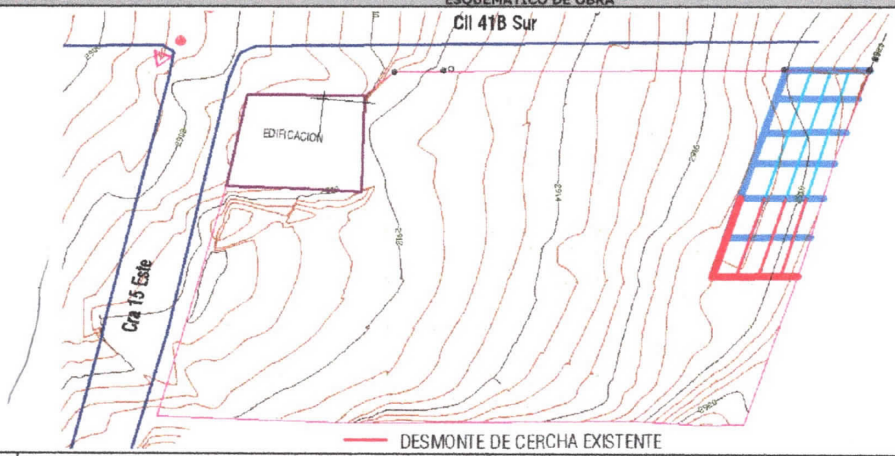

OBSERVACIONES:

FIRMA:	ELABORÓ	FIRMA:	APROBÓ
NOMBRE:	ING. JAVIER ANDRES ESCOBAR PINTOR	NOMBRE:	ARQ. MARCELO SARMIENTO
CARGO:	AUXILIAR DE INGENIERIA CONTRATISTA	CARGO:	DIRECTOR DE OBRA CONTRATISTA
FIRMA:	VALIDÓ	FIRMA:	APROBÓ
NOMBRE:	ING. CAMILO ROMERO	NOMBRE:	ARQ. JHON CUELLAR
CARGO:	RESIDENTE DE OBRA CONTRATISTA	CARGO:	RESIDENTE DE INTERVENTORIA

	INFORME DIARIO DE ACTIVIDADES	Fecha:01/06/2019
		Código: F-OBR-024
	EJECUCIÓN DE OBRA	Versión: 1
		Hoja No.: 1 de 1

No DE CONTRATO Y OBJETO	CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No 470 DE 2018 SUSCRITO ENTRE EL DISTRITO CAPITAL - UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL CUERPO DE BOMBEROS Y GYG INGENIEROS LTDA	CONSECUTIVO	44
LUGAR o ESPECIALIDAD DE LOS TRABAJOS	OBRA	FECHA	jueves 1 de agosto de 2019

INFORME DIARIO No. 44


REGISTRO FOTOGRÁFICO










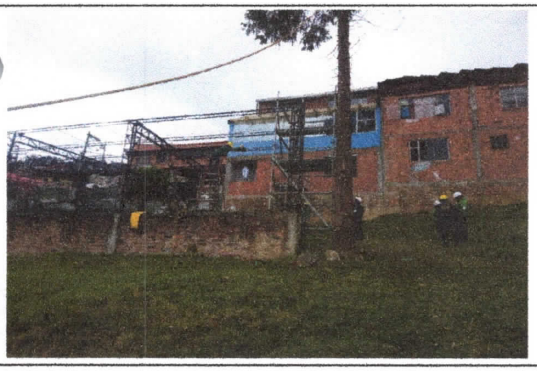

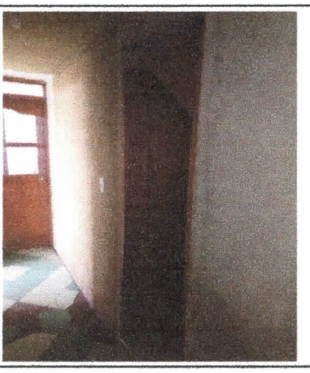

ELABORO:

ING. JAVIER ESCOBAR PINTOR
AUXILIAR DE INGENIERIA - CONTRATISTA

APROBO:

ING CAMILO ROMERO
RESIDENTE DE OBRA CONTRATISTA

G&G Ingenieros Ltda.	INFORME DIARIO DE ACTIVIDADES	Fecha:01/06/2019
		Código: F-OBR-024
	EJECUCIÓN DE OBRA	Versión: 1
		Hoja No.: 1 de 1

No DE CONTRATO DE OBRA Y OBJETO	CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No 470 DE 2018 SUSCRITO ENTRE EL DISTRITO CAPITAL - UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL CUERPO DE BOMBEROS Y GYG INGENIEROS LTDA	CONSECUTIVO	45
LUGAR o ESPECIALIDAD DE LOS TRABAJOS	OBRA	FECHA	viernes 2 de agosto de 2019

HORAS PERDIDAS	POR LLUVIA	POR PAROS		OTROS	TOTALES
Horas Hombre					0.0
Horas Equipo					0.0

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD FUNCIONAL	UND.	CANTIDAD			
				CONTRACTUAL	ACUMULADO ANTERIOR	AVANCE HOY	ACUMULADO ACTUAL
1.00	CORTE DE CERCHA EXISTENTE	GLB	1.00				

DESCRIPCION DE ACTIVIDADES EJECUTADAS

SE CONTINUA CON EL CORTE DE CERCHAS EXISTENTES

MANO DE OBRA EMPLEADA

CARGO	HORA		CANT.	TIEMPO (Horas)
	INICIO	FIN		
Arq. Residente	7:00:00	17:00:00	1.00	9:00:00
Ing. Residente	7:00:00	17:00:00	1.00	9:00:00
Aux. Ingeniero civil	7:00:00	17:00:00	1.00	9:00:00
Ing.. Profesional SST	7:00:00	17:00:00	1.00	9:00:00
Trabajadores	7:00:00	17:00:00	3.00	27:00:00

EQUIPO UTILIZADO

DESCRIPCIÓN	CANT.	TIEMPO (Horas)
ANDAMIOS CERTIFICADOS	1	9:00:00
PULIDORA	1	9:00:00

MATERIALES UTILIZADOS

DESCRIPCIÓN	UND.	CANT.

ESTADO DEL TIEMPO

		HORAS
SECO	X	9
NEBLINA		
LLOVIZNA		
LLUVIA		
TORMENTA		

ACCESO


BUENO	X
REGULAR	
MALO	
NULO	

TERRENO

ROCOSO		DURO		NORMAL	X
ARENOSO		LODOSO		PANTANO	

CAUSA ATRASO/DIA - MEDIDA CORRECTIVA:

ESQUEMÁTICO DE OBRA

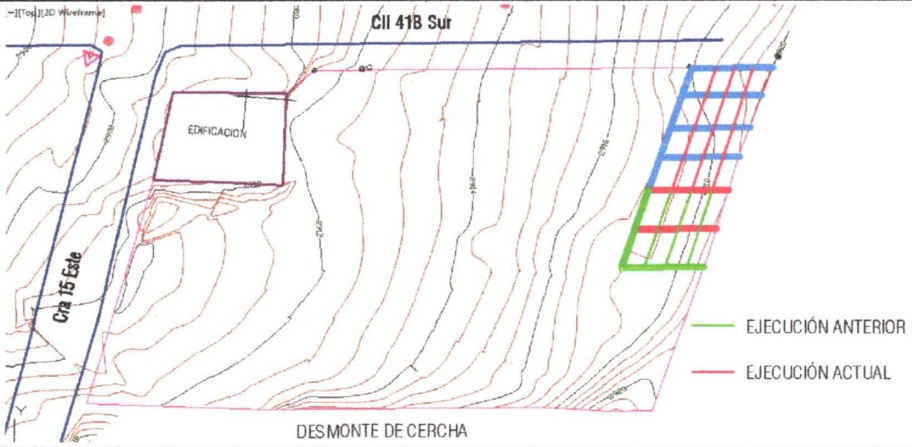

OBSERVACIONES:

	ELABORO	APROBO
FIRMA:		
NOMBRE:	ING. JAVIER ANDRES ESCOBAR PINTOR	ARQ. MARCELO SARMIENTO
CARGO:	AUXILIAR DE INGENIERIA CONTRATISTA	DIRECTOR DE OBRA CONTRATISTA
	VALIDO	APROBO
FIRMA:		
NOMBRE:	ING. CAMILO ROMERO	ARQ. JHON CUELLAR
CARGO:	RESIDENTE DE OBRA CONTRATISTA	RESIDENTE DE INTERVENTORIA

G&G Ingenieros Ltda.	INFORME DIARIO DE ACTIVIDADES	Fecha:01/06/2019
		Código: F-OBR-024
	EJECUCIÓN DE OBRA	Versión: 1
		Hoja No.: 1 de 1

No DE CONTRATO DE OBRA Y OBJETO	CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No 470 DE 2018 SUSCRITO ENTRE EL DISTRITO CAPITAL - UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL CUERPO DE BOMBEROS Y GYG INGENIEROS LTDA	CONSECUTIVO	46
LUGAR o ESPECIALIDAD DE LOS TRABAJOS	OBRA	FECHA	sábado 3 de agosto de 2019

HORAS PERDIDAS	POR LLUVIA	POR PAROS		OTROS	TOTALES
Horas Hombre	1				1.0
Horas Equipo	1				1.0

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD FUNCIONAL	UND.	CANTIDAD			
				CONTRACTUAL	ACUMULADO ANTERIOR	AVANCE HOY	ACUMULADO ACTUAL
1.00	CORTE DE CERCHA EXISTENTE	GLB	1.00				

DESCRIPCION DE ACTIVIDADES EJECUTADAS

SE CONTINUA CON EL CORTE DE CERCHAS EXISTENTES

MANO DE OBRA EMPLEADA

CARGO	HORA		CANT.	TIEMPO (Horas)
	INICIO	FIN		
Arq. Residente	7:00:00	12:00:00	1.00	5:00:00
Ing. Residente	7:00:00	12:00:00	1.00	5:00:00
Aux. Ingeniero civil	7:00:00	12:00:00	1.00	5:00:00
Ing.. Profesional SST	7:00:00	12:00:00	1.00	5:00:00
Trabajadores	7:00:00	12:00:00	3.00	15:00:00
Ing. Ambiental	7:00:00	12:00:00	1.00	5:00:00

EQUIPO UTILIZADO

DESCRIPCIÓN	CANT.	TIEMPO (Horas)
ANDAMIOS CERTIFICADOS	1	9
PULIDORA	1	9

MATERIALES UTILIZADOS

DESCRIPCIÓN	UND.	CANT.

ESTADO DEL TIEMPO

		HORAS
SECO	X	3
NEBLINA		
LLOVIZNA		1
LLUVIA		1
TORMENTA		

ACCESO

BUENO	X
REGULAR	
MALO	
NULO	


TERRENO

ROCOSO		DURO		NORMAL	X
ARENOSO		LODOSO		PANTANO	

CAUSA ATRASO/DIA - MEDIDA CORRECTIVA:

Inicio de obra con lluvia desde las 7:00am a 8;00Am y llovizna 8:00am a 9:00am

ESQUEMÁTICO DE OBRA

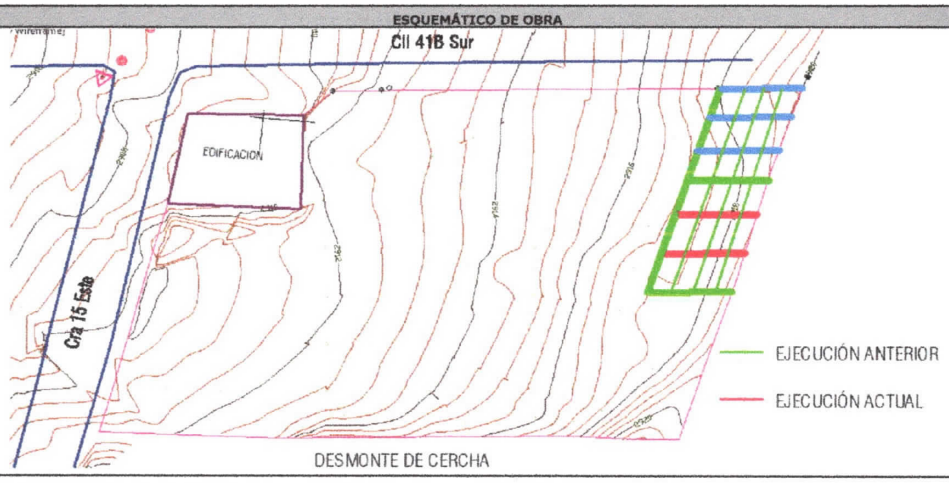

OBSERVACIONES:

	ELABORÓ	APROBÓ
FIRMA:		
NOMBRE:	ING. JAVIER ANDRES ESCOBAR PINTOR	ARQ. MARCELO SARMIENTO
CARGO:	AUXILIAR DE INGENIERIA CONTRATISTA	DIRECTOR DE OBRA CONTRATISTA
	VALIDO	APROBO
FIRMA:		
NOMBRE:	ING. CAMILO ROMERO	ARQ. JHON CUELLAR
CARGO:	RESIDENTE DE OBRA CONTRATISTA	RESIDENTE DE INTERVENTORIA

GG Ingeniería Ltda.	INFORME DIARIO DE ACTIVIDADES	Fecha:01/06/2019
		Código: F-OBR-024
	EJECUCIÓN DE OBRA	Versión: 1
		Hoja No.: 1 de 1

No DE CONTRATO Y OBJETO	CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No 470 DE 2018 SUSCRITO ENTRE EL DISTRITO CAPITAL - UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL CUERPO DE BOMBEROS Y GYG INGENIEROS LTDA	CONSECUTIVO	45
LUGAR o ESPECIALIDAD DE LOS TRABAJOS	OBRA	FECHA	viernes 2 de agosto de 2019

INFORME DIARIO No. 45

Página 2 de 2

REGISTRO FOTOGRÁFICO











ELABORO:

ING. JAVIER ESCOBAR PINTOR
AUXILIAR DE INGENIERIA - CONTRATISTA

APROBO:

ING CAMILO ROMERO
RESIDENTE DE OBRA CONTRATISTA

G&G Ingenieros Ltda.	INFORME DIARIO DE ACTIVIDADES	Fecha:01/06/2019
		Código: F-OBR-024
	EJECUCIÓN DE OBRA	Versión: 1
		Hoja No.: 1 de 1

No DE CONTRATO DE OBRA Y OBJETO	CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No 470 DE 2018 SUSCRITO ENTRE EL DISTRITO CAPITAL - UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL CUERPO DE BOMBEROS Y GYG INGENIEROS LTDA	CONSECUTIVO	47
LUGAR o ESPECIALIDAD DE LOS TRABAJOS	OBRA	FECHA	domingo 4 de agosto de 2019

HORAS PERDIDAS	POR LLUVIA	POR PAROS		OTROS	TOTALES
Horas Hombre					0.0
Horas Equipo					0.0

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD FUNCIONAL	UND.	CANTIDAD			
				CONTRACTUAL	ACUMULADO ANTERIOR	AVANCE HOY	ACUMULADO ACTUAL
1.00	DÍA FESTIVO	GLB	1.00				

DESCRIPCION DE ACTIVIDADES EJECUTADAS

DÍA FESTIVO

MANO DE OBRA EMPLEADA					EQUIPO UTILIZADO		
CARGO	HORA		CANT.	TIEMPO (Horas)	DESCRIPCIÓN	CANT.	TIEMPO (Horas)
	INICIO	FIN					
Arq. Residente							
Ing. Residente							
Aux. Ingeniero civil							
Ing.. Profesional SST							
Trabajadores							

MATERIALES UTILIZADOS			ESTADO DEL TIEMPO		ACCESO	
DESCRIPCIÓN	UND.	CANT.		HORAS		
			SECO ☐		BUENO ☐	
			NEBLINA ☐		REGULAR ☐	
			LLOVIZNA ☐		MALO ☐	
			LLUVIA ☐		NULO ☐	
			TORMENTA ☐			
			TERRENO			
			ROCOSO ☐	DURO ☐	NORMAL ☐	
			ARENOSO ☐	LODOSO ☐	PANTANO ☐	

CAUSA ATRASO/DIA - MEDIDA CORRECTIVA:

ESQUEMÁTICO DE OBRA

OBSERVACIONES:

	ELABORÓ	APROBÓ
FIRMA:		FIRMA:
NOMBRE:	ING. JAVIER ANDRES ESCOBAR PINTOR	ARQ. MARCELO SARMIENTO
CARGO:	AUXILIAR DE INGENIERIA CONTRATISTA	DIRECTOR DE OBRA CONTRATISTA
	VALIDO	APROBO
FIRMA:		FIRMA:
NOMBRE:	ING. CAMILO ROMERO	ARQ. JHON CUELLAR
CARGO:	RESIDENTE DE OBRA CONTRATISTA	RESIDENTE DE INTERVENTORIA

	INFORME DIARIO DE ACTIVIDADES	Fecha:01/06/2019
		Código: F-OBR-024
	EJECUCIÓN DE OBRA	Versión: 1
		Hoja No.: 1 de 1

No DE CONTRATO Y OBJETO	CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No 470 DE 2018 SUSCRITO ENTRE EL DISTRITO CAPITAL - UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL CUERPO DE BOMBEROS Y GYG INGENIEROS LTDA	CONSECUTIVO	46
LUGAR o ESPECIALIDAD DE LOS TRABAJOS	OBRA	FECHA	sábado 3 de agosto de 2019

INFORME DIARIO No. 46

Página 2 de 2

REGISTRO FOTOGRÁFICO







ELABORO:

ING. JAVIER ESCOBAR PINTOR
AUXILIAR DE INGENIERIA - CONTRATISTA

APROBO:

ING CAMILO ROMERO
RESIDENTE DE OBRA CONTRATISTA

G&G Ingenieros Ltda.	INFORME DIARIO DE ACTIVIDADES	Fecha:01/06/2019
		Código: F-OBR-024
	EJECUCIÓN DE OBRA	Versión: 1
		Hoja No.: 1 de 1

No DE CONTRATO DE OBRA Y OBJETO	CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No 470 DE 2018 SUSCRITO ENTRE EL DISTRITO CAPITAL - UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL CUERPO DE BOMBEROS Y GYG INGENIEROS LTDA	CONSECUTIVO	48
LUGAR o ESPECIALIDAD DE LOS TRABAJOS	OBRA	FECHA	lunes 5 de agosto de 2019

HORAS PERDIDAS	POR LLUVIA	POR PAROS		OTROS	TOTALES
Horas Hombre	2				2.0
Horas Equipo	2				2.0

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD FUNCIONAL	UND.	CANTIDAD			
				CONTRACTUAL	ACUMULADO ANTERIOR	AVANCE HOY	ACUMULADO ACTUAL
1.00	CORTE DE CERCHA EXISTENTE	GLB	1.00				

DESCRIPCION DE ACTIVIDADES EJECUTADAS

SE CONTINUA CON EL CORTE DE CERCHAS EXISTENTES Y FINALIZACIÓN DE LA MISMA.

MANO DE OBRA EMPLEADA

CARGO	HORA		CANT.	TIEMPO (Horas)
	INICIO	FIN		
Arq. Residente	7:00:00	16:30:00	1.00	8:30:00
Ing. Residente	7:00:00	16:30:00	1.00	8:30:00
Aux. Ingeniero civil	7:00:00	16:30:00	1.00	8:30:00
Ing.. Profesional SST	7:00:00	16:30:00	1.00	8:30:00
Trabajadores	7:00:00	16:30:00	3.00	25:30:00
Ing.Director de Obra	7:00:00	16:30:00	1.00	8:30:00

EQUIPO UTILIZADO

DESCRIPCIÓN	CANT.	TIEMPO (Horas)
ANDAMIOS CERTIFICADOS	1	8:30:00
PULIDORA	1	8:30:00

MATERIALES UTILIZADOS

DESCRIPCIÓN	UND.	CANT.

ESTADO DEL TIEMPO

		HORAS
SECO	X	5
NEBLINA	X	1
LLOVIZNA	X	1
LLUVIA	X	2
TORMENTA		

ACCESO

BUENO	X
REGULAR	
MALO	
NULO	


TERRENO

ROCOSO		DURO		NORMAL	X
ARENOSO		LODOSO		PANTANO	

CAUSA ATRASO/DIA - MEDIDA CORRECTIVA:

Inicio de obra con lluvia y neblina desde las 7:00am a 9:00am

ESQUEMÁTICO DE OBRA

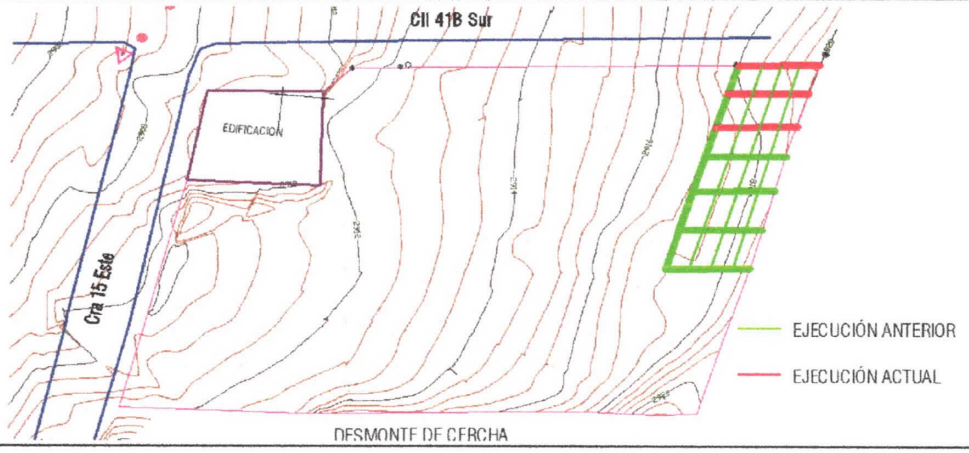

DESMONTE DE CERCHA

OBSERVACIONES:

	ELABORÓ	APROBÓ
FIRMA:		
NOMBRE:	ING. JAVIER ANDRES ESCOBAR PINTOR	ARQ. MARCELO SARMIENTO
CARGO:	AUXILIAR DE INGENIERIA CONTRATISTA	DIRECTOR DE OBRA CONTRATISTA
	VALIDO	APROBO
FIRMA:		
NOMBRE:	ING. CAMILO ROMERO	ARQ. JHON CUELLAR
CARGO:	RESIDENTE DE OBRA CONTRATISTA	RESIDENTE DE INTERVENTORIA

	INFORME DIARIO DE ACTIVIDADES	Fecha:01/06/2019
		Código: F-OBR-024
	EJECUCIÓN DE OBRA	Versión: 1
		Hoja No.: 1 de 1

No DE CONTRATO Y OBJETO	CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No 470 DE 2018 SUSCRITO ENTRE EL DISTRITO CAPITAL - UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL CUERPO DE BOMBEROS Y GYG INGENIEROS LTDA	CONSECUTIVO	48
LUGAR o ESPECIALIDAD DE LOS TRABAJOS	OBRA	FECHA	lunes 5 de agosto de 2019

INFORME DIARIO No. 48

Página 2 de 2

REGISTRO FOTOGRÁFICO













ELABORO:

ING. JAVIER ESCOBAR PINTOR
AUXILIAR DE INGENIERIA - CONTRATISTA

APROBO:

ING CAMILO ROMERO
RESIDENTE DE OBRA CONTRATISTA

G&G Ingenieros Ltda.	INFORME DIARIO DE ACTIVIDADES	Fecha:01/06/2019
		Código: F-OBR-024
	EJECUCIÓN DE OBRA	Versión: 1
		Hoja No.: 1 de 1

No DE CONTRATO DE OBRA Y OBJETO	CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No 470 DE 2018 SUSCRITO ENTRE EL DISTRITO CAPITAL - UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL CUERPO DE BOMBEROS Y GYG INGENIEROS LTDA	CONSECUTIVO	49
LUGAR o ESPECIALIDAD DE LOS TRABAJOS	OBRA	FECHA	martes 6 de agosto de 2019

HORAS PERDIDAS	POR LLUVIA	POR PAROS		OTROS	TOTALES
Horas Hombre					0.0
Horas Equipo					0.0

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD FUNCIONAL	UND.	CANTIDAD			
				CONTRACTUAL	ACUMULADO ANTERIOR	AVANCE HOY	ACUMULADO ACTUAL
1.00	REPLANTEO DE NIVELES EN EL TERRENO	GLB	1.00				
2.00	INSTALACIÓN PUNTO ECOLÓGICO Y SUPERVISIÓN CON DRON EN OBRA	GLB	1.00				

DESCRIPCION DE ACTIVIDADES EJECUTADAS

REPLANTEO DE LOS NIVELES EN EL TERRENO PARA SU TERRACEO, INSTALACIÓN DEL PUNTO ECOLÓGICO Y SUPERVISIÓN SEMANAL CON DRON

MANO DE OBRA EMPLEADA

CARGO	HORA		CANT.	TIEMPO (Horas)
	INICIO	FIN		
Arq. Residente	7:00:00	16:30:00	1.00	8:30:00
Ing. Residente	7:00:00	16:30:00	1.00	8:30:00
Aux. Ingeniero civil	7:00:00	16:30:00	1.00	8:30:00
Ing.. Profesional SST	7:00:00	16:30:00	1.00	8:30:00
Trabajadores	7:00:00	16:30:00	3.00	25:30:00
Profesionales de Topográfia	8:00:00	12:00:00	3.00	12:00:00
Ing. Aux interventoría	7:00:00	11:30:00	1.00	4:30:00

EQUIPO UTILIZADO

DESCRIPCIÓN	CANT.	TIEMPO (Horas)
NIVEL	1	4:00:00
MIRA	1	4:00:00

MATERIALES UTILIZADOS

DESCRIPCIÓN	UND.	CANT.
Pintura	1	1/4 de galón

ESTADO DEL TIEMPO

		HORAS
SECO	X	9
NEBLINA		
LLOVIZNA		
LLUVIA		
TORMENTA		

ACCESO


BUENO	X
REGULAR	
MALO	
NULO	

TERRENO

ROCOSO		DURO		NORMAL	X
ARENOSO		LODOSO		PANTANO	

CAUSA ATRASO/DIA - MEDIDA CORRECTIVA:

ESQUEMÁTICO DE OBRA

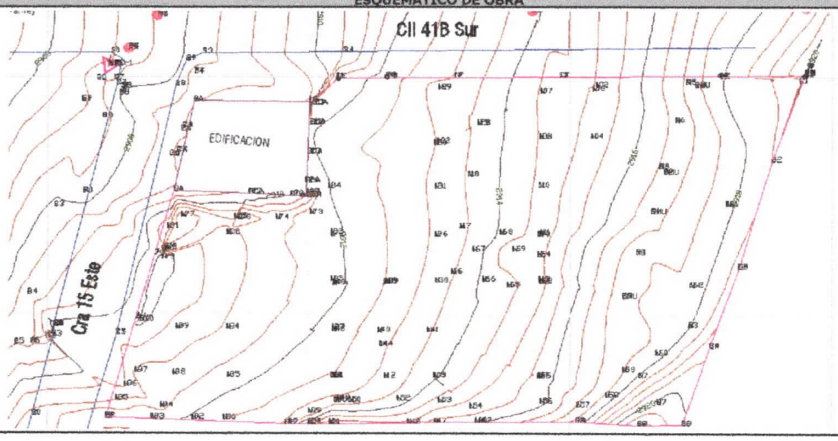

OBSERVACIONES:

	ELABORO	APROBO
FIRMA:		
NOMBRE:	ING. JAVIER ANDRES ESCOBAR PINTOR	ARQ. MARCELO SARMIENTO
CARGO:	AUXILIAR DE INGENIERIA CONTRATISTA	DIRECTOR DE OBRA CONTRATISTA
	VALIDO	APROBO
FIRMA:		
NOMBRE:	ING. CAMILO ROMERO	ARQ. JHON CUELLAR
CARGO:	RESIDENTE DE OBRA CONTRATISTA	RESIDENTE DE INTERVENTORIA


	INFORME DIARIO DE ACTIVIDADES	Fecha:01/06/2019
		Código: F-OBR-024
	EJECUCIÓN DE OBRA	Versión: 1
		Hoja No.: 1 de 1

No DE CONTRATO Y OBJETO	CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No 470 DE 2018 SUSCRITO ENTRE EL DISTRITO CAPITAL - UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL CUERPO DE BOMBEROS Y GYG INGENIEROS LTDA	CONSECUTIVO	49
LUGAR o ESPECIALIDAD DE LOS TRABAJOS	OBRA	FECHA	martes 6 de agosto de 2019


INFORME DIARIO No. 49

REGISTRO FOTOGRÁFICO







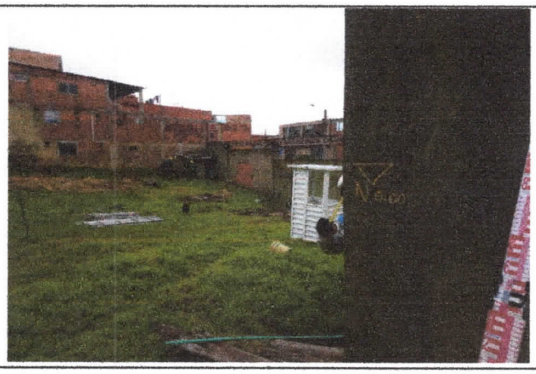











ELABORO:

ING. JAVIER ESCOBAR PINTOR
AUXILIAR DE INGENIERIA - CONTRATISTA

APROBO:

ING CAMILO ROMERO
RESIDENTE DE OBRA CONTRATISTA

G&G Ingenieros Ltda.	INFORME DIARIO DE ACTIVIDADES	Fecha:01/06/2019
		Código: F-OBR-024
	EJECUCIÓN DE OBRA	Versión: 1
		Hoja No.: 1 de 1

No DE CONTRATO DE OBRA Y OBJETO	CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No 470 DE 2018 SUSCRITO ENTRE EL DISTRITO CAPITAL - UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL CUERPO DE BOMBEROS Y GYG INGENIEROS LTDA	CONSECUTIVO	50
LUGAR o ESPECIALIDAD DE LOS TRABAJOS	OBRA	FECHA	miércoles 7 de agosto de 2019

HORAS PERDIDAS	POR LLUVIA	POR PAROS		OTROS	TOTALES
Horas Hombre					0.0
Horas Equipo					0.0

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD FUNCIONAL	UND.	CANTIDAD			
				CONTRACTUAL	ACUMULADO ANTERIOR	AVANCE HOY	ACUMULADO ACTUAL
1.00	DÍA FESTIVO						

DESCRIPCION DE ACTIVIDADES EJECUTADAS

DÍA FESTIVO

MANO DE OBRA EMPLEADA					EQUIPO UTILIZADO		
CARGO	HORA		CANT.	TIEMPO (Horas)	DESCRIPCIÓN	CANT.	TIEMPO (Horas)
	INICIO	FIN					
Arq. Residente							
Ing. Residente							
Aux. Ingeniero civil							
Ing.. Profesional SST							
Trabajadores							

MATERIALES UTILIZADOS			ESTADO DEL TIEMPO			ACCESO	
DESCRIPCIÓN	UND.	CANT.			HORAS		
			SECO	X	9	BUENO	X
			NEBLINA			REGULAR	
			LLOVIZNA			MALO	
			LLUVIA			NULO	
			TORMENTA				
			TERRENO				
			ROCOSO		DURO	NORMAL	X
			ARENOSO		LODOSO	PANTANO	

CAUSA ATRASO/DIA - MEDIDA CORRECTIVA:

ESQUEMÁTICO DE OBRA

OBSERVACIONES:

	ELABORÓ		APROBÓ
FIRMA:		FIRMA:	
NOMBRE:	ING. JAVIER ANDRES ESCOBAR PINTOR	NOMBRE:	ARQ. MARCELO SARMIENTO
CARGO:	AUXILIAR DE INGENIERIA CONTRATISTA	CARGO:	DIRECTOR DE OBRA CONTRATISTA
	VALIDÓ		APROBÓ
FIRMA:		FIRMA:	
NOMBRE:	ING. CAMILO ROMERO	NOMBRE:	ARQ. JHON CUELLAR
CARGO:	RESIDENTE DE OBRA CONTRATISTA	CARGO:	RESIDENTE DE INTERVENTORIA

GG Ingenieros Ltda	INFORME DIARIO DE ACTIVIDADES	Fecha:01/06/2019
		Código: F-OBR-024
	EJECUCIÓN DE OBRA	Versión: 1
		Hoja No.: 1 de 1

No DE CONTRATO DE OBRA Y OBJETO	CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No 470 DE 2018 SUSCRITO ENTRE EL DISTRITO CAPITAL - UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL CUERPO DE BOMBEROS Y GYG INGENIEROS LTDA	CONSECUTIVO	51
LUGAR o ESPECIALIDAD DE LOS TRABAJOS	OBRA	FECHA	Jueves 8 de agosto de 2019

HORAS PERDIDAS	POR LLUVIA	POR PAROS		OTROS	TOTALES
Horas Hombre	2				2.0
Horas Equipo	2				2.0

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD FUNCIONAL	UND.	CANTIDAD			
				CONTRACTUAL	ACUMULADO ANTERIOR	AVANCE HOY	ACUMULADO ACTUAL
1.00	REUNIÓN EN UAECOB	GLB	UN				
2.00	PERSONAL EN OBRA	GLB	UN				

DESCRIPCION DE ACTIVIDADES EJECUTADAS

REUNIÓN PARA LA SOCIALIZACIÓN DE OBSERVACIONES DEL DISEÑO DE LA ESTACIÓN BOMBEROS BELLAVISTA

MANO DE OBRA EMPLEADA

CARGO	HORA		CANT.	TIEMPO (Horas)
	INICIO	FIN		
Arq. Residente	7:00:00	16:30:00	1.00	8:30:00
Ing. Residente	7:00:00	16:30:00	1.00	8:30:00
Aux. Ingeniero civil	7:00:00	16:30:00	1.00	8:30:00
Ing.. Profesional SST	7:00:00	16:30:00	1.00	8:30:00
Trabajadores	7:00:00	16:30:00	3.00	25:30:00
Ing. Aux interventoria	8:00:00	9:45:00	1.00	1:45:00

EQUIPO UTILIZADO

DESCRIPCIÓN	CANT.	TIEMPO (Horas)

MATERIALES UTILIZADOS

DESCRIPCION	UND.	CANT.

ESTADO DEL TIEMPO

		HORAS
SECO	X	7
NEBLINA		
LLOVIZNA		
LLUVIA		2
TORMENTA		

ACCESO

BUENO	X
REGULAR	
MALO	
NULO	

TERRENO

ROCOSO		DURO		NORMAL	X
ARENOSO		LODOSO		PANTANO	

CAUSA ATRASO/DIA - MEDIDA CORRECTIVA:

Lluvia de 9:00 am a 11:00 am

ESQUEMÁTICO DE OBRA



OBSERVACIONES:


	ELABORO	APROBO
FIRMA:		
NOMBRE:	ING. JAVIER ANDRES ESCOBAR PINTOR	ARQ. MARCELO SARMIENTO
CARGO:	AUXILIAR DE INGENIERIA CONTRATISTA	DIRECTOR DE OBRA CONTRATISTA
	VALIDO	APROBO
FIRMA:		
NOMBRE:	ING. CAMILO ROMERO	ARQ. JHON CUELLAR
CARGO:	RESIDENTE DE OBRA CONTRATISTA	RESIDENTE DE INTERVENTORIA

	INFORME DIARIO DE ACTIVIDADES	Fecha:01/06/2019
		Código: F-OBR-024
	EJECUCIÓN DE OBRA	Versión: 1
		Hoja No.: 1 de 1

No DE CONTRATO Y OBJETO	CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No 470 DE 2018 SUSCRITO ENTRE EL DISTRITO CAPITAL - UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL CUERPO DE BOMBEROS Y GYG INGENIEROS LTDA	CONSECUTIVO	51
LUGAR o ESPECIALIDAD DE LOS TRABAJOS	OBRA	FECHA	jueves 8 de agosto de 2019

INFORME DIARIO No. 51 | Página 2 de 2

REGISTRO FOTOGRÁFICO

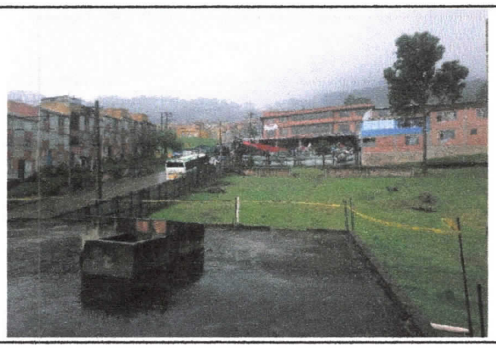

ACTA DE REUNIÓN

Fecha: 08 agosto de 2019 Hora: 11 a.m.
Lugar: Dotación Gestión Corporativo
Tema: Verificación Plan Manejo Ambiental

Asistentes:

Nombre	Entidad/ Dependencia	Teléfono	Correo Electrónico	Firma
Mauricio Ardila	GYG	3122478870	hsegyg2018@gmail.com	
Johanna Pedraza	GyG	3165773275	gygcalidadambiental@gmail.com	
Eva Hernandez	SGA	3144556622	evahernandez@bomberosbogota.gov.co	
Ximena Valencia	SGC	4130	xvalencia@bomberosbogota.gov.co	
Jesus Mao Reyes	SGA	604400	hsegyg@bomberos	
Daniel Alvarado Vaca	Interventoria	4130	dalvarado@bomberosbogota.gov.co	

Desarrollo de la reunión:

El Contratista GyG Ingenieros Ltda atendio el PIN ante la secretaria de Ambiente y oportunamente cargo los reportes en la página de la Secretaría de Ambiente y se remitio copia a Gestión Ambiental de UAECOB.

Se programaron las ultimas luces de cada mes rondas para revisar tema ambiental

Compromisos de la reunión:

No.	Actividad	Responsable	Fecha de entrega

Fecha próxima reunión: 30/09/19

Nota: Imprimir el acta de reunión por las dos caras

ELABORO: _____
ING. JAVIER ESCOBAR PINTOR
AUXILIAR DE INGENIERIA - CONTRATISTA

APROBO: _____
ING. CAMILO ROMERO
RESIDENTE DE OBRA CONTRATISTA

GyG Ingenieros Ltda.	INFORME DIARIO DE ACTIVIDADES	Fecha:01/06/2019
		Código: F-OBR-024
	EJECUCIÓN DE OBRA	Versión: 1
		Hoja No.: 1 de 1

No DE CONTRATO DE OBRA Y OBJETO	CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No 470 DE 2018 SUSCRITO ENTRE EL DISTRITO CAPITAL - UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL CUERPO DE BOMBEROS Y GYG INGENIEROS LTDA	CONSECUTIVO	52
LUGAR o ESPECIALIDAD DE LOS TRABAJOS	OBRA	FECHA	viernes 9 de agosto de 2019

HORAS PERDIDAS	POR LLUVIA	POR PAROS		OTROS	TOTALES
Horas Hombre					0.0
Horas Equipo					0.0

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD FUNCIONAL	UND.	CANTIDAD			
				CONTRACTUAL	ACUMULADO ANTERIOR	AVANCE HOY	ACUMULADO ACTUAL
1.00	REUNION REVISION DE AJUSTES DE DISEÑO EN UAECOB	GLB	UND.				
2.00	PERSONAL EL OBRA	GLB	UND.				

DESCRIPCION DE ACTIVIDADES EJECUTADAS

REUNIÓN PARA LA SOCIALIZACIÓN DE OBSERVACIONES DEL DISEÑO DE LA ESTACIÓN BOMBEROS BELLAVISTA

MANO DE OBRA EMPLEADA

CARGO	HORA		CANT.	TIEMPO (Horas)
	INICIO	FIN		
Arq. Residente	7:00:00	17:00:00	1.00	9:00:00
Ing. Residente	7:00:00	17:00:00	1.00	9:00:00
Aux. Ingeniero civil	7:00:00	17:00:00	1.00	9:00:00
Ing.. Profesional SST	7:00:00	17:00:00	1.00	9:00:00
Trabajadores	7:00:00	17:00:00	3.00	27:00:00

EQUIPO UTILIZADO

DESCRIPCIÓN	CANT.	TIEMPO (Horas)

MATERIALES UTILIZADOS

DESCRIPCIÓN	UND.	CANT.

ESTADO DEL TIEMPO

		HORAS
SECO	X	9
NEBLINA		
LLOVIZNA		
LLUVIA		
TORMENTA		

ACCESO

BUENO	X
REGULAR	
MALO	
NULO	

TERRENO

ROCOSO		DURO		NORMAL	X
ARENOSO		LODOSO		PANTANO	

CAUSA ATRASO/DIA - MEDIDA CORRECTIVA:

ESQUEMÁTICO DE OBRA



OBSERVACIONES: Las respuesta a las nuevas observaciones de los planos se enviara la otra semana, comunicado por parte la empresa consultora

	ELABORO	APROBO
FIRMA:		
NOMBRE:	ING. JAVIER ANDRES ESCOBAR PINTOR	
CARGO:	AUXILIAR DE INGENIERIA CONTRATISTA	DIRECTOR DE OBRA CONTRATISTA
	VALIDO	APROBO
FIRMA:		
NOMBRE:	ING. CAMILO ROMERO	ARQ. JHON CUELLAR
CARGO:	RESIDENTE DE OBRA CONTRATISTA	RESIDENTE DE INTERVENTORIA

	INFORME DIARIO DE ACTIVIDADES	Fecha:01/06/2019
		Código: F-OBR-024
	EJECUCIÓN DE OBRA	Versión: 1
		Hoja No.: 1 de 1


No DE CONTRATO Y OBJETO	CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No 470 DE 2018 SUSCRITO ENTRE EL DISTRITO CAPITAL - UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL CUERPO DE BOMBEROS Y GYG INGENIEROS LTDA	CONSECUTIVO	52
LUGAR o ESPECIALIDAD DE LOS TRABAJOS	OBRA	FECHA	viernes 9 de agosto de 2019


INFORME DIARIO No. 52 | Página 2 de 2


REGISTRO FOTOGRÁFICO














ELABORO: _____
ING. JAVIER ESCOBAR PINTOR
AUXILIAR DE INGENIERIA - CONTRATISTA

APROBO: _____
ING CAMILO ROMERO
RESIDENTE DE OBRA CONTRATISTA

G&G Ingenieros Ltda.	INFORME DIARIO DE ACTIVIDADES	Fecha:01/06/2019
		Código: F-OBR-024
	EJECUCIÓN DE OBRA	Versión: 1
		Hoja No.: 1 de 1

No DE CONTRATO DE OBRA Y OBJETO	CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No 470 DE 2018 SUSCRITO ENTRE EL DISTRITO CAPITAL - UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL CUERPO DE BOMBEROS Y GYG INGENIEROS LTDA	CONSECUTIVO	53
LUGAR o ESPECIALIDAD DE LOS TRABAJOS	OBRA	FECHA	sábado 10 de agosto de 2019

HORAS PERDIDAS	POR LLUVIA	POR PAROS		OTROS	TOTALES
Horas Hombre	1.5				1.5
Horas Equipo	1.5				1.5

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD FUNCIONAL	UND.	CANTIDAD			
				CONTRACTUAL	ACUMULADO ANTERIOR	AVANCE HOY	ACUMULADO ACTUAL
1.00	ORDENAMIENTO Y DESCARGA DE MATERIAL	GLB	1.00				

DESCRIPCION DE ACTIVIDADES EJECUTADAS

ORDENAMIENTO Y DESCARGA DE MATERIAL EN EL CAMPAMENTO PARA USO DEL FIGURADO EN SITIO

MANO DE OBRA EMPLEADA

CARGO	HORA		CANT.	TIEMPO (Horas)
	INICIO	FIN		
Arq. Residente	7:00:00	12:00:00	1.00	5:00:00
Ing. Residente	7:00:00	12:00:00	1.00	5:00:00
Aux. Ingeniero civil	7:00:00	12:00:00	1.00	5:00:00
Ing. Profesional SST	7:00:00	12:00:00	1.00	5:00:00
Trabajadores	7:00:00	12:00:00	3.00	15:00:00
Ing. Ambiental	7:00:00	12:00:00	1.00	5:00:00

EQUIPO UTILIZADO

DESCRIPCIÓN	CANT.	TIEMPO (Horas)

MATERIALES UTILIZADOS

DESCRIPCIÓN	UND.	CANT.

ESTADO DEL TIEMPO

		HORAS
SECO	X	3.5
NEBLINA		
LLOVIZNA		
LLUVIA		1.5
TORMENTA		

TERRENO

ROCOSO		DURO		NORMAL	X
ARENOSO		LODOSO		PANTANO	

ACCESO

BUENO	X
REGULAR	
MALO	
NULO	

CAUSA ATRASO/DIA - MEDIDA CORRECTIVA:

Lluvia de 7:00 am a 8:30 am

ESQUEMÁTICO DE OBRA



OBSERVACIONES:

	ELABORÓ	APROBÓ
FIRMA:		
NOMBRE:	ING. JAVIER ANDRES ESCOBAR PINTOR	
CARGO:	AUXILIAR DE INGENIERIA CONTRATISTA	DIRECTOR DE OBRA CONTRATISTA
	VALIDÓ	APROBÓ
FIRMA:		
NOMBRE:	ING. CAMILO ROMERO	ARQ. JHON CUELLAR
CARGO:	RESIDENTE DE OBRA CONTRATISTA	RESIDENTE DE INTERVENTORIA

	INFORME DIARIO DE ACTIVIDADES	Fecha:01/06/2019
		Código: F-OBR-024
	EJECUCIÓN DE OBRA	Versión: 1
		Hoja No.: 1 de 1


No DE CONTRATO Y OBJETO	CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No 470 DE 2018 SUSCRITO ENTRE EL DISTRITO CAPITAL - UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL CUERPO DE BOMBEROS Y GYG INGENIEROS LTDA	CONSECUTIVO	53
LUGAR o ESPECIALIDAD DE LOS TRABAJOS	OBRA	FECHA	sábado 10 de agosto de 2019

INFORME DIARIO No. 53

REGISTRO FOTOGRÁFICO





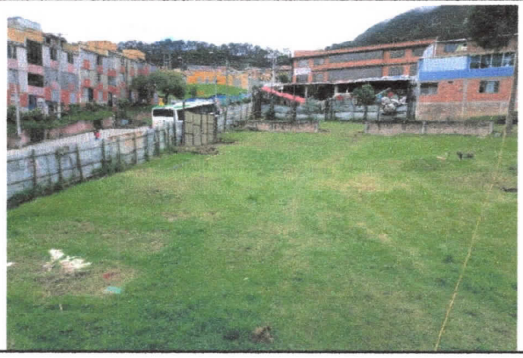







ELABORO:

ING. JAVIER ESCOBAR PINTOR
AUXILIAR DE INGENIERIA - CONTRATISTA

APROBO:

ING. CAMILO ROMERO
RESIDENTE DE OBRA CONTRATISTA

G&G Ingenieros Ltda.	INFORME DIARIO DE ACTIVIDADES	Fecha:01/06/2019
		Código: F-OBR-024
	EJECUCIÓN DE OBRA	Versión: 1
		Hoja No.: 1 de 1

No DE CONTRATO DE OBRA Y OBJETO	CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No 470 DE 2018 SUSCRITO ENTRE EL DISTRITO CAPITAL - UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL CUERPO DE BOMBEROS Y GYG INGENIEROS LTDA	CONSECUTIVO	54
LUGAR o ESPECIALIDAD DE LOS TRABAJOS	OBRA	FECHA	domingo 11 de agosto de 2019

HORAS PERDIDAS	POR LLUVIA	POR PAROS		OTROS	TOTALES
Horas Hombre					0.0
Horas Equipo					0.0

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD FUNCIONAL	UND.	CANTIDAD			
				CONTRACTUAL	ACUMULADO ANTERIOR	AVANCE HOY	ACUMULADO ACTUAL
1.00	DÍA DOMINGO	GLB	1.00				

DESCRIPCION DE ACTIVIDADES EJECUTADAS

DÍA DOMINGO 11 DE AGOSTO DEL 2019

MANO DE OBRA EMPLEADA					EQUIPO UTILIZADO		
CARGO	HORA		CANT.	TIEMPO (Horas)	DESCRIPCIÓN	CANT.	TIEMPO (Horas)
	INICIO	FIN					
Arq. Residente							
Ing. Residente							
Aux. Ingeniero civil							
Ing. Profesional SST							
Trabajadores							

MATERIALES UTILIZADOS			ESTADO DEL TIEMPO		ACCESO	
DESCRIPCION	UND.	CANT.		HORAS		
			SECO [X]		BUENO [X]	
			NEBLINA [ ]		REGULAR [ ]	
			LLOVIZNA [ ]		MALO [ ]	
			LLUVIA [ ]		NULO [ ]	
			TORMENTA [ ]			
			TERRENO			
			ROCOSO [ ]	DURO [ ]	NORMAL [X]	
			ARENOSO [ ]	LODOSO [ ]	PANTANO [ ]	

CAUSA ATRASO/DIA - MEDIDA CORRECTIVA:

ESQUEMÁTICO DE OBRA

OBSERVACIONES:

	ELABORÓ	APROBÓ
FIRMA:		
NOMBRE:	ING. JAVIER ANDRES ESCOBAR PINTOR	ARQ. MARCELO SARMIENTO
CARGO:	AUXILIAR DE INGENIERIA CONTRATISTA	DIRECTOR DE OBRA CONTRATISTA
	VALIDO	APROBO
FIRMA:		
NOMBRE:	ING. CAMILO ROMERO	ARQ. JHON CUELLAR
CARGO:	RESIDENTE DE OBRA CONTRATISTA	RESIDENTE DE INTERVENTORIA

G&G Ingenieros Ltda.	INFORME DIARIO DE ACTIVIDADES	Fecha:01/06/2019
		Código: F-OBR-024
	EJECUCIÓN DE OBRA	Versión: 1
		Hoja No.: 1 de 1

No DE CONTRATO DE OBRA Y OBJETO	CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No 470 DE 2018 SUSCRITO ENTRE EL DISTRITO CAPITAL - UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL CUERPO DE BOMBEROS Y GYG INGENIEROS LTDA	CONSECUTIVO	55
LUGAR o ESPECIALIDAD DE LOS TRABAJOS	OBRA	FECHA	lunes 12 de agosto de 2019

HORAS PERDIDAS	POR LLUVIA	POR PAROS		OTROS	TOTALES
Horas Hombre					0.0
Horas Equipo					0.0

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD FUNCIONAL	UND.	CANTIDAD			
				CONTRACTUAL	ACUMULADO ANTERIOR	AVANCE HOY	ACUMULADO ACTUAL
1.00	REUNIÓN DE LOS REPRESENTANTES LEGALES EN LA SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA	GLB	1.00				
2.00	REVISIÓN DE PLANOS Y PERSONAL EN OBRA	GLB	1.00				

DESCRIPCION DE ACTIVIDADES EJECUTADAS

REUNIÓN DE LOS REPRESENTANTES LEGALES EN LA SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA PARA EL SEGUIMIENTO DE LAS OBSERVACIONES CON NUEVA ENTREGA DE VERSIÓN DE PLANOS ARQUITECTÓNICOS Y ESTRUCTURALES.

MANO DE OBRA EMPLEADA

CARGO	HORA		CANT.	TIEMPO (Horas)
	INICIO	FIN		
Arq. Residente	7:00:00	16:30:00	1.00	9:30:00
Ing. Residente	7:00:00	16:30:00	1.00	9:30:00
Aux. Ingeniero civil	7:00:00	16:30:00	1.00	9:30:00
Ing. Profesional SST	7:00:00	16:30:00	1.00	9:30:00
Trabajadores	7:00:00	16:30:00	2.00	19:00:00

EQUIPO UTILIZADO

DESCRIPCIÓN	CANT.	TIEMPO (Horas)

MATERIALES UTILIZADOS

DESCRIPCIÓN	UND.	CANT.

ESTADO DEL TIEMPO

		HORAS
SECO	X	9.0
NEBLINA		
LLOVIZNA		
LLUVIA		
TORMENTA		

TERRENO


ROCOSO		DURO		NORMAL	X
ARENOSO		LODOSO		PANTANO	

ACCESO

BUENO	X
REGULAR	
MALO	
NULO	

CAUSA ATRASO/DIA - MEDIDA CORRECTIVA:

ESQUEMÁTICO DE OBRA

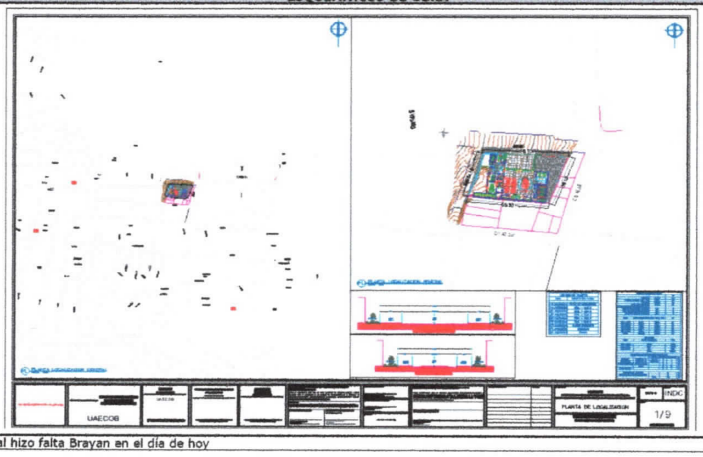

OBSERVACIONES: Por parte del personal hizo falta Brayan en el día de hoy

	ELABORO	APROBO
FIRMA:		
NOMBRE:	ING. JAVIER ANDRES ESCOBAR PINTOR	ARQ. MARCELO SARMIENTO
CARGO:	AUXILIAR DE INGENIERIA CONTRATISTA	DIRECTOR DE OBRA CONTRATISTA
	VALIDO	APROBO
FIRMA:		
NOMBRE:	ING. CAMILO ROMERO	ARQ. JHON CUELLAR
CARGO:	RESIDENTE DE OBRA CONTRATISTA	RESIDENTE DE INTERVENTORIA

	INFORME DIARIO DE ACTIVIDADES	Fecha:01/06/2019
		Código: F-OBR-024
	EJECUCIÓN DE OBRA	Versión: 1
		Hoja No.: 1 de 1

No DE CONTRATO Y OBJETO	CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No 470 DE 2018 SUSCRITO ENTRE EL DISTRITO CAPITAL - UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL CUERPO DE BOMBEROS Y GYG INGENIEROS LTDA	CONSECUTIVO	55
LUGAR o ESPECIALIDAD DE LOS TRABAJOS	OBRA	FECHA	lunes 12 de agosto de 2019

INFORME DIARIO No. 55 | **Página 2 de 2**

REGISTRO FOTOGRÁFICO





PY 370 E+D BOMBEROS - ATENCION OBS REUNION 9 DE AGOSTO

Recibidos ×

Señores
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS
GLORIA VERONICA ZAMBRANO OCAMPO – Subdirectora de Gestión Corporativa
Supervisora de contrato
DANIEL ARMANDO VERA RUIZ
COORDINADOR DE INFRAESTRUCTURA UAECOB
Apoyo a la supervisión de contrato
CESAR RAUL GRANADOS VASQUEZ
RL UNIÓN TEMPORAL INTERDISEÑOS
Ciudad

coordinacion@cycciviles.com 10:01 (hace 6 horas)
para Daniel, Gloria, elrodriguez, director, mi, ingenieria

Bogotá D.C., 12 de agosto de 2019

Referencia: Contrato de consultoría No. 572 de 2018 cuyo objeto "ELABORAR LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y DEMÁS TRÁMITES PARA LA OBTENCIÓN DE LA LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN DE LA ESTACIÓN DE BOMBEROS DE BELLAVISTA Y COMPLEMENTACIÓN Y AJUSTE PARA LA OBTENCIÓN DE LA LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN ESTACIÓN BOMBEROS MARICHUELA"

Asunto: Atención a los compromisos establecidos en la reunión del pasado viernes 9 de agosto

Respetados señores,

En atención a las observaciones realizadas por parte del constructor, y de conformidad con los compromisos adquiridos en la pasada reunión del día 9 de agosto llevada a cabo en la oficina del consultor se hace entrega digital, contiene lo siguiente

- Memoriales de responsabilidad del ingeniero estructural y el ingeniero geotecnista
- Oficio 116 Atención a los compromisos establecidos en reunión el pasado viernes 9 de agosto 2019.
- Oficio 117 con respuesta estructural
- Arquitectura

  Archivo DWG: AP-2018-08-05

  9 planos en formato PDF: cortes, fachadas, localización, n-cubierta, n-0.00, n-3.30, n-3.30, n-6.60, n-6.60, n-9.90, n-3.30.
- **Estructura**

  Archivo DWG: PY-370-EST BOMBEROS BELLAVISTA V080819 – Contiene 22 Planos y Anexo 1.

  Archivos PDF: 23 planos en pdf
- Memoriales de responsabilidad del ingeniero estructural y el ingeniero geotecnista
- Oficio 117 con respuesta estructural

Me permito relacionar link de descargar correspondiente a la entrega digital https://we.tl/t-WC9DKDrLn8

Quedo atenta

Cordialmente,

Consultoría y Construcciones Civiles Ltda.

Vanessa García Escobar
Coordinación de Proyectos
Tel: +57 (1) 926 17 76 Ext: 102
Dir: Calle 93B No 17 - 42 Of 502.
Bogotá D.C.
www.cycciviles.com

CORREO ENVIANDO NUEVA VERSIÓN DE PLANOS EL DÍA 12 DE AGOSTO

ELABORO: _____
ING. JAVIER ESCOBAR PINTOR
AUXILIAR DE INGENIERIA - CONTRATISTA

APROBO: _____
ING. CAMILO ROMERO
RESIDENTE DE OBRA CONTRATISTA

G&G Ingenieros Ltda.	INFORME DIARIO DE ACTIVIDADES	Fecha:01/06/2019
		Código: F-OBR-024
	EJECUCIÓN DE OBRA	Versión: 1
		Hoja No.: 1 de 1

No DE CONTRATO DE OBRA Y OBJETO	CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No 470 DE 2018 SUSCRITO ENTRE EL DISTRITO CAPITAL - UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL CUERPO DE BOMBEROS Y GYG INGENIEROS LTDA	CONSECUTIVO	56
LUGAR o ESPECIALIDAD DE LOS TRABAJOS	OBRA	FECHA	martes 13 de agosto de 2019

HORAS PERDIDAS	POR LLUVIA	POR PAROS		OTROS	TOTALES
Horas Hombre	3				3.0
Horas Equipo	3				3.0

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD FUNCIONAL	UND.	CANTIDAD			
				CONTRACTUAL	ACUMULADO ANTERIOR	AVANCE HOY	ACUMULADO ACTUAL
1.00	TALA ARBOLES CLASE I, H<5M, INCLUYE DESENRAICE, RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL	1.5	UN	3.00	9.00	1.00	10.0
2.00	DESCARGA Y ACOPIO DE ACERO	-	GLB				

DESCRIPCION DE ACTIVIDADES EJECUTADAS

SE HACE EL CORTE DEL ÁRBOL EXISTENTE Y DESCARGA DE MATERIAL DE ACERO PARA FIGURAR EN SITIO

MANO DE OBRA EMPLEADA

CARGO	HORA		CANT.	TIEMPO (Horas)
	INICIO	FIN		
Arq. Residente	7:00:00	16:30:00	1.00	8:30:00
Ing. Residente	7:00:00	16:30:00	1.00	8:30:00
Aux. Ingeniero civil	7:00:00	16:30:00	1.00	8:30:00
Ing.. Profesional SST	7:00:00	16:30:00	1.00	8:30:00
Trabajadores	7:00:00	16:30:00	4.00	34:00:00
Profesionales de interventoría (arq y social)	8:00:00	12:30:00	2.00	9:00:00
Ing. Aux interventoría	7:00:00	16:30:00	1.00	8:30:00

EQUIPO UTILIZADO

DESCRIPCIÓN	CANT.	TIEMPO (Horas)

MATERIALES UTILIZADOS

DESCRIPCIÓN	UND.	CANT.

ESTADO DEL TIEMPO

		HORAS
SECO	X	4.5
NEBLINA		
LLOVIZNA		1
LLUVIA		3.5
TORMENTA		

TERRENO

ROCOSO		DURO		NORMAL	X
ARENOSO		LODOSO		PANTANO	


ACCESO

BUENO	X
REGULAR	
MALO	
NULO	

CAUSA ATRASO/DIA - MEDIDA CORRECTIVA:

Inicio de obra con lluvia 7:00 am a 8:30 am, 11:30 am a 12:30pm y de 2:00pm a 3:00pm

ESQUEMÁTICO DE OBRA

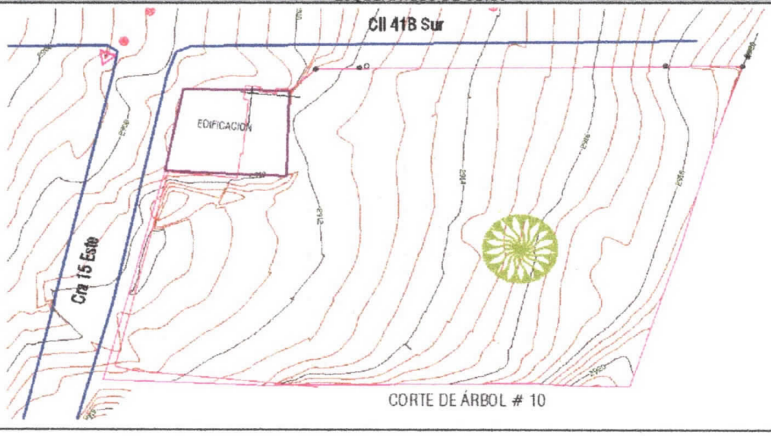

CORTE DE ÁRBOL # 10

OBSERVACIONES:

	ELABORÓ	APROBÓ
FIRMA:		
NOMBRE:	ING. JAVIER ANDRES ESCOBAR PINTOR	ARQ. MARCELO SARMIENTO
CARGO:	AUXILIAR DE INGENIERIA CONTRATISTA	DIRECTOR DE OBRA CONTRATISTA
	VALIDÓ	APROBÓ
FIRMA:		
NOMBRE:	ING. CAMILO ROMERO	ARQ. JHON CUELLAR
CARGO:	RESIDENTE DE OBRA CONTRATISTA	RESIDENTE DE INTERVENTORIA

	INFORME DIARIO DE ACTIVIDADES	Fecha:01/06/2019
		Código: F-OBR-024
	EJECUCIÓN DE OBRA	Versión: 1
		Hoja No.: 1 de 1

No DE CONTRATO Y OBJETO	CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No 470 DE 2018 SUSCRITO ENTRE EL DISTRITO CAPITAL - UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL CUERPO DE BOMBEROS Y GYG INGENIEROS LTDA	CONSECUTIVO	56
LUGAR o ESPECIALIDAD DE LOS TRABAJOS	OBRA	FECHA	martes 13 de agosto de 2019

INFORME DIARIO No. 56

Página 2 de 2

REGISTRO FOTOGRÁFICO













ELABORO:

ING. JAVIER ESCOBAR PINTOR
AUXILIAR DE INGENIERIA - CONTRATISTA

APROBO:

ING CAMILO ROMERO
RESIDENTE DE OBRA CONTRATISTA

GyG Ingenieros Ltda.	INFORME DIARIO DE ACTIVIDADES	Fecha:01/06/2019
		Código: F-OBR-024
	EJECUCIÓN DE OBRA	Versión: 1
		Hoja No.: 1 de 1

No DE CONTRATO DE OBRA Y OBJETO	CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No 470 DE 2018 SUSCRITO ENTRE EL DISTRITO CAPITAL - UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL CUERPO DE BOMBEROS Y GYG INGENIEROS LTDA	CONSECUTIVO	57
LUGAR o ESPECIALIDAD DE LOS TRABAJOS	OBRA	FECHA	miércoles 14 de agosto de 2019

HORAS PERDIDAS	POR LLUVIA	POR PAROS		OTROS	TOTALES
Horas Hombre	3.5				3.5
Horas Equipo	3.5				3.5

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD FUNCIONAL	UND.	CANTIDAD			
				CONTRACTUAL	ACUMULADO ANTERIOR	AVANCE HOY	ACUMULADO ACTUAL
1.00	FIGURADO DE ACERO	GLB	1.00				
2.00	ARREGLO DE ÁREAS DEL CAMPAMENTO	GLB	1.00				

DESCRIPCION DE ACTIVIDADES EJECUTADAS

SE INICIA ACTIVIDAD DEL FIGURADO DE ACERO PARA LOS MUROS DE CONTENCIÓN

MANO DE OBRA EMPLEADA					EQUIPO UTILIZADO		
CARGO	HORA		CANT.	TIEMPO (Horas)	DESCRIPCIÓN	CANT.	TIEMPO (Horas)
	INICIO	FIN					
Arq. Residente	7:00:00	16:30:00	1.00	8:30:00			
Ing. Residente	7:00:00	16:30:00	1.00	8:30:00			
Aux. Ingeniero civil	7:00:00	16:30:00	1.00	8:30:00			
Ing.. Profesional SST	7:00:00	16:30:00	1.00	8:30:00			
Trabajadores	7:00:00	16:30:00	4.00	34:00:00			

MATERIALES UTILIZADOS		
DESCRIPCION	UND.	CANT.

ESTADO DEL TIEMPO		HORAS
SECO	X	4.5
NEBLINA		
LLOVIZNA		1
LLUVIA		3.5
TORMENTA		


ACCESO	
BUENO	X
REGULAR	
MALO	
NULO	

TERRENO					
ROCOSO		DURO		NORMAL	X
ARENOSO		LODOSO		PANTANO	

CAUSA ATRASO/DIA - MEDIDA CORRECTIVA:

Inicio de obra con lluvia 7:00 am a 10:30 am

ESQUEMÁTICO DE OBRA

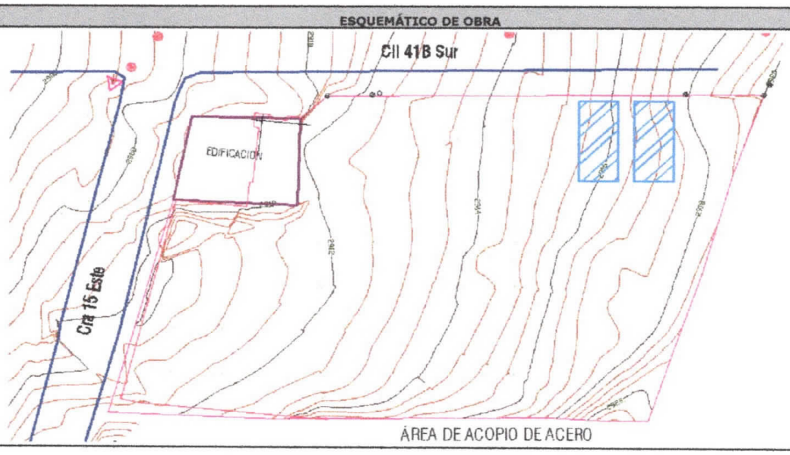

OBSERVACIONES:

	ELABORO	APROBO
FIRMA:		
NOMBRE:	ING. JAVIER ANDRÉS ESCOBAR PINTOR	ARQ. MARCELO SARMIENTO
CARGO:	AUXILIAR DE INGENIERÍA CONTRATISTA	DIRECTOR DE OBRA CONTRATISTA
	VALIDO	APROBO
FIRMA:		
NOMBRE:	ING. CAMILO ROMERO	ARQ. ALEJANDRO QUELLAR
CARGO:	RESIDENTE DE OBRA CONTRATISTA	RESIDENTE DE INTERVENTORIA

	INFORME DIARIO DE ACTIVIDADES	Fecha:01/06/2019
		Código: F-OBR-024
	EJECUCIÓN DE OBRA	Versión: 1
		Hoja No.: 1 de 1

No DE CONTRATO Y OBJETO	CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No 470 DE 2018 SUSCRITO ENTRE EL DISTRITO CAPITAL - UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL CUERPO DE BOMBEROS Y GYG INGENIEROS LTDA	CONSECUTIVO	57
LUGAR o ESPECIALIDAD DE LOS TRABAJOS	OBRA	FECHA	miércoles 14 de agosto de 2019


INFORME DIARIO No. 57

REGISTRO FOTOGRÁFICO








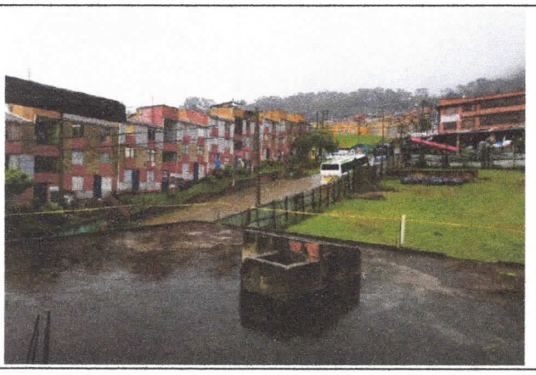



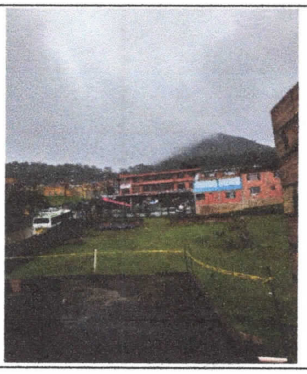

ELABORO:

ING. JAVIER ESCOBAR PINTOR
AUXILIAR DE INGENIERIA - CONTRATISTA

APROBO:

ING CAMILO ROMERO
RESIDENTE DE OBRA CONTRATISTA

G&G Ingenieros Ltda.	INFORME DIARIO DE ACTIVIDADES	Fecha:01/06/2019
		Código: F-OBR-024
	EJECUCIÓN DE OBRA	Versión: 1
		Hoja No.: 1 de 1

No DE CONTRATO DE OBRA Y OBJETO	CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No 470 DE 2018 SUSCRITO ENTRE EL DISTRITO CAPITAL - UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL CUERPO DE BOMBEROS Y GYG INGENIEROS LTDA	CONSECUTIVO	58
LUGAR o ESPECIALIDAD DE LOS TRABAJOS	OBRA	FECHA	jueves 15 de agosto de 2019

HORAS PERDIDAS	POR LLUVIA	POR PAROS		OTROS	TOTALES
Horas Hombre					0.0
Horas Equipo					0.0

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD FUNCIONAL	UND.	CANTIDAD			
				CONTRACTUAL	ACUMULADO ANTERIOR	AVANCE HOY	ACUMULADO ACTUAL
1.00	FIGURADO DE ACERO	GLB	1.00				

DESCRIPCION DE ACTIVIDADES EJECUTADAS

SE CONTINUA ACTIVIDAD DEL FIGURADO DE ACERO PARA LOS MUROS DE CONTENCIÓN

MANO DE OBRA EMPLEADA

CARGO	HORA		CANT.	TIEMPO (Horas)
	INICIO	FIN		
Arq. Residente	7:00:00	16:30:00	1.00	8:30:00
Ing. Residente	7:00:00	16:30:00	1.00	8:30:00
Aux. Ingeniero civil	7:00:00	16:30:00	1.00	8:30:00
Ing.. Profesional SST	7:00:00	16:30:00	1.00	8:30:00
Trabajadores	7:00:00	16:30:00	4.00	34:00:00

EQUIPO UTILIZADO

DESCRIPCIÓN	CANT.	TIEMPO (Horas)

MATERIALES UTILIZADOS

DESCRIPCION	UND.	CANT.

ESTADO DEL TIEMPO

		HORAS
SECO	X	9.0
NEBLINA		
LLOVIZNA		
LLUVIA		
TORMENTA		

ACCESO


BUENO	X
REGULAR	
MALO	
NULO	

TERRENO

ROCOSO		DURO		NORMAL	X
ARENOSO		LODOSO		PANTANO	

CAUSA ATRASO/DIA - MEDIDA CORRECTIVA:

ESQUEMÁTICO DE OBRA

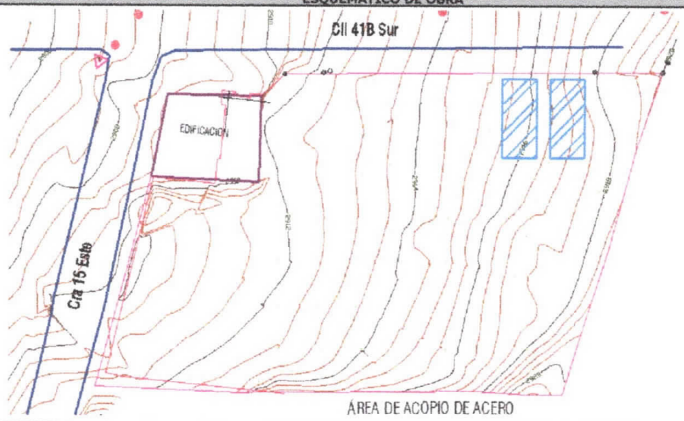

OBSERVACIONES:

	ELABORO	APROBO
FIRMA:		
NOMBRE:	ING. JAVIER ANDRÉS ESCOBAR PINTOR	ARQ. MARCELO SARMIENTO
CARGO:	AUXILIAR DE INGENIERIA CONTRATISTA	DIRECTOR DE OBRA CONTRATISTA
	VALIDO	APROBO
FIRMA:		
NOMBRE:	ING. CAMILO ROMERO	ARQ. JHON CUELLAR
CARGO:	RESIDENTE DE OBRA CONTRATISTA	RESIDENTE DE INTERVENTORIA

	INFORME DIARIO DE ACTIVIDADES	Fecha:01/06/2019
		Código: F-OBR-024
	EJECUCIÓN DE OBRA	Versión: 1
		Hoja No.: 1 de 1

No DE CONTRATO Y OBJETO	CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No 470 DE 2018 SUSCRITO ENTRE EL DISTRITO CAPITAL - UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL CUERPO DE BOMBEROS Y GYG INGENIEROS LTDA	CONSECUTIVO	58
LUGAR o ESPECIALIDAD DE LOS TRABAJOS	OBRA	FECHA	jueves 15 de agosto de 2019


INFORME DIARIO No. 58

REGISTRO FOTOGRÁFICO







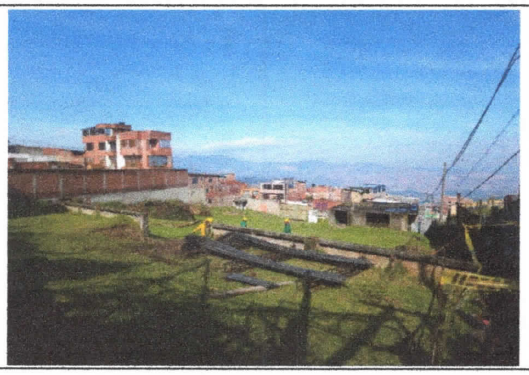

ELABORO:

ING. JAVIER ESCOBAR PINTOR
AUXILIAR DE INGENIERIA - CONTRATISTA

APROBO:

ING CAMILO ROMERO
RESIDENTE DE OBRA CONTRATISTA

G&G Ingenieros Ltda.	INFORME DIARIO DE ACTIVIDADES	Fecha:01/06/2019
		Código: F-OBR-024
	EJECUCIÓN DE OBRA	Versión: 1
		Hoja No.: 1 de 1

No DE CONTRATO DE OBRA Y OBJETO	CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No 470 DE 2018 SUSCRITO ENTRE EL DISTRITO CAPITAL - UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL CUERPO DE BOMBEROS Y GYG INGENIEROS LTDA	CONSECUTIVO	59
LUGAR o ESPECIALIDAD DE LOS TRABAJOS	OBRA	FECHA	viernes 16 de agosto de 2019

HORAS PERDIDAS	POR LLUVIA	POR PAROS		OTROS	TOTALES
Horas Hombre					0.0
Horas Equipo					0.0

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD FUNCIONAL	UND.	CANTIDAD			
				CONTRACTUAL	ACUMULADO ANTERIOR	AVANCE HOY	ACUMULADO ACTUAL
1.00	FIGURADO DE ACERO	GLB	1.00				
1.00	ARREGLO DE CERRAMIENTO	GLB	1.00				

DESCRIPCION DE ACTIVIDADES EJECUTADAS

SE CONTINUA ACTIVIDAD DEL FIGURADO DE ACERO PARA LOS MUROS DE CONTENCIÓN Y ARREGLO DE CERRAMIENTO PUERTAS

MANO DE OBRA EMPLEADA

CARGO	HORA		CANT.	TIEMPO (Horas)
	INICIO	FIN		
Arq. Residente	7:00:00	17:00:00	1.00	9:00:00
Ing. Residente	7:00:00	17:00:00	1.00	9:00:00
Aux. Ingeniero civil	7:00:00	17:00:00	1.00	9:00:00
Ing.. Profesional SST	7:00:00	17:00:00	1.00	9:00:00
Trabajadores	7:00:00	17:00:00	5.00	45:00:00
Profesional de interventoría (social)	8:00:00	9:00:00	1.00	1:00:00

EQUIPO UTILIZADO

DESCRIPCIÓN	CANT.	TIEMPO (Horas)
EQUIPO DE SOLDADURA	1	9.00

MATERIALES UTILIZADOS

DESCRIPCIÓN	UND.	CANT.

ESTADO DEL TIEMPO

		HORAS
SECO	X	8.0
NEBLINA		
LLOVIZNA		1.0
LLUVIA		
TORMENTA		

ACCESO

BUENO	X
REGULAR	
MALO	
NULO	


TERRENO

ROCOSO		DURO		NORMAL	X
ARENOSO		LODOSO		PANTANO	

CAUSA ATRASO/DIA - MEDIDA CORRECTIVA:

llovizna de 8:00 a 9:00am

ESQUEMÁTICO DE OBRA

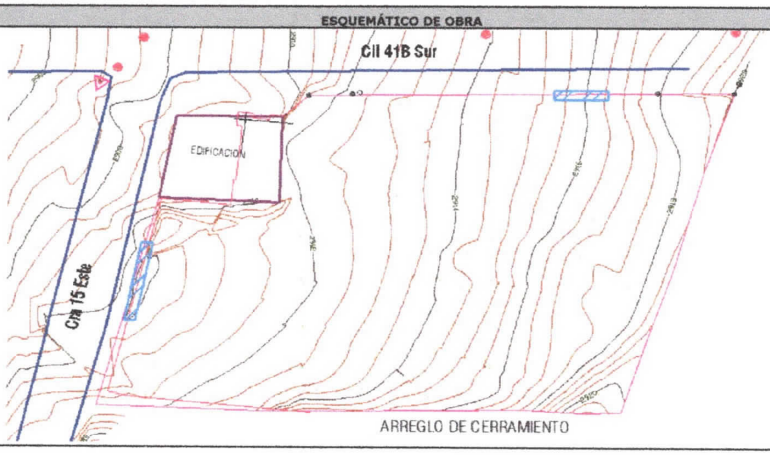

ARREGLO DE CERRAMIENTO

OBSERVACIONES:

	ELABORO	APROBO
FIRMA:		
NOMBRE:	ING. JAVIER ANDRES ESCOBAR PINTOR	ARQ. MARCELO SARMIENTO
CARGO:	AUXILIAR DE INGENIERIA CONTRATISTA	DIRECTOR DE OBRA CONTRATISTA
	VALIDO	APROBO
FIRMA:		
NOMBRE:	ING. CAMILO ROMERO	ARQ. JEAN CUELLAR
CARGO:	RESIDENTE DE OBRA CONTRATISTA	RESIDENTE DE INTERVENTORIA

G&G Ingenieros Ltda.	INFORME DIARIO DE ACTIVIDADES	Fecha:01/06/2019
		Código: F-OBR-024
	EJECUCIÓN DE OBRA	Versión: 1
		Hoja No.: 1 de 1

No DE CONTRATO Y OBJETO	CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No 470 DE 2018 SUSCRITO ENTRE EL DISTRITO CAPITAL - UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL CUERPO DE BOMBEROS Y GYG INGENIEROS LTDA	CONSECUTIVO	59
LUGAR o ESPECIALIDAD DE LOS TRABAJOS	OBRA	FECHA	viernes 16 de agosto de 2019


INFORME DIARIO No. 59

REGISTRO FOTOGRÁFICO







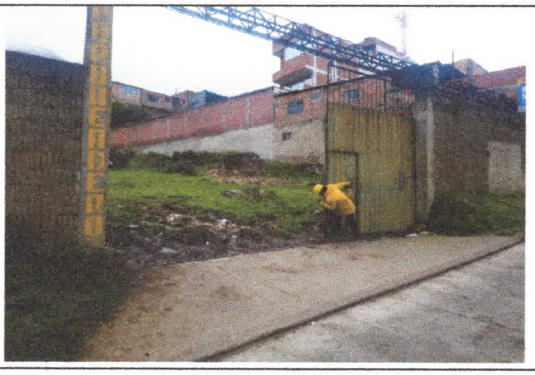





ELABORO:

ING. JAVIER ESCOBAR PINTOR
AUXILIAR DE INGENIERIA - CONTRATISTA

APROBO:

ING CAMILO ROMERO
RESIDENTE DE OBRA CONTRATISTA

G&G Ingenieros Ltda.	INFORME DIARIO DE ACTIVIDADES	Fecha:01/06/2019
		Código: F-OBR-024
	EJECUCIÓN DE OBRA	Versión: 1
		Hoja No.: 1 de 1

No DE CONTRATO DE OBRA Y OBJETO	CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No 470 DE 2018 SUSCRITO ENTRE EL DISTRITO CAPITAL - UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL CUERPO DE BOMBEROS Y GYG INGENIEROS LTDA	CONSECUTIVO	60
LUGAR o ESPECIALIDAD DE LOS TRABAJOS	OBRA	FECHA	sábado 17 de agosto de 2019

HORAS PERDIDAS	POR LLUVIA	POR PAROS		OTROS	TOTALES
Horas Hombre					0.0
Horas Equipo					0.0

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD FUNCIONAL	UND.	CANTIDAD			
				CONTRACTUAL	ACUMULADO ANTERIOR	AVANCE HOY	ACUMULADO ACTUAL
1.00	FIGURADO DE ACERO	GLB	1.00				

DESCRIPCION DE ACTIVIDADES EJECUTADAS

SE CONTINUA ACTIVIDAD DEL FIGURADO DE ACERO PARA LOS MUROS DE CONTENCIÓN Y ZAPATAS

MANO DE OBRA EMPLEADA

CARGO	HORA		CANT.	TIEMPO (Horas)
	INICIO	FIN		
Arq. Residente	7:00:00	12:00:00	1.00	4:00:00
Ing. Residente	7:00:00	12:00:00	1.00	4:00:00
Aux. Ingeniero civil	7:00:00	12:00:00	1.00	4:00:00
Ing. Profesional SST	7:00:00	12:00:00	1.00	4:00:00
Trabajadores	7:00:00	12:00:00	4.00	16:00:00

EQUIPO UTILIZADO

DESCRIPCIÓN	CANT.	TIEMPO (Horas)

MATERIALES UTILIZADOS

DESCRIPCION	UND.	CANT.

ESTADO DEL TIEMPO

		HORAS
SECO	X	
NEBLINA		
LLOVIZNA		
LLUVIA		
TORMENTA		

ACCESO


BUENO	X
REGULAR	
MALO	
NULO	

TERRENO

ROCOSO		DURO		NORMAL	X
ARENOSO		LODOSO		PANTANO	

CAUSA ATRASO/DIA - MEDIDA CORRECTIVA:

ESQUEMÁTICO DE OBRA

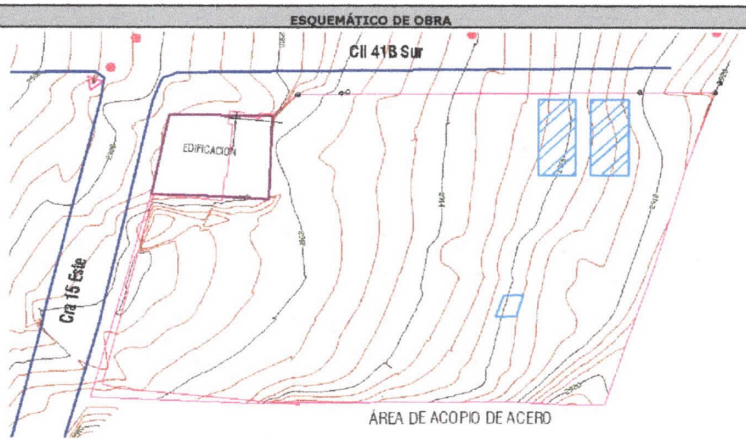

OBSERVACIONES:

	ELABORÓ		APROBÓ
FIRMA:		FIRMA:	
NOMBRE:	ING. JAVIER ANDRES ESCOBAR PINTOR	NOMBRE:	ARQ. MARCELO SARMIENTO
CARGO:	AUXILIAR DE INGENIERIA CONTRATISTA	CARGO:	DIRECTOR DE OBRA CONTRATISTA
	VALIDO		APROBO
FIRMA:		FIRMA:	
NOMBRE:	ING. CAMILO ROMERO	NOMBRE:	ARQ. JHON QUELLAR
CARGO:	RESIDENTE DE OBRA CONTRATISTA	CARGO:	RESIDENTE DE INTERVENTORIA

G&G Ingenieros Ltda.	INFORME DIARIO DE ACTIVIDADES	Fecha:01/06/2019
		Código: F-OBR-024
	EJECUCIÓN DE OBRA	Versión: 1
		Hoja No.: 1 de 1

No DE CONTRATO Y OBJETO	CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No 470 DE 2018 SUSCRITO ENTRE EL DISTRITO CAPITAL - UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL CUERPO DE BOMBEROS Y GYG INGENIEROS LTDA	CONSECUTIVO	60
LUGAR o ESPECIALIDAD DE LOS TRABAJOS	OBRA	FECHA	sábado 17 de agosto de 2019

INFORME DIARIO No. 60

REGISTRO FOTOGRÁFICO







ELABORO:

ING. JAVIER ESCOBAR PINTOR
AUXILIAR DE INGENIERIA - CONTRATISTA

APROBO:

ING CAMILO ROMERO
RESIDENTE DE OBRA CONTRATISTA

G&G Ingenieros Ltda.	INFORME DIARIO DE ACTIVIDADES	Fecha:01/06/2019
		Código: F-OBR-024
	EJECUCIÓN DE OBRA	Versión: 1
		Hoja No.: 1 de 1

No DE CONTRATO DE OBRA Y OBJETO	CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No 470 DE 2018 SUSCRITO ENTRE EL DISTRITO CAPITAL - UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL CUERPO DE BOMBEROS Y GYG INGENIEROS LTDA	CONSECUTIVO	61
LUGAR o ESPECIALIDAD DE LOS TRABAJOS	OBRA	FECHA	domingo 18 de agosto de 2019

HORAS PERDIDAS	POR LLUVIA	POR PAROS		OTROS	TOTALES
Horas Hombre					0.0
Horas Equipo					0.0

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD FUNCIONAL	UND.	CANTIDAD			
				CONTRACTUAL	ACUMULADO ANTERIOR	AVANCE HOY	ACUMULADO ACTUAL
1.00	DÍA FESTIVO	GLB	1.00				

DESCRIPCION DE ACTIVIDADES EJECUTADAS

DÍA FESTIVO

MANO DE OBRA EMPLEADA					EQUIPO UTILIZADO		
CARGO	HORA		CANT.	TIEMPO (Horas)	DESCRIPCIÓN	CANT.	TIEMPO (Horas)
	INICIO	FIN					
Arq. Residente				0:00:00			
Ing. Residente				0:00:00			
Aux. Ingeniero civil				0:00:00			
Ing.. Profesional SST				0:00:00			
Trabajadores				0:00:00			
				0:00:00			

MATERIALES UTILIZADOS			ESTADO DEL TIEMPO		ACCESO	
DESCRIPCION	UND.	CANT.		HORAS		
			SECO [X]		BUENO [X]	
			NEBLINA [ ]		REGULAR [ ]	
			LLOVIZNA [ ]		MALO [ ]	
			LLUVIA [ ]		NULO [ ]	
			TORMENTA [ ]			
			TERRENO			
			ROCOSO [ ]	DURO [ ]	NORMAL [X]	
			ARENOSO [ ]	LODOSO [ ]	PANTANO [ ]	

CAUSA ATRASO/DIA - MEDIDA CORRECTIVA:

ESQUEMÁTICO DE OBRA

OBSERVACIONES:

	ELABORÓ		APROBÓ
FIRMA:		FIRMA:	
NOMBRE:	ING. JAVIER ANDRÉS ESCOBAR PINTOR	NOMBRE:	ARQ. MARCELO SARMIENTO
CARGO:	AUXILIAR DE INGENIERÍA CONTRATISTA	CARGO:	DIRECTOR DE OBRA CONTRATISTA
	VALIDÓ		APROBÓ
FIRMA:		FIRMA:	
NOMBRE:	ING. CAMILO ROMERO	NOMBRE:	ARQ. [illegible]NCUELLAR
CARGO:	RESIDENTE DE OBRA CONTRATISTA	CARGO:	RESIDENTE DE INTERVENTORIA

G&G Ingenieros Ltda.	INFORME DIARIO DE ACTIVIDADES	Fecha:01/06/2019
		Código: F-OBR-024
	EJECUCIÓN DE OBRA	Versión: 1
		Hoja No.: 1 de 1

No DE CONTRATO DE OBRA Y OBJETO	CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No 470 DE 2018 SUSCRITO ENTRE EL DISTRITO CAPITAL - UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL CUERPO DE BOMBEROS Y GYG INGENIEROS LTDA	CONSECUTIVO	62
LUGAR o ESPECIALIDAD DE LOS TRABAJOS	OBRA	FECHA	lunes 19 de agosto de 2019

HORAS PERDIDAS	POR LLUVIA	POR PAROS		OTROS	TOTALES
Horas Hombre					0.0
Horas Equipo					0.0

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD FUNCIONAL	UND.	CANTIDAD			
				CONTRACTUAL	ACUMULADO ANTERIOR	AVANCE HOY	ACUMULADO ACTUAL
1.00	DÍA FESTIVO	GLB	1.00				

DESCRIPCION DE ACTIVIDADES EJECUTADAS

DÍA FESTIVO

MANO DE OBRA EMPLEADA					EQUIPO UTILIZADO		
CARGO	HORA		CANT.	TIEMPO (Horas)	DESCRIPCIÓN	CANT.	TIEMPO (Horas)
	INICIO	FIN					
Arq. Residente				0:00:00			
Ing. Residente				0:00:00			
Aux. Ingeniero civil				0:00:00			
Ing.. Profesional SST				0:00:00			
Trabajadores				0:00:00			
				0:00:00			

MATERIALES UTILIZADOS			ESTADO DEL TIEMPO			ACCESO	
DESCRIPCIÓN	UND.	CANT.			HORAS		
			SECO	X		BUENO	X
			NEBLINA			REGULAR	
			LLOVIZNA			MALO	
			LLUVIA			NULO	
			TORMENTA				
			TERRENO				
			ROCOSO		DURO	NORMAL	X
			ARENOSO		LODOSO	PANTANO	

CAUSA ATRASO/DIA - MEDIDA CORRECTIVA:

ESQUEMÁTICO DE OBRA

OBSERVACIONES:

	ELABORÓ	APROBÓ
FIRMA:		
NOMBRE:	ING. JAVIER ANDRÉS ESCOBAR PINTOR	ARQ. MARCELO SARMIENTO
CARGO:	AUXILIAR DE INGENIERÍA CONTRATISTA	DIRECTOR DE OBRA CONTRATISTA
	VALIDÓ	APROBÓ
FIRMA:		
NOMBRE:	ING. CAMILO ROMERO	ARQ. JHON CUELLAR
CARGO:	RESIDENTE DE OBRA CONTRATISTA	RESIDENTE DE INTERVENTORIA

G+G Ingenieros Ltda.	INFORME DIARIO DE ACTIVIDADES	Fecha:01/06/2019
		Código: F-OBR-024
	EJECUCIÓN DE OBRA	Versión: 1
		Hoja No.: 1 de 1

No DE CONTRATO DE OBRA Y OBJETO	CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No 470 DE 2018 SUSCRITO ENTRE EL DISTRITO CAPITAL - UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL CUERPO DE BOMBEROS Y GYG INGENIEROS LTDA	CONSECUTIVO	63
LUGAR o ESPECIALIDAD DE LOS TRABAJOS	OBRA	FECHA	martes 20 de agosto de 2019

HORAS PERDIDAS	POR LLUVIA	POR PAROS		OTROS	TOTALES
Horas Hombre					0.0
Horas Equipo					0.0

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD FUNCIONAL	UND.	CANTIDAD			
				CONTRACTUAL	ACUMULADO ANTERIOR	AVANCE HOY	ACUMULADO ACTUAL
1.00	FIGURADO DE ACERO	GLB	1.00				
2.00	LLEGADA DE EQUIPO A OBRA						

DESCRIPCION DE ACTIVIDADES EJECUTADAS

SE CONTINUA ACTIVIDAD DEL FIGURADO DE ACERO PARA LOS MUROS DE CONTENCIÓN Y ZAPATAS Y LLEGA A OBRA LA RETROEXCAVADORA

MANO DE OBRA EMPLEADA

CARGO	HORA		CANT.	TIEMPO (Horas)
	INICIO	FIN		
Arq. Residente	7:00:00	16:30:00	1.00	8:30:00
Ing. Residente	7:00:00	16:30:00	1.00	8:30:00
Aux. Ingeniero civil	7:00:00	16:30:00	1.00	8:30:00
Ing.. Profesional SST	7:00:00	16:30:00	1.00	8:30:00
Trabajadores	7:00:00	16:30:00	4.00	34:00:00
Profesional de interventoría (Aux Ing)	7:00:00	16:30:00	1.00	8:30:00

EQUIPO UTILIZADO

DESCRIPCIÓN	CANT.	TIEMPO (Horas)
EXCAVADORA	1	0.00

MATERIALES UTILIZADOS

DESCRIPCION	UND.	CANT.

ESTADO DEL TIEMPO

		HORAS
SECO	X	9.0
NEBLINA		
LLOVIZNA		
LLUVIA		
TORMENTA		

ACCESO


BUENO	X
REGULAR	
MALO	
NULO	

TERRENO

ROCOSO		DURO		NORMAL	X
ARENOSO		LODOSO		PANTANO	

CAUSA ATRASO/DIA - MEDIDA CORRECTIVA:

ESQUEMÁTICO DE OBRA

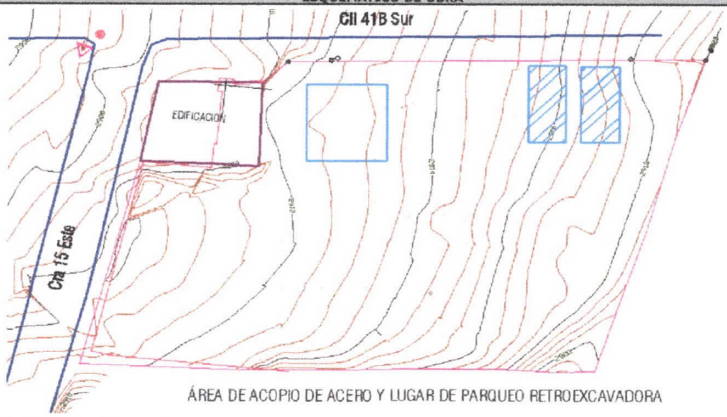

ÁREA DE ACOPIO DE ACERO Y LUGAR DE PARQUEO RETROEXCAVADORA

OBSERVACIONES:


	ELABORÓ	APROBÓ
FIRMA:		
NOMBRE:	ING. JAVIER ANDRES ESCOBAR PINTOR	ARQ. MARCELO SARMIENTO
CARGO:	AUXILIAR DE INGENIERIA CONTRATISTA	DIRECTOR DE OBRA CONTRATISTA
	VALIDO	APROBO
FIRMA:		
NOMBRE:	ING. CAMILO ROMERO	ARQ. JUAN CUELLAR
CARGO:	RESIDENTE DE OBRA CONTRATISTA	RESIDENTE DE INTERVENTORIA

G&G Ingenieros Ltda.	INFORME DIARIO DE ACTIVIDADES	Fecha:01/06/2019
		Código: F-OBR-024
	EJECUCIÓN DE OBRA	Versión: 1
		Hoja No.: 1 de 1

No DE CONTRATO Y OBJETO	CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No 470 DE 2018 SUSCRITO ENTRE EL DISTRITO CAPITAL - UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL CUERPO DE BOMBEROS Y GYG INGENIEROS LTDA	CONSECUTIVO	63
LUGAR o ESPECIALIDAD DE LOS TRABAJOS	OBRA	FECHA	martes 20 de agosto de 2019

INFORME DIARIO No. 63

REGISTRO FOTOGRÁFICO

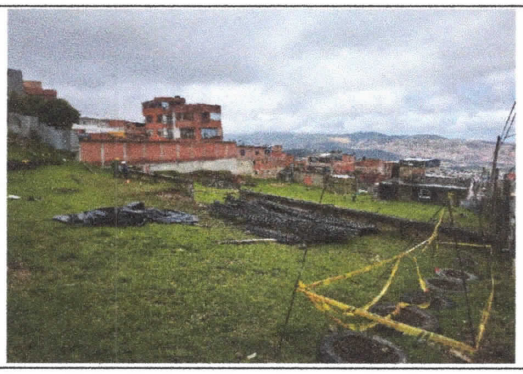











ELABORO:

ING. JAVIER ESCOBAR PINTOR
AUXILIAR DE INGENIERIA - CONTRATISTA

APROBO:

ING CAMILO ROMERO
RESIDENTE DE OBRA CONTRATISTA

G&G Ingenieros Ltda.	INFORME DIARIO DE ACTIVIDADES	Fecha:01/06/2019
		Código: F-OBR-024
	EJECUCIÓN DE OBRA	Versión: 1
		Hoja No.: 1 de 1

No DE CONTRATO DE OBRA Y OBJETO	CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No 470 DE 2018 SUSCRITO ENTRE EL DISTRITO CAPITAL - UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL CUERPO DE BOMBEROS Y GYG INGENIEROS LTDA	CONSECUTIVO	64
LUGAR o ESPECIALIDAD DE LOS TRABAJOS	OBRA	FECHA	miércoles 21 de agosto de 2019

HORAS PERDIDAS	POR LLUVIA	POR PAROS		OTROS	TOTALES
Horas Hombre					0.0
Horas Equipo					0.0

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD FUNCIONAL	UND.	CANTIDAD			
				CONTRACTUAL	ACUMULADO ANTERIOR	AVANCE HOY	ACUMULADO ACTUAL
1.00	FIGURADO DE ACERO	-	GLB				
2.00	DESCAPOTE A MAQUINA INCLUYE RETIRO	1.4	m2	2197.95	0.00	205.78	205.78
3.00	EXCAVACIONES VARIAS A MÁQUINA SIN CLASIFICAR INCLUYE RETIRO.	3.1	m3	18895.39	0.00	75.00	75.00
4.00	COLOCACIÓN SEÑALIZACIÓN PMT	-	GLB				

DESCRIPCION DE ACTIVIDADES EJECUTADAS

SE HACE LA COLOCACIÓN DE LA SEÑALES DE TRANSITO PARA EL MANEJO DEL TRAFICO, SE INICIA EL DESCAPOTE DEL TERRENO, EXCAVACIÓN A MAQUINA Y SE CONTINUA CON EL ACERO FIGURADO

MANO DE OBRA EMPLEADA

CARGO	HORA		CANT.	TIEMPO (Horas)
	INICIO	FIN		
Arq. Residente	7:00:00	16:30:00	1.00	8:30:00
Ing. Residente	7:00:00	16:30:00	1.00	8:30:00
Aux. Ingeniero civil	7:00:00	16:30:00	1.00	8:30:00
Ing.. Profesional SST	7:00:00	16:30:00	1.00	8:30:00
Trabajadores	7:00:00	16:30:00	5.00	42:30:00
Profesional de interventoría (Aux Ing)	7:00:00	16:30:00	1.00	8:30:00

EQUIPO UTILIZADO

DESCRIPCIÓN	CANT.	TIEMPO (Horas)
EXCAVADORA 210	1	5.00
VOLQUETA (VIAJE)	5	8.50

MATERIALES UTILIZADOS

DESCRIPCIÓN	UND.	CANT.
CEMENTO	BL	1
MIXTO	M3	0.1

ESTADO DEL TIEMPO

		HORAS
SECO	X	9.0
NEBLINA		
LLOVIZNA		
LLUVIA		
TORMENTA		

ACCESO


BUENO	X
REGULAR	
MALO	
NULO	


TERRENO

ROCOSO		DURO		NORMAL	X
ARENOSO		LODOSO		PANTANO	

CAUSA ATRASO/DIA - MEDIDA CORRECTIVA:

ESQUEMÁTICO DE OBRA

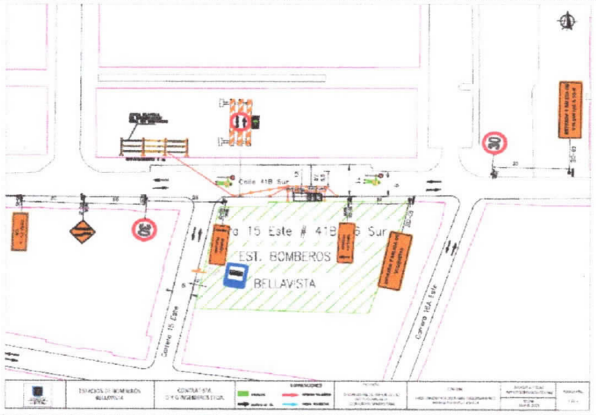

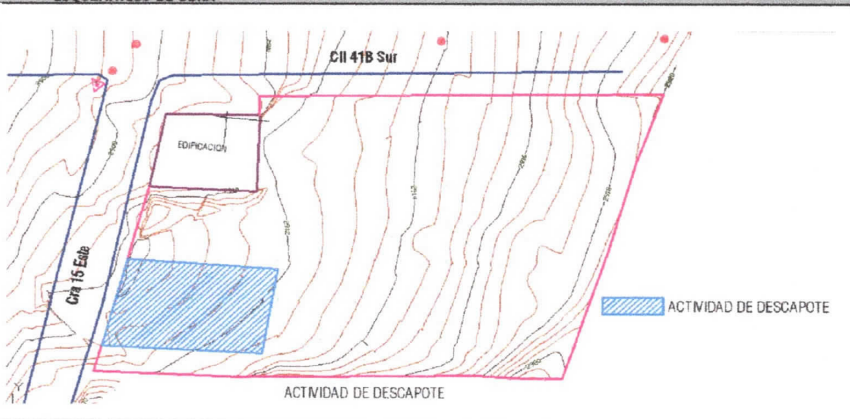

OBSERVACIONES:

	ELABORÓ	APROBÓ
FIRMA:		
NOMBRE:	ING. JAVIER ANDRES ESCOBAR PINTOR	ARQ. MARCELO SARMIENTO
CARGO:	AUXILIAR DE INGENIERIA CONTRATISTA	DIRECTOR DE OBRA CONTRATISTA
	VALIDÓ	APROBÓ
FIRMA:		
NOMBRE:	ING. CAMILO ROMERO	ARQ. JHON CUELLAR
CARGO:	RESIDENTE DE OBRA CONTRATISTA	RESIDENTE DE INTERVENTORIA

G&G Ingenieros Ltda.	INFORME DIARIO DE ACTIVIDADES	Fecha:01/06/2019
		Código: F-OBR-024
	EJECUCIÓN DE OBRA	Versión: 1
		Hoja No.: 1 de 1

No DE CONTRATO Y OBJETO	CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No 470 DE 2018 SUSCRITO ENTRE EL DISTRITO CAPITAL - UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL CUERPO DE BOMBEROS Y GYG INGENIEROS LTDA	CONSECUTIVO	64
LUGAR o ESPECIALIDAD DE LOS TRABAJOS	OBRA	FECHA	miércoles 21 de agosto de 2019


INFORME DIARIO No. 64

REGISTRO FOTOGRÁFICO



















ELABORO:

ING. JAVIER ESCOBAR PINTOR
AUXILIAR DE INGENIERIA - CONTRATISTA

APROBO:

ING CAMILO ROMERO
RESIDENTE DE OBRA CONTRATISTA

G&G Ingenieros Ltda.	INFORME DIARIO DE ACTIVIDADES	Fecha:01/06/2019
		Código: F-OBR-024
	EJECUCIÓN DE OBRA	Versión: 1
		Hoja No.: 1 de 1

No DE CONTRATO DE OBRA Y OBJETO	CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No 470 DE 2018 SUSCRITO ENTRE EL DISTRITO CAPITAL - UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL CUERPO DE BOMBEROS Y GYG INGENIEROS LTDA	CONSECUTIVO	65
LUGAR o ESPECIALIDAD DE LOS TRABAJOS	OBRA	FECHA	jueves 22 de Agosto de 2019

HORAS PERDIDAS	POR LLUVIA	POR PAROS		OTROS	TOTALES
Horas Hombre					0,0
Horas Equipo					0,0

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD FUNCIONAL	UND.	CANTIDAD			
				CONTRACTUAL	ACUMULADO ANTERIOR	AVANCE HOY	ACUMULADO ACTUAL
1,00	FIGURADO DE ACERO	-	GLB				
2,00	DESCAPOTE A MAQUINA INCLUYE RETIRO	1,4	m2	2197,95	205,78	240,79	446,570
3,00	EXCAVACIONES VARIAS A MÁQUINA SIN CLASIFICAR INCLUYE RETIRO.	3,1	m3	18895,39	75,00	225,00	300,00

DESCRIPCION DE ACTIVIDADES EJECUTADAS

SE HACE DESCAPOTE DEL TERRENO, EXCAVACIÓN A MAQUINA Y SE CONTINUA CON EL FIGURADO DE ACERO

MANO DE OBRA EMPLEADA

CARGO	HORA		CANT.	TIEMPO (Horas)
	INICIO	FIN		
Arq. Residente	7:00:00	16:30:00	1,00	8:30:00
Ing. Residente	7:00:00	16:30:00	1,00	8:30:00
Aux. Ingeniero civil	7:00:00	16:30:00	1,00	8:30:00
Ing.. Profesional SST	7:00:00	16:30:00	1,00	8:30:00
Trabajadores	7:00:00	16:30:00	6,00	51:00:00
Profesional de interventoría (Aux Ing)	7:00:00	16:30:00	1,00	8:30:00
Profesionales en topografía GyG	7:00:00	16:30:00	2,00	17:00:00

EQUIPO UTILIZADO

DESCRIPCIÓN	CANT.	TIEMPO (Horas)
EXCAVADORA 210	1	8,50
VOLQUETA (VIAJE)	15	8,50

MATERIALES UTILIZADOS

DESCRIPCIÓN	UND.	CANT.

ESTADO DEL TIEMPO

		HORAS
SECO	X	9,0
NEBLINA		
LLOVIZNA		
LLUVIA		
TORMENTA		

ACCESO


BUENO	X
REGULAR	
MALO	
NULO	

TERRENO

ROCOSO		DURO		NORMAL	X
ARENOSO		LODOSO		PANTANO	

CAUSA ATRASO/DIA - MEDIDA CORRECTIVA:

ESQUEMÁTICO DE OBRA

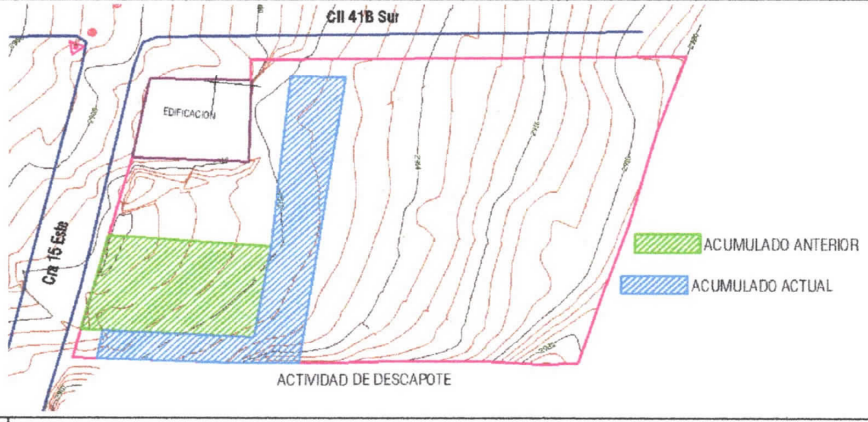

OBSERVACIONES:

	ELABORÓ	APROBÓ
FIRMA:		
NOMBRE:	ING. JAVIER ANDRES ESCOBAR PINTOR	ARQ. MARCELO SARMIENTO
CARGO:	AUXILIAR DE INGENIERIA CONTRATISTA	DIRECTOR DE OBRA CONTRATISTA
	VALIDO	APROBO
FIRMA:		
NOMBRE:	ING. CAMILO ROMERO	ARQ. YHON CUELLAR
CARGO:	RESIDENTE DE OBRA CONTRATISTA	RESIDENTE DE INTERVENTORIA

G&G Ingenieros Ltda.	INFORME DIARIO DE ACTIVIDADES	Fecha:01/06/2019
		Código: F-OBR-024
	EJECUCIÓN DE OBRA	Versión: 1
		Hoja No.: 1 de 1

No DE CONTRATO Y OBJETO	CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No 470 DE 2018 SUSCRITO ENTRE EL DISTRITO CAPITAL - UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL CUERPO DE BOMBEROS Y GYG INGENIEROS LTDA	CONSECUTIVO	65
LUGAR o ESPECIALIDAD DE LOS TRABAJOS	OBRA	FECHA	jueves 22 de Agosto de 2019

INFORME DIARIO No. 65

REGISTRO FOTOGRÁFICO













ELABORO:

ING. JAVIER ESCOBAR PINTOR
AUXILIAR DE INGENIERIA - CONTRATISTA

APROBO:

ING CAMILO ROMERO
RESIDENTE DE OBRA CONTRATISTA

G&G Ingenieros Ltda.	INFORME DIARIO DE ACTIVIDADES	Fecha:01/06/2019
		Código: F-OBR-024
	EJECUCIÓN DE OBRA	Versión: 1
		Hoja No.: 1 de 1

No DE CONTRATO DE OBRA Y OBJETO	CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No 470 DE 2018 SUSCRITO ENTRE EL DISTRITO CAPITAL - UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL CUERPO DE BOMBEROS Y GYG INGENIEROS LTDA	CONSECUTIVO	66
LUGAR o ESPECIALIDAD DE LOS TRABAJOS	OBRA	FECHA	viernes 23 de Agosto de 2019

HORAS PERDIDAS	POR LLUVIA	POR PAROS		OTROS	TOTALES
Horas Hombre					0,0
Horas Equipo					0,0

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD FUNCIONAL	UND.	CANTIDAD			
				CONTRACTUAL	ACUMULADO ANTERIOR	AVANCE HOY	ACUMULADO ACTUAL
1,00	FIGURADO DE ACERO	-	GLB				
2,00	DESCAPOTE A MAQUINA INCLUYE RETIRO	1,4	m2	2197,95	446,57	505,27	951,84
3,00	EXCAVACIONES VARIAS A MÁQUINA SIN CLASIFICAR INCLUYE RETIRO.	3,1	m3	18895,39	300,00	210,00	510,00

DESCRIPCION DE ACTIVIDADES EJECUTADAS

SE HACE DESCAPOTE DEL TERRENO, EXCAVACIÓN A MAQUINA Y SE CONTINUA CON EL FIGURADO DE ACERO

MANO DE OBRA EMPLEADA

CARGO	HORA		CANT.	TIEMPO (Horas)
	INICIO	FIN		
Arq. Residente	7:00:00	17:00:00	1,00	9:00:00
Ing. Residente	7:00:00	17:00:00	1,00	9:00:00
Aux. Ingeniero civil	7:00:00	17:00:00	1,00	9:00:00
Ing.. Profesional SST	7:00:00	17:00:00	1,00	9:00:00
Trabajadores	7:00:00	17:00:00	7,00	63:00:00
Profesional de interventoria (Aux Ing)	7:00:00	17:00:00	1,00	9:00:00
Profesionales en topografia GyG	7:00:00	17:00:00	2,00	18:00:00

EQUIPO UTILIZADO

DESCRIPCIÓN	CANT.	TIEMPO (Horas)
EXCAVADORA 210	1	8,50
VOLQUETA (VIAJE)	14	8,50

MATERIALES UTILIZADOS

DESCRIPCIÓN	UND.	CANT.

ESTADO DEL TIEMPO

		HORAS
SECO	X	8,0
NEBLINA	X	1,0
LLOVIZNA		
LLUVIA		
TORMENTA		

ACCESO

BUENO	X
REGULAR	
MALO	
NULO	

TERRENO

ROCOSO		DURO		NORMAL	X
ARENOSO		LODOSO		PANTANO	

CAUSA ATRASO/DIA - MEDIDA CORRECTIVA:

ESQUEMÁTICO DE OBRA



OBSERVACIONES:


	ELABORÓ	APROBÓ
FIRMA:		
NOMBRE:	ING. JAVIER ANDRES ESCOBAR PINTOR	ARQ. MARCELO SARMIENTO
CARGO:	AUXILIAR DE INGENIERIA CONTRATISTA	DIRECTOR DE OBRA CONTRATISTA
	VALIDÓ	APROBÓ
FIRMA:		
NOMBRE:	ING. CAMILO ROMERO	ARQ. JHON QUELLAR
CARGO:	RESIDENTE DE OBRA CONTRATISTA	RESIDENTE DE INTERVENTORIA

G&G Ingenieros Ltda.	INFORME DIARIO DE ACTIVIDADES	Fecha:01/06/2019
		Código: F-OBR-024
	EJECUCIÓN DE OBRA	Versión: 1
		Hoja No.: 1 de 1

No DE CONTRATO Y OBJETO	CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No 470 DE 2018 SUSCRITO ENTRE EL DISTRITO CAPITAL - UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL CUERPO DE BOMBEROS Y GYG INGENIEROS LTDA	CONSECUTIVO	66
LUGAR o ESPECIALIDAD DE LOS TRABAJOS	OBRA	FECHA	viernes 23 de Agosto de 2019

INFORME DIARIO No. 66

REGISTRO FOTOGRÁFICO

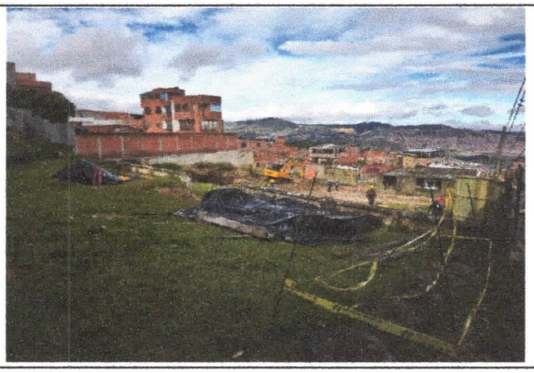











ELABORO:

ING. JAVIER ESCOBAR PINTOR
AUXILIAR DE INGENIERIA - CONTRATISTA

APROBO:

ING CAMILO ROMERO
RESIDENTE DE OBRA CONTRATISTA

GyG Ingenieros Ltda.	INFORME DIARIO DE ACTIVIDADES	Fecha:01/06/2019
		Código: F-OBR-024
	EJECUCIÓN DE OBRA	Versión: 1
		Hoja No.: 1 de 1

No DE CONTRATO DE OBRA Y OBJETO	CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No 470 DE 2018 SUSCRITO ENTRE EL DISTRITO CAPITAL - UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL CUERPO DE BOMBEROS Y GYG INGENIEROS LTDA	CONSECUTIVO	67
LUGAR o ESPECIALIDAD DE LOS TRABAJOS	OBRA	FECHA	sábado 24 de Agosto de 2019

HORAS PERDIDAS	POR LLUVIA	POR PAROS		OTROS	TOTALES
Horas Hombre					0,0
Horas Equipo					0,0

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD FUNCIONAL	UND.	CANTIDAD			
				CONTRACTUAL	ACUMULADO ANTERIOR	AVANCE HOY	ACUMULADO ACTUAL
1,00	FIGURADO DE ACERO	-	GLB				
2,00	EXCAVACIONES VARIAS A MAQUINA SIN CLASIFICAR INCLUYE RETIRO.	3,1	m3	18895,39	510,00	255,00	765,000
3,00	RELLENO EN RECEBO COMÚN COMPACTADO MECÁNICAMENTE.	3,3	m3	406,65	0,00	15,00	15,000

DESCRIPCION DE ACTIVIDADES EJECUTADAS

SE CONTINUA CON LA EXCAVACIÓN A MAQUINA, LA ACTIVIDAD DEL FIGURADO DE ACERO Y MEJORAMIENTO DEL TERRENO CON RECEBO COMÚN

MANO DE OBRA EMPLEADA

CARGO	HORA		CANT.	TIEMPO (Horas)
	INICIO	FIN		
Arq. Residente	7:00:00	12:00:00	1,00	5:00:00
Ing. Residente	7:00:00	12:00:00	1,00	5:00:00
Aux. Ingeniero civil	7:00:00	12:00:00	1,00	5:00:00
Ing.. Profesional SST	7:00:00	12:00:00	1,00	5:00:00
Trabajadores	7:00:00	12:00:00	7,00	35:00:00
Profesional de interventoría (Aux Ing, social y topógrafo)	7:00:00	12:00:00	3,00	15:00:00
Profesionales en topografia GyG	7:00:00	12:00:00	2,00	10:00:00
Ing. Ambiental	7:00:00	12:00:00	1,00	5:00:00
Ing. Gestión de Calidad	7:00:00	12:00:00	1,00	5:00:00

EQUIPO UTILIZADO

DESCRIPCIÓN	CANT.	TIEMPO (Horas)
EXCAVADORA 210	1	8,50
VOLQUETA (VIAJE)	17	8,50

MATERIALES UTILIZADOS

DESCRIPCIÓN	UND.	CANT.
RECEBO	m3	15

ESTADO DEL TIEMPO

		HORAS
SECO	X	4,0
NEBLINA		
LLOVIZNA	X	1,0
LLUVIA		
TORMENTA		

ACCESO

BUENO	X
REGULAR	
MALO	
NULO	


TERRENO

ROCOSO		DURO		NORMAL	X
ARENOSO		LODOSO		PANTANO	

CAUSA ATRASO/DIA - MEDIDA CORRECTIVA:

LLOVIZNA LEVE 10:00AM A 11:00 AM

ESQUEMÁTICO DE OBRA

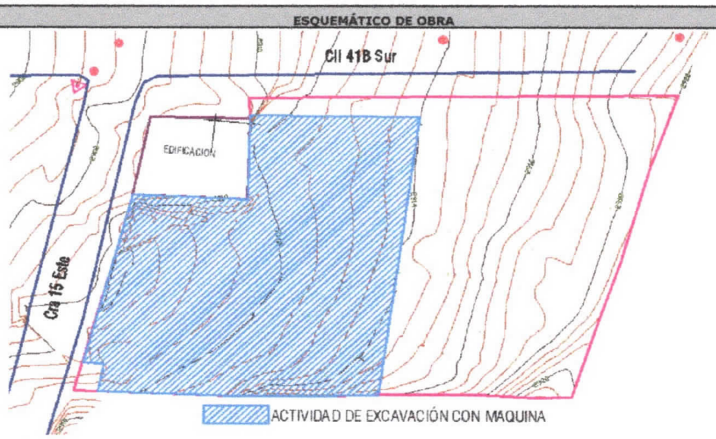

OBSERVACIONES:

	ELABORO	APROBO
FIRMA:		
NOMBRE:	ING. JAVIER ANDRES ESCOBAR PINTOR	ARQ. MARCELO SARMIENTO
CARGO:	AUXILIAR DE INGENIERIA CONTRATISTA	DIRECTOR DE OBRA CONTRATISTA
	VALIDO	APROBO
FIRMA:		
NOMBRE:	ING. CAMILO ROMERO	ARQ. JHON CUELLAR
CARGO:	RESIDENTE DE OBRA CONTRATISTA	RESIDENTE DE INTERVENTORIA

G&G Ingenieros Ltda	INFORME DIARIO DE ACTIVIDADES	Fecha:01/06/2019
		Código: F-OBR-024
	EJECUCIÓN DE OBRA	Versión: 1
		Hoja No.: 1 de 1

No DE CONTRATO Y OBJETO	CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No 470 DE 2018 SUSCRITO ENTRE EL DISTRITO CAPITAL - UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL CUERPO DE BOMBEROS Y GYG INGENIEROS LTDA	CONSECUTIVO	67
LUGAR o ESPECIALIDAD DE LOS TRABAJOS	OBRA	FECHA	sábado 24 de Agosto de 2019

INFORME DIARIO No. 67

REGISTRO FOTOGRÁFICO













ELABORO:

ING. JAVIER ESCOBAR PINTOR
AUXILIAR DE INGENIERIA - CONTRATISTA

APROBO:

ING CAMILO ROMERO
RESIDENTE DE OBRA CONTRATISTA

G&G Ingenieros Ltda.	INFORME DIARIO DE ACTIVIDADES	Fecha:01/06/2019
		Código: F-OBR-024
	EJECUCIÓN DE OBRA	Versión: 1
		Hoja No.: 1 de 1

No DE CONTRATO DE OBRA Y OBJETO	CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No 470 DE 2018 SUSCRITO ENTRE EL DISTRITO CAPITAL - UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL CUERPO DE BOMBEROS Y GYG INGENIEROS LTDA	CONSECUTIVO	68
LUGAR o ESPECIALIDAD DE LOS TRABAJOS	OBRA	FECHA	domingo 25 de Agosto de 2019

HORAS PERDIDAS	POR LLUVIA	POR PAROS		OTROS	TOTALES
Horas Hombre					0,0
Horas Equipo					0,0

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD FUNCIONAL	UND.	CANTIDAD			
				CONTRACTUAL	ACUMULADO ANTERIOR	AVANCE HOY	ACUMULADO ACTUAL
1,00	DÍA FESTIVO						

DESCRIPCION DE ACTIVIDADES EJECUTADAS

DÍA FESTIVO

MANO DE OBRA EMPLEADA					EQUIPO UTILIZADO		
CARGO	HORA		CANT.	TIEMPO (Horas)	DESCRIPCIÓN	CANT.	TIEMPO (Horas)
	INICIO	FIN					

MATERIALES UTILIZADOS			ESTADO DEL TIEMPO			ACCESO	
DESCRIPCIÓN	UND.	CANT.		HORAS			
			SECO	[X]	4,0	BUENO	[X]
			NEBLINA	[ ]		REGULAR	[ ]
			LLOVIZNA	[X]	1,0	MALO	[ ]
			LLUVIA	[ ]		NULO	[ ]
			TORMENTA	[ ]			
			TERRENO				
			ROCOSO	[ ]	DURO [ ]	NORMAL	[X]
			ARENOSO	[ ]	LODOSO [ ]	PANTANO	[ ]

CAUSA ATRASO/DIA - MEDIDA CORRECTIVA:

LLOVIZNA LEVE 10:00AM A 11:00 AM

ESQUEMÁTICO DE OBRA

OBSERVACIONES:

	ELABORÓ		APROBÓ
FIRMA:		FIRMA:	
NOMBRE:	ING. JAVIER ANDRES ESCOBAR PINTOR	NOMBRE:	ARQ. MARCELO SARMIENTO
CARGO:	AUXILIAR DE INGENIERIA CONTRATISTA	CARGO:	DIRECTOR DE OBRA CONTRATISTA
	VALIDÓ		APROBÓ
FIRMA:		FIRMA:	
NOMBRE:	ING. CAMILO ROMERO	NOMBRE:	ARQ. LEON CUELLAR
CARGO:	RESIDENTE DE OBRA CONTRATISTA	CARGO:	RESIDENTE DE INTERVENTORIA

GyG Ingenieros Ltda.	INFORME DIARIO DE ACTIVIDADES	Fecha:01/06/2019
		Código: F-OBR-024
	EJECUCIÓN DE OBRA	Versión: 1
		Hoja No.: 1 de 1

No DE CONTRATO DE OBRA Y OBJETO	CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No 470 DE 2018 SUSCRITO ENTRE EL DISTRITO CAPITAL - UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL CUERPO DE BOMBEROS Y GYG INGENIEROS LTDA	CONSECUTIVO	69
LUGAR o ESPECIALIDAD DE LOS TRABAJOS	OBRA	FECHA	lunes 26 de Agosto de 2019

HORAS PERDIDAS	POR LLUVIA	POR PAROS		OTROS	TOTALES
Horas Hombre					0,0
Horas Equipo					0,0

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD FUNCIONAL	UND.	CANTIDAD			
				CONTRACTUAL	ACUMULADO ANTERIOR	AVANCE HOY	ACUMULADO ACTUAL
1,00	FIGURADO DE ACERO	-	GLB				
2,00	EXCAVACIONES VARIAS A MAQUINA SIN CLASIFICAR INCLUYE RETIRO.	3,1	m3	18895,39	765,00	375,00	1140,00

DESCRIPCION DE ACTIVIDADES EJECUTADAS

SE CONTINUA CON LA EXCAVACIÓN A MAQUINA Y LA ACTIVIDAD DEL FIGURADO DE ACERO

MANO DE OBRA EMPLEADA

CARGO	HORA		CANT.	TIEMPO (Horas)
	INICIO	FIN		
Arq. Residente	7:00:00	16:30:00	1,00	8:30:00
Ing. Residente	7:00:00	16:30:00	1,00	8:30:00
Aux. Ingeniero civil	7:00:00	16:30:00	1,00	8:30:00
Ing.. Profesional SST	7:00:00	16:30:00	1,00	8:30:00
Trabajadores	7:00:00	16:30:00	8,00	68:00:00
Profesional de interventoría (Aux Ing.civil)	7:00:00	16:30:00	1,00	8:30:00
Profesionales en topografía GyG	7:00:00	16:30:00	2,00	17:00:00
Almacenista de obra	7:00:00	16:30:00	2,00	17:00:00

EQUIPO UTILIZADO

DESCRIPCIÓN	CANT.	TIEMPO (Horas)
EXCAVADORA 210	1	8,50
VOLQUETA (VIAJE)	25	8,50
VIBRO COMPACTADOR HAMM	1	8,50

MATERIALES UTILIZADOS

DESCRIPCIÓN	UND.	CANT.

ESTADO DEL TIEMPO

		HORAS
SECO	X	8,0
NEBLINA		
LLOVIZNA	X	1,0
LLUVIA		
TORMENTA		

ACCESO

BUENO	X
REGULAR	
MALO	
NULO	


TERRENO

ROCOSO		DURO		NORMAL	X
ARENOSO		LODOSO		PANTANO	

CAUSA ATRASO/DIA - MEDIDA CORRECTIVA:

LLOVIZNA 8:00 AM A 9:00AM

ESQUEMÁTICO DE OBRA

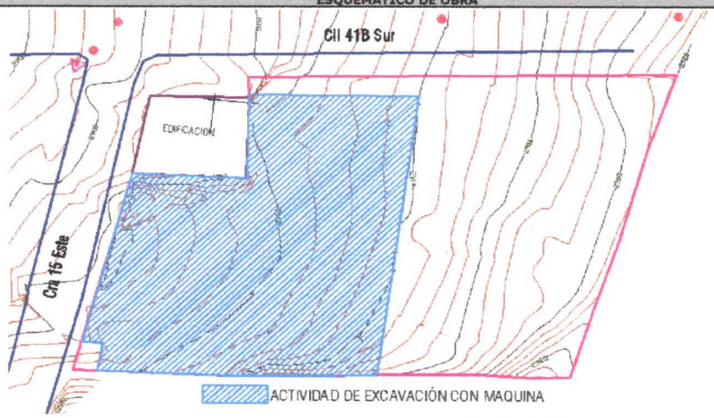

OBSERVACIONES:

	ELABORO	APROBO
FIRMA:		
NOMBRE:	ING. JAVIER ANDRES ESCOBAR PINTOR	ARQ. MARCELO SARMIENTO
CARGO:	AUXILIAR DE INGENIERIA CONTRATISTA	DIRECTOR DE OBRA CONTRATISTA
	VALIDO	APROBO
FIRMA:		
NOMBRE:	ING. CAMILO ROMERO	ARQ. JHON CUELLAR
CARGO:	RESIDENTE DE OBRA CONTRATISTA	RESIDENTE DE INTERVENTORIA

G&G Ingenieros Ltda.	INFORME DIARIO DE ACTIVIDADES	Fecha:01/06/2019
		Código: F-OBR-024
	EJECUCIÓN DE OBRA	Versión: 1
		Hoja No.: 1 de 1

No DE CONTRATO Y OBJETO	CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No 470 DE 2018 SUSCRITO ENTRE EL DISTRITO CAPITAL - UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL CUERPO DE BOMBEROS Y GYG INGENIEROS LTDA	CONSECUTIVO	69
LUGAR o ESPECIALIDAD DE LOS TRABAJOS	OBRA	FECHA	lunes 26 de Agosto de 2019

INFORME DIARIO No. 69

REGISTRO FOTOGRÁFICO













ELABORO:

ING. JAVIER ESCOBAR PINTOR
AUXILIAR DE INGENIERIA - CONTRATISTA

APROBO:

ING CAMILO ROMERO
RESIDENTE DE OBRA CONTRATISTA

G&G Ingenieros Ltda.	INFORME DIARIO DE ACTIVIDADES	Fecha:01/06/2019
		Código: F-OBR-024
	EJECUCIÓN DE OBRA	Versión: 1
		Hoja No.: 1 de 1

No DE CONTRATO DE OBRA Y OBJETO	CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No 470 DE 2018 SUSCRITO ENTRE EL DISTRITO CAPITAL - UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL CUERPO DE BOMBEROS Y GYG INGENIEROS LTDA	CONSECUTIVO	70
LUGAR o ESPECIALIDAD DE LOS TRABAJOS	OBRA	FECHA	martes 27 de Agosto de 2019

HORAS PERDIDAS	POR LLUVIA	POR PAROS		OTROS	TOTALES
Horas Hombre					0,0
Horas Equipo					0,0

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD FUNCIONAL	UND.	CANTIDAD			
				CONTRACTUAL	ACUMULADO ANTERIOR	AVANCE HOY	ACUMULADO ACTUAL
1,00	FIGURADO DE ACERO	-	GLB				
2,00	EXCAVACIONES VARIAS A MAQUINA SIN CLASIFICAR INCLUYE RETIRO.	3,1	m3	18895,39	1140,00	420,00	1560,00
3,00							

DESCRIPCION DE ACTIVIDADES EJECUTADAS

SE CONTINUA CON LA EXCAVACIÓN A MAQUINA Y LA ACTIVIDAD DEL FIGURADO DE ACERO


MANO DE OBRA EMPLEADA					EQUIPO UTILIZADO		
CARGO	HORA		CANT.	TIEMPO (Horas)	DESCRIPCIÓN	CANT.	TIEMPO (Horas)
	INICIO	FIN					
Arq. Residente	7:00:00	16:30:00	1,00	8:30:00	EXCAVADORA 210	1	8,50
Ing. Residente	7:00:00	16:30:00	1,00	8:30:00	VOLQUETA (VIAJE)	28	8,50
Aux. Ingeniero civil	7:00:00	16:30:00	1,00	8:30:00	VIBRO COMPACTADOR HAMM	1	8,50
Ing.. Profesional SST	7:00:00	16:30:00	1,00	8:30:00			
Trabajadores	7:00:00	16:30:00	9,00	76:30:00			
Profesional de interventoría (Aux Ing.. Civil)	7:00:00	16:30:00	1,00	8:30:00			
Profesionales en topografía GyG	7:00:00	16:30:00	2,00	17:00:00			
Almacenista de obra	7:00:00	16:30:00	2,00	17:00:00			

MATERIALES UTILIZADOS			ESTADO DEL TIEMPO			ACCESO	
DESCRIPCION	UND.	CANT.			HORAS		
			SECO	X	9,0	BUENO	X
			NEBLINA			REGULAR	
			LLOVIZNA	X		MALO	
			LLUVIA			NULO	
			TORMENTA				
			TERRENO				
			ROCOSO		DURO	NORMAL	X
			ARENOSO		LODOSO	PANTANO	

CAUSA ATRASO/DIA - MEDIDA CORRECTIVA:

LLOVIZNA LEVE 10:00AM A 11:00 AM

ESQUEMÁTICO DE OBRA

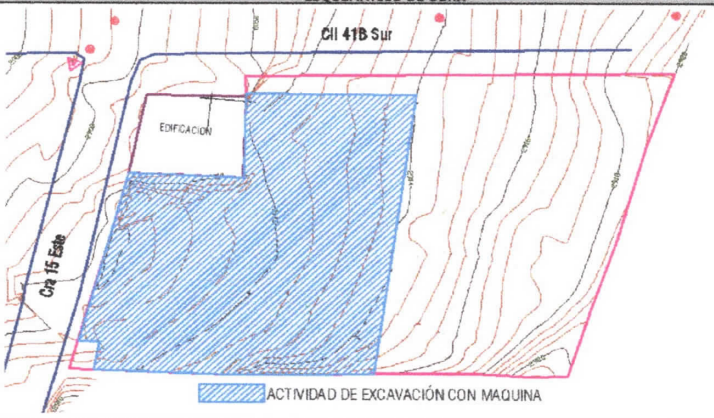

OBSERVACIONES:


	ELABORÓ		APROBÓ
FIRMA:		FIRMA:	
NOMBRE:	ING. JAVIER ANDRES ESCOBAR PINTOR	NOMBRE:	ARQ. MARCELO SARMIENTO
CARGO:	AUXILIAR DE INGENIERIA CONTRATISTA	CARGO:	DIRECTOR DE OBRA CONTRATISTA
	VALIDÓ		APROBÓ
FIRMA:		FIRMA:	
NOMBRE:	ING. CAMILO ROMERO	NOMBRE:	ARQ. JHON CUELLAR
CARGO:	RESIDENTE DE OBRA CONTRATISTA	CARGO:	RESIDENTE DE INTERVENTORIA

G&G Ingenieros Ltda.	INFORME DIARIO DE ACTIVIDADES	Fecha:01/06/2019
		Código: F-OBR-024
	EJECUCIÓN DE OBRA	Versión: 1
		Hoja No.: 1 de 1

No DE CONTRATO Y OBJETO	CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No 470 DE 2018 SUSCRITO ENTRE EL DISTRITO CAPITAL - UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL CUERPO DE BOMBEROS Y GYG INGENIEROS LTDA	CONSECUTIVO	70
LUGAR o ESPECIALIDAD DE LOS TRABAJOS	OBRA	FECHA	martes 27 de Agosto de 2019

INFORME DIARIO No. 70

REGISTRO FOTOGRÁFICO

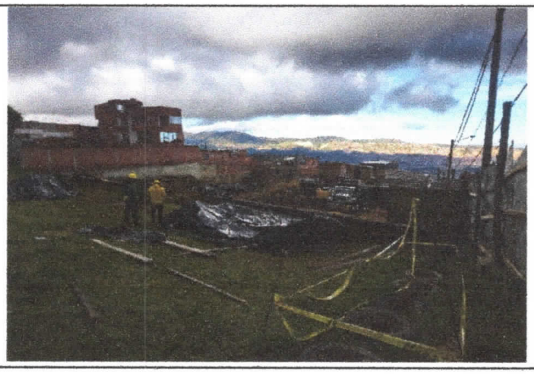









ELABORO:

ING. JAVIER ESCOBAR PINTOR
AUXILIAR DE INGENIERIA - CONTRATISTA

APROBO:

ING CAMILO ROMERO
RESIDENTE DE OBRA CONTRATISTA

G&G Ingenieros Ltda.	INFORME DIARIO DE ACTIVIDADES	Fecha:01/06/2019
		Código: F-OBR-024
	EJECUCIÓN DE OBRA	Versión: 1
		Hoja No.: 1 de 1

No DE CONTRATO DE OBRA Y OBJETO	CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No 470 DE 2018 SUSCRITO ENTRE EL DISTRITO CAPITAL - UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL CUERPO DE BOMBEROS Y GYG INGENIEROS LTDA	CONSECUTIVO	71
LUGAR o ESPECIALIDAD DE LOS TRABAJOS	OBRA	FECHA	miércoles 28 de Agosto de 2019

HORAS PERDIDAS	POR LLUVIA	POR PAROS		OTROS	TOTALES
Horas Hombre	1				1,0
Horas Equipo	1				1,0

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD FUNCIONAL	UND.	CANTIDAD			
				CONTRACTUAL	ACUMULADO ANTERIOR	AVANCE HOY	ACUMULADO ACTUAL
1,00	FIGURADO DE ACERO	-	GLB				
2,00	EXCAVACIONES VARIAS A MAQUINA SIN CLASIFICAR INCLUYE RETIRO.	3,1	m3	18895,39	1560,00	225,00	1785,00
3,00	RELLENO EN RAJÓN, MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD PORTANTE DEL SUELO	-	m3	0,00	0,00	30,00	30,00

DESCRIPCION DE ACTIVIDADES EJECUTADAS

SE CONTINUA CON LA EXCAVACIÓN A MAQUINA, LA ACTIVIDAD DEL FIGURADO DE ACERO Y MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD PORTANTE DEL SUELO CON RAJÓN Y RECEBO COMÚN COMPACTADO PARA LA ZONA DE PARQUEADEROS PRIVADOS.

MANO DE OBRA EMPLEADA

CARGO	HORA		CANT.	TIEMPO (Horas)
	INICIO	FIN		
Arq. Residente	7:00:00	16:30:00	1,00	8:30:00
Ing. Residente	7:00:00	16:30:00	1,00	8:30:00
Aux. Ingeniero civil	7:00:00	16:30:00	1,00	8:30:00
Ing.. Profesional SST	7:00:00	16:30:00	1,00	8:30:00
Trabajadores	7:00:00	16:30:00	9,00	76:30:00
Profesional de interventoría (Aux Ing.. Civil, Aux sisoma)	7:00:00	16:30:00	2,00	17:00:00
Profesionales en topografia GyG	7:00:00	16:30:00	2,00	17:00:00

EQUIPO UTILIZADO

DESCRIPCIÓN	CANT.	TIEMPO (Horas)
EXCAVADORA 210	1	8,50
VOLQUETA (VIAJE)	15	8,50
VIBRO COMPACTADOR HAMM	1	8,50

MATERIALES UTILIZADOS

DESCRIPCIÓN	UND.	CANT.
RAJÓN	m3	30

ESTADO DEL TIEMPO

		HORAS
SECO	[X]	8,0
NEBLINA	[ ]	
LLOVIZNA	[ ]	
LLUVIA	[X]	1
TORMENTA	[ ]	

ACCESO

BUENO	[X]
REGULAR	[ ]
MALO	[ ]
NULO	[ ]


TERRENO


ROCOSO	[ ]	DURO	[ ]	NORMAL	[X]
ARENOSO	[ ]	LODOSO	[ ]	PANTANO	[ ]

CAUSA ATRASO/DIA - MEDIDA CORRECTIVA:

LLUVIA 8:30AM A 9:30AM

ESQUEMÁTICO DE OBRA

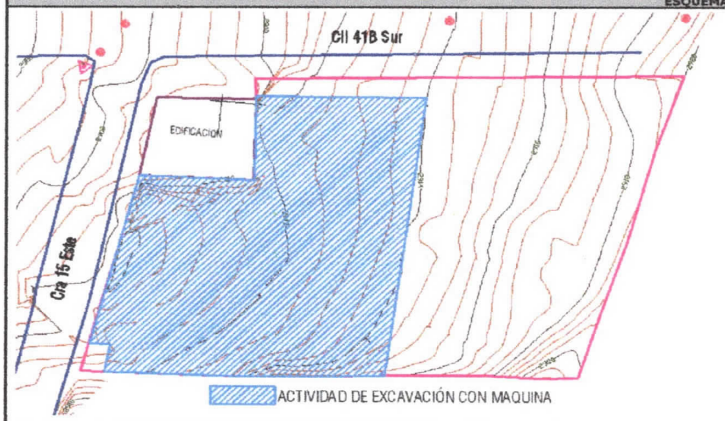

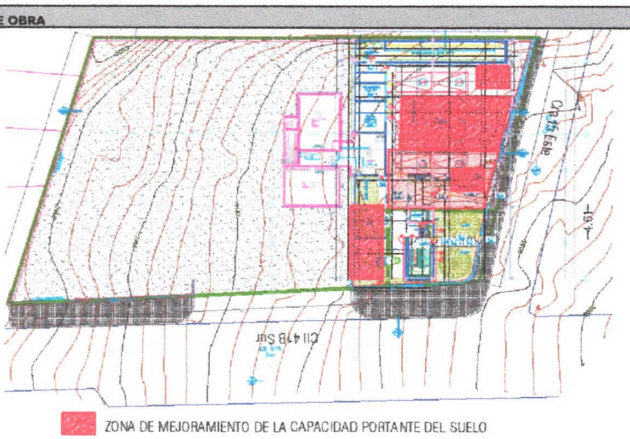

OBSERVACIONES:	LAS CANTIDADES DE ESTA INTERVENCIÓN SERAN ENTREGADAS EN EL INFORME DE TIERRAS

	ELABORO	APROBO
FIRMA:		
NOMBRE:	ING. JAVIER ANDRES ESCOBAR PINTOR	ARQ. MARCELO SARMIENTO
CARGO:	AUXILIAR DE INGENIERIA CONTRATISTA	DIRECTOR DE OBRA CONTRATISTA
	VALIDÓ	APROBO
FIRMA:		
NOMBRE:	ING. CAMILO ROMERO	ARQ. JHON CUELLAR
CARGO:	RESIDENTE DE OBRA CONTRATISTA	RESIDENTE DE INTERVENTORIA

G&G Ingenieros Ltda.	INFORME DIARIO DE ACTIVIDADES	Fecha:01/06/2019
		Código: F-OBR-024
	EJECUCIÓN DE OBRA	Versión: 1
		Hoja No.: 1 de 1

No DE CONTRATO Y OBJETO	CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No 470 DE 2018 SUSCRITO ENTRE EL DISTRITO CAPITAL - UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL CUERPO DE BOMBEROS Y GYG INGENIEROS LTDA	CONSECUTIVO	71
LUGAR o ESPECIALIDAD DE LOS TRABAJOS	OBRA	FECHA	miércoles 28 de Agosto de 2019

INFORME DIARIO No. 71

REGISTRO FOTOGRÁFICO













ELABORO:

ING. JAVIER ESCOBAR PINTOR
AUXILIAR DE INGENIERIA - CONTRATISTA

APROBO:

ING CAMILO ROMERO
RESIDENTE DE OBRA CONTRATISTA

G&G Ingenieros Ltda.	INFORME DIARIO DE ACTIVIDADES	Fecha:01/06/2019
		Código: F-OBR-024
	EJECUCIÓN DE OBRA	Versión: 1
		Hoja No.: 1 de 1

No DE CONTRATO DE OBRA Y OBJETO	CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No 470 DE 2018 SUSCRITO ENTRE EL DISTRITO CAPITAL - UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL CUERPO DE BOMBEROS Y GYG INGENIEROS LTDA	CONSECUTIVO	72
LUGAR o ESPECIALIDAD DE LOS TRABAJOS	OBRA	FECHA	jueves 29 de Agosto de 2019

HORAS PERDIDAS	POR LLUVIA	POR PAROS		OTROS	TOTALES
Horas Hombre	1				1,0
Horas Equipo	1				1,0

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD FUNCIONAL	UND.	CANTIDAD			
				CONTRACTUAL	ACUMULADO ANTERIOR	AVANCE HOY	ACUMULADO ACTUAL
1,00	FIGURADO DE ACERO	-	GLB				
2,00	EXCAVACIONES VARIAS A MAQUINA SIN CLASIFICAR INCLUYE RETIRO.	3,1	m3	18895,39	1785,00	90,00	1875,00
3,00	RELLENO EN RECEBO COMUN COMPACTADO MECÁNICAMENTE.	3,3	m3	406,65	15,00	15,00	30,000
3,00	RELLENO EN RAJÓN, MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD PORTANTE DEL SUELO	-	m3	0,00	30,00	60,00	90,00
5,00	LIMPIEZA DE SUMIDEROS INTERNOS Y ALEDAÑOS	-	GLB				

DESCRIPCION DE ACTIVIDADES EJECUTADAS

SE CONTINUA CON LA EXCAVACIÓN A MAQUINA, LA ACTIVIDAD DEL FIGURADO DE ACERO Y MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD PORTANTE DEL SUELO CON RAJÓN Y RECEBO COMÚN COMPACTADO PARA LA ZONA DE PARQUEADEROS PRIVADOS.

MANO DE OBRA EMPLEADA

CARGO	HORA		CANT.	TIEMPO (Horas)
	INICIO	FIN		
Arq. Residente	7:00:00	16:30:00	1,00	8:30:00
Ing. Residente	7:00:00	16:30:00	1,00	8:30:00
Aux. Ingeniero civil	7:00:00	16:30:00	1,00	8:30:00
Ing.. Profesional SST	7:00:00	16:30:00	1,00	8:30:00
Trabajadores	7:00:00	16:30:00	9,00	76:30:00
Profesional de interventoría (Aux Ing.. Civil, Aux sisoma)	7:00:00	16:30:00	2,00	17:00:00
Profesionales en topografía GyG	7:00:00	16:30:00	2,00	17:00:00

EQUIPO UTILIZADO

DESCRIPCIÓN	CANT.	TIEMPO (Horas)
EXCAVADORA 210	1	8,50
VOLQUETA (VIAJE)	6	8,50
VIBRO COMPACTADOR HAMM	1	8,50

MATERIALES UTILIZADOS

DESCRIPCIÓN	UND.	CANT.
RECEBO COMÚN	m3	15
RAJÓN	m3	60

ESTADO DEL TIEMPO

		HORAS
SECO	X	8,0
NEBLINA	X	1
LLOVIZNA		
LLUVIA		
TORMENTA		

ACCESO


BUENO	X
REGULAR	
MALO	
NULO	

TERRENO

ROCOSO		DURO		NORMAL	X
ARENOSO		LODOSO		PANTANO	

CAUSA ATRASO/DIA - MEDIDA CORRECTIVA:

ESQUEMÁTICO DE OBRA

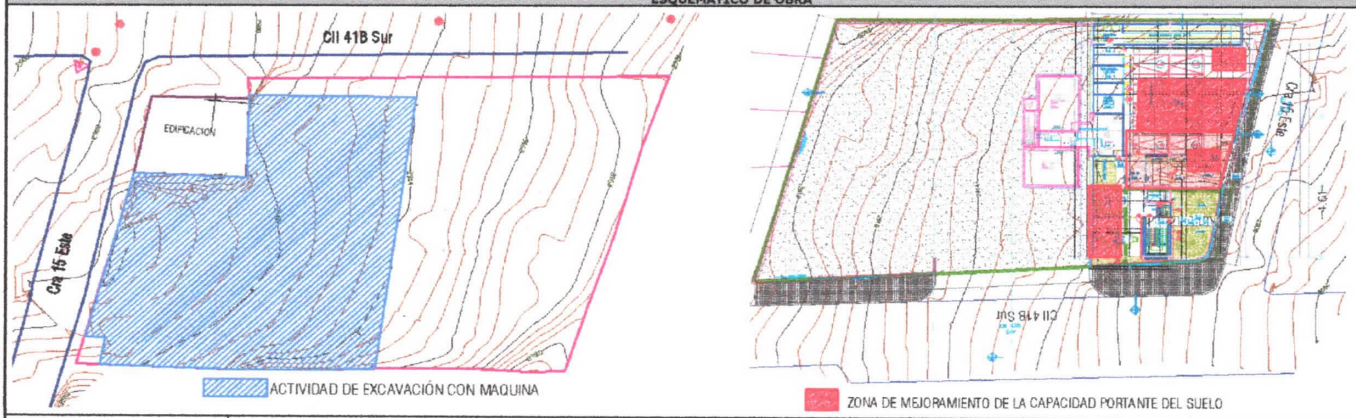

OBSERVACIONES: LAS CANTIDADES DE ESTA INTERVENCIÓN SERAN ENTREGADAS EN EL INFORME DE TIERRAS


	ELABORÓ	APROBÓ
FIRMA:		
NOMBRE:	ING. JAVIER ANDRES ESCOBAR PINTOR	ARQ. MARCELO SARMIENTO
CARGO:	AUXILIAR DE INGENIERIA CONTRATISTA	DIRECTOR DE OBRA CONTRATISTA
	VALIDO	APROBÓ
FIRMA:		
NOMBRE:	ING. CAMILO ROMERO	ARQ. [illegible] CUELLAR
CARGO:	RESIDENTE DE OBRA CONTRATISTA	RESIDENTE DE INTERVENTORIA

G&G Ingenieros Ltda.	INFORME DIARIO DE ACTIVIDADES	Fecha:01/06/2019
		Código: F-OBR-024
	EJECUCIÓN DE OBRA	Versión: 1
		Hoja No.: 1 de 1

No DE CONTRATO Y OBJETO	CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No 470 DE 2018 SUSCRITO ENTRE EL DISTRITO CAPITAL - UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL CUERPO DE BOMBEROS Y GYG INGENIEROS LTDA	CONSECUTIVO	72
LUGAR o ESPECIALIDAD DE LOS TRABAJOS	OBRA	FECHA	jueves 29 de Agosto de 2019

INFORME DIARIO No. 72

REGISTRO FOTOGRÁFICO

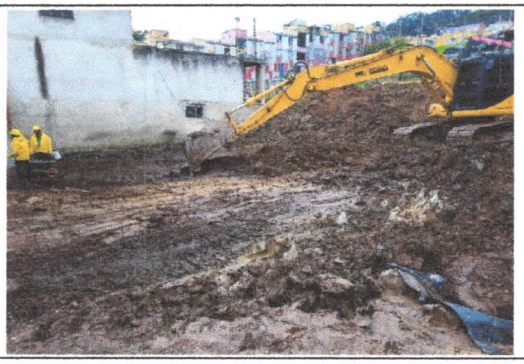










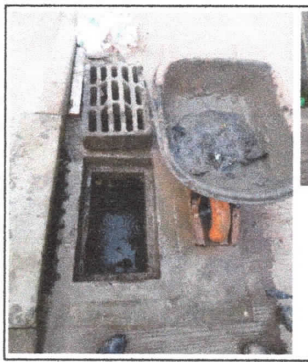









ELABORO:

ING. JAVIER ESCOBAR PINTOR
AUXILIAR DE INGENIERIA - CONTRATISTA

APROBO:

ING CAMILO ROMERO
RESIDENTE DE OBRA CONTRATISTA

GyG Ingenieros Ltda	INFORME DIARIO DE ACTIVIDADES	Fecha:01/06/2019
		Código: F-OBR-024
	EJECUCIÓN DE OBRA	Versión: 1
		Hoja No.: 1 de 1

No DE CONTRATO DE OBRA Y OBJETO	CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No 470 DE 2018 SUSCRITO ENTRE EL DISTRITO CAPITAL - UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL CUERPO DE BOMBEROS Y GYG INGENIEROS LTDA	CONSECUTIVO	73
LUGAR o ESPECIALIDAD DE LOS TRABAJOS	OBRA	FECHA	viernes 30 de Agosto de 2019

HORAS PERDIDAS	POR LLUVIA	POR PAROS		OTROS	TOTALES
Horas Hombre	1				1,0
Horas Equipo	1				1,0

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD FUNCIONAL	UND.	CANTIDAD			
				CONTRACTUAL	ACUMULADO ANTERIOR	AVANCE HOY	ACUMULADO ACTUAL
1,00	FIGURADO DE ACERO	-	GLB				
2,00	EXCAVACIONES VARIAS A MAQUINA SIN CLASIFICAR INCLUYE RETIRO.	3,1	m3	18895,39	1875,00	210,00	2085,00
3,00	RELLENO EN RECEBO COMUN COMPACTADO MECÁNICAMENTE.	3,3	m3	406,65	30,00	105,00	135,000

DESCRIPCION DE ACTIVIDADES EJECUTADAS

SE CONTINUA CON LA EXCAVACIÓN A MAQUINA, LA ACTIVIDAD DEL FIGURADO DE ACERO Y MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD PORTANTE DEL SUELO CON RECEBO COMÚN COMPACTADO PARA LA ZONA DE PARQUEADEROS PRIVADOS.

MANO DE OBRA EMPLEADA

CARGO	HORA		CANT.	TIEMPO (Horas)
	INICIO	FIN		
Arq. Residente	7:00:00	17:00:00	1,00	9:00:00
Ing. Residente	7:00:00	17:00:00	1,00	9:00:00
Aux. Ingeniero civil	7:00:00	17:00:00	1,00	9:00:00
Ing.. Profesional SST	7:00:00	17:00:00	1,00	9:00:00
Trabajadores	7:00:00	17:00:00	10,00	90:00:00
Profesional de interventoría (Aux Ing.. Civil, Aux sisoma)	7:00:00	17:00:00	2,00	18:00:00
Profesionales en topografía GyG	7:00:00	17:00:00	2,00	18:00:00

EQUIPO UTILIZADO

DESCRIPCIÓN	CANT.	TIEMPO (Horas)
EXCAVADORA 210	1	9,00
VOLQUETA (VIAJE)	14	9,00
VIBRO COMPACTADOR HAMM	1	9,00
MINI CARGADOR CASE SR 200	1	9,00

MATERIALES UTILIZADOS

DESCRIPCIÓN	UND.	CANT.
RECEBO COMÚN	m3	105

ESTADO DEL TIEMPO

		HORAS
SECO	X	9,0
NEBLINA		
LLOVIZNA		
LLUVIA		
TORMENTA		

ACCESO


BUENO	X
REGULAR	
MALO	
NULO	

TERRENO


ROCOSO		DURO		NORMAL	X
ARENOSO		LODOSO		PANTANO	

CAUSA ATRASO/DIA - MEDIDA CORRECTIVA:

ESQUEMÁTICO DE OBRA

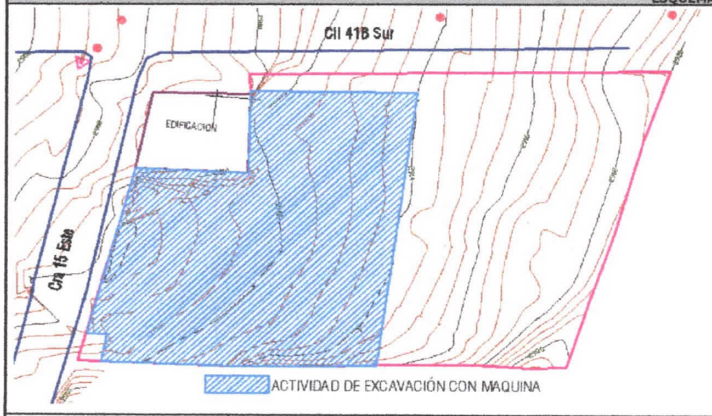

ACTIVIDAD DE EXCAVACIÓN CON MAQUINA

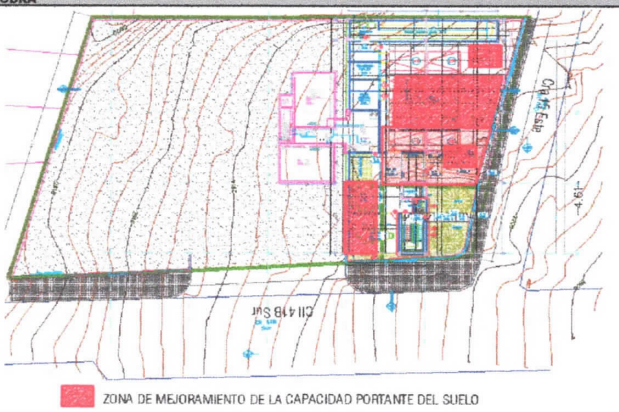

ZONA DE MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD PORTANTE DEL SUELO

OBSERVACIONES: LAS CANTIDADES DE ESTA INTERVENCIÓN SERAN ENTREGADAS EN EL INFORME DE TIERRAS

	ELABORÓ	APROBÓ
FIRMA:		
NOMBRE:	ING. JAVIER ANDRES ESCOBAR PINTOR	ARQ. MARCELO SARMIENTO
CARGO:	AUXILIAR DE INGENIERIA CONTRATISTA	DIRECTOR DE OBRA CONTRATISTA
	VALIDO	APROBÓ
FIRMA:		
NOMBRE:	ING. CAMILO ROMERO	ARQ. JHON CUELLAR
CARGO:	RESIDENTE DE OBRA CONTRATISTA	RESIDENTE DE INTERVENTORIA

GyG Ingenieros Ltda.	INFORME DIARIO DE ACTIVIDADES	Fecha:01/06/2019
		Código: F-OBR-024
	EJECUCIÓN DE OBRA	Versión: 1
		Hoja No.: 1 de 1


No DE CONTRATO Y OBJETO	CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No 470 DE 2018 SUSCRITO ENTRE EL DISTRITO CAPITAL - UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL CUERPO DE BOMBEROS Y GYG INGENIEROS LTDA	CONSECUTIVO	73
LUGAR o ESPECIALIDAD DE LOS TRABAJOS	OBRA	FECHA	viernes 30 de Agosto de 2019

INFORME DIARIO No. 73

REGISTRO FOTOGRÁFICO






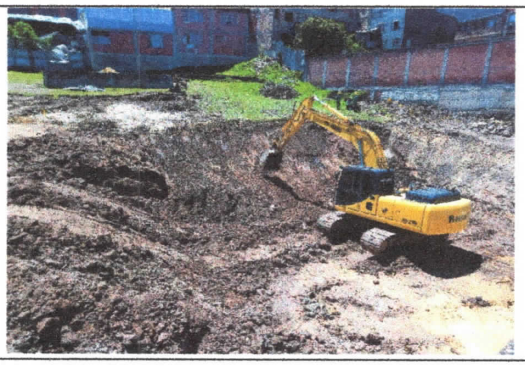







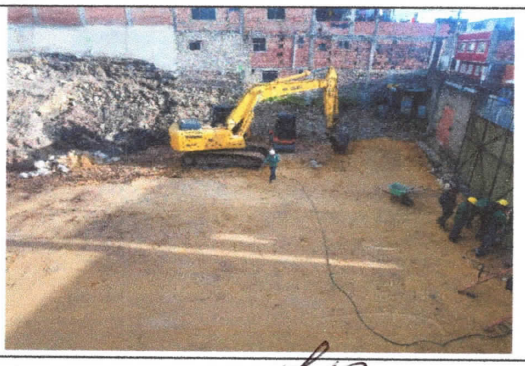



ELABORO:

ING. JAVIER ESCOBAR PINTOR
AUXILIAR DE INGENIERIA - CONTRATISTA

APROBO:

ING CAMILO ROMERO
RESIDENTE DE OBRA CONTRATISTA

G&G Ingenieros Ltda.	INFORME DIARIO DE ACTIVIDADES	Fecha:01/06/2019
		Código: F-OBR-024
	EJECUCIÓN DE OBRA	Versión: 1
		Hoja No.: 1 de 1

No DE CONTRATO DE OBRA Y OBJETO	CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No 470 DE 2018 SUSCRITO ENTRE EL DISTRITO CAPITAL - UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL CUERPO DE BOMBEROS Y GYG INGENIEROS LTDA	CONSECUTIVO	74
LUGAR o ESPECIALIDAD DE LOS TRABAJOS	OBRA	FECHA	sábado 31 de Agosto de 2019

HORAS PERDIDAS	POR LLUVIA	POR PAROS		OTROS	TOTALES
Horas Hombre					0,0
Horas Equipo					0,0

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD FUNCIONAL	UND.	CANTIDAD			
				CONTRACTUAL	ACUMULADO ANTERIOR	AVANCE HOY	ACUMULADO ACTUAL
1,00	FIGURADO DE ACERO Y ARREGLO DEL CERRAMIENTO	-	GLB				
2,00	EXCAVACIONES VARIAS A MAQUINA SIN CLASIFICAR INCLUYE RETIRO.	3,1	m3	18895,39	2085,00	150,00	2235,00
3,00	RELLENO EN RECEBO COMUN COMPACTADO MECÁNICAMENTE.	3,3	m3	406,65	135,00	45,00	180,000

DESCRIPCION DE ACTIVIDADES EJECUTADAS

SE CONTINUA CON LA EXCAVACIÓN A MAQUINA, LA ACTIVIDAD DEL FIGURADO DE ACERO Y MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD PORTANTE DEL SUELO CON RECEBO COMÚN COMPACTADO PARA LA ZONA DE PARQUEADEROS PRIVADOS.

MANO DE OBRA EMPLEADA

CARGO	HORA		CANT.	TIEMPO (Horas)
	INICIO	FIN		
Arq. Residente	7:00:00	12:00:00	1,00	5:00:00
Ing. Residente	7:00:00	12:00:00	1,00	5:00:00
Aux. Ingeniero civil	7:00:00	12:00:00	1,00	5:00:00
Ing.. Profesional SST	7:00:00	12:00:00	1,00	5:00:00
Trabajadores	7:00:00	12:00:00	9,00	45:00:00
Profesional de interventoria (Aux Ing.. Civil, Aux sisoma)	7:00:00	12:00:00	2,00	10:00:00
Profesionales en topografia GyG	7:00:00	12:00:00	2,00	10:00:00
Ing. Ambiental	7:00:00	12:00:00	1,00	5:00:00

EQUIPO UTILIZADO

DESCRIPCIÓN	CANT.	TIEMPO (Horas)
EXCAVADORA 210	1	8,50
VOLQUETA (VIAJE)	10	8,50
VIBRO COMPACTADOR HAMM	1	8,50
MINI CARGADOR CASE SR 200	1	8,50

MATERIALES UTILIZADOS

DESCRIPCIÓN	UND.	CANT.
RECEBO COMUN	m3	45

ESTADO DEL TIEMPO

		HORAS
SECO	X	8,0
NEBLINA		
LLOVIZNA		
LLUVIA	X	1
TORMENTA		

ACCESO


BUENO	X
REGULAR	
MALO	
NULO	

TERRENO

ROCOSO		DURO		NORMAL	X
ARENOSO		LODOSO		PANTANO	

CAUSA ATRASO/DIA - MEDIDA CORRECTIVA:

ESQUEMÁTICO DE OBRA

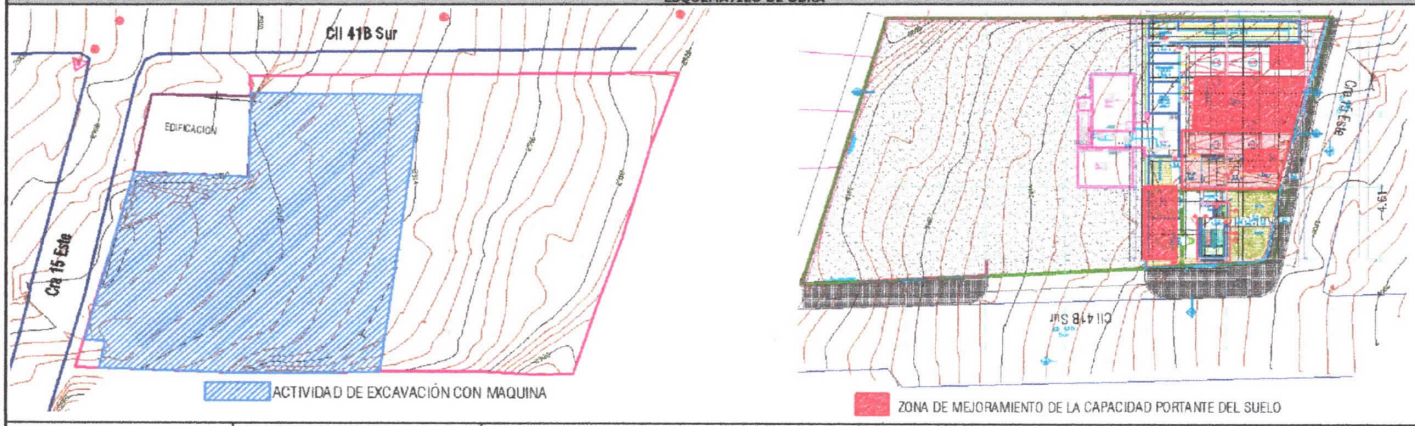

OBSERVACIONES:	LAS CANTIDADES DE ESTA INTERVENCIÓN SERAN ENTREGADAS EN EL INFORME DE TIERRAS

	ELABORÓ	APROBÓ
FIRMA:		
NOMBRE:	ING. JAVIER ANDRES ESCOBAR PINTOR	ARQ. MARCELO SARMIENTO
CARGO:	AUXILIAR DE INGENIERIA CONTRATISTA	DIRECTOR DE OBRA CONTRATISTA
	VALIDÓ	APROBÓ
FIRMA:		
NOMBRE:	ING. CAMILO ROMERO	ARQ. JHON CUELLAR
CARGO:	RESIDENTE DE OBRA CONTRATISTA	RESIDENTE DE INTERVENTORIA

G&G Ingenieros Ltda	INFORME DIARIO DE ACTIVIDADES	Fecha:01/06/2019
		Código: F-OBR-024
	EJECUCIÓN DE OBRA	Versión: 1
		Hoja No.: 1 de 1

No DE CONTRATO Y OBJETO	CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No 470 DE 2018 SUSCRITO ENTRE EL DISTRITO CAPITAL - UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL CUERPO DE BOMBEROS Y GYG INGENIEROS LTDA	CONSECUTIVO	74
LUGAR o ESPECIALIDAD DE LOS TRABAJOS	OBRA	FECHA	sábado 31 de Agosto de 2019

INFORME DIARIO No. 74

REGISTRO FOTOGRÁFICO













ELABORO:

ING. JAVIER ESCOBAR PINTOR
AUXILIAR DE INGENIERIA - CONTRATISTA

APROBO:

ING CAMILO ROMERO
RESIDENTE DE OBRA CONTRATISTA
