Anexo 4. Informes diarios

Calle 3 N°. 4 -70 of. 301 Mosquera, Cundinamarca
E-mail: info@gygingenierosltda.com - gerencia@gygingenierosltda.com
Teléfono: (1) 8299043 - 3502705607
www.gygingenierosltda.com

G-G Ingenieros Ltda	INFORME DIARIO DE ACTIVIDADES	Fecha:01/06/2019
		Código: F-OBR-024
	EJECUCIÓN DE OBRA	Versión: 1
		Hoja No.: 1 de 1

[redacted]	CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No 470 DE 2018 SUSCRITO ENTRE EL DISTRITO CAPITAL - UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL CUERPO DE BOMBEROS Y GYG INGENIEROS LTDA	[redacted]	75
[redacted]	OBRA	[redacted]	domingo 1 de septiembre de 2019

[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
Horas Hombre					0.0
Horas Equipo					0.0

[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
1.00	DÍA DOMINGO	-					

DESCRIPCION DE ACTIVIDADES EJECUTADAS

DÍA DOMINGO NO TRABAJADO

[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
				0:00:00			
				0:00:00			
				0:00:00			
				0:00:00			
				0:00:00			
				0:00:00			

[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
				SECO	X	BUENO	X
				NEBLINA		REGULAR	
				LLOVIZNA		MALO	
				LLUVIA		NULO	
				TORMENTA			
				ROCOSO		DURO		NORMAL	X
				ARENOSO		LODOSO		PANTANO	

OBSERVACIONES:	

ELABORÓ		APROBÓ	
FIRMA:		FIRMA:	
NOMBRE:	ING. JAVIER ANDRES ESCOBAR PINTOR	NOMBRE:	ARQ. MARCELO SARMIENTO
CARGO:	AUXILIAR DE INGENIERIA CONTRATISTA	CARGO:	DIRECTOR DE OBRA CONTRATISTA
VALIDO		APROBO	
FIRMA:		FIRMA:	
NOMBRE:	ING. CAMILO ROMERO	NOMBRE:	ARQ. JHON CUELLAR
CARGO:	RESIDENTE DE OBRA CONTRATISTA	CARGO:	RESIDENTE DE INTERVENTORIA

G&G Ingenieros Ltda.	INFORME DIARIO DE ACTIVIDADES	Fecha:01/06/2019
		Código: F-OBR-024
	EJECUCIÓN DE OBRA	Versión: 1
		Hoja No.: 1 de 1

No DE CONTRATO DE OBRA Y OBJETO	CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No 470 DE 2018 SUSCRITO ENTRE EL DISTRITO CAPITAL - UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL CUERPO DE BOMBEROS Y GYG INGENIEROS LTDA	CONSECUTIVO	76
LUGAR o ESPECIALIDAD DE LOS TRABAJOS	OBRA	FECHA	lunes 2 de septiembre de 2019

HORAS PERDIDAS	POR LLUVIA	POR PAROS		OTROS	TOTALES
Horas Hombre	1				1.0
Horas Equipo	1				1.0

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD FUNCIONAL	UND.	CANTIDAD			
				CONTRACTUAL	ACUMULADO ANTERIOR	AVANCE HOY	ACUMULADO ACTUAL
3.1	EXCAVACIONES VARIAS A MAQUINA SIN CLASIFICAR INCLUYE RETIRO.	N- 3.30	m3	18895.39	2235.00	-400.84	1834.16

DESCRIPCION DE ACTIVIDADES EJECUTADAS

REALIZACIÓN DEL PRIMER COMITÉ DE OBRA CON LAS PARTES EN CUESTIÓN (BOMBEROS , INTERVENTORÍA Y CONSTRUCTOR), PERFILACIÓN DE TALUDES DEL TANQUE, COMPACTACIÓN DE RECEBO COMÚN ZONA PARQUEADEROS PRIVADOS

MANO DE OBRA EMPLEADA

CARGO	HORA		CANT.	TIEMPO (Horas)
	INICIO	FIN		
Arq. Residente	7:00:00	16:30:00	1.00	8:30:00
Ing. Residente	7:00:00	16:30:00	1.00	8:30:00
Aux. Ingeniero civil	7:00:00	16:30:00	1.00	8:30:00
Ing. Profesional SST	7:00:00	16:30:00	1.00	8:30:00
Trabajadores	7:00:00	16:30:00	10.00	85:00:00
Profesional de interventoría (Aux Ing, Residente, social,sisoma)	7:00:00	16:30:00	4.00	34:00:00
Profesionales en topografia GyG	7:00:00	16:30:00	2.00	17:00:00
Representantes legales De las partes	7:00:00	16:30:00	2.00	17:00:00
Profesionales UAECOB	7:00:00	16:30:00	1.00	8:30:00

EQUIPO UTILIZADO

DESCRIPCIÓN	CANT.	TIEMPO (Horas)
EXCAVADORA 210	1	8.50
VOLQUETA (VIAJE)	5	8.50
VIBRO COMPACTADOR HAMM	1	8.50
MINI CARGADOR CASE SR 220	1	8.50

MATERIALES UTILIZADOS

DESCRIPCIÓN	UND.	CANT.

ESTADO DEL TIEMPO

		HORAS
SECO	X	8.0
NEBLINA		
LLOVIZNA		
LLUVIA	X	1.0
TORMENTA		

ACCESO

BUENO	X
REGULAR	
MALO	
NULO	


TERRENO

ROCOSO		DURO		NORMAL	X
ARENOSO		LODOSO		PANTANO	

CAUSA ATRASO/DIA - MEDIDA CORRECTIVA:

LLUVIA 7:00AM A 8:00AM

ESQUEMÁTICO DE OBRA

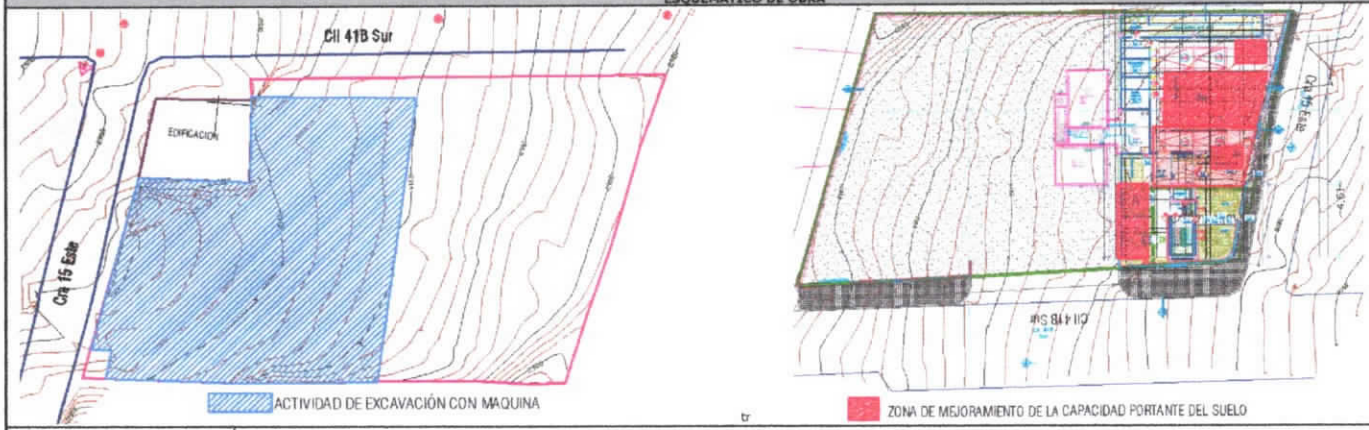

OBSERVACIONES:

	ELABORO	APROBO
FIRMA:		
NOMBRE:	ING. JAVIER ANDRÉS ESCOBAR PINTOR	ARQ. MARCELO SARMIENTO
CARGO:	AUXILIAR DE INGENIERIA CONTRATISTA	DIRECTOR DE OBRA CONTRATISTA
	VALIDO	APROBO
FIRMA:		
NOMBRE:	ING. CAMILO ROMERO	ARQ. JHON CUELLAR
CARGO:	RESIDENTE DE OBRA CONTRATISTA	RESIDENTE DE INTERVENTORIA

GyG Ingenieros Ltda.	INFORME DIARIO DE ACTIVIDADES	Fecha:01/06/2019
		Código: F-OBR-024
	EJECUCIÓN DE OBRA	Versión: 1
		Hoja No.: 1 de 1

No DE CONTRATO Y OBJETO	CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No 470 DE 2018 SUSCRITO ENTRE EL DISTRITO CAPITAL - UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL CUERPO DE BOMBEROS Y GYG INGENIEROS LTDA	CONSECUTIVO	76
LUGAR o ESPECIALIDAD DE LOS TRABAJOS	OBRA	FECHA	lunes 2 de septiembre de 2019

INFORME DIARIO No. 76

REGISTRO FOTOGRÁFICO













ELABORO:

ING. JAVIER ESCOBAR PINTOR
AUXILIAR DE INGENIERIA - CONTRATISTA

APROBO:

ING CAMILO ROMERO
RESIDENTE DE OBRA CONTRATISTA

G&G Ingenieros Ltda.	INFORME DIARIO DE ACTIVIDADES	Fecha:01/06/2019
		Código: F-OBR-024
	EJECUCIÓN DE OBRA	Versión: 1
		Hoja No.: 1 de 1

No DE CONTRATO DE OBRA Y OBJETO	CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No 470 DE 2018 SUSCRITO ENTRE EL DISTRITO CAPITAL - UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL CUERPO DE BOMBEROS Y GYG INGENIEROS LTDA	CONSECUTIVO	77
LUGAR o ESPECIALIDAD DE LOS TRABAJOS	OBRA	FECHA	martes 3 de septiembre de 2019

HORAS PERDIDAS	POR LLUVIA	POR PAROS		OTROS	TOTALES
Horas Hombre					0.0
Horas Equipo					0.0

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD FUNCIONAL	UND.	CANTIDAD			
				CONTRACTUAL	ACUMULADO ANTERIOR	AVANCE HOY	ACUMULADO ACTUAL
3.1	EXCAVACIONES VARIAS A MAQUINA SIN CLASIFICAR INCLUYE RETIRO.	N- 3.30	m3	18895.39	1834.16	113.40	1947.56
3.3	RELLENO EN RECEBO COMUN COMPACTADO MECÁNICAMENTE.	N- 3.30	m3	406.65	180.00	10.00	190.000

DESCRIPCION DE ACTIVIDADES EJECUTADAS

CONTINUACIÓN DE LA PERFILACIÓN DE TALUDES DEL TANQUE, COMPACTACIÓN DE RECEBO COMÚN ZONA PARQUEADEROS PRIVADOS DESCARGUE DE MATERIAL DE ACERO FIGURADO

MANO DE OBRA EMPLEADA

CARGO	HORA		CANT.	TIEMPO (Horas)
	INICIO	FIN		
Arq. Residente	7:00:00	16:30:00	1.00	8:30:00
Ing. Residente	7:00:00	16:30:00	1.00	8:30:00
Aux. Ingeniero civil	7:00:00	16:30:00	1.00	8:30:00
Ing. Profesional SST	7:00:00	16:30:00	1.00	8:30:00
Trabajadores	7:00:00	16:30:00	10.00	85:00:00
Profesional de interventoría (Aux Ing, Residente)	7:00:00	16:30:00	2.00	17:00:00
Profesionales en topografía GyG	7:00:00	16:30:00	2.00	17:00:00

EQUIPO UTILIZADO

DESCRIPCIÓN	CANT.	TIEMPO (Horas)
EXCAVADORA 210	1	8.50
VOLQUETA (VIAJE)	9	8.50
VIBRO COMPACTADOR HAMM	1	8.50
MINI CARGADOR CASE SR 220	1	8.50

MATERIALES UTILIZADOS

DESCRIPCIÓN	UND.	CANT.
RECEBO COMUN	m3	60

ESTADO DEL TIEMPO

		HORAS
SECO	X	
NEBLINA		
LLOVIZNA		
LLUVIA		
TORMENTA		

ACCESO


BUENO	X
REGULAR	
MALO	
NULO	


TERRENO

ROCOSO		DURO		NORMAL	X
ARENOSO		LODOSO		PANTANO	

CAUSA ATRASO/DIA - MEDIDA CORRECTIVA:

ESQUEMÁTICO DE OBRA

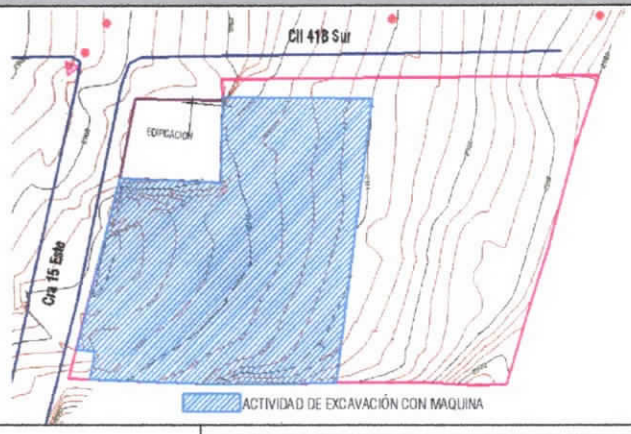

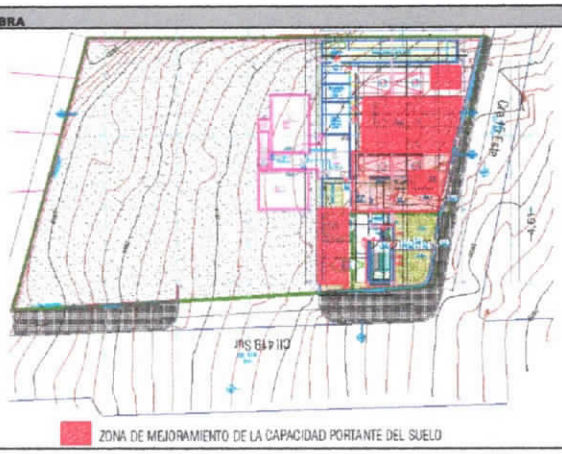

OBSERVACIONES:

	ELABORÓ	APROBÓ
FIRMA:		
NOMBRE:	ING. JAVIER ANDRES ESCOBAR PINTOR	ARQ. MARCELO SARMIENTO
CARGO:	AUXILIAR DE INGENIERIA CONTRATISTA	DIRECTOR DE OBRA CONTRATISTA
	VALIDO	APROBO
FIRMA:		
NOMBRE:	ING. CAMILO ROMERO	ARQ. JHON CUELLAR
CARGO:	RESIDENTE DE OBRA CONTRATISTA	RESIDENTE DE INTERVENTORIA

G&G Ingenieros Ltda	INFORME DIARIO DE ACTIVIDADES	Fecha:01/06/2019
		Código: F-OBR-024
	EJECUCIÓN DE OBRA	Versión: 1
		Hoja No.: 1 de 1

No DE CONTRATO Y OBJETO	CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No 470 DE 2018 SUSCRITO ENTRE EL DISTRITO CAPITAL - UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL CUERPO DE BOMBEROS Y GYG INGENIEROS LTDA	CONSECUTIVO	77
LUGAR o ESPECIALIDAD DE LOS TRABAJOS	OBRA	FECHA	martes 3 de septiembre de 2019

INFORME DIARIO No. 77

REGISTRO FOTOGRÁFICO













ELABORO:

ING. JAVIER ESCOBAR PINTOR
AUXILIAR DE INGENIERÍA - CONTRATISTA

APROBO:

ING CAMILO ROMERO
RESIDENTE DE OBRA CONTRATISTA

GyG Ingenieros Ltda	INFORME DIARIO DE ACTIVIDADES	Fecha:01/06/2019
		Código: F-OBR-024
	EJECUCIÓN DE OBRA	Versión: 1
		Hoja No.: 1 de 1

No DE CONTRATO DE OBRA Y OBJETO	CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No 470 DE 2018 SUSCRITO ENTRE EL DISTRITO CAPITAL - UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL CUERPO DE BOMBEROS Y GYG INGENIEROS LTDA	CONSECUTIVO	78
LUGAR o ESPECIALIDAD DE LOS TRABAJOS	OBRA	FECHA	miércoles 4 de septiembre de 2019

HORAS PERDIDAS	POR LLUVIA	POR PAROS		OTROS	TOTALES
Horas Hombre	1				1.0
Horas Equipo	1				1.0

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD FUNCIONAL	UND.	CANTIDAD			
				CONTRACTUAL	ACUMULADO ANTERIOR	AVANCE HOY	ACUMULADO ACTUAL
3.1	EXCAVACIONES VARIAS A MAQUINA SIN CLASIFICAR INCLUYE RETIRO.	N -3.30	m3	18895.39	1947.56	126.00	2073.56
3.3	RELLENO EN RECEBO COMUN COMPACTADO MECÁNICAMENTE.	N -3.30	m3	406.65	190.00	8.40	198.400

DESCRIPCION DE ACTIVIDADES EJECUTADAS

CONTINUACIÓN DE LA PERFILACIÓN DE TALUDES DEL TANQUE, COMPACTACIÓN DE RECEBO COMÚN ZONA SALA DE JUNTAS Y SALA DE ESPERA NIVEL N-3.30 E INICIO DE LA ACTIVIDAD PAÑETE PARA MEJORAMIENTO TALUD CON MALLA.

MANO DE OBRA EMPLEADA

CARGO	HORA		CANT.	TIEMPO (Horas)
	INICIO	FIN		
Arq. Residente	7:00:00	16:30:00	1.00	8:30:00
Ing. Residente	7:00:00	16:30:00	1.00	8:30:00
Aux. Ingeniero civil	7:00:00	16:30:00	1.00	8:30:00
Ing. Profesional SST	7:00:00	16:30:00	1.00	8:30:00
Trabajadores	7:00:00	16:30:00	10.00	85:00:00
Profesional de interventoria (Aux Ing, Residente)	7:00:00	16:30:00	2.00	17:00:00
Profesionales en topografia GyG	7:00:00	16:30:00	2.00	17:00:00

EQUIPO UTILIZADO

DESCRIPCIÓN	CANT.	TIEMPO (Horas)
EXCAVADORA 210	1	8.50
VOLQUETA (VIAJE)	10	8.50
VIBRO COMPACTADOR HAMM	1	8.50
MINI CARGADOR CASE SR 220	1	8.50

MATERIALES UTILIZADOS

DESCRIPCIÓN	UND.	CANT.
RECEBO COMUN	m3	30
MALLA DE GALLINERO	m2	32.4
CEMENTO	BULTO	4
MIXTO	m3	0.84

ESTADO DEL TIEMPO

		HORAS
SECO	[X]	7.5
NEBLINA	[ ]	
LLOVIZNA	[ ]	
LLUVIA	[X]	1.5
TORMENTA	[ ]	

ACCESO

BUENO	[X]
REGULAR	[ ]
MALO	[ ]
NULO	[ ]


TERRENO

ROCOSO	[ ]	DURO	[ ]	NORMAL	[X]
ARENOSO	[ ]	LODOSO	[ ]	PANTANO	[ ]

CAUSA ATRASO/DIA - MEDIDA CORRECTIVA:

LLUVIA 12:30pm - 2:00pm

ESQUEMÁTICO DE OBRA

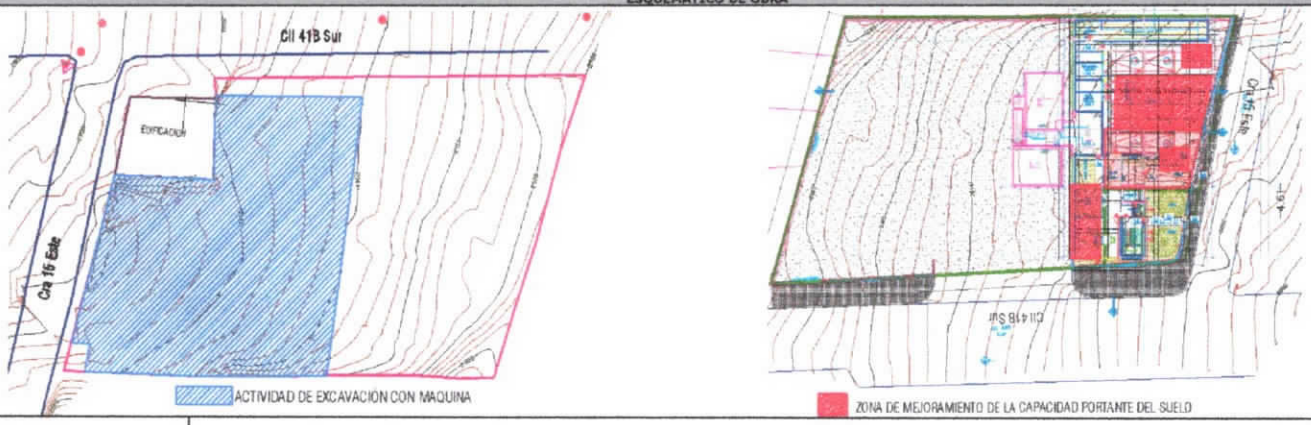

OBSERVACIONES:

	ELABORÓ	APROBÓ
FIRMA:		
NOMBRE:	ING. JAVIER ANDRES ESCOBAR PINTOR	ARQ. MARCELO SARMIENTO
CARGO:	AUXILIAR DE INGENIERIA CONTRATISTA	DIRECTOR DE OBRA CONTRATISTA
	VALIDÓ	APROBÓ
FIRMA:		
NOMBRE:	ING. CAMILO ROMERO	ARQ. JHON CUELLAR
CARGO:	RESIDENTE DE OBRA CONTRATISTA	RESIDENTE DE INTERVENTORIA

G+G Ingenieros Ltda.	INFORME DIARIO DE ACTIVIDADES	Fecha:01/06/2019
		Código: F-OBR-024
	EJECUCIÓN DE OBRA	Versión: 1
		Hoja No.: 1 de 1

No DE CONTRATO Y OBJETO	CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No 470 DE 2018 SUSCRITO ENTRE EL DISTRITO CAPITAL - UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL CUERPO DE BOMBEROS Y GYG INGENIEROS LTDA	CONSECUTIVO	78
LUGAR o ESPECIALIDAD DE LOS TRABAJOS	OBRA	FECHA	miércoles 4 de septiembre de 2019

INFORME DIARIO No. 78

REGISTRO FOTOGRÁFICO












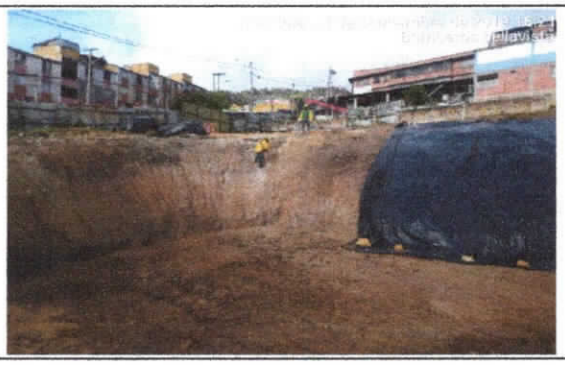

ELABORO:

ING. JAVIER ESCOBAR PINTOR
AUXILIAR DE INGENIERIA - CONTRATISTA

APROBO:

ING CAMILO ROMERO
RESIDENTE DE OBRA CONTRATISTA

G&G Ingenieros Ltda.	INFORME DIARIO DE ACTIVIDADES	Fecha:01/06/2019
		Código: F-OBR-024
	EJECUCIÓN DE OBRA	Versión: 1
		Hoja No.: 1 de 1

No DE CONTRATO DE OBRA Y OBJETO	CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No 470 DE 2018 SUSCRITO ENTRE EL DISTRITO CAPITAL - UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL CUERPO DE BOMBEROS Y GYG INGENIEROS LTDA	CONSECUTIVO	79
LUGAR o ESPECIALIDAD DE LOS TRABAJOS	OBRA	FECHA	Jueves 5 de septiembre de 2019

HORAS PERDIDAS	POR LLUVIA	POR PAROS		OTROS	TOTALES
Horas Hombre					0.0
Horas Equipo					0.0

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD FUNCIONAL	UND.	CANTIDAD			
				CONTRACTUAL	ACUMULADO ANTERIOR	AVANCE HOY	ACUMULADO ACTUAL
3.1	EXCAVACIONES VARIAS A MAQUINA SIN CLASIFICAR INCLUYE RETIRO.	N -3.30	m3	18895.39	2073.56	63.00	2136.56
3.3	RELLENO EN RECEBO COMUN COMPACTADO MECÁNICAMENTE.	N -3.30	m3	406.65	198.40	4.00	202.400

DESCRIPCION DE ACTIVIDADES EJECUTADAS

CONTINUACIÓN DE LA PERFILACIÓN DE TALUDES DEL TANQUE, COMPACTACIÓN DE RECEBO COMÚN ZONA TANQUES DE ALMACENAMIENTOY CONTINUIDAD DE LA ACTIVIDAD PAÑETE PARA MEJORAMIENTO TALUD CON MALLA.

MANO DE OBRA EMPLEADA

CARGO	HORA		CANT.	TIEMPO (Horas)
	INICIO	FIN		
Arq. Residente	7:00:00	16:30:00	1.00	8:30:00
Ing. Residente	7:00:00	16:30:00	1.00	8:30:00
Aux. Ingeniero civil	7:00:00	16:30:00	1.00	8:30:00
Ing. Profesional SST	7:00:00	16:30:00	1.00	8:30:00
Trabajadores	7:00:00	16:30:00	10.00	85:00:00
Profesional de interventoría (Aux Ing, Residente)	7:00:00	16:30:00	2.00	17:00:00
Profesionales en topografía GyG	7:00:00	16:30:00	2.00	17:00:00

EQUIPO UTILIZADO

DESCRIPCIÓN	CANT.	TIEMPO (Horas)
EXCAVADORA 210	1	8.50
VOLQUETA (VIAJE)	5	8.50
VIBRO COMPACTADOR HAMM	1	8.50
MINI CARGADOR CASE SR 220	1	8.50

MATERIALES UTILIZADOS

DESCRIPCIÓN	UND.	CANT.
MALLA DE GALLINERO	M2	64.8
CEMENTO	BULTO	8
MIXTO	m3	1.68

ESTADO DEL TIEMPO

		HORAS
SECO	☒	9.0
NEBLINA	☐	
LLOVIZNA	☐	
LLUVIA	☐	
TORMENTA	☐	

ACCESO


BUENO	☒
REGULAR	☐
MALO	☐
NULO	☐

TERRENO

ROCOSO	☐	DURO	☐	NORMAL	☒
ARENOSO	☐	LODOSO	☐	PANTANO	☐

CAUSA ATRASO/DIA - MEDIDA CORRECTIVA:

ESQUEMÁTICO DE OBRA

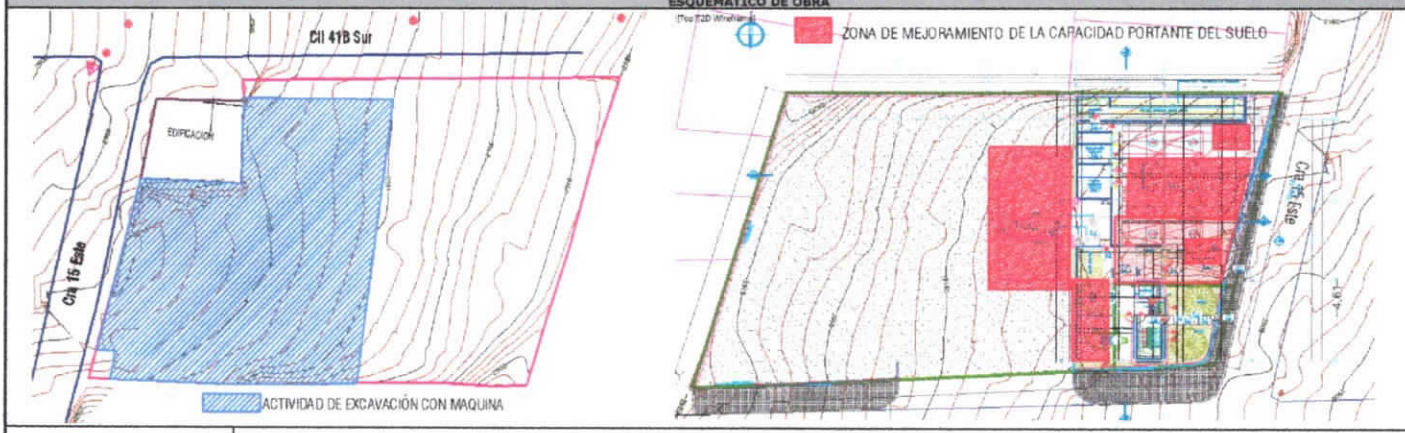

OBSERVACIONES:

	ELABORÓ	APROBÓ
FIRMA:		
NOMBRE:	ING. JAVIER ANDRES ESCOBAR PINTOR	ARQ. MARCELO SARMIENTO
CARGO:	AUXILIAR DE INGENIERIA CONTRATISTA	DIRECTOR DE OBRA CONTRATISTA
	VALIDÓ	APROBÓ
FIRMA:		
NOMBRE:	ING. CAMILO ROMERO	ARQ. JHON CUELLAR
CARGO:	RESIDENTE DE OBRA CONTRATISTA	RESIDENTE DE INTERVENTORIA

G&G Ingenieros Ltda.	INFORME DIARIO DE ACTIVIDADES	Fecha:01/06/2019
		Código: F-OBR-024
	EJECUCIÓN DE OBRA	Versión: 1
		Hoja No.: 1 de 1

No DE CONTRATO Y OBJETO	CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No 470 DE 2018 SUSCRITO ENTRE EL DISTRITO CAPITAL - UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL CUERPO DE BOMBEROS Y GYG INGENIEROS LTDA	CONSECUTIVO	79
LUGAR o ESPECIALIDAD DE LOS TRABAJOS	OBRA	FECHA	jueves 5 de septiembre de 2019

INFORME DIARIO No. 79

REGISTRO FOTOGRÁFICO













ELABORO:

ING. JAVIER ESCOBAR PINTOR
AUXILIAR DE INGENIERIA - CONTRATISTA

APROBO:

ING CAMILO ROMERO
RESIDENTE DE OBRA CONTRATISTA

GyG Ingenieros Ltda.	INFORME DIARIO DE ACTIVIDADES	Fecha:01/06/2019
		Código: F-OBR-024
	EJECUCIÓN DE OBRA	Versión: 1
		Hoja No.: 1 de 1

No DE CONTRATO DE OBRA Y OBJETO	CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No 470 DE 2018 SUSCRITO ENTRE EL DISTRITO CAPITAL - UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL CUERPO DE BOMBEROS Y GYG INGENIEROS LTDA	CONSECUTIVO	80
LUGAR o ESPECIALIDAD DE LOS TRABAJOS	OBRA	FECHA	viernes 6 de septiembre de 2019

HORAS PERDIDAS	POR LLUVIA	POR PAROS		OTROS	TOTALES
Horas Hombre					0.0
Horas Equipo					0.0

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD FUNCIONAL	UND.	CANTIDAD			
				CONTRACTUAL	ACUMULADO ANTERIOR	AVANCE HOY	ACUMULADO ACTUAL
3.3	RELLENO EN RECEBO COMUN COMPACTADO MECÁNICAMENTE.	N -3.30	m3	406.65	202.40	4.00	206.40

DESCRIPCION DE ACTIVIDADES EJECUTADAS

COMPACTACIÓN DE RECEBO COMÚN ZONA TANQUES DE ALMACENAMIENTO CON VIBRO, CONTINUIDAD DE LA ACTIVIDAD PAÑETE PARA MEJORAMIENTO TALUD CON MALLA, DESCARGA DE MATERIAL ACERO FIGURADO Y RETIRO DE LA EXCAVADORA REX 210

MANO DE OBRA EMPLEADA

CARGO	HORA		CANT.	TIEMPO (Horas)
	INICIO	FIN		
Arq. Residente	7:00:00	17:00:00	1.00	9:00:00
Ing. Residente	7:00:00	17:00:00	1.00	9:00:00
Aux. Ingeniero civil	7:00:00	17:00:00	1.00	9:00:00
Ing. Profesional SST	7:00:00	17:00:00	1.00	9:00:00
Trabajadores	7:00:00	17:00:00	10.00	90:00:00
Profesional de interventoría (Aux Ing, Residente)	7:00:00	17:00:00	2.00	18:00:00
Profesionales en topografía GyG	7:00:00	17:00:00	2.00	18:00:00

EQUIPO UTILIZADO

DESCRIPCIÓN	CANT.	TIEMPO (Horas)
VIBRO COMPACTADOR HAMM	1	8.50
MINI CARGADOR CASE SR 220	1	8.50

MATERIALES UTILIZADOS

DESCRIPCIÓN	UND.	CANT.
MALLA DE GALLINERO	m2	32.4
CEMENTO	BULTO	4
MIXTO	m3	0.84

ESTADO DEL TIEMPO

		HORAS
SECO	☒	9.0
NEBLINA	☐	
LLOVIZNA	☐	
LLUVIA	☐	
TORMENTA	☐	

ACCESO


BUENO	☒
REGULAR	☐
MALO	☐
NULO	☐

TERRENO

ROCOSO	☐	DURO	☐	NORMAL	☒
ARENOSO	☐	LODOSO	☐	PANTANO	☐

CAUSA ATRASO/DIA - MEDIDA CORRECTIVA:

ESQUEMÁTICO DE OBRA

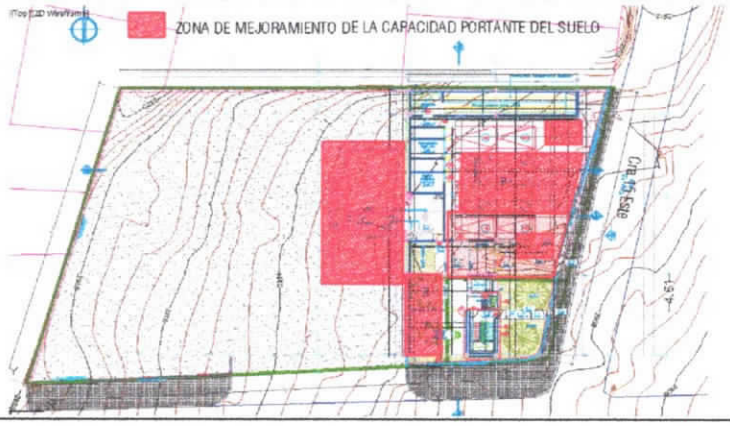

OBSERVACIONES:

	ELABORÓ	APROBÓ
FIRMA:		
NOMBRE:	ING. JAVIER ANDRÉS ESCOBAR PINTOR	ARQ. MARCELO SARMIENTO
CARGO:	AUXILIAR DE INGENIERIA CONTRATISTA	DIRECTOR DE OBRA CONTRATISTA
	VALIDÓ	APROBÓ
FIRMA:		
NOMBRE:	ING. CAMILO ROMERO	ARQ. JHON CUELLAR
CARGO:	RESIDENTE DE OBRA CONTRATISTA	RESIDENTE DE INTERVENTORIA

G&G Ingenieros Ltda.	INFORME DIARIO DE ACTIVIDADES	Fecha:01/06/2019
		Código: F-OBR-024
	EJECUCIÓN DE OBRA	Versión: 1
		Hoja No.: 1 de 1

No DE CONTRATO Y OBJETO	CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No 470 DE 2018 SUSCRITO ENTRE EL DISTRITO CAPITAL - UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL CUERPO DE BOMBEROS Y GYG INGENIEROS LTDA	CONSECUTIVO	80
LUGAR o ESPECIALIDAD DE LOS TRABAJOS	OBRA	FECHA	viernes 6 de septiembre de 2019

INFORME DIARIO No. 80

Página 2 de 2

REGISTRO FOTOGRÁFICO













ELABORO:

ING. JAVIER ESCOBAR PINTOR
AUXILIAR DE INGENIERIA - CONTRATISTA

APROBO:

ING CAMILO ROMERO
RESIDENTE DE OBRA CONTRATISTA

G&G Ingenieros Ltda.	INFORME DIARIO DE ACTIVIDADES	Fecha:01/06/2019
		Código: F-OBR-024
	EJECUCIÓN DE OBRA	Versión: 1
		Hoja No.: 1 de 1

No DE CONTRATO DE OBRA Y OBJETO	CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No 470 DE 2018 SUSCRITO ENTRE EL DISTRITO CAPITAL - UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL CUERPO DE BOMBEROS Y GYG INGENIEROS LTDA	CONSECUTIVO	81
LUGAR o ESPECIALIDAD DE LOS TRABAJOS	OBRA	FECHA	sábado 7 de septiembre de 2019

HORAS PERDIDAS	POR LLUVIA	POR PAROS		OTROS	TOTALES
Horas Hombre					0.0
Horas Equipo					0.0

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD FUNCIONAL	UND.	CANTIDAD			
				CONTRACTUAL	ACUMULADO ANTERIOR	AVANCE HOY	ACUMULADO ACTUAL
3.3	RELLENO EN RECEBO COMUN COMPACTADO MECÁNICAMENTE.	N-3.30	m3	406.65	206.40	4.00	210.40

DESCRIPCION DE ACTIVIDADES EJECUTADAS

COMPACTACIÓN DE RECEBO COMÚN ZONA TANQUES DE ALMACENAMIENTO CON VIBRO, CONTINUIDAD DE LA ACTIVIDAD PAÑETE PARA MEJORAMIENTO TALUD CON MALLA, DESCARGA DE MATERIAL ACERO FIGURADO

MANO DE OBRA EMPLEADA

CARGO	HORA		CANT.	TIEMPO (Horas)
	INICIO	FIN		
Arq. Residente	7:00:00	12:00:00	1.00	5:00:00
Ing. Residente	7:00:00	12:00:00	1.00	5:00:00
Aux. Ingeniero civil	7:00:00	12:00:00	1.00	5:00:00
Ing. Profesional SST	7:00:00	12:00:00	1.00	5:00:00
Trabajadores	7:00:00	12:00:00	9.00	45:00:00
Profesional de interventoría (Aux Ing, Residente)	7:00:00	12:00:00	2.00	10:00:00
Profesionales en topografía GyG	7:00:00	12:00:00	2.00	10:00:00
Ing. Ambiental	7:00:00	12:00:00	1.00	5:00:00

EQUIPO UTILIZADO

DESCRIPCIÓN	CANT.	TIEMPO (Horas)
VIBRO COMPACTADOR HAMM	1	8.50
MINI CARGADOR CASE SR 220	1	8.50

MATERIALES UTILIZADOS

DESCRIPCIÓN	UND.	CANT.

ESTADO DEL TIEMPO

		HORAS
SECO	☒	9.0
NEBLINA	☐	
LLOVIZNA	☐	
LLUVIA	☐	
TORMENTA	☐	

ACCESO


BUENO	☒
REGULAR	☐
MALO	☐
NULO	☐

TERRENO

ROCOSO	☐	DURO	☐	NORMAL	☒
ARENOSO	☐	LODOSO	☐	PANTANO	☐

CAUSA ATRASO/DIA - MEDIDA CORRECTIVA:

ESQUEMÁTICO DE OBRA

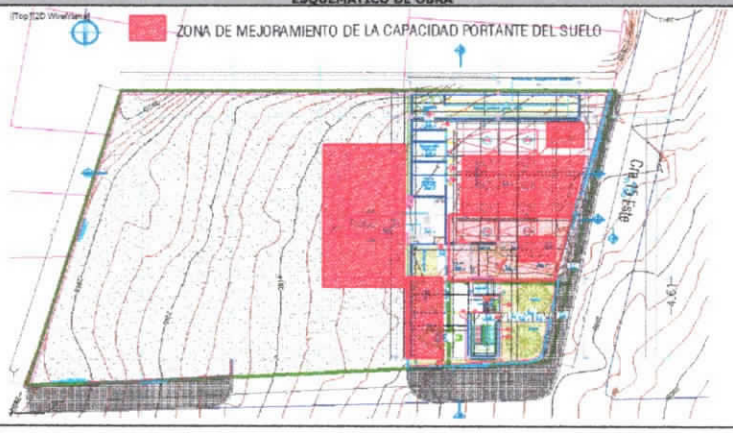

OBSERVACIONES:

	ELABORÓ	APROBÓ
FIRMA:		
NOMBRE:	ING. JAVIER ANDRÉS ESCOBAR PINTOR	ARQ. MARCELO SARMIENTO
CARGO:	AUXILIAR DE INGENIERIA CONTRATISTA	DIRECTOR DE OBRA CONTRATISTA
	VALIDÓ	APROBÓ
FIRMA:		
NOMBRE:	ING. CAMILO ROMERO	ARQ. JHON CUELLAR
CARGO:	RESIDENTE DE OBRA CONTRATISTA	RESIDENTE DE INTERVENTORIA

G+G Ingenieros Ltda.	INFORME DIARIO DE ACTIVIDADES	Fecha:01/06/2019
		Código: F-OBR-024
	EJECUCIÓN DE OBRA	Versión: 1
		Hoja No.: 1 de 1

No DE CONTRATO Y OBJETO	CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No 470 DE 2018 SUSCRITO ENTRE EL DISTRITO CAPITAL - UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL CUERPO DE BOMBEROS Y GYG INGENIEROS LTDA	CONSECUTIVO	81
LUGAR o ESPECIALIDAD DE LOS TRABAJOS	OBRA	FECHA	sábado 7 de septiembre de 2019

INFORME DIARIO No. 81

REGISTRO FOTOGRÁFICO












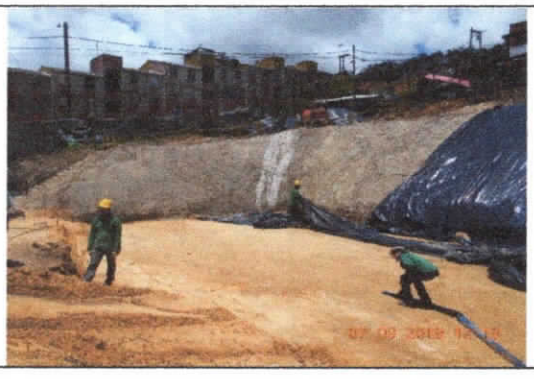

ELABORO:

ING. JAVIER ESCOBAR PINTOR
AUXILIAR DE INGENIERIA - CONTRATISTA

APROBO:

ING CAMILO ROMERO
RESIDENTE DE OBRA CONTRATISTA

G-G Ingenieros Ltda	INFORME DIARIO DE ACTIVIDADES	Fecha:01/06/2019
		Código: F-OBR-024
	EJECUCIÓN DE OBRA	Versión: 1
		Hoja No.: 1 de 1

	CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No 470 DE 2018 SUSCRITO ENTRE EL DISTRITO CAPITAL - UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL CUERPO DE BOMBEROS Y GYG INGENIEROS LTDA		82
	OBRA		domingo 8 de septiembre de 2019

Horas Hombre						0.0
Horas Equipo						0.0

1.00	DÍA DOMINGO	-					

DESCRIPCION DE ACTIVIDADES EJECUTADAS

DÍA DOMINGO NO TRABAJADO

				0:00:00			
				0:00:00			
				0:00:00			
				0:00:00			
				0:00:00			
				0:00:00			

SECO	X			BUENO	X		
NEBLINA				REGULAR			
LLOVIZNA				MALO			
LLUVIA				NULO			
TORMENTA							
ROCOSO		DURO		NORMAL	X		
ARENOSO		LODOSO		PANTANO			

OBSERVACIONES:			

FIRMA:	**ELABORO**	**FIRMA:**	**APROBO**
NOMBRE:	ING. JAVIER ANDRES ESCOBAR PINTOR	**NOMBRE:**	ARQ. MARCELO SARMIENTO
CARGO:	AUXILIAR DE INGENIERIA CONTRATISTA	**CARGO:**	DIRECTOR DE OBRA CONTRATISTA
FIRMA:	**VALIDÓ**	**FIRMA:**	**APROBO**
NOMBRE:	ING. CAMILO ROMERO	**NOMBRE:**	ARQ. JHON CUELLAR
CARGO:	RESIDENTE DE OBRA CONTRATISTA	**CARGO:**	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

GyG Ingenieros Ltda.	INFORME DIARIO DE ACTIVIDADES	Fecha:01/06/2019
		Código: F-OBR-024
	EJECUCIÓN DE OBRA	Versión: 1
		Hoja No.: 1 de 1

No DE CONTRATO DE OBRA Y OBJETO	CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No 470 DE 2018 SUSCRITO ENTRE EL DISTRITO CAPITAL - UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL CUERPO DE BOMBEROS Y GYG INGENIEROS LTDA	CONSECUTIVO	83
LUGAR o ESPECIALIDAD DE LOS TRABAJOS	OBRA	FECHA	lunes 9 de septiembre de 2019

HORAS PERDIDAS	POR LLUVIA	POR PAROS		OTROS	TOTALES
Horas Hombre	1				1.0
Horas Equipo	1				1.0

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD FUNCIONAL	UND.	CANTIDAD			
				CONTRACTUAL	ACUMULADO ANTERIOR	AVANCE HOY	ACUMULADO ACTUAL
3.30	RELLENO EN RECEBO COMÚN COMPACTADO MECÁNICAMENTE.	N -3.30	m3	406.65	210.40	4.00	214.40

DESCRIPCION DE ACTIVIDADES EJECUTADAS

COMITÉ DE OBRA # 2, REALIZACIÓN DE CONTINUIDAD PAÑETE PARA EL MEJORAMIENTO DEL TALUD ALEDAÑO TANQUES DE ALMACENAMIENTO CON MALLA, COMPACTACIÓN CON VIBRO ZONA TANQUES, DENSIDADES DEL RECEBO COMÚN ENSAYO PROCTOR PRELIMINAR.

MANO DE OBRA EMPLEADA

CARGO	HORA		CANT.	TIEMPO (Horas)
	INICIO	FIN		
Arq. Residente	7:00:00	16:30:00	1.00	8:30:00
Ing. Residente	7:00:00	16:30:00	1.00	8:30:00
Aux. Ingeniero civil	7:00:00	16:30:00	1.00	8:30:00
Ing.. Profesional SST	7:00:00	16:30:00	1.00	8:30:00
Trabajadores	7:00:00	16:30:00	10.00	85:00:00
Profesional de interventoría (Aux Ing, social y director,residente)	7:00:00	16:30:00	4.00	34:00:00
Profesionales en topografía GyG	7:00:00	16:30:00	2.00	17:00:00
Ing. Gestión de Calidad	7:00:00	16:30:00	1.00	8:30:00
Representantes legales GyG	7:00:00	16:30:00	1.00	8:30:00

EQUIPO UTILIZADO

DESCRIPCIÓN	CANT.	TIEMPO (Horas)
VIBRO COMPACTADOR HAMM	1	8.50
MINI CARGADOR CASE SR 220	1	8.50

MATERIALES UTILIZADOS

DESCRIPCIÓN	UND.	CANT.
MALLA DE GALLINERO	m2	64.8
CEMENTO	BULTO	9
MIXTO	m3	1.68

ESTADO DEL TIEMPO

		HORAS
SECO	☒	8.0
NEBLINA	☐	
LLOVIZNA	☒	1.0
LLUVIA	☐	
TORMENTA	☐	

TERRENO

ROCOSO	☐	DURO	☐	NORMAL	☒
ARENOSO	☐	LODOSO	☐	PANTANO	☐


ACCESO

BUENO	☒
REGULAR	☐
MALO	☐
NULO	☐

CAUSA ATRASO/DIA - MEDIDA CORRECTIVA:

LLOVIZNA LEVE 10:00AM A 11:00 AM

ESQUEMÁTICO DE OBRA

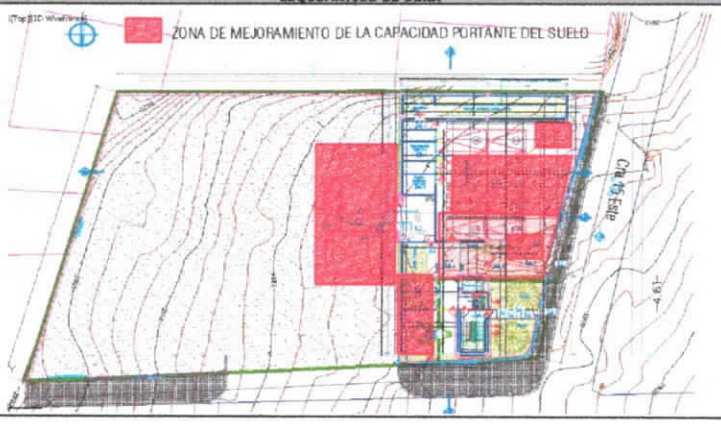

OBSERVACIONES:

	ELABORÓ	APROBÓ
FIRMA:		
NOMBRE:	ING. JAVIER ANDRES ESCOBAR PINTOR	ARQ. MARCELO SARMIENTO
CARGO:	AUXILIAR DE INGENIERIA CONTRATISTA	DIRECTOR DE OBRA CONTRATISTA
	VALIDÓ	APROBÓ
FIRMA:		
NOMBRE:	ING. CAMILO ROMERO	ARQ. JHON CUELLAR
CARGO:	RESIDENTE DE OBRA CONTRATISTA	RESIDENTE DE INTERVENTORIA

G&G Ingenieros Ltda.	INFORME DIARIO DE ACTIVIDADES	Fecha:01/06/2019
		Código: F-OBR-024
	EJECUCIÓN DE OBRA	Versión: 1
		Hoja No.: 1 de 1

No DE CONTRATO Y OBJETO	CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No 470 DE 2018 SUSCRITO ENTRE EL DISTRITO CAPITAL - UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL CUERPO DE BOMBEROS Y GYG INGENIEROS LTDA	CONSECUTIVO	83
LUGAR o ESPECIALIDAD DE LOS TRABAJOS	OBRA	FECHA	lunes 9 de septiembre de 2019

INFORME DIARIO No. 83

REGISTRO FOTOGRÁFICO

















ELABORO:

ING. JAVIER ESCOBAR PINTOR
AUXILIAR DE INGENIERIA - CONTRATISTA

APROBO:

ING CAMILO ROMERO
RESIDENTE DE OBRA CONTRATISTA

GyG Ingenieros Ltda.	INFORME DIARIO DE ACTIVIDADES	Fecha:01/06/2019
		Código: F-OBR-024
	EJECUCIÓN DE OBRA	Versión: 1
		Hoja No.: 1 de 1

No DE CONTRATO DE OBRA Y OBJETO	CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No 470 DE 2018 SUSCRITO ENTRE EL DISTRITO CAPITAL - UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL CUERPO DE BOMBEROS Y GYG INGENIEROS LTDA	CONSECUTIVO	84
LUGAR o ESPECIALIDAD DE LOS TRABAJOS	OBRA	FECHA	martes 10 de septiembre de 2019

HORAS PERDIDAS	POR LLUVIA	POR PAROS		OTROS	TOTALES
Horas Hombre					0.0
Horas Equipo					0.0

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD FUNCIONAL	UND.	CANTIDAD			
				CONTRACTUAL	ACUMULADO ANTERIOR	AVANCE HOY	ACUMULADO ACTUAL
4.1	CONCRETO DE LIMPIEZA EN CONCRETO DE 2500 PSI. E=0.04	N -3.30	m2	510.00	0.00	51.43	51.43

DESCRIPCION DE ACTIVIDADES EJECUTADAS

CONTINUIDAD PAÑETE PARA EL MEJORAMIENTO DEL TALUD ALEDAÑO TANQUES DE ALMACENAMIENTO CON MALLA, COMPACTACIÓN CON VIBRO ZONA TANQUES, EXCAVACIÓN DE ZARPA MURO DE CONTENCIÓN TIPO 4 E INICIO FUNDIDA DE CONCRETO DE LIMPIEZA TANQUE DE ALMACENAMIENTO Y ZARPA MURO TIPO 4.

MANO DE OBRA EMPLEADA

CARGO	HORA		CANT.	TIEMPO (Horas)
	INICIO	FIN		
Arq. Residente	7:00:00	16:30:00	1.00	8:30:00
Ing. Residente	7:00:00	16:30:00	1.00	8:30:00
Aux. Ingeniero civil	7:00:00	16:30:00	1.00	8:30:00
Ing.. Profesional SST	7:00:00	16:30:00	1.00	8:30:00
Trabajadores	7:00:00	16:30:00	16.00	136:00:00
Profesional de interventoría	7:00:00	16:30:00	1.00	8:30:00
Profesionales en topografía GyG	7:00:00	16:30:00	2.00	17:00:00

EQUIPO UTILIZADO

DESCRIPCIÓN	CANT.	TIEMPO (Horas)
VIBRO COMPACTADOR HAMM	1	8.50
MINI CARGADOR CASE SR 220	1	8.50
EXCAVADORA 304C	1	8.50

MATERIALES UTILIZADOS

DESCRIPCIÓN	UND.	CANT.
MALLA DE GALLINERO	m2	86.4
CEMENTO	BULTO	28
MIXTO	m3	5.59

ESTADO DEL TIEMPO

		HORAS
SECO	☒	9.0
NEBLINA	☐	
LLOVIZNA	☐	
LLUVIA	☐	
TORMENTA	☐	

TERRENO


ROCOSO	☐	DURO	☐	NORMAL	☒
ARENOSO	☐	LODOSO	☐	PANTANO	☐

ACCESO

BUENO	☒
REGULAR	☐
MALO	☐
NULO	☐

CAUSA ATRASO/DIA - MEDIDA CORRECTIVA:

ESQUEMÁTICO DE OBRA

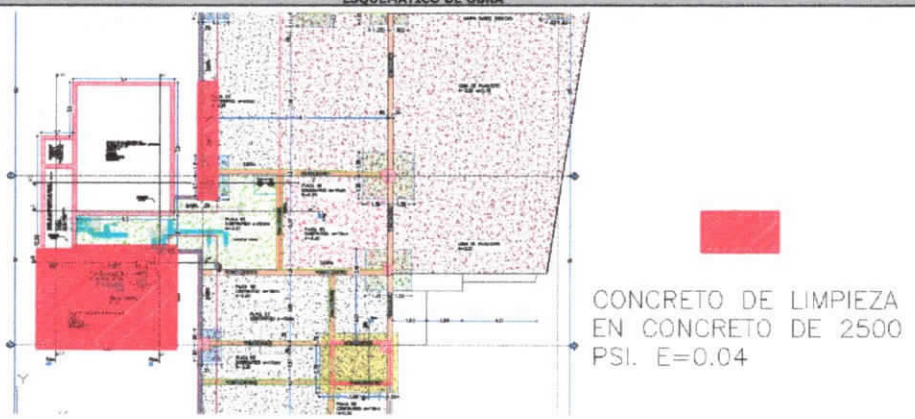

OBSERVACIONES:

	ELABORÓ	APROBÓ
FIRMA:		
NOMBRE:	ING. JAVIER ANDRES ESCOBAR PINTOR	ARQ. MARCELO SARMIENTO
CARGO:	AUXILIAR DE INGENIERIA CONTRATISTA	DIRECTOR DE OBRA CONTRATISTA
	VALIDÓ	APROBÓ
FIRMA:		
NOMBRE:	ING. CAMILO ROMERO	ARQ. JHON CUELLAR
CARGO:	RESIDENTE DE OBRA CONTRATISTA	RESIDENTE DE INTERVENTORIA

GyG Ingenieros Ltda.	INFORME DIARIO DE ACTIVIDADES	Fecha:01/06/2019
		Código: F-OBR-024
	EJECUCIÓN DE OBRA	Versión: 1
		Hoja No.: 1 de 1

No DE CONTRATO Y OBJETO	CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No 470 DE 2018 SUSCRITO ENTRE EL DISTRITO CAPITAL - UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL CUERPO DE BOMBEROS Y GYG INGENIEROS LTDA	CONSECUTIVO	84
LUGAR o ESPECIALIDAD DE LOS TRABAJOS	OBRA	FECHA	martes 10 de septiembre de 2019

INFORME DIARIO No. 84

REGISTRO FOTOGRÁFICO



















ELABORO:

ING. JAVIER ESCOBAR PINTOR
AUXILIAR DE INGENIERIA - CONTRATISTA

APROBO:

ING CAMILO ROMERO
RESIDENTE DE OBRA CONTRATISTA

GyG Ingenieros Ltda.	INFORME DIARIO DE ACTIVIDADES	Fecha:01/06/2019
		Código: F-OBR-024
	EJECUCIÓN DE OBRA	Versión: 1
		Hoja No.: 1 de 1

No DE CONTRATO DE OBRA Y OBJETO	CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No 470 DE 2018 SUSCRITO ENTRE EL DISTRITO CAPITAL - UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL CUERPO DE BOMBEROS Y GYG INGENIEROS LTDA	CONSECUTIVO	85
LUGAR o ESPECIALIDAD DE LOS TRABAJOS	OBRA	FECHA	miércoles 11 de septiembre de 2019

HORAS PERDIDAS	POR LLUVIA	POR PAROS		OTROS	TOTALES
Horas Hombre					0.0
Horas Equipo					0.0

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD FUNCIONAL	UND.	CANTIDAD			
				CONTRACTUAL	ACUMULADO ANTERIOR	AVANCE HOY	ACUMULADO ACTUAL
4.1	CONCRETO DE LIMPIEZA EN CONCRETO DE 2500 PSI. E=0.04	N-4.95	m2	510.00	51.43	47.20	98.63

DESCRIPCION DE ACTIVIDADES EJECUTADAS

SEGUNDA FUNDIDA DE CONCRETO DE LIMPIEZA TANQUE DE ALMACENAMIENTO. MEJORAMIENTO DEL CERRAMIENTO COSTADO ORIENTAL, NUEVA ADECUACIÓN DEL PUNTO ECOLÓGICO Y ARRGLO CAMPAMENTO ESCALERAS INGRESO AL CUARTO DE CAMBIO DE PERSONAL DE OBRA.

MANO DE OBRA EMPLEADA

CARGO	HORA		CANT.	TIEMPO (Horas)
	INICIO	FIN		
Arq. Residente	7:00:00	16:30:00	1.00	8:30:00
Ing. Residente	7:00:00	16:30:00	1.00	8:30:00
Aux. Ingeniero civil	7:00:00	16:30:00	1.00	8:30:00
Ing.. Profesional SST	7:00:00	16:30:00	1.00	8:30:00
Trabajadores	7:00:00	16:30:00	16.00	136:00:00
Profesional de interventoría (Aux Ing)	7:00:00	16:30:00	1.00	8:30:00
Profesionales en topografía GyG	7:00:00	16:30:00	2.00	17:00:00
Ing. Ambiental	7:00:00	16:30:00	1.00	8:30:00

EQUIPO UTILIZADO

DESCRIPCIÓN	CANT.	TIEMPO (Horas)
VIBRO COMPACTADOR HAMM	1	8.50
MINI CARGADOR CASE SR 220	1	8.50
EXCAVADORA 304C	1	8.50

MATERIALES UTILIZADOS

DESCRIPCIÓN	UND.	CANT.
CEMENTO	BULTO	14
MIXTO	m3	3.07

ESTADO DEL TIEMPO

		HORAS
SECO	X	9.0
NEBLINA		
LLOVIZNA	X	"
LLUVIA		
TORMENTA		

ACCESO


BUENO	X
REGULAR	
MALO	
NULO	

TERRENO

ROCOSO		DURO		NORMAL	X
ARENOSO		LODOSO		PANTANO	

CAUSA ATRASO/DIA - MEDIDA CORRECTIVA:

ESQUEMÁTICO DE OBRA

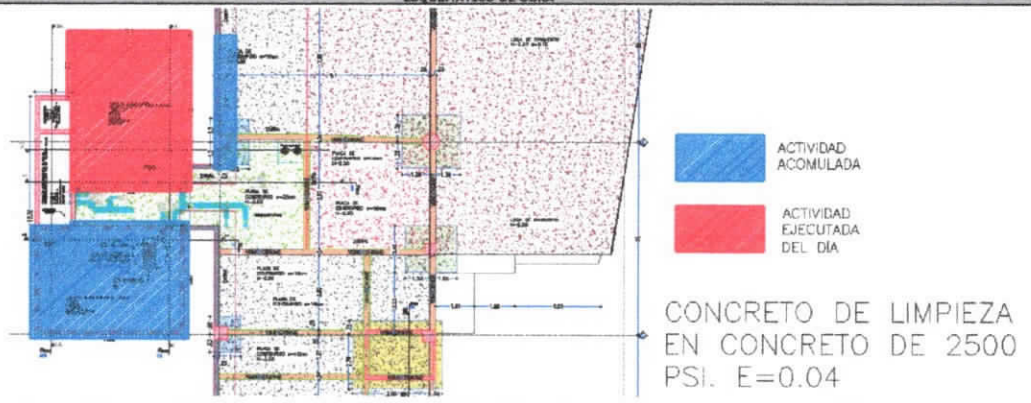

OBSERVACIONES: SE DEFINE CON LA INTERVENTORÍA EL MURO TIPO 11 EL QUIEBRE POR LA MORFOLOGIA DEL TERRENO Y POR LOS PREDIOS QUE COLINDAN DICHO MURO


	ELABORÓ		APROBÓ
FIRMA:		FIRMA:	
NOMBRE:	ING. JAVIER ANDRES ESCOBAR PINTOR	NOMBRE:	ARQ. MARCELO SARMIENTO
CARGO:	AUXILIAR DE INGENIERIA CONTRATISTA	CARGO:	DIRECTOR DE OBRA CONTRATISTA
	VALIDÓ		APROBÓ
FIRMA:		FIRMA:	
NOMBRE:	ING. CAMILO ROMERO	NOMBRE:	ARQ. JHON CUELLAR
CARGO:	RESIDENTE DE OBRA CONTRATISTA	CARGO:	RESIDENTE DE INTERVENTORIA

GyG Ingenieros Ltda.	INFORME DIARIO DE ACTIVIDADES	Fecha:01/06/2019
		Código: F-OBR-024
	EJECUCIÓN DE OBRA	Versión: 1
		Hoja No.: 1 de 1

No DE CONTRATO Y OBJETO	CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No 470 DE 2018 SUSCRITO ENTRE EL DISTRITO CAPITAL - UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL CUERPO DE BOMBEROS Y GYG INGENIEROS LTDA	CONSECUTIVO	85
LUGAR o ESPECIALIDAD DE LOS TRABAJOS	OBRA	FECHA	miércoles 11 de septiembre de 2019

INFORME DIARIO No. 85

REGISTRO FOTOGRÁFICO

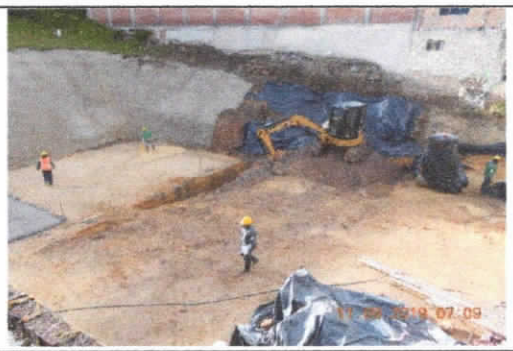















ELABORO:

ING. JAVIER ESCOBAR PINTOR
AUXILIAR DE INGENIERIA - CONTRATISTA

APROBO:

ING CAMILO ROMERO
RESIDENTE DE OBRA CONTRATISTA

G&G Ingenieros Ltda.	INFORME DIARIO DE ACTIVIDADES	Fecha:01/06/2019
		Código: F-OBR-024
	EJECUCIÓN DE OBRA	Versión: 1
		Hoja No.: 1 de 1

No DE CONTRATO DE OBRA Y OBJETO	CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No 470 DE 2018 SUSCRITO ENTRE EL DISTRITO CAPITAL - UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL CUERPO DE BOMBEROS Y GYG INGENIEROS LTDA	CONSECUTIVO	86
LUGAR o ESPECIALIDAD DE LOS TRABAJOS	OBRA	FECHA	Jueves 12 de septiembre de 2019

HORAS PERDIDAS	POR LLUVIA	POR PAROS		OTROS	TOTALES
Horas Hombre					0.0
Horas Equipo					0.0

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD FUNCIONAL	UND.	CANTIDAD			
				CONTRACTUAL	ACUMULADO ANTERIOR	AVANCE HOY	ACUMULADO ACTUAL
4.1	CONCRETO DE LIMPIEZA EN CONCRETO DE 2500 PSI. E=0.04	N-4.25	m2	510.00	98.63	10.52	109.15
4.1	ACERO FIGURADO 60000 PSI	N-4.20	KG	60921.33	0.00	373.00	373.00
3.1	EXCAVACIONES VARIAS A MAQUINA SIN CLASIFICAR INCLUYE RETIRO.	N+4.85	m3	18895.39	2136.56	37.80	2174.36

DESCRIPCION DE ACTIVIDADES EJECUTADAS

FUNDIDA DE CONCRETO DE LIMPIEZA TANQUE DE ALMACENAMIENTO AGUAS LLUVIAS. CONTINUA EL MEJORAMIENTO DEL CERRAMIENTO COSTADO ORIENTAL Y SE DA INICIO A LA ACTIVIDAD DE AMARRE DE ACERO TANQUE DE ALMACENAMIENTO AGUA POTABLE Y RETIRO DE MAQUINAS VIBROCOMPACTADOR Y MINICARGADOR.

MANO DE OBRA EMPLEADA

CARGO	HORA		CANT.	TIEMPO (Horas)
	INICIO	FIN		
Arq. Residente	7:00:00	16:30:00	1.00	8:30:00
Ing. Residente	7:00:00	16:30:00	1.00	8:30:00
Aux. Ingeniero civil	7:00:00	16:30:00	1.00	8:30:00
Ing.. Profesional SST	7:00:00	16:30:00	1.00	8:30:00
Trabajadores	7:00:00	16:30:00	16.00	136:00:00
Profesional de interventoría (Aux Ing)	7:00:00	16:30:00	1.00	8:30:00
Profesionales en topografía GyG	7:00:00	16:30:00	2.00	17:00:00

EQUIPO UTILIZADO

DESCRIPCIÓN	CANT.	TIEMPO (Horas)
VIBRO COMPACTADOR HAMM	1	8.50
MINI CARGADOR CASE SR 220	1	8.50
EXCAVADORA 304C	1	8.50
VIAJE VOLQUETA (15m3)	3	8.50

MATERIALES UTILIZADOS

DESCRIPCIÓN	UND.	CANT.
CEMENTO	BULTO	3
MIXTO	m3	0.68

ESTADO DEL TIEMPO

		HORAS
SECO	X	9.0
NEBLINA		
LLOVIZNA	X	
LLUVIA		
TORMENTA		

ACCESO


BUENO	X
REGULAR	
MALO	
NULO	

TERRENO

ROCOSO		DURO		NORMAL	X
ARENOSO		LODOSO		PANTANO	

CAUSA ATRASO/DIA - MEDIDA CORRECTIVA:

ESQUEMÁTICO DE OBRA

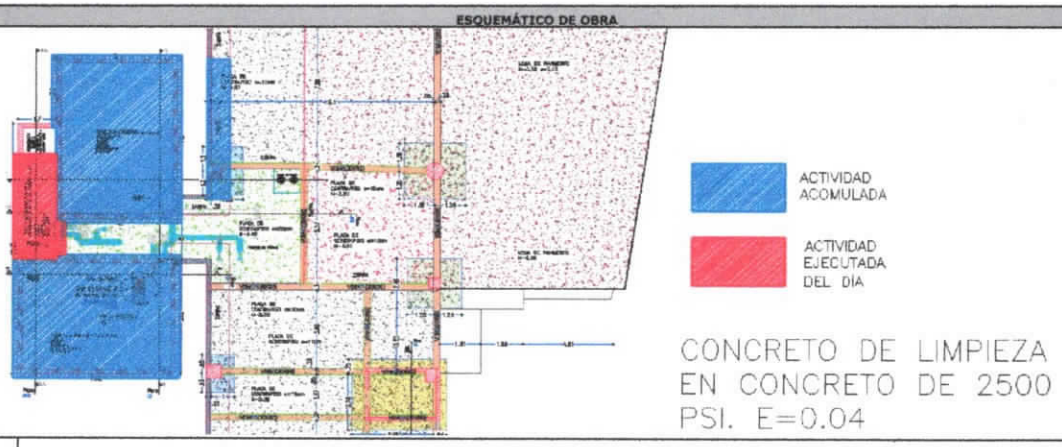

OBSERVACIONES:

	ELABORÓ	APROBÓ
FIRMA:		
NOMBRE:	ING. JAVIER ANDRES ESCOBAR BENTOR	ARQ. MARCELO SARMIENTO
CARGO:	AUXILIAR DE INGENIERIA CONTRATISTA	DIRECTOR DE OBRA CONTRATISTA
	VALIDÓ	APROBÓ
FIRMA:		
NOMBRE:	ING. CAMILO ROMERO	ARQ. JHON CUELLAR
CARGO:	RESIDENTE DE OBRA CONTRATISTA	RESIDENTE DE INTERVENTORIA

G&G Ingenieros Ltda.	INFORME DIARIO DE ACTIVIDADES	Fecha:01/06/2019
		Código: F-OBR-024
	EJECUCIÓN DE OBRA	Versión: 1
		Hoja No.: 1 de 1

No DE CONTRATO Y OBJETO	CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No 470 DE 2018 SUSCRITO ENTRE EL DISTRITO CAPITAL - UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL CUERPO DE BOMBEROS Y GYG INGENIEROS LTDA	CONSECUTIVO	86
LUGAR o ESPECIALIDAD DE LOS TRABAJOS	OBRA	FECHA	jueves 12 de septiembre de 2019

INFORME DIARIO No. 86

REGISTRO FOTOGRÁFICO

















ELABORO:

ING. JAVIER ESCOBAR PINTOR
AUXILIAR DE INGENIERIA - CONTRATISTA

APROBO:

ING CAMILO ROMERO
RESIDENTE DE OBRA CONTRATISTA

GyG Ingenieros Ltda.	INFORME DIARIO DE ACTIVIDADES	Fecha:01/06/2019
		Código: F-OBR-024
	EJECUCIÓN DE OBRA	Versión: 1
		Hoja No.: 1 de 1

No DE CONTRATO DE OBRA Y OBJETO	CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No 470 DE 2018 SUSCRITO ENTRE EL DISTRITO CAPITAL - UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL CUERPO DE BOMBEROS Y GYG INGENIEROS LTDA	CONSECUTIVO	87
LUGAR o ESPECIALIDAD DE LOS TRABAJOS	OBRA	FECHA	viernes 13 de septiembre de 2019

HORAS PERDIDAS	POR LLUVIA	POR PAROS		OTROS	TOTALES
Horas Hombre					0.0
Horas Equipo					0.0

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD FUNCIONAL	UND.	CANTIDAD			
				CONTRACTUAL	ACUMULADO ANTERIOR	AVANCE HOY	ACUMULADO ACTUAL
4.12	ACERO FIGURADO 60000 PSI	N-4.20	GLB	60921.33	373.00	428.65	801.65

DESCRIPCION DE ACTIVIDADES EJECUTADAS

LA CONTINUACIÓN DE ACTIVIDAD DE AMARRE DE ACERO TANQUE DE ALMACENAMIENTO AGUA POTABLE, RECOLECCIÓN DE BASURA POR ARREGLO CERRAMIENTO COSTADO ORIENTE, REPLANTEO DEL MURO APROBADO T 11 PARA SU EXCAVACIÓN Y ZANJA PARA LA PROTECCIÓN ESCORRENTIA CORONA TALUD.

MANO DE OBRA EMPLEADA

CARGO	HORA		CANT.	TIEMPO (Horas)
	INICIO	FIN		
Arq. Residente	7:00:00	17:00:00	1.00	9:00:00
Ing. Residente	7:00:00	18:00:00	1.00	10:00:00
Aux. Ingeniero civil	7:00:00	19:00:00	1.00	11:00:00
Ing.. Profesional SST	7:00:00	20:00:00	1.00	12:00:00
Trabajadores	7:00:00	21:00:00	16.00	208:00:00
Profesional de interventoría (Aux Ing)	7:00:00	22:00:00	1.00	14:00:00
Profesionales en topografia GyG	7:00:00	23:00:00	2.00	30:00:00

EQUIPO UTILIZADO

DESCRIPCIÓN	CANT.	TIEMPO (Horas)
EXCAVADORA 304C	1	8.50

MATERIALES UTILIZADOS

DESCRIPCION	UND.	CANT.

ESTADO DEL TIEMPO

		HORAS
SECO	X	9.0
NEBLINA		
LLOVIZNA	X	
LLUVIA		
TORMENTA		

TERRENO


ROCOSO		DURO		NORMAL	X
ARENOSO		LODOSO		PANTANO	

ACCESO

BUENO	X
REGULAR	
MALO	
NULO	

CAUSA ATRASO/DIA - MEDIDA CORRECTIVA:

ESQUEMÁTICO DE OBRA

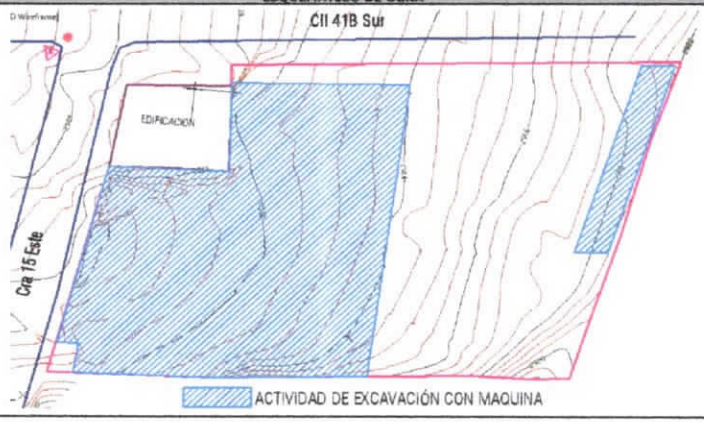

OBSERVACIONES:

	ELABORÓ		APROBÓ
FIRMA:		FIRMA:	
NOMBRE:	ING. JAVIER ANDRES ESCOBAR PINTOR	NOMBRE:	ARQ. MARCELO SARMIENTO
CARGO:	AUXILIAR DE INGENIERIA CONTRATISTA	CARGO:	DIRECTOR DE OBRA CONTRATISTA
	VALIDÓ		APROBÓ
FIRMA:		FIRMA:	
NOMBRE:	ING. CAMILO ROMERO	NOMBRE:	ARQ. JHON CUELLAR
CARGO:	RESIDENTE DE OBRA CONTRATISTA	CARGO:	RESIDENTE DE INTERVENTORIA

G&G Ingenieros Ltda.	INFORME DIARIO DE ACTIVIDADES	Fecha:01/06/2019
		Código: F-OBR-024
	EJECUCIÓN DE OBRA	Versión: 1
		Hoja No.: 1 de 1

No DE CONTRATO Y OBJETO	CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No 470 DE 2018 SUSCRITO ENTRE EL DISTRITO CAPITAL - UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL CUERPO DE BOMBEROS Y GYG INGENIEROS LTDA	CONSECUTIVO	87
LUGAR o ESPECIALIDAD DE LOS TRABAJOS	OBRA	FECHA	viernes 13 de septiembre de 2019

INFORME DIARIO No. 87

REGISTRO FOTOGRÁFICO















ELABORO:

ING. JAVIER ESCOBAR PINTOR
AUXILIAR DE INGENIERIA - CONTRATISTA

APROBO:

ING CAMILO ROMERO
RESIDENTE DE OBRA CONTRATISTA

GyG Ingenieros Ltda.	INFORME DIARIO DE ACTIVIDADES	Fecha:01/06/2019
		Código: F-OBR-024
	EJECUCIÓN DE OBRA	Versión: 1
		Hoja No.: 1 de 1

No DE CONTRATO DE OBRA Y OBJETO	CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No 470 DE 2018 SUSCRITO ENTRE EL DISTRITO CAPITAL - UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL CUERPO DE BOMBEROS Y GYG INGENIEROS LTDA	CONSECUTIVO	88
LUGAR o ESPECIALIDAD DE LOS TRABAJOS	OBRA	FECHA	sábado 14 de septiembre de 2019

HORAS PERDIDAS	POR LLUVIA	POR PAROS		OTROS	TOTALES
Horas Hombre					0.0
Horas Equipo					0.0

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD FUNCIONAL	UND.	CANTIDAD			
				CONTRACTUAL	ACUMULADO ANTERIOR	AVANCE HOY	ACUMULADO ACTUAL
4.12	ACERO FIGURADO 60000 PSI	N-4.20	GLB	60921.33	801.65	350.00	1151.65

DESCRIPCION DE ACTIVIDADES EJECUTADAS

LA CONTINUACIÓN DE ACTIVIDAD DE AMARRE DE ACERO TANQUE DE ALMACENAMIENTO AGUA POTABLE E INCENDIO, ARREGLO ESCALERA PASO PEATONAL EN TALUD, ESCAVACIÓN ZANJA DEL MURO DE CONTENCIÓN TIPO 11 COSTADO ORIENTAL.

MANO DE OBRA EMPLEADA

CARGO	HORA		CANT.	TIEMPO (Horas)
	INICIO	FIN		
Arq. Residente	7:00:00	12:00:00	1.00	5:00:00
Ing. Residente	7:00:00	12:00:00	1.00	5:00:00
Aux. Ingeniero civil	7:00:00	12:00:00	1.00	5:00:00
Ing.. Profesional SST	7:00:00	12:00:00	1.00	5:00:00
Trabajadores	7:00:00	12:00:00	19.00	95:00:00
Profesional de interventoría (Aux Ing)	7:00:00	12:00:00	1.00	5:00:00
Profesionales en topografía GyG	7:00:00	12:00:00	2.00	10:00:00

EQUIPO UTILIZADO

DESCRIPCIÓN	CANT.	TIEMPO (Horas)
EXCAVADORA 304C	1	5.00

MATERIALES UTILIZADOS

DESCRIPCIÓN	UND.	CANT.

ESTADO DEL TIEMPO

		HORAS
SECO	X	5.0
NEBLINA		
LLOVIZNA	X	
LLUVIA		
TORMENTA		

ACCESO

BUENO	X
REGULAR	
MALO	
NULO	

TERRENO

ROCOSO		DURO		NORMAL	X
ARENOSO		LODOSO		PANTANO	

CAUSA ATRASO/DIA - MEDIDA CORRECTIVA:

ESQUEMÁTICO DE OBRA



OBSERVACIONES:

	ELABORÓ		APROBÓ
FIRMA:		FIRMA:	
NOMBRE:	ING. JAVIER ANDRES ESCOBAR PINTOR	NOMBRE:	ARQ. MARCELO SARMIENTO
CARGO:	AUXILIAR DE INGENIERIA CONTRATISTA	CARGO:	DIRECTOR DE OBRA CONTRATISTA
	VALIDÓ		APROBÓ
FIRMA:		FIRMA:	
NOMBRE:	ING. CAMILO ROMERO	NOMBRE:	ARQ. JHON CUELLAR
CARGO:	RESIDENTE DE OBRA CONTRATISTA	CARGO:	RESIDENTE DE INTERVENTORIA

GyG Ingenieros Ltda.	INFORME DIARIO DE ACTIVIDADES	Fecha:01/06/2019
		Código: F-OBR-024
	EJECUCIÓN DE OBRA	Versión: 1
		Hoja No.: 1 de 1

No DE CONTRATO Y OBJETO	CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No 470 DE 2018 SUSCRITO ENTRE EL DISTRITO CAPITAL - UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL CUERPO DE BOMBEROS Y GYG INGENIEROS LTDA	CONSECUTIVO	88
LUGAR o ESPECIALIDAD DE LOS TRABAJOS	OBRA	FECHA	sábado 14 de septiembre de 2019


INFORME DIARIO No. 88

Página 2 de 2

REGISTRO FOTOGRÁFICO





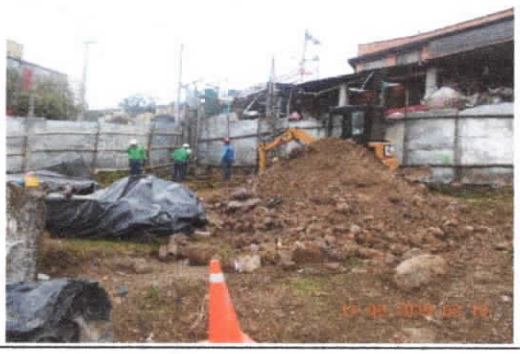







ELABORO:

ING. JAVIER ESCOBAR PINTOR
AUXILIAR DE INGENIERIA - CONTRATISTA

APROBO:

ING CAMILO ROMERO
RESIDENTE DE OBRA CONTRATISTA

GyG Ingenieros Ltda	INFORME DIARIO DE ACTIVIDADES	Fecha:01/06/2019
		Código: F-OBR-024
	EJECUCIÓN DE OBRA	Versión: 1
		Hoja No.: 1 de 1

	CONTRATO DE OBRA PUBLICA No 470 DE 2018 SUSCRITO ENTRE EL DISTRITO CAPITAL - UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL CUERPO DE BOMBEROS Y GYG INGENIEROS LTDA		89
	OBRA		domingo 15 de septiembre de 2019

					0.0
Horas Hombre					0.0
Horas Equipo					

1.00	DÍA DOMINGO NO LABORADO						

DESCRIPCION DE ACTIVIDADES EJECUTADAS

DÍA DOMINGO NO LABORADO

				0:00:00
				0:00:00
				0:00:00
				0:00:00
				0:00:00
				0:00:00
				0:00:00

SECO	X	5.0	BUENO	X	
NEBLINA			REGULAR		
LLOVIZNA	X		MALO		
LLUVIA			NULO		
TORMENTA					
ROCOSO		DURO		NORMAL	X
ARENOSO		LODOSO		PANTANO	

OBSERVACIONES:

	ELABORÓ		APROBÓ
FIRMA:		FIRMA:	
NOMBRE:	ING. JAVIER ANDRES ESCOBAR GINTOR	NOMBRE:	ARQ. MARCELO SARMIENTO
CARGO:	AUXILIAR DE INGENIERIA CONTRATISTA	CARGO:	DIRECTOR DE OBRA CONTRATISTA
	VALIDÓ		APROBÓ
FIRMA:		FIRMA:	
NOMBRE:	ING. CAMILO ROMERO	NOMBRE:	ARQ. JHON CUELLAR
CARGO:	RESIDENTE DE OBRA CONTRATISTA	CARGO:	RESIDENTE DE INTERVENTORIA

GyG Ingenieros Ltda.	INFORME DIARIO DE ACTIVIDADES	Fecha:01/06/2019
		Código: F-OBR-024
	EJECUCIÓN DE OBRA	Versión: 1
		Hoja No.: 1 de 1

No DE CONTRATO DE OBRA Y OBJETO	CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No 470 DE 2018 SUSCRITO ENTRE EL DISTRITO CAPITAL - UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL CUERPO DE BOMBEROS Y GYG INGENIEROS LTDA	CONSECUTIVO	90
LUGAR o ESPECIALIDAD DE LOS TRABAJOS	OBRA	FECHA	lunes 16 de septiembre de 2019

HORAS PERDIDAS	POR LLUVIA	POR PAROS		OTROS	TOTALES
Horas Hombre					0.0
Horas Equipo					0.0

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD FUNCIONAL	UND.	CANTIDAD			
				CONTRACTUAL	ACUMULADO ANTERIOR	AVANCE HOY	ACUMULADO ACTUAL
3,1	EXCAVACIONES VARIAS A MAQUINA SIN CLASIFICAR INCLUYE RETIRO.	N+3.30	M3	15547.63	2174.36	37.80	2212.16
4,1	CONCRETO DE LIMPIEZA EN CONCRETO DE 2500 PSI. E=0.04	N+3.30	M2	510.12	109.15	9.84	118.99
4,12	ACERO FIGURADO 60000 PSI	N-4.20	KG	60921.33	1151.65	575.74	1727.39

DESCRIPCION DE ACTIVIDADES EJECUTADAS

SE REALIZA EL COMITÉ DE OBRA # 3. LA CONTINUACIÓN DE LA ACTIVIDAD DE EXCAVACIÓN COSTADO ORIENTAL ZARPA MURO TIPO 11, TAMBIÉN CON LA ACTIVIDAD DE AMARRE DE ACERO ZONA TANQUES Y EL INICIO DE LA FUNDIDA DEL SOLADO DEL MURO TIPO 11.

MANO DE OBRA EMPLEADA

CARGO	HORA		CANT.	TIEMPO (Horas)
	INICIO	FIN		
Arq. Residente	7:00:00	16:30:00	1.00	8:30:00
Ing. Residente	7:00:00	16:30:00	1.00	8:30:00
Aux. Ingeniero civil	7:00:00	16:30:00	1.00	8:30:00
Ing.. Profesional SST	7:00:00	16:30:00	1.00	8:30:00
Trabajadores	7:00:00	16:30:00	19.00	161:30:00
Profesional de interventoría (Aux Ing, social y director,residente)	7:00:00	16:30:00	4.00	34:00:00
Profesionales en topografía GyG	7:00:00	16:30:00	2.00	17:00:00
Ing. Gestión de Calidad	7:00:00	16:30:00	1.00	8:30:00
Representantes legales GyG	7:00:00	16:30:00	1.00	8:30:00

EQUIPO UTILIZADO

DESCRIPCIÓN	CANT.	TIEMPO (Horas)
EXCAVADORA 304C	1	8.50
VIAJES VOLQUETA DE 15m3	3	8.50

MATERIALES UTILIZADOS

DESCRIPCION	UND.	CANT.
CEMENTO	BULTO	3
MIXTO	m3	0.64

ESTADO DEL TIEMPO

		HORAS
SECO	X	9.0
NEBLINA		
LLOVIZNA		
LLUVIA		
TORMENTA		

ACCESO


BUENO	X
REGULAR	
MALO	
NULO	

TERRENO

ROCOSO		DURO		NORMAL	X
ARENOSO		LODOSO		PANTANO	

CAUSA ATRASO/DIA - MEDIDA CORRECTIVA:

ESQUEMÁTICO DE OBRA

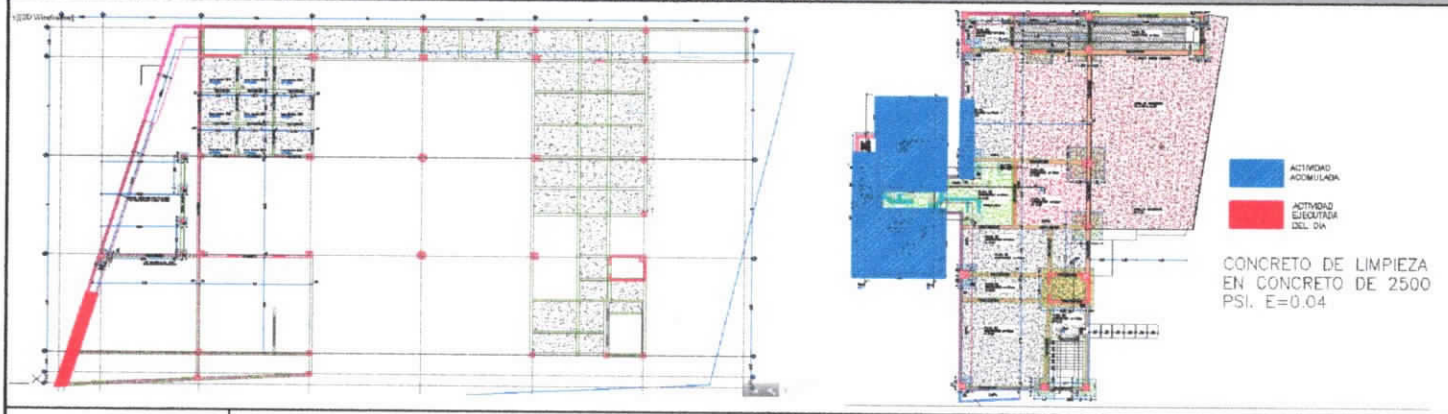

OBSERVACIONES:

	ELABORÓ	APROBÓ
FIRMA:		
NOMBRE:	ING. JAVIER ANDRES ESCOBAR PINTOR	ARQ. MARCELO SARMIENTO
CARGO:	AUXILIAR DE INGENIERIA CONTRATISTA	DIRECTOR DE OBRA CONTRATISTA
	VALIDÓ	APROBÓ
FIRMA:		
NOMBRE:	ING. CAMILO ROMERO	ARQ. JHON CUELLAR
CARGO:	RESIDENTE DE OBRA CONTRATISTA	RESIDENTE DE INTERVENTORIA

GyG Ingenieros Ltda.	INFORME DIARIO DE ACTIVIDADES	Fecha:01/06/2019
		Código: F-OBR-024
	EJECUCIÓN DE OBRA	Versión: 1
		Hoja No.: 1 de 1

No DE CONTRATO Y OBJETO	CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No 470 DE 2018 SUSCRITO ENTRE EL DISTRITO CAPITAL - UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL CUERPO DE BOMBEROS Y GYG INGENIEROS LTDA	CONSECUTIVO	90
LUGAR o ESPECIALIDAD DE LOS TRABAJOS	OBRA	FECHA	lunes 16 de septiembre de 2019

INFORME DIARIO No. 90

Página 2 de 2

REGISTRO FOTOGRÁFICO













ELABORO:

ING. JAVIER ESCOBAR PINTOR
AUXILIAR DE INGENIERIA - CONTRATISTA

APROBO:

ING CAMILO ROMERO
RESIDENTE DE OBRA CONTRATISTA

G&G Ingenieros Ltda.	INFORME DIARIO DE ACTIVIDADES	Fecha:01/06/2019
		Código: F-OBR-024
	EJECUCIÓN DE OBRA	Versión: 1
		Hoja No.: 1 de 1

No DE CONTRATO DE OBRA Y OBJETO	CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No 470 DE 2018 SUSCRITO ENTRE EL DISTRITO CAPITAL - UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL CUERPO DE BOMBEROS Y GYG INGENIEROS LTDA	CONSECUTIVO	91
LUGAR o ESPECIALIDAD DE LOS TRABAJOS	OBRA	FECHA	martes 17 de septiembre de 2019

HORAS PERDIDAS	POR LLUVIA	POR PAROS		OTROS	TOTALES
Horas Hombre					0.0
Horas Equipo					0.0

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD FUNCIONAL	UND.	CANTIDAD			
				CONTRACTUAL	ACUMULADO ANTERIOR	AVANCE HOY	ACUMULADO ACTUAL
3,1	EXCAVACIONES VARIAS A MAQUINA SIN CLASIFICAR INCLUYE RETIRO.	N+3.30	M3	15547.63	2212.16	12.60	2224.76
4,1	CONCRETO DE LIMPIEZA EN CONCRETO DE 2500 PSI. E=0.04	N+3.30	M2	510.12	118.99	10.07	129.06
4,12	ACERO FIGURADO 60000 PSI	N-4.20	KG	60921.33	1727.39	1463.40	3190.78

DESCRIPCION DE ACTIVIDADES EJECUTADAS

CONTINUA CON LA ACTIVIDAD DE AMARRE DE ACERO ZONA TANQUES Y LA FUNDIDA DEL SOLADO DEL MURO TIPO 11 SEGUNDO TRAMO, Y RETIRO DE MATERIAL EXCAVADO

MANO DE OBRA EMPLEADA

CARGO	HORA		CANT.	TIEMPO (Horas)
	INICIO	FIN		
Arq. Residente	7:00:00	16:30:00	1.00	8:30:00
Ing. Residente	7:00:00	16:30:00	1.00	8:30:00
Aux. Ingeniero civil	7:00:00	16:30:00	1.00	8:30:00
Ing.. Profesional SST	7:00:00	16:30:00	1.00	8:30:00
Trabajadores	7:00:00	16:30:00	19.00	161:30:00
Profesional de interventoria (Aux Ing.)	7:00:00	16:30:00	1.00	8:30:00
Profesionales en topografia GyG	7:00:00	12:00:00	2.00	10:00:00

EQUIPO UTILIZADO

DESCRIPCIÓN	CANT.	TIEMPO (Horas)
EXCAVADORA 304C	1	8.50
VIAJES VOLQUETA DE 15m3	1	8.50

MATERIALES UTILIZADOS

DESCRIPCIÓN	UND.	CANT.

ESTADO DEL TIEMPO

		HORAS
SECO	X	9.0
NEBLINA		
LLOVIZNA		
LLUVIA		
TORMENTA		

ACCESO


BUENO	X
REGULAR	
MALO	
NULO	

TERRENO

ROCOSO		DURO		NORMAL	X
ARENOSO		LODOSO		PANTANO	

CAUSA ATRASO/DIA - MEDIDA CORRECTIVA:

ESQUEMÁTICO DE OBRA

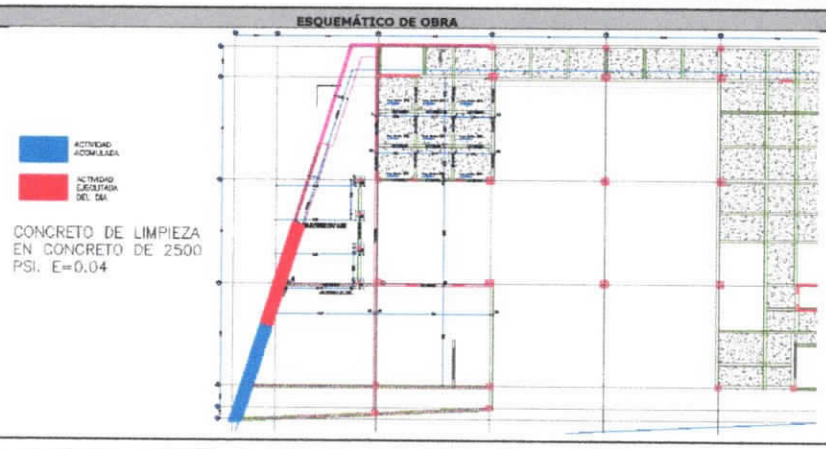

OBSERVACIONES:

	ELABORÓ	APROBÓ
FIRMA:		
NOMBRE:	ING. JAVIER ANDRES ESCOBAR PINTOR	ARQ. MARCELO SARMIENTO
CARGO:	AUXILIAR DE INGENIERIA CONTRATISTA	DIRECTOR DE OBRA CONTRATISTA
	VALIDÓ	APROBÓ
FIRMA:		
NOMBRE:	ING. CAMILO ROMERO	ARQ. JHON CUELLAR
CARGO:	RESIDENTE DE OBRA CONTRATISTA	RESIDENTE DE INTERVENTORIA

GyG Ingenieros Ltda.	INFORME DIARIO DE ACTIVIDADES	Fecha:01/06/2019
		Código: F-OBR-024
	EJECUCIÓN DE OBRA	Versión: 1
		Hoja No.: 1 de 1

No DE CONTRATO Y OBJETO	CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No 470 DE 2018 SUSCRITO ENTRE EL DISTRITO CAPITAL - UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL CUERPO DE BOMBEROS Y GYG INGENIEROS LTDA	CONSECUTIVO	91
LUGAR o ESPECIALIDAD DE LOS TRABAJOS	OBRA	FECHA	martes 17 de septiembre de 2019

INFORME DIARIO No. 91

Página 2 de 2

REGISTRO FOTOGRÁFICO













ELABORO:

ING. JAVIER ESCOBAR PINTOR
AUXILIAR DE INGENIERIA - CONTRATISTA

APROBO:

ING CAMILO ROMERO
RESIDENTE DE OBRA CONTRATISTA

GyG Ingenieros Ltda	INFORME DIARIO DE ACTIVIDADES	Fecha:01/06/2019
		Código: F-OBR-024
	EJECUCIÓN DE OBRA	Versión: 1
		Hoja No.: 1 de 1

No DE CONTRATO DE OBRA Y OBJETO	CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No 470 DE 2018 SUSCRITO ENTRE EL DISTRITO CAPITAL - UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL CUERPO DE BOMBEROS Y GYG INGENIEROS LTDA	CONSECUTIVO	92
LUGAR o ESPECIALIDAD DE LOS TRABAJOS	OBRA	FECHA	miércoles 18 de septiembre de 2019

HORAS PERDIDAS	POR LLUVIA	POR PAROS		OTROS	TOTALES
Horas Hombre					0.0
Horas Equipo					0.0

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD FUNCIONAL	UND.	CANTIDAD			
				CONTRACTUAL	ACUMULADO ANTERIOR	AVANCE HOY	ACUMULADO ACTUAL
4,6	SELLO CON CINTA PVC O-22 O SIMILAR	N-4.20	ML	117.96	0.00	62.62	62.62
4,12	ACERO FIGURADO 60000 PSI	N-4.20	KG	60921.33	3190.78	1606.09	4796.87

DESCRIPCION DE ACTIVIDADES EJECUTADAS

INICIO DE ARMADO DE FORMALETA, TAMBIÉN SE CONTINUA CON EL ARMADO DE ACERO HORIZONTAL DEL TANQUES DE ALMACENAMIENTO, DEMOLICIÓN DE DADOS EXISTENTES Y COLOCACIÓN DEL SELLO CON CINTA PVC.

MANO DE OBRA EMPLEADA

CARGO	HORA		CANT.	TIEMPO (Horas)
	INICIO	FIN		
Arq. Residente	7:00:00	16:30:00	1.00	8:30:00
Ing. Residente	7:00:00	16:30:00	1.00	8:30:00
Aux. Ingeniero civil	7:00:00	16:30:00	1.00	8:30:00
Ing.. Profesional SST	7:00:00	16:30:00	1.00	8:30:00
Trabajadores	7:00:00	16:30:00	19.00	161:30:00
Profesional de interventoría (Aux Ing.)	7:00:00	16:30:00	1.00	8:30:00
Profesionales en topografía GyG	7:00:00	12:00:00	2.00	10:00:00

EQUIPO UTILIZADO

DESCRIPCIÓN	CANT.	TIEMPO (Horas)
EXCAVADORA 304C	1	8.50

MATERIALES UTILIZADOS

DESCRIPCIÓN	UND.	CANT.

ESTADO DEL TIEMPO

		HORAS
SECO	X	9.0
NEBLINA		
LLOVIZNA		
LLUVIA		
TORMENTA		

ACCESO


BUENO	X
REGULAR	
MALO	
NULO	


TERRENO

ROCOSO		DURO		NORMAL	X
ARENOSO		LODOSO		PANTANO	

CAUSA ATRASO/DIA - MEDIDA CORRECTIVA:

ESQUEMÁTICO DE OBRA

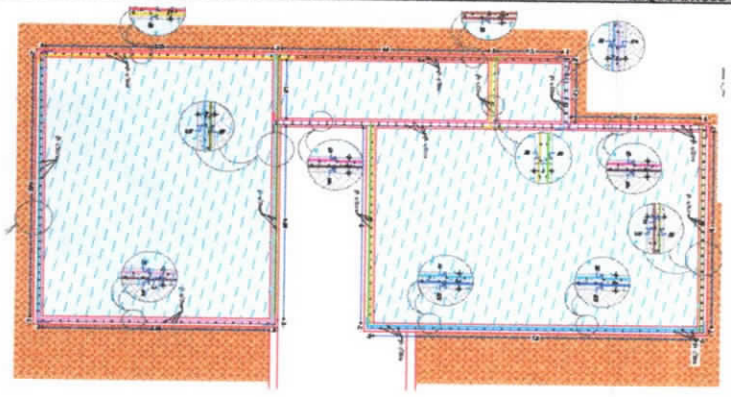



OBSERVACIONES:

	ELABORÓ	APROBÓ
FIRMA:		
NOMBRE:	ING. JAVIER ANDRES ESCOBAR PINTOR	ARQ. MARCELO SARMIENTO
CARGO:	AUXILIAR DE INGENIERIA CONTRATISTA	DIRECTOR DE OBRA CONTRATISTA
	VALIDO	APROBO
FIRMA:		
NOMBRE:	ING. CAMILO ROMERO	ARQ. JHON CUELLAR
CARGO:	RESIDENTE DE OBRA CONTRATISTA	RESIDENTE DE INTERVENTORIA

GyG Ingenieros Ltda.	INFORME DIARIO DE ACTIVIDADES	Fecha:01/06/2019
		Código: F-OBR-024
	EJECUCIÓN DE OBRA	Versión: 1
		Hoja No.: 1 de 1

No DE CONTRATO Y OBJETO	CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No 470 DE 2018 SUSCRITO ENTRE EL DISTRITO CAPITAL - UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL CUERPO DE BOMBEROS Y GYG INGENIEROS LTDA	CONSECUTIVO	92
LUGAR o ESPECIALIDAD DE LOS TRABAJOS	OBRA	FECHA	miércoles 18 de septiembre de 2019

INFORME DIARIO No. 92

REGISTRO FOTOGRÁFICO











ELABORO:

ING. JAVIER ESCOBAR PINTOR
AUXILIAR DE INGENIERIA - CONTRATISTA

APROBO:

ING CAMILO ROMERO
RESIDENTE DE OBRA CONTRATISTA

GyG Ingenieros Ltda.	INFORME DIARIO DE ACTIVIDADES	Fecha:01/06/2019
		Código: F-OBR-024
	EJECUCIÓN DE OBRA	Versión: 1
		Hoja No.: 1 de 1

No DE CONTRATO DE OBRA Y OBJETO	CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No 470 DE 2018 SUSCRITO ENTRE EL DISTRITO CAPITAL - UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL CUERPO DE BOMBEROS Y GYG INGENIEROS LTDA	CONSECUTIVO	93
LUGAR o ESPECIALIDAD DE LOS TRABAJOS	OBRA	FECHA	Jueves 19 de septiembre de 2019

HORAS PERDIDAS	POR LLUVIA	POR PAROS		OTROS	TOTALES
Horas Hombre	2				2.0
Horas Equipo	2				2.0

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD FUNCIONAL	UND.	CANTIDAD			
				CONTRACTUAL	ACUMULADO ANTERIOR	AVANCE HOY	ACUMULADO ACTUAL
4,5	CONCRETO IMPERMEABILIZADO DE 4000 PSI PARA TANQUE SUBTERRANEO E= 0,20 M. NO INCLUYE	-	M3	85.33	0.00	27.00	27.00

DESCRIPCION DE ACTIVIDADES EJECUTADAS

ARMADO FINAL DE FORMALETA PARCIAL PARA LA PRIMERA FUNDIDA DE LOS TANQUES DE ALMACENAMIENTO Y FUNDIDA DE CONCRETO IMPEMEABILIZADO DE RESISTENCIA DE 4000 PSI

MANO DE OBRA EMPLEADA

CARGO	HORA		CANT.	TIEMPO (Horas)
	INICIO	FIN		
Arq. Residente	7:00:00	16:30:00	1.00	8:30:00
Ing. Residente	7:00:00	16:30:00	1.00	8:30:00
Aux. Ingeniero civil	7:00:00	16:30:00	1.00	8:30:00
Ing.. Profesional SST	7:00:00	16:30:00	1.00	8:30:00
Trabajadores	7:00:00	16:30:00	19.00	161:30:00
Profesional de interventoría (Aux Ing.)	7:00:00	16:30:00	1.00	8:30:00
Profesionales en topografía GyG	7:00:00	12:00:00	2.00	10:00:00

EQUIPO UTILIZADO

DESCRIPCIÓN	CANT.	TIEMPO (Horas)
EXCAVADORA 304C	1	8.50

MATERIALES UTILIZADOS

DESCRIPCIÓN	UND.	CANT.

ESTADO DEL TIEMPO

		HORAS
SECO	X	7.0
NEBLINA		
LLOVIZNA		
LLUVIA	X	2
TORMENTA		

ACCESO

BUENO	X
REGULAR	
MALO	
NULO	


TERRENO

ROCOSO		DURO		NORMAL	X
ARENOSO		LODOSO		PANTANO	

CAUSA ATRASO/DIA - MEDIDA CORRECTIVA:

LLUVIA DE 12:00 PM A 3:00 PM

ESQUEMÁTICO DE OBRA

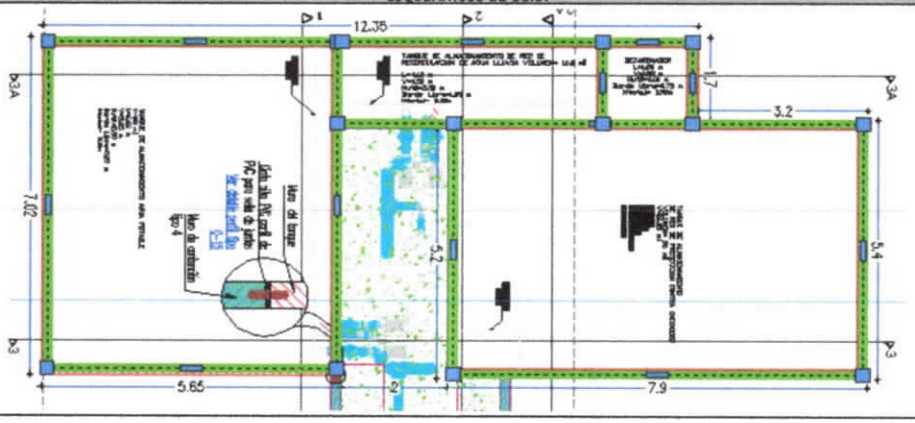

OBSERVACIONES:

	ELABORO	APROBO
FIRMA:		
NOMBRE:	ING. JAVIER ANDRES ESCOBAR PINTOR	ARQ. MARCELO SARMIENTO
CARGO:	AUXILIAR DE INGENIERIA CONTRATISTA	DIRECTOR DE OBRA CONTRATISTA
	VALIDO	APROBO
FIRMA:		
NOMBRE:	ING. CAMILO ROMERO	ARQ. JHON CUELLAR
CARGO:	RESIDENTE DE OBRA CONTRATISTA	RESIDENTE DE INTERVENTORIA

GyG Ingenieros Ltda.	INFORME DIARIO DE ACTIVIDADES	Fecha:01/06/2019
		Código: F-OBR-024
	EJECUCIÓN DE OBRA	Versión: 1
		Hoja No.: 1 de 1

No DE CONTRATO Y OBJETO	CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No 470 DE 2018 SUSCRITO ENTRE EL DISTRITO CAPITAL - UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL CUERPO DE BOMBEROS Y GYG INGENIEROS LTDA	CONSECUTIVO	93
LUGAR o ESPECIALIDAD DE LOS TRABAJOS	OBRA	FECHA	jueves 19 de septiembre de 2019

INFORME DIARIO No. 93

REGISTRO FOTOGRÁFICO













ELABORO:

ING. JAVIER ESCOBAR PINTOR
AUXILIAR DE INGENIERIA - CONTRATISTA

APROBO:

ING CAMILO ROMERO
RESIDENTE DE OBRA CONTRATISTA

GyG Ingenieros Ltda.	INFORME DIARIO DE ACTIVIDADES	Fecha:01/06/2019
		Código: F-OBR-024
	EJECUCIÓN DE OBRA	Versión: 1
		Hoja No.: 1 de 1

No DE CONTRATO DE OBRA Y OBJETO	CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No 470 DE 2018 SUSCRITO ENTRE EL DISTRITO CAPITAL - UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL CUERPO DE BOMBEROS Y GYG INGENIEROS LTDA	CONSECUTIVO	94
LUGAR o ESPECIALIDAD DE LOS TRABAJOS	OBRA	FECHA	viernes 20 de septiembre de 2019

HORAS PERDIDAS	POR LLUVIA	POR PAROS		OTROS	TOTALES
Horas Hombre	2				2.0
Horas Equipo	2				2.0

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD FUNCIONAL	UND.	CANTIDAD			
				CONTRACTUAL	ACUMULADO ANTERIOR	AVANCE HOY	ACUMULADO ACTUAL
4,12	ACERO FIGURADO 60000 PSI	N-3.30	KG	60921.33	4796.87	450.00	5246.87

DESCRIPCION DE ACTIVIDADES EJECUTADAS

CONTINUA EL ARMADO DE ACERO EN LOS MUROS DE LOS TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUAS Y DESENCOFRE DEL TANQUE PARCIAL FUNDIDO.

MANO DE OBRA EMPLEADA

CARGO	HORA		CANT.	TIEMPO (Horas)
	INICIO	FIN		
Arq. Residente	7:00:00	17:00:00	1.00	9:00:00
Ing. Residente	7:00:00	17:00:00	1.00	9:00:00
Aux. Ingeniero civil	7:00:00	17:00:00	1.00	9:00:00
Ing.. Profesional SST	7:00:00	17:00:00	1.00	9:00:00
Trabajadores	7:00:00	17:00:00	19.00	171:00:00
Profesional de interventoría (Aux Ing.)	7:00:00	17:00:00	1.00	9:00:00
Profesionales en topografía GyG	7:00:00	12:00:00	2.00	10:00:00
Director de obra GyG	17:00:00	18:00:00	1.00	1:00:00

EQUIPO UTILIZADO

DESCRIPCIÓN	CANT.	TIEMPO (Horas)
EXCAVADORA 304C	1	8.50

MATERIALES UTILIZADOS

DESCRIPCIÓN	UND.	CANT.

ESTADO DEL TIEMPO

		HORAS
SECO	X	7.0
NEBLINA		
LLOVIZNA		
LLUVIA	X	2
TORMENTA		

ACCESO

BUENO	X
REGULAR	
MALO	
NULO	


TERRENO

ROCOSO		DURO		NORMAL	X
ARENOSO		LODOSO		PANTANO	

CAUSA ATRASO/DIA - MEDIDA CORRECTIVA:

LLUVIA DE 2:00PM A 4:00PM

ESQUEMÁTICO DE OBRA

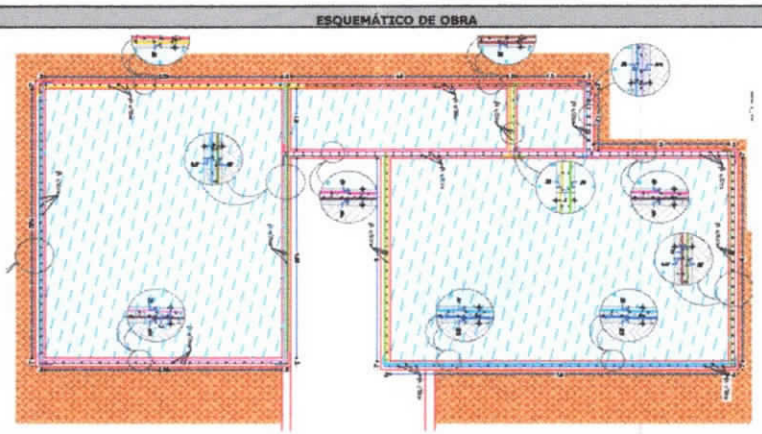

OBSERVACIONES:

	ELABORO	APROBO
FIRMA:		
NOMBRE:	ING. JAVIER ANDRES ESCOBAR PINZON	ARQ. MARCELO SARMIENTO
CARGO:	AUXILIAR DE INGENIERIA CONTRATISTA	DIRECTOR DE OBRA CONTRATISTA
	VALIDO	APROBO
FIRMA:		
NOMBRE:	ING. CAMILO ROMERO	ARQ. JHON CUELLAR
CARGO:	RESIDENTE DE OBRA CONTRATISTA	RESIDENTE DE INTERVENTORIA

G&G Ingenieros Ltda.	INFORME DIARIO DE ACTIVIDADES	Fecha:01/06/2019
		Código: F-OBR-024
	EJECUCIÓN DE OBRA	Versión: 1
		Hoja No.: 1 de 1

No DE CONTRATO Y OBJETO	CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No 470 DE 2018 SUSCRITO ENTRE EL DISTRITO CAPITAL - UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL CUERPO DE BOMBEROS Y GYG INGENIEROS LTDA	CONSECUTIVO	94
LUGAR o ESPECIALIDAD DE LOS TRABAJOS	OBRA	FECHA	viernes 20 de septiembre de 2019

INFORME DIARIO No. 94

REGISTRO FOTOGRÁFICO











ELABORO:

ING. JAVIER ESCOBAR PINTOR
AUXILIAR DE INGENIERIA - CONTRATISTA

APROBO:

ING CAMILO ROMERO
RESIDENTE DE OBRA CONTRATISTA

GyG Ingenieros Ltda	INFORME DIARIO DE ACTIVIDADES	Fecha:01/06/2019
		Código: F-OBR-024
	EJECUCIÓN DE OBRA	Versión: 1
		Hoja No.: 1 de 1

No DE CONTRATO DE OBRA Y OBJETO	CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No 470 DE 2018 SUSCRITO ENTRE EL DISTRITO CAPITAL - UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL CUERPO DE BOMBEROS Y GYG INGENIEROS LTDA	CONSECUTIVO	95
LUGAR o ESPECIALIDAD DE LOS TRABAJOS	OBRA	FECHA	sábado 21 de septiembre de 2019

HORAS PERDIDAS	POR LLUVIA	POR PAROS		OTROS	TOTALES
Horas Hombre	1				1.0
Horas Equipo	1				1.0

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD FUNCIONAL	UND.	CANTIDAD			
				CONTRACTUAL	ACUMULADO ANTERIOR	AVANCE HOY	ACUMULADO ACTUAL
4,12	ACERO FIGURADO 60000 PSI	N-4.20	KG	60921.33	5246.87	547.18	5794.06

DESCRIPCION DE ACTIVIDADES EJECUTADAS

CONTINUA EL ARMADO DE ACERO EN LOS MUROS DE LOS TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUAS, SE COLCAN NIVELES DE LOS ASENTAMIENTOS DE LOS PREDIOS EXISTENTES Y LIMPIEZA DE CARCAMO .

MANO DE OBRA EMPLEADA

CARGO	HORA		CANT.	TIEMPO (Horas)
	INICIO	FIN		
Arq. Residente	7:00:00	12:00:00	1.00	5:00:00
Ing. Residente	7:00:00	12:00:00	1.00	5:00:00
Aux. Ingeniero civil	7:00:00	12:00:00	1.00	5:00:00
Ing.. Profesional SST	7:00:00	12:00:00	1.00	5:00:00
Trabajadores	7:00:00	12:00:00	19.00	95:00:00
Profesional de interventoría (Aux Ing.)	7:00:00	12:00:00	1.00	5:00:00
Profesionales en topografía GyG	7:00:00	12:00:00	2.00	10:00:00
Ing. Ambiental	7:00:00	12:00:00	1.00	5:00:00

EQUIPO UTILIZADO

DESCRIPCIÓN	CANT.	TIEMPO (Horas)
EXCAVADORA 304C	1	8.50

MATERIALES UTILIZADOS

DESCRIPCIÓN	UND.	CANT.

ESTADO DEL TIEMPO

		HORAS
SECO	X	4.0
NEBLINA		
LLOVIZNA		
LLUVIA	X	1
TORMENTA		

ACCESO

BUENO	X
REGULAR	
MALO	
NULO	


TERRENO

ROCOSO		DURO		NORMAL	X
ARENOSO		LODOSO		PANTANO	

CAUSA ATRASO/DIA - MEDIDA CORRECTIVA:

LLUVIA 7:00 AM A 8:00 AM

ESQUEMÁTICO DE OBRA

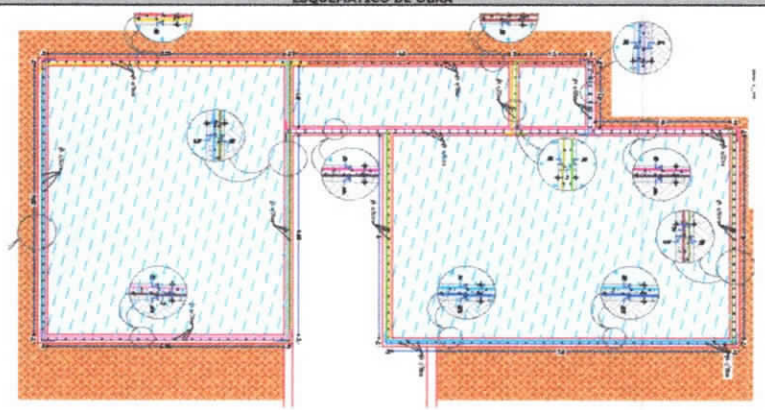

OBSERVACIONES:

	ELABORÓ	APROBÓ
FIRMA:		
NOMBRE:	ING. JAVIER ANDRES ESCOBAR PINTOR	ARQ. MARCELO SARMIENTO
CARGO:	AUXILIAR DE INGENIERÍA CONTRATISTA	DIRECTOR DE OBRA CONTRATISTA
	VALIDÓ	APROBÓ
FIRMA:		
NOMBRE:	ING. CAMILO ROMERO	
CARGO:	RESIDENTE DE OBRA CONTRATISTA	RESIDENTE DE INTERVENTORIA

G&G Ingenieros Ltda.	INFORME DIARIO DE ACTIVIDADES	Fecha:01/06/2019
		Código: F-OBR-024
	EJECUCIÓN DE OBRA	Versión: 1
		Hoja No.: 1 de 1

No DE CONTRATO Y OBJETO	CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No 470 DE 2018 SUSCRITO ENTRE EL DISTRITO CAPITAL - UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL CUERPO DE BOMBEROS Y GYG INGENIEROS LTDA	CONSECUTIVO	95
LUGAR o ESPECIALIDAD DE LOS TRABAJOS	OBRA	FECHA	sábado 21 de septiembre de 2019

INFORME DIARIO No. 95

REGISTRO FOTOGRÁFICO













ELABORO:

ING. JAVIER ESCOBAR PINTOR
AUXILIAR DE INGENIERIA - CONTRATISTA

APROBO:

ING CAMILO ROMERO
RESIDENTE DE OBRA CONTRATISTA

G&G Ingenieros Ltda	INFORME DIARIO DE ACTIVIDADES	Fecha:01/08/2019
		Código: F-OBR-024
	EJECUCIÓN DE OBRA	Versión: 1
		Hoja No.: 1 de 1

	CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No 470 DE 2018 SUSCRITO ENTRE EL DISTRITO CAPITAL - UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL CUERPO DE BOMBEROS Y GYG INGENIEROS LTDA		96
	OBRA		domingo 22 de septiembre de 2019

Horas Hombre						0.0
Horas Equipo						0.0

-	DOMINGO NO LABORADO						

DESCRIPCION DE ACTIVIDADES EJECUTADAS

DOMINGO NO LABORADO

				0:00:00			
				0:00:00			
				0:00:00			
				0:00:00			
				0:00:00			
				0:00:00			
				0:00:00			
				0:00:00			
				0:00:00			

				SECO	X		BUENO X
				NEBLINA			REGULAR
				LLOVIZNA			MALO
				LLUVIA			NULO
				TORMENTA			
				ROCOSO		DURO	NORMAL X
				ARENOSO		LODOSO	PANTANO

OBSERVACIONES:

	ELABORÓ		APROBÓ
FIRMA:		FIRMA:	
NOMBRE:	ING. JAVIER ANDRES ESCOBAR PINTOR	NOMBRE:	ARQ. MARCELO SARMIENTO
CARGO:	AUXILIAR DE INGENIERIA CONTRATISTA	CARGO:	DIRECTOR DE OBRA CONTRATISTA
	VALIDO		APROBÓ
FIRMA:		FIRMA:	
NOMBRE:	ING. CAMILO ROMERO	NOMBRE:	
CARGO:	RESIDENTE DE OBRA CONTRATISTA	CARGO:	RESIDENTE DE INTERVENTORIA

G&G Ingenieros Ltda	INFORME DIARIO DE ACTIVIDADES	Fecha:01/06/2019
		Código: F-OBR-024
	EJECUCIÓN DE OBRA	Versión: 1
		Hoja No.: 1 de 1

No DE CONTRATO DE OBRA Y OBJETO	CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No 470 DE 2018 SUSCRITO ENTRE EL DISTRITO CAPITAL - UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL CUERPO DE BOMBEROS Y GYG INGENIEROS LTDA	CONSECUTIVO	97
LUGAR o ESPECIALIDAD DE LOS TRABAJOS	OBRA	FECHA	lunes 23 de septiembre de 2019

HORAS PERDIDAS	POR LLUVIA	POR PAROS		OTROS	TOTALES
Horas Hombre					0.0
Horas Equipo					0.0

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD FUNCIONAL	UND.	CANTIDAD			
				CONTRACTUAL	ACUMULADO ANTERIOR	AVANCE HOY	ACUMULADO ACTUAL
4,12	ACERO FIGURADO 60000 PSI	N-4.20	KG	60921.33	5794.06	615.62	6409.68

DESCRIPCION DE ACTIVIDADES EJECUTADAS

CONTINUA EL ARMADO DE ACERO HORIZONTAL DEL LOS TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUAS, INICIO DE COLOCACIÓN DE FORMALETA EM LOS MUROS DEL TANQUE Y DESCARGA DE ACERO FIGURADO.

MANO DE OBRA EMPLEADA

CARGO	HORA		CANT.	TIEMPO (Horas)
	INICIO	FIN		
Arq. Residente	7:00:00	16:30:00	1.00	8:30:00
Ing. Residente	7:00:00	16:30:00	1.00	8:30:00
Aux. Ingeniero civil	7:00:00	16:30:00	1.00	8:30:00
Ing. Profesional SST	7:00:00	16:30:00	1.00	8:30:00
Trabajadores	7:00:00	16:30:00	19.00	161:30:00
Profesional de interventoría (Aux Ing, social)	7:00:00	16:30:00	3.00	25:30:00
Profesionales en topografía GyG	7:00:00	16:30:00	2.00	17:00:00
Representantes legales GyG, Profesional de calidad	7:00:00	12:00:00	2.00	10:00:00
Director de obra GyG	7:00:00	13:00:00	1.00	6:00:00

EQUIPO UTILIZADO

DESCRIPCIÓN	CANT.	TIEMPO (Horas)
EXCAVADORA 304C	1	8.50

MATERIALES UTILIZADOS

DESCRIPCIÓN	UND.	CANT.

ESTADO DEL TIEMPO

		HORAS
SECO	X	9.0
NEBLINA		
LLOVIZNA		
LLUVIA		
TORMENTA		

ACCESO


BUENO	X
REGULAR	
MALO	
NULO	

TERRENO

ROCOSO		DURO		NORMAL	X
ARENOSO		LODOSO		PANTANO	

CAUSA ATRASO/DIA - MEDIDA CORRECTIVA:

ESQUEMÁTICO DE OBRA

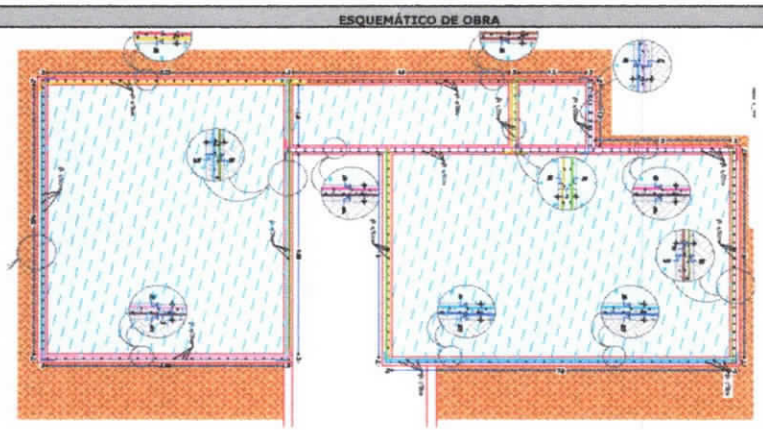

OBSERVACIONES:

	ELABORO	APROBO
FIRMA:		
NOMBRE:	ING. JAVIER ANDRES ESCOBAR PINTOR	ARQ. MARCELO SARMIENTO
CARGO:	AUXILIAR DE INGENIERÍA CONTRATISTA	DIRECTOR DE OBRA CONTRATISTA
	VALIDO	APROBO
FIRMA:		
NOMBRE:	ING. CAMILO ROMERO	
CARGO:	RESIDENTE DE OBRA CONTRATISTA	RESIDENTE DE INTERVENTORIA

G&G Ingenieros Ltda.	INFORME DIARIO DE ACTIVIDADES	Fecha:01/06/2019
		Código: F-OBR-024
	EJECUCIÓN DE OBRA	Versión: 1
		Hoja No.: 1 de 1

No DE CONTRATO Y OBJETO	CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No 470 DE 2018 SUSCRITO ENTRE EL DISTRITO CAPITAL - UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL CUERPO DE BOMBEROS Y GYG INGENIEROS LTDA	CONSECUTIVO	97
LUGAR o ESPECIALIDAD DE LOS TRABAJOS	OBRA	FECHA	lunes 23 de septiembre de 2019

INFORME DIARIO No. 97

REGISTRO FOTOGRÁFICO













ELABORO:

ING. JAVIER ESCOBAR PINTOR
AUXILIAR DE INGENIERIA - CONTRATISTA

APROBO:

ING CAMILO ROMERO
RESIDENTE DE OBRA CONTRATISTA

GyG Ingenieros Ltda.	INFORME DIARIO DE ACTIVIDADES	Fecha:01/06/2019
		Código: F-OBR-024
	EJECUCIÓN DE OBRA	Versión: 1
		Hoja No.: 1 de 1

No DE CONTRATO DE OBRA Y OBJETO	CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No 470 DE 2018 SUSCRITO ENTRE EL DISTRITO CAPITAL - UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL CUERPO DE BOMBEROS Y GYG INGENIEROS LTDA	CONSECUTIVO	98
LUGAR o ESPECIALIDAD DE LOS TRABAJOS	OBRA	FECHA	martes 24 de septiembre de 2019

HORAS PERDIDAS	POR LLUVIA	POR PAROS		OTROS	TOTALES
Horas Hombre					0.0
Horas Equipo					0.0

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD FUNCIONAL	UND.	CANTIDAD			
				CONTRACTUAL	ACUMULADO ANTERIOR	AVANCE HOY	ACUMULADO ACTUAL
4,12	ACERO FIGURADO 60000 PSI	N-4.20	KG	60921.33	6409.68	535.98	6945.66

DESCRIPCION DE ACTIVIDADES EJECUTADAS

CONTINUA EL ARMADO DE ACERO HORIZONTAL DEL LOS TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUAS, COLOCACIÓN DE FORMALETA EN LOS MUROS DEL TANQUE, DESCARGA DE ACERO FIGURADO E INICIO APUNTALAMIENTO EN EL LINDERO EN PREDIOS VECINOS COSTADO SUR.

MANO DE OBRA EMPLEADA

CARGO	HORA		CANT.	TIEMPO (Horas)
	INICIO	FIN		
Arq. Residente	7:00:00	16:30:00	1.00	8:30:00
Ing. Residente	7:00:00	16:30:00	1.00	8:30:00
Aux. Ingeniero civil	7:00:00	16:30:00	1.00	8:30:00
Ing.. Profesional SST	7:00:00	16:30:00	1.00	8:30:00
Trabajadores	7:00:00	16:30:00	19.00	161:30:00
Profesional de interventoría (Aux Ing.)	7:00:00	16:30:00	1.00	8:30:00
Profesionales en topografia GyG	7:00:00	12:00:00	2.00	10:00:00

EQUIPO UTILIZADO

DESCRIPCIÓN	CANT.	TIEMPO (Horas)
EXCAVADORA 304C	1	8.50

MATERIALES UTILIZADOS

DESCRIPCIÓN	UND.	CANT.

ESTADO DEL TIEMPO

		HORAS
SECO	X	9.0
NEBLINA		
LLOVIZNA		
LLUVIA		
TORMENTA		

ACCESO


BUENO	X
REGULAR	
MALO	
NULO	

TERRENO

ROCOSO		DURO		NORMAL	X
ARENOSO		LODOSO		PANTANO	

CAUSA ATRASO/DIA - MEDIDA CORRECTIVA:

ESQUEMÁTICO DE OBRA

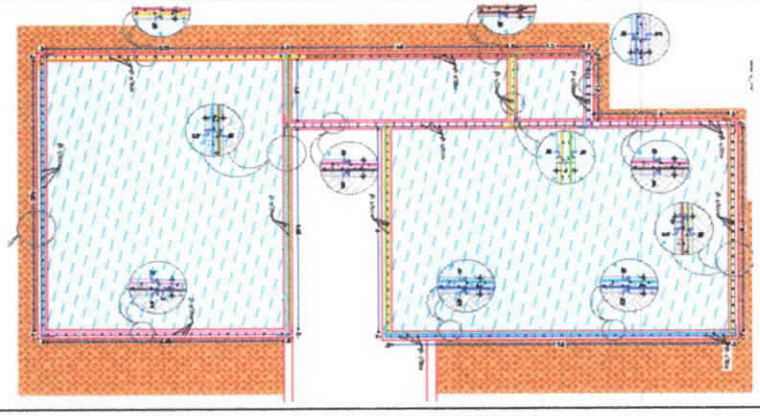

OBSERVACIONES:

	ELABORÓ	APROBÓ
FIRMA:		
NOMBRE:	ING. JAVIER ANDRES ESCOBAR PINTOR	ARQ. MARCELO SARMIENTO
CARGO:	AUXILIAR DE INGENIERIA CONTRATISTA	DIRECTOR DE OBRA CONTRATISTA
	VALIDO	APROBO
FIRMA:		
NOMBRE:	ING. CAMILO ROMERO	ARQ. JHON CUELLAR
CARGO:	RESIDENTE DE OBRA CONTRATISTA	RESIDENTE DE INTERVENTORIA

G&G Ingenieros Ltda.	INFORME DIARIO DE ACTIVIDADES	Fecha:01/06/2019
		Código: F-OBR-024
	EJECUCIÓN DE OBRA	Versión: 1
		Hoja No.: 1 de 1

No DE CONTRATO Y OBJETO	CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No 470 DE 2018 SUSCRITO ENTRE EL DISTRITO CAPITAL - UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL CUERPO DE BOMBEROS Y GYG INGENIEROS LTDA	CONSECUTIVO	98
LUGAR o ESPECIALIDAD DE LOS TRABAJOS	OBRA	FECHA	martes 24 de septiembre de 2019

INFORME DIARIO No. 98

REGISTRO FOTOGRÁFICO











ELABORO:

ING. JAVIER ESCOBAR PINTOR
AUXILIAR DE INGENIERIA - CONTRATISTA

APROBO:

ING CAMILO ROMERO
RESIDENTE DE OBRA CONTRATISTA

GyG Ingenieros Ltda.	INFORME DIARIO DE ACTIVIDADES	Fecha:01/06/2019
		Código: F-OBR-024
	EJECUCIÓN DE OBRA	Versión: 1
		Hoja No.: 1 de 1

No DE CONTRATO DE OBRA Y OBJETO	CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No 470 DE 2018 SUSCRITO ENTRE EL DISTRITO CAPITAL - UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL CUERPO DE BOMBEROS Y GYG INGENIEROS LTDA	CONSECUTIVO	99
LUGAR o ESPECIALIDAD DE LOS TRABAJOS	OBRA	FECHA	miércoles 25 de septiembre de 2019

HORAS PERDIDAS	POR LLUVIA	POR PAROS		OTROS	TOTALES
Horas Hombre					0.0
Horas Equipo					0.0

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD FUNCIONAL	UND.	CANTIDAD			
				CONTRACTUAL	ACUMULADO ANTERIOR	AVANCE HOY	ACUMULADO ACTUAL
4,12	ACERO FIGURADO 60000 PSI	N-4.20	KG	60921.33	6945.66	103.23	7048.89

DESCRIPCION DE ACTIVIDADES EJECUTADAS

CONTINUA EL ARMADO DE ACERO DEL DESARENADOR DEL LOS TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUAS, COLOCACIÓN DE FORMALETA EM LOS MUROS DEL TANQUE, INICIO EXCAVACIÓN POR TRINCHERAS CON MEJORAMIENTO CON PAÑETE DE 3 CM Y MALLA DE 4 MM

MANO DE OBRA EMPLEADA

CARGO	HORA		CANT.	TIEMPO (Horas)
	INICIO	FIN		
Arq. Residente	7:00:00	16:30:00	1.00	8:30:00
Ing. Residente	7:00:00	16:30:00	1.00	8:30:00
Aux. Ingeniero civil	7:00:00	16:30:00	1.00	8:30:00
Ing.. Profesional SST	7:00:00	16:30:00	1.00	8:30:00
Trabajadores	7:00:00	16:30:00	19.00	161:30:00
Profesional de interventoría (Aux Ing.)	7:00:00	16:30:00	1.00	8:30:00

EQUIPO UTILIZADO

DESCRIPCIÓN	CANT.	TIEMPO (Horas)
EXCAVADORA 304C	1	8.50

MATERIALES UTILIZADOS

DESCRIPCIÓN	UND.	CANT.

ESTADO DEL TIEMPO

		HORAS
SECO	X	9.0
NEBLINA		
LLOVIZNA		
LLUVIA		
TORMENTA		

TERRENO


ROCOSO		DURO		NORMAL	X
ARENOSO		LODOSO		PANTANO	

ACCESO

BUENO	X
REGULAR	
MALO	
NULO	

CAUSA ATRASO/DIA - MEDIDA CORRECTIVA:

ESQUEMÁTICO DE OBRA

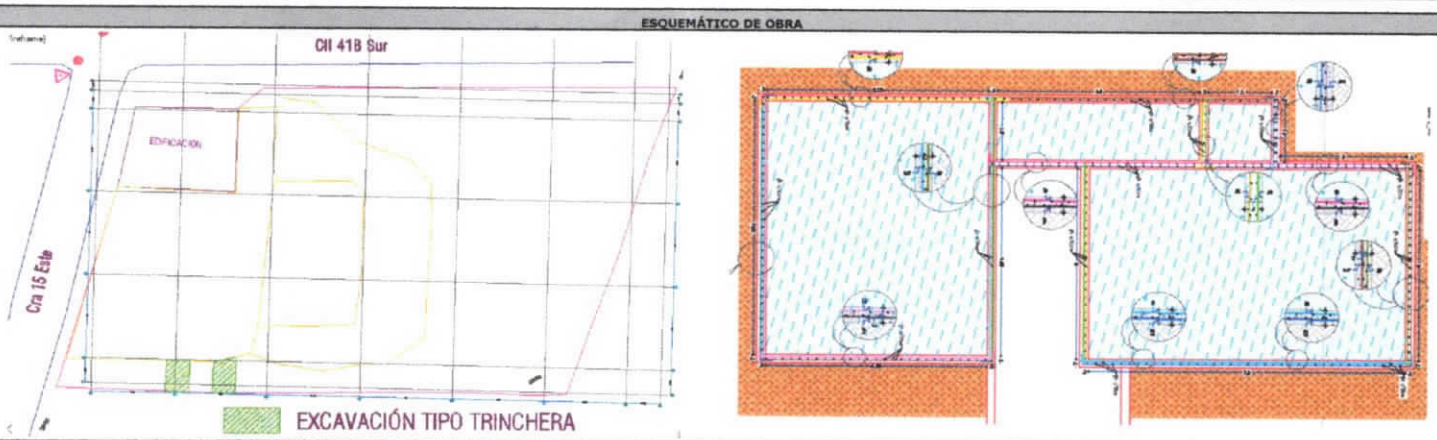

OBSERVACIONES:

	ELABORÓ	APROBÓ
FIRMA:		
NOMBRE:	ING. JAVIER ANDRES ESCOBAR PINTOR	ARQ. MARCELO SARMIENTO
CARGO:	AUXILIAR DE INGENIERIA CONTRATISTA	DIRECTOR DE OBRA CONTRATISTA
	VALIDÓ	APROBÓ
FIRMA:		
NOMBRE:	ING. CAMILO ROMERO	ARQ. JHON CUELLAR
CARGO:	RESIDENTE DE OBRA CONTRATISTA	RESIDENTE DE INTERVENTORIA

G&G Ingenieros Ltda.	INFORME DIARIO DE ACTIVIDADES	Fecha:01/06/2019
		Código: F-OBR-024
	EJECUCIÓN DE OBRA	Versión: 1
		Hoja No.: 1 de 1

No DE CONTRATO Y OBJETO	CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No 470 DE 2018 SUSCRITO ENTRE EL DISTRITO CAPITAL - UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL CUERPO DE BOMBEROS Y GYG INGENIEROS LTDA	CONSECUTIVO	99
LUGAR o ESPECIALIDAD DE LOS TRABAJOS	OBRA	FECHA	miércoles 25 de septiembre de 2019

INFORME DIARIO No. 99

Página 2 de 2

REGISTRO FOTOGRÁFICO











ELABORO:

ING. JAVIER ESCOBAR PINTOR
AUXILIAR DE INGENIERIA - CONTRATISTA

APROBO:

ING CAMILO ROMERO
RESIDENTE DE OBRA CONTRATISTA

GyG Ingenieros Ltda	INFORME DIARIO DE ACTIVIDADES	Fecha:01/06/2019
		Código: F-OBR-024
	EJECUCIÓN DE OBRA	Versión: 1
		Hoja No.: 1 de 1

No DE CONTRATO DE OBRA Y OBJETO	CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No 470 DE 2018 SUSCRITO ENTRE EL DISTRITO CAPITAL - UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL CUERPO DE BOMBEROS Y GYG INGENIEROS LTDA	CONSECUTIVO	100
LUGAR o ESPECIALIDAD DE LOS TRABAJOS	OBRA	FECHA	jueves 26 de septiembre de 2019

HORAS PERDIDAS	POR LLUVIA	POR PAROS		OTROS	TOTALES
Horas Hombre					0.0
Horas Equipo					0.0

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD FUNCIONAL	UND.	CANTIDAD			
				CONTRACTUAL	ACUMULADO ANTERIOR	AVANCE HOY	ACUMULADO ACTUAL
4,12	ACERO FIGURADO 60000 PSI	N-4.20	KG	60921.33	7048.89	100.00	7148.89

DESCRIPCION DE ACTIVIDADES EJECUTADAS

COMITÉ DE OBRA # 4, COLOCACIÓN DE FORMALETA EN LOS MUROS DEL TANQUE, FINALIZACIÓN DE ARMADO DE ACERO DEL DESARENADOR DEL TANQUE AGUAS LLUVIAS, EXCAVACIÓN POR TRINCHERAS CON MEJORAMIENTO CON PAÑETE DE 3 CM Y MALLA DE 4 MM Y ADECUACIÓN ZONA PARA RESIDUOS PELIGROSOS

MANO DE OBRA EMPLEADA

CARGO	HORA		CANT.	TIEMPO (Horas)
	INICIO	FIN		
Arq. Residente	7:00:00	16:30:00	1.00	8:30:00
Ing. Residente	7:00:00	16:30:00	1.00	8:30:00
Aux. Ingeniero civil	7:00:00	16:30:00	1.00	8:30:00
Ing.. Profesional SST e Ing. Ambiental	7:00:00	16:30:00	2.00	17:00:00
Trabajadores	7:00:00	16:30:00	19.00	161:30:00
Profesional de interventoría (Aux Ing, social, SST y director)	7:00:00	16:30:00	4.00	34:00:00
Profesionales en topografia GyG	7:00:00	16:30:00	2.00	17:00:00
Ing. Gestión de Calidad	7:00:00	16:30:00	1.00	8:30:00
Representantes legales GyG	7:00:00	16:30:00	1.00	8:30:00

EQUIPO UTILIZADO

DESCRIPCIÓN	CANT.	TIEMPO (Horas)
EXCAVADORA 304C	1	8.50

MATERIALES UTILIZADOS

DESCRIPCIÓN	UND.	CANT.

ESTADO DEL TIEMPO

		HORAS
SECO	X	9.0
NEBLINA		
LLOVIZNA		
LLUVIA		
TORMENTA		

ACCESO


BUENO	X
REGULAR	
MALO	
NULO	

TERRENO

ROCOSO		DURO		NORMAL	X
ARENOSO		LODOSO		PANTANO	

CAUSA ATRASO/DIA - MEDIDA CORRECTIVA:

ESQUEMÁTICO DE OBRA

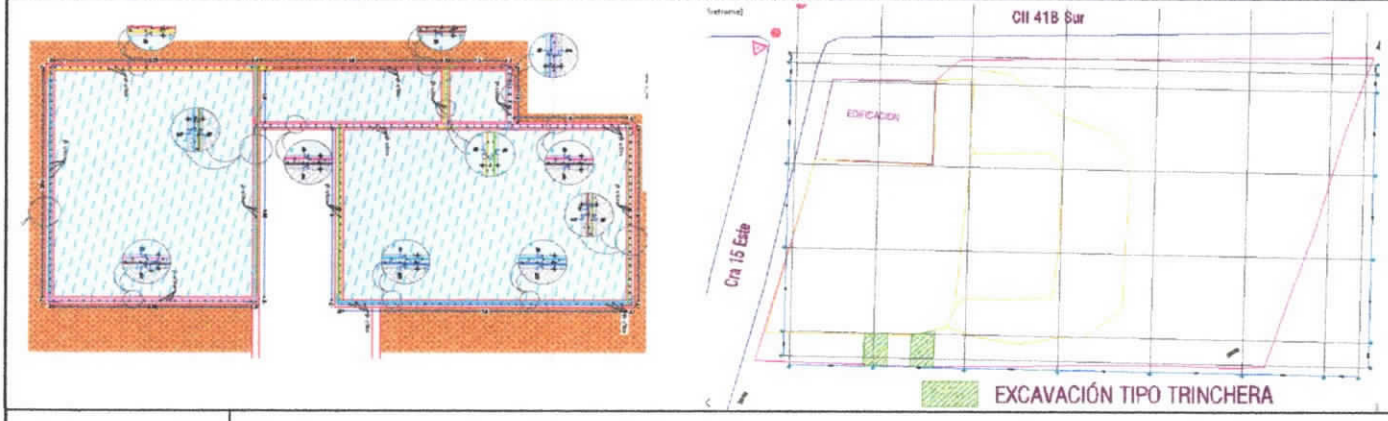

OBSERVACIONES:

	ELABORÓ		APROBÓ
FIRMA:		FIRMA:	
NOMBRE:	ING. JAVIER ANDRES ESCOBAR PINTOR	NOMBRE:	ARQ. MARCELO SARMIENTO
CARGO:	AUXILIAR DE INGENIERIA CONTRATISTA	CARGO:	DIRECTOR DE OBRA CONTRATISTA
	VALIDO		APROBO
FIRMA:		FIRMA:	
NOMBRE:	ING. CAMILO ROMERO	NOMBRE:	ARQ. JHON CUELLAR
CARGO:	RESIDENTE DE OBRA CONTRATISTA	CARGO:	RESIDENTE DE INTERVENTORIA

G&G Ingenieros Ltda.	INFORME DIARIO DE ACTIVIDADES	Fecha:01/06/2019
		Código: F-OBR-024
	EJECUCIÓN DE OBRA	Versión: 1
		Hoja No.: 1 de 1

No DE CONTRATO Y OBJETO	CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No 470 DE 2018 SUSCRITO ENTRE EL DISTRITO CAPITAL - UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL CUERPO DE BOMBEROS Y GYG INGENIEROS LTDA	CONSECUTIVO	100
LUGAR o ESPECIALIDAD DE LOS TRABAJOS	OBRA	FECHA	jueves 26 de septiembre de 2019

INFORME DIARIO No. 100

REGISTRO FOTOGRÁFICO















ELABORO:

ING. JAVIER ESCOBAR PINTOR
AUXILIAR DE INGENIERIA - CONTRATISTA

APROBO:

ING CAMILO ROMERO
RESIDENTE DE OBRA CONTRATISTA

GyG Ingenieros Ltda	INFORME DIARIO DE ACTIVIDADES	Fecha:01/06/2019
		Código: F-OBR-024
	EJECUCIÓN DE OBRA	Versión: 1
		Hoja No.: 1 de 1

No DE CONTRATO DE OBRA Y OBJETO	CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No 470 DE 2018 SUSCRITO ENTRE EL DISTRITO CAPITAL - UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL CUERPO DE BOMBEROS Y GYG INGENIEROS LTDA	CONSECUTIVO	101
LUGAR o ESPECIALIDAD DE LOS TRABAJOS	OBRA	FECHA	viernes 27 de septiembre de 2019

HORAS PERDIDAS	POR LLUVIA	POR PAROS		OTROS	TOTALES
Horas Hombre					0.0
Horas Equipo					0.0

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD FUNCIONAL	UND.	CANTIDAD			
				CONTRACTUAL	ACUMULADO ANTERIOR	AVANCE HOY	ACUMULADO ACTUAL
3,1	EXCAVACIONES VARIAS A MAQUINA SIN CLASIFICAR INCLUYE RETIRO.	N-3.70	M3	15547.63	2224.76	50.40	2275.16

DESCRIPCION DE ACTIVIDADES EJECUTADAS

CONTINUA LA COLOCACIÓN DE FORMALETA EM LOS MUROS DEL TANQUE, EXCAVACIÓN POR TRINCHERAS CON MEJORAMIENTO CON PAÑETE DE 3 CM Y MALLA DE 4 MM, ADECUACIÓN ZONA PARA RESIDUOS PELIGROSOS Y RETIRO DE MATERIAL EXCAVADO.

MANO DE OBRA EMPLEADA

CARGO	HORA		CANT.	TIEMPO (Horas)
	INICIO	FIN		
Arq. Residente	7:00:00	17:00:00	1.00	9:00:00
Ing. Residente	7:00:00	17:00:00	1.00	9:00:00
Aux. Ingeniero civil	7:00:00	17:00:00	1.00	9:00:00
Ing.. Profesional SST	7:00:00	17:00:00	1.00	9:00:00
Trabajadores	7:00:00	17:00:00	19.00	171:00:00
Profesional de interventoría (Aux Ing.)	7:00:00	17:00:00	1.00	9:00:00
Profesionales en topografía GyG	7:00:00	17:00:00	2.00	18:00:00

EQUIPO UTILIZADO

DESCRIPCIÓN	CANT.	TIEMPO (Horas)
EXCAVADORA 304C	1	8.50
VIAJES VOLQUETA DE 15m3	4	8.50

MATERIALES UTILIZADOS

DESCRIPCIÓN	UND.	CANT.

ESTADO DEL TIEMPO

		HORAS
SECO	X	9.0
NEBLINA		
LLOVIZNA		
LLUVIA		
TORMENTA		

ACCESO


BUENO	X
REGULAR	
MALO	
NULO	

TERRENO

ROCOSO		DURO		NORMAL	X
ARENOSO		LODOSO		PANTANO	

CAUSA ATRASO/DIA - MEDIDA CORRECTIVA:

ESQUEMÁTICO DE OBRA

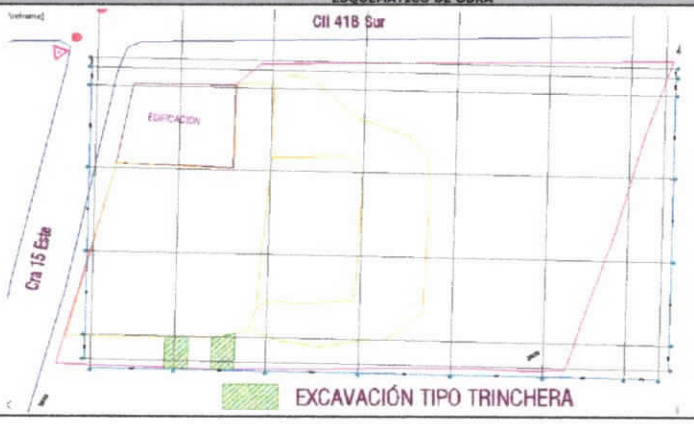

OBSERVACIONES:

	ELABORÓ	APROBÓ
FIRMA:		
NOMBRE:	ING. JAVIER ANDRES ESCOBAR PINTOR	ARQ. MARCELO SARMIENTO
CARGO:	AUXILIAR DE INGENIERIA CONTRATISTA	DIRECTOR DE OBRA CONTRATISTA
	VALIDÓ	APROBÓ
FIRMA:		
NOMBRE:	ING. CAMILO ROMERO	ARQ. JHON CUELLAR
CARGO:	RESIDENTE DE OBRA CONTRATISTA	RESIDENTE DE INTERVENTORIA

G+G Ingenieros Ltda.	INFORME DIARIO DE ACTIVIDADES	Fecha:01/06/2019
		Código: F-OBR-024
	EJECUCIÓN DE OBRA	Versión: 1
		Hoja No.: 1 de 1

No DE CONTRATO Y OBJETO	CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No 470 DE 2018 SUSCRITO ENTRE EL DISTRITO CAPITAL - UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL CUERPO DE BOMBEROS Y GYG INGENIEROS LTDA	CONSECUTIVO	101
LUGAR o ESPECIALIDAD DE LOS TRABAJOS	OBRA	FECHA	viernes 27 de septiembre de 2019

INFORME DIARIO No. 101

REGISTRO FOTOGRÁFICO













ELABORO:

ING. JAVIER ESCOBAR PINTOR
AUXILIAR DE INGENIERIA - CONTRATISTA

APROBO:

ING CAMILO ROMERO
RESIDENTE DE OBRA CONTRATISTA

GyG Ingenieros Ltda	INFORME DIARIO DE ACTIVIDADES	Fecha:01/06/2019
		Código: F-OBR-024
	EJECUCIÓN DE OBRA	Versión: 1
		Hoja No.: 1 de 1

No DE CONTRATO DE OBRA Y OBJETO	CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No 470 DE 2018 SUSCRITO ENTRE EL DISTRITO CAPITAL - UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL CUERPO DE BOMBEROS Y GYG INGENIEROS LTDA	CONSECUTIVO	102
LUGAR o ESPECIALIDAD DE LOS TRABAJOS	OBRA	FECHA	sábado 28 de septiembre de 2019

HORAS PERDIDAS	POR LLUVIA	POR PAROS		OTROS	TOTALES
Horas Hombre					0.0
Horas Equipo					0.0

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD FUNCIONAL	UND.	CANTIDAD			
				CONTRACTUAL	ACUMULADO ANTERIOR	AVANCE HOY	ACUMULADO ACTUAL
3,1	EXCAVACIONES VARIAS A MAQUINA SIN CLASIFICAR INCLUYE RETIRO.	N-3.70	M3	15547.63	2275.16	25.20	2300.36
4,1	CONCRETO DE LIMPIEZA EN CONCRETO DE 2500 PSI. E=0.04	N-4.95	M2	510.12	129.06	2.50	131.56

DESCRIPCION DE ACTIVIDADES EJECUTADAS

CONTINUIA LA COLOCACIÓN DE FORMALETA EM LOS MUROS DEL TANQUE, UBICACIÓN DE NIPLES PASAMUROS ZONA TANQUES, EXCAVACIÓN POR TRINCHERAS CON MEJORAMIENTO CON PAÑETE DE 3 CM Y MALLA DE 4 MM Y RETIRO DE MATERIAL EXCAVADO

MANO DE OBRA EMPLEADA

CARGO	HORA		CANT.	TIEMPO (Horas)
	INICIO	FIN		
Arq. Residente	7:00:00	12:00:00	1.00	5:00:00
Ing. Residente	7:00:00	12:00:00	1.00	5:00:00
Aux. Ingeniero civil	7:00:00	12:00:00	1.00	5:00:00
Ing.. Profesional SST	7:00:00	12:00:00	1.00	5:00:00
Trabajadores	7:00:00	12:00:00	19.00	95:00:00
Profesional de interventoria (Aux Ing, social y director,residente)	7:00:00	12:00:00	4.00	20:00:00
Profesionales en topografia GyG	7:00:00	12:00:00	2.00	10:00:00
Ing. Ambiental GyG	7:00:00	12:00:00	1.00	5:00:00

EQUIPO UTILIZADO

DESCRIPCIÓN	CANT.	TIEMPO (Horas)
EXCAVADORA 304C	1	8.50
VIAJES VOLQUETA DE 15m3	2	8.50

MATERIALES UTILIZADOS

DESCRIPCION	UND.	CANT.
CEMENTO	Bulto	1
MIXTO	m3	0.13

ESTADO DEL TIEMPO

		HORAS
SECO	X	5.0
NEBLINA		
LLOVIZNA		
LLUVIA		
TORMENTA		

ACCESO


BUENO	X
REGULAR	
MALO	
NULO	

TERRENO

ROCOSO		DURO		NORMAL	X
ARENOSO		LODOSO		PANTANO	

CAUSA ATRASO/DIA - MEDIDA CORRECTIVA:

ESQUEMÁTICO DE OBRA

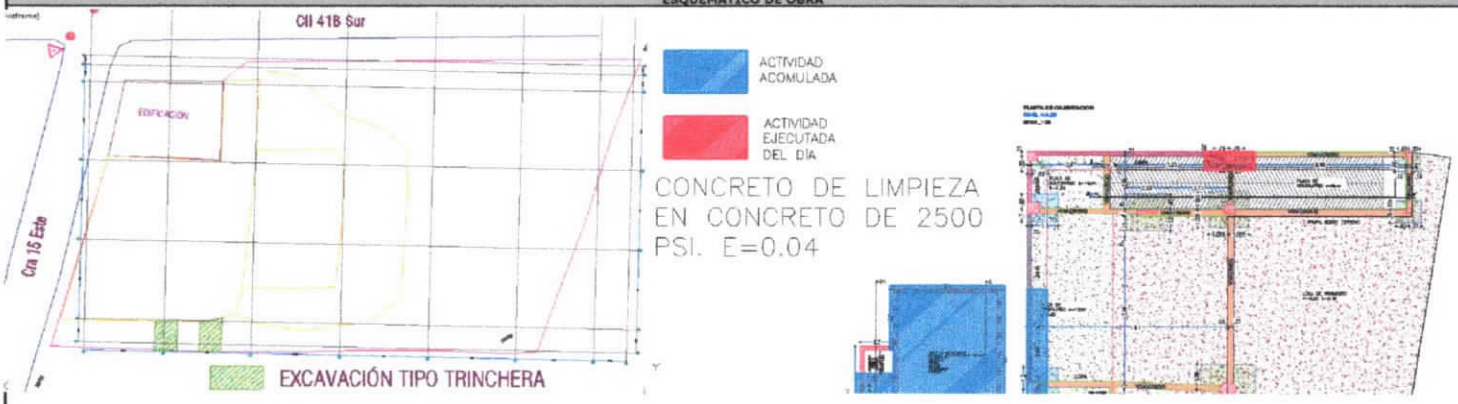

OBSERVACIONES:

	ELABORÓ	APROBÓ
FIRMA:		
NOMBRE:	ING. JAVIER ANDRES ESCOBAR PINTOR	ARQ. MARCELO SARMIENTO
CARGO:	AUXILIAR DE INGENIERIA CONTRATISTA	DIRECTOR DE OBRA CONTRATISTA
	VALIDO	APROBO
FIRMA:		
NOMBRE:	ING. CAMILO ROMERO	
CARGO:	RESIDENTE DE OBRA CONTRATISTA	RESIDENTE DE INTERVENTORIA

G&G Ingenieros Ltda.	INFORME DIARIO DE ACTIVIDADES	Fecha:01/06/2019
	EJECUCIÓN DE OBRA	Código: F-OBR-024
		Versión: 1
		Hoja No.: 1 de 1

No DE CONTRATO Y OBJETO	CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No 470 DE 2018 SUSCRITO ENTRE EL DISTRITO CAPITAL - UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL CUERPO DE BOMBEROS Y GYG INGENIEROS LTDA	CONSECUTIVO	102
LUGAR o ESPECIALIDAD DE LOS TRABAJOS	OBRA	FECHA	sábado 28 de septiembre de 2019

INFORME DIARIO No. 102

REGISTRO FOTOGRÁFICO













ELABORO:

ING. JAVIER ESCOBAR PINTOR
AUXILIAR DE INGENIERIA - CONTRATISTA

APROBO:

ING CAMILO ROMERO
RESIDENTE DE OBRA CONTRATISTA

G-G Ingenieros Ltda	INFORME DIARIO DE ACTIVIDADES	Fecha:01/06/2019
		Código: F-OBR-024
	EJECUCIÓN DE OBRA	Versión: 1
		Hoja No.: 1 de 1

	CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No 470 DE 2018 SUSCRITO ENTRE EL DISTRITO CAPITAL - UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL CUERPO DE BOMBEROS Y GYG INGENIEROS LTDA		103
	OBRA		domingo 29 de septiembre de 2019

Horas Hombre					0.0
Horas Equipo					0.0

-	DOMINGO NO LABORADO						

DESCRIPCION DE ACTIVIDADES EJECUTADAS

DOMINGO NO LABORADO

				0:00:00
				0:00:00
				0:00:00
				0:00:00
				0:00:00
				0:00:00
				0:00:00
				0:00:00
				0:00:00

				SECO		BUENO	X
				NEBLINA		REGULAR	
				LLOVIZNA		MALO	
				LLUVIA		NULO	
				TORMENTA			
				ROCOSO		DURO		NORMAL	X
				ARENOSO		LODOSO		PANTANO	

OBSERVACIONES:	

	ELABORÓ		APROBÓ
FIRMA:		FIRMA:	
NOMBRE:	ING. JAVIER ANDRES ESCOBAR PINTOR	NOMBRE:	ARQ. MARCELO SARMIENTO
CARGO:	AUXILIAR DE INGENIERIA CONTRATISTA	CARGO:	DIRECTOR DE OBRA CONTRATISTA
	VALIDÓ		APROBÓ
FIRMA:		FIRMA:	
NOMBRE:	ING. CAMILO ROMERO	NOMBRE:	
CARGO:	RESIDENTE DE OBRA CONTRATISTA	CARGO:	RESIDENTE DE INTERVENTORIA

G&G Ingenieros Ltda.	INFORME DIARIO DE ACTIVIDADES	Fecha:01/06/2019
		Código: F-OBR-024
	EJECUCIÓN DE OBRA	Versión: 1
		Hoja No.: 1 de 1

No DE CONTRATO DE OBRA Y OBJETO	CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No 470 DE 2018 SUSCRITO ENTRE EL DISTRITO CAPITAL - UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL CUERPO DE BOMBEROS Y GYG INGENIEROS LTDA	CONSECUTIVO	104
LUGAR o ESPECIALIDAD DE LOS TRABAJOS	OBRA	FECHA	lunes 30 de septiembre de 2019

HORAS PERDIDAS	POR LLUVIA	POR PAROS		OTROS	TOTALES
Horas Hombre					0.0
Horas Equipo					0.0

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD FUNCIONAL	UND.	CANTIDAD			
				CONTRACTUAL	ACUMULADO ANTERIOR	AVANCE HOY	ACUMULADO ACTUAL
4,1	CONCRETO DE LIMPIEZA EN CONCRETO DE 2500 PSI. E=0.04	N-4.95	M2	510.12	131.56	2.50	134.06

DESCRIPCION DE ACTIVIDADES EJECUTADAS

LIMPIEZA DE ZONAS POR SATURACIÓN DE AGUA EN ZARPAS POR LLUVIAS DEL FIN DE SEMANA CON BOMBA SUMERGIBLE, ARMADO DE FORMALETA MUROS TANQUE, FUNDIDA DE CONCRETO DE LIMPIEZA SOBRE EL EJE A0 Y ENTRE EL 4 Y 5, INICIO DE ARMADO DE ACERO PARRILLA DEL MURO TIPO T5, ZAPATA Y COLUMNA EN EL EJE 5 Y LIMPIEZA DE EXCAVACIÓN MURO T 11

MANO DE OBRA EMPLEADA

CARGO	HORA		CANT.	TIEMPO (Horas)
	INICIO	FIN		
Arq. Residente	7:00:00	16:30:00	1.00	8:30:00
Ing. Residente	7:00:00	16:30:00	1.00	8:30:00
Aux. Ingeniero civil	7:00:00	16:30:00	1.00	8:30:00
Ing.. Profesional SST	7:00:00	16:30:00	1.00	8:30:00
Trabajadores	7:00:00	16:30:00	20.00	170:00:00
Profesional de interventoría (Aux Ing, profesional SST)	7:00:00	16:30:00	2.00	17:00:00
Profesionales en topografía GyG	7:00:00	16:30:00	2.00	17:00:00
Director de obra GyG	7:00:00	12:00:00	1.00	5:00:00

EQUIPO UTILIZADO

DESCRIPCIÓN	CANT.	TIEMPO (Horas)
EXCAVADORA 304C	1	8.50

MATERIALES UTILIZADOS

DESCRIPCIÓN	UND.	CANT.
CEMENTO	Bulto	1
MIXTO	m3	0.13

ESTADO DEL TIEMPO

		HORAS
SECO	X	9.0
NEBLINA		
LLOVIZNA		
LLUVIA		
TORMENTA		

TERRENO


ROCOSO		DURO		NORMAL	X
ARENOSO		LODOSO		PANTANO	

ACCESO

BUENO	X
REGULAR	
MALO	
NULO	

CAUSA ATRASO/DIA - MEDIDA CORRECTIVA:

ESQUEMÁTICO DE OBRA

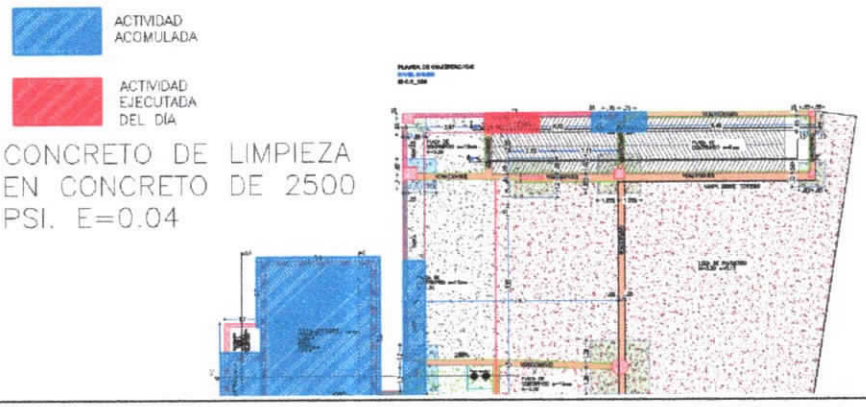

OBSERVACIONES:

	ELABORO	APROBO
FIRMA:		
NOMBRE:	ING. JAVIER ANDRES ESCOBAR PINTOR	ARQ. MARCELO SARMIENTO
CARGO:	AUXILIAR DE INGENIERIA CONTRATISTA	DIRECTOR DE OBRA CONTRATISTA
	VALIDO	APROBO
FIRMA:		
NOMBRE:	ING. CAMILO ROMERO	
CARGO:	RESIDENTE DE OBRA CONTRATISTA	RESIDENTE DE INTERVENTORIA

GyG Ingenieros Ltda.	INFORME DIARIO DE ACTIVIDADES	Fecha:01/06/2019
		Código: F-OBR-024
	EJECUCIÓN DE OBRA	Versión: 1
		Hoja No.: 1 de 1

No DE CONTRATO Y OBJETO	CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No 470 DE 2018 SUSCRITO ENTRE EL DISTRITO CAPITAL - UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL CUERPO DE BOMBEROS Y GYG INGENIEROS LTDA	CONSECUTIVO	104
LUGAR o ESPECIALIDAD DE LOS TRABAJOS	OBRA	FECHA	lunes 30 de septiembre de 2019

INFORME DIARIO No. 104

REGISTRO FOTOGRÁFICO















ELABORO:

ING. JAVIER ESCOBAR PINTOR
AUXILIAR DE INGENIERIA - CONTRATISTA

APROBO:

ING CAMILO ROMERO
RESIDENTE DE OBRA CONTRATISTA
