INFORME PARCIAL OBRA

CONTRATO CALAMIDAD PUBLICA N°002-2021

PERIODO DEL INFORME
26 DE MAYO AL 10 DE JUNIO 2021

"LIMPIEZA DE CALLES, CANALES DE AGUAS LLUVIAS, Y OBRAS DE MITIGACION DEL RIESGO POR ZONAS AFECTADAS POR LA OLA INVERNAL EN EL MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO"

VILLA DEL ROSARIO- JUNIO 2021

JOSE ERNESTO RICO OSORIO
Av. 4 No. 37-94 La Sabana Los Patios

066-04-21

CONTENIDO DEL INFORME

GENERALIDADES DEL PROYECTO
INFORMACION BASICA CONTRATO
ACTAS SUSCRITAS
ESTADO ACTUAL DE LAS PÓLIZAS DEL CONTRATO DE OBRA
BALANCE FINANCIERO
CUADRO ACTA DE RECIBO PARCIAL N° 1
ACTIVIDADES REALIZADAS
ANEXOS FOTOGRAFICO

JOSE ERNESTO RICO OSORIO
Av. 4 No. 37-94 La Sabana Los Patios


066-04-21

1. GENERALIDADES DEL PROYECTO

UBICACIÓN

El proyecto está ubicado en el municipio de Villa del Rosario, el cual está ubicado en la subregión oriental del departamento de Norte de Santander, siendo sus coordenadas geográficas: Longitud al oeste de Greenwich 72 grados 28', Latitud Norte 7 grados 50'. Su superficie es de 228 Km2, que representa el 1,05% del departamento de Norte de Santander; es el tercer municipio con mayor cantidad de habitantes, ya que concentra el 6.24% del total del Departamento y hace parte del Área Metropolitana de Cúcuta. El proyecto se desarrolla en diferentes zonas afectadas por la ola invernal en el municipio de villa del rosario.

Mapa político

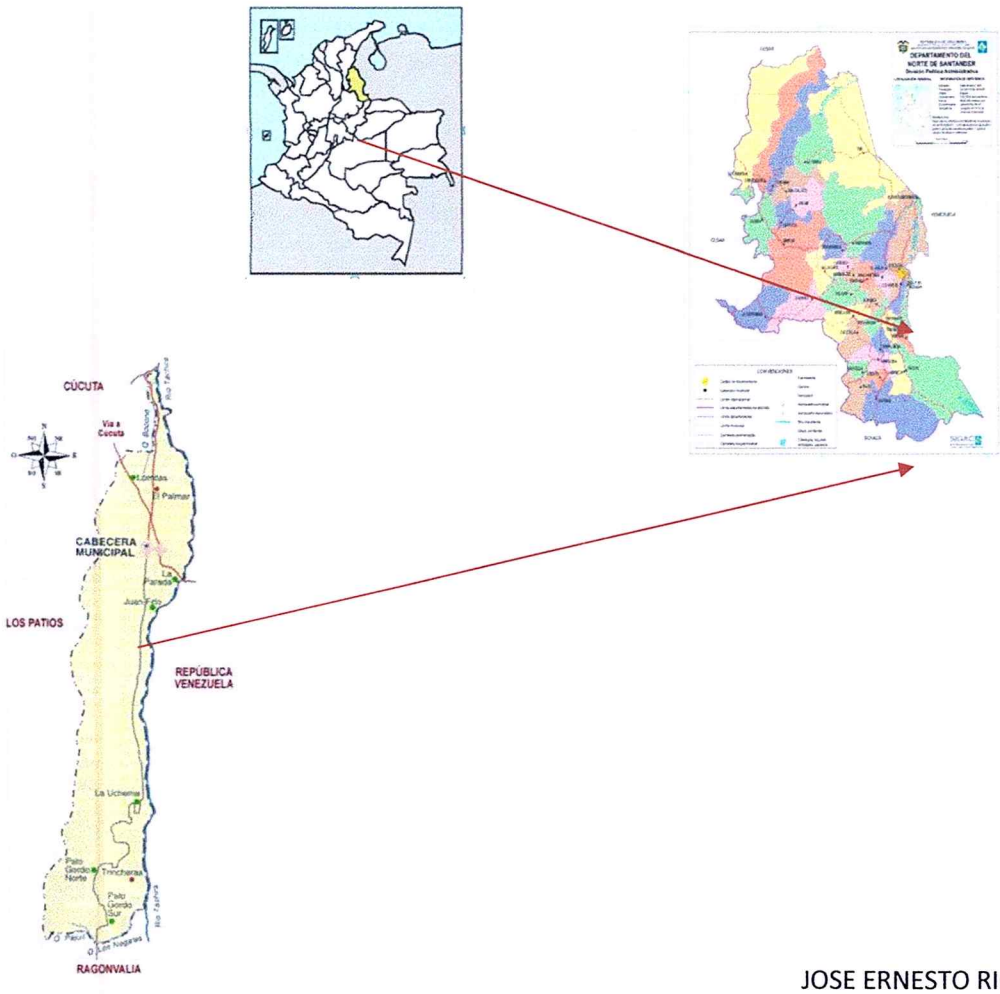

JOSE ERNESTO RICO OSORIO
Av. 4 No. 37-94 La Sabana Los Patios

066-04-21

2. INFORMACION BASICA DEL CONTRATO

NÚMERO DEL CONTRATO	CONTRATO 002 DE CALAMIDAD PUBLICA
OBJETO	LIMPIEZA DE CALLES, CANALES DE AGUAS LLUVIAS, Y OBRAS DE MITIGACION DEL RIESGO POR ZONAS AFECTADAS POR LA OLA INVERNAL EN EL MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO.
NOMBRE CONTRATISTA	ING.JOSE ERNESTO RICO OSORIO
CEDULA CONTRATISTA:	C.C. 13.494.287 de Cúcuta.
APROBACION POLIZAS	26 DE MAYO DE 2021
FECHA INICIO	26 DE MAYO DE 2021
PLAZO DE EJECUCIÓN	01 MESES
VALOR INICIAL	SETENTA Y CINCO MILLONES DE PESOS ($75.000.000.00),
FECHA DE TERMINACIÓN	25 DE JUNIO DE 2021
SUPERVISOR:	SUBSECRETARIA DE VIAS E INFRAESTRUCTURA

3. ACTAS SUSCRITAS

ACTA	FECHA
ACTA #1 INICIO	26 DE MAYO DE 2021
ACTA #2 RECIBO PARCIAL 01	10 DE JUNIO DE 2021

4. ESTADO ACTUAL DE LAS PÓLIZAS DEL CONTRATO DE OBRA

BENEFICIARIO	MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO
TOMADOR	ING.JOSE ERNESTO RICO OSORIO

JOSE ERNESTO RICO OSORIO
Av. 4 No. 37-94 La Sabana Los Patios

D66-04-21

RELACIÓN DE LA GARANTÍA DEL CONTRATO DE CALAMIDAD Nº 002 DE 2021

APROBACIÓN DE PÓLIZA 26-05-2021

ASEGURADORA PROFIANZAS S.A.S.

CUMPLIMIENTO 456

RESPONSABILIDAD CIVIL 220

FECHA EXPEDICIÓN 26-05-2021

PÓLIZA	INICIAL	FINAL
CUMPLIMIENTO	21/05/2021	21/10/2021
PAGO DE SALARIOS	21/05/2021	21/06/2021
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	21/05/2021	21/05/2026
RESPONSABILIDAD CIVIL	21/05/2021	21/06/2021

5. BALANCE FINANCIERO

VALOR CONTRATO	**$ 75.000.000.00**	
VALOR ACTA N° 2 RECIBO PARCIAL N° 01		$ 45.284.290,00
VALOR POR EJECUTAR		$ 29.715.710.00
SUMAS TOTAL IGUALES	**$ 75.000.000.00**	**$ 75.000.000.00**

6. CUADRO ACTA DE RECIBO PARCIAL N° 1

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	V. UNITARIO	SUB TOTAL
1					
1.1	EXTRACCION Y CARGUE DE MATERIAL MANUAL	M3	250,00	$ 47.909,00	$ 11.977.250,00
1.2	CARGUE MECANICO DE MATERIAL DE ARRASTRE DE LAS VIAS	M3	155,00	$ 37.795,00	$ 5.858.225,00
1.3	ACARREO DE MATERIAL A AREAS SELECCIONADAS	M3	410,00	$ 41.460,00	$ 16.998.600,00

JOSE ERNESTO RICO OSORIO
Av. 4 No. 37-94 La Sabana Los Patios

066-04-21

2	**SUMIDEROS**				
2.1	REJILLA METALICA PARA SUMIDEROS EN ANGULO 2"*1/4" Y PLATINAS 2"*1/4"	M2		$ 1.441.075,00	$ -
2.2	RESTAURACION REJILLAS DE SUMIDEROS	M2		$ 786.288,00	$ -
2.3	MALLA GALVANIZADA CAL 10 PARA REJILLAS	M2		$ 463.055,00	$ -
				SUB TOTAL COSTO DIRECTO	**$ 34.834.070,00**
				ADMINISTRACIÓN 23%	$ 8.011.836,00
				IMPREVISTOS 0%	$ -
				UTILIDAD 7%	$ 2.438.385,00
				VALOR ACTA PARCIAL 1	**$ 45.284.290,00**

7. ACTIVIDADES REALIZADAS

EXTRACCION Y CARGUE DE MATERIAL MANUAL

Se realizó a la extracción manual de todo tipo de material o residuo encontrado en los sumideros que impiden el flujo de las aguas lluvias. Se utilizaron Herramientas menores

Inicialmente se hizo el levantamiento de las rejillas de los sumideros; posteriormente con la protección adecuada y con herramientas menores se efectuo una extracción de basuras y bloqueos que se encuentren en estas.

CARGUE MECANICO DE MATERIAL DE ARRASTRE DE LAS VIAS

Se realizó el cargue de material pesado, sedimentos, lodos que fueron arrastrados por aguas lluvias, y que taponaron y no permitían el buen funcionamiento de los sumideros.se utilizo retroexcavadora y volqueta para realizar el cargue de material de lodos y sedimentos.

JOSE ERNESTO RICO OSORIO
Av. 4 No. 37-94 La Sabana Los Patios

066-04-21

ACARREO DE MATERIAL A AREAS SELECCIONADAS

DESCRIPCION:

Se realizó el acarreo de material removido de la limpieza de calles y canales producto de las aguas lluvias y resultante de la remoción manual y remoción mecánica, hacia zonas o áreas seleccionadas dadas las especificaciones particulares.
Se utilizo mano de obra, Herramientas menores y Volqueta

8. ANEXO FOTOGRAFICO

- **CARRERA 12B ENTRE CALLES 19-20 DEL BARRIO LA ESPERANZA, PARTE BAJA**






JOSE ERNESTO RICO OSORIO
Av. 4 No. 37-94 La Sabana Los Patios

066-04-21



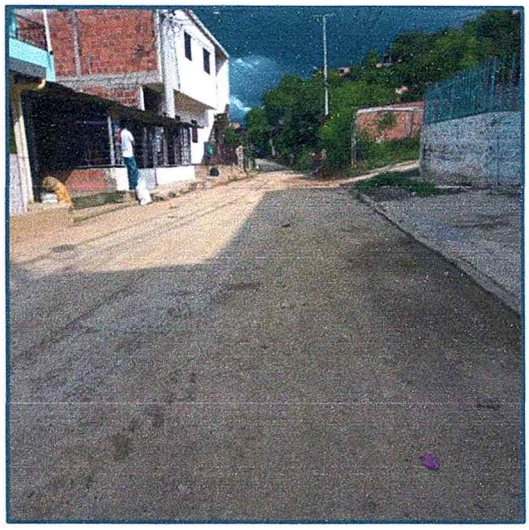

- **BARRIO 20 DE JULIO, CALLE 16N CARRERAS 11/15 DEL SECTOR**





JOSE ERNESTO RICO OSORIO
Av. 4 No. 37-94 La Sabana Los Patios

066-04-21





- **CARRERA 11 ENTRE CALLES 4N DEL BARRIO NARIÑO**





JOSE ERNESTO RICO OSORIO
Av. 4 No. 37-94 La Sabana Los Patios

066-04-21





- **BARRIO 20 DE JULIO, CALLE 16N SECTOR LA PAMPA**






JOSE ERNESTO RICO OSORIO
Av. 4 No. 37-94 La Sabana Los Patios

066-04-21



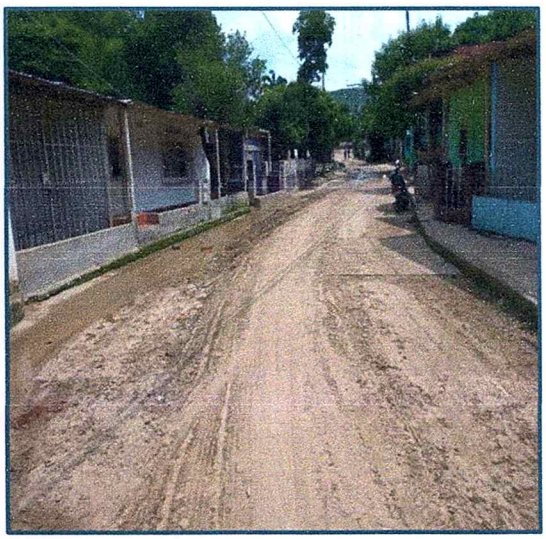


- **SECTOR LA PASTORA, CARRERA 5**





JOSE ERNESTO RICO OSORIO
Av. 4 No. 37-94 La Sabana Los Patios

066-04-21

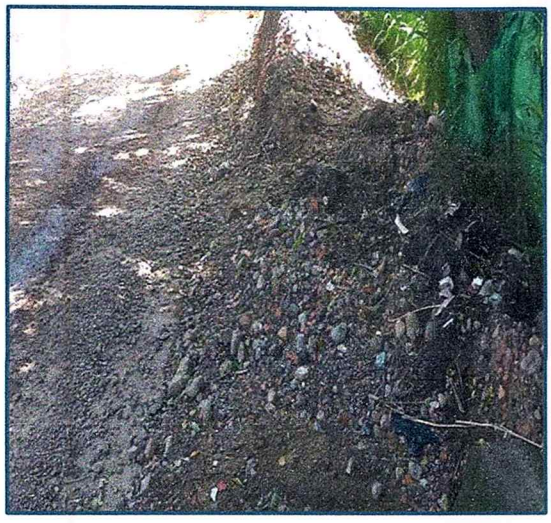



JOSE ERNESTO RICO OSORIO
Av. 4 No. 37-94 La Sabana Los Patios

066-04-21





- **JUAN FRIO**

066-04-21

- **PLACA HUELLAS JUAN FRIO**





- **BARRIO TURBAY AYALA**







JOSE ERNESTO RICO OSORIO
Av. 4 No. 37-94 La Sabana Los Patios

066-04-21

- **LA PARADA**



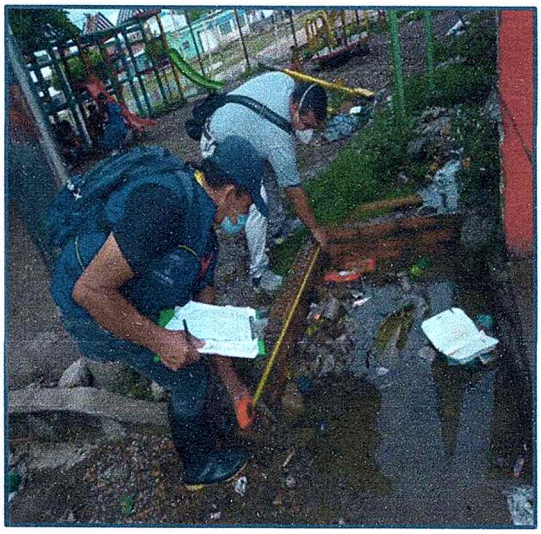

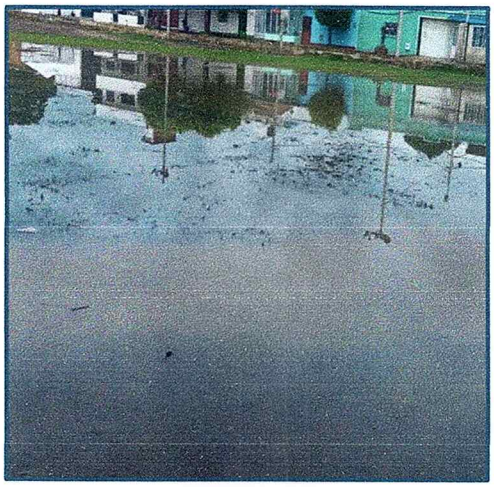

Atentamente,

JOSE ERNESTO RICO OSORIO
C.C N° 13.494.287 DE CUCUTA
MP N° 5420275740NTS

JOSE ERNESTO RICO OSORIO
Av. 4 No. 37-94 La Sabana Los Patios

666-04-21
