ACTA

1

IMPRENTA DISTRITAL

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

PROYECTO: OBRAS SEDES ALCALDÍA

PENTAMA — UNIVERSAL SEC S.A.S. — CONTRATISTA

ARQUITECTURA LIMPIEZA Y VIDA — INTERVENTORIA

ACTA PARCIAL No. 1 — PERIODO DEL ACTA: 28/07/2019 A 1/08/2019

OBJETO

CONTRATO DE OBRA No. — CONTRATISTA

CONTRATO INTERVENTORÍA — INTERVENTORIA — ENTIDAD CONTRATANTE


HOJA 1 DE 2

CAPITULO 1 — PRELIMINARES — ITEM 1.1.8.2 — CERRAMIENTO POLISOMBRA — UNIDAD: ML

ITEM	LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	TOTAL	UNIDAD
	AREA 1-ESPACIO KODAK-M1	2,20			1,00	2,20	ML
	AREA 1-ESPACIO KODAK-M2	1,00			1,00	1,00	ML
	AREA 1-ESPACIO KODAK-M3	6,00			2,00	12,00	ML
	AREA 1-ESPACIO KODAK-M4	4,10			2,00	8,20	ML
	AREA 1-ESPACIO KODAK-M5	1,65			1,00	1,65	ML
	AREA 1-ESPACIO KODAK-M6	1,04			1,00	1,04	ML
	AREA 1-ESPACIO KODAK-M7	2,88			1,00	2,88	ML
	AREA 3-OFICINA KODAK-M8	4,84			1,00	4,84	ML
	AREA 3-OFICINA KODAK-M9	2,30			1,00	2,30	ML
	AREA 2-BODEGA -M10 EXTERIOR	2,04			1,00	2,04	ML
	AREA 2-BODEGA -M11 EXTERIOR	5,53			1,00	5,53	ML
	AREA 2-BODEGA -M12 EXTERIOR	10,92			1,00	10,92	ML
	AREA 2-BODEGA -M13 INTERIOR	5,71			2,00	11,42	ML
	AREA 2-BODEGA -M14	2,01			2,00	4,02	ML
	AREA 2-BODEGA -M15	2,72			2,00	5,44	ML
						75,63	M2
						75,63	M2

OBSERVACIONES:

LOCALIZACION PLANIMETRICA



REGISTRO FOTOGRAFICO



RESIDENTE CONTRATISTA

Jessica Lopera A

RESIDENTE DE INTERVENTORIA


2

880

ALCALDÍA SEDES DE PACHO S.A.S. Secretaría Despacho Gestión	MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA PROYECTO: OBRAS SEDES ALCALDÍA	PRISMA UNIVERSAL SEC S.A.S. CONTRATISTA ARQUITECTURA URBANA LTDA. INTERVENTORÍA

ACTA PARCIAL No.	1	PERIODO DEL ACTA	24/07/2019	A	1/08/2019			
OBJETO								
CONTRATO DE OBRA No		CONTRATISTA		ENTIDAD CONTRATANTE				
CONTRATO INTERVENTORÍA		INTERVENTORÍA		HOJA		1	DE	2

PLANO DETALLE

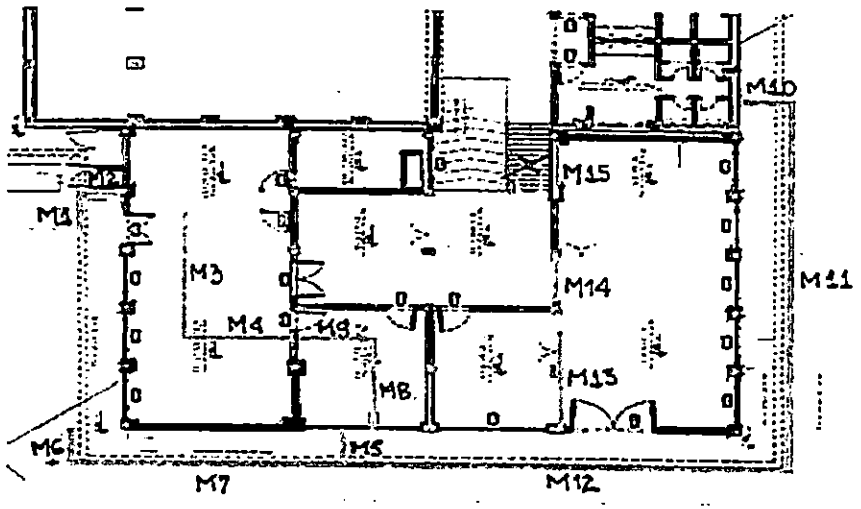

003

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

PROYECTO: OBRAS SEDES ALCALDÍA


UNIVERSALSEC S.A.S.

ACTA PARCIAL No.	1	PERIODO DEL ACTA	26/07/2019	A	1/08/2019		
OBJETO:							
CONTRATO DE OBRA No	775-2019	CONTRATISTA		ENTIDAD CONTRATANTE	SECRETARIA GENERAL - ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA		
CONTRATO INTERVENTORÍA		INTERVENTORÍA					

CAPITULO	1	PRELIMINARES	ITEM	1.1.1.1	Localización y replanteo	UNIDAD	M2

ITEM	LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	TOTAL	UNIDAD
	REPLANTEO AREA 1-ESPACIO BODEGA A	12,42	7,65		1	94,84	M2
	REPLANTEO AREA 3-OFICINA BODEGA B	7,00	5,15		1	28,17	M2
	REPLANTEO AREA 2- BODEGA C	8,58	5,91		1	50,58	M2
						104,55	UND
						104,55	UND

LOCALIZACION PLANIMETRICA

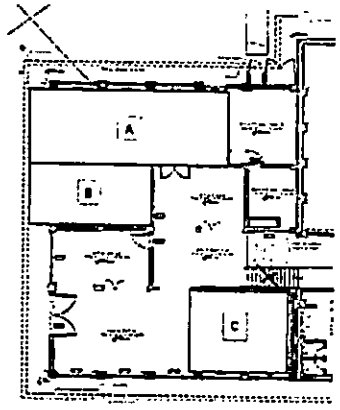

Jessica Lopez A

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

PROYECTO: OBRAS SEDES ALCALDÍA

UNIVERSAL SEC S.A.S.

ACTA PARCIAL No. 1 — PERIODO DEL ACTA: 26/07/2019 a 1/08/2019

CONTRATO DE OBRA No. 731-2019 — CONTRATISTA


CONTRATO INTERVENTORÍA — INTERVENTORÍA

ENTIDAD CONTRATANTE

CAPITULO 1 PRELIMINARES — FOLIO — 1.1.0.1 — AREA GENERAL — MANUAL — NO

ITEM	LOCALIZACIÓN	Dimensiones LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	TOTAL	UNIDAD
	AREA 1-ESPACIO EDOME	11,62	7,81		1	90,04	M2
						90,04	M2

LOCALIZACIÓN PLANIMETRICA



REGISTRO FOTOGRAFICO



RESIDENTE CONTRATISTA

Jessica Lopera A.

RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

PROYECTO: OBRAS SEDES ALCALDÍA


UNIVERSAL SEC S.A.S.

ACTA PARCIAL No.	2	PERIODO DEL ACTA	29/07/2019	A	1/08/2019		
OBJETO:							
CONTRATO DE OBRA No	733-2019	CONTRATISTA		ENTIDAD CONTRATANTE			
CONTRATO INTERVENTORÍA		INTERVENTORÍA		FOLIO	3	DE	3

CAPITULO	1	CIMENTACION	ITEM	2.2.4.1	Demoler piso y contrapiso	UNIDAD	M2

ITEM	LOCALIZACIÓN	Dimensiones LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	TOTAL	UNIDAD
	AREA 1-ESPACIO EDAR						
	A	1,89	1,40			2,65	M2
	B	5,78	1,47			8,50	M2
	C	3,50	1,42			4,97	M2
	D	7,49	1,05			7,77	M2
						23,78	M2
						23,78	M2

LOCALIZACION PLANIMETRICA



REGISTRO FOTOGRAFICO



RESIDENTE CONTRATISTA

Jessica Lopera A

RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Secretaría Integración Social

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

PROYECTO: OBRAS SEDES ALCALDÍA

PRISMA — UNIVERSAL SEC S.A.S. — CONTRATISTA

ARQUITECTURA URBANA LTDA. — INTERVENTORÍA

ACTA PARCIAL No.	1		PERIODO DEL ACTA	28/07/2019	A	1/08/2019	
OBJETO:	SEDES ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA						
CONTRATO DE OBRA No	731-2019	CONTRATISTA	CONSORCIO PRISMA SEDESA	ENTIDAD CONTRATANTE	SECRETARIA GENERAL -ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA		
CONTRATO INTERVENTORÍA		INTERVENTORÍA	ARQUITECTURA URBANA LTDA	HOJA	1	DE	2

CAPITULO	1	COLUMNAS Y MUROS	ITEM	2.3.0.1	Escarificar columnes y adhesivo, incluye la escarificación y el adhesivo especial para unir concreto existente a concreto nuevo	UNIDAD	M2

ITEM	LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	TOTAL	UNIDAD
	AREA 1-ESPACIO KODAK						
	COLUMNA C6 EJE A-5'	0.25		3.00	3.00	1.50	M2
	COLUMNA C7 EJE A-4'	0.25		3.00	3.00	2.25	M2
	COLUMNA C4 EJE B-4'	0.25		3.00	4.00	3.00	M2
	COLUMNA C1 EJE 5' EN B-C-D	0.25		3.00	3.00	2.25	M2


MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

PROYECTO: OBRAS SEDES ALCALDÍA

PRISMA — UNIVERSAL SEC S.A.S. — ARQUITECTURA

ACTA PARCIAL No.	1	PERIODO DEL ACTA	24/07/2019	A	1/08/2019
OBJETO					
CONTRATO DE OBRA No	771-2019	CONTRATISTA		ENTIDAD CONTRATANTE	
CONTRATO INTERVENTORIA		INTERVENTORIA			

CAPITULO	2	ACABADOS	ITEM					RETIRO Y REINSTALACION PUNTOS ELECTRICOS DE COLUMNAS	UNIDAD	UNO
ITEM	LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			CANTIDAD	TOTAL	UNIDAD	LOCALIZACION PLANIMETRICA		
		LARGO	ANCHO	ALTO						
	AREA 1-ESPACIO SOCIAL				6,00	6,00	UND			
						6,00	UND			
						6,00	UND			



REGISTRO FOTOGRAFICO



Jessica Lopera A.

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

PROYECTO: OBRAS SEDES ALCALDÍA


UNIVERSAL SEC S.A.S.

CONTRATO DE OBRA No	731-2019	CONTRATISTA		CONTRATANTE		FOLIO	1 DE 2
CONTRATO INTERVENTORIA		INTERVENTORIA					

CAPITULO: 1 PRELIMINARES ELECTRICOS ITEM: 1.1.0.2 Demolición de muros estructura. UNIDAD: M2

ITEM	LOCALIZACIÓN	Dimensiones LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	TOTAL	UNIDAD
	AREA 1-ESPACIO SOLAR-M2	5,50		3,00	1	15,50	M2
	AREA 1-ESPACIO SOLAR-M2	2,80		3,00	1	8,40	M2
						24,90	M2
						24,90	M2

LOCALIZACION FLAMETRICA



REGISTRO FOTOGRAFICO



Jessica Lopera A

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Secretaría Integración Social

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

PROYECTO: OBRAS SEDES ALCALDÍA

PRISMA GRUPO CONSTRUCTOR — UNIVERSAL SEC S.A. — CONSORCIO PRUNI SEDES 04 — CONTRATISTA

ARQUITECTURA URBANA LTDA. — INTERVENTORÍA


ACTA No.	1		PERIODO DEL ACTA	1/08/2019	A	31/09/2019	
OBJETO	REALIZAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE AJUSTE LAS DIFERENTES OBRAS E INTERVENCIONES ESPECIALIZADAS PARA LAS DIFERENTES SEDES DE LA SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C.						
CONTRATO DE OBRA No	731-2019	CONTRATISTA	CONSORCIO PRUNI SEDES 04		ENTIDAD CONTRATANTE	SECRETARIA GENERAL-ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA	
CONTRATO INTERVENTORÍA	730 DE 2019	INTERVENTORÍA	ARQUITECTURA URBANA LTDA		FRENTE	IMPRENTA DISTRITAL	

CAPITULO	1,1,0	PRELIMINARES	ITEM	1,1,0,1	REPLANTEO	UNIDAD	ML


ITEM	LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	TOTAL	UNIDAD
1	COSTADO ORIENTAL	35,00			1,00	35,00	MI
2	COSTADO SUR	20,00			1,00	20,00	MI
						55,00	ML
						55,00	ML

OBSERVACIONES:

LOCALIZACIÓN PLANIMÉTRICA

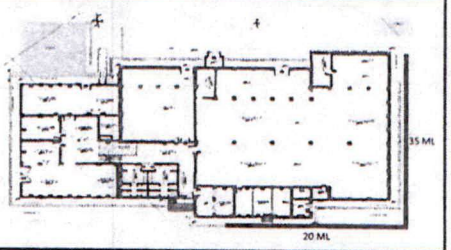

REGISTRO FOTOGRÁFICO



Alejandra Bolaños
ARQ. ALEJANDRA BOLAÑOS
RESIDENTE CONTRATISTA

Jessica Lopera A
ARQ. JESSICA LOPERA
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
Integración Social

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

PROYECTO: OBRAS SEDES ALCALDÍA

PRISMA
UNIVERSAL SEC S.A.S.
CONTRATISTA


ARQUITECTURA UNITARIA LTDA
INTERVENTORÍA

ACTA PARCIAL No.	1		PERIODO DEL ACTA	1/08/2019	A	31/08/2019	
OBJETO							
CONTRATO DE OBRA No		CONTRATISTA			ENTIDAD CONTRATANTE		
CONTRATO INTERVENTORÍA		INTERVENTORÍA			FRENTE:	IMPRENTA DISTRITAL	

CAPITULO	1	PRELIMINARES	ITEM	1.1.0.2	CERRAMIENTO POLISOMBRA	UNIDAD	ML

ÍTEM	LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	TOTAL	UNIDAD
	AREA 2-BODEGA -M10 INTERIOR	2,20			1,00	2,20	ML
	AREA 2-BODEGA -M11 INTERIOR	4,87			2,00	9,74	ML
	AREA 2-BODEGA -M12 INTERIOR	1,65			2,00	3,30	ML
	AREA 2-BODEGA -M13 EXTERIOR	1,85			1,00	1,85	ML
	AREA 2-BODEGA -M14 EXTERIOR	18,50			1,00	18,50	ML
	COSTADO SUR -REDES ELECTRICAS - M15	27,40			1,00	27,40	ML
	ARCHIVO (PLANTA ELECTRICA) - M16	12,05			1,00	12,05	ML
	ADMINISTRACION 2DO PISO (DISEÑO) - M17	11,95			1,00	11,95	ML
	ESCALERA 2DO PISO - M18	5,90			1,00	5,90	ML
	COSTADO SUR - CAJA M-19	6,80			1,00	6,80	ML
OBSERVACIONES:						99,69	ML
						99,69	ML

LOCALIZACION PLANIMETRICA



REGISTRO FOTOGRAFICO



Alejandra Bolaños
ARQ. ALEJANDRA BOLAÑOS
RESIDENTE CONTRATISTA


Jessica Lopera A
ARQ. JESSICA LOPERA
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

260

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Secretaría Integración Social	MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA	PRISMA UNIVERSAL SEC S.A.S. CONTRATISTA	ARQUITECTURA URBANA LTDA INTERVENTORÍA
	PROYECTO: OBRAS SEDES ALCALDÍA		

ACTA PARCIAL No.	1	PERIODO DEL ACTA	1/08/2019	A	31/08/2019		
OBJETO							
CONTRATO DE OBRA No		CONTRATISTA		ENTIDAD CONTRATANTE			
CONTRATO INTERVENTORÍA		INTERVENTORÍA		FRENTE:	IMPRENTA DISTRITAL		

PLANO DETALLE

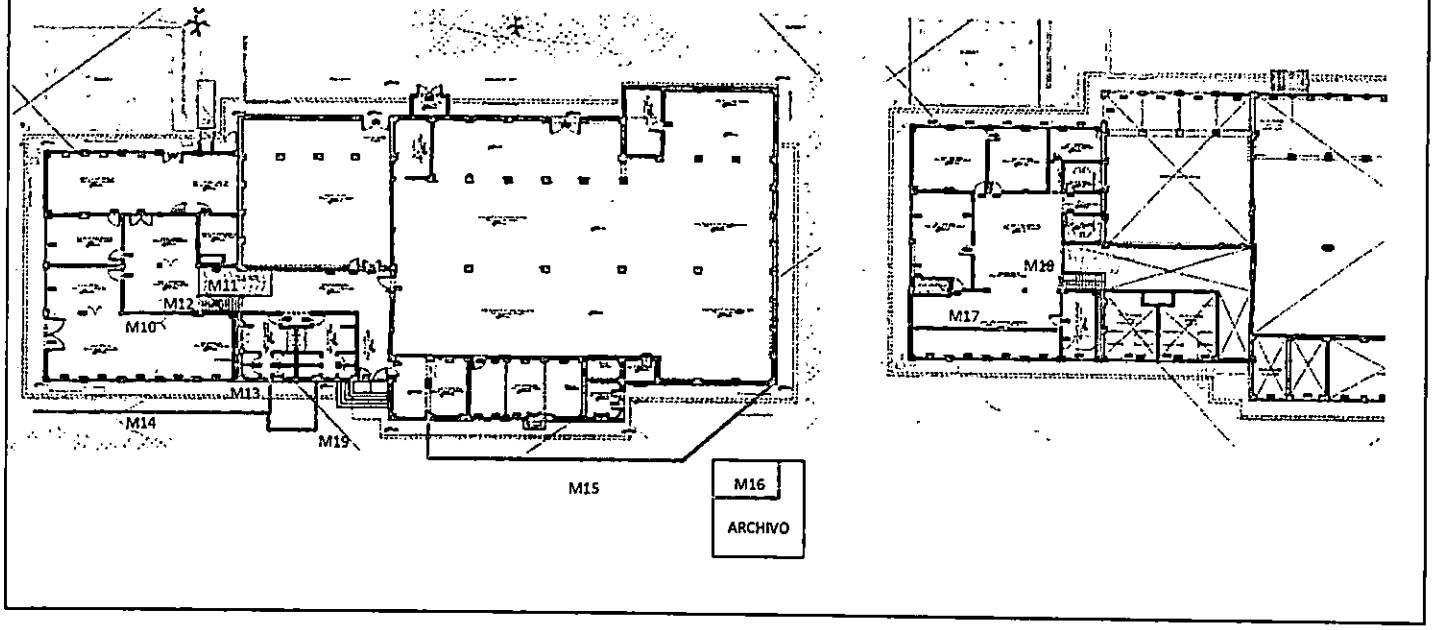

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Integración Social	MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA PROYECTO: OBRAS SEDES ALCALDÍA	PRISMA / UNIVERSAL SEC S.A.S. CONSORCIO PRUNI SEDES 04 — CONTRATISTA	ARQUITECTURA URBANA LTDA. — INTERVENTORÍA


ACTA No.	1		PERIODO DEL ACTA	1/08/2019	A	31/08/2019	
OBJETO	REALIZAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE AJUSTE LAS DIFERENTES OBRAS E INTERVENCIONES ESPECIALIZADAS PARA LAS DIFERENTES SEDES DE LA SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C.						
CONTRATO DE OBRA No	731-2019	CONTRATISTA	CONSORCIO PRUNI SEDES 04		ENTIDAD CONTRATANTE	SECRETARIA GENERAL-ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA	
CONTRATO INTERVENTORÍA	730 DE 2019	INTERVENTORÍA	ARQUITECTURA URBANA LTDA		FRENTE:	IMPRENTA DISTRITAL	

CAPITULO	1,2,0	RED DE SUMINISTRO	ITEM	1,2,0,1	TUBERIA PVC-P RDE 9 1/2"	UNIDAD	ML

ITEM	LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	TOTAL	UNIDAD
1	Costado sur occidental - Provisional de agua potable	24,00			1,00	24,00	ML
						24,00	ML
						24,00	ML

OBSERVACIONES:

LOCALIZACIÓN PLANIMÉTRICA



REGISTRO FOTOGRÁFICO





Alejandra Bolaños
ARQ. ALEJANDRA BOLAÑOS
RESIDENTE CONTRATISTA

Jessica Lopera D
ARQ. JESSICA LOPERA
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

PROYECTO: OBRAS SEDES ALCALDÍA

UNIVERSAL-SEC S.A.S. — CONTRATISTA


ARQUITECTURA URBANA LTDA. — INTERVENTORÍA

ACTA No.	1		PERIODO DEL ACTA	1/08/2019	A	31/08/2019	
OBJETO	REALIZAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE AJUSTE LAS DIFERENTES OBRAS E INTERVENCIONES ESPECIALIZADAS PARA LAS DIFERENTES SEDES DE LA SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C.						
CONTRATO DE OBRA No.	731-2019	CONTRATISTA	CONSORCIO PRUNI SEDES 04		ENTIDAD CONTRATANTE	SECRETARIA GENERAL-ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA	
CONTRATO INTERVENTORÍA	730 DE 2019	INTERVENTORÍA	ARQUITECTURA URBANA LTDA		FRENTE:	IMPRENTA DISTRITAL	

CAPITULO	1,2,0	RED DE SUMINISTRO	ITEM	1,2,0,7	ACCESORIO PVC PRESIÓN 1/2"	UNIDAD	UN

ITEM	LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES LARGO	DIMENSIONES ANCHO	DIMENSIONES ALTO	CANTIDAD	TOTAL	UNIDAD
1	Costado sur occidental - Provisional de agua potable				4,00	4,00	UN
OBSERVACIONES				SUBTOTAL		4,00	UN
						4,00	UN

LOCALIZACIÓN PLANIMÉTRICA



REGISTRO FOTOGRÁFICO



Alejandra Bolaños

ARQ. ALEJANDRA BOLAÑOS
RESIDENTE CONTRATISTA

Jessica Lopera P

ARQ. JESSICA LOPERA
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Secretaría Integración Social	MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA PROYECTO: OBRAS SEDES ALCALDÍA	PRISMA / UNIVERSAL-SEC S.A.S. CONSORCIO PRUNI SEDES 04 — CONTRATISTA	ARQUITECTURA URBANA LTDA. — INTERVENTORÍA


ACTA No.	1		PERIODO DEL ACTA	1/08/2019	A	31/08/2019
OBJETO	REALIZAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE AJUSTE LAS DIFERENTES OBRAS E INTERVENCIONES ESPECIALIZADAS PARA LAS DIFERENTES SEDES DE LA SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C.					
CONTRATO DE OBRA No	731-2019	CONTRATISTA	CONSORCIO PRUNI SEDES 04	ENTIDAD CONTRATANTE :	SECRETARIA GENERAL-ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA	
CONTRATO INTERVENTORÍA:	730 DE 2019	INTERVENTORÍA	ARQUITECTURA URBANA LTDA	FUENTE	IMPRENTA DISTRITAL	

CAPITULO	1,2,0	RED DE SUMINISTRO	ITEM	1,2,0,8	ACCESORIO PVC 3/4"		UNIDAD	UN


ITEM	LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	TOTAL	UNIDAD
1	COSTADO SUR - CAJA				3,00	3,00	UN
						3,00	UN

OBSERVACIONES:

LOCALIZACIÓN PLANIMÉTRICA



REGISTRO FOTOGRÁFICO



Alejandra Bolaños
ARQ. ALEJANDRA BOLAÑOS
RESIDENTE CONTRATISTA

Jessica Lopera A
ARQ. JESSICA LOPERA
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Hacienda Integración Social	MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA PROYECTO: OBRAS SEDES ALCALDÍA	PRISMA UNIVERSAL SEC S.A.S. CONSORCIO PRUNI SEDES 04 — CONTRATISTA	ARQUITECTURA URBANA LTDA. — INTERVENTORÍA


ACTA No.	1		PERIODO DEL ACTA	1/08/2019	A	31/08/2019
OBJETO	REALIZAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE AJUSTE LAS DIFERENTES OBRAS E INTERVENCIONES ESPECIALIZADAS PARA LAS DIFERENTES SEDES DE LA SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C.					
CONTRATO DE OBRA No.	731-2019	CONTRATISTA	CONSORCIO PRUNI SEDES 04	ENTIDAD CONTRATANTE	SECRETARIA GENERAL-ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA	
CONTRATO INTERVENTORÍA	730 DE 2019	INTERVENTORÍA	ARQUITECTURA URBANA LTDA	FRENTE	IMPRENTA DISTRITAL	

CAPITULO	1,5,0	RED DE AGUAS NEGRAS	ITEM	1,5,0,3	TUBERÍA PVC-S 4"	UNIDAD	ML

ITEM	LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	TOTAL	UNIDAD
	COSTADO SUR OCCIDENTAL						
1	Derivación de bajantes de desagües	12,00			1,00	12,00	ML
						12,00	ML
						12,00	ML

OBSERVACIONES:

LOCALIZACIÓN PLANIMÉTRICA



REGISTRO FOTOGRÁFICO



Alejandra Bolaños

ARQ. ALEJANDRA BOLAÑOS
RESIDENTE CONTRATISTA

Jessica Lopera A

ARQ. JESSICA LOPERA
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA


ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Gobierno Integración Social	MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA PROYECTO: OBRAS SEDES ALCALDÍA	PRISMA UNIVERSAL SEC S.A.S. CONSORCIO PRUNI SEDES 04 CONTRATISTA	ARQUITECTURA URBANA LTDA. INTERVENTORÍA

ACTA No.	1		PERIODO DEL ACTA	1/08/2019	A	31/08/2019	
OBJETO	REALIZAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE AJUSTE LAS DIFERENTES OBRAS E INTERVENCIONES ESPECIALIZADAS PARA LAS DIFERENTES SEDES DE LA SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C.						
CONTRATO DE OBRA No	731-2019	CONTRATISTA	CONSORCIO PRUNI SEDES 04		ENTIDAD CONTRATANTE	SECRETARIA GENERAL-ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA	
CONTRATO INTERVENTORÍA	730 DE 2019	INTERVENTORÍA	ARQUITECTURA URBANA LTDA		FRENTE	IMPRENTA DISTRITAL	

CAPITULO	1,5,0	RED DE AGUAS NEGRAS	ITEM	1,5,0,10	ACCESORIO PVC-S 4"	UNIDAD	UN

ITEM	LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES LARGO	DIMENSIONES ANCHO	DIMENSIONES ALTO	CANTIDAD	TOTAL	UNIDAD
	COSTADO SUR OCCIDENTAL						
1	Derivación de bajantes de desagües				4,00	4,00	UN
OBSERVACIONES						4,00	UN
						4,00	UN

LOCALIZACIÓN PLANIMÉTRICA



REGISTRO FOTOGRÁFICO





Alejandra Bolaños
ARQ. ALEJANDRA BOLAÑOS
RESIDENTE CONTRATISTA

Jessica Lopera A
ARQ. JESSICA LOPERA
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Secretaría Integración Social	MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA PROYECTO: OBRAS SEDES ALCALDÍA	PRISMA UNIVERSAL SEC S.A.S. CONSORCIO PRUNI SEDES 04 CONTRATISTA	ARQUITECTURA URBANA LTDA. INTERVENTORÍA


ACTA No.	1		PERIODO DEL ACTA	1/08/2019	A	31/08/2019
OBJETO	REALIZAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE AJUSTE LAS DIFERENTES OBRAS E INTERVENCIONES ESPECIALIZADAS PARA LAS DIFERENTES SEDES DE LA SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C.					
CONTRATO DE OBRA No.	731-2019	CONTRATISTA	CONSORCIO PRUNI SEDES 04	ENTIDAD CONTRATANTE	SECRETARIA GENERAL-ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA	
CONTRATO INTERVENTORÍA	730 DE 2019	INTERVENTORÍA	ARQUITECTURA URBANA LTDA	FRENTE:	IMPRENTA DISTRITAL	

CAPITULO	1,5,0	RED DE AGUAS NEGRAS	ITEM	1,7,0,4	Retiro Ladrillo cemento	UNIDAD	ML

ITEM	LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	TOTAL	UNIDAD
	COSTADO SUR						
1	Redes Electricas						
	CAJA 1	2,10			3,00	6,30	ML
	CAJA 2	2,10			3,00	6,30	ML
	CAJA 3	2,10			3,00	6,30	ML
	CANALIZACIÓN # 7	12,50			1,00	12,50	ML
	CANALIZACIÓN # 8	9,50			1,00	9,50	ML
	CANALIZACIÓN # 9	3,30			1,00	3,30	ML
2	Redes Hidrosanitarias						
	CAJA 4	1,45			2,00	2,90	ML
	CANALIZACION #10	20,00			1,00	20,00	ML
						67,10	ML
						67,10	ML

OBSERVACIONES:

LOCALIZACIÓN PLANIMÉTRICA

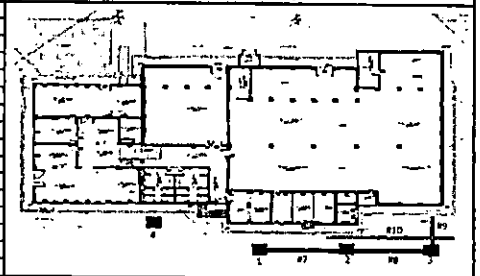

REGISTRO FOTOGRÁFICO



Alejandra Bolaños

ARQ. ALEJANDRA BOLAÑOS
RESIDENTE CONTRATISTA

Jessica Lopera M

ARQ. JESSICA LOPERA
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

104

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Secretaría Integración Social	MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA PROYECTO: OBRAS SEDES ALCALDÍA	PRISMA UNIVERSAL SEC S.A.S. CONSORCIO PRUNI SEDES 04 — CONTRATISTA	ARQUITECTURA URBANA LTDA. — INTERVENTORÍA


ACTA No.	1	PERIODO DEL ACTA:	1/08/2019	A	31/08/2019	
OBJETO	REALIZAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE AJUSTE LAS DIFERENTES OBRAS E INTERVENCIONES ESPECIALIZADAS PARA LAS DIFERENTES SEDES DE LA SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C.					
CONTRATO DE OBRA No 1	731-2019	CONTRATISTA	CONSORCIO PRUNI SEDES 04	ENTIDAD CONTRATANTE	SECRETARIA GENERAL-ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA	
CONTRATO INTERVENTORÍA	730 DE 2019	INTERVENTORÍA	ARQUITECTURA URBANA LTDA	FRENTE:	IMPRENTA DISTRITAL	

CAPITULO	1,7	OBRAS CIVILES	ITEM	1,7,0,6	Excavación manual incluye retiro de material y Disposición final en sitios autorizados	UNIDAD	M3

ITEM	LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	TOTAL	UNIDAD
1	COSTADO ORIENTAL	35,00	0,40	0,50	1,00	7,00	M3
2	CAJA 1 ORIENTE	0,90	0,90	0,50	1,00	0,41	M3
3	CAJA 2 ORIENTE	1,00	1,00	0,60	1,00	0,60	M3
4	COSTADO SUR	20,00	0,60	0,40	1,00	4,80	M3
5	CAJA 3 SUR	1,40	1,45	1,50	3,00	3,05	M3
		1,00	1,00	0,70	3,00	2,10	M3
						17,95	M3
						17,95	M3

OBSERVACIONES:

LOCALIZACIÓN PLANIMÉTRICA



REGISTRO FOTOGRÁFICO



Alejandra Bolaños
ARQ. ALEJANDRA BOLAÑOS
RESIDENTE CONTRATISTA

Jessica Lopera A
ARQ. JESSICA LOPERA
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
Secretaría
Integración Social

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

PROYECTO: OBRAS SEDES ALCALDÍA

PRISMA
UNIVERSAL SEC S.A.
CONSORCIO PRISMA SEDES 04
CONTRATISTA

ARQUITECTURA URBANA LTDA.
INTERVENTORÍA


ACTA PARCIAL No.	1	PERIODO DEL ACTA	3/08/2019	A	31/08/2019		
OBJETO:	SEDES ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA						
CONTRATO DE OBRA No	731-2019	CONTRATISTA	CONSORCIO PRISMA SEDES04		ENTIDAD CONTRATANTE	SECRETARIA GENERAL -ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA	
CONTRATO INTERVENTORÍA		INTERVENTORÍA	ARQUITECTURA URBANA LTDA		FRENTE:	IMPRENTA DISTRITAL	

CAPITULO	2.1.0	PRELIMINARES	ITEM	2.1.0.1	Campamento de obra	UNIDAD	GL

ITEM	LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	TOTAL	UNIDAD
	Campamento de Obra				1,00	1,00	GL
						1,00	GL
						1,00	GL

OBSERVACIONES:

LOCALIZACION PLANIMETRICA

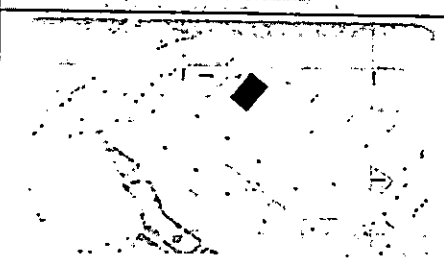

REGISTRO FOTOGRAFICO



Alejandra Bolaños
ARQ. ALEJANDRA BOLAÑOS
RESIDENTE CONTRATISTA

Jessica Lopera A
ARQ. JESSICA LOPERA
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
Secretaría Integración Social

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

PROYECTO: OBRAS SEDES ALCALDÍA

PRISMA — UNIVERSAL SEC S.A.S. — CONTRATISTA

ARQUITECTURA URBANA LTDA. — INTERVENTORÍA


ACTA PARCIAL No.	1	PERIODO DEL ACTA	1/08/2019	A	31/08/2019
OBJETO:	SEDES ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA				
CONTRATO DE OBRA No	731-2019	CONTRATISTA	CONSORCIO PRISMA SEDES04	ENTIDAD CONTRATANTE	SECRETARIA GENERAL -ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA
CONTRATO INTERVENTORÍA		INTERVENTORÍA	ARQUITECTURA URBANA LTDA	FRENTE:	IMPRENTA DISTRITAL

CAPITULO	2.1.0	PRELIMINARES	ITEM	2.1.0.2	Localización y replanteo	UNIDAD	M2

ITEM	LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	TOTAL	UNIDAD
A	REPLANTEO AREA 2- BODEGA	17,48	8,14		1,00	142,29	M2
	SEGUNDO PISO ADMINISTRACION	11,22	21,51		1,00	241,34	M2
B	REPLANTEO REDES ELECTRICAS	11,39	15,50		1,00	176,55	M2
C	ARCHIVO	6,12	4,70		1,00	28,76	M2
						588,94	M2
						588,94	M2

OBSERVACIONES:

LOCALIZACION PLANIMETRICA

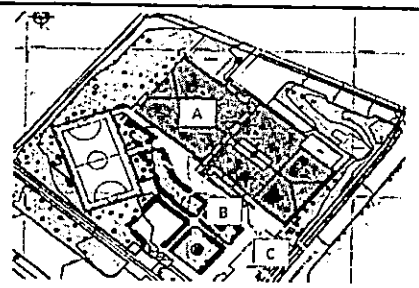

REGISTRO FOTOGRAFICO



Alejandra Blaños
ARQ. ALEJANDRA BLAÑOS
RESIDENTE CONTRATISTA

Jessica Lopera A
ARQ. JESSICA LOPERA
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

PROYECTO: OBRAS SEDES ALCALDÍA

PRISMA — UNIVERSAL SEC S.A.S. — CONTRATISTA

ARQUITECTURA URBANA LTDA. — INTERVENTORIA

ACTA PARCIAL No.	1		PERIODO DEL ACTA	1/07/2019	A	31/08/2019	
OBJETO:	SEDES ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA						
CONTRATO DE OBRA No:	731-2019	CONTRATISTA	CONSORCIO PRISMA SEDES 04		ENTIDAD CONTRATANTE	SECRETARIA GENERAL-ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA	
CONTRATO INTERVENTORÍA		INTERVENTORÍA	ARQUITECTURA URBANA LTDA		FRENTE:	IMPRENTA DISTRITAL	

CAPITULO	2.1.0	PRELIMINARES	ITEM	2.1.0.3	BAÑO MOVIL	UNIDAD	MES


ITEM	LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES LARGO	DIMENSIONES ANCHO	DIMENSIONES ALTO	CANTIDAD	TOTAL	UNIDAD
	Baño movil (instalado 17 de julio)	fracción mes julio			0.50	0.50	MES
	Baño móvil	mes agosto			1.00	1.00	MES
						1.50	MES
						1.50	MES

OBSERVACIONES: INGRESO A OBRA DE BAÑO PORTATIL 17 DE JULIO DE 2019.

LOCALIZACION PLANIMETRICA



REGISTRO FOTOGRAFICO



Alejandra Bolaños

ARQ. ALEJANDRA BOLAÑOS
RESIDENTE CONTRATISTA

Jessica Lopera A

ARQ. JESSICA LÓPERA
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

PROYECTO: OBRAS SEDES ALCALDÍA

PRISMA — UNIVERSAL SEC S.A.S. — CONTRATISTA

ARQUITECTURA URBANA LTDA. — INTERVENTORÍA


ACTA PARCIAL No.	1		PERIODO DEL ACTA	1/08/2019	A	31/08/2019	
OBJETO:	SEDES ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA						
CONTRATO DE OBRA No	731-2019	CONTRATISTA	CONSORCIO PRISMA SEDES04		ENTIDAD CONTRATANTE	SECRETARIA GENERAL -ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA	
CONTRATO INTERVENTORÍA		INTERVENTORÍA	ARQUITECTURA URBANA LTDA		FRENTE:	IMPRENTA DISTRITAL	

CAPITULO	2.1.0	PRELIMINARES	ITEM	2.1.0.4	ASEO GENERAL	UNIDAD	M2

ITEM	LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	TOTAL	UNIDAD
A	AREA 1-ESPACIO KODAK	2,48	7,61		1,00	18,87	M2
	AREA 3-OFICINA KODAK	8,80	5,15		1,00	45,32	M2
	AREA 2- BODEGA	20,46	8,14		1,00	166,54	M2
	SEGUNDO PISO ADMINISTRACION	11,22	21,51		1,00	241,34	M2
B	REDES ELECTRICAS	11,39	15,50		1,00	176,55	M2
C	ARCHIVO	6,12	4,70		1,00	28,76	M2
						677,39	M2
						677,39	M2

OBSERVACIONES:

LOCALIZACION PLANIMETRICA

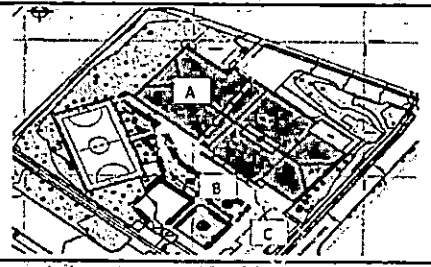

REGISTRO FOTOGRAFICO



Alejandra Bolaños

ARQ. ALEJANDRA BOLAÑOS
RESIDENTE CONTRATISTA

Jessica Lopera A.

ARQ. JESSICA LOPERA
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

PROYECTO: OBRAS SEDES ALCALDÍA

UNIVERSAL SEC S.A.S. — CONTRATISTA

ARQUITECTURA URBANA LTDA. — INTERVENTORIA

ACTA PARCIAL No.	1	PERIODO DEL ACTA	1/08/2019	A	31/08/2019	
OBJETO:	REMODELACION SEDE CDP					
CONTRATO DE OBRA No	733-2019	CONTRATISTA	CONSORCIO PRISMA SEDES CDP	ENTIDAD CONTRATANTE	SECRETARIA GENERAL ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA	
CONTRATO INTERVENTORÍA		INTERVENTORÍA	ARQUITECTURA URBANA LTDA	FRENTE:	IMPRENTA DISTRITAL	


CAPITULO	2.2.0	CIMENTACION	ITEM	2.2.0.3	Demolicion pisos y contrapisos	UNIDAD	M2

ITEM	LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	TOTAL	UNIDAD
	AREA 1-ESPACIO KODAK						
	ZAPATA 1						
	A	0,30	1,40			0,42	M2
	C	0,26	1,67			0,43	M2
	D	7,40	0,42			3,11	M2
	E	2,95	0,60			1,77	M2
	F CIMENTACION COLUMNAS C1 EJE 3'	1,30	0,60		6,00	4,68	M2
	AREA 2 ESPACIO BODEGA						M2
	G COLUMNA C2 EJE 1	1,56	0,70		1,00	1,09	M2
		1,00	0,74		1,00	0,74	M2
		0,60	0,60		1,00	0,36	M2
							M2
	ZAPATA 2						
	H	2,30	0,60			1,38	M2
	I	8,15	1,90			11,59	M2
	J	2,50	1,50			3,75	M2
	K	4,20	1,30			5,46	M2
	L CIMENTACION COLUMNAS C1 EJE 3'	1,30	0,60		8,00	6,24	M2

	MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA		
	PROYECTO: OBRAS SEDES ALCALDÍA	UNIVERSAL SEC S.A.S. CONTRATISTA	ARQUITECTURA URBANA LTDA. INTERVENTORÍA

ACTA PARCIAL No.	1	PERIODO DEL ACTA	1/08/2019	A	31/08/2019	
OBJETO:	SEDES ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA					
CONTRATO DE OBRA No	731-2019	CONTRATISTA	CONSORCIO PRUM SEDES84	ENTIDAD CONTRATANTE	SECRETARIA GENERAL -ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA	
CONTRATO INTERVENTORÍA		INTERVENTORÍA	ARQUITECTURA URBANA LTDA	FRENTE:	IMPRENTA DISTRITAL	

PLANO DETALLE

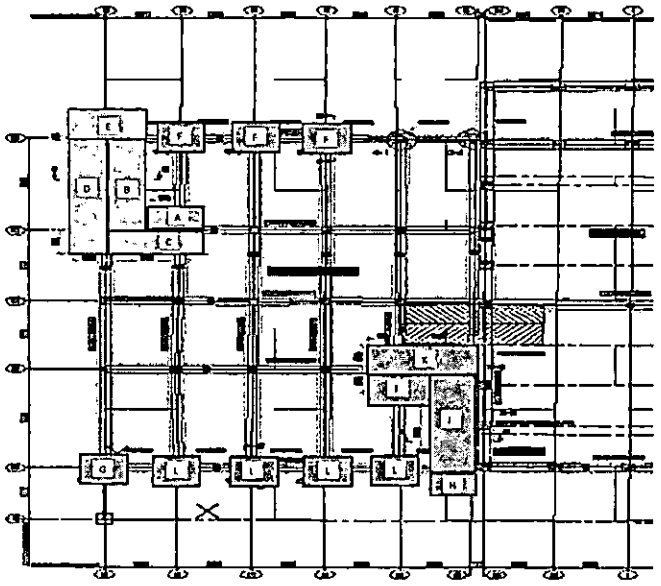

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
Secretaría Integración Social

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

PROYECTO: OBRAS SEDES ALCALDÍA

PRISMA — UNIVERSAL SEC S.A.S. — CONTRATISTA


ARQUITECTURA URBANA LTDA. — INTERVENTORÍA

ACTA PARCIAL No.	1		PERIODO DEL ACTA	1/08/2019	A	31/08/2019	
OBJETO:	SEDES ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA						
CONTRATO DE OBRA No	731-2019	CONTRATISTA	CONSORCIO PRISMA SEDES04		ENTIDAD CONTRATANTE	SECRETARIA GENERAL-ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA	
CONTRATO INTERVENTORÍA		INTERVENTORÍA	ARQUITECTURA URBANA LTDA		FRENTE:	IMPRENTA DISTRITAL	

CAPITULO	2.2.0	CIMENTACION	ITEM	2.2.0.2	Excavación manual para cidópeo y zapatas	UNIDAD	M3

ITEM	LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES AREA	DIMENSIONES ALTO	CANTIDAD	TOTAL	UNIDAD
	AREA 1-ESPACIO KODAK					
	ZAPATA 1					
	B	1,84	1,60		2,94	M3
	C	0,90	1,90	200	3,42	M3
	D	3,00	2,00		6,00	M3
	E	7,25	2,25		16,31	M3
	G	3,08	1,70		5,24	M3
	H	8,38	1,90		15,92	M3
	F CIMENTACION COLUMNAS C1 EJE 5'	0,78	0,40	6,00	1,87	M3
	AREA 2 ESPACIO BODEGA					
	I	5,46	1,70		9,28	M3
	J	0,90	1,30		1,17	M3
	K	8,40	0,75		6,30	M3
	L	2,12	0,70		1,48	M3
	M	4,18	1,70		7,11	M3
	A	2,40	1,85		2,59	M3
	N COLUMNA C2 EJE 1	1,09	0,40		0,44	M3
		0,74	0,40		0,30	M3
		0,36	0,40		0,14	M3
	O CIMENTACION COLUMNAS C1 EJE 1'	0,78	0,40	8,00	2,50	M3
OBSERVACIONES:					83,01	M3
					83,01	M3

LOCALIZACION PLANIMETRICA



REGISTRO FOTOGRAFICO




Alejandra Bolaños
ARQ. ALEJANDRA BOLAÑOS
RESIDENTE CONTRATISTA

Jessica Lopera P.
ARQ. JESSICA LOPERA
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Secretaría Integración Social	MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA PROYECTO: OBRAS SEDES ALCALDÍA	PRISMA UNIVERSAL SEC S.A.S. CONTRATISTA	ARQUITECTURA URBANA LTDA. INTERVENTORÍA

ACTA PARCIAL No.	1	PERIODO DEL ACTA	1/08/2019	A	31/08/2019	
OBJETO:	SEDES ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA					
CONTRATO DE OBRA No	731-2019	CONTRATISTA	CONSORCIO PRISMA SEDES04	ENTIDAD CONTRATANTE	SECRETARIA GENERAL-ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA	
CONTRATO INTERVENTORÍA		INTERVENTORÍA	ARQUITECTURA URBANA LTDA	FRENTE:	IMPRENTA DISTRITAL	

PLANO DETALLE

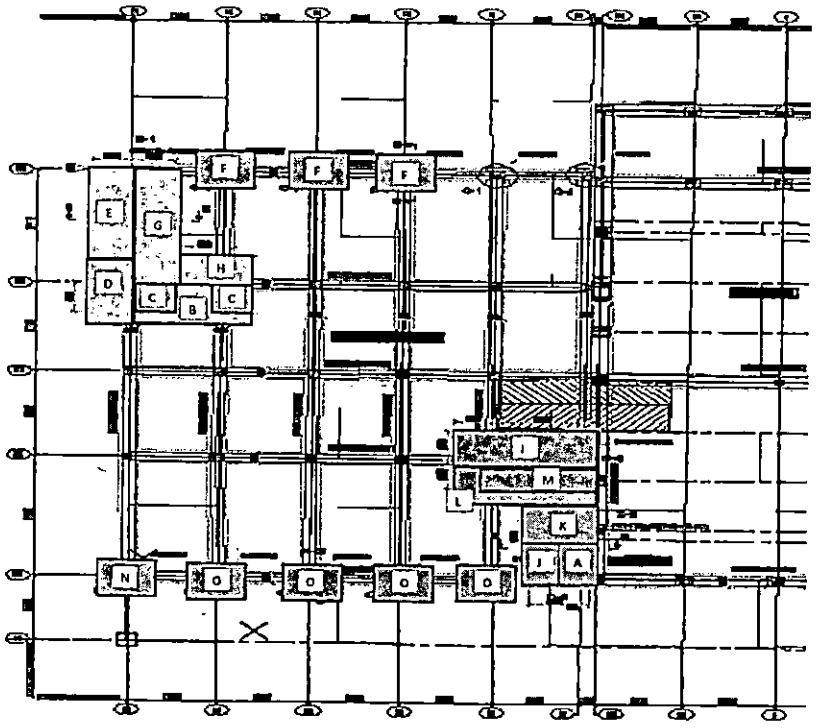

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
Secretaría Integración Social

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

PROYECTO: OBRAS SEDES ALCALDÍA

PRISMA — UNIVERSAL SEC S.A.S. — CONTRATISTA

ARQUITECTURA URBANA LTDA. — INTERVENTORÍA


ACTA PARCIAL No.	1		PERIODO DEL ACTA	1/08/2019	A	31/08/2019	
OBJETO:	SEDES ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA						
CONTRATO DE OBRA No	731-2019	CONTRATISTA	CONSORCIO PRUNI SEDES08		ENTIDAD CONTRATANTE	SECRETARIA GENERAL-ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA	
CONTRATO INTERVENTORÍA		INTERVENTORÍA	ARQUITECTURA URBANA LTDA		FRENTE:	IMPRENTA DISTRITAL	

CAPITULO	2.2.0	CIMENTACION	ITEM	2.2.0.4	Demoler vigas de cimiento	UNIDAD	M3

ITEM	LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	TOTAL	UNIDAD
	AREA 2 (BODEGA)						
1	EJE F ENTRE 1'-2'	5,960	0,250	0,30		0,447	M3
2	EJE 2 ENTRE E'-F'	2,740	0,250	0,30		0,206	M3
						0,65	M3
						0,65	M3

OBSERVACIONES:

LOCALIZACION PLANIMETRICA

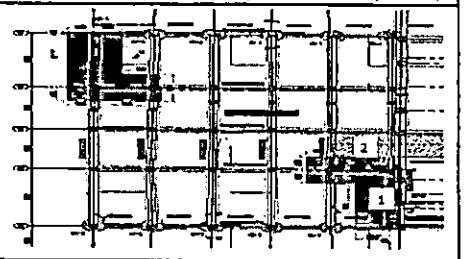

REGISTRO FOTOGRAFICO



Aletandra Blaños
ARQ. ALEJANDRA BOLAÑOS
RESIDENTE CONTRATISTA

Jessica Lopera A
ARQ. JESSICA LOPERA
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
Secretaría Integración Social

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

PROYECTO: OBRAS SEDES ALCALDÍA


PRISMA — UNIVERSAL SEC S.A.S. — CONTRATISTA
ARQUITECTURA URBANA LTDA. — INTERVENTORÍA

ACTA PARCIAL No.	1		PERIODO DEL ACTA	1/08/2019	A	31/08/2019	
OBJETO:	SEDES ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA						
CONTRATO DE OBRA No	731-2019	CONTRATISTA	CONSORCIO PRUNI SEDES04		ENTIDAD CONTRATANTE	SECRETARIA GENERAL -ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA	
CONTRATO INTERVENTORÍA		INTERVENTORÍA	ARQUITECTURA URBANA LTDA		FRENTE	IMPRENTA DISTRITAL	


CAPITULO	2.2.0	CIMENTACION	ITEM	2.2.0.5	Concreto pobre	UNIDAD	M2

ITEM	LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	TOTAL	UNIDAD
	AREA 1-ESPACIO KODAK						
	ZAPATA 1						
	A	0,30	1,40			0,42	M2
	C	0,28	1,47			0,41	M2
	D	7,40	0,42			3,10	M2
	E	2,95	0,60			1,77	M2
	F CIMENTACION COLUMNAS C1 EJE 5'	1,30	0,60		6,00	4,68	M2
	AREA 2 ESPACIO BODEGA						M2
	G COLUMNA C2 EJE 1	1,56	0,70		1,00	1,09	M2
		1,00	0,74		1,00	0,74	M2
		0,60	0,60		1,00	0,36	M2
							M2
	ZAPATA 2						
	H	2,30	0,60			1,38	M2
	I	6,15	1,90			11,69	M2
	J	2,50	1,50			3,75	M2
	K	4,20	1,30			5,46	M2
	L CIMENTACION COLUMNAS C1 EJE 1'	1,30	0,60		8,00	6,24	M2
OBSERVACIONES:						41,09	M2
						41,09	M2

LOCALIZACION PLANIMETRICA



REGISTRO FOTOGRAFICO




Alejandra Bolaños
ARQ. ALEJANDRA BOLAÑOS
RESIDENTE CONTRATISTA

Jessica Lopera A
ARQ. JESSICA LOPERA
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Secretaría Integración Social	MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA	PRISMA UNIVERSAL SEC S.A.S. CONSORCIO PRISMA SEDES 504 CONTRATISTA	ARQUITECTURA URBANA LTDA. INTERVENTORÍA
	PROYECTO: OBRAS SEDES ALCALDÍA		

ACTA PARCIAL No.	1	PERIODO DEL ACTA	1/08/2019	A	31/08/2019	
OBJETO:	SEDES ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA					
CONTRATO DE OBRA No.	731-2019	CONTRATISTA	CONSORCIO PRISMA SEDES04	ENTIDAD CONTRATANTE	SECRETARIA GENERAL-ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA	
CONTRATO INTERVENTORÍA		INTERVENTORÍA	ARQUITECTURA URBANA LTDA	FRENTE:	IMPRENTA DISTRITAL	

PLANO DETALLE

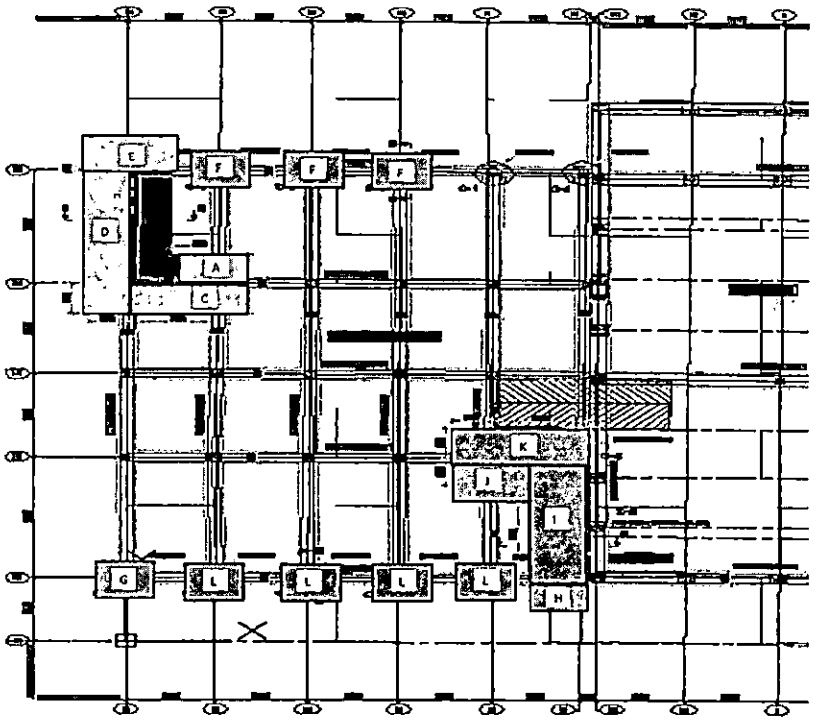

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Gobierno Integración Social

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

PROYECTO: OBRAS SEDES ALCALDÍA

PRISMA — UNIVERSAL SEC S.A.S. — CONTRATISTA

ARQUITECTURA URBANA LTDA. — INTERVENTORIA


ACTA PARCIAL No.	1		PERIODO DEL ACTA	1/08/2019	A	31/08/2019	
OBJETO:	SEDES ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA						
CONTRATO DE OBRA No	731-2019	CONTRATISTA	CONSORCIO PRISMA SEDES 004		ENTIDAD CONTRATANTE	SECRETARIA GENERAL -ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA	
CONTRATO INTERVENTORÍA		INTERVENTORÍA	ARQUITECTURA URBANA LTDA		FRENTE:	IMPRENTA DISTRITAL	

CAPITULO	2.2.0	CIMENTACION	ITEM	2.2.0.6	Concreto ciclópeo, Piedra media zonga y concreto de 3.000 psi	UNIDAD	M3

ITEM	LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	TOTAL	UNIDAD
	ADMINISTRACION 1ER PISO						
	AREA 1-ESPACIO KODAK						
	ZAPATA 1						
	B	1,84	1,30			2,39	M3
	C	0,90	1,60		2,00	2,88	M3
	D	3,00	1,70			5,10	M3
	F	3,08	1,40			4,31	M3
	G	8,38	1,60			13,41	M3
	AREA 2 ESPACIO BODEGA						
	H	5,46	1,40			7,64	M3
	I	0,90	1,00			0,90	M3
	J	8,40	0,45			3,78	M3
	K	2,12	0,40			0,85	M3
	L	4,18	1,40			5,85	M3
	A	1,40	1,55			2,17	M3
						49,28	M3
						49,28	M3

OBSERVACIONES:

LOCALIZACION PLANIMETRICA



REGISTRO FOTOGRAFICO



Alejandra Bolaños

ARQ. ALEJANDRA BOLAÑOS
RESIDENTE CONTRATISTA

Jessica Lopera A


ARQ. JESSICA LOPERA
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

111

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Secretaría Integración Social	MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA **PROYECTO: OBRAS SEDES ALCALDÍA**	PRISMA UNIVERSAL SEC S.A.S. CONSORCIO PALMA SEDES 04 CONTRATISTA	ARQUITECTURA URBANA LTDA. INTERVENTORÍA

ACTA PARCIAL No.	2		PERIODO DEL ACTA	1/08/2019	A	31/08/2019	
OBJETO:	SEDES ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA						
CONTRATO DE OBRA No	731-2019	CONTRATISTA	CONSORCIO PALMA SEDES04		ENTIDAD CONTRATANTE	SECRETARIA GENERAL -ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA	
CONTRATO INTERVENTORÍA		INTERVENTORÍA	ARQUITECTURA URBANA LTDA		FRENTE:	IMPRENTA DISTRITAL	

PLANO DETALLE

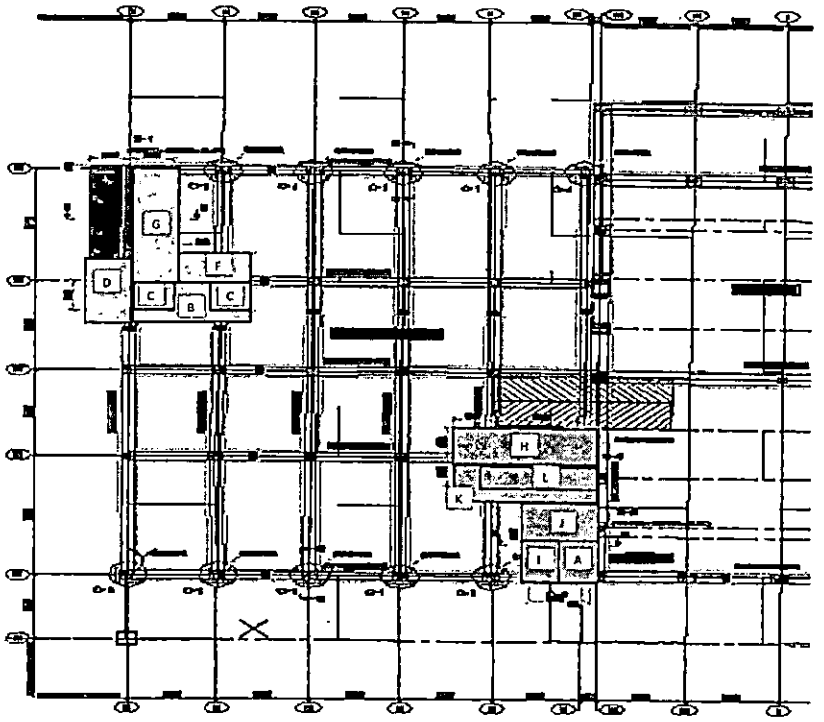

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

PROYECTO: OBRAS SEDES ALCALDÍA

PRISMA — UNIVERSAL SEC S.A.S. — CONTRATISTA

ARQUITECTURA UNITAMA LTDA. — INTERVENTORÍA


ACTA PARCIAL No.	1		PERIODO DE L'ACTA	1/08/2019	A	31/08/2019	
OBJETO:	SEDES ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA						
CONTRATO DE OBRA No.	731-2019	CONTRATISTA	CONSORCIO PRISMA SEDESM		ENTIDAD CONTRATANTE	SECRETARIA GENERAL -ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA	
CONTRATO INTERVENTORÍA		INTERVENTORÍA	ARQUITECTURA URBANA LTDA		FRENTE:	IMPRENTA DISTRITAL	

CAPITULO	2	COLUMNAS Y MUROS	ITEM	2.3.0.1	Escarificar columnas y adhesivo, incluye la escarificación y el adhesivo especial para unir concreto existente a concreto nuevo	UNIDAD	M2

ITEM	LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	TOTAL	UNIDAD
1	COLUMNA C1 (PRIMER Y SEGUNDO PISO)	1,00		5,5	4,00	22,00	M2
	COLUMNA C1 (PRIMER PISO) Eje 5' - E y 1'-E	1,00		3,0	2,00	6,00	M2
2	COLUMNA C2 (PRIMER Y SEGUNDO PISO)	1,00		5,5	1,00	5,50	M2
3	COLUMNA C3 (PRIMER PISO)	1,00		3,0	1,00	3,00	M2
4	COLUMNA C4 (PRIMER Y SEGUNDO PISO)	1,00		5,5	1,00	5,50	M2
5	COLUMNA C5 (PRIMER PISO)	0,75		3,0	1,00	2,25	M2
6	COLUMNA C6 (PRIMER Y SEGUNDO PISO)	1,00		5,5	1,00	5,50	M2
		1,00		3,0	1,00	3,00	M2
7	COLUMNA C7 (PRIMER Y SEGUNDO PISO)	1,00		5,5	1,00	5,50	M2
						58,25	M2
						58,25	M2

OBSERVACIONES:

LOCALIZACIÓN PLANIMETRICA



COLUMNAS AREA ADMINISTRATIVA

REGISTRO FOTOGRAFICO





Alejandra Bolaños

ARQ. ALEJANDRA BOLAÑOS
RESIDENTE CONTRATISTA

Jessica Lopera A

ARQ. JESSICA LÓPERA
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
Secretaría Integración Social

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

PROYECTO: OBRAS SEDES ALCALDÍA

PRISMA — UNIVERSAL SEC S.A.S. — CONTRATISTA

ARQUITECTURA URBANA LTDA. — INTERVENTORÍA


ACTA PARCIAL No.	1		PERIODO DEL ACTA	1/08/2019	A	31/08/2019	
OBJETO:	SEDES ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA						
CONTRATO DE OBRA No.	731-2019	CONTRATISTA	CONSORCIO PRUMI SEDES04		ENTIDAD CONTRATANTE	SECRETARIA GENERAL-ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA	
CONTRATO INTERVENTORÍA		INTERVENTORÍA	ARQUITECTURA URBANA LTDA		FRENTE:	IMPRENTA DISTRITAL	

CAPÍTULO	2	ACABADOS	ITEM	2.8.0.6	Rotura del muro para colocar columneta	UNIDAD	ML

ITEM	LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	TOTAL	UNIDAD
1	COLUMNA C1 (PRIMER Y SEGUNDO PISO)	16,50			6,00	99,00	ML
2	COLUMNA C2 (PRIMER Y SEGUNDO PISO)	16,50			1,00	16,50	ML
3	COLUMNA C6 (PRIMER Y SEGUNDO PISO)	16,50			2,00	33,00	ML
4	COLUMNA C4 (PRIMER Y SEGUNDO PISO)	16,50			1,00	16,50	ML
						165,00	ML
						165,00	ML

OBSERVACIONES:

LOCALIZACION PLANIMETRICA

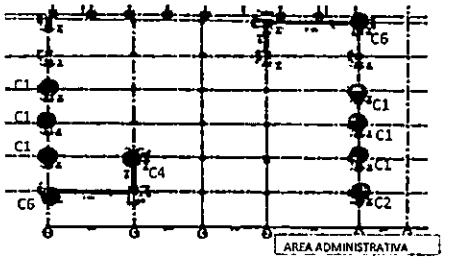

REGISTRO FOTOGRAFICO





Alejandra Bolaños
ARQ. ALEJANDRA BOLAÑOS
RESIDENTE CONTRATISTA

Jessica Lopera A.
ARQ. JESSICA LOPERA
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
Secretaría Integración Social

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

PROYECTO: OBRAS SEDES ALCALDÍA

PRISMA — UNIVERSEC S.A.S. — CONSORCIO PRUNI SEDES04 — CONTRATISTA


ARQUITECTURA URBANA LTDA. — INTERVENTORÍA

ACTA PARCIAL No:	1		PERIODO DEL ACTA	1/08/2019	A	31/08/2019	
OBJETO:	SEDES ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA						
CONTRATO DE OBRA No	731-2019	CONTRATISTA	CONSORCIO PRUNI SEDES04		ENTIDAD CONTRATANTE	SECRETARIA GENERAL-ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA	
CONTRATO INTERVENTORÍA		INTERVENTORÍA	ARQUITECTURA URBANA LTDA		FRENTE:	IMPRENTA DISTRITAL	

CAPITULO	3.0.3	INSTALACIONES ELECTRICAS	ITEM	3.3.0.2	Demolición de muro existente.	UNIDAD	M2

ITEM	LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	TOTAL	UNIDAD
	AREA 1-ESPACIO KODAK-M1						
	(2DO PISO)	5,47		2,20	100	12,03	M2
	AREA 1-ESPACIO KODAK-M2						
	(2DO PISO)	2,70		3,50	100	9,45	M2
OBSERVACIONES:						21,48	M2
						21,48	M2

LOCALIZACION PLANIMETRICA



REGISTRO FOTOGRAFICO



Alejandra Bolaños
ARQ. ALEJANDRA BOLAÑOS
RESIDENTE CONTRATISTA

Jessica Lopera A.
ARQ. JESSICA LOPERA
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Integración Social	MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA PROYECTO: OBRAS SEDES ALCALDÍA	PRISMA UNIVERSAL SEC S.A.S. CONSORCIO PRISMA SEDES 04 — CONTRATISTA	ARQUITECTURA URBANA LTDA. — INTERVENTORÍA


ACTA No.	1	PERIODO DEL ACTA	1/08/2019	A	31/08/2019		
OBJETO	REALIZAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE AJUSTE LAS DIFERENTES OBRAS E INTERVENCIONES ESPECIALIZADAS PARA LAS DIFERENTES SEDES DE LA SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C.						
CONTRATO DE OBRA No	731-2019	CONTRATISTA	CONSORCIO PRISMA SEDES 04	ENTIDAD CONTRATANTE	SECRETARIA GENERAL-ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA		
CONTRATO INTERVENTORÍA	730 DE 2019	INTERVENTORÍA	ARQUITECTURA URBANA LTDA	FRENTE	IMPRENTA DISTRITAL		

CAPITULO	3,4,0	SISTEMA CONTRA INCENDIOS	ITEM	3,4,0,1	Suministro e Instalacion de Tuberia PVC 2x3" + 2x2" tipo pesado DB.	UNIDAD	ML

ITEM	LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	TOTAL	UNIDAD
	COSTADO SUR						
1	# 2 - DUCTO DE 3" (3 Tubos + 1 Reserva) + DUCTOS DE 2" (1 Tubo de 2" + 1 Reserva)	12,50			1,00	12,50	ML
		6,25			1,00	6,25	ML
						18,75	ML
						18,75	ML

OBSERVACIONES:

LOCALIZACIÓN PLANIMÉTRICA

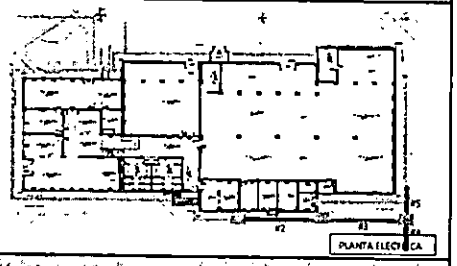

REGISTRO FOTOGRÁFICO



Alejandra Bolaños

ARQ. ALEJANDRA BOLAÑOS
RESIDENTE CONTRATISTA

Jessica Lopera A.

ARQ. JESSICA LOPERA
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

PROYECTO: OBRAS SEDES ALCALDÍA

UNIVERSAL SEC S.A.S. — CONTRATISTA


ARQUITECTURA URBANA LTDA. — INTERVENTORÍA

ACTA No.	1	PERIODO DEL ACTA	1/08/2019	A	31/08/2019		
OBJETO	REALIZAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE AJUSTE LAS DIFERENTES OBRAS E INTERVENCIONES ESPECIALIZADAS PARA LAS DIFERENTES SEDES DE LA SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C.						
CONTRATO DE OBRA No.	731-2019	CONTRATISTA	CONSORCIO PRUNI SEDES 04	ENTIDAD CONTRATANTE	SECRETARIA GENERAL-ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA		
CONTRATO INTERVENTORÍA	730 DE 2019	INTERVENTORÍA	ARQUITECTURA URBANA LTDA	FRENTE:	IMPRENTA DISTRITAL		

CAPITULO	3,4,0	SISTEMA CONTRA INCENDIOS	ITEM	3,4,0,4	Excavación manual en material compactado.	UNIDAD	M3


ITEM	LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	TOTAL	UNIDAD
	COSTADO SUR						
1	CAJA 1	2,10	1,50	1,90	1,00	5,99	M3
2	CAJA 2	2,10	1,50	1,90	1,00	5,99	M3
3	CAJA 3	2,10	1,50	1,90	1,00	5,99	M3
4	CANALIZACIÓN # 7	12,50	0,60	1,30	1,00	9,75	M3
5	CANALIZACIÓN # 8	9,50	0,60	1,30	1,00	7,41	M3
6	CANALIZACIÓN # 9	3,30	0,60	1,30	1,00	2,57	M3
OBSERVACIONES:						37,69	M3
						37,69	M3

LOCALIZACIÓN PLANIMÉTRICA

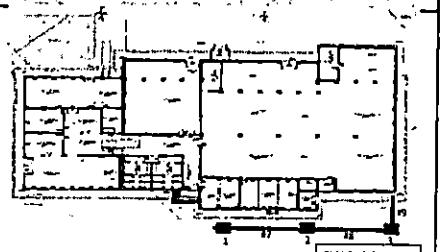

PLANTA ELECTRICA

REGISTRO FOTOGRÁFICO





Alejandra Bolaños

ARQ. ALEJANDRA BOLAÑOS
RESIDENTE CONTRATISTA

Jessica Lopera A.

ARQ. JESSICA LOPERA
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

PROYECTO: OBRAS SEDES ALCALDÍA

PRISMA — UNIVERSAL SEC S.A. — CONTRATISTA

ARQUITECTURA URBANA LTDA. — INTERVENTORÍA


ACTA No.	1		PERIODO DEL ACTA	1/08/2019	A	31/08/2019		
OBJETO	REALIZAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE AJUSTE LAS DIFERENTES OBRAS E INTERVENCIONES ESPECIALIZADAS PARA LAS DIFERENTES SEDES DE LA SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C.							
CONTRATO DE OBRA No	731-2019	CONTRATISTA	CONSORCIO PRUNI SEDES 04	ENTIDAD CONTRATANTE	SECRETARIA GENERAL-ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA			
CONTRATO INTERVENTORÍA	730 DE 2019	INTERVENTORÍA	ARQUITECTURA URBANA LTDA	HOJA	1	DE	1	

CAPITULO	3,4,0	SISTEMA CONTRA INCENDIOS	ITEM	3,4,0,5	Relleno y compactación con recebo (suministro e instalación)	UNIDAD	M3

ITEM	LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES LARGO	DIMENSIONES ANCHO	DIMENSIONES ALTO	CANTIDAD	TOTAL	UNIDAD
	COSTADO SUR						
	CANALIZACIÓN # 7	12,50	0,60	1,30	1,00	9,75	M3
						9,75	M3
						9,75	M3


OBSERVACIONES:

LOCALIZACIÓN PLANIMÉTRICA



PLANTA ELECTRICA

REGISTRO FOTOGRÁFICO



Alejandra Bolaños

ARQ. ALEJANDRA BOLAÑOS
RESIDENTE CONTRATISTA

Jessica Lopera D.

ARQ. JESSICA LOPERA
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

ACTA

2

IMPRENTA DISTRITAL

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA GENERAL

BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

PROYECTO: OBRAS PARA LAS DIFERENTES SEDES DE LA SECRETARÍA GENERAL -ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ

PRISMA! — UNIVERSAL SEC S.A.S. — CONTRATISTA

ARQUITECTURA URBANA LTDA. — INTERVENTORÍA


ACTA PARCIAL No,	2		PERIODO DEL ACTA	1/09/2019	A	30/09/2019
OBJETO	REALIZAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE AJUSTE LAS DIFERENTES OBRAS E INTERVENCIONES ESPECIALIZADAS PARA LAS DIFERENTES SEDES DE LA SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C.					
CONTRATO DE OBRA No	73 1- 2019	CONTRATISTA	CONSORCIO PRUNI SEDES 04		ENTIDAD CONTRATANTE	SECRETARIA GENERAL-ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA
CONTRATO INTERVENTORÍA	730 - 2019	INTERVENTORÍA	ARQUITECTURA URBANA LTDA		FRENTE:	IMPRENTA DISTRITAL

CAPITULO	1.1.0	PRELIMINARES	ITEM	1.1.0.1	REPLANTEO	UNIDAD	Ml


ITEM	LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	TOTAL	UNIDAD
1	COSTADO NORTE EJE A	14,81			1,00	14,81	Ml
2	COSTADO OCCIDENTAL EJE 5'-1'	21,83			1,00	21,83	Ml
3	COSTADO SUR DEL EJE A - J	9,21			1,00	9,21	Ml
4	COSTADO SUR DEL EJE A - J	18,27			1,00	18,27	Ml
5	COSTADO SUR ENTRE ZONA VERDE A CAJA EXISTENTE	25,50			1,00	25,50	Ml
6 -	COSTADO SUR HASTA CAJA EXISTENTE	14,72			1,00	14,72	Ml
7	COSTADO SUR HASTA CAJA EXISTENTE	20,51			1,00	20,51	Ml
						124,85	ML
						124,85	ML

OBSERVACIONES:

LOCALIZACION PLANIMETRICA

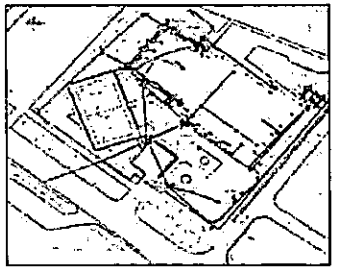

REGISTRO FOTOGRÁFICO

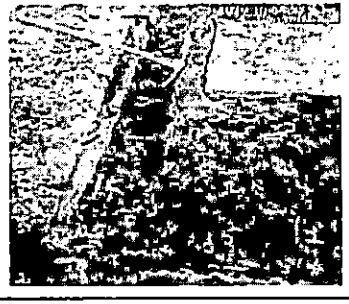

Alejandra Bolaños +
ARQ. ALEJANDRA BOLAÑOS
RESIDENTE CONTRATISTA

Jessica Lopera Arango
ARQ. JESSICA LOPERA
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

280

22

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA GENERAL / BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS	MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA PROYECTO: OBRAS PARA LAS DIFERENTES SEDES DE LA SECRETARÍA GENERAL -ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ	PRISMA / UNIVERSAL SEC S.A.S. CONTRATISTA	ARQUITECTURA URBANA LTDA. INTERVENTORÍA

ACTA PARCIAL No,	2	PERIODO DEL ACTA	1/09/2019	A	30/09/2019	
OBJETO	REALIZAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE AJUSTE LAS DIFERENTES OBRAS E INTERVENCIONES ESPECIALIZADAS PARA LAS DIFERENTES SEDES DE LA SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C.					
CONTRATO DE OBRA No	73 1-2019	CONTRATISTA	CONSORCIO PRUNI SEDES 04	ENTIDAD CONTRATANTE	SECRETARIA GENERAL-ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA	
CONTRATO INTERVENTORÍA	730 - 2019	INTERVENTORÍA	ARQUITECTURA URBANA LTDA	FRENTE:	IMPRENTA DISTRITAL	

PLANO DETALLE



ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARIA GENERAL

BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

PROYECTO: OBRAS PARA LAS DIFERENTES SEDES DE LA SECRETARÍA GENERAL -ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ

PRISMA; UNIVERSAL SEC S.A.S. — CONTRATISTA

ARQUITECTURA URBANA LTDA. — INTERVENTORÍA


ACTA PARCIAL No,	2		PERIODO DEL ACTA	1/09/2019	A	30/09/2019
OBJETO	REALIZAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE AJUSTE LAS DIFERENTES OBRAS E INTERVENCIONES ESPECIALIZADAS PARA LAS DIFERENTES SEDES DE LA SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C.					
CONTRATO DE OBRA No	73 1- 2019	CONTRATISTA	CONSORCIO PRUNI SEDES 04	ENTIDAD CONTRATANTE	SECRETARIA GENERAL-ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA	
CONTRATO INTERVENTORÍA	730 - 2019	INTERVENTORÍA	ARQUITECTURA URBANA LTDA	FRENTE:	IMPRENTA DISTRITAL	

CAPITULO	1.5.0	RED DE AGUAS NEGRAS	ITEM	1.5.0.5	TUBERIA PVC ALCANTARILLADO 110mm	UNIDAD	ML

ITEM	LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	TOTAL	UNIDAD
	COSTADO ORIENTE	34,00			1,00	34,00	MI
						34,00	ML
						34,00	ML

OBSERVACIONES:

LOCALIZACION PLANIMETRICA

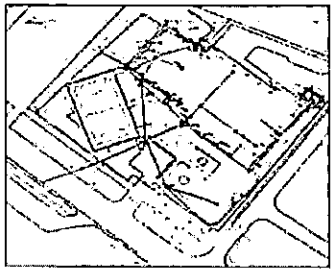

REGISTRO FOTOGRÁFICO



Alejandra Bolaños t
ARQ. ALEJANDRA BOLAÑOS
RESIDENTE CONTRATISTA

Jessica Lopera Arango
ARQ. JESSICA LOPERA
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

084

23

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA GENERAL

BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

PROYECTO: OBRAS PARA LAS DIFERENTES SEDES DE LA SECRETARÍA GENERAL -ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ

PRISMA
UNIVERSAL SEC S.A.S.
CONTRATISTA

ARQUITECTURA URBANA LTDA.
INTERVENTORÍA

ACTA PARCIAL No.	2		PERIODO DEL ACTA	1/09/2019	A	30/09/2019	
OBJETO	REALIZAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE AJUSTE LAS DIFERENTES OBRAS E INTERVENCIONES ESPECIALIZADAS PARA LAS DIFERENTES SEDES DE LA SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C.						
CONTRATO DE OBRA No	731-2019	CONTRATISTA	CONSORCIO PRUNI SEDES 04		ENTIDAD CONTRATANTE	SECRETARIA GENERAL-ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA	
CONTRATO INTERVENTORÍA	730-2019	INTERVENTORÍA	ARQUITECTURA URBANA LTDA		FRENTE:	IMPRENTA DISTRITAL	

PLANO DETALLE



C80


	MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA	PRISMA / UNIVERSAL SEC S.A.	ARQUITECTURA URBANA LTDA.
ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Secretaría Integración Social	PROYECTO: OBRAS SEDES ALCALDÍA	CONSORCIO PRUNI SEDES 04 — CONTRATISTA	INTERVENTORÍA

ACTA PARCIAL No,	2	PERIODO DEL ACTA	1/09/2019	A	30/09/2019	
OBJETO	REALIZAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE AJUSTE LAS DIFERENTES OBRAS E INTERVENCIONES ESPECIALIZADAS PARA LAS DIFERENTES SEDES DE LA SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C.					
CONTRATO DE OBRA No	73 1- 2019	CONTRATISTA	CONSORCIO PRUNI SEDES 04	ENTIDAD CONTRATANTE	SECRETARIA GENERAL-ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA	
CONTRATO INTERVENTORÍA	730 - 2019	INTERVENTORÍA	ARQUITECTURA URBANA LTDA	FRENTE:	IMPRENTA DISTRITAL	

CAPITULO	1,7	OBRAS CIVILES	ITEM	1,7,0,6	Excavación manual incluye retiro de material y Disposición final en sitios autorizados	UNIDAD	M3

ITEM	LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	TOTAL	UNIDAD
	COSTADO SUR						
	CAJA #1	1,00	1,10	0,55	1,00	0,61	M3
	CAJA #2	1,05	1,10	0,65	1,00	0,75	M3
	Canalización	1,60	0,40	0,65	1,00	0,42	M3
	CAJA #3	1,05	1,10	0,65	1,00	0,75	M3
	Canalización	1,40	0,40	0,65	1,00	0,36	M3
	CAJA #4	1,15	1,10	0,70	1,00	0,89	M3
OBSERVACIONES:				[redacted]		3,77	M3
				[redacted]		3,77	M3

LOCALIZACIÓN PLANIMÉTRICA

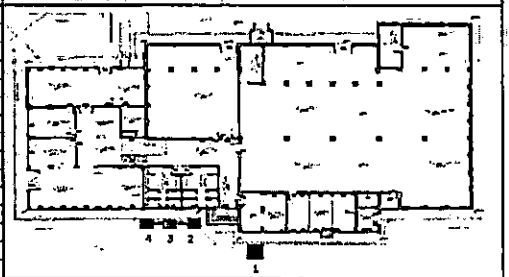

REGISTRO FOTOGRÁFICO



Alejandra Bolaños +
ARQ ALEJANDRA BOLAÑOS
RESIDENTE CONTRATISTA

Jessica Lopera Arango
ARQ. JESSICA LOPERA
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. | BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS
SECRETARÍA GENERAL

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

PROYECTO: OBRAS PARA LAS DIFERENTES SEDES DE LA SECRETARÍA GENERAL -ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ


PRISMA | UNIVERSAL SEC S.A.S. — CONTRATISTA
ARQUITECTURA URBANA LTDA — INTERVENTORÍA

ACTA PARCIAL No,	2		PERIODO DEL ACTA	1/09/2019	A	30/09/2019	
OBJETO	REALIZAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE AJUSTE LAS DIFERENTES OBRAS E INTERVENCIONES ESPECIALIZADAS PARA LAS DIFERENTES SEDES DE LA SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C.						
CONTRATO DE OBRA No	731-2019	CONTRATISTA	CONSORCIO PRUNI SEDES 04		ENTIDAD CONTRATANTE	SECRETARIA GENERAL-ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA	
CONTRATO INTERVENTORÍA	730-2019	INTERVENTORÍA	ARQUITECTURA URBANA LTDA		FRENTE:	IMPRENTA DISTRITAL	


CAPITULO	1.7	PRELIMINARES	ITEM	1.7.0.9	Relleno en arena	UNIDAD	M3

ITEM	LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	TOTAL	UNIDAD
	COSTADO ORIENTE	34,00	0,40	0,10	1,00	1,36	M3
OBSERVACIONES:				SUBTOTAL		1,36	M3
				TOTAL		1,36	M3

LOCALIZACION PLANIMETRICA

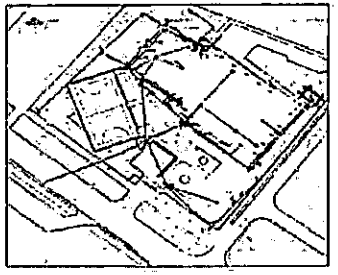

REGISTRO FOTOGRÁFICO

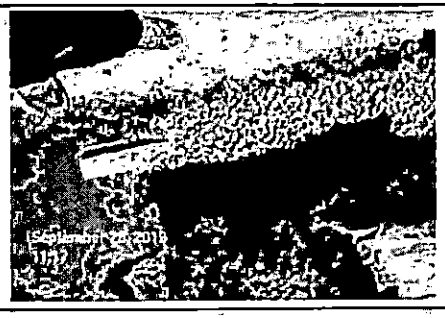

Alejandra Bolaños

ARQ. ALEJANDRA BOLAÑOS
RESIDENTE CONTRATISTA

Jessica Lopera A


ARQ. JESSICA LOPERA
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

280

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA GENERAL / BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS	MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA PROYECTO: OBRAS PARA LAS DIFERENTES SEDES DE LA SECRETARÍA GENERAL -ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ	PRISMA! UNIVERSAL SEC S.A.S. (CONTRATISTA) / ARQUITECTURA URBANA LTDA. (INTERVENTORÍA)

ACTA PARCIAL No,	2		PERIODO DEL ACTA	1/09/2019	A	30/09/2019
OBJETO	REALIZAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE AJUSTE LAS DIFERENTES OBRAS E INTERVENCIONES ESPECIALIZADAS PARA LAS DIFERENTES SEDES DE LA SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C.					
CONTRATO DE OBRA No	73 1-2019	CONTRATISTA	CONSORCIO PRUNI SEDES 04		ENTIDAD CONTRATANTE	SECRETARIA GENERAL-ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA
CONTRATO INTERVENTORÍA	730 - 2019	INTERVENTORÍA	ARQUITECTURA URBANA LTDA		LUGAR:	IMPRENTA DISTRITAL

PLANO DETALLE

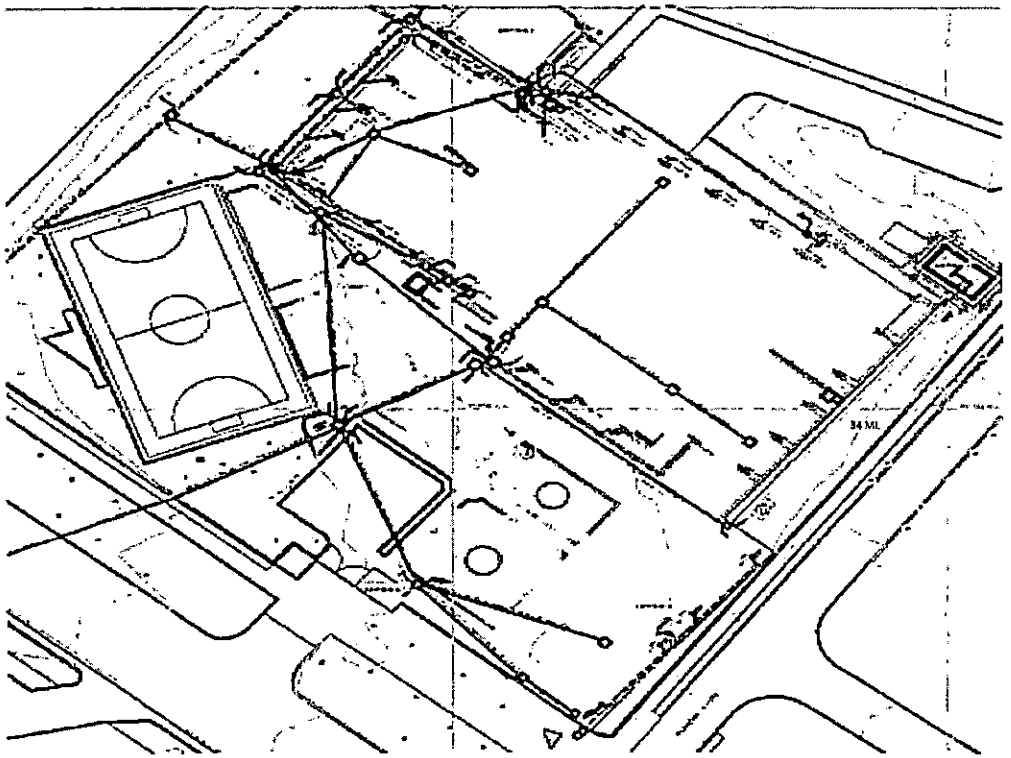

088

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
Secretaría Integración Social
Integración Social

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

PROYECTO: OBRAS SEDES ALCALDÍA

PRISMA — UNIVERSAL SEC S.A.S. — CONTRATISTA
ARQUITECTURA URBANA LTDA — INTERVENTORÍA

ACTA PARCIAL No,	2		PERIODO DEL ACTA	1/09/2019	A	30/09/2019
OBJETO	REALIZAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE AJUSTE LAS DIFERENTES OBRAS E INTERVENCIONES ESPECIALIZADAS PARA LAS DIFERENTES SEDES DE LA SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C.					
CONTRATO DE OBRA No	731-2019	CONTRATISTA	CONSORCIO PRUNI SEDES 04		ENTIDAD CONTRATANTE	SECRETARIA GENERAL-ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA
CONTRATO INTERVENTORÍA	730-2019	INTERVENTORÍA	ARQUITECTURA URBANA LTDA		FRENTE:	IMPRENTA DISTRITAL

CAPITULO	2.1.0	PRELIMINARES	ITEM	2.1.0.3	BAÑO MOVIL	UNIDAD	MES


ITEM	LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	TOTAL	UNIDAD
1	Baño movil (Instalado 17 de julio)				1,00	1,00	MES
2	Baño movil (Instalado 02 de Septiembre)				1,00	1,00	MES
						2,00	MES
						√2,00	MES

OBSERVACIONES: INGRESO A OBRA DE BAÑO PORTATIL 17 DE JULIO DE 2019

LOCALIZACION PLANIMETRICA



REGISTRO FOTOGRAFICO

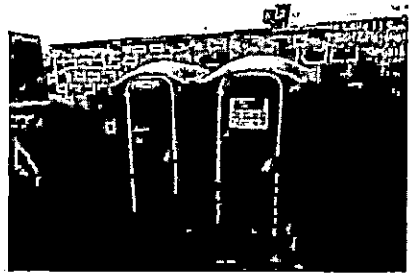

Alejandra Bolaños +
ARQ. ALEJANDRA BOLAÑOS
RESIDENTE CONTRATISTA

Jessica Lopera Arango
ARQ. JESSICA LOPERA
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

089


ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA Integración Social	MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA PROYECTO: OBRAS SEDES ALCALDÍA	PRISMA UNIVERSAL SEC S.A.S. CONSORCIO PRISMA 04 CONTRATISTA	ARQUITECTURA URBANA LTDA INTERVENTORÍA

ACTA PARCIAL No,	2	PERIODO DEL ACTA	1/09/2019	A	30/09/2019	
OBJETO	REALIZAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE AJUSTE LAS DIFERENTES OBRAS E INTERVENCIONES ESPECIALIZADAS PARA LAS DIFERENTES SEDES DE LA SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C.					
CONTRATO DE OBRA No	73 1-2019	CONTRATISTA	CONSORCIO PRISMA SEDES 04	ENTIDAD CONTRATANTE	SECRETARIA GENERAL-ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA	
CONTRATO INTERVENTORÍA	730 - 2019	INTERVENTORÍA	ARQUITECTURA URBANA LTDA	FRENTE:	IMPRENTA DISTRITAL	


CAPITULO	2.2.0	CIMENTACION	ITEM	2.2.0.1	Demoler piso y contrapiso	UNIDAD	M2

ITEM	LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	TOTAL	UNIDAD
	COSTADO SUR						
	REDES ELECTRICAS						
	FACHADA SUR						
	CAJA #11	2,10	1,50			3,15	M2
	Canalización #12	10,00	0,60			6,00	M2
	CAJA #13	2,10	1,50			3,15	M2
	Canalización #14	4,50	0,60			2,70	M2
	Canalización #15	1,80	0,60			1,08	M2
	CAJA #16	2,00	1,60			3,20	M2
	REDES HIDROSANITARIAS						
	CAJA #5	1,05	1,10			1,16	M2
	Canalización	1,60	0,40			0,64	M2
	CAJA #6	1,05	1,10			1,16	M2
	Canalización	1,40	0,40			0,55	M2
	CAJA #7	1,15	1,10			1,27	M2
	CIMENTACION AREA 1 Y 2						
	VIGAS DE CIMENTACION EN COLUMNAS #8	1,10	0,30		8,00	0,33	M2
OBSERVACIONES:				[redacted]		24,39	M2
				[redacted]		24,39	M2

LOCALIZACION PLANIMETRICA

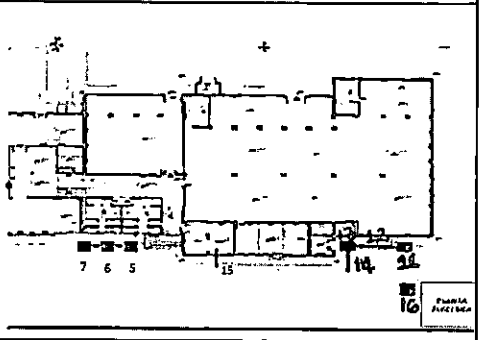

REGISTRO FOTOGRAFICO

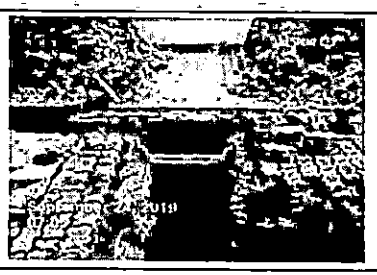


Alejandra Bolaños +
ARQ. ALEJANDRA BOLAÑOS
RESIDENTE CONTRATISTA

Jessica Lopera Arango
ARQ. JESSICA LOPERA
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Secretaría Integración Social	MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA PROYECTO: OBRAS SEDES ALCALDÍA	PRISMA UNIVERSAL SEC S.A.S. CONSORCIO PRUNI SEDES 04 CONTRATISTA	ARQUITECTURA URBANA LTDA. INTERVENTORÍA

ACTA PARCIAL No,	2		PERIODO DEL ACTA	1/09/2019	A	30/09/2019
OBJETO	REALIZAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE AJUSTE LAS DIFERENTES OBRAS E INTERVENCIONES ESPECIALIZADAS PARA LAS DIFERENTES SEDES DE LA SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C.					
CONTRATO DE OBRA No	731-2019	CONTRATISTA	CONSORCIO PRUNI SEDES 04	ENTIDAD CONTRATANTE		SECRETARIA GENERAL-ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA
CONTRATO INTERVENTORÍA	730 - 2019	INTERVENTORIA	ARQUITECTURA URBANA LTDA	FRENTE:		IMPRENTA DISTRITAL

PLANO DETALLE

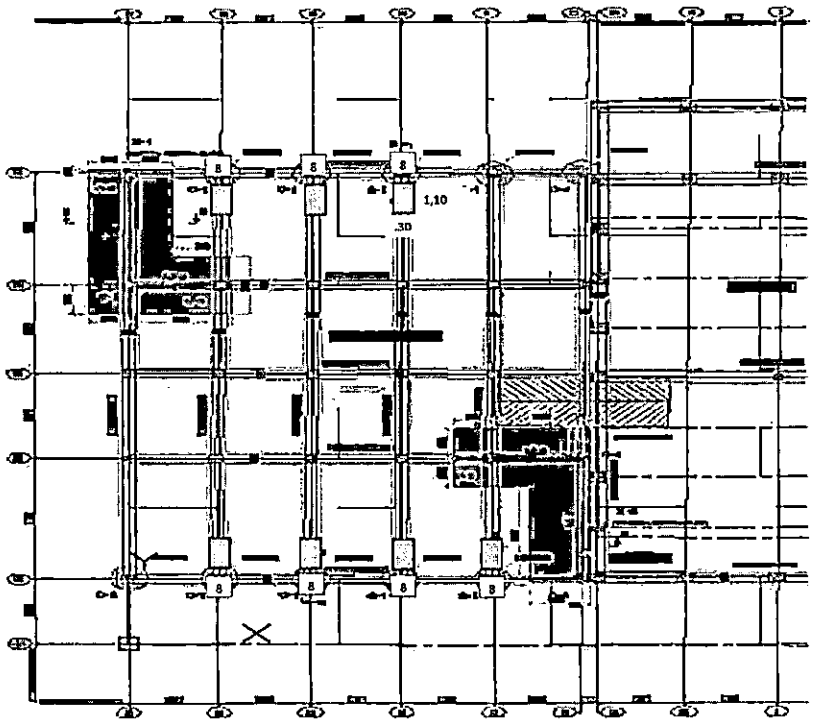

091

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
Secretaría Integración Social

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

PROYECTO: OBRAS SEDES ALCALDÍA

PRISMA — UNIVERSAL SEC S.A.S. — CONSORCIO PRUNISEDES 04 — CONTRATISTA

ARQUITECTURA URBANA LTDA. — INTERVENTORÍA

ACTA PARCIAL No,	2	PERIODO DEL ACTA	1/09/2019	A	30/09/2019		
OBJETO	REALIZAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE AJUSTE LAS DIFERENTES OBRAS E INTERVENCIONES ESPECIALIZADAS PARA LAS DIFERENTES SEDES DE LA SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C.						
CONTRATO DE OBRA No	731-2019	CONTRATISTA	CONSORCIO PRUNISEDES 04		ENTIDAD CONTRATANTE	SECRETARIA GENERAL-ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA	
CONTRATO INTERVENTORÍA	730 - 2019	INTERVENTORÍA	ARQUITECTURA URBANA LTDA		FRENTE:	IMPRENTA DISTRITAL	


CAPÍTULO	2.2.0	CIMENTACION	ITEM	2.2.0.4	Demoler vigas de cimiento	UNIDAD	M3

ITEM	LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	TOTAL	UNIDAD
	ZONA ADMINISTRACION						
1	Eje A entre 5'-4'	5,47	0,25	0,30	1,00	0,41	M3
2	Eje 4' entre A-B	2,70	0,25	0,30	1,00	0,20	M3
3	Ejes B-C-D entre 5'-4'	1,10	0,25	0,30	3,00	0,25	M3
4	Eje 5' entre B-D	0,45	0,25	0,30	6,00	0,20	M3
5	Eje 5' entre A-B	1,65	0,25	0,30	1,00	0,12	M3
6	Eje A entre 4'-3'	1,50	0,25	0,30	1,00	0,11	M3
7	Eje B Entre 5'-4'	1,47	0,25	0,30	2,00	0,22	M3
8	Eje 1' entre B-E	1,70	0,25	0,30	4,00	0,38	M3
9	Eje 1'-A (esquina)	0,25	0,25	0,30	2,00	0,04	M3
10	Eje 1' entre B-E	0,40	0,25	0,30	8,00	0,24	M3
11	Eje VC 1'-F	1,75	0,25	0,30	1,00	0,13	M3
12	Eje E entre 2'-3'	1,40	0,25	0,30	1,00	0,11	M3
13	Eje 2 entre D-E	1,15	0,25	0,30	1,00	0,09	M3
14	Eje E entre 2'-1'	1,58	0,25	0,30	1,00	0,10	M3
15	Eje F entre 2' - 3'	1,40	0,25	0,30	1,00	0,11	M3

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Secretaría Integración Social	MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA PROYECTO: OBRAS SEDES ALCALDÍA	PRISMA UNIVERSAL SEC S.A.S. CONTRATISTA	ARQUITECTURA URBANA LTDA. INTERVENTORÍA

ACTA PARCIAL No,	2		PERIODO DEL ACTA	1/09/2019	A	30/09/2019
OBJETO	REALIZAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE AJUSTE LAS DIFERENTES OBRAS E INTERVENCIONES ESPECIALIZADAS PARA LAS DIFERENTES SEDES DE LA SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C.					
CONTRATO DE OBRA No	731-2019	CONTRATISTA	CONSORCIO PRUNI SEDES 04		ENTIDAD CONTRATANTE	SECRETARIA GENERAL-ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA
CONTRATO INTERVENTORÍA	730-2019	INTERVENTORÍA	ARQUITECTURA URBANA LTDA		FRENTE:	IMPRENTA DISTRITAL

PLANO DETALLE

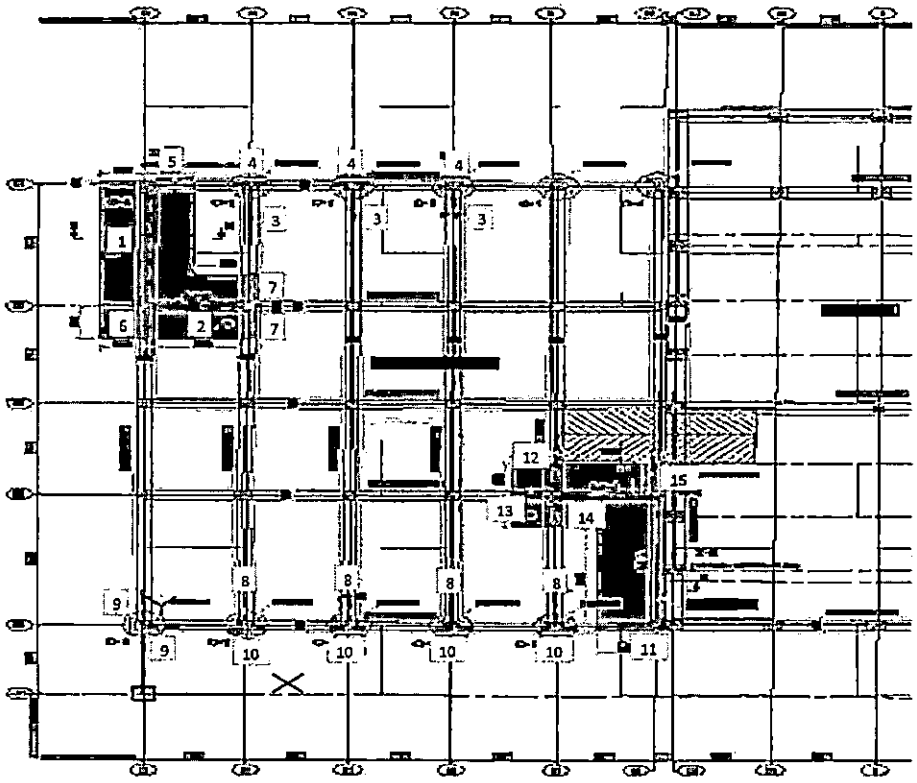

093

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
Secretaría Integración Social

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

PROYECTO: OBRAS SEDES ALCALDÍA

PRISMA — UNIVERSAL SEC S.A. — CONSORCIO PRUNI SEDES 04 — CONTRATISTA


ARQUITECTURA URBANA LTDA. — INTERVENTORÍA

ACTA PARCIAL No,	2		PERIODO DEL ACTA	1/09/2019	A	30/09/2019
OBJETO.	REALIZAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE AJUSTE LAS DIFERENTES OBRAS E INTERVENCIONES ESPECIALIZADAS PARA LAS DIFERENTES SEDES DE LA SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C.					
CONTRATO DE OBRA No	73 1- 2019	CONTRATISTA	CONSORCIO PRUNI SEDES 04		ENTIDAD CONTRATANTE	SECRETARIA GENERAL-ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA
CONTRATO INTERVENTORÍA	730 - 2019	INTERVENTORÍA	ARQUITECTURA URBANA LTDA		FRENTE:	IMPRENTA DISTRITAL


CAPITULO	2.2.0	CIMENTACION	ITEM	2.2.0.5	Concreto pobre	UNIDAD	M2

ITEM	LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	TOTAL:	UNIDAD
	COSTADO SUR						
	Caja de inspección B1	1,15	1,10		1,00	1,27	M2
OBSERVACIONES:				SUBTOTAL		1,27	M2
				TOTAL		1,27	M2

LOCALIZACION PLANIMETRICA

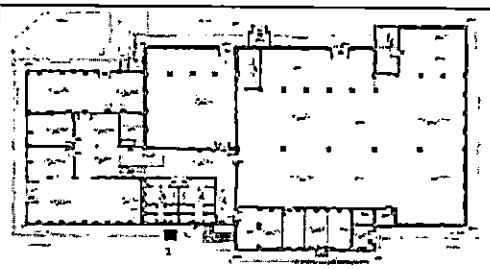

REGISTRO FOTOGRAFICO

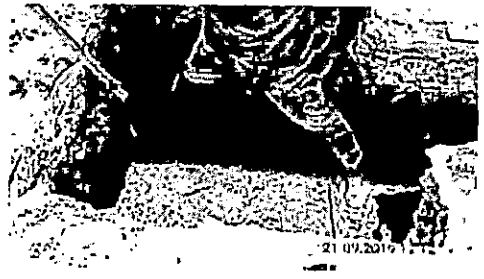

Alejandra Bolaños

ARQ. ALEJANDRA BOLAÑOS
RESIDENTE CONTRATISTA

Jessica Lopera Arango

ARQ. JESSICA LOPERA
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

009.4

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
Secretaría Integración Social

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

PROYECTO: OBRAS SEDES ALCALDÍA

PRISMA — UNIVERSALSEC S.A.S. — CONSORCIO PRUNI SEDES 04 — CONTRATISTA


ARQUITECTURA URBANA LTDA — INTERVENTORÍA

ACTA PARCIAL No,	2	PERIODO DEL ACTA	1/09/2019	A	30/09/2019	
OBJETO	REALIZAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE AJUSTE LAS DIFERENTES OBRAS E INTERVENCIONES ESPECIALIZADAS PARA LAS DIFERENTES SEDES DE LA SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C.					
CONTRATO DE OBRA No	73 1- 2019	CONTRATISTA	CONSORCIO PRUNI SEDES 04	ENTIDAD CONTRATANTE	SECRETARIA GENERAL-ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA	
CONTRATO INTERVENTORÍA	730 - 2019	INTERVENTORÍA	ARQUITECTURA URBANA LTDA	FRENTE:	IMPRENTA DISTRITAL	

CAPITULO	2.2.0	CIMENTACION	ITEM	2.2.0.6	Concreto ciclópeo, Piedra media zonga y concreto de 3.000 psi	UNIDAD	M3

ITEM	LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES AREA	DIMENSIONES ALTO	CANTIDAD	TOTAL	UNIDAD
	ADMINISTRACION 1ER PISO					
	AREA 1-ESPACIO KODAK					
	ZAPATA 1					
	A	7,25	1,90	1,00	13,78	M3
OBSERVACIONES:			SUB TOTAL		13,78	M3
			TOTAL		13,78	M3

LOCALIZACION PLANIMETRICA

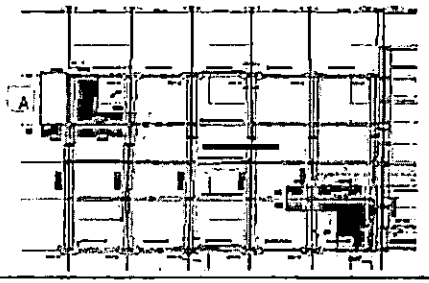

REGISTRO FOTOGRAFICO



Alejandra Bolaños +
ARQ. ALEJANDRA BOLAÑOS
RESIDENTE CONTRATISTA

Jessica Lopera Arango
ARQ. JESSICA LOPERA
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

095

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
Secretaría Integración Social

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

PROYECTO: OBRAS SEDES ALCALDÍA

PRISMA — UNIVERSAL SEC S.A.S. — CONSORCIO PRUNI SEDES 04 — CONTRATISTA

ARQUITECTURA URBANA LTDA — INTERVENTORÍA


ACTA PARCIAL No,	2		PERIODO DEL ACTA	1/09/2019	A	30/09/2019	
OBJETO	REALIZAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE AJUSTE LAS DIFERENTES OBRAS E INTERVENCIONES ESPECIALIZADAS PARA LAS DIFERENTES SEDES DE LA SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C.						
CONTRATO DE OBRA No	731- 2019	CONTRATISTA	CONSORCIO PRUNI SEDES 04		ENTIDAD CONTRATANTE	SECRETARIA GENERAL-ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA	
CONTRATO INTERVENTORÍA	730 - 2019	INTERVENTORÍA	ARQUITECTURA URBANA LTDA		FRENTE:	IMPRENTA DISTRITAL	

CAPITULO	2.2.0	CIMENTACION	ITEM	2.2.0.7	Concreto de zapatas - 4,000 PSI	UNIDAD	M3


ITEM	LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	TOTAL	UNIDAD
	ADMINISTRACION 1ER PISO						
	ZAPATA 1						
	ZAPATA 1 - AREA 1	4,70	3,07	0,30	1,00	4,33	M3
	ZAPATA 1 - AREA 2	2,80	4,50	0,30	1,00	3,78	M3
	ZAPATA 2						
	ZAPATA 2 - AREA 3	2,00	4,92	0,30	1,00	2,95	M3
	ZAPATA 2 - AREA 4	4,50	3,00	0,30	1,00	4,05	M3
	DADOS #5	0,90	0,90	0,35	4,00	1,13	M3
	VIGA DE CIMENTACIÓN #5	1,00	0,20	0,25	4,00	0,20	M3
						16,44	M3
						V16,44	M3

OBSERVACIONES:

LOCALIZACION PLANIMETRICA

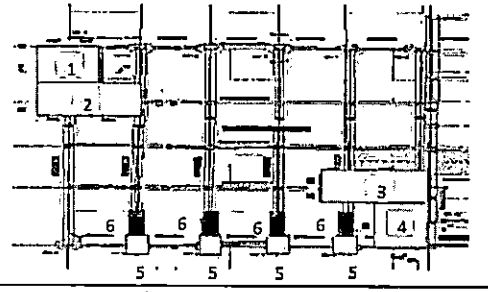

REGISTRO FOTOGRAFICO

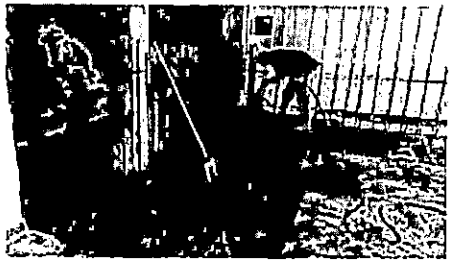

Alejandra Bolaños +
ARQ. ALEJANDRA BOLAÑOS
RESIDENTE CONTRATISTA

Jessica Lopera A
ARQ. JESSICA LOPERA
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

960 - 0

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Secretaría Integración Social

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

PROYECTO: OBRAS SEDES ALCALDÍA

PRISMA — UNIVERSAL SEC S.A.S. — CONTRATISTA


ARQUITECTURA URBANA LTDA. — INTERVENTORIA

ACTA PARCIAL No.	2		PERIODO DEL ACTA	1/09/2019	A	30/09/2019
OBJETO	REALIZAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE AJUSTE LAS DIFERENTES OBRAS E INTERVENCIONES ESPECIALIZADAS PARA LAS DIFERENTES SEDES DE LA SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C.					
CONTRATO DE OBRA No	73 1- 2019	CONTRATISTA	CONSORCIO PRUNI SEDES 04		ENTIDAD CONTRATANTE	SECRETARIA GENERAL-ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA
CONTRATO INTERVENTORÍA	730 - 2019	INTERVENTORÍA	ARQUITECTURA URBANA LTDA		FRENTE:	IMPRENTA DISTRITAL


CAPITULO	2.2.0	CIMENTACION	ITEM	2.2.0.8	Suministro (instalación) figurado y amarre de acero 60000 PSI 420 Mpa.	UNIDAD	KG

ITEM	LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES FIGURA	DIMENSIONES LONGITUD	DIMENSIONES PESO	CANTIDAD	TOTAL	UNIDAD
	ZAPATA 1						
	Acero 5/8" con .20m de escuadra (doble)		3,10	1,552	40,00	192,45	KG
	Acero 5/8" con .20m de escuadra		4,35	1,552	28,00	189,03	KG
	Acero 5/8" con .20m de escuadra		2,02	1,552	28,00	87,78	KG
	Acero 5/8" recto		2,50	1,552	14,00	54,32	KG
	Acero 5/8" con .20m de escuadra		1,70	1,552	12,00	31,66	KG
	Acero 5/8" recto		5,30	1,552	24,00	197,41	KG
	Acero 5/8" con .20m de escuadra		2,80	1,552	24,00	104,29	KG
	Acero 5/8" con .25m de escuadra (doble)		3,40	1,552	14,00	73,88	KG
	Acero 5/8" recto		1,20	1,552	12,00	22,35	KG
	Acero 5/8" con .20m de escuadra (doble)		1,75	1,552	4,00	10,86	KG
	Acero 1/2" recto		1,10	0,994	8,00	8,75	KG
	ADICIONALES ZAPATA 1						
	Acero 5/8" con .20m de escuadra		1,60	1,552	10,00	24,83	KG
	VC EN ZAPATA 1						
	Acero 5/8" con .25m de escuadra (doble)		1,60	1,552	4,00	9,93	KG
	Fleje 3/8" .20x.20 con .10m de gancho		1,00	0,56	6,00	3,36	KG
	DADOS EJE 1' (D-C-D-E)						
	Acero 1/2" con .15m de escuadra (doble)		1,00	0,994	22,00	21,87	KG
	Fleje 3/8" .70x.15 con .10m de gancho		1,90	0,560	30,00	31,92	KG
	U 3/8"		0,65	0,560	12,00	4,37	KG
	ANCLAJE A COLUMNAS C-1 (VC)						
	Acero 1/2" recto		0,90	0,994	16,00	14,31	KG
OBSERVACIONES:						1.083,38	KG
						1.083,38	KG

LOCALIZACION PLANIMETRICA

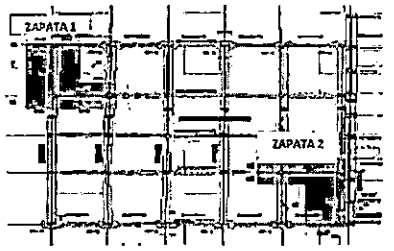

REGISTRO FOTOGRAFICO

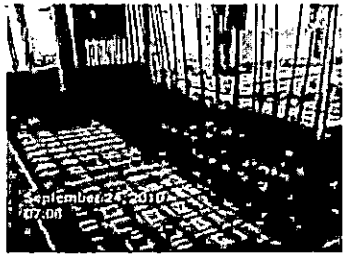

Alejandra Bolaños +

ARQ. ALEJANDRA BOLAÑOS
RESIDENTE CONTRATISTA

Jessica Lopera A


ARQ. JESSICA LOPERA
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

097

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Secretaría Integración Social	MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA	PRISMA / UNIVERSOL SEC S.A.S.	ARQUITECTURA URBANA LTDA.
	PROYECTO: OBRAS SEDES ALCALDÍA	CONTRATISTA	INTERVENTORÍA

ACTA PARCIAL No,	2	PERIODO DEL ACTA	1/09/2019	A	30/09/2019	
OBJETO	REALIZAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE AJUSTE LAS DIFERENTES OBRAS E INTERVENCIONES ESPECIALIZADAS PARA LAS DIFERENTES SEDES DE LA SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C.					
CONTRATO DE OBRA No	731- 2019	CONTRATISTA	CONSORCIO PRUNI SEDES 04	ENTIDAD CONTRATANTE	SECRETARIA GENERAL-ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA	
CONTRATO INTERVENTORÍA	730- 2019	INTERVENTORÍA	ARQUITECTURA URBANA LTDA	FRENTE:	IMPRENTA DISTRITAL	

PLANO DETALLE

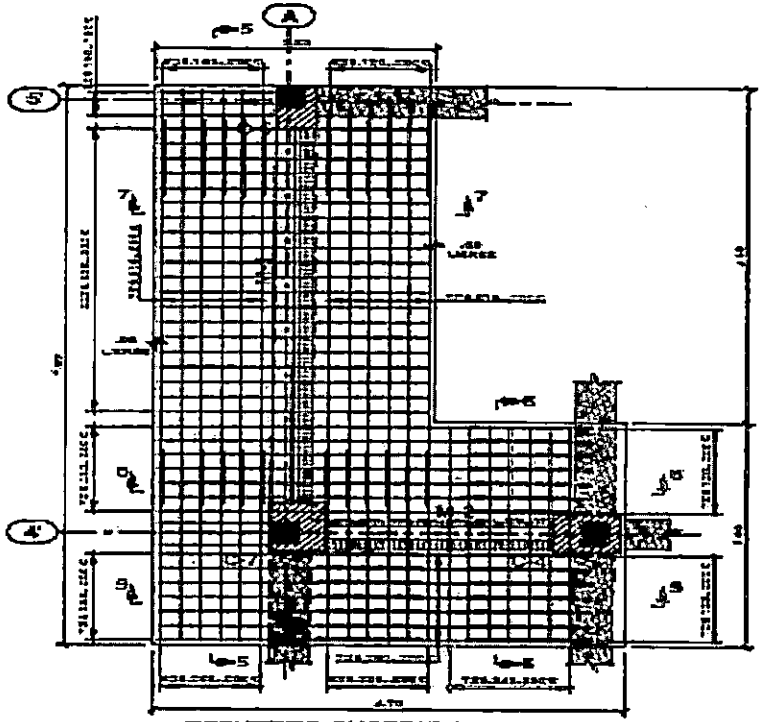

REFUERZO SUPERIOR E INFERIOR
ZAPATA Z-1
ESC 1:50

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
Secretaría Integración Social

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

PROYECTO: OBRAS SEDES ALCALDÍA

PRISMA — UNIVERSAL SEC S.A.S. — CONTRATISTA
ARQUITECTURA URBANA LTDA — INTERVENTORÍA

ACTA PARCIAL No.	2		PERIODO DEL ACTA	1/09/2019	A	30/09/2019	
OBJETO	REALIZAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE AJUSTE LAS DIFERENTES OBRAS E INTERVENCIONES ESPECIALIZADAS PARA LAS DIFERENTES SEDES DE LA SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTA D.C.						
CONTRATO DE OBRA No	731- 2019	CONTRATISTA	CONSORCIO PRUNI SEDES 64		ENTIDAD CONTRATANTE	SECRETARIA GENERAL-ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA	
CONTRATO INTERVENTORÍA	730- 2019	INTERVENTORÍA	ARQUITECTURA URBANA LTDA		FRENTE:	IMPRENTA DISTRITAL	


CAPITULO	2.2.0	CIMENTACION	ITEM	2.2.0.8	Suministro (instalación) figurado y amarre de acero 60000 PSI 420 Mpa.	UNIDAD	KG

ITEM	LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES FIGURA	DIMENSIONES LONGITUD	DIMENSIONES PESO	CANTIDAD	TOTAL	UNIDAD
	VIENEN					1.083,38	KG
	ZAPATA 2						
	Acero 5/8" recto		1,20	1,55	16,00	29,76	KG
	Acero 5/8" recto		5,80	1,55	16,00	143,84	KG
	Acero 5/8" con .20m de escuadra		1,60	1,55	12,00	29,76	KG
	Acero 5/8" con .20m de escuadra		2,65	1,55	16,00	65,72	KG
	Acero 5/8" con .20m de escuadra (dob'e)		3,40	1,55	10,00	52,70	KG
	Acero 5/8" con .20m de escuadra		1,40	1,55	12,00	25,04	KG
	Acero 5/8" con .20m de escuadra		1,60	1,55	12,00	29,76	KG
	Acero 5/8" con .20m de escuadra (doble)		2,46	1,55	46,00	175,40	KG
	Acero 5/8" con .20m de escuadra (doble)		3,60	1,55	14,00	78,12	KG
	Acero 5/8" recto		1,20	1,55	14,00	26,04	KG
	Acero 5/8" con .20m de escuadra		2,70	1,55	14,00	58,59	KG
	Acero 5/8" recto		2,70	1,55	14,00	58,59	KG
	Acero 5/8" con .20m de escuadra		2,70	1,55	14,00	58,59	KG
	ADICIONALES ZAPATA 2						
	Acero 5/8" con .20m de escuadra		2,00	1,55	26,00	80,60	KG
	VC ADICIONAL						
	Acero 1/2" recto		6,00	0,99	4,00	23,86	KG
	Acero 1/2" recto		0,80	0,99	8,00	6,36	KG
	Fle'e 3/8" .10x.20 con .10m de gancho		1,00	0,56	30,00	16,80	KG
	SEPARADORES DE PARRILLA		0,70	0,56	10,00	3,92	KG

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Secretaría Integración Social	MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA PROYECTO: OBRAS SEDES ALCALDÍA	PRISMA UNIVERSAL SEC S.A.S. CONSORCIO PRUNI SEDES 04 CONTRATISTA ARQUITECTURA URBANA LTDA. INTERVENTORÍA

ACTA PARCIAL No.	2		PERIODO DEL ACTA	1/09/2019	A	30/09/2019	
OBJETO	REALIZAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE AJUSTE LAS DIFERENTES OBRAS E INTERVENCIONES ESPECIALIZADAS PARA LAS DIFERENTES SEDES DE LA SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C.						
CONTRATO DE OBRA No	731- 2019	CONTRATISTA	CONSORCIO PRUNI SEDES 04		ENTIDAD CONTRATANTE		SECRETARIA GENERAL-ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA
CONTRATO INTERVENTORÍA	730 - 2019	INTERVENTORÍA	ARQUITECTURA URBANA LTDA		[illegible]		IMPRENTA DISTRITAL

PLANO DETALLE

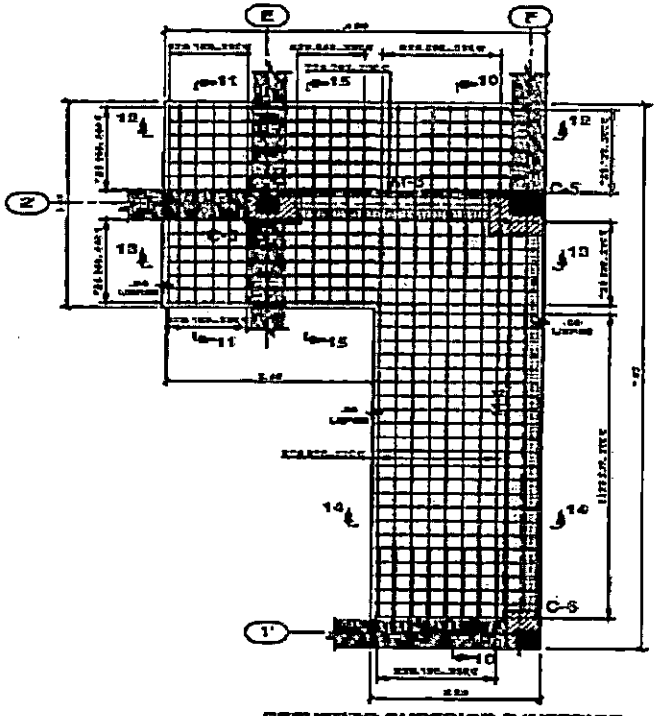

REFUERZO SUPERIOR E INFERIOR
ZAPATA Z-2
ESC 1:50

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Gobierno Integración Social

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

PROYECTO: OBRAS SEDES ALCALDÍA


PRISMA UNIVERSAL SEC S.A.S. — CONTRATISTA | INTERVENTORÍA

ACTA PARCIAL No,	2		PERIODO DEL ACTA	01/09/2019	A	30/09/2019
OBJETO	REALIZAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE AJUSTE LAS DIFERENTES OBRAS E INTERVENCIONES ESPECIALIZADAS PARA LAS DIFERENTES SEDES DE LA SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C.					
CONTRATO DE OBRA No	731-2019	CONTRATISTA	CONSORCIO PRISMA SEDES 04		ENTIDAD CONTRATANTE	SECRETARIA GENERAL-ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA
CONTRATO INTERVENTORÍA	730-2019	INTERVENTORÍA	ARQUITECTURA URBANA LTDA		FRENTE	IMPRENTA DISTRITAL


CAPITULO	2.3.0	COLUMNAS Y MUROS	ITEM	2.3.0.3	Suministro (instalación) figurado y armado de acero 60000 PSI 420 Mpa.	UNIDAD	KG

ITEM	LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES FIGURA	LONGITUD	PESO	CANTIDAD	TOTAL	UNIDAD
	MURO M-1						
	Acero 3/8" con .20m de escuadra		1,35	0,56	52,00	39,31	KG
	Acero 3/8" recto		3,00	0,56	52,00	87,36	KG
	Acero 3/8" recto		1,45	0,56	52,00	42,33	KG
	Acero 3/8" con .20m de escuadra		2,40	0,56	30,00	40,32	KG
	Acero 3/8" con .20m de escuadra		4,10	0,56	30,00	68,88	KG
	Acero 3/8" con .10m de ganchos		0,45	0,56	155,00	69,14	KG
	MURO M-2						
	Acero 3/8" con .20m de escuadra		1,35	0,56	24,00	18,14	KG
	Acero 3/8" recto		3,00	0,56	24,00	40,32	KG
	Acero 3/8" recto		1,45	0,56	24,00	19,49	KG
	Acero 3/8" con .20m de escuadra		1,50	0,56	30,00	25,20	KG
	Acero 3/8" con .20m de escuadra		2,25	0,56	30,00	37,80	KG
	Acero 3/8" con .10m de ganchos		0,45	0,56	90,00	22,68	KG
	COLUMNA C-4						
	Acero 7/8" con .20m de escuadra		2,00	3,04	7,00	42,56	KG
	Acero 7/8" con .20m de escuadra		1,65	3,04	3,00	15,06	KG
	Acero 7/8" recto		3,00	3,04	10,00	91,26	KG
	Acero 7/8" recto		2,45	3,04	10,00	74,53	KG
	Acero 1/8" con .60m de escuadra (doble)		1,25	0,56	62,00	43,40	KG
	Acero 3/8" con .15m de escuadra		0,50	0,56	15,00	4,20	KG
	Acero 3/8" con .15m de escuadra		0,30	0,56	45,00	7,56	KG
	Acero 3/8" con .10m de ganchos		0,65	0,56	31,00	11,28	KG
OBSERVACIONES:				SUB TOTAL		730,75	KG
				TOTAL		730,75	KG

LOCALIZACION PLANIMETRICA

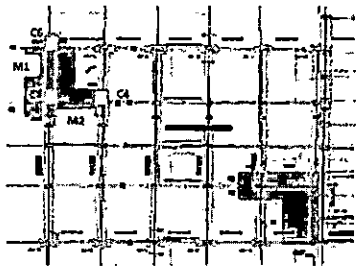

REGISTRO FOTOGRAFICO




Alejandra Bolaños
ARQ. ALEJANDRA BOLAÑOS
RESIDENTE CONTRATISTA


Jessica Lopera A.
ARQ. JESSICA LOPERA
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA


ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Secretaría Integración Social	MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA	PRISMA UNIVERSAL SEC S.A.S. CONSORCIO PRUNI SEDES D4 CONTRATISTA	ARQUITECTURA URBANA LTDA. INTERVENTORÍA
	PROYECTO: OBRAS SEDES ALCALDÍA		


ACTA PARCIAL No.	2		PERIODO DEL ACTA	1/09/2019	A	30/09/2019	
OBJETO	REALIZAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE AJUSTE LAS DIFERENTES OBRAS E INTERVENCIONES ESPECIALIZADAS PARA LAS DIFERENTES SEDES DE LA SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C.						
CONTRATO DE OBRA No	731-2019	CONTRATISTA	CONSORCIO PRUNI SEDES D4		ENTIDAD CONTRATANTE	SECRETARIA GENERAL-ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA	
CONTRATO INTERVENTORÍA	730-2019	INTERVENTORÍA	ARQUITECTURA URBANA LTDA		FRENTE:	IMPRENTA DISTRITAL	

PLANO DETALLE

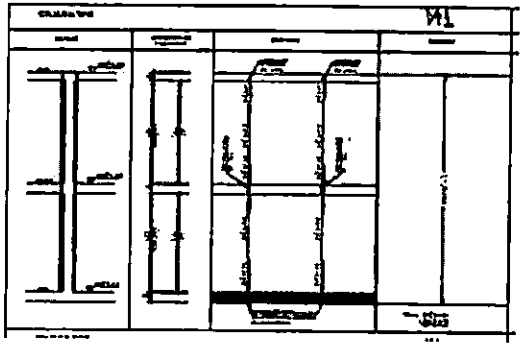

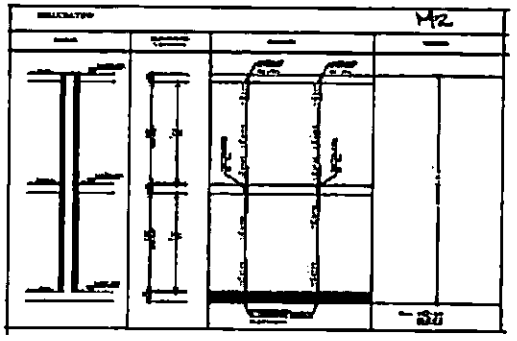





ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
Secretaría Integración Social

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

PROYECTO: OBRAS SEDES ALCALDÍA

PRISMA — UNIVERSAL SEC S.A.S. — CONSORCIO PRUNI SEDES 04 — CONTRATISTA


ARQUITECTURA URBANA LTDA — INTERVENTORÍA

ACTA PARCIAL No.	2		PERIODO DEL ACTA	01/09/2019	A	30/09/2019	
OBJETO	REALIZAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE AJUSTE LAS DIFERENTES OBRAS E INTERVENCIONES ESPECIALIZADAS PARA LAS DIFERENTES SEDES DE LA SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C.						
CONTRATO DE OBRA No	73 1- 2019	CONTRATISTA	CONSORCIO PRUNI SEDES 04		ENTIDAD CONTRATANTE	SECRETARIA GENERAL-ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA	
CONTRATO INTERVENTORÍA	730 - 2019	INTERVENTORÍA	ARQUITECTURA URBANA LTDA		FRENTE:	IMPRENTA DISTRITAL	


CAPITULO	2.3.0	COLUMNAS Y MUROS	ITEM	2.3.0.3	Suministro (instalación) figurada y amarre de acero 60000 PSI 420 Mpa.	UNIDAD	KG

ITEM	LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES FIGURA	LONGITUD	PESO	CANTIDAD	TOTAL	UNIDAD
	VIENE					780,75	KG
	COLUMNA C-6						
	Acero 7/8" con .20m de escuadra		2,00	3,04	5,00	30,42	KG
	Acero 7/8" recto		1,65	3,04	2,00	10,04	KG
	Acero 7/8" recto		3,00	3,04	7,00	63,88	KG
	Acero 7/8" recto		2,45	3,04	7,00	52,17	KG
	Acero 3/8" con .25m de escuadra		0,60	0,56	31,00	10,42	KG
	Acero 3/8" con .25m de escuadra (doble)		0,65	0,56	31,00	11,28	KG
	Acero 3/8" con .10m de ganchos		0,55	0,56	31,00	9,55	KG
	COLUMNA C-7						
	Acero 3/4" con .20m de escuadra		1,75	2,24	14,00	54,76	KG
	Acero 3/4" recto		3,00	2,24	14,00	93,87	KG
	Acero 3/4" recto		2,10	2,24	14,00	65,71	KG
	Acero 3/8" con .23m de escuadra (doble)		1,05	0,56	62,00	36,46	KG
	Acero 3/8" con .25m de escuadra		0,50	0,56	16,00	4,48	KG
	Acero 3/8" con .10m de ganchos		0,45	0,56	31,00	7,81	KG
	Acero 3/8" con .10m de ganchos		0,80	0,56	62,00	27,78	KG
				SUBTOTAL		1.259,37	KG
OBSERVACIONES:				TOTAL		1.259,37	KG

LOCALIZACION PLANIMETRICA

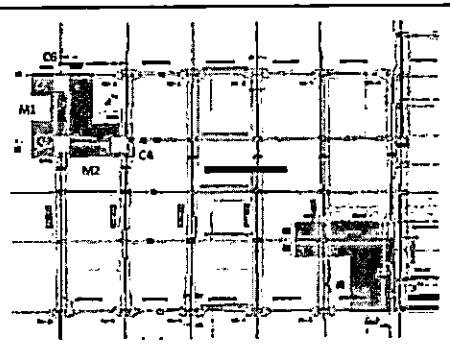

REGISTRO FOTOGRAFICO

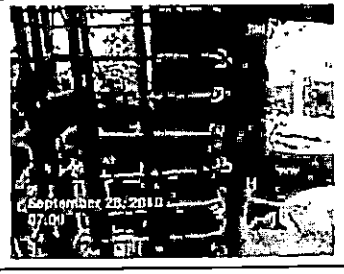


Alejandra Bolaños
ARQ. ALEJANDRA BOLAÑOS
RESIDENTE CONTRATISTA


Jessica Lopera D.
ARQ. JESSICA LOPERA
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA


ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Secretaría Integración Social	MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA	PRISMA UNIVERSAL SEC S.A.S. CONTRATISTA	ARQUITECTURA URBANA LTDA. INTERVENTORÍA
	PROYECTO: OBRAS SEDES ALCALDÍA		

ACTA PARCIAL No.	2	PERIODO DEL ACTA	1/09/2019	A	30/09/2019	
OBJETO	REALIZAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE AJUSTE LAS DIFERENTES OBRAS E INTERVENCIONES ESPECIALIZADAS PARA LAS DIFERENTES SEDES DE LA SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C.					
CONTRATO DE OBRA No	731-2019	CONTRATISTA	CONSORCIO PRUNI SEDES 04	ENTIDAD CONTRATANTE	SECRETARIA GENERAL-ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA	
CONTRATO INTERVENTORÍA	730 - 2019	INTERVENTORÍA	ARQUITECTURA URBANA LTDA	FRENTE:	IMPRENTA DISTRITAL	


PLANO DETALLE

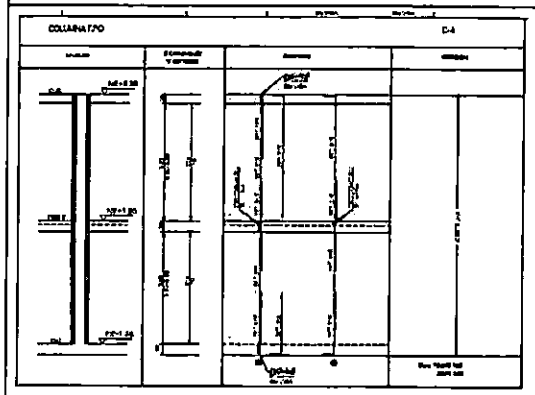

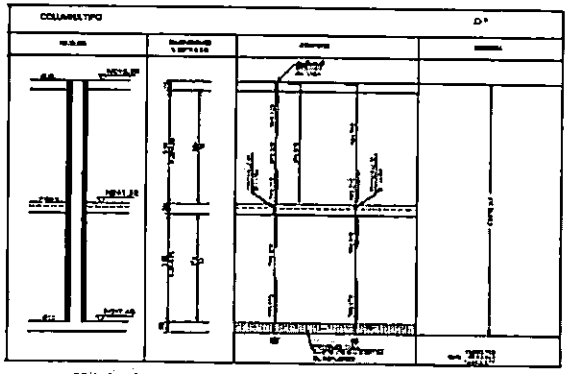


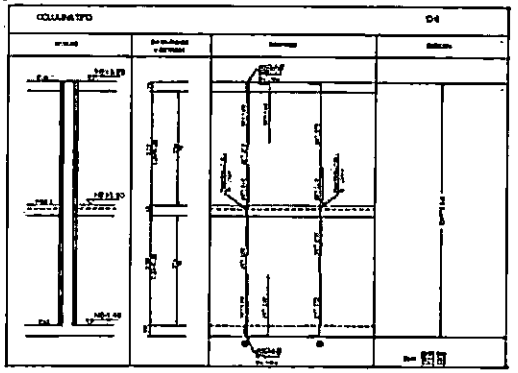


COLUMNA C5



COLUMNA C7



COLUMNA C6



ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
Secretaría Integración Social

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

PROYECTO: OBRAS SEDES ALCALDÍA

PRISMA — UNIVERSAL SEC S.A.S. CONSORCIO PRUNI SEDES 04 — CONTRATISTA

ARQUITECTURA URBANA LTDA. — INTERVENTORÍA


ACTA PARCIAL No,	2		PERIODO DEL ACTA	1/09/2019	A	30/09/2019
OBJETO	REALIZAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE AJUSTE LAS DIFERENTES OBRAS E INTERVENCIONES ESPECIALIZADAS PARA LAS DIFERENTES SEDES DE LA SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C.					
CONTRATO DE OBRA No	731- 2019	CONTRATISTA	CONSORCIO PRUNI SEDES 04		ENTIDAD CONTRATANTE	SECRETARIA GENERAL-ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA
CONTRATO INTERVENTORÍA	730 - 2019	INTERVENTORÍA	ARQUITECTURA URBANA LTDA		FRENTE:	IMPRENTA DISTRITAL

CAPITULO	2.5.0	PERFORACIONES Y EPOXICOS	ITEM	2.5.0.1	Perforación y epóxico # 3 L= 0.15	UNIDAD	UND

ITEM	LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	TOTAL	UNIDAD
	DADOS EJE 1' (A-B-C-D-E)						
	CIMENTACIÓN COLUMNAS				20,00	20,00	UN
	FLEJES COLUMNA C-4				68,00	68,00	UN
	FLEJES COLUMNA C-6				62,00	62,00	UN
	FLEJES COLUMNA C-7				31,00	31,00	UN
						161,00	UN
						161,00	UN

OBSERVACIONES:

LOCALIZACION PLANIMETRICA

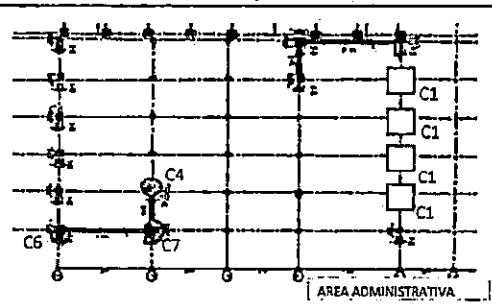

REGISTRO FOTOGRAFICO



Alejandra Bolaños T
ARQ. ALEJANDRA BOLAÑOS
RESIDENTE CONTRATISTA

Jessica Lopera Arango
ARQ. JESSICA LOPERA
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
Secretaría Integración Social

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

PROYECTO: OBRAS SEDES ALCALDÍA

PRISMA — UNIVERSAL-SEC S.A.S. — CONTRATISTA


ARQUITECTURA URBANA LTDA. — INTERVENTORÍA

ACTA PARCIAL No.	2	PERIODO DEL ACTA	1/09/2019	A	30/09/2019	
OBJETO	REALIZAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE AJUSTE LAS DIFERENTES OBRAS E INTERVENCIONES ESPECIALIZADAS PARA LAS DIFERENTES SEDES DE LA SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C.					
CONTRATO DE OBRA No	73 1- 2019	CONTRATISTA	CONSORCIO PRUNI SEDES D4	ENTIDAD CONTRATANTE	SECRETARIA GENERAL-ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA	
CONTRATO INTERVENTORÍA	730 - 2019	INTERVENTORÍA	ARQUITECTURA URBANA LTDA	FRENTE	IMPRENTA DISTRITAL	

CAPITULO	2.5.0	PERFORACIONES Y EPOXICOS	ITEM	2.5.0.2	Perforación y epóxico ø 3 L= 0.30	UNIDAD	UND

ITEM	LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	TOTAL	UNIDAD
	M1						
	Anclajes en viga entrepiso)				52,00	52,00	UN
	C7						
	FLEJES COLUMNA C-7				31,00	31,00	UN
OBSERVACIONES:						83,00	UN
						83,00	UN

LOCALIZACION PLANIMETRICA

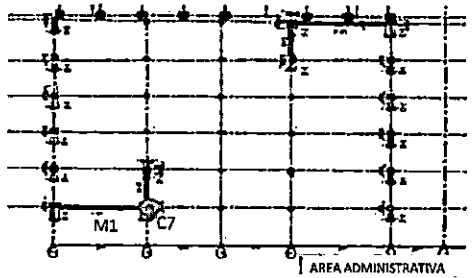

REGISTRO FOTOGRAFICO




Alejandra Blaños +
ARQ. ALEJANDRA BOLAÑOS
RESIDENTE CONTRATISTA

Jessica Lopera Arango
ARQ. JESSICA LOPERA
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA


ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Secretaría Integración Social	MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA PROYECTO: OBRAS SEDES ALCALDÍA	PRISMA / UNIVERSAL SEC S.A.S. CONSORCIO PRUNI SEDES 04 — CONTRATISTA	ARQUITECTURA URBANA LTDA. — INTERVENTORÍA

ACTA PARCIAL No,	2		PERIODO DEL ACTA	1/09/2019	A	30/09/2019
OBJETO	REALIZAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE AJUSTE LAS DIFERENTES OBRAS E INTERVENCIONES ESPECIALIZADAS PARA LAS DIFERENTES SEDES DE LA SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C.					
CONTRATO DE OBRA No	73 1- 2019	CONTRATISTA	CONSORCIO PRUNI SEDES 04	ENTIDAD CONTRATANTE		SECRETARIA GENERAL-ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA
CONTRATO INTERVENTORÍA	730 - 2019	INTERVENTORÍA	ARQUITECTURA URBANA LTDA	FRENTE:		IMPRENTA DISTRITAL

PLANO DETALLE

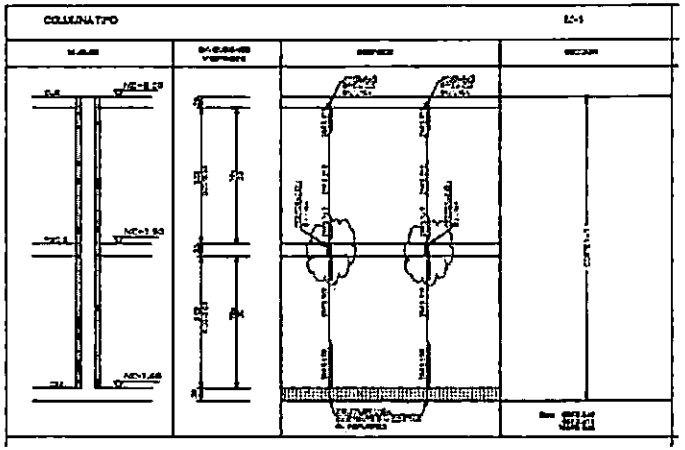

COLUMNA C7

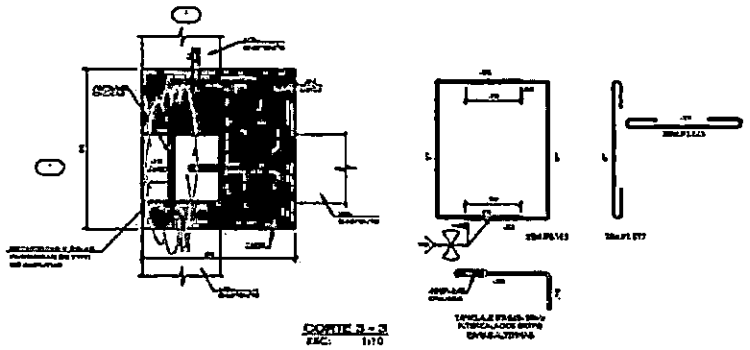


ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Secretaría Integración Social	MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA PROYECTO: OBRAS SEDES ALCALDÍA	PRISMA / UNIVERSEC S.A.S. CONSORCIO PRISMA SEDES 04 — CONTRATISTA	ARQUITECTURA URBANA LTDA. — INTERVENTORÍA

ACTA PARCIAL No,	2	PERIODO DEL ACTA	1/09/2019	A	30/09/2019	
OBJETO	REALIZAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE AJUSTE LAS DIFERENTES OBRAS E INTERVENCIONES ESPECIALIZADAS PARA LAS DIFERENTES SEDES DE LA SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C.					
CONTRATO DE OBRA No	731- 2019	CONTRATISTA	CONSORCIO PRISMA SEDES 04	ENTIDAD CONTRATANTE	SECRETARIA GENERAL-ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA	
CONTRATO INTERVENTORÍA	730 - 2019	INTERVENTORÍA	ARQUITECTURA URBANA LTDA	FUENTE:	IMPRENTA DISTRITAL	


CAPÍTULO	2.7.0	CUBIERTAS	ITEM	2.7.0.2	Adición de elementos metálicos reforzamiento	UNIDAD	KG

ITEM	LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES FIGURA	LONGITUD	PESO	CANTIDAD	TOTAL	UNIDAD
	CORREAS CR-2						
1	Acero 1/2" recto liso		0,31	0,994	5,00	1,54	KG
	Acero 1/2" en V liso	V	0,63	0,994	18,00	11,27	KG
2	Acero 1/2" recto liso		0,31	0,994	8,00	2,47	KG
	Acero 1/2" en V liso	V	0,63	0,994	19,00	11,90	KG
3	Acero 1/2" recto liso		0,31	0,994	4,00	1,23	KG
	Acero 1/2" en V liso	V	0,63	0,994	15,00	9,39	KG
4	Acero 1/2" recto liso		0,31	0,994	2,00	0,62	KG
	Acero 1/2" en V liso	V	0,63	0,994	8,00	5,01	KG
OBSERVACIONES:				SUBTOTAL		43,43	KG
				TOTAL		43,43	KG

LOCALIZACION PLANIMETRICA



REGISTRO FOTOGRAFICO



Alejandra Bolaños +
ARQ. ALEJANDRA BOLAÑOS
RESIDENTE CONTRATISTA

Jessica Lopera A.
ARQ. JESSICA LOPERA
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
Integración Social

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

PROYECTO: OBRAS SEDES ALCALDÍA

PRISMA — UNIVERSAL SEC S.A.S. — CONTRATISTA

ARQUITECTURA URBANA LTDA. — INTERVENTORÍA

ACTA PARCIAL No,	2	PERIODO DEL ACTA	1/09/2019	A	30/09/2019	
OBJETO	REALIZAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE AJUSTE LAS DIFERENTES OBRAS E INTERVENCIONES ESPECIALIZADAS PARA LAS DIFERENTES SEDES DE LA SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C.					
CONTRATO DE OBRA No	731- 2019	CONTRATISTA	CONSORCIO PRUNI SEDES 04	ENTIDAD CONTRATANTE	SECRETARIA GENERAL-ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA	
CONTRATO INTERVENTORÍA	730- 2019	INTERVENTORIA	ARQUITECTURA URBANA LTDA	RADICADO	IMPRENTA DISTRITAL	

CAPITULO	2.8.0	RESTITUCION DE ACABADOS	ITEM	2.8.0.7	Perforaciones y epóxico 1/2" - Le 0.15	UNIDAD	UND

ITEM	LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	TOTAL	UNIDAD
	DADOS EJE 1"(6-D-C-E)						
	ANCLAJES				16,00	16,00	UND
	VC NUEVA (ZAPATA 2)						
	ANCLAJES				8,00	8,00	UND

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Secretaría Integración Social

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

PROYECTO: OBRAS SEDES ALCALDÍA

PRISMA — UNIVERSAL SEC S.A. — CONTRATISTA


ARQUITECTURA URBANA LTDA. — INTERVENTORÍA

ACTA PARCIAL No.	2	PERIODO DEL ACTA	1/09/2019	A	30/09/2019	
OBJETO	REALIZAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE AJUSTE LAS DIFERENTES OBRAS E INTERVENCIONES ESPECIALIZADAS PARA LAS DIFERENTES SEDES DE LA SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C.					
CONTRATO DE OBRA No	73 1- 2019	CONTRATISTA	CONSORCIO PRUNI SEDES 04	ENTIDAD CONTRATANTE	SECRETARIA GENERAL- ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA	
CONTRATO INTERVENTORÍA	730 - 2019	INTERVENTORIA	ARQUITECTURA URBANA LTDA	FRENTE:	IMPRENTA DISTRITAL	

CAPITULO	3.0.3	INSTALACIONES ELECTRICAS	ITEM	3.3.0.2	Demolición de muro existente.	UNIDAD	M2

ITEM	LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES LARGO	DIMENSIONES ANCHO	DIMENSIONES ALTO	CANTIDAD	TOTAL	UNIDAD
A	FACHADA COSTADO SUR						
	Antepechos Primer piso		2,60	1,30	5,00	16,90	M2
	Antepechos Segundo piso		2,50	1,00	3,00	7,50	M2
B	FACHADA COSTADO NORTE						
	Antepechos Primer piso		2,45	1,30	3,00	9,56	M2
	Antepechos Segundo Piso		2,50	1,00	3,00	7,50	M2
C	FACHADA COSTADO OCCIDENTE						
	Antepecho Primer Piso		4,25	1,30	1,00	5,53	M2
OBSERVACIONES:				Parcial:		46,99	M2
				TOTAL		46,99	M2

LOCALIZACION PLANIMETRICA

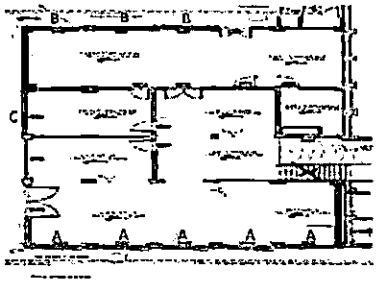

AREA ADMINISTRATIVA

REGISTRO FOTOGRAFICO



Alejandra Bolaños +

ARQ. ALEJANDRA BOLAÑOS
RESIDENTE CONTRATISTA

Jessica Lopera A.

ARQ. JESSICA LOPERA
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA


	MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA		
	PROYECTO: OBRAS SEDES ALCALDÍA	CONTRATISTA	INTERVENTORÍA

ACTA PARCIAL No,	2		PERIODO DEL ACTA	1/09/2019	A	30/09/2019	
OBJETO	REALIZAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE AJUSTE LAS DIFERENTES OBRAS E INTERVENCIONES ESPECIALIZADAS PARA LAS DIFERENTES SEDES DE LA SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C.						
CONTRATO DE OBRA No	731- 2019	CONTRATISTA	CONSORCIO PRUNI SEDES D4		ENTIDAD CONTRATANTE	SECRETARIA GENERAL-ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA	
CONTRATO INTERVENTORÍA	730 - 2019	INTERVENTORÍA	ARQUITECTURA URBANA LTDA		FRENTE:	IMPRENTA DISTRITAL	

CAPITULO	3,4,0	SISTEMA CONTRA INCENDIOS	ITEM	3,4,0,1	Suministro e Instalacion de Tuberia PVC 2x3" + 2x2" tipo pesado DB.	UNIDAD	ML

ITEM	LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	TOTAL	UNIDAD
	COSTADO SUR						
	# 2 - DUCTO DE 3" (3 Tubos + 1 Reserva) + DUCTOS DE 2" (1 Tubo de 2" + 1 Reserva)	6,25			1,00	6,25	ML
	# 3 - DUCTO DE 3" (1 Tubos + 1 Reserva) + DUCTOS DE 2" (1 Tubo de 2" + 1 Reserva)	7,00			2,00	14,00	ML
	# 5 - DUCTO DE 3" (1 Tubos + 1 Reserva) + DUCTOS DE 2" (1 Tubo de 2" + 1 Reserva)	6,50			1,00	6,50	ML
	# 7 - DUCTO DE 3" (1 Tubos + 1 Reserva) + DUCTOS DE 2" (1 Tubo de 2" + 1 Reserva)	6,40			1,00	6,40	ML
OBSERVACIONES:						33,15	ML
						33,15	ML

LOCALIZACIÓN PLANIMÉTRICA

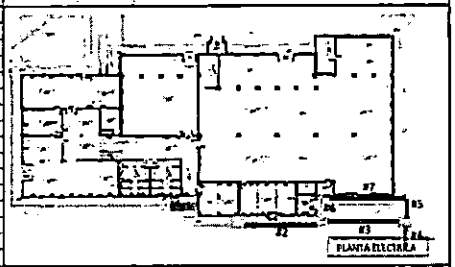

REGISTRO FOTOGRÁFICO



Alejandra Bolaños +

ARQ. ALEJANDRA BOLAÑOS
RESIDENTE CONTRATISTA

Jessica Lopera A.

ARQ. JESSICA LOPERA
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
Secretaría Integración Social

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

PROYECTO: OBRAS SEDES ALCALDÍA

PRISMA — UNIVERSAL SEC S.A.S. — CONSORCIO PRISMA SEDES 04 — CONTRATISTA


ARQUITECTURA URBANA LTDA. — INTERVENTORÍA

ACTA PARCIAL No,	2		PERIODO DEL ACTA	1/09/2019	A	30/09/2019
OBJETO	REALIZAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE AJUSTE LAS DIFERENTES OBRAS E INTERVENCIONES ESPECIALIZADAS PARA LAS DIFERENTES SEDES DE LA SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C.					
CONTRATO DE OBRA No	73 1- 2019	CONTRATISTA	CONSORCIO PAUMI SEDES 04		ENTIDAD CONTRATANTE	SECRETARIA GENERAL-ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA
CONTRATO INTERVENTORÍA	730 - 2019	INTERVENTORÍA	ARQUITECTURA URBANA LTDA		FRENTE:	IMPRENTA DISTRITAL


CAPITULO	3,4,0	SISTEMA CONTRA INCENDIOS	ITEM	3,4,0,4	Excavación manual en material compactado.	UNIDAD	M3

ITEM	LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	TOTAL	UNIDAD
	COSTADO SUR REDES ELECTRICAS						
	Caja #1	2,00	1,60	1,55	1,00	4,96	M3
	Canalización #2	5,60	0,60	1,30	1,00	4,37	M3
	Caja #3	2,00	1,60	1,35	1,00	4,32	M3
	Canalización #4	5,50	0,63	1,50	1,00	5,20	M3
	Caja #5	2,10	2,10	1,60	1,00	7,06	M3
	Canalización #6	3,80	0,60	1,30	1,00	2,96	M3
	Canalización #7	2,50	0,60	1,00	1,00	1,50	M3
OBSERVACIONES:				SUBTOTAL		30,37	M3
				TOTAL		30,37	M3

LOCALIZACIÓN PLANIMÉTRICA

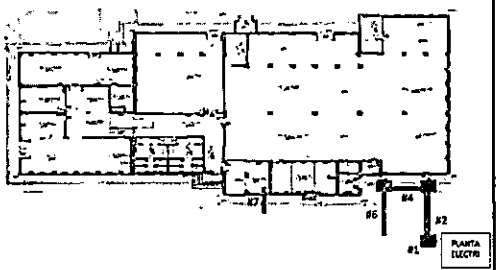

REGISTRO FOTOGRÁFICO

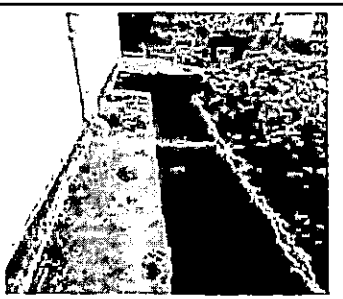

Alejandra Bolaños t
ARQ. ALEJANDRA BOLAÑOS
RESIDENTE CONTRATISTA

Jessica lopera A.
ARQ. JESSICA LOPERA
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

C - 112

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Gobierno Integración Social	MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA PROYECTO: OBRAS SEDES ALCALDÍA	PRISMA / UNIVERSAL SEC S.A.S. CONSORCIO PRUNI SEDES 04 — CONTRATISTA	ARQUITECTURA URBANA LTDA. — INTERVENTORÍA

ACTA PARCIAL No.	2	PERIODO DE LA ACTA	1/09/2019	A	30/09/2019	
OBJETO	REALIZAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE AJUSTE LAS DIFERENTES OBRAS E INTERVENCIONES ESPECIALIZADAS PARA LAS DIFERENTES SEDES DE LA SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C.					
CONTRATO DE OBRA No	731-2019	CONTRATISTA	CONSORCIO PRUNI SEDES 04	ENTIDAD CONTRATANTE	SECRETARIA GENERAL-ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA	
CONTRATO INTERVENTORÍA	730-2019	INTERVENTORÍA	ARQUITECTURA URBANA LTDA	FRENTE:	IMPRENTA DISTRITAL	

CAPITULO	3,4,0	SISTEMA CONTRA INCENDIOS	ITEM	3,4,0,5	Relleno y compactación con recebo (suministro e instalación)	UNIDAD	M3

ITEM	LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	TOTAL	UNIDAD
	COSTADO SUR						
	CANALIZACION # 3	7,00	0,60	1,30	1,00	5,46	M3
	CANALIZACION # 5	6,50	0,60	1,30	1,00	5,07	M3
	CANALIZACION # 7	6,40	0,60	1,30	1,00	4,99	M3

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

PROYECTO: OBRAS SEDES ALCALDÍA

PRISMA — UNIVERSEC S.A.S. — CONTRATISTA


ARQUITECTURA URBANA LTDA. — INTERVENTORÍA

ACTA PARCIAL No,	2	PERIODO DEL ACTA	1/09/2019	A	30/09/2019	
OBJETO	REALIZAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE AJUSTE LAS DIFERENTES OBRAS E INTERVENCIONES ESPECIALIZADAS PARA LAS DIFERENTES SEDES DE LA SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C.					
CONTRATO DE OBRA No	731-2019	CONTRATISTA	CONSORCIO PRUNI SEDES 04	ENTIDAD CONTRATANTE	SECRETARIA GENERAL-ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA	
CONTRATO INTERVENTORÍA	730-2019	INTERVENTORÍA	ARQUITECTURA URBANA LTDA	FRENTE:	IMPRENTA DISTRITAL	

CAPITULO		NP	CIVIL		ITEM	IMP-06	DESMONTE DE VENTANAS METÁLICAS, INCLUYE CARGUE Y ALMACENAMIENTO EN SITIO DONDE DISPONGA LA INTERVENTORIA	UNIDAD	M2

ITEM	LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES LARGO	DIMENSIONES ANCHO	DIMENSIONES ALTO	CANTIDAD	TOTAL	UNIDAD
	ZONA ADMINISTRACIÓN						
A	FACHADA NORTE						
	1ER PISO		2,80	1,75	3,00	14,70	M2
	2DO PISO		2,80	1,20	3,00	10,08	M2
B	FACHADA SUR						
	1ER PISO		2,80	1,75	3,00	24,50	M2
	2DO PISO		2,80	1,20	3,00	10,08	M2
C	FACHADA LATERAL (COSTADO OCCIDENTAL)						
	1ER PISO		4,25	1,75	3,00	7,44	M2
OBSERVACIONES:						68,80	M2
						68,80	M2

LOCALIZACION PLANIMETRICA

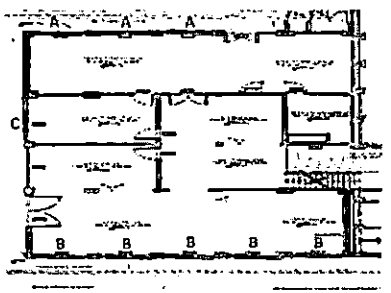

AREA ADMINISTRATIVA

REGISTRO FOTOGRÁFICO



Alejandra Bolaños t

ARQ. ALEJANDRA BOLAÑOS
RESIDENTE CONTRATISTA

Jessica lopera A.

ARQ. JESSICA LOPERA
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Gobierno Integración Social	MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA PROYECTO: OBRAS SEDES ALCALDÍA	PRISMA UNIVERSAL SEC S.A.S. CONSORCIO PRUNI SEDES 04 — CONTRATISTA	ARQUITECTURA URBANA LTDA. — INTERVENTORÍA


ACTA PARCIAL No.	2	PERIODO DEL ACTA	1/09/2019	A	30/09/2019	
OBJETO	REALIZAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE AJUSTE LAS DIFERENTES OBRAS E INTERVENCIONES ESPECIALIZADAS PARA LAS DIFERENTES SEDES DE LA SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C.					
CONTRATO DE OBRA No	73 1- 2019	CONTRATISTA	CONSORCIO PRUNI SEDES 04	ENTIDAD CONTRATANTE	SECRETARIA GENERAL-ALCALDIA MAYCA DE BOGOTA	
CONTRATO INTERVENTORÍA	730 - 2019	INTERVENTORÍA	ARQUITECTURA URBANA LTDA	FRENTE:	IMPRENTA DISTRITAL	

CAPITULO	INP	CIVIL	ITEM	IMP-07	DEMOLICIÓN DE CAJA DE INSPECCIÓN CON MUROS EN MAMPOSTERIA Y TAPA MÁS BASE EN CONCRETO, DIMENSIONES DE 60x60x70, INCLUYE RETIRO DE ESCOMBROS HASTA ESCOMBRERA CERTIFICADA	UNIDAD	UND

ITEM	LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	TOTAL	UNIDAD
	ZONA ADMINISTRACION						
1	Fachada Occidente e/s 5"				1,00	1,00	UN
2	Fachada Occidente e/s 1"				1,00	1,00	UN
						2,00	UN
						2,00	UN


OBSERVACIONES:

LOCALIZACION PLANIMETRICA

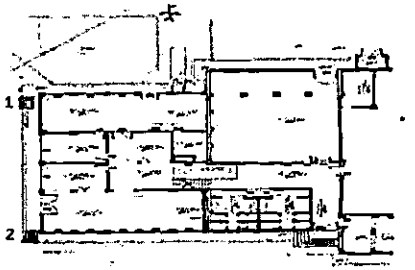

AREA ADMINISTRATIVA

REGISTRO FOTOGRÁFICO

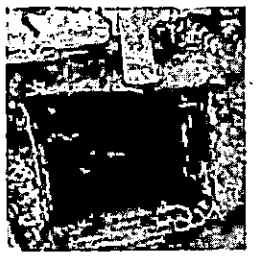

Alejandra Bolaños T
ARQ. ALEJANDRA BOLAÑOS
RESIDENTE CONTRATISTA

Jessica Lopera A.
ARQ. JESSICA LOPERA
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

	MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA	PRISMA / UNIVERSEC S.A.S.	
	PROYECTO: OBRAS SEDES ALCALDÍA	CONTRATISTA	INTERVENTORÍA


ACTA PARCIAL No.	2		PERIODO DEL ACTA :	1/09/2019	A	30/09/2019	
OBJETO	REALIZAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE AJUSTE LAS DIFERENTES OBRAS E INTERVENCIONES ESPECIALIZADAS PARA LAS DIFERENTES SEDES DE LA SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C.						
CONTRATO DE OBRA No	73 1- 2019	CONTRATISTA	CONSORCIO PRUNI SEDES 04		ENTIDAD CONTRATANTE	SECRETARIA GENERAL-ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA	
CONTRATO INTERVENTORÍA	730 - 2019	INTERVENTORÍA	ARQUITECTURA URBANA LTDA		FRENTE:	IMPRENTA DISTRITAL	

CAPITULO		NP	CIVIL		ITEM	IMP-08	DEMOLICIÓN DE CAJA DE INSPECCIÓN CON MUROS EN MAMPOSTERIA Y TAPA MÁS BASE EN CONCRETO, DIMENSIONES DE 40x40x70, INCLUYE RETIRO DE ESCOMBROS HASTA ESCOMBRERA CERTIFICADA	UNIDAD	UND

ITEM	LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES LARGO	DIMENSIONES ANCHO	DIMENSIONES ALTO	CANTIDAD	TOTAL	UNIDAD
	ZONA ADMINISTRACION						
1	Fachada Occidente eje 5"				3,00	3,00	UN
2	Fachada Sur e/e 1"				4,00	4,00	UN
3	Fachada Occidental E e A				1,00	1,00	UN
	[redacted]					8,00	UN
	[redacted]					8,00	UN

OBSERVACIONES:

LOCALIZACION PLANIMETRICA

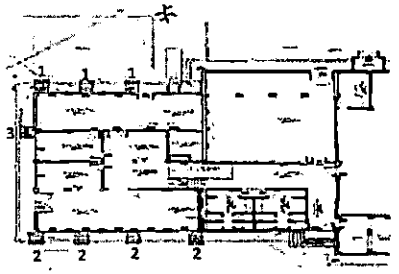

AREA ADMINISTRATIVA

REGISTRO FOTOGRÁFICO



Alejandra Bolaños +

ARQ. ALEJANDRA BOLAÑOS
RESIDENTE CONTRATISTA

Jessica Lopera A.

ARQ. JESSICA LOPERA
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

116

39

	MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA		
	PROYECTO: OBRAS SEDES ALCALDÍA	UNIVERSAL SEC S.A.S. CONTRATISTA	ARQUITECTURA URBANA LTDA. INTERVENTORÍA


ACTA PARCIAL No,	2	PERIODO DEL ACTA	1/09/2019	A	30/09/2019	
OBJETO	REALIZAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE AJUSTE LAS DIFERENTES OBRAS E INTERVENCIONES ESPECIALIZADAS PARA LAS DIFERENTES SEDES DE LA SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C.					
CONTRATO DE OBRA No	731- 2019	CONTRATISTA	CONSORCIO PRUNI SEDES 04	ENTIDAD CONTRATANTE	SECRETARIA GENERAL-ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA	
CONTRATO INTERVENTORÍA	730 - 2019	INTERVENTORÍA	ARQUITECTURA URBANA LTDA	FRENTE:	IMPRENTA DISTRITAL	

CAPITULO		NP	CIVIL		ITEM	IMP-10	APUNTALAMIENTO DE PLACA PARA CONSTRUCCIÓN DE ZAPATAS	UNIDAD	DIA

ITEM	LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	TOTAL	UNIDAD
	ZONA ADMINISTRACION						
1	Apuntalamiento de placa Area 1 cercha y paral (Del 1 al 9 de Agosto)				9,00	9,00	Dia
						9,00	DIA
						9,00	DIA

OBSERVACIONES:

LOCALIZACION PLANIMETRICA

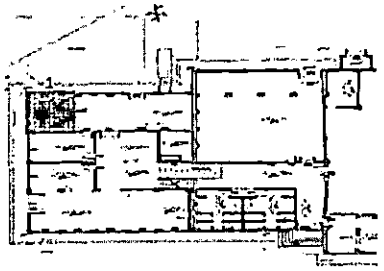

AREA ADMINISTRATIVA

REGISTRO FOTOGRÁFICO



Alejandra Bolaños

ING. ALEJANDRA BOLAÑOS
RESIDENTE CONTRATISTA

Jessica Lopera A.

ARQ. JESSICA LOPERA
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

11

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Gobierno Seguridad Social	MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA PROYECTO: OBRAS SEDES ALCALDÍA	PRISMA UNIVERSAL SEC S.A.S. CONSORCIO PRUNI SEDES 04	ARQUITECTURA URBANA LTDA
		CONTRATISTA	INTERVENTORÍA


ACTA PARCIAL No.	2	PERIODO DEL ACTA	1/09/2019	A	30/09/2019	
OBJETO	REALIZAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE AJUSTE LAS DIFERENTES OBRAS E INTERVENCIONES ESPECIALIZADAS PARA LAS DIFERENTES SEDES DE LA SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C.					
CONTRATO DE OBRA No	73 1- 2019	CONTRATISTA	CONSORCIO PRUNI SEDES 04	ENTIDAD CONTRATANTE	SECRETARIA GENERAL-ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA	
CONTRATO INTERVENTORÍA	730- 2019	INTERVENTORÍA	ARQUITECTURA URBANA LTDA	FRENTE:	IMPRENTA DISTRITAL	

CAPÍTULO	NP	CIVIL	ITEM	IMP-11	DESMONTE BAJANTE METÁLICA EMBEBIDA EN COLUMNAS DE CONCRETO A REFORZAR, INCLUYE RETIRO DE ESCOMBROS	UNIDAD	ML

ITEM	LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	TOTAL	UNIDAD
	ZONA ADMINISTRACION						
1	Fachada Occidente eje 5"	5,82			2,00	11,64	ML
2	Fachada Sur e/e 1"	5,82			3,00	17,46	ML
3	Fachada Occidental en E/e A	5,82			1,00	5,82	ML
						34,92	ML
						V 34,92	ML


OBSERVACIONES:

LOCALIZACION PLANIMETRICA

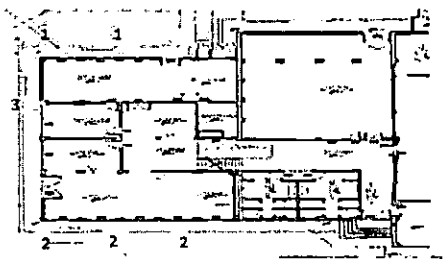

AREA ADMINISTRATIVA

REGISTRO FOTOGRÁFICO

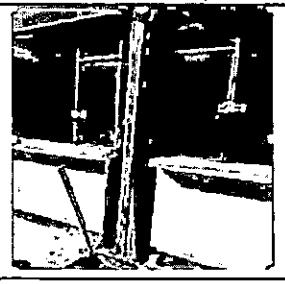

Alejandra Bolaños +

ARQ. ALEJANDRA BOLAÑOS
RESIDENTE CONTRATISTA

Jessica Lopera A

ARQ. JESSICA LOPERA
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

ACTA

3

IMPRENTA DISTRITAL

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA GENERAL

BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

PROYECTO: OBRAS PARA LAS DIFERENTES SEDES DE LA SECRETARÍA GENERAL -ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ

PRISMA. UNIVERSAL SEC S.A.S.
CONTRATISTA


ARQUITECTURA URBANA LTDA
INTERVENTORÍA

ACTA PARCIAL No,	3		PERIODO DEL ACTA	01/10/2019	A	30/10/2019	
OBJETO	REALIZAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE AJUSTE LAS DIFERENTES OBRAS E INTERVENCIONES ESPECIALIZADAS PARA LAS DIFERENTES SEDES DE LA SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C.						
CONTRATO DE OBRA No	73 1- 2019	CONTRATISTA	CONSORCIO PRUNI SEDES 04		ENTIDAD CONTRATANTE	SECRETARIA GENERAL-ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA	
CONTRATO INTERVENTORÍA	730 - 2019	INTERVENTORÍA	ARQUITECTURA URBANA LTDA		FRENTE:	IMPRENTA DISTRITAL	

CAPITULO	1.1.0	PRELIMINARES	ITEM	1.1.0.1	REPLANTEO	UNIDAD	ML

ITEM	LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	TOTAL	UNIDAD
1	COSTADO OCCIDENTAL	12,00				12,00	MI
2	COSTADO OCCIDENTAL	12,60				12,60	MI
3	COSTADO SUR	14,70				14,70	MI
5	COSTADO SUR	2,67				2,67	MI
6	COSTADO SUR	2,30				2,30	MI
7	COSTADO SUR	28,40				28,40	MI
8	COSTADO SUR SENDERO	10,00				10,00	MI
	COSTADO SUR CANCHA	17,65				17,65	
9	COSTADO SUR PARQUEADERO	2,70				2,70	MI
10	COSTADO SUR PARQUEADERO	14,30				14,30	MI
11	COSTADO SUR PARQUEADERO	5,30				5,30	MI
OBSERVACIONES:				SUBTOTAL		122,62	ML
				TOTAL		122,62	ML

LOCAUZACION PLANIMETRICA

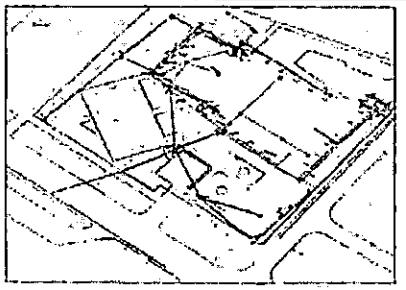


REGISTRO FOTOGRÁFICO



Alejandra Bolaños T
ARQ. ALEJANDRA BOLAÑOS
RESIDENTE CONTRATISTA

Jessica Lopera A.
ARQ. JESSICA LOPERA
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

PLANO DETALLE

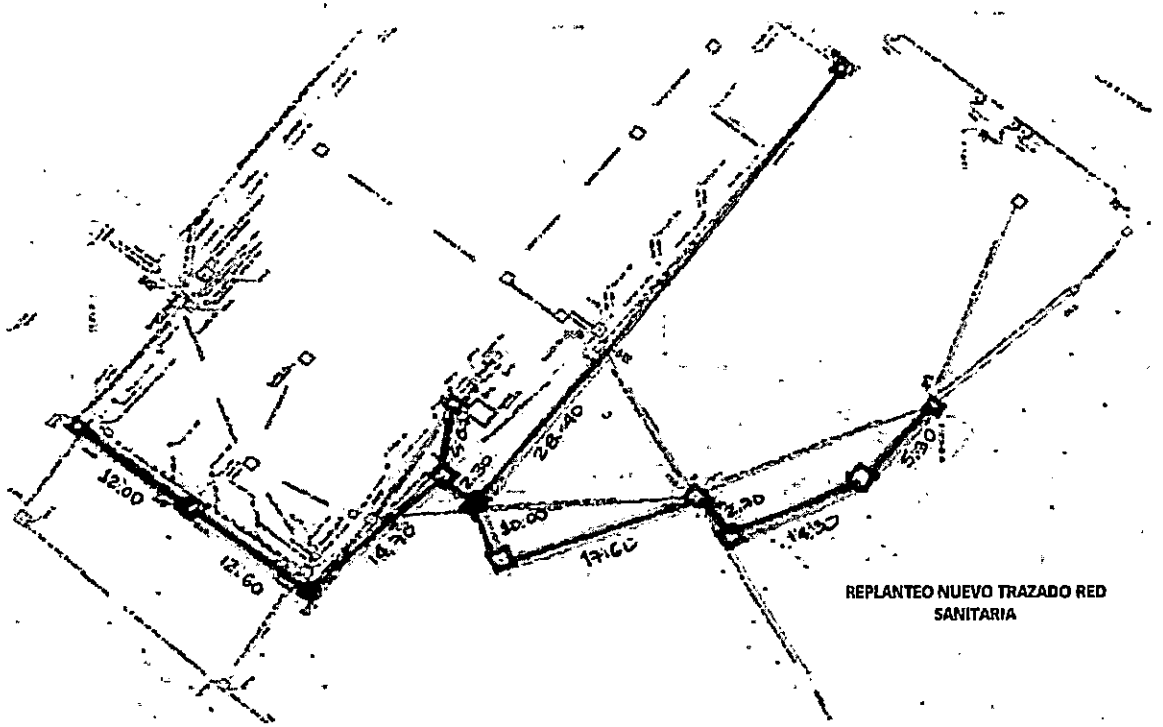

095

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA GENERAL | BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

PROYECTO: OBRAS PARA LAS DIFERENTES SEDES DE LA SECRETARÍA GENERAL -ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ

PRISMA UNIVERSAL SEC S.A.S. — CONTRATISTA

ARQUITECTURA URBANA LTDA. — INTERVENTORÍA


ACTA PARCIAL No,	3		PERIODO DEL ACTA	01/10/2019	A	30/10/2019	
OBJETO:	REALIZAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE AJUSTE LAS DIFERENTES OBRAS E INTERVENCIONES ESPECIALIZADAS PARA LAS DIFERENTES SEDES DE LA SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C.						
CONTRATO DE OBRA No	731- 2019	CONTRATISTA	CONSORCIO PRUNI SEDES 04		ENTIDAD CONTRATANTE	SECRETARIA GENERAL-ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA	
CONTRATO INTERVENTORÍA	730 - 2019	INTERVENTORÍA	ARQUITECTURA URBANA LTDA		FRENTE:	IMPRENTA DISTRITAL	

CAPITULO :	1.5.0	RED DE AGUAS NEGRAS	ITEM	1.5.0.6	TUBERIA PVC ALCANTARILLADO 160mm	UNIDAD	ML

ITEM	LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	TOTAL	UNIDAD
A	COSTADO SUR	48,40			1,00	48,40	ML
B	COSTADO SUR	14,70			1,00	14,70	ML
				SUBTOTAL		63,10	ML
				TOTAL		63,10	ML

OBSERVACIONES:

LOCALIZACION PLANIMETRICA

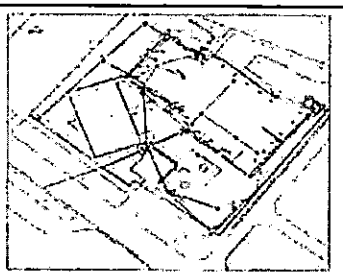

REGISTRO FOTOGRÁFICO






Alejandra Bolaños

ARQ. ALEJANDRA BOLAÑOS
RESIDENTE CONTRATISTA

Jessica Lopera A

ARQ. JESSICA LOPERA
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

PLANO DETALLE

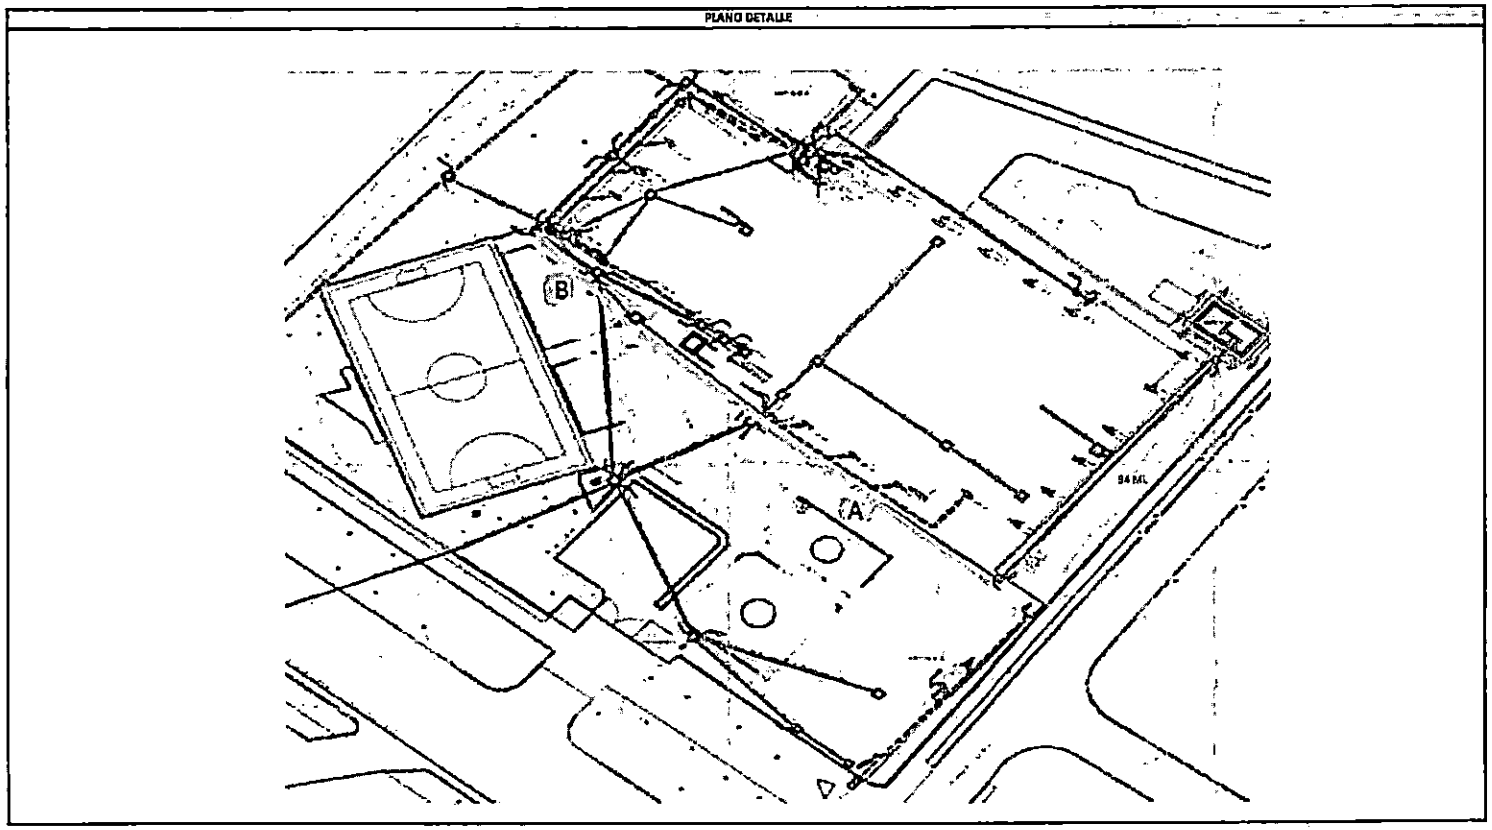

097
460

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. | BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS
SECRETARÍA GENERAL

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

PROYECTO: OBRAS PARA LAS DIFERENTES SEDES DE LA SECRETARÍA GENERAL -ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ

PRISMA | UNIVERSAL SEC S.A.S. — CONTRATISTA


ARQUITECTURA URBANA LTDA — INTERVENTORÍA

ACTA PARCIAL No.	3	PERIODO DEL ACTA	01/10/2019	A	30/10/2019	
OBJETO	REALIZAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE AJUSTE LAS DIFERENTES OBRAS E INTERVENCIONES ESPECIALIZADAS PARA LAS DIFERENTES SEDES DE LA SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C.					
CONTRATO DE OBRA No	73 1- 2019	CONTRATISTA	CONSORCIO PRUNI SEDES 04	ENTIDAD CONTRATANTE	SECRETARIA GENERAL-ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA	
CONTRATO INTERVENTORÍA	730 - 2019	INTERVENTORÍA	ARQUITECTURA URBANA LTDA	FRENTE:	IMPRENTA DISTRITAL	

CAPITULO	1,7,0	OBRAS CIVILES	ITEM	1,7,0,4	Retiro Ladrillo cemento	UNIDAD	ML

ITEM	LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	TOTAL	UNIDAD
1	Redes hidrosanitarias						
	CAJA 5	1,40	0,60		2,00	2,80	ML
	CAJA 6	1,45	0,60		2,00	2,90	ML
	CANALIZACION # 11	28,40	0,60		1,00	28,40	ML
	CANALIZACION # 12	14,70	0,60		1,00	14,70	ML
				SUBTOTAL		48,80	ML
OBSERVACIONES:				TOTAL		48,80	ML

LOCALIZACIÓN PLANIMÉTRICA

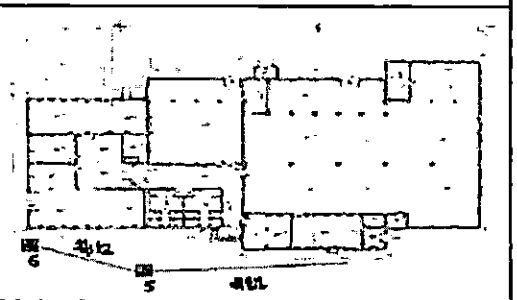

REGISTRO FOTOGRÁFICO



Alejandra Bolaños t
ARQ. ALEJANDRA BOLAÑOS
RESIDENTE CONTRATISTA

Jessica Lopera A
ARQ. JESSICA LOPERA
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA


	MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA		
	PROYECTO: OBRAS SEDES ALCALDÍA	UNIVERSAL SEC S.A.S. CONSORCIO PRUNI SEDES 04 — CONTRATISTA	ARQUITECTURA URBANA LTDA — INTERVENTORÍA

ACTA PARCIAL No,	3	PERIODO DEL ACTA	01/10/2019	A	30/10/2019	
OBJETO:	REALIZAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE AJUSTE LAS DIFERENTES OBRAS E INTERVENCIONES ESPECIALIZADAS PARA LAS DIFERENTES SEDES DE LA SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C.					
CONTRATO DE OBRA No	73 1- 2019	CONTRATISTA	CONSORCIO PRUNI SEDES 04	ENTIDAD CONTRATANTE	SECRETARIA GENERAL-ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA	
CONTRATO INTERVENTORÍA	730 - 2019	INTERVENTORÍA	ARQUITECTURA URBANA LTDA	FRENTE:	IMPRENTA DISTRITAL	


CAPITULO	1,7	OBRAS CIVILES	ITEM	1,7,0,6	Excavación manual Incluye retiro de material y Disposición final en sitios autorizados	UNIDAD	M3

ITEM	LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	TOTAL	UNIDAD
	COSTADO SUR						
1	Canalización	23,400	0,650	1,000	1,000	18,460	M3
2	Canalización	2,400	0,650	1,200	1,000	1,872	M3
	Caja #6	1,250	1,580	1,200	1,000	2,370	M3
3	Canalización	1,400	0,650	1,400	1,000	1,274	M3
	Caja #7	1,250	1,250	0,400	1,000	0,625	M3
4	Canalización	14,700	0,650	1,400	1,000	13,377	M3
OBSERVACIONES:				SUBTOTAL		37,978	M3
				TOTAL		37,978	M3

LOCALIZACIÓN PLANIMÉTRICA

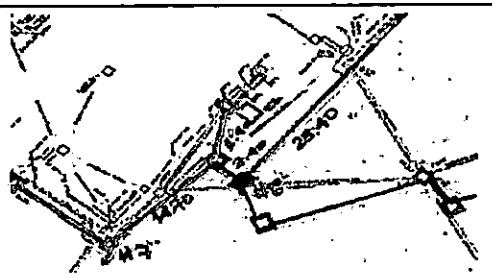

REGISTRO FOTOGRÁFICO

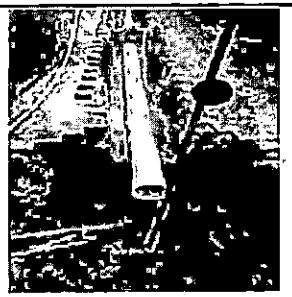

Alejandra Bolaños +
ARQ. ALEJANDRA BOLAÑOS
RESIDENTE CONTRATISTA

Jessica Lopera A.
ARQ. JESSICA LOPERA
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA GENERAL | BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

PROYECTO: OBRAS PARA LAS DIFERENTES SEDES DE LA SECRETARÍA GENERAL -ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ

PRISMA — UNIVERSAL SEC S.A.S. — CONTRATISTA

ARQUITECTURA URBANA LTDA — INTERVENTORÍA


ACTA PARCIAL No,	3		PERIODO DEL ACTA	01/10/2019	A	30/10/2019	
OBJETO	REALIZAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE AJUSTE LAS DIFERENTES OBRAS E INTERVENCIONES ESPECIALIZADAS PARA LAS DIFERENTES SEDES DE LA SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C.						
CONTRATO DE OBRA No	731- 2019	CONTRATISTA	CONSORCIO PRUM SEDES 04		ENTIDAD CONTRATANTE	SECRETARIA GENERAL-ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA	
CONTRATO INTERVENTORÍA	730 - 2019	INTERVENTORÍA	ARQUITECTURA URBANA LTDA		FRENTE:	IMPRENTA DISTRITAL	

CAPITULO	1.7	OBRAS CIVILES	ITEM	1.7.0.8	Relleno Base granular BG_Gr1 o B-600	UNIDAD	M3

ITEM	LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	TOTAL	UNIDAD
	COSTADO SUR						
1	costado sur tramo 1	48,40	0,60	0,25	1,00	12,10	M3
2	costado sur tramo 2	14,70	0,60	0,35	1,00	5,15	M3
				SUBTOTAL		17,25	M3
				TOTAL		17,25	M3

OBSERVACIONES:

LOCALIZACION PLANIMETRICA

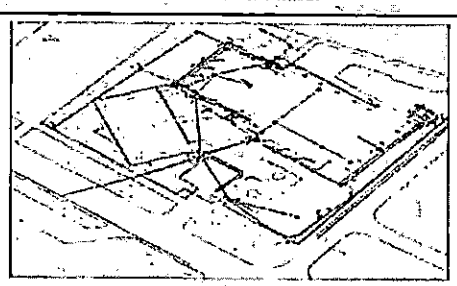

REGISTRO FOTOGRÁFICO




Alejandra Bolaños

ARQ. ALEJANDRA BOLAÑOS
RESIDENTE CONTRATISTA

Jessica Lopera

ARQ. JESSICA LOPERA
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

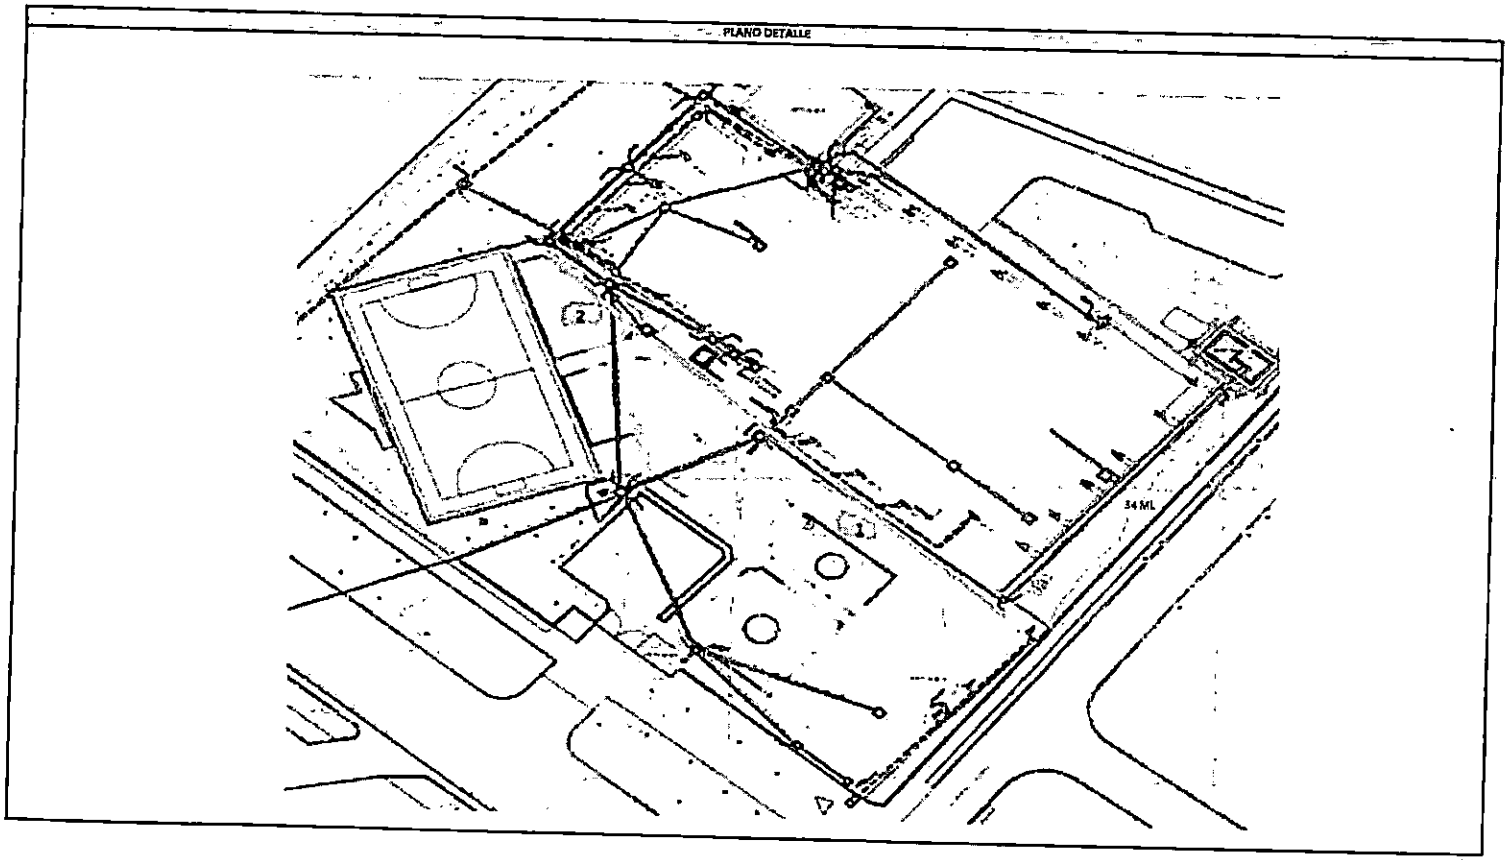
PLANO DETALLE
34 ML

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA GENERAL

BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

PROYECTO: OBRAS PARA LAS DIFERENTES SEDES DE LA SECRETARÍA GENERAL -ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ

PRISMA — UNIVERSAL SEC S.A.S. — CONTRATISTA

ARQUITECTURA URBANA LTDA — INTERVENTORÍA


ACTA PARCIAL No,	3		PERIODO DEL ACTA	01/10/2019	A	30/10/2019	
OBJETO	REALIZAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE AJUSTE LAS DIFERENTES OBRAS E INTERVENCIONES ESPECIALIZADAS PARA LAS DIFERENTES SEDES DE LA SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C.						
CONTRATO DE OBRA No	731-2019	CONTRATISTA	CONSORCIO PRUNI SEDES 04		ENTIDAD CONTRATANTE	SECRETARIA GENERAL-ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA	
CONTRATO INTERVENTORÍA	730-2019	INTERVENTORÍA	ARQUITECTURA URBANA LTDA		FRENTE:	IMPRENTA DISTRITAL	

CAPITULO	1.7	OBRAS CIVILES	ITEM	1.7.0.3	Relleno en arena	UNIDAD	M3

ITEM	LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	TOTAL	UNIDAD
1	COSTADO SUR TRAMO 1	48,40	0,60	0,35	1,00	10,16	M3
2	COSTADO SUR TRAMO 2	14,70	0,60	0,35	1,00	3,09	M3
				SUBTOTAL		13,25	M3
				TOTAL		13,25	M3

OBSERVACIONES:

LOCALIZACION PLANIMETRICA

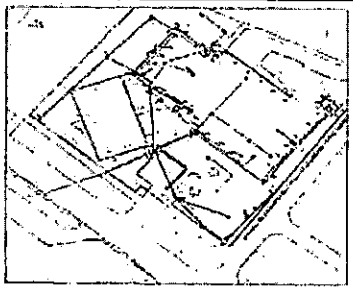


REGISTRO FOTOGRÁFICO



Alejandra Bolaños T
ARQ. ALEJANDRA BOLAÑOS
RESIDENTE CONTRATISTA

Jessica Lopera A
ARQ. JESSICA LOPERA
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

PLANO DETALLE

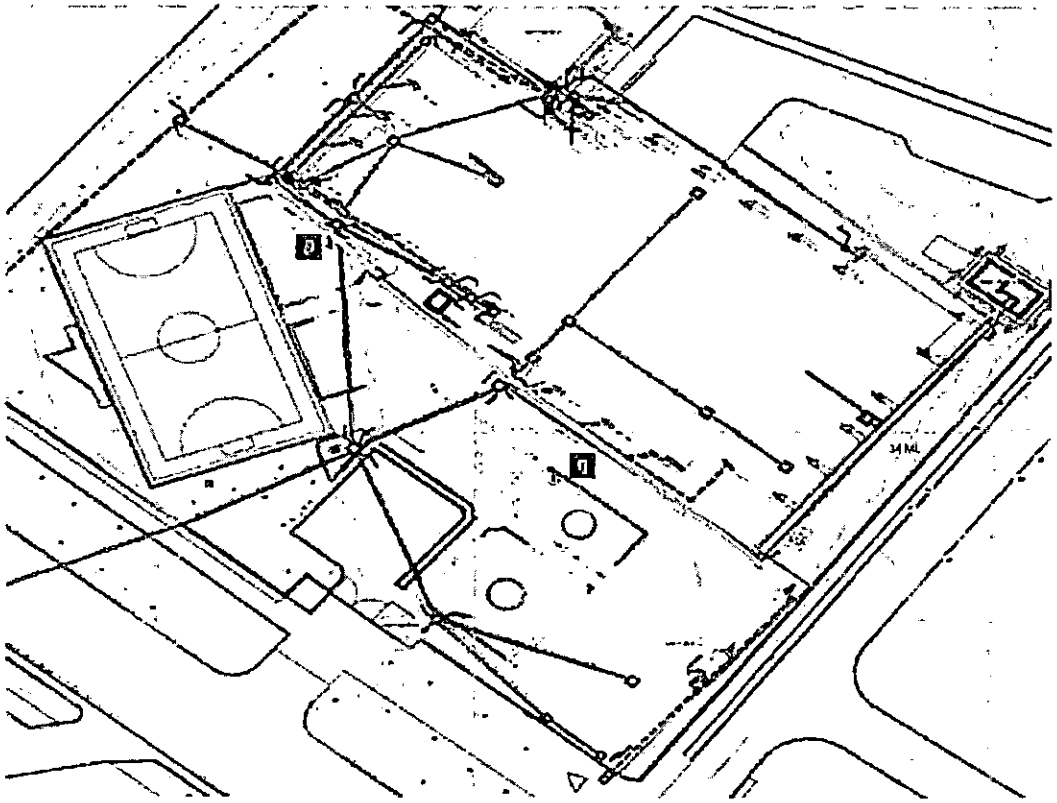


ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Gobierno Integración Social	**MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA**	PRISMA UNIVERSAL SEC S.A.S. CONSORCIO PRUNI SEDES 04 CONTRATISTA	ARQUITECTURA URBANA LTDA INTERVENTORÍA
	PROYECTO: OBRAS SEDES ALCALDÍA		

ACTA PARCIAL No,	2	PERIODO DEL ACTA	01/09/2019	A	30/09/2019	
OBJETO	REALIZAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE AJUSTE LAS DIFERENTES OBRAS E INTERVENCIONES ESPECIALIZADAS PARA LAS DIFERENTES SEDES DE LA SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C.					
CONTRATO DE OBRA No	731-2019	CONTRATISTA	CONSORCIO PRUNI SEDES 04	ENTIDAD CONTRATANTE	SECRETARIA GENERAL-ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA	
CONTRATO INTERVENTORÍA	730 - 2019	INTERVENTORÍA	ARQUITECTURA URBANA LTDA	FRENTE:	IMPRENTA DISTRITAL	

CAPITULO	1,7	OBRAS CIVILES	ITEM	1,7,0,18	CONCRETO DE LIMPIEZA	UNIDAD	M3

ITEM	LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	TOTAL	UNIDAD
	COSTADO SUR (CAJAS SANITARIAS						
	CAJA #1	0,84	0,84	0,05	1,00	0,0353	M3
	CAJA #2	0,84	0,84	0,05	1,00	0,0353	M3
	CAJA #3	1,04	1,04	0,05	1,00	0,0541	M3
	CAJA #4	1,04	1,04	0,05	1,00	0,0541	M3
	CAJA #5	1,04	1,04	0,05	1,00	0,0541	M3
	CAJA #6	1,24	1,24	0,05	1,00	0,0769	M3
OBSERVACIONES:			SUBTOTAL			0,3097	M3
			TOTAL			0,3097	M3

LOCALIZACIÓN PLANIMÉTRICA

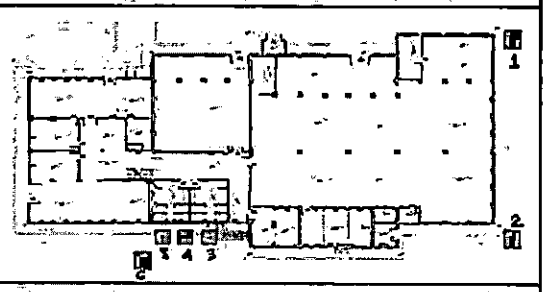

REGISTRO FOTOGRÁFICO



Alejandra Bolaños +
ARQ. ALEJANDRA BOLAÑOS
RESIDENTE CONTRATISTA

Jessica Lopera A.
ARQ. JESSICA LOPERA
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. | BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS
SECRETARÍA GENERAL

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

PROYECTO: OBRAS PARA LAS DIFERENTES SEDES DE LA SECRETARÍA GENERAL -ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ

PRISMA UNIVERSAL SEC S.A.S. — CONTRATISTA


ARQUITECTURA URBANA LTDA — INTERVENTORÍA

ACTA PARCIAL No,	3		PERIODO DEL ACTA	01/10/2019	A	30/10/2019	
OBJETO	REALIZAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE AJUSTE LAS DIFERENTES OBRAS E INTERVENCIONES ESPECIALIZADAS PARA LAS DIFERENTES SEDES DE LA SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C.						
CONTRATO DE OBRA No	731-2019	CONTRATISTA	CONSORCIO PRUNI SEDES 04		ENTIDAD CONTRATANTE	SECRETARIA GENERAL-ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA	
CONTRATO INTERVENTORÍA	730 - 2019	INTERVENTORÍA	ARQUITECTURA URBANA LTDA		FRENTE:	IMPRENTA DISTRITAL	

CAPITULO	1.7	OBRAS CIVILES	ITEM	1.7.0.20	Reposicion ladrillo cemento	UNIDAD	M2

ITEM	LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	TOTAL	UNIDAD
	Redes hidrosanitarias						
	CANALIZACION # 1	28,40	0,60		1,00	17,04	M2
	CANALIZACION # 2	14,70	0,60		1,00	8,82	M2
OBSERVACIONES:				SUBTOTAL		25,86	M2
				TOTAL		25,86	M2

LOCALIZACION PLANIMETRICA

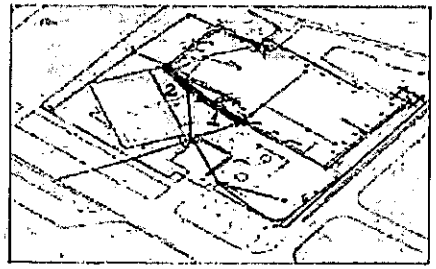

REGISTRO FOTOGRÁFICO



Alejandra Bolaños +
ARQ. ALEJANDRA BOLAÑOS
RESIDENTE CONTRATISTA

Jessica Lopera A.
ARQ. JESSICA LOPERA
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA GENERAL | BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

PROYECTO: OBRAS PARA LAS DIFERENTES SEDES DE LA SECRETARÍA GENERAL -ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ

PRISMA UNIVERSAL SEC S.A.S. — CONTRATISTA

ARQUITECTURA URBANA LTDA — INTERVENTORÍA


ACTA PARCIAL No,	3	PERIODO DEL ACTA	01/10/2019	A	30/10/2019	
OBJETO	REALIZAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE AJUSTE LAS DIFERENTES OBRAS E INTERVENCIONES ESPECIALIZADAS PARA LAS DIFERENTES SEDES DE LA SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C.					
CONTRATO DE OBRA No	731- 2019	CONTRATISTA	CONSORCIO PRUNI SEDES 04	ENTIDAD CONTRATANTE	SECRETARIA GENERAL-ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA	
CONTRATO INTERVENTORÍA	730 - 2019	INTERVENTORÍA	ARQUITECTURA URBANA LTDA	FRENTE:	IMPRENTA DISTRITAL	

CAPITULO	1.8	DESMONTE DE APARATOS SANITARIOS	ITEM	1.8.0.1	DESMONTE DE APARATOS SANITARIOS	UNIDAD	UN


ITEM	LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	TOTAL	UNIDAD
	ZONA ADMINISTRACION						
1	Baño Hombres 1er piso						
	Sanitarios				2,00	2,00	UND
	Orinales				3,00	3,00	UND
	Lavamanos				2,00	2,00	UND
2	Baño Mujeres 2do piso						
	Sanitarios				2,00	2,00	UND
	Lavamanos				1,00	1,00	UND
3	Baño Hombre 2do piso						
	Sanitarios				2,00	2,00	UND
	Lavamanos				1,00	1,00	UND
				SUBTOTAL		13,00	UND
				TOTAL		13,00	UND

OBSERVACIONES:

LOCALIZACIÓN PLANIMETRICA

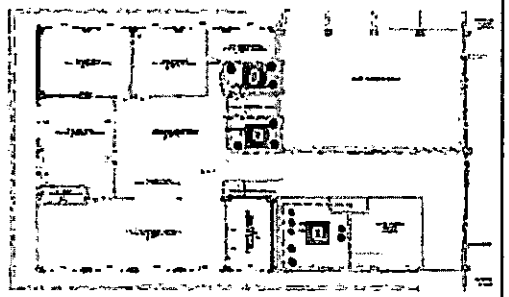

REGISTRO FOTOGRÁFICO

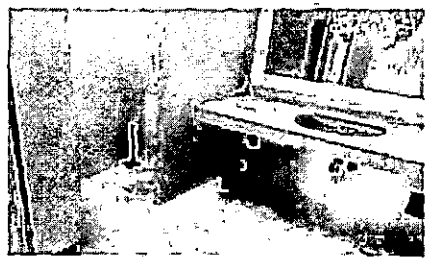


Alejandra Bolaños +

ARQ. ALEJANDRA BOLAÑOS
RESIDENTE CONTRATISTA


Jessica Lopera A.

ARQ. JESSICA LOPERA
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

PLANO DETALLE

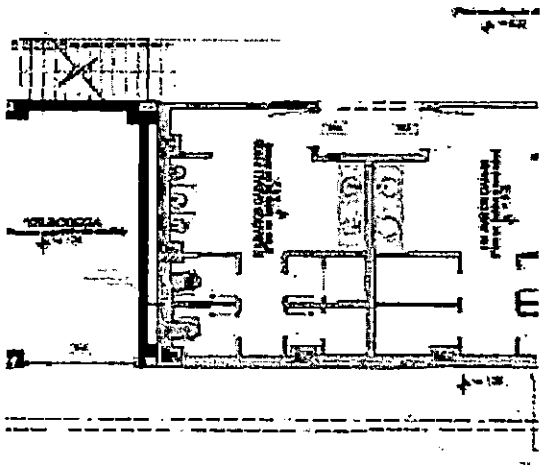

BATERIA SANITARIA HOMBRES 1ER PISO

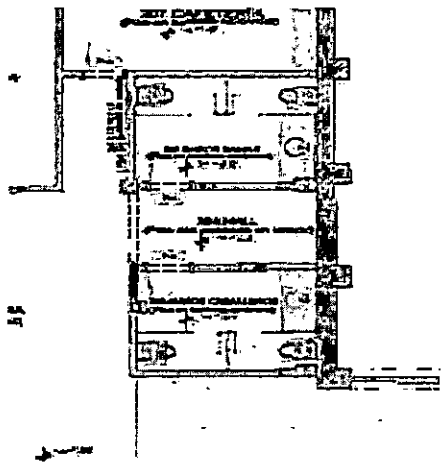

BATERIA SANITARIA HOMBRES Y MUJERES 2DO PISO

- Sanitarios
- Orinales
- Lavamanos

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
Secretaría Integración Social

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

PROYECTO: OBRAS SEDES ALCALDÍA

PRISMA — UNIVERSAL SEC S.A.S. — CONSORCIO PRISMA SEDES 04 — CONTRATISTA


ARQUITECTURA URBANA LTDA — INTERVENTORÍA

ACTA PARCIAL No.	3		PERIODO DEL ACTA	01/10/2019	A	30/10/2019	
OBJETO:	SEDES ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA						
CONTRATO DE OBRA No	731-2019	CONTRATISTA	CONSORCIO PRISMA SEDES04	ENTIDAD CONTRATANTE	SECRETARIA GENERAL -ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA		
CONTRATO INTERVENTORÍA		INTERVENTORÍA	ARQUITECTURA URBANA LTDA	HOJA	1	DE	1

CAPITULO	2.1.0	PRELIMINARES	ITEM	2.1.0.2	LOCALIZACION Y REPLANTEO	UNIDAD	M2

ITEM	LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	TOTAL	UNIDAD
	PRODUCCION						
1	A1	18,10	22,05		1,00	399,11	M2
2	A2	27,00	12,25		1,00	330,75	M2
3	BODEGA DE INSUMOS	8,80	5,45		1,00	47,96	M2
4	Baño Hombres 1er piso	6,00	4,25		1,00	25,50	M2
OBSERVACIONES:				SUBTOTAL		803,32	M2
				TOTAL		803,32	M2

LOCALIZACION PLANIMÉTRICA

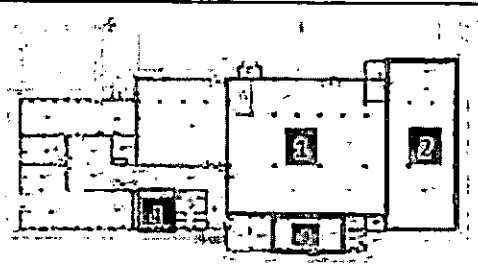

REGISTRO FOTOGRAFICO



Alejandra Bolaños +
ARQ. ALEJANDRA BOLAÑOS
RESIDENTE CONTRATISTA

Jessica Lopera D.
ARQ. JESSICA LOPERA
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
Secretaría Integración Social
Integración Social

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

PROYECTO: OBRAS SEDES ALCALDÍA

PRISMA
UNIVERSAL SEC S.A.S.
CONSORCIO PRUNI SEDES 04
CONTRATISTA

ARQUITECTURA URBANA LTDA
INTERVENTORÍA

ACTA PARCIAL No,	3	PERIODO DEL ACTA	01/10/2019	A	30/10/2019	
OBJETO	REALIZAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE AJUSTE LAS DIFERENTES OBRAS E INTERVENCIONES ESPECIALIZADAS PARA LAS DIFERENTES SEDES DE LA SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C.					
CONTRATO DE OBRA No	731-2019	CONTRATISTA	CONSORCIO PRUNI SEDES 04	ENTIDAD CONTRATANTE	SECRETARIA GENERAL-ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA	
CONTRATO INTERVENTORÍA	730 - 2019	INTERVENTORÍA	ARQUITECTURA URBANA LTDA	FRENTE:	IMPRENTA DISTRITAL	

CAPITULO	2.1.0	PRELIMINARES	ITEM	2.1.0.3	BAÑO MOVIL	UNIDAD	MES


ITEM	LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	TOTAL	UNIDAD
1	Baño movil (instalado 17 de julio) Mes Octubre				1,00	1,00	MES
2	Baño movil (instalado 02 de Septiembre) Mes Octubre				1,00	1,00	MES
				SUBTOTAL		2,00	MES
				TOTAL		2,00	MES

OBSERVACIONES: INGRESO A OBRA DE BAÑO PORTATIL 17 DE JULIO DE 2019

LOCALIZACIÓN PLANIMETRICA



REGISTRO FOTOGRAFICO

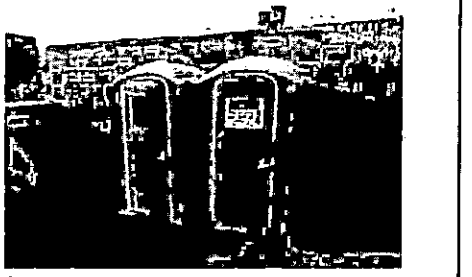

Alejandra Bolaños +
ARQ. ALEJANDRA BOLAÑOS
RESIDENTE CONTRATISTA

Jessica Lopera A.
ARQ. JESSICA LOPERA
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Gobierno Integridad y Confianza	MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA PROYECTO: OBRAS SEDES ALCALDÍA	PRISMA UNIVERSAL SEC S.A.S. CONTRATISTA	ARQUITECTURA URBANA LTDA INTERVENTORÍA

ACTA PARCIAL No,	3	PERIODO DEL ACTA	01/10/2019	A	30/10/2019	
OBJETO	REALIZAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE AJUSTE LAS DIFERENTES OBRAS E INTERVENCIONES ESPECIALIZADAS PARA LAS DIFERENTES SEDES DE LA SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C.					
CONTRATO DE OBRA No	731- 2019	CONTRATISTA	CONSORCIO PRISMA SEDES 04	ENTIDAD CONTRATANTE	SECRETARIA GENERAL-ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA	
CONTRATO INTERVENTORÍA	730 - 2019	INTERVENTORÍA	ARQUITECTURA URBANA LTDA	FRENTE	IMPRENTA DISTRITAL	

CAPITULO	2.2.0	CIMENTACION	ITEM	2.2.0.2	Excavación manual para ciclópeo y zapatas	UNIDAD	M3


ITEM	LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES ANCHO	DIMENSIONES LARGO	DIMENSIONES ALTO	CANTIDAD	TOTAL	UNIDAD
	ZONA DE PRODUCCION						
1	Z-4 EJES 4-N	0,80	2,00	0,60	2,00	1,920	M3
2	Z-4 EJES 4-O	0,80	2,00	0,60	2,00	1,920	M3
3	Z-3 EJES 7-M	2,30	2,30	0,75	1,00	3,968	M3
4	Z-3 EJES 7-5	2,30	2,30	0,75	1,00	3,968	M3
5	Z-4 EJES 11-N	2,30	2,00	0,75	1,00	3,450	M3
6	Z-4 EJES 11-P	2,30	2,00	0,75	1,00	3,450	M3
7	Z-3 EJES 7-O	2,30	2,30	0,75	1,00	3,968	M3
8	Z-4 EJES 11-L	2,30	2,00	0,75	1,00	3,450	M3
9	Z-4 EJES 11-M	2,30	2,00	0,75	1,00	3,450	M3
10	Z-4 EJES 11-O	2,30	2,00	0,75	1,00	3,450	M3

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Integración Social	MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA PROYECTO: OBRAS SEDES ALCALDÍA	PRISMA UNIVERSAL SEC S.A.S. CONSORCIO PRISMA SEDES 04 CONTRATISTA	INTERVENTORÍA

ACTA PARCIAL No.	3		PERIODO DEL ACTA	01/10/2019	A	30/10/2019
OBJETO	REALIZAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE AJUSTE LAS DIFERENTES OBRAS E INTERVENCIONES ESPECIALIZADAS PARA LAS DIFERENTES SEDES DE LA SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C.					
CONTRATO DE OBRA No	73 L- 2019	CONTRATISTA	CONSORCIO PRUNI SEDES 04		ENTIDAD CONTRATANTE	SECRETARIA GENERAL-ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA
CONTRATO INTERVENTORÍA	730 - 2019	INTERVENTORIA	ARQUITECTURA URBANA LTDA		FRENTE:	IMPRENTA DISTRITAL

PLANO DETALLE

ZONA DE PRODUCCION

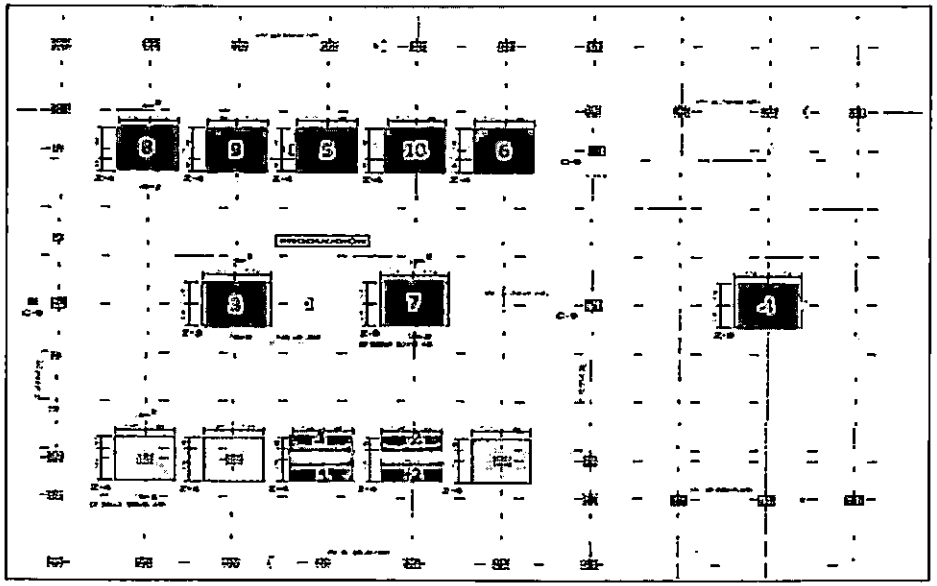

112

Ha Interventoría

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
Secretaría Integración Social

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

PROYECTO: OBRAS SEDES ALCALDÍA

PRISMA — UNIVERSAL SEC S.A.S. — CONSORCIO PRUNI SEDES 04 — CONTRATISTA

ARQUITECTURA URBANA LTDA. — INTERVENTORÍA


ACTA PARCIAL No.	3	PERIODO DEL ACTA	01/10/2019	A	30/10/2019	
OBJETO	REALIZAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE AJUSTE LAS DIFERENTES OBRAS E INTERVENCIONES ESPECIALIZADAS PARA LAS DIFERENTES SEDES DE LA SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C.					
CONTRATO DE OBRA No	731- 2019	CONTRATISTA	CONSORCIO PRUNI SEDES 04	ENTIDAD CONTRATANTE	SECRETARIA GENERAL-ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA	
CONTRATO INTERVENTORÍA	730 - 2019	INTERVENTORÍA	ARQUITECTURA URBANA LTDA	FRENTE:	IMPRENTA DISTRITAL	

CAPITULO	2.2.0	CIMENTACION	ITEM	2.2.0.7	Concreto de zapatas - 4,000 PSI	UNIDAD	M3

ITEM	LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	TOTAL	UNIDAD
	ADMINISTRACION 1ER PISO						
1	1'-A	0,900	0,900	0,350	1,00	0,28	M3
2	5'-B	0,900	0,900	0,350	1,00	0,28	M3
3	5'-C	0,900	0,900	0,350	1,00	0,28	M3
4	5'-D	0,900	0,900	0,350	1,00	0,28	M3
5	VIGA CIMENTACION	1,000	0,200	0,250	3,00	0,15	M3
				SUBTOTAL		1,28	M3
				TOTAL		1,28	M3

OBSERVACIONES:

LOCALIZACION PLANIMETRICA

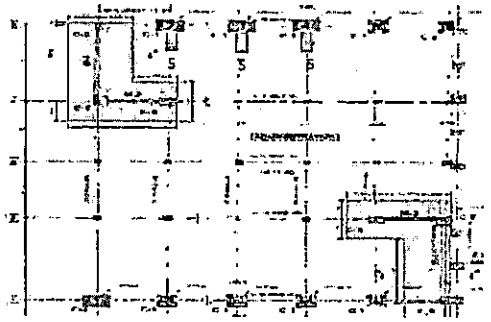

REGISTRO FOTOGRAFICO



Alejandra Bolaños +
ARQ. ALEJANDRA BOLAÑOS
RESIDENTE CONTRATISTA

Jessica Lopera A.
ARQ. JESSICA LOPERA
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

ALCALDIA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
Secretaría Integración Social

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

PROYECTO: OBRAS SEDES ALCALDÍA

PRISMA — UNIVERSAL SEC S.A.S. — CONTRATISTA

ARQUITECTURA URBANA LTDA — INTERVENTORÍA

ACTA PARCIAL No,	3	PERIODO DEL ACTA	01/10/2019	A	30/10/2019	
OBJETO	REALIZAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE AJUSTE LAS DIFERENTES OBRAS E INTERVENCIONES ESPECIALIZADAS PARA LAS DIFERENTES SEDES DE LA SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C.					
CONTRATO DE OBRA No	731-2019	CONTRATISTA	CONSORCIO PRUNI SEDES 04	ENTIDAD CONTRATANTE	SECRETARIA GENERAL-ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA	
CONTRATO INTERVENTORÍA	730-2019	INTERVENTORÍA	ARQUITECTURA URBANA LTDA	FUENTE:	IMPRENTA DISTRITAL	

CAPITULO		2.2.0	CIMENTACION		ITEM	2.2.0.8	Suministro (instalación) figurado y amarre de acero 60000 PSI 420 Mpa.	UNIDAD	KG

ITEM	LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES FIGURA	DIMENSIONES LONGITUD	DIMENSIONES PESO	CANTIDAD	TOTAL	UNIDAD
1	S'-B						
	Acero 1/2" con .15m de escuadra (doble)		1,00	0,994	4,00	3,976	KG
	Fleje 3/8" .70x.15 con .10m de gancho		1,90	0,560	6,00	6,384	KG
	U 3/8"		0,65	0,560	4,00	1,456	KG
2	ANCLAJE A C-1 EN EJES S'-B						KG
	Acero 1/2" recto		0,90	0,994	4,00	3,578	KG
3	S'-C						
	Acero 1/2" con .15m de escuadra (doble)		1,00	0,994	4,00	3,976	KG
	Fleje 3/8" .70x.15 con .10m de gancho		1,90	0,560	6,00	6,384	KG
	U 3/8"		0,65	0,560	4,00	1,456	KG
4	ANCLAJE A C-1 EN EJES S'-C						KG
	Acero 1/2" recto		0,90	0,994	4,00	3,578	KG
5	S'-D						
	Acero 1/2" con .15m de escuadra (doble)		1,00	0,994	4,00	3,976	KG
	Fleje 3/8" .70x.15 con .10m de gancho		1,90	0,560	6,00	6,384	KG
	U 3/8"		0,65	0,560	4,00	1,456	KG
6	ANCLAJE A C-1 EN EJES S'-D						KG
	Acero 1/2" recto		0,90	0,994	4,00	3,578	KG


ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Secretaría General Compromiso Social	**MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA** **PROYECTO: OBRAS SEDES ALCALDÍA**	PRISMA UNIVERSAL SEC S.A.S. CONTRATISTA	INTERVENTORÍA

ACTA PARCIAL No.	3		PERIODO DEL ACTA	01/10/2019	A	30/10/2019	
OBJETO	REALIZAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE AJUSTE LAS DIFERENTES OBRAS E INTERVENCIONES ESPECIALIZADAS PARA LAS DIFERENTES SEDES DE LA SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C.						
CONTRATO DE OBRA No	731-2019	CONTRATISTA	CONSORCIO PRUNI SEDES 04		ENTIDAD CONTRATANTE	SECRETARIA GENERAL-ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA	
CONTRATO INTERVENTORÍA	730-2019	INTERVENTORÍA	ARQUITECTURA URBANA LTDA		FRENTE:	IMPRENTA DISTRITAL	

CAPÍTULO		2	COLUMNAS Y MUROS		ITEM	2.3.0.1	Escarificar columnas y adhesivo, incluye la escarificación y el adhesivo especial para unir concreto existente a concreto nuevo	UNIDAD	M2


ITEM	LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	TOTAL	UNIDAD
	COLUMNAS ZONA DE PRODUCCION						
1	C-8 I-11	1,20		7,00	1,00	8,40	M2
2	C-8 N-11	1,20		7,00	1,00	8,40	M2
3	C-8 P-11	1,20		7,00	1,00	8,40	M2
6	C-9 Q-7	1,20		4,30	1,00	5,16	M2
7	C-10 M-11	1,20		7,00	1,00	8,40	M2
8	C-10 O-11	1,20		7,00	1,00	8,40	M2
9	C-11 M-7	1,20		7,00	1,00	8,40	M2
10	C-11 O-7	1,20		7,00	1,00	8,40	M2
11	C-12 S-7	1,20		4,60	1,00	5,52	M2
OBSERVACIONES:				SUBTOTAL		69,48	M2
				TOTAL		69,48	M2

LOCALIZACION PLANIMETRICA



COLUMNAS AREA PRODUCCION

REGISTRO FOTOGRAFICO

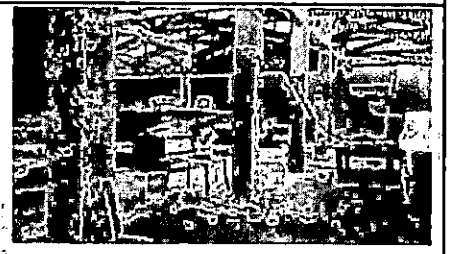

Alexandra Bolaños +

ARQ. ALEJANDRA BOLAÑOS
RESIDENTE CONTRATISTA

Jessica Lopera A.


ARQ. JESSICA LOPERA
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Secretaría Integración Social	MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA	PRISMA UNIVERSAL SEC S.A.S. CONSORCIO PRUNI SEDES 04 CONTRATISTA	ARQUITECTURA URBANA LTDA INTERVENTORÍA
	PROYECTO: OBRAS SEDES ALCALDÍA		

ACTA PARCIAL No.	3	PERIODO DE LA ACTA	01/10/2019	A	30/10/2019	
OBJETO	REALIZAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE AJUSTE LAS DIFERENTES OBRAS E INTERVENCIONES ESPECIALIZADAS PARA LAS DIFERENTES SEDES DE LA SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C.					
CONTRATO DE OBRA No	731-2019	CONTRATISTA	CONSORCIO PRUNI SEDES 04	ENTIDAD CONTRATANTE	SECRETARIA GENERAL-ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA	
CONTRATO INTERVENTORÍA	730-2019	INTERVENTORÍA	ARQUITECTURA URBANA LTDA	FRENTE	IMPRENTA DISTRITAL	

PLANO DETALLE

ZONA DE PRODUCCION

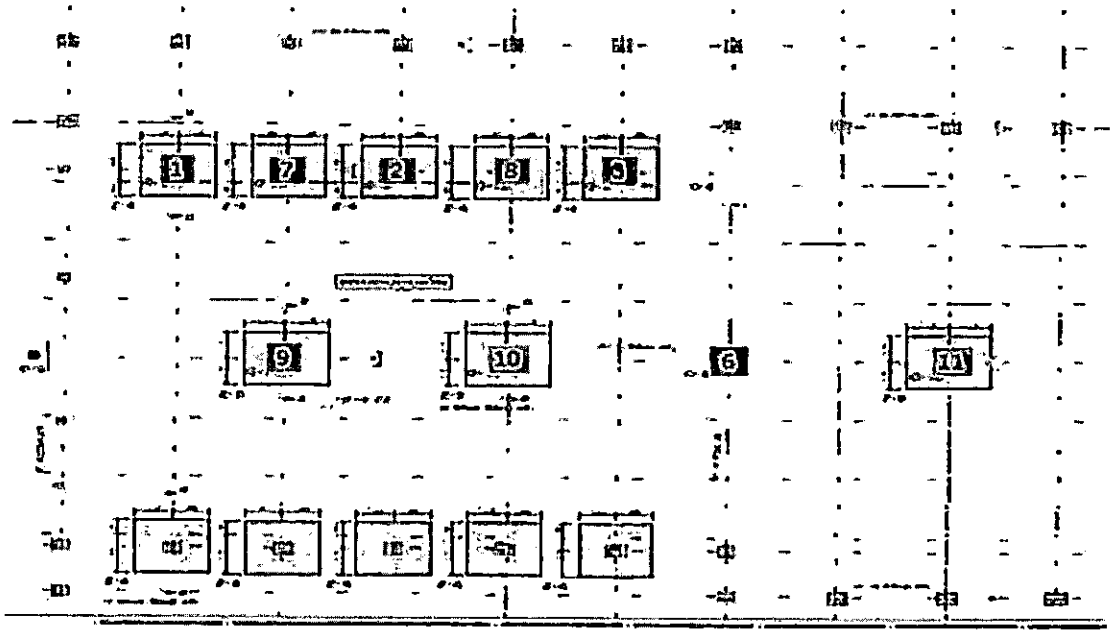

116

Vo. Interventt.
Alejandra

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
Secretaría Integración Social

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

PROYECTO: OBRAS SEDES ALCALDÍA


PRISMA — UNIVERSAL SEC S.A.S. — CONTRATISTA
ARQUITECTURA URBANA LTDA — INTERVENTORÍA

ACTA PARCIAL No.	3	PERIODO DEL ACTA	01/10/2019	A	30/10/2019	
OBJETO	REALIZAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE AJUSTE LAS DIFERENTES OBRAS E INTERVENCIONES ESPECIALIZADAS PARA LAS DIFERENTES SEDES DE LA SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C.					
CONTRATO DE OBRA No	73 1- 2019	CONTRATISTA	CONSORCIO PRUNI SEDES 04	ENTIDAD CONTRATANTE	SECRETARIA GENERAL-ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA	
CONTRATO INTERVENTORÍA	730 - 2019	INTERVENTORÍA	ARQUITECTURA URBANA LTDA	FRENTE:	IMPRENTA DISTRITAL	

CAPITULO	2	COLUMNAS Y MUROS	ITEM	2.3.0.2	Concreto de columnas y muros - 4,000 PSI	UNIDAD	M3

ITEM	LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	TOTAL	UNIDAD
	PRODUCCION						
1	M-1 EJE A ENTRE EJES 5'-4' PRIMER PISO	4,90	0,20	3,09	1,00	3,03	M3
2	M-2	2,27	0,20	3,09	1,00	1,40	M3
3	C-4	0,50	0,65	3,09	1,00	0,88	M3
4	C-6	0,40	0,55	3,09	1,00	0,56	M3
5	C-7	0,40	0,50	3,09	1,00	0,49	M3
6	C-1 B-1'	0,50	0,40	3,09	1,00	0,49	M3
7	C-1 B-5'	0,50	0,40	3,09	1,00	0,49	M3
8	C-1 C-1'	0,50	0,40	3,09	1,00	0,49	M3
9	C-1 C-5'	0,50	0,40	3,09	1,00	0,49	M3
10	C-1 D-1'	0,50	0,40	3,09	1,00	0,49	M3
11	C-2 A-1'	0,40	0,40	3,09	1,00	0,37	M3
12	M-1 2DO PISO	4,90	0,20	2,25	1,00	2,21	M3
13	M-2 2DO PISO	2,21	0,20	2,85	1,00	1,26	M3
14	C-1 B-5' 2DO PISO	0,50	0,65	2,30	1,00	0,66	M3
15	C-1 C-5' 2DO PISO	0,50	0,65	2,30	1,00	0,66	M3
16	C-4 2DO PISO	0,50	0,65	3,00	1,00	0,86	M3
17	C-6 2DO PISO	0,40	0,55	2,45	1,00	0,44	M3
18	C-7 2DO PISO	0,40	0,50	3,00	1,00	0,48	M3
19	C-1 B-1' 2DO PISO	0,50	0,40	2,30	1,00	0,37	M3
20	C-1 C-1' 2DO PISO	0,50	0,40	2,30	1,00	0,37	M3
21	C-1 D-1' 2DO PISO	0,50	0,40	2,30	1,00	0,37	M3
22	C-2 A-1' 2DO PISO	0,40	0,40	2,30	1,00	0,28	M3
				SUBTOTAL		17,14	M3
OBSERVACIONES:				TOTAL		17,14	M3

LOCALIZACION PLANIMETRICA

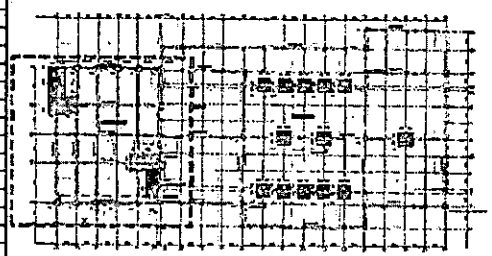

COLUMNAS Y MUROS AREA ADMINISTRATIVA

REGISTRO FOTOGRAFICO



Alejandra Bolaños +
ARQ. ALEJANDRA BOLAÑOS
RESIDENTE CONTRATISTA


Jessica Lopera A.
ARQ. JESSICA LOPERA
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Secretaría Integración Social	MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA PROYECTO: OBRAS SEDES ALCALDÍA	PRISMA UNIVERSAL SEC S.A.S. CONTRATISTA	ARQUITECTURA URBANA LTDA INTERVENTORÍA

ACTA PARCIAL No,	3		PERIODO DEL ACTA	01/10/2019	A	30/10/2019	
OBJETO	REALIZAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE AJUSTE LAS DIFERENTES OBRAS E INTERVENCIONES ESPECIALIZADAS PARA LAS DIFERENTES SEDES DE LA SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C.						
CONTRATO DE OBRA No	731-2019	CONTRATISTA	CONSORCIO PRUNI SEDES 04		ENTIDAD CONTRATANTE	SECRETARIA GENERAL-ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTA	
CONTRATO INTERVENTORÍA	730-2019	INTERVENTORÍA	ARQUITECTURA URBANA LTDA		FRENTE:	IMPRENTA DISTRITAL	

PLANO DETALLE

ZONA DE ADMINISTRACION

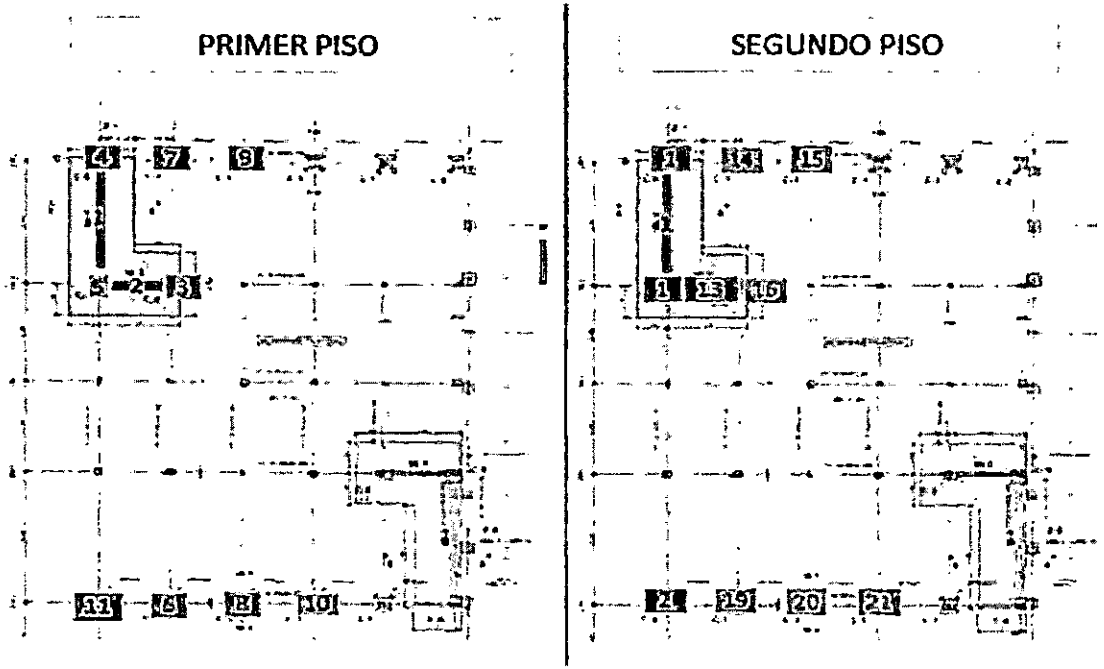

JLA Interv.

118

Alexandra

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
Secretaría Integración Social

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

PROYECTO: OBRAS SEDES ALCALDÍA

PRISMA — UNIVERSAL SEC S.A.S. — CONSORCIO PRUNI SEDES 04 — CONTRATISTA


ARQUITECTURA URBANA LTDA — INTERVENTORÍA

ACTA PARCIAL No,	3	PERIODO DEL ACTA	01/10/2019	A	30/10/2019	
OBJETO	REALIZAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE AJUSTE LAS DIFERENTES OBRAS E INTERVENCIONES ESPECIALIZADAS PARA LAS DIFERENTES SEDES DE LA SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C.					
CONTRATO DE OBRA No	731- 2019	CONTRATISTA	CONSORCIO PRUNI SEDES 04	ENTIDAD CONTRATANTE	SECRETARIA GENERAL-ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA	
CONTRATO INTERVENTORÍA	730 - 2019	INTERVENTORÍA	ARQUITECTURA URBANA LTDA	FRENTE:	IMPRENTA DISTRITAL	


CAPITULO	2	COLUMNAS Y MUROS	ITEM	2.3.0.3	Suministro (instalación) figurada y amarre de acero 60000 PSI 420 Mpa.	UNIDAD	KG

ITEM	LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES FIGURA	DIMENSIONES LARGO	DIMENSIONES PESO (KG)	CANTIDAD	TOTAL	UNIDAD
1	COLUMNA C-1 B-1' (PRIMER PISO)						
	Acero #6 recto		1,40	2,235	8,00	25.032	KG
	Acero #6 recto		3,00	2,235	8,00	53,640	KG
	Acero #3 con .23m de escuadra (doble)		0,75	0,560	62,00	26,040	KG
	Acero #3 con .20m de escuadra		0,20	0.560	14,00	1,568	KG
2	COLUMNA C-1 C-1' (PRIMER PISO)						
	Acero #6 recto		1,40	2,235	8,00	25,032	KG
	Acero #6 recto		3,00	2,235	8,00	53,640	KG
	Acero #3 con .23m de escuadra (doble)		0,75	0,560	62,00	26,040	KG
	Acero #3 con .20m de escuadra		0,20	0,560	14,00	1,568	KG
3	COLUMNA C-1 D-1' (PRIMER PISO)						
	Acero #6 recto		1,40	2,235	8,00	25,032	KG
	Acero #6 recto		3,00	2,235	8,00	53,640	KG
	Acero #3 con .23m de escuadra (doble)		0,75	0,560	62,00	26,040	KG
	Acero #3 con .20m de escuadra		0,20	0,560	14,00	1,568	KG
4	COLUMNA C-1 B-5' (PRIMER PISO)						
	Acero #6 recto		1,40	2,235	8,00	25,032	KG
	Acero #6 recto		3,00	2,235	8,00	53,640	KG
	Acero #3 con .23m de escuadra (doble)		0,75	0,560	62,00	26,040	KG
	Acero #3 con .20m de escuadra		0,20	0,560	14,00	1,568	KG
5	COLUMNA C-1 C-5' (PRIMER PISO)						
	Acero #6 recto		1,40	2,235	8,00	25,032	KG
	Acero #6 recto		3,00	2,235	8,00	53,640	KG
	Acero #3 con .23m de escuadra (doble)		0,75	0,560	62,00	26,040	KG
	Acero #3 con .20m de escuadra		0,20	0,560	14,00	1,568	KG
OBSERVACIONES:			SUBTOTAL			531,400	KG
			TOTAL			531,400	KG

LOCALIZACION PLANIMETRICA

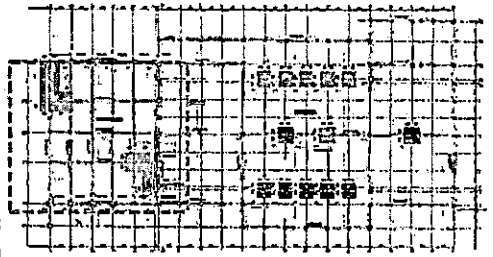

REGISTRO FOTOGRAFICO

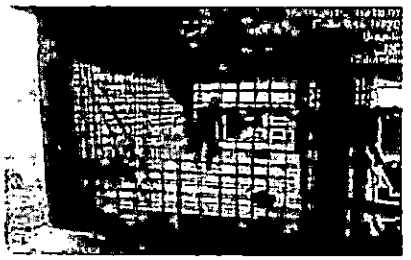

Alejandra Bolaños +


ARQ. ALEJANDRA BOLAÑOS
RESIDENTE CONTRATISTA

Jessica Lopera A.


ARQ. JESSICA LÓPERA
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

PLANO DETALLE

PRIMER PISO

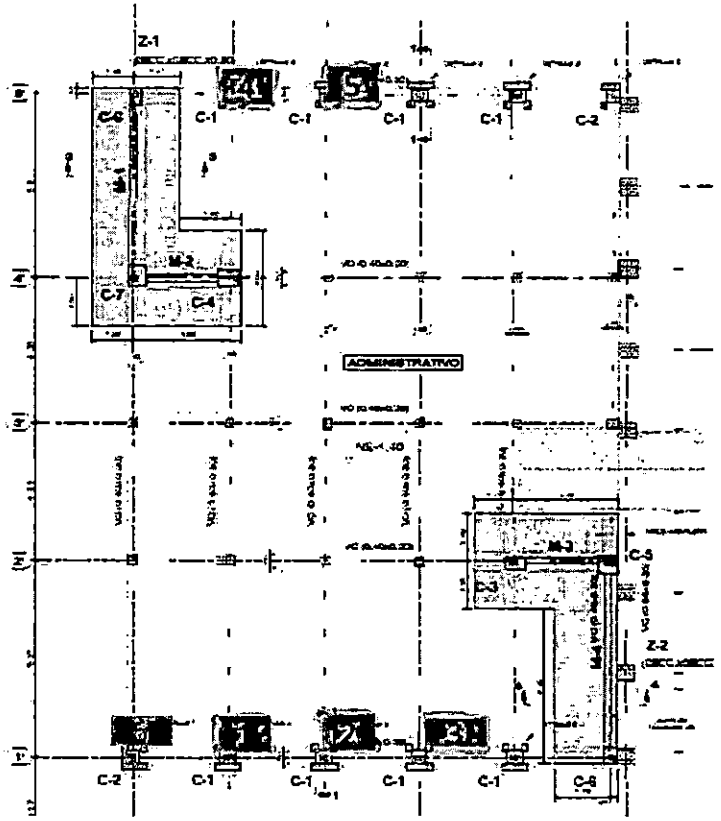

SEGUNDO PISO

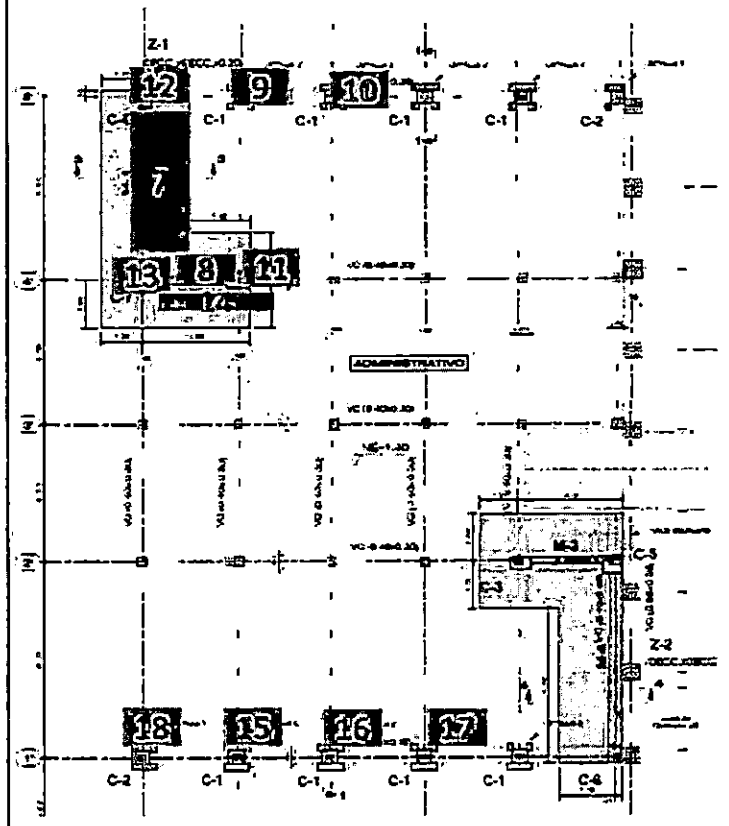

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C
Secretaría Integración Social

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

PROYECTO: OBRAS SEDES ALCALDÍA


PRISMA — UNIVERSAL SEC S.A.S. — CONTRATISTA — INTERVENTORÍA

ACTA PARCIAL No.	3	PERIODO DEL ACTA	01/10/2019	A	30/10/2019	
OBJETO:	REALIZAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE AJUSTE LAS DIFERENTES OBRAS E INTERVENCIONES ESPECIALIZADAS PARA LAS DIFERENTES SEDES DE LA SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C.					
CONTRATO DE OBRA No	731-2019	CONTRATISTA	CONSORCIO PRUNI SEDES 04	ENTIDAD CONTRATANTE	SECRETARIA GENERAL-ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA	
CONTRATO INTERVENTORÍA	730-2019	INTERVENTORÍA	ARQUITECTURA URBANA LTDA	FRENTE:	IMPRENTA DISTRITAL	

CAPITULO	2	COLUMNAS Y MUROS	ITEM	2.3.0.3	Suministro (instalación) figurada y armare de acero 60000 PSI 420 Mpa.	UNIDAD	KG

ITEM	LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES FIGURA	DIMENSIONES LARGO	DIMENSIONES PESO (KG)	CANTIDAD	TOTAL	UNIDAD
	VIENE					531,400	KG
6	COLUMNA C-2 A-1' (PRIMER PISO)						
	Acero #7 recto		1,65	3,042	5,00	23,097	KG
	Acero #7 recto		3,00	3,042	5,00	45,630	KG
	Acero #3 con .20m de estuadra		0,55	0,560	31,00	9,548	KG
	Acero #3 con .20m de estuadra		0,30	0,560	31,00	5,208	KG
7	MURO M-1 2DO PISO						
	Acero #3 recto		1,45	0,560	52,00	42,224	KG
	Acero #3 recto		2,27	0,560	56,00	71,187	KG
	Acero #3 con .15m de estuadra (doble)		5,75	0,560	32,00	103,040	KG
	Acero #3 con .10m de ganchos		0,45	0,560	208,00	52,416	KG
8	MURO M-2 2DO PISO						KG
	Acero #3 recto		1,45	0,560	24,00	19,488	KG
	Acero #3 con .20m de estuadra		3,15	0,560	24,00	42,336	KG
	Acero #3 con .15m de estuadra		2,60	0,560	40,00	58,240	KG
	Acero #3 con .15m de estuadra		1,15	0,560	40,00	25,760	KG
	Acero #3 con .10m de ganchos		0,45	0,560	120,00	30,240	KG
9	COLUMNA C-1 B-5' 2DO PISO						KG
	Acero #6 recto		2,10	2,235	8,00	37,548	KG
	Acero #6 con .25m de estuadra		2,55	2,235	8,00	45,594	KG
	Acero #3 con .23m de estuadra (doble)		0,75	0,560	44,00	18,480	KG
	Acero #3 con .20m de estuadra		0,20	0,560	10,00	1,120	KG
10	COLUMNA C-1 C-5' 2DO PISO						KG
	Acero #6 recto		2,10	2,235	8,00	37,548	KG
	Acero #6 con .25m de estuadra		2,55	2,235	8,00	45,594	KG
	Acero #3 con .23m de estuadra (doble)		0,75	0,560	44,00	18,480	KG
	Acero #3 con .20m de estuadra		0,20	0,560	10,00	1,120	KG
OBSERVACIONES:						1.257,258	KG
						1.257,258	KG

LOCALIZACION PLANIMETRICA



REGISTRO FOTOGRAFICO




Alejandra Bolaños t
ARQ. ALEJANDRA BOLAÑOS
RESIDENTE CONTRATISTA

Jessica Lopera A.
ARQ. JESSICA LOPERA
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA


55

PLANO DETALLE

PRIMER PISO

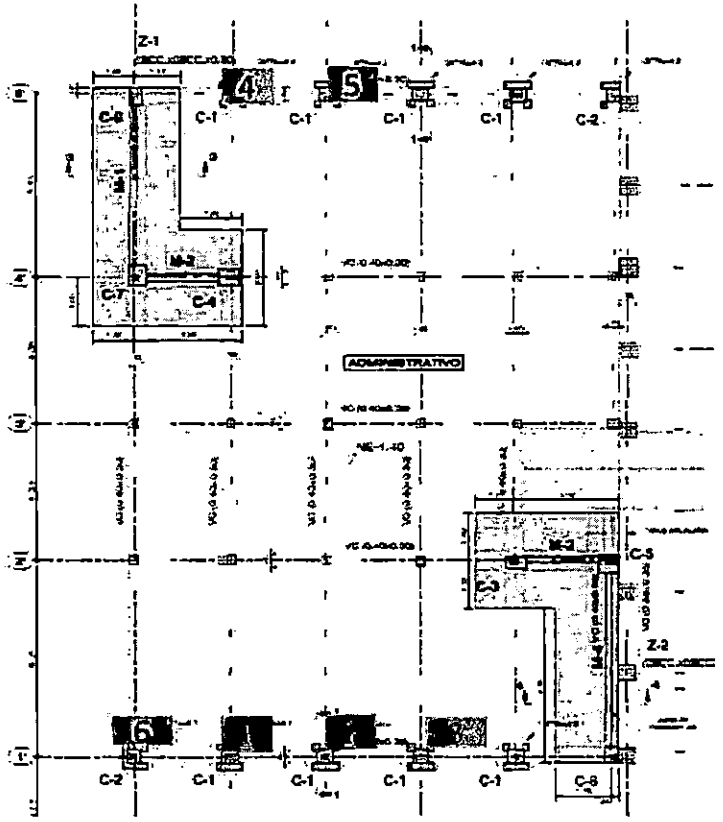

SEGUNDO PISO

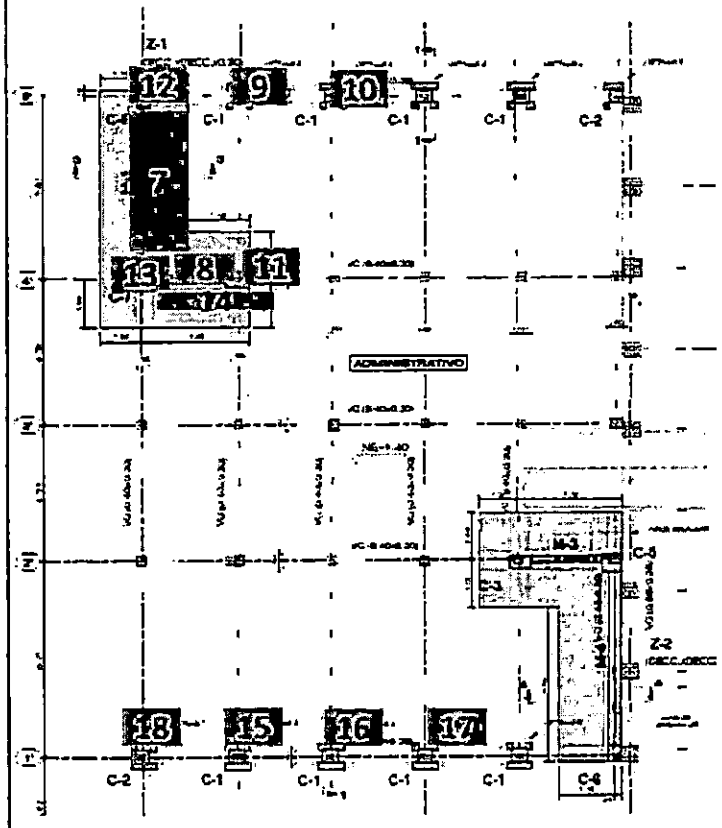

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
Secretaría Integración Social

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

PROYECTO: OBRAS SEDES ALCALDÍA


PRISMA — UNIVERSAL SEC S.A.S. — CONTRATISTA — INTERVENTORÍA

ACTA PARCIAL No.	3		PERIODO DEL ACTA	01/10/2019	A	30/10/2019	
OBJETO	REALIZAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE AJUSTE LAS DIFERENTES OBRAS E INTERVENCIONES ESPECIALIZADAS PARA LAS DIFERENTES SEDES DE LA SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C.						
CONTRATO DE OBRA No	731-2019	CONTRATISTA	CONSORCIO PRUNI SEDES 04		ENTIDAD CONTRATANTE	SECRETARIA GENERAL-ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA	
CONTRATO INTERVENTORÍA	730-2019	INTERVENTORÍA	ARQUITECTURA URBANA LTDA		FRENTE:	IMPRENTA DISTRITAL	


CAPITULO	2	COLUMNAS Y MUROS	ITEM	2.5.8.5	Suministro (instalación) figurada y armado de acero 60000 PSI 420 Mpa.	UNIDAD	KG

ITEM	LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES FIGURA	DIMENSIONES LARGO	DIMENSIONES PESO KG/M	CANTIDAD	TOTAL	UNIDAD
	VIENE					1.267,298	KG
11	COLUMNA C-6 2DO PISO						KG
	Acero #7 recto		2,45	3,042		-	KG
	Acero #7 con .25m de escuadra		3,25	3,042	10,00	98,865	KG
	Acero 3/8" con .40m de escuadra (doble)		1,25	0,560	64,00	44,800	KG
	Acero 3/8" con .15m de escuadra		0,35	0,560	15,00	2,940	KG
	Acero 3/8" con .15m de escuadra		0,15	0,560	45,00	3,780	KG
	Acero 3/8" con .10m de ganchos		0,65	0,560	32,00	11,648	KG
12	COLUMNA C-6 2DO PISO						KG
	Acero #7 recto		2,45	3,042	7,00	52,170	KG
	Acero #7 con .25m de escuadra		2,70	3,042	7,00	57,494	KG
	Acero 3/8" con .25m de escuadra		0,45	0,560	32,00	8,064	KG
	Acero 3/8" con .25m de escuadra (doble)		0,50	0,560	32,00	8,960	KG
	Acero 3/8" con .10m de ganchos		0,55	0,560	32,00	9,856	KG
13	COLUMNA C-7 2DO PISO						
	Acero #6 recto		2,10	2,235	14,00	65,709	KG
	Acero #6 con .25m de escuadra		3,45	2,235	14,00	107,951	KG
	Acero 3/8" con .23m de escuadra (doble)		1,07	0,560	54,00	32,357	KG
	Acero 3/8" con .25m de escuadra		0,35	0,560	16,00	3,136	KG
	Acero 3/8" con .10m de ganchos		0,45	0,560	32,00	8,064	KG
	Acero 3/8" con .10m de ganchos		0,80	0,560	64,00	28,672	KG
14	VIGA DE ENTREPISO M-2 2DO PISO					-	
	Acero #4 recto		2,27	0,994	2,00	4,513	KG
	Acero 3/8" con .15m de escuadra		0,45	0,560	24,00	6,048	KG
15	COLUMNA C-5 B-1' 2DO PISO					-	
	Acero #6 recto		2,10	2,235	8,00	37,548	KG
	Acero #6 recto		2,50	2,235	8,00	44,700	KG
	Acero #3 con .23m de escuadra (doble)		0,78	0,560	44,00	19,096	KG
	Acero #3 con .20m de escuadra		0,20	0,560	18,00	2,016	KG
OBSERVACIONES:						1.925,684	KG
						1.925,684	KG

LOCALIZACION PLANIMETRICA



REGISTRO FOTOGRAFICO




ARQ. ALEJANDRA SOLAÑOS
RESIDENTE CONTRATISTA


ARQ. JESSICA LOPERA
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

PLANO DETALLE

PRIMER PISO

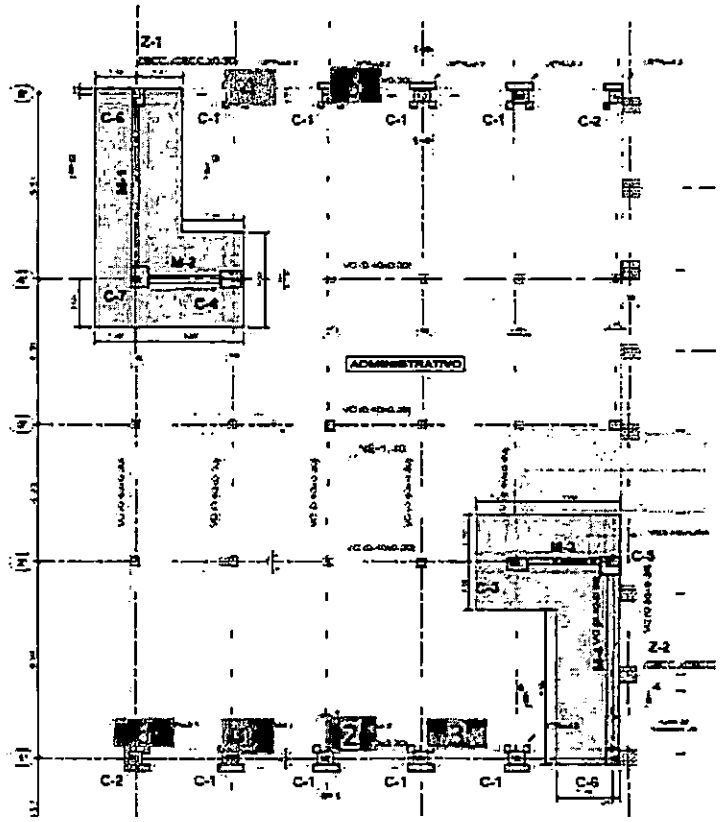

SEGUNDO PISO

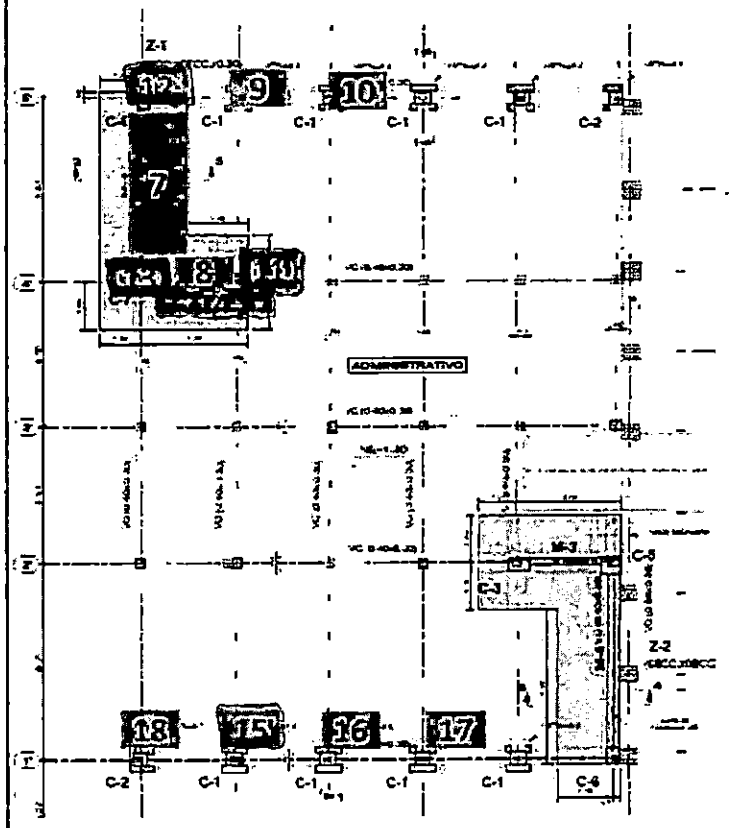

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
Secretaría Integración Social

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

PROYECTO: OBRAS SEDES ALCALDÍA


PRISMA UNIVERSAL SEC S.A.S. — CONTRATISTA
ARQUITECTURA URBANA LTDA — INTERVENTORÍA

ACTA PARCIAL No.	3		PERIODO DEL ACTA	01/10/2019	A	30/10/2019
OBJETO	REALIZAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE AJUSTE LAS DIFERENTES OBRAS E INTERVENCIONES ESPECIALIZADAS PARA LAS DIFERENTES SEDES DE LA SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C.					
CONTRATO DE OBRA No	731-2019	CONTRATISTA	CONSORCIO PRUNI SEDES 04	ENTIDAD CONTRATANTE	SECRETARIA GENERAL-ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA	
CONTRATO INTERVENTORÍA	730-2019	INTERVENTORÍA	ARQUITECTURA URBANA LTDA	FRENTE:	IMPRENTA DISTRITAL	

CAPITULO	2	COLUMNAS Y MUROS	ITEM	2.3.0.3	Suministro (instalación) figurado y amarre de acero 60000 PSI 420 Mpa.	UNIDAD	KG

ITEM	LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES FIGURA	DIMENSIONES LARGO	DIMENSIONES PESO (KG)	CANTIDAD	TOTAL	UNIDAD
	VIENE					1.925,684	KG
16	COLUMNA C-1 C-1° 2DO PISO					-	
	Acero #6 recto		2,10	2,235	8,00	37,548	KG
	Acero #6 recto		2,50	2,235	8,00	44,700	KG
	Acero #3 con .23m de escuadra (doble)		0,78	0,560	44,00	19,096	KG
	Acero #3 con .20m de escuadra		0,20	0,560	11,00	1,232	KG
17	COLUMNA C-1 D-1° 2DO PISO					-	
	Acero #6 recto		2,10	2,235	8,00	37,548	KG
	Acero #6 recto		2,50	2,235	8,00	44,700	KG
	Acero #3 con .23m de escuadra (doble)		0,78	0,560	44,00	19,096	KG
	Acero #3 con .20m de escuadra		0,20	0,560	18,00	2,016	KG
18	COLUMNA C-2 A-1° 2DO PISO					-	
	Acero #7 recto		2,45	3,042	5,00	37,265	KG
	Acero #7 recto		2,50	3,042	5,00	38,025	KG
	Acero #3 con .20m de escuadra		0,55	0,560	22,00	6,776	KG
	Acero #3 con .20m de escuadra		0,30	0,560	22,00	3,696	KG
OBSERVACIONES:			SUBTOTAL			2.217,381	KG
			TOTAL			2.217,381	KG

LOCALIZACION PLANIMETRICA

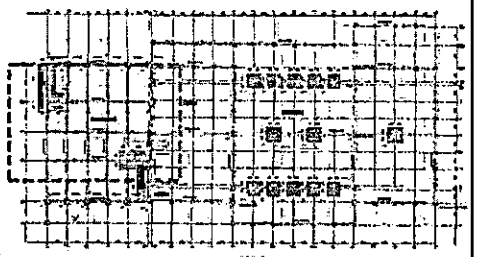

REGISTRO FOTOGRAFICO




Alejandra Bolaños t
ARQ. ALEJANDRA BOLAÑOS
RESIDENTE CONTRATISTA


Jessica Lopera A.
ARQ. JESSICA LOPERA
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

PLANO DETALLE

PRIMER PISO

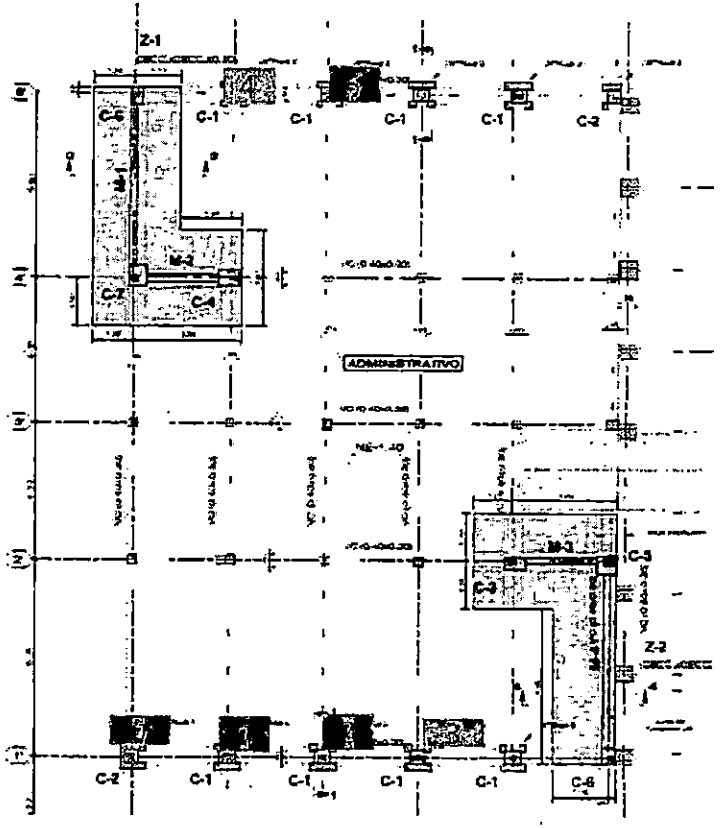

SEGUNDO PISO

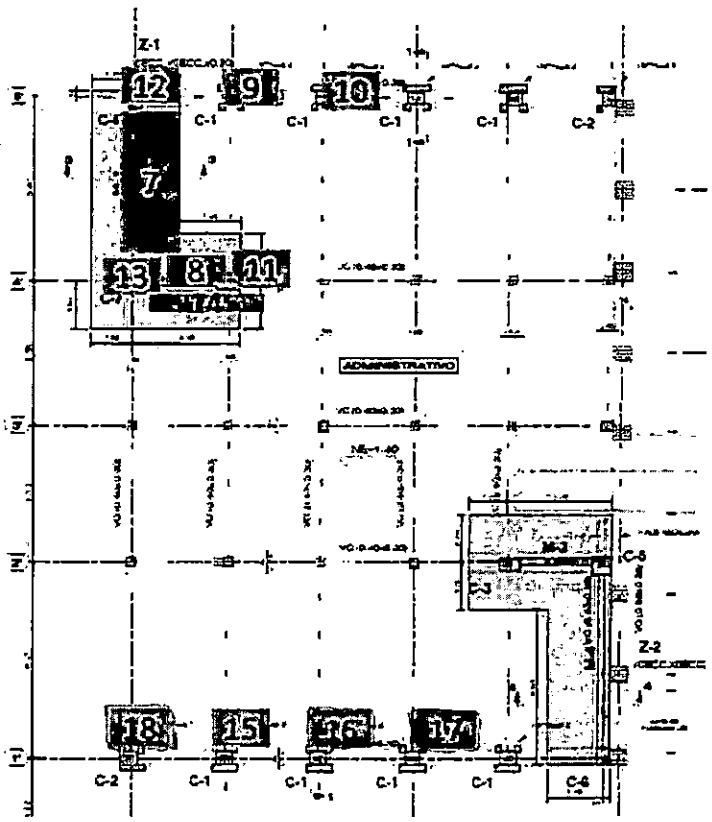

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
Secretaría Integración Social

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

PROYECTO: OBRAS SEDES ALCALDÍA

PRISMA — UNIVERSAL SEC S.A.S. — CONSORCIO PRUNI SEDES 04 — CONTRATISTA


ARQUITECTURA URBANA LTDA — INTERVENTORÍA

ACTA PARCIAL No,	3		PERIODO DEL ACTA	01/10/2019	A	30/10/2019	
OBJETO	REALIZAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE AJUSTE LAS DIFERENTES OBRAS E INTERVENCIONES ESPECIALIZADAS PARA LAS DIFERENTES SEDES DE LA SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C.						
CONTRATO DE OBRA No	731 - 2019	CONTRATISTA	CONSORCIO PRUNI SEDES 04		ENTIDAD CONTRATANTE	SECRETARIA GENERAL-ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA	
CONTRATO INTERVENTORÍA	730 - 2019	INTERVENTORÍA	ARQUITECTURA URBANA LTDA		FRENTE:	IMPRENTA DISTRITAL	

CAPITULO	2.5.0	PERFORACIONES Y EPOXICOS	ITEM	2.5.0.1	Perforación y epóxico # 3 Le 0.15	UNIDAD	UND

ITEM	LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	TOTAL	UNIDAD
1	VC A C-1 EN EJE 5' ENTRE EJES B-C						
	ANCLAJES				16,00	16,00	UN
2	VC A C-1 EN EJE 5'-D						
	ANCLAJES				8,00	8,00	UN
3	FLEJES C-1 B-1'				14,00	14,00	UN
4	FLEJES C-1 C-1'				14,00	14,00	UN
5	FLEJES C-1 D-1'				14,00	14,00	UN
6	FLEJES C-1 B-5'				14,00	14,00	UN
7	FLEJES C-1 C-5'				14,00	14,00	UN
8	FLEJES C-2 A-1'				62,00	62,00	UN
9	Anclaje entre viga de conexión y muro M1				52,00	52,00	UN
10	FLEJES C-1 B-5' 2DO PISO				10,00	10,00	UN
11	FLEJES C-1 C-5' 2DO PISO				10,00	10,00	UN
12	FLEJES C-4 B-4' 2DO PISO				60,00	60,00	UN
13	FLEJES C-6 A-5' 2DO PISO				64,00	64,00	UN
14	FLEJES C-7 A-4' 2DO PISO				5,00	5,00	UN
15	ANCLAJES SOBRE RIOSTRA DEBAJO M-2 2DO PISO				24,00	24,00	UN
16	FLEJES C-1 B-1' 2DO PISO				11,00	11,00	UN
17	FLEJES C-1 C-1' 2DO PISO				11,00	11,00	UN
18	FLEJES C-1 D-1' 2DO PISO				11,00	11,00	UN
19	FLEJES C-2 A-1' 2DO PISO				44,00	44,00	UN
OBSERVACIONES:				SUBTOTAL		458,00	UN
				TOTAL		458,00	UN

LOCALIZACION PLANIMETRICA



AREA ADMINISTRATIVA

REGISTRO FOTOGRAFICO




Alejandra Bolaños +
ARQ. ALEJANDRA BOLAÑOS
RESIDENTE CONTRATISTA


Jessica Lopera A.
ARQ. JESSICA LOPERA
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

PLANO DETALLE

PRIMER PISO

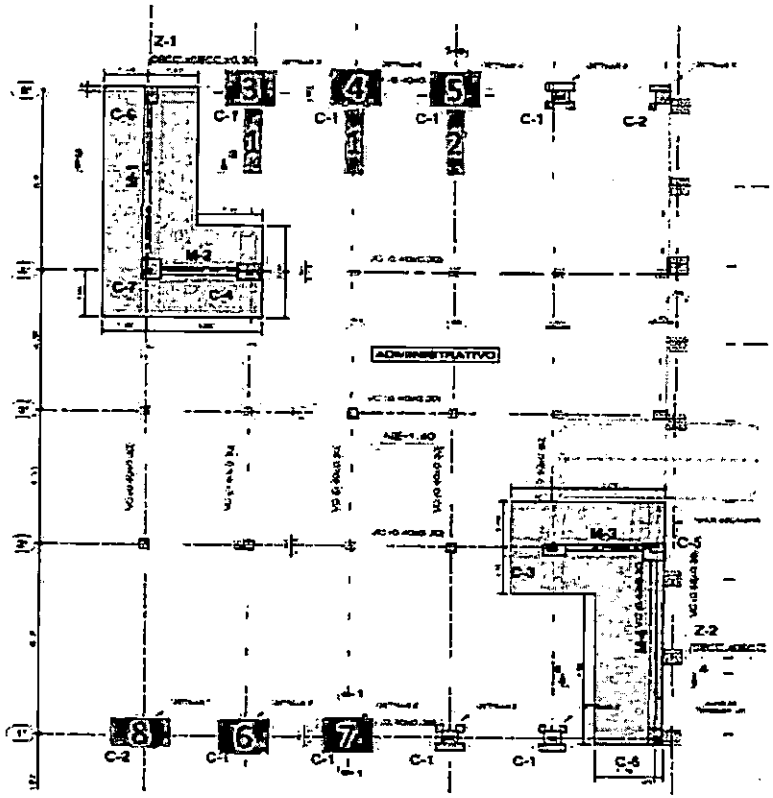

SEGUNDO PISO

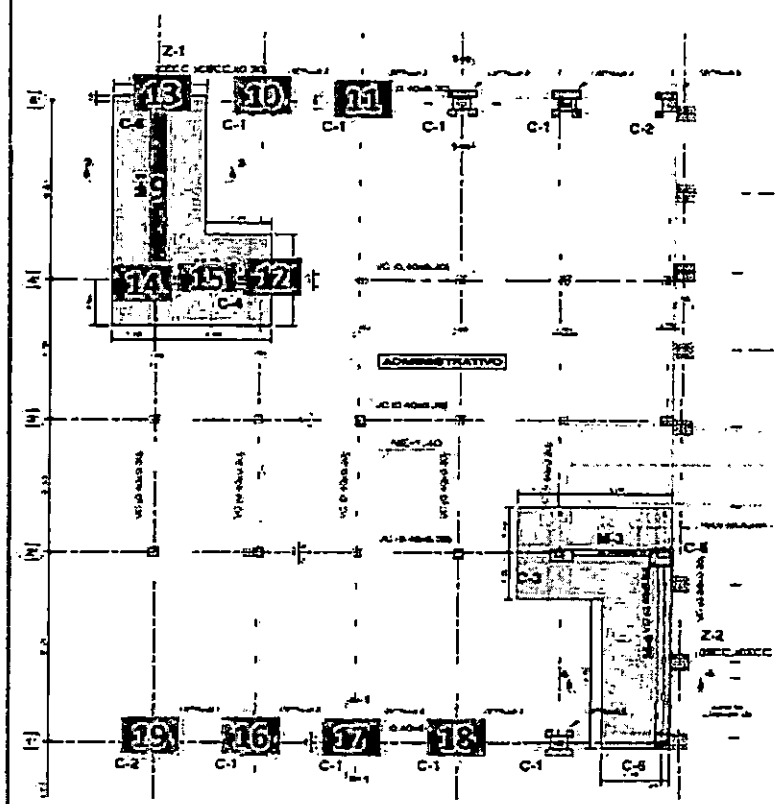

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
Secretaría Integración Social

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

PROYECTO: OBRAS SEDES ALCALDÍA

PRISMA — UNIVERSAL SEC S.A.S. — CONSORCIO PRUNI SEDES 04 — CONTRATISTA

ARQUITECTURA URBANA LTDA — INTERVENTORÍA

ACTA PARCIAL No,	3	PERIODO DEL ACTA	01/10/2019	A	30/10/2019	
OBJETO	REALIZAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE AJUSTE LAS DIFERENTES OBRAS E INTERVENCIONES ESPECIALIZADAS PARA LAS DIFERENTES SEDES DE LA SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C.					
CONTRATO DE OBRA No	731- 2019	CONTRATISTA	CONSORCIO PRUNI SEDES 04	ENTIDAD CONTRATANTE	SECRETARIA GENERAL-ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA	
CONTRATO INTERVENTORÍA	730 - 2019	INTERVENTORÍA	ARQUITECTURA URBANA LTDA	FRENTE:	IMPRENTA DISTRITAL	

CAPITULO	2.5.0	PERFORACIONES Y EPOXICOS	ITEM	2.5.0.2	Perforación y epóxico # 3 L= 0.30	UNIDAD	UND


ITEM	LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	TOTAL	UNIDAD
1	FLEJES COLUMNA C-1 EJE B-1'				31,00	31,00	UN
2	FLEJES COLUMNA C-1 EJE C-1'				31,00	31,00	UN
3	FLEJES COLUMNA C-1 EJE D-1'				31,00	31,00	UN
4	FLEJES COLUMNA C-1 EJE B-5'				31,00	31,00	UN
5	FLEJES COLUMNA C-1 EJE C-5'				31,00	31,00	UN
6	FLEJES COLUMNA C-1 EJE B-5' 2DO PISO				22,00	22,00	UN
7	FLEJES COLUMNA C-1 EJE C-5' 2DO PISO				22,00	22,00	UN
8	FLEJES COLUMNA C-7 EJE A-4' 2DO PISO				22,00	22,00	UN
9	FLEJES COLUMNA C-1 EJE B-1' 2DO PISO				22,00	22,00	UN
10	FLEJES COLUMNA C-1 EJE C-1' 2DO PISO				22,00	22,00	UN
11	FLEJES COLUMNA C-1 EJE D-1' 2DO PISO				22,00	22,00	UN

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Secretaría Integración Social	MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA PROYECTO: OBRAS SEDES ALCALDÍA	PRISMA UNIVERSAL SEC S.A.S. CONSORCIO PRUNI SEDES 04 CONTRATISTA	ARQUITECTURA URBANA LTDA INTERVENTORÍA


ACTA PARCIAL No.	3		PERIODO DEL ACTA	01/10/2019	A	30/10/2019	
OBJETO	REALIZAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE AJUSTE LAS DIFERENTES OBRAS E INTERVENCIONES ESPECIALIZADAS PARA LAS DIFERENTES SEDES DE LA SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C.						
CONTRATO DE OBRA No	731-2019	CONTRATISTA	CONSORCIO PRUNI SEDES 04		ENTIDAD CONTRATANTE	SECRETARIA GENERAL-ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA	
CONTRATO INTERVENTORÍA	730 - 2019	INTERVENTORÍA	ARQUITECTURA URBANA LTDA		FRENTE:	IMPRENTA DISTRITAL	

PLANO DETALLE

PRIMER PISO

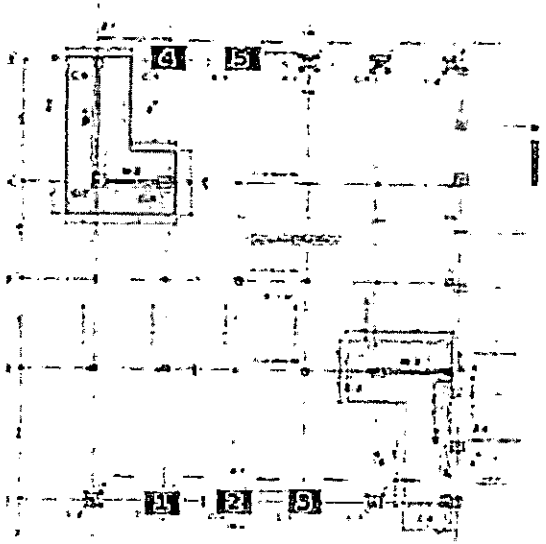

SEGUNDO PISO

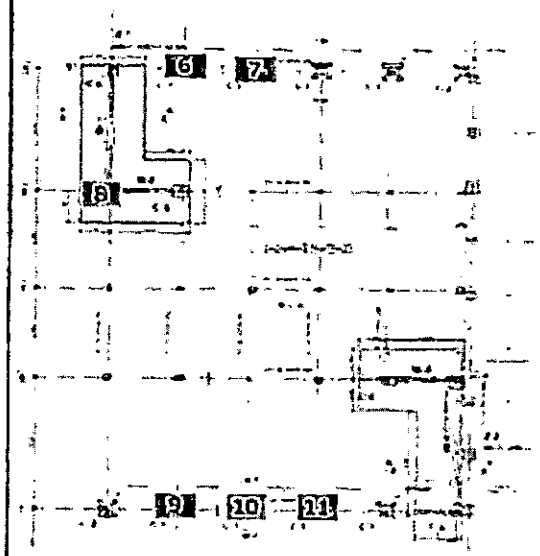

130

Mejorada

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
Secretaría Integración Social

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

PROYECTO: OBRAS SEDES ALCALDÍA

PRISMA — UNIVERSAL SEC S.A.S. — CONSORCIO PRUNI SEDES 04 — CONTRATISTA

ARQUITECTURA URBANA LTDA — INTERVENTORÍA

ACTA PARCIAL No.	3	PERIODO DEL ACTA	01/10/2019	A	30/10/2019	
OBJETO	REALIZAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE AJUSTE LAS DIFERENTES OBRAS E INTERVENCIONES ESPECIALIZADAS PARA LAS DIFERENTES SEDES DE LA SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C.					
CONTRATO DE OBRA No	73 1- 2019	CONTRATISTA	CONSORCIO PRUNI SEDES 04	ENTIDAD CONTRATANTE	SECRETARIA GENERAL-ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA	
CONTRATO INTERVENTORÍA	730 - 2019	INTERVENTORÍA	ARQUITECTURA URBANA LTDA	FRENTE:	IMPRENTA DISTRITAL	

CAPITULO	2.5.0	PERFORACIONES Y EPOXICOS	ITEM	2.5.0.6	Perforación y epóxico # 6 L= 0.22	UNIDAD	UND


ITEM	LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	TOTAL	UNIDAD
1	Columna C-1 Eje B-1'				8,00	8,00	UN
2	Columna C-1 Eje C-1'				8,00	8,00	UN
3	Columna C-1 Eje D-1'				8,00	8,00	UN
4	Columna C-1 Eje B-5'				8,00	8,00	UN
5	Columna C-1 Eje C-5'				8,00	8,00	UN
6	FLEJES COLUMNA C-1 EJE B-5' 2DO PISO				3,00	3,00	UN
7	FLEJES COLUMNA C-1 EJE C-5' 2DO PISO				3,00	3,00	UN
8	Columna C-1 Eje B-1' 2DO PISO				3,00	3,00	UN
9	Columna C-1 Eje C-1' 2DO PISO				3,00	3,00	UN
10	Columna C-1 Eje D-1' 2DO PISO				3,00	3,00	UN

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Secretaría Integración Social	MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA PROYECTO: OBRAS SEDES ALCALDÍA	PRISMA UNIVERSAL SEC S.A.S. CONSORCIO PRUNI SEDES 04 (CONTRATISTA)	ARQUITECTURA URBANA LTDA (INTERVENTORÍA)


ACTA PARCIAL No,	3		PERIODO DEL ACTA	01/10/2019	A	30/10/2019	
OBJETO	REALIZAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE AJUSTE LAS DIFERENTES OBRAS E INTERVENCIONES ESPECIALIZADAS PARA LAS DIFERENTES SEDES DE LA SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C.						
CONTRATO DE OBRA No	73 1- 2019	CONTRATISTA	CONSORCIO PRUNI SEDES 04		ENTIDAD CONTRATANTE	SECRETARIA GENERAL-ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA	
CONTRATO INTERVENTORÍA	730 - 2019	INTERVENTORÍA	ARQUITECTURA URBANA LTDA		FRENTE:	IMPRENTA DISTRITAL	

PLANO DETALLE

PRIMER PISO

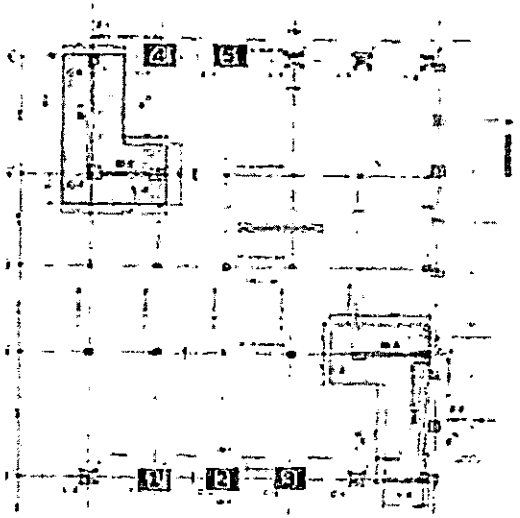

SEGUNDO PISO

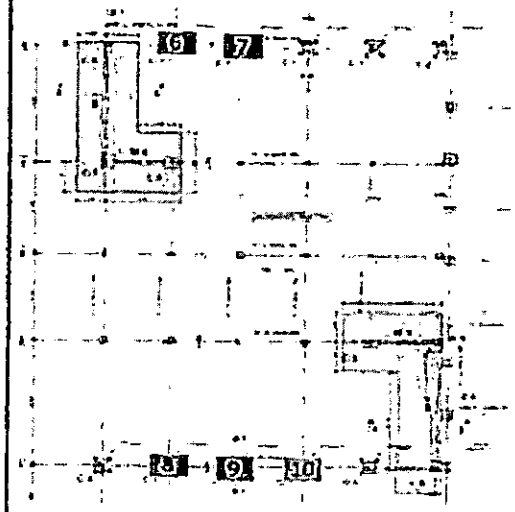

Alejandra B

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
Secretaría Integración Social

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

PROYECTO: OBRAS SEDES ALCALDÍA

PRISMA — UNIVERSAL-SEC S.A.S. — CONSORCIO PRUNI SEDES 04 — CONTRATISTA


ARQUITECTURA URBANA LTDA — INTERVENTORÍA

ACTA PARCIAL No,	3	PERIODO DEL ACTA	01/10/2019	A	30/10/2019	
OBJETO	REALIZAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE AJUSTE LAS DIFERENTES OBRAS E INTERVENCIONES ESPECIALIZADAS PARA LAS DIFERENTES SEDES DE LA SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C.					
CONTRATO DE OBRA No	73 1- 2019	CONTRATISTA	CONSORCIO PRUNI SEDES 04	ENTIDAD CONTRATANTE	SECRETARIA GENERAL-ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA	
CONTRATO INTERVENTORÍA	730 - 2019	INTERVENTORÍA	ARQUITECTURA URBANA LTDA	FRENTE:	IMPRENTA DISTRITAL	

CAPITULO	2.5.0	PERFORACIONES Y EPOXICOS	ITEM	2.5.0.10	Perforación y epóxico ø7 L=0.25	UNIDAD	UND

ITEM	LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	TOTAL	UNIDAD
1	C-2 A-1'				5,00	5,00	UN
2	EJES C-6 A-5' 2DO PISO				3,00	3,00	UN
3	C-2 A-1' 2DO PISO				3,00	3,00	UN
OBSERVACIONES:				SUBTOTAL		11,00	UN
				TOTAL		11,00	UN

LOCALIZACION PLANIMETRICA

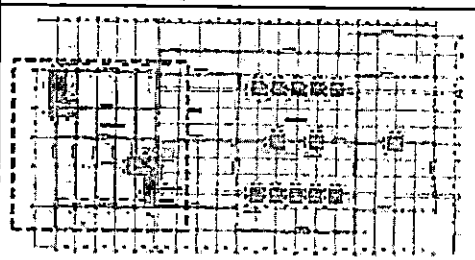

AREA ADMINISTRATIVA

REGISTRO FOTOGRAFICO



ARQ. ALEJANDRA BOLAÑOS
RESIDENTE CONTRATISTA


ARQ. JESSICA LOPERA
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Secretaría Integración Social	MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA PROYECTO: OBRAS SEDES ALCALDÍA	PRISMA UNIVERSAL SEC S.A.S. CONSORCIO PRUNI SEDES 04 CONTRATISTA	ARQUITECTURA URBANA LTDA INTERVENTORÍA


ACTA PARCIAL No,	3	PERIODO DEL ACTA	01/10/2019	A	30/10/2019	
OBJETO	REALIZAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE AJUSTE LAS DIFERENTES OBRAS E INTERVENCIONES ESPECIALIZADAS PARA LAS DIFERENTES SEDES DE LA SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTA D.C.					
CONTRATO DE OBRA No	731-2019	CONTRATISTA	CONSORCIO PRUNI SEDES 04	ENTIDAD CONTRATANTE	SECRETARIA GENERAL-ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA	
CONTRATO INTERVENTORIA	730 - 2019	INTERVENTORÍA	ARQUITECTURA URBANA LTDA	FRENTE:	IMPRENTA DISTRITAL	

PLANO DETALLE

PRIMER PISO

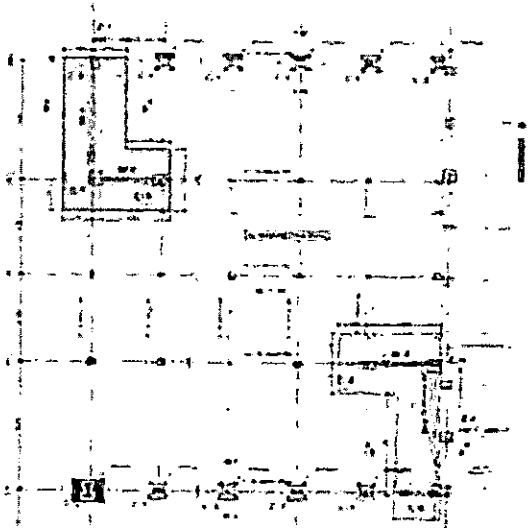

SEGUNDO PISO

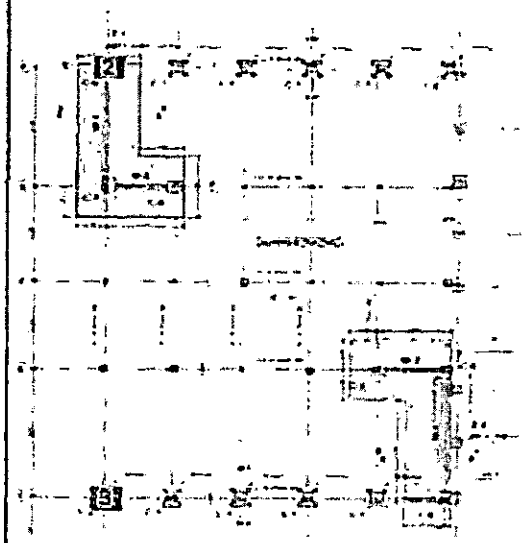

Mapandra

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
Secretaría Integración Social

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

PROYECTO: OBRAS SEDES ALCALDÍA

PRISMA — UNIVERSAL SEC S.A.S. — CONSORCIO PRUNI SEDES 04 — CONTRATISTA


ARQUITECTURA URBANA LTDA — INTERVENTORÍA

ACTA PARCIAL No,	3		PERIODO DEL ACTA	01/10/2019	A	30/10/2019	
OBJETO	REALIZAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE AJUSTE LAS DIFERENTES OBRAS E INTERVENCIONES ESPECIALIZADAS PARA LAS DIFERENTES SEDES DE LA SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C.						
CONTRATO DE OBRA No	73 1- 2019	CONTRATISTA	CONSORCIO PRUNI SEDES 04	ENTIDAD CONTRATANTE	SECRETARIA GENERAL-ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA		
CONTRATO INTERVENTORÍA	730 - 2019	INTERVENTORÍA	ARQUITECTURA URBANA LTDA	FRENTE:	IMPRENTA DISTRITAL		

CAPITULO	2.7.0	CUBIERTAS	ITEM	2.7.0.2	Adición de elementos metálicos reforzamiento	UNIDAD	KG


ITEM	LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES FIGURA	LONGITUD	PESO	CANTIDAD	TOTAL	UNIDAD
	CORREAS CR-2						
1	Acero 1/2" recto liso		0,31	0,994	2,00	0,616	KG
	Acero 1/2" en V liso		0,63	0,994	3,00	1,879	KG
2							
	Acero 1/2" en V liso		0,63	0,994	2,00	1,252	KG
3	Acero 1/2" recto liso		0,31	0,994	3,00	0,924	KG
	Acero 1/2" en V liso		0,63	0,994	6,00	3,757	KG
4	Acero 1/2" recto liso		0,31	0,994	5,00	1,541	KG
	Acero 1/2" en V liso		0,63	0,994	13,00	8,141	KG
5	Acero 1/2" recto liso		0,31	0,994	2,00	0,616	KG
	Acero 1/2" en V liso		0,63	0,994	5,00	3,131	KG
6	Acero 1/2" recto liso		0,31	0,994	2,00	0,616	KG
	Acero 1/2" en V liso		0,63	0,994	5,00	3,131	KG
7	Acero 1/2" recto liso		0,31	0,994	2,00	0,616	KG
	Acero 1/2" en V liso		0,63	0,994	5,00	3,131	KG
8	Acero 1/2" recto liso		0,31	0,994	9,00	2,773	KG
	Acero 1/2" en V liso		0,63	0,994	26,00	16,282	KG
9	Acero 1/2" recto liso		0,31	0,994	9,00	2,773	KG
	Acero 1/2" en V liso		0,63	0,994	26,00	16,282	KG
10	Acero 1/2" recto liso		0,31	0,994	9,00	2,773	KG
	Acero 1/2" en V liso		0,63	0,994	26,00	16,282	KG
11	Acero 1/2" recto liso		0,31	0,994	9,00	2,773	KG
	Acero 1/2" en V liso		0,63	0,994	26,00	16,282	KG
12	Acero 1/2" recto liso		0,31	0,994	4,00	1,233	KG
	Acero 1/2" en V liso		0,63	0,994	14,00	8,767	KG
13	Acero 1/2" recto liso		0,31	0,994	4,00	1,233	KG
	Acero 1/2" en V liso		0,63	0,994	19,00	11,898	KG
OBSERVACIONES:				MOTOR		128,703	KG
				TOTAL		128,703	KG

LOCALIZACION PLANIMETRICA

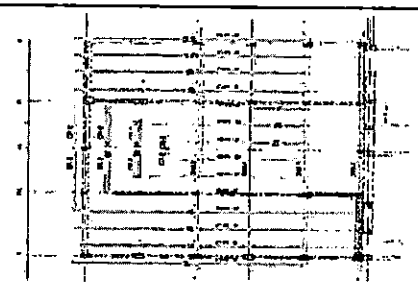

AREA ADMINISTRATIVA

REGISTRO FOTOGRAFICO

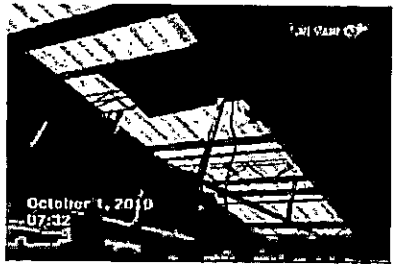


Alejandra Bolaños t
ARQ. ALEJANDRA BOLAÑOS
RESIDENTE CONTRATISTA

Jessica Lopera A.
ARQ. JESSICA LOPERA
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Secretaría Integración Social	MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA PROYECTO: OBRAS SEDES ALCALDÍA	PRISMA UNIVERSAL SEC S.A.S. CONSORCIO PRISMA SEDES 04 (CONTRATISTA)	ARQUITECTURA URBANA LTDA (INTERVENTORÍA)

ACTA PARCIAL No,	3		PERIODO DEL ACTA	01/10/2019	A	30/10/2019	
OBJETO	REALIZAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE AJUSTE LAS DIFERENTES OBRAS E INTERVENCIONES ESPECIALIZADAS PARA LAS DIFERENTES SEDES DE LA SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C.						
CONTRATO DE OBRA No	73 1- 2019	CONTRATISTA	CONSORCIO PRISMA SEDES 04		ENTIDAD CONTRATANTE	SECRETARIA GENERAL-ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA	
CONTRATO INTERVENTORÍA :	730 - 2019	INTERVENTORÍA	ARQUITECTURA URBANA LTDA		FRENTE:	IMPRENTA DISTRITAL	

PLANO DETALLE

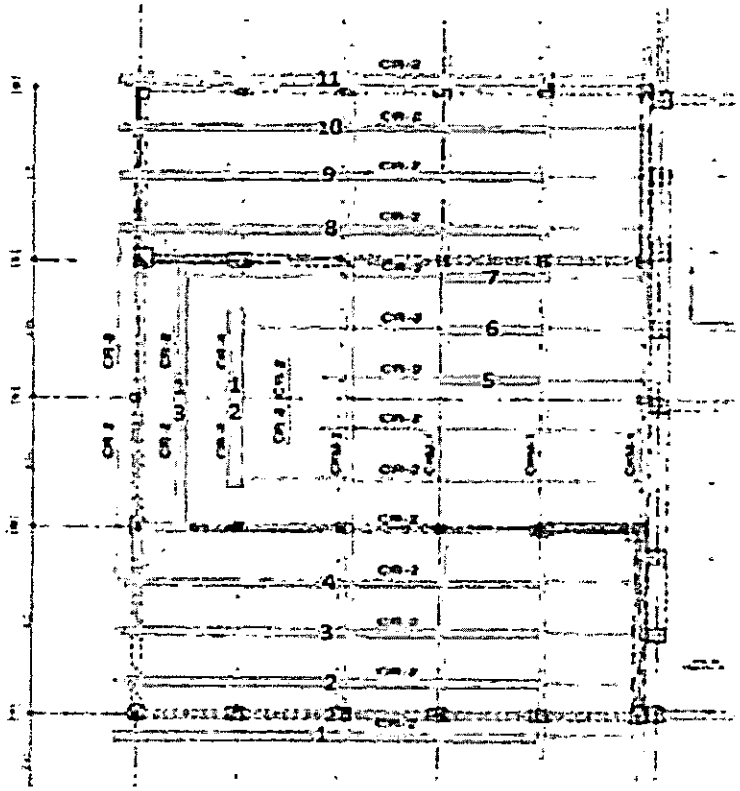

Vo Bo Interventoría

Alexander

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
Secretaría Integración Social

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

PROYECTO: OBRAS SEDES ALCALDÍA

PRISMA — UNIVERSAL SEC S.A.S. — CONSORCIO PRUNI SEDES 04 — CONTRATISTA

ARQUITECTURA URBANA LTDA — INTERVENTORÍA


ACTA PARCIAL No,	3		PERIODO DEL ACTA -	01/10/2019	A	30/10/2019	
OBJETO	REALIZAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE AJUSTE LAS DIFERENTES OBRAS E INTERVENCIONES ESPECIALIZADAS PARA LAS DIFERENTES SEDES DE LA SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C.						
CONTRATO DE OBRA No	73 1- 2019	CONTRATISTA	CONSORCIO PRUNI SEDES 04		ENTIDAD CONTRATANTE	SECRETARIA GENERAL-ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA	
CONTRATO INTERVENTORÍA	730 - 2019	INTERVENTORÍA	ARQUITECTURA URBANA LTDA		FRENTE:	IMPRENTA DISTRITAL	

CAPITULO	2.8.0	RESTITUCION DE ACABADOS	ITEM	2.8.0.7	Perforaciones y epóxico 1/2" - L= 0.15	UNIDAD	UND

ITEM	LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	TOTAL	UNIDAD
1	VC A C-1 EN EJE 5' ENTRE EJES B-C						
	ANCLAJES				8,00	8,00	UN
2	VC A C-1 EN EJE 5'-D						
	ANCLAJES				4,00	4,00	UN
	SUBTOTAL					12,00	UND
	TOTAL					12,00	UND

OBSERVACIONES:

LOCALIZACION PLANIMETRICA

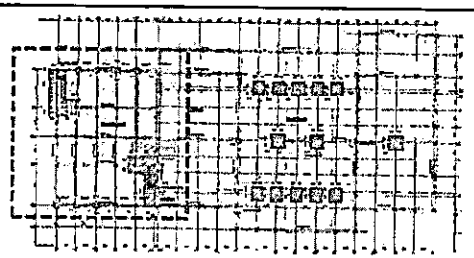

AREA ADMINISTRATIVA

REGISTRO FOTOGRAFICO




ARQ. ALEJANDRA BOLAÑOS
RESIDENTE CONTRATISTA

ARQ. JESSICA LOPERA
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Secretaría Integración Social	MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA PROYECTO: OBRAS SEDES ALCALDÍA	PRISMA UNIVERSAL SEC S.A.S. CONSORCIO PRUNI SEDES 04 (CONTRATISTA)	ARQUITECTURA URBANA LTDA (INTERVENTORÍA)

ACTA PARCIAL No,	3		PERIODO DEL ACTA	01/10/2019	A	30/10/2019	
OBJETO	REALIZAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE AJUSTE LAS DIFERENTES OBRAS E INTERVENCIONES ESPECIALIZADAS PARA LAS DIFERENTES SEDES DE LA SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C.						
CONTRATO DE OBRA No	73 1- 2019	CONTRATISTA	CONSORCIO PRUNI SEDES 04		ENTIDAD CONTRATANTE	SECRETARIA GENERAL ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA	
CONTRATO INTERVENTORÍA	730 - 2019	INTERVENTORÍA	ARQUITECTURA URBANA LTDA		FRENTE:	IMPRENTA DISTRITAL	

PLANO DETALLE

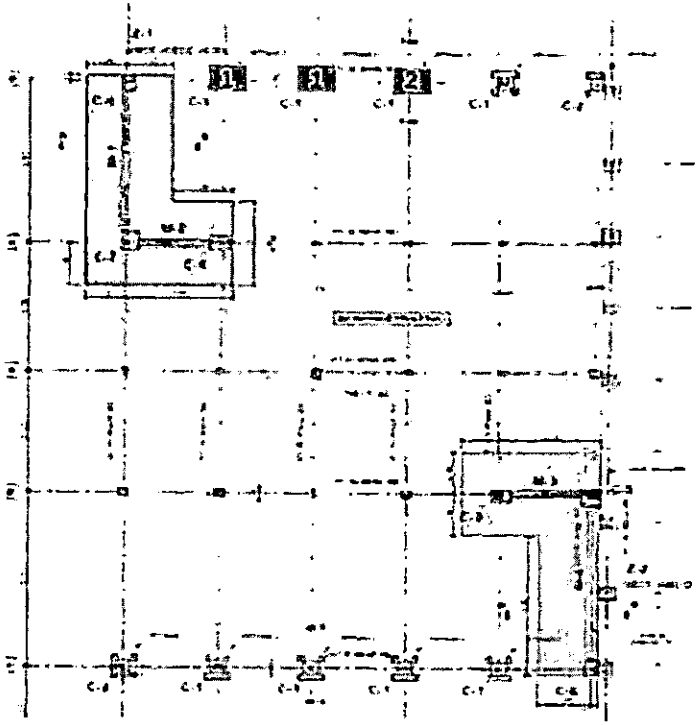

1138

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
Secretaría Integración Social

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

PROYECTO: OBRAS SEDES ALCALDÍA

PRISMA — UNIVERSAL SEC S.A.S. — CONSORCIO PRUNI SEDES 04 — CONTRATISTA


ARQUITECTURA URBANA LTDA — INTERVENTORÍA

ACTA PARCIAL No,	3	PERIODO DEL ACTA	01/10/2019	A	30/10/2019	
OBJETO	REALIZAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE AJUSTE LAS DIFERENTES OBRAS E INTERVENCIONES ESPECIALIZADAS PARA LAS DIFERENTES SEDES DE LA SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C.					
CONTRATO DE OBRA No	73 1- 2019	CONTRATISTA	CONSORCIO PRUNI SEDES 04		ENTIDAD CONTRATANTE	SECRETARIA GENERAL-ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA
CONTRATO INTERVENTORÍA	730 - 2019	INTERVENTORÍA	ARQUITECTURA URBANA LTDA		FRENTE:	IMPRENTA DISTRITAL

CAPITULO	3.3.0	INSTALACIONES ELECTRICAS	ITEM	3.3.0.1	Suministro e instalación de muro en ladrillo tolete	UNIDAD	M2


ITEM	LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	TOTAL	UNIDAD
	PLANTA GENERADORA						
	Muro 1	4,40	2,65		1,00	11,66	M2
	Muro 2	1,10	2,65		1,00	2,92	M2
	Muro 3	4,30	2,65		1,00	11,40	M2
OBSERVACIONES:				SUBTOTAL		25,97	M2
				TOTAL		25,97	M2

LOCALIZACION PLANIMETRICA

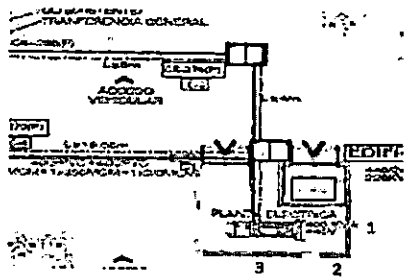

PLANTA ELECTRICA

REGISTRO FOTOGRÁFICO

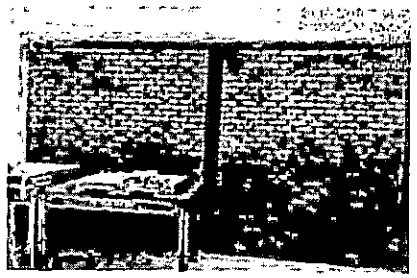

Alejandra Bolaños +
ARQ. ALEJANDRA BOLAÑOS
RESIDENTE CONTRATISTA

Jessica Lopera A.
ARQ. JESSICA LOPERA
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
Secretaría Integración Social

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

PROYECTO: OBRAS SEDES ALCALDÍA

PRISMA — UNIVERSAL SEC S.A.S. — CONSORCIO PRUNI S.EDES 04 — CONTRATISTA


ARQUITECTURA URBANA LTDA — INTERVENTORÍA

ACTA PARCIAL No.	3	PERIODO DEL ACTA	01/10/2019	A	30/10/2019	
OBJETO	REALIZAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE AJUSTE LAS DIFERENTES OBRAS E INTERVENCIONES ESPECIALIZADAS PARA LAS DIFERENTES SEDES DE LA SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C.					
CONTRATO DE OBRA No	731-2019	CONTRATISTA	CONSORCIO PRUNI SEDES 04	ENTIDAD CONTRATANTE	SECRETARIA GENERAL-ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA	
CONTRATO INTERVENTORÍA	730 - 2019	INTERVENTORÍA	ARQUITECTURA URBANA LTDA	FRENTE:	IMPRENTA DISTRITAL	

CAPITULO	3.3.0	INSTALACIONES ELECTRICAS	ITEM	3.3.0.2	Demolición de muro existente.	UNIDAD	M2

ITEM	LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	TOTAL	UNIDAD
	FACHADA COSTADO SUR						
1	Antepechos Segundo piso		2,70	1,00	1,00	2,70	M2
2	FACHADA COSTADO OCCIDENTE						
	Antepecho 2do Piso		4,35	1,00	1,00	4,35	M2
	FACHADA COSTADO NORTE						
3	2do piso M2		3,60	0,70	1,00	2,52	M2
	PRODUCCION						
4	EJE L11		1,90	1,95	1,00	3,71	M2
5	EJE L12		1,50	1,95	1,00	2,93	M2
OBSERVACIONES:				SUBTOTAL		16,20	M2
				TOTAL		16,20	M2

LOCALIZACION PLANIMETRICA

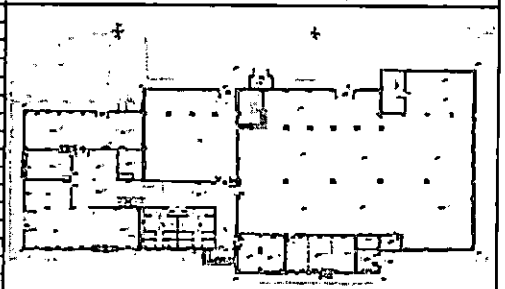

AREA ADMINISTRATIVA Y PRODUCCION

REGISTRO FOTOGRAFICO



Alejandra Bolaños

ARQ. ALEJANDRA BOLAÑOS
RESIDENTE CONTRATISTA

Jessica Lopera A.

ARQ. JESSICA LOPERA
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
Secretaría de Integración Social

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

PROYECTO: OBRAS SEDES ALCALDÍA

PRISMA — UNIVERSAL SEC S.A.S. — CONSORCIO PRUNI SEDES 04 — CONTRATISTA


ARQUITECTURA URBANA LTDA — INTERVENTORÍA

ACTA No.	3		PERIODO DEL ACTA	01/10/2019	A	30/10/2019	
OBJETO	REALIZAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE AJUSTE LAS DIFERENTES OBRAS E INTERVENCIONES ESPECIALIZADAS PARA LAS DIFERENTES SEDES DE LA SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C.						
CONTRATO DE OBRA No	73 1- 2019	CONTRATISTA	CONSORCIO PRUNI SEDES 04		ENTIDAD CONTRATANTE	SECRETARIA GENERAL-ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA	
CONTRATO INTERVENTORÍA	730 - 2019	INTERVENTORÍA	ARQUITECTURA URBANA LTDA		FRENTE:	IMPRENTA DISTRITAL	

CAPITULO		NP	CVA		ITEM	IMP-06	DESMONTE DE VENTANAS METÁLICAS, INCLUYE CARGUE Y ALMACENAMIENTO EN SITIO DONDE DISPONGA LA INTERVENTORIA	UNIDAD	M2

ITEM	LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	TOTAL	UNIDAD
	ZONA ADMINISTRACION						
A	FACHADA SUR						
	2DO PISO		2,80	1,20	1,00	3,36	M2
B	FACHADA LATERAL (COSTADO OCCIDENTAL)						
	2DO PISO		4,25	1,75	1,00	7,44	M2
OBSERVACIONES:				SUBTOTAL		10,80	M2
				TOTAL		10,80	M2

LOCALIZACION PLANIMETRICA

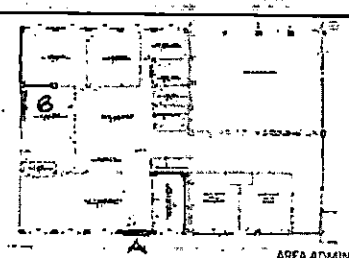

AREA ADMINISTRATIVA

REGISTRO FOTOGRÁFICO



Alejandra Bolaños

ARQ. ALEJANDRA BOLAÑOS
RESIDENTE CONTRATISTA

Jessica Lopera A.

ARQ. JESSICA LOPERA
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Gobierno Integración Social	**MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA** **PROYECTO: OBRAS SEDES ALCALDÍA**	PRISMA / UNIVERSAL SEC S.A.S. CONSORCIO PRUNI SEDES 04 — CONTRATISTA	ARQUITECTURA URBANA LTDA — INTERVENTORÍA

ACTA No.	3	PERIODO DEL ACTA	01/10/2019	A	30/10/2019	
OBJETO	REALIZAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE AJUSTE LAS DIFERENTES OBRAS E INTERVENCIONES ESPECIALIZADAS PARA LAS DIFERENTES SEDES DE LA SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C.					
CONTRATO DE OBRA No	731-2019	CONTRATISTA	CONSORCIO PRUNI SEDES 04	ENTIDAD CONTRATANTE	SECRETARIA GENERAL-ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA	
CONTRATO INTERVENTORÍA	730-2019	INTERVENTORÍA	ARQUITECTURA URBANA LTDA	FRENTE:	IMPRENTA DISTRITAL	

CAPITULO		NP	CIVIL			ITEM	IMP-25	ENCAMISADO CON DADO EN CONCRETO DE 3000 PSI DE BOMBO PARA TUBERIA DE 6" EN GRES	UNIDAD	ML
ITEM	LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES				CANTIDAD	TOTAL	UNIDAD	LOCALIZACION PLANIMETRICA	
		LARGO	ANCHO	ALTO						
	ZAPATA 2									
1	Eje 1' y 2' entre E-F	1,00				2,00	2,00	ML		
2	Eje 1' y 2' entre E-F	1,00				1,00	1,00	ML		

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Secretaría Integración Social	**MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA**	PRISMA / UNIVERSAL SEC S.A.S. CONSORCIO PRISMA SEDES 04 — CONTRATISTA	ARQUITECTURA URBANA LTDA. — INTERVENTORÍA
	PROYECTO: OBRAS SEDES ALCALDÍA		


ACTA No.	3	PERIODO DEL ACTA	01/10/2019	A	30/10/2019		
OBJETO	REALIZAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE AJUSTE LAS DIFERENTES OBRAS E INTERVENCIONES ESPECIALIZADAS PARA LAS DIFERENTES SEDES DE LA SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C.						
CONTRATO DE OBRA No	731-2019	CONTRATISTA	CONSORCIO PRISMA SEDES 04		ENTIDAD CONTRATANTE	SECRETARIA GENERAL-ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA	
CONTRATO INTERVENTORÍA	730-2019	INTERVENTORÍA	ARQUITECTURA URBANA LTDA		FRENTE:	IMPRENTA DISTRITAL	

CAPITULO		NP	CIVIL		ITEM	IMP-28	DESMONTE DE PUERTAS, INCLUYE TRASIEGO Y ALMACENAMIENTO	UNIDAD	M2

ITEM	LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			CANTIDAD	TOTAL	UNIDAD
		- LARGO	ANCHO	ALTO.			
	ZONA ADMINISTRACION						
	Oficina Producción		0,96	2,05	2,00	3,94	M2
	Oficina Subdirección		0,90	2,03	1,00	1,83	M2
	SUBTOTAL					5,76	M2
	TOTAL					5,76	M2


OBSERVACIONES:

LOCALIZACION PLANIMETRICA

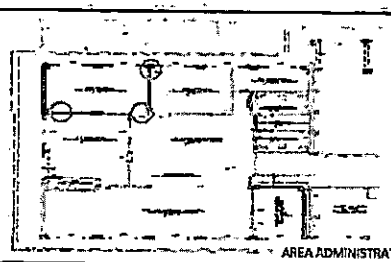

AREA ADMINISTRATIVA

REGISTRO FOTOGRÁFICO



Alejandra Bolaños

ARQ. ALEJANDRA BOLAÑOS
RESIDENTE CONTRATISTA

Jessica Lopera A.

ARQ. JESSICA LOPERA
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
Secretaría Integración Social

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA


PROYECTO: OBRAS SEDES ALCALDÍA

PRISMA — UNIVERSAL SEC S.A.S. — CONTRATISTA


ARQUITECTURA URBANA LTDA — INTERVENTORÍA

ACTA No.	3		PERIODO DEL ACTA	1/10/2019	A	30/10/2019	
OBJETO	REALIZAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE AJUSTE LAS DIFERENTES OBRAS E INTERVENCIONES ESPECIALIZADAS PARA LAS DIFERENTES SEDES DE LA SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C.						
CONTRATO DE OBRA No	73 1- 2019	CONTRATISTA	CONSORCIO PRUNI SEDES 04	ENTIDAD CONTRATANTE	SECRETARIA GENERAL-ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA		
CONTRATO INTERVENTORÍA	730 - 2019	INTERVENTORÍA	ARQUITECTURA URBANA LTDA	FRENTE	IMPRENTA DISTRITAL		

CAPITULO		NP	ELECTRICO		ITEM	IMP-103	DESMONTE Y REINSTALACIÓN DE CANALETA METÁLICA 8x4, INCLUYE CARGUE Y ALMACENAMIENTO EN SITIO DONDE DISPONGA LA INTERVENTORIA	UNIDAD	ML
ITEM	LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	TOTAL	UNIDAD	LOCALIZACION PLANIMETRICA	
	ZONA ADMINISTRACION								
	1er Piso								
1	AREA 1 (Espacio Kodak) 1er piso	12,00			0,50	6,00	ML		
2	AREA 3 (Oficina adyacente a la Kodak) 1er piso	10,60			0,50	5,30	ML		
	2do Piso								
3	Oficina Producción Oficinas 203-209	14,00			0,50	7,00	ML		
4	Oficina Supervisión	7,00			0,50	3,50	ML		
5	Oficina abierta de diseño	16,00			0,50	8,00	ML		
6	Data Center	26,40			0,50	13,20	ML		
OBSERVACIONES:						43,00	M2		
						43,00	M2		



REGISTRO FOTOGRÁFICO





Alejandra Bolaños


ARQ. ALEJANDRA BOLAÑOS
RESIDENTE CONTRATISTA

Jessica Lopera H.


ARQ. JESSICA LOPERA
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

PLANO DETALLE

ADMINISTRACION 1ER PISO

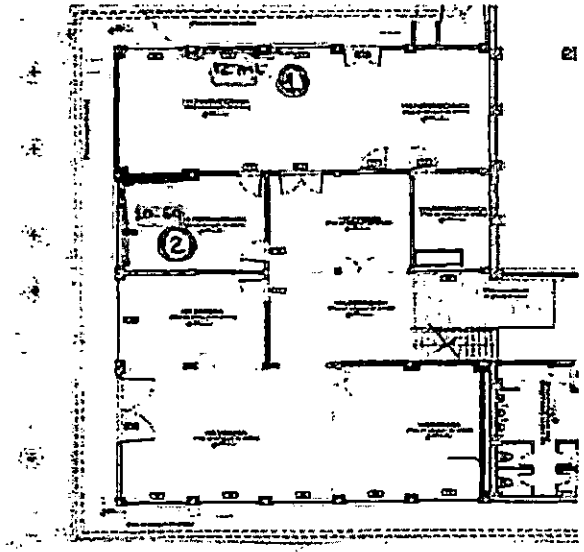

ADMINISTRACION SEGUNDO PISO

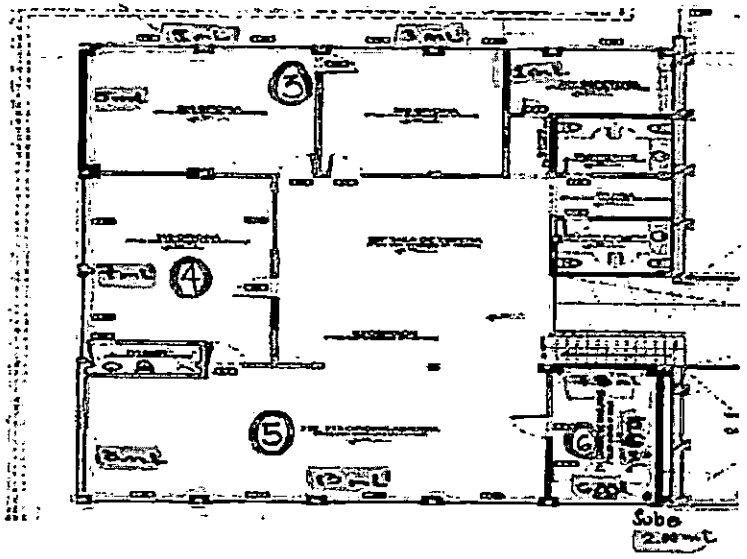

145

Notanda

ACTA

4

IMPRENTA DISTRITAL

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTA D.C. | BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS
SECRETARÍA GENERAL

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

PROYECTO: OBRAS SEDES ALCALDÍA

PRISMA — UNIVERSAL SEC S.A.S. — CONSORCIO PRUNI SEDES 04 — CONTRATISTA

ARQUITECTURA URBANA LTDA — INTERVENTORÍA


ACTA No.	6		PERIODO DEL ACTA	01/11/2019	A	30/11/2019	
OBJETO	REALIZAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE AJUSTE LAS DIFERENTES OBRAS E INTERVENCIONES ESPECIALIZADAS PARA LAS DIFERENTES SEDES DE LA SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C.						
CONTRATO DE OBRA No	731-2019	CONTRATISTA	CONSORCIO PRUNI SEDES 04		ENTIDAD CONTRATANTE	SECRETARIA GENERAL-ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA	
CONTRATO INTERVENTORÍA	730 DE 2019	INTERVENTORÍA	ARQUITECTURA URBANA LTDA		FRENTE:	IMPRENTA DISTRITAL	

CAPITULO	1.1.0	PRELIMINARES	ITEM	1.1.0.2	Cerramiento polisombra	UNIDAD	ML


ITEM	LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	TOTAL	UNIDAD
	EDIFICIO ADMINISTRATIVO 1ER PISO						
1	BODEGA 3	6,00			1,00	6,00	ML
	SUBTOTAL					6,00	ML
	TOTAL					6,00	ML

OBSERVACIONES:

LOCALIZACIÓN PLANIMÉTRICA

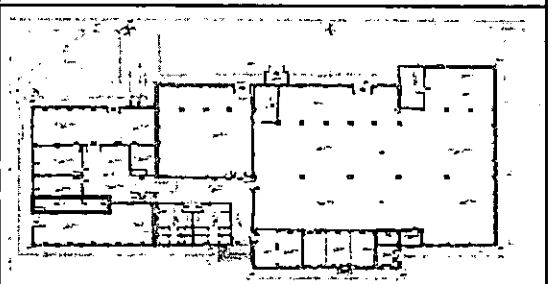

REGISTRO FOTOGRÁFICO

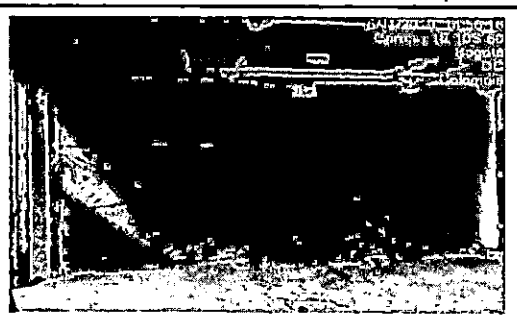

Alejandra Bolaños +
ARQ. ALEJANDRA BOLAÑOS
RESIDENTE CONTRATISTA

Arq. Jessica Lopera Arango.
ARQ. JESSICA LOPERA
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA GENERAL | BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

PROYECTO: OBRAS SEDES ALCALDÍA

PRISMA — UNIVERSAL SEC S.A.S. — CONSORCIO PRUNI SEDES 04 — CONTRATISTA


ARQUITECTURA URBANA LTDA. — INTERVENTORÍA

ACTA No.	4		PERIODO DEL ACTA	01/11/2019	A	30/11/2019	
OBJETO	REALIZAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE AJUSTE LAS DIFERENTES OBRAS E INTERVENCIONES ESPECIALIZADAS PARA LAS DIFERENTES SEDES DE LA SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C.						
CONTRATO DE OBRA No	731-2019	CONTRATISTA	CONSORCIO PRUNI SEDES 04		ENTIDAD CONTRATANTE	SECRETARIA GENERAL-ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA	
CONTRATO INTERVENTORÍA	730 DE 2019	INTERVENTORÍA	ARQUITECTURA URBANA LTDA		FRENTE:	IMPRENTA DISTRITAL	

CAPITULO	1.5.0	RED DE AGUAS NEGRAS	ITEM	1.5.0.1	Tubería PVC-S 2"	UNIDAD	ML

ITEM	LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	TOTAL	UNIDAD
	BAÑO HOMBRES PRIMER PISO						
	DESAGÜES PARA LAVAMANOS Y ORINAL	13,40			1,00	13,40	ML

PLANO DETALLE

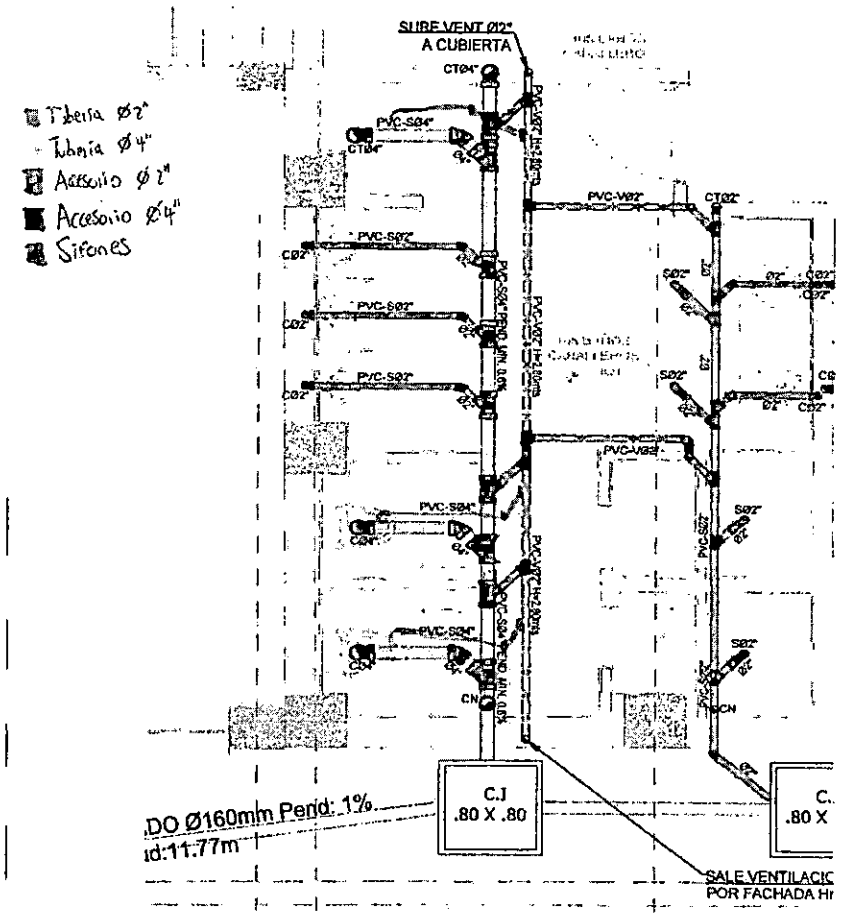

Mega BP

Ing Inter.

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA GENERAL | BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

PROYECTO: OBRAS SEDES ALCALDÍA

PRISMA — UNIVERSAL SEC S.A.S. — CONSORCIO PRUNI SEDES 04 — CONTRATISTA

ARQUITECTURA URBANA LTDA. — INTERVENTORÍA


ACTA No.	4	PERIODO DEL ACTA	01/11/2019	A	30/11/2019	
OBJETO	REALIZAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE AJUSTE LAS DIFERENTES OBRAS E INTERVENCIONES ESPECIALIZADAS PARA LAS DIFERENTES SEDES DE LA SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C.					
CONTRATO DE OBRA No	731-2019	CONTRATISTA	CONSORCIO PRUNI SEDES 04	ENTIDAD CONTRATANTE	SECRETARIA GENERAL-ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA	
CONTRATO INTERVENTORÍA	730 DE 2019	INTERVENTORÍA	ARQUITECTURA URBANA LTDA	FRENTE:	IMPRENTA DISTRITAL	

CAPITULO	1.5.0	RED DE AGUAS NEGRAS	ITEM	1.5.0.3	Tubería PVC-S 4"	UNIDAD	ML


ITEM	LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	TOTAL	UNIDAD
	EDIFICIO ADMINISTRATIVO 1ER PISO						
	DESAGÜES SANITARIOS	9,65			1,00	9,65	ML
	SUBTOTAL					9,65	ML
	TOTAL					9,65	ML

OBSERVACIONES:

LOCALIZACIÓN PLANIMÉTRICA

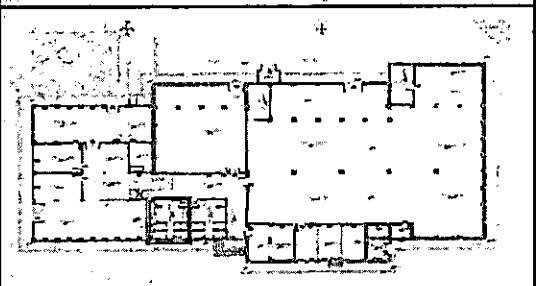

REGISTRO FOTOGRÁFICO

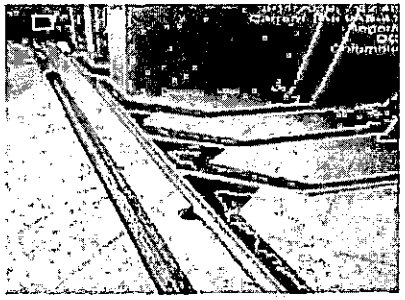

Alejandra Bolaños +


ARQ. ALEJANDRA BOLAÑOS
RESIDENTE CONTRATISTA

Arq. Jessica Lopera Arango SI

ARQ. JESSICA LOPERA
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

Alejb

PLANO DETALLE

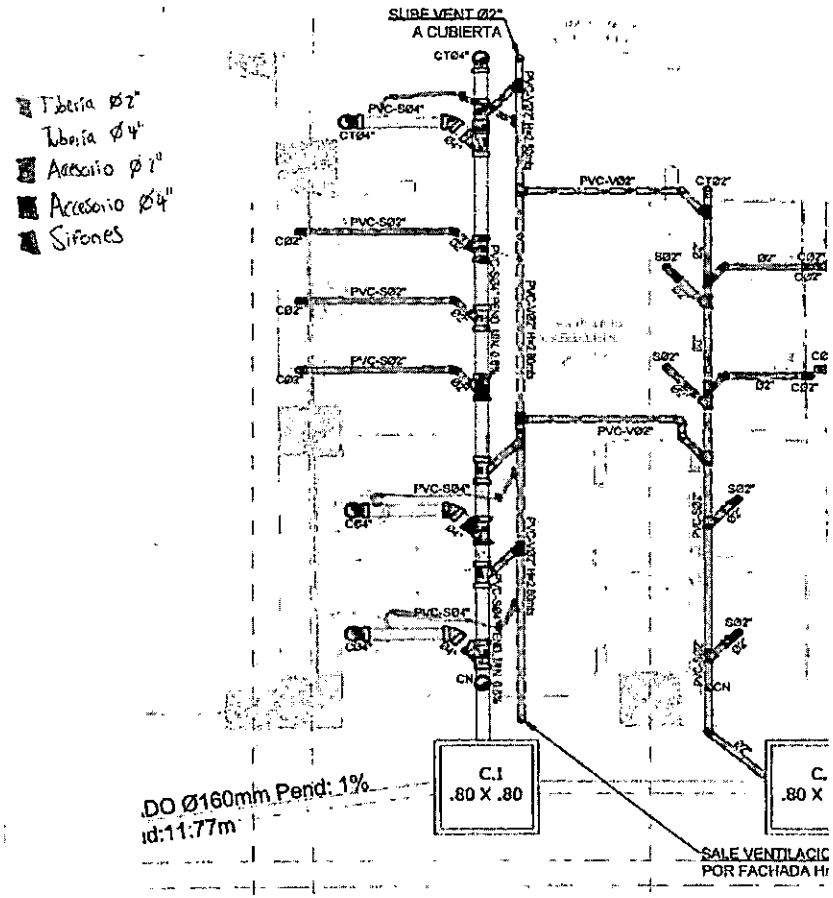

Detalle

Vía
Fatern.

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA GENERAL | BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

PROYECTO: OBRAS SEDES ALCALDÍA

PRISMA — UNIVERSAL SEC S.A.S. — CONSORCIO PRUNI SEDES 04 — CONTRATISTA

ARQUITECTURA URBANA LTDA — INTERVENTORÍA


ACTA No.	4		PERIODO DEL ACTA	01/11/2019	A	30/11/2019
OBJETO	REALIZAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE AJUSTE LAS DIFERENTES OBRAS E INTERVENCIONES ESPECIALIZADAS PARA LAS DIFERENTES SEDES DE LA SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C.					
CONTRATO DE OBRA No	731-2019	CONTRATISTA	CONSORCIO PRUNI SEDES 04	ENTIDAD CONTRATANTE	SECRETARIA GENERAL-ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA	
CONTRATO INTERVENTORÍA	730 DE 2019	INTERVENTORÍA	ARQUITECTURA URBANA LTDA	FRENTE:	IMPRENTA DISTRITAL	

CAPITULO	1.5.0	RED DE AGUAS NEGRAS	ITEM	1.5.0.4	Tubería PVC-L 2"	UNIDAD	ML


ITEM	LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	TOTAL	UNIDAD
	BAÑO HOMBRES PRIMER PISO						
	RED DE VENTILACIÓN	17,95			1,00	17,95	ML
	SUBTOTAL					17,95	ML
	TOTAL					17,95	ML

OBSERVACIONES:

LOCALIZACIÓN PLANIMÉTRICA

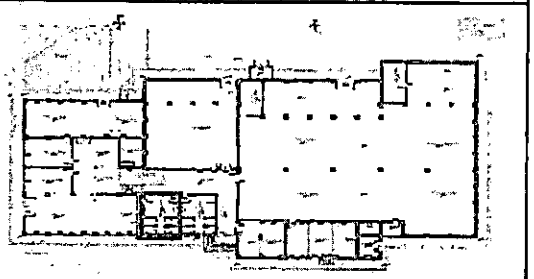

REGISTRO FOTOGRÁFICO

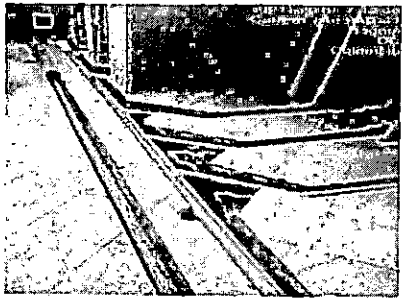


Alejandra Bolaños

ARQ. ALEJANDRA BOLAÑOS
RESIDENTE CONTRATISTA

Arq. Jessica Lopera Arango

ARQ. JESSICA LOPERA
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

PLANO DETALLE

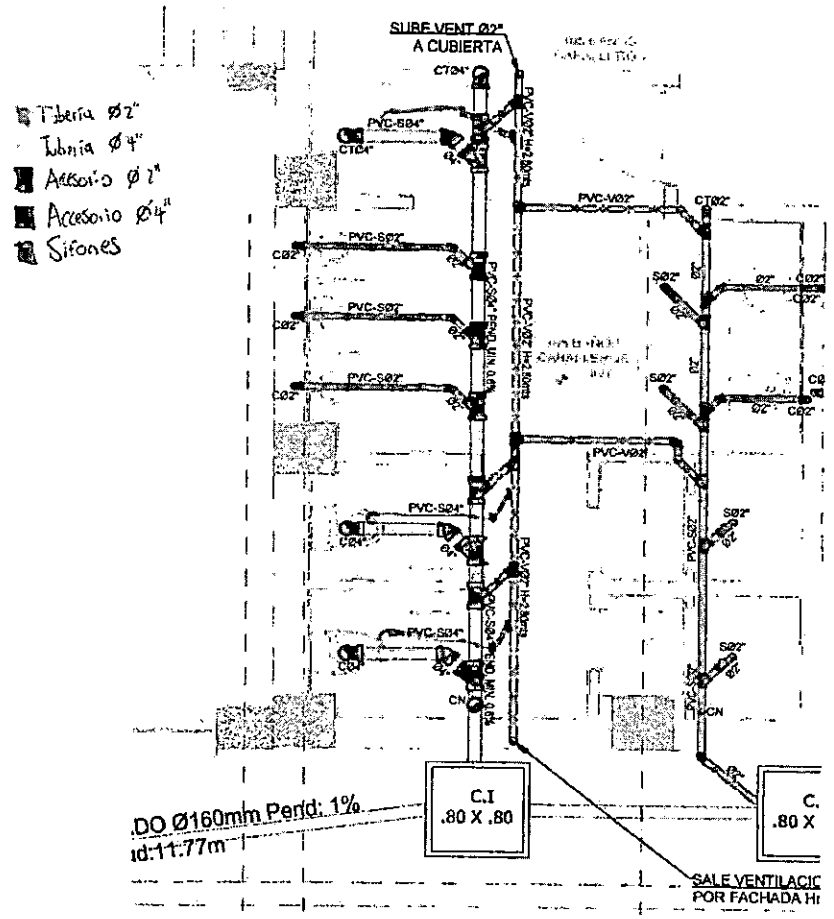

Nota

Ila
Interv.

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. | BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS
SECRETARÍA GENERAL

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

PROYECTO: OBRAS SEDES ALCALDÍA

PRISMA — UNIVERSAL SEC S.A.S. — CONSORCIO PRUNI SEDES 04 — CONTRATISTA

ARQUITECTURA URBANA LTDA — INTERVENTORÍA


ACTA No.	4			PERIODO DEL ACTA	01/11/2019	A	30/11/2019
OBJETO	REALIZAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE AJUSTE LAS DIFERENTES OBRAS E INTERVENCIONES ESPECIALIZADAS PARA LAS DIFERENTES SEDES DE LA SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C.						
CONTRATO DE OBRA No	731-2019	CONTRATISTA		CONSORCIO PRUNI SEDES 04	ENTIDAD CONTRATANTE		SECRETARIA GENERAL-ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA
CONTRATO INTERVENTORÍA	730 DE 2019	INTERVENTORÍA		ARQUITECTURA URBANA LTDA	FRENTE:		IMPRENTA DISTRITAL

CAPITULO	1.5.0	RED DE AGUAS NEGRAS	ITEM	1.5.0.6	Tubería PVC alcantarillado 160mm	UNIDAD	ML


ITEM	LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	TOTAL	UNIDAD
	COSTADO SUR						
1	Red exterior	10,00			1,00	10,00	ML
2	Red exterior	17,65			1,00	17,65	ML
3	Parqueadero	13,70			1,00	13,70	ML
4	Parqueadero	5,30			1,00	5,30	ML
5	Cafeteria	16,25			1,00	16,25	ML
6	Costado Norte	11,00			1,00	11,00	ML
7	Costado Occidente	23,70			1,00	23,70	ML
				SUBTOTAL		97,60	ML
				TOTAL		97,60	ML

OBSERVACIONES:

LOCALIZACIÓN PLANIMÉTRICA

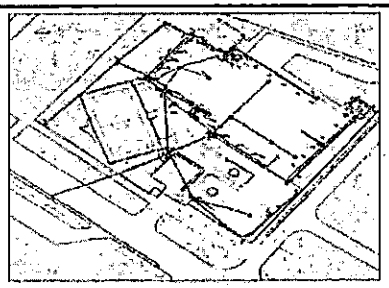

REGISTRO FOTOGRÁFICO

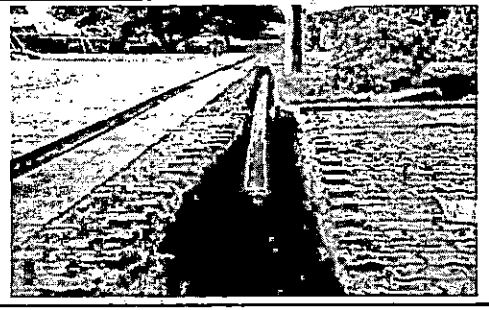


Alejandra Bolaños +

ARQ. ALEJANDRA BOLAÑOS
RESIDENTE CONTRATISTA

Arq. Jessica Lopera Arango

ARQ. JESSICA LOPERA
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

PLANO DETALLE

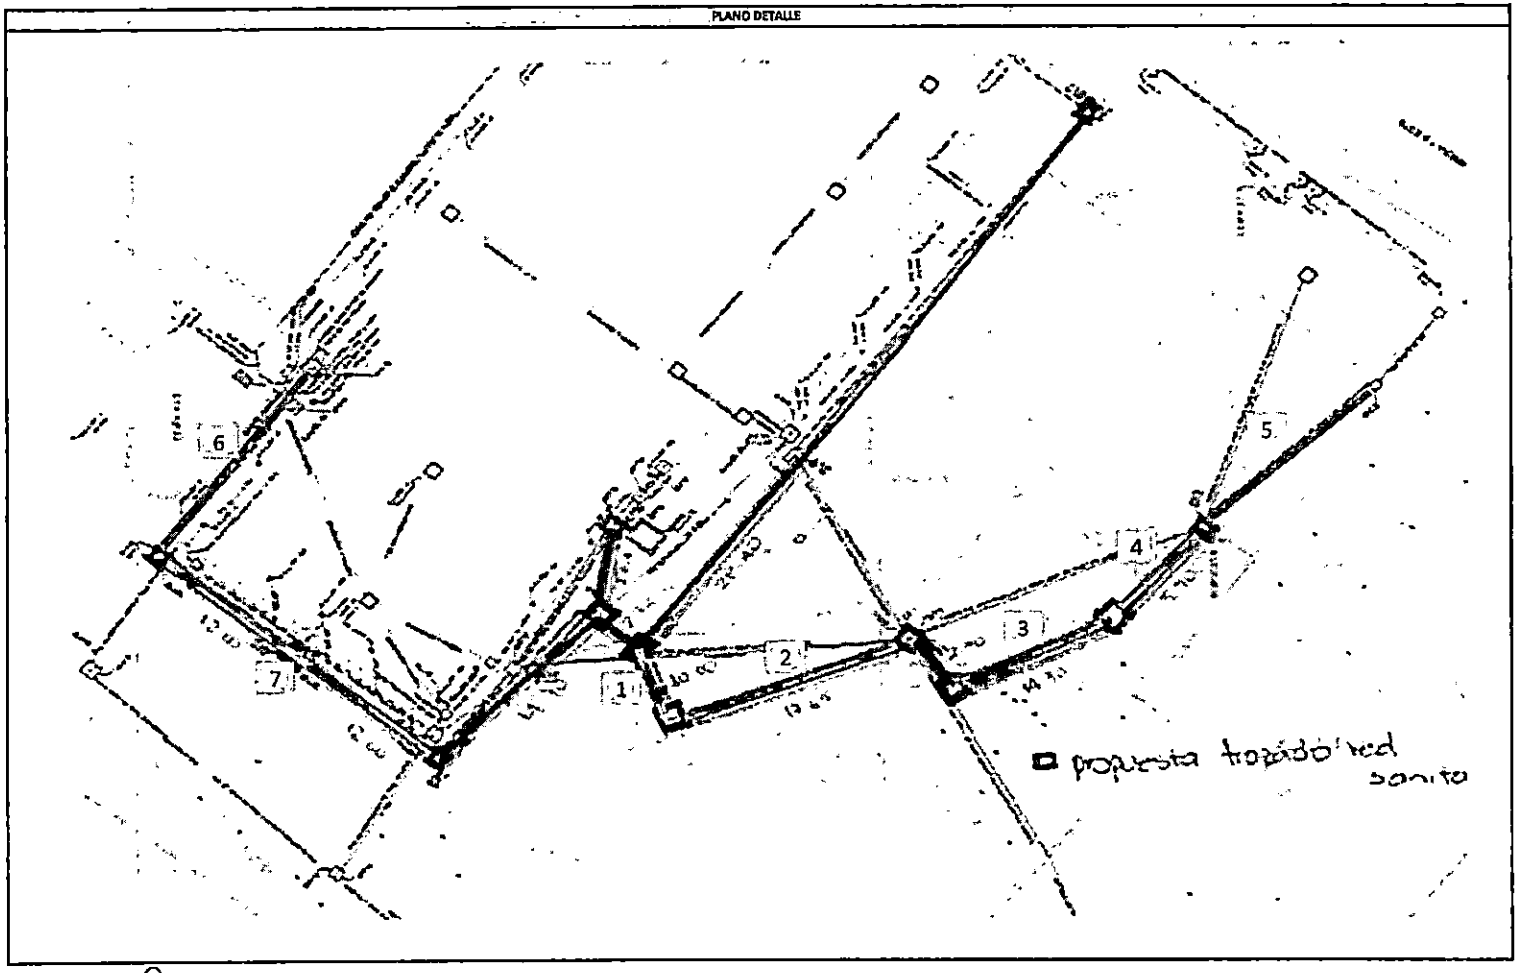

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA GENERAL | BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

PROYECTO: OBRAS SEDES ALCALDÍA

PRISMA | UNIVERSAL SEC S.A.S. — CONSORCIO PRUNI SEDES 04 — CONTRATISTA

ARQUITECTURA URBANA LTDA. — INTERVENTORÍA


ACTA No.	4		PERIODO DEL ACTA	01/11/2019	A	30/11/2019
OBJETO	REALIZAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE AJUSTE LAS DIFERENTES OBRAS E INTERVENCIONES ESPECIALIZADAS PARA LAS DIFERENTES SEDES DE LA SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C.					
CONTRATO DE OBRA No	731-2019	CONTRATISTA	CONSORCIO PRUNI SEDES 04	ENTIDAD CONTRATANTE	SECRETARIA GENERAL-ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA	
CONTRATO INTERVENTORÍA	730 DE 2019	INTERVENTORÍA	ARQUITECTURA URBANA LTDA	FRENTE:	IMPRENTA DISTRITAL	

CAPITULO	1.5.0	RED DE AGUAS NEGRAS	ITEM	1.5.0.8	Accesorio PVC-S 2"	UNIDAD	UN


ITEM	LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	TOTAL	UNIDAD
	BAÑO HOMBRES PRIMER PISO						
	DESAGÜE PARA LAVAMANOS Y ORINALES				27,00	27,00	UN
	RED DE VENTILACIÓN				25,00	25,00	UN
	SUBTOTAL					52,00	UN
	TOTAL					52,00	UN

OBSERVACIONES:

LOCALIZACIÓN PLANIMÉTRICA

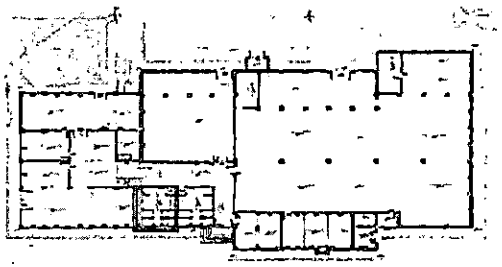

REGISTRO FOTOGRÁFICO

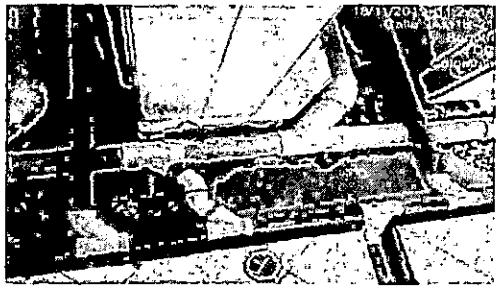


Alejandra Bolaños

ARQ. ALEJANDRA BOLAÑOS
RESIDENTE CONTRATISTA

Arq. Jessica Lopera Arango

ARQ. JESSICA LOPERA
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

PLANO DETALLE

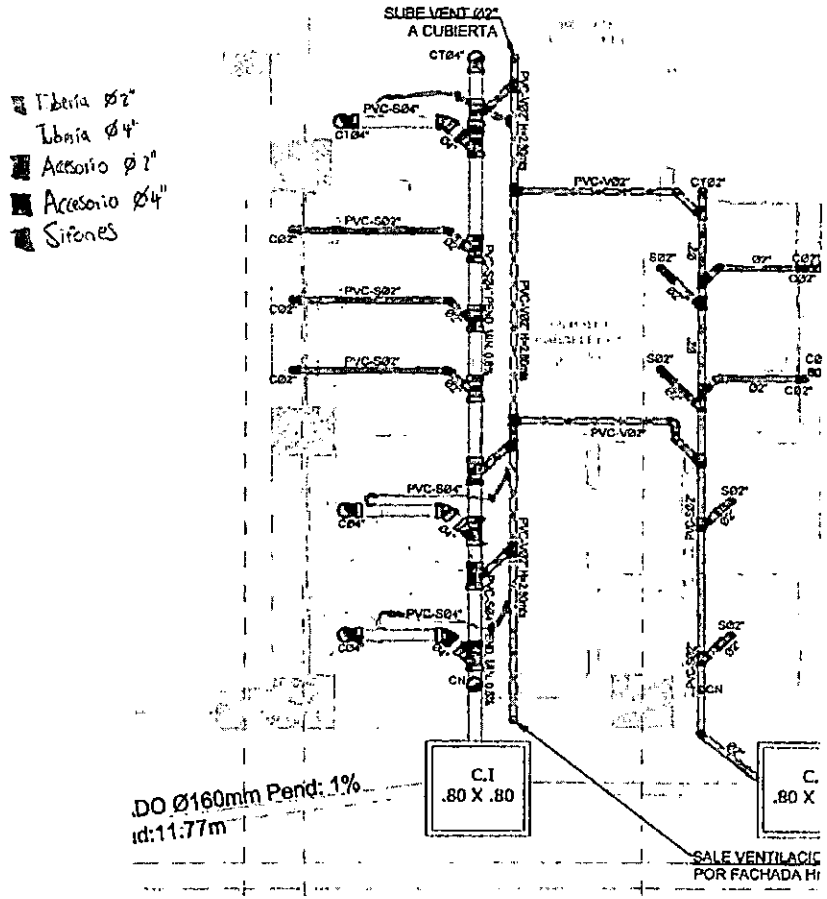

Aprobado

Interv.

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA GENERAL | BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

PROYECTO: OBRAS SEDES ALCALDÍA

PRISMA — UNIVERSAL SEC S.A.S. — CONSORCIO PRUNI SEDES 04 — CONTRATISTA


ARQUITECTURA URBANA LTDA. — INTERVENTORÍA

ACTA No.	4		PERIODO DEL ACTA	01/11/2019	A	30/11/2019
OBJETO	REALIZAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE AJUSTE LAS DIFERENTES OBRAS E INTERVENCIONES ESPECIALIZADAS PARA LAS DIFERENTES SEDES DE LA SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C.					
CONTRATO DE OBRA No	731-2019	CONTRATISTA	CONSORCIO PRUNI SEDES 04	ENTIDAD CONTRATANTE	SECRETARIA GENERAL-ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA	
CONTRATO INTERVENTORÍA	730 DE 2019	INTERVENTORÍA	ARQUITECTURA URBANA LTDA	FRENTE:	IMPRENTA DISTRITAL	


CAPITULO	1.5.0	RED DE AGUAS NEGRAS	ITEM	1.5.0.10	Accesorio PVC-S 4"	UNIDAD	UN

ITEM	LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	TOTAL	UNIDAD
	BAÑO HOMBRES PRIMER PISO						
	DESAGÜES SANITARIOS				19,00	19,00	UN

LOCALIZACIÓN PLANIMÉTRICA

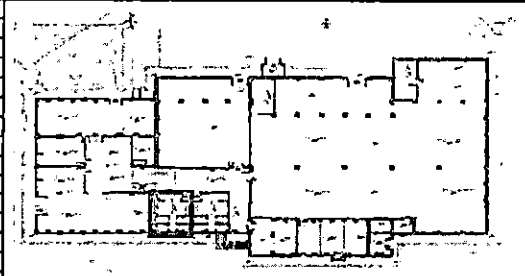

REGISTRO FOTOGRÁFICO

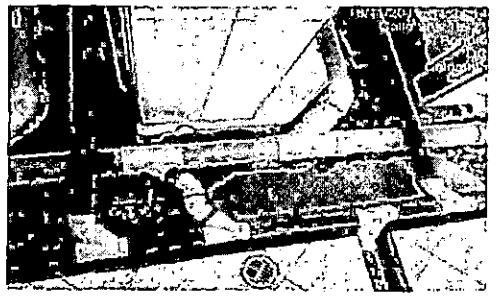

OBSERVACIONES:

SUBTOTAL	19,00	UN
TOTAL	19,00	UN


Alejandra Bolaños +

ARQ. ALEJANDRA BOLAÑOS
RESIDENTE CONTRATISTA

Arq Jessica Lopera Arango

ARQ. JESSICA LOPERA
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

PLANO DETALLE

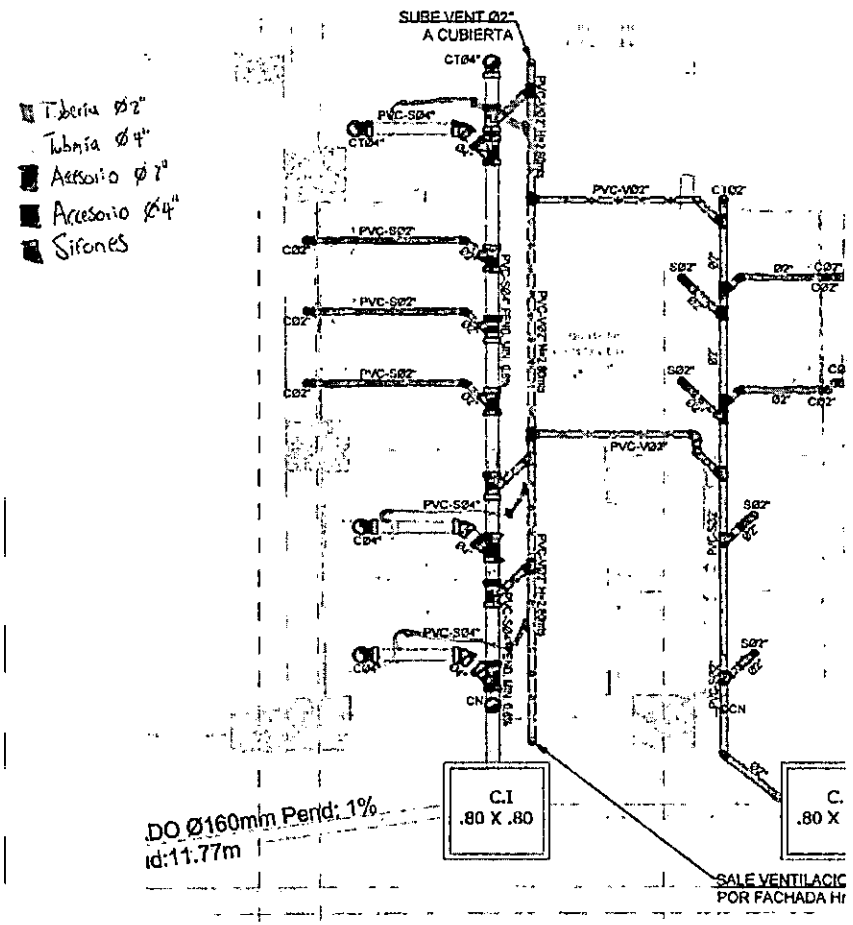

Aprob

Ing Interv.

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA GENERAL | BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

PROYECTO: OBRAS SEDES ALCALDÍA

PRISMA — UNIVERSAL SEC S.A.S. — CONSORCIO PRUNI SEDES 04 — CONTRATISTA

ARQUITECTURA URBANA LTDA. — INTERVENTORÍA


ACTA No.	4		PERIODO DEL ACTA	01/11/2019	A	30/11/2019	
OBJETO	REALIZAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE AJUSTE LAS DIFERENTES OBRAS E INTERVENCIONES ESPECIALIZADAS PARA LAS DIFERENTES SEDES DE LA SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C.						
CONTRATO DE OBRA No.	731-2019	CONTRATISTA	CONSORCIO PRUNI SEDES 04		ENTIDAD CONTRATANTE	SECRETARIA GENERAL-ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA	
CONTRATO INTERVENTORÍA	730 DE 2019	INTERVENTORÍA	ARQUITECTURA URBANA LTDA		FRENTE:	IMPRENTA DISTRITAL	

CAPITULO	1.6.0	PUNTOS SANITARIOS	ITEM	1.6.0.1	S.S. Sanitario 4"	UNIDAD	UN


ITEM	LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	TOTAL	UNIDAD
	BAÑO HOMBRES PRIMER PISO						
	SANITARIOS				3,00	3,00	UN

OBSERVACIONES:	SUBTOTAL	3,00	UN
	TOTAL	3,00	UN

LOCALIZACIÓN PLANIMÉTRICA

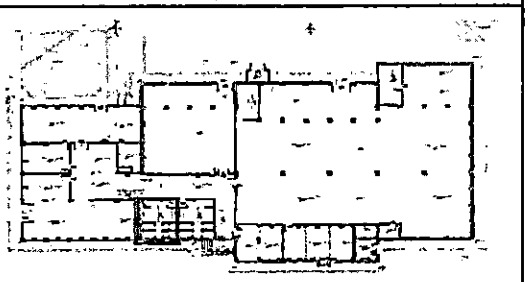

REGISTRO FOTOGRÁFICO

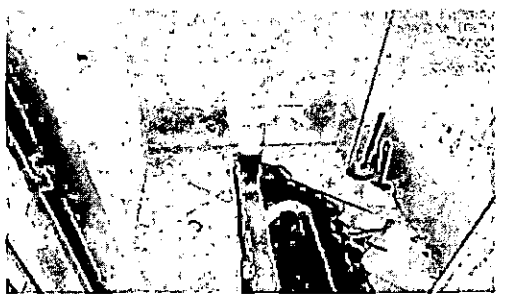


Alejandra Bolaños +

ARQ. ALEJANDRA BOLAÑOS
RESIDENTE CONTRATISTA

Arq. Jessica Lopera Arango

ARQ. JESSICA LOPERA
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

PLANO DETALLE

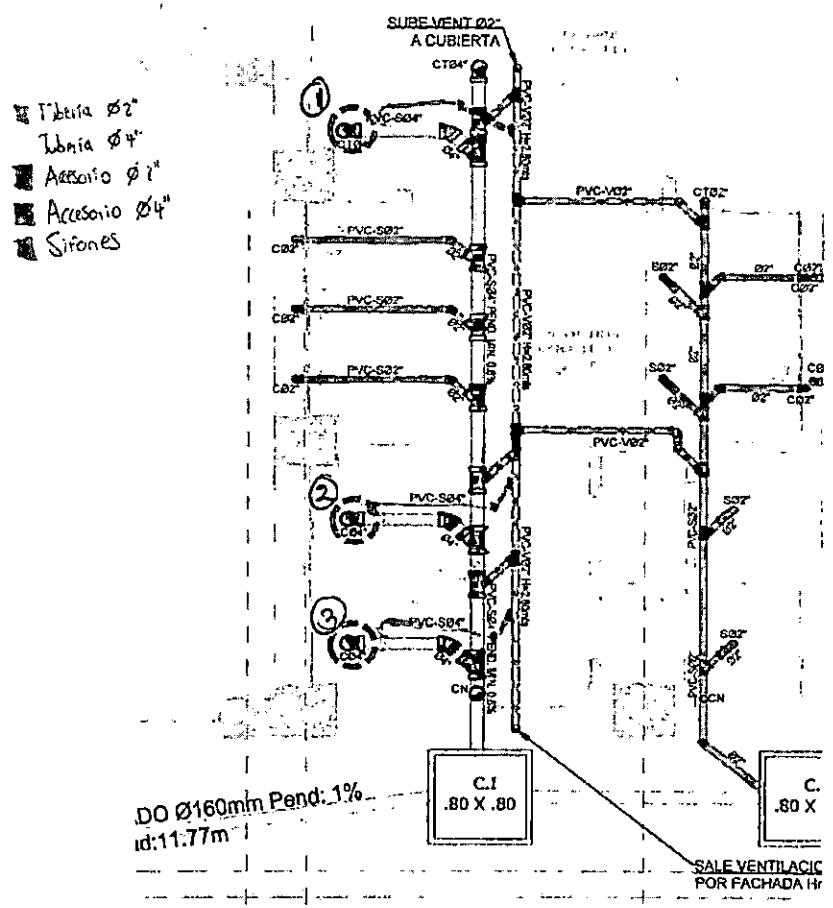

Hoja 88

Ha
Entera

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA GENERAL

BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

PROYECTO: OBRAS SEDES ALCALDÍA

PRISMA — UNIVERSAL SEC S.A.S. — CONSORCIO PRUNI SEDES 04 — CONTRATISTA

ARQUITECTURA URBANA LTDA. — INTERVENTORÍA


ACTA No.	4		PERIODO DEL ACTA	01/11/2019	A	30/11/2019	
OBJETO	REALIZAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE AJUSTE LAS DIFERENTES OBRAS E INTERVENCIONES ESPECIALIZADAS PARA LAS DIFERENTES SEDES DE LA SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C.						
CONTRATO DE OBRA No	731-2019	CONTRATISTA	CONSORCIO PRUNI SEDES 04		ENTIDAD CONTRATANTE	SECRETARIA GENERAL-ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA	
CONTRATO INTERVENTORÍA	730 DE 2019	INTERVENTORÍA	ARQUITECTURA URBANA LTDA		FRENTE:	IMPRENTA DISTRITAL	

CAPITULO	1.6.0	PUNTOS SANITARIOS	ITEM	1.6.0.2	S.S. Lavamanos 2"	UNIDAD	UN


ITEM	LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	TOTAL	UNIDAD
	BAÑO HOMBRES PRIMER PISO						
	LAVAMANOS				2,00	2,00	UN
	SUBTOTAL					2,00	UN
	TOTAL					2,00	UN

OBSERVACIONES:

LOCALIZACIÓN PLANIMÉTRICA

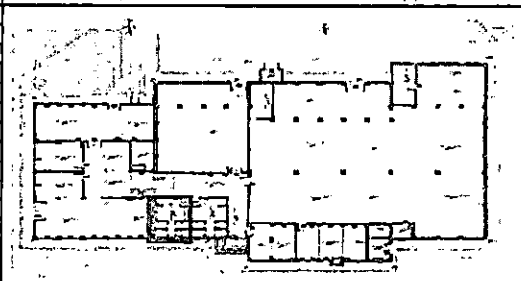


REGISTRO FOTOGRÁFICO

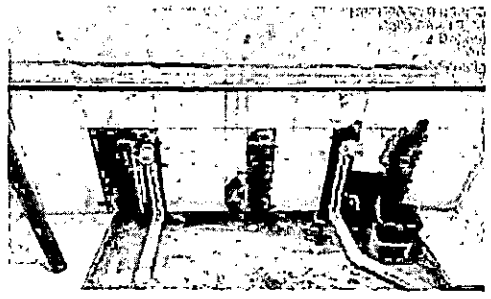

Alejandra Bolaños +
ARQ. ALEJANDRA BOLAÑOS
RESIDENTE CONTRATISTA

Arq. Jessica Lopera Orango.
ARQ. JESSICA LOPERA
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

PLANO DETALLE

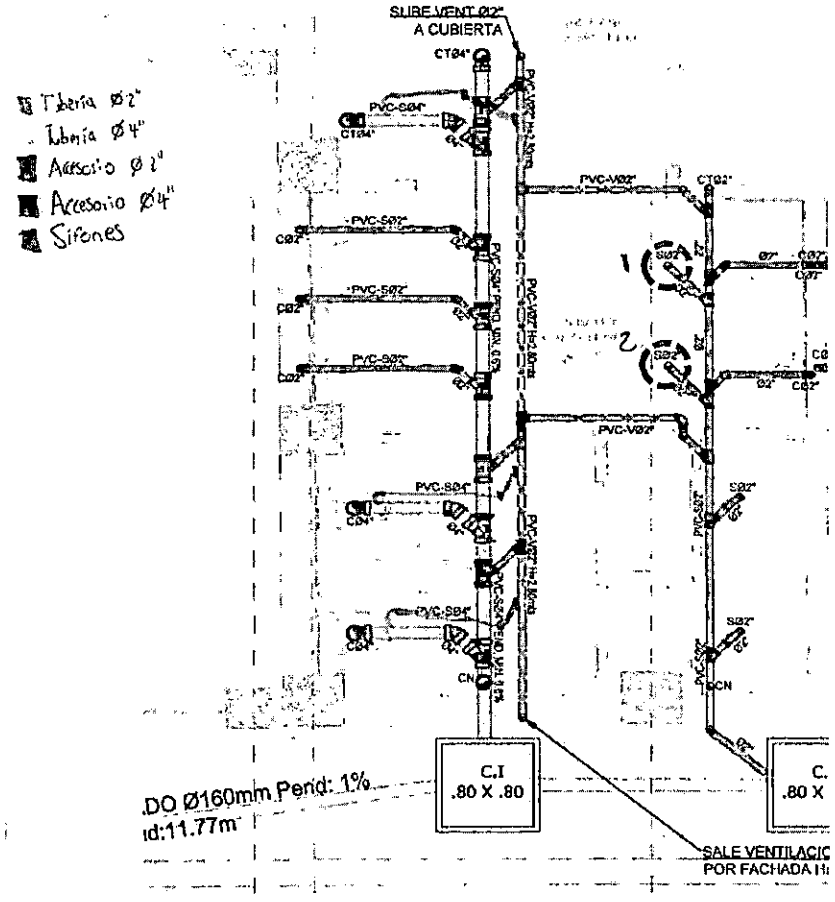

Anexo B

Vía Interv.

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA GENERAL | BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

PROYECTO: OBRAS SEDES ALCALDÍA

PRISMA — UNIVERSAL SEC S.A.S. — CONSORCIO PRUNI SEDES 04 — CONTRATISTA

ARQUITECTURA URBANA LTDA. — INTERVENTORÍA


ACTA No.	4		PERIODO DEL ACTA	01/11/2019	A	30/11/2019
OBJETO	REALIZAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE AJUSTE LAS DIFERENTES OBRAS E INTERVENCIONES ESPECIALIZADAS PARA LAS DIFERENTES SEDES DE LA SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C.					
CONTRATO DE OBRA No	731-2019	CONTRATISTA	CONSORCIO PRUNI SEDES 04	ENTIDAD CONTRATANTE	SECRETARIA GENERAL-ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA	
CONTRATO INTERVENTORÍA	730 DE 2019	INTERVENTORÍA	ARQUITECTURA URBANA LTDA	FRENTE:	IMPRENTA DISTRITAL	

CAPITULO	1.6.0	PUNTOS SANITARIOS	ITEM	1.6.0.5	S.S. Orinal Z°	UNIDAD	UN


ITEM	LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	TOTAL	UNIDAD
	BAÑO HOMBRES PRIMER PISO						
	ORINAL				3,00	3,00	UN
	SUBTOTAL					3,00	UN
	TOTAL					3,00	UN

OBSERVACIONES:

LOCALIZACIÓN PLANIMÉTRICA

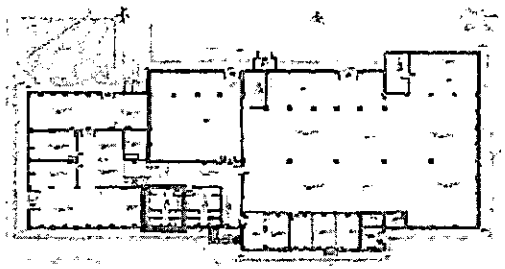

REGISTRO FOTOGRÁFICO

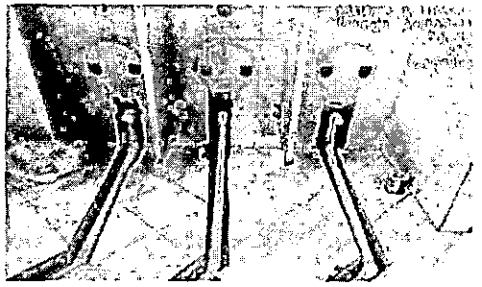


Alejandra Bolaños +

ARQ. ALEJANDRA BOLAÑOS
RESIDENTE CONTRATISTA

Arq. Jessica Lopera A.

ARQ. JESSICA LOPERA
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

PLANO DETALLE

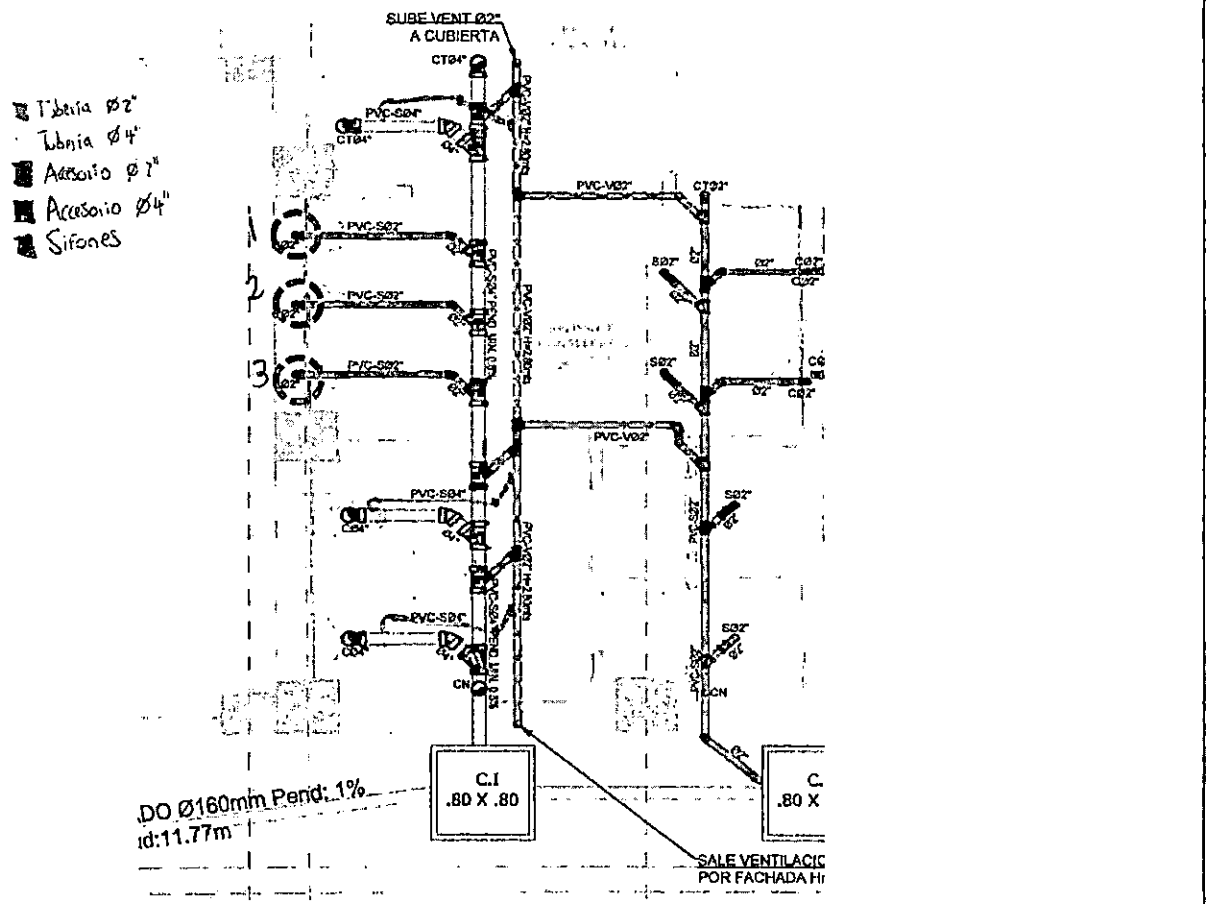

Alcantarillado

Firma

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA GENERAL

BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

PROYECTO: OBRAS SEDES ALCALDÍA

PRISMA
UNIVERSAL SEC S.A.S.
CONTRATISTA

ARQUITECTURA URBANA LTDA.
INTERVENTORÍA


ACTA No.			PERIODO DEL ACTA	01/11/2019	A	30/11/2019
OBJETO	REALIZAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE AJUSTE LAS DIFERENTES OBRAS E INTERVENCIONES ESPECIALIZADAS PARA LAS DIFERENTES SEDES DE LA SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C.					
CONTRATO DE OBRA No	731-2019	CONTRATISTA	CONSORCIO PRUNI SEDES 04	ENTIDAD CONTRATANTE		SECRETARIA GENERAL-ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA
CONTRATO INTERVENTORÍA	730 DE 2019	INTERVENTORÍA	ARQUITECTURA URBANA LTDA	FRENTE:		IMPRENTA DISTRITAL

CAPITULO	1.6.0	PUNTOS SANITARIOS	ITEM	1.6.0.6	S.S. Sifón de piso 2"	UNIDAD	UN

ITEM	LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	TOTAL	UNIDAD
	BAÑO HOMBRES PRIMER PISO						
	SIFONES				4,00	4,00	UN
						SUBTOTAL	4,00 UN
						TOTAL	4,00 UN

OBSERVACIONES:

LOCALIZACIÓN PLANIMÉTRICA

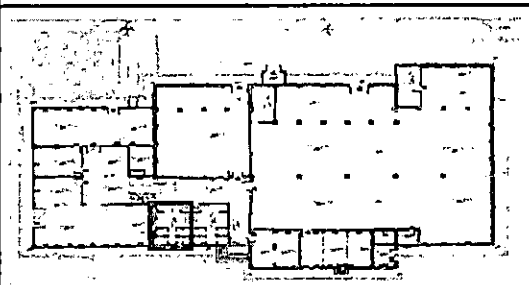


REGISTRO FOTOGRÁFICO



Alejandra Bolaños +
ARQ. ALEJANDRA BOLAÑOS
RESIDENTE CONTRATISTA

Arq. Jessica Lopera Arango
ARQ. JESSICA LOPERA
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

PLANO DETALLE

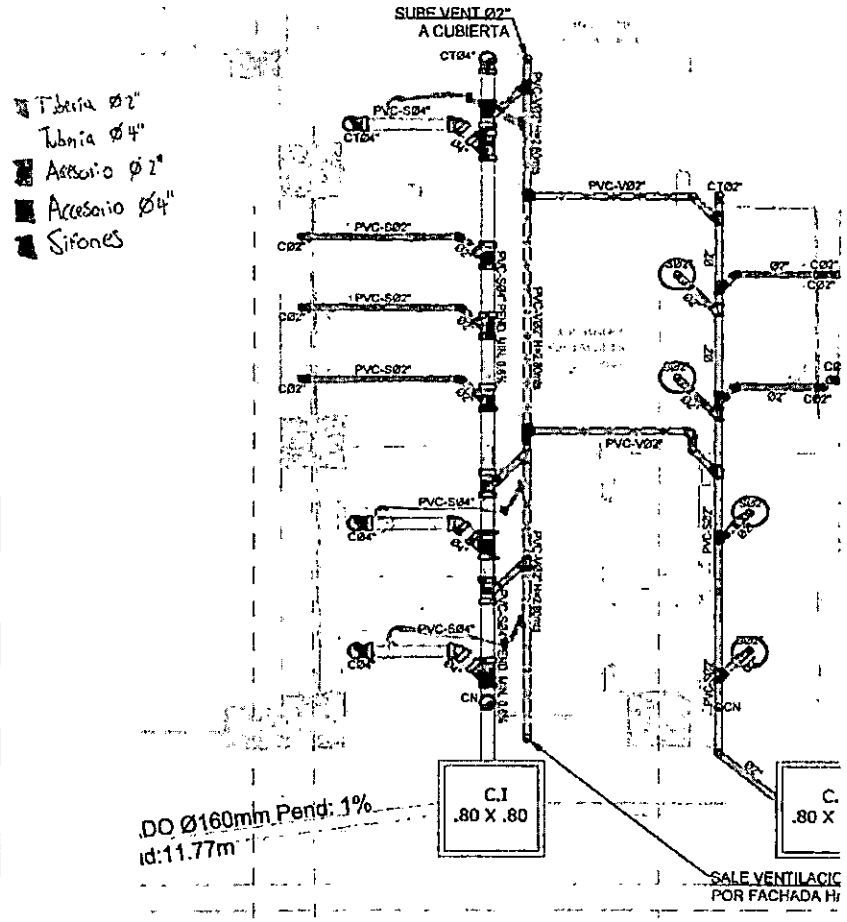

Alega PP

Jla
Interv.

100.

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA GENERAL | BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

PROYECTO: OBRAS SEDES ALCALDÍA

PRISMA — UNIVERSAL SEC S.A.S. — CONSORCIO PRUNI SEDES 04 — CONTRATISTA

ARQUITECTURA URBANA LTDA. — INTERVENTORÍA


ACTA No.	4	PERIODO DEL ACTA	01/11/2019	A	30/11/2019	
OBJETO	REALIZAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE AJUSTE LAS DIFERENTES OBRAS E INTERVENCIONES ESPECIALIZADAS PARA LAS DIFERENTES SEDES DE LA SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C.					
CONTRATO DE OBRA No	731-2019	CONTRATISTA	CONSORCIO PRUNI SEDES 04	ENTIDAD CONTRATANTE	SECRETARIA GENERAL-ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA	
CONTRATO INTERVENTORÍA	730 DE 2019	INTERVENTORÍA	ARQUITECTURA URBANA LTDA	FRENTE:	IMPRENTA DISTRITAL	

CAPITULO	1.7.0	OBRAS CIVILES	ITEM	1.7.0.4	Retiro ladrillo cemento	UNIDAD	ML

ITEM	LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	TOTAL	UNIDAD
	COSTADO SUR						
1	Sendero peatonal	10,00			1,00	10,00	ML
2	Cancha	6,50			1,00	6,50	ML
3	Parqueadero	2,70			1,00	2,70	ML
4	Parqueadero	14,30			1,00	14,30	ML
5	Parqueadero	5,30			1,00	5,30	ML
				SUBTOTAL		38,80	ML
				TOTAL		38,80	ML

OBSERVACIONES:

LOCALIZACIÓN PLANIMÉTRICA

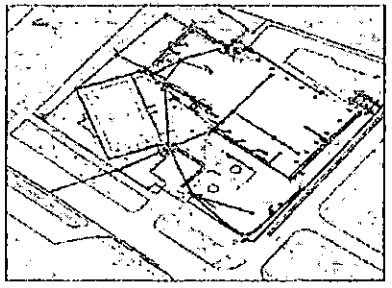


REGISTRO FOTOGRÁFICO



ARQ. ALEJANDRA BOLAÑOS
RESIDENTE CONTRATISTA

ARQ. JESSICA LOPERA
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

PLANO DETALLE

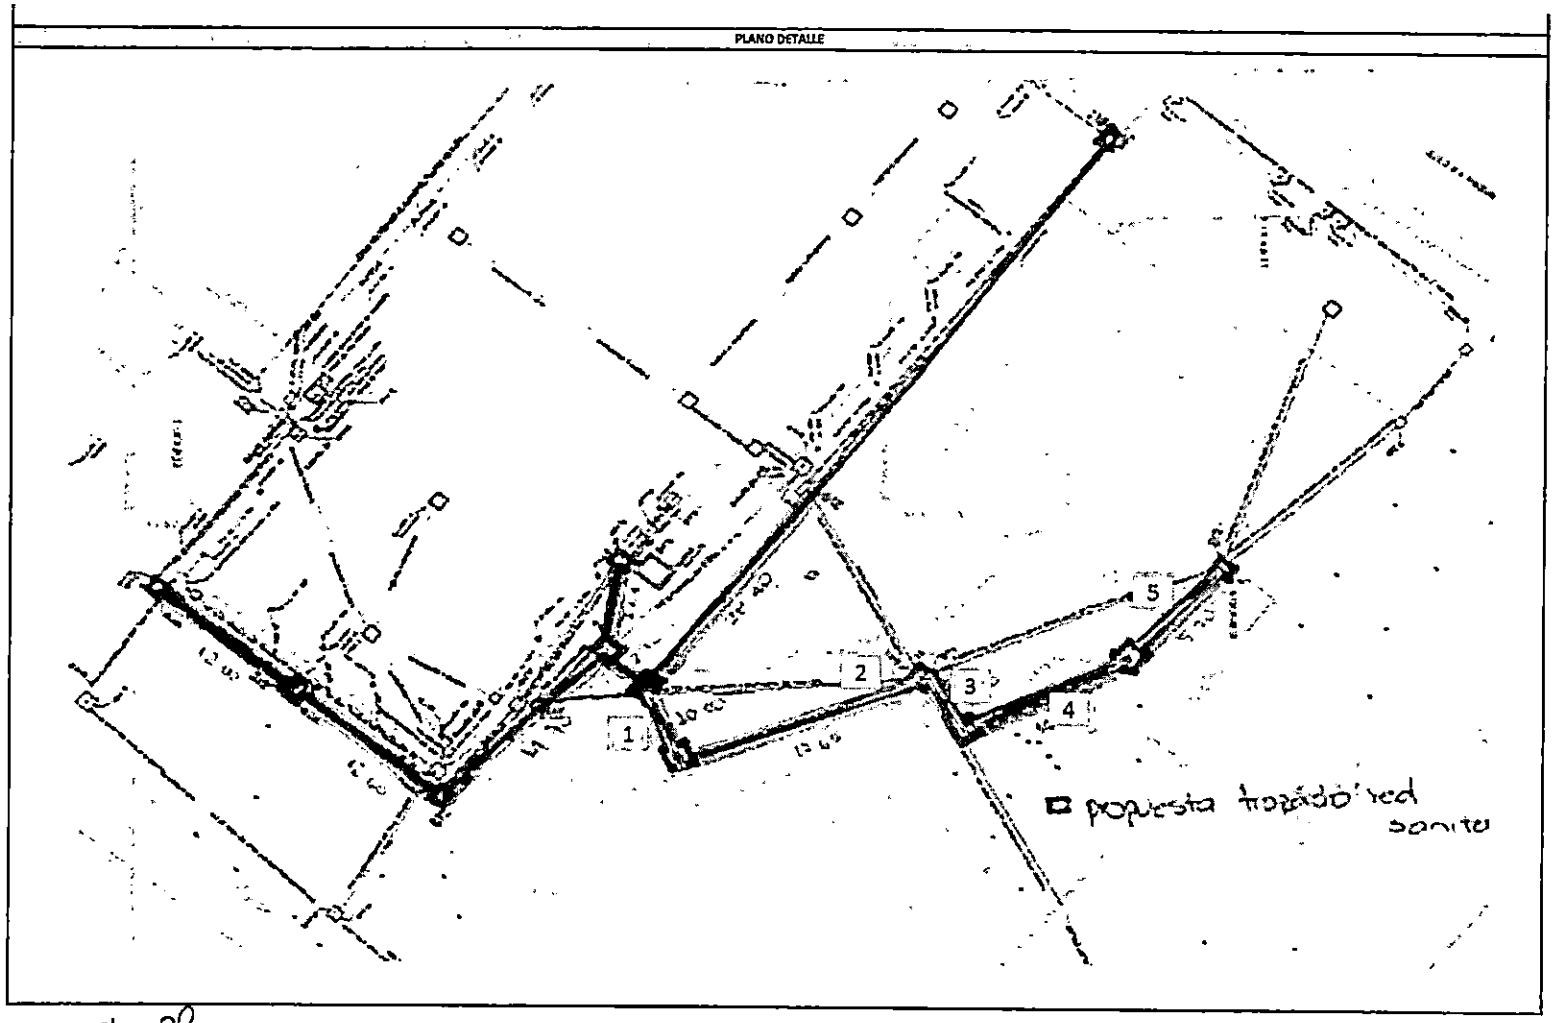

Vía Interv.

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. | BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS
SECRETARÍA GENERAL

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

PROYECTO: OBRAS SEDES ALCALDÍA

PRISMA | UNIVERSAL SEC S.A.S. — CONSORCIO PRUNI SEDES 04 — CONTRATISTA


ARQUITECTURA URBANA LTDA. — INTERVENTORÍA

ACTA No.	4	PERIODO DEL ACTA	01/11/2019	A	30/11/2019	
OBJETO	REALIZAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE AJUSTE LAS DIFERENTES OBRAS E INTERVENCIONES ESPECIALIZADAS PARA LAS DIFERENTES SEDES DE LA SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C.					
CONTRATO DE OBRA No	731-2019	CONTRATISTA	CONSORCIO PRUNI SEDES 04	ENTIDAD CONTRATANTE	SECRETARIA GENERAL-ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA	
CONTRATO INTERVENTORÍA	730 DE 2019	INTERVENTORÍA	ARQUITECTURA URBANA LTDA	FRENTE:	IMPRENTA DISTRITAL	


CAPITULO	1.7.0	OBRAS CIVILES	ITEM	1.7.0.5	Desmonte Cielorraso	UNIDAD	M2

ITEM	LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	TOTAL	UNIDAD
	ADMINISTRACION 2DO PISO						
1	OFICINA ADMINISTRATIVA	4,70	5,80		1,00	27,26	M2
2	OFICINA DISEÑO	6,20	8,78		1,00	54,44	M2
		5,35	3,16		1,00	16,91	M2
3	OFICINA PRODUCCION	5,92	5,75		1,00	34,04	M2
4	OFICINA SUBDIRECCION	4,76	7,73		1,00	36,79	M2
5	BAÑO HOMBRES 2DO PISO	2,45	3,07		1,00	7,52	M2
6	BAÑO MUJERES 2DO PISO	2,58	3,07		1,00	7,92	M2
7	DATACENTER 2DO PISO	6,05	3,20		1,00	19,36	M2
8	HALL 2DO PISO	7,15	8,70		1,00	62,21	M2
9	CAFETERÍA 2DO PISO	4,35	2,90		1,00	12,62	M2
10	VOLADO COSTADO NORTE	17,00	1,50		1,00	25,50	M2
11	ESCALERA 2DO PISO	3,30	4,05		1,00	13,37	M2

LOCALIZACIÓN PLANIMÉTRICA



REGISTRO FOTOGRÁFICO

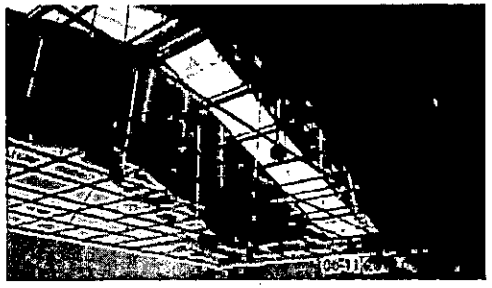

OBSERVACIONES:

SUBTOTAL	317,92	M2
TOTAL	317,92	M2


Alejandra Bolaños T

ARQ. ALEJANDRA BOLAÑOS
RESIDENTE CONTRATISTA

Arq. Jessica Lopera Arango

ARQ. JESSICA LOPERA
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

PLANO DETALLE

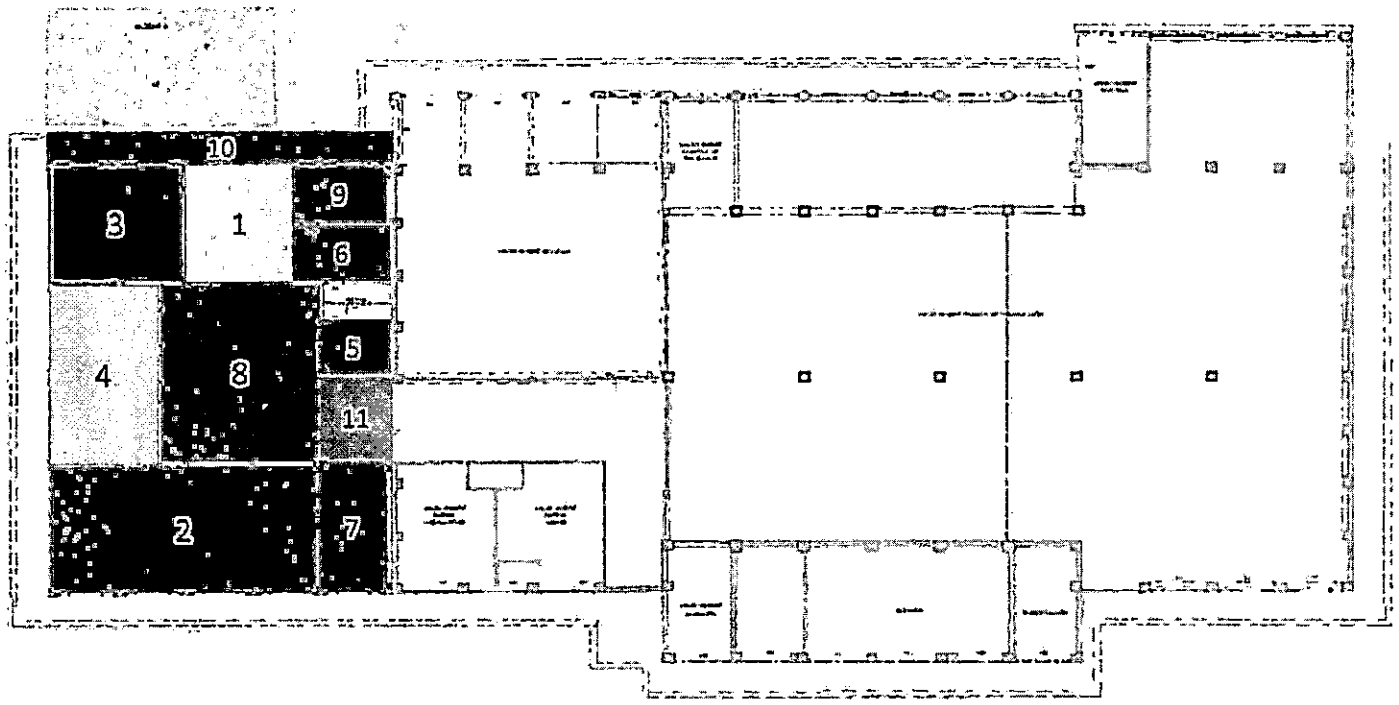

Alejandra P.

Ma
Fatima.

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA GENERAL | BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

PROYECTO: OBRAS SEDES ALCALDÍA

PRISMA UNIVERSAL SEC S.A.S. — CONSORCIO PRUNI SEDES 04 — CONTRATISTA

ARQUITECTURA URBANA LTDA. — INTERVENTORÍA


ACTA No.	4		PERIODO DEL ACTA:	01/11/2019	A	30/11/2019	
OBJETO	REALIZAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE AJUSTE LAS DIFERENTES OBRAS E INTERVENCIONES ESPECIALIZADAS PARA LAS DIFERENTES SEDES DE LA SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C.						
CONTRATO DE OBRA No	731-2019	CONTRATISTA	CONSORCIO PRUNI SEDES 04		ENTIDAD CONTRATANTE	SECRETARIA GENERAL-ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA	
CONTRATO INTERVENTORÍA	730 DE 2019	INTERVENTORÍA	ARQUITECTURA URBANA LTDA		FRENTE:	IMPRENTA DISTRITAL	

CAPITULO	1.7.0	OBRAS CIVILES	ITEM	1.7.0.6	Excavación manual incluye retiro de material y disposición final en sitios autorizados	UNIDAD	M3

ITEM	LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	TOTAL	UNIDAD
	COSTADO SUR						
1	Canalización	10,00	0,62	0,85	1,00	5,27	M3
2	Caja	1,20	1,20	0,90	1,00	1,30	M3
3	Canalización	17,65	0,50	1,05	1,00	9,27	M3
4	Canalización	1,80	0,50	1,00	1,00	0,90	M3
5	Caja	1,15	1,15	1,10	1,00	1,45	M3
6	Canalización	13,70	0,60	0,90	1,00	7,40	M3
7	Caja	1,20	1,20	0,90	1,00	1,30	M3
8	Canalización	5,30	0,55	0,80	1,00	2,33	M3
9	Canalización	12,50	0,65	0,56	1,00	4,55	M3
10	Canalización	24,20	0,40	0,70	1,00	6,78	M3
11	Canalización	16,00	0,60	0,75	1,00	7,20	M3
12	Caja	0,80	0,80	0,70	1,00	0,45	M3
13	Caja	0,70	1,00	0,80	1,00	0,56	M3
14	Apique #1 (ubicación red principal)	4,60	0,75	2,00	1,00	6,90	M3
				SUBTOTAL		55,65	M3
				TOTAL		55,65	M3

OBSERVACIONES:

LOCALIZACIÓN PLANIMÉTRICA

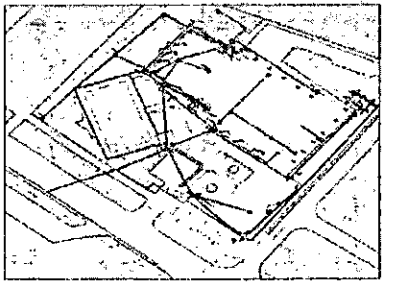

REGISTRO FOTOGRÁFICO




Alejandra Bolaños

ARQ. ALEJANDRA BOLAÑOS
RESIDENTE CONTRATISTA

Arq. Jessica Lopera A.

ARQ. JESSICA LOPERA
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

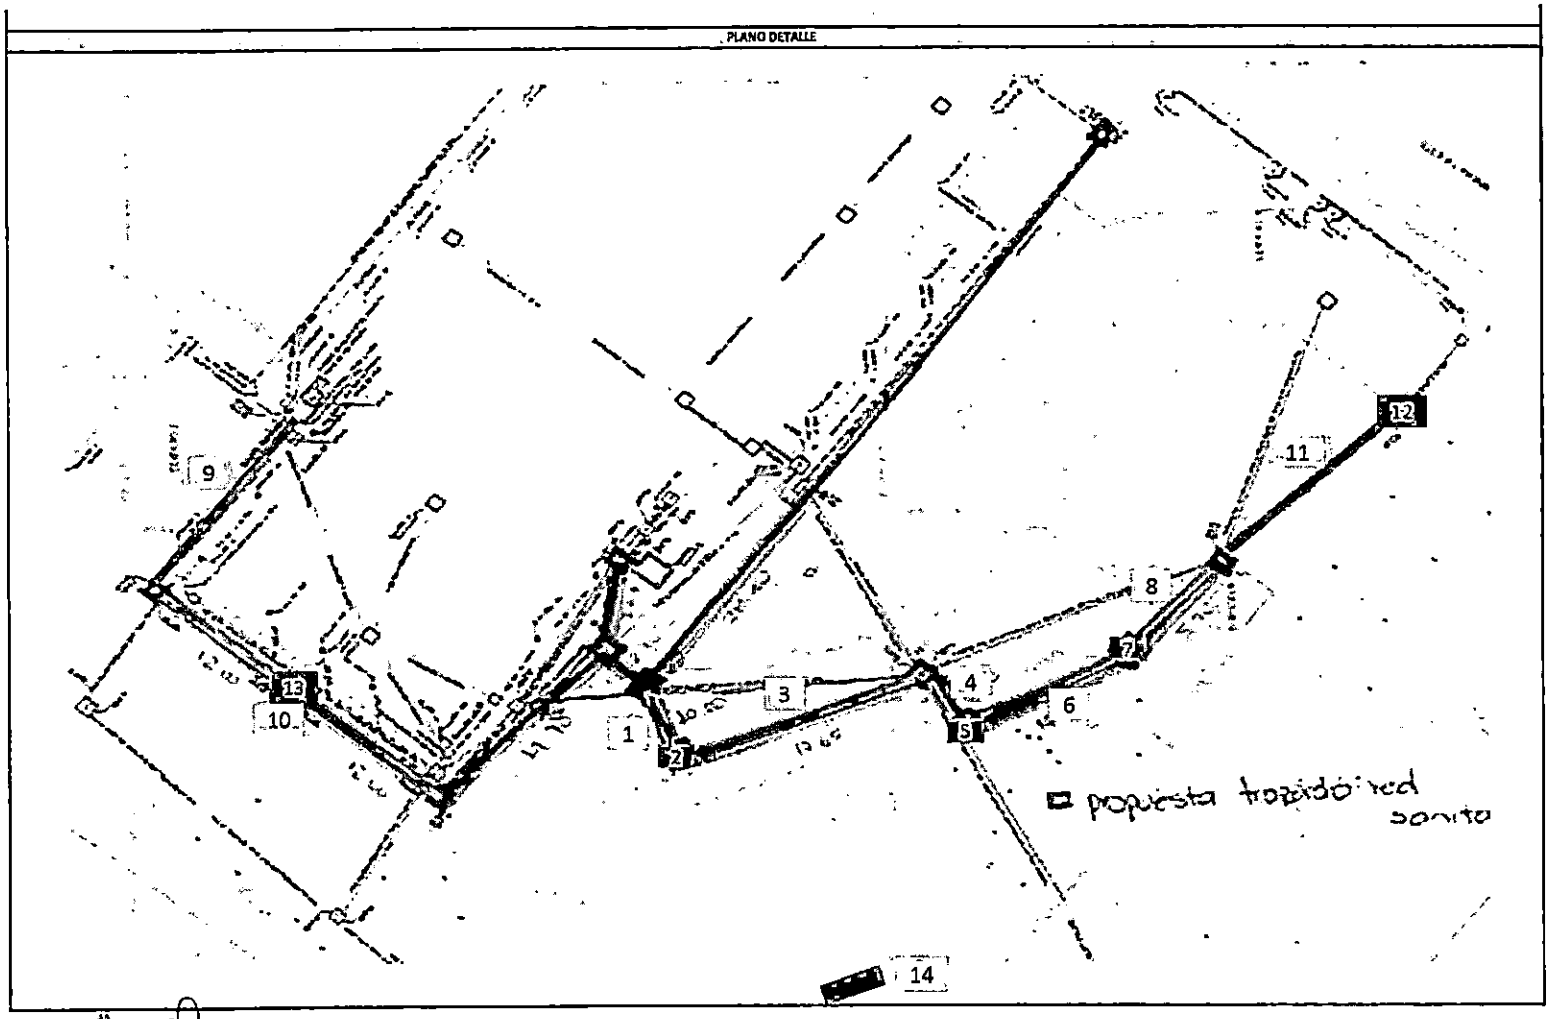

Aprob

Vo
Interv.

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. | BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS
SECRETARÍA GENERAL

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

PROYECTO: OBRAS SEDES ALCALDÍA

PRISMA — UNIVERSAL SEC S.A.S. — CONSORCIO PRUNI SEDES 04 — CONTRATISTA


ARQUITECTURA URBANA LTDA — INTERVENTORÍA

ACTA No:		PERIODO DEL ACTA	01/11/2019	A	30/11/2019
OBJETO	REALIZAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE AJUSTE LAS DIFERENTES OBRAS E INTERVENCIONES ESPECIALIZADAS PARA LAS DIFERENTES SEDES DE LA SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C.				
CONTRATO DE OBRA No	731-2019	CONTRATISTA	CONSORCIO PRUNI SEDES 04	ENTIDAD CONTRATANTE	SECRETARIA GENERAL-ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA
CONTRATO INTERVENTORÍA	730 DE 2019	INTERVENTORÍA	ARQUITECTURA URBANA LTDA	FRENTE:	IMPRENTA DISTRITAL

CAPITULO	1.7.0	OBRAS CIVILES	ITEM	1.7.0.8	Relleno en base granular BG_Gr1 o B-600	UNIDAD	M3

ITEM	LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	TOTAL	UNIDAD
	COSTADO SUR						
1	Canalización	10,00	0,62	0,45	1,00	2,79	M3
2	Canalización	17,65	0,50	0,60	1,00	5,30	M3
3	Canalización	13,70	0,60	0,60	1,00	4,93	M3
4	Canalización	5,30	0,55	0,45	1,00	1,31	M3
5	Canalización	16,00	0,60	0,35	1,00	3,36	M3
6	Canalización	11,00	0,60	0,30	1,00	1,98	M3
7	Canalización	23,70	0,60	0,30	1,00	4,27	M3
OBSERVACIONES:				SUBTOTAL		23,93	M3
				TOTAL		23,93	M3

LOCALIZACIÓN PLANIMÉTRICA

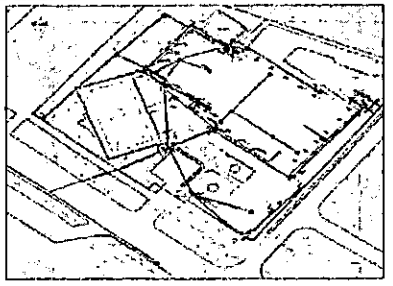


REGISTRO FOTOGRÁFICO



Alejandra Bolaños T.
ARQ. ALEJANDRA BOLAÑOS
RESIDENTE CONTRATISTA

Arq. Jessica Lopera A.
ARQ. JESSICA LOPERA
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

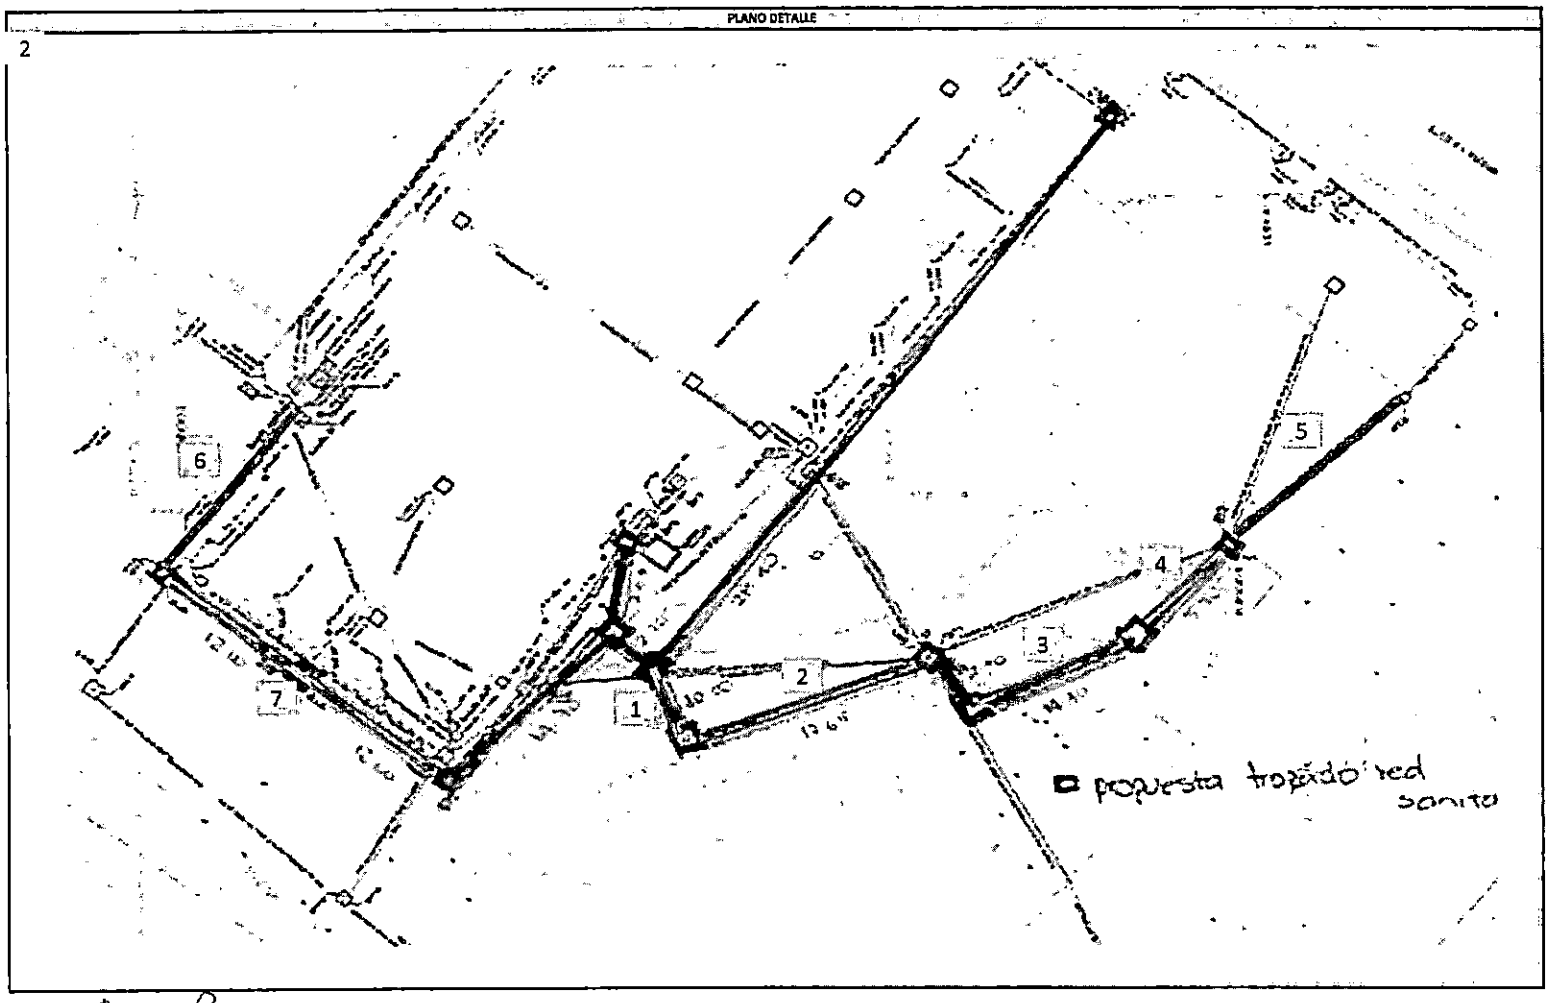

Anexo 8B

Vía interv.

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA GENERAL

BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

PROYECTO: OBRAS SEDES ALCALDÍA

PRISMA — UNIVERSAL SEC S.A.S. — CONSORCIO PRUNI SEDES 04 — CONTRATISTA

ARQUITECTURA URBANA LTDA. — INTERVENTORÍA


ACTA No.	4	PERIODO DEL ACTA	01/11/2019	A	30/11/2019	
OBJETO	REALIZAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE AJUSTE LAS DIFERENTES OBRAS E INTERVENCIONES ESPECIALIZADAS PARA LAS DIFERENTES SEDES DE LA SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C.					
CONTRATO DE OBRA No.	731-2019	CONTRATISTA	CONSORCIO PRUNI SEDES 04	ENTIDAD CONTRATANTE	SECRETARIA GENERAL-ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA	
CONTRATO INTERVENTORÍA	730 DE 2019	INTERVENTORÍA	ARQUITECTURA URBANA LTDA	FRENTE:	IMPRENTA DISTRITAL	

CAPITULO	1.7.0	OBRAS CIVILES	ITEM	1.7.0.9	Relleno en arena	UNIDAD	M3


ITEM	LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	TOTAL	UNIDAD
	COSTADO SUR						
1	Canalización	10,00	0,62	0,30	1,00	1,86	M3
2	Canalización	17,65	0,50	0,30	1,00	2,65	M3
3	Canalización	13,70	0,60	0,30	1,00	2,47	M3
4	Canalización	5,30	0,55	0,35	1,00	1,02	M3
5	Canalización	16,00	0,60	0,30	1,00	2,88	M3
6	Canalización	11,00	0,60	0,30	1,00	1,98	M3
7	Canalización	23,70	0,60	0,30	1,00	4,27	M3
				SUBTOTAL		17,12	M3
				TOTAL		17,12	M3

OBSERVACIONES:

LOCALIZACIÓN PLANIMÉTRICA

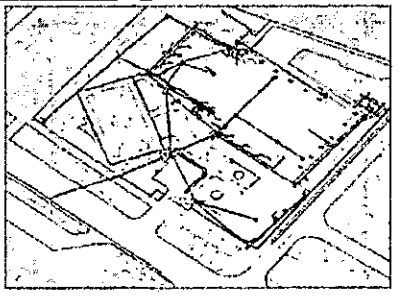


REGISTRO FOTOGRÁFICO

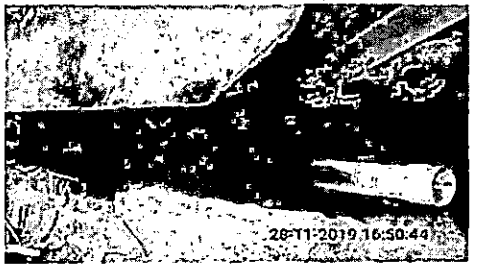

Alejandra Bolaños +
ARQ. ALEJANDRA BOLAÑOS
RESIDENTE CONTRATISTA

Arq. Jessica Lopera A
ARQ. JESSICA LOPERA
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

PLANO DETALLE

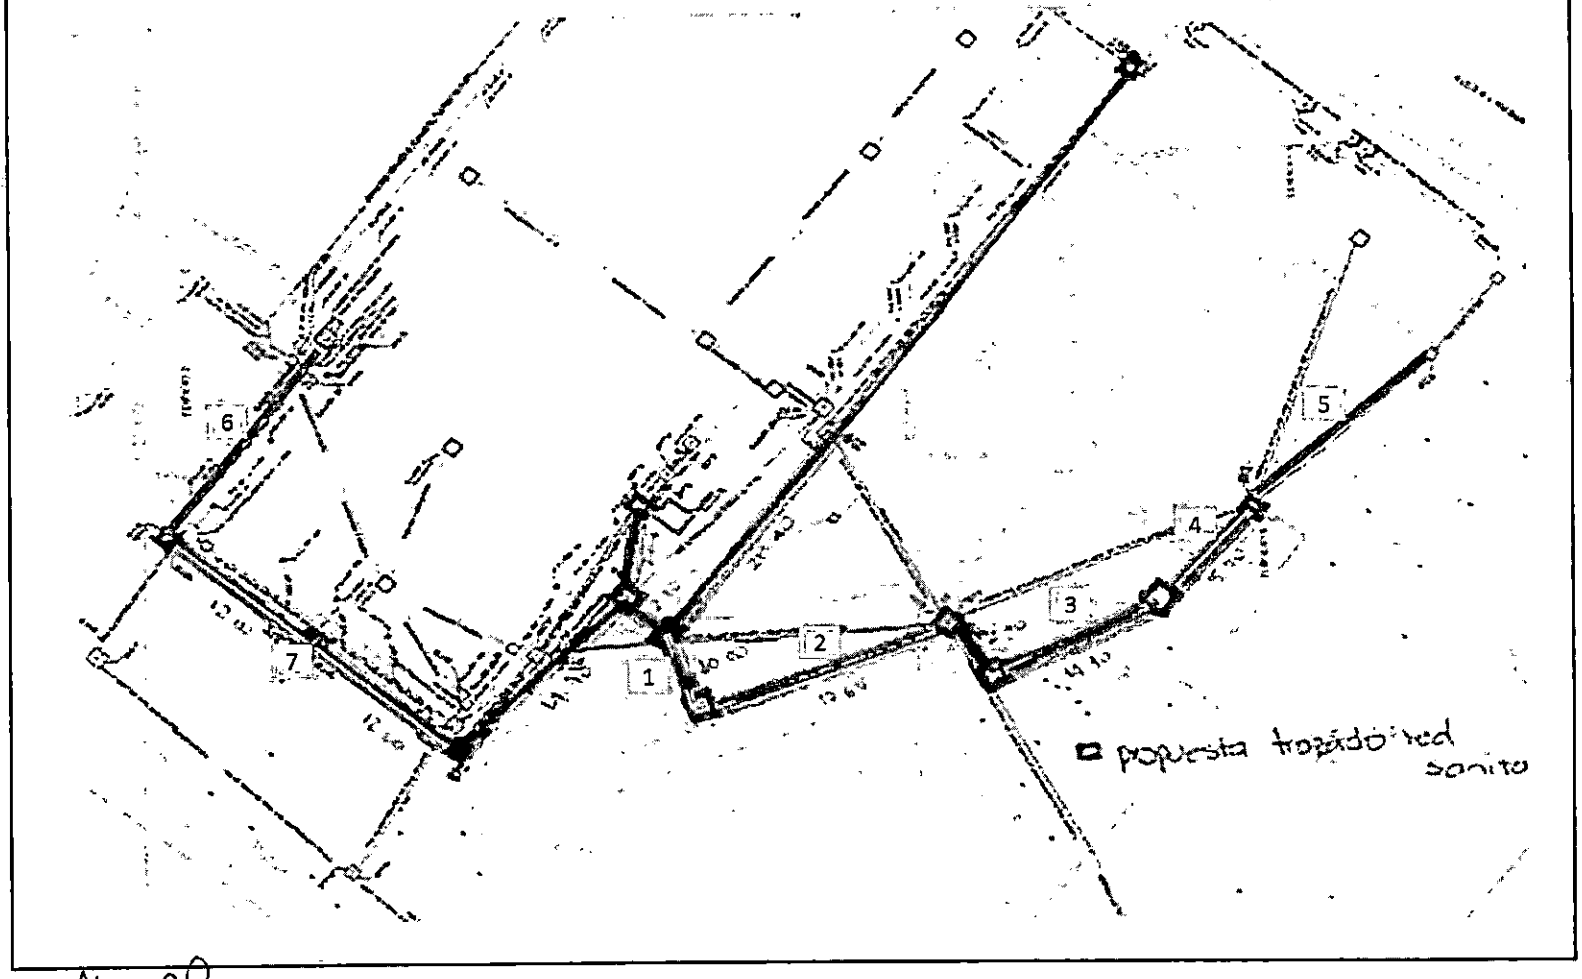

Hoja 8

Ing Intern.

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA GENERAL

BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

PROYECTO: OBRAS SEDES ALCALDÍA

PRISMA — UNIVERSAL SEC S.A.S. — CONSORCIO PRUNI SEDES 04 — CONTRATISTA

ARQUITECTURA URBANA LTDA. — INTERVENTORÍA


ACTA No.	4		PERIODO DEL ACTA	01/11/2019	A	30/11/2019
OBJETO	REALIZAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE AJUSTE LAS DIFERENTES OBRAS E INTERVENCIONES ESPECIALIZADAS PARA LAS DIFERENTES SEDES DE LA SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C.					
CONTRATO DE OBRA No	731-2019	CONTRATISTA	CONSORCIO PRUNI SEDES 04	ENTIDAD CONTRATANTE		SECRETARIA GENERAL-ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA
CONTRATO INTERVENTORÍA	730 DE 2019	INTERVENTORÍA	ARQUITECTURA URBANA LTDA	FRENTE:		IMPRENTA DISTRITAL

CAPITULO	1.7.0	OBRAS CIVILES	ITEM	1.7.0.12	Caja de inspección Hmax=0,60m 40x40 con caja pesada	UNIDAD	UN


ITEM	LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	TOTAL	UNIDAD
	COSTADO ORIENTAL						
1	Caja de Inspeccion				1,00	1,00	UN
2	Caja de Inspeccion				1,00	1,00	UN
				SUBTOTAL		2,00	UN
				TOTAL		2,00	UN

OBSERVACIONES:

LOCALIZACIÓN PLANIMÉTRICA

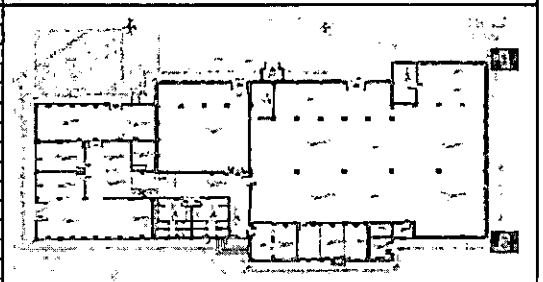

REGISTRO FOTOGRÁFICO

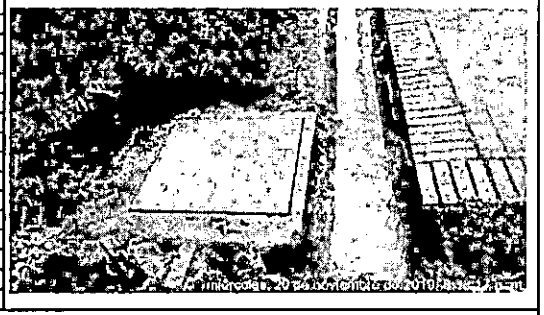

Alejandra Bolaños +
ARQ. ALEJANDRA BOLAÑOS
RESIDENTE CONTRATISTA

Arq. Jessica Lopera A
ARQ. JESSICA LOPERA
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. | BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS
SECRETARÍA GENERAL

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

PROYECTO: OBRAS SEDES ALCALDÍA

PRISMA | UNIVERSAL SEC S.A.S. — CONSORCIO PRUNI SEDES 04 — CONTRATISTA

ARQUITECTURA URBANA LTDA — INTERVENTORÍA


ACTA No.	4		PERIODO DEL ACTA	01/11/2019	A	30/11/2019	
OBJETO	REALIZAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE AJUSTE LAS DIFERENTES OBRAS E INTERVENCIONES ESPECIALIZADAS PARA LAS DIFERENTES SEDES DE LA SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C.						
CONTRATO DE OBRA No	731-2019	CONTRATISTA	CONSORCIO PRUNI SEDES 04		ENTIDAD CONTRATANTE	SECRETARIA GENERAL-ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA	
CONTRATO INTERVENTORÍA	730 DE 2019	INTERVENTORÍA	ARQUITECTURA URBANA LTDA		FRENTE:	IMPRENTA DISTRITAL	

CAPITULO	1.7.0	OBRAS CIVILES	ITEM	1.7.0.14	Caja de Inspección Hmax= 0,80m 80x80	UNIDAD	UN


ITEM	LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	TOTAL	UNIDAD
	EXTERIOR COSTADO SUR						
1	Caja de Inspección				1,00	1,00	UN
2	Caja de Inspección				1,00	1,00	UN
3	Caja de Inspección				1,00	1,00	UN
				SUBTOTAL		3,00	UN
				TOTAL		3,00	UN

OBSERVACIONES:

LOCALIZACIÓN PLANIMÉTRICA

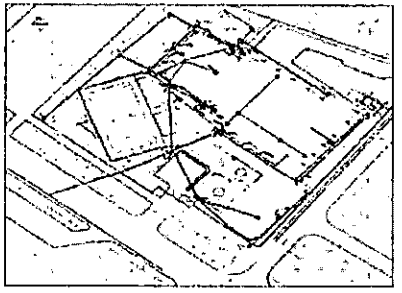


REGISTRO FOTOGRÁFICO

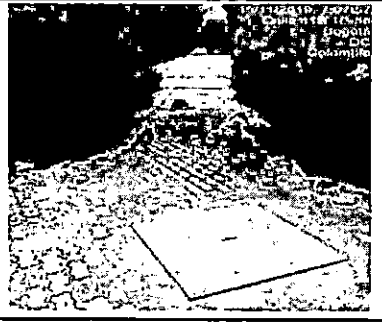

Alejandra Bolaños T
ARQ. ALEJANDRA BOLAÑOS
RESIDENTE CONTRATISTA

Arq. Jessica Lopera A
ARQ. JESSICA LOPERA
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

PLANO DETALLE

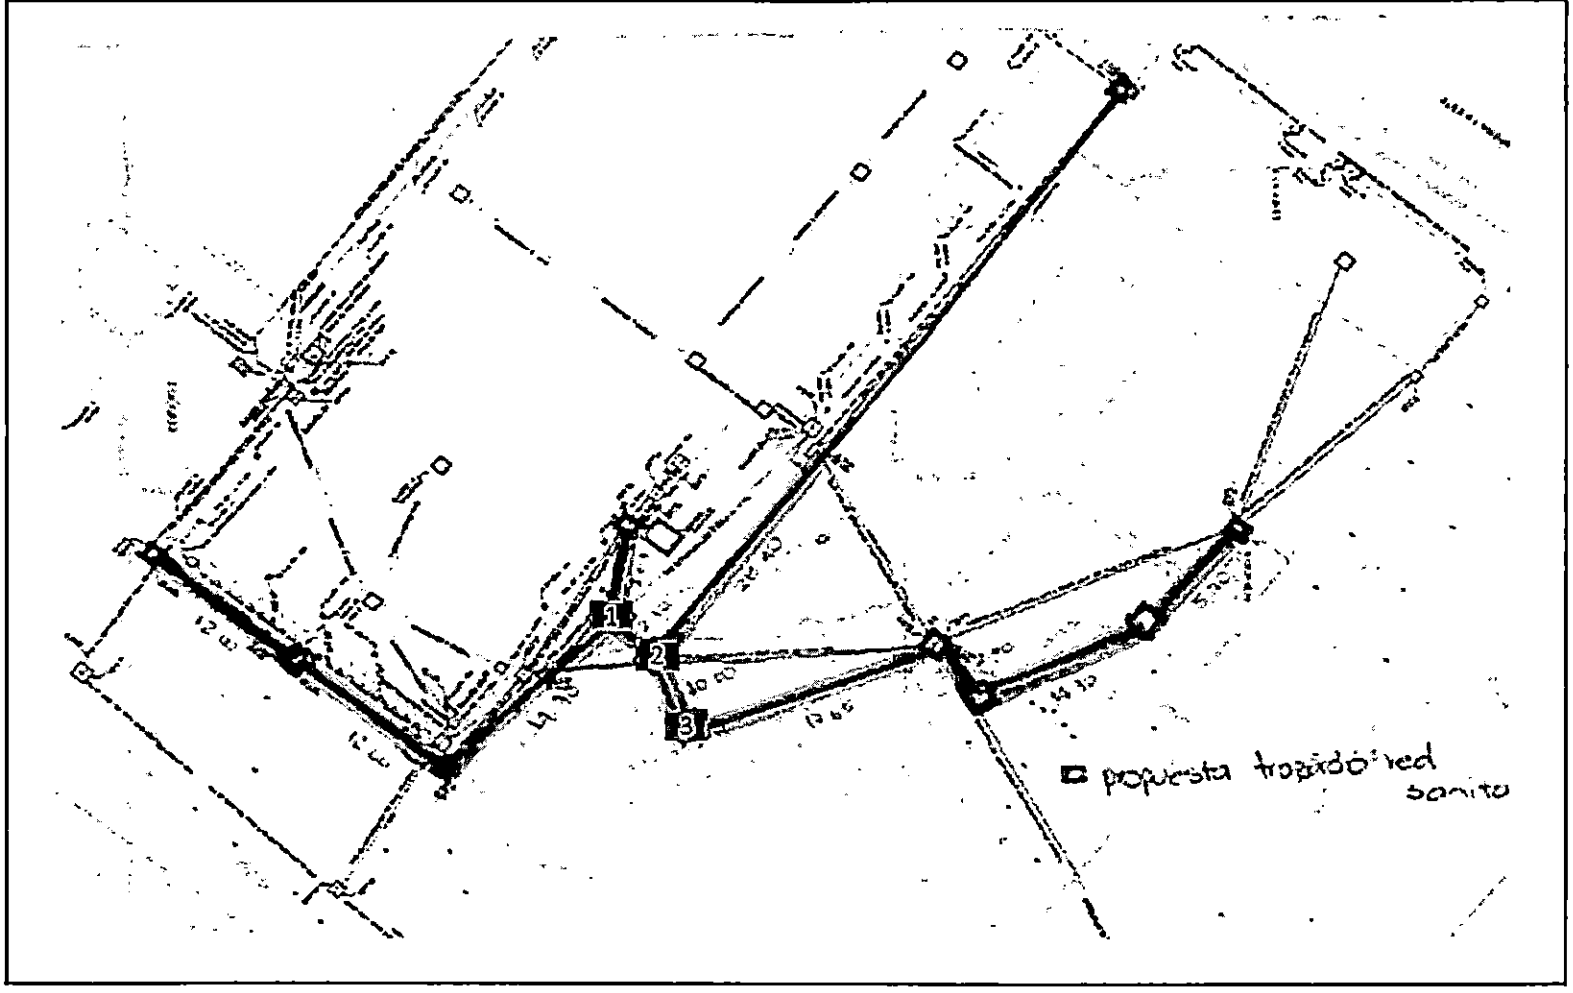

Ing
Inten.

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. | BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS
SECRETARÍA GENERAL

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

PROYECTO: OBRAS SEDES ALCALDÍA


PRISMA | UNIVERSAL SEC S.A.S. — CONSORCIO PRUNI SEDES 04 — CONTRATISTA
ARQUITECTURA URBANA LTDA — INTERVENTORÍA

ACTA No.	4		PERIODO DEL ACTA	01/11/2019	A	30/11/2019	
OBJETO	REALIZAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE AJUSTE LAS DIFERENTES OBRAS E INTERVENCIONES ESPECIALIZADAS PARA LAS DIFERENTES SEDES DE LA SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C.						
CONTRATO DE OBRA No	731-2019	CONTRATISTA	CONSORCIO PRUNI SEDES 04	ENTIDAD CONTRATANTE	SECRETARIA GENERAL-ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA		
CONTRATO INTERVENTORÍA	730 DE 2019	INTERVENTORÍA	ARQUITECTURA URBANA LTDA	FRENTE:	IMPRENTA DISTRITAL		


CAPITULO	1.7.0	OBRAS CIVILES	ITEM	1.7.0.15	Regatas en muro	UNIDAD	ML

ITEM	LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES LARGO	DIMENSIONES ANCHO	DIMENSIONES ALTO	CANTIDAD	TOTAL	UNIDAD
	FACHADA COSTADO SUR						
1	FACHADA SUR (Muro .40 ancho)			1,50	1,00	1,50	ML
2	FACHADA SUR (Muro .40 ancho)			1,50	1,00	1,50	ML
3	FACHADA SUR (Muro .40 ancho)			1,30	1,00	1,30	ML
4	FACHADA SUR (Muro .40 ancho)			1,30	1,00	1,30	ML
5	PREPRENSA	11,50			1,00	11,50	ML
	BAÑO HOMBRES 1ER PISO						
6	ORINALES			1,35	3,00	4,05	ML
7	SANITARIOS			3,75	2,00	7,50	ML
8	VENTILACIÓN			4,30	1,00	4,30	ML
9	LAVAMANOS			2,80	2,00	5,60	ML
10	DUCHAS			1,50	4,00	6,00	ML
OBSERVACIONES:			SUBTOTAL			44,55	ML
			TOTAL			44,55	ML

LOCALIZACIÓN PLANIMÉTRICA

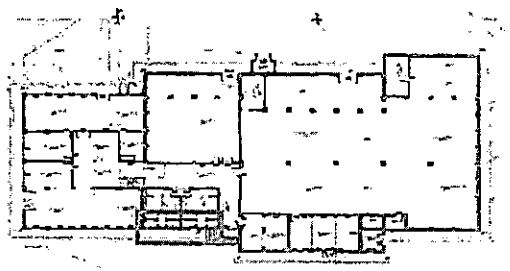


REGISTRO FOTOGRÁFICO

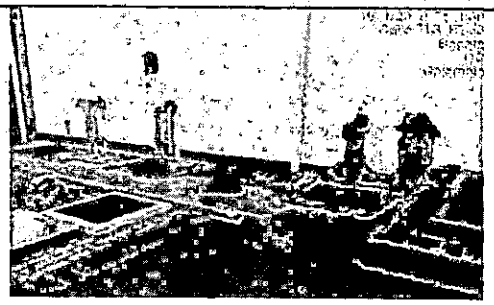

ARQ. ALEJANDRA BOLAÑOS
RESIDENTE CONTRATISTA

ARQ. JESSICA LOPERA
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

PLANO DETALLE

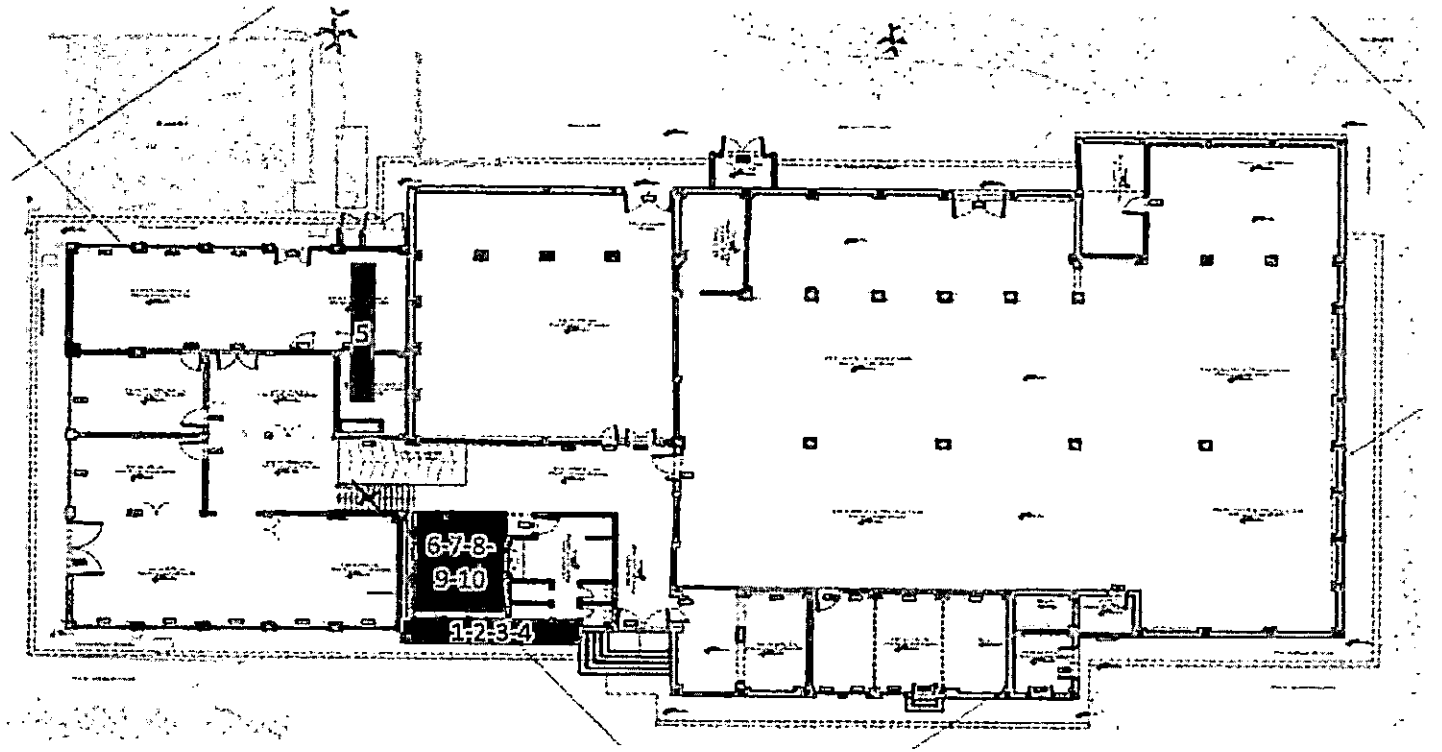

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. | BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS
SECRETARÍA GENERAL

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

PROYECTO: OBRAS SEDES ALCALDÍA

PRISMA — UNIVERSAL SEC S.A.S. — CONSORCIO PRUNI SEDES 04 — CONTRATISTA
ARQUITECTURA URBANA LTDA. — INTERVENTORÍA


ACTA No.	4	PERIODO DEL ACTA	01/11/2019	A	30/11/2019		
OBJETO	REALIZAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE AJUSTE LAS DIFERENTES OBRAS E INTERVENCIONES ESPECIALIZADAS PARA LAS DIFERENTES SEDES DE LA SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C.						
CONTRATO DE OBRA No	731-2019	CONTRATISTA	CONSORCIO PRUNI SEDES 04		ENTIDAD CONTRATANTE	SECRETARIA GENERAL-ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA	
CONTRATO INTERVENTORÍA	730 DE 2019	INTERVENTORÍA	ARQUITECTURA URBANA LTDA		FRENTE:	IMPRENTA DISTRITAL	

CAPITULO	1.7.0	OBRAS CIVILES	ITEM	1.7.0.18	Concreto de limpieza	UNIDAD	M3


ITEM	LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	TOTAL	UNIDAD
	COSTADO SUR						
1	Caja de Inspección	0,80	0,80	0,05	1,00	0,03	M3
2	Caja de Inspección	1,15	1,15	0,05	1,00	0,07	M3
3	Caja de Inspección	0,80	0,80	0,05	1,00	0,03	M3
4	Caja de Inspección	1,00	1,00	0,05	1,00	0,05	M3
				SUBTOTAL		0,18	M3
				TOTAL		0,18	M3

OBSERVACIONES:

LOCALIZACIÓN PLANIMÉTRICA

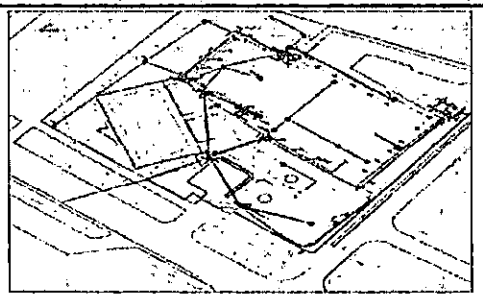


REGISTRO FOTOGRÁFICO

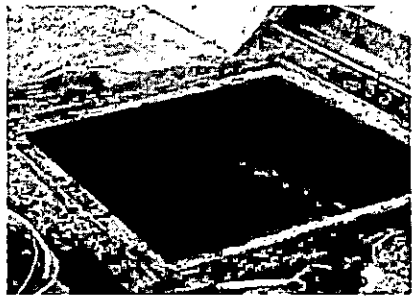

Alejandra Bolaños +
ARQ. ALEJANDRA BOLAÑOS
RESIDENTE CONTRATISTA

Arq. Jessica Lopera Arango
ARQ. JESSICA LOPERA
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

PLANO DETALLE

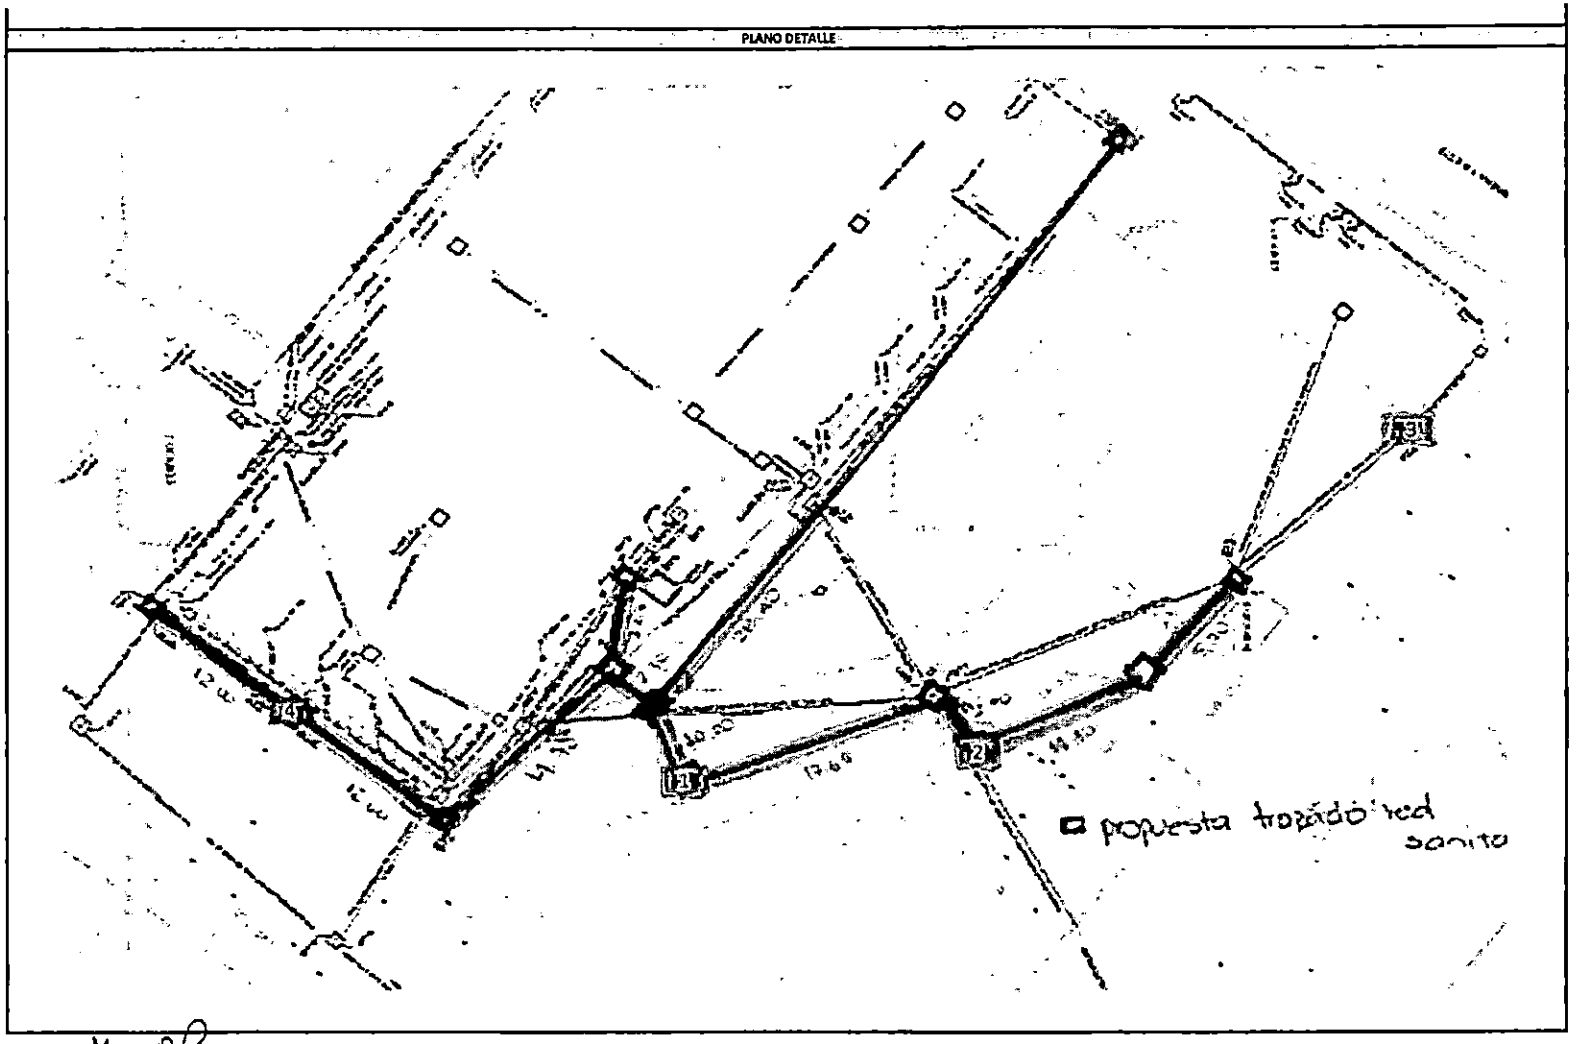

Anexo B

Ola Inten.

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA GENERAL

BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

PROYECTO: OBRAS SEDES ALCALDÍA


PRISMA — UNIVERSAL SEC S.A.S. — CONSORCIO PRUNI SEDES 04 — CONTRATISTA

ARQUITECTURA URBANA LTDA. — INTERVENTORÍA

ACTA No.	4		PERIODO DEL ACTA	01/11/2019	A	30/11/2019	
OBJETO	REALIZAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE AJUSTE LAS DIFERENTES OBRAS E INTERVENCIONES ESPECIALIZADAS PARA LAS DIFERENTES SEDES DE LA SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C.						
CONTRATO DE OBRA No	731-2019	CONTRATISTA	CONSORCIO PRUNI SEDES 04		ENTIDAD CONTRATANTE	SECRETARIA GENERAL-ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA	
CONTRATO INTERVENTORÍA	730 DE 2019	INTERVENTORÍA	ARQUITECTURA URBANA LTDA		FRENTE:	IMPRENTA DISTRITAL	

CAPITULO	1.7.0	OBRAS CIVILES	ITEM	1.7.0.20	Reposición ladrillo cemento	UNIDAD	M2

ITEM	LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	TOTAL	UNIDAD
	COSTADO SUR						
1	Zona exterior	10,00	0,62		1,00	6,20	M2
2	Zona exterior	6,50	1,05		1,00	6,83	M2
7	Red Electric	19,20	1,40		1,00	26,88	M2
8	Red electrica	5,50	0,70		1,00	3,85	M2

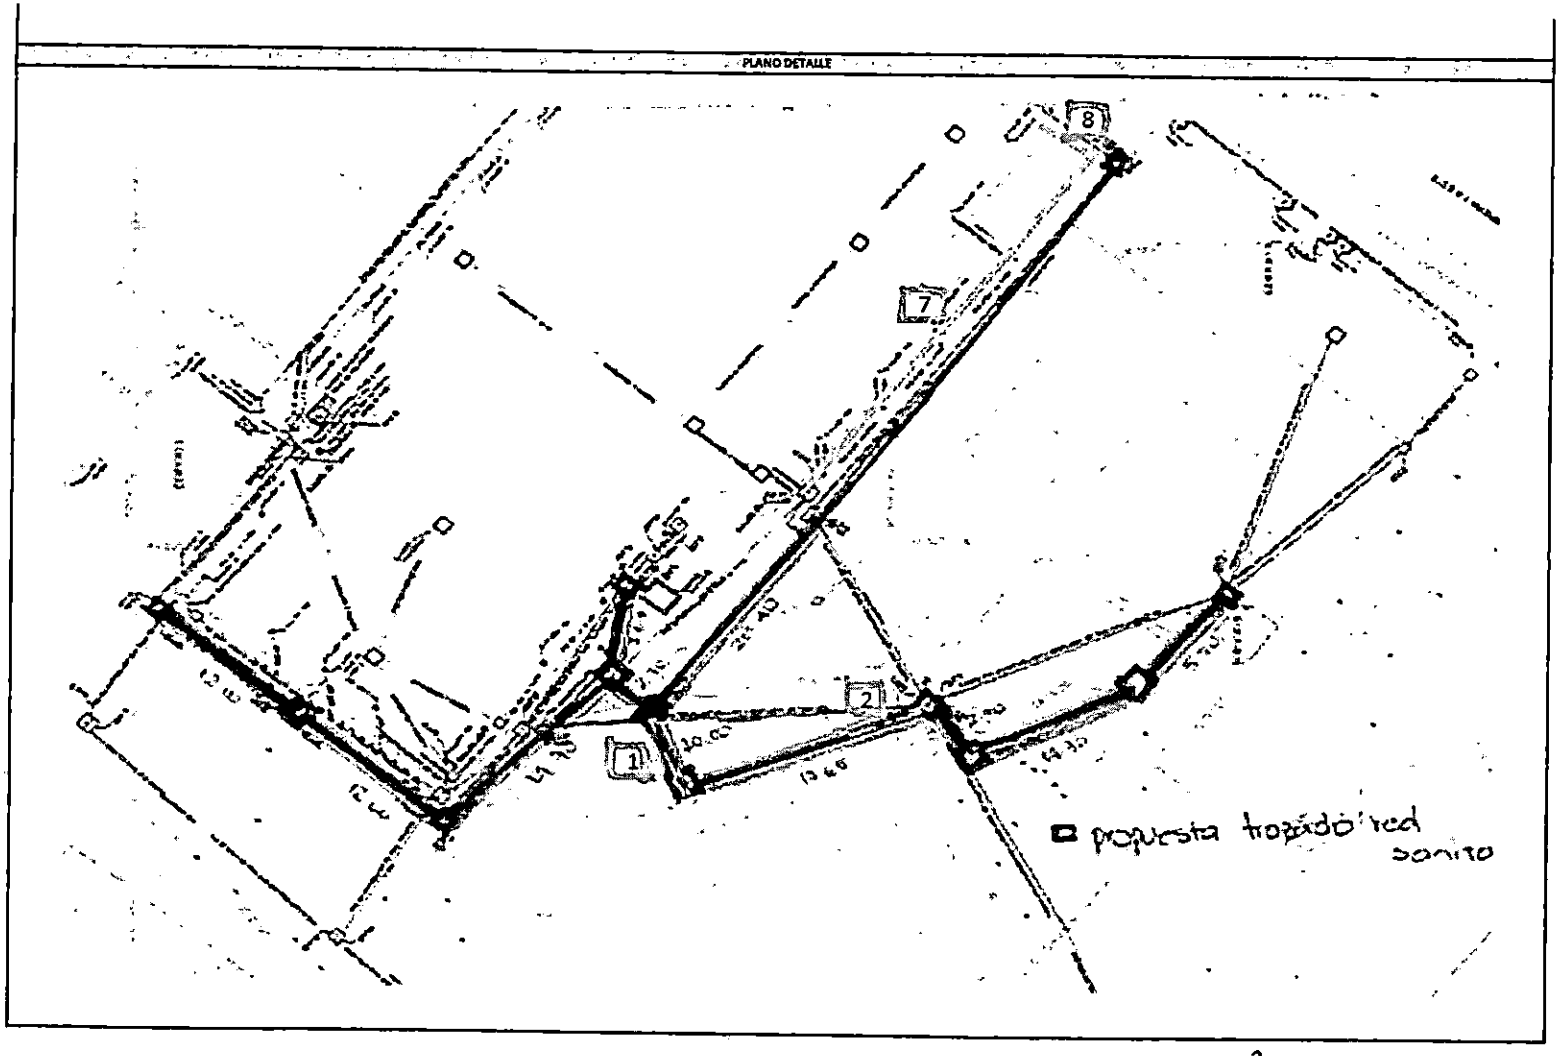

Ma
Interv.

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA GENERAL | BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

PROYECTO: OBRAS SEDES ALCALDÍA

PRISMA — UNIVERSAL SEC S.A.S. — CONSORCIO PRUNI SEDES 04 — CONTRATISTA


ARQUITECTURA URBANA LTDA. — INTERVENTORÍA

ACTA No.	4		PERIODO DEL ACTA	01/11/2019	A	30/11/2019	
OBJETO	REALIZAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE AJUSTE LAS DIFERENTES OBRAS E INTERVENCIONES ESPECIALIZADAS PARA LAS DIFERENTES SEDES DE LA SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C.						
CONTRATO DE OBRA No	731-2019	CONTRATISTA	CONSORCIO PRUNI SEDES 04		ENTIDAD CONTRATANTE	SECRETARIA GENERAL-ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA	
CONTRATO INTERVENTORÍA	730 DE 2019	INTERVENTORÍA	ARQUITECTURA URBANA LTDA		FRENTE:	IMPRENTA DISTRITAL	


CAPITULO	1.8.0	DESMONTE DE APARATOS	ITEM	1.8.0.1	Desmonte de aparatos sanitarios	UNIDAD	UN

ITEM	LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	TOTAL	UNIDAD
1	BAÑO MUJERES 1ER PISO						
	APARATOS SANITARIOS				2,00	2,00	UN
	LAVAMANOS				2,00	2,00	UN
2	BAÑO OFICINA SUBDIRECCION 2DO PISO						
	APARATOS SANITARIOS				1,00	1,00	UN
	LAVAMANOS				1,00	1,00	UN
OBSERVACIONES:				SUBTOTAL		6,00	UN
				TOTAL		6,00	UN

LOCALIZACIÓN PLANIMÉTRICA

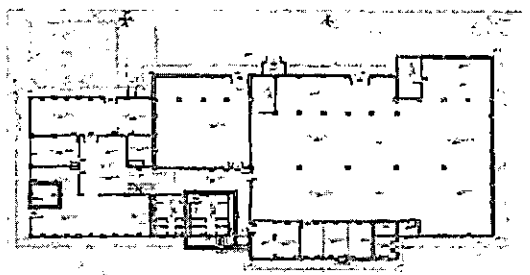

REGISTRO FOTOGRÁFICO

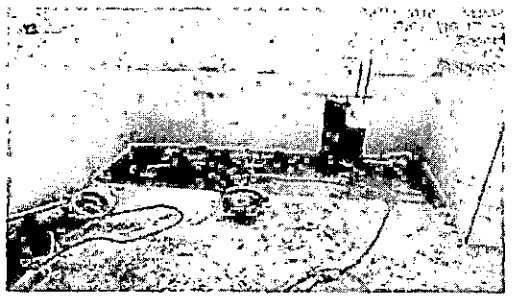


ARQ. ALEJANDRA BOLAÑOS
RESIDENTE CONTRATISTA


ARQ. JESSICA LOPERA
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

PLANO DETALLE

PRIMER PISO

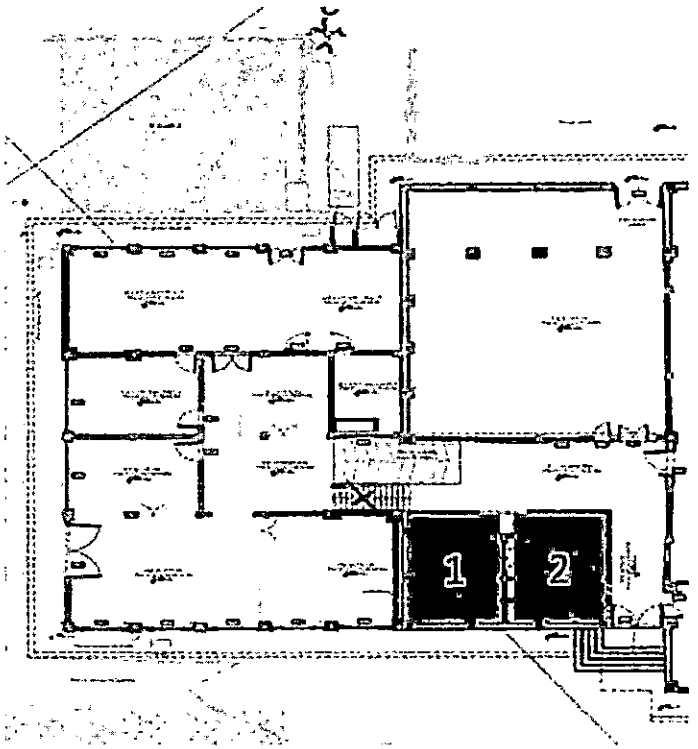

SEGUNDO PISO

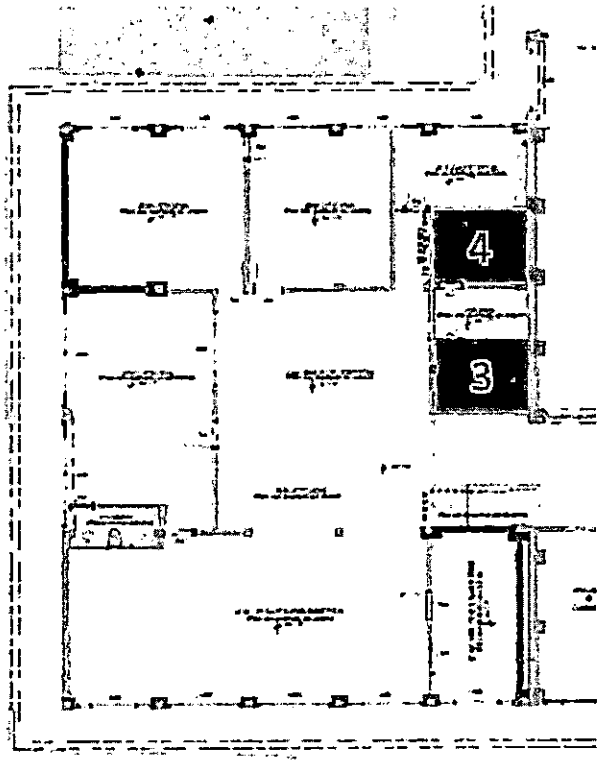

Alga

Ha
Interv.

121

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA GENERAL

BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

PROYECTO: OBRAS SEDES ALCALDÍA

PRISMA — UNIVERSAL SEC S.A.S.
CONSORCIO PRUNI SEDES 04 — CONTRATISTA

ARQUITECTURA URBANA LTDA. — INTERVENTORÍA

ACTA No.			PERIODO DEL ACTA	01/11/2019	A	30/11/2019	
OBJETO	REALIZAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE AJUSTE LAS DIFERENTES OBRAS E INTERVENCIONES ESPECIALIZADAS PARA LAS DIFERENTES SEDES DE LA SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C.						
CONTRATO DE OBRA No	731-2019	CONTRATISTA	CONSORCIO PRUNI SEDES 04		ENTIDAD CONTRATANTE	SECRETARIA GENERAL-ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA	
CONTRATO INTERVENTORÍA	730 DE 2019	INTERVENTORÍA	ARQUITECTURA URBANA LTDA		FRENTE:	IMPRENTA DISTRITAL	


CAPITULO	1.11.0	VARIOS	ITEM	1.11.0.1	Prueba de estanqueidad	UNIDAD	UN

ITEM	LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	TOTAL	UNIDAD
	BAÑO HOMBRES PRIMER PISO						
1	Bateria Sanitaria Hombres				1,00	1,00	UN

OBSERVACIONES:

SUBTOTAL	1,00	UN
TOTAL	1,00	UN

LOCALIZACIÓN PLANIMÉTRICA

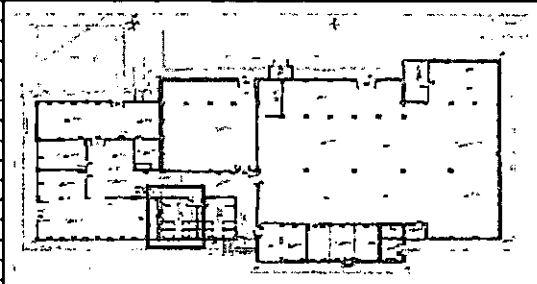

REGISTRO FOTOGRÁFICO



Alejandra Bolaños +
ARQ. ALEJANDRA BOLAÑOS
RESIDENTE CONTRATISTA

Arq. Jessica Lopera A
ARQ. JESSICA LOPERA
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. | BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS
SECRETARÍA GENERAL

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

PROYECTO: OBRAS SEDES ALCALDÍA


PRISMA UNIVERSAL SEC S.A.S. — CONSORCIO PRUNI SEDES 04 — CONTRATISTA
ARQUITECTURA URBANA LTDA — INTERVENTORÍA

ACTA No.	4		PERIODO DEL ACTA	01/11/2019	A	30/11/2019	
OBJETO	REALIZAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE AJUSTE LAS DIFERENTES OBRAS E INTERVENCIONES ESPECIALIZADAS PARA LAS DIFERENTES SEDES DE LA SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C.						
CONTRATO DE OBRA No	731-2019	CONTRATISTA	CONSORCIO PRUNI SEDES 04		ENTIDAD CONTRATANTE	SECRETARIA GENERAL-ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA	
CONTRATO INTERVENTORÍA	730 DE 2019	INTERVENTORÍA	ARQUITECTURA URBANA LTDA		FRENTE:	IMPRENTA DISTRITAL	

CAPITULO	1.11.0	VARIOS	ITEM	1.11.0.5	Desmonte y monte aparatos eléctricos	UNIDAD	UN

ITEM	LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	TOTAL	UNIDAD
1	BAÑO HOMBRES 1ER PISO						
	SECAMANOS				0,50	0,50	UN
	DISPENSADOR DE JABON Y PAPEL				0,50	1,00	UN
2	BAÑO MUJERES 1ER PISO						
	SECAMANOS				0,50	0,50	UN
	DISPENSADOR DE JABON Y PAPEL				0,50	1,00	UN
3	BAÑO HOMBRES 2DO PISO						
	SECAMANOS				0,50	0,50	UN
	DISPENSADOR DE JABON Y PAPEL				0,50	1,00	UN
4	BAÑO MUJERES 2DO PISO						
	SECAMANOS				0,50	0,50	UN
	DISPENSADOR DE JABON Y PAPEL				0,50	1,00	UN
OBSERVACIONES:				SUBTOTAL		6,00	UN
				TOTAL		6,00	UN

LOCALIZACIÓN PLANIMÉTRICA

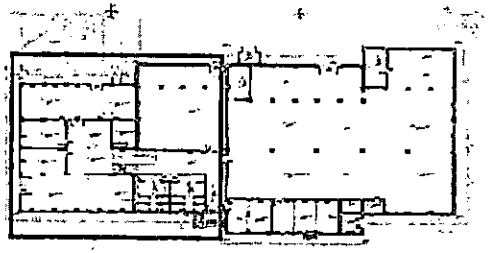

REGISTRO FOTOGRÁFICO




Alejandra Bolaños +
ARQ. ALEJANDRA BOLAÑOS
RESIDENTE CONTRATISTA


Arq. Jessica Lopera Arango
ARQ. JESSICA LOPERA
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

PLANO DETALLE

PRIMER PISO

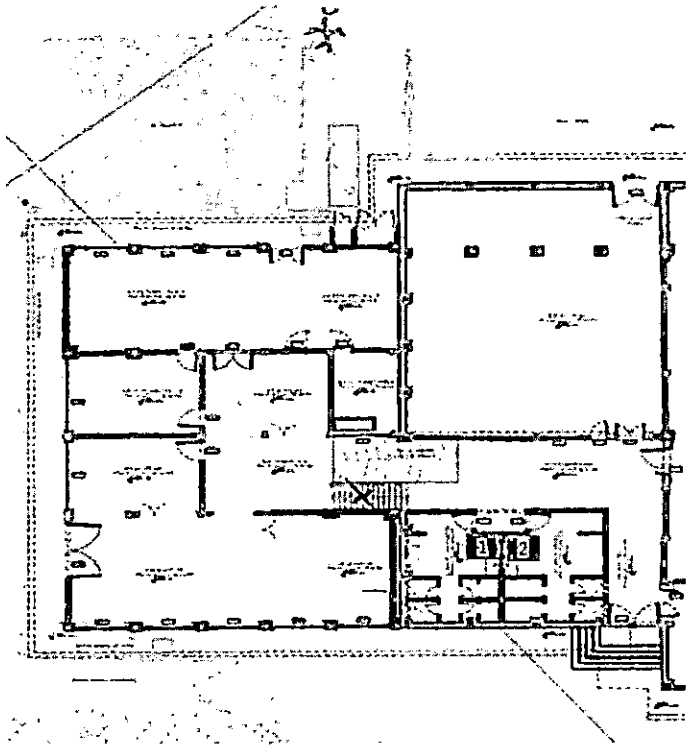

SEGUNDO PISO

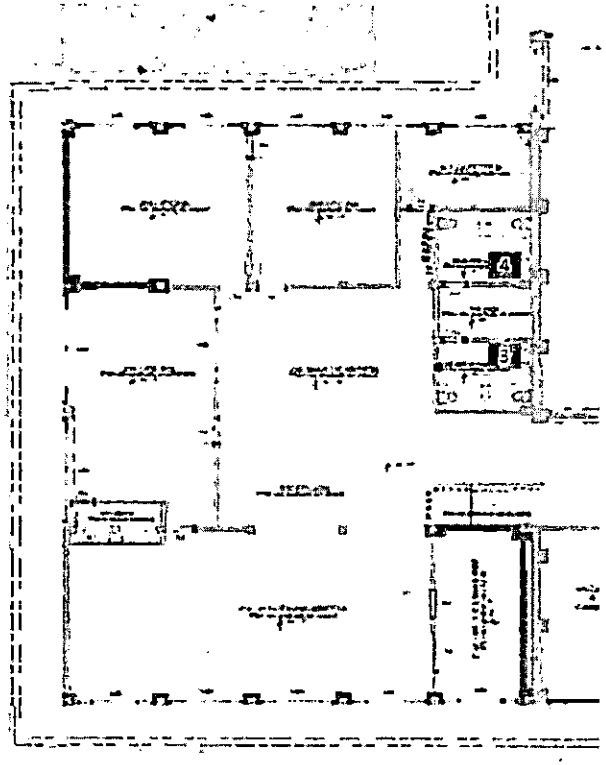

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA GENERAL | BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

PROYECTO: OBRAS SEDES ALCALDÍA

PRISMA — UNIVERSAL SEC S.A.S. — CONSORCIO PRUNI SEDES 04 — CONTRATISTA

ARQUITECTURA URBANA LTDA — INTERVENTORÍA


ACTA No.	4		PERIODO DEL ACTA	01/11/2019	A	30/11/2019	
OBJETO	REALIZAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE AJUSTE LAS DIFERENTES OBRAS E INTERVENCIONES ESPECIALIZADAS PARA LAS DIFERENTES SEDES DE LA SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C.						
CONTRATO DE OBRA No	731-2019	CONTRATISTA	CONSORCIO PRUNI SEDES 04		ENTIDAD CONTRATANTE	SECRETARIA GENERAL-ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA	
CONTRATO INTERVENTORÍA	730 DE 2019	INTERVENTORÍA	ARQUITECTURA URBANA LTDA		FRENTE:	IMPRENTA DISTRITAL	

CAPITULO	2.1.0	PRELIMINARES	ITEM	2.1.0.2	Localización y replanteo	UNIDAD	M2


ITEM	LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	TOTAL	UNIDAD
1	BAÑO HOMBRES 2DO PISO	2,45	3,07		1,00	7,52	M2
2	BAÑO MUJERES 2DO PISO	2,58	3,07		1,00	7,92	M2
3	DATACENTER	6,30	3,20		1,00	20,16	M2
				SUBTOTAL		35,60	M2
				TOTAL		35,60	M2

OBSERVACIONES:

LOCALIZACIÓN PLANIMÉTRICA

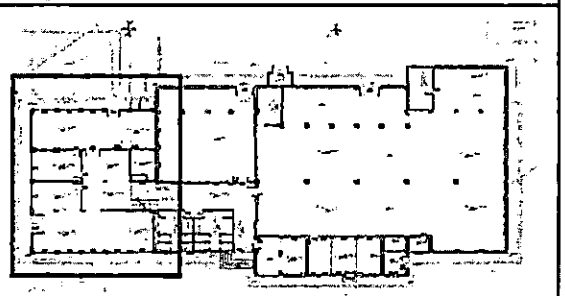


REGISTRO FOTOGRÁFICO

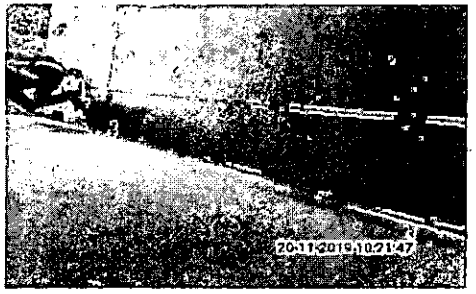

Alejandra Bolaños +
ARQ. ALEJANDRA BOLAÑOS
RESIDENTE CONTRATISTA

Arq. Jessica Lopera Arango
ARQ. JESSICA LOPERA
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

PIANO DETTAGLIO

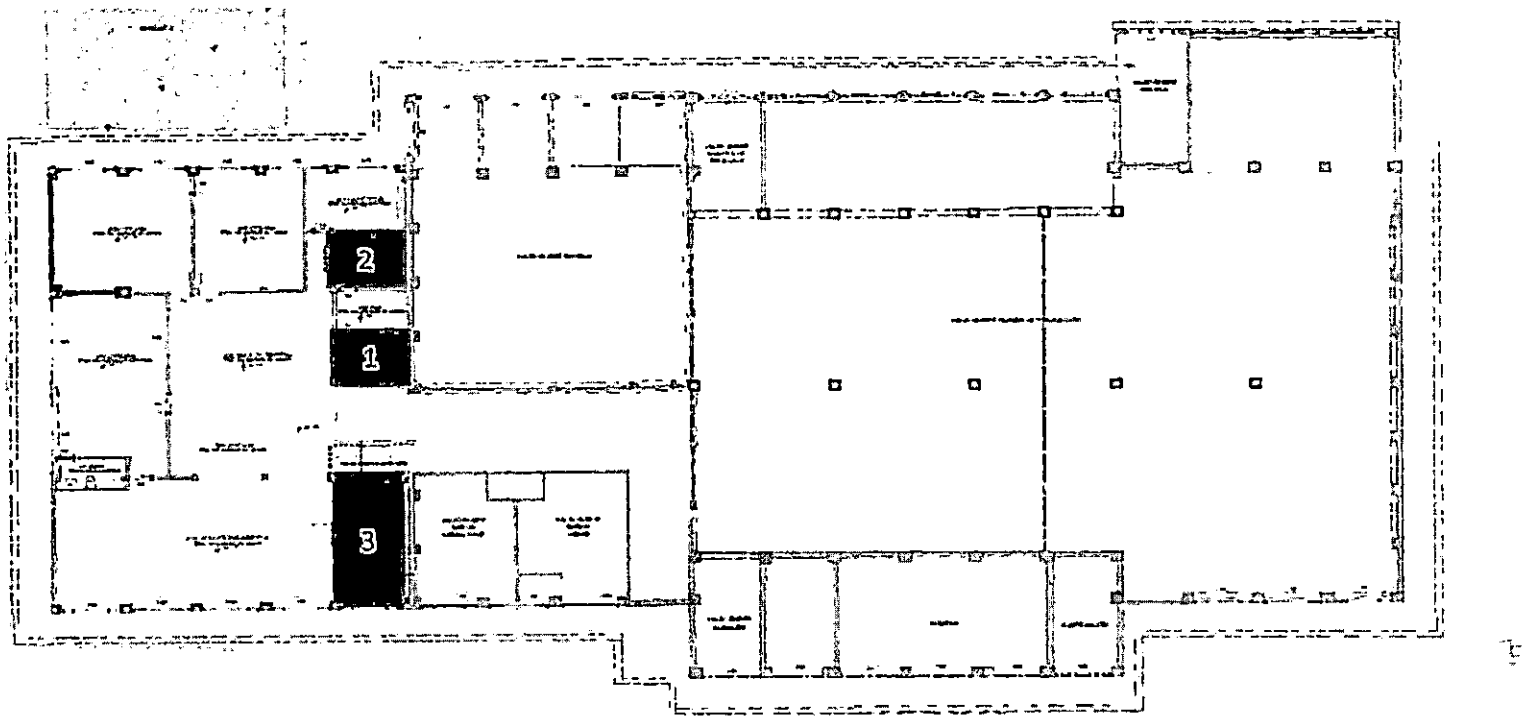

Vedi PG

Vedi Interv.

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA GENERAL

BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

PROYECTO: OBRAS SEDES ALCALDÍA

PRISMA — UNIVERSAL SEC S.A.S. — CONSORCIO PRUNI SEDES 04 — CONTRATISTA

ARQUITECTURA URBANA LTDA. — INTERVENTORÍA


ACTA No.	4		PERIODO DEL ACTA	01/11/2019	A	30/11/2019
OBJETO	REALIZAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE AJUSTE LAS DIFERENTES OBRAS E INTERVENCIONES ESPECIALIZADAS PARA LAS DIFERENTES SEDES DE LA SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C.					
CONTRATO DE OBRA No	731-2019	CONTRATISTA	CONSORCIO PRUNI SEDES 04	ENTIDAD CONTRATANTE		SECRETARIA GENERAL-ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA
CONTRATO INTERVENTORÍA	730 DE 2019	INTERVENTORÍA	ARQUITECTURA URBANA LTDA	FRENTE:		IMPRENTA DISTRITAL

CAPITULO	2.1.0	PRELIMINARES	ITEM	2.1.0.3	BAÑO MOVIL	UNIDAD	MES


ITEM	LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	TOTAL	UNIDAD
1	Baño movil (Instalado 17 de Julio) Mes Noviembre				1,00	1,00	MES
2	Baño movil (Instalado 02 de Septiembre) Mes Noviembre				1,00	1,00	MES
				SUBTOTAL		2,00	MES
				TOTAL		2,00	MES

OBSERVACIONES: INGRESO A OBRA DE BAÑO PORTATIL 17 DE JULIO DE 2019

LOCALIZACION PLANIMETRICA

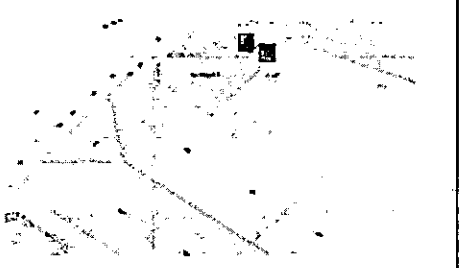

REGISTRO FOTOGRAFICO

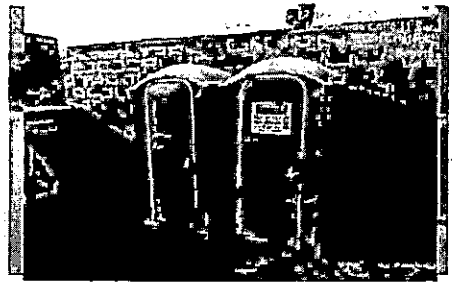

Alejandra Bolaños

ARQ. ALEJANDRA BOLAÑOS
RESIDENTE CONTRATISTA

Arq. Jessica Lopera Arango

ARQ. JESSICA LOPERA
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. | BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS
SECRETARÍA GENERAL

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

PROYECTO: OBRAS SEDES ALCALDÍA

PRISMA — UNIVERSAL SEC S.A.S. — CONSORCIO PRUNI SEDES 04 — CONTRATISTA

ARQUITECTURA URBANA LTDA. — INTERVENTORÍA


ACTA No.	4		PERIODO DEL ACTA	01/11/2019	A	30/11/2019	
OBJETO	REALIZAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE AJUSTE LAS DIFERENTES OBRAS E INTERVENCIONES ESPECIALIZADAS PARA LAS DIFERENTES SEDES DE LA SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C.						
CONTRATO DE OBRA No	731-2019	CONTRATISTA	CONSORCIO PRUNI SEDES 04		ENTIDAD CONTRATANTE	SECRETARIA GENERAL-ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA	
CONTRATO INTERVENTORÍA	730 DE 2019	INTERVENTORÍA	ARQUITECTURA URBANA LTDA		FRENTE:	IMPRENTA DISTRITAL	

CAPITULO	2.2.0	CIMENTACIÓN	ITEM	2.2.0.1	Demoler piso y contrapiso	UNIDAD	M2


ITEM	LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	TOTAL	UNIDAD
1	PRODUCCIÓN						
	ZAPATA EJES Q-11	2,32	1,96		1,00	4,55	M2
2	DATACENTER (PLACA DE ENTREPISO 2DO PISO)	6,30	0,40		1,00	2,52	M2
3	BODEGA ENTRADA	1,00	1,00		1,00	1,00	M2
4	CUARTO ELÉCTRICO						
	Caja de inspección eléctrica	1,00	0,80		1,00	0,80	M2
5	PLACA PROTECCIÓN COMPRESOR	1,00	3,20		1,00	3,20	M2
6	COSTADO OCCIDENTAL						
	Caja de inspección red sanitaria	1,00	0,70		1,00	0,70	M2
	SUBTOTAL					12,77	M2
	TOTAL					12,77	M2

OBSERVACIONES:

LOCALIZACIÓN PLANIMÉTRICA

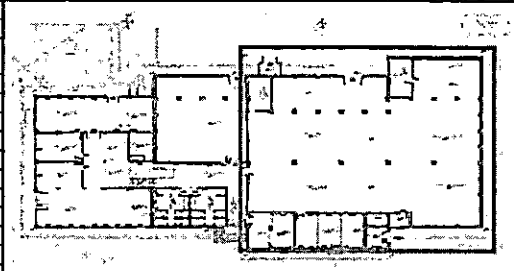

REGISTRO FOTOGRÁFICO

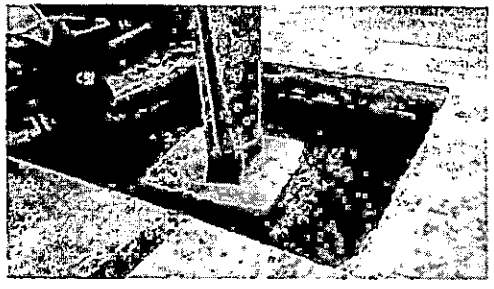


Alejandra Bolaños +
ARQ. ALEJANDRA BOLAÑOS
RESIDENTE CONTRATISTA


Arq. Jessica Lopera A.
ARQ. JESSICA LOPERA
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

PLANO DETALLE

EDIFICIO

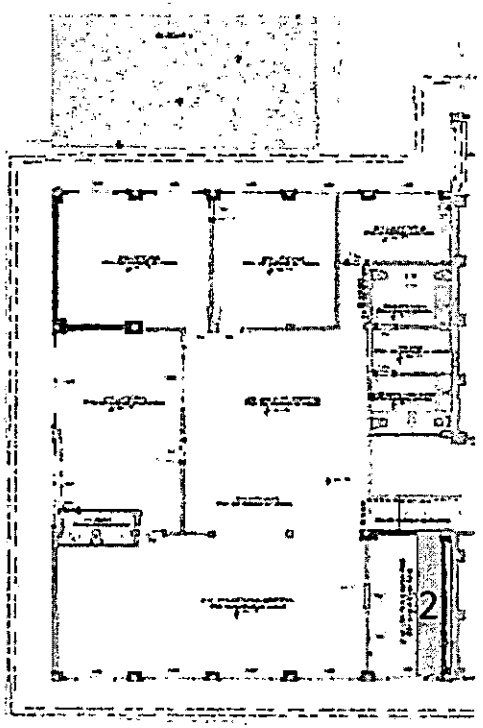

PRODUCCIÓN

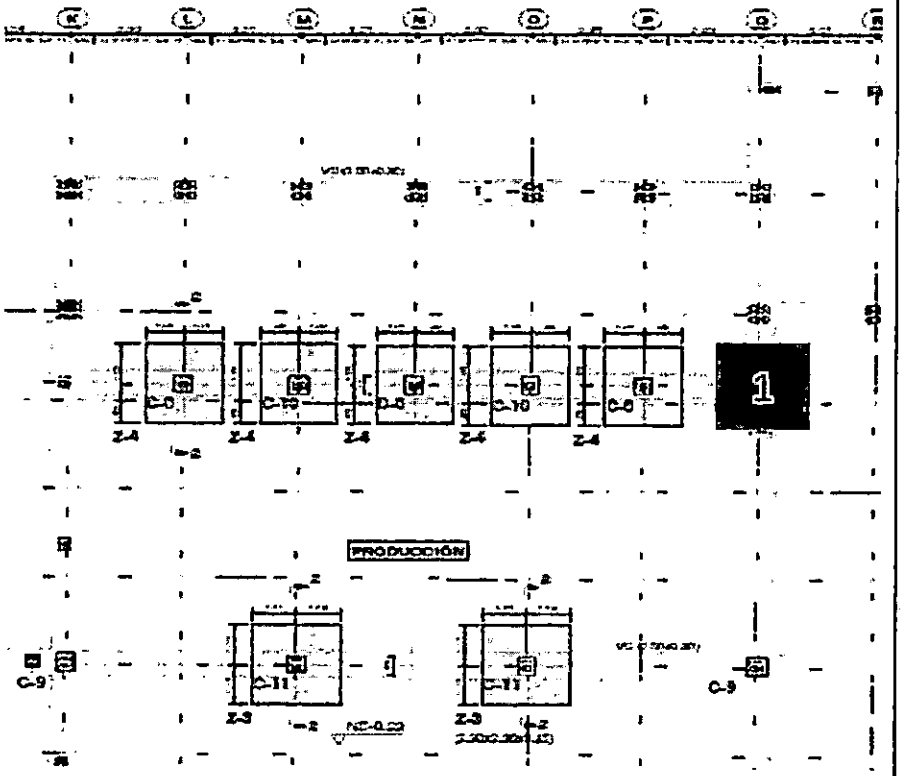

Alegra B

Jessica Lopera A
Ing Interno.

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA GENERAL | BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

PROYECTO: OBRAS SEDES ALCALDÍA

PRISMA — UNIVERSAL SEC S.A.S. — CONSORCIO PRUNI SEDES 04 — CONTRATISTA

ARQUITECTURA URBANA LTDA. — INTERVENTORÍA


ACTA No.	4		PERIODO DEL ACTA	01/11/2019	A	30/11/2019	
OBJETO	REALIZAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE AJUSTE LAS DIFERENTES OBRAS E INTERVENCIONES ESPECIALIZADAS PARA LAS DIFERENTES SEDES DE LA SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C.						
CONTRATO DE OBRA No	731-2019	CONTRATISTA	CONSORCIO PRUNI SEDES 04		ENTIDAD CONTRATANTE	SECRETARIA GENERAL-ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTA	
CONTRATO INTERVENTORÍA	730 DE 2019	INTERVENTORÍA	ARQUITECTURA URBANA LTDA		FRENTE:	IMPRENTA DISTRITAL	

CAPITULO	2.2.0	CIMENTACIÓN	ITEM	2.2.0.2	Excavación manual para ciclópeos y zapata	UNIDAD	M3


ITEM	LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES LARGO	DIMENSIONES ANCHO	DIMENSIONES ALTO	CANTIDAD	TOTAL	UNIDAD
	ZONA PRODUCCIÓN						
1	ZAPATA (Z4) EJES O-11	2,32	1,96	0,65	1,00	2,96	M3
				SUBTOTAL		2,96	M3
				TOTAL		2,96	M3

OBSERVACIONES:

LOCALIZACIÓN PLANIMÉTRICA

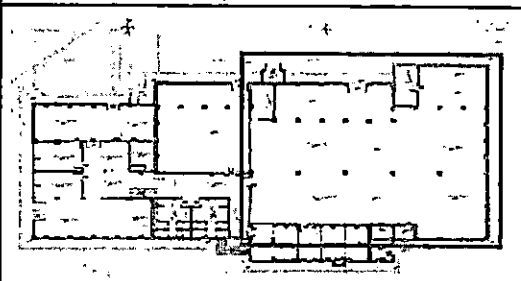


REGISTRO FOTOGRÁFICO

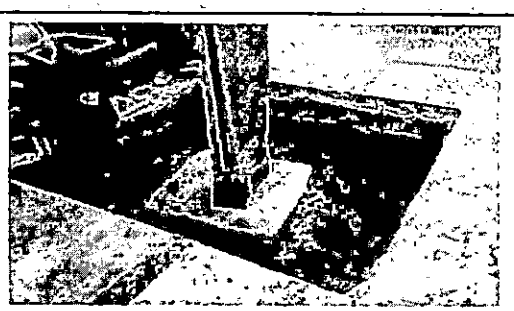

Alejandra Bolaños t
ARQ. ALEJANDRA BOLAÑOS
RESIDENTE CONTRATISTA

Arq. Jessica Lopera A.
ARQ. JESSICA LOPERA
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

PLANO DETALLE

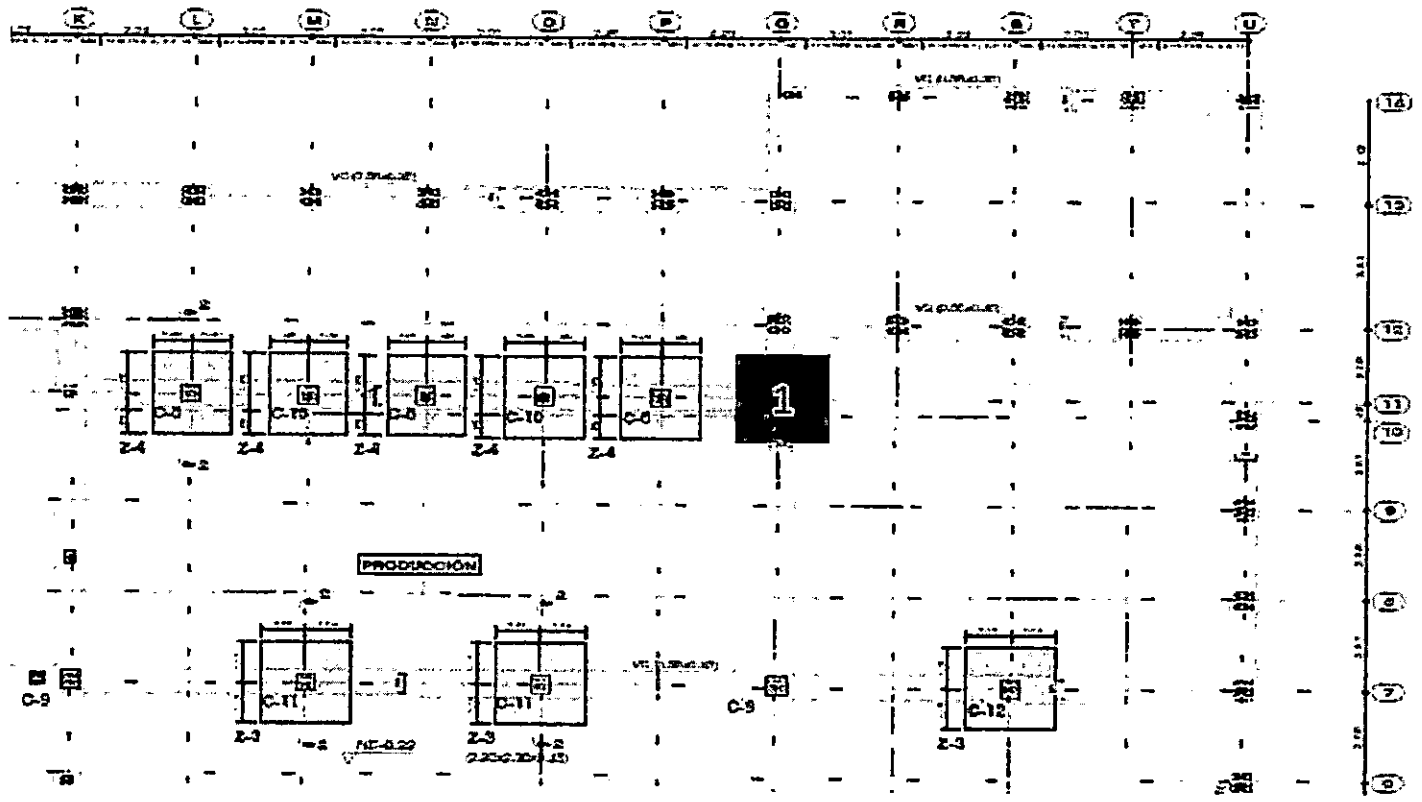

Intein.

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. | BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS
SECRETARIA GENERAL

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

PROYECTO: OBRAS SEDES ALCALDÍA

PRISMA — UNIVERSAL SEC S.A.S. — CONSORCIO PRUNI SEDES 04 — CONTRATISTA


ARQUITECTURA URBANA LTDA — INTERVENTORÍA

ACTA No.	4	PERIODO DEL ACTA	01/11/2019	A	30/11/2019	
OBJETO	REALIZAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE AJUSTE LAS DIFERENTES OBRAS E INTERVENCIONES ESPECIALIZADAS PARA LAS DIFERENTES SEDES DE LA SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTA D.C.					
CONTRATO DE OBRA No	731-2019	CONTRATISTA	CONSORCIO PRUNI SEDES 04	ENTIDAD CONTRATANTE	SECRETARIA GENERAL-ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA	
CONTRATO INTERVENTORÍA	730 DE 2019	INTERVENTORÍA	ARQUITECTURA URBANA LTDA	FRENTE:	IMPRENTA DISTRITAL	

CAPITULO	2.3.0	COLUMNAS Y MUROS	ITEM	2.3.0.3	Suministro figurada y amarre de acero 60000 PSI 420 Mpa	UNIDAD	KG

ITEM	LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES FIGURA	DIMENSIONES LARGO (m)	DIMENSIONES PESO (kg/m)	CANTIDAD	TOTAL	UNIDAD
	Acero de refuerzo para reconstrucion placa de entrepiso y muro 2						
1	PLACA DE ENTREPISO (PARRILLA INF.)						
	Acero #3 recto		0,20	0,560	12,00	1,344	KG
	Acero #3 recto		2,80	0,560	3,00	4,704	KG
2	PLACA DE ENTREPISO (PARRILLA SUP.)						
	Acero #2 recto		0,20	0,250	12,00	0,600	KG
	Acero #2 recto		2,80	0,250	3,00	2,100	KG
3	COLUMNA C-1 EJES 1'-E						
	Acero #6 recto		1,40	2,24	8,00	25,032	KG
	Acero #6 recto		3,00	2,24	8,00	53,640	KG
	Acero #3 con .23m de escuadra (doble)		0,90	0,56	62,00	31,248	KG
	Acero #3 con .20m de escuadra		0,35	0,56	14,00	2,744	KG
4	COLUMNA C-1 EJES 5'-E						
	Acero #6 recto		1,40	2,24	8,00	25,032	KG
	Acero #6 recto		3,00	2,24	8,00	53,640	KG
	Acero #3 con .23m de escuadra (doble)		0,90	0,56	62,00	31,248	KG
	Acero #3 con .20m de escuadra		0,35	0,56	14,00	2,744	KG
5	MURO M-3 EJE 2' ENTRE EJES E-F						
	Acero #3 recto		1,45	0,560	24,00	19,488	KG
	Acero #3 recto		3,00	0,560	24,00	40,320	KG
	Acero #3 recto		1,35	0,560	24,00	18,144	KG
	Acero #3 con doble esc. L=0.15m		3,30	0,560	30,00	55,440	KG
	Acero #3 con doble gancho L=0.10m		0,45	0,560	90,00	22,680	KG
6	MURO M-4 EJE F ENTRE EJES 1'-2'						
	Acero #3 recto		1,45	0,560	56,00	45,472	KG
	Acero #3 recto		3,00	0,560	56,00	94,080	KG
	Acero #3 recto		1,35	0,560	56,00	42,336	KG
	Acero #3 con doble esc. L=0.15m		6,20	0,560	32,00	111,104	KG
	Acero #3 con doble gancho L=0.10m		0,45	0,560	210,00	52,920	KG
OBSERVACIONES:				SUBTOTAL		736,060	KG
				TOTAL		736,060	KG

LOCALIZACIÓN PLANIMÉTRICA

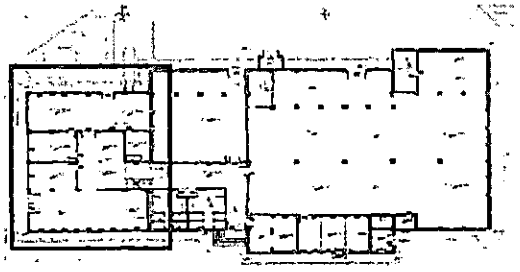


REGISTRO FOTOGRÁFICO



Alejandra Bolaños +
ARQ. ALEJANDRA BOLAÑOS
RESIDENTE CONTRATISTA

Arq. Jessica Lopera Arango
ARQ. JESSICA LOPERA
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

PLANO DETALLE

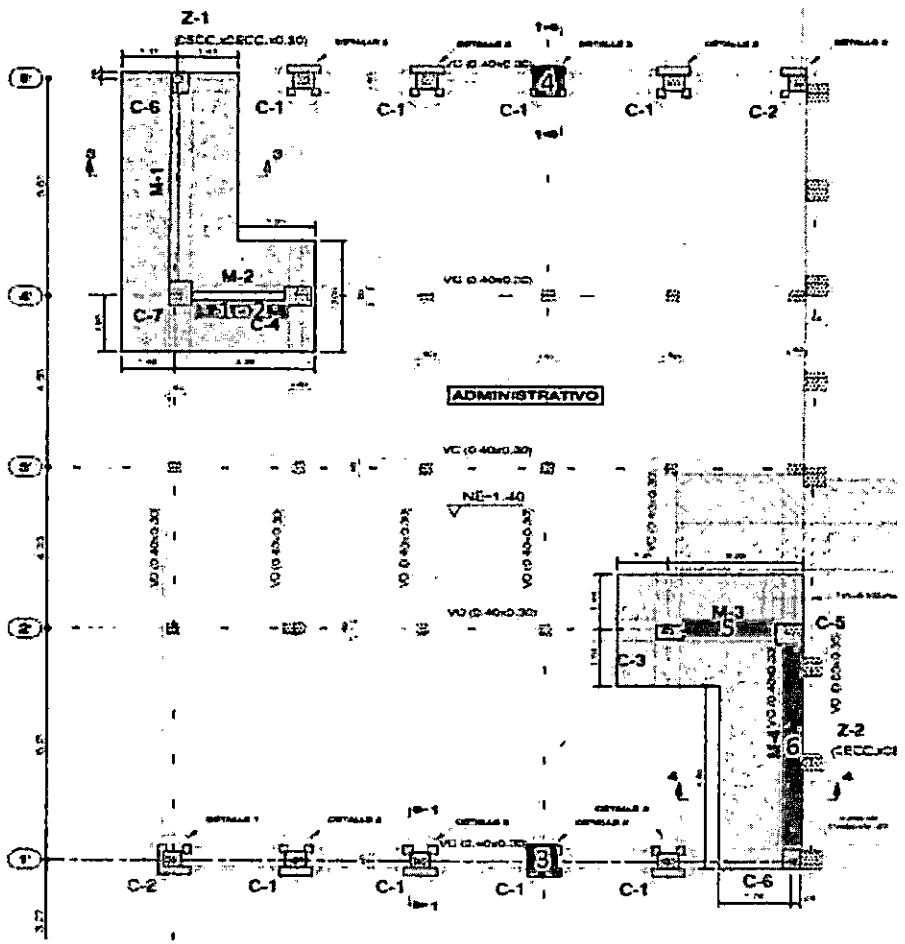

Vía Interv.

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. | BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS
SECRETARÍA GENERAL

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

PROYECTO: OBRAS SEDES ALCALDÍA


PRISMA — UNIVERSAL SEC S.A.S. — CONSORCIO PRUNI SEDES 04 — CONTRATISTA
ARQUITECTURA URBANA LTDA — INTERVENTORÍA

ACTA No.	4		PERIODO DEL ACTA	01/11/2019	A	30/11/2019
OBJETO	REALIZAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE AJUSTE LAS DIFERENTES OBRAS E INTERVENCIONES ESPECIALIZADAS PARA LAS DIFERENTES SEDES DE LA SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C.					
CONTRATO DE OBRA No	731-2019	CONTRATISTA	CONSORCIO PRUNI SEDES 04	ENTIDAD CONTRATANTE	SECRETARIA GENERAL-ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA	
CONTRATO INTERVENTORÍA	730 DE 2019	INTERVENTORÍA	ARQUITECTURA URBANA LTDA	FRENTE:	IMPRENTA DISTRITAL	


CAPITULO	2.3.0	COLUMNAS Y MUROS	ITEM	2.3.0.3	Suministro figurada y amarre de acero 60000 PSI 420 Mpa	UNIDAD	KG

ITEM	LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES FIGURA	LARGO (m)	PESO (kg/m)	CANTIDAD	TOTAL	UNIDAD
					VIENEN	736,060	KG
7	COLUMNA C-3 EJES 2'-E						
	Acero #6 con esc. L=0.30m		2,00	2,235	10,00	44,700	KG
	Acero #6 recto		3,00	2,235	10,00	67,050	KG
	Acero #6 recto		2,00	2,235	10,00	44,700	KG
	Acero #3 doble esc. L=0.25m		1,10	0,560	31,00	19,096	KG
	Acero #3 doble esc. L=0.25m		0,80	0,560	31,00	13,888	KG
	Acero #3 con esc. L=0.15m		0,28	0,560	16,00	2,509	KG
	Acero #3 con doble gancho L=0.10m		0,52	0,560	31,00	9,027	KG
8	COLUMNA C-5 EJES 2'-F						
	Acero #7 con esc. L=0.30		2,20	3,042	10,00	66,924	KG
	Acero #7 recto		3,00	3,042	10,00	91,260	KG
	Acero #7 recto		2,15	3,042	10,00	65,403	KG
	Acero #3 esc. L=0.35m		0,86	0,560	32,00	15,411	KG
	Acero #3 doble esc. L=0.30m		1,05	0,560	32,00	18,816	KG
	Acero #3 con doble gancho L=0.10m		0,70	0,560	32,00	12,544	KG
9	COLUMNA C-6 EJES 1'-F						
	Acero #7 con esc. L=0.30		2,00	3,042	7,00	42,588	KG
	Acero #7 recto		3,00	3,042	7,00	63,882	KG
	Acero #7 recto		2,15	3,042	7,00	45,782	KG
	Acero #3 doble esc. L=0.25m		0,83	0,560	31,00	14,409	KG
	Acero #3 con esc. L=0.15m		0,52	0,560	31,00	9,027	KG
	Acero #3 con doble gancho L=0.10m		0,60	0,560	31,00	10,416	KG
OBSERVACIONES:				SUBTOTAL		1.393,492	KG
				TOTAL		1.393,492	KG

LOCALIZACIÓN PLANIMÉTRICA

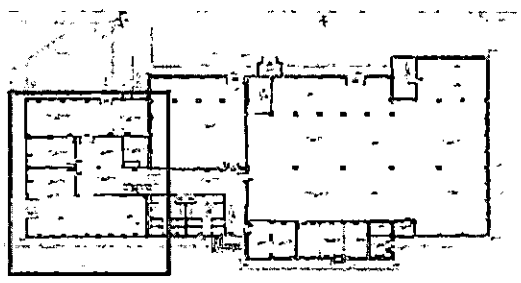


REGISTRO FOTOGRÁFICO

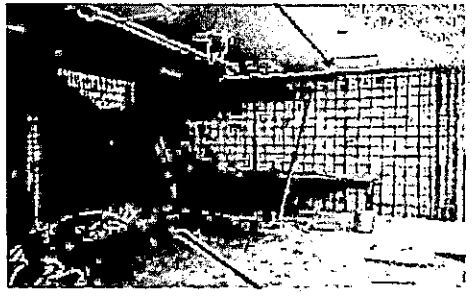

Alejandra Bolaños
ARQ. ALEJANDRA BOLAÑOS
RESIDENTE CONTRATISTA

Arq. Jessica Lopera Arango
ARQ. JESSICA LOPERA
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

PLANO DETALLE

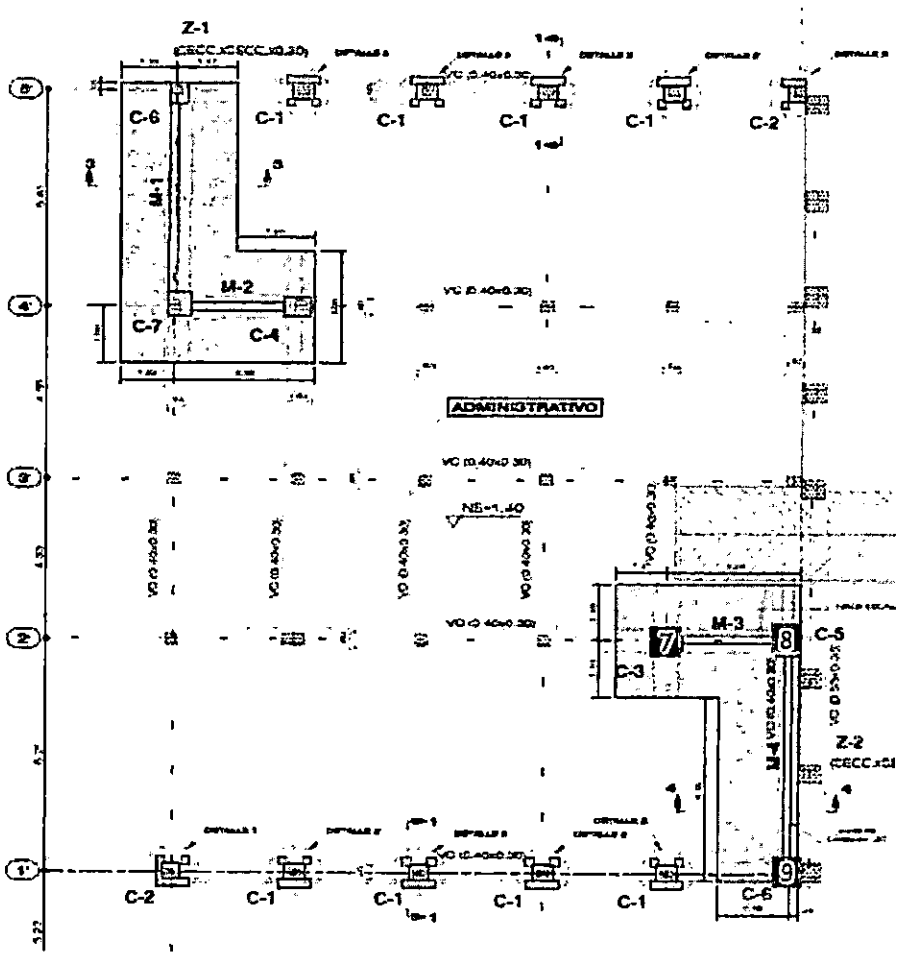

Mejor

Ja
Interv.

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA GENERAL | BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

PROYECTO: OBRAS SEDES ALCALDÍA

PRISMA — UNIVERSAL SEC S.A.S. — CONSORCIO PRUNI SEDES 04 — CONTRATISTA

ARQUITECTURA URBANA LTDA. — INTERVENTORÍA

ACTA No.	4	PERIODO DEL ACTA	01/11/2019	A	30/11/2019	
OBJETO	REALIZAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE AJUSTE LAS DIFERENTES OBRAS E INTERVENCIONES ESPECIALIZADAS PARA LAS DIFERENTES SEDES DE LA SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C.					
CONTRATO DE OBRA No	731-2019	CONTRATISTA	CONSORCIO PRUNI SEDES 04	ENTIDAD CONTRATANTE	SECRETARIA GENERAL-ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA	
CONTRATO INTERVENTORÍA	730 DE 2019	INTERVENTORÍA	ARQUITECTURA URBANA LTDA	FRENTE:	IMPRENTA DISTRITAL	

CAPITULO	2.5.0.	PERFORACIONES Y EPÓXICO	ITEM	2.5.0.1	Perforación y epóxico Ø3 L=0.15	UNIDAD	UN


ITEM	LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES LARGO	DIMENSIONES ANCHO	DIMENSIONES ALTO	CANTIDAD	TOTAL	UNIDAD
	PLANTA ELECTRICO (ARCHIVO)						
1	COLUMNETAS PLANTA ELÉCTRICA				4,00	4,00	UN
2	COLUMNETAS PLANTA ELÉCTRICA				4,00	4,00	UN
3	COLUMNETAS PLANTA ELÉCTRICA				4,00	4,00	UN
4	COLUMNETAS PLANTA ELÉCTRICA				4,00	4,00	UN
5	COLUMNETAS PLANTA ELÉCTRICA				4,00	4,00	UN
6	COLUMNETAS PLANTA ELÉCTRICA				4,00	4,00	UN
7	COLUMNETAS PLANTA ELÉCTRICA				4,00	4,00	UN
8	COLUMNETAS PLANTA ELÉCTRICA				4,00	4,00	UN
9	COLUMNETAS PLANTA ELÉCTRICA				4,00	4,00	UN
10	COLUMNETAS PUERTA PLANTA ELÉCTRICA				4,00	4,00	UN
11	COLUMNETAS PUERTA PLANTA ELÉCTRICA				4,00	4,00	UN
12	COLUMNETAS PUERTA PLANTA ELÉCTRICA				4,00	4,00	UN
13	COLUMNETAS PUERTA PLANTA ELÉCTRICA				4,00	4,00	UN
				SUBTOTAL		52,00	UN
				TOTAL		52,00	UN

OBSERVACIONES:

LOCALIZACIÓN PLANIMÉTRICA



REGISTRO FOTOGRÁFICO

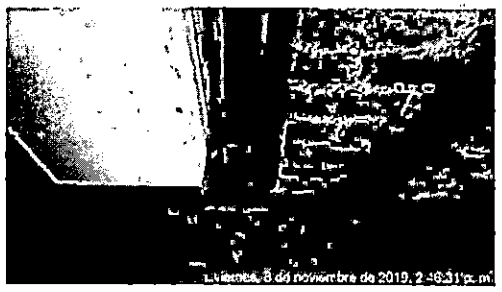


Alejandra Bolaños

ARQ. ALEJANDRA BOLAÑOS
RESIDENTE CONTRATISTA

Arq. Jessica Lopera A.

ARQ. JESSICA LOPERA
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

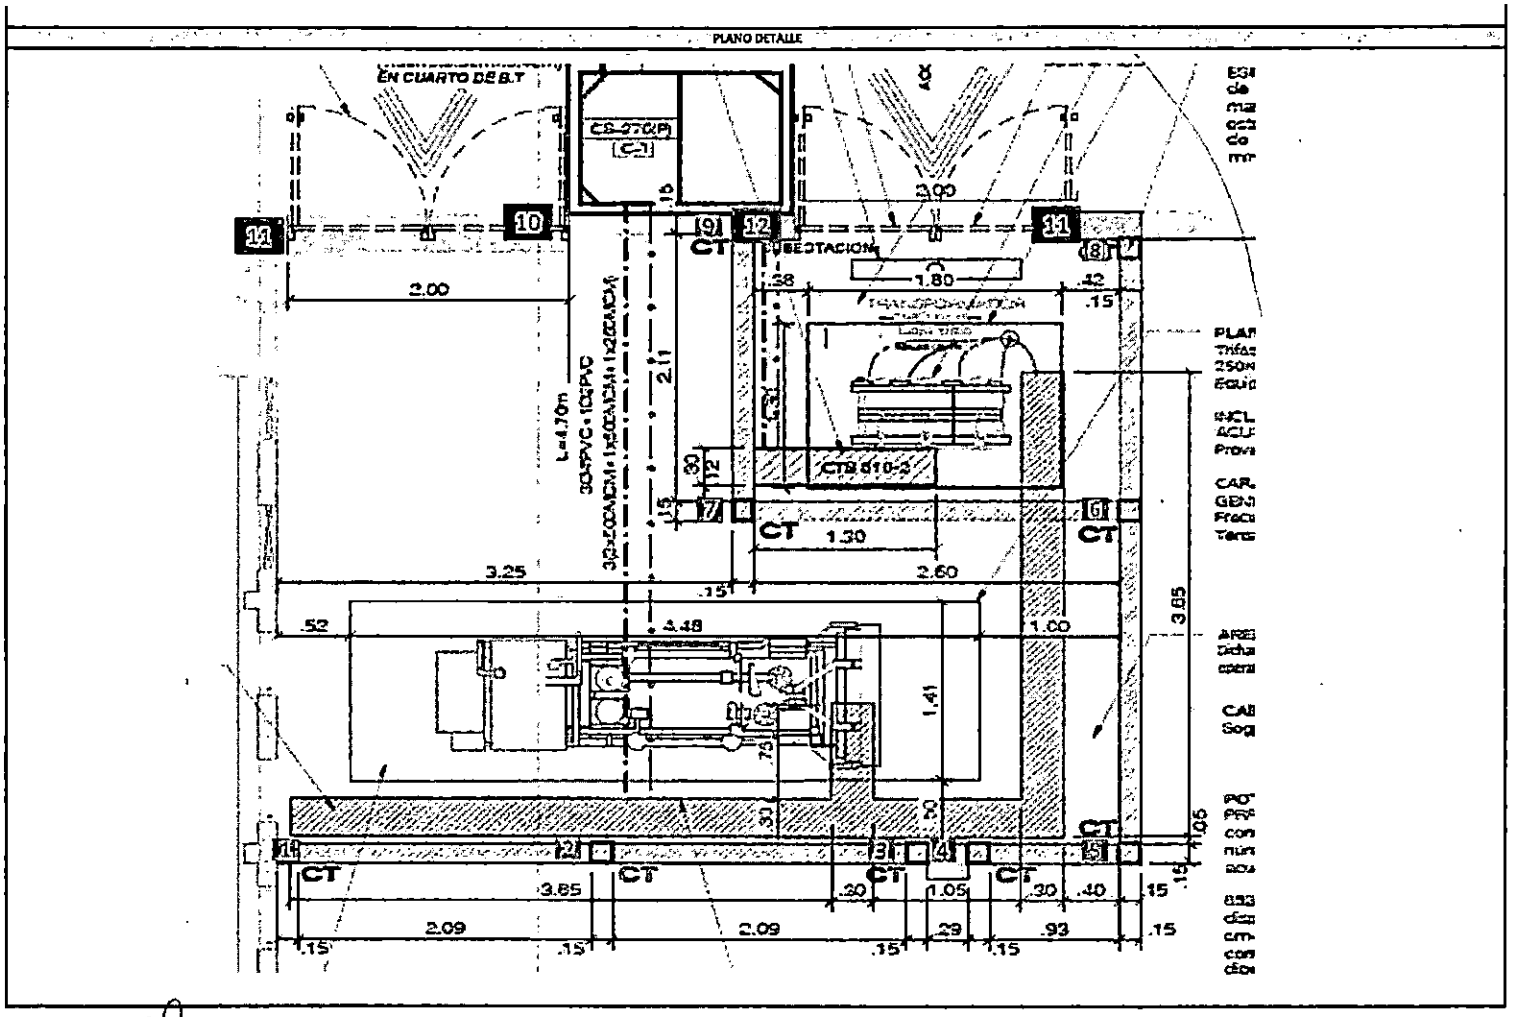

Maya B

Interv.

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA GENERAL | BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

PROYECTO: OBRAS SEDES ALCALDÍA


PRISMA — UNIVERSAL SEC S.A.S. — CONSORCIO PRUNI SEDES 04 — CONTRATISTA

ARQUITECTURA URBANA LTDA — INTERVENTORÍA

ACTA No.	4		PERIODO DEL ACTA	01/11/2019	A	30/11/2019	
OBJETO	REALIZAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE AJUSTE LAS DIFERENTES OBRAS E INTERVENCIONES ESPECIALIZADAS PARA LAS DIFERENTES SEDES DE LA SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C.						
CONTRATO DE OBRA No	731-2019	CONTRATISTA	CONSORCIO PRUNI SEDES 04		ENTIDAD CONTRATANTE	SECRETARIA GENERAL-ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA	
CONTRATO INTERVENTORÍA	730 DE 2019	INTERVENTORÍA	ARQUITECTURA URBANA LTDA		FRENTE:	IMPRENTA DISTRITAL	

CAPITULO	2.5.0.	PERFORACIONES Y EPÓXICO	ITEM	2.5.0.1	Perforación y epóxico #3 L=0.15	UNIDAD	UN

ITEM	LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	TOTAL	UNIDAD
					VIENE	52,00	UN
	FACHADAS ADMINISTRACION						
1	ANCLAJE ENCHAPE EN LADRILLO COLUMNA EJE 1'- C				15,00	15,00	UN
2	ANCLAJE ENCHAPE EN LADRILLO COLUMNA EJE 4'-A				15,00	15,00	UN
3	ANCLAJE ENCHAPE EN LADRILLO COLUMNA EJE 5'-A				15,00	15,00	UN
4	ANCLAJE ENCHAPE EN LADRILLO COLUMNA EJE 5'-A				15,00	15,00	UN
5	ANCLAJE ENCHAPE EN LADRILLO COLUMNA EJE 5'-B				15,00	15,00	UN
6	ANCLAJE ENCHAPE EN LADRILLO COLUMNA EJE 5'-C				15,00	15,00	UN
	SEGUNDO PISO ADMINISTRACION						
7	ANCLAJES PARA RECONSTRUCCION DE PLACA ENTREPISO EXISTENTE				24,00	24,00	UN
8	ANCLAJE COLUMNA C-1 EJES 1'-E				15,00	15,00	UN
9	ANCLAJE COLUMNA C-1 EJES 5'-E				15,00	15,00	UN
10	ANCLAJE COLUMNA C-3 EJES 2'-E				16,00	16,00	UN
11	ANCLAJE COLUMNA C-5 EJES 2'-F				64,00	64,00	UN
12	ANCLAJE COLUMNA C-6 EJES 1'-F				62,00	62,00	UN

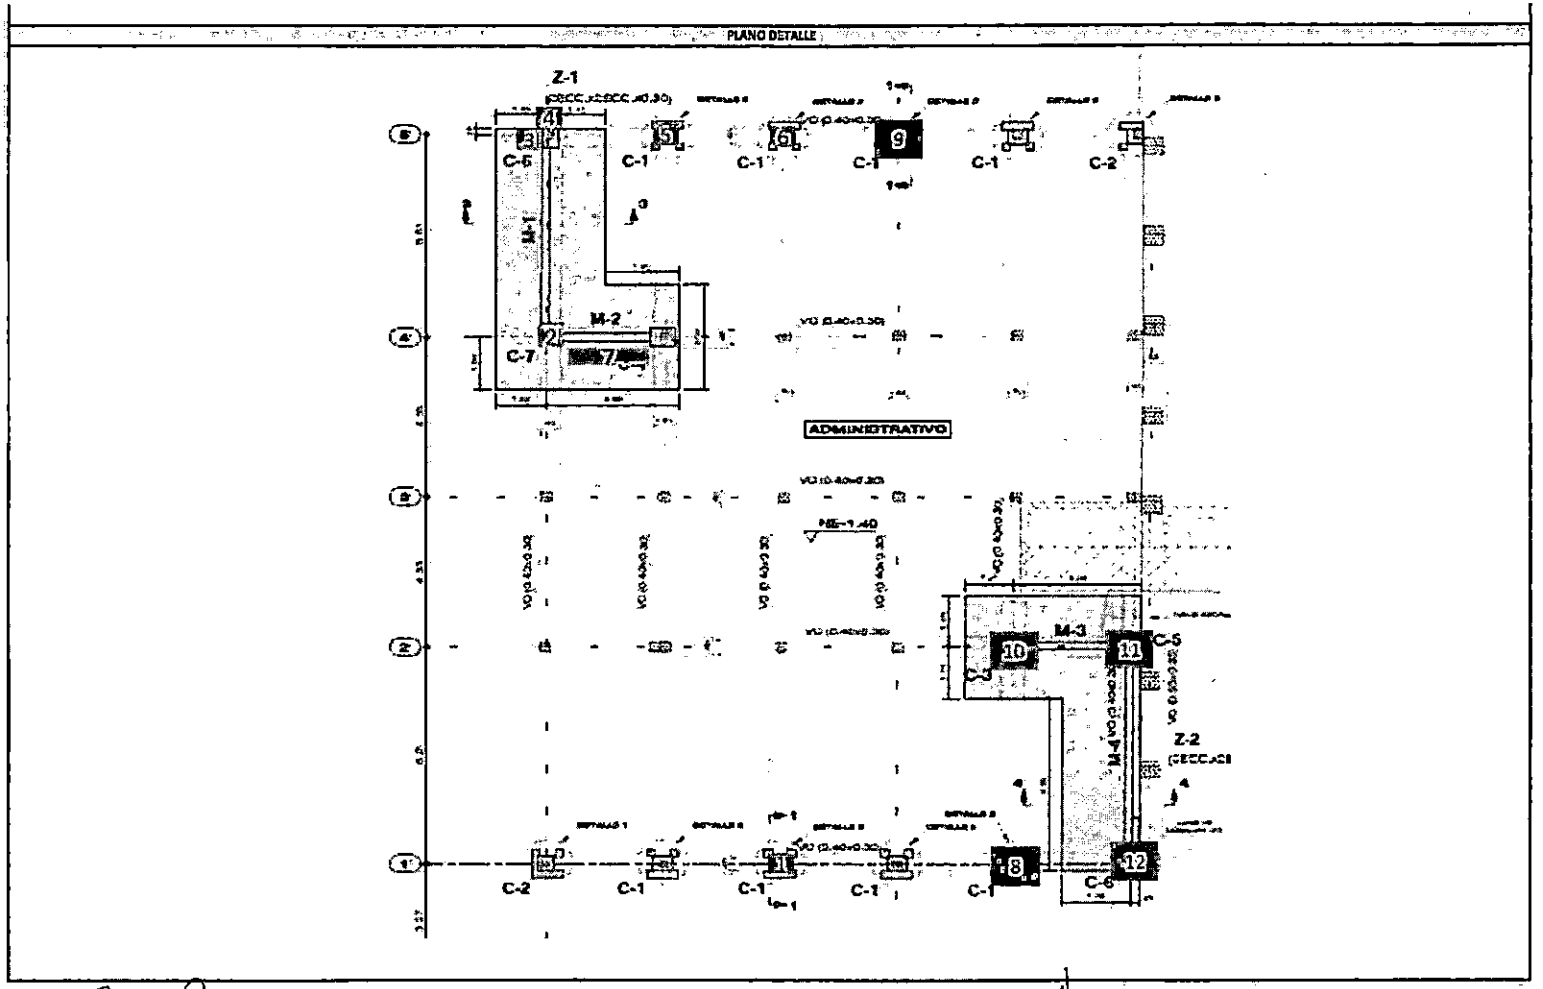
PLANO DETALLE
Z-1
C-6
C-1
C-1
C-1
C-1
C-2
M-2
C-7
ADMINISTRATIVO
M-3
C-5
C-4
Z-2
C-2
C-1
C-1
C-1
C-1
C-6

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA GENERAL | BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

PROYECTO: OBRAS SEDES ALCALDÍA

PRISMA — UNIVERSAL SEC S.A. — CONSORCIO PRUNI SEDES 04 — CONTRATISTA


ARQUITECTURA URBANA LTDA. — INTERVENTORÍA

ACTA No.	4		PERIODO DEL ACTA	01/11/2019	A	30/11/2019	
OBJETO	REALIZAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE AJUSTE LAS DIFERENTES OBRAS E INTERVENCIONES ESPECIALIZADAS PARA LAS DIFERENTES SEDES DE LA SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C.						
CONTRATO DE OBRA No	731-2019	CONTRATISTA	CONSORCIO PRUNI SEDES 04		ENTIDAD CONTRATANTE	SECRETARIA GENERAL-ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA	
CONTRATO INTERVENTORÍA	730 DE 2019	INTERVENTORÍA	ARQUITECTURA URBANA LTDA		FRENTE:	IMPRENTA DISTRITAL	

CAPITULO	2.5.0.	PERFORACIONES Y EPÓXICO	ITEM	2.5.0.2	Perforación y epóxico Ø3 L=0.30	UNIDAD	UN

ITEM	LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	TOTAL	UNIDAD
	ADMINISTRACION PRIMER PISO						
1	ANCLAJES COLUMNA C-1 EJES 1'-E				31,00	31,00	UN
2	ANCLAJES COLUMNA C-1 EJES 5'-E				31,00	31,00	UN
3	ANCLAJES MURO M-3 EJE 2' ENTRE EJES E-F				24,00	24,00	UN
4	ANCLAJES MURO M-4 EJE F ENTRE EJES 1'-2'				29,00	29,00	UN
5	ANCLAJES COLUMNA C-3 EJES 2'-E				31,00	31,00	UN

PLANO DETALLE

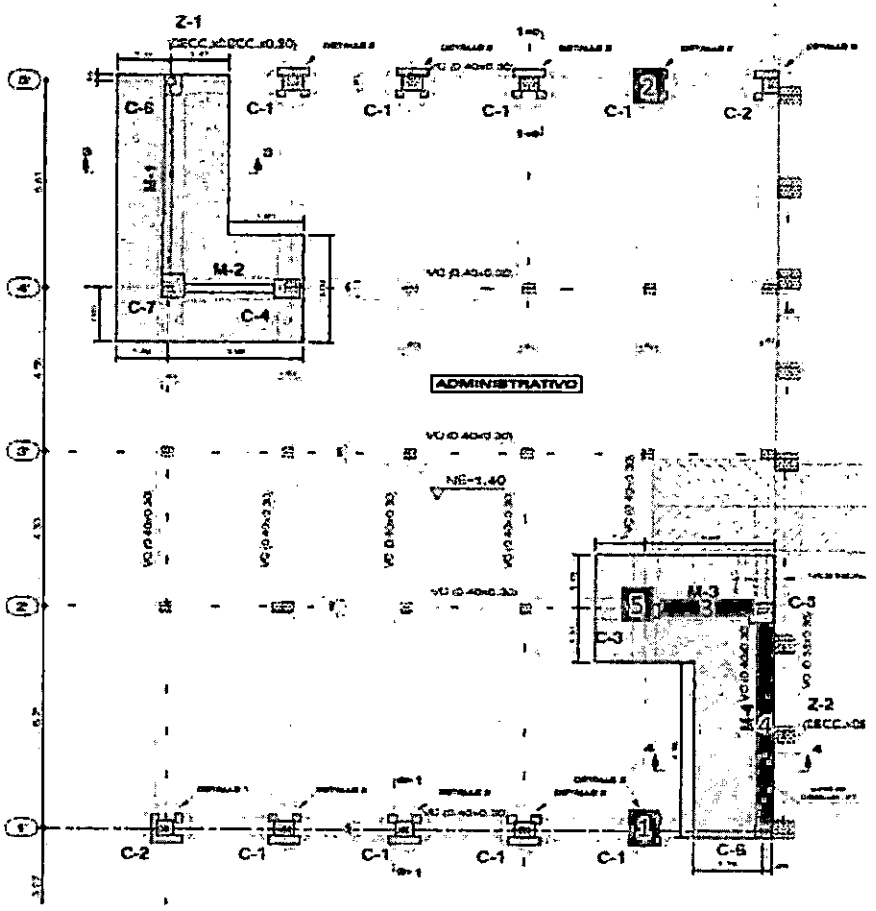

Alga B

dlg
Interv.

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. | BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS
SECRETARÍA GENERAL

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

PROYECTO: OBRAS SEDES ALCALDÍA

PRISMA — UNIVERSAL SEC S.A.S. — CONSORCIO PRUNI SEDES 04 — CONTRATISTA

ARQUITECTURA URBANA LTDA — INTERVENTORÍA


ACTA No.	4		PERIODO DEL ACTA	01/11/2019	A	30/11/2019
OBJETO	REALIZAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE AJUSTE LAS DIFERENTES OBRAS E INTERVENCIONES ESPECIALIZADAS PARA LAS DIFERENTES SEDES DE LA SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C.					
CONTRATO DE OBRA No	731-2019	CONTRATISTA	CONSORCIO PRUNI SEDES 04	ENTIDAD CONTRATANTE	SECRETARIA GENERAL-ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA	
CONTRATO INTERVENTORÍA	730 DE 2019	INTERVENTORÍA	ARQUITECTURA URBANA LTDA	FRENTE:	IMPRENTA DISTRITAL	

CAPITULO	2.5.0.	PERFORACIONES Y EPÓXICO	ITEM	2.5.0.6	Perforación y epóxico #6 L=0.22	UNIDAD	UN

ITEM	LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	TOTAL	UNIDAD
	ADMINISTRACION 1ER PISO						
1	ANCLAJES COLUMNA C-1 EJES 1'-E				8,00	8,00	UN
2	ANCLAJES COLUMNA C-1 EJES 5'-E				8,00	8,00	UN
				SUBTOTAL		16,00	UN
				TOTAL		16,00	UN

OBSERVACIONES:

LOCALIZACIÓN PLANIMÉTRICA

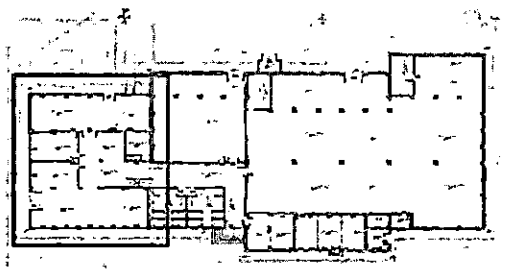


REGISTRO FOTOGRÁFICO



Alejandra Bolaños t
ARQ. ALEJANDRA BOLAÑOS
RESIDENTE CONTRATISTA

Arq. Jessica Lopera Arango
ARQ. JESSICA LOPERA
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

PLANO DETALLE

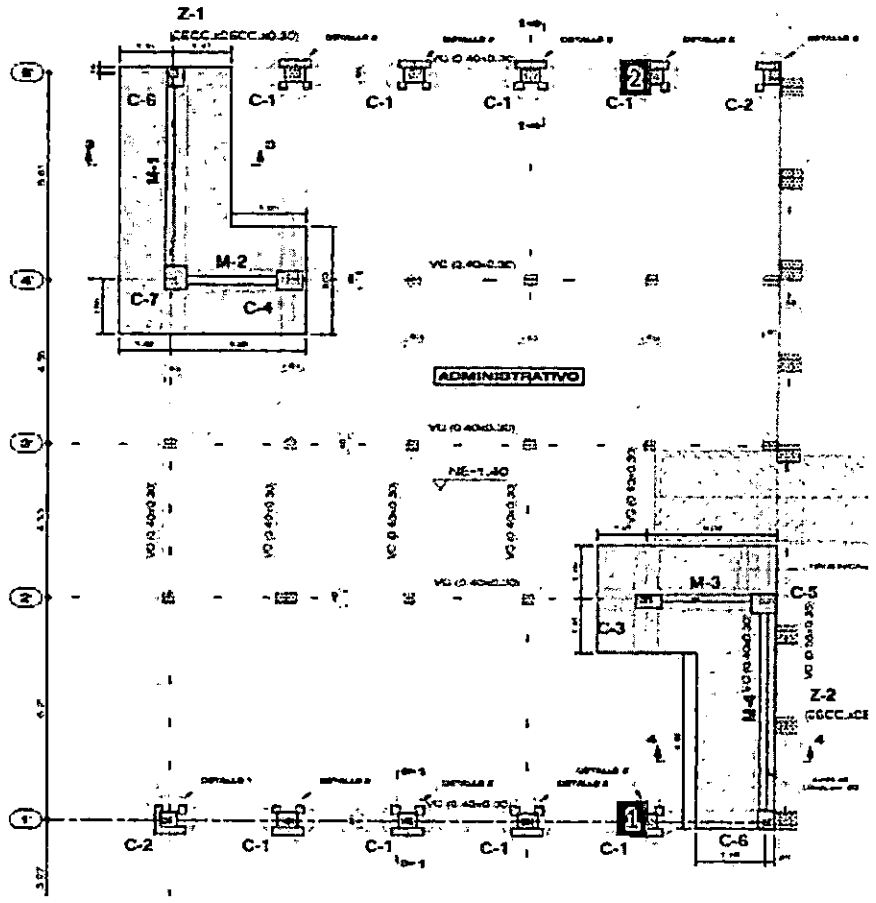

Ila Interv.

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA GENERAL | BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

PROYECTO: OBRAS SEDES ALCALDÍA

PRISMA — UNIVERSAL SEC S.A.S. — CONSORCIO PRUNI SEDES 04 — CONTRATISTA

ARQUITECTURA URBANA LTDA. — INTERVENTORÍA


ACTA No.	4		PERIODO DEL ACTA	01/11/2019	A	30/11/2019
OBJETO	REALIZAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE AJUSTE LAS DIFERENTES OBRAS E INTERVENCIONES ESPECIALIZADAS PARA LAS DIFERENTES SEDES DE LA SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C.					
CONTRATO DE OBRA No	731-2019	CONTRATISTA	CONSORCIO PRUNI SEDES 04	ENTIDAD CONTRATANTE	SECRETARIA GENERAL-ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA	
CONTRATO INTERVENTORÍA	730 DE 2019	INTERVENTORÍA	ARQUITECTURA URBANA LTDA	FRENTE:	IMPRENTA DISTRITAL	

CAPITULO	2.5.0.	PERFORACIONES Y EPÓXICO	ITEM	2.5.0.7	Perforación y epóxico #6 L=0.30	UNIDAD	UN

ITEM	LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	TOTAL	UNIDAD
	ADMINISTRACION 1ER PISO						
1	COLUMNA C-3 EJES 2'-E				10,00	10,00	UN
	SUBTOTAL					10,00	UN
	TOTAL					✓ 10,00	UN

OBSERVACIONES:

LOCALIZACIÓN PLANIMÉTRICA

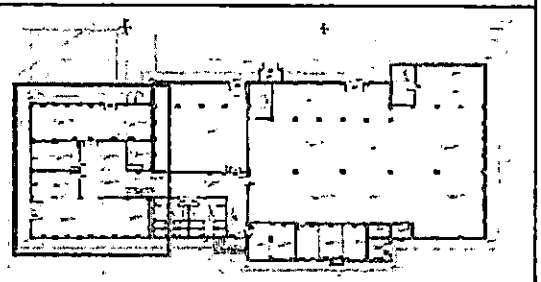

REGISTRO FOTOGRÁFICO




Alejandra Bolaños +
ARQ. ALEJANDRA BOLAÑOS
RESIDENTE CONTRATISTA

Arq. Jessica Lopera Arango
ARQ. JESSICA LOPERA
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

107

141

PLANO DETALLE

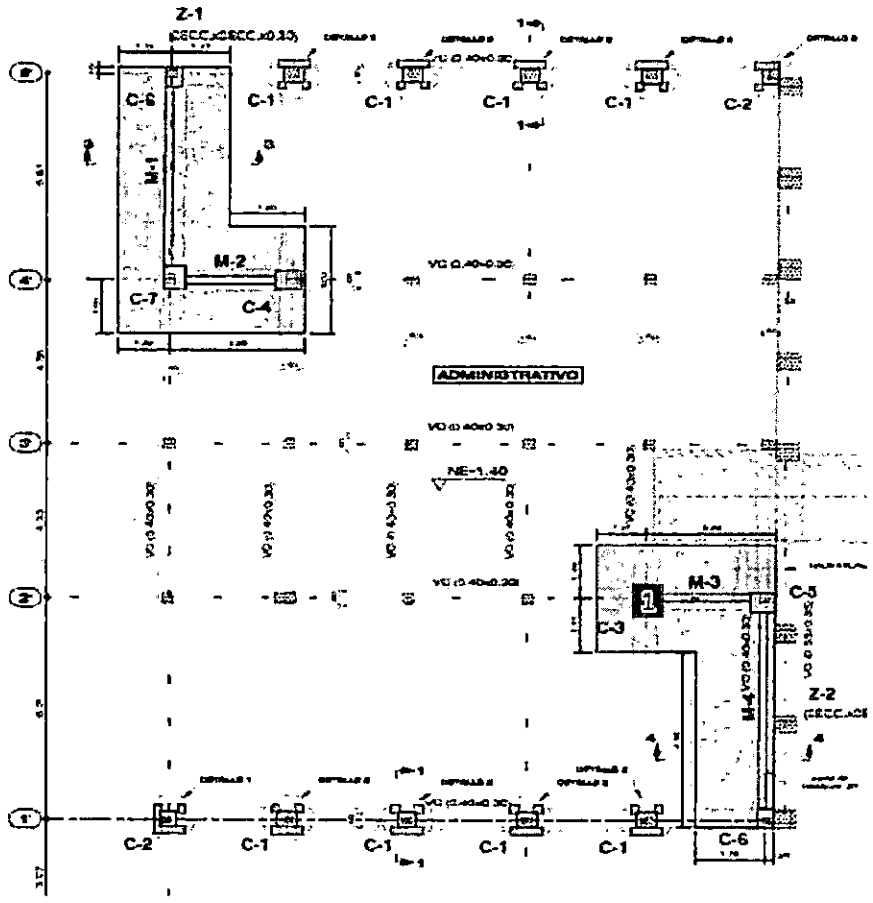

Maya BF

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA GENERAL | BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

PROYECTO: OBRAS SEDES ALCALDÍA

PRISMA — UNIVERSAL SEC S.A.S. — CONSORCIO PRUNI SEDES 04 — CONTRATISTA

ARQUITECTURA URBANA LTDA. — INTERVENTORÍA


ACTA No.	4		PERIODO DEL ACTA	01/11/2019	A	30/11/2019	
OBJETO	REALIZAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE AJUSTE LAS DIFERENTES OBRAS E INTERVENCIONES ESPECIALIZADAS PARA LAS DIFERENTES SEDES DE LA SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C.						
CONTRATO DE OBRA No	731-2019	CONTRATISTA	CONSORCIO PRUNI SEDES 04		ENTIDAD CONTRATANTE	SECRETARIA GENERAL-ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA	
CONTRATO INTERVENTORÍA	730 DE 2019	INTERVENTORÍA	ARQUITECTURA URBANA LTDA		FRENTE:	IMPRENTA DISTRITAL	

CAPITULO	2.5.0.	PERFORACIONES Y EPÓXICO	ITEM	2.5.0.11	Perforación y epóxico ø7 L=0.30	UNIDAD	UN


ITEM	LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES LARGO	DIMENSIONES ANCHO	DIMENSIONES ALTO	CANTIDAD	TOTAL	UNIDAD
	ADMINISTRACION 1ER PISO						
1	COLUMNA C-3 EJES 2'-E				10,00	10,00	UN
2	COLUMNA C-6 EJES 1'-F				7,00	7,00	UN
				SUBTOTAL		17,00	UN
				TOTAL		17,00	UN

OBSERVACIONES:

LOCALIZACIÓN PLANIMÉTRICA

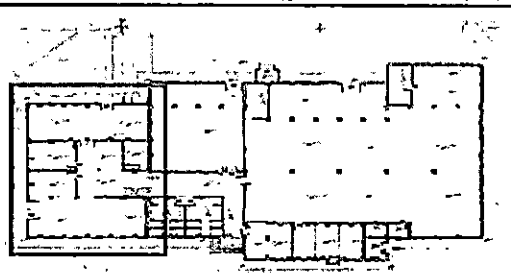

REGISTRO FOTOGRÁFICO

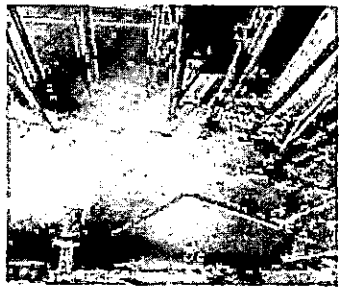

Alejandra Bolaños +

ARQ. ALEJANDRA BOLAÑOS
RESIDENTE CONTRATISTA


Arq. Jessica Lopera Arango

ARQ. JESSICA LOPERA
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

102

146

PLANO DETALLE

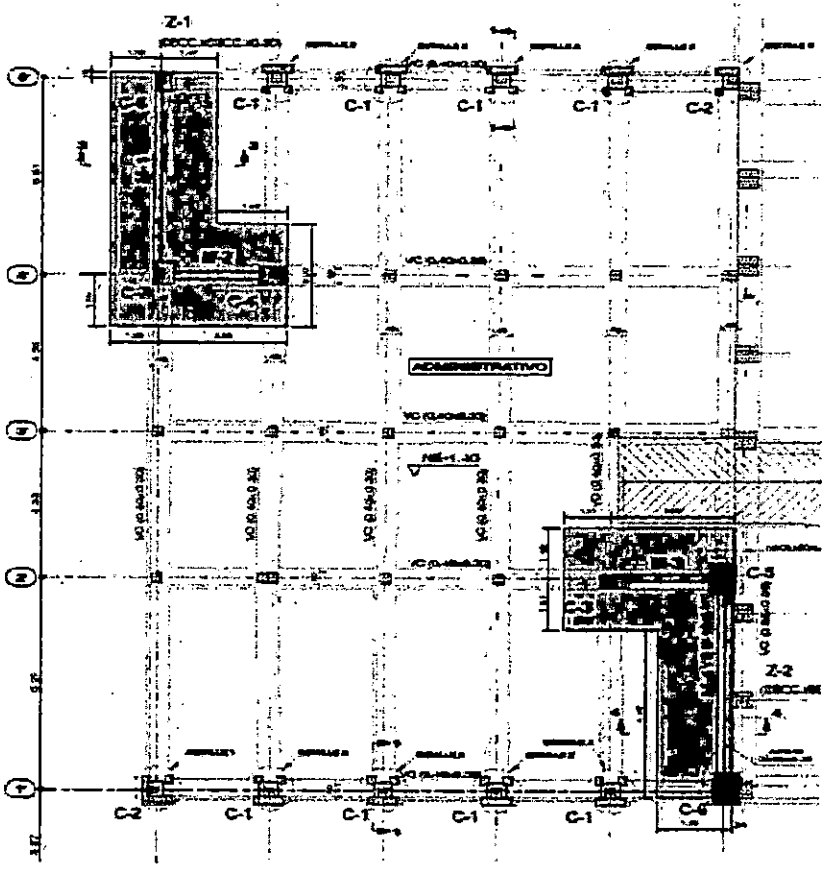

V/a
Interv.

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. | BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS
SECRETARÍA GENERAL

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

PROYECTO: OBRAS SEDES ALCALDÍA

PRISMA — UNIVERSAL SEC S.A.S. — CONSORCIO PRUNI SEDES 04 — CONTRATISTA


ARQUITECTURA URBANA LTDA — INTERVENTORÍA

ACTA No.	4	PERIODO DEL ACTA	01/11/2019	A	30/11/2019	
OBJETO	REALIZAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE AJUSTE LAS DIFERENTES OBRAS E INTERVENCIONES ESPECIALIZADAS PARA LAS DIFERENTES SEDES DE LA SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C.					
CONTRATO DE OBRA No	731-2019	CONTRATISTA	CONSORCIO PRUNI SEDES 04	ENTIDAD CONTRATANTE	SECRETARIA GENERAL-ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA	
CONTRATO INTERVENTORÍA	730 DE 2019	INTERVENTORÍA	ARQUITECTURA URBANA LTDA	FRENTE:	IMPRENTA DISTRITAL	


CAPITULO	2.8.0	RESTITUCIÓN DE ACABADOS	ITEM	2.8.0.6	Rotura del muro para colocar columneta	UNIDAD	ML

ITEM	LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	TOTAL	UNIDAD
	FACHADA NORTE						
1	ROTURA PARA COLUMNETA EJES T-U	2,08			2,00	4,16	ML
2	ROTURA PARA VIGA EJES T-U	2,60			1,00	2,60	ML
3	ROTURA PARA COLUMNETA EJES S-T	2,08			2,00	4,16	ML
4	ROTURA PARA VIGA EJES S-T	2,60			1,00	2,60	ML
5	ROTURA PARA COLUMNETA EJES R-S	2,08			2,00	4,16	ML
6	ROTURA PARA VIGA EJES R-S	2,60			1,00	2,60	ML
7	ROTURA PARA COLUMNETA EJES P-Q	2,45			2,00	4,90	ML
8	ROTURA PARA VIGA EJES P-Q	2,53			1,00	2,53	ML
9	ROTURA PARA COLUMNETA EJES N-O	2,41			2,00	4,82	ML
10	ROTURA PARA VIGA EJES N-O	2,50			1,00	2,50	ML
11	ROTURA PARA COLUMNETA EJES M-N	2,41			2,00	4,82	ML
12	ROTURA PARA VIGA EJES M-N	2,50			1,00	2,50	ML
13	ROTURA PARA COLUMNETA EJES M-N	2,42			2,00	4,84	ML
14	ROTURA PARA VIGA EJES M-N	1,45			1,00	1,45	ML
	SEGUNDO PISO ADMINISTRACION						
15	ROTURA PARA COLUMNA EN DATACENTER	3,40			1,00	3,40	ML
OBSERVACIONES:			SUBTOTAL		52,04	ML	
			TOTAL		✓ 52,04	ML	

LOCALIZACIÓN PLANIMÉTRICA

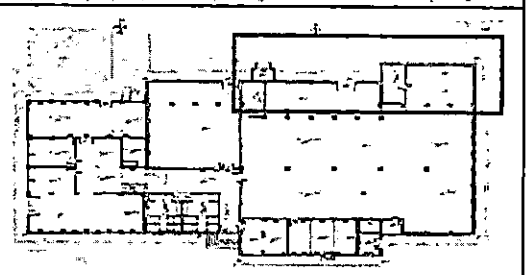

REGISTRO FOTOGRÁFICO

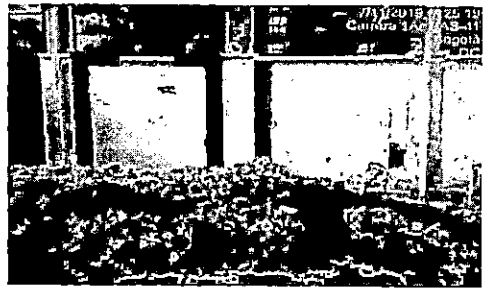

Alejandra Bolaños t
ARQ. ALEJANDRA BOLAÑOS
RESIDENTE CONTRATISTA


Arq. Jessica lopera t.
ARQ. JESSICA LOPERA
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

103


148

PLANO DETALLE

PRODUCCIÓN

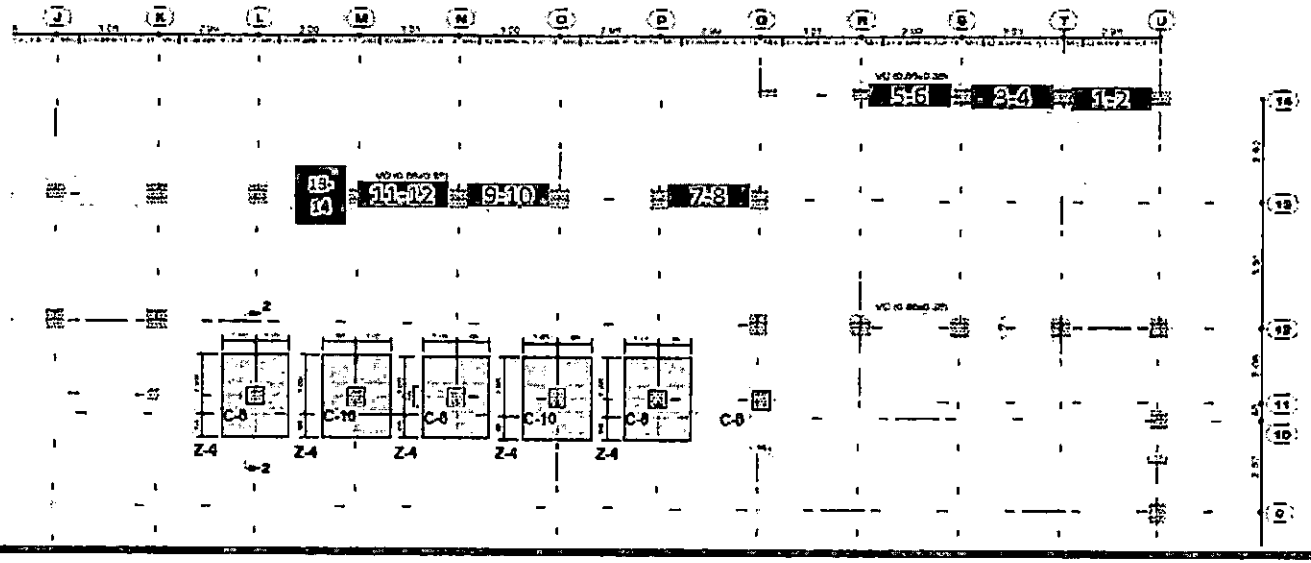

DATACENTER

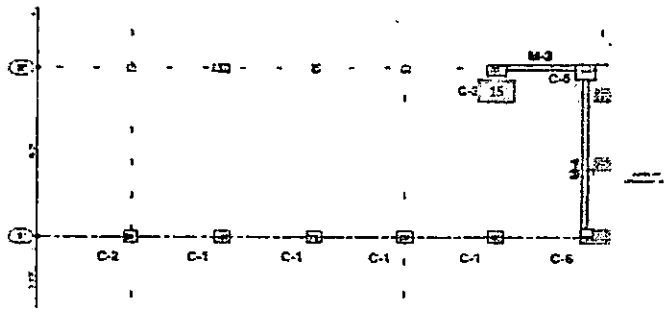

Alega

Ha intern.

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA GENERAL

BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

PROYECTO: OBRAS SEDES ALCALDÍA

PRISMA — UNIVERSAL SEC S.A.S. — CONSORCIO PRUNI SEDES 04 — CONTRATISTA


ARQUITECTURA URBANA LTDA. — INTERVENTORÍA

ACTA No.	4		PERIODO DEL ACTA	01/11/2019	A	30/11/2019
OBJETO	REALIZAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE AJUSTE LAS DIFERENTES OBRAS E INTERVENCIONES ESPECIALIZADAS PARA LAS DIFERENTES SEDES DE LA SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C.					
CONTRATO DE OBRA No	731-2019	CONTRATISTA	CONSORCIO PRUNI SEDES 04	ENTIDAD CONTRATANTE	SECRETARIA GENERAL-ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA	
CONTRATO INTERVENTORÍA	730 DE 2019	INTERVENTORÍA	ARQUITECTURA URBANA LTDA	FRENTE:	IMPRENTA DISTRITAL	


CAPITULO:	2.8.0	RESTITUCIÓN DE ACABADOS	ITEM	2.8.0.7	Perforaciones y epóxico 1/2" L=0.15m	UNIDAD	UN

ITEM	LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	TOTAL	UNIDAD
	ADMINISTRACION PRIMER PISO						
1	COLUMNETAS EJE 1"ENTRE A-B (COSTADO SUR)				8,00	8,00	UN
2	COLUMNETAS EJE 1"ENTRE B-C (COSTADO SUR)				8,00	8,00	UN
3	COLUMNETAS EJE 1"ENTRE C-D (COSTADO SUR)				8,00	8,00	UN
4	COLUMNETAS EJE 5"ENTRE A-B (COSTADO NORTE)				8,00	8,00	UN
5	COLUMNETAS EJE 5"ENTRE B-C (COSTADO NORTE)				8,00	8,00	UN
6	COLUMNETAS EJE A ENTRE 4'-5' (COSTADO OCCIDENTE)				12,00	12,00	UN
	ADMINISTRACION 2DO PISO						
7	COLUMNETAS EJE 1"ENTRE A-B (COSTADO SUR)				8,00	8,00	UN
8	COLUMNETAS EJE 1"ENTRE B-C (COSTADO SUR)				8,00	8,00	UN
9	COLUMNETAS EJE 1"ENTRE C-D (COSTADO SUR)				8,00	8,00	UN
OBSERVACIONES:				SUBTOTAL		76,00	UN
				TOTAL		76,00	UN

LOCALIZACIÓN PLANIMÉTRICA

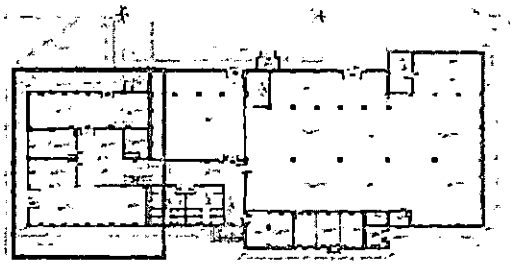

REGISTRO FOTOGRÁFICO

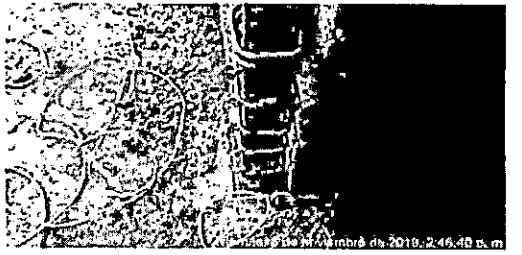


Alejandra Bolaños +
ARQ. ALEJANDRA BOLAÑOS
RESIDENTE CONTRATISTA


Arq. Jessica Lopera Arango
ARQ. JESSICA LOPERA
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

PLANO DETALLE

PRIMER PISO

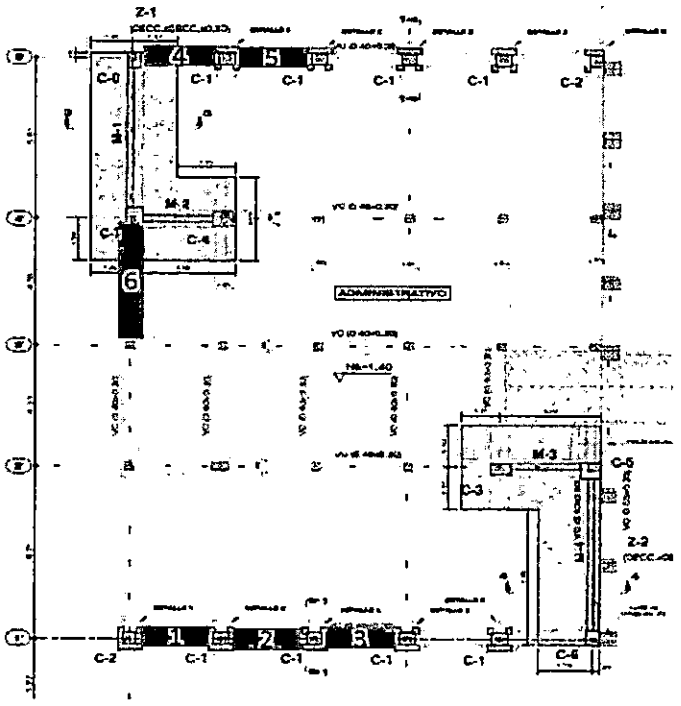

SEGUNDO PISO

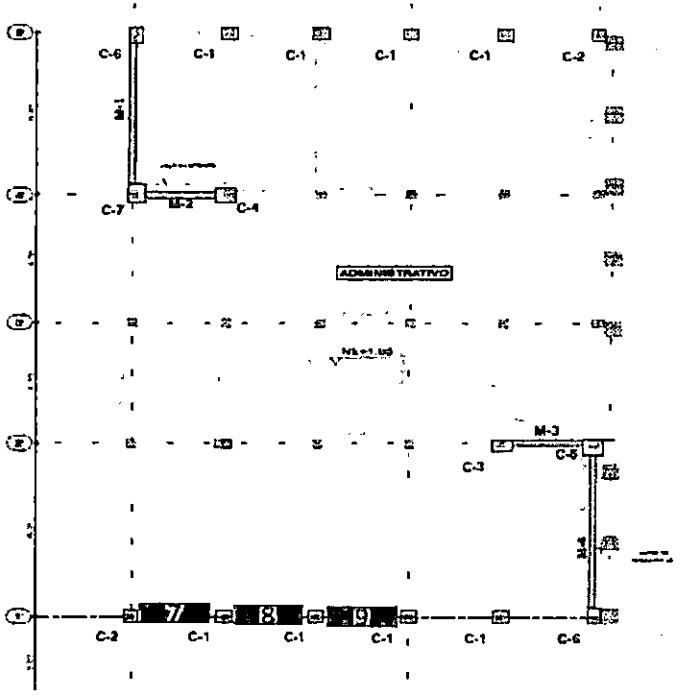

Alga

Ila
Interv.

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA GENERAL | BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

PROYECTO: OBRAS SEDES ALCALDÍA

PRISMA — UNIVERSAL SEC S.A.S. — CONSORCIO PRUNI SEDES 04 — CONTRATISTA


ARQUITECTURA URBANA LTDA. — INTERVENTORÍA

ACTA No.	4	PERIODO DEL ACTA	01/11/2019	A	30/11/2019	
OBJETO	REALIZAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE AJUSTE LAS DIFERENTES OBRAS E INTERVENCIONES ESPECIALIZADAS PARA LAS DIFERENTES SEDES DE LA SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C.					
CONTRATO DE OBRA No	731-2019	CONTRATISTA	CONSORCIO PRUNI SEDES 04	ENTIDAD CONTRATANTE	SECRETARIA GENERAL-ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA	
CONTRATO INTERVENTORÍA	730 DE 2019	INTERVENTORÍA	ARQUITECTURA URBANA LTDA	FRENTE:	IMPRENTA DISTRITAL	


CAPITULO	2.8.0	RESTITUCIÓN DE ACABADOS	ITEM	2.8.0.9	Concreto de 3000 PSI	UNIDAD	M3

ITEM	LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	TOTAL	UNIDAD
	EDIFICIO ADMINISTRATIVO PRIMER PISO						
1	Eje A entre 4-3	0,25	0,10	1,10	3,00	0,08	M3
2	Eje 1 entre A-B	0,25	0,10	1,10	2,00	0,06	M3
3	Eje 1 entre B-C	0,25	0,10	1,10	2,00	0,06	M3
4	Eje 1 entre C-D	0,25	0,10	1,10	2,00	0,06	M3
	EDIFICIO ADMINISTRATIVO SEGUNDO PISO						
5	Eje 1 entre A-B	0,25	0,10	1,10	2,00	0,06	M3
6	Eje 1 entre B-C	0,25	0,10	1,10	2,00	0,06	M3
7	Eje 1 entre C-D	0,25	0,10	1,10	2,00	0,06	M3

LOCALIZACIÓN PLANIMÉTRICA

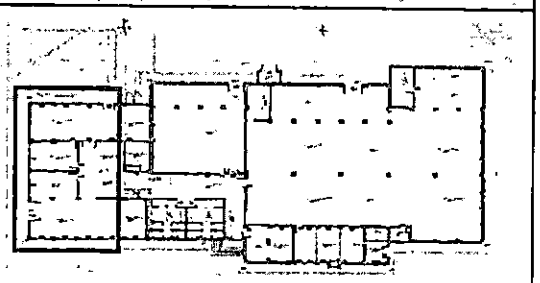

REGISTRO FOTOGRÁFICO

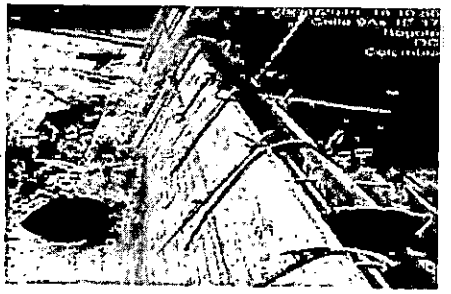

OBSERVACIONES: Falta el 26.07


SUBTOTAL	0,41	M3
TOTAL	0,41	M3

Alejandra Bolaños +
ARQ. ALEJANDRA BOLAÑOS
RESIDENTE CONTRATISTA


Arq. Jessica Lopera A.
ARQ. JESSICA LOPERA
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

PLANO DETALLE

PRIMER PISO

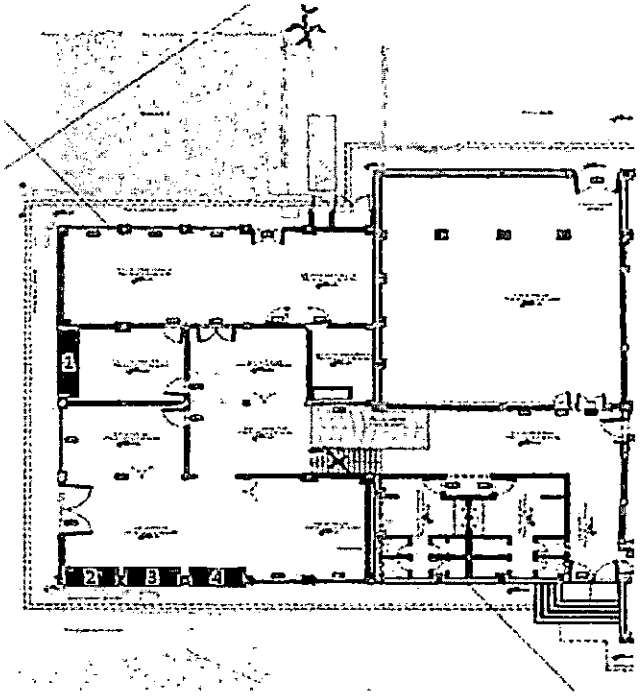

SEGUNDO PISO

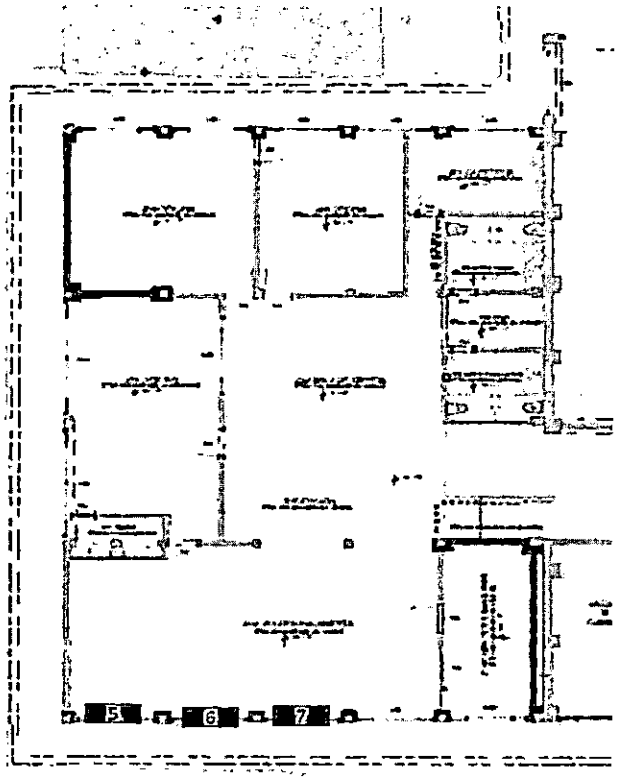

Vega

Ha
Interv.

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA GENERAL | BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

PROYECTO: OBRAS SEDES ALCALDÍA

PRISMA — UNIVERSAL SEC S.A.S. — CONSORCIO PRUNI SEDES 04 — CONTRATISTA


ARQUITECTURA URBANA LTDA — INTERVENTORÍA

ACTA No.	4		PERIODO DEL ACTA	01/11/2019	A	30/11/2019	
OBJETO	REALIZAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE AJUSTE LAS DIFERENTES OBRAS E INTERVENCIONES ESPECIALIZADAS PARA LAS DIFERENTES SEDES DE LA SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C.						
CONTRATO DE OBRA No	732-2019	CONTRATISTA	CONSORCIO PRUNI SEDES 04		ENTIDAD CONTRATANTE	SECRETARIA GENERAL-ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA	
CONTRATO INTERVENTORÍA	730 DE 2019	INTERVENTORÍA	ARQUITECTURA URBANA LTDA		FRENTE:	IMPRENTA DISTRITAL	


CAPITULO	2.8.0	RESTITUCIÓN DE ACABADOS	ITEM	2.8.0.13	Suministro figurado y amarre de acero 60000 PSI 420 Mpa	UNIDAD	KG

ITEM	LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES FIGURA	DIMENSIONES LARGO (m)	DIMENSIONES PESO (kg/m)	CANTIDAD	TOTAL	UNIDAD
	COLUMNETAS PLANTA ELÉCTRICA (SON 9)						
	Acero #3 recto		0,80	0,560	4,00	1,792	KG
	Acero #3 recto		3,00	0,560	4,00	6,720	KG
	Fleje #3 .10m x .10m con .10m de gancho		0,60	0,560	23,00	7,728	KG
1	TOTAL ELEMENTO (1)					16,240	KG
2	COLUMNETA PLANTA ELÉCTRICA (2)				1,00	16,240	KG
3	COLUMNETA PLANTA ELÉCTRICA (3)				1,00	16,240	KG
4	COLUMNETA PLANTA ELÉCTRICA (4)				1,00	16,240	KG
5	COLUMNETA PLANTA ELÉCTRICA (5)				1,00	16,240	KG
6	COLUMNETA PLANTA ELÉCTRICA (6)				1,00	16,240	KG
7	COLUMNETA PLANTA ELÉCTRICA (7)				1,00	16,240	KG
8	COLUMNETA PLANTA ELÉCTRICA (8)				1,00	16,240	KG
9	COLUMNETA PLANTA ELÉCTRICA (9)				1,00	16,240	KG
10	COLUMNETA PUERTA						
	Acero #3 recto		0,70	0,560	4,00	1,568	KG
	Acero #3 recto		2,50	0,560	4,00	5,600	KG
	Acero #3 con escuadra de L=0.80m.		1,60	0,560	4,00	3,584	KG
11	COLUMNETA PUERTA PLANTA ELECTRICA						
	Acero #3 recto		0,70	0,560	4,00	1,568	KG
	Acero #3 recto		2,50	0,560	4,00	5,600	KG
	Acero #3 con escuadra de L=0.80m.		1,60	0,560	4,00	3,584	KG
12	DINTEL PUERTA PLANTA ELECTRICA						
	Acero #3 recto		2,40	0,560	4,00	5,376	KG
	Fleje #3 .20x.14 con .10m de gancho		0,88	0,560	51,00	25,133	KG
13	COLUMNETA PUERTA PLANTA ELECTRICA						
	Acero #3 recto		0,75	0,560	4,00	1,680	KG
	Acero #3 recto		1,50	0,560	4,00	3,360	KG
	Acero #3 recto		2,55	0,560	4,00	5,712	KG
	Fleje #3 .20x.14 con .10m de gancho		0,88	0,560	16,00	7,885	KG
OBSERVACIONES:				SUBTOTAL		216,810	KG
				TOTAL		216,810	KG

LOCALIZACIÓN PLANIMÉTRICA

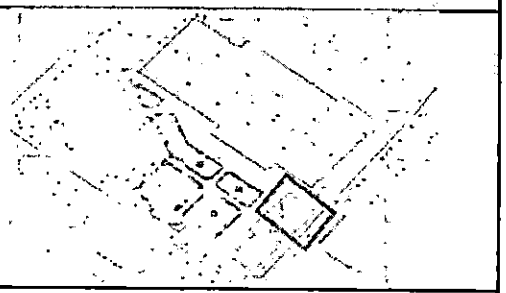

REGISTRO FOTOGRÁFICO

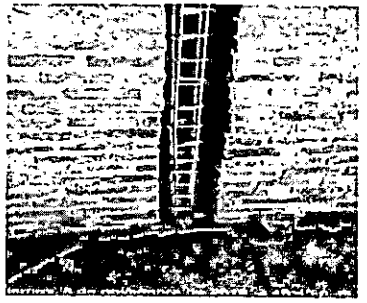


Alejandra Bolaños T

ARQ. ALEJANDRA BOLAÑOS
RESIDENTE CONTRATISTA

Arq. Jessica Lopera Franco

ARQ. JESSICA LOPERA
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

PLANO DETALLE

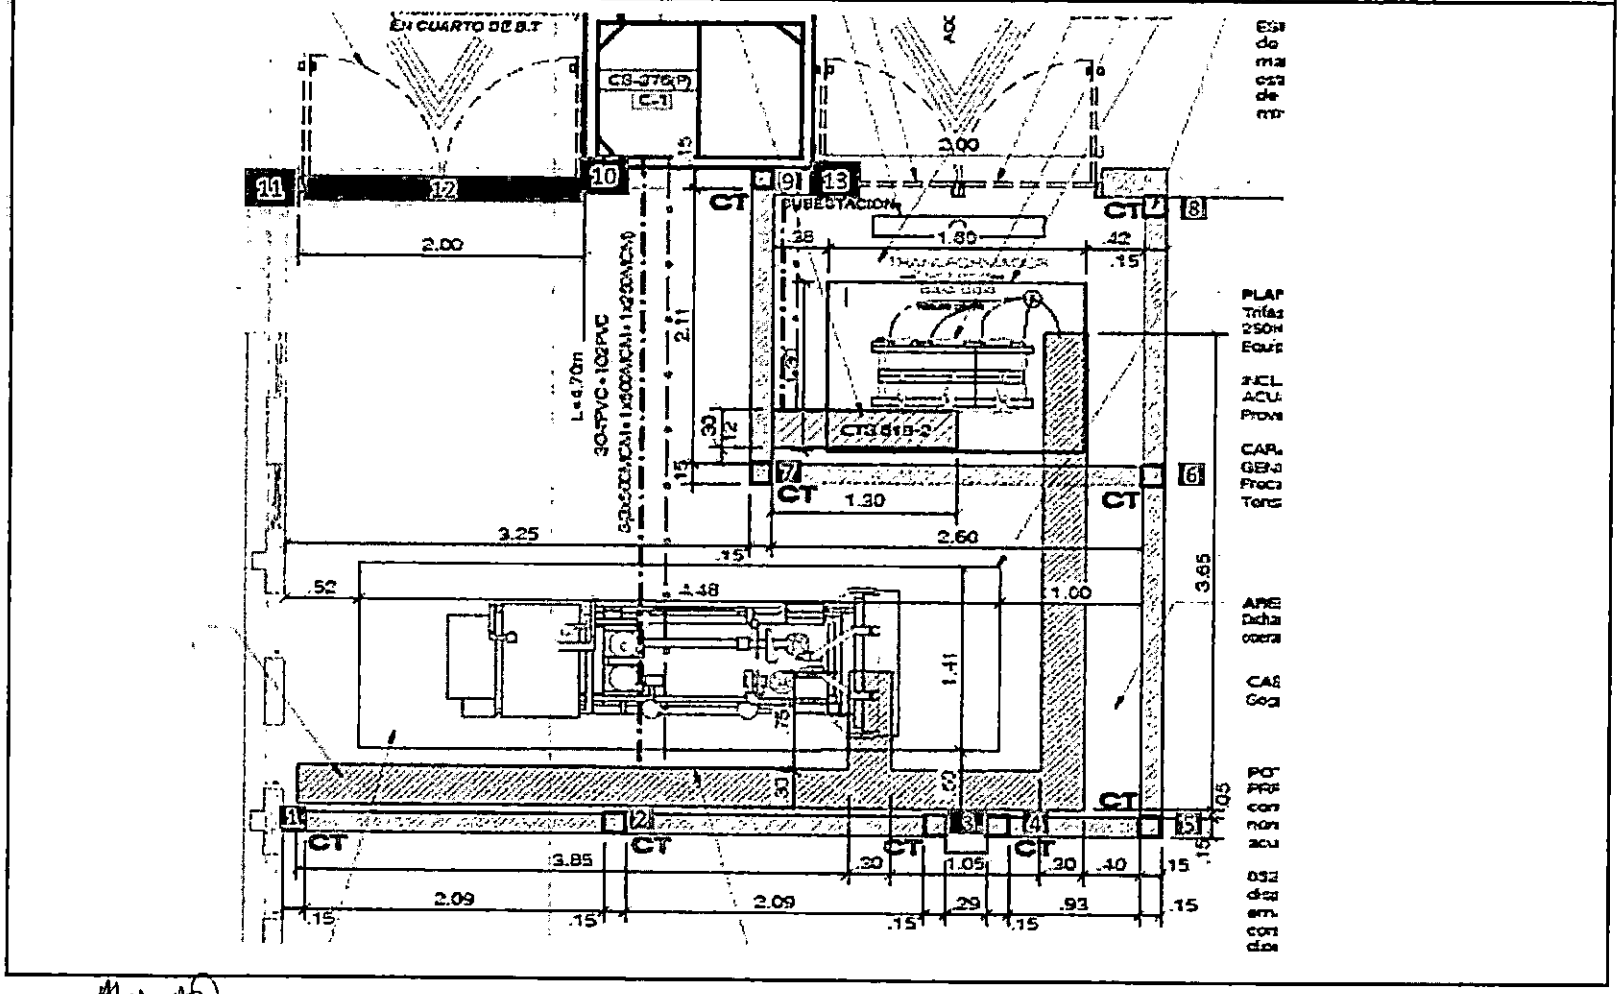

Mapa BP

Intern

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. | BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS
SECRETARÍA GENERAL

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

PROYECTO: OBRAS SEDES ALCALDÍA

PRISMA — UNIVERSAL SEC S.A.S. — CONSORCIO PRUNI SEDES 04 — CONTRATISTA

ARQUITECTURA URBANA LTDA. — INTERVENTORÍA


ACTA No.	4		PERIODO DEL ACTA	01/11/2019	A	30/11/2019	
OBJETO	REALIZAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE AJUSTE LAS DIFERENTES OBRAS E INTERVENCIONES ESPECIALIZADAS PARA LAS DIFERENTES SEDES DE LA SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C.						
CONTRATO DE OBRA No	731-2019	CONTRATISTA	CONSORCIO PRUNI SEDES 04		ENTIDAD CONTRATANTE	SECRETARIA GENERAL-ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA	
CONTRATO INTERVENTORÍA	730 DE 2019	INTERVENTORÍA	ARQUITECTURA URBANA LTDA		FRENTE:	IMPRENTA DISTRITAL	

CAPITULO	2.8.0	RESTITUCIÓN DE ACABADOS	ITEM	2.8.0.13	Suministro figurada y amarre de acero 60000 PSI 420 Mpa	UNIDAD	KG


ITEM	LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES FIGURA	LARGO (m)	PESO (kg/m)	CANTIDAD	TOTAL	UNIDAD
					VIENEN	216,810	KG
14	COLUMNETA PUERTA PLANTA ELECTRICA						
	Acero #3 recto		0,75	0,560	4,00	1,680	KG
	Acero #3 recto		1,50	0,560	4,00	3,360	KG
	Acero #3 recto		2,55	0,560	4,00	5,712	KG
	Fleje #3 .20x.14 con .10m de gancho		0,88	0,560	16,00	7,885	KG
15	DINTEL PUERTA PLANTA ELECTRICA						
	Acero #3 recto		2,05	0,560	4,00	4,592	KG
	Fleje #3 .20x.14 con .10m de gancho		0,88	0,560	14,00	6,899	KG
					SUBTOTAL	246,938	KG
					TOTAL	246,938	KG

OBSERVACIONES:

LOCALIZACIÓN PLANIMÉTRICA

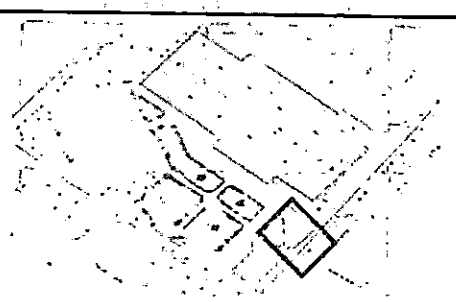


REGISTRO FOTOGRÁFICO

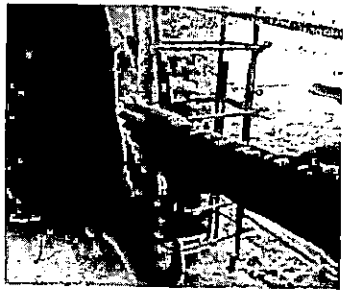

Alejandra Bolaños +
ARQ. ALEJANDRA BOLAÑOS
RESIDENTE CONTRATISTA

Arq. Jessica Lopera A.
ARQ. JESSICA LOPERA
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

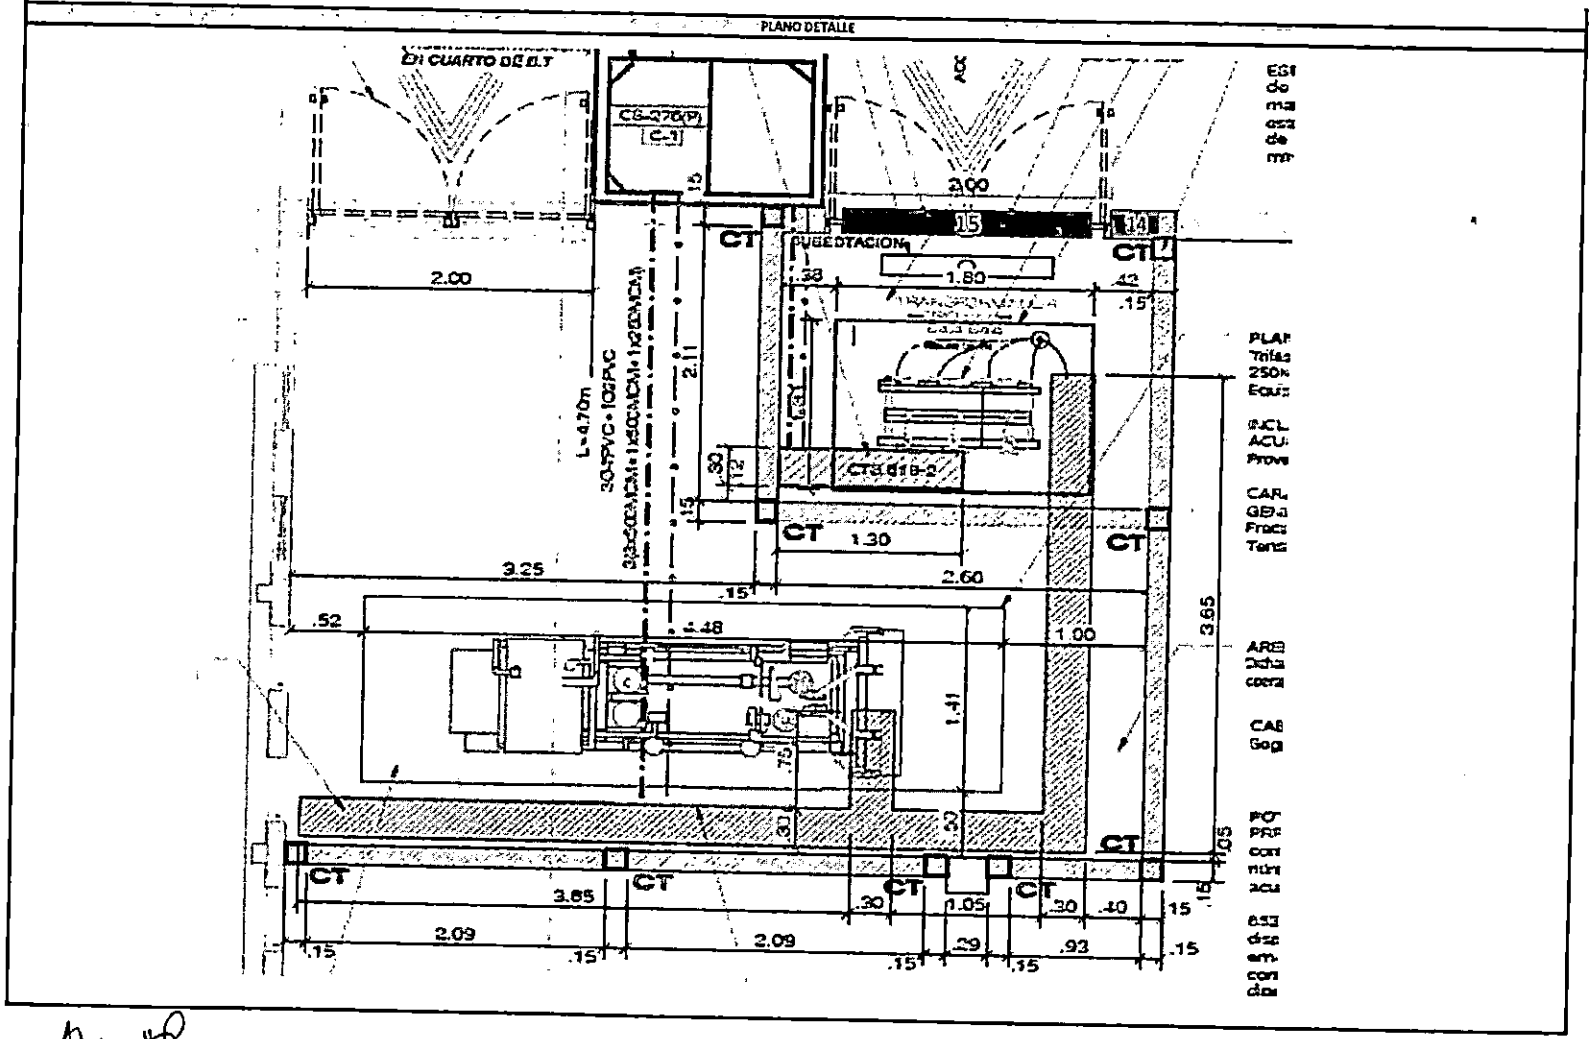

Nota #8

Vía Interv.

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA GENERAL | BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

PROYECTO: OBRAS SEDES ALCALDÍA

PRISMA UNIVERSAL SEC S.A.S. — CONSORCIO PRUNI SEDES 04 — CONTRATISTA


ARQUITECTURA URBANA LTDA — INTERVENTORÍA

ACTA No.	4		PERIODO DEL ACTA	01/11/2019	A	30/11/2019	
OBJETO	REALIZAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE AJUSTE LAS DIFERENTES OBRAS E INTERVENCIONES ESPECIALIZADAS PARA LAS DIFERENTES SEDES DE LA SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C.						
CONTRATO DE OBRA No	731-2019	CONTRATISTA	CONSORCIO PRUNI SEDES 04		ENTIDAD CONTRATANTE	SECRETARIA GENERAL-ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA	
CONTRATO INTERVENTORÍA	730 DE 2019	INTERVENTORÍA	ARQUITECTURA URBANA LTDA		FRENTE:	IMPRENTA DISTRITAL	

CAPITULO	2.8.0	RESTITUCIÓN DE ACABADOS	ITEM	2.8.0.13	Suministro figurada y amarre de acero 60000 PSI 420 Mpa	UNIDAD	KG

ITEM	LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES FIGURA	LARGO (m)	PESO (kg/m)	CANTIDAD	TOTAL	UNIDAD
					VIENEN	246,938	KG
	ADMINISTRACION 1ER PISO						
1	COLUMNETAS EJE 1' ENTRE A-B						
	Acero #4 recto		0,85	0,994	8,00	6,759	KG
	Acero #4 doble escuadra de L=1.20m		4,63	0,994	2,00	9,204	KG
	Acero #4 doble escuadra de L=1.20m		4,83	0,994	2,00	9,602	KG
	Fleje #3 .15m x .07m con .10m de gancho		0,50	0,560	33,00	9,240	KG
2	COLUMNETAS EJE 1' ENTRE B-C						
	Acero #4 recto		0,85	0,994	8,00	6,759	KG
	Acero #4 doble escuadra de L=1.20m		4,63	0,994	2,00	9,204	KG
	Acero #4 doble escuadra de L=1.20m		4,83	0,994	2,00	9,602	KG
	Fleje #3 .15m x .07m con .10m de gancho		0,50	0,560	33,00	9,240	KG
3	COLUMNETAS EJE 1' ENTRE C-D						
	Acero #4 recto		0,85	0,994	8,00	6,759	KG
	Acero #4 doble escuadra de L=1.20m		4,63	0,994	2,00	9,204	KG
	Acero #4 doble escuadra de L=1.20m		4,83	0,994	2,00	9,602	KG
	Fleje #3 .15m x .07m con .10m de gancho		0,50	0,560	33,00	9,240	KG
4	COLUMNETAS EJE 5' ENTRE A-B						
	Acero #4 recto		0,85	0,994	8,00	6,759	KG
	Acero #4 doble escuadra de L=1.20m		4,63	0,994	2,00	9,204	KG
	Acero #4 doble escuadra de L=1.20m		4,83	0,994	2,00	9,602	KG
	Fleje #3 .15m x .07m con .10m de gancho		0,50	0,560	33,00	9,240	KG
5	COLUMNETAS EJE 5' ENTRE B-C						
	Acero #4 recto		0,85	0,994	8,00	6,759	KG
	Acero #4 doble escuadra de L=1.20m		4,63	0,994	2,00	9,204	KG
	Acero #4 doble escuadra de L=1.20m		4,83	0,994	2,00	9,602	KG
	Fleje #3 .15m x .07m con .10m de gancho		0,50	0,560	33,00	9,240	KG
6	COLUMNETAS EJE A ENTRE 3'-4'						
	Acero #4 recto		4,30	0,994	8,00	34,194	KG
	Acero #4 recto		6,65	0,994	1,00	6,610	KG
	Acero #4 doble escuadra de L=1.20m		3,75	0,994	2,00	7,455	KG
	Fleje #3 .15m x .07m con .10m de gancho		0,50	0,560	53,00	14,840	KG
OBSERVACIONES:				SUBTOTAL		484,065	KG
				TOTAL		484,065	KG

LOCALIZACIÓN PLANIMÉTRICA

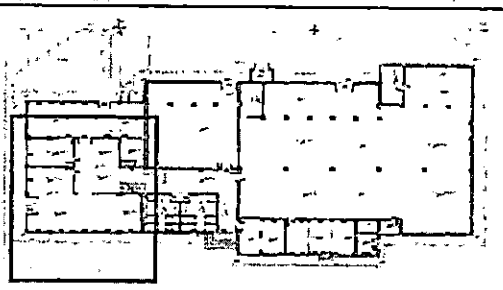

REGISTRO FOTOGRÁFICO



Alejandra Bolaños


ARQ. ALEJANDRA BOLAÑOS
RESIDENTE CONTRATISTA

Arq. Jessica Lopera

ARQ. JESSICA LOPERA
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

PLANO DETALLE

PRIMER PISO

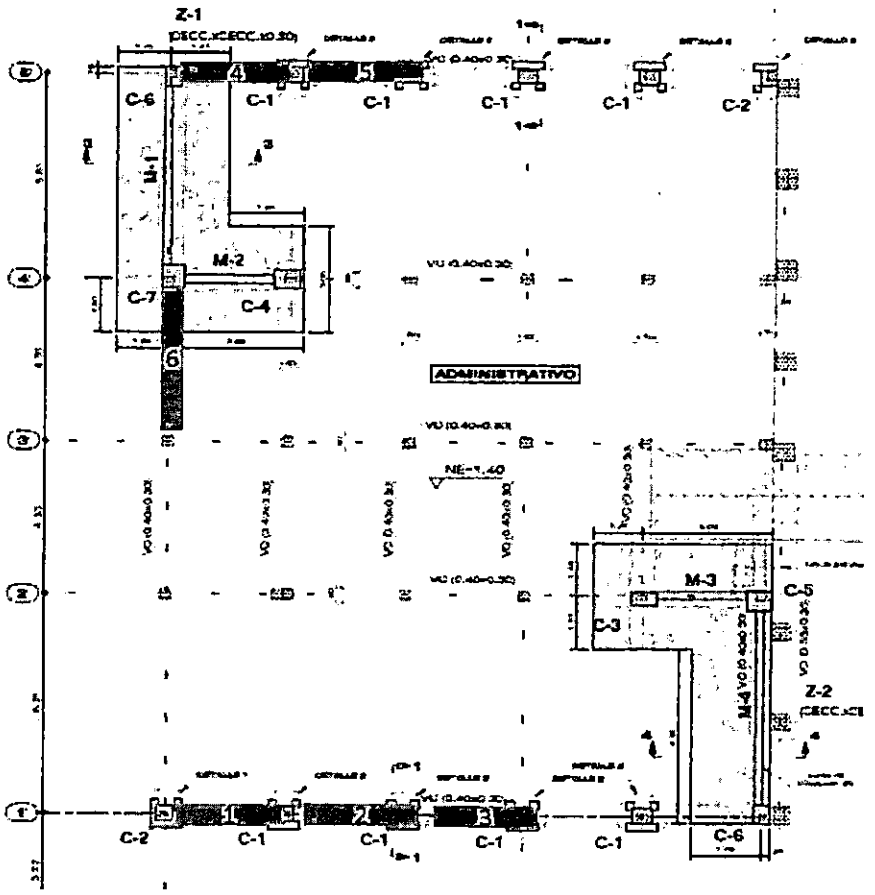

Alva B.

Ulu
Intern.

159.

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. | BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS
SECRETARÍA GENERAL

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

PROYECTO: OBRAS SEDES ALCALDÍA

PRISMA — UNIVERSAL SEC S.A.S. — CONSORCIO PRUNI SEDES 04 — CONTRATISTA

ARQUITECTURA URBANA LTDA. — INTERVENTORÍA


ACTA No.	4		PERIODO DEL ACTA	01/11/2019	A	30/11/2019
OBJETO	REALIZAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE AJUSTE LAS DIFERENTES OBRAS E INTERVENCIONES ESPECIALIZADAS PARA LAS DIFERENTES SEDES DE LA SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C.					
CONTRATO DE OBRA No	731-2019	CONTRATISTA	CONSORCIO PRUNI SEDES 04	ENTIDAD CONTRATANTE	SECRETARIA GENERAL-ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA	
CONTRATO INTERVENTORÍA	730 DE 2019	INTERVENTORÍA -	ARQUITECTURA URBANA LTDA	FRENTE:	IMPRENTA DISTRITAL	

CAPITULO	2.8.0	RESTITUCIÓN DE ACABADOS	ITEM	2.8.0.13	Suministro figurado y amarre de acero 60000 PSI 420 Mpa	UNIDAD	KG


ITEM	LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES FIGURA	DIMENSIONES LARGO (m)	DIMENSIONES PESO (kg/m)	CANTIDAD	TOTAL	UNIDAD
					VIENEN	484,064	KG
	ADMINISTRACION 2DO PISO						
7	COLUMNETAS EJE 1' ENTRE A-B						
	Acero #4 recto		1,60	0,994	2,00	3,181	KG
	Acero #4 doble escuadra de L=1.00m		2,95	0,994	2,00	5,865	KG
	Acero #4 doble escuadra de L=1.00m		3,45	0,994	2,00	6,859	KG
	Acero #4 recto		2,10	0,994	2,00	4,175	KG
	Fleje #3 .15m x .07m con .10m de gancho		0,50	0,560	30,00	8,400	KG
8	COLUMNETAS EJE 1' ENTRE B-C						
	Acero #4 recto		1,60	0,994	2,00	3,181	KG
	Acero #4 doble escuadra de L=1.00m		2,95	0,994	2,00	5,865	KG
	Acero #4 doble escuadra de L=1.00m		3,45	0,994	2,00	6,859	KG
	Acero #4 recto		2,10	0,994	2,00	4,175	KG
	Fleje #3 .15m x .07m con .10m de gancho		0,50	0,560	30,00	8,400	KG
9	COLUMNETAS EJE 1' ENTRE C-D						
	Acero #4 recto		1,60	0,994	2,00	3,181	KG
	Acero #4 doble escuadra de L=1.00m		2,95	0,994	2,00	5,865	KG
	Acero #4 doble escuadra de L=1.00m		3,45	0,994	2,00	6,859	KG
	Acero #4 recto		2,10	0,994	2,00	4,175	KG
	Fleje #3 .15m x .07m con .10m de gancho		0,50	0,560	30,00	8,400	KG
					SUBTOTAL	569,500	KG
					TOTAL	569,500	KG

OBSERVACIONES:

LOCALIZACIÓN PLANIMÉTRICA

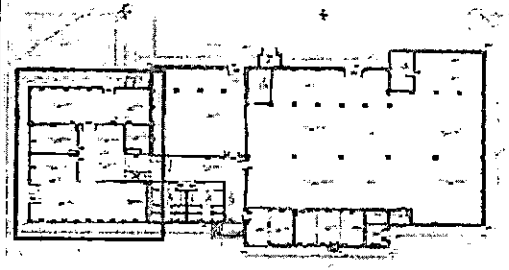

REGISTRO FOTOGRÁFICO

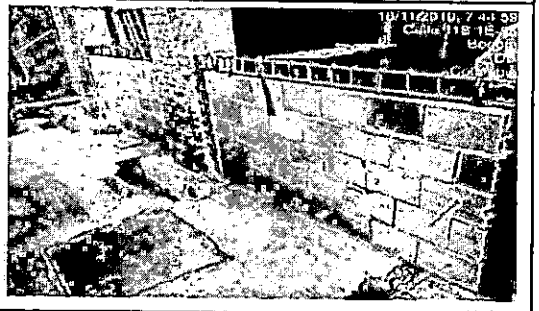


Alejandra Bolaños +
ARQ. ALEJANDRA BOLAÑOS
RESIDENTE CONTRATISTA

Arq. Jessica Lopera A.
ARQ. JESSICA LOPERA
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

PLANO DETALLE

SEGUNDO PISO

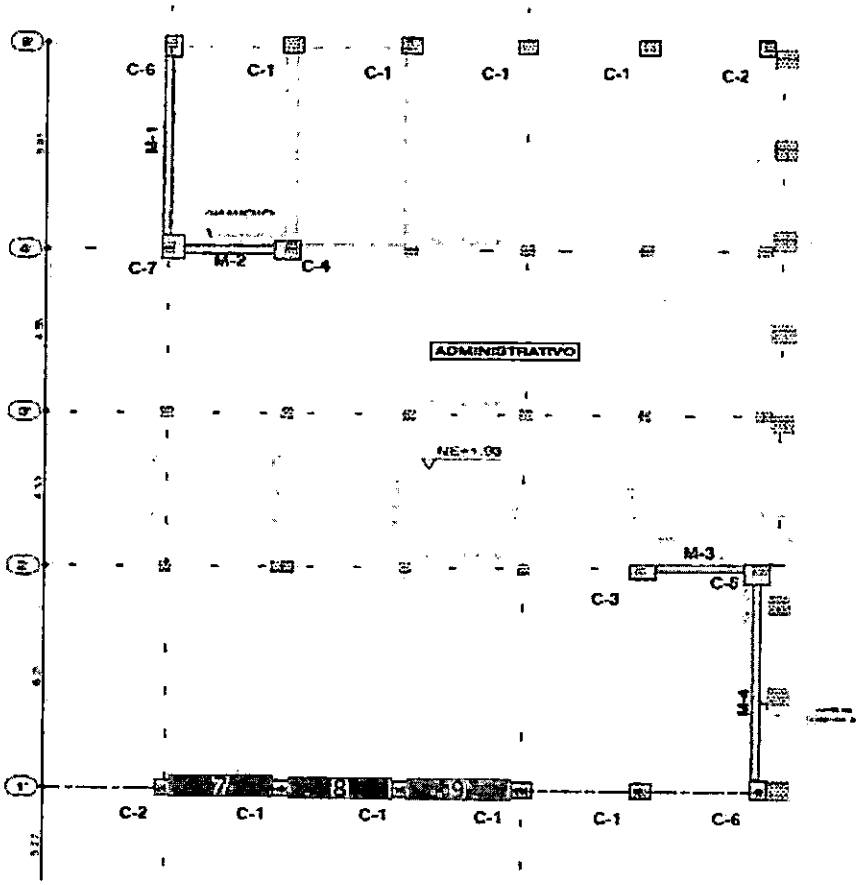

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARIA GENERAL

BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

PROYECTO: OBRAS SEDES ALCALDÍA

PRISMA — UNIVERSAL SEC S.A.S. — CONSORCIO PRISMA SEDES 04 — CONTRATISTA


ARQUITECTURA URBANA LTDA. — INTERVENTORÍA

ACTA No.	4		PERIODO DEL ACTA	01/11/2019	A	30/11/2019
OBJETO	REALIZAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE AJUSTE LAS DIFERENTES OBRAS E INTERVENCIONES ESPECIALIZADAS PARA LAS DIFERENTES SEDES DE LA SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C.					
CONTRATO DE OBRA No	731-2019	CONTRATISTA	CONSORCIO PRUNI SEDES 04	ENTIDAD CONTRATANTE	SECRETARIA GENERAL-ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA	
CONTRATO INTERVENTORÍA	730 DE 2019	INTERVENTORÍA	ARQUITECTURA URBANA LTDA	FRENTE	IMPRENTA DISTRITAL	

CAPITULO	3.2.0	INSTALACIONES ELÉCTRICAS	ITEM	3.2.0.4	Suministro e instalación de caja de inspección tipo norma Codensa 276	UNIDAD	UN

ITEM	LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	TOTAL	UNIDAD
	COSTADO SUR						
1	Caja tipo norma codensa 276				4,00	4,00	UN

PLANO DETALLE

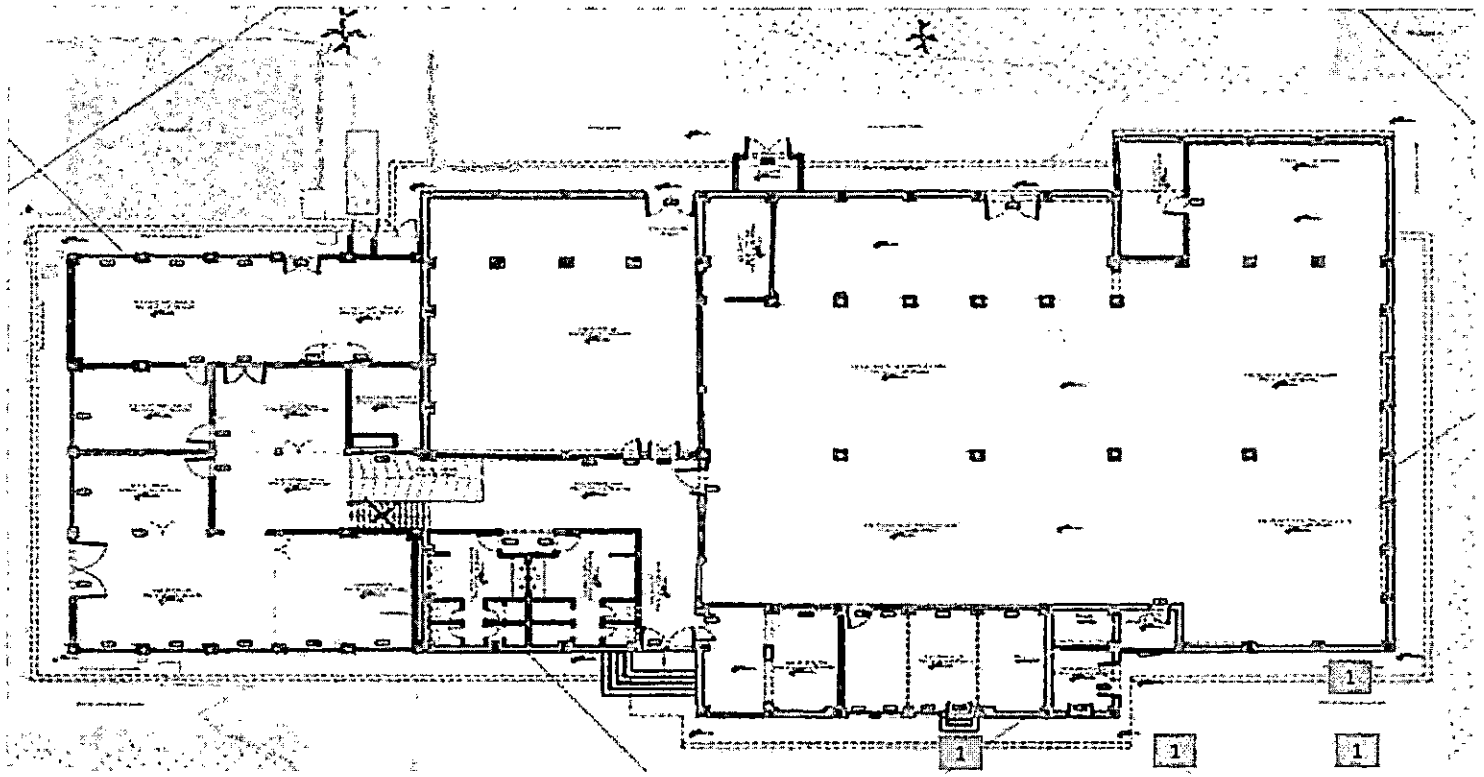

Vía Interior.

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA GENERAL | BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

PROYECTO: OBRAS SEDES ALCALDÍA

PRISMA | UNIVERSAL SEC S.A.S. CONSORCIO PRUNI SEDES 04 — CONTRATISTA

ARQUITECTURA URBANA LTDA — INTERVENTORÍA


ACTA No.			PERIODO DEL ACTA	01/11/2019	A	30/11/2019
OBJETO	REALIZAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE AJUSTE LAS DIFERENTES OBRAS E INTERVENCIONES ESPECIALIZADAS PARA LAS DIFERENTES SEDES DE LA SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C.					
CONTRATO DE OBRA No	731-2019	CONTRATISTA	CONSORCIO PRUNI SEDES 04	ENTIDAD CONTRATANTE	SECRETARIA GENERAL-ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA	
CONTRATO INTERVENTORÍA	730 DE 2019	INTERVENTORÍA	ARQUITECTURA URBANA LTDA	FRENTE:	IMPRENTA DISTRITAL	

CAPITULO	3.3.0	INSTALACIONES ELÉCTRICAS	ITEM	3.3.0.1	Suministro e instalación de muro en ladrillo tolete	UNIDAD	M2


ITEM	LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES LARGO	DIMENSIONES ANCHO	DIMENSIONES ALTO	CANTIDAD	TOTAL	UNIDAD
	ARCHIVO						
1	MURO PLANTA ELÉCTRICA		1,95	2,65	1,00	5,17	M2
2	MURO PLANTA ELÉCTRICA		2,60	2,65	1,00	6,89	M2
3	MURO PLANTA ELÉCTRICA		1,95	2,65	1,00	5,17	M2
4	MURO NTRADA PLANTA ELÉCTRICA		1,20	2,30	1,00	2,76	M2
					SUBTOTAL	19,99	M2
					TOTAL	19,99	M2

OBSERVACIONES:

LOCALIZACIÓN PLANIMÉTRICA

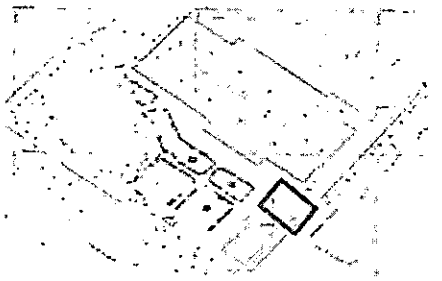

REGISTRO FOTOGRÁFICO




Alejandra Bolaños +

ARQ. ALEJANDRA BOLAÑOS
RESIDENTE CONTRATISTA

Arq. Jessica Lopera Franco

ARQ. JESSICA LOPERA
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

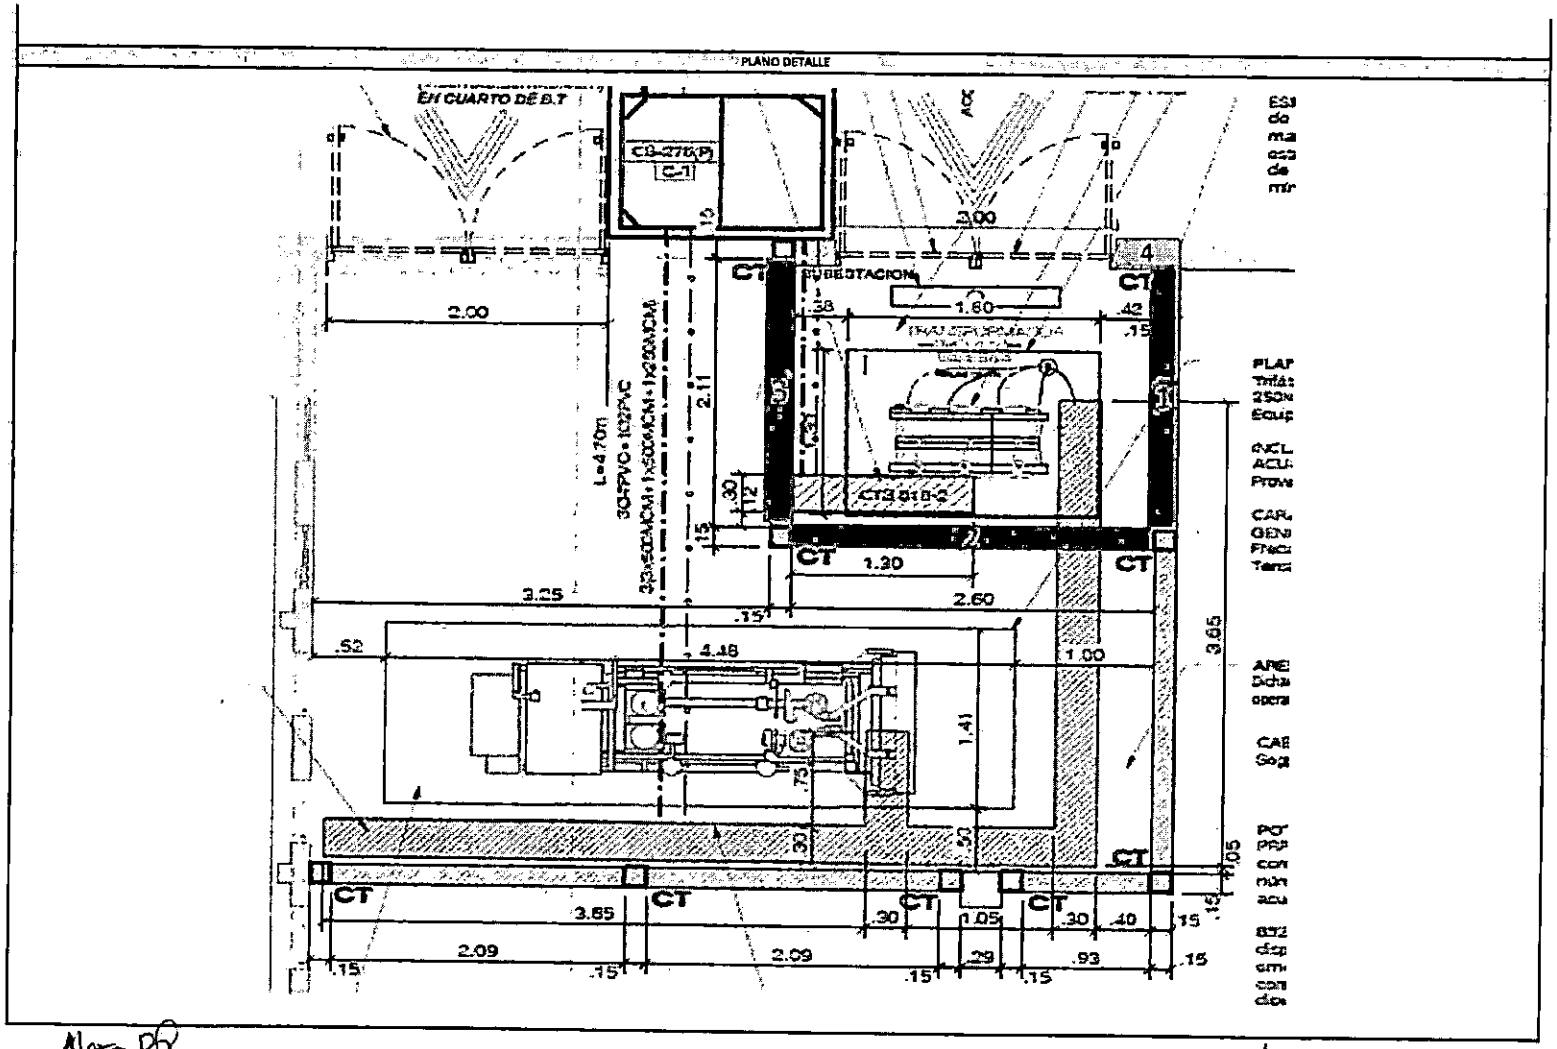

Nota P&C

Ing. Antonio.

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA GENERAL

BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

PROYECTO: OBRAS SEDES ALCALDÍA

PRISMA
UNIVERSAL SEC S.A.S.
CONSORCIO PRUNI BOGOTÁ 04
CONTRATISTA

ARQUITECTURA URBANA LTDA.
INTERVENTORÍA


ACTA No.	4		PERIODO DEL ACTA	01/11/2019	A	30/11/2019	
OBJETO:	REALIZAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE AJUSTE LAS DIFERENTES OBRAS E INTERVENCIONES ESPECIALIZADAS PARA LAS DIFERENTES SEDES DE LA SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C.						
CONTRATO DE OBRA No	731-2019	CONTRATISTA	CONSORCIO PRUNI SEDES 04		ENTIDAD CONTRATANTE	SECRETARIA GENERAL-ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA	
CONTRATO INTERVENTORÍA	730 DE 2019	INTERVENTORÍA	ARQUITECTURA URBANA LTDA		FRENTE:	IMPRENTA DISTRITAL	

CAPITULO	3.3.0	INSTALACIONES ELÉCTRICAS	ITEM	3.3.0.2	Demolición de muro existente	UNIDAD	M2


ITEM	LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	TOTAL	UNIDAD
	FACHADA NORTE 2DO PISO						
1	EJE 5' ENTRE EJES D-E	2,80	2,00		1,00	5,60	M2
	ARCHIVO						
2	ENTRADA PLANTA ELÉCTRICA	2,70	2,70		1,00	7,29	M2
3	ENTRADA PLANTA ELÉCTRICA	2,70	2,70		1,00	7,29	M2
	DATACENTER						
4	FACHADA SUR	1,40	2,72		1,00	3,81	M2
5	DIVISIÓN	1,00	2,20		1,00	2,20	M2
6	COSTADO ESCALERA	2,75	3,40		1,00	9,35	M2
	BAÑO HOMBRES 1ER PISO						
7	DIVISIÓN SANITARIOS	2,75	2,35		1,00	6,46	M2
8	DIVISIÓN SANITARIOS	2,75	2,35		1,00	6,46	M2
	FACHADA NORTE 1ER PISO						
9	MUROS DIVISORIOS COMPRESOR	2,20	1,00		3,00	6,60	M2
10	EJE 5' ENTRE EJES E-F	3,30	0,80		2,00	5,28	M2
	CAFETERÍA 2DO PISO						
11	EJE 5' ENTRE EJES E-F	2,60	1,80		1,00	4,68	M2

PLANO DETALLE

EDIFICIO ADMINISTRATIVO P-1

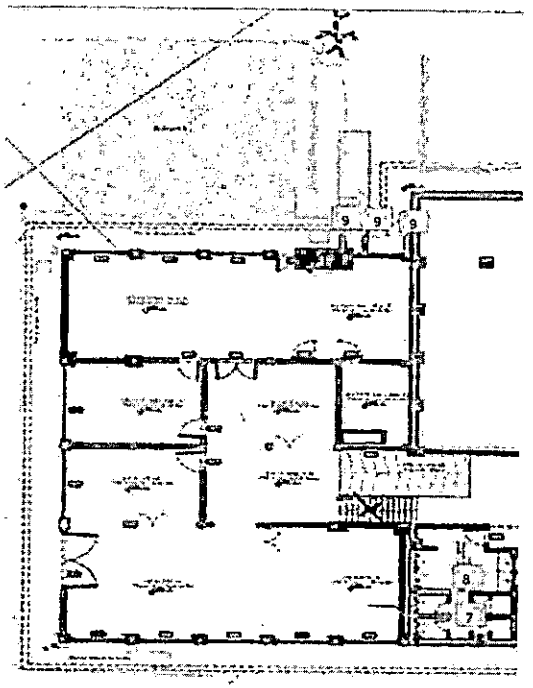


ARCHIVO

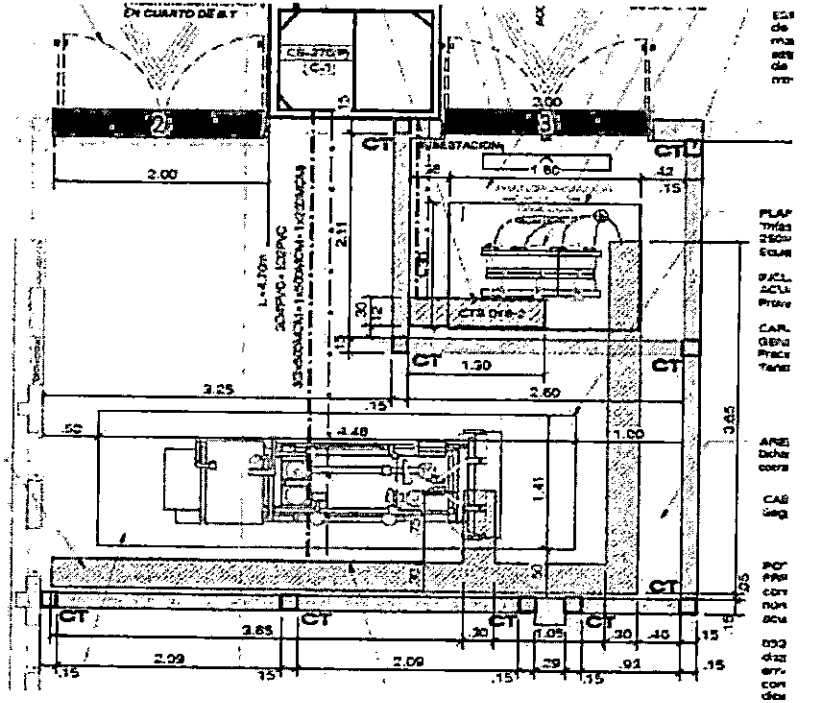

Alega PB

Interv.

EDIFICIO ADMINISTRATIVO P-2

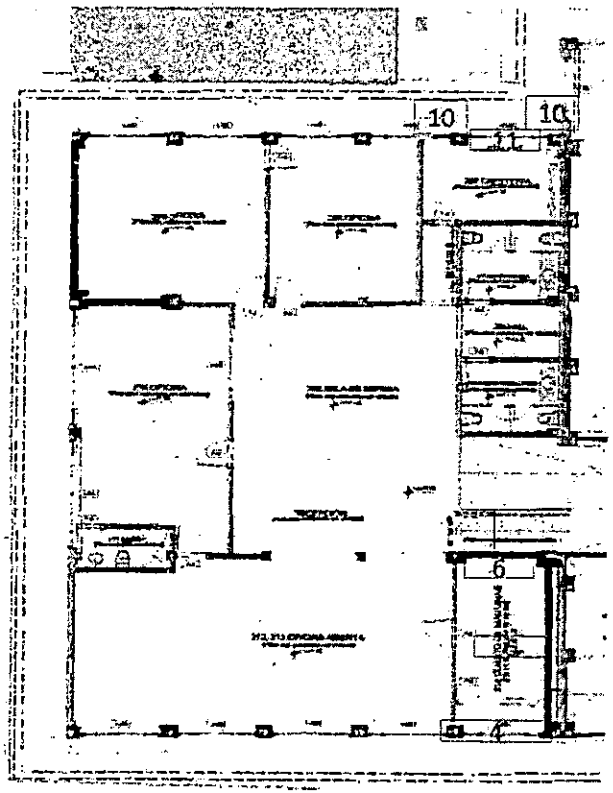

Interv.

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
Secretaría Integración Social

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

PROYECTO: OBRAS SEDES ALCALDÍA

PRISMA — UNIVERSAL SEC S.A.S. — CONSORCIO PRUNI SEDES 04 — CONTRATISTA


ARQUITECTURA URBANA LTDA. — INTERVENTORÍA

ACTA No.	4	PERIODO DEL ACTA	01/11/2019	A	30/11/2019	
OBJETO	REALIZAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE AJUSTE LAS DIFERENTES OBRAS E INTERVENCIONES ESPECIALIZADAS PARA LAS DIFERENTES SEDES DE LA SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C.					
CONTRATO DE OBRA No	731-2019	CONTRATISTA	CONSORCIO PRUNI SEDES 04	ENTIDAD CONTRATANTE	SECRETARIA GENERAL-ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA	
CONTRATO INTERVENTORÍA	730 DE 2019	INTERVENTORÍA	ARQUITECTURA URBANA LTDA	FRENTE:	IMPRENTA DISTRITAL	


CAPITULO	3.3.0	INSTALACIONES ELÉCTRICAS	ITEM	3.3.0.5	Suministro e instalación de columnas y dintel 15x20 para puerta metalica de 1.80m+2,50m	UNIDAD	ML

ITEM	LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	TOTAL	UNIDAD
	PLANTA ELECTRICA (ARCHIVO)						
1	COLUMNETA (,20*,20)			2,65	1,00	2,65	ML
2	COLUMNETA (,20*,20)			2,65	1,00	2,65	ML
3	COLUMNETA (,20*,20)			2,65	1,00	2,65	ML
4	COLUMNETA (,20*,20)			2,65	1,00	2,65	ML
5	COLUMNETA (,20*,20)			2,65	1,00	2,65	ML
6	COLUMNETA (,20*,20)			2,65	1,00	2,65	ML
7	COLUMNETA (,20*,20)			2,65	1,00	2,65	ML
8	COLUMNETA (,20*,20)			2,65	1,00	2,65	ML
9	COLUMNETA (,20*,20)			2,65	1,00	2,65	ML
10	COLUMNETA (,20*,25)			2,53	1,00	2,53	ML
11	COLUMNETA (,20*,25)			2,53	1,00	2,53	ML
						-	
OBSERVACIONES:				SUBTOTAL		28,91	ML
				TOTAL		28,91	ML

LOCALIZACIÓN PLANIMÉTRICA

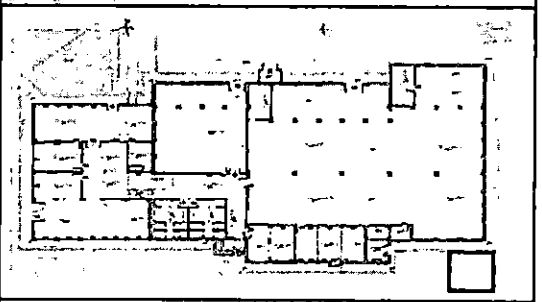


REGISTRO FOTOGRÁFICO

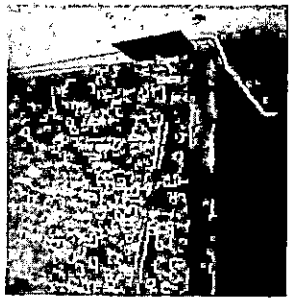

Alejandra Bolaños +
ARQ. ALEJANDRA BOLAÑOS
RESIDENTE CONTRATISTA

Arq. Jessica Lopera Arango
ARQ. JESSICA LOPERA
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

PLANO DETALLE

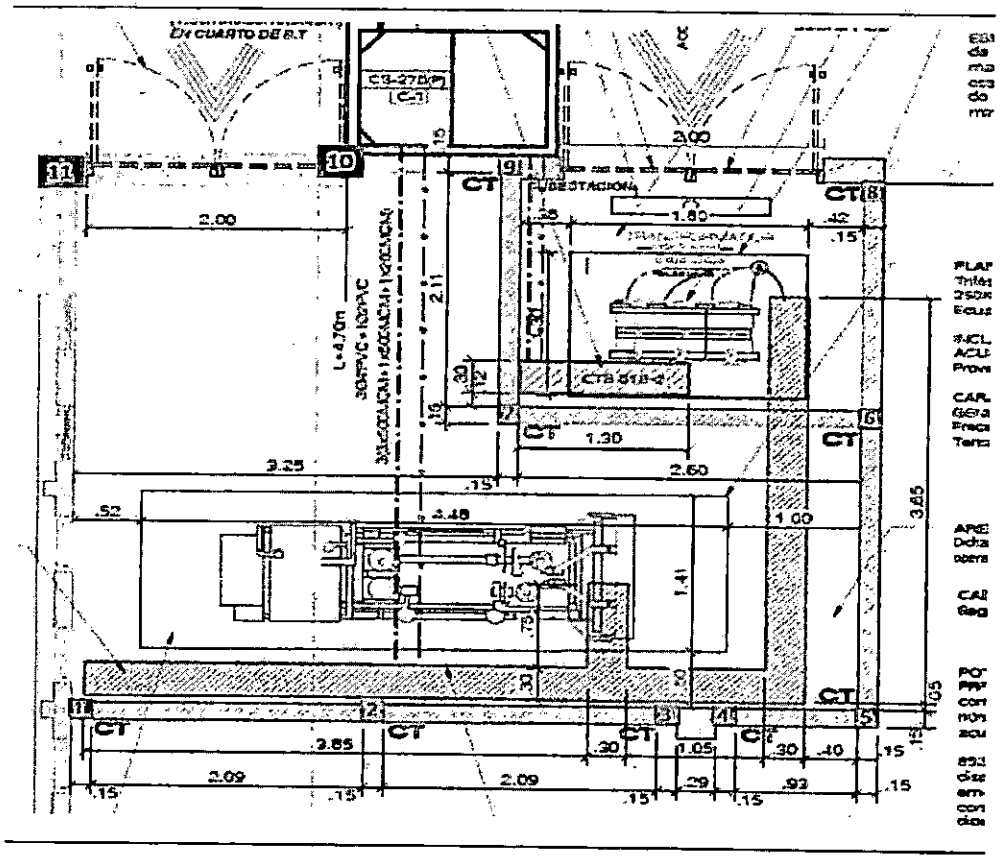

Nota

Interv.

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA GENERAL | BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

PROYECTO: OBRAS SEDES ALCALDÍA

PRISMA | UNIVERSAL SEC S.A.S. CONSORCIO PRUNI SEDES 04 — CONTRATISTA


ARQUITECTURA URBANA LTDA — INTERVENTORÍA

ACTA No.	4	PERIODO DEL ACTA:	01/11/2019	A	30/11/2019	
OBJETO	REALIZAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE AJUSTE LAS DIFERENTES OBRAS E INTERVENCIONES ESPECIALIZADAS PARA LAS DIFERENTES SEDES DE LA SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C.					
CONTRATO DE OBRA No	731-2019	CONTRATISTA	CONSORCIO PRUNI SEDES 04	ENTIDAD CONTRATANTE	SECRETARIA GENERAL-ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA	
CONTRATO INTERVENTORÍA	730 DE 2019	INTERVENTORÍA	ARQUITECTURA URBANA LTDA	FRENTE:	IMPRENTA DISTRITAL	

CAPITULO	3.3.0	INSTALACIONES ELÉCTRICAS	ITEM	3.3.0.7	Suministro e instalación de muro ladrillo tolete	UNIDAD	ML

ITEM	LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	TOTAL	UNIDAD
	FACHADA COSTADO NORTE (1ER PISO)						
1	COLUMNA C-1 EJES C-5'	3,15			1,00	3,15	ML
2	COLUMNA C-1 EJES B-5'	3,10			1,00	3,10	ML
3	COLUMNA C-6 EJES A-5'	3,25			1,00	3,25	ML
	FACHADA COSTADO OCCIDENTAL (1ER PISO)					-	
4	COLUMNA C-6 EJES A-5'	3,05			1,00	3,05	ML
5	COLUMNA C-7 EJES A-4'	3,05			1,00	3,05	ML
	FACHADA COSTADO SUR (1ER PISO)					-	
6	COLUMNA C-1 EJES C-1'	3,05			1,00	3,05	ML
	ESQUINA SUR-OCCIDENTAL (1ER PISO)						
7	ADYACENTE COLUMNA C-2 EJES A-1'	3,09			1,00	3,09	ML
	ESQUINA SUR-OCCIDENTAL (2DO PISO)						
8	ADYACENTE COLUMNA C-2 EJES A-1'	2,50			1,00	2,50	ML
	EDIFICIO ADMINISTRATIVO 1ER PISO					-	
9	ADYACENTE MURO M-2	3,09			1,00	3,09	ML
	EDIFICIO ADMINISTRATIVO 2DO PISO					-	
10	ADYACENTE MURO M-2	2,90			1,00	2,90	ML

PLANO DETALLE

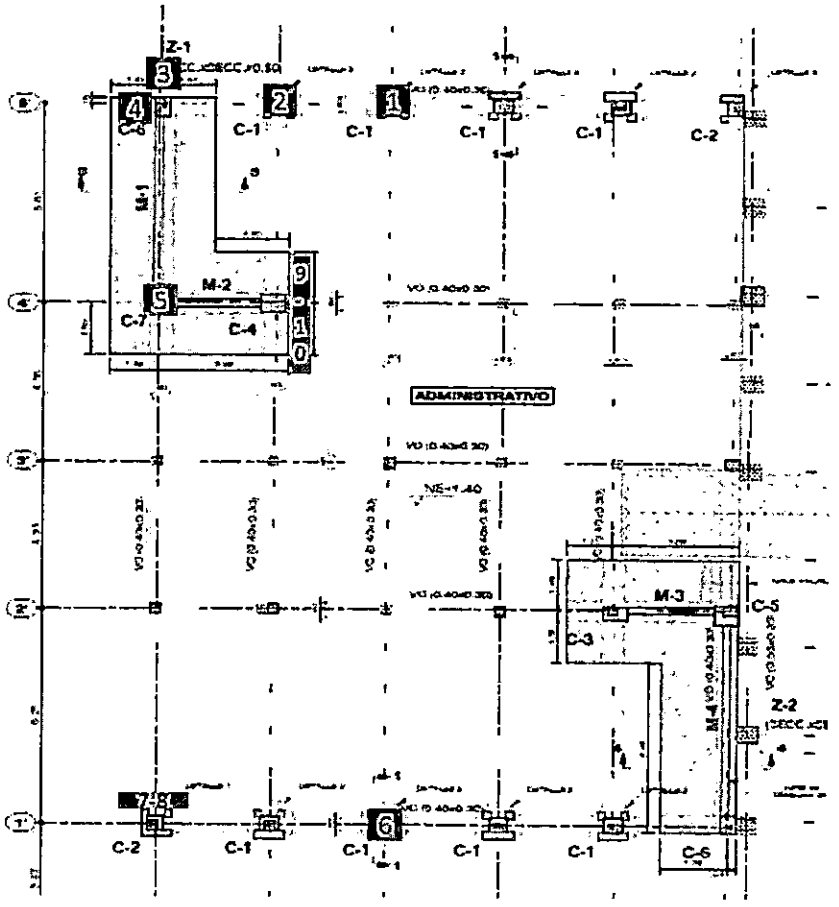

Alzado PP

Interior.

SW

1-12

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA GENERAL | BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

PROYECTO: OBRAS SEDES ALCALDÍA

PRISMA — UNIVERSAL SEC S.A.S. — CONSORCIO PRUNI SEDES 04 — CONTRATISTA

ARQUITECTURA URBANA LTDA. — INTERVENTORÍA


ACTA No.	4		PERIODO DEL ACTA	01/11/2019	A	30/11/2019
OBJETO	REALIZAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE AJUSTE LAS DIFERENTES OBRAS E INTERVENCIONES ESPECIALIZADAS PARA LAS DIFERENTES SEDES DE LA SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C.					
CONTRATO DE OBRA No.	731-2019	CONTRATISTA	CONSORCIO PRUNI SEDES 04	ENTIDAD CONTRATANTE	SECRETARIA GENERAL-ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA	
CONTRATO INTERVENTORÍA	730 DE 2019	INTERVENTORÍA	ARQUITECTURA URBANA LTDA	FRENTE:	IMPRENTA DISTRITAL	

CAPITULO	3.3.0	INSTALACIONES ELÉCTRICAS	ITEM	3.3.0.9	Movimiento de Rack de comunicaciones existente	UNIDAD	GL


ITEM	LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	TOTAL	UNIDAD
	ARCHIVO						
1	PLANTA ELECTRICA				1,00	1,00	GL
	SUBTOTAL					1,00	GL
	TOTAL					1,00	GL

OBSERVACIONES:

LOCALIZACIÓN PLANIMÉTRICA

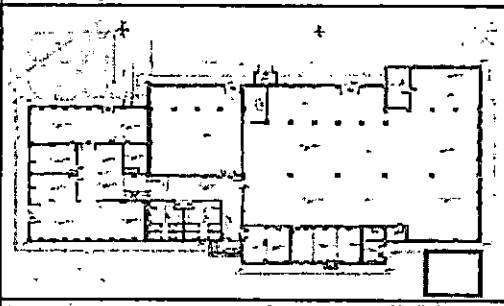

REGISTRO FOTOGRÁFICO



Alejandra Bolaños

ARQ. ALEJANDRA BOLAÑOS
RESIDENTE CONTRATISTA

Arq. Jessica Lopera A.

ARQ. JESSICA LOPERA
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA GENERAL

BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

PROYECTO: OBRAS SEDES ALCALDÍA

PRISMA — UNIVERSAL SEC S.A.S. — CONSORCIO PRUNI SEDES 04 — CONTRATISTA


ARQUITECTURA URBANA LTDA — INTERVENTORÍA

ACTA No.	4		PERIODO DEL ACTA	01/11/2019	A	30/11/2019
OBJETO	REALIZAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE AJUSTE LAS DIFERENTES OBRAS E INTERVENCIONES ESPECIALIZADAS PARA LAS DIFERENTES SEDES DE LA SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C.					
CONTRATO DE OBRA No	731-2019	CONTRATISTA	CONSORCIO PRUNI SEDES 04	ENTIDAD CONTRATANTE	SECRETARIA GENERAL-ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA	
CONTRATO INTERVENTORÍA	730 DE 2019	INTERVENTORÍA	ARQUITECTURA URBANA LTDA	FRENTE:	IMPRENTA DISTRITAL	


CAPITULO	3.4.0	SISTEMA CONTRA INCENDIO	ITEM	3.4.0.4	Excavación manual en material compactado	UNIDAD	M3

ITEM	LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	TOTAL	UNIDAD
	BODEGA ENTRADA						
	Excavación caja de inspeccion electrica Eje 1 y 2 entre K -L	1,00	1,00	2,30	1,00	2,30	M3
	CUARTO ELÉCTRICO						
	Excavación caja de inspección electrica ubicado en Cuarto de Electrico Zona de Producción	1,00	0,80	1,60	1,00	1,28	M3
OBSERVACIONES:				SUBTOTAL		3,58	M3
				TOTAL		3,58	M3

LOCALIZACIÓN PLANIMÉTRICA

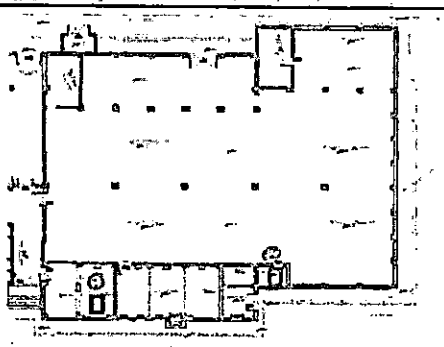

REGISTRO FOTOGRÁFICO

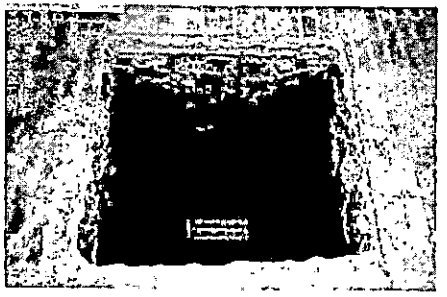

Alejandra Bolaños +
ARQ. ALEJANDRA BOLAÑOS
RESIDENTE CONTRATISTA

Arq. Jessica Lopera A
ARQ. JESSICA LOPERA
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA GENERAL

BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA


PROYECTO: OBRAS SEDES ALCALDÍA

PRISMA — UNIVERSAL SEC S.A.S. — CONSORCIO PRUNI SEDES 04 — CONTRATISTA

ARQUITECTURA URBANA LTDA — INTERVENTORÍA

ACTA No.	4	PERIODO DEL ACTA	01/11/2019	A	30/11/2019		
OBJETO	REALIZAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE AJUSTE LAS DIFERENTES OBRAS E INTERVENCIONES ESPECIALIZADAS PARÁ LAS DIFERENTES SEDES DE LA SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C.						
CONTRATO DE OBRA No.	731-2019	CONTRATISTA	CONSORCIO PRUNI SEDES 04		ENTIDAD CONTRATANTE	SECRETARIA GENERAL-ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA	
CONTRATO INTERVENTORÍA	730 DE 2019	INTERVENTORÍA	ARQUITECTURA URBANA LTDA		FRENTE:	IMPRENTA DISTRITAL	

CAPITULO		NP	CIVIL		ITEM	NP CIVIL - IMP 06	Desmonte de ventanas metálicas	UNIDAD	M2
ITEM	LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	TOTAL	UNIDAD	LOCALIZACIÓN PLANIMÉTRICA	
	FACHADA NORTE 2DO PISO								
1	EJE 5' ENTRE EJES D-E	2,70		1,20	1,00	3,24	M2		
	DATACENTER (2DO PISO)								
2	FACHADA SUR	2,72		1,20	1,00	3,26	M2		
3	DIVISIÓN INTERNA	2,20		1,32	1,00	2,90	M2		
	CAFETERÍA 2DO PISO								
4	FACHADA NORTE 2DO PISO	2,60		1,20	1,00	3,12	M2		
OBSERVACIONES:				SUBTOTAL		12,53	M2		
				TOTAL		12,53	M2		

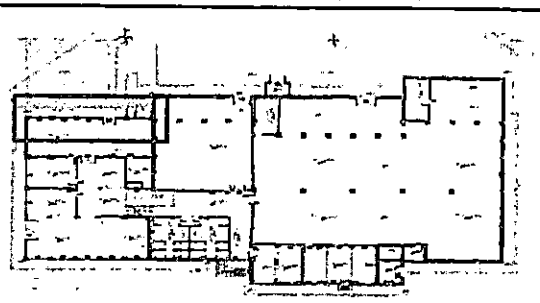

REGISTRO FOTOGRÁFICO




Alejandra Bolaños

ARQ. ALEJANDRA BOLAÑOS
RESIDENTE CONTRATISTA

Arq. Jessica Lopera A

ARQ. JESSICA LOPERA
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

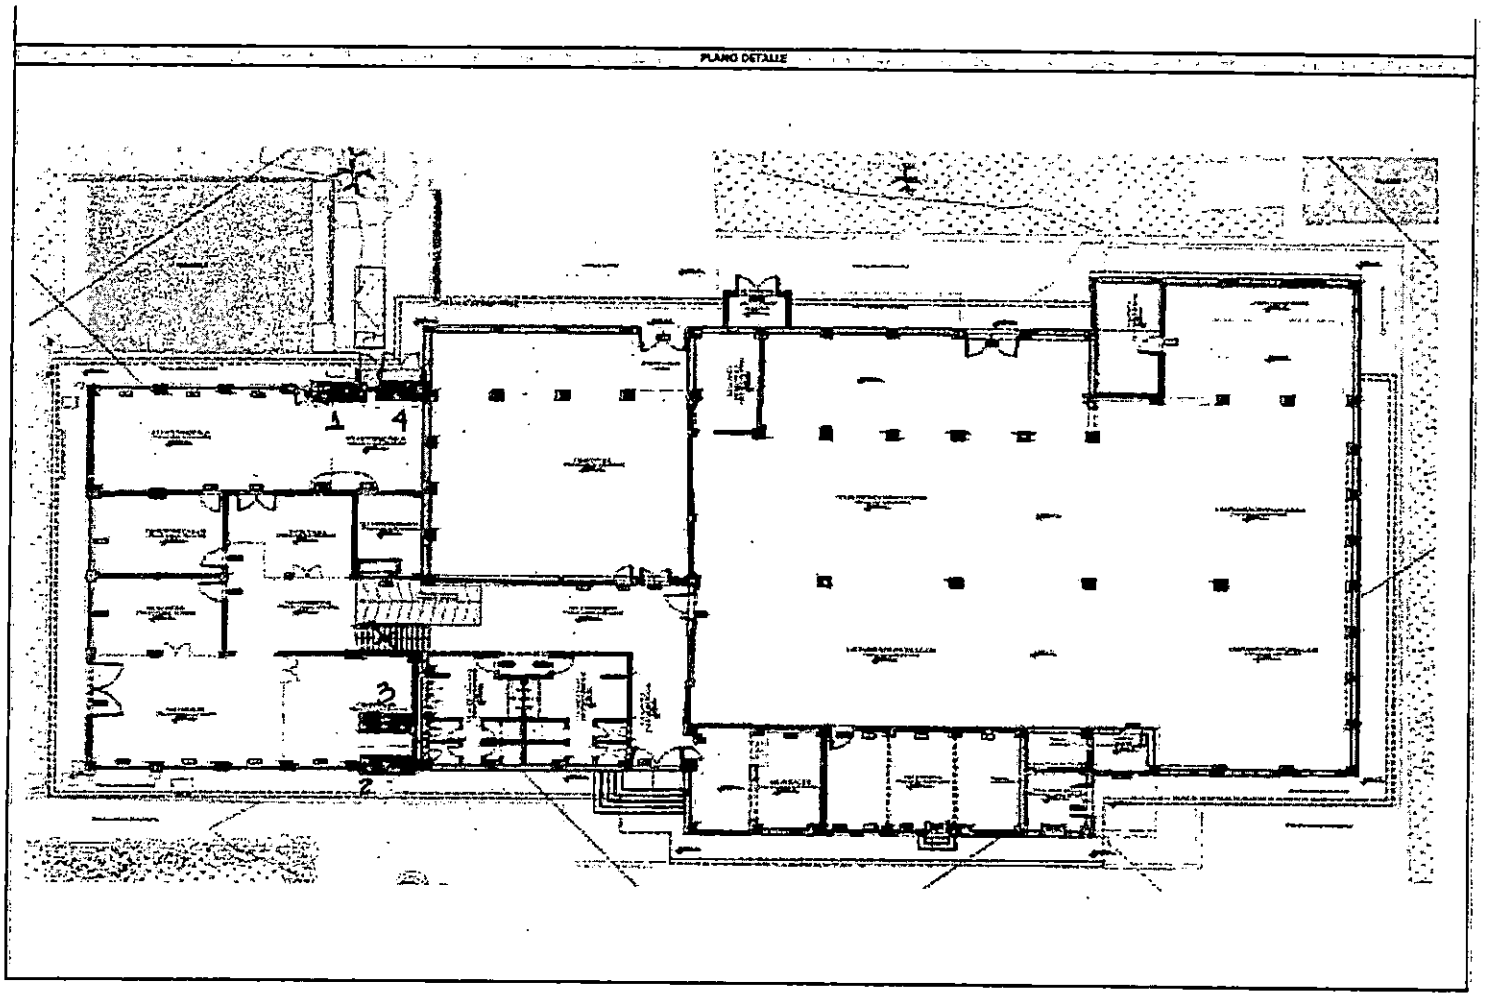

Pla
Interv.

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA GENERAL | BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

PROYECTO: OBRAS SEDES ALCALDÍA


PRISMA — UNIVERSAL SEC S.A.S. — CONSORCIO PRUNI SEDES 04 — CONTRATISTA


ARQUITECTURA URBANA LTDA. — INTERVENTORÍA

ACTA No.	4	PERIODO DEL ACTA	01/11/2019	A	30/11/2019		
OBJETO	REALIZAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE AJUSTE LAS DIFERENTES OBRAS E INTERVENCIONES ESPECIALIZADAS PARA LAS DIFERENTES SEDES DE LA SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C.						
CONTRATO DE OBRA No	731-2019	CONTRATISTA	CONSORCIO PRUNI SEDES 04	ENTIDAD CONTRATANTE	SECRETARIA GENERAL-ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA		
CONTRATO INTERVENTORÍA	730 DE 2019	INTERVENTORÍA	ARQUITECTURA URBANA LTDA	FRENTE:	IMPRENTA DISTRITAL		

CAPITULO		NP	CIVIL		ITEM	NP CIVIL - IMP 26	Desmonte de puertas	UNIDAD	M2
ITEM	LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	TOTAL	UNIDAD	LOCALIZACIÓN PLANIMÉTRICA	
	FACHADA NORTE 2DO PISO								
1	EJE 5' ENTRE EJES D-E	1,85		2,25	1,00	4,16	M2		
	DATACENTER								
2	PUERTA INTERNA	1,05		2,35	1,00	2,47	M2		
	BAÑO HOMBRES 1ER PISO								
3	PUERTAS METÁLICAS	0,55		1,60	4,00	3,52	M2		
4	DIVISIONES METÁLICAS	0,55		1,60	2,00	1,76	M2		
	BAÑO HOMBRES 2DO PISO								
5	PUERTAS METÁLICAS	0,55		1,60	2,00	1,76	M2		
6	DIVISIONES METÁLICAS	0,90		1,60	3,00	4,32	M2		
	BAÑO HOMBRES 2DO PISO								
7	PUERTAS METÁLICAS	0,55		1,60	2,00	1,76	M2		
8	DIVISIONES METÁLICAS	0,90		1,60	3,00	4,32	M2		
	PROTECCIÓN COMPRESOR								
9	PUERTA METÁLICAS	0,90		2,20	1,00	1,98	M2		
10	PUERTAS METÁLICAS	0,95		2,20	2,00	4,18	M2		

PLANO DETALLE

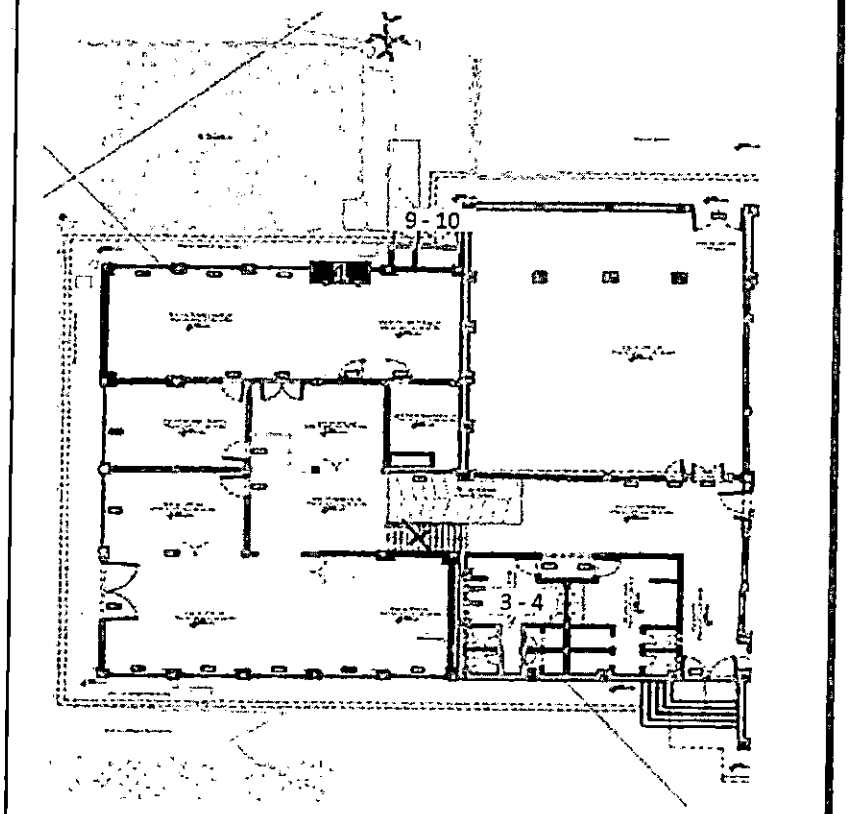

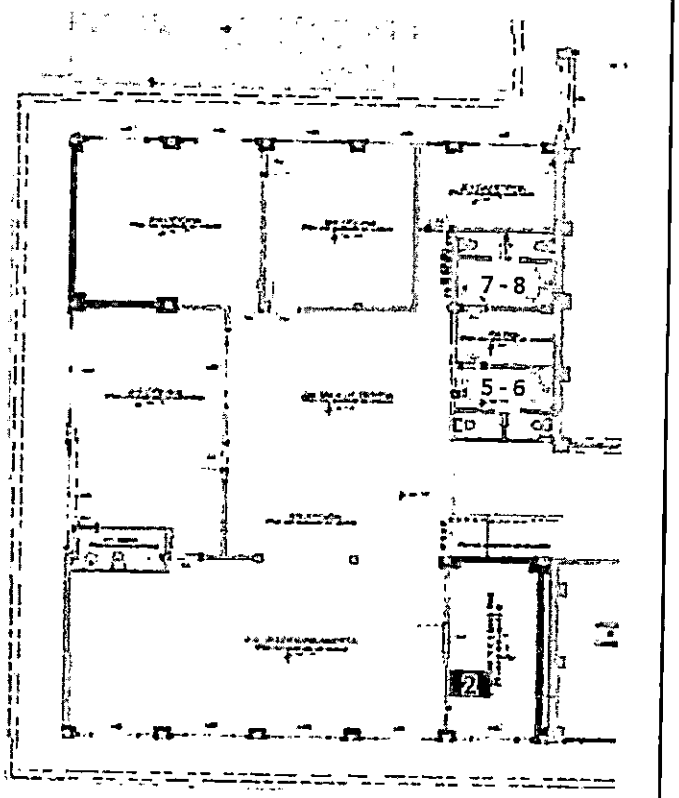

Regards

Inter.

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA GENERAL | BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

PROYECTO: OBRAS SEDES ALCALDÍA

PRISMA — UNIVERSAL SEC S.A.S. — CONSORCIO PRUNI SEDES 04 — CONTRATISTA

ARQUITECTURA URBANA LTDA. — INTERVENTORÍA


ACTA No.	4		PERIODO DEL ACTA	01/11/2019	A	30/11/2019	
OBJETO	REALIZAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE AJUSTE LAS DIFERENTES OBRAS E INTERVENCIONES ESPECIALIZADAS PARA LAS DIFERENTES SEDES DE LA SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C.						
CONTRATO DE OBRA No.	731-2019	CONTRATISTA	CONSORCIO PRUNI SEDES 04		ENTIDAD CONTRATANTE	SECRETARIA GENERAL-ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA	
CONTRATO INTERVENTORÍA	730 DE 2019	INTERVENTORÍA	ARQUITECTURA URBANA LTDA		FRENTE:	IMPRENTA DISTRITAL	

CAPITULO		NP	ELÉCTRICO		ITEM	IMP 103	DESMONTE Y REINSTALACIÓN DE CANALETA METÁLICA 8x4, INCLUYE CARGUE Y ALMACENAMIENTO EN SITIO DONDE DISPONGA LA INTERVENTORIA	UNIDAD	ML


ITEM	LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	TOTAL	UNIDAD
	PRODUCCIÓN						
1	[redacted]	33,00			0,50	16,50	ML
					SUBTOTAL	16,50	ML
					TOTAL	16,50	ML

OBSERVACIONES: SE PAGA SOLO EL 50% QUE ES DESMONTE

LOCALIZACIÓN PLANIMÉTRICA

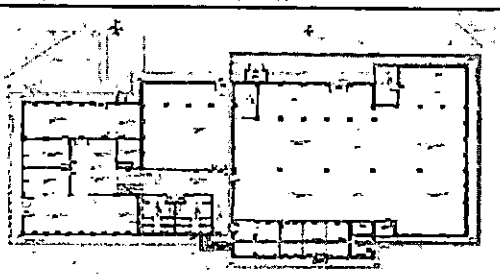

REGISTRO FOTOGRÁFICO




Alejandra Bolaños T
ARQ. ALEJANDRA BOLAÑOS
RESIDENTE CONTRATISTA

Arq. Jessica Lopera A
ARQ. JESSICA LOPERA
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

PLANO DETALLE

Zona Producción

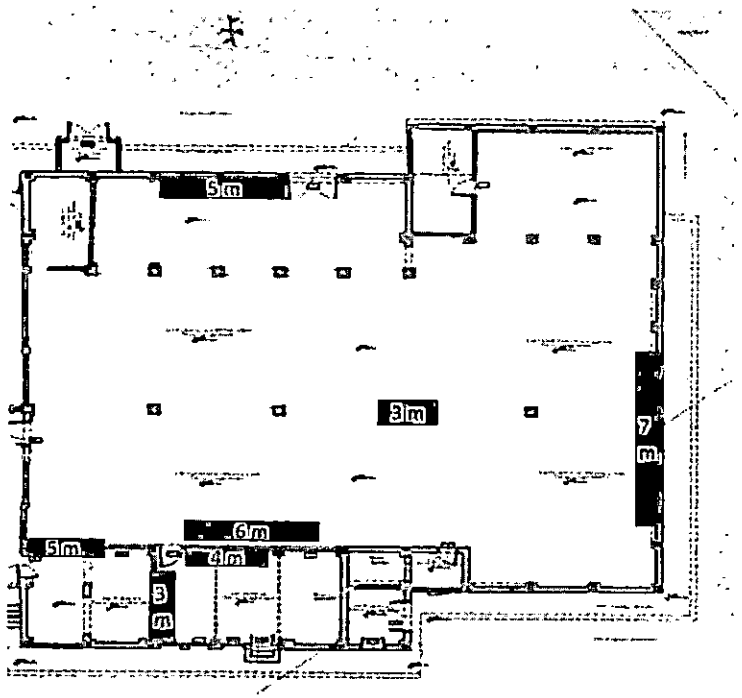

Nota

Ala
Interv.

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA GENERAL | BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

PROYECTO: OBRAS SEDES ALCALDÍA

PRISMA — UNIVERSAL SEC S.A.S. — CONSORCIO PRUNI SEDES 04 — CONTRATISTA

ARQUITECTURA URBANA LTDA — INTERVENTORÍA

ACTA No.	4	PERIODO DEL ACTA	01/11/2019	A	30/11/2019	
OBJETO	REALIZAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE AJUSTE LAS DIFERENTES OBRAS E INTERVENCIONES ESPECIALIZADAS PARA LAS DIFERENTES SEDES DE LA SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C.					
CONTRATO DE OBRA No	731-2019	CONTRATISTA	CONSORCIO PRUNI SEDES 04	ENTIDAD CONTRATANTE	SECRETARIA GENERAL-ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA	
CONTRATO INTERVENTORÍA	730 DE 2019	INTERVENTORÍA	ARQUITECTURA URBANA LTDA	FRENTE:	IMPRENTA DISTRITAL	


CAPITULO	NP	ELÉCTRICO	ITEM	IMP 104	DESMONTE Y REINSTALACIÓN DE BANDEJA PORTA CABLES TIPO CABLOFIL, INCLUYE CARGUE Y ALMACENAMIENTO EN SITIO DONDE DISPONGA LA INTERVENTORIA	UNIDAD	ML

ITEM	LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	TOTAL	UNIDAD
	PRODUCCIÓN						
1	[redacted]	8,00			0,50	4,00	ML
	DATACENTER						
2	[redacted]	1,60			0,50	0,80	ML


OBSERVACIONES: SE PAGA SOLO EL 50% QUE ES DESMONTE

SUBTOTAL	4,80	ML
TOTAL	4,80	ML

LOCALIZACIÓN PLANIMÉTRICA

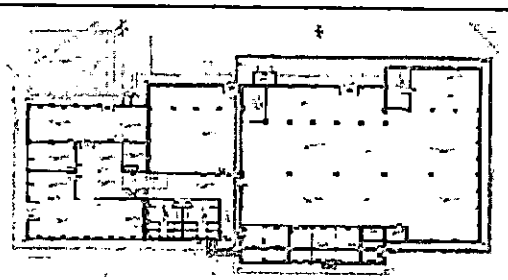

REGISTRO FOTOGRÁFICO

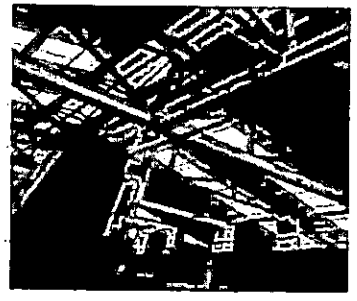

Alejandra Bolaños


ARQ. ALEJANDRA BOLAÑOS
RESIDENTE CONTRATISTA

Arq. Jessica Lopera A.


ARQ. JESSICA LOPERA
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

PLANO DETALLE

SEGUNDO PISO

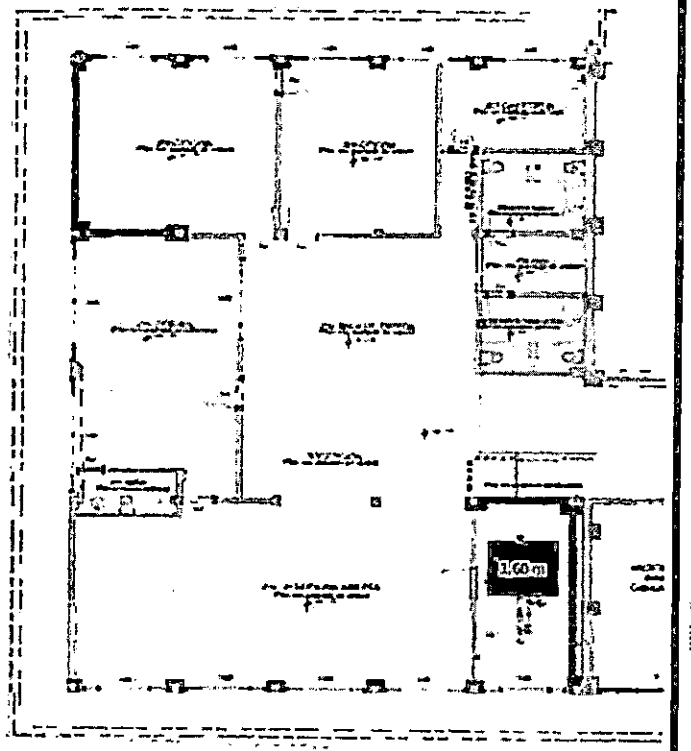

PRIMER PISO

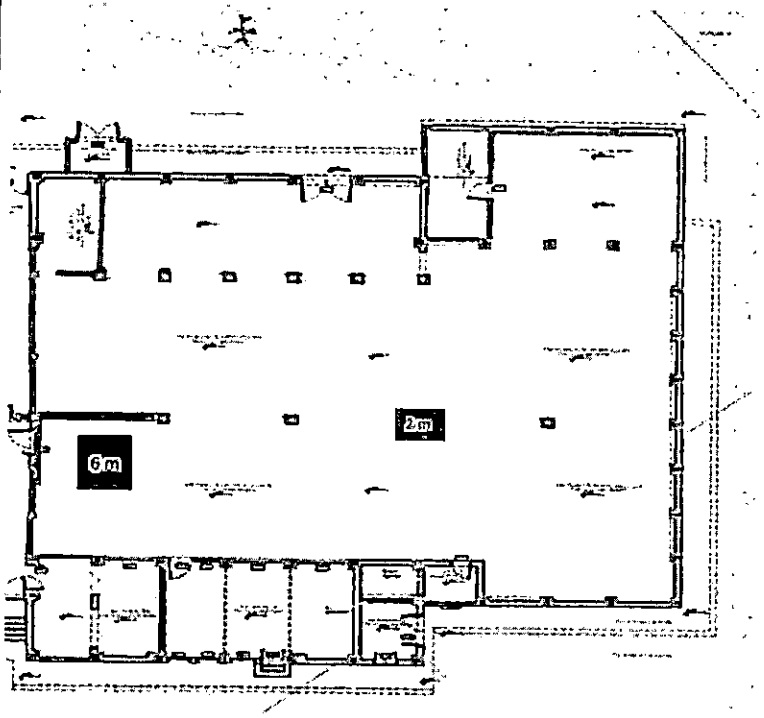

Pag 18

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA GENERAL | BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

PROYECTO: OBRAS SEDES ALCALDÍA


PRISMA — UNIVERSAL SEC S.A.S. — CONSORCIO PRUNI SEDES 04 — CONTRATISTA

ARQUITECTURA URBANA LTDA. — INTERVENTORÍA


ACTA No.	4		PERIODO DEL ACTA	01/11/2019	A	30/11/2019	
OBJETO	REALIZAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE AJUSTE LAS DIFERENTES OBRAS E INTERVENCIONES ESPECIALIZADAS PARA LAS DIFERENTES SEDES DE LA SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C.						
CONTRATO DE OBRA No	731-2019	CONTRATISTA	CONSORCIO PRUNI SEDES 04		ENTIDAD CONTRATANTE	SECRETARIA GENERAL-ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA	
CONTRATO INTERVENTORÍA	730 DE 2019	INTERVENTORÍA	ARQUITECTURA URBANA LTDA		FRENTE:	IMPRENTA DISTRITAL	

CAPITULO		NP	ELÉCTRICO			ITEM	IMP 105	DESMONTE, ALMACENAMIENTO Y REINSTALACIÓN DE TUBERIA EMT DE 3/4"	UNIDAD	ML
ITEM	LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES				CANTIDAD	TOTAL	UNIDAD		
		LARGO	ANCHO	ALTO						
	1er y 2do PISO ADMINISTRACION									
1	[redacted]	10,77				0,50	5,39	ML		
	PRODUCCIÓN									
2	[redacted]	71,50				0,50	35,75	ML		
OBSERVACIONES: SE PAGA SOLO EL 50% QUE ES DESMONTE					SUBTOTAL		41,14	ML		
					TOTAL		41,14	ML		

LOCALIZACIÓN PLANIMÉTRICA

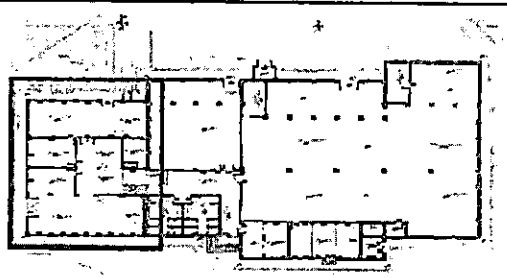

REGISTRO FOTOGRÁFICO

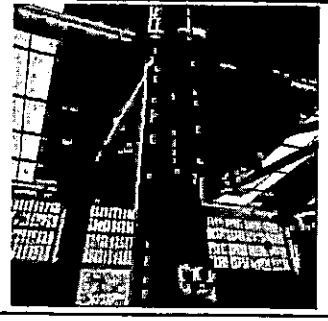

Alejandra Bolaños


ARQ. ALEJANDRA BOLAÑOS
RESIDENTE CONTRATISTA

Arq. Jessica Lopera A


ARQ. JESSICA LOPERA
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

PLANO DETALLE

SEGUNDO PISO

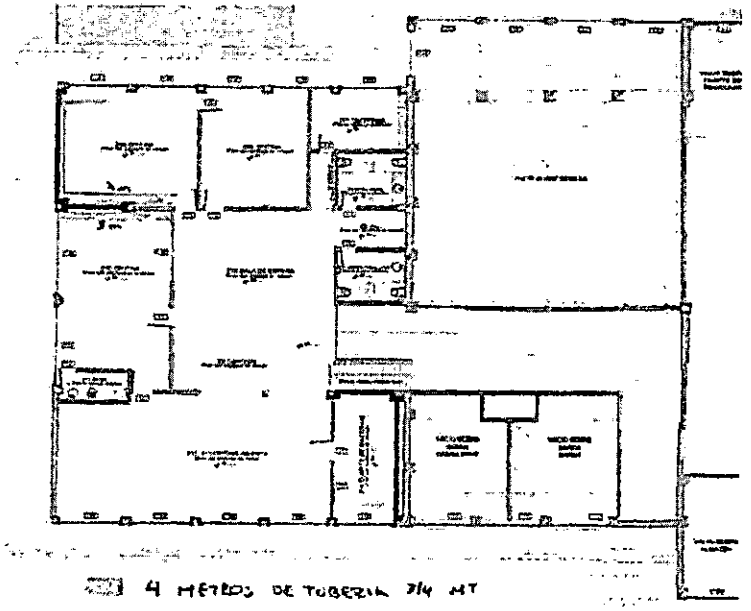


PRIMER PISO

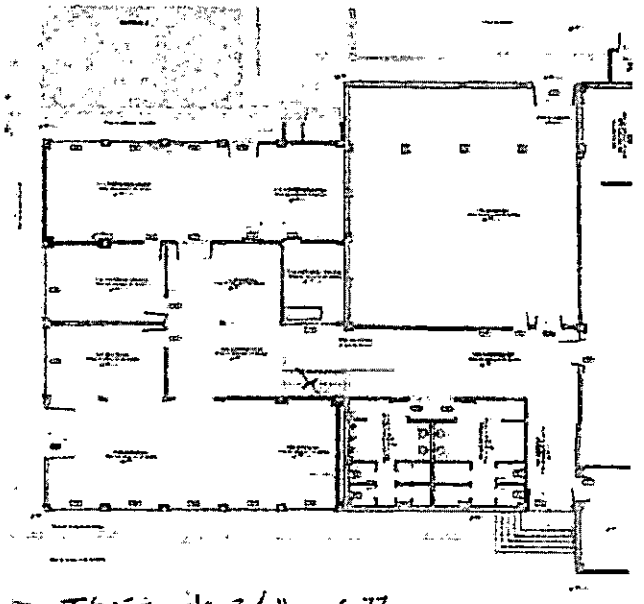

Alejandra

Instalación.

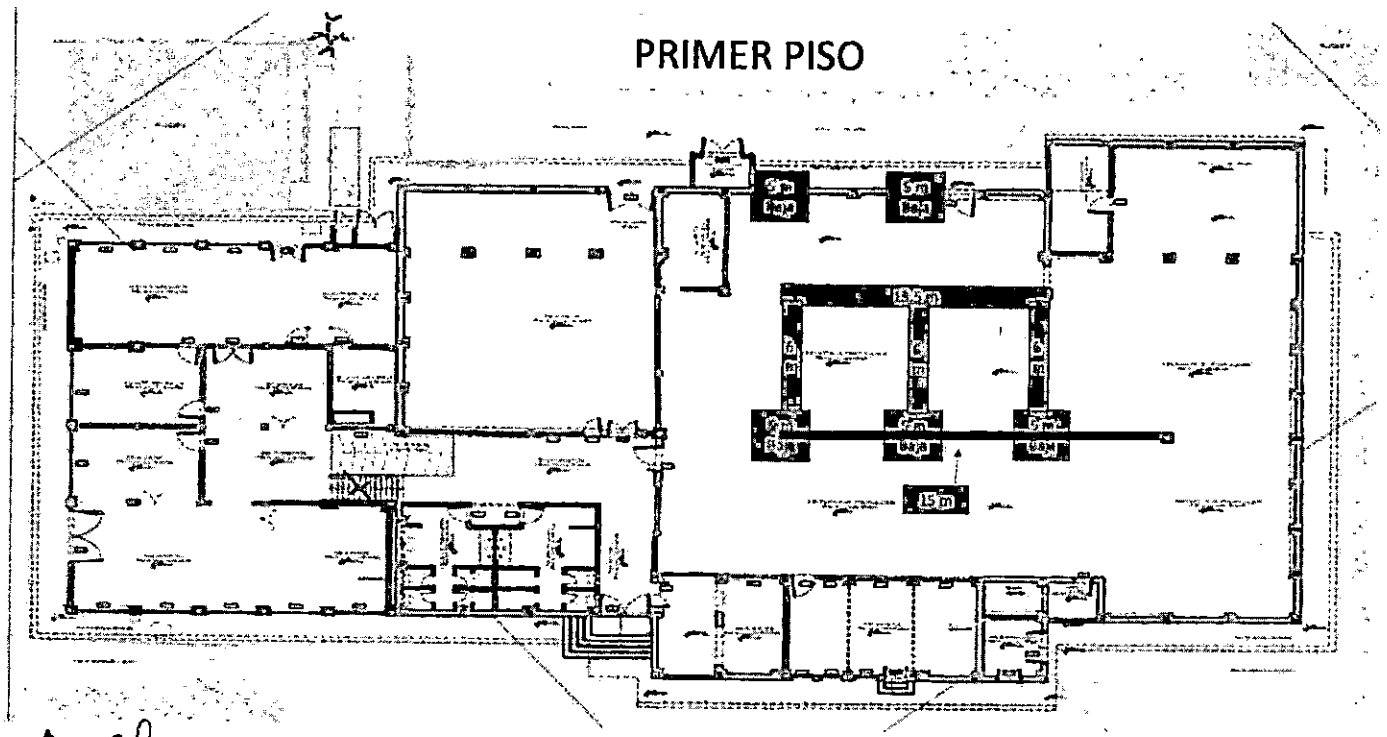

Nota B

Ilc
Interior.

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. | BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS
SECRETARÍA GENERAL

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

PROYECTO: OBRAS SEDES ALCALDÍA

PRISMA | UNIVERSAL SEC S.A.S. | CONSORCIO PRUNI SEDES 04 — CONTRATISTA
ARQUITECTURA URBANA LTDA. — INTERVENTORÍA


ACTA No.			PERIODO DEL ACTA	01/11/2019	A	30/11/2019	
OBJETO	REALIZAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE AJUSTE LAS DIFERENTES OBRAS E INTERVENCIONES ESPECIALIZADAS PARA LAS DIFERENTES SEDES DE LA SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C.						
CONTRATO DE OBRA No	731-2019	CONTRATISTA	CONSORCIO PRUNI SEDES 04	ENTIDAD CONTRATANTE	SECRETARIA GENERAL-ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA		
CONTRATO INTERVENTORÍA	730 DE 2019	INTERVENTORÍA	ARQUITECTURA URBANA LTDA	FRENTE:	IMPRENTA DISTRITAL		

CAPITULO	NP	ELÉCTRICO	ITEM	IMP 106	DESMONTE Y REINSTALACIÓN DE BANDEJA PORTA CABLES TIPO CABLOFIL, INCLUYE CARGUE Y ALMACENAMIENTO EN SITIO DONDE DISPONGA LA INTERVENTORIA	UNIDAD	ML


ITEM	LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	TOTAL	UNIDAD
	PRODUCCIÓN						
1	[redacted]	8,00			0,50	4,00	ML
	DATACENTER						
2	[redacted]	1,60			0,50	0,80	ML
	ADMINISTRACIÓN PRIMER PISO						
3		7,00			0,50	3,50	ML
				SUBTOTAL		8,30	ML
				TOTAL		8,30	ML

OBSERVACIONES: SE PAGA SOLO EL 50% QUE ES DESMONTE

LOCALIZACIÓN PLANIMÉTRICA

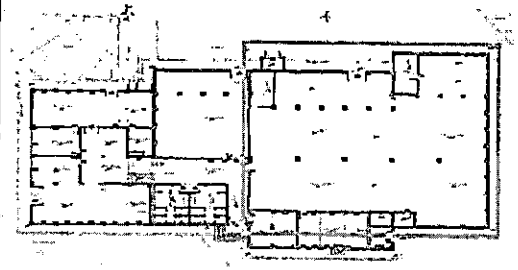


REGISTRO FOTOGRÁFICO

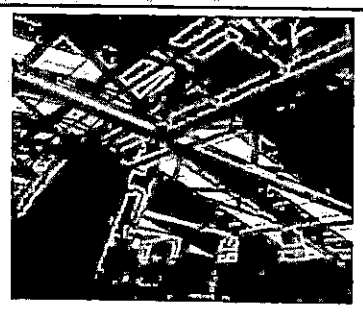


ARQ. ALEJANDRA BOLAÑOS
RESIDENTE CONTRATISTA

ARQ. JESSICA LOPERA
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

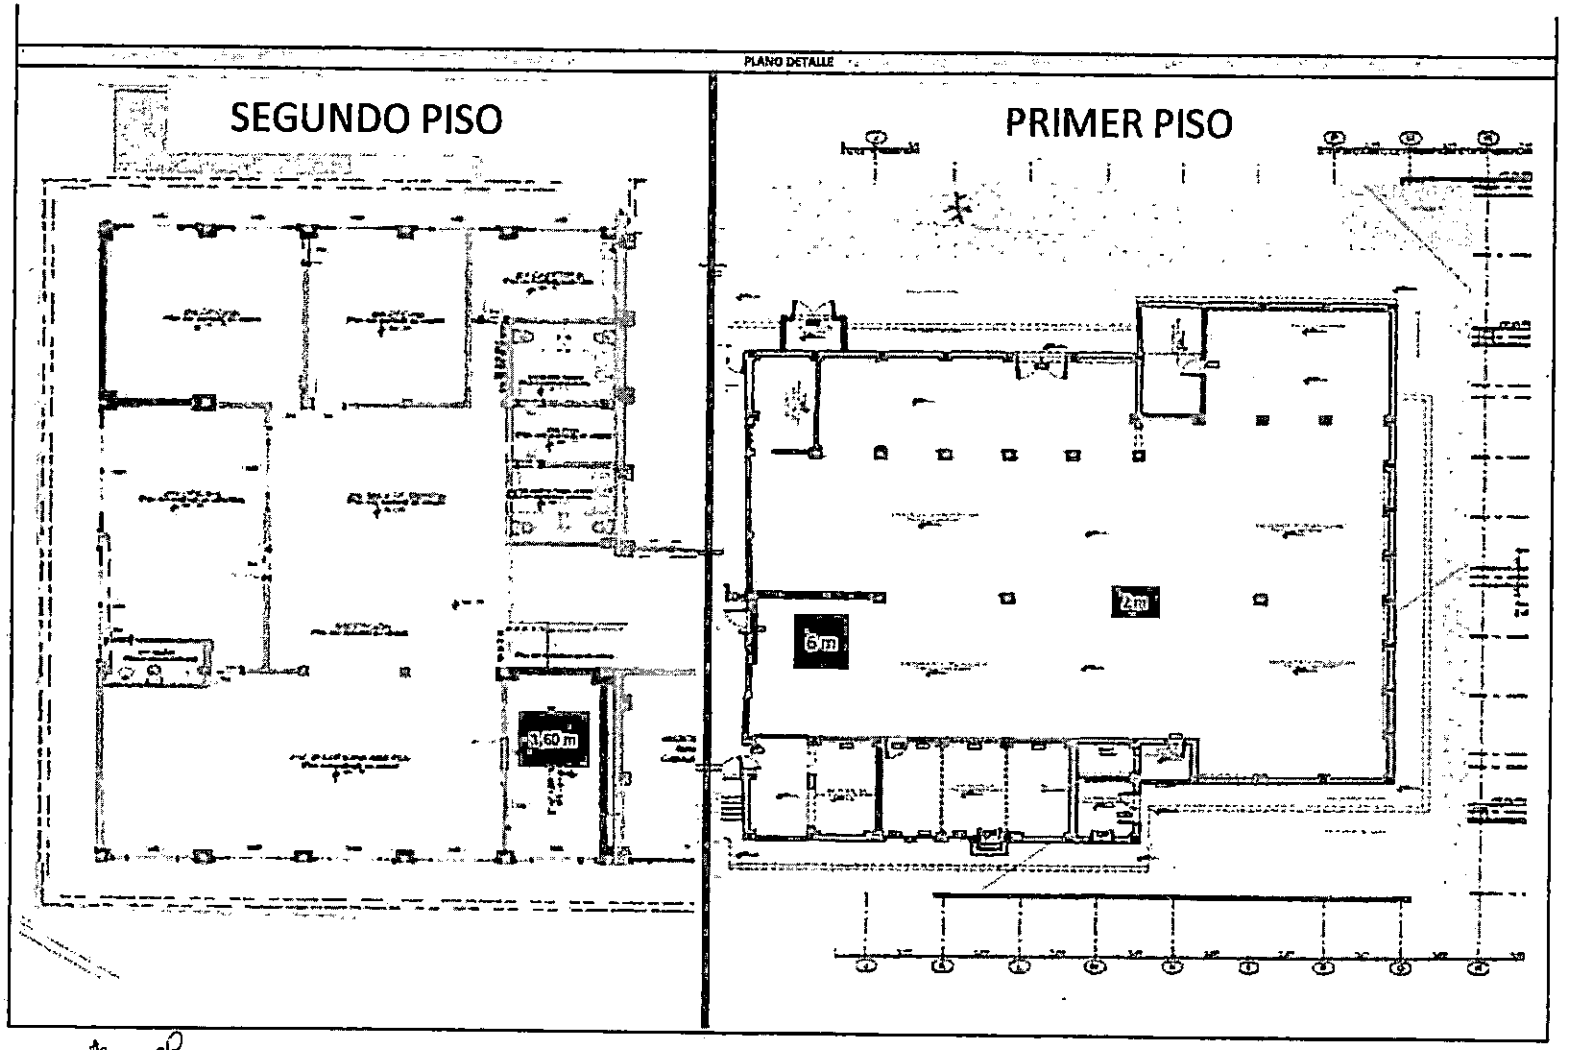

Intern.

PRIMER PISO ADMINISTRACIÓN

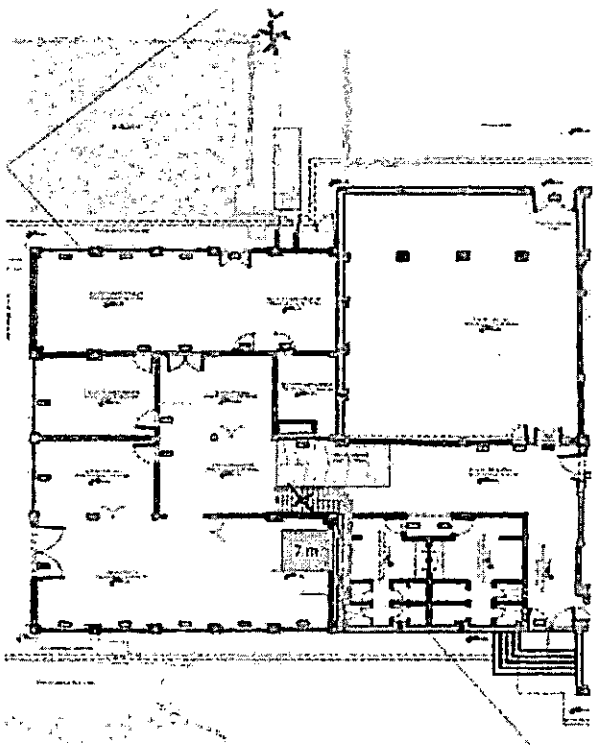

Mapa 8

Ula
Fiscal.

A23

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA GENERAL | BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

PROYECTO: OBRAS SEDES ALCALDÍA


PRISMA GRUPO EMPRESARIAL — UNIVERSAL SEC S.A.S. — CONSORCIO PRUNI SEDES 04 — CONTRATISTA

ARQUITECTURA URBANA LTDA — INTERVENTORÍA

ACTA No.	4	PERIODO DEL ACTA	01/11/2019	A	30/11/2019	
OBJETO	REALIZAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE AJUSTE LAS DIFERENTES OBRAS E INTERVENCIONES ESPECIALIZADAS PARA LAS DIFERENTES SEDES DE LA SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C.					
CONTRATO DE OBRA No	731-2019	CONTRATISTA	CONSORCIO PRUNI SEDES 04	ENTIDAD CONTRATANTE	SECRETARIA GENERAL-ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA	
CONTRATO INTERVENTORÍA	730 DE 2019	INTERVENTORÍA	ARQUITECTURA URBANA LTDA	FRENTE	IMPRENTA DISTRITAL	

CAPITULO		NP	ELÉCTRICO		ITEM	IMP 107	DESMONTE, ALMACENAMIENTO Y REINSTALACION DE TUBERIA EMT DE 1-1/2"	UNIDAD	ML
ITEM	LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	TOTAL	UNIDAD		
	2DO PISO EDIFICIO ADMINISTRATIVO								
1		6,00			0,50	3,00	ML		
	PRODUCCIÓN								
2		16,00			0,50	8,00	ML		
OBSERVACIONES: SE PAGA SOLO EL 50% QUE ES DESMONTE				SUBTOTAL		11,00	ML		
				TOTAL		11,00	ML		

LOCALIZACIÓN PLANIMÉTRICA

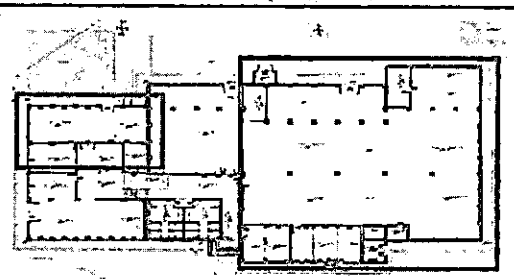

REGISTRO FOTOGRÁFICO




Alejandra Bolaños +

ARQ. ALEJANDRA BOLAÑOS
RESIDENTE CONTRATISTA

Arq. Jessica Lopera A

ARQ. JESSICA LOPERA
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

PLANO DETALLE

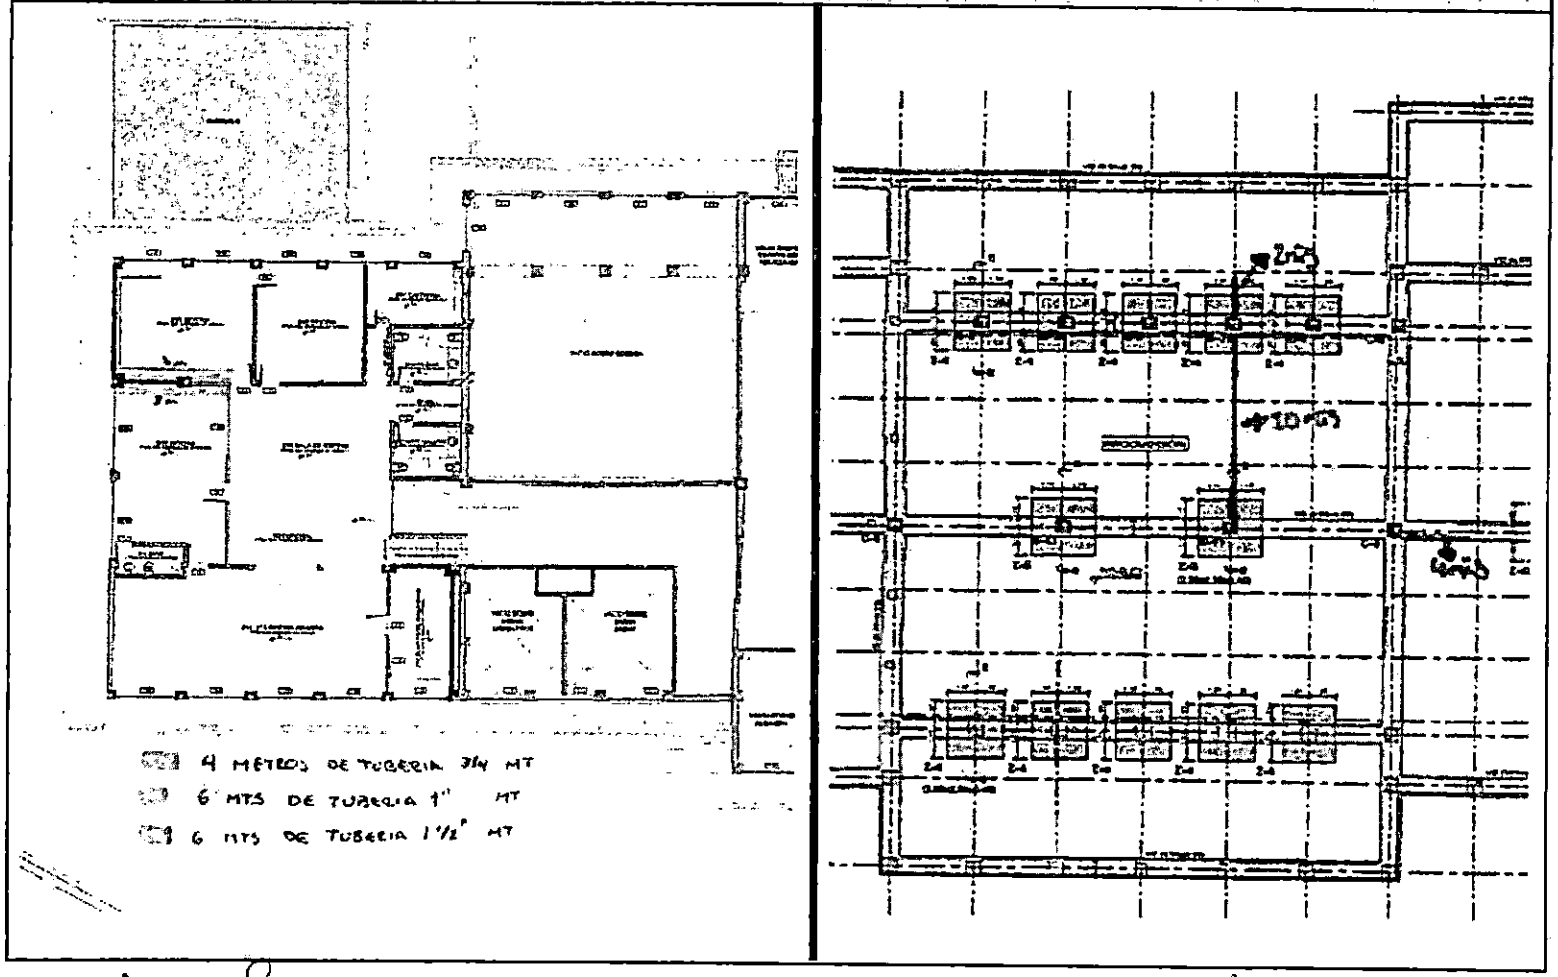

Acpanda

Ilca
Jafaro.

N24

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA GENERAL | BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

PROYECTO: OBRAS SEDES ALCALDÍA


PRISMA — UNIVERSAL SEC S.A.S. — CONTRATISTA

ARQUITECTURA URBANA LTDA — INTERVENTORÍA


ACTA No.	4		PERIODO DEL ACTA	01/11/2019	A	30/11/2019	
OBJETO	REALIZAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE AJUSTE LAS DIFERENTES OBRAS E INTERVENCIONES ESPECIALIZADAS PARA LAS DIFERENTES SEDES DE LA SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C.						
CONTRATO DE OBRA No	731-2019	CONTRATISTA	CONSORCIO PRUNI SEDES 04		ENTIDAD CONTRATANTE	SECRETARIA GENERAL-ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA	
CONTRATO INTERVENTORÍA	730 DE 2019	INTERVENTORÍA	ARQUITECTURA URBANA LTDA		FRENTE:	IMPRENTA DISTRITAL	

CAPITULO		NP	ELÉCTRICO		ITEM	IMP 108	DESMONTE, ALMACENAMIENTO Y REINSTALACION DE TUBERIA EMT DE 2"	UNIDAD	ML
ITEM	LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	TOTAL	UNIDAD		
	PRODUCCIÓN								
1		7,50			0,50	√ 3,75	ML		
OBSERVACIONES: SE PAGA SOLO EL 50% QUE ES DESMONTE				SUBTOTAL		√ 3,75	ML		
				TOTAL		3,75	ML		

LOCALIZACIÓN PLANIMÉTRICA

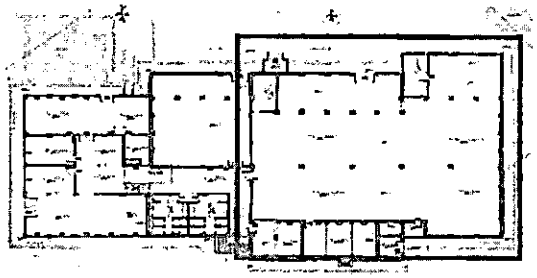

REGISTRO FOTOGRÁFICO

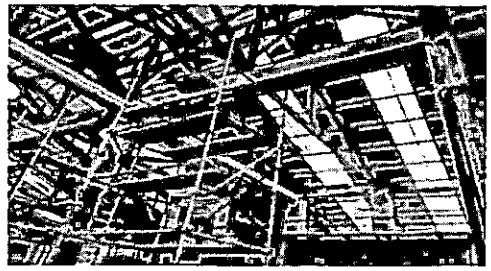

Arq. Jessica Lopera Arango
Residente Interv.


Alejandra Bolaños

ARQ. ALEJANDRA BOLAÑOS
RESIDENTE CONTRATISTA

Arq. Jessica Lopera A

ARQ. JESSICA LOPERA
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

PLANO DETALLE

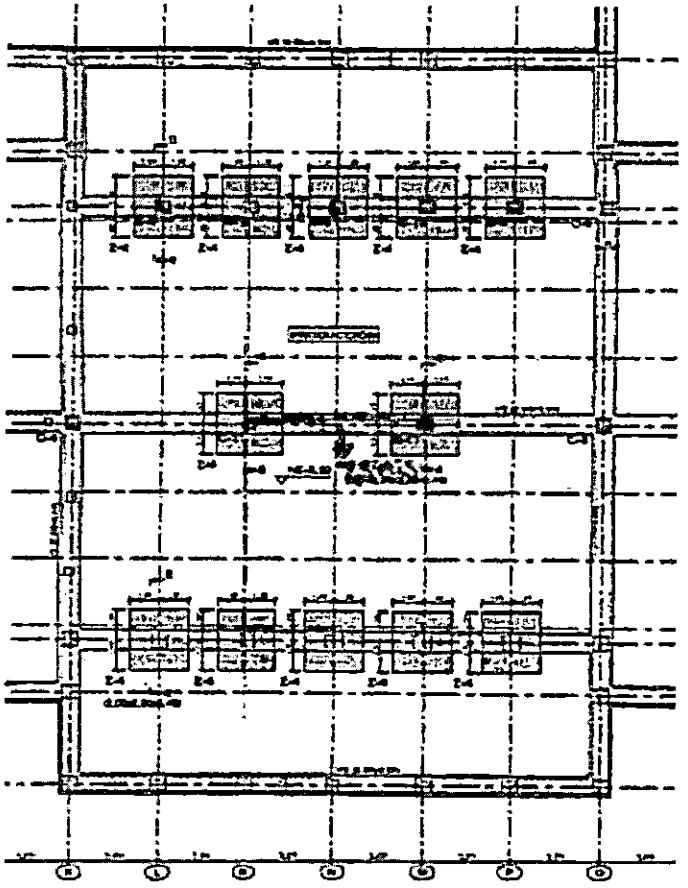

125

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA GENERAL

BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

PROYECTO: OBRAS SEDES ALCALDÍA

PRISMA — UNIVERSAL SEC S.A.S. — CONSORCIO PRUNI SEDES 04 — CONTRATISTA

ARQUITECTURA URBANA LTDA. — INTERVENTORÍA


ACTA No.	6	PERIODO DEL ACTA	01/11/2019	A	30/11/2019	
OBJETO	REALIZAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE AJUSTE LAS DIFERENTES OBRAS E INTERVENCIONES ESPECIALIZADAS PARA LAS DIFERENTES SEDES DE LA SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C.					
CONTRATO DE OBRA No	731-2019	CONTRATISTA	CONSORCIO PRUNI SEDES 04	ENTIDAD CONTRATANTE	SECRETARIA GENERAL-ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA	
CONTRATO INTERVENTORÍA	730 DE 2019	INTERVENTORÍA	ARQUITECTURA URBANA LTDA	FRENTE:	IMPRENTA DISTRITAL	

CAPITULO	NP	ELÉCTRICO	ITEM	IMP 110	DESMONTE, ALMACENAMIENTO Y REINSTALACION DE TOMA MONOFASICA	UNIDAD	UN

ITEM	LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	TOTAL	UNIDAD
	1ER PISO EDIFICIO ADMINISTRATIVO				1,50	1,50	UN
	2DO PISO EDIFICIO ADMINISTRATIVO				12,00	12,00	UN
	PRODUCCIÓN				3,50	3,50	UN


PLANO DETALLE

PRIMER PISO

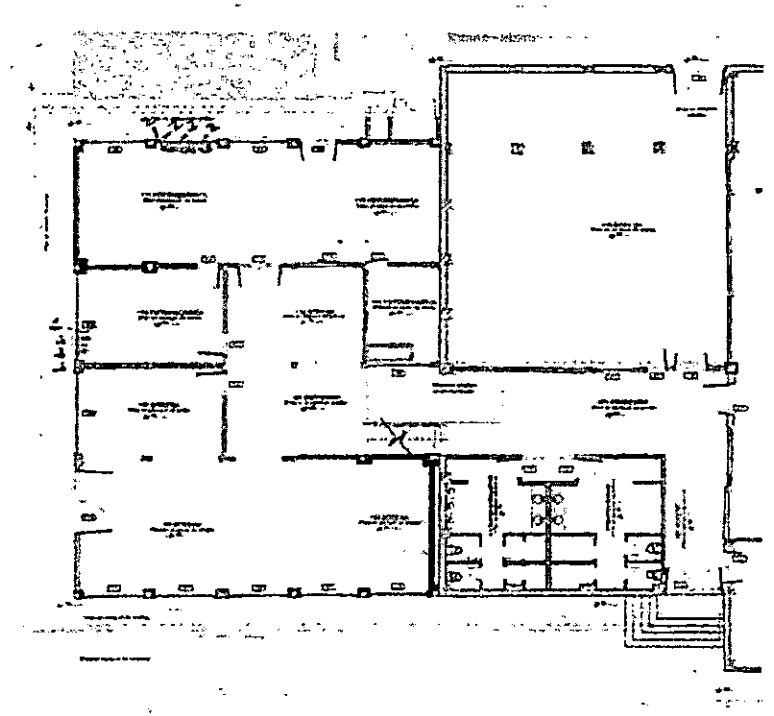

- Salida voz = 5
- Salida Datos = 5
- Salida Regulada = 5
- Toma normal = 3

SEGUNDO PISO

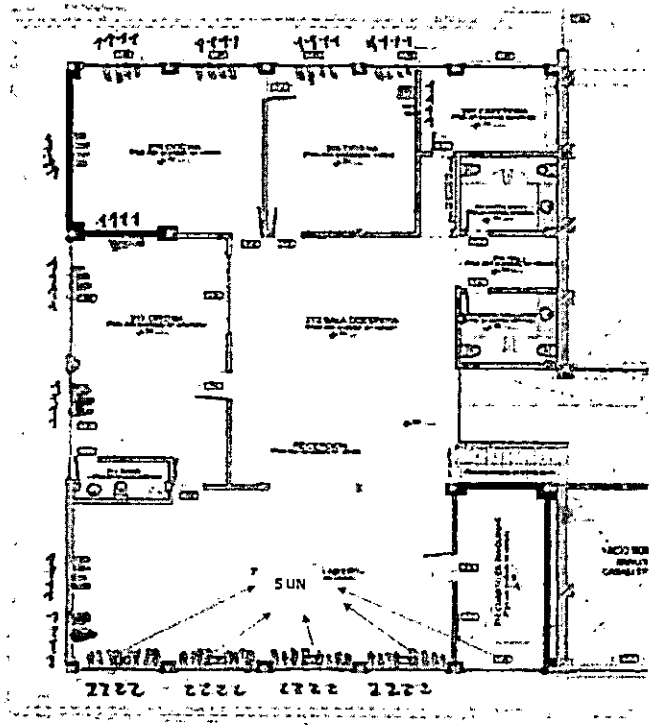

- SALIDA VOZ = 19
- SALIDA NORMAL = 19
- SALIDA REGULADA = 19
- SALIDA DATOS = 19

Nota

Interv.

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA GENERAL

BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

PROYECTO: OBRAS SEDES ALCALDÍA

PRISMA — UNIVERSAL SEC S.A.S. — CONSORCIO PRUNI SEDES 04 — CONTRATISTA

ARQUITECTURA URBANA LTDA — INTERVENTORÍA


ACTA No.	4		PERIODO DEL ACTA	01/11/2019	A	30/11/2019
OBJETO	REALIZAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE AJUSTE LAS DIFERENTES OBRAS E INTERVENCIONES ESPECIALIZADAS PARA LAS DIFERENTES SEDES DE LA SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C.					
CONTRATO DE OBRA No	731-2019	CONTRATISTA	CONSORCIO PRUNI SEDES 04	ENTIDAD CONTRATANTE	SECRETARIA GENERAL-ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA	
CONTRATO INTERVENTORÍA	730 DE 2019	INTERVENTORÍA	ARQUITECTURA URBANA LTDA	FRENTE:	IMPRENTA DISTRITAL	

CAPITULO	NP	ELÉCTRICO	ITEM	IMP 111	DESPLAZAMIENTO DE ACOMETIDA EN TUBERIA PVC DE 1" PARA ALIMENTACION DE MAQUINAS	UNIDAD	ML

ITEM	LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	TOTAL	UNIDAD
	PRODUCCIÓN	1,00			1,00	1,00	ML
				SUBTOTAL		1,00	ML
				TOTAL		1,00	ML

OBSERVACIONES:

LOCALIZACIÓN PLANIMÉTRICA

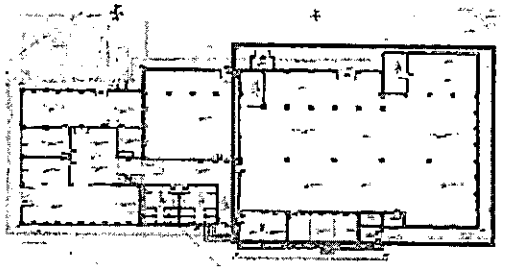

REGISTRO FOTOGRÁFICO



Alejandra Bolaños

ARQ. ALEJANDRA BOLAÑOS
RESIDENTE CONTRATISTA

Arq. Jessica Lopera

ARQ. JESSICA LOPERA
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

PLANO DETALLE
1 ML

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA GENERAL

BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

PROYECTO: OBRAS SEDES ALCALDÍA

PRISMA — UNIVERSAL SEC S.A.S. — CONSORCIO PRUNI SEDES 04 — CONTRATISTA


ARQUITECTURA URBANA LTDA. — INTERVENTORÍA

ACTA No.	4		PERIODO DEL ACTA	01/11/2019	A	30/11/2019	
OBJETO	REALIZAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE AJUSTE LAS DIFERENTES OBRAS E INTERVENCIONES ESPECIALIZADAS PARA LAS DIFERENTES SEDES DE LA SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C.						
CONTRATO DE OBRA No	731-2019	CONTRATISTA	CONSORCIO PRUNI SEDES 04	ENTIDAD CONTRATANTE	SECRETARIA GENERAL-ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA		
CONTRATO INTERVENTORÍA	730 DE 2019	INTERVENTORÍA	ARQUITECTURA URBANA LTDA	FRENTE:	IMPRENTA DISTRITAL		


CAPITULO	NP	ELÉCTRICO	ITEM	IMP 112	DESMONTE, ALMACENAMIENTO Y REINSTALACION DE TOMA REGULADA	UNIDAD	UN

ITEM	LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	TOTAL	UNIDAD
	1ER PISO EDIFICIO ADMINISTRATIVO				1,50	1,50	UN
	2DO PISO EDIFICIO ADMINISTRATIVO				10,00	10,00	UN
	PRODUCCIÓN				3,50	3,50	UN
OBSERVACIONES: SE PAGA SOLO EL 50% QUE ES DESMONTE				SUBTOTAL		15,00	UN
				TOTAL		15,00	UN

LOCALIZACIÓN PLANIMÉTRICA

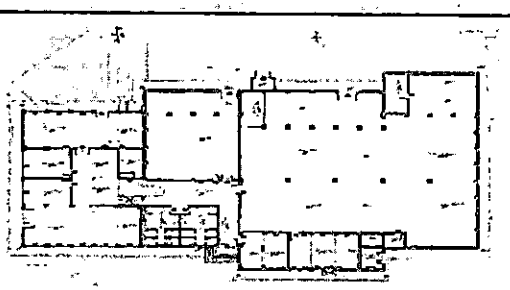

REGISTRO FOTOGRÁFICO

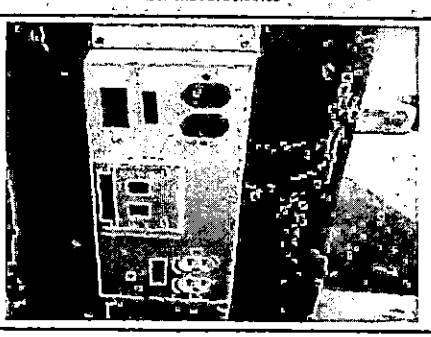


Alejandra Bolaños
ARQ. ALEJANDRA BOLAÑOS
RESIDENTE CONTRATISTA

Arq. Jessica Lopera A
ARQ. JESSICA LOPERA
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

428


PLANO DETALLE

PRIMER PISO

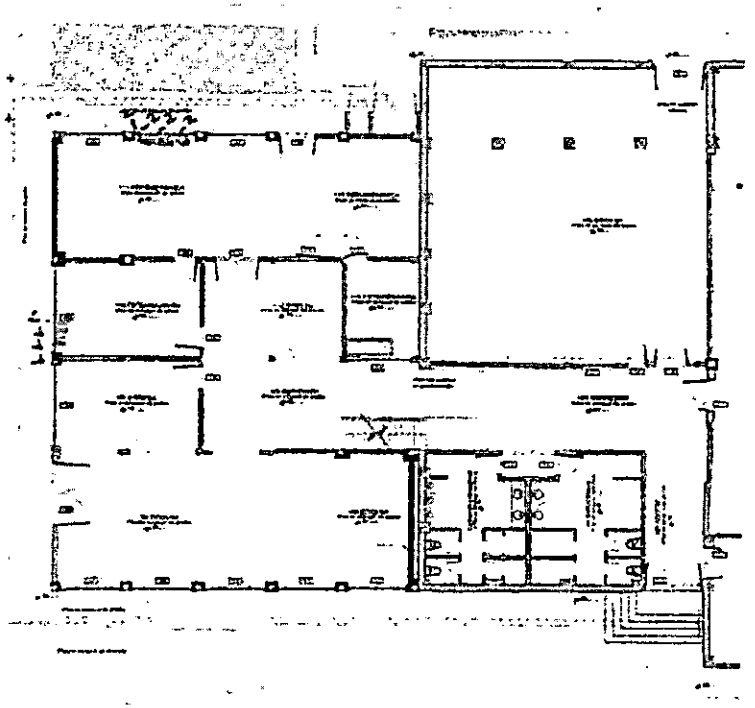


- Salida voz = 3
- Salida Datos = 3
- Salida Regulada = 3
- Toma normal = 3

SEGUNDO PISO

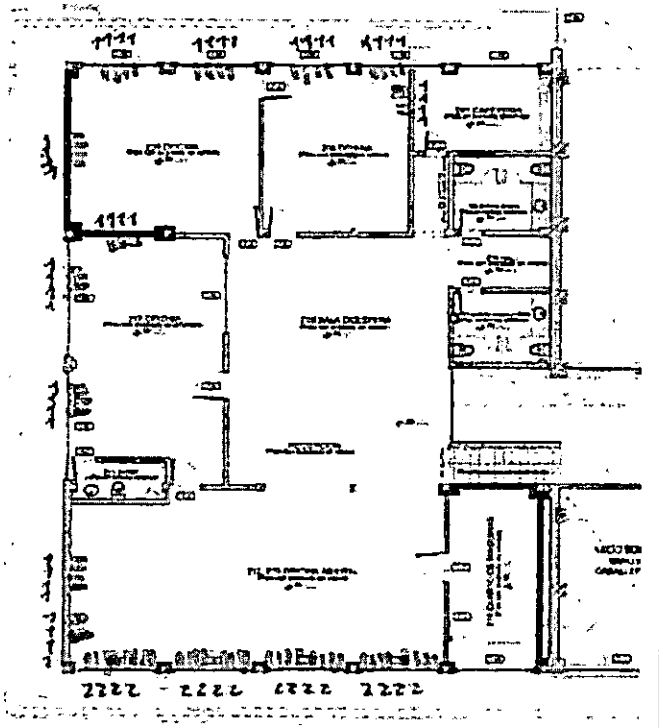

- SALIDA VOZ = 19
- SALIDA NORMAL = 19
- SALIDA REGULADA = 19
- SALIDA DATOS = 19

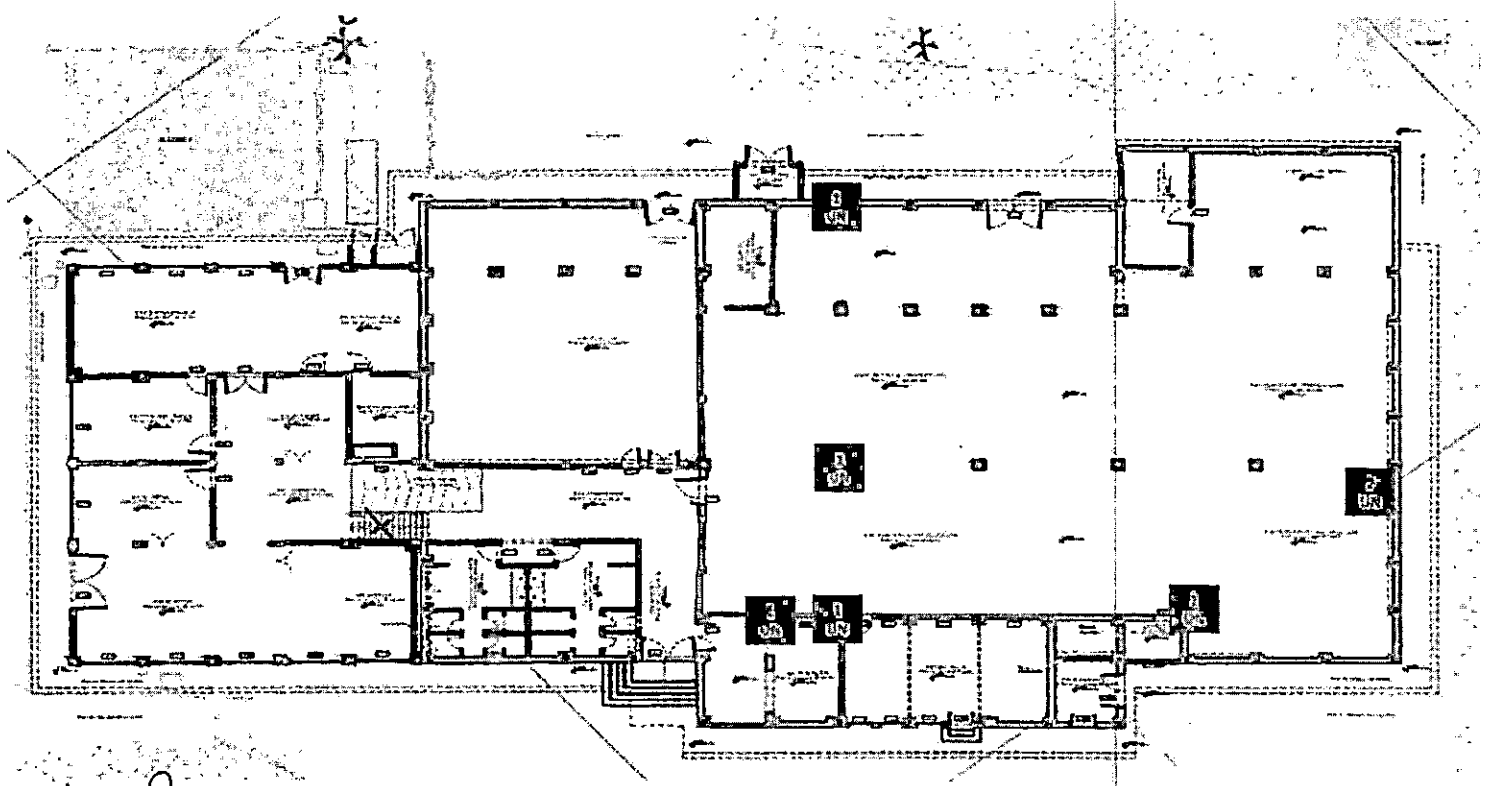

Mapa

2 Ilk
Interi

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA GENERAL

BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

PROYECTO: OBRAS SEDES ALCALDÍA

PRISMA
UNIVERSAL SEC S.A.S.
CONSORCIO PRUNI SEDES 04
CONTRATISTA

ARQUITECTURA URBANA LTDA.
INTERVENTORÍA


ACTA No.	4		PERIODO DEL ACTA	01/11/2019	A	30/11/2019
OBJETO	REALIZAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE AJUSTE LAS DIFERENTES OBRAS E INTERVENCIONES ESPECIALIZADAS PARA LAS DIFERENTES SEDES DE LA SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C.					
CONTRATO DE OBRA No	731-2019	CONTRATISTA	CONSORCIO PRUNI SEDES 04		ENTIDAD CONTRATANTE	SECRETARIA GENERAL-ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA
CONTRATO INTERVENTORÍA	730 DE 2019	INTERVENTORÍA	ARQUITECTURA URBANA LTDA		FRENTE:	IMPRENTA DISTRITAL

CAPITULO		NP	ELÉCTRICO		ITEM	IMP 113	DESMONTE,ALMACENAMIENTO Y REINSTALACION DE SALIDA DATOS.	UNIDAD	UN


ITEM	LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	TOTAL	UNIDAD
	1ER PISO EDIFICIO ADMINISTRATIVO				1,50	1,50	UN
	2DO PISO EDIFICIO ADMINISTRATIVO				10,00	10,00	UN
	PRODUCCIÓN [redacted]				3,50	3,50	UN
	SUBTOTAL					15,00	UN
	TOTAL					15,00	UN

OBSERVACIONES: SE PAGA SOLO EL 50% QUE ES DESMONTE

LOCALIZACIÓN PLANIMÉTRICA

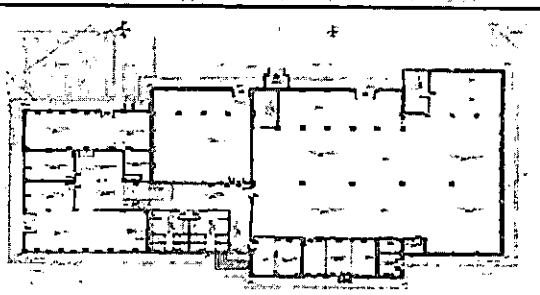

REGISTRO FOTOGRÁFICO

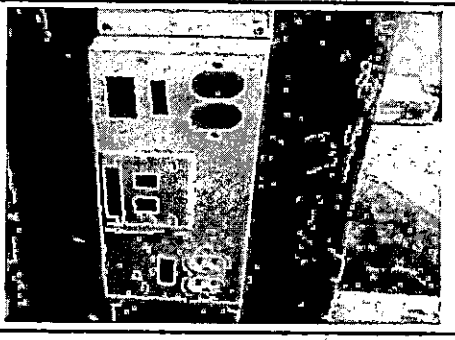

Arq. Jessica Lopera A.
Residente Interventoría

Alejandra Bolaños


ARQ. ALEJANDRA BOLAÑOS
RESIDENTE CONTRATISTA

Arq. Jessica Lopera A

ARQ. JESSICA LOPERA
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA


PLANO DETALLE

PRIMER PISO

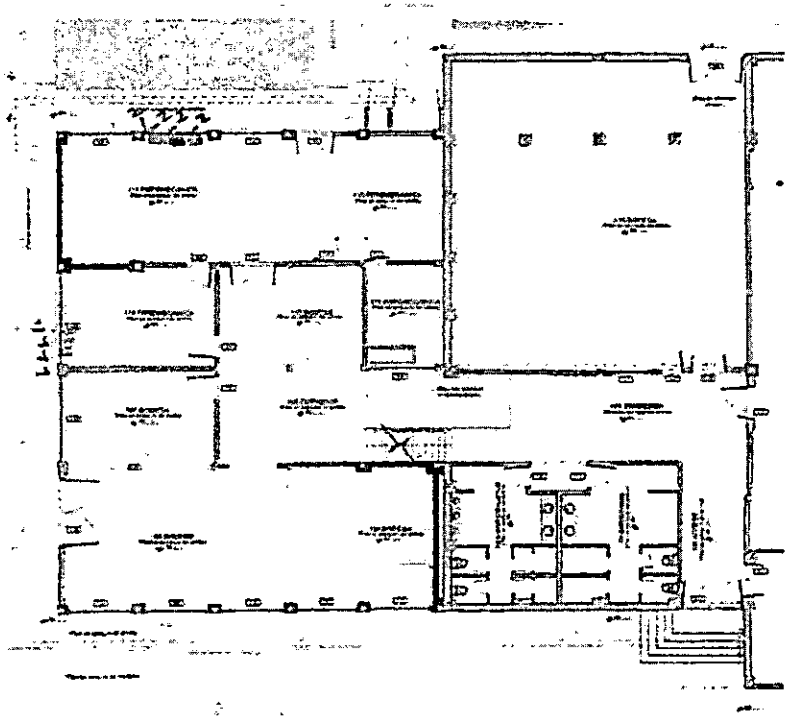


- Salida voz = 3
- Salida Datos = 3
- Salida Regulada = 3
- Toma normal = 3

SEGUNDO PISO

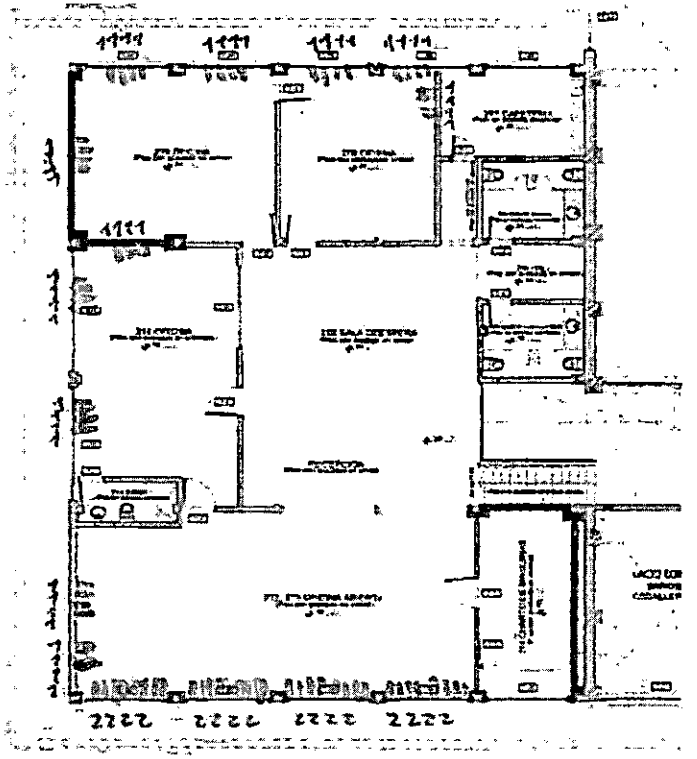

- SALIDA VOZ = 19
- SALIDA NORMAL = 19
- SALIDA REGULADA = 19
- SALIDA DATOS = 19

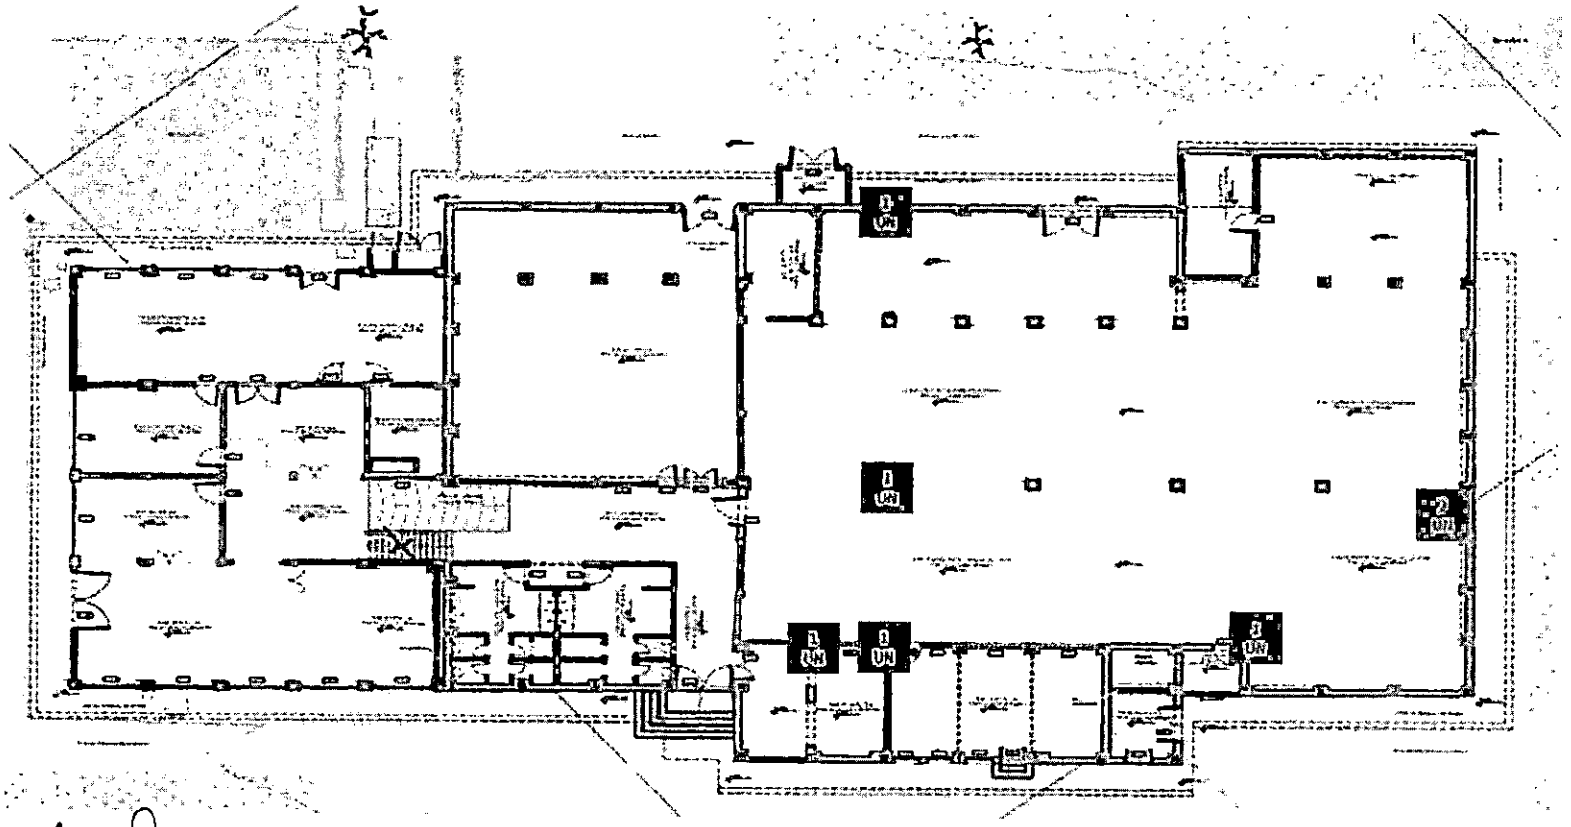

Aqua

Intern.

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. | BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS
SECRETARÍA GENERAL

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

PROYECTO: OBRAS SEDES ALCALDÍA

PRISMA — UNIVERSAL SEC S.A.S. — CONSORCIO PRUNI SEDES 04 — CONTRATISTA


ARQUITECTURA URBANA LTDA. — INTERVENTORÍA

ACTA No.	4		PERIODO DEL ACTA	01/11/2019	A	30/11/2019	
OBJETO	REALIZAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE AJUSTE LAS DIFERENTES OBRAS E INTERVENCIONES ESPECIALIZADAS PARA LAS DIFERENTES SEDES DE LA SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C.						
CONTRATO DE OBRA No.	731-2019	CONTRATISTA	CONSORCIO PRUNI SEDES 04		ENTIDAD CONTRATANTE	SECRETARIA GENERAL-ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA	
CONTRATO INTERVENTORÍA	730 DE 2019	INTERVENTORÍA	ARQUITECTURA URBANA LTDA		FRENTE:	IMPRENTA DISTRITAL	


CAPITULO	NP	ELÉCTRICO	ITEM	IMP 114	DESMONTE, ALMACENAMIENTO Y REINSTALACION TOMA PARA VOZ.	UNIDAD	UN

ITEM	LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	TOTAL	UNIDAD
	1ER PISO EDIFICIO ADMINISTRATIVO				1,50	1,50	UN
	2DO PISO EDIFICIO ADMINISTRATIVO				10,00	10,00	UN
	PRODUCCIÓN				3,50	3,50	UN
OBSERVACIONES: SE PAGA SOLO EL 50% QUE ES DESMONTE				SUBTOTAL		15,00	UN
				TOTAL		15,00	UN

LOCALIZACIÓN PLANIMÉTRICA

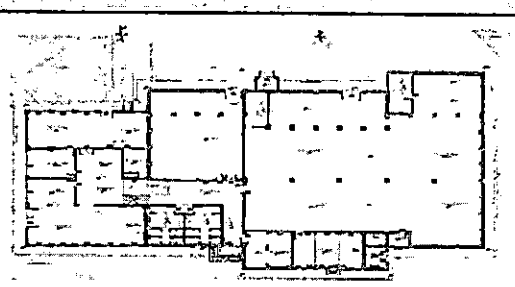

REGISTRO FOTOGRÁFICO

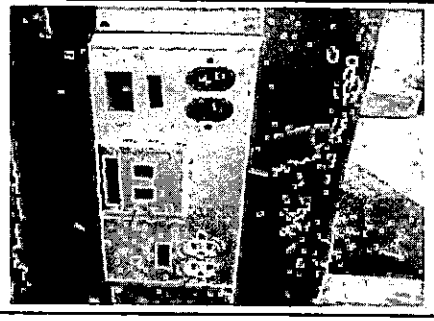

Alejandra Bolaños


ARQ. ALEJANDRA BOLAÑOS
RESIDENTE CONTRATISTA

Arq. Jessica Lopera A.

ARQ. JESSICA LOPERA
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA


PLANO DETALLE

PRIMER PISO

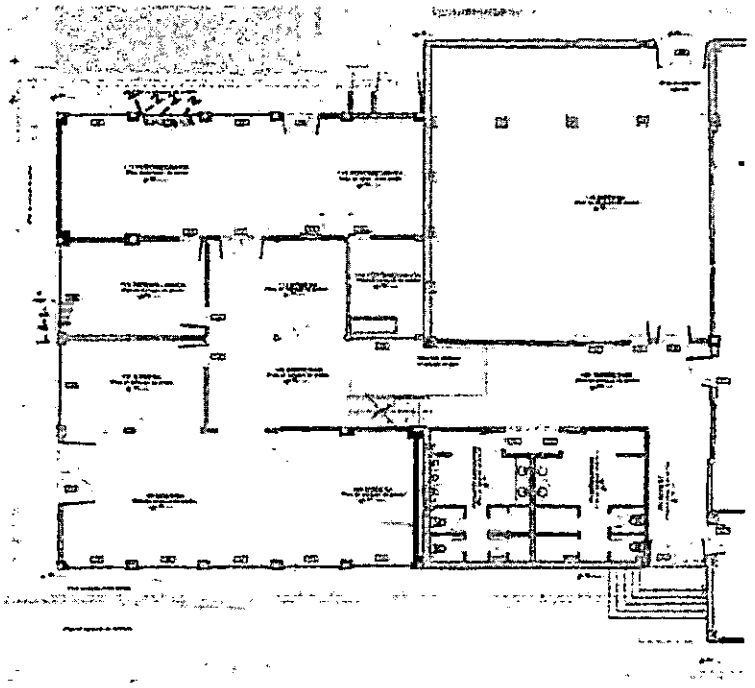


- Salida VOZ = 3
- Salida Datos = 3
- Salida Regulada = 3
- Toma normal = 3

SEGUNDO PISO

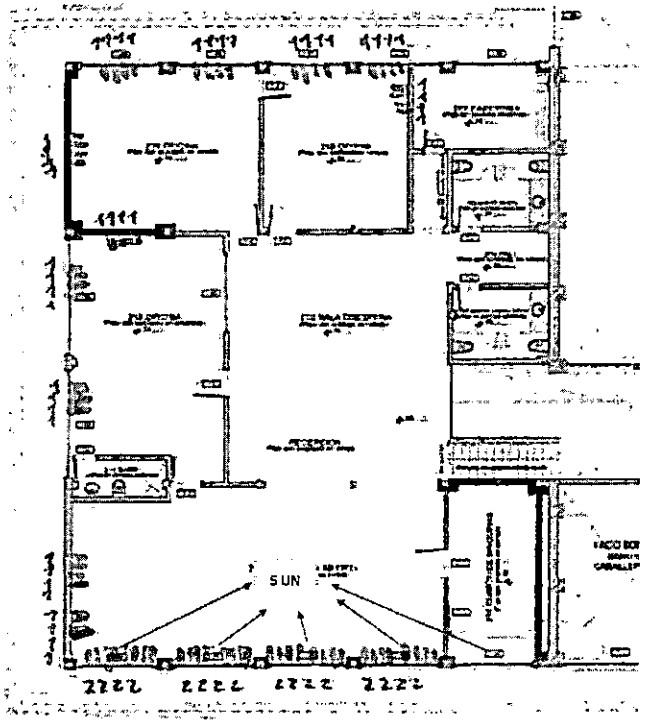

- SALIDA VOZ = 19
- SALIDA NORMAL = 19
- SALIDA REGULADA = 19
- SALIDA DATOS = 19

Interv.

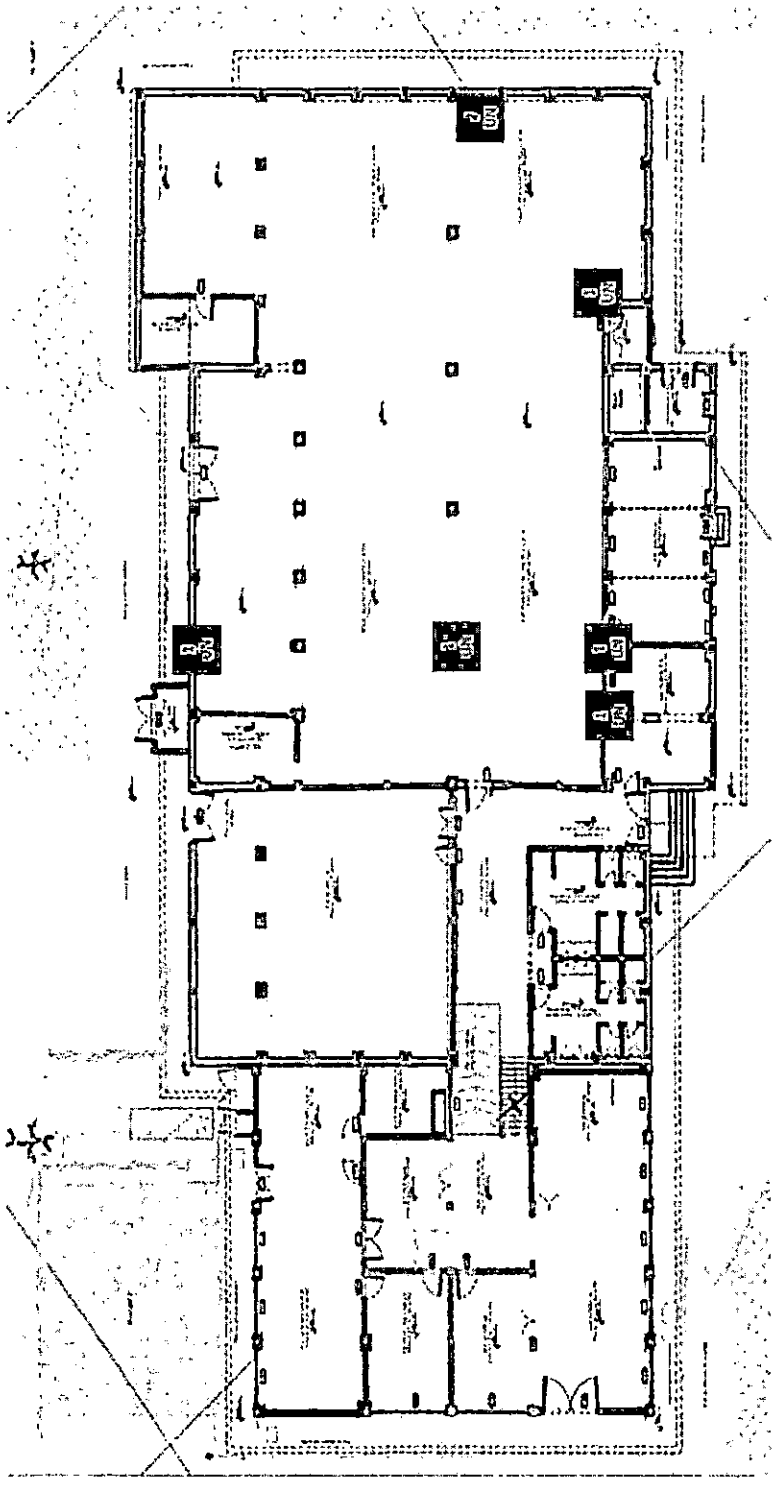

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA GENERAL

BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

PROYECTO: OBRAS SEDES ALCALDÍA

PRISMA — UNIVERSAL SEC S.A.S. — CONTRATISTA


ARQUITECTURA URBANA LTDA. — INTERVENTORÍA

ACTA No.	4		PERIODO DEL ACTA	01/11/2019	A	30/11/2019
OBJETO	REALIZAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE AJUSTE LAS DIFERENTES OBRAS E INTERVENCIONES ESPECIALIZADAS PARA LAS DIFERENTES SEDES DE LA SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C.					
CONTRATO DE OBRA No.	731-2019	CONTRATISTA	CONSORCIO PRUNI SEDES 04	ENTIDAD CONTRATANTE	SECRETARIA GENERAL-ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA	
CONTRATO INTERVENTORÍA	730 DE 2019	INTERVENTORÍA	ARQUITECTURA URBANA LTDA	FRENTE:	IMPRENTA DISTRITAL	


CAPITULO	NP	ELÉCTRICO	ITEM	IMP 115	DESMONTE Y REINSTALACION TABLERO DE DISTRIBUCION	UNIDAD	UN

ITEM	LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	TOTAL	UNIDAD
	PRODUCCIÓN [redacted]				1,00	1,00	UN
	DATACENTER [redacted]				1,50	1,50	UN
	OBSERVACIONES: SE PAGA SOLO EL 50% QUE ES DESMONTE			SUBTOTAL		2,50	UN
				TOTAL		2,50	UN

LOCALIZACIÓN PLANIMÉTRICA

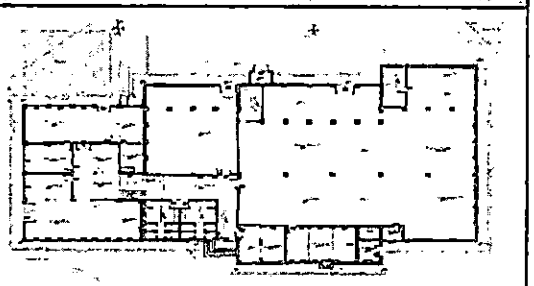

REGISTRO FOTOGRÁFICO

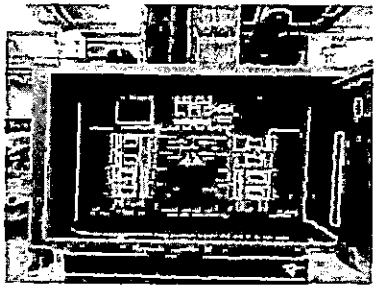


Alejandra Bolaños t
ARQ. ALEJANDRA BOLAÑOS
RESIDENTE CONTRATISTA


Arq Jessica Lopera A.
ARQ. JESSICA LOPERA
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

PLANO DETALLE

SEGUNDO PISO

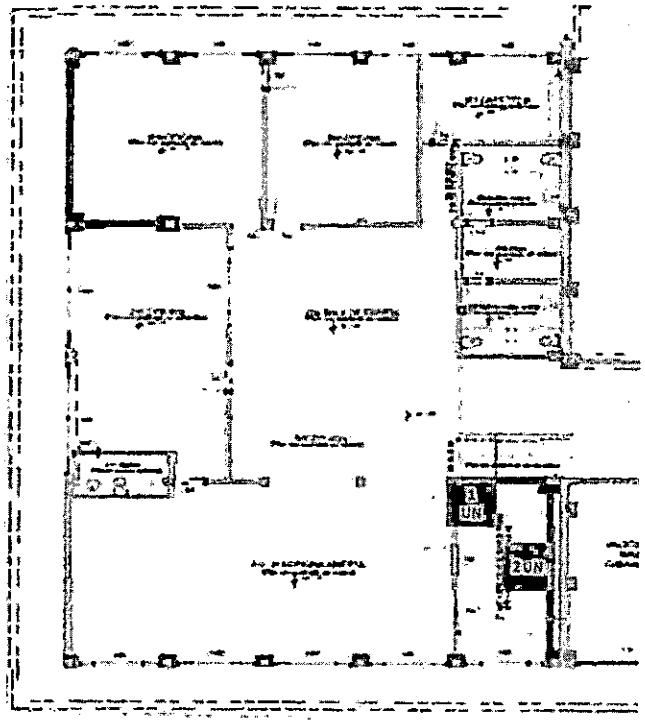

PRIMER PISO

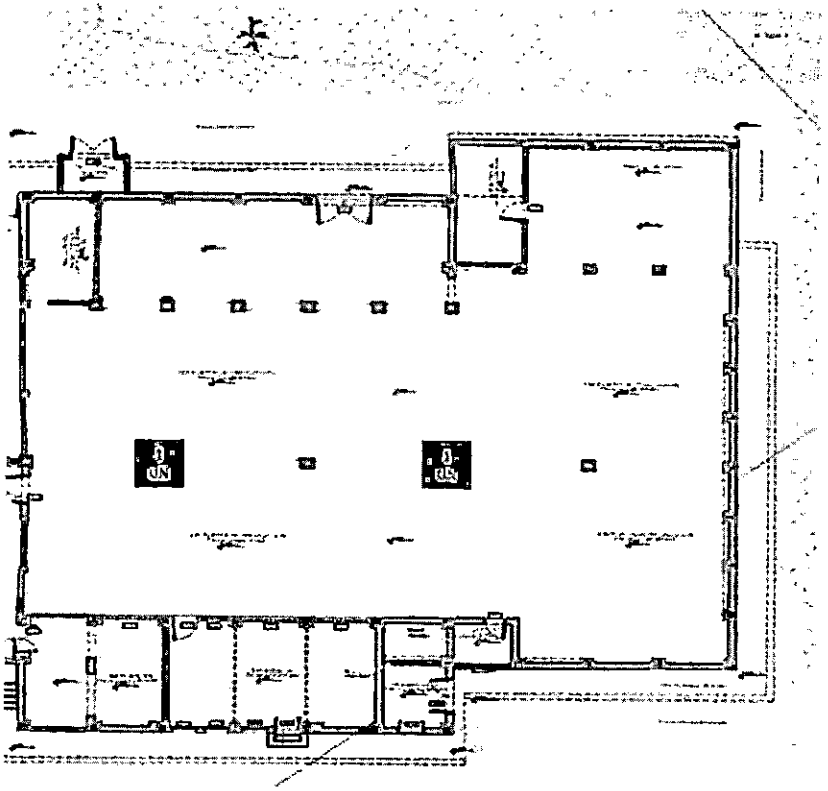

Alepa 18

Ala
Artero.

133

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA GENERAL | BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

PROYECTO: OBRAS SEDES ALCALDÍA


PRISMA — UNIVERSAL SEC S.A.S. — CONSORCIO PRUNI SEDES 04 — CONTRATISTA

ARQUITECTURA URBANA LTDA — INTERVENTORÍA

ACTA No.	4	PERIODO DEL ACTA	01/11/2019	A	30/11/2019	
OBJETO	REALIZAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE AJUSTE LAS DIFERENTES OBRAS E INTERVENCIONES ESPECIALIZADAS PARA LAS DIFERENTES SEDES DE LA SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C.					
CONTRATO DE OBRA No	731-2019	CONTRATISTA	CONSORCIO PRUNI SEDES 04	ENTIDAD CONTRATANTE	SECRETARIA GENERAL-ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA	
CONTRATO INTERVENTORÍA	730 DE 2019	INTERVENTORÍA	ARQUITECTURA URBANA LTDA	FRENTE:	IMPRENTA DISTRITAL	

CAPITULO		NP	ELÉCTRICO		ITEM	IMP 116	DESMONTE, ALMACENAMIENTO Y REINSTALACION DE LUMINARIAS DE INTERIORES	UNIDAD	UN
ITEM	LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	TOTAL	UNIDAD		
	2DO PISO EDIFICIO ADMINISTRATIVO				28,00	28,00	UN		
	ARCHIVO				1,50	1,50	UN		
OBSERVACIONES: SE PAGA SOLO EL 50% QUE ES DESMONTE				SUBTOTAL		29,50	UN		
				TOTAL		29,50	UN		

LOCALIZACIÓN PLANIMÉTRICA

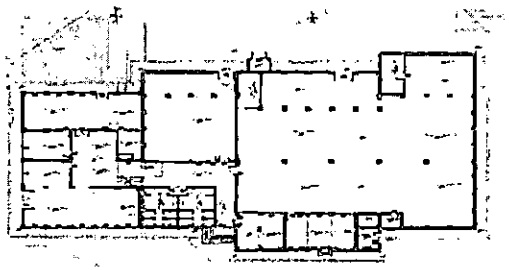

REGISTRO FOTOGRÁFICO



Alejandra Bolaños

ARQ. ALEJANDRA BOLAÑOS
RESIDENTE CONTRATISTA


Arq Jessica Lopera A

ARQ. JESSICA LOPERA
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA


107

PLANO DETALLE :

SEGUNDO PISO

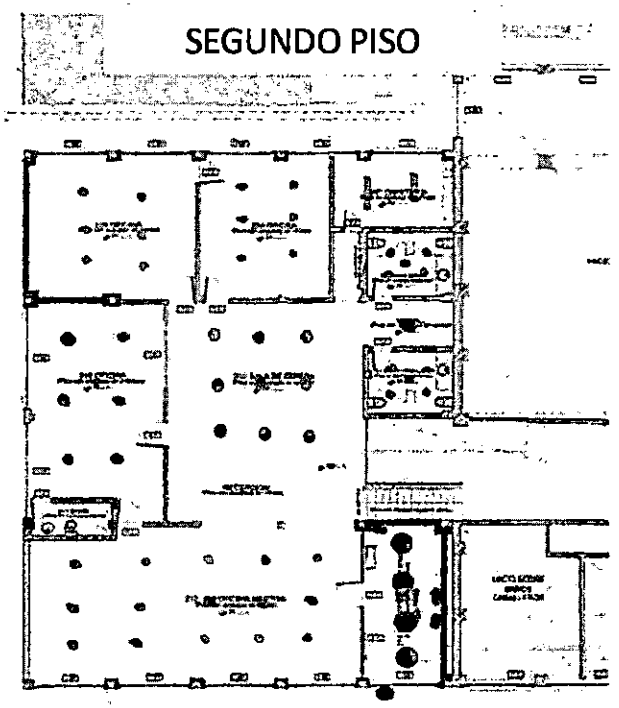

- 3 SENSORES DE MOVIMIENTO
- 1 CAMARA
- 56 LAMPARA
- 3 TABLEROS
- 2 UPS

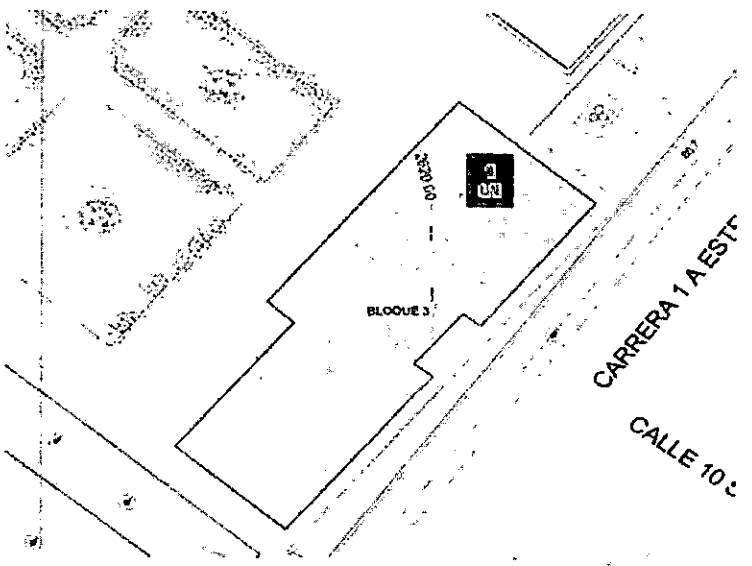

Interv.

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA GENERAL | BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

PROYECTO: OBRAS SEDES ALCALDÍA

PRISMA | UNIVERSAL SEC S.A.S. — CONSORCIO PRUNI SEDES 04 — CONTRATISTA


ARQUITECTURA URBANA LTDA — INTERVENTORÍA

ACTA No.	4	PERIODO DEL ACTA	01/11/2019	A	30/11/2019	
OBJETO	REALIZAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE AJUSTE LAS DIFERENTES OBRAS E INTERVENCIONES ESPECIALIZADAS PARA LAS DIFERENTES SEDES DE LA SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C.					
CONTRATO DE OBRA No	731-2019	CONTRATISTA	CONSORCIO PRUNI SEDES 04	ENTIDAD CONTRATANTE	SECRETARIA GENERAL-ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA	
CONTRATO INTERVENTORÍA	730 DE 2019	INTERVENTORÍA	ARQUITECTURA URBANA LTDA	FRENTE:	IMPRENTA DISTRITAL	

CAPITULO	NP	ELÉCTRICO	ITEM	IMP 117	DESMONTE, ALMACENAMIENTO Y REINSTALACION SENSOR DE MOVIMIENTO	UNIDAD	UN

ITEM	LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	TOTAL	UNIDAD
	2DO PISO EDIFICIO ADMINISTRATIVO				1,50	1,50	UN

PLANO DETALLE

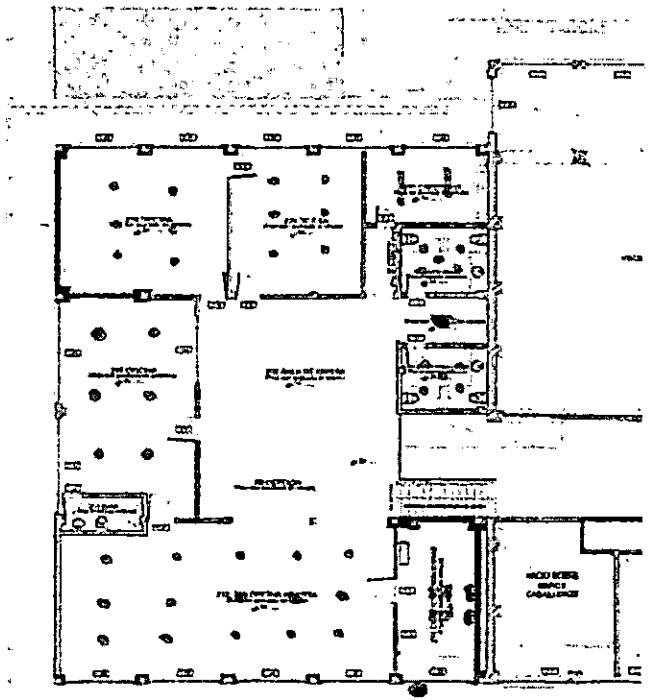

- 3 SENSORES DE MOVIMIENTO
- 1 CAMARA
- 43 LAMPARA
- 3 TABLEROS
- 2 UPS

Planta PB

Vía Interior

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. | BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS
SECRETARÍA GENERAL

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

PROYECTO: OBRAS SEDES ALCALDÍA

PRISMA — UNIVERSAL SEC S.A. — CONSORCIO PRUNI SEDES 04 — CONTRATISTA


ARQUITECTURA URBANA LTDA. — INTERVENTORÍA

ACTA No.	4		PERIODO DEL ACTA	01/11/2019	A	30/11/2019
OBJETO	REALIZAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE AJUSTE LAS DIFERENTES OBRAS E INTERVENCIONES ESPECIALIZADAS PARA LAS DIFERENTES SEDES DE LA SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C.					
CONTRATO DE OBRA No	731-2019	CONTRATISTA	CONSORCIO PRUNI SEDES 04	ENTIDAD CONTRATANTE	SECRETARIA GENERAL-ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA	
CONTRATO INTERVENTORÍA	730 DE 2019	INTERVENTORÍA	ARQUITECTURA URBANA LTDA	FRENTE:	IMPRENTA DISTRITAL	


CAPITULO	NP	ELÉCTRICO	ITEM	IMP 118	DESMONTE ,ALMACENAMIETO Y REINSTALACION CAMARA DE SEGURIDAD	UNIDAD	UN

ITEM	LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	TOTAL	UNIDAD
	2DO PISO EDIFICIO ADMINISTRATIVO				1,00	1,00	UN
OBSERVACIONES:				SUBTOTAL		1,00	UN
				TOTAL		1,00	UN

LOCALIZACIÓN PLANIMÉTRICA

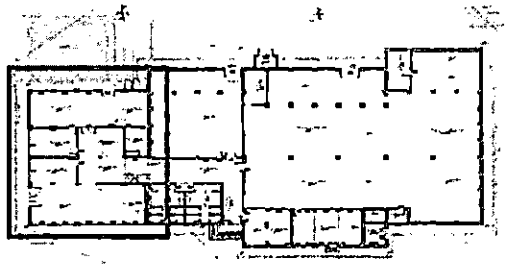


REGISTRO FOTOGRÁFICO



Alejandra Bolaños +
ARQ. ALEJANDRA BOLAÑOS
RESIDENTE CONTRATISTA

Arq. Jessica Lopera A
ARQ. JESSICA LOPERA
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

PLANO DETALLE

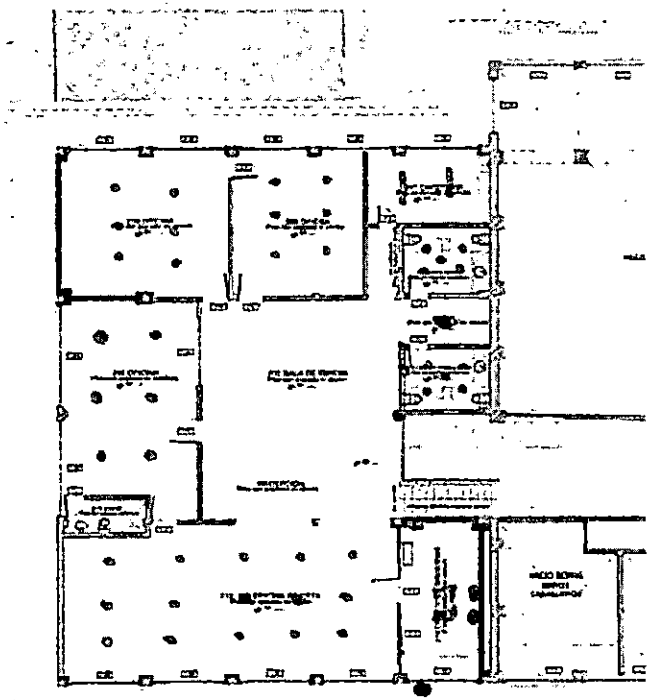

- 3 SENSORES DE MOVIMIENTO
- 2 CAMARA solo se paga 50%
- 43 LAMPARA
- 3 TABLEROS
- 2 UPS

Villa
Antonv.

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA GENERAL — BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

PROYECTO: OBRAS SEDES ALCALDÍA

PRISMA — UNIVERSAL SEC S.A.S. — CONTRATISTA


ARQUITECTURA URBANA LTDA. — INTERVENTORÍA

ACTA No.	4		PERIODO DEL ACTA	01/11/2019	A	30/11/2019	
OBJETO	REALIZAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE AJUSTE LAS DIFERENTES OBRAS E INTERVENCIONES ESPECIALIZADAS PARA LAS DIFERENTES SEDES DE LA SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C.						
CONTRATO DE OBRA No	731-2019	CONTRATISTA	CONSORCIO PRUNI SEDES 04		ENTIDAD CONTRATANTE	SECRETARIA GENERAL-ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA	
CONTRATO INTERVENTORÍA	730 DE 2019	INTERVENTORÍA	ARQUITECTURA URBANA LTDA		FRENTE:	IMPRENTA DISTRITAL	

CAPITULO	NP	ELÉCTRICO	ITEM	IMP 119	DESPLAZAMIENTO DE CIRCUITOS Y PUNTOS DE DATOS EN BODEGA 3 PISO 1, INCLUYE DESMONTAR BANDEJA PORTACABLES, REINSTALARLA A 50 CMS DEL LUGAR PARA PERMITIR MANIOBRA DE REFORZAMIENTO DE MURO, MOVER CABLEADO DE DATOS A BANDEJA SIN DESCONEXIÓN	UNIDAD	ML

ITEM	LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	TOTAL	UNIDAD
	BODEGA FACHADA SUR						
3	[redacted]	7,00			1,00	7,00	ML

PLANO DETALLE

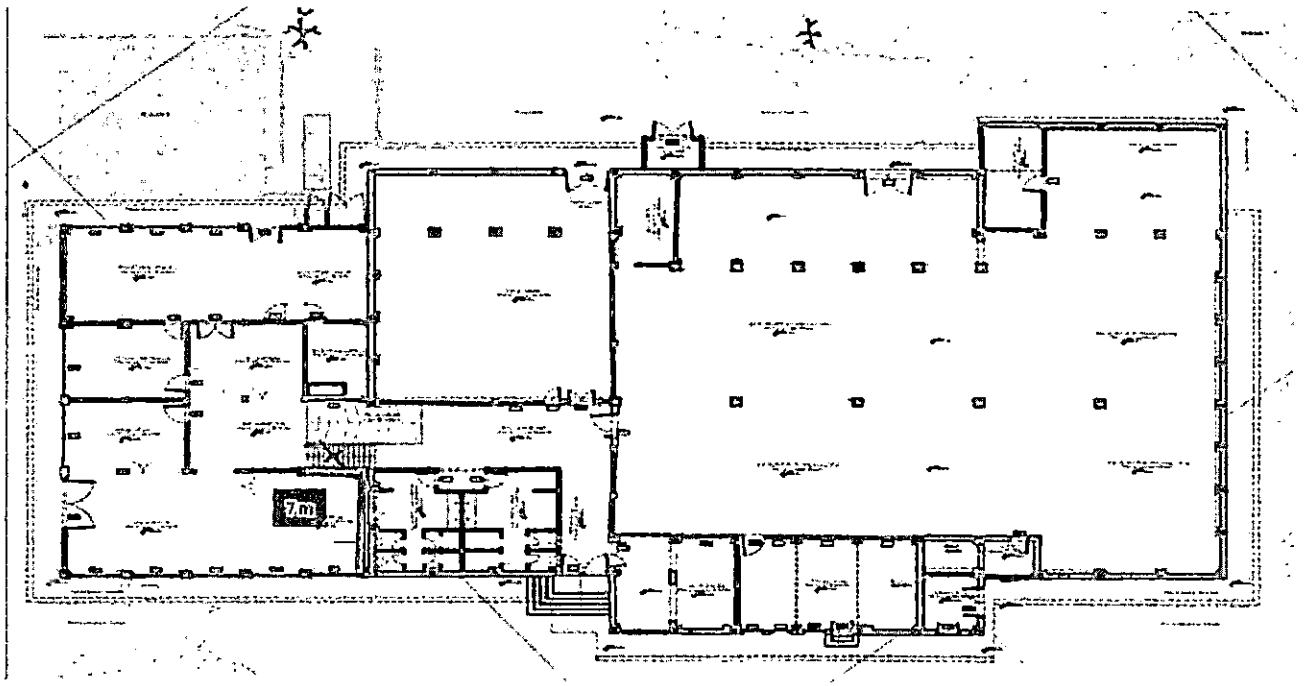

Vega

Interv.

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA GENERAL | BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

PROYECTO: OBRAS SEDES ALCALDÍA

PRISMA — UNIVERSAL SEC S.A.S. — CONSORCIO PRUNI SEDES 04 — CONTRATISTA

ARQUITECTURA URBANA LTDA. — INTERVENTORÍA


ACTA No.	4		PERIODO DEL ACTA	01/11/2019	A	30/11/2019
OBJETO	REALIZAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE AJUSTE LAS DIFERENTES OBRAS E INTERVENCIONES ESPECIALIZADAS PARA LAS DIFERENTES SEDES DE LA SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C.					
CONTRATO DE OBRA No	731-2019	CONTRATISTA	CONSORCIO PRUNI SEDES 04	ENTIDAD CONTRATANTE	SECRETARIA GENERAL-ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA	
CONTRATO INTERVENTORÍA	730 DE 2019	INTERVENTORÍA	ARQUITECTURA URBANA LTDA	FRENTE	IMPRENTA DISTRITAL	

CAPITULO	NP	ELÉCTRICO	ITEM	IMP 120	DESMONTE PUNTO DE SOLDADURA EXOTERMICA DE PUESTA A TIERRA	UNIDAD	UN


ITEM	LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	TOTAL	UNIDAD
	COSTADO OCCIDENTAL				2,00	2,00	UN
				SUBTOTAL		2,00	UN
				TOTAL		2,00	UN

OBSERVACIONES:

LOCALIZACIÓN PLANIMÉTRICA

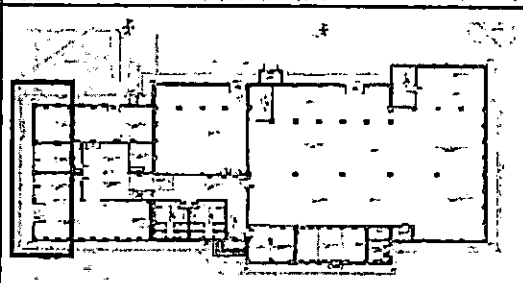

REGISTRO FOTOGRÁFICO

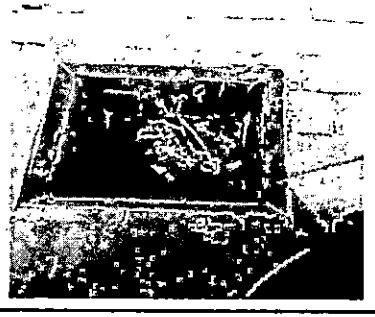


Alejandra Bolaños +

ARQ. ALEJANDRA BOLAÑOS
RESIDENTE CONTRATISTA

Arq Jessica Lopera Arango

ARQ. JESSICA LOPERA
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

PLANO DETALLE

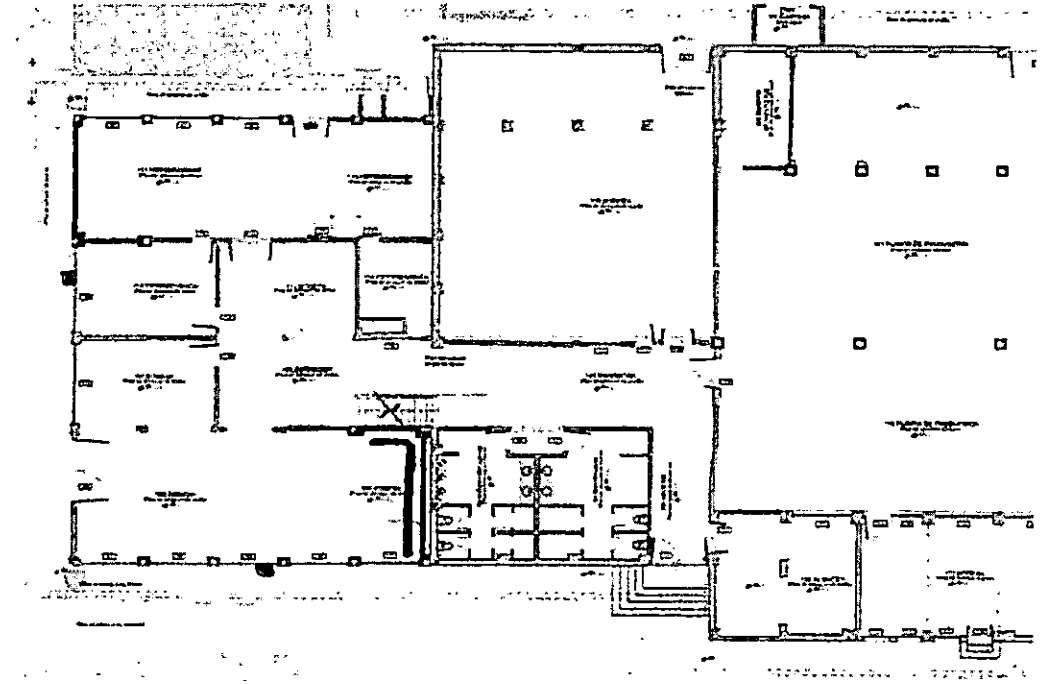

2 PUNTOS DE SOLDADURA EXOTERMICOS

DESPLAZAMIENTO DE BANDEJA PORTACABLE (6.60 mts)

2 REFLECTORES EXTERIOR

Nota P8

Interno.

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA GENERAL

BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

PROYECTO: OBRAS SEDES ALCALDÍA

PRISMA — UNIVERSAL SEC S.A.S. — CONSORCIO PRUNI SEDES D4 — CONTRATISTA

ARQUITECTURA URBANA LTDA — INTERVENTORÍA

ACTA No.	4		PERIODO DEL ACTA	01/11/2019	A	30/11/2019	
OBJETO	REALIZAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE AJUSTE LAS DIFERENTES OBRAS E INTERVENCIONES ESPECIALIZADAS PARA LAS DIFERENTES SEDES DE LA SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C.						
CONTRATO DE OBRA No	731-2019	CONTRATISTA	CONSORCIO PRUNI SEDES D4		ENTIDAD CONTRATANTE	SECRETARIA GENERAL-ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA	
CONTRATO INTERVENTORÍA	730 DE 2019	INTERVENTORÍA	ARQUITECTURA URBANA LTDA		FRENTE	IMPRENTA DISTRITAL	

CAPITULO	NP	ELÉCTRICO	ITEM	IMP 122	DESCONEXION Y REINSTALACION TABLERO DATA CENTER.	UNIDAD	UN

ITEM	LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	TOTAL	UNIDAD
	DATACENTER (2DO PISO ADMINIS.)				0,50	0,50	UN

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. | BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS
SECRETARÍA GENERAL


MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

PROYECTO: OBRAS SEDES ALCALDÍA

PRISMA | UNIVERSAL SEC S.A.S. — CONTRATISTA
ARQUITECTURA URBANA LTDA. — INTERVENTORÍA

ACTA No.	4		PERIODO DEL ACTA	01/11/2019	A	30/11/2019
OBJETO	REALIZAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE AJUSTE LAS DIFERENTES OBRAS E INTERVENCIONES ESPECIALIZADAS PARA LAS DIFERENTES SEDES DE LA SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C.					
CONTRATO DE OBRA No	731-2019	CONTRATISTA	CONSORCIO PRUNI SEDES 04	ENTIDAD CONTRATANTE	SECRETARIA GENERAL-ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA	
CONTRATO INTERVENTORÍA	730 DE 2019	INTERVENTORÍA	ARQUITECTURA URBANA LTDA	FRENTE:	IMPRENTA DISTRITAL	

CAPITULO		NP	ELÉCTRICO		ITEM	IMP 123	RETIRO DESCONEXION Y REINSTALACION RACK ELECTRICO	UNIDAD	UN
ITEM	LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	TOTAL	UNIDAD	LOCALIZACIÓN PLANIMÉTRICA	
	DATACENTER								
	RACK				1,50	1,50	UN		
OBSERVACIONES:					SUBTOTAL	1,50	UN		
					TOTAL	1,50	UN		

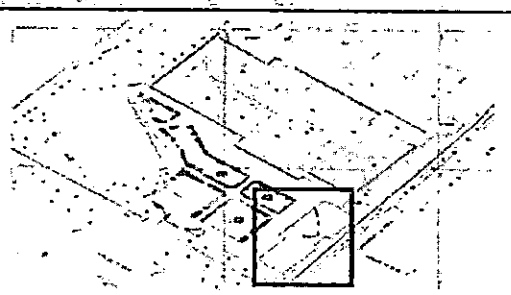

REGISTRO FOTOGRÁFICO



Alejandra Bolaños
ARQ. ALEJANDRA BOLAÑOS
RESIDENTE CONTRATISTA

Arq. Jessica Lopera
ARQ. JESSICA LOPERA
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA GENERAL | BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA


PROYECTO: OBRAS SEDES ALCALDÍA

PRISMA — UNIVERSAL SEC S.A.S. — CONSORCIO PRUNI SEDES 04 — CONTRATISTA


ARQUITECTURA URBANA LTDA. — INTERVENTORÍA

ACTA No.	4		PERIODO DEL ACTA	01/11/2019	A	30/11/2019	
OBJETO	REALIZAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE AJUSTE LAS DIFERENTES OBRAS E INTERVENCIONES ESPECIALIZADAS PARA LAS DIFERENTES SEDES DE LA SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C.						
CONTRATO DE OBRA No	731-2019	CONTRATISTA	CONSORCIO PRUNI SEDES 04	ENTIDAD CONTRATANTE	SECRETARIA GENERAL-ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA		
CONTRATO INTERVENTORÍA	730 DE 2019	INTERVENTORÍA	ARQUITECTURA URBANA LTDA	FRENTE:	IMPRENTA DISTRITAL		

CAPITULO		NP	ELÉCTRICO		ITEM	IMP 124	DESCONEXION Y REINSTALACION UPS DATA CENTER	UNIDAD	UN
ITEM	LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	TOTAL	UNIDAD	LOCALIZACIÓN PLANIMÉTRICA	
	DATACENTER				1,00	1,00	UN		

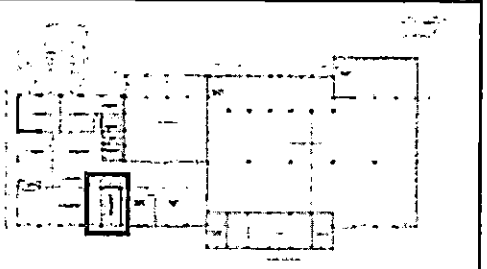

REGISTRO FOTOGRÁFICO

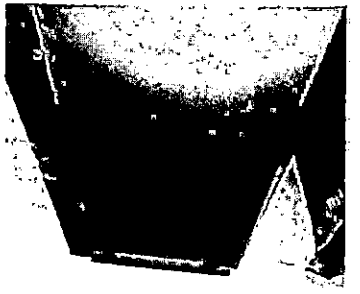

OBSERVACIONES:	SUBTOTAL	1,00	UN
	TOTAL	1,00	UN

Alejandra Bolaños

ARQ. ALEJANDRA BOLAÑOS
RESIDENTE CONTRATISTA

Arq. Jessica Lopera

ARQ. JESSICA LOPERA
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA GENERAL

BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

PROYECTO: OBRAS SEDES ALCALDÍA


PRISMA — UNIVERSAL SEC S.A.S. — CONSORCIO PRUNI SEDES 04 — CONTRATISTA

ARQUITECTURA URBANA LTDA. — INTERVENTORÍA


ACTA No.	4		PERIODO DEL ACTA	01/11/2019	A	30/11/2019	
OBJETO	REALIZAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE AJUSTE LAS DIFERENTES OBRAS E INTERVENCIONES ESPECIALIZADAS PARA LAS DIFERENTES SEDES DE LA SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C.						
CONTRATO DE OBRA No	731-2019	CONTRATISTA	CONSORCIO PRUNI SEDES 04		ENTIDAD CONTRATANTE	SECRETARIA GENERAL-ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA	
CONTRATO INTERVENTORÍA	730 DE 2019	INTERVENTORÍA	ARQUITECTURA URBANA LTDA		FRENTE:	IMPRENTA DISTRITAL	

CAPITULO		NP	ELÉCTRICO		ITEM	IMP 125	DESMONTE Y REINSTALACION CAJA ELECTRICA POLO A TIERRA	UNIDAD	UN
		DIMENSIONES							
ITEM	LOCALIZACIÓN	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	TOTAL	UNIDAD		
	COSTADO OCCIDENTAL								
1	Eje A - 5				0,50	0,50	UN		
2	Eje A - 1				0,50	0,50	UN		
				SUBTOTAL		1,00	UN		
OBSERVACIONES:				TOTAL		1,00	UN		

LOCALIZACIÓN PLANIMÉTRICA

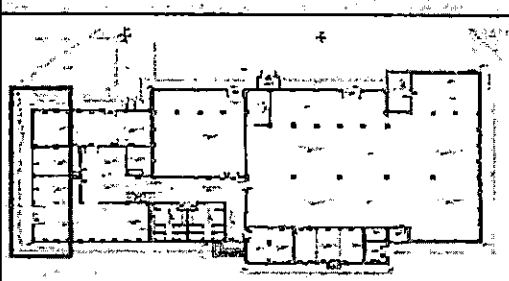

REGISTRO FOTOGRÁFICO

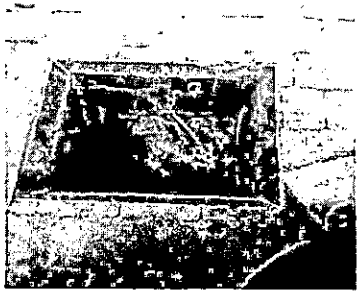


Natanda Bolaños
ARQ. ALEJANDRA BOLAÑOS
RESIDENTE CONTRATISTA

Arq. Jessica Lopera A
ARQ. JESSICA LOPERA
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

140

PLANO DETALLE

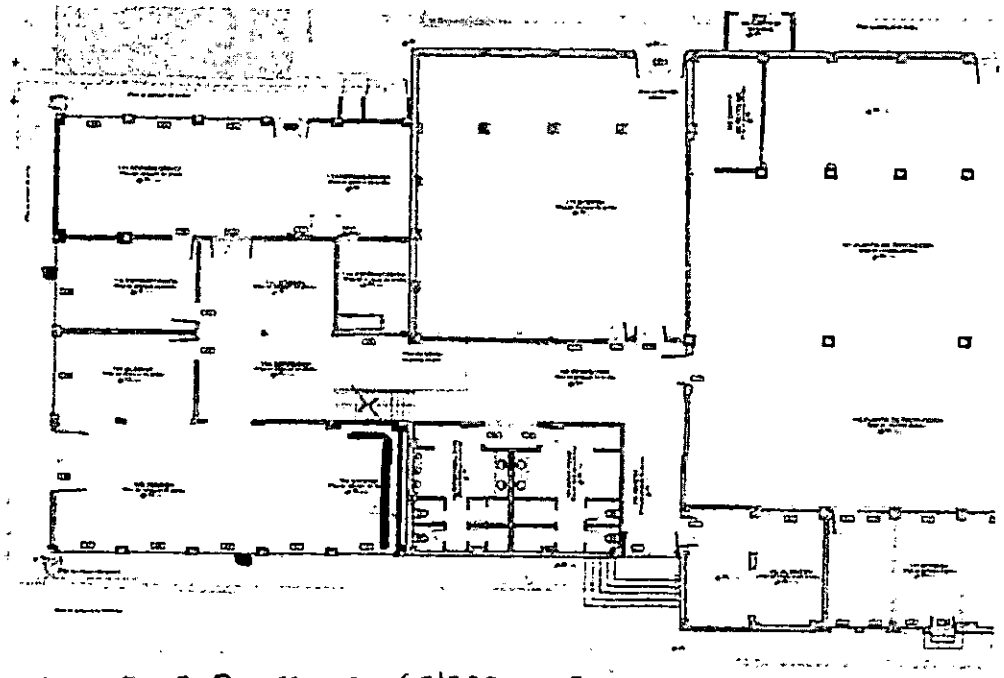

- 2 PUNTOS DE SOLDADURA EXOTERMICOS
- DESPLAZAMIENTO DE BANDEJA PORTACABLE (6.60 Hrs)
- 2 REFLECTORES EXTERIORES

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA GENERAL | BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

PROYECTO: OBRAS SEDES ALCALDÍA

PRISMA — UNIVERSAL SEC S.A. — CONSORCIO PRUNI SEDES 04 — CONTRATISTA

ARQUITECTURA URBANA LTDA. — INTERVENTORÍA


ACTA No.	4		PERIODO DEL ACTA	01/11/2019	A	30/11/2019	
OBJETO	REALIZAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE AJUSTE LAS DIFERENTES OBRAS E INTERVENCIONES ESPECIALIZADAS PARA LAS DIFERENTES SEDES DE LA SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C.						
CONTRATO DE OBRA No.	731-2019	CONTRATISTA	CONSORCIO PRUNI SEDES 04	ENTIDAD CONTRATANTE	SECRETARIA GENERAL-ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA		
CONTRATO INTERVENTORÍA	730 DE 2019	INTERVENTORÍA	ARQUITECTURA URBANA LTDA	FRENTE:	IMPRENTA DISTRITAL		

CAPITULO	NP	ELÉCTRICO		ITEM	IMP 127	DESMONTE Y REINSTALACION AIRE ACONDICIONADO DATA CENTER.	UNIDAD	UN


ITEM	LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	TOTAL	UNIDAD
	FACHADA NORTE				0,50	0,50	UN
	DATACENTER				0,50	0,50	UN
	SUBTOTAL					1,00	UN
	TOTAL					1,00	UN

OBSERVACIONES:

LOCALIZACIÓN PLANIMÉTRICA

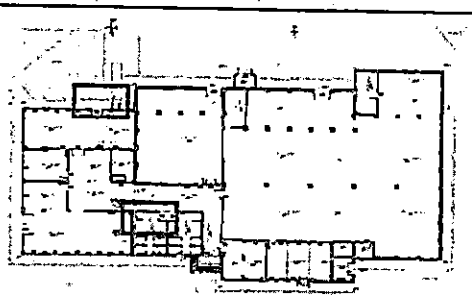

REGISTRO FOTOGRÁFICO

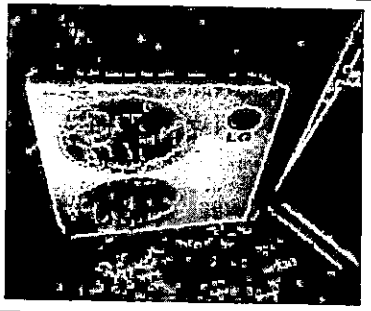

Alejandra Bolaños +

ARQ. ALEJANDRA BOLAÑOS
RESIDENTE CONTRATISTA


Arq. Jessica Lopera A

ARQ. JESSICA LOPERA
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

141

2.7.1

PLANO DETALLE

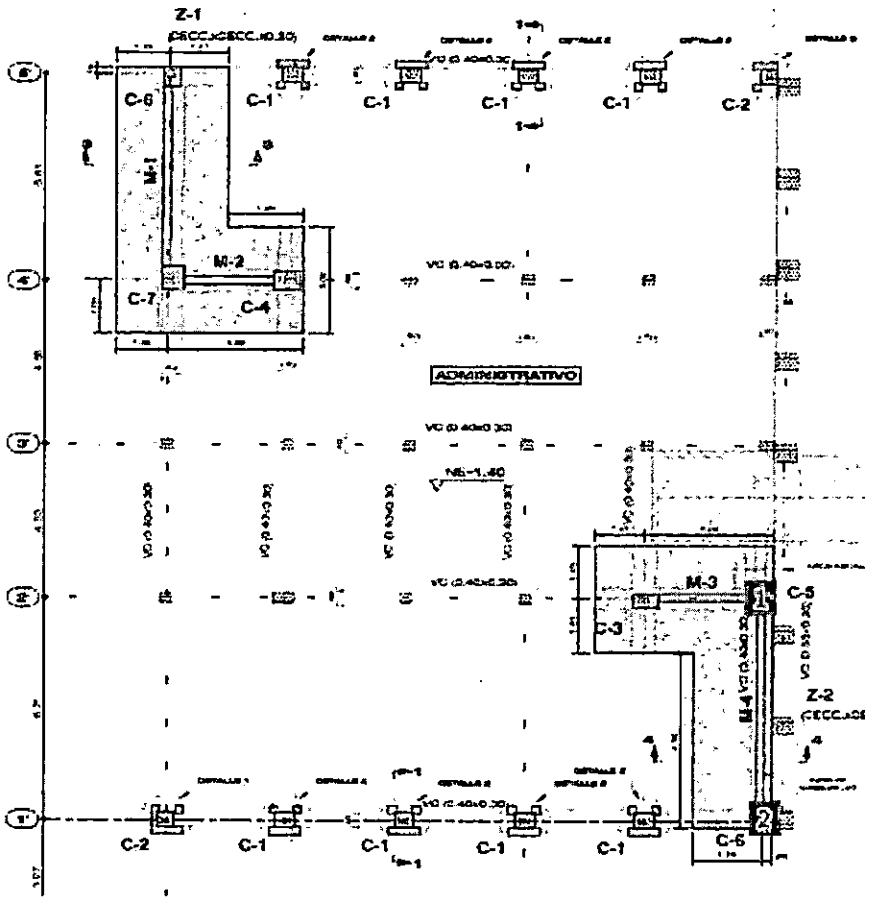

ACTA

5

IMPRENTA DISTRITAL

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA GENERAL / BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS	MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA PROYECTO: OBRAS SEDES ALCALDÍA	PRISMA SAS / UNIVERSAL SEC S.A.S. CONTRATISTA	UNIVERSIDAD CATÓLICA DE COLOMBIA INTERVENTORÍA

ACTA No.	6	FECHA	20 DICIEMBRE DE 2019		
OBJETO	REALIZAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE AJUSTE LAS DIFERENTES OBRAS E INTERVENCIONES ESPECIALIZADAS PARA LAS DIFERENTES SEDES DE LA SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C.				
CONTRATO DE OBRA No	731-2019	CONTRATISTA	CONSORCIO PRISMA SEDES CH	ENTIDAD CONTRATANTE	SECRETARIA GENERAL-ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA
CONTRATO INTERVENTORÍA	732 DE 2019	INTERVENTORÍA	ARQUITECTURA URBANA LTDA	FRENTE	IMPRENTA DISTRITAL


CAPITULO	4	SUMINISTRO SISTEMA EPU 05 IMPRENTA DISTRITAL EDIFICIO 1	ITEM	4,1	A) Grupos de Bombeo EPU 05 Suministro de grupo de bombeo contra incendio de agua conformado marca Hi-bag modelo EPU-05 con un caudal igual de 54,5 lpm, dotados de por cinco bombas de platinas, cada una de ellas equipada con una válvula reguladora y una un caudal de 204,5 lpm por bomba, presión máxima de 210 bar, montado por cinco motores eléctricos (400 V AC, 60 Hz, 27,6 HP cada uno), indicador de presión y instrumentación completa, todo el conjunto montado sobre estructura metálica. Se incluye aparte cuadro de control del grupo de bombeo. B) Tanque de agua Suministro de depósito atmosférico fabricado para almacenamiento de agua potable de polietileno de alta densidad, con capacidad de 5m3/52 y pared-pared de manera tanque con flotador y/o rebosadero con medidas 2.200*2900*1.565 y una capacidad de 5 000 litros. C) Válvulas y Electroválvulas * Suministro de válvula de control marca Hi-bag modelo BVA - 30 código 020010.1 con indicador de paso de agua, manómetro, llaves de pruebas y válvula de cierre y apertura para líneas de mantenimiento con entrada y salida para tubería de 30 mm. * Suministro de manómetro marca Hi-bag modelo MM - 12 código 001500.1 con amortiguamiento, manguito con empaque (24 V DC, 900 mA) y accesorios de apertura y control de abastecimiento con entrada y salida para tubería de 12 mm * Suministro de electroválvula solenoide marca Hi-bag modelo BAV - 20 código 020050.1 con amortiguamiento, alimentada con solenoide (24 V DC, 900 mA) y accesorios de apertura y control de abastecimiento con entrada y salida para tubería de 20 mm. * Instalación de válvula de bola de paso manipulable para tubería de 12 mm con Rosca hembra, código 030005.1 para la purga de la instalación. D) Suministro redes Hidráulicas * Suministro de tramos a instalaciones abierta marca Hi-bag modelo HI Tubo Roscado 1000, Código CT-1250, para una presión con un factor de 3.50, en acero inoxidable con el fin responsabilidad instalar de acero especializado de longitud Hi-bag y roscada de 12 mm. * Suministro de tramos roscados marca Hi-bag modelo 1000 Tubo Roscado 1000 JUNTA código 20001.1.0003 para una presión con un factor de 3.5, compuesta con una tubería comercial y unión tubos en el cobre, tubería con una longitud flexible a 57 °C con el fin responsables conectar a la tubería de 12 mm y galvanizador para ser instalado en placa de cobre roche. *Suministro de tramos roscados marca Hi-bag ECTO modelo DATE código C-00051116 para una presión, equipados con filtro en el cobre tubería con un factor 3.50, tubería con una presión flexible a 57 °C, con el fin responsables conectar galvanizado con unión y a línea de tubería de acero inoxidable de 12 mm con una unión roscada para ser instalado en placa de cobre roche. D Tubería Acero Inoxidable * Suministro para tubería de acero inoxidable con soldadura en calidad 1.4404 DN 10217-7 con cinco de tolerancia D4/T1 de diámetro exterior 30 mm x 2,5 mm. * Tres tubería de tubería de acero inoxidable con soldadura en calidad 1.4404 EN 303 17-7 con cinco de tolerancia D4/T3 de diámetro exterior 33 mm x 1,8 mm con p.p. de uni, soldeos y reducciones según DIN 2353 (soportes incluidos) de acuerdo con el manual de instalación de Manuff. * Suministro de tubería de acero inoxidable con soldadura en calidad 1.4 404 EN 1517-7 con cinco de tolerancia D4/T2 de diámetro exterior 30 mm x 2,5 mm con p.p. de uni, soldeos y reducciones según DIN 2353 (soportes incluidos) de acuerdo con el manual de instalación de Manuff. * Suministro de tubería de acero inoxidable con soldadura en calidad 1.4 404 EN 1517-7 con cinco de tolerancia D4/T1 de diámetro exterior 16 mm x 1,5 mm con p.p. de uni, soldeos y reducciones según DIN 2353 (soportes incluidos) de acuerdo con el manual de instalación de Manuff. * Suministro de tubería de acero inoxidable con soldadura en calidad 1 4404 EN 10217-7 con cinco de tolerancia D4/T3 de diámetro exterior 12 mm x 1,2 mm con p.p. de uni, soldeos y reducciones según DIN 2353 (soportes incluidos) de acuerdo con el manual de instalación de Manuff. F) Soldeteos por termo-fusión SHT Suministro de manguitos Hi-bag código A10500, con 3.5 tiempos de manguito de alta presión de 1/2" montado sobre termoadhesivo automático, con resistencia eléctrica de acero inoxidable. Suministro de tubos marca Hi-bag código 020010.0 dimensión en acero inoxidable y galvanizado Hi-bag de material especial mantenimiento, con material rígido. Suministro de caja protectora para la válvula en clase de 6 mm de espesor de 610 * 610 *150 mm con tapa y pestillos perforación Alcalde en puntos galvanizado Ref 8080 incluido el tornillo.	UNIDAD	1

ITEM	LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	TOTAL	UNIDAD
1	Sistema EPU 05 Edificio 1				1,00	1,00	UNIDAD


OBSERVACIONES: LA PRESENTE ACTA PARCIAL AVALA EL PAGO DEL EQUIPO EPU 05 DE LA SEDE IMPRENTA DISTRITAL EL CUMPLIMIENTO AL MODIFICATORIO No. 1 DEL CONTRATO DE OBRA 731-2019 FIRMADO EL 30 DE DICIEMBRE DE 2019 Y EL OTRO SI A LA RESOLUCION DE No 564 del 20 de Noviembre de 2019 Por medio de la cual se resuelve [illegible]

IMPRIMIR		1,00	UN
TOTAL		1,00	UN

LOCALIZACIÓN PLANIMÉTRICA



REGISTRO FOTOGRÁFICO



ING. FRANCISCO GONZALEZ
DIRECTOR DE OBRA

ARQ. HERNANDO BAZA BERNAL
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

1423

42

ACTA

6

IMPRENTA DISTRITAL

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA GENERAL

BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

PROYECTO: OBRAS SEDES ALCALDÍA

PRISMA — UNIVERSAL SEC S.A.S. — CONSORCIO PRUNI SEDES 04 — CONTRATISTA

ARQUITECTURA URBANA LTDA. — INTERVENTORÍA


ACTA No.	6	PERIODO DEL ACTA	01/12/2019	A	30/12/2019		
OBJETO	REALIZAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE AJUSTE LAS DIFERENTES OBRAS E INTERVENCIONES ESPECIALIZADAS PARA LAS DIFERENTES SEDES DE LA SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C.						
CONTRATO DE OBRA No	731-2019	CONTRATISTA	CONSORCIO PRUNI SEDES 04	ENTIDAD CONTRATANTE	SECRETARIA GENERAL-ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA		
CONTRATO INTERVENTORÍA	730 DE 2019	INTERVENTORÍA	ARQUITECTURA URBANA LTDA	FRENTE	IMPRENTA DISTRITAL		

CAPITULO	NP	CIVIL	ITEM	IMP 06	Desmonte de ventanas metálicas	UNIDAD	M2

ITEM	LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	TOTAL	UNIDAD
	EDIFICIO ADMINISTRATIVO 2DO PISO						
1	MURO EJE A ENTRE 2'-3'		3,77	1,72	1,00	6,48	M2
					SUBTOTAL	6,48	M2
					TOTAL	6,48	M2

OBSERVACIONES:

LOCALIZACIÓN PLANIMÉTRICA

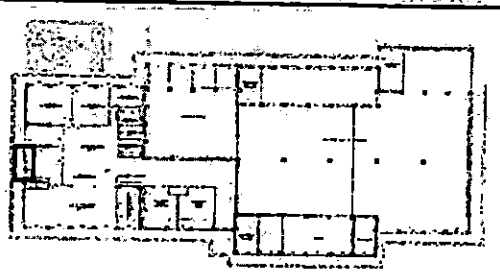

REGISTRO FOTOGRÁFICO



ARQ. ALEJANDRA BOLAÑOS
RESIDENTE CONTRATISTA


ARQ. NANCY AYALA
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

154


145

PLANO DETALLE

PRIMER PISO

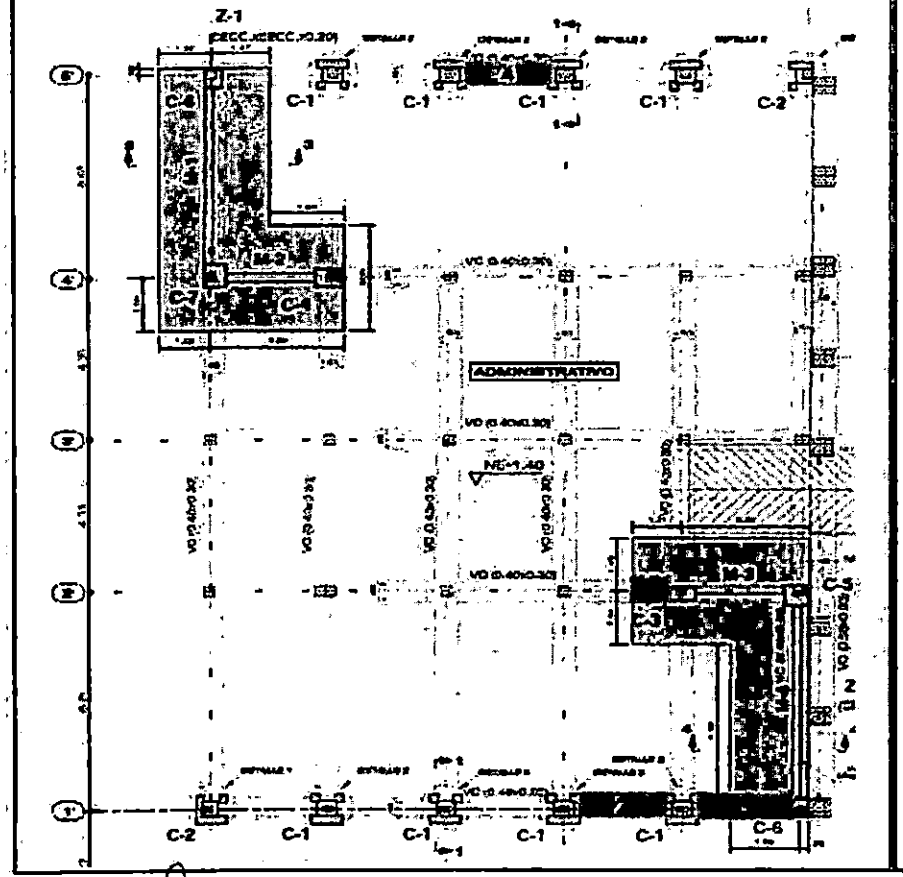

SEGUNDO PISO

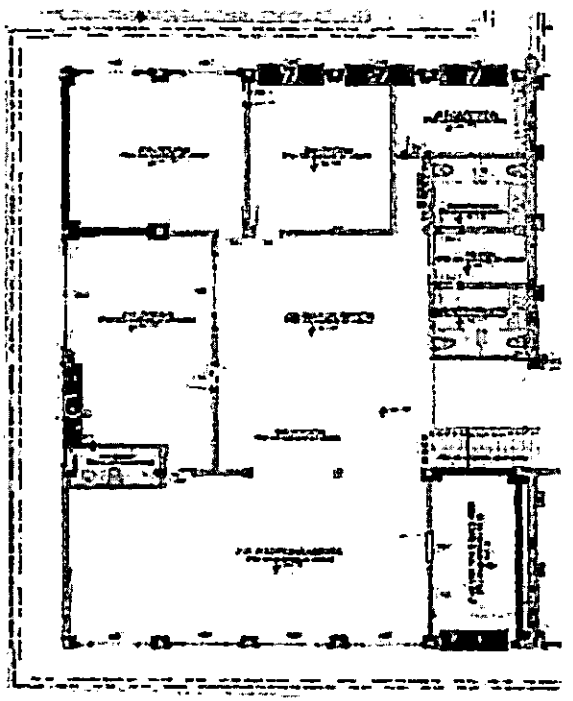

153

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA GENERAL

BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

PROYECTO: OBRAS SEDES ALCALDÍA

PRISMA — UNIVERSAL SEC S.A.S. — CONSORCIO PRUNI SEDES 04 — CONTRATISTA

ARQUITECTURA URBANA LTDA. — INTERVENTORÍA


ACTA No.	6	PERIODO DEL ACTA	01/12/2019	A	30/12/2019
OBJETO	REALIZAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE AJUSTE LAS DIFERENTES OBRAS E INTERVENCIONES ESPECIALIZADAS PARA LAS DIFERENTES SEDES DE LA SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C.				
CONTRATO DE OBRA No	731-2019	CONTRATISTA	CONSORCIO PRUNI SEDES 04	ENTIDAD CONTRATANTE	SECRETARIA GENERAL-ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA
CONTRATO INTERVENTORÍA	730 DE 2019	INTERVENTORÍA	ARQUITECTURA URBANA LTDA	SITIO:	IMPRENTA DISTRITAL

CAPITULO	3.3.0	INSTALACIONES ELÉCTRICAS	ITEM	3.3.0.1	Suministro e instalación de muro en ladrillo tolete	UNIDAD	M2


ITEM	LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	TOTAL	UNIDAD
	ADMINISTRACIÓN 1ER PISO						
1	ADYACENTE MURO M-3 EJES 2'-E		1,10	3,03	1,00	3,33	M2
2	ANTEPECHO EJE 1' ENTRE D-E		2,05	1,00	1,00	2,05	M2
3	ANTEPECHO EJE 1' ENTRE E-F		2,05	1,00	1,00	2,05	M2
4	ANTEPECHO EJE 5' ENTRE D-E		2,00	1,00	1,00	2,00	M2
	ADMINISTRACIÓN 2DO PISO						
5	ANTEPECHO EJE A ENTRE 2'-3'		4,20	1,00	1,00	4,20	M2
6	ANTEPECHO EJE 1' ENTRE E-F		2,05	0,70	1,00	1,44	M2
7	ANTEPECHO EJE A ENTRE 2'-3'		2,05	0,70	3,00	4,31	M2

PLANO DETALLE

PRIMER PISO

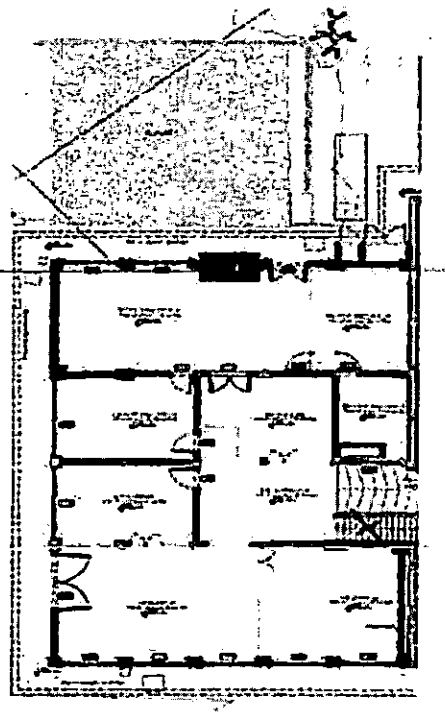

SEGUNDO PISO

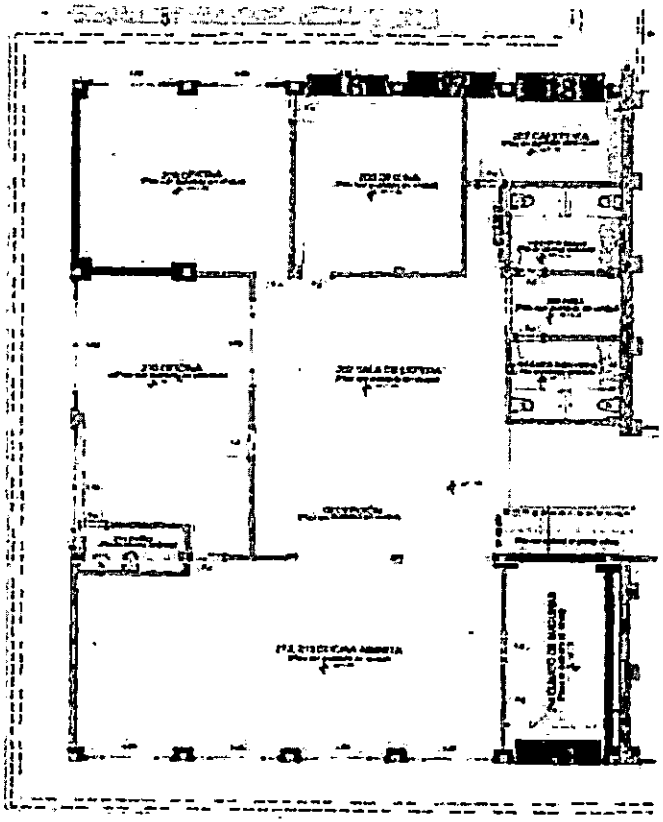

Mapa B

1 de 1

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. | BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS
SECRETARÍA GENERAL

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

PROYECTO: OBRAS SEDES ALCALDÍA

PRISMA | UNIVERSAL SEC S.A.S. — CONSORCIO PRISMA SEDES D4 — CONTRATISTA

ARQUITECTURA URBANA LTDA. — INTERVENTORÍA


ACTA No:	6	PERIODO DEL ACTA	01/12/2019	A	30/12/2019
OBJETO	REALIZAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE AJUSTE LAS DIFERENTES OBRAS E INTERVENCIONES ESPECIALIZADAS PARA LAS DIFERENTES SEDES DE LA SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C.				
CONTRATO DE OBRA No:	731-2019	CONTRATISTA	CONSORCIO PRISMA SEDES D4	ENTIDAD CONTRATANTE	SECRETARIA GENERAL-ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA
CONTRATO INTERVENTORÍA	730 DE 2019	INTERVENTORÍA	ARQUITECTURA URBANA LTDA	FRENTE	IMPRENTA DISTRITAL

CAPITULO	2.8.0	RESTITUCIÓN DE ACABADOS	ITEM	2.8.0.13	Suministro figurado y amarre de acero 60000 PSI 420 Mpa	UNIDAD	KG

ITEM	LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES FIGURA	LARGO (m)	PESO Kg/m	CANTIDAD	TOTAL	UNIDAD
					VIENEN	646,61	KG
	EDIFICIO ADMINISTRATIVO 1ER PISO						
14	COLUMNETAS Y VIGA EJE 5' ENTRE C-D						
	Acero #4 doble esc. L=1.20m		4,60	0,994	2,00	9,14	KG
	Acero #4 doble esc. L=1.00m		4,40	0,994	2,00	8,75	KG
	Fleje #3 de .17x.20		0,65	0,560	32,00	11,65	KG
15	COLUMNETA Y VIGA EJE 1' ENTRE E-F						
	Acero #4 con doble esc. L=0.85m		4,15	0,994	2,00	8,25	KG
	Acero #4 con doble esc. L=0.85m		4,35	0,994	2,00	8,65	KG
	Fleje #3 de .17x.20		0,65	0,560	30,00	10,92	KG
16	COLUMNETA Y VIGA EJE 1' ENTRE E-F						
	Acero #4 con doble esc. L=0.85m		4,15	0,994	2,00	8,25	KG
	Acero #4 con doble esc. L=0.85m		4,35	0,994	2,00	8,65	KG
	Fleje #3 de .17x.20		0,65	0,560	30,00	10,92	KG
17	COLUMNETA Y VIGA EJE 1' ENTRE E-F						
	Acero #4 con doble esc. L=0.85m		4,15	0,994	2,00	8,25	KG
	Acero #4 con doble esc. L=0.85m		4,35	0,994	2,00	8,65	KG
	Fleje #3 de .17x.20		0,65	0,560	30,00	10,92	KG
18	COLUMNETA Y VIGA EJE 1' ENTRE E-F						
	Acero #4 con doble esc. L=0.85m		4,15	0,994	2,00	8,25	KG
	Acero #4 con doble esc. L=0.85m		4,35	0,994	2,00	8,65	KG
	Fleje #3 de .17x.20		0,65	0,560	30,00	10,92	KG
					SUBTOTAL	787,41	KG
					TOTAL	787,41	KG

OBSERVACIONES:

LOCALIZACIÓN PLANIMÉTRICA

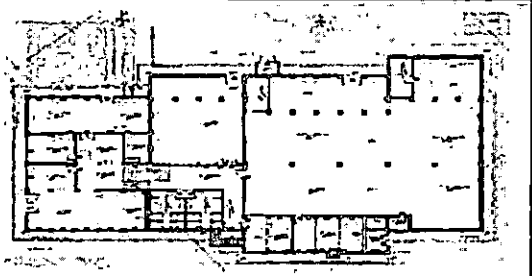


REGISTRO FOTOGRÁFICO



ARQ. ALEJANDRA BOLAÑOS
RESIDENTE CONTRATISTA

ARQ. NANCY AYALA
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

SEGUNDO PISO

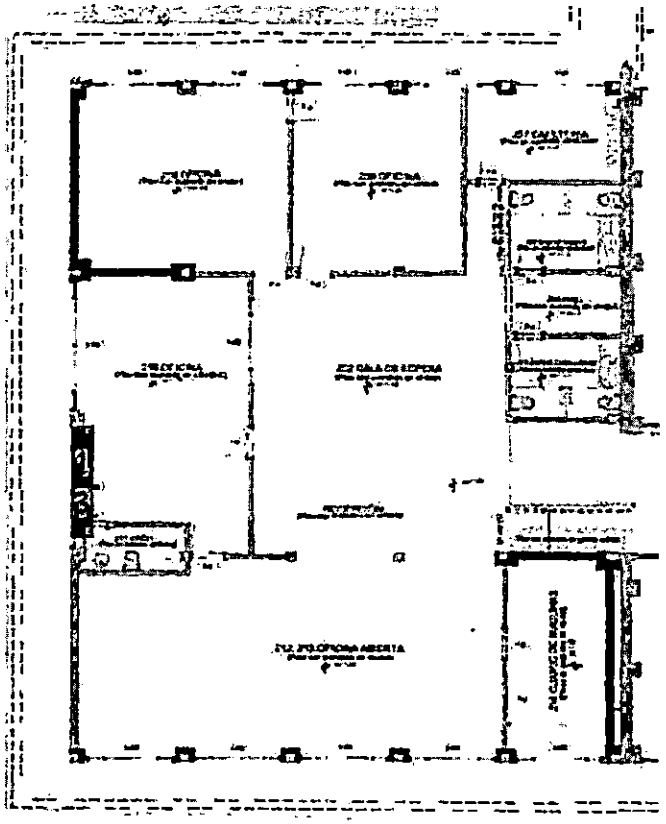

Alejandra BJ


146

148

ANCER CONSTRUCTOR SAS	MEMORIA DE CALCULO DE OBRA	

ORDEN DE SERVICIO		FECHA INICIO	1 DE NOVIEMBRE 2019	FECHA DE TERMINACION	15 DE NOVIEMBRE 2019	UBICACIÓN	MANZANA LIEVANO
						DIRECCION	CARRERA 8 # 10 -65
OBJETO:	OBRAS CIVILES PARA ADELANTAR LOS TRABAJOS DE RED CONTRA INCENDIO DE LA MANZANA LIEVANO ALCALDIA DE BOGOTA						
CAP	OBRAS LOCATIVAS Y ASEO	ITEM	9	MONTAJE DE PISO EN MADERA		U. MEDIDA	M2

EVIDENCIA FOTOGRAFICA DEL ITEM

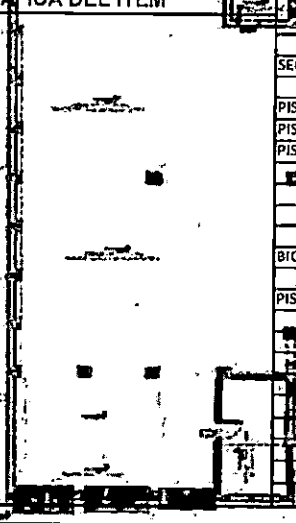

FECHA DE LOCALIZACION Y TOMA: NOVIEMBRE

DESCRIPCION DE LA LOCALIZACION / LUGAR / SITIO EJECUCION	DIMENSIONES			CANTIDAD	CANTIDAD TOTAL EJECUTADA
	LARGO	ANCHO	ALTO		
SECRETARIA DE GOBIERNO					
PISO 1	0,00	0,00		0,00	0,00
PISO 2	0,00	0,00		0,00	0,00
PISO 3	0,00	0,00		0,00	0,00
				SUBTOTAL	0,00
BICENTENARIO I					
PISO 2	0,00	0,00		0,00	0,00
	0,00	0,00		0,00	0,00
	0,00	0,00		0,00	0,00
				SUBTOTAL	0,00
TOTAL ITEM					0,00

OBSERVACIONES:

ARQ. DARIO FRANCO RESIDENTE DE OBRA CONSORCIO PRUNI SEDES 04 - MANZANA LIEVANO	ING. CESAR AUDIFRED CONTRATISTA ANCER CONSTRUCTOR SAS	ING. FREDY GOMEZ DIRECTOR DE OBRA CONSORCIO PRUNI SEDES 04 - MANZANA LIEVANO

PRIMER PISO

PLANO DETALLE

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA GENERAL | BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

PROYECTO: OBRAS SEDES ALCALDÍA

PRISMA — UNIVERSAL SEC S.A.S. — CONSORCIO PRUNI SEDES 04 — CONTRATISTA


ARQUITECTURA URBANA LTDA. — INTERVENTORÍA

ACTA No.	6	PERIODO DEL ACTA	01/12/2019	A	30/12/2019		
OBJETO	REALIZAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE AJUSTE LAS DIFERENTES OBRAS E INTERVENCIONES ESPECIALIZADAS PARA LAS DIFERENTES SEDES DE LA SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C.						
CONTRATO DE OBRA No.	731-2019	CONTRATISTA	CONSORCIO PRUNI SEDES 04	ENTIDAD CONTRATANTE	SECRETARIA GENERAL-ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA		
CONTRATO INTERVENTORÍA	730 DE 2019	INTERVENTORÍA	ARQUITECTURA URBANA LTDA	FRENTE:	IMPRENTA DISTRITAL		

CAPÍTULO	2.8.0	RESTITUCIÓN DE ACABADOS	ITEM	2.8.0.13	Suministro figurado y amarre de acero 60000 PSI 420 Mpa	UNIDAD	KG

ITEM	LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES FIGURA	LARGO (m)	PESO (kg/m)	CANTIDAD	TOTAL	UNIDAD
					VIENEN	448,83	KG
	PRODUCCIÓN						
8	VIGA CINTA EJE 14 ENTRE R-S						
	Acero #4 recto		2,67	0,994	4,00	10,62	KG
	Fleje #3 de .25x.20		0,90	0,560	12,00	6,05	KG
	Acero #3 recto		1,00	0,560	36,00	20,16	KG
9	VIGA CINTA EJE 14 ENTRE S-T						
	Acero #4 recto		2,67	0,994	4,00	10,62	KG
	Fleje #3 de .25x.20		0,90	0,560	12,00	6,05	KG
	Acero #3 recto		1,00	0,560	36,00	20,16	KG
10	VIGA CINTA EJE 14 ENTRE T-U						
	Acero #4 recto		2,67	0,994	4,00	10,62	KG
	Fleje #3 de .25x.20		0,90	0,560	12,00	6,05	KG
	Acero #3 recto		1,00	0,560	36,00	20,16	KG
	EDIFICIO ADMINISTRATIVO 1ER PISO						
11	COLUMNETAS Y VIGA EJE 1' ENTRE D-E						
	Acero #4 doble esc. L=1.20m		4,60	0,994	2,00	9,14	KG
	Acero #4 doble esc. L=1.00m		4,40	0,994	2,00	8,75	KG
	Fleje #3 de .17x.20		0,65	0,560	32,00	11,65	KG
12	COLUMNETAS Y VIGA EJE 1' ENTRE E-F						
	Acero #4 doble esc. L=1.20m		4,60	0,994	2,00	9,14	KG
	Acero #4 doble esc. L=1.00m		4,40	0,994	2,00	8,75	KG
	Fleje #3 de .17x.20		0,65	0,560	32,00	11,65	KG
	EDIFICIO ADMINISTRATIVO 2DO PISO						
13	COLUMNETA Y VIGA EJE A ENTRE 2'-3'						
	Acero #4 con doble esc. L=0.85m		3,65	0,994	4,00	14,51	KG
	Acero #4 con esc. L=0.90m		5,00	0,994	2,00	9,94	KG
	Acero #4 con esc. L=0.90m		1,90	0,994	2,00	3,78	KG
OBSERVACIONES:				SUBTOTAL		646,61	KG
				TOTAL		646,61	KG

LOCALIZACIÓN PLANIMÉTRICA

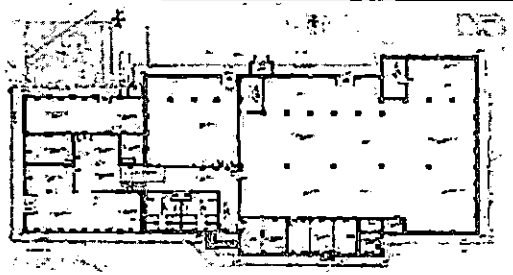

REGISTRO FOTOGRÁFICO




ARQ. ALEJANDRA BOLAÑOS
RESIDENTE CONTRATISTA


ARQ. NANCY AYALA
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

444

ARCHIVO

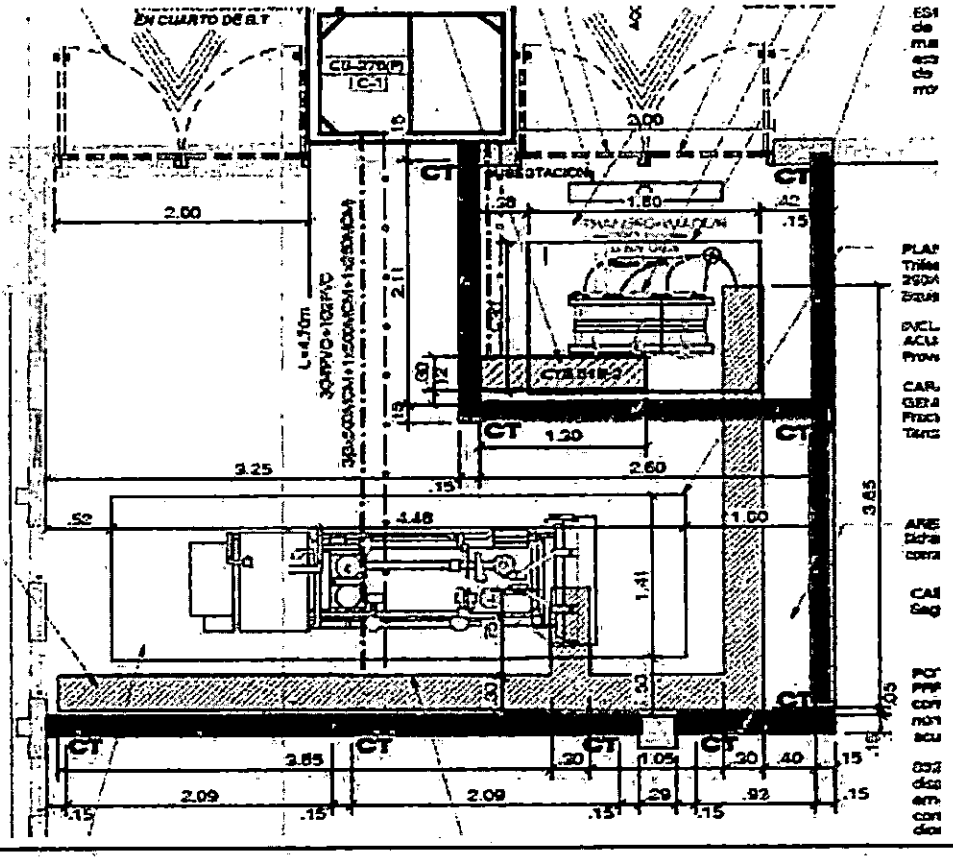
EN CUARTO DE S.T.
CT
2.00
1.80
1.20
2.60
3.25
4.48
1.41
3.85
2.09
1.05
1.60
.40
.92

149

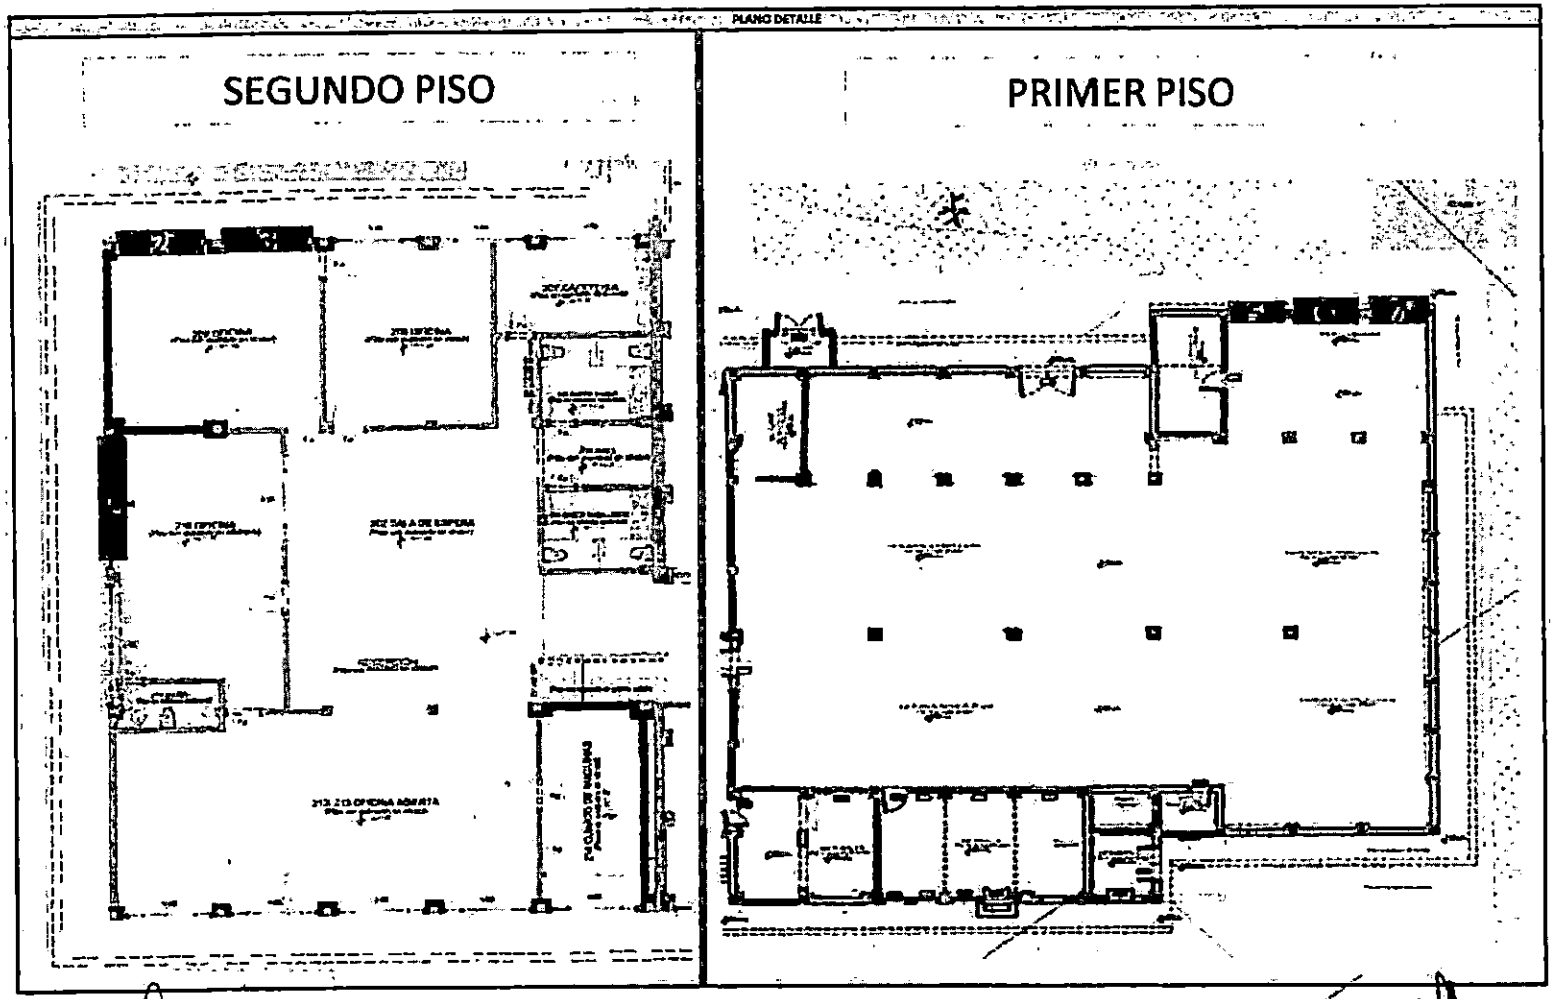
PLANO DETALLE
SEGUNDO PISO
PRIMER PISO

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. | BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS
SECRETARÍA GENERAL

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

PROYECTO: OBRAS SEDES ALCALDÍA


PRISMA | UNIVERSAL SEC S.A.S. — CONSORCIO PRUNI SEDES 04 — CONTRATISTA
ARQUITECTURA URBANA LTDA — INTERVENTORÍA

ACTA No.	6	PERIODO DEL ACTA	01/12/2019	A	30/12/2019
OBJETO	REALIZAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE AJUSTE LAS DIFERENTES OBRAS E INTERVENCIONES ESPECIALIZADAS PARA LAS DIFERENTES SEDES DE LA SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C.				
CONTRATO DE OBRA No	731-2019	CONTRATISTA	CONSORCIO PRUNI SEDES 04	ENTIDAD CONTRATANTE	SECRETARIA GENERAL-ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA
CONTRATO INTERVENTORÍA	730 DE 2019	INTERVENTORÍA	ARQUITECTURA URBANA LTDA	FRENTE:	IMPRENTA DISTRITAL

CAPITULO	2.8.0	RESTITUCIÓN DE ACABADOS	ITEM	2.8.0.13	Suministro figurada y armare de acero 60000 PSI 420 Mpa	UNIDAD	KG

ITEM	LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES FIGURA	LARGO (m)	PESO (kg/m)	CANTIDAD	TOTAL	UNIDAD
	EDIFICIO ADMINISTRATIVO 2DO PISO						
1	COLUMNETA Y VIGA EJE A ENTRE 3'-4'						
	Acero #4 con doble esc. L=0.85m		3,65	0,994	4,00	14,51	KG
	Acero #4 con esc. L=0.90m		5,00	0,994	2,00	9,94	KG
	Acero #4 con esc. L=0.90m		1,90	0,994	2,00	3,78	KG
	Fleje #5 de .17x.20		0,65	0,560	54,00	19,66	KG
2	COLUMNETA Y VIGA EJE 5' ENTRE A-B						
	Acero #4 con doble esc. L=0.85m		4,15	0,994	2,00	8,25	KG
	Acero #4 con doble esc. L=0.85m		4,35	0,994	2,00	8,65	KG
	Fleje #3 de .17x.20		0,65	0,560	30,00	10,92	KG
3	COLUMNETA Y VIGA EJE 5' ENTRE B-C						
	Acero #4 con doble esc. L=0.85m		4,15	0,994	2,00	8,25	KG
	Acero #4 con doble esc. L=0.85m		4,35	0,994	2,00	8,65	KG
	Fleje #3 de .17x.20		0,65	0,560	30,00	10,92	KG
	ARCHIVO (PLANTA ELÉCTRICA)						
4	VIGA SUPERIOR						
	Acero #3 con doble esc. L=0.20m		4,80	0,560	4,00	10,75	KG
	Acero #3 con doble esc. L=0.20m		2,47	0,560	4,00	5,53	KG
	Acero #3 con doble esc. L=0.20m		2,60	0,560	8,00	11,65	KG
	Acero #3 con doble esc. L=0.20m		2,35	0,560	4,00	5,26	KG
	Acero #3 con doble esc. L=0.20m		5,16	0,560	4,00	11,56	KG
	Fleje #3 de .20x.20		0,74	0,560	112,00	46,41	KG
	PRODUCCIÓN						
5	COLUMNETAS EJE 14 ENTRE R-S						
	Acero #6 con esc. L=.60m.		2,67	2,235	12,00	71,61	KG
	Fleje #3 de .25x.20		0,90	0,560	26,00	13,10	KG
6	COLUMNETAS EJE 14 ENTRE S-T						
	Acero #6 con esc. L=.60m.		2,67	2,235	12,00	71,61	KG
	Fleje #3 de .25x.20		0,90	0,560	26,00	13,10	KG
7	COLUMNETAS EJE 14 ENTRE T-U						
	Acero #6 con esc. L=.60m.		2,67	2,235	12,00	71,61	KG
	Fleje #3 de .25x.20		0,90	0,560	26,00	13,10	KG
OBSERVACIONES:				SUBTOTAL		448,83	KG
				TOTAL		✓ 448,83	KG

LOCALIZACIÓN PLANIMÉTRICA

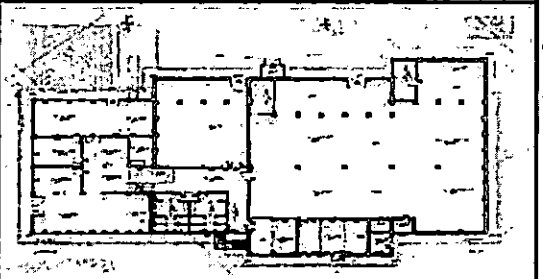

REGISTRO FOTOGRÁFICO



Alejandra Bolaños

ARQ. ALEJANDRA BOLAÑOS
RESIDENTE CONTRATISTA

Nancy Rocio Ayala Gomez


ARQ. NANCY AYALA
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

150

454


PLANO DETALLE

PRIMER PISO

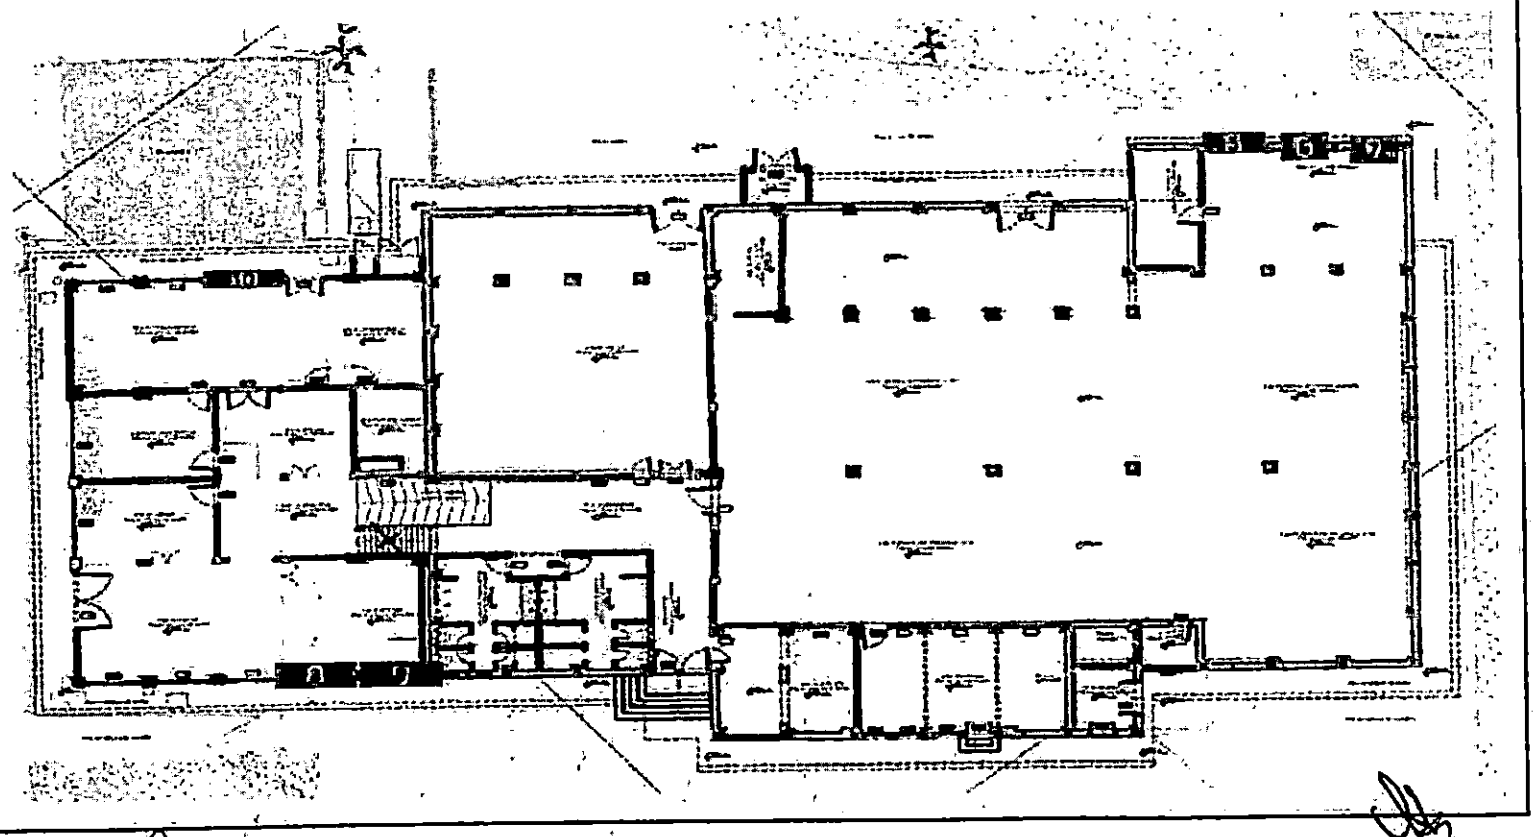

Alejo BF

SEGUNDO PISO

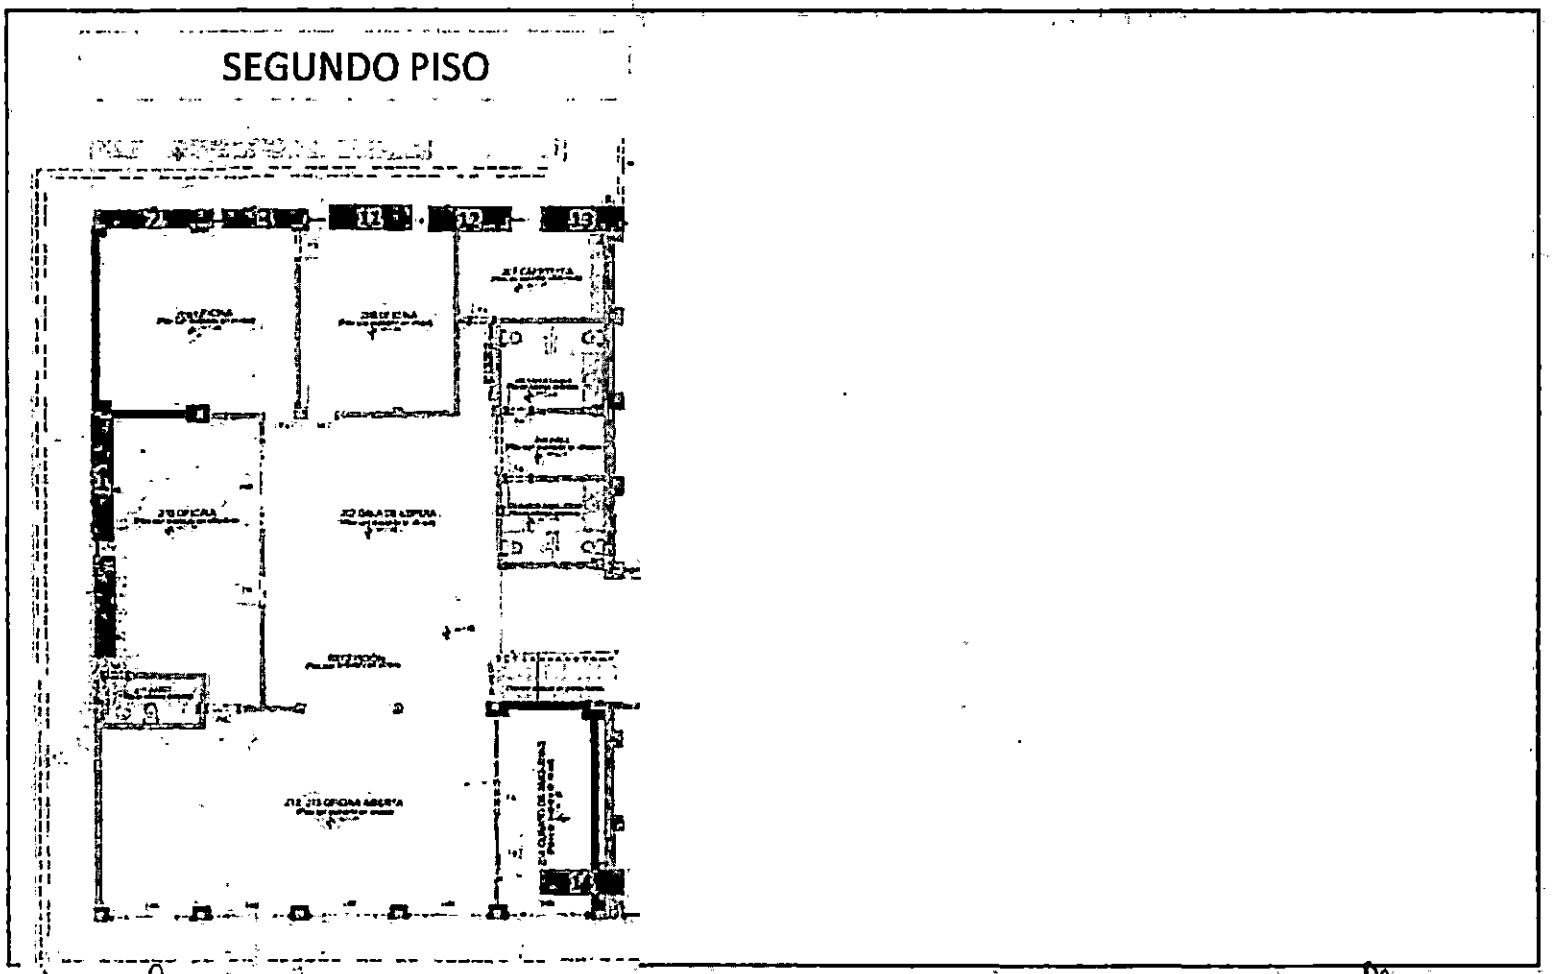

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA GENERAL

BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

PROYECTO: OBRAS SEDES ALCALDÍA

PRISMA — UNIVERSAL SEC S.A.S. — CONSORCIO PRISMA SEDES 04 — CONTRATISTA

ARQUITECTURA URBANA LTDA. — INTERVENTORÍA


ACTA No.	6	PERIODO DEL ACTA	01/12/2019	A	30/12/2019		
OBJETO	REALIZAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE AJUSTE LAS DIFERENTES OBRAS E INTERVENCIONES ESPECIALIZADAS PARA LAS DIFERENTES SEDES DE LA SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C.						
CONTRATO DE OBRA No.	731-2019	CONTRATISTA	CONSORCIO PRÚNI SEDES 04	ENTIDAD CONTRATANTE	SECRETARIA GENERAL-ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA		
CONTRATO INTERVENTORÍA	730 DE 2019	INTERVENTORÍA	ARQUITECTURA URBANA LTDA	FRENTE:	IMPRENTA DISTRITAL		

CAPITULO	2.8.0	RESTITUCIÓN DE ACABADOS	ITEM	2.8.0.16	Viga de remate encima de muros - 3,000 psi	UNIDAD	M3


ITEM	LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	TOTAL	UNIDAD
	EDIFICIO ADMINISTRATIVO 2DO PISO						
1	VIGA EJE A ENTRE 3'-4'	4,25	0,10	0,25	1,00	0,11	M3
2	VIGA EJE 5' ENTRE A-B	2,50	0,10	0,25	1,00	0,06	M3
3	VIGA EJE 5' ENTRE B-C	2,50	0,10	0,25	1,00	0,06	M3
4	VIGA EJE A ENTRE 2'-3'	4,25	0,10	0,25	1,00	0,11	M3
	PRODUCCIÓN						
5	VIGA CINTA EJE 14 ENTRE R-S	2,57	0,21	0,30	1,00	0,16	M3
6	VIGA CINTA EJE 14 ENTRE S-T	2,57	0,21	0,30	1,00	0,16	M3
7	VIGA CINTA EJE 14 ENTRE T-U	2,57	0,21	0,30	1,00	0,16	M3
	EDIFICIO ADMINISTRATIVO 1ER PISO						
8	VIGA EJE 1' ENTRE D-E	1,10	0,10	0,25	1,00	0,03	M3
9	VIGA EJE 1' ENTRE E-F	1,10	0,10	0,25	1,00	0,03	M3
10	VIGA EJE 5' ENTRE C-D	2,50	0,10	0,25	1,00	0,06	M3
	EDIFICIO ADMINISTRATIVO 2DO PISO						
11	VIGA EJE 5' ENTRE C-D	2,50	0,10	0,25	1,00	0,06	M3
12	VIGA EJE 5' ENTRE D-E	2,50	0,10	0,25	1,00	0,06	M3
13	VIGA EJE 5' ENTRE E-F	2,50	0,10	0,25	1,00	0,06	M3
14	VIGA EJE 1' ENTRE E-F	2,50	0,10	0,25	1,00	0,06	M3
					SUBTOTAL	1,19	M3
					TOTAL	1,19	M3

OBSERVACIONES:

LOCALIZACIÓN PLANIMÉTRICA



REGISTRO FOTOGRÁFICO

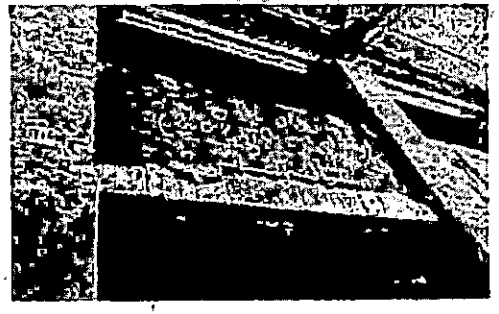


Alejandra Bolaños

ARQ. ALEJANDRA BOLAÑOS
RESIDENTE CONTRATISTA

Nancy Ayala Gómez


ARQ. NANCY AYALA
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

SEGUNDO PISO

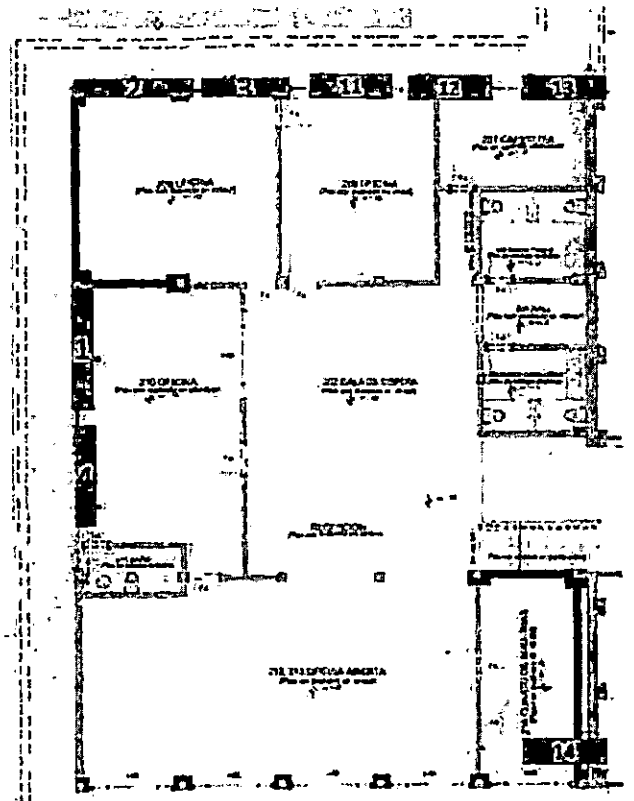

PLANO DETALLE

PRIMER PISO

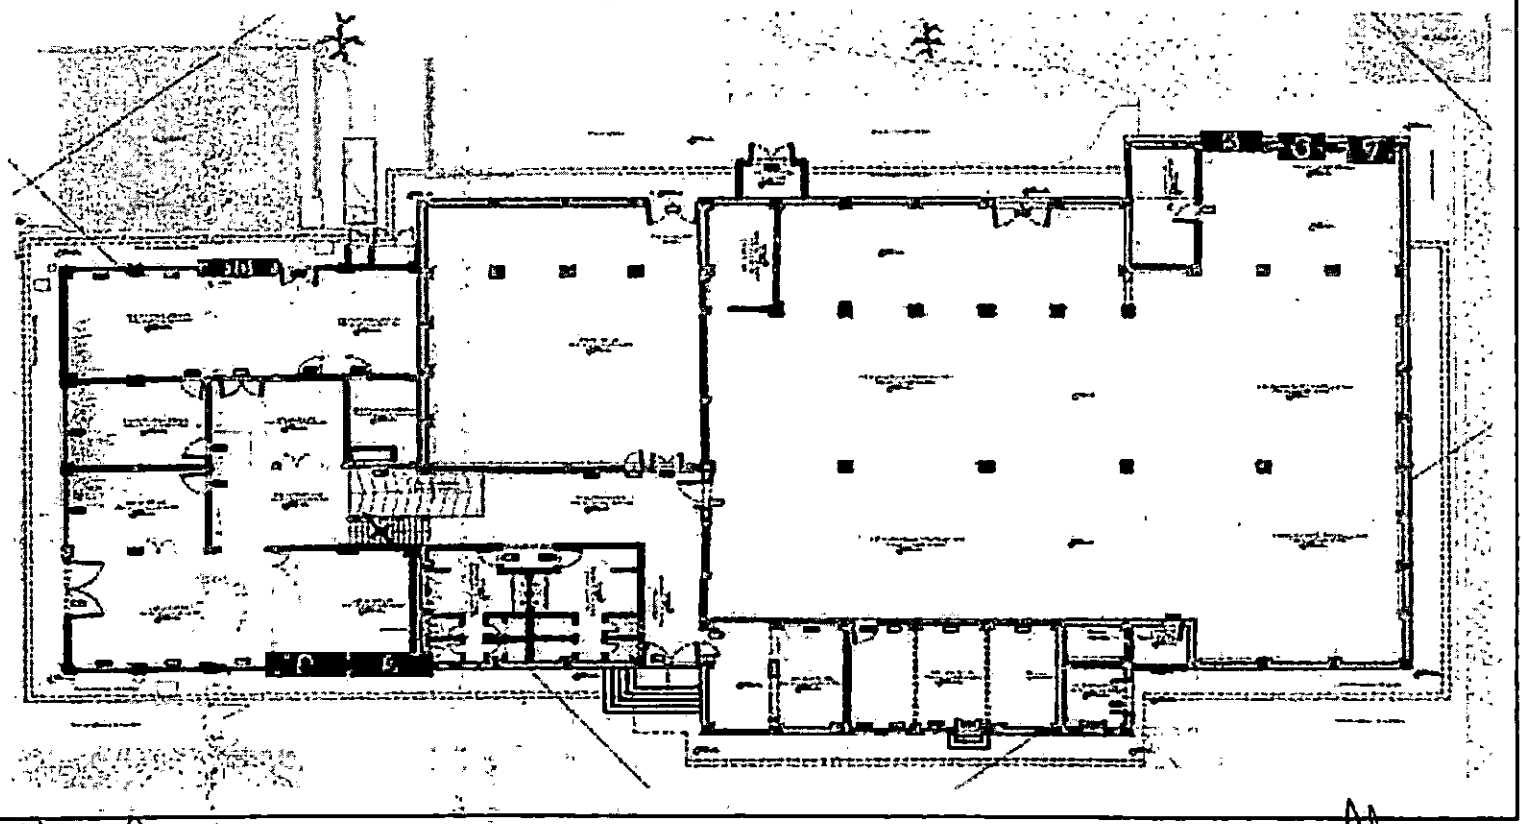

Alga

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. | BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS
SECRETARÍA GENERAL

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

PROYECTO: OBRAS SEDES ALCALDÍA


PRISMA | UNIVERSAL SEC S.A.S. CONSORCIO PRUNI SEDES 04 — CONTRATISTA
ARQUITECTURA URBANA LTDA. — INTERVENTORÍA

ACTA No.	6	PERIODO DEL ACTA	01/12/2019	A	30/12/2019
OBJETO	REALIZAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE AJUSTE LAS DIFERENTES OBRAS E INTERVENCIONES ESPECIALIZADAS PARA LAS DIFERENTES SEDES DE LA SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C.				
CONTRATO DE OBRA No	731-2019	CONTRATISTA	CONSORCIO PRUNI SEDES 04	ENTIDAD CONTRATANTE	SECRETARIA GENERAL-ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA
CONTRATO INTERVENTORÍA	730 DE 2019	INTERVENTORÍA	ARQUITECTURA URBANA LTDA	FRENTE	IMPRENTA DISTRITAL


CAPITULO	2.8.0	RESTITUCIÓN DE ACABADOS	ITEM	2.8.0.9	Concreto de 3000 PSI	UNIDAD	M3

ITEM	LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	TOTAL	UNIDAD
	EDIFICIO ADMINISTRATIVO 2DO PISO						
1	COLUMNETAS EJE A ENTRE 3'-4'	0,25	0,10	0,80	3,00	0,06	M3
2	COLUMNETAS EJE 5' ENTRE A-B	0,25	0,10	0,80	2,00	0,04	M3
3	COLUMNETAS EJE 5' ENTRE B-C	0,25	0,10	0,80	2,00	0,04	M3
4	COLUMNETAS EJE A ENTRE 2'-3'	0,25	0,10	0,80	3,00	0,06	M3
	PRODUCCIÓN						
5	COLUMNETAS EJE 14 ENTRE R-S	0,30	0,27	1,85	2,00	0,30	M3
6	COLUMNETAS EJE 14 ENTRE S-T	0,30	0,27	1,85	2,00	0,30	M3
7	COLUMNETAS EJE 14 ENTRE T-U	0,30	0,27	1,85	2,00	0,30	M3
	EDIFICIO ADMINISTRATIVO 1ER PISO						
8	COLUMNETAS EJE 1' ENTRE D-E	0,25	0,10	1,10	2,00	0,06	M3
9	COLUMNETAS EJE 1' ENTRE E-F	0,25	0,10	1,10	2,00	0,06	M3
10	COLUMNETAS EJE 5' ENTRE C-D	0,25	0,10	1,00	2,00	0,05	M3
	EDIFICIO ADMINISTRATIVO 2DO PISO						
11	COLUMNETAS EJE 5' ENTRE C-D	0,25	0,10	0,80	2,00	0,04	M3
12	COLUMNETAS EJE 5' ENTRE D-E	0,25	0,10	0,80	2,00	0,04	M3
13	COLUMNETAS EJE 5' ENTRE E-F	0,25	0,10	0,80	2,00	0,04	M3
14	COLUMNETAS EJE 1' ENTRE E-F	0,25	0,10	0,80	2,00	0,04	M3
OBSERVACIONES:				SUBTOTAL		1,41	M3
				TOTAL		1,41	M3

LOCALIZACIÓN PLANIMÉTRICA

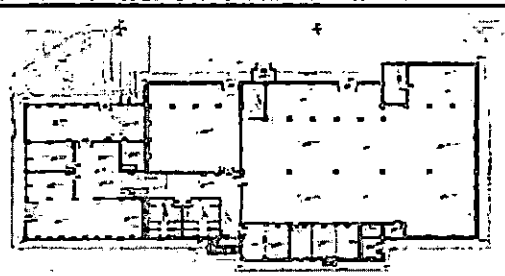

REGISTRO FOTOGRÁFICO

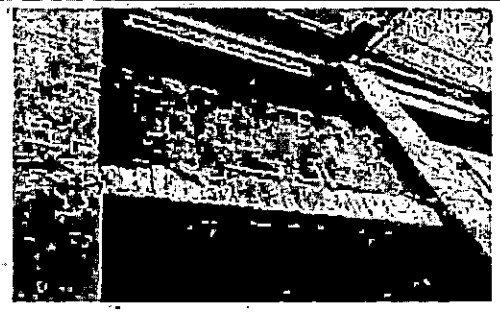

Alejandra Bolaños +
ARQ. ALEJANDRA BOLAÑOS
RESIDENTE CONTRATISTA


Nancy Ayala Gomez
ARQ. NANCY AYALA
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

153


1531

PLANO DETALLE

PRIMER PISO

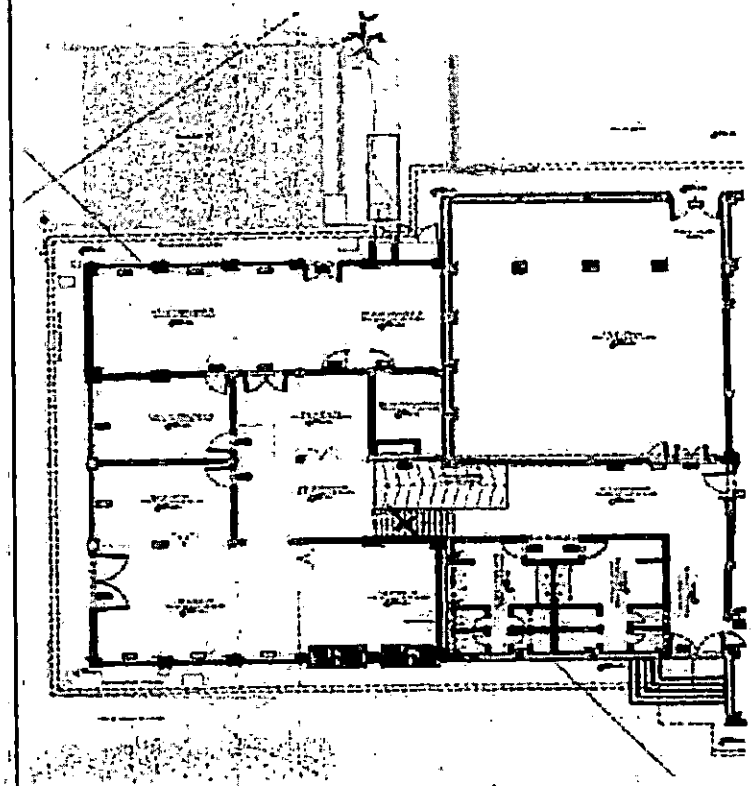

SEGUNDO PISO

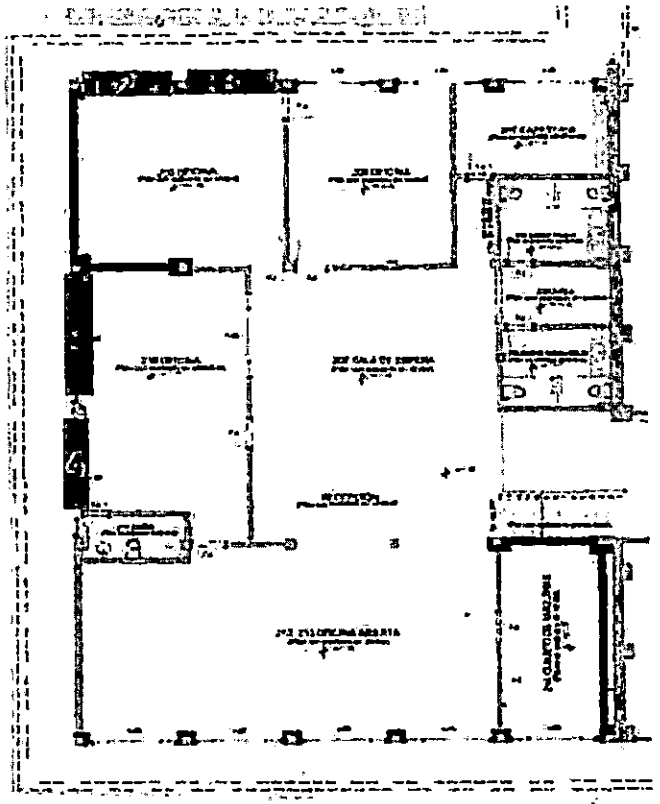

Alegra BF

436

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA GENERAL

BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

PROYECTO: OBRAS SEDES ALCALDÍA


PRISMA — UNIVERSAL SEC S.A.S. — CONSORCIO PRUNI SEDES 04 — CONTRATISTA

ARQUITECTURA URBANA LTDA — INTERVENTORÍA

ACTA No.:	6	-	PERIODO DEL ACTA	01/12/2019	A	30/12/2019	
OBJETO	REALIZAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE AJUSTE LAS DIFERENTES OBRAS E INTERVENCIONES ESPECIALIZADAS PARA LAS DIFERENTES SEDES DE LA SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C.						
CONTRATO DE OBRA No.	731-2019	CONTRATISTA	CONSORCIO PRUNI SEDES 04	ENTIDAD CONTRATANTE	SECRETARIA GENERAL-ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA		
CONTRATO INTERVENTORÍA	730 DE 2019	INTERVENTORÍA	ARQUITECTURA URBANA LTDA	FRENTE:	IMPRENTA DISTRITAL		

CAPITULO	2.8.0	RESTITUCIÓN DE ACABADOS	ITEM	2.8.0.7	Perforaciones y epóxico 1/2" L=0.15m	UNIDAD	UN

ITEM	LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	TOTAL	UNIDAD
	EDIFICIO ADMINISTRATIVO 2DO PISO						
1	COLUMNETA Y VIGA EJE A ENTRE 3'-4'				12,00	12,00	UN
2	COLUMNETA Y VIGA EJE 5' ENTRE A-B				8,00	8,00	UN
3	COLUMNETA Y VIGA EJE 5' ENTRE B-C				8,00	8,00	UN
4	COLUMNETAS EJE A ENTRE 4'-5' (COSTADO OCCIDENTE)				12,00	12,00	UN
	EDIFICIO ADMINISTRATIVO 1ER PISO						
5	COLUMNETAS Y VIGA EJE 1' ENTRE D-E				8,00	8,00	UN
6	COLUMNETAS Y VIGA EJE 1' ENTRE E-F				8,00	8,00	UN

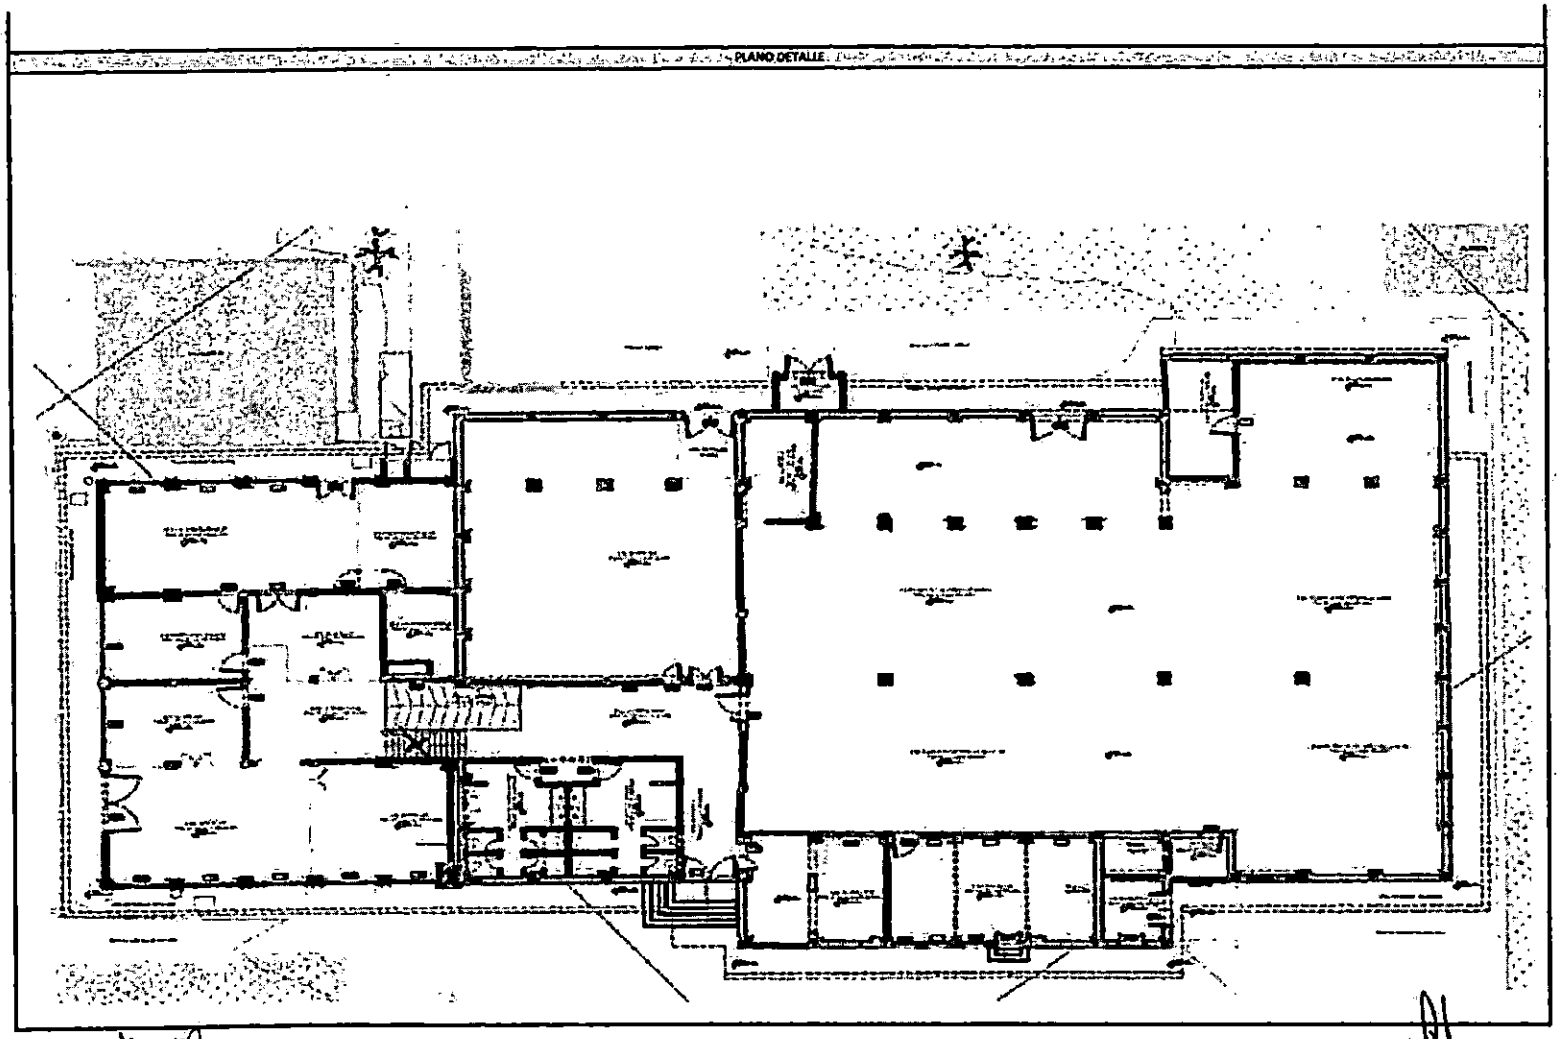

1936

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA GENERAL

BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

PROYECTO: OBRAS SEDES ALCALDÍA


PRISMA — UNIVERSAL SEC S.A.S. — CONSORCIO PRUNI SEDES 04 — CONTRATISTA

ARQUITECTURA URBANA LTDA. — INTERVENTORÍA

ACTA No.	6	PERIODO DEL ACTA	01/12/2019	A	30/12/2019	
OBJETO	REALIZAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE AJUSTE LAS DIFERENTES OBRAS E INTERVENCIONES ESPECIALIZADAS PARA LAS DIFERENTES SEDES DE LA SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C.					
CONTRATO DE OBRA No	731-2019	CONTRATISTA	CONSORCIO PRUNI SEDES 04	ENTIDAD CONTRATANTE	SECRETARIA GENERAL-ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA	
CONTRATO INTERVENTORÍA	730 DE 2019	INTERVENTORÍA	ARQUITECTURA URBANA LTDA	FRENTE:	IMPRENTA DISTRITAL	

CAPITULO	2.5.0	PERFORACIONES Y EPÓXICO	ITEM	2.5.0.9	Perforación y epóxico Ø7 L=0.10	UNIDAD	UN

ITEM	LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	TOTAL	UNIDAD
	EDIFICIO ADMINISTRATIVO 2DO PISO						
	COLUMNA C-6 EJES 1'-F				1,00	1,00	UN

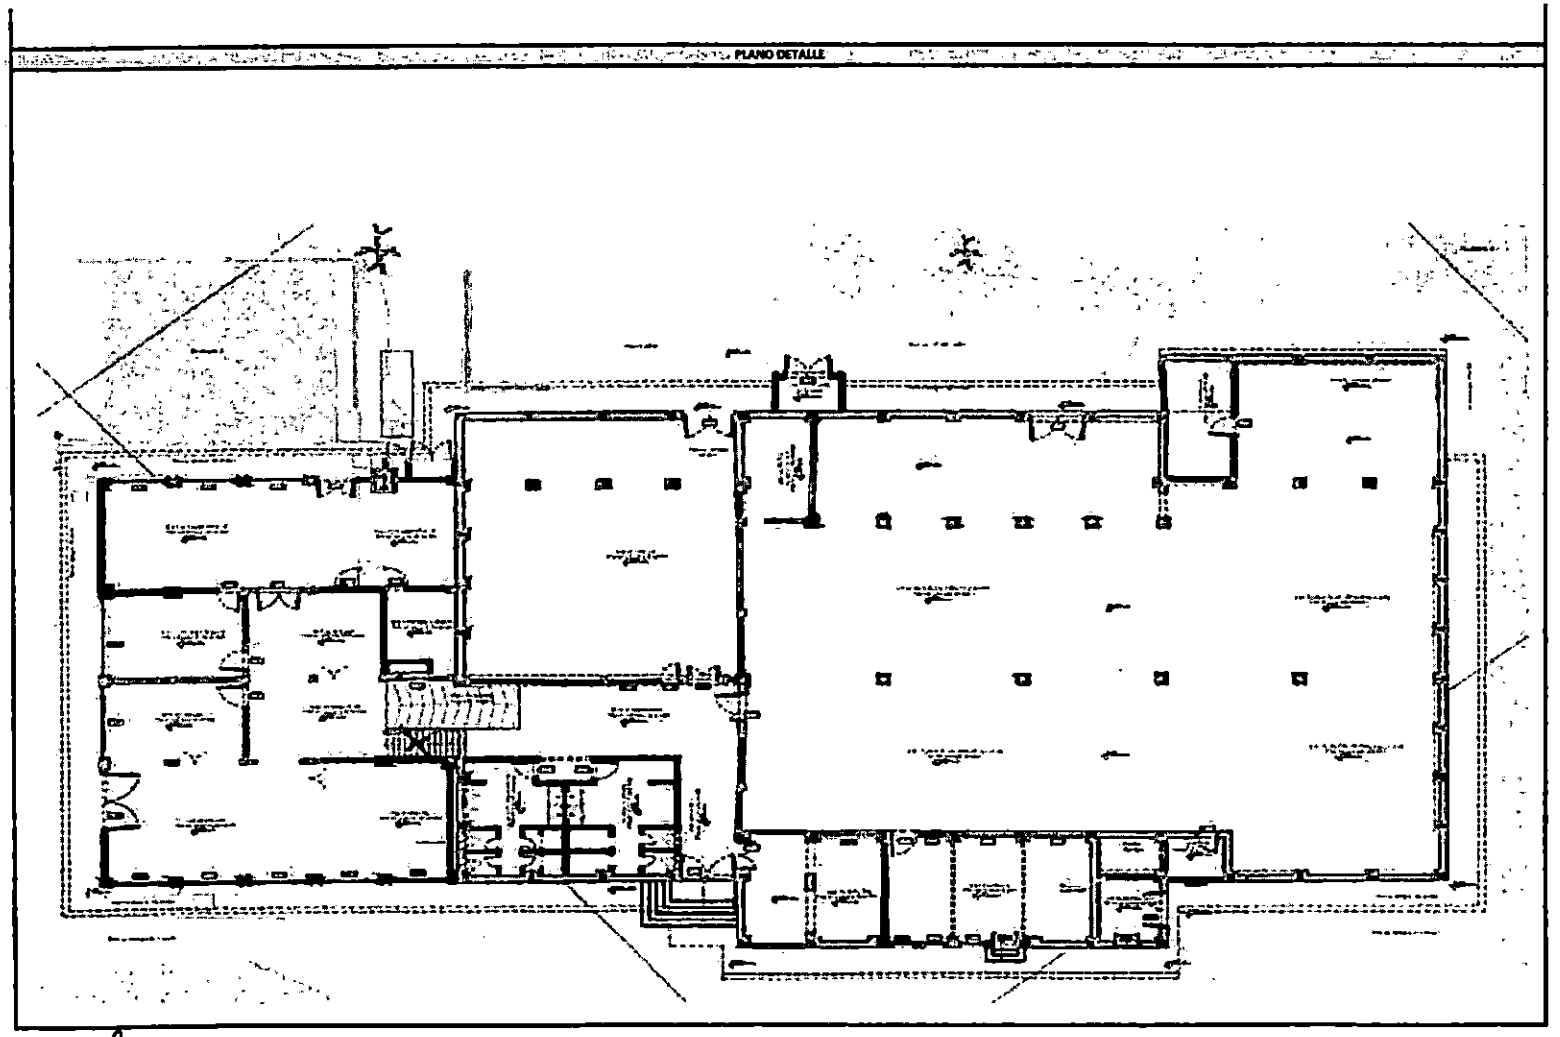
PLANO DETALLE

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA GENERAL | BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

PROYECTO: OBRAS SEDES ALCALDÍA

PRISMA — UNIVERSAL SEC S.A.S. — CONSORCIO PRUNI SEDES 04 — CONTRATISTA

ARQUITECTURA URBANA LTDA. — INTERVENTORÍA


ACTA No.	6	PERIODO DEL ACTA	01/12/2019	A	30/12/2019
OBJETO	REALIZAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE AJUSTE LAS DIFERENTES OBRAS E INTERVENCIONES ESPECIALIZADAS PARA LAS DIFERENTES SEDES DE LA SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C.				
CONTRATO DE OBRA No	731-2019	CONTRATISTA	CONSORCIO PRUNI SEDES 04	ENTIDAD CONTRATANTE	SECRETARIA GENERAL-ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA
CONTRATO INTERVENTORÍA	730 DE 2019	INTERVENTORÍA	ARQUITECTURA URBANA LTDA	FRENTE:	IMPRENTA DISTRITAL

CAPITULO	2.5.0	PERFORACIONES Y EPÓXICO	ITEM	2.5.0.7	Perforación y epóxico Ø6 L=0.30	UNIDAD	UN

ITEM	LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	TOTAL	UNIDAD
	EDIFICIO ADMINISTRATIVO 1ER PISO						
1	COLUMNA C-1 EJES 5'-E				16,00	16,00	UN
	SUBTOTAL					16,00	UN
	TOTAL					16,00	UN

OBSERVACIONES:

LOCALIZACIÓN PLANIMETRICA

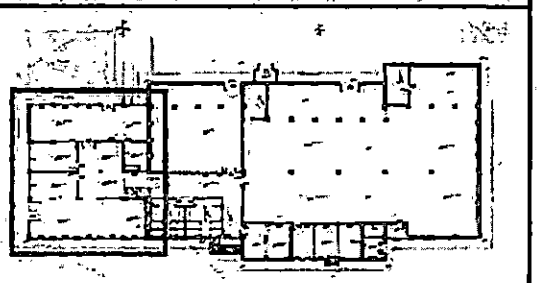

REGISTRO FOTOGRÁFICO



Alejandra Bolaños


ARQ. ALEJANDRA BOLAÑOS
RESIDENTE CONTRATISTA

Nancy Ayala Gomez

ARQ. NANCY AYALA
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

956

1033

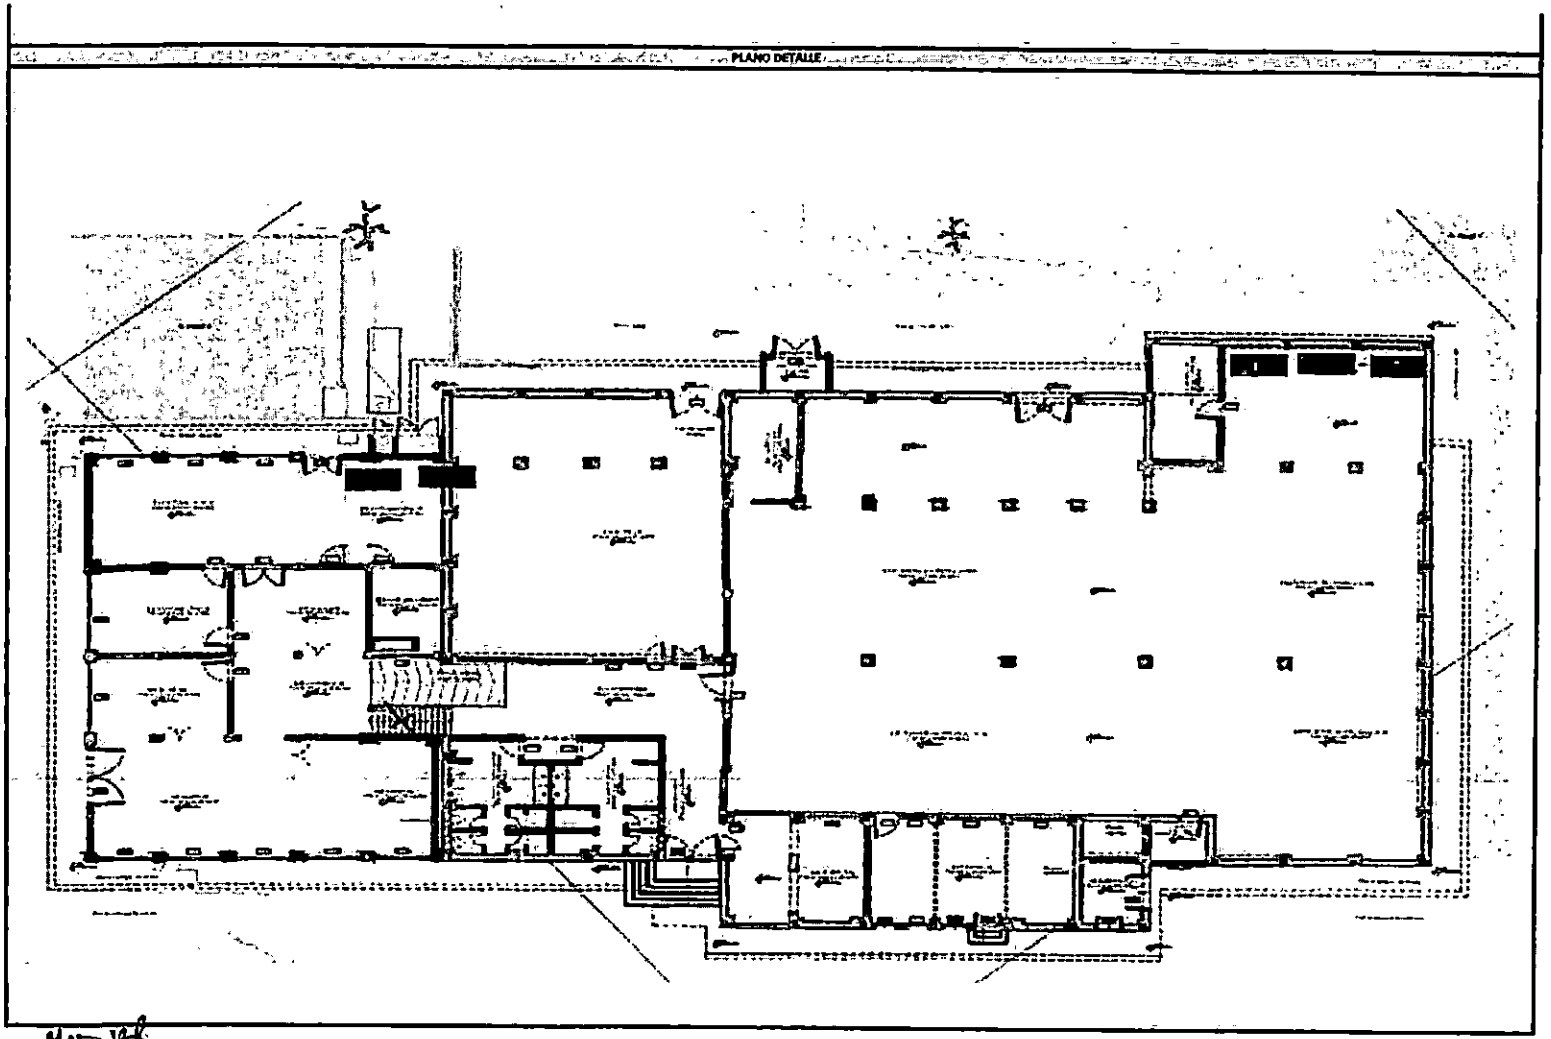

Mura P8

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA GENERAL | BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

PROYECTO: OBRAS SEDES ALCALDÍA

PRISMA | UNIVERSAL SEC S.A. — CONSORCIO PRUNI SEDES 04 — CONTRATISTA


ARQUITECTURA URBANA LTDA. — INTERVENTORÍA

ACTA No.	6	PERIODO DEL ACTA	01/12/2019	A	30/12/2019		
OBJETO	REALIZAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE AJUSTE LAS DIFERENTES OBRAS E INTERVENCIONES ESPECIALIZADAS PARA LAS DIFERENTES SEDES DE LA SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C.						
CONTRATO DE OBRA No	731-2019	CONTRATISTA	CONSORCIO PRUNI SEDES 04	ENTIDAD CONTRATANTE	SECRETARIA GENERAL-ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA		
CONTRATO INTERVENTORÍA	730 DE 2019	INTERVENTORÍA	ARQUITECTURA URBANA LTDA	FRENTE:	IMPRENTA DISTRITAL		


CAPITULO	2.5.0	PERFORACIONES Y EPÓXICO	ITEM	2.5.0.6	Perforación y epóxica Ø6 L=0.22	UNIDAD	UN

ITEM	LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	TOTAL	UNIDAD
	EDIFICIO ADMINISTRATIVO 2DO PISO						
1	COLUMNA C-1 EJES 1'-E				22,00	22,00	UN
2	COLUMNA C-3 EJES 2'-E				32,00	32,00	UN
3	COLUMNA C-1 EJES 5'-D				31,00	31,00	UN
4	COLUMNA C-1 EJES 5'-E				31,00	31,00	UN
5	COLUMNA C-2 EJES 5'-F				22,00	22,00	UN
	EDIFICIO ADMINISTRATIVO 1ER PISO						
6	COLUMNA C-1 EJES 5'-E				31,00	31,00	UN

SEGUNDO PISO

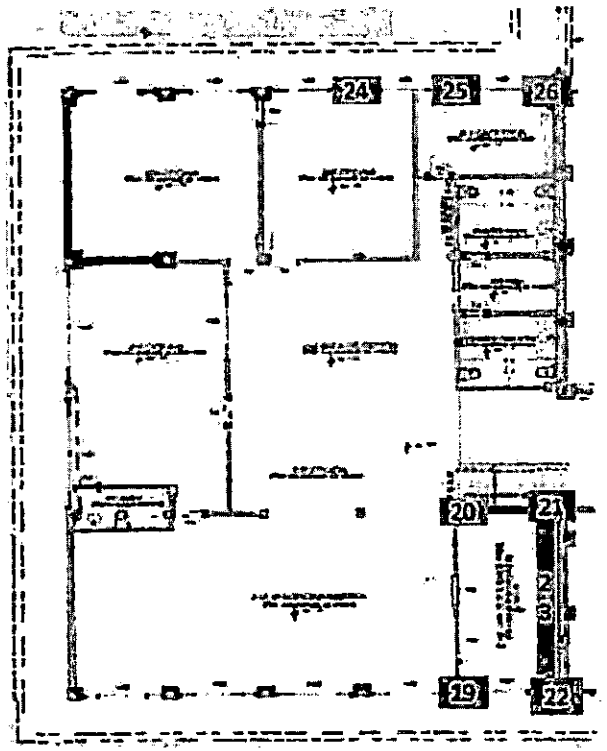

Nota P8

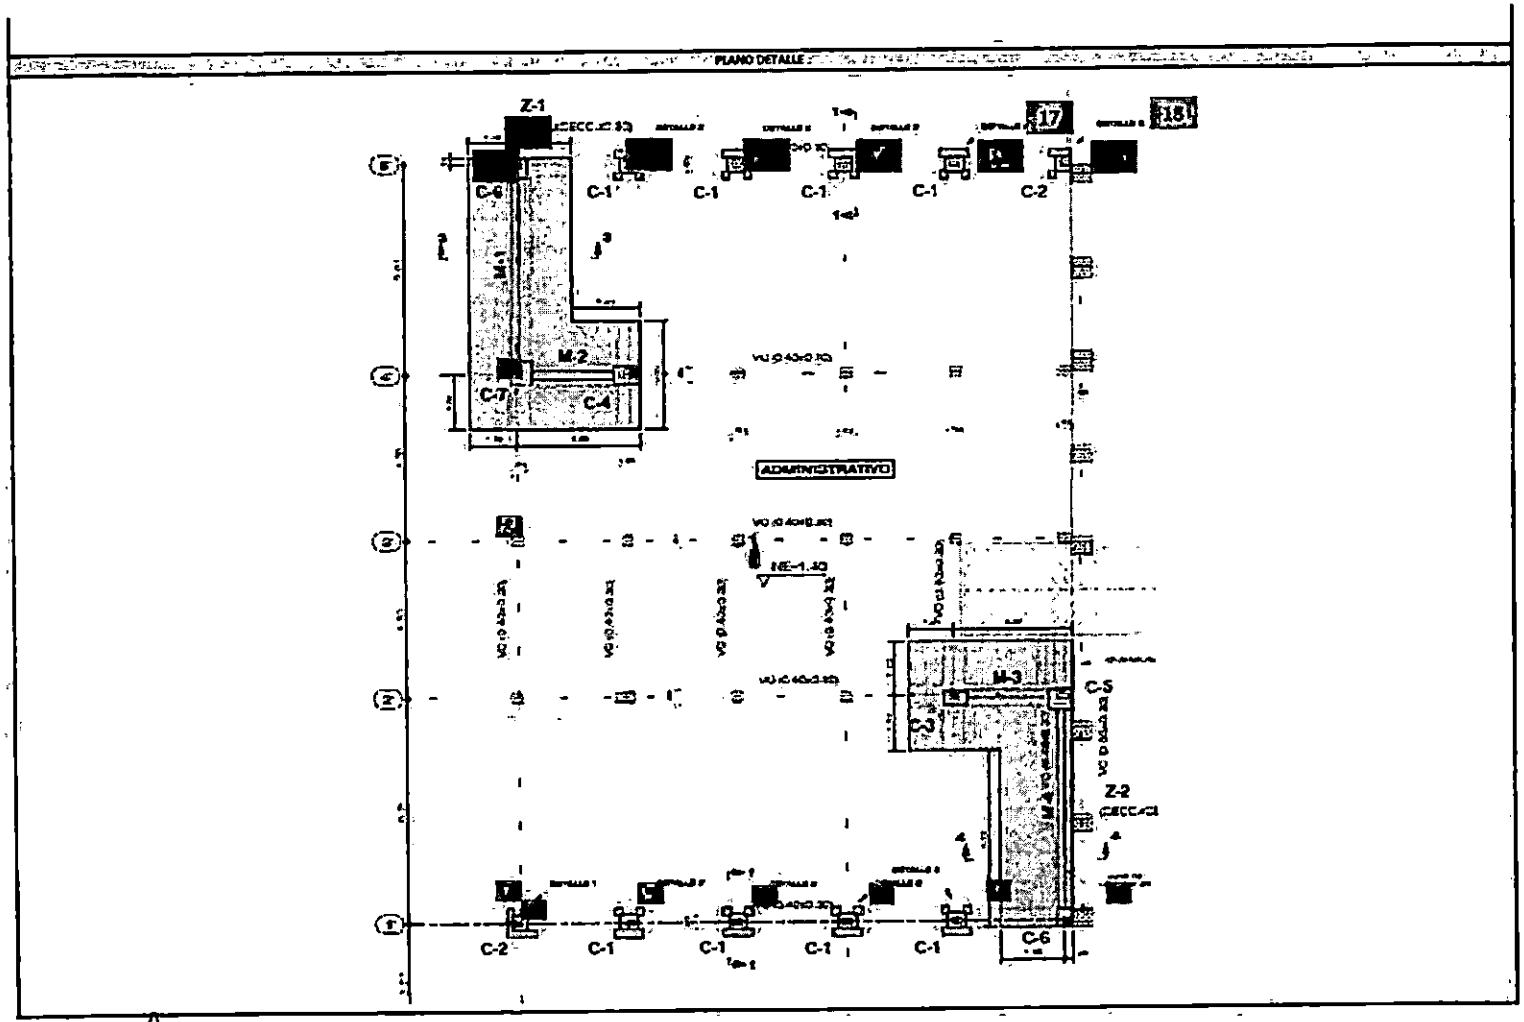

Nota 18

458

171

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA GENERAL

BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

PROYECTO: OBRAS SEDES ALCALDÍA

PRISMA — UNIVERSAL SEC S.A.S. — CONSORCIO PRISMA SEDES 04 — CONTRATISTA

ARQUITECTURA URBANA LTDA — INTERVENTORÍA


ACTA No.	6		PERIODO DEL ACTA:	01/12/2019	A	30/12/2019	
OBJETO:	REALIZAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE AJUSTE LAS DIFERENTES OBRAS E INTERVENCIONES ESPECIALIZADAS PARA LAS DIFERENTES SEDES DE LA SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C.						
CONTRATO DE OBRA No	731-2019	CONTRATISTA	CONSORCIO PRISMA SEDES 04	ENTIDAD CONTRATANTE:	SECRETARIA GENERAL-ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA		
CONTRATO INTERVENTORÍA	730 DE 2019	INTERVENTORÍA	ARQUITECTURA URBANA LTDA	FRENTE:	IMPRENTA DISTRITAL		

CAPITULO	2.5.0	PERFORACIONES Y EPÓXICO	ITEM	2.5.0.1	Perforación y epóxico #3 L=0.15	UNIDAD	UN


ITEM	LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	TOTAL	UNIDAD
	COSTADO SUR 1ER PISO						
1	ENCHAPE LADRILLO EJES 1'-F				30,00	30,00	UN
2	ENCHAPE LADRILLO EJES 1'-E				30,00	30,00	UN
3	ENCHAPE LADRILLO EJES 1'-D				30,00	30,00	UN
4	ENCHAPE LADRILLO EJES 1'-C				15,00	15,00	UN
5	ENCHAPE LADRILLO EJES 1'-B				30,00	30,00	UN
6	ENCHAPE LADRILLO EJES 1'-A				30,00	30,00	UN
	COSTADO OCCIDENTAL 1ER PISO						
7	ENCHAPE LADRILLO EJES A-1'				30,00	30,00	UN
8	ENCHAPE LADRILLO EJES A-3'				30,00	30,00	UN
9	ENCHAPE LADRILLO EJES A-4'				15,00	15,00	UN
10	ENCHAPE LADRILLO EJES A-5'				15,00	15,00	UN
	COSTADO NORTE 1ER PISO						
11	ENCHAPE LADRILLO EJES 5'-A				15,00	15,00	UN
12	ENCHAPE LADRILLO EJES 5'-B				15,00	15,00	UN
13	ENCHAPE LADRILLO EJES 5'-C				15,00	15,00	UN
14	ENCHAPE LADRILLO EJES 5'-D				30,00	30,00	UN
15	ENCHAPE LADRILLO EJES 5'-E				30,00	30,00	UN
16	ENCHAPE LADRILLO EJES 5'-F				30,00	30,00	UN
17	COLUMNA C-1 EJES 5'-E				16,00	15,00	UN
18	COLUMNA C-2 EJES 5'-F				62,00	62,00	UN
	EDIFICIO ADMINISTRATIVO 2DO PISO						
19	COLUMNA C-1 EJES 1'-E				11,00	11,00	UN
20	COLUMNA C-3 EJES 2'-E				64,00	64,00	UN
21	COLUMNA C-3 EJES 2'-F				64,00	64,00	UN
22	COLUMNA C-6 EJES 1'-F				46,00	46,00	UN
23	MURO M-4 EJE F ENTRE EJES 1'-2'				2,00	2,00	UN
24	COLUMNA C-1 EJES 5'-D				16,00	16,00	UN
25	COLUMNA C-1 EJES 5'-E				16,00	15,00	UN
26	COLUMNA C-2 EJES 5'-F				62,00	62,00	UN
				SUBTOTAL		749,00	UN
				TOTAL		749,00	UN

OBSERVACIONES:

LOCALIZACIÓN PLANIMÉTRICA

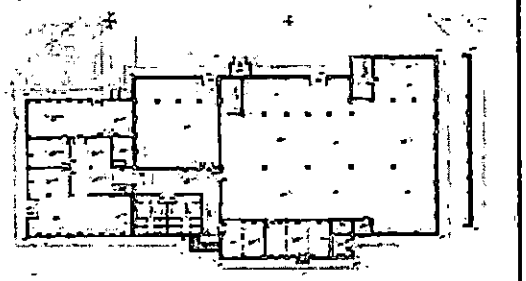

REGISTRO FOTOGRÁFICO

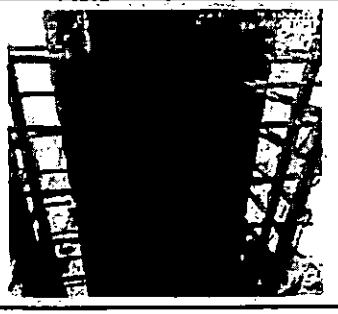


Alejandra Bolaños t.
ARQ. ALEJANDRA BOLAÑOS
RESIDENTE CONTRATISTA

Nancy Rocío Ayala Gómez
ARQ. NANCY AYALA
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

124

PLANO DETALLE

SEGUNDO PISO

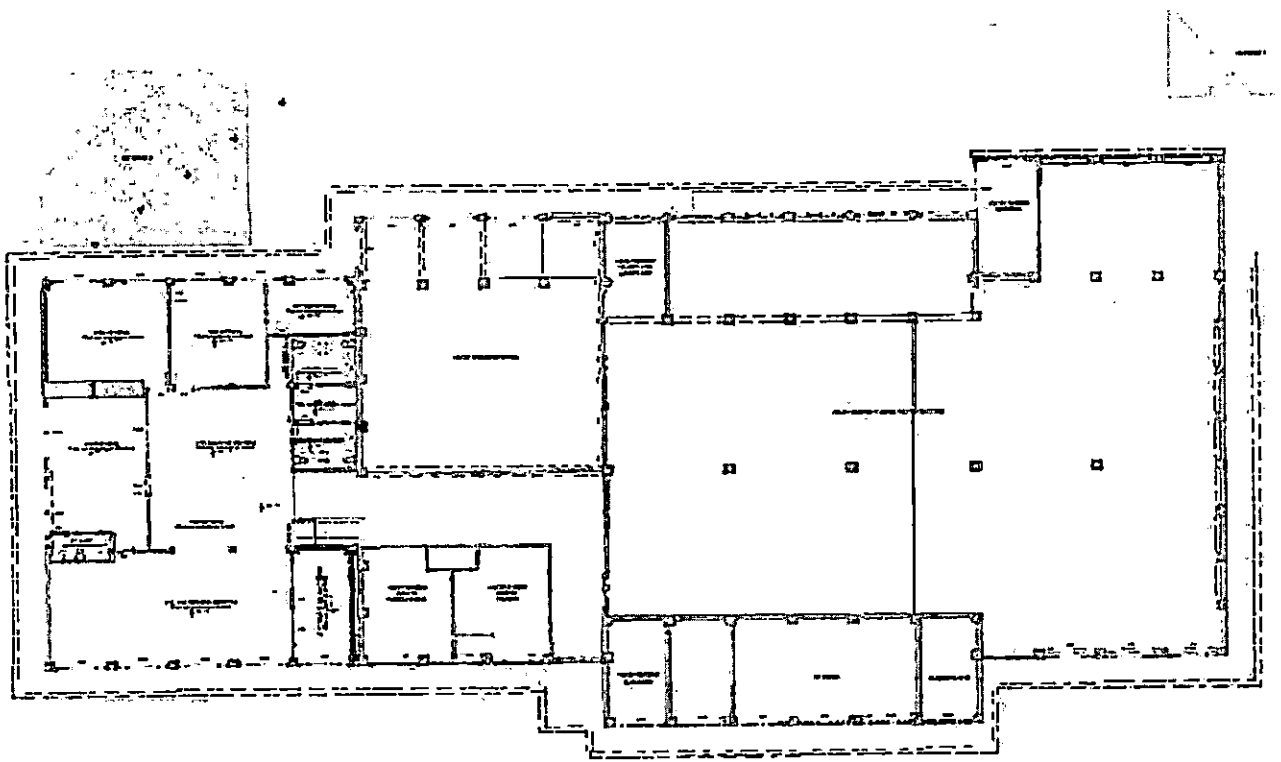

Map 13F

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA GENERAL

BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

PROYECTO: OBRAS SEDES ALCALDÍA

PRISMA — UNIVERSAL SEC S.A.S. — CONSORCIO PRUNI SEDES 04 — CONTRATISTA

ARQUITECTURA URBANA LTDA — INTERVENTORÍA


ACTA No.	6	PERIODO DEL ACTA	01/12/2019	A	30/12/2019	
OBJETO	REALIZAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE AJUSTE LAS DIFERENTES OBRAS E INTERVENCIONES ESPECIALIZADAS PARA LAS DIFERENTES SEDES DE LA SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C.					
CONTRATO DE OBRA No	731-2019	CONTRATISTA	CONSORCIO PRUNI SEDES 04	ENTIDAD CONTRATANTE	SECRETARIA GENERAL-ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA	
CONTRATO INTERVENTORÍA	730 DE 2019	INTERVENTORÍA	ARQUITECTURA URBANA LTDA	FRENTE:	IMPRENTA DISTRITAL	

CAPITULO	2.4.0	VIGAS AEREAS	ITEM	2.4.0.3	Concreto nuevo de vigas - 4000 PSI	UNIDAD	M3

ITEM	LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	TOTAL	UNIDAD
	2DO PISO ADMINISTRACIÓN						
1	VIGA SUPERIOR MURO M-2 EJE 4' ENTRE A-B	5,36	0,20	0,30	1,00	0,32	M3
						0,32	M3
					TOTAL	0,32	M3

OBSERVACIONES:

LOCALIZACIÓN PLANIMÉTRICA

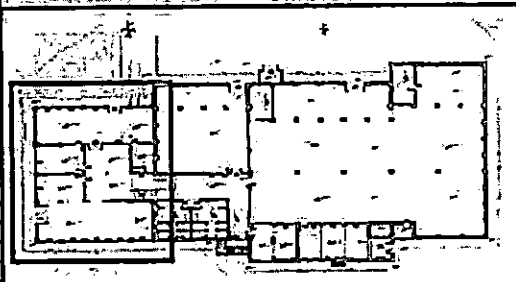

REGISTRO FOTOGRÁFICO




Alejandra Bolaños +
ARQ. ALEJANDRA BOLAÑOS
RESIDENTE CONTRATISTA

Nancy Ayala Gomez
ARQ. NANCY AYALA
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

126

PLANO DETALLE

PRIMER PISO

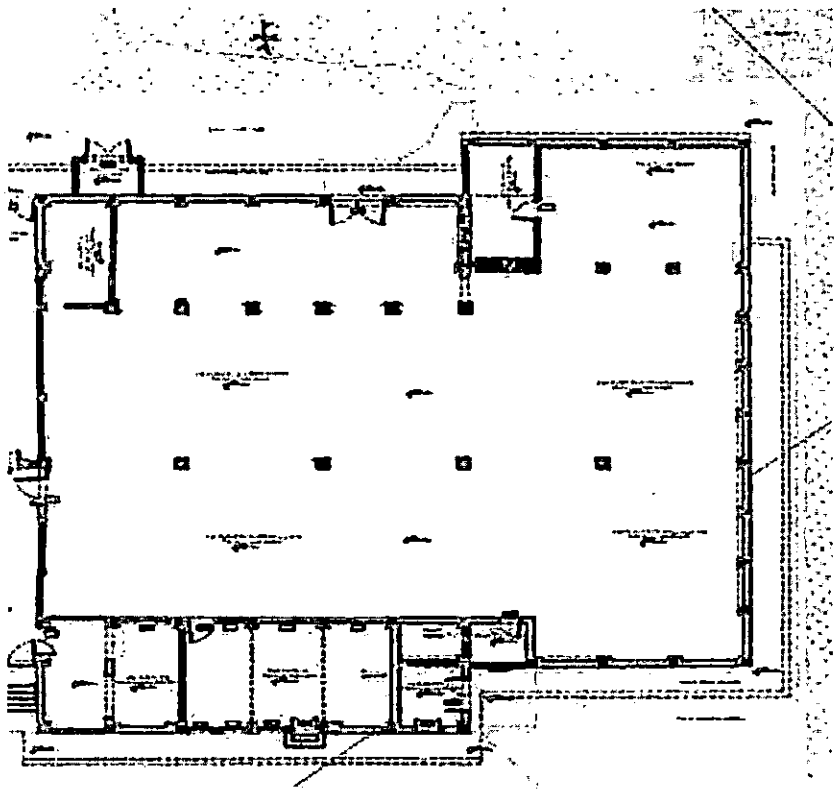

Alega B

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA GENERAL | BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

PROYECTO: OBRAS SEDES ALCALDÍA

PRISMA | UNIVERSAL SEC S.A.S. CONSORCIO PRUNI SEDES 04 — CONTRATISTA | ARQUITECTURA URBANA LTDA — INTERVENTORÍA


ACTA No:	6	PERIODO DEL ACTA:	01/12/2019	A	30/12/2019		
OBJETO	REALIZAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE AJUSTE LAS DIFERENTES OBRAS E INTERVENCIONES ESPECIALIZADAS PARA LAS DIFERENTES SEDES DE LA SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C.						
CONTRATO DE OBRA No	731-2019	CONTRATISTA	CONSORCIO PRUNI SEDES 04	ENTIDAD CONTRATANTE	SECRETARIA GENERAL-ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA		
CONTRATO INTERVENTORÍA	730 DE 2019	INTERVENTORÍA	ARQUITECTURA URBANA LTDA	FRENTE:	IMPRENTA DISTRITAL		

CAPITULO	2.4.0	VIGAS AEREAS	ITEM	2.4.0.1	Demolición tramo alto de vigas	UNIDAD	M3


ITEM	LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	TOTAL	UNIDAD
	PRODUCCIÓN						
1	MURO EJE Q ENTRE EJES 11-13	3,00	0,30	0,30	1,00	0,27	M3
2	MURO EJE 12 ENTRE EJES Q-R	2,50	0,30	0,30	1,00	0,23	M3
					SUBTOTAL	0,50	M3
					TOTAL	0,50	M3

OBSERVACIONES:

LOCALIZACIÓN PLANIMÉTRICA

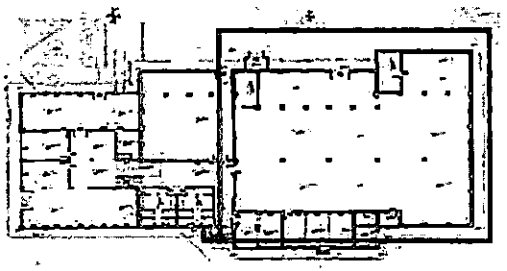

REGISTRO FOTOGRÁFICO

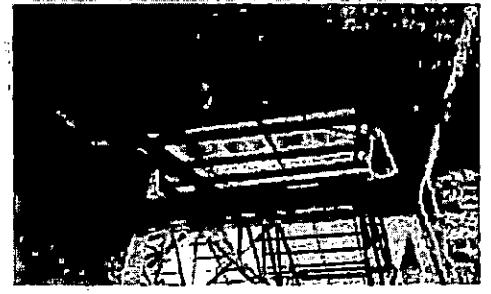


ARQ. ALEJANDRA BOLAÑOS
RESIDENTE CONTRATISTA

ARQ. NANCY AYALA
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

PLANO DETALLE

SEGUNDO PISO

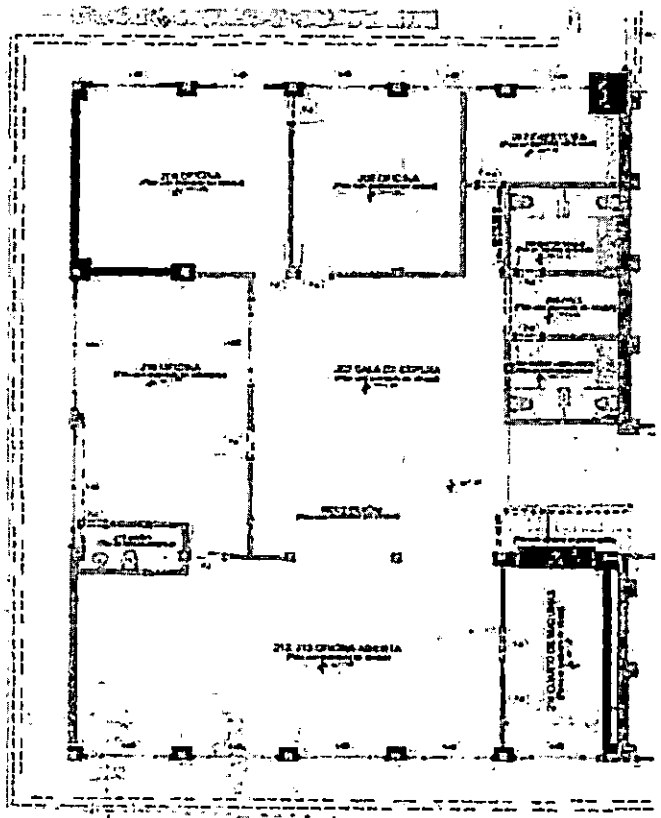

Alga BS

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA GENERAL | BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

PROYECTO: OBRAS SEDES ALCALDÍA

PRISMA — UNIVERSAL SEC S.A.S. — CONSORCIO PRUNI SEDES 04 — CONTRATISTA

ARQUITECTURA URBANA LTDA. — INTERVENTORÍA


ACTA No.	6	PERIODO DEL ACTA	01/12/2019	A	30/12/2019
OBJETO	REALIZAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE AJUSTE LAS DIFERENTES OBRAS E INTERVENCIONES ESPECIALIZADAS PARA LAS DIFERENTES SEDES DE LA SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C.				
CONTRATO DE OBRA No.	731-2019	CONTRATISTA	CONSORCIO PRUNI SEDES 04	ENTIDAD CONTRATANTE	SECRETARIA GENERAL-ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA
CONTRATO INTERVENTORÍA	730 DE 2019	INTERVENTORÍA	ARQUITECTURA URBANA LTDA	FRENTE:	IMPRENTA DISTRITAL

CAPITULO	2.3.0	COLUMNA Y MUROS	ITEM	2.3.0.3	Suministro figurado y amarre de acero 60000 PSI 420 Mpa	UNIDAD	KG


ITEM	LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES FIGURA	LARGO (m)	PESO kg/m	CANTIDAD	TOTAL	UNIDAD
					VIENEN	1.175,500	KG
	EDIFICIO ADMINISTRATIVO 2DO PISO						
1	COLUMNA C-2 EJES 5'-F						
	Acero #7 recto		2,45	3,042	5,00	37,165	KG
	Acero #7 recto		2,50	3,042	5,00	38,025	KG
	Acero #3 con .20m de escuadra		0,70	0,560	22,00	8,624	KG
	Acero #3 con .20m de escuadra		0,45	0,560	22,00	5,544	KG
2	VIGA SUPERIOR MURO M-3 EJE 2' ENTRE E-F						
	Acero #4 dobles esc. Le.15		3,10	0,994	4,00	12,326	KG
	Fleje #3 de .23x.16		0,98	0,560	17,00	9,330	KG
						1.286,61	KG
					TOTAL	1.286,61	KG

OBSERVACIONES:

LOCALIZACIÓN PLANIMÉTRICA

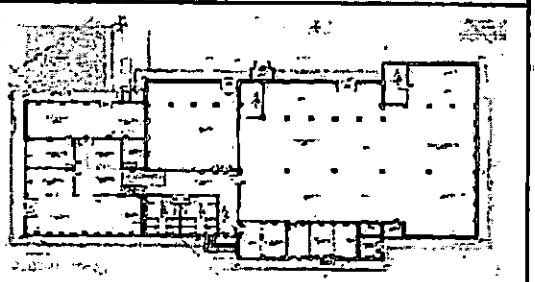

REGISTRO FOTOGRÁFICO

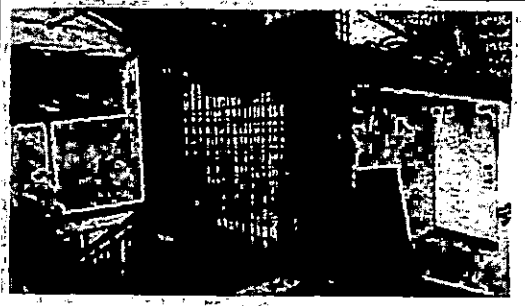


ARQ. ALEJANDRA BOLAÑOS
RESIDENTE CONTRATISTA

ARQ. NANCY AYALA
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA


127

PLANO DETALLE

PRIMER PISO

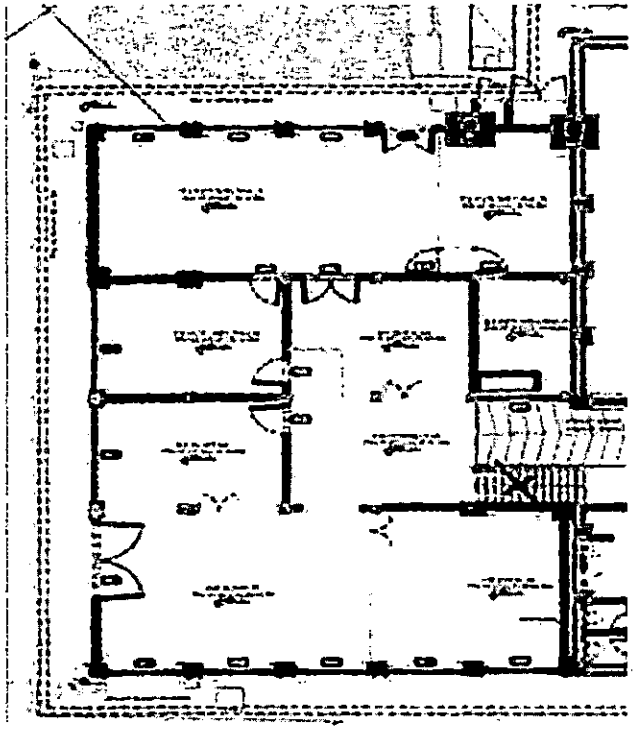

SEGUNDO PISO

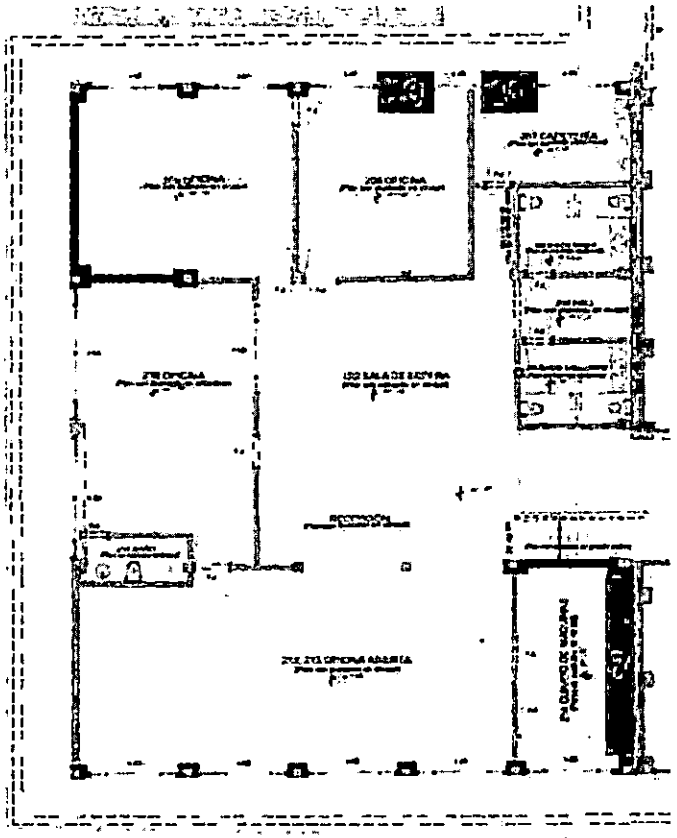

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA GENERAL | BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

PROYECTO: OBRAS SEDES ALCALDÍA


PRISMA | UNIVERSAL SEC S.A.S. — CONTRATISTA | ARQUITECTURA URBANA LTDA. — INTERVENTORÍA

ACTA No:	6	PERIODO DEL ACTA	01/12/2019	A	30/12/2019		
OBJETO	REALIZAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE AJUSTE LAS DIFERENTES OBRAS E INTERVENCIONES ESPECIALIZADAS PARA LAS DIFERENTES SEDES DE LA SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C.						
CONTRATO DE OBRA No.	731-2019	CONTRATISTA	CONSORCIO PRUNI SEDES 04	ENTIDAD CONTRATANTE	SECRETARIA GENERAL-ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA		
CONTRATO INTERVENTORÍA	730 DE 2019	INTERVENTORÍA	ARQUITECTURA URBANA LTDA	FRENTE:	IMPRENTA DISTRITAL		


CAPITULO	2.3.0	COLUMNA Y MUROS	ITEM	2.3.0.3	Suministro figurado y amarre de acero 60000 PSI 420 Mpa	UNIDAD	KG

ITEM	LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES FIGURA	LARGO (m)	PESO (kg/m)	CANTIDAD	TOTAL	UNIDAD
					VIENEN	567,328	KG
	EDIFICIO ADMINISTRATIVO 2DO PISO						
7	MURO M-A EJE F ENTRE EJES 1'-2'						
	Acero #3 esc. L=0.20m		2,63	0,560	56,00	82,477	KG
	Acero #3 doble esc. L=0.20m		6,30	0,560	24,00	84,672	KG
	Acero #3 con doble gancho L=0.10m		0,45	0,560	168,00	42,336	KG
	EDIFICIO ADMINISTRATIVO 1ER PISO						
8	COLUMNA C-1 EJES 5'-E						
	Acero #6 recto		1,40	2,235	8,00	25,032	KG
	Acero #6 recto		3,00	2,235	8,00	53,640	KG
	Acero #6 recto		2,10	2,235	8,00	37,548	KG
	Acero #3 doble esc. L=0.23m		0,58	0,560	31,00	10,069	KG
	Acero #3 doble esc. L=0.23m		0,88	0,560	31,00	15,277	KG
	Acero #3 esc. L=0.15m		0,18	0,560	16,00	1,613	KG
9	COLUMNA C-2 EJES 5'-F						
	Acero #7 recto		1,65	3,042	5,00	25,097	KG
	Acero #7 recto		3,00	3,042	5,00	45,630	KG
	Acero #7 recto		2,45	3,042	5,00	37,265	KG
	Acero #3 doble esc. L=0.18m		0,53	0,560	31,00	9,201	KG
	Acero #3 esc. L=0.18m		0,28	0,560	31,00	4,861	KG
	EDIFICIO ADMINISTRATIVO 2DO PISO						
10	COLUMNA C-1 EJES 5'-D						
	Acero #6 con esc. L=0.20m		2,40	2,235	8,00	42,912	KG
	Acero #3 doble esc. L=0.30m		1,00	0,560	22,00	12,320	KG
	Acero #3 doble esc. L=0.30m		0,80	0,560	22,00	9,856	KG
	Acero #3 esc. L=0.20m		0,25	0,560	11,00	1,540	KG
11	COLUMNA C-1 EJES 5'-E						
	Acero #6 con esc. L=0.20m		2,40	2,235	8,00	42,912	KG
	Acero #3 doble esc. L=0.30m		1,00	0,560	22,00	12,320	KG
	Acero #3 doble esc. L=0.30m		0,80	0,560	22,00	9,856	KG
	Acero #3 esc. L=0.20m		0,25	0,560	11,00	1,540	KG
OBSERVACIONES:				SUBTOTAL		1.175,500	KG
				TOTAL		1.175,500	KG

LOCALIZACIÓN PLANIMÉTRICA

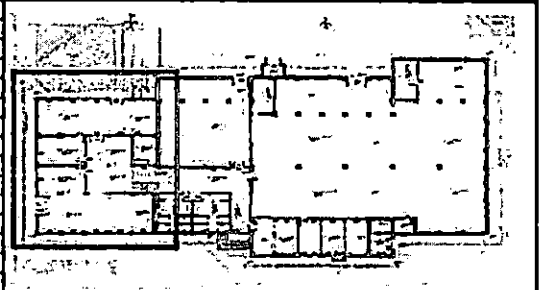

REGISTRO FOTOGRÁFICO

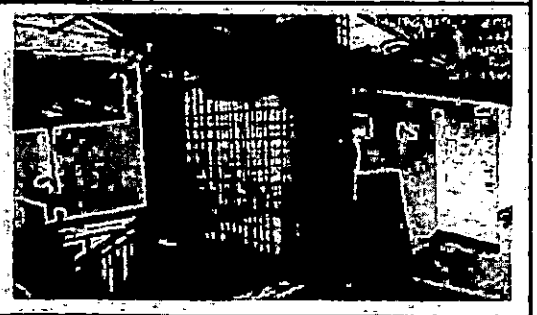


ARQ. ALEJANDRA BOLAÑOS
RESIDENTE CONTRATISTA

ARQ. NANCY AYALA
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

420

PLANO DETALLE

SEGUNDO PISO

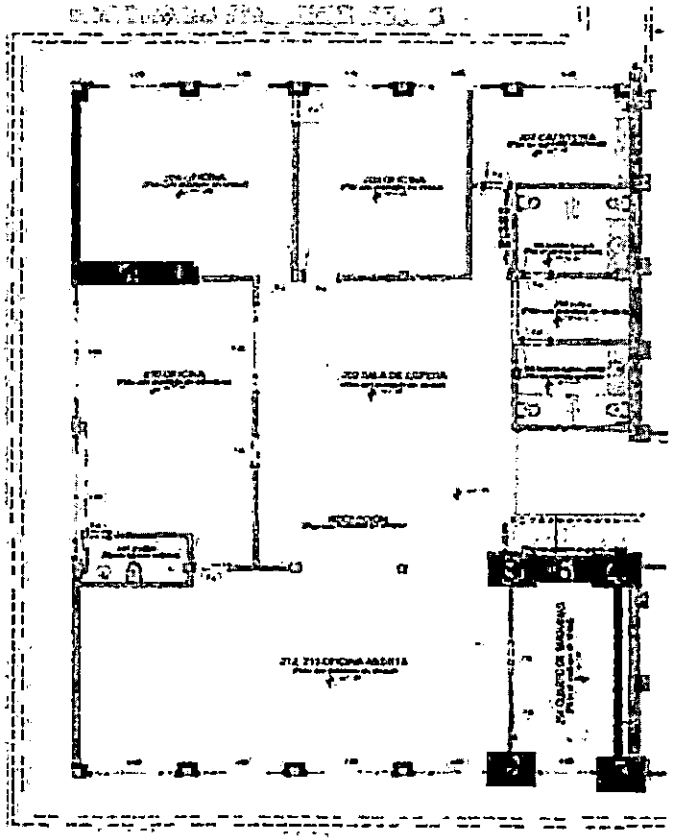

Hoja 88

463

414

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA GENERAL | BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

PROYECTO: OBRAS SEDES ALCALDÍA

PRISMA — UNIVERSAL SEC S.A.S. — CONSORCIO PRUNI SEDES 04 — CONTRATISTA


ARQUITECTURA URBANA LTDA. — INTERVENTORÍA

ACTA No	6		PERIODO DEL ACTA	01/12/2019	A	30/12/2019	
OBJETO	REALIZAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE AJUSTE LAS DIFERENTES OBRAS E INTERVENCIONES ESPECIALIZADAS PARA LAS DIFERENTES SEDES DE LA SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C.						
CONTRATO DE OBRA No	731-2019	CONTRATISTA	CONSORCIO PRUNI SEDES 04	ENTIDAD CONTRATANTE	SECRETARIA GENERAL-ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA		
CONTRATO INTERVENTORÍA	730 DE 2019	INTERVENTORÍA	ARQUITECTURA URBANA LTDA	FRENTE	IMPRENTA DISTRITAL		


CAPITULO	2.3.0	COLUMNA Y MUROS	ITEM	2.3.0.3	Suministro figurado y amarre de acero 60000 PSI 420 Mpa	UNIDAD	KG

ITEM	LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES FIGURA	LARGO (m)	PESO (kg/m)	CANTIDAD	TOTAL	UNIDAD
	EDIFICIO ADMINISTRATIVO 2DO PISO						
1	VIGA SUPERIOR EJE 4' ENTRE A-B						
	Acero #4 con doble esc. L=0.16m		4,02	0,994	4,00	15,984	KG
	Fleje #3 de .25x.15		0,90	0,994	16,00	14,314	KG
2	COLUMNA C-1 EJES 1'-E						
	Acero #6 con esc. L=0.20m		2,40	2,235	8,00	42,912	KG
	Acero #3 doble esc. L=0.30m		1,00	0,560	22,00	12,320	KG
	Acero #3 doble esc. L=0.30m		0,80	0,560	22,00	9,856	KG
	Acero #3 esc. L=0.20m		0,25	0,560	11,00	1,540	KG
3	COLUMNA C-3 EJES 2'-E						
	Acero #6 con esc. L=0.20m		3,58	2,235	10,00	80,013	KG
	Acero #3 doble esc. L=0.30m		0,80	0,560	32,00	14,336	KG
	Acero #3 doble esc. L=0.30m		1,05	0,560	32,00	18,816	KG
	Acero #3 esc. L=0.20m		0,33	0,560	15,00	2,772	KG
	Gancho #3 L=0.55m		0,55	0,560	32,00	9,856	KG
4	COLUMNA C-5 EJES 2'-F						
	Acero #7 con esc. L=0.25		3,58	3,042	10,00	108,904	KG
	Acero #3 esc. L=0.30m		0,58	0,560	32,00	10,394	KG
	Acero #3 doble esc. L=0.40m		1,08	0,560	32,00	19,354	KG
	Acero #3 con doble gancho L=0.10m		0,62	0,560	32,00	11,110	KG
5	COLUMNA C-6 EJES 1'-F						
	Acero #7 con esc. L=0.30		2,47	3,042	7,00	52,596	KG
	Acero #3 doble esc. L=0.30m		0,70	0,560	23,00	9,016	KG
	Acero #3 con esc. L=0.30m		0,50	0,560	23,00	6,440	KG
	Acero #3 con doble gancho L=0.10m		0,50	0,560	23,00	6,440	KG
6	MURO M-3 EJE 2' ENTRE EJES E-F						
	Acero #3 esc. L=0.20m		3,47	0,560	24,00	46,637	KG
	Acero #3 doble esc. L=0.20m		3,05	0,560	30,00	51,240	KG
	Acero #3 con doble gancho L=0.10m		0,45	0,560	90,00	22,680	KG
OBSERVACIONES:				SUBTOTAL		567,528	KG
				TOTAL		567,528	KG

LOCALIZACIÓN PLANIMÉTRICA

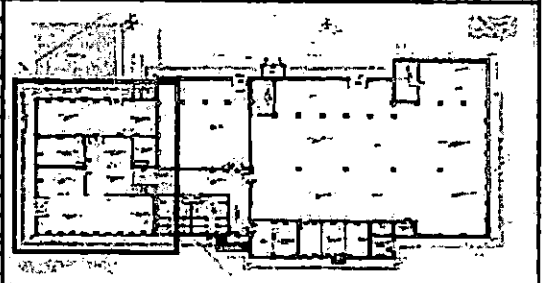

REGISTRO FOTOGRÁFICO

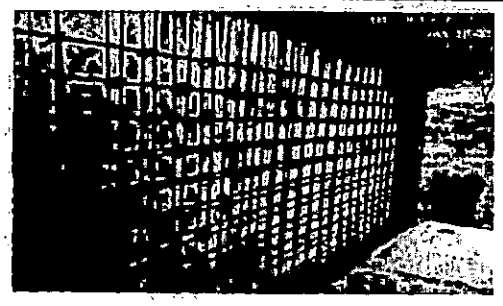


ARQ. ALEJANDRA POLAÑOS
RESIDENTE CONTRATISTA

ARQ. NANCY AYALA
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA


148

PLANO DETALLE

PRIMER PISO

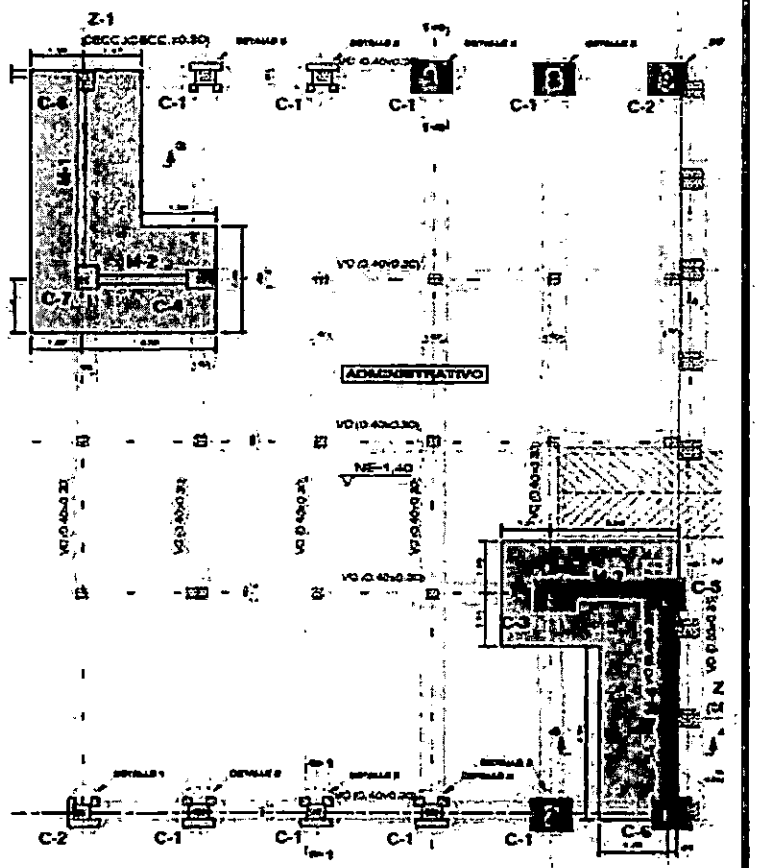

SEGUNDO PISO

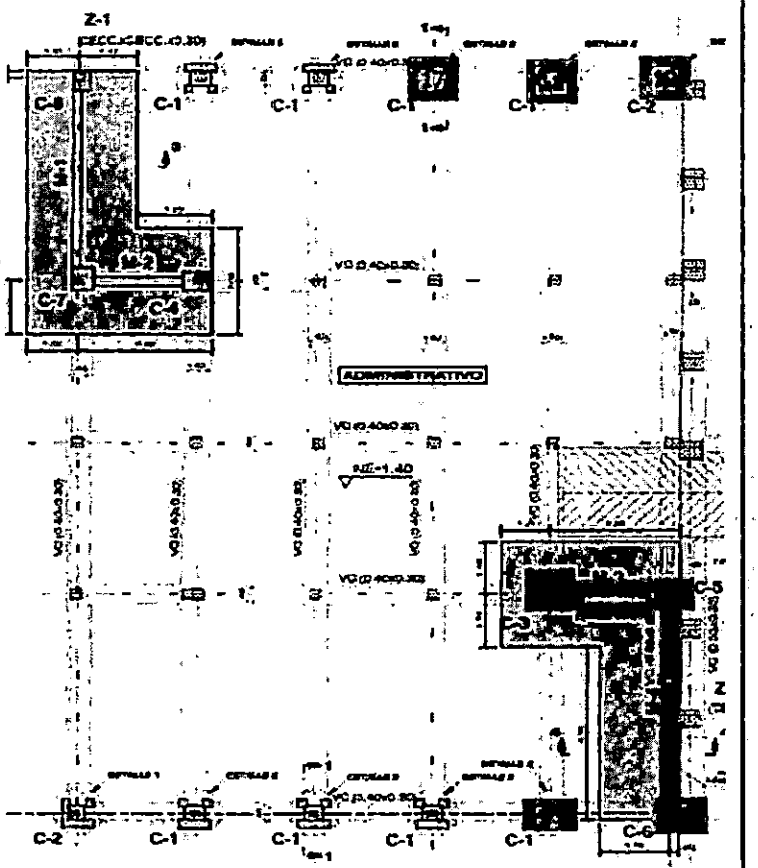

Alejandra Ramos

164

147

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA GENERAL

BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

PROYECTO: OBRAS SEDES ALCALDÍA

PRISMA — UNIVERSAL SEC S.A.S. — CONSORCIO PRUNI SEDES 04 — CONTRATISTA

ARQUITECTURA URBANA LTDA — INTERVENTORÍA


ACTA No.	6	PERIODO DEL ACTA	01/12/2019	A	30/12/2019		
OBJETO	REALIZAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE AJUSTE LAS DIFERENTES OBRAS E INTERVENCIONES ESPECIALIZADAS PARA LAS DIFERENTES SEDES DE LA SECRETARÍA GENERAL DE LA ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C.						
CONTRATO DE OBRA No	731-2019	CONTRATISTA	CONSORCIO PRUNI SEDES 04	ENTIDAD CONTRATANTE	SECRETARIA GENERAL-ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA		
CONTRATO INTERVENTORÍA	730 DE 2019	INTERVENTORÍA	ARQUITECTURA URBANA LTDA	FRENTE:	IMPRENTA DISTRITAL		

CAPITULO	2.3.0	COLUMNAS Y MUROS	ITEM	2.3.0.2	Concreto de columnas y muros - 4000 psi	UNIDAD	M3


ITEM	LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	TOTAL	UNIDAD
	EDIFICIO ADMINISTRATIVO 1ER PISO						
1	C-1 EJES 5'-D	0,40	0,50	3,09	1,00	0,62	M3
2	C-1 EJES 1'-E	0,40	0,50	3,09	1,00	0,62	M3
3	C-3 EJES 2'-E	0,65	0,40	3,09	1,00	0,81	M3
4	C-5 EJES 2'-F	0,55	0,65	3,09	1,00	0,91	M3
5	C-6 EJES 1'-F	0,55	0,40	3,09	1,00	0,69	M3
6	M-3 EJE 2' ENTRE EJES E-F	2,10	0,20	3,09	1,00	1,30	M3
7	M-4 EJE F ENTRE EJES 1'-2'	5,45	0,25	3,09	1,00	4,21	M3
8	C-1 EJES 5'-E	0,40	0,50	3,09	1,00	0,62	M3
9	C-2 EJES 5'-F	0,40	0,40	3,09	1,00	0,50	M3
	EDIFICIO ADMINISTRATIVO 2DO PISO						
10	C-1 EJES 1'-E	0,40	0,50	2,50	1,00	0,34	M3
11	C-3 EJES 2'-E	0,65	0,40	3,10	1,00	0,81	M3
12	C-5 EJES 2'-F	0,55	0,65	3,10	1,00	0,91	M3
13	C-6 EJES 1'-F	0,55	0,40	2,50	1,00	0,39	M3
14	M-3 EJE 2' ENTRE EJES E-F	2,85	0,20	3,10	1,00	1,77	M3
15	M-4 EJE F ENTRE EJES 1'-2'	5,50	0,25	2,50	1,00	3,44	M3
16	VIGA SUPERIOR MURO M-3 EJE 2' ENTRE EJES E-F	3,50	0,20	0,30	1,00	0,21	M3
17	C-1 EJES 5'-D	0,40	0,50	2,50	1,00	0,34	M3
18	C-1 EJES 5'-E	0,40	0,50	2,50	1,00	0,34	M3
19	C-2 EJES 5'-F	0,40	0,40	2,50	1,00	0,24	M3
						17,70	M3
						17,70	M3

OBSERVACIONES: se descuenta Columna existe .25x.25 +

LOCALIZACIÓN PLANIMÉTRICA

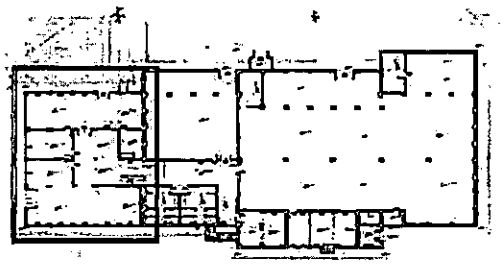

REGISTRO FOTOGRÁFICO

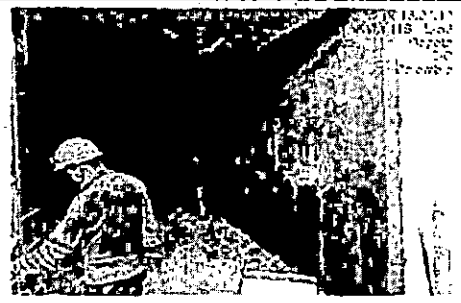

Alejandra Bolaños +


ARQ. ALEJANDRA BOLAÑOS
RESIDENTE CONTRATISTA

Nancy Ayala Gómez

ARQ. NANCY AYALA
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA


176

PRODUCCIÓN

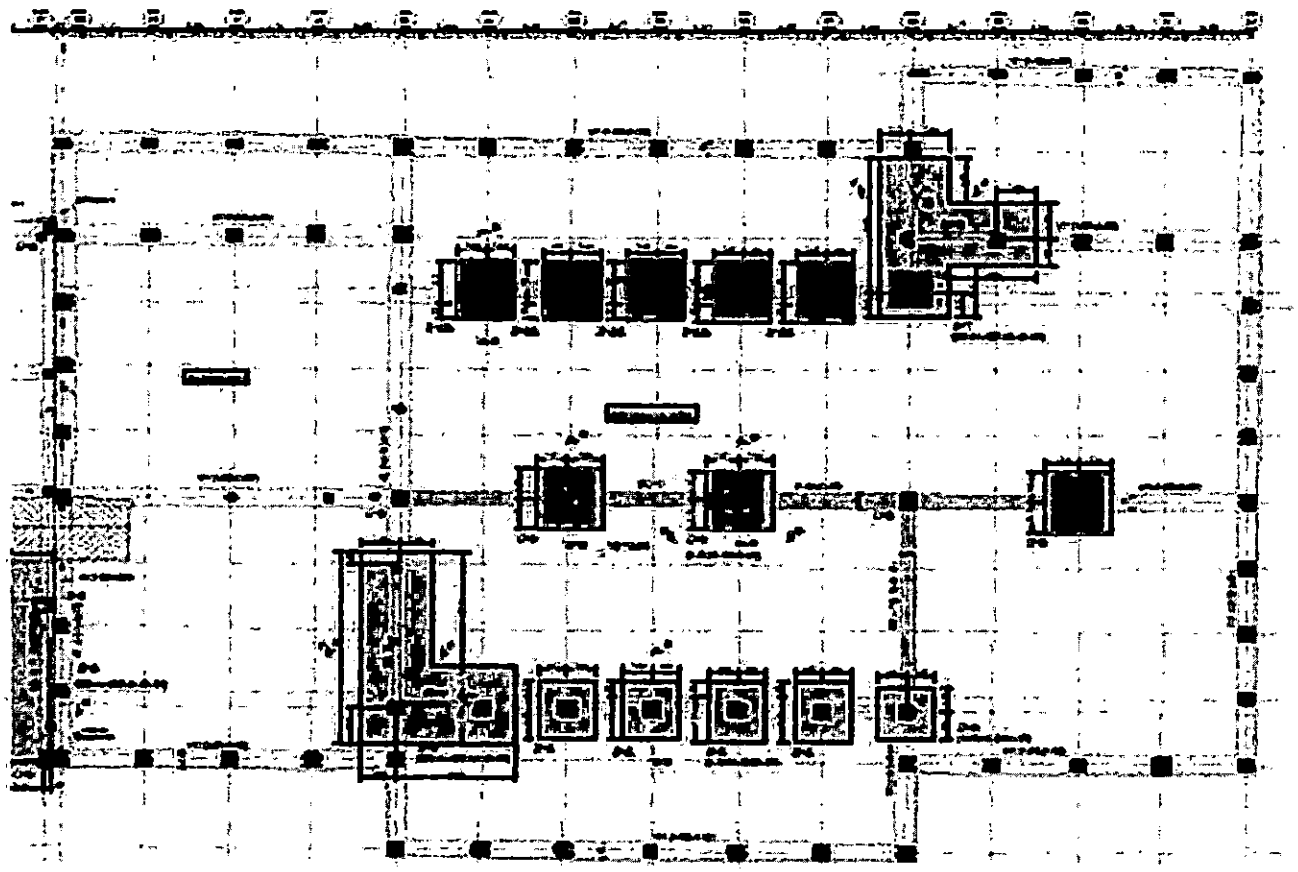


PLANO DETALLE

PRIMER PISO

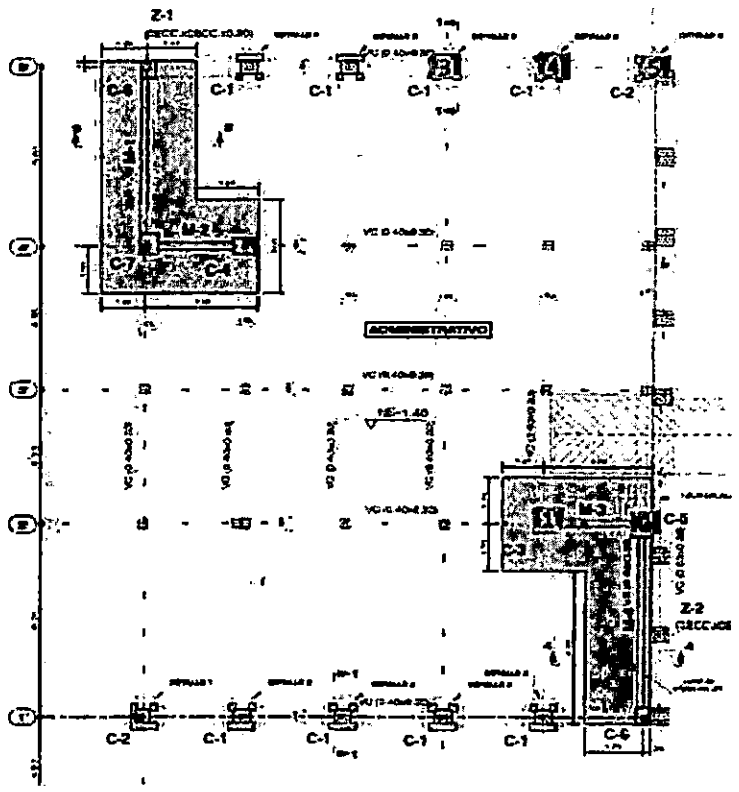

SEGUNDO PISO

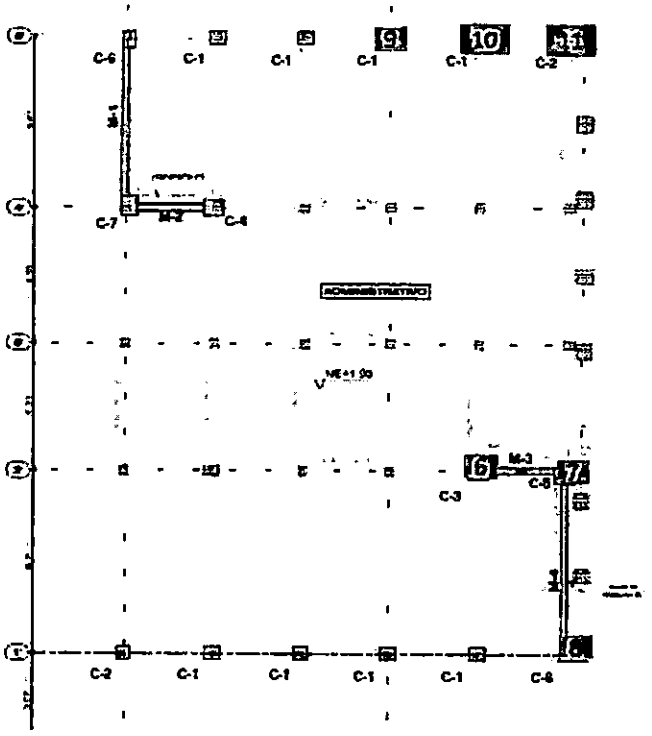

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
Seguridad Integración Social

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

PROYECTO: OBRAS SEDES ALCALDÍA

PRISMA — UNIVERSAL SEC S.A.S. — CONTRATISTA


ARQUITECTURA URBANA LTDA. — INTERVENTORÍA

ACTA No.		PERIODO DEL ACTA	01/01/2020	A	30/01/2020
OBJETO	REALIZAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE AJUSTE LAS DIFERENTES OBRAS E INTERVENCIONES ESPECIALIZADAS PARA LAS DIFERENTES SEDES DE LA SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C.				
CONTRATO DE OBRA No	731-2019	CONTRATISTA	CONSORCIO PRUNI SEDES 04	ENTIDAD CONTRATANTE	SECRETARIA GENERAL-ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA
CONTRATO INTERVENTORÍA	730 DE 2019	INTERVENTORÍA	ARQUITECTURA URBANA LTDA	FRENTE:	IMPRENTA DISTRITAL

CAPITULO	2.3.0	COLUMNAS Y MUROS	ITEM	2.3.0.1	Escarificar columnas y adhesivo, incluye la escarificación y el adhesivo especial para unir concreto existente a concreto nuevo	UNIDAD	M2

ITEM	LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	TOTAL	UNIDAD
	EDIFICIO ADMINISTRATIVO 1ER PISO						
1	COLUMNA C-3 EJES 2'-E		0,25	3,09	4,00	3,09	M2
2	COLUMNA C-5 EJES 2'-F		0,25	3,09	3,00	2,32	M2
3	COLUMNA C-1 EJES 5'-D		0,25	3,09	4,00	3,09	M2
4	COLUMNA C-1 EJES 5'-E		0,25	3,09	4,00	3,09	M2
5	COLUMNA C-2 EJES 5'-F		0,25	3,09	3,00	2,32	M2
	EDIFICIO ADMINISTRATIVO 2DO PISO						
6	COLUMNA C-3 EJES 2'-E		0,25	3,09	4,00	3,09	M2
7	COLUMNA C-5 EJES 2'-F		0,25	3,09	3,00	2,32	M2
8	COLUMNA C-6 EJES 1'-F		0,25	2,50	3,00	1,88	M2
9	COLUMNA C-1 EJES 5'-D		0,25	2,50	4,00	2,50	M2
10	COLUMNA C-1 EJES 5'-E		0,25	2,50	4,00	2,50	M2
11	COLUMNA C-2 EJES 5'-F		0,25	2,50	3,00	1,88	M2
	PRODUCCIÓN						
12	ZAPATA Z-4A EJES 11-L		1,55	1,55	1,00	2,40	M2
13	ZAPATA Z-4A EJES 11-M		1,55	1,55	1,00	2,40	M2
14	ZAPATA Z-4A EJES 11-N		1,55	1,55	1,00	2,40	M2
15	ZAPATA Z-4A EJES 11-O		1,55	1,55	1,00	2,40	M2
16	ZAPATA Z-4A EJES 11-P		1,55	1,55	1,00	2,40	M2
17	ZAPATA Z-7 EJES 12-P		1,55	1,55	1,00	2,40	M2
18	ZAPATA Z-3 EJES 7-M		1,55	1,55	1,00	2,40	M2
19	ZAPATA Z-3 EJES 7-O		1,55	1,55	1,00	2,40	M2
20	ZAPATA Z-3 EJES 7-S		1,55	1,55	1,00	2,40	M2
OBSERVACIONES:				SUBTOTAL		49,69	M2
				TOTAL		49,69	M2

LOCALIZACIÓN PLANIMÉTRICA

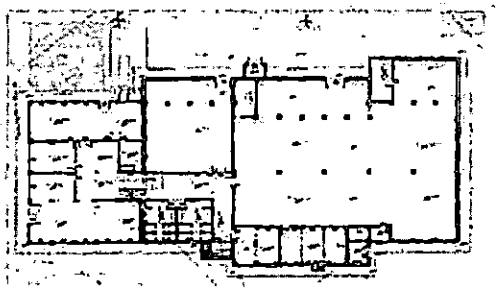

REGISTRO FOTOGRÁFICO



Alejandra Blanco T

ARQ. ALEJANDRA BOLAÑOS
RESIDENTE CONTRATISTA

Nancy Ruth Ayala Gómez

ARQ. NANCY AYALA
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

166

143

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA GENERAL | BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

PROYECTO: OBRAS SEDES ALCALDÍA

PRISMA — UNIVERSAL SEC S.A.S. — CONSORCIO PRUNI SEDES 04 — CONTRATISTA


ARQUITECTURA URBANA LTDA — INTERVENTORÍA

ACTA No.:	6	PERIODO DEL ACTA	01/12/2019	A	30/12/2019		
OBJETO	REALIZAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE AJUSTE LAS DIFERENTES OBRAS E INTERVENCIONES ESPECIALIZADAS PARA LAS DIFERENTES SEDES DE LA SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C.						
CONTRATO DE OBRA No:	731-2019	CONTRATISTA	CONSORCIO PRUNI SEDES 04	ENTIDAD CONTRATANTE	SECRETARIA GENERAL-ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA		
CONTRATO INTERVENTORÍA :	730 DE 2019	INTERVENTORÍA	ARQUITECTURA URBANA LTDA	FRENTE	IMPRENTA DISTRITAL		

CAPITULO	2.2.0	CIMENTACIÓN	ITEM	2.2.0.8	Suministro figurada y amarre de acero 60000 PSI 420 Mpa	UNIDAD	KG

ITEM	LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES FIGURA	LARGO (m)	PESO (kg/m)	CANTIDAD	TOTAL	UNIDAD
	EDIFICIO ADMINISTRATIVO 1ER PISO						
1	ZAPATA (DADO) COLUMNA C-1 EJES 5'-E						
	Acero 1/2" con doble esc. L=0.15m		1,00	0,994	6,00	5,96	KG
	Fleje 3/8" .70x.15 con .10m de gancho		1,90	0,560	8,00	8,51	KG
	U 3/8"		0,65	0,560	3,00	1,09	KG
2	ZAPATA (DADO) COLUMNA C-2 EJES 5'-F						
	Acero 1/2" con doble esc. L=0.15m		1,00	0,994	6,00	5,96	KG
	Fleje 3/8" .70x.15 con .10m de gancho		1,90	0,560	8,00	8,51	KG
	U 3/8"		0,65	0,560	3,00	1,09	KG

PLANO DETALLE

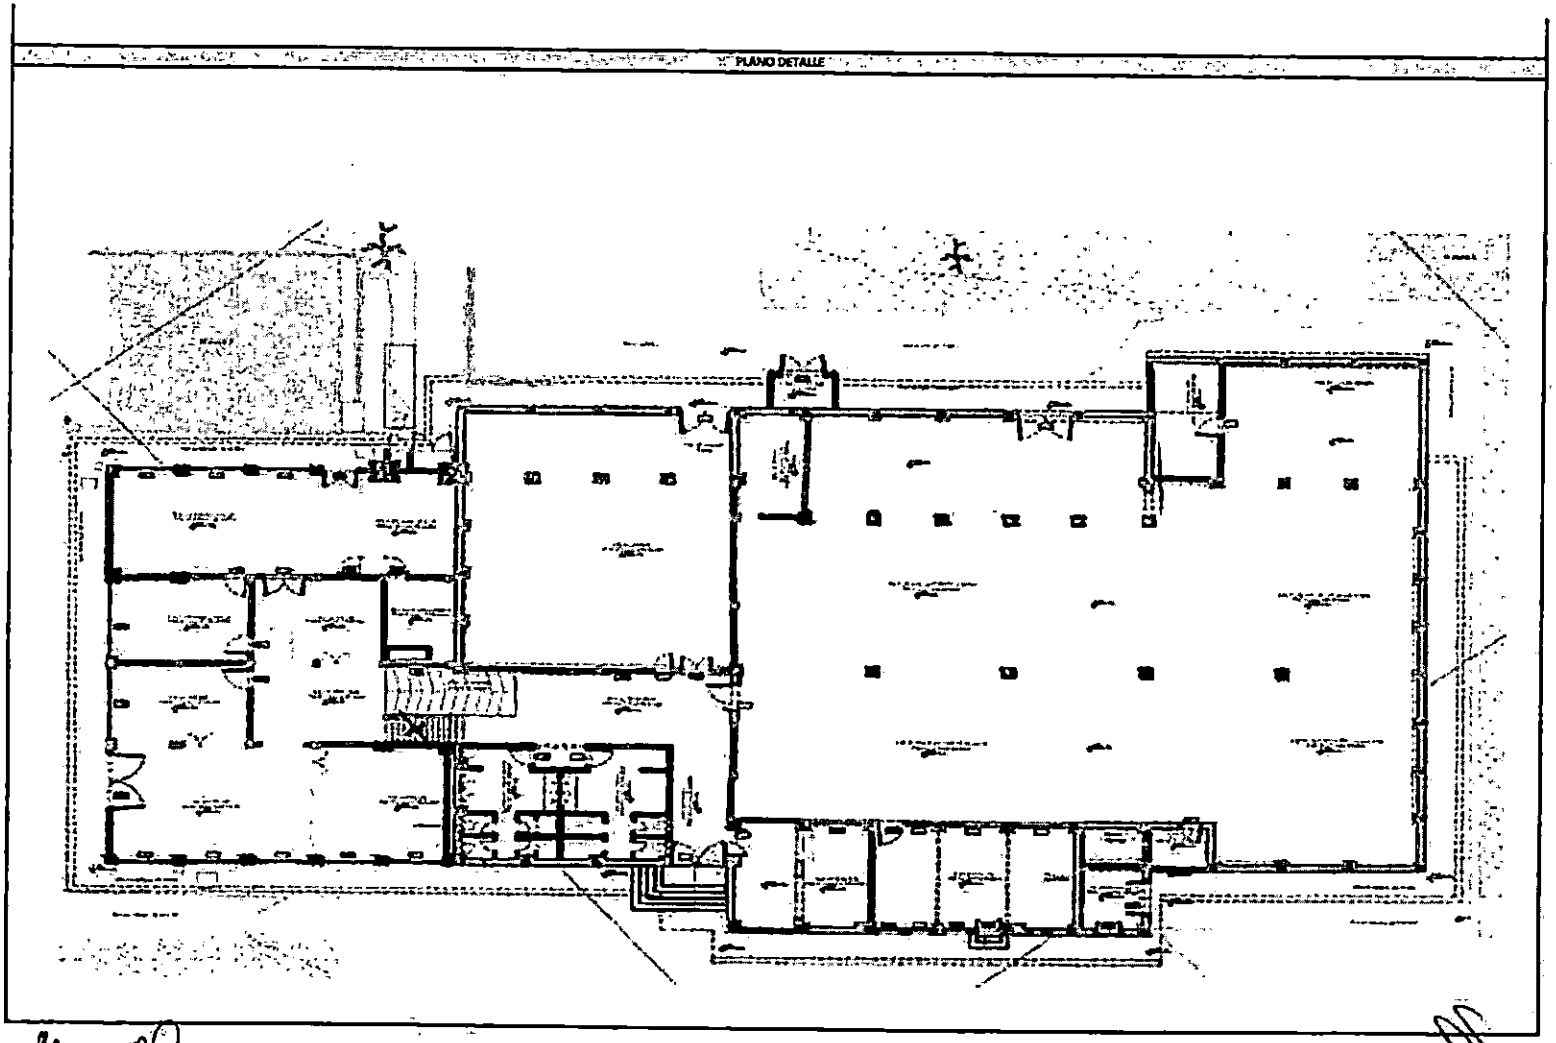

Nota

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA GENERAL | BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

PROYECTO: OBRAS SEDES ALCALDÍA

PRISMA — UNIVERSAL SEC S.A.S. — CONSORCIO PRUNI SEDES 04 — CONTRATISTA

ARQUITECTURA URBANA LTDA — INTERVENTORÍA


ACTA No:	6		PERIODO DEL ACTA	01/12/2019	A	30/12/2019	
OBJETO	REALIZAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE AJUSTE LAS DIFERENTES OBRAS E INTERVENCIONES ESPECIALIZADAS PARA LAS DIFERENTES SEDES DE LA SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C.						
CONTRATO DE OBRA No	731-2019	CONTRATISTA	CONSORCIO PRUNI SEDES 04		ENTIDAD CONTRATANTE	SECRETARIA GENERAL-ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA	
CONTRATO INTERVENTORÍA	730 DE 2019	INTERVENTORÍA	ARQUITECTURA URBANA LTDA		FRENTE:	IMPRENTA DISTRITAL	

CAPITULO	2.2.0	CIMENTACIÓN	ITEM	2.2.0.7	Concreto de zapatas de 4000 psi	UNIDAD	M3


ITEM	LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	TOTAL	UNIDAD
	EDIFICIO ADMINISTRATIVO 1ER PISO						
1	ZAPATA (DADO) COLUMNA C-1 EJES 5'-E	0,90	0,90	0,35	1,00	0,28	M3
2	ZAPATA (DADO) COLUMNA C-2 EJES 5'-F	0,90	0,90	0,35	1,00	0,28	M3
						0,57	M3
					TOTAL	0,57	M3

OBSERVACIONES:

LOCALIZACIÓN PLANIMÉTRICA

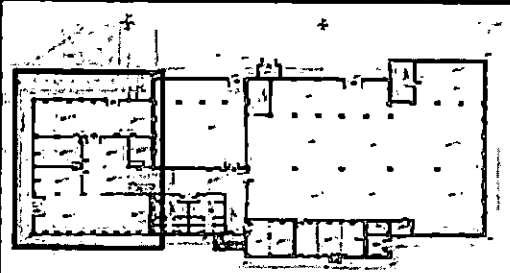

REGISTRO FOTOGRÁFICO

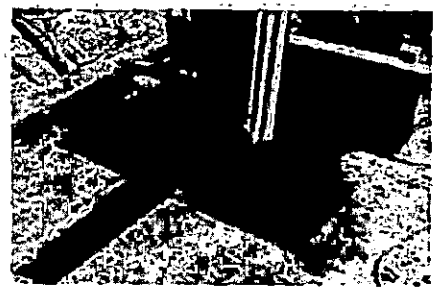

Alejandra Bolaños +

ARQ. ALEJANDRA BOLAÑOS
RESIDENTE CONTRATISTA


Nancy Ayala Gomez

ARQ. NANCY AYALA
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

110

PLANO DETALLE

PRODUCCIÓN

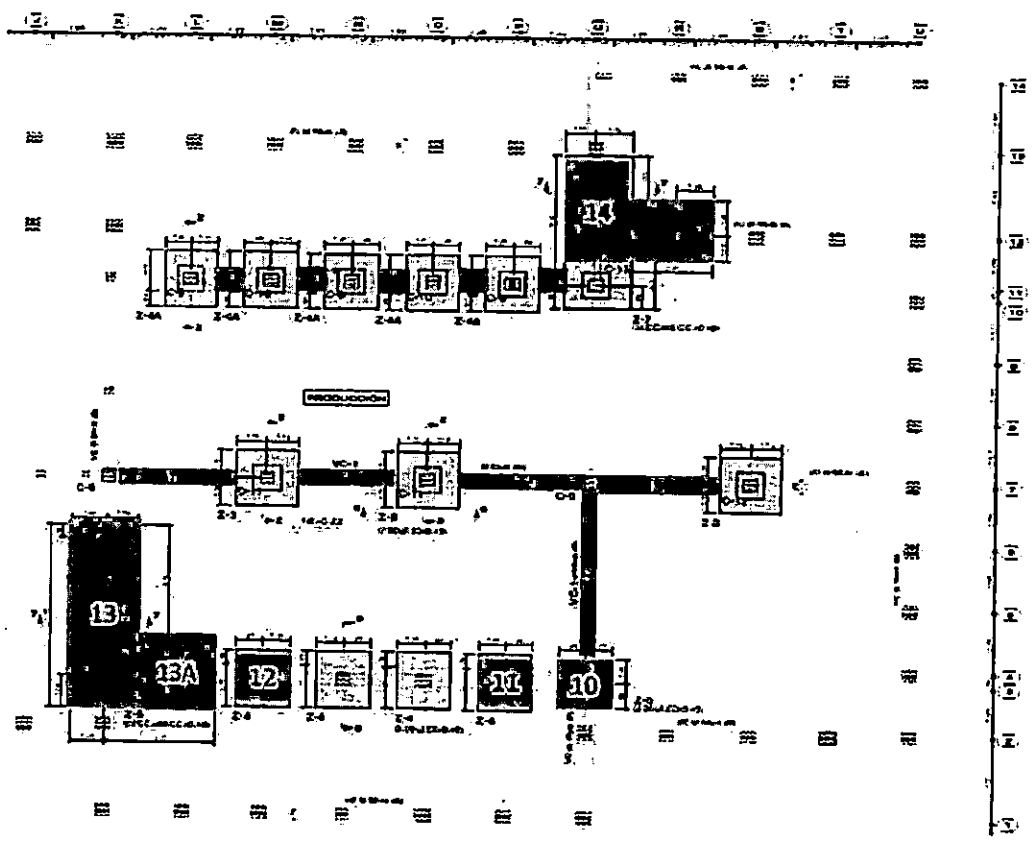

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA GENERAL | BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

PROYECTO: OBRAS SEDES ALCALDÍA

PRISMA — UNIVERSAL SEC S.A.S. — CONSORCIO PRUNI SEDES 04 — CONTRATISTA


ARQUITECTURA URBANA LTDA. — INTERVENTORÍA

ACTA No:	6	PERIODO DEL ACTA:	1/12/2019	A	30/12/2019		
OBJETO	REALIZAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE AJUSTE LAS DIFERENTES OBRAS E INTERVENCIONES ESPECIALIZADAS PARA LAS DIFERENTES SEDES DE LA SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C.						
CONTRATO DE OBRA No.	731-2019	CONTRATISTA	CONSORCIO PRUNI SEDES 04	ENTIDAD CONTRATANTE	SECRETARIA GENERAL-ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA		
CONTRATO INTERVENTORÍA	730 DE 2019	INTERVENTORÍA	ARQUITECTURA URBANA LTDA	FUENTE:	IMPRENTA DISTRITAL		

CAPITULO	2.2.0	CIMENTACIÓN	ITEM	2.2.0.2	Excavación manual para ciclópeo y zapatas	UNIDAD	M3

ITEM	LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	TOTAL	UNIDAD
	PRODUCCIÓN						
1	VC-1 EJE 11	1,00	0,50	0,50	1,00	0,25	M3
2	VC-1 EJE 11	1,00	0,50	0,60	1,00	0,30	M3
3	VC-1 EJE 11	1,00	0,50	0,60	1,00	0,30	M3
4	VC-1 EJE 11	1,00	0,50	0,80	1,00	0,40	M3
5	VC-1 EJE 11	1,20	0,50	0,80	1,00	0,48	M3
6	VC-1 EJE 7	3,60	0,50	0,70	1,00	1,26	M3
7	VC-1 EJE 7	4,70	0,50	0,70	1,00	1,65	M3
8	VC-1 EJE 7	4,60	0,50	0,70	1,00	1,61	M3
9	VC-1 EJE Q	7,00	0,50	0,35	1,00	1,23	M3
10	Z-6 EJE 3-Q	2,00	2,00	0,80	1,00	3,20	M3
11	Z-4 EJE 3-P	2,00	2,40	0,80	1,00	3,84	M3
12	Z-8 EJE 3-M	2,00	2,40	0,80	1,00	3,84	M3
13	Z-5 EJE 4-K	5,54	3,35	0,80	1,00	14,85	M3
13A	Z-5 EJE 4-K	4,55	2,80	0,80	1,00	10,19	M3
14	Z-7 EJE 12-Q	3,42	4,00	0,80	1,00	10,94	M3
15	VC-1 EJE 7	4,90	0,50	0,70	1,00	1,72	M3
OBSERVACIONES:						56,05	M3
						56,05	M3

LOCALIZACIÓN PLANIMÉTRICA

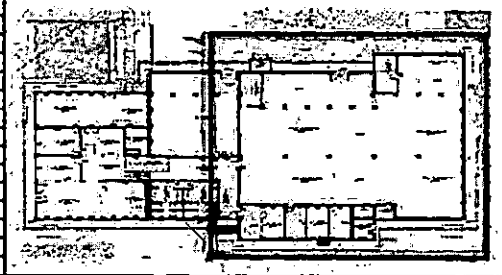

REGISTRO FOTOGRÁFICO




Alejandra Bolaños +


ARQ. ALEJANDRA BOLAÑOS
RESIDENTE CONTRATISTA

ARQ. NANCY AYALA
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

PLANO DETALLE

PRODUCCIÓN

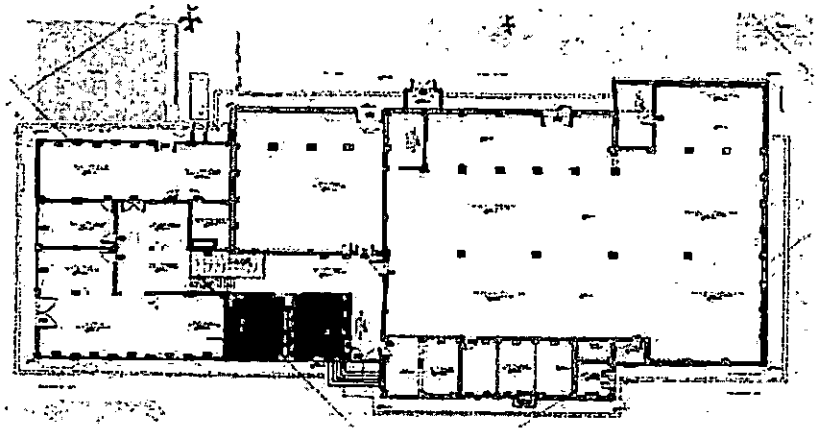


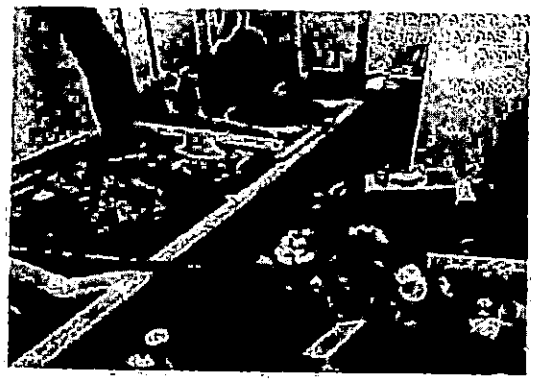

Ruta 88

PLANO DETALLE

PRODUCCIÓN

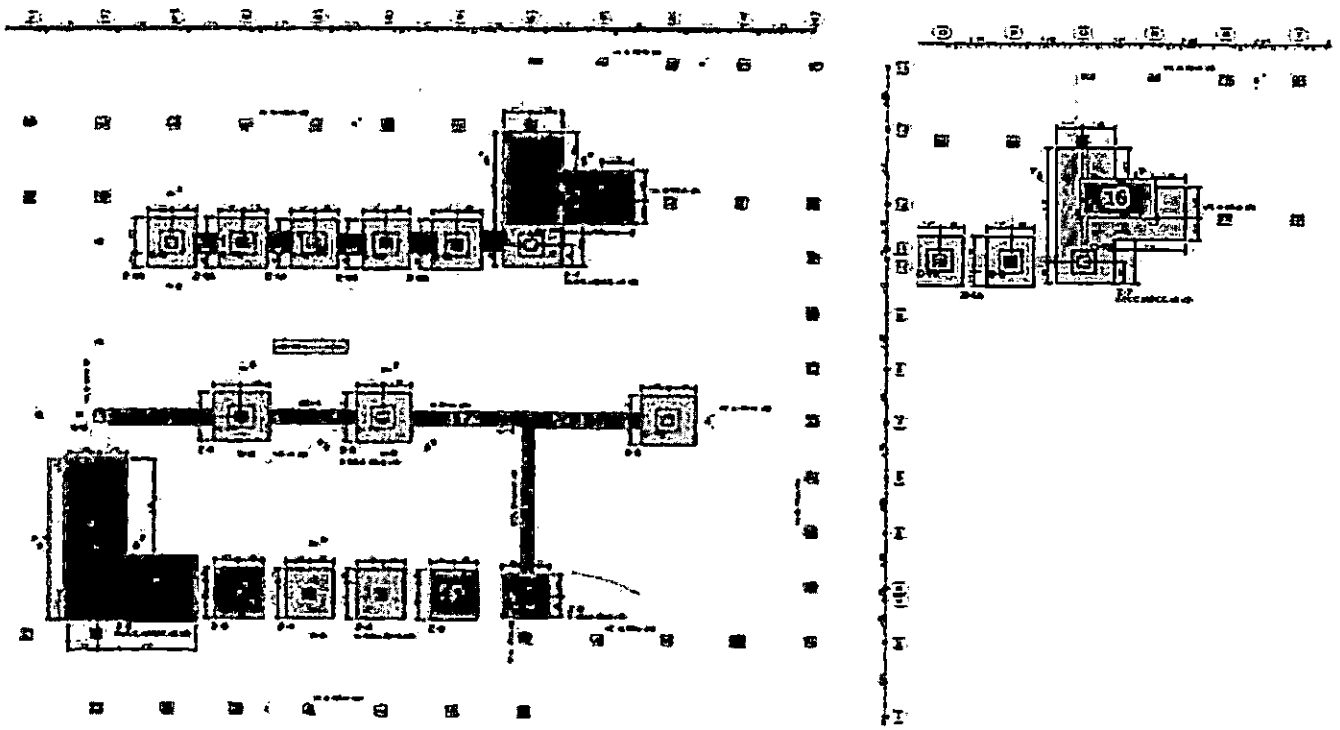

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA GENERAL | BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

PROYECTO: OBRAS SEDES ALCALDÍA

PRISMA UNIVERSAL SEC S.A.S. CONSORCIO PRUNI SEDES 04 — CONTRATISTA

ARQUITECTURA URBANA LTDA — INTERVENTORÍA


ACTA No.	6	PERIODO DEL ACTA	1/12/2019	A	30/12/2019		
OBJETO	REALIZAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE AJUSTE LAS DIFERENTES OBRAS E INTERVENCIONES ESPECIALIZADAS PARA LAS DIFERENTES SEDES DE LA SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C.						
CONTRATO DE OBRA No	731-2019	CONTRATISTA	CONSORCIO PRUNI SEDES 04	ENTIDAD CONTRATANTE	SECRETARIA GENERAL-ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA		
CONTRATO INTERVENTORÍA	730 DE 2019	INTERVENTORÍA	ARQUITECTURA URBANA LTDA	FRENTE:	IMPRENTA DISTRITAL		

CAPITULO	2.2.0	CIMENTACIÓN	ITEM	2.2.0.1	Demoler piso y contrapiso	UNIDAD	M2


ITEM	LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	TOTAL	UNIDAD
	PRODUCCIÓN						
1	VC-1 EJE 11	1,00	0,50		1,00	0,50	M2
2	VC-1 EJE 11	1,00	0,50		1,00	0,50	M2
3	VC-1 EJE 11	1,00	0,50		1,00	0,50	M2
4	VC-1 EJE 11	1,00	0,50		1,00	0,50	M2
5	VC-1 EJE 11	1,20	0,50		1,00	0,60	M2
6	VC-1 EJE 7	3,60	0,50		1,00	1,80	M2
7	VC-1 EJE 7	4,70	0,50		1,00	2,35	M2
8	VC-1 EJE 7	4,60	0,50		1,00	2,30	M2
9	VC-1 EJE Q	7,00	0,50		1,00	3,50	M2
10	Z-6 EJE 3-Q	2,00	2,00		1,00	4,00	M2
11	Z-4 EJE 3-P	2,00	2,40		1,00	4,80	M2
12	Z-4 EJE 3-M	2,00	2,40		1,00	4,80	M2
13	Z-5 EJE 4-K	5,54	3,35		1,00	18,56	M2
13A	Z-5 EJE 4-K	4,55	2,80		1,00	12,74	M2
14	Z-7 EJE 12-Q	3,42	4,00		1,00	13,68	M2
15	VC-1 EJE 7	4,90	0,50		1,00	2,45	M2
16	PLACA ENTREPISO AREA INSUMOS	3,00	3,40		1,00	10,20	M2
	ADMINISTRACIÓN 1ER PISO						
16A	BAÑO HOMBRES	6,05	4,35		1,00	26,32	M2
17	BAÑO MUJERES	6,05	4,60		1,00	27,83	M2
					SUBTOTAL	137,93	M2
					TOTAL	137,93	M2

OBSERVACIONES:

LOCALIZACIÓN PLANIMÉTRICA

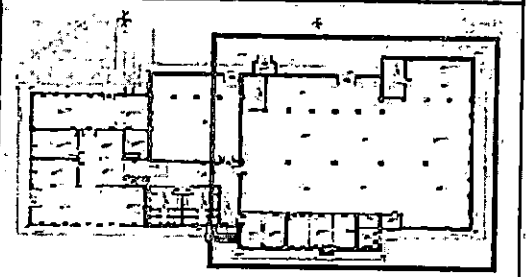

REGISTRO FOTOGRÁFICO

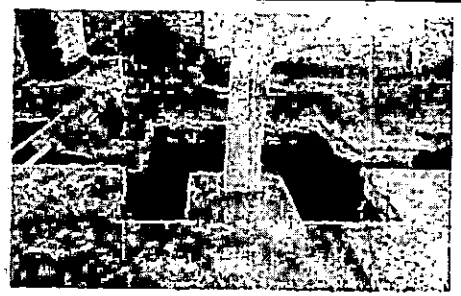

Alejandra Bolaños t

ARQ. ALEJANDRA BOLAÑOS
RESIDENTE CONTRATISTA

Nancy Ayala Gómez

ARQ. NANCY AYALA
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA GENERAL

BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

PROYECTO: OBRAS SEDES ALCALDÍA

PRISMA — UNIVERSAL SEC S.A.S. — CONTRATISTA

ARQUITECTURA URBANA LTDA. — INTERVENTORÍA

ACTA No.	6	PERIODO DEL ACTA	01/12/2019	A	30/12/2019	
OBJETO	REALIZAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE AJUSTE LAS DIFERENTES OBRAS E INTERVENCIONES ESPECIALIZADAS PARA LAS DIFERENTES SEDES DE LA SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C.					
CONTRATO DE OBRA No	731-2019	CONTRATISTA	CONSORCIO PRUNI SEDES 04	ENTIDAD CONTRATANTE	SECRETARIA GENERAL-ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA	
CONTRATO INTERVENTORÍA	730 DE 2019	INTERVENTORÍA	ARQUITECTURA URBANA LTDA	FRENTE:	IMPRENTA DISTRITAL	

CAPITULO	2.1.0	PRELIMINARES	ITEM	2.1.0.3	BAÑO MOVIL	UNIDAD	MES


ITEM	LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	TOTAL	UNIDAD
1	Baño movil (instalado 17 de julio) Mes Diciembre				1,00	1,00	MES
2	Baño movil (instalado 02 de Septiembre) Mes Diciembre				1,00	1,00	MES
3	Baño movil (instalado 25 de Noviembre) Mes Diciembre				1,00	1,00	MES
					SUBTOTAL	3,00	MES
					TOTAL	3,00	MES

OBSERVACIONES:

LOCALIZACION PLANIMETRICA



REGISTRO FOTOGRAFICO

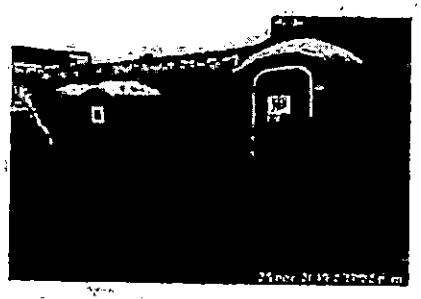


Alejandra Bolaños t

ARQ. ALEJANDRA BOLAÑOS
RESIDENTE CONTRATISTA

Nancy Rocio Ayala Gomez

ARQ. NANCY AYALA
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

104

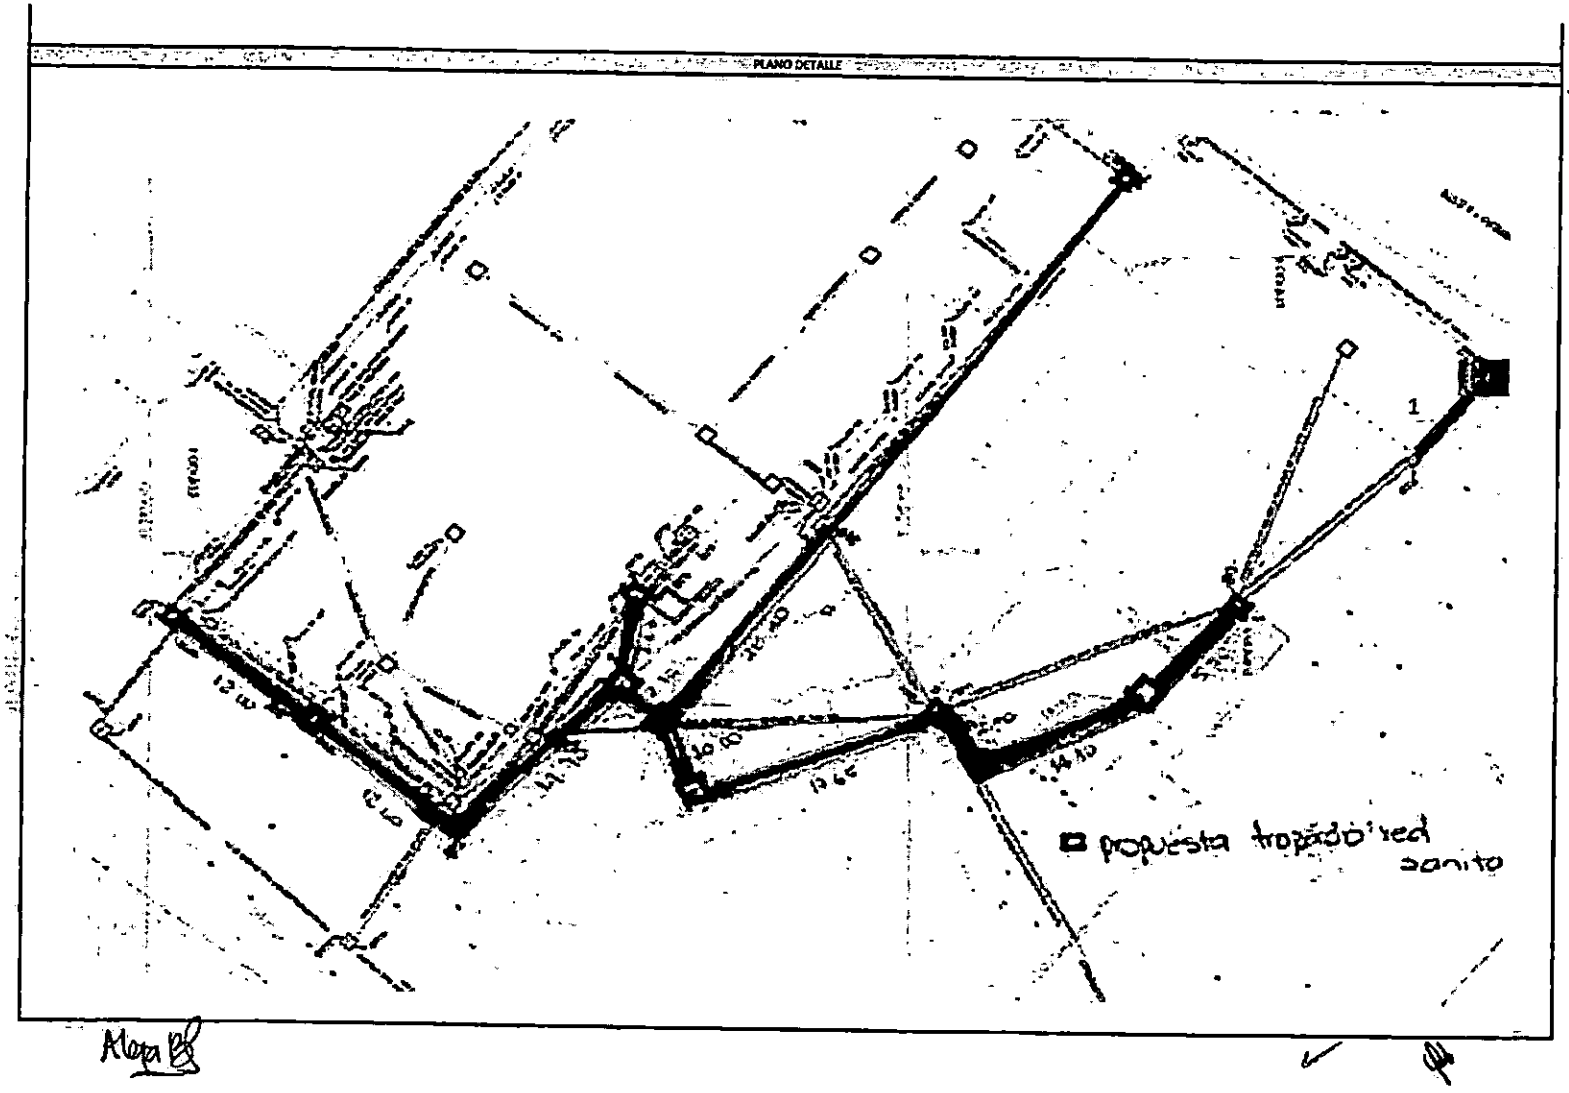

Allegato B

121

103

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA GENERAL

BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

PROYECTO: OBRAS SEDES ALCALDÍA


PRISMA — UNIVERSAL SEC S.A.S. — CONSORCIO PRUNI SEDES 04 — CONTRATISTA

ARQUITECTURA URBANA LTDA. — INTERVENTORÍA

ACTA No.	6	PERIODO DEL ACTA	01/12/2019	A	30/12/2019		
OBJETO	REALIZAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE AJUSTE LAS DIFERENTES OBRAS E INTERVENCIONES ESPECIALIZADAS PARA LAS DIFERENTES SEDES DE LA SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C.						
CONTRATO DE OBRA No.	731-2019	CONTRATISTA	CONSORCIO PRUNI SEDES 04	ENTIDAD CONTRATANTE	SECRETARIA GENERAL-ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA		
CONTRATO INTERVENTORÍA	730 DE 2019	INTERVENTORÍA	ARQUITECTURA URBANA LTDA	FRENTE	IMPRENTA DISTRITAL		

CAPITULO	1.7.0	OBRAS CIVILES	ITEM	1.7.0.6	Excavación manual incluye retiro de material y disposición final en sitios autorizados	UNIDAD	M3

ITEM	LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	TOTAL	UNIDAD
	COSTADO SUR						
1	Zona exterior cafeteria	5,20	0,55	0,70	1,00	2,19	M3
2	Caja de inspeccion	0,80	0,80	0,75	1,00	0,48	M3

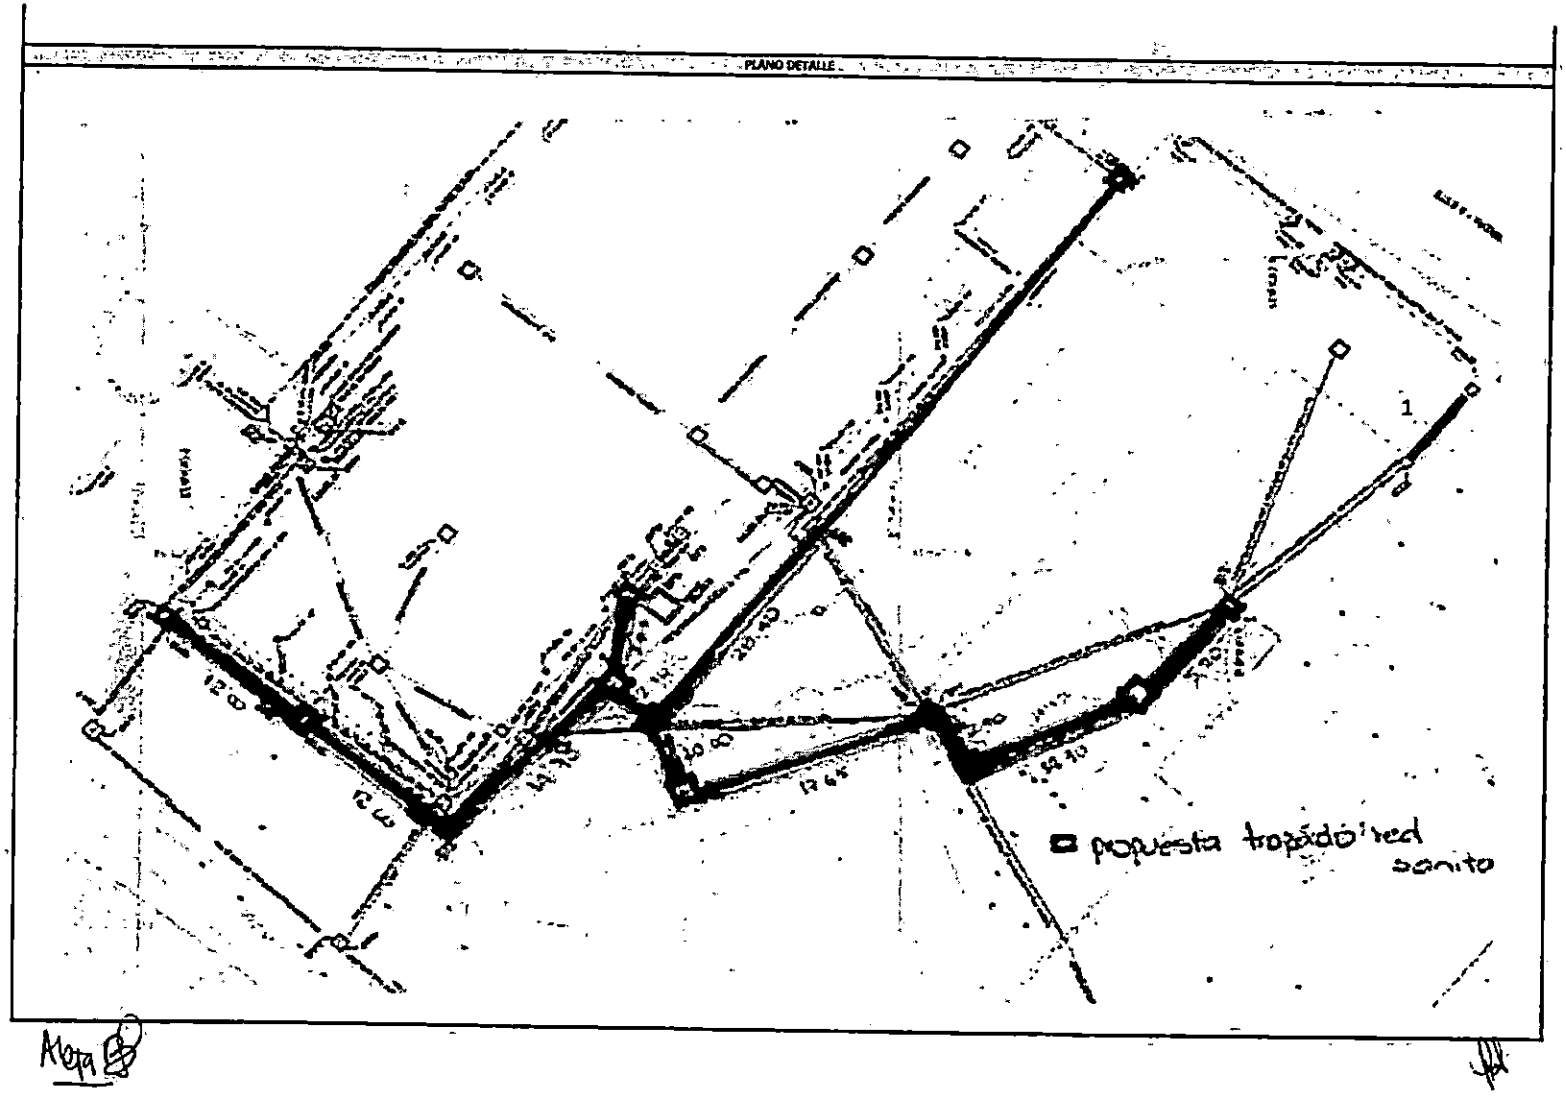

Alegria

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA GENERAL | BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

PROYECTO: OBRAS SEDES ALCALDÍA

PRISMA — UNIVERSAL SEC S.A.S. — CONSORCIO PRUNI SEDES 04 — CONTRATISTA

ARQUITECTURA URBANA LTDA — INTERVENTORÍA


ACTA No:	6	PERIODO DEL ACTA:	01/12/2019	A:	30/12/2019		
OBJETO	REALIZAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE AJUSTE LAS DIFERENTES OBRAS E INTERVENCIONES ESPECIALIZADAS PARA LAS DIFERENTES SEDES DE LA SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C.						
CONTRATO DE OBRA No:	731-2019	CONTRATISTA:	CONSORCIO PRUNI SEDES 04	ENTIDAD CONTRATANTE:	SECRETARIA GENERAL-ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA		
CONTRATO INTERVENTORÍA:	730 DE 2019	INTERVENTORÍA:	ARQUITECTURA URBANA LTDA	FRENTE:	IMPRENTA DISTRITAL		

CAPITULO	1.5.0	RED DE AGUAS NEGRAS	ITEM	1.5.0.5	Tubería PVC alcantarillado 110mm	UNIDAD	ML


ITEM	LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	TOTAL	UNIDAD
	COSTADO SUR						
1	Zona Exterior Cafetería	6,00			1,00	6,00	ML
					SUBTOTAL	6,00	ML
					TOTAL	6,00	ML

OBSERVACIONES:

LOCALIZACIÓN PLANIMÉTRICA

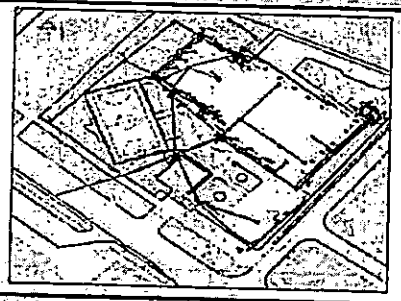

REGISTRO FOTOGRÁFICO



Alejandra Bolaños t

ARQ. ALEJANDRA BOLAÑOS
RESIDENTE CONTRATISTA

Nancy Ayala Gomez

ARQ. NANCY AYALA
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

ACTA

7

IMPRENTA DISTRITAL

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA GENERAL

BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

PROYECTO: OBRAS SEDES ALCALDÍA

PRISMA
UNIVERSAL SEC S.A.S.
CONSORCIO PRUNI SEDES 04
CONTRATISTA


ARQUITECTURA URBANA LTDA
INTERVENTORÍA

ACTA No.	7	PERIODO DEL ACTA	1/01/2020	A	30/01/2020	
OBJETO	REALIZAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE AJUSTE LAS DIFERENTES OBRAS E INTERVENCIONES ESPECIALIZADAS PARA LAS DIFERENTES SEDES DE LA SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTA D.C.					
CONTRATO DE OBRA No	731-2019	CONTRATISTA	CONSORCIO PRUNI SEDES 04	ENTIDAD CONTRATANTE	SECRETARIA GENERAL-ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA	
CONTRATO INTERVENTORÍA	730 DE 2019	INTERVENTORÍA	ARQUITECTURA URBANA LTDA	FRENTE:	IMPRENTA DISTRITAL	


CAPITULO	1.1.6	PRELIMINARES	ITEM	1.1.0.1	REPLANTEO	UNIDAD	ML

ITEM	LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES - LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	TOTAL	UNIDAD
	TUBERIA EXTERIORES						
1	Desde Medidor principal	3,50			1,00	3,50	ML
2	Sendero peatonal	2,50			1,00	2,50	ML
3	Zona verde paralelo a Zona Verde	16,50			1,00	16,50	ML
4	Zona verde	5,80			1,00	5,80	ML
5	Sendero peatonal	14,80			1,00	14,80	ML
6	Fachada Costado Sur Produccion	17,18			1,00	17,18	ML
7	Frente a Acceso peatonal	5,03			1,00	5,03	ML
8	Costado Sur Administracion	10,23			1,00	10,23	ML
9	Costado Occidental	16,77			1,00	16,77	ML
10	Costado Norte	5,57			1,00	5,57	ML
11	Ingreso a cuarto de bombas	6,8			1,00	6,80	ML
12	Fachada Sur administracion	5,60			1,00	5,60	ML
13	Frente a Acceso peatonal	5,50			1,00	5,50	ML
14	Fachada Sur Produccion	48,20			1,00	48,20	ML
15	Fachada posterior Archivo	14,90			1,00	14,90	ML

PLANO DETALLE

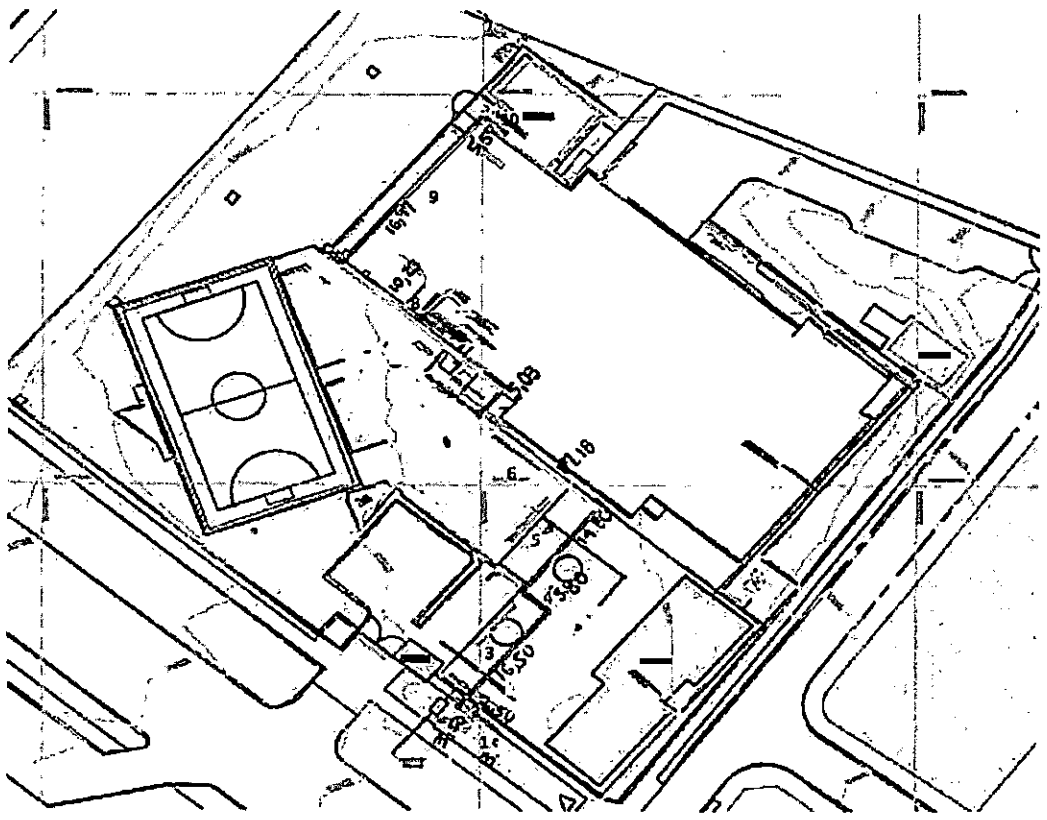

PLANO DETALLE

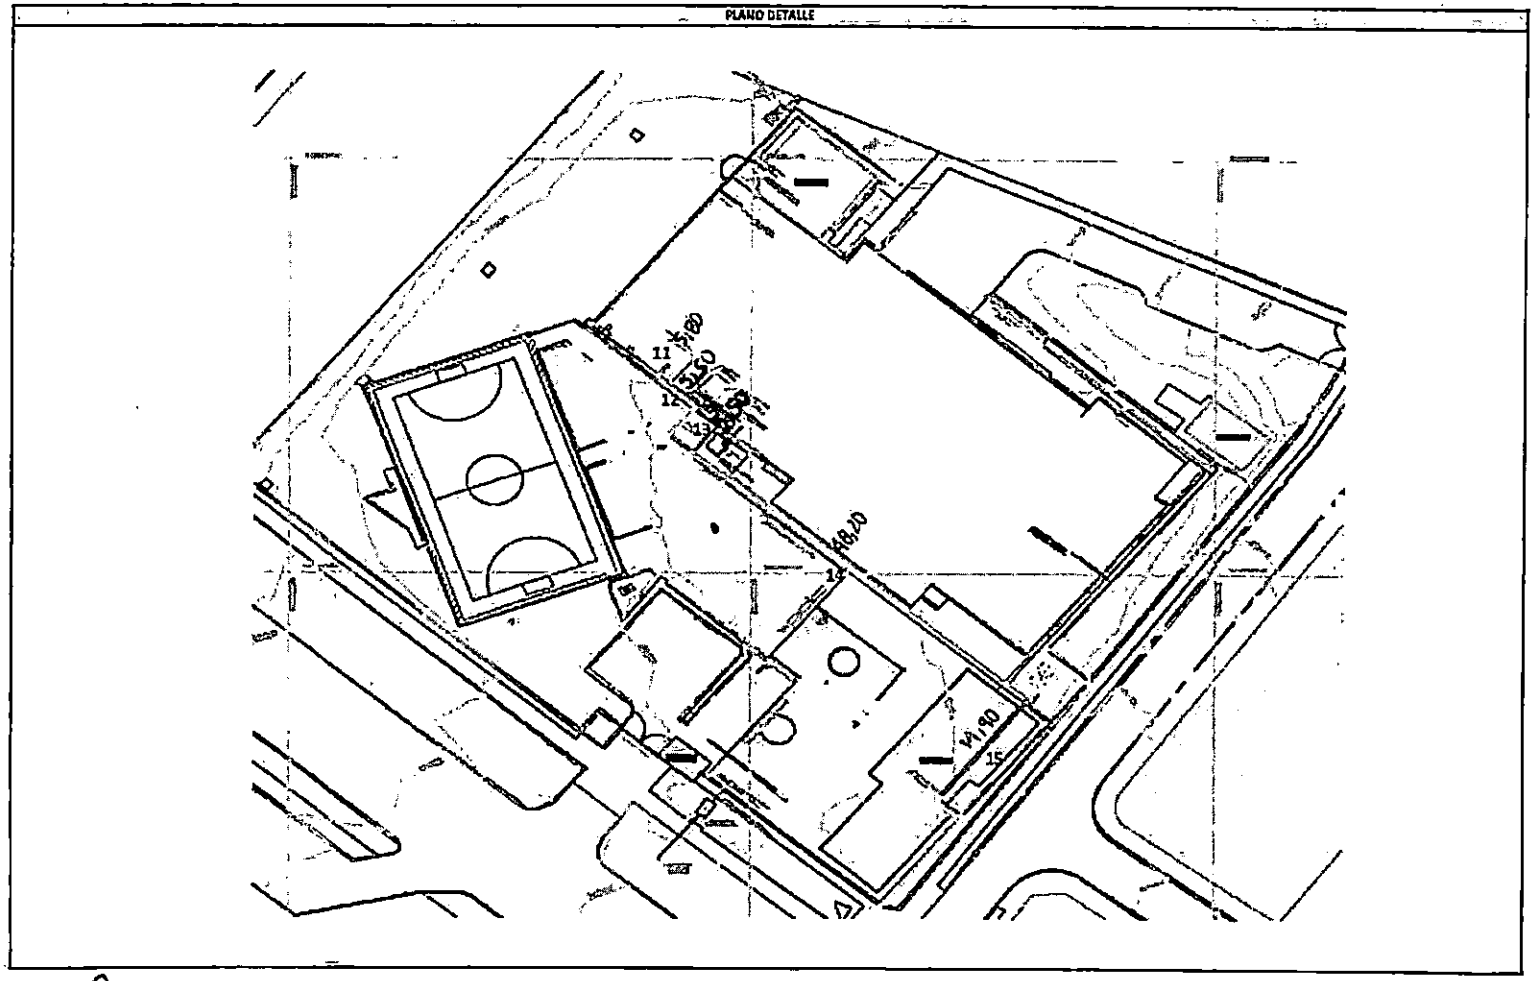

Acf

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA GENERAL | BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

PROYECTO: OBRAS SEDES ALCALDÍA

PRISMA — UNIVERSAL SEC S.A.S. — CONSORCIO PRUNI SEDES D4 — CONTRATISTA


ARQUITECTURA URBANA LTDA — INTERVENTORÍA

ACTA No.	7		PERIODO DEL ACTA	1/01/2020	A	30/01/2020	
OBJETO	REALIZAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE AJUSTE LAS DIFERENTES OBRAS E INTERVENCIONES ESPECIALIZADAS PARA LAS DIFERENTES SEDES DE LA SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C.						
CONTRATO DE OBRA No	731-2019	CONTRATISTA	CONSORCIO PRUNI SEDES D4		ENTIDAD CONTRATANTE	SECRETARIA GENERAL-ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA	
CONTRATO INTERVENTORÍA	730 DE 2019	INTERVENTORÍA	ARQUITECTURA URBANA LTDA		FRENTE:	IMPRENTA DISTRITAL	

CAPITULO	1.2.0	RED DE SUMINISTRO	ITEM	1.2.0.1	TUBERIA PVC-P RDE 9 1/2"	UNIDAD	ML

ITEM	LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	TOTAL	UNIDAD
	Entre los ejes 5'-1' y A-J						
1	Baño hombres Primer piso	3,00			1,00	3,00	ML
2	Baño hombres Primer piso	5,40			1,00	5,40	ML
3	Baño hombres Primer piso	4,40			1,00	4,40	ML
4	Baño mujeres Primer piso	3,00			1,00	3,00	ML
5	Baño mujeres Primer piso	5,40			1,00	5,40	ML
6	Baño mujeres Primer piso	4,40			1,00	4,40	ML
7	Baño hombres Segundo piso	2,70			1,00	2,70	ML
8	Baño hombres Segundo piso	2,20			1,00	2,20	ML
9	Baño hombres Segundo piso	2,20			1,00	2,20	ML
10	Baño hombres Segundo piso	40,80			1,00	40,80	ML
11	Baño mujeres Segundo piso	2,20			1,00	2,20	ML
12	Baño mujeres Segundo piso	2,20			1,00	2,20	ML
13	Baño mujeres Segundo piso	1,00			1,00	1,00	ML
14	Baño mujeres Segundo piso	1,00			1,00	1,00	ML
15	Baño mujeres Segundo piso	1,90			1,00	1,90	ML
16	Baño mujeres Segundo piso	0,80			1,00	0,80	ML
17	Baño mujeres Segundo piso	2,60			1,00	2,60	ML
18	Baño mujeres Segundo piso	2,80			1,00	2,80	ML
19	Baño mujeres Segundo piso	2,70			1,00	2,70	ML
20	Cafeteria	1,30			1,00	1,30	ML
21	Cafeteria	1,10			1,00	1,10	ML
22	Cafeteria	1,40			1,00	1,40	ML
23	Espacio kodak	1,40			1,00	1,40	ML
24	Espacio kodak	6,10			1,00	6,10	ML
25	Espacio kodak	2,60			1,00	2,60	ML
26	Espacio kodak	3,70			1,00	3,70	ML
27	Espacio kodak	1,85			1,00	1,85	ML
28	Espacio kodak	8,30			1,00	8,30	ML
29	Espacio kodak	1,40			1,00	1,40	ML
30	Espacio kodak	1,10			1,00	1,10	ML
31	Espacio kodak	1,15			1,00	1,15	ML
32	Espacio kodak	1,15			1,00	1,15	ML
OBSERVACIONES:				SUBTOTAL		123,25	ML
				TOTAL		123,25	ML

LOCALIZACIÓN PLANIMÉTRICA

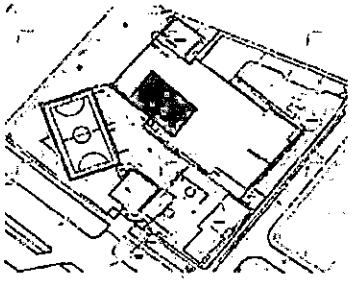


REGISTRO FOTOGRÁFICO




ARQ. ALEJANDRA BOLAÑOS
RESIDENTE CONTRATISTA

ARQ. NANCY AYALA
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

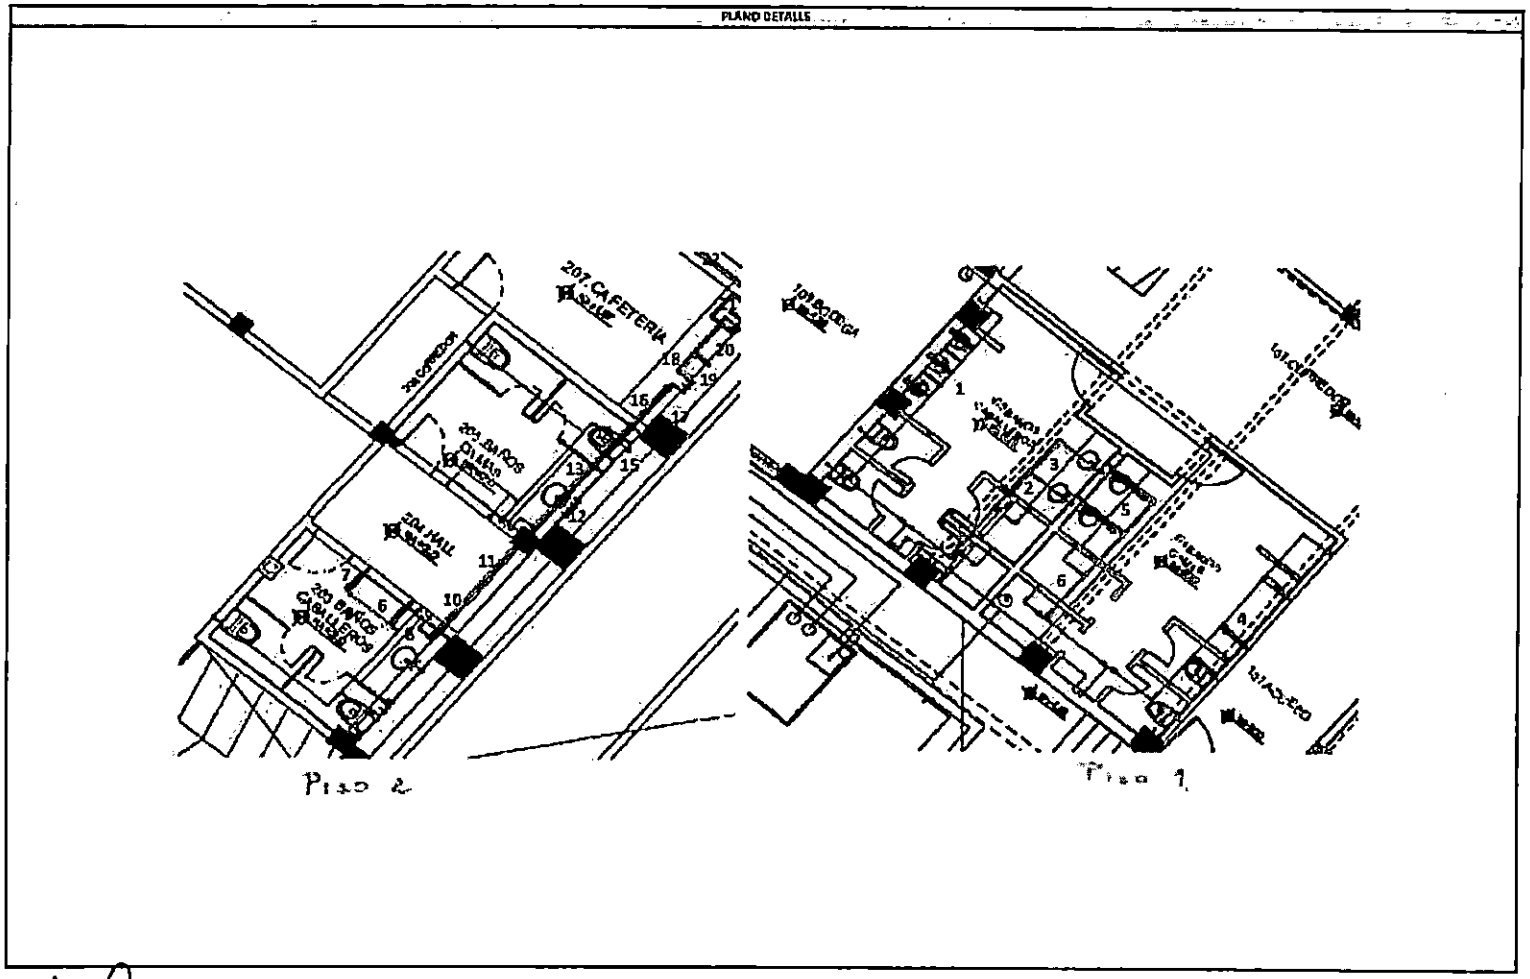

Anexo 8

PLANO DETALLE

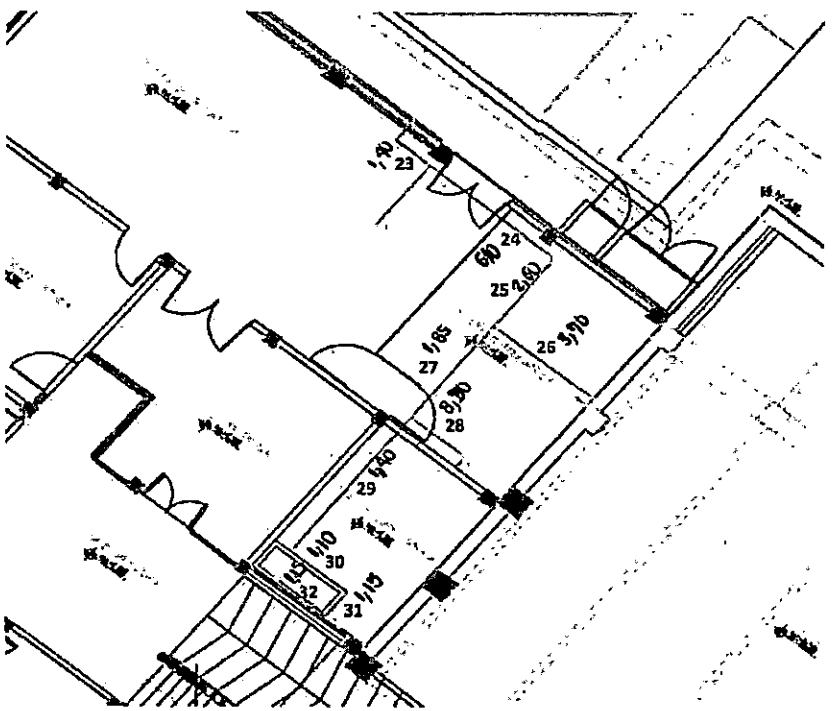

Alello

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. | BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS
SECRETARÍA GENERAL

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

PROYECTO: OBRAS SEDES ALCALDÍA

PRISMA — UNIVERSAL SEC S.A.S. — CONSORCIO PRUNI SEDES 04 — CONTRATISTA


ARQUITECTURA URBANA LTDA — INTERVENTORÍA

ACTA No.	7	PERIODO DEL ACTA	1/01/2020	A	30/01/2020	
OBJETO	REALIZAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE AJUSTE LAS DIFERENTES OBRAS E INTERVENCIONES ESPECIALIZADAS PARA LAS DIFERENTES SEDES DE LA SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C.					
CONTRATO DE OBRA No	781-2019	CONTRATISTA	CONSORCIO PRUNI SEDES 04	ENTIDAD CONTRATANTE	SECRETARIA GENERAL ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA	
CONTRATO INTERVENTORÍA	730 DE 2019	INTERVENTORÍA	ARQUITECTURA URBANA LTDA	FRENTE	IMPRENTA DISTRITAL	


CAPITULO	1.2.0	RED DE SUMINISTRO	ITEM	1.2.0.2	TUBERIA PVC-P RDE 11 3/4"	UNIDAD	ML

ITEM	LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	TOTAL	UNIDAD
	Entre los ejes 5"-1" y A-J						
1	Baños de hombres Piso 1	2,5			1,00	3,00	ML
2	Baños de hombres Piso 1	1,30			1,00	1,30	ML
3	Baños de hombres Piso 1	1,30			1,00	1,30	ML
4	Baños de hombres Piso 1	1,30			1,00	1,30	ML
5	Baños de hombres Piso 1	1,50			1,00	1,50	ML
6	Baños de mujeres Piso 1	2,50			1,00	2,50	ML
7	Baños de mujeres Piso 1	1,30			1,00	1,30	ML
8	Baños de mujeres Piso 1	1,30			1,00	1,30	ML
9	Baños de mujeres Piso 1	1,30			1,00	1,30	ML
10	Baños de mujeres Piso 1	1,50			1,00	1,50	ML
11	Baños de hombres Piso 2	1,70			1,00	1,70	ML
12	Baños de hombres Piso 2	2,20			1,00	2,20	ML
13	Baños de hombres Piso 2	2,40			1,00	2,40	ML
14	Baños de mujeres Piso 2	0,50			1,00	0,50	ML
15	Cafeteria	2,40			1,00	2,40	ML
16	Cafeteria	1,10			1,00	1,10	ML
17	Cafeteria	1,50			1,00	1,50	ML
OBSERVACIONES:				SUBTOTAL		28,10	ML
				TOTAL		28,10	ML

LOCALIZACIÓN PLANIMÉTRICA

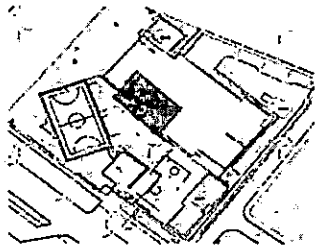


REGISTRO FOTOGRÁFICO

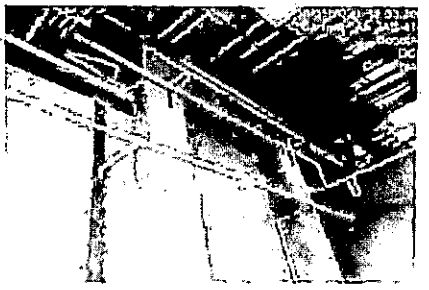

ARQ. ALEJANDRA BOLAÑOS
RESIDENTE CONTRATISTA

ARQ. NANCY AYALA
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

PLANO DETALLE

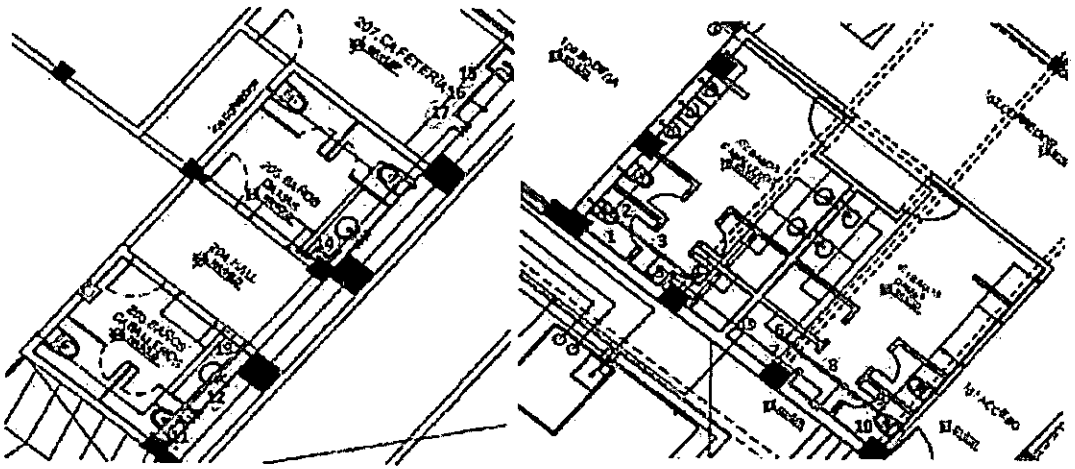

Piso 2.

Piso 1

Tubería 3/4"

Alg 3

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA GENERAL | BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

PROYECTO: OBRAS SEDES ALCALDÍA

PRISMA UNIVERSAL SEC S.A.S. — CONSORCIO PRUNI SEDES 04 — CONTRATISTA


ARQUITECTURA URBANA LTDA — INTERVENTORÍA

ACTA No.	7	PERIODO DEL ACTA	1/01/2020	A	30/01/2020	
OBJETO	REALIZAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE AJUSTE LAS DIFERENTES OBRAS E INTERVENCIONES ESPECIALIZADAS PARA LAS DIFERENTES SEDES DE LA SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C.					
CONTRATO DE OBRA No	731-2019	CONTRATISTA	CONSORCIO PRUNI SEDES 04	ENTIDAD CONTRATANTE	SECRETARIA GENERAL-ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA	
CONTRATO INTERVENTORÍA	730 DE 2019	INTERVENTORÍA	ARQUITECTURA URBANA LTDA	FRENTE:	IMPRENTA DISTRITAL	

CAPITULO	1.2.0	RED DE SUMINISTRO	ITEM	1.2.0.3	TUBERIA PVC-P RDE 13,5 1"	UNIDAD	ML

ITEM	LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	TOTAL	UNIDAD
	Entre los ejes 5'-1' y A-I						
1	Baños de hombres Piso 1	1,00			1,00	1,00	ML
2	Baños de hombres Piso 1	1,00			1,00	1,00	ML
3	Baños de hombres Piso 1	1,40			1,00	1,40	ML
4	Baños de hombres Piso 1	2,00			1,00	2,00	ML
5	Baños de mujeres Piso 1	1,00			1,00	1,00	ML
6	Baños de mujeres Piso 1	1,00			1,00	1,00	ML
7	Baños de mujeres Piso 1	1,40			1,00	1,40	ML
8	Baños de mujeres Piso 1	2,00			1,00	2,00	ML
9	Baños de hombres Piso 2	4,90			1,00	4,90	ML
10	Baños de hombres Piso 2	1,00			1,00	1,00	ML
11	Baños de hombres Piso 2	2,80			1,00	2,80	ML
12	Baños de hombres Piso 2	4,10			1,00	4,10	ML

PLANO DETALLE

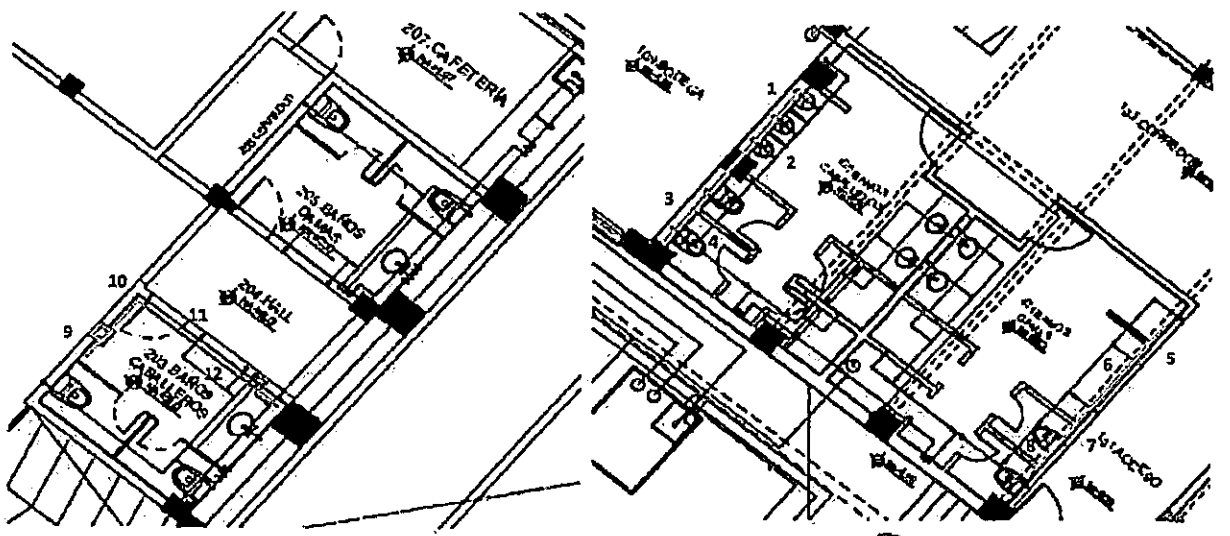

Piso 2.

Piso 1

Tubería 1ª

A 4.15

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. | BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS
SECRETARÍA GENERAL

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

PROYECTO: OBRAS SEDES ALCALDÍA

PRISMA | UNIVERSALSEC S.A.S. CONSORCIO PRUNI SEDES 04 — CONTRATISTA
ARQUITECTURA URBANA LTDA. — INTERVENTORÍA


ACTA No.	7	PERIODO DEL ACTA	1/01/2020	A	30/01/2020
OBJETO	REALIZAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE AJUSTE LAS DIFERENTES OBRAS E INTERVENCIONES ESPECIALIZADAS PARA LAS DIFERENTES SEDES DE LA SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C.				
CONTRATO DE OBRA No	731-2019	CONTRATISTA	CONSORCIO PRUNI SEDES 04	ENTIDAD CONTRATANTE	SECRETARIA GENERAL-ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA
CONTRATO INTERVENTORÍA	730 DE 2019	INTERVENTORÍA	ARQUITECTURA URBANA LTDA	FRENTE:	IMPRENTA DISTRITAL

CAPITULO	1.2.0	RED DE SUMINISTRO	ITEM	1.2.0.4	TUBERÍA PVC-P RDE 21 1 1/4"	UNIDAD	ML

ITEM	LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	TOTAL	UNIDAD
	Entre los ejes 5'-1' y A-J						
1	Baño hombre Primer piso	1,9			1,00	1,90	ML
2	Baño hombre Primer piso	2,90			1,00	2,90	ML
3	Baño hombre Primer piso	3,52			1,00	3,52	ML
4	Baño hombre Primer piso	2,82			1,00	2,82	ML
5	Baño hombre Primer piso	2,00			1,00	2,00	ML
6	Baño mujeres Primer piso	1,90			1,00	1,90	ML
7	Baño mujeres Primer piso	2,90			1,00	2,90	ML
8	Baño mujeres Primer piso	3,52			1,00	3,52	ML
9	Baño mujeres Primer piso	2,82			1,00	2,82	ML
10	Baño mujeres Primer piso	2,00			1,00	2,00	ML
11	Baño mujeres Primer piso	3,00			1,00	3,00	ML
12	Sube segundo piso	4,00			1,00	4,00	ML
13	Sube segundo piso	1,70			1,00	1,70	ML
				SUBTOTAL		34,98	ML
				TOTAL		34,98	ML

OBSERVACIONES:

LOCALIZACIÓN PLANIMÉTRICA

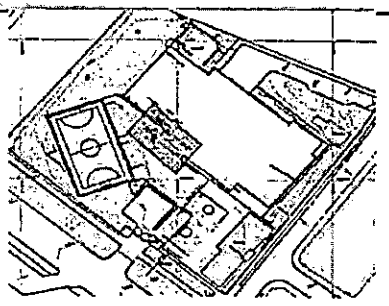


REGISTRO FOTOGRÁFICO



Alejandra Bolaños
ARQ. ALEJANDRA BOLAÑOS
RESIDENTE CONTRATISTA

Nancy Rocío Ayala Gomez
ARQ. NANCY AYALA
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

PIANO DETALLE

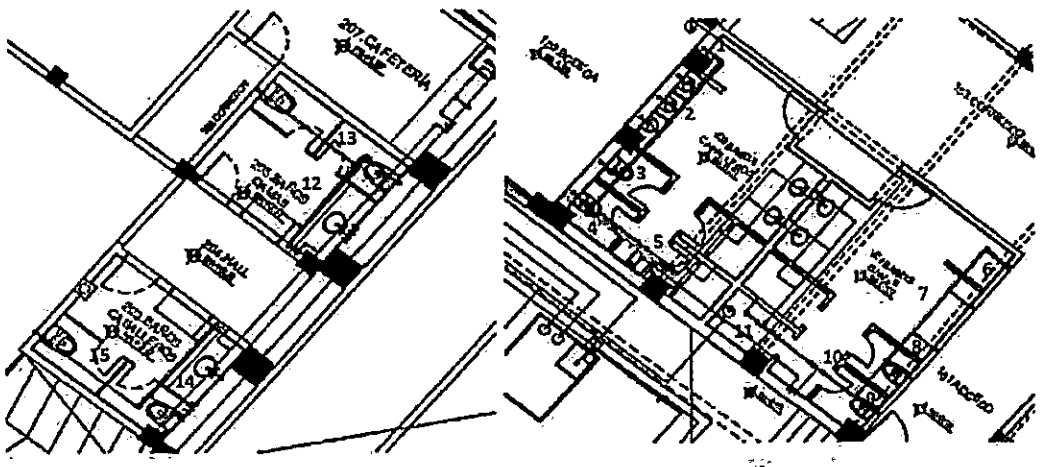
207 CAFETERIA
207 BAGNO
207 HALL
207 BAGNO
12
13
14
15
1
2
3
5
7
10
VIA ROMA
VIA CORRIDONI
VIA DANTE
VIA GIOVANNI
VIA GIOVANNI
VIA GIOVANNI

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE HACIENDA | BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

PROYECTO: OBRAS SEDES ALCALDÍA

PRISMA — UNIVERSAL SEC S.A.S. — CONSORCIO PRUNI SEDES 04 — CONTRATISTA

ARQUITECTURA URBANA LTDA — INTERVENTORÍA


ACTA No.	7		PERIODO DEL ACTA	1/01/2020	A	30/01/2020	
OBJETO	REALIZAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE AJUSTE LAS DIFERENTES OBRAS E INTERVENCIONES ESPECIALIZADAS PARA LAS DIFERENTES SEDES DE LA SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C.						
CONTRATO DE OBRA No	731-2019	CONTRATISTA	CONSORCIO PRUNI SEDES 04		ENTIDAD CONTRATANTE	SECRETARIA GENERAL-ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA	
CONTRATO INTERVENTORÍA	730 DE 2019	INTERVENTORÍA	ARQUITECTURA URBANA LTDA		FRENTE:	IMPRENTA DISTRITAL	

CAPITULO:	1.2.0	RED DE SUMINISTRO	ITEM	1.2.0.5	TUBERÍA PVC-P RDE 21 1 1/2"	UNIDAD	ML


ITEM	LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	TOTAL	UNIDAD
	Entre los ejes 5'-1' y A-J						
1	Baño hombres Piso 1	3,8			1,00	3,80	ML
2	Baño hombres Piso 1	3,20			1,00	3,20	ML
3	Baño mujeres Piso 0	4,50			1,00	4,50	ML
4	Baño mujeres Piso 1	3,80			1,00	3,80	ML
				SUBTOTAL		15,30	ML
				TOTAL		15,30	ML

OBSERVACIONES:

LOCALIZACIÓN PLANIMÉTRICA

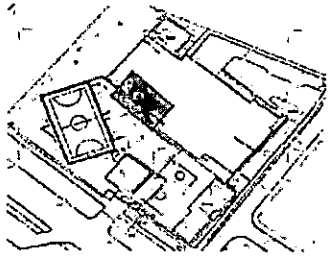

REGISTRO FOTOGRÁFICO

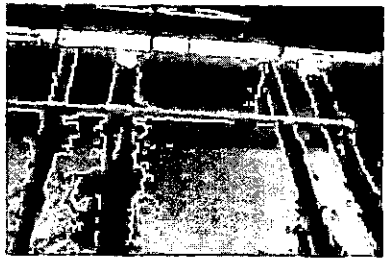


Alejandra Bolaños T

ARQ. ALEJANDRA BOLAÑOS
RESIDENTE CONTRATISTA

Nancy Rocío Ayala Gómez

ARQ. NANCY AYALA
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

PLANO DETALLE

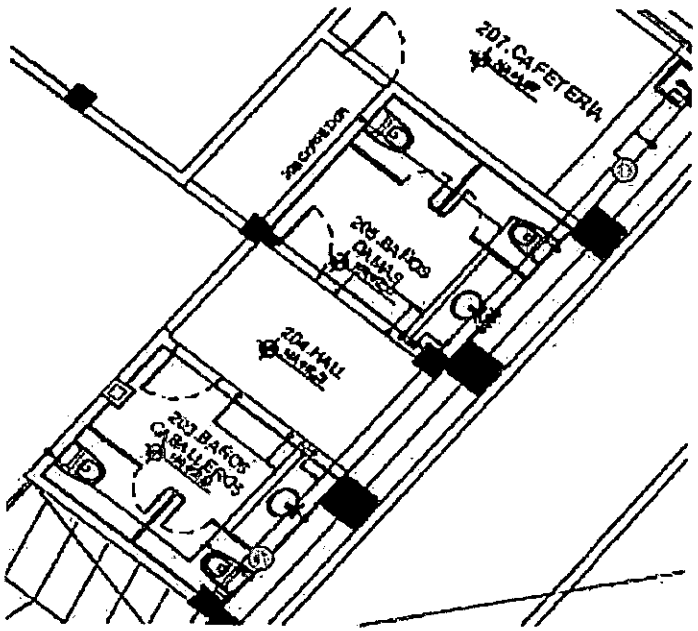

Piso 2

Ale Bb

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA GENERAL | BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

PROYECTO: OBRAS SEDES ALCALDÍA

PRISMA — UNIVERSAL SEC S.A.S. — CONSORCIO PRUNI SEDES 04 — CONTRATISTA


ARQUITECTURA URBANA LTDA — INTERVENTORÍA

ACTA No.	7	PERIODO DEL ACTA	1/01/2020 -	A	30/01/2020
OBJETO	REALIZAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE AJUSTE LAS DIFERENTES OBRAS E INTERVENCIONES ESPECIALIZADAS PARA LAS DIFERENTES SEDES DE LA SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C.				
CONTRATO DE OBRA No.	731-2019	CONTRATISTA	CONSORCIO PRUNI SEDES 04	ENTIDAD CONTRATANTE	SECRETARIA GENERAL-ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA
CONTRATO INTERVENTORÍA	730 DE 2019	INTERVENTORÍA	ARQUITECTURA URBANA LTDA	FRENTE:	IMPRENTA DISTRITAL

CAPITULO	1.2.0	RED DE SUMINISTRO	ITEM	1.2.0.5	TUBERÍA PVC-P RDE 21 2"	UNIDAD	ML

ITEM	LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	TOTAL	UNIDAD
	Entre los ejes 5'-1' y A-J						
1	Baño hombres Piso 1	2,4			1,00	2,40	ML
2	Baño hombres Piso 1	4,00			1,00	4,00	ML
	Entre los ejes 3'-5' y E-G	2,50			1,00	2,50	ML
3	Baño hombres Piso 2	2,50			1,00	2,50	ML

PLANO DETALLE

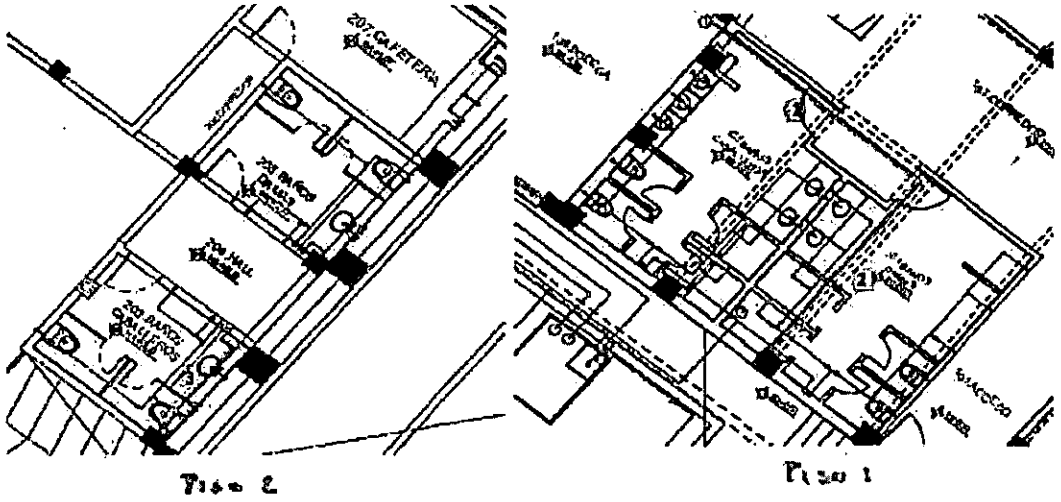

Tubería 2"

A6.18

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA GENERAL | BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

PROYECTO: OBRAS SEDES ALCALDÍA

PRISMA UNIVERSAL SEC S.A.S. CONSORCIO PRUNI SEDES 04 — CONTRATISTA

ARQUITECTURA URBANA LTDA — INTERVENTORÍA


ACTA No.	7			PERIODO DEL ACTA	1/01/2020	A	30/01/2020
OBJETO	REALIZAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE AJUSTE LAS DIFERENTES OBRAS E INTERVENCIONES ESPECIALIZADAS PARA LAS DIFERENTES SEDES DE LA SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C.						
CONTRATO DE OBRA No	731-2019	CONTRATISTA	CONSORCIO PRUNI SEDES 04		ENTIDAD CONTRATANTE	SECRETARIA GENERAL-ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA	
CONTRATO INTERVENTORÍA	730 DE 2019	INTERVENTORÍA	ARQUITECTURA URBANA LTDA		FRENTE:	IMPRENTA DISTRITAL	

CAPITULO		1.2.0	RED DE SUMINISTRO		ITEM	1.2.0.7	ACCESORIO PVC PRESIÓN 1/2"	UNIDAD	UN

ITEM	LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	TOTAL	UNIDAD
	Entre los ejes 5'-1' y A-J						
1	Baño hombres piso 1				36,00	36,00	UND
2	Baño mujeres piso 1				36,00	36,00	UND
	Entre los ejes 3'-5' y E-G						
1	Baño hombres piso 2				16,00	16,00	UND
2	Cafeteria piso 2				24,00	24,00	UND
	SUBTOTAL					112,00	UN
	TOTAL					112,00	UN

OBSERVACIONES:

LOCALIZACIÓN PLANIMÉTRICA

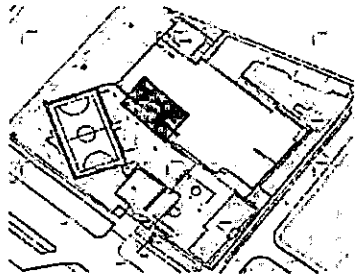

REGISTRO FOTOGRÁFICO




ARQ. ALEJANDRA BOLAÑOS
RESIDENTE CONTRATISTA

ARQ. NANCY AYALA
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

182

102

PLANO DETALLE

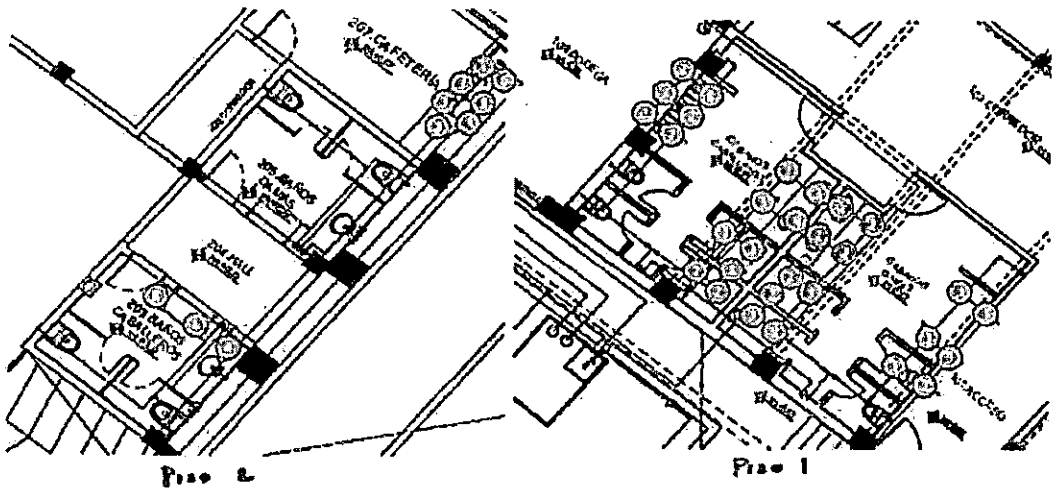

Acceso V/a"

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. | BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS
SECRETARÍA DE NEGRAL

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

PROYECTO: OBRAS SEDES ALCALDÍA

PRISMA UNIVERSAL SEC S.A.S. — CONSORCIO PRUNI SEDES 04 — CONTRATISTA
ARQUITECTURA URBANA LTDA — INTERVENTORÍA


ACTA No.	7		PERIODO DE LA ACTA	1/01/2020	A	30/01/2020	
OBJETO	REALIZAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE AJUSTE LAS DIFERENTES OBRAS E INTERVENCIONES ESPECIALIZADAS PARA LAS DIFERENTES SEDES DE LA SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C.						
CONTRATO DE OBRA No	731-2019	CONTRATISTA	CONSORCIO PRUNI SEDES 04		ENTIDAD CONTRATANTE	SECRETARIA GENERAL-ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA	
CONTRATO INTERVENTORÍA	730 DE 2019	INTERVENTORÍA	ARQUITECTURA URBANA LTDA		FRENTE:	IMPRENTA DISTRITAL	

CAPITULO	1.2.0	RED DE SUMINISTRO	ITEM	1.2.0.8	ACCESORIO PVC PRESIÓN 3/4"	UNIDAD	UN

ITEM	LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	TOTAL	UNIDAD
	Entre los ejes 5'-1' y A-J						
1	Baño hombres piso 1				14,00	14,00	UN
2	Baño mujeres piso 1				15,00	15,00	UN
				SUBTOTAL		29,00	UN
				TOTAL		29,00	UN

OBSERVACIONES:

LOCALIZACIÓN PLANIMÉTRICA

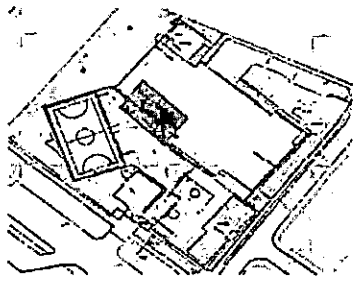


REGISTRO FOTOGRÁFICO



ARQ. ALEJANDRA BOLAÑOS
RESIDENTE CONTRATISTA

ARQ. NANCY AYALA
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

PLANO DETALLE

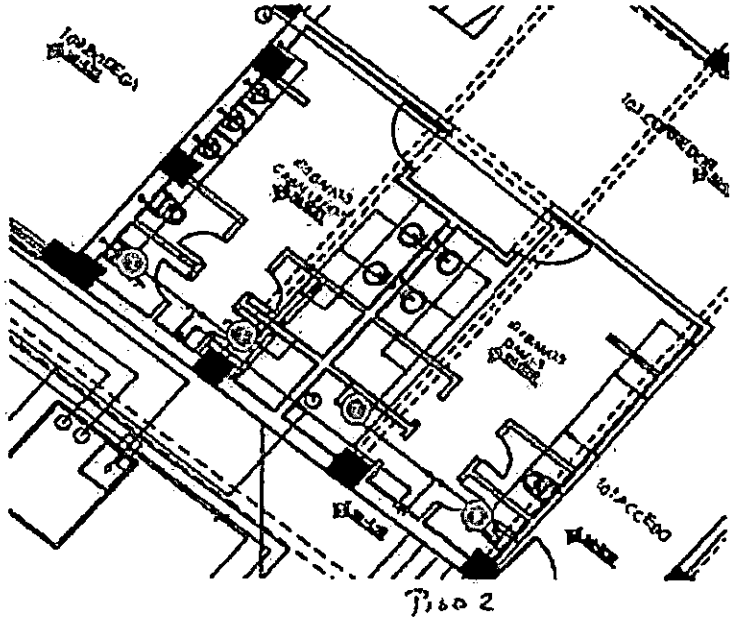

A1c8

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. | BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS
SECRETARÍA GENERAL

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

PROYECTO: OBRAS SEDES ALCALDÍA

PRISMA UNIVERSAL SEC S.A.S. — CONSORCIO PRUNI SEDES 04 — CONTRATISTA

ARQUITECTURA URBANA LTDA — INTERVENTORÍA


ACTA No.	7		PERIODO DEL ACTA	1/01/2020	A	30/01/2020	
OBJETO	REALIZAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE AJUSTE LAS DIFERENTES OBRAS E INTERVENCIONES ESPECIALIZADAS PARA LAS DIFERENTES SEDES DE LA SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C.						
CONTRATO DE OBRA No	731-2019	CONTRATISTA	CONSORCIO PRUNI SEDES 04		ENTIDAD CONTRATANTE	SECRETARIA GENERAL-ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA	
CONTRATO INTERVENTORÍA	730 DE 2019	INTERVENTORÍA	ARQUITECTURA URBANA LTDA		FRENTE:	IMPRENTA DISTRITAL	

CAPÍTULO:	1.2.0	RED DE SUMINISTRO	ITEM	1.2.0.9	ACCESORIO PVC PRESIÓN 1"	UNIDAD	UN


ITEM	LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	TOTAL	UNIDAD
	Entre los ejes 5'-1' y A-J						
1	Baño hombres piso 1				14,00	14,00	UN
2	Baño mujeres piso 1				14,00	14,00	UN
				SUBTOTAL		28,00	UN
				TOTAL		28,00	UN

OBSERVACIONES:

LOCALIZACIÓN PLANIMÉTRICA

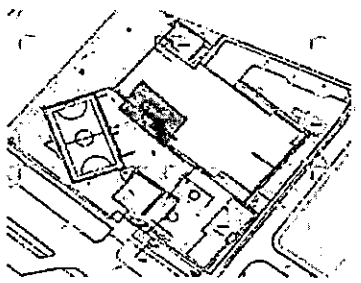

REGISTRO FOTOGRÁFICO

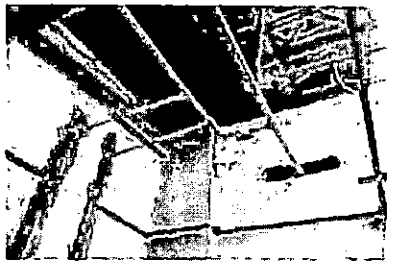


ARQ. ALEJANDRA BOLAÑOS
RESIDENTE CONTRATISTA

ARQ. NANCY AYALA
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

184

901

PIANO DETALLE

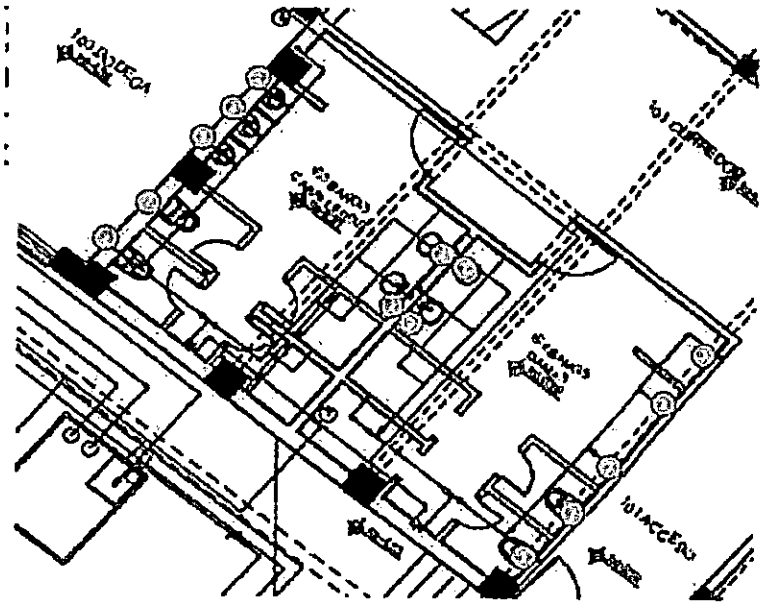

Piano 1

NdP

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA GENERAL | BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

PROYECTO: OBRAS SEDES ALCALDÍA

PRISMA UNIVERSAL SEC S.A.S. CONSORCIO PRUNI SEDES 04 — CONTRATISTA

ARQUITECTURA URBANA LTDA — INTERVENTORÍA


ACTA No.	7		PERIODO DEL ACTA	1/01/2020	A	30/01/2020	
OBJETO	REALIZAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE AJUSTE LAS DIFERENTES OBRAS E INTERVENCIONES ESPECIALIZADAS PARA LAS DIFERENTES SEDES DE LA SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C.						
CONTRATO DE OBRA No	731-2019	CONTRATISTA	CONSORCIO PRUNI SEDES 04		ENTIDAD CONTRATANTE	SECRETARIA GENERAL-ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA	
CONTRATO INTERVENTORÍA	730 DE 2019	INTERVENTORÍA	ARQUITECTURA URBANA LTDA		FRENTE:	IMPRENTA DISTRITAL	

CAPITULO	1.2.0	RED DE SUMINISTRO	ITEM	1.2.0.10	ACCESORIO PVC PRESIÓN 1 1/4"	UNIDAD	UN


ITEM	LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	TOTAL	UNIDAD
	Entre los ejes 5'-1' y A-J						
1	Baño hombres piso 1				13,00	13,00	UND
2	Baño mujeres piso 1				7,00	7,00	UND
	Entre los ejes 3'-5' y E-G						
1	Baño hombres piso 2				14,00	14,00	UND
2	Baño mujeres piso 2				9,00	9,00	UND
	SUBTOTAL					43,00	UN
	TOTAL					43,00	UN

OBSERVACIONES:

LOCALIZACIÓN PLANIMÉTRICA

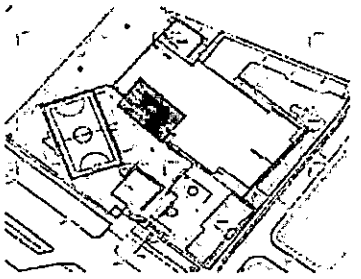


REGISTRO FOTOGRÁFICO

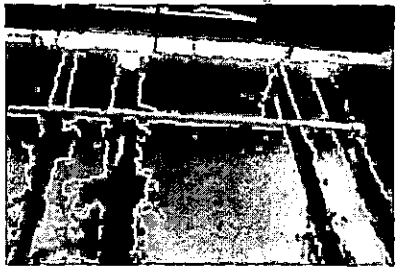

ARQ. ALEJANDRA BOLAÑOS
RESIDENTE CONTRATISTA

ARQ. NANCY AYALA
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

PLANO DETALLE

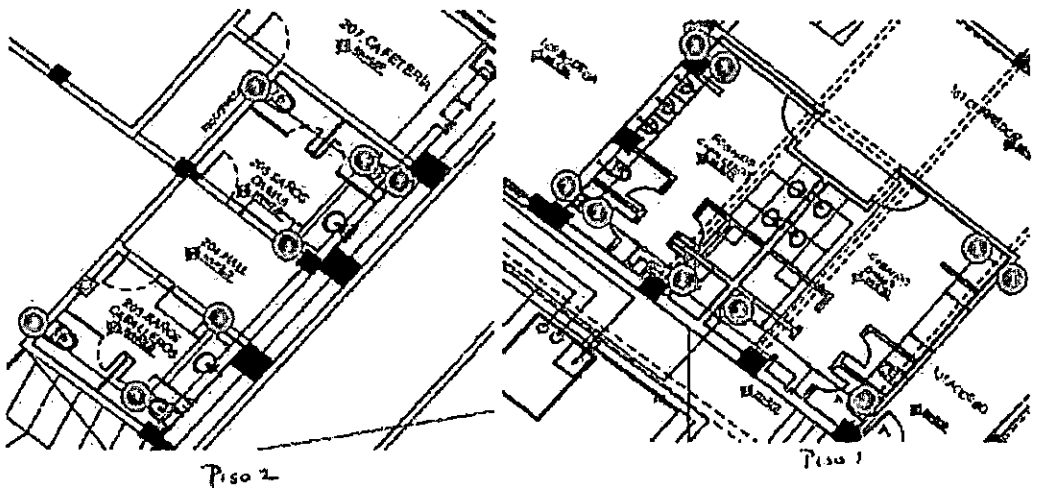

Acceso 1/16"

Alef

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA GENERAL | BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

PROYECTO: OBRAS SEDES ALCALDÍA


PRISMA | UNIVERSAL SEC S.A.S. — CONSORCIO PRUNI SEDES 04 — CONTRATISTA | ARQUITECTURA URBANA LTDA — INTERVENTORÍA

ACTA No.	7		PERIODO DEL ACTA	1/01/2020	A	30/01/2020	
OBJETO	REALIZAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE AJUSTE LAS DIFERENTES OBRAS E INTERVENCIONES ESPECIALIZADAS PARA LAS DIFERENTES SEDES DE LA SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C.						
CONTRATO DE OBRA No	731-2019	CONTRATISTA	CONSORCIO PRUNI SEDES 04		ENTIDAD CONTRATANTE	SECRETARIA GENERAL-ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA	
CONTRATO INTERVENTORÍA	730 DE 2019	INTERVENTORÍA	ARQUITECTURA URBANA LTDA		FRENTE:	IMPRENTA DISTRITAL	


CAPITULO	1.2.0	RED DE SUMINISTRO	ITEM	1.2.0.11	ACCESORIO PVC PRESIÓN 1 1/2"	UNIDAD	UN

ITEM	LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	TOTAL	UNIDAD
	Entre los ejes 5'-1' y A-J						
1	Baño hombres piso 1				12,00	12,00	UND
2	Baño mujeres piso 1				11,00	11,00	UND
	Entre los ejes 3'-5' y E-G						
1	Baño hombres piso 2				4,00	4,00	UND
2	Baño mujeres piso 2				4,00	4,00	UND
OBSERVACIONES:				SUBTOTAL		31,00	UN
				TOTAL		31,00	UN

LOCALIZACIÓN PLANIMÉTRICA

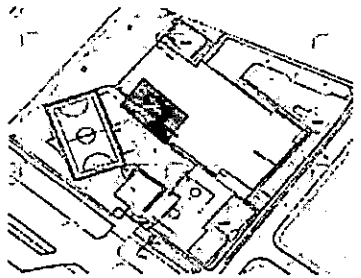


REGISTRO FOTOGRÁFICO

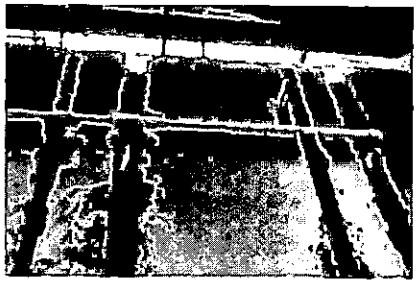

ARQ. ALEJANDRA BOLAÑOS
RESIDENTE CONTRATISTA

ARQ. NANCY AYALA
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

PLANO DETALLE

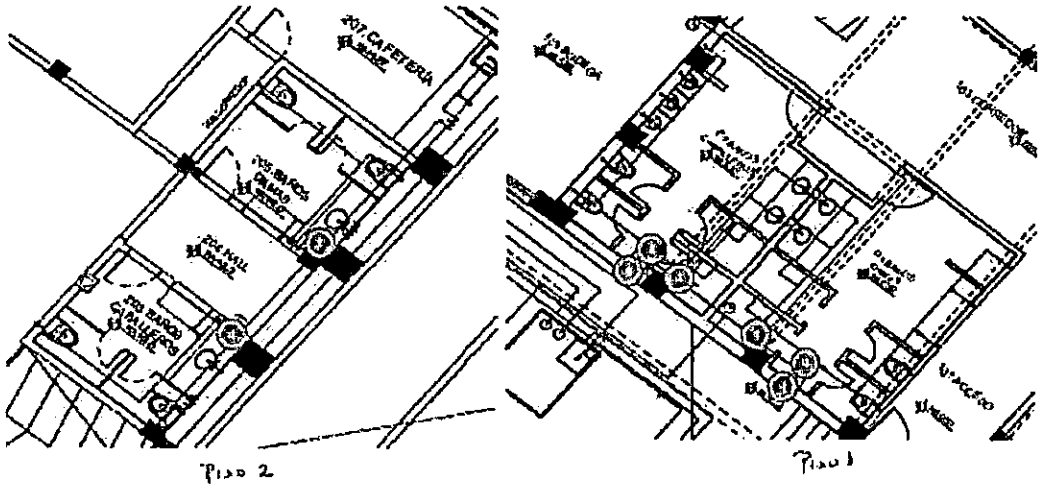

Accesorio 1½"

Ale P.

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE HACIENDA

BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

PROYECTO: OBRAS SEDES ALCALDÍA

PRISMA — UNIVERSAL SEC S.A.S. — CONSORCIO PRUNI SEDES 04 — CONTRATISTA

ARQUITECTURA URBANA LTDA — INTERVENTORÍA


ACTA No.	7	PERIODO DEL ACTA	1/01/2020	A	30/01/2020
OBJETO	REALIZAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE AJUSTE LAS DIFERENTES OBRAS E INTERVENCIONES ESPECIALIZADAS PARA LAS DIFERENTES SEDES DE LA SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C.				
CONTRATO DE OBRA No	731-2019	CONTRATISTA	CONSORCIO PRUNI SEDES 04	ENTIDAD CONTRATANTE	SECRETARIA GENERAL-ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA
CONTRATO INTERVENTORÍA	730 DE 2019	INTERVENTORÍA	ARQUITECTURA URBANA LTDA	FRENTE:	IMPRENTA DISTRITAL

CAPITULO:	1.2.0	RED DE SUMINISTRO	ITEM	1.2.0.12	ACCESORIO PVC PRESIÓN 2"	UNIDAD	UN


ITEM	LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES LARGO	DIMENSIONES ANCHO	DIMENSIONES ALTO	CANTIDAD	TOTAL	UNIDAD
	Entre los ejes 5'-1' y A-J						
1	Baño hombres piso 1				4,00	4,00	UND
2	Baño mujeres piso 1				2,00	2,00	UND
	Entre los ejes 3'-5' y E-G						
1	Baño hombres piso 2				4,00	4,00	UND
	SUBTOTAL					10,00	UN
	TOTAL					10,00	UN

OBSERVACIONES:

LOCALIZACIÓN PLANIMÉTRICA

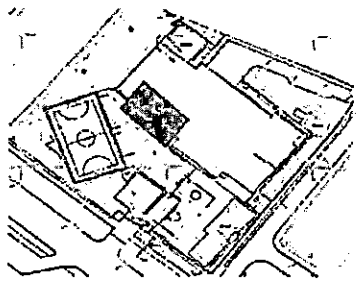


REGISTRO FOTOGRÁFICO



ARQ. ALEJANDRA BOLAÑOS
RESIDENTE CONTRATISTA

ARQ. NANCY AYALA
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

PLANO DETALLE

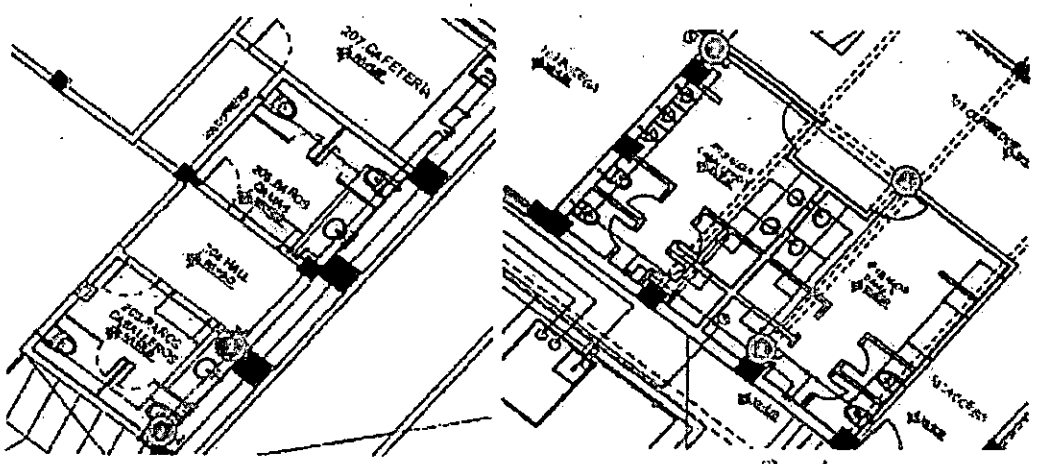

Acceso 2°

Alero

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA GENERAL | BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

PROYECTO: OBRAS SEDES ALCALDÍA

PRISMA — UNIVERSAL SEC S.A.S. — CONSORCIO PRUNI SEDES 04 — CONTRATISTA


ARQUITECTURA URBANA LTDA — INTERVENTORÍA

ACTA No.	7	PERIODO DEL ACTA	1/01/2020	A	30/01/2020	
OBJETO	REALIZAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE AJUSTE LAS DIFERENTES OBRAS E INTERVENCIONES ESPECIALIZADAS PARA LAS DIFERENTES SEDES DE LA SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C.					
CONTRATO DE OBRA No	731-2019	CONTRATISTA	CONSORCIO PRUNI SEDES 04	ENTIDAD CONTRATANTE	SECRETARIA GENERAL-ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA	
CONTRATO INTERVENTORÍA	730 DE 2019	INTERVENTORÍA	ARQUITECTURA URBANA LTDA	FRENTE:	IMPRENTA DISTRITAL	

CAPITULO	1.2.0	RED DE SUMINISTRO	ITEM	1.2.0.13	Registro Paso Directo 1/2"	UNIDAD	UN

ITEM	LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	TOTAL	UNIDAD
	Entre los ejes 5'-1' y A-J						
1	Espacio Kodak				2,00	2,00	UN
2	Cuarto de velado				1,00	1,00	UN
OBSERVACIONES:				SUBTOTAL		3,00	UN
				TOTAL		3,00	UN

LOCALIZACIÓN PLANIMÉTRICA

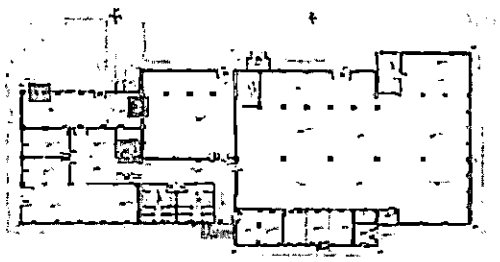

REGISTRO FOTOGRÁFICO




ARQ. ALEJANDRA BOLAÑOS
RESIDENTE CONTRATISTA

ARQ. NANCY AYALA
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

188

114

PLANO DETALLE

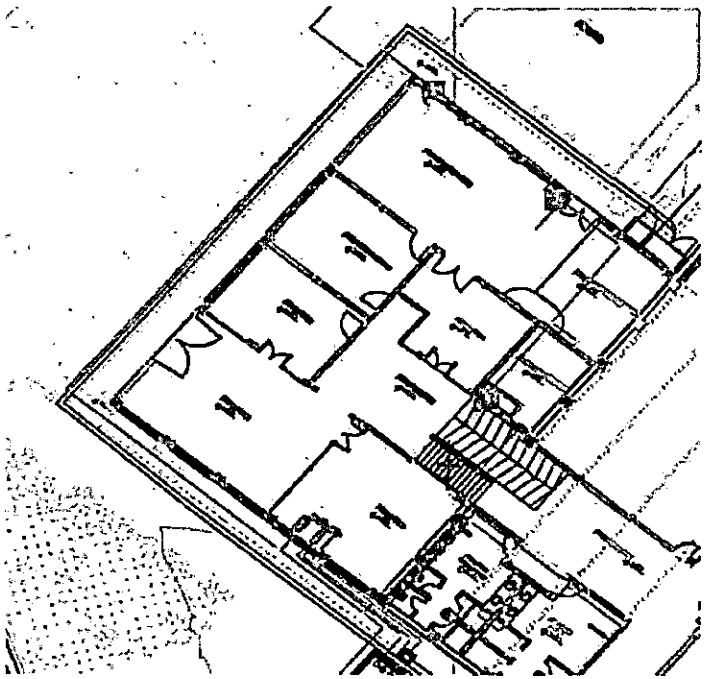

Ale

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA GENERAL | BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

PROYECTO: OBRAS SEDES ALCALDÍA

PRISMA — UNIVERSAL SEC S.A.S. — CONSORCIO PRISMA SEDES 04 — CONTRATISTA

ARQUITECTURA URBANA LTDA — INTERVENTORÍA


ACTA No.	7		PERIODO DEL ACTA	1/01/2020	A	30/01/2020
OBJETO	REALIZAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE AJUSTE LAS DIFERENTES OBRAS E INTERVENCIONES ESPECIALIZADAS PARA LAS DIFERENTES SEDES DE LA SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C.					
CONTRATO DE OBRA No	731-2019	CONTRATISTA	CONSORCIO PRUNI SEDES 04		ENTIDAD CONTRATANTE	SECRETARIA GENERAL-ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA
CONTRATO INTERVENTORÍA	730 DE 2019	INTERVENTORÍA	ARQUITECTURA URBANA LTDA		FRENTE:	IMPRENTA DISTRITAL

CAPITULO	1.2.0	RED DE SUMINISTRO	ITEM	1.2.0.14	Registro Paso Directo 3/4"	UNIDAD	UN

ITEM	LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	TOTAL	UNIDAD
	Entre los ejes 3'-5' y E-G						
1	Baño hombres 2do piso				3,00	3,00	UN
2	Baño mujeres 2do piso				1,00	1,00	UN
				SUBTOTAL		4,00	UN
				TOTAL		4,00	UN

OBSERVACIONES:

LOCALIZACIÓN PLANIMÉTRICA

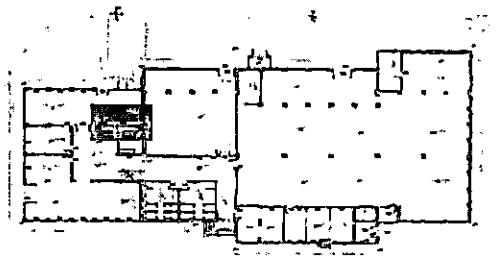

REGISTRO FOTOGRÁFICO




Alejandra Bolaños +

ARQ. ALEJANDRA BOLAÑOS
RESIDENTE CONTRATISTA

Nancy Rocio Ayala Gomez

ARQ. NANCY AYALA
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

PLANO DETALLE

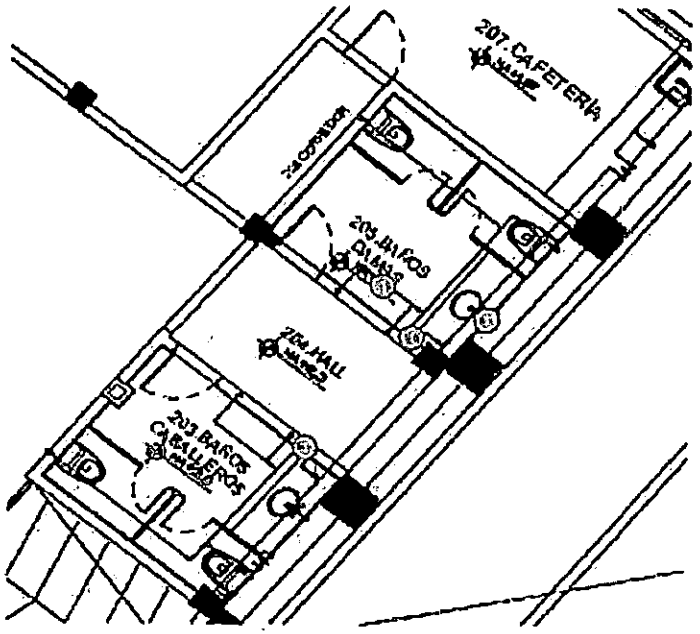

Piso 2.

A6P

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA GENERAL | BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

PROYECTO: OBRAS SEDES ALCALDÍA

PRISMA — UNIVERSAL SEC S.A.S. — CONSORCIO PRUM SEDES 04 — CONTRATISTA


ARQUITECTURA URBANA LTDA — INTERVENTORÍA

ACTA No.	7		PERIODO DEL ACTA	1/01/2020	A	30/01/2020	
OBJETO	REALIZAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE AJUSTE LAS DIFERENTES OBRAS E INTERVENCIONES ESPECIALIZADAS PARA LAS DIFERENTES SEDES DE LA SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C.						
CONTRATO DE OBRA No	731-2019	CONTRATISTA	CONSORCIO PRUM SEDES 04		ENTIDAD CONTRATANTE	SECRETARIA GENERAL-ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA	
CONTRATO INTERVENTORÍA	730 DE 2019	INTERVENTORÍA	ARQUITECTURA URBANA LTDA		FRENTE:	IMPRENTA DISTRITAL	

CAPITULO	1.2.0	RED DE SUMINISTRO	ITEM	1.2.0.17	Registro Paso Directo 1 1/2"	UNIDAD	UN

ITEM	LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	TOTAL	UNIDAD
	Segundo piso edificio administrativo						
1	Cafeteria				1,00	1,00	UN
2	Baño de mujeres				1,00	1,00	UN
OBSERVACIONES:				SUBTOTAL		2,00	UN
				TOTAL		2,00	UN

LOCALIZACIÓN PLANIMÉTRICA

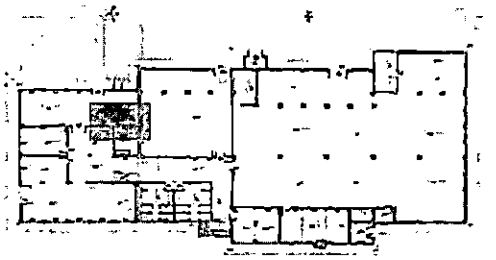

REGISTRO FOTOGRÁFICO



Alejandra Bolaños t

ARQ. ALEJANDRA BOLAÑOS
RESIDENTE CONTRATISTA


Nancy Rocio Ayala Gomez

ARQ. NANCY AYALA
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

090

118

PIANO DETAILE

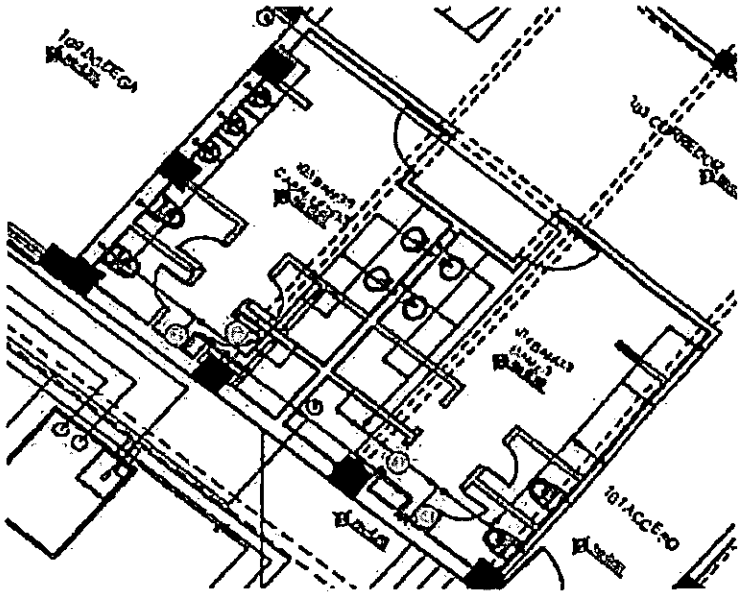

Piano 1

Allegato

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA GENERAL | BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

PROYECTO: OBRAS SEDES ALCALDÍA

PRISMA — UNIVERSAL SEC S.A.S. — CONSORCIO PRUMI SEDES 04 — CONTRATISTA


ARQUITECTURA URBANA LTDA — INTERVENTORÍA

ACTA No.	7	PERIODO DEL ACTA	1/01/2020	A	30/01/2020		
OBJETO	REALIZAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE AJUSTE LAS DIFERENTES OBRAS E INTERVENCIONES ESPECIALIZADAS PARA LAS DIFERENTES SEDES DE LA SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C.						
CONTRATO DE OBRA No	731-2019	CONTRATISTA	CONSORCIO PRUMI SEDES 04		ENTIDAD CONTRATANTE	SECRETARIA GENERAL-ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA	
CONTRATO INTERVENTORÍA	730 DE 2019	INTERVENTORÍA	ARQUITECTURA URBANA LTDA		FRENTE:	IMPRENTA DISTRITAL	


CAPITULO	1.2.0	RED DE SUMINISTRO	ITEM	1.2.0.19	ABRAZADERA 1/2"	UNIDAD	UN

ITEM	LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	TOTAL	UNIDAD
	Entre los ejes 5'-1' y A-J						
1	Baño hombres piso 1				5,00	5,00	UND
2	Baño mujeres piso 1				5,00	5,00	UND
	Entre los ejes 3'-5' y E-G						
1	Baño hombres piso 2				2,00	2,00	UND
	Baño mujeres piso 2				1,00	1,00	UND
OBSERVACIONES:				SUBTOTAL		13,00	UN
				TOTAL		13,00	UN

LOCALIZACIÓN PLANIMÉTRICA

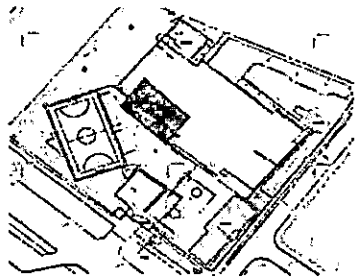

REGISTRO FOTOGRÁFICO

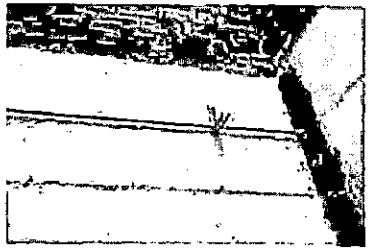


ARQ. ALEJANDRA BOLAÑOS
RESIDENTE CONTRATISTA

ARQ. NANCY AYALA
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

191

120

PLANO DETALLE

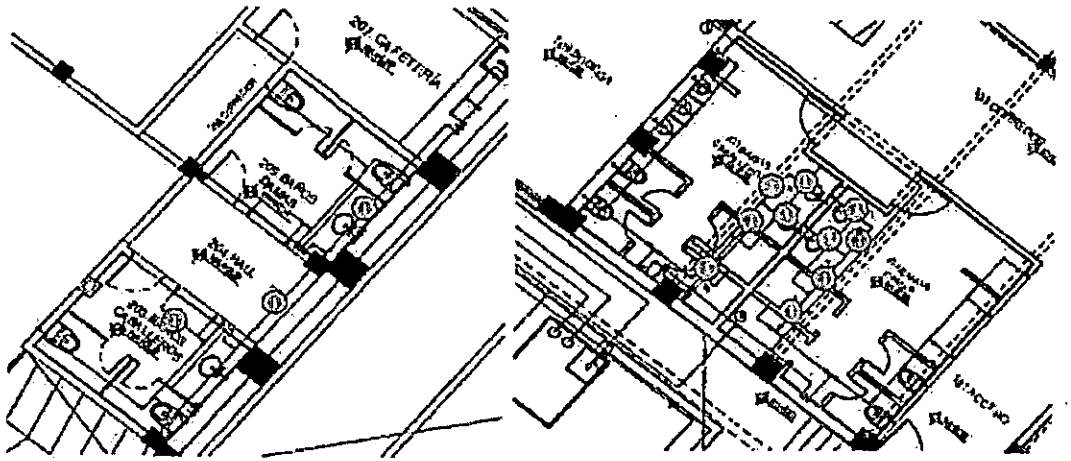

Almendra 1/2"

A6B

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA GENERAL | BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

PROYECTO: OBRAS SEDES ALCALDÍA

PRISMA UNIVERSAL SEC S.A.S. — CONSORCIO PRUMI SEDES 04 — CONTRATISTA

ARQUITECTURA URBANA LTDA — INTERVENTORÍA


ACTA No.	7		PERIODO DEL ACTA	1/01/2020	A	30/01/2020	
OBJETO	REALIZAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE AJUSTE LAS DIFERENTES OBRAS E INTERVENCIONES ESPECIALIZADAS PARA LAS DIFERENTES SEDES DE LA SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C.						
CONTRATO DE OBRA No	731-2019	CONTRATISTA	CONSORCIO PRUMI SEDES 04		ENTIDAD CONTRATANTE	SECRETARIA GENERAL-ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA	
CONTRATO INTERVENTORÍA	730 DE 2019	INTERVENTORÍA	ARQUITECTURA URBANA LTDA		FRENTE:	IMPRENTA DISTRITAL	

CAPITULO	1.Z.0	RED DE SUMINISTRO	ITEM	1.2.0.20	ABRAZADERA 3/4"	UNIDAD	UN


ITEM	LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	TOTAL	UNIDAD
	Entre los ejes 3'-5' y A-J						
1	Baño de hombres				1,00	1,00	UND
2	Baño de mujeres				1,00	1,00	UND
	Entre los ejes 5'-1' y E-G						
1	Cafeteria Piso 2				2,00	2,00	UND
2	Baño mujeres Piso 2				2,00	2,00	UND
	SUBTOTAL					6,00	UN
	TOTAL					6,00	UN

OBSERVACIONES:

LOCALIZACIÓN PLANIMÉTRICA

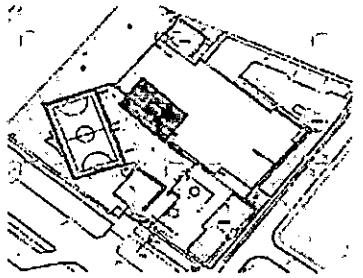

REGISTRO FOTOGRÁFICO

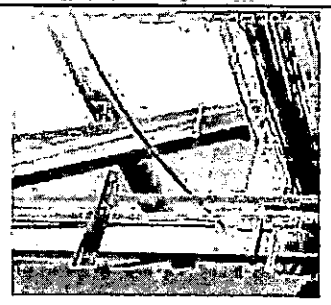

Alejandra Bolaños

ARQ. ALEJANDRA BOLAÑOS
RESIDENTE CONTRATISTA


Nancy Ayala Gomez

ARQ. NANCY AYALA
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

192

122

PIANO DETALLE

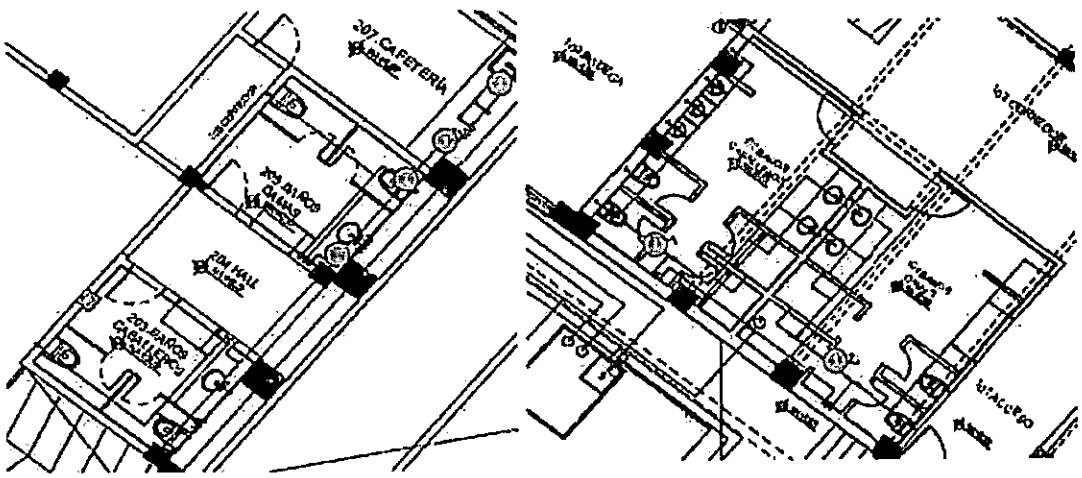

Abruzzo 3/9"

A6 B6

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. | BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS
SECRETARÍA GENERAL

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

PROYECTO: OBRAS SEDES ALCALDÍA

PRISMA — UNIVERSAL SEC S.A.S. — CONSORCIO PRUNI SEDES 04 — CONTRATISTA

ARQUITECTURA URBANA LTDA — INTERVENTORÍA


ACTA No.	7		PERIODO DEL ACTA	1/01/2020	A	30/01/2020	
OBJETO	REALIZAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE AJUSTE LAS DIFERENTES OBRAS E INTERVENCIONES ESPECIALIZADAS PARA LAS DIFERENTES SEDES DE LA SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C.						
CONTRATO DE OBRA No	731-2019	CONTRATISTA	CONSORCIO PRUNI SEDES 04		ENTIDAD CONTRATANTE	SECRETARIA GENERAL-ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA	
CONTRATO INTERVENTORÍA	730 DE 2019	INTERVENTORÍA	ARQUITECTURA URBANA LTDA		FRENTE:	IMPRENTA DISTRITAL	

CAPITULO	1.2.0	RED DE SUMINISTRO	ITEM	1.2.0.21	ABRAZADERA 1"	UNIDAD	UN


ITEM	LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	TOTAL	UNIDAD
	Entre los ejes 5'-1' y A-J						
1	Baño de hombres piso 1				2,00	2,00	UN
2	Baño de mujeres piso 1				3,00	3,00	UN
				SUBTOTAL		5,00	UN
				TOTAL		5,00	UN

OBSERVACIONES:

LOCALIZACIÓN PLANIMÉTRICA

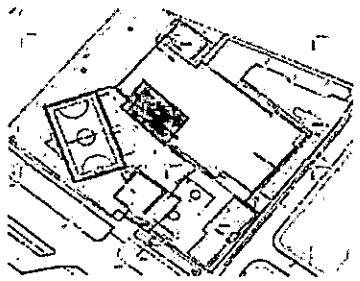

REGISTRO FOTOGRÁFICO

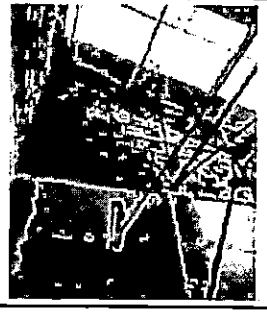

Alejandra Bolaños

ARQ. ALEJANDRA BOLAÑOS
RESIDENTE CONTRATISTA


Nancy Rocío Ayala Gómez

ARQ. NANCY AYALA
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

193

124

PLANO DETALLE

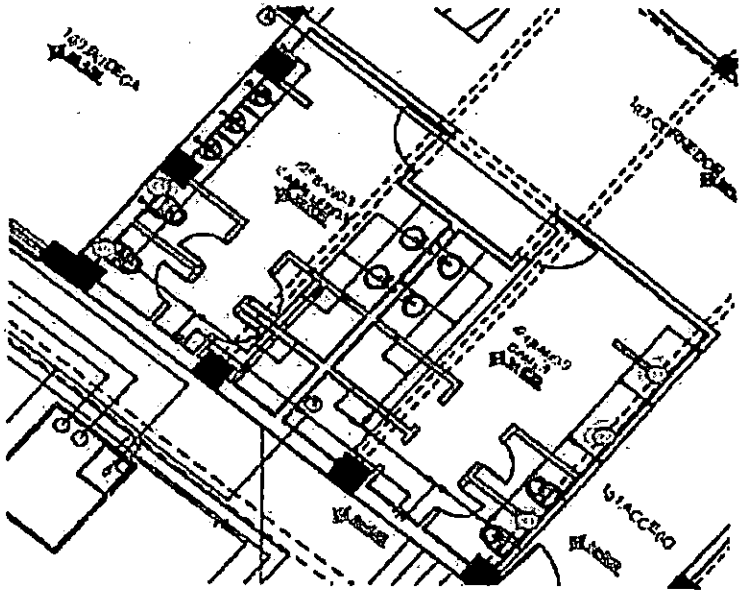
VIA RIVERA
VIA CIPRESDALE
GIARDINO
GIARDINO
GIARDINO

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. | BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

PROYECTO: OBRAS SEDES ALCALDÍA

PRISMA — UNIVERSAL SEC S.A.S. — CONSORCIO PRISMA SEDES D4 — CONTRATISTA

ARQUITECTURA URBANA LTDA — INTERVENTORÍA


ACTA No.	7	PERIODO DEL ACTA	1/01/2020	A	30/01/2020
OBJETO	REALIZAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE AJUSTE LAS DIFERENTES OBRAS E INTERVENCIONES ESPECIALIZADAS PARA LAS DIFERENTES SEDES DE LA SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C.				
CONTRATO DE OBRA No	731-2019	CONTRATISTA	CONSORCIO PRUNI SEDES D4	ENTIDAD CONTRATANTE	SECRETARIA GENERAL-ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA
CONTRATO INTERVENTORÍA	730 DE 2019	INTERVENTORÍA	ARQUITECTURA URBANA LTDA	FRENTE:	IMPRENTA DISTRITAL

CAPÍTULO:	1.2.0	RED DE SUMINISTRO	ITEM	1.2.0.22	ABRAZADERA 1 1/4"	UNIDAD	UN


ITEM	LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	TOTAL	UNIDAD
	Entre los ejes 3'-5' y A-J						
1	Baño de hombres piso 1				1,00	1,00	UN
2	Baño de mujeres piso 1				1,00	1,00	UN
	Entre los ejes 5'-1' y E-G						
1	Baño hombres Piso 2				1,00	1,00	UN
	SUBTOTAL					3,00	UN
	TOTAL					3,00	UN

OBSERVACIONES:

LOCALIZACIÓN PLANIMÉTRICA

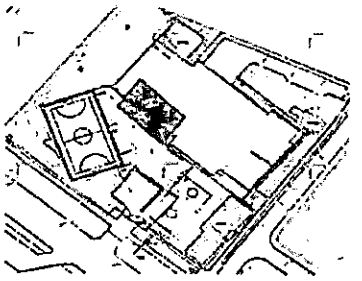

REGISTRO FOTOGRÁFICO

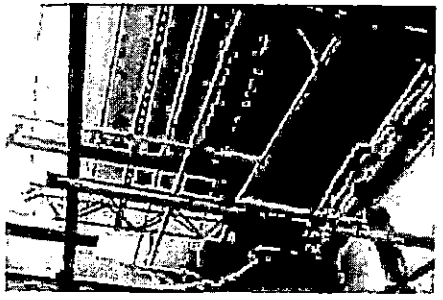


ARQ. ALEJANDRA BOLAÑOS
RESIDENTE CONTRATISTA

ARQ. NANCY AYALA
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

194

126

PLANO DETALLE

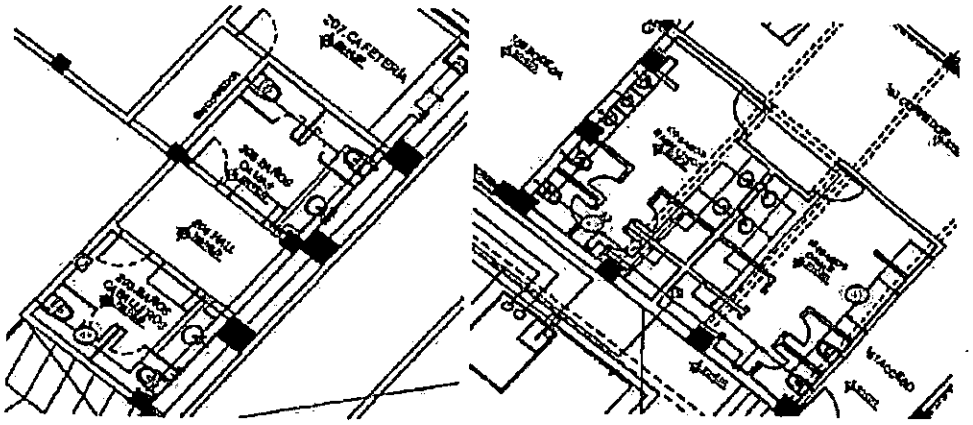

Abrazadera 1/4"

Alan

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA GENERAL

BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

PROYECTO: OBRAS SEDES ALCALDÍA

PRISMA — UNIVERSAL SEC S.A.S. — CONSORCIO PRUNI SEDES 04 — CONTRATISTA

ARQUITECTURA URBANA LTDA — INTERVENTORÍA


ACTA No.	7		PERIODO DEL ACTA	1/01/2020	A	30/01/2020
OBJETO	REALIZAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE AJUSTE LAS DIFERENTES OBRAS E INTERVENCIONES ESPECIALIZADAS PARA LAS DIFERENTES SEDES DE LA SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C.					
CONTRATO DE OBRA No	731-2019	CONTRATISTA	CONSORCIO PRUNI SEDES 04		ENTIDAD CONTRATANTE	SECRETARIA GENERAL-ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA
CONTRATO INTERVENTORÍA	730 DE 2019	INTERVENTORÍA	ARQUITECTURA URBANA LTDA		FRENTE:	IMPRENTA DISTRITAL

CAPITULO	1.2.0	RED DE SUMINISTRO	ITEM	1.2.0.23	ABRAZADERA 1 1/2"	UNIDAD	UN


ITEM	LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	TOTAL	UNIDAD
	Entre los ejes 3'-5' y A-J						
1	Baño de hombres piso 1				4,00	2,00	UN
2	Baño de mujeres piso 1				3,00	3,00	UN
	Entre los ejes 5'-1' y E-G						
1	Baño hombres Piso 2				2,00	2,00	UN
	SUBTOTAL					7,00	UN
	TOTAL					7,00	UN

OBSERVACIONES:

LOCALIZACIÓN PLANIMÉTRICA

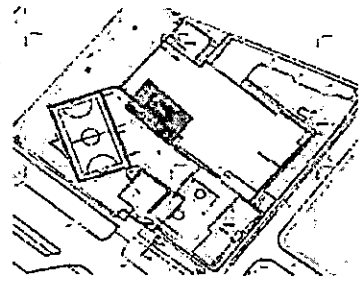


REGISTRO FOTOGRÁFICO

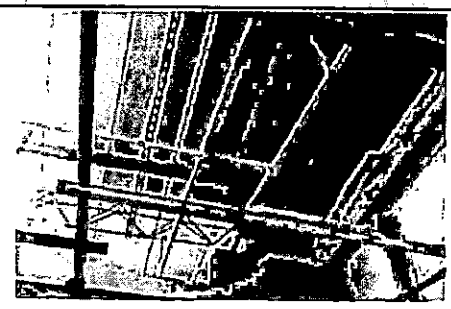

ARQ. ALEJANDRA BOLAÑOS
RESIDENTE CONTRATISTA

ARQ. NANCY AYALA
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

PLANO DETALLE

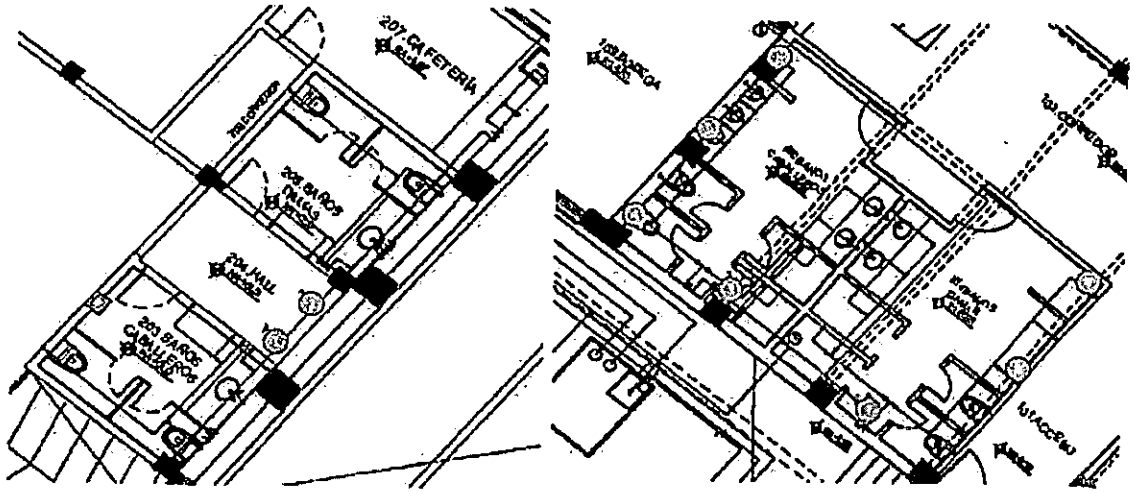

A6 EP

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA GENERAL | BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

PROYECTO: OBRAS SEDES ALCALDÍA

PRISMA — UNIVERSAL SEC S.A.S. — CONSORCIO PRUNI SEDES 04 — CONTRATISTA


ARQUITECTURA URBANA LTDA — INTERVENTORÍA

ACTA No.	7		PERIODO DEL ACTA	1/01/2020	A	30/01/2020	
OBJETO	REALIZAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE AJUSTE LAS DIFERENTES OBRAS E INTERVENCIONES ESPECIALIZADAS PARA LAS DIFERENTES SEDES DE LA SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C.						
CONTRATO DE OBRA No	731-2019	CONTRATISTA	CONSORCIO PRUNI SEDES 04		ENTIDAD CONTRATANTE	SECRETARIA GENERAL-ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA	
CONTRATO INTERVENTORÍA	730 DE 2019	INTERVENTORÍA	ARQUITECTURA URBANA LTDA		FRENTE:	IMPRENTA DISTRITAL	

CAPITULO	1.2.0	RED DE SUMINISTRO	ITEM	1.2.0.24	ABRAZADERA 2"	UNIDAD	UN

ITEM	LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	TOTAL	UNIDAD
	Entre los ejes 5'-1' y A-J						
1	Baño de hombres piso 1				2,00	2,00	UN
2	Baño de mujeres piso 1				1,00	1,00	UN
	Entre los ejes 3'-5' y E-G						
1	Baño de mujeres piso 2				1,00	1,00	UN
OBSERVACIONES:				SUBTOTAL		4,00	UN
				TOTAL		4,00	UN

LOCALIZACIÓN PLANIMÉTRICA

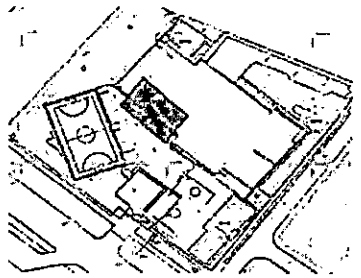

REGISTRO FOTOGRÁFICO




Alejandra Bolaños

ARQ. ALEJANDRA BOLAÑOS
RESIDENTE CONTRATISTA

Nancy Ayala

ARQ. NANCY AYALA
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

PLANO DETALLE

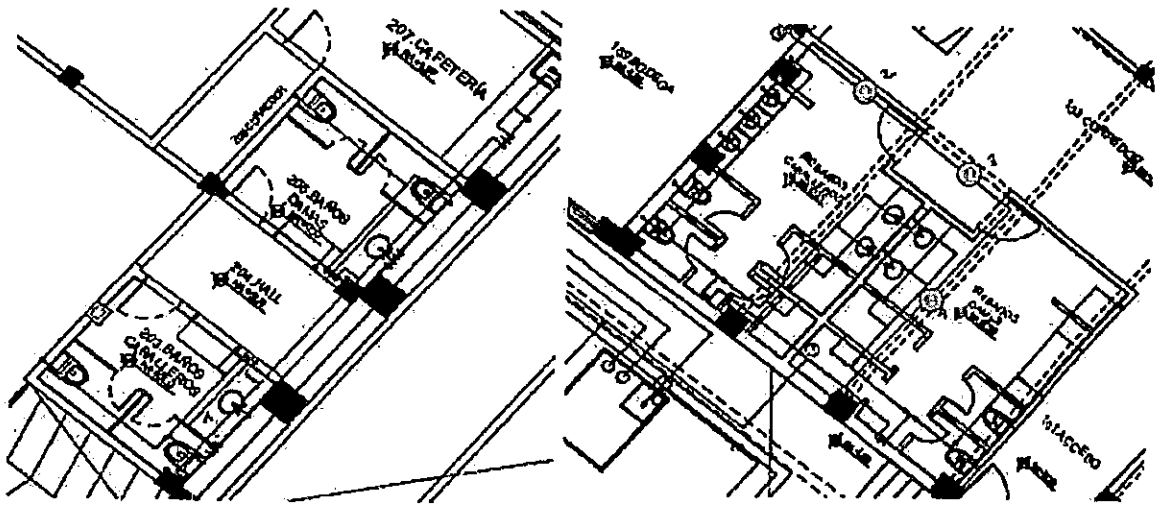

Alexandra 2°

A6 LEP

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA GENERAL | BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

PROYECTO: OBRAS SEDES ALCALDÍA

PRISMA — UNIVERSAL SEC S.A.S. — CONSORCIO PRUNI SEDES 04 — CONTRATISTA


ARQUITECTURA URBANA LTDA — INTERVENTORÍA

ACTA No.	7	PERIODO DEL ACTA	1/01/2020	A	30/01/2020		
OBJETO	REALIZAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE AJUSTE LAS DIFERENTES OBRAS E INTERVENCIONES ESPECIALIZADAS PARA LAS DIFERENTES SEDES DE LA SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C.						
CONTRATO DE OBRA No	731-2019	CONTRATISTA	CONSORCIO PRUNI SEDES 04		ENTIDAD CONTRATANTE	SECRETARIA GENERAL-ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA	
CONTRATO INTERVENTORÍA	730 DE 2019	INTERVENTORÍA	ARQUITECTURA URBANA LTDA		FRENTE:	IMPRENTA DISTRITAL	

CAPITULO	1.3.0	PUNTO HIDRAULICO AGUA FRIA	ITEM	1.3.0.1	PUNTO HIDRÁULICO A.F. LAVAPLATOS PVC 1/2"	UNIDAD	UN

ITEM	LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	TOTAL	UNIDAD
	Entre los ejes 5'-1' y A-J						
1	Cafeteria segundo piso				2,00	2,00	UN

PLANO DETALLE

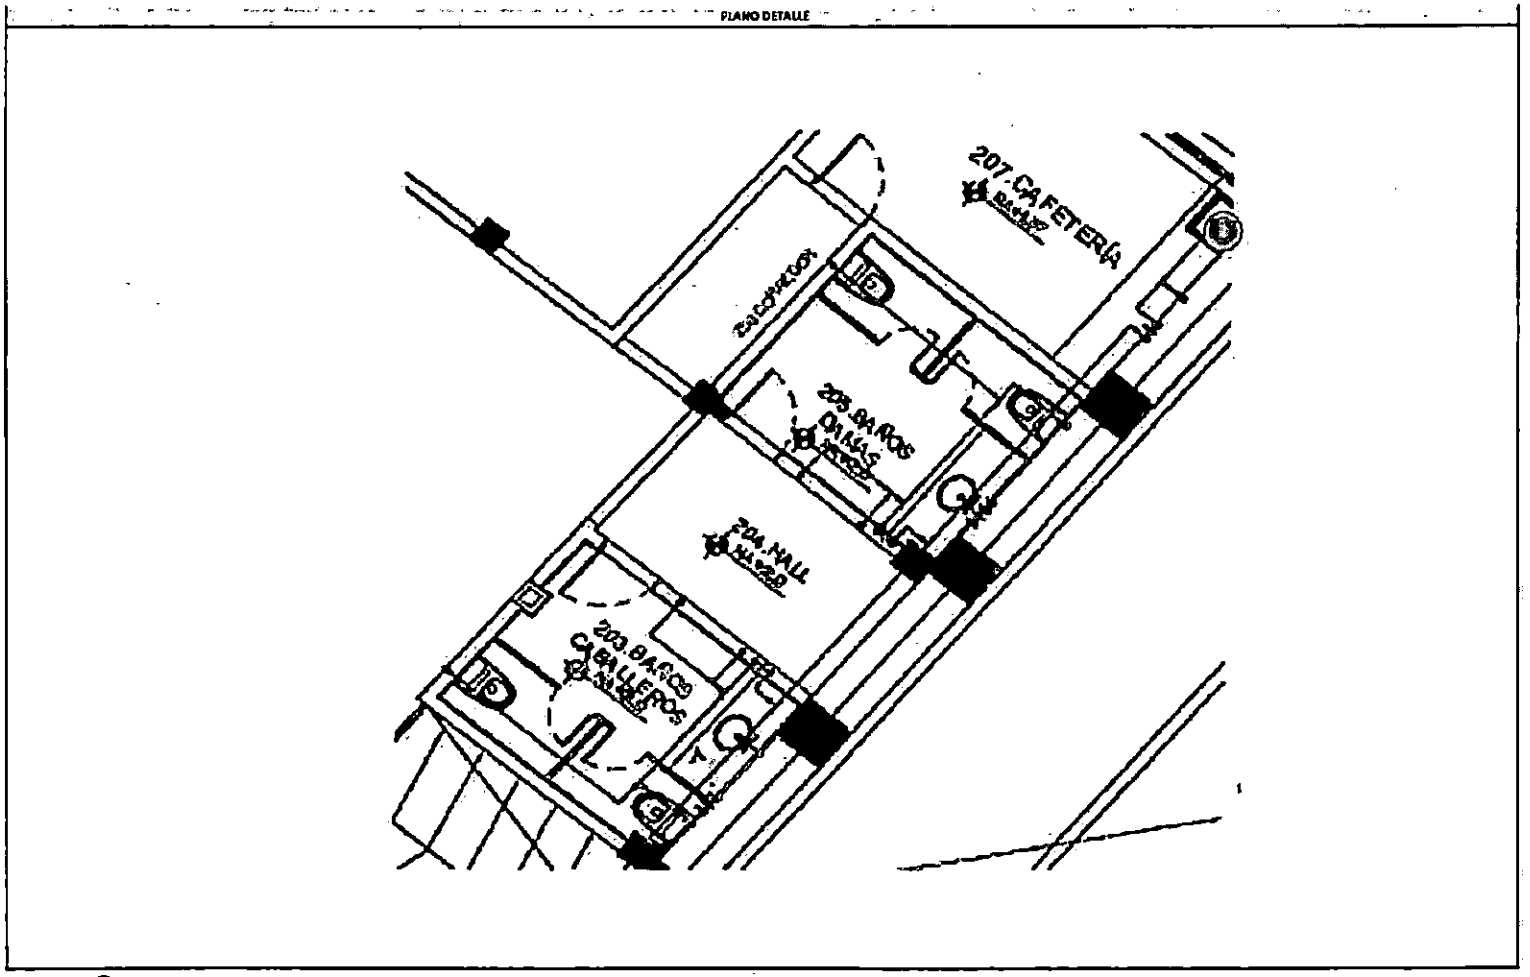

A6 08

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA GENERAL | BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

PROYECTO: OBRAS SEDES ALCALDÍA

PRISMA — UNIVERSAL SEC S.A.S. — CONSORCIO PRUNI SEDES 04 — CONTRATISTA


ARQUITECTURA URBANA LTDA — INTERVENTORÍA

ACTA No.	7		PERIODO DEL ACTA	1/01/2020	A	30/01/2020	
OBJETO	REALIZAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE AJUSTE LAS DIFERENTES OBRAS E INTERVENCIONES ESPECIALIZADAS PARA LAS DIFERENTES SEDES DE LA SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C.						
CONTRATO DE OBRA No	731-2019	CONTRATISTA	CONSORCIO PRUNI SEDES 04		ENTIDAD CONTRATANTE	SECRETARIA GENERAL-ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA	
CONTRATO INTERVENTORÍA	730 DE 2019	INTERVENTORÍA	ARQUITECTURA URBANA LTDA		FRENTE:	IMPRENTA DISTRITAL	


CAPITULO	1.3.0	PUNTO HIDRAULICO AGUA FRÍA	ITEM	1.3.0.2	PUNTO HIDRÁULICO A.F. LAVAMANOS PVC 1/2"	UNIDAD	UN

ITEM	LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	TOTAL	UNIDAD
	Entre los ejes 5'-1' y A-J						
1	Baño de hombres piso 1				3,00	3,00	UN
2	Baño de mujeres piso 1				3,00	3,00	UN
	Entre los ejes 3'-5' y E-G						
1	Baño de hombres piso 2				2,00	2,00	UN
2	Baño de mujeres piso 2				2,00	2,00	UN
OBSERVACIONES:			SUBTOTAL			10,00	UN
			TOTAL			10,00	UN

LOCALIZACIÓN PLANIMÉTRICA

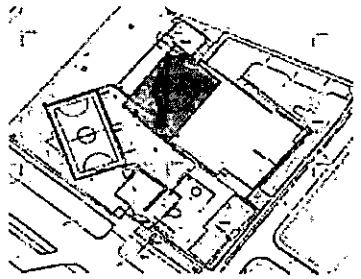

REGISTRO FOTOGRÁFICO

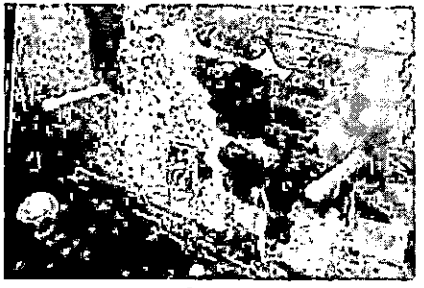


Alejandra Bolaños

ARQ. ALEJANDRA BOLAÑOS
RESIDENTE CONTRATISTA

Nancy Rocío Ayala Gómez

ARQ. NANCY AYALA
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

PLANO DETALLE

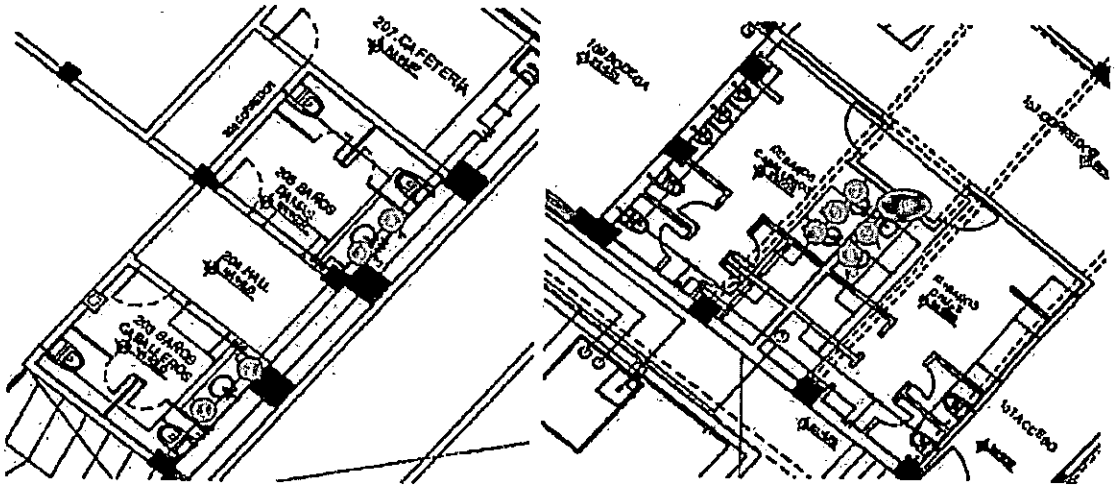

135

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA GENERAL | BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

PROYECTO: OBRAS SEDES ALCALDÍA

PRISMA UNIVERSAL SEC S.A.S. — CONSORCIO PRISMA SEDES 04 — CONTRATISTA

ARQUITECTURA URBANA LTDA — INTERVENTORÍA


ACTA No.	7	PERIODO DEL ACTA	1/01/2020	A	31/01/2020		
OBJETO	REALIZAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE AJUSTE LAS DIFERENTES OBRAS E INTERVENCIONES ESPECIALIZADAS PARA LAS DIFERENTES SEDES DE LA SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C.						
CONTRATO DE OBRA No	731-2019	CONTRATISTA	CONSORCIO PRUNI SEDES 04		ENTIDAD CONTRATANTE	SECRETARIA GENERAL-ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA	
CONTRATO INTERVENTORÍA	730 DE 2019	INTERVENTORÍA	ARQUITECTURA URBANA LTDA		FRENTE:	IMPRENTA DISTRITAL	

CAPITULO	1.3.0	PUNTO HIDRAULICO AGUA FRIA	ITEM	1.3.0.3	PUNTO HIDRÁULICO A.F. DUCHA PVC 1/2"	UNIDAD	UN

ITEM	LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	TOTAL	UNIDAD
	Entre los ejes 5'-1' Y A-J						
1	Baño de hombres piso 1				2,00	2,00	UN
2	Baño de mujeres piso 1				2,00	2,00	UN
				SUBTOTAL		4,00	UN
				TOTAL		4,00	UN

OBSERVACIONES:

LOCALIZACIÓN PLANIMÉTRICA

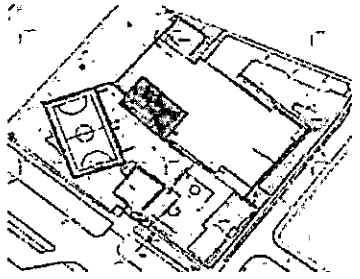

REGISTRO FOTOGRÁFICO




ARQ. ALEJANDRA BOLAÑOS
RESIDENTE CONTRATISTA

ARQ. NANCY AYALA
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

199

136

PLANO DETALLE

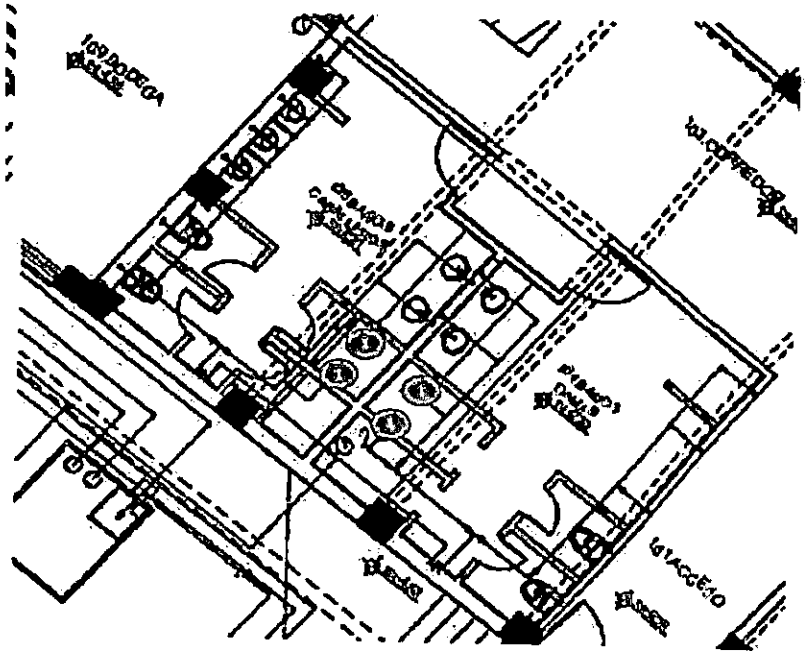

Aleb


ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Secretaría Integración Social	**MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA** **PROYECTO: OBRAS SEDES ALCALDÍA**	PRISMA UNIVERSAL SEC S.A.S. CONSORCIO PRUNI SEDES 04 CONTRATISTA ARQUITECTURA URBANA LTDA INTERVENTORÍA

ACTA No.			PERIODO DEL ACTA	1/01/2020	A	30/01/2020
OBJETO	REALIZAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE AJUSTE LAS DIFERENTES OBRAS E INTERVENCIONES ESPECIALIZADAS PARA LAS DIFERENTES SEDES DE LA SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C.					
CONTRATO DE OBRA No	731-2019	CONTRATISTA	CONSORCIO PRUNI SEDES 04	ENTIDAD CONTRATANTE	SECRETARIA GENERAL-ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA	
CONTRATO INTERVENTORÍA	730 DE 2019	INTERVENTORÍA	ARQUITECTURA URBANA LTDA	FRENTE:	IMPRENTA DISTRITAL	

CAPITULO	1.3.0	RED DE AGUAS NEGRAS		ITEM	1.3.0.4	PUNTO HIDRÁULICO A.F. LLAVE MANGUERA 1/2"	UNIDAD	UND

ITEM	LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES LARGO	DIMENSIONES ANCHO	DIMENSIONES ALTO	CANTIDAD	TOTAL	UNIDAD
1	Entre los ejes A-13 y 1-15				8,00	8,00	UND

PLANO DETALLE

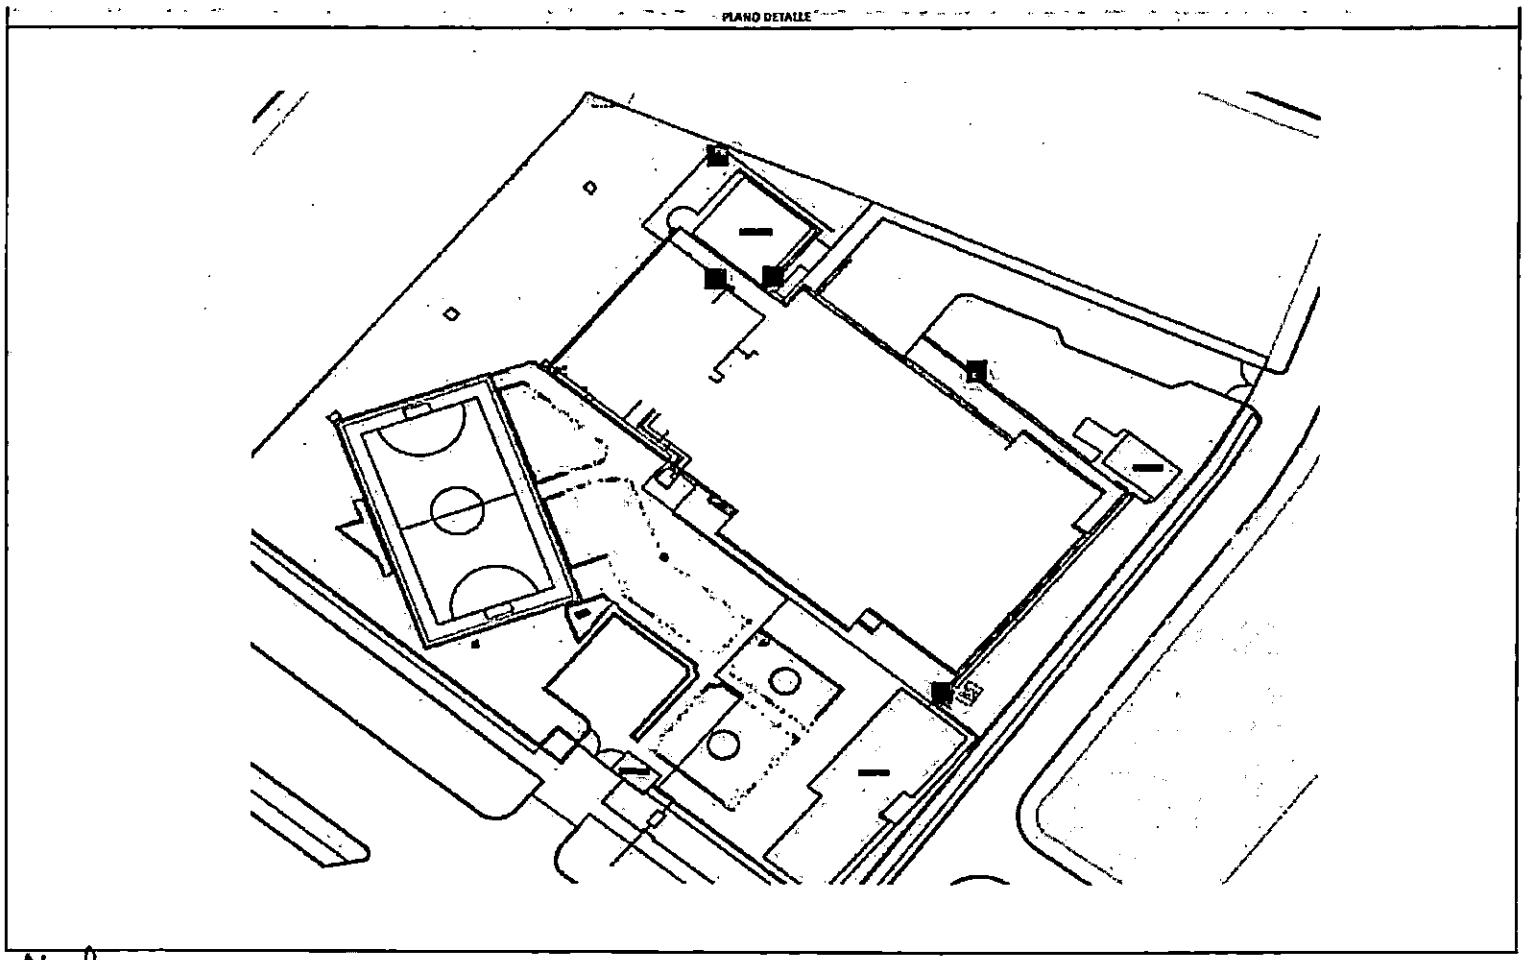

AleB


ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Secretaría Integración Social	**MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA** **PROYECTO: OBRAS SEDES ALCALDÍA**	PRISMA UNIVERSAL SEC S.A.S. CONSORCIO PRUNI SEDES 04 CONTRATISTA

ARQUITECTURA URBANA LTDA INTERVENTORÍA							
ACTA No.			PERIODO DEL ACTA	1/01/2020	A	30/01/2020	
OBJETO	REALIZAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE AJUSTE LAS DIFERENTES OBRAS E INTERVENCIONES ESPECIALIZADAS PARA LAS DIFERENTES SEDES DE LA SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C.						
CONTRATO DE OBRA No	731-2019	CONTRATISTA	CONSORCIO PRUNI SEDES 04	ENTIDAD CONTRATANTE	SECRETARIA GENERAL-ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA		
CONTRATO INTERVENTORÍA	730 DE 2019	INTERVENTORÍA	ARQUITECTURA URBANA LTDA	FRENTE:	IMPRENTA DISTRITAL		

CAPITULO	1.3.0	RED DE AGUAS NEGRAS	ITEM	1.3.0.5	PUNTO HIDRÁULICO A.F. ORINAL 3/4"	UNIDAD	UND

ÍTEM	LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	TOTAL	UNIDAD
	Entre los ejes A-F y 1'-5'						
1	Produccion				4,00	4,00	UND

PLANO DETALLE

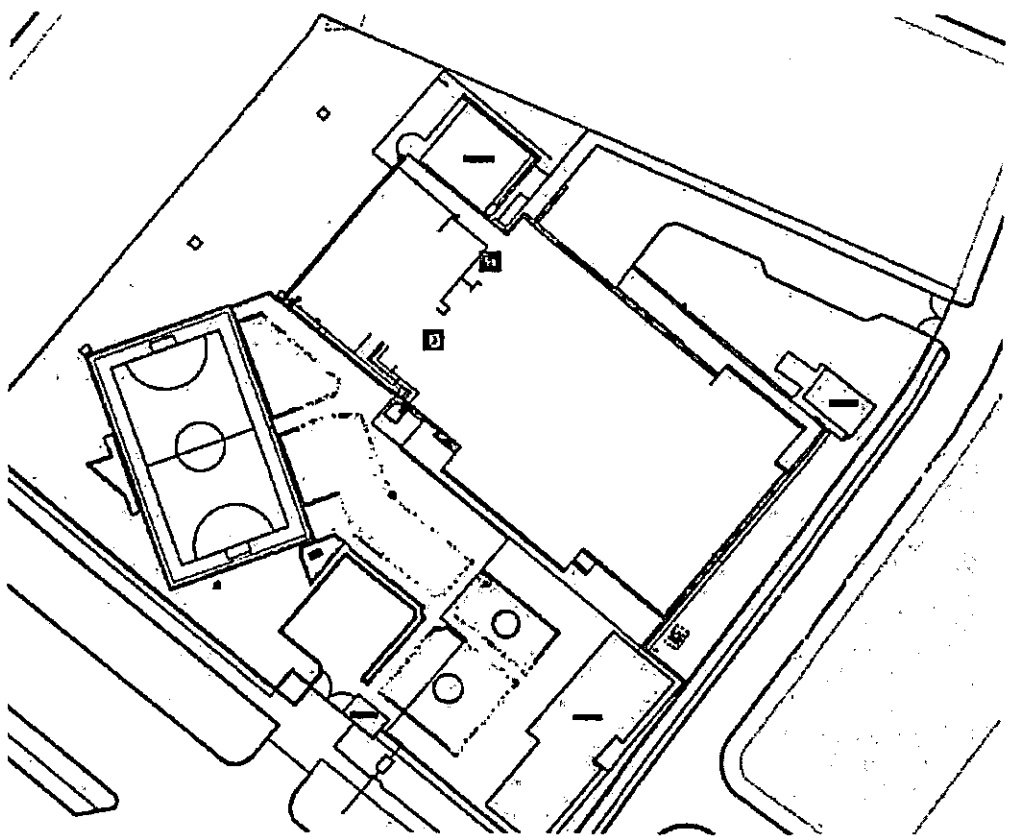

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Secretaría General Integración Social	**MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA** **PROYECTO: OBRAS SEDES ALCALDÍA**	PRISMA UNIVERSAL SEC S.A.S. CONSORCIO PRUMI SEDES 04 CONTRATISTA	ARQUITECTURA URBANA LTDA INTERVENTORÍA


ACTA No.			PERIODO DEL ACTA	1/01/2020	A	30/01/2020	
OBJETO	REALIZAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE AJUSTE LAS DIFERENTES OBRAS E INTERVENCIONES ESPECIALIZADAS PARA LAS DIFERENTES SEDES DE LA SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C.						
CONTRATO DE OBRA No	731-2019	CONTRATISTA	CONSORCIO PRUMI SEDES 04		ENTIDAD CONTRATANTE	SECRETARIA GENERAL-ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA	
CONTRATO INTERVENTORÍA	730 DE 2019	INTERVENTORÍA	ARQUITECTURA URBANA LTDA		FRENTE	IMPRENTA DISTRITAL	

CAPITULO		1.3.0	PUNTO HIDRAULICO AGUA FRIA	ITEM	1.3.0.6	PUNTO HIDRÁULICO A.F. SANITARIO FLUXÓMETRO 1 1/4"	UNIDAD	UN

ITEM	LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	TOTAL	UNIDAD
	Entre los ejes 5'-1' y A-J						
1	Baño de hombres piso 1				2,00	2,00	UN
2	Baño de mujeres piso 1				2,00	2,00	UN
	Entre los ejes 3'-5' y E-G						
1	Baño de hombres piso 2				2,00	2,00	UN
2	Baño de mujeres piso 2				2,00	2,00	UN
	SUBTOTAL					8,00	UN
	TOTAL					8,00	UN

OBSERVACIONES:

LOCALIZACIÓN PLANIMÉTRICA

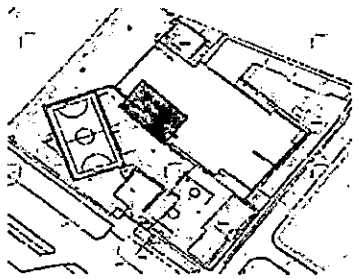

REGISTRO FOTOGRÁFICO



Alejandra Bolaños t

ARQ. ALEJANDRA BOLAÑOS
RESIDENTE CONTRATISTA


Nancy Raío Ayala Gómez

ARQ. NANCY AYALA
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

202

142

PLANO DETALLE

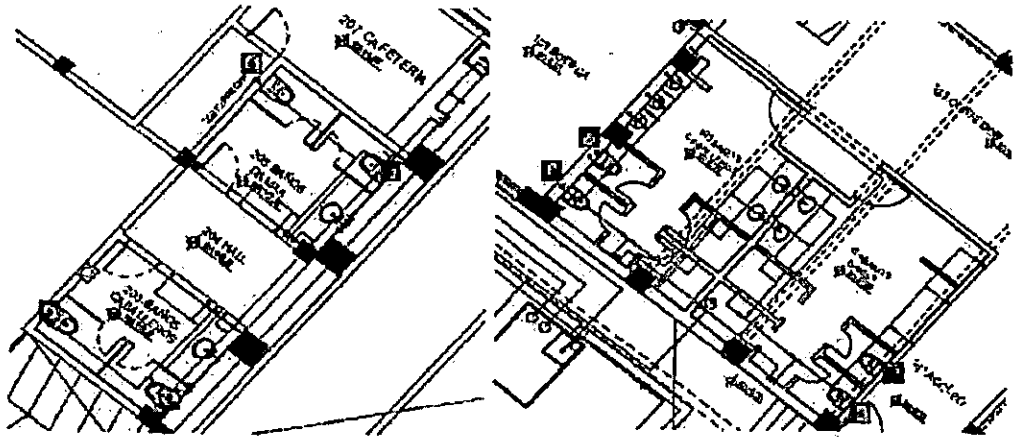

Piso 2

Piso 1

Punto hidrosanitario
proyectado

Ale Bl

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA GENERAL | BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

PROYECTO: OBRAS SEDES ALCALDÍA

PRISMA — UNIVERSAL SEC S.A.S. — CONSORCIO PRUNI SEDES 04 — CONTRATISTA

ARQUITECTURA URBANA LTDA — INTERVENTORÍA


ACTA No.	7		PERIODO DEL ACTA	1/01/2020	A	30/01/2020	
OBJETO	REALIZAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE AJUSTE LAS DIFERENTES OBRAS E INTERVENCIONES ESPECIALIZADAS PARA LAS DIFERENTES SEDES DE LA SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C						
CONTRATO DE OBRA No	731-2019	CONTRATISTA	CONSORCIO PRUNI SEDES 04		ENTIDAD CONTRATANTE	SECRETARIA GENERAL-ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA	
CONTRATO INTERVENTORÍA	730 DE 2019	INTERVENTORÍA	ARQUITECTURA URBANA LTDA		FRENTE:	IMPRENTA DISTRITAL	

CAPITULO	1.5.0	RED DE AGUAS NEGRAS	ITEM	1.5.0.1	Tubería PVC-S 2"	UNIDAD	ML


ITEM	LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	TOTAL	UNIDAD
	BAÑO MUJERES PRIMER PISO						
1	DESAGÜES PARA LAVAMANOS	13,40			1,00	13,40	ML
				SUBTOTAL		13,40	ML
				TOTAL		13,40	ML

OBSERVACIONES:

LOCALIZACIÓN PLANIMÉTRICA

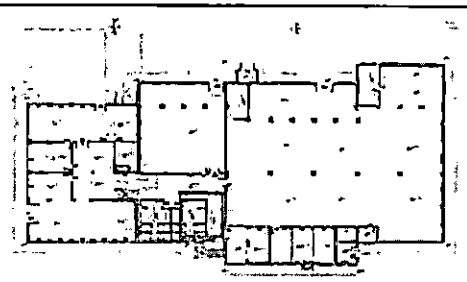

REGISTRO FOTOGRÁFICO

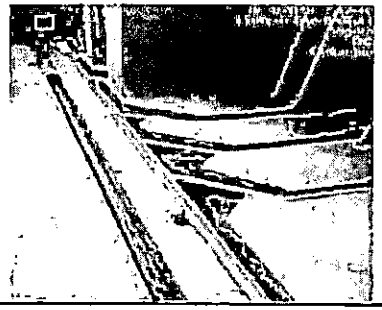


Alejandra Bolaños +

ARQ. ALEJANDRA BOLAÑOS
RESIDENTE CONTRATISTA

Nancy Rocío Ayala Gomez

ARQ. NANCY AYALA
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

PLANO DETALLE

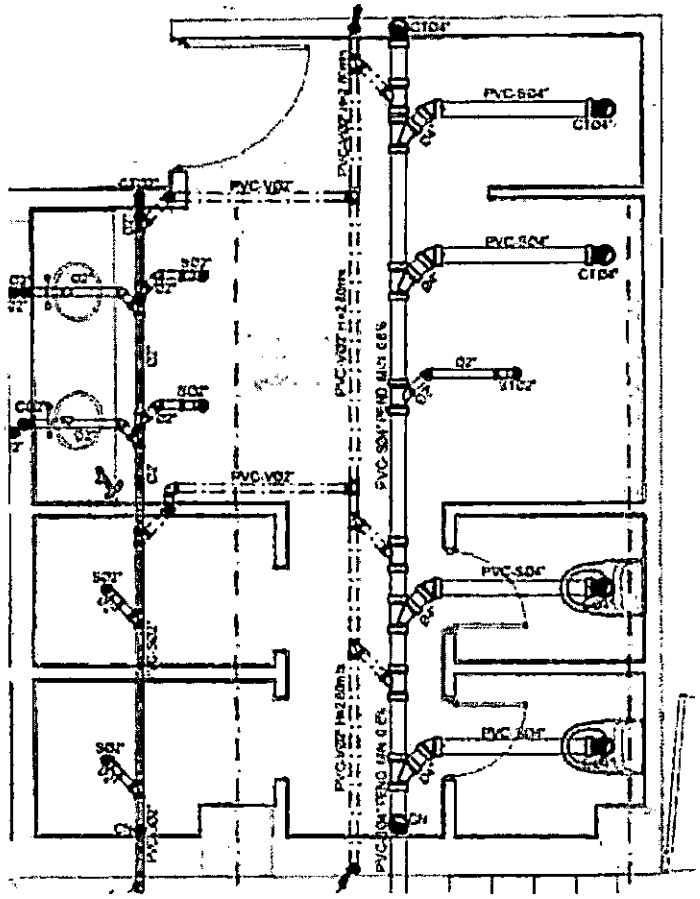

146

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA GENERAL

BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

PROYECTO: OBRAS SEDES ALCALDÍA

PRISMA
UNIVERSAL SEC S.A.S.
CONSORCIO PRUNI SEDES 04
CONTRATISTA

ARQUITECTURA URBANA LTDA
INTERVENTORÍA


ACTA No.	7		PERIODO DEL ACTA	1/01/2020	A	30/01/2020	
OBJETO	REALIZAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE AJUSTE LAS DIFERENTES OBRAS E INTERVENCIONES ESPECIALIZADAS PARA LAS DIFERENTES SEDES DE LA SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C.						
CONTRATO DE OBRA No	731-2019	CONTRATISTA	CONSORCIO PRUNI SEDES 04		ENTIDAD CONTRATANTE	SECRETARIA GENERAL-ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA	
CONTRATO INTERVENTORÍA	730 DE 2019	INTERVENTORÍA	ARQUITECTURA URBANA LTDA		FRENTE:	IMPRENTA DISTRITAL	

CAPITULO	1.5.0	RED DE AGUAS NEGRAS	ITEM	1.5.0.1	TUBERÍA PVC-L 2"	UNIDAD	ML


ITEM	LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	TOTAL	UNIDAD
	BAÑO MUJERES PRIMER PISO						
1	RED DE VENTILACIÓN	17,95			1,00	17,95	ML
					SUBTOTAL	17,95	ML
					TOTAL	17,95	ML

OBSERVACIONES:

LOCALIZACIÓN PLANIMÉTRICA

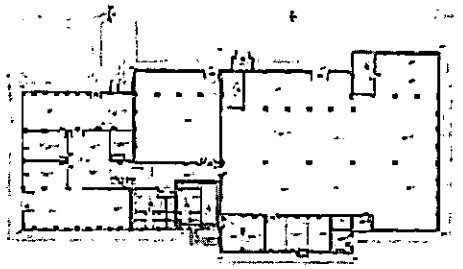

REGISTRO FOTOGRÁFICO

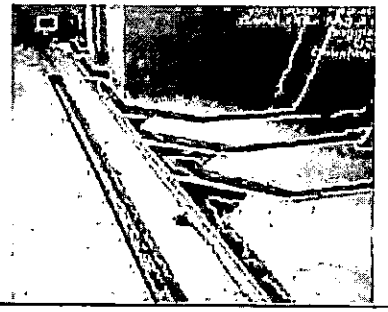


Alejandra Bolaños +
ARQ. ALEJANDRA BOLAÑOS
RESIDENTE CONTRATISTA

Nancy Rocío Ayala Gomez
ARQ. NANCY AYALA
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

204

146

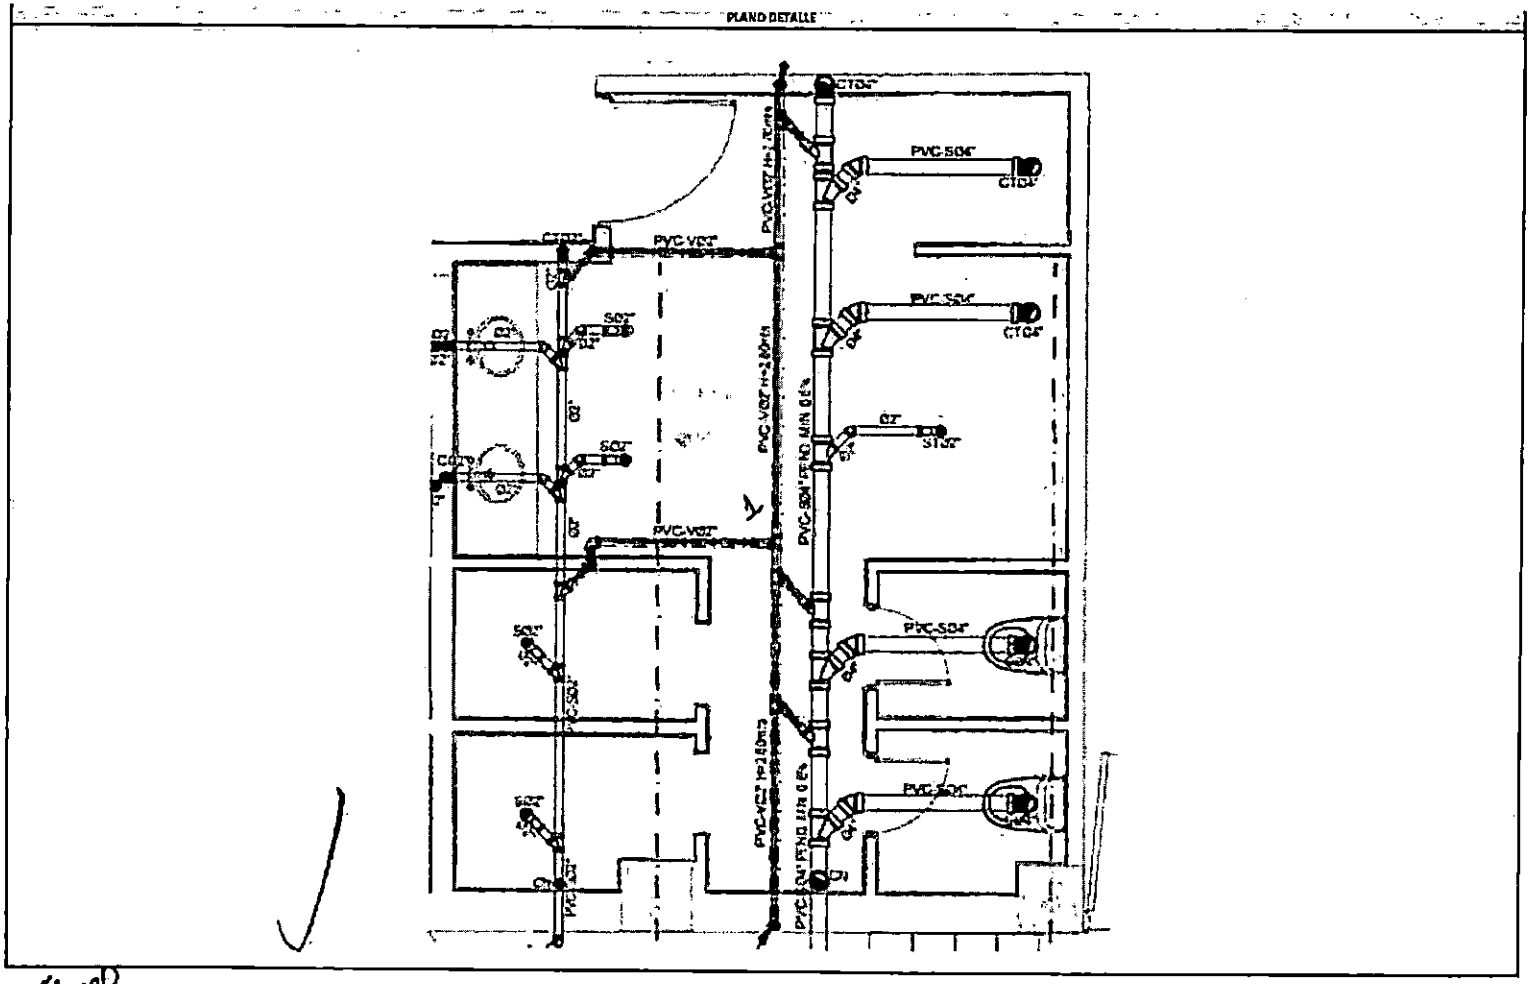
PLANO DETALLE
PVC-SDE
PVC-VEF
PVC-VEF H=2.80m
PVC-SDE TEND MIN 0.6%
PVC-SDE H=2.80m
PVC-SDE TEND MIN 0.6%

Alert

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA GENERAL | BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

PROYECTO: OBRAS SEDES ALCALDÍA


PRISMA — UNIVERSAL SEC S.A.S. — CONTRATISTA

ARQUITECTURA URBANA LTDA — INTERVENTORÍA

ACTA No.	7		PERIODO DEL ACTA	1/01/2020	A	30/01/2020	
OBJETO	REALIZAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE AJUSTE LAS DIFERENTES OBRAS E INTERVENCIONES ESPECIALIZADAS PARA LAS DIFERENTES SEDES DE LA SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C.						
CONTRATO DE OBRA No	731-2019	CONTRATISTA	CONSORCIO PRUNI SEDES 04		ENTIDAD CONTRATANTE	SECRETARIA GENERAL-ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA	
CONTRATO INTERVENTORÍA	730 DE 2019	INTERVENTORÍA	ARQUITECTURA URBANA LTDA		FRENTE:	IMPRENTA DISTRITAL	

CAPITULO	1.5.0	RED DE AGUAS NEGRAS	ITEM	1.5.0.3	Tubería PVC-S 4"	UNIDAD	ML

ITEM	LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	TOTAL	UNIDAD
	EDIFICIO ADMINISTRATIVO 5ER PISO						
1	DESAGÜES SANITARIOS	9,65			1,00	9,65	ML

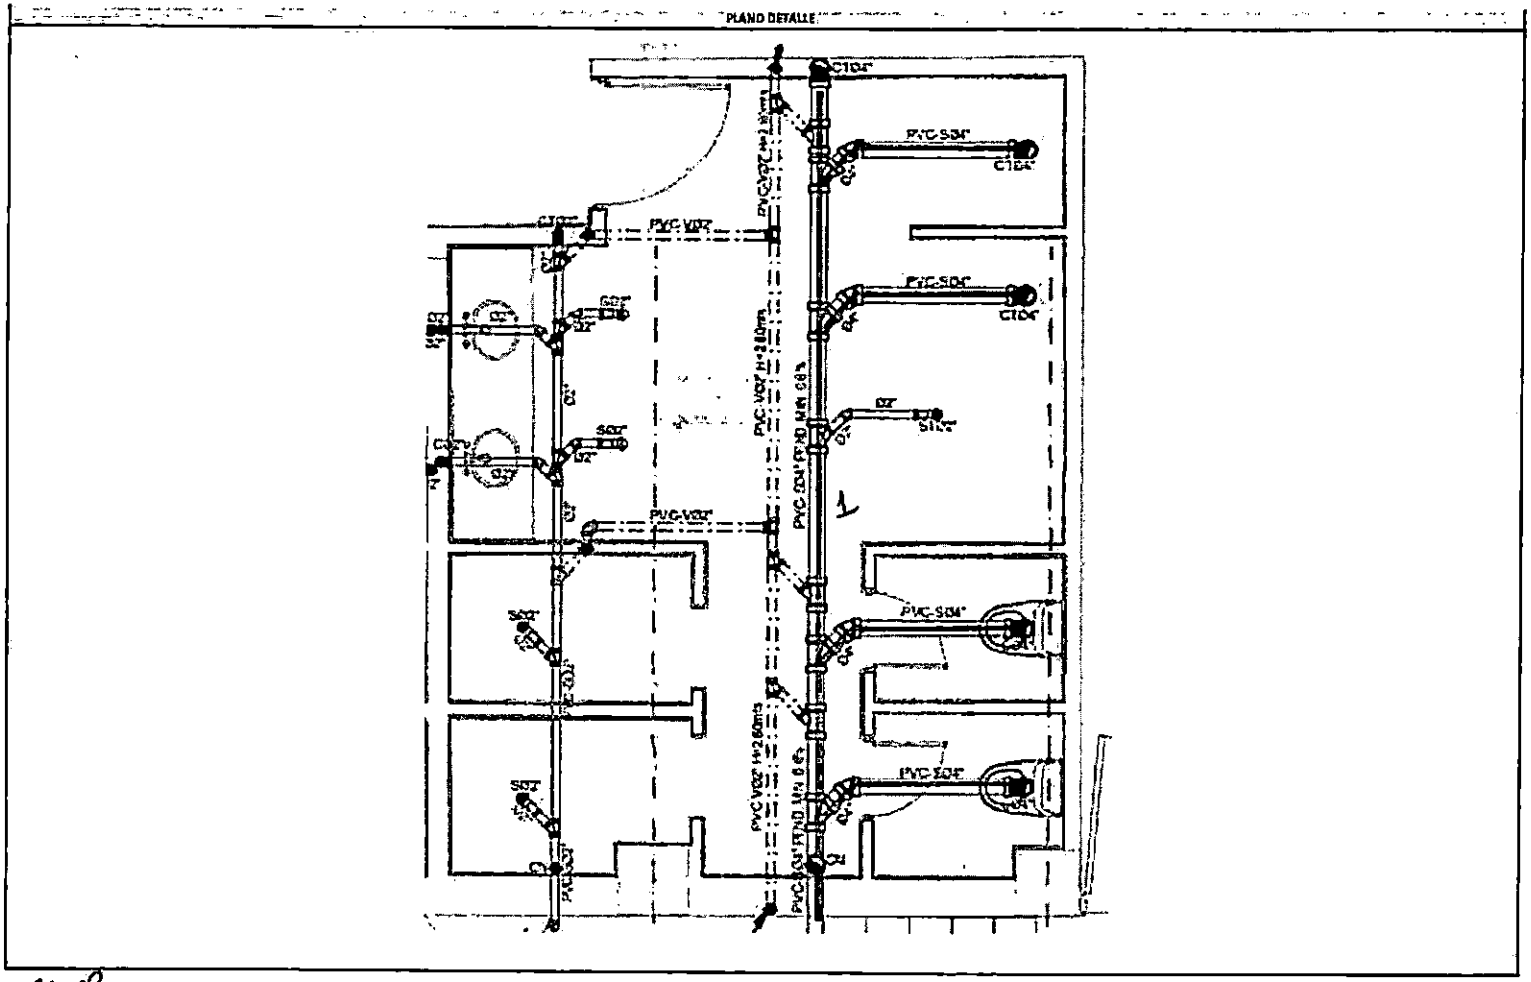
PLANO DETALLE
C10A"
PVC-S04"
PVC-V02"
PVC-S04"
C10A"
PVC-S04"
PVC-V02"
PVC-S04"
PVC-S04"

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA GENERAL

BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

PROYECTO: OBRAS SEDES ALCALDÍA


PRISMA — UNIVERSAL SEC S.A.S. — CONSORCIO PRUNI SEDES 04 — CONTRATISTA

ARQUITECTURA URBANA LTDA — INTERVENTORÍA

ACTA No.	7	PERIODO DEL ACTA	1/01/2020	A	30/01/2020	
OBJETO	REALIZAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE AJUSTE LAS DIFERENTES OBRAS E INTERVENCIONES ESPECIALIZADAS PARA LAS DIFERENTES SEDES DE LA SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C.					
CONTRATO DE OBRA No	731-2019	CONTRATISTA	CONSORCIO PRUNI SEDES 04	ENTIDAD CONTRATANTE	SECRETARIA GENERAL-ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA	
CONTRATO INTERVENTORÍA	730 DE 2019	INTERVENTORÍA	ARQUITECTURA URBANA LTDA	FRENTE:	IMPRENTA DISTRITAL	

CAPITULO	1.5.0	RED DE AGUAS NEGRAS	ITEM	1.5.0.8	Accesorio PVC-S 2"	UNIDAD	UN

ITEM	LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	TOTAL	UNIDAD
	BAÑO MUJERES PRIMER PISO						
1	DESAGÜE PARA LAVAMANOS				27,00	27,00	UN
2	RED DE VENTILACIÓN				25,00	25,00	UN

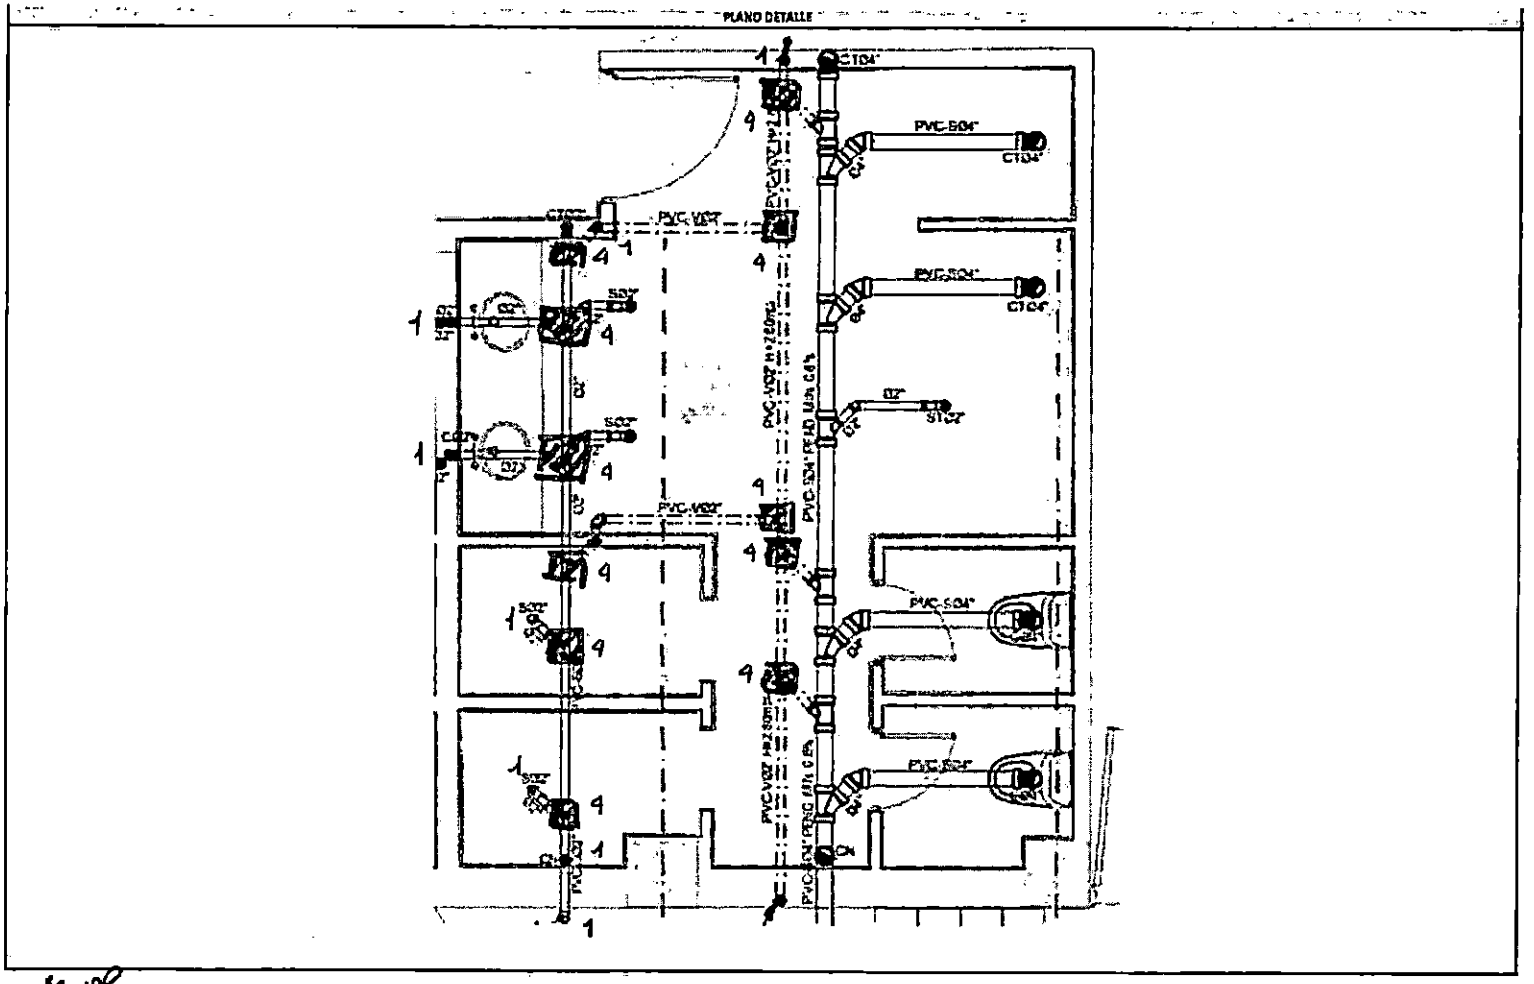

K6 18

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA GENERAL

BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

PROYECTO: OBRAS SEDES ALCALDÍA

PRISMA — UNIVERSAL SEC S.A.S. — CONSORCIO PRUNI SEDES D4 — CONTRATISTA


ARQUITECTURA URBANA LTDA — INTERVENTORÍA

ACTA No.	7	PERIODO DEL ACTA	1/01/2020	A	30/01/2020	
OBJETO	REALIZAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE AJUSTE LAS DIFERENTES OBRAS E INTERVENCIONES ESPECIALIZADAS PARA LAS DIFERENTES SEDES DE LA SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C.					
CONTRATO DE OBRA No.	731-2019	CONTRATISTA	CONSORCIO PRUNI SEDES D4		ENTIDAD CONTRATANTE	SECRETARIA GENERAL-ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA
CONTRATO INTERVENTORÍA	730 DE 2019	INTERVENTORÍA	ARQUITECTURA URBANA LTDA		FRENTE:	IMPRENTA DISTRITAL

CAPITULO	1.S.0	RED DE AGUAS NEGRAS	ITEM	1.S.0.10	Accesorio PVC-S 4"	UNIDAD	UN

ITEM	LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	TOTAL	UNIDAD
	BAÑO MUJERES PRIMER PISO						
1	DESAGÜES SANITARIOS				19,00	19,00	UN

PLANO DETALLE

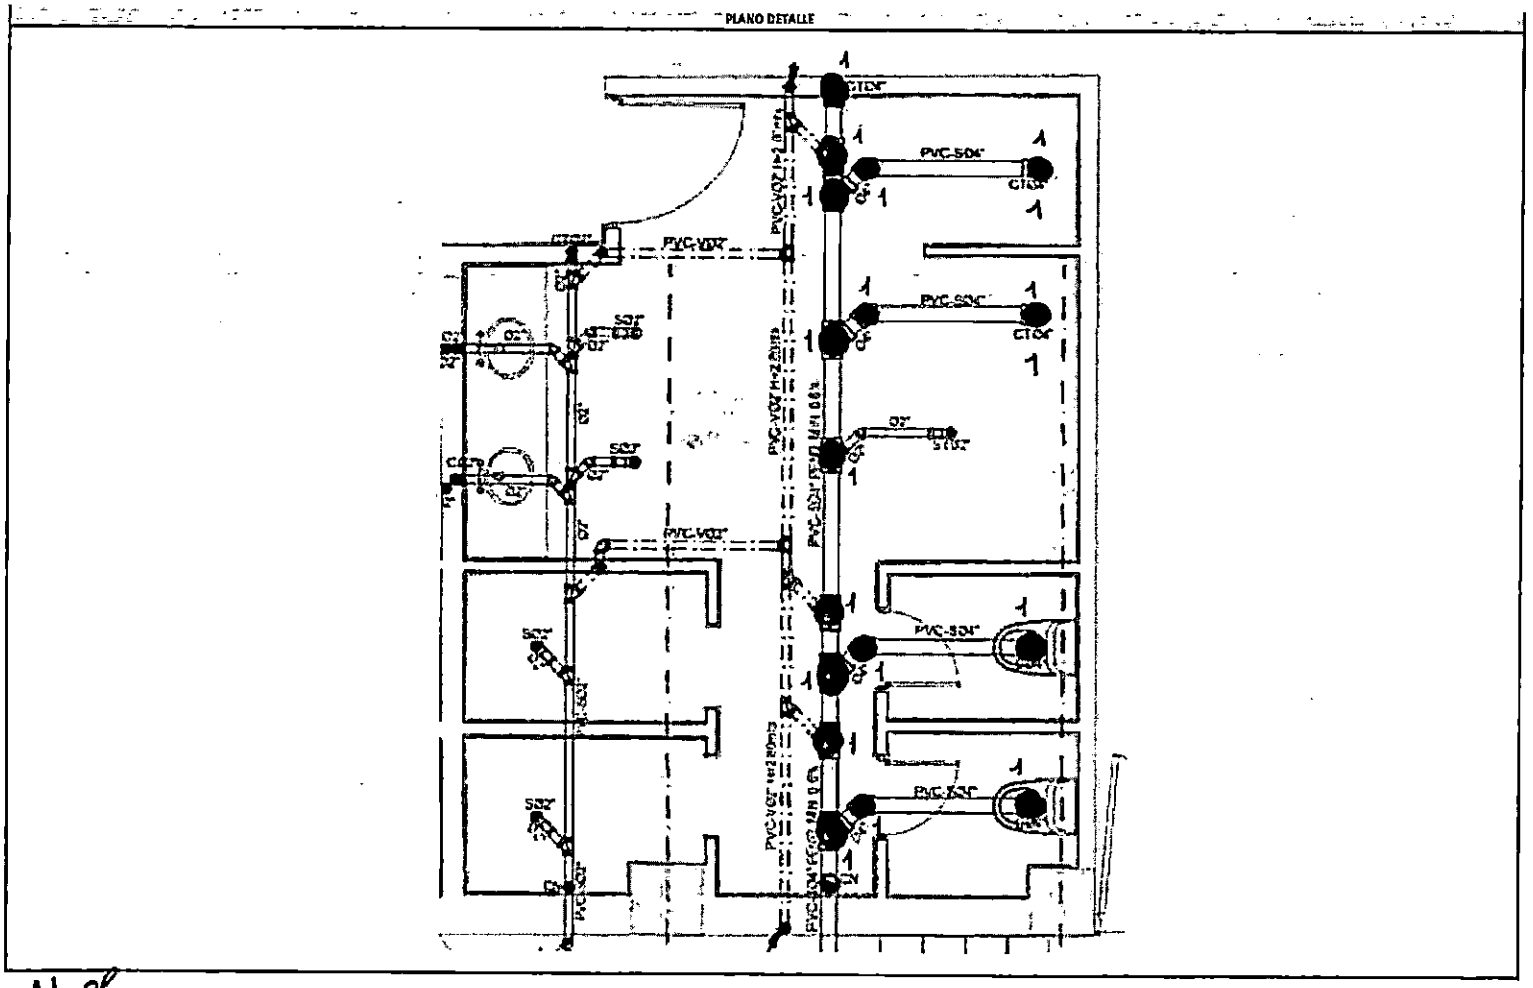

Ale 08

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA GENERAL

BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

PROYECTO: OBRAS SEDES ALCALDÍA


PRISMA
UNIVERSAL-SEC S.A.S.
CONSORCIO PRUNI SEDES 04
CONTRATISTA

ARQUITECTURA URBANA LTDA
INTERVENTORÍA

ACTA No.	7		PERIODO DEL ACTA	1/01/2020	A	30/01/2020	
OBJETO	REALIZAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE AJUSTE LAS DIFERENTES OBRAS E INTERVENCIONES ESPECIALIZADAS PARA LAS DIFERENTES SEDES DE LA SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C.						
CONTRATO DE OBRA No	731-2019	CONTRATISTA	CONSORCIO PRUNI SEDES 04		ENTIDAD CONTRATANTE	SECRETARIA GENERAL-ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA	
CONTRATO INTERVENTORÍA	730 DE 2019	INTERVENTORÍA	ARQUITECTURA URBANA LTDA		FRENTE:	IMPRENTA DISTRITAL	

CAPITULO	1.6.0	PUNTOS SANITARIOS	ITEM	1.6.0.1	S.S. Sanitario 4"	UNIDAD	UN

ITEM	LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	TOTAL	UNIDAD
	BAÑO MUJERES PRIMER PISO						
1	SANITARIOS				4,00	4,00	UN

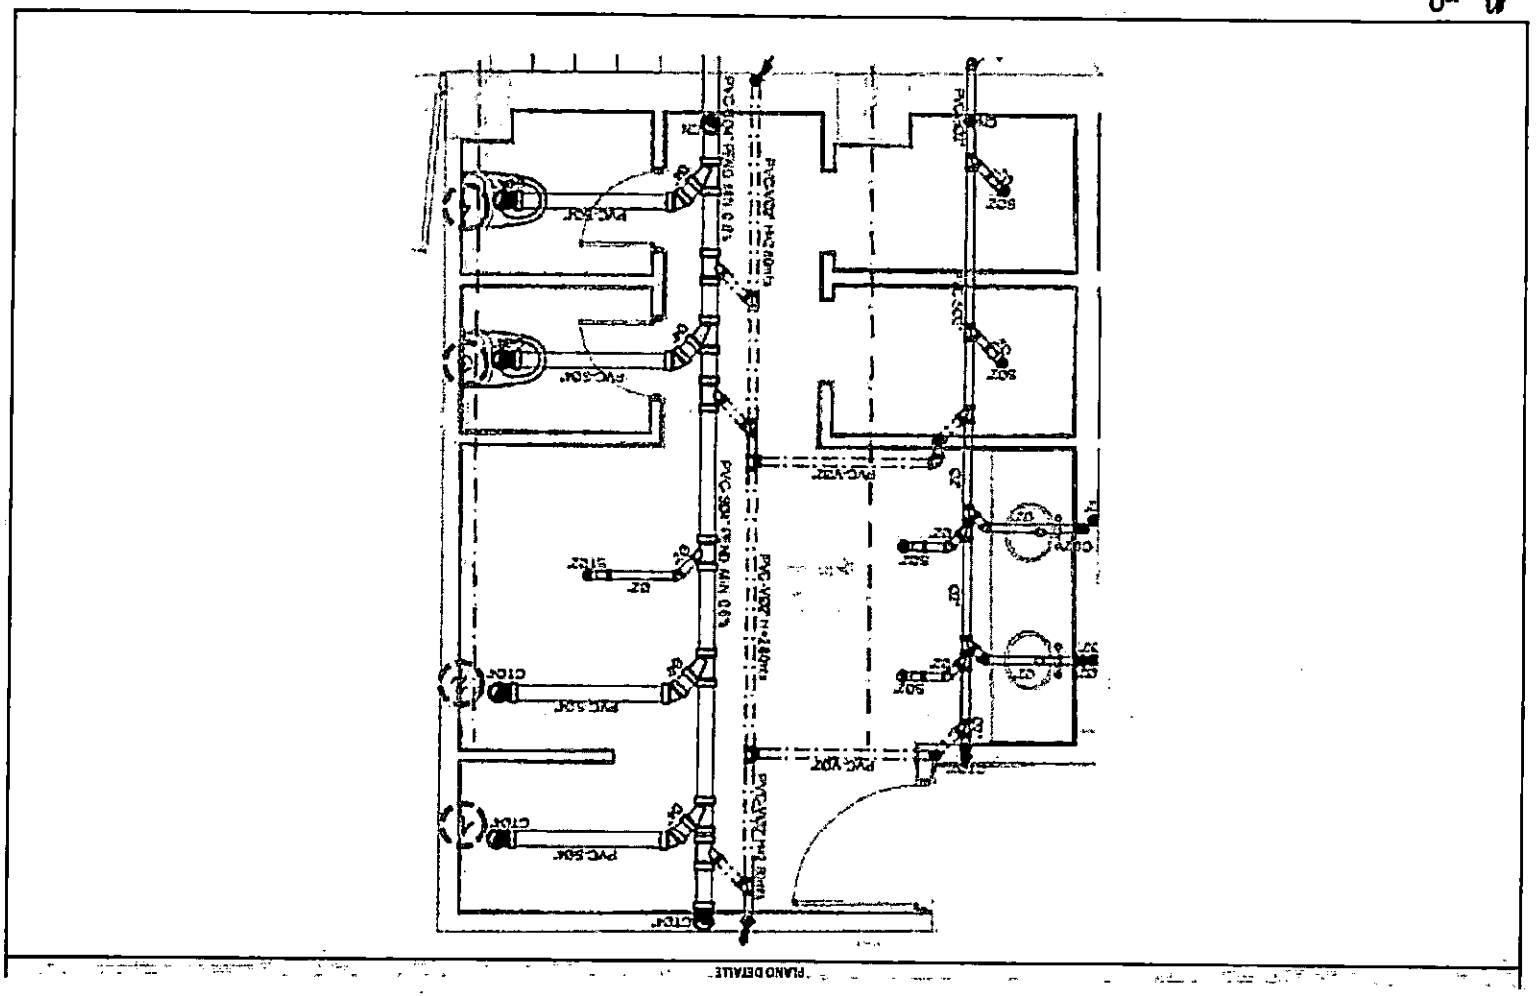
PLAN DETAILS

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA GENERAL

BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

PROYECTO: OBRAS SEDES ALCALDÍA

PRISMA
UNIVERSAL SEC S.A.S.
CONSORCIO PRUNI SEDES 04
CONTRATISTA


ARQUITECTURA URBANA LTDA.
INTERVENTORÍA

ACTA No.	7		PERIODO DEL ACTA	1/01/2020	A	30/01/2020	
OBJETO	REALIZAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE AJUSTE LAS DIFERENTES OBRAS E INTERVENCIONES ESPECIALIZADAS PARA LAS DIFERENTES SEDES DE LA SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C.						
CONTRATO DE OBRA No	731-2019	CONTRATISTA	CONSORCIO PRUNI SEDES 04		ENTIDAD CONTRATANTE	SECRETARIA GENERAL-ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA	
CONTRATO INTERVENTORÍA	730 DE 2019	INTERVENTORÍA	ARQUITECTURA URBANA LTDA		FRENTE:	IMPRENTA DISTRITAL	


CAPITULO	1.6.0	PUNTOS SANITARIOS	ITEM	1.6.0.2	5.5. Lavamanos 2"	UNIDAD	UN

ITEM	LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	TOTAL	UNIDAD
	BAÑO MUJERES PRIMER PISO						
1	LAVAMANOS				3,00	3,00	UN
OBSERVACIONES:				SUBTOTAL		3,00	UN
				TOTAL		3,00	UN

LOCALIZACIÓN PLANIMÉTRICA

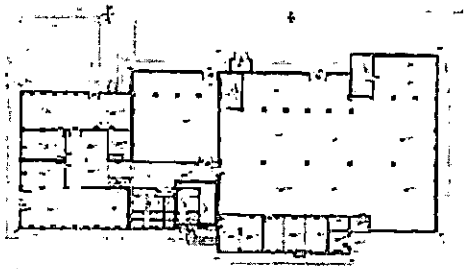


REGISTRO FOTOGRÁFICO

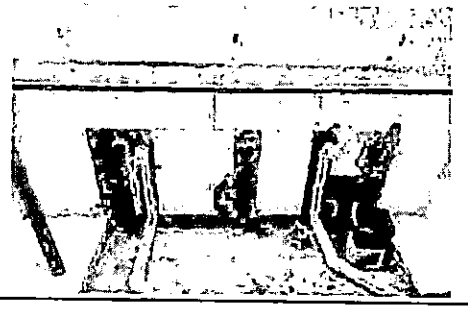

Alejandra Solaños t
ARQ. ALEJANDRA SOLAÑOS
RESIDENTE CONTRATISTA

Nancy Rocio Ayala Gomez
ARQ. NANCY AYALA
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

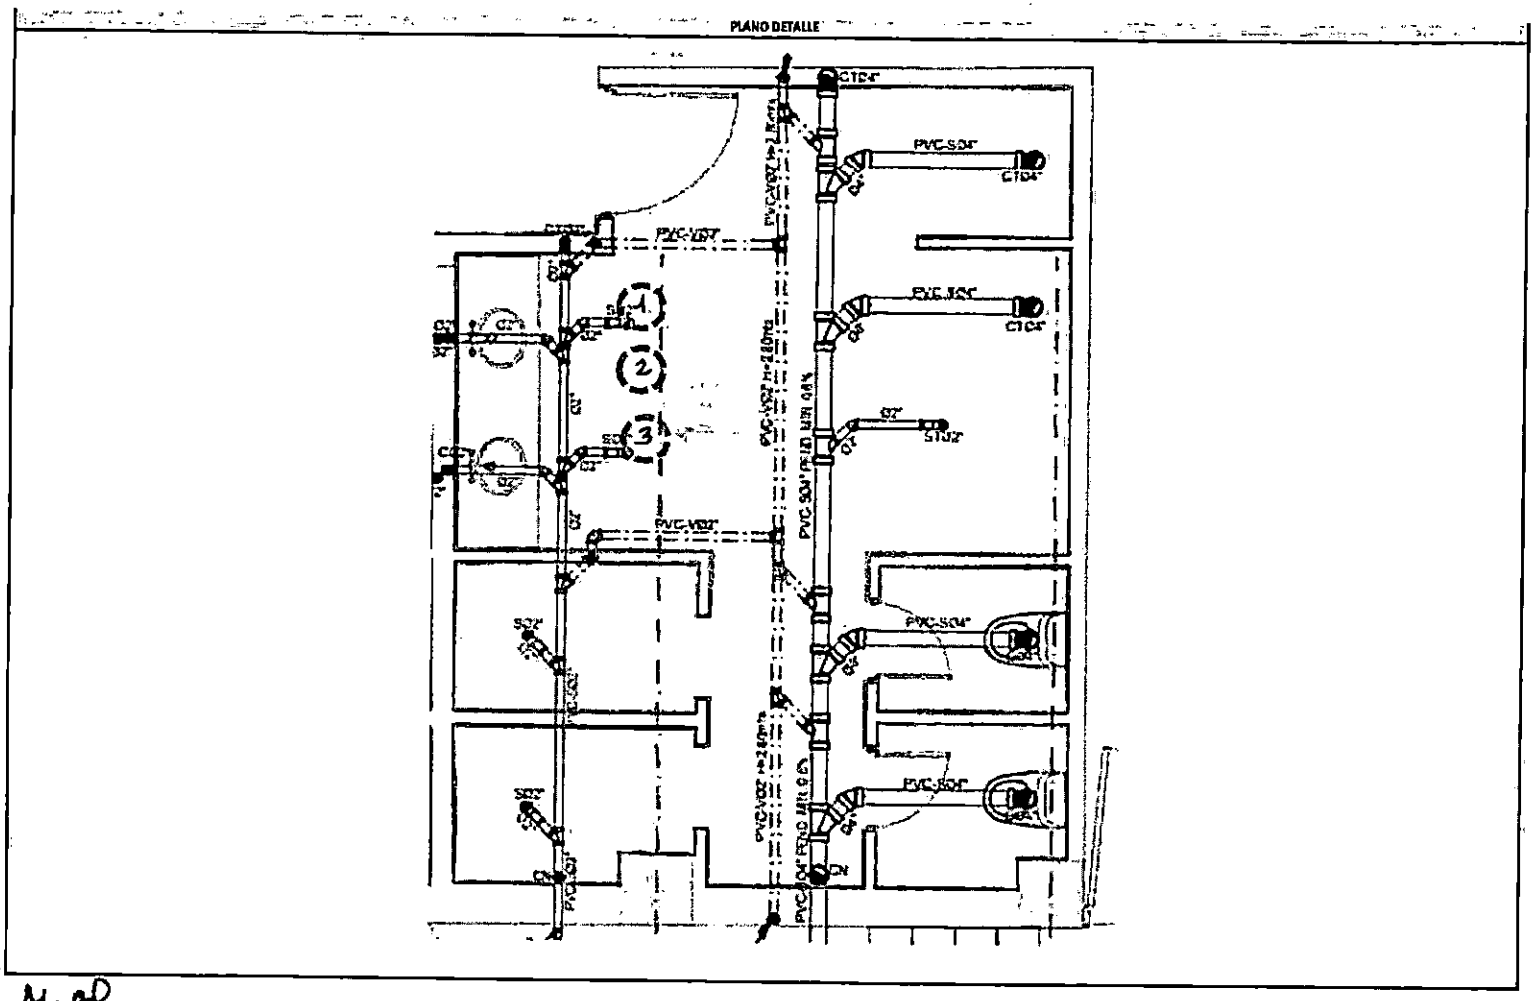
PLANO DETALLE
PVC-SAL
PVC-VENT
PVC-SAN
PVC-SAL
PVC-VENT
PVC-SAN
PVC-SAN
PVC-VENT
PVC-SAL

Ale

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA GENERAL | BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

PROYECTO: OBRAS SEDES ALCALDÍA

PRISMA UNIVERSAL SEC S.A.S. CONSORCIO PRUNI SEDES 04 — CONTRATISTA


ARQUITECTURA URBANA LTDA — INTERVENTORÍA

ACTA No.	7	PERIODO DEL ACTA	1/01/2020	A	30/01/2020		
OBJETO	REALIZAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE AJUSTE LAS DIFERENTES OBRAS E INTERVENCIONES ESPECIALIZADAS PARA LAS DIFERENTES SEDES DE LA SECRETARÍA GENERAL DE LA ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C.						
CONTRATO DE OBRA No	731-2019	CONTRATISTA	CONSORCIO PRUNI SEDES 04		ENTIDAD CONTRATANTE	SECRETARIA GENERAL-ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA	
CONTRATO INTERVENTORÍA	730 DE 2019	INTERVENTORÍA	ARQUITECTURA URBANA LTDA		FRENTE:	IMPRENTA DISTRITAL	

CAPITULO	1.6.0	PUNTOS SANITARIOS	ITEM	1.6.0.6	S.S. Sifón de piso 2"	UNIDAD	UN

ITEM	LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	TOTAL	UNIDAD
	BAÑO MUJERES PRIMER PISO						
1	SIFONES				3,00	3,00	UN

PLANO DETALLE

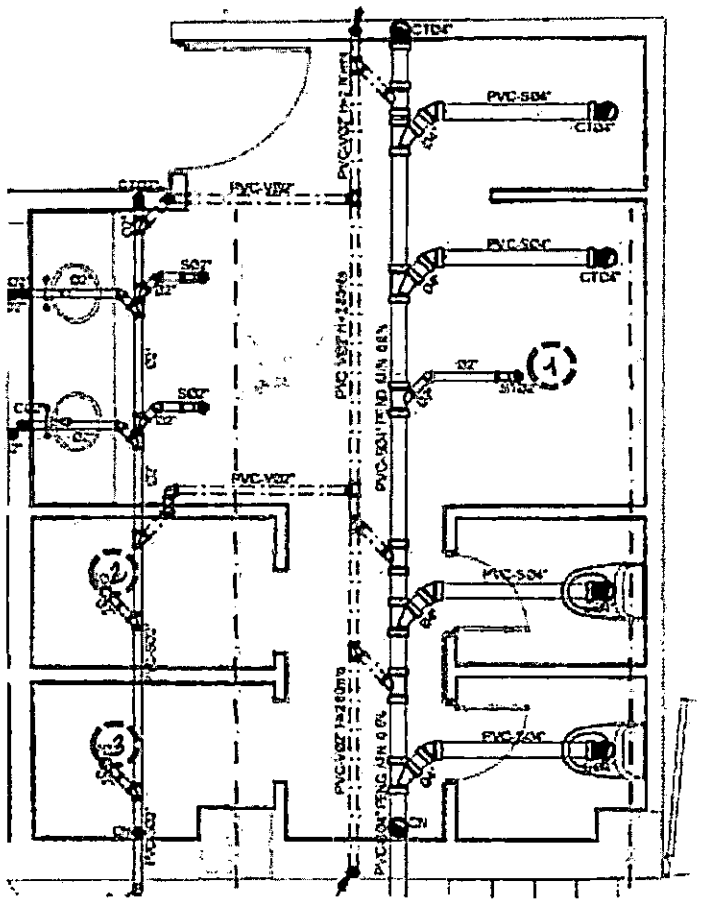

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA GENERAL

BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

PROYECTO: OBRAS SEDES ALCALDÍA


PRISMA — UNIVERSAL SEC S.A.S. — CONSORCIO PRUNI SEDES 04 — CONTRATISTA

ARQUITECTURA URBANA LTDA. — INTERVENTORÍA

ACTA No.	7		PERIODO DEL ACTA	1/01/2020	A	30/01/2020
OBJETO	REALIZAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE AJUSTE LAS DIFERENTES OBRAS E INTERVENCIONES ESPECIALIZADAS PARA LAS DIFERENTES SEDES DE LA SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C					
CONTRATO DE OBRA No	731-2019	CONTRATISTA	CONSORCIO PRUNI SEDES 04	ENTIDAD CONTRATANTE	SECRETARIA GENERAL-ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA	
CONTRATO INTERVENTORÍA	730 DE 2019	INTERVENTORÍA	ARQUITECTURA URBANA LTDA	FRENTE:	IMPRENTA DISTRITAL	

CAPÍTULO	1.7.0	OBRAS CIVILES	ITEM	1.7.0.6	Excavación manual incluye retiro de material y Disposición final en sitios autorizados	UNIDAD	M3

ITEM	LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	TOTAL	UNIDAD
1	Costado sur	43,1	0,2	0,3	1,00	2,59	M3

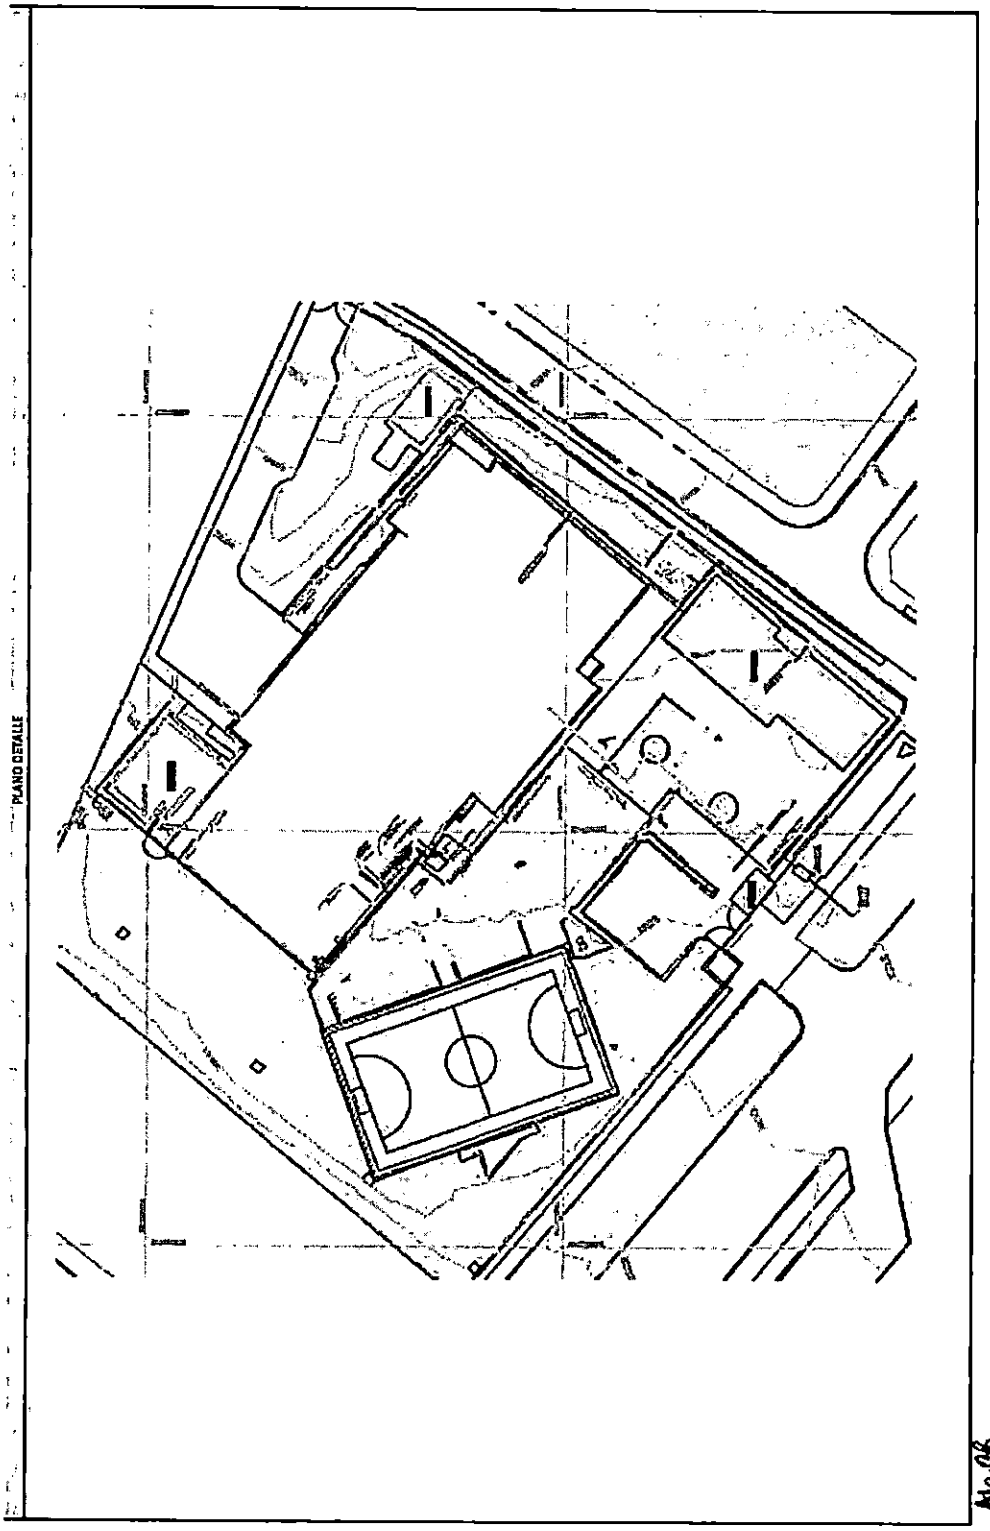
PIANO DETAILE

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. | BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS
SECRETARÍA GENERAL

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

PROYECTO: OBRAS SEDES ALCALDÍA

PRISMA — UNIVERSAL SEC S.A.S. — CONSORCIO PRUNI SEDES D4 — CONTRATISTA

ARQUITECTURA URBANA LTDA — INTERVENTORÍA


ACTA No.	7	PERIODO DEL ACTA	1/01/2020	A	30/01/2020	
OBJETO	REALIZAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE AJUSTE LAS DIFERENTES OBRAS E INTERVENCIONES ESPECIALIZADAS PARA LAS DIFERENTES SEDES DE LA SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C.					
CONTRATO DE OBRA No	731-2019	CONTRATISTA	CONSORCIO PRUNI SEDES D4	ENTIDAD CONTRATANTE	SECRETARIA GENERAL-ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA	
CONTRATO INTERVENTORÍA	730 DE 2019	INTERVENTORÍA	ARQUITECTURA URBANA LTDA	FRENTE:	IMPRENTA DISTRITAL	

CAPITULO	1.7.0	OBRAS CIVILES	ITEM	1.7.0.8	Relleno en base granular BG_Gr1 o B-600	UNIDAD	M3

ITEM	LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	TOTAL	UNIDAD
	COSTADO SUR						
1	Zona Exterior Cafetería	5,70	0,55	0,35	1,00	1,10	M3
					SUBTOTAL	1,10	M3
					TOTAL	1,10	M3

OBSERVACIONES:

LOCALIZACIÓN PLANIMÉTRICA

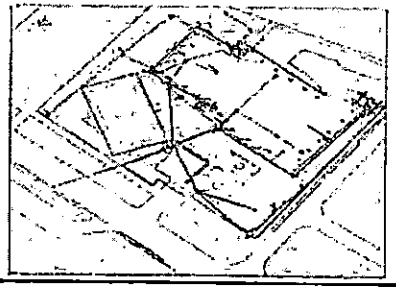

REGISTRO FOTOGRÁFICO




Alejandra Bolaños t
ARQ. ALEJANDRA BOLAÑOS
RESIDENTE CONTRATISTA

Nancy Ayala Gomez
ARQ. NANCY AYALA
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

212

162

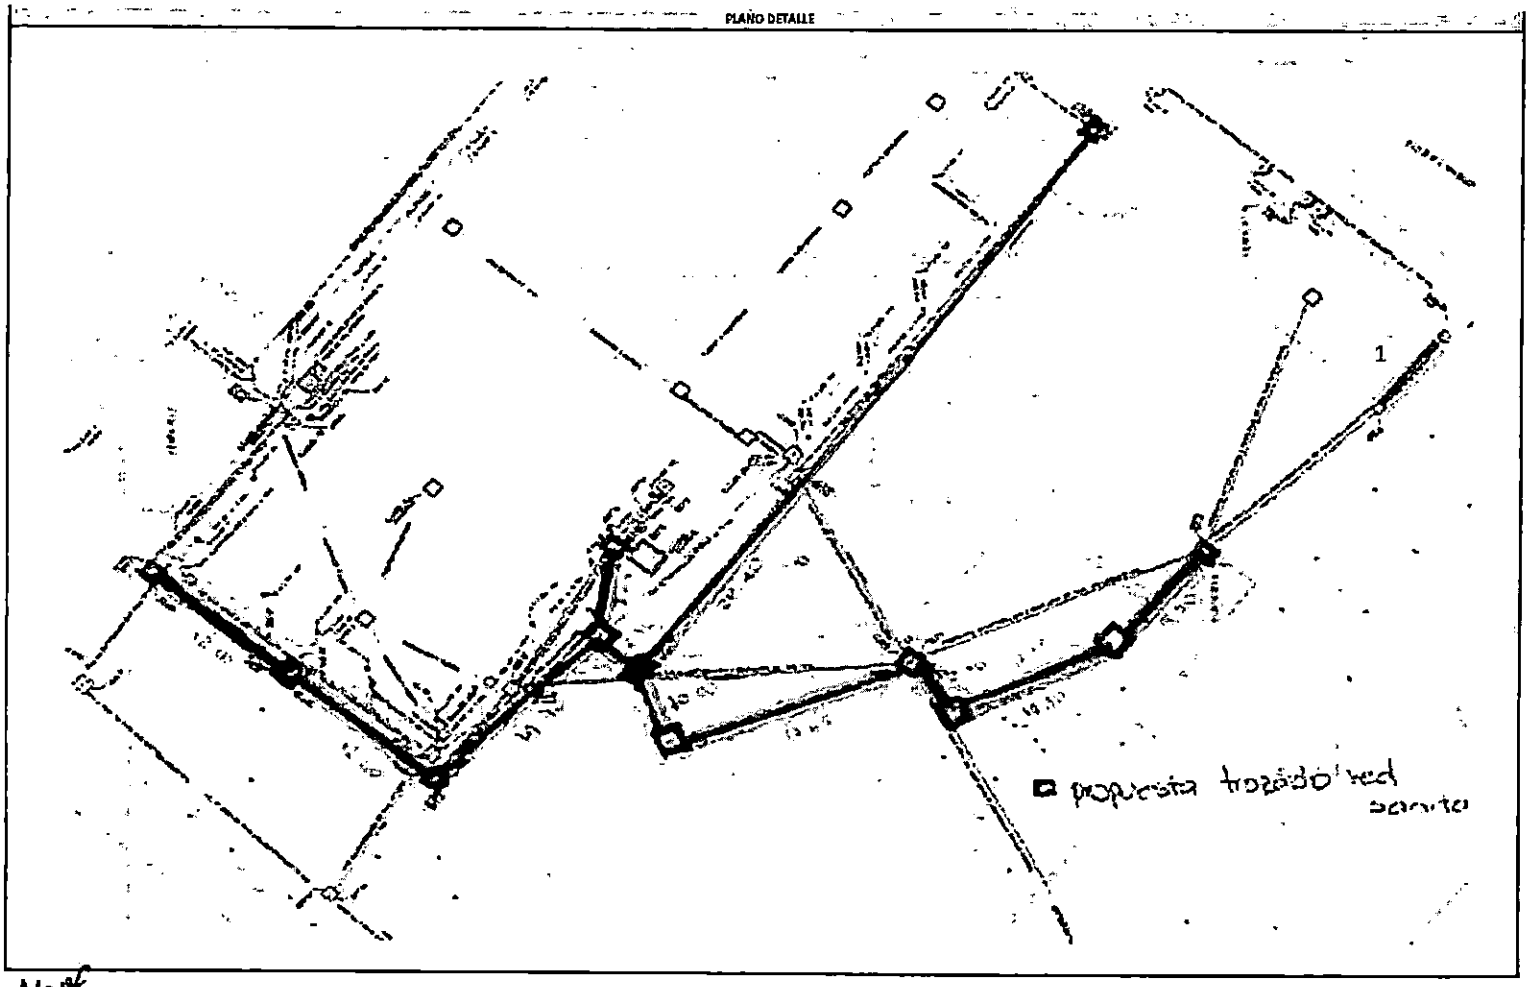

Akaf

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA GENERAL

BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

PROYECTO: OBRAS SEDES ALCALDÍA

PRISMA — UNIVERSAL SEC S.A.S. — CONSORCIO PRUNI SEDES 04 — CONTRATISTA


ARQUITECTURA URBANA LTDA — INTERVENTORÍA

ACTA No.	7	PERIODO DEL ACTA	1/01/2020	A	30/01/2020		
OBJETO	REALIZAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE AJUSTE LAS DIFERENTES OBRAS E INTERVENCIONES ESPECIALIZADAS PARA LAS DIFERENTES SEDES DE LA SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C.						
CONTRATO DE OBRA No	731-2019	CONTRATISTA	CONSORCIO PRUNI SEDES 04		ENTIDAD CONTRATANTE	SECRETARIA GENERAL-ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA	
CONTRATO INTERVENTORÍA	730 DE 2019	INTERVENTORÍA	ARQUITECTURA URBANA LTDA		FRENTE:	IMPRENTA DISTRITAL	


CAPITULO	1.7.0	OBRAS CIVILES	ITEM	1.7.0.9	Relleno en arena	UNIDAD	M3

ITEM	LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	TOTAL	UNIDAD
	COSTADO SUR						
1	Zona Exterior Cafetetria	5,70	0,55	0,25	1,00	0,78	M3

LOCALIZACIÓN PLANIMÉTRICA

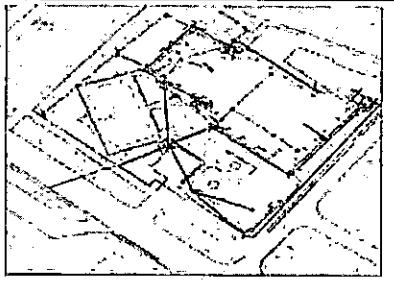

REGISTRO FOTOGRÁFICO

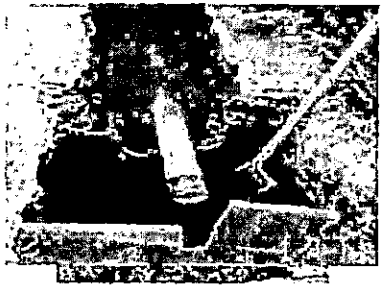


OBSERVACIONES:	SUBTOTAL	0,78	M3
	TOTAL	0,78	M3

Alejandra Bolaños +

ARQ. ALEJANDRA BOLAÑOS
RESIDENTE CONTRATISTA

Nancy Rocío Ayala Gómez

ARQ. NANCY AYALA
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

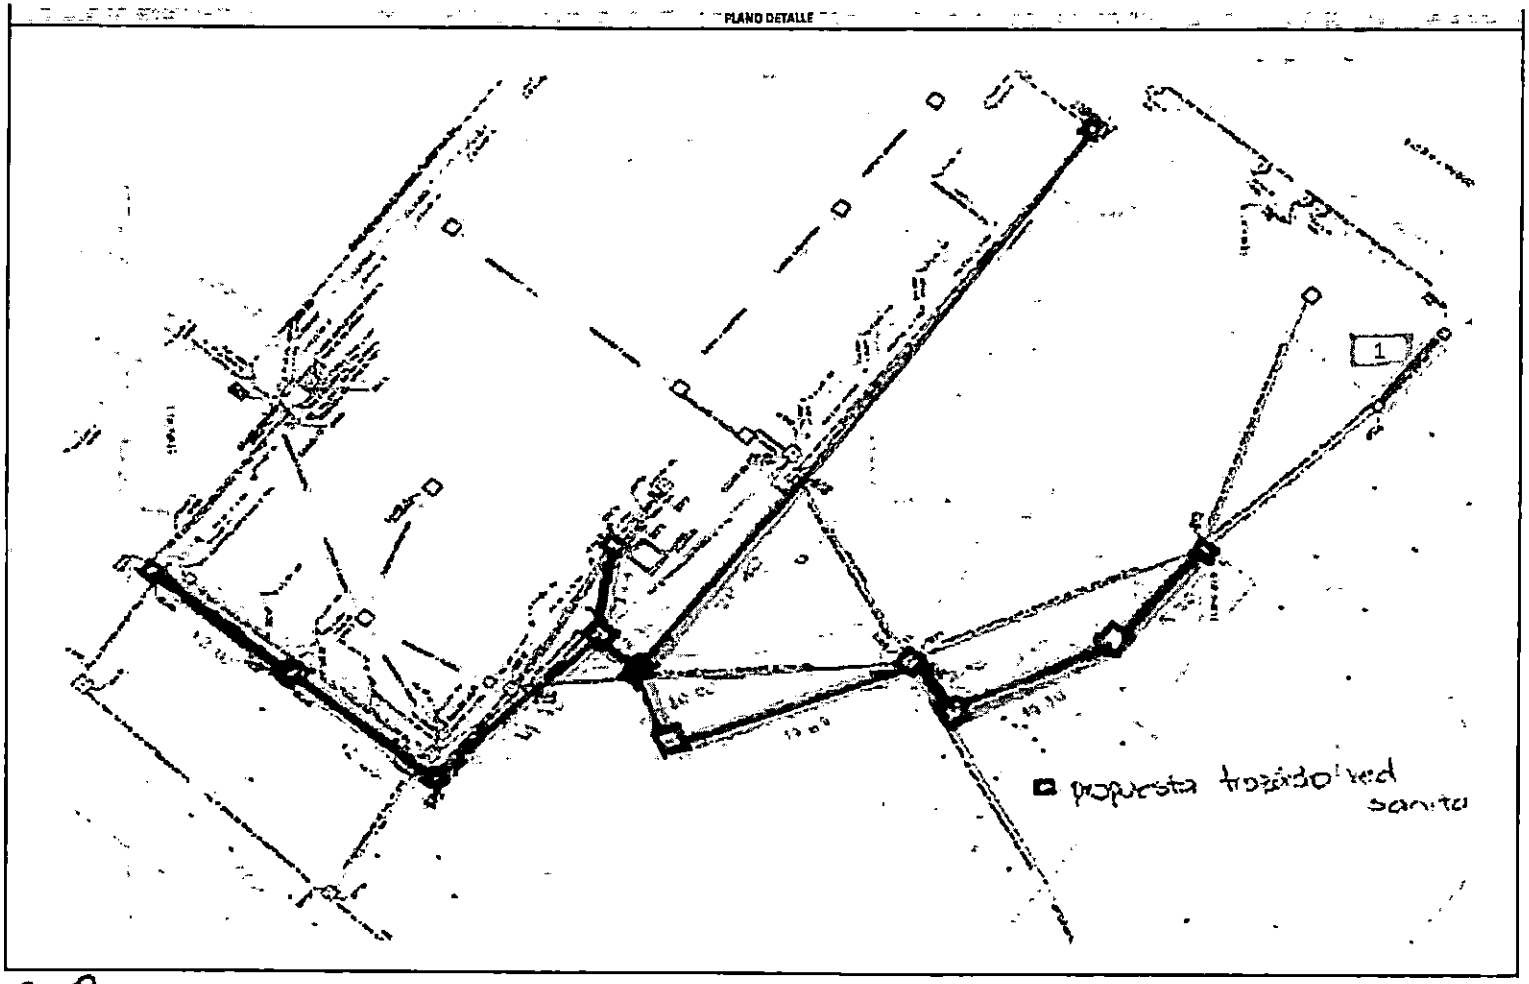
PLANO DETALLE
1
propuesta trazado red
sanita

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA GENERAL | BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

PROYECTO: OBRAS SEDES ALCALDÍA

PRISMA — UNIVERSAL SEC S.A.S. — CONSORCIO PRUNI SEDES 04 — CONTRATISTA

ARQUITECTURA URBANA LTDA — INTERVENTORÍA


ACTA No.	7		PERIODO DEL ACTA	1/01/2020	A	30/01/2020	
OBJETO	REALIZAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE AJUSTE LAS DIFERENTES OBRAS E INTERVENCIONES ESPECIALIZADAS PARA LAS DIFERENTES SEDES DE LA SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C.						
CONTRATO DE OBRA No	731-2019	CONTRATISTA	CONSORCIO PRUNI SEDES 04		ENTIDAD CONTRATANTE	SECRETARIA GENERAL-ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA	
CONTRATO INTERVENTORÍA	730 DE 2019	INTERVENTORÍA	ARQUITECTURA URBANA LTDA		FRENTE:	IMPRENTA DISTRITAL	

CAPITULO	1.7.0	OBRAS CIVILES	ITEM	1.7.0.15	Regatas en muro	UNIDAD	ML


ITEM	LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	TOTAL	UNIDAD
	Entre los ejes 1-J y 1'-2'						
1	BAÑO MUJERES 1ER PISO			4,45	6,00	26,70	ML
2	BAÑO MUJERES 1ER PISO			4,32	1,00	4,32	ML
3	BAÑO MUJERES 1ER PISO			3,23	1,00	3,23	ML
4	BAÑO MUJERES 1ER PISO			2,93	2,00	5,86	ML
					SUBTOTAL	40,11	ML
					TOTAL	40,11	ML

OBSERVACIONES:

LOCALIZACIÓN PLANIMÉTRICA

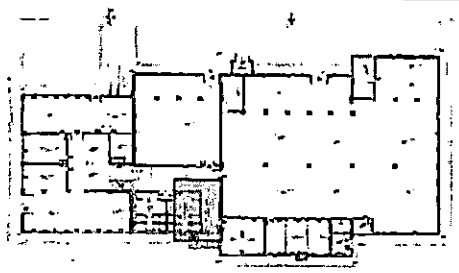

REGISTRO FOTOGRÁFICO

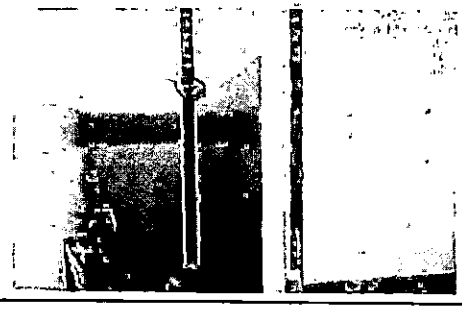

Alejandra Bolaños +

ARQ. ALEJANDRA BOLAÑOS
RESIDENTE CONTRATISTA


Nancy Rocio Ayala Gomez

ARQ. NANCY AYALA
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

214

166

PLANO DETALLE

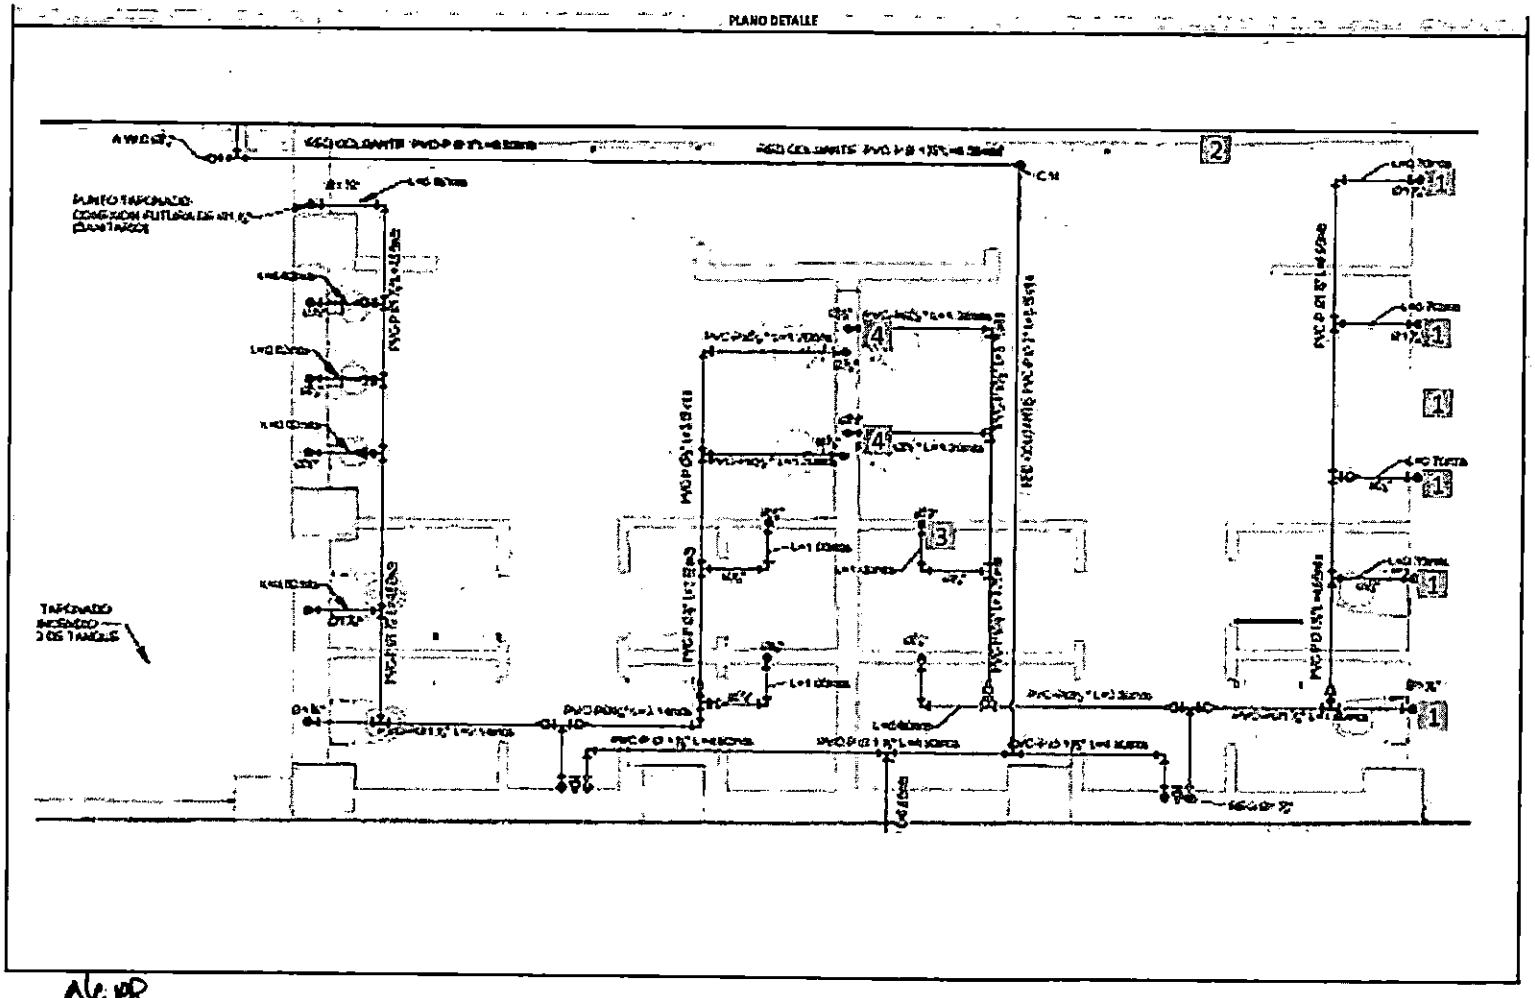

Ale 18

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA GENERAL

BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

PROYECTO: OBRAS SEDES ALCALDÍA


PRISMA — UNIVERSAL SEC S.A.S. — CONTRATISTA

ARQUITECTURA URBANA LTDA — INTERVENTORÍA

ACTA No.	7	PERIODO DEL ACTA	1/01/2020	A	30/01/2020		
OBJETO	REALIZAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE AJUSTE LAS DIFERENTES OBRAS E INTERVENCIONES ESPECIALIZADAS PARA LAS DIFERENTES SEDES DE LA SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C.						
CONTRATO DE OBRA No	731-2019	CONTRATISTA	CONSORCIO PRUNI SEDES D4		ENTIDAD CONTRATANTE	SECRETARIA GENERAL-ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA	
CONTRATO INTERVENTORÍA	730 DE 2019	INTERVENTORÍA	ARQUITECTURA URBANA LTDA		FRENTE:	IMPRENTA DISTRITAL	

CAPITULO	1.7.0	OBRAS CIVILES	ITEM	1.7.0.20	Reposicion ladrillo cemento	UNIDAD	M2

ITEM	LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	TOTAL	UNIDAD
1	Costado sur	8,3	0,8		1,00	6,64	M2
2	Costado sur	14,00	0,30		1,00	4,20	M2
3	Costado sur	1,55	0,30		1,00	0,47	M2

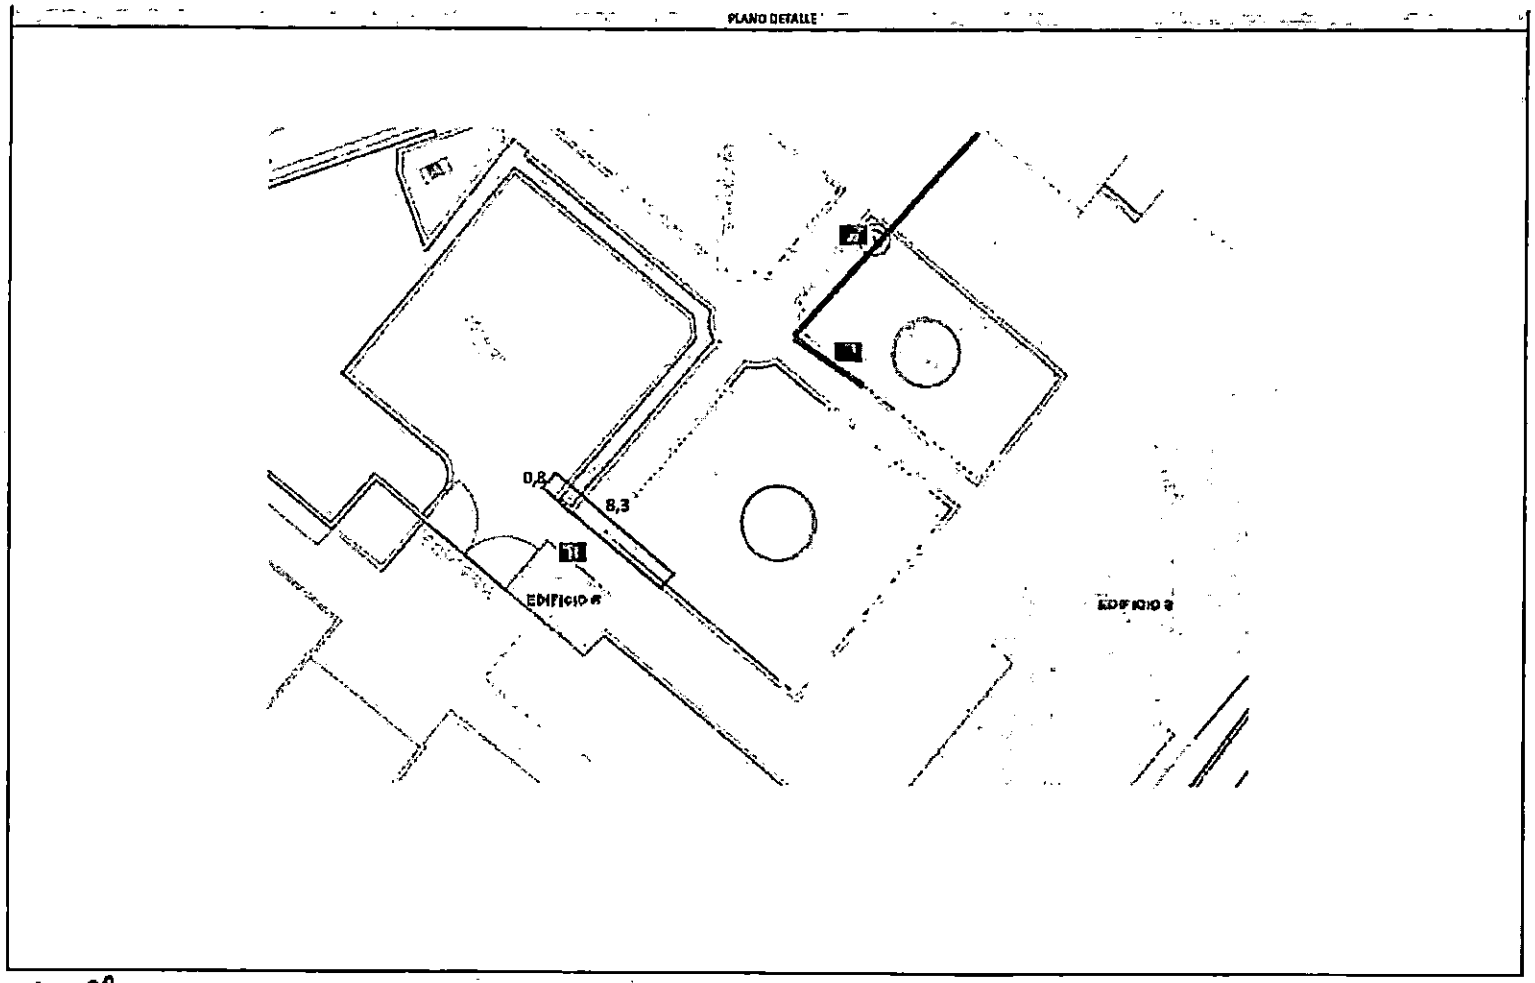

Ale 128

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
Secretaría Integración Social

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

PROYECTO: OBRAS SEDES ALCALDÍA

PRISMA — UNIVERSAL SEC S.A.S. — CONSORCIO PRUNI SEDES D4 — CONTRATISTA

ARQUITECTURA URBANA LTDA — INTERVENTORÍA


ACTA No.	7		PERIODO DEL ACTA	1/01/2020	A	30/01/2020	
OBJETO	REALIZAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE AJUSTE LAS DIFERENTES OBRAS E INTERVENCIONES ESPECIALIZADAS PARA LAS DIFERENTES SEDES DE LA SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C.						
CONTRATO DE OBRA No	731-2019	CONTRATISTA	CONSORCIO PRUNI SEDES D4		ENTIDAD CONTRATANTE	SECRETARIA GENERAL-ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA	
CONTRATO INTERVENTORÍA	730 DE 2019	INTERVENTORÍA	ARQUITECTURA URBANA LTDA		FRENTE:	IMPRENTA DISTRITAL	

CAPÍTULO	1.11.0	VARIOS	ITEM	1.11.0.2	PRUEBA DE PRESIÓN	UNIDAD	UND


ITEM	LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	TOTAL	UNIDAD
	Entre los ejes A-J y 1-5						
1	Costado sur				2,00	2,00	UND
2	Baños primer piso				1,00	1,00	UND
3	Baños segundo piso				1,00	1,00	UND
	SUBTOTAL					4,00	UND
	TOTAL					4,00	UND

OBSERVACIONES:

LOCALIZACIÓN PLANIMÉTRICA

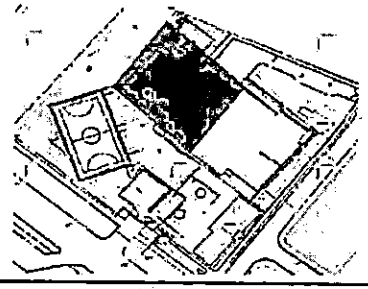

REGISTRO FOTOGRÁFICO

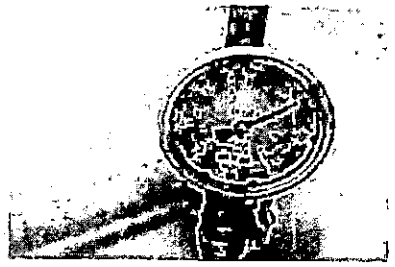


Alejandra Bolaños

ARQ. ALEJANDRA BOLAÑOS
RESIDENTE CONTRATISTA

Nancy Rocio Ayala Gomez

ARQ. NANCY AYALA
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

PLANO DETALLE

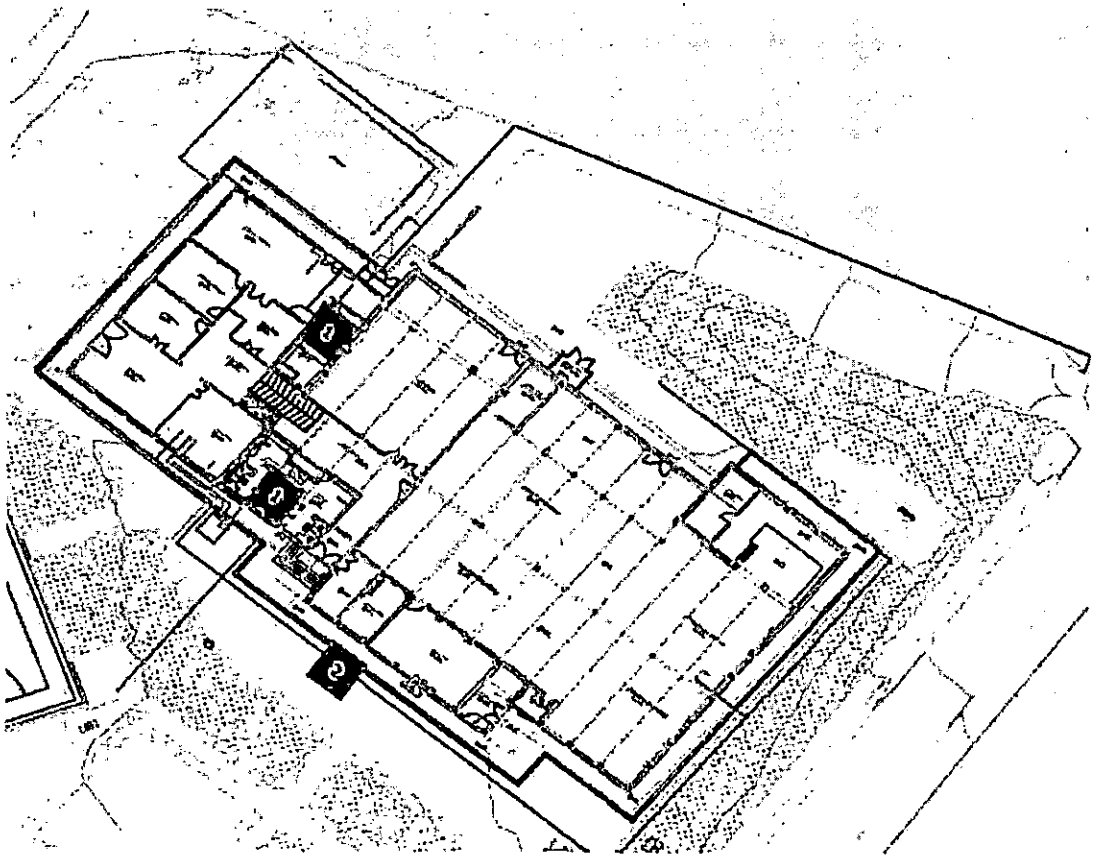

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA GENERAL | BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

PROYECTO: OBRAS SEDES ALCALDÍA

PRISMA — UNIVERSALSEC S.A.S. — CONSORCIO PRUMI SEDES 04 — CONTRATISTA

ARQUITECTURA URBANA LTDA. — INTERVENTORÍA


ACTA No.	7	PERIODO DEL ACTA	1/01/2020	A	30/01/2020	
OBJETO	REALIZAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE AJUSTE LAS DIFERENTES OBRAS E INTERVENCIONES ESPECIALIZADAS PARA LAS DIFERENTES SEDES DE LA SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C.					
CONTRATO DE OBRA No	731-2019	CONTRATISTA	CONSORCIO PRUMI SEDES 04	ENTIDAD CONTRATANTE	SECRETARIA GENERAL-ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA	
CONTRATO INTERVENTORÍA	730 DE 2019	INTERVENTORÍA	ARQUITECTURA URBANA LTDA	FRENTE:	IMPRENTA DISTRITAL	

CAPÍTULO	1.12.0	OTROS	ITEM	1.12.0.1	SUMINISTRO EQUIPO PRESION TIPO LAPICERO 2 BOMBAS 2 HP + 1 HIDRO 200 LTS CON TABLERO VARIADOR DE VELOCIDAD	UNIDAD	UN


ITEM	LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES FIGURA	DIMENSIONES LARGO (m)	DIMENSIONES PESO (kg/m)	CANTIDAD	TOTAL	UNIDAD
1	EQUIPO PRESION TIPO LAPICERO 2 BOMBAS 2 HP + 1 HIDRO 200 LTS CON TABLERO VARIADOR DE VELOCIDAD				0,40	0,400	UN
				SUBTOTAL		0,40	UN
				TOTAL		0,40	UN

OBSERVACIONES:

REGISTRO FOTOGRÁFICO

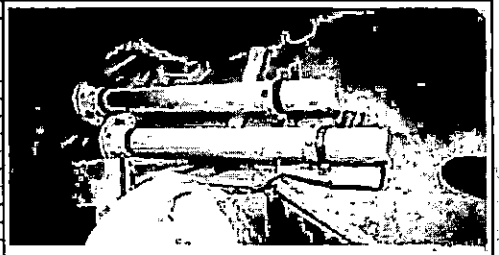

REGISTRO FOTOGRÁFICO

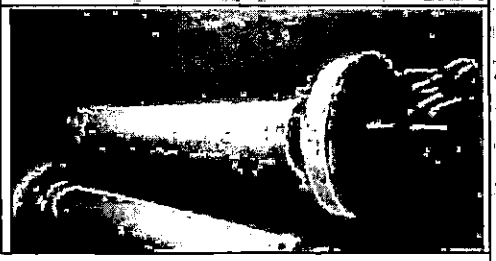

Alejandra Bolaños

ARQ. ALEJANDRA BOLAÑOS
RESIDENTE CONTRATISTA

ARQ. NANCY AYALA
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA GENERAL

BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

PROYECTO: OBRAS SEDES ALCALDÍA

PRISMA — UNIVERSAL SEC S.A.S. — CONSORCIO PRUNI SEDES 04 — CONTRATISTA

ARQUITECTURA URBANA LTDA — INTERVENTORÍA


ACTA No.	7		PERIODO DEL ACTA	01/01/2020	A	30/01/2020	
OBJETO	REALIZAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE AJUSTE LAS DIFERENTES OBRAS E INTERVENCIONES ESPECIALIZADAS PARA LAS DIFERENTES SEDES DE LA SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTA D.C.						
CONTRATO DE OBRA No	731-2019	CONTRATISTA	CONSORCIO PRUNI SEDES 04		ENTIDAD CONTRATANTE	SECRETARIA GENERAL-ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA	
CONTRATO INTERVENTORÍA	730 DE 2019	INTERVENTORÍA	ARQUITECTURA URBANA LTDA		FRENTE:	IMPRENTA DISTRITAL	

CAPITULO	2.1.0	PRELIMINARES	ITEM	2.1.0.2	Localización y replanteo	UNIDAD	M2

ITEM	LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	TOTAL	UNIDAD
1	BAÑO SUBDIRECCION 2DO PISO	6,10	4,64		1,00	28,30	M2
2	BAÑO MUJERES 1ER PISO	3,05	1,45		1,00	4,42	M2
3	BODEGA FACHADA PRINCIPAL	6,00	5,45		1,00	32,70	M2
				SUBTOTAL		65,43	M2
				TOTAL		65,43	M2

OBSERVACIONES:

LOCALIZACIÓN PLANIMÉTRICA

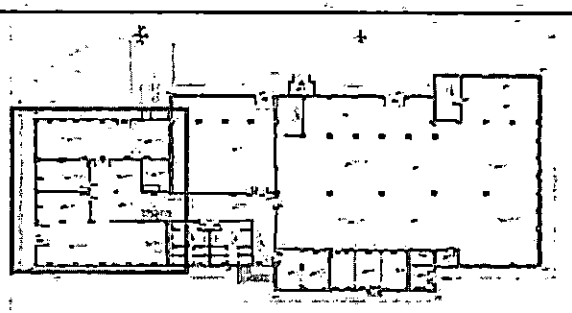

REGISTRO FOTOGRÁFICO



Alejandra Bolaños

ARQ. ALEJANDRA BOLAÑOS
RESIDENTE CONTRATISTA


Nancy Ayala Gomez

ARQ. NANCY AYALA
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

218

185

PLANO DETALLE

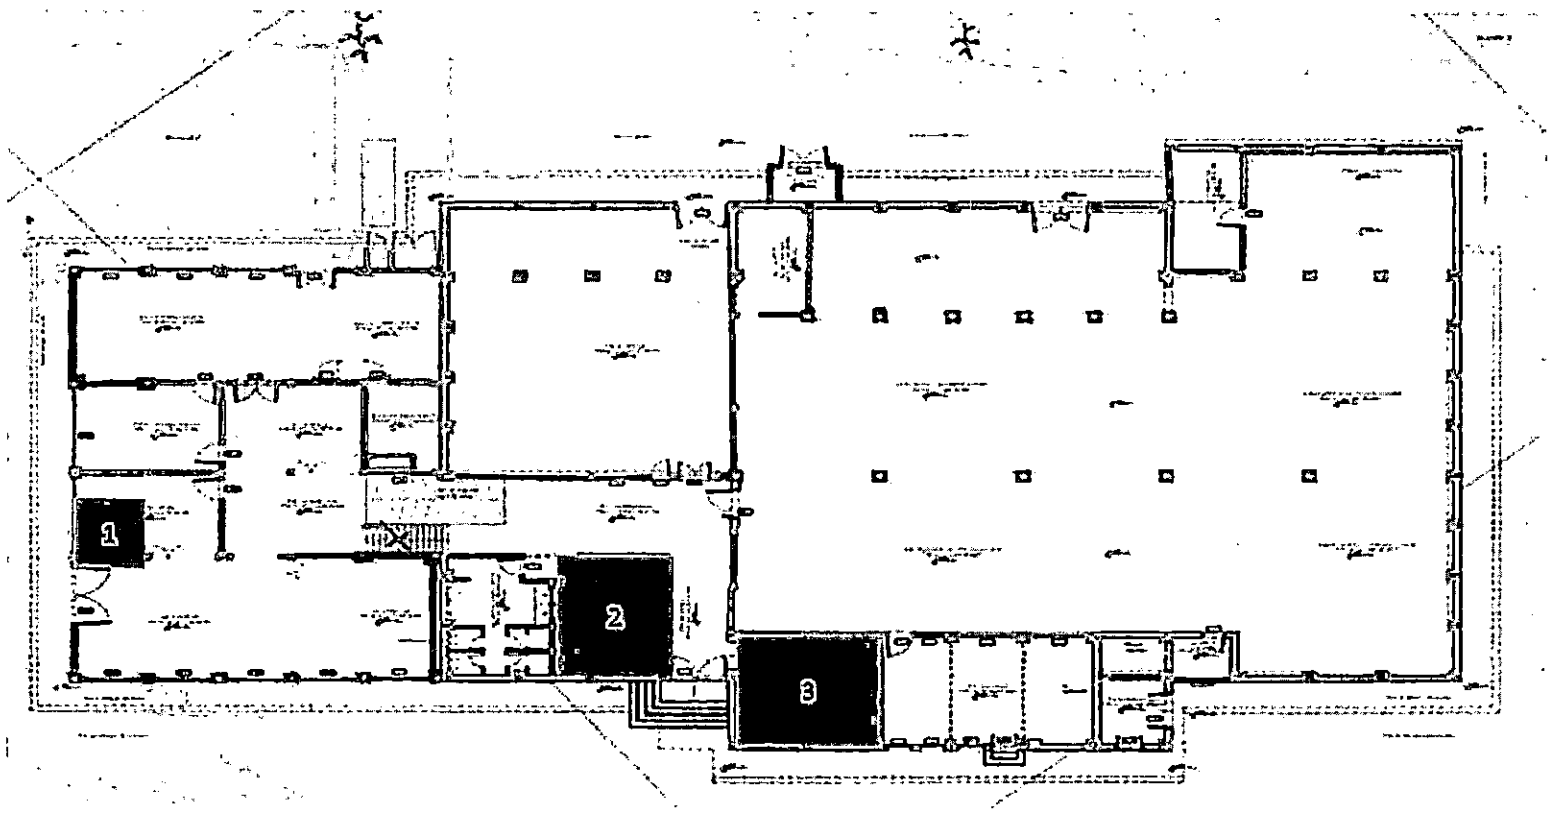

Alexis

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. | BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS
SECRETARÍA GENERAL

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

PROYECTO: OBRAS SEDES ALCALDÍA

PRISMA — UNIVERSAL SEC S.A.S. — CONSORCIO PRUNI SEDES 04 — CONTRATISTA


ARQUITECTURA URBANA LTDA — INTERVENTORÍA

ACTA No.	7		PERIODO DEL ACTA	01/01/2020	A	30/01/2020	
OBJETO	REALIZAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE AJUSTE LAS DIFERENTES OBRAS E INTERVENCIONES ESPECIALIZADAS PARA LAS DIFERENTES SEDES DE LA SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C.						
CONTRATO DE OBRA No	731-2019	CONTRATISTA	CONSORCIO PRUNI SEDES 04		ENTIDAD CONTRATANTE	SECRETARIA GENERAL-ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA	
CONTRATO INTERVENTORÍA	730 DE 2019	INTERVENTORÍA	ARQUITECTURA URBANA LTDA		FRENTE:	IMPRENTA DISTRITAL	


CAPITULO	2.1.0	PRELIMINARES	ITEM	2.1.0.3	Baño móvil	UNIDAD	M2

ITEM	LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	TOTAL	UNIDAD
1	Baño movil (Instalado 17 de julio) Mes Enero 2020				1,00	1,00	MES
2	Baño movil (Instalado 02 de Septiembre) Mes Enero 2020				1,00	1,00	MES
3	Baño movil (Instalado 25 de Noviembre) Mes Enero 2020				1,00	1,00	MES
OBSERVACIONES:				SUBTOTAL		3,00	MES
				TOTAL		3,00	MES

LOCALIZACION PLANIMETRICA

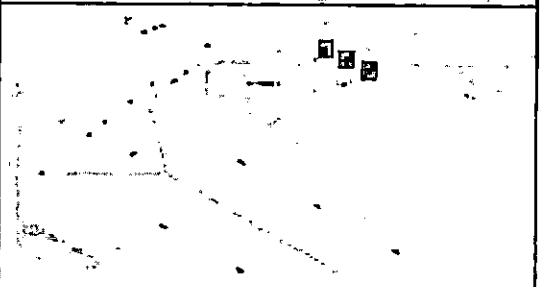

REGISTRO FOTOGRAFICO

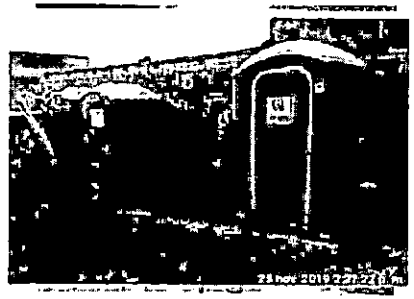

Alejandra Bolaños t
ARQ. ALEJANDRA BOLAÑOS
RESIDENTE CONTRATISTA

Nancy Ayala Gómez
ARQ. NANCY AYALA
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

219

187

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. | BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS
SECRETARÍA GENERAL

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

PROYECTO: OBRAS SEDES ALCALDÍA

PRISMA — UNIVERSAL SEC S.A.S. — CONSORCIO PRUNI SEDES 04 — CONTRATISTA

ARQUITECTURA URBANA LTDA — INTERVENTORÍA


ACTA No.	7		PERIODO DEL ACTA	01/01/2020	A	30/01/2020
OBJETO	REALIZAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE AJUSTE LAS DIFERENTES OBRAS E INTERVENCIONES ESPECIALIZADAS PARA LAS DIFERENTES SEDES DE LA SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C.					
CONTRATO DE OBRA No	731-2019	CONTRATISTA	CONSORCIO PRUNI SEDES 04	ENTIDAD CONTRATANTE	SECRETARIA GENERAL-ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA	
CONTRATO INTERVENTORÍA	730 DE 2019	INTERVENTORÍA	ARQUITECTURA URBANA LTDA	FRENTE:	IMPRENTA DISTRITAL	

CAPITULO	2.2.0	CIMENTACIÓN	ITEM	2.2.0.1	Demoler piso y contrapiso	UNIDAD	M2


ITEM	LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	TOTAL	UNIDAD
1	COSTADO SUR	12,40	1,92		1,00	22,25	M2
2	COSTADO OCCIDENTAL	14,00	1,92		1,00	25,35	M2
3	COSTADO NORTE	11,90	1,95		1,00	20,27	M2
				SUBTOTAL		67,87	M2
				TOTAL		67,87	M2

OBSERVACIONES:

LOCALIZACIÓN PLANIMÉTRICA

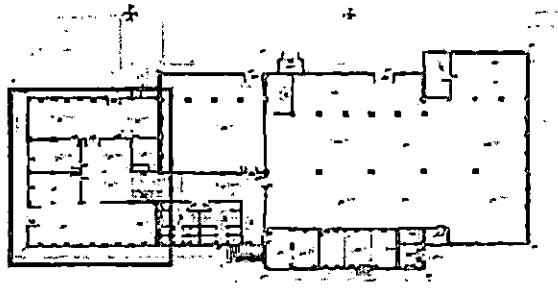


REGISTRO FOTOGRÁFICO

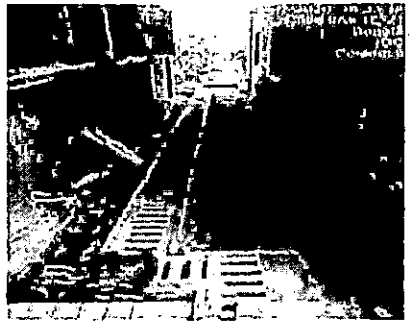

Alejandra Bolaños +
ARQ. ALEJANDRA BOLAÑOS
RESIDENTE CONTRATISTA

Nancy Ayala Gómez
ARQ. NANCY AYALA
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

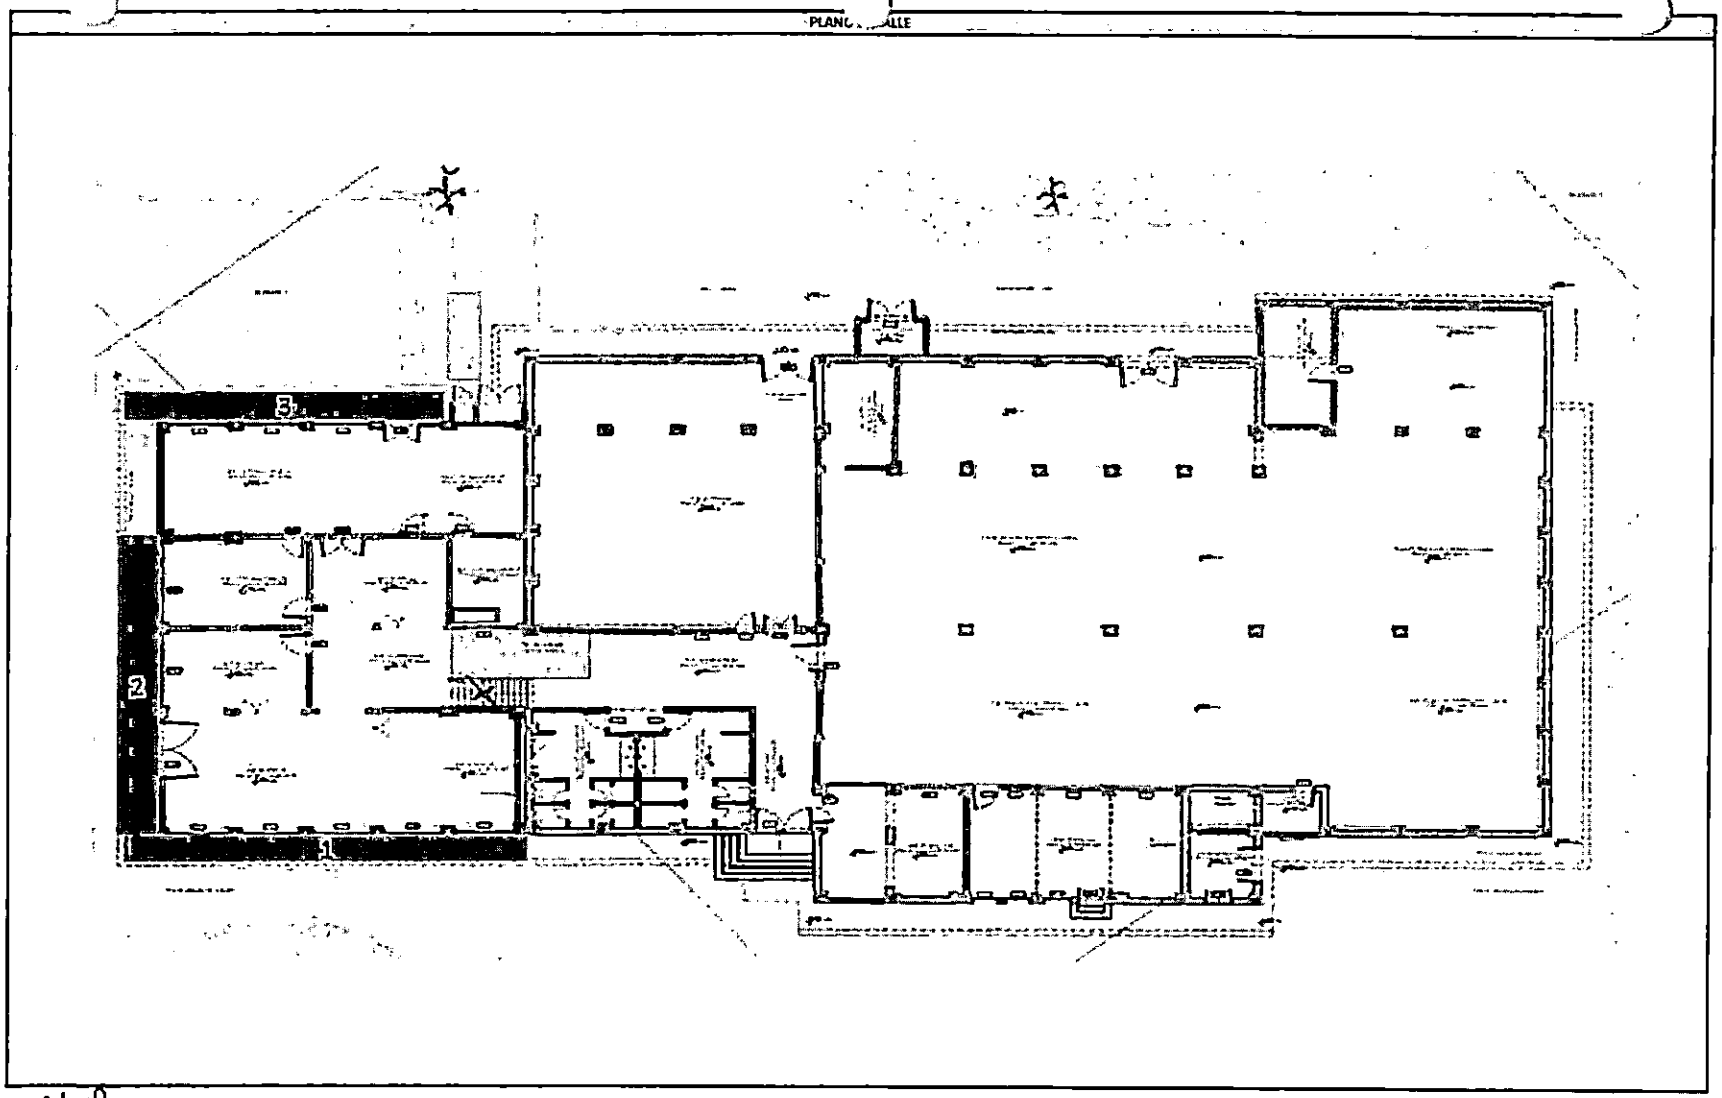

Abb

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. | BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS
SECRETARÍA GENERAL

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

PROYECTO: OBRAS SEDES ALCALDÍA

PRISMA | UNIVERSE SEC S.A.S. (CONSORCIO PRUNI SEDES 04) — CONTRATISTA
ARQUITECTURA URBANA LTDA. — INTERVENTORÍA


ACTA No.	7		PERIODO DEL ACTA	1/01/2020	A	30/01/2020
OBJETO	REALIZAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE AJUSTE LAS DIFERENTES OBRAS E INTERVENCIONES ESPECIALIZADAS PARA LAS DIFERENTES SEDES DE LA SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C.					
CONTRATO DE OBRA No	731-2019	CONTRATISTA	CONSORCIO PRUNI SEDES 04	ENTIDAD CONTRATANTE	SECRETARIA GENERAL-ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA	
CONTRATO INTERVENTORÍA	730 DE 2019	INTERVENTORÍA	ARQUITECTURA URBANA LTDA	FRENTE:	IMPRENTA DISTRITAL	

CAPITULO	2.2.0	CIMENTACIÓN	ITEM	2.2.0.3	Relleno en recebo en areas sin concreto, se considera recebo B-400	UNIDAD	M3


ITEM	LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	TOTAL	UNIDAD
1	COSTADO SUR	12,40	1,26	0,40	1,00	6,25	M3
2	COSTADO OCCIDENTAL	14,00	1,92	0,40	1,00	10,75	M3
2	COSTADO OCCIDENTAL	7,40	0,50	0,40	1,00	1,48	M3
3	COSTADO NORTE	11,90	1,95	0,40	1,00	9,28	M3
				PARCIAL		27,76	M3
				TOTAL		27,76	M3

OBSERVACIONES:

LOCALIZACIÓN PLANIMÉTRICA

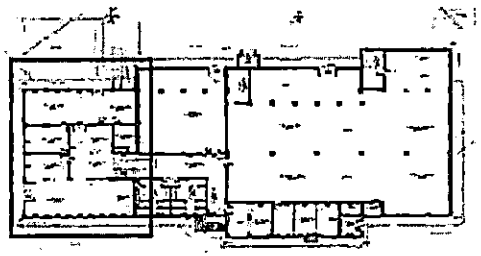


REGISTRO FOTOGRÁFICO

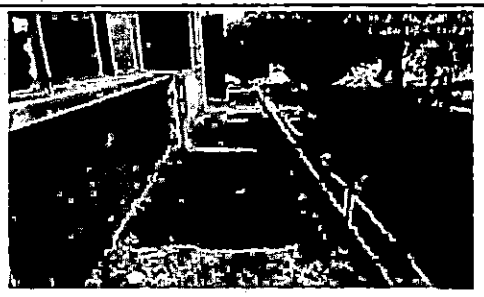

ARQ. ALEJANDRA BOLAÑOS
RESIDENTE CONTRATISTA

ARQ. NANCY AYALA
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

PLANO DETALLE

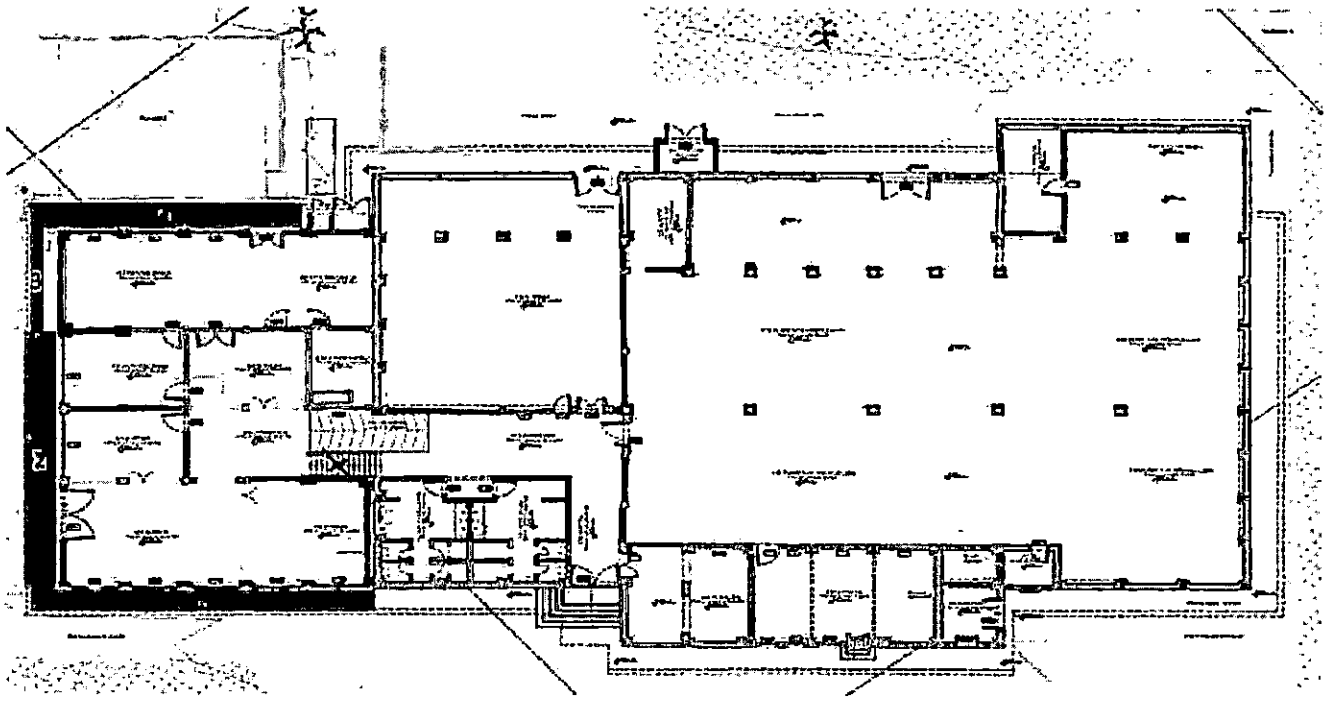

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA GENERAL

BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

PROYECTO: OBRAS SEDES ALCALDÍA

PRISMA — UNIVERSAL SEC S.A.S. — CONSORCIO PRUNI SEDES 04 — CONTRATISTA

ARQUITECTURA URBANA LTDA — INTERVENTORÍA


ACTA No.	7	PERIODO DEL ACTA	01/01/2020	A	30/01/2020	
OBJETO	REALIZAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE AJUSTE LAS DIFERENTES OBRAS E INTERVENCIONES ESPECIALIZADAS PARA LAS DIFERENTES SEDES DE LA SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C.					
CONTRATO DE OBRA No	731-2019	CONTRATISTA	CONSORCIO PRUNI SEDES 04	ENTIDAD CONTRATANTE	SECRETARIA GENERAL-ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA	
CONTRATO INTERVENTORÍA	730 DE 2019	INTERVENTORÍA	ARQUITECTURA URBANA LTDA	FRENTE:	IMPRENTA DISTRITAL	

CAPITULO	2.2.0	CIMENTACIÓN	ITEM	2.2.0.4	Demoler vigas de cimiento	UNIDAD	M3


ITEM	LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	TOTAL	UNIDAD
	PRODUCCIÓN						
1	VIGA EXISTENTE EJES 12-A	1,40	0,30	0,35	1,00	0,15	M3
					SUBTOTAL	0,15	M3
					TOTAL	0,15	M3

OBSERVACIONES:

LOCALIZACIÓN PLANIMÉTRICA

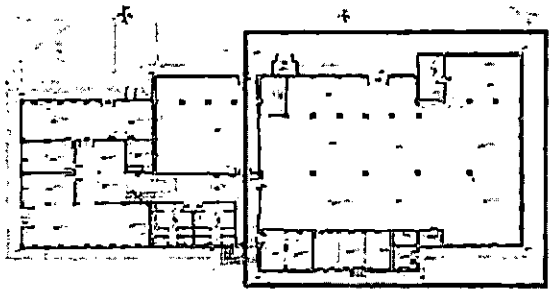

REGISTRO FOTOGRÁFICO

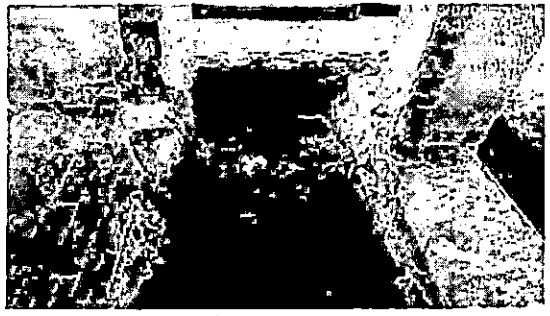

Alejandra Bolaños T
ARQ. ALEJANDRA BOLAÑOS
RESIDENTE CONTRATISTA

Nancy Rocio Ayala Gomez
ARQ. NANCY AYALA
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA GENERAL | BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

PROYECTO: OBRAS SEDES ALCALDÍA

PRISMA — UNIVERSAL SEC S.A.S. — CONSORCIO PRUNI SEDES 04 — CONTRATISTA


ARQUITECTURA URBANA LTDA — INTERVENTORÍA

ACTA No.	7		PERIODO DEL ACTA	01/01/2020	A	30/01/2020	
OBJETO	REALIZAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE AJUSTE LAS DIFERENTES OBRAS E INTERVENCIONES ESPECIALIZADAS PARA LAS DIFERENTES SEDES DE LA SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C.						
CONTRATO DE OBRA No	731-2019	CONTRATISTA	CONSORCIO PRUNI SEDES 04		ENTIDAD CONTRATANTE	SECRETARIA GENERAL-ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA	
CONTRATO INTERVENTORÍA	730 DE 2019	INTERVENTORÍA	ARQUITECTURA URBANA LTDA		FRENTE:	IMPRENTA DISTRITAL	

CAPITULO	2.2.0	CIMENTACIÓN	ITEM	2.2.0.5	Concreto pobre	UNIDAD	M2

ITEM	LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	TOTAL	UNIDAD
	PRODUCCIÓN						
1	ZAPATA Z-4A EJES 11-L	2,00	2,30		1,00	4,60	M2
2	VC-1 EJE 11 ENTRE L-M	1,00	0,50		1,00	0,50	M2
3	ZAPATA Z-4A EJES 11-M	2,00	2,30		1,00	4,60	M2
4	VC-1 EJE 11 ENTRE M-N	1,00	0,50		1,00	0,50	M2
5	ZAPATA Z-4A EJES 11-N	2,00	2,30		1,00	4,60	M2
6	VC-1 EJE 11 ENTRE N-O	1,00	0,50		1,00	0,50	M2
7	ZAPATA Z-4A EJES 11-O	2,00	2,30		1,00	4,60	M2
8	VC-1 EJE 11 ENTRE O-P	1,00	0,50		1,00	0,50	M2
9	ZAPATA Z-4A EJES 11-P	2,00	2,30		1,00	4,60	M2
10	VC-1 EJE 11 ENTRE P-Q	1,00	0,50		1,00	0,50	M2
11	ZAPATA Z-7 EJES 12-P	6,30	2,50		1,00	15,75	M2
11	ZAPATA Z-7 EJES 12-P	3,00	2,50		1,00	7,50	M2
12	VC-1 EJE 7 ENTRE EJES K-M	4,65	0,50		1,00	2,33	M2
13	ZAPATA Z-3 EJES 7-M	2,30	2,30		1,00	5,29	M2
14	VC-1 EJE 7 ENTRE EJES M-O	3,65	0,50		1,00	1,83	M2
15	ZAPATA Z-3 EJES 7-O	2,30	2,30		1,00	5,29	M2
16	VC-1 EJE 7 ENTRE EJES O-Q	4,65	0,50		1,00	2,33	M2
17	VC-1 EJE 7 ENTRE EJES Q-S	4,57	0,50		1,00	2,29	M2
18	ZAPATA Z-3 EJES 7-S	2,30	2,30		1,00	5,29	M2
19	VC-1 EJE Q ENTRE EJES 4-7	8,00	0,50		1,00	4,00	M2
20	ZAPATA Z-5 EJES 4-K	7,50	2,50		1,00	18,75	M2
20	ZAPATA Z-5 EJES 4-K	3,00	3,00		1,00	9,00	M2
21	ZAPATA Z-4 EJES 4-M	2,00	2,30		1,00	4,60	M2
22	ZAPATA Z-4 EJES 4-N	2,00	2,30		1,00	4,60	M2
23	ZAPATA Z-4 EJES 4-O	2,00	2,30		1,00	4,60	M2
24	ZAPATA Z-4 EJES 4-P	2,00	2,30		1,00	4,60	M2
25	ZAPATA Z-6 EJES 4-Q	2,00	2,00		1,00	4,00	M2
OBSERVACIONES:				SUBTOTAL		127,53	M2
				TOTAL		127,53	M2

LOCALIZACIÓN PLANIMÉTRICA

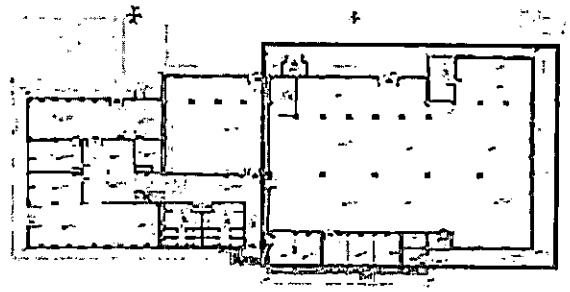

REGISTRO FOTOGRÁFICO




ARQ. ALEJANDRA BOLAÑOS
RESIDENTE CONTRATISTA

ARQ. NANCY AYALA
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

222

193

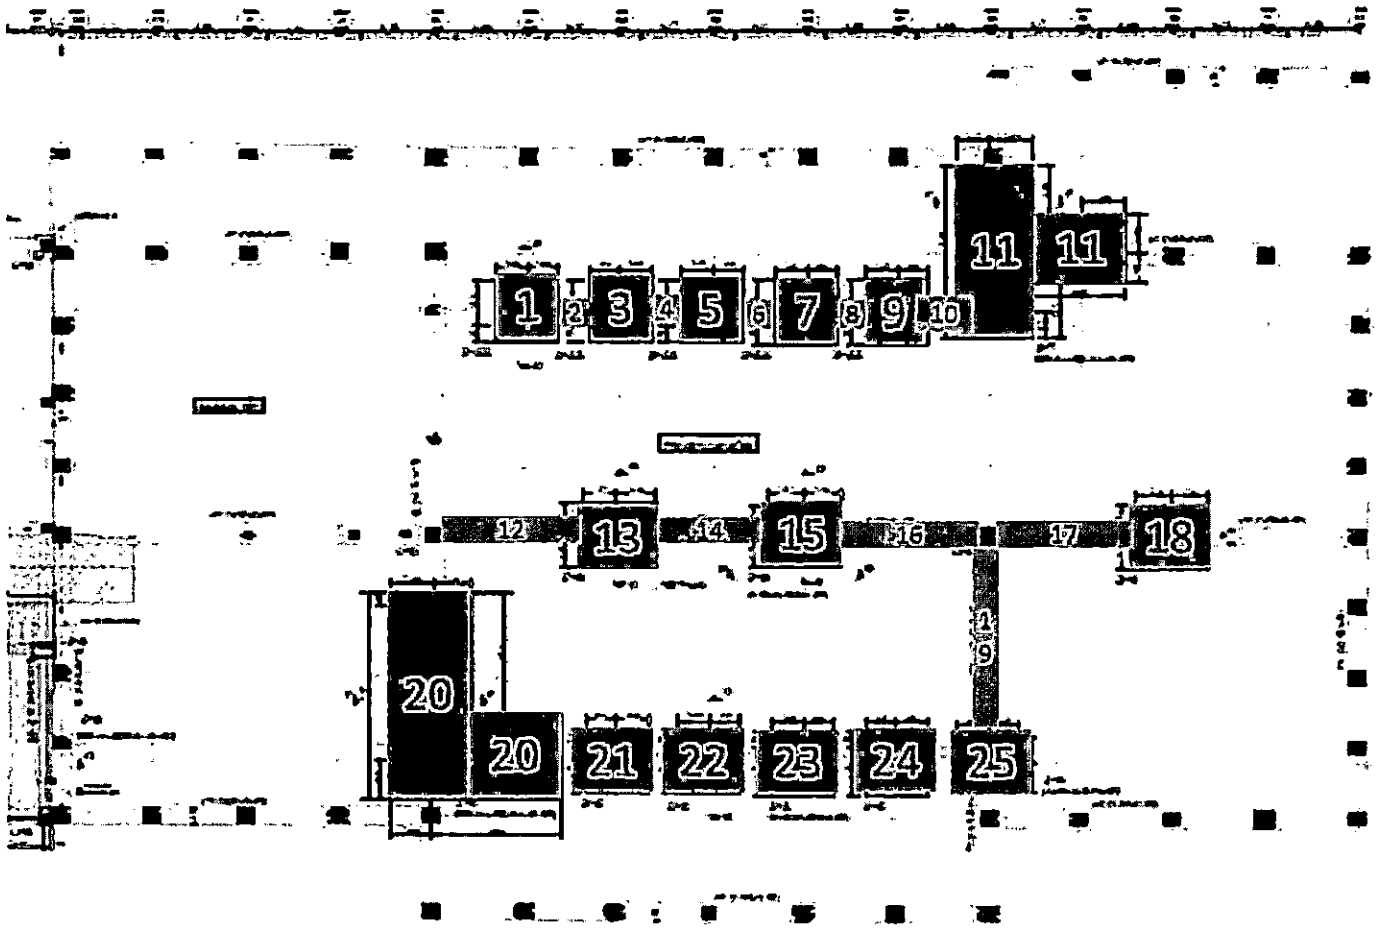

A618

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. | BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS
SECRETARÍA GENERAL

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

PROYECTO: OBRAS SEDES ALCALDÍA

PRISMA — UNIVERSAL SEC S.A.S. — CONSORCIO PRUNI SEDES 04 — CONTRATISTA

ARQUITECTURA URBANA LTDA — INTERVENTORÍA

ACTA No.	7		PERIODO DEL ACTA	01/01/2020	A	30/01/2020	
OBJETO	REALIZAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE AJUSTE LAS DIFERENTES OBRAS E INTERVENCIONES ESPECIALIZADAS PARA LAS DIFERENTES SEDES DE LA SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C.						
CONTRATO DE OBRA No	731-2019	CONTRATISTA	CONSORCIO PRUNI SEDES 04		ENTIDAD CONTRATANTE	SECRETARIA GENERAL-ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA	
CONTRATO INTERVENTORÍA	730 DE 2019	INTERVENTORÍA	ARQUITECTURA URBANA LTDA		FRENTE:	IMPRENTA DISTRITAL	


CAPITULO	2.2.0	CIMENTACIÓN	ITEM	2.2.0.7	Concreto de zapatas - 4000 PSI	UNIDAD	M3

ITEM	LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES LARGO	DIMENSIONES ANCHO	DIMENSIONES ALTO	CANTIDAD	TOTAL	UNIDAD
	PRODUCCIÓN						
1	ZAPATA Z-4A EJES 11-L	2,00	2,30	0,45	1,00	2,07	M3
2	VC-1 EJE 11 ENTRE L-M	1,00	0,50	0,45	1,00	0,23	M3
3	ZAPATA Z-4A EJES 11-M	2,00	2,30	0,45	1,00	2,07	M3
4	VC-1 EJE 11 ENTRE M-N	1,00	0,50	0,45	1,00	0,23	M3
5	ZAPATA Z-4A EJES 11-N	2,00	2,30	0,45	1,00	2,07	M3
6	VC-1 EJE 11 ENTRE N-O	1,00	0,50	0,45	1,00	0,23	M3
7	ZAPATA Z-4A EJES 11-O	2,00	2,30	0,45	1,00	2,07	M3
8	VC-1 EJE 11 ENTRE O-P	1,00	0,50	0,45	1,00	0,23	M3
9	ZAPATA Z-4A EJES 11-P	2,00	2,30	0,45	1,00	2,07	M3
10	VC-1 EJE 11 ENTRE P-Q	1,00	0,50	0,45	1,00	0,23	M3
11	VC-1 EJE 7 ENTRE EJES K-M	4,65	0,50	0,45	1,00	1,05	M3
12	ZAPATA Z-3 EJES 7-M	2,30	2,30	0,45	1,00	2,38	M3
13	VC-1 EJE 7 ENTRE EJES M-O	3,65	0,50	0,45	1,00	0,82	M3
14	ZAPATA Z-3 EJES 7-O	2,30	2,30	0,45	1,00	2,38	M3
15	VC-1 EJE 7 ENTRE EJES O-Q	4,65	0,50	0,45	1,00	1,05	M3
16	VC-1 EJE 7 ENTRE EJES Q-S	4,57	0,50	0,45	1,00	1,03	M3
17	ZAPATA Z-3 EJES 7-S	2,30	2,30	0,45	1,00	2,38	M3
18	VC-1 EJE Q ENTRE EJES 4-7	8,00	0,50	0,45	1,00	1,80	M3
19	ZAPATA Z-5 EJES 4-K	3,60	2,50	0,45	1,00	4,05	M3
20	ZAPATA Z-4 EJES 4-N	2,00	2,30	0,45	1,00	2,07	M3


OBSERVACIONES:

SUBTOTAL	30,48	M3
TOTAL	30,48	M3

LOCALIZACIÓN PLANIMÉTRICA

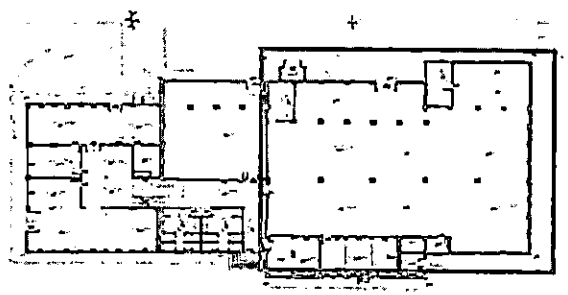

REGISTRO FOTOGRÁFICO

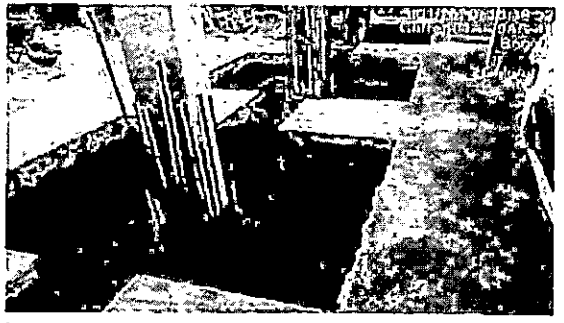


ARQ. ALEJANDRA BOLAÑOS
RESIDENTE CONTRATISTA

ARQ. NANCY AYALA
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

223

195

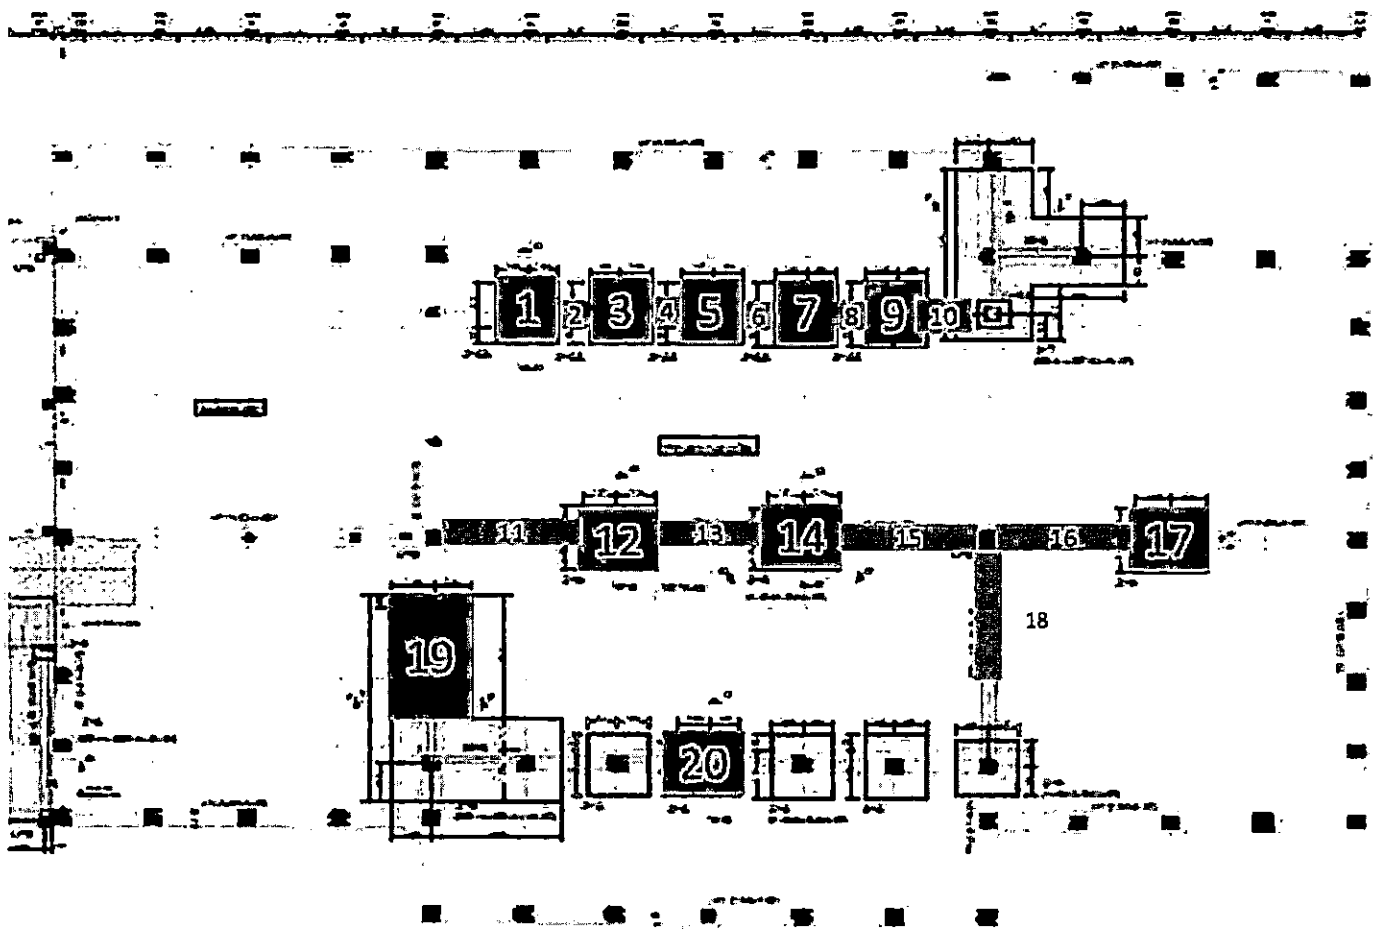

196

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA GENERAL | BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

PROYECTO: OBRAS SEDES ALCALDÍA

PRISMA — UNIVERSAL SEC S.A.S. — CONTRATISTA

ARQUITECTURA URBANA LTDA — INTERVENTORÍA

ACTA No.:	7	PERIODO DE LA ACTA	1/01/2020	A	30/01/2020		
OBJETO	REALIZAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE AJUSTE LAS DIFERENTES OBRAS E INTERVENCIONES ESPECIALIZADAS PARA LAS DIFERENTES SEDES DE LA SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C.						
CONTRATO DE OBRA No	731-2019	CONTRATISTA	CONSORCIO PRUNI SEDES 04	ENTIDAD CONTRATANTE	SECRETARIA GENERAL-ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA		
CONTRATO INTERVENTORÍA	730 DE 2019	INTERVENTORÍA	ARQUITECTURA URBANA LTDA	FRENTE:	IMPRENTA DISTRITAL		


CAPÍTULO	2.2.0	CIMENTACIÓN	ITEM	2.2.0.0	Suministro figurada y amarre de acero 60000 PSI 420 Mpa	UNIDAD	KG

ITEM	LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES FIGURA	DIMENSIONES LARGO (m)	DIMENSIONES PESO (kg/m)	CANTIDAD	TOTAL	UNIDAD
	PRODUCCIÓN						
1	ZAPATA Z-4A EJES 11-L						
	Acero #5 doble esc. L=0.25		2.70	1.552	14.00	58.666	KG
	Acero #5 doble esc. L=0.25		2.40	1.552	18.00	67.046	KG
	Acero #5 doble esc. L=0.25		1.40	1.552	4.00	8.693	KG
	Acero #5 doble esc. L=0.25		1.25	1.552	4.00	7.760	KG
	Acero #5 con esc. L=0.25		0.95	1.552	8.00	11.795	KG
	Acero #5 con esc. L=0.25		0.85	1.552	4.00	5.277	KG
	Gancho #3 L=0.10		0.52	0.560	60.00	17.472	KG
2	VC-1 EJE 11 ENTRE L-M						
	Acero #5 recto		6.00	1.552	4.00	37.248	KG
	Acero #5 doble esc. L=0.25		2.95	1.552	2.00	9.157	KG
	Acero #5 recto		1.55	1.552	4.00	9.622	KG
	Acero #5 recto		1.30	1.552	4.00	8.070	KG
	Estribo #3 .40x.35		1.70	0.560	13.00	12.376	KG
3	ZAPATA Z-4A EJES 11-M						
	Acero #5 doble esc. L=0.25		2.70	1.552	14.00	58.666	KG
	Acero #5 doble esc. L=0.25		2.40	1.552	18.00	67.046	KG
	Acero #5 doble esc. L=0.25		1.40	1.552	4.00	8.693	KG
	Acero #5 doble esc. L=0.25		1.25	1.552	4.00	7.760	KG
	Acero #5 con esc. L=0.25		0.95	1.552	8.00	11.795	KG
	Acero #5 con esc. L=0.25		0.85	1.552	4.00	5.277	KG
	Gancho #3 L=0.10		0.52	0.560	60.00	17.472	KG
4	VC-1 EJE 11 ENTRE M-N						
	Acero #5 con esc. L=0.25		2.02	1.552	2.00	6.270	KG
	Acero #5 recto		1.80	1.552	8.00	22.349	KG
	Estribo #3 .40x.35		1.70	0.560	13.00	12.376	KG


OBSERVACIONES

SUBTOTAL	470.883	KG
TOTAL	470.883	KG

LOCALIZACIÓN PLANIMÉTRICA



REGISTRO FOTOGRÁFICO

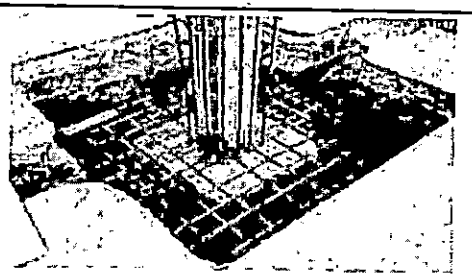

Alejandra Bolaños T

ARQ. ALEJANDRA BOLAÑOS
RESIDENTE CONTRATISTA


Nancy Rocío Ayala Gómez

ARQ. NANCY AYALA
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

224

19

PLANO DETALLE

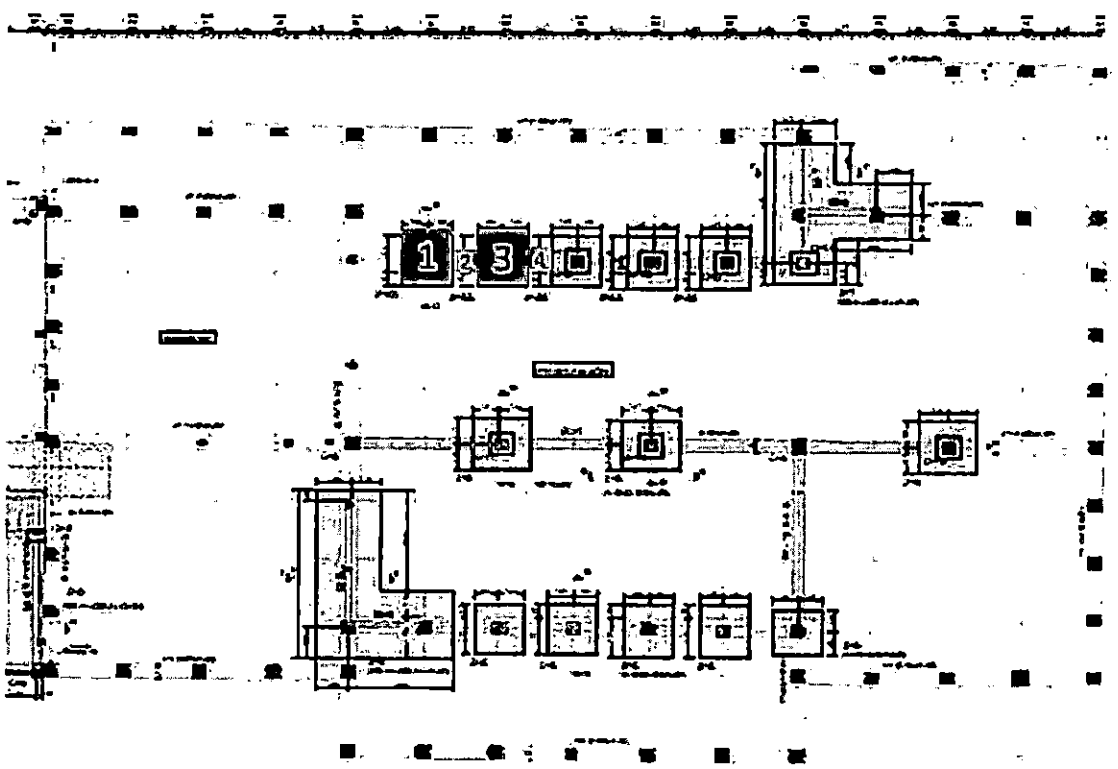

Nº 18

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. | BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS
SECRETARÍA GENERAL

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

PROYECTO: OBRAS SEDES ALCALDÍA

PRISMA | UNIVERSAL SEC S.A.S. — CONTRATISTA
ARQUITECTURA URBANA LTDA — INTERVENTORÍA


ACTA No.	7	PERIODO DEL ACTA	1/01/2020	A	30/01/2020
OBJETO	REALIZAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE AJUSTE LAS DIFERENTES OBRAS E INTERVENCIONES ESPECIALIZADAS PARA LAS DISCRENTES SEDES DE LA SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C.				
CONTRATO DE OBRA No	731-2019	CONTRATISTA	CONSORCIO PRUNI SEDES 04	ENTIDAD CONTRATANTE	SECRETARIA GENERAL-ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA
CONTRATO INTERVENTORÍA	730 01 2019	INTERVENTORÍA	ARQUITECTURA URBANA LTDA	FRENTE:	IMPRENTA DISTRITAL

CAPITULO		2.2.0	CIMENTACIÓN		ITEM	2.2.0.8	Suministro figurado y amarre de acero 60000 PSI 420 Mpa	UNIDAD	KG


ITEM	LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES FIGURA	LARGO (m)	PESO (kg/m)	CANTIDAD	TOTAL	UNIDAD
	PRODUCCIÓN				VIGMEN	470.883	KG
5	ZAPATA Z-4A EJES 11-N						
	Acero #5 doble esc. L=0.25		2.70	1.552	14.00	58.666	KG
	Acero #5 doble esc. L=0.25		2.40	1.552	18.00	67.046	KG
	Acero #5 doble esc. L=0.25		1.40	1.552	4.00	8.691	KG
	Acero #5 doble esc. L=0.25		1.25	1.552	4.00	7.760	KG
	Acero #5 con esc. L=0.25		0.95	1.552	8.00	11.795	KG
	Acero #5 con esc. L=0.25		0.85	1.552	4.00	5.277	KG
	Gancho #3 L=0.10		0.52	0.560	60.00	17.472	KG
6	VC-1 EJE 11 ENTRE N-O						
	Acero #5 con esc. L=0.25		2.48	1.552	2.00	9.250	KG
	Acero #5 recto		1.70	1.552	8.00	21.107	KG
	Estribo #3 .40x.35		1.70	0.560	13.00	12.376	KG
7	ZAPATA Z-4A EJES 11-O						
	Acero #5 doble esc. L=0.25		2.70	1.552	14.00	58.666	KG
	Acero #5 doble esc. L=0.25		2.40	1.552	18.00	67.046	KG
	Acero #5 doble esc. L=0.25		1.40	1.552	4.00	8.691	KG
	Acero #5 doble esc. L=0.25		1.25	1.552	4.00	7.760	KG
	Acero #5 con esc. L=0.25		0.95	1.552	8.00	11.795	KG
	Acero #5 con esc. L=0.25		0.85	1.552	4.00	5.277	KG
	Gancho #3 L=0.10		0.52	0.560	60.00	17.472	KG
8	VC-1 EJE 11 ENTRE O-P						
	Acero #5 doble esc. L=0.25		3.10	1.552	6.00	28.867	KG
	Acero #5 doble esc. L=0.25		1.80	1.552	8.00	22.949	KG
	Estribo #3 .40x.35		1.70	0.560	14.00	13.328	KG
9	ZAPATA Z-4A EJES 11-P						
	Acero #5 doble esc. L=0.25		2.70	1.552	14.00	58.666	KG
	Acero #5 doble esc. L=0.25		2.40	1.552	18.00	67.046	KG
	Acero #5 doble esc. L=0.25		1.40	1.552	4.00	8.691	KG
	Acero #5 doble esc. L=0.25		1.25	1.552	4.00	7.760	KG
	Acero #5 con esc. L=0.25		0.95	1.552	8.00	11.795	KG
	Acero #5 con esc. L=0.25		0.85	1.552	4.00	5.277	KG
	Gancho #3 L=0.10		0.52	0.560	60.00	17.472	KG
				SUBTOTAL		3.109.282	KG
				TOTAL		3.109.282	KG

OBSERVACIONES:

LOCALIZACIÓN PLANIMÉTRICA

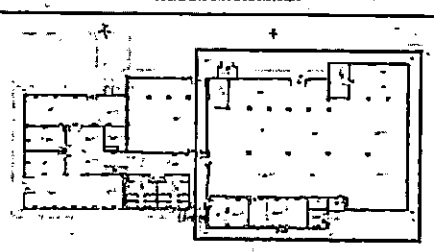

REGISTRO FOTOGRÁFICO

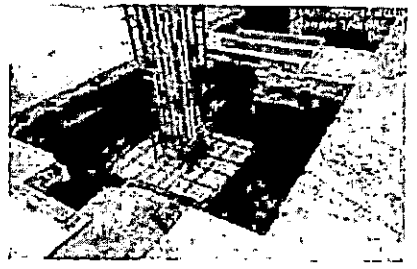


Alejandra Bolaños
ARQ. ALEJANDRA BOLAÑOS
RESIDENTE CONTRATISTA

Nancy Rocio Ayala Gomez
ARQ. NANCY AYALA
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

225

199

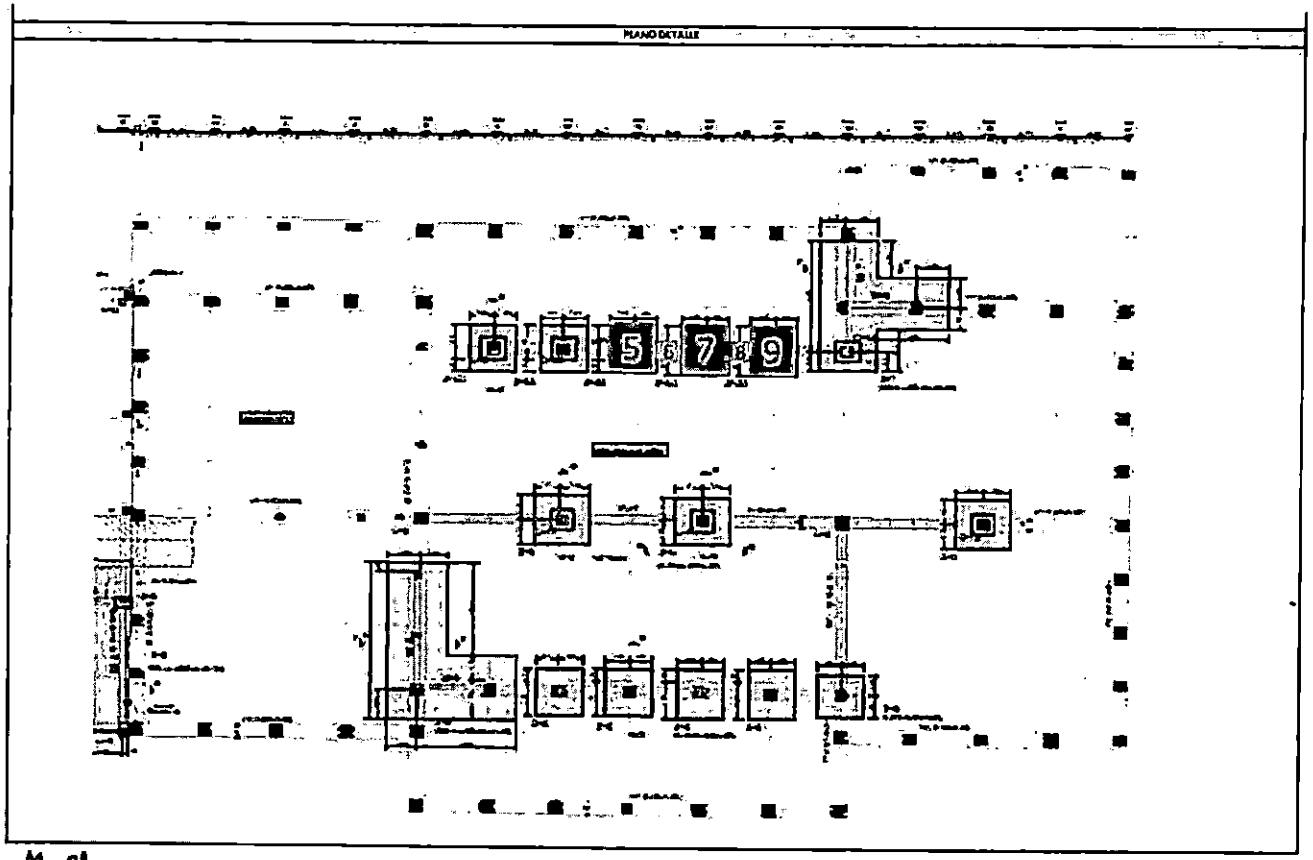
PIANO DETTAGLI
5
7
9

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA GENERAL | BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

PROYECTO: OBRAS SEDES ALCALDÍA


PRISMA UNIVERSAL SEC S.A.S. — CONTRATISTA | ARQUITECTURA URBANA LTDA — INTERVENTORÍA

ACTA No:	7	PERIODO DEL ACTA	1/01/2020	A	30/01/2020	
OBJETO	REALIZAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE AJUSTE LAS DIFERENTES OBRAS E INTERVENCIONES ESPECIALIZADAS PARA LAS DIFERENTES SEDES DE LA SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C.					
CONTRATO DE OBRA No	731-2019	CONTRATISTA	CONSORCIO PRUNI SEDES 04	ENTIDAD CONTRATANTE	SECRETARIA GENERAL-ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA	
CONTRATO INTERVENTORÍA	730 DE 2019	INTERVENTORÍA	ARQUITECTURA URBANA LTDA	FRENTE:	IMPRENTA DISTRITAL	


CAPITULO	2.2.0	CIMENTACIÓN	ITEM	2.2.0.8	Suministro figurado y amarre de acero 60000 PSI 420 Mpa	UNIDAD	KG

ITEM	LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES FIGURA	DIMENSIONES LARGO (m)	DIMENSIONES PESO (kg/m)	CANTIDAD	TOTAL	UNIDAD
	PRODUCCIÓN				VIENEN	1.108,282	KG
10	VC-1 EJE 11 ENTRE P-Q						
	Acero #5 doble esc. L=0.25		2.35	1.552	8.00	29.178	KG
	Acero #5 doble esc. L=0.25		1.80	1.552	8.00	22.349	KG
	Estribo #3 .40x.35		1.70	0.560	14.00	13.328	KG
11	VC-1 EJE 7 ENTRE K-M						
	Acero #5 recto		1.57	1.552	4.00	9.747	KG
	Acero #5 con esc. L=0.25		5.35	1.552	2.00	16.606	KG
	Acero #5 con esc. L=0.25		5.85	1.552	2.00	18.158	KG
	Acero #5 con esc. L=0.25		6.00	1.552	2.00	18.624	KG
	Estribo #3 .40x.35		1.70	0.560	36.00	34.272	KG
12	ZAPATA Z-3 EJES 7-M						
	Acero #5 doble esc. L=0.25		2.70	1.552	36.00	150.854	KG
	Acero #5 doble esc. L=0.25		1.40	1.552	8.00	17.392	KG
	Acero #5 con esc. L=0.25		1.00	1.552	12.00	18.624	KG
	Gancho #3 L=0.10		0.52	0.560	60.00	17.472	KG
13	VC-1 EJE 7 ENTRE M-O						
	Acero #5 recto		6.00	1.552	2.00	18.624	KG
	Acero #5 doble esc. L=0.25		6.00	1.552	2.00	18.624	KG
	Acero #5 recto		1.80	1.552	4.00	11.174	KG
	Acero #5 recto		4.77	1.552	4.00	29.612	KG
	Estribo #3 .40x.35		1.70	0.560	33.00	31.416	KG
14	ZAPATA Z-3 EJES 7-O						
	Acero #5 doble esc. L=0.25		2.70	1.552	36.00	150.854	KG
	Acero #5 doble esc. L=0.25		1.40	1.552	8.00	17.392	KG
	Acero #5 con esc. L=0.25		1.00	1.552	12.00	18.624	KG
	Gancho #3 L=0.10		0.52	0.560	60.00	17.472	KG
15	VC-1 EJE 7 ENTRE O-Q						
	Acero #5 recto		6.00	1.552	4.00	37.248	KG
	Acero #5 recto		1.70	1.552	4.00	10.554	KG
	Acero #5 recto		4.60	1.552	4.00	28.557	KG
	Estribo #3 .40x.35		1.70	0.560	33.00	31.416	KG
OBSERVACIONES:			SUB TOTAL:			1.896.434	KG
			TOTAL:			1.896.434	KG

LOCALIZACIÓN PLANIMÉTRICA

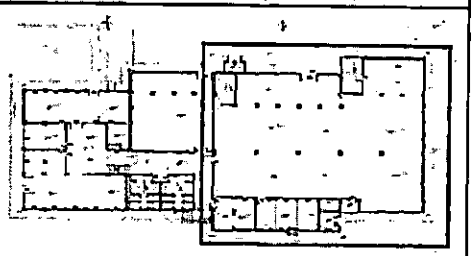

REGISTRO FOTOGRÁFICO

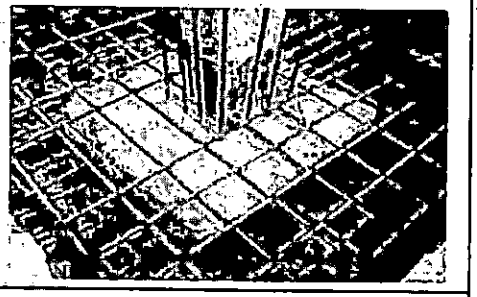

Alejandra Bolaños t


ARQ. ALEJANDRA BOLAÑOS
RESIDENTE CONTRATISTA

Nancy Rocio Ayala Gomez

ARQ. NANCY AYALA
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

226

201

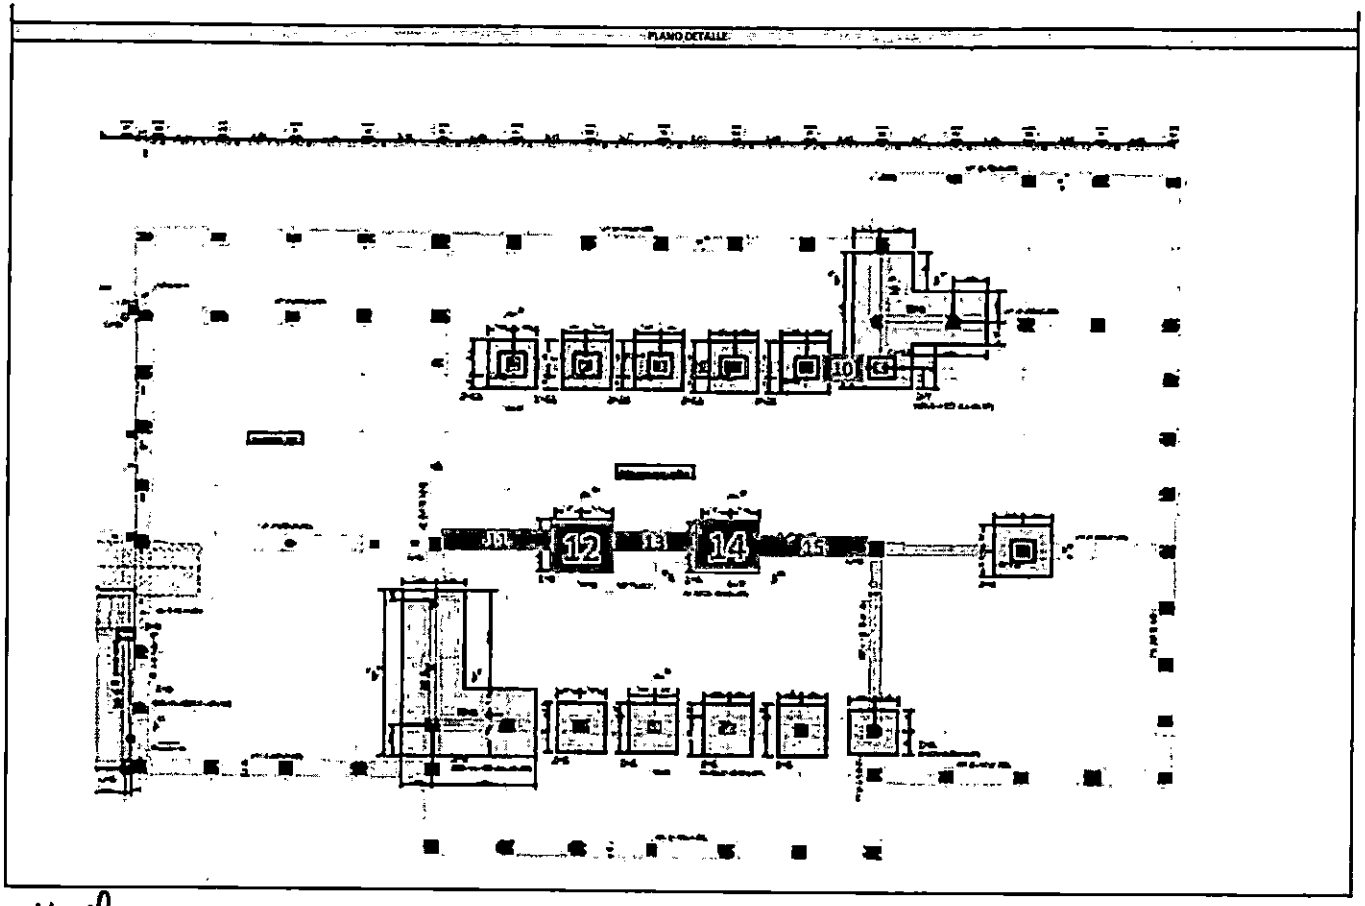

202

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. | BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

PROYECTO: OBRAS SEDES ALCALDÍA

PRISMA — UNIVERSAL SEC S.A.S. — CONSORCIO PRUNI SEDES 04 — CONTRATISTA


ARQUITECTURA URBANA LTDA — INTERVENTORÍA

ACTA No.:	7	PERIODO DEL ACTA	1/01/2020	A	30/01/2020
OBJETO	REALIZAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE AJUSTE LAS DIFERENTES OBRAS E INTERVENCIONES ESPECIALIZADAS PARA LAS DIFERENTES SEDES DE LA SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C.				
CONTRATO DE OBRA NO	732-2019	CONTRATISTA	CONSORCIO PRUNI SEDES 04	ENTIDAD CONTRATANTE	SECRETARIA GENERAL-ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA
CONTRATO INTERVENTORÍA	730 DE 2019	INTERVENTORÍA	ARQUITECTURA URBANA LTDA	FRENTE:	IMPRENTA DISTRITAL


CAPITULO	2.2.0	CIMENTACIÓN	ITEM	2.2.0.8	Suministro figurado y amarre de acero 60000 PSI 420 Mpa	UNIDAD	KG

ITEM	LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES FIGURA	DIMENSIONES LARGO (m)	DIMENSIONES PESO (kg/m)	CANTIDAD	TOTAL	UNIDAD
	PRODUCCIÓN				VIENEN	1,896.434	KG
16	VC-1 EJE 7 ENTRE Q-S						
	Acero #5 con esc. L=0.25		6.00	1.552	4.00	37.248	KG
	Acero #5 recto		2.00	1.552	4.00	12.416	KG
	Acero #5 recto		4.00	1.552	4.00	24.832	KG
	Estribo #3 .40x.35		1.70	0.560	33.00	31.416	KG
17	ZAPATA Z-3 EJES 7-S						
	Acero #5 doble esc. L=0.25		2.70	1.552	36.00	150.854	KG
	Acero #5 doble esc. L=0.25		2.40	1.552	8.00	17.382	KG
	Acero #5 con esc. L=0.25		1.00	1.552	12.00	18.624	KG
	Gancho #3 L=0.10		0.52	0.560	60.00	17.472	KG
	Acero #5 doble esc. L=0.25		1.20	1.552	4.00	7.450	KG
	Acero #5 con esc. L=0.25		0.90	1.552	4.00	5.587	KG
18	VC-1 EJE Q ENTRE EJES 7-S (PARCIAL)						
	Acero #5 recto		4.50	1.552	4.00	27.936	KG
	Acero #3 recto		0.90	1.552	4.00	5.587	KG
	Estribo #3 .40x.35		1.70	0.560	27.00	25.704	KG
19	ZAPATA Z-5 EJES X-3 (PARCIAL)						
	Acero #5 con esc. L=0.25		4.50	1.552	24.00	167.616	KG
	Acero #5 doble esc. L=0.25		3.00	1.552	44.00	204.864	KG
	Gancho #3 L=0.10		0.52	0.560	36.00	10.483	KG
20	ZAPATA Z-4 EJES 3-N						
	Acero #5 con esc. L=0.25		1.05	1.552	36.00	58.666	KG
	Acero #5 recto		1.80	1.552	18.00	50.285	KG
	Acero #5 doble esc. L=0.25		2.40	1.552	20.00	74.496	KG
	Gancho #3 L=0.10		0.52	0.560	60.00	17.472	KG
OBSERVACIONES:			SUBTOTAL:			2,862.824	KG
			TOTAL:			2,862.824	KG

LOCALIZACIÓN PLANIMÉTRICA

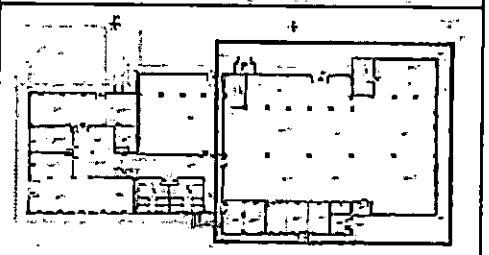

REGISTRO FOTOGRÁFICO

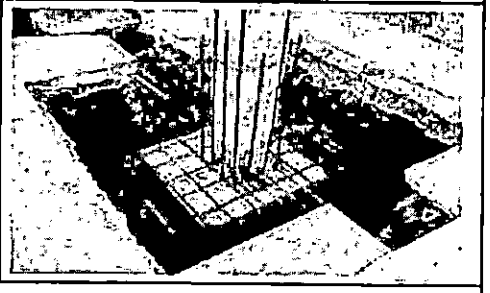


Alejandra Bolaños

ARQ. ALEJANDRA BOLAÑOS
RESIDENTE CONTRATISTA

Nancy Rocío Ayala Gómez

ARQ. NANCY AYALA
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

227

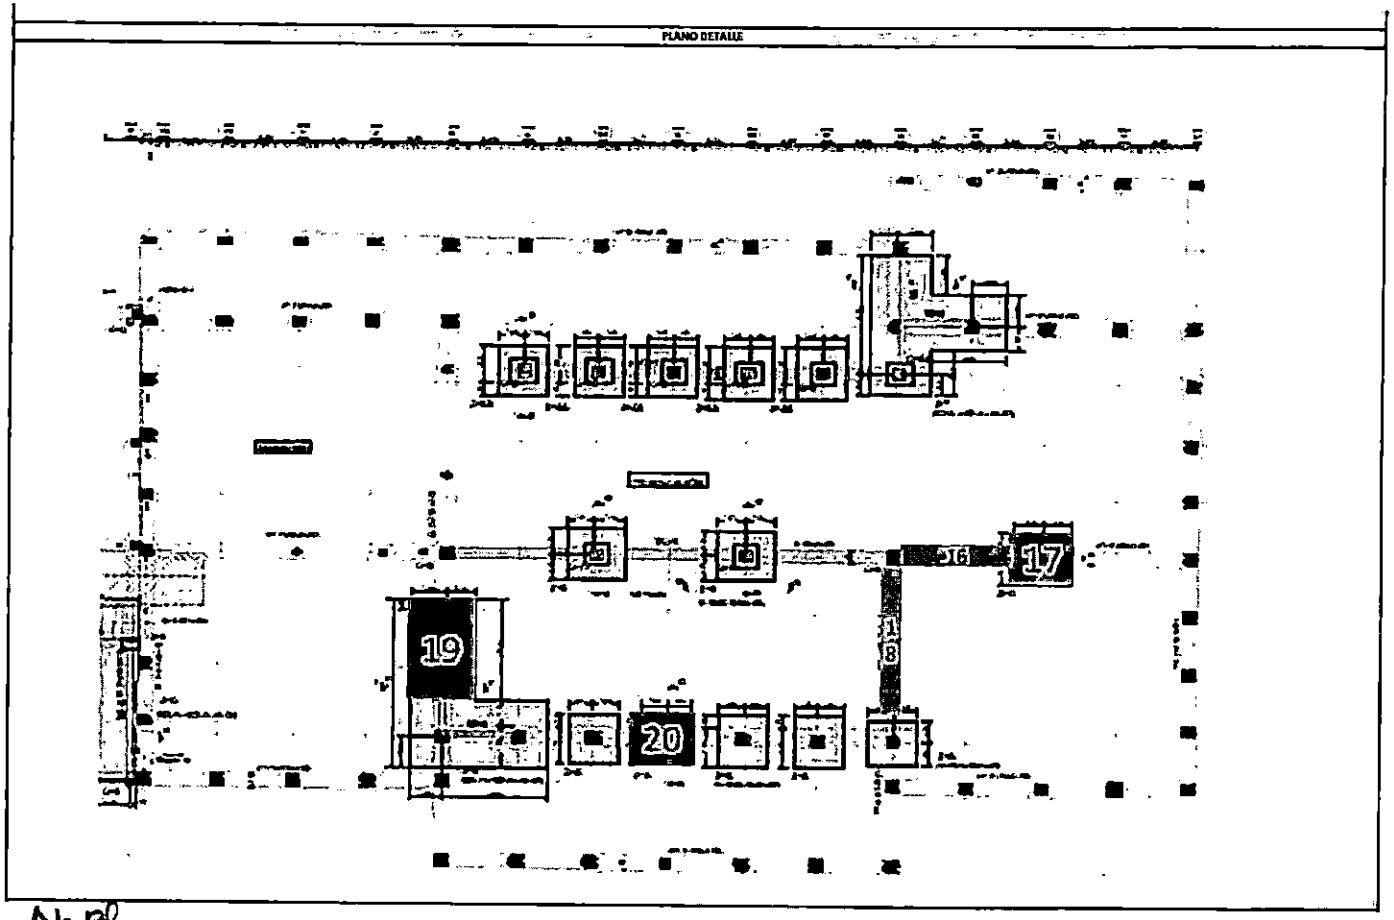

Ale B

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA GENERAL

BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

PROYECTO: OBRAS SEDES ALCALDÍA

PRISMA — UNIVERSAL SEC S.A.S.
CONSORCIO PRUNI SEDES 04 — CONTRATISTA

ARQUITECTURA URBANA LTDA — INTERVENTORÍA


ACTA No.	7	PERIODO DEL ACTA	01/01/2020	A	30/01/2020	
OBJETO	REALIZAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE AJUSTE LAS DIFERENTES OBRAS E INTERVENCIONES ESPECIALIZADAS PARA LAS DIFERENTES SEDES DE LA SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C.					
CONTRATO DE OBRA No	731-2019	CONTRATISTA	CONSORCIO PRUNI SEDES 04	ENTIDAD CONTRATANTE	SECRETARIA GENERAL-ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA	
CONTRATO INTERVENTORÍA	730 DE 2019	INTERVENTORÍA	ARQUITECTURA URBANA LTDA	FRENTE:	IMPRENTA DISTRITAL	

CAPITULO	2.3.0	COLUMNAS Y MUROS	ITEM	2.3.0.1	Escarificar columnas y adhesivo, incluye la escarificación y el adhesivo especial para unir concreto existente a concreto nuevo	UNIDAD	M2


ITEM	LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES LARGO	DIMENSIONES ANCHO	DIMENSIONES ALTO	CANTIDAD	TOTAL	UNIDAD
	PRODUCCIÓN						
1	COLUMNA C-9 EJES	4,35	0,60		1,00	2,61	M2
				SUBTOTAL		2,61	M2
				TOTAL		2,61	M2

OBSERVACIONES:

LOCALIZACIÓN PLANIMÉTRICA

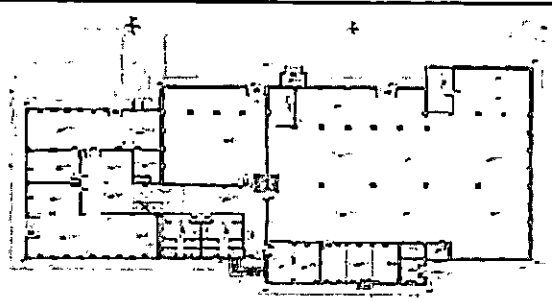

REGISTRO FOTOGRÁFICO

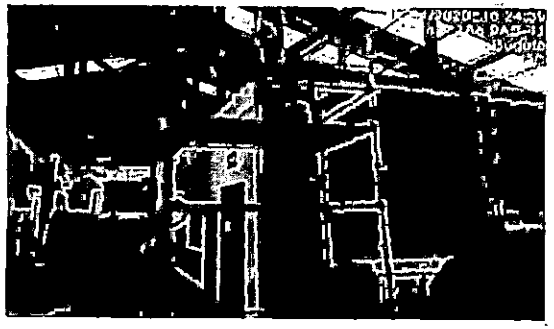

Alejandra Bolaños +
ARQ. ALEJANDRA BOLAÑOS
RESIDENTE CONTRATISTA

Nancy Ayala Goma
ARQ. NANCY AYALA
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

228

205

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA GENERAL | BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

PROYECTO: OBRAS SEDES ALCALDÍA

PRISMA — UNIVERSAL SEC S.A.S. — CONSORCIO PRUNI SEDES 04 — CONTRATISTA


ARQUITECTURA URBANA LTDA — INTERVENTORÍA

ACTA No.	7	PERIODO DEL ACTA	01/01/2020	A	30/01/2020	
OBJETO	REALIZAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE AJUSTE LAS DIFERENTES OBRAS E INTERVENCIONES ESPECIALIZADAS PARA LAS DIFERENTES SEDES DE LA SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C.					
CONTRATO DE OBRA No	731-2019	CONTRATISTA	CONSORCIO PRUNI SEDES 04	ENTIDAD CONTRATANTE	SECRETARIA GENERAL-ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA	
CONTRATO INTERVENTORÍA	730 DE 2019	INTERVENTORÍA	ARQUITECTURA URBANA LTDA	FRENTE:	IMPRENTA DISTRITAL	

CAPITULO	2.3.0	COLUMNAS Y MUROS	ITEM	2.3.0.2	Concreto de columnas y muros - 4000 PSI	UNIDAD	M3

ITEM	LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	TOTAL	UNIDAD
	PRODUCCIÓN						
1	COLUMNA C-8 EJES 11-L	0,50	0,50	3,60	1,00	0,58	M3
2	COLUMNA C-10 EJES 11-M	0,50	0,50	3,60	1,00	0,58	M3
3	COLUMNA C-8 EJES 11-N	0,50	0,50	3,60	1,00	0,58	M3
4	COLUMNA C-11 EJES 7-M	0,50	0,50	3,60	1,00	0,58	M3
5	COLUMNA C-11 EJES 7-O	0,50	0,50	3,60	1,00	0,58	M3
6	COLUMNA C-14 MURO M-5 EJES 6-K	0,30	0,30	4,35	1,00	0,39	M3
7	MURO M-5 EJES 5-K (PARCIAL)	3,60	0,20	4,35	1,00	3,13	M3

PLANO DETALLE

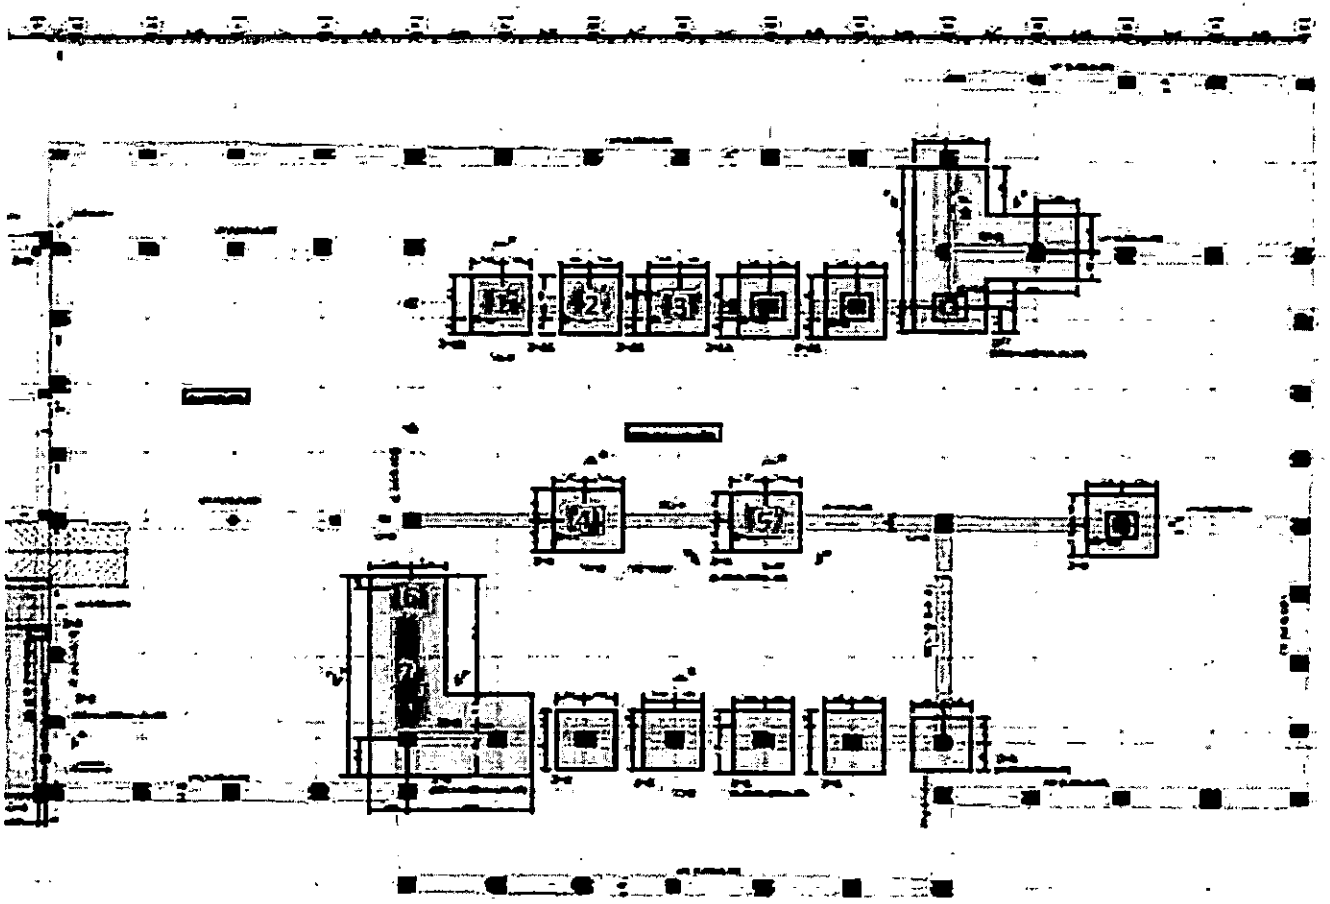

AeB

229

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA GENERAL | BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

PROYECTO: OBRAS SEDES ALCALDÍA

PRISMA — UNIVERSAL SEC S.A.S. — CONSORCIO PRUNI SEDES 04 — CONTRATISTA


ARQUITECTURA URBANA LTDA — INTERVENTORÍA

ACTA No:	7	PERIODO DEL ACTA:	1/01/2020	A	30/01/2020
OBJETO	REALIZAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE AJUSTE LAS DIFERENTES OBRAS E INTERVENCIONES ESPECIALIZADAS PARA LAS DIFERENTES SEDES DE LA SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C.				
CONTRATO DE OBRA No	731-2019	CONTRATISTA	CONSORCIO PRUNI SEDES 04	ENTIDAD CONTRATANTE	SECRETARIA GENERAL-ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA
CONTRATO INTERVENTORÍA	730 DE 2019	INTERVENTORÍA	ARQUITECTURA URBANA LTDA	FRENTE:	IMPRENTA DISTRITAL


CAPITULO	2.3.0	COLUMNAS Y MUROS	ITEM	2.3.0.3	Suministro figurado y amarre de acero 60000 PSI 420 Mpa	UNIDAD	KG

ITEM	LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES FIGURA	LARGO (m)	PESO (kg/m)	CANTIDAD	TOTAL	UNIDAD
	PRODUCCIÓN						
1	COLUMNA C-8 EJES 11-L						
	Acero #6 esc. L=.25m		1.80	2.235	12.00	48.276	KG
	Acero #6 esc. L=.25m		7.20	2.235	12.00	193.104	KG
	Estribo #3 .42x.42		1.68	0.560	67.00	70.538	KG
	Acero #3 esc. L=.15m		0.15	0.560	88.00	7.392	KG
2	COLUMNA C-10 EJES 11-M						
	Acero #6 esc. L=.25m		1.80	2.235	12.00	48.276	KG
	Acero #6 esc. L=.25m		7.20	2.235	12.00	193.104	KG
	Estribo #3 .42x.42		1.68	0.560	67.00	70.538	KG
	Acero #3 esc. L=.15m		0.15	0.560	88.00	7.392	KG
3	COLUMNA C-8 EJES 11-N						
	Acero #6 esc. L=.25m		1.80	2.235	12.00	48.276	KG
	Acero #6 esc. L=.25m		7.20	2.235	12.00	193.104	KG
	Estribo #3 .42x.42		1.68	0.560	67.00	70.538	KG
	Acero #3 esc. L=.15m		0.15	0.560	88.00	7.392	KG
4	COLUMNA C-11 EJES 7-M						
	Acero #6 esc. L=.25m		1.80	2.235	12.00	48.276	KG
	Acero #6 esc. L=.25m		7.20	2.235	12.00	193.104	KG
	Estribo #3 .42x.42		1.68	0.560	67.00	70.538	KG
	Acero #3 esc. L=.15m		0.15	0.560	88.00	7.392	KG
5	COLUMNA C-11 EJES 7-O						
	Acero #6 esc. L=.25m		1.80	2.235	12.00	48.276	KG
	Acero #6 esc. L=.25m		7.20	2.235	12.00	193.104	KG
	Estribo #3 .42x.42		1.68	0.560	67.00	70.538	KG
	Acero #3 esc. L=.15m		0.15	0.560	88.00	7.392	KG
6	COLUMNA C-3A MURO M-5 EJES 8-K						
	Acero #5 recto		3.70	1.552	8.00	45.939	KG
	Acero #5 esc. L=.20m		2.70	1.552	8.00	33.523	KG
	Estribo #3 .24x.24		1.16	0.560	37.00	24.035	KG
	Gancho #3 L=.10m		0.47	0.560	74.00	19.477	KG
OBSERVACIONES:			SUBTOTAL			1.719.522	KG
			TOTAL			1,719.522	KG

LOCALIZACIÓN PLANIMÉTRICA



REGISTRO FOTOGRÁFICO

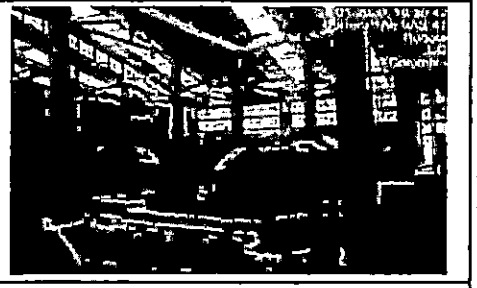


Alejandra Bolaños

ARQ. ALEJANDRA BOLAÑOS
RESIDENTE CONTRATISTA

Nancy Rocío Ayala Gomez

ARQ. NANCY AYALA
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

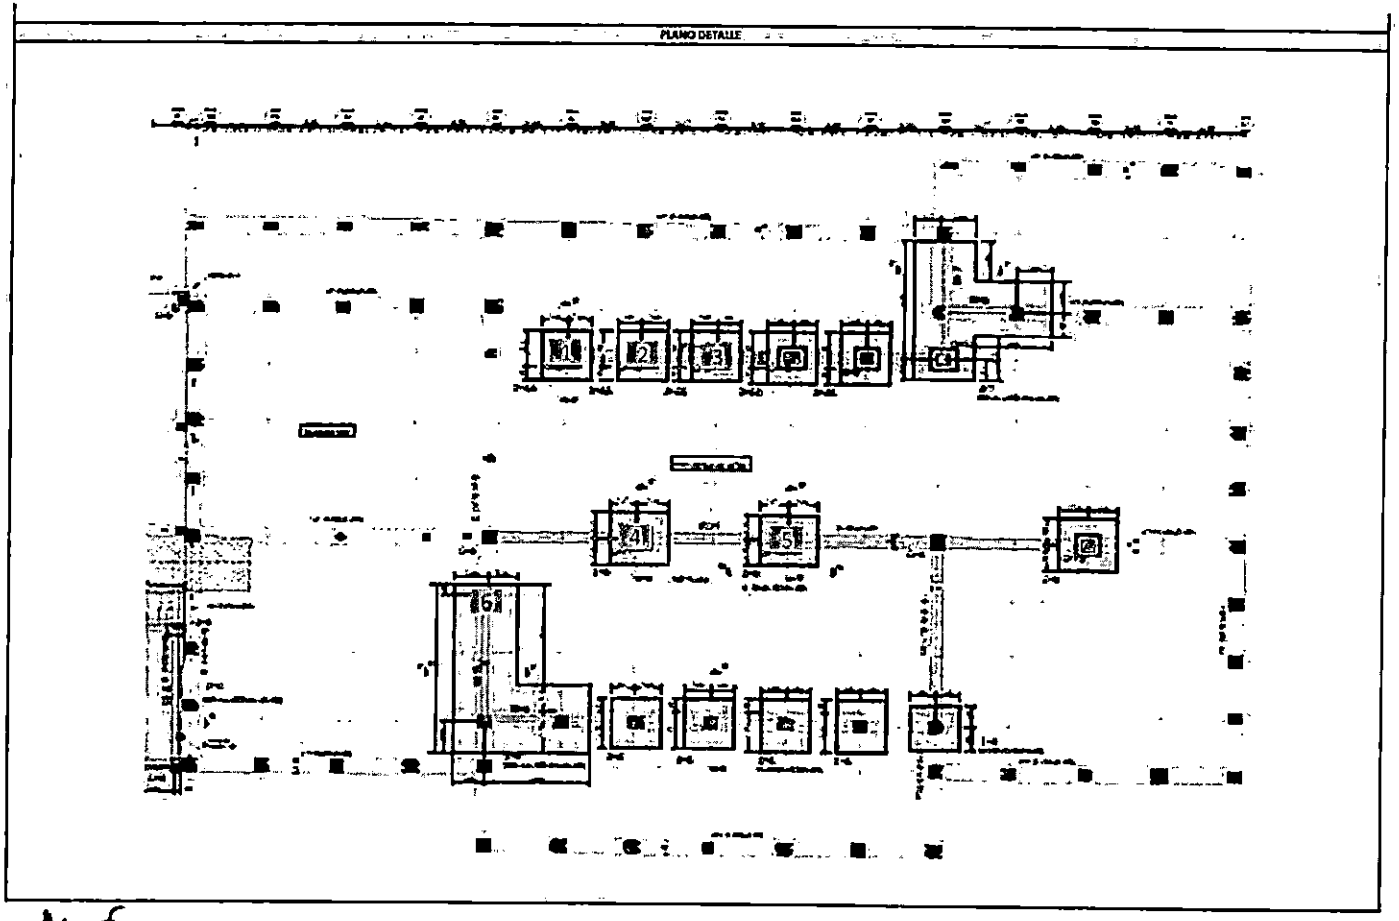

A6f3

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA GENERAL | BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

PROYECTO: OBRAS SEDES ALCALDÍA

PRISMA UNIVERSAL-SEC S.A.S. CONSORCIO PRUNI SEDES 04 — CONTRATISTA

ARQUITECTURA URBANA LTDA — INTERVENTORÍA


ACTA No.	7	PERIODO DEL ACTA	1/01/2020	A	30/01/2020	
OBJETO	REALIZAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE AJUSTE LAS DIFERENTES OBRAS E INTERVENCIONES ESPECIALIZADAS PARA LAS DIFERENTES SEDES DE LA SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C.					
CONTRATO DE OBRA No	731-2019	CONTRATISTA	CONSORCIO PRUNI SEDES 04	ENTIDAD CONTRATANTE	SECRETARIA GENERAL-ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA	
CONTRATO INTERVENTORÍA	730 DE 2019	INTERVENTORÍA	ARQUITECTURA URBANA LTDA	FUENTE:	IMPRENTA DISTRITAL	

CAPITULO	2.3.0	COLUMNAS Y MUROS	ITEM	2.3.0.3	Suministro figurado y amarre de acero 60000 PSI 420 Mpa	UNIDAD	KG

ITEM	LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES FIGURA	DIMENSIONES LARGO (m)	DIMENSIONES PESO (kg/m)	CANTIDAD	TOTAL	UNIDAD
	PRODUCCIÓN				VIENEN	1,719.52	KG
7	MURO M-S EJES 3-K (PARCIAL)						
	Acero #4 recto		1.55	0.994	18.00	27.733	KG
	Acero #4 esc. L=0.13m		3.50	0.994	18.00	62.622	KG
	Acero #4 esc. L=0.15m		5.45	0.994	18.00	97.511	KG
	Acero #3 doble esc. L=0.15m		6.00	0.560	55.00	188.160	KG
	Gancho #3 L=0.10m		0.45	0.560	280.00	70.560	KG
					SUBTOTAL	2,166.11	KG
					TOTAL	2,166.11	KG

OBSERVACIONES:

LOCALIZACIÓN PLANIMÉTRICA

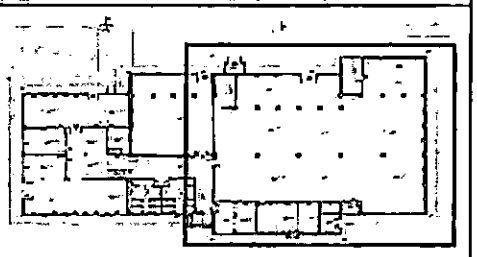


REGISTRO FOTOGRÁFICO



ARQ. ALEJANDRA BOLAÑOS
RESIDENTE CONTRATISTA

ARQ. DANNY AYALA
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

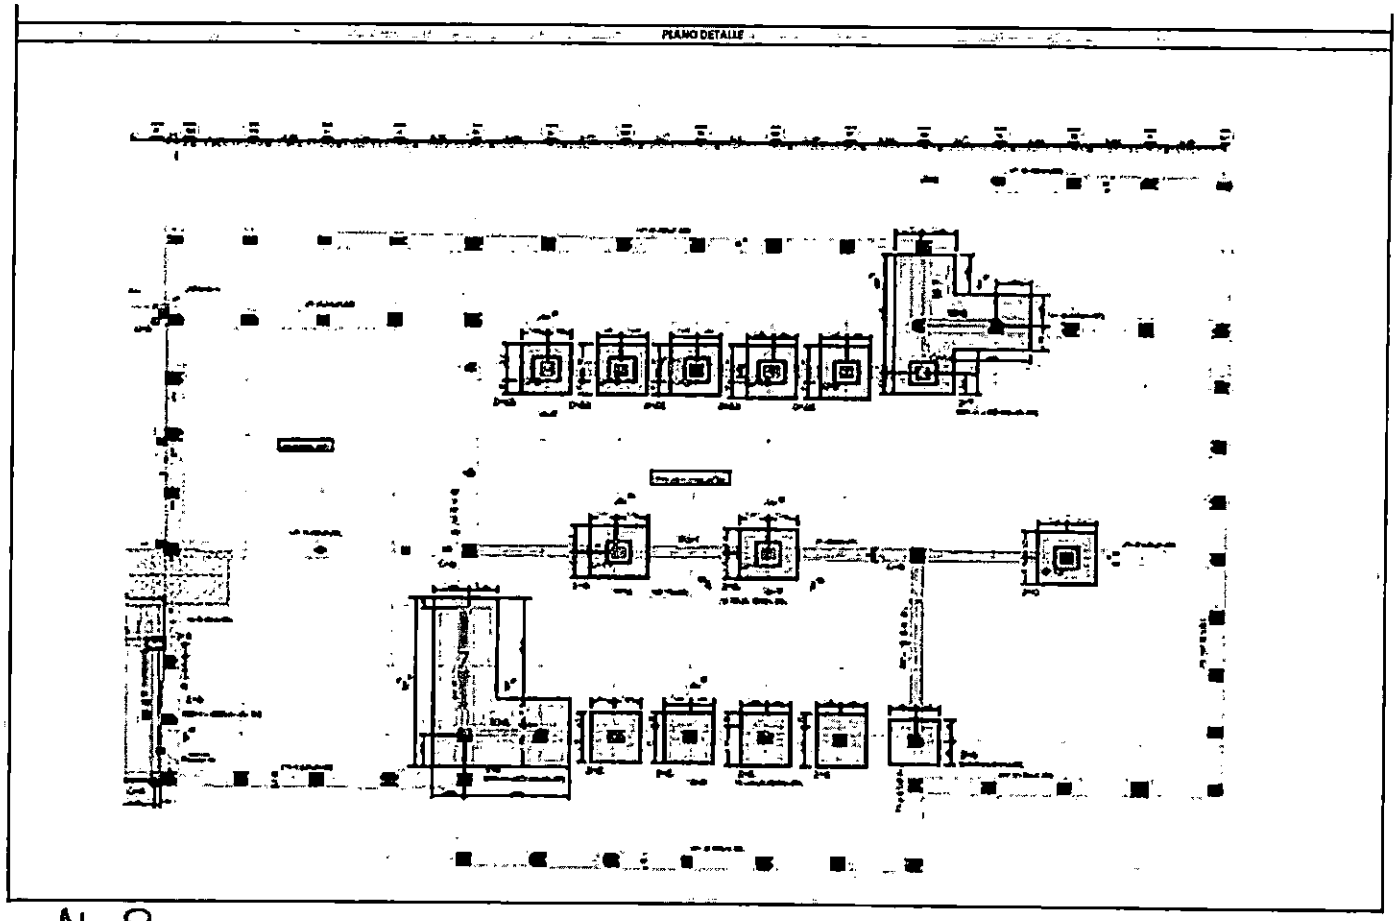

Ale 8

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. | BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS
SECRETARÍA GENERAL

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

PROYECTO: OBRAS SEDES ALCALDÍA

PRISMA — UNIVERSAL SEC S.A.S. — CONTRATISTA
ARQUITECTURA URBANA LTDA — INTERVENTORÍA


ACTA No.	7		PERIODO DEL ACTA	01/01/2020	A	30/01/2020	
OBJETO	REALIZAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE AJUSTE LAS DIFERENTES OBRAS E INTERVENCIONES ESPECIALIZADAS PARA LAS DIFERENTES SEDES DE LA SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C.						
CONTRATO DE OBRA No	731-2019	CONTRATISTA	CONSORCIO PRUNI SEDES 04		ENTIDAD CONTRATANTE	SECRETARIA GENERAL-ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA	
CONTRATO INTERVENTORÍA	730 DE 2019	INTERVENTORÍA	ARQUITECTURA URBANA LTDA		FRENTE:	IMPRENTA DISTRITAL	

CAPITULO	2.4.0	VIGAS AEREAS	ITEM	2.4.0.1	Demolición tramo alto de vigas	UNIDAD	M3

ITEM	LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	TOTAL	UNIDAD
	PRODUCCIÓN						
1	VIGA EXISTENTE EJE 3 ENTRE K-L	2,60	0,40	0,30	2,00	0,62	M3
				SUBTOTAL		0,62	M3
				TOTAL		0,62	M3

OBSERVACIONES:

LOCALIZACIÓN PLANIMÉTRICA

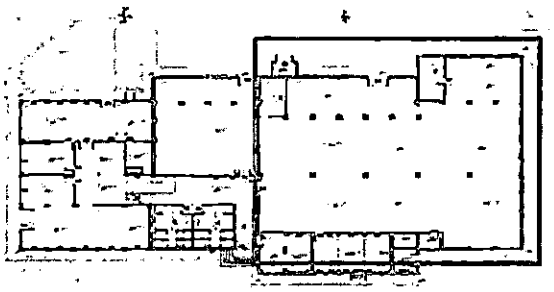


REGISTRO FOTOGRÁFICO



Alejandra Bolaños t
ARQ. ALEJANDRA BOLAÑOS
RESIDENTE CONTRATISTA

Nancy Rocío Ayala Gomez
ARQ. NANCY AYALA
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

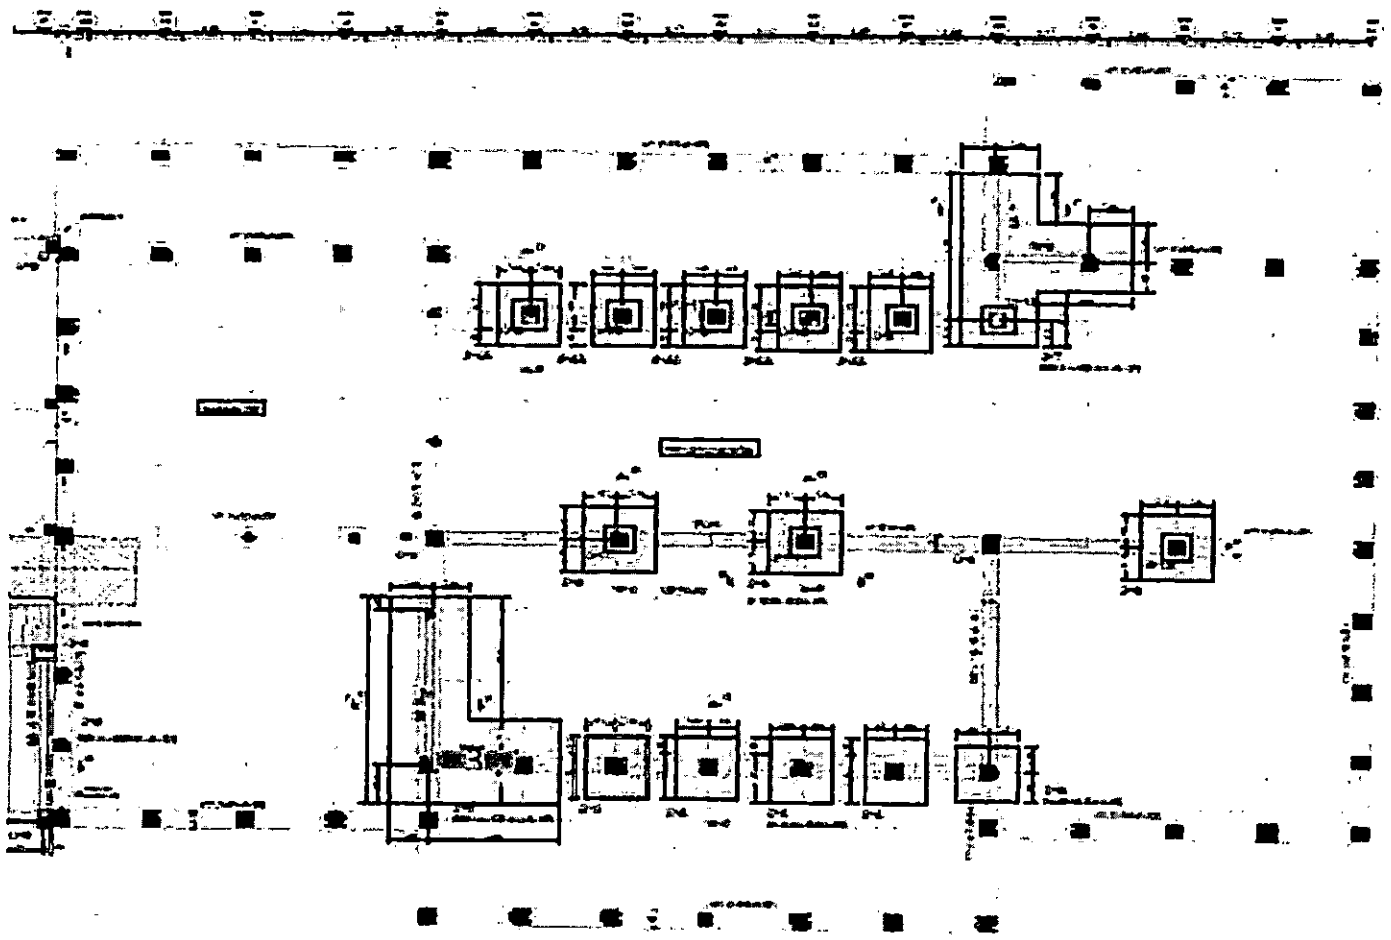

AL P8

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA GENERAL | BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

PROYECTO: OBRAS SEDES ALCALDÍA

PRISMA — UNIVERSAL SEC S.A.S. — CONSORCIO PRUNI SEDES 04 — CONTRATISTA


ARQUITECTURA URBANA LTDA — INTERVENTORÍA

ACTA No.	7	PERIODO DEL ACTA	01/01/2020	A	30/01/2020	
OBJETO	REALIZAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE AJUSTE LAS DIFERENTES OBRAS E INTERVENCIONES ESPECIALIZADAS PARA LAS DIFERENTES SEDES DE LA SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C.					
CONTRATO DE OBRA No	731-2019	CONTRATISTA	CONSORCIO PRUNI SEDES 04	ENTIDAD CONTRATANTE	SECRETARIA GENERAL-ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA	
CONTRATO INTERVENTORÍA	730 DE 2019	INTERVENTORÍA	ARQUITECTURA URBANA LTDA	FRENTE:	IMPRENTA DISTRITAL	

CAPITULO	2.4.0	VIGAS AEREAS	ITEM	2.4.0.2	Escarificar vigas y adhesivo concreto nuevo	UNIDAD	M2


ITEM	LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	TOTAL	UNIDAD
	ZONA DE PRODUCCION						
1	VG-4 EJE 7	11,20	1,90		1,00	21,28	M2
2	VG-5 EJE M	18,30	1,90		1,00	34,77	M2
3	VG-6 EJE O	18,30	1,90		1,00	34,77	M2
OBSERVACIONES:				SUBTOTAL		90,82	M2
				TOTAL		90,82	M2

LOCALIZACIÓN PLANIMÉTRICA

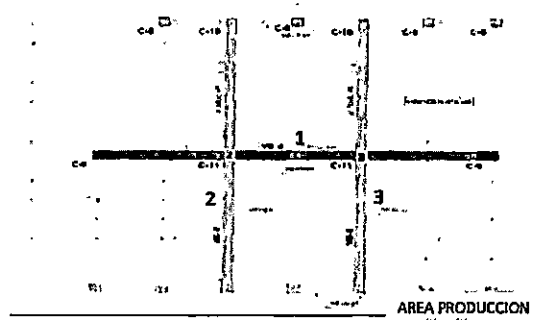

AREA PRODUCCION

REGISTRO FOTOGRAFICO

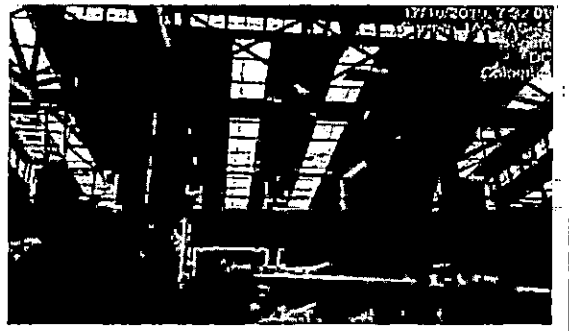


Alejandra Bolaños +

ARQ. ALEJANDRA BOLAÑOS
RESIDENTE CONTRATISTA

Nancy Rocío Ayala Gomez

ARQ. NANCY AYALA
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

PLANO DETALLE

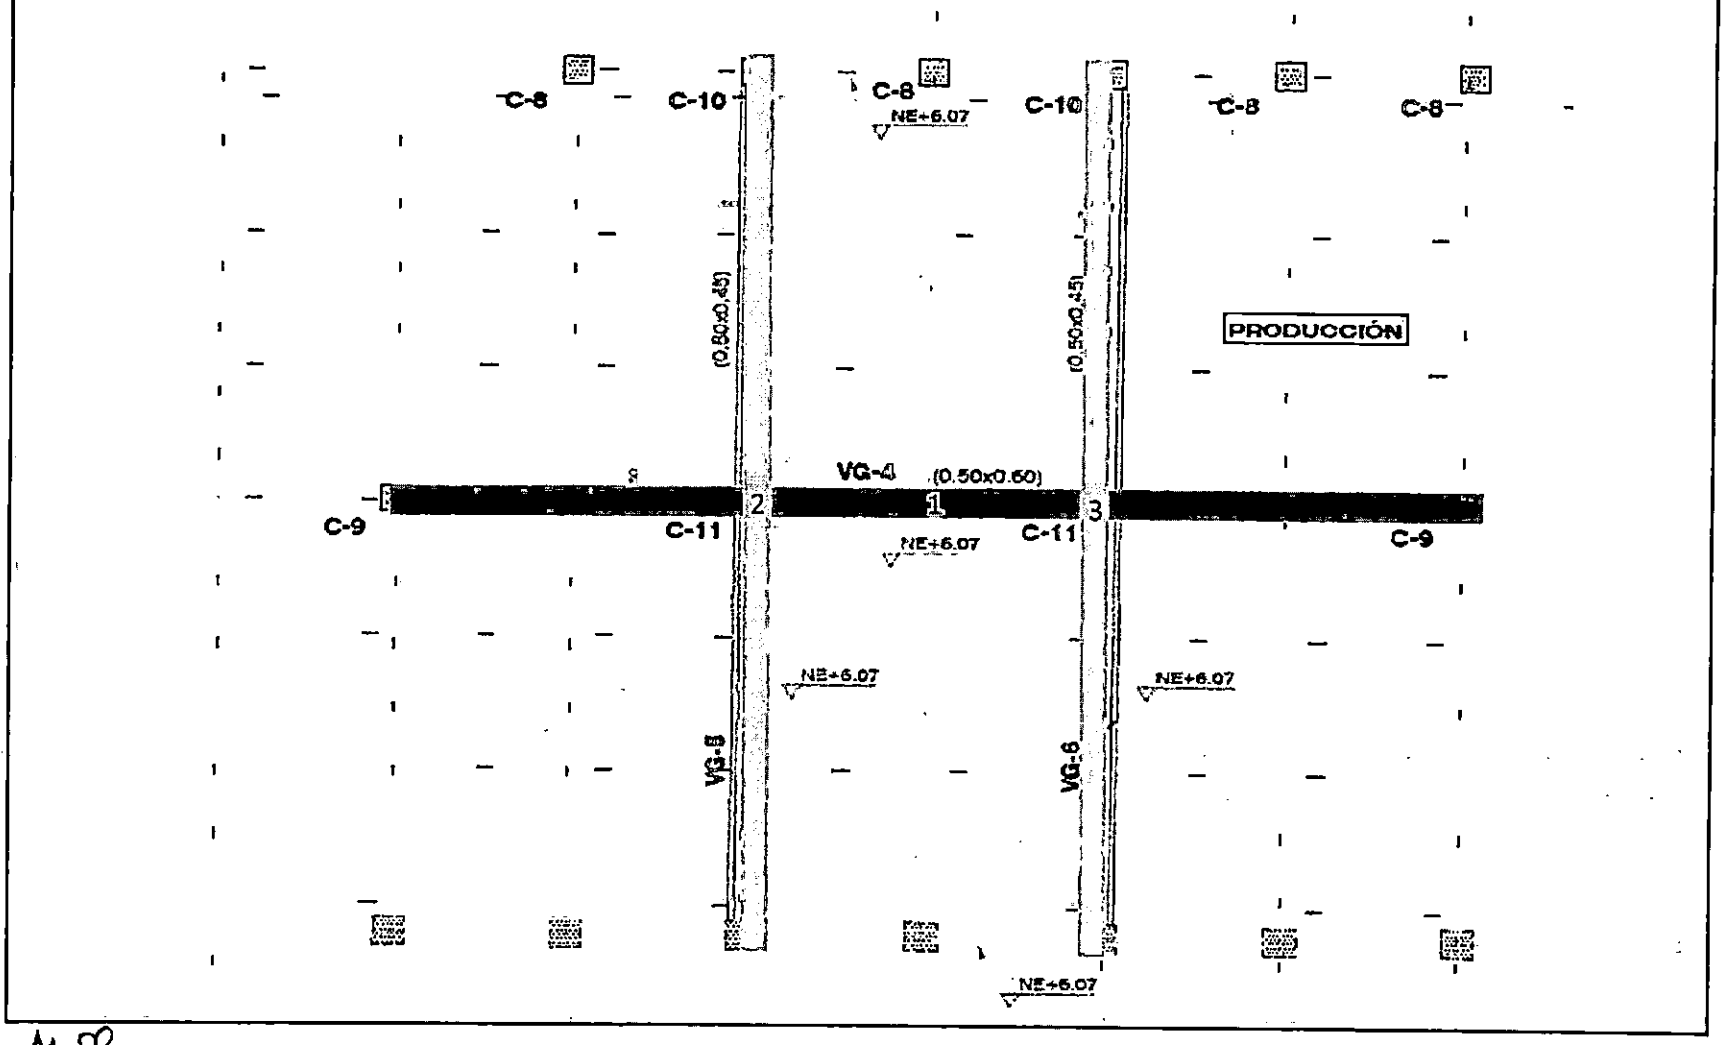

Acep

233

215

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA GENERAL | BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

PROYECTO: OBRAS SEDES ALCALDÍA

PRISMA — UNIVERSAL SEC S.A.S. — CONSORCIO PRUNI SEDES 04 — CONTRATISTA


ARQUITECTURA URBANA LTDA. — INTERVENTORÍA

ACTA No.	7		PERIODO DEL ACTA	01/01/2020	A	30/01/2020
OBJETO	REALIZAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE AJUSTE LAS DIFERENTES OBRAS E INTERVENCIONES ESPECIALIZADAS PARA LAS DIFERENTES SEDES DE LA SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C.					
CONTRATO DE OBRA No	731-2019	CONTRATISTA	CONSORCIO PRUNI SEDES 04	ENTIDAD CONTRATANTE	SECRETARIA GENERAL-ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA	
CONTRATO INTERVENTORÍA	730 DE 2019	INTERVENTORÍA	ARQUITECTURA URBANA LTDA	FRENTE:	IMPRENTA DISTRITAL	


CAPITULO	2.4.0	VIGAS AEREAS	ITEM	2.4.0.3	Concreto nuevo de vigas - 4000 PSI	UNIDAD	M3

ITEM	LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	TOTAL	UNIDAD
	EDIFICIO ADMINISTRATIVO 2DO PISO						
1	VIGA VG-3 EJE F ENTRE EJES 2'-4'	8,60	0,30	0,30	1,00	0,77	M3
OBSERVACIONES:				SUBTOTAL		0,77	M3
				TOTAL		0,77	M3

LOCALIZACIÓN PLANIMÉTRICA

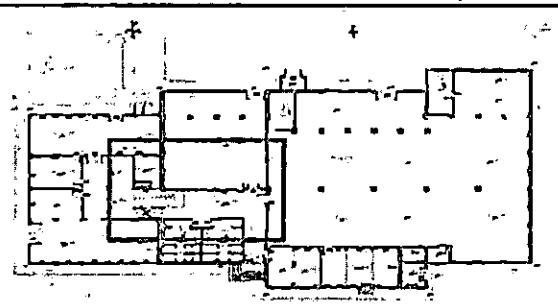


REGISTRO FOTOGRÁFICO

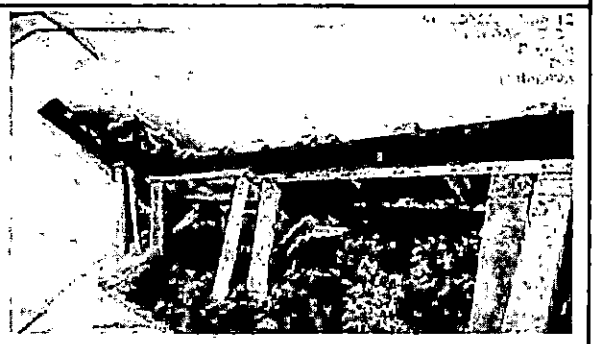

ARQ. ALEJANDRA BOLAÑOS
RESIDENTE CONTRATISTA

ARQ. NANCY AYALA
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

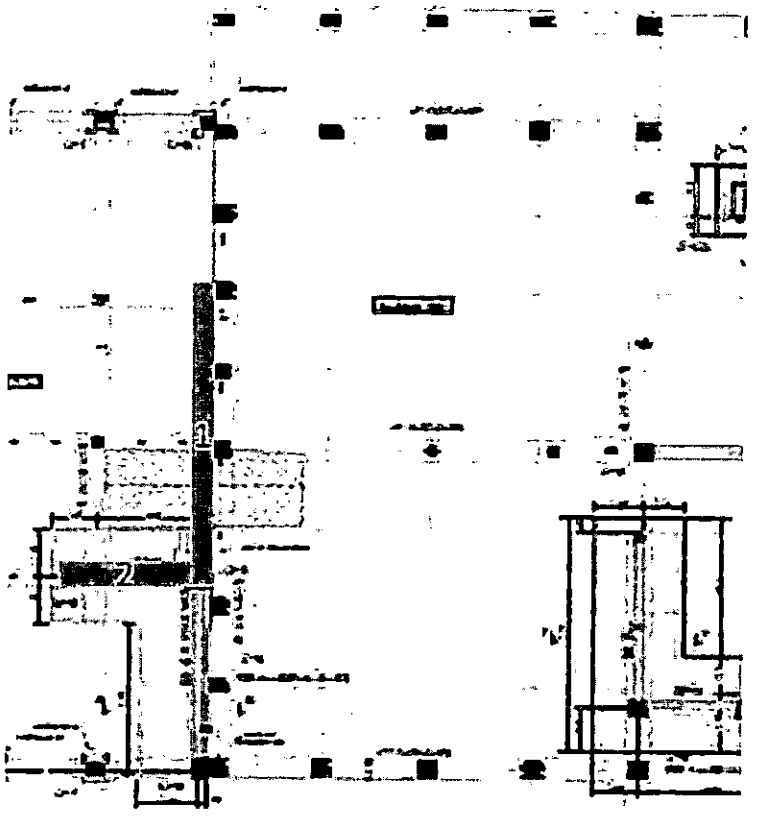

234

217

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA GENERAL | BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

PROYECTO: OBRAS SEDES ALCALDÍA

PRISMA — UNIVERSAL SEC S.A.S. — CONSORCIO PRUNI MOBILIA — CONTRATISTA

ARQUITECTURA URBANA LTDA. — INTERVENTORÍA


ACTA No.	7		PERIODO DEL ACTA	1/01/2020	A	30/01/2020
OBJETO	REALIZAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE AJUSTE LAS DIFERENTES OBRAS E INTERVENCIONES ESPECIALIZADAS PARA LAS DIFERENTES SEDES DE LA SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C.					
CONTRATO DE OBRA No	731-2019	CONTRATISTA	CONSORCIO PRUNI SEDES 04	ENTIDAD CONTRATANTE	SECRETARIA GENERAL-ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA	
CONTRATO INTERVENTORÍA	730 DE 2019	INTERVENTORÍA	ARQUITECTURA URBANA LTDA	FRENTE:	IMPRENTA DISTRITAL	

CAPITULO	2.4.0	VIGAS AEREAS	ITEM	2.4.0.4	Suministro figurado y amarre de acero 60000 PSI 420 Mpa	UNIDAD	KG


ITEM	LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES FIGURA	LARGO (m)	PESO (kg/m)	CANTIDAD	TOTAL	UNIDAD
	EDIFICIO ADMINISTRATIVO 2DO PISO						
1	VIGA VG-3 EJE 9 ENTRE EJES 2'-4'						
	Acero #5 recto		2.90	1.552	6.00	27.005	KG
	Acero #5 recto		1.43	1.552	6.00	13.316	KG
	Acero #5 recto		4.00	1.552	6.00	37.248	KG
	Acero #5 recto		1.40	1.552	6.00	13.037	KG
	Flejo #3 0.25x0.25		1.20	0.550	88.00	59.136	KG
				SUBTOTAL		149.742	KG
				TOTAL		149.742	KG

OBSERVACIONES:

LOCALIZACIÓN PLANIMÉTRICA

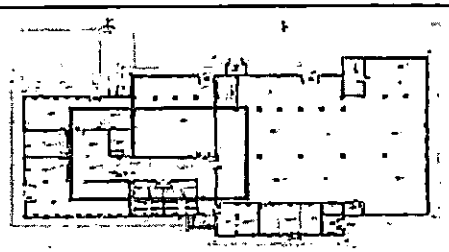


REGISTRO FOTOGRÁFICO

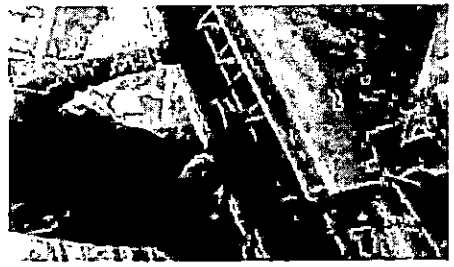

ARQ. ALEJANDRA BOLAÑOS
RESIDENTE CONTRATISTA

ARQ. NANCY AYALA
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

PLANO DETALLE

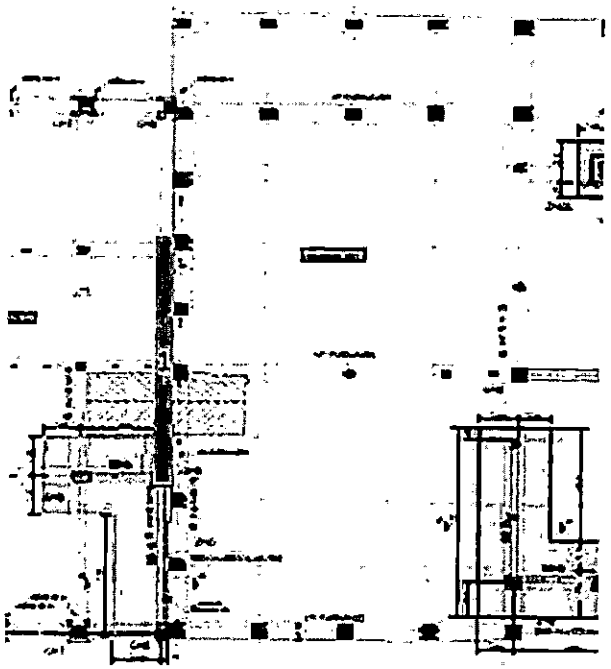

Ref

235

219

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA GENERAL

BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

PROYECTO: OBRAS SEDES ALCALDÍA

PRISMA
UNIVERSAL SEC S.A.S.
CONSORCIO PRUNI SEDES 04
CONTRATISTA


ARQUITECTURA URBANA LTDA
INTERVENTORÍA

ACTA No.	7		PERIODO DEL ACTA	01/01/2020	A	30/01/2020
OBJETO	REALIZAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE AJUSTE LAS DIFERENTES OBRAS E INTERVENCIONES ESPECIALIZADAS PARA LAS DIFERENTES SEDES DE LA SECRETARÍA GENERAL DE LA ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C.					
CONTRATO DE OBRA No	731-2019	CONTRATISTA	CONSORCIO PRUNI SEDES 04	ENTIDAD CONTRATANTE	SECRETARIA GENERAL-ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA	
CONTRATO INTERVENTORÍA	730 DE 2019	INTERVENTORÍA	ARQUITECTURA URBANA LTDA	FRENTE:	IMPRENTA DISTRITAL	

CAPITULO	2.5.0.	PERFORACIONES Y EPÓXICO	ITEM	2.5.0.1	Perforación y epóxico @3 L=0.15	UNIDAD	UN

ITEM	LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	TOTAL	UNIDAD
	PRODUCCIÓN						
1	COLUMNA C-8 EJES 11-L				92,00	92,00	UN
2	COLUMNA C-10 EJES 11-M				92,00	92,00	UN
3	COLUMNA C-8 EJES 11-N				92,00	92,00	UN
4	COLUMNA C-11 EJES 7-M				92,00	92,00	UN
5	COLUMNA C-11 EJES 7-O				92,00	92,00	UN

PLANO DETALLE

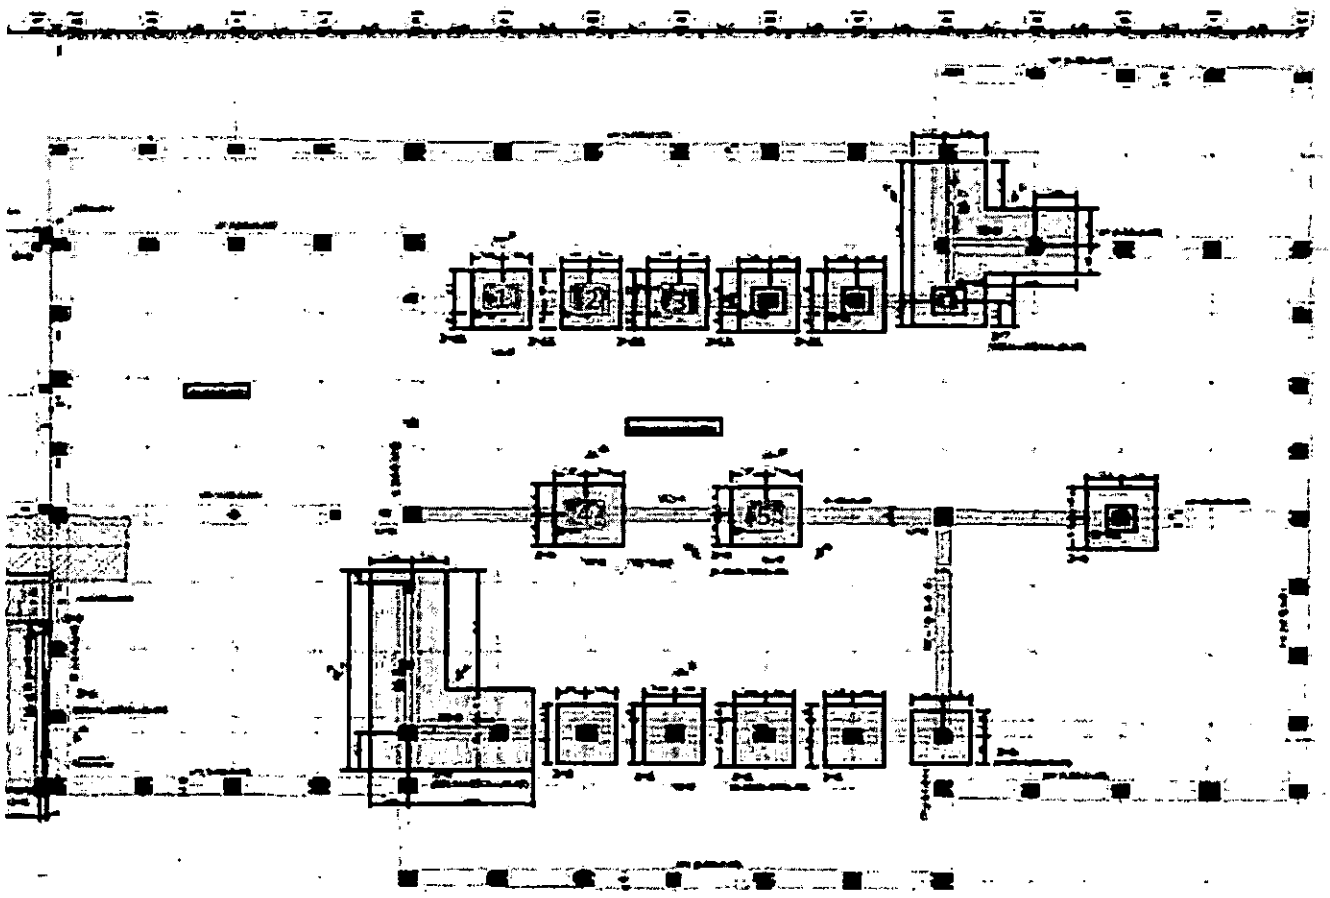

Ateb

236

221

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA GENERAL

BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

PROYECTO: OBRAS SEDES ALCALDÍA

PRISMA — UNIVERSAL SEC S.A.S. — CONSORCIO PRUNI SEDES 04 — CONTRATISTA

ARQUITECTURA URBANA LTDA — INTERVENTORÍA


ACTA No.	6	PERIODO DEL ACTA	01/12/2019	A	30/12/2019	
OBJETO	REALIZAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE AJUSTE LAS DIFERENTES OBRAS E INTERVENCIONES ESPECIALIZADAS PARA LAS DIFERENTES SEDES DE LA SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C.					
CONTRATO DE OBRA No	731-2019	CONTRATISTA	CONSORCIO PRUNI SEDES 04	ENTIDAD CONTRATANTE	SECRETARÍA GENERAL-ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA	
CONTRATO INTERVENTORÍA	730 DE 2019	INTERVENTORÍA	ARQUITECTURA URBANA LTDA	FRENTE:	IMPRENTA DISTRITAL	

CAPITULO	2.5.0	PERFORACIONES Y EPÓXICO	ITEM	2.5.0.2	Perforación y epóxico #3 L=0.30	UNIDAD	UN

ITEM	LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	TOTAL	UNIDAD
	EDIFICIO ADMINISTRATIVO 2DO PISO						
1	COLUMNA C-1 EJES 1'-E				22,00	22,00	UN
2	COLUMNA C-3 EJES 2'-E				32,00	32,00	UN
3	COLUMNA C-1 EJES 5'-D				31,00	31,00	UN
4	COLUMNA C-1 EJES 5'-E				31,00	31,00	UN
5	COLUMNA C-2 EJES 5'-F				22,00	22,00	UN
	EDIFICIO ADMINISTRATIVO 1ER PISO						
6	COLUMNA C-1 EJES 5'-E				31,00	31,00	UN


PLANO DETALLE

SEGUNDO PISO

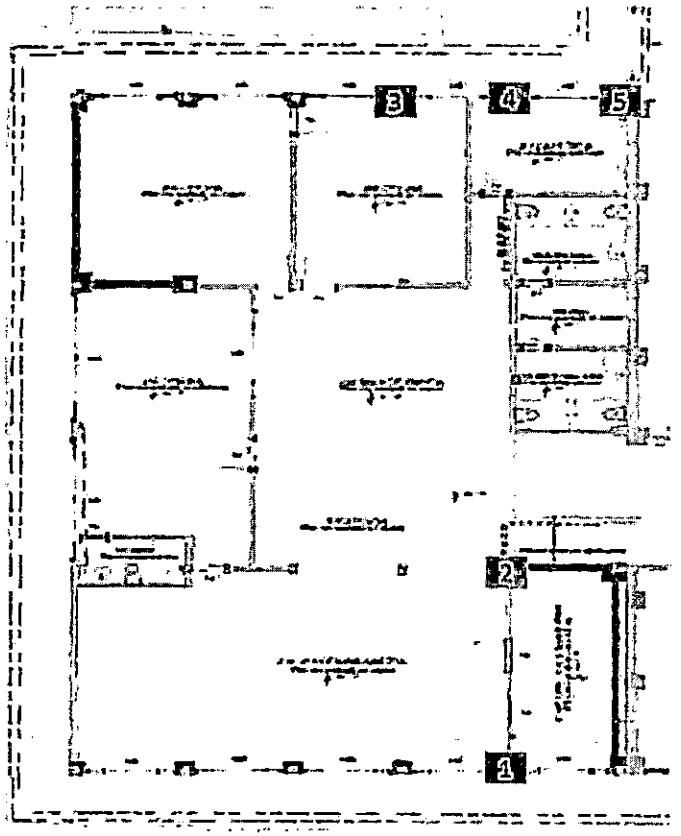

NePS

PRIMER PISO

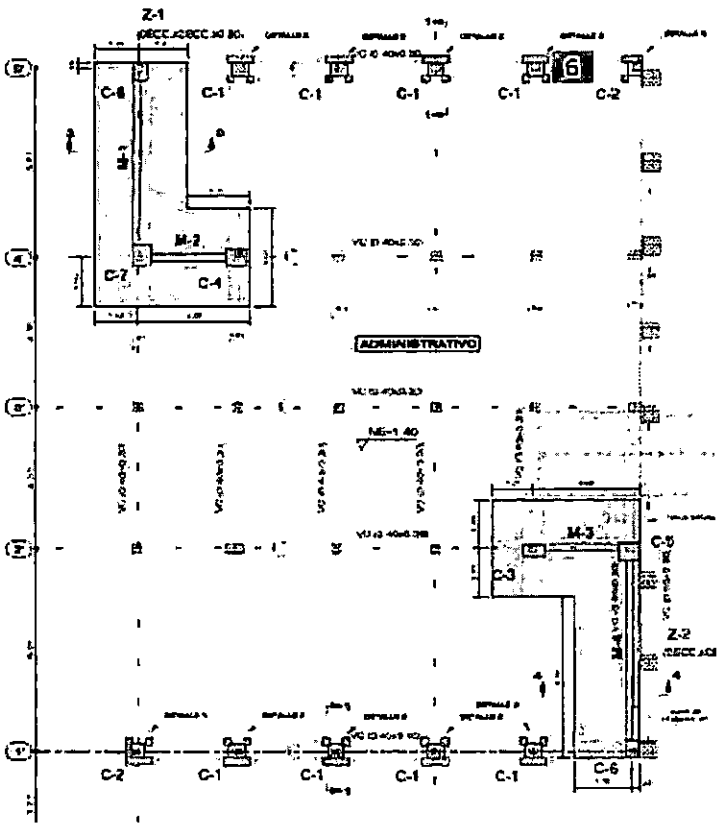

AL-01B8

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. | BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS
SECRETARÍA GENERAL

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

PROYECTO: OBRAS SEDES ALCALDÍA

PRISMA — UNIVERSAL SEC S.A.S. — CONSORCIO PRUNI SEDES 04 — CONTRATISTA


ARQUITECTURA URBANA LTDA — INTERVENTORÍA

ACTA No.	7	PERIODO DEL ACTA	01/01/2020	A	30/01/2020	
OBJETO	REALIZAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE AJUSTE LAS DIFERENTES OBRAS E INTERVENCIONES ESPECIALIZADAS PARA LAS DIFERENTES SEDES DE LA SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C.					
CONTRATO DE OBRA No	731-2019	CONTRATISTA	CONSORCIO PRUNI SEDES 04	ENTIDAD CONTRATANTE	SECRETARÍA GENERAL-ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA	
CONTRATO INTERVENTORÍA	730 DE 2019	INTERVENTORÍA	ARQUITECTURA URBANA LTDA	FRENTE:	IMPRENTA DISTRITAL	


CAPITULO	2.5.0.	PERFORACIONES Y EPÓXICO	ITEM	2.5.0.3	Perforación y epóxico Ø5 L=0.20	UNIDAD	UN

ITEM	LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	TOTAL	UNIDAD
	PRODUCCIÓN						
1	ZAPATA Z-4A EJES 11-L				12,00	12,00	UN
2	VC-1 EJE 11 ENTRE L-M				8,00	8,00	UN
3	ZAPATA Z-4A EJES 11-M				12,00	12,00	UN
4	VC-1 EJE 11 ENTRE M-N				8,00	8,00	UN
5	ZAPATA Z-4A EJES 11-N				12,00	12,00	UN
6	VC-1 EJE 11 ENTRE N-O				8,00	8,00	UN
7	ZAPATA Z-4A EJES 11-M				12,00	12,00	UN
8	VC-1 EJE 11 ENTRE O-P				8,00	8,00	UN
9	ZAPATA Z-4A EJES 11-P				12,00	12,00	UN
10	VC-1 EJE 11 ENTRE P-Q				8,00	8,00	UN
11	VC-1 EJE 7 ENTRE K-M				12,00	12,00	UN
12	ZAPATA Z-3 EJES 7-M				8,00	8,00	UN
13	VC-1 EJE 7 ENTRE M-O				12,00	12,00	UN
14	ZAPATA Z-3 EJES 7-O				8,00	8,00	UN
15	VC-1 EJE 7 ENTRE O-Q				8,00	8,00	UN
16	VC-1 EJE 7 ENTRE Q-S				8,00	8,00	UN
17	ZAPATA Z-3 EJES 7-S				16,00	16,00	UN
18	VC-1 EJE Q ENTRE EJES 7-S (PARCIAL)				4,00	4,00	UN
19	COLUMNA C-14 MURO M-S EJES 6-K				8,00	8,00	UN
	EDIFICIO ADMINISTRATIVO 2DO PISO						
20	VIGA VG-3 EJE F ENTRE EJES 2'-4'				18,00	18,00	UN
OBSERVACIONES:				SUBTOTAL		202,00	UN
				TOTAL		202,00	UN

LOCALIZACIÓN PLANIMÉTRICA

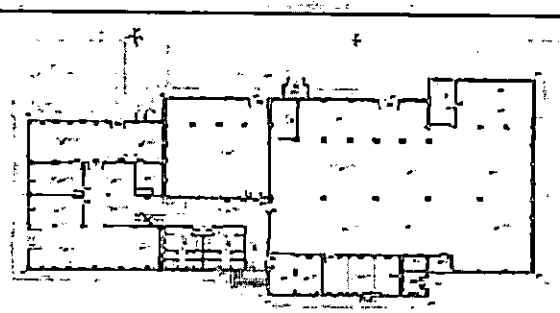

REGISTRO FOTOGRÁFICO

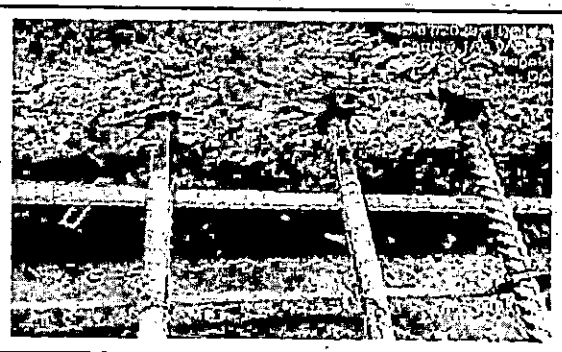

Alejandra Bolaños

ARQ. ALEJANDRA BOLAÑOS
RESIDENTE CONTRATISTA

ARQ. NANCY AYALA
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

238

225

20
19
12
14
17
1
3
5
7
9
10
PLAN

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA GENERAL | BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

PROYECTO: OBRAS SEDES ALCALDÍA

PRISMA — UNIVERSAL SEC S.A.S. — CONTRATISTA


ANQUITECTURA URBANA LTDA — INTERVENTORÍA

ACTA No.	7		PERIODO DEL ACTA	01/01/2020	A	30/01/2020
OBJETO	REALIZAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE AJUSTE LAS DIFERENTES OBRAS E INTERVENCIONES ESPECIALIZADAS PARA LAS DIFERENTES SEDES DE LA SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C.					
CONTRATO DE OBRA No	731-2019	CONTRATISTA	CONSORCIO PRUNI SEDES 04		ENTIDAD CONTRATANTE	SECRETARIA GENERAL-ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA
CONTRATO INTERVENTORÍA	730 DE 2019	INTERVENTORÍA	ARQUITECTURA URBANA LTDA		FRENTE:	IMPRENTA DISTRITAL

CAPITULO	2.5.0	PERFORACIONES Y EPÓXICO	ITEM	2.5.0.6	Perforación y epóxico #6 L=0.22	UNIDAD	UN

ITEM	LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	TOTAL	UNIDAD
	PRODUCCIÓN						
1	COLUMNETAS EJE 13 ENTRE EJES P-Q				12,00	12,00	UN
2	COLUMNETAS EJE 13 ENTRE EJES N-O				12,00	12,00	UN
3	COLUMNETAS EJE 13 ENTRE EJES M-N				12,00	12,00	UN
4	COLUMNETAS EJE 13 ENTRE EJES L-M				12,00	12,00	UN
5	COLUMNETAS EJE 13 ENTRE EJES I-J				12,00	12,00	UN
6	COLUMNETAS EJE 13 ENTRE EJES H-I				12,00	12,00	UN
7	COLUMNETAS EJE 13 ENTRE EJES G-H				12,00	12,00	UN
8	COLUMNETAS EJE 14 ENTRE EJES Q-R				12,00	12,00	UN
9	COLUMNETAS EJE 2 ENTRE EJES G-H				12,00	12,00	UN
10	COLUMNETAS EJE 2 ENTRE EJES H-I				12,00	12,00	UN
11	COLUMNETAS EJE 2 ENTRE EJES I-J				12,00	12,00	UN

PLANO DETALLE

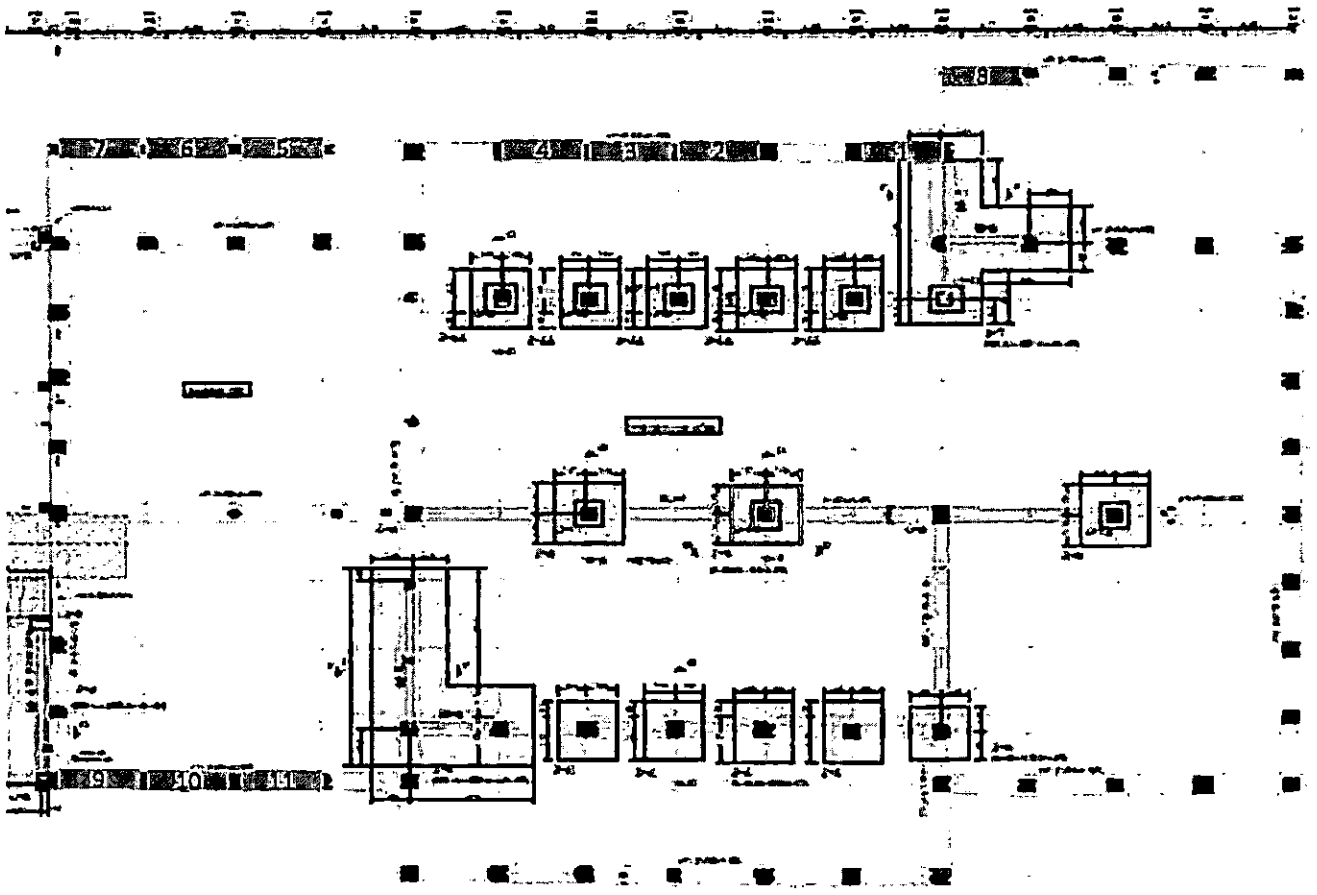

Alo12

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA GENERAL | BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

PROYECTO: OBRAS SEDES ALCALDÍA

PRISMA — UNIVERSAL SEC S.A.S. — CONSORCIO PRUNI SEDES 04 — CONTRATISTA

ARQUITECTURA URBANA LTDA — INTERVENTORÍA

ACTA No.	7		PERIODO DEL ACTA	01/01/2020	A	30/01/2020	
OBJETO	REALIZAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE AJUSTE LAS DIFERENTES OBRAS E INTERVENCIONES ESPECIALIZADAS PARA LAS DIFERENTES SEDES DE LA SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C.						
CONTRATO DE OBRA No	731-2019	CONTRATISTA	CONSORCIO PRUNI SEDES 04		ENTIDAD CONTRATANTE	SECRETARIA GENERAL-ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA	
CONTRATO INTERVENTORÍA	730 DE 2019	INTERVENTORÍA	ARQUITECTURA URBANA LTDA		FRENTE:	IMPRENTA DISTRITAL	

CAPITULO	2.5.0	PERFORACIONES Y EPÓXICO	ITEM	2.5.0.8	Perforación y epóxico Ø6 L= 0.60	UNIDAD	UN

ITEM	LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	TOTAL	UNIDAD
	PRODUCCIÓN						
1	ZAPATA Z-4 EJES 4-N				20,00	20,00	UN

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA GENERAL

BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

PROYECTO: OBRAS SEDES ALCALDÍA


PRISMA — UNIVERSAL SEC S.A.S. — CONSORCIO PRUNI SEDES 04 — CONTRATISTA

ARQUITECTURA URBANA LTDA — INTERVENTORÍA

ACTA No.	7	PERIODO DEL ACTA	01/01/2020	A	30/01/2020
OBJETO	REALIZAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE AJUSTE LAS DIFERENTES OBRAS E INTERVENCIONES ESPECIALIZADAS PARA LAS DIFERENTES SEDES DE LA SECRETARÍA GENERAL DE LA ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C.				
CONTRATO DE OBRA No	731-2019	CONTRATISTA	CONSORCIO PRUNI SEDES 04	ENTIDAD CONTRATANTE	SECRETARIA GENERAL-ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA
CONTRATO INTERVENTORÍA	730 DE 2019	INTERVENTORÍA	ARQUITECTURA URBANA LTDA	FRENTE:	IMPRENTA DISTRITAL

CAPITULO	2.5.0	PERFORACIONES Y EPÓXICO	ITEM	2.5.0.11	Perforación y epóxico Ø7 L=0.30	UNIDAD	UN

ITEM	LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	TOTAL	UNIDAD
	EDIFICIO ADMINISTRATIVO 2DO PISO						
1	COLUMNA C-2 EJES 5'-F				10,00	10,00	UN

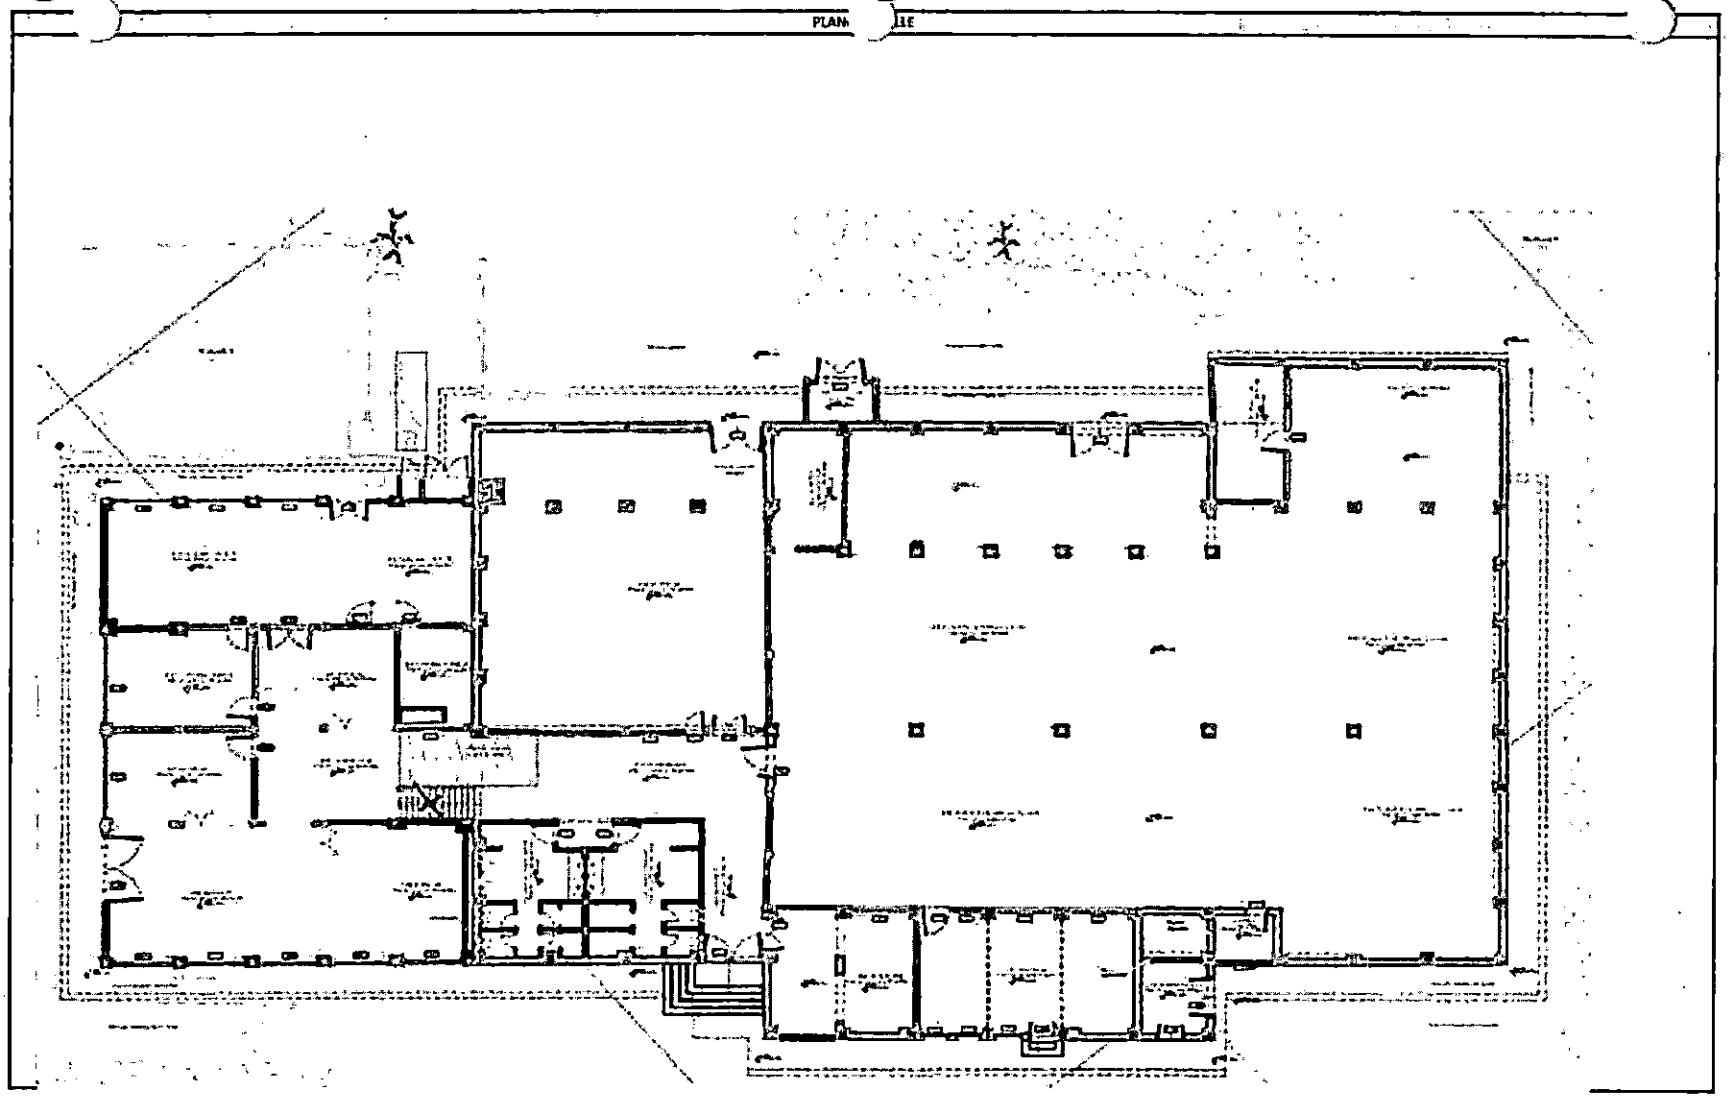

Roof

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. | BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS
SECRETARÍA GENERAL

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

PROYECTO: OBRAS SEDES ALCALDÍA

PRISMA — UNIVERSAL SEC S.A.S. — CONSORCIO PRUNI Sedes 04 — CONTRATISTA


ARQUITECTURA URBANA LTDA — INTERVENTORÍA

ACTA No.	7		PERIODO DEL ACTA	01/01/2020	A	30/01/2020	
OBJETO	REALIZAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE AJUSTE LAS DIFERENTES OBRAS E INTERVENCIONES ESPECIALIZADAS PARA LAS DIFERENTES SEDES DE LA SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C.						
CONTRATO DE OBRA No	731-2019	CONTRATISTA	CONSORCIO PRUNI SEDES 04		ENTIDAD CONTRATANTE	SECRETARIA GENERAL-ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA	
CONTRATO INTERVENTORÍA	730 DE 2019	INTERVENTORÍA	ARQUITECTURA URBANA LTDA		FRENTE:	IMPRENTA DISTRITAL	


CAPITULO	2.7.0	CUBIERTAS	ITEM	2.7.0.2	Adición de elementos metálicos reforzamiento	UNIDAD	KG

ITEM	LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES FIGURA	LARGO (m)	PESO (kg/m)	CANTIDAD	TOTAL	UNIDAD
	EDIFICIO ADMINISTRATIVO 2DO PISO						
1	Acero 1/2" recto liso		0,31	0,994	2,00	0,616	KG
	Acero 1/2" en V liso		0,63	0,994	5,00	3,131	KG
2	Acero 1/2" recto liso		0,31	0,994	2,00	0,616	KG
	Acero 1/2" en V liso		0,63	0,994	5,00	3,131	KG
3	Acero 1/2" recto liso		0,31	0,994	2,00	0,616	KG
	Acero 1/2" en V liso		0,63	0,994	5,00	3,131	KG
4	Acero 1/2" recto liso		0,31	0,994	2,00	0,616	KG
	Acero 1/2" en V liso		0,63	0,994	5,00	3,131	KG
5	Acero 1/2" recto liso		0,31	0,994	5,00	1,541	KG
	Acero 1/2" en V liso		0,63	0,994	13,00	8,141	KG
6	Acero 1/2" recto liso		0,31	0,994	5,00	1,541	KG
	Acero 1/2" en V liso		0,63	0,994	13,00	8,141	KG
7	Acero 1/2" recto liso		0,31	0,994	5,00	1,541	KG
	Acero 1/2" en V liso		0,63	0,994	13,00	8,141	KG
8	Acero 1/2" recto liso		0,31	0,994	5,00	1,541	KG
	Acero 1/2" en V liso		0,63	0,994	13,00	8,141	KG
9	Acero 1/2" recto liso		0,31	0,994	5,00	1,541	KG
	Acero 1/2" en V liso		0,63	0,994	13,00	8,141	KG
10	Acero 1/2" recto liso		0,31	0,994	5,00	1,541	KG
	Acero 1/2" en V liso		0,63	0,994	13,00	8,141	KG
11	Acero 1/2" recto liso		0,31	0,994	2,00	0,616	KG
	Acero 1/2" en V liso		0,63	0,994	5,00	3,131	KG
12	Acero 1/2" recto liso		0,31	0,994	2,00	0,616	KG
	Acero 1/2" en V liso		0,63	0,994	5,00	3,131	KG
13	Acero 1/2" recto liso		0,31	0,994	2,00	0,616	KG
	Acero 1/2" en V liso		0,63	0,994	5,00	3,131	KG
14	Acero 1/2" recto liso		0,31	0,994	2,00	0,616	KG
	Acero 1/2" en V liso		0,63	0,994	5,00	3,131	KG
15	Acero 1/2" recto liso		0,31	0,994	4,00	1,233	KG
	Acero 1/2" en V liso		0,63	0,994	19,00	11,898	KG
OBSERVACIONES:				SUBTOTAL		101,199	KG
				TOTAL		101,199	KG

LOCALIZACIÓN PLANIMÉTRICA

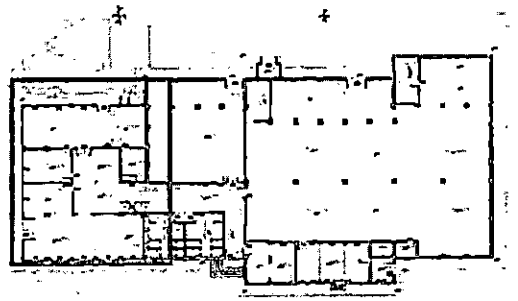

REGISTRO FOTOGRÁFICO

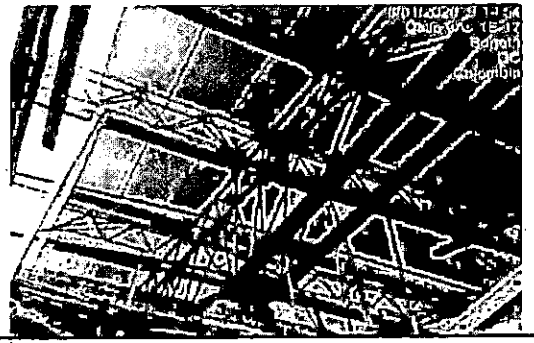

Alejandra Bolaños

ARQ. ALEJANDRA BOLAÑOS
RESIDENTE CONTRATISTA

Nancy Rocio Ayala Gomez

ARQ. NANCY AYALA
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA GENERAL | BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

PROYECTO: OBRAS SEDES ALCALDÍA

PRISMA — UNIVERSAL SEC S.A. — CONSORCIO PRUNI SEDES 04 — CONTRATISTA


ARQUITECTURA URBANA LTDA — INTERVENTORÍA

ACTA No.	7		PERIODO DEL ACTA	01/01/2020	A	30/01/2020	
OBJETO	REALIZAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE AJUSTE LAS DIFERENTES OBRAS E INTERVENCIONES ESPECIALIZADAS PARA LAS DIFERENTES SEDES DE LA SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C.						
CONTRATO DE OBRA No	731-2019	CONTRATISTA	CONSORCIO PRUNI SEDES 04		ENTIDAD CONTRATANTE	SECRETARIA GENERAL-ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA	
CONTRATO INTERVENTORÍA	730 DE 2019	INTERVENTORÍA	ARQUITECTURA URBANA LTDA		FRENTE:	IMPRENTA DISTRITAL	


CAPITULO	2.7.0	CUBIERTAS	ITEM	2.7.0.2	Adición de elementos metálicos reforzamiento	UNIDAD	KG

ITEM	LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES FIGURA	LARGO (m)	PESO (kg/m)	CANTIDAD	TOTAL	UNIDAD
	EDIFICIO ADMINISTRATIVO 2DO PISO				VIENEN	101,20	KG
16	Acero 1/2" recto liso	——	0,31	0,99	4,00	1,23	KG
	Acero 1/2" en V liso	<	0,63	0,99	14,00	8,77	KG
17	Angulo 2"x1/8"		6,00	2,46	12,00	177,12	KG
18	Angulo 2"x1/8"		6,00	2,46	12,00	177,12	KG
19	Angulo 2"x1/8"		6,00	2,46	12,00	177,12	KG
20	Angulo 2"x1/8"		6,00	2,46	12,00	177,12	KG
21	Angulo 2"x1/8"		6,00	2,46	12,00	177,12	KG
22	Angulo 2"x1/8"		6,00	2,46	12,00	177,12	KG
OBSERVACIONES:				SUBTOTAL		1.173,92	KG
				TOTAL		1.173,92	KG

LOCALIZACIÓN PLANIMÉTRICA

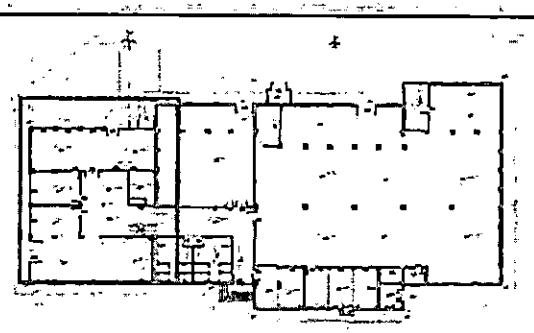

REGISTRO FOTOGRÁFICO

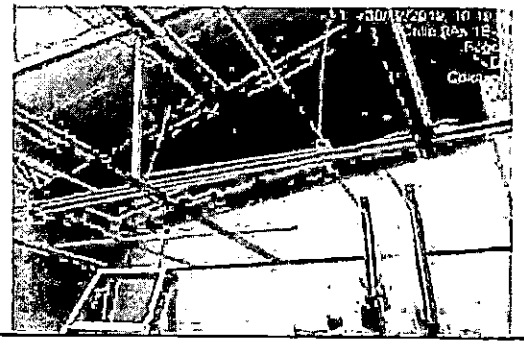


Alejandra Bolaños +


ARQ. ALEJANDRA BOLAÑOS
RESIDENTE CONTRATISTA

Nancy Rocío Ayala Gomez

ARQ. NANCY AYALA
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

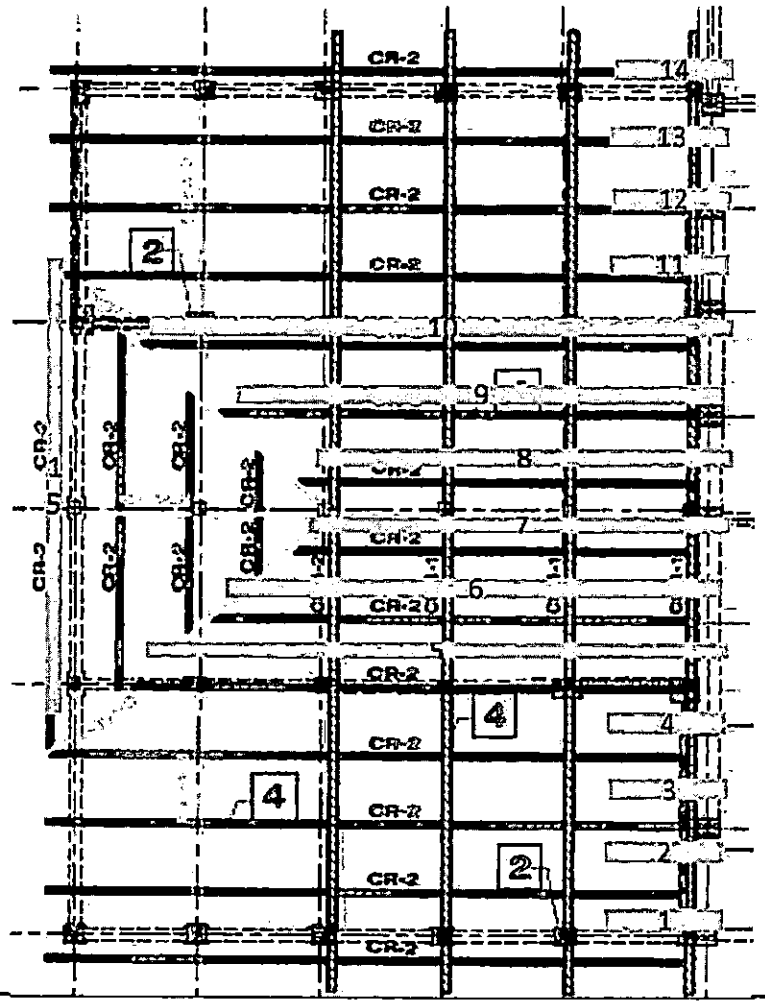
CR-2
14
13
12
11
2
1
9
8
7
6
5
4
3
2
1

PLANO DETALLE

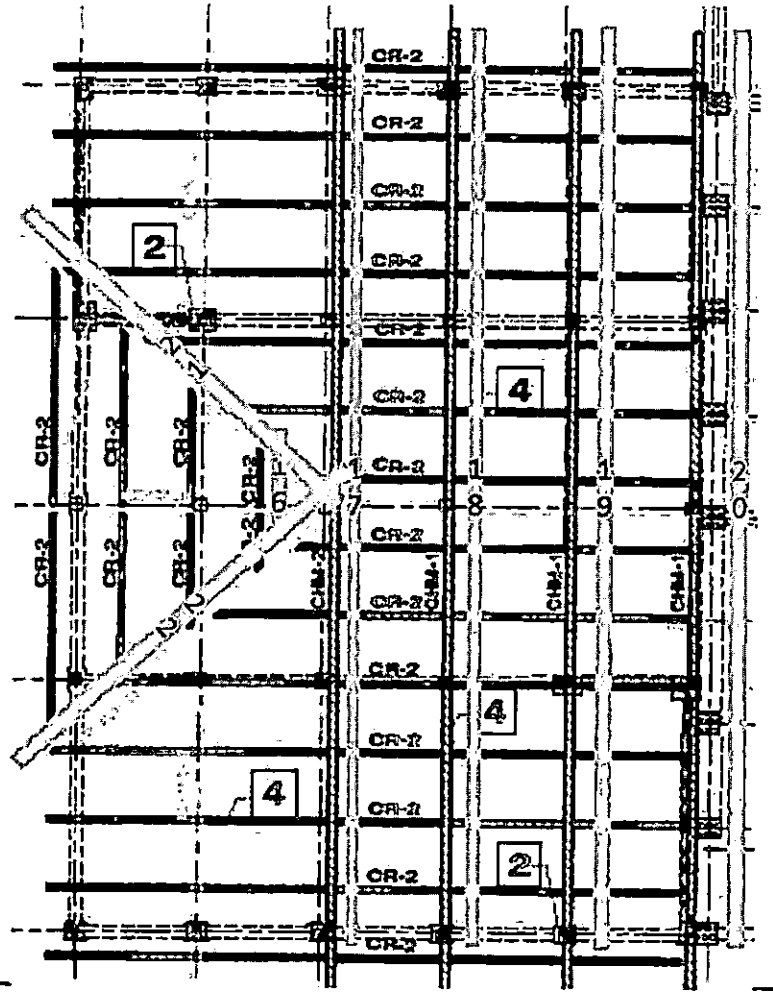

Ne 138

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA GENERAL
BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

PROYECTO: OBRAS SEDES ALCALDÍA

PRISMA
UNIVERSAL SEC S.A.S.
CONSORCIO PRUNI SEDES 04
CONTRATISTA


ARQUITECTURA URBANA LTDA
INTERVENTORÍA

ACTA No.	7		PERIODO DEL ACTA	01/01/2020	A	30/01/2020
OBJETO	REALIZAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE AJUSTE LAS DIFERENTES OBRAS E INTERVENCIONES ESPECIALIZADAS PARA LAS DIFERENTES SEDES DE LA SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C.					
CONTRATO DE OBRA No	731-2019	CONTRATISTA	CONSORCIO PRUNI SEDES 04		ENTIDAD CONTRATANTE	SECRETARIA GENERAL-ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA
CONTRATO INTERVENTORÍA	730 DE 2019	INTERVENTORÍA	ARQUITECTURA URBANA LTDA		FRENTE:	IMPRENTA DISTRITAL


CAPITULO	2.7.0	CUBIERTAS	ITEM	2.7.0.3	Aseo y pintura anticorrosiva de estructura metálica	UNIDAD	M2

ITEM	LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	TOTAL	UNIDAD
1	ADMINISTRACION 200 PISO	21,15	15,40		1,00	325,71	M2
OBSERVACIONES:				SUBTOTAL		325,71	M2
				TOTAL:		325,71	M2

LOCALIZACIÓN PLANIMÉTRICA

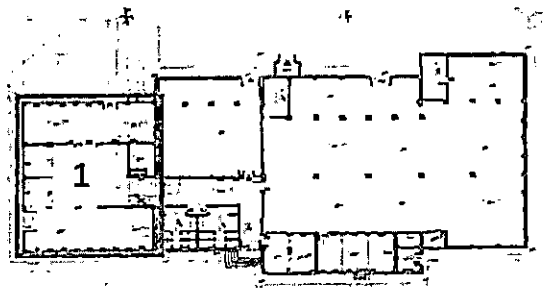

REGISTRO FOTOGRÁFICO

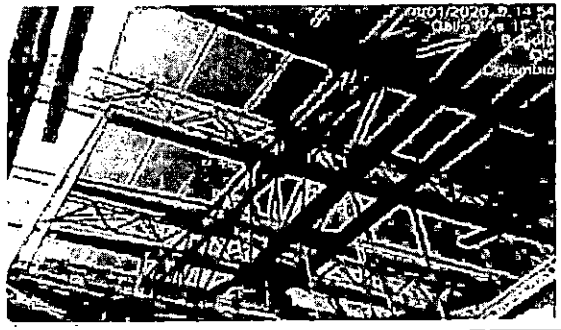

Alejandra Bolaños T
ARQ. ALEJANDRA BOLAÑOS
RESIDENTE CONTRATISTA

Nancy Rocio Ayala Gomez
ARQ. NANCY AYALA
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA GENERAL | BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

PROYECTO: OBRAS SEDES ALCALDÍA

PRISMA UNIVERSAL SEC S.A.S. — CONSORCIO PRUNI SEDES 04 — CONTRATISTA

ARQUITECTURA URBANA LTDA — INTERVENTORÍA


ACTA No.	7	PERIODO DEL ACTA	01/01/2020	A	30/01/2020		
OBJETO	REALIZAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE AJUSTE LAS DIFERENTES OBRAS E INTERVENCIONES ESPECIALIZADAS PARA LAS DIFERENTES SEDES DE LA SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C.						
CONTRATO DE OBRA No	731-2019	CONTRATISTA	CONSORCIO PRUNI SEDES 04	ENTIDAD CONTRATANTE	SECRETARIA GENERAL-ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA		
CONTRATO INTERVENTORÍA	730 DE 2019	INTERVENTORÍA	ARQUITECTURA URBANA LTDA	FRENTE:	IMPRENTA DISTRITAL		

CAPITULO	2.8.0	RESTITUCIÓN DE ACABADOS	ITEM	2.8.0.2	Reparación y restauración contrapiso y piso, se considera igual al area cortada para la intervención	UNIDAD	M2


ITEM	LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES LARGO	DIMENSIONES ANCHO	DIMENSIONES ALTO	CANTIDAD	TOTAL	UNIDAD
	EDIFICIO ADMINISTRATIVO 1ER PISO						
1		2,15	1,69		1,00	3,63	M2
2		5,54	1,62		1,00	8,97	M2
3		9,40	1,20		1,00	11,28	M2
4		2,89	1,87		1,00	5,40	M2
				SUBTOTAL		29,29	M2
				TOTAL		29,29	M2

OBSERVACIONES:

LOCALIZACIÓN PLANIMÉTRICA

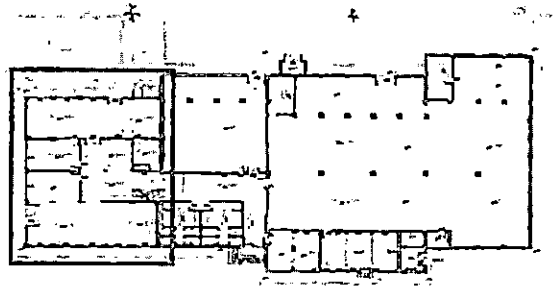

REGISTRO FOTOGRÁFICO




ARQ. ALEJANDRA BOLAÑOS
RESIDENTE CONTRATISTA

ARQ. NANCY AYALA
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

244

237

PIANO [illegible]

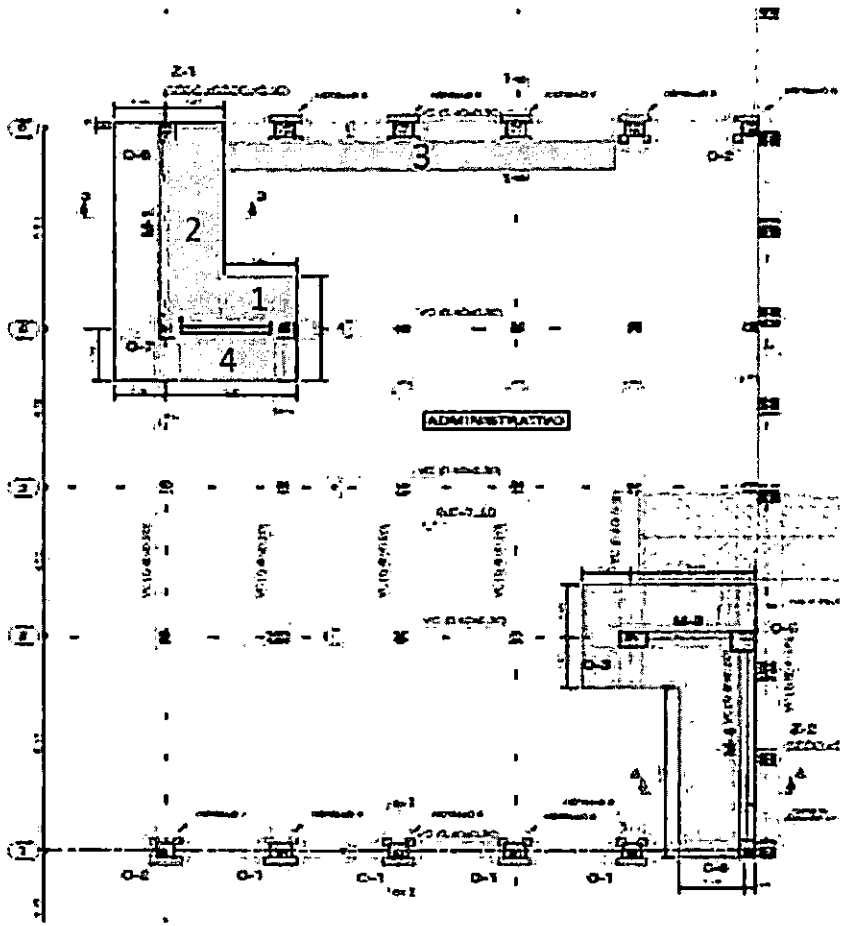

Re B8

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA GENERAL

BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

PROYECTO: OBRAS SEDES ALCALDÍA

PRISMA — UNIVERSAL SEC S.A.S. — CONSORCIO PRUNI SEDES 04 — CONTRATISTA


ARQUITECTURA URBANA LTDA — INTERVENTORÍA

ACTA No.	7		PERIODO DEL ACTA	01/01/2020	A	30/01/2020	
OBJETO	REALIZAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE AJUSTE LAS DIFERENTES OBRAS E INTERVENCIONES ESPECIALIZADAS PARA LAS DIFERENTES SEDES DE LA SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C.						
CONTRATO DE OBRA No	731-2019	CONTRATISTA	CONSORCIO PRUNI SEDES 04		ENTIDAD CONTRATANTE	SECRETARIA GENERAL-ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA	
CONTRATO INTERVENTORÍA	730 DE 2019	INTERVENTORÍA	ARQUITECTURA URBANA LTDA		FRENTE:	IMPRENTA DISTRITAL	


CAPITULO	2.8.0	RESTITUCIÓN DE ACABADOS	ITEM	2.8.0.6	Rotura del muro para columneta	UNIDAD	ML

ITEM	LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	TOTAL	UNIDAD
	PRODUCCIÓN						
1	MURO EJE 13 ENTRE EJES G-H	1,62			2,00	3,24	ML
2	MURO EJE 13 ENTRE EJES G-H	2,45			1,00	2,45	ML
3	MURO EJE 13 ENTRE EJES H-I	1,62			2,00	3,24	ML
4	MURO EJE 13 ENTRE EJES H-I	2,45			1,00	2,45	ML
5	MURO EJE 13 ENTRE EJES I-J	1,62			2,00	3,24	ML
6	MURO EJE 13 ENTRE EJES I-J	2,45			1,00	2,45	ML
7	MURO EJE 13 ENTRE EJES L-M	2,00			2,00	4,00	ML
8	MURO EJE 13 ENTRE EJES Q-R	2,10			2,00	4,20	ML
9	MURO EJE 13 ENTRE EJES Q-R	1,95			1,00	1,95	ML
10	MURO EJE 1' ENTRE EJES G-H	2,20			2,00	4,40	ML
11	MURO EJE 1' ENTRE EJES G-H	2,50			1,00	2,50	ML
12	MURO EJE 1' ENTRE EJES H-I	2,20			2,00	4,40	ML
13	MURO EJE 1' ENTRE EJES H-I	2,50			1,00	2,50	ML
14	MURO EJE 1' ENTRE EJES I-J	2,20			2,00	4,40	ML
15	MURO EJE 1' ENTRE EJES I-J	2,50			1,00	2,50	ML
16	MURO EJE 2 ENTRE EJES R-S	2,40			2,00	4,80	ML
17	MURO EJE 2 ENTRE EJES R-S	2,50			1,00	2,50	ML
18	MURO EJE 2 ENTRE EJES S-T	2,40			2,00	4,80	ML
19	MURO EJE 2 ENTRE EJES S-T	2,50			1,00	2,50	ML
20	MURO EJE 2 ENTRE EJES T-U	2,40			2,00	4,80	ML
21	MURO EJE 2 ENTRE EJES T-U	2,50			1,00	2,50	ML
				SUBTOTAL		69,82	ML
OBSERVACIONES:				TOTAL		69,82	ML

LOCALIZACIÓN PLANIMÉTRICA

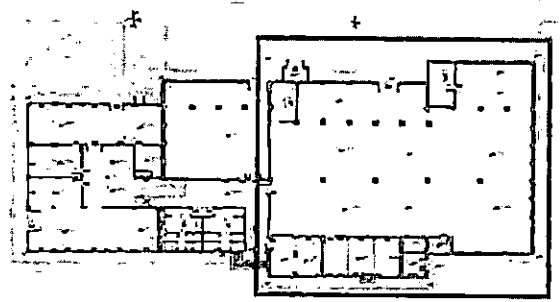

REGISTRO FOTOGRÁFICO

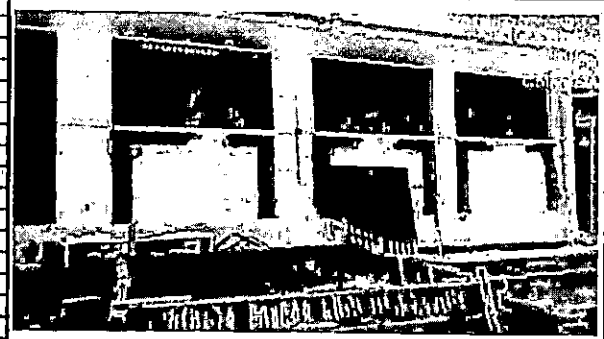

Alejandra Bolaños

ARQ. ALEJANDRA BOLAÑOS
RESIDENTE CONTRATISTA


Nancy Rocío Ayala Gomez

ARQ. NANCY AYALA
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

245

239

246

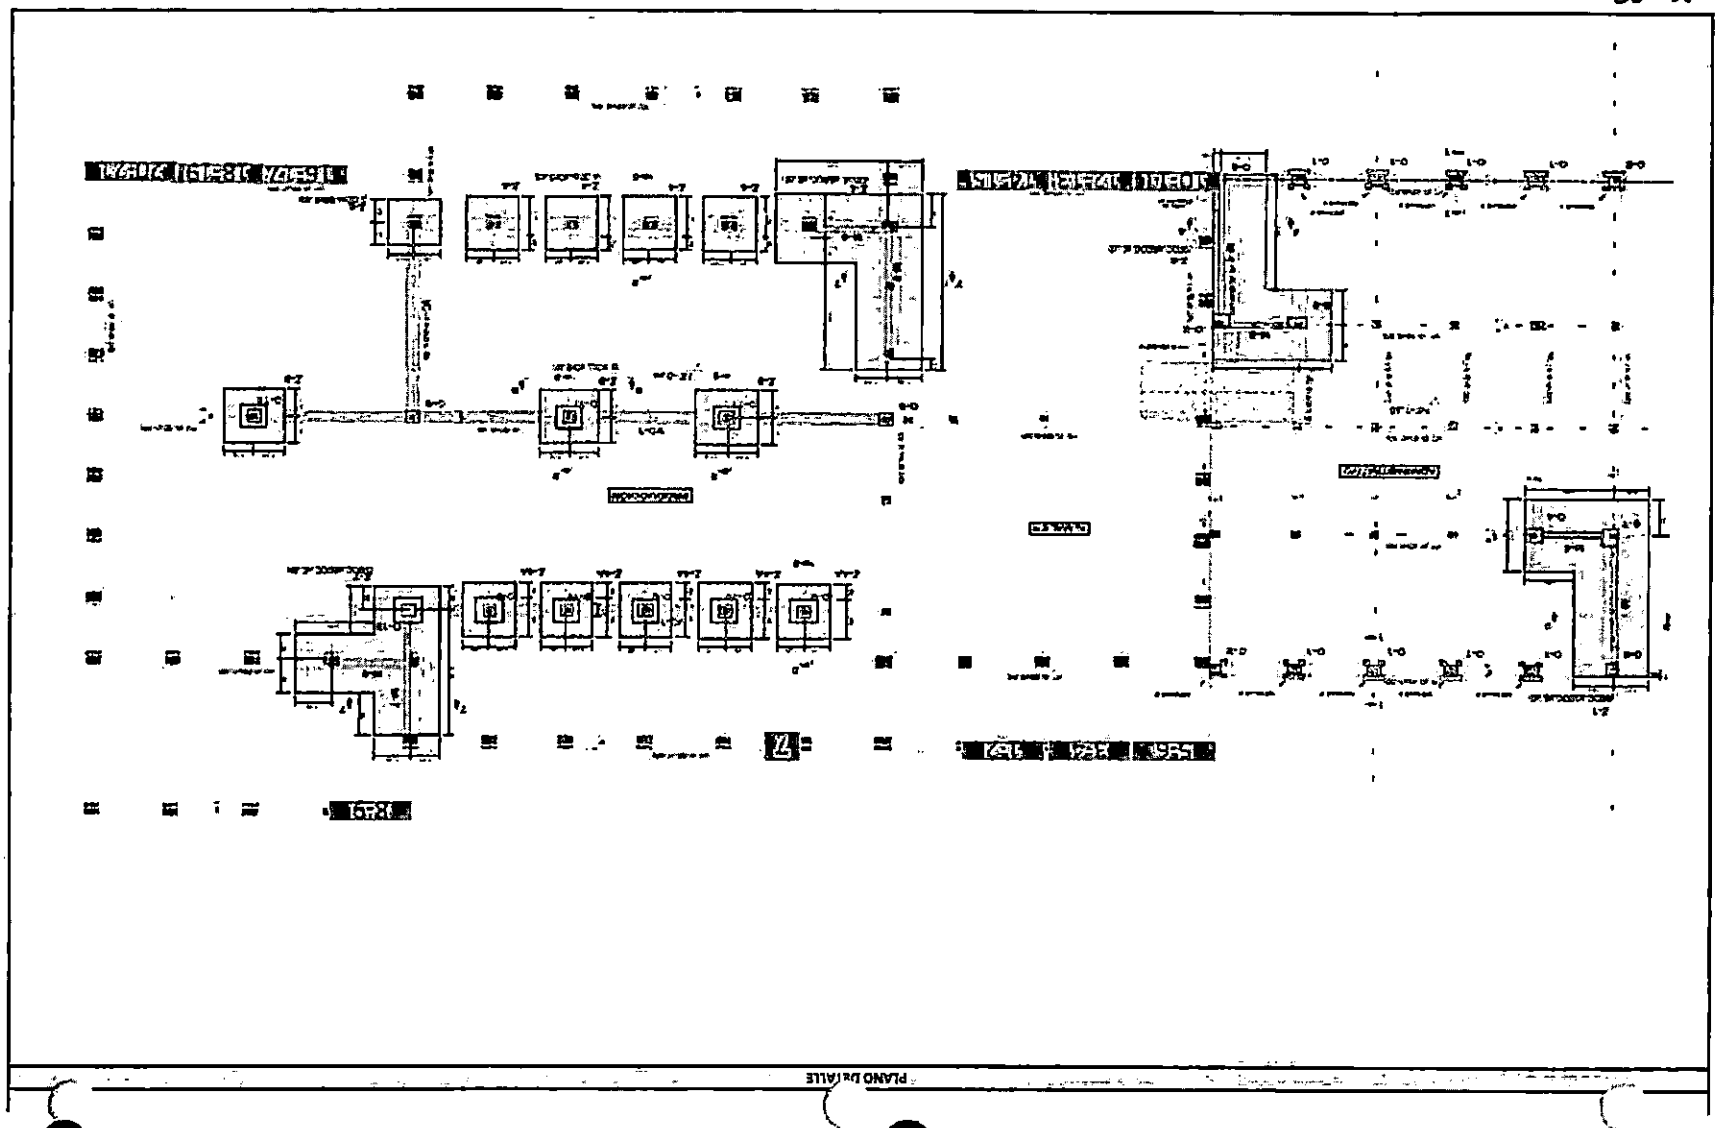

PLANO DE L'AILE

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA GENERAL | BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

PROYECTO: OBRAS SEDES ALCALDÍA

PRISMA — UNIVERSAL SEC S.A.S. — CONSORCIO PRUNI SEDE 04 — CONTRATISTA

ARQUITECTURA URBANA LTDA — INTERVENTORÍA

ACTA No.	7	PERIODO DEL ACTA	01/01/2020	A	30/01/2020		
OBJETO	REALIZAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE AJUSTE LAS DIFERENTES OBRAS E INTERVENCIONES ESPECIALIZADAS PARA LAS DIFERENTES SEDES DE LA SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C.						
CONTRATO DE OBRA No	731-2019	CONTRATISTA	CONSORCIO PRUNI SEDES 04	ENTIDAD CONTRATANTE	SECRETARIA GENERAL-ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA		
CONTRATO INTERVENTORÍA	730 DE 2019	INTERVENTORÍA	ARQUITECTURA URBANA LTDA	FRENTE:	IMPRENTA DISTRITAL		

CAPITULO	2.8.0	RESTITUCIÓN DE ACABADOS	ITEM	2.8.0.7	Perforaciones y epóxico 1/2" L=0.15	UNIDAD	UN

ITEM	LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	TOTAL	UNIDAD
	EDIFICIO ADMINISTRATIVO 2DO PISO						
1	COLUMNETA EJE 1' ENTRE EJES D-E				8,00	8,00	UN

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA GENERAL | BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

PROYECTO: OBRAS SEDES ALCALDÍA

PRISMA — UNIVERSAL SEC S.A.S. — CONSORCIO PRUNI SEDES 04 — CONTRATISTA


ANQUITECTURA URBANA LTDA — INTERVENTORÍA

ACTA No.	7	PERIODO DEL ACTA	01/01/2020	A	30/01/2020	
OBJETO	REALIZAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE AJUSTE LAS DIFERENTES OBRAS E INTERVENCIONES ESPECIALIZADAS PARA LAS DIFERENTES SEDES DE LA SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C.					
CONTRATO DE OBRA No	731-2019	CONTRATISTA	CONSORCIO PRUNI SEDES 04	ENTIDAD CONTRATANTE	SECRETARIA GENERAL-ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA	
CONTRATO INTERVENTORÍA	730 DE 2019	INTERVENTORÍA	ARQUITECTURA URBANA LTDA	FRENTE:	IMPRENTA DISTRITAL	


CAPITULO	2.8.0	RESTITUCIÓN DE ACABADOS	ITEM	2.8.0.8	Escarificar muros existentes, retiro de estucos y pinturas para adherir el mortero nuevo de pañete	UNIDAD	M2

ITEM	LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	TOTAL	UNIDAD
	PRODUCCIÓN						
1	MURO EJE 13 ENTRE EJES L-M		2,47	2,30	1,00	5,68	M2
2	MURO EJE 13 ENTRE EJES M-N		2,47	2,30	1,00	5,68	M2
3	MURO EJE 13 ENTRE EJES N-O		2,47	2,30	1,00	5,68	M2
4	MURO EJE 13 ENTRE EJES P-Q		2,47	2,30	1,00	5,68	M2
5	MURO EJE 14 ENTRE EJES Q-R		2,47	1,90	1,00	4,69	M2
6	MURO EJE 14 ENTRE EJES R-S		2,47	1,90	1,00	4,69	M2
7	MURO EJE 14 ENTRE EJES S-T		2,47	1,90	1,00	4,69	M2
8	MURO EJE 14 ENTRE EJES T-U		2,47	1,90	1,00	4,69	M2
9	MURO EJE 2 ENTRE EJES T-U		2,47	2,25	1,00	5,56	M2
10	MURO EJE 2 ENTRE EJES S-T		2,47	2,25	1,00	5,56	M2
11	MURO EJE 2 ENTRE EJES R-S		2,47	2,25	1,00	5,56	M2
OBSERVACIONES:				SUBTOTAL		58,17	M2
				TOTAL		58,17	M2

LOCALIZACIÓN PLANIMÉTRICA

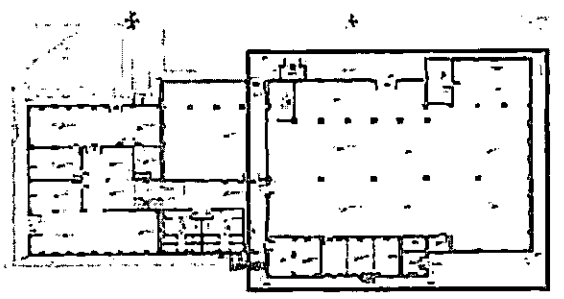

REGISTRO FOTOGRÁFICO

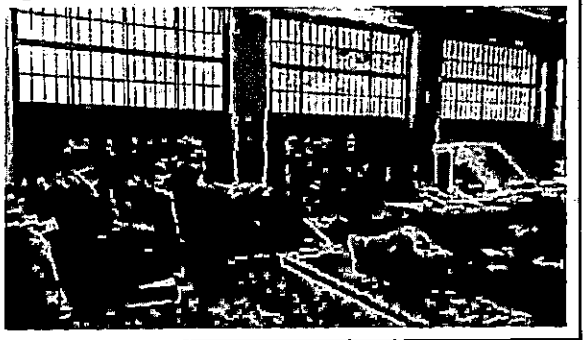


Alejandra Bolaños

ARQ. ALEJANDRA BOLAÑOS
RESIDENTE CONTRATISTA

Nancy Rocio Ayala Gomez

ARQ. NANCY AYALA
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

PLANO DETALLE

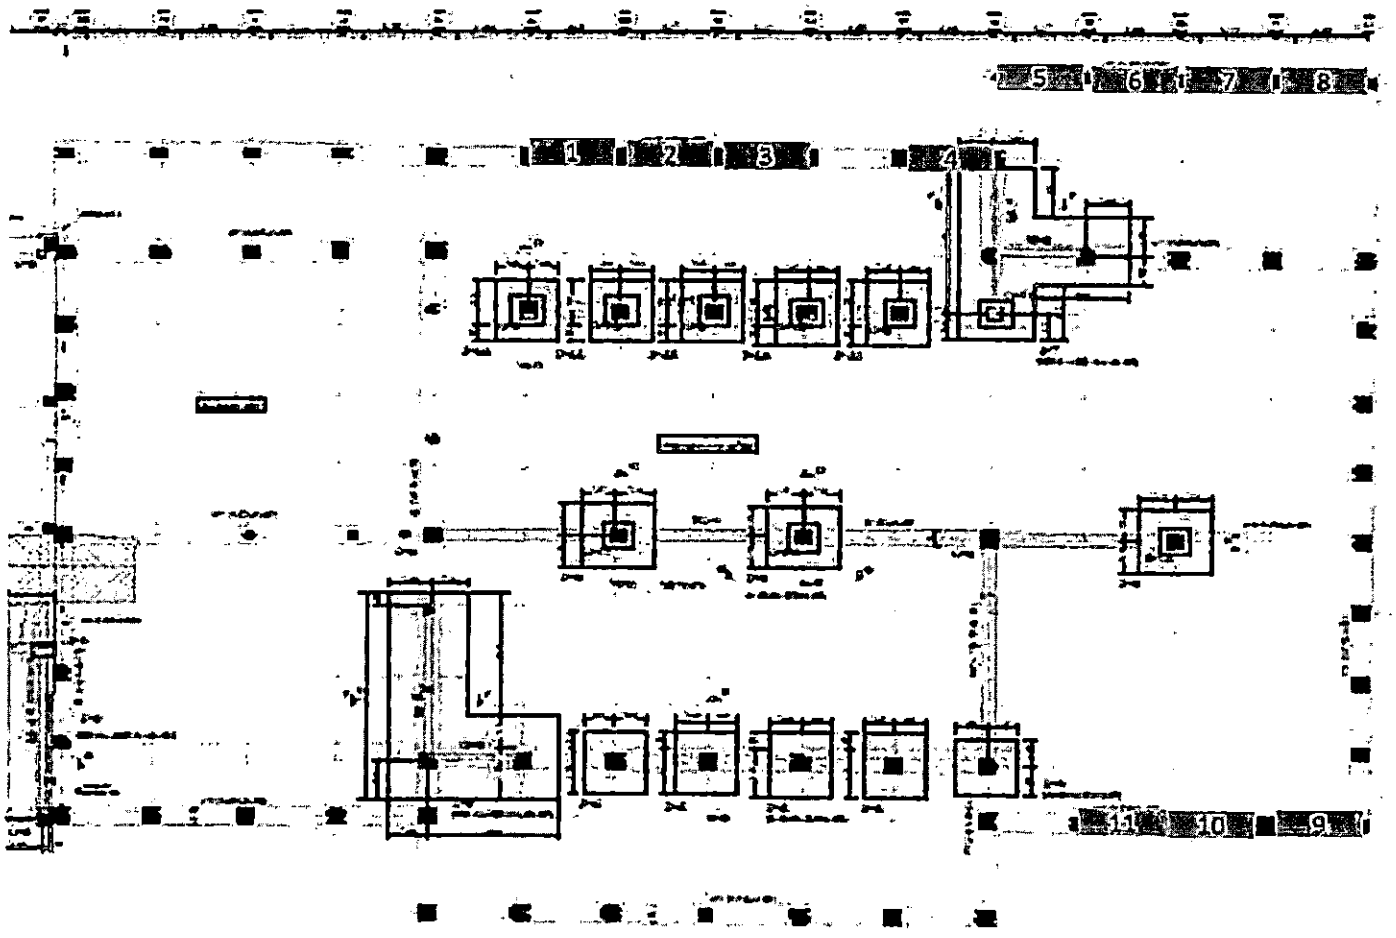

Ale 18

243

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA GENERAL | BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

PROYECTO: OBRAS SEDES ALCALDÍA

PRISMA — UNIVERSAL SEC S.A.S. — CONSORCIO PRUNI SEDES 04 — CONTRATISTA

ARQUITECTURA URBANA LTDA — INTERVENTORÍA


ACTA No.	7		PERIODO DEL ACTA	01/01/2020	A	30/01/2020	
OBJETO	REALIZAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE AJUSTE LAS DIFERENTES OBRAS E INTERVENCIONES ESPECIALIZADAS PARA LAS DIFERENTES SEDES DE LA SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C.						
CONTRATO DE OBRA No	731-2019	CONTRATISTA	CONSORCIO PRUNI SEDES 04		ENTIDAD CONTRATANTE	SECRETARIA GENERAL-ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA	
CONTRATO INTERVENTORÍA	730 DE 2019	INTERVENTORÍA	ARQUITECTURA URBANA LTDA		FRENTE:	IMPRENTA DISTRITAL	

CAPITULO	2.8.0	RESTITUCIÓN DE ACABADOS	ITEM	2.8.0.9	Concreto de 3000 PSI	UNIDAD	M3

ITEM	LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	TOTAL	UNIDAD
	PRODUCCIÓN						
1	COLUMNETAS EJE 13 ENTRE EJES P-Q	2,23	0,35	0,30	2,00	0,47	M3
2	COLUMNETAS EJE 13 ENTRE EJES N-O	2,23	0,35	0,30	2,00	0,47	M3
3	COLUMNETAS EJE 13 ENTRE EJES M-N	2,23	0,35	0,30	2,00	0,47	M3
4	COLUMNETAS EJE 13 ENTRE EJES L-M	2,23	0,35	0,30	2,00	0,47	M3
5	COLUMNETAS EJE 13 ENTRE EJES I-J	1,80	0,35	0,30	2,00	0,38	M3
6	COLUMNETAS EJE 13 ENTRE EJES H-I	1,80	0,35	0,30	2,00	0,38	M3
7	COLUMNETAS EJE 13 ENTRE EJES G-H	1,80	0,35	0,30	2,00	0,38	M3
				SUBTOTAL		3,01	M3
				TOTAL		3,01	M3

OBSERVACIONES:

LOCALIZACIÓN PLANIMÉTRICA

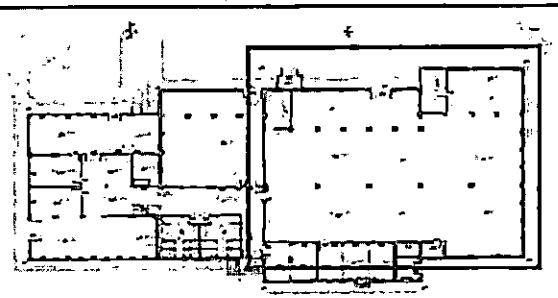

REGISTRO FOTOGRÁFICO




Alejandra Bolaños

ARQ. ALEJANDRA BOLAÑOS
RESIDENTE CONTRATISTA

Nancy Rocío Ayala Gómez

ARQ. NANCY AYALA
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

PLANO DETALLE

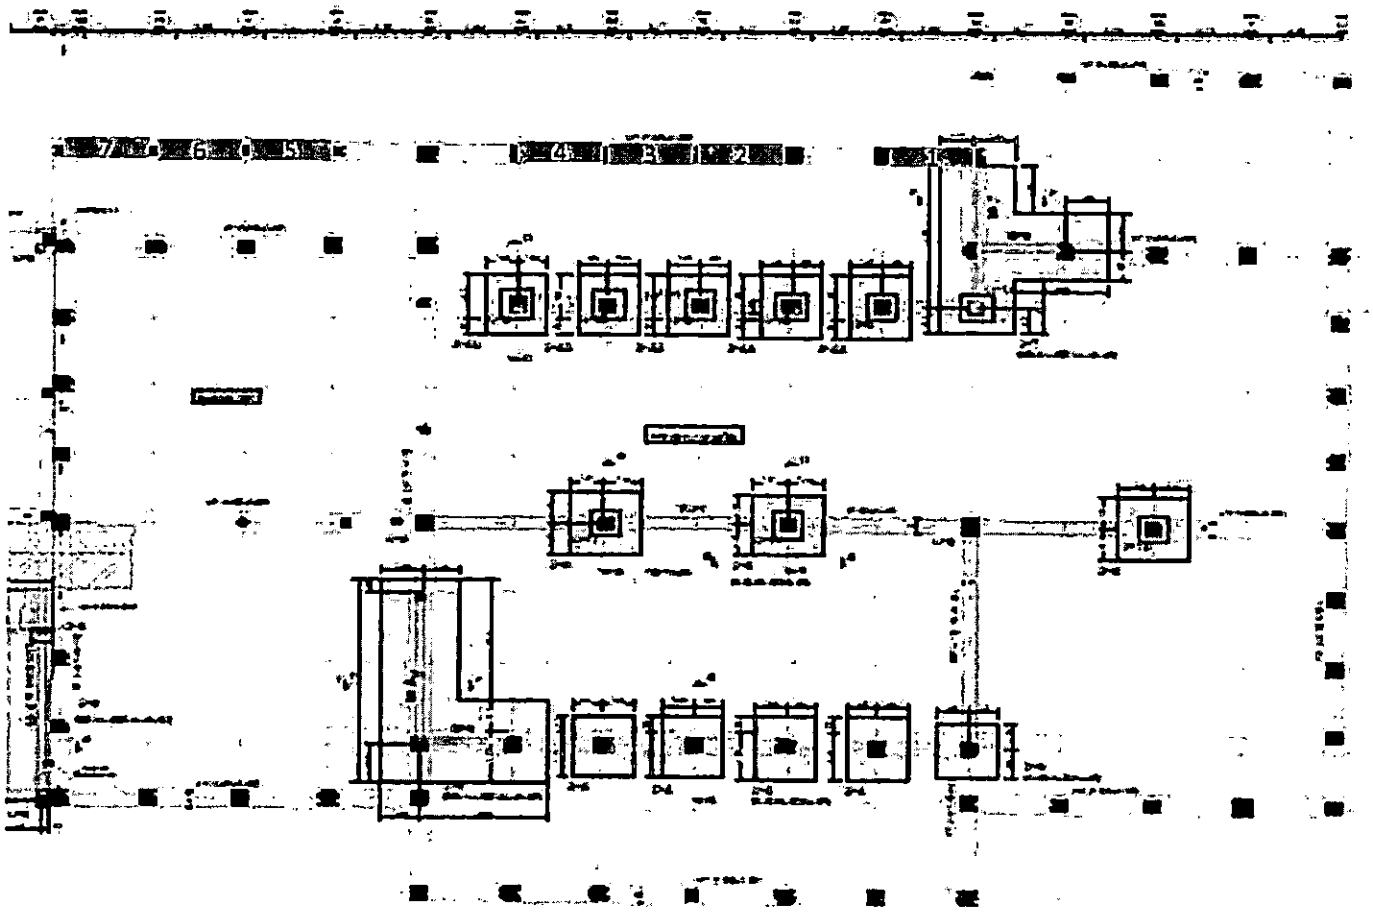

Ne PB

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. | BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS
SECRETARÍA GENERAL

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

PROYECTO: OBRAS SEDES ALCALDÍA


PRISMA — UNIVERSAL SEC S.A.S. — CONTRATISTA
ARQUITECTURA URBANA LTDA — INTERVENTORÍA

ACTA No.	7		PERIODO DEL ACTA	01/01/2020	A	30/01/2020	
OBJETO	REALIZAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE AJUSTE LAS DIFERENTES OBRAS E INTERVENCIONES ESPECIALIZADAS PARA LAS DIFERENTES SEDES DE LA SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C.						
CONTRATO DE OBRA No	731-2019	CONTRATISTA	CONSORCIO PRUNI SEDES 04		ENTIDAD CONTRATANTE	SECRETARIA GENERAL-ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA	
CONTRATO INTERVENTORÍA	730 DE 2019	INTERVENTORÍA	ARQUITECTURA URBANA LTDA		FRENTE:	IMPRENTA DISTRITAL	


CAPITULO	2.8.0	RESTITUCIÓN DE ACABADOS	ITEM	2.8.0.10	Viga de remate encima de muros - 3000 PSI	UNIDAD	M3

ITEM	LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	TOTAL	UNIDAD
	PRODUCCIÓN						
1	VIGA CINTA EJE 13 ENTRE EJES P-Q	2,60	0,30	0,35	1,00	0,27	M3
2	VIGA CINTA EJE 13 ENTRE EJES N-O	2,60	0,30	0,35	1,00	0,27	M3
3	VIGA CINTA EJE 13 ENTRE EJES M-N	2,60	0,30	0,35	1,00	0,27	M3
4	VIGA CINTA EJE 13 ENTRE EJES L-M	2,60	0,30	0,35	1,00	0,27	M3
5	VIGA CINTA EJE 13 ENTRE EJES I-J	1,95	0,30	0,35	1,00	0,20	M3
6	VIGA CINTA EJE 13 ENTRE EJES H-I	1,95	0,30	0,35	1,00	0,20	M3
7	VIGA CINTA EJE 13 ENTRE EJES G-H	1,95	0,30	0,35	1,00	0,20	M3
OBSERVACIONES:				SUBTOTAL		1,71	M3
				TOTAL		1,71	M3

LOCALIZACIÓN PLANIMÉTRICA

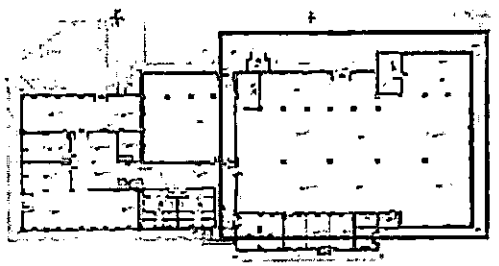


REGISTRO FOTOGRÁFICO

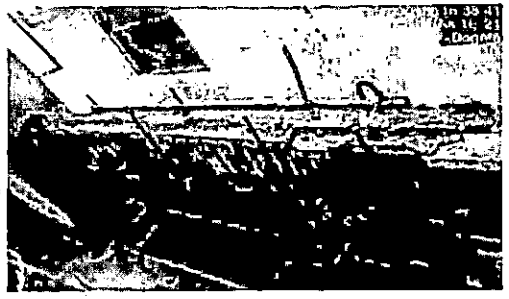

Alejandra Bolaños +
ARQ. ALEJANDRA BOLAÑOS
RESIDENTE CONTRATISTA

Nancy Rocío Ayala Gómez
ARQ. NANCY AYALA
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

PLANO DETALLE

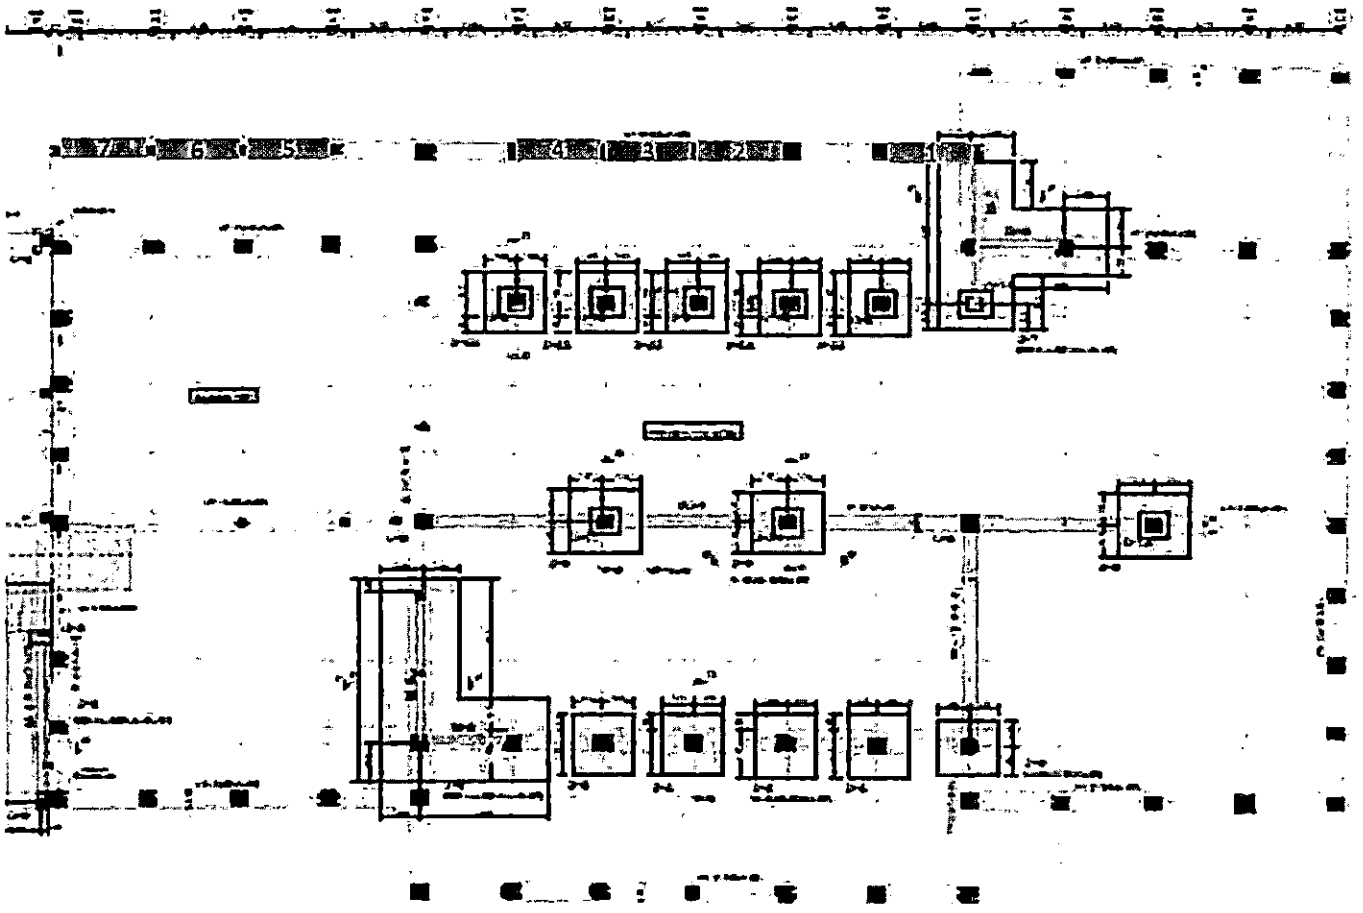

Kuol

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. | BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS | SECRETARÍA GENERAL

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

PROYECTO: OBRAS SEDES ALCALDÍA

PRISMA UNIVERSAL SEC S.A.S. — CONTRATISTA


ARQUITECTURA URBANA LTDA — INTERVENTORÍA

ACTA No.	7		PERIODO DEL ACTA	1/01/2020	A	30/01/2020	
OBJETO	REALIZAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE AJUSTE LAS DIFERENTES OBRAS E INTERVENCIONES ESPECIALIZADAS PARA LAS DIFERENTES SEDES DE LA SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C.						
CONTRATO DE OBRA No	731-2019	CONTRATISTA	CONSORCIO PRIMI SEDES 04		ENTIDAD CONTRATANTE	SECRETARIA GENERAL-ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA	
CONTRATO INTERVENTORÍA	730 DE 2019	INTERVENTORÍA	ARQUITECTURA URBANA LTDA		FRENTE:	IMPRENTA DISTRITAL	


CAPITULO	2.8.0	RESTITUCIÓN DE ACABADOS	ITEM	2.8.0.13	Suministro figurada y amarre de acero 60000 PSI 420 Mpa	UNIDAD	KG

ITEM	LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES FIGURA	DIMENSIONES LARGO (m)	DIMENSIONES PESO (kg/m)	CANTIDAD	TOTAL	UNIDAD
	PRODUCCIÓN						
1	COLUMNETAS EJE 13 ENTRE EJES P-Q						
	Acero #5 con esc. L=.60m		3.08	2.235	12.00	82.606	KG
	Fleje #3 .16x.20		0.92	0.560	30.00	15.456	KG
	Acero #3 recto		1.00	0.560	30.00	16.800	KG
2	VIGA CINTA EJE 13 ENTRE EJES P-Q						
	Acero #4 recto		2.10	0.994	4.00	8.350	KG
	Fleje #3 .15x.20		0.90	0.560	13.00	6.552	KG
	Acero #3 recto		1.00	0.560	13.00	7.280	KG
3	COLUMNETAS EJE 13 ENTRE EJES N-O						
	Acero #5 con esc. L=.60m		2.70	2.235	6.00	36.207	KG
	Acero #5 con esc. L=.60m		2.90	2.235	6.00	38.889	KG
	Fleje #3 .15x.20		0.90	0.560	28.00	14.112	KG
	Acero #3 recto		1.00	0.560	26.00	14.560	KG
4	VIGA CINTA EJE 13 ENTRE EJES N-O						
	Acero #4 recto		2.10	0.994	4.00	8.350	KG
	Fleje #3 .15x.20		0.90	0.560	13.00	6.552	KG
	Acero #3 recto		1.00	0.560	13.00	7.280	KG
5	COLUMNETAS EJE 13 ENTRE EJES M-N						
	Acero #5 con esc. L=.60m		2.70	2.235	6.00	36.207	KG
	Acero #5 con esc. L=.60m		2.90	2.235	6.00	38.889	KG
	Fleje #3 .15x.20		0.90	0.560	28.00	14.112	KG
	Acero #3 recto		1.00	0.560	26.00	14.560	KG
6	VIGA CINTA EJE 13 ENTRE EJES M-N						
	Acero #4 recto		2.10	0.994	4.00	8.350	KG
	Fleje #3 .15x.20		0.90	0.560	13.00	6.552	KG
	Acero #3 recto		1.00	0.560	13.00	7.280	KG
OBSERVACIONES:			SUBTOTAL			388.942	KG
			TOTAL			388.942	KG

LOCALIZACIÓN PLANIMÉTRICA

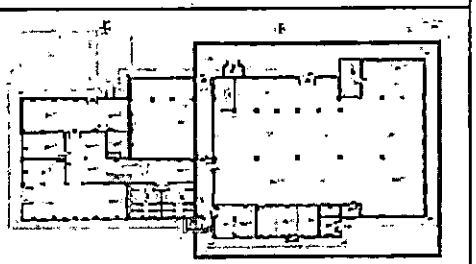

REGISTRO FOTOGRÁFICO

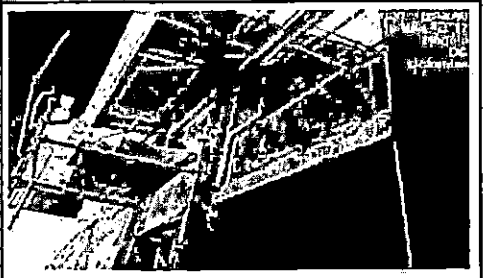


Alejandra Bolaños +

ARQ. ALEJANDRA BOLAÑOS
RESIDENTE CONTRATISTA

Nancy Rocio Ayala Gomez

ARQ. NANCY AYALA
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

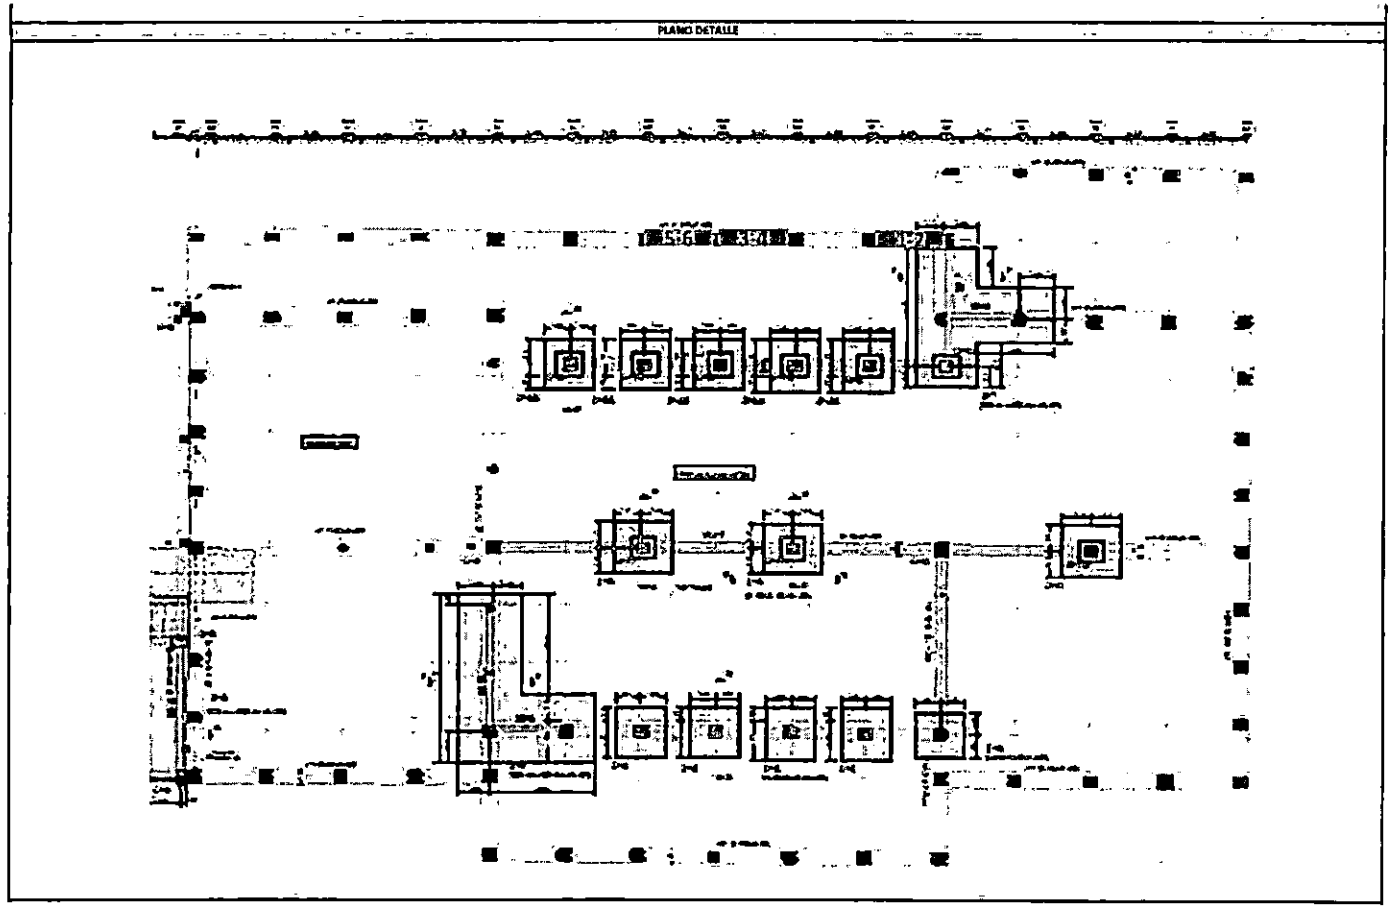

Nº 88

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. | BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS
SECRETARÍA GENERAL

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

PROYECTO: OBRAS SEDES ALCALDÍA

PRISMA — UNIVERSAL SEC S.A. — CONSORCIO PRUMI SEDES 04 — CONTRATISTA

ARQUITECTURA URBANA LTDA — INTERVENTORÍA

ACTA No.	7	PERIODO DEL ACTA	1/01/2020	A	30/01/2020		
OBJETO	REALIZAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE AJUSTE LAS DIFERENTES OBRAS E INTERVENCIONES ESPECIALIZADAS PARA LAS DIFERENTES SEDES DE LA SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C.						
CONTRATO DE OBRA No	731-2019	CONTRATISTA	CONSORCIO PRUMI SEDES 04	ENTIDAD CONTRATANTE	SECRETARIA GENERAL-ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA		
CONTRATO INTERVENTORÍA	730 DE 2019	INTERVENTORÍA	ARQUITECTURA URBANA LTDA	FRENTE:	IMPRENTA DISTRITAL		

CAPITULO		2.8.0	RESTITUCIÓN DE ACABADOS		ITEM	2.8.0.13	Suministro figurado y amarre de acero 60000 PSI 420 Mpa	UNIDAD	KG
ITEM	LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES FIGURA	LARGO (m)	PESO (kg/m)	CANTIDAD	TOTAL	UNIDAD	LOCALIZACIÓN PLANIMÉTRICA	
					VIENEN	383.94	KG		
	PRODUCCIÓN								
7	COLUMNETAS EJE 13 ENTRE EJES L-M								
	Acero #6 con esc. L=.60m		2.70	2.235	6.00	36.207	KG		
	Acero #6 con esc. L=.60m		2.50	2.235	6.00	33.525	KG		
	Fleje #3 .15x.20		0.90	0.560	28.00	14.112	KG		
	Acero #3 recto		1.00	0.560	26.00	14.560	KG		
8	VIGA CINTA EJE 13 ENTRE EJES L-M								
	Acero #4 recto		2.10	0.994	4.00	8.350	KG		
	Fleje #3 .15x.20		0.90	0.560	13.00	6.552	KG		
	Acero #3 recto		1.00	0.560	13.00	7.280	KG		
9	COLUMNETAS EJE 13 ENTRE EJES I-J								
	Acero #6 con esc. L=.60m		2.70	2.235	6.00	36.207	KG		
	Acero #6 con esc. L=.60m		2.50	2.235	6.00	33.525	KG		
	Fleje #3 .15x.20		0.90	0.560	24.00	12.096	KG		
	Acero #3 recto		1.00	0.560	24.00	13.440	KG		
10	VIGA CINTA EJE 13 ENTRE EJES I-J								
	Acero #4 recto		1.85	0.994	4.00	7.356	KG		
	Fleje #3 .15x.20		0.90	0.560	13.00	6.552	KG		
	Acero #3 recto		1.00	0.560	13.00	7.280	KG		
11	COLUMNETAS EJE 13 ENTRE EJES H-I								
	Acero #6 con esc. L=.60m		2.70	2.235	6.00	36.207	KG		
	Acero #6 con esc. L=.60m		2.50	2.235	6.00	33.525	KG		
	Fleje #3 .15x.20		0.90	0.560	24.00	12.096	KG		
	Acero #3 recto		1.00	0.560	24.00	13.440	KG		
12	VIGA CINTA EJE 13 ENTRE EJES H-I								
	Acero #4 recto		1.85	0.994	4.00	7.356	KG		
	Fleje #3 .15x.20		0.90	0.560	13.00	6.552	KG		
	Acero #3 recto		1.00	0.560	13.00	7.280	KG		
OBSERVACIONES:				SUBTOTAL		747.80	KG		
				TOTAL		747.80	KG		

REGISTRO FOTOGRÁFICO




Alejandra Bolaños

ARQ. ALEJANDRA BOLAÑOS
RESIDENTE CONTRATISTA

Nancy Rocio Ayala Gomez

ARQ. NANCY AYALA
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

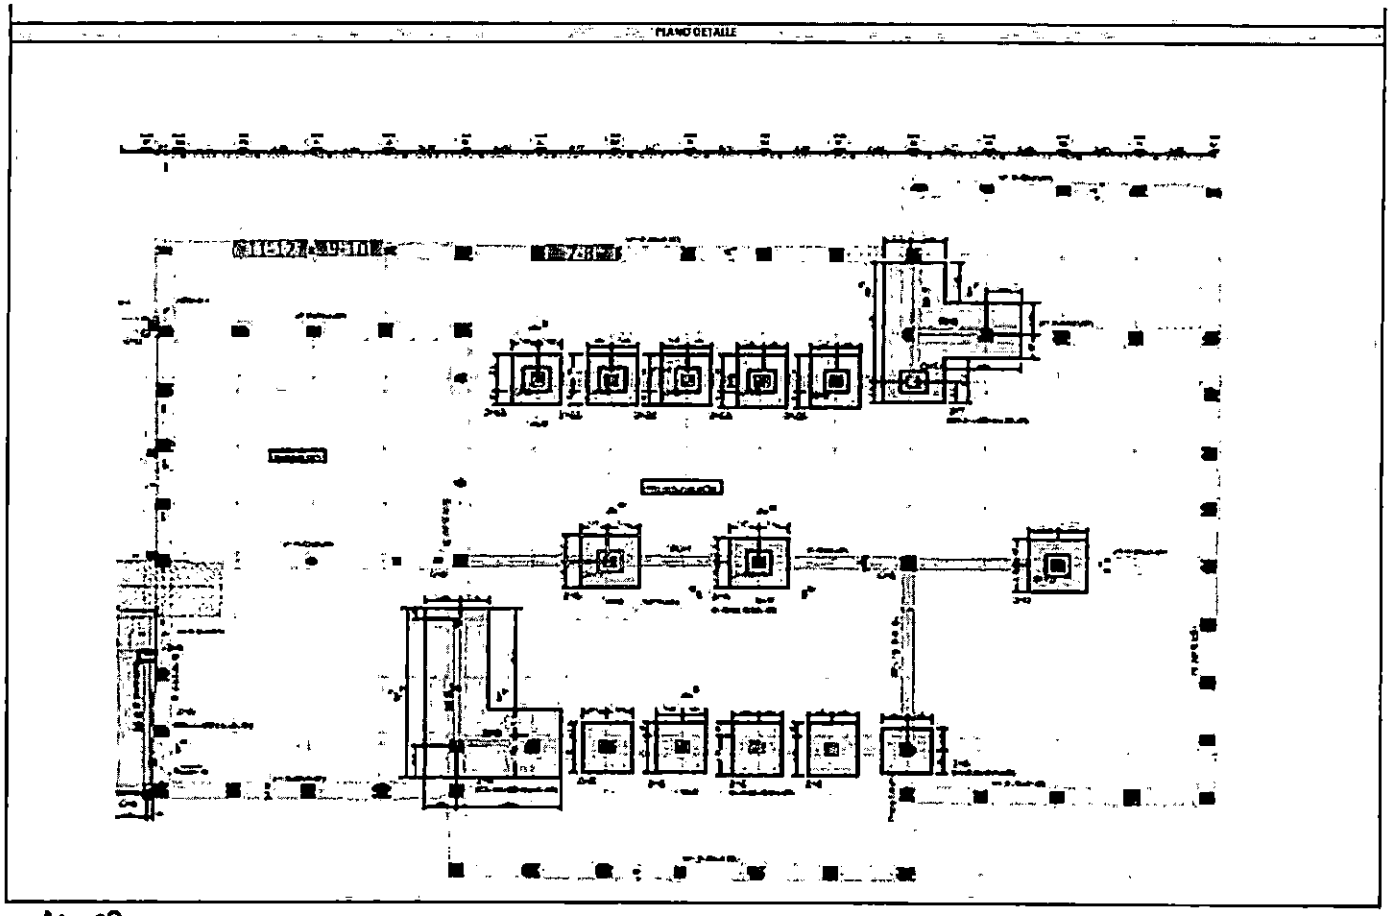

Ale BB

251

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA GENERAL | BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

PROYECTO: OBRAS SEDES ALCALDÍA

PRISMA — UNIVERSAL SEC S.A.S. — CONSORCIO PRUNI SEDES 04 — CONTRATISTA


ARQUITECTURA URBANA LTDA — INTERVENTORÍA

ACTA No.:	7	PERIODO DEL ACTA	1/01/2020	A	30/01/2020	
OBJETO:	REALIZAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE AJUSTE LAS DIFERENTES OBRAS E INTERVENCIONES ESPECIALIZADAS PARA LAS DIFERENTES SEDES DE LA SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C.					
CONTRATO DE OBRA No	731-2019	CONTRATISTA	CONSORCIO PRUNI SEDES 04	ENTIDAD CONTRATANTE	SECRETARIA GENERAL-ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA	
CONTRATO INTERVENTORÍA	730 DE 2019	INTERVENTORÍA	ARQUITECTURA URBANA LTDA	FRENTE:	IMPRENTA DISTRITAL	

CAPITULO	2.8.0	RESTITUCIÓN DE ACABADOS	ITEM	2.8.0.13	Suministro figurado y armado de acero 60000 PSI 420 Mpa	UNIDAD	KG

ITEM	LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES FIGURA	LARGO (m)	PESO (kg/m)	CANTIDAD	TOTAL	UNIDAD
	PRODUCCIÓN				VIENEN	747.80	KG
13	COLUMNETAS EJE 13 ENTRE EJES G-H						
	Acero #6 con esc. L=.60m		2.70	2.235	6.00	35.207	KG
	Acero #6 con esc. L=.60m		2.50	2.235	6.00	33.525	KG
	Fleje #3 .15x.20		0.90	0.560	24.00	12.096	KG
	Acero #3 recto		1.00	0.560	24.00	13.440	KG
14	VIGA CINTA EJE 13 ENTRE EJES G-H						
	Acero #4 recto		1.85	0.994	4.00	7.356	KG
	Fleje #3 .15x.20		0.90	0.560	13.00	6.552	KG
	Acero #3 recto		1.00	0.560	13.00	7.280	KG
15	COLUMNETAS EJE 14 ENTRE EJES Q-R						
	Acero #6 con esc. L=.60m		2.80	2.235	6.00	37.548	KG
	Fleje #3 .15x.20		1.00	0.560	28.00	15.680	KG
	Acero #3 recto		1.00	0.560	28.00	15.680	KG
16	COLUMNETAS EJE 2 ENTRE EJES G-H						
	Acero #6 con esc. L=.60m		3.20	2.235	12.00	85.824	KG
	Fleje #3 .15x.20		1.00	0.560	16.00	8.960	KG
	Acero #3 recto		1.00	0.560	16.00	8.960	KG
17	COLUMNETAS EJE 2 ENTRE EJES H-I						
	Acero #6 con esc. L=.60m		3.20	2.235	12.00	85.824	KG
	Fleje #3 .15x.20		1.00	0.560	16.00	8.960	KG
	Acero #3 recto		1.00	0.560	16.00	8.960	KG
18	COLUMNETAS EJE 2 ENTRE EJES I-J						
	Acero #6 con esc. L=.60m		3.20	2.235	12.00	85.824	KG
	Fleje #3 .15x.20		1.00	0.560	16.00	8.960	KG
	Acero #3 recto		1.00	0.560	16.00	8.960	KG
	EDIFICIO ADMINISTRATIVO 2DO PISO						
19	COLUMNETA EJE 1' ENTRE EJES D-E						
	Acero #4 doble esc. L=.75		2.62	0.994	2.00	5.209	KG
	Acero #4 esc. L=1.35		2.20	0.994	4.00	8.747	KG
	Fleje #3 .15x.10		0.80	0.560	29.00	12.992	KG
OBSERVACIONES:				PARCIAL:		1,271.35	KG
				TOTAL:		1,271.35	KG

LOCALIZACIÓN PLANIMÉTRICA

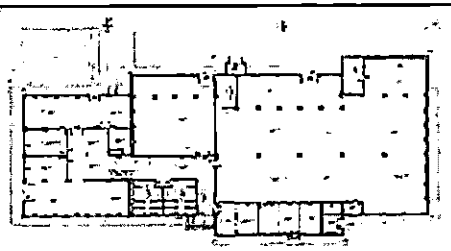

REGISTRO FOTOGRÁFICO



Alejandra Bolaños


ARQ. ALEJANDRA BOLAÑOS
RESIDENTE CONTRATISTA

Nancy Ruso Ayala Gómez

ARQ. NANCY AYALA
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA


PLANO DETALLE

PRIMER PISO

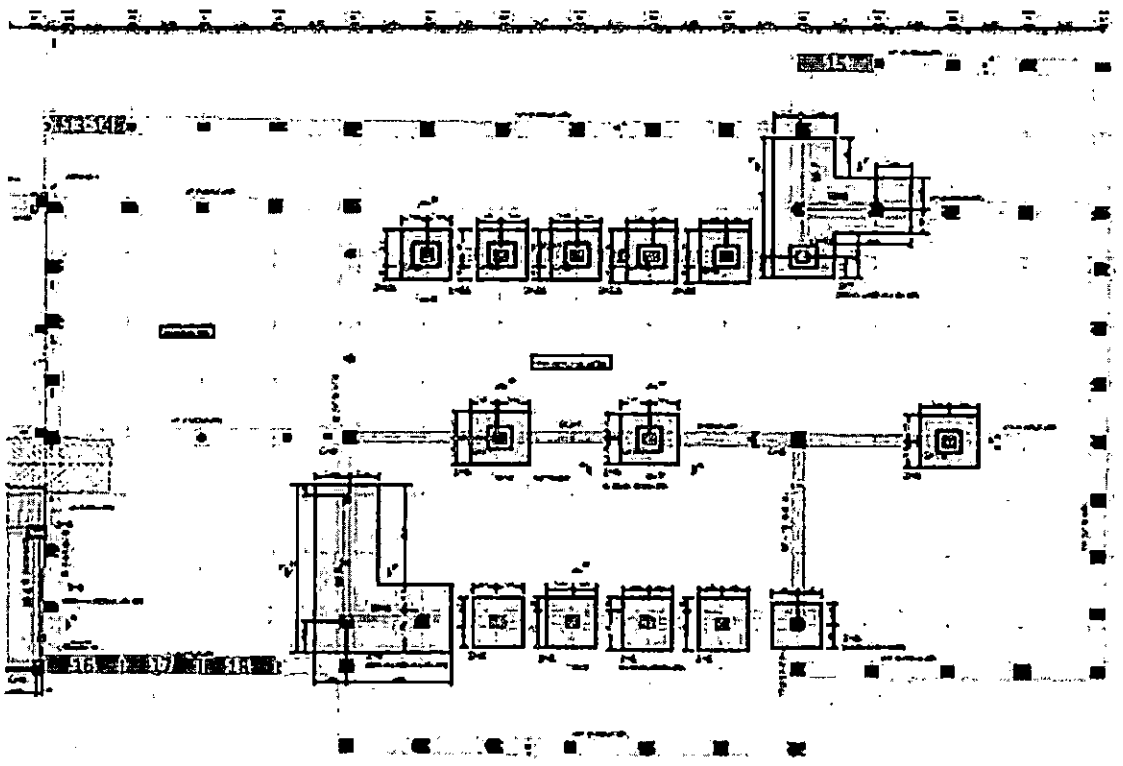

Ale 18

SEGUNDO PISO

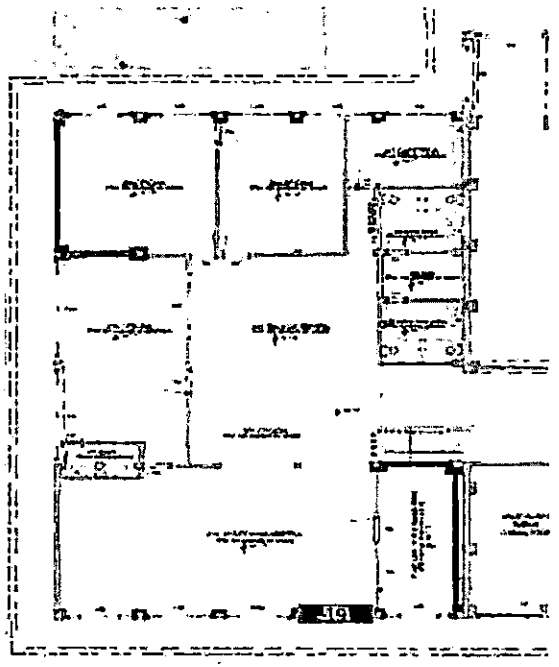

254

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA GENERAL | BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS


MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

PROYECTO: OBRAS SEDES ALCALDÍA

PRISMA UNIVERSAL SEC S.A.S. — CONTRATISTA | ARQUITECTURA URBANA LTDA. — INTERVENTORÍA

ACTA No.	7	PERIODO DEL ACTA	1/01/2020	A	30/01/2020	
OBJETO	REALIZAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE AJUSTE LAS DIFERENTES OBRAS E INTERVENCIONES ESPECIALIZADAS PARA LAS DIFERENTES SEDES DE LA SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C.					
CONTRATO DE OBRA No	731-2019	CONTRATISTA	CONSORCIO PRUNI SEDES 04	ENTIDAD CONTRATANTE	SECRETARIA GENERAL-ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA	
CONTRATO INTERVENTORÍA	730 DE 2019	INTERVENTORÍA	ARQUITECTURA URBANA LTDA	FRENTE:	IMPRENTA DISTRITAL	

CAPÍTULO	3,1,0,	GENERADOR ELECTRICO	ITEM	3,1,0,1	Suministro e instalación de Generador eléctrico de Stand by de 400kVA, 4400v, 60hz, incluya cabina de insonorización, según especificaciones técnicas.	UNIDAD	UN


ITEM	LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES FIGURA	DIMENSIONES LARGO (m)	DIMENSIONES PESO (kg/m)	CANTIDAD	TOTAL	UNIDAD	REGISTRO FOTOGRÁFICO
1	Generador eléctrico de Stand by de 400kVA, 4400v, 60hz, incluya cabina de insonorización, según especificaciones técnicas.				0,40	0,40	UN	
						0,40	UN	
						0,40	UN	

REGISTRO FOTOGRÁFICO

OBSERVACIONES: Se adjuntan las pólizas tal como quedó establecido en el modificatorio para el pago del 40% del valor del equipo.

ARQ. ALEJANDRA BOLAÑOS
RESIDENTE CONTRATISTA

ARQ. NANCY AVILA
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

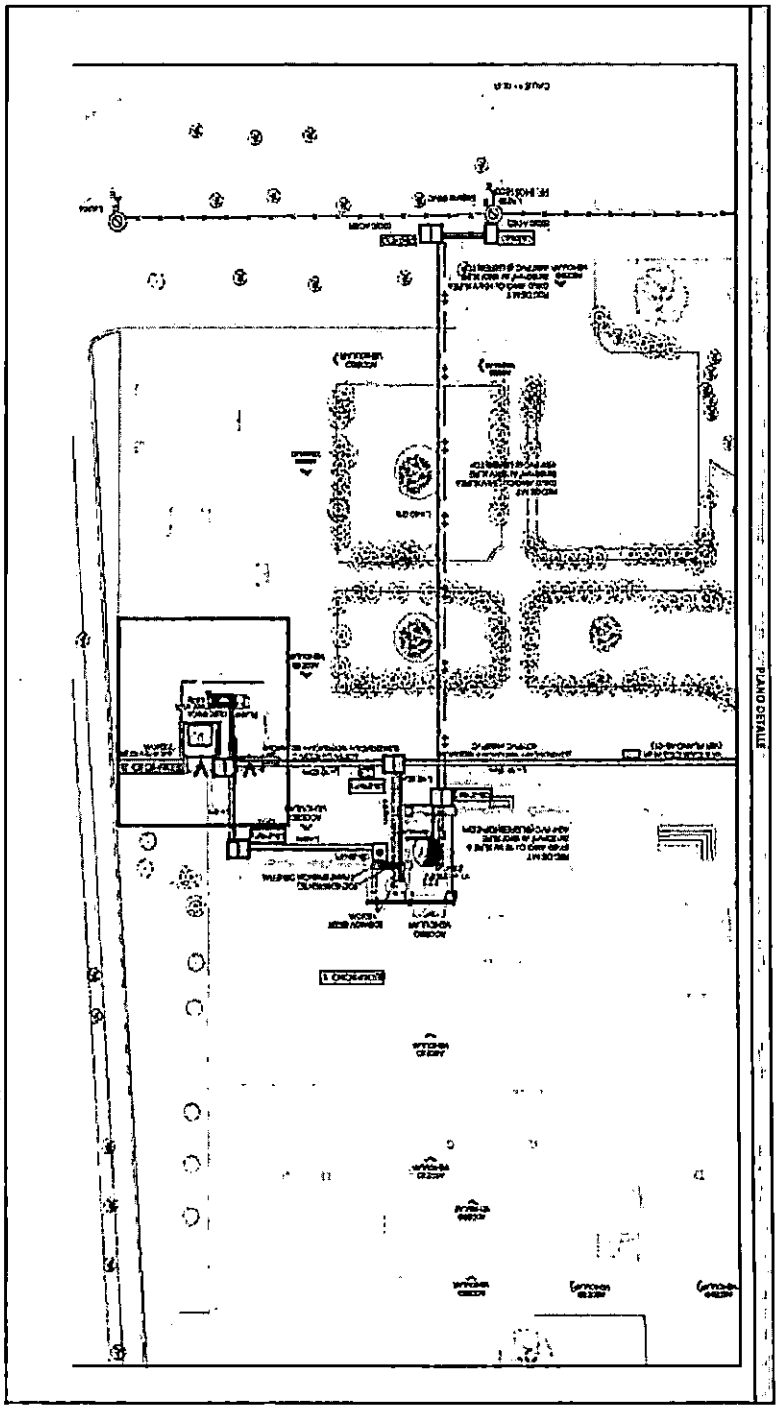

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO PARTICULAR

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

PARTICULAR

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
NIT. 860.009.578-6 BOGOTA, D.C.	CHAPINERO	14	14-45-101055235	0

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
12	08	2019	22	07	2019	00:00	21	07	2024	23:59	EMISION ORIGINAL

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL	IDENTIFICACIÓN
PERALTA CASTELLANOS, DORANCE	CC: 3.019.591

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
cra 103 b n 82-48 bq 5 apto 206	BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	4313899

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO	IDENTIFICACIÓN NIT: 901.294.259-1
CONSORCIO PRUNI SEDES 04	

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
CL 98 NRO. 70 - 91 B12	BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	7441529

ADICIONAL:

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN E-CU-002A RED1S FEBRERO 2011, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS OCASIONADOS POR EL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO DE OBRA No. 001-PS04-2019, CUYO OBJETO ES: EJECUCION DE LAS INSTALACIONES ELECTRICAS PARA LA OBRA, REALIZAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE LAS DIFERENTES OBRAS E INTERVENCIONES ESPECIALIZADAS PARA LAS DIFERENTES SEDES DE LA SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA,D.C., EN LAS SEDES CENTRO DE MEMORIA, PAZ Y RECONCILIACION E IMPRENTA DISTRITAL.

AMPAROS

RIESGO: CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES Y EDIFICIOS.

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG/ACTUAL
CUMPLIMIENTO	22/07/2019	21/12/2019	$172,008,801.31
CALIDAD DE LOS ELEMENTOS	22/07/2019	26/01/2020	$172,008,801.31
SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	22/07/2019	21/12/2019	$28,668,133.55
ESTABILIDAD DE LA OBRA	22/07/2019	21/07/2024	$114,672,534.21

ACLARACIONES

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ 1,884,606.00	$ 20,000.00	$ 358,075.00	$ 2,242,682.00	$ 487,359,270.38	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑÍA	% PART.	VALOR ASEGURADO
AGOR LTDA ASESORES DE SEGUROS	164048	100.00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CRA. 7 NO. 57 -67 - TELEFONO: 2172417 - BOGOTA, D.C.

SEGUROS DEL ESTADO

14-45-101055235

FIRMA AUTORIZADA: Manuel Sarmiento - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

PAULA CASTRO

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

USTED PUEDE CONSULTAR ESTA PÓLIZA EN WWW.SEGUROSDELESTADO.COM

OFICINA PRINCIPAL: CRA. 11 NO. 90-20 BOGOTA D.C. TELEFONOS: 2186977

258

PÓLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

RCE CONTRATOS

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
NIT. 860.009.578-6 BOGOTA, D.C.	CHAPINERO	14	14-40-101029782	0

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
12	08	2019	22	07	2019	00:00	21	12	2019	23:59	EMISION ORIGINAL

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIÓN	
PERALTA CASTELLANOS, DORANCE		CC:	3.019.591
DIRECCIÓN: cra 103 b n 82-48 bq 5 apto 208	CIUDAD: BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	TELÉFONO:	4313899

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO:		IDENTIFICACIÓN NIT:	
CONSORCIO PRUNI SEDES 04		901.294.259-1	
DIRECCIÓN: CL 98 NRO. 70 - 91 812	CIUDAD: BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	TELÉFONO	7441528
BENEFICIARIO: 901294259 - CONSORCIO PRUNI SEDES 04	ADICIONAL:		

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN E-RCE-001A EDICIÓN 04-09 / E-RCE-001A, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

SE AMPARA LA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL EN LA QUE INCURRA EL ASEGURADO EN EL DESARROLLO DEL CONTRATO DE OBRA No. 001-PS04-2019, CUYO OBJETO ES: EJECUCION DE LAS INSTALACIONES ELECTRICAS PARA LA OBRA REALIZAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE LAS DIFERENTES OBRAS E INTERVENCIONES ESPECIALIZADAS PARA LAS DIFERENTES SEDES DE LA SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA,D.C., EN LAS SEDES CENTRO DE MEMORIA, PAZ Y RECONCILIACION E IMPRENTA DISTRITAL.

AMPAROS

RIESGO: CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES Y EDIFICIOS.

AMPAROS	DEDUCIBLE	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG ACTUAL
PREDIOS LABORES Y OPERACIONES -	15.00 % DEL VALOR DE LA ... PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV	22/07/2019	21/12/2019	$414,058,000.00

ACLARACIONES

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ 431,074.00	$ 2,000.00	$ 82,284.00	$ 515,358.00	$ 414,058,000.00	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
AGOR LTDA ASESORES DE SEGUROS	164048	100.00			

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO.

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CRA. 7 NO. 57 -67 - TELEFONO: 2172417 - BOGOTA, D.C.

SEGUROS DEL ESTADO NIT 860.009.578-6

14-40-101029782

FIRMA AUTORIZADA: Manuel Sarmiento - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

CARLOSAMAYA

USTED PUEDE CONSULTAR ESTA PÓLIZA EN WWW.SEGUROSDELESTADO.COM

OFICINA PRINCIPAL: CRA. 11 NO. 90-20 BOGOTA, D.C. TELEFONO: 2180377

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA GENERAL | BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

PROYECTO: OBRAS SEDES ALCALDÍA

PRISMA — UNIVERSAL SEC S.A.S. — CONSORCIO PRUNI SEDES 04 — CONTRATISTA


ARQUITECTURA URBANA LTDA — INTERVENTORÍA

ACTA No:	7	PERIODO DEL ACTA	01/01/2020	A	30/01/2020	
OBJETO	REALIZAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE AJUSTE LAS DIFERENTES OBRAS E INTERVENCIONES ESPECIALIZADAS PARA LAS DIFERENTES SEDES DE LA SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C.					
CONTRATO DE OBRA No	731-2019	CONTRATISTA	CONSORCIO PRUNI SEDES 04	ENTIDAD CONTRATANTE	SECRETARIA GENERAL-ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA	
CONTRATO INTERVENTORÍA	730 DE 2019	INTERVENTORÍA	ARQUITECTURA URBANA LTDA	FRENTE:	IMPRENTA DISTRITAL	


CAPITULO	3.3.0	INSTALACIONES ELÉCTRICAS	ITEM	3.3.0.1	Suministro e instalación de muro en ladrillo tolete	UNIDAD	M2

ITEM	LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES LARGO	DIMENSIONES ANCHO	DIMENSIONES ALTO	CANTIDAD	TOTAL	UNIDAD
	EDIFICIO ADMINISTRATIVO 2DO PISO						
1	EJE 1' ENTRE EJES D-E		2,05	0,67	1,00	1,37	M2
OBSERVACIONES:				SUBTOTAL		1,37	M2
				TOTAL		1,37	M2

LOCALIZACIÓN PLANIMÉTRICA

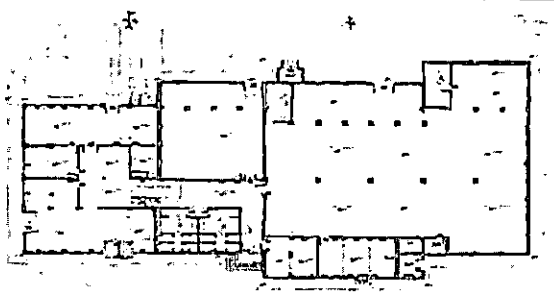

REGISTRO FOTOGRÁFICO

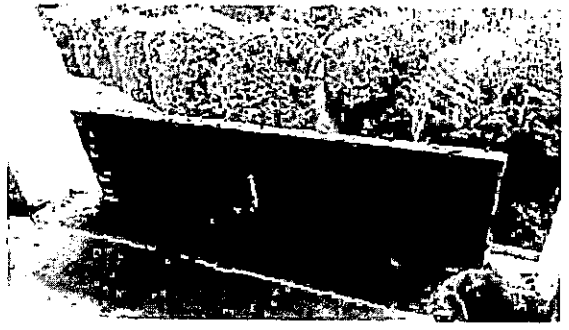

Alejandra Bolaños +

ARQ. ALEJANDRA BOLAÑOS
RESIDENTE CONTRATISTA

Nancy Ayala Gómez

ARQ. NANCY AYALA
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA GENERAL | BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

PROYECTO: OBRAS SEDES ALCALDÍA

PRISMA — UNIVERSAL SEC S.A. — CONSORCIO PRUNI SEDES 04 — CONTRATISTA


ARQUITECTURA URBANA LTDA — INTERVENTORÍA

ACTA No.	7		PERIODO DEL ACTA	01/01/2020	A	30/01/2020	
OBJETO	REALIZAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE AJUSTE LAS DIFERENTES OBRAS E INTERVENCIONES ESPECIALIZADAS PARA LAS DIFERENTES SEDES DE LA SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C.						
CONTRATO DE OBRA No	731-2019	CONTRATISTA	CONSORCIO PRUNI SEDES 04		ENTIDAD CONTRATANTE	SECRETARIA GENERAL-ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA	
CONTRATO INTERVENTORÍA	730 DE 2019	INTERVENTORÍA	ARQUITECTURA URBANA LTDA		FRENTE:	IMPRENTA DISTRITAL	

CAPITULO	3.3.0	INSTALACIONES ELÉCTRICAS	ITEM	3.3.0.2	Demolición de muro existente	UNIDAD	M2

ITEM	LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES LARGO	DIMENSIONES ANCHO	DIMENSIONES ALTO	CANTIDAD	TOTAL	UNIDAD
	PRODUCCIÓN						
1	MURO EXISTENTE EJES 12-R		1,40	4,92	1,00	6,89	M2
2	MURO EXISTENTE EJE X ENTRE 6-7		2,05	4,35	1,00	8,92	M2
3	MURO EXISTENTE EJE 3 ENTRE K-L		2,60	4,00	1,00	10,40	M2
4	DIVISIÓN DE BAÑO HOMBRES		0,50	2,20	1,00	1,10	M2
5	DIVISIÓN DE BAÑO HOMBRES		0,50	2,20	1,00	1,10	M2
6	DIVISIÓN DE BAÑO MUJERES		0,50	2,20	1,00	1,10	M2
7	DIVISIÓN DE BAÑO MUJERES		0,50	2,20	1,00	1,10	M2
8	DIVISIÓN DE BAÑO HOMBRES		1,20	2,20	1,00	2,64	M2
9	DIVISIÓN DE BAÑO MUJERES		1,20	2,20	1,00	2,64	M2
10	MURO M5 EJE X ENTRE EJES 5-6		4,27	5,10	1,00	21,78	M2
11	MURO M7 EJE Q ENTRE EJES 11-13		3,00	4,70	2,00	28,20	M2
12	MURO M8 EJE 12 ENTRE EJES Q-R		2,50	4,70	1,00	11,75	M2
	2DO PISO ADMINISTRACION						
13	MURO ANTEPECHO EJE A ENTRE 2'-3'		4,25	1,00	1,00	4,25	M2
14	MURO EXISTENTE EJE C ENTRE 2'-4' CUBIERTA		9,00	1,20	1,00	10,80	M2
OBSERVACIONES:				SUBTOTAL		112,66	M2
				TOTAL		112,66	M2

LOCALIZACIÓN PLANIMÉTRICA

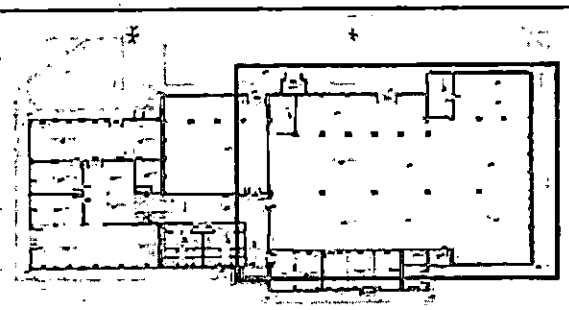

REGISTRO FOTOGRÁFICO



Alejandra Bolaños +


ARQ. ALEJANDRA BOLAÑOS
RESIDENTE CONTRATISTA

Nancy Rocío Ayala Gomez

ARQ. NANCY AYALA
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

PLANO DETALLE

PRIMER PISO

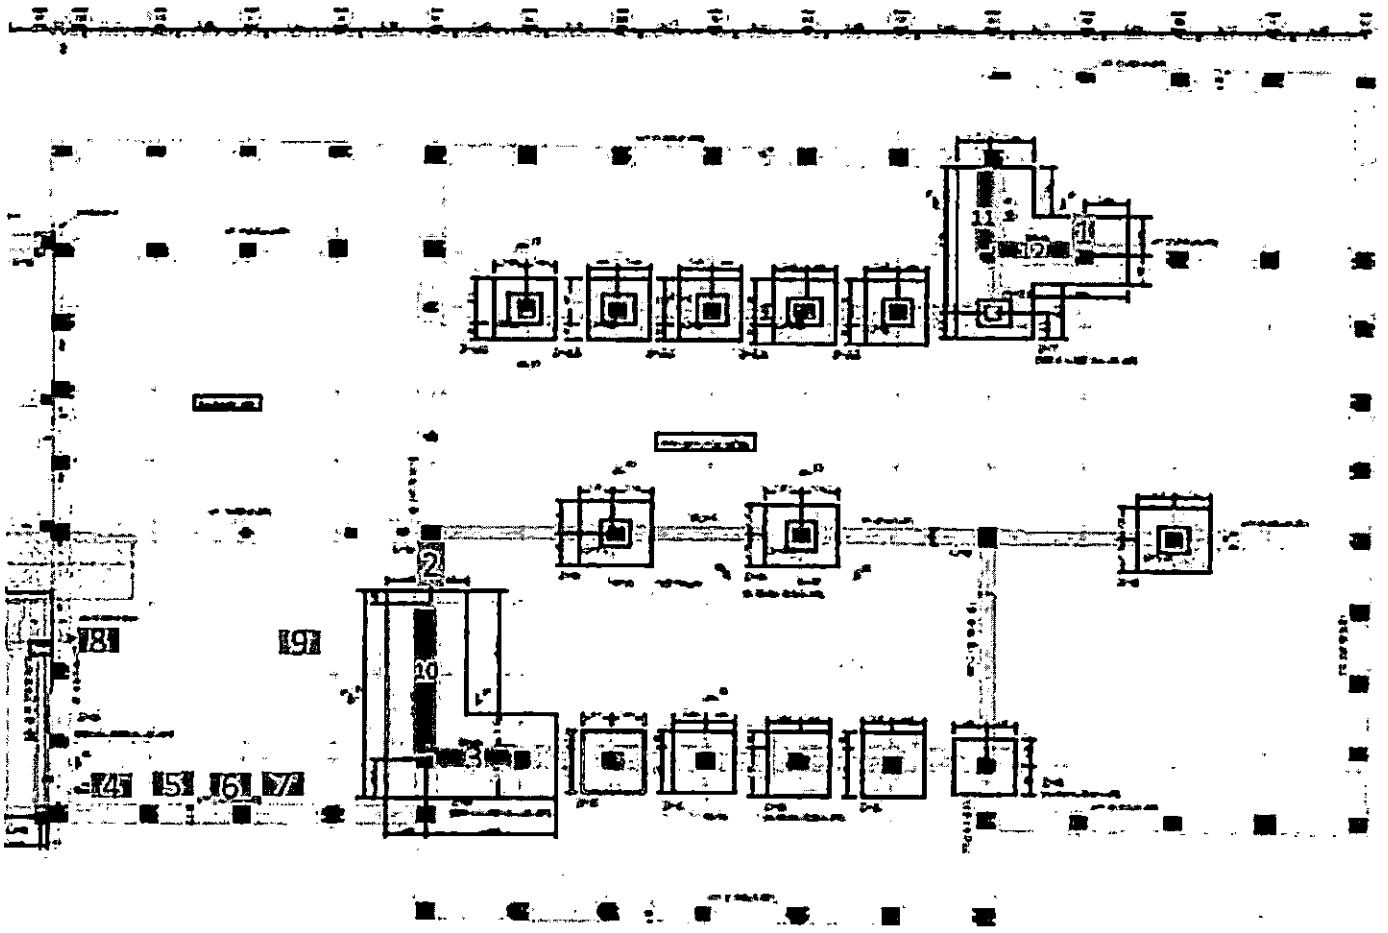

Alcob

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. | BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS
SECRETARÍA GENERAL

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

PROYECTO: OBRAS SEDES ALCALDÍA

PRISMA — UNIVERSAL SEC S.A.S. — CONSORCIO PRUNI SEDES 04 — CONTRATISTA


ARQUITECTURA URBANA LTDA — INTERVENTORÍA

ACTA No.	7	PERIODO DEL ACTA	01/01/2020	A	30/01/2020	
OBJETO	REALIZAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE AJUSTE LAS DIFERENTES OBRAS E INTERVENCIONES ESPECIALIZADAS PARA LAS DIFERENTES SEDES DE LA SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C.					
CONTRATO DE OBRA No	731-2019	CONTRATISTA	CONSORCIO PRUNI SEDES 04	ENTIDAD CONTRATANTE	SECRETARIA GENERAL-ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA	
CONTRATO INTERVENTORÍA	730 DE 2019	INTERVENTORÍA	ARQUITECTURA URBANA LTDA	FRENTE:	IMPRENTA DISTRITAL	

CAPITULO	3.6.0	SUBESTACIÓN	ITEM	3.4.0.6	Suministro e instalación de cable de cobre encauchetado 3X12 awg	UNIDAD	ML

ITEM	LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	TOTAL	UNIDAD
1	DESDE TABLERO PRINCIPAL A EDIFICIO 1 PARA CONEXIÓN PROVISIONAL				80,00	80,00	ML
OBSERVACIONES:				SUBTOTAL		80,00	UN
				TOTAL		80,00	UN

LOCALIZACIÓN PLANIMÉTRICA

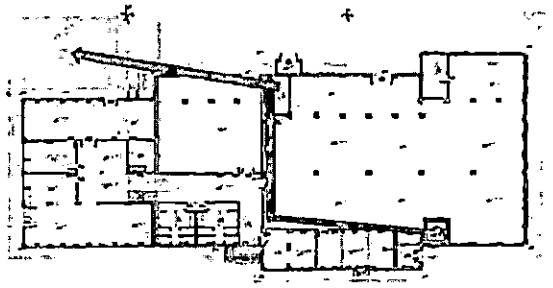

REGISTRO FOTOGRÁFICO



Alejandra Bolaños t


ARQ. ALEJANDRA BOLAÑOS
RESIDENTE CONTRATISTA

Nancy Rocío Ayala Gomez

ARQ. NANCY AYALA
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA


ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA GENERAL / BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS	**MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA** **PROYECTO: OBRAS SEDES ALCALDÍA**	PRISMA / UNIVERSAL SEC S.A.S. CONTRATISTA / ARQUITECTURA URBANA LTDA. INTERVENTORÍA

ACTA No.	7		PERIODO DEL ACTA	1/01/2020	A	30/01/2020	
OBJETO	REALIZAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE AJUSTE LAS DIFERENTES OBRAS E INTERVENCIONES ESPECIALIZADAS PARA LAS DIFERENTES SEDES DE LA SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C.						
CONTRATO DE OBRA No	731-2019	CONTRATISTA	CONSORCIO PRUNI SEDES 04		ENTIDAD CONTRATANTE	SECRETARIA GENERAL-ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA	
CONTRATO INTERVENTORÍA	730 DE 2019	INTERVENTORÍA	ARQUITECTURA URBANA LTDA		FRENTE:	IMPRENTA DISTRITAL	

CAPÍTULO		3,6,0,	SUBESTACIÓN		ITEM	3,6,0,1	Suministro e Instalacion de celda SF6 duplex incluye entrada salida y remonte	UNIDAD	UN
ITEM	LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES FIGURA	LARGO (m)	PESO (kg/m)	CANTIDAD	TOTAL	UNIDAD	REGISTRO FOTOGRÁFICO	
1	Celda SF6 duplex				0,40	0,40	UN		
								REGISTRO FOTOGRÁFICO	
OBSERVACIONES: Se adjuntan las pólizas tal como quedó establecido en el modificatorio para el pago del 40% del valor del equipo.				[redacted]		0,40	UN		
				[redacted]		0,40	UN		

ARQ. ALEJANDRA BOLAÑOS
RESIDENTE CONTRATISTA

ARQ. [illegible]
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

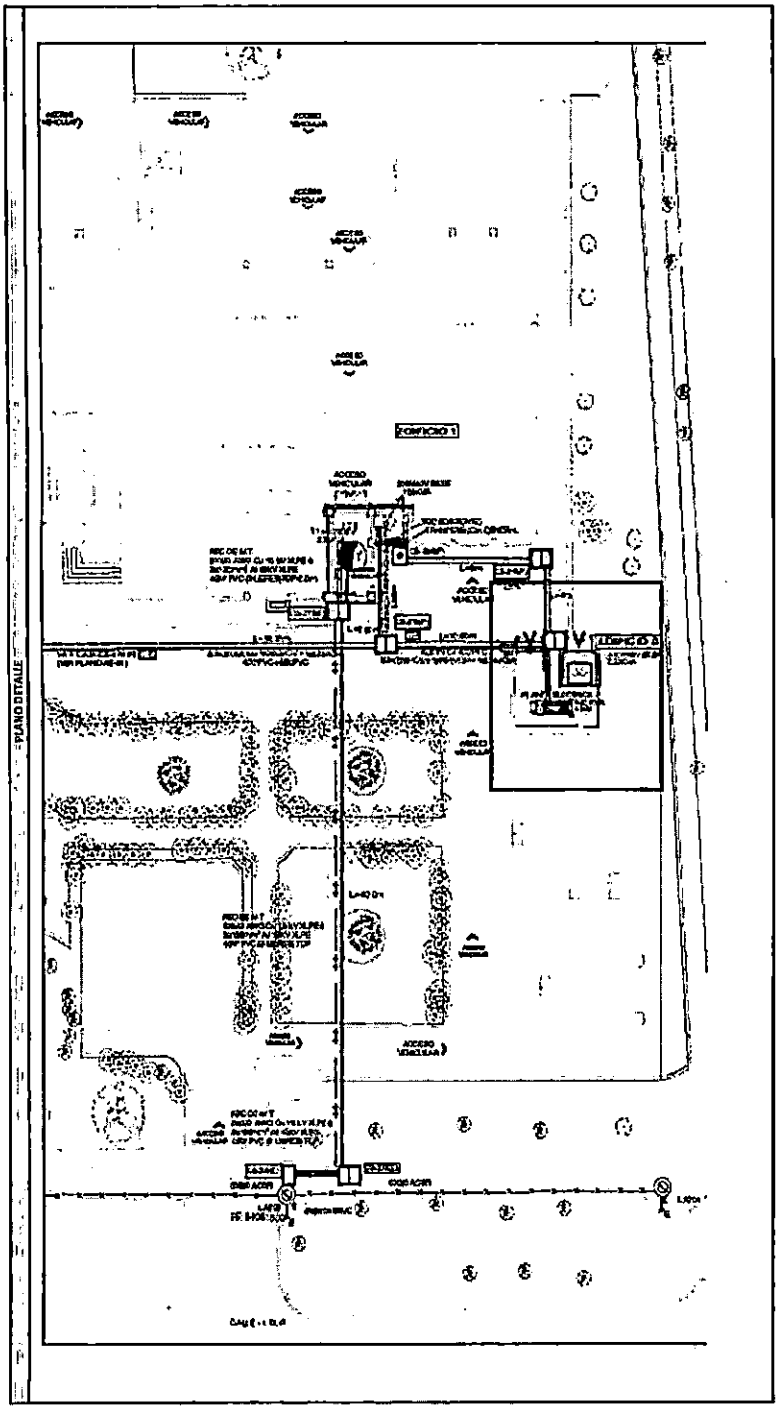
PLANO DETALLE
PORTICHO 1
ACCESO VEHICULAR
ACCESO PEATONAL

CUMPLIMIENTO
RCE CONTRATOS

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	CHAPINERO	14	14-40-101029782	0

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
12	08	2019	22	07	2019	00:00	21	12	2019	23:59	EMISION ORIGINAL

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIÓN	
PERALTA CASTELLANOS, DORANCE			CC: 3.019.591
DIRECCIÓN: cra 103 b n 82-48 bq 5 apto 205	CIUDAD: BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	TELÉFONO:	4313899

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO:		IDENTIFICACIÓN NIT:
CONSORCIO PRUNI SEDES 04		901.294.259-1
DIRECCIÓN: CL 98 NRO. 70 - 91 812	CIUDAD: BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	TELÉFONO 7441529
BENEFICIARIO: 901294259 - CONSORCIO PRUNI SEDES 04	ADICIONAL:	

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN E-RCE-002A REDIS 04-09 / E-RCE-001A, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA;

SE AMPARA LA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL EN LA QUE INCURRA EL ASEGURADO EN EL DESARROLLO DEL CONTRATO DE OBRA No. 001-PS04-2019, CUYO OBJETO ES; EJECUCION DE LAS INSTALACIONES ELECTRICAS PARA LA OBRA REALIZAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE LAS DIFERENTES OBRAS E INTERVENCIONES ESPECIALIZADAS PARA LAS DIFERENTES SEDES DE LA SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA,D.C., EN LAS SEDES CENTRO DE MEMORIA, PAZ Y RECONCILIACION E IMPRENTA DISTRITAL.

AMPAROS

RIESGO: CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES Y EDIFICIOS.

AMPAROS	DEDUCIBLE	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG ACTUAL
PREDIOS LABORES Y OPERACIONES	15.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Minimo: 1.00 SMMLV	22/07/2019	21/12/2019	$414,058,000.00

ACLARACIONES

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ ******431,074.00	$ *******2,000.00	$ ******82,284.00	$ **********515,358.00	$ *******414,058,000.00	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑÍA	% PART.	VALOR ASEGURADO
AGOR LTDA ASESORES DE SEGUROS	164048	100.00			

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO.
QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.
PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CRA. 7 NO. 67 -67 - TELEFONO: 2172417 - BOGOTA, D.C.

SEGUROS DEL ESTADO S.A. NIT 860.009.578

14-40-101029782

FIRMA AUTORIZADA: Manuel Sarmiento - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

PARTICULAR

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
NIT. 860.009.578-6, D.C.	CHAPINERO	14	14-45-101055235	0

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
12	08	2019	22	07	2019	00:00	21	07	2024	23:59	EMISION ORIGINAL

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIÓN	
PERALTA CASTELLANOS, DORANCE			CC: 3.019.591
DIRECCIÓN: cra 103 b n 82-48 bq 5 apto 206	CIUDAD: BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	TELÉFONO:	4313899

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:		IDENTIFICACIÓN NIT: 901.294.259-1	
CONSORCIO PRUNI SEDES 04			
DIRECCIÓN: CL 98 NRO. 70 - 91 812	CIUDAD: BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	TELÉFONO	7441529
ADICIONAL:			

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN E-CU-003A REDIS FEBRERO 2013, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS OCASIONADOS POR EL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO DE OBRA No. 001-PS04-2019, CUYO OBJETO ES: EJECUCION DE LAS INSTALACIONES ELECTRICAS PARA LA OBRA REALIZAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE LAS DIFERENTES OBRAS E INTERVENCIONES ESPECIALIZADAS PARA LAS DIFERENTES SEDES DE LA SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA,D.C., EN LAS SEDES CENTRO DE MEMORIA, PAZ Y RECONCILIACION E IMPRENTA DISTRITAL.

AMPAROS

RIESGO: CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES Y EDIFICIOS.

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG/ACTUAL
CUMPLIMIENTO	22/07/2019	21/12/2019	$172,008,801.31
CALIDAD DE LOS ELEMENTOS	22/07/2019	26/01/2020	$172,008,801.31
SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	22/07/2019	21/12/2019	$28,668,133.55
ESTABILIDAD DE LA OBRA	22/07/2019	21/07/2024	$114,672,534.21

ACLARACIONES

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ ***1,864,606.00	$ ******20,000.00	$ *****358,075.00	$ *********2,242,682.00	$ *******487,358,270.38	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
AGOR LTDA ASESORES DE SEGUROS	164048	100.00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CRA. 7 NO. 57 -67 - TELEFONO: 2172417 - BOGOTA, D.C.

SEGUROS DEL ESTADO

14-45-101055235

FIRMA AUTORIZADA: Manuel Sarmiento - Vicepresidente de Fianzas


FIRMA TOMADOR


VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA GENERAL — BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS	MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA	PRISMA — UNIVERSAL SEC S.A.S. — CONSORCIO PRUNI SEDES 04 — CONTRATISTA	ARQUITECTURA URBANA LTDA. — INTERVENTORÍA
	PROYECTO: OBRAS SEDES ALCALDÍA		

ACTA No.	7	PERIODO DEL ACTA:	1/01/2020	A	30/01/2020	
OBJETO	REALIZAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE AJUSTE LAS DIFERENTES OBRAS E INTERVENCIONES ESPECIALIZADAS PARA LAS DIFERENTES SEDES DE LA SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C.					
CONTRATO DE OBRA No	731-2019	CONTRATISTA	CONSORCIO PRUNI SEDES 04	ENTIDAD CONTRATANTE	SECRETARIA GENERAL-ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA	
CONTRATO INTERVENTORÍA	730 DE 2019	INTERVENTORÍA	ARQUITECTURA URBANA LTDA	FRENTE:	IMPRENTA DISTRITAL	

CAPÍTULO	3,6,0,	SUBESTACIÓN	ITEM	3,6,0,5	Suministro e instalacion de celda de proteccion para trasnformado existente de 225 Kva	UNIDAD	UN

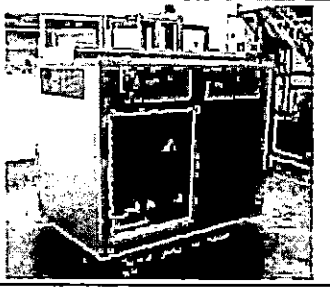ITEM	LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES FIGURA	DIMENSIONES LARGO (m)	DIMENSIONES PESO (kg/m)	CANTIDAD	TOTAL	UNIDAD	REGISTRO FOTOGRÁFICO
1	Celda de proteccion para trasnformado existente de 225 Kva				0,40	0,40	UN	
								REGISTRO FOTOGRÁFICO

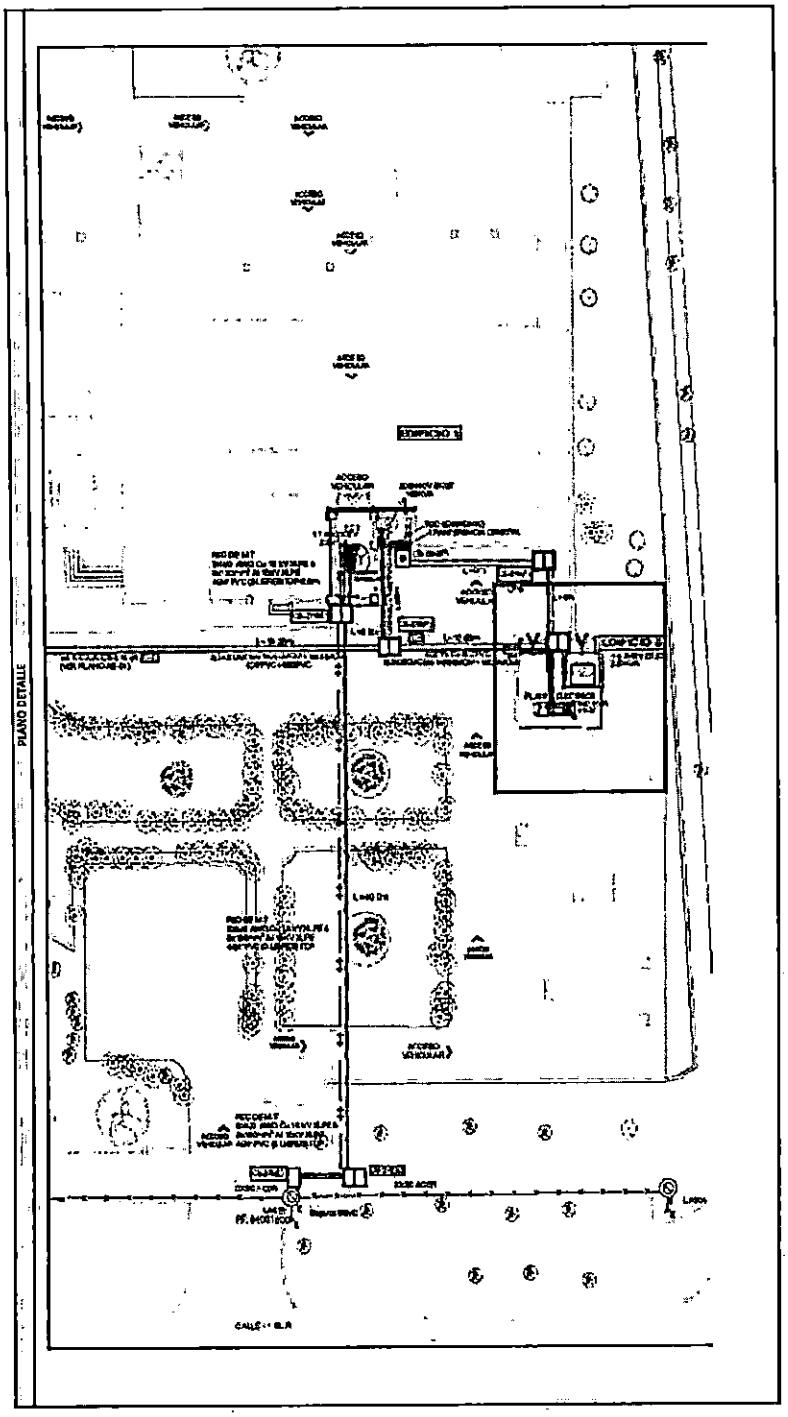
PLANO DETALLE

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

PARTICULAR

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
NIT. 860.009.578-6 BOGOTA, D.C.	CHAPINERO	14	14-45-101055235	0

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
12	08	2019	22	07	2019	00:00	21	07	2024	23:59	EMISION ORIGINAL

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIÓN	
PERALTA CASTELLANOS, DORANCE			CC: 3.019.591
DIRECCIÓN: cra 103 b n 82-48 bq 5 apto 206	CIUDAD: BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	TELÉFONO:	4313899

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:		IDENTIFICACIÓN NIT:	
CONSORCIO PRUNI SEDES 04			901.294.259-1
DIRECCIÓN: CL 98 NRO. 70 - 91 812	CIUDAD: BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	TELÉFONO	7441529
ADICIONAL:			

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN E-CU-003R RDDIS FEBRERO 2013, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS OCASIONADOS POR EL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO DE OBRA No. 001-PS04-2019, CUYO OBJETO ES: EJECUCION DE LAS INSTALACIONES ELECTRICAS PARA LA OBRA REALIZAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE LAS DIFERENTES OBRAS E INTERVENCIONES ESPECIALIZADAS PARA LAS DIFERENTES SEDES DE LA SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA,D.C., EN LAS SEDES CENTRO DE MEMORIA, PAZ Y RECONCILIACION E IMPRENTA DISTRITAL.

AMPAROS

RIESGO: CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES Y EDIFICIOS.

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG/ACTUAL
CUMPLIMIENTO	22/07/2019	21/12/2019	$172,008,801.31
CALIDAD DE LOS ELEMENTOS	22/07/2019	26/01/2020	$172,008,801.31
SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	22/07/2019	21/12/2019	$28,668,133.55
ESTABILIDAD DE LA OBRA	22/07/2019	21/07/2024	$114,672,534.21

ACLARACIONES

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ ***1,864,606.00	$ ******20,000.00	$ *****358,075.00	$ *********2,242,682.00	$ ******487,358,270.38	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑÍA	% PART.	VALOR ASEGURADO
AGOR LTDA ASESORES DE SEGUROS	154048	100.00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CRA. 7 NO. 67 -67 - TELEFONO: 2172417 - BOGOTA, D.C.

SEGUROS DEL ESTADO

14-45-101055235

FIRMA AUTORIZADA: Manuel Sarmiento - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA BANCARIA DE COLOMBIA

270

CUMPLIMIENTO
RCE CONTRATOS

SEGUROS DEL ESTADO S.A.
NIT. 860.009.578-6

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	CHAPINERO	14	14-40-101029782	0

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
12	08	2019	22	07	2019	00:00	21	12	2019	23:59	EMISION ORIGINAL

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIÓN	
PERALTA CASTELLANOS, DORANCE			CC: 3.019.591
DIRECCIÓN: cra 103 b n 82-48 bq 5 apto 206	CIUDAD: BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	TELÉFONO:	4313899

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO:		IDENTIFICACIÓN NIT:
CONSORCIO PRUNI SEDES 04		901.294.259-1
DIRECCIÓN: CL 98 NRO. 70 - 91 812	CIUDAD: BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	TELÉFONO 7441529
BENEFICIARIO: 901294259 - CONSORCIO PRUNI SEDES 04	ADICIONAL:	

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN E-RCE-002A REDIS 04-09 / E-RCE-001A, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

SE AMPARA LA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL EN LA QUE INCURRA EL ASEGURADO EN EL DESARROLLO DEL CONTRATO DE OBRA No. 001-PS04-2019, CUYO OBJETO ES: EJECUCION DE LAS INSTALACIONES ELECTRICAS PARA LA OBRA REALIZAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE LAS DIFERENTES OBRAS E INTERVENCIONES ESPECIALIZADAS PARA LAS DIFERENTES SEDES DE LA SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA,D.C., EN LAS SEDES CENTRO DE MEMORIA, PAZ Y RECONCILIACION E IMPRENTA DISTRITAL.

AMPAROS

RIESGO: CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES Y EDIFICIOS.

AMPAROS	DEDUCIBLE	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG ACTUAL
PREDIOS LABORES Y OPERACIONES	15.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV	22/07/2019	21/12/2019	$414,058,000.00

ACLARACIONES

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ ******431,074.00	$ *******2,000.00	$ ******82,284.00	$ **********515,358.00	$ *******414,058,000.00	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑÍA	% PART.	VALOR ASEGURADO
AGOR LTDA ASESORES DE SEGUROS	164048	100.00			

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO.
QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CRA. 7 NO. 57 -67 - TELEFONO: 2172417 - BOGOTA, D.C.

SEGUROS DEL ESTADO S.A. NIT. 860.009.578-6

14-40-101029782

FIRMA AUTORIZADA: Manuel Sarmiento - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA GENERAL | BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA


PROYECTO: OBRAS SEDES ALCALDÍA

PRISMA UNIVERSAL-SEC S.A.S. CONSORCIO PRISMA SEDES 04 — CONTRATISTA

ARQUITECTURA URBANA LTDA — INTERVENTORÍA

ACTA No.	7		PERIODO DEL ACTA:	1/01/2020	A	30/01/2020
OBJETO	REALIZAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE AJUSTE LAS DIFERENTES OBRAS E INTERVENCIONES ESPECIALIZADAS PARA LAS DIFERENTES SEDES DE LA SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTA D.C.					
CONTRATO DE OBRA No	731-2019	CONTRATISTA	CONSORCIO PRUNI SEDES 04		ENTIDAD CONTRATANTE	SECRETARIA GENERAL-ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA
CONTRATO INTERVENTORÍA	730 DE 2019	INTERVENTORÍA	ARQUITECTURA URBANA LTDA		FRENTE:	IMPRENTA DISTRITAL

CAPÍTULO	3,6,0,	SUBESTACIÓN	ITEM	3,6,0,14	Suministro e instalación de transformador seco tipo h MT 11.400/208V 225 kVA en Aluminio	UNIDAD	UN


ITEM	LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES FIGURA	DIMENSIONES LARGO (m)	DIMENSIONES PESO (kg/m)	CANTIDAD	TOTAL	UNIDAD	REGISTRO FOTOGRÁFICO
1	transformador seco tipo h MT 11.400/208V 225 kVA en Aluminio				0,40	0,40	UN	
						0,40	UN	
						0,40	UN	

REGISTRO FOTOGRÁFICO

OBSERVACIONES: Se adjuntan las pólizas tal como quedó establecido en el modificatorio para el pago del 40% del valor del equipo.

ARQ. ALEJANDRA BOLAÑOS
RESIDENTE CONTRATISTA

ARQ. [illegible]
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

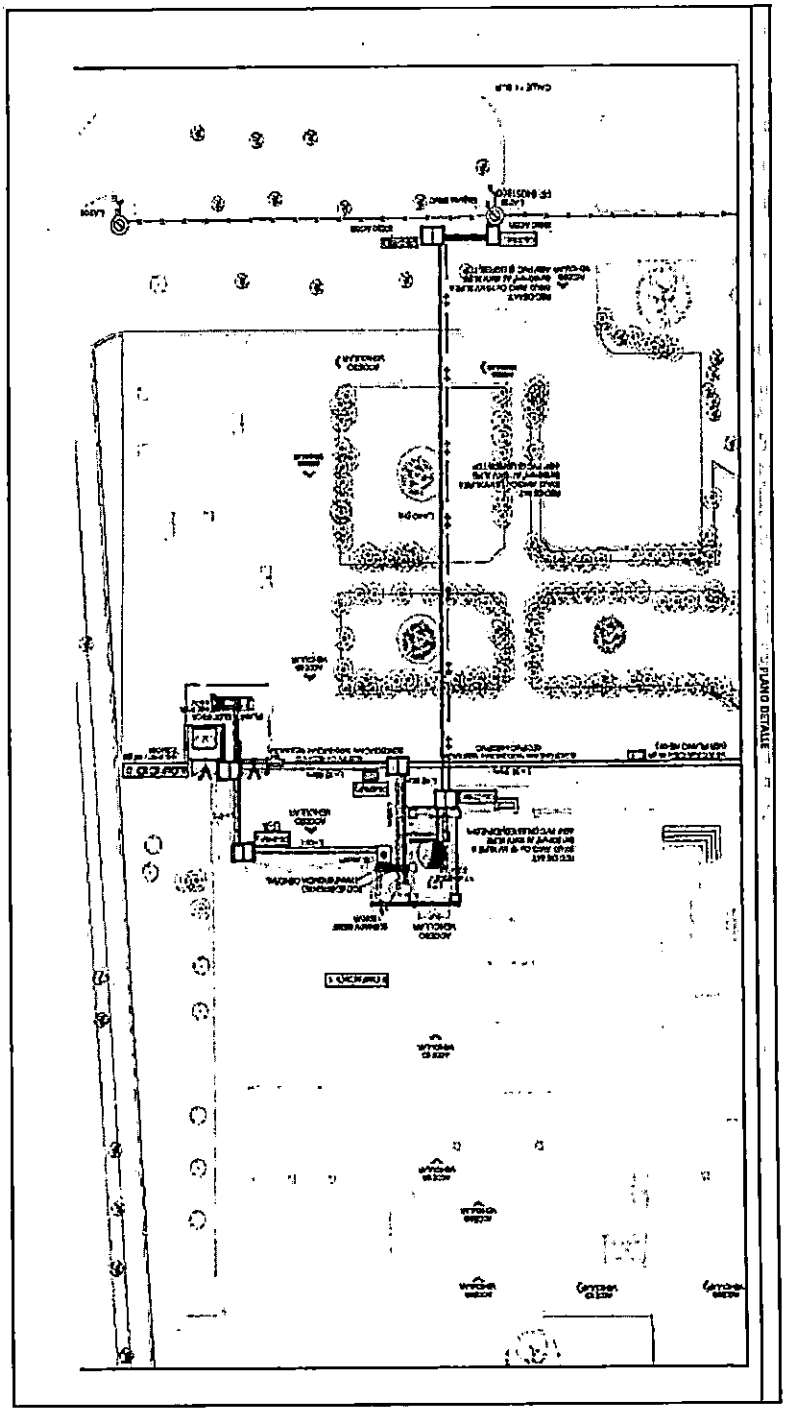

273

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

PARTICULAR

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
NIT. 860.009.578-6 BOGOTA, D.C.	CHAPINERO	14	14-45-101055235	0

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
12	08	2019	22	07	2019	00:00	21	07	2024	23:59	EMISION ORIGINAL

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIÓN	
PERALTA CASTELLANOS, DORANCE			CC: 3.019.591
DIRECCIÓN: cra 103 b n 82-48 bq 5 apto 206	CIUDAD: BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	TELÉFONO:	4313899

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:		IDENTIFICACIÓN NIT: 901.294.259-1	
CONSORCIO PRUNI SEDES 04			
DIRECCIÓN: CL 98 NRO. 70 - 91 812	CIUDAD: BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	TELÉFONO	7441529
ADICIONAL:			

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN E-CU-002A RDIS FEBRERO 2013, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS OCASIONADOS POR EL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO DE OBRA No. 001-PS04-2019, CUYO OBJETO ES: EJECUCION DE LAS INSTALACIONES ELECTRICAS PARA LA OBRA REALIZAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE LAS DIFERENTES OBRAS E INTERVENCIONES ESPECIALIZADAS PARA LAS DIFERENTES SEDES DE LA SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA,D.C., EN LAS SEDES CENTRO DE MEMORIA, PAZ Y RECONCILIACION E IMPRENTA DISTRITAL.

AMPAROS

RIESGO: CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES Y EDIFICIOS.

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG/ACTUAL
CUMPLIMIENTO	22/07/2019	21/12/2019	$172,008,801.31
CALIDAD DE LOS ELEMENTOS	22/07/2019	26/01/2020	$172,008,801.31
SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	22/07/2019	21/12/2019	$28,668,133.55
ESTABILIDAD DE LA OBRA	22/07/2019	21/07/2024	$114,672,534.21

ACLARACIONES

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ ***1,864,606.00	$ *****20,000.00	$ *****358,075.00	$ *********2,242,682.00	$ *****487,358,270.38	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑÍA	% PART.	VALOR ASEGURADO
AGOR LTDA ASESORES DE SEGUROS	164048	100.00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CRA. 7 NO. 57 -67 - TELEFONO: 2172417 - BOGOTA, D.C.

SEGUROS DEL ESTADO

14-45-101055235

FIRMA AUTORIZADA: Manuel Sarmiento - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

262

274.

CUMPLIMIENTO

RCE CONTRATOS

SEGUROS DEL ESTADO S.A.
NIT. 860.009.578-6

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	CHAPINERO	14	14-40-101029782	0

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
12	08	2019	22	07	2019	00:00	21	12	2019	23:59	EMISION ORIGINAL

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIÓN	
	PERALTA CASTELLANOS, DORANCE		CC: 3.019.591
DIRECCIÓN: cra 103 b n 82-48 bq 5 apto 206	CIUDAD: BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	TELÉFONO:	4313895

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO:		IDENTIFICACIÓN NIT: 901.294.259-1
CONSORCIO PRUNI SEDES 04		
DIRECCIÓN: CL 98 NRO. 70 - 91 812	CIUDAD: BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	TELÉFONO 7441529
BENEFICIARIO: 901294259 - CONSORCIO PRUNI SEDES 04	ADICIONAL:	

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN E-RCE-002A REDIS 04-09 / E-RCE-001A, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

SE AMPARA LA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL EN LA QUE INCURRA EL ASEGURADO EN EL DESARROLLO DEL CONTRATO DE OBRA No. 001-PS04-2019, CUYO OBJETO ES: EJECUCION DE LAS INSTALACIONES ELECTRICAS PARA LA OBRA REALIZAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE LAS DIFERENTES OBRAS E INTERVENCIONES ESPECIALIZADAS PARA LAS DIFERENTES SEDES DE LA SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA,D.C., EN LAS SEDES CENTRO DE MEMORIA, PAZ Y RECONCILIACION E IMPRENTA DISTRITAL.

AMPAROS

RIESGO: CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES Y EDIFICIOS.

AMPAROS	DEDUCIBLE	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG ACTUAL
PERDIOS LABORES Y OPERACIONES	15.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV	22/07/2019	21/12/2019	$414,058,000.00

ACLARACIONES

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ *****431,074.00	$ *******2,000.00	$ *****82,284.00	$ **********515,358.00	$ ******414,058,000.00	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑÍA	% PART.	VALOR ASEGURADO
AGOR LTDA ASESORES DE SEGUROS	164048	100.00			

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO.
QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.
PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CRA. 7 NO. 57 -67 - TELEFONO: 2172417 - BOGOTA, D.C.

SEGUROS DEL ESTADO S.A. NIT. 860.009.578-6
14-40-101029782

FIRMA AUTORIZADA: Manuel Sarmiento - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA GENERAL | BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA


PROYECTO: OBRAS SEDES ALCALDÍA

PRISMA — UNIVERSALSEC S.A.S. — CONTRATISTA

ARQUITECTURA URBANA LTDA. — INTERVENTORÍA

ACTA No.	7	PERIODO DEL ACTA	1/01/2020	A	30/01/2020	
OBJETO	REALIZAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE AJUSTE LAS DIFERENTES OBRAS E INTERVENCIONES ESPECIALIZADAS PARA LAS DIFERENTES SEDES DE LA SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C.					
CONTRATO DE OBRA No	731-2019	CONTRATISTA	CONSORCIO PRUNI SEDES 04	ENTIDAD CONTRATANTE	SECRETARIA GENERAL-ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA	
CONTRATO INTERVENTORÍA	730 DE 2019	INTERVENTORÍA	ARQUITECTURA URBANA LTDA	FRENTE:	IMPRENTA DISTRITAL	

CAPÍTULO	3,6,0.	SUBESTACIÓN	ITEM	3,6,0,16	Suministro e instalación de celda SF6 de protecciones para transformador 225 KVA incluye fusibles HH de 25 Amp	UNIDAD	UN

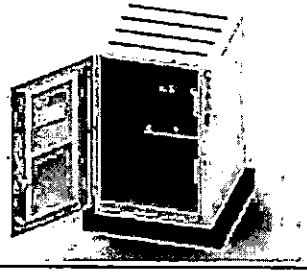ITEM	LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES FIGURA	DIMENSIONES LARGO (m)	DIMENSIONES PESO (kg/m)	CANTIDAD	TOTAL	UNIDAD	REGISTRO FOTOGRÁFICO
1	Celda SF6 de protecciones para transformador 225 KVA incluye fusibles HH de 25 Am				0,40	0,40	UN	
						[redacted]	UN	
						0,40	UN	


REGISTRO FOTOGRÁFICO

OBSERVACIONES: Se adjuntan las pólizas tal como quedó establecido en el modificatorio para el pago del 40% del valor del equipo.

Alejandra Bolaños

ARQ. ALEJANDRA BOLAÑOS
RESIDENTE CONTRATISTA

ARQ. NANCY AYALA
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

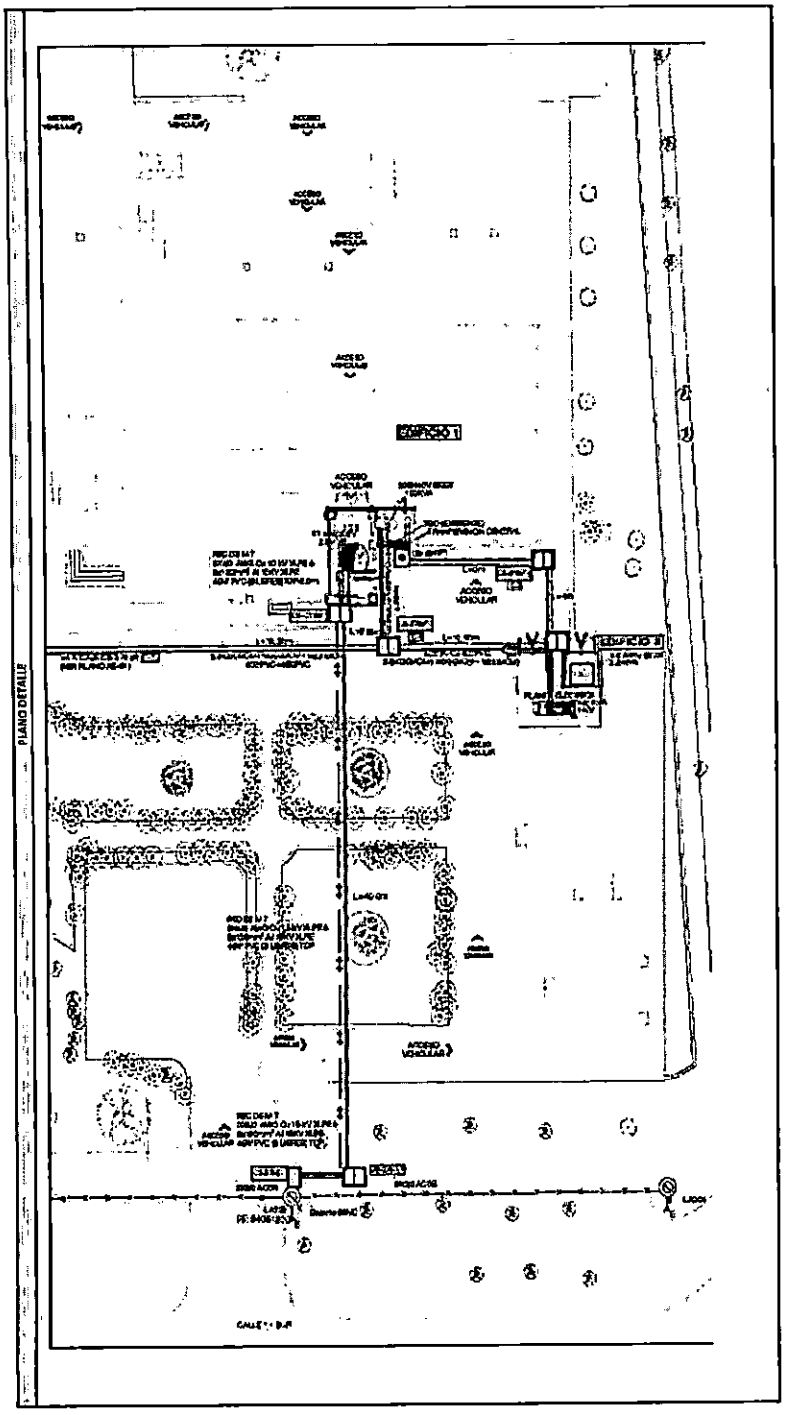
PLANO DETALLE
EDIFICIO 1
EDIFICIO 2
ACCESO VEHICULAR
ACCESO VEHICULAR
ACCESO VEHICULAR

277

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

PARTICULAR

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
NIT. 860.009.578-6, D.C.	CHAPINERO	14	14-45-101055235	0

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
12	08	2019	22	07	2019	00:00	21	07	2024	23:59	EMISION ORIGINAL

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIÓN	
PERALTA CASTELLANOS, DORANCE			CC: 3.019.591
DIRECCIÓN: cra 103 b n 82-48 bq 5 apto 208	CIUDAD: BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	TELÉFONO:	4313899

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:		IDENTIFICACIÓN NIT: 901.294.259-1	
CONSORCIO PRUNI SEDES 04			
DIRECCIÓN: CL 98 NRO. 70 - 91 812	CIUDAD: BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	TELÉFONO	7441529
ADICIONAL:			

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN E-CU-002A REDIS FEBRERO 2013, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS OCASIONADOS POR EL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO DE OBRA No. 001-PS04-2019, CUYO OBJETO ES: EJECUCION DE LAS INSTALACIONES ELECTRICAS PARA LA OBRA REALIZAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE LAS DIFERENTES OBRAS E INTERVENCIONES ESPECIALIZADAS PARA LAS DIFERENTES SEDES DE LA SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA,D.C., EN LAS SEDES CENTRO DE MEMORIA, PAZ Y RECONCILIACION E IMPRENTA DISTRITAL.

AMPAROS

RIESGO: CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES Y EDIFICIOS.

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG/ACTUAL
CUMPLIMIENTO	22/07/2019	21/12/2019	$172,008,801.31
CALIDAD DE LOS ELEMENTOS	22/07/2019	26/01/2020	$172,008,801.31
SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	22/07/2019	21/12/2019	$28,668,133.55
ESTABILIDAD DE LA OBRA	22/07/2019	21/07/2024	$114,672,534.21

ACLARACIONES

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ ***1,864,606.00	$ *****20,000.00	$ *****358,075.00	$ *********2,242,682.00	$ *******487,358,270.38	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑÍA	% PART.	VALOR ASEGURADO
AGOR LTDA ASESORES DE SEGUROS	164048	100.00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CRA. 7 NO. 57 -67 - TELEFONO: 2172417 - BOGOTA, D.C.

SEGUROS DEL ESTADO

14-45-101055235

FIRMA AUTORIZADA: Manuel Sarmiento - Vicepresidente de Planzas

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

USTED PUEDE CONSULTAR ESTA PÓLIZA EN WWW.SEGUROSDELESTADO.COM OFICINA PRINCIPAL: CRA. 11 NO. 90-20 BOGOTA D.C. TELEFONO: 2186977 PAULACASTRO 1

264

CUMPLIMIENTO
RCE CONTRATOS

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
NIT. 860.009.578-6 BOGOTA, D.C.	CHAPINERO	14	14-40-101029782	0

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
12	08	2019	22	07	2019	00:00	21	12	2019	23:59	EMISION ORIGINAL

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIÓN	
PERALTA CASTELLANOS, DORANCE		CC: 3.019.691	
DIRECCIÓN: cra 103 b n 82-48 bq 5 apto 206	CIUDAD: BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	TELÉFONO:	4313899

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO:		IDENTIFICACIÓN NIT:
CONSORCIO PRUNI SEDES 04		901.294.259-1
DIRECCIÓN: CL 98 NRO. 70 - 91 812	CIUDAD: BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	TELÉFONO 7441529
BENEFICIARIO: 901294259 - CONSORCIO PRUNI SEDES 04	ADICIONAL:	

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN E-RCE-001A SEDES 04-09 / E-RCE-001A, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

SE AMPARA LA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL EN LA QUE INCURRA EL ASEGURADO EN EL DESARROLLO DEL CONTRATO DE OBRA No. 001-PS04-2019, CUYO OBJETO ES: EJECUCION DE LAS INSTALACIONES ELECTRICAS PARA LA OBRA REALIZAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE LAS DIFERENTES OBRAS E INTERVENCIONES ESPECIALIZADAS PARA LAS DIFERENTES SEDES DE LA SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA,D.C., EN LAS SEDES CENTRO DE MEMORIA, PAZ Y RECONCILIACION E INGRENTA DISTRITAL.

AMPAROS

RIESGO: CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES Y EDIFICIOS.

AMPAROS	DEDUCIBLE	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG ACTUAL
PREDIOS LABORES Y OPERACIONES	15.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV	22/07/2019	21/12/2019	$414,058,000.00

ACLARACIONES

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ *****431,074.00	$ *******2,000.00	$ ******82,284.00	$ **********515,358.00	$ ******414,058,000.00	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
AGOR LTDA ASESORES DE SEGUROS	164048	100.00			

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO.
QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.
PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CRA. 7 NO. 57 -67 - TELEFONO: 2172417 - BOGOTA, D.C.

SEGUROS DEL ESTADO S.A. NIT. 860.009.578-6

14-40-101029782

FIRMA AUTORIZADA: Manuel Sarmiento - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA GENERAL

BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

PROYECTO: OBRAS SEDES ALCALDÍA

PRISMA — UNIVERSAL SEC S.A.S. — CONSORCIO PRUNI SEDES 04 — CONTRATISTA

ARQUITECTURA URBANA LTDA — INTERVENTORÍA


ACTA No.	7	PERIODO DEL ACTA	01/01/2020	A	30/01/2020	
OBJETO	REALIZAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE AJUSTE LAS DIFERENTES OBRAS E INTERVENCIONES ESPECIALIZADAS PARA LAS DIFERENTES SEDES DE LA SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C.					
CONTRATO DE OBRA No	731-2019	CONTRATISTA	CONSORCIO PRUNI SEDES 04	ENTIDAD CONTRATANTE	SECRETARIA GENERAL-ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA	
CONTRATO INTERVENTORÍA	730 DE 2019	INTERVENTORÍA	ARQUITECTURA URBANA LTDA	FRENTE:	IMPRENTA DISTRITAL	

CAPITULO	NP	CIVIL	ITEM	IMP 09	Desmonte de tubería de gres de 8" incluye retiro de escombros hasta escombrera certificada	UNIDAD	ML


ITEM	LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	TOTAL	UNIDAD
	PRODUCCIÓN						
1		1,40			1,00	1,40	ML
2		1,05			1,00	1,05	ML
3		0,50			1,00	0,50	ML
4		1,32			1,00	1,32	ML
	COSTADO SUR						
5	Sobre anden	10,76			1,00	10,76	ML
					SUBTOTAL:	15,03	ML
					TOTAL:	15,03	ML

OBSERVACIONES:

LOCALIZACIÓN PLANIMÉTRICA

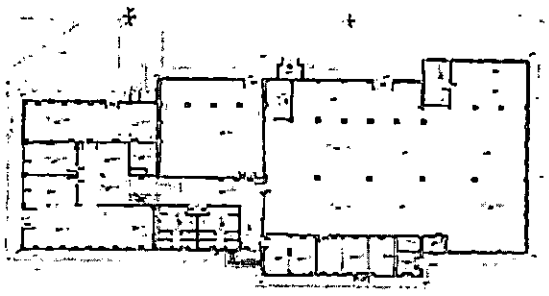

REGISTRO FOTOGRÁFICO

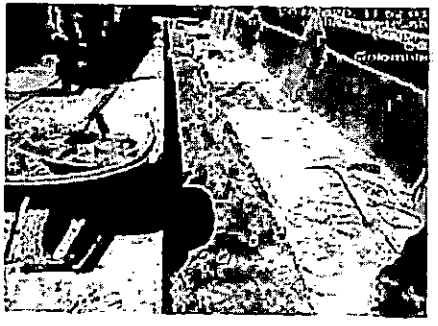


ARQ. ALEJANDRA BOLAÑOS
RESIDENTE CONTRATISTA

ARQ. NANCY AYALA
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

265

279

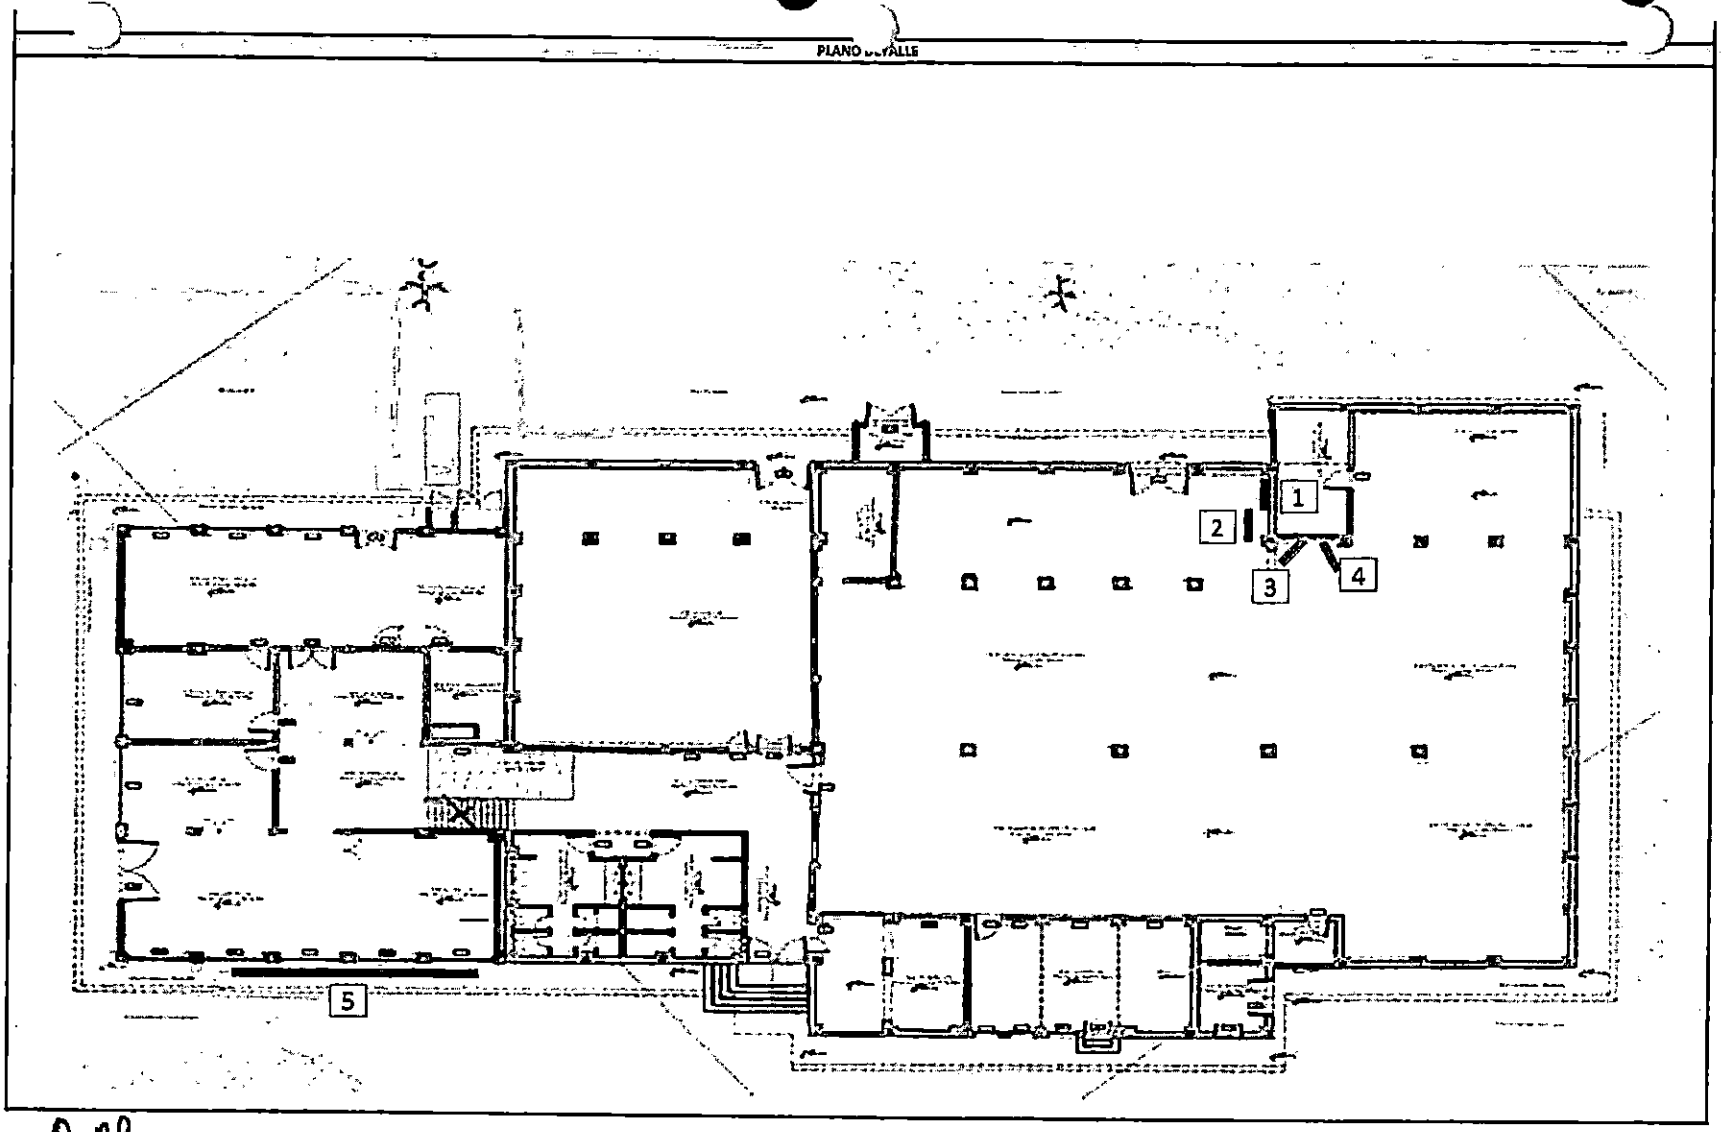

DeBl

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA GENERAL

BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

PROYECTO: OBRAS SEDES ALCALDÍA

PRISMA UNIVERSAL SEC S.A.S.
CONSORCIO PRUNI SEDES 04
CONTRATISTA

ARQUITECTURA URBANA LTDA
INTERVENTORÍA

ACTA No.	7		PERIODO DEL ACTA	01/01/2020	A	30/01/2020	
OBJETO	REALIZAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE AJUSTE LAS DIFERENTES OBRAS E INTERVENCIONES ESPECIALIZADAS PARA LAS DIFERENTES SEDES DE LA SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C.						
CONTRATO DE OBRA No	731-2019	CONTRATISTA	CONSORCIO PRUNI SEDES 04		ENTIDAD CONTRAYANTE	SECRETARIA GENERAL-ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA	
CONTRATO INTERVENTORÍA	730 DE 2019	INTERVENTORÍA	ARQUITECTURA URBANA LTDA		FRENTE:	IMPRENTA DISTRITAL	

CAPITULO		NP	CIVIL		ITEM	IMP 46	CONSTRUCCIÓN DE ALFAJIA EN LADRILLO COMÚN E: 0,25 HILADA PARADA	UNIDAD	ML
ITEM	LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			CANTIDAD	TOTAL	UNIDAD	LOCALIZACIÓN PLANIMÉTRICA	
		LARGO	ANCHO	ALTO					
	EDIFICIO ADMINISTRATIVO 1ER PISO								
1	EJE 1' ENTRE EJES E-F	2,47			1,00	2,47	ML		
2	EJE 1' ENTRE EJES D-E	2,47			1,00	2,47	ML		
3	EJE 1' ENTRE EJES C-D	2,47			1,00	2,47	ML		
4	EJE 1' ENTRE EJES B-C	2,47			1,00	2,47	ML		
5	EJE 1' ENTRE EJES A-B	2,47			1,00	2,47	ML		
6	EJE A ENTRE EJES 3'-4'	4,08			1,00	4,08	ML		
7	EJE 5' ENTRE EJES A-B	2,47			1,00	2,47	ML		
8	EJE 5' ENTRE EJES B-C	2,47			1,00	2,47	ML		
9	EJE 5' ENTRE EJES C-D	2,47			1,00	2,47	ML		
	EDIFICIO ADMINISTRATIVO 2DO PISO								
10	EJE 1' ENTRE EJES E-F	2,47			1,00	2,47	ML		
11	EJE 1' ENTRE EJES D-E	2,47			1,00	2,47	ML		
12	EJE 1' ENTRE EJES C-D	2,47			1,00	2,47	ML		
13	EJE 1' ENTRE EJES B-C	2,47			1,00	2,47	ML		
14	EJE 1' ENTRE EJES A-B	2,47			1,00	2,47	ML		
15	EJE A ENTRE EJES 2'-3'	3,67			1,00	3,67	ML		
16	EJE A ENTRE EJES 3'-4'	4,08			1,00	4,08	ML		
17	EJE 5' ENTRE EJES A-B	2,47			1,00	2,47	ML		
18	EJE 5' ENTRE EJES B-C	2,47			1,00	2,47	ML		
19	EJE 5' ENTRE EJES C-D	2,47			1,00	2,47	ML		
20	EJE 5' ENTRE EJES D-E	2,47			1,00	2,47	ML		
21	EJE 5' ENTRE EJES E-F	2,47			1,00	2,47	ML		
OBSERVACIONES:				SUBTOTAL		56,29	ML		
				TOTAL		56,29	ML		

REGISTRO FOTOGRÁFICO




Alejandra Bolaños +
ARQ. ALEJANDRA BOLAÑOS
RESIDENTE CONTRATISTA


Nancy Rocío Ayala Gomez
ARQ. NANCY AYALA
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

PLANO DETALLE

PRIMER PISO

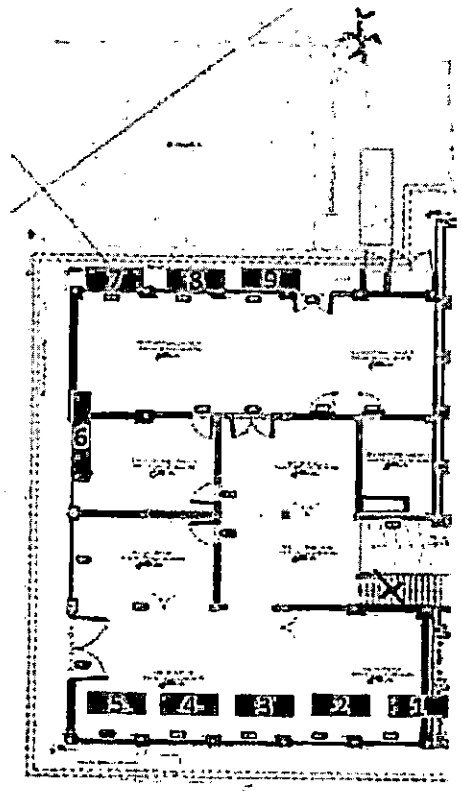

SEGUNDO PISO

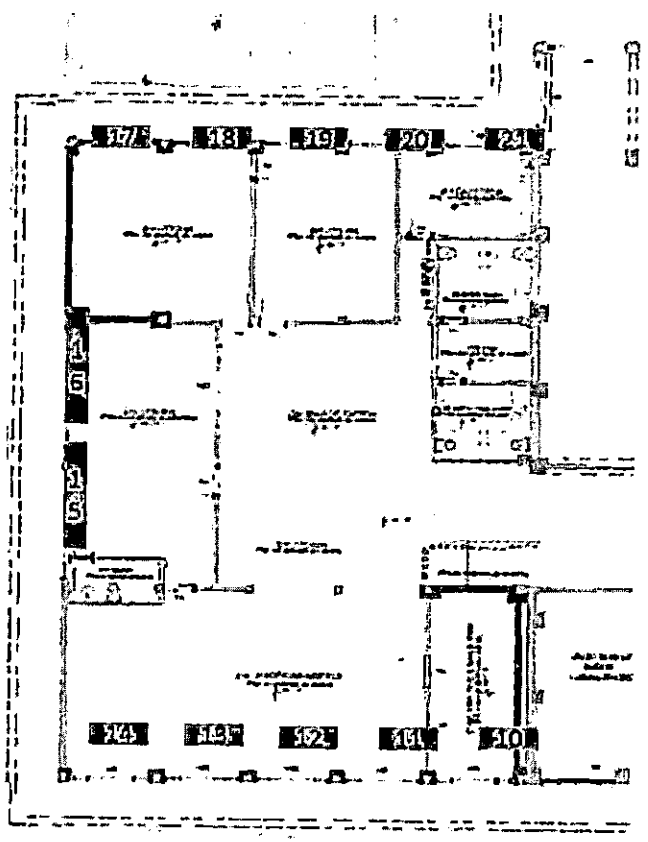

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. | BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS
SECRETARÍA GENERAL

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

PROYECTO: OBRAS SEDES ALCALDÍA


PRISMA — UNIVERSAL SEC S.A.S. — CONSORCIO PRUNI SEDES 04 — CONTRATISTA

ARQUITECTURA URBANA LTDA — INTERVENTORÍA

ACTA No.	7	PERIODO DEL ACTA	01/01/2020	A	30/01/2020	
OBJETO	REALIZAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE AJUSTE LAS DIFERENTES OBRAS E INTERVENCIONES ESPECIALIZADAS PARA LAS DIFERENTES SEDES DE LA SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C.					
CONTRATO DE OBRA No	731-2019	CONTRATISTA	CONSORCIO PRUNI SEDES 04	ENTIDAD CONTRATANTE	SECRETARIA GENERAL-ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA	
CONTRATO INTERVENTORÍA	730 DE 2019	INTERVENTORÍA	ARQUITECTURA URBANA LTDA	FRENTE:	IMPRENTA DISTRITAL	

CAPITULO		NP	CIVIL		ITEM	IMP 58	DEMOLICIÓN DE ENCHAPE, INCLUYE TRASIEGO, CARGUE A PUNTO DE ACOPIO Y RETIRO DE ESCOMBROS A ESCOMBRERA CERTIFICADA	UNIDAD	M2
ITEM	LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			CANTIDAD	TOTAL	UNIDAD		
		LARGO	ANCHO	ALTO					
	BAÑO HOMBRES PRIMER PISO								
1	ENCHAPE DE PISO	4,63	4,63		1,00	21,44	M2		
2	ENCHAPE DE MUROS		39,12	2,20	1,00	86,06	M2		
	BAÑO MUJERES PRIMER PISO								
3	ENCHAPE DE PISO	4,63	4,63		1,00	21,44	M2		
4	ENCHAPE DE MUROS		39,12	2,20	1,00	86,06	M2		
	BAÑO HOMBRES SEGUNDO PISO								
5	ENCHAPE DE PISO	3,50	2,00		1,00	7,00	M2		
6	ENCHAPE DE MUROS		9,75	2,20	1,00	21,45	M2		
	BAÑO MUJERES SEGUNDO PISO								
7	ENCHAPE DE PISO	3,50	2,17		1,00	7,60	M2		
8	ENCHAPE DE MUROS		9,75	2,20	1,00	21,45	M2		
	BAÑO SUBDIRECTOR SEGUNDO PISO								
9	ENCHAPE DE PISO	2,80	1,50		1,00	4,20	M2		
10	ENCHAPE DE MUROS		8,35	2,20	1,00	18,37	M2		
	CAFETERÍA SEGUNDO PISO								
11	ENCHAPE DE PISO	3,82	3,55		1,00	13,56	M2		
12	ENCHAPE DE MUROS		9,12	1,80	1,00	16,42	M2		
OBSERVACIONES:				SUBTOTAL		325,04	M2		
				TOTAL		325,04	M2		

LOCALIZACIÓN PLANIMÉTRICA

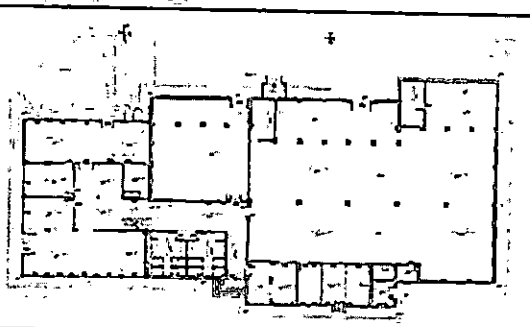

REGISTRO FOTOGRÁFICO




ARQ. ALEJANDRA BOLAÑOS
RESIDENTE CONTRATISTA


ARQ. NANCY AYALA
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

PLANO DETALLE

PRIMER PISO

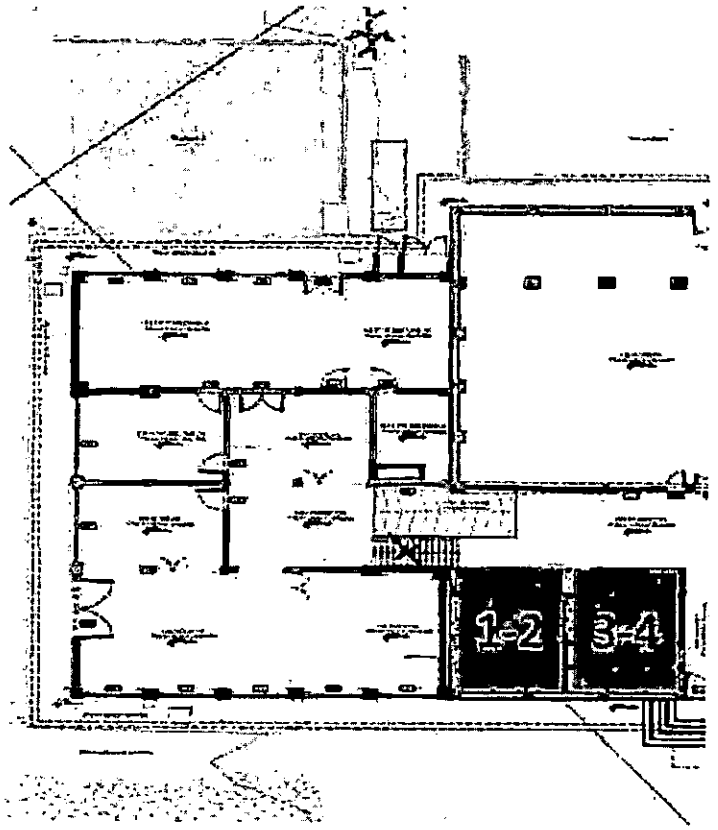

SEGUNDO PISO

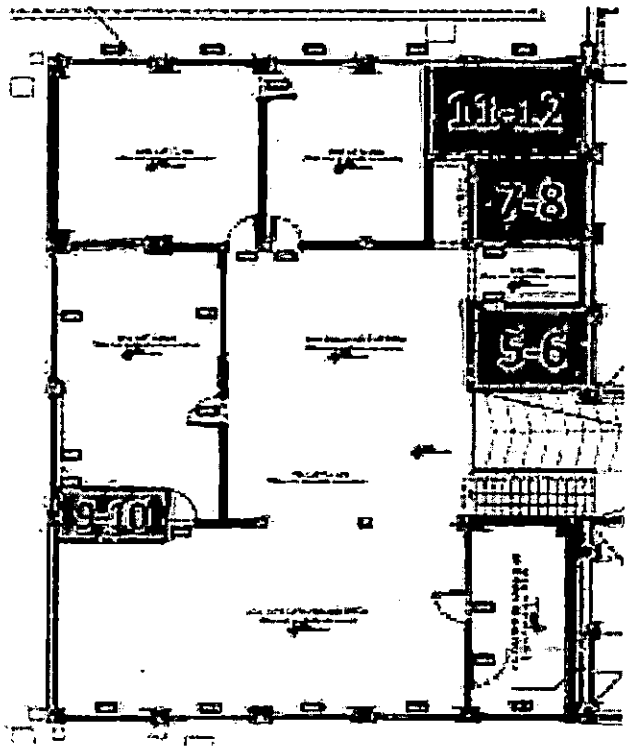

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA GENERAL

BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

PROYECTO: OBRAS SEDES ALCALDÍA

PRISMA — UNIVERSAL SEC S.A.S. — CONSORCIO PRISM SEDES 04 — CONTRATISTA

ARQUITECTURA URBANA LTDA — INTERVENTORÍA

ACTA No.	7	PERIODO DEL ACTA	01/01/2020	A	30/01/2020		
OBJETO	REALIZAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE AJUSTE LAS DIFERENTES OBRAS E INTERVENCIONES ESPECIALIZADAS PARA LAS DIFERENTES SEDES DE LA SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C.						
CONTRATO DE OBRA No	731-2019	CONTRATISTA	CONSORCIO PRUNI SEDES 04	ENTIDAD CONTRATANTE	SECRETARIA GENERAL-ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA		
CONTRATO INTERVENTORÍA	730 DE 2019	INTERVENTORÍA	ARQUITECTURA URBANA LTDA	FRENTE:	IMPRENTA DISTRITAL		

CAPITULO		NP	CIVIL		ITEM	IMP 61	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DILATACIÓN EN ICOPOR PARA JUNTA CONSTRUCTIVA EN MURO	UNIDAD	M2
ITEM	LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			CANTIDAD	TOTAL	UNIDAD	LOCALIZACIÓN PLANIMÉTRICA	
		LARGO	ANCHO	ALTO					
	ADMINISTRACION								
	PRIMER PISO BODEGA								
1	EJE F ENTRE EJES 1'-2'	5,80		3,09	1,00	17,92	M2		
	SEGUNDO PISO DATA CENTER								
2	EJE F ENTRE EJES 1'-2'	5,80		2,50	1,00	14,50	M2		

ACTA

8

IMPRENTA DISTRITAL


ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Seguridad Integración Social	MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA **PROYECTO: OBRAS SEDES ALCALDÍA**	PRISMA UNIVERSAL SEC S.A.S. CONSORCIO PRUNI SEDES 04 (CONTRATISTA) ARQUITECTURA URBANA LTDA. (INTERVENTORIA)

ACTA No.	8	PERIODO DEL ACTA	1/02/2020	A	29/02/2020		
OBJETO	REALIZAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE AJUSTE LAS DIFERENTES OBRAS E INTERVENCIONES ESPECIALIZADAS PARA LAS DIFERENTES SEDES DE LA SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C.						
CONTRATO DE OBRA No	733-2019	CONTRATISTA	CONSORCIO PRUNI SEDES 04	ENTIDAD CONTRATANTE	SECRETARIA GENERAL-ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA		
CONTRATO INTERVENTORÍA	730 DE 2019	INTERVENTORÍA	ARQUITECTURA URBANA LTDA	FRENTE:	IMPRENTA DISTRITAL		


CAPITULO	1.2.0	RED DE SUMINISTRO	ITEM	1.2.0.1	TUBERIA PVC-P RDE 9 1/2"	UNIDAD	ML

ITEM	LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	TOTAL	UNIDAD
	Entre los ejes K-U y 14						
1	Costado oriental	25,80			1,00	25,80	ML
2	Costado oriental	5,30			1,00	5,30	ML
	Entre los ejes A-C y 1-4						
1	Archivo	1,10			1,00	1,10	ML
2	Archivo	1,10			1,00	1,10	ML
3	Archivo	2,60			1,00	2,60	ML
4	Archivo	0,50			1,00	0,50	ML
5	Archivo	1,60			1,00	1,60	ML
6	Archivo	6,00			1,00	6,00	ML
OBSERVACIONES:				SUBTOTAL		44,00	ML
				TOTAL		44,00	ML

LOCALIZACIÓN PLANIMÉTRICA



REGISTRO FOTOGRÁFICO



Alejandra Bolaños


ARQ. ALEJANDRA BOLAÑOS
RESIDENTE CONTRATISTA

ARQ. NANCY AYALA
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

90

270


PLANO DETALLE

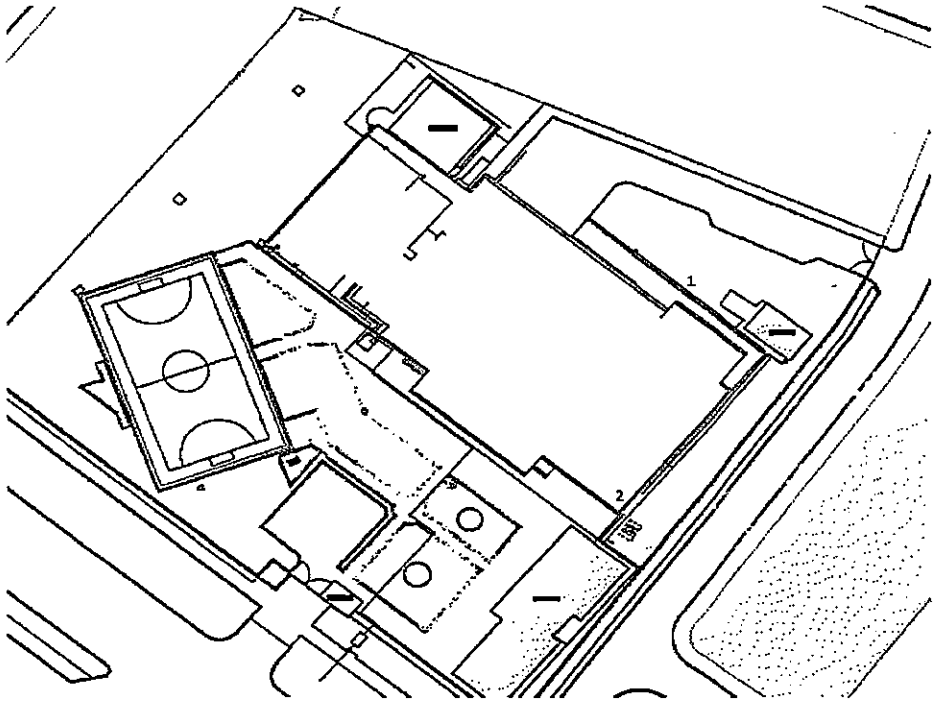

16

92

271

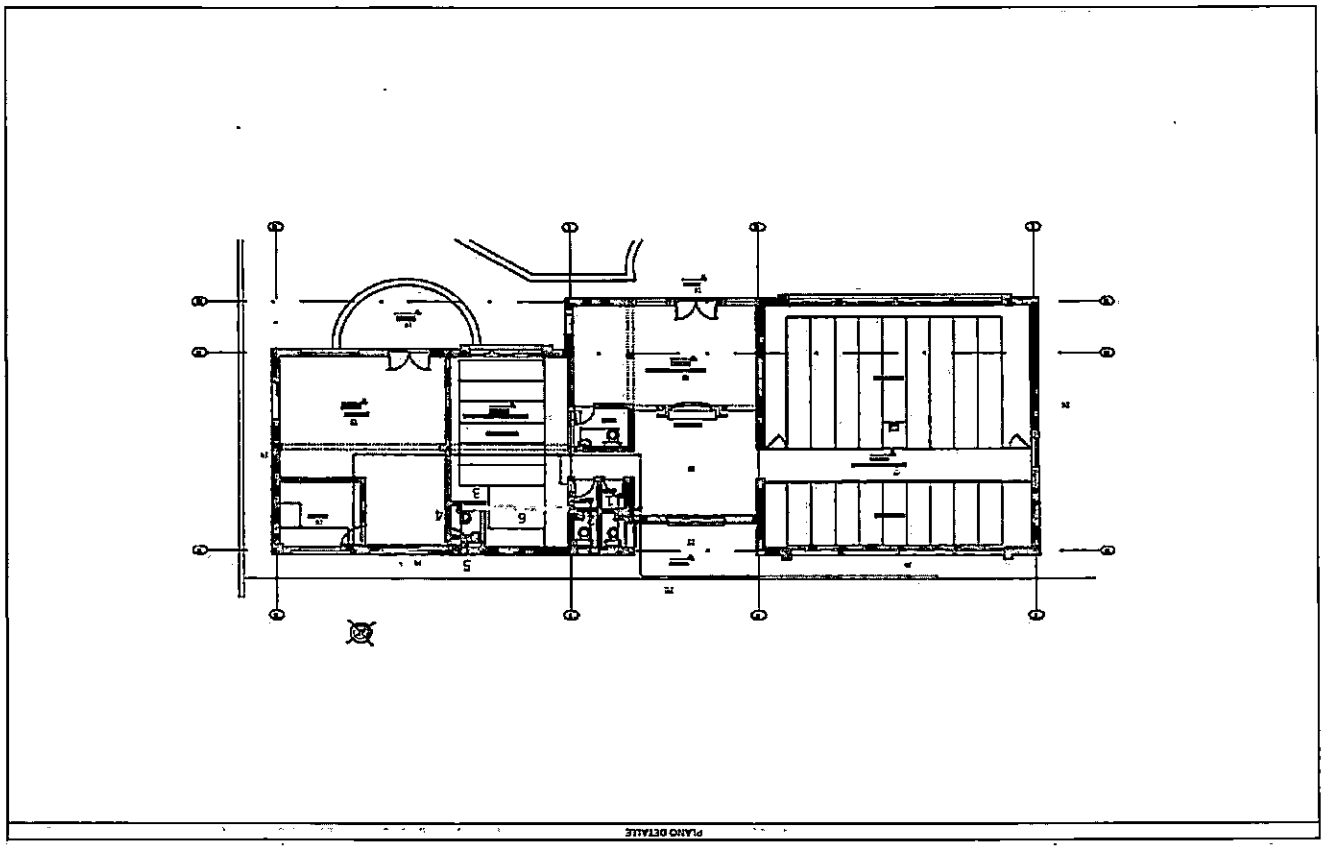

PLANO DETALLE

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Gobierno	MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA	PRISMA UNIVERSAL SEC S.A.S. CONSORCIO PRUM SEDES 04 CONTRATISTA	ARQUITECTURA URBANA LTDA. INTERVENTORÍA
	PROYECTO: OBRAS SEDES ALCALDÍA		


ACTA No.	8	PERIODO DEL ACTA	1/02/2020	A	29/02/2020		
OBJETO	REALIZAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE AJUSTE LAS DIFERENTES OBRAS E INTERVENCIONES ESPECIALIZADAS PARA LAS DIFERENTES SEDES DE LA SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C						
CONTRATO DE OBRA No	731-2019	CONTRATISTA	CONSORCIO PRUM SEDES 04		ENTIDAD CONTRATANTE	SECRETARIA GENERAL-ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA	
CONTRATO INTERVENTORÍA	730 DE 2019	INTERVENTORÍA	ARQUITECTURA URBANA LTDA		FRENTE:	IMPRENTA DISTRITAL	

CAPITULO	1.2.0	RED DE SUMINISTRO	ITEM	1.2.0.2	TUBERIA PVC-P RDE 11 3/4"	UNIDAD	ML


ITEM	LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES LARGO	DIMENSIONES ANCHO	DIMENSIONES ALTO	CANTIDAD	TOTAL	UNIDAD
	Entre los ejes K-U y 24						
1	Costado oriental	1,30			1,00	37,30	ML
2	Costado oriental	36,00			1,00	1,80	ML
				SUBTOTAL		39,30	ML
				TOTAL		39,30	ML

OBSERVACIONES:

LOCALIZACIÓN PLANIMÉTRICA

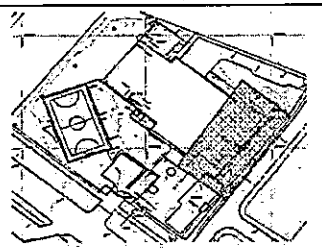

REGISTRO FOTOGRÁFICO




Alejandra Bolaños

ARQ. ALEJANDRA BOLAÑOS
RESIDENTE CONTRATISTA

ARQ. NANCY AYALA
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

93

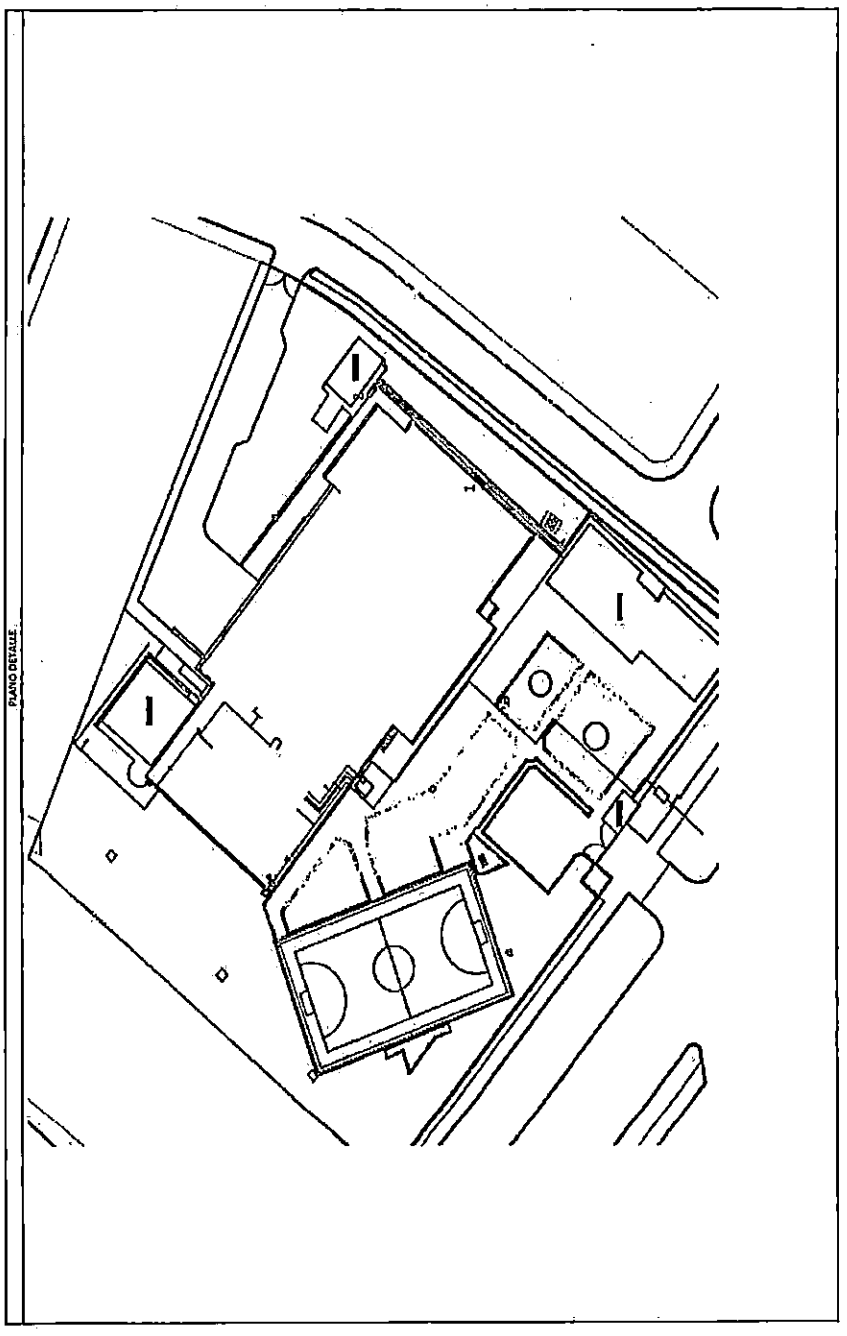
PLANO DETALLE


ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Secretaría Integración Social	MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA **PROYECTO: OBRAS SEDES ALCALDÍA**	PRISMA UNIVERSAL SEC S.A.S. CONSORCIO PRUNI SEDES 04 — CONTRATISTA	ARQUITECTURA URBANA LTDA — INTERVENTORÍA

ACTA No.	8	PERIODO DEL ACTA	1/02/2020	A	29/02/2020		
OBJETO	REALIZAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE AJUSTE LAS DIFERENTES OBRAS E INTERVENCIONES ESPECIALIZADAS PARA LAS DIFERENTES SEDES DE LA SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C.						
CONTRATO DE OBRA No	731-2019	CONTRATISTA	CONSORCIO PRUNI SEDES 04		ENTIDAD CONTRATANTE	SECRETARIA GENERAL-ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA	
CONTRATO INTERVENTORÍA	730 DE 2019	INTERVENTORÍA	ARQUITECTURA URBANA LTDA		FRENTE:	IMPRENTA DISTRITAL	


CAPITULO	1.2.0	RED DE SUMINISTRO	ITEM	1.2.0.4	TUBERÍA PVC-P RDE 21 1 1/4"	UNIDAD	ML

ITEM	LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	TOTAL	UNIDAD
	Entre los ejes A-C y 1-4						
1	Archivo	1,40			1,00	1,40	ML
2	Archivo	5,33			1,00	5,33	ML
3	Archivo	1,45			1,00	1,45	ML
4	Archivo	2,50			1,00	2,50	ML
5	Archivo	3,10			1,00	3,10	ML
6	Archivo	6,00			1,00	6,00	ML
OBSERVACIONES:			SUBTOTAL			19,83	ML
			TOTAL			19,83	ML

LOCALIZACIÓN PLANIMÉTRICA




REGISTRO FOTOGRÁFICO



Alejandra Bolaños

ARQ. ALEJANDRA BOLAÑOS
RESIDENTE CONTRATISTA

ARQ. NANCY AYALA
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

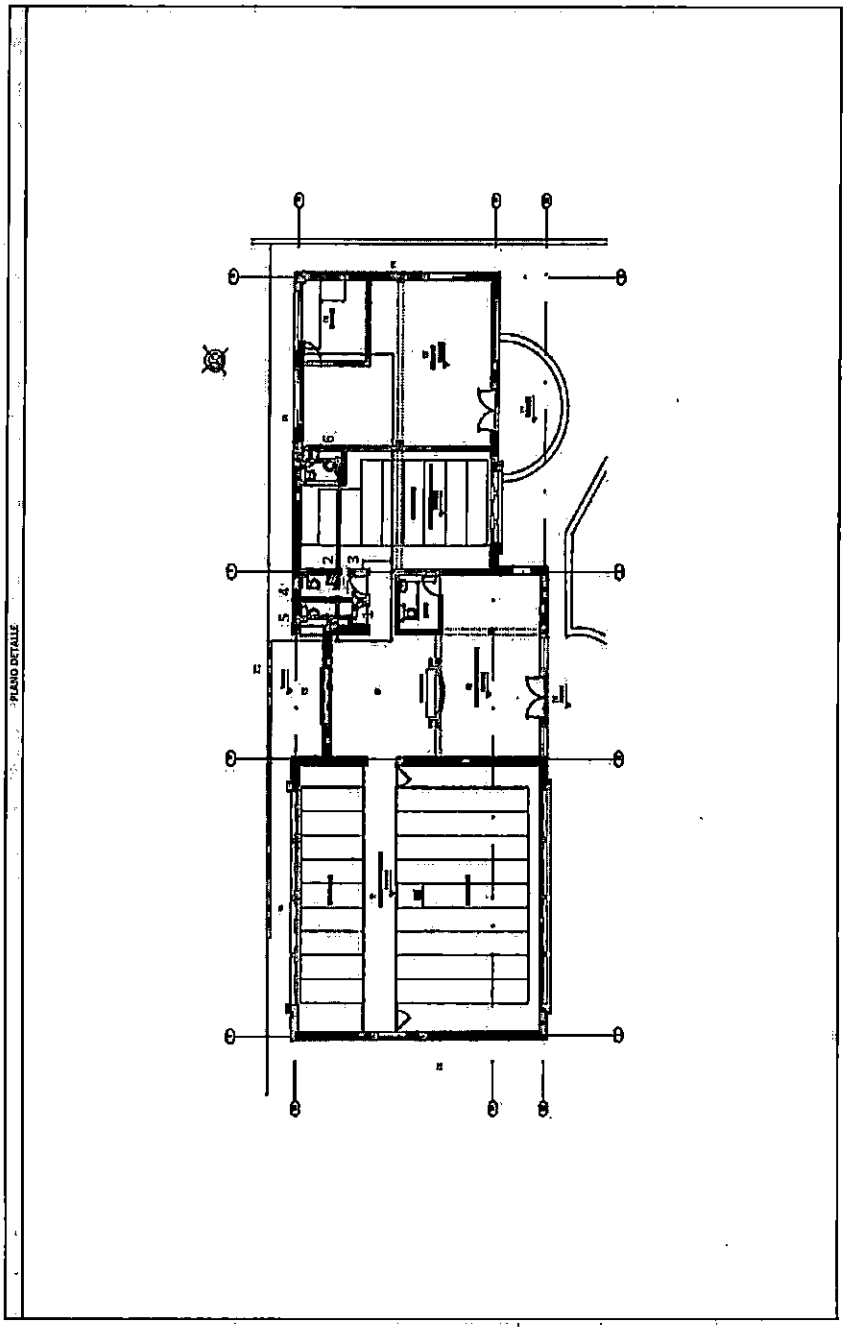
PLANO DETALLE

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Secretaría Integración Social

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

PROYECTO: OBRAS SEDES ALCALDÍA

PRISMA — UNIVERSAL SEC S.A.S. — CONSORCIO PRISMA SEDES 04 — CONTRATISTA


ARQUITECTURA URBANA LTDA. — INTERVENTORÍA

ACTA No.	8	PERIODO DEL ACTA	1/02/2020	A:	29/02/2020
OBJETO	REALIZAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE AJUSTE LAS DIFERENTES OBRAS E INTERVENCIONES ESPECIALIZADAS PARA LAS DIFERENTES SEDES DE LA SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C.				
CONTRATO DE OBRA No.	731-2019	CONTRATISTA	CONSORCIO PRISMA SEDES 04	ENTIDAD CONTRATANTE	SECRETARIA GENERAL-ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA
CONTRATO INTERVENTORÍA	730 DE 2019	INTERVENTORÍA	ARQUITECTURA URBANA LTDA	FRENTE:	IMPRENTA DISTRITAL

CAPITULO	1.2.0	RED DE SUMINISTRO	ITEM	1.2.0.5	TUBERÍA PVC-P RDE 21 1 1/2"	UNIDAD	ML

ITEM	LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	TOTAL	UNIDAD
	Entre los ejes A-C y 1-4						
1	Archivo	1,40			1,00	1,40	ML

PLANO DETALLE

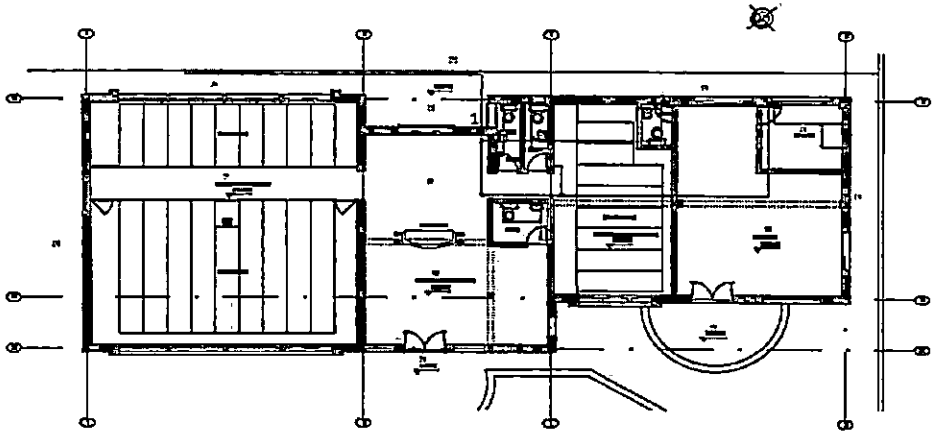

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Secretaría Integración Social	MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA PROYECTO: OBRAS SEDES ALCALDÍA	PRISMA / UNIVERSAL SEC S.A.S. CONSORCIO PRUNI SEDES 04 — CONTRATISTA	ARQUITECTURA URBANA LTDA. — INTERVENTORÍA


ACTA No.	8	PERIODO DEL ACTA	1/02/2020	A	29/02/2020	
OBJETO	REALIZAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE AJUSTE LAS DIFERENTES OBRAS E INTERVENCIONES ESPECIALIZADAS PARA LAS DIFERENTES SEDES DE LA SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C.					
CONTRATO DE OBRA No	731-2019	CONTRATISTA	CONSORCIO PRUNI SEDES 04	ENTIDAD CONTRATANTE	SECRETARIA GENERAL-ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA	
CONTRATO INTERVENTORÍA	730 DE 2019	INTERVENTORÍA	ARQUITECTURA URBANA LTDA	FRENTE:	IMPRENTA DISTRITAL	

CAPITULO	1.2.0	RED DE SUMINISTRO	ITEM	1.2.0.6	TUBERÍA PVC-P RDE 22 2"	UNIDAD	ML


ITEM	LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	TOTAL	UNIDAD
	Entre los ejes A y 2-4						
1	Archivo	2,40			1,00	2,40	ML
2	Archivo	3,20			1,00	3,20	ML
				SUBTOTAL		5,60	ML
				TOTAL		5,60	ML

OBSERVACIONES:

LOCALIZACION PLANIMÉTRICA



REGISTRO FOTOGRÁFICO



Alejandra Bolaños

ARQ. ALEJANDRA BOLAÑOS
RESIDENTE CONTRATISTA

ARQ. NANCY AYALA
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

PLANO DETALLE

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Secretaría Integración Social

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

PROYECTO: OBRAS SEDES ALCALDÍA


PRISMA — UNIVERSAL SEC S.A.S. — CONTRATISTA

ARQUITECTURA URBANA LTDA. — INTERVENTORÍA

ACTA No.	8	PERIODO DEL ACTA	1/02/2020	A	29/02/2020
OBJETO	REALIZAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE AJUSTE LAS DIFERENTES OBRAS E INTERVENCIONES ESPECIALIZADAS PARA LAS DIFERENTES SEDES DE LA SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C.				
CONTRATO DE OBRA No	731-2019	CONTRATISTA	CONSORCIO PRISMA SEDES 04	ENTIDAD CONTRATANTE	SECRETARIA GENERAL-ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA
CONTRATO INTERVENTORÍA	730 DE 2019	INTERVENTORÍA	ARQUITECTURA URBANA LTDA	FRENTE:	IMPRENTA DISTRITAL

CAPITULO		1.2.0	RED DE SUMINISTRO		ITEM	1.2.0.7	ACCESORIO PVC PRESIÓN 1/2"	UNIDAD	UND.

ITEM	LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	TOTAL	UNIDAD
	Entre los ejes A y 2-4						
1	Archivo				20,00	20,00	UND

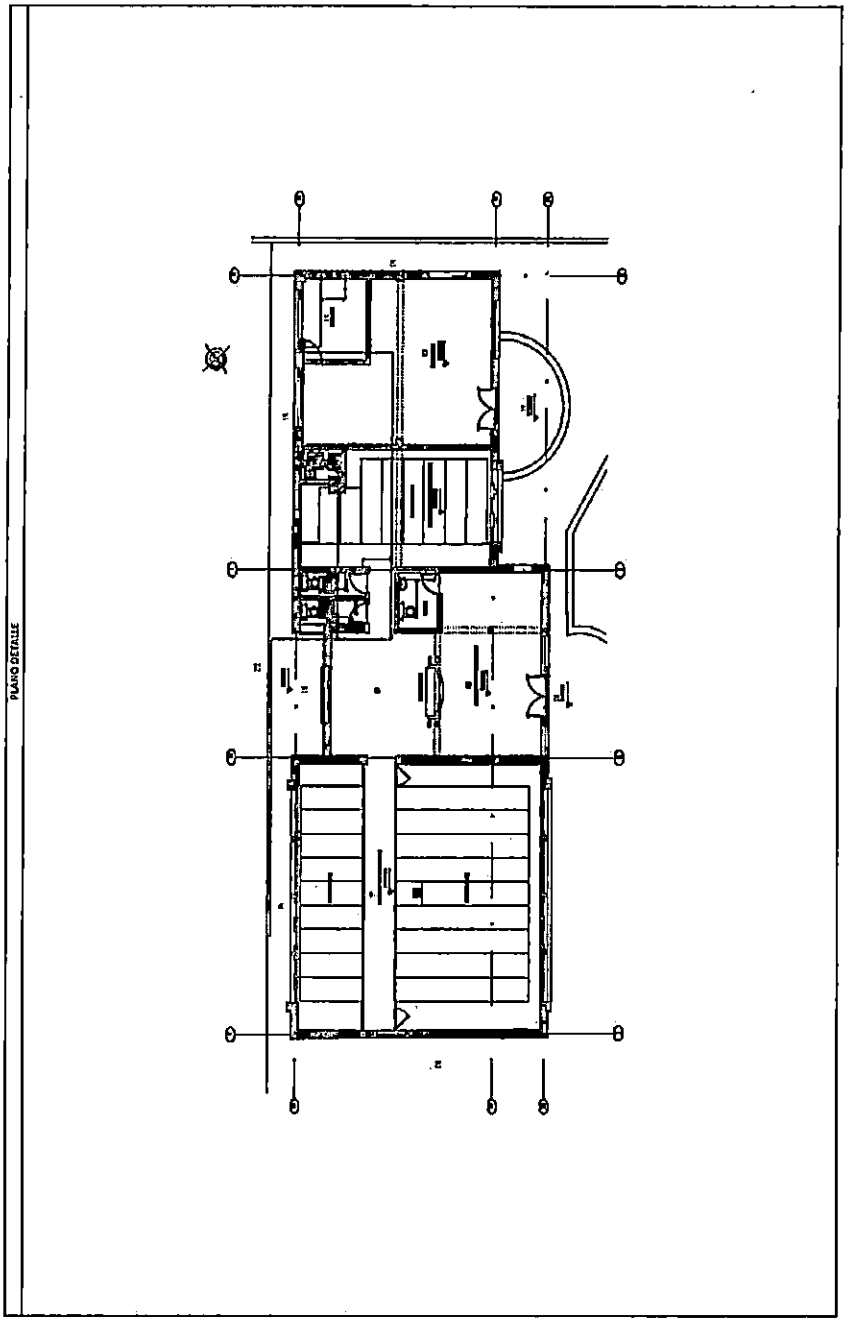

PLANO DETALLE

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Secretaría Integración Social	MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA PROYECTO: OBRAS SEDES ALCALDÍA	PRISMA UNIVERSAL SEC S.A.S. CONSORCIO PRUNI SEDES 04 CONTRATISTA	ARQUITECTURA URBANA LTDA. INTERVENTORÍA

ACTA No.	8	PERIODO DEL ACTA	1/02/2020	A	29/02/2020		
OBJETO	REALIZAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE AJUSTE LAS DIFERENTES OBRAS E INTERVENCIONES ESPECIALIZADAS PARA LAS DIFERENTES SEDES DE LA SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C.						
CONTRATO DE OBRA No	731-2019	CONTRATISTA	CONSORCIO PRUNI SEDES 04	ENTIDAD CONTRATANTE	SECRETARIA GENERAL-ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA		
CONTRATO INTERVENTORÍA	730 DE 2019	INTERVENTORÍA	ARQUITECTURA URBANA LTDA	FRENTE:	IMPRENTA DISTRITAL		

CAPITULO	1.2.0	RED DE SUMINISTRO	ITEM	1.2.0.3	ACCESORIO PVC PRESIÓN 3/4"	UNIDAD	UNO

ITEM	LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES LARGO	DIMENSIONES ANCHO	DIMENSIONES ALTO	CANTIDAD	TOTAL	UNIDAD
	Entre los ejes K-U y 14						
1	Costado oriental				15,00	15,00	UND

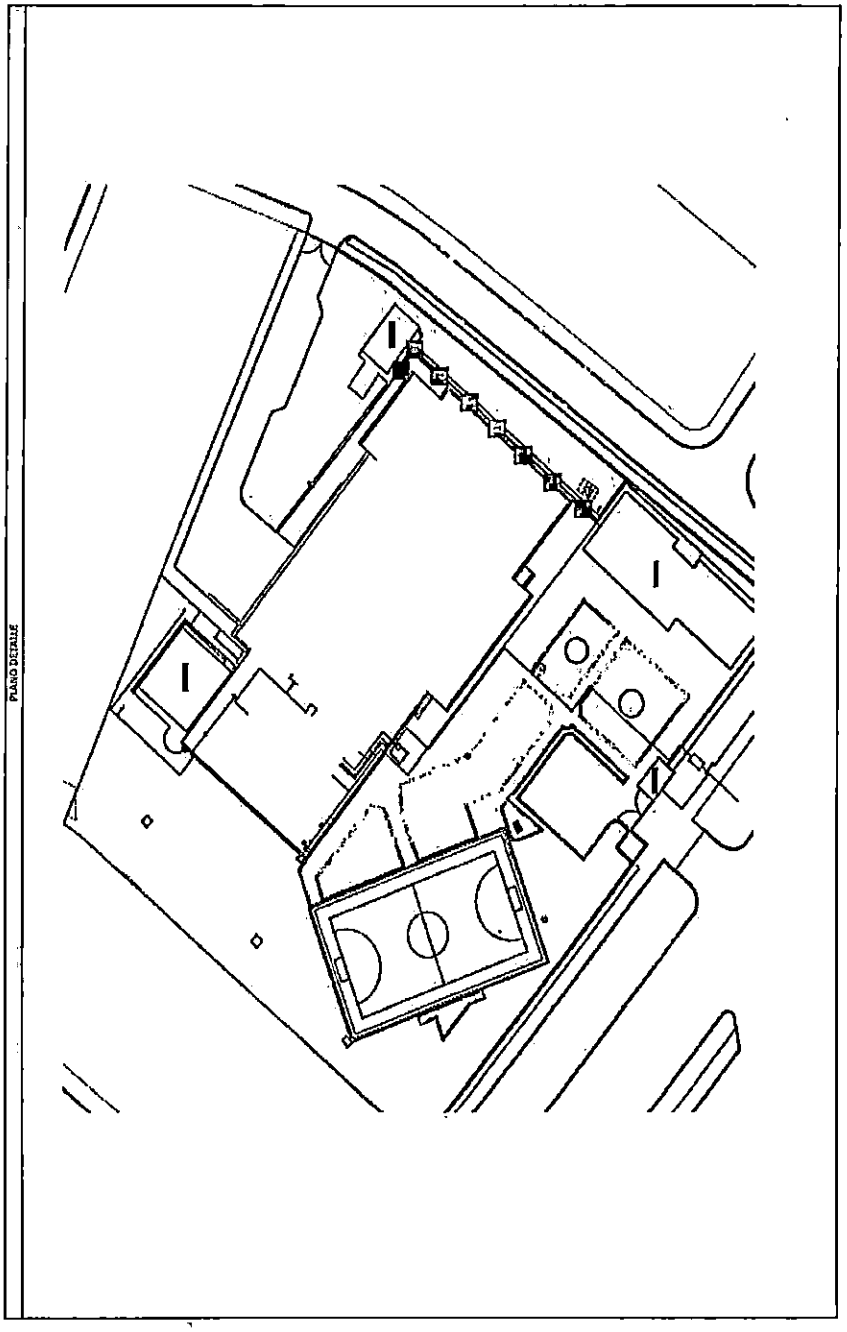
PLANO DETALLE


ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Secretaría Integración Social	MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA PROYECTO: OBRAS SEDES ALCALDÍA	PRISMA UNIVERSAL-SEC S.A.S. CONTRATISTA	ARQUITECTURA URBANA LTDA. INTERVENTORIA

ACTA No.	8	PERIODO DEL ACTA	1/02/2020	A	29/02/2020	
OBJETO	REALIZAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE AJUSTE LAS DIFERENTES OBRAS E INTERVENCIONES ESPECIALIZADAS PARA LAS DIFERENTES SEDES DE LA SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C.					
CONTRATO DE OBRA No :	731-2019	CONTRATISTA	CONSORCIO PAUNI SEDES 04	ENTIDAD CONTRATANTE	SECRETARIA GENERAL-ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA	
CONTRATO INTERVENTORÍA	780 DE 2019	INTERVENTORÍA	ARQUITECTURA URBANA LTDA.	FRENTE:	IMPRENTA DISTRITAL	


CAPITULO	1.2.0	RED DE SUMINISTRO	ITEM	1.2.0.10	ACCESORIO PVC PRESIÓN 1 1/4"	UNIDAD	UND

ITEM	LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	TOTAL	UNIDAD
	Entre los ejes A-C y 1-4						
1	Archivo				24,00	24,00	UND
OBSERVACIONES:				SUBTOTAL		24,00	UND
				TOTAL		24,00	UND

LOCALIZACIÓN PLANIMÉTRICA




REGISTRO FOTOGRÁFICO



Alejandra Bolaños

ARQ. ALEJANDRA BOLAÑOS
RESIDENTE CONTRATISTA

ARQ. NANCY AYALA
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

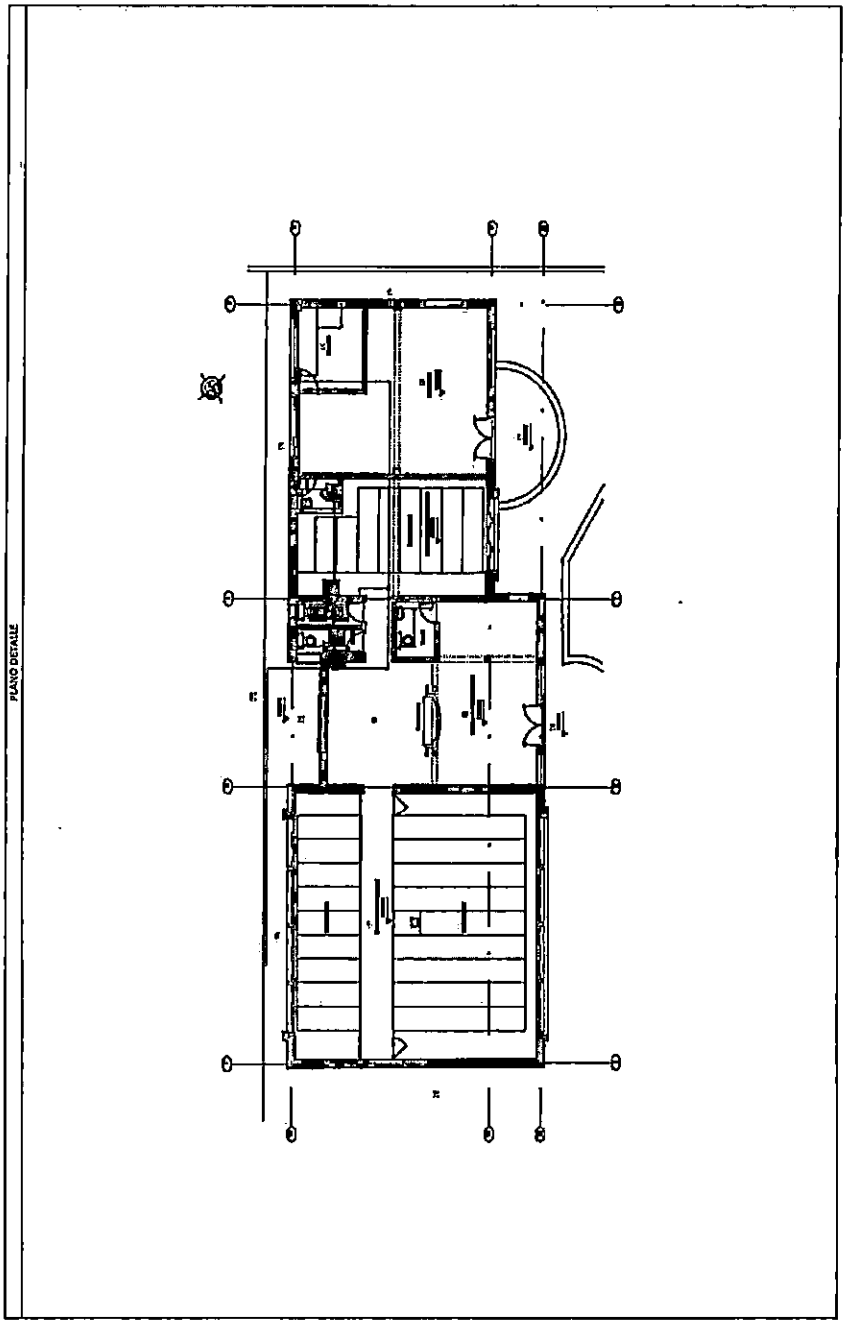

PIANO DETTAGLIO

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA GENERAL	MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA PROYECTO: OBRAS SEDES ALCALDÍA	PRISMA UNIVERSAL SEC S.A.S. CONSORCIO PRUNI SEDES 04 CONTRATISTA	ARQUITECTURA URBANA LTDA. INTERVENTORÍA

ACTA No.	8	PERIODO DEL ACTA	1/02/2020	A	29/02/2020		
OBJETO	REALIZAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE AJUSTE LAS DIFERENTES OBRAS E INTERVENCIONES ESPECIALIZADAS PARA LAS DIFERENTES SEDES DE LA SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C.						
CONTRATO DE OBRA No	731-2019	CONTRATISTA	CONSORCIO PRUNI SEDES 04		ENTIDAD CONTRATANTE	SECRETARIA GENERAL-ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA	
CONTRATO INTERVENTORÍA	730 DE 2019	INTERVENTORÍA	ARQUITECTURA URBANA LTDA		FRENTE:	IMPRENTA DISTRITAL	

CAPITULO		1.2.0	RED DE SUMINISTRO	ITEM	1.2.0.11	ACCESORIO PVC PRESIÓN 1 1/2"		UNIDAD	UND
ITEM	LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			CANTIDAD	TOTAL	UNIDAD	LOCALIZACIÓN PLANIMÉTRICA	
		LARGO	ANCHO	ALTO					
	Entre los ejes A-C y 1-4								
1	Archivo				3,00	3,00	UND		

PLAN D'ENSEMBLE

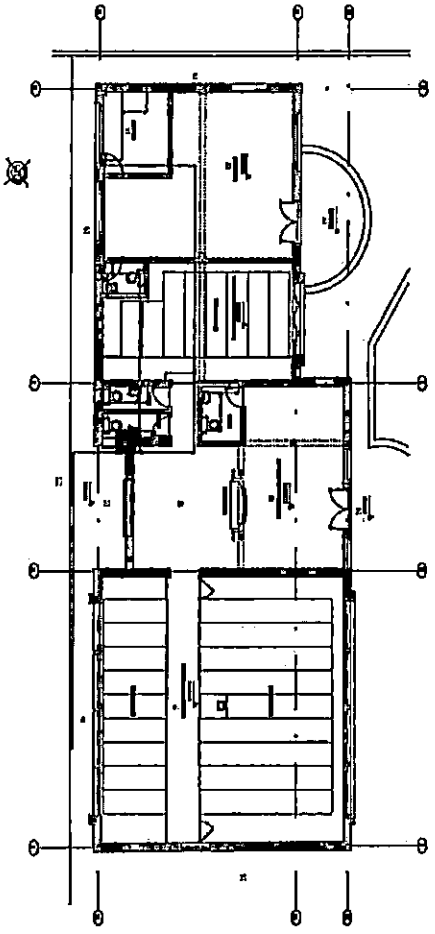

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Secretaría Integración Social	MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA PROYECTO: OBRAS SEDES ALCALDÍA	PRISMA / UNIVERSAL SEC S.A.S. CONSORCIO PRUNI SEDES 04 — CONTRATISTA	ARQUITECTURA URBANA LTDA. — INTERVENTORÍA


ACTA No.	8	PERIODO DEL ACTA	1/02/2020	A	29/02/2020	
OBJETO	REALIZAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE AJUSTE LAS DIFERENTES OBRAS E INTERVENCIONES ESPECIALIZADAS PARA LAS DIFERENTES SEDES DE LA SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C.					
CONTRATO DE OBRA No	731-2019	CONTRATISTA	CONSORCIO PRUNI SEDES 04	ENTIDAD CONTRATANTE	SECRETARIA GENERAL-ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA	
CONTRATO INTERVENTORÍA	730 DE 2019	INTERVENTORÍA	ARQUITECTURA URBANA LTDA	FRENTE:	IMPRENTA DISTRITAL	

CAPITULO	1.2.0	RED DE SUMINISTRO	ITEM	1.2.0.12	ACCESORIO PVC PRESIÓN 2"	UNIDAD:	UND


ITEM	LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES LARGO	DIMENSIONES ANCHO	DIMENSIONES ALTO	CANTIDAD	TOTAL	UNIDAD
	Entre los ejes A y 2-4						
1	Archivo				9,00	9,00	UND
				SUBTOTAL		9,00	UND
				TOTAL		9,00	UND

OBSERVACIONES:

LOCALIZACION PLANIMÉTRICA




REGISTRO FOTOGRÁFICO



Alejandra Bolaños

ARQ. ALEJANDRA BOLAÑOS
RESIDENTE CONTRATISTA

ARQ. NANCY AYALA
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

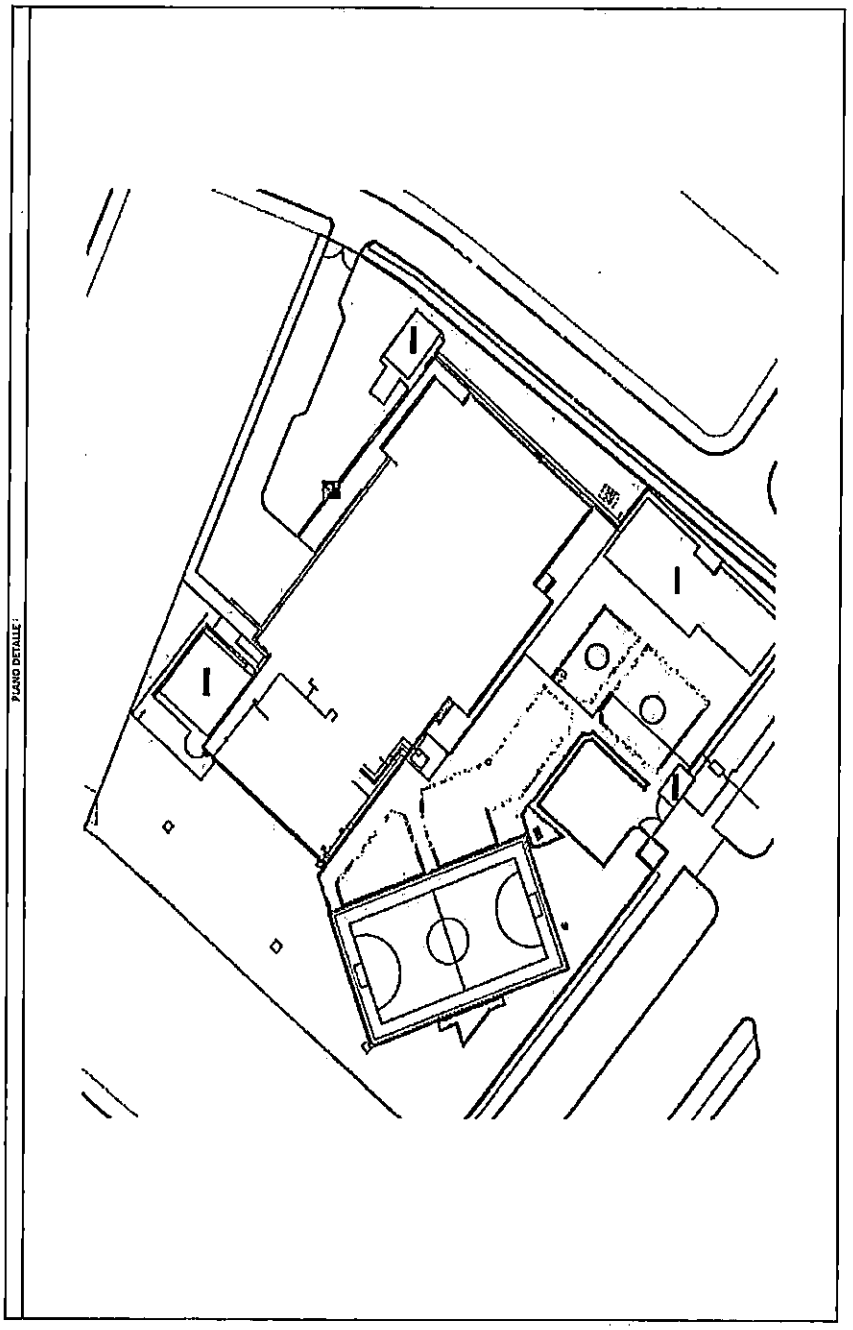
PIANO DETTAGLIO

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Secretaría Integración Social	MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA PROYECTO: OBRAS SEDES ALCALDÍA	PRISMA UNIVERSAL SEC S.A.S. CONSORCIO PRUNI SEDES 04 CONTRATISTA	ARQUITECTURA URBANA LTDA. INTERVENTORÍA


ACTA No.	8	PERIODO DEL ACTA	1/02/2020	A	29/02/2020		
OBJETO	REALIZAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE AJUSTE LAS DIFERENTES OBRAS E INTERVENCIONES ESPECIALIZADAS PARA LAS DIFERENTES SEDES DE LA SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C.						
CONTRATO DE OBRA No	731-2019	CONTRATISTA	CONSORCIO PRUNI SEDES 04	ENTIDAD CONTRATANTE	SECRETARIA GENERAL-ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA		
CONTRATO INTERVENTORÍA	730 DE 2019	INTERVENTORÍA	ARQUITECTURA URBANA LTDA	FRENTE:	IMPRENTA DISTRITAL		

CAPITULO		1.2.0	RED DE SUMINISTRO		ITEM	1.2.0.13	Registro Paso Directo 1/2"	UNIDAD	UND

ITEM	LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	TOTAL	UNIDAD
	Entre los ejes A-U y 1-15						
1	Costado oriental				1,00	1,00	UND
	Entre los ejes A-B y 2-3						
1	Archivo				1,00	1,00	UND
					SUBTOTAL	2,00	UND
					TOTAL	2,00	UND

OBSERVACIONES:

LOCALIZACIÓN PLANIMÉTRICA




REGISTRO FOTOGRÁFICO




Alejandra Bolaños

ARQ. ALEJANDRA BOLAÑOS
RESIDENTE CONTRATISTA

ARQ. NANCY AYALA
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

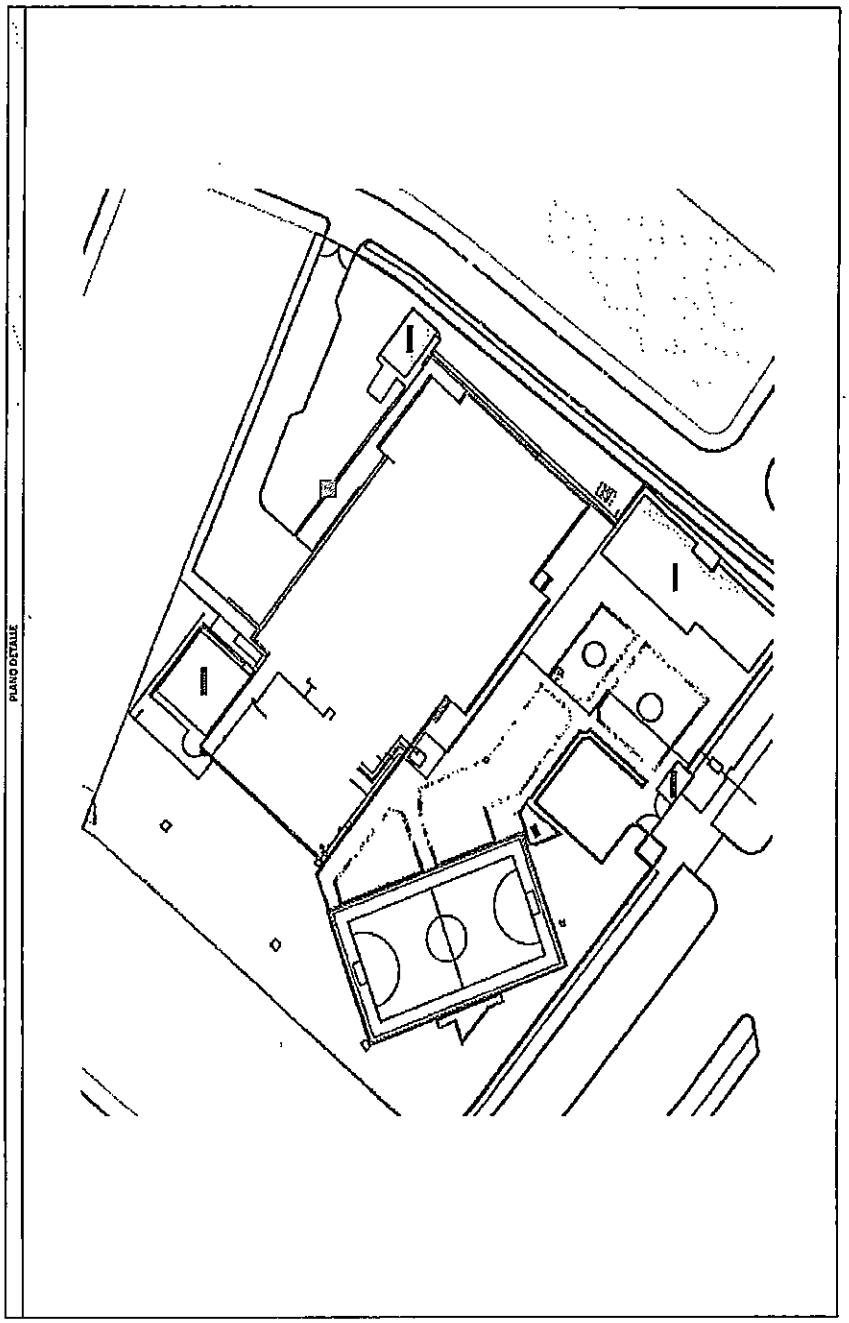
PLANO DETALLE

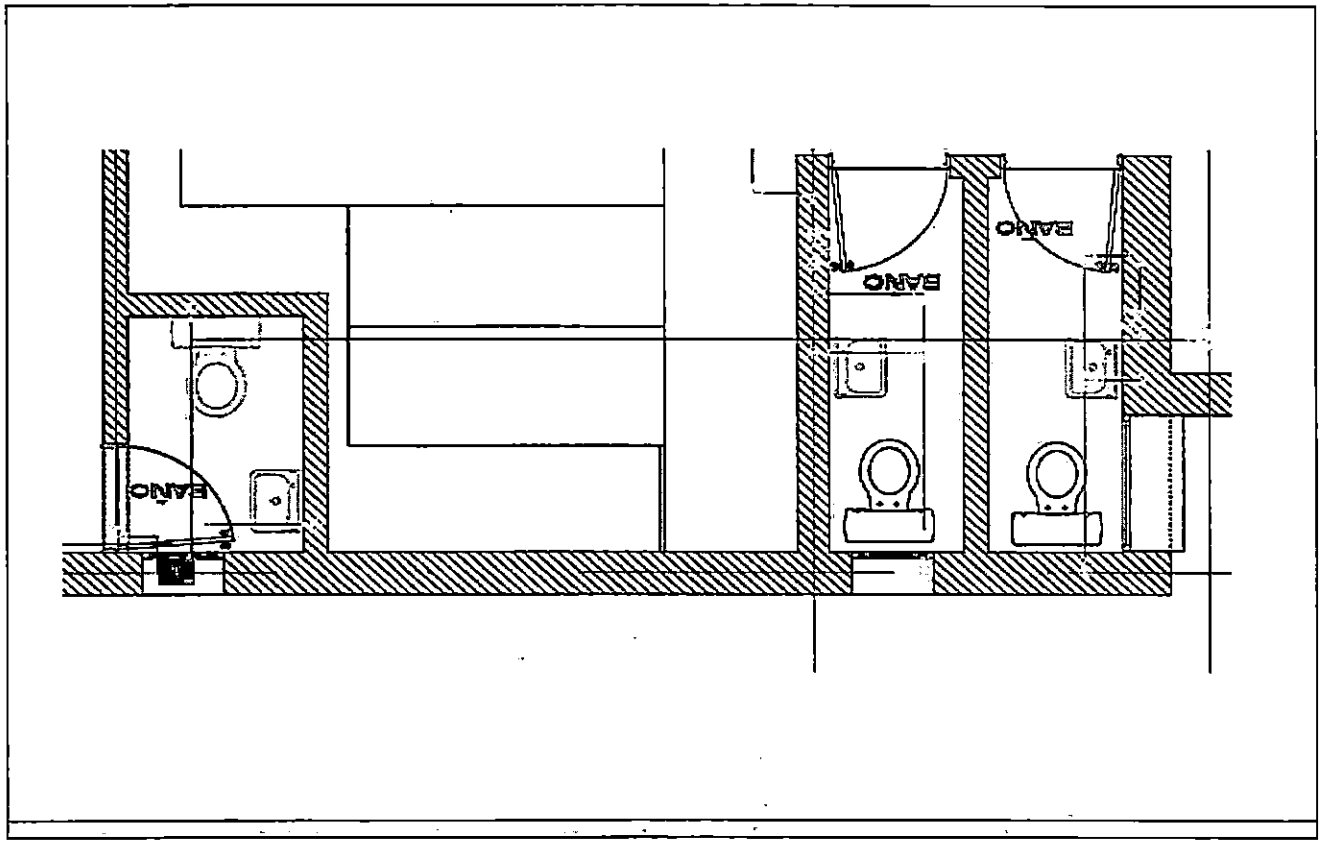

BAÑO
BAÑO
BAÑO

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA General	MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA PROYECTO: OBRAS SEDES ALCALDÍA	PRISMA / UNIVERSAL SEC S.A.S. CONSORCIO PRUNI SEDES 04 — CONTRATISTA	ARQUITECTURA URBANA LTDA. — INTERVENTORÍA

ACTA No.	8	PERIODO DEL ACTA	1/02/2020	A	29/02/2020		
OBJETO	REALIZAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE AJUSTE LAS DIFERENTES OBRAS E INTERVENCIONES ESPECIALIZADAS PARA LAS DIFERENTES SEDES DE LA SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C.						
CONTRATO DE OBRA No	731-2019	CONTRATISTA	CONSORCIO PRUNI SEDES 04	ENTIDAD CONTRATANTE	SECRETARIA GENERAL-ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA		
CONTRATO INTERVENTORÍA	730 DE 2019	INTERVENTORÍA	ARQUITECTURA URBANA LTDA	FRENTE:	IMPRENTA DISTRITAL		

CAPITULO	1.2.0	RED DE SUMINISTRO	ITEM	1.2.0.16	Registro Paso Directo 1 1/4"	UNIDAD	UND

ITEM	LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	TOTAL	UNIDAD
	Entre los ejes A-C y 1-6						
1	Archivo				2,00	2,00	UND

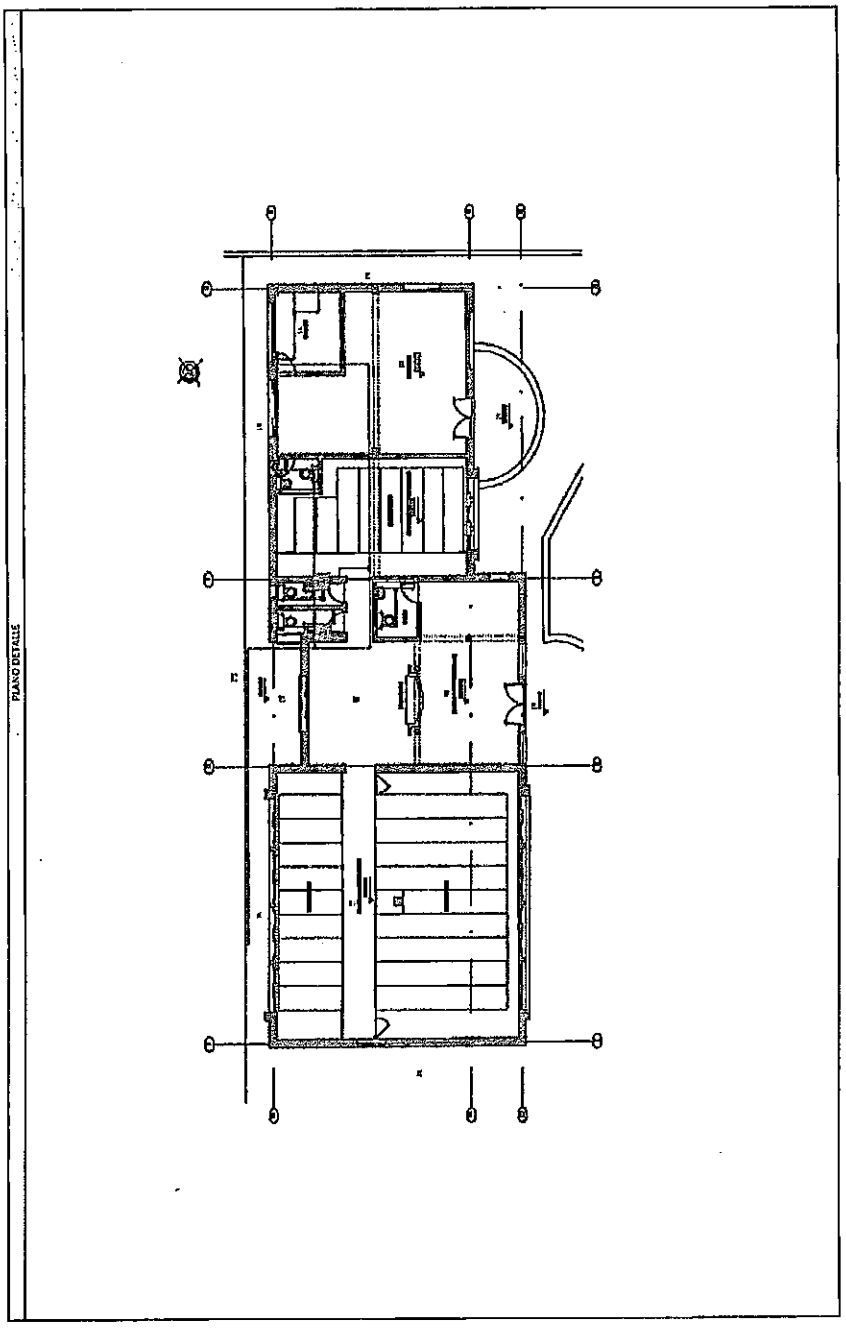

PLANO DETALLE

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Secretaría Integración Social	MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA PROYECTO: OBRAS SEDES ALCALDÍA	PRISMA UNIVERSAL SEC S.A.S. CONTRATISTA	ARQUITECTURA URBANA LTDA. INTERVENTORÍA

ACTA No.	8	PERIODO DEL ACTA	1/01/2020	A	29/02/2020	
OBJETO	REALIZAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE AJUSTE LAS DIFERENTES OBRAS E INTERVENCIONES ESPECIALIZADAS PARA LAS DIFERENTES SEDES DE LA SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C.					
CONTRATO DE OBRA No	731-2019	CONTRATISTA	CONSORCIO PRUNI SEDES 04	ENTIDAD CONTRATANTE	SECRETARIA GENERAL-ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA	
CONTRATO INTERVENTORÍA	730 DE 2019	INTERVENTORÍA	ARQUITECTURA URBANA LTDA	FRENTE:	IMPRENTA DISTRITAL	

CAPITULO	1.3.0	PUNTO HIDRAULICO AGUA FRIA	ITEM	1.3.0.1	PUNTO HIDRÁULICO A.F. LAVAPLATOS PVC 1/2"	UNIDAD	UND

ITEM	LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	TOTAL	UNIDAD
	Entre los ejes C-E y 4'-5'						
1	Cafeteria Segundo piso				2.00	2.00	UND

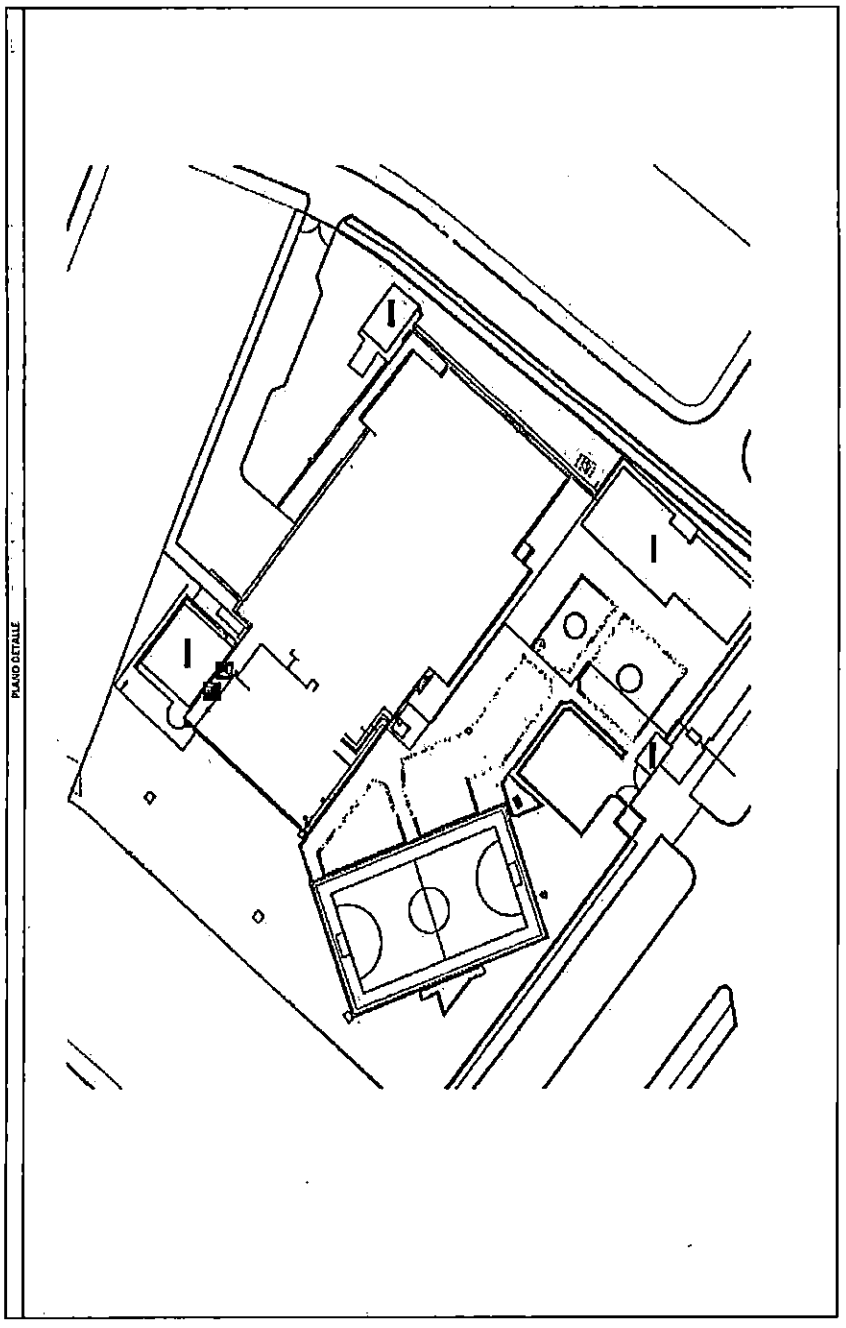
PLANO DETALLE


ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Secretaría Integración Social	MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA PROYECTO: OBRAS SEDES ALCALDÍA	PRISMA UNIVERSAL SEC S.A.S. CONTRATISTA	ARQUITECTURA URBANA LTDA. INTERVENTORÍA

ACTA No.	6	PERIODO DEL ACTA	1/02/2020	A	29/02/2020	
OBJETO	REALIZAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE AJUSTE LAS DIFERENTES OBRAS E INTERVENCIONES ESPECIALIZADAS PARA LAS DIFERENTES SEDES DE LA SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C.					
CONTRATO DE OBRA No	731-2019	CONTRATISTA	CONSORCIO PRUNI SEDES 04	ENTIDAD CONTRATANTE	SECRETARIA GENERAL-ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA	
CONTRATO INTERVENTORÍA	730 DE 2019	INTERVENTORÍA	ARQUITECTURA URBANA LTDA	FRENTE:	IMPRENTA DISTRITAL	


CAPITULO	1.3.0	PUNTO HIDRAULICO AGUA FRIA	ITEM	1.3.0.2	PUNTO HIDRÁULICO A.F. LAVAMANOS PVC 1/2"	UNIDAD	UND

ITEM	LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	TOTAL	UNIDAD
	Entre los ejes D-J y 1'-5'						
1	Baños primer Piso				6,00	6,00	UND
2	Baños segundo Piso				2,00	2,00	UND
	Entre los ejes A-B y 2-3						
1	Archivo				3,00	3,00	UND
OBSERVACIONES:				SUBTOTAL		11,00	UND
				TOTAL		11,00	UND

LOCALIZACIÓN PLANIMÉTRICA




REGISTRO FOTOGRÁFICO




Alejandra Bolaños.

ARQ. ALEJANDRA BOLAÑOS
RESIDENTE CONTRATISTA

ARQ. NANCY AVALA
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

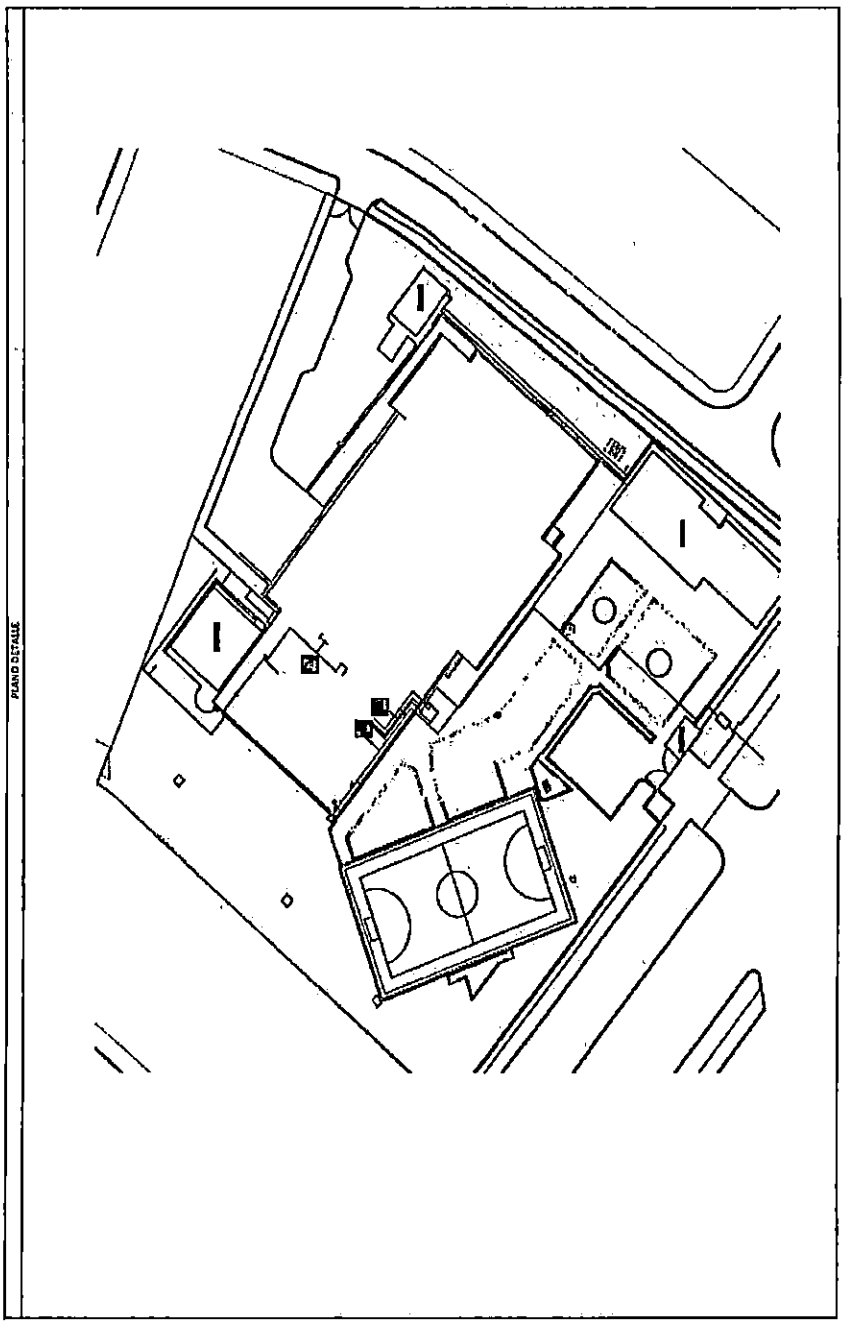
PLAN D'ETAGE

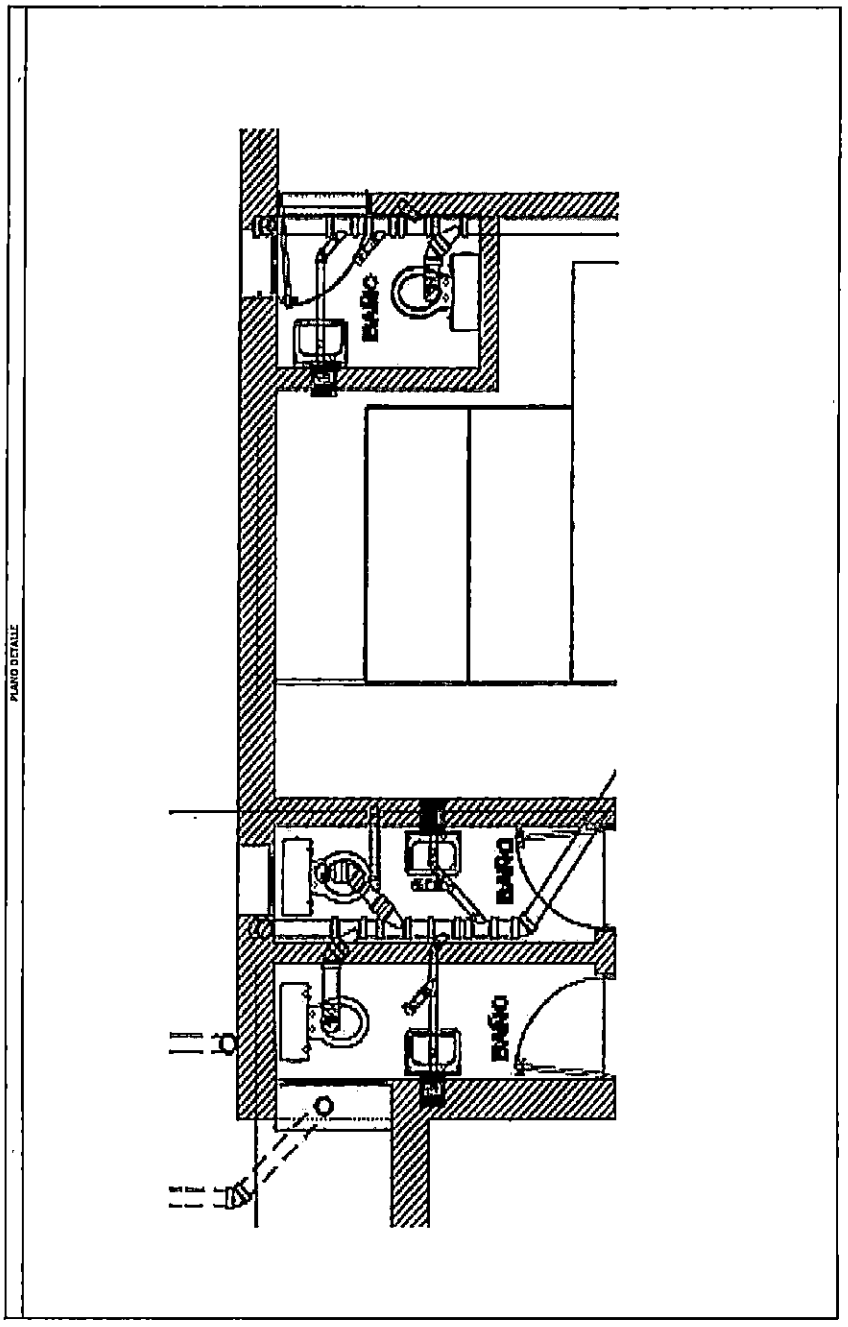
PLANO DETALLE
BAÑO
BAÑO
BAÑO


ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA Integración Social	MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA	PRISMA UNIVERSAL SEC S.A.S. CONSORCIO PRUNI SEDES 04	ARQUITECTURA URBANA LTDA.
	PROYECTO: OBRAS SEDES ALCALDÍA	CONTRATISTA	INTERVENTORÍA

ACTA No.	8	PERIODO DEL ACTA	1/02/2020	A	29/02/2020		
OBJETO	REALIZAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE AJUSTE LAS DIFERENTES OBRAS E INTERVENCIONES ESPECIALIZADAS PARA LAS DIFERENTES SEDES DE LA SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C.						
CONTRATO DE OBRA No	731-2019	CONTRATISTA	CONSORCIO PRUNI SEDES 04	ENTIDAD CONTRATANTE	SECRETARIA GENERAL-ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA		
CONTRATO INTERVENTORÍA	780 DE 2019	INTERVENTORÍA	ARQUITECTURA URBANA LTDA	FRENTE:	IMPRENTA DISTRITAL		

CAPITULO		1.3.0	PUNTO HIDRAULICO AGUA FRIA		ITEM	1.3.0.3	PUNTO HIDRÁULICO A.F. DUCHA PVC 1/2"	UNIDAD	UND

ITEM	LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	TOTAL	UNIDAD
	Entre los ejes A-J y 1'-5'						
1	Baño subdirección				4,00	4,00	UND
2	Baños primer piso				1,00	1,00	UND
OBSERVACIONES:				SUBTOTAL		5,00	UND
				TOTAL		5,00	UND

LOCALIZACIÓN PLANIMÉTRICA




REGISTRO FOTOGRÁFICO



Alejandra Bolaños

ARQ. ALEJANDRA BOLAÑOS
RESIDENTE CONTRATISTA

ARQ. NANCY AYALA
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

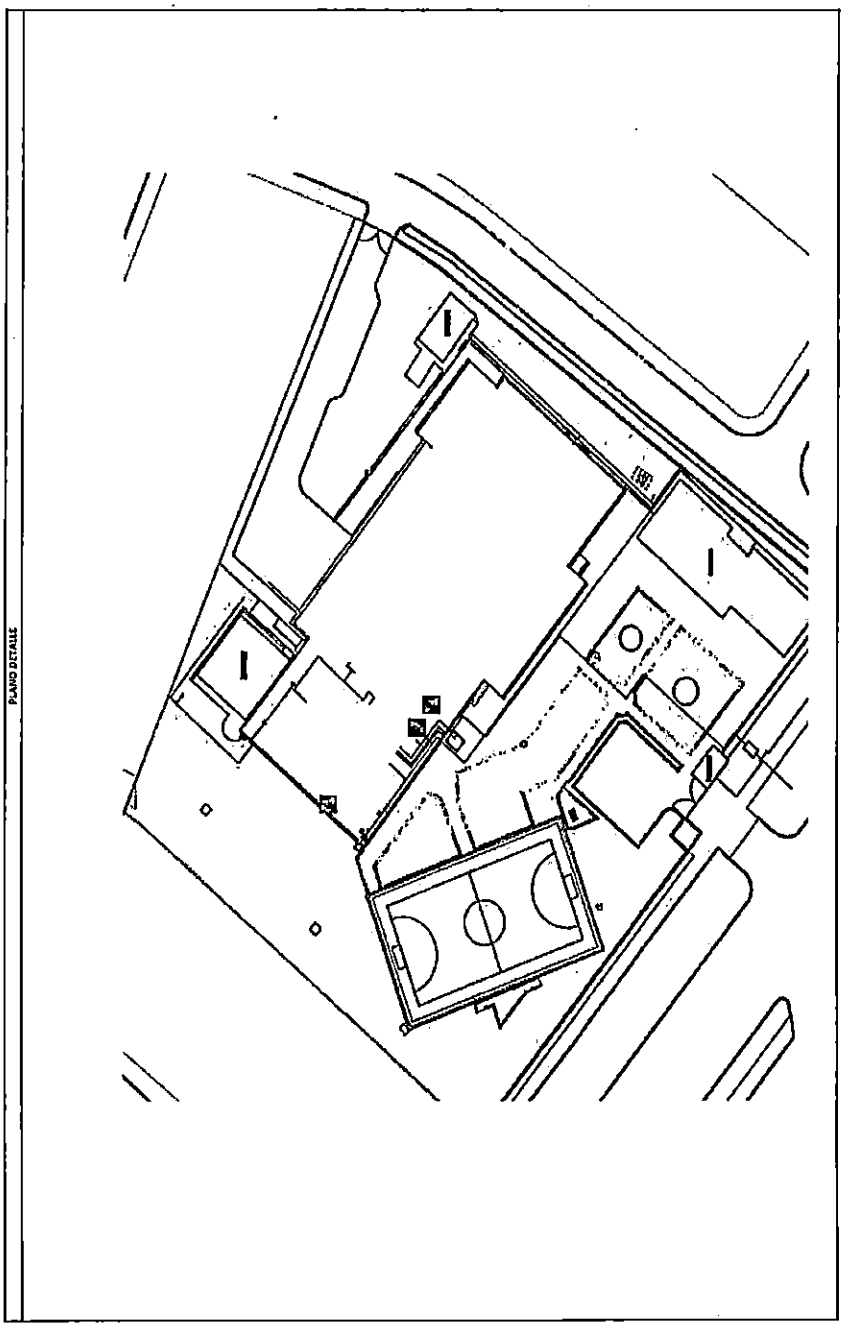
PLAN D'ETAGE

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Secretaría Integración Social	MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA PROYECTO: OBRAS SEDES ALCALDÍA	PRISMA UNIVERSAL SEC S.A.S. CONTRATISTA	ARQUITECTURA URBANA LTDA. INTERVENTORÍA


ACTA No.	8	PERIODO DEL ACTA	1/02/2020	A	29/02/2020	
OBJETO	REALIZAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE AJUSTE LAS DIFERENTES OBRAS E INTERVENCIONES ESPECIALIZADAS PARA LAS DIFERENTES SEDES DE LA SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C.					
CONTRATO DE OBRA No	731-2019	CONTRATISTA	CONSORCIO PRUNI SEDES 04	ENTIDAD CONTRATANTE	SECRETARIA GENERAL-ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA	
CONTRATO INTERVENTORÍA	730 DE 2019	INTERVENTORÍA	ARQUITECTURA URBANA LTDA	FRENTE:	IMPRENTA DISTRITAL	

CAPITULO	1.3.0	PUNTO HIDRAULICO AGUA FRIA	ITEM	1.3.0.4	PUNTO HIDRÁULICO A.F. LLAVE MANGUERA 1/2"	UNIDAD	UND

ITEM	LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	TOTAL	UNIDAD
	Entre los ejes A-U y 1-15						
1	Piso 1				8,00	8,00	UND
	SUBTOTAL					8,00	UND
	TOTAL					8,00	UND

OBSERVACIONES:

LOCALIZACIÓN PLANIMÉTRICA

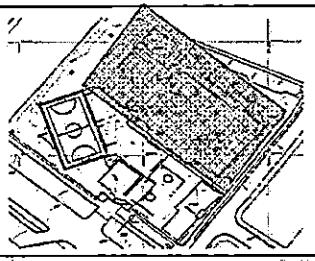


REGISTRO FOTOGRÁFICO



Alejandra Bolaños

ARQ. ALEJANDRA BOLAÑOS
RESIDENTE CONTRATISTA

ARQ. NANCY AYALA
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

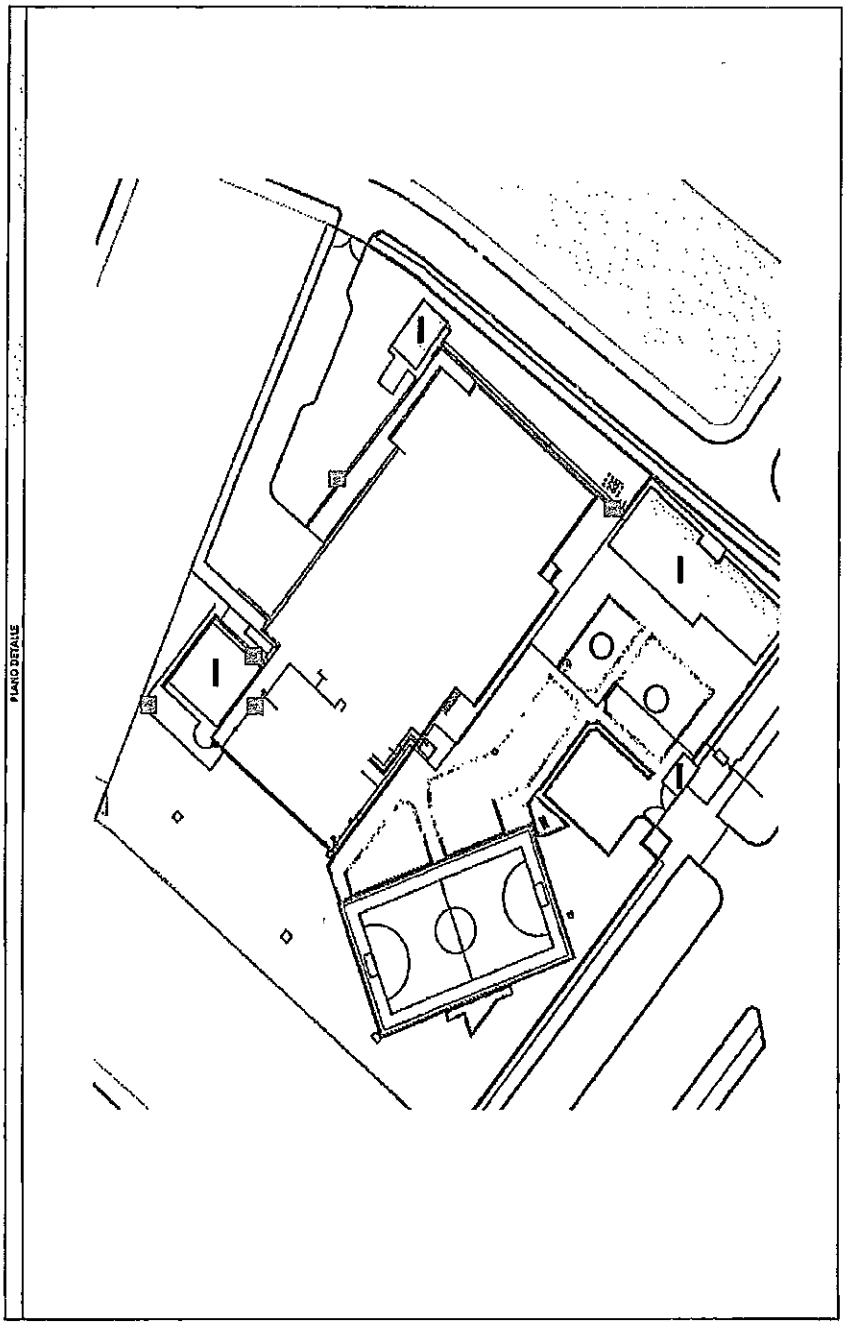
PLANO DETALLE


ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Seguridad Integración Social	MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA PROYECTO: OBRAS SEDES ALCALDÍA	PRISMA / UNIVERSAL SEC S.A.S. CONSORCIO PRUNI SEDES 04 — CONTRATISTA	ARQUITECTURA URBANA LTDA — INTERVENTORÍA

ACTA No.	6	PERIODO DEL ACTA	1/02/2020	A	29/02/2020		
OBJETO	REALIZAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE AJUSTE LAS DIFERENTES OBRAS E INTERVENCIONES ESPECIALIZADAS PARA LAS DIFERENTES SEDES DE LA SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C.						
CONTRATO DE OBRA No	731-2019	CONTRATISTA	CONSORCIO PRUNI SEDES 04		ENTIDAD CONTRATANTE	SECRETARIA GENERAL-ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA	
CONTRATO INTERVENTORÍA	730 DE 2019	INTERVENTORÍA	ARQUITECTURA URBANA LTDA		FRENTE:	IMPRENTA DISTRITAL	


CAPITULO	1.3.0	PUNTO HIDRAULICO AGUA FRIA	ITEM	1.3.0.5	PUNTO HIDRÁULICO A.F. ORINAL 3/4"	UNIDAD	UND

ITEM	LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES LARGO	DIMENSIONES ANCHO	DIMENSIONES ALTO	CANTIDAD	TOTAL	UNIDAD
	Entre los ejes A-F y 1'-5"						
1	Baños hombres				4,00	4,00	UND
OBSERVACIONES				SUBTOTAL		4,00	UND
				TOTAL		4,00	UND

LOCALIZACIÓN PLANIMÉTRICA

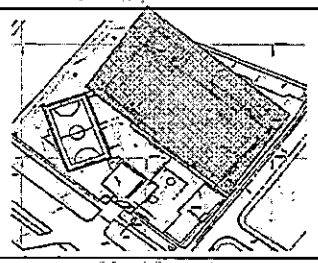

REGISTRO FOTOGRÁFICO




Alejandra Bolaños

ARQ. ALEJANDRA BOLAÑOS
RESIDENTE CONTRATISTA

ARQ. NANCY AYALA
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

PLANO DETALLE

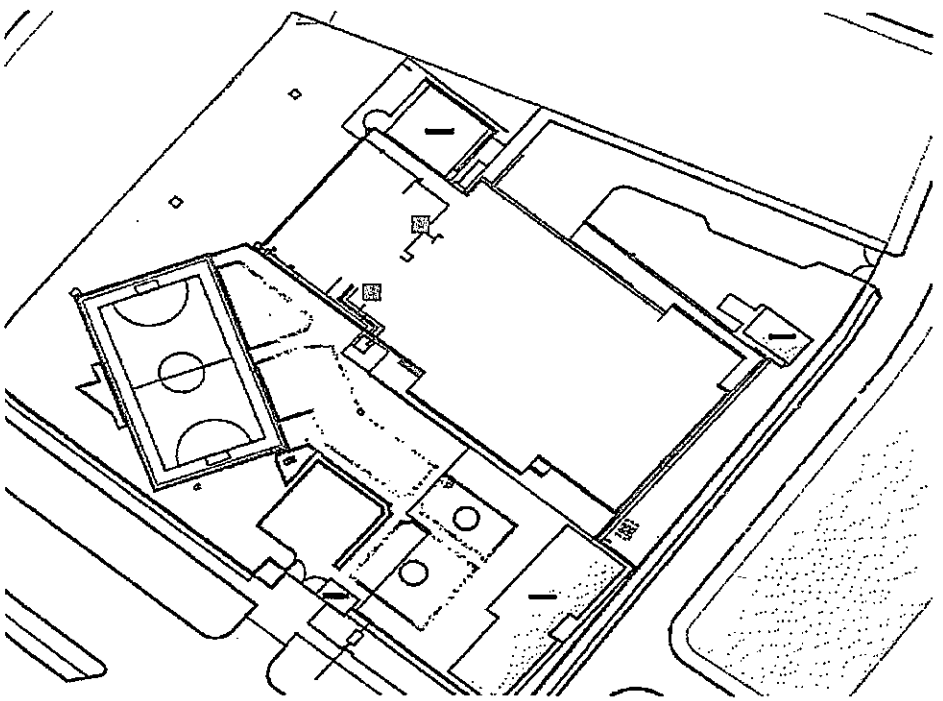

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Secretaría Integración Social

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

PROYECTO: OBRAS SEDES ALCALDÍA

PRISMA — UNIVERSAL SEC S.A. — CONSORCIO PRUNI SEDES 04 — CONTRATISTA

ARQUITECTURA URBANA LTDA. — INTERVENTORÍA


ACTA No.	8	PERIODO DEL ACTA	1/02/2020	A	29/02/2020	
OBJETO	REALIZAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE AJUSTE LAS DIFERENTES OBRAS E INTERVENCIONES ESPECIALIZADAS PARA LAS DIFERENTES SEDES DE LA SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C.					
CONTRATO DE OBRA No	731-2019	CONTRATISTA	CONSORCIO PRUNI SEDES 04	ENTIDAD CONTRATANTE	SECRETARIA GENERAL-ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA	
CONTRATO INTERVENTORÍA	730 DE 2019	INTERVENTORÍA	ARQUITECTURA URBANA LTDA	FRENTE:	IMPRENTA DISTRITAL	

CAPITULO	1.3.0	PUNTO HIDRAULICO AGUA FRIA	ITEM	1.3.0.5	PUNTO HIDRÁULICO A.P. SANITARIO FLUXÓMETRO 1 1/4"	UNIDAD	UND


ITEM	LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	TOTAL	UNIDAD
	Entre los ejes A-F y 1'-5'						
1	Baños Piso 1				8,00	8,00	UND
2	Baños Piso 2				2,00	2,00	UND
	Entre los ejes A-B y 2-3						
1	Archivo				2,00	2,00	UND
	SUBTOTAL					12,00	UND
	TOTAL					12,00	UND

OBSERVACIONES:

LOCALIZACIÓN PLANIMÉTRICA

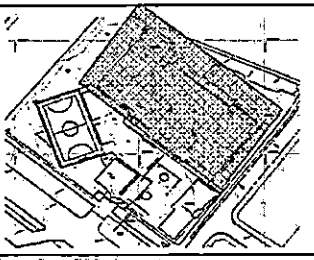

REGISTRO FOTOGRÁFICO





Alejandra Bolaños

ARQ. ALEJANDRA BOLAÑOS
RESIDENTE CONTRATISTA

ARQ. NANCY AYALA
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

PLANO DETALLE

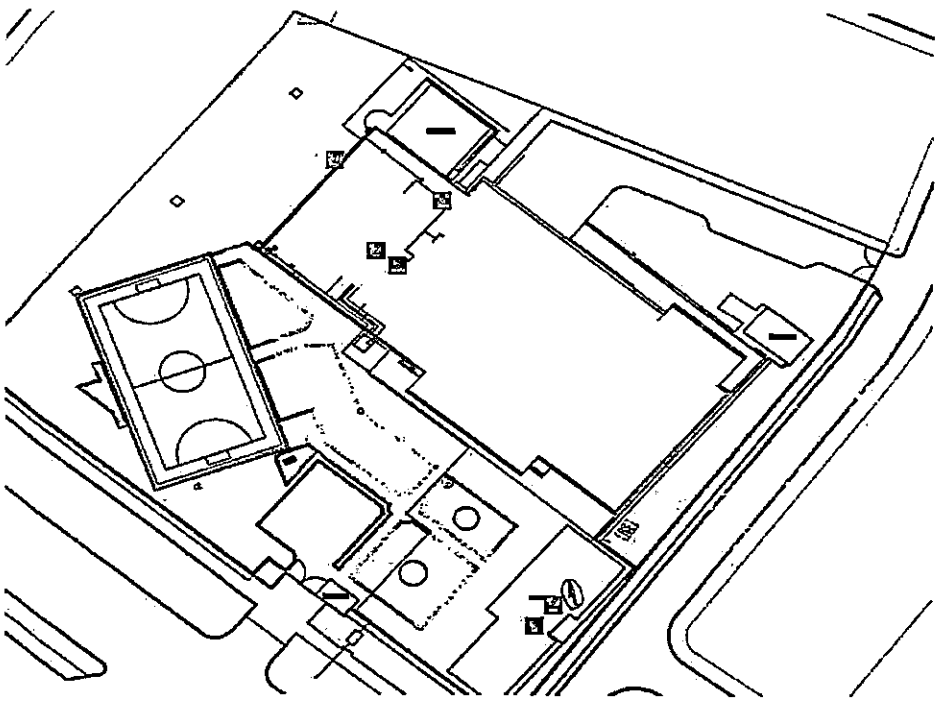

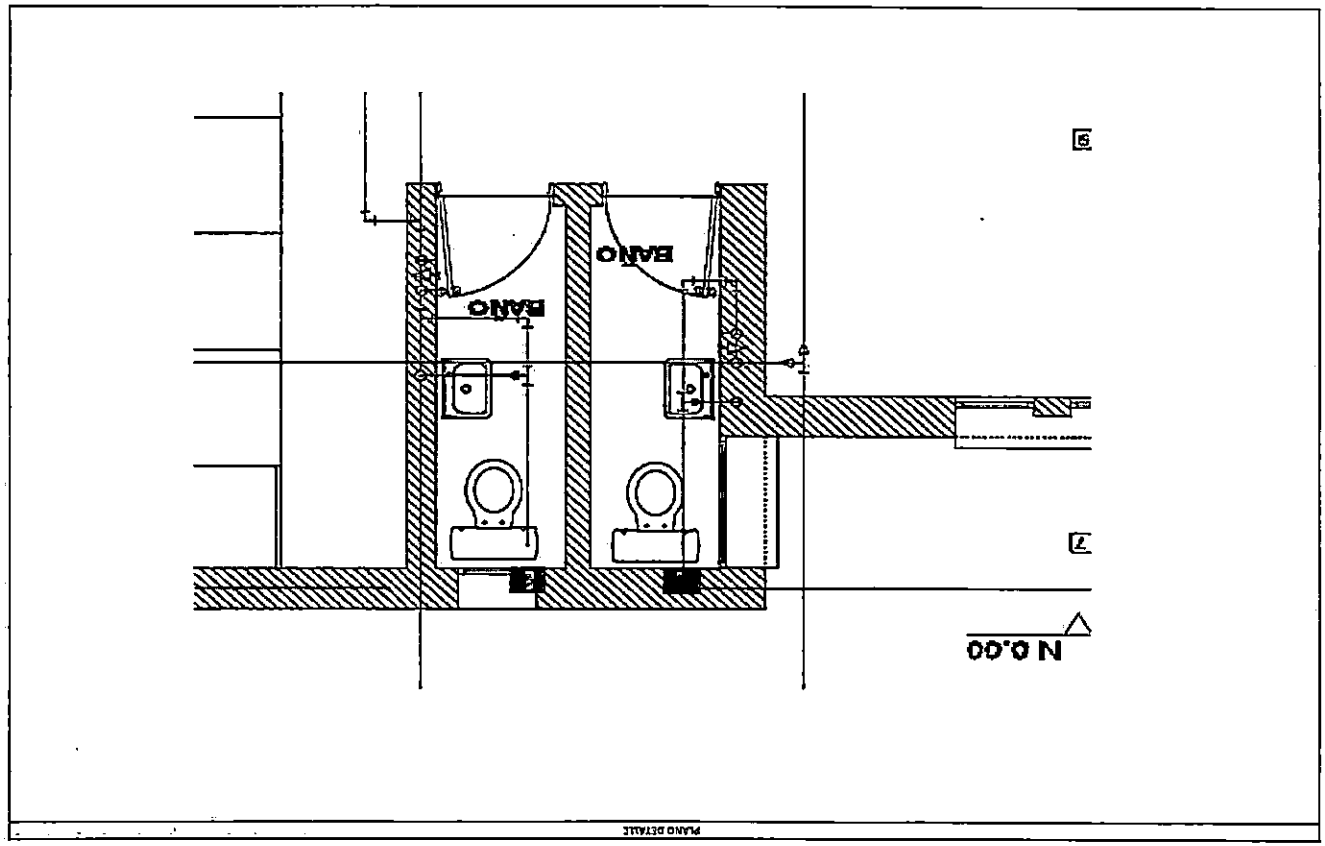
BAÑO
BAÑO
N 0.00
PLANO DETALLE


ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Bogotá Integración Social	MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA PROYECTO: OBRAS SEDES ALCALDÍA	PRISMA UNIVERSAL SEC S.A.S. CONSORCIO PRUNI SEDES 04 CONTRATISTA	ARQUITECTURA URBANA LTDA. INTERVENTORÍA

ACTA No.	8	PERIODO DEL ACTA	1/02/2020	A	29/02/2020		
OBJETO	REALIZAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE AJUSTE LAS DIFERENTES OBRAS E INTERVENCIONES ESPECIALIZADAS PARA LAS DIFERENTES SEDES DE LA SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C.						
CONTRATO DE OBRA No	731-2019	CONTRATISTA	CONSORCIO PRUNI SEDES 04		ENTIDAD CONTRATANTE	SECRETARIA GENERAL-ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA	
CONTRATO INTERVENTORÍA	730 DE 2019	INTERVENTORÍA	ARQUITECTURA URBANA LTDA		FRENTE:	IMPRENTA DISTRITAL	


CAPITULO	1.3.0	CUARTO BOMBAS	ITEM	1.4.0.2	Brida Roscada 2"		UNIDAD	UND

ITEM	LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	TOTAL	UNIDAD
	Entre los ejes D-I y 1						
1	Piso 1				4.00	4.00	UN

LOCALIZACIÓN PLANIMÉTRICA



REGISTRO FOTOGRÁFICO




OBSERVACIONES:	SUBTOTAL	4.00	UND
	TOTAL	4.00	UND

Alejandra Bolaños

ARQ. ALEJANDRA BOLAÑOS
RESIDENTE CONTRATISTA

ARQ. NANCY AYALA
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

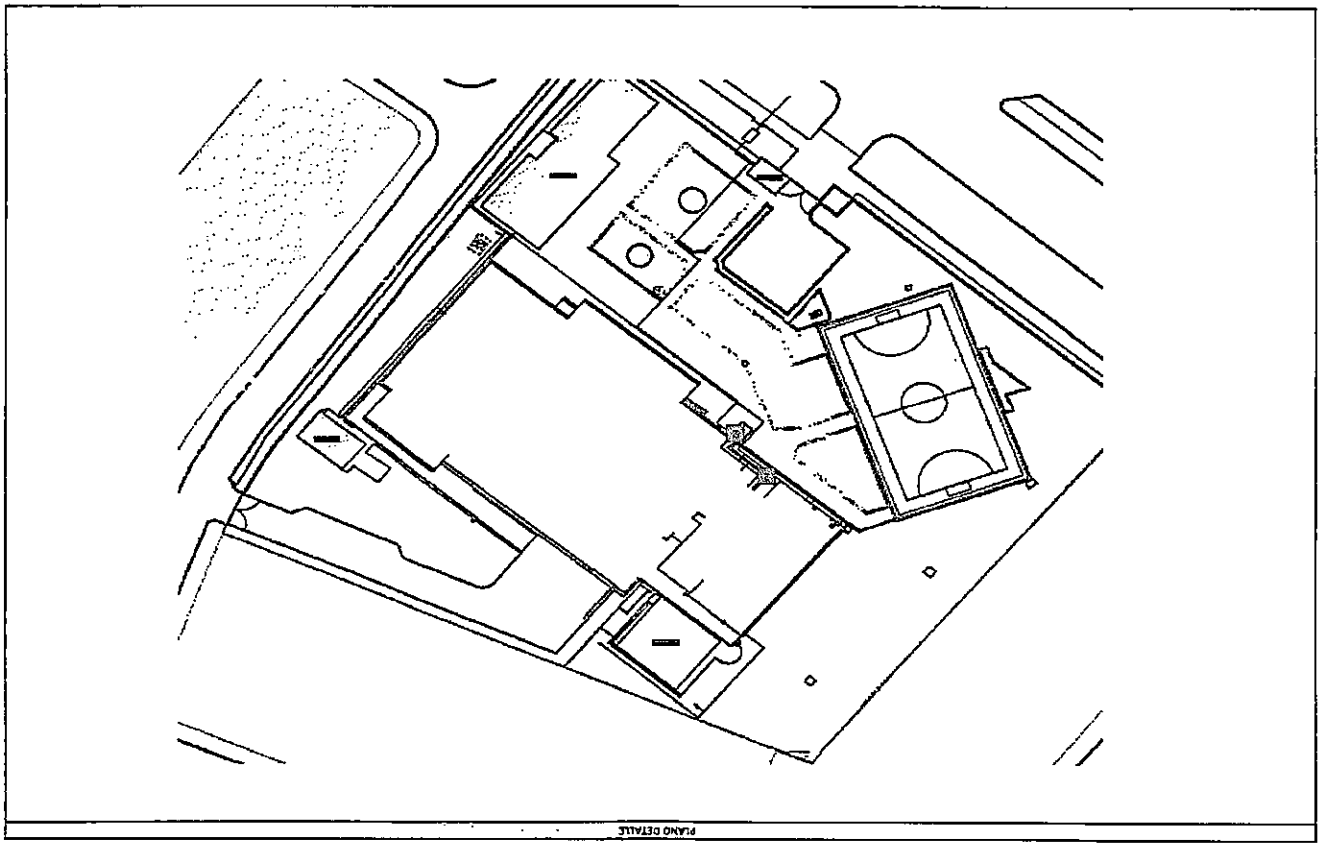
PLANO DETAILE


ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Secretaría Integración Social	MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA **PROYECTO: OBRAS SEDES ALCALDÍA**	PRISMA UNIVERSAL SEC S.A.S. CONSORCIO PRUNI SEDES 04 — CONTRATISTA	ARQUITECTURA URBANA LTDA. — INTERVENTORÍA

ACTA No.	8	PERIODO DEL ACTA	1/02/2020	A	29/02/2020		
OBJETO	REALIZAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE AJUSTE LAS DIFERENTES OBRAS E INTERVENCIONES ESPECIALIZADAS PARA LAS DIFERENTES SEDES DE LA SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C.						
CONTRATO DE OBRA No	731-2019	CONTRATISTA	CONSORCIO PRUNI SEDES 04		ENTIDAD CONTRATANTE	SECRETARIA GENERAL-ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA	
CONTRATO INTERVENTORÍA	730 DE 2019	INTERVENTORÍA	ARQUITECTURA URBANA LTDA		FRENTE:	IMPRENTA DISTRITAL	

CAPITULO	1.3.0	CUARTO BOMBAS	ITEM	1.4.0.7	Accesorios Polipropileno PN16 2"	UNIDAD	UND

ITEM	LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	TOTAL	UNIDAD
	Entre los ejes D-I y 1						
1	Piso 1				8,00	8,00	UND
OBSERVACIONES:				SUBTOTAL		8,00	UND
				TOTAL		8,00	UND

LOCALIZACION PLANIMETRICA




REGISTRO FOTOGRÁFICO



Alejandra Bolaños

ARQ. ALEJANDRA BOLAÑOS
RESIDENTE CONTRATISTA

ARQ. NANCY AYALA
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

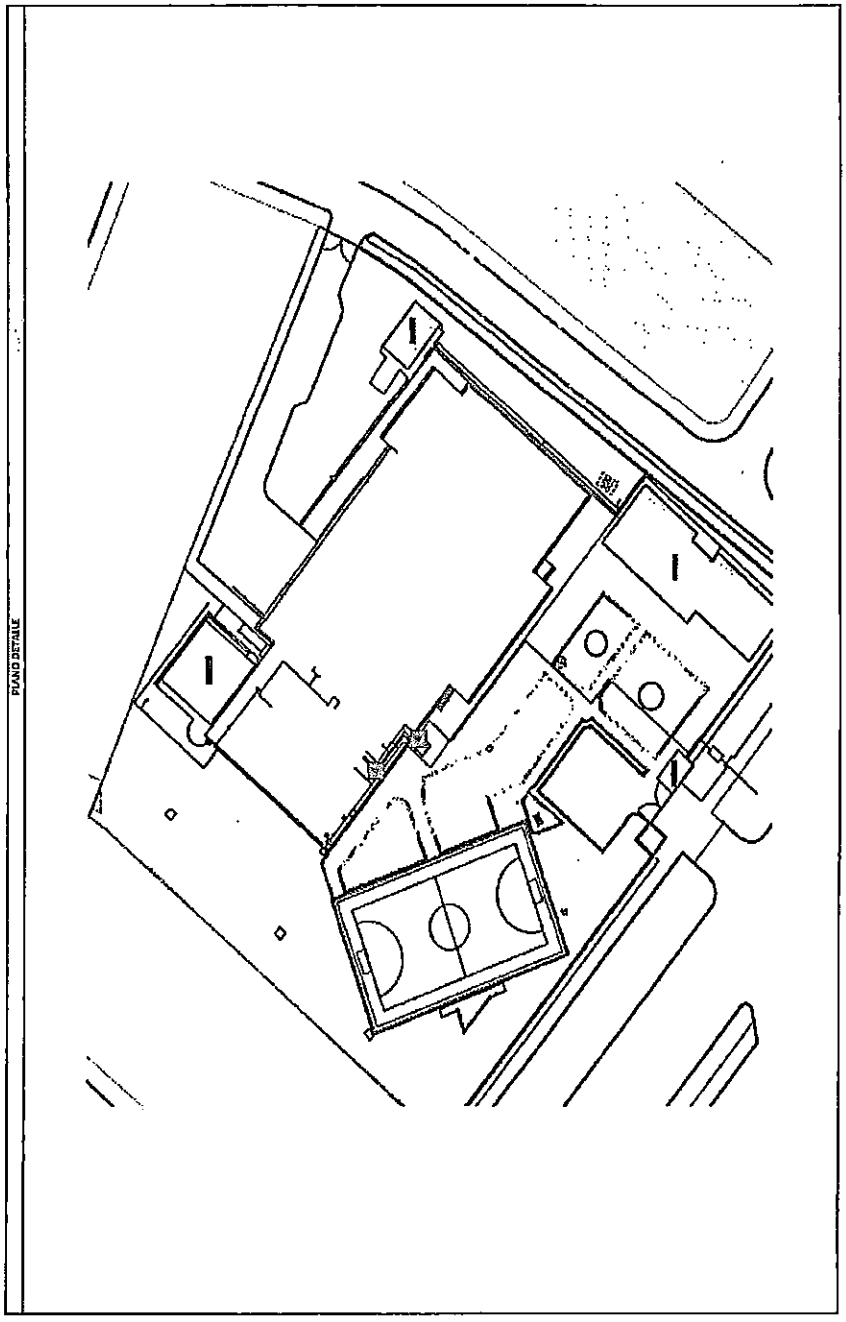
PLAN DETAILE

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Secretaría Integración Social	MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA	PRISMA / UNIVERSAL SEC S.A.S. CONSORCIO PRISMA SEC 2019	ARQUITECTURA URBANA LTDA.
	PROYECTO: OBRAS SEDES ALCALDÍA	CONTRATISTA	INTERVENTORÍA


ACTA No.	8	PERIODO DEL ACTA	1/02/2020	A	29/02/2020	
OBJETO	REALIZAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE AJUSTE LAS DIFERENTES OBRAS E INTERVENCIONES ESPECIALIZADAS PARA LAS DIFERENTES SEDES DE LA SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C.					
CONTRATO DE OBRA No	731-2019	CONTRATISTA	CONSORCIO PRISMA SEDES 04	ENTIDAD CONTRATANTE	SECRETARIA GENERAL-ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA	
CONTRATO INTERVENTORÍA	730 DE 2019	INTERVENTORÍA	ARQUITECTURA URBANA LTDA	FRENTE:	IMPRENTA DISTRITAL	

CAPITULO	1.3.0	CUARTO BOMBAS	ITEM	1.6.0.9	Tubería Polipropileno PN 16 2"	UNIDAD	ML

ITEM	LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	TOTAL	UNIDAD
	Entre los ejes D-4 y 1						
1	Piso 1	12,00			1,00	12,00	ML
2	Piso 1	12,00			1,00	12,00	ML
				SUBTOTAL		24,00	ML
				TOTAL		24,00	ML

OBSERVACIONES:

LOCALIZACIÓN PLANIMÉTRICA




REGISTRO FOTOGRÁFICO



Alejandra Bolaños

ARQ. ALEJANDRA BOLAÑOS
RESIDENTE CONTRATISTA

ARQ. NANCY AYALA
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

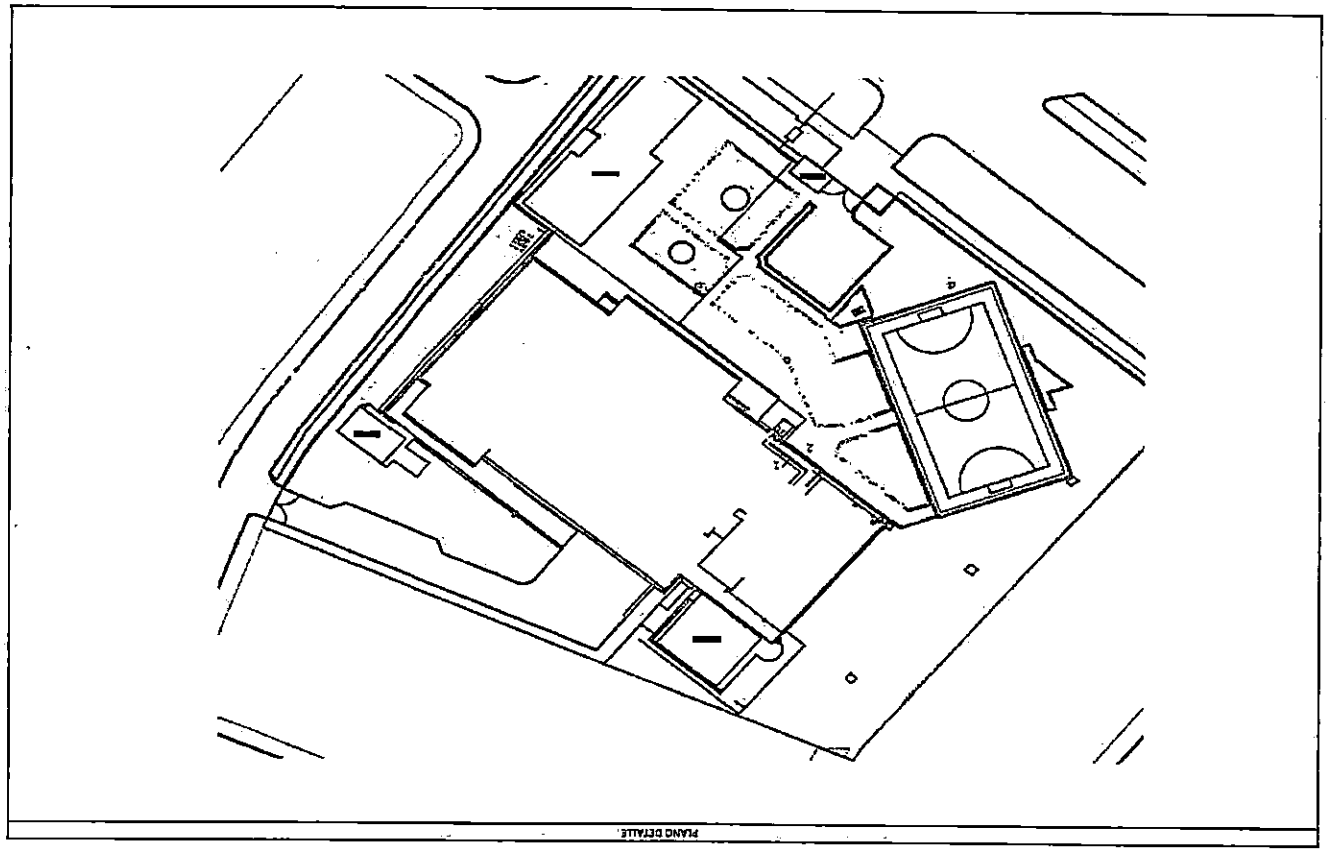
PLAND DETAILE


ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Secretaría Integración Social	MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA	PRISMA / UNIVERSAL SEC S.A. CONSORCIO PRUNI SEDES 04 — CONTRATISTA	ARQUITECTURA URBANA LTDA. — INTERVENTORÍA
	PROYECTO: OBRAS SEDES ALCALDÍA		

ACTA No.	3	PERIODO DEL ACTA	1/02/2020	A	25/02/2020		
OBJETO	REALIZAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE AJUSTE, LAS DIFERENTES OBRAS E INTERVENCIONES ESPECIALIZADAS PARA LAS DIFERENTES SEDES DE LA SECRETARÍA GENERAL DE LA ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.						
CONTRATO DE OBRA No	731-2019	CONTRATISTA	CONSORCIO PRUNI SEDES 04		ENTIDAD CONTRATANTE	SECRETARIA GENERAL-ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA	
CONTRATO INTERVENTORÍA	730 DE 2019	INTERVENTORÍA	ARQUITECTURA URBANA LTDA		FRENTE:	IMPRENTA DISTRITAL	


CAPITULO	1.5.0	RED DE AGUAS NEGRAS	ITEM	1.5.0.1	TUBERÍA PVC-S 2"	UNIDAD	ML

ITEM	LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	TOTAL	UNIDAD
	Entre los ejes E-F y 5'-3'						
1	Cuarto de velado	1.80			1.00	1.80	ML
2	Cuarto de velado	2.10			1.00	2.10	ML
3	Cuarto de velado	1.80			1.00	1.80	ML
4	Cuarto de velado	1.90			1.00	1.90	ML
5	Cuarto de velado	3.50			1.00	3.50	ML
6	Cuarto de velado	3.65			1.00	3.65	ML
7	Cuarto de velado	1.00			1.00	1.00	ML
	Entre los ejes A-B y 1'-3'						
1	Baño subdirección	1.20			1.00	1.20	ML
2	Baño subdirección	0.20			1.00	0.20	ML
	Entre los ejes A y 1-4						
1	Archivo	1.60			1.00	1.60	ML
2	Archivo	7.30			1.00	7.30	ML
	Entre los ejes A-B y 2-3						
1	Archivo	0.90			1.00	0.90	ML
2	Archivo	0.50			1.00	0.50	ML
3	Archivo	0.50			1.00	0.50	ML
4	Archivo	0.40			1.00	0.40	ML
5	Archivo	0.30			1.00	0.30	ML
6	Archivo	0.60			1.00	0.60	ML
7	Archivo	1.20			1.00	1.20	ML
8	Archivo	0.60			1.00	0.60	ML
9	Archivo	0.70			1.00	0.70	ML
10	Archivo	0.70			1.00	0.70	ML
11	Archivo	0.15			1.00	0.15	ML
12	Archivo	6.00			1.00	6.00	ML
OBSERVACIONES:				SUBTOTAL		38.60	ML
				TOTAL		38.60	ML

LOCALIZACIÓN PLANIMÉTRICA

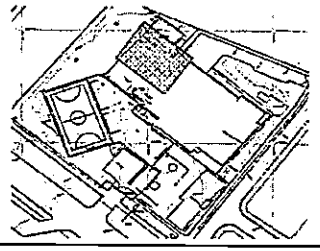


REGISTRO FOTOGRÁFICO




Alejandra Bolaños


ARQ. ALEJANDRA BOLAÑOS
RESIDENTE CONTRATISTA

ARQ. NANCY AYALA
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

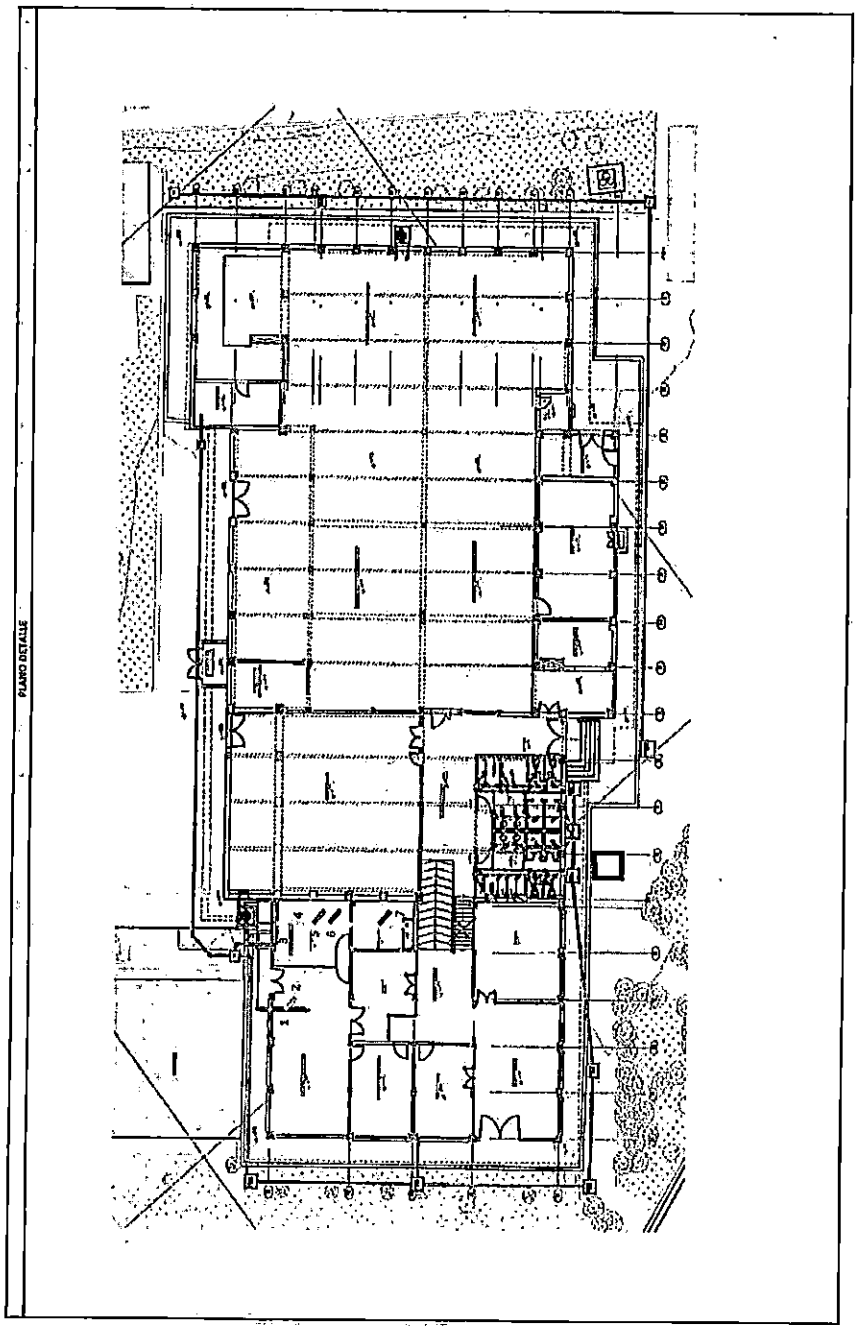

PLANO DETALLE

PLANO DETALLE

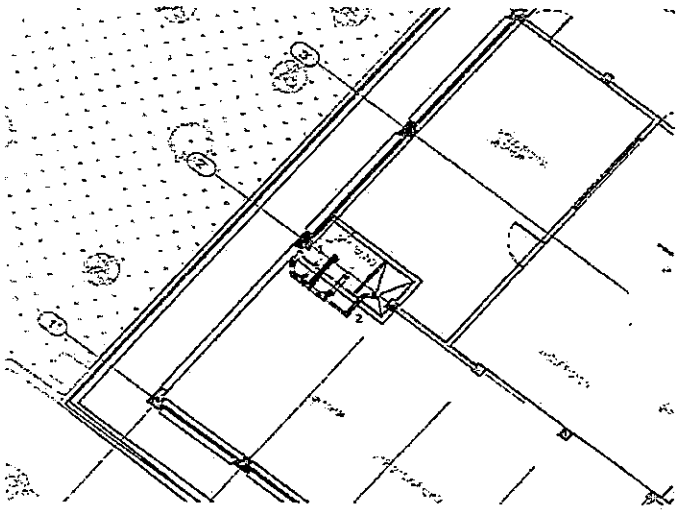

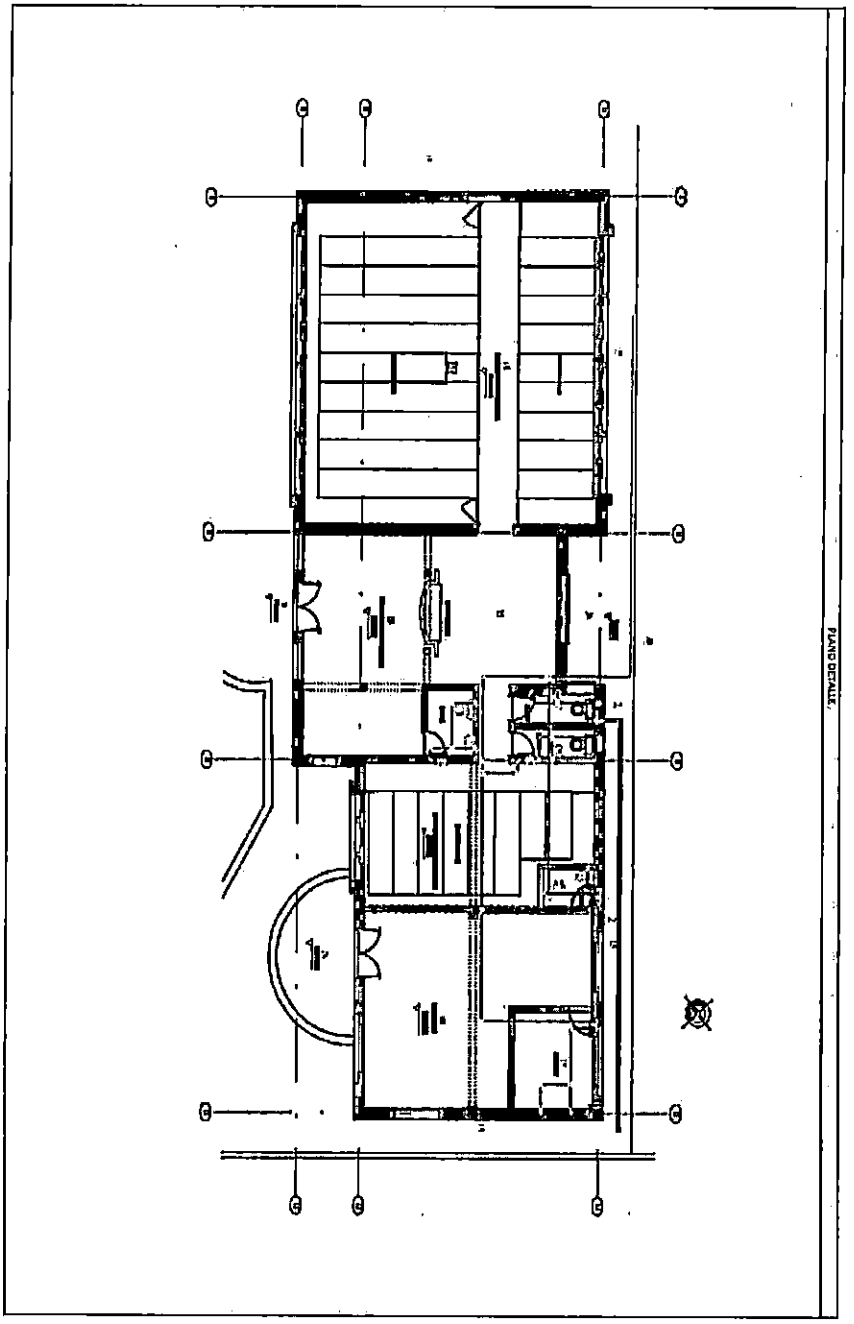

PLANO DETALLE

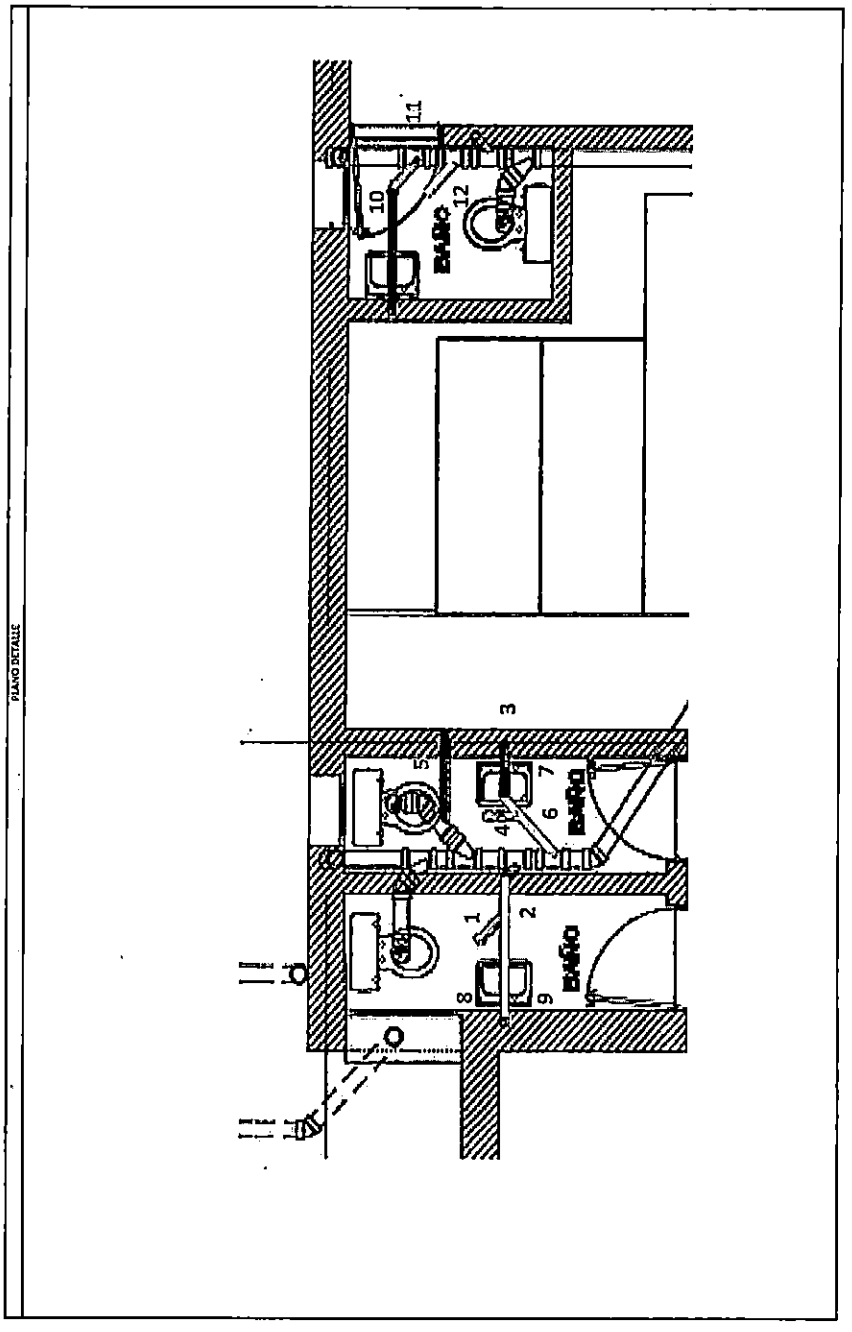
PLANO DETALLE
BAÑO
BAÑO
BAÑO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12


ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. GOBIERNO Integración Social	MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA PROYECTO: OBRAS SEDES ALCALDÍA	PRISMA UNIVERSAL SEC S.A.S. CONSORCIO PRUNI SEDES 04 CONTRATISTA	ARQUITECTURA URBANA LTDA. INTERVENTORIA

ACTA No.	8	PERIODO DEL ACTA	1/02/2020	A	29/02/2020		
OBJETO	REALIZAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE AJUSTE LAS DIFERENTES OBRAS E INTERVENCIONES ESPECIALIZADAS PARA LAS DIFERENTES SEDES DE LA SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C.						
CONTRATO DE OBRA No	731-2019	CONTRATISTA	CONSORCIO PRUNI SEDES 04		ENTIDAD CONTRATANTE	SECRETARIA GENERAL-ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA	
CONTRATO INTERVENTORÍA	730 DE 2019	INTERVENTORÍA	ARQUITECTURA URBANA LTDA		FRENTE:	IMPRENTA DISTRITAL	


CAPITULO	1.5.0	RED DE AGUAS NEGRAS	ITEM	1.5.0.3	TUBERÍA PVC-S 6"	UNIDAD	ML

ITEM	LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES LARGO	DIMENSIONES ANCHO	DIMENSIONES ALTO	CANTIDAD	TOTAL	UNIDAD
	Entre los ejes E-F y 5'-3'						
1	Cuarto de velado	10,00			1,00	10,00	ML
2	Cuarto de velado	1,30			1,00	1,30	ML
3	Cuarto de velado	6,00			1,00	6,00	ML
4	Cuarto de velado	2,10			1,00	2,10	ML
5	Cuarto de velado	2,20			1,00	2,20	ML
6	Cuarto de velado	1,30			1,00	1,30	ML
7	Cuarto de velado	1,60			1,00	1,60	ML
8	Cuarto de velado	2,70			1,00	2,70	ML
9	Cuarto de velado	2,00			1,00	2,00	ML
	Entre los ejes A-B y 1'-3'						
1	Baño subdireccion	2,30			1,00	2,30	ML
2	Baño subdireccion	2,55			1,00	2,55	ML
3	Baño subdireccion	1,20			1,00	1,20	ML
4	Baño subdireccion	0,90			1,00	0,90	ML
	Entre los ejes A y 1'-4'						
1	Archivo	10,00			1,00	10,00	ML
	Entre los ejes A-B y 2-3						
1	Archivo	1,80			1,00	1,80	ML
2	Archivo	1,20			1,00	1,20	ML
OBSERVACIONES:				SUBTOTAL		49,15	ML
				TOTAL		49,15	ML

LOCALIZACIÓN PLANIMÉTRICA




REGISTRO FOTOGRÁFICO





Alejandra Bolaños

ARQ. ALEJANDRA BOLAÑOS
RESIDENTE CONTRATISTA

ARQ. NANCY AYALA
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

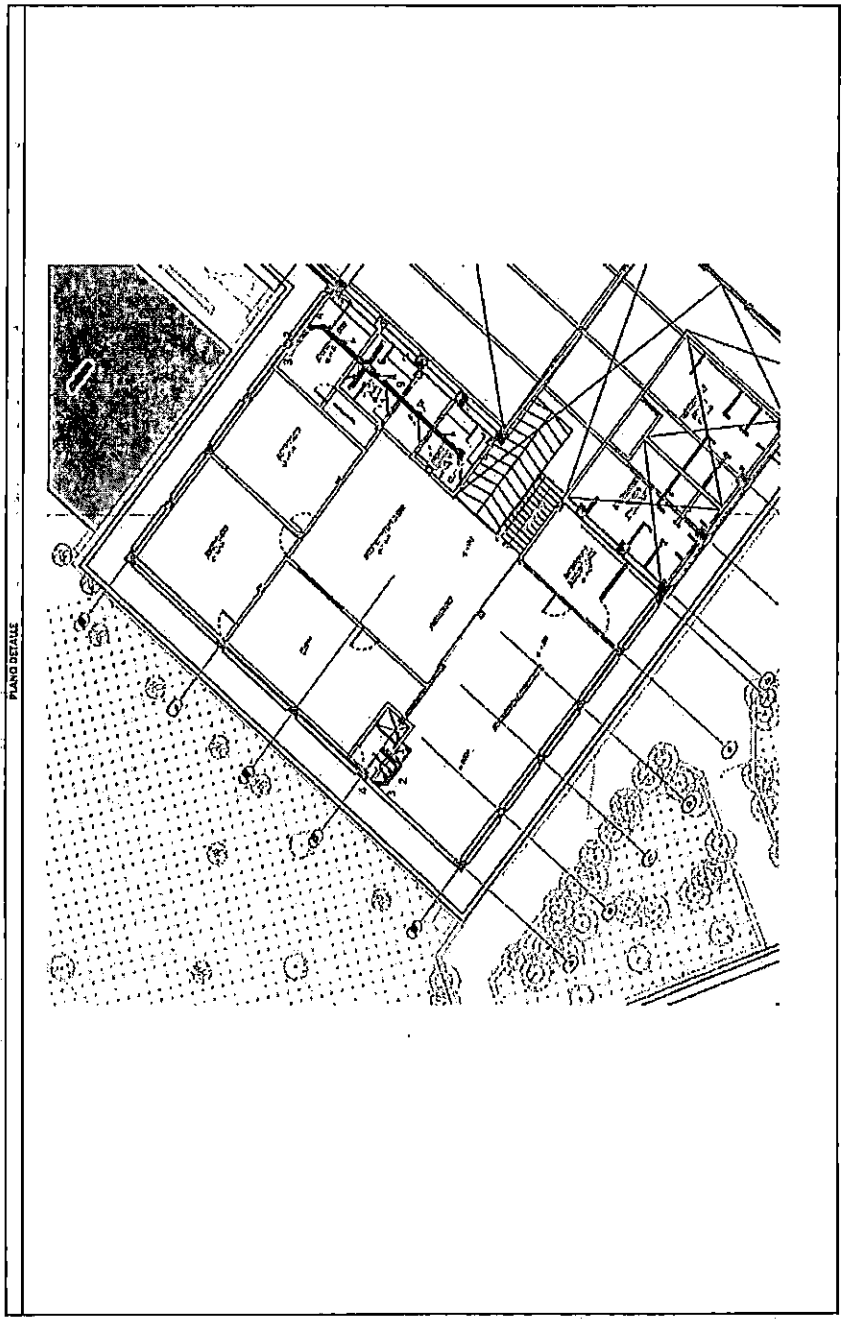
PLANO DETALLE

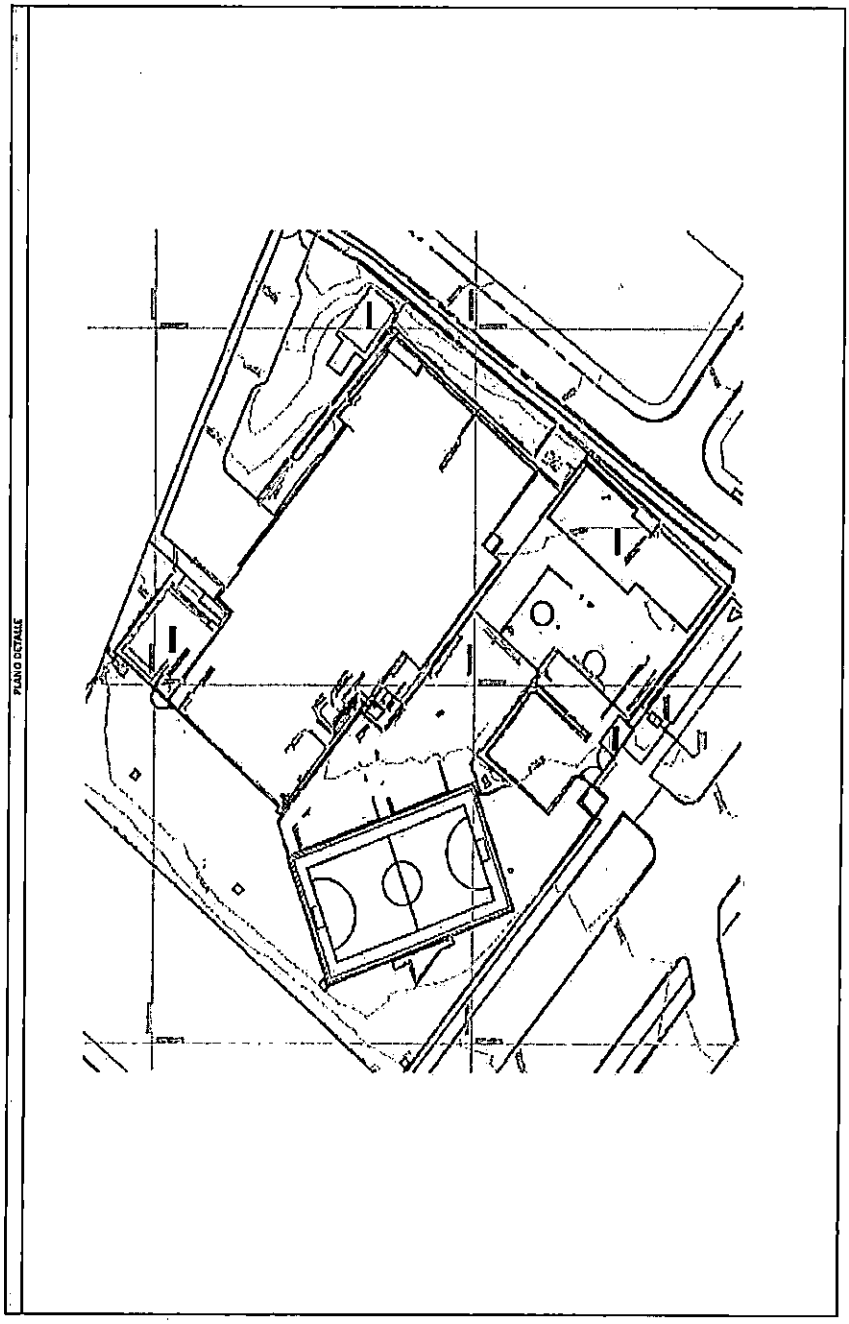
PLANO DETALLE

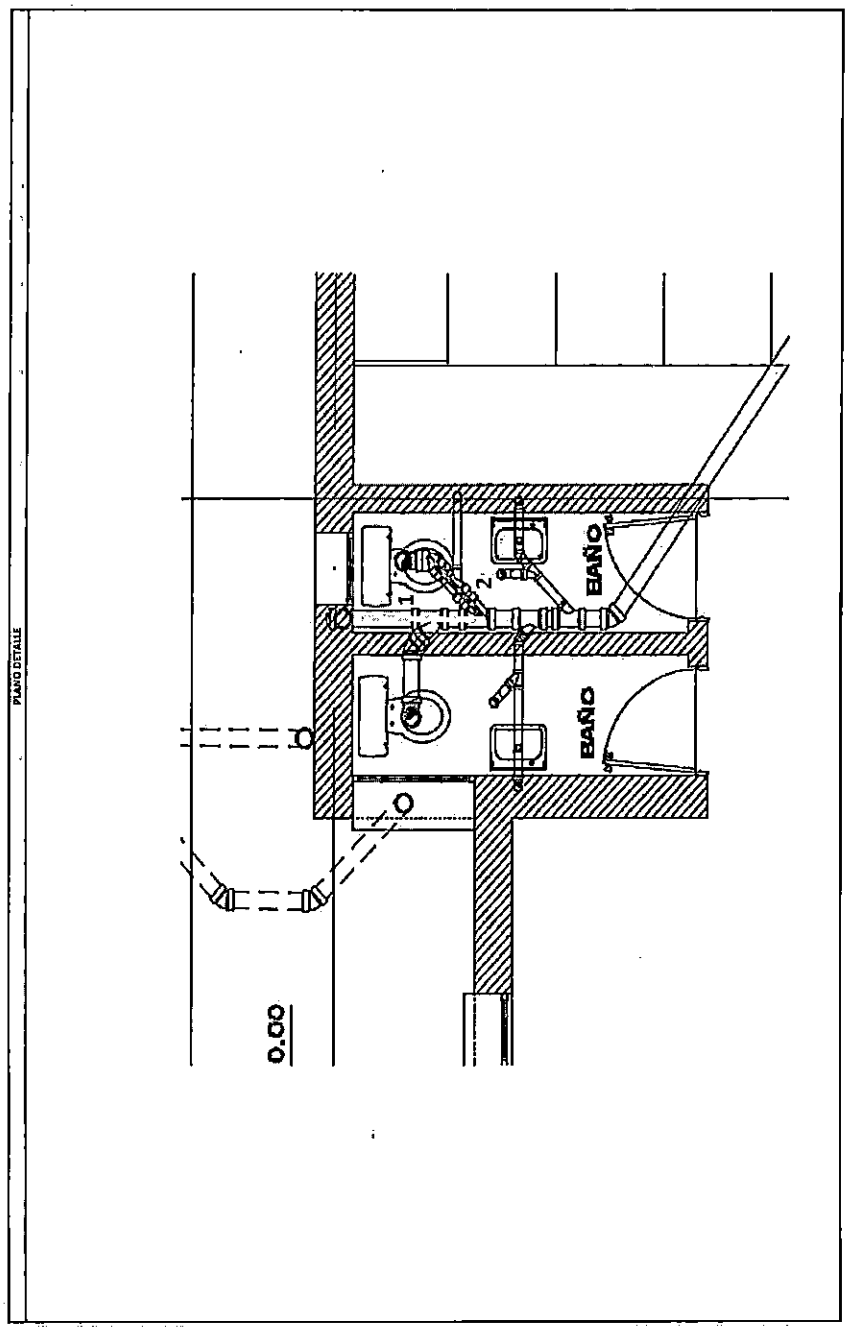
PLANO DETALLE
BAÑO
BAÑO
0.00

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA
Integración Social

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

PROYECTO: OBRAS SEDES ALCALDÍA


PRISMA — UNIVERSAL SEC S.A.S. — CONSORCIO PAUNI SEDES 04 — CONTRATISTA

ARQUITECTURA URBANA LTDA. — INTERVENTORÍA

ACTA No.	8		PERIODO DEL ACTA	1/02/2020	A	29/02/2020	
OBJETO	REALIZAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE AJUSTE LAS DIFERENTES OBRAS E INTERVENCIONES ESPECIALIZADAS PARA LAS DIFERENTES SEDES DE LA SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C.						
CONTRATO DE OBRA No	731-2019	CONTRATISTA	CONSORCIO PAUNI SEDES 04		ENTIDAD CONTRATANTE	SECRETARIA GENERAL-ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA	
CONTRATO INTERVENTORÍA	730 DE 2019	INTERVENTORÍA	ARQUITECTURA URBANA LTDA		FRENTE:	IMPRENTA DISTRITAL	

CAPITULO	1.5.0	RED DE AGUAS NEGRAS	ITEM	1.5.0.4	TUBERÍA PVC-U 2"	UNIDAD	ML

ITEM	LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	TOTAL	UNIDAD
	Entre los ejes E-F y 5'-3'						
1	Cuarto de veiado	1,80			1,00	1,80	ML
2	Cuarto de veiado	1,00			1,00	1,00	ML
3	Cuarto de veiado	2,70			1,00	2,70	ML
4	Cuarto de veiado	1,20			1,00	1,20	ML
5	Cuarto de veiado	3,80			1,00	3,80	ML
	Entre los ejes A-B y 1'-3'						
1	Baño subdireccion	2,60			1,00	2,60	ML

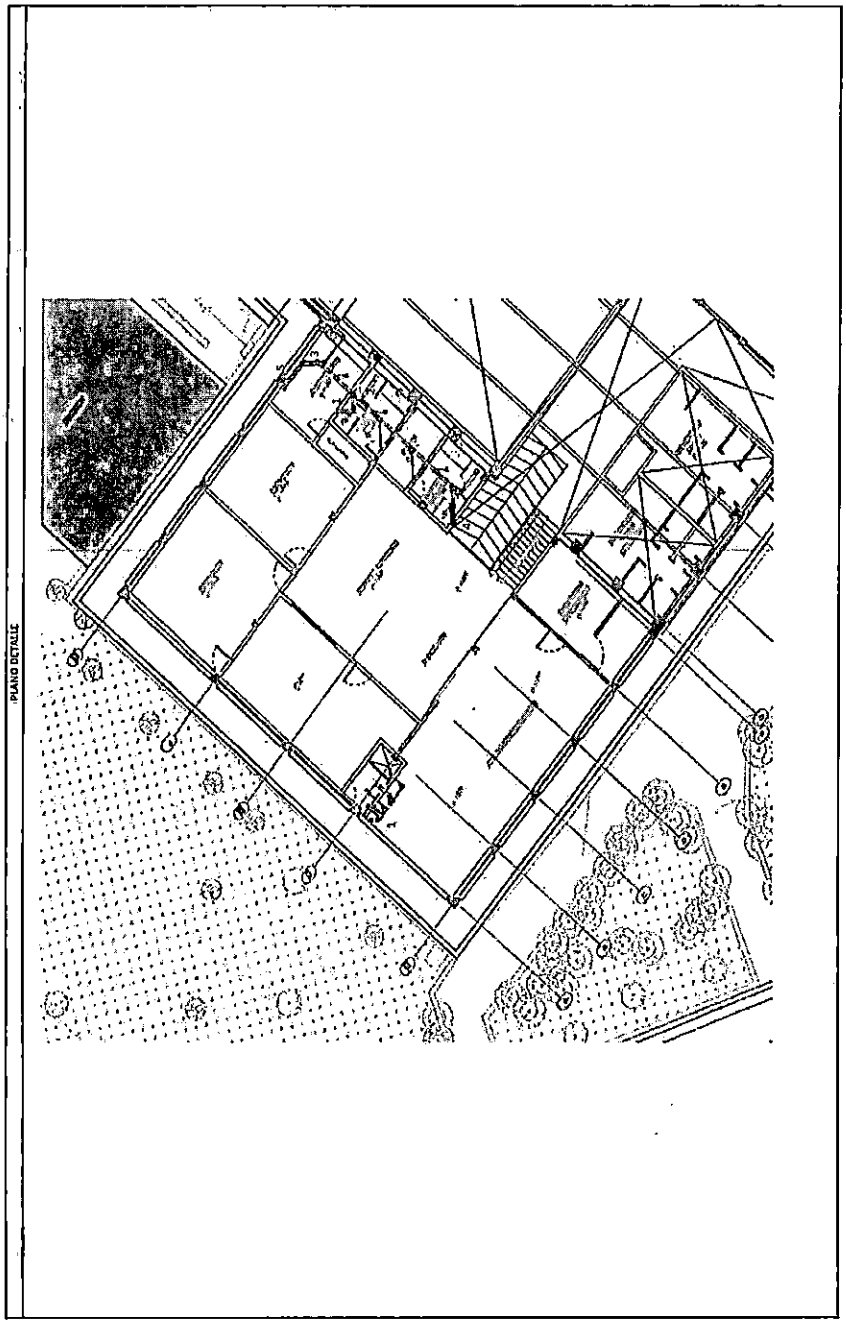

PIANO DETTAGLIO

	MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA		
ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Secretaría Integración Social	PROYECTO: OBRAS SEDES ALCALDÍA	PRISMA UNIVERSAL SEC S.A.S. CONSORCIO PRUNI SEDES 04 CONTRATISTA	ARQUITECTURA URBANA LTDA INTERVENTORÍA

ACTA No.	8	PERIODO DEL ACTA	1/01/2020	A	29/01/2020	
OBJETO	REALIZAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE AJUSTE LAS DIFERENTES OBRAS E INTERVENCIONES ESPECIALIZADAS PARA LAS DIFERENTES SEDES DE LA SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C.					
CONTRATO DE OBRA No	731-2019	CONTRATISTA	CONSORCIO PRUNI SEDES 04	ENTIDAD CONTRATANTE	SECRETARIA GENERAL-ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA	
CONTRATO INTERVENTORÍA	730 DE 2019	INTERVENTORÍA	ARQUITECTURA URBANA LTDA	FRENTE:	IMPRENTA DISTRITAL	

CAPITULO	1.5.0	RED DE AGUAS NEGRAS	ITEM	1.5.0.5	TUBERIA PVC ALCANTARILLADO 110mm	UNIDAD	ML

ITEM	LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	TOTAL	UNIDAD
	Entre los ejes A y 1'-4'						
1	Archivo	10.40			1.00	10,40	ML

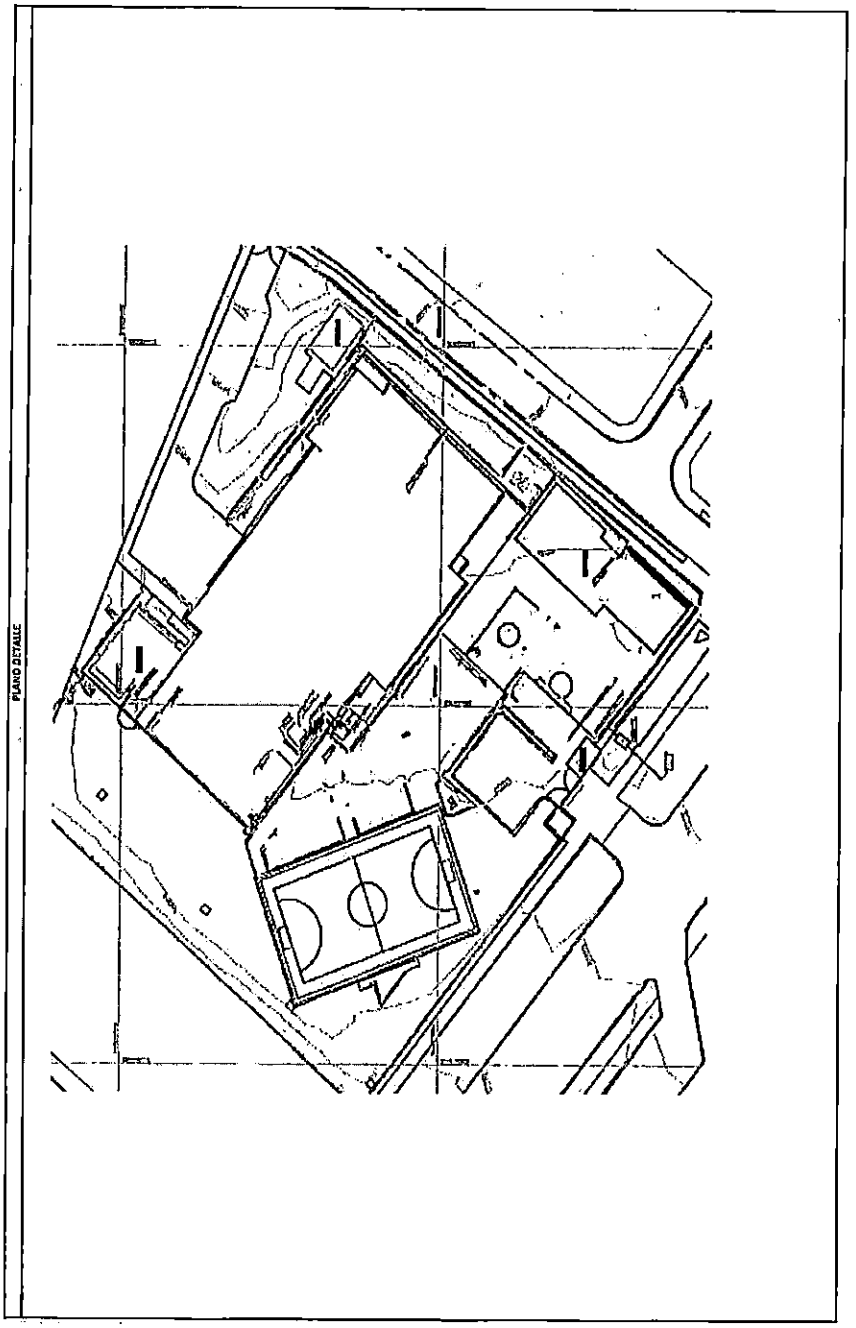
PLAN D'ENSEMBLE

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Secretaría Integración Social	MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA PROYECTO: OBRAS SEDES ALCALDÍA	PRISMA / UNIVERSAL SEC S.A.S. CONSORCIO PRUNI SEDES 04 (CONTRATISTA)	ARQUITECTURA URBANA LTDA (INTERVENTORÍA)


ACTA No.	8	PERIODO DEL ACTA:	1/02/2020	A	29/02/2020	
OBJETO	REALIZAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE AJUSTE LAS DIFERENTES OBRAS E INTERVENCIONES ESPECIALIZADAS PARA LAS DIFERENTES SEDES DE LA SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C.					
CONTRATO DE OBRA No	731-2019	CONTRATISTA	CONSORCIO PRUNI SEDES 04	ENTIDAD CONTRATANTE	SECRETARIA GENERAL-ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA	
CONTRATO INTERVENTORÍA	730 DE 2019	INTERVENTORÍA	ARQUITECTURA URBANA LTDA	FRENTE:	IMPRENTA DISTRITAL	

CAPITULO	1.5.0	RED DE AGUAS NEGRAS	ITEM	1.5.0.6	TUBERIA PVC ALCANTARILLADO 160mm	UNIDAD	ML


ITEM	LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	TOTAL	UNIDAD
1	COSTADO OCCIDENTAL	22,40			1,00	22,40	ML
2	COSTADO OCCIDENTAL	2,00			1,00	2,00	ML
				SUBTOTAL		24,40	ML
				TOTAL		24,40	ML

OBSERVACIONES:

LOCALIZACIÓN PLANIMÉTRICA



REGISTRO FOTOGRÁFICO




Alejandra Bolaños

ARQ. ALEJANDRA BOLAÑOS
RESIDENTE CONTRATISTA

ARQ. NANCY AYALA
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

149

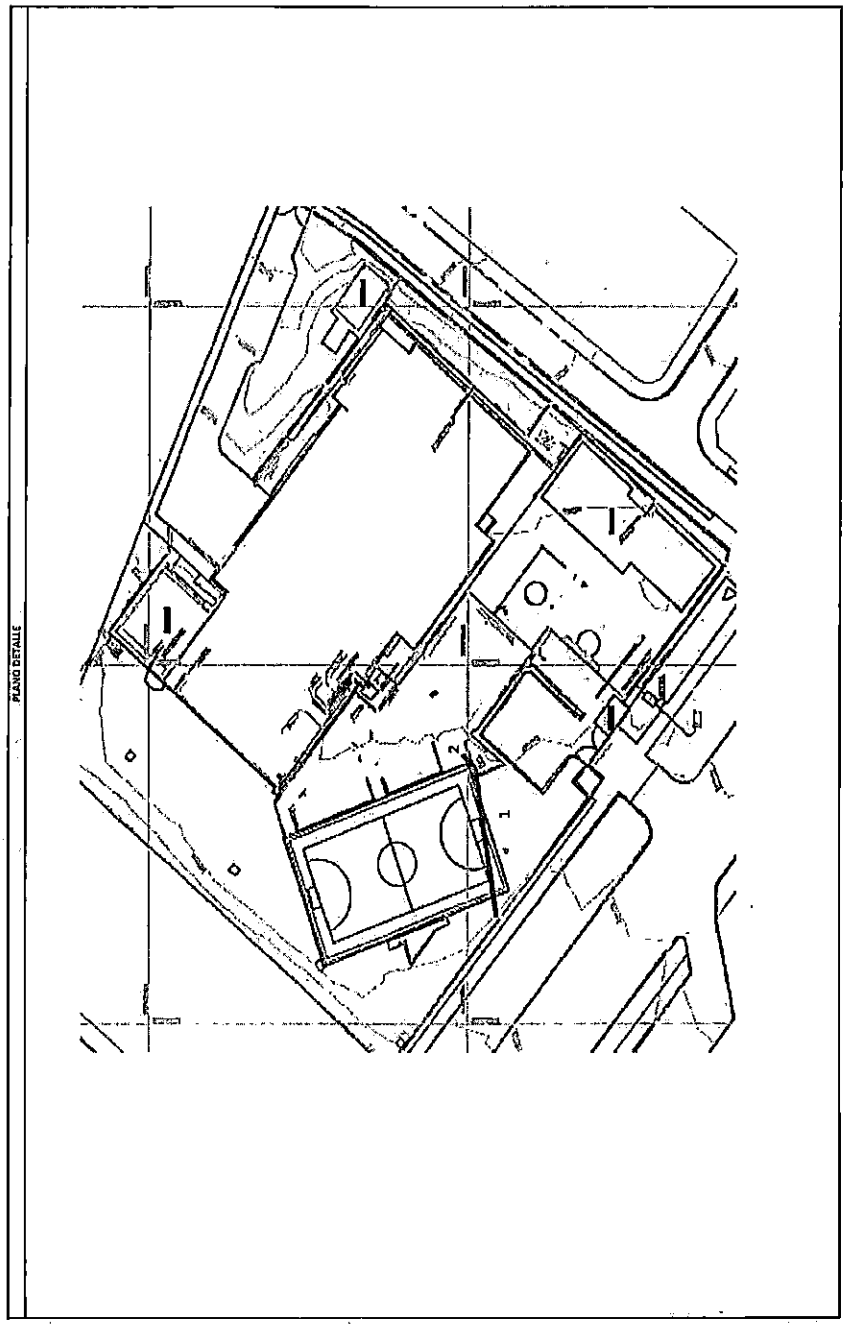
PLANO DETALLE


	MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA		
ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Secretaría Integración Social	PROYECTO: OBRAS SEDES ALCALDÍA	PRISMA / UNIVERSAL SEC S.A.S. CONSORCIO PRUNI SEDES 04 — CONTRATISTA	ARQUITECTURA URBANA LTDA. — INTERVENTORÍA

ACTA No.	8	PERIODO DEL ACTA	1/02/2020	A	29/02/2020		
OBJETO	REALIZAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE AJUSTE LAS DIFERENTES OBRAS E INTERVENCIONES ESPECIALIZADAS PARA LAS DIFERENTES SEDES DE LA SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C.						
CONTRATO DE OBRA No	751-2019	CONTRATISTA	CONSORCIO PRUNI SEDES 04		ENTIDAD CONTRATANTE	SECRETARIA GENERAL-ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA	
CONTRATO INTERVENTORÍA	730 DE 2019	INTERVENTORÍA	ARQUITECTURA URBANA LTDA		FUENTE:	IMPRENTA DISTRITAL	


CAPITULO		1.5.0	RED DE AGUAS NEGRAS		ITEM	1.5.0.6	ACCESORIO PVC-S 2"	UNIDAD	UND

ITEM	LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	TOTAL	UNIDAD
	Entre los ejes E-F y 5'-2'						
1	Cuarto de velado				41,00	41,00	UND
	Entre los ejes A-B y 1'-3'						
1	Baño subdireccion				6,00	6,00	UND
	Entre los ejes A y 1-4						
1	Archivo				6,00	6,00	UND
	Entre los ejes A-B y 2-3.						
1	Archivo				13,00	13,00	UND
OBSERVACIONES:				SUBTOTAL		66,00	UND
				TOTAL		66,00	UND

LOCALIZACIÓN PLANIMÉTRICA

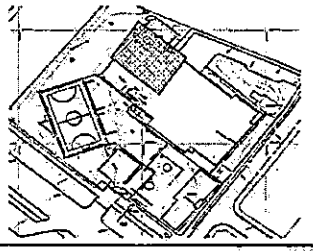

REGISTRO FOTOGRÁFICO

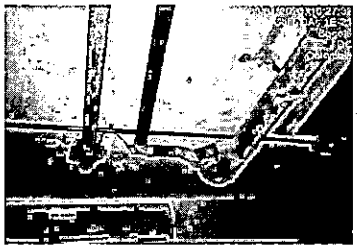

Alejandra Bolaños

ANA ALEJANDRA BOLAÑOS
RESIDENTE CONTRATISTA

ARQ. NANCY AYALA
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
