Información de la Planilla Pagada

Nit de comercio Operador de Información	900097333-9
Razón Social del Operador de Información	SIMPLE S.A.
Descripción	Pago de SuAporte
Fecha	2021-10-13, 03:10:45 PM
Periodo de Cotización Otros Riesgos	septiembre de 2021
Periodo de Cotización Para Salud	octubre de 2021
Empresa	QUATTRO PROYECTOS E INVERSIONES SAS
NIT	NI 900297404
Código Sucursal (Nombre)	( )
Referencia de Pago/ Número Planilla	1040862216
Tipo de Planilla	E
Número Transacción Bancaria/ CUS	1164915437
Banco	(1007) - BANCOLOMBIA
Valor	$ 7.580.200
Estado de la Transacción	Aprobada
Dirección IP de Origen	10.0.19.58

Nit	Código	Administradora	Número Afiliados	Valor sin Mora	Total Intéreses Mora
N800224808	230301	PORVENIR	3	$ 1.072.000	$ 0
N800229739	230201	PROTECCION FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS	3	$ 1.472.000	$ 0
N900336004	25-14	COLPENSIONES	4	$ 1.608.800	$ 0
N900156264	EPS037	NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD NUEVA EPS S.A.	1	$ 33.400	$ 0
N800251440	EPS005	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SANITAS S.A.	4	$ 508.000	$ 0
N800130907	EPS002	SALUD TOTAL S.A. ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD	4	$ 364.400	$ 0
N800088702	EPS010	EPS SURA	1	$ 120.000	$ 0
N860011153	14-23	ARP - POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS	10	$ 1.375.800	$ 0
N890900842	CCF03	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMFENALCO ANTIOQUIA	1	$ 120.000	$ 0
N860066942	CCF24	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	5	$ 636.000	$ 0
N890806490	CCF11	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE CALDAS	4	$ 269.800	$ 0
		SubTotales:		$ 7.580.200	$ 0
		Total a Pagar:			$ 7.580.200

SIMPLE S.A. no se hace responsable de las planillas y pagos realizados a través de otros operadores de información dado que no tiene medios para corroborar la


ANEXO 4: REGISTRO FOTOGRAFICO




Reconocimiento obra visita N°01




Reconocimiento obra visita N°01

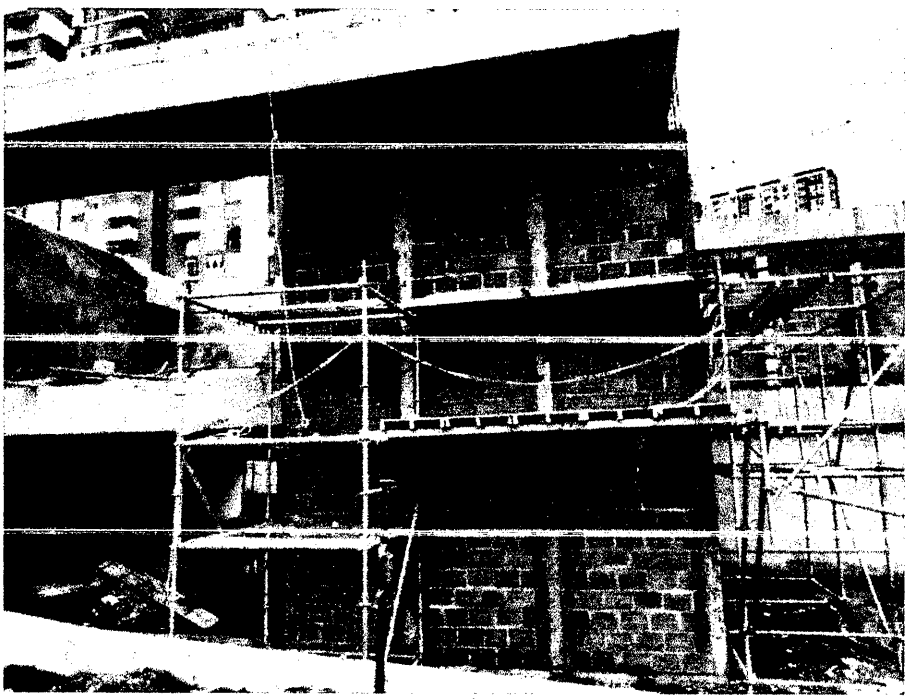

Reconocimiento obra visita N°01

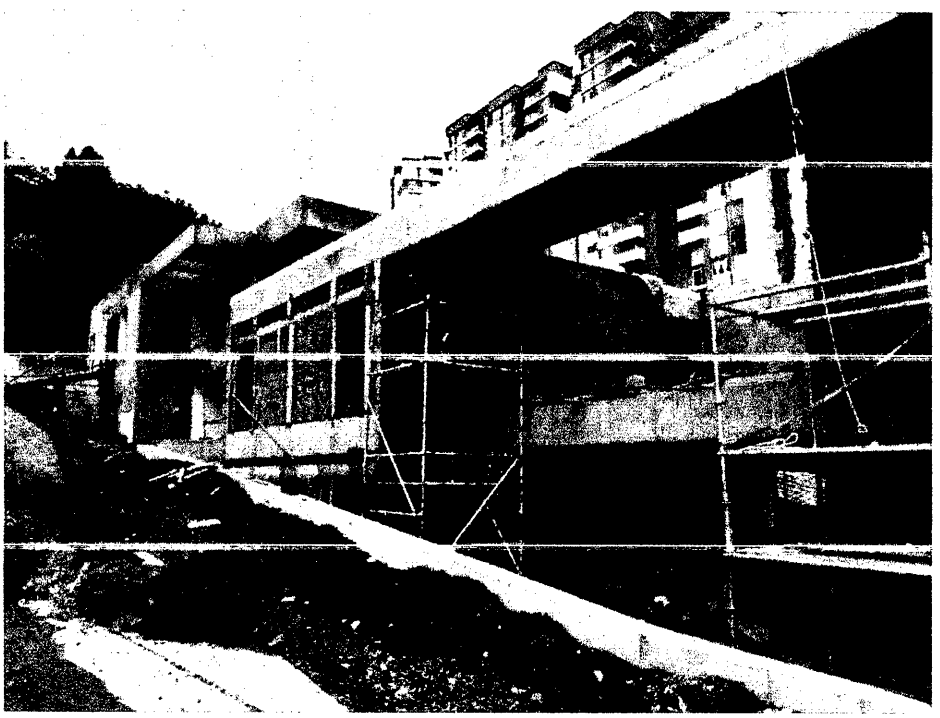


Reconocimiento obra visita N°01

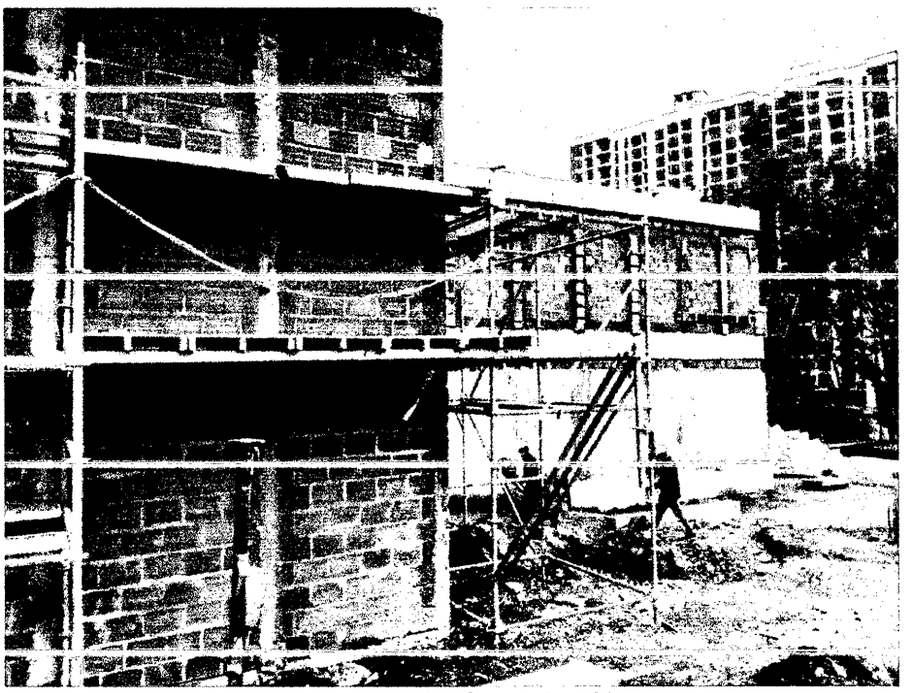

Reconocimiento obra visita N°01




Reconocimiento obra visita N°01

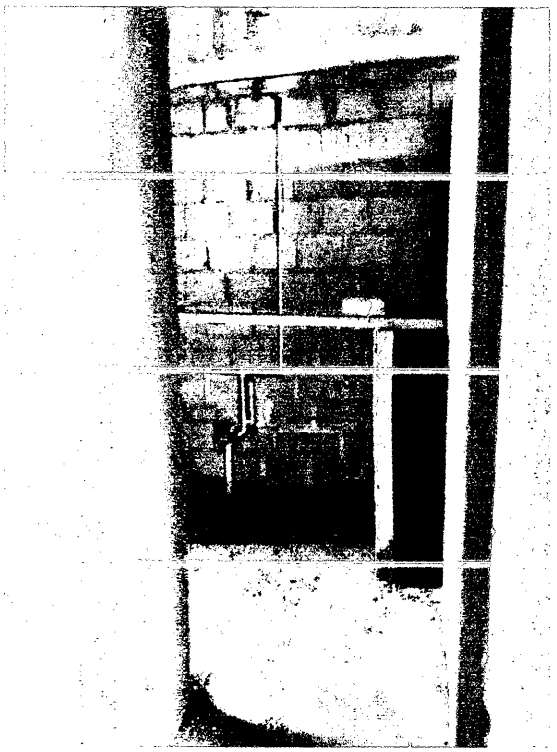

Reconocimiento obra visita N°01




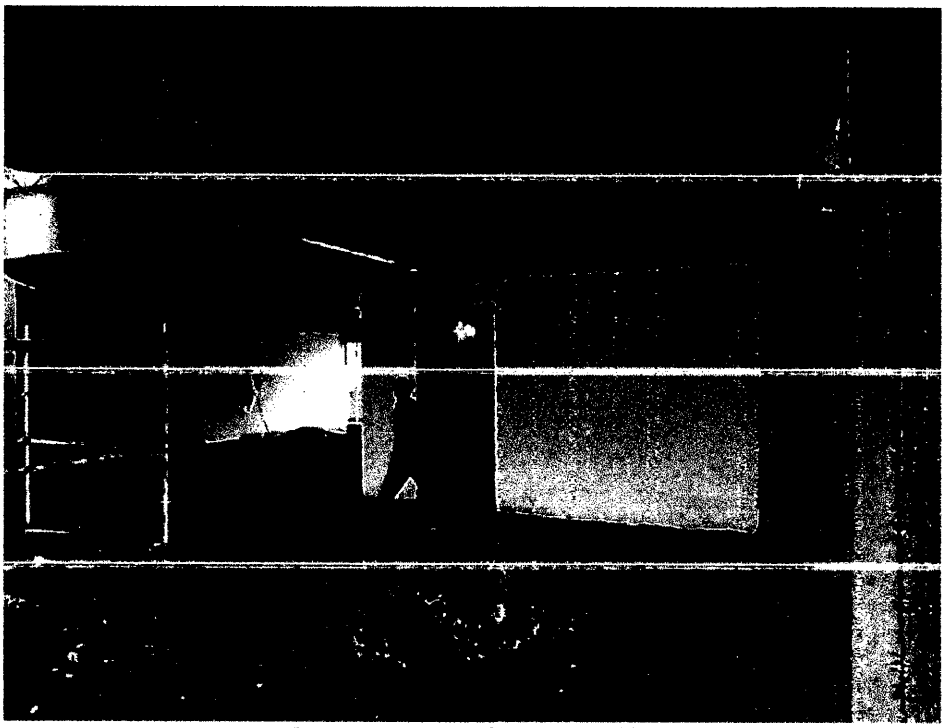


Reconocimiento obra visita N°01




Reconocimiento obra visita N°01

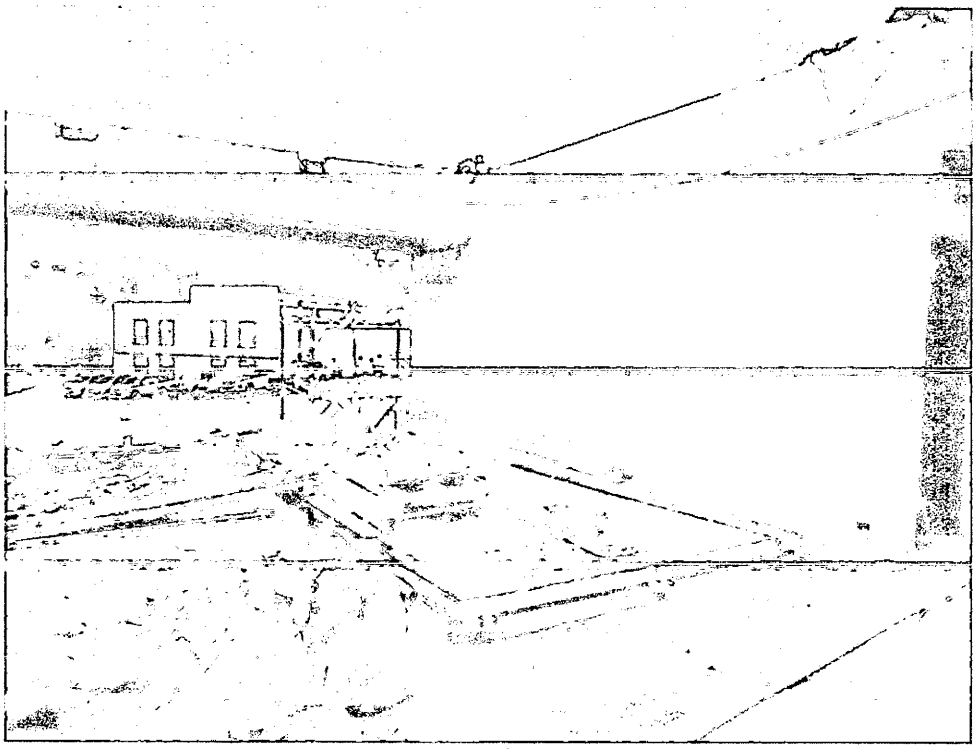


Reconocimiento obra visita N°01

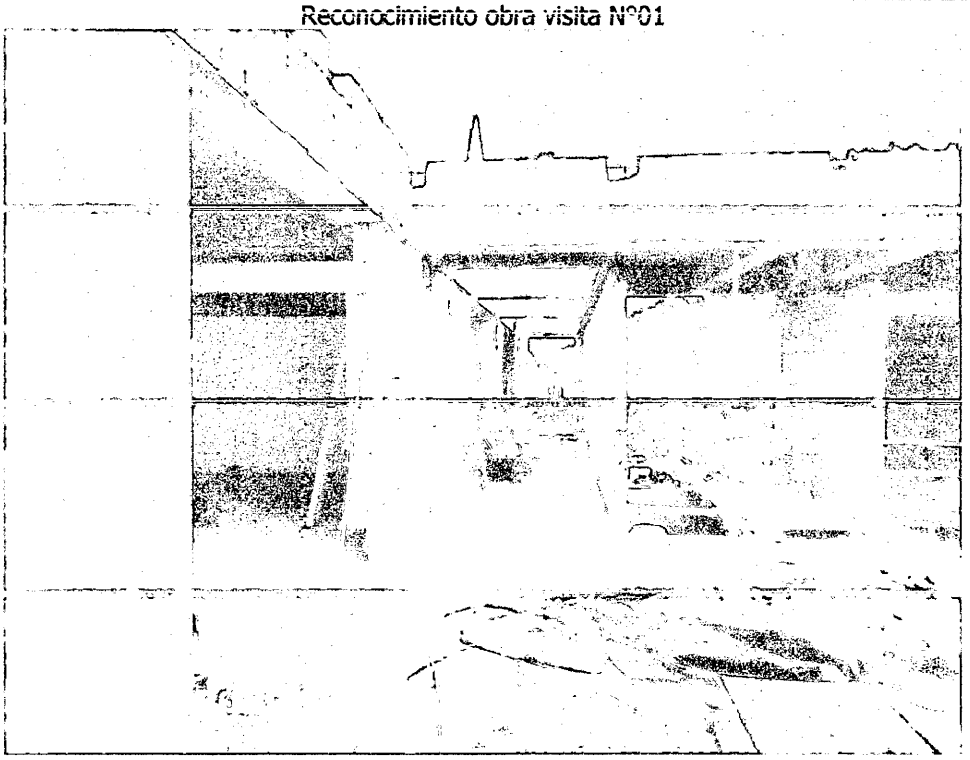


Reconocimiento obra visita N°01

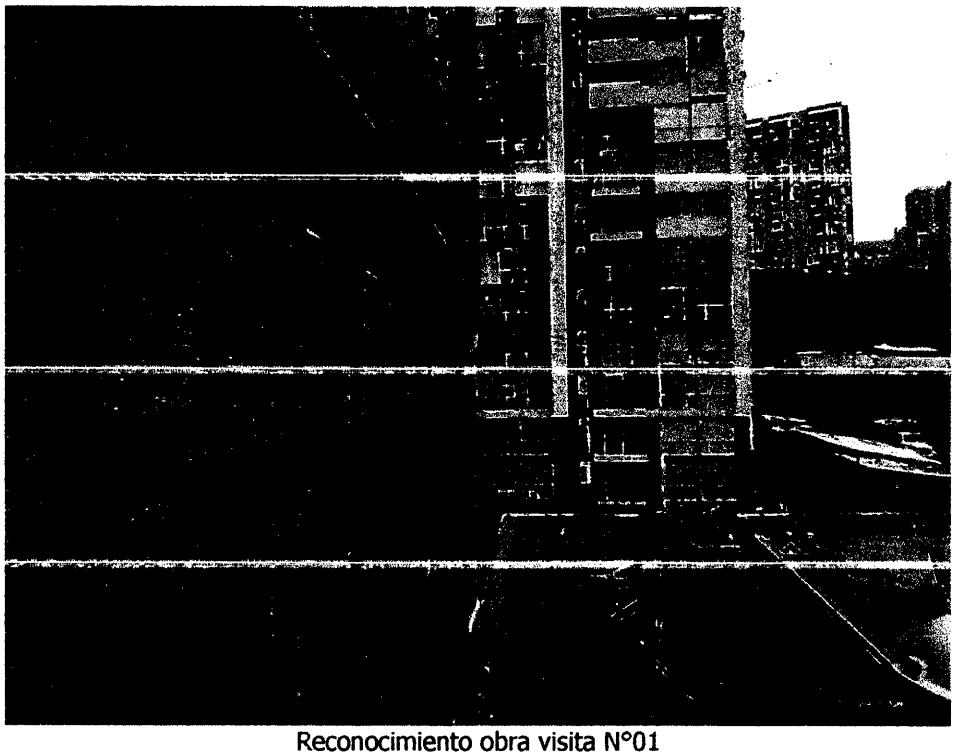


Reconocimiento obra visita N°01

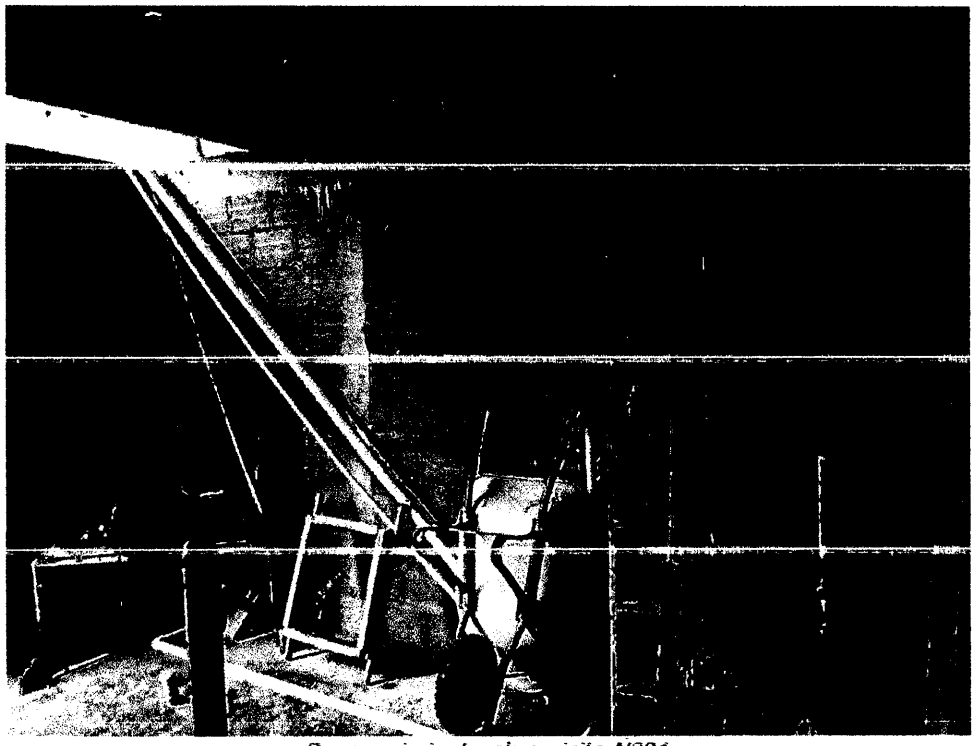


Reconocimiento obra visita N°01

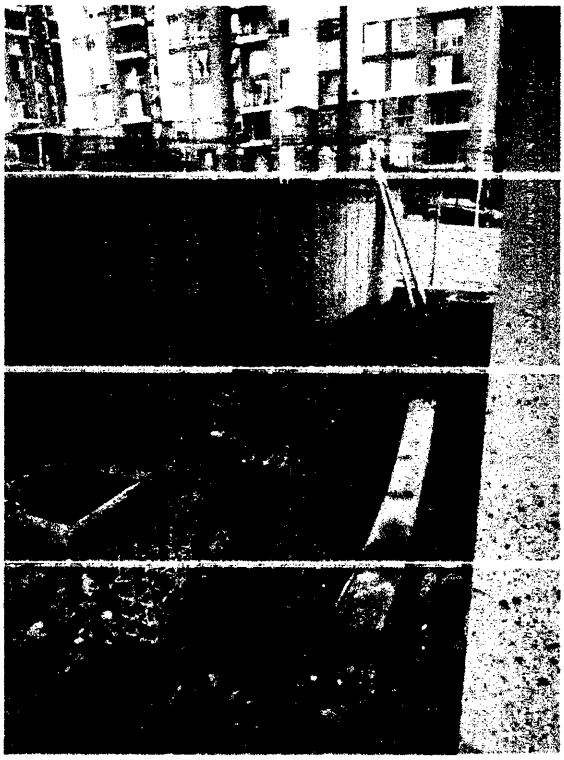

Reconocimiento obra visita N°01

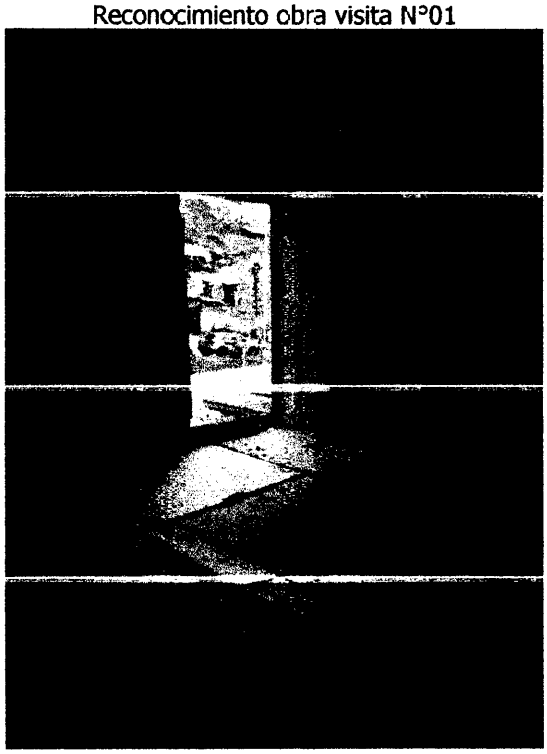


Reconocimiento obra visita N°01

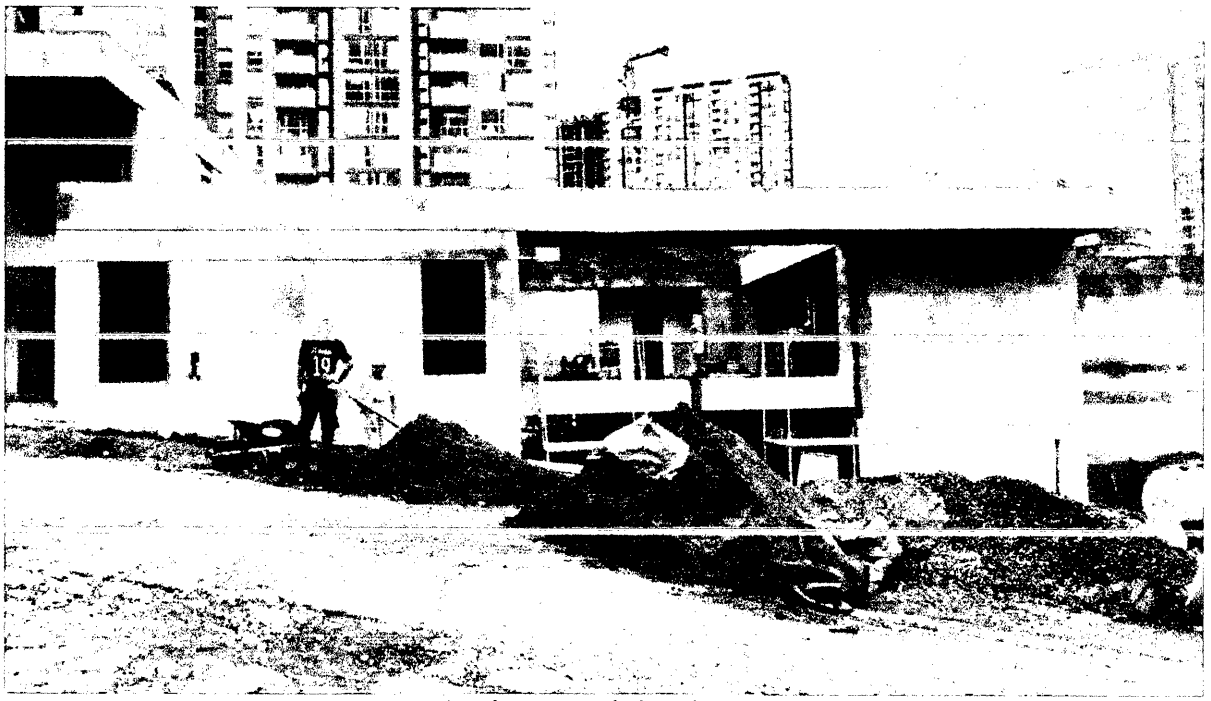


Recibo material alistado piso



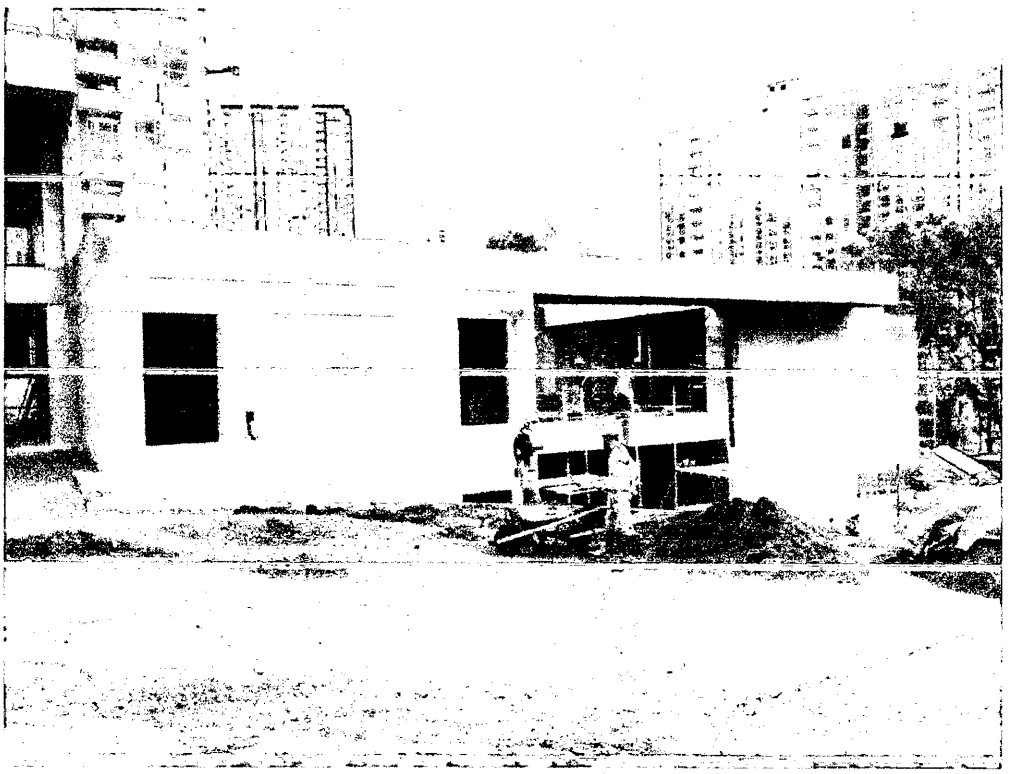

Transporte arena alistado piso




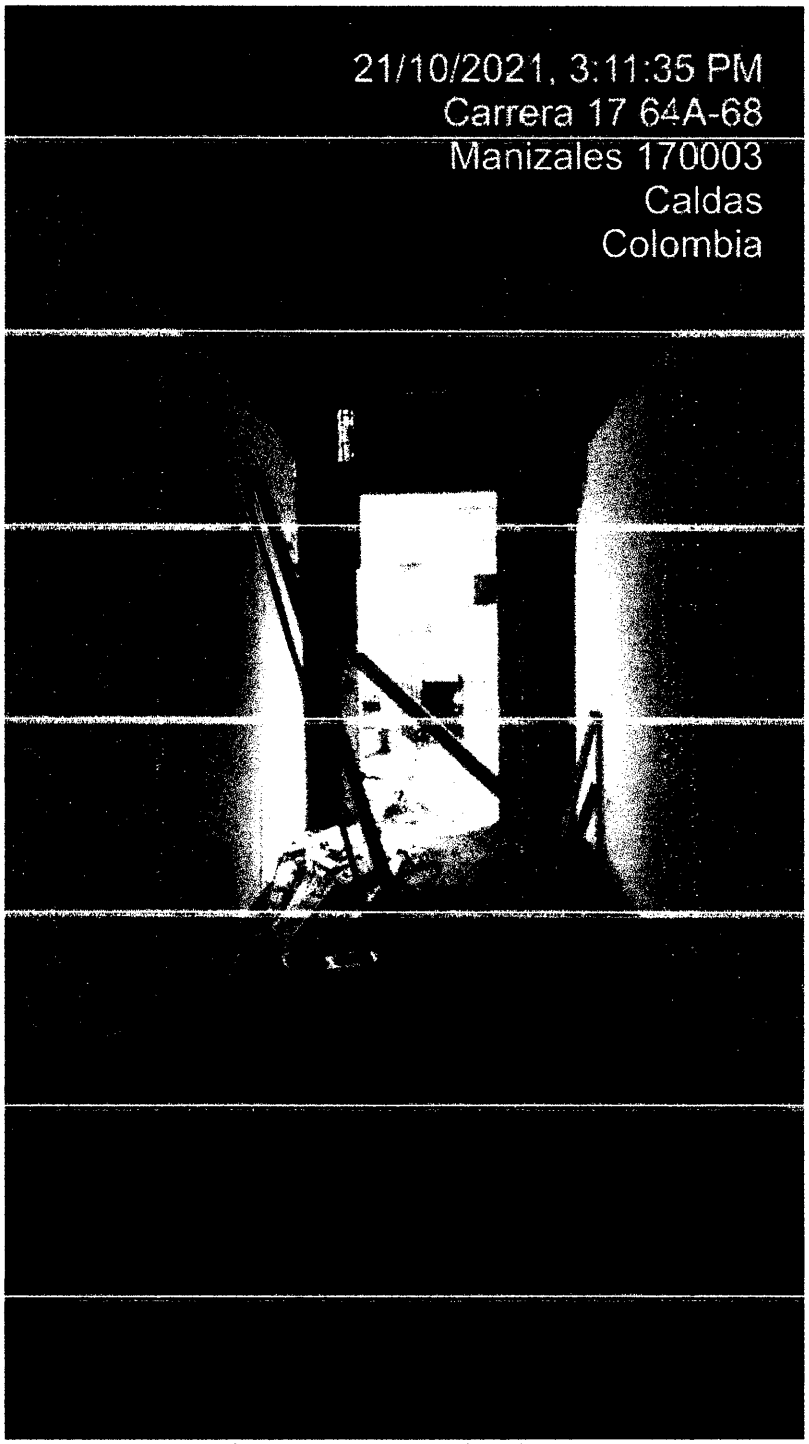

Almacenaje material alistado piso




Almacenaje material alistado piso

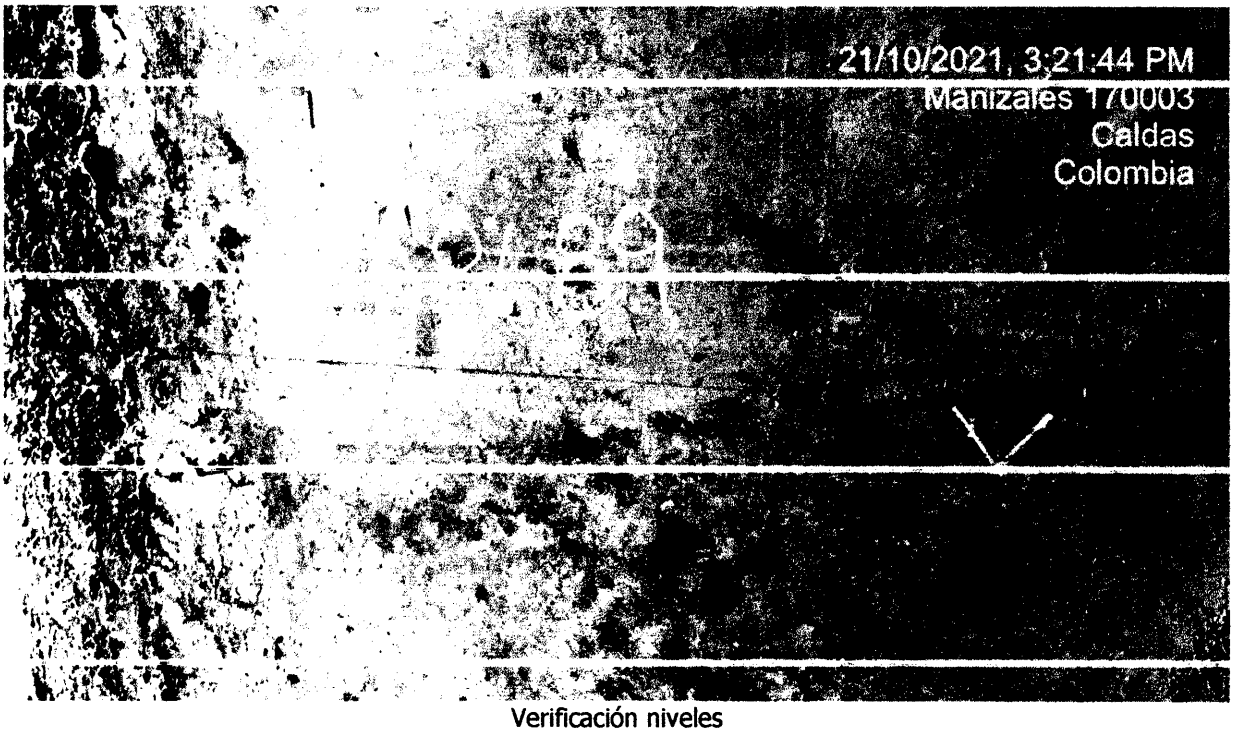


Verificación niveles




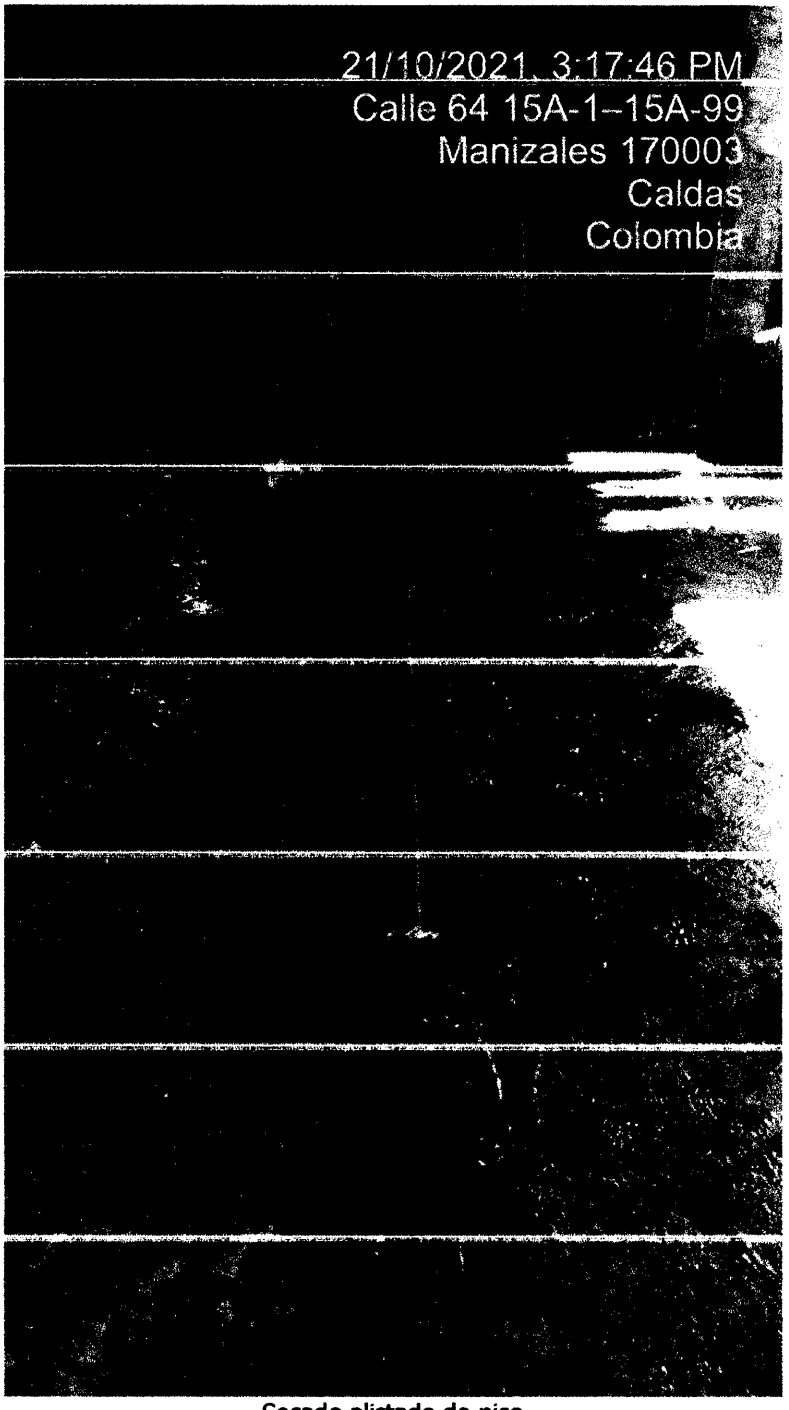


Secado alistado de piso

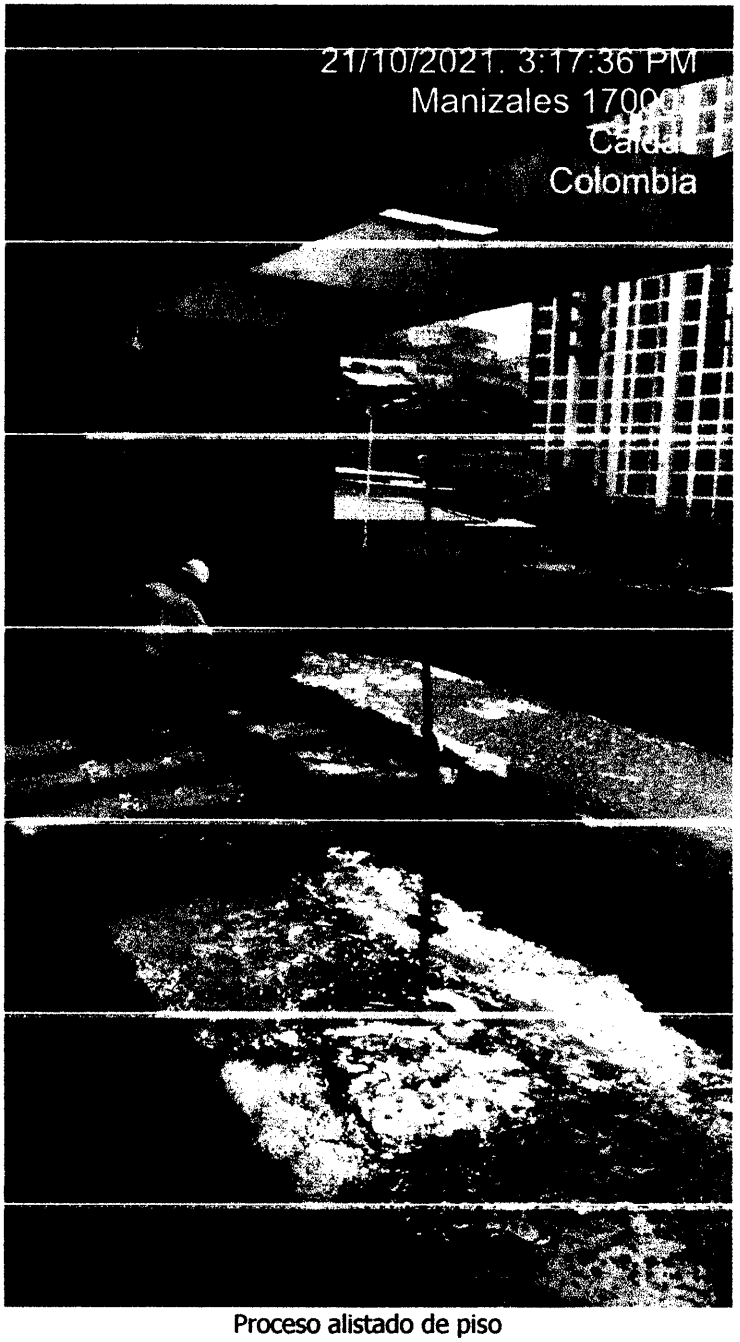

Proceso alistado de piso

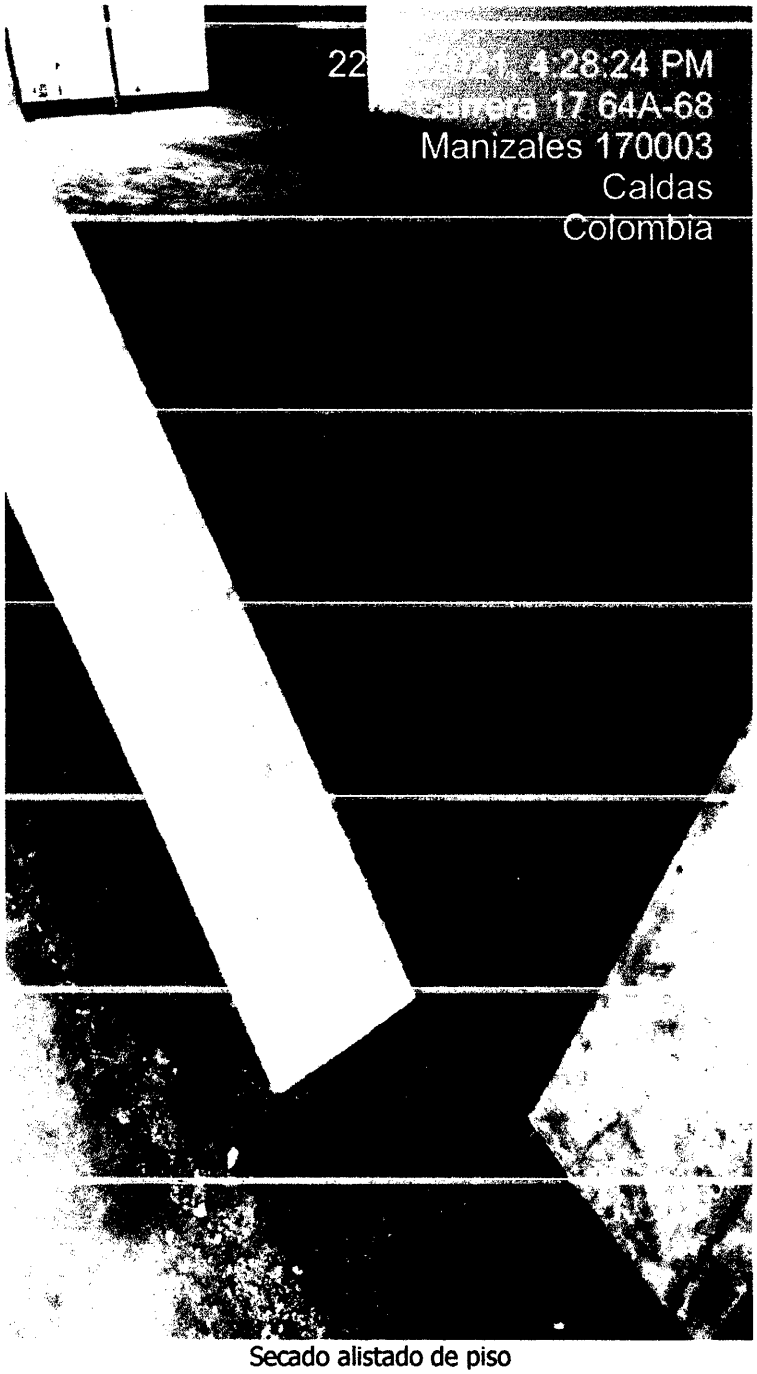


Secado alistado de piso

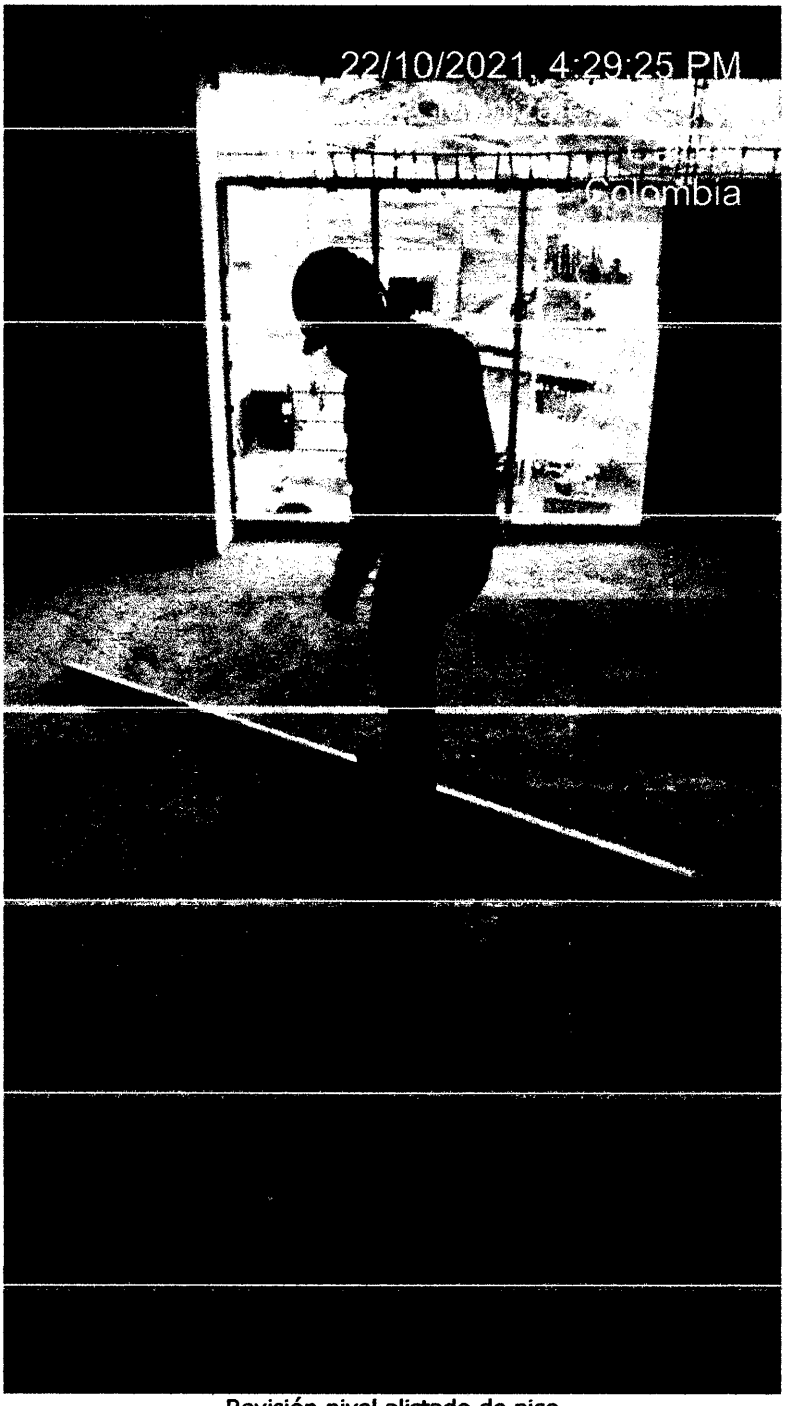

Revisión nivel alistado de piso



Revisión nivel alistado de piso



ANEXO 5. BITACORA DE OBRA

1-10-2021 A través de esta Bitacora se pretende mantener una comunicación entre las partes que suscribieron el contrato de obra celebrado entre la dirección Nacional de Escuelas con Nit. 900.373.379-0 y la empresa Quattro Proyectos e Inversiones SAS con Nit 900.297.404-1, cuyo objeto es la "TERMINACION DE LAS OBRAS CORRESPONDIENTES A LA CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO HABITACIONAL MULTIPLE, DOTACION Y OBRAS EXTERIORES ESCUELA DE CARABINEROS ALEJANDRO GUTIERREZ ESACU" cuyo N.º PN DNAE N.º 80-6-10073-21, por lo cual me permito dar apertura al libro BITACORA, con el fin de oficializar todas las acciones, cambios, modificaciones y contratos que se presenten durante el desarrollo de la construccion en mencion y asi mismo dar a conocer en el tiempo indicado la fecha de terminación de la obra y dar la autorización de uso y ocupacion.
Hoy 01-10-2021 se acude a la audiencia de adjudicación y se firma el acta de inicio entre las partes.

Arq. Yamil Armando Mendieta O
Residente de Obra

CT CAMILO GARCIA GOMEZ
SUPERVISOR

1-10-2021 Se realiza reconocimiento de la edificación en proceso de construccion, con el fin de revisar el estado actual de las areas a intervenir dentro del marco contractual, se aprecia dentro del recorrido que los espacios estan todavia en obra negra, por lo tanto se solicita la entrega oportuna de las areas para iniciar la ejecución de las obras contempladas en la ETAPA II del contrato en mención.

Arq. Yamil A Mendieta O.
Residente de Obra

CT. CAMILO GARCIA GOMEZ
SUPERVISOR

11.10.2021 Celebración del comité de Obra entre los participantes viten empezar con la Etapa I (Omicron). Interventoría y Supervisión por Parte de la Policía la el jefe de Planeación Cp. Arq. Camilo García y por Parte del contratista Quattro Proyectos e Inversiones S.A.S como responsable de la Segunda Etapa. El Representante legal procede a legalizar las hojas de vida de los profesionales idóneos integrantes del equipo de trabajo entre ellos: 1 Director de Obra, 1 Residente de Obra (100%) y 1 Profesional HSEQ (100%), además a esto, se hace entrega de la programación por un periodo de 90 días y un plan de Calidad acorde a las necesidades protocolarias establecidas dentro de lo Contratado

Arq. Yamil Amando Mendieta D.
Residente de Obra.

Capitán Camilo García
Arquitecto Supervisor

15.10.2021 Se informa al Supervisor de la Obra Capitán Arquitecto Camilo García sobre algunos inconveniente con los espacios a intervenir debido a que en esta Etapa de la obra no se han iniciado las actividades de pañetes, por lo cual el Representante legal de Quattro Proyectos e Inversiones S.A.S Arq. Mauricio Vargas Gaitan recomienda y sugiera postergar el inicio de la Obras para la Etapa II hasta cuando se tengan los pañetes de estos espacios terminados por el Contratista Etapa I.

Arq. Yamil Amando Mendieta D.
Residente de Obra

Ct. Camilo García
Arquitecto Supervisor

18.10.2021 Estado del tiempo: Fuerte lluvia en horas de la tarde en un periodo de las 13:37 hasta las 17:15 lluvias intermitentes. Hora inicio 7:00 am Hora salida 5:00
Personal en Obra: Residente de Obra, Maestro de Obra, 2 oficiales 3 Ayudantes
Equipos y Herramienta menor: Herramienta personal y menor oficiales.
Actividades: Proceden con replanteo, hilos y niveles con el fin de demarcar ubicación de pisos en área habilitada del 2º Piso

Arq Yamil A. Mendieta

10.2021 Estado del tiempo: Lluvias intermitentes en horas de la tarde
Hora de inicio: 7:00 am Hora de salida 5:00 pm
Personal en Obra: Residente de Obra, Maestro de Obra, 2 oficiales 3 Ayudantes
Equipo y Herramienta: Herramienta menor del personal perfil oficial de Construcción
Actividades: Después de realizar el chequeo de niveles proceden con iniciar con corregir guia o maestras para realizar el vaciado de mortero 1:3 en areas habilitadas como el Auditorio multiple +2, cuarto técnico (Auditorio) y una oficina.

Arq. Yamil Armando Mendieta O.
Residente de Obra

Capitán Camilo García
Arq. Supervisor

3.10.2021 Estado del tiempo: Sin lluvias
Hora de inicio: 7:00 am Hora de salida 5:00 pm
Personal en Obra: Residente de Obra, HSEQ, Maestro de Obra, 2 oficiales 3 Ayudantes
Equipo y Herramienta: herramienta personal perfil oficial de Construcción
Actividades: Continuan con vaciado mortero 1:3 area del 2do piso y dan inicio a las obras de chequeo niveles en area 1er Piso, sobre las zonas habilitadas para tal fin, a continuación proceden con vaciado mortero 1:3 en area Gimnasio, peluqueria y baños hombres y mujeres. Se le solicita a la arquitecta residente de Unicacon, entregar el espacio correspondiente a salón de eventos debido a que se utiliza como bodega de cerámica y aparatos sanitarios que obstaculizan la continuidad de las obras de vaciado morteros 1:3.

Arq. Yamil Armando Mendieta O.
Residente de Obra

Ct. Camilo García
Supervisor

28-10 2021 Estado del tiempo: Lluvias intermitentes en horas de la tarde.
Hora de inicio: 7:00 am Hora de salida 5:00 pm
Personal en Obra: Residente de Obra, HSEQ, Maestro de Obra, 2 of
Ayudantes. Charla sobre la utilización de los elementos de protección y c
Equipo y Herramienta: Baquillevar, botas, palas, herramientas men
Actividades: El profesional HSEQ pone en practica los protocolos
salud y seguridad en el trabajo, realiza la charla sobre la
del personal para protege su integridad y hace enfasis en el
y limpieza general de las areas de influencia de las obr
La empresa contratista Omicron inicia el traslado del material
y aparatos sanitarios hasta una zona ya intervenida con
facilitar las obras en ejecución.

Arq Yam Fernando Mendieta
Residente de Obra

.10 2021 ESTADO DEL TIEMPO.
