CONTENIDO DEL INFORME

1. CONDICIONES DEL CONTRATO 1
2. OBJETO DEL CONTRATO 1
3. ACTIVIDADES EJECUTADAS, OBLIGACIONES CUMPLIDAS, PRODUCTOS ENTREGADOS Y/O BIENES ENTREGADOS. 1
4. OBSERVACIONES A LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS, A LAS OBLIGACIONES CUMPLIDAS, Y A LOS PRODUCTOS Y/O BIENES ENTREGADOS. 2
5. OBSERVACIONES ADICIONALES, SI A ELLO HUBIERE LUGAR. 6
6. PORCENTAJES DE AVANCE PRESUPUESTAL Y EN EJECUCIÓN DEL CONTRATO. 7

CONDICIONES DEL CONTRATO

Número de Contrato:	20001175-01-H3 de 2020
Nombre del Contratista:	RADIOCOM S.A.S.
Periodo informe:	**01 de octubre a 31 de ocyubre de 2021**
Nombre de Supervisor:	**Yonatan Alexander Montoya Peña**
Nombre del Interventor:	
Área perteneciente:	**DITEL – Grupo Sistemas para la Meteorología Aeronáutica**

1. OBJETO DEL CONTRATO

REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE SISTEMAS AWOS A NIVEL NACIONAL – ADJUDICACIÓN PARCIAL LOTE 1

2. ACTIVIDADES EJECUTADAS, OBLIGACIONES CUMPLIDAS, PRODUCTOS ENTREGADOS Y/O BIENES ENTREGADOS.

2.1. ACTIVIDADES EJECUTADAS:

PERÍODO: 01 de octubre al 31 de octubre de 2021		
OBLIGACIONES	**DESCRIPCIÓN DE AVANCE O CUMPLIMIENTO**	**UBICACIÓN DE SOPORTES**
1. Recepción final de equipos	• Se realiza el mantenimiento preventivo con el montaje de los sensor de temperatura HMP-155, la tarjeta CLK-311del Ceilometro, se cambia la resistencia de calefacción	Anexo informe del aeropuerto de Guapi

	del PWD-22 y LM-21 y los demás equipos instalados en pista del • Se realiza mantenimiento de la infraestructura física que soporta los equipos, sensorica, sistema solar, UPS, gabinetes, herrajes, sistema de tierras, pintura general de las torres auto soportadas y poda de pasto • La verificación física y limpieza externa e interna de las EMAS, sistema de viento, Ceilometro, RVR, sistema de comunicaciones, sistema alterno y el rack del sistema de procesamiento central de datos con la medición de parámetros, verificación de software, visualización y conexiones de red. • Se realizan pruebas a los diferentes sensores para observar si se encuentran calibrados y/o patronados • Se entregan los equipos al personal ATSEP sin ninguna novedad • Se realiza la recepción final (SAT)	


A. OBLIGACIONES CUMPLIDAS:

- Visita y pruebas SAT al aeropuerto de Guapi

a. PRODUCTOS ENTREGADOS Y/O BIENES ENTREGADOS:

2. OBSERVACIONES A LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS, A LAS OBLIGACIONES CUMPLIDAS, Y A LOS PRODUCTOS Y/O BIENES ENTREGADOS.

Metconsole de Guapi

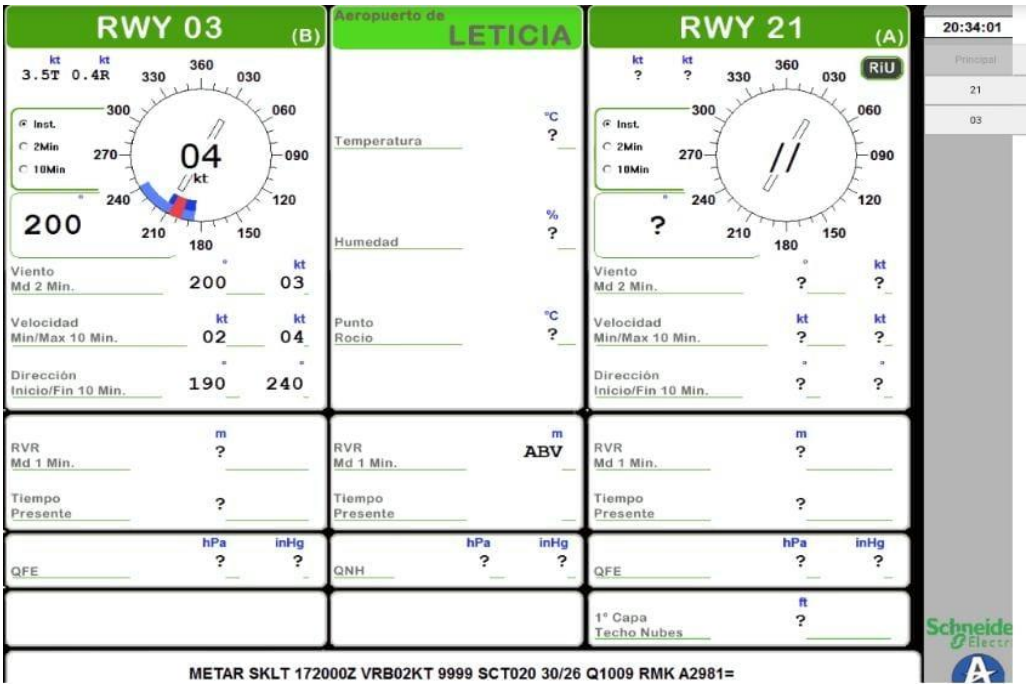

Baterías de la UPS












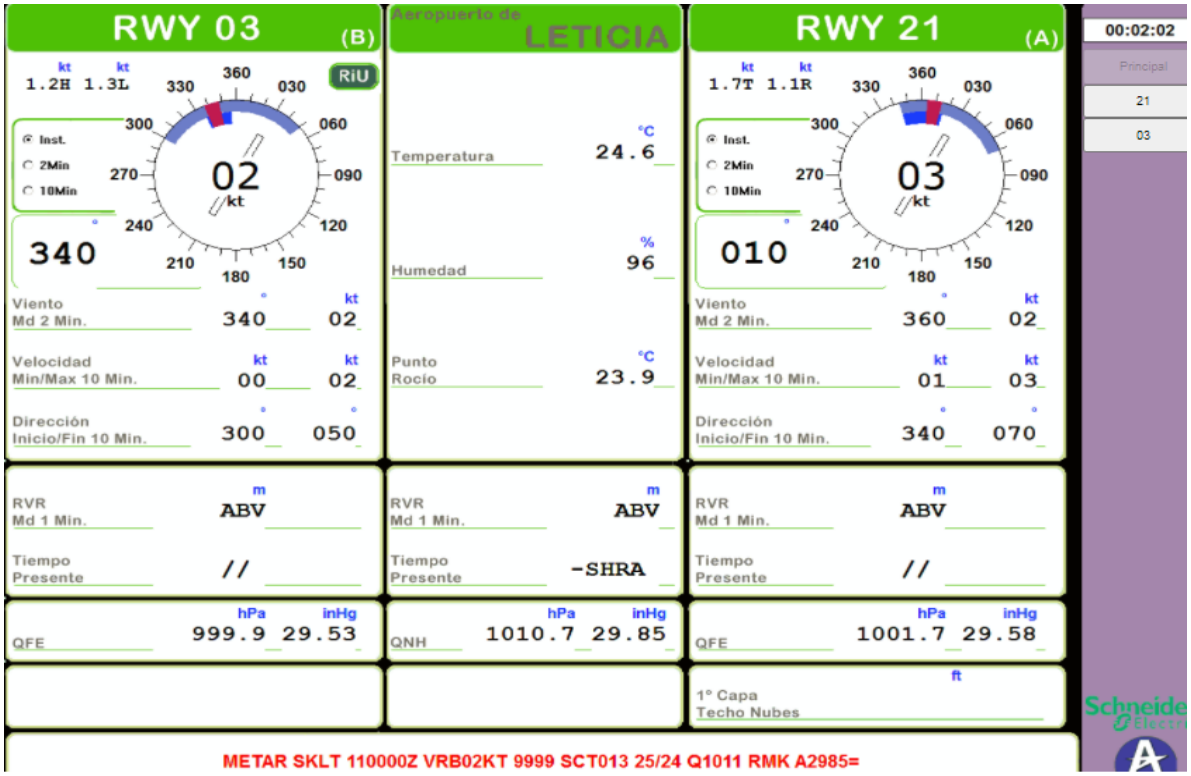

3. OBSERVACIONES ADICIONALES, SI A ELLO HUBIERE LUGAR.

ninguna

a. ANÁLISIS MATERIALIZACIÓN Y MITIGACIÓN DEL RIESGO:

1	¿Durante la ejecución se materializó algún riesgo?	SI
2	Tipo de riesgo	BIOLOGICO
3	¿Cómo se materializó el riesgo?	PANDEMIA COVID - 19
4	¿Cómo se mitigó el riesgo?	PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD
5	¿Fue oportuna la mitigación?	SI
OBSERVACIONES: EL CONTRATO TIENE RESTRICCIONES POR LA PANDEMIA COVID - 19		

b. VERIFICACIÓN de obligaciones frente al SGSST

5.2.1 EXAMEN OCUPACIONAL

¿CUENTA CON EL EXAMEN PREOCUPACIONAL VIGENTE?	
SI	**NO**
¿FUE ENTREGADA LA COPIA DEL EXAMEN A LA SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS SRH-GSST?	
SI	**NO**

En caso de ser afirmativas las anteriores respuestas, por favor diligencie la siguiente información:

FECHA DE REALIZACIÓN DEL EXAMEN	**FECHA DE VENCIMIENTO DEL EXAMEN**

5.2.2. CAPACITACIÓN EN EL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

¿ASISTIÓ A LA CAPACITACIÓN EN EL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO?	
SI	**NO**
X	
FECHA DE REALIZACIÓN DE LA CAPACITACIÓN	

c. PUBLICACIÓN DEL INFORME EN LA PLATAFORMA SECOP II

NÚMERO DE INFORME	**PUBLICACIÓN EN SECOP II**	
	SI	**NO**
1		
2		
3		
4		

NOTA: este cuadro deberá ser diligenciado a partir del **momento en que la Dirección Administrativa informe.**

4. PORCENTAJES DE AVANCE PRESUPUESTAL Y EN EJECUCIÓN DEL CONTRATO.

a. AVANCE PRESUPUESTAL DEBIDO A LOS PAGOS REALIZADOS:

Se realizo el pago parcial del contrato

b. AVANCE EN EL PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO RESPECTO DE LOS PRODUCTOS Y/O BIENES ENTREGADOS.

El porcentaje de avance físico es del 48.5%
El porcentaje de avance financiero es del 67.5%

En mi calidad de supervisor del contrato me permito avalar el contenido del informe y el avance en la ejecución del mismo de acuerdo con lo descrito.

El contrato no presenta a la fecha dificultades en su ejecución, ni situaciones exógenas que afecten el normal desarrollo del mismo.

YONATAN ALEXANDER MONTOYA PEÑA
CC. 80850230 DE BTA
SUPERVISOR DE CONTRATO 20001175-01-H3-2020
