# INFORME DE EJECUCION ACTA PARCIAL No.1

**CONTRATO DE OBRA No. SA-011-MC-2021**

CUYO OBJETO ES

***"SUMINISTRO, INSTALACION Y DESMONTE DE SEÑALIZACION HORIZONTAL Y VERTICAL EN VIAS DEL MUNICIPIO DE SINCELEJO"***

MUNICIPIO DE SINCELEJO

**CONTRATANTE**


PRESENTADO POR:

**ADM. JUAN PABLO PIEDRAHITA SILEBE**

SEGURIDAD Y SERVICIOS SEÑALIZACION S.A.

NIT. 802.017.424-3.


DICIEMBRE 7 DE 2021

SEGURIDAD & SERVICIOS SENALIZACION

Sincelejo
Unidos transformamos más

Sincelejo
Secretaría de Movilidad

# DATOS GENERALES

| | |
|---|---|
| **Tipo de Contrato:** | **CONTRATO DE OBRA SA-011-MC-2021** |
| **Contratante:** | **MUNICIPIO DE SINCELEJO** |
| **Objeto:** | **"SUMINISTRO, INSTALACION Y DESMONTE DE SEÑALIZACION HORIZONTAL Y VERTICAL EN VIAS DEL MUNICIPIO DE SINCELEJO"** |
| **Contratista:** | Seguridad Y Servicios Señalización S.A.<br>Nit. N° 802.017.424-3<br>R.L. Juan Pablo Piedrahita Silebe |
| **Supervisor:** | German Cassas Garcia<br>Secretario de Movilidad - Municipio de Sincelejo |
| **Valor:** | CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES MILLONES SESENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS CON OCHENTA Y OCHO CENTAVOS M/L (**$ 433.068.299,88**) |
| **Plazo de ejecución:** | 4 MESES CONTADOS A PARTIR DE LA FIRMA DEL ACTA DE INICIO, previo el cumplimiento de los requisitos de ejecución de perfeccionamiento y ejecución y aprobación de los documentos previstos en el Pliego de Condiciones |
| **Forma de Pago** | El Municipio de Sincelejo, realizará al contratista un primer abono por el siguiente concepto:<br>- un anticipo equivalente al 20% del valor total del presupuesto.<br>El valor correspondiente del contrato se cancelará al contratista así:<br>- El 90% del valor del contrato mediante actas parciales mensulaes, según avance de la ejecución, certificadas por el Supervisor.<br>- Y un 10 % con la presentación del acta de recibo final correspondiente al último pago.<br>El municipio realizará en cada pago el descuento correspondiete a la amortozación del anticipo, de manera equivalente al valor del acta.<br>El contratista deberá presentar al supervisor los siguientes documentos: Factura, paz y salvo por concepto de pago de seguridad social y aportes parafiscales de la empresa contratista, impuesto CREE (en el evento que aplique), paz y salvo o certificación por el Supervisor del contrato de la ejecución del objeto contractual.<br>Los desembolsos se darán previo trámite de solicitud de pago y el derecho a turno asignado para la respectiva cuenta legalizada. |
| **Pólizas** | SEGUROS DEL ESTADO S.A. POLIZA DE CUMPLIMIENTO - No. Póliza 85-44-101112196. POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL No. 85-40-101049605 |
| **Aprobación de Pólizas** | 10 de septiembre de 2021 |
| **Fecha Acta de Inicio:** | 13 de Septiembre de 2021 |

# POLIZAS

**POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL**
**DECRETO 1082 DE 2015**

| POLIZA N° 85-44-101112196 Anexo 2 | | | |
|---|---|---|---|
| COMPAÑÍA | SEGUROS DEL ESTADO | | |
| TOMADOR | SEGURIDAD Y SERVICIOS DE SEÑALIZACION | | |
| ASEGURADO/BENEFICIARIO | MUNICIPIO DE SINCELEJO | | |
| FECHA DE EXPEDICION | 09 DE SEPTIEMBRE DE 2021 | | |
| AMPAROS | SUMAS ASEGURADAS | VIGENCIA INICIAL (DD/MM/AA) | VIGENCIA FINAL (DD/MM/AA) |
| Buen manejo y correcta inversión del anticipo | $86,613,659.98 | 26/08/2021 | 26/12/2023 |
| Cumplimiento del contrato | $43,306,829.99 | 26/08/2021 | 26/12/2023 |
| Pagos salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales | $43,306,829.99 | 26/08/2021 | 26/12/2024 |
| Estabilidad y calidad de la obra | $43,306,829.99 | SI AMPARA 5 AÑOS, 0 MESES Y 0 DIAS- | |

**POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DEL CUMPLIMIENTO**

| POLIZA N° 85-40-101049605 Anexo 2 | | | | |
|---|---|---|---|---|
| COMPAÑÍA | SEGUROS DEL ESTADO | | | |
| TOMADOR | SEGURIDAD Y SERVICIOS DE SEÑALIZACION | | | |
| ASEGURADO/BENEFICIARIO | MUNICIPIO DE SINCELEJO | | | |
| FECHA DE EXPEDICION | 09 DE SEPTIEMBRE DE 2021 | | | |
| AMPAROS | VIGENCIA | | | |
| RIESGO: CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES Y EDIFICIOS | DESDE | HASTA | SUMA ASEGURADA ACTUAL | DEDUCIBLE |
| Predios Laborales Y Operaciones | 26/08/2021 | 26/12/2021 | $ 181,705,200.00 | 10% Del valor de la pérdida - mínimo: 1 SMMLV |
| Perjuicios Extrapatrimoniales | 26/08/2021 | 26/12/2021 | $ 181,705,200.00 | 10% Del valor de la pérdida - mínimo: 1 SMMLV |
| Daño Emergente y Lucro Cesante | 26/08/2021 | 26/12/2021 | $ 181,705,200.00 | 10% Del valor de la pérdida - mínimo: 1 SMMLV |
| Contratistas y Subcontratistas | 26/08/2021 | 26/12/2021 | $ 181,705,200.00 | 10% Del valor de la pérdida - mínimo: 1 SMMLV |
| Vehículos Propios y No Propios | 26/08/2021 | 26/12/2021 | $ 181,705,200.00 | 10% Del valor de la pérdida - mínimo: 1 SMMLV |
| Responsabilidad Civil Patronal | 26/08/2021 | 26/12/2021 | $ 181,705,200.00 | 10% Del valor de la pérdida - mínimo: 1 SMMLV |

SEGURIDAD & SERVICIOS SENALIZACION

Sincelejo
Unidos transformamos más

Sincelejo
Secretaría de Movilidad

# DESARROLLO Y AVANCE

Con el fin de dar cumplimiento a las obligaciones adquiridas en el contrato de obra No. **SA-011-MC-2021**, cuyo objeto es ***SUMINISTRO, INSTALACION Y DESMONTE DE SEÑALIZACION HORIZONTAL Y VERTICAL EN VIAS DEL MUNICIPIO DE SINCELEJO***, se presenta el siguiente INFORME DE AVANCE, en el cual se sintetizan las actividades realizadas en desarrollo de las mismas, durante el periodo comprendido entre el **13 de Septiembre al 7 de diciembre del 2021.**

Luego de llevar a cabo cada uno de los tramites de legalización del contrato, se realizaron los recorridos de ubicación de la señalización solicitada por el Municipio, en acompañamiento por el personal de apoyo técnico de la Secretaría de Movilidad, la cual fue designada como Supervisora del Contrato.

De acuerdo a las necesidades plasmadas en el Estudio Previo y a los recorridos realizados, la Entidad realizó el Acta de Modificación No. 1, en la que se realizaron mayores y menores cantidades, ajustando las condiciones contractuales tal como se muestra en la siguiente tabla:

| CONDICIONES CONTRACTUALES INCLUYE ACTA DE MODIFICACION No.1 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| N° | DESCRIPCION | UND. | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
| 1 | **Actividad 1. Suministro e instalación de señalización horizontal.** | | | | |
| 1.1 | Insumo 1.1. Suministro e instalación de Resaltos plásticos: Fabricado en polímeros de alta resistencia al impacto y desgarramiento, Tramo lineal conformado por 4 módulos medida Nal: 108 x 37 x 5 cm. Dimensiones: Base 37 x 27 cm; Altura 5 cm; Peso 1,2 Kg. | Metro Lineal | 144,00 | $ 426.315,00 | $ 61.389.360,00 |
| 1.2 | Insumo 1.2. Demarcación pasos peatonales: contempla el Suministro y aplicación de pintura de tráfico acrílica base solvente para la demarcación de pasos peatonales con líneas de 40 cm de ancho, reflectorizada con microesferas de vidrio con espesores en seco de 9 mil y 51% de sólidos en volumen. | Metro Cuadrado | 1362,21 | $ 50.782,00 | $ 69.175.494,31 |
| 1.3 | IInsumo 1.3. Demarcación Urbanismo Tactico: contempla el Suministro y aplicación de pintura de tráfico acrílica base solvente para la demarcación de pictogramas , reflectorizada con microesferas de vidrio con espesores en seco de 9 mil y 51% de sólidos en volumen. | Metro Cuadrado | 150,00 | $ 58.183,00 | $ 8.727.450,00 |
| 1.4 | IInsumo 1.4. Demarcación Horizontal pintura de tráfico - ACHURADOS: Contempla el Suministro y aplicación de pintura de tráfico acrílica base solvente para la demarcación de marcas viales (Flechas), reflectorizada con microesferas de vidrio con espesores en seco de 9 mil y 51% de sólidos en volumen. | Metro Cuadrado | 150,34 | $ 58.183,00 | $ 8.747.232,22 |
| 1.5 | Insumo 1.5. Demarcación Horizontal pintura de tráfico - FLECHA DE FRENTE: Contempla el Suministro y aplicación de pintura de tráfico acrílica base solvente para la demarcación de marcas viales (Flechas), | Metro Cuadrado | 75,60 | $ 58.183,00 | $ 4.398.634,80 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | reflectorizada con microesferas de vidrio con espesores en seco de 9 mil y 51% de sólidos en volumen. | | | | |
| 1.6 | Insumo 1.6. Demarcación Horizontal pintura de tráfico - FLECHA DE FRENTE O A LA DERECHA. Contempla el Suministro y aplicación de pintura de tráfico acrílica base solvente para la demarcación de marcas viales (Flechas), reflectorizada con microesferas de vidrio con espesores en seco de 9 mil y 51% de sólidos en volumen. | Metro Cuadrado | 36,98 | $ 58.183,00 | $ 2.151.316,43 |
| 1.7 | Insumo 1.7. Demarcación Horizontal pintura de tráfico - FLECHA DE FRENTE A LA DERECHA O A LA IZQUIERDA. Contempla el Suministro y aplicación de pintura de tráfico acrílica base solvente para la demarcación de marcas viales (Flechas), reflectorizada con microesferas de vidrio con espesores en seco de 9 mil y 51% de sólidos en volumen. | Metro Cuadrado | 9,45 | $ 58.183,00 | $ 549.829,35 |
| 1.8 | Insumo 1.8 Demarcación Horizontal pintura de tráfico - FLECHA DE FRENTE O A LA IZQUIERDA. Contempla el Suministro y aplicación de pintura de tráfico acrílica base solvente para la demarcación de marcas viales (Flechas), reflectorizada con microesferas de vidrio con espesores en seco de 9 mil y 51% de sólidos en volumen. | Metro Cuadrado | 36,98 | $ 58.183,00 | $ 2.151.316,43 |
| 1.9 | Insumo 1.9. Demarcación Horizontal pintura de tráfico - FLECHA A LA DERECHA O A LA IZQUIERDA. Contempla el Suministro y aplicación de pintura de tráfico acrílica base solvente para la demarcación de marcas viales (Flechas), reflectorizada con microesferas de vidrio con espesores en seco de 9 mil y 51% de sólidos en volumen. | Metro Cuadrado | 2,48 | $ 58.183,00 | $ 144.218,20 |
| 1.10 | Insumo 1.10. Demarcación Horizontal pintura de tráfico - FLECHA A LA DERECHA. Contempla el Suministro y aplicación de pintura de tráfico acrílica base solvente para la demarcación de marcas viales (Flechas), reflectorizada con microesferas de vidrio con espesores en seco de 9 mil y 51% de sólidos en volumen. | Metro Cuadrado | 1,50 | $ 58.183,00 | $ 87.489,78 |
| 1.11 | Insumo 1.11. Demarcación Horizontal pintura de tráfico - FLECHA A LA IZQUIERDA. Contempla el Suministro y aplicación de pintura de tráfico acrílica base solvente para la demarcación de marcas viales (Flechas), reflectorizada con microesferas de vidrio con espesores en seco de 9 mil y 51% de sólidos en volumen. | Metro Cuadrado | 1,50 | $ 58.183,00 | $ 87.489,78 |
| 1.12 | Insumo 1.12. Demarcación Horizontal pintura de tráfico - FLECHA DE TERMINACION DE CARRIL. Contempla el Suministro y aplicación de pintura de tráfico acrílica base solvente para la demarcación de marcas viales (Flechas), reflectorizada con microesferas de vidrio con espesores en seco de 9 mil y 51% de sólidos en volumen. | Metro Cuadrado | 18,00 | $ 58.183,00 | $ 1.047.294,00 |
| 1.13 | Insumo 1.13. Demarcación Horizontal pintura de tráfico -LIMITE DE VELOCIDAD. Contempla el Suministro y aplicación de pintura de tráfico acrílica base solvente para la demarcación de marcas viales (Flechas), reflectorizada con microesferas de vidrio con espesores en seco de 9 mil y 51% de sólidos en volumen. | Metro Cuadrado | 18,00 | $ 58.183,00 | $ 1.047.294,00 |
| 1.14 | Insumo 1.14. Demarcación Horizontal pintura de tráfico -CEDA EL PASO. Contempla el Suministro y aplicación de pintura de tráfico acrílica base solvente para la demarcación de marcas viales (Flechas), reflectorizada con microesferas de vidrio con espesores en seco de 9 mil y 51% de sólidos en volumen. | Metro Cuadrado | 3,00 | $ 58.183,00 | $ 174.549,00 |
| 1.15 | Insumo 1.15. Demarcación Horizontal pintura de tráfico -ZONA ESCOLAR. Contempla el Suministro y aplicación de pintura de tráfico acrílica base solvente para la demarcación de marcas viales (Flechas), reflectorizada | Metro Cuadrado | 12,00 | $ 58.183,00 | $ 698.196,00 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | con microesferas de vidrio con espesores en seco de 9 mil y 51% de sólidos en volumen. | | | | |
| 1.16 | Insumo 1.16. Demarcación líneas longitudinales: Contempla el Suministro y aplicación de pintura de tráfico acrílica base solvente para la demarcación de líneas longitudinales de 12 cm de espesor, reflectorizada con microesferas de vidrio con espesores en seco de 9 mil y 51% de sólidos en volumen. | Metro lineal | 3743,83 | $ 12.965,00 | $ 48.538.742,59 |
| 1.17 | Insumo 1.17. Borrado Demarcación Horizontal pintura de tráfico -. Contempla el Suministro y aplicación de removedor de pintura tráfico acrílica base solvente para la demarcación de marcas viales (Flechas, achurados ), | Metro Cuadrado | 68,00 | $ 90.278,00 | $ 6.138.904,00 |
| 1.18 | Insumo 1.18. Suministro e instalación de Bordillo no traspasable: Fabricado en polímeros de alta resistencia al impacto y desgarramiento. Utilizado como delimitador de carril horizontal no rebasable. De dimensiones: Base: 20 cm; Altura 15 cm; Longitud 80 cm y Peso de 6 kg. | Unidad | 90,00 | $ 407.507,00 | $ 36.675.630,00 |
| 1.19 | Insumo 1.19. Suministro e instalación de Bordillo Traspasable: Fabricado en polímeros de alta resistencia al impacto y desgarramiento. Utilizado como delimitador de carril horizontal no rebasable. De dimensiones: Base: 15 cm; Altura 8 cm; Longitud 40 cm y Peso de 1,2 kg. | Unidad | 38,00 | $ 192.360,00 | $ 7.309.680,00 |
| 1.20 | Insumo 1.20. Suministro e instalación de Boyas: Fabricado en polímeros de alta resistencia al impacto y desgarramiento. Utilizado como delimitador de carril horizontal no rebasable. De dimensiones: Base: 20 cm; Altura 7 cm; Longitud 20 cm y Peso de 0,6 kg. | Unidad | 150,00 | $ 112.848,00 | $ 16.927.200,00 |
| 1.21 | Insumio 1.21 Estoperol: Fabricado en aluminio de alte resistencia con base plana de 10 cm, Altura 2 cm con espiga para fijarlo al pavimento. | Unidad | 238,00 | $ 26.331,00 | $ 6.266.778,00 |
| 1.22 | Insumo 1.22 Tachon: fabricado en polímeros flexibles de alta resistencia al impacto y desgarramiento. ulilizado como delimitador de carril horizontal rebasable . DIMENSIONES - Longitud: 25 cm - Altura: 6 cm - Profundidad: 15 cm - Peso: 0,65 kg | Unidad | 309,00 | $ 73.978,00 | $ 22.859.202,00 |
| 1.23 | Insumo 1.23. Desmonte de Bordillo Traspasable. | Unidad | 92,00 | $ 43.885,00 | $ 4.037.420,00 |
| 1.24 | **Insumo 1.24.** Desmonte de Hitos. | Unidad | 391,00 | $ 43.885,00 | $ 17.159.035,00 |
| 1.25 | **Insumo 1.25.** Desmonte de Estoperoles | Unidad | 52,00 | $ 15.046,00 | $ 782.392,00 |
| 1.26 | **Insumo 1.26.** Desmonte de Señales verticales | Unidad | 53,00 | $ 43.885,00 | $ 2.325.905,00 |
| | | | | **Subtotal Actividad 1** | **$ 329.598.052,88** |
| | | | | | |
| 2 | **Actividad 2. Suministro e instalación de señalización vertical.** | | | | |
| 2.1 | Insumo 2.1. Señal Vertical: SP-59 - CICLISTAS EN LA VIA": Poste en ángulo de hierro de 2" x1/4" con pintura blanca electrostática secada al horno. Tablero de sencillas de 60cm x 60 cms Lámina galvanizada calibre - 16. De acuerdo a la normativa vigente. Antivandalismo tablero atornillado y con remaches ambos con protección galvanizada. | Unidad | 1,00 | $ 486.851,00 | $ 486.851,00 |
| 2.2 | Insumo 2.2. Señal Vertical: SR- 28A PROHIBIDO PARQUEAR O DETENERSE. Poste en ángulo de hierro de 2" x1/4" con pintura blanca electrostática secada al horno. Tablero de sencillas de 99 cm x 60 cms Lámina galvanizada calibre -16. de acuerdo a la normativa vigente. Antivandalismo tablero atornillado y con remaches ambos con protección galvanizada. | Unidad | 50,00 | $ 533.897,00 | $ 26.694.850,00 |
| 2.3 | Insumo 2.3. Señal Vertical: SP-46 ZONA DE PEATONES. Poste en ángulo de hierro de 2" x1/4" con pintura blanca electrostática secada al horno. Tablero | Unidad | 2,00 | $ 486.851,00 | $ 973.702,00 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | de sencillas de 60cm x 60 cms Lámina galvanizada calibre -16. de acuerdo a la normativa vigente. Antivandalismo tablero atornillado y con remaches ambos con protección galvanizada. | | | | |
| 2.4 | Insumo 2.4. Señal Vertical: SR-01 PARE. Poste en ángulo de hierro de 2" x1/4" con pintura blanca electrostática secada al horno. Tablero de sencillas de 60cm x 60 cms Lámina galvanizada calibre -16. Con cinta 3m grado ingeniería de acuerdo a la normativa vigente. Antivandalismo tablero atornillado y con remaches ambos con protección galvanizada. | Unidad | 12,00 | $ 486.851,00 | $ 5.842.212,00 |
| 2.5 | Insumo 2.5. Señal Vertical: SP 25 - PROXIMIDAD DE RESALTO. Poste en ángulo de hierro de 2" x1/4" con pintura blanca electrostática secada al horno. Tablero de sencillas de 60cm x 60 cms Lámina galvanizada calibre - 16. Con cinta 3m grado ingeniería de acuerdo a la normativa vigente. Antivandalismo tablero atornillado y con remaches ambos con protección galvanizada. | Unidad | 40,00 | $ 486.851,00 | $ 19.474.040,01 |
| 2.6 | Insumo 2.6. Señal Vertical: SP 25A - UBICACIÓN DE RESALTO. Poste en ángulo de hierro de 2" x1/4" con pintura blanca electrostática secada al horno. Tablero de sencillas de 60cm x 60 cms Lámina galvanizada calibre - 16. Con cinta 3m grado ingeniería de acuerdo a la normativa vigente. Antivandalismo tablero atornillado y con remaches ambos con protección galvanizada. | Unidad | 48,00 | $ 486.851,00 | $ 23.368.848,01 |
| 2.7 | Insumo 2.7. Señal Vertical: SR - 04 NO PASE. Poste en ángulo de hierro de 2" x1/4" con pintura blanca electrostática secada al horno. Tablero de sencillas de 60cm x 60 cms Lámina galvanizada calibre -16. de acuerdo a la normativa vigente. Antivandalismo tablero atornillado y con remaches ambos con protección galvanizada. | Unidad | 2,00 | $ 486.851,00 | $ 973.702,00 |
| 2.8 | Insumo 2.8. Señal Vertical: SR-10 PROHIBIDO GIRAR EN U Poste en ángulo de hierro de 2" x1/4" con pintura blanca electrostática secada al horno. Tablero de sencillas de 60cm x 60 cms Lámina galvanizada calibre - 16. de acuerdo a la normativa vigente. Antivandalismo tablero atornillado y con remaches ambos con protección galvanizada | Unidad | 2,00 | $ 486.851,00 | $ 973.702,00 |
| 2.9 | Insumo 2.9. Señal Vertical: SR -07 GIRO A LA DERECHA SOLAMENTE. Poste en ángulo de hierro de 2" x1/4" con pintura blanca electrostática secada al horno. Tablero de sencillas de 60cm x 60 cms Lámina galvanizada calibre - 16. de acuerdo a la normativa vigente. Antivandalismo tablero atornillado y con remaches ambos con protección galvanizada. | Unidad | 1,00 | $ 486.851,00 | $ 486.851,00 |
| 2.10 | Insumo 2.10. es una señal doble, Señal Vertical Doble: SR -02 - SR -07 . Poste en ángulo de hierro de 2" x1/4" con pintura blanca electrostática secada al horno. Tablero de sencillas de 60cm x 60 cms Lámina galvanizada calibre - 16. de acuerdo a la normativa vigente. Antivandalismo tablero atornillado y con remaches ambos con protección galvanizada. | Unidad | 0,00 | $ 520.355,00 | $ 0,00 |
| 2.11 | Insumo 2.11. Señal Vertical: SR -02 CEDA EL PASO. Poste en ángulo de hierro de 2" x1/4" con pintura blanca electrostática secada al horno. Tablero de sencillas de 60cm x 60 cms Lámina galvanizada calibre -16. de acuerdo a la normativa vigente. Antivandalismo tablero atornillado y con remaches ambos con protección galvanizada. | Unidad | 3,00 | $ 486.851,00 | $ 1.460.553,00 |
| 2.12 | Insumo 2.12. Señal Vertical: RUTA ALTERNATIVA. Poste en ángulo de hierro de 2" x1/4" con pintura blanca | Unidad | 1,00 | $ 486.851,00 | $ 486.851,00 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | electrostática secada al horno. Tablero de sencillas de 60cm x 60 cms Lámina galvanizada calibre -16. de acuerdo a la normativa vigente. Antivandalismo tablero atornillado y con remaches ambos con protección galvanizada. | | | | |
| 2.13 | Insumo 2.13. Señal Vertical: SR-08. PROHIBIDO GIRAR A LA DERECHA Poste en ángulo de hierro de 2" x1/4" con pintura blanca electrostática secada al horno. Tablero de sencillas de 60cm x 60 cms Lámina galvanizada calibre -16. de acuerdo a la normativa vigente. Antivandalismo tablero atornillado y con remaches ambos con protección galvanizada. | Unidad | 4,00 | $ 486.851,00 | $ 1.947.404,00 |
| 2.14 | Insumo 2.14. Separadores metálicos en tubo de 2" curvo incluye pintura, anticorrosivo y todas las actividades y elementos necesarios para su correcta instalación. | Unidad | 10,00 | $ 282.120,00 | $ 2.821.200,00 |
| 2.15 | Insumo 2.15. Instalacion de Bolardo | Unidad | 21,00 | $ 496.281,00 | $ 10.421.901,00 |
| 2.16 | Insumo 2.16. Instalacion de Materas | Unidad | 8,00 | $ 344.814,00 | $ 2.758.512,00 |
| | | | | **Subtotal actividad 2** | **$ 99.171.179,00** |
| ITEMS NUEVOS | | | | | |
| 3.1 | Insumo . Señal Vertical: MARCADOR DE OBSTACULO DOBLE Poste en ángulo de hierro de 2" x1/4" con pintura blanca electrostática secada al horno. Tablero de sencillas de 30cm x 80 cms Lámina galvanizada calibre -16. de acuerdo a la normativa vigente. Antivandalismo tablero atornillado y con remaches ambos con protección galvanizada. | Unidad | 1,00 | $ 337.252,00 | $ 337.252,00 |
| 3.2 | Insumo . es una señal doble, Señal Vertical Doble: SR - 01 - SR -08 . Poste en ángulo de hierro de 2" x1/4" con pintura blanca electrostática secada al horno. Tablero de sencillas de 60cm x 60 cms Lámina galvanizada calibre - 16. de acuerdo a la normativa vigente. Antivandalismo tablero atornillado y con remaches ambos con protección galvanizada. | Unidad | 1,00 | $ 520.355,00 | $ 520.355,00 |
| 3.3 | Insumo . Señal Vertical: SR-06. PROHIBIDO GIRAR A LA IZQUIERDA Poste en ángulo de hierro de 2" x1/4" con pintura blanca electrostática secada al horno. Tablero de sencillas de 60cm x 60 cms Lámina galvanizada calibre -16. de acuerdo a la normativa vigente. Antivandalismo tablero atornillado y con remaches ambos con protección galvanizada. | Unidad | 3,00 | $ 486.851,00 | $ 1.460.553,00 |
| 3.4 | Insumo . Señal Vertical: SR-30. VELOCIDAD MAXIMA PERMITIDA Poste en ángulo de hierro de 2" x1/4" con pintura blanca electrostática secada al horno. Tablero de sencillas de 60cm x 60 cms Lámina galvanizada calibre -16. de acuerdo a la normativa vigente. Antivandalismo tablero atornillado y con remaches ambos con protección galvanizada. | Unidad | 1,00 | $ 486.851,00 | $ 486.851,00 |
| 3.5 | Insumo . Señal Vertical: SR-30. VELOCIDAD MAXIMA PERMITIDA Poste en ángulo de hierro de 2" x1/4" con pintura blanca electrostática secada al horno. Tablero de sencillas de 60cm x 60 cms Lámina galvanizada calibre -16. de acuerdo a la normativa vigente. Antivandalismo tablero atornillado y con remaches ambos con protección galvanizada. | Unidad | 2,00 | $ 486.851,00 | $ 973.702,00 |
| 3.6 | Insumo . Señal Vertical ENTAMBORADA: SP 25A - UBICACIÓN DE RESALTO. Poste en ángulo de hierro de 2" x1/4" con pintura blanca electrostática secada al horno. Tablero de sencillas de 60cm x 60 cms Lámina galvanizada calibre - 16. Con cinta 3m grado ingeniería de acuerdo a la normativa vigente. Antivandalismo | Unidad | 1,00 | $ 520.355,00 | $ 520.355,00 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | tablero atornillado y con remaches ambos con protección galvanizada. | | | | |
| | | | | Subtotal actividad 3 | $ 4.299.068,00 |
| | | | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | TOTAL | | $ 433.068.299,88 |
| | DESCRIPCION | | |
| | ADMINISTRACION | 22,00% | $ 72.178.049,98 |
| | IMPREVISTO | 5,00% | $ 16.404.102,27 |
| | UTILIDAD | 5,00% | $ 16.404.102,27 |
| | AL A.I.U | A.I.U.= | 32% |

Teniendo en cuenta los requerimientos solicitados por el contratante, se llevaron a cabo los procesos de fabricación, suministro e instalación de los elementos de seguridad vial, de acuerdo a las necesidades de cada ubicación en el Municipio.

En la siguiente tabla se puede observar el avance del contrato hasta el día 7 de diciembre de 2021, presentando una inversión total en el Acta de Recibo Parcial No.1 de **$217.746.575,15** en costos directos e indirectos, lo que representa el **50,28%** del contrato, siendo recibidas a satisfacción por el Supervisor del contrato.

Las ubicaciones y los registros fotográficos de los elementos de este avance se pueden encontrar en el **ANEXO 1**.

| CONDICIONES CONTRACTUALES INCLUYE ACTA DE MODIFICACION No.1 | | | | | | | PRESENTE ACTA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N° | DESCRIPCION | UND. | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL | | CANTIDAD | VALOR TOTAL |
| 1 | **Actividad 1. Suministro e instalación de señalización horizontal.** | | | | | | | |
| 1.1 | Insumo 1.1. Suministro e instalación de Resaltos plásticos: Fabricado en polímeros de alta resistencia al impacto y desgarramiento, Tramo lineal conformado por 4 módulos medida Nal: 108 x 37 x 5 cm. Dimensiones: Base 37 x 27 cm; Altura 5 cm; Peso 1,2 Kg. | Metro Lineal | 144,00 | $ 426.315,00 | $ 61.389.360,00 | | 81,67 | $ 34.817.146,05 |
| 1.2 | Insumo 1.2. Demarcación pasos peatonales: contempla el Suministro y aplicación de pintura de tráfico acrílica base solvente para la demarcación de pasos peatonales con líneas de 40 cm de ancho, reflectorizada con microesferas de vidrio con espesores en seco de 9 mil y 51% de sólidos en volumen. | Metro Cuadrado | 1362,21 | $ 50.782,00 | $ 69.175.494,31 | | 488,08 | $ 24.785.678,56 |
| 1.3 | IInsumo 1.3. Demarcación Urbanismo Tactico: contempla el Suministro y aplicación de | Metro Cuadrado | 150,00 | $ 58.183,00 | $ 8.727.450,00 | | | $ 0,00 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | pintura de tráfico acrílica base solvente para la demarcación de pictogramas , reflectorizada con microesferas de vidrio con espesores en seco de 9 mil y 51% de sólidos en volumen. | | | | | | | |
| 1.4 | IInsumo 1.4. Demarcación Horizontal pintura de tráfico - ACHURADOS: Contempla el Suministro y aplicación de pintura de tráfico acrílica base solvente para la demarcación de marcas viales (Flechas), reflectorizada con microesferas de vidrio con espesores en seco de 9 mil y 51% de sólidos en volumen. | Metro Cuadrado | 150,34 | $ 58.183,00 | $ 8.747.232,22 | | 70,19 | $ 4.083.952,04 |
| 1.5 | Insumo 1.5. Demarcación Horizontal pintura de tráfico - FLECHA DE FRENTE: Contempla el Suministro y aplicación de pintura de tráfico acrílica base solvente para la demarcación de marcas viales (Flechas), reflectorizada con microesferas de vidrio con espesores en seco de 9 mil y 51% de sólidos en volumen. | Metro Cuadrado | 75,60 | $ 58.183,00 | $ 4.398.634,80 | | 19,20 | $ 1.117.113,60 |
| 1.6 | Insumo 1.6. Demarcación Horizontal pintura de tráfico - FLECHA DE FRENTE O A LA DERECHA. Contempla el Suministro y aplicación de pintura de tráfico acrílica base solvente para la demarcación de marcas viales (Flechas), reflectorizada con microesferas de vidrio con espesores en seco de 9 mil y 51% de sólidos en volumen. | Metro Cuadrado | 36,98 | $ 58.183,00 | $ 2.151.316,43 | | 17,40 | $ 1.012.384,20 |
| 1.7 | Insumo 1.7. Demarcación Horizontal pintura de tráfico - FLECHA DE FRENTE A LA DERECHA O A LA IZQUIERDA. Contempla el Suministro y aplicación de pintura de tráfico acrílica base solvente para la demarcación de marcas viales (Flechas), reflectorizada con microesferas de vidrio con espesores en seco de 9 mil y 51% de sólidos en volumen. | Metro Cuadrado | 9,45 | $ 58.183,00 | $ 549.829,35 | | | $ 0,00 |
| 1.8 | Insumo 1.8 Demarcación Horizontal pintura de tráfico - FLECHA DE FRENTE O A LA IZQUIERDA. Contempla el Suministro y aplicación de pintura de tráfico acrílica base solvente para la demarcación de marcas viales (Flechas), reflectorizada con microesferas de vidrio con espesores en seco | Metro Cuadrado | 36,98 | $ 58.183,00 | $ 2.151.316,43 | | 17,40 | $ 1.012.384,20 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | de 9 mil y 51% de sólidos en volumen. | | | | | | | |
| 1.9 | Insumo 1.9. Demarcación Horizontal pintura de tráfico - FLECHA A LA DERECHA O A LA IZQUIERDA. Contempla el Suministro y aplicación de pintura de tráfico acrílica base solvente para la demarcación de marcas viales (Flechas), reflectorizada con microesferas de vidrio con espesores en seco de 9 mil y 51% de sólidos en volumen. | Metro Cuadrado | 2,48 | $ 58.183,00 | $ 144.218,20 | | | $ 0,00 |
| 1.10 | Insumo 1.10. Demarcación Horizontal pintura de tráfico - FLECHA A LA DERECHA. Contempla el Suministro y aplicación de pintura de tráfico acrílica base solvente para la demarcación de marcas viales (Flechas), reflectorizada con microesferas de vidrio con espesores en seco de 9 mil y 51% de sólidos en volumen. | Metro Cuadrado | 1,50 | $ 58.183,00 | $ 87.489,78 | | | $ 0,00 |
| 1.11 | Insumo 1.11. Demarcación Horizontal pintura de tráfico - FLECHA A LA IZQUIERDA. Contempla el Suministro y aplicación de pintura de tráfico acrílica base solvente para la demarcación de marcas viales (Flechas), reflectorizada con microesferas de vidrio con espesores en seco de 9 mil y 51% de sólidos en volumen. | Metro Cuadrado | 1,50 | $ 58.183,00 | $ 87.489,78 | | | $ 0,00 |
| 1.12 | Insumo 1.12. Demarcación Horizontal pintura de tráfico - FLECHA DE TERMINACION DE CARRIL. Contempla el Suministro y aplicación de pintura de tráfico acrílica base solvente para la demarcación de marcas viales (Flechas), reflectorizada con microesferas de vidrio con espesores en seco de 9 mil y 51% de sólidos en volumen. | Metro Cuadrado | 18,00 | $ 58.183,00 | $ 1.047.294,00 | | | $ 0,00 |
| 1.13 | Insumo 1.13. Demarcación Horizontal pintura de tráfico - LIMITE DE VELOCIDAD. Contempla el Suministro y aplicación de pintura de tráfico acrílica base solvente para la demarcación de marcas viales (Flechas), reflectorizada con microesferas de vidrio con espesores en seco de 9 mil y 51% de sólidos en volumen. | Metro Cuadrado | 18,00 | $ 58.183,00 | $ 1.047.294,00 | | | $ 0,00 |
| 1.14 | Insumo 1.14. Demarcación Horizontal pintura de tráfico - CEDA EL PASO. Contempla el | Metro Cuadrado | 3,00 | $ 58.183,00 | $ 174.549,00 | | | $ 0,00 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Suministro y aplicación de pintura de tráfico acrílica base solvente para la demarcación de marcas viales (Flechas), reflectorizada con microesferas de vidrio con espesores en seco de 9 mil y 51% de sólidos en volumen. | | | | | | | |
| 1.15 | Insumo 1.15. Demarcación Horizontal pintura de tráfico - ZONA ESCOLAR. Contempla el Suministro y aplicación de pintura de tráfico acrílica base solvente para la demarcación de marcas viales (Flechas), reflectorizada con microesferas de vidrio con espesores en seco de 9 mil y 51% de sólidos en volumen. | Metro Cuadrado | 12,00 | $ 58.183,00 | $ 698.196,00 | | | $ 0,00 |
| 1.16 | Insumo 1.16. Demarcación líneas longitudinales: Contempla el Suministro y aplicación de pintura de tráfico acrílica base solvente para la demarcación de líneas longitudinales de 12 cm de espesor, reflectorizada con microesferas de vidrio con espesores en seco de 9 mil y 51% de sólidos en volumen. | Metro lineal | 3743,83 | $ 12.965,00 | $ 48.538.742,59 | | 1391,30 | $ 18.038.204,50 |
| 1.17 | Insumo 1.17. Borrado Demarcación Horizontal pintura de tráfico -. Contempla el Suministro y aplicación de removedor de pintura tráfico acrílica base solvente para la demarcación de marcas viales (Flechas, achurados ), | Metro Cuadrado | 68,00 | $ 90.278,00 | $ 6.138.904,00 | | | $ 0,00 |
| 1.18 | Insumo 1.18. Suministro e instalación de Bordillo no traspasable: Fabricado en polímeros de alta resistencia al impacto y desgarramiento. Utilizado como delimitador de carril horizontal no rebasable. De dimensiones: Base: 20 cm; Altura 15 cm; Longitud 80 cm y Peso de 6 kg. | Unidad | 90,00 | $ 407.507,00 | $ 36.675.630,00 | | 50,00 | $ 20.375.350,00 |
| 1.19 | Insumo 1.19. Suministro e instalación de Bordillo Traspasable: Fabricado en polímeros de alta resistencia al impacto y desgarramiento. Utilizado como delimitador de carril horizontal no rebasable. De dimensiones: Base: 15 cm; Altura 8 cm; Longitud 40 cm y Peso de 1,2 kg. | Unidad | 38,00 | $ 192.360,00 | $ 7.309.680,00 | | 20,00 | $ 3.847.200,00 |
| 1.20 | Insumo 1.20. Suministro e instalación de Boyas: Fabricado en polímeros de alta resistencia al impacto y desgarramiento. Utilizado como delimitador de | Unidad | 150,00 | $ 112.848,00 | $ 16.927.200,00 | | 150,00 | $ 16.927.200,00 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | carril horizontal no rebasable. De dimensiones: Base: 20 cm; Altura 7 cm; Longitud 20 cm y Peso de 0,6 kg. | | | | | | | |
| 1.21 | Insumio 1.21 Estoperol: Fabricado en aluminio de alte resistencia con base plana de 10 cm, Altura 2 cm con espiga para fijarlo al pavimento. | Unidad | 238,00 | $ 26.331,00 | $ 6.266.778,00 | | 150,00 | $ 3.949.650,00 |
| 1.22 | Insumo 1.22 Tachon: fabricado en polímeros flexibles de alta resistencia al impacto y desgarramiento. ulilizado como delimitador de carril horizontal rebasable . DIMENSIONES - Longitud: 25 cm - Altura: 6 cm - Profundidad: 15 cm - Peso: 0,65 kg | Unidad | 309,00 | $ 73.978,00 | $ 22.859.202,00 | | 100,00 | $ 7.397.800,00 |
| 1.23 | Insumo 1.23. Desmonte de Bordillo Traspasable. | Unidad | 92,00 | $ 43.885,00 | $ 4.037.420,00 | | 32,00 | $ 1.404.320,00 |
| 1.24 | **Insumo 1.24**. Desmonte de Hitos. | Unidad | 391,00 | $ 43.885,00 | $ 17.159.035,00 | | 194,00 | $ 8.513.690,00 |
| 1.25 | **Insumo 1.25**. Desmonte de Estoperoles | Unidad | 52,00 | $ 15.046,00 | $ 782.392,00 | | | $ 0,00 |
| 1.26 | **Insumo 1.26**. Desmonte de Señales verticales | Unidad | 53,00 | $ 43.885,00 | $ 2.325.905,00 | | 23,00 | $ 1.009.355,00 |
| | | | | **Subtotal Actividad 1** | **$ 329.598.052,88** | | **Subtotal Actividad 1** | **$ 148.291.428,15** |
| | | | | | | | | |
| 2 | **Actividad 2. Suministro e instalación de señalización vertical.** | | | | | | | |
| 2.1 | Insumo 2.1. Señal Vertical: SP-59 - CICLISTAS EN LA VIA": Poste en ángulo de hierro de 2" x1/4" con pintura blanca electrostática secada al horno. Tablero de sencillas de 60cm x 60 cms Lámina galvanizada calibre -16. De acuerdo a la normativa vigente. Antivandalismo tablero atornillado y con remaches ambos con protección galvanizada. | Unidad | 1,00 | $ 486.851,00 | $ 486.851,00 | | 1,00 | $ 486.851,00 |
| 2.2 | Insumo 2.2. Señal Vertical: SR-28A PROHIBIDO PARQUEAR O DETENERSE. Poste en ángulo de hierro de 2" x1/4" con pintura blanca electrostática secada al horno. Tablero de sencillas de 99 cm x 60 cms Lámina galvanizada calibre -16. de acuerdo a la normativa vigente. Antivandalismo tablero atornillado y con remaches ambos con protección galvanizada. | Unidad | 50,00 | $ 533.897,00 | $ 26.694.850,00 | | 50,00 | $ 26.694.850,00 |
| 2.3 | Insumo 2.3. Señal Vertical: SP-46 ZONA DE PEATONES. Poste en ángulo de hierro de 2" x1/4" con pintura blanca | Unidad | 2,00 | $ 486.851,00 | $ 973.702,00 | | 2,00 | $ 973.702,00 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | electrostática secada al horno. Tablero de sencillas de 60cm x 60 cms Lámina galvanizada calibre -16. de acuerdo a la normativa vigente. Antivandalismo tablero atornillado y con remaches ambos con protección galvanizada. | | | | | | | |
| 2.4 | Insumo 2.4. Señal Vertical: SR-01 PARE. Poste en ángulo de hierro de 2" x1/4" con pintura blanca electrostática secada al horno. Tablero de sencillas de 60cm x 60 cms Lámina galvanizada calibre -16. Con cinta 3m grado ingeniería de acuerdo a la normativa vigente. Antivandalismo tablero atornillado y con remaches ambos con protección galvanizada. | Unidad | 12,00 | $ 486.851,00 | $ 5.842.212,00 | | 12,00 | $ 5.842.212,00 |
| 2.5 | Insumo 2.5. Señal Vertical: SP 25 - PROXIMIDAD DE RESALTO. Poste en ángulo de hierro de 2" x1/4" con pintura blanca electrostática secada al horno. Tablero de sencillas de 60cm x 60 cms Lámina galvanizada calibre - 16. Con cinta 3m grado ingeniería de acuerdo a la normativa vigente. Antivandalismo tablero atornillado y con remaches ambos con protección galvanizada. | Unidad | 40,00 | $ 486.851,00 | $ 19.474.040,01 | | 21,00 | $ 10.223.871,00 |
| 2.6 | Insumo 2.6. Señal Vertical: SP 25A - UBICACIÓN DE RESALTO. Poste en ángulo de hierro de 2" x1/4" con pintura blanca electrostática secada al horno. Tablero de sencillas de 60cm x 60 cms Lámina galvanizada calibre - 16. Con cinta 3m grado ingeniería de acuerdo a la normativa vigente. Antivandalismo tablero atornillado y con remaches ambos con protección galvanizada. | Unidad | 48,00 | $ 486.851,00 | $ 23.368.848,01 | | 30,00 | $ 14.605.530,01 |
| 2.7 | Insumo 2.7. Señal Vertical: SR - 04 NO PASE. Poste en ángulo de hierro de 2" x1/4" con pintura blanca electrostática secada al horno. Tablero de sencillas de 60cm x 60 cms Lámina galvanizada calibre -16. de acuerdo a la normativa vigente. Antivandalismo tablero atornillado y con remaches ambos con protección galvanizada. | Unidad | 2,00 | $ 486.851,00 | $ 973.702,00 | | 2,00 | $ 973.702,00 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.8 | Insumo 2.8. Señal Vertical: SR-10 PROHIBIDO GIRAR EN U Poste en ángulo de hierro de 2" x1/4" con pintura blanca electrostática secada al horno. Tablero de sencillas de 60cm x 60 cms Lámina galvanizada calibre -16. de acuerdo a la normativa vigente. Antivandalismo tablero atornillado y con remaches ambos con protección galvanizada | Unidad | 2,00 | $ 486.851,00 | $ 973.702,00 | | 2,00 | $ 973.702,00 |
| 2.9 | Insumo 2.9. Señal Vertical: SR - 07 GIRO A LA DERECHA SOLAMENTE. Poste en ángulo de hierro de 2" x1/4" con pintura blanca electrostática secada al horno. Tablero de sencillas de 60cm x 60 cms Lámina galvanizada calibre - 16. de acuerdo a la normativa vigente. Antivandalismo tablero atornillado y con remaches ambos con protección galvanizada. | Unidad | 1,00 | $ 486.851,00 | $ 486.851,00 | | 1,00 | $ 486.851,00 |
| 2.10 | Insumo 2.10. es una señal doble, Señal Vertical Doble: SR -02 - SR -07 . Poste en ángulo de hierro de 2" x1/4" con pintura blanca electrostática secada al horno. Tablero de sencillas de 60cm x 60 cms Lámina galvanizada calibre - 16. de acuerdo a la normativa vigente. Antivandalismo tablero atornillado y con remaches ambos con protección galvanizada. | Unidad | 0,00 | $ 520.355,00 | $ 0,00 | | | $ 0,00 |
| 2.11 | Insumo 2.11. Señal Vertical: SR - 02 CEDA EL PASO. Poste en ángulo de hierro de 2" x1/4" con pintura blanca electrostática secada al horno. Tablero de sencillas de 60cm x 60 cms Lámina galvanizada calibre -16. de acuerdo a la normativa vigente. Antivandalismo tablero atornillado y con remaches ambos con protección galvanizada. | Unidad | 3,00 | $ 486.851,00 | $ 1.460.553,00 | | 3,00 | $ 1.460.553,00 |
| 2.12 | Insumo 2.12. Señal Vertical: RUTA ALTERNATIVA. Poste en ángulo de hierro de 2" x1/4" con pintura blanca electrostática secada al horno. Tablero de sencillas de 60cm x 60 cms Lámina galvanizada calibre -16. de acuerdo a la normativa vigente. Antivandalismo tablero atornillado y con remaches | Unidad | 1,00 | $ 486.851,00 | $ 486.851,00 | | 1,00 | $ 486.851,00 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ambos con protección galvanizada. | | | | | | | |
| 2.13 | Insumo 2.13. Señal Vertical: SR-08. PROHIBIDO GIRAR A LA DERECHA Poste en ángulo de hierro de 2" x1/4" con pintura blanca electrostática secada al horno. Tablero de sencillas de 60cm x 60 cms Lámina galvanizada calibre -16. de acuerdo a la normativa vigente. Antivandalismo tablero atornillado y con remaches ambos con protección galvanizada. | Unidad | 4,00 | $ 486.851,00 | $ 1.947.404,00 | | 4,00 | $ 1.947.404,00 |
| 2.14 | Insumo 2.14. Separadores metálicos en tubo de 2" curvo incluye pintura, anticorrosivo y todas las actividades y elementos necesarios para su correcta instalación. | Unidad | 10,00 | $ 282.120,00 | $ 2.821.200,00 | | | $ 0,00 |
| 2.15 | Insumo 2.15. Instalacion de Bolardo | Unidad | 21,00 | $ 496.281,00 | $ 10.421.901,00 | | | $ 0,00 |
| 2.16 | Insumo 2.16. Instalacion de Materas | Unidad | 8,00 | $ 344.814,00 | $ 2.758.512,00 | | | $ 0,00 |
| | | | | **Subtotal actividad 2** | **$ 99.171.179,00** | | **Subtotal actividad 2** | **$ 65.156.079,00** |
| **ITEMS NUEVOS** | | | | | | | | |
| 3.1 | Insumo . Señal Vertical: MARCADOR DE OBSTACULO DOBLE Poste en ángulo de hierro de 2" x1/4" con pintura blanca electrostática secada al horno. Tablero de sencillas de 30cm x 80 cms Lámina galvanizada calibre -16. de acuerdo a la normativa vigente. Antivandalismo tablero atornillado y con remaches ambos con protección galvanizada. | Unidad | 1,00 | $ 337.252,00 | $ 337.252,00 | | 1,00 | $ 337.252,00 |
| 3.2 | Insumo . es una señal doble, Señal Vertical Doble: SR -01 - SR -08 . Poste en ángulo de hierro de 2" x1/4" con pintura blanca electrostática secada al horno. Tablero de sencillas de 60cm x 60 cms Lámina galvanizada calibre - 16. de acuerdo a la normativa vigente. Antivandalismo tablero atornillado y con remaches ambos con protección galvanizada. | Unidad | 1,00 | $ 520.355,00 | $ 520.355,00 | | 1,00 | $ 520.355,00 |
| 3.3 | Insumo . Señal Vertical: SR-06. PROHIBIDO GIRAR A LA IZQUIERDA Poste en ángulo de hierro de 2" x1/4" con pintura blanca electrostática secada al horno. Tablero de sencillas de 60cm x 60 cms Lámina galvanizada calibre -16. de | Unidad | 3,00 | $ 486.851,00 | $ 1.460.553,00 | | 3,00 | $ 1.460.553,00 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | acuerdo a la normativa vigente. Antivandalismo tablero atornillado y con remaches ambos con protección galvanizada. | | | | | | | |
| 3.4 | Insumo . Señal Vertical: SR-30. VELOCIDAD MAXIMA PERMITIDA Poste en ángulo de hierro de 2" x1/4" con pintura blanca electrostática secada al horno. Tablero de sencillas de 60cm x 60 cms Lámina galvanizada calibre -16. de acuerdo a la normativa vigente. Antivandalismo tablero atornillado y con remaches ambos con protección galvanizada. | Unidad | 1,00 | $ 486.851,00 | $ 486.851,00 | | 1,00 | $ 486.851,00 |
| 3.5 | Insumo . Señal Vertical: SR-30. VELOCIDAD MAXIMA PERMITIDA Poste en ángulo de hierro de 2" x1/4" con pintura blanca electrostática secada al horno. Tablero de sencillas de 60cm x 60 cms Lámina galvanizada calibre -16. de acuerdo a la normativa vigente. Antivandalismo tablero atornillado y con remaches ambos con protección galvanizada. | Unidad | 2,00 | $ 486.851,00 | $ 973.702,00 | | 2,00 | $ 973.702,00 |
| 3.6 | Insumo . Señal Vertical ENTAMBORADA: SP 25A - UBICACIÓN DE RESALTO. Poste en ángulo de hierro de 2" x1/4" con pintura blanca electrostática secada al horno. Tablero de sencillas de 60cm x 60 cms Lámina galvanizada calibre - 16. Con cinta 3m grado ingeniería de acuerdo a la normativa vigente. Antivandalismo tablero atornillado y con remaches ambos con protección galvanizada. | Unidad | 1,00 | $ 520.355,00 | $ 520.355,00 | | 1,00 | $ 520.355,00 |
| | | | | **Subtotal actividad 3** | **$ 4.299.068,00** | | **Subtotal actividad 3** | **$ 4.299.068,00** |
| | | | | | | | | |
| | | | **TOTAL** | | **$ 433.068.299,88** | | | **$ 217.746.575,15** |
| | | | **DESCRIPCION** | | | | | |
| | | | **ADMINIS TRACION** | 22,00% | **$ 72.178.049,98** | | | **$ 36.291.095,86** |
| | | | **IMPREVISTO** | 5,00% | **$ 16.404.102,27** | | | **$ 8.247.976,33** |
| | | | **UTILIDAD** | 5,00% | **$ 16.404.102,27** | | | **$ 8.247.976,33** |
| | | | **AL A.I.U** | **A.I.U.=** | **32%** | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | **AMORTIZACION DEL ANTICIPO (20%)** | | **$ 86.613.659,98** | | | **$ 43.549.315,03** |
| | | | **VALOR NETO DEL ACTA** | | | | | **$ 174.197.260,12** |

| RESUMEN DE AVANCE DEL CONTRATO | | | |
|---|---|---|---|
| **Fecha** | **Concepto** | **Valor Total** | **% de Avance** |
| | Acta de Avance No. 1 | **$217.746.575,15** | **50,28%** |
| | | | |
| | | | |
| | **Total Avance del Contrato** | **$217.746.575,15** | **50,28%** |

**JUAN PABLO PIEDRAHITA SILEBE**
**CC. No. 8.786.022**
**Representante Legal**

SEGURIDAD & SERVICIOS SENALIZACION

Sincelejo
Unidos transformamos más

Sincelejo
Secretaría de Movilidad

# ANEXO No.1 UBICACIÓN DE LA INSTALACIÓN Y REGISTRO FOTOGRÁFICO

| N° | DESCRIPCION | UND. | CANTIDAD |
|---|---|---|---|
| 1.1 | Insumo 1.1. Suministro e instalación de Resaltos plásticos: Fabricado en polímeros de alta resistencia al impacto y desgarramiento, Tramo lineal conformado por 4 módulos medida Nal: 108 x 37 x 5 cm. Dimensiones: Base 37 x 27 cm; Altura 5 cm; Peso 1,2 Kg. | Metro Lineal | 81,67 |
| 2.5 | Insumo 2.5. Señal Vertical: SP 25 - PROXIMIDAD DE RESALTO. Poste en ángulo de hierro de 2" x1/4" con pintura blanca electrostática secada al horno. Tablero de sencillas de 60cm x 60 cms Lámina galvanizada calibre - 16. Con cinta 3m grado ingeniería de acuerdo a la normativa vigente. Antivandalismo tablero atornillado y con remaches ambos con protección galvanizada. | Unidad | 21,00 |
| 2.6 | Insumo 2.6. Señal Vertical: SP 25A - UBICACIÓN DE RESALTO. Poste en ángulo de hierro de 2" x1/4" con pintura blanca electrostática secada al horno. Tablero de sencillas de 60cm x 60 cms Lámina galvanizada calibre - 16. Con cinta 3m grado ingeniería de acuerdo a la normativa vigente. Antivandalismo tablero atornillado y con remaches ambos con protección galvanizada. | Unidad | 30,00 |
| 3.6 | Insumo . Señal Vertical ENTAMBORADA: SP 25A - UBICACIÓN DE RESALTO. Poste en ángulo de hierro de 2" x1/4" con pintura blanca electrostática secada al horno. Tablero de sencillas de 60cm x 60 cms Lámina galvanizada calibre - 16. Con cinta 3m grado ingeniería de acuerdo a la normativa vigente. Antivandalismo tablero atornillado y con remaches ambos con protección galvanizada. | Unidad | 1,00 |

| NUM | DIRECCION | RESALTO | SP-25 | SP-25A |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CRA 10A 5 | 5,33 | 1 | 2 |
| 2 | CRA 10A 6 | 5,33 | 1 | 2 |
| 3 | CALLE 25 9B 3-37 | 5,33 | 1 | 2 |
| 4 | CALLE 25 9B 3-37 | 5,33 | 1 | 2 |
| 5 | CRA 14B 31A 04 | 5,33 | 1 | 2 |
| 6 | CRA 14B 31 46 | 5,33 | 1 | 2 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 7 | CRA 17 33 04 | 4,34 | 1 | 2 |
| 8 | CRA 17 32C 35 | 5,34 | 1 | 2 |
| 9 | CRA 16F 40B 26 | 4,34 | 2 | 2 |
| 10 | CRA 16F 40D 04 | 4,34 | 1 | 2 |
| 11 | CALLE 6 10 13 CHOCHO | 5,34 | 2 | 2 |
| 12 | CALLE 6 9 36 CHOCHO | 5,33 | 2 | 2 |
| 13 | CRA 6 7 21 CHOCHO | 5,33 | 1 | 2 |
| 14 | CRA 6 5 31 CHOCHO | 5,33 | 1 | 2 |
| 15 | CALLE 2 CRA 1 144 LAS PALMAS | 5 | 2 | 2 |
| 16 | CALLE 2 CRA 1 144 LAS PALMAS | 5 | 2 | 1 |






| N° | DESCRIPCION | UND. | CANTIDAD |
|---|---|---|---|
| 1.2 | Insumo 1.2. Demarcación pasos peatonales: contempla el Suministro y aplicación de pintura de tráfico acrílica base solvente para la demarcación de pasos peatonales con líneas de 40 cm de ancho, reflectorizada con microesferas de vidrio con espesores en seco de 9 mil y 51% de sólidos en volumen. | Metro Cuadrado | 488,08 |
| 1.4 | IInsumo 1.4. Demarcación Horizontal pintura de tráfico - ACHURADOS: Contempla el Suministro y aplicación de pintura de tráfico acrílica base solvente para la demarcación de marcas viales (Flechas), reflectorizada con microesferas de vidrio con espesores en seco de 9 mil y 51% de sólidos en volumen. | Metro Cuadrado | 70,19 |
| 1.5 | Insumo 1.5. Demarcación Horizontal pintura de tráfico - FLECHA DE FRENTE: Contempla el Suministro y aplicación de pintura de tráfico acrílica base solvente para la demarcación de marcas viales (Flechas), reflectorizada con microesferas de vidrio con espesores en seco de 9 mil y 51% de sólidos en volumen. | Metro Cuadrado | 19,20 |
| 1.6 | Insumo 1.6. Demarcación Horizontal pintura de tráfico - FLECHA DE FRENTE O A LA DERECHA. Contempla el Suministro y aplicación de pintura de tráfico acrílica base solvente para la demarcación de marcas viales (Flechas), reflectorizada con microesferas de vidrio con espesores en seco de 9 mil y 51% de sólidos en volumen. | Metro Cuadrado | 17,40 |
| 1.8 | Insumo 1.8 Demarcación Horizontal pintura de tráfico - FLECHA DE FRENTE O A LA IZQUIERDA. Contempla el Suministro y aplicación de pintura de tráfico acrílica base solvente para la demarcación de marcas viales (Flechas), reflectorizada con microesferas de vidrio con espesores en seco de 9 mil y 51% de sólidos en volumen. | Metro Cuadrado | 17,40 |
| 1.16 | Insumo 1.16. Demarcación líneas longitudinales: Contempla el Suministro y aplicación de pintura de tráfico acrílica base solvente para la demarcación de líneas longitudinales de 12 cm de espesor, reflectorizada con microesferas de vidrio con espesores en seco de 9 mil y 51% de sólidos en volumen. | Metro lineal | 1391,30 |

SEGURIDAD & SERVICIOS SENALIZACION

Sincelejo
Unidos transformamos más

Sincelejo
Secretaría de Movilidad

## Plaza de Majagual

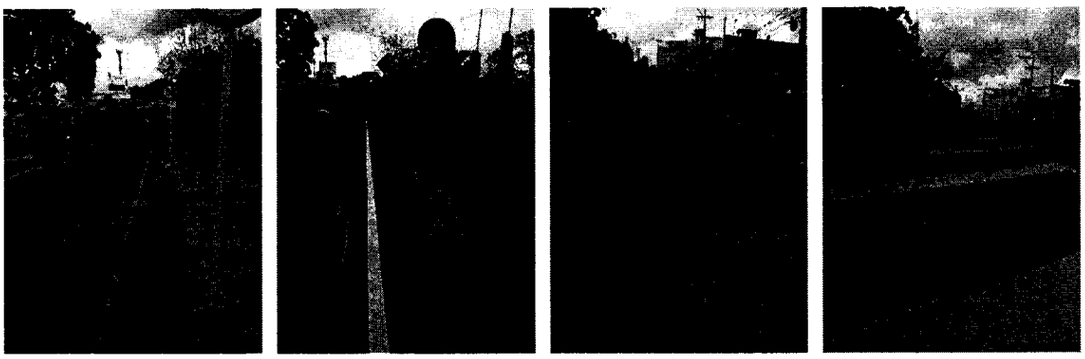

## Avenida Ocala con Avenida La Paz



SEGURIDAD & SERVICIOS SENALIZACION

Sincelejo
Unidos transformamos más


Sincelejo
Secretaría de Movilidad



## Avenida Ocala con Calle 28



| N° | DESCRIPCION | UND. | CANTIDAD |
|---|---|---|---|
| 1.18 | Insumo 1.18. Suministro e instalación de Bordillo no traspasable: Fabricado en polímeros de alta resistencia al impacto y desgarramiento. Utilizado como delimitador de carril horizontal no rebasable. De dimensiones: Base: 20 cm; Altura 15 cm; Longitud 80 cm y Peso de 6 kg. | Unidad | 50,00 |
| 1.19 | Insumo 1.19. Suministro e instalación de Bordillo Traspasable: Fabricado en polímeros de alta resistencia al impacto y desgarramiento. Utilizado como delimitador de carril horizontal no rebasable. De dimensiones: Base: 15 cm; Altura 8 cm; Longitud 40 cm y Peso de 1,2 kg. | Unidad | 20,00 |
| 1.20 | Insumo 1.20. Suministro e instalación de Boyas: Fabricado en polímeros de alta resistencia al impacto y desgarramiento. Utilizado como delimitador de carril horizontal no rebasable. De dimensiones: Base: 20 cm; Altura 7 cm; Longitud 20 cm y Peso de 0,6 kg. | Unidad | 150,00 |
| 1.21 | Insumio 1.21 Estoperol: Fabricado en aluminio de alte resistencia con base plana de 10 cm, Altura 2 cm con espiga para fijarlo al pavimento. | Unidad | 150,00 |
| 1.22 | Insumo 1.22 Tachon: fabricado en polímeros flexibles de alta resistencia al impacto y desgarramiento. ulilizado como delimitador de carril horizontal rebasable . DIMENSIONES - Longitud: 25 cm - Altura: 6 cm - Profundidad: 15 cm - Peso: 0,65 kg | Unidad | 100,00 |
| 1.23 | Insumo 1.23. Desmonte de Bordillo Traspasable. | Unidad | 32,00 |
| 1.24 | **Insumo 1.24**. Desmonte de Hitos. | Unidad | 194,00 |

## Plaza de Majagual

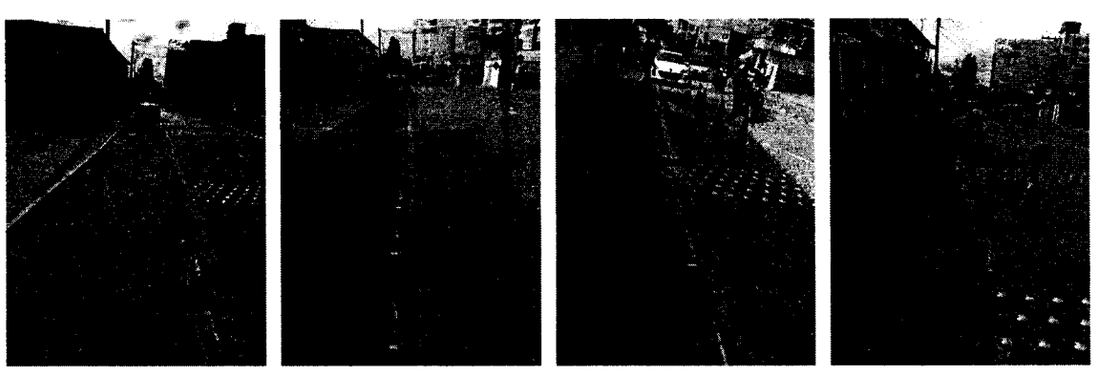

| N° | DESCRIPCION | UND. | CANTIDAD |
|---|---|---|---|
| 1.26 | Insumo 1.26. Desmonte de Señales verticales | Unidad | 23,00 |
| 2.1 | Insumo 2.1. Señal Vertical: SP-59 - CICLISTAS EN LA VIA": Poste en ángulo de hierro de 2" x1/4" con pintura blanca electrostática secada al horno. Tablero de sencillas de 60cm x 60 cms Lámina galvanizada calibre -16. De acuerdo a la normativa vigente. Antivandalismo tablero atornillado y con remaches ambos con protección galvanizada. | Unidad | 1,00 |
| 2.2 | Insumo 2.2. Señal Vertical: SR- 28A PROHIBIDO PARQUEAR O DETENERSE. Poste en ángulo de hierro de 2" x1/4" con pintura blanca electrostática secada al horno. Tablero de sencillas de 99 cm x 60 cms Lámina galvanizada calibre -16. de acuerdo a la normativa vigente. Antivandalismo tablero atornillado y con remaches ambos con protección galvanizada. | Unidad | 50,00 |
| 2.3 | Insumo 2.3. Señal Vertical: SP-46 ZONA DE PEATONES. Poste en ángulo de hierro de 2" x1/4" con pintura blanca electrostática secada al horno. Tablero de sencillas de 60cm x 60 cms Lámina galvanizada calibre -16. de acuerdo a la normativa vigente. Antivandalismo tablero atornillado y con remaches ambos con protección galvanizada. | Unidad | 2,00 |
| 2.4 | Insumo 2.4. Señal Vertical: SR-01 PARE. Poste en ángulo de hierro de 2" x1/4" con pintura blanca electrostática secada al horno. Tablero de sencillas de 60cm x 60 cms Lámina galvanizada calibre -16. Con cinta 3m grado ingeniería de acuerdo a la normativa | Unidad | 12,00 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | vigente. Antivandalismo tablero atornillado y con remaches ambos con protección galvanizada. | | |
| 2.5 | Insumo 2.5. Señal Vertical: SP 25 - PROXIMIDAD DE RESALTO. Poste en ángulo de hierro de 2" x1/4" con pintura blanca electrostática secada al horno. Tablero de sencillas de 60cm x 60 cms Lámina galvanizada calibre - 16. Con cinta 3m grado ingeniería de acuerdo a la normativa vigente. Antivandalismo tablero atornillado y con remaches ambos con protección galvanizada. | Unidad | 21,00 |
| 2.6 | Insumo 2.6. Señal Vertical: SP 25A - UBICACIÓN DE RESALTO. Poste en ángulo de hierro de 2" x1/4" con pintura blanca electrostática secada al horno. Tablero de sencillas de 60cm x 60 cms Lámina galvanizada calibre - 16. Con cinta 3m grado ingeniería de acuerdo a la normativa vigente. Antivandalismo tablero atornillado y con remaches ambos con protección galvanizada. | Unidad | 30,00 |
| 2.7 | Insumo 2.7. Señal Vertical: SR - 04 NO PASE. Poste en ángulo de hierro de 2" x1/4" con pintura blanca electrostática secada al horno. Tablero de sencillas de 60cm x 60 cms Lámina galvanizada calibre -16. de acuerdo a la normativa vigente. Antivandalismo tablero atornillado y con remaches ambos con protección galvanizada. | Unidad | 2,00 |
| 2.8 | Insumo 2.8. Señal Vertical: SR-10 PROHIBIDO GIRAR EN U Poste en ángulo de hierro de 2" x1/4" con pintura blanca electrostática secada al horno. Tablero de sencillas de 60cm x 60 cms Lámina galvanizada calibre -16. de acuerdo a la normativa vigente. Antivandalismo tablero atornillado y con remaches ambos con protección galvanizada | Unidad | 2,00 |
| 2.9 | Insumo 2.9. Señal Vertical: SR -07 GIRO A LA DERECHA SOLAMENTE. Poste en ángulo de hierro de 2" x1/4" con pintura blanca electrostática secada al horno. Tablero de sencillas de 60cm x 60 cms Lámina galvanizada calibre - 16. de acuerdo a la normativa vigente. Antivandalismo tablero atornillado y con remaches ambos con protección galvanizada. | Unidad | 1,00 |
| 2.11 | Insumo 2.11. Señal Vertical: SR -02 CEDA EL PASO. Poste en ángulo de hierro de 2" x1/4" con pintura blanca electrostática secada al horno. Tablero de sencillas de 60cm x 60 cms Lámina galvanizada calibre | Unidad | 3,00 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | -16. de acuerdo a la normativa vigente. Antivandalismo tablero atornillado y con remaches ambos con protección galvanizada. | | |
| 2.12 | Insumo 2.12. Señal Vertical: RUTA ALTERNATIVA. Poste en ángulo de hierro de 2" x1/4" con pintura blanca electrostática secada al horno. Tablero de sencillas de 60cm x 60 cms Lámina galvanizada calibre -16. de acuerdo a la normativa vigente. Antivandalismo tablero atornillado y con remaches ambos con protección galvanizada. | Unidad | 1,00 |
| 2.13 | Insumo 2.13. Señal Vertical: SR-08. PROHIBIDO GIRAR A LA DERECHA Poste en ángulo de hierro de 2" x1/4" con pintura blanca electrostática secada al horno. Tablero de sencillas de 60cm x 60 cms Lámina galvanizada calibre -16. de acuerdo a la normativa vigente. Antivandalismo tablero atornillado y con remaches ambos con protección galvanizada. | Unidad | 4,00 |
| 3.1 | Insumo . Señal Vertical: MARCADOR DE OBSTACULO DOBLE Poste en ángulo de hierro de 2" x1/4" con pintura blanca electrostática secada al horno. Tablero de sencillas de 30cm x 80 cms Lámina galvanizada calibre -16. de acuerdo a la normativa vigente. Antivandalismo tablero atornillado y con remaches ambos con protección galvanizada. | Unidad | 1,00 |
| 3.2 | Insumo . es una señal doble, Señal Vertical Doble: SR - 01 - SR -08 . Poste en ángulo de hierro de 2" x1/4" con pintura blanca electrostática secada al horno. Tablero de sencillas de 60cm x 60 cms Lámina galvanizada calibre - 16. de acuerdo a la normativa vigente. Antivandalismo tablero atornillado y con remaches ambos con protección galvanizada. | Unidad | 1,00 |
| 3.3 | Insumo . Señal Vertical: SR-06. PROHIBIDO GIRAR A LA IZQUIERDA Poste en ángulo de hierro de 2" x1/4" con pintura blanca electrostática secada al horno. Tablero de sencillas de 60cm x 60 cms Lámina galvanizada calibre -16. de acuerdo a la normativa vigente. Antivandalismo tablero atornillado y con remaches ambos con protección galvanizada. | Unidad | 3,00 |
| 3.4 | Insumo . Señal Vertical: SR-30. VELOCIDAD MAXIMA PERMITIDA Poste en ángulo de hierro de 2" x1/4" con pintura blanca electrostática secada al horno. Tablero de sencillas de 60cm x 60 cms Lámina galvanizada calibre -16. de acuerdo a la normativa | Unidad | 1,00 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | vigente. Antivandalismo tablero atornillado y con remaches ambos con protección galvanizada. | | |
| 3.5 | Insumo . Señal Vertical: SR-30. VELOCIDAD MAXIMA PERMITIDA Poste en ángulo de hierro de 2" x1/4" con pintura blanca electrostática secada al horno. Tablero de sencillas de 60cm x 60 cms Lámina galvanizada calibre -16. de acuerdo a la normativa vigente. Antivandalismo tablero atornillado y con remaches ambos con protección galvanizada. | Unidad | 2,00 |

| DIRECCION | TIPO DE SEÑAL | INSTALACION | DESMONTE |
|---|---|---|---|
| CL 21 18 77 | SR28A | 1 | 1 |
| CL 21 20 40 | SR30(30) | 1 | 1 |
| CL 21 20 ESQ | SR01 | 1 | |
| CL 21 22 13 | SR28A | 1 | |
| CL 21 23 57 | SR28A | 1 | |
| CL 21 24 | SR28A | 1 | |
| CL 21 24 ESQ | SR30(20) | 1 | 1 |
| CL 22 17 65 | SR28A | 1 | 1 |
| CL 22 18 | SR28A | 1 | 1 |
| CL 22 20 | SP59 | 1 | |
| CL 22 21 ESQ | SR01 | 1 | |
| CL 22 21 A | SR28A | 1 | 1 |
| CL 22 23 | SR28A | 1 | |
| CL 22 24 80 | SR28A | 1 | |
| CL 23 14 25 | SR28A | 1 | |
| CL 23 15 62 | SR28A | 1 | |
| CL 23 17 69 | SP46 | 1 | 1 |
| CL 23 18 30 | SR28A | 1 | |
| CL 23 18 | SP46 | 1 | 1 |
| CL 23 19 40 | SR28A | 1 | 1 |
| CL 23 20 30 | SR28A | 1 | |
| CL 23 21 55 TEATRO | SR28A | 1 | 1 |
| CL 23 22 19 | SR28A | 1 | 1 |
| CL 23 23 84 | SR28A | 1 | 1 |
| CL 23 23A | SR28A | 1 | 1 |
| CL 23 A 14 | RUTA ALTERNATIVA | 1 | 1 |
| CL 24 18 37 | SR28A | 1 | |
| CL 24 19 22 | SR28A | 1 | |
| CL 24 20 ESQ | SR01/SR08 | 1 | |
| CL 25 18 18 | SR28A | 1 | |
| CL 25 18 ESQ | SR06 | 1 | 1 |

SEGURIDAD & SERVICIOS SENALIZACION



Sincelejo
Unidos transformamos más


Sincelejo
Secretaría de Movilidad

| | | | |
|---|---|---|---|
| CL 25 18 ESQ | SR08 | 1 | 1 |
| CL 25 19 26 | SR28A | 1 | |
| CL 25 20 60 | SR28A | 1 | |
| CL 25 22 63 | SR28A | 1 | |
| CL 25 25 120 | SR28A | 1 | 1 |
| | | 1 | 1 |
| | | 1 | 1 |
| | | | 1 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| CL 25 18 ESQ | SR08 | 1 | 1 |
| CL 25 19 26 | SR28A | 1 | |
| CL 25 20 60 | SR28A | 1 | |
| CL 25 22 63 | SR28A | 1 | |
| CL 25 25 120 | SR28A | 1 | 1 |
| CL 25 25 140 | SR28A | 1 | 1 |
| CR 25B 25 | SR28A | 1 | 1 |
| CR 25B 28 ESQ | SR01 | 1 | 1 |
| CL 28 25 B | SR10 | 1 | |
| CRA 29 TV 32 | SR10 | 1 | |
| CL 32 27 A 107 | SR28A | 1 | |
| CL 32 | SR28A | 1 | |
| CL 32 | SR30(30) | 1 | |
| CR 14 21 ESQ | SR08 | 1 | |
| CR 14 22 ESQ | SR06 | 1 | |
| CR 17 16A | SR04 | 1 | |
| CR 17 20 18 | SP23 | | |
| CR 17 23 | SR28A | 1 | |
| CR 17 24 ESQ | SR01 | 1 | |
| CR 18 24 28 | SR28A | 1 | |
| CR 19 21 68 | SR28A | 1 | 1 |
| CR 19 23 23 | SR28A | 1 | |
| CR 19 23 ESQ | SR08 | 1 | |
| CR 19 24 19 | SR28A | 1 | |
| CR 19 28 | SR05 | | |
| CR 19 A 15 100 | SR28A | 1 | |
| CR 19 A 15 15 | SR28A | 1 | |
| CR 20 13 A | SR28A | 1 | 1 |
| CR 20 13A | SR28A | 1 | 1 |
| CR 20 15 | SR28A | 1 | |
| CR 20 16 | SR28A | 1 | |
| CR 20 18 17 | SR28A | 1 | |
| CR 20 18B | SR28A | 1 | |
| CR 20 20 | SR08 | 1 | |
| CR 20 20-19 | SR28A | 1 | |
| CR 20 22 | SR28A | 1 | |
| CR 20 24 51 | SR28A | 1 | |
| CR 20 25 92 | SR28A | 1 | |
| CR 20 27 | SR28A | 1 | |
| CR 21 14 27 | SR28A | 1 | |
| CR 21 19 ESQ | SR01 | | |
| CR 21 20 ESQ | SR01 | 1 | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| CR 22 14 ESQ | SR01 | 1 | |
| CR 22 14 ESQ | SR04 | 1 | |
| CR 22 18 120 | SR06 | 1 | |
| CR 22 18 ES | SR01 | 1 | |
| CR 29 TRAV 31 | SR01 | 1 | |
| CR 29 TRAV 31 | SR28A | 1 | |
| CR 29 TRAV 33 | SR01 | 1 | |
| TV 31 DIAG 35 | SR02 | 3 | |
| DIAG 18 12 | SR07 | 1 | |
| DIAG 18 12 | CHEVRON DOBLE | 1 | |
| CL 28 17 | SR28A | 1 | |
| CR 36 32A | SR01 | 2 | |

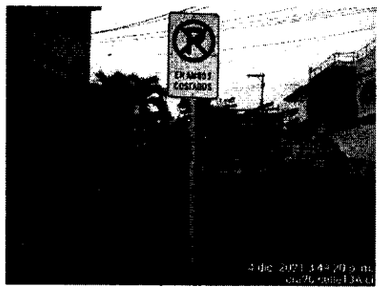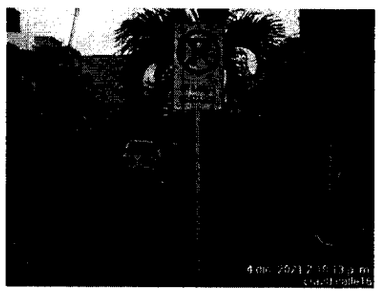
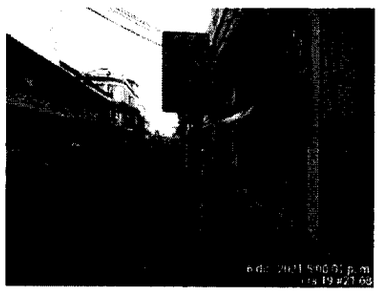
# PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
# COMPROBANTE DE PAGO

BBVA

| | | | |
|---|---|---|---|
| TIPO IDENTIFICACIÓN: | | NIT NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN: | 802017424 |
| NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL: | | | SEGURIDAD Y SERVICIOS SENALIZACION SA |
| CIUDAD/MUNICIPIO: | BARRANQUILLA | DEPARTAMENTO: | ATLANTICO |
| DIRECCIÓN: | CR 33 53C - 48 | TELÉFONO: | 3705195 |
| TIPO APORTANTE: | 01-EMPLEADOR | CLASE APORTANTE: | B-MENOS DE 200 COTIZANTES |
| TIPO EMPRESA: | PRIVADA | ACTIVIDAD ECONOMICA: | Actividades reguladoras y |
| FORMA DE PRESENTACIÓN: | SUCURSAL | SUCURSAL / DEPENDENCIA: | 001 - SINCELEJO |
| APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA): | | | SI |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| NÚMERO PLANILLA: | **7819024105** | TIPO DE PLANILLA: | | | E-EMPLEADOS |
| PERIODO COTIZACIÓN | MES: | noviembre | PERIODO COTIZACIÓN | MES: | diciembre |
| OTROS SUBSISTEMAS: | AÑO: | 2021 | SALUD: | AÑO: | 2021 |
| DÍAS DE MORA: | | 0 | | | |
| FECHA PAGO (aaaa/mm/dd): | | 2021/12/03 | NÚMERO AUTORIZACIÓN: | | 1229792571 |

| | | | TOTALES | |
|---|---|---|---|---|
| | | | COTIZANTES | TOTAL PAGADO |
| **PENSIÓN** | | | | |
| ADMINISTRADORA | | | | |
| NIT | CÓDIGO | NOMBRE | | |
| 900336004 | 25-14 | 25-14 COLPENSIONES | 1 | $ 320.000 |
| 800227940 | 231001 | 231001-COLFONDOS | 1 | $ 240.000 |
| 800224808 | 230301 | 230301-PORVENIR | 3 | $ 431.400 |
| **SUBTOTAL:** | | | 5 | **$ 991.400** |
| **SALUD** | | | | |
| ADMINISTRADORA | | | | |
| NIT | CÓDIGO | NOMBRE | | |
| 800251440 | EPS005 | EPS005-SANITAS S.A. | 2 | $ 140.000 |
| 800130907 | EPS002 | EPS002-SALUD TOTAL | 1 | $ 36.400 |
| 806008394 | ESSC07 | ESSC07-ASOC. MUT. SER EMPRESA SOL. ESS | 2 | $ 71.600 |
| **SUBTOTAL:** | | | 5 | **$ 248.000** |
| **CAJA DE COMPENSACIÓN** | | | | |
| ADMINISTRADORA | | | | |
| NIT | CÓDIGO | NOMBRE | | |
| 890101994 | CCF07 | CCF07-COMFAMILIAR ATLÁNTICO | 5 | $ 248.000 |
| **SUBTOTAL:** | | | 5 | **$ 248.000** |
| **RIESGOS PROFESIONALES** | | | | |
| ADMINISTRADORA | | | | |
| NIT | CÓDIGO | NOMBRE | | |
| 890903790 | 14-11 | 14-11 - ARL SURA | 5 | $ 151.200 |
| **SUBTOTAL:** | | | 5 | **$ 151.200** |

| | |
|---|---|
| **TOTAL PAGADO:** | **$ 1.638.600** |

# SEGURIDAD Y SERVICIOS SEÑALIZACION S.A.

NIT: 802.017.424-3
Carrera 33 N° 53C - 48
PBX: 3705195 - FAX 3796456
BARRANQUILLA
Regimen Comun. Actividad ICA- 4210 Tarifa 7 x Mil.

CONVERTIDOR AUTORIZADO

Res.Dian Electronica No. 18764019811467 de fecha 21.10.2021 CON VIGENCIA DE 12 MESES
desde SYS 755 a 1000 vence 21 Oct 2022

Cliente.....: MUNICIPIO DE SINCELEJO
Nit/Cedula...: 800104062
**Direccion.:** CL 28 25 A 246 AV LUIS CARLOS GALAN ET SEGUNDA
**Telefono..:** 2748824 - 27
Vendedor..: PIEDRAHITA SILEBE JUAN PABLO
Orden No..: SA-011-MC2021

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
No. SYS 871
Fecha Factura..: 20-12-2021
Vencimiento.....: 30-12-2021
Condiciones.....: 10 DIAS
Remision No.....:

Factura Electronica de venta elaborada por software FOMPLUS_NET NIT. 802008489-3 L.F OROZCO PEREZ Y CIA S C A; Facturador Electronico FACTURE S.A.S NIT 900399741-7

| CANT. | DESCRIPCION DEL PRODUCTO | Vr.UNIDAD | Vr.TOTAL |
|---|---|---|---|
| 1.00 | COSTO DIRECTO POR AVANCE DE OBRAS, SEGUN ACTA DE AVANCE N°1, CORRESPONDIENTE A CONTRATO DE OBRA N°SA-011-MC-2021, CUYO OBJETO ES: "SUMINISTRO, INSTALACION Y DESMONTE DE SEÑALIZACION HORIZONTAL Y VERTICAL EN VIAS DEL MUNICIPIO DE SINCELEJO" | 164,959,526.63 | 164,959,526.63 |

SON: DOSCIENTOS DIECISIETE MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS CON 00/100 M.L.

OBS: VALOR FACTURA $217.746.575 MENOS AMORTIZACION 20% DE ANTICIPO $43.549.315.03 SALDO A PAGAR $174.197.259.97

**La presente FACTURA DE VENTA se asimila en todos sus efectos legales a LA LETRA DE CAMBIO, segun el articulo 779 del codigo de comercio Y TIENE CARACTER DE TITULO VALOR QUE SE RIGE POR LA LEY 1231 DE JULIO 17/2008.**

Version: 02 Fecha de Aprobacion 12/10/17

| | | |
|---|---|---|
| Vr.Bruto | : | 164,959,527.00 |
| Vr.descue | : | 0.00 |
| Vr.Administra. 22% | : | 36,291,096.00 |
| Vr.Imprevisto 5% | : | 8,247,976.00 |
| Vr.Utilidad 5% | : | 8,247,976.00 |
| **Vr.Subtotal** | : | **217,746,575.00** |
| Vr.IVA | : | 0.00 |
| Vr.IVA Ret | : | 0.00 |
| Vr.Ret.Fuente | : | 0.00 |
| Vr.Ret.Ic | : | 0.00 |
| **Total Factura** | : | **217,746,575.00** |

FACTURA IMPRESA POR COMPUTADOR PROGRAMA FOMPLUS.NET PARA WINDOWS TEL: 3782737
**E-mail: cartera@seguridadyservicios.com - www.seguridadyservicios.com**

AUTORIZADA POR.:_____
NIT/CC No.

RECIBIDO POR.:_____
NIT/CC No.

CUFE: b800873866a1edec494ba0555b6330fcbefecb22c6a5dbea783d44f0485349e16301609c158b76170ed25dd0c1c93d34

# SEGURIDAD Y SERVICIOS SEÑALIZACION S.A.

NIT: 802.017.424-3
Carrera 33 N° 53C - 48
PBX: 3705195 - FAX 3796456
BARRANQUILLA
Regimen Comun. Actividad ICA- 4210 Tarifa 7 x Mil.

3M CONVERTIDOR AUTORIZADO

CON VIGENCIA DE 24 MESES

Cliente.....: MUNICIPIO DE SINCELEJO
Nit/Cedula...: 800104062
**Direccion.:** CL 28 25 A 246 AV LUIS CARLOS GALAN ET SEGUNDA
**Telefono..:** 2748824 - 27
Vendedor..: PIEDRAHITA SILEBE JUAN PABLO
Orden No..:

NOTA CREDITO ELECTRONICA
No. NCFE 44
Fecha Factura..: 20-12-2021
Vencimiento.....: 09-12-2021
Condiciones.....: 30 DIAS
Remision No.....:

| CANT. | DESCRIPCION DEL PRODUCTO | Vr.UNIDAD | Vr.TOTAL |
|---|---|---|---|
| 1.00 | COSTO DIRECTO POR AVANCE DE OBRAS, SEGUN ACTA DE AVANCE N°1, CORRESPONDIENTE A CONTRATO DE OBRA N°SA-011-MC-2021, CUYO OBJETO ES: "SUMINISTRO, INSTALACION Y DESMONTE DE SEÑALIZACION HORIZONTAL Y VERTICAL EN VIAS DEL MUNICIPIO DE SINCELEJO" | 164,959,526.63 | 164,959,526.63 |

SON: DOSCIENTOS ONCE MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS DIECISIETE PESOS CON 00/100 M.L.

OBS: CUFE FACTURA No.SYS 000000827 :
640a059f637971791784b319ff1951723b46a2b9e921fdb3a4e00a114b44b4be77f2417e446884aa0d37139321bd04f5
NOTA CREDITO FACTURA 827

| | | |
|---|---|---|
| Vr.Bruto | : | 164,959,527.00 |
| Vr.descue | : | 0.00 |
| Vr.Administra. 22% | : | 36,291,096.00 |
| Vr.Imprevisto 5% | : | 8,247,976.00 |
| Vr.Utilidad 5% | : | 8,247,976.00 |
| **Vr.Subtotal** | : | **217,746,575.00** |
| Vr.IVA | : | 0.00 |
| Vr.IVA Ret | : | 0.00 |
| Vr.Ret.Fuente | : | 4,354,932.00 |
| Vr.Ret.Ic | : | 1,524,226.00 |
| **Total Factura** | : | **211,867,417.00** |

**E-mail: cartera@seguridadyservicios.com - www.seguridadyservicios.com**

AUTORIZADA POR.:._____
NIT/CC No.

RECIBIDO POR.:._____
NIT/CC No.
