CONSTRUIC S.A.S.

INFORME TÉCNICO

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 2452 DEL 25 DE NOVIEMBRE DE 2021

"CONTRATAR EL MANTENIMIENTO Y ATENCIÓN DE PUNTOS CRÍTICOS DEL TRAMO VIAL ROVIRA-PLAYARRICA-SAN ANTONIO PARA LA ATENCIÓN DE EMERGENCIA VIAL EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA".

IBAGUÉ, TOLIMA.

KM 0 + 800 MTS VÍA MARIQUITA- IBAGUÉ
MARIQUITA - TOLIMA
construicsas@gmail.com
Teléfono: +57 312 486 3851

CONSTRUIC S.A.S.

CONSTRUIC S.A.S.
Ingeniería y construcción

Contenido

INTRODUCCIÓN 3
OBJETIVOS 4
Objetivo General 4
Objetivos Específicos 4
IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATO 5
GARANTÍAS 6
GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO 6
RESPONSABILIDAD CIVIL 6
LOCALIZACIÓN DEL CONTRATO 7
DESARROLLO DE ACTIVIDADES 8
VOLUMEN DE MATERIAL TRANSPORTADO 23
HORAS TRABAJADAS. 25
MAQUINARIA Y EQUIPO UTILIZADO 27
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MAQUINARIA 27
REGISTRO FOTOGRAFICO MAQUINARIA 28
BALANCE ECONÓMICO DEL CONTRATO 29
CONCLUSIONES 30

CONSTRUIC S.A.S.

INTRODUCCIÓN

Este informe se realiza con el fin de mostrar los avances presentados en el contrato de prestación de servicios No. 2452 del 25 de noviembre de 2021, cuyo objeto es **"CONTRATAR EL MANTENIMIENTO Y ATENCIÓN DE PUNTOS CRÍTICOS DEL TRAMO VIAL ROVIRA-PLAYARRICA-SAN ANTONIO PARA LA ATENCIÓN DE EMERGENCIA VIAL EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA".** En donde la GOBERNACIÓN DEL TOLIMA en busca de una mejora en las vías que comunican a los municipios de Rovira, Playarrica y San Antonio, adelanta este tipo de intervenciones en las locaciones más solicitadas, realizando un mantenimiento programado y de acuerdo a las necesidades que estas vías presentan.

CONSTRUIC S.A.S.

OBJETIVOS

Objetivo General

Mostrar el desarrollo de las actividades relacionadas con el contrato de prestación de servicios No. 2452 del 25 de noviembre de 2021, cuyo objeto es **"CONTRATAR EL MANTENIMIENTO Y ATENCIÓN DE PUNTOS CRÍTICOS DEL TRAMO VIAL ROVIRA-PLAYARRICA-SAN ANTONIO PARA LA ATENCIÓN DE EMERGENCIA VIAL EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA".**

Objetivos Específicos

- Realizar el correcto seguimiento y verificación de los puntos intervenidos, los kilómetros intervenidos, el volumen de material removido.
- Dar a conocer el valor ejecutado de las actividades realizadas durante el desarrollo del proyecto.
- Mostrar las actividades ejecutadas y sus cantidades
- Cumplir con el requisito establecido en las obligaciones contractuales

CONSTRUIC S.A.S.

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATO

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO	
CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No.	2452 del 25 de noviembre de 2021
CONTRATISTA	CONSTRUIC SAS
C.C. O NIT.	830.045.658-0
OBJETO	" CONTRATAR EL MANTENIMIENTO Y ATENCIÓN DE PUNTOS CRÍTICOS DEL TRAMO VIAL ROVIRA-PLAYARRICA-SAN ANTONIO PARA LA ATENCIÓN DE EMERGENCIA VIAL EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA"
VALOR	NOVENTA MILLONES DE PESOS M/CTE ($90.000.000) M/CTE. CON IVA INCLUIDO
FECHA DE INICIO	02 DE DICIEMBRE DE 2021
PLAZO	TREINTA DÍAS (30) CALENDARIO
SUPERVISOR	JUAN SEBASTIÁN ORTIZ PEÑUELA

CONSTRUIC S.A.S.
Ingeniería de construcción

GARANTÍAS

GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO

Amparo	Vigencia	Porcentaje Asegurado	Valor asegurado	No. Póliza
CUMPLIMIENTO	25/11/2021 HASTA 25/06/2022	10% del valor total del contrato.	$ 9.000.000	EC-100022163
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	25/11/2021 HASTA 25/12/2024	5% del valor total del contrato	$ 4.500.000	EC-100022163
AMPARO DE CALIDAD DEL SERVICIO	25/11/2021 HASTA 25/11/2026	30% del valor final de las obras.	$ 27.000.000	EC-100022163

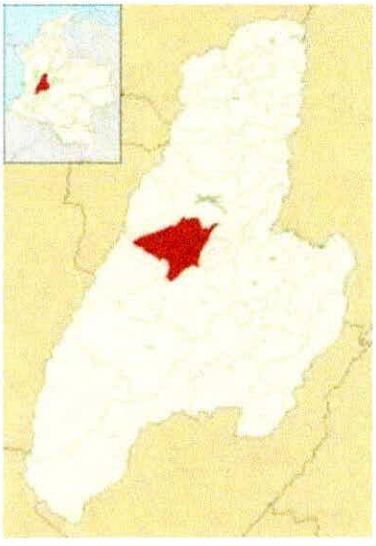
RESPONSABILIDAD CIVIL

Amparo	Vigencia	Porcentaje Asegurado	Valor asegurado	No. Póliza
PREDIOS LABORALES Y OPERACIONES		N/A 200 SMMLV	$ 181.705.200	EC-100003834

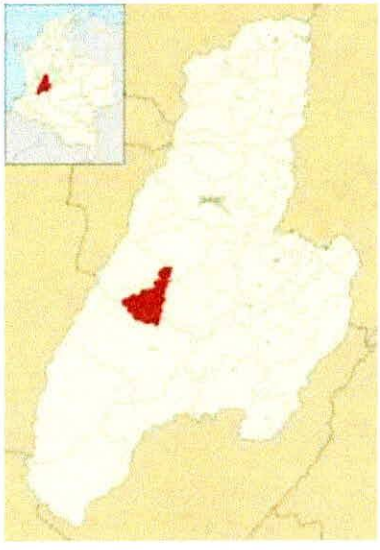
CONSTRUIC S.A.S.

LOCALIZACIÓN DEL CONTRATO

El presente contrato de prestación de servicios tendrá localización en los municipios de Rovira, Playarrica y San Antonio, siendo este enfocado en las vías que comunican a estos municipios.



Municipio de Rovira



Municipio de San Antonio

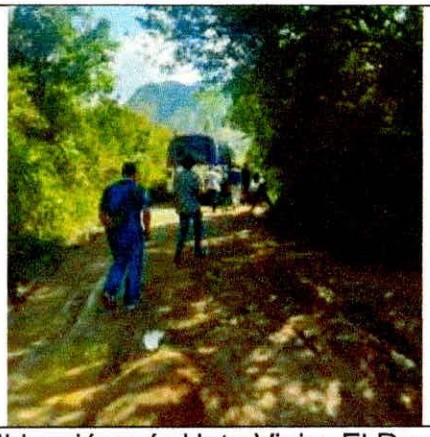
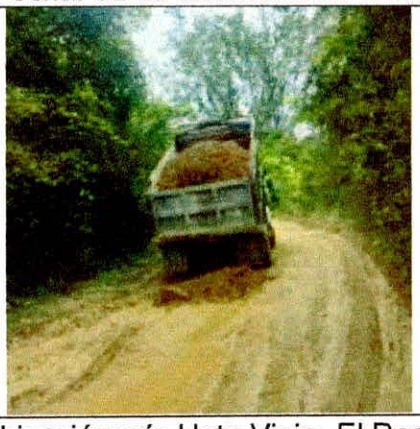
KM 0 + 800 MTS VÍA MARIQUITA- IBAGUÉ
MARIQUITA - TOLIMA
construicsas@gmail.com
Teléfono: +57 312 486 3851

CONSTRUIC S.A.S.

CONSTRUIC S.A.S.

DESARROLLO DE ACTIVIDADES

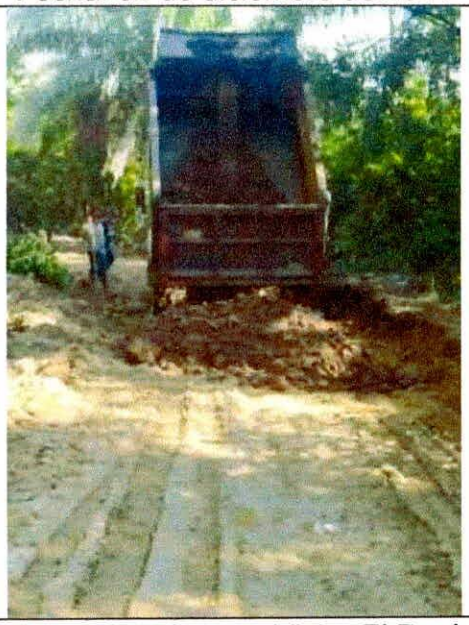
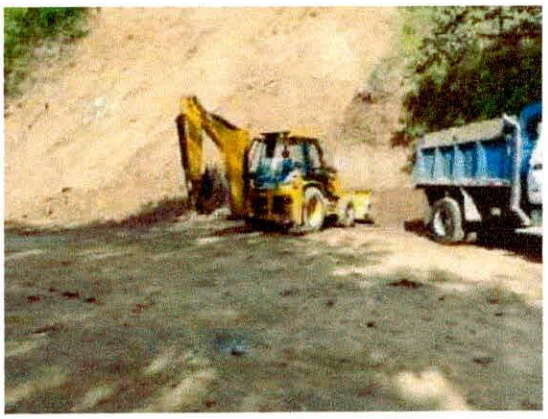
A continuación, se muestra el registro de las actividades que se ejecutaron hasta la fecha:

	
Ubicación: vía Hato Viejo -El Real, Rovira Fecha: 02 de diciembre de 2021	Ubicación: vía Hato Viejo -El Real, Rovira Fecha: 02 de diciembre de 2021
	
Ubicación: vía Hato Viejo -El Real, Rovira Fecha: 02 de diciembre de 2021	Ubicación: vía Hato Viejo -El Real, Rovira Fecha: 02 de diciembre de 2021

KM 0 + 800 MTS VÍA MARIQUITA- IBAGUÉ
MARIQUITA - TOLIMA
construicsas@gmail.com
Teléfono: +57 312 486 3851

CONSTRUIC S.A.S.

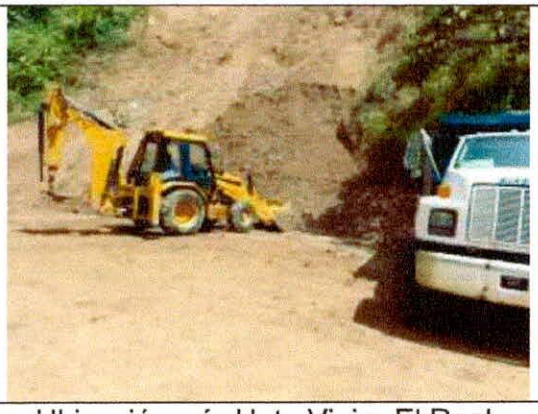
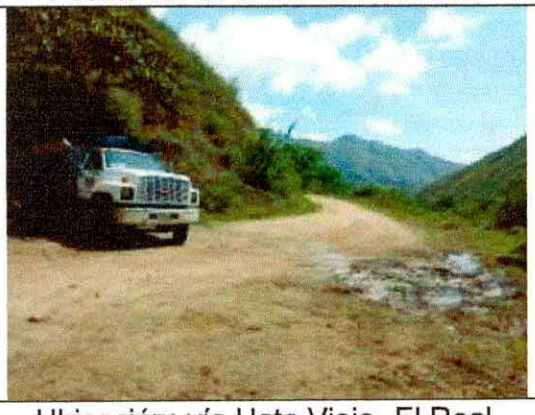
CONSTRUIC S.A.S.

	
Ubicación: vía Hato Viejo -El Real, Rovira Fecha: 02 de diciembre de 2021	Ubicación: vía Hato Viejo -El Real, Rovira Fecha: 02 de diciembre de 2021
	
Ubicación: vía Hato Viejo -El Real, Rovira Fecha: 02 de diciembre de 2021	Ubicación: vía Hato Viejo -El Real, Rovira Fecha: 02 de diciembre de 2021

KM 0 + 800 MTS VÍA MARIQUITA- IBAGUÉ
MARIQUITA - TOLIMA
construicsas@gmail.com
Teléfono: +57 312 486 3851

CONSTRUIC S.A.S.

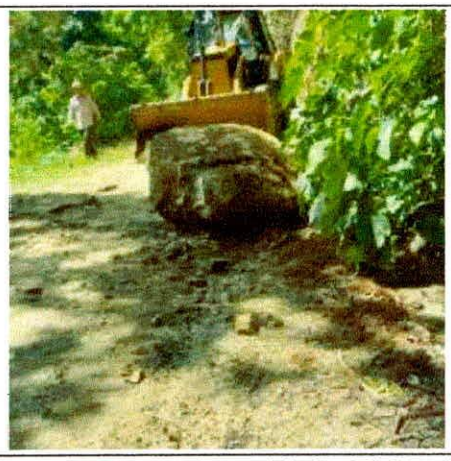
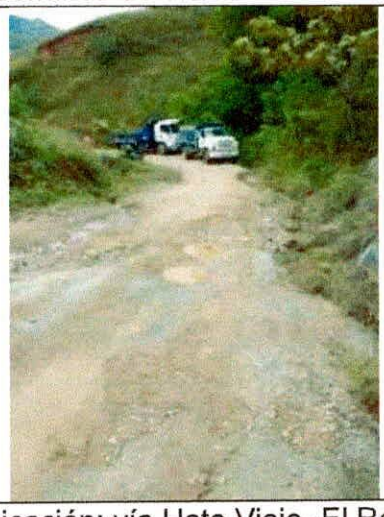
CONSTRUIC S.A.S.

	
Ubicación: vía Hato Viejo -El Real, Rovira Fecha: 02 de diciembre de 2021	Ubicación: vía Hato Viejo -El Real, Rovira Fecha: 02 de diciembre de 2021
	
Ubicación: vía Hato Viejo -El Real, Rovira Fecha: 02 de diciembre de 2021	Ubicación: vía Hato Viejo -El Real, Rovira Fecha: 02 de diciembre de 2021

KM 0 + 800 MTS VÍA MARIQUITA- IBAGUÉ
MARIQUITA - TOLIMA
construicsas@gmail.com
Teléfono: +57 312 486 3851

CONSTRUIC S.A.S.

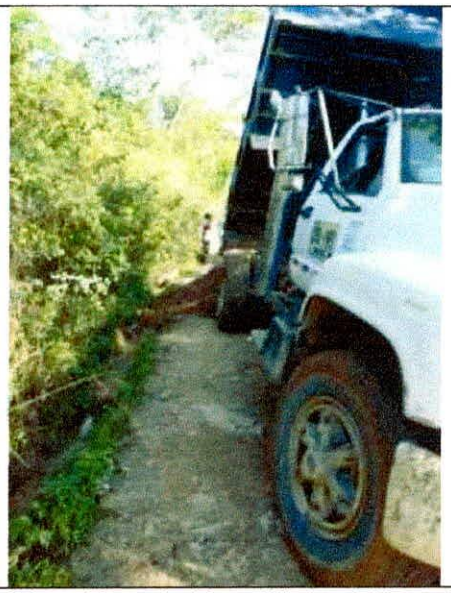
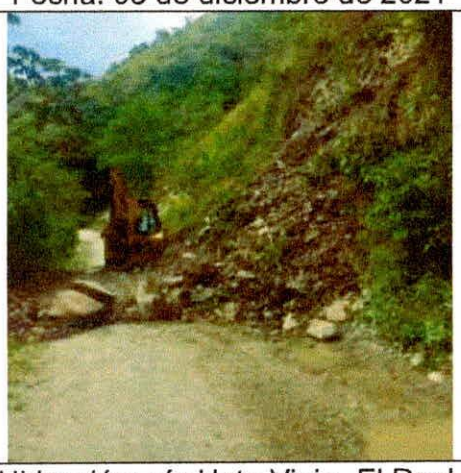
CONSTRUIC S.A.S.

	
Ubicación: vía Hato Viejo -El Real, Rovira Fecha: 03 de diciembre de 2021	Ubicación: vía Hato Viejo -El Real, Rovira Fecha: 03 de diciembre de 2021
	
Ubicación: vía Hato Viejo -El Real, Rovira Fecha: 03 de diciembre de 2021	Ubicación: vía Hato Viejo -El Real, Rovira Fecha: 03 de diciembre de 2021

KM 0 + 800 MTS VÍA MARIQUITA- IBAGUÉ
MARIQUITA - TOLIMA
construicsas@gmail.com
Teléfono: +57 312 486 3851

CONSTRUIC S.A.S.

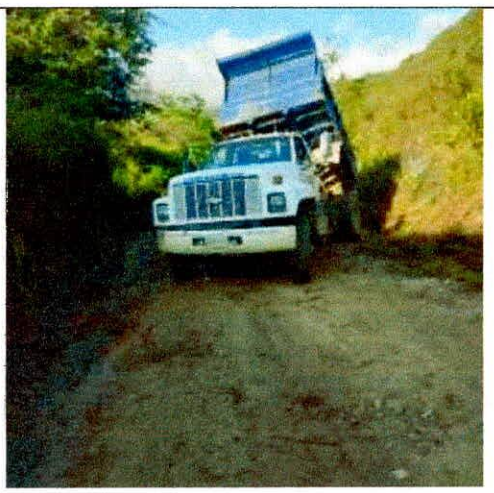
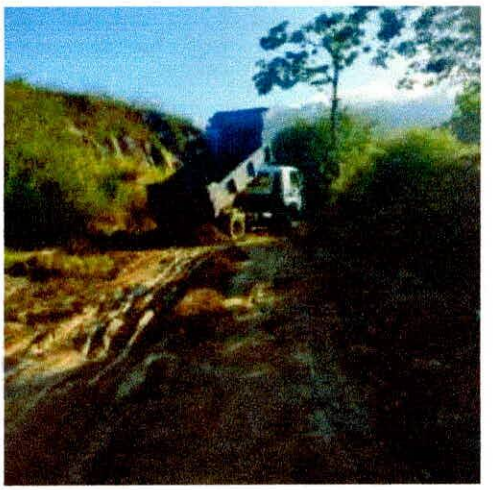
CONSTRUIC S.A.S.

	
Ubicación: vía Hato Viejo -El Real, Rovira Fecha: 03 de diciembre de 2021	Ubicación: vía Hato Viejo -El Real, Rovira Fecha: 03 de diciembre de 2021
	
Ubicación: vía Hato Viejo -El Real, Rovira Fecha: 03 de diciembre de 2021	Ubicación: vía Hato Viejo -El Real, Rovira Fecha: 03 de diciembre de 2021

KM 0 + 800 MTS VÍA MARIQUITA- IBAGUÉ
MARIQUITA - TOLIMA
construicsas@gmail.com
Teléfono: +57 312 486 3851

CONSTRUIC S.A.S.

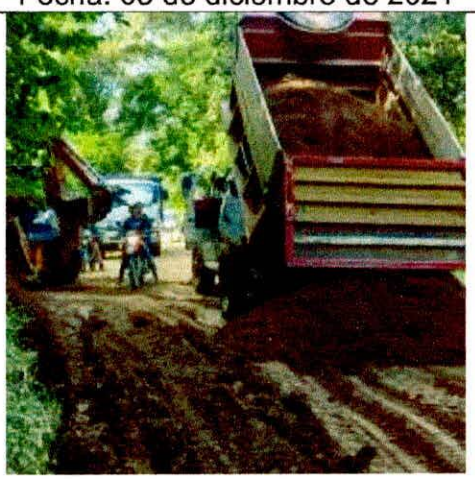
CONSTRUIC S.A.S.

	
Ubicación: vía Hato Viejo -El Real, Rovira Fecha: 04 de diciembre de 2021	Ubicación: vía Hato Viejo -El Real, Rovira Fecha: 04 de diciembre de 2021
	
Ubicación: vía Hato Viejo -El Real, Rovira Fecha: 04 de diciembre de 2021	Ubicación: vía Hato Viejo -El Real, Rovira Fecha: 04 de diciembre de 2021

KM 0 + 800 MTS VÍA MARIQUITA- IBAGUÉ
MARIQUITA - TOLIMA
construicsas@gmail.com
Teléfono: +57 312 486 3851

CONSTRUIC S.A.S.

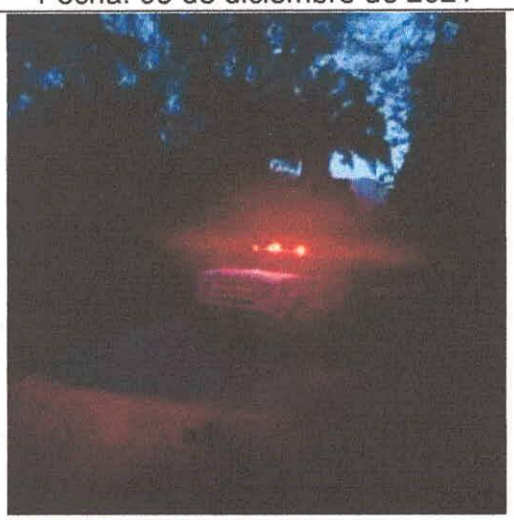
CONSTRUIC S.A.S.

	
Ubicación: vía Hato Viejo -El Real, Rovira Fecha: 05 de diciembre de 2021	Ubicación: vía Hato Viejo -El Real, Rovira Fecha: 05 de diciembre de 2021
	
Ubicación: vía Hato Viejo -El Real, Rovira Fecha: 05 de diciembre de 2021	Ubicación: vía Hato Viejo -El Real, Rovira Fecha: 05 de diciembre de 2021

KM 0 + 800 MTS VÍA MARIQUITA- IBAGUÉ
MARIQUITA - TOLIMA
construicsas@gmail.com
Teléfono: +57 312 486 3851

CONSTRUIC S.A.S.

CONSTRUIC S.A.S.
ingeniería+construcción

	
Ubicación: vía Hato Viejo -El Real, Rovira Fecha: 05 de diciembre de 2021	Ubicación: vía Hato Viejo -El Real, Rovira Fecha: 05 de diciembre de 2021
	
Ubicación: vía Hato Viejo -El Real, Rovira Fecha: 05 de diciembre de 2021	Ubicación: vía Hato Viejo -El Real, Rovira Fecha: 05 de diciembre de 2021

KM 0 + 800 MTS VÍA MARIQUITA- IBAGUÉ
MARIQUITA - TOLIMA
construicsas@gmail.com
Teléfono: +57 312 486 3851

CONSTRUIC S.A.S.

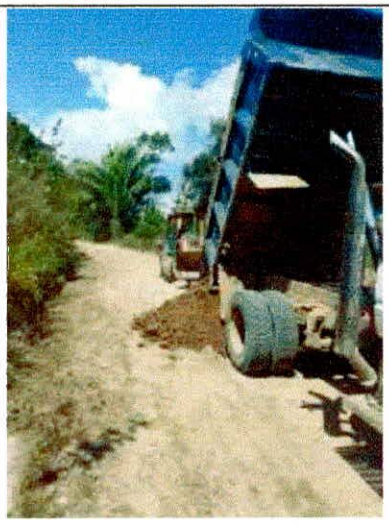
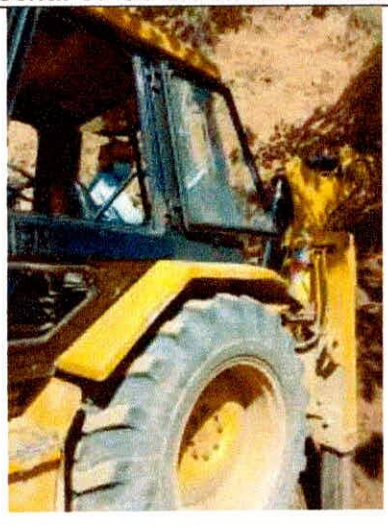
CONSTRUIC S.A.S.

	
Ubicación: vía Hato Viejo -El Real, Rovira Fecha: 06 de diciembre de 2021	Ubicación: vía Hato Viejo -El Real, Rovira Fecha: 06 de diciembre de 2021
	
Ubicación: vía Hato Viejo -El Real, Rovira Fecha: 06 de diciembre de 2021	Ubicación: vía Hato Viejo -El Real, Rovira Fecha: 06 de diciembre de 2021

KM 0 + 800 MTS VÍA MARIQUITA- IBAGUÉ
MARIQUITA - TOLIMA
construicsas@gmail.com
Teléfono: +57 312 486 3851

CONSTRUIC S.A.S.

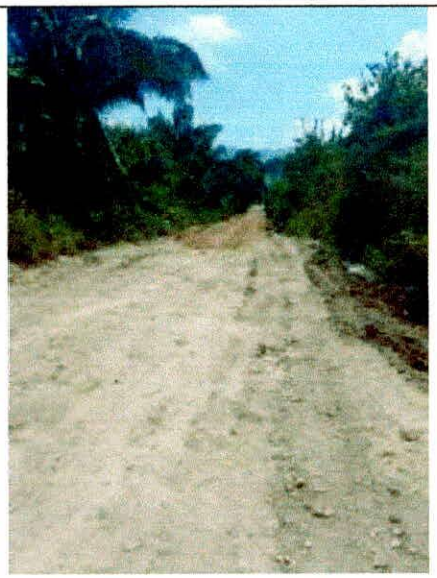
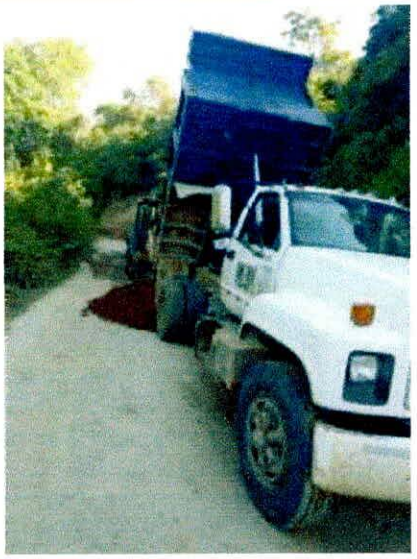
CONSTRUIC S.A.S.

	
Ubicación: vía Hato Viejo -El Real, Rovira Fecha: 07 de diciembre de 2021	Ubicación: vía Hato Viejo -El Real, Rovira Fecha: 07 de diciembre de 2021
	
Ubicación: vía Hato Viejo -El Real, Rovira Fecha: 07 de diciembre de 2021	Ubicación: vía Hato Viejo -El Real, Rovira Fecha: 07 de diciembre de 2021

KM 0 + 800 MTS VÍA MARIQUITA- IBAGUÉ
MARIQUITA - TOLIMA
construicsas@gmail.com
Teléfono: +57 312 486 3851

CONSTRUIC S.A.S.

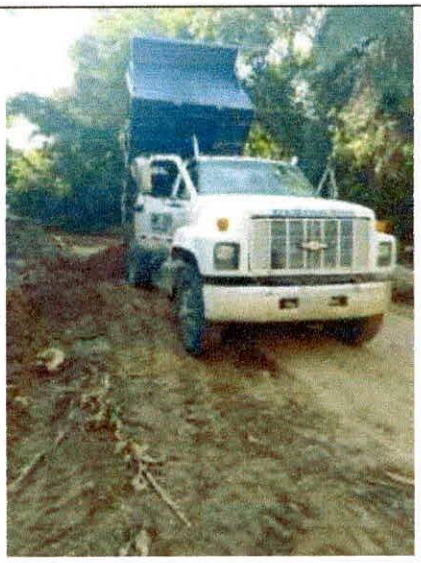

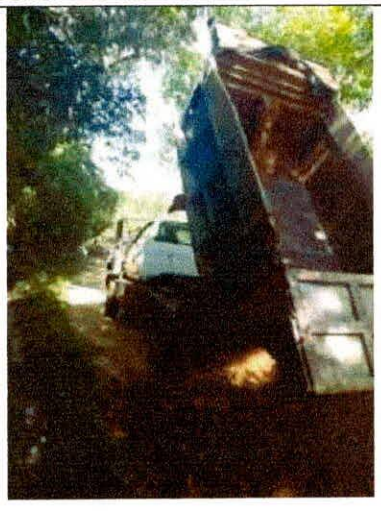
CONSTRUIC S.A.S.

	
Ubicación: vía Hato Viejo -El Real, Rovira Fecha: 07 de diciembre de 2021	Ubicación: vía Hato Viejo -El Real, Rovira Fecha: 07 de diciembre de 2021
	
Ubicación: vía Hato Viejo -El Real, Rovira Fecha: 07 de diciembre de 2021	Ubicación: vía Hato Viejo -El Real, Rovira Fecha: 07 de diciembre de 2021

KM 0 + 800 MTS VÍA MARIQUITA- IBAGUÉ
MARIQUITA - TOLIMA
construicsas@gmail.com
Teléfono: +57 312 486 3851

CONSTRUIC S.A.S.

CONSTRUIC S.A.S.

	
Ubicación: vía Hato Viejo -El Real, Rovira Fecha: 08 de diciembre de 2021	Ubicación: vía Hato Viejo -El Real, Rovira Fecha: 08 de diciembre de 2021
	
Ubicación: vía Hato Viejo -El Real, Rovira Fecha: 08 de diciembre de 2021	Ubicación: vía Hato Viejo -El Real, Rovira Fecha: 08 de diciembre de 2021

KM 0 + 800 MTS VÍA MARIQUITA- IBAGUÉ
MARIQUITA - TOLIMA
construicsas@gmail.com
Teléfono: +57 312 486 3851

CONSTRUIC S.A.S.

CONSTRUIC S.A.S.
Ingeniería de construcción

	
Ubicación: vía Hato Viejo -El Real, Rovira Fecha: 08 de diciembre de 2021	Ubicación: vía Hato Viejo -El Real, Rovira Fecha: 08 de diciembre de 2021
	
Ubicación: vía Hato Viejo -El Real, Rovira Fecha: 08 de diciembre de 2021	Ubicación: vía Hato Viejo -El Real, Rovira Fecha: 08 de diciembre de 2021

KM 0 + 800 MTS VÍA MARIQUITA- IBAGUÉ
MARIQUITA - TOLIMA
construicsas@gmail.com
Teléfono: +57 312 486 3851

CONSTRUIC S.A.S.

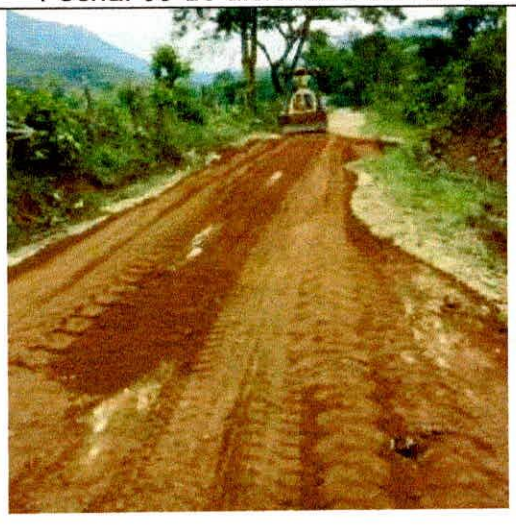
CONSTRUIC S.A.S.
ingeniería y construcción

	
Ubicación: vía Hato Viejo -El Real, Rovira Fecha: 09 de diciembre de 2021	Ubicación: vía Hato Viejo -El Real, Rovira Fecha: 09 de diciembre de 2021
	
Ubicación: vía Hato Viejo -El Real, Rovira Fecha: 09 de diciembre de 2021	Ubicación: vía Hato Viejo -El Real, Rovira Fecha: 09 de diciembre de 2021

KM 0 + 800 MTS VÍA MARIQUITA- IBAGUÉ
MARIQUITA - TOLIMA
construicsas@gmail.com
Teléfono: +57 312 486 3851

CONSTRUIC S.A.S.

CONSTRUIC S.A.S.

	
Ubicación: vía Hato Viejo -El Real, Rovira Fecha: 09 de diciembre de 2021	Ubicación: vía Hato Viejo -El Real, Rovira Fecha: 09 de diciembre de 2021
	
Ubicación: vía Hato Viejo -El Real, Rovira Fecha: 09 de diciembre de 2021	Ubicación: vía Hato Viejo -El Real, Rovira Fecha: 09 de diciembre de 2021

KM 0 + 800 MTS VÍA MARIQUITA- IBAGUÉ
MARIQUITA - TOLIMA
construicsas@gmail.com
Teléfono: +57 312 486 3851

CONSTRUIC S.A.S.

CONSTRUIC S.A.S.

VOLUMEN DE MATERIAL TRANSPORTADO

VOLUMEN DE MATERIAL

Fecha	Descripción	Vol. De Material (m3)	Puntos intervenidos
2/12/2021	Reemplazo de material	189	vía Hato Viejo -El Real, Rovira
3/12/2021	Reemplazo de material	231	vía Hato Viejo -El Real, Rovira
4/12/2021	Reemplazo de material	189	vía Hato Viejo -El Real, Rovira
5/12/2021	Reemplazo de material	189	vía Hato Viejo -El Real, Rovira
6/12/2021	Reemplazo de material	147	vía Hato Viejo -El Real, Rovira
7/12/2021	Reemplazo de material	147	vía Hato Viejo -El Real, Rovira
8/12/2021	Reemplazo de material	168	vía Hato Viejo -El Real, Rovira
9/12/2021	Reemplazo de material	147	vía Hato Viejo -El Real, Rovira

KM 0 + 800 MTS VÍA MARIQUITA- IBAGUÉ
MARIQUITA - TOLIMA
construicsas@gmail.com
Teléfono: +57 312 486 3851

CONSTRUIC S.A.S.

CONSTRUIC S.A.S.

KILMETROS INTERVENIDOS

TRAMO INTERVENIDO			
Fecha inicio	**fecha final**	**kilómetros intervenidos**	**Puntos intervenidos**
2/12/2021	9/12/2021	12,8	vía Hato Viejo -El Real, Rovira

KM 0 + 800 MTS VÍA MARIQUITA- IBAGUÉ
MARIQUITA - TOLIMA
construicsas@gmail.com
Teléfono: +57 312 486 3851

CONSTRUIC S.A.S.

CONSTRUIC S.A.S.

HORAS TRABAJADAS.

RETROEXCAVADORAS

Fecha	Descripción	Número de Horas X Maq	cantidad de maquinaria	Horas totales	Tipo de maquinaria	lugar de trabajo
2/12/2021	conformado vía	10	3	30	Retroexcavadora	vía Hato Viejo -El Real, Rovira
3/12/2021	conformado vía	9	3	27	Retroexcavadora	vía Hato Viejo -El Real, Rovira
4/12/2021	conformado vía	10	3	30	Retroexcavadora	vía Hato Viejo -El Real, Rovira
5/12/2021	conformado vía	10	3	30	Retroexcavadora	vía Hato Viejo -El Real, Rovira
6/12/2021	conformado vía	9	3	27	Retroexcavadora	vía Hato Viejo -El Real, Rovira
7/12/2021	conformado vía	10	3	30	Retroexcavadora	vía Hato Viejo -El Real, Rovira
8/12/2021	conformado vía	10	3	30	Retroexcavadora	vía Hato Viejo -El Real, Rovira
9/12/2021	conformado vía	9	3	27	Retroexcavadora	vía Hato Viejo -El Real, Rovira
		Total, Horas trabajadas		**231**		

KM 0 + 800 MTS VÍA MARIQUITA- IBAGUÉ
MARIQUITA - TOLIMA
construicsas@gmail.com
Teléfono: +57 312 486 3851

CONSTRUIC S.A.S.

CONSTRUIC S.A.S.

VOLQUETAS

Fecha	Descripción	Número de Horas X Maq	cantidad de maquinaria	Horas totales	Tipo de maquinaria	lugar de trabajo
2/12/2021	conformado vía	9	3	27	Volqueta	vía Hato Viejo -El Real, Rovira
3/12/2021	conformado vía	9	3	27	Volqueta	vía Hato Viejo -El Real, Rovira
4/12/2021	conformado vía	9	3	27	Volqueta	vía Hato Viejo -El Real, Rovira
5/12/2021	conformado vía	9	3	27	Volqueta	vía Hato Viejo -El Real, Rovira
6/12/2021	conformado vía	10	3	30	Volqueta	vía Hato Viejo -El Real, Rovira
7/12/2021	conformado vía	9	3	27	Volqueta	vía Hato Viejo -El Real, Rovira
8/12/2021	conformado vía	10	3	30	Volqueta	vía Hato Viejo -El Real, Rovira
9/12/2021	conformado vía	9	3	27	Volqueta	vía Hato Viejo -El Real, Rovira
		Total Horas trabajadas		222		

KM 0 + 800 MTS VÍA MARIQUITA- IBAGUÉ
MARIQUITA - TOLIMA
construicsas@gmail.com
Teléfono: +57 312 486 3851

CONSTRUIC S.A.S.

CONSTRUIC S.A.S.
Ingeniería de construcción

MAQUINARIA Y EQUIPO UTILIZADO

La maquinaria y equipo utilizado por el contratista para la ejecución de las obras, son hasta el momento la siguiente:

- RETROEXCAVADORAS
- VOLQUETAS

El suministro de la maquinaria para la ejecución del contrato, como la supervisión ha verificado en campo, cumple con las especificaciones técnicas requeridas por la entidad.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MAQUINARIA

RETROEXCAVADORA CARGADORA	
MOTOR	
Tipo	Diésel con turbo
Potencia Neta	Mínimo 90 H.P.
Cilindrada	Mínimo 4 L
Normatividad de Emisiones	Mínimo Tier 3
SISTEMA HIDRAULICO	
Bomba	Pistones y flujo variable
Sistema principal: Flujo máx	Mínimo 160 L/min
PESOS EN ORDEN DE TRABAJO	
Peso en orden de trabajo	Entre 7.000 y 9.000 kg
DIRECCIÓN	
Tipo	Hidrostática
ESPECIFICACIONES DE OPERACIÓN CARGADOR FRONTAL	
Altura hasta el pasador de articulación	Mínimo 3,400 mm
Ángulo de descarga a máxima altura	Mínimo 44°
Cucharón	Mínimo 1.0 m^3
ESPECIFICACIONES DE OPERACIÓN BRAZO EXCAVADOR	
Fuerza de excavación cucha	Mínimo 60 kN
Fuerza de excavación del br	Mínimo 42 kN
Profundidad de excavación	Mínimo 4,300 mm
Altura de carga	Mínimo 3,600 mm
TREN INFERIOR	
Llantas delantera	12.5 80
Llantas traseras	19.5L-24
Espacio libre al suelo	Mínimo 290
Estabilizadores	Abatibles, Tipo Abanico

VOLQUETA	
COMBUSTIBLE	DIESEL
MOTOR	POTENCIA NETA: SUPERIOR O IGUAL A 222 HP
RANGO DE CAPACIDAD DE CARGA	10 a 12 TONELADAS
TRACCION	4X2
No. de Ejes	2

CONSTRUIC S.A.S.

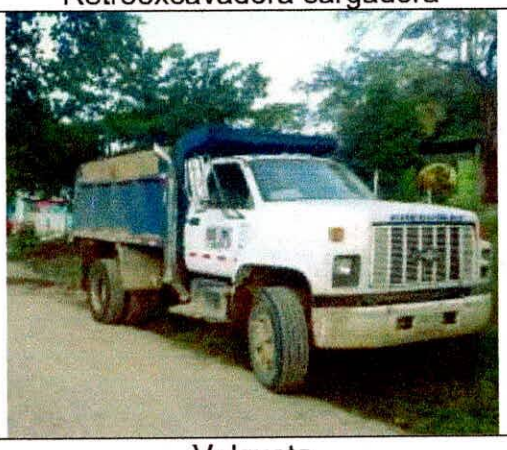
REGISTRO FOTOGRAFICO MAQUINARIA



Retro excavadora



Retroexcavadora cargadora



Volqueta

KM 0 + 800 MTS VÍA MARIQUITA- IBAGUÉ
MARIQUITA - TOLIMA
construicsas@gmail.com
Teléfono: +57 312 486 3851

CONSTRUIC S.A.S.

CONSTRUIC S.A.S.

BALANCE ECONÓMICO DEL CONTRATO

HORAS EJECUTADAS

MAQUINARIA	VALOR HORA	TOTAL, HORAS LABORADAS	COSTO TOTAL
Hora retroexcavadora de llantas	$ 160.000,00	231	$ 36.960.000,00
Hora volqueta	$ 90.000,00	222	$ 19.980.000,00
VALOR EJECUTADO			**$ 56.940.000,00**

BALANCE DEL CONTRATO			
			PORCENTAJE
Valor Inicial del Contrato	$90.000.000,0		100,00%
Valor Anticipo		$0,00	
Valor acumulado		$0,00	
Valor Acta Parcial 01		**$56.940.000,00**	**63,27%**
Saldo por Ejecutar		$33.060.000,00	**36,73%**
SUMAS IGUALES	**$90.000.000,000**	**$90.000.000,00**	**100,00%**

KM 0 + 800 MTS VÍA MARIQUITA- IBAGUÉ
MARIQUITA - TOLIMA
construicsas@gmail.com
Teléfono: +57 312 486 3851

CONSTRUIC S.A.S.

CONSTRUIC S.A.S.
Ingeniería de construcción

CONCLUSIONES

- La ejecución del presente contrato se encuentra en un 63% en lo referente al alcance de la mismo, con un valor de CINCUENTA Y SEIS MILLONES, NOVECIENTOS CUARENTA MIL PESOS.
- Para la correcta finalización del mismo faltan en ejecución 37% de alcance del mismo, equivalente a TREINTA Y TRES MILLONES, SESENTA MIL PESOS.
- Las actividades ejecutadas fueron revisadas por el supervisor y contaron con el aval del mismo.
- Se presenta el actual informe como medio de cumplimiento a las obligaciones y pautas para el cobro del contrato.

Atentamente,

Mayra Tatiana Guillen Castaño
CC. 1.007.303.056 de Fresno - Tolima
NIT: 830.045.658-0
Representante legal CONSTRUIC SAS

KM 0 + 800 MTS VÍA MARIQUITA- IBAGUÉ
MARIQUITA - TOLIMA
construicsas@gmail.com
Teléfono: +57 312 486 3851

CONSTRUIC S.A.S.

CONSTRUIC S.A.S.
Ingeniería de construcción

ANEXOS

- TARJETAS DE PROPIEDAD MAQUINARIA Y AUTOMOTORES



REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE TRANSPORTE
LICENCIA DE TRÁNSITO No. 10022368278

PLACA	MARCA	LÍNEA	MODELO
NFD369	DODGE	D 600 157	1971

CILINDRADA CC	COLOR	SERVICIO
6.194	ESTRATO PLATA	PÚBLICO

CLASE DE VEHÍCULO	TIPO CARROCERÍA	COMBUSTIBLE	CAPACIDAD KgPSJ
VOLQUETA	PLATON	DIESEL	6000

NÚMERO DE MOTOR	REG	VIN
GT15012	N	******

NÚMERO DE SERIE	REG	NÚMERO DE CHASIS	REG
N314170	N	N314170	N

PROPIETARIO APELLIDO(S) Y NOMBRE(S): INGEOCON SAS
IDENTIFICACIÓN: NIT 830045658



RESTRICCIÓN MOVILIDAD:
BLINDAJE: ******
POTENCIA HP: 0
DECLARACIÓN DE IMPORTACIÓN: 5235
DE: I
FECHA IMPORT: 12/11/1991
PUERTAS: 2
LIMITACIÓN A LA PROPIEDAD: ******
FECHA MATRÍCULA: 01/01/1971
FECHA EXP. LIC. TTO.: 26/02/2021
FECHA VENCIMIENTO: ******
ORGANISMO DE TRÁNSITO: STRIA DE TTOYTTE MCPAL DE SAN SEBASTIAN DE MARIQUITA TOLIMA
LT0206261211



REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE TRANSPORTE
Libertad y Orden
LICENCIA DE TRÁNSITO No. 10021430244

PLACA	MARCA	LINEA	MODELO
SKB826	DODGE	D 600	1981

CILINDRADA CC	COLOR	SERVICIO
5.916	AZUL BRUMA	PÚBLICO

CLASE DE VEHÍCULO	TIPO CARROCERIA	COMBUSTIBLE	CAPACIDAD KG/PSJ
VOLQUETA	PLATON	DIESEL	7000

NUMERO DE MOTOR
468TM2U403934

REG VIN
N ******

NUMERO DE SERIE
DT008013

REG NUMERO DE CHASIS
N DT008013

REG
N

PROPIETARIO: APELLIDO(S) Y NOMBRE(S)
INGEOCON SAS

IDENTIFICACIÓN
NIT 830045658



RESTRICCIÓN MOVILIDAD

BLINDAJE
******

POTENCIA HP
0

DECLARACIÓN DE IMPORTACIÓN
43518

LIC
I

FECHA IMPORT
18/02/1981

PUERTAS
2

LIMITACIÓN A LA PROPIEDAD
******

FECHA MATRICULA
01/10/1981

FECHA EXP LIC TTO
23/10/2020

FECHA VENCIMIENTO
******

ORGANISMO DE TRÁNSITO
STRIA DE TTOYTTE MCPAL DE SAN SEBASTIAN DE MARIQUITA TOLIMA

LT02006081140

KM 0 + 800 MTS VÍA MARIQUITA- IBAGUÉ
MARIQUITA - TOLIMA
construicsas@gmail.com
Teléfono: +57 312 486 3851

CONSTRUIC S.A.S.



REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE TRANSPORTE
Libertad y Orden
LICENCIA DE TRÁNSITO No. 10021430159

PLACA	MARCA	LÍNEA	MODELO
UYG791	CHEVROLET	KODIAK 209	1995

CILINDRADA CC	COLOR	SERVICIO
6.600	BLANCO	PÚBLICO

CLASE DE VEHÍCULO	TIPO CARROCERÍA	COMBUSTIBLE	CAPACIDAD Kg/PSJ
VOLQUETA	PLATON	DIESEL	11000

NUMERO DE MOTOR: 9GK67668
REG: N
VIN: ******
NUMERO DE SERIE: CM95301810
REG: N
NUMERO DE CHASIS: CM95301810
REG: N
PROPIETARIO APELLIDO(S) Y NOMBRE(S): INGEOCON SAS
IDENTIFICACIÓN: NIT 830045658



RESTRICCIÓN MOVILIDAD
BLINDAJE: ******
POTENCIA HP: 0
DECLARACIÓN DE IMPORTACIÓN
LIC: I
FECHA IMPORT
PUERTAS: 2
LIMITACIÓN A LA PROPIEDAD
******
FECHA MATRÍCULA: 16/03/2006
FECHA EXP. LIC. TTO: 23/10/2020
FECHA VENCIMIENTO: ******
ORGANISMO DE TRÁNSITO
STRIA DE TTOYTTE MCPAL DE SAN SEBASTIAN DE MARIQUITA TOLIMA
LT0200608139

KM 0 + 800 MTS VÍA MARIQUITA- IBAGUÉ
MARIQUITA - TOLIMA
construicsas@gmail.com
Teléfono: +57 312 486 3851

CONSTRUIC S.A.S.



REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE TRANSPORTE
TARJETA DE REGISTRO DE MAQUINARIA
Libertad y Orden
No. 67559

No. DE REGISTRO	MARCA	LINEA	AÑO MODELO
MC053535	CATERPILLAR	428B	1996

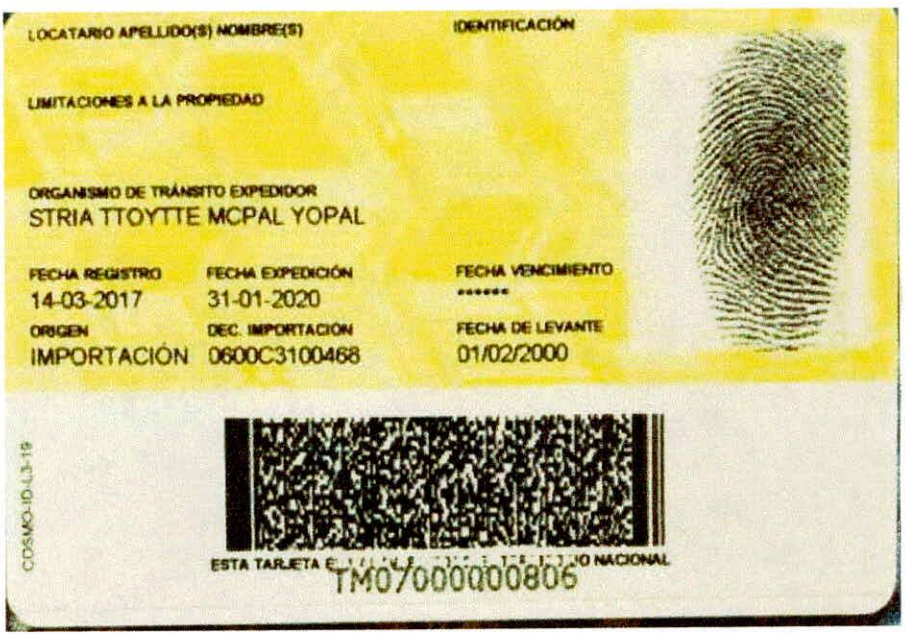
TIPO DE MAQUINARIA	CLASE	No. SERIE
CONSTRUCCION	RETROEXCAVADORA	7EJ09110

COLOR(ES)	No. MOTOR	RODA..E
AMARILLO	5HK38158	NEUMATICOS

PESO Y MEDIDAS SIN ACCESORIOS

PESO	ALTO	ANCHO	LARGO
7000 Kg	2900 mm	2300 mm	5760 mm

PROPIETARIO: APELLIDO(S) Y NOMBRE(S): INGEOCON SAS
IDENTIFICACIÓN: NIT 830.045.658



LOCATARIO APELLIDO(S) NOMBRE(S)
IDENTIFICACIÓN
LIMITACIONES A LA PROPIEDAD
ORGANISMO DE TRÁNSITO EXPEDIDOR: STRIA TTOYTTE MCPAL YOPAL

FECHA REGISTRO	FECHA EXPEDICIÓN	FECHA VENCIMIENTO
14-03-2017	31-01-2020	******

ORIGEN	DEC. IMPORTACIÓN	FECHA DE LEVANTE
IMPORTACIÓN	0600C3100468	01/02/2000

COSMO-ID-L3-19
ESTA TARJETA E... ...IO NACIONAL
TM07000000806

KM 0 + 800 MTS VÍA MARIQUITA- IBAGUÉ
MARIQUITA - TOLIMA
construicsas@gmail.com
Teléfono: +57 312 486 3851



REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE TRANSPORTE
TARJETA DE REGISTRO DE MAQUINARIA
No. 65109

No. DE REGISTRO	MARCA	LINEA	AÑO MODELO
MC108472	JOHN DEERE	310 SG	2005

TIPO DE MAQUINARIA	CLASE	No. SERIE
CONSTRUCCION	RETROEXCAVADORA	T0310SG945974

COLOR(ES)	No. MOTOR	RODAJE
AMARILLO	PE4045T[illegible]656	NEUMATICOS

PESO Y MEDIDAS SIN ACCESORIOS

PESO	ALTO	ANCHO	LARGO
6301 Kg	1950 mm	1525 mm	3233 mm

PROPIETARIO APELLIDO(S) Y NOMBRE(S): INGEOCON SAS
IDENTIFICACIÓN: NIT 830.045.658



LOCATARIO APELLIDO(S) NOMBRE(S)
IDENTIFICACIÓN
LIMITACIONES A LA PROPIEDAD
ORGANISMO DE TRANSITO EXPEDIDOR
STRIA DE TTOYTTE MCPAL DE SAN SEBASTIAN DE MARIQUITA TOLIMA

FECHA REGISTRO	FECHA EXPEDICIÓN	FECHA VENCIMIENTO
25-11-2019	25-11-2019	******

ORIGEN	DEC. IMPORTACION	FECHA DE LEVANTE
IMPORTACIÓN	062005100057259	18/04/2005

ESTA TARJETA ES VALIDA EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL
TM03000043175

CONSTRUIC S.A.S.



REPÚBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE TRANSPORTE

TARJETA DE REGISTRO DE MAQUINARIA

No. 28513

No. DE REGISTRO	MARCA	LINEA	AÑO MODELO
MC053763	CATERPILLAR	428B	1994

TIPO DE MAQUINARIA	CLASE	No. SERIE
CONSTRUCCION	RETROEXCAVADORA	76J03398

COLOR(ES)	No. MOTOR	RODAJE
AMARILLO	5HK15819	NEUMATICOS

PESO Y MEDIDAS SIN ACCESORIOS

PESO	ALTO	ANCHO	LARGO
7000 Kg	2870 mm	2300 mm	7030 mm

PROPIETARIO APELLIDO(S) Y NOMBRE(S)	IDENTIFICACION
ROJAS BELTRAN MARIA MELANIA Y OTRO(S)	C.C. 28.738.209



LOCATARIO APELLIDO(S) NOMBRE(S)

IDENTIFICACION

LIMITACIONES A LA PROPIEDAD

ORGANISMO DE TRANSITO EXPEDIDOR

STRIA DE TTOYTTE MCPAL DE SAN SEBASTIAN DE MARIQUITA TOLIMA

FECHA REGISTRO	FECHA EXPEDICION	FECHA VENCIMIENTO
10-02-2017	10-02-2017	******

ORIGEN	DEC. IMPORTACION	FECHA DE LEVANTE
IMPORTACION	0800C2100051	13/01/1998

ESTA TARJETA ES VALIDA EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL

TM03000016374

KM 0 + 800 MTS VÍA MARIQUITA- IBAGUÉ
MARIQUITA - TOLIMA
construicsas@gmail.com
Teléfono: +57 312 486 3851

CONSTRUIC S.A.S.
