INFORME DE SUPERVISION No.02
CONTRATO Y/O CONVENIO: G-19-2022

NÚMERO DE CONTRATO: G-19-2022	**FECHA CELEBRACIÓN DEL CONTRATO:** 07 DE ABRIL DE 2022
CONTRATISTA **NOMBRE:** CONSORCIO MAR CARIBE NIT: 901.581.941-6 **REPRESENTANTE LEGAL**: JADER YAMIT MAESTRE CONTRERAS **CEDULA DE CIUDADANIA No**. 1.082.874.528 **DIRECCIÓN:** MZ 7 CASA 28 URB. ACODIS SANTA MARTA	**SUPERVISOR:** **NOMBRE:** JOHNNY WALTER PEÑALOZA NIÑO **CARGO:** GERENTE **RESOLUCIÓN DE SUPERVISIÓN No:** 0114 DEL 06 ABRIL DE 2022

OBJETO:	"MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LOS TRAMOS A CARGO DEL IDESAN: SECTOR COMPRENDIDO ENTRE LA INTERSECCIÓN T DEL AEROPUERTO (PR 63+800 RUTA 6602) Y EL AEROPUERTO DE PALONEGRO DE BUCARAMANGA, SECTOR COMPRENDIDO ENTRE LA INTERSECCIÓN PALENQUE (PR 71+310 RUTA 6602) Y LA INTERSECCIÓN T DEL AEROPUERTO (PR 63+800 RUTA 6602), SECTOR COMPRENDIDO ENTRE LA INTERSECCIÓN T DEL AEROPUERTO (PR 63+800 RUTA 6602) Y EL MUNICIPIO DE LEBRIJA (PR 60+000 RUTA 6602), SECTOR COMPRENDIDO ENTRE EL CERO (PR 11+150 RUTA 45A08) Y EL MUNICIPIO DE RIONEGRO (PR 18+000 RUTA 45A08), SECTOR COMPRENDIDO ENTRE LA INTERSECCIÓN LA CEMENTO (PR 0+300 RUTA 45A08) Y EL CERO (PR 11+150 RUTA 45A08), SECTOR COMPRENDIDO ENTRE EL PUENTE LA CEMENTO (PR 0+000 DE LA RUTA 45A 08) Y LA , INTERSECCIÓN LA CEMENTO (PR 0+300 RUTA 45A08), SECTOR COMPRENDIDO ENTRE LA INTERSECCIÓN DE PALENQUE COMPRENDIDA LA TOTALIDAD DE LA INTERSECCIÓN (PR 71+310 DE LA RUTA 6602 Ó PR 10+100 DE LA RUTA 45 A ST 08) HASTA CAFÉ MADRID (PR 19+300 DE LA RUTA 45 AST 08), SECTOR COMPRENDIDO ENTRE LA INTERSECCIÓN PALENQUE (PR 71+301) HASTA EL PR73+690 RUTA 6602. ENTRE EL PR73+690, RUTA 6602 HASTA LA CARRERA 27 CON CALLE 65 EN BUCARAMANGA, (COLEGIO LA SALLE) SIN INCLUIR EL PUENTE, SECTOR COMPRENDIDO ENTRE EL CAI LA VIRGEN (BUCARAMANGA CRUCE CARRERA 15 CALLE 3) Y LA INTERSECCIÓN LA CEMENTO (PR0+300 RUTA 45A08), SECTOR COMPRENDIDO ENTRE CAFÉ MADRID (PR19+300 DE LA RUTA 45 AST 08) Y LA INTERSECCIÓN LA CEMENTO (PR0+300 RUTA 45A08), INCLUYENDO TODA LA INTERSECCIÓN"	
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL:	**NÚMERO**	4515
	FECHA	15 - FEBRERO - 2022
REGISTRO PRESUPUESTAL:	**NÚMERO**	4709
	FECHA	06 - ABRIL - 2022
VALOR:	DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE MILLONES DOSCIENTOS VEINTICINCO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y UN PESOS CON VEINTIDÓS CENTAVOS ($237.225.971,22)	
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL ADICIÓN (SI APLICA AL CONTRATO):	**NÚMERO**	N/A
	FECHA	N/A
REGISTRO PRESUPUESTAL ADICIÓN (SI APLICA AL CONTRATO):	**NÚMERO**	N/A
	FECHA	N/A
VALOR ADICIÓN (SI APLICA AL CONTRATO):	N/A	
VALOR TOTAL:	DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE MILLONES DOSCIENTOS VEINTICINCO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y UN PESOS CON	

	VEINTIDÓS CENTAVOS ($237.225.971,22)	
PÓLIZA:	**ASEGURADORA**	SEGUROS DEL ESTADO S.A.
	NÚMERO	15-40-101078016 ANEXO 1 15-44-101261106 ANEXO 1
	FECHA	20-04-2022 20-04-2022
PRÓRROGA PÓLIZA (SI APLICA AL CONTRATO)	**ASEGURADORA**	N/A
	NÚMERO	N/A
	FECHA	N/A
PLAZO:	LA DURACIÓN DEL CONTRATO ES DE **03 (TRES) MESES** CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO.	
PLAZO CON ADICIÓN (SI APLICA AL CONTRATO) **:**	N/A	
MODIFICATORIOS AL CONTRATO Y/O CONVENIOS:	N/A	
FECHA DE INICIO:	20 DE ABRIL DE 2022	
FECHA DE TERMINACIÓN:	19 DE JULIO DE 2022	
FECHA DE TERMINACIÓN CON ADICIÓN (SI APLICA):	N/A	
I.B.C.:	N/A	
PERIODO DE COTIZACIÓN	ABRIL DE 2022	
EPS:	VARIAS – NUMERO DE PLANILLA: 9435282534– PAGADA EL 02 DE JUNIO 2022	
ARL:	VARIAS – NUMERO DE PLANILLA: 9435282534 – PAGADA EL 02 DE JUNIO 2022	
FONDO DE PENSIONES:	VARIOS – NUMERO DE PLANILLA: 9435282534 – PAGADA EL 02 DE JUNIO 2022	

Con base en el informe presentados por el Contratista del contrato de obra **G-19-2022**, respecto a las actividades ejecutadas en el presente contrato y como parte de la constancia, tomando como base la presente acta, se recomienda el trámite del acta por un valor de **SETENTA Y NUEVE MILLONES SETENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS VEINTE Y TRES PESOS CON SETENTA Y CUATRO CENTAVOS ($79.075.323,74).**

C E R T I F I C A Q U E:


De acuerdo con las condiciones establecidas en el presente contrato y una vez revisada la documentación suministrada por el supervisor con relación al desarrollo y ejecución de este, las actividades representativas realizadas desde el 20 de mayo de 2022 al 19 de junio de 2022 fueron:


DESCRIPCION DE ACTIVIDADES INFORMES PARCIALES:


ACTIVIDADES	SECTOR	PR INTERVENCIÓN
Rocería y desmonte manual	La Salle – palenque Centro abastos – palenque Café Madrid – la cemento Bocas – la cemento La cemento – la virgen	78+640-71+280 16+020-10+020 19+260-cco cemento 15+800-cco cemento cco cemento-4+020
Limpieza de bermas pavimentadas	La Salle – palenque Centro abastos – palenque Café Madrid – la cemento Bocas – la cemento La cemento – la virgen	78+640-71+280 16+020-10+020 19+260-cco cemento 15+800-cco cemento cco cemento-4+020
Limpieza de calzada, despeje de derrumbes (sin maquinaria)	La Salle – palenque Centro abastos – palenque Café Madrid – la cemento Bocas – la cemento La cemento – la virgen	78+640-71+280 16+020-10+020 19+260-cco cemento 15+800-cco cemento cco cemento-4+020
Limpieza manual de cunetas	La Salle – palenque Centro abastos – palenque Café Madrid – la cemento Bocas – la cemento La cemento – la virgen	78+640-71+280 16+020-10+020 19+260-cco cemento 15+800-cco cemento cco cemento-4+020


Limpieza manual de cunetas revestidas en tierra	Punto Crítico Villas san Ignacio ambos costados	19+120-18+980
Parcheo con mezcla asfáltica (se recibieron 114m3 de mezcla, derivado del contrato de suministro de mezcla asfáltica, se realizó corte y retiro con maquinaria, se realiza limpieza de la superficie e imprimación, se realizó la colocación de la mezcla extendida y compactación con un vibro compactador de rodillo y una rana, durante 4 días se realizaron los trabajos con una sola cuadrilla y otros 4 días se reforzo con otra cuadrilla)	Lebrija -peaje	Pr60+020-pr60+600 calzada derecha sentido Lebrija -girón
	Palenque -café Madrid	10+280-11+500 Pr12+620-pr14+760 calzada derecha
	Centro abastos- café Madrid	Pr14+740-12+600 calzada izquierda
Vigilancia	Todos los tramos	Todos los tramos
Limpieza de alcantarilla y obras de drenaje	Lebrija Girón La Salle Puente tierra La virgen Rio negro	PR60+020/60+620 PR70+080/69+640 PR78+620/77+040 PR7+380/6+740 PR4+020/3+220 PR15+600/16+600
Limpieza y arreglo de señalización	La Salle -palenque Girón -peaje	PR78+620/77+040 PR69+040/67+900


REGISTRO FOTOGRÁFICO

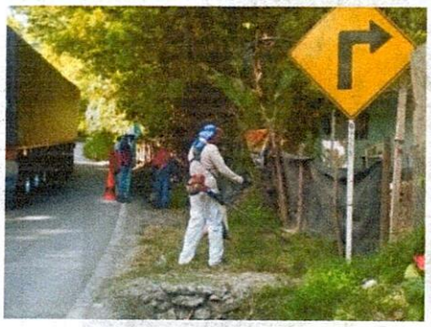

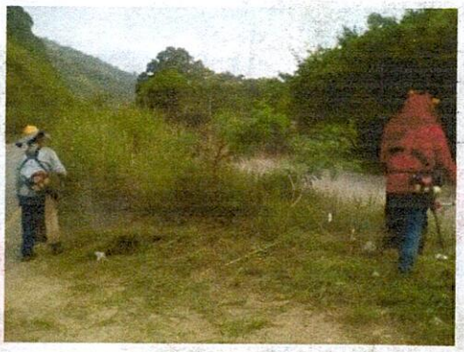


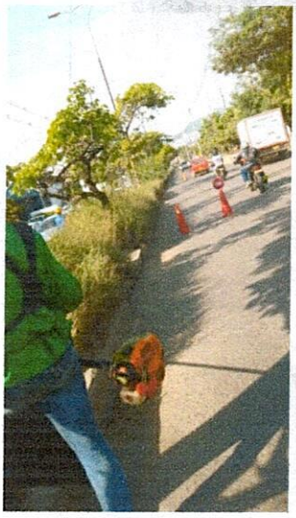

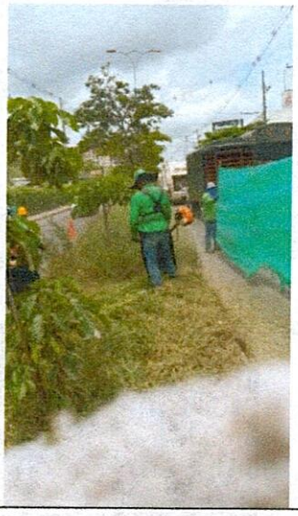


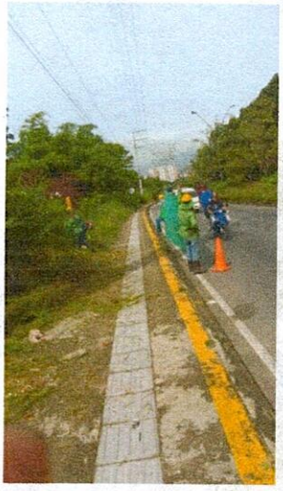



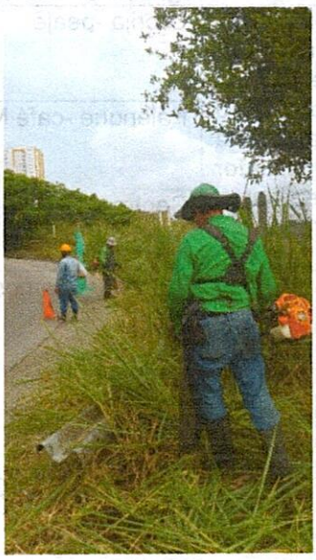




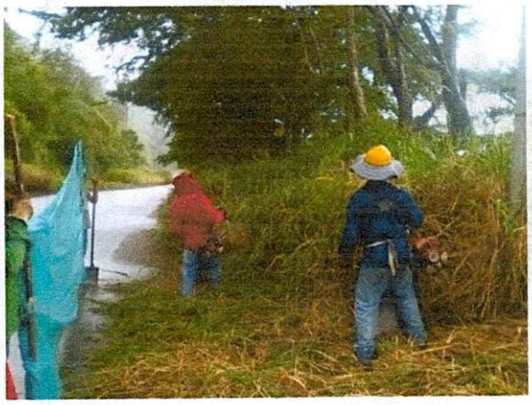






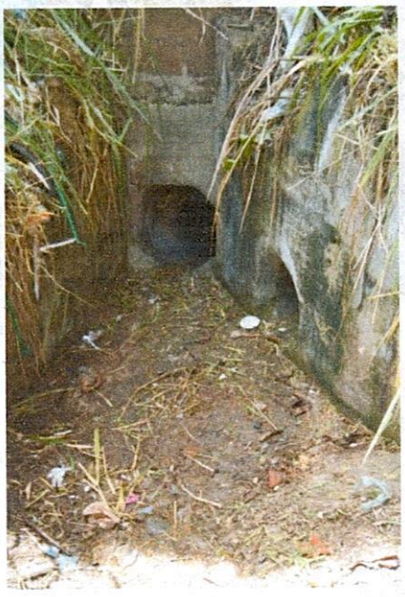






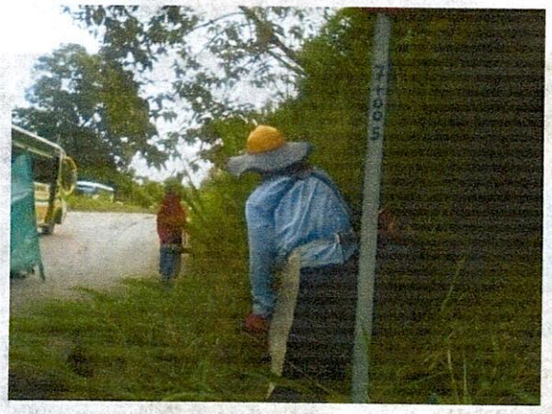





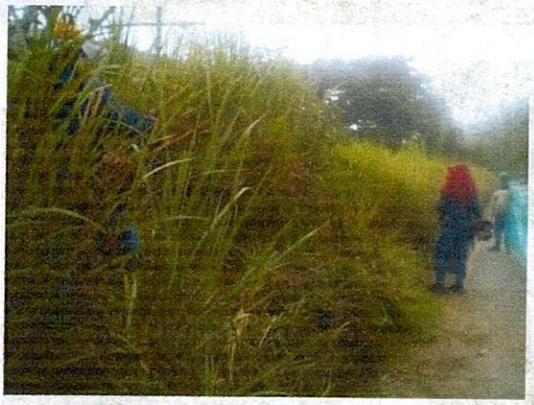





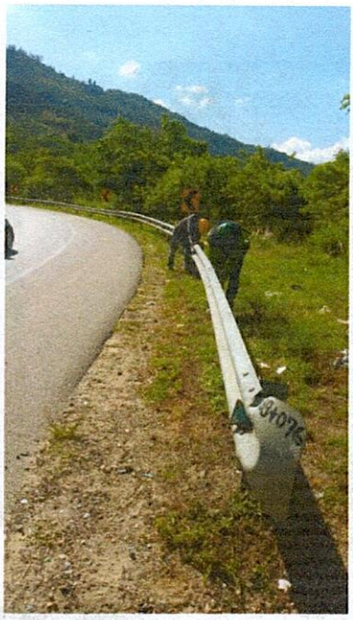

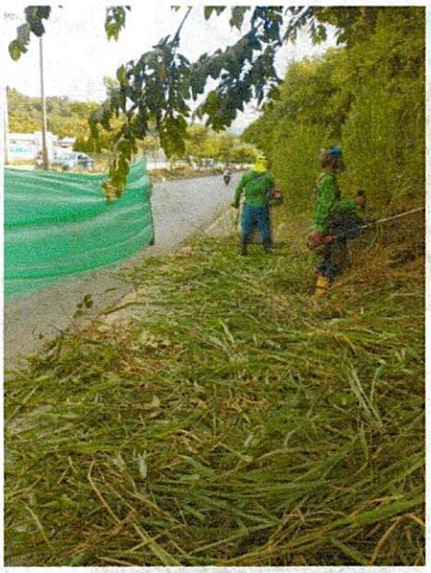









PRECAUCION
DESCENSO





4+298

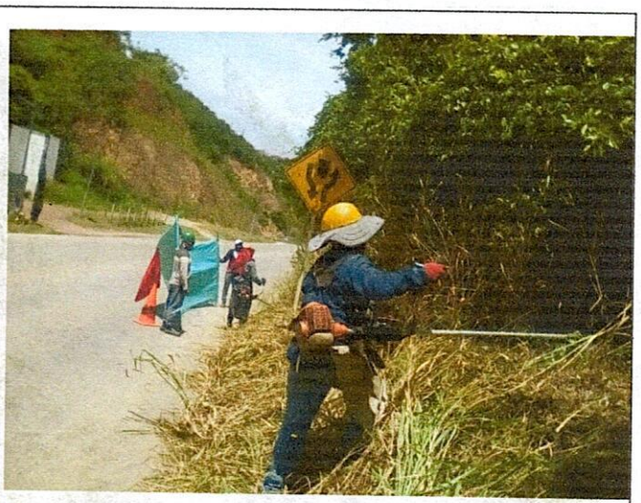


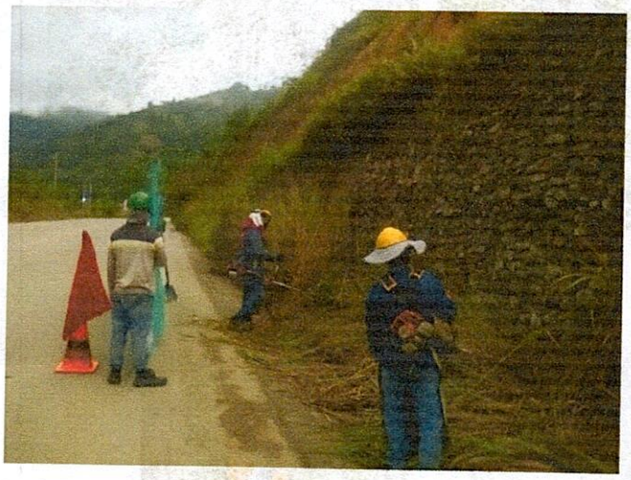

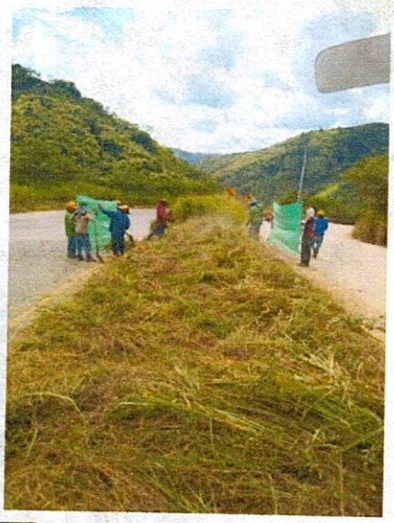




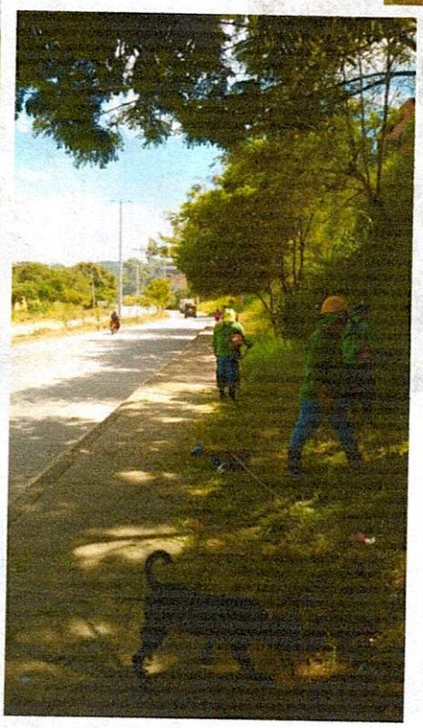


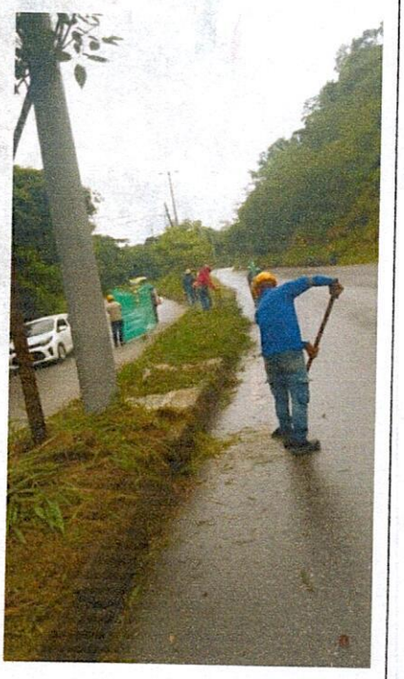






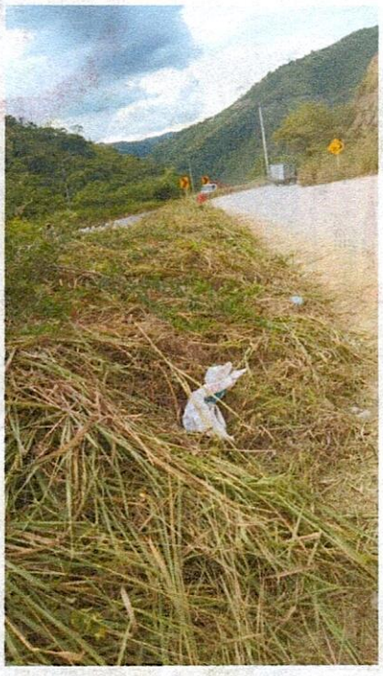


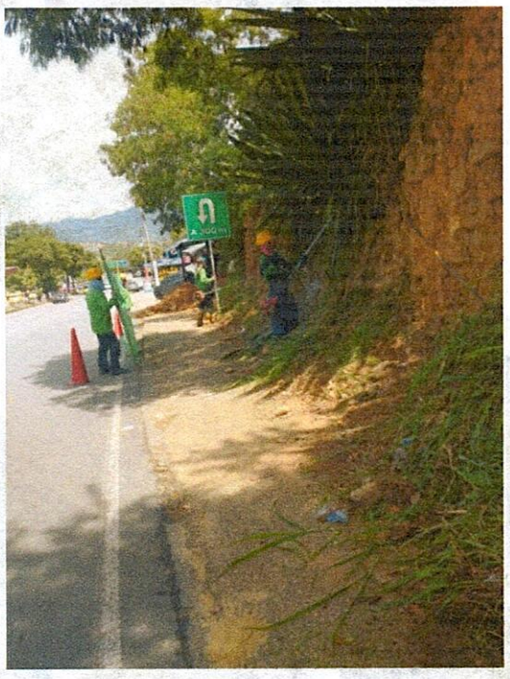








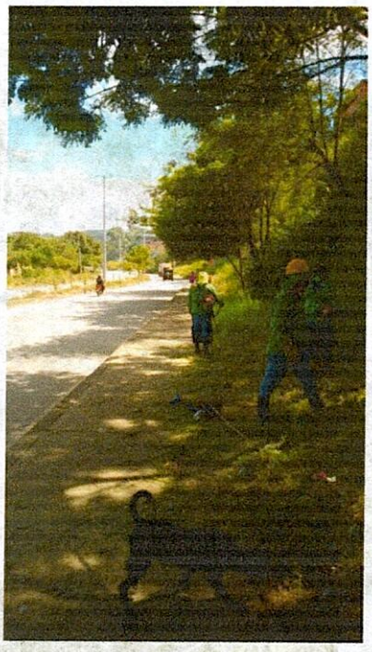

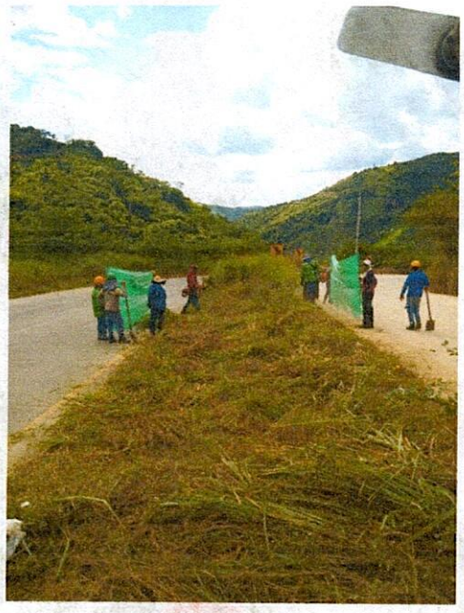


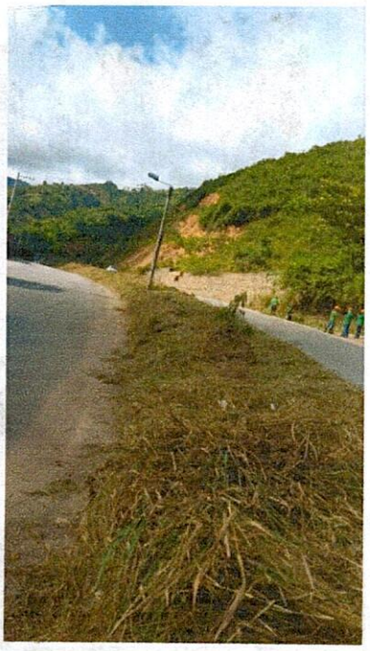


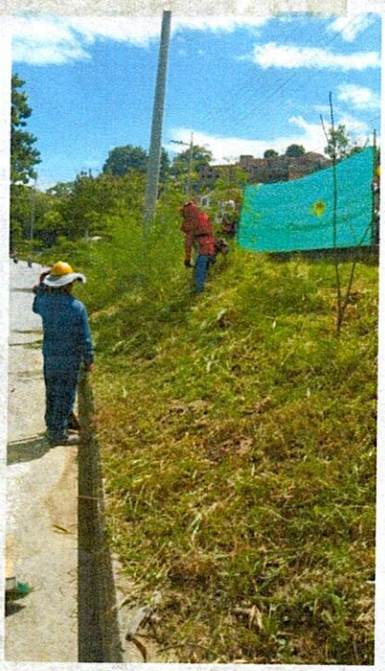

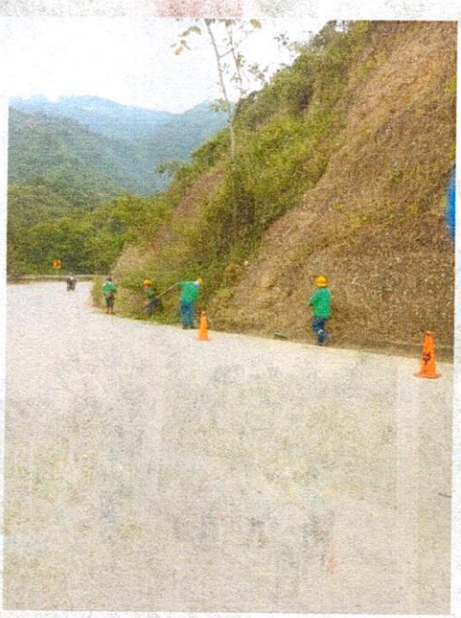



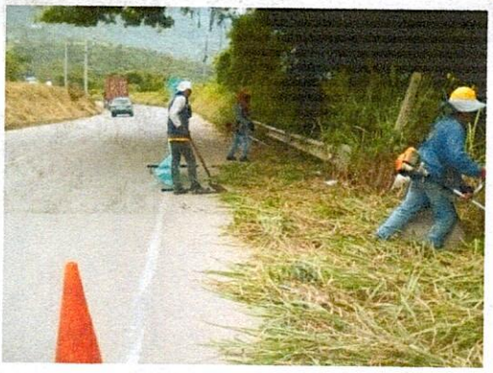

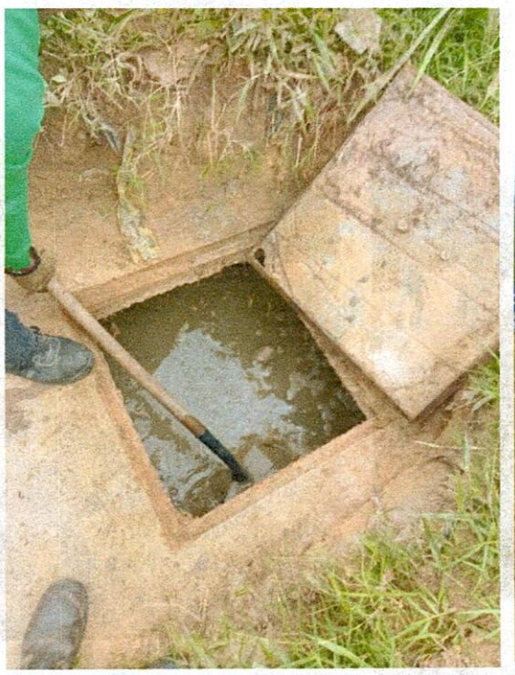












30
2









30
2






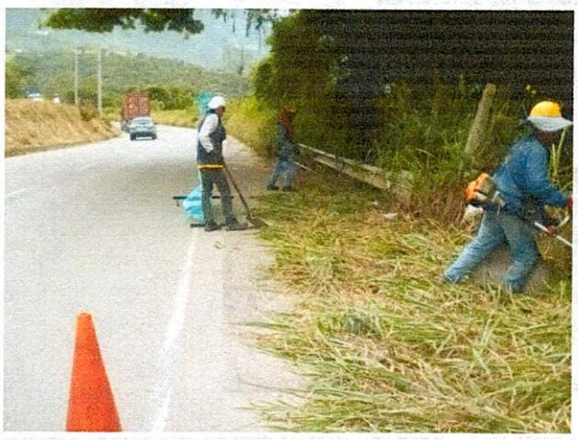

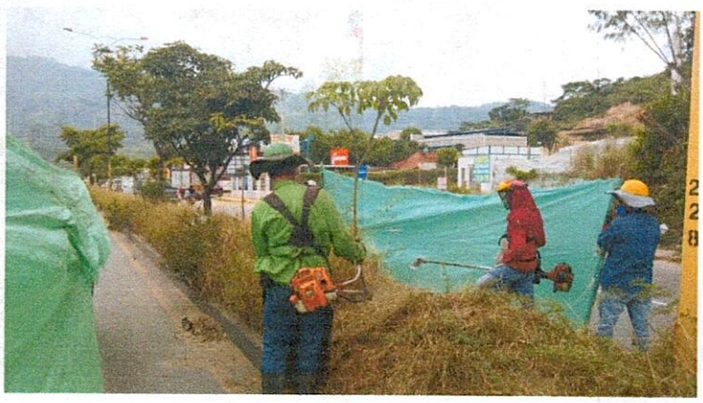


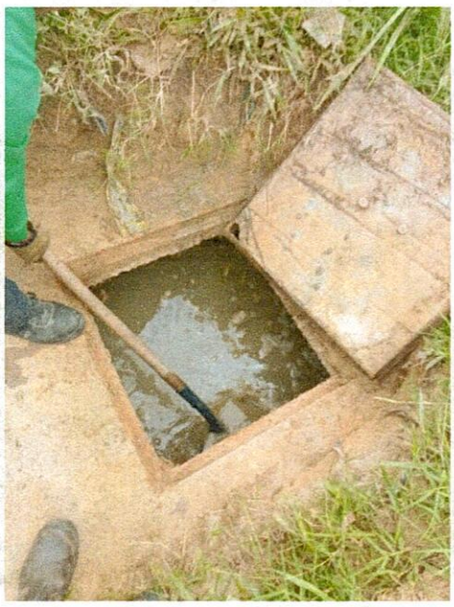





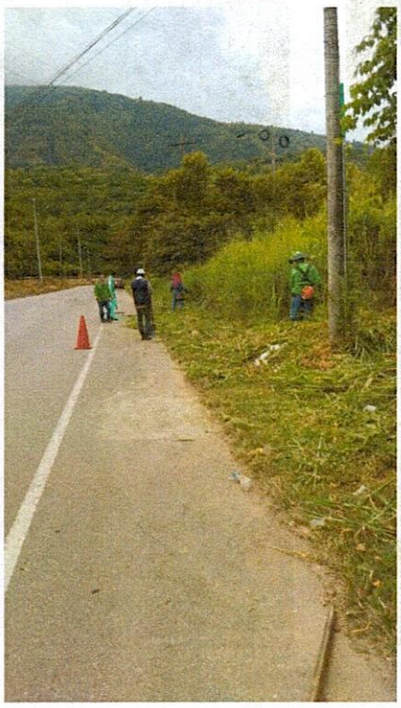



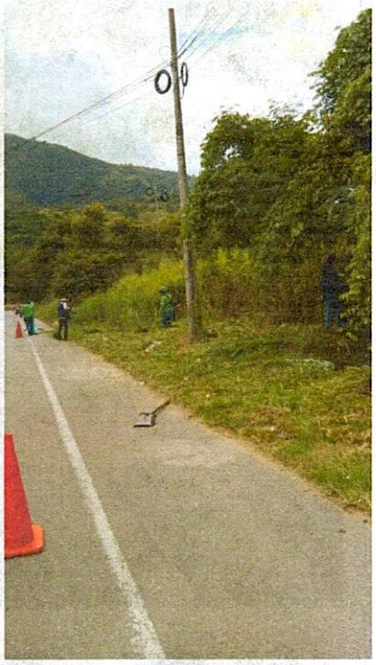


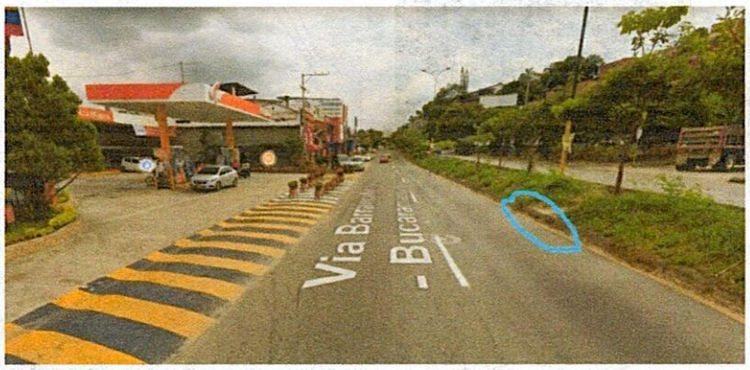
Via

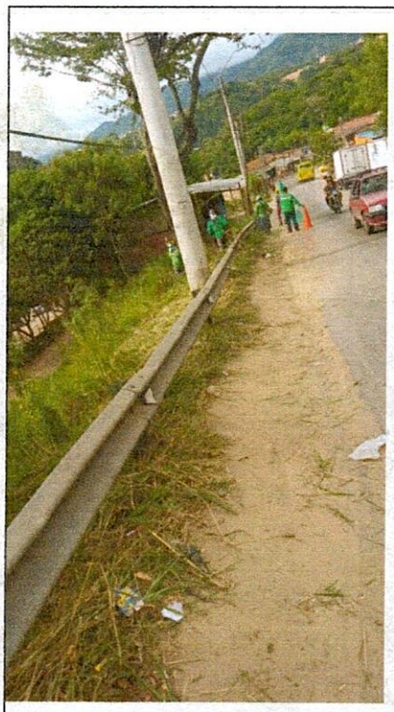







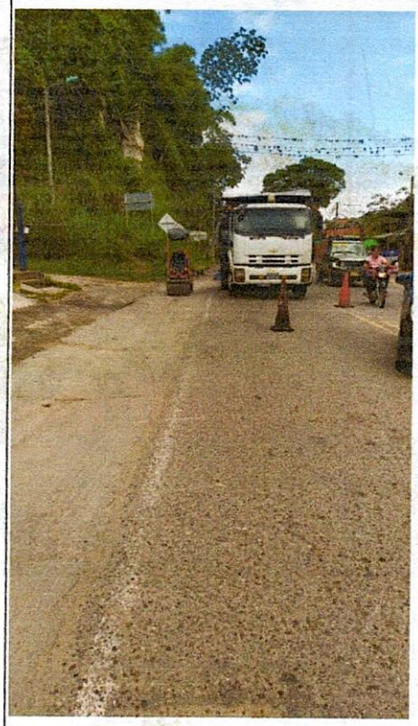



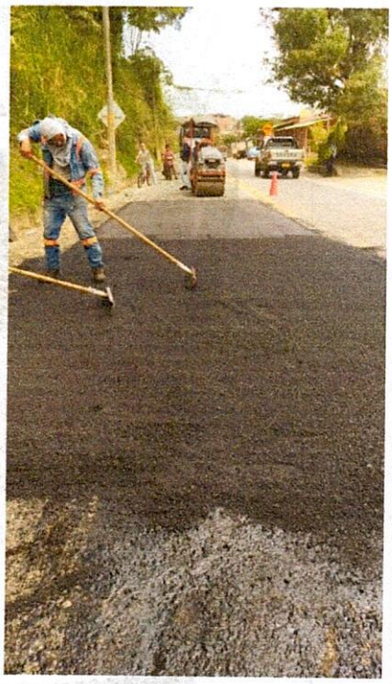

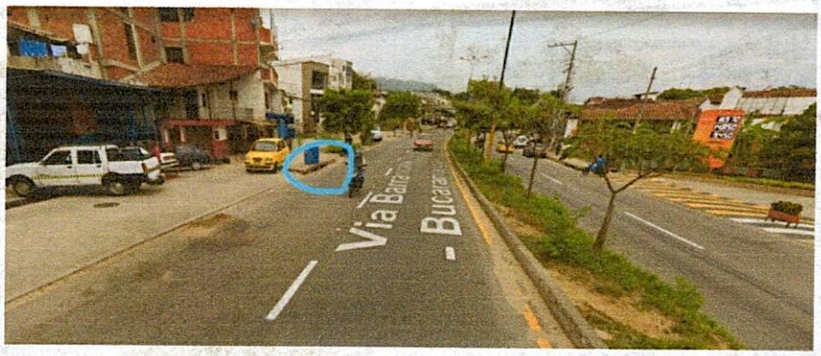

Via Bari
Bucara










Via Bara
Bucara

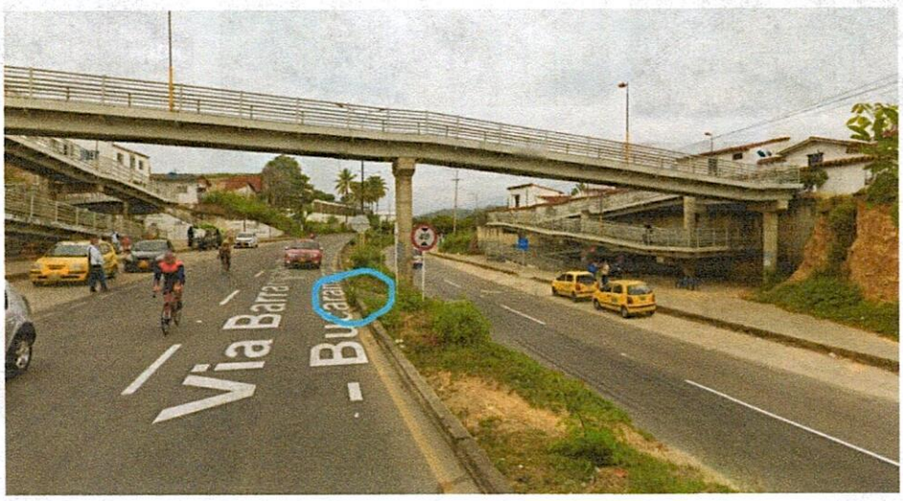
Via Bara
Bu

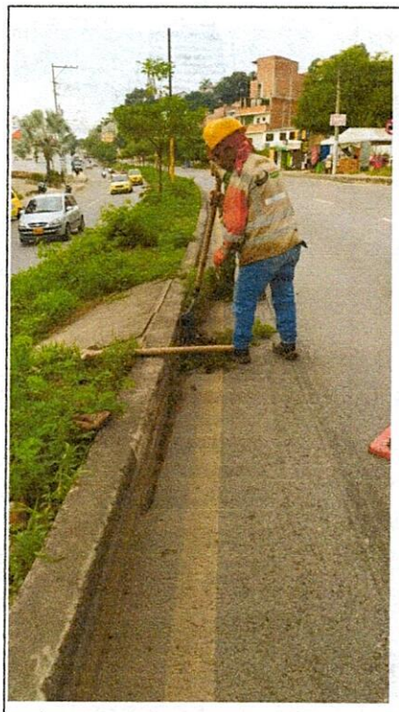











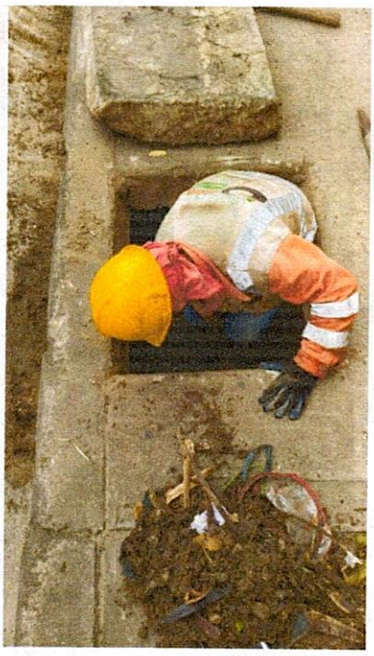






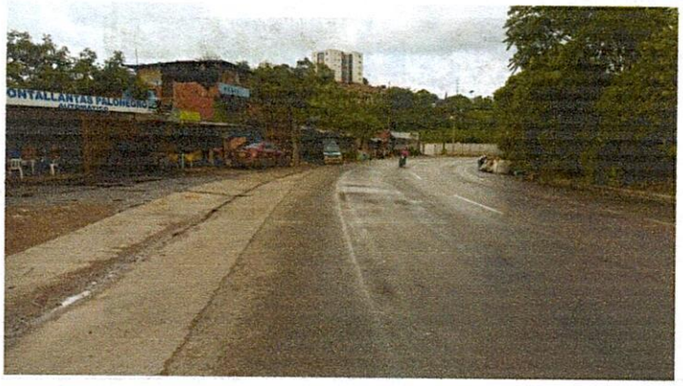


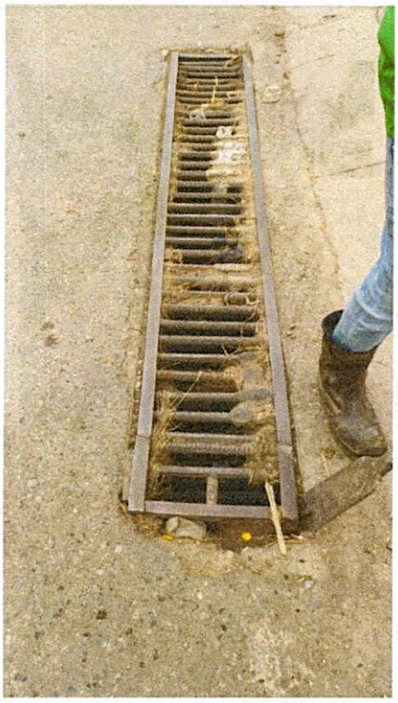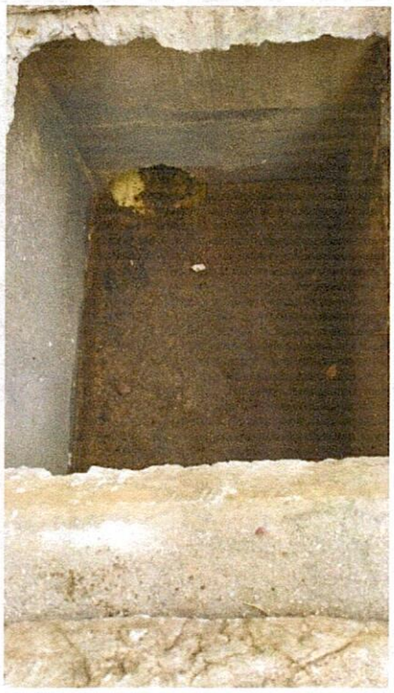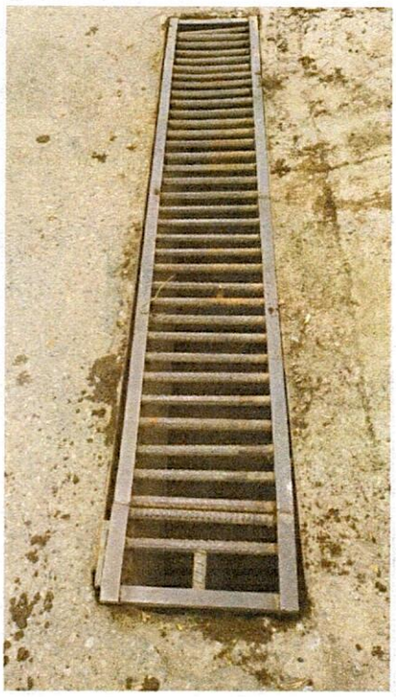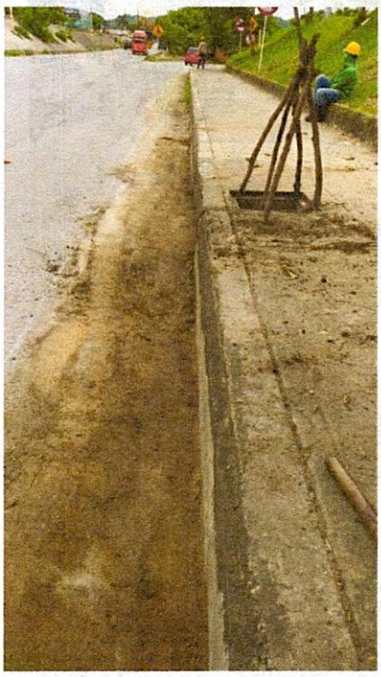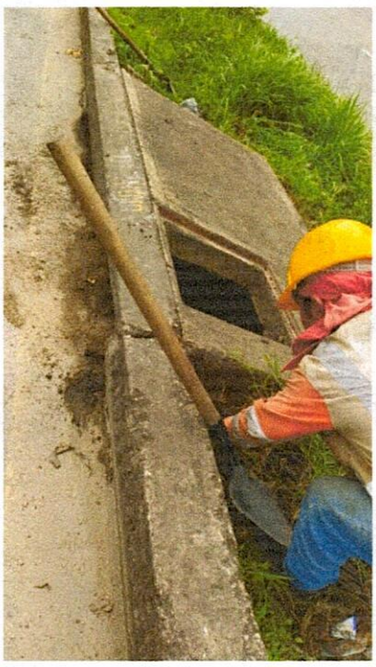






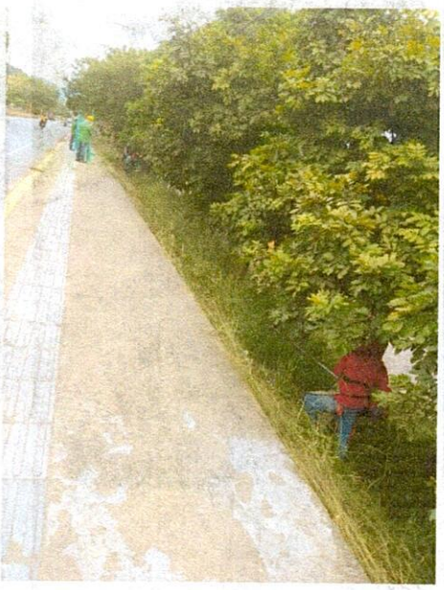


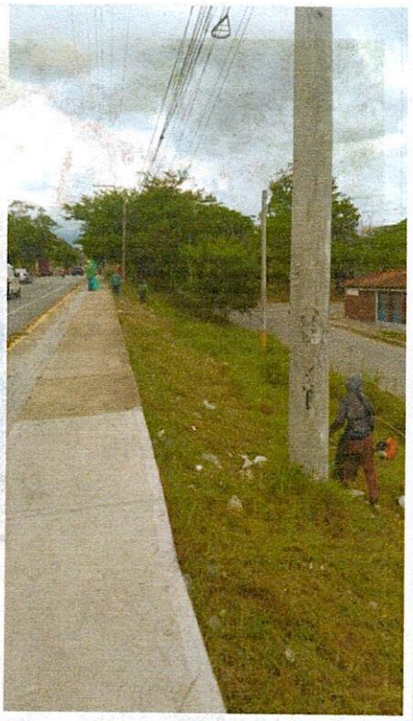

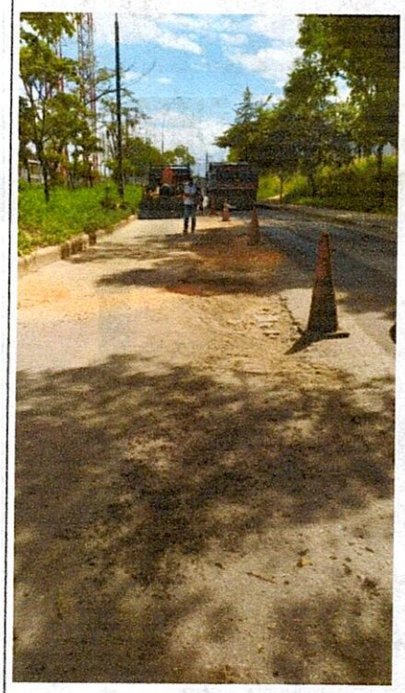






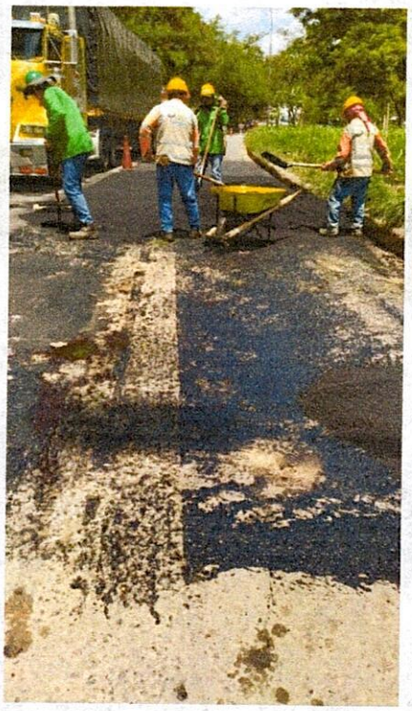






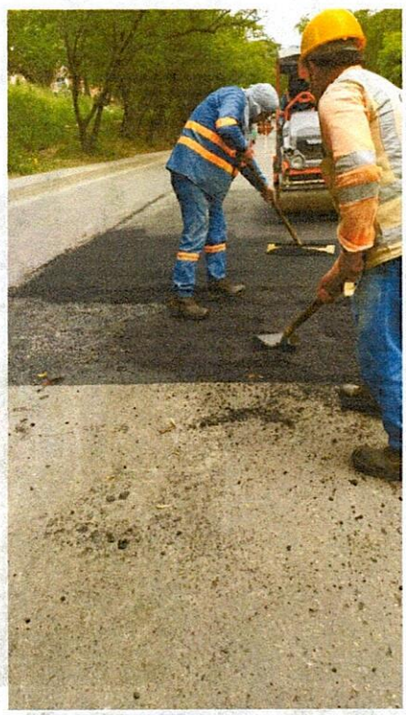









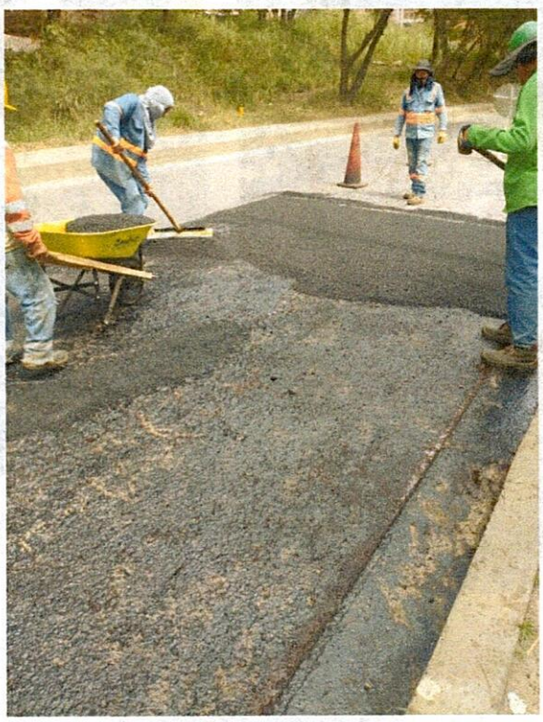



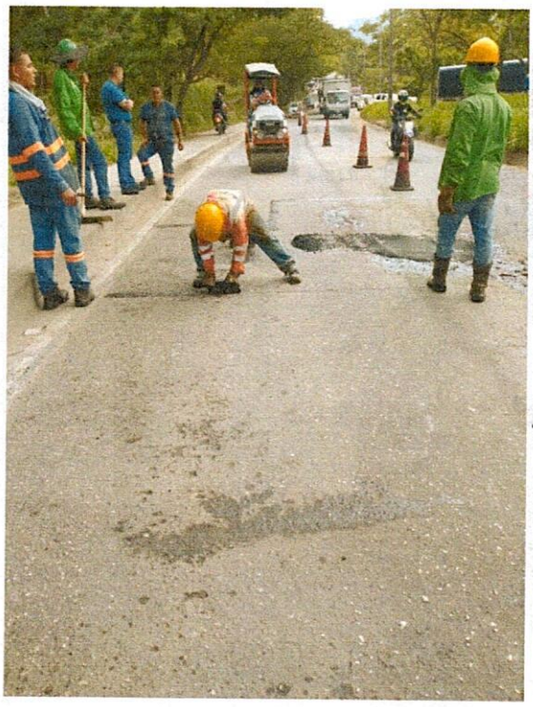

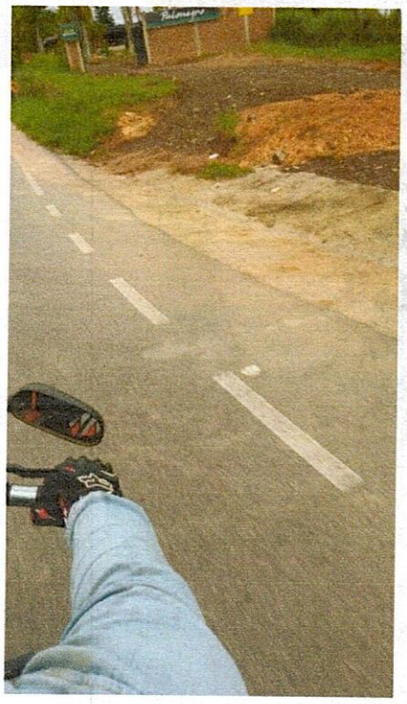











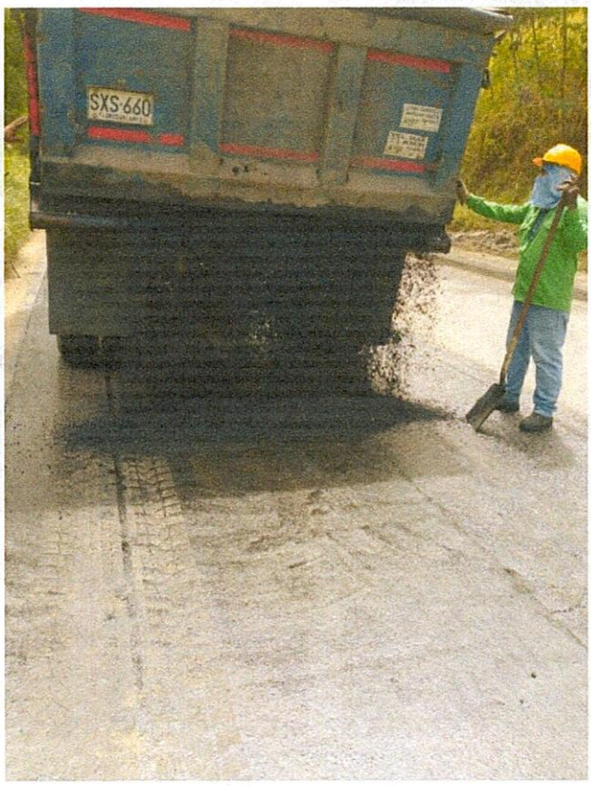


SXS·660

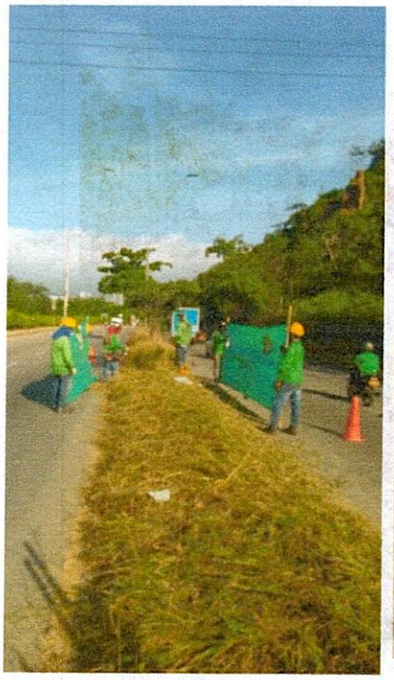













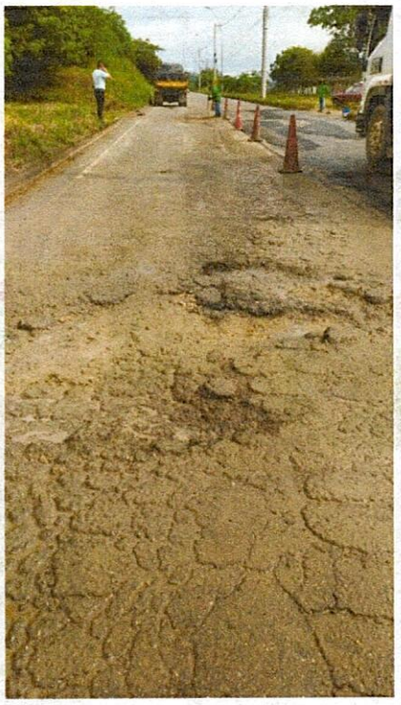


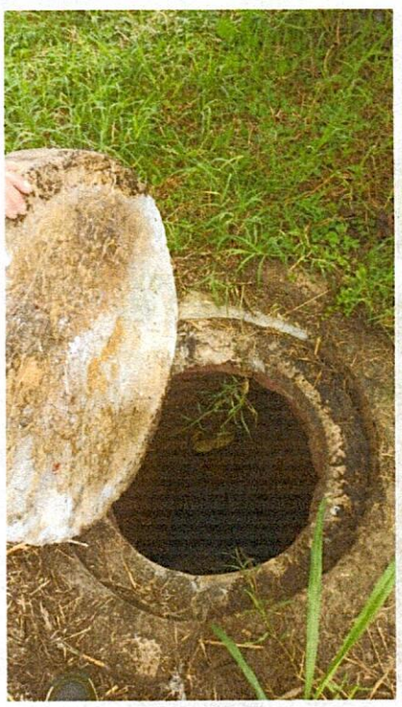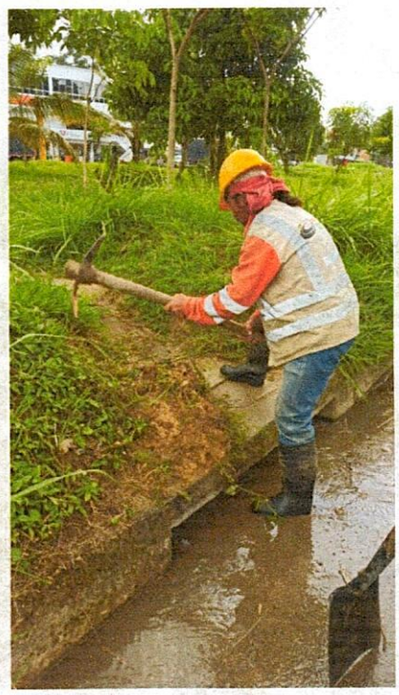


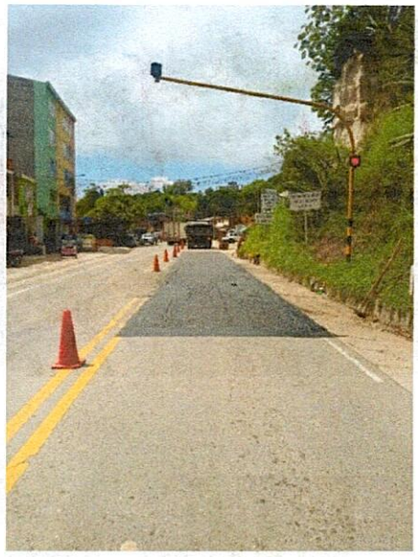


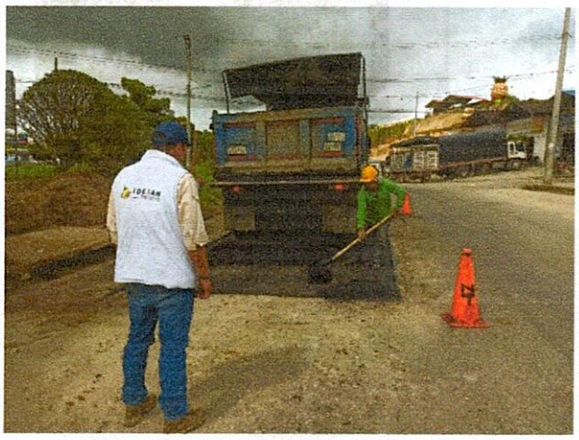



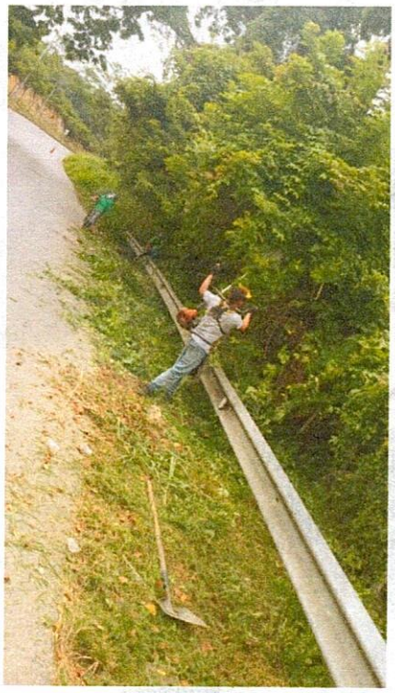






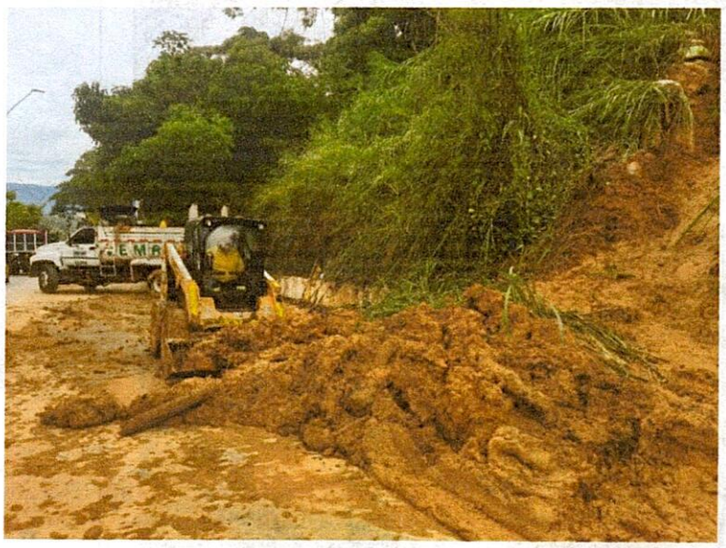


















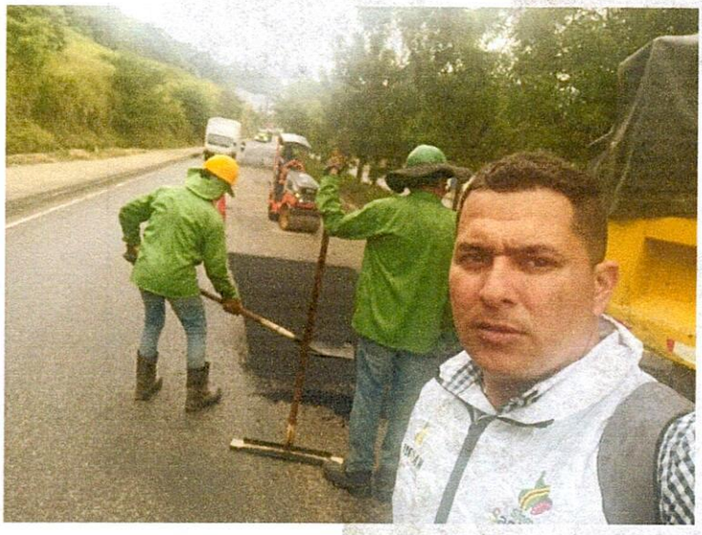




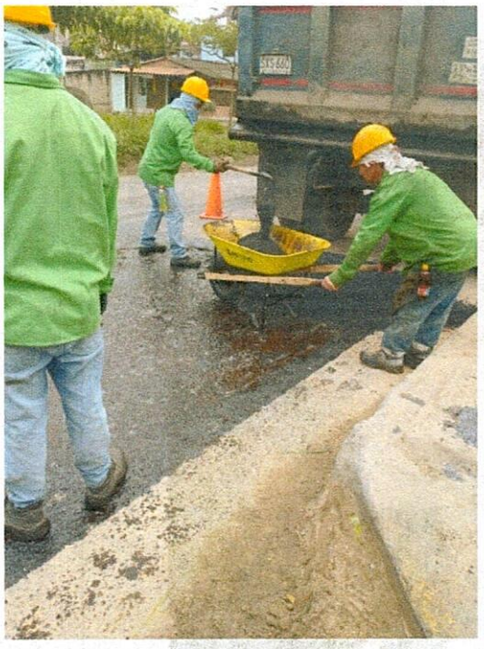

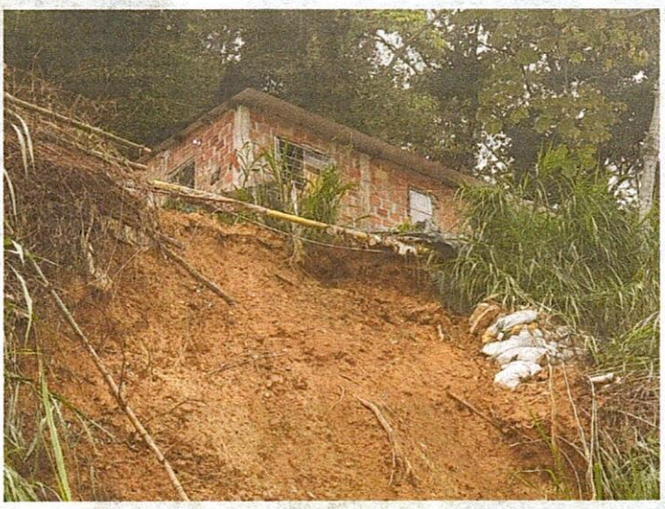


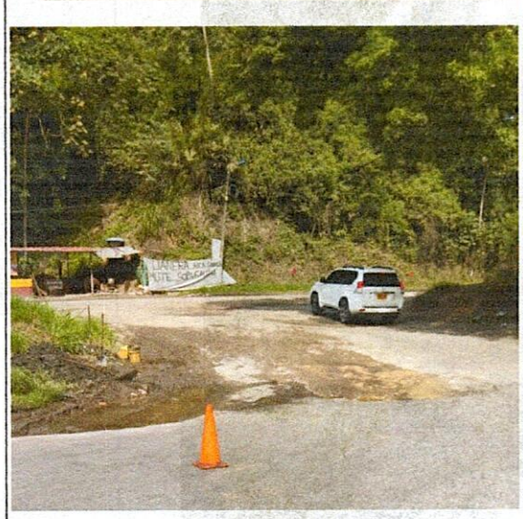



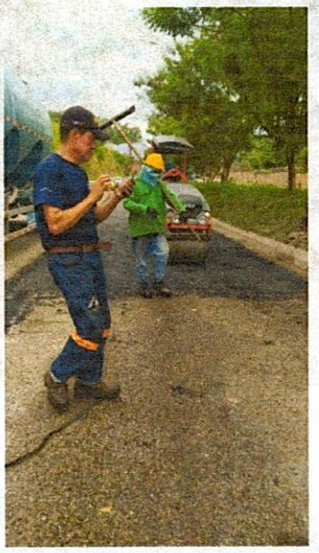




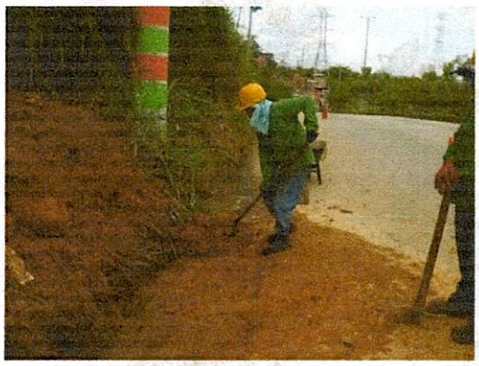











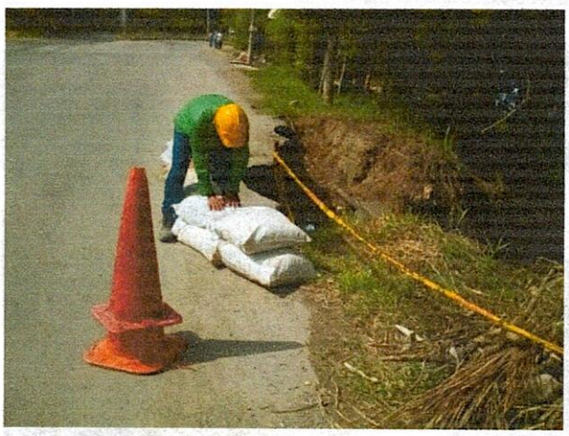


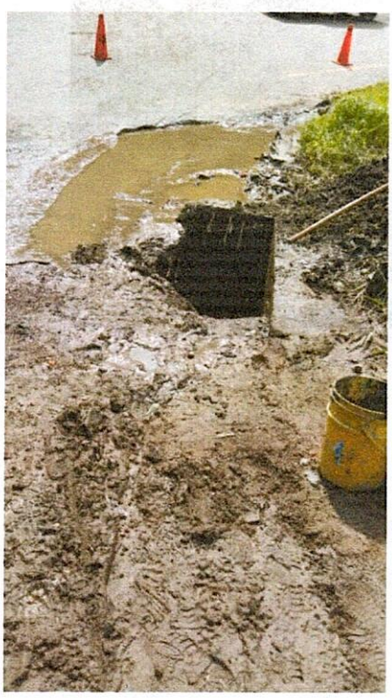

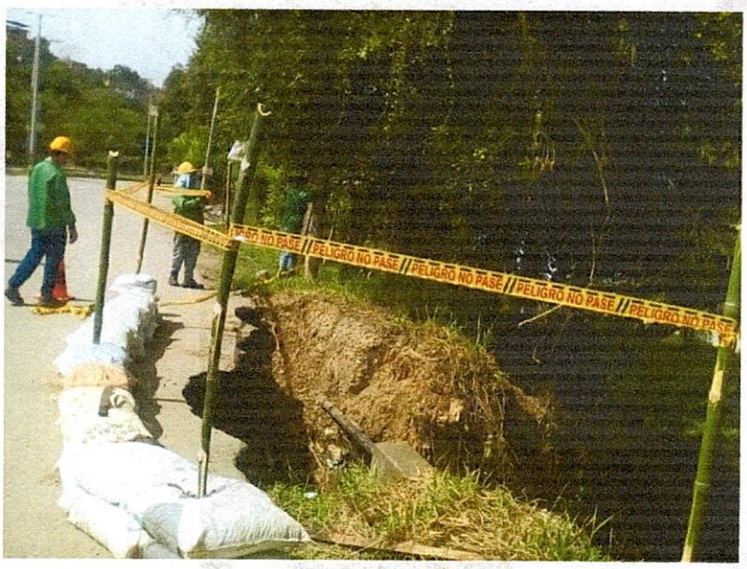

PELIGRO NO PASE // PELIGRO NO PASE // PELIGRO NO PASE // PELIGRO NO PASE // PELIGRO NO PASE




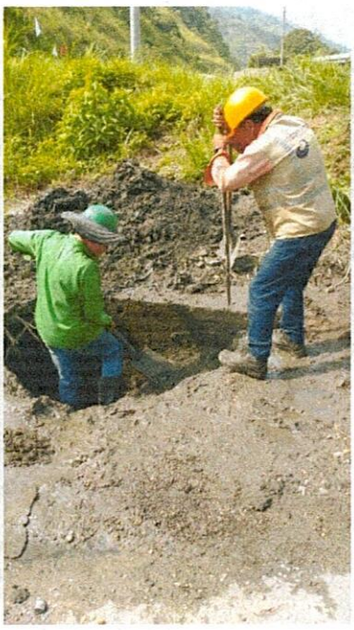

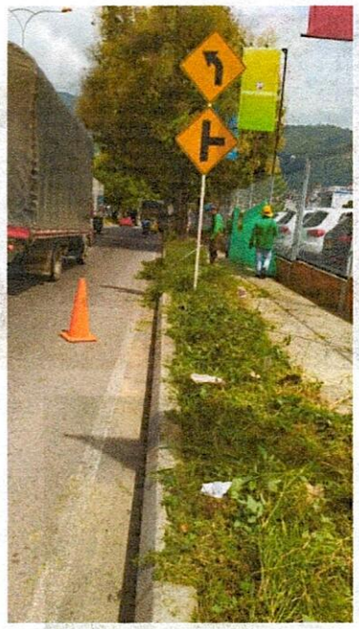


PELIGRO NO PASE

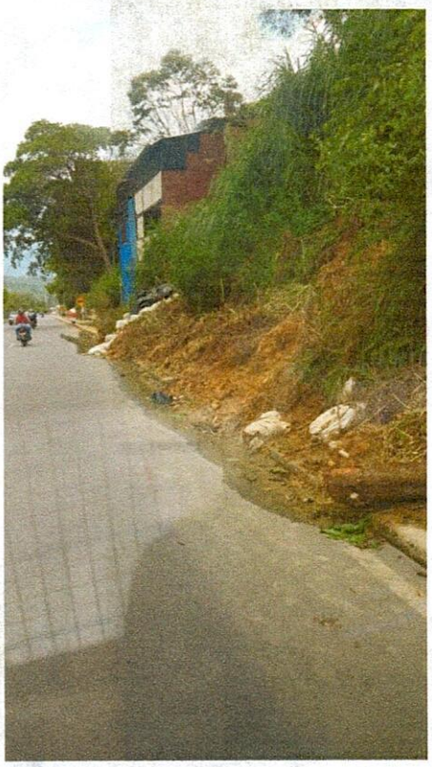

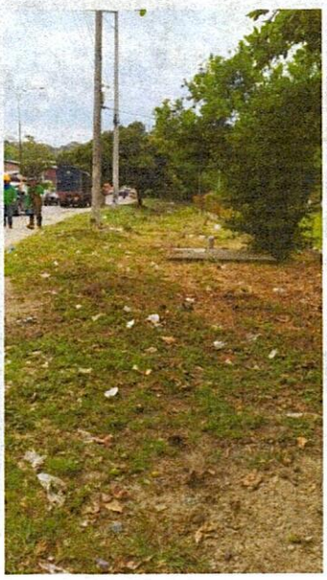





La descripción de las actividades está basada en la revisión y aprobación del informe presentado por el contratista N° 02 de fecha 23 de junio de 2022.
Se adjunta copia de pago de las planillas de aportes parafiscales con:
EPS Varios-Planilla (9435282534) pagada el 02 de junio de 2022.
ARL: Colpatria- Planilla (9435282534) pagada el 02 de junio de 2022.
PENSIÓN: Varios- Planilla (9435282534) pagada el 02 de junio de 2022.
con lo cual se verificó el cumplimiento con el pago de los aportes a los sistemas de salud, pensión, riesgos laborales.

Se firma en Bucaramanga a, los veintitrés (23) días del mes de junio de 2022.

JOHNNY WALTER PEÑALOZA NIÑO
GERENTE

HERMES SUAREZ CABALLERO
APOYO AL SUPERVISOR
