CIVIDEPORTES

CORTE DE OBRA N° 1 Y FINAL
CONTRATO 410 DE 2022

REVISIÓN: Rev No. 01

FECHA DE APROBACIÓN:

NOMBRE DE LA OBRA: CANCHA SINTETICA EN EL BARRIO PENSILVANIA

CONTRATISTA: CIVIDEPORTES SAS — **NIT: 830 131 918 -9**

OBJETO DEL CONTRATO: ADECUACION DE UN ESPACIO DEPORTIVO Y CONSTRUCCION DE UNA CANCHA SINTETICA EN EL BARRIO PENSILVANIA EN EL MUNICIPIO DE FACATATIVÁ CUNDINAMARCA DE ACUERDO AL CONVENIO ICCU No. 656 DE 2021.

No. CONTRATO: 410 DE 2022 — No. CORTE: 1 Y FINAL

FECHA DEL CORTE: 06/09/2022

INDICAR SI ESTE ES EL ULTIMO CORTE DE OBRA: **SI _X_** **NO __**

CONDICIONES CONTRACTUALES							**MODIFIACTORIO No.1**		**MODIFICATORIO(+/-)**		**ACTA No. 1**	
PRELIMINARES							**PRELIMINARES**					
ITEM	**CODIGO**	**DESCRIPCION**	**UND**	**CANTIDAD**	**VALOR UNITARIO**	**VALOR TOTAL**	**CANTIDAD ACTUALIZADA**	**VALOR ACTUALIZADO**	**CANTIDAD ACTUALIZADA**	**VALOR ACTUALIZADO**	**EJECUTADO**	**VALOR ACTA**
1		EXCAVACIÓN MANUAL ZANJA EN TIERRA H	M3	12.72	$ 30,120.00	$ 383,126.40	12.72	$ 383,126.40	4.35	$ 130,931.64	4.35	$ 130,931.64
2		RELLENO AGREGADO EN MATERIAL DE BASE COMPACTADO MECANICAMENTE	M3	4.35	$ 172,280.00	$ 749,418.00	4.35	$ 749,418.00	4.35	$ 748,901.16	4.35	$ 748,901.16
3		IMPRIMACIÓN CON BASE RESURFACER	M2	506.36	$ 12,500.00	$ 6,329,500.00	518.00	$ 6,475,000.00	518.07	$ 6,475,912.50	518.07	$ 6,475,912.50
4		PISO MODULAR SISTEMA SPORT	M2	556.99	$ 297,000.00	$ 165,426,030.00	518.00	$ 153,846,000.00	518.07	$ 153,867,681.00	518.07	$ 153,867,681.00
5		MALLA NYLON PETROLIZADA VOLEIBOL	UND	1.00	$ 92,000.00	$ 92,000.00	1.00	$ 92,000.00	1.00	$ 92,000.00	1.00	$ 92,000.00
6		SOPORTE MALLA VOLEIBOL CON TENSOR	UND	2.00	$ 1,669,000.00	$ 3,338,000.00	2.00	$ 3,338,000.00	2.00	$ 3,338,000.00	2.00	$ 3,338,000.00
7		BORDILLO PREFABRICADO A-80	ML	92.14	$ 74,000.00	$ 6,818,360.00	-	$ -	0.00	$ -	-	$ -
ACTIVIDADES ADICIONALES NO PREVISTAS							**NO PREVISTOS**		**NO PREVISTOS**			
NP1		CERRAMIENTO EN MALLA ESLABONADA C. 10 INC. ÁNGULO (PARAL EN TUBO ESTRUCTURAL GALVANIZADO 2")	M2	-	$ 124,118.00	$ -	139.68	$ 17,336,802.24	141.53	$ 17,566,420.54	141.53	$ 17,566,420.54
NP2		CANECA EN ACERO INOXIDABLE TIPO BARCELONA	UND	-	$ 916,587.00	$ -	1.00	$ 916,587.00	1.00	$ 916,587.00	1.00	$ 916,587.00
		SUBTOTAL				$ 183,136,434.40		$ 183,136,933.64		$ 183,136,433.84		$ 183,136,433.84
		*** A.I.U. 33%**				$ 60,435,023.35		$ 60,435,188.10		$ 60,435,023.17		$ 60,435,023.17
		TOTAL CON A.I.U.				$ 243,571,457.75		$ 243,572,121.74		$ 243,571,457.01		$ 243,571,457.01
		AJUSTE AL PESO				$ (0.75)		$ (664.74)		$ (0.01)		$ (0.01)
		VALOR TOTAL				$ 243,571,457.00		$ 243,571,457.00		$ 243,571,457.00		$ 243,571,457.00

RESIDENTE DE OBRA
NOMBRE: OLIVERIO GOMEZ RIOS

DIRECTOR OPERATIVO DE OBRAS PUBLICAS
NOMBRE: FRANKY SEBASTIAN S/

DIRECTOR DE OBRA
NOMBRE: ALVARO GABRIEL AREVALO

CONTRATISTA
NOMBRE: WILSON ORLANDO PE
CARGO REPRESENTANTE LEGAL

CIVIDEPORTES®	**ENTIDAD: ALCALDIA DE FACATATIVA** **DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA** **MEMORIA DE CALCULO**


INFORMACIÓN BÁSICA	
CONTRATISTA	CIVIDEPORTES SAS NIT. 830131918-9
CONTRATO No.	410
INFORMACIÓN DEL PROYECTO	
OBJETO PROYECTO:	ADECUACION DE UN ESPACIO DEPORTIVO Y CONSTRUCCION DE UNA CANCHA SINTETICA EN EL BARRIO PENSILVANIA EN EL MUNICIPIO DE FACATATIVÁ CUNDINAMARCA DE ACUERDO AL CONVENIO ICCU No. 656 DE 2021.
FECHA DE INICIACIÓN:	01 DE JUNIO DE 2022
FECHA DE TERMINACIÓN	06 DE SEPTIEMBRE DE 2022

FRENTE DE OBRA		PENSILVANIA
ÍTEM	**UNIDAD**	**DESCRIPCIÓN**
1	**M3**	**EXCAVACIÓN MANUAL ZANJA EN TIERRA H=1.0M**

DESCRIPCIÓN	**DIMENSIONES**				
	ANCHO	**LARGO**	**ALTO**	**CANTIDAD**	**TOTAL**
SECTOR CERRAMIENTO	0.46	0.45	1.00	21.00	4.35
			-		-
PASAN:				**SUBTOTAL**	**4.35**
				TOTAL REDONDEADO A LA DECIMA	

OBSERVACIÓN:

ESQUEMA DEL ÍTEM

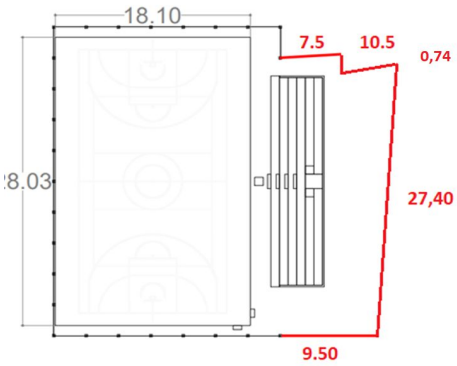



Firma

DIRECTOR DE OBRA
ALVARO GABRIEL AREVALO

CIVIDEPORTES®	**ENTIDAD: ALCALDIA DE FACATATIVA** **DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA** **MEMORIA DE CALCULO**

INFORMACIÓN BÁSICA	
CONTRATISTA	CIVIDEPORTES SAS NIT. 830131918-9
CONTRATO No.	410


INFORMACIÓN DEL PROYECTO	
OBJETO PROYECTO:	ADECUACION DE UN ESPACIO DEPORTIVO Y CONSTRUCCION DE UNA CANCHA SINTETICA EN EL BARRIO PENSILVANIA EN EL MUNICIPIO DE FACATATIVÁ CUNDINAMARCA DE ACUERDO AL CONVENIO ICCU No. 656 DE 2021.
FECHA DE INICIACIÓN:	01 DE JUNIO DE 2022
FECHA DE TERMINACIÓN	06 DE SEPTIEMBRE DE 2022

FRENTE DE OBRA		PENSILVANIA
ÍTEM	**UNIDAD**	**DESCRIPCIÓN**
2	**M3**	**RELLENO AGREGADO EN MATERIAL DE BASE COMPACTADO MECANICAMENTE**

DESCRIPCIÓN	**DIMENSIONES**				
	ANCHO	**LARGO**	**ALTO**	**CANTIDAD**	**TOTAL**
SECTORCERRAMIENTO	0.46	0.45	1.00	21.00	4.35
			-		-
PASAN:				**SUBTOTAL**	**4.35**
				TOTAL REDONDEADO A LA DECIMA	

OBSERVACIÓN:

ESQUEMA DEL ÍTEM

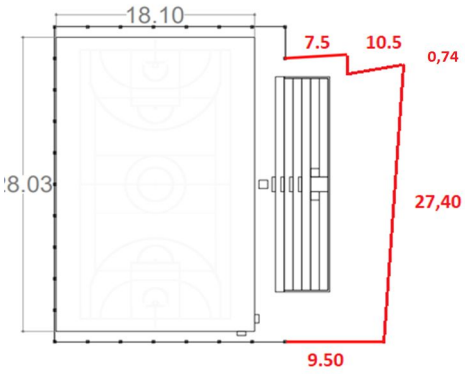



Firma

DIRECTOR DE OBRA
ALVARO GABRIEL AREVALO

CIVIDEPORTES®	**ENTIDAD: ALCALDIA DE FACATATIVA** **DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA** **MEMORIA DE CALCULO**

INFORMACIÓN BÁSICA	
CONTRATISTA	CIVIDEPORTES SAS NIT. 830131918-9
CONTRATO No.	410

INFORMACIÓN DEL PROYECTO	
OBJETO PROYECTO:	ADECUACION DE UN ESPACIO DEPORTIVO Y CONSTRUCCION DE UNA CANCHA SINTETICA EN EL BARRIO PENSILVANIA EN EL MUNICIPIO DE FACATATIVÁ CUNDINAMARCA DE ACUERDO AL CONVENIO ICCU No. 656 DE 2021.
FECHA DE INICIACIÓN:	01 DE JUNIO DE 2022
FECHA DE TERMINACIÓN	06 DE SEPTIEMBRE DE 2022

FRENTE DE OBRA		PENSILVANIA
ÍTEM	**UNIDAD**	**DESCRIPCIÓN**
3	**M2**	**IMPRIMACIÓN CON BASE RESURFACER**

DESCRIPCIÓN	**DIMENSIONES**				
	ANCHO	**LARGO**	**ALTO**	**CANTIDAD**	**TOTAL**
SUPERFICIE CANCHA	18.30	28.31	-	1.00	518.07
			-		-
PASAN:				**SUBTOTAL**	**518.07**
				TOTAL REDONDEADO A LA DECIMA	

OBSERVACIÓN: AREA TOTAL CALCULADA DE PLANO AUTOCAD

ESQUEMA DEL ÍTEM

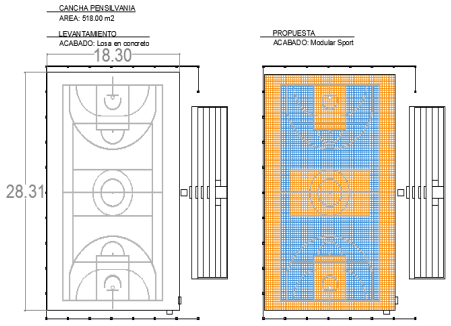








IMAGEN TOMADA AUTOCAD

Firma

DIRECTOR DE OBRA
ALVARO GABRIEL AREVALO

CIVIDEPORTES®

ENTIDAD: ALCALDIA DE FACATATIVA

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA

MEMORIA DE CALCULO

INFORMACIÓN BÁSICA	
CONTRATISTA	CIVIDEPORTES SAS NIT. 830131918-9
CONTRATO No.	410


INFORMACIÓN DEL PROYECTO	
OBJETO PROYECTO:	ADECUACION DE UN ESPACIO DEPORTIVO Y CONSTRUCCION DE UNA CANCHA SINTETICA EN EL BARRIO PENSILVANIA EN EL MUNICIPIO DE FACATATIVÁ CUNDINAMARCA DE ACUERDO AL CONVENIO ICCU No. 656 DE 2021.
FECHA DE INICIACIÓN:	01 DE JUNIO DE 2022
FECHA DE TERMINACIÓN	06 DE SEPTIEMBRE DE 2022

FRENTE DE OBRA		PENSILVANIA
ÍTEM	**UNIDAD**	**DESCRIPCIÓN**
4	**M2**	**PISO MODULAR SISTEMA SPORT**


DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES				
	ANCHO	LARGO	ALTO	CANTIDAD	TOTAL
SUPERFICIE CANCHA	18.30	28.31	-	1.00	518.07
			-		-
PASAN:				**SUBTOTAL**	**518.07**
				TOTAL REDONDEADO A LA DECIMA	

OBSERVACIÓN: AREA TOTAL CALCULADA DE PLANO AUTOCAD

ESQUEMA DEL ÍTEM

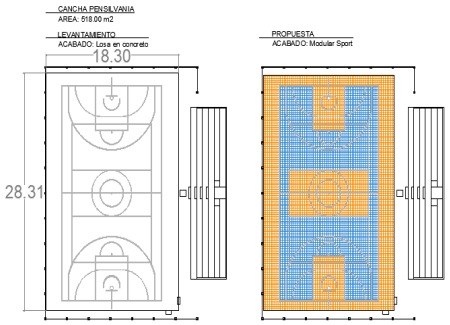



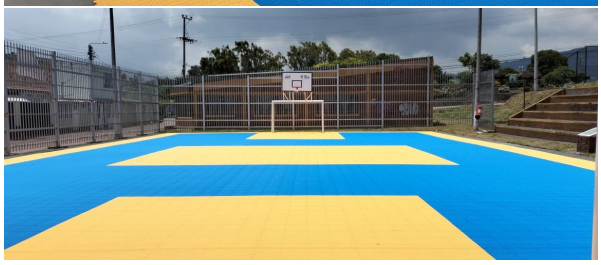

Firma

DIRECTOR DE OBRA

ALVARO GABRIEL AREVALO

CIVIDEPORTES®	**ENTIDAD: ALCALDIA DE FACATATIVA** **DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA** **MEMORIA DE CALCULO**

INFORMACIÓN BÁSICA	
CONTRATISTA	CIVIDEPORTES SAS NIT. 830131918-9
CONTRATO No.	410


INFORMACIÓN DEL PROYECTO	
OBJETO PROYECTO:	ADECUACION DE UN ESPACIO DEPORTIVO Y CONSTRUCCION DE UNA CANCHA SINTETICA EN EL BARRIO PENSILVANIA EN EL MUNICIPIO DE FACATATIVÁ CUNDINAMARCA DE ACUERDO AL CONVENIO ICCU No. 656 DE 2021.
FECHA DE INICIACIÓN:	01 DE JUNIO DE 2022
FECHA DE TERMINACIÓN	06 DE SEPTIEMBRE DE 2022

FRENTE DE OBRA		PENSILVANIA
ÍTEM	**UNIDAD**	**DESCRIPCIÓN**
5	**UND**	**MALLA NYLON PETROLIZADA VOLEIBOL**

DESCRIPCIÓN	**DIMENSIONES**				
	ANCHO	**LARGO**	**ALTO**	**CANTIDAD**	**TOTAL**
CANCHA	-	-	-	1.00	1.00
			-		-
PASAN:				**SUBTOTAL**	**1.00**
				TOTAL REDONDEADO A LA DECIMA	

OBSERVACIÓN:

ESQUEMA DEL ÍTEM

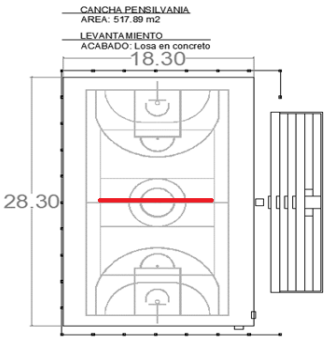



Firma

DIRECTOR DE OBRA
ALVARO GABRIEL AREVALO

CIVIDEPORTES	**ENTIDAD: ALCALDIA DE FACATATIVA** **DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA** **MEMORIA DE CALCULO**

INFORMACIÓN BÁSICA	
CONTRATISTA	CIVIDEPORTES SAS NIT. 830131918-9
CONTRATO No.	410


INFORMACIÓN DEL PROYECTO	
OBJETO PROYECTO:	ADECUACION DE UN ESPACIO DEPORTIVO Y CONSTRUCCION DE UNA CANCHA SINTETICA EN EL BARRIO PENSILVANIA EN EL MUNICIPIO DE FACATATIVÁ CUNDINAMARCA DE ACUERDO AL CONVENIO ICCU No. 656 DE 2021.
FECHA DE INICIACIÓN:	01 DE JUNIO DE 2022
FECHA DE TERMINACIÓN	06 DE SEPTIEMBRE DE 2022


FRENTE DE OBRA		PENSILVANIA
ÍTEM	**UNIDAD**	**DESCRIPCIÓN**
6	**UND**	**SOPORTE MALLA VOLEIBOL CON TENSOR**

DESCRIPCIÓN	**DIMENSIONES**				
	ANCHO	**LARGO**	**ALTO**	**CANTIDAD**	**TOTAL**
CANCHA	-	-	-	2.00	2.00
			-		-
PASAN:				**SUBTOTAL**	**2.00**
				TOTAL REDONDEADO A LA DECIMA	

OBSERVACIÓN:

ESQUEMA DEL ÍTEM

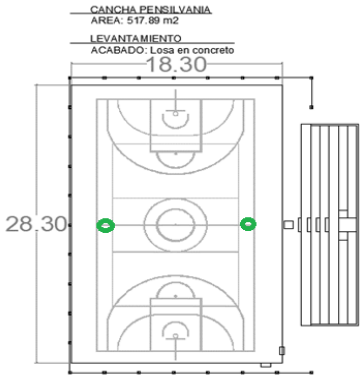





Firma

DIRECTOR DE OBRA
ALVARO GABRIEL AREVALO

CIVIDEPORTES®	**ENTIDAD: ALCALDIA DE FACATATIVA** **DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA** **MEMORIA DE CALCULO**

INFORMACIÓN BÁSICA	
CONTRATISTA	CIVIDEPORTES SAS NIT. 830131918-9
CONTRATO No.	410


INFORMACIÓN DEL PROYECTO	
OBJETO PROYECTO:	ADECUACION DE UN ESPACIO DEPORTIVO Y CONSTRUCCION DE UNA CANCHA SINTETICA EN EL BARRIO PENSILVANIA EN EL MUNICIPIO DE FACATATIVÁ CUNDINAMARCA DE ACUERDO AL CONVENIO ICCU No. 656 DE 2021.
FECHA DE INICIACIÓN:	01 DE JUNIO DE 2022
FECHA DE TERMINACIÓN	06 DE SEPTIEMBRE DE 2022

FRENTE DE OBRA		PENSILVANIA
ÍTEM	**UNIDAD**	**DESCRIPCIÓN**
NP1	**M2**	**CERRAMIENTO EN MALLA ESLABONADA C. 10 INC. ÁNGULO (PARAL EN TUBO ESTRUCTURAL GALVANIZADO 2")**

DESCRIPCIÓN	**DIMENSIONES**				
	ANCHO	**LARGO**	**ALTO**	**CANTIDAD**	**TOTAL**
CANCHA	-	56.61	2.50	1.00	141.53
			-		-
PASAN:				**SUBTOTAL**	**141.53**
				TOTAL REDONDEADO A LA DECIMA	

OBSERVACIÓN:

ESQUEMA DEL ÍTEM

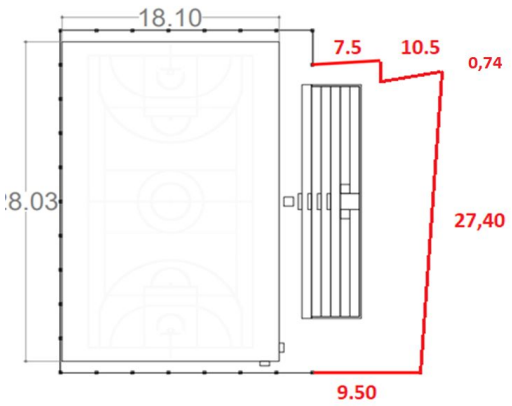





Firma

DIRECTOR DE OBRA
ALVARO GABRIEL AREVALO

CIVIDEPORTES®	**ENTIDAD: ALCALDIA DE FACATATIVA** **DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA** **MEMORIA DE CALCULO**

INFORMACIÓN BÁSICA	
CONTRATISTA	CIVIDEPORTES SAS NIT. 830131918-9
CONTRATO No.	410


INFORMACIÓN DEL PROYECTO	
OBJETO PROYECTO:	ADECUACION DE UN ESPACIO DEPORTIVO Y CONSTRUCCION DE UNA CANCHA SINTETICA EN EL BARRIO PENSILVANIA EN EL MUNICIPIO DE FACATATIVÁ CUNDINAMARCA DE ACUERDO AL CONVENIO ICCU No. 656 DE 2021.
FECHA DE INICIACIÓN:	01 DE JUNIO DE 2022
FECHA DE TERMINACIÓN	06 DE SEPTIEMBRE DE 2022

FRENTE DE OBRA		PENSILVANIA
ÍTEM	**UNIDAD**	**DESCRIPCIÓN**
NP2	**UND**	**CANECA EN ACERO INOXIDABLE TIPO BARCELONA**

DESCRIPCIÓN	**DIMENSIONES**				
	ANCHO	**LARGO**	**ALTO**	**CANTIDAD**	**TOTAL**
CANCHA	-	-	-	1.00	1.00
			-		-
PASAN:				**SUBTOTAL**	**1.00**
				TOTAL REDONDEADO A LA DECIMA	

OBSERVACIÓN:

ESQUEMA DEL ÍTEM

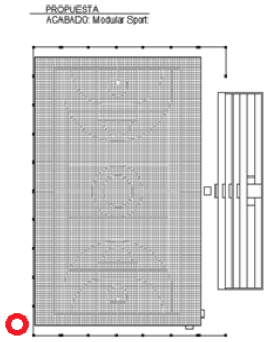



Firma

DIRECTOR DE OBRA
ALVARO GABRIEL AREVALO
