EMPRESA DE RENOVACIÓN Y DESARROLLO URBANO DE BOGOTÁ
Transformamos ciudad


FICHA DE SUPERVISION Y ACOMPAÑAMIENTO DE DISEÑO

VERSIÓN	1
FECHA	ABRIL 17 DE 2018
CÓDIGO	CDB-008-SUP

TIPO DE DISEÑO:	ARQUITECTONICO	**SOLICITUD No.**	
DISEÑADOR:	COLECTIVO 720	**CONTRATISTA:**	CONSORCIO CINE CULTURA BOGOTA
FECHA:	ABRIL 17 DE 2018	**INTERVENTOR:**	CONSORCIO INTERCINEMATECA
UBICACIÓN:	CINEMATECA DISTRITAL DE BOGOTÁ	**SUPERVISOR:**	ALEJANDRO DE ANGULO BLUM

REGISTRO FOTOGRAFICO

LOCALIZACIÓN:	MURO MU-13 ACUSTICO	**ACTIVIDAD DESARROLLADA:**	**MUROS ACUSTICOS EN SALAS CINE**

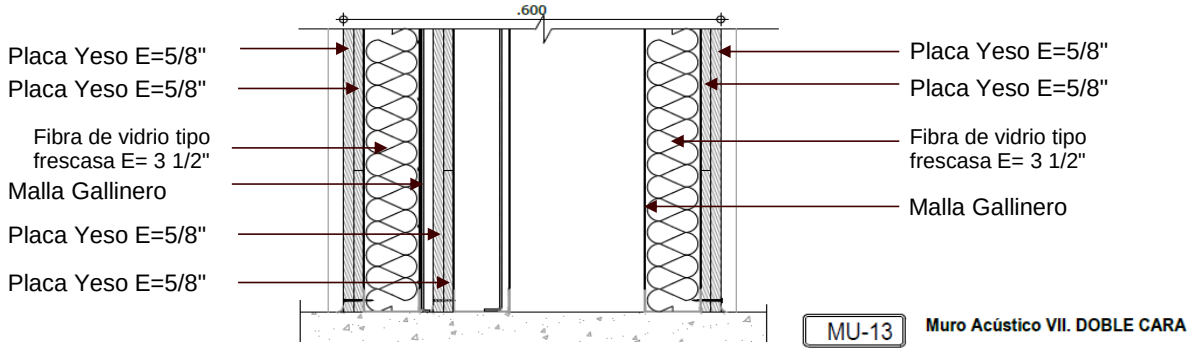

CAMBIO E IMPLEMENTACION DE DISEÑOS

ANTECEDENTES	FECHA
MU-13 **Muro Acústico VII. DOBLE CARA** Doble muro; Muro exterior e interior en cara doble de Panel Yeso E=$\frac{5}{8}$" con juntas traslapadas y debidamente selladas con cinta-malla + fibra de vidrio tipo frescasa E=3 $\frac{1}{2}$", sin papel + malla de gallinero o similar + manto de alta densidad tipo technifoam E=3mm + perfil de anclaje en lamina de acero galvaniza (ancho min. 9cm/cal.20) + sellados con mastico contra la placa. (ver detalles tipo de muros)	PLANOS AJUSTES VERSION 6 2017.05.26

FIRMA CONTRATISTA:		FIRMA INTERVENTOR:	

PROPUESTA DE AJUSTE DE DISEÑO

La especificación del muro acustico MU-13 se sintetiza de la siguiente manera: Doble muro, muros exteriores en cara doble de panel yeso E=5/8" y muro interior en cara doble de panel yeso E=5/8", ambos con juntos traslapadas y debidamente selladas con cinta-malla. En la parte interior de las dos caras doble de panel yeso de E=5/8" debe estar una fibra de vidrio tipo frescasa E=3 1/2" + malla de gallinero o similar + manto de alta densidad tipo technifoam E=3mm.

AJUSTE REALIZADO POR	COLECTIVO 720

SEGUIMIENTO AJUSTE DE DISEÑO

ACTIVIDAD	FECHA
NO APLICA	NO APLICA
NO APLICA	NO APLICA
NO APLICA	NO APLICA
NO APLICA	NO APLICA
NO APLICA	NO APLICA
NO APLICA	NO APLICA
NO APLICA	NO APLICA

CONTRATISTA _____	INTERVENTOR _____	DISEÑADOR __COLECTIVO 720__

AFECTACION PRESUPUESTAL			AFECTACIONES EN DISEÑO			
ITEM	CANTIDAD	VALOR	CODIGO	REVIS	NOMBRE	FECHA
NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	N.A.	NO APLICA	N.A
NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	N.A.	NO APLICA	N.A
NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	N.A.	NO APLICA	N.A
NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	N.A.	NO APLICA	N.A
NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	N.A.	NO APLICA	N.A
NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	N.A.	NO APLICA	N.A
COSTO TOTAL ESTIMADO		NO APLICA	NO APLICA	N.A.	NO APLICA	N.A

Nota: Mediante las firmas aquí consignadas, las personas que intervienen en el presente documento afirman conocer claramente toda la información que se encuentra contenida aquí.
