CONTRATO DE SERVICIOS No CSE-20220003

OBJETO: ***SERVICIOS DE MANO DE OBRA COMO APOYO A LAS OBRAS DE PARCHEO EJECUTADAS POR SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA.***

INFORME PARCIAL 4

CONTRATISTA: FERIEL S.A.S.
NIT. 900497897-7

R.L. JOSE JULIAN LOPEZ PEÑALOZA

DUITAMA
SEPTIEMBRE 2022

FERIEL S.A.S..
NIT. **900497897-7**

Powered by CamScanner

INFORME PARCIAL 4 CONTRATO DE SERVICIOS No CSE-20220003 cuyo objeto es "SERVICIOS DE MANO DE OBRA COMO APOYO A LAS OBRAS DE PARCHEO EJECUTADAS POR SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA"

ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

TIPO Y No. DEL CONTRATO O CONVENIO	CONTRATO DE SERVICIOS No CSE-20220003
ACTA No.	(CUATRO) con corte del 26/09 al 07/10/2022
OBJETO	*SERVICIOS DE MANO DE OBRA COMO APOYO A LAS OBRAS DE PARCHEO EJECUTADAS POR SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA.*
DEPENDENCIA	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
CONTRATISTA	FERIEL S.A.S. NIT. 900497897-7 R.L JOSE JULIAN LOPEZ PEÑALOZA C.C 74.376.933 DE DUITAMA
VALOR DEL CONTRATO	$ 408.820.457,67
DURACIÓN DEL CONTRATO	4 MESES A PARTIR DE LA FECHA DE SUSCIPCION DEL ACTA DE INICIO SIN QUE SUPERE LA VIGENCIA 2022
FECHA SUSCRIPCION CONTRATO	09 DE MAYO DE 2022
FECHA DE INICIO	19 DE MAYO DE 2022
FECHA DE TERMINACION CON ADICION EN TIEMPO	02 DE NOVIEMBRE DE 2022
NOMBRE DEL SUPERVISOR	ING. HUGO ARMANDO MONTAÑA SANABRIA TECNICO SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

Powered by CamScanner

INFORME PARCIAL 4 CONTRATO DE SERVICIOS No CSE-20220003 cuyo objeto es "SERVICIOS DE MANO DE OBRA COMO APOYO A LAS OBRAS DE PARCHEO EJECUTADAS POR SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA"

ASPECTOS TECNICOS

En el contrato de servicios no CSE-20220003 se ha realizado las siguientes actividades de obra con el fin de ejecutar el objeto del contrato ***"SERVICIOS DE MANO DE OBRA COMO APOYO A LAS OBRAS DE PARCHEO EJECUTADAS POR SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA"***, tal como se describen a continuación:

Los sectores a intervenir están de acuerdo a una priorización realizada por la secretaría de Infraestructura, de los sectores, más afectados del centro de la ciudad, dentro de los cuales se encuentran:

carrera 15 entre calle 18 y 19, calle 19 con carrera 15 esquina, calle 19 entre carrera 16 y 17, calle 19 entre carreras 16 y 17, carrera 16 con calle 19, carrera 15 con calle 19 cruce, calle 19 entre carreras 16 y 17, calle 18 entre carrera 15 y 16, carrera 14 entre calles 16 y 17, carrera 14 entre calles 16 y 17, carrera 14 entre calles 15 y 16, calle 14 entre carrera 14 y 15, calle 18 entre carrera 13 y 14, calle 14 entre carrera 13 y 14, calle 14 entre carrera 14 y 15, carrera 16 entre calles 15 y 16, calle 13 con carrera 16, calle 16 entre carreras 16 y 17, calle 13 con carrera 16, Ruta el Mundial sector San Pedro, sector cuatro esquinas

En estos sectores se llevaron a cabo las siguientes actividades:

ITEM 1. APERTURA MECANICA DE CAJA Y RETIRO DE SOBRANTES (INCLUYE CORTE)

El servicio de mano de obra en este ítem se ejecutó para la apertura de la caja con retiro de sobrantes, actividad que se ejecuta previa definición de las áreas a intervenir por parte del supervisor del contrato de obra, las cuales obedecen a una afectación en su estructura, priorizada de acuerdo a la severidad de los daños que se presentan en la carpeta asfáltica. Se ha realizado la intervención de sectores de la ciudad como Zona centro y parte de la ruta del mundial correspondiente a: carrera 15 entre calle 18 y 19, calle 19 con carrera 15 esquina, calle 19 entre carrera 16 y 17, calle 19 entre carreras 16 y 17, carrera 16 con calle 19, carrera 15 con calle 19 cruce, calle 19 entre carreras 16 y 17, calle 18 entre carrera 15 y 16, carrera 14 entre calles 16 y 17, carrera 14 entre calles 16 y 17, carrera 14 entre calles 15 y 16, calle 14 entre carrera 14 y 15, calle 18 entre carrera 13 y 14, calle 14 entre carrera 13 y 14, calle 14 entre carrera 14 y 15, carrera 16 entre calles 15 y 16, calle 13 con carrera 16, calle 16 entre carreras 16 y 17, calle 13 con carrera 16, Ruta el Mundial sector San Pedro, sector cuatro esquinas.

Powered by CamScanner

INFORME PARCIAL 4 CONTRATO DE SERVICIOS No CSE-20220003 cuyo objeto es "SERVICIOS DE MANO DE OBRA COMO APOYO A LAS OBRAS DE PARCHEO EJECUTADAS POR SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA"

Una vez se marcan las áreas a intervenir, definidas y aprobadas por el Municipio, se procede a realizar el corte del pavimento, para el retiro de la capa de rodadura afectada, logrando así el área de cajeo y posterior alistamiento de su estructura, tal como se registra a continuación:













Powered by CamScanner

INFORME PARCIAL 4 CONTRATO DE SERVICIOS No CSE-20220003 cuyo objeto es "SERVICIOS DE MANO DE OBRA COMO APOYO A LAS OBRAS DE PARCHEO EJECUTADAS POR SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA"


















FERIEL S.A.S..

***NIT.* 900497897-7**

Powered by CamScanner


ITEM 3. IMPRIMACION INCLUYE BARRIDO Y SOPLADO

Posterior a realizar la apertura mecánica de la caja se procede a realizar la imprimación, con material suministrado por la Alcaldía, en las áreas ya definidas con anterioridad. Para la ejecución de esta actividad se procedió a realizar la limpieza del área a intervenir incluyendo barrido y soplado con el fin de garantizar que la imprimación quede técnicamente bien aplicada, cumpliendo así su función de obtener una capa impermeable, logrando las condiciones óptimas para la adherencia entre la estructura expuesta y la capa asfáltica.

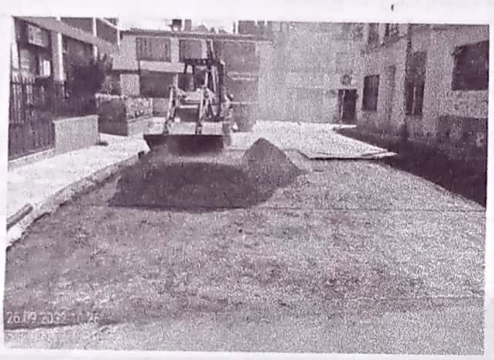







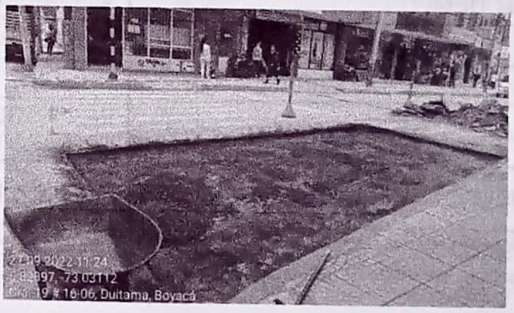

Powered by CamScanner

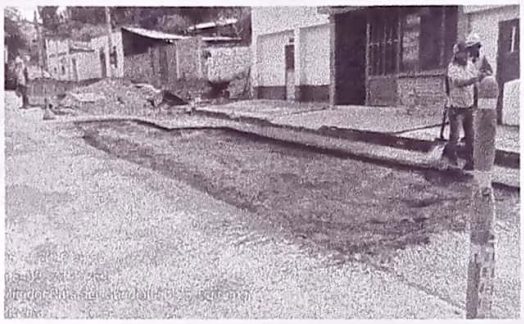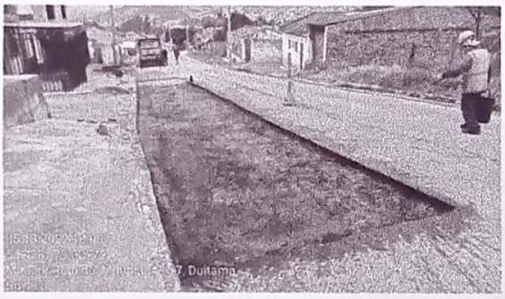

ITEM 4. EXTENDIDA Y COMPACTACION DE MEZCLA ASFALTICA PARA PARCHEO.

Completadas las anteriores actividades de apertura de caja e imprimación, en las áreas definidas, se procede a realizar la ejecución de la actividad para la extendida y compactación de la mezcla asfáltica para parcheo. En la misma se garantiza que los niveles y espesores empalmen de acuerdo con las áreas existentes. Una vez se tiene instalada la mezcla asfáltica, se procede a realizar la compactación con el equipo idóneo para este tipo de trabajos, tal como se registra a continuación:

Powered by CamScanner

INFORME PARCIAL 4 CONTRATO DE SERVICIOS No CSE-20220003 cuyo objeto es "SERVICIOS DE MANO DE OBRA COMO APOYO A LAS OBRAS DE PARCHEO EJECUTADAS POR SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA"













FERIEL S.A.S..


***NIT.* 900497897-7**

Powered by CamScanner

INFORME PARCIAL 4 CONTRATO DE SERVICIOS No CSE-20220003 cuyo objeto es "SERVICIOS DE MANO DE OBRA COMO APOYO A LAS OBRAS DE PARCHEO EJECUTADAS POR SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA"





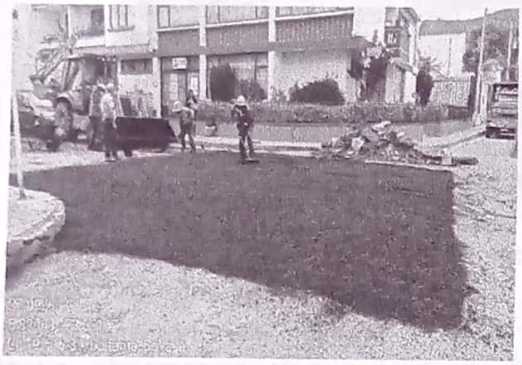







FERIEL S.A.S..


***NIT.* 900497897-7**

Powered by CamScanner


Fe.Riel S.A.S.

INFORME PARCIAL 4 CONTRATO DE SERVICIOS No CSE-20220003 cuyo objeto es "SERVICIOS DE MANO DE OBRA COMO APOYO A LAS OBRAS DE PARCHEO EJECUTADAS POR SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA"



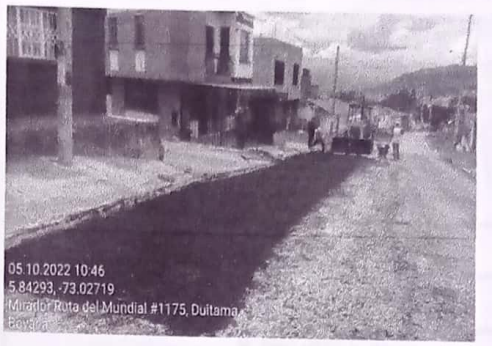



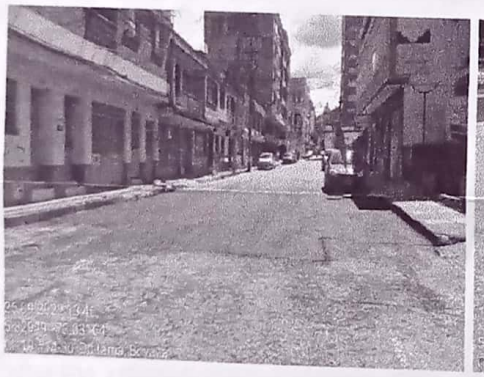







FERIEL S.A.S..

***NIT.* 900497897-7**

Powered by CamScanner











Powered by CamScanner

ASPECTOS FINANCIEROS:

A continuación, se relaciona los aspectos financieros del C***ONTRATO DE SERVICIOS No CSE-20220003***, dentro de los cuales se ha realizado el pago de un tres (3) actas parciales tal como sigue:

ITEM	DETALLE	VALORES (Cifra en pesos colombianos)
1	VALOR INICIAL	**$ 408.820.457,67**
	* APORTE ALCALDIA	
	* APORTE ENTIDAD CONVENIENTE	
2	VALOR ADICIONADO	$ 0.00
3	VALOR TOTAL (1+2)	$ 408.820.457,67
4	VALOR PRESENTE ACTA	**$ 55.585.179,10**
5	VALOR TOTAL PAGOS EFECTUADOS	$ 310.379.275,90
6	VALOR EJECUTADO (4+5)	$ 365.964.455,00
7	SALDO POR EJECUTAR (3-5)	$ 42.856.002,67

Atentamente,

JOSE JULIAN LOPEZ PEÑALOZA
R.L. FERIEL S.A.S

FERIEL S.A.S..
***NIT.* 900497897-7**

Powered by CamScanner
