ASOPAGOS s.a.

RAZON SOCIAL :	HUGO FERNELLY DIAZ PLAZAS
IDENTIFICACION:	NI-12110283
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	078
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	PAICOL
FECHA GENERACION REPORTE:	2022-10-27
FECHA LIMITE DE PAGO:	2022-10-21
FECHA DE PAGO:	2022-10-27
ENTIDAD DE PAGO:	BANCOLOMBIA
PERIODO PENSION:	2022-09
PERIODO SALUD:	2022-10
NUMERO PLANILLA:	24487960
TOTAL COTIZANTES:	20
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	24487960
TIPO DE PLANILLA:	E

CODIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NUMERO AFILIADOS	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS005	800251440	SANITAS	5	$ 0	$ 0	$ 1.800	$ 301.200	$ 303.000
EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	12	$ 0	$ 0	$ 3.800	$ 653.100	$ 656.900
EPSIC3	817001773	EPS-S AIC CAUCA	1	$ 0	$ 0	$ 300	$ 45.900	$ 46.200
ESSC91	901093846	EPS ECOOPSOS S.A.S	2	$ 0	$ 0	$ 200	$ 33.000	$ 33.200
Subtotal Salud		4	20	$ 0	$ 0	$ 6.100	$ 1.033.200	$ 1.039.300
230201	800229739	PROTECCION	5	$ 0	$ 0	$ 4.700	$ 818.600	$ 823.300
230001	800224808	PORVENIR	7	$ 0	$ 0	$ 7.800	$ 1.346.700	$ 1.354.500
231001	800227940	COLFONDOS	3	$ 0	$ 0	$ 3.800	$ 648.000	$ 651.800
25-14	900336004	COLPENSIONES	4	$ 0	$ 0	$ 6.200	$ 1.070.600	$ 1.076.800
Subtotal Pensión		4	19	$ 0	$ 0	$ 22.500	$ 3.883.900	$ 3.906.400
14-23	860011153	POSITIVA	20	$ 0	$ 0	$ 10.300	$ 1.797.300	$ 1.807.600
Subtotal ARL		1	20	$ 0	$ 0	$ 10.300	$ 1.797.300	$ 1.807.600
CCF32	891180008	COMFAMILIAR DEL HUILA	20	$ 0	$ 0	$ 6.000	$ 1.033.200	$ 1.039.200
Subtotal CCF		1	20	$ 0	$ 0	$ 6.000	$ 1.033.200	$ 1.039.200
		Total a pagar		$ 0	$ 0	$ 44.900	$ 7.747.600	$ 7.792.500

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	22/11/2022

ASOPAGOS s.a.

CONSULTA EMPLEADO

Razón Social: HUGO FERNELLY DIAZ PLAZAS
Identificación NI - 12110283
Sucursal 078
Período Pensión 2022-09
Período Salud 2022-10
Fecha Pago Planilla 2022-10-27

Tipo Identificación	CC
Numero Identificación	12128127
Nombre	ALDEMAR TOVAR FERNANDEZ
EPS	NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD S.A.
AFP	Administradora Colombiana de Pensiones COLPENSIONES
Caja de compensación	Caja de Compensacion Familiar del Huila COMFAMILIAR
ARL	ARL - POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS
Número Planilla	24487960
Referencia de Pago(PIN)	
Tipo Planilla	E
Periodo Pensión	2022-09
Periodo Salud	2022-10
Tipo Cotizante	Dependiente
Subtipo de Cotizante	No aplica

ING	Fecha ING	RET	Fecha RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	Fecha VSP	VTE	VST	SLN	Fecha Sln Inicio	Fecha Sln Fin	IGE	Fecha Ige Inicio	Fecha Ige Fin	LMA	Fecha LMA	Fecha LMA Fin	VAC	Fecha Vac Inicio	Fecha VAC Fin	AVP	VCT	Fecha VCT Inicio	Fecha VCT Fin	IRL	Fecha IRL Inicio	Fecha IRL Fin
																												0		

SISTEMA GENERAL DE SALUD

Días Cot	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	UPC adicional	Incapacidades E.G		Licencias de Maternidad o	
					Número Autorización	Valor	Número Autorización	Valor
30	1.987.500	0,0400000	$ 79.500	$ 0	0	$ 0	0	$ 0

SISTEMA GENERAL DE PENSIONES

Días Cot	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	Cot. Voluntaria		Total	Fondo de Solidaridad de	Fondo de Subsistencia	Valor no retenido
				Afiliado	Aportante				
30	1.987.500	0,1600000	$ 318.000	$ 0	$ 0	$ 318.000	$ 0	$ 0	$ 0

SISTEMA GENERAL DE RIESGOS LABORALES

Días Cot	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	Código de centro de trabajo
30	1.987.500	0,0696000	$ 138.400	5

APORTES PARAFISCALES

Días Cot	Caja de Compensación Familiar			Sena			ICBF		ESAP		MIN DE EDUCACIÓN	
	IBC	Tarifa	Cot.Obligatori	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	Tarifa	Cot. Obligatori	Tarifa	Cot.	Tarifa	Cot. Obligatori
30	1.987.500	0,0400000	$ 79.500	0	0,0000000	$ 0	0,0000000	$ 0	0,0000000	$ 0	0,0000000	$ 0

ASOPAGOS s.a.

CONSULTA EMPLEADO

Razón Social: HUGO FERNELLY DIAZ PLAZAS
Identificación NI - 12110283
Sucursal 078
Período Pensión 2022-09
Período Salud 2022-10
Fecha Pago Planilla 2022-10-27

Tipo Identificación	CC
Numero Identificación	1004082211
Nombre	ANDRES MAURICIO ILLERA LONDOÑO
EPS	NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD S.A.
AFP	PROTECCION (ING+PROTECCION)
Caja de compensación	Caja de Compensacion Familiar del Huila COMFAMILIAR
ARL	ARL - POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS
Número Planilla	24487960
Referencia de Pago(PIN)	
Tipo Planilla	E
Periodo Pensión	2022-09
Periodo Salud	2022-10
Tipo Cotizante	Dependiente
Subtipo de Cotizante	No aplica

ING	Fecha ING	RET	Fecha RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	Fecha VSP	VTE	VST	SLN	Fecha Sln inicio	Fecha Sln Fin	IGE	Fecha Ige Inicio	Fecha Ige Fin	LMA	Fecha LMA	Fecha LMA Fin	VAC	Fecha Vac Inicio	Fecha VAC Fin	AVP	VCT	Fecha VCT Inicio	Fecha VCT Fin	IRL	Fecha IRL Inicio	Fecha IRL Fin
																												0		

SISTEMA GENERAL DE SALUD

Días Cot	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	UPC adicional	Incapacidades E.G		Licencias de Maternidad o	
					Número Autorización	Valor	Número Autorización	Valor
30	1.088.542	0,0400000	$ 43.600	$ 0	0	$ 0	0	$ 0

SISTEMA GENERAL DE PENSIONES

Días Cot	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	Cot. Voluntaria		Total	Fondo de Solidaridad de	Fondo de Subsistencia	Valor no retenido
				Afiliado	Aportante				
30	1.088.542	0,1600000	$ 174.200	$ 0	$ 0	$ 174.200	$ 0	$ 0	$ 0

SISTEMA GENERAL DE RIESGOS LABORALES

Días Cot	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	Código de centro de trabajo
30	1.088.542	0,0696000	$ 75.800	5

APORTES PARAFISCALES

Días Cot	Caja de Compensación Familiar			Sena			ICBF		ESAP		MIN DE EDUCACIÓN	
	IBC	Tarifa	Cot.Obligatori	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	Tarifa	Cot. Obligatori	Tarifa	Cot.	Tarifa	Cot. Obligatori
30	1.088.542	0,0400000	$ 43.600	0	0,0000000	$ 0	0,0000000	$ 0	0,0000000	$ 0	0,0000000	$ 0

ASOPAGOS s.a.

CONSULTA EMPLEADO

Razón Social: HUGO FERNELLY DIAZ PLAZAS
Identificación NI - 12110283
Sucursal 078
Período Pensión 2022-09
Período Salud 2022-10
Fecha Pago Planilla 2022-10-27

Tipo Identificación	CC
Numero Identificación	7684022
Nombre	AURELIO CACHAYA
EPS	NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD S.A.
AFP	PROTECCION (ING+PROTECCION)
Caja de compensación	Caja de Compensacion Familiar del Huila COMFAMILIAR
ARL	ARL - POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS
Número Planilla	24487960
Referencia de Pago(PIN)	
Tipo Planilla	E
Periodo Pensión	2022-09
Periodo Salud	2022-10
Tipo Cotizante	Dependiente
Subtipo de Cotizante	No aplica

ING	Fecha ING	RET	Fecha RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	Fecha VSP	VTE	VST	SLN	Fecha Sln Inicio	Fecha Sln Fin	IGE	Fecha Ige Inicio	Fecha Ige Fin	LMA	Fecha LMA	Fecha LMA Fin	VAC	Fecha Vac Inicio	Fecha VAC Fin	AVP	VCT	Fecha VCT Inicio	Fecha VCT Fin	IRL	Fecha IRL Inicio	Fecha IRL Fin
																												0		

SISTEMA GENERAL DE SALUD

Dias Cot	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	UPC adicional	Incapacidades E.G		Licencias de Maternidad o	
					Número Autorización	Valor	Número Autorización	Valor
30	1.213.542	0,0400000	$ 48.600	$ 0	0	$ 0	0	$ 0

SISTEMA GENERAL DE PENSIONES

Dias Cot	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	Cot. Voluntaria		Total	Fondo de Solidaridad de	Fondo de Subsistencia	Valor no retenido
				Afiliado	Aportante				
30	1.213.542	0,1600000	$ 194.200	$ 0	$ 0	$ 194.200	$ 0	$ 0	$ 0

SISTEMA GENERAL DE RIESGOS LABORALES

Dias Cot	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	Código de centro de trabajo
30	1.213.542	0,0696000	$ 84.500	5

APORTES PARAFISCALES

Dias Cot	Caja de Compensación Familiar			Sena			ICBF		ESAP		MIN DE EDUCACIÓN	
	IBC	Tarifa	Cot.Obligatori	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	Tarifa	Cot. Obligatori	Tarifa	Cot.	Tarifa	Cot. Obligatori
30	1.213.542	0,0400000	$ 48.600	0	0,0000000	$ 0	0,0000000	$ 0	0,0000000	$ 0	0,0000000	$ 0

ASOPAGOS s.a.

CONSULTA EMPLEADO

Razón Social: HUGO FERNELLY DIAZ PLAZAS
Identificación NI - 12110283
Sucursal 078
Período Pensión 2022-09
Período Salud 2022-10
Fecha Pago Planilla 2022-10-27

Tipo Identificación	CC
Numero Identificación	7702859
Nombre	BORIS LAY TRUJILLO CORDOBA
EPS	NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD S.A.
AFP	PORVENIR
Caja de compensación	Caja de Compensacion Familiar del Huila COMFAMILIAR
ARL	ARL - POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS
Número Planilla	24487960
Referencia de Pago(PIN)	
Tipo Planilla	E
Periodo Pensión	2022-09
Periodo Salud	2022-10
Tipo Cotizante	Dependiente
Subtipo de Cotizante	No aplica

ING	Fecha ING	RET	Fecha RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	Fecha VSP	VTE	VST	SLN	Fecha Sln inicio	Fecha Sln Fin	IGE	Fecha Ige Inicio	Fecha Ige Fin	LMA	Fecha LMA	Fecha LMA Fin	VAC	Fecha Vac Inicio	Fecha VAC Fin	AVP	VCT	Fecha VCT Inicio	Fecha VCT Fin	IRL	Fecha IRL Inicio	Fecha IRL Fin
																												0		

SISTEMA GENERAL DE SALUD

Días Cot	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	UPC adicional	Incapacidades E.G		Licencias de Maternidad o	
					Número Autorización	Valor	Número Autorización	Valor
30	1.987.500	0,0400000	$ 79.500	$ 0	0	$ 0	0	$ 0

SISTEMA GENERAL DE PENSIONES

Días Cot	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	Cot. Voluntaria		Total	Fondo de Solidaridad de	Fondo de Subsistencia	Valor no retenido
				Afiliado	Aportante				
30	1.987.500	0,1600000	$ 318.000	$ 0	$ 0	$ 318.000	$ 0	$ 0	$ 0

SISTEMA GENERAL DE RIESGOS LABORALES

Días Cot	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	Código de centro de trabajo
30	1.987.500	0,0696000	$ 138.400	5

APORTES PARAFISCALES

Días Cot	Caja de Compensación Familiar			Sena			ICBF		ESAP		MIN DE EDUCACIÓN	
	IBC	Tarifa	Cot.Obligatori	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	Tarifa	Cot. Obligatori	Tarifa	Cot.	Tarifa	Cot. Obligatori
30	1.987.500	0,0400000	$ 79.500	0	0,0000000	$ 0	0,0000000	$ 0	0,0000000	$ 0	0,0000000	$ 0

ASOPAGOS s.a.

CONSULTA EMPLEADO

Razón Social: HUGO FERNELLY DIAZ PLAZAS
Identificación NI - 12110283
Sucursal 078
Período Pensión 2022-09
Período Salud 2022-10
Fecha Pago Planilla 2022-10-27

Tipo Identificación	CC
Numero Identificación	1079509558
Nombre	EDGAR PEDREROS CAMACHO
EPS	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SANITAS S.A.
AFP	Administradora Colombiana de Pensiones COLPENSIONES
Caja de compensación	Caja de Compensacion Familiar del Huila COMFAMILIAR
ARL	ARL - POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS
Número Planilla	24487960
Referencia de Pago(PIN)	
Tipo Planilla	E
Periodo Pensión	2022-09
Periodo Salud	2022-10
Tipo Cotizante	Dependiente
Subtipo de Cotizante	No aplica

ING	Fecha ING	RET	Fecha RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	Fecha VSP	VTE	VST	SLN	Fecha Sln Inicio	Fecha Sln Fin	IGE	Fecha Ige Inicio	Fecha Ige Fin	LMA	Fecha LMA	Fecha LMA Fin	VAC	Fecha Vac Inicio	Fecha VAC Fin	AVP	VCT	Fecha VCT Inicio	Fecha VCT Fin	IRL	Fecha IRL Inicio	Fecha IRL Fin
																												0		

SISTEMA GENERAL DE SALUD

Días Cot	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	UPC adicional	Incapacidades E.G		Licencias de Maternidad o	
					Número Autorización	Valor	Número Autorización	Valor
30	1.632.813	0,0400000	$ 65.400	$ 0	0	$ 0	0	$ 0

SISTEMA GENERAL DE PENSIONES

Días Cot	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	Cot. Voluntaria		Total	Fondo de Solidaridad de	Fondo de Subsistencia	Valor no retenido
				Afiliado	Aportante				
30	1.632.813	0,1600000	$ 261.300	$ 0	$ 0	$ 261.300	$ 0	$ 0	$ 0

SISTEMA GENERAL DE RIESGOS LABORALES

Días Cot	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	Código de centro de trabajo
30	1.632.813	0,0696000	$ 113.700	5

APORTES PARAFISCALES

Días Cot	Caja de Compensación Familiar			Sena			ICBF		ESAP		MIN DE EDUCACIÓN	
	IBC	Tarifa	Cot.Obligatori	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	Tarifa	Cot. Obligatori	Tarifa	Cot.	Tarifa	Cot. Obligatori
30	1.632.813	0,0400000	$ 65.400	0	0,0000000	$ 0	0,0000000	$ 0	0,0000000	$ 0	0,0000000	$ 0

ASOPAGOS s.a.

CONSULTA EMPLEADO

Razón Social: HUGO FERNELLY DIAZ PLAZAS-
Identificación NI - 12110283
Sucursal 078
Período Pensión 2022-09
Período Salud 2022-10
Fecha Pago Planilla 2022-10-27

Tipo Identificación	CC
Numero Identificación	4920179
Nombre	HENRY LIZCANO VANEGAS
EPS	NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD S.A.
AFP	PROTECCION (ING+PROTECCION)
Caja de compensación	Caja de Compensacion Familiar del Huila COMFAMILIAR
ARL	ARL - POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS
Número Planilla	24487960
Referencia de Pago(PIN)	
Tipo Planilla	E
Periodo Pensión	2022-09
Periodo Salud	2022-10
Tipo Cotizante	Dependiente
Subtipo de Cotizante	No aplica

ING	Fecha ING	RET	Fecha RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	Fecha VSP	VTE	VST	SLN	Fecha Sln Inicio	Fecha Sln Fin	IGE	Fecha Ige Inicio	Fecha Ige Fin	LMA	Fecha LMA	Fecha LMA Fin	VAC	Fecha Vac Inicio	Fecha VAC Fin	AVP	VCT	Fecha VCT Inicio	Fecha VCT Fin	IRL	Fecha IRL Inicio	Fecha IRL Fin
X	20/09/22										X																	0		

SISTEMA GENERAL DE SALUD

Días Cot	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	UPC adicional	Incapacidades E.G		Licencias de Maternidad o	
					Número Autorización	Valor	Número Autorización	Valor
11	620.313	0,0400000	$ 24.900	$ 0	0	$ 0	0	$ 0

SISTEMA GENERAL DE PENSIONES

Días Cot	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	Cot. Voluntaria		Total	Fondo de Solidaridad de	Fondo de Subsistencia	Valor no retenido
				Afiliado	Aportante				
11	620.313	0,1600000	$ 99.300	$ 0	$ 0	$ 99.300	$ 0	$ 0	$ 0

SISTEMA GENERAL DE RIESGOS LABORALES

Días Cot	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	Código de centro de trabajo
11	620.313	0,0696000	$ 43.200	5

APORTES PARAFISCALES

Días Cot	Caja de Compensación Familiar			Sena			ICBF		ESAP		MIN DE EDUCACIÓN	
	IBC	Tarifa	Cot.Obligatori	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	Tarifa	Cot. Obligatori	Tarifa	Cot.	Tarifa	Cot. Obligatori
11	620.313	0,0400000	$ 24.900	0	0,0000000	$ 0	0,0000000	$ 0	0,0000000	$ 0	0,0000000	$ 0

ASOPAGOS s.a.

CONSULTA EMPLEADO

Razón Social: HUGO FERNELLY DIAZ PLAZAS
Identificación NI - 12110283
Sucursal 078
Período Pensión 2022-09
Período Salud 2022-10
Fecha Pago Planilla 2022-10-27

Tipo Identificación	CC
Numero Identificación	26529652
Nombre	HIRIANA MARCELA CHANTRE CAMERO
EPS	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SANITAS S.A.
AFP	PORVENIR
Caja de compensación	Caja de Compensacion Familiar del Huila COMFAMILIAR
ARL	ARL - POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS
Número Planilla	24487960
Referencia de Pago(PIN)	
Tipo Planilla	E
Periodo Pensión	2022-09
Periodo Salud	2022-10
Tipo Cotizante	Dependiente
Subtipo de Cotizante	No aplica

ING	Fecha ING	RET	Fecha RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	Fecha VSP	VTE	VST	SLN	Fecha Sln Inicio	Fecha Sln Fin	IGE	Fecha Ige Inicio	Fecha Ige Fin	LMA	Fecha LMA	Fecha LMA Fin	VAC	Fecha Vac Inicio	Fecha VAC Fin	AVP	VCT	Fecha VCT Inicio	Fecha VCT Fin	IRL	Fecha IRL Inicio	Fecha IRL Fin
																												0		

SISTEMA GENERAL DE SALUD

Días Cot	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	UPC adicional	Incapacidades E.G		Licencias de Maternidad o	
					Número Autorización	Valor	Número Autorización	Valor
30	1.679.688	0,0400000	$ 67.200	$ 0	0	$ 0	0	$ 0

SISTEMA GENERAL DE PENSIONES

Días Cot	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	Cot. Voluntaria		Total	Fondo de Solidaridad de	Fondo de Subsistencia	Valor no retenido
				Afiliado	Aportante				
30	1.679.688	0,1600000	$ 268.800	$ 0	$ 0	$ 268.800	$ 0	$ 0	$ 0

SISTEMA GENERAL DE RIESGOS LABORALES

Días Cot	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	Código de centro de trabajo
30	1.679.688	0,0696000	$ 117.000	5

APORTES PARAFISCALES

Días Cot	Caja de Compensación Familiar			Sena			ICBF		ESAP		MIN DE EDUCACIÓN	
	IBC	Tarifa	Cot.Obligatori	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	Tarifa	Cot. Obligatori	Tarifa	Cot.	Tarifa	Cot. Obligatori
30	1.679.688	0,0400000	$ 67.200	0	0,0000000	$ 0	0,0000000	$ 0	0,0000000	$ 0	0,0000000	$ 0

ASOPAGOS s.a.

CONSULTA EMPLEADO

Razón Social: HUGO FERNELLY DIAZ PLAZAS
Identificación NI - 12110283
Sucursal 078
Período Pensión 2022-09
Período Salud 2022-10
Fecha Pago Planilla 2022-10-27

Tipo Identificación	CC
Numero Identificación	4920363
Nombre	HUMBERTO. BAUTISTA PERDOMO
EPS	NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD S.A.
AFP	PROTECCION (ING+PROTECCION)
Caja de compensación	Caja de Compensacion Familiar del Huila COMFAMILIAR
ARL	ARL - POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS
Número Planilla	24487960
Referencia de Pago(PIN)	
Tipo Planilla	E
Período Pensión	2022-09
Período Salud	2022-10
Tipo Cotizante	Dependiente
Subtipo de Cotizante	No aplica

ING	Fecha ING	RET	Fecha RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	Fecha VSP	VTE	VST	SLN	Fecha Sln Inicio	Fecha Sln Fin	IGE	Fecha Ige Inicio	Fecha Ige Fin	LMA	Fecha LMA	Fecha LMA Fin	VAC	Fecha Vac Inicio	Fecha VAC Fin	AVP	VCT	Fecha VCT Inicio	Fecha VCT Fin	IRL	Fecha IRL Inicio	Fecha IRL Fin
																												0		

SISTEMA GENERAL DE SALUD

Días Cot	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	UPC adicional	Incapacidades E.G		Licencias de Maternidad o	
					Número Autorización	Valor	Número Autorización	Valor
30	1.046.875	0,0400000	$ 41.900	$ 0	0	$ 0	0	$ 0

SISTEMA GENERAL DE PENSIONES

Días Cot	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	Cot. Voluntaria		Total	Fondo de Solidaridad de	Fondo de Subsistencia	Valor no retenido
				Afiliado	Aportante				
30	1.046.875	0,1600000	$ 167.500	$ 0	$ 0	$ 167.500	$ 0	$ 0	$ 0

SISTEMA GENERAL DE RIESGOS LABORALES

Días Cot	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	Código de centro de trabajo
30	1.046.875	0,0696000	$ 72.900	5

APORTES PARAFISCALES

Días Cot	Caja de Compensación Familiar			Sena			ICBF		ESAP		MIN DE EDUCACIÓN	
	IBC	Tarifa	Cot.Obligatori	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	Tarifa	Cot. Obligatori	Tarifa	Cot.	Tarifa	Cot. Obligatori
30	1.046.875	0,0400000	$ 41.900	0	0,0000000	$ 0	0,0000000	$ 0	0,0000000	$ 0	0,0000000	$ 0

ASOPAGOS s.a.

CONSULTA EMPLEADO

Razón Social: HUGO FERNELLY DIAZ PLAZAS
Identificación NI - 12110283
Sucursal 078
Período Pensión 2022-09
Período Salud 2022-10
Fecha Pago Planilla 2022-10-27

Tipo Identificación	CC
Numero Identificación	7703695
Nombre	JAIME ENRIQUE BAUTISTA
EPS	NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD S.A.
AFP	COLFONDOS
Caja de compensación	Caja de Compensacion Familiar del Huila COMFAMILIAR
ARL	ARL - POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS
Número Planilla	24487960
Referencia de Pago(PIN)	
Tipo Planilla	E
Periodo Pensión	2022-09
Periodo Salud	2022-10
Tipo Cotizante	Dependiente
Subtipo de Cotizante	No aplica

ING	Fecha ING	RET	Fecha RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	Fecha VSP	VTE	VST	SLN	Fecha Sln Inicio	Fecha Sln Fin	IGE	Fecha Ige Inicio	Fecha Ige Fin	LMA	Fecha LMA	Fecha LMA Fin	VAC	Fecha Vac Inicio	Fecha VAC Fin	AVP	VCT	Fecha VCT Inicio	Fecha VCT Fin	IRL	Fecha IRL Inicio	Fecha IRL Fin
		X	30/09/22																									0		

SISTEMA GENERAL DE SALUD

Dias Cot	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	UPC adicional	Incapacidades E.G		Licencias de Maternidad o	
					Número Autorización	Valor	Número Autorización	Valor
30	1.570.313	0,0400000	$ 62.900	$ 0	0	$ 0	0	$ 0

SISTEMA GENERAL DE PENSIONES

Dias Cot	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	Cot. Voluntaria		Total	Fondo de Solidaridad de	Fondo de Subsistencia	Valor no retenido
				Afiliado	Aportante				
30	1.570.313	0,1600000	$ 251.300	$ 0	$ 0	$ 251.300	$ 0	$ 0	$ 0

SISTEMA GENERAL DE RIESGOS LABORALES

Dias Cot	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	Código de centro de trabajo
30	1.570.313	0,0696000	$ 109.300	5

APORTES PARAFISCALES

Dias Cot	Caja de Compensación Familiar			Sena			ICBF		ESAP		MIN DE EDUCACIÓN	
	IBC	Tarifa	Cot.Obligatori	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	Tarifa	Cot. Obligatori	Tarifa	Cot.	Tarifa	Cot. Obligatori
30	1.570.313	0,0400000	$ 62.900	0	0,0000000	$ 0	0,0000000	$ 0	0,0000000	$ 0	0,0000000	$ 0

ASOPAGOS s.a.

CONSULTA EMPLEADO

Razón Social: HUGO FERNELLY DIAZ PLAZAS
Identificación NI - 12110283
Sucursal 078
Período Pensión 2022-09
Período Salud 2022-10
Fecha Pago Planilla 2022-10-27

Tipo Identificación	CC
Numero Identificación	1066533812
Nombre	JOHNALBERT RAMIREZ QUINTERO
EPS	EMPRESA PROMOTORA DE SALUD ECOOPSOS EPS S.A.S
AFP	PORVENIR
Caja de compensación	Caja de Compensacion Familiar del Huila COMFAMILIAR
ARL	ARL - POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS
Número Planilla	24487960
Referencia de Pago(PIN)	
Tipo Planilla	E
Periodo Pensión	2022-09
Periodo Salud	2022-10
Tipo Cotizante	Dependiente
Subtipo de Cotizante	No aplica

ING	Fecha ING	RET	Fecha RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	Fecha VSP	VTE	VST	SLN	Fecha Sln Inicio	Fecha Sln Fin	IGE	Fecha Ige Inicio	Fecha Ige Fin	LMA	Fecha LMA	Fecha LMA Fin	VAC	Fecha Vac Inicio	Fecha VAC Fin	AVP	VCT	Fecha VCT Inicio	Fecha VCT Fin	IRL	Fecha IRL Inicio	Fecha IRL Fin
X	20/09/22										X																	0		

SISTEMA GENERAL DE SALUD

Días Cot	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	UPC adicional	Incapacidades E.G		Licencias de Maternidad o	
					Número Autorización	Valor	Número Autorización	Valor
11	408.334	0,0400000	$ 16.400	$ 0	0	$ 0	0	$ 0

SISTEMA GENERAL DE PENSIONES

Días Cot	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	Cot. Voluntaria		Total	Fondo de Solidaridad de	Fondo de Subsistencia	Valor no retenido
				Afiliado	Aportante				
11	408.334	0,1600000	$ 65.400	$ 0	$ 0	$ 65.400	$ 0	$ 0	$ 0

SISTEMA GENERAL DE RIESGOS LABORALES

Días Cot	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	Código de centro de trabajo
11	408.334	0,0696000	$ 28.500	5

APORTES PARAFISCALES

Días Cot	Caja de Compensación Familiar			Sena			ICBF		ESAP		MIN DE EDUCACIÓN	
	IBC	Tarifa	Cot.Obligatori	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	Tarifa	Cot. Obligatori	Tarifa	Cot.	Tarifa	Cot. Obligatori
11	408.334	0,0400000	$ 16.400	0	0,0000000	$ 0	0,0000000	$ 0	0,0000000	$ 0	0,0000000	$ 0

ASOPAGOS s.a.

CONSULTA EMPLEADO

Razón Social: HUGO FERNELLY DIAZ PLAZAS
Identificación NI - 12110283
Sucursal 078
Período Pensión 2022-09
Período Salud 2022-10
Fecha Pago Planilla 2022-10-27

Tipo Identificación	CC
Numero Identificación	12120775
Nombre	JOSE ALEJANDRO RIVERA RIOS
EPS	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SANITAS S.A.
AFP	Administradora Colombiana de Pensiones COLPENSIONES
Caja de compensación	Caja de Compensacion Familiar del Huila COMFAMILIAR
ARL	ARL - POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS
Número Planilla	24487960
Referencia de Pago(PIN)	
Tipo Planilla	E
Periodo Pensión	2022-09
Periodo Salud	2022-10
Tipo Cotizante	Dependiente
Subtipo de Cotizante	No aplica

ING	Fecha ING	RET	Fecha RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	Fecha VSP	VTE	VST	SLN	Fecha Sln Inicio	Fecha Sln Fin	IGE	Fecha Ige Inicio	Fecha Ige Fin	LMA	Fecha LMA	Fecha LMA Fin	VAC	Fecha Vac Inicio	Fecha VAC Fin	AVP	VCT	Fecha VCT Inicio	Fecha VCT Fin	IRL	Fecha IRL Inicio	Fecha IRL Fin
																												0		

SISTEMA GENERAL DE SALUD

Días Cot	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	UPC adicional	Incapacidades E.G		Licencias de Maternidad o	
					Número Autorización	Valor	Número Autorización	Valor
30	1.300.000	0,0400000	$ 52.000	$ 0	0	$ 0	0	$ 0

SISTEMA GENERAL DE PENSIONES

Días Cot	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	Cot. Voluntaria		Total	Fondo de Solidaridad de	Fondo de Subsistencia	Valor no retenido
				Afiliado	Aportante				
30	1.300.000	0,1600000	$ 208.000	$ 0	$ 0	$ 208.000	$ 0	$ 0	$ 0

SISTEMA GENERAL DE RIESGOS LABORALES

Días Cot	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	Código de centro de trabajo
30	1.300.000	0,0696000	$ 90.500	5

APORTES PARAFISCALES

Días Cot	Caja de Compensación Familiar			Sena			ICBF		ESAP		MIN DE EDUCACIÓN	
	IBC	Tarifa	Cot.Obligatori	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	Tarifa	Cot. Obligatori	Tarifa	Cot.	Tarifa	Cot. Obligatori
30	1.300.000	0,0400000	$ 52.000	0	0,0000000	$ 0	0,0000000	$ 0	0,0000000	$ 0	0,0000000	$ 0

ASOPAGOS s.a.

CONSULTA EMPLEADO

Razón Social: HUGO FERNELLY DIAZ PLAZAS
Identificación NI - 12110283
Sucursal 078
Período Pensión 2022-09
Período Salud 2022-10
Fecha Pago Planilla 2022-10-27

Tipo Identificación	CC
Numero Identificación	12128689
Nombre	JOSE ALIRIO RIVERA CRUZ
EPS	NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD S.A.
AFP	PORVENIR
Caja de compensación	Caja de Compensacion Familiar del Huila COMFAMILIAR
ARL	ARL - POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS
Número Planilla	24487960
Referencia de Pago(PIN)	
Tipo Planilla	E
Periodo Pensión	2022-09
Periodo Salud	2022-10
Tipo Cotizante	Dependiente
Subtipo de Cotizante	No aplica

ING	Fecha ING	RET	Fecha RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	Fecha VSP	VTE	VST	SLN	Fecha Sln Inicio	Fecha Sln Fin	IGE	Fecha Ige Inicio	Fecha Ige Fin	LMA	Fecha LMA	Fecha LMA Fin	VAC	Fecha Vac Inicio	Fecha VAC Fin	AVP	VCT	Fecha VCT Inicio	Fecha VCT Fin	IRL	Fecha IRL Inicio	Fecha IRL Fin
																												0		

SISTEMA GENERAL DE SALUD

Días Cot	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	UPC adicional	Incapacidades E.G		Licencias de Maternidad o	
					Número Autorización	Valor	Número Autorización	Valor
30	1.171.875	0,0400000	$ 46.900	$ 0	0	$ 0	0	$ 0

SISTEMA GENERAL DE PENSIONES

Días Cot	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	Cot. Voluntaria		Total	Fondo de Solidaridad de	Fondo de Subsistencia	Valor no retenido
				Afiliado	Aportante				
30	1.171.875	0,1600000	$ 187.500	$ 0	$ 0	$ 187.500	$ 0	$ 0	$ 0

SISTEMA GENERAL DE RIESGOS LABORALES

Días Cot	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	Código de centro de trabajo
30	1.171.875	0,0696000	$ 81.600	5

APORTES PARAFISCALES

Días Cot	Caja de Compensación Familiar			Sena			ICBF		ESAP		MIN DE EDUCACIÓN	
	IBC	Tarifa	Cot.Obligatori	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	Tarifa	Cot. Obligatori	Tarifa	Cot.	Tarifa	Cot. Obligatori
30	1.171.875	0,0400000	$ 46.900	0	0,0000000	$ 0	0,0000000	$ 0	0,0000000	$ 0	0,0000000	$ 0

ASOPAGOS s.a.

CONSULTA EMPLEADO

Razón Social: HUGO FERNELLY DIAZ PLAZAS
Identificación NI - 12110283
Sucursal 078
Período Pensión 2022-09
Período Salud 2022-10
Fecha Pago Planilla 2022-10-27

Tipo Identificación	CC
Numero Identificación	1082214647
Nombre	JOSE ANDERSON RAMIREZ VILLEGAS
EPS	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SANITAS S.A.
AFP	COLFONDOS
Caja de compensación	Caja de Compensacion Familiar del Huila COMFAMILIAR
ARL	ARL - POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS
Número Planilla	24487960
Referencia de Pago(PIN)	
Tipo Planilla	E
Periodo Pensión	2022-09
Periodo Salud	2022-10
Tipo Cotizante	Dependiente
Subtipo de Cotizante	No aplica

ING	Fecha ING	RET	Fecha RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	Fecha VSP	VTE	VST	SLN	Fecha Sln inicio	Fecha Sln Fin	IGE	Fecha Ige Inicio	Fecha Ige Fin	LMA	Fecha LMA	Fecha LMA Fin	VAC	Fecha Vac Inicio	Fecha VAC Fin	AVP	VCT	Fecha VCT Inicio	Fecha VCT Fin	IRL	Fecha IRL Inicio	Fecha IRL Fin
																												0		

SISTEMA GENERAL DE SALUD

Días Cot	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	UPC adicional	Incapacidades E.G		Licencias de Maternidad o	
					Número Autorización	Valor	Número Autorización	Valor
30	1.375.000	0,0400000	$ 55.000	$ 0	0	$ 0	0	$ 0

SISTEMA GENERAL DE PENSIONES

Días Cot	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	Cot. Voluntaria		Total	Fondo de Solidaridad de	Fondo de Subsistencia	Valor no retenido
				Afiliado	Aportante				
30	1.375.000	0,1600000	$ 220.000	$ 0	$ 0	$ 220.000	$ 0	$ 0	$ 0

SISTEMA GENERAL DE RIESGOS LABORALES

Días Cot	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	Código de centro de trabajo
30	1.375.000	0,0696000	$ 95.700	5

APORTES PARAFISCALES

Días Cot	Caja de Compensación Familiar			Sena			ICBF		ESAP		MIN DE EDUCACIÓN	
	IBC	Tarifa	Cot.Obligatori	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	Tarifa	Cot. Obligatori	Tarifa	Cot.	Tarifa	Cot. Obligatori
30	1.375.000	0,0400000	$ 55.000	0	0,0000000	$ 0	0,0000000	$ 0	0,0000000	$ 0	0,0000000	$ 0

ASOPAGOS s.a.

CONSULTA EMPLEADO

Razón Social: HUGO FERNELLY DIAZ PLAZAS
Identificación NI - 12110283
Sucursal 078
Período Pensión 2022-09
Período Salud 2022-10
Fecha Pago Planilla 2022-10-27

Tipo Identificación	CC
Numero Identificación	14226767
Nombre	JOSE YECID PERDOMO GODOY
EPS	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SANITAS S.A.
AFP	Sin AFP
Caja de compensación	Caja de Compensacion Familiar del Huila COMFAMILIAR
ARL	ARL - POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS
Número Planilla	24487960
Referencia de Pago(PIN)	
Tipo Planilla	E
Periodo Pensión	2022-09
Periodo Salud	2022-10
Tipo Cotizante	Dependiente
Subtipo de Cotizante	Cotizante a quien se le ha reconocido indemnización sustitutiva o devolución de saldos

ING	Fecha ING	RET	Fecha RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	Fecha VSP	VTE	VST	SLN	Fecha Sln Inicio	Fecha Sln Fin	IGE	Fecha Ige Inicio	Fecha Ige Fin	LMA	Fecha LMA	Fecha LMA Fin	VAC	Fecha Vac Inicio	Fecha VAC Fin	AVP	VCT	Fecha VCT Inicio	Fecha VCT Fin	IRL	Fecha IRL Inicio	Fecha IRL Fin
X	8/09/22										X																	0		

SISTEMA GENERAL DE SALUD

Días Cot	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	UPC adicional	Incapacidades E.G		Licencias de Maternidad o	
					Número Autorización	Valor	Número Autorización	Valor
23	1.539.584	0,0400000	$ 61.600	$ 0	0	$ 0	0	$ 0

SISTEMA GENERAL DE PENSIONES

Días Cot	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	Cot. Voluntaria		Total	Fondo de Solidaridad de	Fondo de Subsistencia	Valor no retenido
				Afiliado	Aportante				
0	0	0,0000000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

SISTEMA GENERAL DE RIESGOS LABORALES

Días Cot	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	Código de centro de trabajo
23	1.539.584	0,0696000	$ 107.200	5

APORTES PARAFISCALES

Días Cot	Caja de Compensación Familiar			Sena			ICBF		ESAP		MIN DE EDUCACIÓN	
	IBC	Tarifa	Cot.Obligatori	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	Tarifa	Cot. Obligatori	Tarifa	Cot.	Tarifa	Cot. Obligatori
23	1.539.584	0,0400000	$ 61.600	0	0,0000000	$ 0	0,0000000	$ 0	0,0000000	$ 0	0,0000000	$ 0

ASOPAGOS s.a.

CONSULTA EMPLEADO

Razón Social: HUGO FERNELLY DIAZ PLAZAS
Identificación NI - 12110283
Sucursal 078
Período Pensión 2022-09
Período Salud 2022-10
Fecha Pago Planilla 2022-10-27

Tipo Identificación	CC
Numero Identificación	7699514
Nombre	JUAN CARLOS SUAZA GAMBOA
EPS	NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD S.A.
AFP	PORVENIR
Caja de compensación	Caja de Compensacion Familiar del Huila COMFAMILIAR
ARL	ARL - POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS
Número Planilla	24487960
Referencia de Pago(PIN)	
Tipo Planilla	E
Periodo Pensión	2022-09
Periodo Salud	2022-10
Tipo Cotizante	Dependiente
Subtipo de Cotizante	No aplica

ING	Fecha ING	RET	Fecha RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	Fecha VSP	VTE	VST	SLN	Fecha Sln Inicio	Fecha Sln Fin	IGE	Fecha Ige Inicio	Fecha Ige Fin	LMA	Fecha LMA	Fecha LMA Fin	VAC	Fecha Vac Inicio	Fecha VAC Fin	AVP	VCT	Fecha VCT Inicio	Fecha VCT Fin	IRL	Fecha IRL Inicio	Fecha IRL Fin
																												0		

SISTEMA GENERAL DE SALUD

Días Cot	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	UPC adicional	Incapacidades E.G		Licencias de Maternidad o	
					Número Autorización	Valor	Número Autorización	Valor
30	1.754.400	0,0400000	$ 70.200	$ 0	0	$ 0	0	$ 0

SISTEMA GENERAL DE PENSIONES

Días Cot	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	Cot. Voluntaria		Total	Fondo de Solidaridad de	Fondo de Subsistencia	Valor no retenido
				Afiliado	Aportante				
30	1.754.400	0,1600000	$ 280.800	$ 0	$ 0	$ 280.800	$ 0	$ 0	$ 0

SISTEMA GENERAL DE RIESGOS LABORALES

Días Cot	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	Código de centro de trabajo
30	1.754.400	0,0696000	$ 122.200	5

APORTES PARAFISCALES

Días Cot	Caja de Compensación Familiar			Sena			ICBF		ESAP		MIN DE EDUCACIÓN	
	IBC	Tarifa	Cot.Obligatori	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	Tarifa	Cot. Obligatori	Tarifa	Cot.	Tarifa	Cot. Obligatori
30	1.754.400	0,0400000	$ 70.200	0	0,0000000	$ 0	0,0000000	$ 0	0,0000000	$ 0	0,0000000	$ 0

ASOPAGOS s.a.

CONSULTA EMPLEADO

Razón Social: HUGO FERNELLY DIAZ PLAZAS
Identificación NI - 12110283
Sucursal 078
Período Pensión 2022-09
Período Salud 2022-10
Fecha Pago Planilla 2022-10-27

Tipo Identificación	CC
Numero Identificación	1081420612
Nombre	KEVIN NICOLAS MALDONADO RUIZ
EPS	NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD S.A.
AFP	PORVENIR
Caja de compensación	Caja de Compensacion Familiar del Huila COMFAMILIAR
ARL	ARL - POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS
Número Planilla	24487960
Referencia de Pago(PIN)	
Tipo Planilla	E
Periodo Pensión	2022-09
Periodo Salud	2022-10
Tipo Cotizante	Dependiente
Subtipo de Cotizante	No aplica

ING	Fecha ING	RET	Fecha RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	Fecha VSP	VTE	VST	SLN	Fecha Sln Inicio	Fecha Sln Fin	IGE	Fecha Ige Inicio	Fecha Ige Fin	LMA	Fecha LMA	Fecha LMA Fin	VAC	Fecha Vac Inicio	Fecha VAC Fin	AVP	VCT	Fecha VCT Inicio	Fecha VCT Fin	IRL	Fecha IRL Inicio	Fecha IRL Fin
																												0		

SISTEMA GENERAL DE SALUD

Días Cot	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	UPC adicional	Incapacidades E.G		Licencias de Maternidad o	
					Número Autorización	Valor	Número Autorización	Valor
30	1.000.000	0,0400000	$ 40.000	$ 0	0	$ 0	0	$ 0

SISTEMA GENERAL DE PENSIONES

Días Cot	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	Cot. Voluntaria		Total	Fondo de Solidaridad de	Fondo de Subsistencia	Valor no retenido
				Afiliado	Aportante				
30	1.000.000	0,1600000	$ 160.000	$ 0	$ 0	$ 160.000	$ 0	$ 0.	$ 0

SISTEMA GENERAL DE RIESGOS LABORALES

Días Cot	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	Código de centro de trabajo
30	1.000.000	0,0696000	$ 69.600	5

APORTES PARAFISCALES

Días Cot	Caja de Compensación Familiar			Sena			ICBF		ESAP		MIN DE EDUCACIÓN	
	IBC	Tarifa	Cot.Obligatori	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	Tarifa	Cot. Obligatori	Tarifa	Cot.	Tarifa	Cot. Obligatori
30	1.000.000	0,0400000	$ 40.000	0	0,0000000	$ 0	0,0000000	$ 0	0,0000000	$ 0	0,0000000	$ 0

ASOPAGOS s.a.

CONSULTA EMPLEADO

Razón Social: HUGO FERNELLY DIAZ PLAZAS
Identificación NI - 12110283
Sucursal 078
Período Pensión 2022-09
Período Salud 2022-10
Fecha Pago Planilla 2022-10-27

Tipo Identificación	CC
Numero Identificación	12350030
Nombre	LIBARDO CERQUERA COLLAZOS
EPS	NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD S.A.
AFP	Administradora Colombiana de Pensiones COLPENSIONES
Caja de compensación	Caja de Compensacion Familiar del Huila COMFAMILIAR
ARL	ARL - POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS
Número Planilla	24487960
Referencia de Pago(PIN)	
Tipo Planilla	E
Periodo Pensión	2022-09
Periodo Salud	2022-10
Tipo Cotizante	Dependiente
Subtipo de Cotizante	No aplica

ING	Fecha ING	RET	Fecha RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	Fecha VSP	VTE	VST	SLN	Fecha Sln Inicio	Fecha Sln Fin	IGE	Fecha Ige Inicio	Fecha Ige Fin	LMA	Fecha LMA	Fecha LMA Fin	VAC	Fecha Vac Inicio	Fecha VAC Fin	AVP	VCT	Fecha VCT Inicio	Fecha VCT Fin	IRL	Fecha IRL Inicio	Fecha IRL Fin
																												0		

SISTEMA GENERAL DE SALUD

Días Cot	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	UPC adicional	Incapacidades E.G		Licencias de Maternidad o	
					Número Autorización	Valor	Número Autorización	Valor
30	1.770.313	0,0400000	$ 70.900	$ 0	0	$ 0	0	$ 0

SISTEMA GENERAL DE PENSIONES

Días Cot	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	Cot. Voluntaria		Total	Fondo de Solidaridad de	Fondo de Subsistencia	Valor no retenido
				Afiliado	Aportante				
30	1.770.313	0,1600000	$ 283.300	$ 0	$ 0	$ 283.300	$ 0	$ 0	$ 0

SISTEMA GENERAL DE RIESGOS LABORALES

Días Cot	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	Código de centro de trabajo
30	1.770.313	0,0696000	$ 123.300	5

APORTES PARAFISCALES

Días Cot	Caja de Compensación Familiar			Sena			ICBF		ESAP		MIN DE EDUCACIÓN	
	IBC	Tarifa	Cot.Obligatori	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	Tarifa	Cot. Obligatori	Tarifa	Cot.	Tarifa	Cot. Obligatori
30	1.770.313	0,0400000	$ 70.900	0	0,0000000	$ 0	0,0000000	$ 0	0,0000000	$ 0	0,0000000	$ 0

ASOPAGOS s.a.

CONSULTA EMPLEADO

Razón Social: HUGO FERNELLY DIAZ PLAZAS
Identificación NI - 12110283
Sucursal 078
Período Pensión 2022-09
Período Salud 2022-10
Fecha Pago Planilla 2022-10-27

Tipo Identificación	CC
Numero Identificación	1084578661
Nombre	NEYID EMBUS LEMUS
EPS	ASOCIACION INDIGENA DEL CAUCA
AFP	PROTECCION (ING+PROTECCION)
Caja de compensación	Caja de Compensacion Familiar del Huila COMFAMILIAR
ARL	ARL - POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS
Número Planilla	24487960
Referencia de Pago(PIN)	
Tipo Planilla	E
Periodo Pensión	2022-09
Periodo Salud	2022-10
Tipo Cotizante	Dependiente
Subtipo de Cotizante	No aplica

ING	Fecha ING	RET	Fecha RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	Fecha VSP	VTE	VST	SLN	Fecha Sln Inicio	Fecha Sln Fin	IGE	Fecha Ige Inicio	Fecha Ige Fin	LMA	Fecha LMA	Fecha LMA Fin	VAC	Fecha Vac Inicio	Fecha VAC Fin	AVP	VCT	Fecha VCT Inicio	Fecha VCT Fin	IRL	Fecha IRL Inicio	Fecha IRL Fin
																												0		

SISTEMA GENERAL DE SALUD

Días Cot	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	UPC adicional	Incapacidades E.G		Licencias de Maternidad o	
					Número Autorización	Valor	Número Autorización	Valor
30	1.145.833	0,0400000	$ 45.900	$ 0	0	$ 0	0	$ 0

SISTEMA GENERAL DE PENSIONES

Días Cot	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	Cot. Voluntaria		Total	Fondo de Solidaridad de	Fondo de Subsistencia	Valor no retenido
				Afiliado	Aportante				
30	1.145.833	0,1600000	$ 183.400	$ 0	$ 0	$ 183.400	$ 0	$ 0	$ 0

SISTEMA GENERAL DE RIESGOS LABORALES

Días Cot	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	Código de centro de trabajo
30	1.145.833	0,0696000	$ 79.800	5

APORTES PARAFISCALES

Días Cot	Caja de Compensación Familiar			Sena			ICBF		ESAP		MIN DE EDUCACIÓN	
	IBC	Tarifa	Cot.Obligatori	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	Tarifa	Cot. Obligatori	Tarifa	Cot.	Tarifa	Cot. Obligatori
30	1.145.833	0,0400000	$ 45.900	0	0,0000000	$ 0	0,0000000	$ 0	0,0000000	$ 0	0,0000000	$ 0

ASOPAGOS s.a.

CONSULTA EMPLEADO

Razón Social: HUGO FERNELLY DIAZ PLAZAS
Identificación NI - 12110283
Sucursal 078
Período Pensión 2022-09
Período Salud 2022-10
Fecha Pago Planilla 2022-10-27

Tipo Identificación	CC
Numero Identificación	7709694
Nombre	ORLANDO ZULETA PEÑA
EPS	NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD S.A.
AFP	COLFONDOS
Caja de compensación	Caja de Compensacion Familiar del Huila COMFAMILIAR
ARL	ARL - POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS
Número Planilla	24487960
Referencia de Pago(PIN)	
Tipo Planilla	E
Periodo Pensión	2022-09
Periodo Salud	2022-10
Tipo Cotizante	Dependiente
Subtipo de Cotizante	No aplica

ING	Fecha ING	RET	Fecha RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	Fecha VSP	VTE	VST	SLN	Fecha Sln Inicio	Fecha Sln Fin	IGE	Fecha Ige Inicio	Fecha Ige Fin	LMA	Fecha LMA	Fecha LMA Fin	VAC	Fecha Vac Inicio	Fecha VAC Fin	AVP	VCT	Fecha VCT Inicio	Fecha VCT Fin	IRL	Fecha IRL Inicio	Fecha IRL Fin
																												0		

SISTEMA GENERAL DE SALUD

Días Cot	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	UPC adicional	Incapacidades E.G		Licencias de Maternidad o	
					Número Autorización	Valor	Número Autorización	Valor
30	1.104.166	0,0400000	$ 44.200	$ 0	0	$ 0	0	$ 0

SISTEMA GENERAL DE PENSIONES

Días Cot	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	Cot. Voluntaria		Total	Fondo de Solidaridad de	Fondo de Subsistencia	Valor no retenido
				Afiliado	Aportante				
30	1.104.166	0,1600000	$ 176.700	$ 0	$ 0	$ 176.700	$ 0	$ 0	$ 0

SISTEMA GENERAL DE RIESGOS LABORALES

Días Cot	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	Código de centro de trabajo
30	1.104.166	0,0696000	$ 76.900	5

APORTES PARAFISCALES

Días Cot	Caja de Compensación Familiar			Sena			ICBF		ESAP		MIN DE EDUCACIÓN	
	IBC	Tarifa	Cot.Obligatori	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	Tarifa	Cot. Obligatori	Tarifa	Cot.	Tarifa	Cot. Obligatori
30	1.104.166	0,0400000	$ 44.200	0	0,0000000	$ 0	0,0000000	$ 0	0,0000000	$ 0	0,0000000	$ 0

ASOPAGOS s.a.

CONSULTA EMPLEADO

Razón Social: HUGO FERNELLY DIAZ PLAZAS
Identificación NI - 12110283
Sucursal 078
Período Pensión 2022-09
Período Salud 2022-10
Fecha Pago Planilla 2022-10-27

Tipo Identificación	CC
Numero Identificación	1079509797
Nombre	ROBER ALVARADO BARRERA
EPS	EMPRESA PROMOTORA DE SALUD ECOOPSOS EPS S.A.S
AFP	PORVENIR
Caja de compensación	Caja de Compensacion Familiar del Huila COMFAMILIAR
ARL	ARL - POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS
Número Planilla	24487960
Referencia de Pago(PIN)	
Tipo Planilla	E
Periodo Pensión	2022-09
Periodo Salud	2022-10
Tipo Cotizante	Dependiente
Subtipo de Cotizante	No aplica

ING	Fecha ING	RET	Fecha RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	Fecha VSP	VTE	VST	SLN	Fecha Sln Inicio	Fecha Sln Fin	IGE	Fecha Ige Inicio	Fecha Ige Fin	LMA	Fecha LMA	Fecha LMA Fin	VAC	Fecha Vac Inicio	Fecha VAC Fin	AVP	VCT	Fecha VCT Inicio	Fecha VCT Fin	IRL	Fecha IRL Inicio	Fecha IRL Fin
X	20/09/22										X																	0		

SISTEMA GENERAL DE SALUD

Días Cot	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	UPC adicional	Incapacidades E.G		Licencias de Maternidad o	
					Número Autorización	Valor	Número Autorización	Valor
11	413.542	0,0400000	$ 16.600	$ 0	0	$ 0	0	$ 0

SISTEMA GENERAL DE PENSIONES

Días Cot	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	Cot. Voluntaria		Total	Fondo de Solidaridad de	Fondo de Subsistencia	Valor no retenido
				Afiliado	Aportante				
11	413.542	0,1600000	$ 66.200	$ 0	$ 0	$ 66.200	$ 0	$ 0	$ 0

SISTEMA GENERAL DE RIESGOS LABORALES

Días Cot	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	Código de centro de trabajo
11	413.542	0,0696000	$ 28.800	5

APORTES PARAFISCALES

Días Cot	Caja de Compensación Familiar			Sena			ICBF		ESAP		MIN DE EDUCACIÓN	
	IBC	Tarifa	Cot.Obligatori	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	Tarifa	Cot. Obligatori	Tarifa	Cot.	Tarifa	Cot. Obligatori
11	413.542	0,0400000	$ 16.600	0	0,0000000	$ 0	0,0000000	$ 0	0,0000000	$ 0	0,0000000	$ 0

ASOPAGOS s.a.

RAZON SOCIAL :	HUGO FERNELLI DIAZ PLAZAS
IDENTIFICACION:	NI-12110283
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	318
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	LA PLATA
FECHA GENERACION REPORTE:	2022-10-27
FECHA LIMITE DE PAGO:	2022-10-21
FECHA DE PAGO:	2022-10-27
ENTIDAD DE PAGO:	BANCOLOMBIA
PERIODO PENSION:	2022-09
PERIODO SALUD:	2022-10
NUMERO PLANILLA:	24488653
TOTAL COTIZANTES:	5
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	24488653
TIPO DE PLANILLA:	E

CODIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NUMERO AFILIADOS	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	5	$ 0	$ 0	$ 1.300	$ 215.200	$ 216.500
Subtotal Salud		1	5	$ 0	$ 0	$ 1.300	$ 215.200	$ 216.500
230201	800229739	PROTECCION	2	$ 0	$ 0	$ 1.200	$ 201.300	$ 202.500
230301	800224808	PORVENIR	3	$ 0	$ 0	$ 3.800	$ 658.800	$ 662.600
Subtotal Pensión		2	5	$ 0	$ 0	$ 5.000	$ 860.100	$ 865.100
14-23	860011153	POSITIVA	5	$ 0	$ 0	$ 2.200	$ 374.300	$ 376.500
Subtotal ARL		1	5	$ 0	$ 0	$ 2.200	$ 374.300	$ 376.500
CCF32	891180008	COMFAMILIAR DEL HUILA	5	$ 0	$ 0	$ 1.300	$ 215.200	$ 216.500
Subtotal CCF		1	5	$ 0	$ 0	$ 1.300	$ 215.200	$ 216.500
		Total a pagar		$ 0	$ 0	$ 9.800	$ 1.664.800	$ 1.674.600

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	22/11/2022

ASOPAGOS s.a.

CONSULTA EMPLEADO

Razón Social: HUGO FERNELLI DIAZ PLAZAS
Identificación NI - 12110283
Sucursal 318
Período Pensión 2022-09
Período Salud 2022-10
Fecha Pago Planilla 2022-10-27

Tipo Identificación	CC
Numero Identificación	12235896
Nombre	CARLOS ALBERTO CABRERA CAMACHO
EPS	NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD S.A.
AFP	PORVENIR
Caja de compensación	Caja de Compensacion Familiar del Huila COMFAMILIAR
ARL	ARL - POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS
Número Planilla	24488653
Referencia de Pago(PIN)	
Tipo Planilla	E
Periodo Pensión	2022-09
Periodo Salud	2022-10
Tipo Cotizante	Dependiente
Subtipo de Cotizante	No aplica

ING	Fecha ING	RET	Fecha RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	Fecha VSP	VTE	VST	SLN	Fecha Sln Inicio	Fecha Sln Fin	IGE	Fecha Ige Inicio	Fecha Ige Fin	LMA	Fecha LMA	Fecha LMA Fin	VAC	Fecha Vac Inicio	Fecha VAC Fin	AVP	VCT	Fecha VCT Inicio	Fecha VCT Fin	IRL	Fecha IRL Inicio	Fecha IRL Fin
																												0		

SISTEMA GENERAL DE SALUD

Días Cot	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	UPC adicional	Incapacidades E.G		Licencias de Maternidad o	
					Número Autorización	Valor	Número Autorización	Valor
30	2.002.344	0,0400000	$ 80.100	$ 0	0	$ 0	0	$ 0

SISTEMA GENERAL DE PENSIONES

Días Cot	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	Cot. Voluntaria		Total	Fondo de Solidaridad de	Fondo de Subsistencia	Valor no retenido
				Afiliado	Aportante				
30	2.002.344	0,1600000	$ 320.400	$ 0	$ 0	$ 320.400	$ 0	$ 0	$ 0

SISTEMA GENERAL DE RIESGOS LABORALES

Días Cot	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	Código de centro de trabajo
30	2.002.344	0,0696000	$ 139.400	5

APORTES PARAFISCALES

Días Cot	Caja de Compensación Familiar			Sena			ICBF		ESAP		MIN DE EDUCACIÓN	
	IBC	Tarifa	Cot.Obligatori	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	Tarifa	Cot. Obligatori	Tarifa	Cot.	Tarifa	Cot. Obligatori
30	2.002.344	0,0400000	$ 80.100	0	0,0000000	$ 0	0,0000000	$ 0	0,0000000	$ 0	0,0000000	$ 0

ASOPAGOS s.a.

CONSULTA EMPLEADO

Razón Social: HUGO FERNELLI DIAZ PLAZAS
Identificación NI - 12110283
Sucursal 318
Período Pensión 2022-09
Período Salud 2022-10
Fecha Pago Planilla 2022-10-27

Tipo Identificación	CC
Numero Identificación	1075268941
Nombre	JHON WILMER VEGA VERA
EPS	NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD S.A.
AFP	PROTECCION (ING+PROTECCION)
Caja de compensación	Caja de Compensacion Familiar del Huila COMFAMILIAR
ARL	ARL - POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS
Número Planilla	24488653
Referencia de Pago(PIN)	
Tipo Planilla	E
Periodo Pensión	2022-09
Periodo Salud	2022-10
Tipo Cotizante	Dependiente
Subtipo de Cotizante	No aplica

ING	Fecha ING	RET	Fecha RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	Fecha VSP	VTE	VST	SLN	Fecha Sln Inicio	Fecha Sln Fin	IGE	Fecha Ige Inicio	Fecha Ige Fin	LMA	Fecha LMA	Fecha LMA Fin	VAC	Fecha Vac Inicio	Fecha VAC Fin	AVP	VCT	Fecha VCT Inicio	Fecha VCT Fin	IRL	Fecha IRL Inicio	Fecha IRL Fin
		X	30/09/22																									0		

SISTEMA GENERAL DE SALUD

Días Cot	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	UPC adicional	Incapacidades E.G		Licencias de Maternidad o	
					Número Autorización	Valor	Número Autorización	Valor
30	1.223.958	0,0400000	$ 49.000	$ 0	0	$ 0	0	$ 0

SISTEMA GENERAL DE PENSIONES

Días Cot	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	Cot. Voluntaria		Total	Fondo de Solidaridad de	Fondo de Subsistencia	Valor no retenido
				Afiliado	Aportante				
30	1.223.958	0,1600000	$ 195.900	$ 0	$ 0	$ 195.900	$ 0	$ 0	$ 0

SISTEMA GENERAL DE RIESGOS LABORALES

Días Cot	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	Código de centro de trabajo
30	1.223.958	0,0696000	$ 85.200	5

APORTES PARAFISCALES

Días Cot	Caja de Compensación Familiar			Sena			ICBF		ESAP		MIN DE EDUCACIÓN	
	IBC	Tarifa	Cot.Obligatori	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	Tarifa	Cot. Obligatori	Tarifa	Cot.	Tarifa	Cot. Obligatori
30	1.223.958	0,0400000	$ 49.000	0	0,0000000	$ 0	0,0000000	$ 0	0,0000000	$ 0	0,0000000	$ 0

ASOPAGOS s.a.

CONSULTA EMPLEADO

Razón Social: HUGO FERNELLI DIAZ PLAZAS
Identificación NI - 12110283
Sucursal 318
Período Pensión 2022-09
Período Salud 2022-10
Fecha Pago Planilla 2022-10-27

Tipo Identificación	CC
Numero Identificación	1003815582
Nombre	JORGE ANDRES CARDOZO CADENA
EPS	NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD S.A.
AFP	PROTECCION (ING+PROTECCION)
Caja de compensación	Caja de Compensacion Familiar del Huila COMFAMILIAR
ARL	ARL - POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS
Número Planilla	24488653
Referencia de Pago(PIN)	
Tipo Planilla	E
Periodo Pensión	2022-09
Periodo Salud	2022-10
Tipo Cotizante	Dependiente
Subtipo de Cotizante	No aplica

ING	Fecha ING	RET	Fecha RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	Fecha VSP	VTE	VST	SLN	Fecha Sln Inicio	Fecha Sln Fin	IGE	Fecha Ige Inicio	Fecha Ige Fin	LMA	Fecha LMA	Fecha LMA Fin	VAC	Fecha Vac Inicio	Fecha VAC Fin	AVP	VCT	Fecha VCT Inicio	Fecha VCT Fin	IRL	Fecha IRL Inicio	Fecha IRL Fin
		X	1/09/22																									0		

SISTEMA GENERAL DE SALUD

Días Cot	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	UPC adicional	Incapacidades E.G		Licencias de Maternidad o	
					Número Autorización	Valor	Número Autorización	Valor
1	33.334	0,0400000	$ 1.400	$ 0	0	$ 0	0	$ 0

SISTEMA GENERAL DE PENSIONES

Días Cot	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	Cot. Voluntaria		Total	Fondo de Solidaridad de	Fondo de Subsistencia	Valor no retenido
				Afiliado	Aportante				
1	33.334	0,1600000	$ 5.400	$ 0	$ 0	$ 5.400	$ 0	$ 0	$ 0

SISTEMA GENERAL DE RIESGOS LABORALES

Días Cot	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	Código de centro de trabajo
1	33.334	0,0696000	$ 2.400	5

APORTES PARAFISCALES

Días Cot	Caja de Compensación Familiar			Sena			ICBF		ESAP		MIN DE EDUCACIÓN	
	IBC	Tarifa	Cot.Obligatori	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	Tarifa	Cot. Obligatori	Tarifa	Cot.	Tarifa	Cot. Obligatori
1	33.334	0,0400000	$ 1.400	0	0,0000000	$ 0	0,0000000	$ 0	0,0000000	$ 0	0,0000000	$ 0

ASOPAGOS s.a.

CONSULTA EMPLEADO

Razón Social: HUGO FERNELLI DIAZ PLAZAS
Identificación NI - 12110283
Sucursal 318
Período Pensión 2022-09
Período Salud 2022-10
Fecha Pago Planilla 2022-10-27

Tipo Identificación	CC
Numero Identificación	83116134
Nombre	LUIS HERNANDO RIVERA RIOS
EPS	NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD S.A.
AFP	PORVENIR
Caja de compensación	Caja de Compensacion Familiar del Huila COMFAMILIAR
ARL	ARL - POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS
Número Planilla	24488653
Referencia de Pago(PIN)	
Tipo Planilla	E
Periodo Pensión	2022-09
Periodo Salud	2022-10
Tipo Cotizante	Dependiente
Subtipo de Cotizante	No aplica

ING	Fecha ING	RET	Fecha RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	Fecha VSP	VTE	VST	SLN	Fecha Sln inicio	Fecha Sln Fin	IGE	Fecha Ige Inicio	Fecha Ige Fin	LMA	Fecha LMA	Fecha LMA Fin	VAC	Fecha Vac Inicio	Fecha VAC Fin	AVP	VCT	Fecha VCT Inicio	Fecha VCT Fin	IRL	Fecha IRL Inicio	Fecha IRL Fin
X	28/09/22										X																	0		

SISTEMA GENERAL DE SALUD

Días Cot	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	UPC adicional	Incapacidades E.G		Licencias de Maternidad o	
					Número Autorización	Valor	Número Autorización	Valor
3	181.250	0,0400000	$ 7.300	$ 0	0	$ 0	0	$ 0

SISTEMA GENERAL DE PENSIONES

Días Cot	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	Cot. Voluntaria		Total	Fondo de Solidaridad de	Fondo de Subsistencia	Valor no retenido
				Afiliado	Aportante				
3	181.250	0,1600000	$ 29.000	$ 0	$ 0	$ 29.000	$ 0	$ 0	$ 0

SISTEMA GENERAL DE RIESGOS LABORALES

Días Cot	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	Código de centro de trabajo
3	181.250	0,0696000	$ 12.700	5

APORTES PARAFISCALES

Días Cot	Caja de Compensación Familiar			Sena			ICBF		ESAP		MIN DE EDUCACIÓN	
	IBC	Tarifa	Cot.Obligatori	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	Tarifa	Cot. Obligatori	Tarifa	Cot.	Tarifa	Cot. Obligatori
3	181.250	0,0400000	$ 7.300	0	0,0000000	$ 0	0,0000000	$ 0	0,0000000	$ 0	0,0000000	$ 0

ASOPAGOS s.a.

CONSULTA EMPLEADO

Razón Social: HUGO FERNELLI DIAZ PLAZAS
Identificación NI - 12110283
Sucursal 318
Período Pensión 2022-09
Período Salud 2022-10
Fecha Pago Planilla 2022-10-27

Tipo Identificación	CC
Numero Identificación	7724723
Nombre	WILSON TOVAR PERDOMO
EPS	NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD S.A.
AFP	PORVENIR
Caja de compensación	Caja de Compensacion Familiar del Huila COMFAMILIAR
ARL	ARL - POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS
Número Planilla	24488653
Referencia de Pago(PIN)	
Tipo Planilla	E
Periodo Pensión	2022-09
Periodo Salud	2022-10
Tipo Cotizante	Dependiente
Subtipo de Cotizante	No aplica

ING	Fecha ING	RET	Fecha RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	Fecha VSP	VTE	VST	SLN	Fecha Sln Inicio	Fecha Sln Fin	IGE	Fecha Ige Inicio	Fecha Ige Fin	LMA	Fecha LMA	Fecha LMA Fin	VAC	Fecha Vac Inicio	Fecha VAC Fin	AVP	VCT	Fecha VCT Inicio	Fecha VCT Fin	IRL	Fecha IRL Inicio	Fecha IRL Fin
		X	30/09/22																									0		

SISTEMA GENERAL DE SALUD

Días Cot	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	UPC adicional	Incapacidades E.G		Licencias de Maternidad o	
					Número Autorización	Valor	Número Autorización	Valor
30	1.933.594	0,0400000	$ 77.400	$ 0	0	$ 0	0	$ 0

SISTEMA GENERAL DE PENSIONES

Días Cot	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	Cot. Voluntaria		Total	Fondo de Solidaridad de	Fondo de Subsistencia	Valor no retenido
				Afiliado	Aportante				
30	1.933.594	0,1600000	$ 309.400	$ 0	$ 0	$ 309.400	$ 0	$ 0	$ 0

SISTEMA GENERAL DE RIESGOS LABORALES

Días Cot	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	Código de centro de trabajo
30	1.933.594	0,0696000	$ 134.600	5

APORTES PARAFISCALES


Días Cot	Caja de Compensación Familiar			Sena			ICBF		ESAP		MIN DE EDUCACIÓN	
	IBC	Tarifa	Cot.Obligatori	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	Tarifa	Cot. Obligatori	Tarifa	Cot.	Tarifa	Cot. Obligatori
30	1.933.594	0,0400000	$ 77.400	0	0,0000000	$ 0	0,0000000	$ 0	0,0000000	$ 0	0,0000000	$ 0

CERTIFICADO DEL CONTADOR SOBRE APORTES A SEGURIDAD SOCIAL DEL CONTRATISTA

CERTIFICACIÓN PAGO APORTES PARAFISCALES Y SISTEMAS DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL

Yo **ANDRY LORENA POLO MENDEZ**, identificada con cédula de ciudadanía N° 1.075.247.764 de Neiva-Huila y tarjeta profesional N° 185716-T, en calidad de Contador Público, manifiesto bajo la Gravedad de Juramento que el Ingeniero **HUGO FERNELI DÍAZ PLAZAS**, identificado con cédula de ciudadanía N° 12.110.283 de Neiva y Matricula Profesional N° 25202-22776 CND, ha cumplido durante los últimos seis (6) meses con las obligaciones de los aportes correspondientes a los sistemas de salud, pensiones, riesgos profesionales, caja de compensación familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), señaladas en el artículo 50 de la ley 789 del 27 de diciembre de 2002.

Se firma en Neiva, a los Veintinueve (29) días del mes de Octubre del año 2022.



ANDRY LORENA POLO MENDEZ
TARJETA PROFESIONAL N°185716-T
Contador Público

CERTIFICACIÓN BANCARIA

Certificado
Bancario

Lunes, 24 de octubre de 2022

Señor(a)
A QUIEN PUEDA INTERESAR

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que HUGO FERNELI DIAZ PLAZAS identificado(a) con CC 12110283, a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el banco los siguientes productos:

Producto	No. Producto	Fecha Apertura	Estado
CUENTA CORRIENTE	07621518619	2014/03/11	ACTIVA

***Importante:** Esta constancia solo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.

*Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia los siguientes números: Medellín - Local: (60-4) 510 90 00 - Bogotá - Local: (60-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (60-5) 361 88 88 - Cali - Local: (60-2) 554 05 05 - Resto del país: 01800 09 12345. Sucursales Telefónicas en el exterior: España (34) 900 995 717 - Estados Unidos (1) 1 866 379 97 14.

Catalina Cortés Uribe.
Gerente Servicios Contact Center & BPO.

Bancolombia

VIGILADO

REGISTRO FOTOGRÁFICO

REGISTRO FOTOGRÁFICO



Vista estado inicial de la plaza de mercado



Vista estado inicial de la plaza de mercado



Inicio de actividades preliminares




Desmonte y limpieza teja de barro



Desmonte y limpieza teja de barro



Demolición zona de locales de verdura

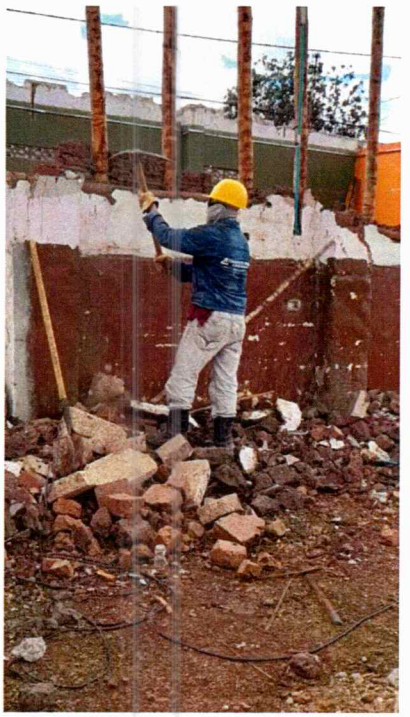

Demolición antigua biblioteca municipal



Demolición zona de descargue



Demolición vista general



Demolición de cubierta zona personería



Localización y replanteo con topografía



Localización y replanteo con topografía



Colocación de valla y cerramiento provisional



Cerramiento provisional Calle 4



Excavación manual zona de mercado campesino



Excavación manual zona oficina de operadores turístico



Excavación manual zona de mercado campesino




Excavación mecánica zona de oficinas



Excavación mecánica zona de cárnicos



Sola de limpieza en concreto de 2000 PSI para zapata zona de restaurante

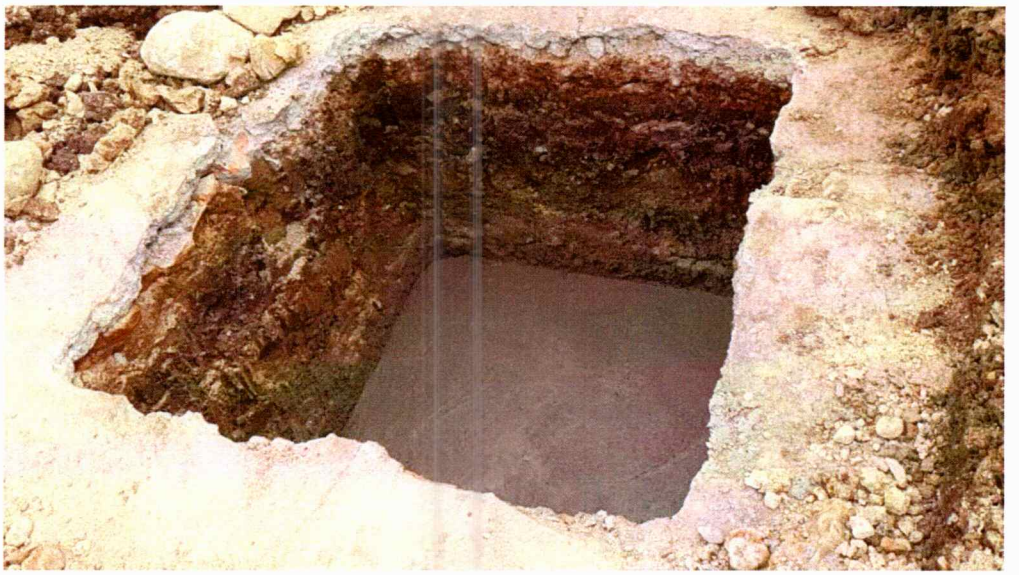

Solado de limpieza en concreto de 2000 PSI para zapata zona de mercado campesino



Acero de refuerzo corrugado 420 Mpa para zapata zona de mercado campesino



Acero de refuerzo corrugado 420 Mpa para zapata en zona de mercado campesino



Fundición de zapata concreto de 3000 PSI en zona de mercado campesino



Zapatas en concreto de 3000 PSI zona de descarga



Solado de limpieza en concreto de 2000 PSI para viga de cimentación




Solado de limpieza en concreto de 2000 PSI para vigas y viguetas de cimentación




Acero de refuerzo de 420 Mpa Para viga de cimentación



Acero de refuerzo de 420 Mpa Para viga de cimentación

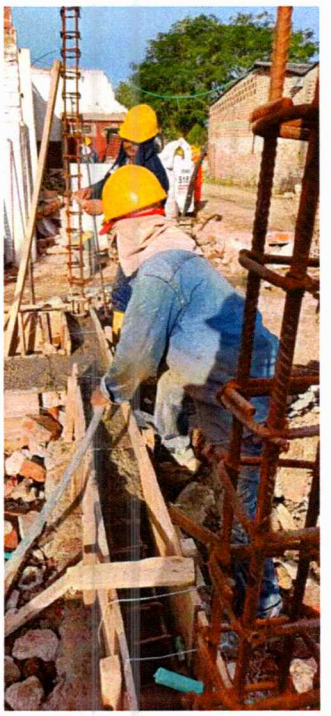

Fundición de vigas de cimentación en concreto de 3000 PSI

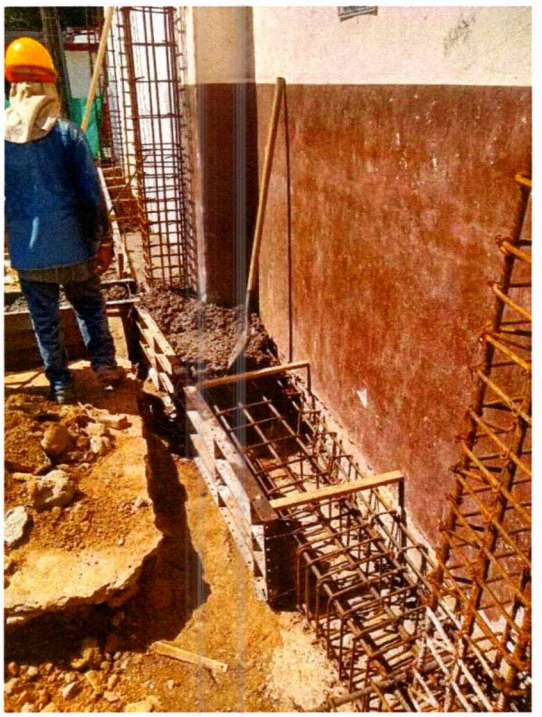

Fundición de vigas de cimentación en concreto de 3000 PSI



Vigas y viguetas de cimentación en concreto de 3000 PSI



Fundición de vigas de cimentación en concreto de 3000 PSI



Relleno en recebo compactado mecánicamente



Relleno en recebo compactado mecánicamente



Compactación de rellenos en recebo



Acero de refuerzo de 420 Mpa para columnas



Acero de refuerzo de 420 Mpa para columnas



Fundición de columnas en concreto de 3000 PSI zona de personería



Columnas en concreto de 3000 PSI




Construcción de muro en ladrillo hueco No.5 en zona de oficinas



Construcción de muro en ladrillo hueco No.5 en zona de cárnicos



Construcción de columna de confinamiento zona de cárnicos

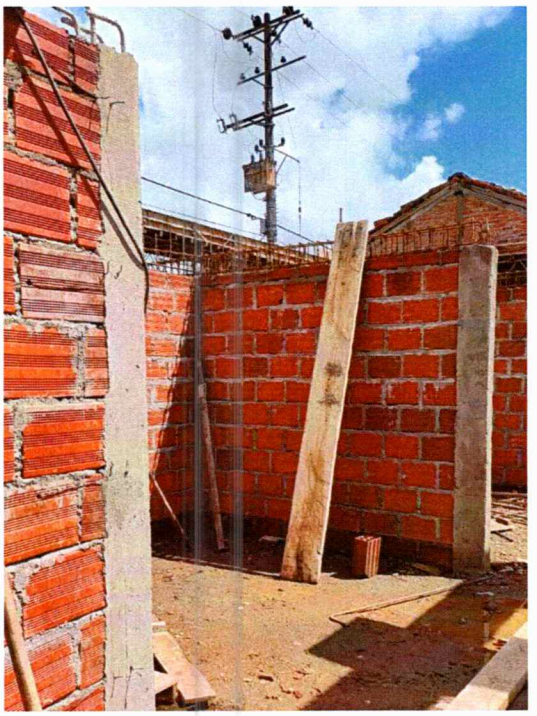


Columnas de confinamiento zona de personería




Acero de refuerzo de 420 Mpa para columnas de confinamiento



Viga aérea de confinamiento zona de personería

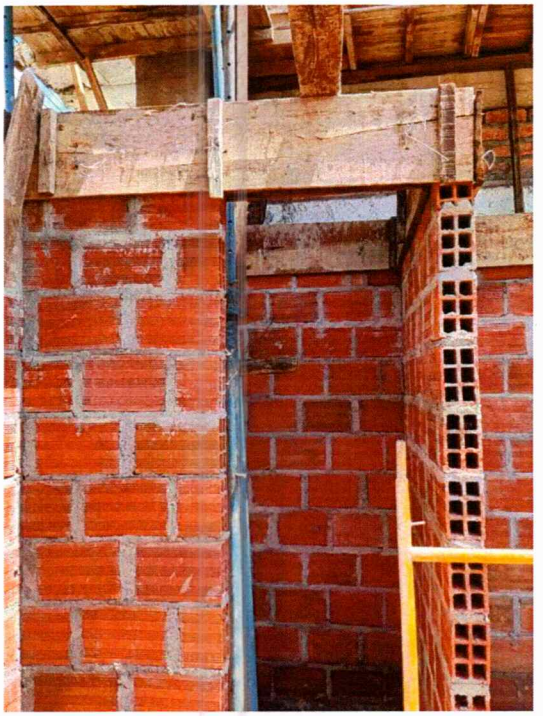

Formaleta para viga aérea de confinamiento zona de oficinas

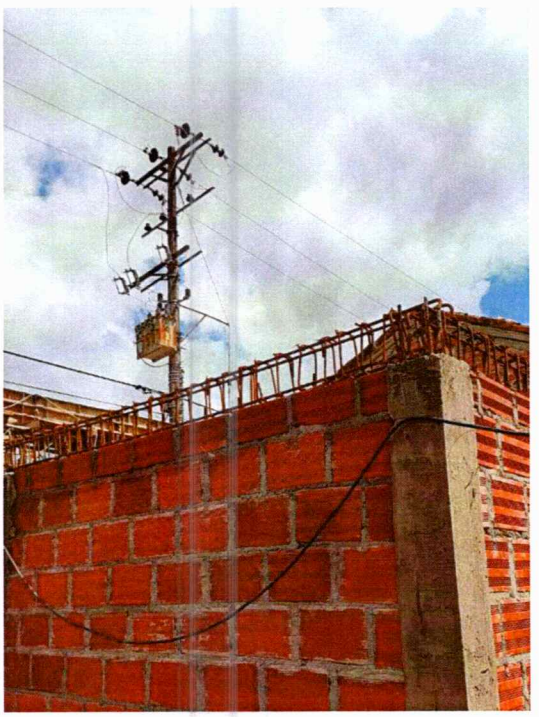

Acero de refuerzo de 420 Mpa para viga aérea de confinamiento



Viga de cubierta zona de mercado campesino




Vigas de cubierta vista zona de fachada y mercado campesino



Acero de refuerzo de 420 Mpa para viga aérea de cubierta

FOTO VALLA DEL PROYECTO

REGISTRO FOTOGRÁFICO

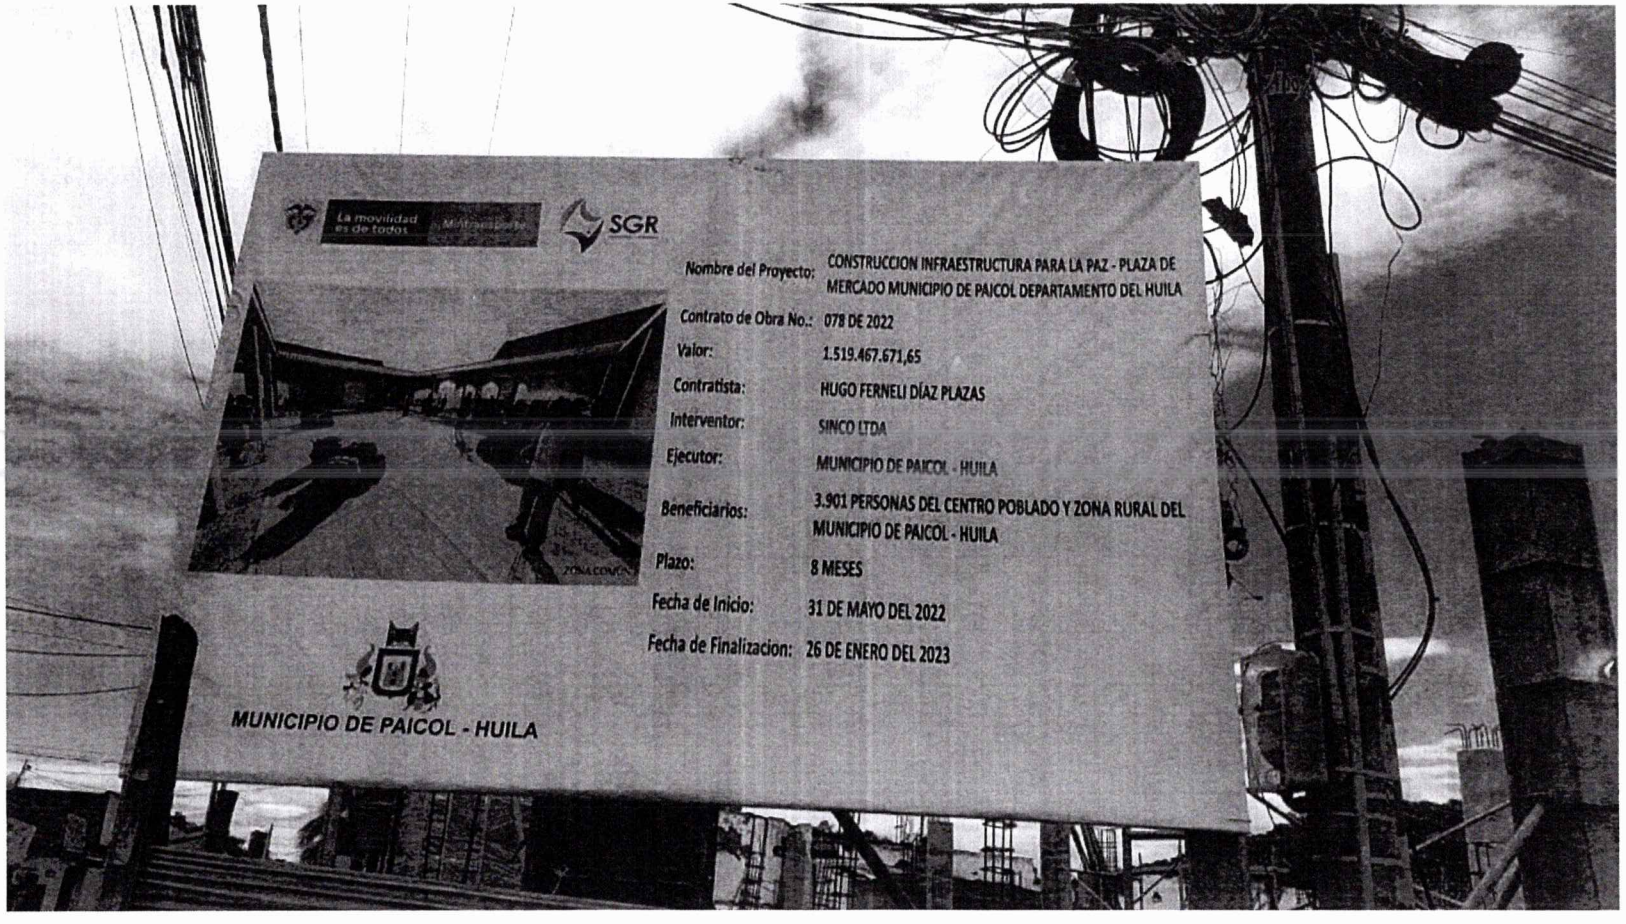

Valla alusiva al proyecto

ENSAYOS DE LABORATORIO

Servi.Lab Ingeniería Laboratorio Suelos - Pavimentos - Concretos - Materiales	RESISTENCIA A LA COMPRESION DE CILINDROS DE CONCRETO NORMA DE ENSAYO INV E - 410	LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD VERSION CODIGO

CLIENTE	HUGO FERNELI DÍAZ PLAZAS	ORDEN DE SERVICIO	SL-046-2021
PROYECTO	CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA PARA LA PAZ, PLAZA DE MERCADO MUNICIPIO DE PAICOL	FECHA REPORTE	AGOSTO 24-2022
LOCALIZACION	PAICOL - HUILA		SEPTIEMBRE 07-2022

RESULTADOS DE LABORATORIO

MUESTRA No.	LOCALIZACION	SLUMP	RC DISEÑO	FECHA		EDAD ROTURA (DÍAS)	FUERZA KN	DIAMETRO cm	RESISTENCIA A LA COMPRESION - PSI			
			P.S.I.	TOMA	ROTURA				OBTENIDA	PROMEDIO	% REFERIDA DISEÑO	PROYECTADA 28 dias
1	ZONA ZAPATAS E3		3000	10-ago-22	17-ago-22	7	358,2	15,10	2.901	2.901	96,7	4144
2	ZONA ZAPATAS E3		3000	10-ago-22	24-ago-22	14	455,1	15,35	3.567	3.567	118,9	4050
3	ZONA ZAPATAS E3		3000	10-ago-22	7-sep-22	28	534,9	15,45	4.138			4138
4	ZONA ZAPATAS E3		3000	10-ago-22	7-sep-22	28	554,9	15,45	4.293	4.216	140,5	4293
OBSERV.:	LAS MUESTRAS (CILINDROS) SON TOMADOS, CURADOS Y TRANSPORTADOS AL LABORATORIO POR EL CLIENTE											

Los resultados de los ensayos de laboratorio que se presentan en este informe, solo son aplicables a las muestras procesadas.

Las muestras son tomadas, transportadas y curadas por	
Cliente	X
Servi. Lab Ingenieria	

REVISA

GEOT. JOSE HERNEY SOLARTE SOLARTE
MAT. 1951600199CAU

Servi.Lab Ingeniería Laboratorio Suelos - Pavimentos - Concretos - Materiales	RESISTENCIA A LA COMPRESION DE CILINDROS DE CONCRETO NORMA DE ENSAYO INV E - 410	LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD VERSION CODIGO

CLIENTE **HUGO FERNELI DÍAZ PLAZAS** — ORDEN DE SERVICIO **SL-046-2021**

PROYECTO CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA PARA LA PAZ, PLAZA DE MERCADO MUNICIPIO DE PAICOL — FECHA REPORTE **AGOSTO 25-2022**

LOCALIZACION **PAICOL - HUILA** — **SEPTIEMBRE 08-2022**

RESULTADOS DE LABORATORIO

MUESTRA No.	LOCALIZACION	SLUMP	RC DISEÑO P.S.I.	FECHA TOMA	FECHA ROTURA	EDAD ROTURA (DIAS)	FUERZA KN	DIAMETRO cm	RESISTENCIA A LA COMPRESION - PSI OBTENIDA	PROMEDIO	% REFERIDA DISEÑO	PROYECTADA 28 dias
5	**ZONA ZAPATAS C3**		3000	11-ago-22	18-ago-22	7	336,7	15,50	2.588	**2.588**	86,3	3697
6	ZONA ZAPATAS C3		3000	11-ago-22	25-ago-22	14	436,7	15,50	3.357	**3.357**	111,9	3812
7	ZONA ZAPATAS C3		3000	11-ago-22	8-sep-22	28	493,7	15,40	3.844			3844
8	ZONA ZAPATAS C3		3000	11-ago-22	8-sep-22	28	502,6	15,35	3.939	**3.892**	129,7	3939

OBSERV.: **LAS MUESTRAS (CILINDROS) SON TOMADOS, CURADOS Y TRANSPORTADOS AL LABORATORIO POR EL CLIENTE**

Los resultados de los ensayos de laboratorio que se presentan en este informe, solo son aplicables a las muestras procesadas.

Las muestras son tomadas, transportadas y curadas por Cliente: X
Servi. Lab Ingeniería:

REVISA

GEOT. JOSE HERNEY SOLARTE SOLARTE
MAT. 1951600199CAU

Laboratorio Carrera 2 A No. 1 - 47 / Cel. 3123705819
email:johesos@hotmail.com Neiva - Huila

Servi.Lab Ingeniería Laboratorio Suelos - Pavimentos - Concretos - Materiales	RESISTENCIA A LA COMPRESION DE CILINDROS DE CONCRETO NORMA DE ENSAYO INV E - 410	LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD VERSION CODIGO

CLIENTE **HUGO FERNELI DÍAZ PLAZAS** — ORDEN DE SERVICIO **SL-046-2022**

PROYECTO CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA PARA LA PAZ, PLAZA DE MERCADO MUNICIPIO DE PAICOL — FECHA REPORTE **OCTUBRE 06 - 2022**

LOCALIZACION **PAICOL - HUILA** — **OCTUBRE 20 - 2022**

RESULTADOS DE LABORATORIO

MUESTRA No.	LOCALIZACION	SLUMP	RC DISEÑO P.S.I.	FECHA TOMA	FECHA ROTURA	EDAD ROTURA (DÍAS)	FUERZA KN	DIAMETRO cm	RESISTENCIA A LA COMPRESION - PSI OBTENIDA	PROMEDIO	% REFERIDA DISEÑO	PROYECTADA 28 dias
17	VC EJE AC (1-3)		3000	22-sep-22	6-oct-22	14	404,5	15,50	3.109			3531
18	VC EJE AC (1-3)		3000	22-sep-22	6-oct-22	14	383,9	15,25	3.048	3.079	102,6	3462
19	VC EJE AC (1-3)		3000	22-sep-22	20-oct-22	28	467,9	15,40	3.643			3643
20	VC EJE AC (1-3)		3000	22-sep-22	20-oct-22	28	450,5	15,20	3.601	3.622	120,7	3601

OBSERV.: **LAS MUESTRAS (CILINDROS) SON TOMADOS, CURADOS Y TRANSPORTADOS AL LABORATORIO POR EL CLIENTE**

Los resultados de los ensayos de laboratorio que se presentan en este informe, solo son aplicables a las muestras procesadas.

Las muestras son tomadas, transportadas y curadas por Cliente: [ ] Servi. Lab Ingenieria: [X]

REVISA

GEOT. JOSE HERNEY SOLARTE SOLARTE
MAT. 1951600199CAU

Laboratorio Carrera 2 A No. 1 - 47 / Cel. 3123705819
email:johesos@hotmail.com Neiva - Huila

Servi.Lab Ingeniería Laboratorio — Suelos - Pavimentos - Concretos - Materiales	RESISTENCIA A LA COMPRESION DE CILINDROS DE CONCRETO NORMA DE ENSAYO INV E - 410	LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD VERSION CODIGO

CLIENTE **HUGO FERNELI DÍAZ PLAZAS** — ORDEN DE SERVICIO **SL-046-2022**

PROYECTO CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA PARA LA PAZ, PLAZA DE MERCADO MUNICIPIO DE PAICOL — FECHA REPORTE **OCTUBRE 07 - 2022**

LOCALIZACION **PAICOL - HUILA** — **OCTUBRE 21 - 2022**

RESULTADOS DE LABORATORIO

MUESTRA No.	LOCALIZACION	SLUMP	RC DISEÑO P.S.I.	FECHA TOMA	FECHA ROTURA	EDAD ROTURA (DÍAS)	FUERZA KN	DIAMETRO cm	RESISTENCIA A LA COMPRESION - PSI OBTENIDA	PROMEDIO	% REFERIDA DISEÑO	PROYECTADA 28 dias
21	VC EJE 1 (C-D)		3000	23-sep-22	7-oct-22	14	340,9	15,25	2.707			3074
22	VC EJE 1 (C-D)		3000	23-sep-22	7-oct-22	14	389,5	15,30	3.073	2.890	96,3	3489
23	VC EJE 1 (C-D)		3000	23-sep-22	21-oct-22	28	416,9	15,25	3.310			3310
24	VC EJE 1 (C-D)		3000	23-sep-22	21-oct-22	28	435,9	15,50	3.351	3.330	111,0	3351

OBSERV.: **LAS MUESTRAS (CILINDROS) SON TOMADOS, CURADOS Y TRANSPORTADOS AL LABORATORIO POR EL CLIENTE**

Los resultados de los ensayos de laboratorio que se presentan en este informe, solo son aplicables a las muestras procesadas.

Las muestras son tomadas, transportadas y curadas por Cliente	
Servi. Lab Ingeniería	X

REVISA

GEOT. JOSE HERNEY SOLARTE SOLARTE
MAT. 1951600199CAU

Servi.Lab Ingeniería Laboratorio *Suelos - Pavimentos - Concretos - Materiales*	RESISTENCIA A LA COMPRESION DE CILINDROS DE CONCRETO NORMA DE ENSAYO INV E - 410	LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD VERSION CODIGO

CLIENTE **HUGO FERNELI DÍAZ PLAZAS** — ORDEN DE SERVICIO **SL-046-2022**

PROYECTO CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA PARA LA PAZ, PLAZA DE MERCADO MUNICIPIO DE PAICOL — FECHA REPORTE **OCTUBRE 10 - 2022**

LOCALIZACION **PAICOL - HUILA**

RESULTADOS DE LABORATORIO

MUESTRA No.	LOCALIZACION	SLUMP	RC DISEÑO P.S.I.	FECHA TOMA	FECHA ROTURA	EDAD ROTURA (DÍAS)	FUERZA KN	DIAMETRO cm	RESISTENCIA A LA COMPRESION - PSI OBTENIDA	PROMEDIO	% REFERIDA DISEÑO	PROYECTADA 28 dias
25	COLUMNA 1 EJE A		3000	26-sep-22	10-oct-22	14	342,1	15,20	2.734			3105
26	COLUMNA 1 EJE A		3000	26-sep-22	10-oct-22	14	352,2	15,20	2.815	2.775	92,5	3197
27	COLUMNA 1 EJE A		3000	26-sep-22	24-oct-22	28						
28	COLUMNA 1 EJE A		3000	26-sep-22	24-oct-22	28						

OBSERV.: **LAS MUESTRAS (CILINDROS) SON TOMADOS, CURADOS Y TRANSPORTADOS AL LABORATORIO POR EL CLIENTE**

Los resultados de los ensayos de laboratorio que se presentan en este informe, solo son aplicables a las muestras procesadas.

Las muestras son tomadas, transportadas y curadas por
Cliente — X
Servi. Lab Ingenieria

REVISA

GEOT. JOSE HERNEY SOLARTE SOLARTE
MAT. 1951600199CAU

Servi.Lab Ingeniería Laboratorio Suelos - Pavimentos - Concretos - Materiales	RESISTENCIA A LA COMPRESION DE CILINDROS DE CONCRETO NORMA DE ENSAYO INV E - 410	LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD VERSION CODIGO

CLIENTE **HUGO FERNELI DÍAZ PLAZAS** — ORDEN DE SERVICIO **SL-046-2022**

PROYECTO CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA PARA LA PAZ, PLAZA DE MERCADO MUNICIPIO DE PAICOL — FECHA REPORTE **OCTUBRE 06 - 2022**

LOCALIZACION **PAICOL - HUILA**

RESULTADOS DE LABORATORIO

MUESTRA No.	LOCALIZACION	SLUMP	RC DISEÑO P.S.I.	FECHA TOMA	FECHA ROTURA	EDAD ROTURA (DÍAS)	FUERZA KN	DIAMETRO cm	RESISTENCIA A LA COMPRESION - PSI OBTENIDA	PROMEDIO	% REFERIDA DISEÑO	PROYECTADA 28 dias
29	**COLUMNA 2 EJE A**		3000	28-sep-22	6-oct-22	8	380,9	15,45	2.947	**2.947**	98,2	3890
30	COLUMNA 2 EJE A		3000	28-sep-22	12-oct-22	14	452,3	15,45	3.499	**3.499**	116,6	3974
31	COLUMNA 2 EJE A		3000	28-sep-22	26-oct-22	28						
32	COLUMNA 2 EJE A		3000	28-sep-22	26-oct-22	28						

OBSERV.: **LAS MUESTRAS (CILINDROS) SON TOMADOS, CURADOS Y TRANSPORTADOS AL LABORATORIO POR EL CLIENTE**

Los resultados de los ensayos de laboratorio que se presentan en este informe, solo son aplicables a las muestras procesadas.

Las muestras son tomadas, transportadas y curadas por Cliente	
Servi. Lab Ingenieria	X

REVISA

GEOT. JOSE HERNEY SOLARTE SOLARTE
MAT. 1951600199CAU

Servi.Lab Ingeniería Laboratorio Suelos - Pavimentos - Concretos - Materiales	RESISTENCIA A LA COMPRESION DE CILINDROS DE CONCRETO NORMA DE ENSAYO INV E - 410	LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD VERSION CODIGO

CLIENTE **HUGO FERNELI DÍAZ PLAZAS** — ORDEN DE SERVICIO **SL-046-2022**

PROYECTO CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA PARA LA PAZ, PLAZA DE MERCADO MUNICIPIO DE PAICOL — FECHA REPORTE **OCTUBRE 18 - 2022**

LOCALIZACION **PAICOL - HUILA**

RESULTADOS DE LABORATORIO

MUESTRA No.	LOCALIZACION	SLUMP	RC DISEÑO P.S.I.	FECHA TOMA	FECHA ROTURA	EDAD ROTURA (DÍAS)	FUERZA KN	DIAMETRO cm	RESISTENCIA A LA COMPRESION - PSI OBTENIDA	PROMEDIO	% REFERIDA DISEÑO	PROYECTADA 28 días
33	COLUMNA 6 EJE H		3000	4-oct-22	18-oct-22	14	527,4	15,30	4.161	4.161	138,7	4725
34	COLUMNA 6 EJE H		3000	4-oct-22	1-nov-22	28						
35	COLUMNA 6 EJE H		3000	4-oct-22	1-nov-22	28						

OBSERV.: **LAS MUESTRAS (CILINDROS) SON TOMADOS, CURADOS Y TRANSPORTADOS AL LABORATORIO POR EL CLIENTE**

Los resultados de los ensayos de laboratorio que se presentan en este informe, solo son aplicables a las muestras procesadas.

Las muestras son tomadas, transportadas y curadas por Cliente: X
Servi. Lab Ingenieria:

REVISA

GEOT. JOSE HERNEY SOLARTE SOLARTE
MAT. 1951600199CAU

Servi.Lab Ingeniería Laboratorio — Suelos - Pavimentos - Concretos - Materiales	RESISTENCIA A LA COMPRESION DE CILINDROS DE CONCRETO NORMA DE ENSAYO INV E - 410	LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD VERSION CODIGO

CLIENTE **HUGO FERNELI DÍAZ PLAZAS** — ORDEN DE SERVICIO **SL-046-2022**

PROYECTO CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA PARA LA PAZ, PLAZA DE MERCADO MUNICIPIO DE PAICOL — FECHA REPORTE **OCTUBRE 18 - 2022**

LOCALIZACION **PAICOL - HUILA**

RESULTADOS DE LABORATORIO

MUESTRA No.	LOCALIZACION	SLUMP	RC DISEÑO P.S.I.	FECHA TOMA	FECHA ROTURA	EDAD ROTURA (DÍAS)	FUERZA KN	DIAMETRO cm	RESISTENCIA A LA COMPRESION - PSI OBTENIDA	PROMEDIO	% REFERIDA DISEÑO	PROYECTADA 28 dias
36	**VIGA E EJES (7-9)**		**3000**	11-oct-22	18-oct-22	7	**306,7**	15,30	**2.419**	**2.419**	80,6	3456
37	VIGA E EJES (7-9)		**3000**	11-oct-22	25-oct-22	14						
38	VIGA E EJES (7-9)		**3000**	11-oct-22	8-nov-22	28						

OBSERV.: **LAS MUESTRAS (CILINDROS) SON TOMADOS, CURADOS Y TRANSPORTADOS AL LABORATORIO POR EL CLIENTE**

Los resultados de los ensayos de laboratorio que se presentan en este informe, solo son aplicables a las muestras procesadas.

Las muestras son tomadas, transportadas y curadas por Cliente: X
Servi. Lab Ingeniería:

REVISA

GEOT. JOSE HERNEY SOLARTE SOLARTE
MAT. 1951600199CAU

BITÁCORA

BITÁCORA DE OBRA

CONTRATO 078 DE 2022 PARA LA "CONSTRUCCIÓN INFRAESTRUCTURA PARA LA PAZ - PLAZA DE MERCADO MUNICIPIO DE PAICOL DEPARTAMENTO DEL HUILA".

DIA: Marzo 09 /22
ACTIVIDADES: Se firma el día de hoy el contrato de obra 078/22 entre el Municipio de Paicol y el ingeniero Hugo ferneli Diaz Plazas.

DIA: Marzo 23 /22
ACTIVIDADES: se firma el día de hoy el contrato de interventoría 080/22 entre el Municipio de Paicol y la firma consultora SINCO LTDA.

DIA: Abril 27 /22
ACTIVIDADES: Se convoca el día de hoy a las partes involucradas y personas interesadas, para hacer la socialización del proyecto el próximo miercoles 4 mayo /22

DIA: Miércoles 04 Mayo /22
ACTIVIDADES: El día de hoy en horas de la mañana, se realiza en las instalaciones de la alcaldía municipal de Paicol, la socialización para informar el alcance del proyecto de construcción de la plaza de mercado. Asiste el contratista de obra, interventor, alcalde municipal, secretaria de planeación y obras públicas, concejales, vendedores que actualmente están ubicados en plaza de mercado existente,

responsables de patrimonio por parte del Municipio de Paicol, personero municipal y comunidad en general. El alcalde hace la introducción de la socialización explicando la importancia del proyecto para el desarrollo del Municipio. Seguido se hace una exposición por parte del ingeniero Carlos Ruiz por la interventoría, explicando detalladamente el alcance definido para el proyecto. Al final se tratan las inquietudes que manifestaron las personas de la comunidad que asistieron a la socialización.
Se deja el compromiso por parte del Municipio di Paicol para reubicar a los vendedores qué actualmente están haciendo uso de las instalaciones de la plaza de mercado existente, en un plazo de 2 a 3 semanas. Serán reubicadas así mismo la biblioteca y personería municipal.

DIA: Mártes 31 mayo /22
ACTIVIDADES: Se suscribe el día de hoy el acta de inicio del contrato de obra 078/22. El ingeniero contratista procede a la actualización de las pólizas respectivas. Se inician inmediatamente los trámites para hacer el desembolso del anticipo, con la obtención de la información necesaria que será enviada a la fiduciaria para la apertura y elaboración de contrato mediante el cual serán manejados dichos fondos.
Se hace revisión de forma conjunta entre contratista e interventor, de todo la información relacionada con el proyecto: diseños, planos,

presupuesto, especificaciones, etc...

RESIDENTE OBRA

DIA: Miércoles 01 Junio /22

ACTIVIDADES: Sigue haciéndose revisión de planos de diseño y memorias de diseño del proyecto.

RESIDENTE OBRA

DIA: Jueves 02 Junio /22

ACTIVIDADES: El día de hoy se expiden las pólizas actualizadas por acta de inicio concernientes al contrato de obra. Se llevan a aprobación del Municipio luego de su envío a Municipio de Paicol por medio de la plataforma SECOP II. Sigue la revisión de los planos de diseño.

RESIDENTE OBRA

DIA: Viernes 03 Junio /22

ACTIVIDADES: Siguen las actividades de revisión de planos de diseño y memorias de cálculo. Se encuentran inconsistencias entre las medidas que se relacionan en plano arquitectónico y plano de localización. Se identifica en plano arquitectónico un espacio destinado para cuarto frío que no fue contratado. Se identifican divisiones en acero inoxidable para la zona de batería sanitaria, y que no está dentro del presupuesto contratado. Hay una inconsistencia en plano eléctrico por cuanto existen unos

Componentes para la red eléctrica que son monofásicos, mientras que otros son trifilares, requiriéndose hacer la aclaración para que se maneje un solo tipo. Se consulta cómo se procederá con la estructura para cubierta debido a que la misma fue diseñada con perfiles en cajón tipo 2P que no se consiguen en el mercado debido a la escacez de material que se viene presentando en el territorio nacional por causa del impacto que se viene sintiendo a nivel mundial por la pandemia de COVID-19 y por la crisis de contenedores. Misma situación se presenta con los pisos en cerámica contratados, pues fueron muy específicos al momento de hacer la descripción de cada ítem, y consultado en el mercado, se encuentra que la mayoría de estos pisos están actualmente agotados o se encuentra descontinuada su producción. Para estos 2 últimos casos, se obtiene una certificación de ferretería que da cuenta de la escacez de estos materiales por causa del coletazo producto de la pandemia por COVID-19 y por la consiguiente crisis de los contenedores. Se decide que se hará rediseño de la estructura de cubierta considerando el empleo de material disponible en el mercado local y cumpliendo la norma sismo resistente vigente para ese efecto. Para el caso de los pisos cerámicos, será propuesto su cambio por las razones expuestas, mediante la presentación de un balance de obra que se empezará a elaborar. Se hace entrega de la plaza de mercado para poder hacer el inicio físico de las actividades de construcción.


RESIDENTE OBRA

DIA: Lunes 06 Junio /22
CLIMA: Parcialmente soleado
ACTIVIDADES: El día de hoy se inicia en terreno con las actividades físicas de construcción que fueron contratadas para la nueva plaza de mercado. Se hace el cerramiento con tela verde en la zona adyacente a la carrera 6 y calle 4. L.
Se inicia con las actividades de desmonte de la teja existente en barro, actividad para la cual se debe tener especial cuidado, pues se busca reutilizar la mayor cantidad de teja para ser reinstalada en la cubierta de la nueva plaza de mercado.
El contratista ingeniero Hugo Ferneli Diaz Plazas dispone en terreno de personal previamente afiliado porque se encontraba laborando en otra obra bajo la misma razón social con la que hizo el contrato 078/22. Este personal lo compone el maestro general Héctor Rivera, el oficial Aldemar Tovar Fernández, Jaime Enrique Bautista, Aurelio Cachaya y Jhon Jairo Andrade. Se están haciendo los trámites de afiliación del personal que reside en el Municipio de Paicol para cumplimiento con el compromiso de contratar mano de obra local.
El Municipio de Paicol facilita un espacio en instalaciones de alcaldía para hacer almacenaje de tejas recuperadas que se reutilizarán.

RESIDENTE OBRA

DIA: Martes 07 Junio /22
CLIMA: Soleado
ACTIVIDADES: Hoy se incrementa el personal de obra con el ingreso de trabajadores que previamente fueron afiliados por el contratista a seguridad social y a quienes además se les efectuó su respectivo examen de ingreso. Este personal nuevo lo conforman Hiriana Marcela Chantre Camero, Elian Aldair Ochoa Erazo, Carlos Alberto Cabrera Camacho y Humberto Bautista Perdomo.
Siguen las actividades de desmonte de teja de barro de cubierta existente, siendo muy bajo el rendimiento por el cuidado que se debe tener para no romper las tejas y recuperar así la mayor cantidad posible.
Se hace modificación de planos y diseños eléctricos dejando todo el sistema trifilar, por lo cual se cambia el tipo de transformador y acometida entre otros. Se le solicita información al Municipio de Paicol para cumplir con trámite de radicación de planos eléctricos ante la Electrificadora del Huila, pero no encontramos que no ha sido expedida la correspondiente licencia de construcción.

RESIDENTE OBRA



DIA: Miércoles 08 Junio /22
CLIMA: parcialmente soleado
ACTIVIDADES: Continúa haciéndose las actividades de desmonte de la teja de barro existente.
Se obtienen los diseños de mezclas para los

concretos de 2000 PSI, 3.000 p.s.i y 3500 PSI; para los cuales será empleado material de planta trituradora MASSEQ, se obtienen también los documentos, licencias y permisos ambientales de la planta MASSEQ para poder hacer explotación de material pétreo.
Sigue tramitándose el anticipo, pero hay demoras en el Municipio de Paicol para el diligenciamiento de formatos que exige la fiduciaria Bancolombia que eligió el contratista para este fin.

RESIDENTE OBRA

DIA: Jueves 09 junio /22
CLIMA: Parcialmente soleado
ACTIVIDADES: se sigue haciendo el desmonte de la teja de barro existente de la plaza de mercado, en costado oriente junto a la carrera 6.


RESIDENTE OBRA

DIA: Viernes 10 junio /22
CLIMA: Nubado
ACTIVIDADES: Se siguen desmontando las tejas de barro de cubierta existente, para lo cual se tiene especial cuidado de no ir a romper estas tejas y por lo cual se tiene un muy bajo rendimiento. se hace desmonte por el costado oriente.

RESIDENTE OBRA


SABADO: 11 junio /22
CLIMA: Nubado con lluvias ligeras
ACTIVIDADES: Se viene terminando de desmontar la teja sobre el costado oriental y se inicia esta actividad por el costado norte.

RESIDENTE OBRA




DIA: Lunes 13 junio /22
CLIMA: Parcialmente nubado
ACTIVIDADES: Sigue haciéndose el desmonte de teja de barro por el costado norte de la plaza de mercado existente.

RESIDENTE OBRA



DIA: Martes 14 junio /22
CLIMA: Nubado
ACTIVIDADES: Viene haciéndose desmonte de teja de barro por el costado occidental, con un rendimiento bajo, razón por la cual hoy se ingresa a dos trabajadores Kenn Nicolás Mallonado Ruiz y Luis Fernando Berjan Menza, quienes se encuentran debidamente afiliados y a quienes como al igual que a todos, se les hace entrega de elementos para protección personal. Se emplea un minicargador Botcat para el traslado cuidadosamente de las tejas recuperadas y que son ubicadas dentro de un lote adyunto perteneciente al Municipio de Paicol.

RESIDENTE OBRA



DIA: Miércoles 15 junio /22
CLIMA: Soleado
ACTIVIDADES: Sigue el desmonte de tejas en barro por el costado occidental de la plaza de mercado.

RESIDENTE OBRA

DIA: Jueves 16 junio /22
CLIMA: parcialmente soleado
ACTIVIDADES: Viene terminándose de hacer desmonte de teja de barro por el costado occidental y se inicia esta actividad por costado sur junto calle 4, se hace el ingreso de un nuevo trabajador Jorge Andrés Cardozo Cadena para aumentar el rendimiento de la actividad de desmonte de teja.

RESIDENTE OBRA

DIA: Viernes 17 junio /22
CLIMA: parcialmente soleado
ACTIVIDADES: Sigue haciéndose el desmonte de las tejas de barro en el costado sur de la plaza de mercado. Se tramite cuenta de cobro del anticipo correspondiente al contrato de obra y por medio de la plataforma del SECOP II.

RESIDENTE OBRA

DIA: Sábado 18 junio 122
CLIMA: Parcialmente soleado
ACTIVIDADES: Sigue haciéndose el desmonte de las tejas de barro y con ello la actividad de revisión minuciosa para su recuperación.

RESIDENTE OBRA

DIA: Mártes 21 junio 122
CLIMA: Parcialmente nubado
ACTIVIDADES: finaliza la actividad de desmonte de tejas de barro, las cuales fueron revisadas, y las tejas en buen estado fueron limpiadas y trasladadas a un lote adyacente donde fueron cuidadosamente almacenadas.
Se inicia hoy la actividad de desmonte de estructura de cubierta, que está conformada por madera que mayormente está en mal estado, por lo cual se regirá a la comunidad previa autorización de la alcaldía de Paicol, mientras que se conserva la madera que se encuentra en óptimo estado. Algunas personas presentan queja a la alcaldía, pero se les aclara que no se conservará la madera que se encuentre en mal estado, sino que se regalará a las personas que la llegue a necesitar, mientras que se almacenará la madera que se encuentre en mejor estado, aunque al contratista de obra no se haya contratado para hacer este tipo de actividad, salvo en el caso de la teja de barro

razón por la cual se sigue teniendo un bajo rendimiento en el desarrollo de las actividades preliminares.
Además surge de momento otra dificultad porque el municipio de Paicol no dispone de un espacio para almacenar la madera recuperada de la estructura de cubierta, lo que afecta el desarrollo de actividades del contratista por cuanto dicha madera ocupa espacio en el interior de la plaza de mercado. Así mismo, estamos a la espera de que la alcaldía retire un cemento que actualmente tiene almacenada en un costado de la plaza de mercado, lo que también incide en las actividades preliminares que se vienen haciendo.

RESIDENTE OBRA

DIA: Miércoles 22 Junio /22
CLIMA: Nubado. llovizna en la mañana
ACTIVIDADES: Siguen haciéndose las actividades de desmonte de madera y demas que compone la estructura de cubierta existente de plaza de mercado.
Viene identificándose que los muros perimetrales de la plaza de mercado son en ladrillo y no en adobe o tierra armada como se manifestaba en principio. El contratista sigue esperando que sean desembolsado los fondos del anticipo para ir adquiriendo materia-

les para la obra, pues estos siguen encareciéndose cada vez más y en la actualidad algunos superan los valores que fueron inicialmente contratados

RESIDENTE OBRA

DIA: Jueves 23 junio /22
CLIMA: Nubado
ACTIVIDADES: Viene haciéndose demolición de mesones en zona que anteriormente se usó para comercialización de cerámicas. Así mismo sigue haciéndose desmonte de estructura de cubierta en madera, procurando rescatar la madera que se encuentra en buen estado pese a que al contratista no se le contrató para hacer esto ni se contempló hacer esto dentro de la programación de obra, lo que ha incidido en la ejecución y su rendimiento.

RESIDENTE OBRA

DIA: Viernes 24 junio /22
CLIMA: Parcialmente nubado
ACTIVIDADES: Siguen las actividades de demolición de mesones y retiro de madera que compone estructura de cubierta. El contratista le hace entrega al municipio de Paicol a través de sus funcionarios, de materiales recuperables que salen tras las actividades preliminares de desmonte y demolición y que consisten en tubería metálica, malla cerramiento, cableado eléctrico y

aparatos varios

RESIDENTE OBRA

DIA: Sábado 25 Junio /22 .
CLIMA: Parcialmente Soleado
ACTIVIDADES: Siguen haciéndose actividades preliminares de desmonte y demoliciones varias. Al día de hoy, el contratista sigue esperando que le hagan el desembolso de los recursos del anticipo.

RESIDENTE OBRA

DIA: Mártes 28 Junio /22 .
CLIMA: Parcialmente soleado
ACTIVIDADES: Sigue realizándose la actividad de desmonte de madera que conformaba la estructura de cubierta de la plaza de mercado. Se sigue trabajando a un bajo rendimiento por el cuidado que se debe tener para no afectar muros de perímetro, por el proceso de selección de madera y por los puentes festivos que se tienen con la llegada de las fiestas de San Pedro que se vienen desarrollando a lo largo de todo el territorio huilense.

RESIDENTE OBRA

DIA: Miércoles 29 Junio /22
CLIMA: Parcialmente soleado
ACTIVIDADES: Hoy se hace el desembolso del anticipo, aunque no le han entregado el comprobante de dicha transacción, el que se debe remitir a la fiduciaria para confirmación y para que se pueda empezar a hacer el manejo de estos fondos mediante compra de materiales con destino a la obra de nueva plaza de mercado de paical.
En obra se sigue haciendo demolición de mesones y desmonte de estructura de cubierta. El retiro se viene haciendo hacia algunos lotes de propiedad de personas particulares que previamente han presentado solicitud y autorización escrita para hacer la disposición de este tipo de material.

RESIDENTE OBRA

DIA: Jueves 30 Junio /22
CLIMA: Soleado
ACTIVIDADES: Viene haciéndose demolición de muros internos existentes en zona que anteriormente se destinaba para el funcionamiento de biblioteca y zona ludoteca, conservando únicamente los muros perimetrales de fachada, que no son en adobe como se creía en principio sino en ladrillo tolete cerámico.

RESIDENTE OBRA

DIA: Viernes 01 Julio /22
CLIMA: Parcialmente soleado
ACTIVIDADES: Hoy remiten al contratista la copia de comprobante del desembolso del anticipo para hacer respectivo tramite ante la fiduciaria.
Seguimos esperando que el municipio de Paicol remita la licencia de construcción que debió expedir en la formulación del proyecto de construcción de la nueva plaza de mercado.
En obra se siguen demoliendo los muros internos de la plaza de mercado que existía anteriormente. Se dejan algunos muros sin demoler para darle rigidez a los muros de fachada que serán conservados, mientras se hace la actividad de reforzamiento.

RESIDENTE OBRA

DIA: Sábado 02 Julio /22
CLIMA: Soleado
ACTIVIDADES: Se viene haciendo retiro de material de demolición y desmonte. En obra se siguen haciendo actividades de demolición de muros internos de la zona en la que anteriormente funcionaba la personería y oficina de atención a víctimas.

RESIDENTE OBRA

DIA: Martes 05 julio /22
CLIMA: Soleado
ACTIVIDADES: Llega el acero de refuerzo a la obra, que en su mayoría es figurado. Mientras sigue haciéndose demolición de muros y estructura interna de anterior plaza de mercado, en cubículos de vendedores.
Sigue actividad de retiro de material de demolición, empleando un minicargador botcat y volquetas sencillas.

RESIDENTE OBRA

DIA: Miércoles 06 julio /22
CLIMA: Soleado
ACTIVIDADES: Hoy se le consulta nuevamente al Municipio de Paicol por la licencia de construcción, pero manifiestan que no la han logrado ubicar, ni han empezado aún el trámite para su expedición.
Se dispone en obra de una comisión topográfica para hacer el levantamiento del lote donde será construida la nueva plaza de mercado, con el fin de determinar las medidas que en definitiva quedarán entre ejes, esto debido a que ahora que se tiene gran parte del lote despejado, no hubo coincidencia con las medidas presentadas en planos de distribución arquitectónicos.
Seguimos esperando que la alcaldía de Paicol haga el retiro de varios elementos y materiales que tiene almacenados en un sector de la galería que no se ha podido demoler todavía, situación que viene

causando retrasos al contratista para la ejecución de las actividades preliminares.
Se viene armando las parrillas en acero que serán usadas en la construcción de las zapatas.
Siguen haciéndose actividades de demolición de muros internos de anterior plaza de mercado, a la vez que se sigue retirando con volquetas el material resultante de dicha demolición.

RESIDENTE OBRA

DIA = Jueves 07 Julio 2022
Clima = Soleado
Residente de obra = Ronni Wilmer Perdomo Quiroz
Residente Interventoria = Andrea palomino
Maquinaria y equipo = Bobcat
Actividades = se continuo armando las parrillas en acero que serán usadas en la construcción de las zapatas.
se viene armando los castillos en acero que seran usados en la construccion de columnas.
Se viene figurando Acero para columnetas.
se realizo acopio de escombros.

RESIDENTE OBRA

Dia= viernes 08 Julio 2022
clima= soleado
Residente de obra = Ronni Wilmer Perdomo Quiroz
Residente de Interventoria = Andrea palomino
Coordinador de Interventoria= Julian Moreno
Actividades.- Amarre de parrillas de columnas
*Se solicita certificado de calidad y remisión del acero para su aprobación.
*Se solicita proteger el muro de adobe del eje 1 entre A y B, teniendo especial cuidado con la integridad y estabilidad del mismo
*Se solicita coordinación de la profesional encargada del SST del contratista para alinear información con interventoria. (formatos de asistencia, planillas de afiliación del personal, EPP, etc.)
se suspenden actividades de 1:30 pm a 3:00 PM por motivos de lluvia.


Coordinador Interventoria.

RESIDENTE OBRA

Dia= 09- Julio 2022
clima= parcialmente Nublado
Residente de obra= Ronni wilmer perdomo quiroz
Residente de interventoria= Andrea palomino
Adividades = Amarre de castillos en acero que seran usados en la construccion de


columnas.
se suspenden actividades de 2:19 PM a 3:00 PM por motivos de lluvia.

RESIDENTE OBRA



Dia= 10 Julio 2022.
clima= Nublado.
Residente de obra= Ronni wilmer Perdomo Quiroz
Residente de Interventoria= Andrea palomino
Actividades= Amarre de castillos en acero que seran usados en la construccion de columnas.

RESIDENTE OBRA



Dia 11 Julio 202"
Clima: SOLEADO.
SE OBSERVA AL TRABAJADOR Jho wilmer Vega Vca. con calzado o' no correspondE A OBRA SE SOLICITA REALIZAR CAMBIO RESPECTIVO; LINDAY SISU CAPACITA DICHO CALZADO PERO RECOMIENDA SU CAMBIO PRES. TRABAJO EN ALTURA"
El trabajador Jhon wilmer vega vera tiene calzado con puntera "botas de cuero con punteva.
"Actividades= Amarre de castillos en acero que seran usadas en la construccion de Columnas.

En oficina se vienen haciendo a la par actividades de tipo técnico.

RESIDENTE OBRA

Dia = 12- Julio - 2022
clima = soleado
Residente de obra = Ronni wilmer Perdomo Quiroz
Residente de interventoria = Andrea palomino
Actividades = se continua Amassando castillos para columnas tipo 2
se continua figurando acero para columnetas.

RESIDENTE OBRA

Dia = 13 Julio -2022
clima: soleado
Residente de obra Ronni wilmer Perdomo Quiroz
Residente de interventoria Andrea palomino
Actividades: se continua Amarrando castillos para columnas tipo 2.
se continua figurando acero para columnetas

RESIDENTE OBRA

Dia 14 Julio 2022
clima : soleado
Residente de obra Ronni wilmer perdomo Quiroz
Residente de Interventoria Andrea palomino
Actividades : se finalizo el amarre de castillos en acero para columnas.
amarre de castillos para columnetas.
se continua figurando acero para columnetas.

RESIDENTE OBRA

Dia: 15-julio 2022
clima : en la mañana lluvioso - tarde - soleado
Residente de obra Ronni wilmer perdomo Quiroz
Residente de Interventoria: Andrea palomino
Actividades: Amarre de castillos, se tapo con un plastico negro el acero.
se suspenden Actividades de 8:00 AM a 9:30 AM por lluvia.
A la vez se vienen haciendo labores de tipo técnico en oficina.

RESIDENTE OBRA

Dia = 19 - Julio 2022
clima = Parcialmente Nublado
Residente de obra = Ronni Wilmer Perdomo Quiroz
Residente de Interventoria = Andrea Palomino
Actividades = se continua Amarrando castillos para columnetas.
A su vez se vienen haciendo en oficina ajustes de tipo tecnico por parte de un equipo de profesionales designados entre contratista e interventoria.

RESIDENTE OBRA

Dia = 20 - Julio - 2022
clima = lluvioso . llovio toda la mañana
Residente de obra = Ronni Wilmer Perdomo Quiroz
Residente de Interventoria =
Actividades = se demolio el baño de biblioteca, se realizo el Amarre de columnas de confinamiento. "columnetas".

RESIDENTE OBRA

Dia: 21- Julio 2022 - Jueves
clima: Parcialmente nublado
Residente de obra: Ronni Wilmer Perdomo Quiroz
Residente de Interventoria:
Actividades: En el momento se están desarrollando labores administrativas por causa de ajustes técnicos necesarios de efectuar al proyecto.

RESIDENTE OBRA

DIA: Viernes 22 julio /22
CLIMA: Parcialmente nubado
RESIDENTE OBRA: Ronni W. Perdomo
RESIDENTE INTERVENTORIA:
ACTIVIDADES: Siguen realizándose labores de tipo administrativo y de logistica de materiales.

RESIDENTE OBRA

DIA: Sábado 23 julio 2022
CLIMA: Parcialmente nubado
RESIDENTE OBRA: Ronni W. Perdomo
RESIDENTE INTERVENTORIA:
ACTIVIDADES: Se siguen haciendo actividades de tipo administrativo.

RESIDENTE OBRA

DIA: Lunes 25 julio /22
CLIMA: Parcialmente soleado
RESIDENTE OBRA: Rouni W. Perdomo
RESIDENTE INTERVENTORIA:
ACTIVIDADES: Las actividades a lo largo del día han consistido en la logística de materiales y labores de tipo administrativo necesarias para efectuar ajustes técnicos al proyecto.

RESIDENTE OBRA

DIA: Martes 26 julio /22
CLIMA: Soleado
RESIDENTE OBRA: Rouni W. Perdomo
RESIDENTE INTERVENTORIA:
ACTIVIDADES: Se siguen realizando actividades de tipo técnico y logística materiales.

RESIDENTE OBRA

DIA: Miércoles 27 julio /22
CLIMA: Parcialmente nublado
ACTIVIDADES: El día de hoy se desarrollan labores de tipo técnico y logística de materiales.

RESIDENTE OBRA

DIA: Jueves 27 julio /22
CLIMA: Nublado
ACTIVIDADES: Se siguen haciendo labores de tipo técnico y de logística de materiales.

RESIDENTE OBRA

Fecha: Viernes, 29 de Julio de 2022.
Reunion: Proyecto Plaza de Mercado Paicol - Huila.
Asistentes:
- Aldemar Tovar fernandez - Contramaestro de obra.
- Hiriana Marcela Chontle Camero - Asistente HSE. Contratista.
- Pablo Cesar Arrieta Ramirez - Apoyo Tecnico Oficina de Planeacion alcaldia de Paicol.

Hora: 10:00 a.m.

El dia de hoy se realiza visita por parte de la supervision del proyecto de construccion de la Plaza de mercado del municipio de Paicol al sitio donde se este ejecutando el proyecto, encontrando lo siguiente:

Personal en obra del contratista:
5 ayudantes.
4 oficiales.
1 Operador de minicargador.
1. Asistente HSE.
1. Contramaestro.

Personal de la Interventoria: No se encuentra en obra

Materiales en Obra:
- Acero figurado para estructura de cimentacion, Columnas.
y Vigas. malla electrosoldada.
- 17 bultos de cemento.
- formaleta metalica para estructura.

Equipo en obra:
- 2 mezcladores de 1 bulto.
- 2 minicargadores.
- 1 apisonador Tipo Canguro
- 6 Secciones de andamios.

En el momento de realizar la visita, el personal en obra no se encontraba laborando, manifestando que se encuentran resolviendo algunas dificultades Tecnicas del proyecto.

Pablo Arrieta.
Apoyo Tecnico Alcaldia Paical.

Aldemar Tarazona
CONTRA MAESTRO

Miriana Marcela chamise camero
Asistente HSE

Dia = 01-08-2022
clima = Soleado
Residente de obra = Ronni wilmer perdomo Quiroz
Residente de interventoria = Johan Moreno
Actividades = Replanteo de lote - Demarcacion de zapatas.

RESIDENTE OBRA

Interventoria

Dia = 02-08-2022
clima = Parcialmente Nublado
Residente de obra = Ronni Wilmer Perdomo Quiroz

Residente de interventoria:
Actividades: Replanteo de lotes, escabacion y demarcacion de zapatas. Demolicion de piso de zapatas.

RESIDENTE OBRA

Interventoria


DIA: Miércoles 03 Agosto /22
CLIMA: Parcialmente nublado
RESIDENTE OBRA: Ronni W. Perdomo
RESIDENTE INTERVENTORIA: Johan Moreno
PERSONAL DE OBRA: 1 maestro general, 1 contramaestro, 1 operador, 1 asistente HSE, 4 oficiales y 4 ayudantes.
ACTIVIDADES: Sigue haciendose la demolizión de piso para el inicio de excavación para las zapatas. Así mismo se siguen replanteando los distintos ejes de construcción.

RESIDENTE OBRA


Interventoria

DIA: Jueves 04 Agosto /22
CLIMA: Parcialmente nubado
RESIDENTE OBRA: Ronni W. Perdomo
RESIDENTE INTERVENTORIA:
PERSONAL DE OBRA: 1 maestro general, 1 contramaestro,

1 operador, 1 asistente HSE, 4 oficiales y 4 ayudantes.
ACTIVIDADES: En el día se hace replanteo de ejes, demarcación de área para zapatas, demolición de piso y excavación manual para estructura cimentación tipo zapatas.



DIA: Viernes 05 Agosto /22
CLIMA: Parcialmente soleado
RESIDENTE OBRA: Rouni W. Perdomo
RESIDENTE INTERVENTORIA: Julian Moreno
PERSONAL OBRA: 1 maestro general, 1 contramaestro, 1 operador, 1 asistente HSE, 4 oficiales y 4 ayudantes.
ACTIVIDADES: Viene haciéndose actividad de replanteo de ejes y excavación para la construcción de las zapatas.



DIA: Sábado 06 Agosto /22
CLIMA: Parcialmente soleado
RESIDENTE OBRA: Rouni W. Perdomo
RESIDENTE INTERVENTORIA: Julian Moreno
PERSONAL OBRA: 1 maestro general, 1 contramaestro, 1 operador, 1 asistente HSE, 4 oficiales y 4 ayudantes.
ACTIVIDADES: Sigue realizándose la actividad

de replanteo de ejes y excavación manual para construcción de zapatas. Se retira material RCD sobrante de excavaciones.

RESIDENTE OBRA

Interventoria

DIA: Lunes 08 Agosto /22
CLIMA: Parcialmente soleado
RESIDENTE OBRA: Ronni A. Perdomo
RESIDENTE INTERVENTORIA: Julian Moreno
PERSONAL OBRA: 1 maestro general, 1 contramaestro, 1 operador, 1 asistente HSE, 4 oficiales y 4 ayudantes
ACTIVIDADES: Viene siendo construidos los solados de limpieza para fondo de las zonas donde quedarán las zapatas.

RESIDENTE OBRA

Interventoria

DIA: Martes 09 Agosto /22
CLIMA: Soleado
RESIDENTE OBRA: Ronni A. Perdomo
RESIDENTE INTERVENTORIA: Julian Moreno
PERSONAL OBRA: 1 maestro general, 1 contramaestro, 1 operador; 1 asistente HSE, 4 oficiales y 4 ayudantes
ACTIVIDADES: Sigue realizándose la actividad de construcción de solados de limpieza para las zapatas, en donde a su

vez viene siendo instalado el acero de refuerzo para zapatas y para columnas.

RESIDENTE COBRA


Interventoría


DIA: Miércoles 10 Agosto /22
CLIMA: Parcialmente soleado
RESIDENTE OBRA: Rommel Perdomo
RESIDENTE INTERVENTORIA: Julián Moreno
PERSONAL OBRA: 1 maestro General, 1 contramaestro, 1 operador, 1 asistente HSE 6 oficiales y 5 ayudantes.
ACTIVIDADES: Se empieza la fundición de zapatas, que se ubican en el eje 3. Se hace toma de muestras de concreto para control de calidad y verificación de la resistencia de diseño que para el caso de la zapatas debe ser de 3000 psi. Así mismo se continúa excavando para zapatas del eje A, donde también se hace demolición de piso.
Se hace retiro de material sobrante de las excavaciones a sitio autorizado perteneciente a la empresa MASSER.

Se solicita por parte de interventoría los planos record de lo ejecutado para verificación de ejes y medidas


Se realiza comité de obra junto con la supervisión, la interventoría y el contratista, donde se aclaró la


situación de la obra y se dió respuesta satisfactoria a las solicitudes de interventoría y supervisión.





Dia = 11-Agosto 2022 Jueves
clima: parcialmente soleado
Residente de obra = Ronni wimer perdomo
Residente de Interventoría = Jolan D Moreno
Personal de obra = 1 maestro general, 1 contramaestro, 1 operador, 1 Asistente HSE, 6 oficiales y 5 ayudantes.
Actividades: Fundicion de zapatas eje C y F fundicion de solado de limpieza para zapatas. eje 2 y 4. fundicion de pedestales eje C se realiza toma de muestras de concreto. para control de calidad y verificacion de. Resistencia, se continua escavando para zapatas, se continúa Retirando Material. sobrante de las excavaciones.





Dia = 12 - Agosto 2022 Viernes
Clima: parcialmente soleado
Residente de obra: Ronni wilmer Perdomo Ruiz
Residente de Interventoria: Julian D Moreno
personal de obra: 1 maestro General 1
contramaestro 1 operador 1 Asistente HSE,
6 oficiales, y 5 ayudante.
Actividades: fundición de solados de limpieza
para zapatas., fundicion de pedestales
se continua escabando para zapatas.
Se continua Retirando Material sobrante
de las excavaciones. A partir de hoy no
se labora hasta la próxima debido a las festividades
que se llevan a cabo en el Municipio de Paicol.

Residente obra

Interv. Obra

Dia: 16 - Agosto 2022 - Martes
Clima: soleado
Residente de obra: Ronni Wilmer Ruiz
Residente de Interventoria: Nicolas Davila Rojas - Julian Moreno
personal de obra: 1 Maestro general 1
contramaestro, 1 operador, 1 Asistente Hse
6 oficiales 5 ayudantes.
Actividades: fundicion de pedestales
ubicados en el eje F con ejes 5 y 6
Demoliciones ubicados en el eje 2 con
EJE H, EJE 4 con F, EJE 5 F Y EJE
1 con F, fundicion de 5 zapatas,

2 EJE 4 con EJES A y H, 2 EJE E con EJES 7 y 1, 1 EJE 2 con H, se continua Realizando Excavaciones.

RESIDENTE COBITRA

Interventoría

Dia = 17 de agosto de 2022 - miércoles
Clima: Soleado
Residente de obra: Ronni Wilmer Perdomo
Residente de interventoria: Nicolas Davila Rojas - Julian Moreno
Personal de Obra: 1 maestro general, 1 contramaestro, 1 operador, 1 asistente HSE, 6 oficiales y 7 ayudantes
Actividades: Fundición de 2 zapatas: Eje 5 con Eje H, Eje 1 con eje C.
Demoliciones: Para Columnas: Eje 1 con eje C
Excavacion para zapatas: Eje 7 con eje E, Eje 6 con Eje H y eje 1 con eje 6.
Fundición de 3 Pedestales: Eje 7 con eje F, Eje 1 con eje F y eje 2 con eje H
fundicion de Solados: Eje 5 con Eje A
Se realizan los rellenos de zapatas Compactados mecánicamente
Colocación de acero de refuerzo para zapatas y Columnas
A día de hoy el contratista no ha podido culminar el 100% de las actividades preliminares por cuanto el Municipio de Paicol no ha hecho la entrega de parte de la edificación existente de galería entre los ejes AE y 7-9, sector en donde faltan hacer las actividades de demolición y desmontes, y en donde

además se comienzan a ver retrasos en las actividades de cimentaciones.

RESIDENTE OBRA

Interventoría

Dia = 18 de agosto de 2022 - Jueves
Clima = Soleado
Residente de Obra = Ronni Wilmer Perdomo
Residente interventoría = Nicolas Davila Rojas - Julian Moreno
Personal de Obra = 1 maestro, 1 Contramaestro, 1 Operador, 1 asistente H&E, 6 oficiales y 7 ayudantes
Actividades: Fundición de 3 solados Eje 1 con eje f, eje 7 con eje F y eje 6 con eje H.
Excavación Para Zapatas: Eje 1 con eje f y Eje 1 con D y 3 con A
Fundición de 4 pedestales: Eje 3 con Eje H, Eje 4 con C - Eje 2 con A y Eje 4 con A.
Se inicia la excavación para Viga de cimentación en el eje C entre ejes 3 y 7, Eje 3 entre ejes H y C y Eje 11 entre ejes 3 y 7. Se realizan rellenos de Zapatas Compactados mecánicamente, Se Colocan aceros de refuerzos Para Zapatas y Columnas, Fundición de Zapata en el Eje 3 con eje A.

Interventoría

RESIDENTE OBRA

Dia = 19 de agosto de 2022 - Viernes
Clima: Soleado
Residente de Obra: Ronni Wilmer Perdomo
Residente de interventoría: Nicolas Davila Rojas

Personal de obra: 1 maestro, 1 contramaestro, 1 operador, 1 asistente HSE, 6 oficiales y 7 ayudantes
Actividades: Fundicion solado de limpieza eje E con eje 1.
Excavación para zapatas: Se finalnan las excavaciones para el eje 1 con eje E y Eje 1 con D.
Se Finalizan las excavaciones de zapata en el eje 1 con eje E y D.
Se funden las zapatas del eje 7 con eje E, Eje 5 con A y eje 1 con 6, de igual forma son fundidos los pedestale Ubicados en el eje 3 con eje A, eje 7 con eje E y 1 con 6, Se realizan los rellenos de zapatas compactados mecanicamente.
* La interventoria no permite la excavacion y posterior Fundicion de viga de arrastre en la carrera A y calle 6 (Perimetral) hasta q no se cuente con el aval del diagnostico estructural.

Interventoria

RESIDENTE OBRA

Dia: 20 de agosto de 2022 - Sabado
Clima: Lluvioso y soleado
Residente de Obra: Ronni Wilmer Perdomo
Residente interventoría: Nicolas Davila
Personal de Obra: 1 maestro, 1 contramaestro, 1 asistente HSE, 6 oficiales y 7 ayudantes, 1 operador
Actividades: Se hicieron las excavaciones para zapatas del eje A con ejes 2 y 7, eje D con eje 1 y eje H con eje 7.
Fundición de zapatas: Eje H con eje 6 y eje E con eje 7.
Se realizan los rellenos compactados mecánicamente, Se recoge el material de excavación sobrante.
El dia de hoy se presentan pausas en la obra por causa de las lluvias

Interventoria

RESIDENTE OBRA


Dia: 21 de agosto de 2022 - Domingo
Clima: Soleado
Residente de Obra: Ronni Wilmer Peridomo
Residente Interventoria: Nicolas Davila
Personal de Obra: 1 maestro, 1 Contramaestro, 1 asistente HSE, 5 Oficiales, 5 ayudantes, 1 operador
Actividades: Se realizaron las excavaciones para zapata en el eje 7 con ejes H, D y A y el eje 6 con eje A, de igual forma la excavacion para colocar un poste de electricidad, Fundicion de solados ubicados en el eje 7 con H, D y A y eje C con A, Rellenos de zapatas Compactados mecanicamente.

Interventoria

RESIDENTE OBRA

Dia: 22 de agosto de 2022 - ~~Domingo~~ Lunes
Clima: Soleado
Residente de Obra: Ronni Wilmer Peridomo
Residente Interventoria: Nicolas Davila
Personal de Obra: 1 Maestro, 1 contramaestro, 1 asistente HSE, 1 Operador, 6 oficiales, 8 ayudantes
Actividades: Se realizan las excavaciones para zapatas en el eje 3 con eje H y eje 1 con D, excavacion para vigas de cimentación en el eje 3 entre ejes C y A, eje 4 entre ejes C y A, eje 5 entre ejes C y A y eje 6 entre ejes C y A, se realiza el transporte del material sobrante de excavación, fundición de zapatas en el eje 7 con ejes D y A y eje 6 con eje A, fundición

de Pedestal en el eje L con eje H y se hacen los rellenos de zapatas compactados mecanicamente.



Dia: 23 de agosto de 2022 - Martes
Clima: Soleado
Residente de Obra: Ronni Wilmer perdomo
Residente de interventoria: Nicolas Davila Rojas
Personal de obra: 1 maestro, 1 Contramaestre, 1 Operador, Asistente HSE, 5 oficiales, 8 ayudantes
Actividades: Se realizan las excavaciones para zapatas ubicados en el eje 3 con eje H, tambien las excavaciones para vigas de cimentacion en el eje 7 entre eje C y eje A, eje A entre ejes 3 y 6 y eje f entre ejes 3 y 6.
Se realiza la demolición del muro para la columna ubicada en el eje 7 con eje H
Fundición de zapata ubicada en el eje D con eje 7, fundición de Pedestales Ubicados en el eje 6 con eje A, eje 1 con eje E, eje 7 con eje A, fundición de Solado para viga de Cimentacion en los ejes 4, 5, 6 entre ejes A y C, se demolió un muro Ubicado entre el eje A y C.
Se retira el material sobrante de la obra, se realizan rellenos de zapatas Compactados mecanicamente.
La interventoria no permite realizar la demolición y excavación para zapatas y columnas ubicados en el eje 1 con eje A y eje 1 con eje B, hasta no tener el concepto tecnico y estructural y patrimonial.
La interventoria solicita nuevamente concepto estructural para la fundida de las vigas perimetrales del eje H, y eje 7, las cuales sostendrán los muros existentes de fachada

La interventoria nuevamente solicita que se tengan planos actualizados en obra con las modificaciones que se hicieron en el Plano arquitectonico del nivel 1.

Interventoria

RESIDENTE OBRA

Dia: 24 de agosto de 2022 Miercoles

Clima: Soleado

Residente de obra: Ronni Wilmer Peidomo

Residente interventoria: Nicolas Davila Rojas

Personal de Obra: 1 maestro, 1 Contramaestro, 1 operador, 1 Asistente HSE, 6 oficiales, 5 ayudantes

Actividades: Se realiza la excavación para el solado de viga de Cimentación en los ejes A de eje B a 7, eje C de eje 1 a 3 y eje f de eje 3 a 7. Demolición de muro para reforma en el eje 3 con eje H. fundición de zapata ubicada en el eje 7 con eje H. fundicion de pedestal ubicado en el eje 1 con D. Fundición de solado para zapata en el eje H con 3. Fundición de solado para viga de cimentación en el eje 3 de eje A a C, eje f de 3 a 7, eje 3 de eje E a F y A a D, eje c de eje 1 a 3, eje A de eje 3 a 7, eje 1-7 de eje A a C. Se hace el retiro de material sobrante de excavación, se hacen "rellenos para zapatas Compactados mecánicamente.

Se solicita a la alcaldia municipal el retiro de los elementos guardados en el sitio de obra para poder comenzar con construcciones de zapatas y vigas de cimentacion entre los ejes 8 y 9.

La secretaria de planeación responde que quitaran todos los elementos a más tardar lunes y comenzaron a retirar algunos elementos.

La interventoria solicita nuevamente concepto estructural para la fundida de las vigas perimetrales del eje H y eje 7, las cuales son fundamentales para sostener los muros existentes de las fachadas.
La interventoria solicita nuevamente que se tengan Planos actualizados en la obra con las modificaciones tecnicas que se hicieron en el Plano arquitectonico.

Interventoria

RESIDENTE OBRA

Dia: 25 de agosto de 2022 - Jueves
Clima: soleado
Residente de obra: Ronni Wilmer Perdomo
Residente interventoria: Nicolas Davila Rojas
Personal de Obra: 1 maestro, 1 contramaestro, 1 operador, 1 asistente HSE, 6 oficiales, 8 ayudantes
Actividades:
Se realizó la fundicion de la zapata ubicada en el eje 3 con eje H, fundición de Pedestal ubicado en el eje 3 con eje H; Amarre de acero de refuerzo de la viga de cimentación en el eje C entre ejes 1 y 3, Excavacion para viga de cimentacion en el eje D de ejes 1 a 3, se hacen rellenos para zapatas compactados mecanicamente

RESIDENTE OBRA

Dia: 26 de agosto de 2022 - Viernes
Clima: Soleado
Residente de obra: Ronni Wilmer Perdomo
Residente de interventoría: Nicolás Davila Rovas
Personal de Obra: 1 maestro, 1 contramaestro, 1 operador, 1 asistente HSE, 6 oficiales, 8 ayudantes
Actividades: Se Realizó la fundición de solado en el eje A dentre ejes 2 y 3, eje D entre eje 1 y 3 y eje 3 entre ejes D y E. Colocación y amarre de acero de refuerzo en el eje C entre ejes 3 y 6; Fundición de pedestal ubicado en el eje 3 con H; se hace relleno con material para zapatas compactados mecánicamente.

RESIDENTE OBRA

DIA: Sábado 27 Agosto /22
CLIMA: Soleado
RESIDENTE OBRA: Ronni W. Perdomo
RESIDENTE INTERVENTORÍA:
PERSONAL OBRA: 1 maestro, 1 contramaestro, 1 operador, 1 asistente HSEQ, 6 oficiales y 8 ayudantes.
ACTIVIDADES: Se suspenden las actividades en obra el día de hoy, por lo cual contratista e interventoría de manera conjunta se dedicarán en los días siguientes a actividades de ajustes técnicos que permitan identificar claramente las obras que serán objeto de intervención de ahora en adelante. Se espera a su vez tener definido un balance de obra por medio del cual sean establecidas las actividades a realizar y los costos de las mismas para po-

der entregar el proyecto de forma completa y funcional.

RESIDENTE OBRA

DIA: Lunes 29 Agosto /22
CLIMA: Soleado
RESIDENTE OBRA: Ronni W. Perdomo
RESIDENTE INTERVENTORIA:
ACTIVIDADES: Sigue realizándose de manera conjunta entre contratista e interventor, la revisión que por medio de ajustes técnicos permitan trazar la ruta a seguir para posibilitar la entrega completa y funcional del proyecto de construcción de la plaza de mercado del Municipio de Paicol.

RESIDENTE OBRA

DIA: Martes 30 Agosto /22
CLIMA: Soleado
RESIDENTE OBRA: Ronni W. Perdomo
RESIDENTE INTERVENTORIA:
ACTIVIDADES: Las actividades a lo largo del día han consistido en aquellas desarrolladas para hacer ajustes técnicos y por consiguiente para elaboración del balance de obra.

RESIDENTE OBRA

DIA: Miércoles 31 Agosto /22
CLIMA: Soleado
RESIDENTE INTERVENTORIA:
RESIDENTE OBRA: Ronni W. Perdomo
ACTIVIDADES: Se hace entrega por parte del Municipio de Paicol, de la zona de la plaza de mercado antigua en la que disponía del acopio de materiales y otros elementos propios y en donde no ha sido posible iniciar las actividades preliminares de demolición y descante. De otro lado, siguen realizándose ajustes técnicos y revisión para elaboración del balance de obra.

RESIDENTE OBRA

DIA: Miércoles 31 Agosto /22
CLIMA: Soleado
RESIDENTE INTERVENTORIA:
RESIDENTE OBRA: Rovni W. Perdomo
ACTIVIDADES: Se hace entrega por parte del Municipio de Paicol, de la zona de la plaza de mercado antigua en la que disponía del acopio de materiales y otros elementos propios y en donde no ha sido posible iniciar las actividades preliminares de demolición y desmonte. De otro lado, siguen realizándose ajustes técnicos y revisión para elaboración del balance de obra.

RESIDENTE OBRA

DIA: Jueves 01 Septiembre /22
CLIMA: Soleado
RESIDENTE OBRA: Rovni W. Perdomo
ACTIVIDADES: Siguen haciendose actividades propias para elaboración del balance de obra por medio de ajustes técnicos al proyecto.

RESIDENTE OBRA

Interventoria

DIA: Viernes 02 septiembre /22
CLIMA: Soleado
ACTIVIDADES: Se siguen realizando ajustes técnicos al proyecto que propicien la elaboración del balance de obra y que permitan la continuación de las actividades de construcción de la nueva plaza de mercado del Municipio de Paicol.

PRESIDENTE COBRA

Interventoría

Dia: Martes 06 de septiembre /22
Clima: Soleado
Residente de obra: Ronni Wilmer Perdomo
Residente de interventoría:
Personal de obra: 1 maestro, 1 contramaestro, 1 operador, 1 asistente HSE, 1 inspector de obra, 6 oficiales y 7 ayudantes. y 1 Celador
Actividades: Demolición de muro en el eje 1 del eje B al eje D, retiro de material sobrante de la obra

RESIDENTE OBRA

Interventoría

Dia: Miercoles 07 de septiembre/22
Clima: Soleado
Residente de obra: Ronni Wilmer Perdomo
Residente de interventoria:
Personal de Obra: 1 maestro, 1 contramaestro, 1 operador, 1 asistente HSE, 1 inspectos, cohetiales y 7 ayudantes y 1 Vigilante
Actividades: Demolición muro en el eje 1 del eje D al H, retiro de material sobrante

RESIDENTE OBRA

Interventoría

Dia: Jueves 08 de septiembre/22
Clima: Soleado
Residente de obra: Ronni Wilmer Perdomo
Residente de interventoría:
Personal de Obra: 1 maestro, 1 contramaestro, 1 operador, 1 asistente HSE, 1 inspector de obra, 6 oficiales y 7 ayudantes y 1 Vigilante
Actividades: Demolición de muro en el eje H entre el eje 1 y eje 3, retiro de material sobrante

RESIDENTE OBRA


Interventoría

Dia: Viernes 09 de septiembre/22
Clima: Soleado
Residente obra: Ronni Wilmer Perdomo
Residente interventoría:
Personal de Obra: 1 maestro, 1 contramaestro, 1 operador, 1 asistente HSE, 1 inspector de obra, 6 oficiales y 7 ayudantes y 1 Vigilante
Actividades: Demolición de muro en el eje H entre el eje 3 y el eje 6, retiro de material sobrante


RESIDENTE OBRA

Interventoría

Dia: Sabado 10 de septiembre de 2022
Clima: Lluvioso
Residente de obra: Ronni Wilmer Perdomo
Residente Interventoria:
Personal de obra: 1 maestro, 1 contramaestro, 1 operador, 1 asistente HSE, 1 inspector, 6 oficiales, 7 ayudantes y 1 Vigilante
Actividades: Demolición de muro en el eje H entre eje 1 y eje 9, retiro de material sobrante




Dia: Lunes 12 de septiembre/22
Clima: Soleado
Residente de obra: Ronni Wilmer Perdomo
Residente de interventoría:
Personal de obra: 1 maestro, 1 contramaestro, 1 operador, 1 asistente HSE, 1 inspector de obra, 6 oficiales, 7 ayudantes y 1 Vigilante
Actividades: Excavación para zapatas ubicados en el eje 1 con ejes A, B y H; excavación para viga de cimentación en el eje 1 entre ejes B y D, retiro de material sobrante de obra




Dia: Martes 13 de septiembre/22
Clima: Soleado
Residente de obra: Ronni Wilmer Perdomo
Residente de interventoria:
Personal de obra: 1 maestro, 1 contramaestro, 1 operador, 1 asistente HSE, 1 inspector de obra, 6 oficiales, 7 ayudantes y 1 Vigilante
Actividades: Se fundieron los zapatas ubicados en el eje 1 con ejes A, B y H; excavación para vigas de cimentación en el eje 1

entre ejes D y F, eje H entre ejes 1 y 2 y eje E entre ejes 1 y 3; Se retira el material de obra sobrante



Dia: Miercoles 14 de Septiembre/22
Clima: Soleado
Residente de obra: Ronni Wilmer Pardomo
Residente de interventoria
Personal de obra: 1 maestro, 1 contramaestro, 1 operador, 1 asistente Hse, 1 inspectos de obra, 6 oficiales y 7 ayudantes y 1 Vigilante
Actividades: Se Fundieron los pedestales de las zapatas ubicados en el eje 1 con ejes A, B y H, Fundicion de solado para Viga de Cimentación en el eje 2 entre ejes B y H; Excavación para Viga de Cimentacion en el eje H entre ejes 2 y 3, en el eje F entre ejes 1 y 3., Se iniciaron las excavaciones para zapatas ubicados en el eje H con ejes 8 y 9; Se retira el material sobrante



Dia: Jueves 15 de Septiembre de 2022
Clima: soleado
Residente de obra: Ronni Wilmer Pardomo
Residente de interventoria:
Personal de obra: 1 maestro, 1 contramaestro, 1 operador, 1 asistente Hse, 1 inspector de obra, 6 oficiales, 7 ayudantes y 1 Vigilante
Actividades: Se Funden las zapatas ubicadas en el eje H con ejes B y 9; Fundicion de solados en el eje E de ejes 1 a 3 y eje H entre ejes A y 5, Se hacen rellenos para zapatas Compactados mecánicamente, Excavacion para Vigas de Cimiento

en el eje A entre eje 1 y 2 y eje H entre ejes 4 y 5, Se inician las excavaciones de las zapatas ubicadas en el eje 9 con G y eje 9 con eje F, Se retira el material sobrante de la obra.

RESIDENTE OBRA

Interventoría

Día: Viernes 16 de Septiembre de 2022
Clima: Soleado
Residente de obra: Ronni Wilmer Perdomo
Residente interventoría:
Personal de obra: 1 maestro, 1 Contramaestro, 1 Operador, 1 asistente HSE, 1 inspector de obra, 5 oficiales, 7 ayudantes, 1 Vigilante
Actividades: Excavación para solados Viga de Cimentación en el eje B entre ejes 2 y 3 eje C entre eje 1 y eje 3, fundición zapata ubicada en el eje 9 con eje G, fundición solado ubicado en el eje 9 con eje F, excavacion para zapatas, retiro de material sobrante.

RESIDENTE OBRA

Interventoría

Día: 17 de Septiembre de 2022 Sabado
Clima: Lluvioso
Residente de obra: Ronni Wilmer Perdomo
Residente de interventoria:
Personal de Obra: 1 maestro, 1 contramaestro, 1 operador, 1 asistente HSE, 1 inspector, 5 oficiales, 7 ayudantes, 1 Vigilante
Actividades: Excavación para Zapata ubicada en el eje 9 con eje F y fundicion solado en el eje F de eje 1 a eje 3, Fundición y excavación para Vigueta, retiro de material sobrante de obra

Romi
RESIDENTE OBRA

Interventoría

Dia: Lunes 19 de septiembre de 2022
Clima: Lluvioso
Residente de obra: Romi Wilmer Peidomo
Residente interventoría:
Personal de obra: 1 maestro, 1 contramaestro, 1 asistente HSE, 1 operador, 1 inspector de obra, 6 oficiales, 6 ayudantes.
Actividades: Excavación para viga de cimentación en el eje H entre ejes 3 y 9, eje 1 entre ejes A y B; Excavación para Vigueta de muros divisorios, acopio de material sobrante, Excavación para zapata Ubicada en el eje 9 con eje E; Colocación y amarre de acero de refuerzo para Vigas de cimentación, fundición de solados para Vigueta y Vigas de cimentación; El dia de ayer se desplomó o colapso el muro en tapia Pisada ubicado en el eje 1 entre ejes A y B

Romi
RESIDENTE OBRA

Interventoría

Dia: Martes 20 de septiembre de 2022
Clima: Lluvioso
Residente de obra: Romi Wilmer Peidomo
Residente de interventoría: 1 maestro, 1 contramaestro, 1 operador, 1 asistente HSE, 1 inspector, 7 oficiales, 10 ayudantes, 1 Vigilante
Actividades: Excavación para Vigas y Vigueta para muros, acopio de material sobrante, se finaliza la excavación para la zapata Ubicada en el eje 9 con eje E, fundición de solados para Vigas y Vigueta, Colocación y amarre de acero de refuerzo para Vigas y Vigueta.

RESIDENTE OBRA

Interventoría

Dia: Miercoles 21 de septiembre de 2022
Clima: Lluvioso
Residente de obra: Ronni Wilmer Perdomo
Residente interventoria:
Personal: 1 maestro, 1 contramaestro, 7 operadores, 1 asistente HSE, 1 inspector de obra, 7 oficiales, 20 ayudantes, 1 Vigilante
Actividades: De 7 a 11 de la mañana se presentan fuertes lluvias por lo tanto se hizo una pausa en las actividades de obra; Amarre y colocación de acero de refuerzo, retiro de material sobrante, Excavación para vigas y viguetas de cimentación, Fundición de Solados para Viguetas, Colocación de formaletas para Vigas y Vigueta de Cimiento.

RESIDENTE OBRA

Interventoría

Dia: Viernes 22 de septiembre de 2022
Clima: Soleado
Residente de obra: Ronni Wilmer Perdomo
Residente de interventoria:
Personal de obra: 1 maestro, 1 contramaestro, 1 operador, 1 asistente HSE, 1 inspector de obra, 10 ayudantes, 7 oficiales, 1 vigilante
Actividades: Amarre y colocación de acero de refuerzo, colocación de formaletas para, Vigas y Viguetas de cimientos, retiro de material sobrante, Fundicion de Solados para Vigas y Viguetas, Fundición de Vigas y Viguetas

RESIDENTE OBRA

Interventoría

Dia: Viernes 23 de septiembre de 2022
Clima: Soleado
Residente de obra: Ronni Wilmer Perdomo
Residente interventoría:
Personal de obra: 1 maestro, 1 contramaestro, 1 operador, 1 asistente Hse, 1 inspector de obra, 10 ayudantes, 7 oficiales, 1 Vigilante
Actividades: Colocación de formaletas para vigas y Viguetas de Cimentación, Curado de concreto, armada, figuración y colocación de acero de refuerzo, Fundición de solados, fundición de Vigas y Viguetas de Cimentación, Relleno con recebo para placa de piso.

RESIDENTE OBRA

Interventoría

Dia: Sábado 24 de Septiembre de 2022
Clima: Lluvioso
Residente de obra: Ronni Wilmer Perdomo
Residente de interventoría:
Personal de obra: 1 maestro, 1 contramaestro, 1 operador, 1 asistente Hse, 1 inspector de obra, 10 ayudantes, 7 oficiales, 1 Vigilante
Actividades: Colocación de formaletas para Vigas y Viguetas, Curado de concreto, armada y colocación de acero de refuerzo para Vigas y Viguetas Fundición de solados, fundición de Vigas y Viguetas, se Presentaron Pausas de 8 am a 11 am por causa de las fuertes lluvias.

RESIDENTE OBRA

Interventoría

Día: Domingo 25 de Septiembre de 2022
Clima: Soleado
Residente de obra: Ronni Wilmer Perdomo
Residente de interventoría:
Personal de obra: 1 maestro, 1 contramaestro, 1 asistente Hse, 12 ofic

ales, 5 ayudantes, 1 Vigilante.
Actividades: Colocación de Formaletas para vigas y Vigretas de cimentación, Fundicion de solados para Vigas y Vigretas, Colocación de acero de refuerzo, Excavacion para Vigas de Cimentación.

PRESIDENTE OBRA

Interventoría

Dia: Lunes 26 de septiembre de 2022
Clima: Soleado
Residente de obra: Ronni Wilmer Peidomo
Residente de interventoría:
Personal de obra: 1 maestro, 1 contramaestro, 1 operador, 1 Asistente HSE, 1 Inspector de obra, 7 Oficiales, 11 Ayudantes, 1 Vigilante
Actividades: Colocación de formaletas para Columnas, Vigas y Vigretas de cimentación; Excavación para Vigas y Vigretas, relleno de recebo compactado mecánicamente, acopio de material sobrante, curado de estructuras en concreto, fundición de vigas y Vigretas de cimentación, fundición de Columnas ubicados en el eje 4 con eje A

PRESIDENTE OBRA

Interventoría

Día: Martes 27 de septiembre de 2022
Clima: Soleado
Residente de obra: Ronni Wilmer Peidomo
Residente de interventoría:
Personal de obra: 1 maestro, 1 contramaestro, 1 operador, 1 asistente HSE, 1 inspector de obra, 7 oficiales, 11 Ayudantes, 1 Vigilante
Actividades: Colocación de formaletas para columnas, Vigas y Vigretas de Cimentación, Excavación para Vigas y Vigretas, Colocación de acero de refuerzo para Vigas y Vigretas, Curado de estructuras en concreto,

Fundición de vigas y Vigue as de cimentación, fundición de columnas ubicados en el eje A con eje 3, eje A con eje 5, eje 1 con eje D,

RESIDENTE OBRA

Interventoría

Día: Miercoles 28 de septiembre de 2022.
Clima: Soleado
Residente de obra: Ronni Wilmer Perdomo
Residente de interventoría:
Personal de obra: 1 maestro, 1 contramaestro, 1 operador, 1 asistente Hsf, 1 Inspectos de obra, 8 Oficiales, 11 ayudantes, 1 Vigilante.
Actividades: Relleno de recebo compactado mecánicamente; excavación de Vigas y Vigueta de cimentación; Colocación de acero de refuerzo, fundición de Vigas y Vigueta de Cimentación; fundicion de columnas ubicadas en el eje A con eje 4, eje A con eje 2, eje 1 con eje C, Eje 3 con eje C.

RESIDENTE OBRA

Interventoría.

Jueves 29 de septiembre de 2022
Clima: Soleado
Residente de obra: Ronni Wilmer Perdomo
Residente de interventoría:
Personal de obra: 1 maestro, 1 contramaestro, 1 operador, 1 asistente Hsf, 1 Inpector de obra, 8 oficiales, 11 ayudantes, 1 vigilante
Actividades: Relleno de recebo compactado mecánicamente, Colocación de acero de refuerzo y fundición de vigas y Vigretes de cimentación, Fundición de columbas ubicadas en el eje 1 con ejes B, E, F, 6, Ejs: 2 con eje F.

RESIDENTE OBRA

Interventoría

Día: Viernes 30 de Septiembre de 2022
Clima: Soleado
Residente de obra: Ronni Wilmer Peidomo
Residente de interventoría:
Personal de obra: 1 maestro, 1 contramaestro, 1 operador, 1 asistente HSE, 1 inspector de obra, 8 oficiales, 11 ayudantes, 1 Vigilante
Actividades: Amarre y colocación de acero de refuerzo para vigas y Viguetas de cimentación, fundición de vigas y Vigueta de cimentación, fundicion de solado para viga de cimsentacion sobre el eje 7, fundición de columnas ubicadas en el eje 1 con eje H, eje 3 con eje H, eje 2 con eje H y eje D con eje 3.

RESIDENTE OBRA

Interventoría

Día: Lunes 3 de octubre de 2022
Clima: Soleado
Residente de obra: Ronni Wilmer Peidomo
Residente de interventoría:
Personal de obra: 1 maestro, 1 contramaestro, 1 operador, 1 Asistente HSE, 1 Inspector de obra, 6 oficiales, 10 ayudantes, 1 Vigilante:
Actividades: Amarre y colocación de acero de refuerzo, fundición de Vigas y Vigvetas de cimentación, fundición de zapata ubicada en el eje 9 con eje F, fundición de Columnas ubicadas en el eje 5 con ejes H y E, Excavación para Vigas, Viguetas y zapatas.

RESIDENTE OBRA

Interventoría

Día: Martes 4 de Octubre de 2022
Clima: Soleado
Residente de obra: Ronni Wilmer Peidomo
Residente de interventoría:

Personal de obra: 1 maestro, 1 contramaestro, 1 operador, 1 asistente HSE, 1 inspector de obra, 6 oficiales, 10 ayudantes, 1 Vigilante.
Actividades: Fundición de vigas y Vigueta de cimentación, Excavacion para vigas y Vigueta de cimentación, Amarre y colocación de acero de refuerzo para Vigas y Viguetas; Fundición de columnas Ubicados en el eje 4 con eje F y eje 6 con H; Fundición de zapata ubicado en el eje 4 con eje E.

RESIDENTE OBRA

Interventoria

Día: Miercoles 5 de Octubre de 2022
Clima: Soleado
Residente de obra: Ronni Wilmer Perdomo
Residente de interventoría:
Personal de obra: 1 maestro, 1 contramaestro, 1 operador, 1 asistente Hse, 1 inspectos, 6 oficiales, 10 ayudantes, 1 vigilante
Actividades: Fundición de Vigas y Viguetas, Demolición de muros y desmonte de tejas, Fundición de Columna ubicada en el eje 6 con eje F; Relleno con recebo compactado mecánicamente entre vigas y Viguetas, retiro de material sobrante de obra.

RESIDENTE OBRA

interventoria

Dia: Viernes 6 de octubre de 2022
Clima: Soleado
Residente de obra: Ronni Wilmer Perdomo
Residente de interventoría:
Personal de obra: 1 maestro, 1 contramaestro, 1 operador, 1 asistente Hse, 1 inspector, 6 oficiales, 10 ayudantes, 1 Vigilante

Actividades de obra: Fundición de Vigas y Viguetas de cimentación, relleno con recebo entre vigas y viguetas compactado mecánicamente, fundición de columnas ubicadas en el eje B en eje F, eje 8 con eje H, eje 9 con eje H, demolición de muros, colocación de formaletas para vigas y viguetas de cimentación, retiro de material sobrante de la obra

Ronni Residente obra

Interventoría

Día: Viernes 7 de octubre de 2022
Clima: Soleado
Residente de obra: Ronni Wilmer Perdomo
Residente de interventoría:
Personal de obra: 1 maestro, 1 contramaestro, 1 operador, 1 asistente HSE, 1 Inspector de obra, 6 oficiales, 10 ayudantes, 1 Vigilante
Actividades: Fundición de columnas ubicados en el eje C con eje 4, eje 9 con eje 6, eje 9 con eje F, retiro de material sobrante de la obra, demolición de muros, relleno de zapata compactado mecanicamente, fundición de solados para vigas y viguetas de cimentación, fundicion de vigas y viguetas, Excavación de zapatas ubicados en el eje 9 con eje B, C, D

Ronni Residente obra

Interventoría

Día: Sábado 8 de octubre de 2022
Clima: Soleado
Residente de obra: Ronni Wilmer Perdomo
Residente de interventoría:

Personal de obra: 1 maestro, 1 contramaestro, 1 oficiales, 1 asistente HSE, 1 Inspector de obra, 6 oficiales, 10 ayudantes, 1 Vigilante
Actividades: Amarre y colocación de acero de refuerzo, excavación para zapatas, retiro de material sobrante de obra, fundición de vigas y viguetas, fundición de zapatas ubicadas en el eje 9 con A, B, C, D, fundición de columna ubicada en el eje 5 con eje C.

RESIDENTE OBRA

interventoria

Día: 9 de octubre de 2022, Domingo
Clima: Soleado
Residente de obra: Ronni Wilmer Perdomo
Residente de interventoría:
Personal de obra: 1 maestro, 1 contramaestro, 1 operador, 1 asistente HSE, 1 inspector, 6 oficiales, 10 ayudantes, 1 Vigilante
Actividades: fundición de pedestales, excavación para zapata en el eje A con eje 8, fundición de soldados para vigas y viguetas, fundición de columna ubicada en el eje H con eje B, colocación y amarre de acero de refuerzo.

RESIDENTE OBRA

interventoria

Día: Lunes 10 de octubre de 2022
Clima: Soleado
Residente de obra: Ronni Wilmer Perdomo
Residente de interventoría:
Personal de obra: 1 maestro, 1 contramaestro, 1 operador, 1 inspector

6 oficiales, 10 ayudantes, 1 Vigilante
Actividades: Amarre y colocación de acero de refuerzo, relleno para zapatas en recebo compactado mecánicamente, fundición de solados de limpieza para Vigas y Viguetas, fundicion de Columna Ubicada en el eje E con eje 7, excavacion para zapatas.

RESIDENTE OBRA

interventoría

Día: Martes 11 de octubre de 2021
Clima: Soleado
Residente de obra: Lonni Wilmer Perdomo
Actividades: fundicion de Vigas y Viguetas de cimentacrón, mamposteria, amarre y colocación de acero de refuerzo para Vigas y Viguetas, fundicion de solado para Vigas y Viguetas, colocacrón de formaletas Para Vigas y Vigretas

RESIDENTE OBRA

interventoría

Día: Miercoles 12 de octubre de 2022
Clima: Soleado
Residente de obra: Lonni Wilmer Perdomo
Residente de interventoría:
Personal de obra: 1 maestro, 1 contramaestro, 1 operador, 1 asistente HSE, 1 inspector, 6 oficiales, 10 ayudantes, 1 Vigilante
Actividades: Fundición de Vigas y Viguetas, Colocación y amarre de acero de refuerzo, fundición de Solados para Vigas y Viguetas relleno para zapatas en recebo Compactado mecánicamente, fundición de pedestal de la zapata ubicado en eje B con eje A, fundición de columnas ubicados, en el eje D con eje 7,

eje E con eje 9, mampostería

RESIDENTE OBRA

Interventoría


Día: 13 de octubre de 2022, Jueves
Clima: Soleado
Residente de obra: Ronni Wilmer Perdomo
Residente de interventoría:
Personal de obra: 1 maestro, 1 contramaestro, 1 operador, 1 asistente HSE, 1 inspector, 6 oficiales, 10 ayudantes, 1 Vigilante
Actividades: Fundición de vigas y Vigretas de cimentación, relleno de recebo compactado mecánicamente entre Vigas y Vigretas, mampostería, fundición de columnas ubicadas en el eje C con eje 7, eje D con eje 9, eje E con eje 9.

RESIDENTE OBRA

Interventoría

Dia: Viernes 14 de octubre de 2022
Clima: Soleado
Residente de obra: Ronni Wilmer Perdomo
Residente de interventoría:
Actividades: Fundición de Vigas y Vigretas de Cimentación, fundición de zapatas ubicadas en el eje 9 con eje A y eje B con eje C, relleno en recebo compactado mecánicamente.
Personal de obra: 1 maestro, 1 contramaestro, 1 operador, 1 asistente HSE, 1 inspector, 6 oficiales, 10 ayudantes, 1 Vigilante

RESIDENTE OBRA



Dia: Martes 18 de octubre de 2022
Clima: lluvioso
Residente de obra: Ronni Wilmer Perdomo
Residente de interventoría:
Personal de obra: 1 maestro, 1 contramaestro, 1 operador, 1 asistente HSE, 1 inspector, 7 oficiales, 12 ayudantes
Actividades: fundición de columnas vaciados en el eje A con eje 7 y 8, relleno en recebo compactado mecánicamente, construcción de mampostería, construcción o fundición de columnas de confinamiento

RESIDENTE OBRA

