Bitacora de Obra

CONTRATISTA RAIMUR AGUIRRE ZAPATA
CONTRATO No CO1.PCCNTR.3996477
CONTRATANTE: SENA
SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA - REGIONAL ANTIOQUIA
DIA DE OBRA No 0031 FECHA jueves, 27 de octubre de 2022

OBRA **PRESTAR SERVICIOS PARA REALIZAR LAS REPARACIONES LOCATIVAS A LAS INSTALACIONES DEL SERVICIO MÉDICO ASISTENCIAL DE LA REGIONAL ANTIOQUIA DEL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA.**

TIEMPO SECO **TEMPERATURA** 22°C
PRECIPITACIONES SIN LLUVIAS

Personal presente:

Contratista: INGENIERO AUXILIAR
SISO

upervición y/o Supervición : ENCARGADO DE SSGT SENA
INTERVENTORA

Personal de obra **Cantidad** 6 **Horas hombre** 40

No	Cantidad	Tareas realizadas	Personal	Horas-homb
1	1		MAESTRO DE OBRA	8
2	1		OFICIAL DE OBRA	8
3	2		AYUDANTE DE OBRA	8
4	1		SISO	8
5	1		INGENIERO AUXILIAR	8

Breve Resumen de actividades:

Resane de muros, pintura e instalación de luminarias


Impedimentos:

Materiales:

Material	cantidad	Unidad	Uso
Estuco Acrilico	4	kg	Estuco muros
Pintura Epoxica	4	gal	pinturas
Luminarias 60 x 60	5	Unidad	Luminiarias
Luminairia de 18	2	Unidad	Luminiarias

Maquinaria:

Equipo, Maquina	Uso	Entrada	Salida	Pausa	Causa pausa



RAIMUR AGUIRRE ZAPATA **Vo Bo Interventoría y/o supervisión**

Bitacora de Obra

CONTRATISTA RAIMUR AGUIRRE ZAPATA
CONTRATO No CO1.PCCNTR.3996477
CONTRATANTE: SENA

DIA DE OBRA No 0031 FECHA jueves, 27 de octubre de 2022


OBRA **PRESTAR SERVICIOS PARA REALIZAR LAS REPARACIONES LOCATIVAS A LAS INSTALACIONES DEL SERVICIO MÉDICO ASISTENCIAL DE LA REGIONAL ANTIOQUIA DEL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA.**

Estado de avance de la obra

Se realizan los resanes de los sitios donde se presentarin ampollas de pintura, se continua con segunda mano de pintura en los consultorios 1 y 2, vestiar y primera mano del 3, se intalan luminarias de consultorios 1, 2 , vestier, esterilización y bodega de esterilización. se reinstalan ductors de ventilación de consultorios 1 y 2

Registro Fotografico:



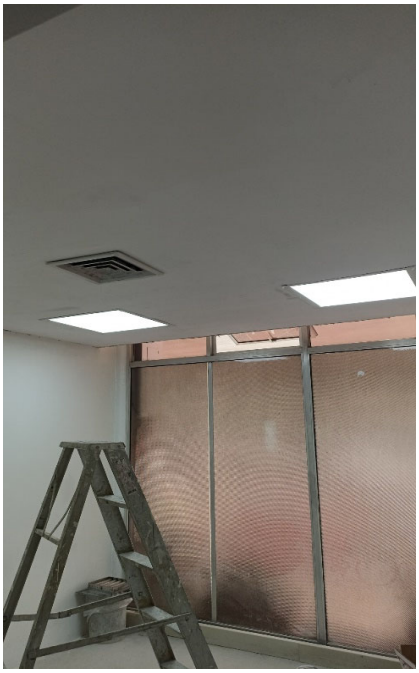



Raimur Aguirre Zapata

VoBo Interventoría y/o supervisión
