	MEMORIAS DE CÁLCULO							
CONTRATISTA:	CONSTRUCCIONES Y VARIEDADES LA MEJOR OPCION NEIVER S.A.S.	FECHA:	DIA	9	MES	11	AÑO	2022
CAPÍTULO	1.0 PRELIMINARES							
ÍTEM:	1.1cielo raso en dry wall, incluye todo lo necesrio para sucorrecta intalacion							



LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			UNIDAD	CANT.	TOTAL
	ANCHO	LARGO	AREA			
bodega	5,4	8,9		m2	1	48
pasillo	1,6	11		m2	1	18
oficina 1	4,9	8,9		m2	1	44
salon 1	1,75	8		m2	1	14
oficina familias en accion	4,75	5,45		m2	1	26
oficina segundo piso	5,75	7,4		m2	1	42,55
TOTAL						191,71

OBSERVACIONES

CONTRATISTA	SUPERVISION
FIRMA:	FIRMA:
NEIVER MARMOLEJO MORENO	
REPRESENTANTE LEGAL	SUPERVISOR MUNICIPIO

	MEMORIAS DE CÁLCULO							
CONTRATISTA:	CONSTRUCCIONES Y VARIEDADES LA MEJOR OPCION NEIVER S.A.S.	FECHA:	DIA	9	MES	11	AÑO	2022

CAPÍTULO	1.0 PRELIMINARES	LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			UNIDAD	CANT.	TOTAL
ÍTEM:	1.2 suministro e instalacion de luminaria redonda tipo ojo de buey led de empotrar en cielo raso,12W, 6500° , 82-265 V, IP 20.		ANCHO	LARGO	AREA			
		bodega				und	8	8
		pasillo				und	5	5
		oficina 1				und	8	8
		salon 1				und	4	4
		TOTAL						25,00

OBSERVACIONES

CONTRATISTA	SUPERVISION
FIRMA:	FIRMA:
NEIVER MARMOLEJO MORENO	
REPRESENTANTE LEGAL	SUPERVISOR MUNICIPIO

	MEMORIAS DE CÁLCULO	

CONTRATISTA:	CONSTRUCCIONES Y VARIEDADES LA MEJOR OPCION NEIVER S.A.S.	FECHA:	DIA	9	MES	11	AÑO	2022
CAPÍTULO	1.0 PRELIMINARES							
ÍTEM:	1.3 construccion de muro en dry wll, incluye todo lo necesario para su correcta construccion							



LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			UNIDAD	CANT.	TOTAL
	ANCHO	LARGO	ALTURA			
bodega	4,2		2,2	m2	1	9
TOTAL						9,24

OBSERVACIONES

CONTRATISTA	SUPERVISION
FIRMA:	FIRMA:
NEIVER MARMOLEJO MORENO	
REPRESENTANTE LEGAL	SUPERVISOR MUNICIPIO

	MEMORIAS DE CÁLCULO							
CONTRATISTA:	CONSTRUCCIONES Y VARIEDADES LA MEJOR OPCION NEIVER S.A.S.	FECHA:	DIA	9	MES	11	AÑO	2022

CAPÍTULO	1.0 PRELIMINARES
ÍTEM:	1.4 construccion de rampla para discapacitados, incluye



LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			UNIDAD	CANT.	TOTAL
	ANCHO	LARGO	ALTURA			
entrada princiapl casa de la mujer				glb	1	1
TOTAL						1,00

OBSERVACIONES

CONTRATISTA	SUPERVISION
FIRMA:	FIRMA:
NEIVER MARMOLEJO MORENO	
REPRESENTANTE LEGAL	SUPERVISOR MUNICIPIO

	MEMORIAS DE CÁLCULO							
CONTRATISTA:	CONSTRUCCIONES Y VARIEDADES LA MEJOR OPCION NEIVER S.A.S.	FECHA:	DIA	9	MES	11	AÑO	2022

CAPÍTULO	1.0 PRELIMINARES	LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			UNIDAD	CANT.	TOTAL
ÍTEM:	1.5 suministro e instalacion de puerta en lamina cal. 18 de (1,00x2,37 m), incluye todo lo necesario para su correcta instalacion		ANCHO	LARGO	ALTURA			
		bodega				und	1	1
		TOTAL						1,00

OBSERVACIONES

CONTRATISTA	SUPERVISION
FIRMA:	FIRMA:
NEIVER MARMOLEJO MORENO	
REPRESENTANTE LEGAL	SUPERVISOR MUNICIPIO

	MEMORIAS DE CÁLCULO	

CONTRATISTA:	CONSTRUCCIONES Y VARIEDADES LA MEJOR OPCION NEIVER S.A.S.	FECHA:	DIA	9	MES	11	AÑO	2022

CAPÍTULO	1.0 PRELIMINARES
ÍTEM:	1.6 reparacion de cubierta, incluye todo lo necesario para su correcta funcion





LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			UNIDAD	CANT.	TOTAL
	ANCHO	LARGO	ALTURA			
cubierta				glb	1	1
TOTAL						1,00

OBSERVACIONES

CONTRATISTA	SUPERVISION
FIRMA:	FIRMA:
NEIVER MARMOLEJO MORENO	
REPRESENTANTE LEGAL	SUPERVISOR MUNICIPIO

	MEMORIAS DE CÁLCULO							
CONTRATISTA:	CONSTRUCCIONES Y VARIEDADES LA MEJOR OPCION NEIVER S.A.S.	FECHA:	DIA	9	MES	11	AÑO	2022

CAPÍTULO	1.0 PRELIMINARES	LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			UNIDAD	CANT.	TOTAL
ÍTEM:	1.7 instalacion de red electrica, incluye tomacorrientes e interruptores y todo lo necesario para su correcto funcionamiento		ANCHO	LARGO	ALTURA			
 		casa de la mujer				glb	1	1
		TOTAL						1,00

OBSERVACIONES

CONTRATISTA	SUPERVISION
FIRMA: 	FIRMA:
NEIVER MARMOLEJO MORENO	
REPRESENTANTE LEGAL	SUPERVISOR MUNICIPIO

	MEMORIAS DE CÁLCULO							
CONTRATISTA:	CONSTRUCCIONES Y VARIEDADES LA MEJOR OPCION NEIVER S.A.S.	FECHA:	DIA	9	MES	11	AÑO	2022

CAPÍTULO	1.0 PRELIMINARES	LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			UNIDAD	CANT.	TOTAL
ÍTEM:	1.8 mantenimiento de aire acondicionado, incluye todo lo necesario para su correcto funcionamiento		ANCHO	LARGO	ALTURA			
		casa de la mujer				und	7	7
		TOTAL						7,00

OBSERVACIONES

CONTRATISTA	SUPERVISION
FIRMA:	FIRMA:
NEIVER MARMOLEJO MORENO	
REPRESENTANTE LEGAL	SUPERVISOR MUNICIPIO

	MEMORIAS DE CÁLCULO	

CONTRATISTA:	CONSTRUCCIONES Y VARIEDADES LA MEJOR OPCION NEIVER S.A.S.	FECHA:	DIA	9	MES	11	AÑO	2022

CAPÍTULO	1.0 PRELIMINARES
ÍTEM:	1.9 suministro e instalacion de aire acondicionado de 18000 BTU, incluye todo lo necesario para su correcta instalacion y funcionamiento



LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			UNIDAD	CANT.	TOTAL
	ANCHO	LARGO	ALTURA			
oficinas				und	3	3
TOTAL						3,00

OBSERVACIONES


CONTRATISTA	SUPERVISION
FIRMA:	FIRMA:
NEIVER MARMOLEJO MORENO	
REPRESENTANTE LEGAL	SUPERVISOR MUNICIPIO

	MEMORIAS DE CÁLCULO								
CONTRATISTA:	CONSTRUCCIONES Y VARIEDADES LA MEJOR OPCION NEIVER S.A.S.	FECHA:	DIA	9	MES	11	AÑO	2022	
CAPÍTULO	1.0 PRELIMINARES	LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			UNIDAD	CANT.	TOTAL	
ÍTEM:	1.10 suministro e instalacion de hidroflox, incluye todo lo necesario para su correcta instalacion y funcionamiento		ANCHO	LARGO	ALTURA				
		area de patio				und	1	1	
		TOTAL						1,00	
OBSERVACIONES									
CONTRATISTA		SUPERVISION							
FIRMA:		FIRMA:							
NEIVER MARMOLEJO MORENO									
REPRESENTANTE LEGAL		SUPERVISOR MUNICIPIO							

MEMORIAS DE CÁLCULO


CONTRATISTA:	CONSTRUCCIONES Y VARIEDADES LA MEJOR OPCION NEIVER S.A.S.	FECHA:	DIA	9	MES	11	AÑO	2022
CAPÍTULO	1.0 PRELIMINARES							
ÍTEM:	1.11 suministro y aplicación de pintura tipo vinilo 3 manos							



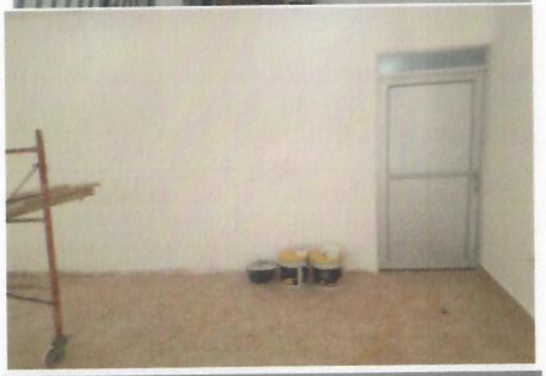



LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			UNIDAD	CANT.	TOTAL
	ANCHO	LARGO	ALTURA			
bodega						
techo	5,4	8,9		m2	1	48
paredes laterales		8,9	3,1	m2	2	55
muro en dry wall	5,4		3,1	m2	1	17
pasillo intermedio						
techo	1,6	11		m2	1	17,6
pared lado bodega		13,6	3,1	m2	1	42,16
lado oficina		9,2	3,1	m2	1	28,52
area lavadero						
pared 1	2,2		3,1	m2	1	6,82
pared 2	1,3		3,1	m2	1	4,03
pared 3	3,7		3,1	n2	1	11,47
oficina 1						
techo	4,9	8,9		m2	1	43,61
pared frontal		8,9	3,1	m2	1	27,59
pared tracera	8,9		3,1	m2	1	27,59
pared lateral	4,9		3,1	m2	2	30,38
salon 1						
techo	8	9		m2	1	72
pared lateral		9	2,45	m2	2	44,1
pared frontal	8		2,45	m2	2	39,2
oficina adulto mayor						
techo	5,45	7		m2	1	38,15
paredes laterales	5,45		2,8	m2	2	30,52
paredes frontales		7	2,8	m2	2	39,2
oficina familias en accion						
techo	4,75	5,45		m2	1	25,89
pared frontal	4,75		2,8	m2	2	26,6
pared lateral	5,45		2,8	m2	2	30,52
zona baños						
techo	4,66	5,45		m2	1	25,397
segundo piso						
oficina lado derecho						
techo	8	7,3		m2	1	58,4
pared lateral	8		2,45	m2	2	39,2
pared frontal		7,3	2,45	m2	2	35,77
oficina lado izquierdo						
techo	5,75	8,8		m2	1	50,6
pared lateral	5,75		2,45	m2	2	28,18
pared frontal		8,8	2,45	m2	2	43,12
pared exterior	3	9,5		m3	1	28
TOTAL						**1015,00**

OBSERVACIONES	
CONTRATISTA	**SUPERVISION**
FIRMA: 	FIRMA:
NEIVER MARMOLEJO MORENO	
REPRESENTANTE LEGAL	SUPERVISOR MUNICIPIO
