	ALCALDÍA DE TUNJA	FECHA: 06/03/2015
	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	VERSIÓN: 02
	PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL	CÓDIGO: GDO-F002
	FORMATO: ACTA DE COMITÉ	

ACTA Nº	LUGAR	FECHA	HORA DE INICIO	HORA FINAL
192	Campamento de Obra	28/11/2023	8:30 a.m	10:50 a.m

RESPONSABLE: ING ROBLIN SILVA ESPITIA

OBJETIVO

SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA Nº 1641 DE FECHA 07 DE OCTUBRE DE 2019 CUYO OBJETO ES "ADECUACIÓN, REMODELACIÓN Y CONSTRUCCIÓN PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO "MEJORAMIENTO DE LOS ESPACIOS PÚBLICOS URBANOS DEL CENTRO HISTÓRICO Y SU ZONA DE INFLUENCIA DEL MUNICIPIO DE TUNJA, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ" CONFORME LO ESTABLECIDO EN EL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 2131 DE 2019 SUSCRITO ENTRE EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ Y EL MUNICIPIO DE TUNJA Y LO SEÑALADO EN LA RESOLUCIÓN No. 1710 DE 15 DE JUNIO DE 2017 EMITIDA POR EL MINISTERIO DE CULTURA".

ORDEN DEL DÍA

En el campamento de obra se reunen contratista de obra, supervisión, interventoria, delegados de Veolia y demás integrantes que firman el presente comité con el fin de tratar temas relacionados al contrato de obra 1641 de 2019.

-Actualización del diseño pluvial carrera 10 entre calles 24 y 25.
Se da inicio al presente comité donde se presenta la actualización al diseño de la red pluvial en la carrera 10 entre calles 24 y 25, donde se encontro una tuberia de asbesto y una tuberia en polietileno propiedad de Veolia, lo cual impide la instalación de tuberia

Powered by CamScanner

CONTENIDO ACTA DE COMITÉ No. 192

para la red de alcantarillado pluvial ya que esta se intercepta con el alineamiento con las redes encontradas. Veolia sugiere que se profundice el pozo de inspección en la calle 24 1,2m más con respecto al diseño inicial el cual estaba proyectado a 1,50m, lo cual implica mayores cantidades de excavación y relleno. Por lo anterior, se toma la decisión de trasladar el alineamiento hacia el eje de la vía manteniendo las profundidades del diseño inicial, realizando transiciones con pozos de inspección donde sea necesario.

Se realiza visita al sitio de obra en la carrera 10 entre calles 24 y 25 en conjunto con delegados de Veolia para verificar el alineamiento a seguir con la red de alcantarillado pluvial. En definitiva, se define el alineamiento de la red de alcantarillado pluvial entre la red de polietileno y la red de asbesto, según el diseño suministrado por Veolia manteniendo las profundidades iniciales.

Powered by CamScanner


- Recuperación de la carpeta asfáltica en la carrera 10 entre calles 24 y 25. Se evidencia da necesidad de realizar la recuperación de la carpeta asfáltica retirada por las actividades de la construcción del alcantarillado pluvial, esto según las incertidumbres presentadas en este tramo de vía, donde se realizará el balance de mayores y menores cantidades según la necesidad.

- Situación de agresión a personal profesional del consorcio SAGA Chavez el pasado Sabado 26 de noviembre de 2022.

El pasado Sabado 26 de noviembre de noviembre de 2022, el contratista de obra por medio del grupo de Whatsapp del proyecto Plan Bicentenario Fase II, informa con evidencia audiovisual la agresión por parte de un comerciante del sector de la carrera 10 entre calles 24 y 25, donde agrede a un profesional del contratista de obra de manera física y verbal. Por lo anterior, el contratista de obra solicita de manera apremiante el acompañamiento o apoyo policivo en los frentes de obra en ejecución con el fin de evitar cualquier posible conflicto o agresión al personal del contratista de obra, teniendo en cuenta que esta situación se ha presentado anteriormente donde han solicitado apoyo de la policía a la interventoría

Powered by CamScanner

y supervisión, quienes han remitido esta solicitud sin respuesta favorable.

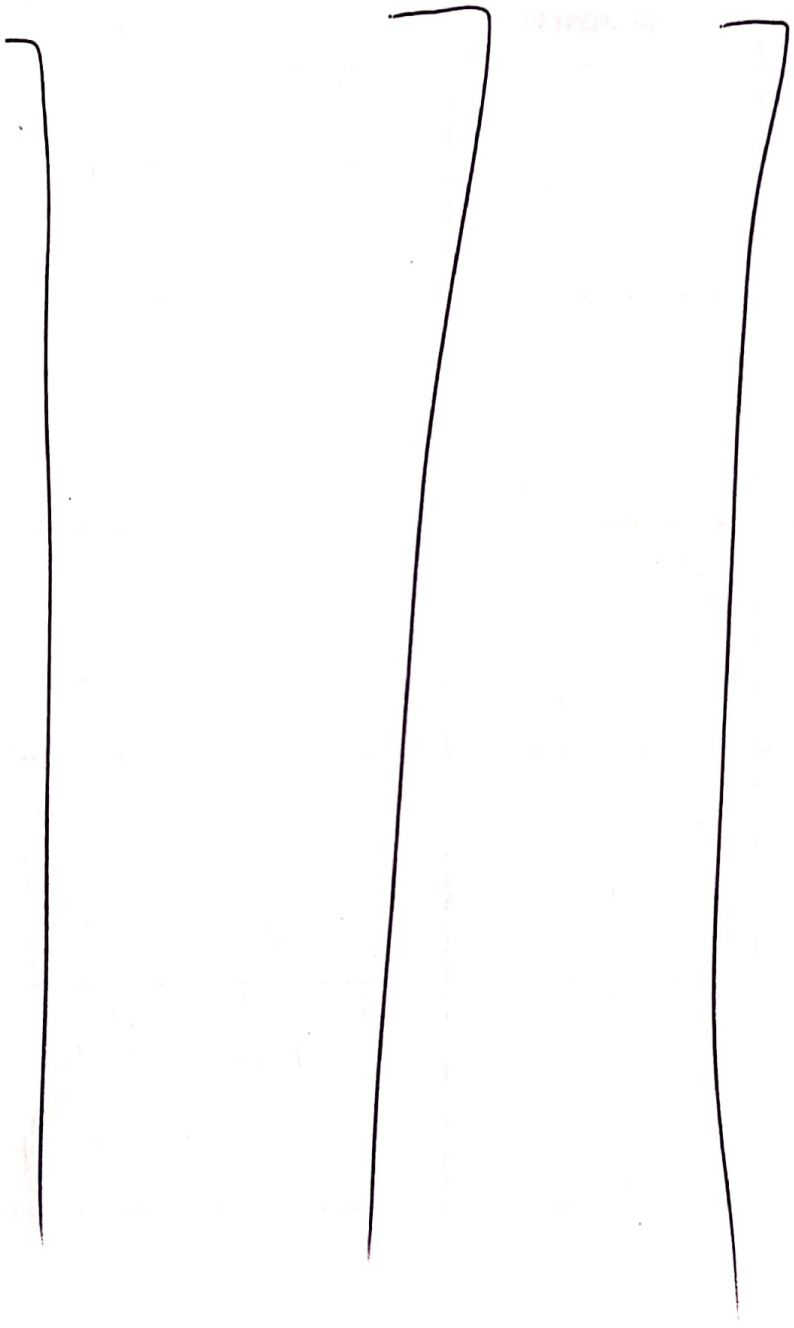

Powered by CamScanner

FIRMA DE APROBACIÓN DEL ACTA DE COMITÉ Nº 192

NOMBRE COMPLETO	CARGO	FIRMA
Javier Almeida Rey	Jefe Obras Vedia Cel: 3214704874	
Eric Andres Garcia.	Consorcio SAGA Chavez Cel: 3114490795	
Tito J. Gonzalez	SAGA CHAVEZ. Cel: 3219224284	
Harold Gil Castillo	OAP. Supervisión Cel: 3165376319	
[illegible]	OAP. Ingeniero Cel: 3176580971	
Elisa Lopez	Saga - Chavez Cel: 3123718784	
Nelson Gutierrez Lozano	Consorcio Saga - Chavez Cel: 3192755081	

Powered by CamScanner

FIRMA DE APROBACIÓN DEL ACTA DE COMITÉ No. 192

NOMBRE COMPLETO	CARGO	FIRMA
Luis Aldana Lara	Profesional Apoyo Interventoría Cel: 3202465356	
	Cel:	
	Cel:	
	Cel:	
	Cel:	
	Cel:	
	Cel:	

Powered by CamScanner
