Juan de Jesús Guerrero Gómez
Servicios especializados de Arquitectura y Restauración

Diciembre 2 de 2022

Señores
ALCALDIA DE TUNJA
Ing. Pedro Alejandro Rodríguez Ávila
Secretario de Infraestructura (E)
Supervisor
Ciudad –

Ref. Solicitud de suspensión
Contrato de obra 1318 de 2022

Respetado Ingeniero, cordial saludo

En la actualidad se viene ejecutando el contrato de obra 1318 de 2022 cuyo objeto es "SCT-59 REALIZAR LA RESTAURACIÓN AL BIEN DE INTERÉS CULTURAL DEL ÁMBITO NACIONAL "OBELISCO A LOS MÁRTIRES", LOCALIZADO EN EL PARQUE DE SAN LAUREANO, EN EL CENTRO HISTÓRICO DE LA CIUDAD DE TUNJA BIEN DE INTERÉS CULTURAL", como es de su conocimiento, este es un bien de interés cultural que se encuentra emplazado en el centro del parque de San Laureano de la cuidad de Tunja.

Con fecha de inicio del 10 de octubre de 2022 se dio inicio al desarrollo de las actividades contractuales, para la cual, dadas las características formales y dimensiones del obelisco, se requirió de la instalación de dos estructuras de andamio multidireccional metálico con altura de 12 m que permitiera desarrollar cada uno de los procesos técnicos, garantizando la seguridad del personal y ajustados a la normatividad vigentes para trabajos en altura.

Como es de su conocimiento la temporada de lluvias que se ha presentado en el territorio nacional es una situación que no resulta ajena a la ciudad de Tunja, donde, durante los meses de octubre, noviembre y diciembre se ha presentado un alto régimen de lluvias asociado a otras condiciones climáticas como tormentas eléctricas, durante en un alto porcentaje de los días, lo cual, dado que las actividades son desarrolladas a la intemperie, en un espacio que por otra parte se encuentra rodeada de árboles, constituyen una circunstancia que ha obligado a suspender reiteradamente la ejecución de los procesos de restauración, como medida para controlar y evitar el riesgo a la integridad física del personal, máxime cuando los procesos que se realizan, en especial en la escultura metálica del cóndor deben ser desarrolladas con herramientas eléctricas lo que constituye un factor de altísimo riesgo que obliga a evitar el los trabajadores se expongan a cualquier situación de peligro.

Recib: Fernando Nieto
06/12/2022.
11:22 Am.

Arquitecto - Restaurador de bienes muebles
Magister en restauración de monumentos arquitectónicos
Dirección: Carrera 6 No. 11 – 73 Oficina 301
Email: jdejguerrerog@gmail.com *Teléfonos: 2438799 - 3138451987*

Powered by CamScanner

Si bien a la fecha se encuentra ejecutado un gran porcentaje de las actividades contractuales de restauración del obelisco, la reiterada suspensión de estas ha impedido que se realicen los procesos dirigidos al reforzamiento de la cimentación, proceso que requiere realizar una excavación la cual no es no es posible de ser ejecutada por la necesaria presencia de las estructuras de andamio.

Por lo anterior de la manera más atenta me permito solicitar la suspensión del contrato de la referencia en término de un (1) mes calendario a partir del día 7 de diciembre de 2022.

A continuación, se presenta el reporte de lluvias que se hace en obra de manera diaria para los meses de octubre y noviembre de 2022

REPORTE DE LLUVIAS
Octubre de 2022

Dia	Fecha	Hora inicio	Hora fin	Dia	Fecha	Hora inicio	Hora fin
SABADO	1	NO APLICA		LUNES	17	DIA FESTIVO	
DOMINGO	2			MARTES	18		
LUNES	3			MIERCOLES	19	2:25 p. m.	3:50 p. m.
MARTES	4			JUEVES	20	1:15 p. m.	3:05 p. m.
MIERCOLES	5			VIERNES	21		
JUEVES	6			SABADO	22		
VIERNES	7			DOMINGO	23	DIA FESTIVO	
SABADO	8			LUNES	24	10:10 a. m.	11:15 a. m.
DOMINGO	9			MARTES	25		
LUNES	10	INICIO CONTRATO		MIERCOLES	26		
MARTES	11			JUEVES	27	3:30 p. m.	4:30 p. m.
MIERCOLES	12	2:15 p. m.	2:50 p. m.	VIERNES	28	11:15 a. m.	3:30 p. m.
JUEVES	13	4:10 p. m.	5:15 p. m.	SABADO	29		
VIERNES	14			DOMINGO	30	DIA FESTIVO	
SABADO	15	9:30 a. m.	10:05 a. m.	LUNES	31	3:30 p. m.	4:40 p. m.
DOMINGO	16	DIA FESTIVO					


REPORTE DE LLUVIAS
Noviembre de 2022


Dia	Fecha	Hora inicio	Hora fin	Dia	Fecha	Hora inicio	Hora fin
MARTES	1			MIERCOLES	16		
MIERCOLES	2			JUEVES	17		
JUEVES	3			VIERNES	18		
VIERNES	4	1:00 p. m.	2:00 p. m.	SABADO	19		
SABADO	5	7:00 a. m.	9:25 a. m.	DOMINGO	20	DIA FESTIVO	
DOMINGO	6	DIA FESTIVO		LUNES	21		
LUNES	7	DIA FESTIVO		MARTES	22		
MARTES	8	3:41 p. m.	4:30 p. m.	MIERCOLES	23	1:08 p. m.	2:15 p. m.
MIERCOLES	9	11:50 a. m.	6:00 p. m.	JUEVES	24		
JUEVES	10	12:30 p. m.	1:30 p. m.	VIERNES	25	4:00 p. m.	4:45 p. m.
VIERNES	11	2:40 p. m.	5:25 p. m.	SABADO	26		
SABADO	12			DOMINGO	27	DIA FESTIVO	
DOMINGO	13	DIA FESTIVO		LUNES	28	3:00 p. m.	6:00 p. m.
LUNES	14	DIA FESTIVO		MARTES	29		
MARTES	15			MIERCOLES	30		

Arquitecto - Restaurador de bienes muebles
Magister en restauración de monumentos arquitectónicos
Dirección: Carrera 6 No. 11 – 73 Oficina 301
Email: jdejguerrerog@gmail.com *Teléfonos: 2438799 - 3138451987*

Powered by CamScanner

La anterior información puede ser corroborada través del archivo meteorológico disponible en la pagina https://www.meteoblue.com/es/tiempo/historyclimate/weatherarchive/tunja_colombia_3666608?fcstlength=-15&year=2022&month=10, de las que se obtiene la siguiente información del régimen de lluvias para los meses de octubre y noviembre de 2022.

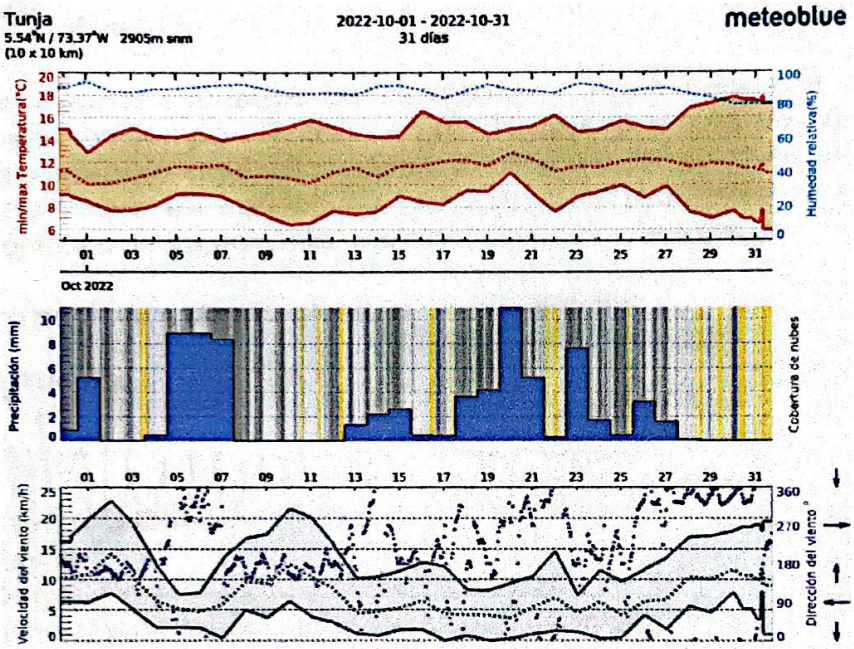

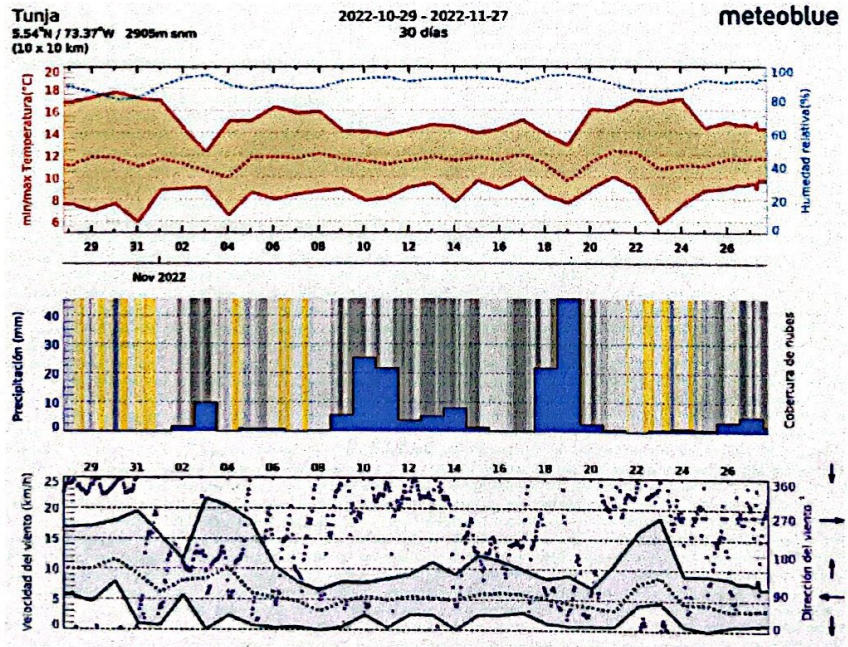

Arquitecto - Restaurador de bienes muebles
Magister en restauración de monumentos arquitectónicos
Dirección: Carrera 6 No. 11 – 73 Oficina 301
Email: jdejguerrerog@gmail.com ***Teléfonos: 2438799 - 3138451987 - 3153355598***

Powered by CamScanner

Los diagramas del archivo meteorológico se dividen en tres gráficos:

- Temperatura, incluyendo la humedad relativa en intervalos de una hora
- Nubes (fondo gris) y cielo claro (fondo amarillo). Cuanto más oscuro es el fondo gris, es más densa la cubierta de nubes
- Velocidad y dirección del viento (en grados desde 0° = Norte, 90° = Este, 180° = Sur y 270° = Oeste). En el meteograma del archivo histórico, los puntos morados representan la dirección del viento, como se muestra en el eje derecho.

Por las razones expuestas anteriormente se hace necesario el trámite de la suspensión en tiempo solicitada en un (1) me calendario. Se aclara a la entidad que la suspensión aquí solicitada no implica modificación alguna en el valor del contrato y que en calidad de contratistas se realizaran las actualizaciones y ampliaciones de las garantías contractuales establecidas.

Sin otro particular, quedo atento a sus comentarios

Cordialmente,

Juan de Jesús Guerrero Gómez
Contratista
Arquitecto - Restaurador de bienes muebles
Magister en restauración de monumentos arquitectónicos

Arquitecto - Restaurador de bienes muebles
Magister en restauración de monumentos arquitectónicos
Dirección: Carrera 6 No. 11 – 73 Oficina 301
Email: jdejguerrerog@gmail.com ***Teléfonos: 2438799 - 3138451987***

Powered by CamScanner
