CENTRAL DE ALARMAS Y BATERÍAS S.A.S. - ZESE

Arauca, 27 de diciembre de 2022

Señores
SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE – SENA
Arauca.

Referencia: Informe ejecución contrato No. CO1.PCCNTR.4325428

Comedidamente me dirijo a ustedes con el fin de poner en conocimiento el siguiente informe de ejecución presupuestal del contrato en mención, como soporte anexo de la factura a radicar para pago, así:


CONTRATO:	No. CO1.PCCNTR.4325428
OBJETO:	Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo, el cual incluye materiales, insumos, repuestos nuevos y originales, alistamiento y trámite para la revisión tecno mecánica para los vehículos del parque automotor del Centro de Gestión y Desarrollo Agroindustrial de Arauca, Sena Regional Arauca.
CONTRATISTA:	CENTRAL DE ALARMAS Y BATERIAS S.A.S.
SUPERVISOR:	Fredy Mauricio A. Torres Cáceres Instructor F.P.I. Grado 8. Sena-Regional Arauca ftorresc@sena.edu.co Tel: 321 428 3263 Carrera 20 # 28-163 Barrio Libertadores, Arauca, Arauca
VALOR DEL CONTRATO:	$ 43.997.143,00.
PLAZO:	El plazo de ejecución del contrato será de quince (15) días, a partir de la fecha correspondiente al acta de inicio y sin exceder el 15 de diciembre de 2022 o hasta agotar presupuesto, lo que ocurra primero, previo el cumplimiento de los requisitos de legalización de conformidad con la Ley.

CENTRAL DE ALARMAS Y BATERÍAS S.A.S. - ZESE

REGISTRO FOTOGRAFICO





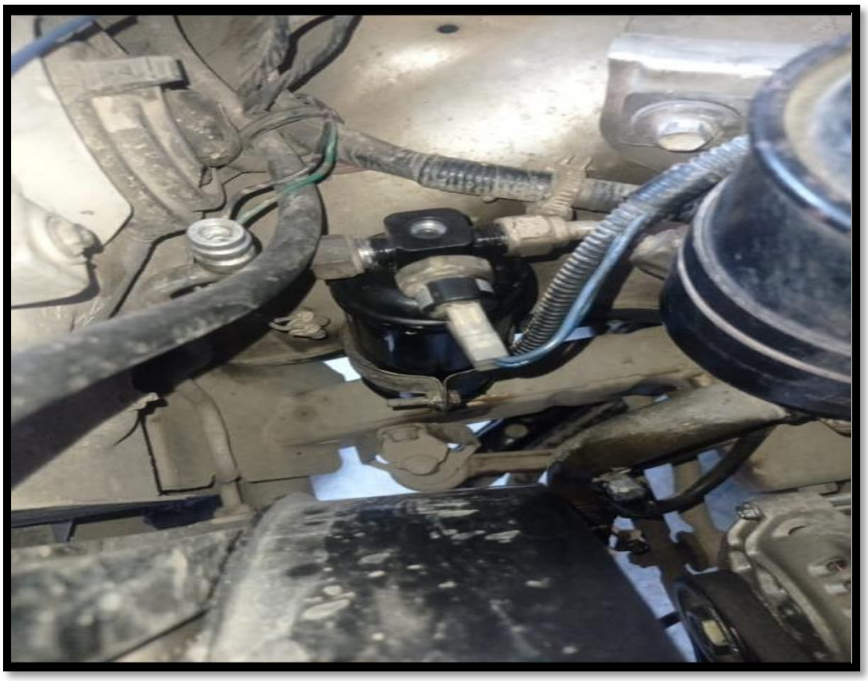

Dirección Carrera 16 # 19 60
Email: centraldealarmaybateria@gmail.com
Arauca - Arauca

CENTRAL DE ALARMAS Y BATERÍAS S.A.S. - ZESE

ACTIVIDADES DESARROLLADAS

- El día 19/12/2022 ingresó el vehículo marca Chevrolet línea Vitara modelo 2007 de placa OBG625, a las instalaciones de central de alarmas: al vehículo se le realizan la respectiva orden de trabajo para suministro y Cambio de plumillas de limpia parabrisas, cambio y suministro de bujías, balanceo de las 4 llantas, Alineación de tren delantero, suministro y cambio de amortiguadores delanteros y traseros, cambio de bujes de tijeras, suministro e instalación de sensor maf y mantenimiento al sistema de aire acondicionado incluyendo prueba de fugas y cambio de gas, por último se le suministró el kit de carretera que establece el artículo 30 del código de nacional de tránsito

- El día 19/12/2022 ingresó el vehículo marca Volkswagen línea amarok andina modelo 2015 de placa OJX747 a las instalaciones de central de alarmas y baterías: al vehículo se le realiza la respectiva orden de trabajo para Cambio del sistema de inyección incluyendo desmonte y montaje de inyectores. cambio de bomba de alta presión de combustible, codificación de inyectores y limpieza a toda la tubería de inyección incluyendo limpieza de tanque, balanceo a las 4 llantas, Alineación de tren delantero, cambio y suministros de amortiguadores delanteros y traseros, cambio y suministro de bujes de tijera, cambio y suministro de gomas de suspensión, cambio y suministro de guardapolvos de eje, pulida de farolas delanteras, ajuste de cabina y plantón, cambio y suministro de plumillas de limpiaparabrisas, suministro y cambio de filtro de aceite de motor filtro de aire de motor, filtro de aire acondicionado, filtro de combustible, suministro y cambio de aceite de motor que incluía la referencia 15w40, corrección de falla de sistema de ABS, donde el problema era el cableado más no el sensor trasero como se había acordado en la orden de trabajo, mantenimiento de aire acondicionado donde se le hizo el cambio de gas y prueba de fugas y prueba de enfriamiento, por último se le suministró el kit de carretera que establece el artículo 30 del código nacional de Tránsito y se le hizo la aprobación de la tecno mecánica.

Dirección Carrera 16 # 19 60
Email: centraldealarmaybateria@gmail.com
Arauca - Arauca

- El día 23/12/2022 ingresó el vehículo marca Volkswagen línea amarok andina modelo 2016 de placa OJY088 a las instalaciones de central de alarmas y batería: al vehículo se le realiza la respectiva orden de trabajo. Balanceo a las 4 llantas, Alineación de tren delantero, suministro y cambio de amortiguadores traseros, suministro y cambio de guardapolvos de eje, suministro y cambio de bujes de tijera, pulida de farolas, mantenimiento de aire acondicionado donde se le hizo cambio de gas pero no se le pudo hacer pruebas de enfriamiento porque el vehículo presenta fallas mecánicas y no enciende por lo tal tampoco se le hizo la aprobación de la técnico mecánica por lo mismo, por último se le suministró el kit de carretera que establece el artículo 30 del código nacional de Tránsito.

- El día 23/12/2022 ingresó el vehículo marca JAC modelo 2022 placa JGU990 a las instalaciones de central de alarmas y baterías: al vehículo se le realiza la respectiva orden de trabajo para Suministro y cambio de plumilla limpia parabrisas del vidrio retrovisor.

- El día 20/12/2022 ingresó el vehículo marca Chevrolet modelo 2015 placa OJZ194 a las instalaciones de central de alarmas y baterías: al vehículo se le realiza las respectiva orden de trabajo para suministro y cambio de válvulina de la caja de cambios, suministro y cambio de valvulina de la transmisión trasera, suministro e instalaciones de todas las luces laterales, suministro e instalación de amortiguadores delanteros, Alineación de tren delantero, construcción e instalación de pie de amigo para puntas delanteras de carrocería, reparación de puerta del baño, reparación de fuga de líquido de frenos del cilindro delantero izquierdo, calibración y reparación de falla en el sistema de embrague, suministro e instalación de llantas con referencia 235/75R17,suministro de kit de carretera que establece el artículo 30 del código nacional de tránsito, suministro de multiplicador de fuerza con cuadrante 1” que incluya copa 33 y 32.

- El día 20/12/2022 ingresó el vehículo marca Chevrolet FRR PLACA OCK770 a las instalaciones de central de alarmas y baterías: al vehículo se le realiza la respectiva orden de trabajo a las siguientes. engrase general donde se engrasa columpios, bujes, pasadores, muelles, crucetas, balinera de centro, barras, terminales, splinderes, suministro e instalación de todas las luces laterales, rotación balanceo calibración de llantas y Alineación de tren delantero, manteamiento del motor de la plata eléctrica que incluye suministro y cambio de aceite de motor filtro de aire de motor filtro de aceite y filtro de combustible y cambio de refrigerante de motor,

suministro y cambio. De tapa de combustible y lavado general, mantenimiento preventivo de generador de planta eléctrica donde se le hizo limpieza y ajuste a todos los terminales eléctricos, aprobación de la tecno mecánica.

- El día 23/12/2022, se realiza visita desde Arauca hacia el municipio de arauquita en las instalaciones del el sena donde se realiza la respectiva orden de trabajo de engrase general para los 2 tractores y se le hizo el desmonte de un arranque para hacer el respectivo mantenimiento.

- El día 22/12/2022 ingresó. El vehículo marca Hyundai línea HD72 modelo 2009 placa OKL208 a las instalaciones de central de alarmas y baterías : al vehículo se le realiza la respectiva orden de trabajo a las siguientes : engrase general donde incluye columpios bujes pasadores muelles crucetas balconeras de cardan mecanismo de dirección barras terminales splinderes, reparada y puesta a punto de sistema de freno de ahogo, reparación de suich eleva vidrio de la puerta derecha, suministro y instalación de todas las luches laterales , rotación balanceo calibración de todas las llantas y Alineación de tren delantero, aprobación de la tecno mecánica.

- El día 21/12/2022 ingresó el vehículo marca Hyundai línea HD72 modelo 2009 de placa OBH177 a las instalaciones de central de alarmas y baterías: al vehículo se le realiza la respectiva orden de trabajo de engrase general donde incluye columpios bujes pasadores muelles crucetas balinera de cardan mecanismo de dirección terminales splinderes, mantenimiento de aire acondicionado que incluye cambio de gas y prueba de enfriamiento, suministro e instalación de todas las luces laterales, rotación balanceo calibración de todas las llantas y Alineación de tren delantero, aprobación de la tecno mecánica.

CENTRAL DE ALARMAS Y BATERÍAS S.A.S. - ZESE

EJECUCION CONTRATO:

VALOR DEL CONTRATO:	$ 43.997.143,00.
VR RADICACION FACTURA:	$ 43.616.190,00.
SALDO SIN EJECUTAR:	$ 380.952,00.

NOTA ACLARATORIA: del total de los ítems contratados no se ejecutó el siguiente:

41	Alistamiento, gestión, presentación y aprobación de certificado de Revisión Técnico-mecánica y de emisión de gases contaminantes. (15/12/2022)	1	$ 380.952

Debido a que el vehículo tipo camioneta marca: Volkswagen, Línea: Amarok Andina. Color Blanca. Modelo: 2016. Placa: OJY-088 presenta fallas de encendido, y que el diagnóstico y solución no está comprendido en el contrato, no fue posible realizar el traslado al CDA para ejecutar la RTM y emisiones contaminantes.

Además, conforme al valor de la factura correspondiente a la entrega final se presenta por un valor total de $43.616.191, existe una diferencia de $1 al valor a pagar de $43.616.190 por defecto con respecto a los valores ofertados en el SECOP II. Lo anterior debido a que el programa contable de la empresa CENTRAL DE ALARMAS Y BATERIAS S.A.S. no puede redondear los valores unitarios con IVA. Entonces el valor total a pagar es de: CUARENTA Y TRES MILLONES SEICIENTOS DIECISEIS MIL CIENTO NOVENTA PESOS moneda corriente ($**43.616.190** COP) incluyendo IVA.

Atentamente,



DAVID ALCIDES AGUILERA GARCÍA
Representante Legal
Nit. 901.475.730-5

Dirección Carrera 16 # 19 60
Email: centraldealarmaybateria@gmail.com
Arauca - Arauca
